SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA No. 1
CONVENIO/CONTRATO DE OBRA No. 002 DE 2022

SUPERVISOR/INTERVENTOR: MILTON CESAR TORRES HERNANDEZ

APOYO A LA SUPERVISIÒN: JAMES NORBERTO OSPINA CARDENAS

CONTRATISTA: WILSON YUBER BLANDON CORTES

OBJETO: **"OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SALENTO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO"**

1. DATOS GENERALES	
Modalidad de Contratación	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
No. Proceso	029 -2021
Tipo de Contrato	CONTRATO DE OBRA No. 002 de 2022
Secretaria que genera la necesidad y responsable de la elaboración del estudio previo.	SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA
Dependencia que genera el proceso	SECRETARIA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA DIRECCION DE AGUAS Y SANEAMIENTO BASICO
No. Del contrato	CONTRATO No.002 de 2022
Fecha de suscripción del contrato	01 /02/2022
Contratista	WILSON YUBER BLANDON CORTES
NIT / CC	C.C 7.552.271 DE ARMENIA
Valor Inicial del Contrato	$216.769.927
Forma de pago (ídem al contrato)	El Departamento del Quindío cancelará al contratista el valor total del contrato, a precios unitarios y sin formula de reajuste, mediante pagos parciales hasta llegar al cien por ciento (100%), así: a). Pagos parciales, correspondientes al Noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, mensualmente, de acuerdo con la cantidad ejecutada del objeto de la obra, los

Escaneado con CamScanner

	ítems de obra desarrollados, debidamente revisados y aprobados por la supervisión, (según el caso) y el presupuesto disponible. A cada una de las actas se le descontará las retenciones y deducciones de ley. b). Un último pago, correspondiente al diez por ciento (10%) restante del valor total y/o del balance final del contrato, que será cancelado al contratista previo a la entrega y recibido final a satisfacción de las actividades del objeto contratado. A este pago se le descontará las retenciones y deducciones de ley.
Plazo Inicial del contrato	TREINTA DIAS CALENDARIO
Fecha de inicio:	21 DE FEBRERO DE 2022
Fecha de terminación inicial	22 DE MARZO DE 2022
Fecha de suspensión:	NO APLICA
Fecha de reinicio:	NO APLICA
Fecha de terminación final:	MAYO 21 DE 2022
Modificación No. 1	PRORROGA POR TREINTA DIAS CALENDARIO
Modificatorio No. 2	PRORROGA POR TREINTA DIAS CALENDARIO
Supervisor por parte del Departamento	MILTON CESAR TORRES HERNANDEZ

2. DATOS FINANCIEROS	
No. y Valor del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	CDP No. 4 Valor :$ 227.477.820,00
No. y valor Registro Presupuestal	REGISTRO No. 1830 Valor 216.769.927 M/CTE
Modificatorio No.1 del 22 de Marzo de 2022)	PRORROGA DE TREINTA DIAS CALENDARIO
Modificatorio No.2 del 21 de Abril de 2022)	PRORROGA DE TREINTA DIAS CALENDARIO
Valor Total del Contrato	$216.769.927 M/CTE

Escaneado con CamScanner

	FORMATO	Código: F-INF-13
QUINDIO 1966	Informe de Supervisión y/o Interventoría de obra	Versión: 05 Fecha: 19/03/2019
		Página 3 de 10

3. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA:

A continuación se relaciona la cantidad más representativa del contrato ejecutada a la fecha del mes de Mayo de 2022 contando con una ejecución del 87% del contrato

4. REGISTRO FOTOGRAFICO *(si aplica)*












Escaneado con CamScanner

	FORMATO	Código: F-INF-13
	Informe de Supervisión y/o Interventoría de obra	Versión: **05** Fecha: 19/03/2019
		Página 4 de 10

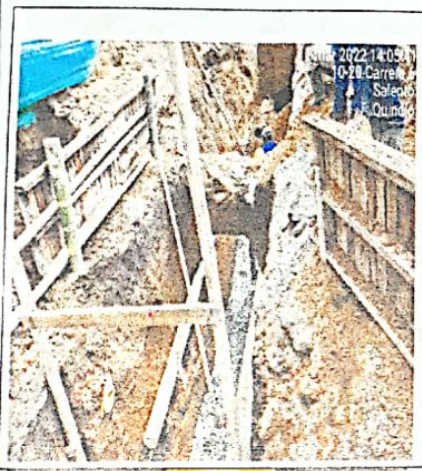

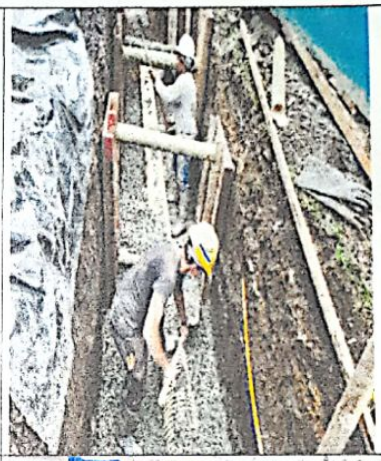

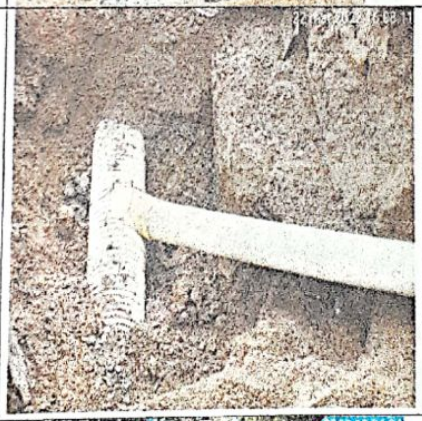

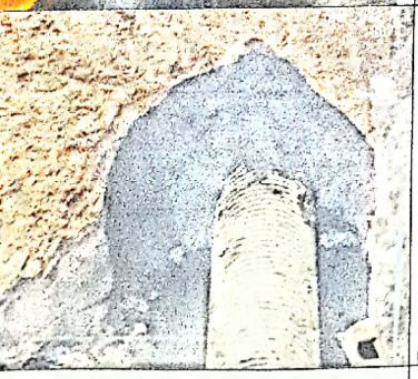




Escaneado con CamScanner

	FORMATO	Código: F-INF-13
	Informe de Supervisión y/o Interventoría de obra	Versión: **05** Fecha: 19/03/2019
		Página 5 de 10






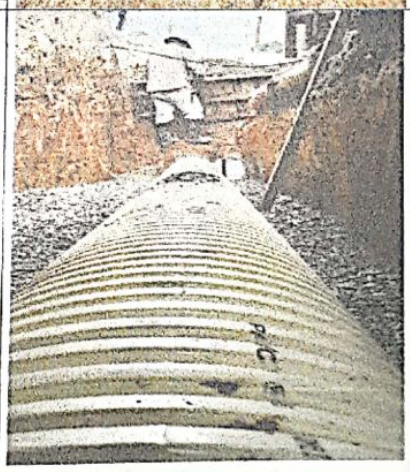


Escaneado con CamScanner

	FORMATO	Código: F-INF-13
	Informe de Supervisión y/o Interventoría de obra	Versión: 05 Fecha: 19/03/2019
		Página 6 de 10



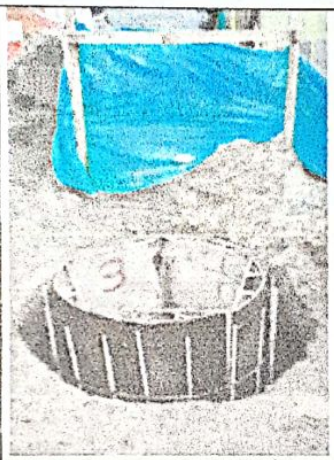









Escaneado con CamScanner

	FORMATO	Código: F-INF-13
	Informe de Supervisión y/o Interventoría de obra	Versión: 05 Fecha: 19/03/2019
		Página 7 de 10





5. ACTIVIDADES PRINCIPALES EJECUTADAS

1	PRELIMINARES		
ÍTEM	3. A32:D46	UNID	CANT
1,1	Localización y replanteo	ml	166,60
1,2	Señalización preventiva con tela pp	ml	357,00
1,3	Corte pavimento con máquina, hasta 7 cm	ml	40,78
1,4	Demolición de pisos y andenes de concreto e=7 a 12 cm	m2	1,11
1,5	Demolición de pavimento a mano hasta 25 cm de espesor	m2	36,20
1,6	Demolición de estructuras en concreto (cámaras, pozos, cajas de inspección, bases, cañuelas existentes)	m3	6,02
1,7	Manejo de aguas	ml	172,40
2	MOVIMIENTO DE TIERRA		
2,1	Excavación en material común a mano entre 0-2 m (No incluye cargue y retiro de sobrantes)	m3	655,46
2,2	Excavación en material común a mano entre 2-4 m (No incluye cargue y retiro de sobrantes)	m3	266,81
2,3	Excavación en material común a mano entre 4-6 m (No incluye cargue y retiro de sobrantes)	m3	7,40
2,4	Lleno compactado con material de sitio	m3	464,42
2,5	Lleno compactado incluye suministro de material de préstamo de cantera y/o río	m3	279,20
2,7	Encamado triturado 3/4" para soporte de tubería. E=0,15m a 1/2 tubo	m3	85,29
2,8	Entibado en madera	m2	410,08
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO		
3,1	Suministro e instalación tubería perfilada PVC de 12"	ml	119,00

Escaneado con CamScanner

	FORMATO	Código: F-INF-13
QUINDIO 1966	Informe de Supervisión y/o Interventoría de obra	Versión: 05 Fecha: 19/03/2019 Página 8 de 10

3,2	Suministro e instalación tubería perfilada PVC de 20"	ml	30,00
3,3	Suministro e instalación YEE 12" a 6"	und	19,00
3,4	Suministro e instalación YEE 20" a 6"	und	4,00
3,7	Suministro e instalación tubería perfilada PVC de 6"	ml	69,12

4	**OBRAS EN CONCRETO**		
4,1	Cámara + cuerpo + cono + peldaños D= 1,20 mts	ml	2,45
4,2	Placa tapa cámara en manhole polimérico. Losa 1,60 x 1,60	und	1
4,3	Base y cañuela	und	2
4,6	Empalme cámaras existentes	und	3,00
5	**PAVIMENTOS Y REPOSICIONES**		
5,2	Suministro, Figurado y amarre Acero de refuerzo 60000PSI 420Mpa	kg	98,08
5,4	Sub base granular compactada e=20	m3	35,10
6	**OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**		
6,1	Cargue y retiro de material sobrante hasta 25 km	m3	63,00
7	**ACTIVIDADES, INSTRUMENTOS, INSUMOS, MATERIALES Y COMPLEMENTARIOS PARA BIOSEGURIDAD CONTINGENCIA POR EMERGENCIA SANITARIA COVID -19 EJECUCION POR DOS MESES**		
7,1	Alquiler Lavamanos portátil (1 por cada 20 trabajadores)	und/mes	1,50
7,2	Alquiler de Baño portátil (1 por cada 20 trabajadores)	und/mes	1,50
7,3	Alquiler Fumigadora Manual - Capacidad del tanque: 20 litros	und/mes	1,50
7,4	Alcohol Antiséptico al 70% (0.006*50*24)	litro/mes	10,80
7,5	Gel Antibacterial (0.003*50*24)	litro/mes	5,40
7,6	Hipoclorito de Uso Doméstico (0.05*50*24)	litro/mes	3,00
7,7	Disposición final de Residuos Peligrosos (Numeral 3.6 Resolución 666 de 2020)	und/mes	3,00
7,8	Jabón Liquido Antibacterial (0.005*50*24)	litro/mes	9,00
7,9	Termómetro digital y/o infrarrojo para laboratorio	und/mes	0,60
7,10	Punto de hidratación (Dispensador de Agua Mesa)	und/mes	0,30
	ITEMS NO CONTEMPLADOS		
	BARRERA DE PROTECCION Y CONTROL DE EXCAVACION EN GUADUA PROVISIONAL	ML	97,70
	IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO MEDIANTE SEÑALIZACION (MALETINES,BARRERAS Y SEÑALES)	GLB	1,00
	SOBREACARREO MATERIAL DE EXCAVACION Y DEMOLICION	M3	279,93
	DEMOLICION Y RETIRO TUBERIA ALCANTARILLADO EXISTENTE	ML	160,40

Escaneado con CamScanner

	FORMATO	Código: F-INF-13
QUINDIO 1966	Informe de Supervisión y/o Interventoría de obra	Versión: **05** Fecha: 19/03/2019
		Página 9 de 10

6. BALANCE FINANCIERO:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO	SALDO
VALOR INICIAL	$216.769.927	0	$216.769.927
ADICION No.	0	0	$216.769.927
ACTA No. 1	0	$187.469.640,40	$29.300.286,60
TOTAL	$216.769.927	$187.469.640,40	$29.300.286,60

Valor a pagar presente acta: **Ciento Ochenta y Siete Millones Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Cuarenta Pesos con Cuarenta Centavos Mcte ($187.469.640,40); con un avance de obra del 86.48%**

7. APORTES SEGURIDAD SOCIAL.

De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el **(profesional a cargo)**, en su calidad de interventor y/o supervisor deja constancia que el contratista cumplió con las obligaciones frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social integral.

Nota: El contratista presentó CERTIFICADO del contador público Titulado **YALILA QUINTERO VILLA** con tarjeta profesional No. **61842 T** donde certifica que el **INGENIERO WILSON YUBER BLANDON CORTES**, identificado con número de cédula **7.552.271** de **ARMENIA QUINDIO**, se encuentra a PAZ Y SALVO con el sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, ICBF y con los aporte parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo. **(si aplica)**

VALOR PAGADO SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRATISTA:

Nombre(s)	Salud	Pensión	ARL	No. Planilla	Mes
WILSON YUBER BLANDON CORTES	387.500	496.000	215.800	**9433220307**	FEBRERO
WILSON YUBER BLANDON CORTES	387.500	496.000	215.800	9432278208	MARZO

Escaneado con CamScanner

INGRESO BASE DE COTIZACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO EN PROPUESTA:

Nombre(s) - cargo	Salud	Pensión	ARL	No. Planilla	Mes

Nota: No se solicitó personal mínimo requerido para este proceso contractual

MODO DE PAGO (Marcar con una X):

CHEQUE	
TRANSFERENCIA	X

En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se deberá diligenciar la siguiente información:

Nombre del banco	Tipo de cuenta	No. de cuenta	Titular de la cuenta
BANCO DE BOGOTA	AHORROS	781020573	WILSON YUBER BLANDON CORTES

Nota: para el pago de cuentas con recursos nacionales, la forma de pago no puede efectuarse mediante cheque.

Para constancia, se firma en el Municipio de Armenia Departamento del Quindío, a los CUATRO (04) días del mes de MAYO del año dos mil VEINTIDOS (2022).

MILTON CESAR TORRES HERNANDEZ
Director de Aguas y Saneamiento Básico
Secretaria de Aguas e Infraestructura
Departamento del Quindío
Supervisor / Interventor

JAMES NORBERTO OSPINA CARDENAS
Ingeniero Contratista PDA
Departamento del Quindío
Apoyo a la Supervisión

VoBo. Secretario Despacho

Elaboró:

REVISADO MAY 2022

Escaneado con CamScanner
