ING. WILSON BLANDON
CRECIENDO CON CALIDAD

INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA FINAL

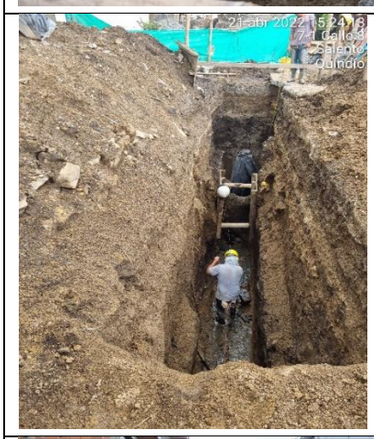
NOMBRE DEL CONTRATISTA: Wilson Yuber Blandón Cortes	**NIT/CÉDULA:** 7.552.271	**CORREO DEL CONTRATISTA:** ingyuber@hotmail.com
INTERVENTOR/SUPERVISOR: Gobernación del Quindío **REPRESENTANTE:** Milton Cesar Torres Hernandez	**NIT/CÉDULA:** 4.376.958	**CORREO DEL INTERVENTOR/SUPERVISOR** tecnicopda@gmail.com
CLASE DE CONTRATO, NÚMERO Y FECHA: Contrato de Obra No. 002-2022 21 Febrero 2022		**TELÉFONO DEL CONTRATISTA:** 3155333926
OBJETO DEL CONTRATO: “OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SALENTO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO”		
PERÍODO DEL INFORME: Feberero-Marzo-Abril		
SITIO DE EJECUCION: Calle 8 entre Calles 7, 8 y 8. Salento Quindío		

El presente informe tiene como función exponer las actividades realizadas durante el desarrollo del contrato 002 de 2022 para el corte del Acta No 1. Se informan las cantidades ejecutadas para la primera acta con su respectivo porcentaje de ejecución y el porcentaje restante para el Acta Final.


	1	PRELIMINARES				
FOTO	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANT**	**% DE EJECUCIÓN**	**% RESTANTE**
	1,1	Localización y replanteo	ml	166,60	100%	0%
	1,2	Señalización preventiva con tela pp	ml	357,00	100%	0%

	1,3	Corte pavimento con máquina, hasta 7 cm	ml	40,78	100%	0%
	1,4	Demolición de pisos y andenes de concreto e=7 a 12 cm	m2	1,11	100%	0%
	1,5	Demolición de pavimento a mano hasta 25 cm de espesor	m2	36,20	100%	0%
	1,6	Demolición de estructuras en concreto (cámaras, pozos, cajas de inspección, bases, cañuelas existentes)	m3	6,02	100%	0%
	1,7	Manejo de aguas	ml	172,40	100%	0%

Cra 14 No 27-20 Oficina 101 Balcones del Parque, Armenia Quindío Colombia
email: ingyuber@hotmail.com
Celular 315 533 39 26

	2	MOVIMIENTO DE TIERRA				
	2,1	Excavación en material común a mano entre 0-2 m (No incluye cargue y retiro de sobrantes)	m3	655,46	100%	0%
	2,2	Excavación en material común a mano entre 2-4 m (No incluye cargue y retiro de sobrantes)	m3	266,81	100%	0%
	2,3	Excavación en material común a mano entre 4-6 m (No incluye cargue y retiro de sobrantes)	m3	7,40	100%	0%
	2,4	Lleno compactado con material de sitio	m3	464,42	97%	3%
	2,5	Lleno compactado incluye suministro de material de préstamo de cantera y/o río	m3	279,20	100%	0%

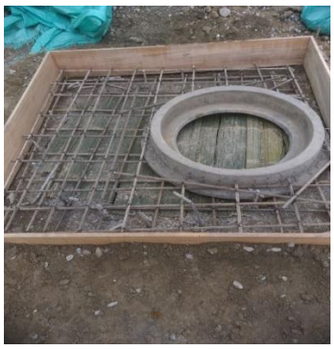
Cra 14 No 27-20 Oficina 101 Balcones del Parque, Armenia Quindío Colombia
email: ingyuber@hotmail.com
Celular 315 533 39 26

	2,7	Encamado triturado 3/4" para soporte de tubería. E=0,15m a 1/2 tubo	m3	85,29	95%	5%
	2,8	Entibado en madera	m2	410,08	100%	0%
	3	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO**				
	3,1	Suministro e instalación tubería perfilada PVC de 12"	ml	119,00	100%	0%
	3,2	Suministro e instalación tubería perfilada PVC de 20"	ml	30,00	72%	28%

Cra 14 No 27-20 Oficina 101 Balcones del Parque, Armenia Quindío Colombia
email: ingyuber@hotmail.com
Celular 315 533 39 26

	3,3	Suministro e instalación YEE 12" a 6"	und	19,00	100%	0%
	3,4	Suministro e instalación YEE 20" a 6"	und	4,00	100%	0%
	3,7	Suministro e instalación tubería perfilada PVC de 6"	ml	69,12	90%	10%
	4	**OBRAS EN CONCRETO**				
	4,1	Cámara + cuerpo + cono + peldaños D= 1,20 mts	ml	2,45	35%	65%

Cra 14 No 27-20 Oficina 101 Balcones del Parque, Armenia Quindío Colombia
email: ingyuber@hotmail.com
Celular 315 533 39 26

	4,2	Placa tapa cámara en manhole polimérico. Losa 1,60 x 1,60	und	1,00	50%	50%
	4,3	Base y cañuela	und	2,00	67%	33%
	4,6	Empalme cámaras existentes	und	3,00	75%	25%
	5	**PAVIMENTOS Y REPOSICIONES**				
	5,2	Suministro, Figurado y amarre Acero de refuerzo 60000PSI 420Mpa	kg	98,08	28%	72%
	5,4	Sub base granular compactada e=20	m3	35,10	85%	15%
	6	**OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**				

	6,1	Cargue y retiro de material sobrante hasta 25 km	m3	273,33	100%	0%
		ITEMS NO CONTEMPLADOS				
		BARRERA DE PROTECCION Y CONTROL DE EXCAVACION EN GUADUA PROVISIONAL	ML	97,70		
		IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO MEDIANTE SEÑALIZACION (MALETINES,BARRERAS Y SEÑALES)	GLB	1,00		
		SOBREACARREO MATERIAL DE EXCAVACION Y DEMOLICION	M3	279,93		
		DEMOLICION Y RETIRO DE TUBERIA ALCANTARILLADO EXISTENTE	ML	160,40		

WILSON YUBER BLANDON CORTES
CC. 7.552.271
315 5333926

Cra 14 No 27-20 Oficina 101 Balcones del Parque, Armenia Quindío Colombia
email: ingyuber@hotmail.com
Celular 315 533 39 26
