Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - PORTADA**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

OBJETO:CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN BANCA, en el DEL PUNTO CRÍTICO K2+000 GEORREFERENCIACIÓN 1° 28' 05.57" Norte 77° 05' 33.85" OESTE, CORRESPONDIENTE A LA VÍA DEPARTAMENTAL 25ANR01 DENOMINADA CRUCE TRAMO 2501A - SAN JOSÉ - SAN BERNARDO - LA CRUZ - SAN PABLO. LO ANTERIOR PARA ATENDER LA EMERGENCIA PRESENTADA COMO CONSECUENCIA DE LA II TEMPORADA DE LLUVIAS CON INCIDENCIA DEL FENÓMENO DE LA NIÑA.

CONTRATO No.: 1632-22

INFORME DE SUPERVISION No.: 2

PERIODO: 01 DE MARZO A 31 DE MARZO DE 2022

San Juan de Pasto, marzo 2022

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig. 23/05/2016

FECHA DE PRESETACION:	18/04/2022	CON CORTE :	28/03/2022

1. ASPECTOS ADMISTRATIVOS

PROCESO LICITATORIO:			
CONVENIO MACRO No:	N/A		
CONTRATO No.:	GN1632 de 28 de enero de 2022		
CDP No.:	2022010144	FECHA:	17/01/2022
REGISTRO No:	2022011926	FECHA:	28/01/2022
OBJETO DEL CONTRATO:	OBJETO:CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN BANCA, en el DEL PUNTO CRÍTICO K2+000 GEORREFERENCIACIÓN 1° 28' 05.57" Norte 77° 05' 33.85" OESTE, CORRESPONDIENTE A LA VÍA DEPARTAMENTAL 25ANR01 DENOMINADA CRUCE TRAMO 2501A - SAN JOSÉ - SAN BERNARDO - LA CRUZ - SAN PABLO. LO ANTERIOR PARA ATENDER LA EMERGENCIA PRESENTADA COMO CONSECUENCIA DE LA II TEMPORADA DE LLUVIAS CON INCIDENCIA DEL FENÓMENO DE LA NIÑA.		
MODIFICACION No.:			
CONTRATISTA DE OBRA:	JAIRO GUILLERMO NARVAEZ BRAVO C.C. 98.384.058 de Pasto (N).		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	JOSE LUIS NATES DULCECC 12.749.315		
SUPERVISOR	ING NILZA MARIA PANTOJA AGREDA		
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION	Ing. SONIA Y. LASSO MEDINA		
META FISICA	1 PUNTO CRITICO ATENDIDO		
VALOR DEL CONTRATO:	$ 1.564.849.791,00		
VALOR CONTRATO ADICIONAL1	$ -		
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 1.564.849.791,00		
FECHA DE INICIACION:	31/01/2022		
PLAZO DEL CONTRATO:	4 MESES		
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	30/05/2022		
SUSPENSION	N/A		
REINICIO	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACION	N/A		
PORCENTEJE ANTICIPO	40%		
TOTAL ANTICIPO	$ 625.939.916,40		
VALOR PAGADO ACTAS + ANTIC.	$ 625.939.916,40		
GARANTIAS:	SEGUROS DEL ESTADO SA		
Póliza No.:	41-44-101252829 Y 41-40-101043901		
% AVANCE FISICO EN OBRA	% PROGRAMADO 2,85%	% EJECUTADO:	1,77% INFORME SEMANAL 08
% AVANCE FINANCIERO	% PROGRAMADO 29,11%	% EJECUTADO	0%

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - AVANCE DEL CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

2. DESCRIPCION AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

ASPECTOS TECNICOS : El contrato se inicia el 31 de enero de 2022, luego de declarar la urgencia manifiesta, cumpliendo los criterios para estos casos. Para el inicio de la obra se entrega tanto al contratista como a la interventoría, los diseños establecidos para ejecutar en este punto crítico. Se realizaron observaciones por parte de la Interventoría y el contratista de obras, respecto a algunos temas principalmente de Geotecnia y Estructurales.

El consultor de los estudios hizo las revisiones del caso y entregó información con algunos ajustes y los profesionales de la consultoría dan respuesta a las observaciones finales y manifiestan que los estudios y diseños entregados se encuentran dentro de la normatividad vigente para este tipo de estructuras, por tanto mantiene los diseños, expresan entre otros la responsabilidad que tienen frente a los estudios entregados los cuales tiene cartas y memoriales de responsabilidad y que observan que realizarán el acompañamiento durante la ejecución de la obra ante cualquier solicitud requerida.

En el mes de marzo de 2022, se aprueban las hojas de vida del personal del contratista por parte de la Interventoría. Se informa el 9 de marzo de 2022 por parte de la interventoría que se presentaron deslizamientos en el talud superior del punto crítico, debido a la fuerte temporada invernal en el sector y a las excavaciones recientes que se realizaron en dicho talud por parte del Municipio de Albán. Los propietarios de predios en el sector que se encontraban en riesgo y en trámite de evacuación por parte del Municipio, no han desalojado por lo cual se solicitó al Municipio se agilice el tema, para lo cual envió oficios a propietarios solicitando se cumpla la orden de evacuación.

Se inicia a realizar la excavación para la zarpa del muro superior y se observa que son afectadas por el deslizamiento del talud superior que es progresivo, igualmente se tiene retraso en la construcción del aliviadero que se inició a construir. No se ha iniciado con el sondeo para qeu se realice un chequeo para el muro sobre pilotes .

La Interventoría contratada para el seguimiento y control mediante contrato GN1431-22, suscrito con el Ing. José Luis Nates, ha presentado el informe mensual No 2, el cual se solcito ajustar, el cual detalla los temas técnicos del contrato en el mes de marzo de 2022.

ASPECTOS FINANCIEROS : A la fecha de corte del presente informe se ha entregado al contratista el pago del anticipo del 40 %, estipulado en el contrato. No se han presentado actas parciales

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS : Se firma acta de inicio el 31 de enero de 2022, el contrato se encuentra en ejecución

ASPECTOS LEGALES: Las pólizas se encuentran vigentes.

3.OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Proyecto: Ing. Sonia Y Lasso Medina
Profesional Universitario - SIMD
Apoyo a la Supervisión - Gobernacion de Nariño

Revisó: Ing. Mario Trujillo Ceron
Sub- Secretario de Infraestructira y Vias - SIMD
Gobernacion de Nariño

Revisó: Ing. Nilza Maria Pantoja Agreda
Secretaria de Infraestructira y Minas - SIMD
Gobernacion de Nariño

Firmado digitalmente por NILZA MARIA PANTOJA AGREDA
Ubicación: SIM2912

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

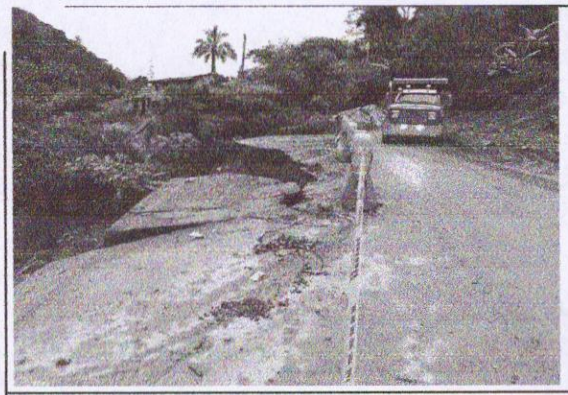


Foto1: Perdida de banca en progreso

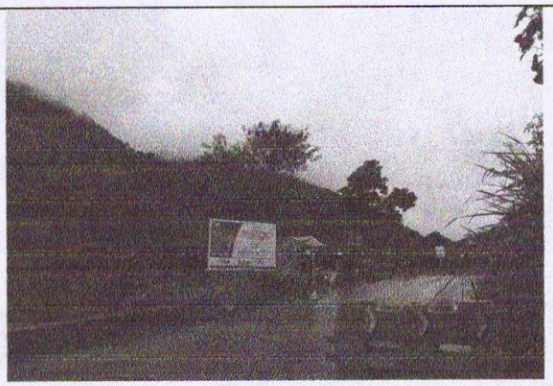


Foto2: Señalización en obra, para protección de usuarios de la vía y valla informativa

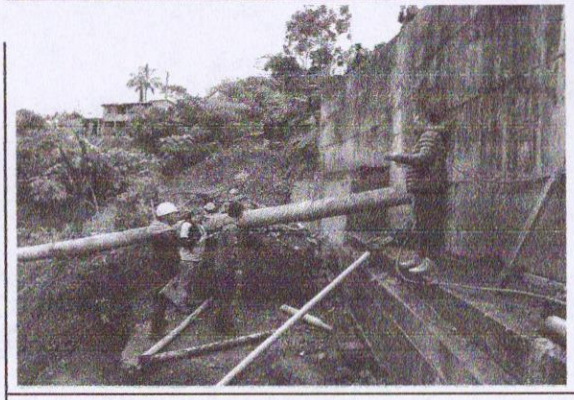


Foto 3: Visita con consultores del siito critico 2 marzo 2022

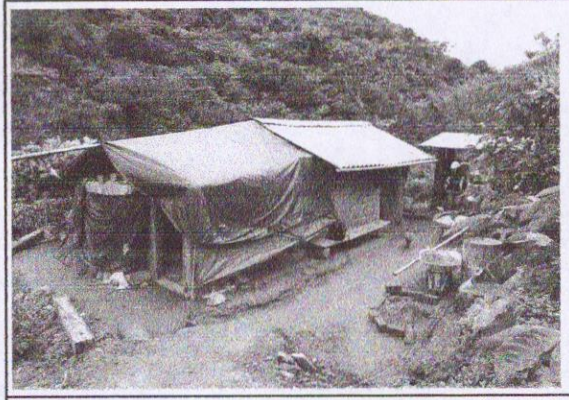


Foto4: Campamento del contratista



Foto 5: Talud superior con delizamientos

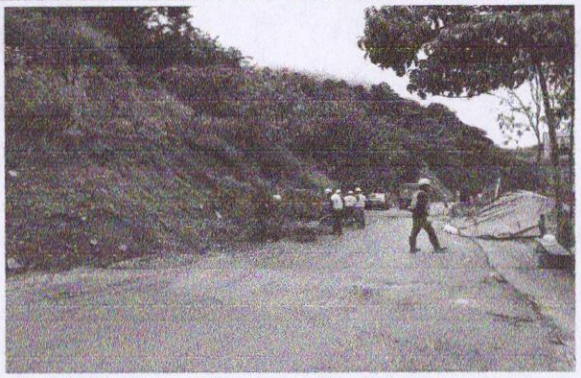


Foto 6: Trabajos de limpieza de la zona

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - SEGUIMIENTO FINANCIERO**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

5. INFORME FINANCIERO

CONTRATO No.:	**GN1632-2022**	$ 1.564.849.791,00

ACTAS	FECHA	VR. TOTAL	ACUMULADO	AMORT. ANTICIPO	VR. NETO	VR EGRESO	TOTAL DESC	ORDEN DE GIRO	FECHA PAGO
ANTICIPO	15/03/2022	$ 625.939.916,40	**$ 625.939.916,40**		$ 625.939.916,40		$ 625.939.916,40		
ACTA 1					$ 0,00		$ 0,00		
ACTA 2					$ 0,00		$ 0,00		
ACTA 3					$ 0,00		$ 0,00		
ACTA 4					$ 0,00		$ 0,00		
TOTAL		**$ 625.939.916,40**	**$ 625.939.916,40**	**$ 0,00**	**$ 625.939.916,40**	$ 0,00	**$ 625.939.916,40**		

AVANCE FISICO	1,77%
AVANCE FINANCIERO	40%

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS **FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL POLIZAS**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

6. CONTROL POLIZAS

$ 1.564.849.791,00

CONTRATO No GN1632-22

GARANTIAS:	Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO.A.
Póliza No.:	41-44-101252829 Y 41-40-101043901

ANEXO 0			FECHA APROBACION	28/01/2022	FECHA EXPEDICION
DETALLE	**VALOR**	**%**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**OBSERVACIONES**
Cumplimiento	$ 312.969.958,20	20%	28-ene-22	28-nov-22	Condicioens originales
Estabilidad de la obra	$ 469.454.937,30	30%	28-may-22	28-may-27	Condicioens originales
Salarios y prestaciones	$ 312.969.958,20	20%	28-ene-22	28-may-25	Condicioens originales
Buen manejo de Anticipado	$ 625.939.916,40	40%	02-may-19	02-nov-22	Condicioens originales
Responsabilidad extracont	$ 300.000.000,00	19%	28-ene-22	28-may-22	Condicioens originales

ANEXO 1			FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION
DETALLE	**VALOR**	**%**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**OBSERVACIONES**
Cumplimiento	$ 312.969.958,20	20%	31-ene-22	01-dic-22	Acta inicio
Estabilidad de la obra	$ 469.454.937,30	30%	31-ene-22	31-may-27	Acta inicio
Salarios y prestaciones	$ 312.969.958,20	20%	31-ene-22	31-ene-25	Acta inicio
Buen manejo de Anticipado	$ 625.939.916,40	40%	31-ene-22	01-dic-22	Acta inicio
Responsabilidad extracont	$ 300.000.000,00	19%	31-ene-22	31-may-22	Acta inicio
