Municipio El Carmen de Viboral	**INFORME DE SUPERVISIÓN**	
	CÓDIGO: F-CT-039 Versión: 03 Fecha: 02-01-2020	

FECHA ELABORACIÓN	**01 DE JUNIO**
TIPO DE CONTRATO	**Urgencia manifiesta.**

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	120-CPS 204-2022
OBJETO	URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA GENERADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL
CONTRATISTA	CONCIVELSA Y CIA S.A.S.
FECHA DEL CONTRATO	06 de mayo de 2022, por Secop II
PLAZO DE EJECUCIÓN	TREINTA (30) DÍAS
VALOR INICIAL	$ 249.970.015
FECHA INICIO	6/05/2022
FECHA TERMINACIÓN	6/06/2022
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 249.970.015

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	30
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	25
AVANCE PORCENTUAL	83,33%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 249.970.015
VALOR EJECUTADO	$ 100.950.207,00
PORCENTAJE EJECUTADO	40,38%

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Secretaría de Infraestructura



2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

Teniendo en cuenta que el contratista suministró la documentación requerida para el respectivo pago del contrato por urgencia manifiesta No. 120-CPS 204-2022, por parte de la Secretaría de Infraestructura se realiza la respectiva revisión y por lo tanto se procede a autorizar el primer pago, con el fin de dar continuidad a las actividades que se han venido realizando por parte del contratista, correspondientes al objeto contractual. En el certificado de pago, se relacionan los documentos

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

La supervisión se encuentra realizando constante seguimiento al contrato de urgencia manifiesta que cumplan con la documentacion adecuada, pago de sus prestaciones sociales.

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

NO APLICA

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

De acuerdo al Artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, en la contratación directa la exigencia de garantías establecidas del Decreto no es obligatoria.

POLIZAS VIGENTES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	No PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato (vigencia del contrato)	Seguros del Estado S.A	65-44-101212104	6/05/2022	6/06/2022	$ 24.997.001,50
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (vigencia del contrato y 3 años mas)	Seguros del Estado S.A	65-44-101212104	6/05/2022	6/06/2022	$ 12.498.500,75
Predios labores y operaciones (vigencia del contrato)	Seguros del Estado S.A	65-40-101065233	6/05/2022	6/06/2022	$ 200.000.000,00
Contratista y subcontratista (vigencia del contrato 10%)	Seguros del Estado S.A	65-40-101065233	6/05/2022	6/06/2022	$ 60.000.000,00
Vehículos propios y no propios	Seguros del Estado S.A	65-40-101065233	6/05/2022	6/06/2022	$ 60.000.000,00
Responsabilidad civil patronal	Seguros del Estado S.A	65-40-101065233	6/05/2022	6/06/2022	$ 60.000.000,00
Responsabilidad civil cruzada	Seguros del Estado S.A	65-40-101065233	6/05/2022	6/06/2022	$ 60.000.000,00
Gastos médicos	Seguros del Estado S.A	65-40-101065233	6/05/2022	6/06/2022	$ 60.000.000,00

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Para la autorización del segundo pago, se verificó la entrega por parte del contratista de la seguridad social y el certificado de cumplimiento de obligaciones correspondientes.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Anexos a Continuación

Jobanny José Copete Alvarez
Supervisor del contrato

Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	27/04/2022	Samaria	6°05'00"	- 75°20'28"	52
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	27/04/2022	Samaria	6°05'03"	- 75°20'33"	32
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	27/04/2022	Samaria	6°05'03.2"	- 75°20'33.7"	16
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	27/04/2022	Samaria	6°05'03.8"	- 75°20'34"	48

Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	27/04/2022	Samaria	6°05'00"	- 75°20'28"	52









Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	27/04/2022	Samaria	6°05'03"	- 75°20'33"	32







Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	27/04/2022	Samaria	6°05'03.2"	- 75°20'33.7"	16





Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	27/04/2022	Samaria	6°05'03.8"	- 75°20'34"	48







Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	28/04/2022	Samaria	6°05'04.1"	- 75°20'34.1"	26





Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	28/04/2022	Samaria	6°05'04"	- 75°20'34"	14





Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	28/04/2022	Samaria	6°05'06"	- 75°20'36"	40







Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	28/04/2022	Samaria	6°05'08"	- 75°20'50"	12







Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	29/04/2022	Samaria	6°05'16"	- 75°21'03"	48
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	29/04/2022	Samaria	6°05'08"	- 75°21'05"	18
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	29/04/2022	Samaria	6°05'04"	- 75°21'09.5"	16
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	29/04/2022	Samaria	6°05'04"	- 75°21'11.3"	24
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	29/04/2022	camino Viejo	6°05'39.5"	- 75°19'01.3"	32

Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	29/04/2022	Samaria	6°05'16"	- 75°21'03"	48







Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	29/04/2022	Samaria	6°05'08"	- 75°21'05"	18







Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	29/04/2022	Samaria	6°05'04"	- 75°21'09.5"	16









Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	29/04/2022	Samaria	6°05'04"	- 75°21'11.3"	24










Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	29/04/2022	camino Viejo	6°05'39.5"	- 75°19'01.3"	32



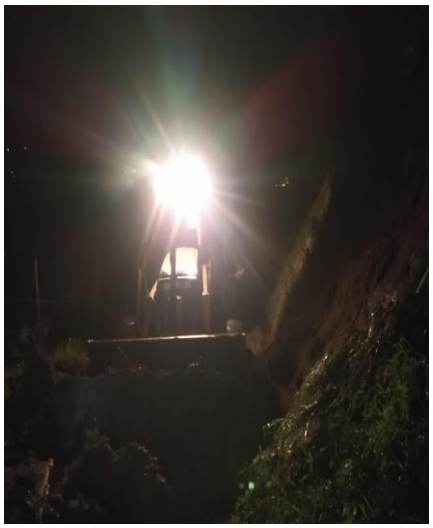

Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Remoción mecánica de material en sitio.	30/04/2022	camino Viejo	6°05'39.5"	- 75°19'01.3"	65
Suministro, colocación, conformación y compactación de base granular . Incluye transporte.	30/04/2022	Filo de hambre	6°05'31.5"	- 75°18'39.9"	8
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	30/04/2022	Alto grande	6°06'09.3"	- 75°19'26.1"	16
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	30/04/2022	Alto grande	6°06'04"	- 75°19'58.2"	50

Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Remoción mecánica de material en sitio.	30/04/2022	camino Viejo	6°05'39.5"	- 75°19'01.3"	65









Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Suministro, colocación, conformación y compactación de base granular . Incluye transporte.	30/04/2022	Filo de hambre	6°05'31.5"	- 75°18'39.9"	8





Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	30/04/2022	Alto grande	6°06'09.3"	- 75°19'26.1"	16




Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	2/05/2022	Samaria	6°05'12.8"	- 75°21'36.5"	26
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	2/05/2022	Samaria-Quirama	6°05'13.7"	- 75°21'39"	3
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	2/05/2022	La aurora	6°05'16"	- 75°19'20"	26
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	2/05/2022	La aurora	6°05'20"	- 75°19'17"	40
Remoción manual de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	5-2022 al 06-05-2	Barrio Villas de la Paz (Placa deportiva)	6°05'32"	- 75°20'24.8"	15,8

Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	2/05/2022	Samaria	6°05'12.8"	- 75°21'36.5"	26





Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	2/05/2022	Samaria-Quirama	6°05'13.7"	- 75°21'39"	3





Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	2/05/2022	La aurora	6°05'16"	- 75°19'20"	26



Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	2/05/2022	La aurora	6°05'20"	- 75°19'17"	40





Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	3/05/2022	Samaria-Quirama	6°05'10.8"	- 75°21'44.2"	24
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	3/05/2022	Canada - el carmen	6°04'51"	- 75°20'50"	32
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	3/05/2022	La aurora	6°05'21"	- 75°19'16"	24
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	3/05/2022	La aurora	6°05'22"	- 75°19'03"	12
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	3/05/2022	La aurora	6°05'24"	- 75°18'58"	8
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	3/05/2022	la aurora	6°05'04"	- 75°18'35.6"	88
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	3/05/2022	Quintas	6°04'25.7"	- 75°20'08.9"	10

Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	3/05/2022	Samaria-Quirama	6°05'10.8"	- 75°21'44.2"	24







Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	3/05/2022	Canada - el carmen	6°04'51"	- 75°20'50"	32








Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	3/05/2022	La aurora	6°05'21"	- 75°19'16"	24



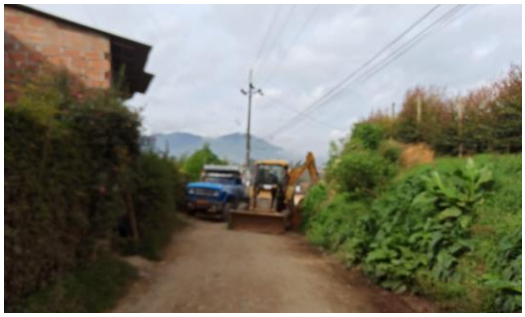

Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	3/05/2022	La aurora	6°05'22"	- 75°19'03"	12



Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	3/05/2022	la aurora	6°05'04"	- 75°18'35.6"	88







Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	3/05/2022	Quintas	6°04'25.7"	- 75°20'08.9"	10







Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	4/05/2022	las brisas	6°04'57"	- 75°19'51"	29
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	4/05/2022	las brisas	6°05'00"	- 75°19'52.4"	46
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	4/05/2022	las brisas	6°04'58"	- 75°19'51"	38
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	4/05/2022	El quemado	6°05'01"	- 75°19'03"	36
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	4/05/2022	Canada - el carmen	6°04'51"	- 75°20'36"	43
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	4/05/2022		6°06'30.8"	- 75°17'54.1"	35
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	4/05/2022	Rivera	6°06'30.8"	- 75°17'54.1"	14
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	4/05/2022		6°06'55.1"	- 75°22'29.2"	20

Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	4/05/2022	las brisas	6°04'57"	- 75°19'51"	29





Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	4/05/2022	las brisas	6°05'00"	- 75°19'52.4"	46







Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	4/05/2022	las brisas	6°04'58"	- 75°19'51"	38





Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	4/05/2022	El quemado	6°05'01"	- 75°19'03"	36



Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	4/05/2022	Canada - el carmen	6°04'51"	- 75°20'36"	43



Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	4/05/2022		6°06'30.8"	- 75°17'54.1"	35













Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	4/05/2022	Rivera	6°06'30.8"	- 75°17'54.1"	14









Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	4/05/2022		6°06'55.1"	- 75°22'29.2"	20



Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	5/05/2022	Samaria-Quirama	6°05'31"	- 75°21'25"	45
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	5/05/2022	El quemado	6°05'31"	- 75°21'25"	30
Suministro, colocación, conformación y compactación de base granular . Incluye transporte.	5/05/2022	Camargo	6°04'39"	- 75°20'18"	8

Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	5/05/2022	Samaria-Quirama	6°05'31"	- 75°21'25"	45









Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	5/05/2022	El quemado	6°05'31"	- 75°21'25"	30







Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Suministro, colocación, conformación y compactación de base granular . Incluye transporte.	5/05/2022	Camargo	6°04'39"	- 75°20'18"	8











Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Suministro, colocación, conformación y compactación de base granular . Incluye transporte.	6/05/2022	camino Viejo	6°05'39.5"	- 75°19'01.3"	8
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	6/05/2022	Camargo	6°06'55.1"	- 75°22'29.2"	29

Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Suministro, colocación, conformación y compactación de base granular . Incluye transporte.	6/05/2022	camino Viejo	6°05'39.5"	- 75°19'01.3"	8







Actividad	Fecha	Lugar	Latitud	Longitud	Metros cubicos
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría	6/05/2022	Camargo	6°06'55.1"	- 75°22'29.2"	29
