FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL								INFORME SEMANAL			
Código: FO-JEM-JEING-288			**Versión:** 0		**Fecha de Emisión:** 2014-08-21					**Pág.** 1 de 1	
FECHA			**DÍA**	**3**	**MES**	**JULIO**			**AÑO**	**2018**	

SEMANA N°	1	**DEL**	25 DE JUNIO DE 2018	**AL**	30 DE JUNIO DE 2018
FECHA INICIO :	**05 DE JUNIO DE 2018**		**FECHA TERMINACIÓN :**		**05 DE NOV DE 2018**

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA					
OBJETO DEL CONTRATO	**"GRUPO I: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN COMEDOR DE TROPA - BATALLON DE INSTRUCCIÓN, ENTRENEMIENTO Y REENTRENAMIENTO No. 3"**				
INTERVENTOR	**SAMUEL NARCISO RAMÍREZ DE LA HOZ**	**NIT O C.C.**	**7.573.021 - 9**	**CONTRATO N°**	**289 DE 2018**
CONTRATISTA	**ECO HABITAT SAS**	**NIT O C.C.**	**830.091.013-6**	**CONTRATO N°**	**273 DE 2018**

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCIÓN SEMANAL POR CAPÍTULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
PRELIMINARES	8,55%	9,03%		
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	0,00%	0,00%		
MAMPOSTERIA	2,04%	1,97%		
INSTALACIONES ELECTRICAS Y RED DE INFRAESTRUCTURA	0,00%	0,00%		
PAÑETES - RESANES	0,73%	0,73%		
CUBIERTAS	0,51%	0,62%		
CIELO RASOS	0,00%	0,00%		
PISOS - ACABADOS	0,00%	0,00%		
ENCHAPES Y ACCESORIOS	0,00%	0,00%		
CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO	0,00%	0,00%		
CERRAJERIA	0,00%	0,00%		
PINTURA	0,00%	0,00%		
ASEO GENERAL	0,00%	0,00%		
	0,00%			
TOTAL SEMANAS ANTERIORES	**24,17%**	**22,88%**		
TOTAL PRESENTE SEMANA	**11,84%**	**12,35%**		
TOTALES	**36,01%**	**35,23%**		

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSIÓN	SEMANA	ACUMULADO
	$215.579.687,47	$75.948.723,90	**$139.630.963,57**		12,35%	35,23%

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ARQUITECTOS	1	INSPECTOR	1
INGENIEROS		OBREROS	1
TOPÓGRAFO		AYUDANTES	4

PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO


V.ESTADO DEL TIEMPO

	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)				SI ☐ NO ☐

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL							
				INFORME SEMANAL			
Código: FO-JEM-JEING-288		**Versión:** 0		**Fecha de Emisión:** 2014-08-21		**Pág.** 1 de 1	
FECHA		**DÍA**	**3**	**MES**	**JULIO**	**AÑO**	**2018**

SEMANA N°	1	**DEL**	25 DE JUNIO DE 2018	**AL**	30 DE JUNIO DE 2018

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCIÓN Vs PROGRAMADO)

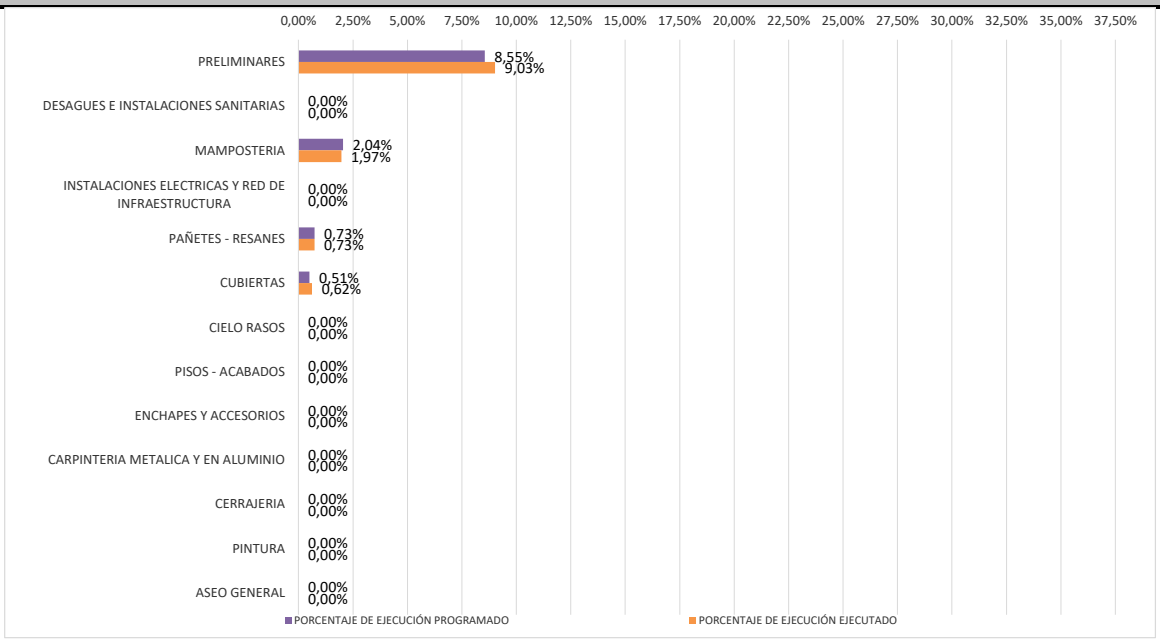

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

El Contratista realiza el inicio de las actividades, interviniedo la zona noreste del comedor donde se realiza el desmontaje de la tubería electrica, ventiladores y tejas de cubierta, se realiza mantenimiento de perfileria metalica de cubierta y adecuación de espacio para bodega.

FIRMA DEL DIRECTOR INTERVENTOR O DEL RESIDENTE INTERVENTOR
