| FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>EJÉRCITO NACIONAL | INFORME SEMANAL |
|---|---|

| **Código:** FO-JEM-JEING-288 | **Versión:** 0 | **Fecha de Emisión:** 2014-08-21 | **Pág.** 1 de 1 |
|---|---|---|---|

| FECHA | DÍA | 16 | MES | JULIO | AÑO | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| SEMANA N° | 1 | DEL | 9 DE JULIO DE 2018 | AL | 14 DE JULIO DE 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA INICIO : | 05 DE JUNIO DE 2018 | | FECHA TERMINACIÓN : | | 05 DE NOV DE 2018 |

## I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | "GRUPO I: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN COMEDOR DE TROPA - BATALLON DE INSTRUCCIÓN, ENTRENEMIENTO Y REENTRENAMIENTO No. 3" | | | | |
| INTERVENTOR | SAMUEL NARCISO RAMÍREZ DE LA HOZ | NIT O C.C. | 7.573.021 - 9 | CONTRATO N° | 289 DE 2018 |
| CONTRATISTA | ECO HABITAT SAS | NIT O C.C. | 830.091.013-6 | CONTRATO N° | 273 DE 2018 |

## II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

### CONTROL DE PROGRAMACIÓN

| EJECUCIÓN SEMANAL POR CAPÍTULOS | | | ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO | |
|---|---|---|---|---|
| CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PROGRAMADO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EJECUTADO | ACTIVIDADES | MOTIVOS |
| PRELIMINARES | 0,94% | 0,53% | | |
| DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS | 0,45% | 0,00% | | |
| MAMPOSTERIA | 0,00% | 0,00% | | |
| INSTALACIONES ELECTRICAS Y RED DE INFRAESTRUCTURA | 0,00% | 0,00% | | |
| PAÑETES - RESANES | 0,00% | 0,00% | | |
| CUBIERTAS | 0,00% | 0,00% | | |
| CIELO RASOS | 0,00% | 0,00% | | |
| PISOS - ACABADOS | 4,17% | 3,07% | | |
| ENCHAPES Y ACCESORIOS | 0,00% | 0,00% | | |
| CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO | 0,00% | 0,00% | | |
| CERRAJERIA | 0,00% | 0,00% | | |
| PINTURA | 8,43% | 7,25% | | |
| ASEO GENERAL | 0,00% | 0,00% | | |
| | 0,00% | | | |
| TOTAL SEMANAS ANTERIORES | 50,00% | 47,11% | | |
| TOTAL PRESENTE SEMANA | 13,98% | 10,85% | | |
| TOTALES | 63,98% | 57,96% | | |

## III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

| BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U. | VR.TOTAL CONTRATO | VR. TOTAL EJECUTADO | VR. POR EJECUTAR | AVANCE DE INVERSIÓN | SEMANA | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $215.579.687,47 | $124.949.986,86 | $90.629.700,61 | | 10,85% | 57,96% |

## IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

| PERSONAL | CANTIDAD | PERSONAL | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| ARQUITECTOS | 1 | INSPECTOR | 1 |
| INGENIEROS | | OBREROS | 2 |
| TOPÓGRAFO | | AYUDANTES | 6 |

PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO


## V.ESTADO DEL TIEMPO

| | FECHA | MAÑANA | TARDE | LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS |
|---|---|---|---|---|
| PERIODO DE LLUVIAS (HORAS) | | | | SI ☐ NO ☐ |
| | | | | |
| | | | | |

| FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA<br>EJÉRCITO NACIONAL | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **INFORME SEMANAL** | | | |
| **Código:** FO-JEM-JEING-288 | | **Versión:** 0 | | **Fecha de Emisión:** 2014-08-21 | | **Pág.** 1 de 1 | |
| **FECHA** | | **DÍA** | **16** | **MES** | **JULIO** | **AÑO** | **2018** |

| **SEMANA N°** | 1 | **DEL** | 9 DE JULIO DE 2018 | **AL** | 14 DE JULIO DE 2018 |
|---|---|---|---|---|---|

## VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCIÓN Vs PROGRAMADO)

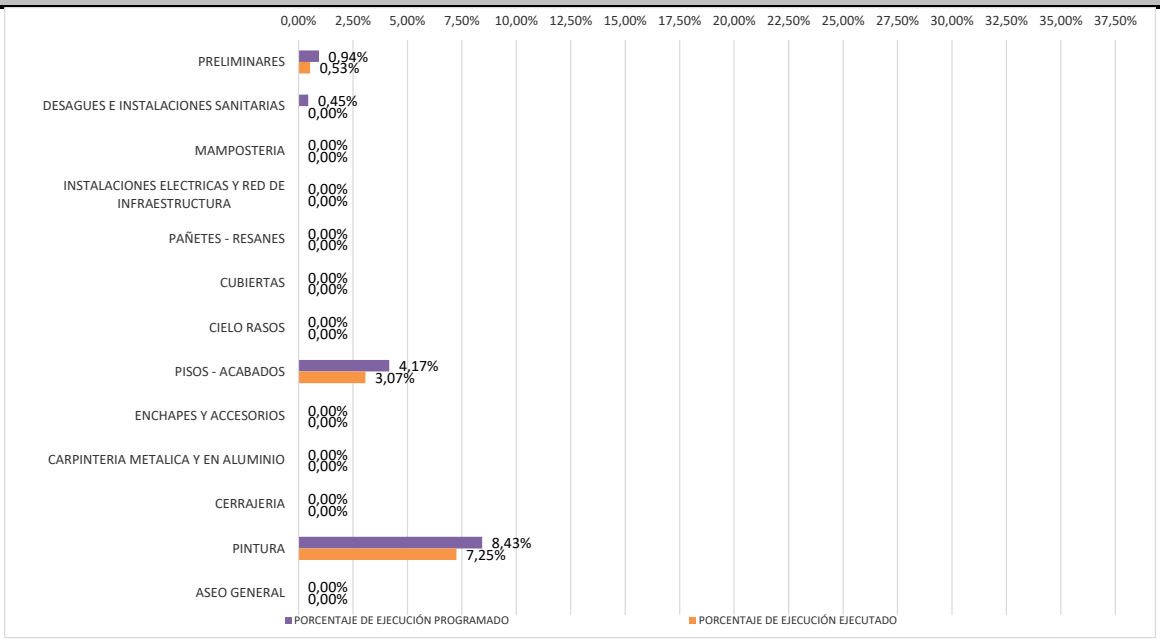


## VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

El Contratista realiza el inicio de las actividades, interviniedo la zona noreste del comedor donde se realiza el desmontaje de la tubería electrica, ventiladores y tejas de cubierta, se realiza mantenimiento de perfileria metalica de cubierta y adecuación de espacio para bodega.

FIRMA DEL DIRECTOR INTERVENTOR O DEL RESIDENTE INTERVENTOR
