FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL								INFORME SEMANAL			
Código: FO-JEM-JEING-288			**Versión:** 0		**Fecha de Emisión:** 2014-08-21				**Pág.** 1 de 1		
FECHA			**DÍA**	**30**	**MES**	**JULIO**			**AÑO**	**2018**	
SEMANA N°	7	**DEL**	23 DE JULIO DE 2018				**AL**	28 DE JULIO DE 2018			
FECHA INICIO :	**05 DE JUNIO DE 2018**			**FECHA TERMINACIÓN :**				**05 DE NOV DE 2018**			
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA											
OBJETO DEL CONTRATO	**"GRUPO I: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN COMEDOR DE TROPA - BATALLON DE INSTRUCCIÓN, ENTRENEMIENTO Y REENTRENAMIENTO No. 3"**										
INTERVENTOR	**SAMUEL NARCISO RAMÍREZ DE LA HOZ**				**NIT O C.C.**	**7.573.021 - 9**		**CONTRATO N°**		**289 DE 2018**	
CONTRATISTA	**ECO HABITAT SAS**				**NIT O C.C.**	**830.091.013-6**		**CONTRATO N°**		**273 DE 2018**	

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCIÓN SEMANAL POR CAPÍTULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
PRELIMINARES	0,00%	2,30%		
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	0,00%	0,75%		
MAMPOSTERIA	0,00%	0,00%		
INSTALACIONES ELECTRICAS Y RED DE INFRAESTRUCTURA	0,00%	0,00%		
PAÑETES - RESANES	0,00%	0,00%		
CUBIERTAS	0,00%	0,00%		
CIELO RASOS	0,00%	0,00%		
PISOS - ACABADOS	0,37%	0,00%	SUMINISTRO E INSTALCION DE PISO DE COCINA	FALTA DEFINIR
ENCHAPES Y ACCESORIOS	0,00%	0,00%		
CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO	7,93%	0,00%	MARCOS,VENTANERIA, DIVISIONES DE VIDRIO TEMPLADO Y ALUMINIO	FALTA DE SUMINISTRO
CERRAJERIA	0,17%	0,00%	CERRAJERIA	FALTA DE SUMINISTRO
PINTURA	6,56%	0,00%		
ASEO GENERAL	0,00%	0,00%		
ACTIVIDADES ADICIONALES	0,00%	1,56%		
TOTAL SEMANAS ANTERIORES	**76,58%**	**62,45%**		
TOTAL PRESENTE SEMANA	**15,03%**	**3,05%**		
TOTALES	**91,61%**	**65,50%**		

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSIÓN	SEMANA	ACUMULADO
	$215.579.687,47	$141.204.695,29	**$74.374.992,18**		3,05%	65,50%

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ARQUITECTOS	1	INSPECTOR	1
INGENIEROS		OBREROS	2
TOPÓGRAFO		AYUDANTES	6
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO			


V.ESTADO DEL TIEMPO

	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)				
				SI ☐ NO ☐

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL							INFORME SEMANAL
Código: FO-JEM-JEING-288		**Versión:** 0		**Fecha de Emisión:** 2014-08-21			**Pág.** 1 de 1
FECHA		**DÍA**	**30**	**MES**	**JULIO**	**AÑO**	**2018**

SEMANA N°	7	**DEL**	23 DE JULIO DE 2018	**AL**	28 DE JULIO DE 2018

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCIÓN Vs PROGRAMADO)

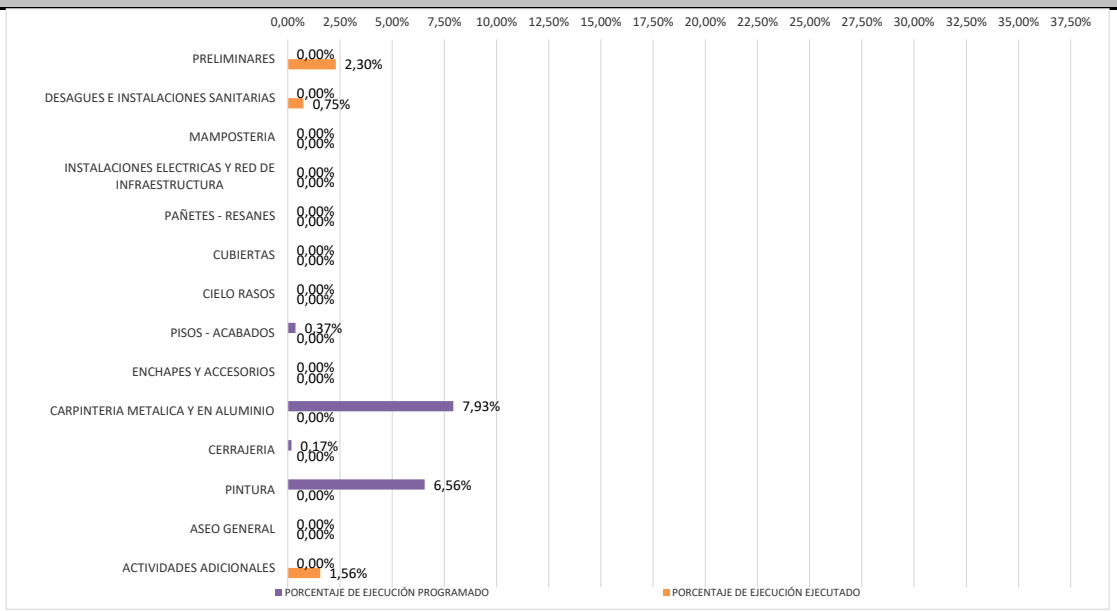

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se presenta ejecucion de actividades diferente a la prevista debido a cambios en los items establecidos.

Se realizan actividades adicionales no previstas.

Ausencia de residente o encargado de obra por parte del contratista.

Es solicitado por parte del contratista la definicion del tipo de piso para cocina, contemplando las opciones de piso en Poliuretano como estaba establecido y la opcion de Gres Industrial.

Se solicita el estudio para el cambio en varios items como lo son: 1). Cambio de piso en poliuretano por gres industrial. 2). Cambio de cielo raso en PVC por cielo raso en otro material, debido a la no resistencia del PVC al calor. 3) cambio en las instalaciones electricas segun el estudio del electricista.

FIRMA DEL DIRECTOR INTERVENTOR O DEL RESIDENTE INTERVENTOR
