FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	INFORME SEMANAL

Código: FO-JEM-JEING-288	**Versión:** 0	**Fecha de Emisión:** 2014-08-21	**Pág.** 1 de 1

FECHA	DÍA	6	MES	AGOSTO	AÑO	2018

SEMANA N°	8	DEL	30 DE JULIO DE 2018	AL	4 DE AGOSTO DE 2018
FECHA INICIO :	05 DE JUNIO DE 2018		FECHA TERMINACIÓN :		05 DE NOV DE 2018

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	"GRUPO I: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN COMEDOR DE TROPA - BATALLON DE INSTRUCCIÓN, ENTRENEMIENTO Y REENTRENAMIENTO No. 3"				
INTERVENTOR	SAMUEL NARCISO RAMÍREZ DE LA HOZ	NIT O C.C.	7.573.021 - 9	CONTRATO N°	289 DE 2018
CONTRATISTA	ECO HABITAT SAS	NIT O C.C.	830.091.013-6	CONTRATO N°	273 DE 2018

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCIÓN SEMANAL POR CAPÍTULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
PRELIMINARES	0,00%	1,07%		
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	0,00%	0,00%		
MAMPOSTERIA	0,00%	0,00%		
INSTALACIONES ELECTRICAS Y RED DE INFRAESTRUCTURA	0,00%	0,00%		
PAÑETES - RESANES	0,00%	0,04%		
CUBIERTAS	0,00%	0,00%		
CIELO RASOS	0,00%	0,00%		
PISOS - ACABADOS	0,00%	0,00%		
ENCHAPES Y ACCESORIOS	0,00%	0,00%		
CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO	7,93%	0,00%		
CERRAJERIA	0,00%	0,00%		
PINTURA	0,00%	0,22%		
ASEO GENERAL	0,46%	0,00%		
ACTIVIDADES ADICIONALES	0,00%	1,00%		
TOTAL SEMANAS ANTERIORES	91,61%	67,06%		
TOTAL PRESENTE SEMANA	8,39%	2,33%		
TOTALES	100,00%	69,39%		

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSIÓN	SEMANA	ACUMULADO
	$215.579.687,47	$149.590.745,14	$65.988.942,33		2,33%	69,39%

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ARQUITECTOS	1	INSPECTOR	1
INGENIEROS		OBREROS	2
TOPÓGRAFO		AYUDANTES	6
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO			


V.ESTADO DEL TIEMPO

	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)				
				SI ☐ NO ☐

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL							
				INFORME SEMANAL			
Código: FO-JEM-JEING-288		**Versión:** 0		**Fecha de Emisión:** 2014-08-21		**Pág.** 1 de 1	
FECHA		**DÍA**	**6**	**MES**	**AGOSTO**	**AÑO**	**2018**

SEMANA N°	8	**DEL**	30 DE JULIO DE 2018	**AL**	4 DE AGOSTO DE 2018

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCIÓN Vs PROGRAMADO)

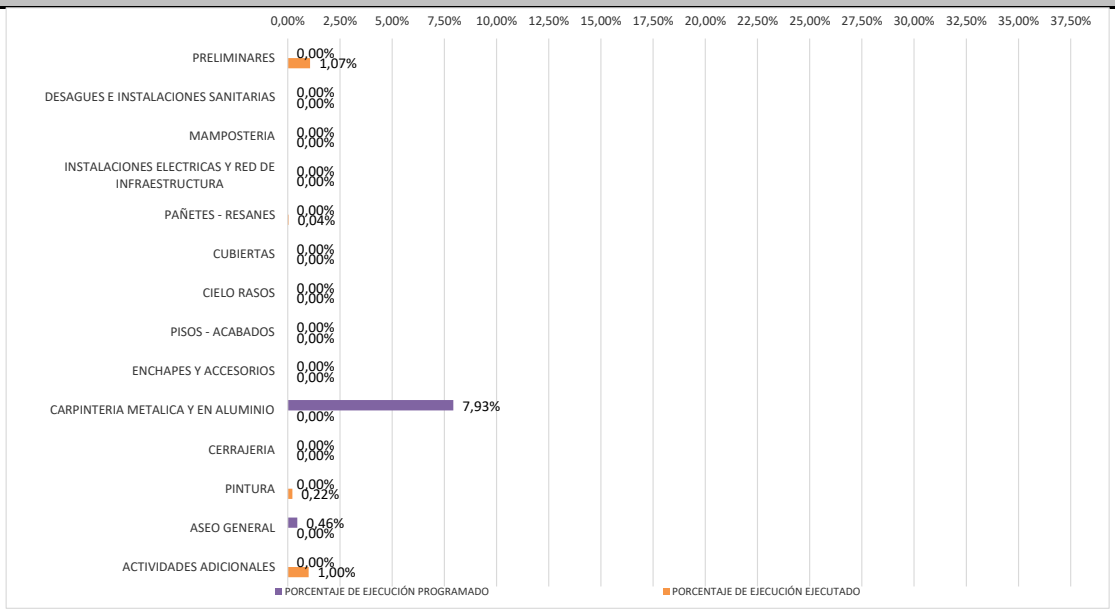

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Se presentan atrasos en la obra debido a la falta de suministros por parte del contratista.

Ausencia de residente o encargado de obra por parte del contratista.

FIRMA DEL DIRECTOR INTERVENTOR O DEL RESIDENTE INTERVENTOR
