INFORME DEL CONTRATISTA

Valledupar, cesar 08 de junio de 2022

Señores
INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA -INDER- VALLEDUPAR
Calle 28 N° 13 - 65 Parque Barrio Doce de Octubre
Valledupar - Cesar

Ref. Informe del contratista

La suscrita **ASTRID ROCIO OVIEDO GUITERREZ** con cedula de ciudadanía **49.796.959** de Valledupar, cesar en calidad de representante legal de la empresa **DISTRIBUCIONES RBR SAS**, identificada con **NIT 900.020.282-0,** me permito presentar informe de los servicios realizados, los cuales fueron entregados en el **INSTITUTO DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA -INDER- VALLEDUPAR,** en marco contrato prestación de servicio No 143 de 2022, estos mismos fueron realizados y recibidos a satisfacción por parte de las áreas encargadas. En el siguiente cuadro se describe los servicios que se prestaron.

AREA	EQUIPO	DIAGNOSTICO
Sala de planeación talento humano	Arie DAIKIN	Mantenimiento preventivo: AIRES DE 12000 BTU lavando de unidad interior (evaporador) y exterior (condensador) revisiones y monitoreos de amperajes y presión del equipo.
Jefatura de deportes	Arie DAIKIN	Mantenimiento correctivo: AIRES DE 12000 BTU lavado de unidad interior (evaporador) lavado de unidad exterior (condensador) Corrección de fugas en el sistema, des taponamientos de drenajes, cambios de aislamiento de tuberías.
Auditorio APE cuello	4 Aires CIAC	Mantenimiento preventivo: AIRES DE 3600 BTU lavando de unidad interior (evaporador) y exterior (condensador) revisiones y monitoreos de amperajes y presión del equipo.
Prensa y comunicaciones	Aire MILEXU	Mantenimiento preventivo: AIRE DE 2400 BTU lavando de unidad interior (evaporador) y exterior (condensador) revisiones y monitoreos de amperajes y presión del equipo
Administración y financiera	Aire MILEXU	Mantenimiento correctivo: AIRES DE 2400 BTU lavado de unidad interior (evaporador) lavado de unidad exterior (condensador) Corrección de fugas en el sistema, des taponamientos de drenajes, cambios de aislamiento de tuberías.
Secretaria	Aire Ciac	Mantenimiento preventivo: AIRES DE 3600 BTU lavando de unidad interior (evaporador) y exterior (condensador) revisiones y monitoreos de amperajes y presión del equipo.


Jurídica y contratación	Aire Panasonic	Mantenimiento correctivo: AIRES DE 2400 BTU lavado de unidad interior (evaporador) lavado de unidad exterior (condensador) Corrección de fugas en el sistema, des taponamientos de drenajes, cambios de aislamiento de tuberías.
Archivo	Aire Daikin	Mantenimiento correctivo: AIRES DE 12000 BTU lavado de unidad interior (evaporador) lavado de unidad exterior (condensador) Corrección de fugas en el sistema, des taponamientos de drenajes, cambios de aislamiento de tuberías.
sala de juntas	Aire conforking	Mantenimiento correctivo: AIRES DE 1800 BTU lavado de unidad interior (evaporador) lavado de unidad exterior (condensador) Corrección de fugas en el sistema, des taponamientos de drenajes, cambios de aislamiento de tuberías.
talento humano	Aire MILEXUS	Mantenimiento correctivo: AIRES DE 1800 BTU lavado de unidad interior (evaporador) lavado de unidad exterior (condensador) Corrección de fugas en el sistema, des taponamientos de drenajes, cambios de aislamiento de tuberías.
Sala de deporte formativo	Aire Ciac	Mantenimiento preventivo: AIRES DE 3600 BTU lavando de unidad interior (evaporador) y exterior (condensador) revisiones y monitoreos de amperajes y presión del equipo.
Sala de actividad física	Aire Ciac	Mantenimiento preventivo: AIRES DE 3600 BTU lavando de unidad interior (evaporador) y exterior (condensador) revisiones y monitoreos de amperajes y presión del equipo.
Sala de deporte social	Aire ciac	Mantenimiento preventivo: AIRES DE 3600 BTU lavando de unidad interior (evaporador) y exterior (condensador) revisiones y monitoreos de amperajes y presión del equipo.
Sala de control interno	Aire DAIKIN	Mantenimiento correctivo: AIRES DE 12000 BTU lavado de unidad interior (evaporador) lavado de unidad exterior (condensador) Corrección de fugas en el sistema, des taponamientos de drenajes, cambios de aislamiento de tuberías.
Sala de promoción de deporte	2 Aire PANASONIC	Mantenimiento correctivo: AIRES DE 12000 BTU lavado de unidad interior (evaporador) lavado de unidad exterior (condensador) Corrección de fugas en el sistema, des taponamientos de drenajes, cambios de aislamiento de tuberías.
Sala de dirección general	Aire Samsung	Mantenimiento preventivo: AIRE DE 2400 BTU lavando de unidad interior (evaporador) y exterior (condensador) revisiones y monitoreos de amperajes y presión del equipo

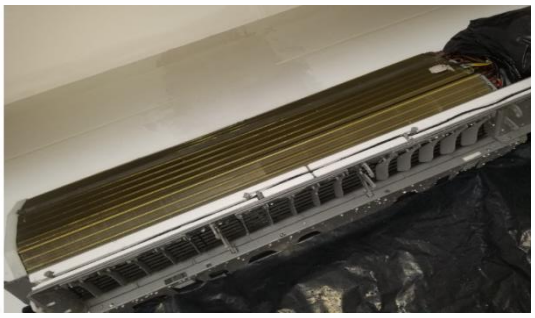
Sala de Rack	Aire Westinghouse	Mantenimiento correctivo: AIRES DE 9000 BTU lavado de unidad interior (evaporador) lavado de unidad exterior (condensador) Corrección de fugas en el sistema, des taponamientos de drenajes, cambios de aislamiento de tuberías.

EN PROCESO DE MANTENIMIENTO



REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	DESPUES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
	
 	

El presente informe se expide el día 8 de Junio de 2022 para tramites de cobro.

Atentamente,

FIRMA Astrid R. Oviedo G.

ASTRID ROCIO OVIEDO GUTIERREZ
Representante Legal
Cc 49.796.959 De Valledupar
DISTRIBUCIONES RBR SAS
