Municipio El Carmen de Viboral	**INFORME SEMANAL AVANCE DEL CONTRATO DE EMERGENCIA OLA INVERNAL**	CONCIVELSA	3

INFORME No. 3

FECHA: 9 DE MAYO AL 14 DE MAYO DE 2022

SUPERVISOR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL: Jobanny Jose Copete Alvarez	

DATOS CONTRATISTA

N° DEL CONTRATO	**N°120-CPS-204.2022**
OBJETO:	**Realizar actividades necesarias para la atención de la emergencia generada por la ola invernal.**
RAZÓN SOCIAL:	**CONCIVELSA Y CIA S.A.S**
NIT:	**811013037-0**
FECHA DE INICIO:	**Abril 27 de 2022**
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 249.970.015**
DURACIÓN:	**Un (1) mes**
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	**Junio 6 de 2022**
DIRECCIÓN:	**Carrera 28 #33a-34**
EMAIL:	concivelsa@gmail.com
TELÉFONO:	**3128668729**
UBICACION:	**El Carmen de Viboral, Antioquia**

EQUIPO DE TRABAJO CONTRATISTA

Tecnologo supervisor:	**Gustavo Sánchez**	**C.C. No.**	1.060.647.230
Tecnologo auxiliar:	**Oscar Sánchez Bello**	**C.C. No.**	71.114.799
Tecnologo sst:	**Isabel Cristina Garcia Jimenez**	**C.C. No.:**	1.036.401.391

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA ACTUALIZADAS CON ACTA DE INICIO

AMPARO	VIGENCIA		VALOR	ASEGURADOR
	DESDE	HASTA		
Cumplimiento del Contrato	**6/05/2022**	**6/06/2022**	**$24,997,001.50**	Seguros dl Estado
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	**6/05/2022**	**6/06/2022**	**$12,498,500.75**	Seguros dl Estado
Estabilidad de la Obra	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA ACTUALIZADAS CON ACTA DE INICIO


AMPARO	VIGENCIA		VALOR	ASEGURADOR
	DESDE	HASTA		
Predios labores y operaciones	**6/05/2022**	**6/05/2022**	**$200,000,000.00**	**Seguros del Estado**
Contratistas y subcontratistas	**6/05/2022**	**6/05/2022**	**$60,000,000.00**	**Seguros del Estado**
Responsabilidad civil patronal	**6/05/2022**	**6/05/2022**	**$60,000,000.00**	**Seguros del Estado**
Responsabilidad civil cruzada	**6/05/2022**	**6/05/2022**	**$60,000,000.00**	**Seguros del Estado**
Gastos medicos	**6/05/2022**	**6/05/2022**	**$60,000,000.00**	**Seguros del Estado**
Bienes bajo cuidado, tenencia y control	**6/05/2022**	**6/05/2022**	**$60,000,000.00**	**Seguros del Estado**
Daño emergente y lucro cesante	**6/05/2022**	**6/05/2022**	**$60,000,000.00**	**Seguros del Estado**
Perjuicios extrapatrimoniales	**6/05/2022**	**6/05/2022**	**$60,000,000.00**	**Seguros del Estado**


DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

(Localización, sectores, alcance, características, espacios a construir)

Realizar remoción de derrumbes causado por la emergencia causada por ola invernal en diferentes veredas del municipio de El Carmen de Viboral, tales como Samaria, La Aurora, Viboral, Rivera y en la zona urbana en el sector las Brisas.

ESTADO GENERAL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA						
FINANCIEROS					**PLAZOS**	
Valor Inicial ($):			**$**	**249.970.015**	**Fecha de Iniciación:**	ABRIL 27 DE 2022
Adición No 1						
Valor total del proyecto			**$**	**249.970.015**	**Fecha de Vencimiento:**	JUNIO 6 DE 2022
Inversión programada semana No 3 ($):			**$**	**62.492.504**		
Inversión programada acumulada ($):			**$**	**124.985.008**	**Plazo Inicial en semanas**	4
Inversión ejecutada semana No 3 ($):			**$**	**7.170.063**	**Prorroga No 1**	
Inversión ejecutada acumulada ($):			**$**	**52.348.593**	**Plazo final en semanas**	4
Diferencia entre lo planeado y lo ejecutado acumulado			**$**	**(72.636.414)**	**Tiempo transcurrido en semanas**	3
		Hay un adelanto en la inversión				
Inversión facturada ($):		Acta de Pago No 1	**$**	**100.950.207**	**Avance en tiempo (%)**	**75,00%**
		semana 3	**$**	**7.170.063**		
Avance facturado (%):		**43%**				

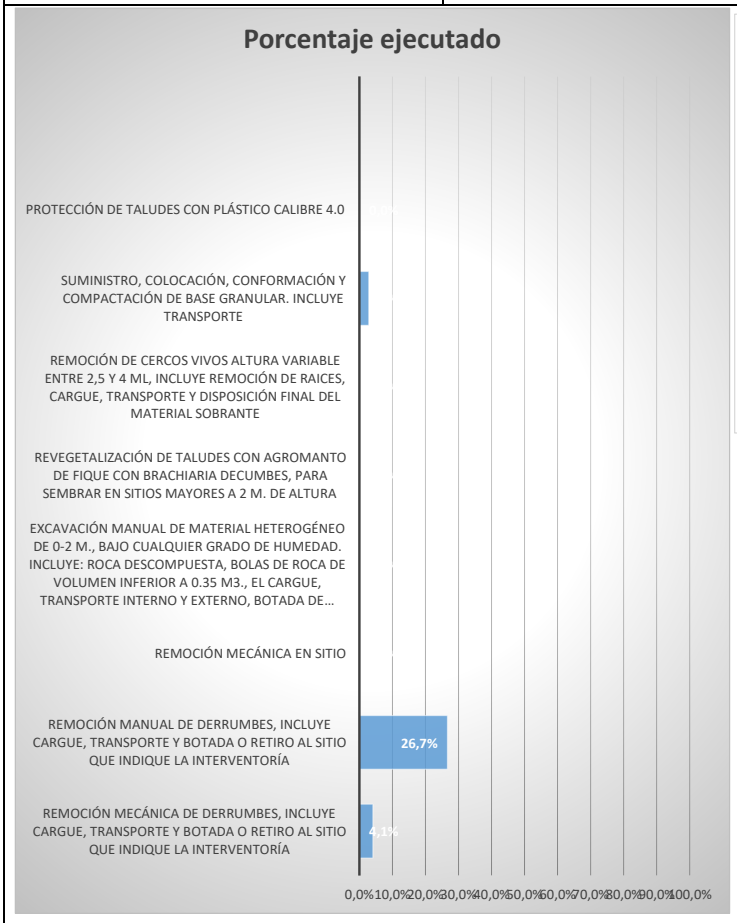

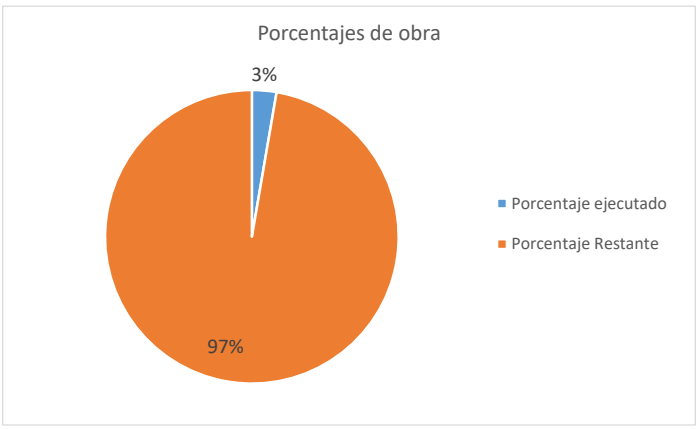

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
TÉCNICO
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría
Remoción manual de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría
Remoción mecánica en sitio
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Se verifica documentación de la maquinaria en obra
Se realizan verificaciones de los elementos de protección personal
TAREAS Y COMPROMISOS PROGRAMADOS SIGUIENTE SEMANA
ACTIVIDADES DE OBRA PROGRAMADAS
Remoción mecánica de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría
Remoción manual de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría
Remoción mecánica en sitio
ACTIVIDADES PROGRAMADAS NO EJECUTADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO REPRESENTATIVO DE LA SEMANA











FIRMAS

SUPERVISOR	CONTRATISTA
ADMINISTRACION MUNICIPAL	CONCIVELSA Y CIA S.A.S

Municipio El Carmen de Viboral	**INFORME SEMANAL AVANCE DEL CONTRATO DE EMERGENCIA OLA INVERNAL**	CONCIVELSA	4

INFORME No. 4

FECHA: 16 DE MAYO AL 21 DE MAYO DE 2022

SUPERVISOR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL: Jobanny Jose Copete Alvarez	

DATOS CONTRATISTA

N° DEL CONTRATO	**N°120-CPS-204.2022**
OBJETO:	**Realizar actividades necesarias para la atención de la emergencia generada por la ola invernal.**
RAZÓN SOCIAL:	**CONCIVELSA Y CIA S.A.S**
NIT:	**811013037-0**
FECHA DE INICIO:	**Abril 27 de 2022**
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 249.970.015**
DURACIÓN:	**Un (1) mes**
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	**Junio 6 de 2022**
DIRECCIÓN:	**Carrera 28 #33a-34**
EMAIL:	concivelsa@gmail.com
TELÉFONO:	**3128668729**
UBICACION:	**El Carmen de Viboral, Antioquia**

EQUIPO DE TRABAJO CONTRATISTA

Tecnologo supervisor:	**Gustavo Sánchez**	**C.C. No.**	1.060.647.230
Tecnologo auxiliar:	**Oscar Sánchez Bello**	**C.C. No.**	71.114.799
Tecnologo sst:	**Isabel Cristina Garcia Jimenez**	**C.C. No.:**	1.036.401.391

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA ACTUALIZADAS CON ACTA DE INICIO

AMPARO	VIGENCIA		VALOR	ASEGURADOR
	DESDE	HASTA		
Cumplimiento del Contrato	**6/05/2022**	**6/06/2022**	**$24,997,001.50**	Seguros dl Estado
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	**6/05/2022**	**6/06/2022**	**$12,498,500.75**	Seguros dl Estado
Estabilidad de la Obra	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA ACTUALIZADAS CON ACTA DE INICIO

AMPARO	VIGENCIA		VALOR	ASEGURADOR
	DESDE	HASTA		
Predios labores y operaciones	**6/05/2022**	**6/05/2022**	**$200,000,000.00**	**Seguros del Estado**
Contratistas y subcontratistas	**6/05/2022**	**6/05/2022**	**$60,000,000.00**	**Seguros del Estado**
Responsabilidad civil patronal	**6/05/2022**	**6/05/2022**	**$60,000,000.00**	**Seguros del Estado**
Responsabilidad civil cruzada	**6/05/2022**	**6/05/2022**	**$60,000,000.00**	**Seguros del Estado**
Gastos medicos	**6/05/2022**	**6/05/2022**	**$60,000,000.00**	**Seguros del Estado**
Bienes bajo cuidado, tenencia y control	**6/05/2022**	**6/05/2022**	**$60,000,000.00**	**Seguros del Estado**
Daño emergente y lucro cesante	**6/05/2022**	**6/05/2022**	**$60,000,000.00**	**Seguros del Estado**
Perjuicios extrapatrimoniales	**6/05/2022**	**6/05/2022**	**$60,000,000.00**	**Seguros del Estado**

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO


(Localización, sectores, alcance, características, espacios a construir)


Realizar remoción de derrumbes causado por la emergencia causada por ola invernal en diferentes veredas del municipio de El Carmen de Viboral, tales como Samaria, La Aurora, Viboral, Rivera y en la zona urbana en el sector las Brisas.

ESTADO GENERAL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

FINANCIEROS			PLAZOS	
Valor Inicial ($):		**$ 249.970.015**	**Fecha de Iniciación:**	ABRIL 27 DE 2022
Adición No 1				
Valor total del proyecto		**$ 249.970.015**	**Fecha de Vencimiento:**	JUNIO 6 DE 2022
Inversión programada semana No 4 ($):		**$ 62.492.504**		
Inversión programada acumulada ($):		**$ 124.985.008**	**Plazo Inicial en semanas**	5
Inversión ejecutada semana No 4 ($):		**$ 29.875.796**	**Prorroga No 1**	

Inversión ejecutada acumulada ($):			$ 75.054.326	**Plazo final en semanas**	5
Diferencia entre lo planeado y lo ejecutado acumulado			$ (49.930.681)	**Tiempo transcurrido en semanas**	4
		Hay un adelanto en la inversión			
Inversión facturada ($):		Acta de Pago No 1	$ 100.950.207	**Avance en tiempo (%)**	**80,00%**
		semana 4	$ 29.875.796		
Avance facturado (%):		**52%**			

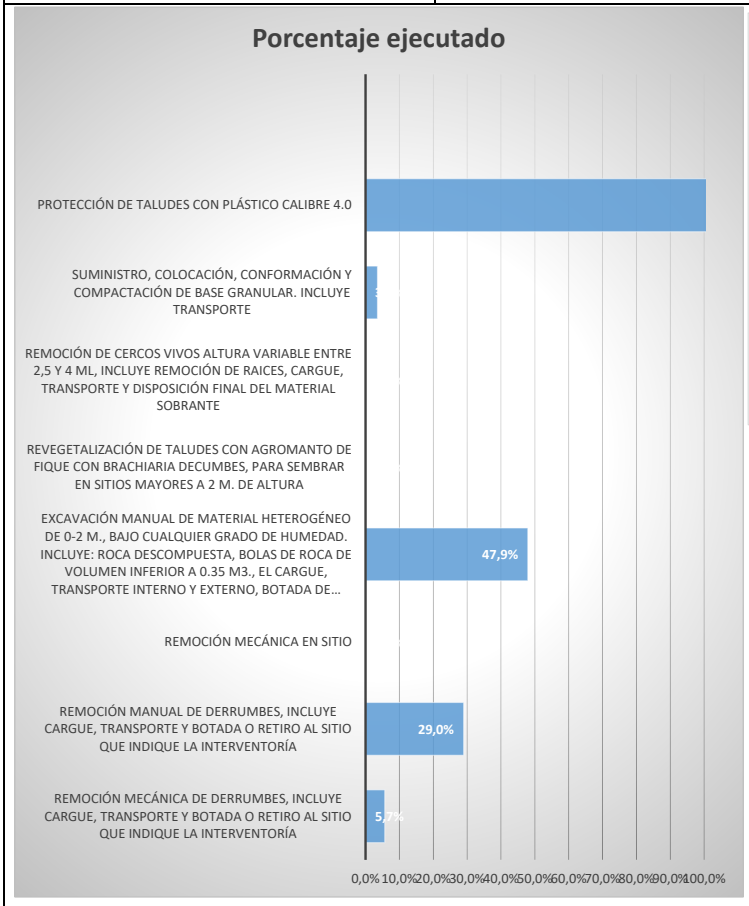


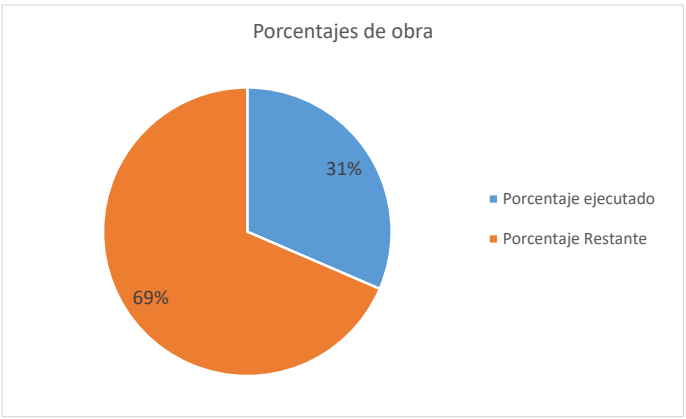

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
TÉCNICO
Excavación manual de material heterogéneo de 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.
Suministro, colocación, conformación y compactación de base granular . Incluye transporte.
Remoción manual de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría
Se instala plastico en la Maria, barrio Villas de la Paz, placa deportiva
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Se verifica documentación de la maquinaria en obra
Se realizan verificaciones de los elementos de protección personal
TAREAS Y COMPROMISOS PROGRAMADOS SIGUIENTE SEMANA
ACTIVIDADES DE OBRA PROGRAMADAS
Excavación manual de material heterogéneo de 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado. Suministro, colocación, conformación y compactación de base granular . Incluye transporte. Remoción manual de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría
ACTIVIDADES PROGRAMADAS NO EJECUTADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO REPRESENTATIVO DE LA SEMANA



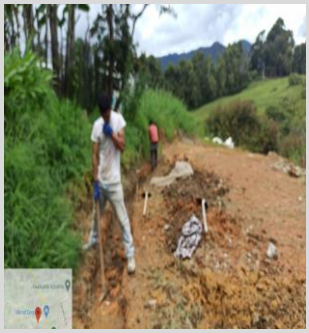









FIRMAS

SUPERVISOR	CONTRATISTA
ADMINISTRACION MUNICIPAL	CONCIVELSA Y CIA S.A.S

Municipio El Carmen de Viboral	**INFORME SEMANAL AVANCE DEL CONTRATO DE EMERGENCIA OLA INVERNAL**	CONCIVELSA	5

INFORME No. 5

FECHA: 23 DE MAYO AL 28 DE MAYO DE 2022

SUPERVISOR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL: Jobanny Jose Copete Alvarez	

DATOS CONTRATISTA

N° DEL CONTRATO	**N°120-CPS-204.2022**
OBJETO:	**Realizar actividades necesarias para la atención de la emergencia generada por la ola invernal.**
RAZÓN SOCIAL:	**CONCIVELSA Y CIA S.A.S**
NIT:	**811013037-0**
FECHA DE INICIO:	**Abril 27 de 2022**
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 249.970.015**
DURACIÓN:	**Un (1) mes**
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	**Junio 6 de 2022**
DIRECCIÓN:	**Carrera 28 #33a-34**
EMAIL:	concivelsa@gmail.com
TELÉFONO:	**3128668729**
UBICACION:	**El Carmen de Viboral, Antioquia**

EQUIPO DE TRABAJO CONTRATISTA

Tecnologo supervisor:	**Gustavo Sánchez**	**C.C. No.**	1.060.647.230
Tecnologo auxiliar:	**Oscar Sánchez Bello**	**C.C. No.**	71.114.799
Tecnologo sst:	**Isabel Cristina Garcia Jimenez**	**C.C. No.:**	1.036.401.391

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA ACTUALIZADAS CON ACTA DE INICIO

AMPARO	VIGENCIA		VALOR	ASEGURADOR
	DESDE	HASTA		
Cumplimiento del Contrato	**6/05/2022**	**6/06/2022**	**$24,997,001.50**	Seguros dl Estado
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	**6/05/2022**	**6/06/2022**	**$12,498,500.75**	Seguros dl Estado
Estabilidad de la Obra	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA ACTUALIZADAS CON ACTA DE INICIO


AMPARO	VIGENCIA		VALOR	ASEGURADOR
	DESDE	HASTA		
Predios labores y operaciones	**6/05/2022**	**6/05/2022**	**$200,000,000.00**	**Seguros del Estado**
Contratistas y subcontratistas	**6/05/2022**	**6/05/2022**	**$60,000,000.00**	**Seguros del Estado**
Responsabilidad civil patronal	**6/05/2022**	**6/05/2022**	**$60,000,000.00**	**Seguros del Estado**
Responsabilidad civil cruzada	**6/05/2022**	**6/05/2022**	**$60,000,000.00**	**Seguros del Estado**
Gastos medicos	**6/05/2022**	**6/05/2022**	**$60,000,000.00**	**Seguros del Estado**
Bienes bajo cuidado, tenencia y control	**6/05/2022**	**6/05/2022**	**$60,000,000.00**	**Seguros del Estado**
Daño emergente y lucro cesante	**6/05/2022**	**6/05/2022**	**$60,000,000.00**	**Seguros del Estado**
Perjuicios extrapatrimoniales	**6/05/2022**	**6/05/2022**	**$60,000,000.00**	**Seguros del Estado**


DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

(Localización, sectores, alcance, características, espacios a construir)

Realizar remoción de derrumbes causado por la emergencia causada por ola invernal en diferentes veredas del municipio de El Carmen de Viboral, tales como Samaria, La Aurora, Viboral, Rivera y en la zona urbana en el sector las Brisas.

ESTADO GENERAL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA					
FINANCIEROS				**PLAZOS**	
Valor Inicial ($):			**$ 249.970.015**	**Fecha de Iniciación:**	ABRIL 27 DE 2022
Adición No 1					
Valor total del proyecto			**$ 249.970.015**	**Fecha de Vencimiento:**	JUNIO 6 DE 2022
Inversión programada semana No 5 ($):			**$ 62.492.504**		
Inversión programada acumulada ($):			**$ 124.985.008**	**Plazo Inicial en semanas**	5
Inversión ejecutada semana No 5 ($):			**$ 31.960.756**	**Prorroga No 1**	
Inversión ejecutada acumulada ($):			**$ 77.139.286**	**Plazo final en semanas**	5
Diferencia entre lo planeado y lo ejecutado acumulado			**$ (47.845.721)**	**Tiempo transcurrido en semanas**	5
		Hay un adelanto en la inversión			
Inversión facturada ($):		Acta de Pago No 1	**$ 100.950.207**	**Avance en tiempo (%)**	**100,00%**
		semana 5	**$ 31.960.756**		
Avance facturado (%):		**53%**			

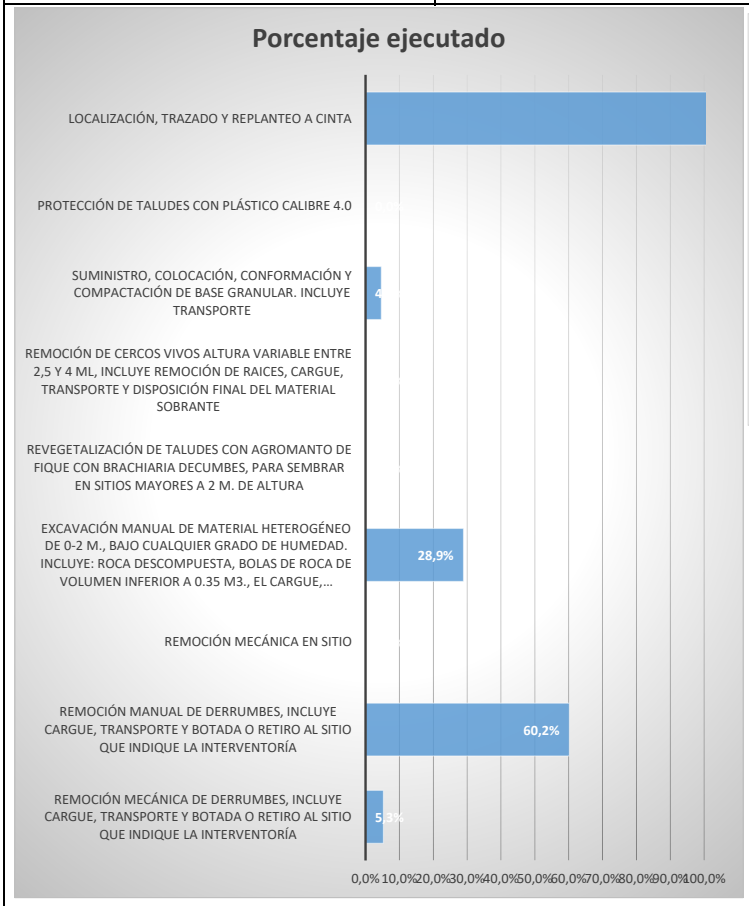

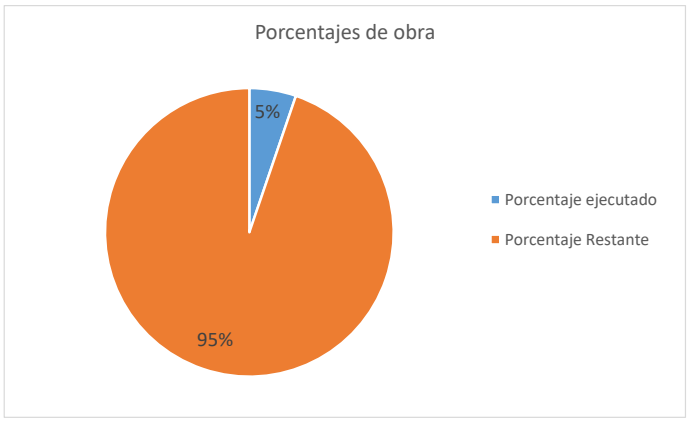

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
TÉCNICO
Remoción manual de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría
Suministro, transporte e instalación de concreto para cunetas
Se realiza tala de arboles en la vereda la Aurora
Suministro, transporte e instalación de concreto para cordon manejo de aguas lluvias
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Se realizan pausas activas
Se verifica documentación del sistema como pago de seguridad social
Se realiza capacitación sobre el uso adecuado de los EPP
TAREAS Y COMPROMISOS PROGRAMADOS SIGUIENTE SEMANA
ACTIVIDADES DE OBRA PROGRAMADAS
Remoción manual de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría
Suministro, transporte e instalación de concreto para cunetas
Se realiza tala de arboles en la vereda la Aurora
Suministro, transporte e instalación de concreto para cordon manejo de aguas lluvias
ACTIVIDADES PROGRAMADAS NO EJECUTADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO REPRESENTATIVO DE LA SEMANA



































FIRMAS

SUPERVISOR	CONTRATISTA
ADMINISTRACION MUNICIPAL	CONCIVELSA Y CIA S.A.S

Municipio El Carmen de Viboral	**INFORME SEMANAL AVANCE DEL CONTRATO DE EMERGENCIA OLA INVERNAL**	CONCIVELSA	6

INFORME No. 6

FECHA: 31 DE MAYO AL 4 DE JUNIO DE 2022

SUPERVISOR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL: Jobanny Jose Copete Alvarez	

DATOS CONTRATISTA

N° DEL CONTRATO	**N°120-CPS-204.2022**
OBJETO:	**Realizar actividades necesarias para la atención de la emergencia generada por la ola invernal.**
RAZÓN SOCIAL:	**CONCIVELSA Y CIA S.A.S**
NIT:	**811013037-0**
FECHA DE INICIO:	**Abril 27 de 2022**
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 249.970.015**
DURACIÓN:	**Un (1) mes**
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	**Junio 6 de 2022**
DIRECCIÓN:	**Carrera 28 #33a-34**
EMAIL:	concivelsa@gmail.com
TELÉFONO:	**3128668729**
UBICACION:	**El Carmen de Viboral, Antioquia**

EQUIPO DE TRABAJO CONTRATISTA

Tecnologo supervisor:	**Gustavo Sánchez**	**C.C. No.**	1.060.647.230
Tecnologo auxiliar:	**Oscar Sánchez Bello**	**C.C. No.**	71.114.799
Tecnologo sst:	**Isabel Cristina Garcia Jimenez**	**C.C. No.:**	1.036.401.391

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA ACTUALIZADAS CON ACTA DE INICIO

AMPARO	VIGENCIA		VALOR	ASEGURADOR
	DESDE	HASTA		
Cumplimiento del Contrato	**6/05/2022**	**6/06/2022**	**$24,997,001.50**	Seguros dl Estado
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	**6/05/2022**	**6/06/2022**	**$12,498,500.75**	Seguros dl Estado
Estabilidad de la Obra	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA ACTUALIZADAS CON ACTA DE INICIO


AMPARO	VIGENCIA		VALOR	ASEGURADOR
	DESDE	HASTA		
Predios labores y operaciones	**6/05/2022**	**6/05/2022**	**$200,000,000.00**	**Seguros del Estado**
Contratistas y subcontratistas	**6/05/2022**	**6/05/2022**	**$60,000,000.00**	**Seguros del Estado**
Responsabilidad civil patronal	**6/05/2022**	**6/05/2022**	**$60,000,000.00**	**Seguros del Estado**
Responsabilidad civil cruzada	**6/05/2022**	**6/05/2022**	**$60,000,000.00**	**Seguros del Estado**
Gastos medicos	**6/05/2022**	**6/05/2022**	**$60,000,000.00**	**Seguros del Estado**
Bienes bajo cuidado, tenencia y control	**6/05/2022**	**6/05/2022**	**$60,000,000.00**	**Seguros del Estado**
Daño emergente y lucro cesante	**6/05/2022**	**6/05/2022**	**$60,000,000.00**	**Seguros del Estado**
Perjuicios extrapatrimoniales	**6/05/2022**	**6/05/2022**	**$60,000,000.00**	**Seguros del Estado**


DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

(Localización, sectores, alcance, características, espacios a construir)

Realizar remoción de derrumbes causado por la emergencia causada por ola invernal en diferentes veredas del municipio de El Carmen de Viboral, tales como Samaria, La Aurora, Viboral, Rivera y en la zona urbana en el sector las Brisas.

ESTADO GENERAL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA						
FINANCIEROS					**PLAZOS**	
Valor Inicial ($):				**$ 249.970.015**	**Fecha de Iniciación:**	ABRIL 27 DE 2022
Adición No 1						
Valor total del proyecto				**$ 249.970.015**	**Fecha de Vencimiento:**	JUNIO 6 DE 2022
Inversión programada semana No 6 ($):				**$ 62.492.504**		
Inversión programada acumulada ($):				**$ 124.985.008**	**Plazo Inicial en semanas**	5
Inversión ejecutada semana No 6 ($):				**$ 5.814.586**	**Prorroga No 1**	
Inversión ejecutada acumulada ($):				**$ 50.993.116**	**Plazo final en semanas**	5
Diferencia entre lo planeado y lo ejecutado acumulado				**$ (73.991.892)**	**Tiempo transcurrido en semanas**	6
			Hay un adelanto en la inversión			
Inversión facturada ($):		Acta de Pago No 1		**$ 100.950.207**	**Avance en tiempo (%)**	**120,00%**
		semana 6		**$ 5.814.586**		
Avance facturado (%):			**43%**			

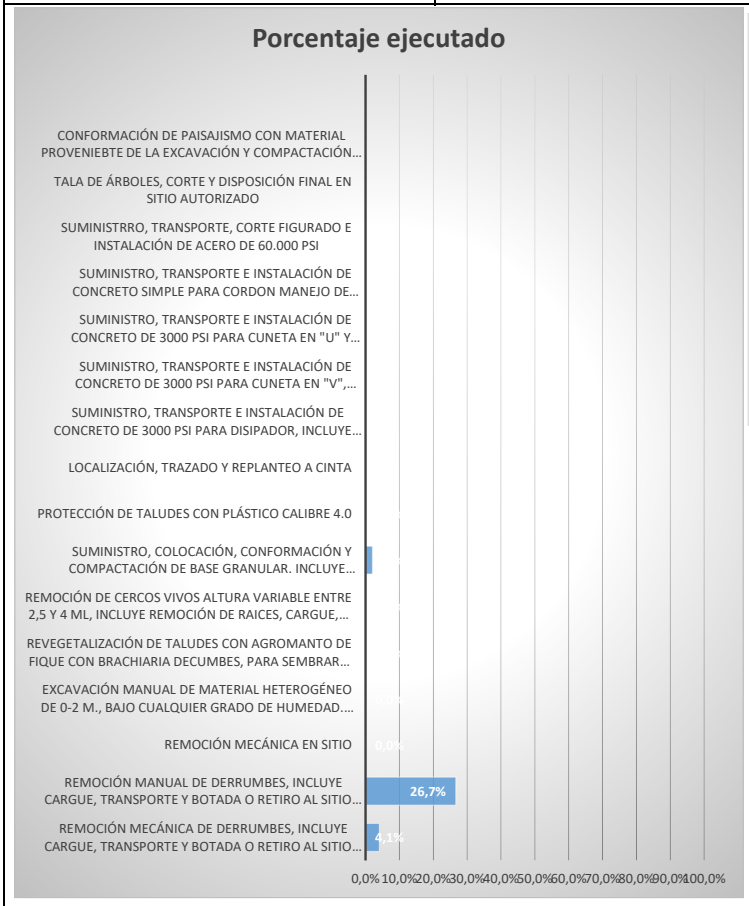

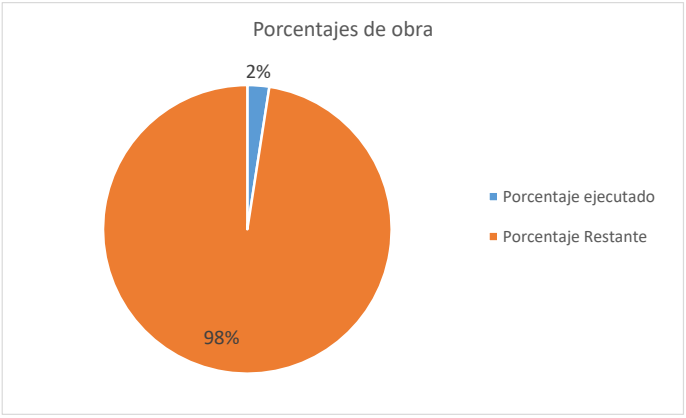


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
TÉCNICO
Remoción manual de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría
Excavación manual de material heterogéneo de 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m3., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Se revisan los Epp
TAREAS Y COMPROMISOS PROGRAMADOS SIGUIENTE SEMANA
ACTIVIDADES DE OBRA PROGRAMADAS
Remoción manual de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría
Excavación manual de material heterogéneo de 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m3., el cargue, transporte interno y
ACTIVIDADES PROGRAMADAS NO EJECUTADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO REPRESENTATIVO DE LA SEMANA





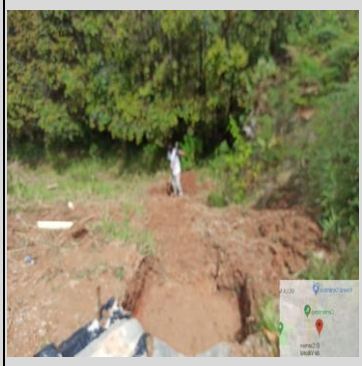






FIRMAS

SUPERVISOR	CONTRATISTA
ADMINISTRACION MUNICIPAL	CONCIVELSA Y CIA S.A.S

Municipio El Carmen de Viboral	**INFORME SEMANAL AVANCE DEL CONTRATO DE EMERGENCIA OLA INVERNAL**	CONCIVELSA	7

INFORME No. 7

FECHA: 6 DE JUNIO AL 11 DE JUNIO DE 2022

SUPERVISOR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL: Jobanny Jose Copete Alvarez	

DATOS CONTRATISTA

N° DEL CONTRATO	**N°120-CPS-204.2022**
OBJETO:	**Realizar actividades necesarias para la atención de la emergencia generada por la ola invernal.**
RAZÓN SOCIAL:	**CONCIVELSA Y CIA S.A.S**
NIT:	**811013037-0**
FECHA DE INICIO:	**Abril 27 de 2022**
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 249.970.015**
DURACIÓN:	**Un (1) mes**
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	**Junio 6 de 2022**
DIRECCIÓN:	**Carrera 28 #33a-34**
EMAIL:	concivelsa@gmail.com
TELÉFONO:	**3128668729**
UBICACION:	**El Carmen de Viboral, Antioquia**

EQUIPO DE TRABAJO CONTRATISTA

Tecnologo supervisor:	**Gustavo Sánchez**	**C.C. No.**	1.060.647.230
Tecnologo auxiliar:	**Oscar Sánchez Bello**	**C.C. No.**	71.114.799
Tecnologo sst:	**Isabel Cristina Garcia Jimenez**	**C.C. No.:**	1.036.401.391

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA ACTUALIZADAS CON ACTA DE INICIO

AMPARO	VIGENCIA		VALOR	ASEGURADOR
	DESDE	HASTA		
Cumplimiento del Contrato	**6/05/2022**	**6/06/2022**	**$24,997,001.50**	Seguros dl Estado
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	**6/05/2022**	**6/06/2022**	**$12,498,500.75**	Seguros dl Estado
Estabilidad de la Obra	**N.A**	**N.A**	**N.A**	**N.A**

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA ACTUALIZADAS CON ACTA DE INICIO


AMPARO	VIGENCIA		VALOR	ASEGURADOR
	DESDE	HASTA		
Predios labores y operaciones	**6/05/2022**	**6/05/2022**	**$200,000,000.00**	**Seguros del Estado**
Contratistas y subcontratistas	**6/05/2022**	**6/05/2022**	**$60,000,000.00**	**Seguros del Estado**
Responsabilidad civil patronal	**6/05/2022**	**6/05/2022**	**$60,000,000.00**	**Seguros del Estado**
Responsabilidad civil cruzada	**6/05/2022**	**6/05/2022**	**$60,000,000.00**	**Seguros del Estado**
Gastos medicos	**6/05/2022**	**6/05/2022**	**$60,000,000.00**	**Seguros del Estado**
Bienes bajo cuidado, tenencia y control	**6/05/2022**	**6/05/2022**	**$60,000,000.00**	**Seguros del Estado**
Daño emergente y lucro cesante	**6/05/2022**	**6/05/2022**	**$60,000,000.00**	**Seguros del Estado**
Perjuicios extrapatrimoniales	**6/05/2022**	**6/05/2022**	**$60,000,000.00**	**Seguros del Estado**


DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

(Localización, sectores, alcance, características, espacios a construir)

Realizar remoción de derrumbes causado por la emergencia causada por ola invernal en diferentes veredas del municipio de El Carmen de Viboral, tales como Samaria, La Aurora, Viboral, Rivera y en la zona urbana en el sector las Brisas.

ESTADO GENERAL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA					
FINANCIEROS				**PLAZOS**	
Valor Inicial ($):			**$ 249.970.015**	**Fecha de Iniciación:**	ABRIL 27 DE 2022
Adición No 1					
Valor total del proyecto			**$ 249.970.015**	**Fecha de Vencimiento:**	JUNIO 6 DE 2022
Inversión programada semana No 7 ($):			**$ 62.492.504**		
Inversión programada acumulada ($):			**$ 124.985.008**	**Plazo Inicial en semanas**	5
Inversión ejecutada semana No 7($):			**$ 5.218.280**	**Prorroga No 1**	8,5
Inversión ejecutada acumulada ($):			**$ 50.396.810**	**Plazo final en semanas**	13,5
Diferencia entre lo planeado y lo ejecutado acumulado			**$ (74.588.197)**	**Tiempo transcurrido en semanas**	7
		Hay un adelanto en la inversión			
Inversión facturada ($):		Acta de Pago No 1	**$ 100.950.207**	**Avance en tiempo (%)**	**51,85%**
		semana 5	**$ 5.218.280**		
Avance facturado (%):		**42%**			

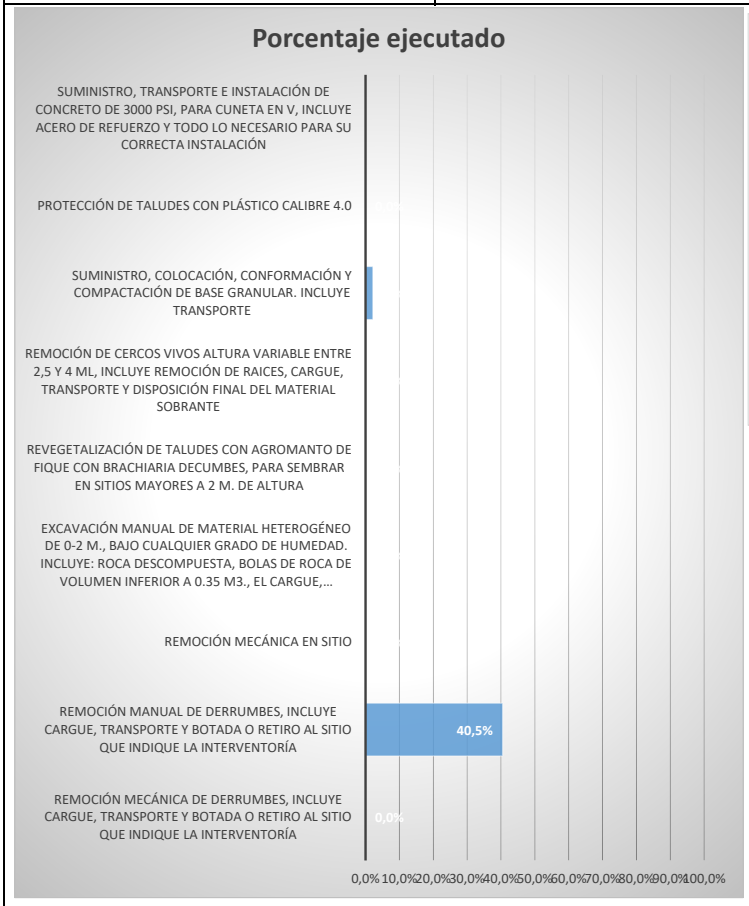

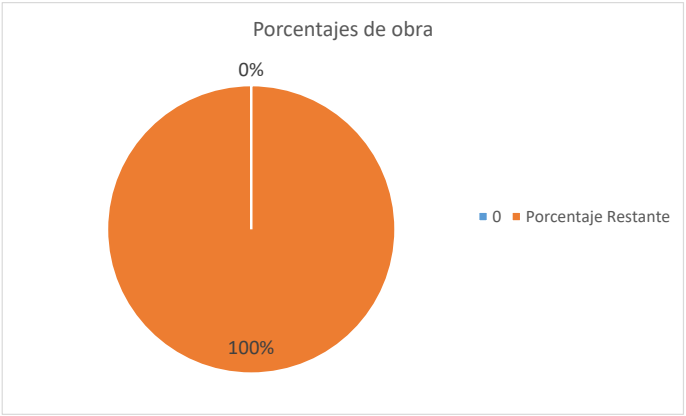


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
TÉCNICO
Remoción manual de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría, sector Sacatin
Suministro, transporte e instalación de acero para disipador sector la Maria
Suministro, transporte e instalación de encofrado y vaciado de concreto para disipador, sector la Maria
Suministro, colocación, conformación y compactación de base granular. Incluye transporte
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Se realizan pausas activas
Se verifica documentación del sistema como pago de seguridad social
Se realiza capacitación sobre el uso adecuado de los EPP
TAREAS Y COMPROMISOS PROGRAMADOS SIGUIENTE SEMANA
ACTIVIDADES DE OBRA PROGRAMADAS
Remoción manual de derrumbes, incluye cargue, transporte y botada o retiro al sitio que indique la interventoría
Suministro, transporte e instalación de acero para disipador sector la Maria
Suministro, transporte e instalación de encofrado y vaciado de concreto para disipador, sector la Maria
Suministro, colocación, conformación y compactación de base granular. Incluye transporte
ACTIVIDADES PROGRAMADAS NO EJECUTADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO REPRESENTATIVO DE LA SEMANA














FIRMAS

SUPERVISOR	CONTRATISTA
ADMINISTRACION MUNICIPAL	CONCIVELSA Y CIA S.A.S
