REPORTE

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN "SMSCE"

REPORTE MES DE MAYO DE 2022

En el siguiente informe se reportan las actividades que se desarrollaron con base al cierre del mes de Mayo en las siguientes plataformas de Regalías y los diferentes Entes de Control.

REPORTE GENERAL DE LOS PROYECTOS EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS "GESPROY"

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Proyectos En Desarrollo

Mostrar 10 registros por página Buscar

BPIN	Nombre	Valor Proyecto	Valor SGR	Estado	Designación
2019050450102	Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia	1.496.096.428,00	718.845.457,00	TERMINADO	Entidad Ejecutora
2020000100731	Generación de plataformas de articulación de CTi+E para la reconversión económica y productiva que atiendan los efectos actuales y futuros de la emergencia económica social y ecológica causada por el covid-19 en el departamento de Antioquia	7.543.169.163,00	5.736.369.097,00	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Aportante Recursos
2020050450048	Construcción de pavimento rígido y urbanismo en el Municipio de Apartadó Antioquia	10.397.673.176,00	5.000.000.000,00	SIN CONTRATAR	Entidad Aportante Recursos
20181301010478	Mejoramiento de vías terciarias en los municipios PDET en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Paz a Nivel Nacional	86.183.934.965,83	86.183.934.965,83	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Aportante Recursos
20191301010197	Construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía apartado corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó	5.098.957.370,00	5.098.957.370,00	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Ejecutora
20201301010064	Construcción de placa huella en vías rurales para mejorar la conectividad vial y contribuir a alcanzar una paz estable y duradera en el Municipio de Apartadó, Antioquia	11.281.488.350,00	11.281.488.350,00	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Ejecutora
20201301011128	Construcción de unidades sanitarias con pozo séptico en el marco de la implementación de los acuerdos de paz para población dispersa vulnerable victimas y desplazados del municipio de Apartadó	13.176.723.455,66	13.176.723.455,66	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	Entidad Ejecutora

PROYECTO CERRADO

Proyectos Cerrados

Mostrar 10 registros por página Buscar

BPIN	Nombre	Valor Proyecto	Valor SGR	Estado	Designación
2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo	3.708.826.886,52	3.708.826.886,52	CERRADO	Entidad Ejecutora

Mostrando página 1 de 1 Anterior 1 Siguiente

Planeación – ejecución

Código BPIN	2016050450001
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo
fuentes de financiación registradas en SUIFP-SGR:	$ 3.708.826.886,52
Tipo de Programación del Proyecto	Programación Anterior
Valor Actividades Programadas	$ 3.292.759.972,28
Valor Actividades Contratadas	$ 3.292.759.972,28
Valor Actividades Ejecutadas	$ 3.292.759.972,28

Descargar archivo de programación actual ...
Descargar archivo de contratación actual..

Producto MGA Construcción depavimento en concreto hidraulico, desarrollo urbanistico, carrera 102 entre calle 101 y 104c entre carrera 100 y 104 y carrera 84 entre calles 100 y 103 en el Muni

Actividad MGA APLICAR CONCRETO REFORZADO 21MPA PARA VIGA DE CIERRE ANDENES

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2016 10	2016 11	2016 12	2017 01	2017 02	2017 03
1	APLICAR CONCRETO REFORZADO 21MPA PARA VIGA DE CIERRE ANDENES	m3	1.47	100	No		Inicial					31	31			
							Prog	62	599.650	37.178.300		3,45	3,45	3,45	3,45	3,45
							Cont	62	599.650	37.178.300	62					
							Eje	62	599.650	37.178.300	62					

Actividad MGA APLICAR CONCRETO REFORZADO PARA RESALTOS

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2016 10	2016 11	2016 12	2017 01	2017 02	2017 03
1	APLICAR CONCRETO REFORZADO PARA RESALTOS	ml	.12	100	No		Inicial								49	
							Prog	14	211.449	2.960.286			1,17	1,17	1,17	1,17
							Cont	14	211.449	2.960.286	14					
							Eje	14	211.449	2.960.286	14					

Actividad MGA APLICAR SUB BASE GRANUALAR

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2016 10	2016 11	2016 12	2017 01	2017 02	2017 03
1	APLICAR SUB BASE GRANUALAR	m3	3.29	100	No	Inicial				379	379	378			
						Prog	1.078,58	77.315	83.390.412,7	77,1	77,1	77,1	77,1	77,1	77,1
						Cont	1.078,58	77.315	83.390.412,7	1.078,58					
						Eje	1.078,58	77.315	83.390.412,7	1.078,58					

Actividad MGA CONSTRUIR ALCORQUE EN CONCRETO PREFABRICADOS 1,2*1,2

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2016 10	2016 11	2016 12	2017 01	2017 02	2017 03
1	CONSTRUIR ALCORQUE EN CONCRETO PREFABRICADOS 1,2*1,2	und	0	0	No	Inicial								50	
						Prog		0	0						
						Cont		0	0						
						Eje		0	0						

Actividad MGA CONSTRUIR ANDEN EN TABLETA 20*20 TACTIL Y SEÑALIZADO SOBRE MORTERO DE 4CM

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

			Ponderación	Físico	Especie					10	11	12	01	02	03
1	CONSTRUIR ANDEN EN TABLETA 20*20 TACTIL Y SEÑALIZADO SOBRE MORTERO DE 4CM	m2	8.57	100	No	Inicial				464	464	464			
						Prog	2.013,92	107.830	217.160.993,6		111,89	111,89	111,89	111,89	111,89
						Cont	2.013,92	107.830	217.160.993,6	2.013,92					
						Eje	2.013,92	107.830	217.160.993,6	2.013,92					
2	SELLADO DE JUNTAS DEL PAVIMENTO	ml	.14	100	No	Inicial									
						Prog	1.080	3.257	3.517.560	77,14	77,14	77,14	77,14	77,14	77,14
						Cont	1.080	3.257	3.517.560	1.080					
						Eje	1.080	3.257	3.517.560	1.080					
3	ASERRADO MECANICO DE JUNTAS	ml	.19	100	No	Inicial									
						Prog	1.080	4.506	4.866.480	77,14	77,14	77,14	77,14	77,14	77,14
						Cont	1.080	4.506	4.866.480	1.080					
						Eje	1.080	4.506	4.866.480	1.080					

Actividad MGA CONSTRUIR BANCA EN CONCRETO

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2016 10	2016 11	2016 12	2017 01	2017 02	2017 03

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

1	Construir Bordillos en Concreto	ml	4.07	100	No	Inicial									
						Prog	1.895,36	54.372	103.054.513,9		146	146	146	146	146
						Cont	1.895,36	54.372	103.054.513,9	1.895,36					
						Eje	1.895,36	54.372	103.054.513,9	1.895,36					

Actividad MGA CONSTRUIR CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2016 10	2016 11	2016 12	2017 01	2017 02	2017 03
1	CONSTRUIR CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU	m3	3.14	100	No	Inicial				59	59				
						Prog	126,3	630.425	79.622.677,5		9,71	9,71	9,71	9,71	9,71
						Cont	126,3	630.425	79.622.677,5	126,3					
						Eje	126,3	630.425	79.622.677,5	126,3					

Actividad MGA CONSTRUIR PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2016 10	2016 11	2016 12	2017 01	2017 02	2017 03

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

				% Avance Físico	Aporte Especie												
1	CONSTRUIR PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO	m3	45.66	100	No		Inicial				552	552	552				
							Prog	1.656	698.375	1.156.509.000		127,38	127,38	127,38	127,38	127,38	1
							Cont	1.656	698.375	1.156.509.000	1.656						
							Eje	1.656	698.375	1.156.509.000	1.656						
2	CONSTRUCCION DE CARCAMO EN CONCRETO, INCLUYE TAPA Y ACERO	ml	2.62	100	No		Inicial										
							Prog	180	368.000	66.240.000	13,85	13,85	13,85	13,85	13,85	13,85	1
							Cont	180	368.000	66.240.000	180						
							Eje	180	368.000	66.240.000	180						

Actividad MGA CONSTRUIR PISO EN LOSETA CUADRATICA PREFABRICADA TACTIL ALERTA, 20*20 E=60 MM-SE INSTALARÁ SOBRE UNA CAPA DE MORTERO 1:4 DE 4CM.

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2016 10	2016 11	2016 12	2017 01	2017 02	2017 03	
	CONSTRUIR PISO EN LOSETA CUADRATICA PREFABRICADA TACTIL						Inicial					46	45				
							Prog		0	0							

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2016 10	2016 11	2016 12	2017 01	2017 02	2017 03	
1	CONSTRUIR PISO EN LOSETA CUADRATICA PREFABRICADA TACTIL ALERTA, 20*20 E=60 MM-SE INSTALARÁ SOBRE UNA CAPA DE MORTERO 1:4 DE 4CM.	m2	0	0	No		Inicial					46	45				
							Prog		0	0							
							Cont		0	0							
							Eje		0	0							

Actividad MGA INSTALAR CONTENEDOR DE RAÍZ EN CONCRETO DE 2,500PSI PARA MURO Y VIGA, INCLUYE REFUERZO Y PERFORACIONES SEGÚN DISEÑO IDU TIPO C, B-20

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2016 10	2016 11	2016 12	2017 01	2017 02	2017 03	
	INSTALAR CONTENEDOR DE RAÍZ EN CONCRETO DE						Inicial								50		

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

1	INSTALAR CONTENEDOR DE RAÍZ EN CONCRETO DE 2,500PSI PARA MURO Y VIGA, INCLUYE REFUERZO Y PERFORACIONES SEGÚN DISEÑO IDU TIPO C, B-20	und	0	0	No		Inicial								50		
							Prog		0	0							
							Cont		0	0							
							Eje		0	0							

Actividad MGA INSTALAR TUBERIA NOVAFORT 160MM REPLAZO DAÑOS TUBERIA A.A.R.A

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2016 10	2016 11	2016 12	2017 01	2017 02	2017 03	
1	INSTALAR TUBERIA NOVAFORT 160MM REPLAZO DAÑOS TUBERIA A.A.R.A	ml	0	0	No		Inicial				8	8					
							Prog		0	0							
							Cont		0	0							
							Eje		0	0							

Actividad MGA INSTALAR TUBERIA NOVAFORT 200MM REPLAZO DAÑOS TUBERIA A.A.R

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANiSTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Fisico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2016 10	2016 11	2016 12	2017 01	2017 02	2017 03
1	INSTALAR TUBERIA NOVAFORT 200MM REPLAZO DAÑOS TUBERIA A.A.R	ml	.06	100	No	Inicial				8	8				
						Prog	16	86.964	1.391.424		1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
						Cont	16	86.964	1.391.424	16					
						Eje	16	86.964	1.391.424	16					

Actividad MGA INSTALAR TUBERIA NOVAFORT 250MM REMPLAZO Y NUEVOS PARA SUMIDEROS

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Fisico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2016 10	2016 11	2016 12	2017 01	2017 02	2017 03
1	INSTALAR TUBERIA NOVAFORT 250MM REMPLAZO Y NUEVOS PARA SUMIDEROS	ml	1.35	100	No	Inicial				227,5	227,5				
						Prog	331,85	103.131	34.224.022,35		25,53	25,53	25,53	25,53	25,53
						Cont	331,85	103.131	34.224.022,35	331,85					
						Eje	331,85	103.131	34.224.022,35	331,85					

Actividad MGA INSTALAR TUBERIA NOVAFORT 355 MM COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANiSTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

1	INSTALAR TUBERIA NOVAFORT 355 MM COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS	ml	.83	100	No	Inicial				67	67				
						Prog	120,7	174.899	21.110.309,3		9,29	9,29	9,29	9,29	9,29
						Cont	120,7	174.899	21.110.309,3	120,7					
						Eje	120,7	174.899	21.110.309,3	120,7					

Actividad MGA INSTALAR TUBERIA NOVAFORT 400MM COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Fisico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2016 10	2016 11	2016 12	2017 01	2017 02	2017 03
1	INSTALAR TUBERIA NOVAFORT 400MM COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS	ml	2.06	100	No	Inicial				96	96				
						Prog	236,65	220.495	52.180.141,75		18,2	18,2	18,2	18,2	18,2
						Cont	236,65	220.495	52.180.141,75	236,65					
						Eje	236,65	220.495	52.180.141,75	236,65					

Actividad MGA INSTALAR TUBERIA NOVAFORT 450MM COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Fisico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2016 10	2016 11	2016 12	2017 01	2017 02	2017 03

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANiSTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

			Ponderación	Fisico	Especie					10	11	12	01	02	03
1	INSTALAR TUBERIA NOVAFORT 450MM COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS	ml	0	0	No	Inicial				18,5	18,5				
						Prog		0	0						
						Cont		0	0						
						Eje		0	0						

Actividad MGA REALIZAR CERRAMIENTO

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Fisico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2016 10	2016 11	2016 12	2017 01	2017 02	2017 03
1	REALIZAR CERRAMIENTO	ml	0	0	No	Inicial				1.026	1.026				
						Prog		0	0						
						Cont		0	0						
						Eje		0	0						

Actividad MGA REALIZAR CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANiSTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2016 10	2016 11	2016 12	2017 01	2017 02	2017 03
1	REALIZAR CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	3.41	100	No	Inicial				2.524	2.524	2.524			
						Prog	7.350,4	11.764	86.470.105,6	525,1	525,1	525,1	525,1	525,1	525,1
						Cont	7.350,4	11.764	86.470.105,6	7.350,4					
						Eje	7.350,4	11.764	86.470.105,6	7.350,4					

Actividad MGA REALIZAR CONSTRUCCION DE CAJAS TIPO SUMIDERO

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2016 10	2016 11	2016 12	2017 01	2017 02	2017 03
1	REALIZAR CONSTRUCCION DE CAJAS TIPO SUMIDERO	und	.99	100	No	Inicial				32,5	32,5				
						Prog	44	569.850	25.073.400		3,38	3,38	3,38	3,38	3,38
						Cont	44	569.850	25.073.400	44					
						Eje	44	569.850	25.073.400	44					

Actividad MGA REALIZAR CONSTRUCCION DE MH HASTA 1,5 PROFUNDIDAD CONSTRUIDO EN SITIO

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANiSTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

1	REALIZAR CONSTRUCCION DE MH HASTA 1,5 PROFUNDIDAD CONSTRUIDO EN SITIO	und	.36	100	No	Inicial									
						Prog	6	1.505.200	9.031.200		0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
						Cont	6	1.505.200	9.031.200	6					
						Eje	6	1.505.200	9.031.200	6					

Actividad MGA REALIZAR DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS, PISOS, ANDENES Y BORDILLOS DE CONCRETO

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2016 10	2016 11	2016 12	2017 01	2017 02	2017 03
1	REALIZAR DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS, PISOS, ANDENES Y BORDILLOS DE CONCRETO	m2	2.09	100	No	Inicial				1.021	1.020				
						Prog	2.016	26.269	52.958.304		118,59	118,59	118,59	118,59	118,59
						Cont	2.016	26.269	52.958.304	2.016					
						Eje	2.016	26.269	52.958.304	2.016					

Actividad MGA REALIZAR ESTABILIZACION DE LOS SUELOS DE SUBRASANTE CON GEOTEXTIL TEJIDO 2100

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2016 10	2016 11	2016 12	2017 01	2017 02	2017 03

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANiSTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

1	REALIZAR ESTABILIZACION DE LOS SUELOS DE SUBRASANTE CON GEOTEXTIL TEJIDO 2100	m2	2.52	100	No	Inicial				2.524	2.524	2.524			
						Prog	7.350,4	8.689	63.867.625,6	525,1	525,1	525,1	525,1	525,1	525,1
						Cont	7.350,4	8.689	63.867.625,6	7.350,4					
						Eje	7.350,4	8.689	63.867.625,6	7.350,4					

Actividad MGA REALIZAR EXCAVACION DE LA EXPLANEACION, CANALES Y PRESTAMOS, CAJEOS

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2016 10	2016 11	2016 12	2017 01	2017 02	2017 03
1	REALIZAR EXCAVACION DE LA EXPLANEACION, CANALES Y PRESTAMOS, CAJEOS	m3	3.19	100	No	Inicial				868,75	868,75	868,75	868,75		
						Prog	3.425,41	23.609	80.870.504,69	244,68	244,68	244,68	244,68	244,68	244,68
						Cont	3.425,41	23.609	80.870.504,69	3.425,41					
						Eje	3.425,41	23.609	80.870.504,69	3.425,41					

Actividad MGA REALIZAR EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2016 10	2016 11	2016 12	2017 01	2017 02	2017 03
1	REALIZAR EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	m3	.31	100	No	Inicial				101,6	101,6	101,6	101,6	101,6	
						Prog	329,12	23.609	7.770.194,08		25,3	25,3	25,3	25,3	25,3
						Cont	329,12	23.609	7.770.194,08	329,12					
						Eje	329,12	23.609	7.770.194,08	329,12					

Actividad MGA REALIZAR LLENO CON MATERIAL GRANULAR PARA FUNDACION, MESA DE TUBERIA

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2016 10	2016 11	2016 12	2017 01	2017 02	2017 03
1	REALIZAR LLENO CON MATERIAL GRANULAR PARA FUNDACION, MESA DE TUBERIA	m3	.36	100	No	Inicial				107,5	107,5				
						Prog	146,54	61.346	8.989.642,84	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46
						Cont	146,54	61.346	8.989.642,84	146,54					
						Eje	146,54	61.346	8.989.642,84	146,54					

Actividad MGA REALIZAR LLENO CON MATERIAL GRANULAR TIPO LIMO DE PRESTAMO

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

1	REALIZAR LLENO CON MATERIAL GRANULAR TIPO LIMO DE PRESTAMO	m3	.09	100	No	Prog	46	50.951	2.343.746		3,53	3,53	3,53	3,53	3,53
						Cont	46	50.951	2.343.746	46					
						Eje	46	50.951	2.343.746	46					

Actividad MGA REALIZAR LLENO DE CONFINAMIENTO PARA BORDILLO CON MATERIAL GRANULAR DE EXCAVACIÓN NO CONTAMINADO AL 60% Y 40% SUBBASE GRANULAR

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2016 10	2016 11	2016 12	2017 01	2017 02	2017 03
1	REALIZAR LLENO DE CONFINAMIENTO PARA BORDILLO CON MATERIAL GRANULAR DE EXCAVACIÓN NO CONTAMINADO AL 60% Y 40% SUBBASE GRANULAR	m3	2.15	100	No	Inicial				349	349	348			
						Prog	1.038,13	52.375	54.372.058,75		79,9	79,9	79,9	79,9	79,9
						Cont	1.038,13	52.375	54.372.058,75	1.038,13					
						Eje	1.038,13	52.375	54.372.058,75	1.038,13					

Actividad MGA Realizar Localización y replanteo

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2016	2016	2016	2017	2017	2017

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2016 10	2016 11	2016 12	2017 01	2017 02	2017 03
1	Realizar Localización y replanteo	m2	1.04	100	No	Inicial				13.145					
						Prog	13.145	1.994	26.211.130	938,93	938,93	938,93	938,93	938,93	938,93
						Cont	13.145	1.994	26.211.130	13.145					
						Eje	13.145	1.994	26.211.130	13.145					

Actividad MGA REALIZAR MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATEIRALES

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2016 10	2016 11	2016 12	2017 01	2017 02	2017 03
1	REALIZAR MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATEIRALES	m3	4.35	100	No	Inicial				379	379	378			
						Prog	1.078,5	102.174	110.194.659	77,1	77,1	77,1	77,1	77,1	77,1
						Cont	1.078,5	102.174	110.194.659	1.078,5					
						Eje	1.078,5	102.174	110.194.659	1.078,5					

Actividad MGA REALIZAR PLANTACIÓN DE ESPECIES FORESTALES

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANiSTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

1	REALIZAR PLANTACIÓN DE ESPECIES FORESTALES	und	0	0	No		Prog		0	0							
							Cont		0	0							
							Eje		0	0							

Actividad MGA REALIZAR REALCE DE CAJA INSPECCION CIRCULAR

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2016 10	2016 11	2016 12	2017 01	2017 02	2017 03
1	REALIZAR REALCE DE CAJA INSPECCION CIRCULAR	und	.25	100	No		Inicial				4,75	4,75	4,75	4,75		
							Prog	19	337.563	6.413.697		1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
							Cont	19	337.563	6.413.697	19					
							Eje	19	337.563	6.413.697	19					

Actividad MGA REALIZAR REALCE DE CAJAS DOMICILIARIAS

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2016 10	2016 11	2016 12	2017 01	2017 02	2017 03

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANiSTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

				Físico													
1	REALIZAR REALCE DE CAJAS DOMICILIARIAS	und	.9	100	No		Inicial				28,5	28,5	28,5	28,5		
							Prog	114	199.394	22.730.916		8,77	8,77	8,77	8,77	8,77
							Cont	114	199.394	22.730.916	114					
							Eje	114	199.394	22.730.916	114					

Actividad MGA REALIZAR REALCE DE CAJAS DOMICILIARIAS MEDIDOR

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2016 10	2016 11	2016 12	2017 01	2017 02	2017 03
1	REALIZAR REALCE DE CAJAS DOMICILIARIAS MEDIDOR	und	.33	100	No		Inicial				28,5	28,5	28,5	28,5		
							Prog	114	73.394	8.366.916		8,77	8,77	8,77	8,77	8,77
							Cont	114	73.394	8.366.916	114					
							Eje	114	73.394	8.366.916	114					

Actividad MGA REALIZAR REALCE DE VALVULA DE ACUEDUCTO

No.	Detalle Actividad	Unidad	%	% Avance	Aporte			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2016	2016	2016	2017	2017	2017

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANiSTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2016 10	2016 11	2016 12	2017 01	2017 02	2017 03
1	REALIZAR REALCE DE VALVULA DE ACUEDUCTO	und	.01	100	No		Inicial				0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
							Prog	4	45.884	183.536		0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
							Cont	4	45.884	183.536	4					
							Eje	4	45.884	183.536	4					

Actividad MGA REALIZAR REMOCION DE ESPECIES VEGETALES DE MENOR ALTURA

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2016 10	2016 11	2016 12	2017 01	2017 02	2017 03
1	REALIZAR REMOCION DE ESPECIES VEGETALES DE MENOR ALTURA	und	.05	100	No		Inicial				9	9				
							Prog	12	113.400	1.360.800		1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
							Cont	12	113.400	1.360.800	12					
							Eje	12	113.400	1.360.800	12					

Actividad MGA REALIZAR SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2016 10	2016 11	2016 12	2017 01	2017 02	2017 03
1	REALIZAR SEÑALIZACION HORTIZONTAL (LINEAS DE DEMARCACION Y MARCAS VIALES)	ml	0	0	No	Inicial								3.533	
						Prog		0	0						
						Cont		0	0						
						Eje		0	0						

Actividad MGA REALIZAR SUMINISTRO CORTE, FIGURACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO 60000 PSI

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2016 10	2016 11	2016 12	2017 01	2017 02	2017 03
1	REALIZAR SUMINISTRO CORTE, FIGURACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO 60000 PSI	Kg	.34	100	No	Inicial				466	466	465			
						Prog	1.718	5.065	8.701.670	132,15	132,15	132,15	132,15	132,15	132,15
						Cont	1.718	5.065	8.701.670	1.718					
						Eje	1.718	5.065	8.701.670	1.718					

Actividad MGA REALIZAR TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

Actividad MGA REALIZAR TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2016 10	2016 11	2016 12	2017 01	2017 02	2017 03
1	REALIZAR TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION	m3	3	100	No	Inicial				796,6	796,6	796,6	796,6	796,6	
						Prog	3.878,98	19.569	75.907.759,62		298,38	298,38	298,38	298,38	298,38
						Cont	3.878,98	19.569	75.907.759,62	3.878,98					
						Eje	3.878,98	19.569	75.907.759,62	3.878,98					

Actividad MGA SEMBRAR GRAMA PARA LAS ZONAS VERDES

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2016 10	2016 11	2016 12	2017 01	2017 02	2017 03
1	SEMBRAR GRAMA PARA LAS ZONAS VERDES	m2	0	0	No	Inicial								1.346	
						Prog		0	0						
						Cont		0	0						
						Eje		0	0						

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

1	Valor correspondiente a la administración y utilidad del proyecto	ADMON Costos A.I.U	0	0	No	Inicial									
						Prog	1	759.867.686	759.867.686						
						Cont	1	759.867.686	759.867.686	1					
						Eje	1	759.867.686	759.867.686	1					

Actividad MGA Valor correspondiente a la interventoría del proyecto

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2016 10	2016 11	2016 12	2017 01	2017 02	2017 03
1	Valor correspondiente a la interventoría del proyecto	INTV Interventoría	0	0	No	Inicial									
						Prog		0	0						
						Cont		0	0						
						Eje		0	0						

Actividad MGA Valor correspondiente al PGIO

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2016 10	2016 11	2016 12	2017 01	2017 02	2017 03



Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANíSTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

1	interventoría del proyecto	Interventoría	0	0	No		Cont		0	0							
							Eje		0	0							

Actividad MGA Valor correspondiente al PGIO

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Fisico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2016 10	2016 11	2016 12	2017 01	2017 02	2017 03
1	Valor correspondiente al PGIO	Global	0	0	No		Inicial				0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
							Prog		0	0						
							Cont		0	0						
							Eje		0	0						

Ejecución Bienes y Servicios — Crear Ejecución Bienes y Servicios

Mostrar 10 registros por página — Buscar

INFORMACIÓN DE CONTRATISTAS DE OBRA



Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANíSTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

Valor Total Contratos del proyecto: $3,630,227,631.0

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Tipo de Contrato	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Creado por	Fecha creación
270	20/10/2016	Obra pública	901019405	901019405-CONSORCIO APARTADO VIAL 2016	3,355,702,746.0	Por Aplicación	19/11/2016

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Supervisores de Contratos — Asignar Supervisores de Contratos

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Nombre del Funcionario	Cargo	Dependencia	Contratos en Supervisión

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

Detalle Información Contratos

Contrato No	270	Tipo de Contrato	Obra pública	Modalidad de Contratación	Licitación pública (Ley 1150 de 2007)
Identificación del Contratista	901019405-CONSORCIO APARTADO VIAL 2016	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	901019405	Tipo Contratista	Consorcio
Objeto	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS EN CONCRETO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE APARTADO - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA			Valor Contrato Para Proyecto	3.355.702.746,00
Fecha de Inicio	31/10/2016	Fecha Final Contractual	10/12/2017	Fecha Final Real	29/03/2018
Fecha Suscripción del Contrato	20/10/2016	Plazo Contractual	14,50 Mes(es)	Término Para Liquidación en Meses	4 Mes(es)
Proceso Precontractual	010/2016	Maneja Múltiples Proyectos	No	Contrato Valor Total	3.355.702.746,00
Estado Contrato	Suspendido	Nuevo Multiproyecto	No		

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

Estado Contrato	Suspendido	Nuevo Multiproyecto	No

Detalle de Contratistas para Consorcios o Uniones Temporales — Crear Detalle de Contratistas para Consorcios o Uniones Temporales

Mostrar 10 registros por página — Buscar

		Identificación del Contratista	Nombre del Contratista	%	Representante Legal	Teléfonos
1	✖	17339779	JOSE MIGUEL CUELLAR BOBADILLA	50,00	JOSE MIGUEL CUELLAR BOBADILLA	8281080
2	✖	900456006	MANOS POR URABA S.A.S	50,00	CARLOS EDUARDO DIAZ IBARGUEN	

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

Aspectos Financieros del Contrato

Registros Presupuestales — Crear Registro Presupuestal

Mostrar 10 registros por página — Buscar

ID				No Registro Presupuestal	Registro Presupuestal Incluye Recursos Regalías	Los rubros están con cargo a la incorporación de regalías en el ente ejecutor	Fecha	Valor	Vigencia	Concepto	Dependencia que Certifica el Registro	Creado por	Fecha creación
1		✎	✖	2318	Si	Si	20/10/2016	3.355.702.746,00	2016	Construcción de pavimento en concreto	Secretaría de Hacienda	Por Aplicación	07/09/2017

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

Recursos de Regalías — Ingresar Fuente Aporte Especie

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Entidad Aportante	Fuente Financiación	Vigencia	Creado por	Fecha creación	Valor	Valor en Especie
APARTADÓ-ANTIOQUIA	Fondo De Compensación Regional 2016050450001	2015	Por Aplicación	07/09/2017	3.355.702.746,00	0,00
				Total Recursos Regalías	**3.355.702.746,00**	**0,00**

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Otras Fuentes de Financiación del Contrato

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Otras Fuentes de Financiación del Contrato

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Entidad Aportante	Fuente Financiación	Incluida SUIFP	Creado por	Fecha creación	Valor	Valor en Especie
No se encontró información.						
				Total Otras Fuentes	**0,00**	**0,00**
				Total Contrato	**3.355.702.746,00**	**0,00**

No se encontró información. — Anterior Siguiente

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

Actas del Contrato — Crear Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Acta No:	Tipo Acta	Fecha Acta	Detalle/Observaciones	Valor	Fecha de Acta Legalización	Causal de Suspensión	Otra Causal
Sin número del 31/10/2016	Acta de inicio	31/10/2016	Se establece como acta de inicio y se deja constancia que se cumplieron los requisitos de ley, que permiten la iniciación formal del contrato.	0,00	07/09/2017		
n/a	Acta de suspensión	30/11/2017	se decide suspender el contrato hasta tanto las condiciones climaticas sean favorables para la culminación de la obra	0,00	15/02/2018		
N/A	Acta de reinicio	26/02/2018	Luego de superar los inconvenientes se reanuda labores	0,00	13/04/2018		
Sin Número	Acta de suspensión	09/04/2018	se suspende debido a las fuertes lluvias que se han presentado en la zona	0,00	25/05/2018		

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

Amparos del Contrato — Crear Amparos del Contrato

Amparo Inicial del Contrato

Nombre Aseguradora	Equidad Seguros	N. Amparo	AA026542
Beneficiario	MUNICIPIO DE APARTADO	Tomador	CONSORCIO APARTADO VIAL 2016
Tipo Amparo	Cumplimiento		

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

Documento aprobación

Documento	N. Amparo	Fecha
Resolución	329	21/10/2016

Cubrimientos — Crear Cubrimientos

		Tipo Cubrimiento	Valor	porcentaje	Vigencia		Observación
					Fecha inicial	Fecha Final	
✎	✖	Cumplimiento	335.570.274,60	33,33	21/10/2016	30/06/2017	NO

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

		Tipo Cubrimiento	Valor	porcentaje	Vigencia		Observación
					Fecha inicial	Fecha Final	
✎	✖	Cumplimiento	335.570.274,60	33,33	21/10/2016	30/06/2017	NO
✎	✖	Estabilidad de la obra	335.570.274,60	33,33	21/10/2016	21/10/2021	NO
✎	✖	Salarios y prestaciones	335.570.274,60	33,33	21/10/2016	31/12/2019	NO

Actualizaciones y Modificaciones Amparo: AA026542 — Crear Modificación del Amparo del Contrato

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

Amparo Inicial del Contrato

Nombre Aseguradora	Equidad Seguros	N. Amparo	AA026543
Beneficiario	MUNICIPIO DE APARTADO - TERCEROS AFECTADOS	Tomador	CONSORCIO APARTADO VIAL 2016
Tipo Amparo	Responsabilidad Civil Extracontractual		

Documento aprobación

Documento	N. Amparo	Fecha

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

Documento	N. Amparo	Fecha
Resolución	329	21/10/2016

Cubrimientos — Crear Cubrimientos

Tipo Cubrimiento	Valor	porcentaje	Vigencia		Observación
			Fecha inicial	Fecha Final	
Predios, Labores y Operaciones	275.781.600,00	100,00	21/10/2016	31/12/2016	NO

Actualizaciones y Modificaciones Amparo: AA026543 — Crear Modificación del Amparo del Contrato

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

Modificaciones al Contrato — Crear Modificaciones al Contrato

Mostrar 10 registros por página — Buscar

	Tipo De Modificación	Documento	Documento Número	Fecha Documento	Objeto	Valor	Adición En Tiempo
1	Tiempo	Otrosí	OTRO SI N. 1	28/11/2016	El plazo que se procede a adicionar es de 4 meses y 20 días , para un total de 7 meses . Sustentada por labores realizadas por las empresa Prestadora de Servicios Aguas de Urabá		140 Dia(s)
2	Tiempo	Otrosí	Otro sí N. 2	11/05/2017	El plazo que se procede adicionar es de 4 meses, para un total del 11 meses . La adición se sustenta " Debido a las obras realizadas por la empres prestadora de servicios "Aguas de Urabá "		120 Dia(s)
3	Tiempo	Otrosí	Otrosi N° 3	21/09/2017	El plazo que se procede adicionar es de 2 meses y 15 días para un total 13 meses y 20 días.		75 Dia(s)
4	Aclaración	Modificatorio	Otrosi N° 4	22/11/2017	Por error de transcripción involuntario en la elaboración del otrosi N°3 al contrato de obra 270 de 2016 en la CLAUSULA SEGUNDA - DURACIÓN: se indico que el plazo total del contrato era de TRECE (13)		

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

2			Tiempo	Otrosí	Otro sí N. 2	11/05/2017	El plazo que se procede adicionar es de 4 meses, para un total del 11 meses . La adición se sustenta " Debido a las obras realizadas por la empres prestadora de servicios "Aguas de Urabá "		120 Dia(s)
3			Tiempo	Otrosí	Otrosi N° 3	21/09/2017	El plazo que se procede adicionar es de 2 meses y 15 días para un total 13 meses y 20 días.		75 Dia(s)
4			Aclaración	Modificatorio	Otrosi N° 4	22/11/2017	Por error de transcripción involuntario en la elaboración del otrosi N°3 al contrato de obra 270 de 2016 en la CLAUSULA SEGUNDA - DURACIÓN: se indico que el plazo total del contrato era de TRECE (13) meses con VEINTE (20) dias cuando en realidad el plazo es de TRECE (13) Meses y QUINCE (15) DÍAS		
5			Tiempo	Otrosí	Otrosi N° 5	02/03/2018	En la CLAUSULA TERCERA Duración del contrato a dicionar treinta (30) días para un plazo total de CATORCE (14) meses y QUINCE (15) días. quedando como fecha de terminación 11 de abril de 2018.. En la CLAUSULA SEGUNDA se modifica el paragrafo del articulo primero de las especificaciones iniciales en cuanto a disminuir el valor del AU (30%) a un nuevo AU del (25,61%)		30 Dia(s)

Mostrando página 1 de 1 Anterior 1 Siguiente

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

Contratos de Interventoría — Crear Contrato de Interventoría

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Objeto	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Contratos Objeto de la Interventoria	Creado por	Fecha creación
272	21/10/2016	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS EN CONCRETO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE APARTADO-DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	73198009	73198009-MARTELO MARTELO OSVALDO	274,524,885.0	270	Por Aplicación	07/09/2017

Mostrando página 1 de 1 Anterior 1 Siguiente

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo				
Contrato No	272	Tipo de Contrato	Interventoria	Modalidad de Contratación	de 2007)	
Identificación del Contratista	73198009-MARTELO MARTELO OSVALDO	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	73198009	Tipo Contratista	Persona Natural	
Objeto	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS EN CONCRETO RÍGIDO EN EL MUNICIPIO DE APARTADO-DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.			Valor Contrato Para Proyecto	274.524.885,00	
Fecha de Inicio	31/10/2016	Fecha Final Contractual	30/09/2017	Fecha Final Real	26/02/2018	
Fecha Suscripción del Contrato	21/10/2016	Plazo Contractual	13,50 Mes(es)	Término Para Liquidación en Meses	4 Mes(es)	
Proceso Precontractual	003/2016	Maneja Múltiples Proyectos	No	Contrato Valor Total	274.524.885,00	
Estado Contrato	Suspendido	Nuevo Multiproyecto	No			

Contratista

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

Registros Presupuestales — Crear Registro Presupuestal

Mostrar 10 registros por página — Buscar

ID	No Registro Presupuestal	Registro Presupuestal Incluye Recursos Regalías	Los rubros están con cargo a la incorporación de regalías en el ente ejecutor	Fecha	Valor	Vigencia	Concepto	Dependencia que Certifica el Registro	Creado por	Fecha creación
1	2326	Si	Si	21/10/2016	274.524.885,00	2016	Contrtato de interventoría 272/2016, cuyo objeto es interventoría técnica administrativa y financiera para la construcción de vías urbanas en concreto rígido en el municipio de Apartado Antioquia.	Secretaría de Hacienda Municipal	Por Aplicación	07/09/2017

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Recursos de Regalías — Ingresar Fuente Aporte Especie

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Entidad Aportante	Fuente Financiación	Vigencia	Creado por	Fecha creación	Valor	Valor en Especie
APARTADÓ-ANTIOQUIA	Fondo De Compensación Regional 2016050450001	2015	Por Aplicación	13/09/2017	274.524.885,00	0,00
				Total Recursos Regalías	274.524.885,00	0,00

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Otras Fuentes de Financiación del Contrato


Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANISTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

Actas del Contrato — Crear Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Acta No:	Tipo Acta	Fecha Acta	Detalle/Observaciones	Valor	Fecha de Acta Legalización	Causal de Suspensión	Otra Causal
Sin numero del 31/10/2016	Acta de inicio	31/10/2016	Se dejá constancia que se cumplieron con los requisitos establecidos en la ley y la reglamentación interna que permiten la iniciación formal del presente contrato.	0,00	07/09/2017		
n/a	Acta de suspensión	30/11/2017	se suspende hasta tanto las condiciones climaticas sean favorable para la culminación de la obra	0,00	15/02/2018		
N/A	Acta de reinicio	26/02/2018	luego de superar los inconvenientes se reanuda labores	0,00	14/04/2018		
Sin Número	Acta de suspensión	09/04/2018	se suspende debido a las fuertes lluvias que se han presentado en la zona	0,00	25/05/2018		

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

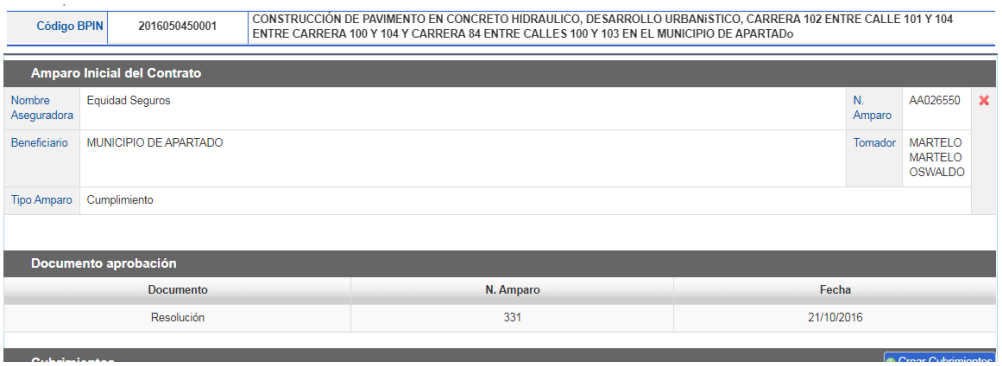


Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANiSTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

Amparo Inicial del Contrato


Nombre Aseguradora	Equidad Seguros	N. Amparo	AA026550
Beneficiario	MUNICIPIO DE APARTADO	Tomador	MARTELO MARTELO OSWALDO
Tipo Amparo	Cumplimiento		

Documento aprobación

Documento	N. Amparo	Fecha
Resolución	331	21/10/2016




Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANiSTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

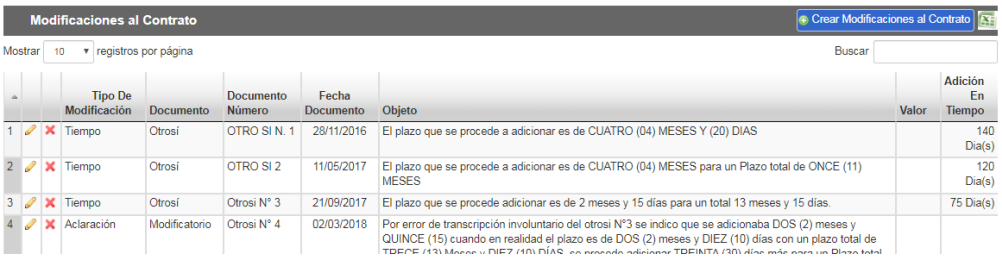

Modificaciones al Contrato — Crear Modificaciones al Contrato


Mostrar 10 registros por página — Buscar

	Tipo De Modificación	Documento	Documento Número	Fecha Documento	Objeto	Valor	Adición En Tiempo
1	Tiempo	Otrosí	OTRO SI N. 1	28/11/2016	El plazo que se procede a adicionar es de CUATRO (04) MESES Y (20) DIAS		140 Dia(s)
2	Tiempo	Otrosí	OTRO SI 2	11/05/2017	El plazo que se procede a adicionar es de CUATRO (04) MESES para un Plazo total de ONCE (11) MESES		120 Dia(s)
3	Tiempo	Otrosí	Otrosi N° 3	21/09/2017	El plazo que se procede adicionar es de 2 meses y 15 días para un total 13 meses y 15 días.		75 Dia(s)
4	Aclaración	Modificatorio	Otrosi N° 4	02/03/2018	Por error de transcripción involuntario del otrosi N°3 se indico que se adicionaba DOS (2) meses y QUINCE (15) cuando en realidad el plazo es de DOS (2) meses y DIEZ (10) días con un plazo total de TRECE (13) Meses y DIEZ (10) DÍAS, se procede adicionar TREINTA (30) días más para un Plazo total		



Código BPIN	2016050450001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO, DESARROLLO URBANiSTICO, CARRERA 102 ENTRE CALLE 101 Y 104 ENTRE CARRERA 100 Y 104 Y CARRERA 84 ENTRE CALLES 100 Y 103 EN EL MUNICIPIO DE APARTADo

No se encontró información. Anterior Siguiente



Circunstancias Excepcionales — Crear Circunstancias Excepcionales

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Tipo Circunstancia	Tipo Acto Administrativo	No. Acto Administrativo	Fecha
No se encontró información.			


No se encontró información. Anterior Siguiente

Cargue Masivo Actividades del Contrato

Proyecto identificado con BPIN 2019050450102 – cuyo objeto es **Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia. – por valor de $ 1.076.910.119,00 recursos que fueron aprobados por Regalías Fondo de Compensación Regional "FCR" y Recursos Propios**



FUENTES DE FINANCIACIÓN

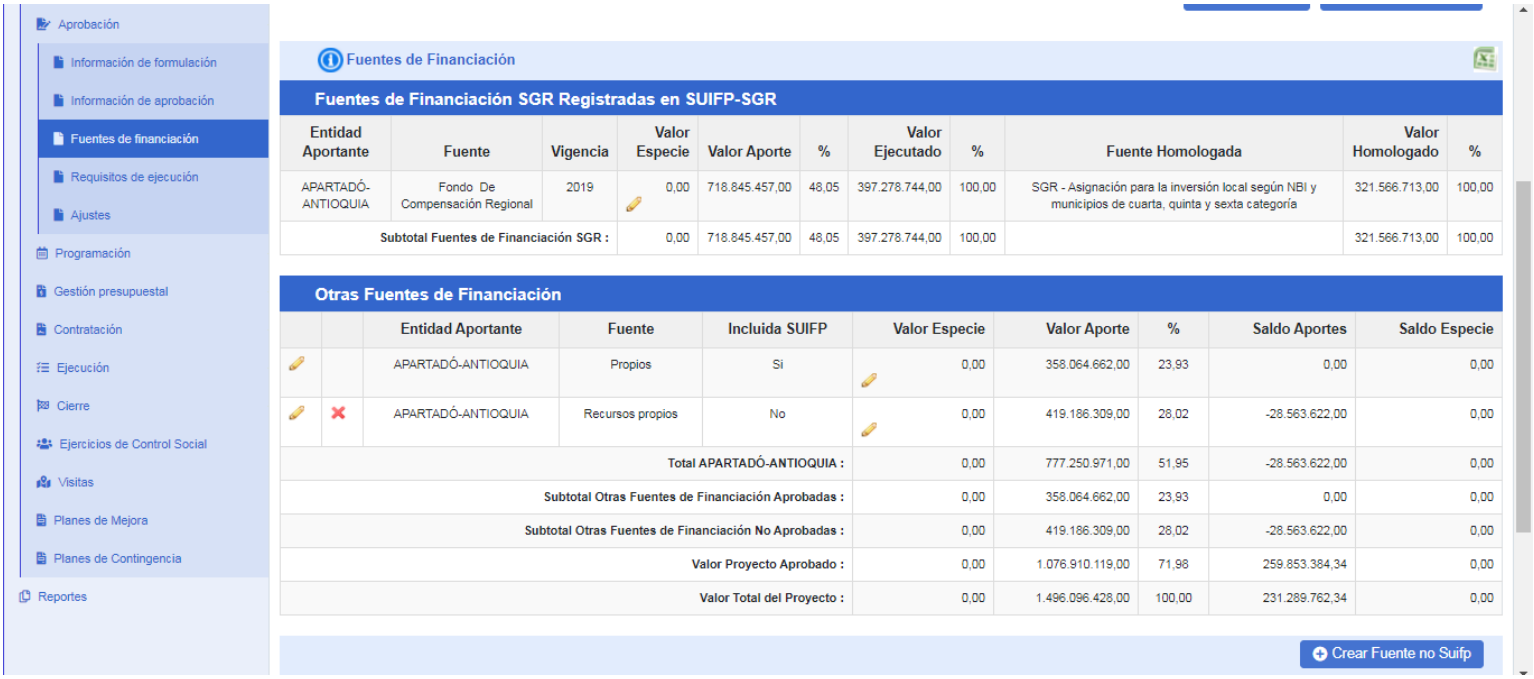

- Aprobación
  - Información de formulación
  - Información de aprobación
  - Fuentes de financiación
  - Requisitos de ejecución
  - Ajustes
- Programación
- Gestión presupuestal
- Contratación
- Ejecución
- Cierre
- Ejercicios de Control Social
- Visitas
- Planes de Mejora
- Planes de Contingencia
- Reportes

Fuentes de Financiación

Fuentes de Financiación SGR Registradas en SUIFP-SGR


Entidad Aportante	Fuente	Vigencia	Valor Especie	Valor Aporte	%	Valor Ejecutado	%	Fuente Homologada	Valor Homologado	%
APARTADÓ-ANTIOQUIA	Fondo De Compensación Regional	2019	0,00	718.845.457,00	48,05	397.278.744,00	100,00	SGR - Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría	321.566.713,00	100,00
Subtotal Fuentes de Financiación SGR :			0,00	718.845.457,00	48,05	397.278.744,00	100,00		321.566.713,00	100,00

Otras Fuentes de Financiación

		Entidad Aportante	Fuente	Incluida SUIFP	Valor Especie	Valor Aporte	%	Saldo Aportes	Saldo Especie
		APARTADÓ-ANTIOQUIA	Propios	Si	0,00	358.064.662,00	23,93	0,00	0,00
		APARTADÓ-ANTIOQUIA	Recursos propios	No	0,00	419.186.309,00	28,02	-28.563.622,00	0,00
				Total APARTADÓ-ANTIOQUIA :	0,00	777.250.971,00	51,95	-28.563.622,00	0,00
				Subtotal Otras Fuentes de Financiación Aprobadas :	0,00	358.064.662,00	23,93	0,00	0,00
				Subtotal Otras Fuentes de Financiación No Aprobadas :	0,00	419.186.309,00	28,02	-28.563.622,00	0,00
				Valor Proyecto Aprobado :	0,00	1.076.910.119,00	71,98	259.853.384,34	0,00
				Valor Total del Proyecto :	0,00	1.496.096.428,00	100,00	231.289.762,34	0,00

Crear Fuente no Suifp

INFORMACIÓN REPRESENTANTE LEGAL

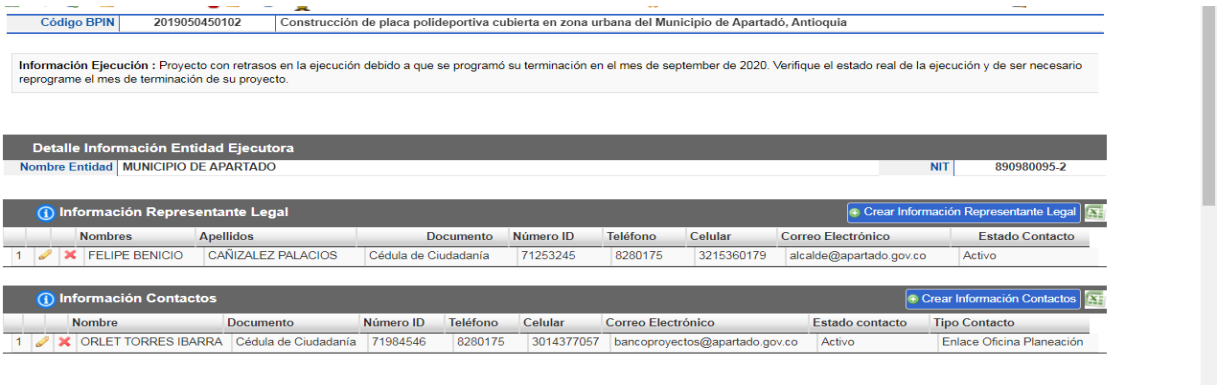

Código BPIN	2019050450102	Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartadó, Antioquia

Información Ejecución : Proyecto con retrasos en la ejecución debido a que se programó su terminación en el mes de september de 2020. Verifique el estado real de la ejecución y de ser necesario reprograme el mes de terminación de su proyecto.

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad	MUNICIPIO DE APARTADO	NIT	890980095-2


Información Representante Legal — Crear Información Representante Legal

	Nombres	Apellidos	Documento	Número ID	Teléfono	Celular	Correo Electrónico	Estado Contacto
1	FELIPE BENICIO	CAÑIZALEZ PALACIOS	Cédula de Ciudadanía	71253245	8280175	3215360179	alcalde@apartado.gov.co	Activo


Información Contactos — Crear Información Contactos

	Nombre	Documento	Número ID	Teléfono	Celular	Correo Electrónico	Estado contacto	Tipo Contacto
1	ORLET TORRES IBARRA	Cédula de Ciudadanía	71984546	8280175	3014377057	bancoproyectos@apartado.gov.co	Activo	Enlace Oficina Planeación


ACUERDO DE APROBACIÓN

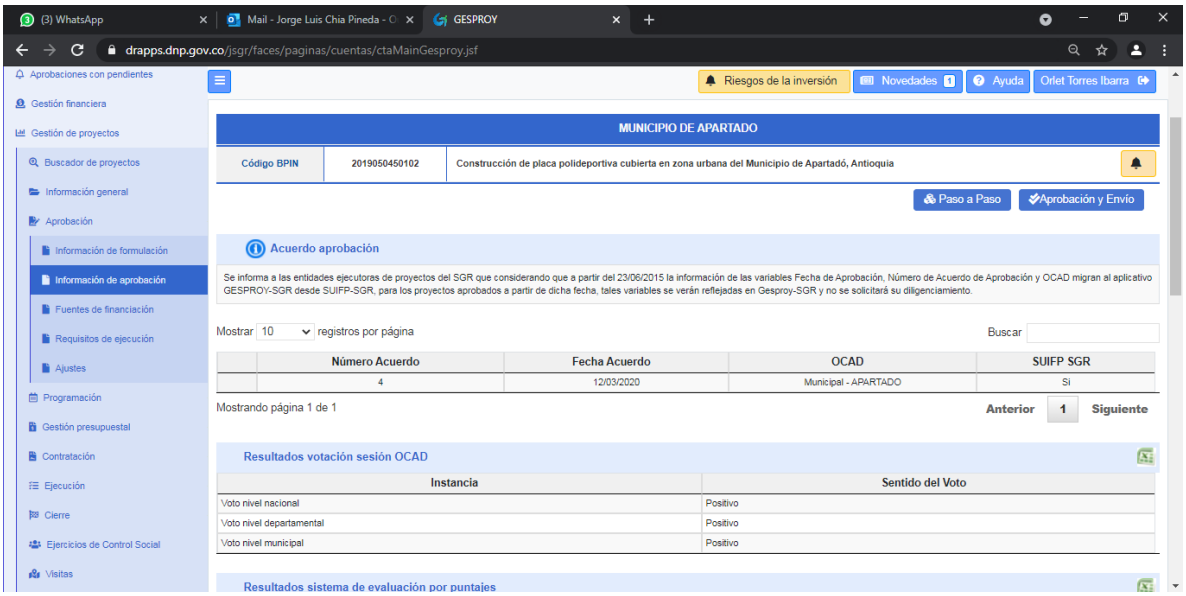


OBJETIVO DEL PROYECTO

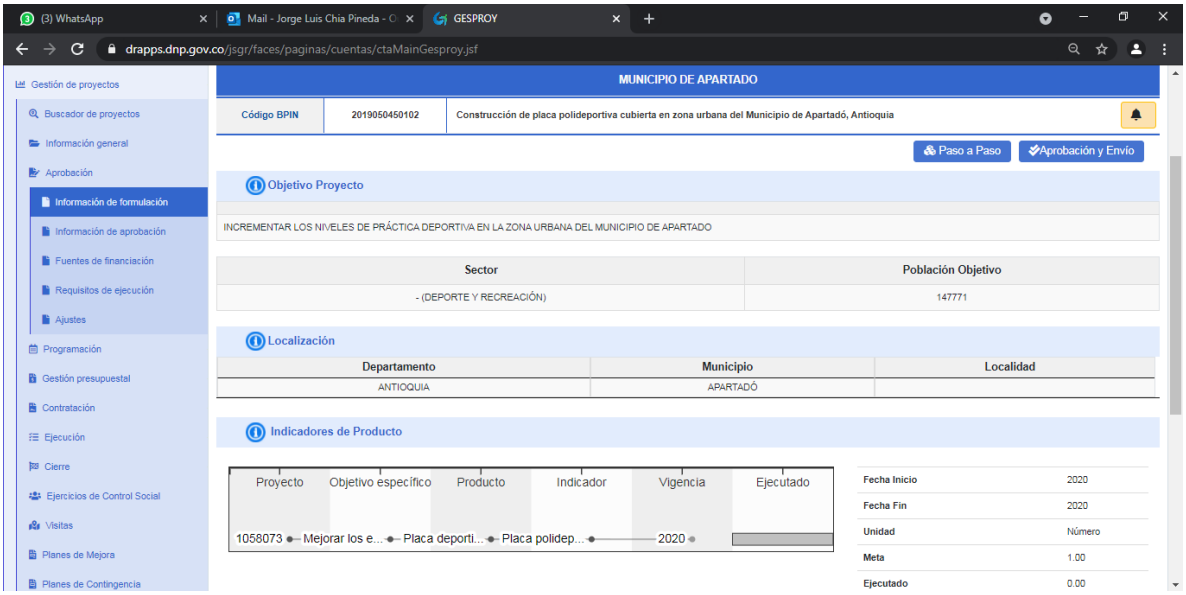


CUMPLIMIENTO REQUISITOS PARA CONTRATACIÓN

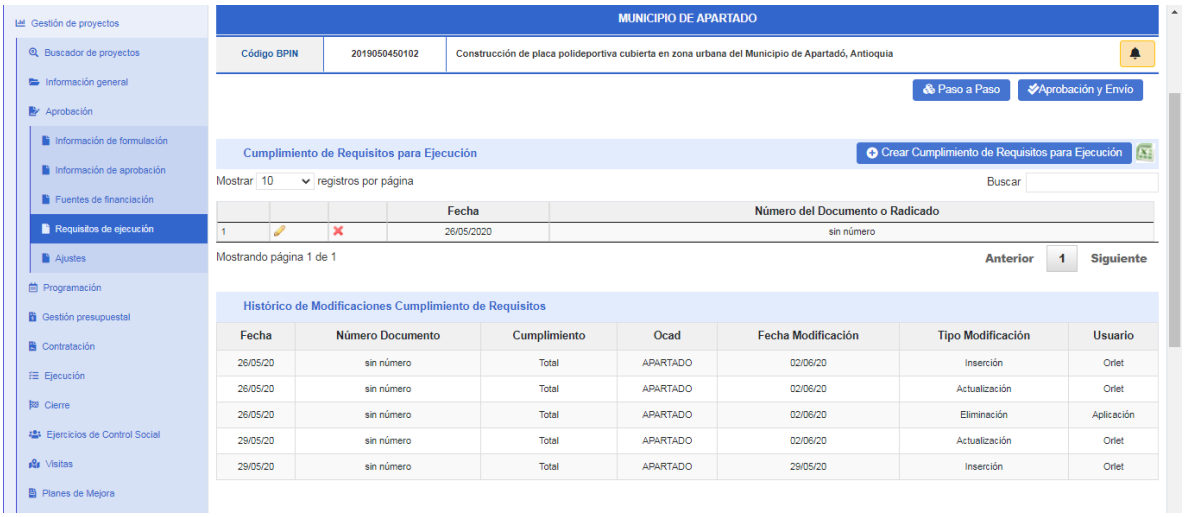


LINEA DE TIEMPO DEL PROYECTO

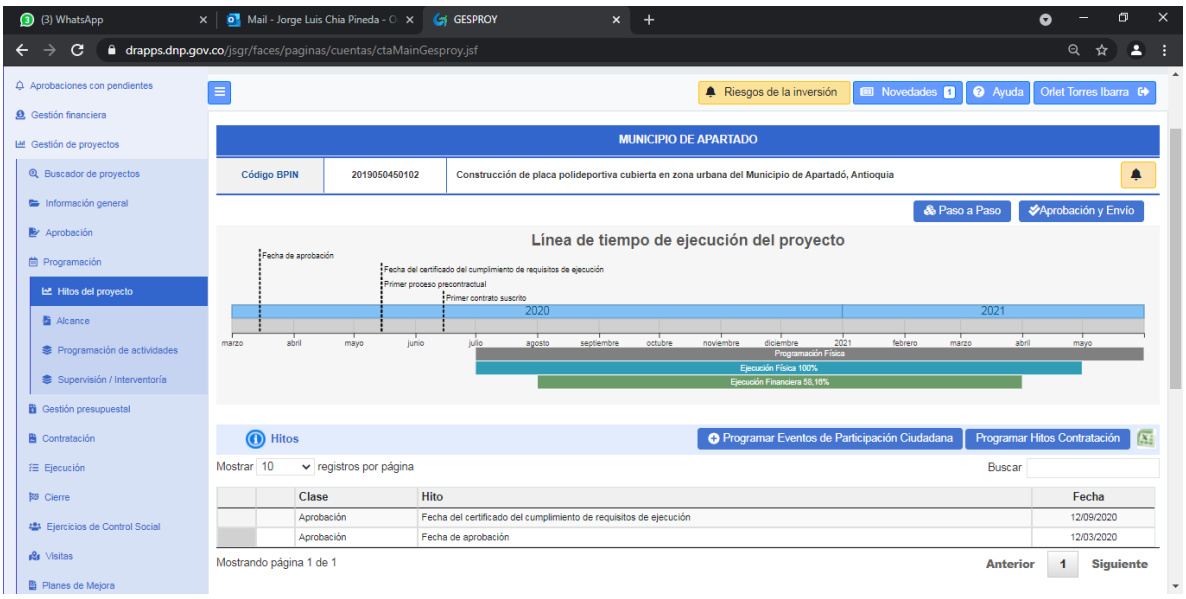


ALCANCE

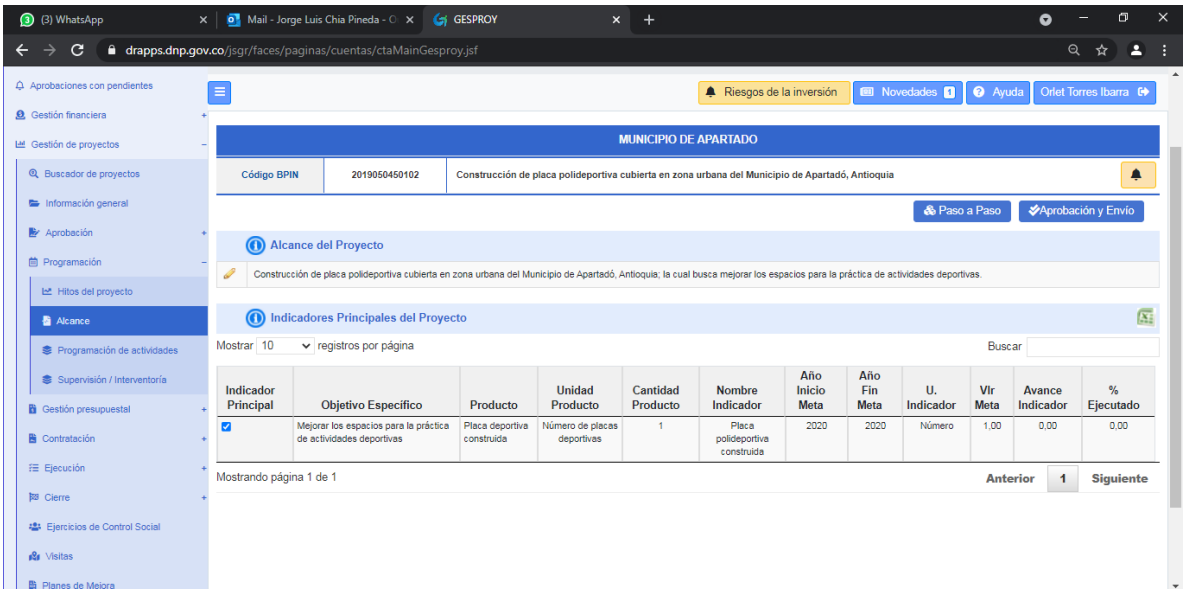

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

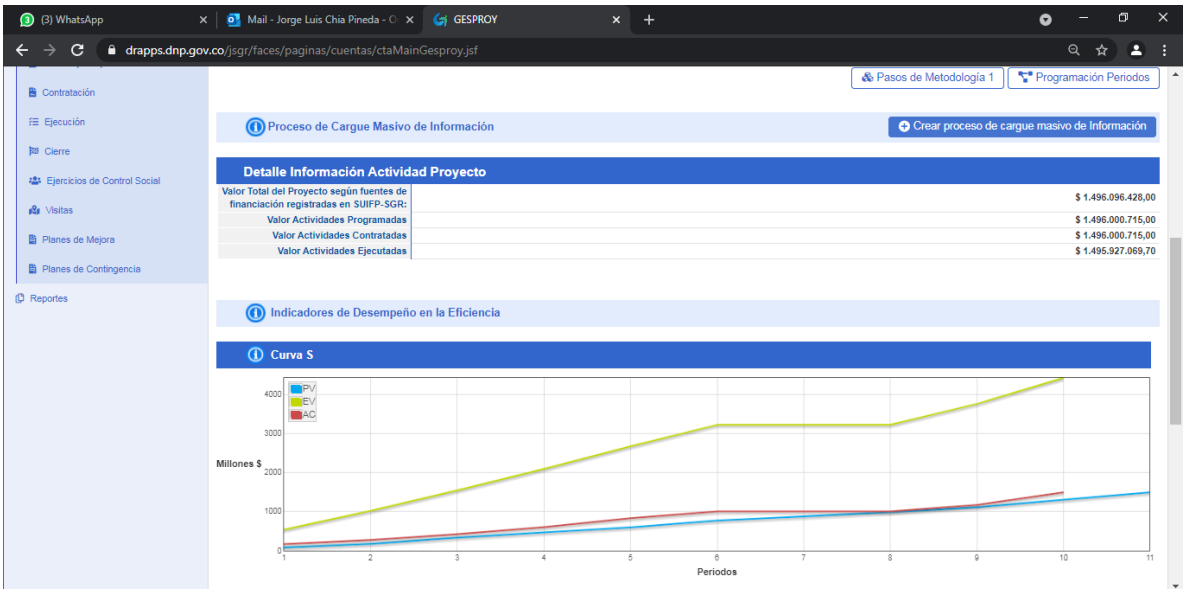


PERIODOS – AVANCE EN LA LINEA DE TIEMPO

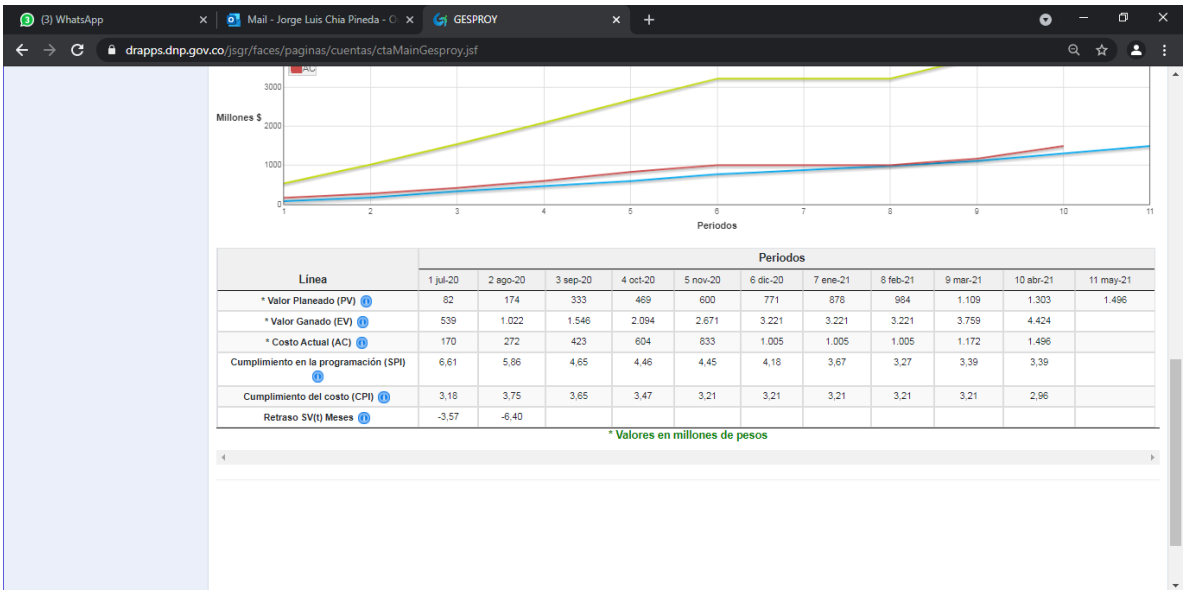

Línea	Periodos										
	1 jul-20	2 ago-20	3 sep-20	4 oct-20	5 nov-20	6 dic-20	7 ene-21	8 feb-21	9 mar-21	10 abr-21	11 may-21
* Valor Planeado (PV)	82	174	333	469	600	771	878	984	1.109	1.303	1.496
* Valor Ganado (EV)	539	1.022	1.546	2.094	2.671	3.221	3.221	3.221	3.759	4.424	
* Costo Actual (AC)	170	272	423	604	833	1.005	1.005	1.005	1.172	1.496	
Cumplimiento en la programación (SPI)	6,61	5,86	4,65	4,46	4,45	4,18	3,67	3,27	3,39	3,39	
Cumplimiento del costo (CPI)	3,18	3,75	3,65	3,47	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	2,96	
Retraso SV(t) Meses	-3,57	-6,40									

* Valores en millones de pesos

RUBROS

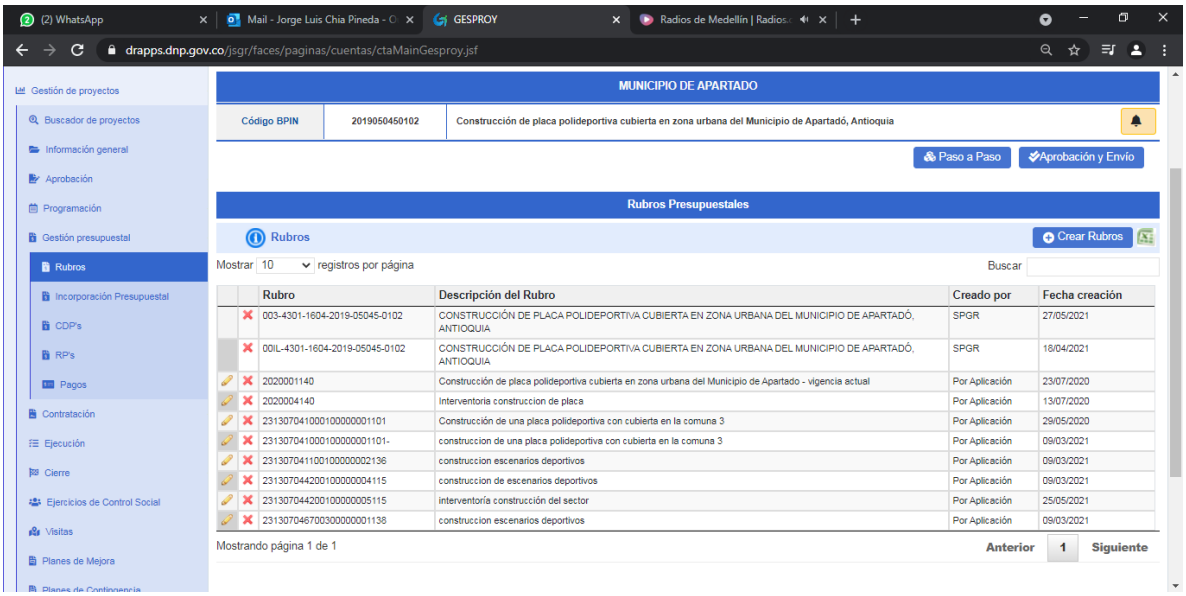


INCORPORACIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO




Vigencia	Fuente	Rubro - Descripción	Valor Incorporado	Acto Administrativo	Fecha de Acto Administrativo	Vigencia Futura	de Vigencia Futura	Creado por	Fecha creación
2019	Fondo De Compensación Regional	003-4301-1604-2019-05045-0102 CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA	259.853.384,34	4	12/03/2020	No		SPGR	27/05/2021
2020	Fondo De Compensación Regional	2020001140 Construcción de placa polideportiva cubierta en zona urbana del Municipio de Apartado - vigencia actual	385.638.984,66	154	03/04/2020	No		Por Aplicación	23/07/2020
2020	Fondo De Compensación Regional	2020004140 Interventoria construccion de placa	73.353.088,00	154-	03/04/2020	No		Por Aplicación	13/07/2020
2020	Propios	2313070410001000000001101 Construcción de una placa polideportiva con cubierta en la comuna 3	358.064.662,00	065	14/02/2020	No		Por Aplicación	12/06/2020
2020	Recursos propios	2313070410001000000001101- construccion de una placa polideportiva con cubierta en la comuna 3	33.670.290,00	359	31/12/2020	No		Por Aplicación	11/03/2021
2020	Recursos propios	2313070411001000000002136 construccion escenarios deportivos	23.897.957,00	359	31/12/2020	No		Por Aplicación	11/03/2021
2020	Recursos propios	2313070442001000000004115 construccion de escenarios deportivos	228.555.313,00	359	31/12/2020	No		Por Aplicación	11/03/2021
2020	Recursos propios	2313070442001000000005115 interventoría construcción del sector	28.563.622,00	359	31/12/2020	No		Por Aplicación	25/05/2021
2020	Recursos propios	2313070467003000000001138 construccion escenarios deportivos	104.499.127,00	359	31/12/2020	No		Por Aplicación	11/03/2021
2021	SGR - Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría	00IL-4301-1604-2019-05045-0102 CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA	259.853.384,34	298	19/03/2021	No		SPGR	21/04/2021

CDP´S

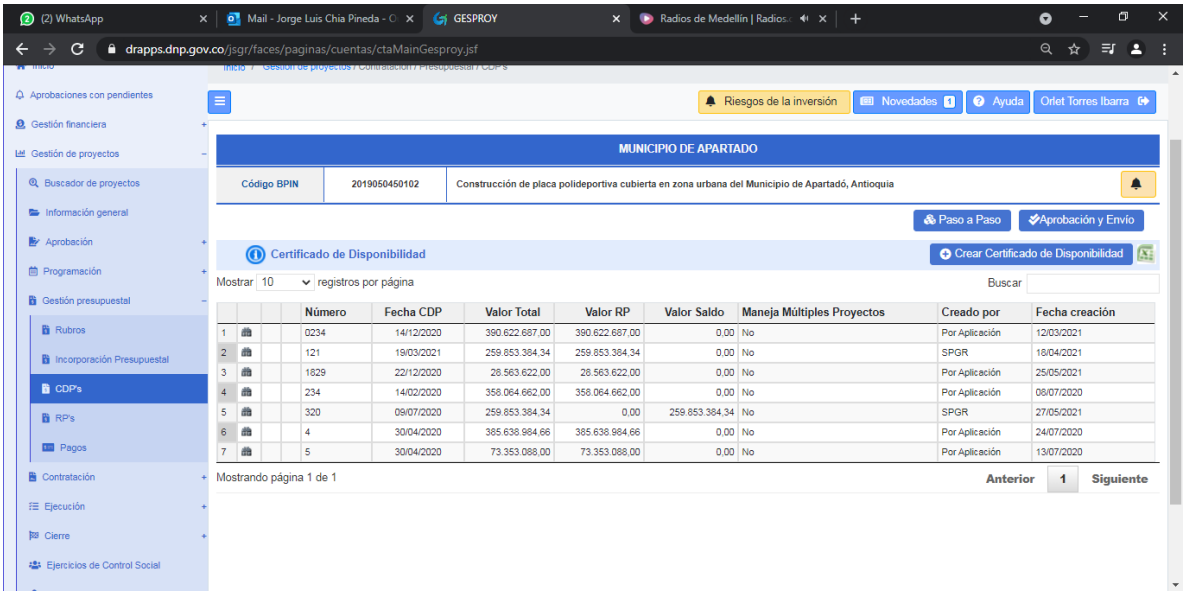


	Número	Fecha CDP	Valor Total	Valor RP	Valor Saldo	Maneja Múltiples Proyectos	Creado por	Fecha creación
1	0234	14/12/2020	390.622.687,00	390.622.687,00	0,00	No	Por Aplicación	12/03/2021
2	121	19/03/2021	259.853.384,34	259.853.384,34	0,00	No	SPGR	18/04/2021
3	1829	22/12/2020	28.563.622,00	28.563.622,00	0,00	No	Por Aplicación	25/05/2021
4	234	14/02/2020	358.064.662,00	358.064.662,00	0,00	No	Por Aplicación	08/07/2020
5	320	09/07/2020	259.853.384,34	0,00	259.853.384,34	No	SPGR	27/05/2021
6	4	30/04/2020	385.638.984,66	385.638.984,66	0,00	No	Por Aplicación	24/07/2020
7	5	30/04/2020	73.353.088,00	73.353.088,00	0,00	No	Por Aplicación	13/07/2020

RESGISTROS PRESUPUESTAL

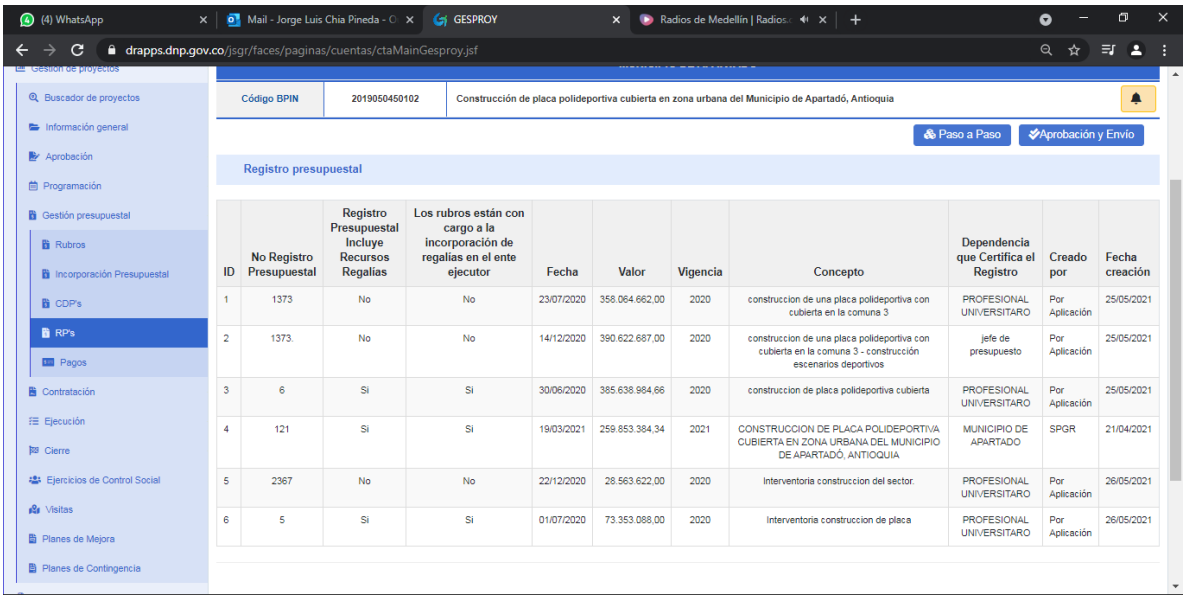

ID	No Registro Presupuestal	Registro Presupuestal Incluye Recursos Regalías	Los rubros están con cargo a la incorporación de regalías en el ente ejecutor	Fecha	Valor	Vigencia	Concepto	Dependencia que Certifica el Registro	Creado por	Fecha creación
1	1373	No	No	23/07/2020	358.064.662,00	2020	construccion de una placa polideportiva con cubierta en la comuna 3	PROFESIONAL UNIVERSITARO	Por Aplicación	25/05/2021
2	1373.	No	No	14/12/2020	390.622.687,00	2020	construccion de una placa polideportiva con cubierta en la comuna 3 - construcción escenarios deportivos	jefe de presupuesto	Por Aplicación	25/05/2021
3	6	Si	Si	30/06/2020	385.638.984,66	2020	construccion de placa polideportiva cubierta	PROFESIONAL UNIVERSITARO	Por Aplicación	25/05/2021
4	121	Si	Si	19/03/2021	259.853.384,34	2021	CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA	MUNICIPIO DE APARTADO	SPGR	21/04/2021
5	2367	No	No	22/12/2020	28.563.622,00	2020	Interventoria construccion del sector.	PROFESIONAL UNIVERSITARO	Por Aplicación	26/05/2021
6	5	Si	Si	01/07/2020	73.353.088,00	2020	Interventoria construccion de placa	PROFESIONAL UNIVERSITARO	Por Aplicación	26/05/2021


CONTRATISTAS

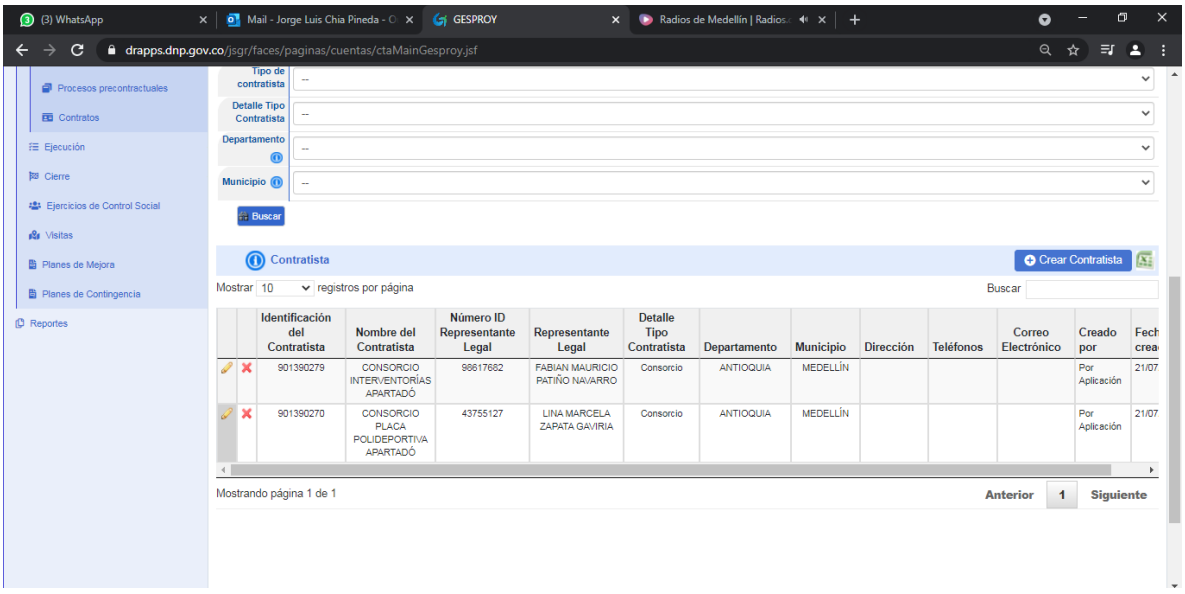


		Identificación del Contratista	Nombre del Contratista	Número ID Representante Legal	Representante Legal	Detalle Tipo Contratista	Departamento	Municipio	Dirección	Teléfonos	Correo Electrónico	Creado por	Fech crea
		901390279	CONSORCIO INTERVENTORÍAS APARTADÓ	98617682	FABIAN MAURICIO PATIÑO NAVARRO	Consorcio	ANTIOQUIA	MEDELLÍN				Por Aplicación	21/07
		901390270	CONSORCIO PLACA POLIDEPORTIVA APARTADÓ	43755127	LINA MARCELA ZAPATA GAVIRIA	Consorcio	ANTIOQUIA	MEDELLÍN				Por Aplicación	21/07

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente


PROCESO PRECONTRACTUAL

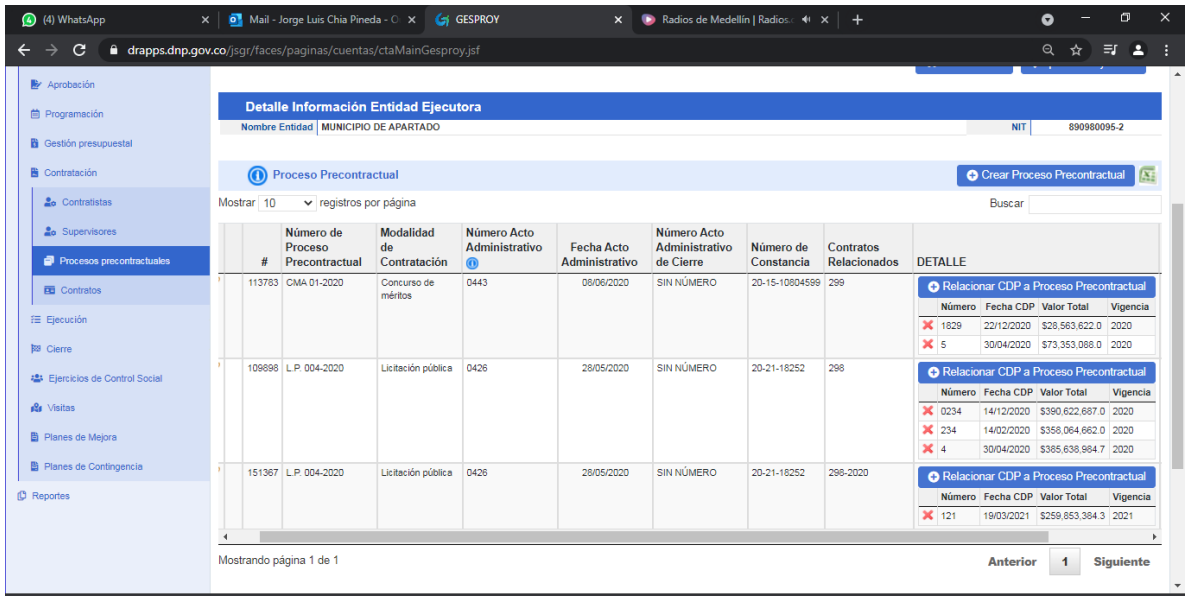


CONTRATO DE OBRA

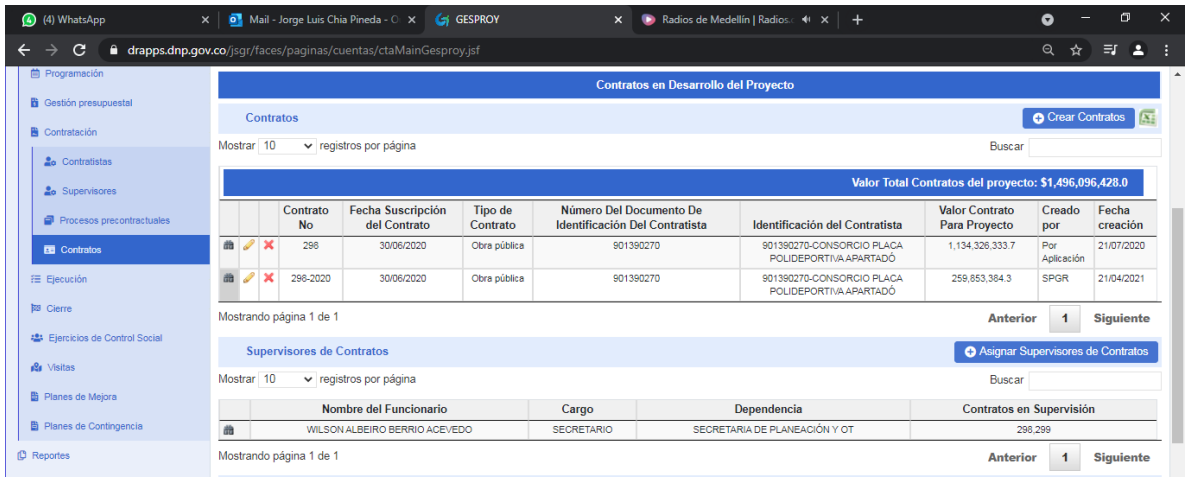


ACTUALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

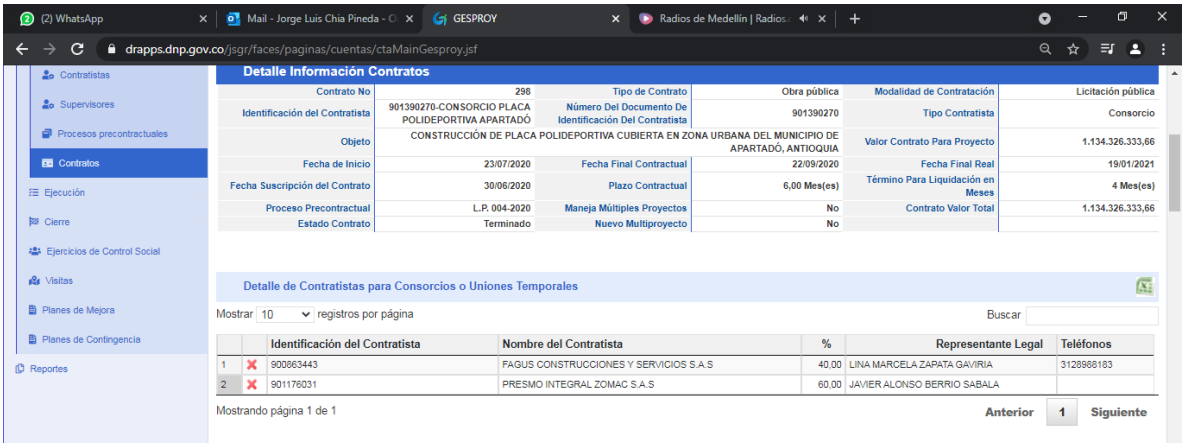

AFECTACIÓN RP

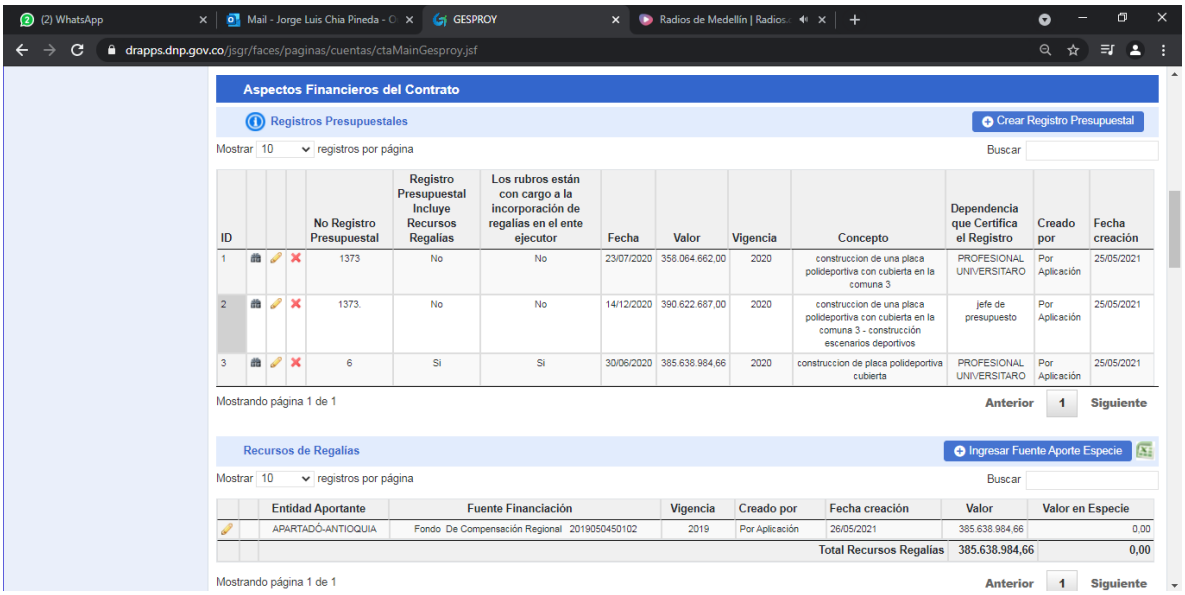

OTRAS FUENTES - CONTRATOS

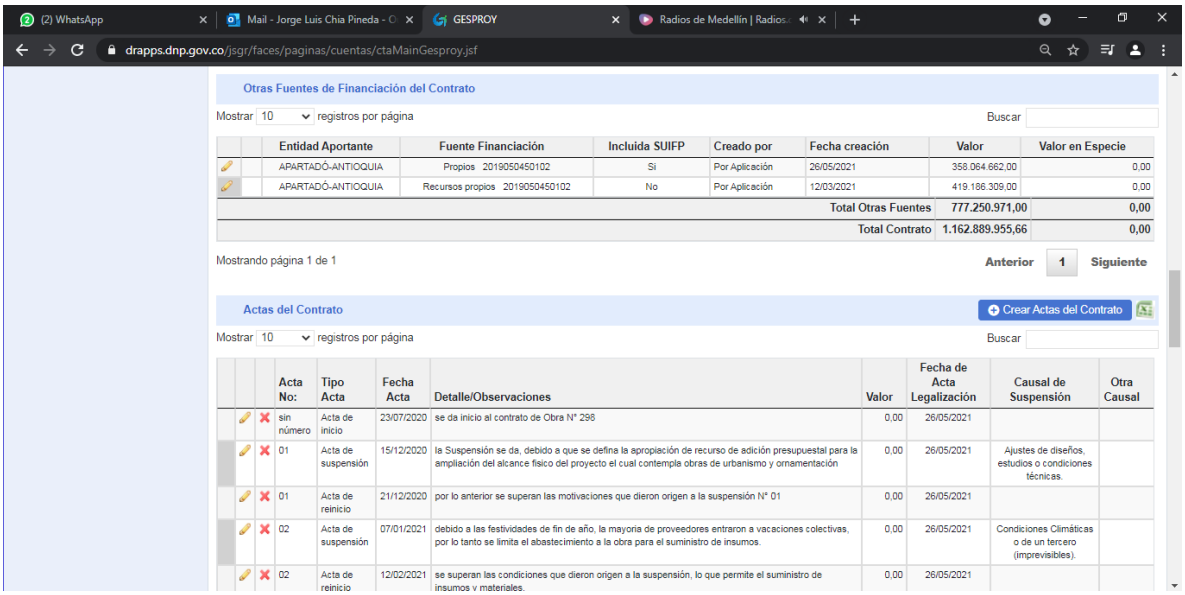

Otras Fuentes de Financiación del Contrato

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Entidad Aportante	Fuente Financiación	Incluida SUIFP	Creado por	Fecha creación	Valor	Valor en Especie
APARTADÓ-ANTIOQUIA	Propios 2019050450102	Si	Por Aplicación	26/05/2021	358.064.662,00	0,00
APARTADÓ-ANTIOQUIA	Recursos propios 2019050450102	No	Por Aplicación	12/03/2021	419.186.309,00	0,00
				Total Otras Fuentes	777.250.971,00	0,00
				Total Contrato	1.162.889.955,66	0,00


Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Actas del Contrato — Crear Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página — Buscar

Acta No:	Tipo Acta	Fecha Acta	Detalle/Observaciones	Valor	Fecha de Acta Legalización	Causal de Suspensión	Otra Causal
sin número	Acta de inicio	23/07/2020	se da inicio al contrato de Obra N° 296	0,00	26/05/2021		
01	Acta de suspensión	15/12/2020	la Suspensión se da, debido a que se defina la apropiación de recurso de adición presupuestal para la ampliación del alcance físico del proyecto el cual contempla obras de urbanismo y ornamentación	0,00	26/05/2021	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas.	
01	Acta de reinicio	21/12/2020	por lo anterior se superan las motivaciones que dieron origen a la suspensión N° 01	0,00	26/05/2021		
02	Acta de suspensión	07/01/2021	debido a las festividades de fin de año, la mayoria de proveedores entraron a vacaciones colectivas, por lo tanto se limita el abastecimiento a la obra para el suministro de insumos.	0,00	26/05/2021	Condiciones Climáticas o de un tercero (imprevisibles).	
02	Acta de reinicio	12/02/2021	se superan las condiciones que dieron origen a la suspensión, lo que permite el suministro de insumos y materiales.	0,00	26/05/2021		

POLIZAS

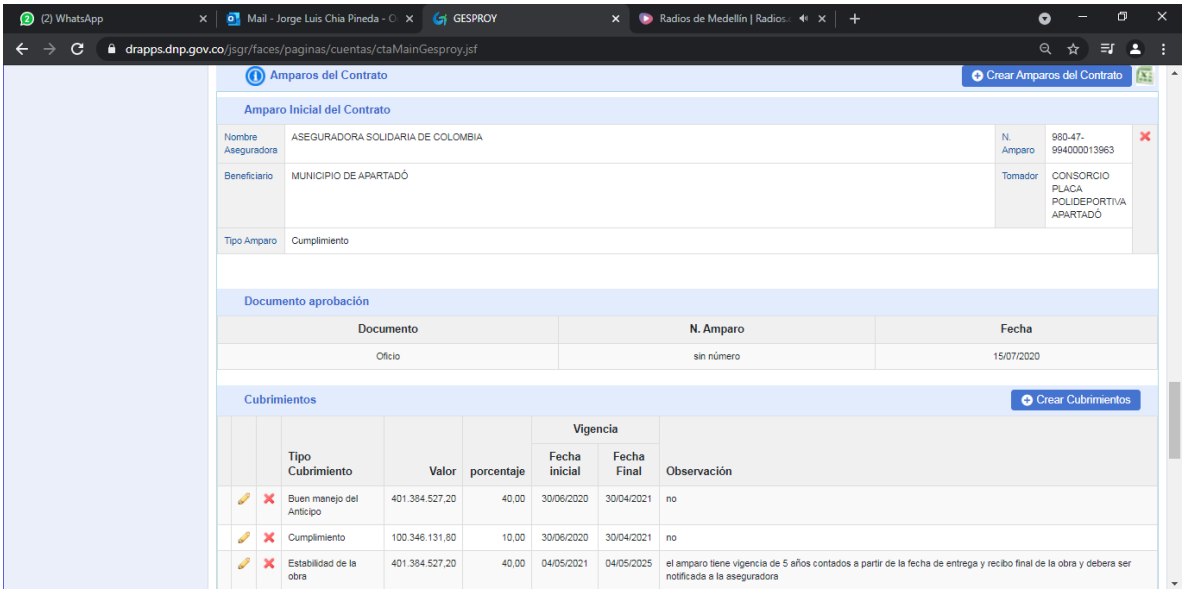

Amparos del Contrato — Crear Amparos del Contrato

Amparo Inicial del Contrato

Nombre Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	N. Amparo	980-47-994000013963
Beneficiario	MUNICIPIO DE APARTADÓ	Tomador	CONSORCIO PLACA POLIDEPORTIVA APARTADÓ
Tipo Amparo	Cumplimiento		


Documento aprobación

Documento	N. Amparo	Fecha
Oficio	sin número	15/07/2020

Cubrimientos — Crear Cubrimientos

Tipo Cubrimiento	Valor	porcentaje	Vigencia Fecha inicial	Vigencia Fecha Final	Observación
Buen manejo del Anticipo	401.384.527,20	40,00	30/06/2020	30/04/2021	no
Cumplimiento	100.346.131,80	10,00	30/06/2020	30/04/2021	no
Estabilidad de la obra	401.384.527,20	40,00	04/05/2021	04/05/2025	el amparo tiene vigencia de 5 años contados a partir de la fecha de entrega y recibo final de la obra y debera ser notificada a la aseguradora

MODIFICACIÓN CONTRATO – OTROSI TIEMPO Y DINERO

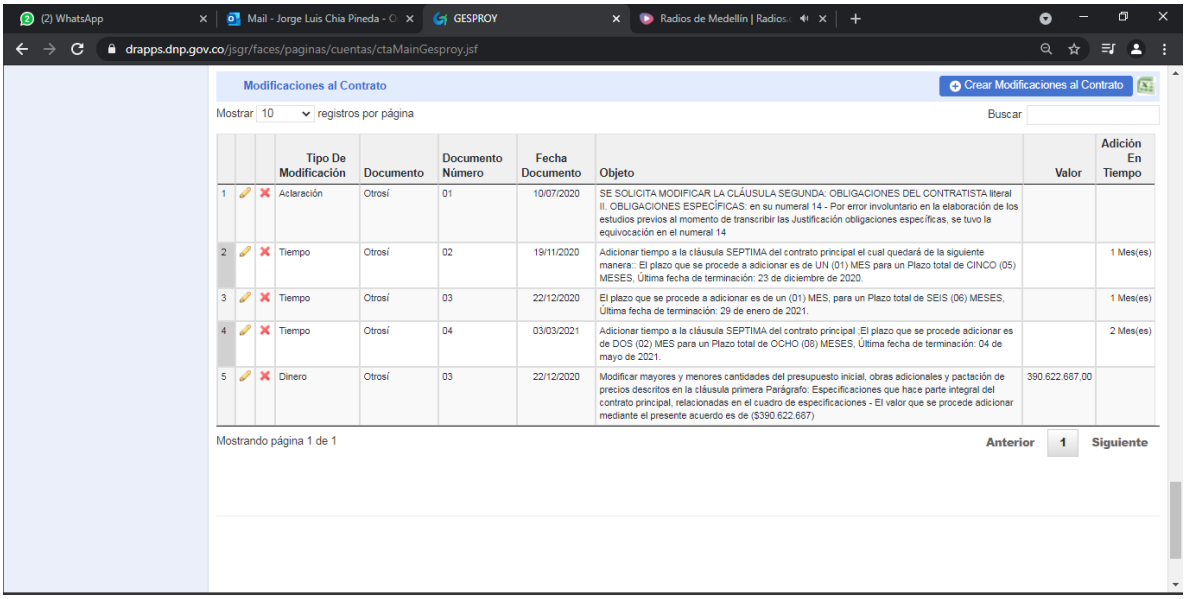

	Tipo De Modificación	Documento	Documento Número	Fecha Documento	Objeto	Valor	Adición En Tiempo
1	Aclaración	Otrosí	01	10/07/2020	SE SOLICITA MODIFICAR LA CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA literal II. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: en su numeral 14 - Por error involuntario en la elaboración de los estudios previos al momento de transcribir las Justificación obligaciones específicas, se tuvo la equivocación en el numeral 14		
2	Tiempo	Otrosí	02	19/11/2020	Adicionar tiempo a la cláusula SEPTIMA del contrato principal el cual quedará de la siguiente manera:: El plazo que se procede a adicionar es de UN (01) MES para un Plazo total de CINCO (05) MESES, Última fecha de terminación: 23 de diciembre de 2020.		1 Mes(es)
3	Tiempo	Otrosí	03	22/12/2020	El plazo que se procede a adicionar es de un (01) MES, para un Plazo total de SEIS (06) MESES, Última fecha de terminación: 29 de enero de 2021.		1 Mes(es)
4	Tiempo	Otrosí	04	03/03/2021	Adicionar tiempo a la cláusula SEPTIMA del contrato principal :El plazo que se procede adicionar es de DOS (02) MES para un Plazo total de OCHO (08) MESES, Última fecha de terminación: 04 de mayo de 2021.		2 Mes(es)
5	Dinero	Otrosí	03	22/12/2020	Modificar mayores y menores cantidades del presupuesto inicial, obras adicionales y pactación de precios descritos en la cláusula primera Parágrafo: Especificaciones que hace parte integral del contrato principal, relacionadas en el cuadro de especificaciones - El valor que se procede adicionar mediante el presente acuerdo es de ($390.622.687)	390.622.687,00	

Mostrando página 1 de 1 Anterior 1 Siguiente

ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA





	Contrato No	Fecha Suscripción del Contrato	Objeto	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	Identificación del Contratista	Valor Contrato Para Proyecto	Contratos Objeto de la Interventoría	Creado por	Fecha creación
	299	30/06/2020	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA	901390279	901390279-CONSORCIO INTERVENTORÍAS APARTADÓ	101,916,710.0		Por Aplicación	21/07/2020

Mostrando página 1 de 1 Anterior 1 Siguiente




RP AFECTACIÓN

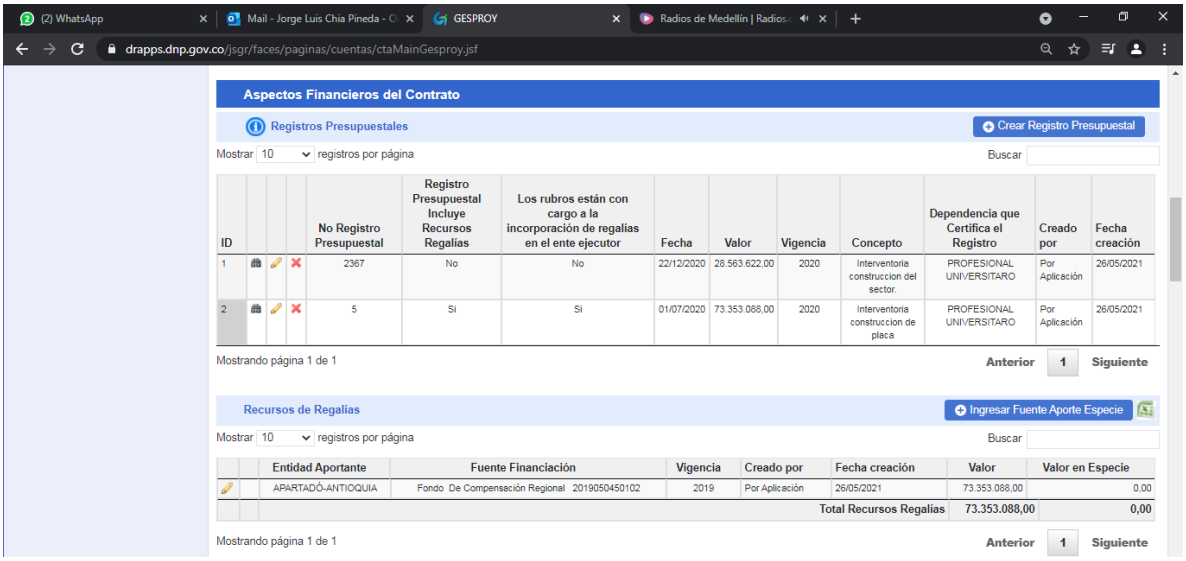


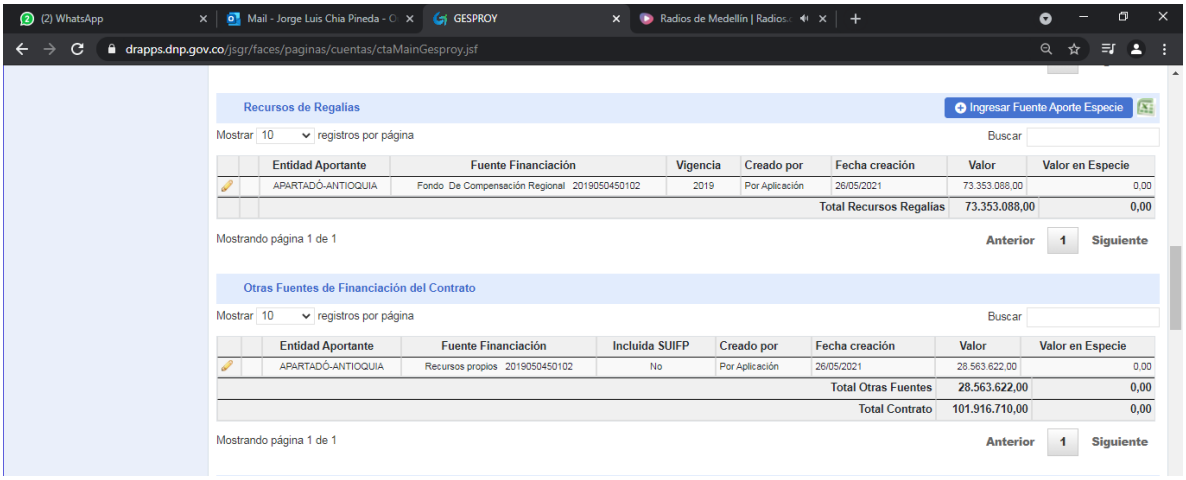


ACTUALIZACIÓN DE CONTRATOS

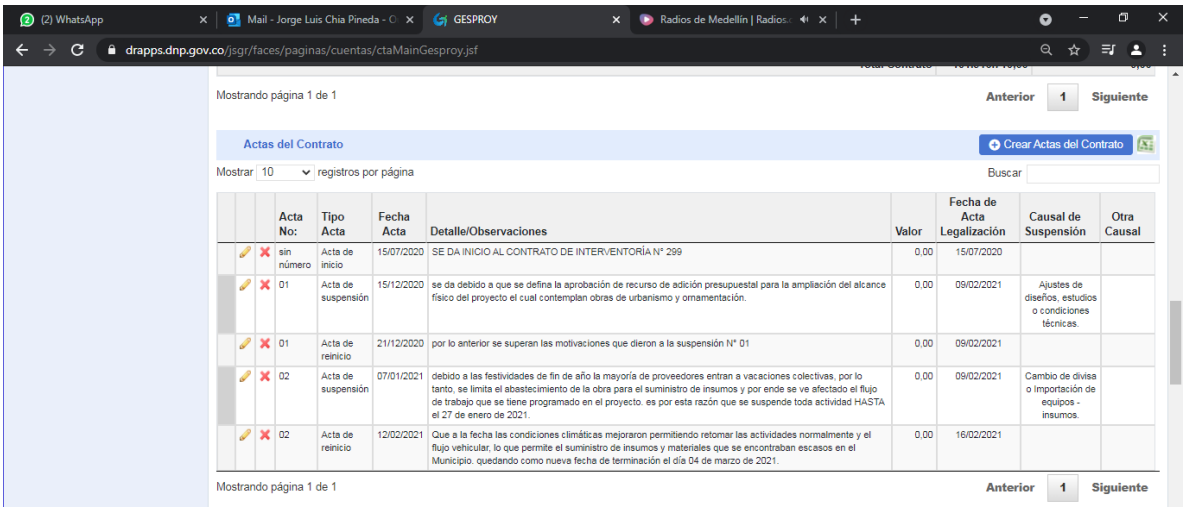


ACTUALIZACIÓN POLIZAS

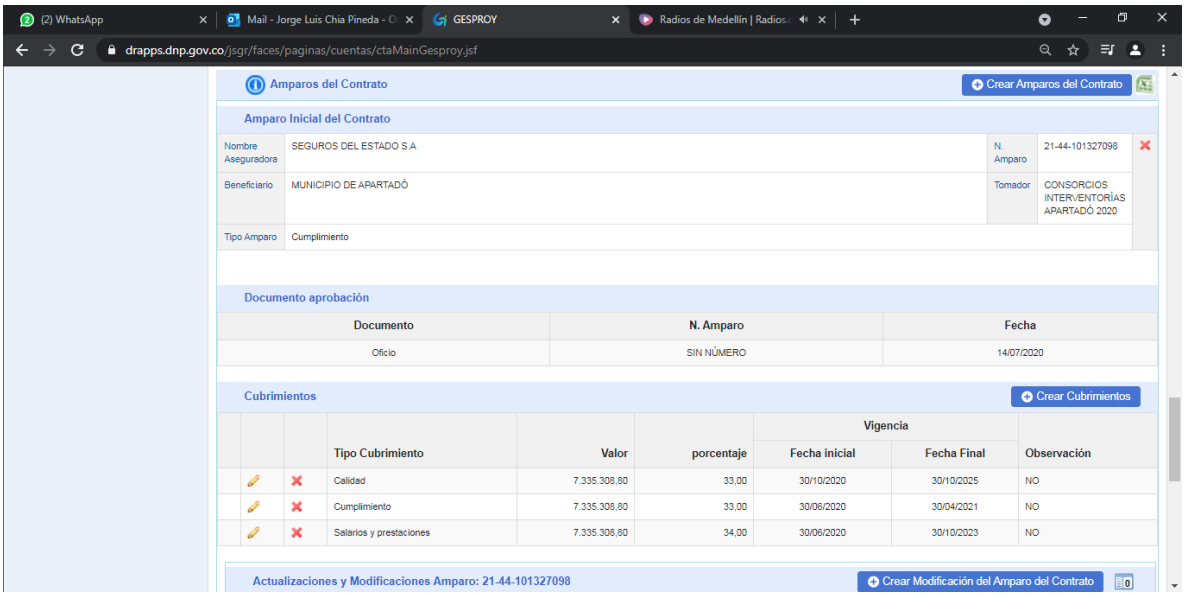



ACTUALIZACIÓN – MODIFICACIÓN DE CONTRATO – OTROSI EN TIEMPO Y DINERO

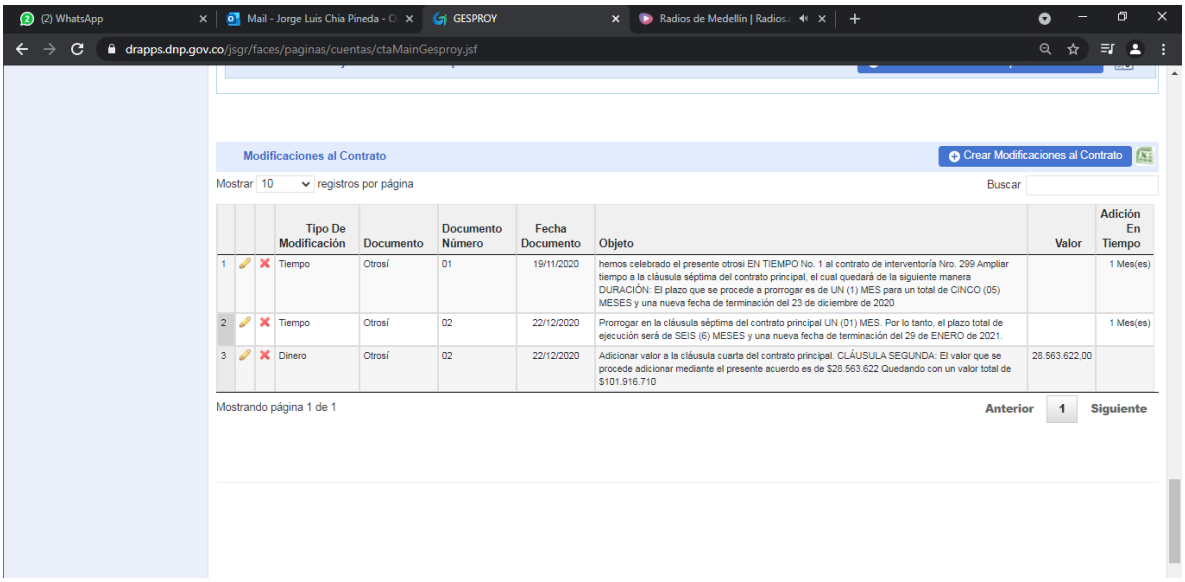

ACTUALIZACIÓN AVANCE OBRA

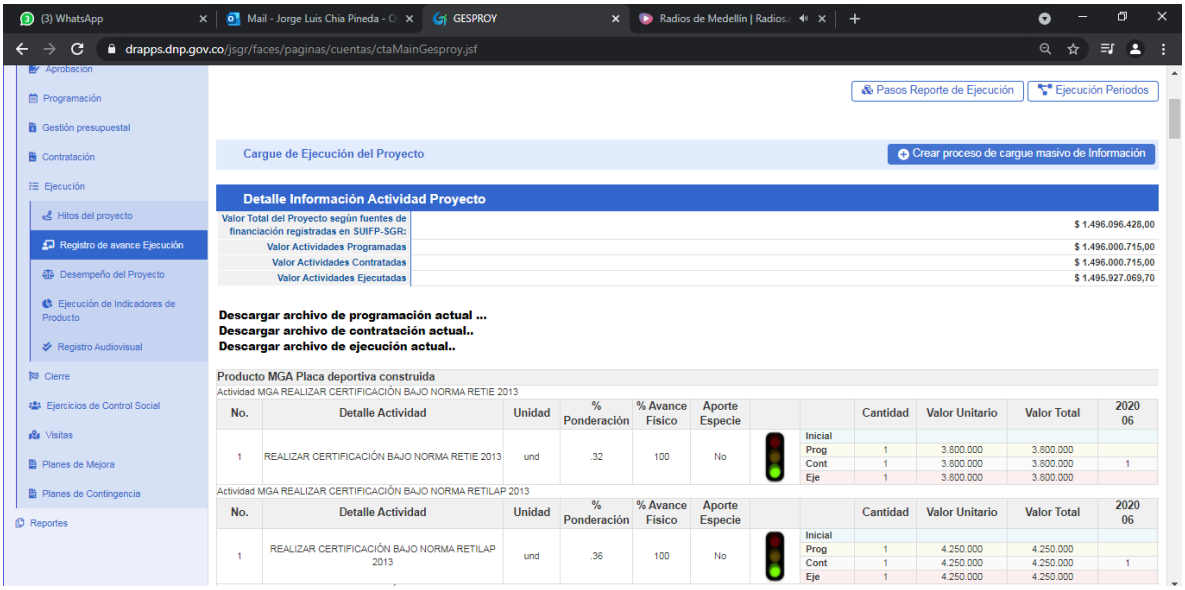

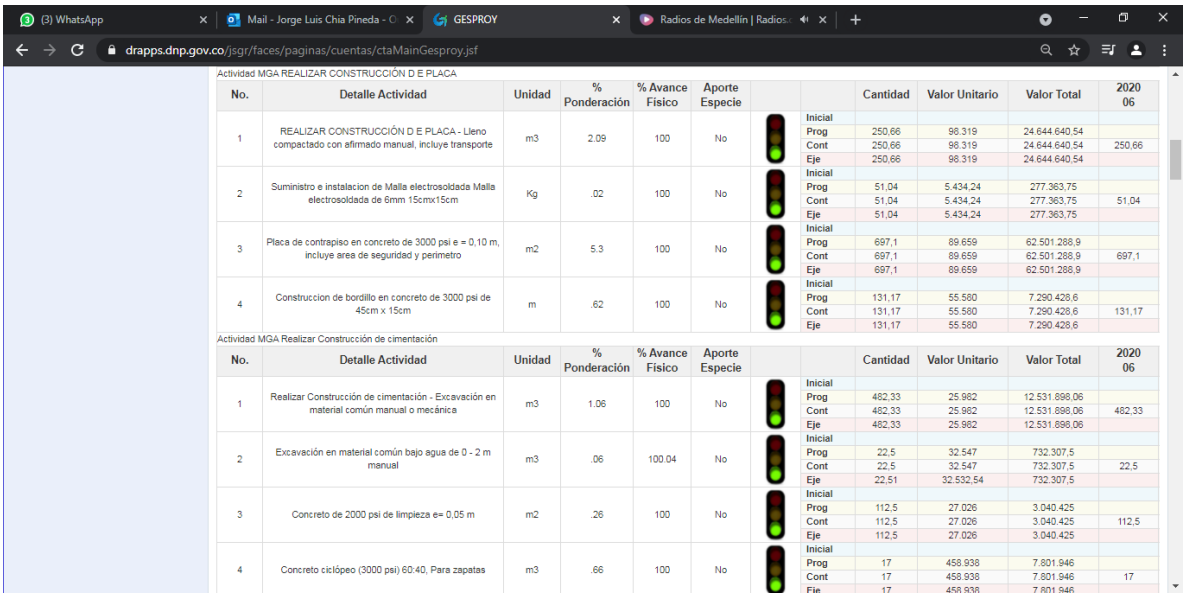

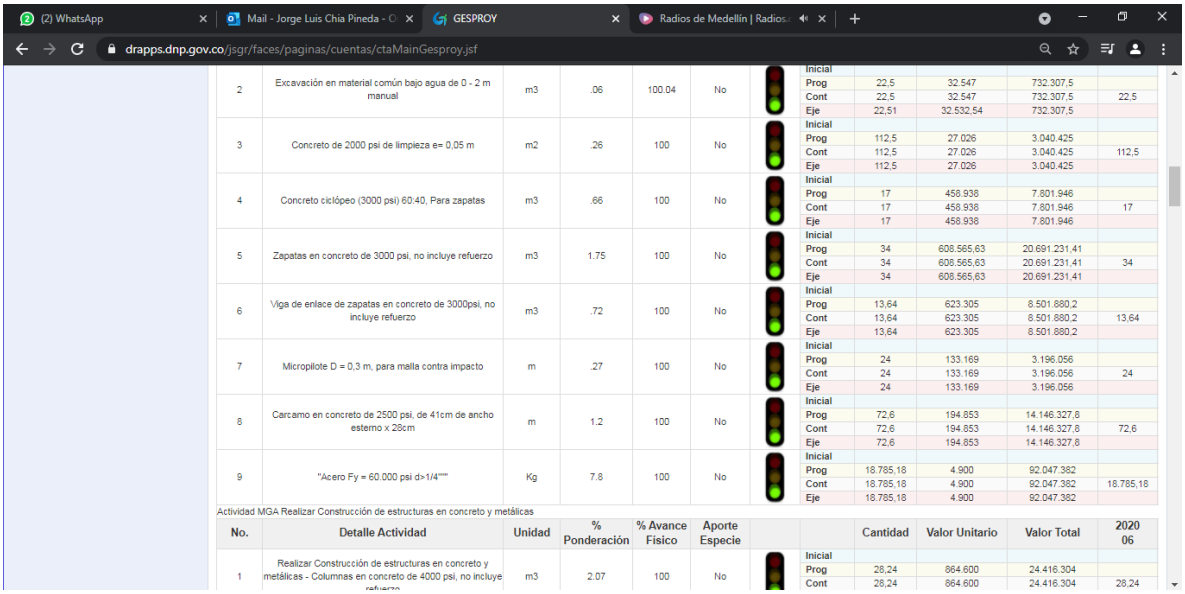

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2020 06
2	Excavación en material común bajo agua de 0 - 2 m manual	m3	.06	100.04	No		Inicial				
							Prog	22,5	32.547	732.307,5	
							Cont	22,5	32.547	732.307,5	22,5
							Eje	22,51	32.532,54	732.307,5	
3	Concreto de 2000 psi de limpieza e= 0,05 m	m2	.26	100	No		Inicial				
							Prog	112,5	27.026	3.040.425	
							Cont	112,5	27.026	3.040.425	112,5
							Eje	112,5	27.026	3.040.425	
4	Concreto ciclópeo (3000 psi) 60:40, Para zapatas	m3	.66	100	No		Inicial				
							Prog	17	458.938	7.801.946	
							Cont	17	458.938	7.801.946	17
							Eje	17	458.938	7.801.946	
5	Zapatas en concreto de 3000 psi, no incluye refuerzo	m3	1.75	100	No		Inicial				
							Prog	34	608.565,63	20.691.231,41	
							Cont	34	608.565,63	20.691.231,41	34
							Eje	34	608.565,63	20.691.231,41	
6	Viga de enlace de zapatas en concreto de 3000psi, no incluye refuerzo	m3	.72	100	No		Inicial				
							Prog	13,64	623.305	8.501.880,2	
							Cont	13,64	623.305	8.501.880,2	13,64
							Eje	13,64	623.305	8.501.880,2	
7	Micropilote D = 0,3 m, para malla contra impacto	m	.27	100	No		Inicial				
							Prog	24	133.169	3.196.056	
							Cont	24	133.169	3.196.056	24
							Eje	24	133.169	3.196.056	
8	Carcamo en concreto de 2500 psi, de 41cm de ancho esterno x 28cm	m	1.2	100	No		Inicial				
							Prog	72,6	194.853	14.146.327,8	
							Cont	72,6	194.853	14.146.327,8	72,6
							Eje	72,6	194.853	14.146.327,8	
9	"Acero Fy = 60.000 psi d>1/4"""	Kg	7.8	100	No		Inicial				
							Prog	18.785,18	4.900	92.047.382	
							Cont	18.785,18	4.900	92.047.382	18.785,18
							Eje	18.785,18	4.900	92.047.382	

Actividad MGA Realizar Construcción de estructuras en concreto y metálicas

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2020 06
1	Realizar Construcción de estructuras en concreto y metálicas - Columnas en concreto de 4000 psi, no incluye refuerzo	m3	2.07	100	No		Inicial				
							Prog	28,24	864.600	24.416.304	
							Cont	28,24	864.600	24.416.304	28,24
							Eje	28,24	864.600	24.416.304	
2	Viga aérea en concreto de 4000 psi, no incluye acero	m3	.72	100	No		Inicial				
							Prog	9,07	930.421	8.438.918,47	
							Cont	9,07	930.421	8.438.918,47	9,07
							Eje	9,07	930.421	8.438.918,47	
3	Estructura en acero A36 para Cubierta	Kg	15.26	100	No		Inicial				
							Prog	16.183	11.121	179.971.143	
							Cont	16.183	11.121	179.971.143	16.183
							Eje	16.183	11.121	179.971.143	
4	Malla contra impacto según diseño estructural, incluye suministro e instalación de anclajes	m2	4.34	100	No		Inicial				
							Prog	171	299.315	51.182.865	
							Cont	171	299.315	51.182.865	171
							Eje	171	299.315	51.182.865	
5	Suministro e instalacion de Portería múltiple fija, incluye malla 100% nylon	und	.6	100	No		Inicial				
							Prog	2	3.533.083	7.066.166	
							Cont	2	3.533.083	7.066.166	2
							Eje	2	3.533.083	7.066.166	
6	"Suministro e instalación parales de voleibol (incluye parales 3"" en tubería"	und	.03	100	No		Inicial				
							Prog	1	395.318	395.318	
							Cont	1	395.318	395.318	1
							Eje	1	395.318	395.318	

Actividad MGA REALIZAR CONSTRUCCIÓN DE GRADERIAS

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2020 06
1	REALIZAR CONSTRUCCIÓN DE GRADERIAS - Muro en bloque de cemento de 0,14x0,19x0,39	m2	.43	100	No		Inicial				
							Prog	80,41	63.665	5.119.302,65	
							Cont	80,41	63.665	5.119.302,65	80,41
							Eje	80,41	63.665	5.119.302,65	
2	Placa maciza en concreto de 20,7 Mpa e = 0,05 m, graderia	m3	.26	100	No		Inicial				
							Prog	4	767.254	3.069.016	
							Cont	4	767.254	3.069.016	4



WhatsApp | Mail - Jorge Luis Chia Pineda - O | GESPROY | Radios de Medellín | Radios

drapps.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf


3	"Pasamanos en tubería de H. G. de 2"" Cal 14, incluye accesorios"	m	.73	100	No		Prog	47,34	181.879	8.610.151,86	
							Cont	47,34	181.879	8.610.151,86	47,34
							Eje	47,34	181.879	8.610.151,86	

Actividad MGA REALIZAR CONSTRUCCIÓN DE LAS CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2020 06
1	REALIZAR CONSTRUCCIÓN DE LAS CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES - Sumibistro e instalacion de Teja arquitectónica curva calibre 28 termoacústica	m2	6.29	100	No		Inicial				
							Prog	894,15	82.934	74.155.436,1	
							Cont	894,15	82.934	74.155.436,1	894,15
							Eje	894,15	82.934	74.155.436,1	
2	Suministro e instalacion de canal en lámina galvanizada cal. 20 desarrollo <200<=250 mm	m	.68	100	No		Inicial				
							Prog	66,16	120.608	7.979.425,28	
							Cont	66,16	120.608	7.979.425,28	66,16
							Eje	66,16	120.608	7.979.425,28	

Actividad MGA Realizar instalación de redes eléctricas


No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2020 06
1	Realizar instalación de redes eléctricas - S.E.I de acometida para tablero TE-01 en cable conductor monopolar sólido THHN/THWN No. 2x8+8+10 AWG	m	.03	100	No		Inicial				
							Prog	15	24.234	363.510	
							Cont	15	24.234	363.510	15
							Eje	15	24.234	363.510	
2	S.E.I Tubería PVC 1"	m	.05	100	No		Inicial				
							Prog	72	8.762	630.864	
							Cont	72	8.762	630.864	72
							Eje	72	8.762	630.864	
3	S.E.I Tubería PVC 2"	m	.01	100	No		Inicial				
							Prog	10	14.471	144.710	
							Cont	10	14.471	144.710	10
							Eje	10	14.471	144.710	
4	S.E.I Contador elect. 2F-3H (120-240)V	und	.09	100	No		Inicial				
							Prog	1	1.007.371,68	1.007.371,68	
							Cont	1	1.007.371,68	1.007.371,68	1
							Eje	1	1.007.371,68	1.007.371,68	
5	S.E.I de cable conductor monopolar sólido N 3x12 AWG	m	.52	100	No		Inicial				
							Prog	515,37	11.841	6.102.496,17	
							Cont	515,37	11.841	6.102.496,17	515,37
							Eje	515,37	11.841	6.102.496,17	
							Inicial				

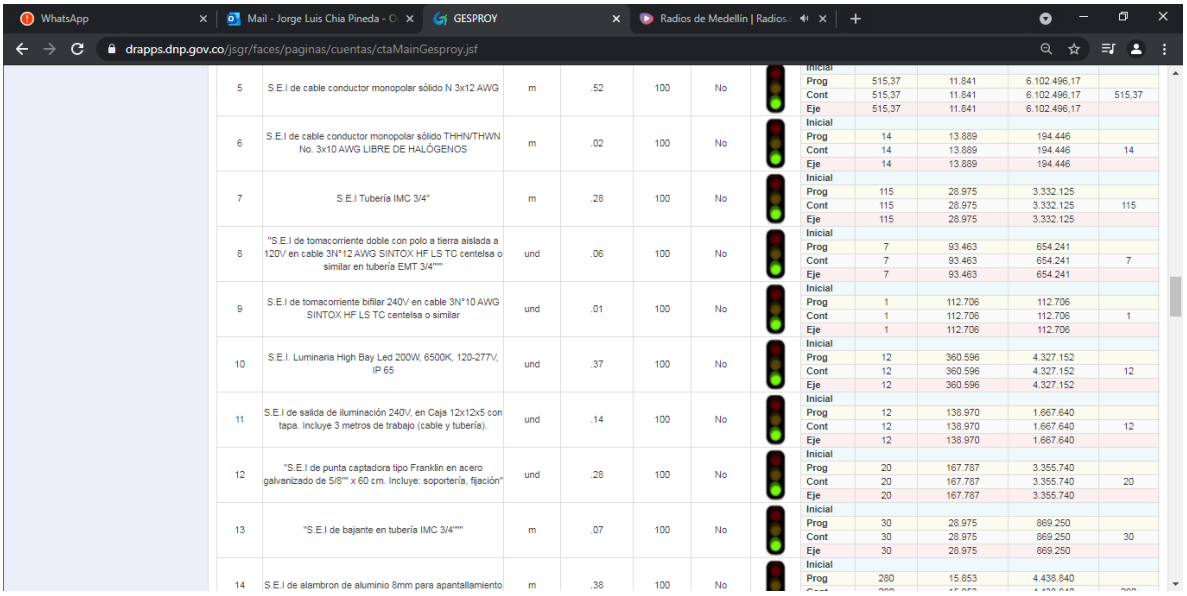

WhatsApp | Mail - Jorge Luis Chia Pineda - O | GESPROY | Radios de Medellín | Radios

drapps.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf

							Inicial				
5	S.E.I de cable conductor monopolar sólido N 3x12 AWG	m	.52	100	No		Prog	515,37	11.841	6.102.496,17	
							Cont	515,37	11.841	6.102.496,17	515,37
							Eje	515,37	11.841	6.102.496,17	
6	S.E.I de cable conductor monopolar sólido THHN/THWN No. 3x10 AWG LIBRE DE HALÓGENOS	m	.02	100	No		Inicial				
							Prog	14	13.889	194.446	
							Cont	14	13.889	194.446	14
							Eje	14	13.889	194.446	
7	S.E.I Tubería IMC 3/4"	m	.28	100	No		Inicial				
							Prog	115	28.975	3.332.125	
							Cont	115	28.975	3.332.125	115
							Eje	115	28.975	3.332.125	
8	"S.E.I de tomacorriente doble con polo a tierra aislada a 120V en cable 3N°12 AWG SINTOX HF LS TC centelsa o similar en tubería EMT 3/4""	und	.06	100	No		Inicial				
							Prog	7	93.463	654.241	
							Cont	7	93.463	654.241	7
							Eje	7	93.463	654.241	
9	S.E.I de tomacorriente bifilar 240V en cable 3N°10 AWG SINTOX HF LS TC centelsa o similar	und	.01	100	No		Inicial				
							Prog	1	112.706	112.706	
							Cont	1	112.706	112.706	1
							Eje	1	112.706	112.706	
10	S.E.I. Luminaria High Bay Led 200W, 6500K, 120-277V, IP 65	und	.37	100	No		Inicial				
							Prog	12	360.596	4.327.152	
							Cont	12	360.596	4.327.152	12
							Eje	12	360.596	4.327.152	
11	S.E.I de salida de iluminación 240V, en Caja 12x12x5 con tapa. Incluye 3 metros de trabajo (cable y tubería).	und	.14	100	No		Inicial				
							Prog	12	138.970	1.667.640	
							Cont	12	138.970	1.667.640	12
							Eje	12	138.970	1.667.640	
12	"S.E.I de punta captadora tipo Franklin en acero galvanizado de 5/8"" x 60 cm. Incluye: soportería, fijación"	und	.28	100	No		Inicial				
							Prog	20	167.787	3.355.740	
							Cont	20	167.787	3.355.740	20
							Eje	20	167.787	3.355.740	
13	"S.E.I de bajante en tubería IMC 3/4""	m	.07	100	No		Inicial				
							Prog	30	28.975	869.250	
							Cont	30	28.975	869.250	30
							Eje	30	28.975	869.250	
14	S.E.I de alambron de aluminio 8mm para apantallamiento	m	.38	100	No		Inicial				
							Prog	280	15.853	4.438.840	

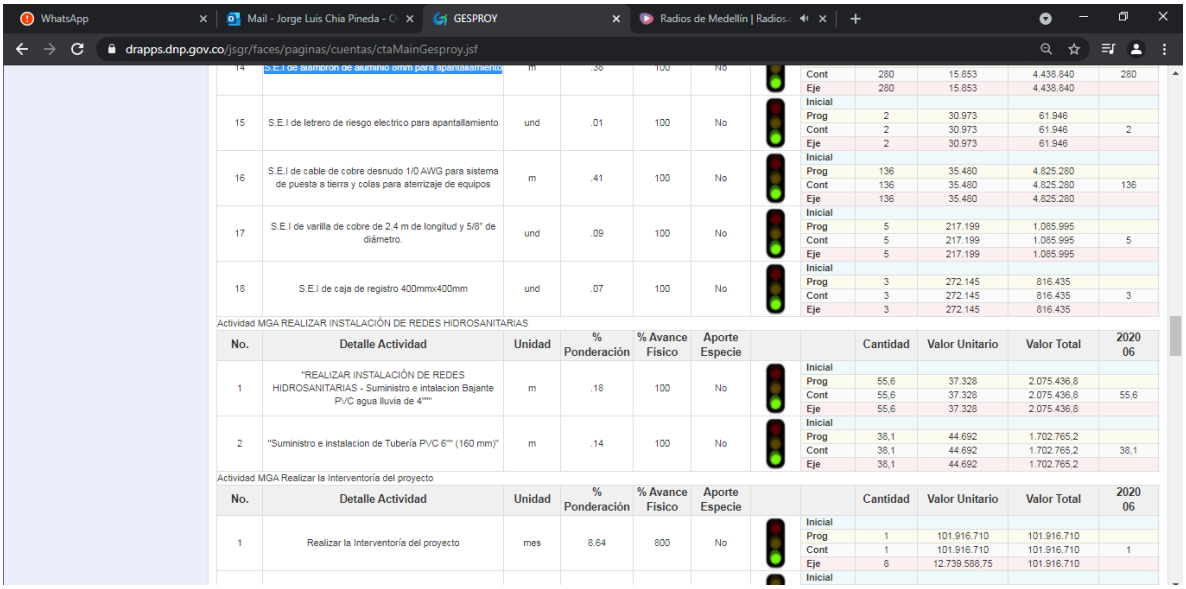


No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2020 06
14	S.E.I de alambron de aluminio 6mm para apantallamiento	m	.38	100	No		Cont	280	15.853	4.438.840	280
							Eje	280	15.853	4.438.840	
15	S.E.I de letrero de riesgo electrico para apantallamiento	und	.01	100	No		Inicial				
							Prog	2	30.973	61.946	
							Cont	2	30.973	61.946	2
							Eje	2	30.973	61.946	
16	S.E.I de cable de cobre desnudo 1/0 AWG para sistema de puesta a tierra y colas para aterrizaje de equipos	m	.41	100	No		Inicial				
							Prog	136	35.480	4.825.280	
							Cont	136	35.480	4.825.280	136
							Eje	136	35.480	4.825.280	
17	S.E.I de varilla de cobre de 2,4 m de longitud y 5/8" de diámetro.	und	.09	100	No		Inicial				
							Prog	5	217.199	1.085.995	
							Cont	5	217.199	1.085.995	5
							Eje	5	217.199	1.085.995	
18	S.E.I de caja de registro 400mmx400mm	und	.07	100	No		Inicial				
							Prog	3	272.145	816.435	
							Cont	3	272.145	816.435	3
							Eje	3	272.145	816.435	

Actividad MGA REALIZAR INSTALACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2020 06
1	"REALIZAR INSTALACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS - Suministro e intalacion Bajante PVC agua lluvia de 4"""	m	.18	100	No		Inicial				
							Prog	55,6	37.328	2.075.436,8	
							Cont	55,6	37.328	2.075.436,8	55,6
							Eje	55,6	37.328	2.075.436,8	
2	"Suministro e instalacion de Tubería PVC 6"" (160 mm)"	m	.14	100	No		Inicial				
							Prog	38,1	44.692	1.702.765,2	
							Cont	38,1	44.692	1.702.765,2	38,1
							Eje	38,1	44.692	1.702.765,2	

Actividad MGA Realizar la Interventoría del proyecto

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2020 06
1	Realizar la Interventoría del proyecto	mes	8.64	800	No		Inicial				
							Prog	1	101.916.710	101.916.710	
							Cont	1	101.916.710	101.916.710	1
							Eje	8	12.739.588,75	101.916.710	

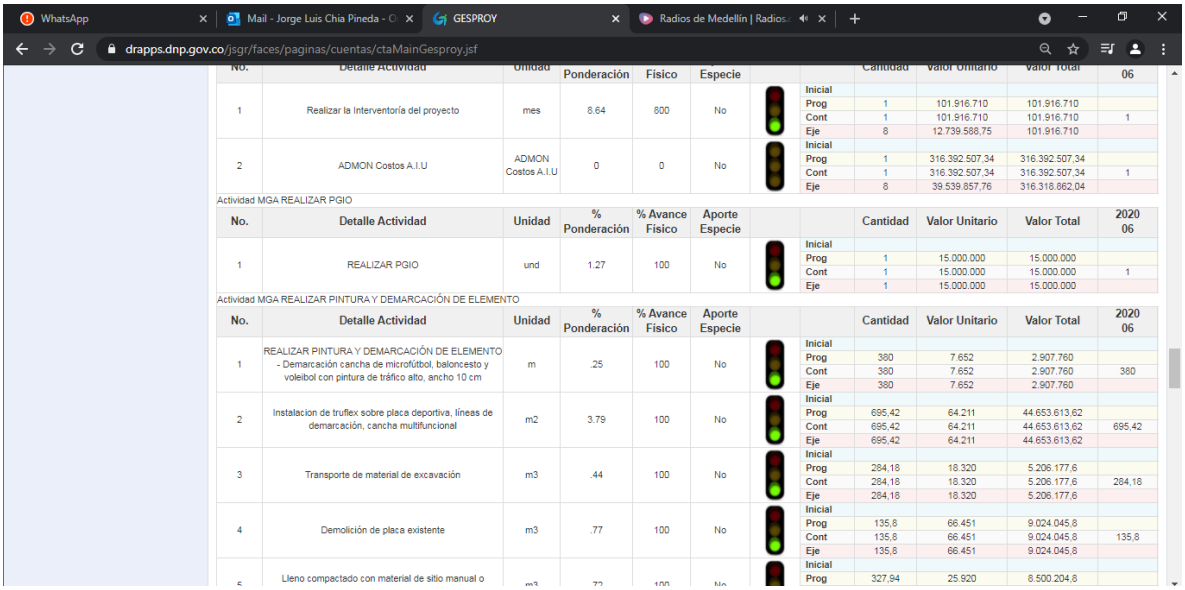

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2020 06
1	Realizar la Interventoría del proyecto	mes	8.64	800	No		Inicial				
							Prog	1	101.916.710	101.916.710	
							Cont	1	101.916.710	101.916.710	1
							Eje	8	12.739.588,75	101.916.710	
2	ADMON Costos A.I.U	ADMON Costos A.I.U	0	0	No		Inicial				
							Prog	1	316.392.507,34	316.392.507,34	
							Cont	1	316.392.507,34	316.392.507,34	1
							Eje	8	39.539.857,76	316.318.862,04	

Actividad MGA REALIZAR PGIO

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2020 06
1	REALIZAR PGIO	und	1.27	100	No		Inicial				
							Prog	1	15.000.000	15.000.000	
							Cont	1	15.000.000	15.000.000	1
							Eje	1	15.000.000	15.000.000	

Actividad MGA REALIZAR PINTURA Y DEMARCACIÓN DE ELEMENTO


No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie			Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2020 06
1	REALIZAR PINTURA Y DEMARCACIÓN DE ELEMENTO - Demarcación cancha de microfútbol, baloncesto y voleibol con pintura de tráfico alto, ancho 10 cm	m	.25	100	No		Inicial				
							Prog	380	7.652	2.907.760	
							Cont	380	7.652	2.907.760	380
							Eje	380	7.652	2.907.760	
2	Instalacion de truflex sobre placa deportiva, líneas de demarcación, cancha multifuncional	m2	3.79	100	No		Inicial				
							Prog	695,42	64.211	44.653.613,62	
							Cont	695,42	64.211	44.653.613,62	695,42
							Eje	695,42	64.211	44.653.613,62	
3	Transporte de material de excavación	m3	.44	100	No		Inicial				
							Prog	284,18	18.320	5.206.177,6	
							Cont	284,18	18.320	5.206.177,6	284,18
							Eje	284,18	18.320	5.206.177,6	
4	Demolición de placa existente	m3	.77	100	No		Inicial				
							Prog	135,8	66.451	9.024.045,8	
							Cont	135,8	66.451	9.024.045,8	135,8
							Eje	135,8	66.451	9.024.045,8	
5	Lleno compactado con material de sitio manual o	m3	.72	100	No		Inicial				
							Prog	327,94	25.920	8.500.204,8	




4	Demolición de placa existente	m3	.77	100	No	Inicial				
						Prog	135,8	66.451	9.024.045,8	
						Cont	135,8	66.451	9.024.045,8	135,8
						Eje	135,8	66.451	9.024.045,8	
5	Lleno compactado con material de sitio manual o mecánico	m3	.72	100	No	Inicial				
						Prog	327,94	25.920	8.500.204,8	
						Cont	327,94	25.920	8.500.204,8	327,94
						Eje	327,94	25.920	8.500.204,8	
6	Anden en concreto de 3000 psi e = 0,08 m, incluye area perimetral de cancha y zona graderías	m2	1.52	100	No	Inicial				
						Prog	237,03	75.808	17.968.770,24	
						Cont	237,03	75.808	17.968.770,24	237,03
						Eje	237,03	75.808	17.968.770,24	
7	Viga de cimentación en concreto de 3000 PSI, no incluye refuerzo	m3	.62	100	No	Inicial				
						Prog	11,56	637.440	7.368.806,4	
						Cont	11,56	637.440	7.368.806,4	11,56
						Eje	11,56	637.440	7.368.806,4	
8	Caja de inspección de 0,60 x 0,60 en bloque, concreto de 3000 psi	und	.06	100	No	Inicial				
						Prog	2	360.812	721.624	
						Cont	2	360.812	721.624	2
						Eje	2	360.812	721.624	
9	Conformación de terreno	m2	1.13	100	No	Inicial				
						Prog	922	14.405	13.281.410	
						Cont	922	14.405	13.281.410	922
						Eje	922	14.405	13.281.410	
10	Sub base granular	m3	.51	100	No	Inicial				
						Prog	72,63	82.129	5.965.029,27	
						Cont	72,63	82.129	5.965.029,27	72,63
						Eje	72,63	82.129	5.965.029,27	
11	Piso en adoquín liso gris 40x20 sobre capa de arena	m2	3.94	100	No	Inicial				
						Prog	656,4	70.748	46.438.987,2	
						Cont	656,4	70.748	46.438.987,2	656,4
						Eje	656,4	70.748	46.438.987,2	
12	Zonas duras concreto hidraulico fc= 250 Kg/cm2. Texturizado, vía peatonal	m3	2.04	100	No	Inicial				
						Prog	31,35	768.102	24.079.997,7	
						Cont	31,35	768.102	24.079.997,7	31,35
						Eje	31,35	768.102	24.079.997,7	
	Piso en loseta cuadratica prefabricada tactil alerta, 20x20					Inicial				
						Prog	31,12	116.660	3.630.459,2	



						Cont	31,12	116.660	3.630.459,2	31,12
						Eje	31,12	116.660	3.630.459,2	
13	Piso en loseta cuadratica prefabricada tactil alerta, 20x20 e=60mm	m2	.31	100	No	Inicial				
						Prog	40	74.492	2.979.680	
						Cont	40	74.492	2.979.680	40
						Eje	40	74.492	2.979.680	
14	Plantación de especies vegetales forestales	und	.25	100	No	Inicial				
						Prog	145,92	168.086,57	24.527.192,29	
						Cont	145,92	168.086,57	24.527.192,29	145,92
						Eje	145,92	168.086,57	24.527.192,29	
15	Contenedor de raíz. 100cm x 15 cm x L = 100 cm, en concreto de 2500	m	2.08	100	No	Inicial				
						Prog	74,4	72.987	5.430.232,8	
						Cont	74,4	72.987	5.430.232,8	74,4
						Eje	74,4	72.987	5.430.232,8	
16	Borde complemento en concreto 15 cm x15 cm, de 2500 PSI	m	.46	100	No	Inicial				
						Prog	64,75	61.437,04	3.978.046,55	
						Cont	64,75	61.437,04	3.978.046,55	64,75
						Eje	64,75	61.437,04	3.978.046,55	
17	Grama sintetica, color verde	m2	.34	100	No	Inicial				
						Prog	3.742	8.842	33.086.764	
						Cont	3.742	8.842	33.086.764	3.742
						Eje	3.742	8.842	33.086.764	
18	Estructura metálica para cubierta pergola zona	Kg	2.8	100	No	Inicial				
						Prog	100	72.591	7.259.100	
						Cont	100	72.591	7.259.100	100
						Eje	100	72.591	7.259.100	
19	Cubierta en policarbonato alveolar	m2	.62	100	No	Inicial				
						Prog	100	113.246	11.324.600	
						Cont	100	113.246	11.324.600	100
						Eje	100	113.246	11.324.600	
20	Techo en madera de pino imunizada para pergolas	m2	.96	100	No	Inicial				
						Prog	3	4.926.029,37	14.778.088,1	
						Cont	3	4.926.029,37	14.778.088,1	3
						Eje	3	4.926.029,37	14.778.088,1	
21	Banca en concreto de 3000 PSI tipo jardinera, incluye anclaje, formaleta	und	1.25	100	No	Inicial				
						Prog	3	771.458	2.314.374	
						Cont	3	771.458	2.314.374	3
22	"SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE POSTE METÁLICO GALVANIZADO DE 5M DE ALTURA, 2.5"" DE	und	.2	100	No	Inicial				

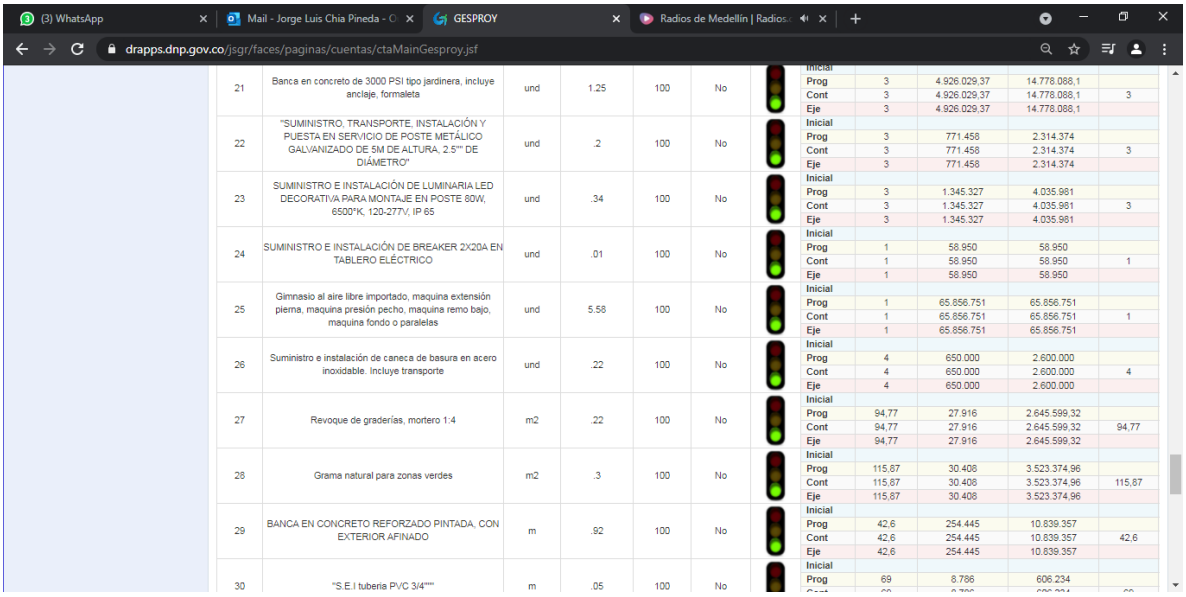

21	Banca en concreto de 3000 PSI tipo jardinera, incluye anclaje, formaleta	und	1.25	100	No	Inicial					
						Prog	3	4.926.029,37	14.778.088,1		
						Cont	3	4.926.029,37	14.778.088,1	3	
						Eje	3	4.926.029,37	14.778.088,1		
22	"SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE POSTE METÁLICO GALVANIZADO DE 5M DE ALTURA, 2.5"" DE DIÁMETRO"	und	.2	100	No	Inicial					
						Prog	3	771.458	2.314.374		
						Cont	3	771.458	2.314.374	3	
						Eje	3	771.458	2.314.374		
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DECORATIVA PARA MONTAJE EN POSTE 80W, 6500°K, 120-277V, IP 65	und	.34	100	No	Inicial					
						Prog	3	1.345.327	4.035.981		
						Cont	3	1.345.327	4.035.981	3	
						Eje	3	1.345.327	4.035.981		
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 2X20A EN TABLERO ELÉCTRICO	und	.01	100	No	Inicial					
						Prog	1	58.950	58.950		
						Cont	1	58.950	58.950	1	
						Eje	1	58.950	58.950		
25	Gimnasio al aire libre importado, maquina extensión pierna, maquina presión pecho, maquina remo bajo, maquina fondo o paralelas	und	5.58	100	No	Inicial					
						Prog	1	65.856.751	65.856.751		
						Cont	1	65.856.751	65.856.751	1	
						Eje	1	65.856.751	65.856.751		
26	Suministro e instalación de caneca de basura en acero inoxidable. Incluye transporte	und	.22	100	No	Inicial					
						Prog	4	650.000	2.600.000		
						Cont	4	650.000	2.600.000	4	
						Eje	4	650.000	2.600.000		
27	Revoque de graderías, mortero 1:4	m2	.22	100	No	Inicial					
						Prog	94,77	27.916	2.645.599,32		
						Cont	94,77	27.916	2.645.599,32	94,77	
						Eje	94,77	27.916	2.645.599,32		
28	Grama natural para zonas verdes	m2	.3	100	No	Inicial					
						Prog	115,87	30.408	3.523.374,96		
						Cont	115,87	30.408	3.523.374,96	115,87	
						Eje	115,87	30.408	3.523.374,96		
29	BANCA EN CONCRETO REFORZADO PINTADA, CON EXTERIOR AFINADO	m	.92	100	No	Inicial					
						Prog	42,6	254.445	10.839.357		
						Cont	42,6	254.445	10.839.357	42,6	
						Eje	42,6	254.445	10.839.357		
30	"S.E.I tuberia PVC 3/4""	m	.05	100	No	Inicial					
						Prog	69	8.786	606.234		

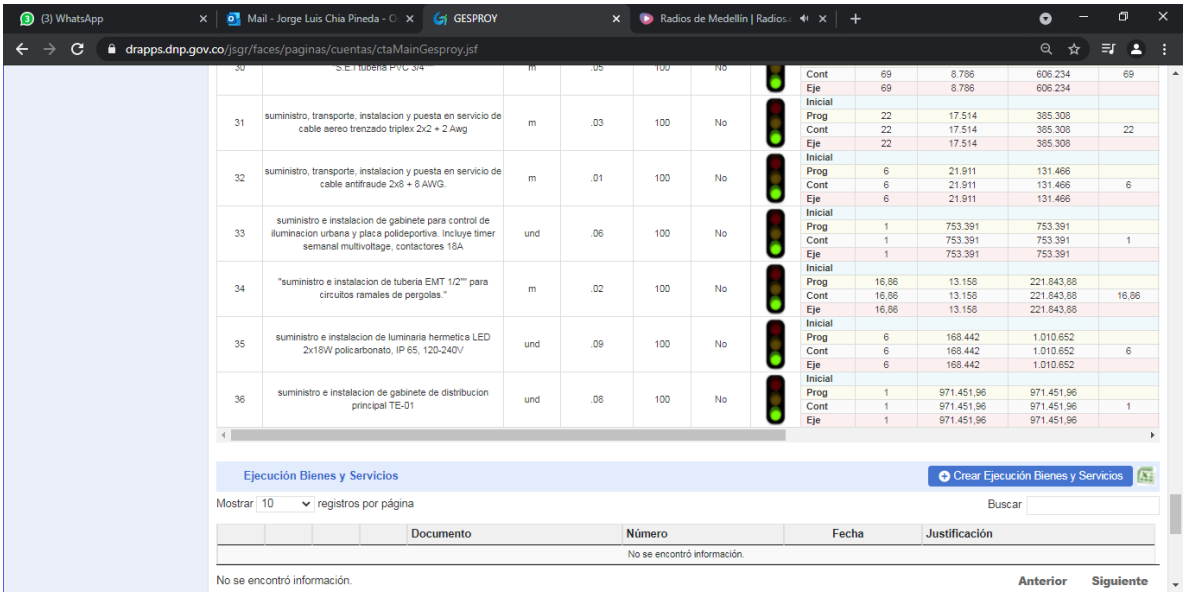

						Cont	69	8.786	606.234	69	
						Eje	69	8.786	606.234		
31	suministro, transporte, instalacion y puesta en servicio de cable aereo trenzado triplex 2x2 + 2 Awg	m	.03	100	No	Inicial					
						Prog	22	17.514	385.308		
						Cont	22	17.514	385.308	22	
						Eje	22	17.514	385.308		
32	suministro, transporte, instalacion y puesta en servicio de cable antifraude 2x8 + 8 AWG.	m	.01	100	No	Inicial					
						Prog	6	21.911	131.466		
						Cont	6	21.911	131.466	6	
						Eje	6	21.911	131.466		
33	suministro e instalacion de gabinete para control de iluminacion urbana y placa polideportiva. Incluye timer semanal multivoltage, contactores 18A	und	.06	100	No	Inicial					
						Prog	1	753.391	753.391		
						Cont	1	753.391	753.391	1	
						Eje	1	753.391	753.391		
34	"suministro e instalacion de tuberia EMT 1/2"" para circuitos ramales de pergolas."	m	.02	100	No	Inicial					
						Prog	16,86	13.158	221.843,88		
						Cont	16,86	13.158	221.843,88	16,86	
						Eje	16,86	13.158	221.843,88		
35	suministro e instalacion de luminaria hermetica LED 2x18W policarbonato, IP 65, 120-240V	und	.09	100	No	Inicial					
						Prog	6	168.442	1.010.652		
						Cont	6	168.442	1.010.652	6	
						Eje	6	168.442	1.010.652		
36	suministro e instalacion de gabinete de distribucion principal TE-01	und	.08	100	No	Inicial					
						Prog	1	971.451,96	971.451,96		
						Cont	1	971.451,96	971.451,96	1	
						Eje	1	971.451,96	971.451,96		

Ejecución Bienes y Servicios

Crear Ejecución Bienes y Servicios

Mostrar 10 registros por página


Buscar

				Documento	Número	Fecha	Justificación
					No se encontró información.		

No se encontró información.

Anterior Siguiente

INDICADOR DE DESEMPEÑO DE LA EFICACIA

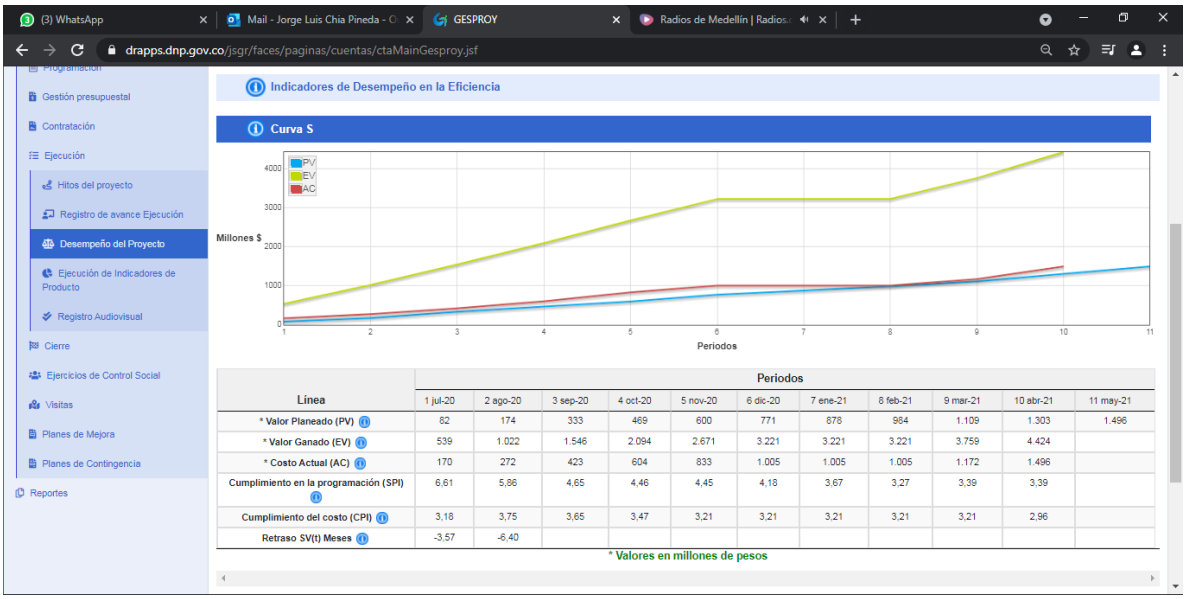


Línea	Periodos										
	1 jul-20	2 ago-20	3 sep-20	4 oct-20	5 nov-20	6 dic-20	7 ene-21	8 feb-21	9 mar-21	10 abr-21	11 may-21
* Valor Planeado (PV)	82	174	333	469	600	771	878	984	1.109	1.303	1.496
* Valor Ganado (EV)	539	1.022	1.546	2.094	2.671	3.221	3.221	3.221	3.759	4.424	
* Costo Actual (AC)	170	272	423	604	833	1.005	1.005	1.005	1.172	1.496	
Cumplimiento en la programación (SPI)	6,61	5,86	4,65	4,46	4,45	4,18	3,67	3,27	3,39	3,39	
Cumplimiento del costo (CPI)	3,18	3,75	3,65	3,47	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	2,96	
Retraso SV(t) Meses	-3,57	-6,40									

* Valores en millones de pesos


ACTUALIZACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN ASFALTO TIPO MDC-2 VÍA APARTADO CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ, DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ


LINEA DE TIEMPO

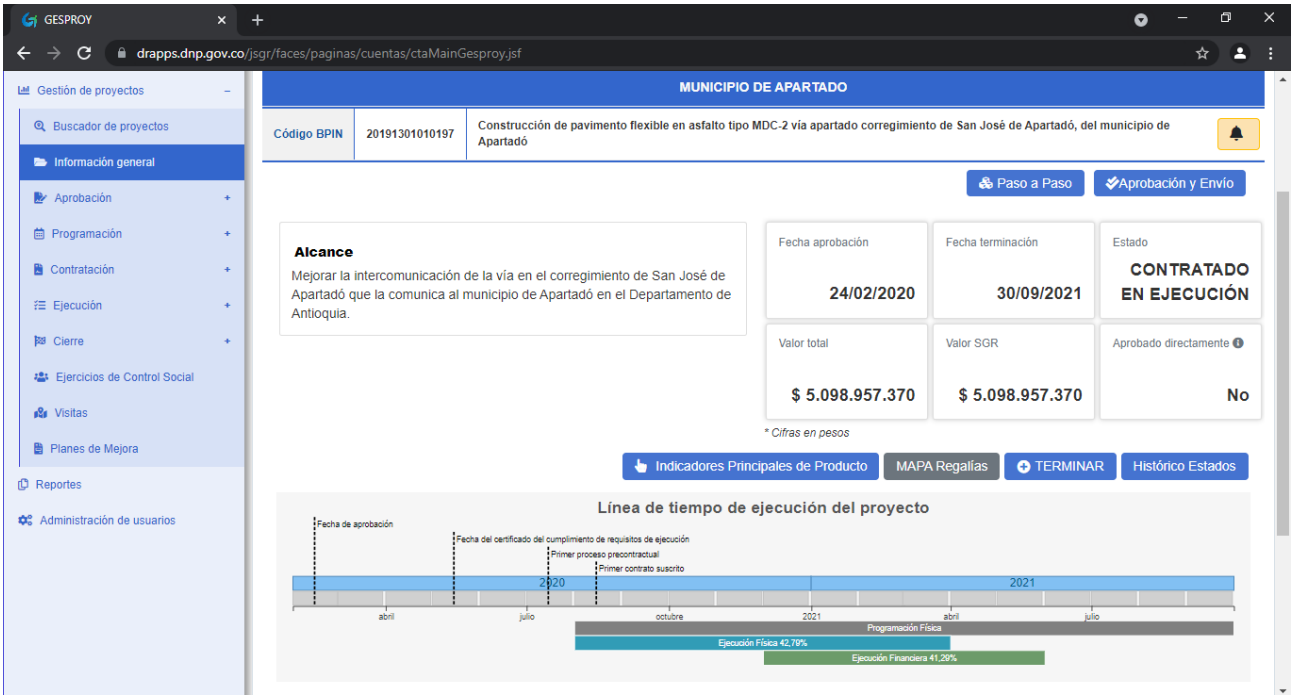


FUENTE DE FINANCIACIÓN

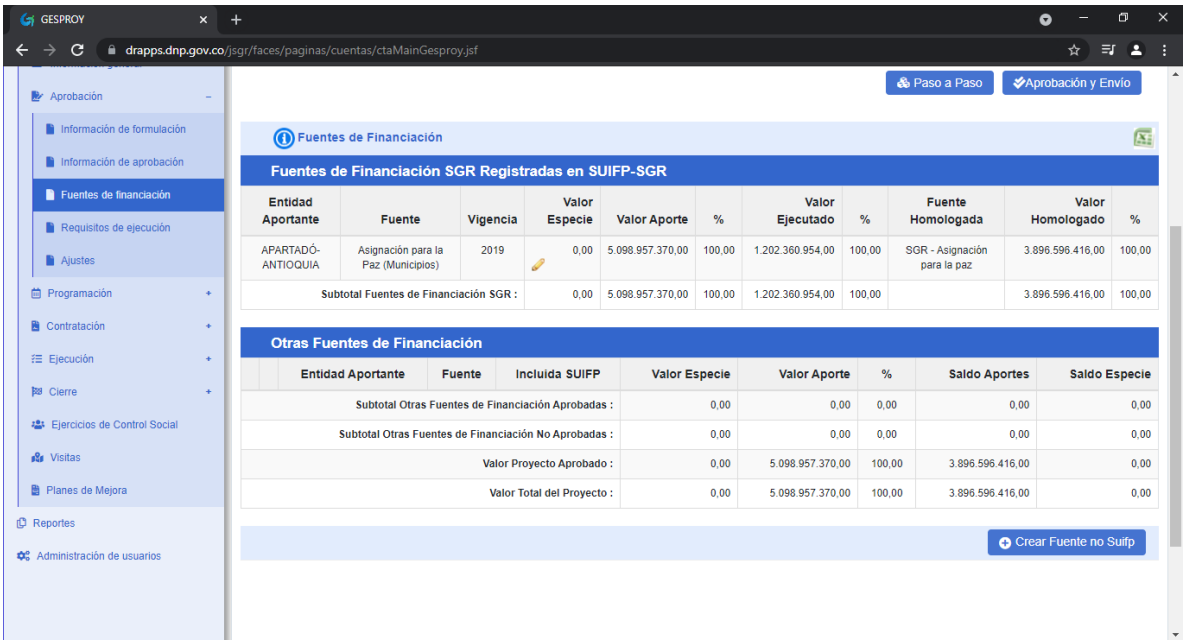


ACTUALIZACIÓN EN EL ALCANCE DEL PROYECTO

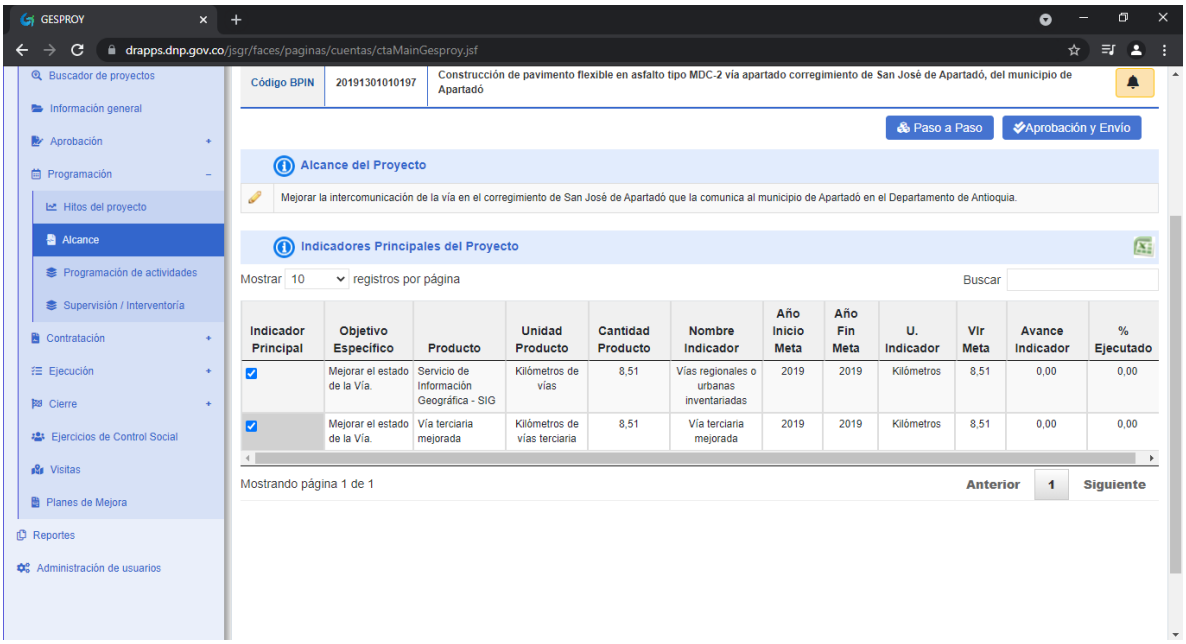


INIDICADOR DE DESEMPEÑO

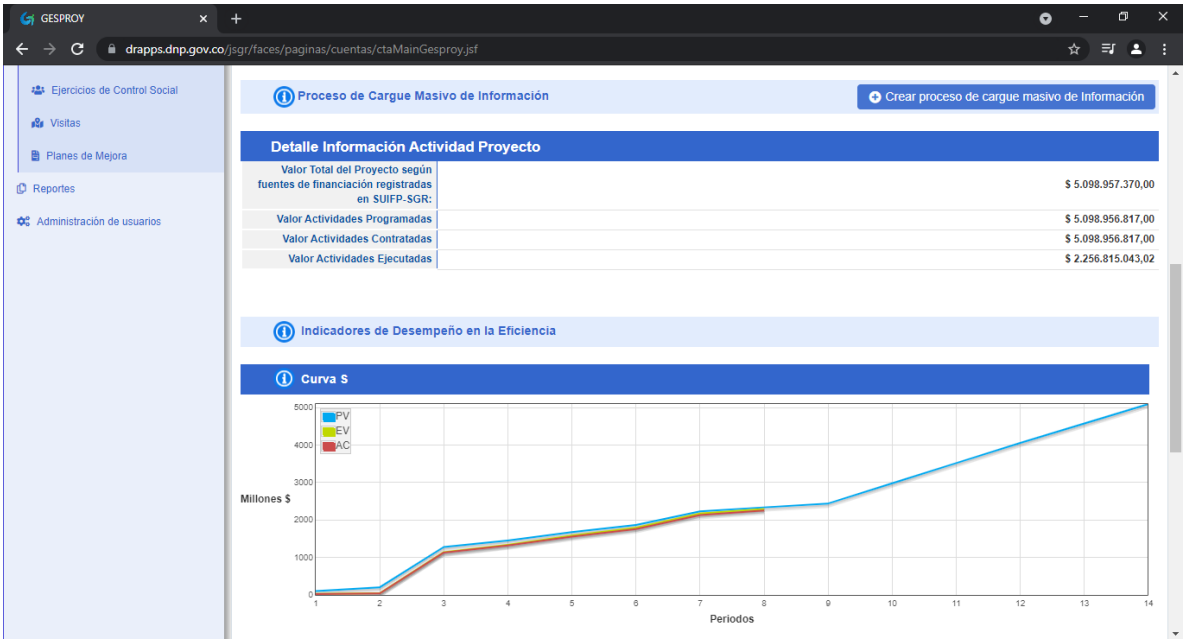


ACTUALIZACIÓN RUBROS

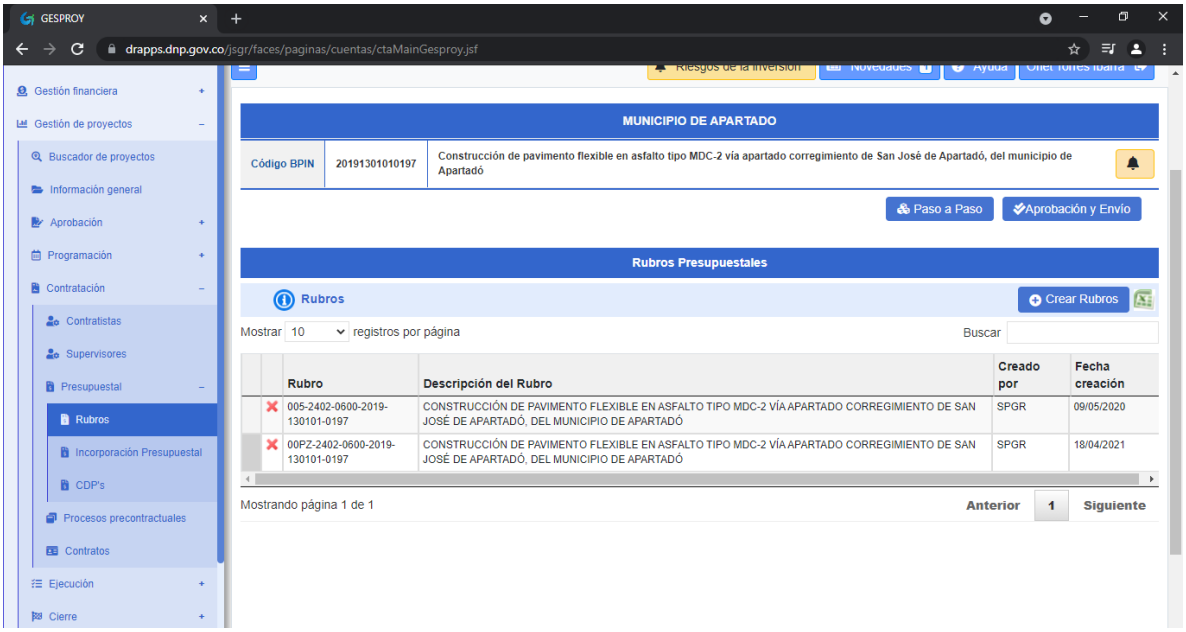


INCORPORACIÓN PRESUPUESTAL

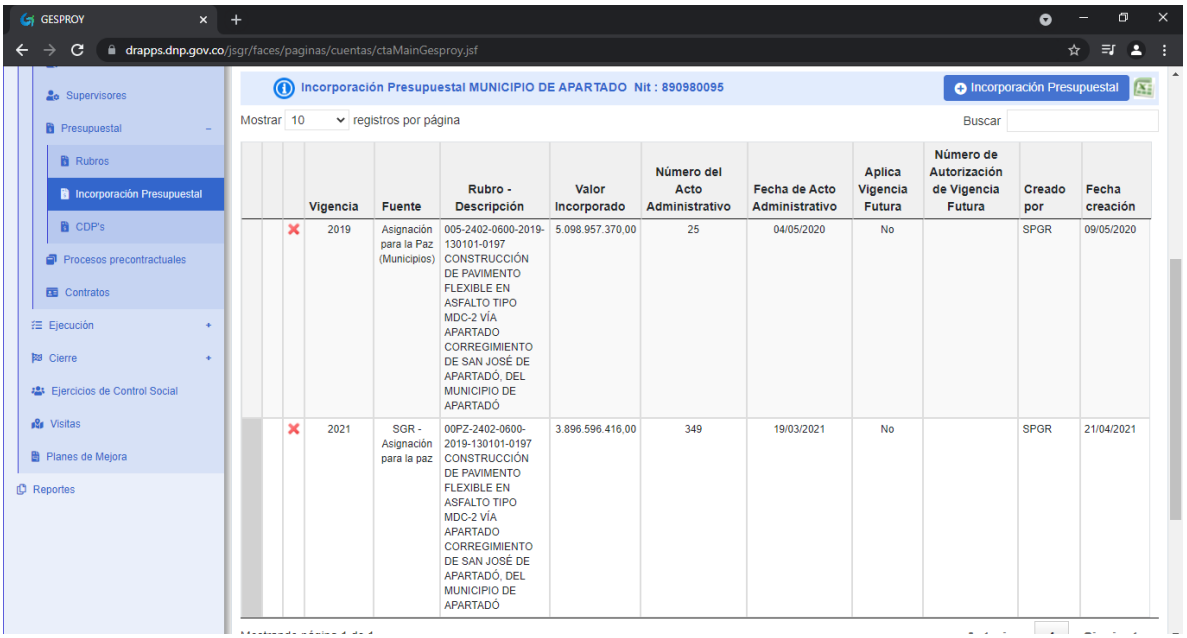


ACTUALIZACIÓN CDP´S

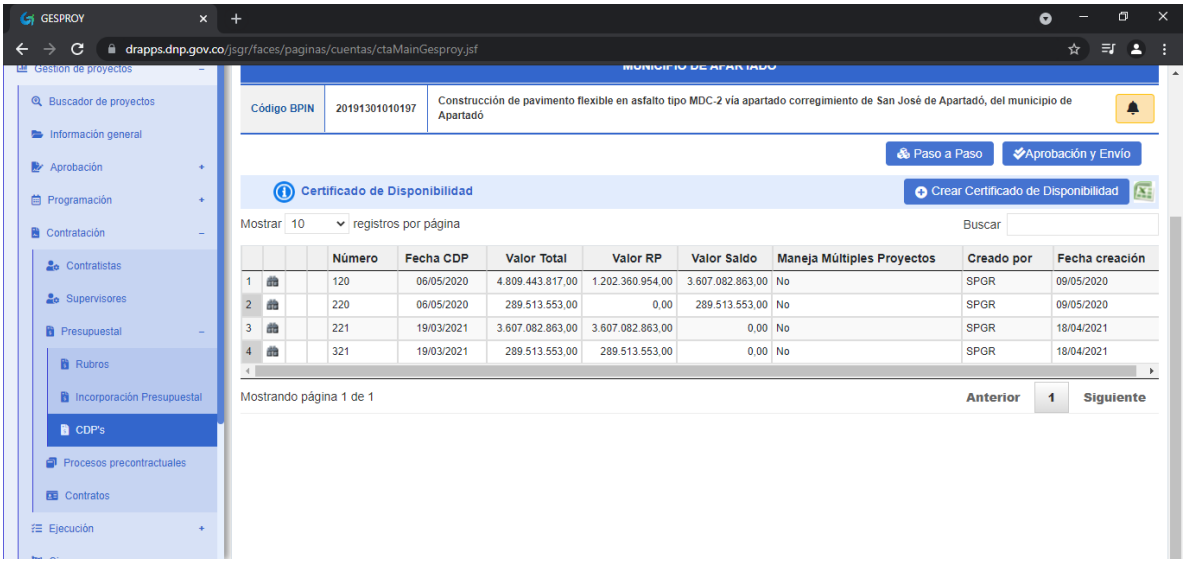

PROCESO CONTRACTUAL

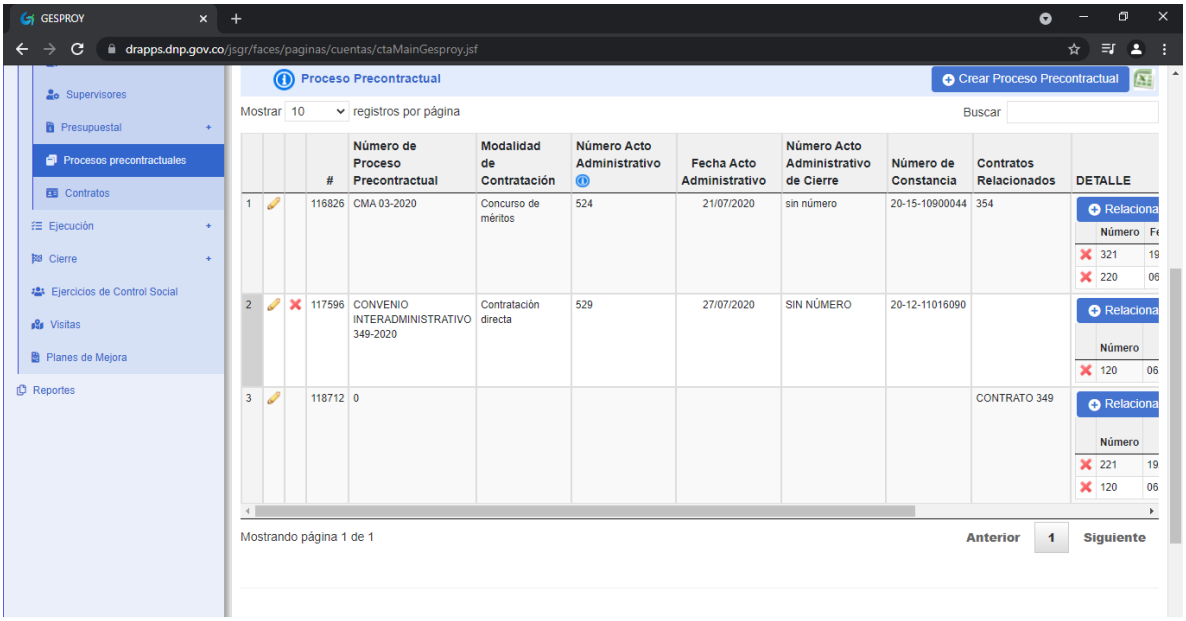



CONTRATO DE OBRA

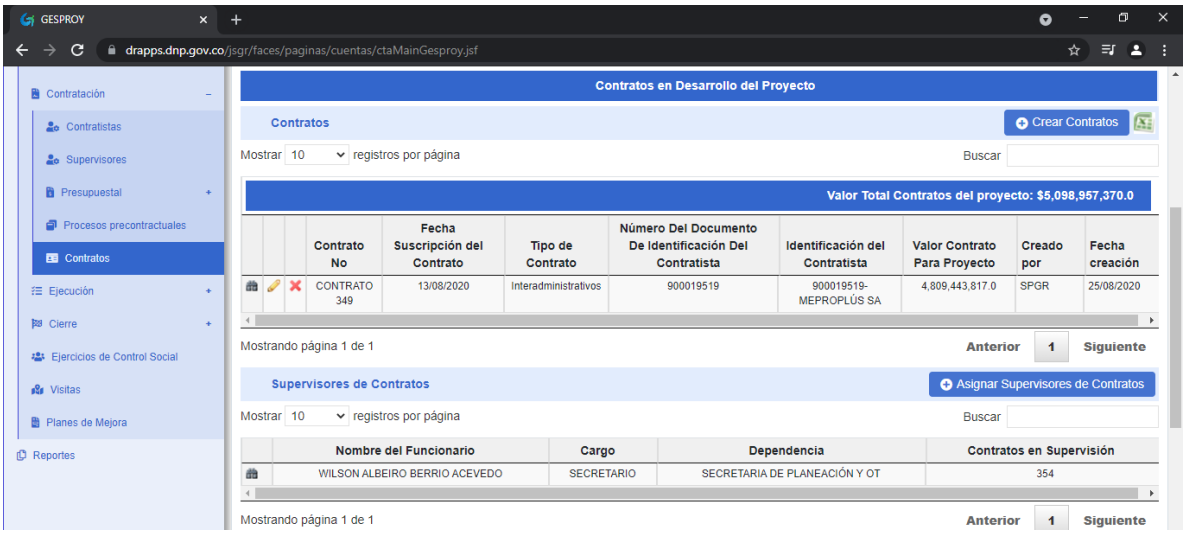



ACTUALIZACIÓN CONTRATO DE OBRA




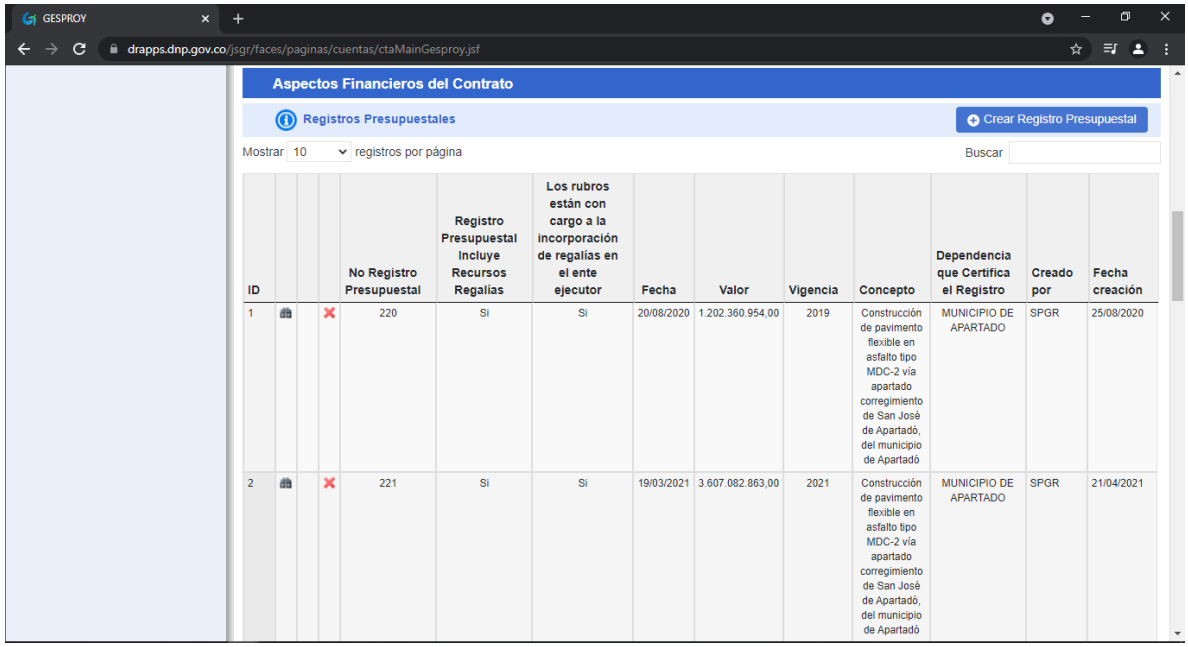

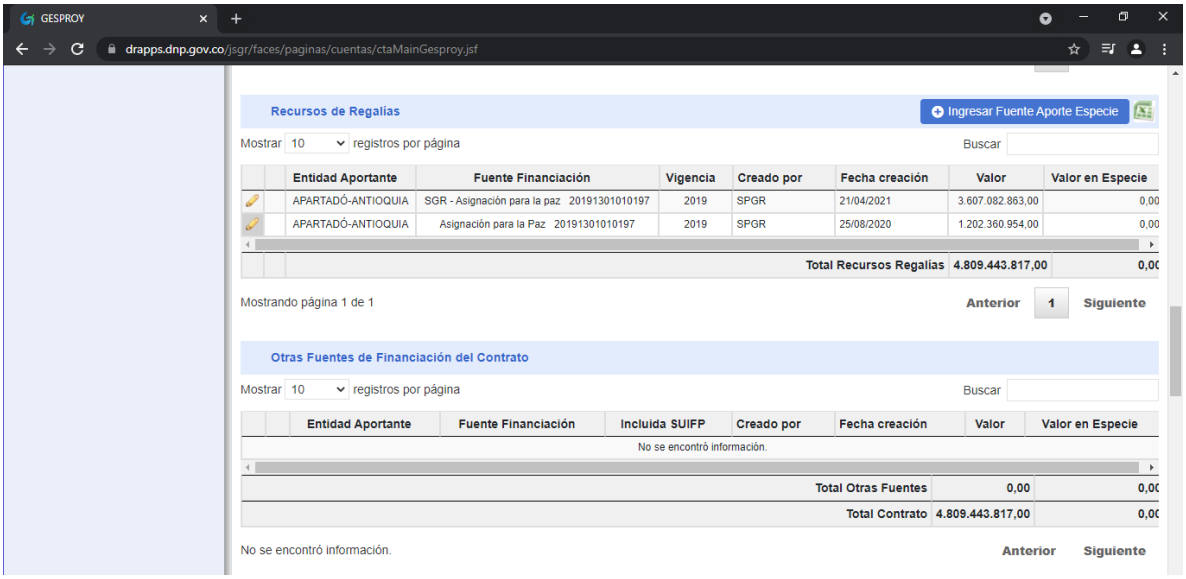

GESPROY
drapps.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Recursos de Regalías
Ingresar Fuente Aporte Especie
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Entidad Aportante | Fuente Financiación | Vigencia | Creado por | Fecha creación | Valor | Valor en Especie
APARTADÓ-ANTIOQUIA | SGR - Asignación para la paz 20191301010197 | 2019 | SPGR | 21/04/2021 | 3.607.082.863,00 | 0,00
APARTADÓ-ANTIOQUIA | Asignación para la Paz 20191301010197 | 2019 | SPGR | 25/08/2020 | 1.202.360.954,00 | 0,00
Total Recursos Regalías 4.809.443.817,00 0,00
Mostrando página 1 de 1
Anterior 1 Siguiente
Otras Fuentes de Financiación del Contrato
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Entidad Aportante | Fuente Financiación | Incluida SUIFP | Creado por | Fecha creación | Valor | Valor en Especie
No se encontró información.
Total Otras Fuentes 0,00 0,00
Total Contrato 4.809.443.817,00 0,00
No se encontró información.
Anterior Siguiente

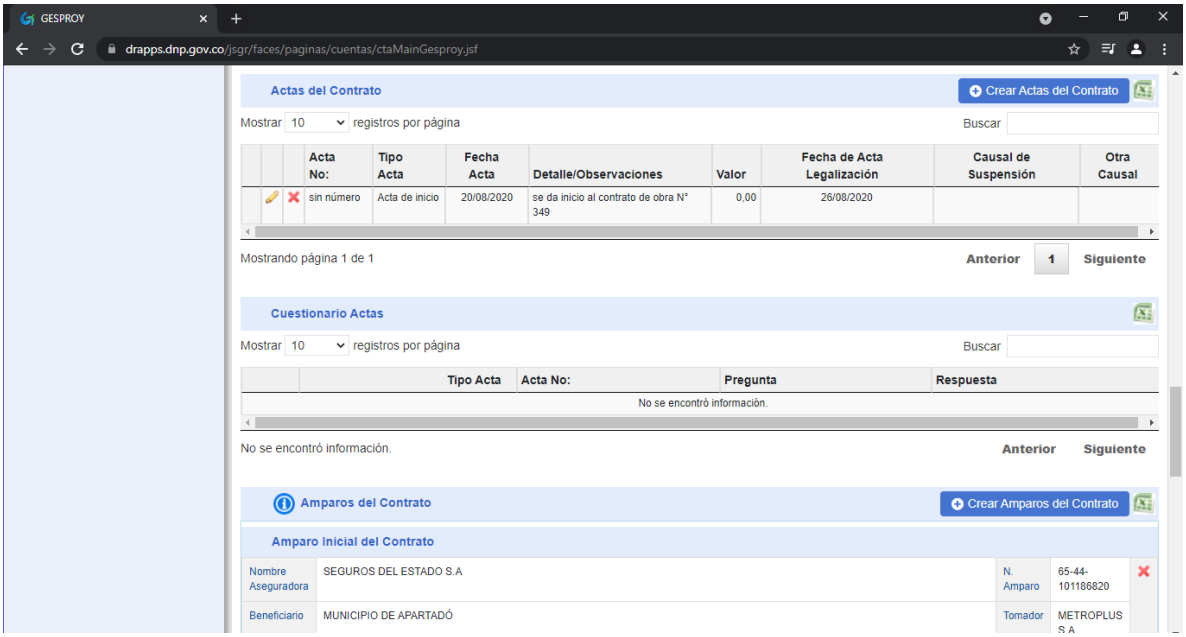

GESPROY
drapps.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Actas del Contrato
Crear Actas del Contrato
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Acta No: | Tipo Acta | Fecha Acta | Detalle/Observaciones | Valor | Fecha de Acta Legalización | Causal de Suspensión | Otra Causal
sin número | Acta de inicio | 20/08/2020 | se da inicio al contrato de obra N° 349 | 0,00 | 26/08/2020
Mostrando página 1 de 1
Anterior 1 Siguiente
Cuestionario Actas
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Tipo Acta | Acta No: | Pregunta | Respuesta
No se encontró información.
No se encontró información.
Anterior Siguiente
Amparos del Contrato
Crear Amparos del Contrato
Amparo inicial del Contrato
Nombre Aseguradora | SEGUROS DEL ESTADO S.A
N. Amparo | 65-44-101186820
Beneficiario | MUNICIPIO DE APARTADÓ
Tomador | METROPLUS S.A

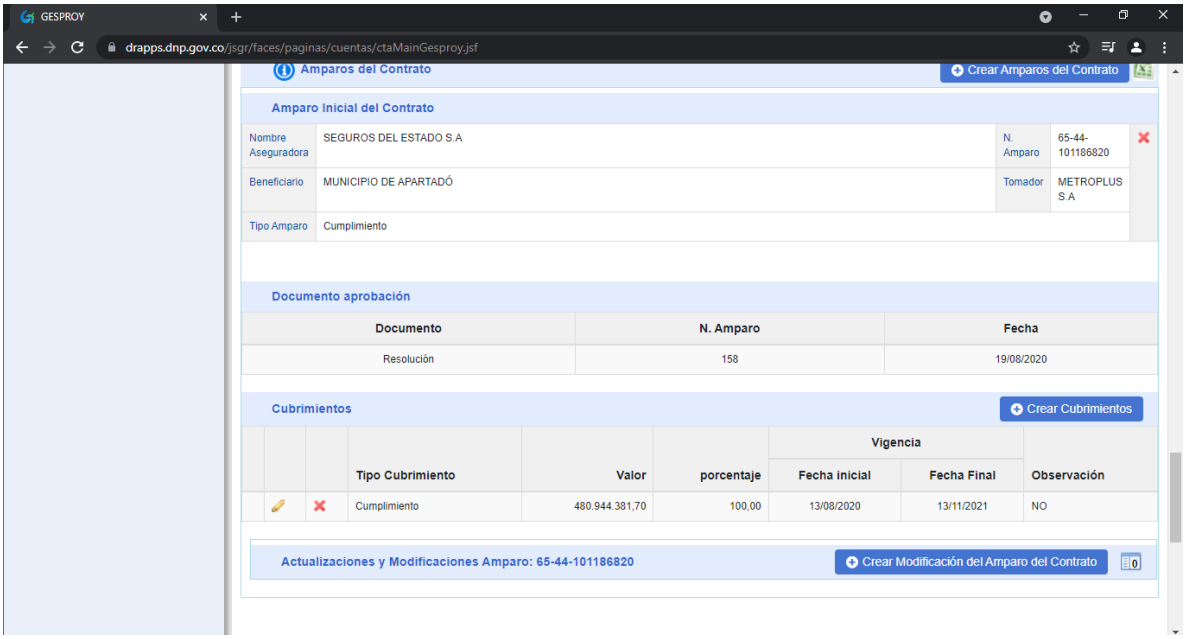

GESPROY
drapps.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Amparos del Contrato
Crear Amparos del Contrato
Amparo Inicial del Contrato
Nombre Aseguradora
SEGUROS DEL ESTADO S.A
N. Amparo
65-44-101186820
Beneficiario
MUNICIPIO DE APARTADÓ
Tomador
METROPLUS S.A
Tipo Amparo
Cumplimiento
Documento aprobación
Documento
N. Amparo
Fecha
Resolución
158
19/08/2020
Cubrimientos
Crear Cubrimientos
Vigencia
Tipo Cubrimiento
Valor
porcentaje
Fecha inicial
Fecha Final
Observación
Cumplimiento
480.944.381,70
100,00
13/08/2020
13/11/2021
NO
Actualizaciones y Modificaciones Amparo: 65-44-101186820
Crear Modificación del Amparo del Contrato

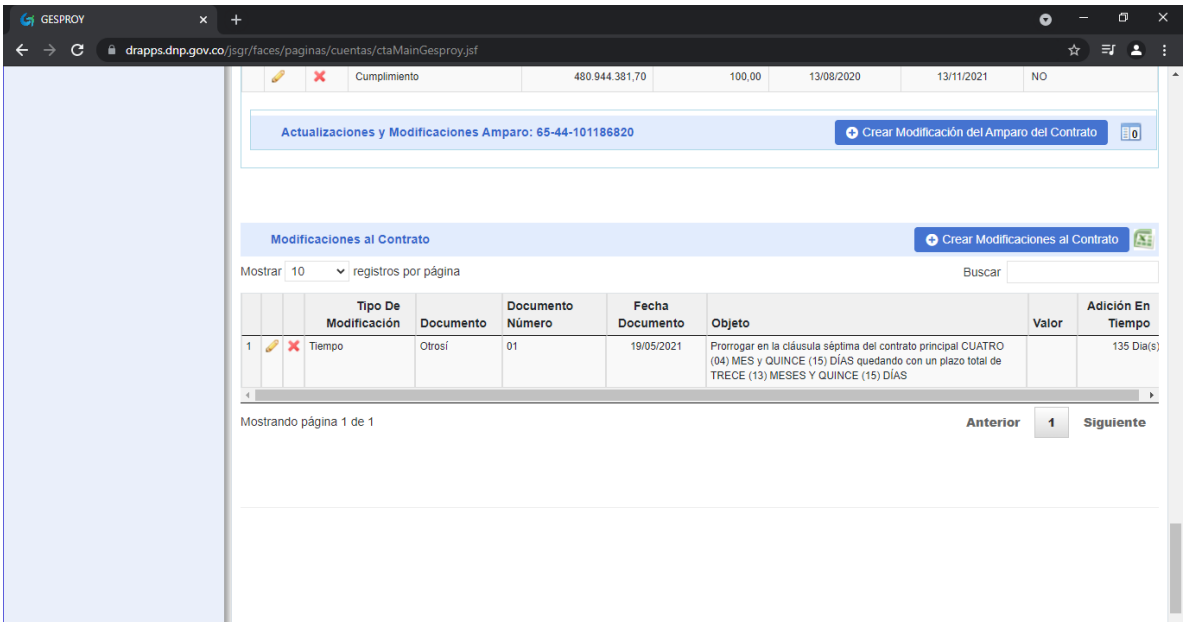
GESPROY
drapps.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Cumplimiento
480.944.381,70
100,00
13/08/2020
13/11/2021
NO
Actualizaciones y Modificaciones Amparo: 65-44-101186820
Crear Modificación del Amparo del Contrato
Modificaciones al Contrato
Crear Modificaciones al Contrato
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Tipo De Modificación
Documento
Documento Número
Fecha Documento
Objeto
Valor
Adición En Tiempo
1
Tiempo
Otrosí
01
19/05/2021
Prorrogar en la cláusula séptima del contrato principal CUATRO (04) MES y QUINCE (15) DÍAS quedando con un plazo total de TRECE (13) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
135 Dia(s)
Mostrando página 1 de 1
Anterior
1
Siguiente

ACTUALIZACIÓN EJECUCIÓN AVANCE DE OBRA

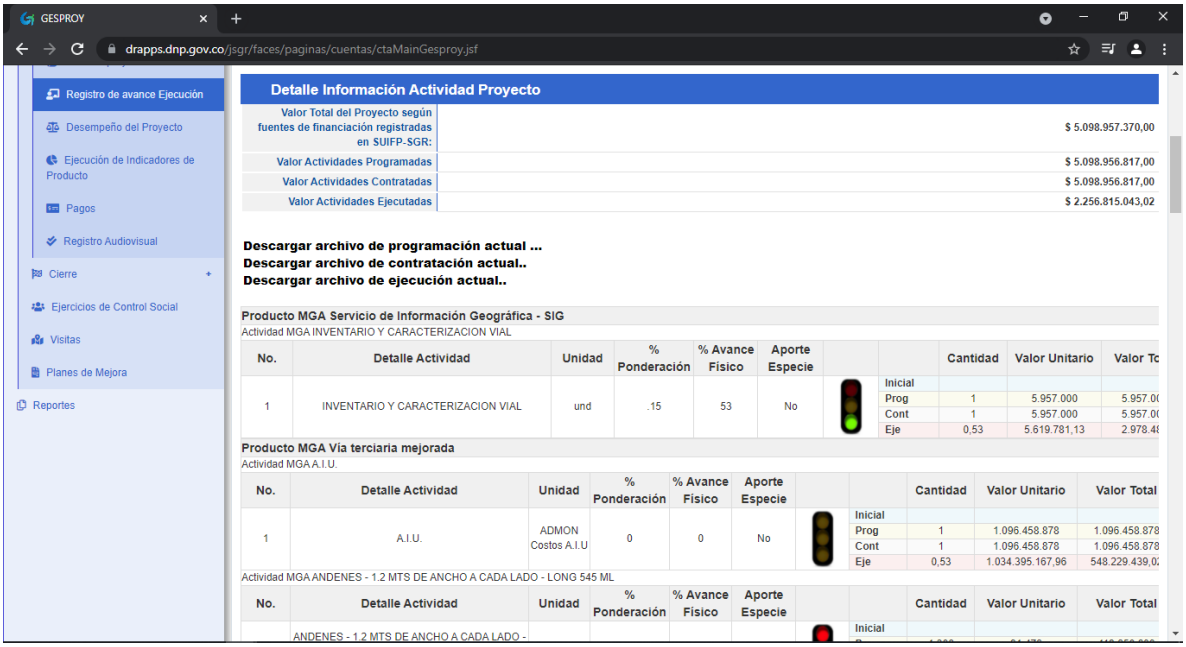

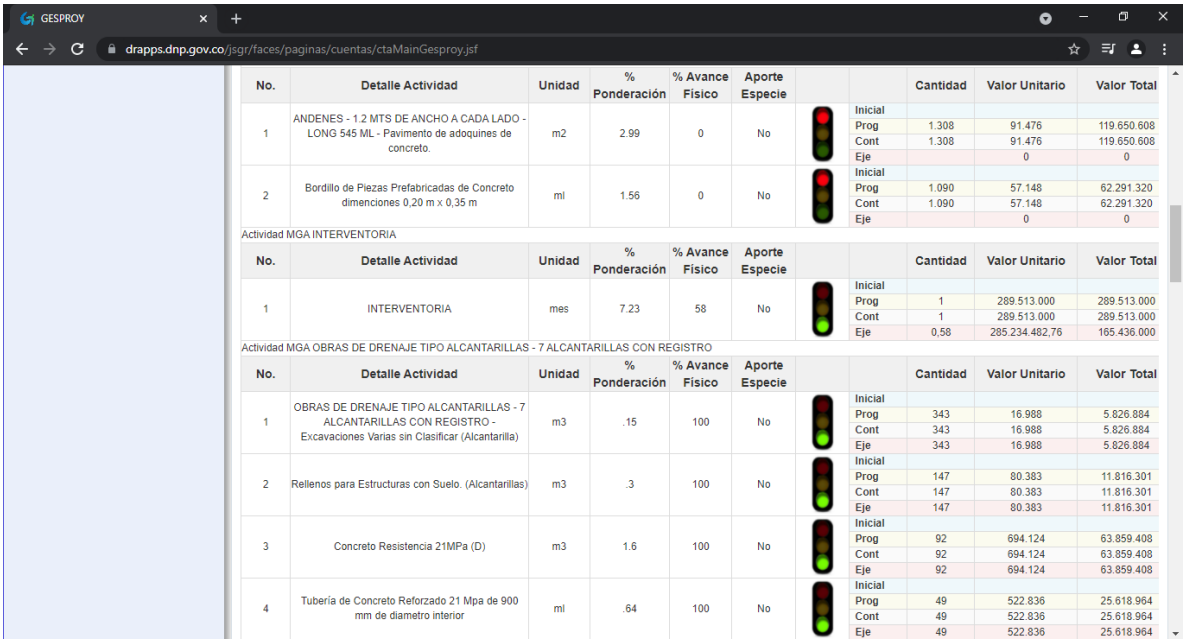


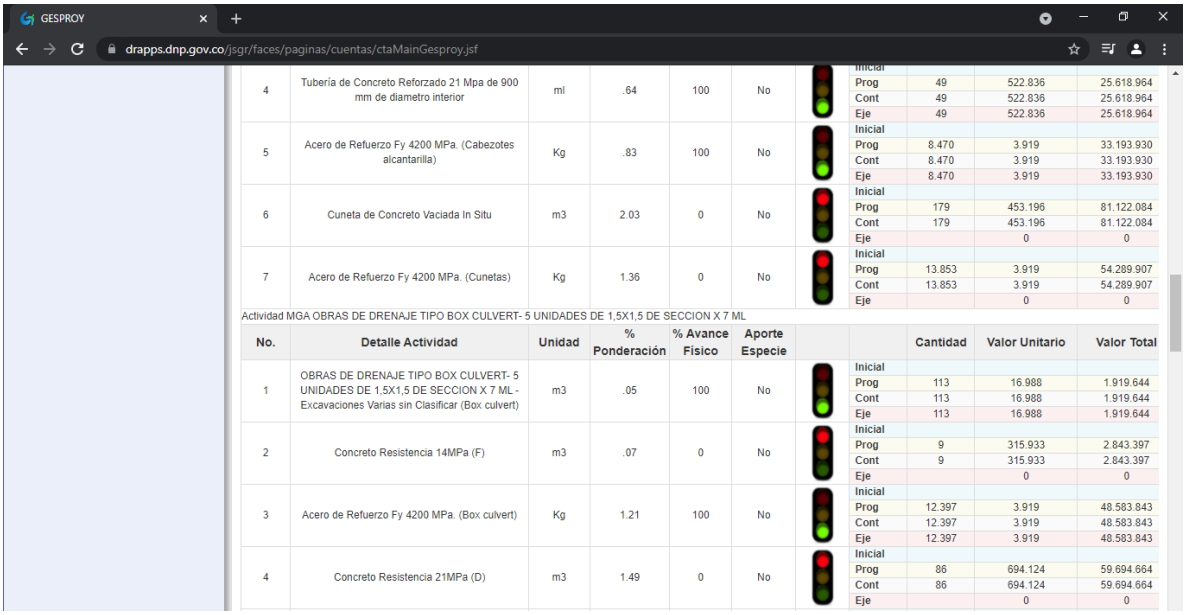

4	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	ml	.64	100	No	Inicial			
						Prog	49	522.836	25.618.964
						Cont	49	522.836	25.618.964
						Eje	49	522.836	25.618.964
5	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. (Cabezotes alcantarilla)	Kg	.83	100	No	Inicial			
						Prog	8.470	3.919	33.193.930
						Cont	8.470	3.919	33.193.930
						Eje	8.470	3.919	33.193.930
6	Cuneta de Concreto Vaciada In Situ	m3	2.03	0	No	Inicial			
						Prog	179	453.196	81.122.084
						Cont	179	453.196	81.122.084
						Eje		0	0
7	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. (Cunetas)	Kg	1.36	0	No	Inicial			
						Prog	13.853	3.919	54.289.907
						Cont	13.853	3.919	54.289.907
						Eje		0	0

Actividad MGA OBRAS DE DRENAJE TIPO BOX CULVERT- 5 UNIDADES DE 1,5X1,5 DE SECCION X 7 ML

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	OBRAS DE DRENAJE TIPO BOX CULVERT- 5 UNIDADES DE 1,5X1,5 DE SECCION X 7 ML - Excavaciones Varias sin Clasificar (Box culvert)	m3	.05	100	No	Inicial			
						Prog	113	16.988	1.919.644
						Cont	113	16.988	1.919.644
						Eje	113	16.988	1.919.644
2	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	.07	0	No	Inicial			
						Prog	9	315.933	2.843.397
						Cont	9	315.933	2.843.397
						Eje		0	0
3	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa. (Box culvert)	Kg	1.21	100	No	Inicial			
						Prog	12.397	3.919	48.583.843
						Cont	12.397	3.919	48.583.843
						Eje	12.397	3.919	48.583.843
4	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	1.49	0	No	Inicial			
						Prog	86	694.124	59.694.664
						Cont	86	694.124	59.694.664
						Eje		0	0

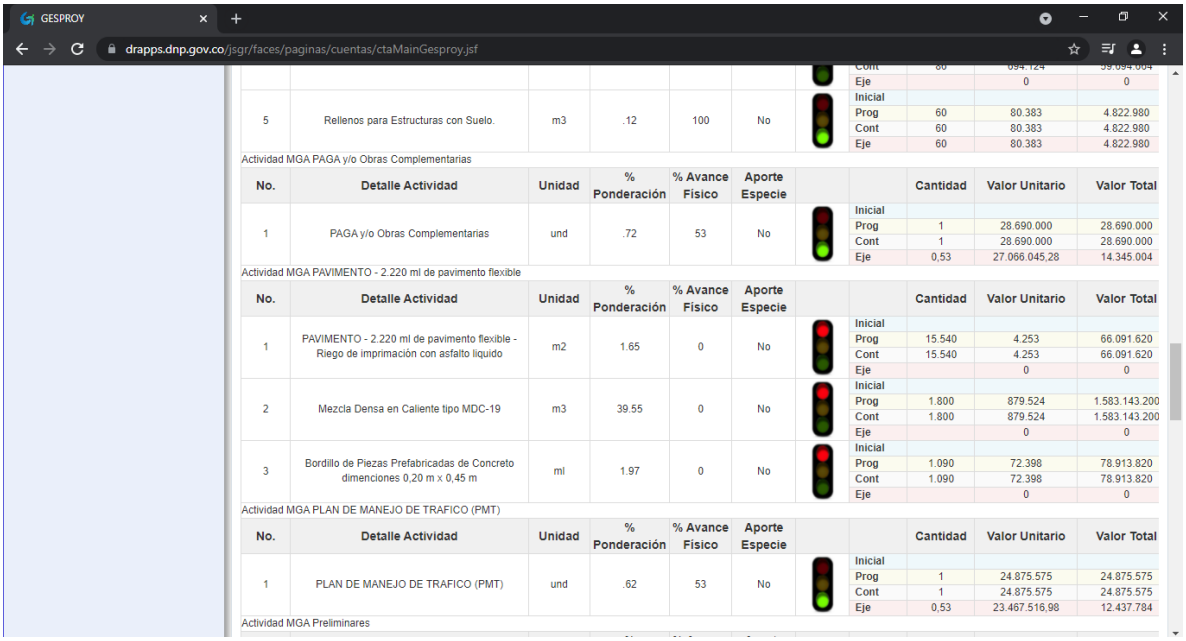

						Eje		0	0
5	Rellenos para Estructuras con Suelo.	m3	.12	100	No	Inicial			
						Prog	60	80.383	4.822.980
						Cont	60	80.383	4.822.980
						Eje	60	80.383	4.822.980

Actividad MGA PAGA y/o Obras Complementarias

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	PAGA y/o Obras Complementarias	und	.72	53	No	Inicial			
						Prog	1	28.690.000	28.690.000
						Cont	1	28.690.000	28.690.000
						Eje	0,53	27.066.045,28	14.345.004


Actividad MGA PAVIMENTO - 2.220 ml de pavimento flexible

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	PAVIMENTO - 2.220 ml de pavimento flexible - Riego de imprimación con asfalto liquido	m2	1.65	0	No	Inicial			
						Prog	15.540	4.253	66.091.620
						Cont	15.540	4.253	66.091.620
						Eje		0	0
2	Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-19	m3	39.55	0	No	Inicial			
						Prog	1.800	879.524	1.583.143.200
						Cont	1.800	879.524	1.583.143.200
						Eje		0	0
3	Bordillo de Piezas Prefabricadas de Concreto dimenciones 0,20 m x 0,45 m	ml	1.97	0	No	Inicial			
						Prog	1.090	72.398	78.913.820
						Cont	1.090	72.398	78.913.820
						Eje		0	0

Actividad MGA PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)	und	.62	53	No	Inicial			
						Prog	1	24.875.575	24.875.575
						Cont	1	24.875.575	24.875.575
						Eje	0,53	23.467.516,98	12.437.784

Actividad MGA Preliminares

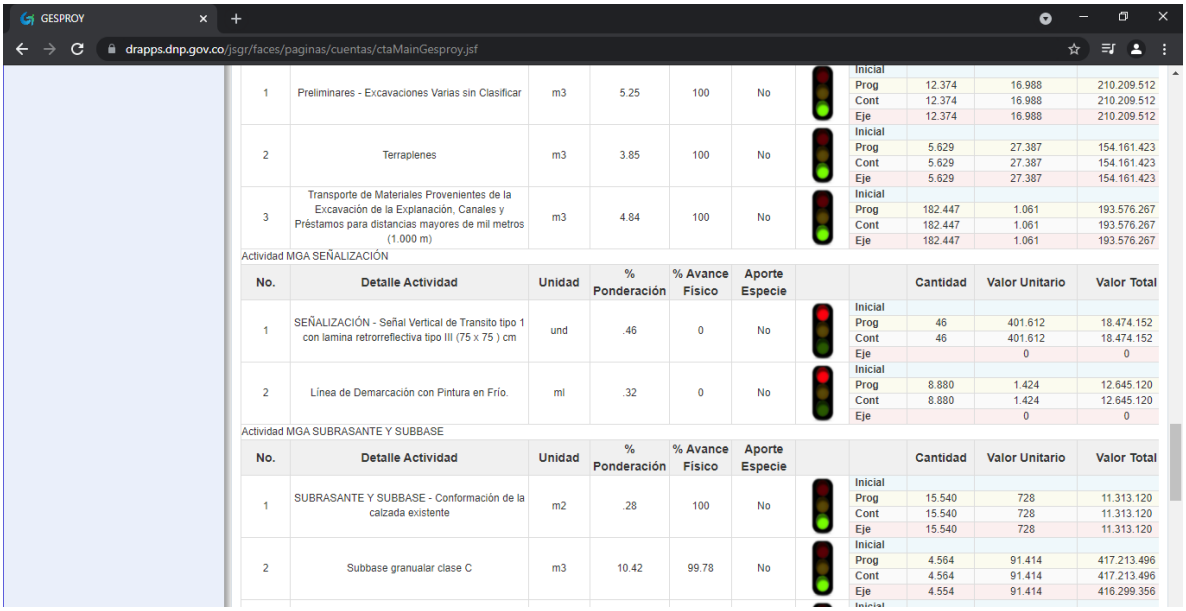

1	Preliminares - Excavaciones Varias sin Clasificar	m3	5.25	100	No	Inicial			
						Prog	12.374	16.988	210.209.512
						Cont	12.374	16.988	210.209.512
						Eje	12.374	16.988	210.209.512
2	Terraplenes	m3	3.85	100	No	Inicial			
						Prog	5.629	27.387	154.161.423
						Cont	5.629	27.387	154.161.423
						Eje	5.629	27.387	154.161.423
3	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m)	m3	4.84	100	No	Inicial			
						Prog	182.447	1.061	193.576.267
						Cont	182.447	1.061	193.576.267
						Eje	182.447	1.061	193.576.267


Actividad MGA SEÑALIZACIÓN

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	SEÑALIZACIÓN - Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	und	.46	0	No	Inicial			
						Prog	46	401.612	18.474.152
						Cont	46	401.612	18.474.152
						Eje		0	0
2	Línea de Demarcación con Pintura en Frío.	ml	.32	0	No	Inicial			
						Prog	8.880	1.424	12.645.120
						Cont	8.880	1.424	12.645.120
						Eje		0	0

Actividad MGA SUBRASANTE Y SUBBASE


No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	SUBRASANTE Y SUBBASE - Conformación de la calzada existente	m2	.28	100	No	Inicial			
						Prog	15.540	728	11.313.120
						Cont	15.540	728	11.313.120
						Eje	15.540	728	11.313.120
2	Subbase granular clase C	m3	10.42	99.78	No	Inicial			
						Prog	4.564	91.414	417.213.496
						Cont	4.564	91.414	417.213.496
						Eje	4.554	91.414	416.299.356

DESEMPEÑO DE LA EFICIENCIA

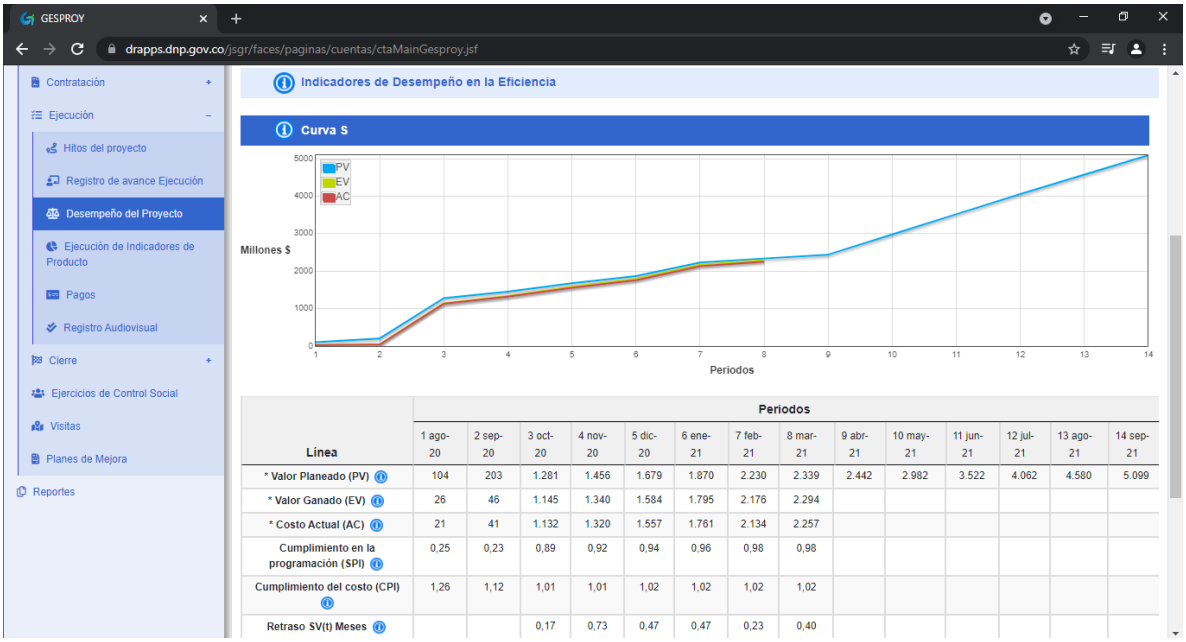

Línea	Periodos													
	1 ago-20	2 sep-20	3 oct-20	4 nov-20	5 dic-20	6 ene-21	7 feb-21	8 mar-21	9 abr-21	10 may-21	11 jun-21	12 jul-21	13 ago-21	14 sep-21
* Valor Planeado (PV)	104	203	1.281	1.456	1.679	1.870	2.230	2.339	2.442	2.982	3.522	4.062	4.580	5.099
* Valor Ganado (EV)	26	46	1.145	1.340	1.584	1.795	2.176	2.294						
* Costo Actual (AC)	21	41	1.132	1.320	1.557	1.761	2.134	2.257						
Cumplimiento en la programación (SPI)	0,25	0,23	0,89	0,92	0,94	0,96	0,98	0,98						
Cumplimiento del costo (CPI)	1,26	1,12	1,01	1,01	1,02	1,02	1,02	1,02						
Retraso SV(t) Meses			0,17	0,73	0,47	0,47	0,23	0,40						

LINEA AVANCE POR PERIODO

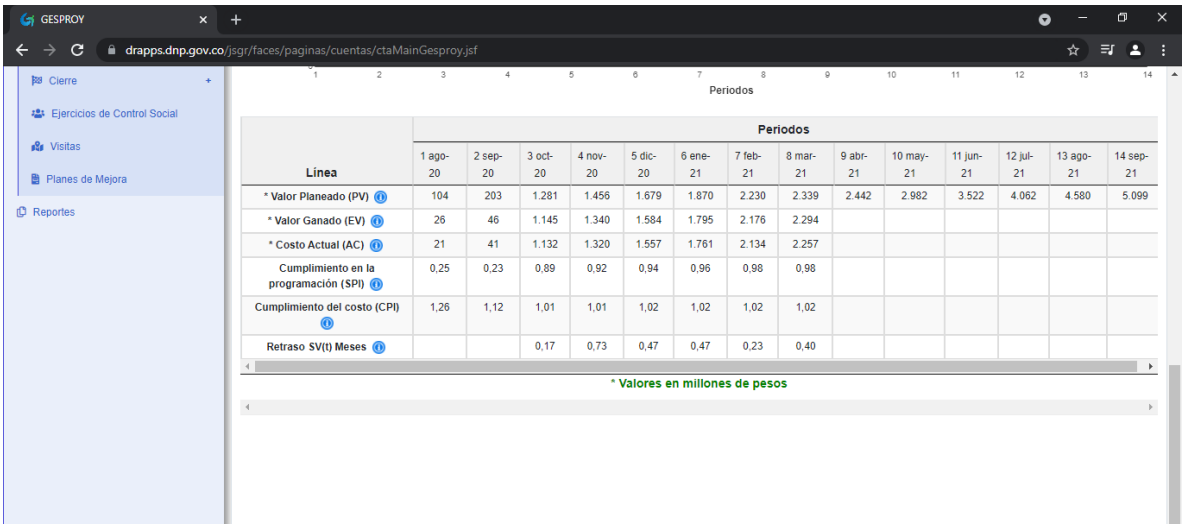



Linea	Periodos													
	1 ago-20	2 sep-20	3 oct-20	4 nov-20	5 dic-20	6 ene-21	7 feb-21	8 mar-21	9 abr-21	10 may-21	11 jun-21	12 jul-21	13 ago-21	14 sep-21
* Valor Planeado (PV)	104	203	1.281	1.456	1.679	1.870	2.230	2.339	2.442	2.982	3.522	4.062	4.580	5.099
* Valor Ganado (EV)	26	46	1.145	1.340	1.584	1.795	2.176	2.294						
* Costo Actual (AC)	21	41	1.132	1.320	1.557	1.761	2.134	2.257						
Cumplimiento en la programación (SPI)	0,25	0,23	0,89	0,92	0,94	0,96	0,98	0,98						
Cumplimiento del costo (CPI)	1,26	1,12	1,01	1,01	1,02	1,02	1,02	1,02						
Retraso SV(t) Meses			0,17	0,73	0,47	0,47	0,23	0,40						


* Valores en millones de pesos

SPGR

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

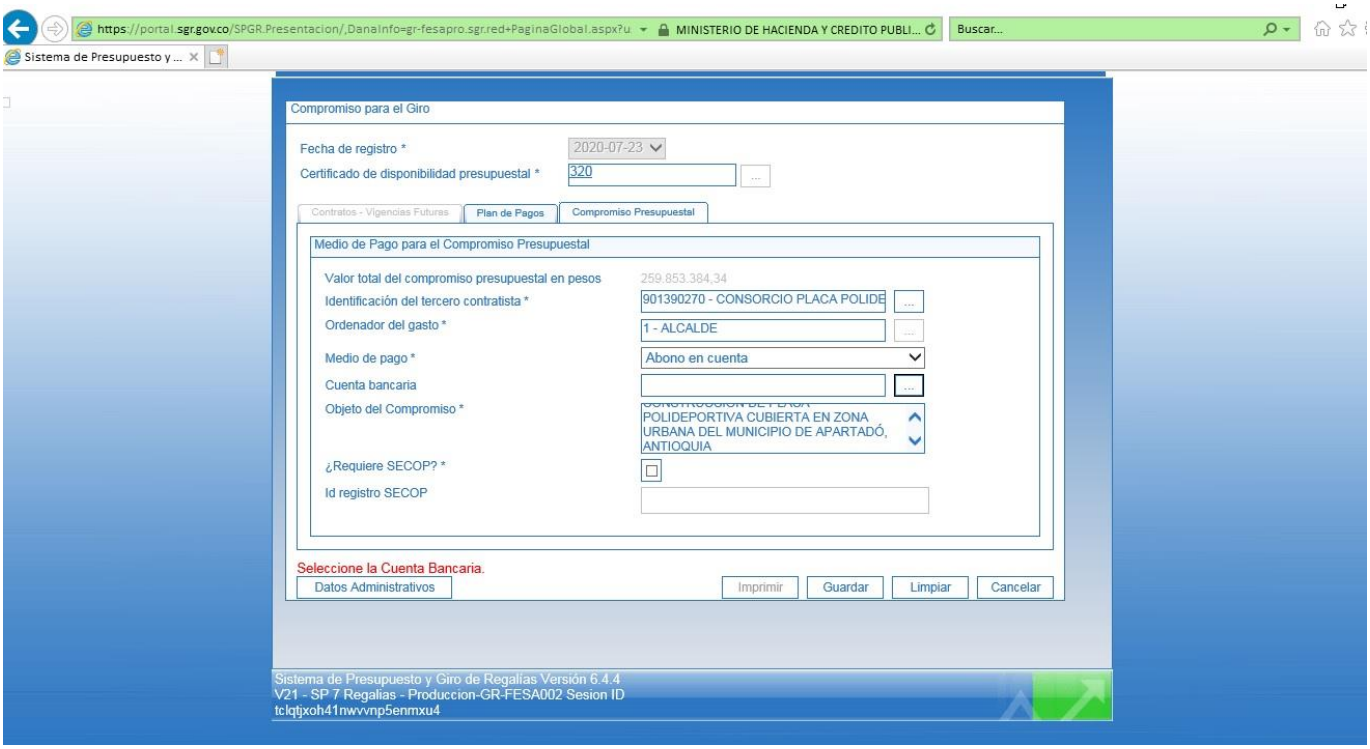


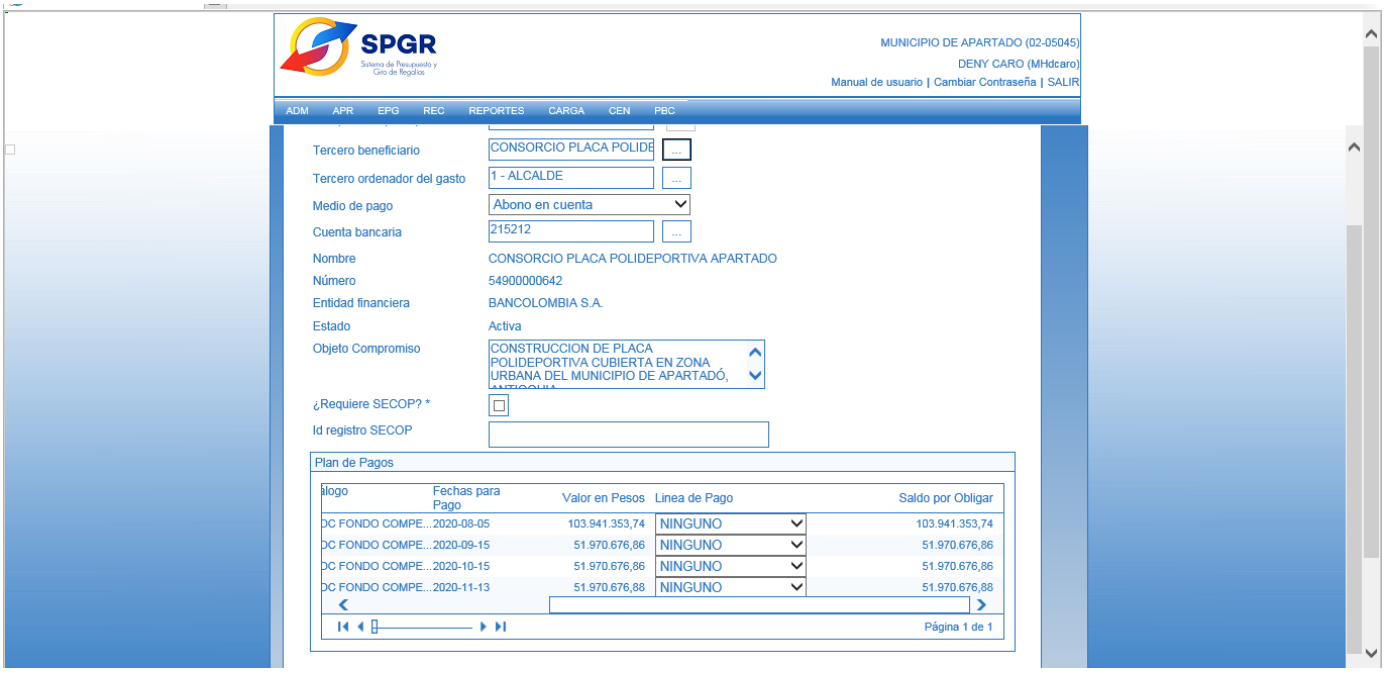
SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías
MUNICIPIO DE APARTADO (02-05045)
DENY CARO (MHdcaro)
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR
ADM APR EPG REC REPORTES CARGA CEN PBC
Tercero beneficiario
CONSORCIO PLACA POLIDE
Tercero ordenador del gasto
1 - ALCALDE
Medio de pago
Abono en cuenta
Cuenta bancaria
215212
Nombre
CONSORCIO PLACA POLIDEPORTIVA APARTADO
Número
54900000642
Entidad financiera
BANCOLOMBIA S.A.
Estado
Activa
Objeto Compromiso
CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ,
¿Requiere SECOP? *
Id registro SECOP
Plan de Pagos
Fechas para Pago
Valor en Pesos
Linea de Pago
Saldo por Obligar
2020-08-05 103.941.353,74 NINGUNO 103.941.353,74
2020-09-15 51.970.676,86 NINGUNO 51.970.676,86
2020-10-15 51.970.676,86 NINGUNO 51.970.676,86
2020-11-13 51.970.676,88 NINGUNO 51.970.676,88
Página 1 de 1

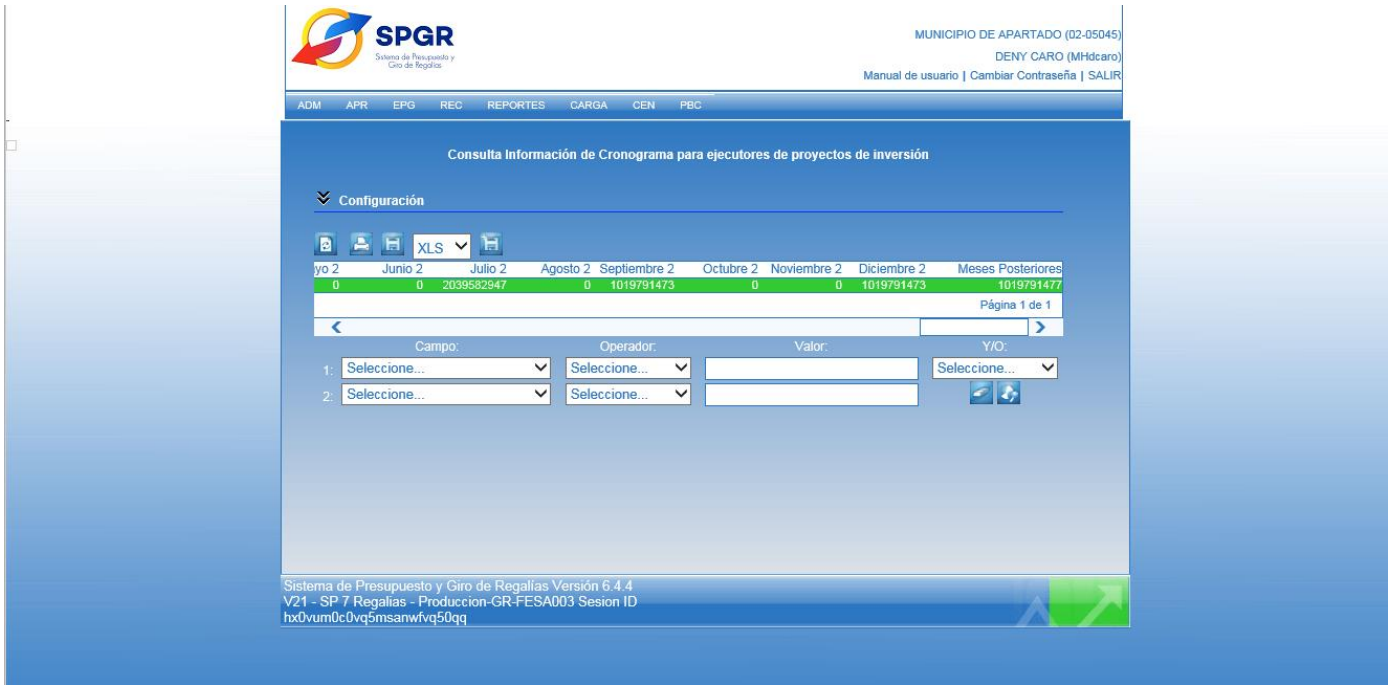
SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías
MUNICIPIO DE APARTADO (02-05045)
DENY CARO (MHdcaro)
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR
ADM APR EPG REC REPORTES CARGA CEN PBC
Consulta Información de Cronograma para ejecutores de proyectos de inversión
Configuración
XLS
Junio 2 Julio 2 Agosto 2 Septiembre 2 Octubre 2 Noviembre 2 Diciembre 2 Meses Posteriores
0 0 2039582947 0 1019791473 0 0 1019791473 1019791477
Página 1 de 1
Campo: Operador: Valor: Y/O:
1: Seleccione... Seleccione... Seleccione...
2: Seleccione... Seleccione...
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías Versión 6.4.4
V21 - SP 7 Regalias - Produccion-GR-FESA003 Sesion ID
hx0vum0c0vq5msanwfvq50qq

REPORTE EN EL APLICATIVO DE GESPROY CUENTAS MAESTRA DE REGALÍAS

ACTUALIZACIÓN MOVIMIENTOS SALDO A LA CUENTA

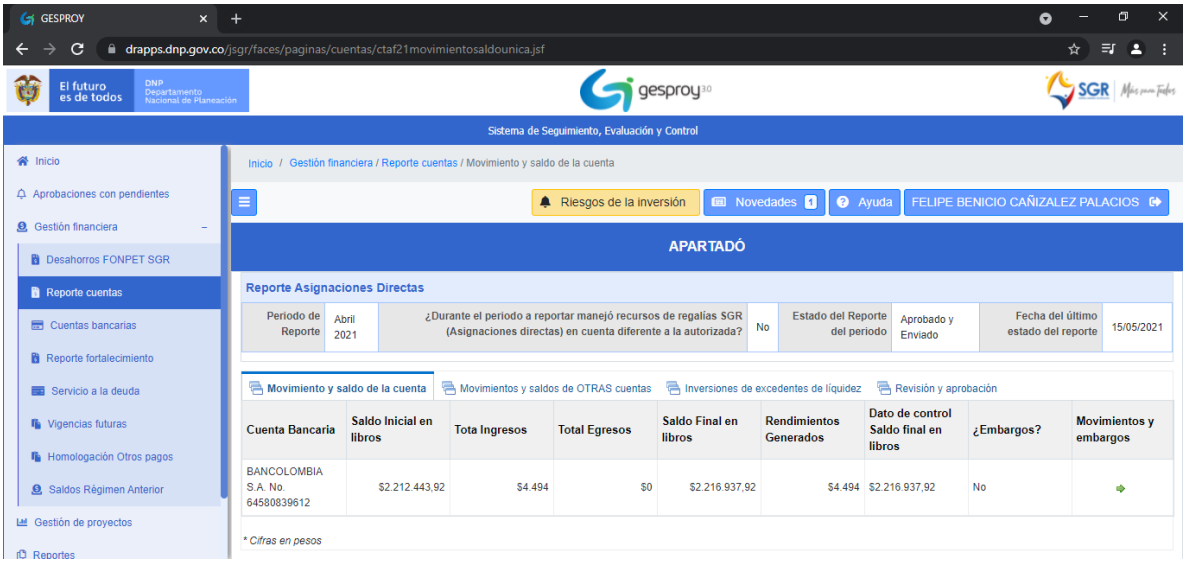

ACTUALIZACIÓN CUENTAS MAESTRA VIGENTES

