PARA LA PRESENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, FAVOR CONTÁCTESE CON LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA SUBSECRETARÍA DE INVERSIONES Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS AL PBX: 3779595 EXT: 1187

TIPO DE REQUERIMIENTO

BIEN [ ] **SERVICIO** [x] **OBRA** [x]

OTRO [ ] **CUAL** contratar para efectuar la obra e infraestructura necesaria para la instalación y puesta en funcionamiento del servicio de acueducto del inmueble y suministro de agua potable a través de tanques de almacenamiento

Nota: El presente formato No Aplica para pago de servicios públicos, contratos de comodato, contrato de prestación de servicios profesionales y contrato de apoyo a la gestión

DATOS DEL SOLICITANTE	
FECHA: (D-M-A)	**23/05/2022**
NOMBRE:	**Mayor General ELIECER CAMACHO JÍMENEZ**
CARGO:	**Comandante Policía Metropolitana de Bogotá**
ENTIDAD/FUERZA PÚBLICA /ÁREA SCJ:	**Policía Metropolitana de Bogotá**
¿El requerimiento se encuentra incluido en el PAA de la SDSCJ?:	**SI** [ ] **NO** [ ]

ANÁLISIS DE PRE FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DEL PROCESO

1. **Descripción de la Necesidad:**

¿Cuál es el problema o necesidad que se pretende resolver?

En la actualidad el CAI SAN DIEGO, ubicado en el centro internacional de Bogotá, carrera séptima (7), con avenida veinte seis(26), no tiene el servicio público de suministro de agua potable, desde el año de 2018, el cual fue suspendido por la empresa prestadora de servicio, (EAAB) dado que se presentaron cambios en la reglamentación, sobre obras de conexión de suministro de agua potable, afectando en este caso la acometida de suministro afectando de esta manera el funcionamiento del sistema hidráulico y sanitario, para la operación de CAI, y de esta manera incumpliendo con las normas de salubridad pública. En este sentido y dada la importancia que el CAI, tenga los estándares de normas para la correcta operación y el suministro de agua potable se haga de manera continua y con el lleno de los requisitos se requiere realizar un contrato de obra civil que permita el suministro de agua potable, de manera continua con el fin de lograr el cumplimiento de la normativa existente para edificaciones de carácter institucional, en este caso el CAI SAN

DIEGO, que en la actualidad opera con xxxx agentes en xxxx turnos, durante las 24 horas del dia , los site días de la semana y los doce meses del año.

Esta contratación debe prever en sus fases de ejecución, una actividad prioritaria de contingencia, la cual consiste en resolver a la menor brevedad posible, el suministro de agua, mediante la utilización de tanques de almacenamiento, suministro de agua con carrotanques. Estos volúmenes calculados de conformidad a los consumos del personal fijo y personal flotante dentro del CAI. De igual forma y de manera simultánea se harán las obras de infraestructura necesaria, con la utilización de tecnología de punta tales como sistemas de utilización de equipos de perforación profunda dirigida (PHD), perforación horizontal dirigida, la cual evita la construcción de zanjas, maxime cuando estamos en una zona de alta complejidad, para realizar este tipo de obras, dados los tiempo de ejecución restringidos, reparaciones de vías, impactos de manejo de tráfico, aspectos de reglamentación ambiental, etc.
Se agrega de manera complementaria, los tramites necesarios, de disponibilidad del servicio de acuerdo a concepto emitido por la empresa de acueducto y alcantarillado, dada la investigación de catastro de redes sobre el sector.

En la actualidad el CAI San Diego el cual, hace parte de la infraestructura de la (SCSJ) secretaria de la seguridad convivencia y justicia de Distrito Capital, instalaciones que coadyuvan a la disminución de los índices de inseguridad en la ciudad capital, con la finalidad de brindar las condiciones básicas necesarias, en lo referente a proporcionar los recursos logísticos necesarios a los funcionarios adscritos a esa unidad policial.

La Resolución reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de diseño construcción, puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada con los servicios públicos de acueducto y aseo.
Por lo tanto se requiere de manera prioritaria contratar las obras civiles necesarias para la instalación y puesta en funcionamiento del servicio de suministro de agua potable (Acometida acueducto), del inmueble en el diámetro que garantice el suministro de manera continua y sea aprobado por la empresa prestadora de servicio.

Como quedo expresado anteriormente, la situación de no la mno disponibilidad del servicio, se deriva de que se presento una redistribución de redes públicas realizadas por la empresa de acueducto de Bogotá, dejando el equipamiento de seguridad (CAI SAN DIEGO) fuera del servicio de acceso a estas redes para dar cumplimiento de los parámetros técnicos y la normatividad vigente, toda vez que fue construido hace varios años, con tuberías, cajas de inspección y demás que no cumplen con los requerimientos y especificaciones técnicas de la nueva Resolución 0330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio "por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS"; necesarias en relación con el

suministro adecuado del servicio, de acuerdo a la cantidad mínima requerida por la edificación comprometida.

Por lo anterior se requiere iniciar el proceso contractual para iniciar la obra de infraestructura necesaria en el equipamiento de seguridad, toda vez que esta instalación, adolece de tanques de reserva y el suministro de agua potable es inexistente.
Este servicio de agua potable es de carácter vital, para el correcto funcionamiento del CAI..

¿Se han estudiado otras alternativas para satisfacer la necesidad o solucionar el problema descrito? (marque con una X):

SI ☐ **NO** ■

¿Cuáles? No aplica.

1.1. PISCJ (Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia):

¿Definir cómo se enmarca la necesidad en el PISCJ?

El Plan Integral de Seguridad de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia, es un documento sectorial de política pública que marca la hoja de ruta interinstitucional. Este plan contiene justamente las responsabilidades, estrategias y acciones que el Distrito tomará durante el gobierno 2020-2024.

El presente requerimiento se encuentra amparado en la **Estrategia**: "Dotación, tecnología, equipamiento y formación", **Acción**: "Atender los delitos y comportamientos contrarios a la seguridad y convivencia a través del fortalecimiento las capacidades (logísticas, mobiliarias, movilidad, tecnológicas, infraestructura, armamento, profesionales, capacitación) institucionales que se requiere para el Servicio de Policía en la MEBOG" y **Meta**: "Fortalecer el 100% las capacidades priorizadas de reacción y atención de MEBOG para atender los delitos y comportamientos contrarios que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana en la Ciudad Capital.

En la formulación del PISCCJ, se establece la importancia de garantizar el presupuesto necesario y evaluar de modo permanente la calidad del gasto en movilidad del personal uniformado, como un factor primordial en la oferta institucional brindada al ciudadano contribuyendo a mejorar la percepción de seguridad y la satisfacción de las necesidades de tranquilidad y convivencia de los habitantes de la ciudad de Bogotá.

2. Descripción del bien y/o servicio

Efectuar (contratación para efectuar la obra e infraestructura necesaria para la instalación y puesta en funcionamiento del servicio de acueducto del inmueble y suministro de agua potable a través de tanques de almacenamiento) en la edificación relacionada en el presente; lo anterior con el objeto de brindar de manera continua el suministro de los servicios públicos al personal

policial que laboran en esta instalación y al cliente externo, con el fin de garantizar a la ciudadanía la atención de manera permanente y oportuna las 24 horas del día en toda la localidad.

2.1. Territorialización del bien o servicio solicitado

Se debe especificar su localización.

UPL:		**BARRIO:**	
LOCALIDAD:	Localidad Tercera Santafé	**DIRECCIÓN:**	CAI San Diego: Carrera 7 con calle 26

2.2. Especificaciones técnicas del bien y/o servicio solicitado:

Denominación general del bien o servicio	(Contratación para efectuar la obra e infraestructura necesaria para la instalación y puesta en funcionamiento del servicio de acueducto del inmueble y suministro de agua potable a través de tanques de almacenamiento).
Denominación específica y técnica del bien o servicio	(Contratar para efectuar la obra e infraestructura necesaria para la instalación y puesta en funcionamiento del servicio de acueducto del inmueble y suministro de agua potable a través de tanques de almacenamiento).del inmueble, con el fin de formalizar la acometida y subsanar las novedades técnico-administrativas que presenta el inmueble, para la normalización de la acometida de acueducto; (instalación y puesta en servicio de tanques de suministro de agua potable), (conexión de la red de acueducto autorizada a la edificación), alcantarillado (entrega de aguas lluvias y residuales a las redes autorizadas por los entes de control y empresa prestadora del servicio según corresponda a la edificación) de los equipamientos de seguridad (Centros de Atención Inmediata CAI que no cumple con los requerimientos y especificaciones de la nueva Resolución 0330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio "Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009 Así mismo las

	actividades administrativas con el fin de legalizar el servicio público domiciliario ante la empresa prestadora del mismo, que permita posterior a la consultoría realizada, adelantar las obras civiles necesarias para adecuar las redes de suministro, equipos y demás elementos físicos que las componen, tales como tanques de almacenamiento, medidores, plantas, motobombas.
Presupuesto aproximado para asignación	$25.000.000,00
Unidad de medida	servicio
Cantidad requerida	Comandos de Atención Inmediata uno (01)
Observaciones generales	
Características adicionales	

• Si se considera pertinente o útil se puede elaborar un mapa, plano, diagrama que ayude a entender la descripción del bien o servicio.

2.3. Ficha técnica del bien a contratar (cuando aplique).

Anexar de ser necesario

2.4. Estudios técnicos (cuando aplique)

No aplica

3. Documentos o constancias técnicas especiales. Marque con una X

Certificación de único proveedor o de distribuidor exclusivo.		Justificación de contratación directa personal	
Certificación de registro de derechos de autor ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor.		Patentes	
Estudios de títulos – suelos – impacto ambiental – transito.		Otros ¿Cuál?	
Autorización para distribución de productos restringidos.		Ficha Técnica	

4. Necesidad de contratar una interventoría (Justificar cuando aplique)

Se hace necesario contar con la interventoría para que atreves de la misma se avale cualquier actividad que se realice en cumplimiento del objeto contractual, al igual que supervisar la aplicación de los parámetros, normas y especificaciones técnicas establecidas por la entidad contratante.

5. Relación y descripción de anexos:

Justificación Cuadro unidades policiales (Estaciones, Subestaciones, CAI, especialidades, entre otras)

6. Información del responsable de la entidad solicitante

Nombre de la persona que realiza el requerimiento	Mayor General ELIECER CAMACHO JÍMENEZ
Cargo	Comandante Policía Metropolitana de Bogotá

DATOS DE VERIFICACION DE LA SDSCJ. Uso exclusivo de la SDSCJ.

AVAL PARA CONTINUAR CON EL PROCESO							
FECHA ANÁLISIS:	DD	M	A			NOMBRE:	
				SI	NO	CARGO:	
						FIRMA:	
OBSERVACIONES							

Mayor General **ELIECER CAMACHO JÍMENEZ**
Comandante Policía Metropolitana de Bogotá

Nota Final: Todas las solicitudes serán objeto de verificación y aprobación por parte de la SDSCJ.





Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DEL PROY...	19/03/2019 6:31 p. m.	Documento Adob...	1.427 KB
1.2 ACTA DE POSESIÓN			393 KB
1.2 ACTA DE POSESIÓN			6.377 KB
1.3 CÉDULA ALCALDE			134 KB
1.3 CÉDULA GOBERNAD			709 KB
1.4 RUT GOBERNACIÓN	13/12/2018 10:53 a. m.	Documento Adob...	632 KB
1.4 RUT MUNICIPIO	13/12/2018 10:55 a. m.	Documento Adob...	162 KB
1.5 ACUERDO 014 FACULTADES ALCALDE...	24/04/2018 3:47 p. m.	Documento Adob...	566 KB
1.5. Ordenanza #076-2018 - Presupuesto ...	19/03/2019 6:58 p. m.	Documento Adob...	467 KB
1.6. CDP ENTIDAD SOLICITANTE	18/06/2018 2:09 p. m.	Documento Adob...	1.265 KB
2.1. CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LIBER...	19/03/2019 7:09 p. m.	Documento Adob...	60 KB
2.1. DECLARACIÓN DE BALDÍO-9-33	17/12/2018 12:11 p. m.	Documento Adob...	1.858 KB
2.1. ESTUDIO DE TÍTULOS PROYECTO EST...	7/02/2019 3:12 p. m.	Documento Adob...	1.270 KB
2.2. FICHA PREDIAL IGAC	17/07/2017 6:45 p. m.	Documento Adob...	1.447 KB
2.3. CONCEPTO USO DE SUELO	7/02/2019 3:22 p. m.	Documento Adob...	2.240 KB
2.4. CERTIFICACIÓN DE PREVENCIÓN Y A...	7/02/2019 3:21 p. m.	Documento Adob...	123 KB
2.5 ACTA DE SOCIALIZACIÓN CON LA CO...	20/12/2018 5:37 p. m.	Documento Adob...	2.351 KB
2.5 FIRMAS ASISTENCIA SOCIALIZACIÓN ...	20/12/2018 6:33 p. m.	Documento Adob...	384 KB
2.5 TARJETA PROFESIONAL INGENIERO T...	16/12/2018 4:32 p. m.	Documento Adob...	158 KB
2.5. CERTIFICACIÓN MINISTERIO DE CULT...	4/10/2017 8:07 p. m.	Documento Adob...	59 KB
2.5. CERTIFICACIÓN PATRIMONIO HISTÓR...	7/02/2019 3:20 p. m.	Documento Adob...	145 KB
2.5. CERTIFICADO DE DEMOLICIÓN	15/03/2019 4:19 p. m.	Documento Adob...	368 KB
2.5. COPNIA INGENIERO TOBIAS GALINDO	29/01/2019 6:06 p. m.	Documento Adob...	1.082 KB
2.5. INFORME ESTABILIDAD DE LA CONS...	20/12/2018 5:02 p. m.	Documento Adob...	5.904 KB
2.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO	7/09/2018 6:40 p. m.	Documento Adob...	3.005 KB
2.6 PLANOS DE LOCALIZACIÓN 1 CON FI...	18/12/2018 5:30 p. m.	Documento Adob...	419 KB
2.6 PLANOS DE LOCALIZACIÓN 2 CON FI...	18/12/2018 5:30 p. m.	Documento Adob...	722 KB
2.7 MATRÍCULA PROFESIONAL INGENIER...	17/09/2018 2:54 p. m.	Documento Adob...	183 KB

1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y SOLICITUD DE COFINANCIACIÓN
Tipo: Documento Adobe Acrobat
Tamaño: 1,39 MB
Fecha de modificación: 19/03/2019 6:31 p. m.

REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE 04/05/2022

	
SE VERIFICA FINALIZACION DE LA INSTALACION DE CIELORRASO ZONA DEL SOTANO, SECTOR SUR	LA ACTIVIDAD DE FINALIZACION DE ELEMENTOS ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURADO PARA MAMPARAS Y CIELORRASOS ZONA DE SOTANO
	
VISTA COSTADO NORTE, FACHADA CERCA DEL CANLAL, PISOS DE CIRCULACION FINALIZADOS	CONTINUACION DE AJUSTES INSTALACIONES HIDRUALICAS, REDES DE SERVICIO

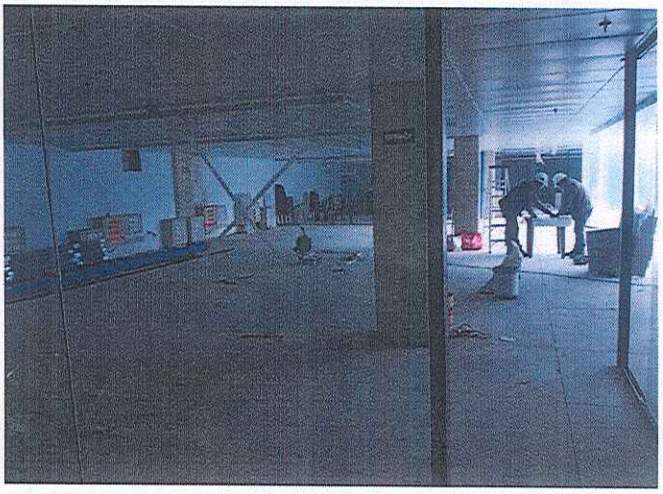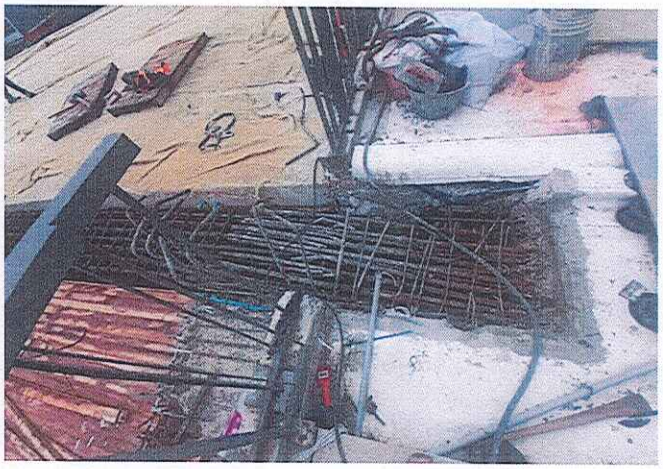	
FINALIZACION DE COLOCACION DE CIELORRRASO	MAMPARAS YA DISPUESTAS EN EL PRIMER NIVEL SOTANO, FUTURA DIJIN, ELEMENTOS DIVISORIOS
	
MAMPARAS, ZONA DE FUTURA DIJIN ACTIVIDAD CON UN RENDIMIENTO ADECUADO	APOYO DE LA VIGA DE SOPORTE DE LA CUPULA COSTADO ORIENTAL, ELEMENTO PARA FUNDIR
	
VISTA DEL SISTEMA DE SOPORTE, LOS TABLEROS DE APOYO DE LA RESTANTE CUPULA EN CONCRETO	PANORAMICA DEL ESTADO DE PLAZOLETA COSTADO SUR, FINALIZADO




PLAZA DE ARMAS, AL FONDO AUDTIIO



VISTA EL CERRAMIENTO, ZONA DE CIRCULACION FACHADA NORTE, ALEDAÑO AL CANAL



PROCESO DE CURADO DEL CONCRETO DE LA CUPULA, ESTRUCTURA RECIENTEMENTE FUNDIDA,

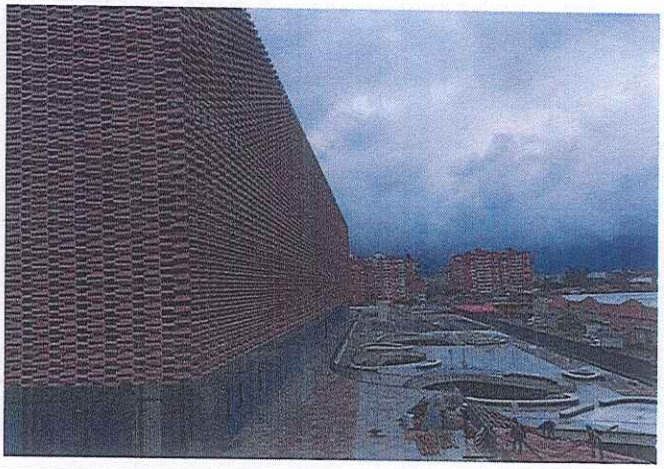

VISTA FACHADA SUR Y PARTE DE LA ACIVIDAD EN PROCESO DE ARMADDA DE CUPULA ZONA NORTE



SE DESTACA EL ELEMENTOS ARQUITECTONICO



ARMADA DE FORMALETA, PARA COMPLETAR LA CUPULA POR EL COSTADO NORTE



PROCESO DE INSTALACION DE LOS TABLEROS Y LA ESTRUCTURA DE SOPORTE, DE LA PLACA DE CONCRETO



VISTA FACHADA ORIENTAL Y COSTADO NORTE, CORREDOR LATERAL QUE LINDA CON EL CANAL DEL RIO FUCHA, CERRAMIENTO



PARQUEADEROS Y BORDILLOS OBRAS EXTERIORES DE URBANIOS



TIPO DE CERRAMIENTO TUBULAR, CON PEDESTEAL EN VIGA DE CONCRETO, ELEMENTO DE SEGURIDAD SOBRE EL COSTADO DEL CANAL



SOBR ESTA ZONA SE VERIFICA EL FACHADA ORIEENTAL



ACCESO A PARQUEADEROS, DEL SOTANO

	
GARITA SOBRE ESTE CORREDOR PARA CONTROL SOBRE ZONA DEL CANAL	CORREDOR DONDE SE EVIDENCIA COLOCACCION DE REJILLAS Y CIRCULACION
	
ESTAS REJILLAS, GENERAN UNA CIRCULACION DE AIRE SOBRE EL SOTANO DEL EDIFICIO PRINCIPAL	ELEMENTO ESTRUCTURAL DE SOPORTE VIGAS EN ACERO PARA SOPORTAR LA REJILLA DE VENTILACION.

OBSERVACIONES

En la actualidad la obra, tiene los siguientes frentes principales de ejecución.

- Auditorio, el cual corresponde a las obras del propio auditorio y sus obras aledañas de la zona del sótano.
- Edificio Atrio, el cual corresponde al edificio central,
- Plazoleta, futura zona de plaza de armas y elementos arquitectónicos como la bóveda
- Obras de urbanismo

En la organización del contratista se realizan las siguientes actividades de obra:

En la zona del auditorio, se hacen actividades de acabados finales, tales como:

Cielo rasos especiales: Piso 1: cielo raso aluzinc blanco, remate de lucarnas

Bóveda (armado testereado y fundida): Piso 1: Afinado de placa curva bóveda occidente, Armadura costado oriental placa curva bóveda, Fundida de placa bóveda costado occidente,

Actividades de instalaciones de redes de servicio, tales, como redes eléctricas, redes de sistema de red contra incendios.

Actividades de pintura, resanes

En la parte de urbanismo, se continúan con obras, de colocación de red de acueducto por la carrea 60, alistamiento colocación del hidrante.

Se hace énfasis en los protocolos de conexión de servicios públicos, esto es alistamiento de documentación para las entidades prestadoras de servicio, gas natural, donde están en curso, los protocolos ante AVANTI

En el edificio central, se continua, con la colocación de las divisiones en vidrio, esto es lo que se denomina mamparas, continuación de colocación de aparatos sanitarios, luminarias, cielorrasos en madera, aparatos sanitarios, espejos, resanes y pintura.

ESTADO DE PROGRAMACION

ACTIVIDAD	PROGRAMADO %	EJECUTADO %
PRELIMINARES	100	100
ESTRUCTURA	92,95	93,48
OBRA GRIS	97,88	97,91
ACABADOS	64,40	64,07

ANALISIS POR LOS FRENTES DE EJECUCION

	AUDITORIO	ATRIO FRENTE 2	ATRIO FRENTE 3	PLAZOLETA	EXTERIORES	PROMEDIOS
% PROGRAMADO	69,03%	84,29%	70,39%	80,67%	81,75%	77,02%
EJECUTADO	67,50%	84,65%	72,17%	81,10%	78,21%	76,77%

ES IMPORTANTE LA CONTRATACION DEL MOBILIARIO TODA VEZ QUE LO REFLEJADO A EN LA EJECUCION, ESTA CONTINUA CON LOS RENDIMIENTOS NORMALES, LO CUAL DA UN ESTIMADO DE ENTREGA PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022

GENERAR OFICIO A LOS DISEÑADORES, PARA VER LA POSIBILIDAD DE MEJORAR EL ACCESO DADO LAS RESTRINCCIONES QUE SE EVIDENCIAN EN LA ZONA DE ACCESO, ESTO POR LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, ESTA ES LA VIA Y EL LOTE ALEDAÑO, DONDE QUEDO EL COMPROMISO DE VERIFICAR EL PROPIETARIOS



Piso 1:	Auditorio:	Bóveda (armado testereado y fundida):	Bóveda (armado testereado y fundida): Piso 1: Afinado de placa curva bóveda occidente, Armadura costado oriental placa curva bóveda, Fundida de placa bóveda costado occidente,
Piso 1:	Auditorio:	Cielo rasos especiales:	Cielo rasos especiales: Piso 1: cielo raso aluzinc blanco, muestra cielo raso aluzinc y maquillaje nichos lucarnas
Piso 1:	Auditorio:	Lucarnas:	Lucarnas: Piso 1: Estructura para cielo raso, resanes y maquilla en nichos lucarnas, pintura en nichos lucarnas, Resane de nichos para lucarnas, Resanes y maquillaje de nichos para lucarnas,
Sótano:	Auditorio:	Instalaciones eléctricas:	Instalaciones eléctricas: Sótano: Cableado por tubería cable estructurado par señal equipos A/C eje 7-11/A-B
Sótano:	Auditorio:	Instalaciones red incendio:	Instalaciones red incendio: Sótano: rociadores red contra incendio eje 7-11/E-F
Sótano:	Auditorio:	Luminarias:	Luminarias: Sótano: soportes para luminarias eje 7-8/B-D
Sótano:	Auditorio:	Pintura:	Pintura: Sótano: Resane de muro pantalla eje 6-7/C-E
Sótano:	Auditorio:	Resanes generales:	Resanes generales: Sótano: Resanes de vigas bajo placa eje 6-7/E-F
Piso 6:	Atrio:	Aparatos sanitarios y accesorios:	Aparatos sanitarios y accesorios: Piso 6: espejo en baños minusválidos eje 15-16/C-D, 16-18/B-D, soporte de refuerzo división de baños eje 19-30/B-D,
Piso 6:	Atrio:	Divisiones de	Divisiones de oficina: Piso 6: mampara eje 18-20/D-E, perfiles mamparas eje 27-29/D-E, perfiles para mamparas eje 2829/D-E, perfiles para mamparas eje


		oficina:	s12-13/E-F, tapaluz inferior mamparas eje 19-22/D-E, tapaluz inferior mamparas eje 21/D-E,
Piso 6:	Atrio:	Resanes generales:	Resanes generales: Piso 6: tapa muros contra fachada interior eje 28-29/G
Piso 5:	Atrio:	Aparatos sanitarios y accesorios:	Aparatos sanitarios y accesorios: Piso 5: espejos en baño eje 25-26/E-F, 29-30/C-D
Piso 5:	Atrio:	Divisiones de oficina:	Divisiones de oficina: Piso 5: silicona en vidrios mamparas eje 19-20/E-F, silicona en vidrios mamparas eje 27-28/D, tapaluz inferior mamparas y aplicación silicona en vidrios ejes 14-15/D-E, tapaluz inferior mamparas y aplicación silicona en vidrios ejes 18/D-E, tapaluz inferior mamparas y aplicación silicona en vidrios ejes 22-24/E-F,
Piso 5:	Atrio:	Instalaciones eléctricas:	Instalaciones eléctricas: Piso 5: Cableado par control de aire , instalación de cajas y tubería EMT a tablero eje 15-16/C-D, 28-29/F-G, caja de paso aires e instalación de tubería 1" hacia cuarto técnico eje 13-14/B-C
Piso 5:	Atrio:	Luminarias:	Luminarias: Piso 5: sensores de iluminación eje 12-15/E-G, 12-13/B_E
Piso 4:	Atrio:	Divisiones de oficina:	Divisiones de oficina: Piso 4: silicona entre vidrio mamparas eje 23-24/B-D, silicona entre vidrios mamparas eje 19-23/D-E, silicona vidrios mamparas eje 1922/D-E,
Piso 4:	Atrio:	Luminarias:	Luminarias: Piso 4: sensores de movimiento iluminación eje 16-18/C-D
Piso 4:	Atrio:	Pintura:	Pintura: Piso 4: dilataciones entre ejes 28-29/F-G, Resanes y maquillaje de punto fijo eje 28-29/E-F,
Piso 4:	Atrio:	Resanes generales:	Resanes generales: Piso 4: tapas muros en superboard eje 13-14/B-C
Piso 3:	Atrio:	Aparatos sanitarios y accesorios:	Aparatos sanitarios y accesorios: Piso 3: taparegidtros en baños eje 18-19/B-C
Piso 3:	Atrio:	Carpinteria Metálica:	Carpinteria Metálica: Piso 3: Chequeo y manijas en basculantes eje 12-30/G, perfil tapaluz gotero fachada sur eje25-30/G, tapaluz gotero eje 19-22/G, tapaluz gotero eje 22-25/G, tapaluz gotero eje G/12-19,
Piso 3:	Atrio:	Cielo rasos especiales:	Cielo rasos especiales: Piso 3: Replanteo para instalación cielo raso en madera eje 16-19/E->G
Piso 3:	Atrio:	Divisiones de	Divisiones de oficina: Piso 3: Angulo superior mamparas eje 18-22/E, silicona entre vidrios mampara je 28-30/D-E, vidrios mamparas ejes 23/E-F,



		oficina: Instalaciones eléctricas:	
Piso 3:	Atrio:		Instalaciones eléctricas: Piso 3: Cableado de puesta tierra rack cuarto técnico eje 24-25/F->G
Piso 3:	Atrio:	Pintura:	Pintura: Piso 3: dilataciones en muros ejej28-29/F-G, Masillado de dinteles en superboard eje 26-28/D-E, Remates de muros y dilataciones ejes 13-14/B-C,
Piso 3:	Atrio:	Resanes generales:	Resanes generales: Piso 3: tapa muro en superboard eje 13/B
Piso 3:	Atrio:	Sellos cortafuego:	Sellos cortafuego: Piso 3: Resanes y dilataciones en cuarto técnico para aplicación de sello cortafuego eje 13-14/B-C
Piso 2:	Atrio:	Cielo rasos especiales:	Cielo rasos especiales: Piso 2: cielo raso en madera eje 17-19/D-E, 25-26/D-E, 28-30/C-D, 28-30/D-E, cielo raso en madera eje 23-25/D-E, cielo raso en madera eje 17-19/D-E, cielo raso en madera eje 28-30/B-E, 26-27/B-D, cielo raso en madera eje 28-30/D-E, 26-28/D-E, Desmonte de luminarias por instalación de cielo raso en madera eje 28-30/D-E, tornillos cielo raseo en madera eje 22-24/E-F, tornillos cielo raseo en madera eje 28-30/D-E, vigas de madera y nivelación eje 13-14/H-J,
Piso 2:	Atrio:	Divisiones de oficina:	Divisiones de oficina: Piso 2: perfiles mamparas eje 12-14/A-G, perfiles mamparas eje 12-13/B-D, perfiles mamparas eje 12-13/B-E, perfiles para mamparas eje 23-24/E-F, platinas para perfiles mamparas eje 12-13/B-D, platinas para perfiles mamparas eje 12-13/B-F,
Piso 2:	Atrio:	Luminarias:	Luminarias: Piso 2: luminarias eje 25-26/D-E
Piso 2:	Atrio:	Pintura:	Pintura: Piso 2: Remates de escalera ejes 28-29/E-F, Remates en punto fijo escalera eje 13-14/B-D,
Piso 2:	Atrio:	Pisos secos:	Pisos secos: Piso 2: Renivelacion de pisó en mortero para acabado de piso eje 26-28/D-E
Piso 2:	Atrio:	Resanes generales:	Resanes generales: Piso 2: Remates de piso eje 19-22/C-D, Remates de piso ejes 26-28/D-E,
Piso 1:	Atrio:	Cielo rasos especiales:	Cielo rasos especiales: Piso 1: complemento en fibrocemento cielo raso eje 12-16/G
Piso 1:	Atrio:	Divisiones de oficina:	Divisiones de oficina: Piso 1: perfiles mamparas eje 12-18/D, perfiles para mamparas eje 12-17/E, 21-22/E-G, perfiles para mamparas eje 12-17/E-G, tapas fibrocemento por desplazamiento de celosías mamparas eje 14-15/D,
Piso 1:	Atrio:	Luminarias:	Luminarias: Piso 1: cinta led iluminación eje 14-17/A-D, cinta led iluminación eje 25-28/F-G, cinta led para iluminación y perforaciones en cielo raso ejes 25-28/E-


			G, Perforaciones para luminarias emergencia eje 12-30/A-G,
Piso 1:	Atrio:	Pisos secos:	Pisos secos: Piso 1: Renivelacion de pisos en mortero eje 22-24/E_F, 16-17/D
Sótano:	Atrio:	Instalaciones eléctricas:	Instalaciones eléctricas: Sótano: Cableado por tubería para sistema de señales equipos A/C eje 16-28/C-E
Sótano:	Atrio:	Instalaciones hidrosanitarias:	Instalaciones hidrosanitarias:Sótano: registros de control tubería agua potable eje 29/C
Sótano:	Atrio:	Instalaciones red incendio:	Instalaciones red incendio: Sótano: Pruebas de tubería red de incendio eje 19-16/F-H
Sótano:	Atrio:	Resanes generales:	Resanes generales: Sótano: Remates de viga eje 29-30/A-B, Resane de viga eje 18-22/A-C, resanes de vigas en concreto eje 27-28/A-B,
Piso 1:	Plazoleta:	Carpinteria Metálica:	Carpinteria Metálica: Piso 1: rejilla bajo bancas, rejilla bajo vidrio lucarna contra suppla, soportes para rejilla bajo vidrio lucarna suppla, vidrios lucarnas contra Suppla
Piso 2:	Plazoleta:	Bóveda (armado testereado y fundida):	Bóveda (armado testereado y fundida): Piso 2: antisol a placa curva eje 7-11/H-J, Corte de repisas y alistado de cajón para armado de viga eje h/12, costales sobre placa para curado eje 7-11/H-J, humectación de placa curva bóveda eje 7-11/H-J, listines de piso placa curva eje 13-14/H-J, Nivelación andamios de carga e instalación de cajones placa curva eje 13-14/H-J, Nivelación de cama y vigas de madera, instalación de listón sajo eje 12-14/H-J placa bóveda parte 2, Nivelación de vigas eje 13-14/H-J,
Sótano:	Plazoleta:	Cielo rasos especiales:	Cielo rasos especiales: Sótano: aluzinc blanco eje 26-30/G-I, cuelgas par cielo raso eje 13-16/I-J, cuelgas y estructura cielo raso eje 16-17/I-K, estructura cielo raso eje 13-16/I-K, estructura cielo raso eje 16-17/I-K, remate cielo raso contra vacíos eje 25-27/G-J, Remate de cuña de cielo raso en aluzinc eje 27-29/G-H, remates en cielo raso contra mamparas eje 25-30/G-K,
Sótano:	Plazoleta:	Divisiones de oficina:	Divisiones de oficina: Sótano: Acopio de vidrios para mamparas, Localización de mamparas eje 24-25/G-H,
Sótano:	Plazoleta:	Instalaciones red incendio:	Instalaciones red incendio: Sótano: soporte bajo techo para amarre tubería red contra incendió eje 17-20/G-J

Sótano:	Plazoleta:	Luminarias:	Luminarias: Sótano: lámparas iluminación eje 29-30/G-I
Piso 1: Urbanismo occ: Urbanismo occ: Urbanismo orient:	Atrio: Acometida agua potable Kra 60: Acometida agua potable Kra 60: Obras exteriores (parqueadero):	Pisos exteriores: obras de arte, vías y andenes: Tuberías suministro exteriores: Instalaciones hidrosanitarias:	Pisos exteriores: Piso 1: ángulos para instalación de piso en rejilla eje 19-21/A-B, piso en rejilla eje 19-22/A-B, piso en rejilla eje 21-23/A-B, piso en rejilla eje22-4/A-B, obras de arte, vías y andenes: Urbanismo occ: Urbanismo occ: Construcción de caja en mampostería 50x50 válvula de cierre cra 60, Nivelación y compactación sub base anden cra 60 Tuberías suministro exteriores: Urbanismo occ: tapón de 12 " inicio tubería red de acueducto cra 60 Instalaciones hidrosanitarias:Urbanismo orient: Excavación manual y alistado e instalación hidrante red acueducto, Excavación y alistado para instalación hidrante zona verde acceso portería, válvula 3" provisional para prueba,
Piso 1:	Atrio:	Aseo general de obra:	Aseo general de obra: Piso 1: Aseo general de piso, Piso 3: Limpieza tubería hidrosanitaria eje 12-18/B-D, Piso 4: Aseo tuberías hidrosanitaria eje 15-17/B-C, Piso 5: Aseo general de piso, Limpieza y demarcación tuberías sanitaria eje 27-30/E-F, Piso 6: Aseo general de piso, Sótano: Aseo y retiro de escombros vacío 1eje 2-7/H-K,

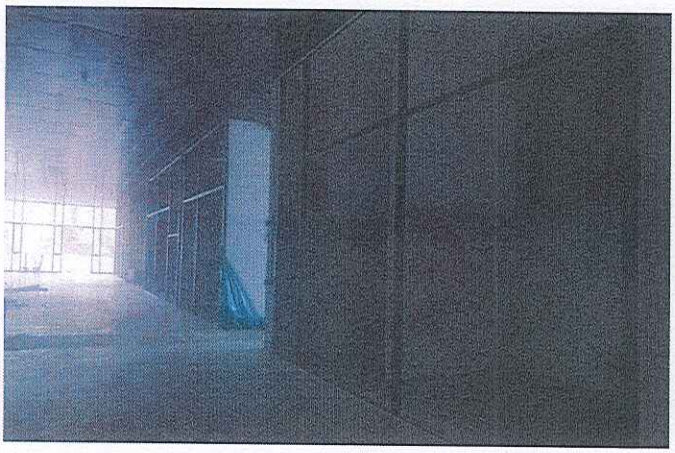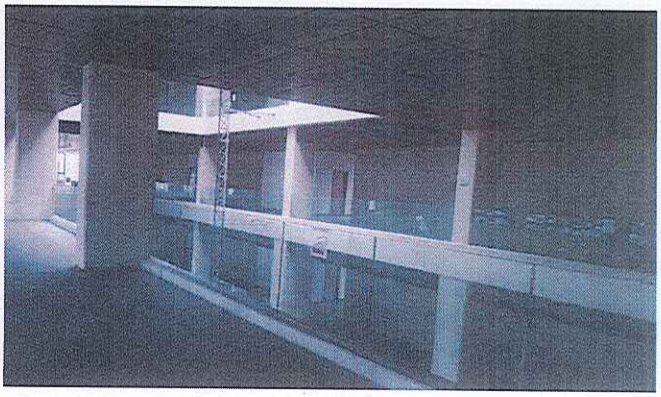	
VISTA DE AVANCE SEGUNDO NIVEL, YA EN PROCESO DE FINALIZACION	OTRA VISTA DEL ESTRUCUTADO DE LAS MAMPARAS
	
VISTA COSTADO ORIENTAL, MAMPARAS ACTIVDAD FINAL, PARA CERRR ESPACION, CON LO CUAL SE DISPONDRIA EL MOBILIARIO Y REDES DE TELEMATICA	TERCER Y CUARTO NIVEL, ACTIVIDAD DE COLOCACION DE CIERLORRASO EN MADERA, ALISTAMIENTO DEL AREA A COLOCAR, CON ESPACIO YA CERRADO
	
VIST PISO SUPERIORES, CERRADOS, FINALIZADO	MAMPARAS Y CIELORRASOS FINALIZADOS

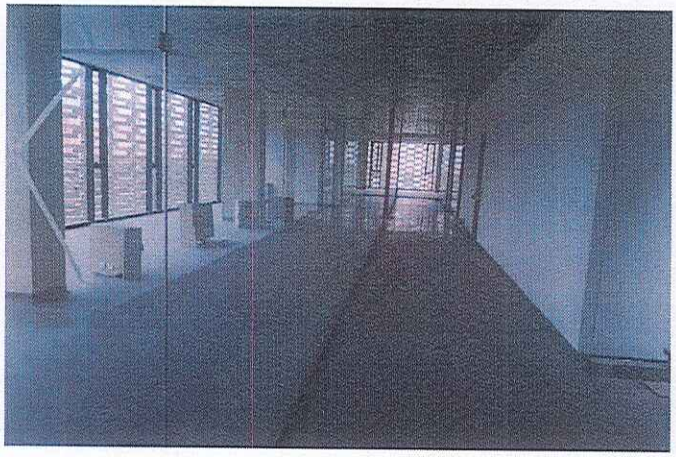	
ALISTAMIENTO CIELORRASO Y SISTEMAS DE REDES DE SERVICIOS SOBREPUESTAS	CIELORRASO EN MADERA, PARA COLOCACION, DE ACUERDO A ZONIFICIACION ARQUITECTONICA
	
ALISTAMIENTO PARA MOBILIARIO Y REDES TELEMATICA, ZONAS FINALIZADAS	ZONA FINALIZADA, EN PISO CUARTO, DONDE SE DISPONDRA DE MUEBLES, DE ACUERDO A REQUIMIENTO
	

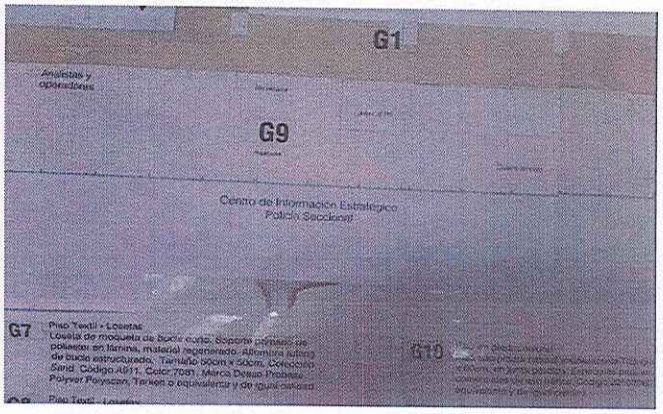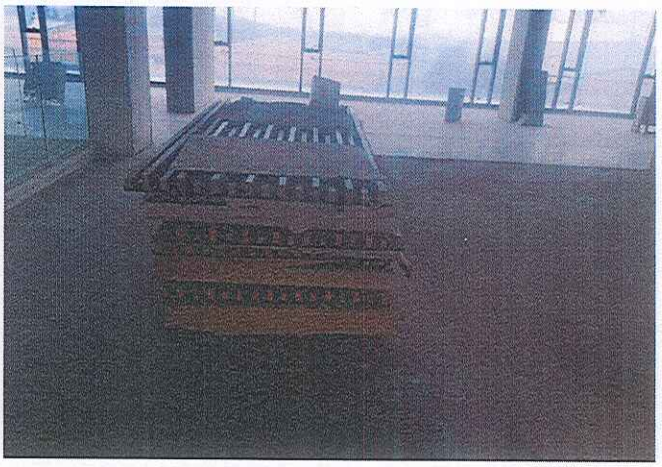SE DESTACA LA LOGISTICA DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE ACABADOS EN EJECUCION, DONDE SE DISPONEN CADA UNO DE LOS ELEMENTOS EN LAS ZONAS DE COLOCACION, CON EL FIN DE OPTIMIZAR RENDIMIENTOS Y CUMPLIR CON LA PROGRAMACION	ZONA TERMINADA, POR LO CUAL EL PROCESO DE MOBILIARIO Y REDES, DEBE SER PRIORITARIO, TODA VEZ QUE VA A GARANTIZAR LA ENTREGA EN EL PLAZO DE EJECUCION Y LA PUETA EN OPERACIÓN DEL EDIFICIO, CON LA TOTALIDAD DE LAS PRUEBAS NESARIAS
	
CIELORRADO EN MADERA COLOCADO, CONEL COLOR DEFINIDO	ZONIFICACION DE PISOS, GUIA DE COLOCACION, PISO POR PISO
	
SIENDO ESRTA LA ACTIVIDAD FINAL DE LA INSTALACION DEL CIERLORRASO DE MADERA	ZONA DE ALISTAMIENTO, PROTEJIENDO EL CIELORRASO EN MADERA

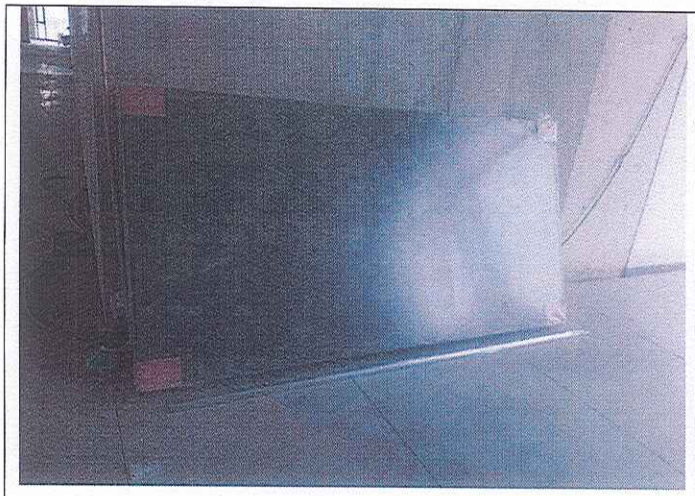

ELEMENTOS ARQUITECTONICO, FIBER GLASS



SEGUNDO NIVLE, EN PROCESO, DE FINALIZACION, COLOCION DE MAMPARAS



PROCEDMIENTO SEGUENCIA, DE LA COLOCACION DE ESTE ELEMENTOS ARQUITECTONICO.



SE INTENSIFICO ESTAS ACTIVIDADES, POR LA PROGRAMACION PROPUESTA





VISTA DE VERIFICACION, DE SITEMA DE ROCIADORES, ILUMINACIONY CIELORRASOS	PANORMICA DEL PARQUEADERO EXTERNO, DONDE SE EVIDENCIO, EN LA ZONA DE ACCESO SERIAS RESTRINCCIONES DE VEHICULOS DE GRAN TAMAÑO.

BOGOTÁ

SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN

SEMANA No **177 de 208** DEL **15-may-22** AL **22-may-2022**

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG

Id	Actividad	Duración días	Comienzo	Fin	% programado	% Completado sem Ant	% De desviación	% completado	(-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario	Observaciones
				PROGRAMA AVANCE PORCENTUAL POR CAPÍTULO					*	
	Preliminares y obras Generales				**100,00%**	**100,00%**		**100,00%**	*	**Actividad Capítulo**
	Estructura				**93,64%**	**94,11%**		**94,71%**	*	**Actividad Capítulo**
	Obra gris				**97,88%**	**97,91%**		**97,91%**	*	**Actividad Capítulo**
	Acabados				**66,54%**	**66,23%**		**67,47%**	*	**Actividad Capítulo**
				PROGRAMA CONSOLIDADO					*	
0	**reprogramacion 3 v19**		**28-12-18**	**17-12-22**	**78,25%**	**77,57%**	**-0,16%**	**78,41%**	**(-) 2 días**	**Actividad Capítulo**
				PROGRAMA CONSOLIDADO POR FRENTES					*	
	Auditorio F1 - Consolidado		**28-12-18**	**14-12-22**	**71,28%**	**68,35%**	**2,46%**	**68,82%**	**(+) 16 días**	**Actividad Capítulo**
535	**Piso 3**	**0**	**3-01-22**	**14-12-22**	**33,00%**	**7,00%**	**26,00%**	**7,00%**	**(+) 70 días**	**Actividad Capítulo**
537	Posible reforzamiento cubierta	60	26-01-22	5-04-22	100,00%	60,00%	40,00%	60,00%	(+) 75 días	Atraso neto duración restante 75 días
538	Cubierta auditorio (remate)	32	6-04-22	14-05-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 46 días	Atraso neto duración restante 46 días
539	Fachada auditorio	120	14-03-22	2-08-22	48,00%	35,00%	8,00%	40,00%	(+) 11 días	Fachada auditorio: Piso 3: Armado de andamio para reparación estructura metálica, Atraso neto duración restante 11 días
540	Instalaciones hidrosanitarias	30	6-04-22	12-05-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 46 días	Atraso neto duración restante 46 días
541	Instalaciones eléctricas	90	6-04-22	21-07-22	42,00%	0,00%	42,00%	0,00%	(+) 45 días	Atraso neto duración restante 45 días
542	Instalaciones voz y datos	90	6-04-22	21-07-22	42,00%	0,00%	42,00%	0,00%	(+) 45 días	Atraso neto duración restante 45 días
543	Instalaciones seguridad y control	90	6-04-22	21-07-22	42,00%	0,00%	42,00%	0,00%	(+) 45 días	Atraso neto duración restante 45 días
544	Instalaciones climatización	90	6-04-22	21-07-22	42,00%	36,00%	6,00%	36,00%	(+) 6 días	Atraso neto duración restante 6 días
545	Instalaciones red incendio	90	6-04-22	21-07-22	42,00%	0,00%	42,00%	0,00%	(+) 45 días	Atraso neto duración restante 45 días
546	Muros secos	60	6-04-22	16-06-22	63,00%	0,00%	63,00%	0,00%	(+) 45 días	Atraso neto duración restante 45 días
547	Sellos cortafuego	30	6-04-22	12-05-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 46 días	Atraso neto duración restante 46 días
548	Cielo rasos en fibrocemento	60	6-04-22	16-06-22	63,00%	0,00%	63,00%	0,00%	(+) 45 días	Atraso neto duración restante 45 días
549	Cielo rasos especiales	60	6-04-22	16-06-22	63,00%	2,00%	61,00%	2,00%	(+) 43 días	Atraso neto duración restante 43 días
550	Carpintería Metálica	60	6-04-22	16-06-22	63,00%	5,00%	58,00%	5,00%	(+) 41 días	Atraso neto duración restante 41 días
556	Pisos húmedos	50	13-05-22	9-07-22	16,00%	0,00%	16,00%	0,00%	(+) 9 días	Atraso neto duración restante 9 días
566	**Piso 2 y plaza armas**	**0**	**3-01-22**	**8-12-22**	**50,00%**	**47,00%**	**3,00%**	**47,00%**	**(+) 7 días**	**Actividad Capítulo**
569	Impermeabilización remate en perimetro de auditorio	60	25-05-22	2-08-22	0,00%	2,00%	-2,00%	2,00%	(-) -4 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -4 días
570	Instalaciones hidrosanitarias	120	3-01-22	24-05-22	98,00%	93,00%	5,00%	93,00%	(+) 7 días	Atraso neto duración restante 7 días
571	Instalaciones eléctricas	120	3-01-22	24-05-22	98,00%	93,00%	5,00%	93,00%	(+) 7 días	Atraso neto duración restante Con el programa, adelanto 7 días
572	Instalaciones voz y datos	120	3-01-22	24-05-22	98,00%	93,00%	5,00%	93,00%	(+) 7 días	Atraso neto duración restante Con el programa, adelanto 7 días
573	Instalaciones seguridad y control	120	3-01-22	24-05-22	98,00%	93,00%	5,00%	93,00%	(+) 7 días	Atraso neto duración restante Con el programa, adelanto 7 días
574	Instalaciones climatización	120	3-01-22	24-05-22	98,00%	93,00%	5,00%	93,00%	(+) 7 días	Atraso neto duración restante Con el programa, adelanto 7 días
575	Instalaciones red incendio	120	3-01-22	24-05-22	98,00%	93,00%	5,00%	93,00%	(+) 7 días	Atraso neto duración restante Con el programa, adelanto 7 días
578	Lucarnas	90	7-02-22	24-05-22	98,00%	91,00%	7,00%	91,00%	(+) 7 días	Atraso neto duración restante Con el programa, adelanto 7 días
579	Pisos plazoletas remates perimetro auditorio	60	3-08-22	11-10-22	0,00%	5,00%	-5,00%	5,00%	(-) -73 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -73 días
581	Sellos cortafuego	45	12-04-22	4-06-22	73,00%	47,00%	26,00%	47,00%	(+) 14 días	Atraso neto duración restante 14 días
582	Cielo rasos en fibrocemento	60	13-05-22	21-07-22	13,00%	3,00%	0,00%	13,00%	(-) 0 días	Con el programa, adelanto 0 días
583	Cielo rasos especiales	60	13-05-22	21-07-22	13,00%	0,00%	13,00%	0,00%	(+) 9 días	Atraso neto duración restante 9 días
584	Carpintería Metálica	60	13-05-22	21-07-22	13,00%	15,00%	-2,00%	15,00%	(-) 59 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto 59 días
586	Remates generales	80	29-06-22	29-09-22	0,00%	1,00%	-1,00%	1,00%	(-) -37 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -37 días
588	Pisos húmedos	30	25-05-22	28-06-22	0,00%	15,00%	-15,00%	15,00%	(-) -8 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -8 días
601	**Piso 1 y plaza de acceso**	**0**	**3-01-22**	**14-12-22**	**41,00%**	**42,00%**	**-3,00%**	**44,00%**	**(-) 11 días**	**Actividad Capítulo**
607	Fragüe de bóveda y descimbrado de formaleta	20	17-06-22	9-07-22	0,00%	25,00%	-30,00%	30,00%	(-) -31 días	Fragüe de bóveda y descimbrado de formaleta: Piso 1: Descimbrado de placa bóveda tramo 1 ejes 7-11/H-J, ejes 7-9/H-J, adelanto -31 días

BOGOTÁ

SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN

SEMANA No **177 de 208** DEL **15-may-22** AL **22-may-2022**

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG

Id	Actividad	Duración días	Comienzo	Fin	% programado	% Completado sem Ant	% De desviación	% completado	(-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario	Observaciones
608	Impermeabilización en zona de bóveda y juntas	30	11-07-22	13-08-22	0,00%	2,00%	-2,00%	2,00%	(-) -48 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -48 días
609	Instalaciones eléctricas	60	17-06-22	25-08-22	0,00%	2,00%	-2,00%	2,00%	(-) -26 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -26 días
612	Instalaciones climatización	60	17-06-22	25-08-22	0,00%	0,00%	-10,00%	10,00%	(-) -31 días	Instalaciones climatización: Piso 1: Cableado para A/C cuarto técnico, ductos A/C casa coral, adelanto -31 días
613	Instalaciones red incendio	60	17-06-22	25-08-22	0,00%	0,00%	-10,00%	10,00%	(-) -31 días	Instalaciones red incendio: Piso 1: tubería de 12mm rociadores red contra incendios, adelanto -31 días
621	Sellos cortafuego	30	14-03-22	19-04-22	100,00%	15,00%	85,00%	15,00%	(+) 64 días	Atraso neto duración restante 64 días
623	Enchapes	60	14-03-22	24-05-22	97,00%	87,00%	0,00%	97,00%	(-) 0 días	Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días
624	Cielo rasos especiales	101	14-03-22	11-07-22	57,00%	51,00%	0,00%	57,00%	(-) 0 días	Cielo rasos especiales: Piso 1: aluzinc blanco en baños, dilataciones en cielo raso RH baños, Replanteo para instalación de celosías cuarto técnico, Con el programa, adelanto 0 días
625	Carpinteria Metálica	60	14-03-22	24-05-22	97,00%	87,00%	0,00%	97,00%	(-) 0 días	Carpinteria Metálica: Piso 1: celosía para cerrar buitrón, Con el programa, adelanto 0 días
626	Pisos húmedos	30	25-05-22	28-06-22	0,00%	1,00%	-1,00%	1,00%	(-) -3 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -3 días
627	Aparatos sanitarios y accesorios	30	25-05-22	28-06-22	0,00%	5,00%	-5,00%	5,00%	(-) -4 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -4 días
628	Pintura	80	26-08-22	26-11-22	0,00%	10,00%	-20,00%	20,00%	(-) -109 días	Pintura: Piso 1: Lijado y dilataciones en muros fibrocemento, Maquillaje de estructura en concreto, masilla en cielo raso RH baños, pintura cielo raso de baños, muestra de pintura estructura metálica y anticorrosivo, Retiro de pintura estructura metálica, adelanto -109 días
629	Remates generales	80	26-08-22	26-11-22	0,00%	2,00%	-2,00%	2,00%	(-) -93 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -93 días
630	Pisos plazoletas	60	15-08-22	22-10-22	0,00%	5,00%	-5,00%	5,00%	(-) -84 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -84 días
632	Luminarias	50	3-08-22	29-09-22	0,00%	2,00%	-2,00%	2,00%	(-) -70 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -70 días
645	**Sótano**	**0**	**3-01-22**	**14-12-22**	**35,00%**	**35,00%**	**-2,00%**	**37,00%**	**(-) 8 días**	**Actividad Capítulo**
647	Instalaciones eléctricas	60	11-07-22	17-09-22	0,00%	10,00%	-10,00%	10,00%	(-) -54 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -54 días
649	Instalaciones seguridad y control	60	11-07-22	17-09-22	0,00%	5,00%	-5,00%	5,00%	(-) -51 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -51 días
650	Instalaciones climatización	60	11-07-22	17-09-22	0,00%	2,00%	-2,00%	2,00%	(-) -49 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -49 días
651	Instalaciones red incendio	60	11-07-22	17-09-22	0,00%	10,00%	-10,00%	10,00%	(-) -54 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -54 días
660	Pisos húmedos	40	20-04-22	4-06-22	70,00%	55,00%	0,00%	70,00%	(-) 0 días	Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días
661	Aparatos sanitarios y accesorios	30	20-04-22	24-05-22	93,00%	73,00%	0,00%	93,00%	(-) 0 días	Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días
662	Sellos cortafuego	60	14-03-22	24-05-22	97,00%	15,00%	82,00%	15,00%	(+) 58 días	Atraso neto duración restante 58 días
664	Cielo rasos especiales	40	15-08-22	29-09-22	0,00%	20,00%	-30,00%	30,00%	(-) -94 días	Cielo rasos especiales: Sótano: aluzinc ejes 3-7/G-H, cielo raso en superboard ejes 5-6/C-E, ejes 6-7/C-E, adelanto -94 días
665	Carpinteria Metálica	40	15-08-22	29-09-22	0,00%	15,00%	-20,00%	20,00%	(-) -89 días	Carpinteria Metálica: Sótano: Adecuación de vano puerta de emergencia ejes 6-7/B-C, adelanto -89 días
666	Pintura	90	15-08-22	26-11-22	0,00%	12,00%	-15,00%	15,00%	(-) -95 días	Pintura: Sótano: Encintado masillado cielo raso en superboard ejes 5-6/C-E, ejes 6-7/C-E, adelanto -95 días
667	Remates generales	90	15-08-22	26-11-22	0,00%	5,00%	-5,00%	5,00%	(-) -86 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -86 días

BOGOTÁ

SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN

SEMANA No **177 de 208** DEL **15-may-22** AL **22-may-2022**

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG

Id	Actividad	Duración días	Comienzo	Fin	% programado	% Completado sem Ant	% De desviación	% completado	(-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario	Observaciones
669	Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio)	60	20-08-22	28-10-22	0,00%	10,00%	-15,00%	15,00%	(-) -95 días	Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio): Sótano: rociadores red contra a incendio ejes 7-11/A-B, ejes 7-11/A-C, ejes 7-11/B-E, ejes 7-11/D.-E, adelanto -95 días
670	Luminarias	30	30-09-22	3-11-22	0,00%	10,00%	-15,00%	15,00%	(-) -129 días	Luminarias: Sótano: luminarias ejes 6-7/C-E, ejes 7-11/A-B, adelanto -129 días
672	Divisiones de oficina	50	30-09-22	26-11-22	0,00%	18,00%	-25,00%	25,00%	(-) -138 días	Divisiones de oficina: Sótano: vidrio mamparas ejes 1-3/H-I, ejes 6-7/A-B, ejes 7-11/F, adelanto -138 días
	Atrio frente 2 y 3 - Consolidado		**28-12-18**	**17-12-22**	**80,23%**	**80,63%**	**-1,47%**	**81,70%**	**(-) 12 días**	**Actividad Capítulo**
	Atrio F2 - Consolidado		**28-12-18**	**14-12-22**	**85,54%**	**85,55%**	**-0,83%**	**86,37%**	**(-) 12 días**	**Actividad Capítulo**
682	**Cubierta**	**0**	**14-03-22**	**19-04-22**	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**0,00%**	**(+) 56 días**	**Actividad Capítulo**
683	Torre de comunicación	30	14-03-22	19-04-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 69 días	Atraso neto duración restante 69 días
716	**Piso 5**	**0**	**25-01-22**	**26-11-22**	**53,00%**	**53,00%**	**-3,00%**	**56,00%**	**(-) 12 días**	**Actividad Capítulo**
725	Sellos cortafuego	30	26-01-22	1-03-22	100,00%	50,00%	45,00%	55,00%	(+) 97 días	Atraso neto duración restante 97 días
729	Enchapes	20	19-05-22	10-06-22	15,00%	5,00%	0,00%	15,00%	(-) 0 días	Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días
730	Aparatos sanitarios y accesorios	30	11-06-22	15-07-22	0,00%	20,00%	-25,00%	25,00%	(-) -27 días	Aparatos sanitarios y accesorios: Piso 5: divisiones de ducha ejes 28-29/B-E, espejos en alojamientos ejes 25-28/C-D, adelanto -27 días
731	Cielo rasos especiales	60	6-04-22	16-06-22	63,00%	53,00%	0,00%	63,00%	(-) 0 días	Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días
732	Carpintería Metálica	60	6-04-22	16-06-22	63,00%	53,00%	0,00%	63,00%	(-) 0 días	Carpintería Metálica: Piso 5: magnétos en marco de puerta ejes 22-23/E-F, Con el programa, adelanto 0 días
733	Pintura	60	6-04-22	16-06-22	63,00%	53,00%	0,00%	63,00%	(-) 0 días	Pintura: Piso 5: Pintura muros cuarto técnico ejes 28-29/F-G, Con el programa, adelanto 0 días
734	Remates generales	80	6-04-22	9-07-22	48,00%	40,00%	0,00%	48,00%	(-) 0 días	Resanes generales: Piso 5: Remate de piso contra mampara ejes 27-28/D-E, Con el programa, adelanto 0 días
735	Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio)	30	17-06-22	21-07-22	0,00%	1,00%	-1,00%	1,00%	(-) -25 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -25 días
736	Luminarias	60	17-06-22	25-08-22	0,00%	20,00%	-25,00%	25,00%	(-) -41 días	Luminarias: Piso 5: sensores de iluminación ejes 15-19/E-G, adelanto -41 días
737	Divisiones de oficina	60	17-06-22	25-08-22	0,00%	40,00%	-45,00%	45,00%	(-) -54 días	Divisiones de oficina: Piso 5: perfiles mamparas ejes 19-2/B-D, silicona entre vidrios mamparas, ejes 19-2/B-D, ejes18-19/D-E, tapa luz vidrios mamparas ejes 18-21/E, vidrio mampara ejes 22/D, adelanto -54 días
739	Pisos secos	45	22-07-22	12-09-22	0,00%	5,00%	-5,00%	5,00%	(-) -60 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -60 días
748	**Piso 4**	**0**	**17-02-22**	**13-12-22**	**48,00%**	**49,00%**	**-3,00%**	**51,00%**	**(-) 12 días**	**Actividad Capítulo**
758	Sellos cortafuego	30	18-02-22	24-03-22	100,00%	50,00%	45,00%	55,00%	(+) 74 días	Atraso neto duración restante 74 días
762	Aparatos sanitarios y accesorios	30	7-05-22	10-06-22	43,00%	23,00%	0,00%	43,00%	(-) 0 días	Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días
763	Cielo rasos especiales	60	2-05-22	9-07-22	30,00%	33,00%	-5,00%	35,00%	(-) 45 días	Cielo rasos especiales: Piso 4: parrilla cielo raso en madera ejes 28-29/D-E, adelanto 45 días
764	Carpintería Metálica	60	2-05-22	9-07-22	30,00%	20,00%	0,00%	30,00%	(-) 0 días	Carpintería Metálica: Piso 4: Protección de puertas, Protección de puertas ejes 13-14/B-C, tapa gotero fachada norte ejes B/12-17, tapa gotero fachada occidental ejes 112/B-G, tapa gotero fachada sur ejes 12-15/G, ejes 15-22/G, ejes 22-25/G, Con el programa, adelanto 0 días
765	Pintura	120	2-05-22	17-09-22	15,00%	10,00%	0,00%	15,00%	(-) 0 días	Pintura: Piso 4: Hechura de dilatación en escalera je e13-14/C-D, Pintura de curto técnico ejes 28-29/F-G, Remate de masillado muros ejes 13-14/B-C, 28-29/F-G, Con el programa, adelanto 0 días
766	Remates generales	80	2-05-22	2-08-22	23,00%	15,00%	0,00%	23,00%	(-) 0 días	Resanes generales: Piso 4: Remate de piso contra mamparas ejes 21-22/D-E, Con el programa, adelanto 0 días
767	Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio)	30	11-07-22	13-08-22	0,00%	1,00%	-10,00%	10,00%	(-) -51 días	Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio)Piso 4: tomas de piso ejes 12-15/E-G, adelanto -51 días

BOGOTÁ

SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN

SEMANA No 177 de 208 DEL **15-may-22** AL **22-may-2022**

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG

Id	Actividad	Duración días	Comienzo	Fin	% programado	% Completado sem Ant	% De desviación	% completado	(-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario	Observaciones
768	Luminarias	30	11-07-22	13-08-22	0,00%	20,00%	-25,00%	25,00%	(-) -55 días	Luminarias: Piso 4: Apertura de huecos para balas ejes 16-18/C-D, sensores de movimiento en baños ejes 24-26/E-F, 16-18/B-D, adelanto -55 días
770	Divisiones de oficina	60	11-07-22	17-09-22	0,00%	50,00%	-55,00%	55,00%	(-) -83 días	Divisiones de oficina: Piso 4: vidrios mamparas ejes 19-21/D-E, ejes 28-29/D-E, adelanto -83 días
771	Pisos secos	45	12-09-22	2-11-22	0,00%	5,00%	-5,00%	5,00%	(-) -110 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -110 días
779	**Piso 3**	**0**	**12-03-22**	**14-12-22**	**42,00%**	**46,00%**	**-9,00%**	**51,00%**	**(-) 12 días**	**Actividad Capítulo**
782	Instalaciones eléctricas	60	14-03-22	24-05-22	97,00%	87,00%	0,00%	97,00%	(-) 0 días	Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días
783	Instalaciones voz y datos	60	14-03-22	24-05-22	97,00%	87,00%	0,00%	97,00%	(-) 0 días	Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días
784	Instalaciones seguridad y control	60	14-03-22	24-05-22	97,00%	87,00%	0,00%	97,00%	(-) 0 días	Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días
785	Instalaciones climatización	60	14-03-22	24-05-22	97,00%	87,00%	0,00%	97,00%	(-) 0 días	Instalaciones climatización: Piso 3: ducto A/C ejes 26-27/D-E, Con el programa, adelanto 0 días
786	Instalaciones red incendio	60	14-03-22	24-05-22	97,00%	87,00%	0,00%	97,00%	(-) 0 días	Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días
788	Muros secos	60	14-03-22	24-05-22	97,00%	87,00%	0,00%	97,00%	(-) 0 días	Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días
789	Sellos cortafuego	30	14-03-22	19-04-22	100,00%	30,00%	60,00%	40,00%	(+) 55 días	Atraso neto duración restante 55 días
790	Cielo rasos en fibrocemento	60	14-03-22	24-05-22	97,00%	87,00%	0,00%	97,00%	(-) 0 días	Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días
791	Pisos húmedos	60	14-03-22	24-05-22	97,00%	87,00%	0,00%	97,00%	(-) 0 días	Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días
792	Enchapes	20	7-05-22	30-05-22	65,00%	35,00%	0,00%	65,00%	(-) 0 días	Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días
793	Aparatos sanitarios y accesorios	30	31-05-22	4-07-22	0,00%	20,00%	-20,00%	20,00%	(-) -15 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -15 días
794	Cielo rasos especiales	60	25-05-22	2-08-22	0,00%	40,00%	-45,00%	45,00%	(-) -32 días	Cielo rasos especiales: Piso 3: Anclaje varillas para cielo raso ejes 18-19/D-E, 22-23/B-D, ejes 16-19/F-G, cielo raso en madera ejes 28-29/D-E, ejes 16-19/E-G, ejes 19-22/B-D, tornillos para cielo raso madera ejes 21-22/B-D, 26-28/D-E, varillas cielo raso en madera ejes 26-27/D-E, adelanto -32 días
795	Carpinteria Metálica	60	25-05-22	2-08-22	0,00%	20,00%	-25,00%	25,00%	(-) -19 días	Carpinteria Metálica: Piso 3: Arreglo de puertas en piso, adelanto -19 días
796	Pintura	140	25-05-22	3-11-22	0,00%	20,00%	-20,00%	20,00%	(-) -34 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -34 días
797	Remates generales	80	25-05-22	25-08-22	0,00%	10,00%	-15,00%	15,00%	(-) -16 días	Resanes generales: Piso 3: Remates en escalera ejes 13-14/C-D, Remates masillado muros ejes 13-14/B-C, adelanto -16 días
798	Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio)	30	3-08-22	6-09-22	0,00%	1,00%	-10,00%	10,00%	(-) -73 días	Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio)Piso 3: tomas de piso ejes 26-27/B-D, adelanto -73 días
799	Divisiones de oficina	60	3-08-22	11-10-22	0,00%	50,00%	-60,00%	60,00%	(-) -109 días	Divisiones de oficina: Piso 3: silicona entre vidrios mamparas ejes 23-26/C-D, adelanto -109 días
800	Luminarias	30	3-08-22	6-09-22	0,00%	20,00%	-20,00%	20,00%	(-) -76 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -76 días
802	Pisos secos	30	12-10-22	15-11-22	0,00%	10,00%	-10,00%	10,00%	(-) -139 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -139 días
	Atrio F3 - Consolidado		**28-12-18**	**17-12-22**	**72,57%**	**73,53%**	**-2,38%**	**74,95%**	**(-) 5 días**	**Actividad Capítulo**
684	**Piso 6**	**0**	**3-01-22**	**26-11-22**	**51,00%**	**53,00%**	**-5,00%**	**56,00%**	**(-) 12 días**	**Actividad Capítulo**
695	Sellos cortafuego	30	14-01-22	17-02-22	100,00%	50,00%	25,00%	75,00%	(+) 103 días	Atraso neto duración restante 103 días
697	Cielo rasos especiales	60	14-03-22	24-05-22	97,00%	87,00%	0,00%	97,00%	(-) 0 días	Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días
698	Carpinteria Metálica	60	14-03-22	24-05-22	97,00%	87,00%	0,00%	97,00%	(-) 0 días	Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días
699	Enchapes	20	7-05-22	30-05-22	65,00%	35,00%	0,00%	65,00%	(-) 0 días	Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días
700	Aparatos sanitarios y accesorios	30	31-05-22	4-07-22	0,00%	5,00%	-5,00%	5,00%	(-) -10 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -10 días

BOGOTÁ

SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN

SEMANA No **177 de 208** DEL **15-may-22** AL **22-may-2022**

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG

Id	Actividad	Duración días	Comienzo	Fin	% programado	% Completado sem Ant	% De desviación	% completado	(-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario	Observaciones
702	Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio)	30	25-05-22	28-06-22	0,00%	6,00%	-10,00%	10,00%	(-) -6 días	Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio)Piso 6: tomas de piso ejes 12-13/E-G, ejes 13-17/E-G, tomas en techo y piso ejes 12-14/E-G, Instalaciones climatización: Cubierta: coraza entre cajas a equipos A/C ejes 15-19/B-D, ejes 15-19/C-D, Piso 6: Cableado de equipos A/C ejes 25-26/E-F, ejes 15-16/C-D, adelanto -6 días
703	Luminarias	50	25-05-22	21-07-22	0,00%	10,00%	-15,00%	15,00%	(-) -11 días	Luminarias: Piso 6: Apertura de huecos para balas iluminación ejes 19-2/E-G, Apertura huecos balas iluminación en baños ejes 24-26/E-F, adelanto -11 días
705	Divisiones de oficina	60	25-05-22	2-08-22	0,00%	40,00%	-45,00%	45,00%	(-) -32 días	Divisiones de oficina: Piso 6: perfiles mamparas ejes 18-19/C-E, 21-22/D-E, vidrios mamparas ejes 21-22/D-E, ejes 28-29/D-E, adelanto -32 días
706	Pintura	90	5-07-22	17-10-22	0,00%	20,00%	-22,00%	22,00%	(-) -64 días	Pintura: Piso 6: Pintura de muros cuarto técnico je 28-29/E-G, adelanto -64 días
707	Remates generales	60	5-07-22	12-09-22	0,00%	6,00%	-10,00%	10,00%	(-) -48 días	Resanes generales: Piso 6: Remates de piso ejes 12-14/E-G, Remates de pisos contra a mampara ejes 21-22/D-E, Remates masillado de muros ejes 28-29/F-G, Renivelacion pasos punto fijo escalera ejes 2-22/E-F, adelanto -48 días
708	Pisos secos	45	28-07-22	17-09-22	0,00%	2,00%	-2,00%	2,00%	(-) -65 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -65 días
710	Carpintería Madera	30	1-09-22	5-10-22	0,00%	5,00%	-5,00%	5,00%	(-) -99 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -99 días
810	**Piso 2**	**0**	**5-04-22**	**14-12-22**	**30,00%**	**31,00%**	**-5,00%**	**35,00%**	**(-) 12 días**	**Actividad Capítulo**
813	Instalaciones eléctricas	45	6-04-22	30-05-22	84,00%	71,00%	0,00%	84,00%	(-) 0 días	Con el programa, adelanto 0 días
814	Instalaciones voz y datos	60	6-04-22	16-06-22	63,00%	53,00%	0,00%	63,00%	(-) 0 días	Con el programa, adelanto 0 días
815	Instalaciones seguridad y control	60	6-04-22	16-06-22	63,00%	53,00%	0,00%	63,00%	(-) 0 días	Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días
816	Instalaciones climatización	60	6-04-22	16-06-22	63,00%	53,00%	0,00%	63,00%	(-) 0 días	Instalaciones climatización: Piso 2: Cableado equipos A/C ejes 15-16/C-D, Con el programa, adelanto 0 días
817	Instalaciones red incendio	60	6-04-22	16-06-22	63,00%	53,00%	0,00%	63,00%	(-) 0 días	Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días
818	Muros secos	60	6-04-22	16-06-22	63,00%	53,00%	0,00%	63,00%	(-) 0 días	Con el programa, adelanto 0 días
819	Sellos cortafuego	30	6-04-22	12-05-22	100,00%	25,00%	70,00%	30,00%	(+) 35 días	Atraso neto duración restante 35 días
820	Cielo rasos en fibrocemento	60	6-04-22	16-06-22	63,00%	53,00%	0,00%	63,00%	(-) 0 días	Con el programa, adelanto 0 días
821	Instalaciones red de gas	30	26-04-22	30-05-22	77,00%	57,00%	-3,00%	80,00%	(-) 7 días	adelanto 7 días
824	Impermeabilización	30	13-05-22	16-06-22	27,00%	7,00%	0,00%	27,00%	(-) 0 días	Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días
825	Aparatos sanitarios y accesorios	30	23-06-22	27-07-22	0,00%	10,00%	-10,00%	10,00%	(-) -34 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -34 días
826	Pisos plazoletas	41	17-06-22	3-08-22	0,00%	5,00%	-5,00%	5,00%	(-) -27 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -27 días
827	Cielo rasos especiales	60	17-06-22	25-08-22	0,00%	40,00%	-45,00%	45,00%	(-) -54 días	Cielo rasos especiales: Piso 2: celosías cielo raso ejes 12-13/E-F, 19-2/E-F, 24-25/B-D, cielo raso en madera ejes 28-29/E-G, ejes 26-28/D-E, 17-19/D-E, adelanto -54 días
828	Carpintería Metálica	60	17-06-22	25-08-22	0,00%	15,00%	-15,00%	15,00%	(-) -35 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -35 días
829	Pintura	60	17-06-22	25-08-22	0,00%	11,00%	-11,00%	11,00%	(-) -32 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -32 días
830	Remates generales	80	17-06-22	17-09-22	0,00%	7,00%	-7,00%	7,00%	(-) -31 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -31 días
831	Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio)	30	26-08-22	29-09-22	0,00%	2,00%	-2,00%	2,00%	(-) -92 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -92 días
832	Luminarias	30	26-08-22	29-09-22	0,00%	11,00%	-11,00%	11,00%	(-) -95 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -95 días
834	Divisiones de oficina	60	26-08-22	3-11-22	0,00%	50,00%	-55,00%	55,00%	(-) -127 días	Divisiones de oficina: Piso 2: ángulos metálicos para perfilería ejes 27-29/B-D, perfiles mamparas ejes 13-14/E-G, ejes 13-2/E-F, ejes 12-14/E-G, ejes 22-24/E-G, ejes 15-16/G, adelanto -127 días
835	Pisos secos	50	12-10-22	8-12-22	0,00%	11,00%	-11,00%	11,00%	(-) -142 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -142 días

BOGOTÁ

SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN

SEMANA No **177 de 208** DEL **15-may-22** AL **22-may-2022**

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG

Id	Actividad	Duración días	Comienzo	Fin	% programado	% Completado sem Ant	% De desviación	% completado	(-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario	Observaciones
837	Carpintería Madera	30	10-11-22	14-12-22	0,00%	1,00%	-1,00%	1,00%	(-) -164 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -164 días
843	**Piso 1**	**0**	**30-04-22**	**17-12-22**	**15,00%**	**16,00%**	**-8,00%**	**23,00%**	**(-) 12 días**	**Actividad Capítulo**
845	Instalaciones hidrosanitarias	45	2-05-22	22-06-22	40,00%	27,00%	0,00%	40,00%	(-) 0 días	Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días
846	Instalaciones eléctricas	60	2-05-22	9-07-22	30,00%	20,00%	0,00%	30,00%	(-) 0 días	Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días
847	Instalaciones voz y datos	60	2-05-22	9-07-22	30,00%	20,00%	0,00%	30,00%	(-) 0 días	Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días
848	Instalaciones seguridad y control	60	2-05-22	9-07-22	30,00%	20,00%	0,00%	30,00%	(-) 0 días	Instalaciones seguridad y control: Piso 1: Reubicación de cableado para cámaras de bóveda, Con el programa, adelanto 0 días
849	Instalaciones climatización	60	2-05-22	9-07-22	30,00%	20,00%	0,00%	30,00%	(-) 0 días	Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días
850	Instalaciones red incendio	60	2-05-22	9-07-22	30,00%	20,00%	0,00%	30,00%	(-) 0 días	Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días
851	Muros secos	60	2-05-22	9-07-22	30,00%	20,00%	0,00%	30,00%	(-) 0 días	Con el programa, adelanto 0 días
852	Sellos cortafuego	30	2-05-22	4-06-22	60,00%	20,00%	30,00%	30,00%	(+) 10 días	Atraso neto duración restante 10 días
853	Cielo rasos en fibrocemento	60	2-05-22	9-07-22	30,00%	20,00%	0,00%	30,00%	(-) 0 días	Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días
854	Pisos húmedos	30	2-05-22	4-06-22	60,00%	40,00%	0,00%	60,00%	(-) 0 días	Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días
855	Instalaciones red de gas	30	2-05-22	4-06-22	60,00%	40,00%	-20,00%	80,00%	(-) 6 días	adelanto 6 días
856	Enchapes	20	6-06-22	28-06-22	0,00%	10,00%	-10,00%	10,00%	(-) -16 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -16 días
857	Aparatos sanitarios y accesorios	30	29-06-22	2-08-22	0,00%	4,00%	-4,00%	4,00%	(-) -37 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -37 días
858	Cielo rasos especiales	60	6-06-22	13-08-22	0,00%	30,00%	-35,00%	35,00%	(-) -37 días	Cielo rasos especiales: Piso 1: cielo raso en fibrocemento ejes G-I/12-16, Estructura metálica para cielo raso ejes 12-16/G-I, adelanto -37 días
859	Carpintería Metálica	60	6-06-22	13-08-22	0,00%	15,00%	-15,00%	15,00%	(-) -24 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -24 días
860	Pintura	100	11-07-22	3-11-22	0,00%	6,00%	-10,00%	10,00%	(-) -58 días	Pintura: Piso 1: Detallado paredes para aplicación pintura en piso, Maquillaje estructuras en concreto ejes 3-5/H, masilla y juntas cielo raso RH baños, adelanto -58 días
861	Remates generales	80	11-07-22	11-10-22	0,00%	10,00%	-15,00%	15,00%	(-) -61 días	Resanes generales: Piso 1: Remate e enchape de pisos y paredes baños ejes 18-19/A-B, 24-26/E-F, Renivelacion de dinteles casa cural, adelanto -61 días
862	Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio)	30	15-08-22	17-09-22	0,00%	5,00%	-5,00%	5,00%	(-) -82 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -82 días
863	Luminarias	30	15-08-22	17-09-22	0,00%	20,00%	-25,00%	25,00%	(-) -89 días	Luminarias: Piso 1: Peroraciones en cielo raso baños luminarias ejes 24-26/E-F, 16-18/C-D, adelanto -89 días
865	Divisiones de oficina	60	15-08-22	22-10-22	0,00%	40,00%	-45,00%	45,00%	(-) -110 días	Divisiones de oficina: Piso 1: ángulo sobre perfil instalación de rejas y platinas ejes 14-6/A-B, perfiles mamparas ejes 12-17/E-G, adelanto -110 días
866	Pisos secos	45	7-09-22	28-10-22	0,00%	16,00%	-16,00%	16,00%	(-) -110 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -110 días
868	Carpintería Madera	30	7-10-22	10-11-22	0,00%	2,00%	-2,00%	2,00%	(-) -132 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -132 días
874	**Sótano**	**0**	**18-07-22**	**17-12-22**	**0,00%**	**9,00%**	**-9,00%**	**9,00%**	**(-) 7 días**	**Actividad Capítulo**
876	Instalaciones hidrosanitarias	30	19-07-22	22-08-22	0,00%	16,00%	-20,00%	20,00%	(-) -62 días	Instalaciones hidrosanitarias: Sótano: Reinstalación de 3 bombas de red contra incendio, adelanto -62 días
877	Instalaciones eléctricas	90	19-07-22	31-10-22	0,00%	11,00%	-11,00%	11,00%	(-) -66 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -66 días
878	Instalaciones voz y datos	90	19-07-22	31-10-22	0,00%	15,00%	-15,00%	15,00%	(-) -70 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -70 días

BOGOTÁ

SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN

SEMANA No 177 de 208 DEL 15-may-22 AL 22-may-2022

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG

Id	Actividad	Duración días	Comienzo	Fin	% programado	% Completado sem Ant	% De desviación	% completado	(-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario	Observaciones
879	Instalaciones seguridad y control	90	19-07-22	31-10-22	0,00%	10,00%	-10,00%	10,00%	(-) -65 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -65 días
880	Instalaciones climatización	60	19-07-22	26-09-22	0,00%	10,00%	-10,00%	10,00%	(-) -62 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -62 días
881	Instalaciones red incendio	30	19-07-22	22-08-22	0,00%	5,00%	-5,00%	5,00%	(-) -57 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -57 días
882	Instalaciones red de gas y calderas	90	19-07-22	31-10-22	0,00%	10,00%	-10,00%	10,00%	(-) -65 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -65 días
884	Muros secos	60	19-07-22	26-09-22	0,00%	15,00%	-15,00%	15,00%	(-) -65 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -65 días
885	Carpintería Metálica	60	19-07-22	26-09-22	0,00%	15,00%	-15,00%	15,00%	(-) -65 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -65 días
887	Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio)	30	27-09-22	31-10-22	0,00%	3,00%	-3,00%	3,00%	(-) -123 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -123 días
889	Pintura	41	20-10-22	6-12-22	0,00%	7,00%	-7,00%	7,00%	(-) -147 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -147 días
891	Remates generales	30	1-11-22	5-12-22	0,00%	5,00%	-5,00%	5,00%	(-) -156 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -156 días
	Plazoleta F4 - Consolidado		**28-12-18**	**17-12-22**	**81,34%**	**81,49%**	**-0,47%**	**81,81%**	**(-) 11 días**	**Actividad Capítulo**
897	**Piso 1 y plaza de acceso**	**0**	**3-01-22**	**17-12-22**	**35,00%**	**36,00%**	**-1,00%**	**36,00%**	**(-) 4 días**	**Actividad Capítulo**
902	Apuntalamiento bajo bóveda nivel -3.8.	97	2-03-22	24-06-22	70,00%	70,00%	0,00%	70,00%	(-) 0 días	Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días
903	Bóveda (armado testereado y fundida)	60	6-04-22	16-06-22	63,00%	53,00%	0,00%	63,00%	(-) 0 días	Bóveda (armado testereado y fundida): Piso 2: Reforzamiento de armadura ejes 12-14/H-J, Amarre de acero 1 y 2 parrilla placa curva bóveda tramo 2 ejes 12-14/H-J, Perforación y anclajes de parrilla ejes 13-14/H, testero de borde placa bóveda ejes 12-14/H-J, Con el programa, adelanto 0 días
905	Impermeabilización en zona de bóveda y juntas	30	11-07-22	13-08-22	0,00%	1,00%	-1,00%	1,00%	(-) -48 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -48 días
918	Enchapes	60	14-03-22	24-05-22	97,00%	87,00%	0,00%	97,00%	(-) 0 días	Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días
919	Pisos húmedos	30	25-05-22	28-06-22	0,00%	1,00%	-1,00%	1,00%	(-) -3 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -3 días
920	Aparatos sanitarios y accesorios	30	25-05-22	28-06-22	0,00%	1,00%	-1,00%	1,00%	(-) -3 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -3 días
922	Cielo rasos en fibrocemento y especiales	70	17-06-22	6-09-22	0,00%	1,00%	-1,00%	1,00%	(-) -25 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -25 días
923	Pintura	65	19-09-22	2-12-22	0,00%	4,00%	-4,00%	4,00%	(-) -117 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -117 días
924	Remates generales	31	19-09-22	24-10-22	0,00%	10,00%	-10,00%	10,00%	(-) -117 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -117 días
925	Pisos plazoletas	80	15-08-22	15-11-22	0,00%	7,00%	-7,00%	7,00%	(-) -87 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -87 días
928	Cielo rasos especiales	45	3-08-22	23-09-22	0,00%	1,00%	-5,00%	5,00%	(-) -72 días	Cielo rasos especiales: Piso 1: rejilla abajo lucarna contra Suppla, adelanto -72 días
929	Carpintería Metálica	45	3-08-22	23-09-22	0,00%	20,00%	-20,00%	20,00%	(-) -79 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -79 días
930	Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio)	30	17-08-22	20-09-22	0,00%	10,00%	-10,00%	10,00%	(-) -86 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -86 días
931	Luminarias	30	19-09-22	22-10-22	0,00%	1,00%	-1,00%	1,00%	(-) -114 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -114 días
934	Pisos secos	45	8-10-22	29-11-22	0,00%	1,00%	-1,00%	1,00%	(-) -133 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -133 días
942	**Sótano**	**0**	**3-01-22**	**17-12-22**	**48,00%**	**49,00%**	**-2,00%**	**50,00%**	**(-) 14 días**	**Actividad Capítulo**
944	Instalaciones hidrosanitarias	30	3-01-22	5-02-22	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	Finalizado	Instalaciones hidrosanitarias: Sótano: Demolición de placa de contra piso para instalación de punto desagüe lavaojos ejes 13-14/J-K, tubería de 3" y 2" , sifones de piso red desagües lavaojos ejes 13-14/I-K, Finalizado

BOGOTÁ

SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN

SEMANA No 177 de 208 DEL 15-may-22 AL 22-may-2022

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG

Id	Actividad	Duración días	Comienzo	Fin	% programado	% Completado sem Ant	% De desviación	% completado	(-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario	Observaciones
948	Instalaciones climatización	60	3-01-22	12-03-22	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	Finalizado	Instalaciones climatización: Sótano: Armado de ductos A/C y alistado para instalación, Finalizado
952	Pisos húmedos	30	20-04-22	24-05-22	93,00%	73,00%	0,00%	93,00%	(-) 0 días	Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días
953	Aparatos sanitarios y accesorios	30	20-04-22	24-05-22	93,00%	73,00%	0,00%	93,00%	(-) 0 días	Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días
954	Sellos cortafuego	60	14-03-22	24-05-22	97,00%	25,00%	67,00%	30,00%	(+) 48 días	Atraso neto duración restante 48 días
956	Cielo rasos especiales	45	15-08-22	5-10-22	0,00%	50,00%	-55,00%	55,00%	(-) -107 días	Cielo rasos especiales: Sótano: cielo raso aluzinc batería de baño ejes 3/F-G, cielo raso aluzinc ejes 12-17/F-G, ejes 14-2/F-I, ejes 12-2/F-G, adelanto -107 días
957	Carpintería Metálica	45	15-08-22	5-10-22	0,00%	15,00%	-15,00%	15,00%	(-) -88 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -88 días
958	Pintura	100	15-08-22	8-12-22	0,00%	10,00%	-10,00%	10,00%	(-) -92 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -92 días
959	Remates generales	70	15-08-22	3-11-22	0,00%	1,00%	-1,00%	1,00%	(-) -82 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -82 días
960	Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio)	30	6-10-22	9-11-22	0,00%	3,00%	-3,00%	3,00%	(-) -131 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -131 días
961	Luminarias	30	15-08-22	17-09-22	0,00%	20,00%	-25,00%	25,00%	(-) -89 días	Luminarias: Sótano: luminarias ejes 17-2/I-L, ejes 23-24/H-J, luminarias zona verde vacío 4 y 5, adelanto -89 días
963	Divisiones de oficina	50	6-10-22	2-12-22	0,00%	20,00%	-25,00%	25,00%	(-) -144 días	Divisiones de oficina: Sótano: ejes 19-2/I-J, perfiles para mamparas ejes 19-2/I-J, adelanto -144 días
966	Carpintería Madera	30	4-11-22	8-12-22	0,00%	1,00%	-1,00%	1,00%	(-) -158 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -158 días
	Exteriores F5 - Consolidado		**28-12-18**	**17-12-22**	**82,95%**	**78,40%**	**3,21%**	**79,74%**	**(+) 63 días**	**Actividad Capítulo**
373	Inst. hidro (alcantarillado cajas y pozos)	341	28-12-20	28-01-22	99,00%	99,00%	0,00%	99,00%	(-) 0 días	Con el programa, adelanto 0 días
374	Inst. hidrosanitarias (acometida)	335	28-12-20	22-01-22	99,00%	99,00%	0,00%	99,00%	(-) 0 días	Con el programa, adelanto 0 días
378	Inst. eléctricas (media tensión)	294	19-04-21	26-03-22	100,00%	99,00%	1,00%	99,00%	(+) 60 días	Atraso neto duración restante 60 días
380	Excavaciones y rellenos exteriores	294	26-04-21	2-04-22	76,00%	76,00%	0,00%	76,00%	(-) 0 días	Con el programa, adelanto 0 días
381	Cañuelas y obras de arte en concreto	249	24-05-21	9-03-22	82,00%	82,00%	0,00%	82,00%	(-) 0 días	Con el programa, adelanto 0 días
383	Vías y andenes	264	31-05-21	2-04-22	87,00%	87,00%	0,00%	87,00%	(-) 0 días	Con el programa, adelanto 0 días
974	Portería y garita	200	25-08-21	16-04-22	100,00%	99,00%	1,00%	99,00%	(+) 38 días	Atraso neto duración restante Atraso neto duración restante 38 días
975	**Acometida agua potable Kra 60**	**0**	**3-01-22**	**27-04-22**	**100,00%**	**56,00%**	**40,00%**	**60,00%**	**(+) 49 días**	**Actividad Capítulo**
977	Demolición pavimento	45	31-01-22	23-03-22	100,00%	30,00%	70,00%	30,00%	(+) 96 días	Atraso neto duración restante 96 días
978	Excavación tuberías exteriores	45	8-02-22	31-03-22	100,00%	76,00%	20,00%	80,00%	(+) 62 días	Atraso neto duración restante Atraso neto duración restante 62 días
979	Tuberías suministro exteriores	45	16-02-22	8-04-22	100,00%	75,00%	20,00%	80,00%	(+) 54 días	Atraso neto duración restante 54 días
980	Rellenos de tuberías exteriores	45	24-02-22	19-04-22	100,00%	76,00%	20,00%	80,00%	(+) 44 días	Atraso neto duración restante Atraso neto duración restante 44 días
981	Pavimento en acceso Suppla	7	31-03-22	7-04-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 52 días	Atraso neto duración restante 52 días
982	Conexión a red principal EAAB	10	9-04-22	22-04-22	100,00%	0,00%	75,00%	25,00%	(+) 40 días	Conexión a red principal EAAB: Acometida agua potable Cra 60: Excavaciones instalación de hidrante cra 60, Atraso neto duración restante 40 días

BOGOTÁ

SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN

SEMANA No 177 de 208 DEL **15-may-22** AL **22-may-2022**

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG

Id	Actividad	Duración días	Comienzo	Fin	% programado	% Completado sem Ant	% De desviación	% completado	(-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario	Observaciones
983	obras de arte, vías y andenes	45	4-03-22	27-04-22	100,00%	30,00%	65,00%	35,00%	(+) 60 días	obras de arte, vías y andenes: Acometida agua potable Cra 60: adoquín provisional anden cra 60, Reinstalación de adoquín provisional anden cra 60, accesorio de 6" e instalación de hidrante glorieta, Atraso neto duración restante 60 días
984	Fin acometida frente kra 60	0	27-04-22	27-04-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 25 días	Atraso neto duración restante 25 días
985	**Acometida agua potable Kra 56**	**0**	**3-01-22**	**24-03-22**	**100,00%**	**77,00%**	**23,00%**	**77,00%**	**(+) 49 días**	**Actividad Capítulo**
987	Demolición pavimento	7	1-02-22	8-02-22	100,00%	15,00%	85,00%	15,00%	(+) 109 días	Atraso neto duración restante 109 días
988	Excavación tuberías exteriores	20	1-02-22	23-02-22	100,00%	95,00%	5,00%	95,00%	(+) 89 días	Atraso neto duración restante 89 días
989	Tuberías suministro exteriores	20	9-02-22	3-03-22	100,00%	95,00%	5,00%	95,00%	(+) 81 días	Atraso neto duración restante 81 días
990	Rellenos de tuberías exteriores	24	17-02-22	16-03-22	100,00%	95,00%	5,00%	95,00%	(+) 68 días	Atraso neto duración restante 68 días
991	Conexión a red principal EAAB	10	4-03-22	15-03-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 79 días	Atraso neto duración restante 79 días
992	obras de arte, vías y andenes	7	17-03-22	24-03-22	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%	(+) 63 días	Atraso neto duración restante 63 días
993	Fin acometida frente kra 56	0	24-03-22	24-03-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 59 días	Atraso neto duración restante 59 días
994	**Aguas residuales costado norte**	**0**	**3-01-22**	**6-04-22**	**100,00%**	**25,00%**	**75,00%**	**25,00%**	**(+) 70 días**	**Actividad Capítulo**
996	Excavación tuberías exteriores	20	31-01-22	22-02-22	100,00%	20,00%	80,00%	20,00%	(+) 107 días	Atraso neto duración restante 107 días
997	Pozos sumideros y cárcamos	30	8-02-22	14-03-22	100,00%	20,00%	80,00%	20,00%	(+) 96 días	Atraso neto duración restante 96 días
998	Tuberías desagües exteriores	30	16-02-22	22-03-22	100,00%	20,00%	80,00%	20,00%	(+) 88 días	Atraso neto duración restante 88 días
999	Rellenos de tuberías exteriores	30	24-02-22	30-03-22	100,00%	20,00%	80,00%	20,00%	(+) 80 días	Atraso neto duración restante 80 días
1000	Conexión a red principal IEEAB	13	23-03-22	6-04-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 60 días	Atraso neto duración restante 60 días
1001	Fin conexión aguas residuales	0	6-04-22	6-04-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 46 días	Atraso neto duración restante 46 días
1002	**Aguas lluvias costado norte**	**0**	**28-03-22**	**7-06-22**	**89,00%**	**9,00%**	**80,00%**	**9,00%**	**(+) 42 días**	**Actividad Capítulo**
1003	Excavación tuberías exteriores	20	28-03-22	22-04-22	100,00%	57,00%	43,00%	57,00%	(+) 41 días	Atraso neto duración restante 41 días
1004	Pozos sumideros y cárcamos	30	5-04-22	12-05-22	100,00%	15,00%	85,00%	15,00%	(+) 41 días	Atraso neto duración restante 41 días
1005	Tuberías desagües exteriores	30	13-04-22	20-05-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 39 días	Atraso neto duración restante 39 días
1006	Rellenos de tuberías exteriores	30	23-04-22	28-05-22	81,00%	0,00%	81,00%	0,00%	(+) 28 días	Atraso neto duración restante 28 días
1007	Cabezal de entrega	52	28-03-22	30-05-22	87,00%	0,00%	87,00%	0,00%	(+) 55 días	Atraso neto duración restante 55 días
1010	**Aguas lluvias costado nor-oriental**	**0**	**28-03-22**	**11-05-22**	**100,00%**	**30,00%**	**70,00%**	**30,00%**	**(+) 42 días**	**Actividad Capítulo**
1011	Excavación tuberías exteriores	15	28-03-22	16-04-22	100,00%	23,00%	77,00%	23,00%	(+) 51 días	Atraso neto duración restante 51 días
1012	Pozos sumideros y cárcamos	19	5-04-22	29-04-22	100,00%	76,00%	24,00%	76,00%	(+) 29 días	Atraso neto duración restante 29 días
1013	Tuberías desagües exteriores	15	13-04-22	3-05-22	100,00%	7,00%	93,00%	7,00%	(+) 38 días	Atraso neto duración restante 38 días
1014	Rellenos de tuberías exteriores	15	23-04-22	11-05-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 29 días	Atraso neto duración restante 29 días
1015	Fin aguas lluvias costado nor-oriental	0	11-05-22	11-05-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 11 días	Atraso neto duración restante 11 días
1016	**Obras exteriores (parqueadero)**	**0**	**7-03-22**	**17-12-22**	**10,00%**	**42,00%**	**-34,00%**	**44,00%**	**(-) 12 días**	**Actividad Capítulo**
1018	Instalaciones hidrosanitarias	45	11-05-22	2-07-22	21,00%	55,00%	-34,00%	55,00%	(-) 23 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto 23 días
1020	obras de arte, vías y andenes	80	3-06-22	5-09-22	0,00%	85,00%	-85,00%	85,00%	(-) -87 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -87 días
1021	Pisos exteriores	91	15-06-22	29-09-22	0,00%	30,00%	-35,00%	35,00%	(-) -58 días	Pisos exteriores: Obras exteriores (parqueadero): ángulos para instalación de piso rejilla ejes 13-16/A-B, platinas para piso en rejilla ejes 16-18/A-B, adelanto -58 días
1023	Luminarias exteriores	30	16-09-22	21-10-22	0,00%	50,00%	-50,00%	50,00%	(-) -128 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -128 días
1025	Automatización V/D, S/C, y Otros	30	21-10-22	25-11-22	0,00%	1,00%	-1,00%	1,00%	(-) -145 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -145 días
1026	Jardines y mobiliario urbano	78	16-09-22	16-12-22	0,00%	15,00%	-20,00%	20,00%	(-) -128 días	Jardines y mobiliario urbano: Obras exteriores (parqueadero): baranda sobre muro, Remate de muro cerramiento, adelanto -128 días

BOGOTÁ

SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN

SEMANA No **177 de 208** DEL **15-may-22** AL **22-may-2022**

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG

Id	Actividad	Duración días	Comienzo	Fin	% programado	% Completado sem Ant	% De desviación	% completado	(-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario	Observaciones
1029	**Obras exteriores (Volteadero)**	**0**	**25-03-22**	**17-12-22**	**21,00%**	**0,00%**	**21,00%**	**0,00%**	**(+) 42 días**	**Actividad Capítulo**
1030	Rellenos	60	25-03-22	4-06-22	80,00%	0,00%	0,00%	80,00%	(+) 0 días	Atraso neto duración restante 0 días
1031	Redes	60	2-05-22	9-07-22	30,00%	0,00%	0,00%	30,00%	(+) 0 días	Atraso neto duración restante 0 días
1037	**Obras exteriores (zonas verdes de cesión)**	**0**	**11-05-22**	**1-12-22**	**8,00%**	**0,00%**	**8,00%**	**0,00%**	**(+) 14 días**	**Actividad Capítulo**
0	Aprobación actualización plano urbanistico aprobado por curaduía (Fuente: SDCSJ)	0	2-05-22	2-05-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 20 días	Atraso neto duración restante 20 días
0	Pago acutualización plano urbanistico	0	2-05-22	2-05-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 20 días	Atraso neto duración restante 20 días
0	Radicado IDRD (U Nacional)	0	2-05-22	9-07-22	30,00%	0,00%	30,00%	0,00%	(+) 20 días	Atraso neto duración restante 20 días
0	Radicado IDU glorieta de retorno (U Nacional)	0	2-05-22	27-07-22	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	(+) 22 días	Atraso neto duración restante 22 días
0	Radicado IDU verificación plazoleta de acceso Cr 60 (CSUDC)	0	2-05-22	27-07-22	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	(+) 22 días	Atraso neto duración restante 22 días
1039	Movimiento de tierras	30	11-05-22	15-06-22	31,00%	0,00%	0,00%	31,00%	(+) 0 días	Atraso neto duración restante 0 días
1040	Conexión desagües	30	11-05-22	15-06-22	31,00%	0,00%	0,00%	31,00%	(+) 0 días	Atraso neto duración restante 0 días
1042	Obras de arte y concretos	40	20-07-22	5-09-22	0,00%	1,00%	-1,00%	1,00%	(-) -56 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -56 días
1044	Jardines y mobiliario urbano	45	16-09-22	8-11-22	0,00%	1,00%	-1,00%	1,00%	(-) -112 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -112 días
482	**TRAMITES OBTENCION DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**0**	**19-07-21**	**5-12-22**	**84,00%**	**64,00%**	**20,00%**	**64,00%**	**(+) 42 días**	**Actividad Capítulo**
484	**Tramites para servicios de EAAB**	**0**	**19-07-21**	**28-03-22**	**100,00%**	**99,00%**	**1,00%**	**99,00%**	**(+) 42 días**	**Actividad Capítulo**
493	**Permiso de ocupación de cauce ante la Secretaria de Ambiente**	**0**	**19-07-21**	**28-03-22**	**100,00%**	**97,00%**	**3,00%**	**97,00%**	**(+) 42 días**	**Actividad Capítulo**
498	trámite interno SDA (Estudio)	90	13-12-21	28-03-22	100,00%	93,00%	7,00%	93,00%	(+) 62 días	Atraso neto duración restante 62 días
499	Obtención permiso de ocupación de cauce	0	28-03-22	28-03-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 55 días	Atraso neto duración restante 55 días
513	**Trámites domiciliarias energía eléctrica CODENSA**	**0**	**19-07-21**	**5-12-22**	**63,00%**	**57,00%**	**6,00%**	**57,00%**	**(+) 56 días**	**Actividad Capítulo**
518	Tramite CODENSA aprobación proyecto serie 6	96	3-01-22	26-04-22	100,00%	75,00%	25,00%	75,00%	(+) 54 días	Atraso neto duración restante 54 días
395	Aseo general de obra	634	9-11-20	29-12-21	75,00%	74,00%	0,00%	75,00%	(-) 0 días	Aseo general de obra: Auditorio: Piso 1: Sótano: Aseo general, Sótano: Aseo general de piso ejes 7-11/A-F, Atrio: Piso 1: Limpieza de tuberia y cielo raso ejes 24-29/E-G, Piso 2: Aseo general de piso, Aseo punto fijo escalera je 18-19/E-F, Piso 3: Aseo general de piso, Piso 5: Aseo general de piso, Plazoleta: Piso 1: Limpieza de estructura metálica lucarnas Suppla ay aplicación de anticorrosivo, Con el programa, adelanto 0 días
									*	R. Critica:21 días
									*	R. Critica Ant:14 días
	El porcentaje programado es 78,25% y el ejecutado es 78,28% con un adelanto de -2 días. El porcentaje de influencia de las zonas de cesión en el acumulado seria si se estuvieran ejecutando de 0,13% para un total ejecutado de 78,41%. En la presente semana se deberá radicar el proyecto para revalidación licencia urbanística (23 de mayo de 2022). El personal programado en obra es de 110 y el real es de 120.								*	Actividad Capítulo

Descripción	Oficial en obra Sem 177	Ayudante en obra Sem 177	Oficial Programado Sem 177	Ayudante programado Sem 177			
							*
Acabados	22	10	17	11	32	28	*
Carpintería Metálica	7	0	6	4	7	10	*
Cielo	12	0	12	8	12	20	*
Climatización	2	0	3	2	2	5	*
Divisiones	16	0	1	1	16	2	*
Eléctrico	5	5	8	5	10	13	*
Estructura	20	0	2	2	20	4	*
Hidrosanitarias	7	0	4	2	7	6	*
Incendio	4	0	3	2	4	5	*

BOGOTÁ


SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN

SEMANA No **177 de 208** DEL **15-may-22** AL **22-may-2022**

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG

Id	Actividad	Duración días	Comienzo	Fin	% programado	% Completado sem Ant	% De desviación	% completado	(-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario	Observaciones
	Luminarias		6	0	1	1	6	2	*	
	Vias		2	0	0	0	2	0	*	
	Pisos		0	0	6	4	0	10	*	
	Sellos Corta fuego		2	0	3	2	2	5	*	
	Total		120,00		110,00				*	
									*	

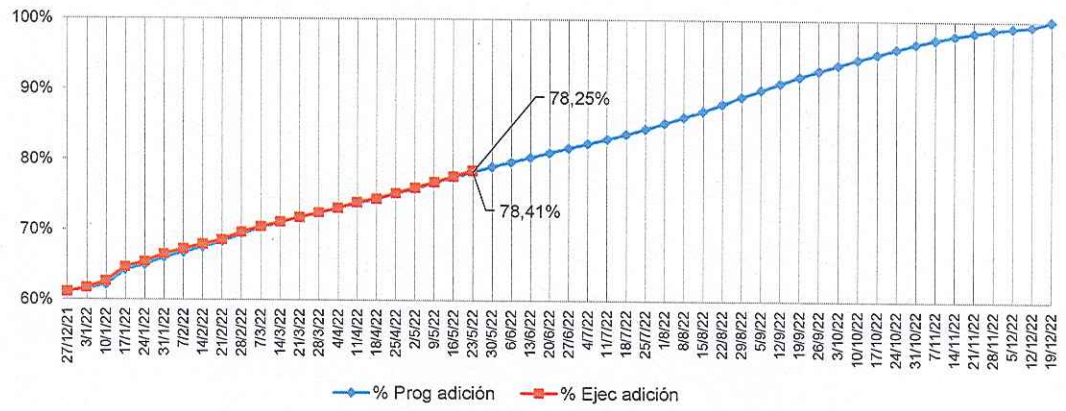


*

*


MEBOG

Id	Nombre de tarea	% Prog	% Ejec
0	**reprogramacion 3 v19_corte may 22_por frente**	**78,25%**	**78,28%**
122	**Auditorio F1 - Consolidado**	**71,28%**	**68,82%**
210	**ADICION Y REMATE DE PROYECTO**	**41,00%**	**39,00%**
211	**FRENTE 1 AUDITORIO**	**40,00%**	**35,00%**
212	**Piso 3**	**33,00%**	**7,00%**
214	Posible reforzamiento cubierta	100,00%	60,00%
215	Cubierta auditorio (remate)	100,00%	0,00%
216	Fachada auditorio	48,00%	40,00%
217	Instalaciones hidrosanitarias	100,00%	0,00%
218	Instalaciones eléctricas	42,00%	0,00%
219	Instalaciones voz y datos	42,00%	0,00%
220	Instalaciones seguridad y control	42,00%	0,00%
221	Instalaciones climatización	42,00%	36,00%
222	Instalaciones red incendio	42,00%	0,00%
223	Muros secos	63,00%	0,00%
224	Sellos cortafuego	100,00%	0,00%
225	Cielo rasos en fibrocemento	63,00%	0,00%
226	Cielo rasos especiales	63,00%	2,00%
227	Carpinteria Metálica	63,00%	5,00%
233	Pisos húmedos	16,00%	0,00%
243	**Piso 2 y plaza armas**	**50,00%**	**47,00%**
246	Impermeabilización remate en perímetro de auditorio	0,00%	2,00%
247	Instalaciones hidrosanitarias	98,00%	93,00%
248	Instalaciones eléctricas	98,00%	93,00%
249	Instalaciones voz y datos	98,00%	93,00%
250	Instalaciones seguridad y control	98,00%	93,00%
251	Instalaciones climatización	98,00%	93,00%
252	Instalaciones red incendio	98,00%	93,00%
255	Lucarnas	98,00%	91,00%
256	Pisos plazoletas remates perimetro auditorio	0,00%	5,00%
258	Sellos cortafuego	73,00%	47,00%
259	Cielo rasos en fibrocemento	13,00%	13,00%
260	Cielo rasos especiales	13,00%	0,00%
261	Carpinteria Metálica	13,00%	15,00%
263	Remates generales	0,00%	1,00%
265	Pisos húmedos	0,00%	15,00%
278	**Piso 1 y plaza de acceso**	**41,00%**	**44,00%**
284	Frague de bóveda y descimbrado de formaleta	0,00%	30,00%
285	Impermeabilización en zona de bóveda y juntas	0,00%	2,00%
286	Instalaciones eléctricas	0,00%	2,00%
289	Instalaciones climatización	0,00%	10,00%
290	Instalaciones red incendio	0,00%	10,00%
298	Sellos cortafuego	100,00%	15,00%
300	Enchapes	97,00%	97,00%
301	Cielo rasos especiales	57,00%	57,00%
302	Carpinteria Metálica	97,00%	97,00%
303	Pisos húmedos	0,00%	1,00%
304	Aparatos sanitarios y accesorios	0,00%	5,00%
305	Pintura	0,00%	20,00%
306	Remates generales	0,00%	2,00%
307	Pisos plazoletas	0,00%	5,00%
309	Luminarias	0,00%	2,00%
322	**Sótano**	**35,00%**	**37,00%**
324	Instalaciones eléctricas	0,00%	10,00%
326	Instalaciones seguridad y control	0,00%	5,00%
327	Instalaciones climatización	0,00%	2,00%
328	Instalaciones red incendio	0,00%	10,00%
337	Pisos húmedos	70,00%	70,00%
338	Aparatos sanitarios y accesorios	93,00%	93,00%
339	Sellos cortafuego	97,00%	15,00%

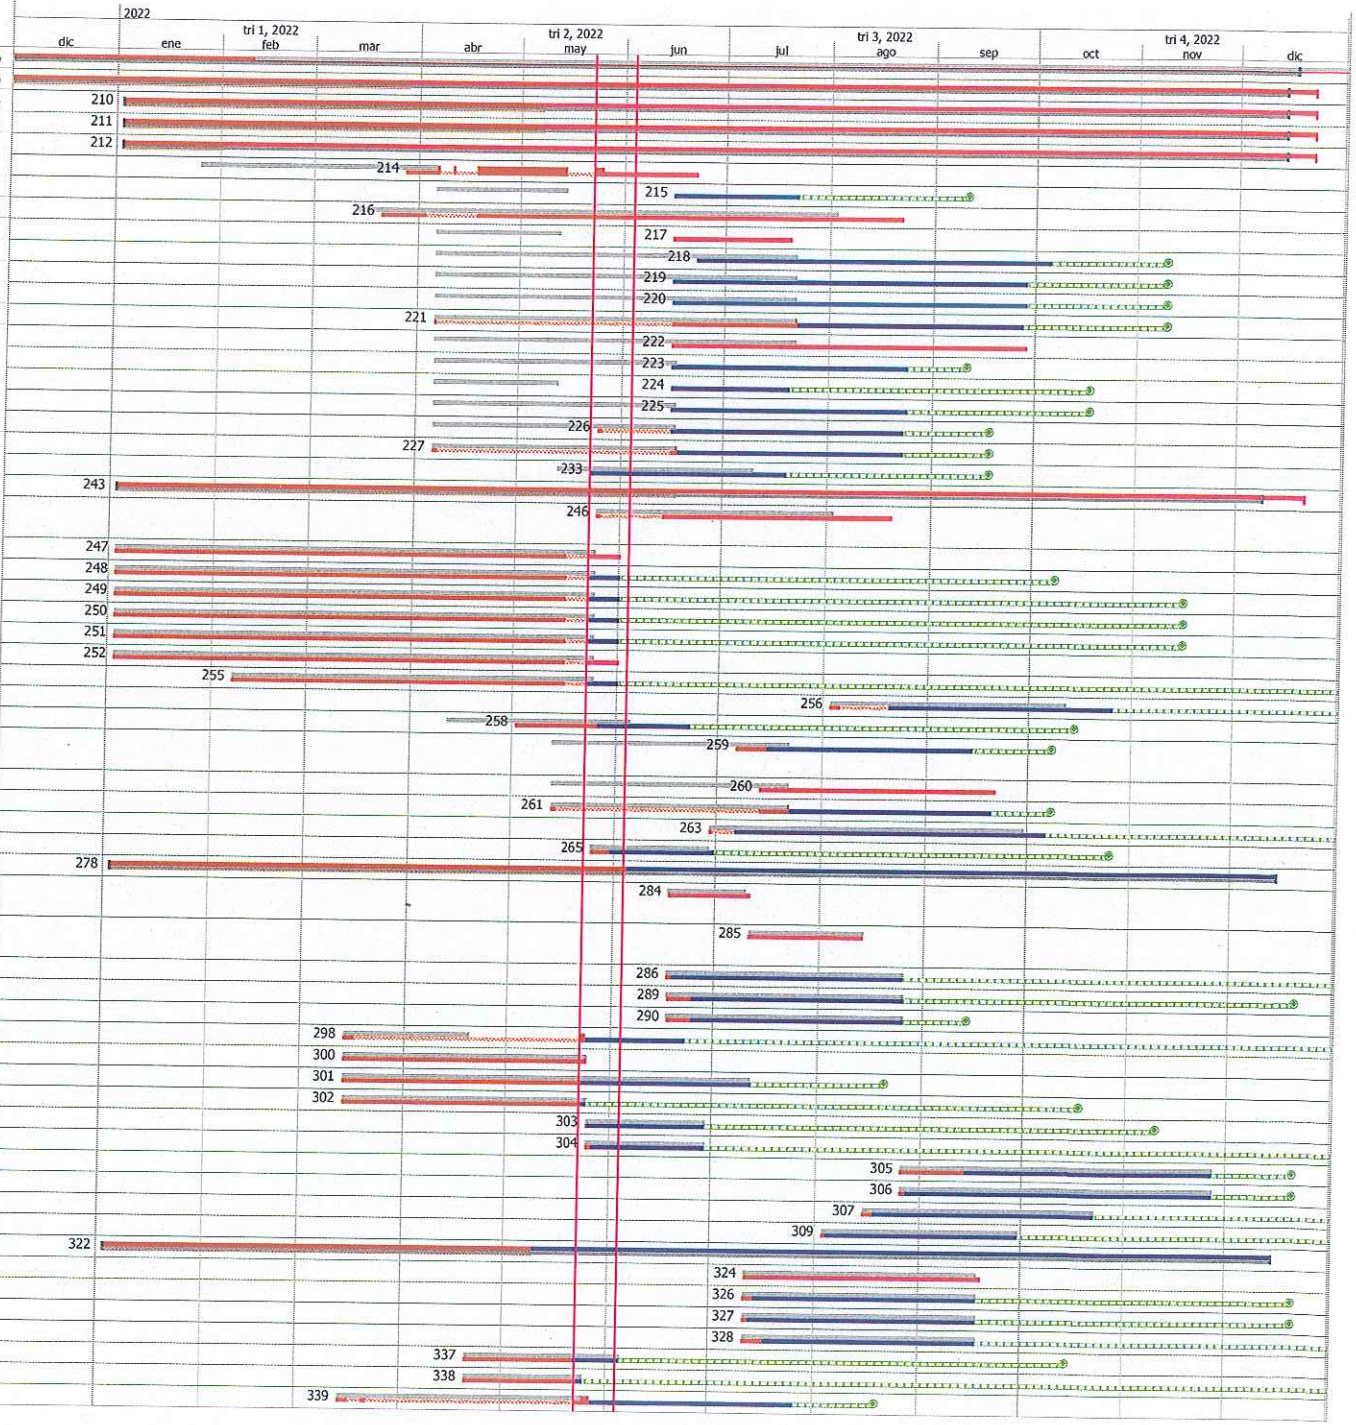


MEBOG

Id	Nombre de tarea	% Prog	% Ejec
341	Cielo rasos especiales	0,00%	30,00%
342	Carpinteria Metálica	0,00%	20,00%
343	Pintura	0,00%	15,00%
344	Remates generales	0,00%	5,00%
346	Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, i	0,00%	15,00%
347	Luminarias	0,00%	15,00%
349	Divisiones de oficina	0,00%	25,00%
358	**Atrio frente 2 y 3 - Consolidado**	**80,23%**	**81,70%**
513	**ADICION Y REMATE DE PROYECTO**		
514	**FRENTE 2 y 3 ATRIO**	**36,00%**	**42,00%**
515	**Atrio F2 - Consolidado**	**85,54%**	**86,37%**
516	**Cubierta**	**100,00%**	**0,00%**
517	Torre de comunicación	100,00%	0,00%
518	**Piso 5**	**53,00%**	**56,00%**
527	Sellos cortafuego	100,00%	55,00%
531	Enchapes	15,00%	15,00%
532	Aparatos sanitarios y accesorios	0,00%	25,00%
533	Cielo rasos especiales	63,00%	63,00%
534	Carpinteria Metálica	63,00%	63,00%
535	Pintura	63,00%	63,00%
536	Remates generales	48,00%	48,00%
537	Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización	0,00%	1,00%
538	Luminarias	0,00%	25,00%
539	Divisiones de oficina	0,00%	45,00%
541	Pisos secos	0,00%	5,00%
550	**Piso 4**	**48,00%**	**51,00%**
560	Sellos cortafuego	100,00%	55,00%
564	Aparatos sanitarios y accesorios	43,00%	43,00%
565	Cielo rasos especiales	30,00%	35,00%
566	Carpinteria Metálica	30,00%	30,00%
567	Pintura	15,00%	15,00%
568	Remates generales	23,00%	23,00%
569	Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización	0,00%	10,00%
570	Luminarias	0,00%	25,00%
572	Divisiones de oficina	0,00%	55,00%
573	Pisos secos	0,00%	5,00%
581	**Piso 3**	**42,00%**	**51,00%**
584	Instalaciones eléctricas	97,00%	97,00%
585	Instalaciones voz y datos	97,00%	97,00%
586	Instalaciones seguridad y control	97,00%	97,00%
587	Instalaciones climatización	97,00%	97,00%
588	Instalaciones red incendio	97,00%	97,00%
590	Muros secos	97,00%	97,00%
591	Sellos cortafuego	100,00%	40,00%
592	Cielo rasos en fibrocemento	97,00%	97,00%
593	Pisos húmedos	97,00%	97,00%
594	Enchapes	65,00%	65,00%
595	Aparatos sanitarios y accesorios	0,00%	20,00%
596	Cielo rasos especiales	0,00%	45,00%
597	Carpinteria Metálica	0,00%	25,00%
598	Pintura	0,00%	20,00%
599	Remates generales	0,00%	15,00%
600	Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización	0,00%	10,00%
601	Divisiones de oficina	0,00%	60,00%
602	Luminarias	0,00%	20,00%
604	Pisos secos	0,00%	10,00%
612	**Atrio F3 - Consolidado**	**72,57%**	**74,95%**
613	**Piso 6**	**51,00%**	**56,00%**
624	Sellos cortafuego	100,00%	75,00%
626	Cielo rasos especiales	97,00%	97,00%
627	Carpinteria Metálica	97,00%	97,00%
628	Enchapes	65,00%	65,00%
629	Aparatos sanitarios y accesorios	0,00%	5,00%
631	Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización	0,00%	10,00%

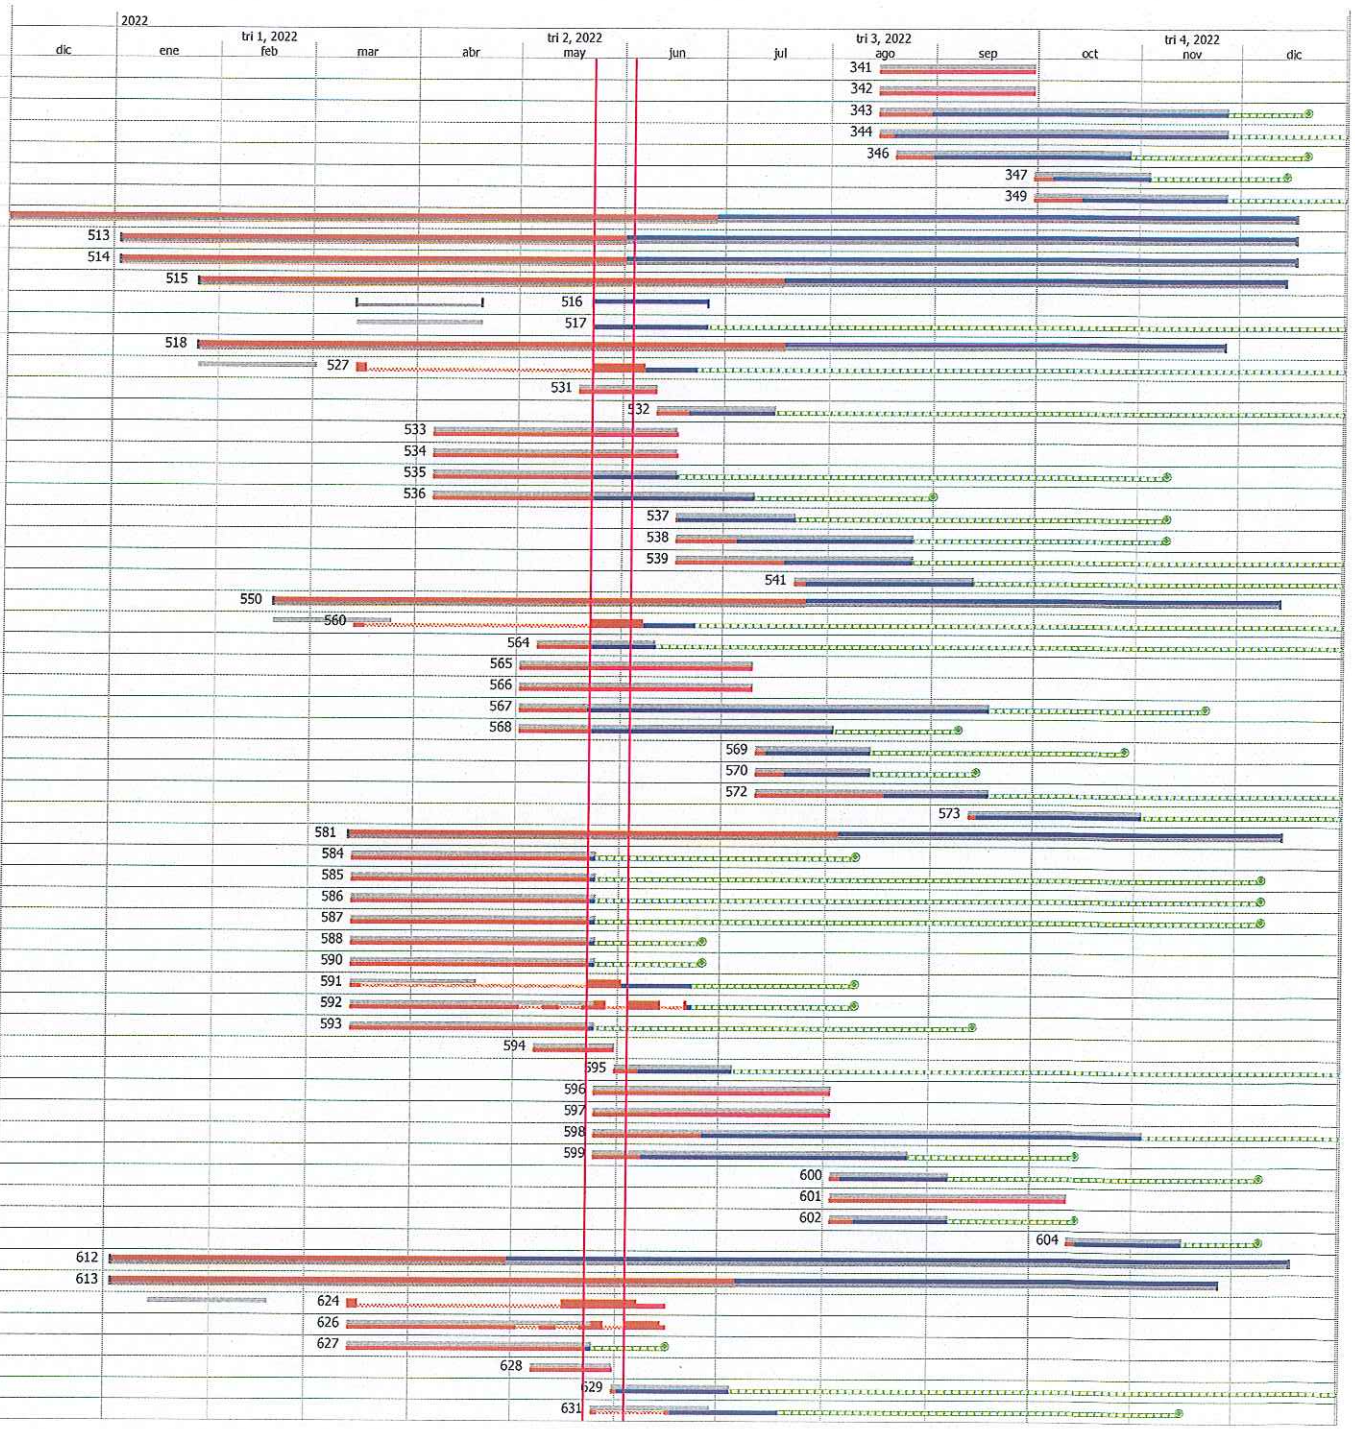


MEBOG

Id	Nombre de tarea	% Prog	% Ejec
632	Luminarias	0,00%	15,00%
634	Divisiones de oficina	0,00%	45,00%
635	Pintura	0,00%	22,00%
636	Remates generales	0,00%	10,00%
637	Pisos secos	0,00%	2,00%
639	Carpinteria Madera	0,00%	5,00%
645	**Piso 2**	**30,00%**	**35,00%**
648	Instalaciones eléctricas	84,00%	84,00%
649	Instalaciones voz y datos	63,00%	63,00%
650	Instalaciones seguridad y control	63,00%	63,00%
651	Instalaciones climatización	63,00%	63,00%
652	Instalaciones red incendio	63,00%	63,00%
653	Muros secos	63,00%	63,00%
654	Sellos cortafuego	100,00%	30,00%
655	Cielo rasos en fibrocemento	63,00%	63,00%
656	Instalaciones red de gas	77,00%	80,00%
659	Impermeabilización	27,00%	27,00%
660	Aparatos sanitarios y accesorios	0,00%	10,00%
661	Pisos plazoletas	0,00%	5,00%
662	Cielo rasos especiales	0,00%	45,00%
663	Carpinteria Metálica	0,00%	15,00%
664	Pintura	0,00%	11,00%
665	Remates generales	0,00%	7,00%
666	Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización	0,00%	2,00%
667	Luminarias	0,00%	11,00%
669	Divisiones de oficina	0,00%	55,00%
670	Pisos secos	0,00%	11,00%
672	Carpinteria Madera	0,00%	1,00%
678	**Piso 1**	**15,00%**	**23,00%**
680	Instalaciones hidrosanitarias	40,00%	40,00%
681	Instalaciones eléctricas	30,00%	30,00%
682	Instalaciones voz y datos	30,00%	30,00%
683	Instalaciones seguridad y control	30,00%	30,00%
684	Instalaciones climatización	30,00%	30,00%
685	Instalaciones red incendio	30,00%	30,00%
686	Muros secos	30,00%	30,00%
687	Sellos cortafuego	60,00%	30,00%
688	Cielo rasos en fibrocemento	30,00%	30,00%
689	Pisos húmedos	60,00%	60,00%
690	Instalaciones red de gas	60,00%	80,00%
691	Enchapes	0,00%	10,00%
692	Aparatos sanitarios y accesorios	0,00%	4,00%
693	Cielo rasos especiales	0,00%	35,00%
694	Carpinteria Metálica	0,00%	15,00%
695	Pintura	0,00%	10,00%
696	Remates generales	0,00%	15,00%
697	Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización	0,00%	5,00%
698	Luminarias	0,00%	25,00%
700	Divisiones de oficina	0,00%	45,00%
701	Pisos secos	0,00%	16,00%
703	Carpinteria Madera	0,00%	2,00%
709	**Sótano**	**0,00%**	**9,00%**
711	Instalaciones hidrosanitarias	0,00%	20,00%
712	Instalaciones eléctricas	0,00%	11,00%
713	Instalaciones voz y datos	0,00%	15,00%
714	Instalaciones seguridad y control	0,00%	10,00%
715	Instalaciones climatización	0,00%	10,00%
716	Instalaciones red incendio	0,00%	5,00%
717	Instalaciones red de gas y calderas	0,00%	10,00%
719	Muros secos	0,00%	15,00%
720	Carpinteria Metálica	0,00%	15,00%
722	Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización	0,00%	3,00%

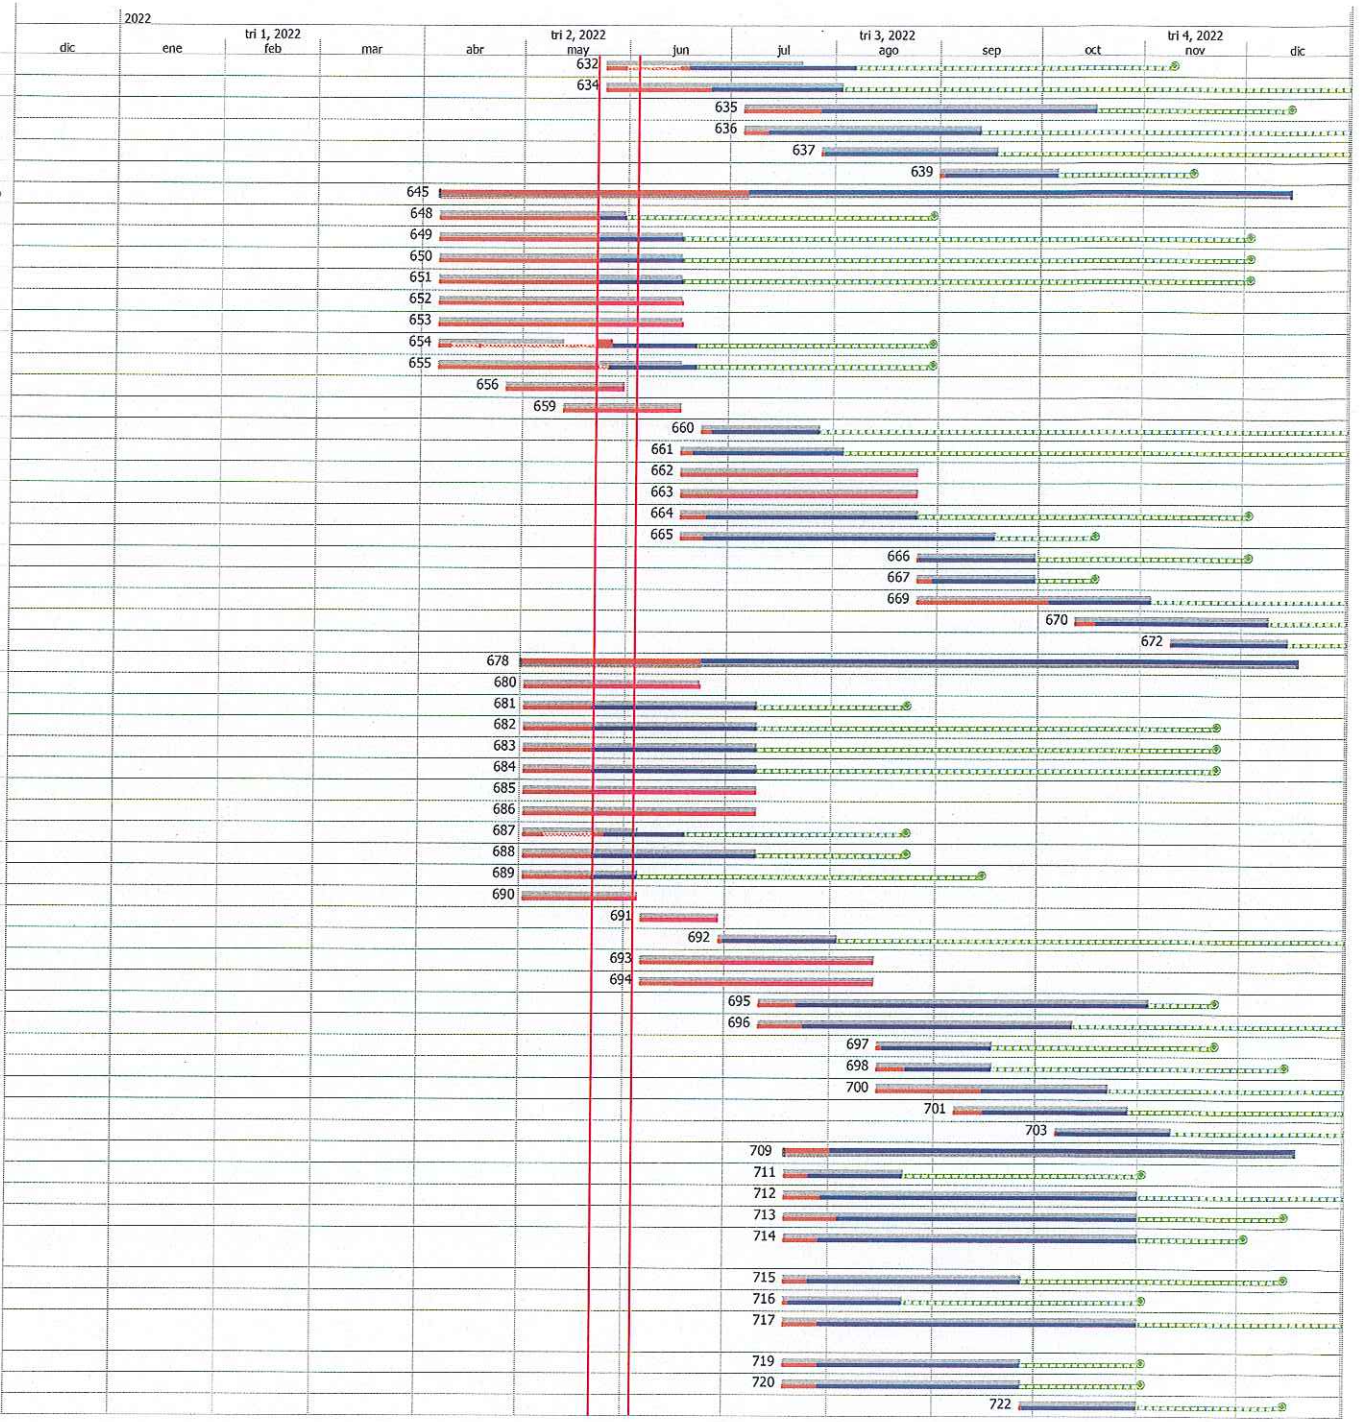

MEBOG

Id	Nombre de tarea	% Prog	% Ejec
724	Pintura	0,00%	7,00%
726	Remates generales	0,00%	5,00%
731	**Plazoleta F4 - Consolidado**	**81,34%**	**81,81%**
807	**ADICION Y REMATE DE PROYECTO**	**41,00%**	**39,00%**
808	**FRENTE 4 BLOQUE D Y BLOQUE E. ADICION**	**40,00%**	**42,00%**
809	**Piso 1 y plaza de acceso**	**35,00%**	**36,00%**
814	Apuntalamiento bajo bóveda nivel -3.8.	70,00%	70,00%
815	Bóveda (armado testereado y fundida)	63,00%	63,00%
817	Impermeabilización en zona de bóveda y juntas	0,00%	1,00%
830	Enchapes	97,00%	97,00%
831	Pisos húmedos	0,00%	1,00%
832	Aparatos sanitarios y accesorios	0,00%	1,00%
834	Cielo rasos en fibrocemento y especiales	0,00%	1,00%
835	Pintura	0,00%	4,00%
836	Remates generales	0,00%	10,00%
837	Pisos plazoletas	0,00%	7,00%
840	Cielo rasos especiales	0,00%	5,00%
841	Carpinteria Metálica	0,00%	20,00%
842	Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, i	0,00%	10,00%
843	Luminarias	0,00%	1,00%
846	Pisos secos	0,00%	1,00%
854	**Sótano**	**48,00%**	**50,00%**
856	Instalaciones hidrosanitarias	100,00%	100,00%
860	Instalaciones climatización	100,00%	100,00%
864	Pisos húmedos	93,00%	93,00%
865	Aparatos sanitarios y accesorios	93,00%	93,00%
866	Sellos cortafuego	97,00%	30,00%
868	Cielo rasos especiales	0,00%	55,00%
869	Carpinteria Metálica	0,00%	15,00%
870	Pintura	0,00%	10,00%
871	Remates generales	0,00%	1,00%
872	Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, i	0,00%	3,00%
873	Luminarias	0,00%	25,00%
875	Divisiones de oficina	0,00%	25,00%
878	Carpinteria Madera	0,00%	1,00%
884	**Exteriores F5 - Consolidado**	**82,95%**	**78,64%**
885	**Exteriores**	**87,00%**	**95,00%**
891	Inst. hidro (alcantarillado cajas y pozos)	99,00%	99,00%
892	Inst. hidrosanitarias (acometida)	99,00%	99,00%
896	Inst. eléctricas (media tensión)	100,00%	99,00%
898	Excavaciones y rellenos exteriores	76,00%	76,00%
899	Cañuelas y obras de arte en concreto	82,00%	82,00%
901	Vias y andenes	87,00%	87,00%
917	**ADICION Y REMATE DE PROYECTO**	**41,00%**	**39,00%**
918	**FRENTE 5 - EXTERIORES**	**59,00%**	**35,00%**
920	Porteria y garita	100,00%	99,00%
921	**Acometida agua potable Kra 60**	**100,00%**	**60,00%**
923	Demolición pavimento	100,00%	30,00%
924	Excavación tuberías exteriores	100,00%	80,00%
925	Tuberías suministro exteriores	100,00%	80,00%
926	Rellenos de tuberías exteriores	100,00%	80,00%
927	Pavimento en aceso Suppla	100,00%	0,00%
928	Conexión a red principal EAAB	100,00%	25,00%
929	obras de arte, vías y andenes	100,00%	35,00%
930	Fin acometida frente kra 60	100,00%	0,00%
931	**Acometida agua potable Kra 56**	**100,00%**	**77,00%**
933	Demolición pavimento	100,00%	15,00%
934	Excavación tuberías exteriores	100,00%	95,00%
935	Tuberías suministro exteriores	100,00%	95,00%

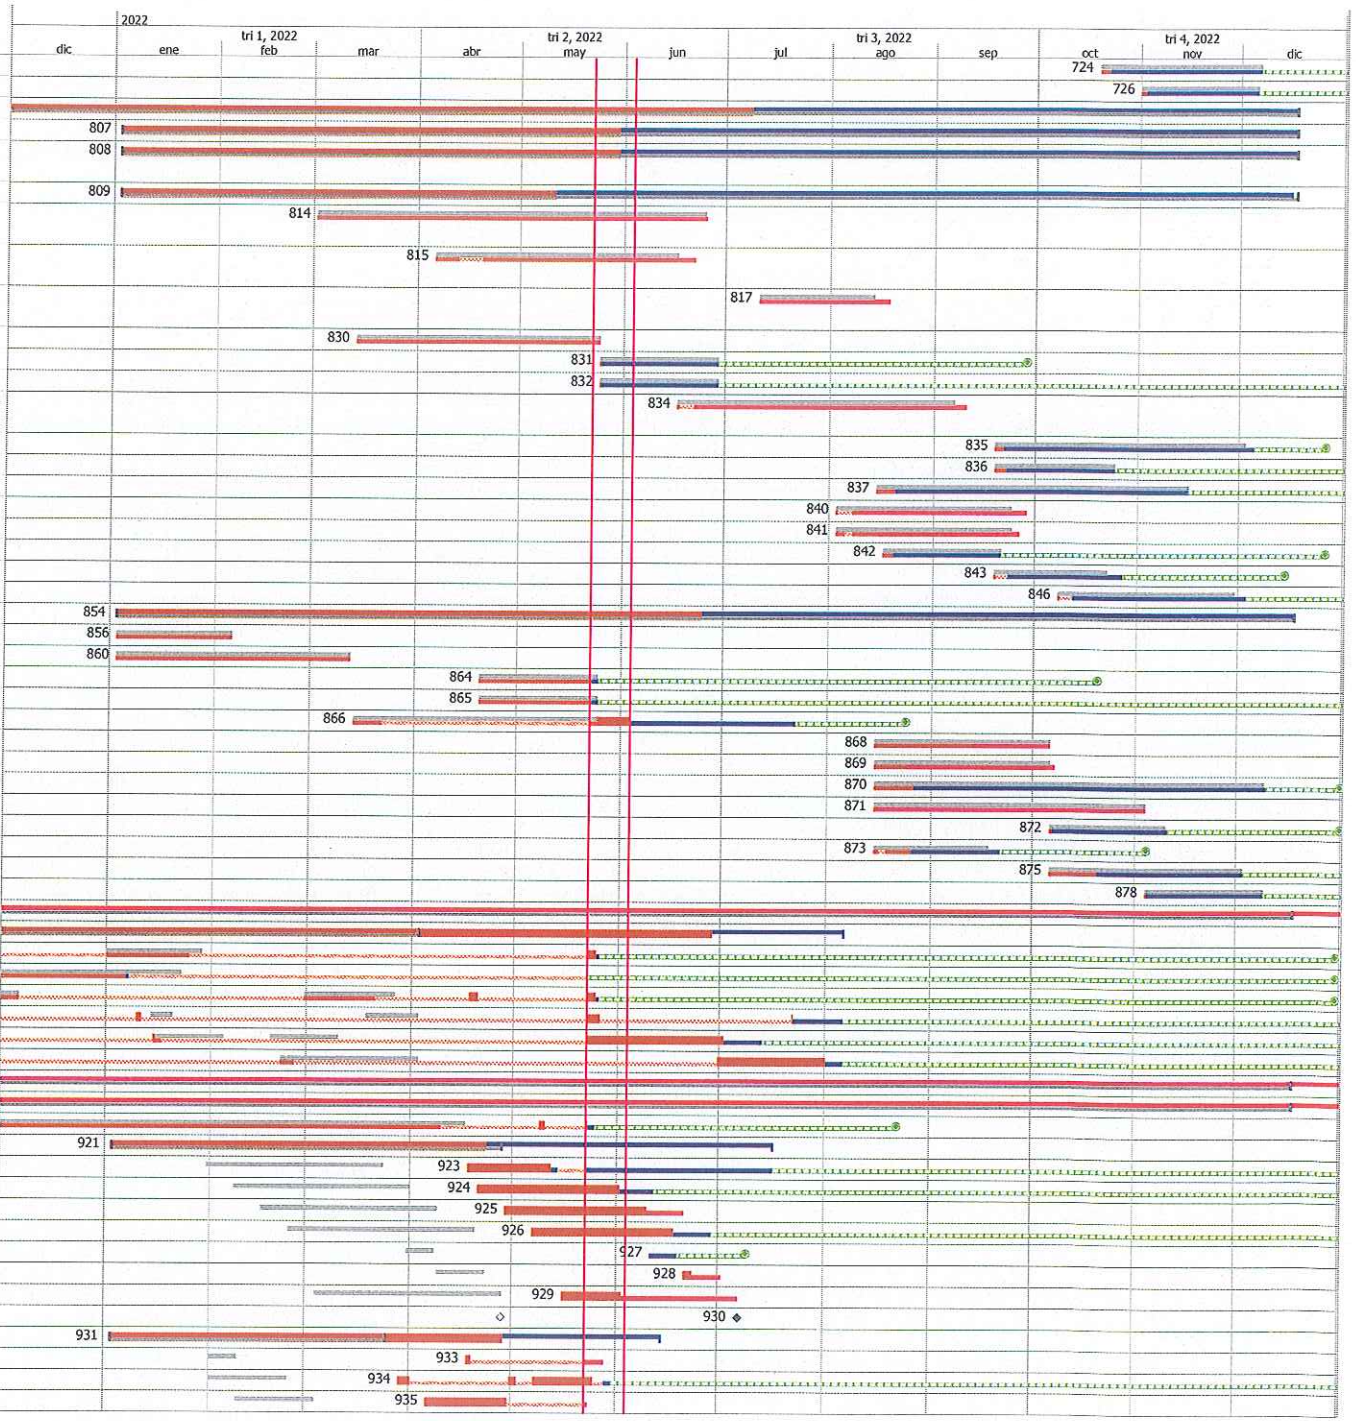

BOGOTÁ

SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN

SEMANA No **177 de 208** DEL **15-may-22** AL **22-may-2022**

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG

Id	Actividad	Duración días	Comienzo	Fin	% programado	% Completado sem Ant	% De desviación	% completado	(-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario	Observaciones
948	Instalaciones climatización	60	3-01-22	12-03-22	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	Finalizado	Instalaciones climatización: Sótano: Armado de ductos A/C y alistado para instalación, Finalizado
952	Pisos húmedos	30	20-04-22	24-05-22	93,00%	73,00%	0,00%	93,00%	(-) 0 días	Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días
953	Aparatos sanitarios y accesorios	30	20-04-22	24-05-22	93,00%	73,00%	0,00%	93,00%	(-) 0 días	Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días
954	Sellos cortafuego	60	14-03-22	24-05-22	97,00%	25,00%	67,00%	30,00%	(+) 48 días	Atraso neto duración restante 48 días
956	Cielo rasos especiales	45	15-08-22	5-10-22	0,00%	50,00%	-55,00%	55,00%	(-) -107 días	Cielo rasos especiales: Sótano: cielo raso aluzinc batería de baño ejes 3/F-G, cielo raso aluzinc ejes 12-17/F-G, ejes 14-2/F-I, ejes 12-2/F-G, adelanto -107 días
957	Carpinteria Metálica	45	15-08-22	5-10-22	0,00%	15,00%	-15,00%	15,00%	(-) -88 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -88 días
958	Pintura	100	15-08-22	8-12-22	0,00%	10,00%	-10,00%	10,00%	(-) -92 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -92 días
959	Remates generales	70	15-08-22	3-11-22	0,00%	1,00%	-1,00%	1,00%	(-) -82 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -82 días
960	Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio)	30	6-10-22	9-11-22	0,00%	3,00%	-3,00%	3,00%	(-) -131 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -131 días
961	Luminarias	30	15-08-22	17-09-22	0,00%	20,00%	-25,00%	25,00%	(-) -89 días	Luminarias: Sótano: luminarias ejes 17-2/I-L, ejes 23-24/H-J, luminarias zona verde vacío 4 y 5, adelanto -89 días
963	Divisiones de oficina	50	6-10-22	2-12-22	0,00%	20,00%	-25,00%	25,00%	(-) -144 días	Divisiones de oficina: Sótano: ejes 19-2/I-J, perfiles para mamparas ejes 19-2/I-J, adelanto -144 días
966	Carpinteria Madera	30	4-11-22	8-12-22	0,00%	1,00%	-1,00%	1,00%	(-) -158 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -158 días
	Exteriores F5 - Consolidado		**28-12-18**	**17-12-22**	**82,95%**	**78,40%**	**3,21%**	**79,74%**	**(+) 63 días**	**Actividad Capítulo**
373	Inst. hidro (alcantarillado cajas y pozos)	341	28-12-20	28-01-22	99,00%	99,00%	0,00%	99,00%	(-) 0 días	Con el programa, adelanto 0 días
374	Inst. hidrosanitarias (acometida)	335	28-12-20	22-01-22	99,00%	99,00%	0,00%	99,00%	(-) 0 días	Con el programa, adelanto 0 días
378	Inst. eléctricas (media tensión)	294	19-04-21	26-03-22	100,00%	99,00%	1,00%	99,00%	(+) 60 días	Atraso neto duración restante 60 días
380	Excavaciones y rellenos exteriores	294	26-04-21	2-04-22	76,00%	76,00%	0,00%	76,00%	(-) 0 días	Con el programa, adelanto 0 días
381	Cañuelas y obras de arte en concreto	249	24-05-21	9-03-22	82,00%	82,00%	0,00%	82,00%	(-) 0 días	Con el programa, adelanto 0 días
383	Vias y andenes	264	31-05-21	2-04-22	87,00%	87,00%	0,00%	87,00%	(-) 0 días	Con el programa, adelanto 0 días
974	Porteria y garita	200	25-08-21	16-04-22	100,00%	99,00%	1,00%	99,00%	(+) 38 días	Atraso neto duración restante Atraso neto duración restante 38 días
975	**Acometida agua potable Kra 60**	**0**	**3-01-22**	**27-04-22**	**100,00%**	**56,00%**	**40,00%**	**60,00%**	**(+) 49 días**	**Actividad Capítulo**
977	Demolición pavimento	45	31-01-22	23-03-22	100,00%	30,00%	70,00%	30,00%	(+) 96 días	Atraso neto duración restante 96 días
978	Excavación tuberías exteriores	45	8-02-22	31-03-22	100,00%	76,00%	20,00%	80,00%	(+) 62 días	Atraso neto duración restante Atraso neto duración restante 62 días
979	Tuberías suministro exteriores	45	16-02-22	8-04-22	100,00%	75,00%	20,00%	80,00%	(+) 54 días	Atraso neto duración restante 54 días
980	Rellenos de tuberías exteriores	45	24-02-22	19-04-22	100,00%	76,00%	20,00%	80,00%	(+) 44 días	Atraso neto duración restante Atraso neto duración restante 44 días
981	Pavimento en aceso Suppla	7	31-03-22	7-04-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 52 días	Atraso neto duración restante 52 días
982	Conexión a red principal EAAB	10	9-04-22	22-04-22	100,00%	0,00%	75,00%	25,00%	(+) 40 días	Conexión a red principal EAAB: Acometida agua potable Cra 60: Excavaciones instalación de hidrante cra 60, Atraso neto duración restante 40 días

BOGOTÁ

SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN

SEMANA No 177 de 208 DEL 15-may-22 AL 22-may-2022

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG

Id	Actividad	Duración días	Comienzo	Fin	% programado	% Completado sem Ant	% De desviación	% completado	(-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario	Observaciones
983	obras de arte, vías y andenes	45	4-03-22	27-04-22	100,00%	30,00%	65,00%	35,00%	(+) 60 días	obras de arte, vías y andenes: Acometida agua potable Cra 60: adoquín provisional anden cra 60, Reinstalación de adoquín provisional anden cra 60, accesorio de 6" e instalación de hidrante glorieta, Atraso neto duración restante 60 días
984	Fin acometida frente kra 60	0	27-04-22	27-04-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 25 días	Atraso neto duración restante 25 días
985	**Acometida agua potable Kra 56**	**0**	**3-01-22**	**24-03-22**	**100,00%**	**77,00%**	**23,00%**	**77,00%**	**(+) 49 días**	**Actividad Capítulo**
987	Demolición pavimento	7	1-02-22	8-02-22	100,00%	15,00%	85,00%	15,00%	(+) 109 días	Atraso neto duración restante 109 días
988	Excavación tuberías exteriores	20	1-02-22	23-02-22	100,00%	95,00%	5,00%	95,00%	(+) 89 días	Atraso neto duración restante 89 días
989	Tuberías suministro exteriores	20	9-02-22	3-03-22	100,00%	95,00%	5,00%	95,00%	(+) 81 días	Atraso neto duración restante 81 días
990	Rellenos de tuberías exteriores	24	17-02-22	16-03-22	100,00%	95,00%	5,00%	95,00%	(+) 68 días	Atraso neto duración restante 68 días
991	Conexión a red principal EAAB	10	4-03-22	15-03-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 79 días	Atraso neto duración restante 79 días
992	obras de arte, vías y andenes	7	17-03-22	24-03-22	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%	(+) 63 días	Atraso neto duración restante 63 días
993	Fin acometida frente kra 56	0	24-03-22	24-03-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 59 días	Atraso neto duración restante 59 días
994	**Aguas residuales costado norte**	**0**	**3-01-22**	**6-04-22**	**100,00%**	**25,00%**	**75,00%**	**25,00%**	**(+) 70 días**	**Actividad Capítulo**
996	Excavación tuberías exteriores	20	31-01-22	22-02-22	100,00%	20,00%	80,00%	20,00%	(+) 107 días	Atraso neto duración restante 107 días
997	Pozos sumideros y cárcamos	30	8-02-22	14-03-22	100,00%	20,00%	80,00%	20,00%	(+) 96 días	Atraso neto duración restante 96 días
998	Tuberías desagües exteriores	30	16-02-22	22-03-22	100,00%	20,00%	80,00%	20,00%	(+) 88 días	Atraso neto duración restante 88 días
999	Rellenos de tuberías exteriores	30	24-02-22	30-03-22	100,00%	20,00%	80,00%	20,00%	(+) 80 días	Atraso neto duración restante 80 días
1000	Conexión a red principal IEEAB	13	23-03-22	6-04-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 60 días	Atraso neto duración restante 60 días
1001	Fin conexión aguas residuales	0	6-04-22	6-04-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 46 días	Atraso neto duración restante 46 días
1002	**Aguas lluvias costado norte**	**0**	**28-03-22**	**7-06-22**	**89,00%**	**9,00%**	**80,00%**	**9,00%**	**(+) 42 días**	**Actividad Capítulo**
1003	Excavación tuberías exteriores	20	28-03-22	22-04-22	100,00%	57,00%	43,00%	57,00%	(+) 41 días	Atraso neto duración restante 41 días
1004	Pozos sumideros y cárcamos	30	5-04-22	12-05-22	100,00%	15,00%	85,00%	15,00%	(+) 41 días	Atraso neto duración restante 41 días
1005	Tuberías desagües exteriores	30	13-04-22	20-05-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 39 días	Atraso neto duración restante 39 días
1006	Rellenos de tuberías exteriores	30	23-04-22	28-05-22	81,00%	0,00%	81,00%	0,00%	(+) 28 días	Atraso neto duración restante 28 días
1007	Cabezal de entrega	52	28-03-22	30-05-22	87,00%	0,00%	87,00%	0,00%	(+) 55 días	Atraso neto duración restante 55 días
1010	**Aguas lluvias costado nor-oriental**	**0**	**28-03-22**	**11-05-22**	**100,00%**	**30,00%**	**70,00%**	**30,00%**	**(+) 42 días**	**Actividad Capítulo**
1011	Excavación tuberías exteriores	15	28-03-22	16-04-22	100,00%	23,00%	77,00%	23,00%	(+) 51 días	Atraso neto duración restante 51 días
1012	Pozos sumideros y cárcamos	19	5-04-22	29-04-22	100,00%	76,00%	24,00%	76,00%	(+) 29 días	Atraso neto duración restante 29 días
1013	Tuberías desagües exteriores	15	13-04-22	3-05-22	100,00%	7,00%	93,00%	7,00%	(+) 38 días	Atraso neto duración restante 38 días
1014	Rellenos de tuberías exteriores	15	23-04-22	11-05-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 29 días	Atraso neto duración restante 29 días
1015	Fin aguas lluvias costado nor-oriental	0	11-05-22	11-05-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 11 días	Atraso neto duración restante 11 días
1016	**Obras exteriores (parqueadero)**	**0**	**7-03-22**	**17-12-22**	**10,00%**	**42,00%**	**-34,00%**	**44,00%**	**(-) 12 días**	**Actividad Capítulo**
1018	Instalaciones hidrosanitarias	45	11-05-22	2-07-22	21,00%	55,00%	-34,00%	55,00%	(-) 23 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto 23 días
1020	obras de arte, vías y andenes	80	3-06-22	5-09-22	0,00%	85,00%	-85,00%	85,00%	(-) -87 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -87 días
1021	Pisos exteriores	91	15-06-22	29-09-22	0,00%	30,00%	-35,00%	35,00%	(-) -58 días	Pisos exteriores: Obras exteriores (parqueadero): ángulos para instalación de piso rejilla ejes 13-16/A-B, platinas para piso en rejilla ejes 16-18/A-B, adelanto -58 días
1023	Luminarias exteriores	30	16-09-22	21-10-22	0,00%	50,00%	-50,00%	50,00%	(-) -128 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -128 días
1025	Automatización V/D, S/C, y Otros	30	21-10-22	25-11-22	0,00%	1,00%	-1,00%	1,00%	(-) -145 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -145 días
1026	Jardines y mobiliario urbano	78	16-09-22	16-12-22	0,00%	15,00%	-20,00%	20,00%	(-) -128 días	Jardines y mobiliario urbano: Obras exteriores (parqueadero): baranda sobre muro, Remate de muro cerramiento, adelanto -128 días

BOGOTÁ

SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN

SEMANA No **177 de 208** DEL **15-may-22** AL **22-may-2022**

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG

Id	Actividad	Duración días	Comienzo	Fin	% programado	% Completado sem Ant	% De desviación	% completado	(-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario	Observaciones
1029	**Obras exteriores (Volteadero)**	**0**	**25-03-22**	**17-12-22**	**21,00%**	**0,00%**	**21,00%**	**0,00%**	**(+) 42 días**	**Actividad Capítulo**
1030	Rellenos	60	25-03-22	4-06-22	80,00%	0,00%	0,00%	80,00%	(+) 0 días	Atraso neto duración restante 0 días
1031	Redes	60	2-05-22	9-07-22	30,00%	0,00%	0,00%	30,00%	(+) 0 días	Atraso neto duración restante 0 días
1037	**Obras exteriores (zonas verdes de cesión)**	**0**	**11-05-22**	**1-12-22**	**8,00%**	**0,00%**	**8,00%**	**0,00%**	**(+) 14 días**	**Actividad Capítulo**
0	Aprobación actualización plano urbanistico aprobado por curaduía (Fuente: SDCSJ)	0	2-05-22	2-05-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 20 días	Atraso neto duración restante 20 días
0	Pago acutualización plano urbanistico	0	2-05-22	2-05-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 20 días	Atraso neto duración restante 20 días
0	Radicado IDRD (U Nacional)	0	2-05-22	9-07-22	30,00%	0,00%	30,00%	0,00%	(+) 20 días	Atraso neto duración restante 20 días
0	Radicado IDU glorieta de retorno (U Nacional)	0	2-05-22	27-07-22	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	(+) 22 días	Atraso neto duración restante 22 días
0	Radicado IDU verificación plazoleta de acceso Cr 60 (CSUDC)	0	2-05-22	27-07-22	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	(+) 22 días	Atraso neto duración restante 22 días
1039	Movimiento de tierras	30	11-05-22	15-06-22	31,00%	0,00%	0,00%	31,00%	(+) 0 días	Atraso neto duración restante 0 días
1040	Conexión desagües	30	11-05-22	15-06-22	31,00%	0,00%	0,00%	31,00%	(+) 0 días	Atraso neto duración restante 0 días
1042	Obras de arte y concretos	40	20-07-22	5-09-22	0,00%	1,00%	-1,00%	1,00%	(-) -56 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -56 días
1044	Jardines y mobiliario urbano	45	16-09-22	8-11-22	0,00%	1,00%	-1,00%	1,00%	(-) -112 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -112 días
482	**TRAMITES OBTENCION DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**0**	**19-07-21**	**5-12-22**	**84,00%**	**64,00%**	**20,00%**	**64,00%**	**(+) 42 días**	**Actividad Capítulo**
484	**Tramites para servicios de EAAB**	**0**	**19-07-21**	**28-03-22**	**100,00%**	**99,00%**	**1,00%**	**99,00%**	**(+) 42 días**	**Actividad Capítulo**
493	**Permiso de ocupación de cauce ante la Secretaria de Ambiente**	**0**	**19-07-21**	**28-03-22**	**100,00%**	**97,00%**	**3,00%**	**97,00%**	**(+) 42 días**	**Actividad Capítulo**
498	trámite interno SDA (Estudio)	90	13-12-21	28-03-22	100,00%	93,00%	7,00%	93,00%	(+) 62 días	Atraso neto duración restante 62 días
499	Obtención permiso de ocupación de cauce	0	28-03-22	28-03-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 55 días	Atraso neto duración restante 55 días
513	**Trámites domiciliarias energía eléctrica CODENSA**	**0**	**19-07-21**	**5-12-22**	**63,00%**	**57,00%**	**6,00%**	**57,00%**	**(+) 56 días**	**Actividad Capítulo**
518	Tramite CODENSA aprobación proyecto serie 6	96	3-01-22	26-04-22	100,00%	75,00%	25,00%	75,00%	(+) 54 días	Atraso neto duración restante 54 días
395	Aseo general de obra	634	9-11-20	29-12-21	75,00%	74,00%	0,00%	75,00%	(-) 0 días	Aseo general de obra: Auditorio: Piso 1: Sótano: Aseo general, Sótano: Aseo general de piso ejes 7-11/A-F, Atrio: Piso 1: Limpieza de tubería y cielo raso ejes 24-29/E-G, Piso 2: Aseo general de piso, Aseo punto fijo escalera je 18-19/E-F, Piso 3: Aseo general de piso, Piso 5: Aseo general de piso, Plazoleta: Piso 1: Limpieza de estructura metálica lucarnas Suppla ay aplicación de anticorrosivo, Con el programa, adelanto 0 días
									*	R. Critica:21 días
									*	R. Critica Ant:14 días
	El porcentaje programado es 78,25% y el ejecutado es 78,28% con un adelanto de -2 días. El porcentaje de influencia de las zonas de cesión en el acumulado seria si se estuvieran ejecutando de 0,13% para un total ejecutado de 78,41%. En la presente semana se deberá radicar el proyecto para revalidación licencia urbanística (23 de mayo de 2022). El personal programado en obra es de 110 y el real es de 120.								*	Actividad Capítulo

Descripción	Oficial en obra Sem 177	Ayudante en obra Sem 177	Oficial Programado Sem 177	Ayudante programado Sem 177			
							*
Acabados	22	10	17	11	32	28	*
Carpintería Metálica	7	0	6	4	7	10	*
Cielo	12	0	12	8	12	20	*
Climatización	2	0	3	2	2	5	*
Divisiones	16	0	1	1	16	2	*
Eléctrico	5	5	8	5	10	13	*
Estructura	20	0	2	2	20	4	*
Hidrosanitarias	7	0	4	2	7	6	*
Incendio	4	0	3	2	4	5	*

BOGOTÁ


SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN

SEMANA No **177 de 208** DEL **15-may-22** AL **22-may-2022**

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG

Id	Actividad	Duración días	Comienzo	Fin	% programado	% Completado sem Ant	% De desviación	% completado	(-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario	Observaciones
	Luminarias		6	0	1	1	6	2	*	
	Vias		2	0	0	0	2	0	*	
	Pisos		0	0	6	4	0	10	*	
	Sellos Corta fuego		2	0	3	2	2	5	*	
	Total		120,00		110,00				*	
									*	

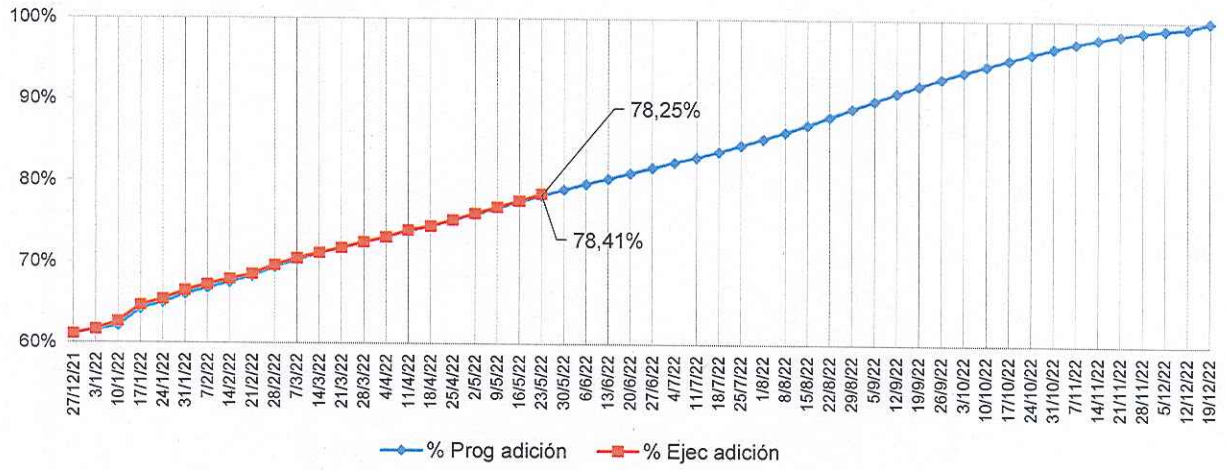

*

*

BOGOTÁ

SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN

SEMANA No 178 de 208 DEL 22-may-22 AL 29-may-2022

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG

Id	Actividad	Duración días	Comienzo	Fin	% programado	% Completado sem Ant	% De desviación	% completado	(-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario	Observaciones
982	Conexión a red principal EAAB	10	9-04-22	22-04-22	100,00%	25,00%	75,00%	25,00%	(+) 47 días	Atraso neto duración restante 47 días
983	obras de arte, vías y andenes	45	4-03-22	27-04-22	100,00%	35,00%	50,00%	50,00%	(+) 59 días	obras de arte, vías y andenes: Acometida agua potable Cra 60: Retiro de loseta anden cra 60, Atraso neto duración restante 59 días
984	Fin acometida frente kra 60	0	27-04-22	27-04-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 32 días	Atraso neto duración restante 32 días
985	**Acometida agua potable Kra 56**	**0**	**3-01-22**	**24-03-22**	**100,00%**	**77,00%**	**23,00%**	**77,00%**	**(+) 49 días**	**Actividad Capítulo**
987	Demolición pavimento	7	1-02-22	8-02-22	100,00%	15,00%	85,00%	15,00%	(+) 116 días	Atraso neto duración restante 116 días
988	Excavación tuberías exteriores	20	1-02-22	23-02-22	100,00%	95,00%	5,00%	95,00%	(+) 96 días	Atraso neto duración restante 96 días
989	Tuberías suministro exteriores	20	9-02-22	3-03-22	100,00%	95,00%	5,00%	95,00%	(+) 88 días	Atraso neto duración restante 88 días
990	Rellenos de tuberías exteriores	24	17-02-22	16-03-22	100,00%	95,00%	5,00%	95,00%	(+) 75 días	Atraso neto duración restante 75 días
991	Conexión a red principal EAAB	10	4-03-22	15-03-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 86 días	Atraso neto duración restante 86 días
992	obras de arte, vías y andenes	7	17-03-22	24-03-22	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%	(+) 70 días	Atraso neto duración restante 70 días
993	Fin acometida frente kra 56	0	24-03-22	24-03-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 66 días	Atraso neto duración restante 66 días
994	**Aguas residuales costado norte**	**0**	**3-01-22**	**6-04-22**	**100,00%**	**25,00%**	**75,00%**	**25,00%**	**(+) 70 días**	**Actividad Capítulo**
996	Excavación tuberías exteriores	20	31-01-22	22-02-22	100,00%	20,00%	80,00%	20,00%	(+) 114 días	Atraso neto duración restante 114 días
997	Pozos sumideros y cárcamos	30	8-02-22	14-03-22	100,00%	20,00%	80,00%	20,00%	(+) 103 días	Atraso neto duración restante 103 días
998	Tuberías desagües exteriores	30	16-02-22	22-03-22	100,00%	20,00%	80,00%	20,00%	(+) 95 días	Atraso neto duración restante 95 días
999	Rellenos de tuberías exteriores	30	24-02-22	30-03-22	100,00%	20,00%	80,00%	20,00%	(+) 87 días	Atraso neto duración restante 87 días
1000	Conexión a red principal IEEAB	13	23-03-22	6-04-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 67 días	Atraso neto duración restante 67 días
1001	Fin conexión aguas residuales	0	6-04-22	6-04-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 53 días	Atraso neto duración restante 53 días
1002	**Aguas lluvias costado norte**	**0**	**28-03-22**	**7-06-22**	**96,00%**	**9,00%**	**87,00%**	**9,00%**	**(+) 42 días**	**Actividad Capítulo**
1003	Excavación tuberías exteriores	20	28-03-22	22-04-22	100,00%	57,00%	43,00%	57,00%	(+) 48 días	Atraso neto duración restante 48 días
1004	Pozos sumideros y cárcamos	30	5-04-22	12-05-22	100,00%	15,00%	85,00%	15,00%	(+) 48 días	Atraso neto duración restante 48 días
1005	Tuberías desagües exteriores	30	13-04-22	20-05-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 46 días	Atraso neto duración restante 46 días
1006	Rellenos de tuberías exteriores	30	23-04-22	28-05-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 36 días	Atraso neto duración restante 36 días
1007	Cabezal de entrega	52	28-03-22	30-05-22	99,00%	0,00%	99,00%	0,00%	(+) 62 días	Atraso neto duración restante 62 días
1010	**Aguas lluvias costado nor-oriental**	**0**	**28-03-22**	**11-05-22**	**100,00%**	**30,00%**	**70,00%**	**30,00%**	**(+) 42 días**	**Actividad Capítulo**
1011	Excavación tuberías exteriores	15	28-03-22	16-04-22	100,00%	23,00%	77,00%	23,00%	(+) 58 días	Atraso neto duración restante 58 días
1012	Pozos sumideros y cárcamos	19	5-04-22	29-04-22	100,00%	76,00%	24,00%	76,00%	(+) 36 días	Atraso neto duración restante 36 días
1013	Tuberías desagües exteriores	15	13-04-22	3-05-22	100,00%	7,00%	93,00%	7,00%	(+) 45 días	Atraso neto duración restante 45 días
1014	Rellenos de tuberías exteriores	15	23-04-22	11-05-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 36 días	Atraso neto duración restante 36 días
1015	Fin aguas lluvias costado nor-oriental	0	11-05-22	11-05-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 18 días	Atraso neto duración restante 18 días
1016	**Obras exteriores (parqueadero)**	**0**	**7-03-22**	**17-12-22**	**12,00%**	**44,00%**	**-36,00%**	**48,00%**	**(-) 12 días**	**Actividad Capítulo**
1018	Instalaciones hidrosanitarias	45	11-05-22	2-07-22	34,00%	55,00%	-21,00%	55,00%	(-) 23 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto 23 días
1020	obras de arte, vías y andenes	80	3-06-22	5-09-22	0,00%	85,00%	-85,00%	85,00%	(-) -81 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -81 días
1021	Pisos exteriores	91	15-06-22	29-09-22	0,00%	35,00%	-60,00%	60,00%	(-) -77 días	Pisos exteriores: Obras exteriores (parqueadero): perfiles y rejas de piso eje 13-16/A-B, adelanto -77 días
1023	Luminarias exteriores	30	16-09-22	21-10-22	0,00%	50,00%	-50,00%	50,00%	(-) -121 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -121 días
1025	Automatización V/D, S/C, y Otros	30	21-10-22	25-11-22	0,00%	1,00%	-1,00%	1,00%	(-) -138 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -138 días
1026	Jardines y mobiliario urbano	78	16-09-22	16-12-22	0,00%	20,00%	-20,00%	20,00%	(-) -122 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -122 días
1029	**Obras exteriores (Volteadero)**	**0**	**25-03-22**	**17-12-22**	**25,00%**	**0,00%**	**25,00%**	**0,00%**	**(+) 42 días**	**Actividad Capítulo**
1030	Rellenos	60	25-03-22	4-06-22	90,00%	0,00%	0,00%	90,00%	(+) 0 días	Atraso neto duración restante 0 días

BOGOTÁ

SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN

SEMANA No 178 de 208 DEL 22-may-22 AL 29-may-2022

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG

Id	Actividad	Duración días	Comienzo	Fin	% programado	% Completado sem Ant	% De desviación	% completado	(-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario	Observaciones
1031	Redes	60	2-05-22	9-07-22	40,00%	0,00%	0,00%	40,00%	(+) 0 días	Atraso neto duración restante 0 días
1037	**Obras exteriores (zonas verdes de cesión)**	**0**	**11-05-22**	**1-12-22**	**14,00%**	**0,00%**	**14,00%**	**0,00%**	**(+) 14 días**	**Actividad Capítulo**
0	Aprobación actualización plano urbanistico aprobado por curaduía (Fuente: SDCSJ)	0	2-05-22	2-05-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 27 días	Atraso neto duración restante 27 días
0	Pago acutualización plano urbanistico	0	2-05-22	2-05-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 27 días	Atraso neto duración restante 27 días
0	Radicado IDRD (U Nacional)	0	2-05-22	9-07-22	40,00%	0,00%	40,00%	0,00%	(+) 27 días	Atraso neto duración restante 27 días
0	Radicado IDU glorieta de retorno (U Nacional)	0	2-05-22	27-07-22	32,00%	0,00%	32,00%	0,00%	(+) 28 días	Atraso neto duración restante 28 días
0	Radicado IDU verificación plazoleta de acceso Cr 60 (CSUDC)	0	2-05-22	27-07-22	32,00%	0,00%	32,00%	0,00%	(+) 28 días	Atraso neto duración restante 28 días
1038	Inicio	0	11-05-22	11-05-22	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	Terminado	Atraso neto duración restante 0 días
1039	Movimiento de tierras	30	11-05-22	15-06-22	51,00%	0,00%	0,00%	51,00%	(+) 0 días	Atraso neto duración restante 0 días
1040	Conexión desagües	30	11-05-22	15-06-22	51,00%	0,00%	0,00%	51,00%	(+) 0 días	Atraso neto duración restante 0 días
1042	Obras de arte y concretos	40	20-07-22	5-09-22	0,00%	1,00%	-1,00%	1,00%	(-) -50 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -50 días
1044	Jardines y mobiliario urbano	45	16-09-22	8-11-22	0,00%	1,00%	-1,00%	1,00%	(-) -105 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -105 días
482	**TRAMITES OBTENCION DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**0**	**19-07-21**	**5-12-22**	**84,00%**	**64,00%**	**20,00%**	**64,00%**	**(+) 42 días**	**Actividad Capítulo**
484	**Tramites para servicios de EAAB**	**0**	**19-07-21**	**28-03-22**	**100,00%**	**99,00%**	**1,00%**	**99,00%**	**(+) 42 días**	**Actividad Capítulo**
493	**Permiso de ocupación de cauce ante la Secretaria de Ambiente**	**0**	**19-07-21**	**28-03-22**	**100,00%**	**97,00%**	**3,00%**	**97,00%**	**(+) 42 días**	**Actividad Capítulo**
498	trámite interno SDA (Estudio)	90	13-12-21	28-03-22	100,00%	93,00%	7,00%	93,00%	(+) 69 días	Atraso neto duración restante 69 días
499	Obtención permiso de ocupación de cauce	0	28-03-22	28-03-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 62 días	Atraso neto duración restante 62 días
513	**Trámites domiciliarias energía eléctrica CODENSA**	**0**	**19-07-21**	**5-12-22**	**63,00%**	**57,00%**	**6,00%**	**57,00%**	**(+) 56 días**	**Actividad Capítulo**
518	Tramite CODENSA aprobación proyecto serie 6	96	3-01-22	26-04-22	100,00%	75,00%	25,00%	75,00%	(+) 61 días	Atraso neto duración restante 61 días
395	Aseo general de obra	634	9-11-20	29-12-21	76,00%	75,00%	0,00%	76,00%	(-) 0 días	Aseo general de obra: Auditorio: Piso 1: Aseo general de piso, Atrio: Piso 4: Aseo general de piso, Con el programa, adelanto 0 días
									*	R. Critica:28 días
									*	R. Critica Ant:21 días
	El porcentaje programado es 78,98% y el ejecutado es 79,05% con un adelanto de -2 días. El porcentaje de influencia de las zonas de cesión en el acumulado seria si se estuvieran ejecutando de 0,16% para un total ejecutado de 79,21%. Contiua la afecración en ruta critica por inicio de obra en zonas de cesión que esta siendo influenciada por la aprobacion de diseños El personal programado en obra es de 112 y el real es de 126.								*	Actividad Capítulo

Descripción	Oficial en obra Sem 178	Ayudante en obra Sem 178	Oficial Programado Sem 178	Ayudante programado Sem 178
Acabados	19	10	19	13
Carpintería Metálica	11	0	6	4
Cielo	13	0	12	8
Climatización	6	0	3	2
Divisiones	17	0	1	1
Eléctrico	3	5	6	4
Estructura	21	0	5	3
Fachada	5	0	1	1
Hidrosanitarias	2	0	1	1
Incendio	2	0	3	2
Luminarias	4	0	1	1
Vias	7	1	0	0
Pisos	0	0	6	4
Sellos Corta fuego	0	0	2	2
Total	126,00		112,00	

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


BOGOTÁ

SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN

SEMANA No **178 de 208** DEL **22-may-22** AL **29-may-2022**

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG

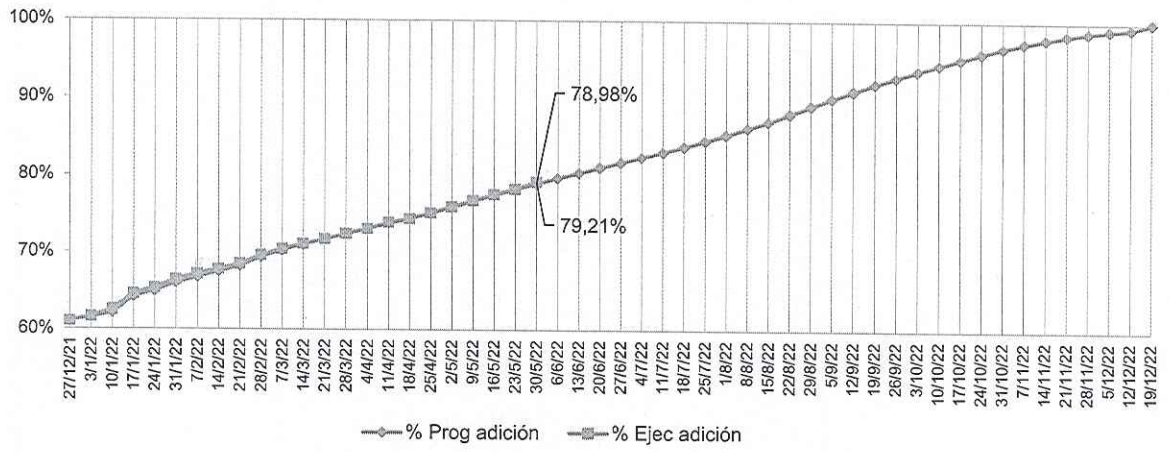Id	Actividad	Duración días	Comienzo	Fin	% programado	% Completado sem Ant	% De desviación	% completado	(-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario	Observaciones
*										

*

BOGOTÁ

SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN

SEMANA No **177 de 208** DEL **15-may-22** AL **22-may-2022**

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG

Id	Actividad	Duración días	Comienzo	Fin	% programado	% Completado sem Ant	% De desviación	% completado	(-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario	Observaciones
879	Instalaciones seguridad y control	90	19-07-22	31-10-22	0,00%	10,00%	-10,00%	10,00%	(-) -65 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -65 días
880	Instalaciones climatización	60	19-07-22	26-09-22	0,00%	10,00%	-10,00%	10,00%	(-) -62 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -62 días
881	Instalaciones red incendio	30	19-07-22	22-08-22	0,00%	5,00%	-5,00%	5,00%	(-) -57 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -57 días
882	Instalaciones red de gas y calderas	90	19-07-22	31-10-22	0,00%	10,00%	-10,00%	10,00%	(-) -65 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -65 días
884	Muros secos	60	19-07-22	26-09-22	0,00%	15,00%	-15,00%	15,00%	(-) -65 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -65 días
885	Carpinteria Metálica	60	19-07-22	26-09-22	0,00%	15,00%	-15,00%	15,00%	(-) -65 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -65 días
887	Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio)	30	27-09-22	31-10-22	0,00%	3,00%	-3,00%	3,00%	(-) -123 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -123 días
889	Pintura	41	20-10-22	6-12-22	0,00%	7,00%	-7,00%	7,00%	(-) -147 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -147 días
891	Remates generales	30	1-11-22	5-12-22	0,00%	5,00%	-5,00%	5,00%	(-) -156 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -156 días
	Plazoleta F4 - Consolidado		**28-12-18**	**17-12-22**	**81,34%**	**81,49%**	**-0,47%**	**81,81%**	**(-) 11 días**	**Actividad Capítulo**
897	**Piso 1 y plaza de acceso**	**0**	**3-01-22**	**17-12-22**	**35,00%**	**36,00%**	**-1,00%**	**36,00%**	**(-) 4 días**	**Actividad Capítulo**
902	Apuntalamiento bajo bóveda nivel -3.8.	97	2-03-22	24-06-22	70,00%	70,00%	0,00%	70,00%	(-) 0 días	Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días
903	Bóveda (armado testereado y fundida)	60	6-04-22	16-06-22	63,00%	53,00%	0,00%	63,00%	(-) 0 días	Bóveda (armado testereado y fundida): Piso 2: Reforzamiento de armadura ejes 12-14/H-J, Amarre de acero 1 y 2 parrilla placa curva bóveda tramo 2 ejes 12-14/H-J, Perforación y anclajes de parrilla ejes 13-14/H, testero de borde placa bóveda ejes 12-14/H-J, Con el programa, adelanto 0 días
905	Impermeabilización en zona de bóveda y juntas	30	11-07-22	13-08-22	0,00%	1,00%	-1,00%	1,00%	(-) -48 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -48 días
918	Enchapes	60	14-03-22	24-05-22	97,00%	87,00%	0,00%	97,00%	(-) 0 días	Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días
919	Pisos húmedos	30	25-05-22	28-06-22	0,00%	1,00%	-1,00%	1,00%	(-) -3 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -3 días
920	Aparatos sanitarios y accesorios	30	25-05-22	28-06-22	0,00%	1,00%	-1,00%	1,00%	(-) -3 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -3 días
922	Cielo rasos en fibrocemento y especiales	70	17-06-22	6-09-22	0,00%	1,00%	-1,00%	1,00%	(-) -25 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -25 días
923	Pintura	65	19-09-22	2-12-22	0,00%	4,00%	-4,00%	4,00%	(-) -117 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -117 días
924	Remates generales	31	19-09-22	24-10-22	0,00%	10,00%	-10,00%	10,00%	(-) -117 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -117 días
925	Pisos plazoletas	80	15-08-22	15-11-22	0,00%	7,00%	-7,00%	7,00%	(-) -87 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -87 días
928	Cielo rasos especiales	45	3-08-22	23-09-22	0,00%	1,00%	-5,00%	5,00%	(-) -72 días	Cielo rasos especiales: Piso 1: rejilla abajo lucarna contra Suppla, adelanto -72 días
929	Carpinteria Metálica	45	3-08-22	23-09-22	0,00%	20,00%	-20,00%	20,00%	(-) -79 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -79 días
930	Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio)	30	17-08-22	20-09-22	0,00%	10,00%	-10,00%	10,00%	(-) -86 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -86 días
931	Luminarias	30	19-09-22	22-10-22	0,00%	1,00%	-1,00%	1,00%	(-) -114 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -114 días
934	Pisos secos	45	8-10-22	29-11-22	0,00%	1,00%	-1,00%	1,00%	(-) -133 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -133 días
942	**Sótano**	**0**	**3-01-22**	**17-12-22**	**48,00%**	**49,00%**	**-2,00%**	**50,00%**	**(-) 14 días**	**Actividad Capítulo**
944	Instalaciones hidrosanitarias	30	3-01-22	5-02-22	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	Finalizado	Instalaciones hidrosanitarias: Sótano: Demolición de placa de contra piso para instalación de punto desagüe lavaojos ejes 13-14/J-K, tubería de 3" y 2" , sifones de piso red desagües lavaojos ejes 13-14/I-K, Finalizado

BOGOTÁ

SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN

SEMANA No 177 de 208 DEL 15-may-22 AL 22-may-2022

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG

Id	Actividad	Duración días	Comienzo	Fin	% programado	% Completado sem Ant	% De desviación	% completado	(-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario	Observaciones
948	Instalaciones climatización	60	3-01-22	12-03-22	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	Finalizado	Instalaciones climatización: Sótano: Armado de ductos A/C y alistado para instalación, Finalizado
952	Pisos húmedos	30	20-04-22	24-05-22	93,00%	73,00%	0,00%	93,00%	(-) 0 días	Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días
953	Aparatos sanitarios y accesorios	30	20-04-22	24-05-22	93,00%	73,00%	0,00%	93,00%	(-) 0 días	Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días
954	Sellos cortafuego	60	14-03-22	24-05-22	97,00%	25,00%	67,00%	30,00%	(+) 48 días	Atraso neto duración restante 48 días
956	Cielo rasos especiales	45	15-08-22	5-10-22	0,00%	50,00%	-55,00%	55,00%	(-) -107 días	Cielo rasos especiales: Sótano: cielo raso aluzinc batería de baño ejes 3/F-G, cielo raso aluzinc ejes 12-17/F-G, ejes 14-2/F-I, ejes 12-2/F-G, adelanto -107 días
957	Carpinteria Metálica	45	15-08-22	5-10-22	0,00%	15,00%	-15,00%	15,00%	(-) -88 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -88 días
958	Pintura	100	15-08-22	8-12-22	0,00%	10,00%	-10,00%	10,00%	(-) -92 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -92 días
959	Remates generales	70	15-08-22	3-11-22	0,00%	1,00%	-1,00%	1,00%	(-) -82 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -82 días
960	Aparatos (electricos, comunicaciones, climatización, incendio)	30	6-10-22	9-11-22	0,00%	3,00%	-3,00%	3,00%	(-) -131 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -131 días
961	Luminarias	30	15-08-22	17-09-22	0,00%	20,00%	-25,00%	25,00%	(-) -89 días	Luminarias: Sótano: luminarias ejes 17-2/I-L, ejes 23-24/H-J, luminarias zona verde vacio 4 y 5, adelanto -89 días
963	Divisiones de oficina	50	6-10-22	2-12-22	0,00%	20,00%	-25,00%	25,00%	(-) -144 días	Divisiones de oficina: Sótano: ejes 19-2/I-J, perfiles para mamparas ejes 19-2/I-J, adelanto -144 días
966	Carpinteria Madera	30	4-11-22	8-12-22	0,00%	1,00%	-1,00%	1,00%	(-) -158 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -158 días
	Exteriores F5 - Consolidado		**28-12-18**	**17-12-22**	**82,95%**	**78,40%**	**3,21%**	**79,74%**	**(+) 63 días**	**Actividad Capítulo**
373	Inst. hidro (alcantarillado cajas y pozos)	341	28-12-20	28-01-22	99,00%	99,00%	0,00%	99,00%	(-) 0 días	Con el programa, adelanto 0 días
374	Inst. hidrosanitarias (acometida)	335	28-12-20	22-01-22	99,00%	99,00%	0,00%	99,00%	(-) 0 días	Con el programa, adelanto 0 días
378	Inst. eléctricas (media tensión)	294	19-04-21	26-03-22	100,00%	99,00%	1,00%	99,00%	(+) 60 días	Atraso neto duración restante 60 días
380	Excavaciones y rellenos exteriores	294	26-04-21	2-04-22	76,00%	76,00%	0,00%	76,00%	(-) 0 días	Con el programa, adelanto 0 días
381	Cañuelas y obras de arte en concreto	249	24-05-21	9-03-22	82,00%	82,00%	0,00%	82,00%	(-) 0 días	Con el programa, adelanto 0 días
383	Vias y andenes	264	31-05-21	2-04-22	87,00%	87,00%	0,00%	87,00%	(-) 0 días	Con el programa, adelanto 0 días
974	Porteria y garita	200	25-08-21	16-04-22	100,00%	99,00%	1,00%	99,00%	(+) 38 días	Atraso neto duración restante Atraso neto duración restante 38 días
975	**Acometida agua potable Kra 60**	**0**	**3-01-22**	**27-04-22**	**100,00%**	**56,00%**	**40,00%**	**60,00%**	**(+) 49 días**	**Actividad Capítulo**
977	Demolición pavimento	45	31-01-22	23-03-22	100,00%	30,00%	70,00%	30,00%	(+) 96 días	Atraso neto duración restante 96 días
978	Excavación tuberías exteriores	45	8-02-22	31-03-22	100,00%	76,00%	20,00%	80,00%	(+) 62 días	Atraso neto duración restante Atraso neto duración restante 62 días
979	Tuberías suministro exteriores	45	16-02-22	8-04-22	100,00%	75,00%	20,00%	80,00%	(+) 54 días	Atraso neto duración restante 54 días
980	Rellenos de tuberías exteriores	45	24-02-22	19-04-22	100,00%	76,00%	20,00%	80,00%	(+) 44 días	Atraso neto duración restante Atraso neto duración restante 44 días
981	Pavimento en aceso Suppla	7	31-03-22	7-04-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 52 días	Atraso neto duración restante 52 días
982	Conexión a red principal EAAB	10	9-04-22	22-04-22	100,00%	0,00%	75,00%	25,00%	(+) 40 días	Conexión a red principal EAAB: Acometida agua potable Cra 60: Excavaciones instalación de hidrante cra 60, Atraso neto duración restante 40 días

BOGOTÁ

SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN

SEMANA No **177 de 208** DEL **15-may-22** AL **22-may-2022**

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG

Id	Actividad	Duración días	Comienzo	Fin	% programado	% Completado sem Ant	% De desviación	% completado	(-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario	Observaciones
983	obras de arte, vías y andenes	45	4-03-22	27-04-22	100,00%	30,00%	65,00%	35,00%	(+) 60 días	obras de arte, vías y andenes: Acometida agua potable Cra 60: adoquín provisional anden cra 60, Reinstalación de adoquín provisional anden cra 60, accesorio de 6" e instalación de hidrante glorieta, Atraso neto duración restante 60 días
984	Fin acometida frente kra 60	0	27-04-22	27-04-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 25 días	Atraso neto duración restante 25 días
985	**Acometida agua potable Kra 56**	**0**	**3-01-22**	**24-03-22**	**100,00%**	**77,00%**	**23,00%**	**77,00%**	**(+) 49 días**	**Actividad Capítulo**
987	Demolición pavimento	7	1-02-22	8-02-22	100,00%	15,00%	85,00%	15,00%	(+) 109 días	Atraso neto duración restante 109 días
988	Excavación tuberías exteriores	20	1-02-22	23-02-22	100,00%	95,00%	5,00%	95,00%	(+) 89 días	Atraso neto duración restante 89 días
989	Tuberías suministro exteriores	20	9-02-22	3-03-22	100,00%	95,00%	5,00%	95,00%	(+) 81 días	Atraso neto duración restante 81 días
990	Rellenos de tuberías exteriores	24	17-02-22	16-03-22	100,00%	95,00%	5,00%	95,00%	(+) 68 días	Atraso neto duración restante 68 días
991	Conexión a red principal EAAB	10	4-03-22	15-03-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 79 días	Atraso neto duración restante 79 días
992	obras de arte, vías y andenes	7	17-03-22	24-03-22	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%	(+) 63 días	Atraso neto duración restante 63 días
993	Fin acometida frente kra 56	0	24-03-22	24-03-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 59 días	Atraso neto duración restante 59 días
994	**Aguas residuales costado norte**	**0**	**3-01-22**	**6-04-22**	**100,00%**	**25,00%**	**75,00%**	**25,00%**	**(+) 70 días**	**Actividad Capítulo**
996	Excavación tuberías exteriores	20	31-01-22	22-02-22	100,00%	20,00%	80,00%	20,00%	(+) 107 días	Atraso neto duración restante 107 días
997	Pozos sumideros y cárcamos	30	8-02-22	14-03-22	100,00%	20,00%	80,00%	20,00%	(+) 96 días	Atraso neto duración restante 96 días
998	Tuberías desagües exteriores	30	16-02-22	22-03-22	100,00%	20,00%	80,00%	20,00%	(+) 88 días	Atraso neto duración restante 88 días
999	Rellenos de tuberías exteriores	30	24-02-22	30-03-22	100,00%	20,00%	80,00%	20,00%	(+) 80 días	Atraso neto duración restante 80 días
1000	Conexión a red principal IEEAB	13	23-03-22	6-04-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 60 días	Atraso neto duración restante 60 días
1001	Fin conexión aguas residuales	0	6-04-22	6-04-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 46 días	Atraso neto duración restante 46 días
1002	**Aguas lluvias costado norte**	**0**	**28-03-22**	**7-06-22**	**89,00%**	**9,00%**	**80,00%**	**9,00%**	**(+) 42 días**	**Actividad Capítulo**
1003	Excavación tuberías exteriores	20	28-03-22	22-04-22	100,00%	57,00%	43,00%	57,00%	(+) 41 días	Atraso neto duración restante 41 días
1004	Pozos sumideros y cárcamos	30	5-04-22	12-05-22	100,00%	15,00%	85,00%	15,00%	(+) 41 días	Atraso neto duración restante 41 días
1005	Tuberías desagües exteriores	30	13-04-22	20-05-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 39 días	Atraso neto duración restante 39 días
1006	Rellenos de tuberías exteriores	30	23-04-22	28-05-22	81,00%	0,00%	81,00%	0,00%	(+) 28 días	Atraso neto duración restante 28 días
1007	Cabezal de entrega	52	28-03-22	30-05-22	87,00%	0,00%	87,00%	0,00%	(+) 55 días	Atraso neto duración restante 55 días
1010	**Aguas lluvias costado nor-oriental**	**0**	**28-03-22**	**11-05-22**	**100,00%**	**30,00%**	**70,00%**	**30,00%**	**(+) 42 días**	**Actividad Capítulo**
1011	Excavación tuberías exteriores	15	28-03-22	16-04-22	100,00%	23,00%	77,00%	23,00%	(+) 51 días	Atraso neto duración restante 51 días
1012	Pozos sumideros y cárcamos	19	5-04-22	29-04-22	100,00%	76,00%	24,00%	76,00%	(+) 29 días	Atraso neto duración restante 29 días
1013	Tuberías desagües exteriores	15	13-04-22	3-05-22	100,00%	7,00%	93,00%	7,00%	(+) 38 días	Atraso neto duración restante 38 días
1014	Rellenos de tuberías exteriores	15	23-04-22	11-05-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 29 días	Atraso neto duración restante 29 días
1015	Fin aguas lluvias costado nor-oriental	0	11-05-22	11-05-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 11 días	Atraso neto duración restante 11 días
1016	**Obras exteriores (parqueadero)**	**0**	**7-03-22**	**17-12-22**	**10,00%**	**42,00%**	**-34,00%**	**44,00%**	**(-) 12 días**	**Actividad Capítulo**
1018	Instalaciones hidrosanitarias	45	11-05-22	2-07-22	21,00%	55,00%	-34,00%	55,00%	(-) 23 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto 23 días
1020	obras de arte, vías y andenes	80	3-06-22	5-09-22	0,00%	85,00%	-85,00%	85,00%	(-) -87 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -87 días
1021	Pisos exteriores	91	15-06-22	29-09-22	0,00%	30,00%	-35,00%	35,00%	(-) -58 días	Pisos exteriores: Obras exteriores (parqueadero): ángulos para instalación de piso rejilla ejes 13-16/A-B, platinas para piso en rejilla ejes 16-18/A-B, adelanto -58 días
1023	Luminarias exteriores	30	16-09-22	21-10-22	0,00%	50,00%	-50,00%	50,00%	(-) -128 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -128 días
1025	Automatización V/D, S/C, y Otros	30	21-10-22	25-11-22	0,00%	1,00%	-1,00%	1,00%	(-) -145 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -145 días
1026	Jardines y mobiliario urbano	78	16-09-22	16-12-22	0,00%	15,00%	-20,00%	20,00%	(-) -128 días	Jardines y mobiliario urbano: Obras exteriores (parqueadero): baranda sobre muro, Remate de muro cerramiento, adelanto -128 días

BOGOTÁ

SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN

SEMANA No **177 de 208** DEL **15-may-22** AL **22-may-2022**

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG

Id	Actividad	Duración días	Comienzo	Fin	% programado	% Completado sem Ant	% De desviación	% completado	(-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario	Observaciones
1029	**Obras exteriores (Volteadero)**	**0**	**25-03-22**	**17-12-22**	**21,00%**	**0,00%**	**21,00%**	**0,00%**	**(+) 42 días**	**Actividad Capítulo**
1030	Rellenos	60	25-03-22	4-06-22	80,00%	0,00%	0,00%	80,00%	(+) 0 días	Atraso neto duración restante 0 días
1031	Redes	60	2-05-22	9-07-22	30,00%	0,00%	0,00%	30,00%	(+) 0 días	Atraso neto duración restante 0 días
1037	**Obras exteriores (zonas verdes de cesión)**	**0**	**11-05-22**	**1-12-22**	**8,00%**	**0,00%**	**8,00%**	**0,00%**	**(+) 14 días**	**Actividad Capítulo**
0	Aprobación actualización plano urbanistico aprobado por curaduía (Fuente: SDCSJ)	0	2-05-22	2-05-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 20 días	Atraso neto duración restante 20 días
0	Pago acutualización plano urbanistico	0	2-05-22	2-05-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 20 días	Atraso neto duración restante 20 días
0	Radicado IDRD (U Nacional)	0	2-05-22	9-07-22	30,00%	0,00%	30,00%	0,00%	(+) 20 días	Atraso neto duración restante 20 días
0	Radicado IDU glorieta de retorno (U Nacional)	0	2-05-22	27-07-22	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	(+) 22 días	Atraso neto duración restante 22 días
0	Radicado IDU verificación plazoleta de acceso Cr 60 (CSUDC)	0	2-05-22	27-07-22	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	(+) 22 días	Atraso neto duración restante 22 días
1039	Movimiento de tierras	30	11-05-22	15-06-22	31,00%	0,00%	0,00%	31,00%	(+) 0 días	Atraso neto duración restante 0 días
1040	Conexión desagües	30	11-05-22	15-06-22	31,00%	0,00%	0,00%	31,00%	(+) 0 días	Atraso neto duración restante 0 días
1042	Obras de arte y concretos	40	20-07-22	5-09-22	0,00%	1,00%	-1,00%	1,00%	(-) -56 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -56 días
1044	Jardines y mobiliario urbano	45	16-09-22	8-11-22	0,00%	1,00%	-1,00%	1,00%	(-) -112 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -112 días
482	**TRAMITES OBTENCION DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**0**	**19-07-21**	**5-12-22**	**84,00%**	**64,00%**	**20,00%**	**64,00%**	**(+) 42 días**	**Actividad Capítulo**
484	**Tramites para servicios de EAAB**	**0**	**19-07-21**	**28-03-22**	**100,00%**	**99,00%**	**1,00%**	**99,00%**	**(+) 42 días**	**Actividad Capítulo**
493	**Permiso de ocupación de cauce ante la Secretaría de Ambiente**	**0**	**19-07-21**	**28-03-22**	**100,00%**	**97,00%**	**3,00%**	**97,00%**	**(+) 42 días**	**Actividad Capítulo**
498	trámite interno SDA (Estudio)	90	13-12-21	28-03-22	100,00%	93,00%	7,00%	93,00%	(+) 62 días	Atraso neto duración restante 62 días
499	Obtención permiso de ocupación de cauce	0	28-03-22	28-03-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 55 días	Atraso neto duración restante 55 días
513	**Trámites domiciliarias energía eléctrica CODENSA**	**0**	**19-07-21**	**5-12-22**	**63,00%**	**57,00%**	**6,00%**	**57,00%**	**(+) 56 días**	**Actividad Capítulo**
518	Tramite CODENSA aprobación proyecto serie 6	96	3-01-22	26-04-22	100,00%	75,00%	25,00%	75,00%	(+) 54 días	Atraso neto duración restante 54 días
395	Aseo general de obra	634	9-11-20	29-12-21	75,00%	74,00%	0,00%	75,00%	(-) 0 días	Aseo general de obra: Auditorio: Piso 1: Sótano: Aseo general, Sótano: Aseo general de piso ejes 7-11/A-F, Atrio: Piso 1: Limpieza de tubería y cielo raso ejes 24-29/E-G, Piso 2: Aseo general de piso, Aseo punto fijo escalera je 18-19/E-F, Piso 3: Aseo general de piso, Piso 5: Aseo general de piso, Plazoleta: Piso 1: Limpieza de estructura metálica lucarnas Suppla ay aplicación de anticorrosivo, Con el programa, adelanto 0 días
									*	R. Critica:21 días
									*	R. Critica Ant:14 días
	El porcentaje programado es 78,25% y el ejecutado es 78,28% con un adelanto de -2 días. El porcentaje de influencia de las zonas de cesión en el acumulado seria si se estuvieran ejecutando de 0,13% para un total ejecutado de 78,41%. En la presente semana se deberá radicar el proyecto para revalidación licencia urbanística (23 de mayo de 2022). El personal programado en obra es de 110 y el real es de 120.								*	Actividad Capítulo

Descripción	Oficial en obra Sem 177	Ayudante en obra Sem 177	Oficial Programado Sem 177	Ayudante programado Sem 177			
Acabados	22	10	17	11	32	28	*
Carpintería Metálica	7	0	6	4	7	10	*
Cielo	12	0	12	8	12	20	*
Climatización	2	0	3	2	2	5	*
Divisiones	16	0	1	1	16	2	*
Eléctrico	5	5	8	5	10	13	*
Estructura	20	0	2	2	20	4	*
Hidrosanitarias	7	0	4	2	7	6	*
Incendio	4	0	3	2	4	5	*

BOGOTÁ


SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN

SEMANA No **177 de 208** DEL **15-may-22** AL **22-may-2022**

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG

Id	Actividad	Duración días	Comienzo	Fin	% programado	% Completado sem Ant	% De desviación	% completado	(-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario	Observaciones
	Luminarias		6	0	1	1	6	2	*	
	Vias		2	0	0	0	2	0	*	
	Pisos		0	0	6	4	0	10	*	
	Sellos Corta fuego		2	0	3	2	2	5	*	
	Total		120,00		110,00				*	
									*	

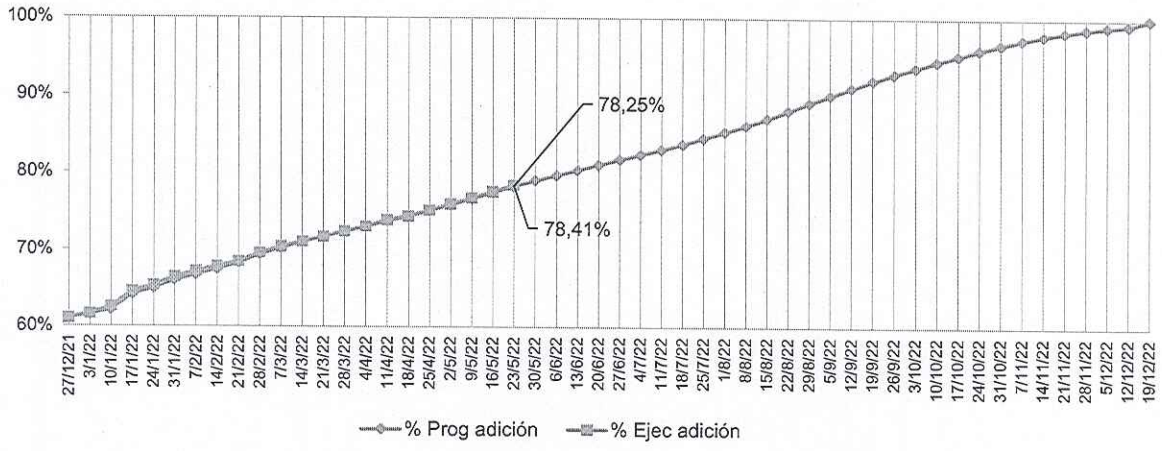

*

*

BOGOTÁ

SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN

SEMANA No **173 de 208** DEL **17-abr-22** AL **24-abr-2022**

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG

Id	Actividad	Duración días	Comienzo	Fin	% programado	% Completado sem Ant	% De desviación	% completado	(-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario	Observaciones
953	Aparatos sanitarios y accesorios	30	20-04-22	24-05-22	13,00%	2,00%	0,00%	13,00%	(-) 0 días	Avance equivalente al programado Con el programa, adelanto 0 días
954	Sellos cortafuego	60	14-03-22	24-05-22	57,00%	15,00%	32,00%	25,00%	(+) 23 días	Atraso neto duración restante 23 días
956	Cielo rasos especiales	45	15-08-22	5-10-22	0,00%	20,00%	-30,00%	30,00%	(-) -122 días	Cielo rasos especiales: Sótano: aluzinc blanco eje 17-18/I-J, aluzinc blanco eje 17-18/I-K, estructura cielo raso eje 17-18/H-J, estructura cielo raso eje 17-18/I-J, adelanto -122 días
957	Carpinteria Metálica	45	15-08-22	5-10-22	0,00%	5,00%	-5,00%	5,00%	(-) -110 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior adelanto -110 días
958	Pintura	100	15-08-22	8-12-22	0,00%	3,00%	-5,00%	5,00%	(-) -113 días	Pintura: Sótano: Estuco y pintura muro seco eje 14-16/H-I, Estuco y pintura muros eco eje 14-20/H-I, adelanto -113 días
959	Remates generales	70	15-08-22	3-11-22	0,00%	1,00%	-1,00%	1,00%	(-) -108 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior adelanto -108 días
960	Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio)	30	6-10-22	9-11-22	0,00%	3,00%	-3,00%	3,00%	(-) -158 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior adelanto -158 días
961	Luminarias	30	15-08-22	17-09-22	0,00%	4,00%	-4,00%	4,00%	(-) -109 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior adelanto -109 días
963	Divisiones de oficina	50	6-10-22	2-12-22	0,00%	10,00%	-10,00%	10,00%	(-) -162 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior adelanto -162 días
966	Carpinteria Madera	30	4-11-22	8-12-22	0,00%	1,00%	-1,00%	1,00%	(-) -185 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior adelanto -185 días
	Exteriores F5 - Consolidado		**28-12-18**	**17-12-22**	**80,45%**	**75,93%**	**3,97%**	**76,48%**	**(+) 49 días**	**Actividad Capítulo**
373	Inst. hidro (alcantarillado cajas y pozos)	341	28-12-20	28-01-22	99,00%	99,00%	0,00%	99,00%	(-) 0 días	Con el programa, adelanto 0 días
374	Inst. hidrosanitarias (acometida)	335	28-12-20	22-01-22	99,00%	99,00%	0,00%	99,00%	(-) 0 días	Con el programa, adelanto 0 días
378	Inst. eléctricas (media tensión)	294	19-04-21	26-03-22	100,00%	98,00%	1,00%	99,00%	(+) 32 días	Inst. eléctricas (media tensión): Urbanismo orient: Alistado de cinta en concreto para fundida de caja red de media tensión, Atraso neto duración restante 32 días
380	Excavaciones y rellenos exteriores	294	26-04-21	2-04-22	76,00%	76,00%	0,00%	76,00%	(-) 0 días	Con el programa, adelanto 0 días
381	Cañuelas y obras de arte en concreto	249	24-05-21	9-03-22	82,00%	82,00%	0,00%	82,00%	(-) 0 días	Con el programa, adelanto 0 días
383	Vías y andenes	264	31-05-21	2-04-22	87,00%	87,00%	0,00%	87,00%	(-) 0 días	Con el programa, adelanto 0 días
974	Porteria y garita	200	25-08-21	16-04-22	100,00%	98,00%	2,00%	98,00%	(+) 13 días	Atraso neto duración restante 13 días
975	**Acometida agua potable Kra 60**	**0**	**3-01-22**	**27-04-22**	**99,00%**	**6,00%**	**81,00%**	**18,00%**	**(+) 56 días**	**Actividad Capítulo**
977	Demolición pavimento	45	31-01-22	23-03-22	100,00%	0,00%	85,00%	15,00%	(+) 75 días	Demolición pavimento: Acometida agua potable Kra 60: Apiques para verificación de redes cra 60, Retiro adoquín sendero para continuación de excavación, Retiro de adoquín cra 60, Atraso neto duración restante 75 días
978	Excavación tuberías exteriores	45	8-02-22	31-03-22	100,00%	10,00%	85,00%	15,00%	(+) 67 días	Excavación tuberías exteriores: Acometida agua potable Kra 60: Excavación e instalación de tubería 12 " agua potable cra 60, Atraso neto duración restante 67 días
979	Tuberías suministro exteriores	45	16-02-22	8-04-22	100,00%	0,00%	85,00%	15,00%	(+) 59 días	Tuberías suministro exteriores: Acometida agua potable Kra 60: válvula de cierre 12 " agua potable cra 60, Atraso neto duración restante 59 días
980	Rellenos de tuberías exteriores	45	24-02-22	19-04-22	100,00%	0,00%	85,00%	15,00%	(+) 51 días	Atraso neto duración restante 51 días
981	Pavimento en aceso Suppla	7	31-03-22	7-04-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 24 días	Atraso neto duración restante 24 días
982	Conexión a red principal EAAB	10	9-04-22	22-04-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 15 días	Atraso neto duración restante 15 días
983	obras de arte, vías y andenes	45	4-03-22	27-04-22	93,00%	0,00%	78,00%	15,00%	(+) 42 días	obras de arte, vías y andenes: Urbanismo occReinstalación de losetas 40x40 y alistado sendero peatonal cra 60, Relleno y compactación para conformación de sendero peatonal cra 60, Adecuación de sendero peatonal cra 60, Atraso neto duración restante 42 días
985	**Acometida agua potable Kra 56**	**0**	**3-01-22**	**24-03-22**	**100,00%**	**76,00%**	**39,00%**	**61,00%**	**(+) 56 días**	**Actividad Capítulo**
987	Demolición pavimento	7	1-02-22	8-02-22	100,00%	0,00%	85,00%	15,00%	(+) 81 días	Atraso neto duración restante 81 días
988	Excavación tuberías exteriores	20	1-02-22	23-02-22	100,00%	95,00%	85,00%	15,00%	(+) 79 días	Atraso neto duración restante 79 días

BOGOTÁ

SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN

SEMANA No **173 de 208** DEL **17-abr-22** AL **24-abr-2022**

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG

Id	Actividad	Duración días	Comienzo	Fin	% programado	% Completado sem Ant	% De desviación	% completado	(-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario	Observaciones
989	Tuberías suministro exteriores	20	9-02-22	3-03-22	100,00%	95,00%	5,00%	95,00%	(+) 53 días	Atraso neto duración restante 53 días
990	Rellenos de tuberías exteriores	24	17-02-22	16-03-22	100,00%	95,00%	5,00%	95,00%	(+) 40 días	Atraso neto duración restante 40 días
991	Conexión a red principal EAAB	10	4-03-22	15-03-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 51 días	Atraso neto duración restante 51 días
992	obras de arte, vías y andenes	7	17-03-22	24-03-22	100,00%	43,00%	57,00%	43,00%	(+) 35 días	Atraso neto duración restante 35 días
993	Fin acometida frente kra 56	0	24-03-22	24-03-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 31 días	Atraso neto duración restante 31 días
994	**Aguas residuales costado norte**	**0**	**3-01-22**	**6-04-22**	**100,00%**	**25,00%**	**75,00%**	**25,00%**	**(+) 56 días**	**Actividad Capítulo**
996	Excavación tuberías exteriores	20	31-01-22	22-02-22	100,00%	20,00%	80,00%	20,00%	(+) 79 días	Atraso neto duración restante 79 días
997	Pozos sumideros y cárcamos	30	8-02-22	14-03-22	100,00%	20,00%	80,00%	20,00%	(+) 68 días	Atraso neto duración restante 68 días
998	Tuberías desagües exteriores	30	16-02-22	22-03-22	100,00%	20,00%	80,00%	20,00%	(+) 60 días	Atraso neto duración restante 60 días
999	Rellenos de tuberías exteriores	30	24-02-22	30-03-22	100,00%	20,00%	80,00%	20,00%	(+) 52 días	Atraso neto duración restante 52 días
1000	Conexión a red principal IEEAB	13	23-03-22	6-04-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 32 días	Atraso neto duración restante 32 días
1001	Fin conexión aguas residuales	0	6-04-22	6-04-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 18 días	Atraso neto duración restante 18 días
1002	**Aguas lluvias costado norte**	**0**	**28-03-22**	**7-06-22**	**38,00%**	**9,00%**	**29,00%**	**9,00%**	**(+) 21 días**	**Actividad Capítulo**
1003	Excavación tuberías exteriores	20	28-03-22	22-04-22	100,00%	57,00%	43,00%	57,00%	(+) 13 días	Atraso neto duración restante 13 días
1004	Pozos sumideros y cárcamos	30	5-04-22	12-05-22	48,00%	15,00%	33,00%	15,00%	(+) 12 días	Atraso neto duración restante 12 días
1005	Tuberías desagües exteriores	30	13-04-22	20-05-22	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	(+) 9 días	Atraso neto duración restante 9 días
1006	Rellenos de tuberías exteriores	30	23-04-22	28-05-22	1,00%	0,00%	1,00%	0,00%	(+) 0 días	Atraso neto duración restante 0 días
1007	Cabezal de entrega	52	28-03-22	30-05-22	41,00%	0,00%	41,00%	0,00%	(+) 26 días	Atraso neto duración restante 26 días
1010	**Aguas lluvias costado nor-oriental**	**0**	**28-03-22**	**11-05-22**	**58,00%**	**14,00%**	**28,00%**	**30,00%**	**(+) 21 días**	**Actividad Capítulo**
1011	Excavación tuberías exteriores	15	28-03-22	16-04-22	100,00%	23,00%	77,00%	23,00%	(+) 23 días	Atraso neto duración restante 23 días
1012	Pozos sumideros y cárcamos	19	5-04-22	29-04-22	76,00%	25,00%	0,00%	76,00%	(-) 0 días	Con el programa, adelanto 0 días
1013	Tuberías desagües exteriores	15	13-04-22	3-05-22	49,00%	7,00%	42,00%	7,00%	(+) 8 días	Atraso neto duración restante 8 días
1014	Rellenos de tuberías exteriores	15	23-04-22	11-05-22	3,00%	0,00%	3,00%	0,00%	(+) 1 días	Atraso neto duración restante 1 días
1016	**Obras exteriores (parqueadero)**	**0**	**7-03-22**	**17-12-22**	**7,00%**	**33,00%**	**-29,00%**	**36,00%**	**(-) 4 días**	**Actividad Capítulo**
1017	Instalaciones eléctricas	45	7-03-22	29-04-22	89,00%	76,00%	13,00%	76,00%	(-) 7 días	Atraso neto duración restante 7 días
1018	Instalaciones hidrosanitarias	45	11-05-22	2-07-22	0,00%	50,00%	-50,00%	50,00%	(-) -41 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior adelanto -41 días
1020	obras de arte, vías y andenes	80	3-06-22	5-09-22	0,00%	82,00%	-85,00%	85,00%	(-) -114 días	obras de arte, vías y andenes: Obras exteriores (parqueadero): Recorte de cárcamos desportillados para reparación, adelanto -114 días
1021	Pisos exteriores	91	15-06-22	29-09-22	0,00%	17,00%	-25,00%	25,00%	(-) -75 días	Pisos exteriores: Obras exteriores (parqueadero): perfiles metálicos para piso en rejilla eje 23-25/A-D, Perforación e instalación de platina para perfiles de piso en rejilla eje 13-15/A-B, piso en rejilla eje 26-28/A-B, platinas para perfiles metálicos piso rejilla eje 14-16/A-B, Perforación e instalación de platina para perfiles de piso en rejilla, Urbanismo orient: losetas de 40x40 en anden cuarto de medidores, Nivelación de zona blanda para relleno de tierra negra, adelanto -75 días
1023	Luminarias exteriores	30	16-09-22	21-10-22	0,00%	9,00%	-30,00%	30,00%	(-) -148 días	Luminarias exteriores: Obras exteriores (parqueadero): Cableado e izado de postes de iluminación, Urbanismo norte: Fundida d pedestal para postes de alumbrado público, sendero peatonal eje 3-8/A, Montaje de postes alumbrado sendero garitas eje 30/A, Urbanismo orient: Alambrado para montaje de postes alumbrado en parqueaderos, adelanto -148 días
1025	Automatización V/D, S/C, y Otros	30	21-10-22	25-11-22	0,00%	1,00%	-1,00%	1,00%	(-) -171 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior adelanto -171 días
1026	Jardines y mobiliario urbano	78	16-09-22	16-12-22	0,00%	2,00%	-2,00%	2,00%	(-) -139 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior adelanto -139 días
1029	**Obras exteriores (Volteadero)**	**0**	**25-03-22**	**17-12-22**	**8,00%**	**0,00%**	**8,00%**	**0,00%**	**(+) 21 días**	**Actividad Capítulo**

BOGOTÁ

SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN

SEMANA No 173 de 208 DEL **17-abr-22** AL **24-abr-2022**

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG

Id	Actividad	Duración días	Comienzo	Fin	% programado	% Completado sem Ant	% De desviación	% completado	(-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario	Observaciones
1030	Rellenos	60	25-03-22	4-06-22	40,00%	0,00%	40,00%	0,00%	(+) 28 días	Atraso neto duración restante 28 días
1037	**Obras exteriores (zonas verdes de cesión)**	**0**	**11-05-22**	**1-12-22**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**(-) 0 días**	**Actividad Capítulo**
1042	Obras de arte y concretos	40	20-07-22	5-09-22	0,00%	1,00%	-1,00%	1,00%	(-) -83 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior adelanto -83 días
1044	Jardines y mobiliario urbano	45	16-09-22	8-11-22	0,00%	1,00%	-1,00%	1,00%	(-) -138 días	No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior adelanto -138 días
482	**TRAMITES OBTENCION DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**0**	**19-07-21**	**5-12-22**	**84,00%**	**81,00%**	**20,00%**	**64,00%**	**(+) 21 días**	**Actividad Capítulo**
484	**Tramites para servicios de EAAB**	**0**	**19-07-21**	**28-03-22**	**100,00%**	**99,00%**	**1,00%**	**99,00%**	**(+) 21 días**	**Actividad Capítulo**
493	**Permiso de ocupación de cauce ante la Secretaria de Ambiente**	**0**	**19-07-21**	**28-03-22**	**100,00%**	**97,00%**	**3,00%**	**97,00%**	**(+) 21 días**	**Actividad Capítulo**
498	trámite interno SDA (Estudio)	90	13-12-21	28-03-22	100,00%	93,00%	7,00%	93,00%	(+) 34 días	Atraso neto duración restante 34 días
499	Obtención permiso de ocupación de cauce	0	28-03-22	28-03-22	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	(+) 27 días	Atraso neto duración restante 27 días
513	**Trámites domiciliarias energía eléctrica CODENSA**	**0**	**19-07-21**	**5-12-22**	**62,00%**	**57,00%**	**5,00%**	**57,00%**	**(+) 35 días**	**Actividad Capítulo**
518	Tramite CODENSA aprobación proyecto serie 6	96	3-01-22	26-04-22	98,00%	75,00%	23,00%	75,00%	(+) 26 días	Atraso neto duración restante 26 días
395	Aseo general de obra	634	9-11-20	29-12-21	72,00%	71,00%	0,00%	72,00%	(-) 0 días	Aseo general de obra: Piso 6: Piso 5: Piso 4: Piso 3: Piso 2: Aseo general de piso, Sótano: Lavado de piso con maquina eje 13-14/A-C, Con el programa, adelanto 0 días
									*	R. Critica:0 días
									*	R. Critica Ant:0 días

El porcentaje programado es 75,13% y el ejecutado es 75,16% con un adelanto de -2 días. *

En la presente semana se dio inicio a las demoliciones de andén para conexión de redes de servicios públicos en la carrera 60, corrigiendo la afectación en ruta crítica reportada en los informes anteriores.

La afectación de ruta crítica del proyecto se centra en la construcción de redes exteriores de aguas lluvias en el costado nor-oriental y La aprobación de planos serie 6 ante condesa que influencia la terminación de instalación de luminarias exteriores en las zonas de sesión.

La afectación de ruta crítica en zonas de sesión se vería mitigada con el cumplimiento de la meta fijada la semana pasada relacionada con el recibo de la actualización del plan urbanístico aprobado por curaduría para el 2 de mayo de 2022 que permitiría la iniciación de movimientos de tierra en esta área de acuerdo a lo programado.

El personal programado en obra es de 112 y el real es de 113.

Descripción	Oficial en obra Sem 173	Ayudante en obra Sem 173	Oficial Programado Sem 173	Ayudante programado Sem 173
Acabados	26	12	14	10
Carpintería Metálica	9	0	5	3
Cielo	9	0	10	6
Climatización	0	0	4	2
Divisiones	15	0	0	0
Eléctrico	3	2	5	3
Estructura	15	0	4	3
Fachada	0	0	1	1
Hidrosanitarias	7	1	11	7
Incendio	2	0	4	2
Luminarias	8	0	0	0
Vias	2	0	1	1
Pisos	0	0	2	2
Lucarnas	2	0	1	0
Sellos Corta fuego	0	0	6	4
Total	113,00		112,00	

*


BOGOTÁ


SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN

SEMANA No **173 de 208** DEL **17-abr-22** AL **24-abr-2022**

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG

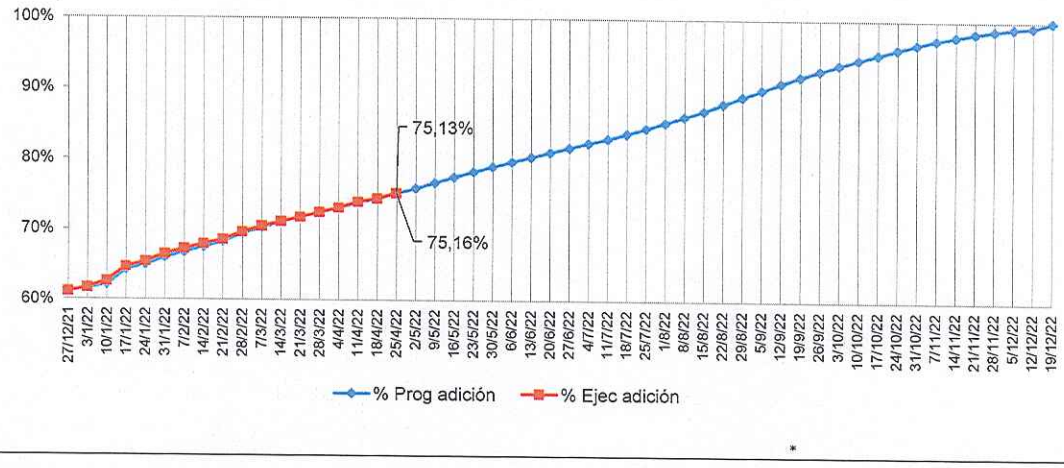Id	Actividad	Duración días	Comienzo	Fin	% programado	% Completado sem Ant	% De desviación	% completado	(-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario	Observaciones
*										

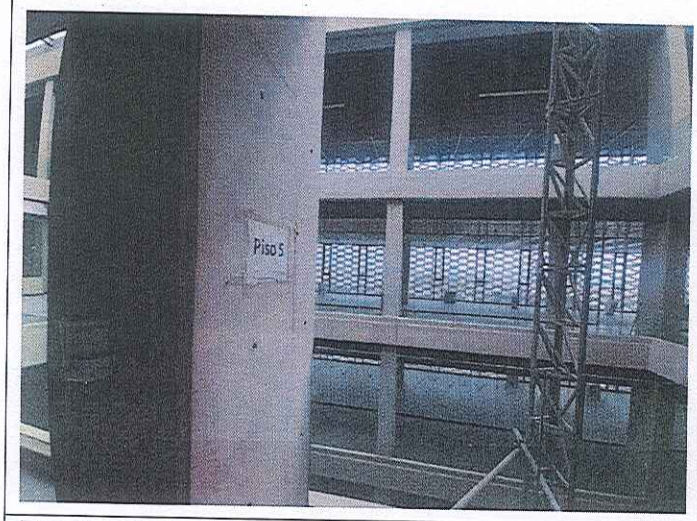


DETALLES ZONA CENTRAL, PISOS SUPERIORES FINALIZADOS



ESTADO ACTUAL DE LA CUBIERTA, ZONA FINALIZADA



PUNTO FIJO, MARQUESINSA, ILUMINACION CENTRAL, LUZ NATURAL FINALIZADA

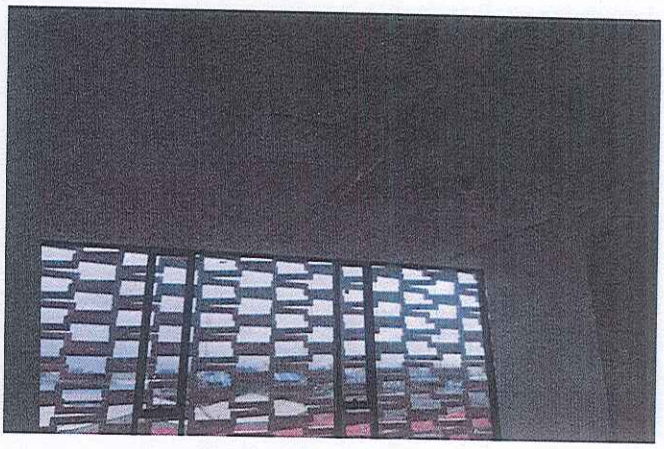


DETALLE DESDE EL INTERIOR DE LA FACHADA, DOBLE PIEL, ELEMENTOS EN ARCILLA



CIELORRASO EN MADERA, SOBRE ALGUNAS OFICINAS



SECUENCA DE INSTALACION CIELORRASO EN MADERA

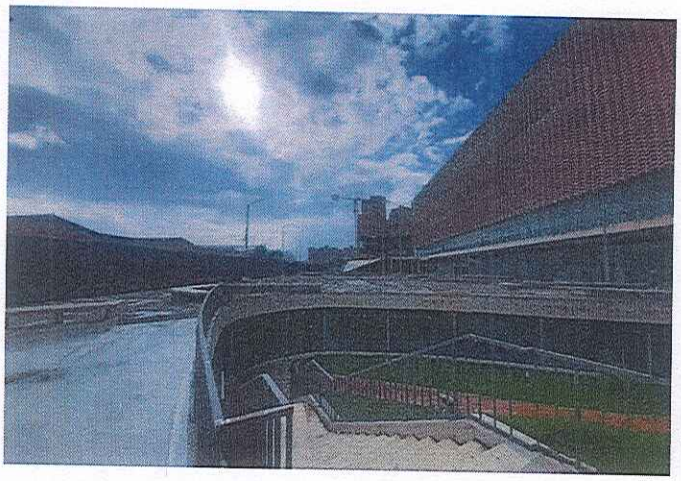

VISTA GENERAL ZONA DE PLAZOLETA



PARTE INFERIOR DEL SOTANO, SIJIN EN ACTIVIDAD DE ACABADOS FINALES






MAMPARAS, EN PROCESO ZONA DE DIJIN



ACTIVIDADES DE ACABADOS FINALES DIJIN



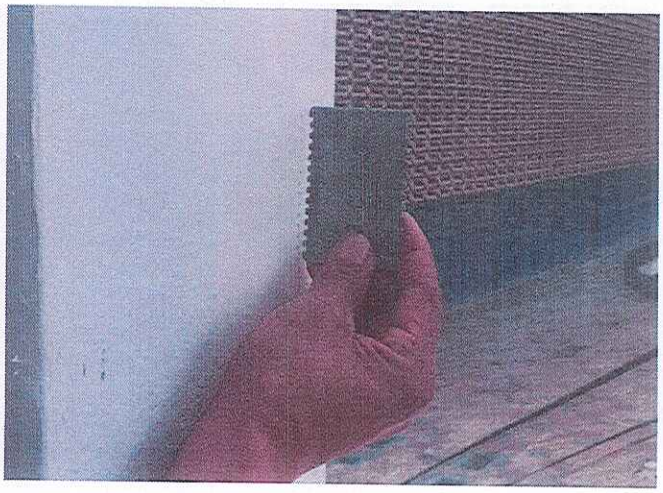

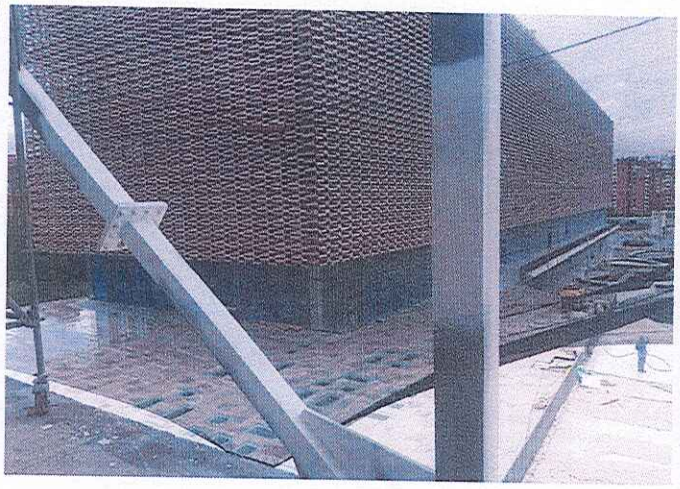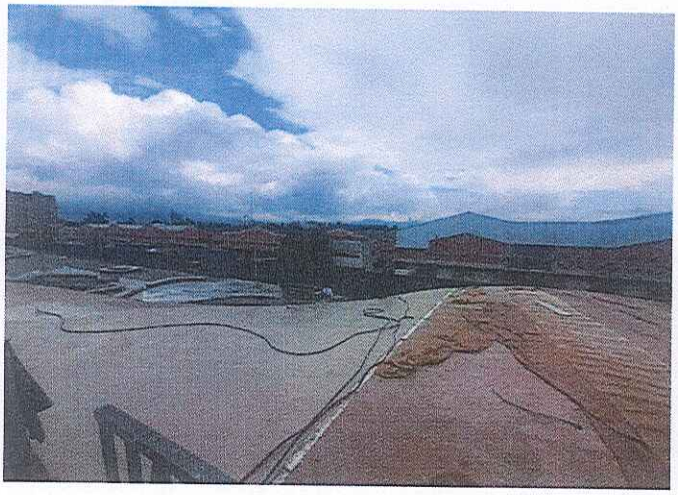CUPULA EN CONCRETO, FINALIZADA,	VERIFICACION ESPESOR PINTURA PROTECCION CONTRA EL FUEGO ZONA AUDITORIO
	
VISTA APLICACIÓN PINTURA ANTIFUEGO (INTUMECENTE) ADITORIO	VISTA PLAZOLETA DE ARMAS, AL FONDO TORRE DE LA IGLESIA
	
CASCARON DE CONCRETO O CUPULA FINALIZADA	FACHADA SUR OCCIDENTAL, TERMINADA
	

ELEMENTO ARQUITECTONICO QUE SE DESTACA, POR SU GEOMETRIA Y COMPLEJIDAD CONSTRUCTIVA, LO CUAL RESALTA	ESTE ELEMENTO ARQUITECTONICO, LOCALIZADO SOBRE EL FUTURO ACCESO A LA IGLESIA Y EL AUDITORIO.

MEBOG

Id	Nombre de tarea	% Prog	% Ejec
936	Rellenos de tuberías exteriores	100,00%	95,00%
937	Conexión a red principal EAAB	100,00%	0,00%
938	obras de arte, vías y andenes	100,00%	50,00%
939	Fin acometida frente kra 56	100,00%	0,00%
940	**Aguas residuales costado norte**	**100,00%**	**25,00%**
942	Excavación tuberías exteriores	100,00%	20,00%
943	Pozos sumideros y cárcamos	100,00%	20,00%
944	Tuberías desagües exteriores	100,00%	20,00%
945	Rellenos de tuberías exteriores	100,00%	20,00%
946	Conexión a red principal IEEAB	100,00%	0,00%
947	Fin conexión aguas residuales	100,00%	0,00%
948	**Aguas lluvias costado norte**	**89,00%**	**9,00%**
949	Excavación tuberías exteriores	100,00%	57,00%
950	Pozos sumideros y cárcamos	100,00%	15,00%
951	Tuberías desagües exteriores	100,00%	0,00%
952	Rellenos de tuberías exteriores	81,00%	0,00%
953	Cabezal de entrega	87,00%	0,00%
956	**Aguas lluvias costado nor-oriental**	**100,00%**	**30,00%**
957	Excavación tuberías exteriores	100,00%	23,00%
958	Pozos sumideros y cárcamos	100,00%	76,00%
959	Tuberías desagües exteriores	100,00%	7,00%
960	Rellenos de tuberías exteriores	100,00%	0,00%
961	Fin aguas lluvias costado nor-oriental	100,00%	0,00%
962	**Obras exteriores (parqueadero)**	**10,00%**	**44,00%**
964	Instalaciones hidrosanitarias	21,00%	55,00%
966	obras de arte, vías y andenes	0,00%	85,00%
967	Pisos exteriores	0,00%	35,00%
969	Luminarias exteriores	0,00%	50,00%
971	Automatización V/D, S/C, y Otros	0,00%	1,00%
972	Jardines y mobiliario urbano	0,00%	20,00%
975	**Obras exteriores (Volteadero)**	**21,00%**	**0,00%**
976	Rellenos	80,00%	0,00%
977	Redes	30,00%	0,00%
983	**Obras exteriores (zonas verdes de cesión)**	**8,00%**	**0,00%**
991	Aprobación actualización plano urbanistico aprobado por curaduía (Fuente: SDCSJ)	100,00%	0,00%
992	Pago acutualización plano urbanistico	100,00%	0,00%
993	Radicado IDRD (U Nacional)	30,00%	0,00%
999	Radicado IDU glorieta de retorno (U Nacional)	25,00%	0,00%
1000	Radicado IDU verificación plazoleta de acceso Cr 60 (CSUDC)	25,00%	0,00%
1002	Inicio	100,00%	0,00%
1003	Movimiento de tierras	31,00%	0,00%
1004	Conexión desagües	31,00%	0,00%
1006	Obras de arte y concretos	0,00%	1,00%
1008	Jardines y mobiliario urbano	0,00%	1,00%
1011	**TRAMITES OBTENCION DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**84,00%**	**64,00%**
1022	**Tramites para servicios de EAAB**	**100,00%**	**99,00%**
1031	**Permiso de ocupación de cauce ante la Secretaria de Ambiente**	**100,00%**	**97,00%**
1036	trámite interno SDA (Estudio)	100,00%	93,00%
1037	Obtención permiso de ocupación de cauce	100,00%	0,00%
1051	**Trámites domiciliarias energía eléctrica CODENSA**	**63,00%**	**57,00%**
1056	Tramite CODENSA aprobación proyecto serie 6	100,00%	75,00%
1077	Aseo general de obra	75,00%	75,00%

