	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	4
		Vigencia	17/12/2021

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	6/07/2022	**PERIODO REPORTADO DEL:**	5/06/2022	**AL:**	6/07/2022
CONTRATO Nº	027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022	**CONTRATISTA**	INGEBLAR SAS		
OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE				
FECHA DE INICIO	16/05/2022	**FECHA DE TERMINACIÓN**	31/07/2022		
VALOR INICIAL	$ 179.304.253,93	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 179.304.253,93				

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO FUE EL DIA 29 DE ABRIL DE 2022 EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO, EL NUMERO DE POLIZA ES EL No. 21-44-101381551 DE SEGUROS DEL ESTADO S.A, POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 21-40-101186834 DE SEGUROS DEL ESTADO S.A, EL ACTA DE INICIO FUE FIRMADA EL DIA 16 DE MAYO DE 2022.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
N/A	N/A	PINTURA EN VINILO TIPO 1	4 CANECAS	CARRETILLA	1	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	2	**100**	**100**	SI	**N/A**
N/A	N/A	PINTUTA EPOXICA	2 CANECAS	ANDAMIOS CERTIFICADOS	4	INSPECTORA SST	1	**100**	**100**	SI	**N/A**
N/A	N/A	CIELO RASO EN PVC	480 M2	TALADROS	2	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	1	**100**	**100**	SI	**N/A**
N/A	N/A	ESTUCO PLASTICO	1 CANECA	PULIDORA	1	OFICIAL DE OBRA	2	**100**	**100**	SI	**N/A**
N/A	N/A	LUMINARIAS LED CUADRADA DE 60 X 60	70	HERRAMIENTA MENOR	VARIOS	AYUDANTE DE OBRA	2	**100**	**100**	SI	**N/A**
N/A	N/A	LUMINARIA REDONDA	24	ESCALERA	1						
N/A	N/A	BLOQUE No.5	50	MEZCLADORA	1						
N/A	N/A	TRITURADO DE 1/2	3 M3	VIBRO-COMPACTADOR	1						
N/A	N/A	ARROCILLO	3 M3	FORMALETA	1						
N/A	N/A	CEMENTO	50 BULTOS								
						TOTAL	8				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)	80,18%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 1	3,32%	**80,18%**	**80,15%**	**0,03%**
Semana 2	5,07%			
Semana 3	18,18%			
Semana 4	8,14%			
Semana 5	14,56%			
Semana 6	11,55%			
Semana 7	10,04%			
Semana 8	9,32%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA
















AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**80,15%**
EJECUTADO		**80,18%**

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
2. MAMPOSTERIA	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**70,00%**
3. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**

4. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		90,00%
5. PAÑETES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
6. CIELORRASO	PROGRAMADO		79,00%
	EJECUTADO		90,00%
7. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		30,00%
8. ACABADOS DE MUROS PINTURA Y ENCHAPES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		85,00%
9. CARPINTERIA EN MADERA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		25,00%
10. CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		25,00%
11. CUBIERTA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
12. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
13. URBANISMO	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
14. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		60,00%

5- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	77	52	25
Proyección	77	52	25

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
52	1	30/07/2022

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

1,1 DESMONTE DE CIELORRASO, INCLUYE RETIRO / 1,2 REMOCION (DEMOLICION) DE ACABA DOS DE PISO Y PAREDES, INCLUYEW RETIRO / 1,3 DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES, INLCUYE RETIRO / 1,4 DEMOLICION DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL / 1,6 DESMONTE DE MESONES DE BAÑOS EN ACRILICO, INCLUYE LAVAMANOS Y GRIFERIA / 1,7 DEMOLICION DE POYOS DUCHAS, INCLUYE RETIRO / 1,8 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS REGATA DE 1" EN PÍSO INLCUYE MONTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTE / 5,1 MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5 E_ 0,15 MTS (0,33X0,115X0,23)MTS / 7,3,1 SUMINISTRO E INTALACION DE LUMINARIAS LED REDONDA / 7,3,2 SUMINSTRO E INTALACION DE LUMINARIA LED PANEL DE 60 X 60 40 W / 13,2 PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES) / 13,3 VINILO TIPO 1, 3 MANOS (INCLUIYE FILOS Y DILATACIONES) / 23,1 CONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI / 12,2 ALISTADO DE PISO EN CONCRETO DE 3500 PSI / REVISION Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
N/A	SI		NO	

OBSERVACIONES: NO SE PRESENTAN ATRASOS DE ITEM EN OBRA

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 179.304.253,93	$ 179.304.253,93	$ 143.766.150,80	80,18%	$ 35.538.103,13	20%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 179.304.253,93	$ 179.304.253,93				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 179.304.253,93	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 179.304.253,93	

ANTICIPO (Si aplica)	$ 0,00	
PRIMER PAGO PAC JULIO 2022	$ 0,00	Se pasaron documentos de pagos mediante factura No. E18 del 16 de junio de 2022, por valor de $ 64.467.495,37
PAGO FINAL PAC AGOSTO 2022	$ 0,00	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0,00	

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI	SI		
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI	SI		
PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES	SI	SI		
PRESENTACION ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	SI	SI		

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

ESTA PENDIENTE POR REALIZAR UNA ADICION AL CONTRATO POR VALOR DE $ 10.695.746,07 CON EL FIN DE EJECUTAR ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL 100% DEL CONTRATO.

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

SE HAN PRESENTADO LLUVIAS CASI 65 PORCIENTO DEL TIEMPO A CORTE DESDE EL ACTA DE INICIO DEL 16 DE MAYO A 5 DE JULIO DE 2022, PRESENTANDO LLUVIAS EXTREMAS EN LA MAÑANA O EN LA TARDE, ESTO DIFICULTANDO LA INCIACION DE LAS ACTIVIDADES.

ELABORO:	REVISO:
CT. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO Residente de Interventoria/Supervisor Firma y Posfirma	Director de Interventoria Firma y Posfirma

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PERIODO REPORTADO


















LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	**X**		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	**X**		
7	Evidencias de ejecución de las actividades			

	contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			NO APLICA DURANTE EL LAPSO INFORMADO
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			CONTRATO EN EJECUCION

CT. SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO
Supervisor Contrato

CIUDAD: YOPAL
FECHA: 7 DE JUNIO DE 2022

PERSONAL
RESIDENTE: 1 : JEYSON LEONARDO FONSECA ROJAS
RESIDENTE: 2 : JUDITH ANAYA MEJIA
INSPECTOR SST : LINA CATALINA PUENTES
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO: CARLOS DIAL PUENTES
DOS OFICIALES Y TRES AYUDANTES

SE INICIAN LABORES A LAS 7:30 AM, PRESENTANDO UN DIA SOLEADO, SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES DE CIELO RASO EN PVC E INSTALACION DE LUMINARIAS, CON CAMBIO DE TUBERIA A EMT, CON CAMBIO DE CABLEADO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ZONA DE PASILLO DE AMBULANCIA, AL MISMO SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES DE PINTURA VINILO TIPO -1 EN PASILLO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO HASTA RECEPCION, CON SUS RESPECTIVAS RESANES EN ENCHAPE.

SIENDO LAS 12:00 PM SE DA PAUSA A LAS ACTIVIDADES POR MOTIVO DE HORA DEL ALMUERZO.

SIENDO LAS 2:00 PM SE REINICIAN LAS ACTIVIDADES, CONTINUANDO CON LAS MISMAS ACTIVIDADES, SIN PRESENTAR CAMBIOS EN EL CLIMA NI PERSONAL

SIENDO LAS 5:00 PM SE DA POR TERMINADO LAS ACTIVIDADES DE LA JORNADA LABORAL.

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

Scanned with CamScanner

CIUDAD: YOPAL.
FECHA: 8 DE JUNIO DE 2022

PERSONAL
RESIDENTE 1: JEYSON LEONARDO TORRES ROJAS
RESIDENTE 2: JULIETH ANAYA MEJIA.
INSPECTORA SST: LINA OTALORA LOPEZ.
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO: CARLOS DIAZ PUENTES
DOS OFICIALES Y TRES AYUDANTES

SE INICIAN LABORES A LAS 7:30 A.M. PRESENTANDO UN DIA SOLEADO SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES DE CIELO RASO EN PVC E INSTALACION DE LUMINARIAS, CON CAMBIO DE TUBERIA A MT, CON CAMBIO DE CABLEADO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICA EN ZONA DE SALA DE ESPERA, ASI MISMO SE CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE PINTURA VINILO TIPO-1 EN PASILLO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO HASTA RECEPCION, CON DOS RESPECTIVOS RESANES EN ESTUCO.

SIENDO LAS 12:00 PM. SE DA PAUSA A LAS ACTIVIDADES POR MOTIVO DE HORA DE ALMUERZO.

SIENDO LAS 2:00 PM SE REINICIAN LAS ACTIVIDADES, CONTINUANDO CON LAS MISMAS ACTIVIDADES, SIN PRESENTAR CAMBIOS EN EL CLIMA NI PERSONAL.

SIENDO LA 5:00 PM. SE DA POR TERMINADO LAS ACTIVIDADES DE LA JORNADA LABORAL.

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

Scanned with CamScanner

CIUDAD : YOPAL CASANARE
FECHA : 09 JUNIO 2022

PERSONAL:
RESIDENTE 1: JEYSON FORERO ROJAS
RESIDENTE 2: JULIETH ANAYA MEJIA
INSPECTOR SISO : LINA OTALORA LOPEZ
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO: CARLOS DIAZ PUENTES
DOS OFICIALES Y TRES AYUDANTE

SE INICIA LABORES A LAS 7:30 AM, PRESENTANDO UN AIA DESEADO SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD. DE CIELO RASO EN PVC, E INSTALACION DE LUMINARIAS, CAMBIO DE TUBERIA PVC A EMT, CAMBIO DE CABLEADO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ZONA DE PASILLO DE AMBULANCIA, SALA DE ESPERA, ASI MISMO SE CONTINUAN CON RESANES NECESARIOS EN PASILLO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO HASTA, RECEPCION, APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO 1

SIENDO LAS DOCE 12:00 PM SE PAUSAN ACTIVIDADES POR MOTIVO DE HORA DE ALMUERZO.

SIENDO LAS 2:00 PM SE REINICIAN ACTIVIDADES CONTINUANDO CON LAS MISMAS, SIN PRESENTAR CAMBIOS EN EL CLIMA NI EL PERSONAL

SIENDO LAS 5PM SE DAN POR TERMINADA LA JORNADA LABORAL.

Residente de obra

Supervisor de obra

Scanned with CamScanner

CIUDAD: YOPAL CASANARE
FECHA: 10 JUNIO 2020.

PERSONAL:
RESIDENTE 1: JEYSON FORERO ROJAS
RESIDENTE 2.: JULIETH ANAYA MEJIA.
INSPECTOR SISO: LINA OTALORA LOPEZ.
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO.: CARLOS DIAZ FUENTES.
DOS OFICIALES Y DOS AYUDANTE:

SE INICIAN LABORES A LAS 7:30 AM, PRESENTANDO UN DIA LLUVIOSO, SE CONTINUAN LABORES DE MONTAJE DE CIELO RASO PVC, DESMONTAJE DE DRYWALL, AREA DE ESPERA, E INTALACION DE LUMINARIAS, CAMBIO DE TUBERIA A EMT, CON CAMBIO DE CABLEADO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS, ASI MISMO SE CONTINUAN ACTIVIDADES DE PINTURA VINICO TIPO 1, CON SUS RESPECTIVOS RESANES EN ESTUCO.

SIENDO LAS 12:00 PM SE DA PAUSA A LAS ACTIVIDADES POR MOTIVO DE HORA DE ALMUERZO.

SIENDO LAS 2:00PM SE REINICIAN LAS ACTIVIDADES, CONTINUANDO CON LAS MISMAS ACTIVIDADES, SIN PRESENTAR CAMBIOS EN EL PERSONAL, A LAS 3 PM SE PARAPON ACTIVIDADES POR SIMULACRO ORGANIZADO EN EL AREA POR FUERZA AEREA, SE INICIAN A LAS 4:PM, ACTIVIDADES

SE CIERRAN ACTIVIDADES A LAS 5:00 PM.

Residente de obra

Supervisor de obra

Scanned with CamScanner

CIUDAD : YOPAL CASANARE
FECHA = 11 JUNIO 2022

Personal
Residente 1 : Jeyson Forero Rojas
Residente 2. JuGeth Anaya Mejia
Inspector SISO : Jins otalora lopez
Supervisor administrativo : Carlos Diaz Puentes
Dos oficiales y dos ayudantes

Se inician actividades a las 7:30 am, presentando un dia soleado, Se continua con las actividades de instalacion cielo raso PVC, instalación de luminarias, cambio tuberia a EMT con cambio de cableado, en zona de sala de espera, asi mismo continuan con resanes en estuco, y actividades de pintula unilo tipo 1.

Siendo las 2:00pm se finalizan actividades, dando por terminada la jornada laboral

Residente de obra

Supervisor de obra

Scanned with CamScanner

CIUDAD: YOPAL CASANARE.
FECHA: 13 JUNIO 2022.

PERSONAL
Residente 1: Jeyson Forero Rojas.
Residente 2: Julieth Anaya Mejia
Inspector SISO: Lina otalora
Supervisor Administrativo: Carlos Diaz Puentes
Dos oficiales y dos ayudantes.

Se inician labores a las 7:30 am presentando un dia lluvioso, se continua con actividades de montaje de cielo raso PVC, instalación de luminarias, cambio Tuberia a EMT, con cambio de cableado segun especipicaciones técnicas en baños y zona de procedimientos, asi mismo se continuan actividades de pintura vinilo tipo I, con sus respectivos resanes. en estuco.

Siendo las 12:00 pm se pausan actividades por hora de almuerzo.

A Las 2:00 pm se continuan las mismas actividades, sin presentar cambios en el personal, ni el clima.
Se da por finalizada la jornada laboral a las 5:00 pm.

Residente de obra

Supervisor de obra.

Scanned with CamScanner

Ciudad : Yopal Casanare
Fecha : 14 Jun 2022

Personal
Residente 1 : Deyson Forero Rojas.
Residente 2 : Julieth Anaya Mejia
Inspector SISO: Lina otalora Lopez
Supervisor Administrativo : Carlos Diaz Puentes
Dos oficiales y dos ayudantes

SE INICIAN LABORES A LAS 7:30 AM, PRESENTANDO UN DIA SOLEADO SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE MONTAJE DE CIELO RASO EN PVC, INSTALACION DE LUMINARIAS CON CAMBIO DE TUBERIA EMT, CON CAMBIO DE CABLEADO ELECTRICO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS, EN PUNTO DENOMINADO, BAÑOS DE MUJERES Y HOMBRES, TAMBIEN EN CAFETERIA, ASI MISMO SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE PINTURA DE MURO TIPO 1, CON SUS RESPECTIVOS RESANES EN ESTUCO EN PUNTOS DE RECEPCION Y PASILLO.

SIENDO LAS 12:00 PM SE PAUSAN ACTIVIDADES POR MOTIVO DE HORA DE ALMUERZO.

SIENDO LAS 2:00 PM SE CONTINUAN LAS MISMAS ACTIVIDADES, SIN PRESENTAR CAMBIO EN EL PERSONAL, NI EN EL CLIMA.

SE DA POR FINALIZADA LA JORNADA LABORAL A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE DE OBRA

OPERADOR DE OBRA

Scanned with CamScanner

CIUDAD: YOPAL CASANARE
FECHA: 15 DE JUNIO DE 2022

PERSONAL
RESIDENTE 1: JEYSON LEONARDO FONSECA ROJAS
RESIDENTE 2: JULIETH ANAYA MEJIA
INSPECTOR SISO: LINA OTALORA LOPEZ
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO: CARLOS DIAZ FUENTES
DOS OFICIALES Y DOS AYUDANTES

SE INICIAN LABORES A LAS 7:30AM, PRESENTANDO UN DIA SOLEADO SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE MONTAJE DE CIELO RASO EN PVC, INSTALACION DE LUMINARIA CON CAMBIO DE TUBERIA A EMT. CON CAMBIO DE CABLEADO ELECTRICO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS, EN PUNTO DENOMINADO, BAÑOS DE MUJERES Y HOMBRES, TAMBIEN EN CAFETERIA, DE SI MISMO SE CONTINUA LAS ACTIVIDADES DE PINTURA EN MURO TIPO 1, CON SU RESPECTIVOS RESANES EN ESTUCO EN PUNTOS DE RECEPCION Y PASILLO.

SIENDO LAS 1:2800 PM SE PAUSAN ACTIVIDADES POR MOTIVO DE HORA DE ALMUERZO

SIENDO LAS 2:00 PM. SE CONTINUAN LAS MISMAS ACTIVIDADES, SIN PRESENTAR CAMBIOS EN EL PERSONAL, NI EN EL CLIMA.

SE DA POR TERMINADA LA JORNADA LABORAL A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

Scanned with CamScanner

CIUDADAD : YOPAL CASANARE
FECHA : 16 DE JUNIO DE 2022

PERSONAL
RESIDENTE 1 : JEYSON LEONARDO TORRES ROJAS
RESIDENTE 2 : JUDITH ARANA MEJIA
INSPECTOR SISO : LAURA CATALINA LOPEZ
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO : CARLOS DIAZ PUENTES
DOS OFICIALES Y 3 AYUDANTES

SE INICIAN LABORES A LAS 7:30 AM, PRESENTANDO UN DIA SOLEADO, SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE MONTAJE DE CIELO RASO EN PVC, INSTALACION DE LUMINARIAS, CON CAMBIO DE TUBERIA A EMT, CON CAMBIO DE CABLEADO ELECTRICO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS, EN PUNTO DENOMINADO DEPOSITO - LABORATORIO, LABORATORIO HEMATOLOGIA Y RECEPCION TOMA DE MUESTRAS ASI MISMO SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE PINTURA EN VINILO TIPO 1, CON SUS RESPECTIVOS RESANES EN ESTUCO EN PUNTOS DE PASILLO DE SALA DE ESPERA.

SIENDO LAS 12:00 SE PAUSAN ACTIVIDADES POR MOTIVO DE HORA DE ALMUERZO.

SIENDO LAS 2:00 PM SE CONTINUA CON LAS MISMAS ACTIVIDADES, SIN PRESENTAR CAMBIOS EN EL PERSONAL, NI EN EL CLIMA

SE DA POR TERMINADA LA JORNADA LABORAL A LAS 5:00 PM

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

Scanned with CamScanner

CIUDAD: YOPAL CASANARE
FECHA: 17 DE JUNIO DE 2022

PERSONAL:
RESIDENTE 1: JEYDUN FERNANDO FONSECA ROJAS.
RESIDENTE 2: JULIETH ANAYA MEJIA.
INSPECTOR SISO: LINA OTALORA LOPEZ.
SUPERVISION ADMINISTRATIVO: CARLOS DIAZ FUENTES.
DOS OFICIALES Y 3 AYUDANTES.

SE INICIAN LABORES A LAS 7:30 AM, PRESENTANDO UN DIA NUBLADO. DE 7:30 A 9:30 AM., SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE MONTAJE DE CIELO RASO EN PVC, INSTALACION DE LUMINARIAS, CON CAMBIO DE TUBERIA A EMT, CON CAMBIO DE CABLEADO ELECTRICO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS, EN PUNTO DENOMINADO DEPOSITO - LABORATORIO, LABORATORIO HEMATOLOGIA Y RECEPCION TOMA DE MUESTRAS Y ASI MISMO SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE PINTURA EN MURO TIPO 1, CON SUS RESPECTIVOS RESANES EN ESTUCO EN PUNTOS DE PASO DE SALA DE ESPERA.

SIENDO LAS 1:2000 SE PAUSAN ACTIVIDADES POR MOTIVO DE HORA DE ALMUERZO.

SIENDO LAS 2:00 PM., SE CONTINUA CON LAS MISMAS ACTIVIDADES, Y SE INICIA CON LA INSTALACION DE DESEMBOS DESCOLABLES DE TABLETA DE PISO, NO SE PRESENTAN CAMBIOS EN EL PERSONAL, NI EN EL CLIMA.

SE DA POR TERMINADA LA JORNADA LABORAL A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISION DE OBRA

Scanned with CamScanner

CIUDAD: YOPAL CASANARE
FECHA: 18 DE JUNIO DE 2022

PERSONAL
RESIDENTE 1: JEYSON LEONARDO FONSECA REYES
RESIDENTE 2: JULIETH ANDREA MEJIA
INSPECTOR SISO: LINA OTALORA LOPEZ
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO: CARLOS DIAZ FUENTES
DOS OFICIALES Y 3 AYUDANTES

SE INICIAN LABORES A LAS 7:30 AM, PRESENTANDO UN DIA SOLEADO, SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE MONTAJE DE CIELO RASO EN PVC, INSTALACION DE LUMINARIAS, CON CAMBIO DE TUBERIA A EMT, CON CAMBIO DE CABLEADO ELECTRICO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS, EN PUNTO DENOMINADO DEPOSITO - LABORATORIO, LABORATORIO HEMATOLOGIA Y RECEPCION-TOMA DE MUESTRAS, A SU MISMO SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 CON SUS RESPECTIVAS RESANES DE ESTUCO EN PUNTOS DE PINTURA, ASI MISMO SE INICIA LA ACTIVIDAD DE INSTALACION DE MURO EN BLOQUE EN ZONA DE VACUNACION.

SIENDO LAS 12:00 PM. SE DA POR TERMINADA LA JORNADA LABORAL.

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

Scanned with CamScanner

CIUDAD: YOPAL CASANARE
FECHA: 21 DE JUNIO DE 2022

PERSONAL
RESIDENTE 1: JEYSON ALEJANDRO FORERO ROJAS
RESIDENTE 2: JULIETH ANAYA MEJIA
INSPECTOR SISO: LINA OTALORA LOPEZ
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO: CARLOS DIAS FUENTES.
DOS OFICIALES Y 3 AYUDANTES.

SE INICIAN LABORES A LAS **7:30 AM**, PRESENTANDO UN DIA SOLEADO, SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE MONTAJE DE CIELO RASO EN PVC, INSTALACION DE LUMINARIAS, CON CAMBIO DE TUBERIA EMT, CON CAMBIO DE CABLEADO ELECTRICO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS, EN PUNTO DENOMINADO DEPOSITO - LABORATORIO, LABORATORIO HEMATOLOGIA Y RECEPCION - TOMA DE MUESTRAS, A SI MISMO SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE PINTURA EN MURO TIPO 1, CON SUS RESPECTIVOS RESANES DE ESTUCO EN PUNTOS DE PINTURA, A SI MISMO SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE MURO EN BLOQUE EN ZONA DE VACUNACION.

SIENDO LAS **12:00 PM** SE PAUSA LAS ACTIVIDADES POR HORA DE ALMUERZO

SIENDO LAS 2:00 PM, SE DA INICIO A LAS ACTIVIDADES, CONTINUANDO CON LAS MISMAS ACTIVIDADES, SIN PRESENTAR CAMBIO EN CLIMA NI EN PERSONAL

SE DA POR TERMINADA LA JORNADA LABORAL A LAS **5:00 PM**.

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

Scanned with CamScanner

CIUDAD: YUPAL CASANARE
FECHA: 22 DE JUNIO DE 2022

PERSONAL
RESIDENTE 1: JEYSON LEONARDO FORERO ROJAS
RESIDENTE 2: JULIETH ANDREA MUJICA
INSPECTOR SISO: LINA CATALINA LOPEZ
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO: CARLOS DIAZ PUENTES
DOS OFICIALES Y 3 AYUDANTES

SE INICIA LAS ACTIVIDADES A LAS 7:30 AM, PRESENTANDO UN DIA LLUVIOSO HASTA LAS 9:00 AM, SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE MONTAJE DE CIELO RASO EN PVC, INSTALACION DE LUMINARIA, CON CAMBIO DE TUBERIA A EMT., CON CAMBIO DE CABLEADO ELECTRICO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS, EN PUNTO REQUERIDO JEFATURA, ASI MISMO SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE PINTURA EN VINILO TIPO 1, CON SU RESPECTIVA RESANES EN ESTUCO EN PUNTOS DE PINTURA, ASI MISMO SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE BLOQUE PARA MURO EN ZONA DE VACUNACION, TAMBIEN SE DA INICIO AL PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN ZONA DE VACUNACION.

SIENDO LAS 12:00 PM SE DA PAUSA A LAS ACTIVIDADES POR HORA DE ALMUERZO.

SIENDO LAS 2:00 PM., SE DA INICIO A LAS ACTIVIDADES CONTINUANDO CON LAS MISMAS ACTIVIDADES, SIN PRESENTAR CAMBIOS EN CLIMA NI EN PERSONAL.

SE DA POR TERMINADA LA JORNADA LABORAL A LAS 5:00 PM

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

Scanned with CamScanner

CIUDAD: YOPAL CASANARE
FECHA: 23 DE JUNIO DE 2022

PERSONAL
RESIDENTE 1: JEISON ALEXANDER FORERO
RESIDENTE 2: JULIETH ANAYA MEJIA
INSPECTOR SISO: CARLOS DIAZ FUENTES
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO: LINA VIVIANA LOPEZ
DOS OFICIALES Y TRES AYUDANTES

SE INICIA LAS ACTIVIDADES A LAS 7:30 AM, PRESENTANDO UN DIA LLUVIOSO, SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE MONTAJE DE CIELO RASO EN PVC, INSTALACION DE LUMINARIA, CON CAMBIO DE CUBIERTA A EMT, CON CAMBIO DE CABLEADO ELECTRICO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS, EN PUNTO DENOMINADO JEFATURA, A SI MISMO SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE PINTURA EN MURO TIPO 1, CON UN RESPECTIVO RESANES EN ESTUCO EN PUNTOS DE PINTURA, AS MISMO SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE PANEL IMPERMEABILIZADO EN ZONA DE VACUNACION.

SIENDO LAS 12:00 PM SE DA PAUSA A LAS ACTIVIDADES POR HORA DE ALMUERZO.

SIENDO LAS 2:00 PM., SE DA INICIO A LAS ACTIVIDADES, SE PRESENTAN LLUVIAS HASTA LAS 3:30 PM, CONTINUANDO CON LAS MISMAS ACTIVIDADES, SIN PRESENTAR CAMBIO EN PERSONAL

SE DA POR TERMINADA LA JORNADA LABORAL A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

Scanned with CamScanner

CIUDAD: YOPAL CASANARE
FECHA: 24 DE JUNIO DE 2022

PERSONAL
RESIDENTE 1: JEYSON LEONARDO FONSECA
RESIDENTE 2: JULIETH ANAYA MEJIA
INSPECTOR SISO: LINA OTALORA LOPEZ
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO: CARLOS DIAZ FUENTES
DOS OFICIALES Y TRES AYUDANTES

SE INICIAN LAS ACTIVIDADES A LAS 7:30 AM, PRESENTANDO UN DIA NUBLADO, SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES DE MONTAJE DE CIELO RASO EN PVC, INSTALACION DE LUMINARIAS CON CAMBIO DE TOBERA A EMT, TAMBIEN CAMBIO DE CABLEADO ELECTRICO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS, EN PUNTO DENOMINADO JEFATURA - Y SALA DE DESECHOS, A SI MISMO SE CONTINUANDA CON LAS ACTIVIDADES DE PINTURA EN MURO TIPO I, CON SUS RESPECTIVOS RESANES EN ESTUCO EN PUNTO DE PINTURA, SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE PUESTE INSTALADO EN ZONA DE VACUNACION.

SIENDO LAS 12:00 PM, SE DA PAUSA A LAS ACTIVIDADES POR HORA DE ALMUERZO

SIENDO LAS 2:00 P.M., SE DA INICIO A LAS ACTIVIDADES, SE PRESENTA LLUVIAS HASTA LA 4:00 PM, CONTINUANDO CON LAS MISMAS ACTIVIDADES, SIN PRESENTAR ACCIDENTES EN PERSONAL

SE DA POR TERMINADA LA JORNADA LABORAL A LAS 5:00 PM.

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

Scanned with CamScanner

CIUDAD: YOPAL CASANARE
FECHA: 25 DE JUNIO DE 2022

PERSONAL
RESIDENTE 1: JEYSON LEONARDO FORERO
RESIDENTE 2: JULIETH ANAYA MEJIA
INSPECTOR SISO: LINA OTALORA LOPEZ
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO: CARLOS DIAZ PUENTES
DOS OFICIALES Y TRES AYUDANTES

SE INICIAN LAS ACTIVIDADES A LAS 7:30 AM., PRESENTANDO UN DIA SOLEADO, SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE MONTAJE DE CIELO RASO EN PVC, INSTALACION DE LUMINARIA. CON CAMBIO DE TUBERIA A EMT, TAMBIEN CAMBIO DE CABLEADO ELECTRICO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS, EN PUNTO DENOMINADO ESCALERA - Y CUARTO DE DESECHOS, A SI MISMO SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE PINTURA EN MURO TIPO 1, CON SUS RESPECTIVOS RESANES EN ESTUCO EN PUNTOS DE PINTURA, SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN ZONA DE VACUNACION.

SIENDO LAS 12:00 PM, SE DA PAUSA POR TERMINADA LAS ACTIVIDADES LABORALES.

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

Scanned with CamScanner

INGEBLAR S.A.S Gerencia, Consultoría & Construcción	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	Código: Versión: Fecha:

FECHA: 06 de julio de 2022 LUGAR: Fuerza Aérea Yopal
OBRA: Mantenimiento y adecuación de las instalaciones del Establecimiento. AREA: Sanidad

INFORMACION GENERAL

En el área de sanidad del grupo aéreo del Casanare se están realizando actividades de mantenimiento y adecuación de las instalaciones (Desmontaje de ventanas, levantamiento de muros, pañete, aplicación de estuco, resanes, pintura , desmontaje de cielo raso en drywall, instalación de cielo raso en PVC y luminarias, cambio de tubería techo PVC a EMT, demolición y levantamiento de piso, fundir piso en concreto y construcción de anden para área de residuos, para estas actividades se han tenido en cuenta actividades previas para el aseguramiento de las actividades y la conservación del bienestar de trabajadores, como son diligenciamiento de permiso de Trabajo en alturas, acompañamiento al personal, inspecciones pre operacionales de equipos, charlas pre operacionales diarias, calistenia, señalización y delimitación de áreas de trabajo, diligenciamiento y divulgación de Análisis de riesgo, manejo de los residuos.

Desde: 01 de junio de 2022 Hasta: 30 de junio de 2022

PERSONAL EJECUTANTE

CARGO	CANTIDAD
Ingeniero residente	2
Inspector SST	1
Supervisor administrativo	1
Maestro de construcción	5

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Charla pre operacional importancia tareas de alto riesgo
- ATS para la instalación de cielo raso en PVC y luminarias.
- Charla preoperacional conceptos de ATS y permisos de trabajo.
- ATS para el desmonte de drywall en las áreas faltantes.
- Charla pre operacional cuidado de manos.
- ATS para resanes en granito, estuco y aplicación de pintura
- Charla pre operacional sobre condiciones y actos inseguros.
- Señalización de áreas de Trabajo
- Chequeo condiciones de salud para trabajo en altura.
- Inspección de herramienta
- Charla pre operacional clasificación de peligros.
- ATS para la instalación de techo en PVC, tubería en EMT, luminarias.
- Charla pre operacional cuidado del medio ambiente.
- Charla pre operacional herramientas manuales
- Permiso de trabajo en alturas trabajo en alturas semanal para la instalación del cielo raso en PVC.
- ATS para el desmonte de tubería luminaria en PVC y montaje de tubería en EMT
- ATS para el cambio de estructura del techo
- Charla pre operacional riesgo eléctrico
- Charla pre operacional cultura de autocuidado
- Charla preoperacional inspecciones de seguridad
- Charla pre operacional equipos eléctricos móviles.
- Charla pre operacional uso eficiente de la energía.
- Charla pre operacional concentración en el trabajo
- Charla pre operacional autocuidado
- ATS para el desmonte de ventanas
- Charla pre operacional incidentes de trabajo
- ATS para la demolición de piso y levantamiento de muros.
- Charla pre operacional material particulado
- ATS para aplicación de pañete y relleno de paredes.
- Chequeo condiciones de salud de los trabajadores.

- Charla pre operacional trabajo en equipo
- Inspección de taladro
- Inspección de pulidora
- Charla pre operacional riesgos en el sector de la construcción
- Charla pre operacional conceptos equipos de protección contra caídas
- ATS para desmonte de drywall, aplicación de pañete.
- Charla pre operacional riesgo eléctrico
- Inspección de andamio.
- Inspección de trabajo en alturas.
- Charla preoperacional actitudes y procedimientos de trabajo seguros.
- ATS para relleno de muro en bloque, pañetar y estucar.
- ATS para actividades de afinación paredes, enchape, aplicación de estuco, pintura, orden y aseo.
- Entrega de EPP
- Verificar tiempos de trabajo, receso, estiramiento e hidratación del personal
- Acompañamiento y supervisión al personal
- Charla pre operacional cuidados con el uso de equipos de construcción
- ATS para construcción de anden, desagüe de poceta, demolición de piso y poceta área residuos.
- Charla pre operacional uso de vibro compactador y mezcladora de concreto
- Charla pre operacional impacto ambiental
- ATS para la fundición y alisado de anden y pisos.
- Socialización de Análisis de Trabajo Seguro.
- Inspección de vibro compactador
- Inspección de mezcladora de concreto

MANEJO AMBIENTAL

Se ha tenido en cuenta realizar orden y aseo al terminar la jornada laboral, junto con el supervisor de obra se designó un punto de acopio para la recolección y evacuación de los residuos generados por las actividades, para su respectiva disposición final, uso eficiente y responsable de recursos naturales, ahorro de luz y agua, inspeccionar área de trabajo, antes de salir a revisar que todas las luminarias queden apagadas, y que tanto las instalaciones como las actividades no generen un riesgo para el medio ambiente.

ESTADISTICAS

Número de trabajadores	9
Número de Incidentes de trabajo	0
Accidentes de trabajo	0
Días de incapacidad debido a incidentes o accidentes de trabajo	0
Accidentes con daño a la propiedad	0
Incidentes ambientales	0
Análisis de Trabajo Seguro	18
Permisos de trabajo en altura	4
Charlas de seguridad	25

REGISTRO FOTOGRAFICO








Charlas de Seguridad y calistenia











Supervisión de personal









Señalización y delimitación





MANEJO AMBIENTAL (orden y aseo, acopio de escombro)












HERRAMIENTAS Y EQUIPOS UTILIZADOS

Realizado por:	Revisado por:
Lina Otálora L.	
Lina Otálora- Inspectora SST	Jeison Forero- Ing. Residente 1

ANEXOS

INGEBLAR S.A.S Gerencia, Consultoria & Construcción	Asistencia a Capacitación,Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA:	01/06/2022	LUGAR:	Fuerza Aerea Yopal - Sanidad.
TIEMPO EN MINUTOS:	15 minutos.		
NOMBRE CAPACITADOR:	Ana Otálora.	EMPRESA:	Ingeblar S.A.S.
TEMA: Tareas de alto riesgo.			
OBJETIVO: Describir los tipos de trabajos de Alto riesgo, consecuencias y medidas necesarias para evitar accidentes.			

PARTICIPANTES

ITEMS	NOMBRE	N° DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jeyson Forero.	1.116.545.102	Ingeniero Residente	
2	Julieth Anaya. Mejia.	1055.552.109	Ingeniera Residente	
3	Jesus Rondon.	1.022.365.767	Maestro Construcción	
4	Luis Enrique Rondón	79.997.120.	Maestro Constr.	
5	Diego Rondon.	19.252.411	Maestro Construc.	
6	Roberto Carlos Casas	79.218.255.	Maestro Construc.	
7	JEYSON J. FORERO	1.116.545.102	RESIDENTE DE OBRA	
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES: Se realizan estiramientos, analisis de riesgo, socialización de controles.

INGEBLAR S.A.S

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

Código:
Versión:
Fecha:

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	31	05	22	HORA	8:30am	LUGAR	Fuerza Aerea Yopal
VALIDO DESDE	31	05	22	HASTA	04	06	22 AREA: Sanidad.

PERMISO CONCEDIDO A LOS TRABAJADORES (NOMBRE, CARGO, UNIDAD, EPS "SALUD", AFP "PENSIÓN", ARL "RIESGOS")

NOMBRE	CARGO	EPS	AFP	ARL
Roberto Casas	Maestro Const.	Nueva eps	Proteccion.	Sura.
Enrique Rondón.	Maestro const.	Capital Salud	Porvenir	Sura.

TIPO DE TRABAJO: Mantenimiento y adecuacion de instalaciones.

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA: Instalacion cielo raso en PVC.
-Instalar cornisa perimetral, cortar lamina PVC
-Instalacion de PVC y luminarias

ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 1.60 m

Riesgos asociados: -Trabajo en alturas (caidas, caida de objeto) -condicion de seguridad
-Manipulacion de herramientas y Piezas (mecánico)

LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LOS SIGUIENTES SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS, DEBERÁN SER UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES DURANTE LA LABOR (MARQUE CON X)

CASCO CON BARBUQUEJO	X	ESLINGA CON ABSORVEDOR		KIT DE RESCATE	
GAFAS DE SEGURIDAD	X	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	X	AUTORRETRACTIL	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	X	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMATICO		SILLA DE SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	X	ANCLAJE PORTATIL (TIEE OF)		ANDAMIOS	X
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	X	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS ANTIDESLIZANTES	X	PRETALES		ESCALERA TIJERA	
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	X	DESCENDEDORES		OTRO(S):	

HERRAMIENTAS A UTILIZAR:

Taladro, soldadora, carretilla, herramienta menor.

PREPARACIÓN DEL AREA (MARQUE CON X)	SI	NO	NA
SE HA INSTALADO SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA QUE DELIMITE EL ÁREA DE TRABAJO (CINTA, CONOS, SEÑALES TUBULARES O POLISOMBRAS, DE TAL MANERA QUE SE PUEDA AISLAR O RESTRINGIR LA ZONA Y NO SE PERMITA EL PASO DE PERSONAS O VEHÍCULOS AJENOS A LA LABOR)	X		
EL TRABAJO EN ALTURAS MÍNIMO LO VAN A REALIZAR DOS TRABAJADORES O EJECUTORES	X		
LOS TRABAJADORES ESTAN CERTIFICADOS EN ALTURAS (CURSO AVANZADO Y/O RE-ENTRENAMIENTO VIGENTE)	X		
LOS TRABAJADORES ESTAN APTOS PARA DESARROLLAR LA LABOR (ESTADO DE SALUD Y CON CONCEPTO MEDICO VIGENTE)	X		
LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS A UTILIZAR EN LA LABOR SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	X		
LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR EN LA LABOR SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	X		
LOS TRABAJADORES REVISAN LOS ACCESOS AL ÁREA DE TRABAJO Y LOS REQUERIMIENTOS DE RESCATE EN CASO DE PRESENTARSE UNA EMERGENCIA	X		
LOS TRABAJADORES REALIZAN EL PERMISO DE TRABAJO EN EL LUGAR A INTERVENIR	X		
LOS TRABAJADORES REALIZAN EL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y LO SOCIALIZAN ANTES DE INICIAR LA LABOR	X		
EL LUGAR DONDE REALIZARÁ LA TAREA TIENE INSTALADA LA LÍNEA DE VIDA O UNA ESTRUCTURA DONDE EL TRABAJADOR PUEDE ASEGURARSE			X
SE TIENEN EN CUENTA MEDIDAS DE TRABAJO SEGURAS PARA ADELANTAR LABORES EN CERCANIAS A LINEAS Y/O EQUIPOS ELECTRICOS ENERGIZADOS	X		
EN CASO DE TRABAJAR EN ESPACIOS CONFINADOS (CERRADOS) O TRABAJOS EN CALIENTE (TRABAJOS DONDE SE EMITE CHISPAS O FUEGO), SE REALIZAN LAS CONSULTAS PREVENTIVAS RESPECTIVAS, INCLUYENDO OTROS PERMISOS CON REQUERIMIENTOS ESPECIALES.			X

VERIFICAR Y/O CONSULTAR LAS LÍNEAS DE EMERGENCIA DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE RESCATE EVALUADO EN EL AREA DE TRABAJO. LINEA DE EMERGENCIA: LÍNEA DE PORTERÍA:

FIRMA DE LOS TRABAJADORES (EJECUTORES) (NOMBRE, FIRMA Y NRO. DE CEDULA)
"HE SOCIALIZADO EL ANALISIS DE RIESGOS, COMPRENDO LAS PRECAUCIONES QUE DEBEN SER TOMADAS Y ME COMPROMETO A DESARROLLAR EL TRABAJO CUMPLIENDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS, PROCURANDO EL AUTOCUIDADO, CUMPLIENDO PROCEDIMIENTOS Y EVITANDO ACTOS INSEGUROS, ASI COMO REPORTAR CUALQUIER DAÑO DE EQUIPOS O INCIDENTES Y/O ACCIDENTES PRESENTADOS"

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Roberto Carlos Casas.	79218255	
Enrique Rondón.	79.997.120.	

OBSERVACIONES

AUTORIZACION DEL TRABAJO

CARGO	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
COORDINADOR DE ALTURAS	Lina Marcela Otálora.	1007588441	Lina Otálora
RESIDENTE DE OBRA	Jeison Forero.	1'116.545.102	
SUPERVISOR DE LA OBRA	Ct. Sanchez reyes Jorge	7.187.268	

CIERRE DEL PERMISO

NOMBRE	Lina Otálora	EL AREA ESTA EN ORDEN Y ASEO	SI	X		NO		
FIRMA	Lina Otálora	EL TRABAJO FUE TERMINADO	SI			NO		X
FECHA	04/06/2022	EL AREA ESTA SEÑALIZADA	SI	X		NO		

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRABAJO EN ALTURAS

CODIGO:
VERSIÓN:00
FECHA: 03/04/2018

ACTIVIDAD: Desmontaje de Orywall, montaje de Puc y luminaria. | EMPRESA: Fuerza Aerea Yopal | RESPONSABLE: Jina Otálora. | FECHA: Semana DEL: 31 mayo AL 04 DE Junio 2022

ITEM	ASPECTOS A EVALUAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
1	Se ha diligenciado permiso de trabajo	X			X			X			X			X			X					
2	Se ha realizado charla de seguridad antes de iniciar el trabajo	X			X			X			X			X			X					
3	Existe un AST o Análisis de riesgo vigente para la tarea y los controles recomendados han sido dispuestos	X			X			X			X			X			X					
4	Ha sido revisado el método de acceso al sitio: Escaleras portátiles o fijas, líneas de izaje, andamio	X			X			X			X			X			X					
5	La línea de vida ha sido inspeccionada?, Es adecuada para soportar una caída			X			X			X			X			X			X			
6	Se cuenta con arnés de cuerpo entero y este ha sido inspeccionado	X			X			X			X			X			X					
7	Se ha hecho una inspección reciente de los elementos propios del área de trabajo que tengan el riesgo de caer	X			X			X			X			X			X					
8	Se ha verificado que el método de subir herramientas hacia el sitio de trabajo es seguro	X			X			X			X			X			X					
9	Se ha señalizado / aislado el área debajo de la cual se realizará el trabajo	X			X			X			X			X			X					
10	Se cuenta con cuerdas para amarrar las herramientas cuando se este realizando el trabajo		X			X			X			X			X			X				
11	Se ha dispuesto de un método para asegurar que piezas retiradas durante el trabajo en altura no caigan? Algún tipo de recipiente	X			X			X			X			X			X					
12	Se ha previsto un método para asegurar elementos, equipos o piezas que vayan a ser retiradas o manipuladas desde lo alto			X			X			X			X			X			X		
13	El peso / volumen de las piezas, elementos o equipos que se vayan a manipular en lo alto es adecuado para la capacidad de la plataforma de trabajo y de la persona(s) que realizará el trabajo	X			X			X			X			X			X					
14	Se han inspeccionado todos los elementos de izaje que se vayan a utilizar durante el trabajo			X			X			X			X			X			X		
15	Las condiciones físicas de quien va trabajar en altura son adecuadas	X			X			X			X			X			X					
ITEM	LA PLATAFORMA																					
1	Es firme	X			X			X			X			X			X					
2	Se encuentra en orden, no hay objetos sueltos	X			X			X			X			X			X					
3	Cuenta con barandas	X			X			X			X			X			X					
4	Tiene instalados rodapiés		X			X			X			X			X			X				
5	Tiene el piso cubierto para evitar caida de objetos pequeños por rendijas		X			X			X			X			X			X				
Vo.Bo. Ejecutante o Inspector	Jina Otálora				Jina O			Jina O			Jina O			Jina O			Jina O					

OBSEVACIONES:

INGEBLAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código:
		Versión: 00
		Fecha:

Nombre actividad: Instalación cielo raso en PVC. y luminarias. Fecha: 31/05/2022-01/06-2022

Herramientas usadas: Taladro, destornillador, herramienta menor. Lugar: Fuerza Aerea Yopal- Sanidad.

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Alistamiento de Herramienta.	Locativo (almacenamiento, condición de orden y aseo) Mecánico (manipulación de herramienta.	- Contusión, herida, golpes, atrapamientos. - caídas, atrapam., fractura, herida	> Charla Seg. Calistenia. - Trabajo en equipo. - Señalización y demar - Revisar herramienta.
Armado de andamio.	> Manipulación de piezas y herrament. levant. manual de cargas, caída de objetos - movimientos repet.	> Machucón, contusión, ematoma, heridas. Caída, golpes, fracturas - Agotamiento osteomuscular	- Inspec. de herramienta - Inspección de andamio. > Autocuidado.
Instalación de cornisa perimetral, techo en PVC.	- Trabajo en altura. - Uso de herram. de corte-, vibración - Postura forzada.	> caídas, golpes, fracturas, traumatismo. - cortes, heridas. - lesiones osteomuscular agutum.	> Uso de Equipos y elementos de Protec Personal. - Estiramientos.
Instalación de cielo raso en PVC y luminaria.	Ruido de impacto. Desplome andamio, Caída de objetos. - Trabajo en alturas.	- lesiones auditivas, cefalea - Atrapamiento, trauma craneo - Golpes a demas personas.	- Uso de prot. auditiva. Autocuidado - Uso de casco y demas epp. - Señalización.
Aplicación de Pintura epoxica.	Quimico (gases y vapores) toxicos y fuertes Temperatura extrema	- Mareo, intoxicación, cefalea. - Golpes de calor, deshidratación	Uso protección respiratoria, gafas., ropa industrial - Breves descanso, hidratar.

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Tina Otálora.	1002758.841.	Inspector SST	Tina Otálora L.
Roberto Casas.	79.218.255.	Maestro Construcción.	
Jesús Rondón.	1.022.365.767	Maestro Construcción.	
Enrique Rondón.	79.997.120.	Maestro Construcción	
Diego Rondón.	19.252.411	Maestro Construcción.	Diego Rondón
Julieth Araya.	1.055.552.104.	Residente 2.	
Jeisson Forero.	1.116.545.102.	Residente 1.	

Escaneado con CamScanner

INGEBLAR S.A.S Gerencia, Consultoría & Construcción	Asistencia a Capacitación, Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA:	02/06/2022.	LUGAR:	Fuerza Aerea Yopal - Sanidad.
TIEMPO EN MINUTOS:	15 minutos.		
NOMBRE CAPACITADOR:	Ing Otálora.	EMPRESA:	Ingeblar S.A.S.
TEMA:	ATS y Permiso de Trabajo.		
OBJETIVO:	Socializar analisis de Trabajo Segura, recordar los controles a implementar, Permiso de trabajo y medidas necesarias en el Trabajo en Altura.		

PARTICIPANTES

ITEMS	NOMBRE	Nº DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Julieth Anaya Mejia.	1005552109	Auxiliar de Residente 2.	
2	Jeyson J. Forero	1.116.545.102	Residente de obra	
3	Jesus Rondón.	1.022.365.767	Maestro Construc.	
4	Luis Enrique Rondón.	19.252.411.	Maestro construcción	
5	Roberto Carlos Casas.	79.218.255.	Maestro Const.	
6	Diego Rondón.	79.994120.	Maestro constr.	
7	Carlos Diaz Rueites.	71.795.722	Superv. Administrativo	
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES: Se realiza calistenia.

INGEBLAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código:
		Versión: 00
		Fecha:

Nombre actividad: Desmontaje de drywall en cuartos de farmacia e H. clinica. Fecha: 02/06/2022.

Herramientas usadas: Lugar: Sanidad - Fuerza Aerea Yopal.

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Alistamiento de herramienta y armado de andamio.	-Mecánico (manipulación de herramienta) Piezas. -Locativo (orden y aseo, material)	> cortes, heridas > caidas, Fracturas, lesiones leves o graves.	-Inspección de herramienta. -Inspección de piezas andamio, autocuidado -Uso de EPP.
Desmontaje de cielo raso. drywall.	-caida de objetos. -Polvos organicos e inorganicos. -Trabajo en altura.	> Golpes, Fracturas, contusión. > mareo, alergia, Infección, dolor de cabeza.	-Inspeccionar andamio. -Uso de casco, gafas, protección respiratoria. -Inspección y acomodo al personal, orden y aseo.
Desmonte de luminaria.	-Electricidad. -Caida de objetos. -Trabajo en altura. -Postura prolongada.	> Quemaduras, golpe de tensión. > Atrapamientos, Fracturas,	-Bajar breakers. -uso permanente de casco, botas de seguridad. -Arnes, inspección de andamio, estiramientos.
Aplicación de pintura a base de agua y epoxica.	-Movimiento repetitivo -Vapores inorganicos. -Quimico (olor fuerte) -locativo (orden y aseo)	> Agotamiento muscular, adormecimiento, caidas, Fract > mareos, cefalea, lesión de la piel, ojos, afección respiratoria	-Protección respiratoria, visual, ropa industrial, brecas -descansos, hidratación Estiramientos, aseo.
Evacuación de material desmontado	-Polvos organicos e inorganicos -levant. manual de cargas, trans. personal -manipulación de carga	> Infección, alergia, lesiones en vias respiratorias. > Agotamiento osteomuscular, desgarros, dolor muscular.	-Uso de protección respiratoria y visual. -ropa industrial -Señalizar area de trabajo -Buenas posturas

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Lina Otálora.	1.002.758.841.	Inspectora SST	Lina Otálora L.
Roberto Casas usagen	91.218.255.	Maestro Construccion.	
Jesus Rondón.	1.022.365.767	Maestro Construcción.	
Carlos Diaz Puentes	71.795.722	Supervisor Administrat	
Julieth Anaya.	1.005.552.109.	Ingeniera Residente 2.	
Jeyson Forero.	1.116.545.102.	Ingeniero Residente 1.	
Diego Rondón.	79.997.120.	Maestro Construcción.	Diego R.
Luis Enrique Rondón	19.252.411.	Maestro Construcción.	

Escaneado con CamScanner

INGEBLAR S.A.S Gerencia, Consultoría & Construcción	Asistencia a Capacitación,Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA:	03/06/2022.	LUGAR:	Fuerza Aerea Yopal - Sanidad.
TIEMPO EN MINUTOS:	10 minutos.		
NOMBRE CAPACITADOR:	Jina Otálora.	EMPRESA:	Ingeblar S.A.S.

TEMA: Cuidado de las manos.

OBJETIVO: • Promover el cuidado de las manos, dar a conocer los riesgos de exposición de las manos, EPP y medidas de protección.

PARTICIPANTES

ITEMS	NOMBRE	Nº DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Carlos Cass	79218255	Maestro Const.	
2	Jesus Enrique Rondon	79.997.120	Maestro Construc.	
3	Diego Rondón.	19.252.411	Maestro Construc.	
4	Julieth Araya Mejia.	1.055.552.109	Ing. residente 2.	
5	Jeyson Forero.	1.116.545.002	Ing. residente 1.	
6	Jesus Rondón.	1.022.365.767	Maestro Constr.	
7	Carlos Diaz Puentes.	71.795.722	Sup. Administrativo	
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES: Se realizan estiramientos.

INGEBLAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código:
		Versión: 00
		Fecha:

Nombre actividad: Resanes en granito, pintura y aplicación de pintura. Fecha: 03/06/2022

Herramientas usadas: Espatulas, palustre, pincel, rodillo, llanas. Lugar: Fuerza Aerea Yopal.

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Alistamiento de herramienta.	condición de seguridad (manejo de herramientas & piezas a trabajar). locativo (medios de almac)	- cortes, heridas, contusión. - caidas, golpes, Fracturas.	Inspección de la area de trabajo y la herramenta -Autocuidado, protección de las manos.
Preparar el Granito.	-Biomecánico (postural mantenida), movimientos repetitivos, mat. particulado -Quimico (polvo inorganico) -Psicosocial (organizacional)	>lesion osteomuscular, agotamiento corporal. >Afección respiratoria. -estres.	-Breves descansos, estiramientos. -uso de protección visual, respiratoria, buena organización del trabajo.
Mezclar la pintura y revolver.	-Mecánico (uso de herrame) -Iluminación deficiente, -Quimico (gases y vapores Fuertes, toxicos).	- cortes, heridas. - Agotamiento visual, estres. > marcos, desmayos, afeccion respiratoria.	-Verificar herramienta, uso de guantes, tener buena iluminación. -uso permanente de protección respiratoria.
Aplicar el granito.	>Biomecánico (movimientos repetitivos), postura prolongada >Material particulado (quimico) >Locativo (sup. condic. nivel).	> Adormecamiento corporal, agotamiento osteomuscular. - lesiones visuales, en la piel - caidas, Fracturas, lesiones.	-Buenas posturas, estiramientos, descansos e hidratación. -Ropa industrial. -Mantener orden y aseo.
Aplicar la pintura.	>Quimico (gases y vapores, toxicos y Fuertes) Psicosocial (condiciones de la tarea), carga mental. >Biomec (maim-repetitivos).	-Marco, cefalea, infección, sensibilidad, lesión respiratoria, estres, ansiedad, agotamiento, agotamiento Fisico.	-uso permanente de protección respiratoria y demas EPP, instrucciones de trabajo, Breves descansos e hidratación

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Tina Otálora.	1.002.788.841.	Inspector SST.	Tina Otálora L.
Julieth Anaya.	1.085.552.109.	Ingeniera Residente 2.	
Carlos Diaz.	71.795.722	Supervisor Administrativo.	
Roberto Casas.	79.218.255.	Maestro Construcc	
Jesús Rondón.	1.022.365.767.	Maestro Construcción	
Diego Rondón	79.997.120	Maestro Const.	
Jayson Forero.	1.116.545.102	Ingeniero Residente 1	
Enrique Rondón	19.252.411.	Maestro construcción	

Escaneado con CamScanner

INGEBLAR S.A.S Gerencia, Consultoría & Construcción	Asistencia a Capacitación, Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA:	04/06/2022	LUGAR:	Fuerza Aerea – Sanidad.
TIEMPO EN MINUTOS:	15 minutos.		
NOMBRE CAPACITADOR:	Lina Otálora.	EMPRESA:	BFC

TEMA: Actos y condiciones inseguros.

OBJETIVO: Concientizar al personal acerca de los actos inseguros, ocasuntes de accidentes de trabajo, importancia del autocuidado y reporte, control de condiciones inseguras

PARTICIPANTES

ITEMS	NOMBRE	N° DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Roberto Carlos Casas.	79.218.255.	Maestro Constr.	
2	Julieth Anaya mejía.	1.055.552.109.	Ingeniera Residente	
3	Jesús Rondón.	1.022.365.767	Maestro Construcc.	
4	Diego Rondón.	19.752.411	Maestro Construc	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES: Se realiza calistenia, recomendaciones de seguridad.

INGEBLAR S.A.S Gerencia, Consultoría & Construcción	Asistencia a Capacitación, Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA:	06/06/2022.	LUGAR:	Fuerza Aerea Yopal.-Sanidad
TIEMPO EN MINUTOS:	20 minutos.		
NOMBRE CAPACITADOR:	Tina Otálora.	EMPRESA:	Bellator Fortis. Construccion
TEMA:	Clasificación de Peligros.		
OBJETIVO:	Socializar todos los peligros a los cuales se encuentran los trabajadores, los controles a aplicar y La importancia del autocuidado		

PARTICIPANTES

ITEMS	NOMBRE	N° DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Oscar Calvo Ospina.	1122.236333	Ayudande Construc.	
2	Jesús Rondón.	1022.365.767	Muestro Constr.	
3	Roberto Carlos Casas.	79.218.255.	Maestro Constr.	
4	Diego Rondón.	19.252.411.	Maestro Construc.	Diego R
5	Julieth Anaya.	1005552109	Ingeniera Resid.	
6	Jeyson Forero	1.116.545.002	Ingeniero Resid.	
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES: Se realiza calistenia, diligenciamiento y socialización de ATS y permiso de Trabajo.

INGEBLAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código:
		Versión: 00
		Fecha:

Nombre actividad: Desmontaje de cielo raso en Drywall, instalación PVC Fecha: 06/06/2022.

Herramientas usadas: Pulidora, taladro, herramienta menor Lugar: Fuerza Aerea Yopal - Sanidad.

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Alistamiento de herramienta.	-mecánico (manipulación de herramienta): -Locativo (superficies de trabajo, orden y aseo)	- Heridas, lesiones corporales o visuales. - caidas, fracturas, incidentes	- Autocuidado - Inspección de la herramienta. - Mantener en orden y aseo el lugar de Tr.
Armado de andamio.	Manipulación de piezas, levantamiento manual de cargas. -Trabajo en altura.	- Golpes, atrapamientos, contusión - lesiones osteomusculares. - caidas, fracturas, traumas.	- Señalizar. - Buenas posturas de levantamiento. - inspeccionar el andamio.
Desmontaje de cielo raso en Drywall	- Trabajo en altura. - polvos organicos e inor. - Ruido de impacto - material particulado	- caidas, trauma craneoencefalico, fracturas. > Alergia, infección, afectación pulmonar, lesión auditiva y en ojos.	- uso de arnes - uso de gafas y protección respiratoria. uso permanente de los EPP.
Instalación de techo en PVC	- Caida de objetos. - manipulación de equip. energizados, - Postura forzada.	- Atrapamiento, golpes, contusión - Energia electrica, corte, ulceración. - Agotamiento, dolor muscular.	> No estar debajo de la actividad > Inspeccionar los equipos. - Realizar estiramiento.
Aplicar pintura. Recoger residuos.	Quimico (gases y vapores) Biomec (postura mantenida) - Polvos organicos e inorganicos.	> Mareos, afección de vias respiratorias, dolor de cabeza. > Agotamiento osteomuscular. > Infección, alergia, afect. pulmonar.	- uso de proteccion respiratoria. > usar buenas posturas. - usar ropa industrial mascarilla.

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Dina Otálora.	1.002.758.841.	Inspectora SST.	Dina Otálora L.
Jeyson F. Forero	1.116.545.102	RESIDENTE DE OBRA	
Luheth Arroyo M	1005552109	Residente de obra 2	
Roberto C. Cozal	79.268.255	Maistro	
Diego Rondon.	19.252.411.	Maestro Construcción	
Jesus Rondon	1.022.365.767.	Maestro const.	
Oscar Calvo	1.122236.333	Ayudante constr.	

Escaneado con CamScanner

INGEBLAR S.A.S Gerencia, Consultoría & Construcción	Asistencia a Capacitación, Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA:	07/06/2022	LUGAR:	Sanidad Fuerza Aerea Yopal C.
TIEMPO EN MINUTOS:	15 minutos.		
NOMBRE CAPACITADOR:	Tina Galora.	EMPRESA:	Bellator Fortis Construc.

TEMA: Cuidado del medio ambiente

OBJETIVO: Promover el cuidado del medio ambiente, gestión de residuos, ahorro de energía.

PARTICIPANTES

ITEMS	NOMBRE	N° DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Carlos Diaz Puentes.	71.795.722	Supervisor Administ.	
2	Jeyson Forero.	1.116.543.102	Ingenero Residente	
3	Julieth Anaya Mejra.	1.005.552.109	Ingeniera Residente	
4	Jesus Rondón.	1.022.365.767.	Ayudante Construc.	
5	Diego Rondón.	79.997.120.	Oficial de Constr.	
6	Roberto Casas Usaquen	79.218.255.	Maestro Construc.	
7	Oscar Calvo	1.122.236.333	Ayudante Construc	
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES: Se realiza estiramiento., ATS y socialización permiso de trabajo.

INGEBLAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código:
		Versión: 00
		Fecha:

Nombre actividad: Desmonte instalación electrica de luminarias. Fecha: 07/06/2022.

Herramientas usadas: destornillador, herramienta menor. Lugar: Sanidad - Fuerza Aerea Yopal

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Alistamiento de materiales y herramienta.	mecánico (manejo de herramienta Locativo (material cordic. de orden y aseo)	golpes, atrapamiento, cortaduras heridas. - Cardas, golpes, Fracturas.	Inspección area de trabajo. - Señalizar, acordonar herramienta. - Autocuidado.
Desmonte de tubería en PVC.	- Trabajo en alturas - Caida de objetos. - manipulación de herr. - Movim y postura rep.	Caidas, traumatismo, Fracturas. - golpes, contusión, hematoma - Afectación osteomuscular.	- verificar ausencia de tensión, tener desenergizado, - inspección de andamio.
Montaje tubería en EMT.	- desplome de andamio mecánico (fuerza manual con herramienta - Postura antigravitac.	- Atrapamiento, Fractura golpes, heridas, contusión). - Hematomas, heridas - Dolores osteomusculares.	uso de arnes y anclaje. Acompañamiento al personal. - Hidratación, descans y
Realización de instalación electrica de luminarias.	- Riesgo electrico. - movimiento repetit. - Postura prolongada - Psicosocial (carga mental)	- lesiones, quemaduras - Adormecimiento, dolor - Cansancio, dolor de espalda Estres, agotamiento mental	Bajar Breakers. Trabajar desenergizado. - Realizar estiv. - Organización del trabajo
Aplicar resanes y Pintura a paredes.	Quimico (gases y vapores) olores fuertes y toxicos. movimientos repetitiv. Posturas prolongadas.	> mareos, desmayos, dolor de cabeza, afectación respiratoria. > Dolores osteomusculares, agotamiento fisico.	uso de mascarilla protección respirat. - pausas activas - Estiramiento.

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Ina Otálora.	1.002.758.841.	Inspecta SST.	Ina Otálora L.
Roberto Casas.	79.218.255.	Maestro Construc.	
Jesús Rondon.	1.022.365.767	Ayudante Construc	
Diego Rondón.	79.997.120.	Oficial construcc.	Diego R
Oscar Calvo	1.122.236.333.	Ayudante Construcc	
Julieth Anaya.	1.065.552.109.	Ingeniera Residente	
Jeyson Forero.	1.116.545.002	Ingeniero Residente.	

Escaneado con CamScanner

INGEBLAR S.A.S	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código:
		Versión:
		Fecha:

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	06	06	22	HORA	8 am	LUGAR	Fuerza Aerea Yopal
VALIDO DESDE	06	06	22	HASTA	11	06	22	AREA:	Sanidad.

PERMISO CONCEDIDO A LOS TRABAJADORES (NOMBRE, CARGO; UNIDAD; EPS "SALUD"; AFP "PENSIÓN"; ARL "RIESGOS")

NOMBRE	CARGO	EPS	AFP	ARL
Roberto Carlos Casas	Maestro Const	Nueva eps	Protección	Sura.

TIPO DE TRABAJO: Mantenimiento y adecuación de instalaciones

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA: Desmonte de Drywall. Armar andamio, instalar correa perimetral, instalar pvc y luminaria.

ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD: 1.

Riesgos asociados: Caida de personas, caida de objetos (trabajo en alturas) Mecánico (manipulación de piezas y herramientas)

LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LOS SIGUIENTES SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS, DEBERÁN SER UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES DURANTE LA LABOR (MARQUE CON X)

CASCO CON BARBUQUEJO	X	ESLINGA CON ABSORVEDOR		KIT DE RESCATE	
GAFAS DE SEGURIDAD	X	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	X	AUTORRETRACTIL	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	X	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMATICO		SILLA DE SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	X	ANCLAJE PORTATIL (TIEE OF)		ANDAMIOS	X
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	X	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS ANTIDESLIZANTES	X	PRETALES		ESCALERA TIJERA	X
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	X	DESCENDEDORES		OTRO(S):	

HERRAMIENTAS A UTILIZAR:

Herramienta menor, Pulidora, taladro

PREPARACIÓN DEL AREA (MARQUE CON X)	SI	NO	NA
SE HA INSTALADO SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA QUE DELIMITE EL ÁREA DE TRABAJO (CINTA, CONOS, SEÑALES TUBULARES O POLISOMBRAS, DE TAL MANERA QUE SE PUEDA AISLAR O RESTRINGIR LA ZONA Y NO SE PERMITA EL PASO DE PERSONAS O VEHÍCULOS AJENOS A LA LABOR)	X		
EL TRABAJO EN ALTURAS MÍNIMO LO VAN A REALIZAR DOS TRABAJADORES O EJECUTORES	X		
LOS TRABAJADORES ESTAN CERTIFICADOS EN ALTURAS (CURSO AVANZADO Y/O RE-ENTRENAMIENTO VIGENTE)	X		
LOS TRABAJADORES ESTAN APTOS PARA DESARROLLAR LA LABOR (ESTADO DE SALUD Y CON CONCEPTO MEDICO VIGENTE)	X		
LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS A UTILIZAR EN LA LABOR SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	X		
LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR EN LA LABOR SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	X		
LOS TRABAJADORES REVISAN LOS ACCESOS AL ÁREA DE TRABAJO Y LOS REQUERIMIENTOS DE RESCATE EN CASO DE PRESENTARSE UNA EMERGENCIA	X		
LOS TRABAJADORES REALIZAN EL PERMISO DE TRABAJO EN EL LUGAR A INTERVENIR	X		
LOS TRABAJADORES REALIZAN EL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y LO SOCIALIZAN ANTES DE INICIAR LA LABOR	X		
EL LUGAR DONDE REALIZARÁ LA TAREA TIENE INSTALADA LA LÍNEA DE VIDA O UNA ESTRUCTURA DONDE EL TRABAJADOR PUEDE ASEGURARSE			X
SE TIENEN EN CUENTA MEDIDAS DE TRABAJO SEGURAS PARA ADELANTAR LABORES EN CERCANIAS A LINEAS Y/O EQUIPOS ELECTRICOS ENERGIZADOS	X		
EN CASO DE TRABAJAR EN ESPACIOS CONFINADOS (CERRADOS) O TRABAJOS EN CALIENTE (TRABAJOS DONDE SE EMITE CHISPAS O FUEGO), SE REALIZAN LAS CONSULTAS PREVENTIVAS RESPECTIVAS, INCLUYENDO OTROS PERMISOS CON REQUERIMIENTOS ESPECIALES.			X

VERIFICAR Y/O CONSULTAR LAS LÍNEAS DE EMERGENCIA DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE RESCATE EVALUADO EN EL AREA DE TRABAJO. LINEA DE EMERGENCIA: LÍNEA DE PORTERÍA:

FIRMA DE LOS TRABAJADORES (EJECUTORES) (NOMBRE, FIRMA Y NRO. DE CEDULA)
"HE SOCIALIZADO EL ANALISIS DE RIESGOS, COMPRENDO LAS PRECAUCIONES QUE DEBEN SER TOMADAS Y ME COMPROMETO A DESARROLLAR EL TRABAJO CUMPLIENDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS, PROCURANDO EL AUTOCUIDADO, CUMPLIENDO PROCEDIMIENTOS Y EVITANDO ACTOS INSEGUROS, ASI COMO REPORTAR CUALQUIER DAÑO DE EQUIPOS O INCIDENTES Y/O ACCIDENTES PRESENTADOS"

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Roberto Carlos Casas Vargas	79.218.255.	

OBSERVACIONES

Se da a conocer la importancia de renovar curso de alturas y para que trabajen dos personas en alturas.

AUTORIZACION DEL TRABAJO

CARGO	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
COORDINADOR DE ALTURAS	Jina Otálora J.	1.002.758.841	
RESIDENTE DE OBRA	Jeyson Forero.	1.116.545.102.	
SUPERVISOR DE LA OBRA	C. Sanchez Reyes Jorge	7.187.268.	

CIERRE DEL PERMISO

NOMBRE	Jina Otálora.	EL AREA ESTA EN ORDEN Y ASEO	SI	X		NO	
FIRMA	Jina O.	EL TRABAJO FUE TERMINADO	SI			NO	X
FECHA	11/06/2022	EL AREA ESTA SEÑALIZADA	SI	X		NO	

CONDICIONES DE SALUD DEL TRABAJADOR

DENTIFICACION
EMPRESA: Ingeblar S.A.S. FECHA Y HORA: 06/06/2022. 8:00 am.

NOMBRES: Roberto Carlos APELLIDOS: Casas Usaquen.

EDAD: 41 CARGO: Maestro Construcción. TRABAJO: Mantenimiento.

TAREA DE ALTO RIESGO A REALIZAR:

ESPACIOS CONFINADOS	____
TRABAJO EN ALTURAS	X
TEMPERATURAS EXTREMAS	____
OTROS	____

ANTECEDENTES

	SI	NO
• Hipertensión no controlada	—	X
• Daltonismo	—	X
• Trastorno psiquiátrico	—	X
• Claustrofobia	—	X
• Fobia a las alturas	—	X
• Anemia	—	X

CONDICION ACTUAL

• Trastorno osteomuscular activo	—	X
• Trastorno del equilibrio Mareo, vértigo	—	X
• Trastorno auditivo	—	X
• Trastorno del sueño	—	X
• Vomito	—	X
• Consumo de medicamentos que afectan órganos de los sentidos, capacidad de reacción.	—	X
• Consumo de alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 24 horas antes	—	X

Certifico que la información consignada en esta ficha es verídica, en este momento no padezco ninguna condición física conocida por mí que pueda afectar mi desempeño en la tarea de alto riesgo en la cual estaré involucrado.

C.C. 79.218.255.
Firma del Trabajador

FECHA	07/06/22.	08/06/22	09/06/22	10/06/22	11/06/22
FIRMA					

INGEBLAR S.A.S.

FORMATO INSPECCIÓN DE ANDAMIOS.

Codigo:
Versión:
Fecha:

OBRA: Mantenimiento y adecuación de instalaciones

RESPONSABLE DEL ANDAMIO: Julio Salcedo.

FECHA DE INSPECCIÓN: 06/06/22 LUGAR DE INSPECCION: Fuerza Aerea Yopal-Sanidad

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Jina Otálora.

ACTIVIDAD O ÁREA: Desmonte e instalación de cielo raso en PVC y luminarias.

CRITERIO: APROBADO X NO APROBADO

DESCRIPCION	ITEM	CRITERIOS	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		CUMPLE -NO CUMPLE - NO APLICA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
ESTADO DE ACCESORIOS	1	Las plataformas de trabajo y acceso estan en buenas condiciones (deformaciones, grietas, oxidación)	X			X			X			X			X			X					
	2	Las verticales se encuentran en buen estado tuberia y rocetas (oxidación, deformación, fracturas, etc)	X			X			X			X			X			X					
	3	Diagonales en buen estado (oxidación, deformación, fracturas, etc)	X			X			X			X			X			X					
	4	Abrazaderas	X			X			X			X			X			X					
	5	La escalera esta en buenas condiciones laterales y peldaños (oxidación, deformación, fracturas, etc)	X			X			X			X			X			X					
	6	Terreno armado andamio	X			X			X			X			X			X					
	7	Pines/pasadores sin puntas o filos sobresaliendo	X			X			X			X			X			X					
	8	Horizontales en buen estado (oxidación, deformación, fracturas, etc)	X			X			X			X			X			X					
	9	Rodapies		X			X			X			X			X			X				
	10	Bases (tornillos niveladores, rodachines, base collarin)	X			X			X			X			X			X					
	11	Abrazaderas	X			X			X			X			X			X					
ARMADO	12	Esta el andamio nivelado	X			X			X			X			X			X					
	13	Zapatas en la base de los andamios	X			X			X			X			X			X					
	14	Rodachinas en la base de los andamios	X			X			X			X			X			X					
	15	Los rodachines cuentan con frenos de seguridad.	X			X			X			X			X			X					
	16	Esta armado sobre superficie adecuada firme	X			X			X			X			X			X					
	17	Cuenta con pines de aseguramiento entre secciones	X			X			X			X			X			X					
	18	Firmemente asegurado a estructura fija contra movimiento	X			X			X			X			X			X					
	19	La estabilidad del andamio es segura según relación base altura	X			X			X			X			X			X					
	20	Se encuentra con un sistema adecuado para acceder a superficies de trabajo (escaleras)	X			X			X			X			X			X					
	21	La plataforma donde se trabaja esta completa sin peligro de caida de personas o materiales	X			X			X			X			X			X					
	22	Plataforma de trabajo esta bien asegurada a la estructura del andamio	X			X			X			X			X			X					
	23	Cuenta con barandas en plataforma de trabajo para prevenir caidas	X			X			X			X			X			X					
	24	Cuenta con rodapiés en plataforma de trabajo para prevenir caidas		X			X			X			X			X			X					
USO	25	Los trabajadores cuentan con sistema protección individual contra caida de alturas	X			X			X			X			X			X					
	26	Los usuarios del andamio utilizan los EPP necesarios para la actividad	X			X			X			X			X			X					
	27	Los trabajadores se encuentran debidamente anclados	X			X			X			X			X			X					
	28	Se cuenta con puntos de anclajes seguros (la misma estructura o Independiente)																					
	29	El andamio se encuentra en orden y aseo	X			X			X			X			X			X					
	30	Las herramientas usadas en la labor se encuentran aseguradas para evitar caidas accidentales	X			X			X			X			X			X					
	31	El andamio esta siendo utilizado para la carga maxima permitida	X			X			X			X			X			X					
	32	Se encuentra demarcada y señalizada el area de trabajo	X			X			X			X			X			X					
	33	Los accesorios se almacenan de forma segura separados por forma y tamaño.	X			X			X			X			X			X					

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADROS

Codigo:
Versión:
Fecha:

PROYECTO:	mantenimiento y adecuación instalaciones	LUGAR:	Sanidad-Fuerza Aerea Yopal.
ACTIVIDAD:	Desmontaje de drywall	MARCA:	Makita.
SEMANA DEL	06/06/2022. AL 11/06/2022	DE	

	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sabado			Domingo		
Estado (B; Bueno, R; Regular, M; Malo)	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
Estado y funcionamiento del porta brocas	X			X			X			X			X			X					
Estado y funcionamiento de mandril	X			X			X			X			X			X					
Estado y funcionamiento del interruptor	X			X			X			X			X			X					
Estado del mango	X			X			X			X			X			X					
Estado del cuerpo	X			X			X			X			X			X					
Estado de entrada de corriente eléctrica (cables)	X			X			X			X			X			X					
Estado de botón cambio de giro	X			X			X			X			X			X					
Estado general del taladro	X			X			X			X			X			X					
INSPECCIONADO POR: Roberto Casas.																					
Vo. Bo Inspector DE SST: Lina Otálora.	Lina O.			Lina O			Lina O			Lina O.			Lina O			Lina O					

Acción que se realiza después de la inspección

Sacar de servicio		Reparar antes de usar		Usar con restricción		Usar sin acción	X

OBSERVACIONES:

INGEBLAR S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	Codigo:
		Versión:
		Fecha:

PROYECTO:	mantenimiento y adecuación de instalaciones.				UBICACION:	Fuerza Aerea Yopal Sanidad.
ACTIVIDAD:	Desmonte de Drywall.				MARCA:	Bauker.
SEMANA DEL	06/06/2022	AL	11/06	DE	2022	

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	X		X		X		X		X		X			
Estado del interruptor de encendido y su seguro	X		X		X		X		X		X			
Estado del accesorio portadiscos	X		X		X		X		X		X			
Estado del mango	X		X		X		X		X		X			
Estado del cuerpo	X		X		X		X		X		X			
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	X		X		X		X		X		X			
Estado general de la guía y la guarda	X		X		X		X		X		X			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	X		X		X		X		X		X			
Condiciones de orden y aseo	X		X		X		X		X		X			
OTROS														
INSPECCIONADO POR: Roberto Casas.														
Vo. Bo Inspector DE SST: Lina Otálora.	Lina O.		Lina O		Lina O.		Lina O.		Lina O.		Lina O			

INGEBLAR S.A.S Gerencia, Consultoría & Construcción	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRABAJO EN ALTURAS	CODIGO
		VERSIÓN 00
		FECHA: 03/04/2018

ACTIVIDAD: Desmonte de Drywall, instalación de techo PVC. | EMPRESA: Fuerza Aerea Yopal | RESPONSABLE: Tina Otálora. | FECHA: Semana DEL 06 AL 11 DE Junio 2022.

ITEM	ASPECTOS A EVALUAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
1	Se ha diligenciado permiso de trabajo	X			X			X			X			X			X					
2	Se ha realizado charla de seguridad antes de iniciar el trabajo	X			X			X			X			X			X					
3	Existe un AST o Análisis de riesgo vigente para la tarea y los controles recomendados han sido dispuestos	X			X			X			X			X			X					
4	Ha sido revisado el método de acceso al sitio: Escaleras portátiles o fijas, líneas de izaje, andamio	X			X			X			X			X			X					
5	La línea de vida ha sido inspeccionada?, Es adecuada para soportar una caída			X			X			X			X			X			X			
6	Se cuenta con arnés de cuerpo entero y este ha sido inspeccionado	X			X			X			X			X			X					
7	Se ha hecho una inspección reciente de los elementos propios del área de trabajo que tengan el riesgo de caer	X			X			X			X			X			X					
8	Se ha verificado que el método de subir herramientas hacia el sitio de trabajo es seguro	X			X			X			X			X			X					
9	Se ha señalizado / aislado el área debajo de la cual se realizará el trabajo	X			X			X			X			X			X					
10	Se cuenta con cuerdas para amarrar las herramientas cuando se este realizando el trabajo		X			X			X			X			X			X				
11	Se ha dispuesto de un método para asegurar que piezas retiradas durante el trabajo en altura no caigan? Algún tipo de recipiente	X			X			X			X			X			X					
12	Se ha previsto un método para asegurar elementos, equipos o piezas que vayan a ser retiradas o manipuladas desde lo alto			X			X			X			X			X			X		
13	El peso / volumen de las piezas, elementos o equipos que se vayan a manipular en lo alto es adecuado para la capacidad de la plataforma de trabajo y de la persona(s) que realizará el trabajo	X			X			X			X			X			X					
14	Se han inspeccionado todos los elementos de izaje que se vayan a utilizar durante el trabajo			X			X			X			X			X			X		
15	Las condiciones físicas de quien va trabajar en altura son adecuadas	X			X			X			X			X			X					
ITEM	LA PLATAFORMA																					
1	Es firme	X			X			X			X			X			X					
2	Se encuentra en orden, no hay objetos sueltos	X			X			X			X			X			X					
3	Cuenta con barandas	X			X			X			X			X			X					
4	Tiene instalados rodapiés		X			X			X			X			X			X				
5	Tiene el piso cubierto para evitar caída de objetos pequeños por rendijas			X		X			X			X			X			X				
Vo.Bo. Ejecutante o Inspector		Tina Otálora	Tina O		Tina O.			Tina O			Tina O			Tina O.			Tina O.					

OBSEVACIONES:

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

Asistencia a Capacitación,Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento

CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:

FECHA:	08/06/2022	LUGAR:	Fuerza Aerea Yopal-Sanidad.
TIEMPO EN MINUTOS:	15 minutos.		
NOMBRE CAPACITADOR:	Jina Otálora.	EMPRESA:	BFC. Bellator Fortis.
TEMA:	Herramientas manuales.		
OBJETIVO:	Crear conciencia en los trabajadores acerca del uso correcto de las herramientas manuales		

PARTICIPANTES

ITEMS	NOMBRE	N° DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Oscar Calvo	1.122.236,333	Ayudante Constr.	
2	Diego Rondón.	74.997.120.	Oficial Constr.	
3	Jesús Rondón.	1.022.365.767	Ayudante Constr.	
4	Roberto Casas.	79.218.255.	Maestro Construcción	
5	Julieth Anaya.	1.005.552.109	Ingeniera Residente.	
6	Jeyson Forero.	1.116.345.002	Ingeniero Residente.	
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES: Se realiza calistenia, socaliza ATS y Permiso de Trabajo.

INGEBLAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código: Versión: 00 Fecha:

Nombre actividad: Instalación techo PVC, tubería EMT, lámina Fecha: 08/06/2022 - 09/06/2022

Herramientas usadas: Taladro, soldadora, martillo Lugar: Fuerza Aérea Yopal - Sanidad

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Alistamiento de materiales y herramienta.	mecánico (herramientas y piezas a utilizar condiciones del lugar	cortes, heridas. caídas, Fracturas, contusión.	-Inspeccionar la herramienta. -uso de guantes -Autocuidado.
Armado de andamios.	manipulación de cargas, objetos y piezas levantamiento manual	> golpes, Fractura. -Hematomas,	-Inspeccionar piezas del andamio. -levant de objet.
Instalación de cielo raso en PVC.	-trabajo en altura. -postura forzada -uso de equipos y herramientas de corte.	caídas, traumatismo, fracturas leves, graves - cortes, amputación, heridas.	-Inspeccionar el andamio. -Inspeccionar los equipos. -Breves descansos.
Realizar resanes y terminaciones de Pinturas.	Movimiento repetit. Químico (gases y vapores) olores toxicos.	> Espasmos musculares, -Dolor de espalda. - Mareo, cefalea, afección respiratoria.	-Breves descansos, estiramientos -uso de protección respiratoria
Desmontar tubería en PVC	caída de objetos. -paso de energía. -Movimientos repetitivos.	golpes, traumatismo. > golpes de tensión, - Agotamiento osteomusc.	-No se puede trans debajo del trabaj -Señalizar, desenergizar.
Montar tubería en EMT e instal de luminarias.	movimientos repetit. mecánico. -Golpes de calor. -Trabajo en alturas.	- Dolor, malestar muscul - Golpes, hematomas. - Deshidratación, cefalea - caída, fractura trauma	-Descansos, pausas activas -Inspección her y estipos. -Hidratación cont

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Ina otálora	1.007.758.841	Inspector SST	Ina Otálora
Jeyson Forero.	1.116.545-002	Ing. residente.	
Julieth Araya.	1.005.552.109.	Ing. residente	
Roberto Casas.	79.218.255.	Maestro Constr.	
Jesús Rondón.	1.022.368.767.	Maestro Constr.	
Diego Rondón	79.997.120	Maestro Constr	
Oscar Calvo	1.122.236.333	Ayud. constr.	
Carlos Dian		Sup Admtivo	

Escaneado con CamScanner

INGEBLAR S.A.S Gerencia, Consultoría & Construcción	Asistencia a Capacitación, Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA:	09/06/2022	LUGAR:	Sanidad - Fuerza Aerea Yopal.
TIEMPO EN MINUTOS:	10 minutos		
NOMBRE CAPACITADOR:	Jena Otálora.	EMPRESA:	BFC. Bellator Fortis Co

TEMA: Riesgo electrico.

OBJETIVO: Concientizar la importancia de los controles que se debe tener con la electricidad y los accidentes que se pueden generar.

PARTICIPANTES

ITEMS	NOMBRE	N° DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jeyson Forero.	1.116.545.002	Ing. Residente 1	
2	Julieth Arcila Mejia.	1.005-552.109	Ing. Residente 2.	
3	Roberto Casas.	79.218.255.	Maestro Const.	
4	Jesus Rondón	1.022.365.767	Ayud. Construccion	
5	Diego Rondón	79.997.120	Oficial Constr.	
6	Oscar Calvo.	1.122.236.333	Ayudan. Construc.	
7	Carlos Diaz		Superv. Administ.	
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES: Se realiza calistenia.

INGEBLAR S.A.S Gerencia, Consultoría & Construcción	Asistencia a Capacitación,Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA:	10/06/2022	LUGAR:	Sanidad- Fuerza Aerea Yopal.
TIEMPO EN MINUTOS:	15 minutos.		
NOMBRE CAPACITADOR:	Ana Otálora.	EMPRESA:	BFC

TEMA: Cultura de Prevencion

OBJETIVO: Que todos sean concientes de la prevencion de accidentes, y se realize de forma diaria hasta generarse cultura de prevencion.

PARTICIPANTES

ITEMS	NOMBRE	N° DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Roberto Carlos Casss	79218.255	Maistro	
2	Oscar Alexander Calvo O	1122236338	Ayunte	
3	Jesus A. Rondon Triana.	1022365767	MAESTRO	
4	DIEGO E. RONDON TRIANA	79.997.120	Maestro	
5	Carlos Diaz.	71.795.722	Sup. administrativo	
6	Jeyson Forero.	1.116.543.102	Ingeniero Resid 1.	
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES: Se realizan estiramientos y analisis de riesgo.

INGEBLAR S.A.S Gerencia, Consultoría & Construcción	TAMIZAJE ESTADO DE SALUD DE LOS TRABAJADORES	Código:
		Versión:
		Fecha:

FECHA: 13/06/2022 LUGAR: Sanidad - Fuerza Aerea Yopal.

DATOS				¿Sufre alguna de estas enfermedades?							Sintomas					FIRMA
NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	Cancer	Diabetes	Enfermedad pulmonar	Sistema inmune debilitado	Afección cardiaca	Falla renal(riñones)	Hepatopatia (higado)	Fiebre	Tos	Dificultad par arespirar	Secreción nasal	Fatiga	
Jeyson	Forero.	1.116.545.107	Ing. Reside.	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	
Oscar	Calvo.	1.122.236.333	Ayud. Constr.	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	
Diego	Rondón.	1.121.997.120.	Maestr. Const	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Diego R.
Jesus	Rondón	1.022.365.767	Maest. Constr.	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	
Roberto	Casas	79.218.255	Maestr. Const	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	
Jina	Otálora.	1.002.759.841	Inspectora SST	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Jina Otálora L.

INGEBLAR S.A.S Gerencia, Consultoría & Construcción	Asistencia a Capacitación, Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA:	13/06/2022.	LUGAR:	Fuerza Aerea Nodal - Sanidad.
TIEMPO EN MINUTOS:	15 minutos.		
NOMBRE CAPACITADOR:	Ina Otalora.	EMPRESA:	BFC-Bellator Fortis C
TEMA:	Equipos electricos moviles.		
OBJETIVO:	Dar recomendaciones en el manejo de equipos electricos que sean manipulados correctamente.		

PARTICIPANTES

ITEMS	NOMBRE	N° DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Roberto Casas Usagren	79.218.255	Maestro Constr.	
2	Jeyson Forero.	1.116.545.102	Ingeniero Resid 1.	
3	Diego Rondón	79.997.120.	Maestro Construcción	Diego R
4	Jesús Rondón.	1.022.365767	Ayudante Constr.	
5	Oscar Calvo.	1.122.236333	Ayudante Constr.	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES: Se realizan estiramientos, socializan controles del ATS y permiso de trabajo.

INGEBLAR S.A.S	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código:
		Versión:
		Fecha:

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	13	06	22	HORA		LUGAR	Fuerza Aerea Yopal
VALIDO DESDE	13	06	22	HASTA	19	06	22. AREA: Sanidad.

PERMISO CONCEDIDO A LOS TRABAJADORES (NOMBRE, CARGO, UNIDAD, EPS "SALUD"; AFP "PENSIÓN"; ARL "RIESGOS")

NOMBRE	CARGO	EPS	AFP	ARL
Roberto Casas Usaquen.	Maestro constr.	Nueva eps.	Proteccion	Sura.

TIPO DE TRABAJO: Mantenimiento y adecuacion de instalaciones.

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA: Montaje cielo raso en PVC y Luminarias -Desmontaje Drywall.

ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD:

Riesgos asociados: Caida de objetos, trabajo en altura, mecánico (uso de herramientas) Quimicos (polvos organicos e inorganicos).

LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LOS SIGUIENTES SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS, DEBERÁN SER UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES DURANTE LA LABOR (MARQUE CON X)

CASCO CON BARBUQUEJO	X	ESLINGA CON ABSORVEDOR		KIT DE RESCATE	
GAFAS DE SEGURIDAD	X	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	X	AUTORRETRACTIL	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	X	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMATICO		SILLA DE SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	X	ANCLAJE PORTATIL (TIEE OF)		ANDAMIOS	X
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	X	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS ANTIDESLIZANTES	X	PRETALES		ESCALERA TIJERA	
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	X	DESCENDEDORES		OTRO(S):	

HERRAMIENTAS A UTILIZAR:

Pulidora, taladro, destornillador, herramienta menor.

PREPARACIÓN DEL AREA (MARQUE CON X)	SI	NO	NA
SE HA INSTALADO SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA QUE DELIMITE EL ÁREA DE TRABAJO (CINTA, CONOS, SEÑALES TUBULARES O POLISOMBRAS, DE TAL MANERA QUE SE PUEDA AISLAR O RESTRINGIR LA ZONA Y NO SE PERMITA EL PASO DE PERSONAS O VEHÍCULOS AJENOS A LA LABOR)	X		
EL TRABAJO EN ALTURAS MÍNIMO LO VAN A REALIZAR DOS TRABAJADORES O EJECUTORES	X		
LOS TRABAJADORES ESTAN CERTIFICADOS EN ALTURAS (CURSO AVANZADO Y/O RE-ENTRENAMIENTO VIGENTE)		X	
LOS TRABAJADORES ESTAN APTOS PARA DESARROLLAR LA LABOR (ESTADO DE SALUD Y CON CONCEPTO MEDICO VIGENTE)	X		
LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS A UTILIZAR EN LA LABOR SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	X		
LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR EN LA LABOR SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	X		
LOS TRABAJADORES REVISAN LOS ACCESOS AL ÁREA DE TRABAJO Y LOS REQUERIMIENTOS DE RESCATE EN CASO DE PRESENTARSE UNA EMERGENCIA	X		
LOS TRABAJADORES REALIZAN EL PERMISO DE TRABAJO EN EL LUGAR A INTERVENIR	X		
LOS TRABAJADORES REALIZAN EL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y LO SOCIALIZAN ANTES DE INICIAR LA LABOR	X		
EL LUGAR DONDE REALIZARÁ LA TAREA TIENE INSTALADA LA LÍNEA DE VIDA O UNA ESTRUCTURA DONDE EL TRABAJADOR PUEDE ASEGURARSE			X
SE TIENEN EN CUENTA MEDIDAS DE TRABAJO SEGURAS PARA ADELANTAR LABORES EN CERCANIAS A LINEAS Y/O EQUIPOS ELECTRICOS ENERGIZADOS	X		
EN CASO DE TRABAJAR EN ESPACIOS CONFINADOS (CERRADOS) O TRABAJOS EN CALIENTE (TRABAJOS DONDE SE EMITE CHISPAS O FUEGO), SE REALIZAN LAS CONSULTAS PREVENTIVAS RESPECTIVAS, INCLUYENDO OTROS PERMISOS CON REQUERIMIENTOS ESPECIALES.			X

VERIFICAR Y/O CONSULTAR LAS LÍNEAS DE EMERGENCIA DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE RESCATE EVALUADO EN EL AREA DE TRABAJO. LINEA DE EMERGENCIA: LÍNEA DE PORTERÍA:

FIRMA DE LOS TRABAJADORES (EJECUTORES) (NOMBRE, FIRMA Y NRO. DE CEDULA)
"HE SOCIALIZADO EL ANALISIS DE RIESGOS, COMPRENDO LAS PRECAUCIONES QUE DEBEN SER TOMADAS Y ME COMPROMETO A DESARROLLAR EL TRABAJO CUMPLIENDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS, PROCURANDO EL AUTOCUIDADO, CUMPLIENDO PROCEDIMIENTOS Y EVITANDO ACTOS INSEGUROS, ASI COMO REPORTAR CUALQUIER DAÑO DE EQUIPOS O INCIDENTES Y/O ACCIDENTES PRESENTADOS"

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Roberto Casas Usaquen.	79.218.255.	

OBSERVACIONES

AUTORIZACION DEL TRABAJO

CARGO	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
COORDINADOR DE ALTURAS	Dina Otalora.	1.002.758.841	
RESIDENTE DE OBRA	Jeysón Forero.	1.116.545.102	
SUPERVISOR DE LA OBRA	Ct. Sanchez Reyes Jorge.	7.187.268	

CIERRE DEL PERMISO

NOMBRE	Dina Otalora	EL AREA ESTA EN ORDEN Y ASEO	SI	X		NO	
FIRMA	Dina O.	EL TRABAJO FUE TERMINADO	SI			NO	X
FECHA	17/06/2022.	EL AREA ESTA SEÑALIZADA	SI	X		NO	

INGEBLAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código:
		Versión: 00
		Fecha:

Nombre actividad: Cambio de estructura para techo e instalacion techo PVC Fecha: 10/06/2022 - 11/06-2022.

Herramientas usadas: Taladro, polidora, herramienta menor. Lugar: Sanidad - Fuerza Aerea Yopal.

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Alistamiento de equipos y herramientas.	locativo (orden y aseo, espacios). -Mecanico (herramienta cortopunzante).	choques, caidas, heridas, traumatismo. - Cortes, heridas.	Inspeccion area de trabajo y herramienta -Practicar el autocuidado.
Corte y nivelacion de perfileria. Vigetas y omega.)	-Uso de equipos a alta revolucion -Trabajo en altura. -Caida de objetos. -Posturas prolungadas,	-Heridas, atrapamiento. -Caidas, fracturas, traumatismo -Golpes. -Dolor muscular	-Uso de EPP necesarios. -Inspeccion de herram. -Autocuidado. -correcto al modo de andamio
Montaje de estructura para techo. Ajuste de vigetas y omega.	uso de herramienta manual. -Trabajo en altura, -Desplome de andamio. -Desplazamiento de personas	-cortes, golpes, heridas. -Caidas, Fracturas, traumatismo. - Atrapamiento.	uso correcto de la herramienta. -Revisar estabilidad del andamio. -Acompanam. al personal
Montaje de cornisa perimetral y lamina PVC.	-Herramientas cortopunzantes. -Movimientos repetitivos. -caida de personas, de objetos.	-Cortes, heridas. -Dolor osteomuscular. - Golpes, hematomas	-Uso de Elementos de Proteccion personal. -Realizar estiramientos -Señalizar area, asegur. herram.
Instalacion luminaria -Recoger herramienta -orden y aseo.	-Trabajo en alturas. -caida de objetos, Cortas herramientas -Polvos inorganicos -Incativo (superficies, andamios)	- Caidas. traumas, fracturas. - Golpes, -Lesiones respiratorias.	-Anclaje, inspeccion de andamio -señalizacion -uso de Proteccion respiratoria.

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Lina Otálora f.	1.002.758.841.	Inspectora SST.	Lina Otálora f.
Diego Rondon.	79.997.120.	Maestro Construccion	
Jesus Rondón	1.022.365.767.	Maestro Construccion.	
Roberto Casas	79.218.255.	Maestro Construcción.	
Julieth Anaya.	1.005.552.109.	Ingeniera Residente.	
Jeyson Forero.	1.116.545.102.	Ingenrero Residente.	
Oscar Calvo.	1.122.236.333	Ayudante Construcc.	

INGEBLAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código:
		Versión: 00
		Fecha:

Nombre actividad: Cambio tuberia PVC a EMT, montge de cielo raso. Fecha: 13/06/22-14/06/2022.

Herramientas usadas: Taladro, soldadora, andamio, h. menor. Lugar: Sanidad - Fuerza Aerea Yopal.

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Alistar herramienta, piezas y EPP a utilizar.	Mecanico (herramientas, equipos piezas, material) Biomec. (Manip. manual de carga) -locativo (medios de almac. superficies irregulares.	- lesiones osteomusculares - Cortes heridas, golpes - caidas, Fracturas, traumatismo	-Inspección area de trabajo, herramienta. - Dejar en orden y aseo al finalizar jornada.
Nivelación de perfilerra.	Herramienta cortopunzante Psicosocial (jornada de trabajo) comunicación y organización del trabajo).	- Heridas, golpes. - Estres, cefalea, agotamiento Fisico y mental.	-Inspección de equipos y herramientas. -Autocuidado. -Organización y explicación del trabajo
montaje de estructura, tuberia EMT.	-Trabajo en alturas. - Caida de objetos, herramientas personas - Desplome del andamio	-Caidas, Fracturas, traumatismo. - Golpes, hematomas, contusión. - lesiones corporales - Atrapamiento, golpes Fuertes.	- uso de equipos y EPP -Senalización. -Inspección del andamio, nivelación,
Instalación cielo raso en PVC.	- Movimiento repetitivo -Mecanico (uso de herr. cortopunzante). -Postura forzada. -Trabajo con andamio	- Agotamiento osteomuscular - Cortes, heridas, hematomas. -Espasmos musculares - Atrapamientos, Fracturas.	Pausas activas, breaks descansos, hidratación. - Estiramientos. - Inspección de heram y -equipos de trabajo.
Aplicación de estuco y vinilo. (Pintura).	Quimico (vapores, olor fuerte y toxico) Movimientos repetitivos Fisico (temperaturas altas).	-Afección respiratoria, ardor, mareo, cefalea, - Agotamiento osteomuscular. - Deshidratación, golpes de calor	-uso de protección respiratoria. -Estiramiento. -descansos e hidratación constante.

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Ana Otálora.	1.00.758.841.	Inspectora SST	Ana Otálora T.
Jeyson Forero.	1.116.545.102.	Ingeniero Residente.	
Diego Rondón	79497.120.	Maestro Construcción.	Diego R.
Jesus Rondón	1.022.365.767	Ayudante Construcción	
Roberto Casas	79.218.255.	Maestro construcción.	
Julieth Araya.	1.005.552.109.	Ingeniera Residente.	
Oscar Calvo.	1.122.236.333.	Ayudante Construcción	

INGEBLAR S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	Codigo:
		Versión:
		Fecha:

PROYECTO:	Mantenimiento y adecuación de instalaciones			UBICACION:	Sanidad - Fuerza Aerea Yopal.
ACTIVIDAD:	Desmonte drywall, instalacion techo PVC.			MARCA:	Bowker
SEMANA DEL	13/06/2022.	AL	18/06	DE	2022

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)	X		X		X		X		X					
Estado del interruptor de encendido y su seguro	X		X		X		X		X					
Estado del accesorio portadiscos	X		X		X		X		X					
Estado del mango	X		X		X		X		X					
Estado del cuerpo	X		X		X		X		X					
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)	X		X		X		X		X					
Estado general de la guía y la guarda	X		X		X		X		X					
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)	X		X		X		X		X					
Condiciones de orden y aseo	X		X		X		X		X					
OTROS														
INSPECCIONADO POR: Roberto Casas.														
Vo. Bo Inspector DE SST: Lina Otálora.	Lina O.		Lina O		Lina O		Lina O.		Lina O					

INGEBLAR S.A.S

FORMATO INSPECCIÓN DE ANDAMIOS.

Codigo:
Versión:
Fecha:

OBRA: Mantenimiento y adecuación de instalaciones

RESPONSABLE DEL ANDAMIO: Julio Salcedo.

FECHA DE INSPECCIÓN: 13/08/22 LUGAR DE INSPECCION: Fuerza Aerea Yopal.

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Jina Otálora.

ACTIVIDAD O ÁREA: Sanidad / Desmonte de Drywall e instalacion techo PVC y luminarias.

CRITERIO: APROBADO X NO APROBADO

DESCRIPCION	ITEM	CRITERIOS	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		CUMPLE -NO CUMPLE - NO APLICA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
ESTADO DE ACCESORIOS	1	Las plataformas de trabajo y acceso estan en buenas condiciones (deformaciones, grietas, oxidación)	X			X			X			X			X								
	2	Las verticales se encuentran en buen estado tuberia y rocetas (oxidación, deformación, fracturas, etc)	X			X			X			X			X								
	3	Diagonales en buen estado (oxidación, deformación, fracturas, etc)	X			X			X			X			X								
	4	Abrazaderas	X			X			X			X			X								
	5	La escalera esta en buenas condiciones laterales y peldaños (oxidación, deformación, fracturas, etc)	X			X			X			X			X								
	6	Terreno armado andamio	X			X			X			X			X								
	7	Pines/pasadores sin puntas o filos sobresaliendo	X			X			X			X			X								
	8	Horizontales en buen estado (oxidación, deformación, fracturas, etc)	X			X			X			X			X								
	9	Rodapies		X			X			X			X			X								
	10	Bases (tornillos niveladores, rodachines, base collarin)	X			X			X			X			X								
	11	Abrazaderas	X			X			X			X			X								
ARMADO	12	Esta el andamio nivelado	X			X			X			X			X								
	13	Zapatas en la base de los andamios	X			X			X			X			X								
	14	Rodachinas en la base de los andamios	X			X			X			X			X								
	15	Los rodachines cuentan con frenos de seguridad.	X			X			X			X			X								
	16	Esta armado sobre superficie adecuada firme	X			X			X			X			X								
	17	Cuenta con pines de aseguramiento entre secciones	X			X			X			X			X								
	18	Firmemente asegurado a estructura fija contra movimiento	X			X			X			X			X								
	19	La estabilidad del andamio es segura según relación base altura	X			X			X			X			X								
	20	Se encuentra con un sistema adecuado para acceder a superficies de trabajo (escaleras)	X			X			X			X			X								
	21	La plataforma donde se trabaja esta completa sin peligro de caida de personas o materiales	X			X			X			X			X								
	22	Plataforma de trabajo esta bien asegurada a la estructura del andamio	X			X			X			X			X								
	23	Cuenta con barandas en plataforma de trabajo para prevenir caidas	X			X			X			X			X								
	24	Cuenta con rodapiés en plataforma de trabajo para prevenir caidas		X			X			X			X			X								
USO	25	Los trabajadores cuentan con sistema protección individual contra caida de alturas	X			X			X			X			X								
	26	Los usuarios del andamio utilizan los EPP necesarios para la actividad	X			X			X			X			X								
	27	Los trabajadores se encuentran debidamente anclados	X			X			X			X			X								
	28	Se cuenta con puntos de anclajes seguros (la misma estructura o independiente)	X			X			X			X			X								
	29	El andamio se encuentra en orden y aseo	X			X			X			X			X								
	30	Las herramientas usadas en la labor se encuentran aseguradas para evitar caidas accidentales	X			X			X			X			X								
	31	El andamio esta siendo utilizado para la carga maxima permitida	X			X			X			X			X								
	32	Se encuentra demarcada y señalizada el area de trabajo	X			X			X			X			X								
	33	Los accesorios se almacenan de forma segura separados por forma y tamaño.	X			X			X			X			X								

INGEBLAR S.A.S	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADROS	Codigo:
		Versión:
		Fecha:

PROYECTO:	Mantenimiento y adecuación de instalac	LUGAR:	Fuerza Aerea Yopal - Sanidad		
ACTIVIDAD:	Desmonte drywall, instalacion techo PVC.			MARCA:	Makita
SEMANA DEL	13/06/2022	AL	18/06/2022	DE	

	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sabado			Domingo		
Estado (B; Bueno, R; Regular, M; Malo)	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
Estado y funcionamiento del porta brocas	X			X			X			X			X								
Estado y funcionamiento de mandril	X			X			X			X			X								
Estado y funcionamiento del interruptor	X			X			X			X			X								
Estado del mango	X			X			X			X			X								
Estado del cuerpo	X			X			X			X			X								
Estado de entrada de corriente eléctrica (cables)	X			X			X			X			X								
Estado de botón cambio de giro	X			X			X			X			X								
Estado general del taladro	X			X			X			X			X								
INSPECCIONADO POR: Roberto Casas																					
Vo. Bo Inspector DE SST: Tina Otálora.	Lina O.			Lina O.			Lina O.			Lina O.			Lina O.								

Acción que se realiza después de la inspección

Sacar de servicio		Reparar antes de usar		Usar con restricción		Usar sin acción	X

OBSERVACIONES:

CONDICIONES DE SALUD DEL TRABAJADOR

DENTIFICACION EMPRESA: Ingeblar S.A.S. FECHA Y HORA: 13/06/2022.

NOMBRES: Roberto Casas APELLIDOS: Usuguen.

EDAD: 41 CARGO: Maestro Construcción. TRABAJO: Mantenimiento.

TAREA DE ALTO RIESGO A REALIZAR:

ESPACIOS CONFINADOS ___

TRABAJO EN ALTURAS X

TEMPERATURAS EXTREMAS ___

OTROS ___


ANTECEDENTES

	SI	NO
• Hipertensión no controlada	___	X
• Daltonismo	___	X
• Trastorno psiquiátrico	___	X
• Claustrofobia	___	X
• Fobia a las alturas	___	X
• Anemia	___	X

CONDICION ACTUAL




• Trastorno osteomuscular activo	___	X
• Trastorno del equilibrio Mareo, vértigo	___	X
• Trastorno auditivo	___	X
• Trastorno del sueño	___	X
• Vomito	___	X
• Consumo de medicamentos que afectan órganos de los sentidos, capacidad de reacción.	___	X
• Consumo de alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 24 horas antes	___	X

Certifico que la información consignada en esta ficha es verídica, en este momento no padezco ninguna condición física conocida por mí que pueda afectar mi desempeño en la tarea de alto riesgo en la cual estaré involucrado.



cc. 79218.255

Firma del Trabajador

FECHA	14/06/22.	15/06/22	16/06/22.	17/06/22	
FIRMA					

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRABAJO EN ALTURAS

CODIGO:
VERSIÓN:00
FECHA: 03/04/2018

ACTIVIDAD: Instalaciones y mantenimiento y accesorios
EMPRESA: Fuerza Aerea Yopal
RESPONSABLE: Jinci Ofd Lorca
FECHA: Semana DEL 13 AL 17 DE Junio 2022

ITEM	ASPECTOS A EVALUAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
1	Se ha diligenciado permiso de trabajo	X			X			X			X			X								
2	Se ha realizado charla de seguridad antes de iniciar el trabajo	X			X			X			X			X								
3	Existe un AST o Análisis de riesgo vigente para la tarea y los controles recomendados han sido dispuestos	X			X			X			X			X								
4	Ha sido revisado el método de acceso al sitio: Escaleras portátiles o fijas, lineas de izaje, andamio	X			X			X			X			X								
5	La linea de vida ha sido inspeccionada?, Es adecuada para soportar una caida			X			X			X			X			X						
6	Se cuenta con arnés de cuerpo entero y este ha sido inspeccionado	X			X			X			X			X								
7	Se ha hecho una inspección reciente de los elementos propios del área de trabajo que tengan el riesgo de caer	X			X			X			X			X								
8	Se ha verificado que el método de subir herramientas hacia el sitio de trabajo es seguro	X			X			X			X			X								
9	Se ha señalizado / aislado el área debajo de la cual se realizará el trabajo	X			X			X			X			X								
10	Se cuenta con cuerdas para amarrar las herramientas cuando se este realizando el trabajo		X			X			X			X			X								
11	Se ha dispuesto de un método para asegurar que piezas retiradas durante el trabajo en altura no caigan? Algún tipo de recipiente	X			X			X			X			X								
12	Se ha previsto un método para asegurar elementos, equipos o piezas que vayan a ser retiradas o manipuladas desde lo alto			X			X			X			X			X						
13	El peso / volumen de las piezas, elementos o equipos que se vayan a manipular en lo alto es adecuado para la capacidad de la plataforma de trabajo y de la persona(s) que realizará el trabajo	X			X			X			X			X								
14	Se han inspeccionado todos los elementos de izaje que se vayan a utilizar durante el trabajo			X			X			X			X			X						
15	Las condiciones fisicas de quien va trabajar en altura son adecuadas	X			X			X			X			X								
ITEM	LA PLATAFORMA																					
1	Es firme	X			X																	
2	Se encuentra en orden, no hay objetos sueltos	X			X																	
3	Cuenta con barandas	X			X																	
4	Tiene instalados rodapiés		X			X																
5	Tiene el piso cubierto para evitar caida de objetos pequeños por rendijas	X			X																	
Vo.Bo. Ejecutante o Inspector		firmo			firmo			firmo.			firmo.			firmo.								

OBSEVACIONES:

INGEBLAR S.A.S Gerencia, Consultoría & Construcción	Asistencia a Capacitación, Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA:	14/06/2022	LUGAR:	Sanidad Fuerza Aerea Yopal.
TIEMPO EN MINUTOS:	15 minutos.		
NOMBRE CAPACITADOR:	Lina Olálora.	EMPRESA:	BFC-Bellator Fortis Con

TEMA: Uso eficiente de la energia.

OBJETIVO: Sensibilizar acerca de la importancia del ahorro de energia, uso adecuado y prudente de la misma.

PARTICIPANTES

ITEMS	NOMBRE	N° DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Diego Rondón	74.947.120.	Maestro Constrc.	Diego R.
2	Jesus Rondón.	1022365767	MAESTRO	
3	Roberto Casas.	79218.255	Maistro	
4	Oscar Calvo	1122236333	Ayudante	
5	Jeyson Forero.	1'116.545.102	ING. RESIDENTE 1	
6	Julieth Anaya.	1005552109	Ingeniera Residente 2	
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES: Se realizo calistenia, socialización de ATS y recomendaciones permiso de trabajo.

INGEBLAR S.A.S Gerencia, Consultoría & Construcción	Asistencia a Capacitación,Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA:	15/06/2022.	LUGAR:	Sanidad-Fuerza Aerea Yopal.
TIEMPO EN MINUTOS:			
NOMBRE CAPACITADOR:	Finca Otálora.	EMPRESA:	Bellafor Fortis Construcciones

TEMA: Concentración en el Trabajo.

OBJETIVO: Concientizar la importancia de mente, ojos y manos en la tarea, para evitar accidentes.
- Actitud laboral alcada en el Trabajo.

PARTICIPANTES

ITEMS	NOMBRE	N° DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jeyson Forero.	1116.545.102.	Ingen. Residente 1.	
2	Juleth Anaya.	1.065.552.109	Ingen. Residente 2.	
3	Diego Rondón.	79.997.120	Maestro Construc.	
4	Jesús Rondón	1.022.365.767	Maestro.	
5	Roberto Casus Usaguen.	79.218.255.	Maestro Constru.	
6	Oscar Calvo	1.122.236.333	Ayudante Constr	
7				
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES: Se realizan estiramientos.
- Controles ATS y permiso de Trabajo.

INGEBLAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código:
		Versión: 00
		Fecha:

Nombre actividad: Cambio tuberia EMT, montaje cielo raso PVC. Fecha: 15/06/22.

Herramientas usadas: taladros, esmeriladora, herramienta menor Lugar: Sanidad - Fuerza Aerea Yopal.

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Preparacion area de trabajo Alistamiento de herramientas.	-mecanico (herramient y prezas) locativo (orden y aseo, instalaciones)	-cortes, heridas. -caidas, golpes, fracturas, lesiones miembros sup e inf.	-Inspeccionar la herramienta y el entorno de trabajo -Autocuidado.
Desmontaje de cielo raso Drywall.	-Trabajo en altura. -Biologico (virus, bacterias) excrementos -Ruido de impacto. -caida de objetos	-Caidas, atrapam. Fractura. -Infeccion, alergias. -lesiones auditivas. -Golpes, contusión, hematoma	Uso de EPP. Proteccion respiratoria, guantes -uso de tapa oidos. -señalizacion.
Evacuacion de material desmontado Instalación de techo PVC.	-Quimico (polvos org. inorganicos), excrement. -Trabajo en altura, -Herr. cortopunzantes.	-Mareo, cefalea, alergia. -Golpes, Fracturas graves traumatismo. -Heridas, cortaduras	Uso de proteccion respiratoria. -Inspeccion de andamio -uso de arnes y EPP. -Inspeccion de herram.
Adecuacion de tierra, montaje tuberia EMT	-Trabajo en altura con andamio. -movimientos repetitivos -Posturas Forzadas.	- Traumatismo, Fracturas, - Atrapamientos. -Estres, agotamiento muscular.	-verificar estabilidad del andamio. -Realizar estiramient. pausas activas e hidrat.
Orden, aseo del lugar de Trabajo.	-Manejo manual de cargas. -levantamiento de carga. -Bromecanico; biologico.	- lesiones osteomusculares - Agotamiento Fisico. - Picaduras, virus o bacterias.	-usar buenas posturas de trabajo. -Trabajo en equipo -uso de EPP.

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Lina Otálora L	1.002.758.241.	Inspectora SST	Lina Otálora L.
Jeyson Forero.	1.116.545.102.	Ingeniero Residente 1.	
Julieth Anaya	1.005.552.109.	Ingeniera Res	
Diego Rondon.	79.694.120.	Maestro construcción	D. Rondon.
Jesus Rondón.	1.022.365.767.	Maestro construcción	
Roberto Casas.	79.218.255.	Maestro Construcción	
Oscar Calvo.	1.122.236.333.	Ayudante Construcción.	

Escaneado con CamScanner

INGEBLAR S.A.S Gerencia, Consultoría & Construcción	Asistencia a Capacitación, Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA:	16/06/2022	LUGAR:	Sanidad - Fuerza Aerea Yopal
TIEMPO EN MINUTOS:	15 minutos.		
NOMBRE CAPACITADOR:	Tina Otálora.	EMPRESA:	BFC - Bellator Fortis C.

TEMA: Autocuidado.

OBJETIVO: Que los trabajadores practiquen el autocuidado en la realización de las actividades.

PARTICIPANTES

ITEMS	NOMBRE	N° DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jhon Isaac Usaquen.	1024.467.063.	Maestro Construcc.	Jhon Usaquen
2	Roberto Casas Usaquen	79.218.255.	Maestro Construc.	
3	Diego Rondón	79.997.120	Maestro Constr.	Diego R.
4	Julieth Arcaya,	1.005.552.109	Ingeniera Resid 2	
5	Jesús Rondón	1.122.236-333	Maestro Constr.	
6	Oscar Calvo.	1.022.365.767	Ayudante Constr.	
7	Jeyson Forero.	1116.545.102.	Ingeniero Resid 1.	
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES: Se realiza estiramiento, ATS y socialización permiso de trabajo.

INGEBLAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código:
		Versión: 00
		Fecha:

Nombre actividad: Desmonte de ventanas, instalación cielo raso PVC. Fecha: 16/06/2022

Herramientas usadas: Herramienta menor, taladro, Polidora. Lugar: Sanidad – Fuerza Aerea Yopal.

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Alistar materiales, herramientas y EPP.	-mecánico uso de herramienta, prensas, -locativo superficies de trabajo.	Cortes, golpes Caidas, Fracturas	-Inspección visual del area de trabajo y la herramienta. -Al finalizar la jornada dejar en orden y aseo
Desajustar y desmontar ventanas.	-Caida de objetos. - Material particulado. biomec. levantamiento manual de cargas.	lesiones en miembros superiores, -lesiones oculares. > lesión osteomuscular.	-Autocuidado
Instalación de cornisa perimetral y techo PVC.	-Herramienta cortopunz. -Trabajo en alturas. -movim. repetitivos.	-Cortes, heridas. -traumatismo, Fractura leve o grave -Cansancio, estres, deshidratación.	-Acompañamiento al personal -Hidratación. uso de EPP, pausas activ. estiramiento. hidratación.
Aplicar resanes en estuco y pintura vinilo tipo 1.	Quimico (gases, vapores) olores fuertes y toxicos -movim. repetitivos	> mareo, dolor de cabeza, afección respiratoria -Agotamiento osteomuscular.	-uso de proteccion manos, y respiratoria.
Armado de andamio. -Desmonte cielo raso Drywall.	-manipulacion manual de carga (levantam) - trabajo en alturas. -Desplome de andamio -caida de objetos.	Golpes, fracturas. Traumatismo Atrapamientos Golpes, hematomas, lesión en ojos	-uso de Equipos y EPP. inspección de andamios. -Acompañamiento al pers. -Señalizar y delimitar area de trabajo

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Jina Otálora t.	1.002.758.847.	Inspector SST.	Jina Otálora L.
Diego Rondón.	79.992.120.	Maestro Construcción.	Diego R.
Jesús Rondón	1.122.236.333	Maestro Construcción.	
Roberto Casas.	79.218.255.	Maestro Construcción	
Jhon Isaac Usaquen.	7.024.467.063.	Maestro Construcción	
Juliath Araujo.	1.005.582.109.	Ingeniera Residente	
Jeyson Forero.	1.116.545.102.	Ingeniero Residente	
Oscar calva.	1.122.236.333.	Maestro Construcción	

Escaneado con CamScanner

INGEBLAR S.A.S Gerencia, Consultoría & Construcción	Asistencia a Capacitación,Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA:	17/06/2022.	LUGAR:	Sanidad - Fuerza Aerea Yopal
TIEMPO EN MINUTOS:	15 minutos.		
NOMBRE CAPACITADOR:	Tina Otálora.	EMPRESA:	BFC. Bellator Fortis Construc.

TEMA: Incidentes laborales.

OBJETIVO: Concientizarnos que muchos de los accidentes se pueden evitar, si de los incidentes tomamos medidas preventivas para evitar que este se convierta en un accidente.

PARTICIPANTES

ITEMS	NOMBRE	N° DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jhon Isaac Usaquen.	1.031.467.063	Maestro Constr.	
2	Roberto Casas Usaquen	79.218.255	Maestro Const.	
3	Diego Rondón triana.	79.4C7.120.	Maestro Const.	
4	Julieth Anay C.	1.005.552.109	Ing. Residente 2.	
5	Jesus Rondon triana	1022.365.767	Maestro Const.	
6	Oscar Calvo	1.122.236.333	Ayudante Const.	
7	Jeyson Pinero	1116.545.102	Ing. Residente 1.	
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES: Se realiza calistenia.

INGEBLAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código: Versión: 00 Fecha:

Nombre actividad: levantamiento piso Fecha: 17/06/2022 - 18/06/2022.

Herramientas usadas: Martillo, cincel, taladro, pulidora, h.menor Lugar: Sanidad Fuerza Aerea Yopal

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Aislamiento de herramienta y material.	Locativo(condiciones de orden y aseo) -Mecánico(uso de herr. manuales, prezas).	caidas, golpes, fracturas. Heridas, contusión, herretarra	-verificar entorno de trabajo y inspeccion visual de herramienta. - Dejar en orden el lugar
Aplicación de resanes en estuco. pintura vinilo.	-Quimicos(productos toxicos). Gases vapores. Biomec(movim. repetitivos)	- lesiones respiratorias - Mareo, dolor de cabeza. - Espasmos musculares, cansancio. osteomuscular.	- uso de Elementos de protección personal, mascarilla respirato. - Realizar estiramientos - Hidratación.
Instalacion cielorraso PVC y Luminaria.	-Trabajo en alturas - Manipulación de anda -Caida de objetos.	- caidas fracturas, traumatismo - Atrapamientos, golpes fue. - Golpes, hematomas, lesiones en el cuerpo.	- Inspección de equipos - andamio, uso de EPP -señalizar y delimitar area de trabajo. -uso de casco barbuquin
levantamiento de piso.	Ruido intermitente. Material particulado Mecánico(uso de herramienta cortopunzante	- lesiones auditivas. - lesiones visuales. - Golpes, heridas, hematomas.	-uso de protección visual y auditiva. -Autocuidado. - Inspección de herram. -Estiramiento.
levantamiento y relleno de muros	-Quimicos(polvos organicos e inorganicos) -movimientos repetitivos. -Material particulado	- Afección respiratoria, pulmonar. - Dolor muscular, cansancio. -lesion ojos, piel.	-uso de Protección respiratoria. -estiramientos, protección visual y demas EPP.

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Tina Otálora.	Inspectora SST	1007758841.	Tina Otalora J.
Jhon Isaac Usaquen	1.024.467.063.	Maestro Construccion.	Jhon Usaquen.
Jolreth Anaya.	1.085.532.109	Ingeniera Residente2	
Roberto Casas Usaquen	79.218.255.	Maestro Construccion.	
Diego Rondón Triana	79.907.120.	Maestro Construccion.	Diego R.
Jesus Rondón	1.022.365.767.	Ayudante construc.	
Oscar Calvo	1.122.236.333.	Ayudante Construc.	
Carlos Diaz		Super u. Administrad.	
Jeyson Forero.	1.116.545.102.	Ingeniero Residente	

Escaneado con CamScanner

INGEBLAR S.A.S Gerencia, Consultoría & Construcción	Asistencia a Capacitación, Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA:	21/06/2022.	LUGAR:	Sanidad - Fuerza Aerea Yopal.
TIEMPO EN MINUTOS:	10 minutos.		
NOMBRE CAPACITADOR:	Jira Otálora	EMPRESA:	BFC Bellator Fortis Const.
TEMA:	Material particulado.		
OBJETIVO:	Fomentar la cultura de autocuidado, informar los riesgos del material particulado y recordar la importancia del uso de protección respiratoria y visual		

PARTICIPANTES

ITEMS	NOMBRE	N° DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jhon Isaac Usuguen	1.024.467.083	Maestro Construc.	
2	Roberto Casas	79.248.255.	Maestro Construc.	
3	Diego Rondón	79.947.120.	Maestro Construc.	
4	Jesús Rondón	1.022.365.767	Ayudante Constr.	
5	Oscar Calvo.	1.122.236.333	Ayudante Constr.	
6	Jeyson Forero.	1.116.543.102.	Ingeniero Resident.	
7	Carlos Diaz	71.795.722	Superv. Administrat.	
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES: Se realiza calistenia, análisis de riesgo y permiso de trabajo.

INGEELAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código:
		Versión: 00
		Fecha:

Nombre actividad: Desmonte Drywall, pañetar, montaje PVC. Fecha: 21/06/2022 - 22/06/2022.

Herramientas usadas: Taladro, Soldadura, cortefillo, herr. menor. Lugar: Sanidad - Fuerza Aerea Yopal.

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Alistamiento de herramienta y material de trabajo.	mecanico (herramientas, Piezas, materiales). locativo(medios de almacen. orden y aseo, caida de objetos).	- cortes, heridas. - caidas, golpes leves o graves.	- Inspeccion visual de herramienta y entorno de trabajo. - Orden y aseo.
Desmontaje de Drywall - cambio de estructura techo.	- Trabajo en alturas. - Polvos organicos e inorganicos, excrementos - Mecanico (herramienta). - caida de objetos.	- caidas, fracturas graves o leves - Alergia, mareo, dolor de cabeza. - Golpes, hematomas, contusión	- Uso de Epipes y epp. - Proteccion respiratoria - señalizacion.
> Preparar mezcla de cemento. > levantar pared relleno ventanas.	Quimico (polvos inorg) Biomecanicos (movim. repetitivo postura prolongada). Material particulado	- Mareo, cefalea, afeccion en vias respiratorias. - Agotamiento osteomuscular. - lesiones visuales.	> Proteccion respirat. - Pausas activas, estiramiento. - proteccion visual.
Aplicacion de pintura. vinilo, estuco. Resanes en estuco, estucar	- Quimico (gases y vapores - Posturas incomodas, movim. repetitivos.	- Afeccion respiratoria, - Agotamiento fisico. - Dolores musculares.	- Uso de proteccion respiratoria, mascarilla - Ropa industrial. - Guantes PVC.
Montaje techo en PVC y luminarias.	- Trabajo en altura. - caida de objetos. - Desplome de andamio. - Herramienta cortopunz. - Paso de energia el	caida, Fracturas, traumatismo - Golpes/lesiones en el cuerpo - Atrapamiento, Fracturas. - cortes heridas - Paso de tension.	- uso de Elementos prot. personal. - caidas con objetos. - Inspeccion de andamio - Bajar breakers.

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Jina Otálora Lopez	1002.758.841	Inspectora SST	Jina Otálora L.
Diego Rondón.	79.997.120.	Maestro construcción	- Diego R.
Jesús Rondón	1-022.365.767.	Maestro.	-
Roberto Casas.	79.218.255.	Maestro construcción	-
Oscar Calvo.	1.122.236.333.	Ayudante Construcción.	
Jhon Isaac usaquen.	1.024.467.063	Maestro Construcción	
Carlos Diaz	71.795.722	Superv. Administrativo.	
Jeyson Forero.	1.116.545.102	Ingeniero Residente.	

INGEBLAR S.A.S
Ingeniería, Construcción & Consultoría

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADROS

Codigo:
Versión:
Fecha:

PROYECTO: Mantenimiento y adecuacion Instalaciones | LUGAR: Fuerza Aerea Yopal-Sanidad

ACTIVIDAD: Desmonte drywall, montaje techo PVC y Luminaria. | MARCA: Makita.

SEMANA DEL 21/06/2022 AL 25/06/2022. DE

	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sabado			Domingo		
Estado (B; Bueno, R; Regular, M; Malo)	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
Estado y funcionamiento del porta brocas				X			X			X			X			X					
Estado y funcionamiento de mandril				X			X			X			X			✓					
Estado y funcionamiento del interruptor				X			X			X			X			X					
Estado del mango				✓			X			X			✓			X					
Estado del cuerpo				✓			X			X			✓			X					
Estado de entrada de corriente eléctrica (cables)				X			X			X			X			✓					
Estado de botón cambio de giro				X			✓			X			X			X					
Estado general del taladro				X			X			X			✓			X					
INSPECCIONADO POR: Roberto Casas.																					
Vo. Bo Inspector DE SST: Lina Otálora.				Lina O.			Lina O			Lina O			Lina O.			Lina O					

Acción que se realiza después de la inspección

Sacar de servicio		Reparar antes de usar		Usar con restricción		Usar sin acción	X

OBSERVACIONES:

CONDICIONES DE SALUD DEL TRABAJADOR

DENTIFICACION

EMPRESA: Ingeblar S.A.S. FECHA Y HORA: 21/06/2022.

NOMBRES: Roberto Carlos APELLIDOS: Casas Usaquen.

EDAD: 41 CARGO: Maestro constrcc TRABAJO: Mantenimiento.

TAREA DE ALTO RIESGO A REALIZAR:

ESPACIOS CONFINADOS	___
TRABAJO EN ALTURAS	X
TEMPERATURAS EXTREMAS	___
OTROS	___

ANTECEDENTES

	SI	NO
• Hipertensión no controlada	___	X
• Daltonismo	___	X
• Trastorno psiquiátrico	___	X
• Claustrofobia	___	X
• Fobia a las alturas	___	X
• Anemia	___	X

CONDICION ACTUAL

• Trastorno osteomuscular activo	___	X
• Trastorno del equilibrio Mareo, vértigo	___	X
• Trastorno auditivo	___	X
• Trastorno del sueño	___	X
• Vomito	___	X
• Consumo de medicamentos que afectan órganos de los sentidos, capacidad de reacción.	___	X
• Consumo de alcohol y/o drogas psicoactivas hasta 24 horas antes	___	X

Certifico que la información consignada en esta ficha es verídica, en este momento no padezco ninguna condición física conocida por mí que pueda afectar mi desempeño en la tarea de alto riesgo en la cual estaré involucrado.

C.C. 79'218.253

Firma del Trabajador

FECHA	22/06/22	23/06/22	24/06/22	25/06/2022	
FIRMA					

INGEBLAR S.A.S

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRABAJO EN ALTURAS

CODIGO:
VERSIÓN:00
FECHA: 03/04/2018

ACTIVIDAD: Mantenimiento y adecuacion de instalacion. | EMPRESA: Fuerza Aerea Hosp. | RESPONSABLE: Ina Otálora. | FECHA: Semana DEL 21 AL 25 DE Junio 20 22

ITEM	ASPECTOS A EVALUAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
1	Se ha diligenciado permiso de trabajo				X			X			X			X								
2	Se ha realizado charla de seguridad antes de iniciar el trabajo				X			X			X			X								
3	Existe un AST o Análisis de riesgo vigente para la tarea y los controles recomendados han sido dispuestos				X			X			X			X								
4	Ha sido revisado el método de acceso al sitio: Escaleras portátiles o fijas, líneas de izaje, andamio				X			X			X			X								
5	La línea de vida ha sido inspeccionada?, Es adecuada para soportar una caída						X			X			X			X						
6	Se cuenta con arnés de cuerpo entero y este ha sido inspeccionado				X			X			X			X								
7	Se ha hecho una inspección reciente de los elementos propios del área de trabajo que tengan el riesgo de caer				X			X			X			X								
8	Se ha verificado que el método de subir herramientas hacia el sitio de trabajo es seguro				X			X			X			X								
9	Se ha señalizado / aislado el área debajo de la cual se realizará el trabajo				X			X			X			X								
10	Se cuenta con cuerdas para amarrar las herramientas cuando se este realizando el trabajo					X			X			X			X								
11	Se ha dispuesto de un método para asegurar que piezas retiradas durante el trabajo en altura no caigan? Algún tipo de recipiente				X			X			X			X								
12	Se ha previsto un método para asegurar elementos, equipos o piezas que vayan a ser retiradas o manipuladas desde lo alto						X			X			X			X						
13	El peso / volumen de las piezas, elementos o equipos que se vayan a manipular en lo alto es adecuado para la capacidad de la plataforma de trabajo y de la persona(s) que realizará el trabajo				X			X			X			X								
14	Se han inspeccionado todos los elementos de izaje que se vayan a utilizar durante el trabajo						X			X			X			X						
15	Las condiciones físicas de quien va trabajar en altura son adecuadas				X			X			X			X								
ITEM	LA PLATAFORMA																					
1	Es firme																					
2	Se encuentra en orden, no hay objetos sueltos																					
3	Cuenta con barandas																					
4	Tiene instalados rodapiés																					
5	Tiene el piso cubierto para evitar caída de objetos pequeños por rendijas																					
Vo.Bo. Ejecutante o Inspector					Lina O.			Lina			Lina O			Lina O.								

OBSEVACIONES:

INGEBLAR S.A.S

FORMATO INSPECCIÓN DE ANDAMIOS.

Codigo:
Versión:
Fecha:

OBRA	Mantenimiento y adecuación de instalaciones.	RESPONSABLE DEL ANDAMIO	Julio Salcedo
FECHA DE INSPECCIÓN	21/06/22	LUGAR DE INSPECCION	Fuerza Aerea Yopal.
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	Tina Otálora.		
ACTIVIDAD O ÁREA	Sanidad / Desmonte Drywall, montaje techo PVC y luminarias.	CRITERIO: APROBADO	X NO APROBADO

DESCRIPCION	ITEM	CRITERIOS CUMPLE -NO CUMPLE - NO APLICA	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
			C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
ESTADO DE ACCESORIOS	1	Las plataformas de trabajo y acceso estan en buenas condiciones (deformaciones, grietas, oxidación)				X			X			X			X								
	2	Las verticales se encuentran en buen estado tuberia y rocetas (oxidación, deformación, fracturas, etc)				X			X			X			X								
	3	Diagonales en buen estado (oxidación, deformación, fracturas, etc)				X			X			X			X								
	4	Abrazaderas				X			X			X			X								
	5	La escalera esta en buenas condiciones laterales y peldaños (oxidación, deformación, fracturas, etc)				X			X			X			X								
	6	Terreno armado andamio				X			X			X			X								
	7	Pines/pasadores sin puntas o filos sobresaliendo				X			X			X			X								
	8	Horizontales en buen estado (oxidación, deformación, fracturas, etc)				X			X			X			X								
	9	Rodapies					X			X			X			X								
	10	Bases (tornillos niveladores, rodachines, base collarin)				X			X			X			X								
	11	Abrazaderas				X			X			X			X								
ARMADO	12	Esta el andamio nivelado				X			X			X			X								
	13	Zapatas en la base de los andamios				X			X			X			X								
	14	Rodachinas en la base de los andamios				X			X			X			X								
	15	Los rodachines cuentan con frenos de seguridad.				X			X			X			X								
	16	Esta armado sobre superficie adecuada firme				X			X			X			X								
	17	Cuenta con pines de aseguramiento entre secciones				X			X			X			X								
	18	Firmemente asegurado a estructura fija contra movimiento				X			X			X			X								
	19	La estabilidad del andamio es segura según relación base altura				X			X			X			X								
	20	Se encuentra con un sistema adecuado para acceder a superficies de trabajo (escaleras)				X			X			X			X								
	21	La plataforma donde se trabaja esta completa sin peligro de caida de personas o materiales				X			X			X			X								
	22	Plataforma de trabajo esta bien asegurada a la estructura del andamio				X			X			X			X								
	23	Cuenta con barandas en plataforma de trabajo para prevenir caídas				X			X			X			X								
	24	Cuenta con rodapiés en plataforma de trabajo para prevenir caídas					X			X			X			X								
USO	25	Los trabajadores cuentan con sistema protección individual contra caida de alturas				X			X			X			X								
	26	Los usuarios del andamio utilizan los EPP necesarios para la actividad				X			X			X			X								
	27	Los trabajadores se encuentran debidamente anclados				X			X			X			X								
	28	Se cuenta con puntos de anclajes seguros (la misma estructura o independiente)				X			X			X			X								
	29	El andamio se encuentra en orden y aseo				X			X			X			X								
	30	Las herramientas usadas en la labor se encuentran aseguradas para evitar caidas accidentales				X			X			X			X								
	31	El andamio esta siendo utilizado para la carga maxima permitida				X			X			X			X								
	32	Se encuentra demarcada y señalizada el area de trabajo				X			X			X			X								
	33	Los accesorios se almacenan de forma segura separados por forma y tamaño.				X			X			X			X								

Escaneado con CamScanner

INGEBLAR S.A.S Gerencia, Consultoría & Construcción	Asistencia a Capacitación, Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA:	22/06/2022.	LUGAR:	Sanidad - Fuerza Aerea Yopal.
TIEMPO EN MINUTOS:	20 minutos.		
NOMBRE CAPACITADOR:	Tina Otálora.	EMPRESA:	BFC. Bellator Fortis Constr.

TEMA: Equipos contracaidas - Protecaión.

OBJETIVO: Dar a conocer los conceptos de Equipos contra caidas, su Función y la necesidad del uso en la realización de actividades en alturas.

PARTICIPANTES

ITEMS	NOMBRE	N° DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jesús Rondón Triana.	1.022.365.767	Ayud. construcción.	
2	Diego Rondón Triana.	79.997.120.	Maestro Constr.	Diego R.
3	Roberto Carlos Casas.	79.218.255.	Maestro Constr.	
4	Jhon Isaac Usaquen.	1-024.467.068	Maestro Construc.	Jhon Usaquen.
5	Oscar Calvo	1.22.236.333.	Ayudant. Construc.	
6	Jeyson Forero.	1.116.545.102.	Ingeniero Resid 1.	
7	Julieth Anaya.	1.005.552.109.	Ingeniera Resid 2.	
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES: Se realizan estiramientos, recomendaciones y controles actividades a realizar..

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

TAMIZAJE ESTADO DE SALUD DE LOS TRABAJADORES

Código:
Versión:
Fecha:

FECHA: 22/06/2022 LUGAR: Sanidad - Fuerza Aerea Yopal

DATOS				¿Sufre alguna de estas enfermedades?							Sintomas					
NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	Cancer	Diabetes	Enfermedad pulmonar	Sistema inmune debilitado	Afección cardiaca	Falla renal(riñones)	Hepatopatia (higado)	Fiebre	Tos	Dificultad par arespirar	Secreción nasal	Fatiga	FIRMA
Jeyson	Forero.	1.116.545.102	Ing Residente	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Isaac	Usuagen.	1.024.467.063	Maestro Con	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Diego	Rondón.	79.997.120.	Maestro Const.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Jesus	Rondón.	1.022.365.767	Ayud. Const.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Roberto	Casas.	79.218.255.	Maestro Cont	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Oscar	Calvo.	1.122.236.333	Ayud. Constr.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Julieth	Anaya.	1.005.552.109	Ing Resid	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Lina	Otálora.	1.002.88.814	Inspector SST	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	

INGEELAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código:
		Versión: 00
		Fecha:

Nombre actividad: Desmonte Drywall, pañetar, montaje PVC. Fecha: 21/06/2022. - 22/06/2022.

Herramientas usadas: Taladro, soldadora, cortefilla, herr. menor. Lugar: Sanidad - Fuerza Aerea Yopal.

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Alistamiento de herramienta y material de trabajo.	mecanico (herramientas, piezas, materiales) locativo(medios de almacen. orden y aseo, caida de objetos).	- cortes, heridas. - caidas, golpes leves o graves.	- Inspeccion visual de herramienta y entorno de trabajo. - Orden y aseo.
Desmontaje de Drywall - Cambio de estructura techo.	- Trabajo en alturas. - Polvos organicos e inorganicos, excrementos - Mecanico (herramientas). - caida de objetos.	- caidas, Fracturas graves o leves - Alergia, mareo, dolor de cabeza - Golpes, hematomas, contusión	- Uso de Epipes y epp. - Proteccion respiratoria - señalizacion.
> Preparar mezcla de cemento. > levantar pared relleno ventanas.	Quimico (polvos inorg) Biomecanicos (movim. repetitivo postura prolongada). Material particulado	- Mareo, cefalea, afeccion en vias respiratorias. - Agotamiento osteomuscular - lesiones visuales.	> Proteccion respirat. - Pausas activas, estiramiento. - proteccion visual.
Aplicacion de pintura. vinilo, estuco. Resanes en estuco, estucar	- Quimico gases y vapores - posturas incomodas, movim. repetitivos.	- Afeccion respiratoria, - Agotamiento Fisico. - Dolores musculares.	- Uso de proteccion respiratoria, mascarilla. - Ropa industrial. - Guantes PVC.
Montaje techo en PVC y luminarias.	- Trabajo en altura. - caida de objetos. - Desplome de andamio. - Herramienta cortopunz. - Paso de energia electrica	caida, Fracturas, traumatismo - Golpes, lesiones en el cuerpo - Atrapamiento, Fracturas. - cortes, heridas - paso de tension.	uso de elementos prot. personal. - caidas con objetos. - Inspeccion de andamio - Bajar breakers.

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Tina Otálora Lopez	1002.758.841	Inspectora SST	Tina Otálora L.
Diego Rondón.	79.997.120	Maestro construcción	- Diego R
Jesús Rondón	1.022.365.767.	Maestro.	-
Roberto Casas.	79.218.255.	Maestro construcción	-
Oscar Calvo.	1.122.236.333.	Ayudante Construcción.	
Jhon Isaac usagen.	1.024.467.063	Maestro Construcción	
Carlos Diaz	71.795.722	Superv. Administrativo	
Jeyson Forero.	1.116.545.102	Ingeniero Residente.	

INGEBLAR S.A.S Gerencia, Consultoría & Construcción	Asistencia a Capacitación, Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA:	23/06/2022.	LUGAR:	Sanidad - Fuerza Aerea Yopal.
TIEMPO EN MINUTOS:	10 minutos.		
NOMBRE CAPACITADOR:	Lina Otálora.	EMPRESA:	BFC Bellator Fortis.

TEMA: Actitudes y procedimientos de trabajo seguros.

OBJETIVO: Fomentar en los trabajadores la practica de actitudes y realización de actividades siguiendo paso a paso de trabajo seguros.

PARTICIPANTES

ITEMS	NOMBRE	N° DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Diego Rondon Triana	79.997.120	Maestro construcc.	
2	Jesus Rondón Triana.	1022.365.767	Ayudant. constr.	
3	Jhon Isaac Usaquen.	1.024.467.063	Ayudante Constr.	
4	Roberto Casas usaquen	79.218.255.	Maestro Construcc.	
5	Oscar Calvo.	1.122.236.333	Maestro Constr.	
6	Julieth Anaya.	1.005.552.109	Ingeniera Resid 2.	
7	Jeyson Forero.	1116.545.102.	Ingeniero Resid 1.	
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES: Se realiza realistenia, analisis de riesgo y recomendaciones.

INGEBLAR S.A.S

ATS (Analisis de Trabajo Seguro)

Código:
Versión: 00
Fecha:

Nombre actividad: Pellero de muro en bloque, pañetar y estucar. Fecha: 23/06/22 - 24/06/2022

Herramientas usadas: Carretilla, palustre, pala. Lugar: Sanidad - Fuerza Aerea Yopal

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Alistamiento de material y herramienta.	• Psicosocial (gestión organizacional del trabajo) Mecanico (manip de piezas y herramienta) condiciones de orden y aseo	- Estres, desmotivación. - Golpes, hematomas, contusión. - caidas, golpes, fracturas.	- Inspeccion visual de areas de trabajo. - mantener orden y aseo, buena comunicación - Inspección de herramt.
Preparar mezcla cemento.	Quimico (polvos organicos e inorganicos), material particulado: levantamiento de cargas. Movimiento repetitivo.	- Afeccion en vias respiratorias, infeccion pulmonar. - Dolores musculares, desgarros. - Agotamiento osteomuscular.	- uso de protección respiratoria, visual. - Posturas ergonomicas. - Estiramiento. - Hidratacion.
Pegar bloque para rellenar pared, levantar muro.	Quimico material partic. Biome (movim. repetitivos) postura prolongada. Mecanico uso de piezas y herramientas.	- Enfermedades respiratorias. - Agotamiento muscular, cansancio - golpes, heridas, hematomas.	- uso de mascarilla, uso de gafas. - Estiramientos, descansos. - Inspección de heram. - Autocuidado
Pañetar	material particulado, movimientos repetitivos. Fisico (temper: extr calor), condiciones ayur (superficie de trabajo, cond de orden).	- lesiones respiratorias y visuales. - Golpe de calor, estres, deshidrat. - caidas, golpes, fracturas.	Proteccion respiratoria y visual. - Hidratacion constante. - orden y almacenam de material.
Montaje techo en PVC. Cornisa y	- Trabajo en altura. - uso de andamio. - caida de objetos. - Herram. corto punzante postura prolongada.	caidas, golpes, fracturas Atrapamientos, golpes fuertes Golpes, heridas, hematomas. - Heridas, dolor y cansancio muscular	- Inspección de andamio. - Acompañamiento al personal, uso de EPP. - Senalizacion y delim. - verificar herram.

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Jina Otálora.	1.002.758.841.	Inspectora SST	Jina Otálora J.
Diego Rondón	79.997.120.	Maestro Construcción	
Jesus Rondón.	1.022.365.767	Ayudante Construcción.	
Oscar Calvo.	1.122.236.333.	Ayudante Constr.	
Jhon Isaac Usaquen	1.024.467.063.	Maestro Construc:	Jhon Usaquen
Roberto Cassg.	79.218.255.	Maestro Construcción.	
Jeyson Forero.	1.116.545.102.	Ingeniero Residente 1.	
Julieth Anaya.	1.006.552.604.	Ingeniera Residente 2	

Escaneado con CamScanner

INGEBLAR S.A.S Gerencia, Consultoría & Construcción	Asistencia a Capacitación, Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA:	23/06/2022.	LUGAR:	Sanidad - Fuerza Aerea Opal.
TIEMPO EN MINUTOS:	10 minutos.		
NOMBRE CAPACITADOR:	Lina Otálora.	EMPRESA:	BFC Bellator Fortis.

TEMA: Actitudes y procedimientos de trabajo seguros.

OBJETIVO: Fomentar en los trabajadores la practica de actitudes y realización de actividades siguiendo paso a paso de trabajo seguros.

PARTICIPANTES

ITEMS	NOMBRE	N° DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Diego Rondon Triana	79.997.120	Maestro constructor	
2	Jesus Rondón Triana.	1022.365.767	Ayudant. Constr.	
3	Jhon Isaac Usaquen.	1.024.467.063	Ayudante Constr.	
4	Roberto Casas Usaquen	79.218.255.	Maestro Construc.	
5	Oscar Calvo.	1.122.236.333	Maestro Constr.	
6	Julieth Arciya.	1.005.552.109	Ingeniera Resid 2.	
7	Jeyson Forero.	1116.545.102.	Ingeniero Resid 1.	
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES: Se realiza calistenia, analisis de riesgo y recomendaciones.

INGEBLAR S.A.S Gerencia, Consultoría & Construcción	Asistencia a Capacitación, Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA:	24/06/2022	LUGAR:	Sanidad - Fuerza Aerea Yopal.
TIEMPO EN MINUTOS:	10 minutos.		
NOMBRE CAPACITADOR:	Aina Otálora.	EMPRESA:	BFC.

TEMA: Trabajo en equipo

OBJETIVO: Sensibilizar al personal para practicar el buen trabajo en equipo, el cual agiliza actividades y evita accidentes de trabajo.

PARTICIPANTES

ITEMS	NOMBRE	N° DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jeyson Forero	1.116.545.102.	Ing. Residente 1.	
2	Julieth Araya Mejia	1.005.552.109.	Ing. Residente 2	
3	Diego Rondón Triana.	79.949.120.	Maestro Construc.	
4	Jesús Rondón Triana.	1.022.365.767	Maestro construcción	
5	Roberto Casas.	79.218.255.	Maestro construcción	
6	Oscar Calvo.	1.122.236.333	Ayud. construcción	
7	Jhon Isaac Usaquen.	1.024.467063.	Maestro construcción	
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES: Se realiza calistenia, socialización de controles necesarios para actividades diarias

INGEBLAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código:
		Versión: 00
		Fecha:

Nombre actividad: Fecha: 25/06/2022.

Herramientas usadas: Palustre, carretilla, h. menor Lugar: Sanidad - Fuerza Aerea Yopal

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Alistamiento de herramienta y material.	-Mecanico (piezas y herramientas) locativo (almacenamiento, obstrucción).	- Heridas, cortes. - caidas, tropezos, golpes, fracturas.	-Inspeccion visual de entorno de trabajo y herramient Autocuidado
Preparar mezcla cemento.	-Polvos organicos e inorganicos, material particulado. -Postura incomoda, movimiento repetitivo.	- lesion vias respiratorias, enfermedad pulmonar. - lesiones visuales. - Dolores musculares.	-Señalizacion. -uso prot. respiratoria y visual. -Estiramientos, descan -Inspección de herramie
Enchapar muro	Movimientos repetit. Material particulado. - Calor -Mecánico (herr. manuales)	Agotamiento osteomuscular. -lesiones respiratorias y visuales. -Deshidratación, estres.	-Breves descansos. acompañam. personal. -Uso de gafas y mascarilla. -Hidratación.
Aplicar pintura epoxica, resanes en lijar para estuco.	Quimico (gases vapores fuertes toxicos), movimiento repetitivos - Material particulado Polvo.	- Afeccion respiratoria, alergia en piel. - Cansancio, agotamiento mental y fisico, lesión en ojos y respirat.	-usar mascarilla, ropa industrial. - Pausas activas, estira. - gafas.
Realizar orden, aseo, clasificación de residuos.	-manipulación de cargas, levantamiento. -Biologicos (baideras, excrementos) - locativo (almacen.)	- Desgaire muscular, golpes, contusiones, dolor osteomuscular. - Alergia en piel, infeccion. - caidas, fracturas, traumas.	- usar buenas posturas. - correcto uso de equipos. -uso tapabocas. - Guantes.

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Ina Ofelora Lopez	1.002.758.841.	Inspectora SST.	Ina Ofelora L.
Jeyson Forero.	1.116.545.102.	Ingeniero Resid 1.	
Julieth Anaya.	1.005.552.109.	Ingeniera Resid 2.	
Jesús Rondon.	1.022.365.767	Ayud. construcción	
Diego Rondon	79.497.120	Maestro Construc	Diego R.
Roberto Casas.	1.024.467.063	Maestro Construc.	
Jhon Isaac Usaquen.	79.218.255	Maestro Construc.	Jhon Usaquen.
Oscar Calvo.	1.122.236.333	Ayudante construc.	

Escaneado con CamScanner

INGEBLAR S.A.S Gerencia, Consultoría & Construcción	Asistencia a Capacitación, Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA:	25/06/2022.	LUGAR:	Sanidad - Fuerza Aerea Yopal.
TIEMPO EN MINUTOS:	10 minutos.		
NOMBRE CAPACITADOR:	Tina Otálora	EMPRESA:	BFC.

TEMA: Riesgos Sector de la Construcción.

OBJETIVO: Fomentar el uso de EPP para construccion de obra civil, actividades de construcción, medidas preventivas.

PARTICIPANTES

ITEMS	NOMBRE	N° DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Julieth Anaya.	1.005.552.109	Ingeniera Residente.	Julieth A.
2	Carlos Diaz.		Supervisor Admtvo.	Carlos Díaz P.
3	Jesus Rondón Triana	1.022.365.767	Ayudant. Constr.	JRTs
4	Diego Rondón Triana.	79.947.120	Maestro Constru.	Diego R.
5	Oscar Calvo	1.122.236.333	Ayudant. Const.	
6	Jhon Isaac Usaquen.	1024.467.063	Maestro const	Jhon Usaquen
7	Roberto Casas.	79.218.255.	Maestro Const.	
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES: Se realiza calistenia, recomendaciones de seguridad, controles, cartas de trabajo.

INGEBLAR S.A.S

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

Código:
Versión:
Fecha:

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	21	06	2022	HORA		LUGAR	Fuerza Aerea Yopal
VALIDO DESDE	21	06	22.	HASTA		AREA:	Sanidad.

PERMISO CONCEDIDO A LOS TRABAJADORES (NOMBRE, CARGO; UNIDAD; EPS "SALUD"; AFP "PENSIÓN"; ARL "RIESGOS")

NOMBRE	CARGO	EPS	AFP	ARL
Roberto Casas Usaquen	Maestro Constr	Nueva eps.	Proteccion.	Sura.

TIPO DE TRABAJO: Mantenimiento y adecuación de instalaciones.

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA: Desmontar cielo raso Drywall. Montaje cielo raso en PVC.

ALTURA APROXIMADA A LA CUAL SE VA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD:

Riesgos asociados: caida de objetos, biologico(bacterias, etcrementos), trabajo en alturas

LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LOS SIGUIENTES SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS, DEBERÁN SER UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES DURANTE LA LABOR (MARQUE CON X)

CASCO CON BARBUQUEJO	X	ESLINGA CON ABSORVEDOR		KIT DE RESCATE	
GAFAS DE SEGURIDAD	X	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO	X	AUTORRETRACTIL	
GUANTES ANTIDESLIZANTES	X	MOSQUETON DE CIERRE AUTOMATICO		SILLA DE SUSPENSIÓN	
PROTECCION AUDITIVA	X	ANCLAJE PORTATIL (TIEE OF)		ANDAMIOS	X
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	X	LINEA DE VIDA PORTATIL		ESCALERA EXTENSIBLE	
BOTAS ANTIDESLIZANTES	X	PRETALES		ESCALERA TIJERA	
ARNÉS DE CUERPO COMPLETO	X	DESCENDEDORES		OTRO(S):	

HERRAMIENTAS A UTILIZAR:

Bisturi, taladro, pulidora, herramienta menor

PREPARACIÓN DEL AREA (MARQUE CON X)	SI	NO	NA
SE HA INSTALADO SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA QUE DELIMITE EL ÁREA DE TRABAJO (CINTA, CONOS, SEÑALES TUBULARES O POLISOMBRAS, DE TAL MANERA QUE SE PUEDA AISLAR O RESTRINGIR LA ZONA Y NO SE PERMITA EL PASO DE PERSONAS O VEHÍCULOS AJENOS A LA LABOR)	X		
EL TRABAJO EN ALTURAS MÍNIMO LO VAN A REALIZAR DOS TRABAJADORES O EJECUTORES	X		
LOS TRABAJADORES ESTAN CERTIFICADOS EN ALTURAS (CURSO AVANZADO Y/O RE-ENTRENAMIENTO VIGENTE)		X	
LOS TRABAJADORES ESTAN APTOS PARA DESARROLLAR LA LABOR (ESTADO DE SALUD Y CON CONCEPTO MEDICO VIGENTE)	X		
LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS A UTILIZAR EN LA LABOR SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	X		
LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR EN LA LABOR SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES	X		
LOS TRABAJADORES REVISAN LOS ACCESOS AL ÁREA DE TRABAJO Y LOS REQUERIMIENTOS DE RESCATE EN CASO DE PRESENTARSE UNA EMERGENCIA	X		
LOS TRABAJADORES REALIZAN EL PERMISO DE TRABAJO EN EL LUGAR A INTERVENIR	X		
LOS TRABAJADORES REALIZAN EL ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y LO SOCIALIZAN ANTES DE INICIAR LA LABOR	X		
EL LUGAR DONDE REALIZARÁ LA TAREA TIENE INSTALADA LA LÍNEA DE VIDA O UNA ESTRUCTURA DONDE EL TRABAJADOR PUEDE ASEGURARSE			X
SE TIENEN EN CUENTA MEDIDAS DE TRABAJO SEGURAS PARA ADELANTAR LABORES EN CERCANIAS A LINEAS Y/O EQUIPOS ELECTRICOS ENERGIZADOS	X		
EN CASO DE TRABAJAR EN ESPACIOS CONFINADOS (CERRADOS) O TRABAJOS EN CALIENTE (TRABAJOS DONDE SE EMITE CHISPAS O FUEGO), SE REALIZAN LAS CONSULTAS PREVENTIVAS RESPECTIVAS, INCLUYENDO OTROS PERMISOS CON REQUERIMIENTOS ESPECIALES.			X

VERIFICAR Y/O CONSULTAR LAS LÍNEAS DE EMERGENCIA DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE RESCATE EVALUADO EN EL AREA DE TRABAJO. LINEA DE EMERGENCIA: LÍNEA DE PORTERÍA:

FIRMA DE LOS TRABAJADORES (EJECUTORES) (NOMBRE, FIRMA Y NRO. DE CEDULA)
"HE SOCIALIZADO EL ANALISIS DE RIESGOS, COMPRENDO LAS PRECAUCIONES QUE DEBEN SER TOMADAS Y ME COMPROMETO A DESARROLLAR EL TRABAJO CUMPLIENDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS, PROCURANDO EL AUTOCUIDADO, CUMPLIENDO PROCEDIMIENTOS Y EVITANDO ACTOS INSEGUROS, ASI COMO REPORTAR CUALQUIER DAÑO DE EQUIPOS O INCIDENTES Y/O ACCIDENTES PRESENTADOS"

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Roberto Casas Usaquen	79.218.255.	

OBSERVACIONES

AUTORIZACION DEL TRABAJO

CARGO	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
COORDINADOR DE ALTURAS	Jina Otálora Lopez	1.002758.841.	
RESIDENTE DE OBRA	Jeyson Forero.	1.116.545.102.	
SUPERVISOR DE LA OBRA	Ct Sanchez Reyes Jorge.	7.187.268.	

CIERRE DEL PERMISO

NOMBRE		EL AREA ESTA EN ORDEN Y ASEO	SI	X	NO	
FIRMA		EL TRABAJO FUE TERMINADO	SI	X	NO	
FECHA		EL AREA ESTA SEÑALIZADA	SI		NO	X

INGEBLAR S.A.S Gerencia, Consultoría & Construcción	Asistencia a Capacitación, Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CÓDIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA:	28/06/2022.	LUGAR:	Sanidad - Fuerza Aerea Yopal
TIEMPO EN MINUTOS:	10 minutos.		
NOMBRE CAPACITADOR:	Dina Otálora.	EMPRESA:	BTC.

TEMA: Equipos de construcción.

OBJETIVO: Sensibilizar al personal en los cuidados necesarios que se deben tener en cuenta en el uso de equipos de apoyo para la construcción (vibrocompactador), mezcladora de concreto.

PARTICIPANTES

ITEMS	NOMBRE	N° DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jeyson Forero	1.116.545.102.	Ing. Residente.	
2	Julieth Araya.	1.005.552.109	Ing. Residente.	
3	Diego Rondón.	79.997.120.	Maestro constr.	
4	Jesús Rondón.	1.022.365.767	Ayudante constr.	
5	Roberto Bosas.	79.218.255.	Maestro constr.	
6	Jhon Isaac Usaquen.	1.024.467.063	Maestro consti.	
7	Oscar Rolvo.	1.122.236.333.	Ayudante constr.	
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES: Se realiza calistenia, controles y recomendaciones de seguridad.

INGEBAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código: Versión: 00 Fecha:

Nombre actividad: Preparacion terreno para fundir anden, retoque de paredes. Fecha: 28/06/2022 - 29/06/2022

Herramientas usadas: Formaleta, carretilla, herram. menor Lugar: Sanidad - Fuerza Aerea Yopal.

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Alistamiento de herramienta	Mecanico(manipulación de piezas y herramientas a utilizar. locativo(superficies irregulares, cord.elec. cord. varios)	-cortes, heridas, golpes, hematomas. - Caidas, fracturas, golpes fuertes.	Inspeccion entorno de trabajo y herramienta. -Autocuidado, prevencion al caminar, quitar obstaculos.
Replantear piso, corte de raices arboles, nivelar p	- postura incomoda. - Herramienta cortopunzan. -Mecanico(manip.heram). -movim. repetitivo.	- Dolores dorsales, osteomuscular. - cortaduras, heridas. - golpes, hematomas, contusiones. - calor, deshidratacion, estres, cansancio	- Realizar estiramiento, en lo posible buenas posturas. -uso de guantes, gafas. -Estiramientos.
-Desague de poseta - Instalar tuberia de 3", de presión.	Ruido de impacto -vibracion segmentaria. -Mecanico(herramientas de golpe, cortopunzante). Biomec(posturas incomod. movimient. repetitivo.	- lesiones auditivas, estres, agotamiento muscular, cansancio calor, deshidratación. Hematomas, golpe, contusión.	- Proteccion auditiva. - Breaks descansos. - hidratacion constante. - Inspeccion herramienta.
Aplicación de estuco, resanes de paredes y Pintura.	-Quimico (polvos inorganic) vapores, toxicos. -Movimientos repetitivos. -Postura incomodas. -Psicosocial (demanda tareas)	- Afeccion vias respiratorias. - en la piel, irritación. - Dolores osteomusculares. - Agotamiento Fisico y mental. -Estres, dolor de cabeza, agotam.	- uso de mascarilla. - Ropa industrial. -Pausas activas. - Hidratación.
- Colocar formaleta para anden. -Rellenar con grauilla para compactar con asadilla	-Posturas incomodas. -Golpes de calor. -Mecanico(manejo de piezas y herramientas). -movimiento repetitivo.	-Dolor osteomuscular. - Estres, agotamiento, deshidratac. - golpes, cortes, contusiones.	-En lo posible usar buenas posturas. - Descansar e hidratar. - Inspección de heram. - Estiramientos.

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Tina Otálora Lopez	1.002.758.841.	Inspectora SST.	Tina Otálora L.
Jhon Isaac Usaquen	1.024.467.063.	Maestro Construcción.	JHON Usaquen
Roberto Casas Usaquen	79.218.255.	Maestro Construcción.	
Diego Rondón Triana.	79.997.120.	Maestro Construcción	Diego R.
Jesús Rondón Triana.	1.022.365.767.	Ayudante Construcción	
Oscar Calvo Osorio.	1.122.236.333.	Ayudante Construcción.	
Jeyson Forero.	1.116.545.102.	Ingeniero Residente.	
Julieth Anaya.	1.005.552.109.	Ingeniera Residente.	

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

INGEBLAR S.A.S Gerencia, Consultoría & Construcción	Asistencia a Capacitación, Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento	CODIGO:
		VERSIÓN:
		FECHA:

FECHA:	29/06/2022	LUGAR:	Sanidad Fuerza Aerea Yopal.
TIEMPO EN MINUTOS:	15 minutos		
NOMBRE CAPACITADOR:	Tina Otálora.	EMPRESA:	BTC.

TEMA: Uso de vibrocompactadora.

OBJETIVO: Exponer los riesgos que implica el uso del vibrocompactador, los cuidados necesarios, sensibilizar al personal en el uso correcto.

PARTICIPANTES

ITEMS	NOMBRE	N° DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Roberto Casas.	79.218.255.	Maestro Constr.	
2	Jhon Isaac Usuguen.	1.024.467.063	Maestro Constr.	
3	Oscar Salvo. Ospina.	1.122.236.333	Ayuda. Constuc.	
4	Diego Rondón	79.919.720.	Maestro Constr.	
5	Jesús Rondón.	1.022.365.767	Ayud. Construcción.	
6	Jeyson Forero.	1.116.543.102.	Ingeniero Resid.	
7	Lileth Anaya	1.005.552.109	Ingeniera Resid.	
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES: Se realizan estiramientos, recomendaciones y controles de seguridad ATS.

BFC Ingenieros Reliable Partis Construcciones	INSPECCION VIBROCOMPACTADORA	CODIGO: VERSION: FECHA:

MARCA DEL EQUIPO: GX 160 - HONDA.
TIPO DE COMBUSTIBLE: Gasolina.
NOMBRE OPERARIO: Jhon Isaac Usagen.
REFERENCIA GX 160.
COLOR: Gris / Naranja.
NOMBRE INSPECTOR: Tina Otálora.

ASPECTOS A INSPECCIONAR	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
ESTADO DEL MOTOR																					
Encendido							X														
Yoyo de arranque							X														
Sistema de on/off del motor							X														
Nivel de aceite							X														
Ausencia de fugas de aceite							X														
Ausencia de fugas de combustible							X														
Soportes del motor							X														
Filtro del motor							X														
Tubo de escape							X														
Sistema eléctrico									X												
Limpieza del motor							X														
ESTADO MECÁNICO																					
Ruedas para transportarla									X												
Resortes de amortigación									X												
Palanca para sujeción							X														
Tapas protectoras del motor							X														
Funcionamiento							X														
Tanque de gasolina							X														
Exhosto							X														
MECANISMOS DE SEGURIDAD							X														
Protección yoyo de arranque							X														
Protección de correas							X														
Guardas puntos de operación							X														
FIRMA RESIDENTE																					
FIRMA OPERADOR																					
FIRMA INSPECTOR																					

Lugar: Fuerza Aerea Yopal Fecha: 29/06/22

INSPECCION MEZCLADORA PORTATIL DE CONCRETO

CODIGO:
VERSION:
FECHA:

ACTIVIDAD/PROYECTO: Construccion ampliacion, mantenimiento y adecuacion de instalaciones.
MARCA: Senco.
NOMBRE OPERARIO: Diego Rondón.
MODELO
NOMBRE INSPECTOR: Jinci Otálora.

Semana 28/06/22 al 02/07/22 de 2022

ASPECTOS A INSPECCIONAR	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
Estado de las llantas										X											
Estado de los ejes (sin torceduras)										X											
Estructura de soporte										X											
Balineras y bujes de rotación										X											
Mecanismo de giro para vaciado										X											
Palanca de giro para vaciado										X											
Seguro										X											
Corona de rotación										X											
Caneca de mezclado										X											
Patas de anclaje										X											
Motor										X											
Tubo de escape										X											
Estado de pasadores (bastidor)										X											
Resguardos correas motor										X											
Resguardos mecanismos de giro trompo										X											
Tapa del motor con seguro										X											
Clutch de giro del trompo										X											
Corona de arranque del motor										X											
Control de fugas de combustible												X									
Control de fugas hidráulicas										X											
Yoyo de encendido del motor												X									
Control de fugas de aceite										X											
Estado general de la maquina										X											
El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso del equipo										X											
El operador usa la maquina de manera correcta segura										X											
FIRMA RESIDENTE																					
FIRMA OPERADOR																					
FIRMA INSPECTOR																					

Lugar: Sanidad- Fuerza Aerea Yopal. Fecha: 30/06/22

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS

Codigo:
Versión:
Fecha:

PROYECTO:	Mantenimiento y adecuación de instalaciones	UBICACION:	Sanidad - Fuerza Aerea Yopal.
ACTIVIDAD:	Corte de tuberia desagues.	MARCA:	Baker.
SEMANA DEL	28/06/2022 AL	DE	

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)			X		X				V		X			
Estado del interruptor de encendido y su seguro			V		X				X		X			
Estado del accesorio portadiscos			X		X				X		X			
Estado del mango			X		X				X		X			
Estado del cuerpo			X		X				X		X			
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)			X		X				X		X			
Estado general de la guía y la guarda			X		X				X		X			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)			X		X				X		X			
Condiciones de orden y aseo			X		X				X		X			
OTROS														
INSPECCIONADO POR: Roberto Cosas Usaquen.														
Vo. Bo Inspector DE SST: Jina Otálora.			Lina O.		Lina O.				Lina O.		Lina O			

INGEBLAR S.A.S

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORAS

Codigo:
Versión:
Fecha:

PROYECTO:	Mantenimiento y adecuación de Instalac.			UBICACION:	Sanidad - Fuerza Aerea Yopal.
ACTIVIDAD:	Desmonte drywall montaje techo PVC luminar.			MARCA:	Bauker.
SEMANA DEL	21/06/2022	AL	25/06	DE	2022

ESTADO (B: BUENO - M: MALO)	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (cable, extensiones, tomas)			X		X		X		X		X			
Estado del interruptor de encendido y su seguro			X		X		X		X		X			
Estado del accesorio portadiscos			X		X		X		X		X			
Estado del mango			X		X		X		X		X			
Estado del cuerpo			X		X		X		X		X			
Estado accesorio RPM (8500 - 15000)			X		X		X		X		X			
Estado general de la guía y la guarda			X		X		X		X		X			
Estado general pulidora (fisuras, ruptura, etc.)			X		X		X		X		X			
Condiciones de orden y aseo			X		X		X		X		X			
OTROS														
INSPECCIONADO POR: Roberto Casas.														
Vo. Bo Inspector DE SST: Lina Otálora.			Lina O.		Lina O.		Lina O.		Lina O		Lina O.			

INGEBLAR S.A.S

TAMIZAJE ESTADO DE SALUD DE LOS TRABAJADORES

Código:
Versión:
Fecha:

FECHA: 30/06/2022 LUGAR: Sanidad - Fuerza Aerea Yopal.

DATOS				¿Sufre alguna de estas enfermedades?							Sintomas					
NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	CARGO	Cancer	Diabetes	Enfermedad pulmonar	Sistema Inmune debilitado	Afección cardiaca	Falla renal(riñones)	Hepatopatia (higado)	Fiebre	Tos	Dificultad par arespirar	Secreción nasal	Fatiga	FIRMA
Jina.	Ofalora.	1-00235984	Inspector SST	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Jason	Forero.	1.116.545.102	Ing. Residen	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Julieth	Anaya.	1005.552.104	Ing residen	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Diego	Rondón	79.997.120.	Maestro	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Jesus	Rondon.	1.022.365767	Ayudante	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Oscar	Calvo.	1.122.236332	Ayudante	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Ihan Isaac.	Usaquen.	1.024.467.068	Maestro	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Roberto	Casas.	79.218.255.	Maestro	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Carlos	Diaz	71.795.722	Sup. Admtivo	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

Asistencia a Capacitación, Charlas, Inducción, Divulgación y Entrenamiento

CODIGO:
VERSIÓN:
FECHA:

FECHA:	30/06/2022.	LUGAR:	Sanidad - Fuerza Aerea Yopal.
TIEMPO EN MINUTOS:	15 minutos.		
NOMBRE CAPACITADOR:	Tira Otálora.	EMPRESA:	BFC.

TEMA: Impacto ambiental.

OBJETIVO: Sensibilizar acerca de la responsabilidad ambiental que tenemos, el cuidado a tener para evitar al maximo impactos ambientales negativos.

PARTICIPANTES

ITEMS	NOMBRE	N° DE CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Jesus A. Rondon TRIANA	1022365767	M- CONSTRUCCION	
2	Jhon Isaac Osaquen	1024467863.	Maestro.	
3	Roberto Carlos Casas	79'218255	Maistro	
4	Oscar Alexander Calvo O	1122236333	Ayudante	
5	Julieth Anaya Mejia	1005552109	Residente 2.	
6	Jeyson Forero.	1'116.545.102	Ing. Residente 1.	
7	Jesdreyo Rondón	74.947.120	Maestro.	
8				
9				
10				
11				
12				

OBSERVACIONES: Se realiza charla sistemica, socialización de riesgos (ATS) y controles necesarios.

INGEBAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código: Versión: 00 Fecha:

Nombre actividad: Construcción de anden en concreto, Fecha: 29/06/2022 - 30/06/2022

Herramientas usadas: Maceta, carretilla, cincel, nivel compactador Lugar: Sanidad - Fuerza Aerea Yopal.

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Continuar con nivelacion de formaleta y relleno de anden con gravilla y arrocillo.	Mecánico (uso de piezas, herramienta manual). - Posturas incomodas. - locat. (Piso desnivel).	- Golpes, hematomas, heridas - Dolor muscular - Agotamiento osteomuscular. - Cardas, Fracturas.	Inspeccion visual de area de trabajo. - Autocuidado. - Señalizacion. - Estiramientos, pausas
Demolición de Paceta	- Ruido, impacto. - Escombros, material particulado, polvos inorg. - Mecanico (herram)	- Dolor de cabeza, estres, lesiones auditivas, oculares y respiratorias - lesiones visuales. - Golpes. machucon, hematoma.	- Tapones auditivos. - Ropa industrial. - uso de gafas - Guantes, inspeccion.
Compactar material de anden, con vibrocompactador	- Vibracion cuerpo entero y segmentario - Ruido intermitente. - Movimiento repetitivo - Maquina en movimiento	- Adormecimiento del cuerpo, dolores musculares. - lesion auditiva. - lesiones osteomusculares. - Atrapamiento, aplastam. lesion grave	- Rotacion personal - uso protec. auditiva. - Descansos, estiram. - Trabajo en equipo. - Inspeccion del equipo.
Demolición de Piso (levantamiento).	- Ruido de impacto. - Vibraciones - Material particulado. - Mecánico	- lesiones auditivas, estres - cefalea, sordera. - Adormecimiento corporal. - lesión en piel, ojos. - Corte, heridas, hematomas.	- uso proteccion auditiva. - pausas activas, estiramiento. - Ropa industrial, ya Fal - inspeccion herramienta
Realizar mezcla para fundir con mezcladora	- Ruido intermitente. - maquina en movimiento - material particulado. - movimiento repetitivo. - Vibracion segmentar	- Dolor de cabeza, estres, sordera. - Afeccion respiratoria. Aplastamiento, atrapamiento. - lesiones visuales. - Dolor muscular, agotamiento.	- Proteccion auditiva, gafas - uso de mascarilla, - Inspeccion de mezcladora. - Pausas activas.

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Tina Otálora Lopez	1.002.758.841.	Inspectora SST	Tina Otálora L.
Jeyson Forero.	1.116.545.102.	Ingeniero Residente.	
Roberto Casas.	79.218.255.	Maestro construc.	
Oscar Calvo.	1.122.236.333.	Ayud - Construccion	
Jhon Isaac Usuguen.	1.024.467.063.	Maestro Construcción.	Jhon Usuguen.
Jess Rondón	1.022.365.767.	Ayud. Construccion	
Diego Rondon.	79.497.120	Maestro Constr	Diego R.
Julieth Araya	1.005.552.109.	Ingeniera Residente.	

INGEBLAR S.A.S	ATS (Analisis de Trabajo Seguro)	Código: Versión: 00 Fecha:

Nombre actividad: Fundir anden area residuos y osos. Fecha: 30/06/22 - 01-07-2022.

Herramientas usadas: Mezcladora de concreto, pala, carretilla Lugar: Sanidad - Fuerza Aerea Yopal.

PASO A PASO DE LA ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	CONTROLES
Alistamento de herramienta, piezas materiales.	Locativo (condiciones de orden, terrenos con diferencia de nivel) Mecánico (manip de piezas equip. y herramientas).	Caidas, golpes, fracturas. - Cortes, golpes, hematomas.	- señalizar area de trabajo. - Inspección de area y herramienta.
Mezclar material en mezcladora trompo.	Ruido, vibración. Temperatura extrema, material particulado. Mecanico (man. equipo).	- Estres, cefalea, lesion auditiva. - Golpe de calor, deshidratación. - lesiones visuales, en la piel. - Golpes, atrapamiento	> proteccion auditiva > hidratacion, descansos > gafas, ropa industrial > Autocuidado Inspección
Verter mezcla sobre la malla y formaleta. > Aplanar y nivelar mezcla.	Movimiento repetitivo. Biomecl levant. manual de cargas. Locativo (diferc. nivel).	> Agotamiento osteomuscular, fisico y mental, dolor muscular. - Caidas, golpes, fracturas.	> Estiramientos. - Descansos. - Uso de EPP, gafas, mascarilla, cuidado al caminar
- Verter mezcla en piso, esparcir y nivelar. • Alisado de pisos concreto.	> Posturas incomodas > Material particulado. > movimientos repetitivos. - Quimicos.	- lesiones osteomusculares. - lesion en piel y ojos. - Afeccion respiratoria.	- Pausas activas - uso de gafas, ropa industrial y mascarilla
Alisado y dilatacion de concreto. en anden y pisos.	Polvos organicos e inorg. movim. repetitivos, posturas prolongadas. material particulado, mango herramienta.	- Afeccion respiratoria. > Espasmos musculares. > Agotamiento osteomuscular. > lesion visual, golpes, heridas.	> uso protec. respiratoria - Estiramiento. - Inspeccionar, equip. y herramienta.

NOTA: El supervisor/residente de la actividad y los trabajadores, declaramos que se han identificado los posibles riesgos y peligros al ejecutar esta actividad; nos consideramos idoneos y competentes para realizar este trabajo con responsabilidad y seguridad y nos comprometemos a aplicar controles necesarios.

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Tina Otálora. Lopez	1.0027.58.841.	Inspectora SST	Tina Otálora L.
Julieth Anaya Mejia.	1.005.552.109.	Ingeniera Resid. 2.	
Roberto Casas Usaquen	79.218.255.	Maestro constru.	
Jhon Isaac Usaquen	1.024.467.063.	Maestro Constr.	Jhon Usaquen
Oscar Calvo.	1.122.236.333.	Ayudant. Constru.	
Diego Rondón.	79.907.120.	Maestro const.	
Jesús Rondón.	1022365.767.	Ayud. construcción.	
Jeyson Forero.	1.116.545.102.		

INGEBLAR S.A.S

FORMATO DE ENTREGA DE ELEMETOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Código:
Versión:00
Fecha:

item	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	Elementos entregados														FIRMA
					CASCO	BOTAS PUNTA DE ACERO	GAFAS TRANSPARENTE (lente Claro)	PROTECCION AUDITIVA	PROTECCIÓN RESPIRATORIA MATERIAL PARTICULADO TIPO MASCARILLA Valvul.	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE CARNAZA TIPO SOLDADOR	GUANTES DE VAQUETA	CAMISA DOTACION	PANTALON DOTACION	OTRO: Guantes Nylon Nitrilo	INICIAL	REPOSICION	Firma de quien recibe Nota: Recibo los elementos y me responsabilizo del cuidado y uso de los mismo
1	19/05/22	Luis enrique Rondon	19.252.411	Maestro Obra	X	X	X	X	X				X		X	X		
2	19/05/22	Roberto Carlos casas	79.218.255	Maestro	X	X	X	X	X				X		X	X		
3	19/05/22	Jesus Rondón.	1022365767	Maestro.	X	X	X	X	X				X		X	X		
4	19/05/22	Lina Otálora.	1002758841.	Inspector SST	X			X					X			X		Lina Otálora.
5	19/05/22	Carlos Diaz	71.795.722	Sop. Administr.	X	X	X	X					X			X		
6	19/05/22	Diego Rondón.	79.997.120	Maestro Obra	X	X	X	X	X				X		X	X		
7	19/05/22	Yelson Forero	1.116.545.102	Ing. Residente	X								X			X		
8	19/05/22	Julieth Anaya	1005552109	Ing Residente	X	X		X	X				X			X		
9	06/06/22	Oscar Calvo.	1.122.236,333	Ayudante Const	X		X	X	X				X		X	X		
10	16/06/22	Jhon Isaac Usaquen.	1024.467053.	Maestro Const.	X	X	X	X	X				X		X	X		
11																		
11																		
12																		
13																		

MARQUE CON UNA EQUIS (X) SI SE REALIZÓ LA ENTREGA / EN LA CELDA ELEMENTOS ENTREGADOS Y TIPO DE ENTREGA
MARQUE CON UNA RAYA (-) SI NO SE REALIZA LA ENTREGA / EN LA CELDA ELEMENTOS ENTREGADOS Y TIPO DE ENTREGA

Observaciones: Elementos entregados en Fuerza Aerea Yopal Casanare.

INFORME DE OBRA No.1

DE 1 DE JUNIO DE 2022 A 30 DE JUNIO DE 2022

CONTRATO DE OBRA No. 027-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022



OBJETO: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE"

CONTRATISTA: INGEBLAR SAS

REPRESENTANTE LEGAL: JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO

YOPAL- CASANARE 2022

Oficina Principal
EMAIL: gerenciaingeblar@gmail.com

CONTENIDO

1. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 3
2. INTRODUCCION 4
3. Información General del contrato. 6
3.4. Localización del proyecto 7
3. INFORME ADMINISTRATIVO Y LEGAL 8
4.1. Aspectos administrativos 8
4.1.1. Profesionales y personal propuesto. 8
4.1.2. Cronología del contrato de obra 8
4.2. Relación de equipos 9
4.3. Personal de la obra 9
4.3.1. Relación del personal de obra 10
4.3.2. Sistema de seguridad social y de parafiscales 10
4.3.3. Resumen de pagos de seguridad social y parafiscal. 11
4. INFORME DE AVANCE DE OBRA 12
5.1. Actividades ejecutadas en el periodo comprendido del 16 de mayo al 4 de junio de 2022. 12
6. RELACION DE CANTIDADES. 27
6.1. Cantidades contractuales 27
6.1.1. Seguimiento del estado del tiempo 32
7. RESUMEN PRESUPUESTAL Y FINANCIERO 32
7.1. Resumen financiero 32
7.1.1. Relación de pagos contrato de obra 32
8. CONCLUSIONES 33

Oficina Principal
EMAIL: gerenciaingeblar@gmail.com

1. LISTA DE DISTRIBUCIÓN

El ORIGINAL del presente documento será entregado a la dependencia y entidad correspondiente, según se indica a continuación.

DEPENDENCIA	No DE COPIAS
SUPERVISOR DE OBRA	ORIGINAL

Las observaciones que resulten de su revisión y aplicación deberán ser informadas para proceder a realizar sus modificaciones correspondientes.

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

ÍNDICE DE REVISIÓN	CAPITULO MODIFICADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

TITULO DEL DOCUMENTO	INFORME MENSUAL DE OBRA

REVISIÓN		0	1	2
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN	NOMBRE	JHON BLADIMIRO ROMERO		
	FIRMA			
	FECHA			
RESPONSABLE DE REVISIÓN	NOMBRE	CT. JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES		
	FIRMA			
	FECHA			
RESPONSABLE DE SUPERVISIÓN	NOMBRE			
	FIRMA			
	FECHA			

Oficina Principal
EMAIL: gerenciaingeblar@gmail.com

2. INTRODUCCION

Las fuerzas aéreas aprobaron un contrato que tiene por objeto “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR 3082 DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE”, al contratista INGEBLAR SAS cuyo representante legal es JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO, con asignación presupuestal de $ 179.304.253.53 M/CTE.

Este informe tiene como objetivo determinar los parámetros constructivos, sistemas de cuantificación y pago de las actividades a realizar, a los que se debe sujetar el Contratista y en general todas aquellas personas que tengan injerencia directa en la construcción y el control de los diferentes proyectos de construcción de tal forma que se unifiquen los criterios de los procesos constructivos y se garantice la óptima calidad de los resultados.

El proyecto contempla el mantenimiento y adecuación de las instalaciones de sanidad, el cual se desprende con los siguientes componentes como **PRELIMINARES**, **MAMPOSTERIA**, **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**, **INSTALACIONES ELECTRICAS**, **PAÑETES**, **CIELORRASO**, **ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**, **ACABADOS DE MUROS PINTURA Y ENCHAPES**, **CARPINTERIA EN MADERA**, **CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**, **CUBIERTA**, **APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**, **URBANISMO**, **ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS** con las especificaciones técnicas definidas en lo contractual.

El informe contiene la ejecución técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del contrato No. 027 de 2022, de acuerdo a las exigencias de la entidad contratante contenidas en las especificaciones técnicas, referidas en los siguientes aspectos:

- ⇒ **Trabajos ejecutados**: Descripción general de las obras ejecutadas evaluadas técnicamente de acuerdo a las especificaciones y diseños para obtener unos porcentajes patrones de cumplimiento de las metas.

Oficina Principal
EMAIL: gerenciaingeblar@gmail.com

⇒ **Recursos:** Relacionados con el personal y equipo de obra en el periodo correspondiente del informe.

⇒ **Aspectos administrativos**: Modificaciones, actas, pólizas, problemas y soluciones adoptadas, y reuniones con la comunidad y comités técnicos de obra.

⇒ **Control de Calidad**: Cuadro resumen de pruebas de laboratorio en el cual se describirán las fechas en las cuales se efectuaron los ensayos, la localización y los resultados obtenidos; se incluirán los resultados de los ensayos de laboratorio, los análisis y conclusiones correspondientes y demás información pertinente al proyecto.

De esta forma se dará cumplimiento a los requerimientos de **seguimiento y medición** exigidos por la Fuerza Aérea, para recibir obras con la calidad exigida por la entidad contratante.

Oficina Principal
EMAIL: gerenciaingeblar@gmail.com

3. Información General del contrato.

Ficha técnica del contrato de obra pública No 027 de 2022

No CONTRATO	027-2022	
CONTRATANTE	FUERZA AEREA	
CONTRATISTA	INGEBLAR SAS	
NIT	901.087.858-4	
REPRESENTANTE LEGAL	JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO	
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS	
PLAZO CON PRORROGA	N/A	
FECHA ACTA DE INICIO	DOS (16) DE MAYO DE 2022	
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN	TREINTA (30) DE JULIO DE 2022	
ESTADO DEL CONTRATO	EJECUCIÓN	
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA No 027-2022		
VALOR CONTRATO INICIAL	$	179,304,253.00
COSTO DIRECTO	$	179,304,253.00
ADMINISTRACIÓN (22.7%)	$	31,684,622.00
IMPREVISTOS (1%)	$	1,395,798.00
UTILIDAD (4%)	$	5,583,193.00
TOTAL AIU (27.7%)	$	38,663613.00
IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$	1,060,807.00

Tabla 1 ficha técnica del contrato.


Contratista:	INGEBLAR SAS
Interventor:	N/A
Supervisión:	CT. JORGE ROBERTO SANCHEZ REYES

Oficina Principal
EMAIL: gerenciaingeblar@gmail.com

3.4. Localización del proyecto

El la fuerza Aérea del Municipio de Yopal forma parte de la región de la Orinoquía en estribaciones de la cordillera oriental, se encuentra ubicado al sur occidente en el departamento del Casanare, y en Yopal, capital Departamental.

Ilustración 1: Localización de la Fuerza Aérea del municipio de Yopal Casanare.

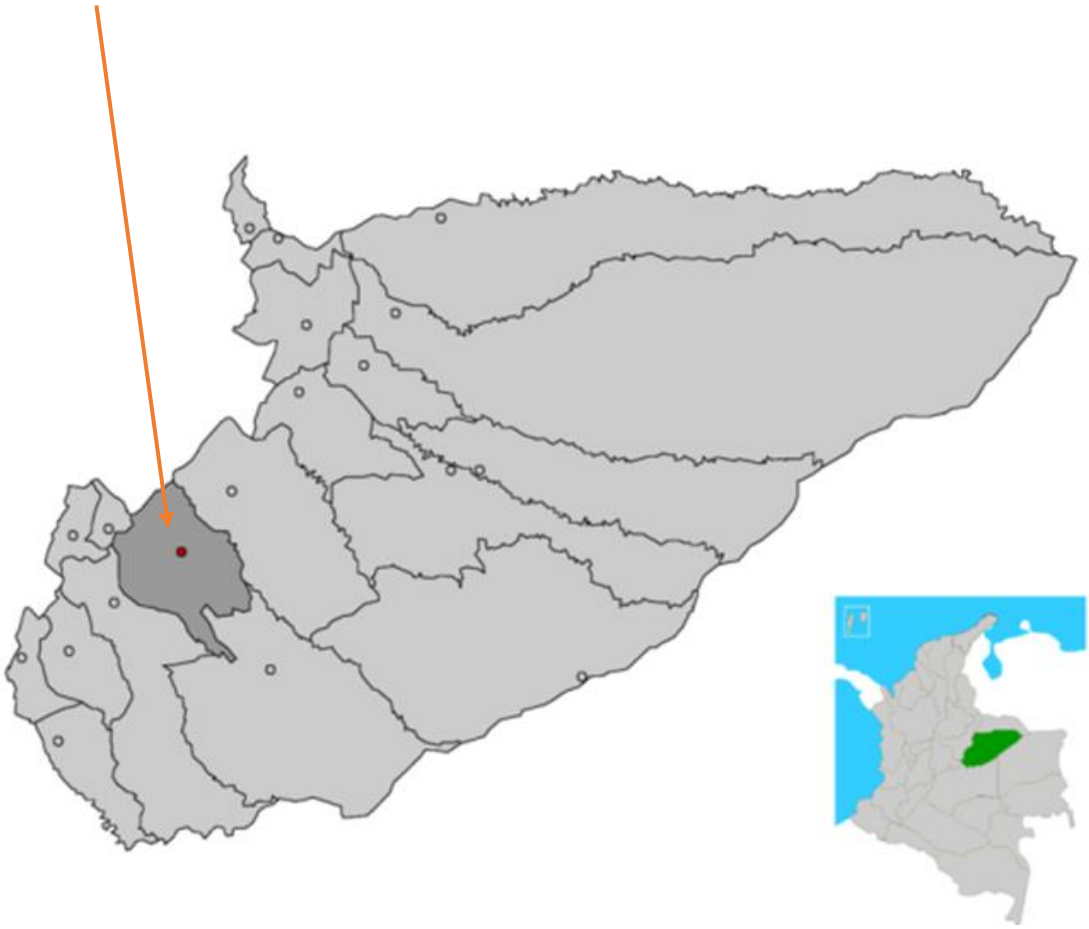

Oficina Principal
EMAIL: gerenciaingeblar@gmail.com

3. INFORME ADMINISTRATIVO Y LEGAL

4.1. Aspectos administrativos

A continuación, se realiza la descripción de los aspectos administrativos del contrato de obra No 027 de 2022 así:

4.1.1. Profesionales y personal propuesto.

NOMBRE	CARGO
JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO	Representante legal
JEYSON LEONARDO FORERO ROJAS	Ingeniero Residente (100%)
LINA MARCELA OTALORA	Inspector en SST (100%)
JULIETH ANAYA	Ingeniero Residente 2 (100%)

4.1.2. Cronología del contrato de obra

CRONOLOGIA DEL CONTRATO			
ACTAS SUSCRITAS (Inicio, Suspensión, Reinicio, Prorroga, Adicional, Modificatoria, Parciales, Terminación, Liquidación)	**FECHA**	**DURACIÓN**	**OBSERVACIONES**
1. ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA	16/05/2022	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS	

Oficina Principal
EMAIL: gerenciaingeblar@gmail.com

4.2. Relación de equipos

- PULIDORA
- TALADRO
- ANDAMIOS CERTIFICADOS
- ESCALERA
- MEZCLADORA
- VIBRO COMPACTADOR MANUAL (RANA)
- HERRAMIENTA MENOR

4.3. Personal de la obra

PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRATIVO DE LA OBRA

Se dispone del siguiente personal:

Representante legal: JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO.

Ingeniero Residente de la obra: JEYSON LEONARDO FORERO ROJAS

Ingeniero Residente de la obra 2: JULIETH ANAYA

Inspector en SST: LINA MARCELA OTALORA

MANO DE OBRA DIRECTA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contratista utiliza para la ejecución de la obra el siguiente personal:

PERSONAL	CANTIDAD PROMEDIO	ACTIVIDADES REALIZADAS
Auxiliar administrativo	1	Encargada de llevar todo lo de papelería y pagos de cuentas en oficina
Oficial de Obra	2	Encargados de las actividades a ejecutar con la técnica necesaria para ejecutar las labores.
Ayudante de Obra	3	Encargados de las actividades a ejecutar mano de obra no calificada necesaria para ejecutar las labores.

Oficina Principal
EMAIL: gerenciaingeblar@gmail.com

4.3.1. Relación del personal de obra

NOMBRE	CARGO
JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO	Representante legal
JEYSON LEONARDO FORERO ROJAS	Ingeniero Residente (100%)
LINA MARCELA OTALORA	Inspector en SST (100%)
JULIETH ANAYA	Ingeniero Residente 2 (100%)
JESUS RONDON	Ayudante de obra
OSCAR CALVO	Ayudante de obra
LUIS ENRIQUE RONDON	Ayudante de obra
DIEGO RONDON	Oficial de obra
ROBERTO CASAS USAQUEN	Oficial de obra

4.3.2. Sistema de seguridad social y de parafiscales

A Todos los trabajadores que intervinieron en la obra se les realizo el examen médico general de ingreso. Se encuentran afiliados a salud, ARL y todo lo relacionado de ley, con el fin de evitar inconvenientes derivados de la ejecución del contrato, igualmente se hizo entrega a la interventoría las afiliaciones y la planilla de pago.

Se realizaron los pagos de seguridad social y parafiscal a los profesionales y personal propuesto por el contratista según la dedicación y tiempo aprobado en el contrato y demás personas que se contrataron para el proyecto.

Oficina Principal
EMAIL: gerenciaingeblar@gmail.com

Ver anexo Afiliaciones y pago de planillas

4.3.3. Resumen de pagos de seguridad social y parafiscal.

En el siguiente cuadro se relaciona los pagos realizados en el mes de mayo de 2019

No. PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSION	ARL	CAJA DE COMP	SENA	ICBF
8493276527	2022-05	$400,400	$ 512,400	$ 223,200	$ 128,400	$ 64,400	$ 96,400
8493276527	2022-06	$400,400	$ 512,400	$ 223,200	$ 128,400	$ 64,400	$ 96,400

Oficina Principal
EMAIL: gerenciaingeblar@gmail.com

4. INFORME DE AVANCE DE OBRA

5.1. Actividades ejecutadas en el periodo comprendido del 1 de junio al 30 de junio de 2022.

De acuerdo con el presupuesto, el contrato de obra se conformó de ciertas actividades, las cuales se relacionan a continuación para mostrar la forma como se avanzó en la ejecución mensual de las siguientes actividades de Obra las cuales se describen a continuación:

1. PRELIMINARES

1.1. DESMONTE DE CIELORRASO, INCLUYE RETIRO

Actividad que consiste en la desinstalación del cielorraso existente en la edificación a intervenir, en puntos establecidos contractualmente.





Oficina Principal
EMAIL: gerenciaingeblar@gmail.com

PRELIMINARES									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA MES	% EJECUTADO MES	ACUMULADO	% ACUMULADO	CANTIDAD POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
1.1	**DESMONTE DE CIELORRASO, INCLUYE RETIRO**	M2	482,00	130,12	26.99 %	430.12	89.23%	51.88	10.77 %

Durante el periodo del 1 de junio al 30 de junio de 2022, se realizó la actividad de desmonte de cielorraso en las instalaciones del establecimiento de sanidad militar.

1.2. REMOCION (DEMOLICION) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE RETIRO

Actividad que consiste en la demolición total de acabados en estructuras existentes en el terreno a intervenir.




Oficina Principal
EMAIL: gerenciaingeblar@gmail.com

PRELIMINARES									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA MES	% EJECUTADO MES	ACUMULADO	% ACUMULADO	CANTIDAD POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
1.2	**REMOCION (DEMOLICION) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE RETIRO**	M2	22.15	14.05	63.43 %	22.15	100 %	0.00	0.00 %

Durante el periodo del 1 de junio al 30 de junio de 2022, se realizó la actividad de desmonte de acabados en paredes y pisos en las instalaciones del establecimiento de sanidad militar.

1.4. DEMOLCION DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL

Actividad que consiste en **DEMOLER** paredes existentes en el edificio según especificaciones, con su respectivo retiro de material

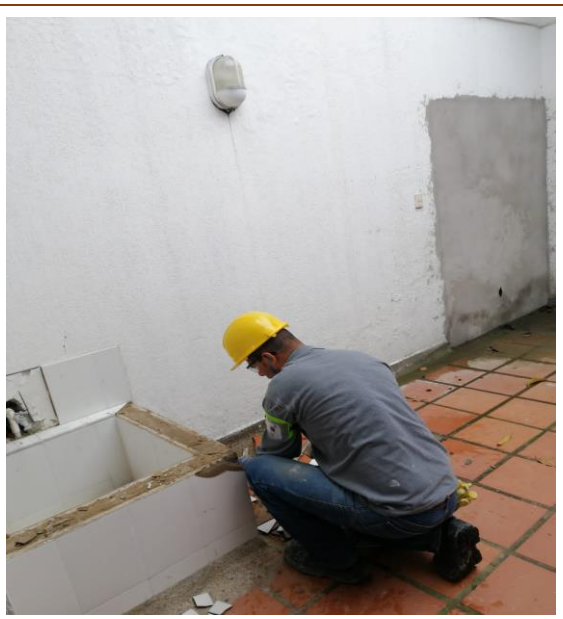



Oficina Principal
EMAIL: gerenciaingeblar@gmail.com

PRELIMINARES									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA MES	% EJECUTADO MES	ACUMULADO	% ACUMULADO	CANTIDAD POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
1.4	**DEMOLCION DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL**	M2	7.40	1.28	12.00%	9.28	120.00 %	0.00	0.00 %

Durante el periodo del 1 de junio al 30 de junio de 2022, se realizó la actividad de demolición de muro en bloque en las instalaciones del establecimiento de sanidad militar.

7. INSTALACIONES ELECTRICAS

7.1 PRELIMINARES

7.3.1. SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA 12W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), TUBERIA EMT ¾", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIOS.

Actividad que consiste en la instalación de LUMINARIAS LED redonda en puntos establecidos a intervenir en las unidades sanitarias que se encuentran en el edificio según especificaciones, con su respectivo retiro de material.

Oficina Principal
EMAIL: gerenciaingeblar@gmail.com






PRELIMINARES									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA MES	% EJECUTADO MES	ACUMULADO	% ACUMULADO	CANTIDAD POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
7.3.1	**SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA 12W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), TUBERIA EMT ¾", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIOS**	Und	21	10	47.61 %	20	95.22 %	1.00	4.78 %


Oficina Principal
EMAIL: gerenciaingeblar@gmail.com

Durante el periodo del 1 de junio al 30 de junio de 2022, se realizó la actividad de instalación de luminarias LED redondas que se encuentran en los puntos establecidos por la supervisión, en las instalaciones del establecimiento de sanidad militar.

7.3.2. SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 40W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), TUBERIA EMT ¾", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIOS.

Actividad que consiste en la instalación de LUMINARIAS LED cuadrada de 60x60 40w en puntos establecidos a intervenir en las unidades sanitarias que se encuentran en el edificio según especificaciones, con su respectivo retiro de material.

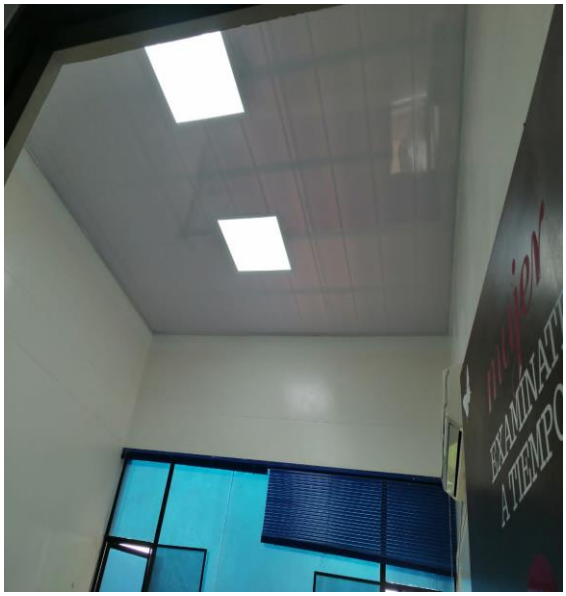

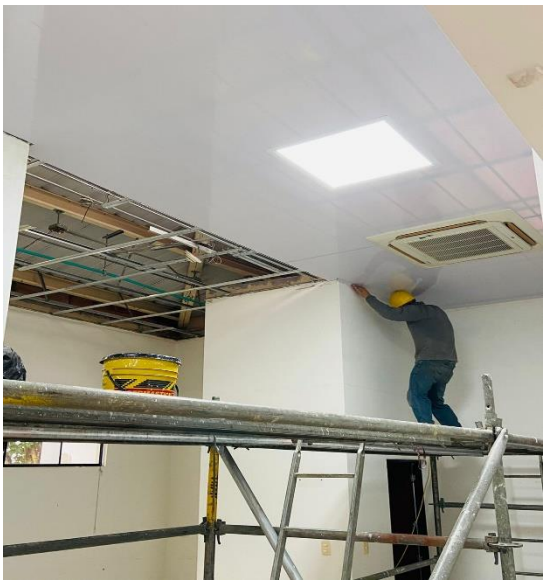

.

Oficina Principal
EMAIL: gerenciaingeblar@gmail.com

PRELIMINARES									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA MES	% EJECUTADO MES	ACUMULADO	% ACUMULADO	CANTIDAD POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
7.3.2	**SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 40W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), TUBERIA EMT ¾", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIOS**	Und	68	12	17.64 %	58	85.28 %	10.00	14.72 %

Durante el periodo del 1 de junio al 30 de junio de 2022, se realizó la actividad de instalación de luminarias LED panel de 60x60 40w que se encuentran en los puntos establecidos por la supervisión, en las instalaciones del establecimiento de sanidad militar.

11. CIELORRASO

11.1. CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION).

Actividad que consiste en la instalación de PVC PARA CIELO RASO en toda el área a intervenir en las unidades sanitarias que se encuentran en el edificio según especificaciones, con su respectivo retiro de material.

Oficina Principal
EMAIL: gerenciaingeblar@gmail.com



PRELIMINARES									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA MES	% EJECUTADO MES	ACUMULADO	% ACUMULADO	CANTIDAD POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
11.1	**CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION)**	M2	482.00	162.6	33.73 %	460.00	95.52 %	22.00	4.48 %

12.ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES

12.2. ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI E: 0.05 M (PREPARACION DE SUPERFICIE)

Actividad que consiste en la instalación de CONCRETO EN UN ALISTADO DE PISO en toda el área a intervenir en las unidades sanitarias que se encuentran en el edificio según especificaciones, con su respectivo retiro de material.

Oficina Principal
EMAIL: gerenciaingeblar@gmail.com





PRELIMINARES									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA MES	% EJECUTADO MES	ACUMULADO	% ACUMULADO	CANTIDAD POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
12.2	**ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI E: 0.05 M (PREPARACION DE SUPERFICIE)**	M2	21.05	21.05	100.00 %	21.05	100.00 %	0.00	0.00 %

13. ACABADOS DE MUROS PINTURA Y ENCHAPES

13.1. ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES

Actividad que consiste en la instalación de ESTUCO en los puntos establecidos a intervenir por deterioro o filos que lo requieran en las unidades sanitarias que se encuentran en el edificio según especificaciones, con su respectivo retiro de material.

Oficina Principal
EMAIL: gerenciaingeblar@gmail.com



PRELIMINARES									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA MES	% EJECUTADO MES	ACUMULADO	% ACUMULADO	CANTIDAD POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
13.2	**PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES).**	M2	150.00	101.00	67.33 %	101.00	67.33 %	49.00	32.67 %

13.2. PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES).

Actividad que consiste en la instalación de PINTURA EPOXICA en los puntos establecidos a intervenir en las unidades sanitarias que se encuentran en el edificio según especificaciones, con su respectivo retiro de material.

Oficina Principal
EMAIL: gerenciaingeblar@gmail.com





PRELIMINARES									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA MES	% EJECUTADO MES	ACUMULADO	% ACUMULADO	CANTIDAD POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
13.2	**PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES).**	M2	150.00	49.00	32.67 %	150.00	100.00 %	0.00	0.00 %

13.3. VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)

Actividad que consiste en la instalación de PINTURA VINILO TIPO 1 en los puntos establecidos a intervenir en las unidades sanitarias que se encuentran en el edificio según especificaciones, con su respectivo retiro de material.

Oficina Principal
EMAIL: gerenciaingeblar@gmail.com





PRELIMINARES									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA MES	% EJECUTADO MES	ACUMULADO	% ACUMULADO	CANTIDAD POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
13.3	**VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)**	M2	350.00	458.39	130.96 %	458.39	130.96 %	0.00	0.0 %


23. URBANISMO

23.1. CONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO DE 300 PSI E: 0.10 M INCLUYE MATERIALES, FORMALETA, TEXTURIZADO, CURADO Y MALLA ELECTROSOLDADA

Actividad que consiste en la instalación de CONCRETO PARA ANDEN PERIMETRAL en los puntos establecidos a intervenir en las unidades sanitarias que se encuentran en el edificio según especificaciones, con su respectivo retiro de material.

Oficina Principal
EMAIL: gerenciaingeblar@gmail.com



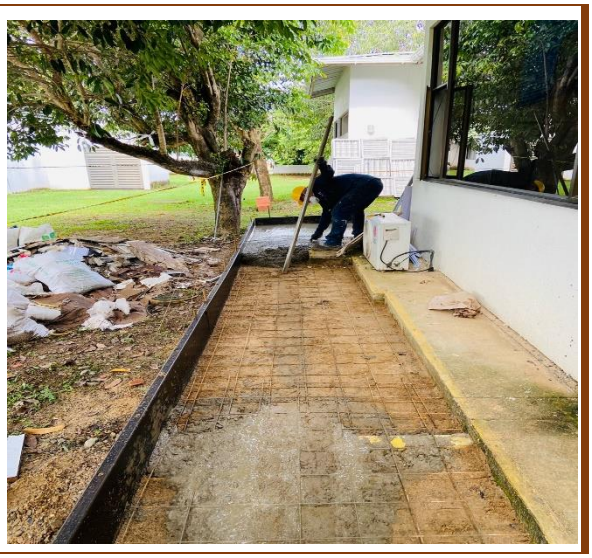

PRELIMINARES									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA MES	% EJECUTADO MES	ACUMULADO	% ACUMULADO	CANTIDAD POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
23.1	**CONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO DE 300 PSI E: 0.10 M INCLUYE MATERIALES, FORMALETA, TEXTURIZADO, CURADO Y MALLA ELECTROSOLDADA**	M2	23.76	21.00	88.38 %	21.00	88.38 %	2.76	11.62 %

Oficina Principal
EMAIL: gerenciaingeblar@gmail.com

5.2. Resumen avance de obra.


INGEBLAR SAS inicio trabajo el día 16 de mayo de 2022, en el predio comprendido ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD de las fuerzas aéreas del Municipio de Yopal Casanare.

Para el periodo comprendido 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022, se hicieron actividades correspondientes a SUMINISTRO DE LUMINARIA PANEL DE 60X60, CIELO RASO PVC, INSTALACION DE PINTURA EPOXICA, INSTALACION DE PINTURA VINILO TIPO-1, ALISTADO DE PISO EN CONCRETO DE 3500 PSI. INSTALACION DE CONCRERTO PARA ANDEN PERIMETRAL DE 3000 PSI.

El avance ejecutado de la obra es de **80.18%** contra un programado de **80.15 %**, se evidencia un avance positivo de obra del **0.03 %** en el presente periodo, se genera un avance positivo en este periodo, siguiendo al pie de la letra la programación presentada con el fin de culminar las actividades en los tiempos proyectados, INGEBLAR SAS manifiesta que en siguiente mes se continuara con el mismo rigor las actividades en ejecución con respecto a lo programado y llevar un balance positivo del proyecto en referencia.

Oficina Principal
EMAIL: gerenciaingeblar@gmail.com

5.3. CONTROL AVANCE FÍSICO CONTRATO DE OBRA (CUMPLIMIENTO PROGRAMACIÓN DE OBRA)

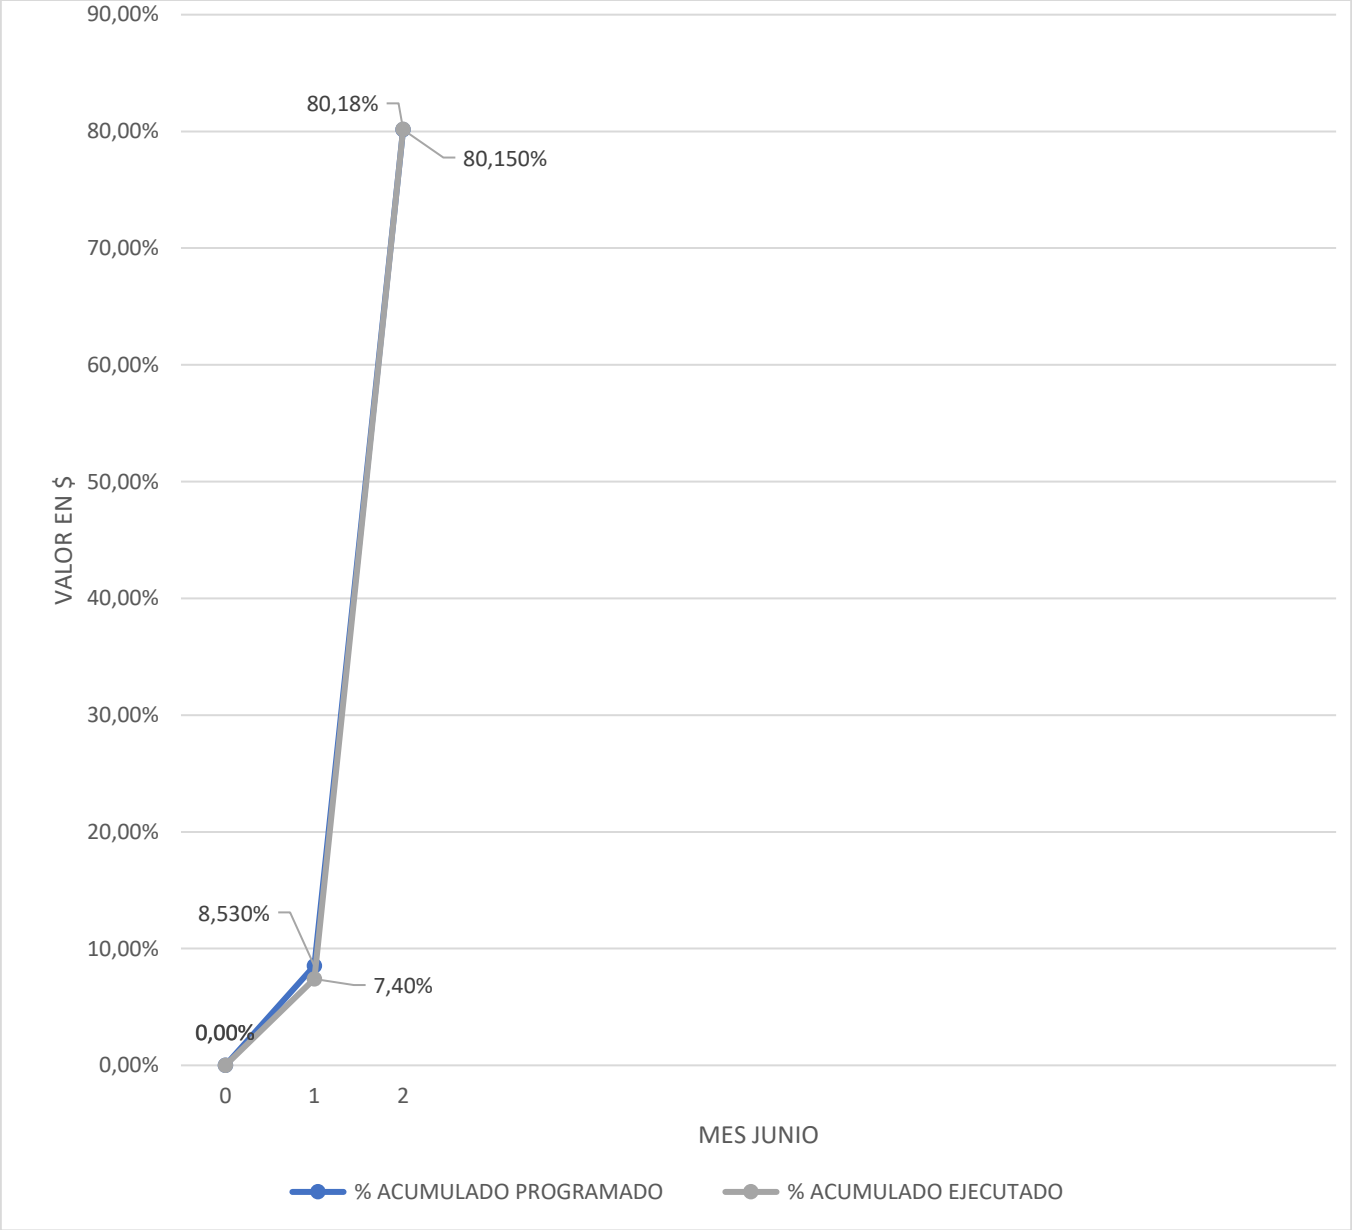

VER ANEXO DE EJECUTADO VS PROGRAMADO

Oficina Principal
EMAIL: gerenciaingeblar@gmail.com

6. RELACION DE CANTIDADES.

6.1. Cantidades contractuales

1	PRELIMINARES				-
1.1	DESMONTE DE CIELORRASO, INCLUYE RETIRO	M²	482,00	8.947,00	4.312.454,00
1.2	REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE RETIRO	M²	22,15	5.092,00	112.780,16
1.3	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES., INCLUYE RETIRO	Un	2,00	10.235,00	20.470,00
1.4	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	M²	7,40	19.508,00	144.359,20
1.5	DESMONTE DE VENTANERIA, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS	M²	63,00	10.899,00	686.637,00
1.6	DESMONTE DE MESONES DE BAÑOS EN ACRÍLICO, INCLUYE LAVAMANOS Y GRIFERÍA	Ml	4,20	9.409,00	39.517,80
1.7	DEMOLICIÓN POYOS DUCHAS, INCLUYE RETIRO	Ml	2,00	6.225,00	12.450,00
1.8	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	Un	1,00	7.238,00	7.238,00
1.9	REGATA DE 1" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES	Ml	5,00	10.677,00	53.385,00
1.10	REGATA DE 3" EN PISO INCLUYE MORTERO PARA REPARACION Y RETIRO DE SOBRANTES	Ml	5,00	13.368,00	66.840,00
5	MAMPOSTERIA				
5.1	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 E=0.15 MTS (0.33X0.115X0.23) MTS.	M²	10,50	38.957,00	409.048,50

Oficina Principal
EMAIL: gerenciaingeblar@gmail.com

5.2	MURO EN DRYWALL CON ESTRUCTURA Y ACABADO A 2 CARAS E= 0,12 MTS. Y FRESCASA	M²	25,16	53.559,00	1.347.544,44
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				-
6.1	PRELIMINARES				-
6.1	PUNTO SANITARIO Ø 3" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	Un	1,00	58.438,00	58.438,00
6.2	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"	Un	1,00	39.197,00	39.197,00
6.3	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2"	Ml	5,00	13.088,00	65.440,00
6.4	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	Ml	5,00	39.141,00	195.705,00
7.	INSTALACIONES ELECTRICAS				-
7.1	PRELIMINARES				-
7.3	SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES)				-
7.3.1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA 12W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	Un	21,00	131.817,00	2.768.157,00

Oficina Principal
EMAIL: gerenciaingeblar@gmail.com

7.3.2	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL 60X60 40W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	Un	68,00	242.292,00	16.475.856,00
10	PAÑETES				
10,1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	M²	18,00	26.381,00	474.858,00
11	CIELORRASO				
11,1	CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION)	M²	482,00	81.603,00	39.332.646,00
12	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES N/A				
12.1	CERAMICA PARED BLANCO REF 20CM X 20CM	M²	2,10	46.550,00	97.755,00
12.2	ALISTADO DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3500 PSI E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	M²	21,05	25.854,00	544.187,92
12.3	PINTURA EPOXICA AZUL - AMARILLA CON DEMARCACION DE SEGURIDAD, PARA TRAFICO PESADO - BODEGA. PINTURA EPÓXICA EN 3 CAPAS EN EL PRIMER NIVEL DE LA SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA, (INCLUYE APLICACIÓN DE DESINCRUSTANTE DEMARCACIÓN DE ZONAS DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN EN PLANOS	M²	21,05	53.986,00	1.136.324,32

Oficina Principal
EMAIL: gerenciaingeblar@gmail.com

13	ACABADOS DE MUROS PINTURA Y ENCHAPES N/A				
13.1	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	M²	100,00	28.156,00	2.815.600,00
13.2	PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	M²	150,00	36.260,00	5.439.000,00
13.3	VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M²	350,00	9.503,00	3.326.050,00
14	CARPINTERIA EN MADERA				
14.1	SIPS MUEBLE TABLERO MELAMINICO RH ESPESOR DE 15 MM PARA INSTALAR BAJO MESÓN DE LAVAMANOS, INCLUYE SUPERFICIE EN SUS SEIS LADOS, ENTREPAÑOS, DIVISIONES INTERNAS, MANIJAS Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M²	1,25	478.180,00	597.725,00
16	CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO				
16.1	VENTANERIA TIPO PERSIANA ALUMINIO SERIE 7038	M²	1,60	244.212,00	390.739,20
16.2	V-1 VENTANERIA CORREDIZA ALUMINIO SERIE 7038 DE TRES CUERPOS Y VIDRIO DE 5 MM EN FACHADA.	M²	63,00	411.545,00	25.927.335,00
16.3	PUERTA EN ALUMINIO CORREDIZA	M²	2,00	115.922,00	231.844,00
18	CUBIERTAS				
18.1	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA	M²	648,00	32.283,00	20.919.384,00
18.2	ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METALICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	M²	21,05	80.822,00	1.701.181,87

Oficina Principal
EMAIL: gerenciaingeblar@gmail.com

18.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR VERDE COLMENA O SIMILAR INCLUYE CABALLETES, LIMATESAS, LIMAHOYAS REMATES LATERALES CONTRA MUROS Y TODO ACCESORIO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M²	21,05	94.582,00	1.990.809,23
19	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				-
19.1	MESON EN GRANITO PULIDO INCLUYE LAVAPLATOS DOBLE TANQUE	ML	2,50	608.200,00	1.520.500,00
23	URBANISMO				
23.1	CONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 0,10M. INCLUYE MATERIALES, FORMALETA, TEXTURIZADO, CURADO Y MALLA ELECTROSOLDADA	M²	23,76	110.997,00	2.637.288,72
24	ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS				
24.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	M²	456,00	4.840,00	2.207.040,00
24.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	M³	32,00	46.064,00	1.474.048,00
TOTAL, COSTO DIRECTO					**$ 139.579.833,36**
ADMINISTRACIÓN		**22,7%**			**$ 31.684.622**
IMPREVISTOS		**1%**			**$ 1.395.798**
UTILIDADES		**4%**			**$ 5.583.193**
IVA SOBRE UTILIDAD		**19%**			**$ 1.060.807**
SUBTOTALES OBRA					**$ 179.304.253,53**

Oficina Principal
EMAIL: gerenciaingeblar@gmail.com

6.1.1. Seguimiento del estado del tiempo

En el mes de junio se presentaron precipitaciones altas, se lograron desarrollar las actividades más relevantes para obtener un avance positivo, sin que se hubiera afectado dichas actividades, esto generando un rendimiento óptimo para cumplir con lo proyectado según programación.

VER ANEXO DEL ESTADO DEL TIEMPO

7. RESUMEN PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

7.1. Resumen financiero

7.1.1. Relación de pagos contrato de obra

En la vigencia del presente informe no se presentaron por parte del contratista actas parciales de cobro.

	Valor contratado	Vr. actas	Valor giros y/o pagos
Valor inicial del contrato	$ 179.304.253,53		
Valor anticipo (50%)		N/A	
Valor acta parcial No 1		N/A	
Valor a pagar cuenta parcial No 1		N/A	
Valor ejecutado presente a cta.		N/A	
Valor por ejecutar		$ 179.304.253,53	
Valor anticipo por amortizar		N/A	
Totales	$ 179.304.253,53	$ 179.304.253,53	

Oficina Principal
EMAIL: gerenciaingeblar@gmail.com

8. CONCLUSIONES

- En el presente periodo correspondiente a 1 de junio de 2022 hasta 30 de junio de 2022, el avance financiero del proyecto fue $ 92.475.130,00 correspondiente al 71.65 % en el mes de junio y un acumulado de $ 142.660.009,00 que corresponde a 80.18 % del valor total del contrato.
- Las pólizas que aseguran el contrato se encuentran vigentes desde la fecha de acta de inicio.
- En el desarrollo de las actividades del presente mes se presentaron fuertes lluvias.
- En el desarrollo del contrato no se presentaron accidentes.
- Se hicieron comités para verificación de balance general del proyecto, avances de obra, rendimiento en porcentajes, verificación de diseños, esto con el fin de que no se presenten inconvenientes contractuales, cumpliendo con las normas y especificaciones adecuadas presentadas por el contrato.

JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
Representante Legal
INGEBLAR

Oficina Principal
EMAIL: gerenciaingeblar@gmail.com

MINUTA DE OBRA

Oficina Principal
EMAIL: gerenciaingeblar@gmail.com

ACTAS GENERADAS DE CONTRATO

Oficina Principal
EMAIL: gerenciaingeblar@gmail.com

POLIZAS

Oficina Principal
EMAIL: gerenciaingeblar@gmail.com

APROBACION DE POLIZAS

Oficina Principal
EMAIL: gerenciaingeblar@gmail.com

COPIA DE BITACORA DE OBRA

Oficina Principal
EMAIL: gerenciaingeblar@gmail.com

NOMINA MENSUAL OBRA

Oficina Principal
EMAIL: gerenciaingeblar@gmail.com

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES OBRA

Oficina Principal
EMAIL: gerenciaingeblar@gmail.com

PROGRAMACION DE OBRA

Oficina Principal
EMAIL: gerenciaingeblar@gmail.com

ESTADO DEL TIEMPO OBRA

Oficina Principal
EMAIL: gerenciaingeblar@gmail.com

INFORME DE HSE

Oficina Principal
EMAIL: gerenciaingeblar@gmail.com

PROGRAMADO VS EJECUTADO

Oficina Principal
EMAIL: gerenciaingeblar@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1116545102
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JEYSON LEONARDO FORERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUAZUL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 15 N 13 57	TELÉFONO:	3777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**4452705193**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/07/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9990513829

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 192.000	$ 0	$ 192.000
SUBTOTALES:										**$ 192.000**	**$ 0**	**$ 192.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 150.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150.000	$ 0	$ 0	$ 150.000
SUBTOTALES:													**$ 150.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 150.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.300	$ 6.300	$ 0	$ 0	$ 6.300
SUBTOTALES:									**$ 6.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD							ARP															
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																																																		ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1116545102	FORERO JEYSON LEONARDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.200.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.200.000	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 192.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.200.000	$ 150.000	$ 0	$ 150.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.200.000	111654510	$ 6.300		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 348.300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71795722
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS DIDIER DIAZ PUENTES
CIUDAD/MUNICIPIO:	COROZAL	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	CRA 19 NO 33 F 4	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4453555292**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/07/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2070542983

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
SUBTOTALES:										**$ 160.000**	**$ 0**	**$ 160.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS048	MUTUAL SER EPS-S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000
SUBTOTALES:													**$ 125.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 125.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 71795722	DIAZ PUENTES CARLOS DIDIER	INDEPEND		$ 1.000.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	MUTUAL SER EPS-S	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000			$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 285.000**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1002758841
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LINA MARCELA OTALORA LOPEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 29 - 13 - 20 YOPAL CASANARE	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4452115817**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/06/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9990396122

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
SUBTOTALES:										**$ 160.000**	**$ 0**	**$ 160.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000
SUBTOTALES:													**$ 125.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 125.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD							ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																										
1	CC 1002758841	OTALORA LOPEZ LINA MARCELA	INDEPEND		$ 1.000.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000			$ 0		$ 0		$ 0			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 285.000**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1122236333
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OSCAR ALEXANDER CALVO OSPINA
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	YOPAL	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4453851134**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/07/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2070644519

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 79.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.200	$ 0	$ 0	$ 79.200
SUBTOTALES:													**$ 79.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 79.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 44.100	$ 44.100	$ 0	$ 0	$ 44.100
SUBTOTALES:									**$ 44.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 44.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP													
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 1122236333	CALVO OSPINA OSCAR ALEXANDER	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	REQ CUMP PENS	$ 1.000.000				NO	12																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	19	$ 633.334	$ 79.200	$ 0	$ 79.200	14-11 - ARL SURA	19	$ 633.334	112223633	$ 44.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 123.300**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1024467063
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JHON ISAAC USAQUEN CHIQUINQUIRA
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	YOPAL	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4453849288**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/07/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2070644554

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC91	ESSC91-ECOOPSOS EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 79.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.200	$ 0	$ 0	$ 79.200
SUBTOTALES:													**$ 79.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 79.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 44.100	$ 44.100	$ 0	$ 0	$ 44.100
SUBTOTALES:									**$ 44.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 44.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD					ARP													
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1024467063	USAQUEN CHIQUINQUIRA JHON ISAAC	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	REQ CUMP PENS	$ 1.000.000				NO	12																	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	ESSC91-ECOOPSOS EPS	19	$ 633.334	$ 79.200	$ 0	$ 79.200	14-11 - ARL SURA	19	$ 633.334	102446706	$ 44.100	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 123.300**

Planilla Pagada

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2022-07-05, 10:49:31 AM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS

Periodo Cotización: junio de 2022 **Periodo Servicio:** junio de 2022 **Referencia pago (PIN):** 8869871613

Fecha limite de pago: 2022-07-21

GUARDADA 05/07/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ABA				
Documento	NI901366376	**Dirección**	CL 33 SUR #19 A - 27 BARRIO LOS ALPES		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3233629278		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	3
Ciudad	COROZAL	**Departamento**	SUCRE		
Representante Legal	BOHORQUEZ GALLARDO ANGEL ALBERTO	**Identificación**	CC1103121620		

IMPORTANTE: SEÑOR APORTANTE, POR FAVOR VERIFIQUE LA LIQUIDACIÓN ANTES DE REALIZAR EL PAGO, Simple S.A., da por entendido que, de realizar el pago con esta planilla, usted está de acuerdo con la información consignada, en consecuencia, la atención de cualquier inconsistencia con las administradoras es su responsabilidad. Recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas establecidas y evite posibles inconvenientes en la prestación de los servicios con sus administradoras. Por favor tenga en cuenta que los pagos realizados después de las 3.00 p.m., se harán efectivos el siguiente día hábil.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79218255	CASAS USAQUEN ROBERTO CARLOS	59	04	X															0	0	9	9	0	NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	NUEVA EPS	$ 300.000	$ 37.500	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 300.000	$ 20.900	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.400
CC 79997120	RONDON TRIANA DIEGO ENRIQUE	59	04	X			X												0	0	9	9	0	NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	COMPENSAR EPS	$ 300.000	$ 37.500	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 300.000	$ 20.900	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.400
CC 1022365767	RONDON TRIANA JESUS ALEJANDRO	59	04	X			X												0	0	9	9	0	NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	SALUD TOTAL EPS	$ 300.000	$ 37.500	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	$ 300.000	$ 20.900	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 0	$ 900.000	$ 900.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.500	$ 62.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 175.200	$ 0	$ 175.200

IV.INFORMACION

Día hábil de pago sin mora
13

Periodo cotización salud											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Centro de Servicios Cafam - Supermecados Colsubsidio

8888698716130000000991231

Mibanco - Corresponsables AKI - Supermercados Comfandi - Almacenes Grupo Éxito

(415)7709998485884(8020)8869871613(3900)0000000(96)20991231

MEDIOS DE PAGO PRESENCIALES Corresponsales: 4/72 - Punto de pago - Punto Red - Baloto - AKI (MiBanco) - MOViiRED / Centro de Servicios: Cafam / Supermercados: Colsubsidio - Comfandi - Éxito - Carulla – Surtimax / App: Móvil Colpatria – MOVii / Bancos: Mibanco - Banco de Occidente

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

JUL 06 2022 10:49:22 RBMICT 9.43

EXITO YOPAL

CL 30 26-29 LOC 72 ALCA

CORRESPONSAL

BANCO DE OCCIDENTE

C.UNICO: 0012919072 TER: 00G8V027

C.BANC: 0023

ID CAJERO: 0121910239

RECIBO: 039505 RRN: 054435

APRO: 286730

RECAUDO

SERVICIO: 6347

FACTURA: 000000000000000886987161 3

** PAGO FACTURA **

TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 175.200

BANCO DE OCCIDENTE es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta.

Para reclamos comuniquese al:

01 8000514652

CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.

*** CLIENTE ***

Escaneado con CamScanner
