	REPORTE SEMANAL DE AVANCE DE OBRA		
GJC-F-030	VERSIÓN 3	FECHA DE EMISIÓN 02/01/2020	

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLON, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA POLIDEPORTIVO ESCALLÓN**

FECHA: 18-jun-22

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA DE MADRID - CUNDINAMARCA | DIRECCIÓN TERRITORIAL: **S.I.S.P** | SEMANA No.: **3** | del **16-jun-22** al **18-jun-22**

GESTOR TECNICO DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE MADRID | SUPERVISOR DEL PROYECTO: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLON, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA | FECHA DE INICIO: 16-jun-22

CONTRATO DE OBRA PUBLICA				**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**			
CONTRATISTA:	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S			INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTER POLIDEPORTIVOS MADRID 2022		
REP. LEGAL:	JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS			REP. LEGAL:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO		
CONTRATO No.	543-2022	VALOR INICIAL:	$ 4,404,922,142.00	CONTRATO No.	539-2022	VALOR INICIAL:	$ 327,895,944.00
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES	ADICIONES:		PLAZO INICIAL:	NUEVE (09) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:		VALOR ACUMULADO:	**$ 4,404,922,142.00**	PLAZO ACUMULADO:		VALOR ACUMULADO:	**$ 327,895,944.00**

II. AVANCE FINANCIERO


DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS OBRA - FRENTE POLIDEPORTIVO ESCALLÓN

OBRA:
INVERSIÓN PROGRAMADA SEMANAL: $ 23,276,846.00
INVERSIÓN EJECUTADA SEMANAL: $ 17,029,655.01
TOTAL OBRA :
INVERSIÓN PROGRAMADA FRENTE: **$ 1,428,004,293.00**
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 17,029,655.01

OBRA SEMANAL:
PROGRAMADA: **1.63%**
EJECUTADA: **0.39%**
TOTAL OBRA:
PROGRAMADA FRENTE: **32.42%**
EJECUTADA ACUMULADA FRENTE: **1.19%**

III. AVANCE FÍSICO

ACTIVIDADES EN OBRA (PRELIMINARES)	ACUMULADO SEMANAL PROYECTO % 1	2	3	4	TOTAL
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO					
DESMONTE DE CERRAMIENTO					
DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA					
DEMOLICION DE PLACA PISO			100		**100**
DEMOLICION VIGAS Y COLUMNAS					
DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO					
RETIRO DE SOBRANTES GENERADOS POR LA PLACA			69.2		**69.23**
LIMPIEZA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA					
LIMPIEZA DE ESTRUCTURA DE PARQUE METALICO					

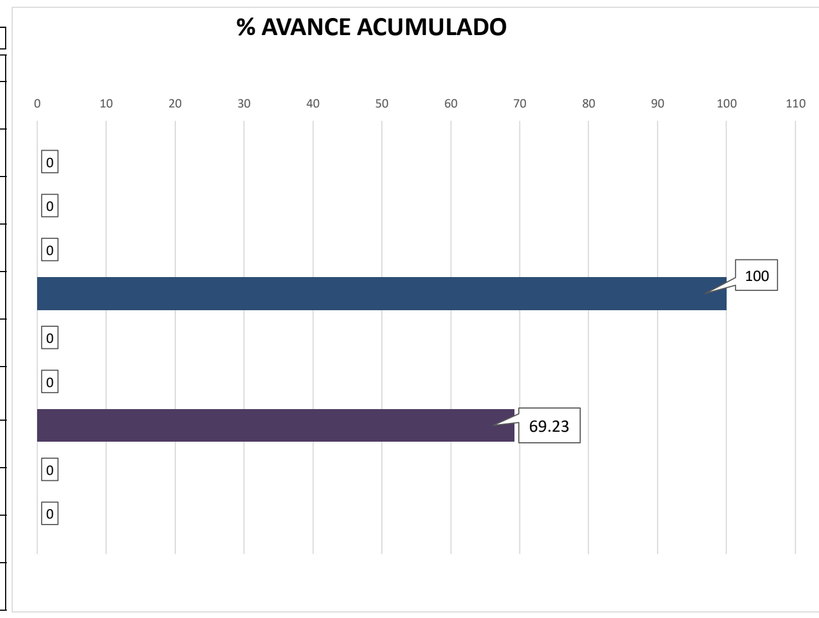

MAQUINARIA Y EQUIPOS

	1	2	3	4	TOTAL
Minicargador (horas):			20		20
Volqueta (viajes):			9		9
Otros:					

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ **NA**
_____ LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ **NA**

UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ **NA**
_____ LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ **NA**

:OBSERVACIONES

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL (PR 8 al PR 18)

BOTADEROS	SI	____	NO	____	N/A		**X**
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	____	N/A		**X**
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	____	N/A		**X**
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	____	N/A		**X**
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	____	N/A		**X**
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	____	N/A		**X**
EMISIONES:	SI	____	NO	____	N/A		**X**

:OBSERVACIONES

PAGA (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO: _____
INVERSIÓN EN GESTIÓN SOCIAL PREDIAL Y AMBIENTAL _____

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: NA
FICHAS PREDIALES APROBADAS: NA
AVALÚOS APROBADOS: NA
PREDIOS ADQUIRIDOS: NA
INVERSIÓN POR COMPRA DE PREDIOS NA

:OBSERVACIONES

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 5

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
SEDES SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 1

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

SE INICIAN LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN DE LA PLACA BASE DEL POLIDEPORTIVO DEL ESCALLON, Y POR CONSIGUIENTE, SE PROCEDE A REALIZAR EL RETIRO DE LOS ESCOMBROS QUE SE GENERARON.

	REPORTE SEMANAL DE AVANCE DE OBRA		
	GJC-F-030	VERSIÓN 3	FECHA DE EMISIÓN 02/01/2020

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLON, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA POLIDEPORTIVO ESCALLÓN**

FECHA: 18-jun-22

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA DE MADRID - CUNDINAMARCA

DIRECCIÓN TERRITORIAL **S.I.S.P** SEMANA No.: **3** del **16-jun-22** al **18-jun-22**

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

1.	RETIRAR LOS SOBRANTES DE LOS ESCOMBROS GENERADOS POR LA DEMOLICIÓN DE LA PLACA BASE.
2.	DESMONTE DE LOS PERFILES Y MALLA QUE COMPONEN EL CERAMIENTO DEL POLIDEPOTIVO ESCALLON
3.	EJECUCIÓN DEL CERRAMIENTO CONFORMADO POR POLISOMBRA Y PARALES DE MADERA
4.	DESCAPOTE MANUAL EN LA ZONA DONDE SE UBICARAN LAS GRADERIAS

NOTA:

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO Y OBSERVACIONES

POLIDEPORTIVO BARRIO ESCALLON



1. Estado incial de la placa base



2. Inicio actividades de demolición de la placa base



3. Finalización de la demolicón de la placa base



4. Acumulación de material



5. Cargue de volquetas con material, producto de la demolición de la placa



6. Estado de la placa al culminar labores de la semana; presencia de sobrantes



7. Afectaciones en las labores, generadas por la lluvia



8. Retiro de los de Futsal por parte del presidente de la junta del barrio Escallón

OBSERVACIONES:

DIRECTOR DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: **JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS**

No. MAT: **25202-252504 CND**
