Alcaldía Municipal de MADRID Departamento de Cundinamarca — Madrid CRECE CONTIGO · ANDRÉS TOVAR ALCALDE	**REPORTE SEMANAL DE AVANCE DE OBRA**		
	GJC-F-030	VERSIÓN 3	FECHA DE EMISIÓN 02/01/2020

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLON, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA**
POLIDEPORTIVO ESCALLÓN

FECHA: 26-jun-22

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA DE MADRID - CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN TERRITORIAL: **S.I.S.P**
SEMANA No.: **4** del **20-jun-22** al **26-jun-22**

GESTOR TECNICO DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE MADRID
SUPERVISOR DEL PROYECTO: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLON, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA
FECHA DE INICIO: 16-jun-22

CONTRATO DE OBRA PUBLICA				**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**			
CONTRATISTA:	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S			INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTER POLIDEPORTIVOS MADRID 2022		
REP. LEGAL:	JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS			REP. LEGAL:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO		
CONTRATO No.	543-2022	VALOR INICIAL:	$ 4,404,922,142.00	CONTRATO No.	539-2022	VALOR INICIAL:	$ 327,895,944.00
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES	ADICIONES:		PLAZO INICIAL:	NUEVE (09) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:		VALOR ACUMULADO:	**$ 4,404,922,142.00**	PLAZO ACUMULADO:		VALOR ACUMULADO:	**$ 327,895,944.00**

II. AVANCE FINANCIERO


DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS OBRA - FRENTE POLIDEPORTIVO ESCALLÓN

OBRA:
INVERSIÓN PROGRAMADA SEMANAL: $ 35,596,402.00
INVERSIÓN EJECUTADA SEMANAL: $ 6,516,094.58
TOTAL OBRA :
INVERSIÓN PROGRAMADA FRENTE: **$ 1,428,004,293.00**
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 23,545,749.59

OBRA SEMANAL:
PROGRAMADA: **2.49%**
EJECUTADA: **0.15%**
TOTAL OBRA:
PROGRAMADA FRENTE: **32.42%**
EJECUTADA ACUMULADA FRENTE: **1.65%**

III. AVANCE FÍSICO

ACTIVIDADES EN OBRA (PRELIMINARES)	ACUMULADO SEMANAL PROYECTO % 1	2	3	4.00	TOTAL
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN					
DESMONTE DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA Y PARALES TUBULARES					
DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0,15M				**59.03**	**59.03**
DEMOLICION DE PLACA PISO 0,15 M			100		**100**
DEMOLICION VIGAS Y COLUMNAS				**59.03**	**59.03**
DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO					
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)			69.23	**38.27**	**107.50**
LIMPIEZA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA CON HIDROLAVADORA					
LIMPIEZA DE ESTRUCTURA DE PARQUE METALICO CON HIDROLAVADORA					
EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)					
RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE					
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBUSTO INCLUYE TIERRA NEGRA					
DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M				**37**	**37**

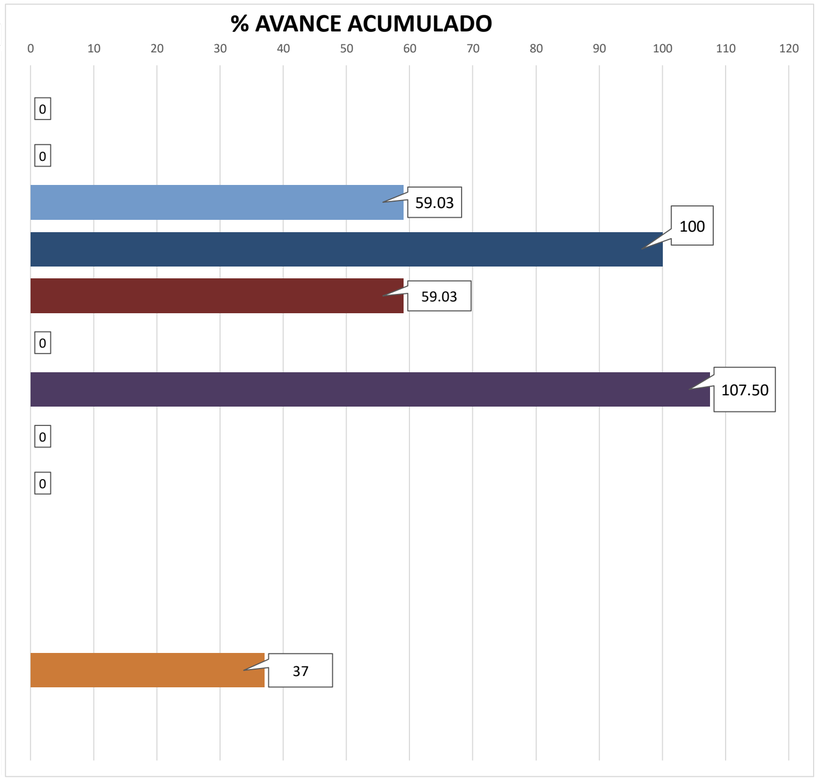

MAQUINARIA Y EQUIPOS

	1	2	3	4	TOTAL
Minicargador (horas):			20		20
Volqueta (viajes):			9		9

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: _____
PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ **NA**
LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ **NA**

UBICACIÓN: _____
PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ **NA**
LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ **NA**

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL (PR 8 al PR 18)

BOTADEROS	SI	____	NO	____	N/A		X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	____	N/A		X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	____	N/A		X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	____	N/A		X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	____	N/A		X
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	____	N/A		X
EMISIONES:	SI	____	NO	____	N/A		X

OBSERVACIONES:

PAGA (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO: _____
INVERSIÓN EN GESTIÓN SOCIAL PREDIAL Y AMBIENTAL _____

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: NA
FICHAS PREDIALES APROBADAS: NA
AVALÚOS APROBADOS: NA
PREDIOS ADQUIRIDOS: NA
INVERSIÓN POR COMPRA DE PREDIOS NA

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
SEDES SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 1

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

SE CONTINUA Y FINALIZA CON LA ACTIVIDAD DE REMOCIÓN DE ESCOMBROS GENERADOS POR LA DEMOLICIÓN DE LA PLACA BASE

SE INICIA CON LA ACTIVIDAD DE DEMOLICIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO, LO QUE INCLUYE DEMOLICIÓN DE: MAMPOSTERIA, VIGAS Y COLUMNAS Y EL RETIRO DE LOS PERFILES Y MALLA QUE CONFORMABAN EL CERRAMIENTO

SE REALIZA DESCAPOTE PARA DESPEJAR LA ZONA DONDE SE CONSTRUIRAN LAS GRADERIAS Y SE PROCEDIO A RETIRAR EL MATERIAL QUE SE GENERO POR ESTA ACTIVIDAD

	REPORTE SEMANAL DE AVANCE DE OBRA		
	GJC-F-030	VERSIÓN 3	FECHA DE EMISIÓN 02/01/2020

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLON, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA POLIDEPORTIVO ESCALLÓN**

FECHA: 26-jun-22

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA DE MADRID - CUNDINAMARCA

DIRECCIÓN TERRITORIAL **S.I.S.P** SEMANA No.: **4** del **20-jun-22** al **26-jun-22**

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

1.	CONTINUAR DEMOLICIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO, INCLUYE: DEMOLICIÓN MURO EN MAMPOSTERIA, VIGAS, COLUMNAS Y DESMONTE DE PERFILES Y MALLAS
2.	CONTINUAR CON EL DESCAPOTE Y RETIRO SE SOBRANTES GENERADOS POR ESTA ACTIVIDAD
3.	INICIAR DEMOLICIÓN DEL CIMIENTO ENTERRADO
4.	

NOTA:

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO Y OBSERVACIONES

POLIDEPORTIVO BARRIO ESCALLON



1. Retiro del material sobrante producto de la demolición de la placa



2.Nivelación del terreno



3. Inicio actividades de descapote



4. Iinicio demolición del muro de cerramiento



5. Retiro del acero de vigas y columnas del muro de cerramiento



6. Afectaciones por lluvia en las actividades

OBSERVACIONES:

DIRECTOR DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: **JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS**

No. MAT: **25202-252504 CND**
