	REPORTE SEMANAL DE AVANCE DE OBRA		
GJC-F-030	VERSIÓN 3	FECHA DE EMISIÓN 02/01/2020	

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLON, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA POLIDEPORTIVO ESCALLÓN**

FECHA: 3-jul-22

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA DE MADRID - CUNDINAMARCA

DIRECCIÓN TERRITORIAL **S.I.S.P** SEMANA No.: **5** del **27-jun-22** al **3-jul-22**

GESTOR TECNICO DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE MADRID

SUPERVISOR DEL PROYECTO: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLON, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA

FECHA DE INICIO: 16-jun-22

CONTRATO DE OBRA PUBLICA				**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**			
CONTRATISTA:	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S			INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTER POLIDEPORTIVOS MADRID 2022		
REP. LEGAL:	JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS			REP. LEGAL:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO		
CONTRATO No.	543-2022	VALOR INICIAL:	$ 4,404,922,142.00	CONTRATO No.	539-2022	VALOR INICIAL:	$ 327,895,944.00
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES	ADICIONES:		PLAZO INICIAL:	NUEVE (09) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:		VALOR ACUMULADO:	**$ 4,404,922,142.00**	PLAZO ACUMULADO:		VALOR ACUMULADO:	**$ 327,895,944.00**

II. AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS OBRA - FRENTE POLIDEPORTIVO ESCALLÓN

OBRA:
INVERSIÓN PROGRAMADA SEMANAL: $ 18,750,905.00
INVERSIÓN EJECUTADA SEMANAL: $ 12,886,951.26


TOTAL OBRA :
INVERSIÓN PROGRAMADA FRENTE: **$ 1,428,004,293.00**
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 36,432,700.85

OBRA SEMANAL:
PROGRAMADA: **1.31%**
EJECUTADA: **0.29%**

TOTAL OBRA:
PROGRAMADA FRENTE: **32.42%**
EJECUTADA ACUMULADA FRENTE: **2.55%**

III. AVANCE FÍSICO

ACTIVIDADES EN OBRA (PRELIMINARES)	ACUMULADO SEMANAL PROYECTO % 1	2	3	4	5	TOTAL
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN						
DESMONTE DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA Y PARALES TUBULARES					**100.00**	**100**
DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0,15M				59.03	**40.97**	**100**
DEMOLICION DE PLACA PISO 0,15 M			100			**100**
DEMOLICION VIGAS Y COLUMNAS				59.03	**40.97**	**100**
DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO					**43.00**	**43**
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)			69.23	38.27	**70.00**	**178**
LIMPIEZA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA CON HIDROLAVADORA						
LIMPIEZA DE ESTRUCTURA DE PARQUE METALICO CON HIDROLAVADORA						
EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)						
RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE						
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBUSTO INCLUYE TIERRA NEGRA						
DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M				37	**65**	**102**

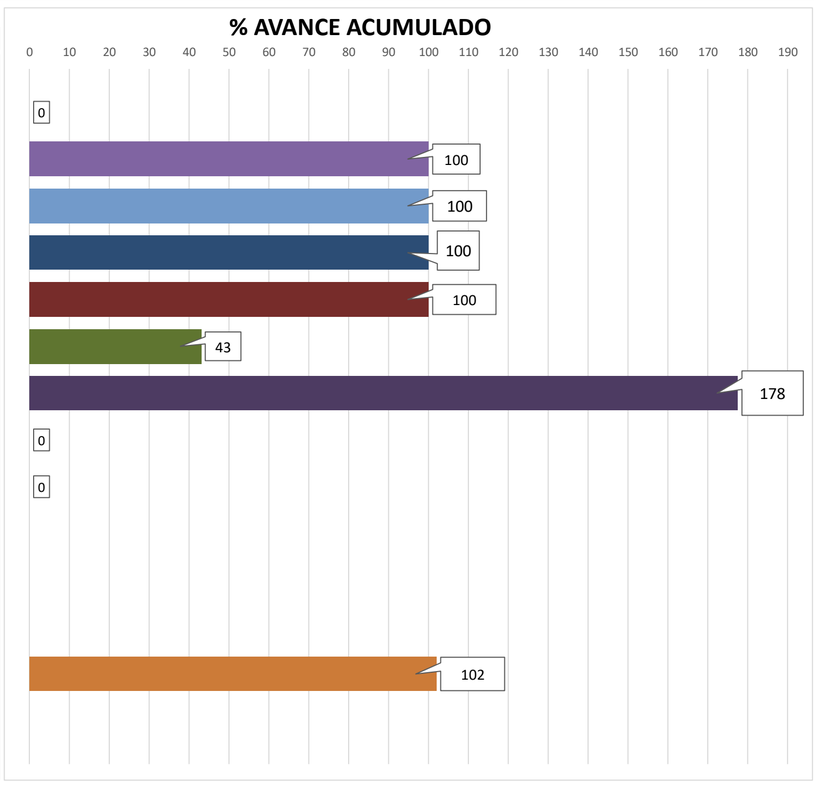

MAQUINARIA Y EQUIPOS

	3	4	5	6	TOTAL
Minicargador (horas):	20	4	16		40
Volqueta (viajes):	9	10	25		44
Pulidora 4 1/2" (und)		1	1		2
Pulidora 9" (und)		1	1		2
Porras (und)		2	2		4
Macetas (und)		2	2		4
Retroexcavadora (horas)		4	10		14

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ **NA**
LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ **NA**

UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ **NA**
LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ **NA**

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL (PR 8 al PR 18)

BOTADEROS	SI ___	NO ___	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ___	NO ___	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI ___	NO ___	N/A	X
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A	X

OBSERVACIONES:

PAGA (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO: _____
INVERSIÓN EN GESTIÓN SOCIAL PREDIAL Y AMBIENTAL _____

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: NA
FICHAS PREDIALES APROBADAS: NA
AVALÚOS APROBADOS: NA
PREDIOS ADQUIRIDOS: NA
INVERSIÓN POR COMPRA DE PREDIOS NA

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
SEDES SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 1

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

SE CONTINUA Y FINALIZA CON LA ACTIVIDAD DE DEMOLICIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO, LO QUE INCLUYE DEMOLICIÓN DE: MAMPOSTERIA, VIGAS Y COLUMNAS Y EL RETIRO DE LOS PERFILES Y MALLA QUE CONFORMABAN EL CERRAMIENTO

SE CONTINUA Y FINALIZA CON EL DESCAPOTE DE LA ZONA DONDE SE UBICARAN LAS GRADERIAS Y SE CULMINA CON LA ACTIVIDAD DE RETIRO DE MATERIAL GENRADO POR ESTA MISMA ACTIVIDAD

SE DA INICIO A LA ACTIVIDAD DE DEMOLICIÓN DEL CIMIENTO ENTERRADO

SE HACE ENTREGA DE LOS PERFILES Y MALLA QUE CONFORMABAN EL CERRAMIETO AL ALMACEN DE LA ALCALDIA

Casa de Gobierno: Calle 5 No. 4 - 74 Madrid, Cundinamarca
PBX: 744 9745 - **E-mail:** *alcaldia@madrid-cundinamarca.gov.co*
Código Postal: *250030*
www.madrid-cundinamarca.gov.co

REPORTE SEMANAL DE AVANCE DE OBRA		
GJC-F-030	VERSIÓN 3	FECHA DE EMISIÓN 02/01/2020

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLON, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA**
POLIDEPORTIVO ESCALLÓN

FECHA: 3-jul-22

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA DE MADRID - CUNDINAMARCA

DIRECCIÓN TERRITORIAL **S.I.S.P** SEMANA No.: **5** del **27-jun-22** al **3-jul-22**

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

1.	INICIO ACTIVIDAD DE LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
2.	EJECUCIÓN DEL CERRAMIENTO CONFORMADO POR POLISOMBRA Y PARALES DE MADERA
3.	INICIO A LA ACTIVIDAD DE EXCAVACIÓN
4.	DESARROLLAR UN SISTEMA DE DESAGUE PARA EVITAR EMPOSAMIENTOS EN EL TERRENO, PROVENIENTES

NOTA:

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO Y OBSERVACIONES

POLIDEPORTIVO BARRIO ESCALLON



1. Descapote zona donde se ubicaran las graderias



2.Demolición del muro de cerramiento



3. Retiro de los perfiles y malla del cerramiento



4. Retiro del material generado por el descapote



5. Demolición del cimiento enterrado



6. Entrega de material al almacen de la alcaldia

OBSERVACIONES:

DIRECTOR DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: **JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS**

No. MAT: **25202-252504 CND**
