Alcaldía Municipal de MADRID Departamento de Cundinamarca · Madrid CRECE CONTIGO · ANDRÉS TOVAR ALCALDE	**REPORTE SEMANAL DE AVANCE DE OBRA**		
	GJC-F-030	VERSIÓN 3	FECHA DE EMISIÓN 02/01/2020

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLON, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA**
POLIDEPORTIVO ESCALLÓN

FECHA: 10-jul-22

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA DE MADRID - CUNDINAMARCA

DIRECCIÓN TERRITORIAL **S.I.S.P** SEMANA No.: **6** del **4-jul-22** al **10-jul-22**

GESTOR TECNICO DEL CONTRATO: MUNICIPIO DE MADRID

SUPERVISOR DEL PROYECTO: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLON, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA

FECHA DE INICIO: 16-jun-22

CONTRATO DE OBRA PUBLICA				**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**			
CONTRATISTA:	GCS CONSTRUCCIONES S.A.S			INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL INTER POLIDEPORTIVOS MADRID 2022		
REP. LEGAL:	JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS			REP. LEGAL:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO		
CONTRATO No.	543-2022	VALOR INICIAL:	$ 4,404,922,142.00	CONTRATO No.	539-2022	VALOR INICIAL:	$ 327,895,944.00
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES	ADICIONES:		PLAZO INICIAL:	NUEVE (09) MESES	ADICIONES:	
PLAZO ACUMULADO:		VALOR ACUMULADO:	**$ 4,404,922,142.00**	PLAZO ACUMULADO:		VALOR ACUMULADO:	**$ 327,895,944.00**

II. AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS OBRA - FRENTE POLIDEPORTIVO ESCALLÓN

OBRA:
INVERSIÓN PROGRAMADA SEMANAL: $ 23,955,644.00
INVERSIÓN EJECUTADA SEMANAL: $ 36,670,439.36

TOTAL OBRA :
INVERSIÓN PROGRAMADA FRENTE: **$ 1,428,004,293.00**
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 73,103,140.21


OBRA SEMANAL:
PROGRAMADA: **1.68%**
EJECUTADA: **0.83%**

TOTAL OBRA:
PROGRAMADA FRENTE: **32.42%**
EJECUTADA ACUMULADA FRENTE: **5.12%**

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO SEMANAL PROYECTO %

ACTIVIDADES EN OBRA (PRELIMINARES)	3	4	**5**	6	7	**TOTAL**
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN				**100**		**100**
DESMONTE DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA Y PARALES TUBULARES			100.00			**100**
DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0,15M		59.03	40.97			**100**
DEMOLICION DE PLACA PISO 0,15 M	100					**100**
DEMOLICION VIGAS Y COLUMNAS		59.03	40.97			**100**
DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO			43.00	**57**		**100**
RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	69.23	38.27	70.00	**10**		**188**
LIMPIEZA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA CON HIDROLAVADORA						
LIMPIEZA DE ESTRUCTURA DE PARQUE METALICO CON HIDROLAVADORA						
EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)						
RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE						
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBUSTO INCLUYE TIERRA NEGRA						
DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M		37	65			**102**

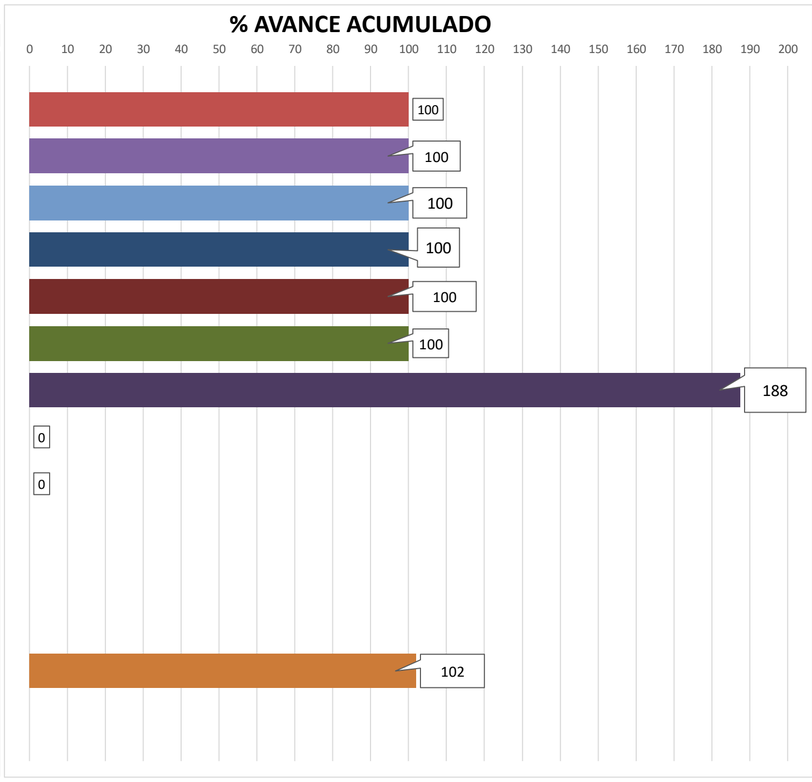

MAQUINARIA Y EQUIPOS

	3	4	5	6	TOTAL
Minicargador (horas):	20	4	16	**6.5**	46.5
Volqueta (viajes):	9	10	25	**2**	46
Pulidora 4 1/2" (und)		1	1	**1**	3
Pulidora 9" (und)		1	1	**1**	3
Porras (und)		2	2	**4**	8
Macetas (und)		2	2	**2**	6
Retroexcavadora (horas)		4	10	**9**	23
Demoledor manual				**1**	1

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: _____
PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ **NA**
LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ **NA**

UBICACIÓN: _____
PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ **NA**
LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ **NA**

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL (PR 8 al PR 18)

BOTADEROS	SI ____	NO ____	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	X
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	X

OBSERVACIONES:

PAGA (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO: _____
INVERSIÓN EN GESTIÓN SOCIAL PREDIAL Y AMBIENTAL _____

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: NA
FICHAS PREDIALES APROBADAS: NA
AVALÚOS APROBADOS: NA
PREDIOS ADQUIRIDOS: NA
INVERSIÓN POR COMPRA DE PREDIOS NA

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
SEDES SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: 1

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

SE CONTINUA FINALIZA CON LA ACTIVIDAD DE DEMOLICIÓN DE CIMIENTO ENTERRADO
SE FINALIZA EL RETIRO DE MATERIAL GENERADO POR DESCAPOTE
SE REALIZA EL CERRAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO EN POLISOMBRA DE TELA VERDE
SE REALIZA EL ALMACENAMIENTO DE MATERIAL GENERADO POR DEMOLICIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO
SE INICIA Y FINALIZA LA ACTIVIDAD DE REPLANTEO

REPORTE SEMANAL DE AVANCE DE OBRA		
GJC-F-030	VERSIÓN 3	FECHA DE EMISIÓN 02/01/2020

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **MEJORAMIENTO DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS: LA MAGNOLIA, ESCALLON, SAN LUIS Y SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE MADRID, CUNDINAMARCA POLIDEPORTIVO ESCALLÓN**

FECHA: 10-jul-22

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA DE MADRID - CUNDINAMARCA

DIRECCIÓN TERRITORIAL **S.I.S.P** SEMANA No.: **6** del **4-jul-22** al **10-jul-22**

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

1.	INICIO DE EXCAVACIÓN CIMENTACIÓN DE GRADERIA
2.	INICIO DE AMARRE DE ACERO Y FUNDICIÓN DEL CONCRETO DE ZAPATAS GRADERIAS
3.	DESARROLLAR UN SISTEMA DE DESAGUE PARA EVITAR EMPOSAMIENTOS EN EL TERRENO, PROVENIENTES DE AGUAS LLUVIA
4.	

NOTA:

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO Y OBSERVACIONES

POLIDEPORTIVO BARRIO ESCALLON



1. Demolición de cimiento enterrado



2.Retiro de material sobrante de descapote



3. Cerramiento en polisombra



4. Almacenamiento de material de demolición de muro



5. Replanteo





6. Disposición de RCD para petición de la comunidad

OBSERVACIONES:

DIRECTOR DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: **JAVIER ANTONIO GONZALEZ ARENAS**

No. MAT: **25202-252504 CND**
