DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14830630559

(415)7707212489984(8020) 000001483063055 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1102840197	7	Impuestos y Aduanas de Sincelejo 23	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1102840197	20090625

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Sucre 70	Sincelejo 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RAMOS	JARABA	MARIA	BERNARDA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
METALICAS DE SUCRE	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Sucre 70	Sincelejo 001

41. Dirección principal: CR 4 B 11 F 37

42. Correo electrónico: cpmariaramos@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	2822710	3205287023

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
2511	20220209	4752	20220112					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código: 22	49	52																							

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2022-05-28 17:00:47

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante.

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada.

984. Nombre: RAMOS JARABA MARIA BERNARDA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Certificado
Bancario

Miércoles, 1 de junio de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MARIA BERNARDA RAMOS JARABA identificado(a) con CC 1102840197, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	08211300427	2013/08/02	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Bancolombia

CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
MARIA BERNARDA RAMOS JARABA

Fecha expedición: 2022/05/27 - 16:17:34 **** Recibo No. S000463401 **** Num. Operación. 01-MVARGAS-20220527-0019

*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN CGBhruM8tB

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: MARIA BERNARDA RAMOS JARABA
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: PERSONA NATURAL
IDENTIFICACIÓN : CÉDULA DE CIUDADANIA - 1102840197
NIT : 1102840197-7
ADMINISTRACIÓN DIAN : SINCELEJO
DOMICILIO : SINCELEJO

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 117937
FECHA DE MATRÍCULA : OCTUBRE 29 DE 2020
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MAYO 27 DE 2022
ACTIVO TOTAL : 2,000,000.00
GRUPO NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CR 4 B NRO. 11 F - 37 BRR VILLA ORIETA
MUNICIPIO / DOMICILIO: 70001 - SINCELEJO
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3205287023
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : cpmariaramos@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CR 4 B NRO. 11 F - 37 BRR VILLA ORIETA
MUNICIPIO : 70001 - SINCELEJO
TELÉFONO 1 : 3205287023
CORREO ELECTRÓNICO : cpmariaramos@gmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : cpmariaramos@gmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA : FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL, COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.

ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2511 - FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
ACTIVIDAD SECUNDARIA : G4752 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO :** METALICAS DE SUCRE
MATRICULA : 117938
FECHA DE MATRICULA : 20201029

CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
MARIA BERNARDA RAMOS JARABA

Fecha expedición: 2022/05/27 - 16:17:34 ****** Recibo No.** S000463401 ****** Num. Operación.** 01-MVARGAS-20220527-0019

*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN CGBhruM8IB

FECHA DE RENOVACION : 20220527
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
DIRECCION : CR 4 B NRO. 11 F - 37 BRR VILLA ORISTA
MUNICIPIO : 70001 - SINCELEJO
TELEFONO 1 : 3205287023
CORREO ELECTRONICO : cpmariaramos@gmail.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2511 - FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
ACTIVIDAD SECUNDARIA : G4752 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 2,000,000

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $2,000,000
Actividad económica por la que percibio mayores ingresos en el periodo - CIIU : C2511

INFORMA - REPORTE A ENTIDADES

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
a. Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.
b. Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $5,200

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace https://siicincelejo.confecamaras.co/cv.php seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación CGBhruM8IB

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

DP-3	20150928	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	SINCELEJO	RM09-20318	20151005
DP-3	20150928	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	SINCELEJO	RM09-20319	20151005
AC-6	20160905	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	SINCELEJO	RM09-21647	20160912
CC-1	20160930	REVISOR FISCAL	SINCELEJO	RM09-21738	20161014
AC-7	20170616	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	SINCELEJO	RM09-23712	20170622
AC-7	20201024	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	SINCELEJO	RM09-29568	20201030

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA PERSONA JURIDICA ES INDEFINIDO

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA DISENO Y PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA DISENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES OBRAS CIVILES HIDRAULICAS PRENSAS DIQUES O MUELLES TODO TIPO DE ACTIVIDADES INMOBILIARIAS ACTIVIDADES DE FACTORING Y COMPRA Y VENTA DE CARTERA SISTEMAS DE IRRIGACION Y DRENAJE LEVANTAMIENTO SUMNISTRO DE DOTACIONES INDUSTRIALES DE TODO TIPO DESDE VESTIDOS HASTA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL TOPOGRAFICO DRAGADOS Y CANALES DE AGUAS SUBTERRANEOS Y POZOS PROFUNDOS GENERACION Y MODIFICACION DE PLAYAS CONDUCCION DE AGUAS OBRAS SANITARIAS Y AMBIENTALES REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUAS SERVIDAS ESTACIONES DE BOMBEO PLANTA DE TRATAMIENTO TANQUES DE ALMACENAMIENTO SERVICIOS AGRO INDUSTRIALES MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MEDIDAS DE PROTECCION MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL SERVICIO DE ASEO EN GENERAL SOLDADURA Y PINTURA ROCERIA SAMBLASTING SISTEMA DE DEMOTICAS SISTEMA LIVIANO EN SECO DISENO Y PROTECCION Y CONTROL DE EROSIONES EN PIADIZACION RELLENOS SANITARIOS POZOS SEPTICOS MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL SISTEMAS DE COMUNICACIONES Y OBRAS DE URBANISMO PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS ESTRUCTURAS METALICAS ESTRUCTURAS DE MADERA INSTALACIONES DE INTERIOR PARA EDIFICIOS MONTAJE ELECTRONICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SUBESTACIONES DE ENERGIA LINEAS DE TRASMISIONES Y SUBTRANSMICION DE ENERGIA REDES DE DISTRIBUCION AREA Y SUBTERRANEA SISTEMAS DE CALEFACCION REFRIGERACION Y ENFRIAMIENTO MONTAJE DE ASCENSORES MONTACARGAS Y PUENTE GRUA ALUMBRADO PUBLICO AEROPUERTO CANCHAS DEPORTIVAS DE EDIFICACIONES (EXTERIORES E INTERIORES) MONTAJE DE TUBERIAS DE PRESION SISTEMAS SERVICIOS INDUSTRIALES UNIDADES DE PROCESO SERVICIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS QUIMICOS VIDRIOS ACRILICOS Y SIMILARES FRIGORIFICOS MATADEROS BODEGAS OBRAS PARA MINERIA E HIDROCARBURO DUCTOS PARA TRANSPORTE DE HIDROCARBURO ESTRUCTURAS MARI NAS PLATAFORMAS Y MONOBOYAS TANQUES METALICOS VACIAS DE PROCESOS ESTACIONES DE RECOLECCION Y/O BOMBEO OBRAS DE TRANSPORTES Y COMPLEMENTARIAS VIAS DE COMUNICACION EN SUPERFICIE PAVIMENTO RIGIDO PAVIMENTO FLEXIBLES PUERTOS MARITIMOS Y FLUVIALES SENALIZACION Y CONTROL CERCAS ELECTRICAS DE SEGURIDAD CONSULTORIAS INTERVENTORIAS EN TODAS LAS RAMAS AVALUOS FABRICACION DE BLOQUES Y TUBOS VIBRADOS EN CONCRETO SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y ELECTRICOS LAMINACION DE MUROS EN LAMINAS DE PLOMO SUMINISTRO DE ANIMALES VIVOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRODUCTO DEL REINO VEGETAL PRODUCTOS Y MATERIALES TEXTILES PAPELERIA ENCICLOPEDIAS MATERIAL DIDACTICO SILLAS PARA COLEGIOS UNIVERSIDADES Y OFICINA PRODUCTOS HOSPITALARIOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS MATERIAL Y APARATOS MEDICOS QUIRURGICOS MADERAS Y MANUFACTURAS EN MADERAS ARTESANIAS Y ARTICULOS DE CESTERIA APARATOS ELECTRICOS SUS PARTES Y ACCESORIOS JUGUETERIA VEHICULOS SUS PARTES Y ACCESORIOS ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION COMPRA Y VENTA DE BIENES RAICES COMPRA VENTA E IMPORTACION DE VEHICULOS MAQUINARIA EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES PARA OFICINAS COLEGIO Y UNIVERSIDADES EN FIN PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS A UNA NUEVA TECNOLOGIA DEL ACERO FINES CON SU OBJETO SOCIAL ASI MISMO PODRA REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONOMICA LICITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	500.000.000,00	1.000,00	500.000,00
CAPITAL SUSCRITO	500.000.000,00	1.000,00	500.000,00
CAPITAL PAGADO	500.000.000,00	1.000,00	500.000,00

CERTIFICA

JUNTA DIRECTIVA - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 7 DEL 16 DE JUNIO DE 2017 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 23713 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 22 DE JUNIO DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL	MORENO ORTEGA GLORIA ESTELLA	CC 45,466,865

POR ACTA NÚMERO 7 DEL 16 DE JUNIO DE 2017 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 23713 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 22 DE JUNIO DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL	PALENCIA DIEGO CARLOS JOSE	CC 92,501,075

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 1-2014 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2014 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 18468 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE OCTUBRE DE 2014, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL	PALENCIA DIEGO CARLOS JOSE	CC 92,501,075

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 1-2014 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2014 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 18468 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 28 DE OCTUBRE DE 2014, FURON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE SUPLENTE	MORENO ORTEGA GLORIA ESTELLA	CC 45,466,865

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN PODRÁ COMPROMETER A LA SOCIEDAD EN UN MONTO INDEFINIDO SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS EN LA RELACIONES FRENTE A TERCEROS LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. EL REPRESENTANTE LEGAL TIENE FACULTADES DE OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS O CRÉDITOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER POR PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES. ASÍ MISMO, SE LE OTORGA FACULTADES PARA REALIZAR CONVENIOS, GESTIONAR CRÉDITOS BANCARIOS, FIRMAR CONTRATOS Y REALIZAR NEGOCIACIONES CON TERCEROS SIN LIMITANTES.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 4 DEL 26 DE FEBRERO DE 2016 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 20840 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 07 DE MARZO DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	ARIAS LLORENTE ANUAR ANTONIO	CC 92,543,005	186702 T

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRIMEROS SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 5 DEL 26 DE MARZO DE 2018 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO

CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO
MARIA BERNARDA RAMOS JARABA

Fecha expedición: 2022/05/27 - 16:17:34 **** Recibo No. S003463401 **** Num. Operación. 01-MVARGAS-20220527-0019

*** EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN CGBhruM9tB

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

Anexo 7. Acta de seguimiento de contrato

territorio	**ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO**	CÓDIGO:	**F-GG-09**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

ACTA No:	07
FECHA:	01- Junio - 2022
CONTRATO No:	2220585 de 2022
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

Acción de Proyecto No. ____ <No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se encuentra en el FMI054 Cuadro de control de trazabilidad de acciones de proyecto. Este aparte se repite tantas veces como Acciones del Proyecto o compromisos existan.>			
Responsable por Contratista	NA		
Responsable por Interventoría	NA		
Fecha programada cumplimiento	NA	% de avance	NA
Indique el avance en ejecución de las acciones o compromisos previos.			
Si la acción o compromiso se encuentra incumplida, indique las causas y los recursos a asignar.			

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha.

TEMAS DEL PROYECTO

1	Actividad 1.Diseño de Prototipos
2	Actividad 2 Inicio diagnósticos
3	Actividad 3 Ejecución de obra
4	Actividad 4 Social

Aspectos Técnicos

COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 7 PCI SINCELEJO - 31 DE MAYO DE 2022

No.	Descripción	Avance	Compromiso	Responsable

Actividad 1: Se atendieron unas observaciones con respecto a un refuerzo longitudinal, el dia 31 de Mayo se dió el aval Total de la actividad.

Actividad 2: Total de dignosticos realizados 373 a la fecha, 103 dragnosticos aprobados Aumulados.

están en aprobación 20, ya que estaban en revisión, y hay 50 en revisión entregadas en el día de ayer.

→ Se deja el comité de Aprobación para el día Viernes 03-05-2022 ya que el Lunes fué festivo.

Se desea manejar un volumen de entre 60 y 70 diagnosticos aprobados por semana. Actividad 3.

→ El promedio general para terminar una caseta es de 7 días

→ Solo se ha iniciado con 10 Viviendas, con la vigas de Cimentacion. existe un atraso a la fecha ya que el acceso al barrio es muy complicado, y las lluvias son constantes, todos estos factores perjudican el acarreo de los materiales.

→ La entidad propone a la Alcaldía colaboracion al mejoramiento de las Vias para dar cumplimiento con celeridad al contrato.

→ Segun Infamación de la representante del FOVIS, comenta que la Temporada de ciclones el día de hoy. Se debe tener encuenta para la programacion de la ejecucion del proyecto.

→ La Entidad transmite un mensaje al alcalde para que brinde el apoyo en este proyecto.

→ En el recorrido de las dos de la tarde en el día de hoy,. Se buscarán estrategias para mitigar esta problematica, del acarreo de los materiales.

Tratar de hablar con los Lideres del barrio para brinden alguna Solución con el acarreo de los materiales.

→ Para la Visita en la tarde al barrio el poblado, se necesita llevar los diagnosticos aprobados, los diez con los que se comenzaron las Intervenciones.

→ Se van a visitar las viviendas, para realizar las observaciones Pertinentes.

→ Tener todos los registros fotograficos donde se demuestre la instalación de los micromedidores nuevos

→ La Rotura de las cajas de Inspección, debe certificarse por la Interventoría.

→ Para el tema de las Viviendas que se encuentran dentro de

la matriz Inicial, y en el plano Su predio aparece por la mitad en riesgo, Se solicita acompañamiento de la alcaldía y estos a su vez piden compañía de la oficina de gestión de riesgos para que ellos evalúen estos Lotes, y se pueda brindar un criterio de si pueden ser aptos para aplicarles un diagnostico.

Actividad 4:

→Se han recepcionado a la fecha el total de 9 Solicitudes de Inclusion, estas Solicitudes Se enviarón a la Alcaldía, ellos Se las pasan al fovis, y ellos Se encargan de realizar el diagnostico a la vivienda, esto Se debe hacer a la mayor Brevedad posible, para que el contratista pueda evaluar el Presupuesto.

→ las viviendas terminadas deben Ser entregadas a la parte Social para que Se les pueda realizar la Socialización al beneficiario.

→El Link que debe entregar la alcaldía, Comentan que lo maneja una empresa de Bogotá y que ellos realizaran la Solicitud, pero que pueden dar respuesta dentro de un mes. Dentro de este link, van a ir incluidos los avances del Proyecto, fotografías, y noticias de las actividades.

Programa de Proyecto
Aspectos Administrativos
Aspectos Presupuestales:
Riesgos
Aspectos sociales y/o ambientales

ACCIONES FORMULADAS EN BASE A LO PRESENTE ACTA

Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen **Acción de Proyecto No. ____** < No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se debe ser registrado en el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto> >	
Responsable por Contratista	N/A
Responsable por Interventoría	N/A
Fecha programada cumplimiento	N/A
escriba la No Conformidad o compromiso.	
Describa las acciones a implementar.	

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha.

PARTICIPANTES		
NOMBRE	Jaky Paulin Rios Araya.	Firma
En Representación de	Interventoria GAVINCO.	
Correo electrónico	Julyrios87@gmail.com.	Jaky Rios Araya.
Teléfono	3007629365.	
NOMBRE	Johana Trujillo Arrieta	Firma
En Representación de	Consorcio Turquia.	
Correo electrónico	Johanatrujillo100@hotmail.com.	Johana Trujillo Arrieta.
Teléfono	3015571707.	
NOMBRE	Jose Ignacio Cardenas M	Firma
En Representación de	Consorcio turquia	
Correo electrónico	ingcardenas_2017@icloud.com	
Teléfono	3192992037	
NOMBRE	OSCAR EDWIN SALCEDO MENDOZA	Firma
En Representación de	MUNICIPIO DE SINCELEJO.	
Correo electrónico	GERENCIA - FONVAS @ sincelejo.gov.co	
NOMBRE	Sindy Paola Castro A.	Firma
En Representación de	MVCT	
Correo electrónico	Scastro@minvivienda.gov.co	
NOMBRE	Juan David Amon R	Firma
En Representación de	ENTerritorio	
Correo electrónico	Jamon@enterritorio.gov.co	
NOMBRE	Lina Otálvaro	Firma
En Representación de	ENTerritorio	
Correo electrónico	lotalvar@enterritorio.gov.co	
NOMBRE	Esteban Contreras Oviedo.	Firma
En Representación de	Sec. de Planeación Municipal.	
Correo electrónico	Planeacion@sincelejo.gov.co.	
Teléfono		
NOMBRE	Rafael Vegara De la ossa	Firma
En Representación de	Gavinco Interventoria	Rafael Vegara De la ossa
Correo electrónico	radar789@hotmail.com	
NOMBRE	Enrique Medina Narvaez	Firma
En Representación de	ofi. Comunicaciones Alcaldía Scl	
Correo electrónico	enriquemedina309@hotmail.com	
NOMBRE	Marianela García Piñeret	Firma
En Representación de	PDA	Marianela García
Correo electrónico	23.garciamarianela@gmail.com	
NOMBRE	Milena Zabaleta Perez	Firma
En Representación de	Fondo Municipal de Vivienda.	
Correo electrónico	Gerencia-fovis@sincelejo.gov.co.	
NOMBRE	Alexandra Duran Paternina	Firma
En Representación de	Veolia SA ESP	Alexandra Duran
Correo electrónico	alexandra-patricia.duran@veolia.com	
NOMBRE	Sandra contreras Navarro	Firma
En Representación de	Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S	Contreras
Correo electrónico	Sandracn.0530@gmail.com	
	3042151125	

PARTICIPANTES		
NOMBRE	Edgar A. Aragón Otero	Firma
En Representación de	Govinco - Interventoria	
Correo electrónico	earagón@govinco.com	
Teléfono	3175769086	
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
Teléfono		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		
NOMBRE		Firma
En Representación de		
Correo electrónico		

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO**	CÓDIGO:	**F-GG-09**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

ACTA No:	008
FECHA:	2022/06/07
CONTRATO No:	2220585 de 2022
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

Acción de Proyecto No. ____ <No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se encuentra en el FMI054 Cuadro de control de trazabilidad de acciones de proyecto. Este aparte se repite tantas veces como Acciones del Proyecto o compromisos existan.>			
Responsable por Contratista	NA		
Responsable por Interventoría	NA		
Fecha programada cumplimiento	NA	% de avance	NA
Indique el avance en ejecución de las acciones o compromisos previos.			
Si la acción o compromiso se encuentra incumplida, indique las causas y los recursos a asignar.			

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha.

TEMAS PRESENTE ACTA

1	Actividad 1.Diseño de Prototipos
2	Actividad 2 Inicio diagnósticos
3	Actividad 3 Ejecución de obra
4	Actividad 4 Social

Aspectos Técnicos

COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 8 PCI SINCELEJO - 07 DE JUNIO DE 2022				
No.	**Descripción**	**Avance**	**Compromiso**	**Responsable**
1	Actividad 1. Diseño de Prototipos	**Aprobado. Se remitió a la Entidad.**		
2	Actividad 2 Inicio diagnósticos	**Compromisos anteriores:** **1. Comité de aprobación de diagnósticos para el día 03-05-22** Se cumplió. **2. Compromiso de aprobación de diagnósticos. Contratista entre 60 y 70 por semana.** Se aprobaron en comité del día 3 de junio de 2022 un total de 39 diagnósticos. **TEMAS COMITÉ** *** Revisión de diagnósticos a la fecha de comité de seguimiento.**	Carta relación de beneficiarios que no cuentan con el documento FOVIS para el día 09 de junio de 2022. Viviendas aprobadas:192 Viviendas visitadas: 493 Viviendas para aprobación próximo martes 14/06/22: 60 Viviendas programadas a	CONTRATISTA

COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 8 PCI SINCELEJO - 07 DE JUNIO DE 2022				
No.	**Descripción**	**Avance**	**Compromiso**	**Responsable**
		Viviendas aprobadas: 142 a corte de 02 de junio de 2022. Viviendas programadas (Con aprobación): 370. Viviendas efectivas: 398. Viviendas no efectivas: 5. Viviendas visitadas: 403. Próxima semana viviendas programadas (Con aprobación): 470.	corte domingo 12 de junio de 2022 (Con aprobación): 470	
		* Se solicitó por Interventoría indicar fechas en las cuales se adelantarán las actividades de entrega de diagnósticos. El contratista de obra mencionó que se han realizado pocas visitas por el tema de las lluvias, sin embargo, se ha venido trabajando en el alistamiento de un volumen grande para pre-aprobación de interventoría, una vez se tenga el visto bueno se procederá a radicar de manera formal para firma y aprobación definitiva en comité de aprobación; se tiene proyectado entregar un total de 60 diagnósticos para el día martes 14 de junio de 2022. Interventoría mencionó que se encuentra en revisión 70 a 75 diagnósticos para pre-aprobación y/o observaciones, de estos hasta el momento del comité se logró tener revisados 23 diagnósticos, 12 se devolvieron con observaciones y 11 ya se encuentran firmados para que el Consorcio Turquía los radique de manera formal para poder ser incluidos en el comité de aprobación programado para la presente semana. Dentro de lo que se presentó a interventoría, se está realizando una verificación de todos los diagnósticos y viviendas, con el fin de no tener visitas pendientes por realizar, con el fin de tener un orden en el cierre de la manzana en cuanto a los diagnósticos y continuar con las intervenciones. El contratista de obra manifestó que no ha podido conseguir el documento FOVIS actualizado de alrededor de 80 viviendas, debido a que los beneficiarios son de bajos recursos y no cuentan con el dinero para realizar el trámite. La Entidad mencionó que en comités anteriores el contratista había manifestado que no se tenían inconvenientes para la consecución del documento de tenencia. Interventoría solicitó realizar el trámite con la personería y entregar el listado de los beneficiarios que no cuentan con estos documentos. El contratista de obra menciona que se han realizado los trámites con la Personería pero no se ha obtenido respuesta de la misma. La Entidad menciona que en comités pasados se había preguntado para obtener ayuda del FOVIS, sin embargo se manifestó en su momento que no se tenían inconvenientes. Se solicita al contratista de obra realizar el listado de los beneficiarios que no tienen dicho documento y debe radicarse en ENTerritorio para realizar su gestión ante las Entidades pertinentes, este documento se solicita para el día jueves 9 de junio de 2022.		
		* ENTerritorio menciona que este documento también se puede conseguir con la inspección de policía, por lo tanto se solicita al contratista de obra revisar todos los caminos para obtenerlo. * Interventoría identifico los predios con consecutivo 033 y 152 que presentan duplicidad, por lo tanto estos no fueron aprobados. El contratista menciona que se está realizando la verificación e inicialmente se logró verificar que no se presenta esa duplicidad en cuanto al consecutivo 033, en las horas del final de la tarde se dará respuesta a Interventoría.		
3	Actividad 3 Ejecución de obra	La Entidad menciona que de acuerdo con la programación se evidencia que en la próxima semana se va a superar el atraso del mayor del 5%, por lo tanto la Interventoría deberá requerir un plan de contingencia, si se supera el 10% interventoría iniciará el proceso de incumplimiento. Por lo tanto se solicitó al contratista tomar las medidas correctivas. Interventora manifestó que se ha venido realizando las diferentes solicitudes de tomar las medidas correctivas y recomendaciones para subsanar los atrasos. Viviendas iniciadas deben estar terminadas en una semana o como máximo en 10 días, ya que no podemos tomarnos más tiempo en su ejecución.	COMPROMISO Viviendas programadas (Ejecución): 69 Viviendas en iniciadas: 35 Viviendas terminadas: 13 Viviendas en ejecución: 22	CONTRATISTA

COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 8 PCI SINCELEJO - 07 DE JUNIO DE 2022

No.	Descripción	Avance	Compromiso	Responsable

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ACTA DE ENTREGA	Fecha de inicio	Fecha limite terminación.
INTERV No. 3 S-SC-EP-M35-VE- 003	25/05/2022	01/06/2022
INTERV No. 4 S-SC-EP-M35-VE-004	25/05/2022	01/06/2022
INTERV No. 5 S-SC-EP-M35-VE-005	04/06/2022	11/06/2022
INTERV No. 6 S-SC-EP-M35-VE- 006	25/05/2022	01/06/2022
INTERV No. 7 S-SC-EP-M35-VE- 007	25/05/2022	01/06/2022
INTERV No. 8 S-SC-EP-M35-VE- 008	25/05/2022	01/06/2022
INTERV No. 10 S-SC-EP-M35-VE-010	25/05/2022	01/06/2022
INTERV No. 11 S-SC-EP-M35-VE-011	04/06/2022	11/06/2022
INTERV No. 12 S-SC-EP-M35-VE-012	04/06/2022	11/06/2022
INTERV No. 13 S-SC-EP-M35-VE-013	25/05/2022	01/06/2022
INTERV No. 14 S-SC-EP-M35-VE-014	25/05/2022	01/06/2022
INTERV No. 15 S-SC-EP-M35-VE-015	25/05/2022	01/06/2022
INTERV No. 16 S-SC-EP-M35-VE-016	25/05/2022	01/06/2022

* El contratista menciona que se han tenido diferentes factores que han influido en el atraso de la ejecución y entrega de viviendas, por lluvias en el municipio de Sincelejo y esto ocasionó que las vías se vieran afectadas en el ingreso de los materiales transportados. El Contratista cuenta con la cerámica adquirida, está pendiente el despacho por el proveedor. Se está gestionando en las manzanas 35 y 36 el transporte de los materiales a las viviendas que se van a iniciar.

Se espera que la próxima semana se terminen las viviendas en ejecución.

* El Contratista menciona que se van a iniciar con 16 viviendas y se están transportando materiales.

* Interventoría pregunta si el contratista cuenta con todos los materiales para terminar las viviendas en ejecución y por iniciar.

La Entidad menciona que de acuerdo con la programación se evidencia que en la próxima semana se va a superar el atraso del mayor del 5%, por lo tanto la Interventoría deberá requerir un plan de contingencia, si se supera el 10% interventoría iniciará el proceso de incumplimiento. Por lo tanto se solicitó al contratista tomar las medidas correctivas.

Interventora manifestó que se ha venido realizando las diferentes solicitudes de tomar las medidas correctivas y recomendaciones para subsanar los atrasos. Viviendas iniciadas deben estar terminadas en una semana o como máximo en 10 días, ya que no podemos tomarnos más tiempo en su ejecución.

	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ACTA DE ENTREGA	Fecha de inicio	Fecha limite terminación.	Fecha compromiso de entrega.
1	INTERV No. 3 S-SC-EP-M35-VE- 003	25/05/2022	01/06/2022	16 de junio de 2022
2	INTERV No. 4 S-SC-EP-M35-VE-004	25/05/2022	01/06/2022	16 de junio de 2022
3	INTERV No. 5 S-SC-EP-M35-VE-005	04/06/2022	11/06/2022	17 de junio de 2022
4	INTERV No. 6 S-SC-EP-M35-VE- 006	25/05/2022	01/06/2022	16 de junio de 2022
5	INTERV No. 7 S-SC-EP-M35-VE- 007	25/05/2022	01/06/2022	16 de junio de 2022
6	INTERV No. 8 S-SC-EP-M35-VE- 008	25/05/2022	01/06/2022	16 de junio de 2022
7	INTERV No. 10 S-SC-EP-M35-VE-010	25/05/2022	01/06/2022	16 de junio de 2022
8	INTERV No. 11 S-SC-EP-M35-VE-011	04/06/2022	11/06/2022	17 de junio de 2022
9	INTERV No. 12 S-SC-EP-M35-VE-012	04/06/2022	11/06/2022	17 de junio de 2022
10	INTERV No. 13 S-SC-EP-M35-VE-013	25/05/2022	01/06/2022	16 de junio de 2022
11	INTERV No. 14 S-SC-EP-M35-VE-014	25/05/2022	01/06/2022	16 de junio de 2022
12	INTERV No. 15 S-SC-EP-M35-VE-015	25/05/2022	01/06/2022	16 de junio de 2022
13	INTERV No. 16 S-SC-EP-M35-VE-016	25/05/2022	01/06/2022	16 de junio de 2022

Se está revisando por la Entidad la solicitud del cambio de la especificación, sin embargo, no se tienen observaciones por Interventoría, estaría pendiente la revisión de la dirección de la Entidad para aprobación y/o observaciones.

*Matriz tres momentos: el contratista menciona que se tiene terminada la matriz y se está midiendo cantidades entre inspectores y se remitirá al finalizar la tarde del día de hoy. Se recuerda al contratista que la matriz debe ser entregada a interventoría los días jueves o, a más tardar el día viernes después de comité de aprobación, en cuanto a la ejecución se

Matriz tres momentos actualizada para el día de hoy 07/06/2022

Ficha técnica de micromedidores. 14/06/2022

Certificados de calidad de

CONTRATISTA

COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 8 PCI SINCELEJO - 07 DE JUNIO DE 2022				
No.	**Descripción**	**Avance**	**Compromiso**	**Responsable**
		debe incluir cuando esté finalizada la obra. * Ficha micromedidores. No se ha recibido en Interventoría, se solicita indicar fecha de entrega. El contratista menciona que se entregará el día 14 de junio de 2022. * Acabados y ejecución de obra, esta interventoría menciona que se evidencio observaciones a las actividades de obra. El Contratista menciona que en temas de calidad, se ha venido ajustando actividades pendientes y mejorando con el personal de obra para que no vuelvan a ocurrir, en cuanto al material acopiado se dio respuesta a interventoría mencionando. La Entidad solicita dar respuesta a Interventoría con las medidas tomadas para subsanar las obras ejecutadas. Se debe remitir certificado de materiales de obra que soporte la calidad. Se solicita realizar un ensayo de laboratorio por parte del contratista para asegurar la calidad.	materiales bloque No. 4. 08/06/22 Ensayo de laboratorio Bloque No. 4. 14/06/22 Ensayos de compresión de concretos. 14/06/22	
4	Actividad 4 Instalación Punto de Información	* Se reitera que los comités sean organizados para que su duración no pase de una hora. Se solicita en el próximo comité y siguientes iniciar con la actividad No. 4. * Compromiso envió de cronograma de actividades. Será remitido el día de mañana 08 de junio de 2022 el cronograma. * Socialización sectorizada para el jueves 09 de junio de 2022 sebe ir con el acompañamiento del director del contratista en campo. * Se evidencio el cambio del punto de atención, en donde la interventoría menciona que se ubicó dentro del barrio con horario de 2:00 pm a 4:00 pm de lunes a jueves. * Inclusiones, no se ha dado respuesta de la Alcaldía, sin embargo se evidencio visitas en campo de los funcionarios. * Resolución personería del comité veedor, se debe remitir correo a la Entidad quien notificará al Ministerio.		

Programa de Proyecto
<Relación de todas actividades que presentan atraso indicando los días de atraso y acción correctiva> Se revisará el cumplimiento de la ruta crítica. En el informe semanal, se anexa archivo del programa de proyecto con porcentaje de avance en todas las actividades.
Aspectos Administrativos
<Verificación de pagos de salud, pensión y demás, manejo ambiental, seguridad industrial, programa de salud ocupacional, aspectos sociales, permisos y licencias, gestión de servicios públicos, Otros>
Aspectos Presupuestales:
<Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, verificación de balances de actividades ejecutadas ejecución financiera del contrato, Otros>
Riesgos
<Riesgos detectados y acciones implementadas para su eliminación, mitigación o transferencia. Si se trata de un contrato de obra, relacione los profesionales expertos que asistieron al Comité indicando su especialidad y las recomendaciones dadas por cada uno de ellos.>
Aspectos sociales y/o ambientales

ACCIONES FORMULADAS EN BASE A LA PRESENTE ACTA

Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen **Acción de Proyecto No. ____** < No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se debe ser registrado en el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto> >	
Responsable por Contratista	N/A
Responsable por Interventoría	N/A
Fecha programada cumplimiento	N/A
escriba la No Conformidad o compromiso.	
Describa las acciones a implementar.	

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha.

PARTICIPANTES		
NOMBRE	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ	Firma
En Representación de	ENTerritorio	
Correo electrónico	Jamon@enterritorio.gov.co	
Teléfono	3203518734	
NOMBRE	LINA PATRICIA OTALVARO LOPEZ	Firma
En Representación de	ENTerritorio	
Correo electrónico	lotalvar@enterritorio.gov.co	
Teléfono		
NOMBRE	JOSE IGNACIO CARDENAS	Firma
En Representación de	Consorcio Turquía	
Correo electrónico	Coordinadorturquiapci@gmail.com	
Teléfono	3142996037	
NOMBRE	WILLIAM ANTONIO MARTÍNEZ PALOMINO	Firma
En Representación de	Consorcio Turquía	
Correo electrónico		
NOMBRE	MILAGRO MERCADO CONTRERAS	Firma
En Representación de	Consorcio Turquía	
Correo electrónico		
NOMBRE	WILBERTO ECHAVARRIA DÍAZ	Firma
En Representación de	Consorcio Turquía	
Correo electrónico		
NOMBRE	WENDY JHOANA TRUJILLO	Firma
En Representación de	Consorcio Turquía	
Correo electrónico		
NOMBRE	EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO	Firma
En Representación de	Gavinco SAS	
Correo electrónico	earagon@gavinco.com	
Teléfono	3175769086	
NOMBRE	HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES	Firma
En Representación de	Gavinco SAS	
Correo electrónico	hjunco@gavinco.com	
NOMBRE	SANDRA CONTRERAS	Firma
En Representación de	Gavinco SAS	
Correo electrónico		

PARTICIPANTES		
NOMBRE	JULY RIOS	Firma
En Representación de	Gavinco SAS	
Correo electrónico		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
Nombre: William Antonio Martínez Palomino
CONTRATISTA[1]

Firma_____
Nombre: Edgar Alfonso Aragón
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre: Juan David Amon Rodríguez
SUPERVISOR ENTerritorio

Para uso exclusivo del supervisor de ENTerritorio: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR ENTerritorio

Original: ENTerritorio
Copia: interventoría
Copia: contratista

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2

[1] En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado.
Para el seguimiento de los contratos de interventoría, no aplica firma en este campo.

del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

ACTA No:	009
FECHA:	2022/06/14
CONTRATO No:	2220585 de 2022
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

Acción de Proyecto No. ____ <No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se encuentra en el FMI054 Cuadro de control de trazabilidad de acciones de proyecto. Este aparte se repite tantas veces como Acciones del Proyecto o compromisos existan.>			
Responsable por Contratista	NA		
Responsable por Interventoría	NA		
Fecha programada cumplimiento	NA	% de avance	NA
Indique el avance en ejecución de las acciones o compromisos previos.			
Si la acción o compromiso se encuentra incumplida, indique las causas y los recursos a asignar.			

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha.

TEMAS PRESENTE ACTA

1	Actividad 1.Diseño de Prototipos
2	Actividad 2 Inicio diagnósticos
3	Actividad 3 Ejecución de obra
4	Actividad 4 Social

Aspectos Técnicos

COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 9 PCI SINCELEJO - 14 DE JUNIO DE 2022				
1	Actividad 1. Diseño de Prototipos	**Aprobado. Se remitió a la Entidad.**		
2	Actividad 2 Inicio diagnósticos	**Compromisos anteriores:** **1. Carta relación de beneficiarios que no cuentan con el documento FOVIS para el día 09 de junio de 2022.** No se cumplió. El contratista menciona que se han identificado entre 12 a 14 diagnósticos que no cuentan con el documento fovis, se está realizando por el área social el listado para verificar la cantidad de viviendas que no cuentan con este documento. De las manzanas de la 1 a 35 se han verificado las que no cuentan con este documento, de la 36 a 71 se avanza de casa a casa para verificar el documento de tenencia del predio. La Entidad menciona que el contratista puede hacer una relación de las viviendas que no cuentan con esta información y presentar la solicitud. En el documento de planeación de obra menciona el procedimiento para obtener esta documentación. Se entregará el día viernes 17 de junio de 2022. **2. Diagnósticos - compromiso comité anterior.** Viviendas aprobadas: 192, Se cumplió. Viviendas visitadas: 493	1. Carta relación de beneficiarios que no cuentan con el documento FOVIS para el día 17 de junio de 2022. 2. Diagnósticos Viviendas aprobadas: 300 Viviendas visitadas: 593 Viviendas para aprobación próximo martes 21/06/22: 100 Viviendas programadas a corte domingo 19 de	CONTRATISTA

COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 9 PCI SINCELEJO - 14 DE JUNIO DE 2022

		Viviendas para aprobación próximo martes 14/06/22: 60 Viviendas programadas a corte domingo 19 de junio de 2022 (Con aprobación): 470 **TEMAS COMITÉ** *** Revisión de diagnósticos a la fecha de comité de seguimiento.** Viviendas aprobadas: 200 a corte de 10 de junio de 2022 Viviendas programadas (Con aprobación): 470 Viviendas efectivas: 449 Viviendas no efectivas: 5 Viviendas visitadas: 454 Próxima semana viviendas programadas (Con aprobación): 565. *** Tramite alcaldía verificación y concepto posibles beneficiarios ubicados en zona de riesgo.** Se realizó el trámite con la Alcaldía sobre la verificación de zona de riesgo del predio ubicado en la Manzana 60 Lote 8 cuyo poseedor es el señor Francisco Cabrera Lara, mediante la comunicación GA-DOMI-051-22 del día 08 de junio de 2022. • Diagnósticos de Inclusión: El contratista de obra pregunta sobre la forma de proceder con la solicitud de una inclusión de un beneficiario que se acercó al punto de información y al realizar la verificación la dirección manifestada, ya se encuentra diagnosticada. La Entidad menciona que se debe realizar la verificación en la matriz y si las direcciones concuerdan en campo, así como también revisar respecto al recibo de alcantarillado y agua potable que suministre para poder dar respuesta a la PQR. * Las medidas de las unidades sanitarias ya están establecidas y no es posible realizar la construcción de una unidad sanitaria con dimensiones menores.	junio de 2022 (Con aprobación): 565	
3	Actividad 3 Ejecución de obra	*** Seguimiento compromisos comité anterior.** **1, Matriz tres momentos actualizada para el día de hoy 07/06/2022** Se cumplió. **2, Ficha técnica de micromedidores. 14/06/2022** Se envió correo a la Ing. Alexandra para solicitar las especificaciones de los micro medidores que están instalando en el barrio, para ser presentada a Interventoría. La Entidad menciona que las especificaciones técnicas ya habían sido remitidas al contratista desde el día 12 de mayo de 2022, se remite por ENTerritorio nuevamente para su verificación. Se reprograma para el día jueves 16 de junio de 2022. **3, Certificados de calidad de materiales bloque No. 4. 08/06/22** Se cumplió. **4, Ensayo de laboratorio Bloque No. 4. 14/06/22** Se cumplió. **5, Ensayos de compresión de concretos. 14/06/22** Se realizarán la toma de las muestras en presencia con interventoría. La Entidad menciona sobre la periodicidad de la toma de muestras se debe tener respecto a la norma. Se coordinara en campo. **6, Compromiso ejecución de obra** Viviendas programadas (Ejecución): 69 Viviendas iniciadas: 35 NO SE CUMPLIO Viviendas terminadas: 13 Viviendas en ejecución: 22	COMPROMISO: Se actualiza en comité de aprobación. 1. Ejecución de obra Viviendas programadas (Ejecución): 86 Viviendas iniciadas: Viviendas terminadas: Viviendas en ejecución: 2. Plan de contingencia el día 17 de junio de 2022. 3. Ficha técnica de micromedidores. 14/06/22	CONTRATISTA

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ACTA DE ENTREGA	Fecha de inicio	Fecha limite terminación.	Fecha compromiso de entrega.
INTERV No. 3 S-SC-EP-M35-VE- 003	25/05/2022	01/06/2022	16 de junio de 2022
INTERV No. 4 S-SC-EP-M35-VE-004	25/05/2022	01/06/2022	16 de junio de 2022
INTERV No. 5 S-SC-EP-M35-VE-005	04/06/2022	11/06/2022	17 de junio de 2022
INTERV No. 6 S-SC-EP-M35-VE- 006	25/05/2022	01/06/2022	16 de junio de 2022
INTERV No. 7 S-SC-EP-M35-VE- 007	25/05/2022	01/06/2022	16 de junio de 2022
INTERV No. 8 S-SC-EP-M35-VE- 008	25/05/2022	01/06/2022	16 de junio de 2022
INTERV No. 10 S-SC-EP-M35-VE-010	25/05/2022	01/06/2022	16 de junio de 2022
INTERV No. 11 S-SC-EP-M35-VE-011	04/06/2022	11/06/2022	17 de junio de 2022
INTERV No. 12 S-SC-EP-M35-VE-012	04/06/2022	11/06/2022	17 de junio de 2022
INTERV No. 13 S-SC-EP-M35-VE-013	25/05/2022	01/06/2022	16 de junio de 2022
INTERV No. 14 S-SC-EP-M35-VE-014	25/05/2022	01/06/2022	16 de junio de 2022
INTERV No. 15 S-SC-EP-M35-VE-015	25/05/2022	01/06/2022	16 de junio de 2022
INTERV No. 16 S-SC-EP-M35-VE-016	25/05/2022	01/06/2022	16 de junio de 2022

COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 9 PCI SINCELEJO - 14 DE JUNIO DE 2022

El contratista menciona que se realizó la adquisición de los materiales para poder terminar las obras, sin embargo los proveedores no han entregado los materiales ya que el transporte se les ha dificultado, se está realizando la gestión en las unidades sanitarias para tener la construcción en el mayor adelanto posible, con el fin de que las actividades faltantes sean menores y se puedan entregar a los beneficiarios en un plazo dos días, una vez se tenga el material pendiente.

La Entidad solicita gestionar el trámite de adquisición de materiales para obtenerlos y se tenga disponibilidad en obra para dar por terminadas las unidades sanitarias en los plazos establecidos ya que el contratista de obra tenía pleno conocimiento de la escasez de alguno de los materiales antes de la firma del acta de inicio, y tanto interventoría como la Entidad solicitó realizar la compra con anterioridad para que no se presentará la situación de falta de materiales para terminar las unidades sanitarias.

TEMARIO COMITE

* Estado intervenciones (total programado vs total ejecutado)

Viviendas programadas (Ejecución): 69
Viviendas en ejecución: 17
Viviendas terminadas: 0
Viviendas no iniciadas (Ejecución): 52

Próxima semana viviendas programadas y terminadas: 86

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LAS OBRAS.	Fecha de inicio	Fecha limite terminacion.	Fecha compromiso de entrega.
INTERV No. 1 S-SC-EP-M35-VE- 001	08/06/2022	15/06/2022	
INTERV No. 2 S-SC-EP-M35-VE- 002	07/06/2022	14/06/2022	
INTERV No. 3 S-SC-EP-M35-VE- 003	25/05/2022	01/06/2022	16 de junio de 2022
INTERV No. 4 S-SC-EP-M35-VE-004	25/05/2022	01/06/2022	16 de junio de 2022
INTERV No. 5 S-SC-EP-M35-VE-005	04/06/2022	11/06/2022	17 de junio de 2022
INTERV No. 6 S-SC-EP-M35-VE- 006	25/05/2022	01/06/2022	16 de junio de 2022
INTERV No. 7 S-SC-EP-M35-VE- 007	25/05/2022	01/06/2022	16 de junio de 2022
INTERV No. 8 S-SC-EP-M35-VE- 008	25/05/2022	01/06/2022	16 de junio de 2022
INTERV No. 9 S-SC-EP-M35-VE- 009	09/06/2022	16/06/2022	
INTERV No. 10 S-SC-EP-M35-VE-010	25/05/2022	01/06/2022	16 de junio de 2022
INTERV No. 11 S-SC-EP-M35-VE-011	04/06/2022	11/06/2022	17 de junio de 2022
INTERV No. 12 S-SC-EP-M35-VE-012	04/06/2022	11/06/2022	17 de junio de 2022
INTERV No. 13 S-SC-EP-M35-VE-013	25/05/2022	01/06/2022	16 de junio de 2022
INTERV No. 14 S-SC-EP-M35-VE-014	25/05/2022	01/06/2022	16 de junio de 2022
INTERV No. 15 S-SC-EP-M35-VE-015	25/05/2022	01/06/2022	16 de junio de 2022
INTERV No. 16 S-SC-EP-M35-VE-016	25/05/2022	01/06/2022	16 de junio de 2022
INTERV No. 17 S-SC-EP-M35-VE-017	09/06/2022	16/06/2022	

*Observaciones ejecución actividades de obra.

El Contratista menciona que se remitirá la respuesta y subsanaciones el día de hoy 14 de junio de 2022

* Inicio intervención contrato acueducto.

Se tuvo reunión con la ESP y por temas de lluvia se han atrasado, se tiene programado iniciar el 22 a 24 de junio de 2022. El contratista de obra menciona que al parecer el tramo que afectaría la obra no se realizaría, sin embargo se confirmara para tener en cuenta y coordinar entre los dos proyectos para el ingreso de materiales de obra, estas obras duran aproximadamente 15 días. Se gestionará por el contratista una bodega satélite para mantener materiales en obra. La Entidad menciona que es importante tener en cuenta que si esas obras inician debe tener los materiales completos y en sitio para terminar las unidades sanitarias.

En cuanto al arreglo de la calle de acceso la ESP mencionó que la máquina que realizaría las obras se dañó, se realizara llamado con el Ing. Oscar para obtener el arreglo de la vía.

4	Actividad 4 Instalación Punto de Información	* La Entidad menciona que teniendo en cuenta que las inclusiones son pocas se puede definir nueva fecha para que se realice el trámite de proceso de inclusión.		

Programa de Proyecto

<Relación de todas actividades que presentan atraso indicando los días de atraso y acción correctiva>
Se revisará el cumplimiento de la ruta crítica. En el informe semanal, se anexa archivo del programa de proyecto con porcentaje de avance en todas las actividades.

Aspectos Administrativos

<Verificación de pagos de salud, pensión y demás, manejo ambiental, seguridad industrial, programa de salud ocupacional, aspectos

sociales, permisos y licencias, gestión de servicios públicos, Otros>
Aspectos Presupuestales:
<Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, verificación de balances de actividades ejecutadas ejecución financiera del contrato, Otros>
Riesgos
<Riesgos detectados y acciones implementadas para su eliminación, mitigación o transferencia. Si se trata de un contrato de obra, relacione los profesionales expertos que asistieron al Comité indicando su especialidad y las recomendaciones dadas por cada uno de ellos.>
Aspectos sociales y/o ambientales

ACCIONES FORMULADAS EN BASE A LA PRESENTE ACTA

Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen **Acción de Proyecto No. ____** < No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se debe ser registrado en el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto> >	
Responsable por Contratista	N/A
Responsable por Interventoría	N/A
Fecha programada cumplimiento	N/A
escriba la No Conformidad o compromiso.	
Describa las acciones a implementar.	

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha.

PARTICIPANTES		
NOMBRE	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ	Firma
En Representación de	ENTerritorio	
Correo electrónico	Jamon@enterritorio.gov.co	
Teléfono	3203518734	
NOMBRE	LINA PATRICIA OTALVARO LOPEZ	Firma
En Representación de	ENTerritorio	
Correo electrónico	lotalvar@enterritorio.gov.co	
Teléfono		
NOMBRE	JOSE IGNACIO CARDENAS	Firma
En Representación de	Consorcio Turquía	
Correo electrónico	Coordinadorturquiapci@gmail.com	
Teléfono	3142996037	
NOMBRE	WILLIAM ANTONIO MARTÍNEZ PALOMINO	Firma
En Representación de	Consorcio Turquía	
Correo electrónico		
NOMBRE	MILAGRO MERCADO CONTRERAS	Firma
En Representación de	Consorcio Turquía	
Correo electrónico		

PARTICIPANTES		
NOMBRE	WILBERTO ECHAVARRIA DÍAZ	Firma
En Representación de	Consorcio Turquía	
Correo electrónico		
NOMBRE	WENDY JHOANA TRUJILLO	Firma
En Representación de	Consorcio Turquía	
Correo electrónico		
NOMBRE	EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO	Firma
En Representación de	Gavinco SAS	
Correo electrónico	earagon@gavinco.com	
Teléfono	3175769086	
NOMBRE	HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES	Firma
En Representación de	Gavinco SAS	
Correo electrónico	hjunco@gavinco.com	
NOMBRE	SANDRA CONTRERAS	Firma
En Representación de	Gavinco SAS	
Correo electrónico		
NOMBRE	JULY RIOS	Firma
En Representación de	Gavinco SAS	
Correo electrónico		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
Nombre: William Antonio Martínez Palomino
CONTRATISTA[1]

Firma_____
Nombre: Edgar Alfonso Aragón
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre: Juan David Amon Rodríguez
SUPERVISOR ENTerritorio

Para uso exclusivo del supervisor de ENTerritorio: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR ENTerritorio

Original: ENTerritorio
Copia: interventoría

[1] En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado.
Para el seguimiento de los contratos de interventoría, no aplica firma en este campo.

Copia: contratista

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	**ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO**	CÓDIGO:	**F-GG-09**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

ACTA No:	010
FECHA:	2022/06/21
CONTRATO No:	2220585 de 2022
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

Acción de Proyecto No. ____ <No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se encuentra en el FMI054 Cuadro de control de trazabilidad de acciones de proyecto. Este aparte se repite tantas veces como Acciones del Proyecto o compromisos existan.>			
Responsable por Contratista	NA		
Responsable por Interventoría	NA		
Fecha programada cumplimiento	NA	% de avance	NA
Indique el avance en ejecución de las acciones o compromisos previos.			
Si la acción o compromiso se encuentra incumplida, indique las causas y los recursos a asignar.			

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha.

TEMAS PRESENTE ACTA

1	Actividad 1.Diseño de Prototipos
2	Actividad 2 Inicio diagnósticos
3	Actividad 3 Ejecución de obra
4	Actividad 4 Social

Aspectos Técnicos

COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 10 PCI SINCELEJO - 21 DE JUNIO DE 2022				
No.	**Descripción**	**Avance**	**Compromiso**	**Responsable**
1	Actividad 1. Diseño de Prototipos	**Aprobado. Se remitió a la Entidad.**		
2	Actividad 2 Inicio diagnósticos	**Compromisos anteriores:** **1. Carta relación de beneficiarios que no cuentan con el documento FOVIS para el día 17 de junio de 2022.** En revisión de interventoría. Se mencionó por la Interventoría que antes de elevar esta consulta se debe realizar la revisión de todas las posibilidades disponibles para la obtención del documento que certifique la tenencia o poseedor del predio, por lo tanto, se solicita realizar la revisión tanto con la inspección de policía y la Alcaldía de Sincelejo. El Contratista de obra menciona que se tienen 20 viviendas que no cuentan con el	1, Radicar comunicación relacionando beneficiarios que no cuentan documento FOVIS y los de fecha de expedición antigua con copia a Interventoría y ENTerritorio. 28/06/22.	CONTRATISTA

COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 10 PCI SINCELEJO - 21 DE JUNIO DE 2022				
No.	**Descripción**	**Avance**	**Compromiso**	**Responsable**
		documento FOVIS y se requiere que la Entidad generé el documento a los beneficiarios de manera más ágil. Enterritorio menciona que dentro del proceso también se puede acreditar la posesión con el recibo de servicios públicos y dejar nota que falta este documento del FOVIS, esto permitiría avanzar con mayor agilidad, sin embargo, se debe tener la certeza que el beneficiario realizó el tramite con las Entidades pertinentes que le dieran el documento de tenencia o estén en trámite de actualización de la documentación mencionada. Se aclaró que este proceso se tomará como último recurso al no obtener la información requerida y deberá ser actualizada por el Contratista de Obra, ya que de no cumplir con lo establecido en los pliegos no será reconocido por ENTerritorio. De acuerdo a lo anterior, se menciona por interventoría que la comunicación recibida por correo electrónico debe ser radicada ante el FOVIS, en donde se tiene que relacionar los posibles beneficiarios, así como también, solicitar el documento de las resoluciones que tienen fecha de expedición muy antigua. Dicha carta se debe remitir con copia a la Interventoría y ENTerritorio. **2. Diagnósticos - compromiso comité anterior.** Viviendas aprobadas: 300. No se cumplió. Viviendas visitadas: 593. No se cumplió Viviendas para aprobación próximo martes 21/06/22: 100, se tienen 80 diagnósticos entregados. Viviendas programadas a corte domingo 19 de junio de 2022 (Con aprobación): 565		
		TEMAS COMITÉ *** Revisión de diagnósticos a la fecha de comité de seguimiento.** Viviendas aprobadas: 259 a corte de 17 de junio de 2022 Viviendas programadas (Con aprobación): 480 Viviendas efectivas: 533 Viviendas no efectivas: 5 Viviendas visitadas: 538 Próxima semana viviendas programadas (Con aprobación): *** Plan de contingencia.** Se recibió el Plan de Contingencia solicitado por interventoría por el atraso reportado, del cual al realizar el seguimiento de las actividades del Consorcio Turquía, se evidenció que se han aumentado los grupos de trabajo para la ejecución de diagnósticos y mano de obra no calificada para la construcción de las unidades sanitarias para el Programa de Conexiones Intradomiciliaria. La Entidad solicitó remitir el documento de manera oficial para hacer seguimiento.		
3	Actividad 3 Ejecución de obra	*** Seguimiento compromisos comité anterior.** 1**, Ficha técnica de micromedidores. 16/06/2022** No se cumplió. No se ha conseguido la especificación sin embargo se está gestionando y una vez se tenga será remitida a interventoría para aprobación.	COMPROMISO: Se actualiza en comité de aprobación. 1. Ejecución	CONTRATISTA

COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 10 PCI SINCELEJO - 21 DE JUNIO DE 2022

No.	Descripción	Avance	Compromiso	Responsable
		2, Compromiso ejecución de obra Viviendas programadas (Ejecución): 56 Viviendas en ejecución: 26 Viviendas terminadas: 0 Viviendas no iniciadas (Ejecución): 67	Viviendas acumuladas iniciadas 25/06/22: 56 Viviendas terminadas 25/06/22: 17 Viviendas terminadas 30/06/22: 56 2. Enchape en obra el día jueves 23/06/22 3, Ficha técnica de micro medidores. 22/06/22	

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LAS OBRAS.	Fecha de inicio	Fecha limite terminacion.	Fecha compromiso de entrega.	
INTERV No. 1 S-SC-EP-M35-VE- 001	08/06/2022	15/06/2022		No cumplió
INTERV No. 2 S-SC-EP-M35-VE- 002	07/06/2022	14/06/2022		No cumplió
INTERV No. 3 S-SC-EP-M35-VE- 003	25/05/2022	01/06/2022	16 de junio de 2022	No cumplió
INTERV No. 4 S-SC-EP-M35-VE-004	25/05/2022	01/06/2022	16 de junio de 2022	No cumplió
INTERV No. 5 S-SC-EP-M35-VE-005	04/06/2022	11/06/2022	17 de junio de 2022	No cumplió
INTERV No. 6 S-SC-EP-M35-VE- 006	25/05/2022	01/06/2022	16 de junio de 2022	No cumplió
INTERV No. 7 S-SC-EP-M35-VE- 007	25/05/2022	01/06/2022	16 de junio de 2022	No cumplió
INTERV No. 8 S-SC-EP-M35-VE- 008	25/05/2022	01/06/2022	16 de junio de 2022	No cumplió
INTERV No. 9 S-SC-EP-M35-VE- 009	09/06/2022	16/06/2022		No cumplió
INTERV No. 10 S-SC-EP-M35-VE-010	25/05/2022	01/06/2022	16 de junio de 2022	No cumplió
INTERV No. 11 S-SC-EP-M35-VE-011	04/06/2022	11/06/2022	17 de junio de 2022	No cumplió
INTERV No. 12 S-SC-EP-M35-VE-012	04/06/2022	11/06/2022	17 de junio de 2022	No cumplió
INTERV No. 13 S-SC-EP-M35-VE-013	25/05/2022	01/06/2022	16 de junio de 2022	No cumplió
INTERV No. 14 S-SC-EP-M35-VE-014	25/05/2022	01/06/2022	16 de junio de 2022	No cumplió
INTERV No. 15 S-SC-EP-M35-VE-015	25/05/2022	01/06/2022	16 de junio de 2022	No cumplió
INTERV No. 16 S-SC-EP-M35-VE-016	25/05/2022	01/06/2022	16 de junio de 2022	No cumplió
INTERV No. 17 S-SC-EP-M35-VE-017	09/06/2022	16/06/2022		No cumplió

* Plan de contingencia. Se cumplió con la entrega.

TEMARIO COMITÉ:

* **Respecto al plan de contingencia** se tiene proyectado terminar un total de 17 viviendas, sin embargo se evidenció que no han llegado los materiales necesarios. El contratista de obra menciona que se tuvo un inconveniente con un proveedor que envió los enchapes que no cumplen con las especificaciones, estos fueron devueltos para su cambios y se recibirán en obra el día jueves 23 de junio de 2022. Interventoría solicitó dar estricto cumplimiento al plan de contingencia ya que de no cumplir se procederá a informar a la Entidad y dar trámite de los procesos sancionatorios pertinentes.

* **Acero viguetas**: Interventoría menciona que el acero para realizar los machones están llegando materiales de acero de menor calibre, se solicita verificar y tomar medidas correctivas al Contratista de obra, debido a que el diseño dice que es una varilla de 3/8" (9,5mm) y el Consorcio Turquía utilizó varillas con diámetro de 8,5mm, la cual está en un diámetro entre 1/4" a 3/8". El contratista mencionó que el material utilizado cumple para el acero de los machones únicamente y no se incluye para otras actividades, sin embargo se manifiesta que no se continuará realizando dicha actividad. Se le menciona por interventoría que se debe regir con el diseño aprobado y estos tienen un calibre de 3/8#, por lo tanto las viviendas que no cumplan con las especificaciones y diseños no serán reconocidas por ENTerritorio y la interventoría, dicho caso se presentó en la vivienda con el consecutivo 019.

La Entidad se acogió a lo manifestado por interventoría en cuanto a que estas no serán recibidas ni reconocidas hasta su subsanación y cumplimiento con los diseños.

COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 10 PCI SINCELEJO - 21 DE JUNIO DE 2022				
No.	**Descripción**	**Avance**	**Compromiso**	**Responsable**
		* Se evidencio mejoría en las actividades y correctivos de la calidad en la ejecución de las actividades de obra, esto de acuerdo a la capacitación realizada por el Consorcio Turquía. * **Mano de Obra**: Se tienen en campo entre oficiales y ayudantes 30 trabajadores, respecto a la semana pasada se evidencio un aumento de 12 personas. * **Materiales**: Se ha evidenciado la llegada de materiales y están suministrando los necesarios para cada una de las viviendas. Se requiere remitir registro fotográfico de la llegada de grandes cantidades de materiales para evidenciar la disponibilidad y el avance.		
4	Actividad 4 Instalación Punto de Información	* **Inclusiones:** Solicitud de aumento del plazo para las inclusiones, el cual fue ampliado hasta el 30 de junio de 2022. La Alcaldía solamente ha dado respuesta a 7 solicitudes de inclusión de 34 en total tramitadas. Se debe remitir correo a ENTerritorio con el fin de gestionar la respuesta con ayuda del Ministerio de Vivienda. Interventoría menciona que se tuvo contacto con el Ing. Oscar sobre las solicitudes de inclusión, quien manifestó que realizo recorrido para verificación de las solicitudes de inclusión y se está gestionando la respuesta. * Interventoría menciona que se cuenta con la resolución de la conformación de la veeduría del barrio El Poblado emitido por parte de la Alcaldía de Sincelejo. * Se realizó reunión sectorizada el día 14 de junio de 2022 con asistencia del contratista e interventoría. Se les había informado a la Alcaldía mediante WhatsApp, la Entidad menciona que se debe informar a las Entidades locales de manera oficial para contar con su asistencia. Se debe revisar las estrategias de información a la comunidad para dar claridad del alcance del Programa de Conexiones Intradomiciliaria. * Link informativo de la Alcaldía, se menciona que la sección de comunicaciones estuvo en el sector y el link ya está disponible, sin embargo no se ha alimentado con la información del proyecto y la ejecución.	* Reunión jueves 23 de junio de 2022, 10:00 am revisión Link informativo.	CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y ENTERRITORIO

Programa de Proyecto
<Relación de todas actividades que presentan atraso indicando los días de atraso y acción correctiva> Se revisará el cumplimiento de la ruta crítica. En el informe semanal, se anexa archivo del programa de proyecto con porcentaje de avance en todas las actividades.
Aspectos Administrativos
<Verificación de pagos de salud, pensión y demás, manejo ambiental, seguridad industrial, programa de salud ocupacional, aspectos sociales, permisos y licencias, gestión de servicios públicos, Otros>
Aspectos Presupuestales:
<Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, verificación de balances de actividades ejecutadas ejecución financiera del contrato, Otros>
Riesgos
<Riesgos detectados y acciones implementadas para su eliminación, mitigación o transferencia. Si se trata de un contrato de obra, relacione los profesionales expertos que asistieron al Comité indicando su especialidad y las recomendaciones dadas por cada uno de ellos.>
Aspectos sociales y/o ambientales

ACCIONES FORMULADAS EN BASE A LA PRESENTE ACTA

Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen **Acción de Proyecto No. ____** < No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se debe ser registrado en el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto> >	
Responsable por Contratista	N/A
Responsable por Interventoría	N/A
Fecha programada cumplimiento	N/A
escriba la No Conformidad o compromiso.	
Describa las acciones a implementar.	

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha.

PARTICIPANTES		
NOMBRE	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ	Firma
En Representación de	ENTerritorio	
Correo electrónico	Jamon@enterritorio.gov.co	
Teléfono	3203518734	
NOMBRE	LINA PATRICIA OTALVARO LOPEZ	Firma
En Representación de	ENTerritorio	
Correo electrónico	lotalvar@enterritorio.gov.co	
Teléfono		
NOMBRE	JOSE IGNACIO CARDENAS	Firma
En Representación de	Consorcio Turquía	
Correo electrónico	Coordinadorturquiapci@gmail.com	
Teléfono	3142996037	
NOMBRE	WILLIAM ANTONIO MARTÍNEZ PALOMINO	Firma
En Representación de	Consorcio Turquía	
Correo electrónico		
NOMBRE	MILAGRO MERCADO CONTRERAS	Firma
En Representación de	Consorcio Turquía	
Correo electrónico		
NOMBRE	WILBERTO ECHAVARRIA DÍAZ	Firma
En Representación de	Consorcio Turquía	
Correo electrónico		
NOMBRE	WENDY JHOANA TRUJILLO	Firma
En Representación de	Consorcio Turquía	
Correo electrónico		
NOMBRE	EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO	Firma
En Representación de	Gavinco SAS	
Correo electrónico	earagon@gavinco.com	
Teléfono	3175769086	

PARTICIPANTES		
NOMBRE	HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES	Firma
En Representación de	Gavinco SAS	
Correo electrónico	hjunco@gavinco.com	
NOMBRE	SANDRA CONTRERAS	Firma
En Representación de	Gavinco SAS	
Correo electrónico		
NOMBRE	JULY RIOS	Firma
En Representación de	Gavinco SAS	
Correo electrónico		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
Nombre: William Antonio Martínez Palomino
CONTRATISTA[1]

Firma_____
Nombre: Edgar Alfonso Aragón
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre: Juan David Amon Rodríguez
SUPERVISOR ENTerritorio

Para uso exclusivo del supervisor de ENTerritorio: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR ENTerritorio

Original: ENTerritorio
Copia: interventoría
Copia: contratista

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades

[1] En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado.
Para el seguimiento de los contratos de interventoría, no aplica firma en este campo.

debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	**ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO**	CÓDIGO:	**F-GG-09**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

ACTA No:	011
FECHA:	2022/06/28
CONTRATO No:	2220585 de 2022
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

Acción de Proyecto No. ____ <No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se encuentra en el FMI054 Cuadro de control de trazabilidad de acciones de proyecto. Este aparte se repite tantas veces como Acciones del Proyecto o compromisos existan.>			
Responsable por Contratista	NA		
Responsable por Interventoría	NA		
Fecha programada cumplimiento	NA	% de avance	NA
Indique el avance en ejecución de las acciones o compromisos previos.			
Si la acción o compromiso se encuentra incumplida, indique las causas y los recursos a asignar.			

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha.

TEMAS PRESENTE ACTA

1 Actividad 1.Diseño de Prototipos
2 Actividad 2 Inicio diagnósticos
3 Actividad 3 Ejecución de obra
4 Actividad 4 Social

Aspectos Técnicos

COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 11 PCI SINCELEJO - 28 DE JUNIO DE 2022				
No.	**Descripción**	**Avance**	**Compromiso**	**Responsable**
1	Actividad 1. Diseño de Prototipos	**Aprobado. Se remitió a la Entidad.**		
2	Actividad 2 Inicio diagnósticos	**Compromisos anteriores:** **1. Radicar comunicación relacionando beneficiarios que no cuentan documento fovis y los de fecha de expedición antigua con copia a Interventoría y ENTerritorio.** No se cumplió la entrega de la copia a Interventoría y Enterritorio, el contratista menciona que se realizó recorrido general al bario para identificar el total de beneficiarios, se había establecido una cantidad de 20, sin embargo está pendiente revisar una cantidad de 108 viviendas para llegar al número de predios diagnosticados. Interventoría menciona	COMPROMISO PROXIMA SEMANA: * Viviendas aprobadas próxima semana: 497 * Viviendas visitadas: 612	

COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 11 PCI SINCELEJO - 28 DE JUNIO DE 2022				
No.	**Descripción**	**Avance**	**Compromiso**	**Responsable**
		que el tema es sobre la gestión de la obtención del documento fovis o tenencia del predio. Se reitera que se debe remitir el oficio al FOVIS por parte del contratista de obra con la relación de los beneficiarios que no cuentan con la acreditación de tenencia para el día de hoy 28 de junio de 2022. Interventoría realizará la remisión de la comunicación al FOVIS. Las 108 viviendas está sucediendo que de acuerdo a la matriz inicial se ha encontrado entre lotes baldíos y vivienda abandonadas. La Entidad menciona que si se encuentra la vivienda abandonada esta pasaría como no efectiva. Para registrar las viviendas no efectivas, a las que se les realizo más de tres visitas sin encontrarla habitada es necesario diligenciar el formato PCI-016 verificación de viviendas visitadas y realizar el informe respectivo presentándolo a Interventoría. Cada una de las viviendas no efectivas debe contar con su soporte respectivo del por qué se determinó su estado. Interventoría solicita realizar la verificación en campo junto con interventoría para identificar la situación de cada una de ellas.		
		TEMAS COMITÉ *** Revisión de diagnósticos a la fecha de comité de seguimiento.** Viviendas programadas con aprobación: 480 Viviendas Efectivas: 533 Viviendas No efectivas: 5 Viviendas visitadas: 538 Viviendas aprobadas: 323 Próxima semana viviendas programadas (Con aprobación): *** Plan de contingencia.** **Diagnósticos a presentar a corte del 25 de junio de 2022:** según el plan de contingencia se deben tener a corte del 25 de junio de 2022 un total de 205 diagnósticos y en los últimos dos comités se han aprobado 123. El Contratista menciona que se han tenido inconvenientes con el escáner para la digitalización de los diagnósticos para remisión oficial, sin embargo se procederá con la toma de las acciones para que en el próximo comité de aprobación se nivele con la meta establecida en el plan. Se reprograma comité para el día viernes con el fin de que el contratista entregue la mayor cantidad, ya que se debe entregar en interventoría un total de 151 diagnósticos. Se recomienda por Interventoría remitirlos con tiempo entre el día miércoles y jueves.		
3	Actividad 3 Ejecución de obra	*** Seguimiento compromisos comité anterior.** **1. Ejecución** Viviendas acumuladas iniciadas 25/06/22: 56 Viviendas terminadas 25/06/22: 17 Viviendas terminadas 30/06/22: 56 **2. Enchape en obra el día jueves 23/06/22**	* Carta de solicitud cronograma de actividades de la Alcaldía por la obras de Alcantarillado. 29/06/2022	

COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 11 PCI SINCELEJO - 28 DE JUNIO DE 2022				
No.	**Descripción**	**Avance**	**Compromiso**	**Responsable**
		El enchape se recibió el día viernes 24 de junio de 2022 en las horas de la tarde para un total de 52 viviendas. Las 17 viviendas en ejecución se están terminando con la actividad de enchape y se entrega para el día jueves. **3. Ficha técnica de micromedidores. 22/06/22** * Se está realizando la revisión de la consecución del micromedidor, sin embargo se remitió un documento para revisión de Interventoría. Se menciona que será revisada por el especialista para contar con su concepto y se requiero la remisión a Veolia.	* Reunión técnica de atraso para el día de mañana 29 de junio de 2022 a las 2:00 pm Compromiso * Viviendas iniciadas a corte del 03 de julio de 22: 56 * Viviendas terminadas corte del 03 de julio de 22: 39	
		TEMARIO COMITÉ *** Revisión estado de ejecución obras:** Viviendas programadas: 90 Viviendas en ejecución: 27 Viviendas terminas 0 Viviendas no iniciadas: 63 *** Plan de contingencia:** Viviendas programadas terminadas a corte del 25/06/222: 17 Viviendas terminadas: 0 Viviendas iniciadas programadas: 56 Viviendas iniciadas en la semana: 2 Próxima fecha Plan de Contingencia viviendas terminadas a corte del 30 de junio de 2022: 56 EL Contratista menciona que se han trabajado los días festivos, sin embargo por inclemencia del clima no se ha podido laborar de manera constante ya que las lluvias han impedido tanto el ingreso de materiales como la misma mano de obra ejercer sus labores. Remitir oficio de solicitud de cronograma de actividades de las obras que se están adelantando en el alcantarillado, ya que es la única vía de acceso al barrio el poblado y puede incurrir en atrasos en el proyecto del Programa de Conexiones Intradomiciliaria. Se debe remitir inicialmente a la Interventoría el día 29 de junio de 2022.		
		* De acuerdo con la reunión solicitada por la Entidad se sugirió fecha para el día de la tarde 2:00 pm del 29 de junio de 2022. Se debe tener información actualizada con corte de hoy de las actividades 2 y 3 * La Entidad menciona que de acuerdo a lo manifestado por el Contratista de Obra respecto a las lluvias se debe tener documentado en bitácora y reportes del IDEAM y en cuanto al estado de las vías de debe documentar mediante registro fotográfico.		

COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 11 PCI SINCELEJO - 28 DE JUNIO DE 2022				
No.	**Descripción**	**Avance**	**Compromiso**	**Responsable**
4	Actividad 4 Instalación Punto de Información	*** Seguimiento compromisos comité anterior.** **1, Reunión jueves 23 de junio de 2022, 10:00 am revisión Link informativo.** **TEMAS COMITÉ:** *** Estado inclusiones:** Interventoría menciona que se ha dado únicamente 7 respuestas por parte de la Alcaldía de Sincelejo - Sucre. Se debe revisar el tema de las PQR´s para que la Alcaldía de respuesta a cada una de ellas. * La semana pasada se revisó el acrílico y se debe ir adelantando el proceso de impresión para cuando se entreguen las viviendas contar con el elemento para su instalación. * Se solicita por Interventoría al área técnica del contratista de obra informar a los sociales el inicio de la intervención con el fin de realizar la socialización previa a cada una de las viviendas.		

Programa de Proyecto
<Relación de todas actividades que presentan atraso indicando los días de atraso y acción correctiva> Se revisará el cumplimiento de la ruta crítica. En el informe semanal, se anexa archivo del programa de proyecto con porcentaje de avance en todas las actividades.
Aspectos Administrativos
<Verificación de pagos de salud, pensión y demás, manejo ambiental, seguridad industrial, programa de salud ocupacional, aspectos sociales, permisos y licencias, gestión de servicios públicos, Otros>
Aspectos Presupuestales:
<Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, verificación de balances de actividades ejecutadas ejecución financiera del contrato, Otros>
Riesgos
<Riesgos detectados y acciones implementadas para su eliminación, mitigación o transferencia. Si se trata de un contrato de obra, relacione los profesionales expertos que asistieron al Comité indicando su especialidad y las recomendaciones dadas por cada uno de ellos.>
Aspectos sociales y/o ambientales

ACCIONES FORMULADAS EN BASE A LA PRESENTE ACTA

Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen

Acción de Proyecto No. _____ < No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se debe ser registrado en el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto> >

Responsable por Contratista	N/A
Responsable por Interventoría	N/A
Fecha programada cumplimiento	N/A
escriba la No Conformidad o compromiso.	
Describa las acciones a implementar.	

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha.

PARTICIPANTES		
NOMBRE	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ	Firma
En Representación de	ENTerritorio	
Correo electrónico	Jamon@enterritorio.gov.co	
Teléfono	3203518734	
NOMBRE	LINA PATRICIA OTALVARO LOPEZ	Firma
En Representación de	ENTerritorio	
Correo electrónico	lotalvar@enterritorio.gov.co	
Teléfono		
NOMBRE	JOSE IGNACIO CARDENAS	Firma
En Representación de	Consorcio Turquía	
Correo electrónico	Coordinadorturquiapci@gmail.com	
Teléfono	3142996037	
NOMBRE	WILLIAM ANTONIO MARTÍNEZ PALOMINO	Firma
En Representación de	Consorcio Turquía	
Correo electrónico		
NOMBRE	MILAGRO MERCADO CONTRERAS	Firma
En Representación de	Consorcio Turquía	
Correo electrónico		
NOMBRE	WILBERTO ECHAVARRIA DÍAZ	Firma
En Representación de	Consorcio Turquía	
Correo electrónico		
NOMBRE	WENDY JHOANA TRUJILLO	Firma
En Representación de	Consorcio Turquía	
Correo electrónico		
NOMBRE	EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO	Firma
En Representación de	Gavinco SAS	
Correo electrónico	earagon@gavinco.com	
Teléfono	3175769086	
NOMBRE	HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES	Firma
En Representación de	Gavinco SAS	
Correo electrónico	hjunco@gavinco.com	
NOMBRE	SANDRA CONTRERAS	Firma
En Representación de	Gavinco SAS	
Correo electrónico		
NOMBRE	JULY RIOS	Firma
En Representación de	Gavinco SAS	

PARTICIPANTES		
Correo electrónico		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
Nombre: William Antonio Martínez Palomino
CONTRATISTA[1]

Firma_____
Nombre: Edgar Alfonso Aragón
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre: Juan David Amon Rodríguez
SUPERVISOR ENTerritorio

Para uso exclusivo del supervisor de ENTerritorio: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR ENTerritorio

Original: ENTerritorio
Copia: interventoría
Copia: contratista

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

[1] En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado.
Para el seguimiento de los contratos de interventoría, no aplica firma en este campo.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

Anexo 8. Formato de registro fotográfico

NOMBRE DEL PROYECTO:	Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Barrio El Poblado de Sincelejo (Sucre)
CONTRATISTA:	Consorcio Turquía
CONTRATO DE OBRA No.:	2220577
INTERVENTOR:	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	2220585
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**30 de junio de 2022**

FOTOGRAFÍA (1)



(1) Tamaño 10 X 14 u 8 X 12 para fotos de perspectiva; y tamaño 7.5 x 10 u 6 X 8 para Fotografías que muestren detalles.

Texto explicativo de la fotografía. Charlas sectorizadas en el barrio el poblado.

FOTOGRAFÍA (2)



Texto explicativo de la fotografía. Puntos ecológicos en obra.

FOTOGRAFÍA (3)



Texto explicativo de la fotografía. Capacitación a mano de obra no calificada.

FOTOGRAFÍA (4)



Texto explicativo de la fotografía. Charlas de seguridad.

FOTOGRAFÍA (5)



Texto explicativo de la fotografía. Levante de muros y verificación de medidas.

FOTOGRAFÍA (6)



Texto explicativo de la fotografía. Instalación del enchape en las unidades sanitarias.

FOTOGRAFÍA (7)



Texto explicativo de la fotografía. Arreglo de la calle principal del barrio el poblado.

FOTOGRAFÍA (7)



Texto explicativo de la fotografía. Aplicación del carburo caseta tipo 3.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**Programa de Conexiones Intradomiciliarias.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Barrio el Poblado, Sincelejo Sucre.
CONTRATISTA:	Consorcio Turquía
CONTRATO DE OBRA No.:	2220577-2022
INTERVENTOR:	GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	2220585
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**28 de junio 2022**

FOTOGRAFÍA (1)









Visitas para entrega de oficio respuesta de FOVIS

NOMBRE DEL PROYECTO:	**Programa de Conexiones Intradomiciliarias.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Barrio el Poblado, Sincelejo Sucre.
CONTRATISTA:	Consorcio Turquía
CONTRATO DE OBRA No.:	2220577-2022
INTERVENTOR:	GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	2220585
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**01 al 15 de Junio/2022**

FOTOGRAFÍA (1)







Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.





Socialización sectorizada para beneficiarios donde sus viviendas ya están siendo intervenidas. 09/06/2022

Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**Programa de Conexiones Intradomiciliarias.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Barrio el Poblado, Sincelejo Sucre.
CONTRATISTA:	Consorcio Turquía
CONTRATO DE OBRA No.:	2220577-2022
INTERVENTOR:	GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	2220585
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**1 al 16 de junio 2022**

FOTOGRAFÍA (1)







Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.

Visita casa a casa socialización PCI y entrega de folleto y volante informativo.

Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**Programa de Conexiones Intradomiciliarias.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Barrio el Poblado, Sincelejo Sucre.
CONTRATISTA:	Consorcio Turquía
CONTRATO DE OBRA No.:	2220577-2022
INTERVENTOR:	GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	2220585
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**14 al de junio 2022**

FOTOGRAFÍA (1)







Capacitación personal de mano de obra. 14/06/2022

Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**Programa de Conexiones Intradomiciliarias.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Barrio el Poblado, Sincelejo Sucre.
CONTRATISTA:	Consorcio Turquía
CONTRATO DE OBRA No.:	2220577-2022
INTERVENTOR:	GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	2220585
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**10 de junio 2022**

FOTOGRAFÍA (1)









Punto de atención, Recepción de PQRS.

Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**Programa de Conexiones Intradomiciliarias.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Barrio el Poblado, Sincelejo Sucre.
CONTRATISTA:	Consorcio Turquía
CONTRATO DE OBRA No.:	2220577-2022
INTERVENTOR:	GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	2220585
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**24 de Junio/2022**

FOTOGRAFÍA (1)









Acompañamiento al equipo técnico de encuestadores encargados de realizar diagnósticos

Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.

Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**Programa de Conexiones Intradomiciliarias.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Barrio el Poblado, Sincelejo Sucre.
CONTRATISTA:	Consorcio Turquía
CONTRATO DE OBRA No.:	2220577-2022
INTERVENTOR:	GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	<2220585
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**20 de junio 2022**

FOTOGRAFÍA (1)











Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.





Punto de atención, Recepción de PQRS.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**Programa de Conexiones Intradomiciliarias.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Barrio el Poblado, Sincelejo Sucre.
CONTRATISTA:	Consorcio Turquía
CONTRATO DE OBRA No.:	2220577-2022
INTERVENTOR:	GAVINCO ingenieros consultores S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	2220585
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	**28 de junio 2022**

FOTOGRAFÍA (1)









Recorrido de obra y apertura de nuevas viviendas

Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.

Anexo 9. Bitácora de Obra

En la Vivienda 009 se funde la cimentación, en la Vivienda 010 se figura los aceros de cimentación, se termina colocar el acero en la estructura, en la Vivienda 008 se funde en concreto la cimentación Y se figura acero de columna, en la Vivienda 015 se hace la intervención, la cual es caseta tipo 2, se termina de organizar acero Y se funde la cimentación, en la Vivienda 016 se termina de replantear la batería sanitaria, se realiza la excavación Y se funde la cimentación.

Clima: Nublado en la mañana
1:40PM - 3:00PM Lluvias
Equipos Y Materiales: formato de encuestas, Lapiceros, flexometro, Planilleros, dotación del Personal, herramientas menores (Palas, barras, Palines, Palaustres, Pitas, Plomadas), Pulidoras.

Residente de Interventoría

Residente de obra

→ fecha: 01 de JUNIO 2022 Miercoles
Hora de Inicio: 7:00AM
Hora de finalización: 5:00PM
Contratista: Consorcio Turquia
Interventor: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S
Proyecto: Conexiones Intradomiciliarias de agua Potable Y Saneamiento basico en la ciudad de Sincelejo.

Personal en obra: Residente de obra 3 Sociales (contratista), Residente de Interventoria, 1 Social (Interventoria), 1 Practicante siso (contratista), 1 Residente SISO (contratista), 1 Residente Siso (Interventoria) 1 Auxiliar Social Interventoria, Ministerio de Vivienda Enterritorio, Alcaldia, FOVIS, Contratista, director

de obra e interventoria, supervisor entrega materiales (contratista) 2 Inspector de obra Interventoria, 2 encuestadores, 1 maestro, 10 oficiales, 10 Ayudantes.

Actividades: En el dia de hoY se Presentan en campo 2 encuestadores Y se realizan 4 encuestas.
Por Parte del equipo de contratista la auxiliar siso dicta una charla con todo el Personal del contratista, hace un Pequeño calentamiento, Para que el Personal este activo.
Se continua trabajando con 21 Persona Y se dividen en cuadrillas donde a la fecha Cuenta con 9 cuadrillas el contratista.
En la Vivienda 001, no se está interviniendo, Porque Pasa cerrada la casa Y es una adecuación, en la Vivienda 002 es una adecuación Y Cambia caseta tipo 2, en la Vivienda 003, se hace la mamposteria del baño, figuración del acero Y colocación estribo columnas, en la Vivienda 004, se termina figurar acero Y colocación de estribo columna Y columnetas, en la Vivienda 005, intervención tipo 1, aún no se ha intervenido, en la Vivienda 006, levantamiento de mamposteria en ladrillo, en la Vivienda 007, figuración acero columnas estribo, levante mamposteria en ladrillo, en la Vivienda 008, figuración estribo, columnas, Intervención de Plomeria, instalación tubo 4", elaboración de registros, en la Vivienda 009, intervención tipo 2, no se ha empezado a intervenir, en la Vivienda 010, intervención tipo 2, Se fundio cimentación, intervención de Plomeria, instalación tubo 4", tubo hidraulico, elaboración registro 0,40 X 0,40 en concreto, en la Vivienda 012, figuración de estribo columnas, colocación de este mismo, formaleta metalica de columna, en la Vivienda 013, figuración estribo de columna se colocaron Y se formaletco con formaletas metalicas, en la Vivienda 014 figuración acero estribo columna, en la Vivienda 015, figuración acero estribo columna, en la Vivienda 016, se hizo el levantamiento de mamposteria en ladrillo.
Ingreso de materiales: (arena, cemento, tubo 4", acero, triturado, ladrillo)

Escaneado con CamScanner

y hay retrazo para el ingreso de material por el acceso de la via en mal estado, no pueden entrar con facilidad los vehiculos.
Visita en obra para ver el avance del Proyecto, donde estubieron el ministerio de Vivienda, enterritorio, alcaldia, fovis, Contratista, director de obra del contratista e interventoria, y Contratista e interventoria. Ingreso de Practicante ambiental por parte del contratista.

Clima: Soleado.
Equipos y Materiales: formato de encuestas, Lapiceros, flexometros, Planilleros, dotación del Personal, herramientas menores (Palas, barras, Palines, Palaustre, Pitas, Plomadas), Polidoras

Residente de Interventoria

Residente de obra

-> fecha: 02 de Junio 2022 Jueves
Hora de Inicio: 7:00AM
Hora de finalización: 5:00PM
Contratista: Consorcio Turguia
Interventor: GaVinco Ingenieros Consultores S.A.S
Proyecto: Conexiones Intradomiciliarias de agua Potable y Sancamiento básico en la ciudad de Sincelejo.

Personal en obra: Residente de obra, 2 sociales (contratista), Residente Siso (contratista), 1 Practicante Siso, 1 Residente Sso Interventoria, 2 Inspector de obra Interventoria, Supervisor entrega de materiales (contratista), 1 maestro, 10 oficiales, 10 Ayudantes.

Actividades: En el dia de hoy las sociales con acompañamiento de Planeación, fondo de Vivienda y Veolia visitaron 6 casas de

inclusión, de las 6 visitas solo estaban 4 en casa, en la tarde hicieron socialización de inicio de obra de casa en casa en la segunda calle a intervenir manzana 32 y 35.
En la vivienda 003 se levanto mamposteria, se formaleteo los machones, instalación de tuberia sanitaria de 4", se hizo el relleno con material en sitio de la excavación de la tuberia de 4".
En la vivienda 004 se formaleteo las columnas y se fundieron no utilizando vibrador para fundir, siendo esta una caseta tipo 3
En la vivienda 005 se comenzo a intervenir, con la excavación para viga cimiento y armado del acero de viga cimiento.
En la vivienda 009 se hizo levante de muro, armado de acero de los machones, excavación para instalación de tuberias sanitaria de 4".
En la vivienda 008 se hizo el armado de la estructura y se fundió el registro de la caja de inspección, amarre del acero de Parrilla de columnas y machones, relleno de excavación con material en sitio de la tubería sanitaria de 4".
En la vivienda 010, Levantamiento de muro, amarre de acero de machones y columnas, se fundio la caja de inspección, relleno de excavación con material sitio de la tuberia sanitaria de 4".
En la vivienda 012 se formaleteo las columnas, se fundio las columnas.
En la vivienda 013, se hizo el amarre del acero de las columnas.
En la vivienda 015, Levantamiento de muro, se formaleteo los machones y se fundieron, siendo esta una caseta tipo 2.
En la vivienda 016, Levantamiento de muro, se formaleteo los machones y se fundieron, siendo esta una caseta tipo 2.
Se ingreso material a obra, lo: cual fue, arena, tuberia de 4", tuberia 1/2", Puntillas, Cemento, Ladrillos, formaletas metalicas, alambre.

Clima: Soleado
Equipos y Materiales: formato de encuestas, Lapiceros, flexometros,

Escaneado con CamScanner

Planilleros, dotación del Personal, herramientas menores (Palas, barras, palines, Palaustre, Pitas, Plomadas), Pulidoras.

Residente de Interventoria

Residente de obra

→ fecha: 03 de Junio 2022 Viernes
Hora de Inicio: 7:00AM
Hora de finalización: 5:00PM
Contratista: Consorcio Turguia
Interventor: Gavinco Ingenieros consultores S.A.S
Proyecto: conexiones Intradomiciliarias de agua Potable y Saneamiento básico en la ciudad de Sincelejo.

Personal en obra:
Personal del Contratista: 1 Residente de obra. 3 trabajadoras sociales, 1 Residente Siso, 1 Auxiliar residente siso, 1 maestro de obra, 10 oficiales. 10 Ayudantes
Personal de Interventoria: Residente de interventoria, 1 social, 1 Residente siso, 2 inspectores de obra

Actividades: en el dia de hoy no se Presentaron encuestadores en el campo, ya que se encuentran digitalizando diagnosticos en la oficina del consorcio. Y hubo comité de aprobación.
Realización Visitas: 0
Acumulado de visitas: 403.
En obra se continua con la ejecución de las viviendas, con los codigos del 001 al 016.
Vivienda 001: aún no se empieza labores Porque la vivienda Pesa cerrada.
Vivienda 002: no se inicia actividades de ejecución.
Vivienda 003: Se fundio columnas y machones
Vivienda 004: se empezo a fundir columnas

Vivienda 005: Tipo de intervención tipo 1, se siguio con la fundida de la viga cimentación.
Vivienda 006: se continua con el levante mamposteria y se funde columnas.
Vivienda 007: se continua con el levante en mamposteria.
Vivienda 008: fundida de columnas.
Vivienda 009: Intervención tipo 2, aun no se ha empezado Labores.
Vivienda 010: Excavación y fundida de zapata (tipo 2), encofrado y fundida de machones.
Vivienda 011: Tipo 2, empezo con la excavación de baño, excavación de tubería de 4".
Vivienda 012: Levantamiento de muro.
Vivienda 013: encofrado y fundida de columnas (tipo 3).
Vivienda 014: Armado de formaleta, terminación de fundida de viga de cimentación.
Vivienda 015: Levante de mamposteria y fundida de columnetas
Vivienda 016: Armado del acero de Parrilla de la viga corona, encofrado y se fundio.
En la obra se han Presentado atrazos, Por el ingreso del material, Por el mal estado de las vias.

Clima: Soleado
Equipos y Materiales: Herramientas menores, formaletas, Andamios, extenciones.
Cemento, Varillas, triturado, Arena, Tubena.

Residente Interventoría

Residente de obra

Escaneado con CamScanner

→ fecha: 04 de Junio 2022 Sabado
Hora de Inicio: 9:00AM
Hora de finalización: 12:00
Contratista: Consorcio Turquia
Interventor: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S
Proyecto: conexiones Intradomiciliarias de agua Potable y Sancamiento basico en la ciudad de sincelejo.

Personal en obra:
Personal del contratista: 1 Residente de obra, Practicante siso, 1 supervisor entrega materiales. 1 maestro, 10 oficiales. 16 Ayudantes; 1 Ingeniero ambiental. 1 Aux ambiental
Personal de Interventoria: Residente Interventoria. 2 Inspectores de obra.

Actividades: En el dia de hoy sabado, no se Presentaron encuestadores a campo, ya que se encuentran digitalizando diagnosticos en la oficinas del consorcio.
Acomulado de visitas: 403.
en obra se continua con la ejecucion de actividades de obras civiles en las viviendas 001 hasta la 016.
Vivienda 001: Tipo adecuación, no se ha empezado labores Porque Pasa cerrada
Vivienda 002: No se ha empezado actividades de ejecución. (tipo 2). ya que era una adecuación y se cambio a caseta tipo 2.
Vivienda 003: fundida de columnas, mampostería y se siguio con la excavación de la tubería de 4", elaboración registro 0,40 x 0,40.
Vivienda 004: Desencofrado de columnas, Levantamiento en mampostería (tipo 3).
Vivienda 005: Levante en mampostena, fundida de machones (tipo 1).
Vivienda 006: fundición de columna, levante mampostena, fundida columnetas, excavación tuberia 4" (tipo 3).

Vivienda 007: Se continua con el levante mampostería, se empieza excavación tubería 4", fundida registro de 0.40x0.40.
Vivienda 008: Levante en ladrillo, terminación tubería de 4". (tipo 3).
Vivienda 009: (tipo 2). No se ha empezado Labores.
Vivienda 010: Se termino levante de mampostena, se comento a formaletear la columna. (tipo 2).
Vivienda 011: excavacion Para tubería 4". (tipo 2).
Vivienda 012: fundida de machones, Levantamiento de mampostena.
Vivienda 013: fundida de columnas.
Vivienda 014: Armado y fundida de columnas.
Vivienda 015: Terminación de levante.
Vivienda 016: Terminación de Levante, inicio Pared interior del baño.

Clima: Soleado
Equipos y Materiales:
Equipos: Herramienta menores, formaletas, andamios, extenciones, Pulidoras, vibrador de concreto.
Materiales: Cemento, Varilla, Arena, Triturado, tubería

Residente Interventoria

Residente de obra

→ fecha: 06 de Junio 2022 Lunes
Hora de Inicio: 7:00AM
Hora de finalización: 5:00PM
Contratista: Consorcio Turquia
Interventor: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S
Proyecto: Conexiones Intradomiciliarias de agua Potable y Sancamiento basico en la ciudad de sincelejo.

Personal en obra:

Escaneado con CamScanner

Personal del contratista: 1 Residente de obra, Practicante siso, Practicante Ambiental, 1 supervisor entrega materiales, 1 maestro, 10 oficiales, 12 Ayudantes, 2 trabajadoras sociales, 2 encuestadores
Personal de Interventoria: 1 social, 1 Residente siso y 2 Inspector de obra.

Actividades: En el día de hoy los sociales socializaron 4 manzanas, verificaron 40 Personas en matriz, en la tarde abrieron en el barrio el Punto de atención al usuario y se hicieron 10 PQR de Inclusión.
En el día de hoy se Presentan en campo 2 encuestadores y se realizan 5 encuestas.
Acumulado de visitas = 408
Se le Pide los certificados de calidad de los materiales al contratista y los entrega incompletos.
En obra se continua con la ejecución de las viviendas, con los codigos del 001 al 016.
Vivienda 001: aún no se empieza labores Porque la Vivienda Pasa cerrada.
Vivienda 002: Ingreso de material, Para comenzar a ejecutar.
Vivienda 003: Levantamiento de muro.
Vivienda 004: Levantamiento de mamposteria.
Vivienda 005: desencoframiento de machones, armado de Parrilla Para Viga Corona.
Vivienda 006: Levantamiento de muros, encofrado y fundida de machones.
Vivienda 007: encofrado y fundida de columnas y machones.
Vivienda 008: Levantamiento de muro.
Vivienda 010: se fundio el Pedestal de la columna.
Vivienda 011: [illegible]

Vivienda 012: se siguió con el levantamiento de muro.
Vivienda 013: se inicia el levantamiento de muro en ladrillo, se realizó la excavación Para registro sanitario, y tubería sanitaria PVC de 4" e instalación de la misma.
Vivienda 014: fundida de columnas, excavación Para tubería Sanitaria PVC de 4" y registro Sanitario.
Vivienda 015: se fundio la viga corona, se hizo el armado de la Parrilla de está y el encoframiento.
Vivienda 016: se Paneto el interior y exterior de los muros del baño, excavación de zapata, se fundio el solado.
En la obra se han Presentado atrazos, Por la falta de material.

Clima: Soleado
Lluvia en la noche
EQUIPOS Y Materiales: formato de encuestas, LaPiceros, flexometro, Planilleros, dotación del Personal, herramientas menores, formaletas, andamios, extensiones, Pulidoras, Vibrador de concreto
Materiales: Cemento, Arena, Triturado, Varilla, Tuberias.

Residente Interventoria

Residente de obra

→ fecha: 07 de Junio 2022 Martes
Hora de Inicio: 7:00AM
Hora de finalización: 5:00PM
Contratista: Consorcio Turquia
Interventor: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S
Proyecto: Conexiones Intradomiciliarias de agua Potable y Sanamiento basico en la ciudad de Sincelejo.

Personal en obra.
Personal del contratista: 1 Residente de obra, 2 sociales, 1 siso Residente, Practicante Siso, Practicante Ambiental, 1 supervisor entrega materiales, 1 maestro, 10 oficiales, 12 Ayudantes, 1 encuestador.
Personal de Interventoria: 1 Social, Residente siso, 2 Inspector de obra.

Escaneado con CamScanner

Actividades: en el dia de hoy se Presentan en campo 1 encuestador y realiza 4 encuestas.
Las Sociales en la mañana no Pueden trabajar Por la lluvia, en la tarde revisan los codigos repetidos.
Acumulado de visitas: 409
En obra se continua con la ejecución de las Viviendas, con los codigos 001 al 016.
Vivienda 001: se comienza a intervenir, haciendo la demolición de lo existente, y ingresando los materiales Para su ejecución.
Vivienda 002: excavación Para la instalación de la tuberia de 4"
Vivienda 003: no se trabajo hoy
Vivienda 004: encofrado y fundida de machones, instalación de calados. Anclaje de viga corona.
Vivienda 005: Pañete interno y extarno, desencoframiento de machones y viga corona. (caseta tipo 1).
Vivienda 006: fundicion machones, y se desencofro y se anclaron la viga corona a la columna.
Vivienda 007: se desencofro las columnas, se hizo el armado de la Parrilla de la viga corona, se ancla a la columna y se formaleteo.
Vivienda 008: encoframiento de machones y se fundicion
Vivienda 010: no se trabajo hoy.
Vivienda 011: Levantamiento de muro, armado de canasta de machones, encoframiento y fundida de machones.
Vivienda 012: no se trabajo hoy.
Vivienda 013: Levantamiento de muro.
Vivienda 014: no se trabajo hoy.
Vivienda 015: se Pañeto el muro interno y extarno, armado de acero de zapata, excavación de zapata, fundida de solado y en la tarde se fundio la zapata.
Vivienda 016: se fundio la zapata, encoframiento de Pedestal, se fundio el Pedestal y se Pañeto el muro exterior.
Al contratista se le han hecho las recomendaciones de las columnas que algunas han salido torcidas, hay otras que se han corrido con respecto al muro, la mezcla se sigue

laborando en el Piso, esta Propensa a contaminación, no ha subsanado los oficios que se han enviado acerca de esta recomendaciones y si Persisten en estas actividades Interventoria no va a recibir estas unidades sanitarias.
Hubo comite, estubo la entidad, Interventoria, contratista, se le hizo seguimiento a la obra y se dejaron unos compromisos, donde las viviendas que se comenzaron a intervenir el 25 de mayo, se deben de terminar el 15 de Junio.

Clima: Lluvia en la mañana.
Nublado en la tarde

equipos y Materiales: formato de encuestas, Lapiceros, flexometro Planilleros, dotación del Personal, herramientas menores, formaletas, andamios, extensiones, Polidoras.
Materiales: cemento, Arena, triturado, varillas, Tuberias.

Residente Interventoria

Residente de obra

→ fecha: 08 Junio 2022 Miercoles
Hora de Inicio: 7:00AM
Hora de finalización: 5:00PM
Contratista: Consorcio Turguia
Interventor: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S
Proyecto: Conexiones Intradomiciliarias de agua Potable y Sanamiento basico en la ciudad de Sincelejo.

Personal en obra:
Personal del contratista: 1 Residente de obra, 3 Sociales, 1 siso Residente, Practicante siso. Practicante ambiental, 1 supervisor entrega materiales, 5 encuestadores, 1 maestro, 12 oficiales, 14 Ayudantes.

Escaneado con CamScanner

Personal de Interventoria: Residente Interventoria, 1 Social, Residente siso, 2 Inspector de obra.

Actividades: En el dia las sociales, socializaron el Proyecto en 3 manzanas y 32 viviendas y se hicieron 3 inclusiones. Se Presentan en campo 5 encuestadores y realizan 37 encuestas.

Acumulado de visitas = 446

En Obra se continua con la ejecución de las viviendas, con los codigos 001 al 017.

Vivienda 001: Excavación, amarre de acero y fundida de viga cimentación

Vivienda 002: excavación Para tuberia Puc 4" sanitaria.

Vivienda 003: se termino el levante hasta altura de viga amarre, fundida de machones, amarre de Parrillas y fundida de viga amarre.

Vivienda 004: se termino el levante hasta altura de viga amarre, instalación de calados, se realizan cájuelas Para instalacion de tubería hidrosanitaria, amarre de acero de viga de amarre.

Vivienda 005: Levante y Pañete de cuchillas, levante de muro Para lavadero.

Vivienda 006: Desencofrado de machones, amarre de Parrillas de acero, encofrado y fundida de viga amarre e instalación de calados

Vivienda 007: Desencofrado de machones, amarre de Parrillas, encofrado y fundida de viga amarre, instalacion de calados

Vivienda 008: Desencofrado de machones, amarre de Parrillas de acero, encofrado y fundida de viga amarre e instalación de calados.

Vivienda 010: se termino el levante hasta altura de viga de amarre, se hizo fundida de machones.

Vivienda 011: Desencofrado de machones, levante hasta altura de viga amarre.

Vivienda 012: No se trabajo.

Vivienda 013: se termino el levante hasta altura de viga de amarre, encofrado de machones

Vivienda 014: No se trabajo.

Vivienda 015: encofrado y fundida de columnas Para tanque elevado, Pañete exterior, ingreso de materiales y tanque elevad

Vivienda 016: Encofrado y fundida de columnas Para tanque elevado.

Vivienda 017: Ingreso de materiales, excavación Para viga cimentación. Se realizo un recorrido la interventoria junto al Personal del cont contratista y el dirección de obra, donde se observo en, la obra que la vivienda 008, la columna esta desfasada, en la vivienda 010, el Pedestal supera la altura de especificación, en la vivienda 013, las columnas están torcidas, vivienda 015 es tipo 2, Pero una Parte queda Por fuera, deben garantizar el techo, la mezcla se sigue elaborando en el suelo, las recomendacio aun no se han subsanado, esto ocurre en todas las viviendas, se observa que los Paneles comienzan con un espesor y terminan con otro, la vivienda 014 Pasa cerrada, esto acarrea atraso Para seguir realizando trabajos, la vivienda 011, en su Propuesta dice tipo 2, Pero ello se amarraron a una cimentación existente, Por lo tanto el formato debe cambiar a adecuación, y no se evidencio formaleta de registro de 0.40x0.40, ni los accesorios de Plomeria, instalaciones hidráulicas y sanitarios.

Clima: Nublado en la mañana

Lluvias: 1:00PM – 3:00PM

Equipos y Materiales: formato de encuestas, Lapiceros, flexometros Planilleros, dotación del Personal, herramientas menores, formaletas andamios, extensiones, Pulidoras.

Materiales: Cemento, Arena, triturado, Varillas, tuberias, tanque.

Residente Interventoria

Residente de obra

Escaneado con CamScanner

-> Fecha: 09 Junio 2022 Jueves.
Hora de Inicio: 7:00AM
Hora de finalización: 5:00PM
Contratista: Consorcio Turgua
Interventor: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S
Proyecto: Conexiones Intradomiciliarias de agua Potable y Saneamiento basico en la ciudad de Sincelejo.

Personal en obra: 1 Residente de obra, 3 sociales, 1 Siso Residente, Practicante siso, Practicante ambiental. 1 supervisor entrega materiales, 1 maestro, 12 oficiales. 14 Ayudantes. (contratista).
Personal de Interventoria: Residente Interventoria, 1 social, Residente Siso, 2 Insfector de obra.

Actividades: En el dia de hoy no se Presentarón encuestadores en campo. Ya que se encuentran digitalizando los diagnosticos. Las sociales tubierón la Primera reunión sectorizada, realizaron la revisión de inclusión.
Se realizó una reunión donde estubieron Presentes el director de obra del contratista, el Personal del contratista, Personal de Interventoria accion comunal, Veedores, la comunidad, donde el caracter de la reunión fue informativo, Pero no se Pudo llegar al final de esta Portque la comunidad entro en discusión y se nos hizo imposible terminar la reunión
en obra se continua con la ejecución de las viviendas, con los codigos 004 al 017.
Vivienda 004: Levantamiento de muro, amarre de acero Para machones y fundida de machones
Vivienda 002: excavación, amarre de acero y fundida de viga cimentación.
Vivienda 003: Desencofrado de Viga de amarre.
Vivienda 004: Encofrado y fundida de viga de amarre.
Vivienda 005: NO Se trabajo.
Vivienda 006: Desencofrado de Viga de amarre, encofrado y amarre de acero Para Viga y losa de tanque elevado.
Vivienda 007: Desencofrado de viga amarre, encofrado y amarre de acero Para viga y losa de tanque elevado, se fundio viga y losa de tanque elevado.
Vivienda 008: Desencofrado de viga amarre y Pañete del muro.
Vivienda 009: Ingreso de material.
Vivienda 010: No se trabajo.
Vivienda 011: encofrado, amarre y fundida de viga amarre.
Vivienda 012: No se trabajo.
Vivienda 013: Desencofrado de machones.
Vivienda 014: se inicia el levante de muros.
Vivienda 015: No se trabajo
Vivienda 016: Desencofrado de columna.
Vivienda 017: NO se trabajo
Hay atrazos Por la falta de material en la obra, la mezcla y el concreto se sigue realizando en el suelo.

Clima: 7:00AM - 9:00AM Lluvias
Soleado Tarde.
Equipos y Materiales: formato de encuestas, Lapiceros, flexometros, Planilleros, dotación del Personal, herramientas, menores, formaletas, andamios, extensiones, Pulidoras.
Materiales: Cemento, Arena, triturado, Varillas, tuberias, tanque.

Residente Interventona

Residente de ob

-> Fecha: 10 Junio 2022 Viernes
Hora de Inicio: 7:00AM
Hora de finalización: 5:00PM
Contratista: Consorcio Turgua
Interventor: Gavinco Ingenieros
Proyecto: Conexiones Intradomicilianas de agua Potable y

Escaneado con CamScanner

Saneamiento básico en la ciudad de Sincelejo.

Personal en obra:
Personal del contratista: 1 Residente de obra, 2 sociales, 1 siso Residente, Practicante siso, Practicante ambiental, 1 supervisor entrega materiales, 1 maestro, 12 oficiales, 14 Ayudantes, 1 encuestadora
Personal de Interventoria: 1 Residente siso, 2 Inspector de obra

Actividades: En el dia de hoy se Presenta en campo 1 encuestador y realiza **5** encuesta.
Acumulado de visitas: 455
En obra se continua con la ejecución de las Viviendas, con los codigos 001 al 017.
Vivienda 001: Levante de muros y fundida de machones, se hace una observación en el diametro de las canasta Para viga de amarre. Porque son en Varillas #4 y aros de 1/4 y las estan trayendo en 3/8 y aros de 1/4. El acero de los machones no Cumplen con el distansiamiento entre los estribos, se realiza excavación Para zapatas.
Vivienda 002: amarre estribo de machones, Se realiza observación de las canasta de viga de amarre.
Vivienda 003: Armadura de Plafón o encofrado Para losa de tanque elevado.
Vivienda 004: Pañete exterior, suministro de lamina de fibrocemento.
Vivienda 005: No se trabajo.
Vivienda 006: fundida de losa, Para tanque elevado.
Vivienda 007: Pañete exterior.
Vivienda 008: encofrado de losa Para tanque elevado.
Vivienda 009: excavación Para zapatas e ingreso de materiales.
Vivienda 010: encofrado y fundida de viga de amarre.
Vivienda 011: Desencofrado de viga de amarre.
Vivienda 012: No se trabajo.
Vivienda 013: No se trabajo.
Vivienda 014: No se trabajó

Vivienda 015: encofrado de losa de tanque
Vivienda 016: No se trabajo.
Vivienda 017: No se trabajo.
Siguen los atrazos en la obra Por falta de material.
Hubo cambio de residente Por Parte del contratista, el nuevo residente ingreso hoy
Clima: Soleado en la mañana
2:30PM — 4:00PM Lluvia
Equipos y Materiales: formato de encuestas, Lapiceros, Flexometros, Planilleros, dotación del Personal, Herramientas menores, formaletas, andamios, extensiones, Pulidoras.
Materiales: Cemento, Arena, triturado, Varillas, tuberias, tanque.

Residente Interventoria

Residente de obra

→ fecha: 11 Junio 2022 Sabado
Hora de Inicio: 7:00 AM
Hora de finalización: 1:00 PM
Contratista: Consorcio Turquia
Interventor: Galinco Ingenieros consultores S.A.S
Proyecto: Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Basico en la ciudad de Sincelejo
Personal en obra: 1 Residente de obra, 2 Sociales, 1 Siso residente, Practicante Siso, practicante ambiental, Supervisor entrega de materiales
1 maestro, 12 oficiales, 14 ayudantes, 1 residente Siso.
2 Inspectores de obra, 1 residente Interventoria.

Actividades: En el dia de hoy no se realizan visitas para Diagnosticos.
En obra se continua con la ejecucion de obras de las

Escaneado con CamScanner

Viviendas ya Intervenidas anteriormente.
Se observa, que las recomendaciones dadas por esta Interventoría aún no han sido subsanadas, hasta el momento solo se realizó cambio de las formaletas. Se realiza levante de cuchilla después de la viga corona, y Se observó que no se está cumpliendo con lo que especifica el plano estructural acerca de este elemento, Se sugiere una reunión de Seguimiento Interna, donde se presenten los Inspectores de obra, Residentes de obra, Director de Interventoría y Director de obra, la reunion se programa para el día lunes 13 de Junio a las 4 de la tarde.
Se le entrega a esta Interventoría 57 paquetes de Encuestas para ser revisados.

clima: Soleado.
Equipos y Materiales: Dotación del personal, Herramientas Menores, andamios, Polidoras, Cemento, Arena, Grava, Acero, Tuberías, Tanque.

Residente Interventoría

Residente obra

→Fecha: 13 Junio 2022 Lunes
Hora de Inicio: 7:00AM
Hora de finalización: 5:00PM
Contratista: Consorcio Turquia
Interventor: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S
Proyecto: Conexiones Intradomiciliarias de agua Potable y Sancamiento básico en la ciudad de sincelejo.
P
Personal en obra:
Personal del contratista: 1 Residente de obra, 3 sociales, 1 siso

Residente, Practicante siso, Practicante ambiental, 1 Supervisor entrega materiales, 2 encuestadores, 1 maestro, 10 oficiales, 8 Ayudantes.
Personal Interventoría: 1 social, 1 Residente siso, 2 Inspector de obra.

Actividades: En el dia de hoy las sociales hacen recorrido por manzana en la zona donde se van a intervenir, Verificando las Personas con Papeles y sin Papeles esperando diagnóstico.
Los encuestadores se Presentan en campo y realizan 21 encuestas
Acumulado de visitas: 472
En obra se continua con la ejecución de las viviendas, donde en las siguientes no se trabajo Por falta de material y Por lluvia, las cuales son: (001, 002, 005, 006, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 016).
Vivienda 003: Levante de mampostería, cuchillas sin viga de amarre y Pañete exterior.
Vivienda 004: Levante de muro y Pañete interno, cuchilla sin viga cinta, instalación de tubería hidrosanitaria.
Vivienda 005: Levante, cuchillas y Pañete, no se realizo la viga cinta.
Vivienda 014: fundida de machones.
Vivienda 015: Desencofrado de losa de tanque
Vivienda 017: Levante de muros, encofrado de machones, amarre de acero y fundida de machones.
Se realizo una reunión entre el Personal del contratista e interventori donde se habló de subsanar y Corregir actividades que se venían haciendo incorrectamente.

Clima: Soleado Mañana.
Lluvias 2:30PM – 4:00PM
Equipos y Materiales: formato de encuestas, Lapiceros, flexometros, Planilleros, dotación del Personal, herramientas menores, formaletas, andamios, extensiones, Polidoras.
Materiales: cemento, Arena, triturado, varillas, tuberías, tanque.

Residente Interventoría

Residente de obra

Escaneado con CamScanner

→ fecha: 14 Junio 2022 Martes
Hora de Inicio: 7:00AM
Hora de finalización: 5:00PM
contratista: Consorcio Turquia
Interventor: Gauinco Ingenieros consultores S.A.S
Proyecto: Conexiones Intradomiciliarias de agua Potable y Saneamiento basico en la ciudad de sincelejo.

Personal en obra:
Personal del contratista: 1 Residente de obra, 2 sociales, 1 Siso Residente, Practicante Siso, Practicante ambiental, 1 supervisor entrega materiales, 1 maestro, 7 oficiales, 6 Ayudantes.
Personal Interventoria: Residente Interventoria, 1 Social. 1 Residente Siso, 2 Inspector de obra.

Actividades: En el dia de hoy no se Presentan encuestadores en campo.
Las sociales hacen recorrido Por manzanas, verificando Personas Por Papeles y Sin Papeles.
En obra se continua con la ejecución de las viviendas, con los codigos 005 al 017.
Vivienda 001: fundida de Solado, Armado de Parrillas, encofrado y fundida de viga de amarre.
Vivienda 002: Levante de muros.
Vivienda 003: NO se trabajo.
Vivienda 004: NO se realizó trabajo hasta el medio dia. y despues del medio dia se trabajo haciendo el Pañete donde no se termino Por falta de arena.
Vivienda 005: No se trabajo.
Vivienda 006: NO se trabajo
Vivienda 007: NO se trabaja
Vivienda 008: Armado de Parrilla, encofrado y fundida de viga de amarre
Vivienda 009: No se trabajo.
Vivienda 010: NO se trabaja.

Vivienda 011: excavación y instalación de tubería Pvc 4".
Vivienda 012: No se trabajo
Vivienda 013: No se trabajo
Vivienda 014: Armado de Parrillas, encofrado y fundida de viga de amarre.
Vivienda 015 y 016: No se trabajo.
Vivienda 017: Armadura de Parrillas de acero, encofrado y fundida de viga de amarre.
Hubieron muchas viviendas que no trabajaron Por falta de material y Por lluvias.
Hubo comité, estubo la entidad, Interventoria, contratista, donde se le hizo seguimiento a la obra.

Clima: Lluvias 6:30AM – 3:00PM
equipos y Materiales: formato de encuestas, Lapiceros, flexometros, Planilleros, dotacion del personal, herramientas menores, formaletas andamios, extensiones, Pulidoras.
Materiales: cemento, Arena, triturado, Varillas, tuberias, tanque.

Residente Interventoria

Residente de obra

→ fecha: 15 Junio 2022 Miercoles
Hora de Inicio: 7:00AM
Hora de finalización: 5:00PM
Contratista: consorcio-turquia
Interventor: Gauinco Ingenieros consultores S.A.S
Proyecto: Conexiones Intradomiciliarias de agua Potable y Saneamiento basico en la ciudad de sincelejo

Personal en obra:
Personal del contratista: 1 Residente de obra, 3 sociales, 1 S.Siso Residente, Practicante Siso, Practicante ambiental, 1 supervisor entrega materiales,

Escaneado con CamScanner

6 encuestadores, 1 maestro, 11 oficiales, 10 Ayudantes.
Personal Interventoria: Residente Interventoria, 1 social, 1 Residente siso, 2 Inspector de obra.

Actividades: En el dia de hoy los sociales hacen el recorrido de calle Por calle verificando quien falta Por diagnóstico y en la tarde pasarán en el Punto de atención.
Los encuestadores se Presentan en campo y realizan 25 encuestas.
Acumulado de visitas: 497
En obra se continua con la ejecución de las viviendas, con los codigos 001 al 017.
Vivienda 001: Pañete interno y externo.
Vivienda 002: Encofrado y fundida de machones.
Vivienda 003: Desencofrado de viga amarre, Pañete interno y externo.
Vivienda 004: Pañete de cuchillas.
Vivienda 005: Trazado, corte y demolición de Plantilla existente Para tubería sanitaria y registros.
Vivienda 006: No se trabajo.
Vivienda 007: Instalación de cubierta.
Vivienda 008: Pañete externo e interno.
Vivienda 009: NO se trabajo
Vivienda 010: Pañete interno.
Vivienda 011: No se trabajo.
Vivienda 012: Levante de muros.
Vivienda 013: Amarre de Parrillas, encofrado y fundida de vigas.
Vivienda 014, 015 y 016: NO se trabajo.
Vivienda 017: fundida de vigas y Pañete interno.
Ingreso de material a cada una de las viviendas intervenidas.
Se abrio una bodega en campo, Para el almacenamiento de materiales.

Clima: Soleado
Equipos y Materiales: formato de encuestas, Lapiceros, Flexometros, Planilleros dotación, del Personal, herramientas menores, formaletas, andamios,

extensiones, Pulidoras.
Materiales: Cemento, Arena, triturado, varillas, tuberias, tanque.

Residente Interventoria

Residente de obra

→ fecha: 16 Junio 2022 Jueves
Hora de Inicio: 7:00AM
Hora de finalización: 5:00PM
Contratista: Consorcio Turaca
Interventor: Gavinco Ingenieros consultores S.AS
Proyecto: conexiones Intradomiciliarias de agua Potable y saneamiento básico en la ciudad de sincelejo.

Personal en obra:
Personal del contratista: 1 Residente de obra, 3 sociales, 1 siso Residente, Practicante siso, Practicante ambiental, 1 supervisor entrega materiales, 6 encuestadores, 1 maestro, 10 oficiales, 9 Ayudantes.
Personal Interventoria: Residente Interventoria, 1 social, 1 Residente siso, 2 Inspector de obra.

Actividades: En el dia de hoy las sociales hacen recorrido en acompañamiento con la alcaldia calle Por calle verificando quien falta Por diagnóstico y junto con el residente de obra identificando las casas y supervisandolas las que se estan interviniendo.
Los encuestadores se Presentan en campo, los cuales son 6 y realizan 38 encuestas.
Acumulado de visitas: 535
En obra se continua con la ejecución de las viviendas, donde se realizó fundida de zapatas, desencofrado de machones, armado de Parrillas, encofrado, fundida de viga de amarre y machones, Pañete exterior de filos, excavación Para tubería Sanitaria e instalación de cubierta, Pañete interno y externo, instalación de tubería hidrosanitaria, realización de Cajuelas Para tuberias hidrosanitaria.

Escaneado con CamScanner

en las siguientes Viviendas no se trabajo: (003, 014, 015, 016).
El VicePresidente de la acción comunal hizo una denuncia a la ejecución del Proyecto en la contraloría municipal y esta realizo una visita sin Previo aviso mandando un funcionario de su Parte, donde realizó una inspección a la obra y no hizo ninguna objección. Se intervino la vivienda 018, se le hizo la excavación, armado de acero y se fundio la Viga Cimie
Ingreso de material a la bodega.

Clima: Soleado
Equipos y Materiales: formato de encuestas, Lapiceros, flexometros, Planilleros, dotación del Personal, herramientas menores, formaletas, andamios, extensiones, Pulidoras.
Materiales: Cemento, Arena, triturado, Varillas, tuberias, tanque.

Residente Interventoria

Residente de obra

-> fecha: 17 Junio Viernes 2022
Hora de Inicio: 7:00AM
Hora de finalización: 5:00PM
Contratista: Consorcio Turquia
Interventor: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S
Proyecto: Conexiones Intradomiciliarias de agua Potable y sancamiento básico en la ciudad de Sincelejo

Actividades: en el dia de hoy no se Presentan encuestadores en campo.
Las sociales hacen recorrido calle Por calle verificando quien falta Por diagnostico y en la tarde se encuentran en el Punto de atención.
en obra se continua con la ejecución de las viviendas intervenidas, donde se realizan las siguientes actividades: Pañete interno y externo, excavación de zapata y fundida de Solado, Excavación Para tuberia

Sanitaria y registros, fundida de registros, instalación de tubería hidrosanitaria, relleno con material en sitio Para zapata, excavación de cimentación, desencofrado de machon, encofrado de viga de amarre y encofrado y fundida de columnas.
En las siguientes viviendas no se trabajo: (001, 003, 004, 007, 010, 015).
Porque el Plomero esta esperando los aparatos sanitario que llegue Para instalarlos.
También se intervinieron 3 nuevas viviendas, las cuales son: Vivienda 019 (caseta tipo 3), Vivienda 021 (caseta tipo 2) y Vivienda 023 (caseta tipo 3) donde se realizo la excavación, armado de acero de Parrilla de zapata y viga cimiento y fundida de zapata corrida y viga cimiento.

Personal en obra:
Personal del contratista: 1 Residente de obra, 2 Sociales, Practicante siso, Practicante ambiental, 1 supervisor entrega materiales, 1 maestro, 12 oficiales, 11 Ayudantes.
Personal Interventoria: 1 Residente siso, 2 Inspector de obra.

Clima: Nublado en la mañana
Lluvia en la tarde
Equipos y Materiales: formato de encuestas, Lapiceros, flexometros, Planilleros, dotación del Personal, herramientas, menores, formaletas, andamios extensiones, Pulidoras.
Materiales: Cemento, Arena, triturado, Varillas, tuberias, tanque

Residente Interventoria

Residente de obra

Escaneado con CamScanner

-> fecha: 18 Junio Sabado 2022
Hora de Inicio: 7:00AM
Hora de finalización: 5:00PM
contratista: consorcio Turgoia
Interventor: Gavinco Ingenieros consultores S.A.S
Proyecto: conexiones Intradomiciliarias de agua Potable y saneamiento básico en la ciudad de Sincelejo.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de Interventoría Siso, practicante ambiental, 1 maestro, 12 Ayudantes, 12 oficiales, 2 Inspectores de obra.

Actividades en campo: En el dia de hoy no se realizan trabajos de encuestas para Diagnosticos, Por otra parte el Contratista continua con Actividades de ejecución de obra en la Mayoria de las Viviendas, (Excavación para Tubería Sanitaria, Excavación de Cimentacion, levante de muros, Solado, Armado del acero.
En horas de la mañana se realiza un recorrido de Verificación de Actividades y se encuentra que en la Vivienda 019, el Acero de 3/8" no cumple con la especificación de los 9,5mm, Se está llevando a obra un acero de 8,5mm, esta Interventoría hace la recomendación de que se debe cambiar este acero y Adiciente que de seguir asi las viviendas no se recibirán.

Clima: Soleado
Equipos y Materiales: flexometros, Herramientas menores, dotación del personal, andamios, pulidora, Formaletas.

Residente Interventoria

Residente de obra.

Escaneado con CamScanner

-> Fecha: 21 Junio Martes 2022
Hora de Inicio: 7:00AM
Hora de finalización: 5:00PM
Contratista: Consorcio Turquia
Interventora: Gainco Ingenieros Consultores S.A.S
Proyecto: Conexiones Intradomiciliarias de agua Potable y saneamiento básico en la ciudad de Sincelejo

Personal en obra: Residente de obra, Residente de Interventoría, 1 social (contratista), siso (Interventoría), Practicante ambiental. Practicante Siso, Supervisor entrega de materiales, 1 Inspector de obra. 6 encuestadores, 1 maestro, 12 oficiales, 10 Ayudantes.

Actividades: Los días 19 y 20 de Junio Se laboró en obra con actividades de Trazado y excavacion, fundida de Cimentación, fundida de machares, Instalación de cubierta, pañete interno Amarre y encofrado de Viga Corona, desencofrado de columnas, en las viviendas anteriormente ya Intervenidas.
en estos días También se abren 3 Viviendas nuevas, con el consecutivo 029. 030, 032.
Para el día Correspondiente al 21 de Junio, Se continuó con las Actividades de ejecución de obra en los Viviendos anteriormente Abiertos.
Por otra parte se realiza en horas de la Tarde el Comité de seguimiento de obra, en el cual asisten la Entidad, Contratista, y esta Interventoría, donde se realizaron algunas recomendaciones, Se habla acerca del Tema del acero de 3/8" que llega con 8.5 mm, el Director de Interventoría afirma que no cumple con Especificación, y que se debe cambiar de Inmediato. Se Realizaron 17 Encuestas de Diagnosticos
Clima: Lluvias en la mañana
Tarde Soleada.

Escaneado con CamScanner

Equipos y materiales: planillenos, formatos de Encuestas dotación del personal, andamios, Polidoras, formaletas.

Residente Interventoria

Residente de obra

→ fecha: 22 Junio Miercoles 2022
Hora de Inicio: 9:00AM
Hora de finalización: 5:00PM
Contratista: Consorcio Turquia
Interventor: Gavinco Ingenieros consultores S.A.S
Proyecto: Conexiones Intradomiciliarias de agua Potable y Sancamiento basico en la ciudad de Sincelejo.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de Interventoria, 2 Social (contratista), Siso (Interventoria), Practicante ambiental, Practicante Siso, Supervisor entrega materiales, Director de Obra de Interventoria y contratista, fovis, 2 Inspector de Obra, 6 encuestadores, 1 maestro, 12 Oficiales, 13 Ayudantes.

Actividades: En el dia de hoy se realizó un recorrido en campo con el acompañamiento del director de interventoria, el director de obra, el representante legal del consorcio Turquia, los residentes e insitectores, donde se realizaron Varias recomendaciones acerca del avance de la ejecución de las Unidades sanitarias, Ya que Para esta fecha se debió haber hecho entrega de las Primeras 13 inicialmente intervenidas. con respecto al acero que estaba llegando con menos milimetraje, este Ya no será utilizado y el contratista se compromete a suministrar el que menciona las especificaciones. Por otra Parte tambien se realizaron 18 encuestas de diagnosticos, tambien hubo recorrido del fovis, con: el acompañamiento de las sociales del contratista e interventoria, Para hacer inspección y cumplir con el Protocolo que incurren las solicitudes de

Inclusión.
Tambien se siguio con las actividades de encofrado y fundida de columna, tratado y corte de Piso, Para la instalación de tubería Sanitaria, encofrado y fundida de machones, encofrado, armado de Parrilla y fundida de losa de tanque, Instalación de tubería hidrosanitaria, fundida de registro sanitario, Pañete interno, encofrado y fundida de viga de amarre, fundida de cimentación, desencofrado de machones, fundida de columnas, levante de cuchillas, encofrado y fundida de viga cinta, levante de muros, excavación Para zapatas y desencofrado de columnas.
Ingreso de una Pajarita Para la mejoración y conformación de las calles del Poblado. Para facilitar el ingreso del material, ingreso de material de relleno y Arena.

Clima: Lluvia 5:30AM - 7:00AM
soleado en la tarde.
Equipos y Materiales: flexometros, Herramientas menores, dotación del Personal, andamios, Polidoras, formaletas.

Residente Interventoria

Residente de obra.

→ fecha: 23 Junio Jueves 2022
Hora de Inicio: 7:00AM
Hora de finalización: 5:00PM
Contratista: Consorcio TURquia
Interventor: Gavinco Ingenieros consultores S.A.S
Proyecto: Conexiones Intradomiciliarias de agua Potable y Sancamiento basico en la Ciudad de Sincelejo.

Personal en obra: Residente de obra, 1 social (contratista), Practicante ambiental, Practicante siso, Supervisor entrega materiales, Siso (interventoria), 2 Inspector de obra, 9 encuestadores, 1 maestro,

Escaneado con CamScanner

12 Oficiales, 13 AYudantes.

Actividades: En el día de hoy el residente de obra Por Parte del contratista, en acompañamiento con el Personal de campo realiza una reunión en la bodega, Para organizar la entrega de los materiales y saber los materiales que faltan en cada una de las viviendas intervenidas.
Se sigue con las actividades de levante de muros, encofrado, amarre de acero Para losa de tanque, trazado y corte de Plantilla Para excavación, Para tubería Sanitaria, Pañete externo y interno, fundida de Plantilla, desencofrado de Viga de amarre, encofrado y fundida de columnas, fundida de machones, fundida de Viga de amarre, levante de cuchilla y armado de acero, encofrado y fundida de Viga cinta.
Por otra Parte se recomendó cumplir con las medidas de la losa Para tanque elevado, según el diseño.
Por otra Parte también se realizaron 20 encuestas de diagnosticos
Clima: Lluvia 6:00AM - 7:30AM
Nublado en la tarde
Equipos y Materiales: flexometros, Herramientas menores, dotación del Personal, andamios, Polidoras, formaletas.

Residente Interventoria

Residente de obra.

→ fecha: 24 Junio Viernes 2022
Hora de Inicio: 7:00AM
Hora de finalización: 5:00PM
Contratista: consorcio Turquia
Interventor: Gavinco Ingenieros consultores S.A.S
Proyecto: Conexiones Intradomiciliarias de agua Potable y Saneamiento basico en la ciudad de Sincelejo.

Personal en obra: Residente de obra, Residente de Interventoria,

2 Social (contratista), Practicante ambiental, Practicante siso, Supervisor entrega materiales, siso (Interventoria), 2 Inspector de obra, 1 maestro, 12 oficiales, 13 AYudantes.

Actividades: En el día de hoy no se realizan encuestas Por falta de documentos de los beneficiarios.
Por otra Parte se sigue con las actividades de encofrado y fundida de viga amarre, instalación de tubería Sanitaria a registro existente, encofrado y fundida de losa de tanque, instalación de cubierta, realización de cajuelas Para Puntos hidrosanitarios, levante de cuchillas, encofrado y fundida de Viga cinta, levante de muros.
En la Vivienda 004 se mando a Parar la actividad de Pintura a la unidad Sanitaria, Ya que el color que le estaban echando no es el que dice en las especificaciones.
Ingreso de material de arena y material de reecbo.

Clima: Nublado
Equipos y Materiales: flexometros, Herramientas menores, dotación del Personal, andamios, Polidoras, formaletas.

Residente Interventoria

Residente de obra

→ fecha: 25 Junio Sabado 2022
Hora de Inicio: 7:00AM
Hora de finalización: 5:00PM
Contratista: Consorcio Turquia
Interventor: Gavinco Ingenieros consultores S.A.S
Proyecto: Conexiones Intradomiciliarias de agua Potable y Saneamiento basico en la ciudad de sincelejo.

Personal en obra: Residente de obra, 1 Social (contratista), Practicante ambiental, Practicante siso, Supervisor entrega materiales, siso

Escaneado con CamScanner

(Interventoria), 2 Inspector de obra, 1 maestro, 12 Oficiales, 13 Ayudantes.

Actividades: En el día se sigue con las siguientes actividades en obra, se realiza excavación de zanjas para tubería sanitaria, encofrado y fundida de machones, Pañete interno, encofrado y fundida de columnas.
En la vivienda 004, se enchapo el baño con ceramica antideslizante de 40x40, se aplico cal con cemento blanco a la batería sanitaria.
En las viviendas 011 y 013, también se siguio con la actividad del enchafe. y en las viviendas (001, 003, 005, 006, 007, 008, 012, 015, 016, 019, 029, 030, 031, 018, 020) no se trabajo.

Clima: Lluvia 10:00AM - 1:30PM
Equipos y Materiales: flexometros, Herramientas menores, dotación del Personal, andamios, Pulidoras, formaletas.

Residente Interventoria

Residente de obra

→ Fecha: 26 Junio Domingo 2022
Hora de Inicio: 7:00AM
Hora de finalización: 3:00PM
Contratista: Consorcio TURQUIA
Interventor: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S
Proyecto: Conexiones Intradomiciliarias de agua Potable y Saneamiento básico en la ciudad de sincelejo

Personal en obra: Residente de obra, supervisor entrega materiales 1 Inspector de obra, 1 maestro, 12 oficiales, 13 Ayudantes.

Actividades: En el día de hoy se siguio con las actividades de enchafe, instalación de tubería sanitaria, Pañete interno y

se instalaron los aparatos sanitario.

Clima: Lluvia - 6:30AM - 10:00AM
Equipos y Materiales: flexometros, Herramientas menores, dotación del Personal, andamios, Pulidoras, formaletas.

Residente Interventoria

Residente de obra

→ Fecha: 27 Junio Lunes 2022
Hora de Inicio: 9:00AM
Hora de finalización: 5:00PM
Contratista: Consorcio TURQUIA
Interventor: Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S
Proyecto: Conexiones Intradomiciliarias de agua Potable y Saneamiento básico en la ciudad de Sincelejo.

Personal en obra: Residente de obra, supervisor entrega materiales, 1 Inspector de obra, 1 maestro, 12 oficiales, 13 Ayudant

Actividades: En este día se siguio con la actividad de enchafe, instalación de tubería sanitaria, se fundio Plantilla del baño y se instalaron los aparatos sanitario.

Clima: Lluvia 6:00AM - 7:30AM
Equipos y Materiales: flexometros, Herramientas menores, dotación del Personal, andamios, Pulidoras, formaletas.

Residente Interventoria

Residente de obra

Escaneado con CamScanner

Anexo 10. Relación de correspondencia

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA**	CÓDIGO:	**F-GG-11**
		VERSIÓN:	**02**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-12-07**

Informe No. **3** **Fecha Informe** **30/06/2022** **Periodo comprendido entre** **01/06/2022** **y** **30/06/22**

TIPO DE CONTRATO:	Interventoría
NÚMERO DE CONTRATO:	2220585
OBJETO:	Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre.
CONTRATISTA:	Consorcio Turquía
INTERVENTOR:	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
SUPERVISOR:	Juan David Amon

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
29/03/2022	GA-DOMI-001-22	Solicitud documentacion inicial de obra	GAVINCO Ingenieros Consultores	CONSORICO TURQUIA
05/04/2022	GA-DOMI-002-22	Solicitud cumplimiento compromisos de entrega de la documentación inicial	GAVINCO Ingenieros Consultores	CONSORICO TURQUIA
05/04/2022	GA-DOMI-003-22	Traslado correo electrónico, valla institucional para el proyecto de conexiones	GAVINCO Ingenieros Consultores	CONSORICO TURQUIA
06/04/2022	GA-DOMI-004-22	Remisión documentos previos a la firma del Acta de Inicio - Grupo 1: Sincelejo,	GAVINCO Ingenieros Consultores	CONSORICO TURQUIA
06/04/2022	GA-DOMI-005-22	Remisión póliza de garantía única de Cumplimiento y de RCE del contrato de	GAVINCO Ingenieros Consultores	Enterritorio
11/04/2022	GA-DOMI-006-22	Remisión hoja de vida del contrato de Interventoría 2220585	GAVINCO Ingenieros Consultores	Enterritorio
11/04/2022	GA-DOMI-007-22	Remisión requisitos para suscripción de acta de inicio del contrato de	GAVINCO Ingenieros Consultores	Enterritorio
11/04/2022	GA-DOMI-008-22	Remisión requisitos para suscripción de acta de inicio del contrato de obra N°.	GAVINCO Ingenieros Consultores	Enterritorio
18/04/2022	GA-DOMI-009-22	Actividad 1. Chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según la	GAVINCO Ingenieros Consultores	CONSORICO TURQUIA
19/04/2022	GA-DOMI-010-22	Cambio hojas de vida Inspector 1, Inspector 3 y Auxiliar Social del Contrato de	GAVINCO Ingenieros Consultores	Enterritorio
19/04/2022	GA-DOMI-011-22	Remisión plan de inversión de anticipo del contrato de obra firmado.	GAVINCO Ingenieros Consultores	CONSORICO TURQUIA
20/04/2022	GA-DOMI-012-22	Remisión actualización pólizas del contrato de interventoría respecto al Acta de	GAVINCO Ingenieros Consultores	Enterritorio
25/04/2022	GA-DOMI-013-22	Remisión Informe Semanal No. 01 periodo del 13 al 24 de abril de 2022	GAVINCO Ingenieros Consultores	Enterritorio
25/04/2022	GA-DOMI-014-22	Codificación viviendas para diagnósticos del barrio El Poblado	GAVINCO Ingenieros Consultores	CONSORICO TURQUIA
27/04/2022	GA-DOMI-016-22	Solicitud entrega productos Actividad 1. Chequeo y validación de diseño de los	GAVINCO Ingenieros Consultores	CONSORICO TURQUIA
04/04/2022	20222200064831	Socialización de los actores vinculados en la ejecución del Programa de Co-	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consul
13/04/2022	20222200071361	Aprobación del personal mínimo requerido para ejecución del contrato de	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consul
13/04/2022	20222200071371	Entrega documentación para la ejecución del contrato de interventoría No.	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consul
05/04/2022	CONS-TUR-SINC-008	Remisión de soportes preliminares para acta de inicio.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consul
21/04/2022	CONS-TUR-SINC-011	MINUTA DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE PARA	CONSORICO TURQUIA	Enterritorio
29/04/2022	CONS-TUR-SINC-013	Entrega de Productos ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACION DE DISEÑO	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consul
27/04/2022	GA-DOMI-016-22	Solicitud entrega productos Actividad 1. Chequeo y validación de diseño de los	GAVINCO Ingenieros Consultores	CONSORICO TURQUIA
02/05/2022	GA-DOMI-017-22	Remisión Informe Semanal No. 02 periodo del 25 de abril de 2022 al 01 de	GAVINCO Ingenieros Consultores	Enterritorio
03/05/2022	GA-DOMI-018-22	Solicitud disponibilidad de materiales de construcción – Actividad 3. Ejecución	GAVINCO Ingenieros Consultores	CONSORICO TURQUIA
04/05/2022	GA-DOMI-019-22	Remisión Informe Mensual Técnico de Interventoría No. 01 periodo del 13 de	GAVINCO Ingenieros Consultores	Enterritorio
05/05/2022	GA-DOMI-020-22	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-013, Entrega de Productos	GAVINCO Ingenieros Consultores	CONSORICO TURQUIA
05/05/2022	GA-DOMI-021-22	Solicitud remisión soportes de implementación de protocolo de bioseguridad	GAVINCO Ingenieros Consultores	CONSORICO TURQUIA
05/05/2022	GA-DOMI-022-22	Remisión actualización póliza RCE del contrato de interventoría.	GAVINCO Ingenieros Consultores	Enterritorio
05/05/2022	GA-DOMI-023-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-017.	GAVINCO Ingenieros Consultores	Enterritorio
09/05/2022	GA-DOMI-024-22	Solicitud Ajustes productos Actividad 1: chequeo y validación de diseño de los	GAVINCO Ingenieros Consultores	CONSORICO TURQUIA
09/05/2022	GA-DOMI-025-22	Remisión Informe Semanal No. 03 periodo del 02 de mayo de 2022 al 08 de	GAVINCO Ingenieros Consultores	Enterritorio
11/05/2022	GA-DOMI-026-22	Cambio hoja de vida personal del Contrato de Interventoría - Profesional HSEQ.	GAVINCO Ingenieros Consultores	Enterritorio
11/05/2022	GA-DOMI-027-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-018.	GAVINCO Ingenieros Consultores	Enterritorio
13/05/2022	GA-DOMI-028-22	Resp comunicación CONS-TUR-SINC-020	GAVINCO Ingenieros Consultores	CONSORICO TURQUIA
13/05/2022	GA-DOMI-029-22	Solicitud diagnosticos	GAVINCO Ingenieros Consultores	CONSORICO TURQUIA
16/05/2022	GA-DOMI-030-22	Aprobación diseño estructural con observaciones - Actividad 1. Chequeo y	GAVINCO Ingenieros Consultores	Enterritorio
17/08/2022	GA-DOMI-031-22	Remisión Informe Semanal No. 04 periodo del 09 de mayo de 2022 al 15 de	GAVINCO Ingenieros Consultores	Enterritorio
18/05/2022	GA-DOMI-032-22	Solicitud cumplimiento de los compromisos adquiridos en comité de	GAVINCO Ingenieros Consultores	CONSORICO TURQUIA
24/05/2022	GA-DOMI-033-22	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 1. De Interventoría. Periodo facturado del	GAVINCO Ingenieros Consultores	Enterritorio
20/05/2022	GA-DOMI-034-22	Segunda solicitud cumplimiento compromisos comité de seguimiento N°. 5.	GAVINCO Ingenieros Consultores	CONSORICO TURQUIA
24/05/2022	GA-DOMI-035-22	Remisión Informe Semanal No. 05 periodo del 16 de mayo de 2022 al 22 de	GAVINCO Ingenieros Consultores	Enterritorio
24/05/2022	GA-DOMI-036-22	Remision solicitud desembolso anticipo contrato de obra	GAVINCO Ingenieros Consultores	Enterritorio
25/05/2022	GA-DOMI-037-22	Solicitud inclusión para nuevos posible beneficiario del Programa de	GAVINCO Ingenieros Consultores	Alcaldia Sincelejo
26/05/2022	GA-DOMI-038-22	Respuesta comunicaciones CONS-TUR-SINC-029 y CONS-TUR-SINC-028	GAVINCO Ingenieros Consultores	CONSORICO TURQUIA
26/05/2022	GA-DOMI-039-22	Obligaciones actividad 3 ejecución de obra y forma de pago.	GAVINCO Ingenieros Consultores	CONSORICO TURQUIA
09/05/2022	CONS-TUR-SINC-018	CAMBIOS EN EL DOCUMENTO INICIAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consul
10/05/2022	CONS-TUR-SINC-019	Entrega de planos y memorias de casetas tipo.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consul
12/05/2022	CONS-TUR-SINC-020	CANTIDADES DE OBRA – ELEMENTOS ESTRUCTURALES	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consul
11/05/2022	CONS-TUR-SINC-020	Entrega de diagnósticos Paquete 01.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consul
12/05/2022	CONS-TUR-SINC-021	Entrega de diagnósticos Paquete 02.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consul
17/05/2022	CONS-TUR-SINC-022	Entrega de diagnósticos Paquete 03.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consul
18/05/2022	CONS-TUR-SINC-023	Entrega de diagnósticos Paquete 04.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consul
19/05/2022	CONS-TUR-SINC-024	Entrega de diagnósticos Paquete 05	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consul
23/05/2022	CONS-TUR-SINC-025	Entrega de diagnósticos Paquete 06	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consul
23/05/2022	CONS-TUR-SINC-026	Robo de micromedidores Barrio El Poblado, Sincelejo –Sucre.	CONSORICO TURQUIA	VEOLIA
24/05/2022	CONS-TUR-SINC-027	Entrega de diagnósticos Paquete 07.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consul
24/05/2022	CONS-TUR-SINC-028	Escasez de cerámica a nivel nacional	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consul
24/05/2022	CONS-TUR-SINC-029	Cambio especificaciones técnicas cerámica.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consul
26/05/2022	CONS-TUR-SINC-030	Entrega de diagnósticos Paquete 08	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consul

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	CÓDIGO:	F-GG-11
		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-12-07

Informe No. **3** **Fecha Informe** **30/06/2022** **Periodo comprendido entre** **01/06/2022** **y** **30/06/22**

27/05/2022	CONS-TUR-SINC-031	Cambio de especificación técnica ítems 3.27 y 3.28	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consul
27/05/2022	CONS-TUR-SINC-032	Cambio en planimetría enviada de Casetas 1, 2, 3 y 4.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consul
18/05/2022	20222200093481	Aprobación Informe mensual de Interventoría No. 1, correspondiente al mes	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consul
26/05/2022	GA-DOMI-039-22	Obligaciones actividad 3 ejecución de obra y forma de pago.	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
31/05/2022	GA-DOMI-040-22	Complemento y aprobación actividad 1. Chequeo y Validación prototipos	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
31/05/2022	GA-DOMI-041-22	Solicitud inclusión para nuevos posible beneficiario del Programa de	GAVINCO Ingenieros Consultore	ALCALDIA DE SINCELEJO
31/05/2022	GA-DOMI-042-22	Comunicaciones CONS-TUR-SINC-028, CONS-TUR-SINC-029 y CONS-TUR-	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
01/06/2022	GA-DOMI-043-22	Remisión Informe Semanal No. 06 periodo del 23 de mayo de 2022 al 29 de	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
03/06/2022	GA-DOMI-044-22	Almacenamiento inadecuado de materiales de construcción en viviendas	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
03/06/2022	GA-DOMI-045-22	Solicitud mayor disponibilidad de materiales de construcción – Actividad 3.	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
03/06/2022	GA-DOMI-046-22	Atraso cronograma de obra.	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
03/06/2022	GA-DOMI-047-22	Recomendaciones para la ejecución de las obras	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
06/06/2022	GA-DOMI-048-22	Remisión Informe Mensual de Interventoría No. 02 periodo del 01 de mayo de	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
06/06/2022	GA-DOMI-049-22	Comunicaciones CONS-TUR-SINC-034.	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
08/06/2022	GA-DOMI-050-22	Remisión Informe Semanal No. 07 periodo del 30 de mayo de 2022 al 05 de	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
08/06/2022	GA-DOMI-051-22	Solicitud verificación predio en zona de riesgo – manzana 60 lote 8.	GAVINCO Ingenieros Consultore	ALCALDIA DE SINCELEJO
08/06/2022	GA-DOMI-052-22	Solicitud cumplimiento compromisos comité de seguimiento N°. 8.	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
09/06/2022	GA-DOMI-053-22	Solicitud inclusión para nuevos posible beneficiario del Programa de	GAVINCO Ingenieros Consultore	ALCALDIA DE SINCELEJO
10/06/2022	GA-DOMI-054-22	Observaciones ejecución de la obra.	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
10/06/2022	GA-DOMI-055-22	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-035	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
10/06/2022	GA-DOMI-056-22	Solicitud verificación de predio en zona de riesgo	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
15/06/2022	GA-DOMI-057-22	Remisión Informe Semanal No. 08 periodo del 06 de junio de 2022 al 12 de	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
15/06/2022	GA-DOMI-058-22	Solicitud inclusión para nuevos posibles beneficiarios del Programa de	GAVINCO Ingenieros Consultore	ALCALDIA DE SINCELEJO
15/06/2022	GA-DOMI-059-22	Solicitud verificación de predio en zona de riesgo	GAVINCO Ingenieros Consultore	ALCALDIA DE SINCELEJO
15/06/2022	GA-DOMI-060-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-040 del 13 de junio de 2022.	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
15/06/2022	GA-DOMI-061-22	Compromiso de entrega de las 13 viviendas inicialmente intervenidas.	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
22/06/2022	GA-DOMI-062-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-045 del 17 de junio de 2022	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
22/06/2022	GA-DOMI-063-22	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 2. De Interventoría. Periodo facturado del	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
23/06/2022	GA-DOMI-064-22	Remisión Informe Semanal No. 09 periodo del 13 de junio de 2022 al 19 de	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
24/06/2022	GA-DOMI-065-22	Aprobación cambio de especificaciones tecnicas	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
24/06/2022	GA-DOMI-066-22	Solicitud inclusión para nuevos posibles beneficiarios del Programa de	GAVINCO Ingenieros Consultore	ALCALDIA DE SINCELEJO
24/06/2022	GA-DOMI-067-22	Solicitud inclusión para nuevos posibles beneficiarios del Programa de	GAVINCO Ingenieros Consultore	ALCALDIA DE SINCELEJO
28/06/2022	GA-DOMI-068-22	Solicitud verificación de predio en zona de riesgo No. 04	GAVINCO Ingenieros Consultore	ALCALDIA DE SINCELEJO
28/06/2022	GA-DOMI-069-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-049	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
29/06/2022	GA-DOMI-070-22	Solicitud cumplimiento de dimensiones de las placas aéreas de soporte del	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
30/06/2022	GA-DOMI-071-22	Seguimiento Plan de Contingencia.	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
01/07/2022	GA-DOMI-072-22	Solicitud inclusión N°. 7 para nuevos posible beneficiario del Programa de	GAVINCO Ingenieros Consultore	ALCALDIA DE SINCELEJO
01/07/2022	GA-DOMI-073-22	Solicitud verificación de predio en zona de riesgo No. 6	GAVINCO Ingenieros Consultore	ALCALDIA DE SINCELEJO
01/07/2022	GA-DOMI-074-22	CONS-TUR-SINC-053	GAVINCO Ingenieros Consultore	ALCALDIA DE SINCELEJO
01/07/2022	GA-DOMI-075-22	Cambio hojas de vida personal del Contrato de Interventoría.	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
05/07/2022	GA-DOMI-076-22	Respuesta oficio 20222200120441 plan de contingencia	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
05/07/2022	GA-DOMI-077-22	Observaciones unidades de viviendas en ejecución para entrega.	GAVINCO Ingenieros Consultore	CONSORICO TURQUIA
06/07/2022	GA-DOMI-078-22	Remisión Informe Semanal No. 11 periodo del 27 de junio de 2022 al 03 de	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
07/07/2022	GA-DOMI-079-22	Resp oficio 20222200118481	GAVINCO Ingenieros Consultore	Enterritorio
03/06/2022	CONS-TUR-SINC-033	Envìo Paquete 10 - Diagnosticos	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consul
06/06/2022	CONS-TUR-SINC-034	Cambio especificaciones técnicas cerámica.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consul
06/06/2022	CONS-TUR-SINC-035	Envío de documentación para aprobación de desembolso de anticipo	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consul
07/06/2022	CONS-TUR-SINC-036	Respuesta oficio GA-DOMI-044-22.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consul
09/06/2022	CONS-TUR-SINC-038	Entrega de diagnósticos Paquete 11.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consul
10/06/2022	CONS-TUR-SINC-039	Respuesta oficio GA-DOMI-046-22.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consul
13/06/2022	CONS-TUR-SINC-040	Solicitud de aprobación de hoja de vida de residente de obra Actividad 3.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consul
16/06/2022	CONS-TUR-SINC-041	Envío diagnósticos Paquete 12	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consul
15/06/2022	CONS-TUR-SINC-042	Respuesta oficio GA-DOMI-047-22 - Recomendaciones para la ejecución de	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consul
16/06/2022	CONS-TUR-SINC-044	Entrega de diagnósticos Paquete 13.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consul
17/06/2022	CONS-TUR-SINC-045	Respuesta oficio GA-DOMI-054-22 Observaciones ejecución de la obra.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consul
18/06/2022	CONS-TUR-SINC-046	Carta relación de beneficiarios que no cuentan con documento FOVIS	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consul
19/06/2022	CONS-TUR-SINC-047	Entrega de diagnósticos Paquete 14a	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consul
20/06/2022	CONS-TUR-SINC-048	Entrega de diagnósticos Paquete 14b	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consul
21/06/2022	CONS-TUR-SINC-049	Cambio de Profesional Social Proyecto Conexiones Intradomiciliarias	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consul
22/06/2022	CONS-TUR-SINC-050	Entrega de diagnósticos Paquete 15	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consul
23/06/2022	CONS-TUR-SINC-051	Entrega de diagnósticos Paquete 15a	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consul
24/06/2022	CONS-TUR-SINC-052	Información Contrato de Alcantarillado barrio Puerto Arturo	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consul
25/06/2022	CONS-TUR-SINC-053	Entrega de diagnósticos Paquete 15c	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consul
22/06/2022	20222200117251	Aprobación Informe mensual de Interventoría No. 2, correspondiente al mes de	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consul

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA**	CÓDIGO:	**F-GG-11**
		VERSIÓN:	**02**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-12-07**

Informe No. **3** **Fecha Informe** **30/06/2022** **Periodo comprendido entre** **01/06/2022** **y** **30/06/22**

Firma:

Nombre: Edgar A. Aragon O.
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo 11. Relación de documentos

Contratista

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**RELACIÓN DE DOCUMENTOS**	CÓDIGO:	**F-GG-19**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2010-10-12**

CONTRATO No. :	2220577
OBJETO:	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
SUPERVISOR:	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

No.	Título del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado por	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
1	HOJAS DE VIDA PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO	1	1		Interventoria		X	X	
2	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN PROJECT CON SU FLUJO DE INVERSIÓN EN EXCEL.	1	1		Interventoria		X	X	
3	PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	1	1		Interventoria		X	X	
4	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL	1	1		Interventoria		X	X	
5	PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL.	1	1		Interventoria		X	X	
6	PLAN DE CALIDAD	1	1		Interventoria		X	X	
7	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD APROBADO POR LA ARL Y RADICADO EN EL ENTE TERRITORIAL.	1	1		Interventoria		X	X	
8	ORGANIGRAMA GENERAL DEL PROYECTO	1	1		Interventoria		X	X	
9	METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO	1	1		Interventoria		X	X	
10	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y LISTADO DE PRECIOS DE LA TOTALIDAD DE LOS INSUMOS PRESENTADOS EN LA OFERTA ECONOMÍA PARA LA ACTIVIDAD 3	1	1		Interventoria		X	X	
11	PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO	1	1		Interventoria		X	X	
12	FLUJO DE INVERSIÓN DEL CONTRATO	1	1		Interventoria		X	X	

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 05 días del mes abril del 2022.

ENTREGA	RECIBE
NOMBRE: JOSE IGNACIO CARDENAS MENESES (R/L)	**NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO (R/L)**
Fecha: 12 de abril de 2022	Fecha: 12 de abril de 2022

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

Interventoría

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	RELACIÓN DE DOCUMENTOS	CÓDIGO:	F-GG-19
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2010-10-12

CONTRATO No. :	2220585
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
SUPERVISOR:	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

No.	Título del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado por	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
1	MATRIZ DE EVALIACION DE ENCUETAS PCI, SINCELEJO, SUCRE.	1	1		Juan David Amon R			X	
2	CARTA DE PRESENTACION PCI, MUNICIPIO DE SINCELEJO, SUCRE.	1	1		Juan David Amon R		X	X	
3	RESUMEN PROYECTO INTRADOMICILIARIAS.	1	1		Juan David Amon R		X	X	
4	CERTIFICACION ESTADO DE LEGALIDAD DE LOS BARRIOS.	1	1		Juan David Amon R		X	X	
5	CERTIFICADO NO ZONA DE RIESGO BARRIO EL POBLADO	1	1		Juan David Amon R		X	X	
6	CERTIFICADO EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS BARRIO EL POBLADO	1	1		Juan David Amon R		X	X	
7	PLAN DE GESTION SOCIAL	1	1		Juan David Amon R	X		X	
8	ESPECIFICACIONES TECNICAS	1	1		Juan David Amon R	X		X	Especificaciones técnicas generales, Capitulo I, Capitulo II, Capitulo III, Capitulo IV,
9	FORMATOS PCI								PCI-001_Lista de chequeo para aprobación Diagnóstico
									PCI-002_Lista de chequeo para Aprobación Intervención
									PCI-003 Encuesta portenciales beneficiarios
									PCI-004_Carta de Compromiso Prop
									PCI-004a_Acta de rechazo
									PCI-005_Carta de Concertación propiet o poseedor
									PCI-006_Matriz_Suministrada por Municipio
									PCI-007_Plan de intervención Beneficiario. Presupuesto
									PCI-008_Plan de intervención. Presupuesto
									PCI-009_Acta de concertacion para la intervención
									PCI-010_Autorizacion inicio de obra
									PCI-011_Ajustes al Diagnóstico inicial
									PCI-012 Cambio Plan de intervención
									PCI-013_Acta de pruebas Técnicas
									PCI-014_Acta Recibo beneficiario6
									PCI-015_Acta de cierre e historico vivienda
									PCI-016_Verificación de viviendas visitadas
									PCI-017_Cronograma general de ejecución
									PCI-018_Cronograma especifico de ejecución
									PCI-019 Lineamientos para la inclusión de potenciales beneficiarios
									PCI-020 Plantilla Informe Quincenal
									PCI-021_Informe Mensual
									PCI-022_Lista de asistencia beneficiarios
									PCI-023_Lista de Convocatoria a beneficiarios
									PCI-024_ Solicitud del Ciudadano PQR
									PCI-025_Registro y Seguimiento PQR
									PCI-026_Criterios de planeación, Ej y Ev Reuniones con la comunidad
									PCI-027_Plantilla Agenda de Capacitación Educación Sanitaria
									PCI-028_Orientaciones y formatos MEMORIAS PCI
									PCI-029_Indicador de Empleo Mensual

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 05 días del mes abril del 2022.

ENTREGA	RECIBE
NOMBRE: JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ	**NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO (R/L)**
Fecha: 05 de abril de 2022	Fecha: 05 de abril de 2022

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

Entrega de informe mensual

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**RELACIÓN DE DOCUMENTOS**	CÓDIGO:	**F-GG-19**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2010-10-12**

CONTRATO No. :	2220585
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
SUPERVISOR:	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

No.		Título del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado por	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
1		**INFORME MENSUAL N°. 3 V-0**	1	1		Juan David Amon R			X	
	CONTENIDO INFORME MENSUAL N°. 3 V-1	1. RESUMEN EJECUTIVO	N/A						X	
		F-GG-08 - Informe Ejecutivo Mensual de Interventoría	N/A						X	
		2. INFORME BÁSICO	N/A						X	
		2.1 ANEXO ADMINISTRATIVO	N/A						X	
		F-GG-04 - Acta de Vecindad	N/A						X	
		F-GG-09 - Acta de seguimiento de contrato	N/A						X	
		F-GG-09 - Acta de seguimiento de contrato - Actas de aprobación.	N/A						X	
		F-GG-10 - Control de personal	N/A						X	
		F-GG-11 - Relación de correspondencia	N/A						X	
		PCI-009 - Actas de concertación	N/A						X	
		2.2. ANEXO TECNICO	N/A						X	
		F-GG-19 - Relación de documentos	N/A						X	
		F-GG-20 - Relación de planos	N/A						X	
		F-GG-24 - Control de seguridad industrial	N/A						X	
		F-GG-25 - Formato de registro fotográfico	N/A						X	
		F-GG-21 - Análisis de Precios Unitarios	N/A						X	
		Cumplimiento normatividad ambiental	N/A						X	
		2.3. ANEXO PRESUPUESTAL	N/A						X	
		F-GG-32 - Acta de recibo parcial y balance presupuestal	N/A						X	
		F-GG-33 - Acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos	N/A						X	
		Fotocopia de la bitácora o libro de obra de toda la ejecución del proyecto.	N/A						X	
		Informe de gestión social del proyecto.	N/A						X	
		Planillas de Seguridad Social	N/A						X	
	ANEXOS INFORME MENSUAL N°. 3 V-1	Anexo 0. Aplicación y cumplimiento de requisitos del informe mensual de interventoría	N/A						X	
		Anexo 1. Informe Ejecutivo Mensual de Interventoría (Formato F-GG-08)	N/A						X	
		Anexo 2. Contrato de Interventoría y Contratista	N/A						X	
		Anexo 3. Pólizas contrato de Obra e Interventoría	N/A						X	
		Anexo 4. Acta de inicio contratos de Obra e Interventoría	N/A						X	
		Anexo 5. Análisis de Precios Unitarios	N/A						X	
		Anexo 6. Plan de inversión del anticipo	N/A						X	
		Anexo 7. Acta de seguimiento de contrato	N/A						X	
		Anexo 8. Formato de registro fotográfico	N/A						X	
		Anexo 9. Bitácora de Obra	N/A						X	
		Anexo 10. Relación de correspondencia	N/A						X	
		Anexo 11. Relación de documentos	N/A						X	
		Anexo 12. Relación de planos	N/A						X	
		Anexo 13. Acreditación pagos al sistema de seguridad social	N/A						X	
		Anexo 14. Control de personal	N/A						X	
		Anexo 15. Control de seguridad industrial	N/A						X	
		Anexo 16. Cumplimiento ambiental	N/A						X	
		Anexo 17. Informes semanales	N/A						X	
		Anexo 18. Informe de gestión social	N/A						X	
		Anexo 19. Diagnósticos aprobados.	N/A						X	
		Anexo 20. Certificaciones de materiales.	N/A						X	
		Anexo 21. Acta de Vecindad	N/A						X	
		Anexo 22. Actas de concertación	N/A						X	
		Anexo 23. Acta de recibo parcial y balance presupuestal de interventoría	N/A						X	

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 07 días del mes julio del 2022.

ENTREGA	**RECIBE**
NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO (R/L)	**NOMBRE: JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ**
Fecha: 07 de julio de 2022	Fecha: 07 de julio de 2022

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

Anexo 12. Relación de planos

Contratista

	RELACIÓN DE PLANOS	CÓDIGO	F-GG-20
enterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-12

CONTRATO No. :	2220577
OBJETO:	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
SUPERVISOR:	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

No.	Plano #	Versión	Fecha	Contenido	Remplaza Plano #	Nueva Versión	Aprobado por	Observaciones
1	PLANO 1-2	1	abr-22	PLANTA DE CIMIENTOS, PLANTA DE VIGAS DE CUBIERTA, DETALLES DE VIGAS CIMIENTO Y DE CUBIERTA, CORTE ESTRUCTURAL, PLANTILLA, LOSA MACIZA Y MACHONES. DE CASETAS T1 Y T2. Y DETALLES DE COLUMNA DE TANQUE.	N/A	N/A	Interventoría	Producto Actividad 1. Chequeo y validación de prototipos.
2	PLANO 2-2	1	abr-22	PLANTA DE CIMIENTOS, PLANTA DE VIGAS DE CUBIERTA, DETALLES DE VIGAS CIMIENTO Y DE CUBIERTA, CORTE ESTRUCTURAL, PLANTILLA, LOSA MACIZA Y MACHONES. DE CASETAS T1 Y T2	N/A	N/A	Interventoría	Planos proceso INA 032 2021

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 05 días del mes abril del 2022.

ENTREGA	RECIBE
NOMBRE: JOSE IGNACIO CARDENAS MENESES (R/L)	**NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO**
Fecha: 31 de mayo de 2022	Fecha: 31 de mayo de 2022

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

	RELACIÓN DE PLANOS	CÓDIGO	F-GG-20
enterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-12

CONTRATO No. :	2220577
OBJETO:	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
SUPERVISOR:	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

No.	Plano #	Versión	Fecha	Contenido	Remplaza Plano #	Nueva Versión	Aprobado por	Observaciones
1	CASETA	1		Tipologia caseta Tipo I	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021
2	CASETA	1		Tipologia caseta Tipo II	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021
3	CASETA	1		Tipologia caseta Tipo III	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021
4	CASETA	1		Tipologia caseta Tipo IV	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 05 días del mes abril del 2022.

ENTREGA	RECIBE
NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO	**NOMBRE: JOSE IGNACIO CARDENAS MENESES (R/L)**
Fecha: 05 de abril de 2022	Fecha: 05 de abril de 2022

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

Interventoría

enterritorio	RELACIÓN DE PLANOS	CÓDIGO	F-GG-20
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-12

CONTRATO No. :	2220585
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
SUPERVISOR:	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

No.	Plano #	Versión	Fecha	Contenido	Remplaza Plano #	Nueva Versión	Aprobado por	Observaciones
1	CASETA	1		Tipologia caseta Tipo I	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021
2	CASETA	1		Tipologia caseta Tipo II	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021
3	CASETA	1		Tipologia caseta Tipo III	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021
4	CASETA	1		Tipologia caseta Tipo IV	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 05 días del mes abril del 2022.

ENTREGA	RECIBE
NOMBRE: JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ	**NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO (R/L)**
Fecha: 05 de abril de 2022	Fecha: 05 de abril de 2022

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

	RELACIÓN DE PLANOS	CÓDIGO	F-GG-20
enterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-12

CONTRATO No. :	2220577
OBJETO:	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
SUPERVISOR:	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

No.	Plano #	Versión	Fecha	Contenido	Remplaza Plano #	Nueva Versión	Aprobado por	Observaciones
1	PLANO 1-2	1	abr-22	PLANTA DE CIMIENTOS, PLANTA DE VIGAS DE CUBIERTA, DETALLES DE VIGAS CIMIENTO Y DE CUBIERTA, CORTE ESTRUCTURAL, PLANTILLA, LOSA MACIZA Y MACHONES. DE CASETAS T1 Y T2. Y DETALLES DE COLUMNA DE TANQUE.	N/A	N/A	Interventoría	Producto Actividad 1. Chequeo y validación de prototipos.
2	PLANO 2-2	1	abr-22	PLANTA DE CIMIENTOS, PLANTA DE VIGAS DE CUBIERTA, DETALLES DE VIGAS CIMIENTO Y DE CUBIERTA, CORTE ESTRUCTURAL, PLANTILLA, LOSA MACIZA Y MACHONES. DE CASETAS T1 Y T2	N/A	N/A	Interventoría	Planos proceso INA 032 2021

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 05 días del mes abril del 2022.

ENTREGA	RECIBE
NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO	**NOMBRE: JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ**
Fecha: 31 de mayo de 2022	Fecha: 31 de mayo de 2022

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

Anexo 13. Acreditación pagos al sistema de seguridad social

Contratista

consorcio Turquía

NIT.901570934-7

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA

CERTIFICACIÓN

Certifico que la persona jurídica **CONSORCIO TURQUIA** con **NIT No. 901.570.934 - 7,** ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante los últimos (6) meses.

Expedida el veinte (06) del mes de junio 2022

JOSE IGNACIO CARDENAS MENESES
C.C No 1.117.491.406 DE FLORENCIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TURQUIA

JAIME RICARDO MARQUEZ CONTRERAS
T.P N[redacted]
C.C. No. 72.245.947 DE BARRANQUILLA
CONTADOR PUBLICO

Sincelejo Sucre Barrio Ford Cll 16 14ª 71 local 2
Correo electrónico: coordinadorturquiapci@gmail.com,
Teléfono: 3142996037-3107480482

Interventoría

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NIT 900.916.608-4

CERTIFICAN QUE:

A la fecha, la firma **GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**, Se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar de sus empleados, durante los últimos doce (12) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide a solicitud de la compañía a los 02 días del mes de junio del 2022.

Atentamente,

LUZ ANDREA FAJARDO C.
Representante Legal
GAVINCO S.A.S.

MARIA ALEJANDRA GARZON RUBIO
Revisor Fiscal
T.P 260106-T

Anexo 14. Control de personal

Interventoría

	CONTROL DE PERSONAL	CÓDIGO:	F-GG-10
enterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/05/2022 Y EL 31/05/2022 PLAZO: 8 meses

INTERVENTOR: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS CONTRATO No. 2220577

SUPERVISOR JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ CONTRATO No. 2220585

PERSONAL DEL CONTRATISTA (INTERVENTORIA)

FECHA	MES 1																													OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
CARGO																																
Director de Interventoría	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Actividad 1 y 2
Residente de Interventoría	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Actividad 1 y 2
Especialista en Estructuras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Actividad 1 y 2
Profesional Social	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Actividad 1 y 2
Profesional HSEQ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Actividad 1 y 2
Especialista Hidrosanitario	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Actividad 1 y 2
Profesional Costos y Presupuesto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Actividad 1 y 2
Auxiliar social	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Actividad 1 y 2
Inspector de Interventoría	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Actividad 1 y 2
Inspector de Interventoría	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Actividad 1 y 2
Inspector de Interventoría																																
PERSONAL CONTRATISTA	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**TOTAL PERIODO** 310

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE*																															SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA																																**0**	**0,00%**	
De la región																																0	0,00%	
De fuera de la región																																0	0,00%	
MANO OBRA CALIFICADA																																**0**	**0,00%**	
De la región																																0	0,00%	
De fuera de la región																																0	0,00%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS																																**0**	**0,00%**	
De la región	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		120	38,71%	**S**
De fuera de la región	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		180	58,06%	**S**
POBLACIÓN VULNERABLE																																**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social																																0	0,00%	
En condición de desplazamiento																																0	0,00%	
MUJERES																																**0**	**0,00%**	
Mano de Obra no Calificada																																0	0,00%	
Mano de Obra Calificada																																0	0,00%	
Profesionales - Técnicos	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		150	48,39%	**S**
PROVEEDORES																																		
Local																																		
Nacional																																		
Internacional																																		

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JAIRO ALONSO ZORRO ROA identificado(a) con CC 1031120730

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-07	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-06	30

Este certificado se expide el día 2022-07-05 a las 10:19.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JAIRO ANDRES MEZA ROSAS identificado(a) con CC 13874430

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-07	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-06	30

Este certificado se expide el día 2022-07-05 a las 10:17.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JULY PAULIN RIOS ANAYA identificado(a) con CC 1102813002

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-07	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-06	30

Este certificado se expide el día 2022-07-05 a las 10:18.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LEIDER DE JESUS SUAREZ OZUNA identificado(a) con CC 1103109623

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	EPS	CCFC33	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-07	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-06	30

Este certificado se expide el día 2022-07-05 a las 10:43.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para RAFAEL ANTONIO LOPEZ MOLINA identificado(a) con CC 1102874551

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	EPS	CCFC33	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-07	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-06	30

Este certificado se expide el día 2022-07-05 a las 10:44.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA identificado(a) con CC 11052258

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-07	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-06	30

Este certificado se expide el día 2022-07-05 a las 10:19.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SANDRA PATRICIA CONTRERAS NAVARRO identificado(a) con CC 1102854339

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-07	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-06	30

Este certificado se expide el día 2022-07-05 a las 10:17.

Certificado de Aportes

Se certifica que CONSORCIO BIENESTAR COMUNITARIO identificado(a) con NI 901348892 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SINDY LORENA ESTUPIÑAN BALAGUERA identificado(a) con CC 1019085903

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9436176628	1508796967	E	2022-06-16	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-06	30
9436176628	1508796967	E	2022-06-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-05	30
9436176628	1508796967	E	2022-06-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-05	30
9436176628	1508796967	E	2022-06-16	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-05	30
9436176628	1508796967	E	2022-06-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-05	30
9436176628	1508796967	E	2022-06-16	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-05	30
9436176628	1508796967	E	2022-06-16	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-05	30
9436176628	1508796967	E	2022-06-16	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-05	30

Este certificado se expide el día 2022-07-05 a las 10:46.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para YOJAIRA ISABEL MEZA SUAREZ identificado(a) con CC 64742516

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-07	3
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-06	3
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-06	3
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-06	3
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-06	3
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-06	3
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-06	3
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-06	3

Este certificado se expide el día 2022-07-05 a las 10:42.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO identificado(a) con CC 1022363189

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-07	28
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-07	2
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-06	28
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-06	2
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-06	28
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-06	2
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-06	28
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-06	2
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-06	28
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-06	2
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-06	28
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-06	2
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-06	28
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-06	2
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-06	28
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-06	2

Este certificado se expide el día 2022-07-05 a las 10:16.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES identificado(a) con CC 1049796249

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-07	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-06	30
9436890376	1536655447	E	2022-07-05	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-06	30

Este certificado se expide el día 2022-07-05 a las 10:20.

Contratista

enterritorio	**CONTROL DE PERSONAL**	CÓDIGO:	**F-GG-10**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/06/2022 Y EL 30/06/2022 PLAZO: 8 meses

CONTRATISTA: Consorcio Turquia — CONTRATO No. 2220577

INTERVENTOR: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS — CONTRATO No. 2220585

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES 3																													OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
CARGO																																
Especialista estructural	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Actividad 1, 2 y 3
Profesional tecnico de diadnosticos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Actividad 2
Especialista Hidrosanitario	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Actividad 2 y 3
Profesional costos y presupuesto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Actividad 1, 2 y 3
Profesional Social	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Actividad 1, 2 y 3
Director de obra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Actividad 1, 2 y 3
Residente de obra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Actividad 2y 3
Profesional de calidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Actividad 2 y 3
Tecnico PGIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Actividad 2 y 3
Profesional encuestador	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		Actividad 2
supervisor de materiales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Actividad 3
Maestro de obra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Actividad 3
oficiales	11	11	11	11	11	11	11	11	8	11	10	10	8	4	8	7	14	13	13	13	12	13	13	11	13	13	13	12	12	14		Actividad 3
ayudantes	15	15	15	15	15	15	15	15	12	15	12	12	11	8	13	12	19	18	18	18	18	18	18	17	18	18	18	16	16	18		Actividad 3
almacenista	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Actividad 3
herrero	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Actividad 3
Auxiliar de herrero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Auxiliar de bodega	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		Actividad 3
																																Actividad 3
PERSONAL CONTRATISTA	**55**	**55**	**55**	**55**	**55**	**55**	**55**	**55**	**49**	**55**	**51**	**51**	**48**	**44**	**53**	**51**	**65**	**63**	**63**	**63**	**61**	**62**	**62**	**59**	**62**	**62**	**62**	**59**	**59**	**63**	**0**	**TOTAL PERIODO**	**1707**

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE*																															SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA																																**0**	**0,00%**	
De la región	37	37	37	37	37	37	37	37	31	37	33	33	30	23	32	30	44	42	42	42	41	42	42	39	42	42	42	39	39	43		1126	65,96%	
De fuera de la región	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0,00%	
MANO OBRA CALIFICADA																																**0**	**0,00%**	
De la región	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	21	21	21	21	21	21	21	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		581	34,04%	
De fuera de la región	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0,00%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS																																**0**	**0,00%**	
De la región	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		240	14,06%	
De fuera de la región	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0,00%	
POBLACIÓN VULNERABLE																																**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social																																0	0,00%	
En condición de desplazamiento																																0	0,00%	
MUJERES																																**0**	**0,00%**	
Mano de Obra no Calificada																																0	0,00%	
Mano de Obra Calificada	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		230	13,47%	
Profesionales - Técnicos	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		230	13,47%	
PROVEEDORES																																		

	CONTROL DE PERSONAL	CÓDIGO:	F-GG-10
enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/06/2022 Y EL 30/06/2022 PLAZO: 8 meses

CONTRATISTA: Consorcio Turquia CONTRATO No. 2220577

INTERVENTOR: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS CONTRATO No. 2220585

Local				
Nacional				
Internacional				

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre: Edgar A. Aragon O.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo 15. Control de seguridad industrial

	CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	CÓDIGO:	F-GG-24
enterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-19

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA					
NÚMERO DE CONTRATO:	2220585	**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL**	01/06/2022	**Y EL**	30/06/2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA					
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES					

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Bueno	Deficiente	
MAQUINARIA - EQUIPO			N/A, en el periodo evaluado el contratista no realizó trabajos con maquinarias y equipos.
- Estado del equipo			N/A
- Regularidad del mantenimiento			N/A
- Vibraciones /Ruidos			N/A
- Protecciones / Guardas / Frenos			N/A
- Idoneidad operarios			N/A
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
- Dotación completa	X		Durante el periodo las instalaciones del campamento principal y bodegas se mantuvieron ordenadas y con un correcto almacenamiento de materiales. Estos cuentan con equipos de atencion de emergencias.
- Buen estado	X		
- Fácil acceso y operación	X		Se hace claridad que la bodega localizada en el barrio El Poblado presenta problemas de acceso en dias de lluvias, dado que las vias y calles del barrio no estan en buen estado.
DOTACIÓN DEL PERSONAL			
- Dotación completa	X		Durante el periodo se observó al personal laborando con los EPP requeridos de acuerdo a las actividades realizadas.
- Buen estado	X		
- Uso según zona de trabajo	X		
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			
- Uso permanente	X		Se demarcan los sitios donde se esta interviniendo y los materiales se mantinen señalizados y demarcados. Se trabaja en condicones óptimas de iluminación.
- Uso según zona de trabajo	X		
VIGILANCIA			
- Personal suficiente	X		Se mantuvo personal suficiente para la vigilancia en el area administrativa y en el campamento
- Diurna	X		
- Nocturna	X		
EMERGENCIAS			
- Convenio centro de asistencia	X		Todo el personal que igresa es afiliado a seguridad social integral.
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARP	X		

Firma:

Nombre: Edgar A. Aragón O.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo 16. Cumplimiento ambiental

CONTROL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA				
NÚMERO DE CONTRATO:	2220585	**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL**	01/06/2022	**Y EL**	30/06/2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA				
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES				

DESCRIPCIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
PERMISOS Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES			
Se cuenta con licencia ambiental y registro minero de las canteras donde se extare el material petereo	x		El Contratista cuenta con la licencia ambiental de la cantera que le suministra materiales, la cual fue otorgada por CARSUCRE, mediante Resolucion N° 1054 del 22 de mayo de 2016 y registro minero N°FFU-142 del 16 de febrero de 2010 otorgado por la Agencia Nacional Minera.
Cuenta con autorizacion para la disposicion de RCD	x		Los escombros que se generan son donados a la comunidad para relleno de patios o lotes con previa solicitud del propietario.
MAJEJO DE SEÑALIZACION			
Los frentes de trabajo se encuentran señalizados y demarcados	X		
Los materiales almacenados en los frentes de obra están ubicados y acordonados dentro de la señalización del frente de obra y no deberán obstaculizar el tránsito vehicular y peatonal.	X		Sin embargo, el Contratista en los primeros días en los que se iniciaron las intervenciones a las viviendas y que los materiales eran trasladados y almacenados en las mismas, se presentaron algunas falencias en cuanto al almacenamiento inadecuado de los materiales, razón por la cual la Interventoría mediante oficio N° GA-DOMI-044-22 de fecha junio 03 de 2022 solicita al Contratista realizar una correcta disposición y almacenamiento de cada uno de los materiales de obra implementando las medidas de señalización y delimitación requeridas
Los materiales de obra y los escombros, se ubicarán en sitios que no interfieran con el tránsito peatonal.	X		
MANEJO DE MAQUINARIA, VEHICULOS Y EQUIPOS			
Los vehículos que se encuentran operando actualmente en el proyecto cuentan con las revisiones técnico-mecánicas, vigentes y expedidas en un sitio autorizado por la autoridad competente.	X		Los vehicuolos cuentan con revision tecnomecanica vigente.
Las volquetas utilizan carpas para cubrir los materiales para la construccion el transporte de los mismos.	X		Se cumple este aspecto.
Las operaciones de mantenimiento de la maquinaria se adelantan únicamente en sitios autorizados	X		
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS			
Se cuenta con recipientes adecuados para el almcacenamiento y separacion de los residuos solidos que se generen en el proyecto.	X		Se cuentan con puntos ecologicos en los frentes de trabajo
se realiza disposicion final adecuada de los residuos generados en el proyecto	X		
CONTROL DE AGREGADOS PETREOS			
Se realiza un correcto almacenamiento de los materiales petreos que se utilizan en la ejecucion de actividades constructivas.	X		Los materiales petreos se acopian y almacenan de forma correcta en el campamento y bodega localizada en el Barrio El Poblado.
Los materiales dispuestos temporalmente serán cubiertos para evitar emisiones a la atmosfera y arrastre por efectos de la lluvia	X		Se observo cubrimiento de los materiales en el periodo evaluado.
Los sitios de acopio de materiales granulares se encuentran retirados de cuerpos de agua o zonas de vegetación.	X		

El cemento es acopiado en un lugar seco y aislados del suelo.	X		Se cumple con este aspecto.
CAMPAMENTOS Y AREA DE ALMACENES			
El campamento o almcenes se encuentran ordenados, aseados y señalizados de forma correcta	X		El campamento principal y la bodega localizada en el Barrio El Poblado, se mantuvieron ordenados y se evidencio almacenamiento adecuado de materiales.
El campamento cuenta con equipos para control de incendios –extintores	X		Se cuenta con punto de atencion de emergencias
El campamento cuenta con punto de atencion de primeros auxilios	X		Se cuenta con punto de primeros auxilios
MANEJO DE ESCOMBROS			
Ese realiza un manejo adecuado de los escombros que se generan en el proyecto	X		Se generan pocos escombros. Estos son reutilizados para el relleno de patios o lotes. Aveces para calles en mal estado.
CAPACITACIONES			
Se realiza capacitación permanente, para sensibilizar y evitar acciones que atenten contra el equilibrio ambiental de la zona donde se desarrolla el proyecto.	X		Se realizaron charlas y capacitaciones en materia ambiental duarante el periodo.

Firma: _____

Nombre: Edgar A. Aragon O.

Director de Interventoria

Anexo 17. Informes semanales

Bogotá D.C, 08 de junio de 2022

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial FECHA 8/06/2022 HORA: 9:52:40 a. m.
20224300216572

Señor
JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
Supervisor
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio
Calle 26 N°. 13-19
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Interventoría N°. 2220585 "Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre"**

Asunto: **Remisión Informe Semanal No. 07 periodo del 30 de mayo de 2022 al 05 de junio de 2022**

Apreciado señor,

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, anexo, se remite el informe semanal de Interventoría No. 07 del contrato de la referencia para el período comprendido entre el 30 de mayo de 2022 al 05 de junio de 2022.

Anexo se remite como soporte al Informe Semanal N°. 7, Acta de seguimiento 7, Acta de comité de aprobación No. 4, bitácora de obra, lista de chequeo seguimiento estado de salud, informe social, resumen de avance y Matriz Tres Momentos.

Cordialmente,

EDGAR ALFONSO ARAGÓN OTERO
Director de Interventoría
Anexos: Lo enunciado en sesenta y tres (63) folios y archivos en magnético.
C.C.: Ing. Juan David Amón – Supervisor del contrato Convenio Inter administrativo 221005; Enterritorio.
Archivo
Elaboró: MJ
Revisó: EAO

INFORME SEMANAL

Cra. 48 No. 101A – 29 Bogotá, Colombia Tel: (57 1) 236 7974 – 621 5383
E-mail: info@gavinco.com www.gavinco.com

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 06

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **30/05/2022** al **05/06/2022** Fecha **06/06/2022**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CODIGO PROYECTO	2220577			
OBJETO DEL PROYECTO	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre.			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO**	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO
GERENCIA A CARGO	GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1			
SUPERVISOR	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ			
ESTADO DEL PROYECTO	En ejecución.			

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2220577		
Contratista	CONSORCIO TURQUIA		
Valor inicial	$ 5.034.941.972,00		
Valor actual	$ 5.034.941.972,00		
Variación del valor	$ -		
Fecha de Inicio	13/04/2022		
Plazo inicial (Días)	244 Días		
Plazo actual (Días)	244 Días		100,00%
Variación en plazo	Días		
Fecha Contractual de terminación	13/12/2022		
Tiempo Transcurrido (días)	53		21,72%
Días remanentes del Contrato	190		77,87%
Acumulado a última acta pagada	$ -		
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ -		

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.	2220585		
Interventor	GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S.		
Valor inicial	$ 542.723.071,00		
Valor actual	$ 542.723.071,00		
Variación del valor	$ -		
Fecha de Inicio	13/04/2022		
Plazo inicial	244 Días		
Plazo actual	244 Días		100,00%
Variación en plazo	Días		
Fecha Contractual de terminación	13/12/2022		
Ejecución del Contrato	53		21,72%
Días remanentes del Contrato	190		77,87%
Acumulado a última acta pagada	$ -		
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ -		

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 5.034.941.972,00

Semáforo

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 153.995.319,49	3,06%	$ 31.216.640,23	0,62%	-$ 122.778.679,27	-2,44%
Durante el Periodo	$ 262.625.632,65	5,22%	$ 18.492.082,00	0,37%	-$ 244.133.550,65	-4,85%
Acumulado a la Fecha	**$ 416.620.952,14**	**8,27%**	**$ 49.708.722,23**	**0,99%**	**-$ 366.912.229,91**	**-7,29%**

Desviación en días: -18 Días

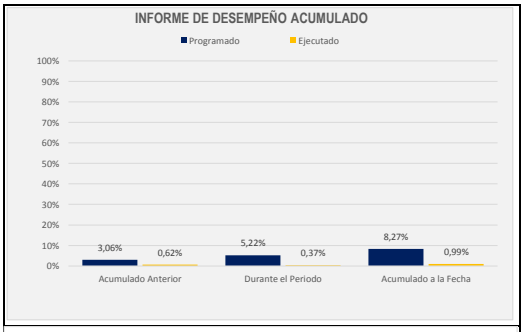

Observaciones al desempeño del proyecto


** **Actividad 1.** Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquia. Aprobado por interventoría con cartas GA-DOMI-040-22 del día 31 de mayo de 2022 y radicado en ENTerritorio bajo el N°. 20224300206752 y GA-DOMI-030-22 radicado N°. 20224300189742.*


** **Actividad 2.** Se han realizado un total de 403 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria, a la fecha de corte del informe semanal se han presentado a esta Interventoría, por el Contratista de obra, un total de 184 diagnósticos, de los cuales se han aprobados 142 diagnósticos acumulados, y 40 se enviaron a observación. En cuanto a las 219 visitas el Consorcio Turquía se encuentra organizando la documentación.*

** **Actividad 3.** Se han iniciado actividades de acuerdo con la programación de obra, el cual se tiene proyectado como fecha de inicio el día 25 de mayo de 2022. El Contratista de Obra comenzó a transportar materiales a las viviendas a intervenir, que a corte de este informe se llevan intervenidas 13 viviendas.*

** **Actividad 4.** Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas objeto del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado. por otra parte se han recepcionado 8 solicitudes de inclusión.*

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

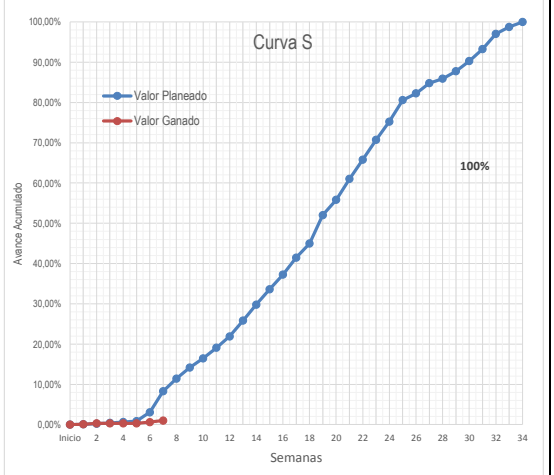

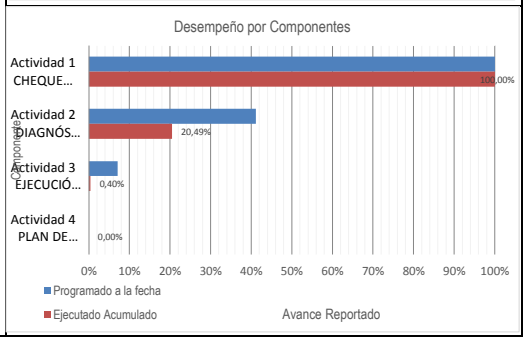

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)

Se ajusta la curva S del proyecto conforme a la capacitación dada el 28 de abril de 2022 por parte del supervisor de ENTerritorio.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado %	Ejecutado %	Desviación %	Semáforo
Acumulado Anterior	3,06%	0,62%	-2,44%	
Durante el Periodo	5,22%	0,37%	-4,85%	
Acumulado a la Fecha	**8,27%**	**0,99%**	**-7,29%**	




AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 5.034.941.972,00	$ 5.034.941.972,00	$ -	$ 981.956.213,58	$ -	$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
0	$ -	0,00%	0	$ -	0,00%	N/A	$ -







AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR


Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 542.723.071,00	$ 542.723.071,00	$ -	N/A	N/A	#¡VALOR!

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
0	$ -	0,00%	0	$ -	0,00%	N/A	$ -

ANÁLISIS DE VALOR CONTRACTUAL | ESTADO ANTICIPO | ESTADO FINANCIERO DEL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 06

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **30/05/2022** al **05/06/2022** Fecha **06/06/2022**









OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

Actividad 1. Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, se presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquía.

Actividad 2. Se han realizado un total de 403 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria. De acuerdo a la fecha de corte del presente informe semanal, el Consorcio Turquía ha presentado a esta Interventoría un total de 184 diagnósticos, de los cuales se aprobaron 142 que cumplen con los requisitos exigidos por la Entidad y los 40 restantes fueron devueltos con observaciones por falta de documentación. En cuanto a las demás visitas que no han sido allegadas a esta Interventoría, el Consorcio Turquía se encuentra organizando la documentación para radicación.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

* El día 31 de mayo de 2022 se realizó el comité de seguimiento en las instalaciones de la Alcaldía de Sincelejo – Sucre, con la asistencia de los representantes del Contratista de Obra, ENTerritorio, Ministerio de Vivienda, Supervisor de la Alcaldía, FOVIS, Interventoría, Empresa de Servicios Públicos (VEOLIA) y Aguas de Sucre, en donde se trataron los siguientes temas:

ACTIVIDAD 2:

1. Se realizó seguimiento de los avances en los diagnósticos y se corroboró que el volumen promedio de diagnósticos entregados por el contratista cada semana es de 60.
2. El reporte entregado a la entidad es: 103 diagnósticos aprobados, y un total de visitas de 373.

ACTIVIDAD 3:

1. Se reportó el inicio de actividades de construcción de diez (10) unidades sanitarias y conexiones intradomiciliaria en las viviendas priorizadas, de las cuales el Contratista de Obra adelantó la actividad de fundida de vigas de cimentación.
2. En cuanto a los Micromedidores, el Contratista de Obra debe entregar la ficha técnica del elemento y remitirla a la ESP-Veolia para su aval. Esta actividad se debe realizar antes de la compra. Se recomendó que al instalar los micromedidores se debe contar con registro fotográfico de cada una de actividades o intervenciones de las viviendas.
3. Para la actividad de rotura de las cajas de inspección y construcción de la nueva caja, la Interventoría deberá realizar el seguimiento a las obras y certificar el cumplimiento de las especificaciones de la Entidad a la obra adelantada por el contratista de obra.
4. Las viviendas que están en la matriz inicial, y aparecen en riesgo, se le debe enviar la evidencia a la alcaldía y estos lo remiten al fovis, para que ellos realicen la verificación correspondiente y emitan concepto.

ACTIVIDAD 4:

1. Se solicitó al contratista de obra instalar el punto de atención en el barrio el poblado o cerca al mismo.
2. Al momento de realizar la entrega de las viviendas al beneficiario, se debe tener acompañamiento del equipo técnico y grupo social para realizar la socialización de la estructura construida.
3. El link lo maneja una empresa de Bogotá, y estos aún no han realizado el diseño, la Alcaldía realiza la solicitud y ellos responden que dentro de un mes estaría listo.

* La Actividad 1. Chequeo y Validacion de Prototipos, fue aprobado por interventoría con cartas GA-DOMI-040-22 del día 31 de mayo de 2022 y radicado en ENTerritorio bajo el N°. 20224300206752 y GA-DOMI-030-22 radicado N°. 20224300189742.

* En cuanto a la disponibilidad de materiales para el proyecto como lo es el enchape antideslizante con dimensiones 0.2X0.20, el Consorcio Turquía en la verificación de la reserva para su adquisición en el mercado, logro identificar que la consecución de la cerámica blanca de 20 x 20 tipo institucional se ha visto afectada debido a las demandas actuales del producto y la problemática proveniente a la adquisición de las materias primas para su elaboración.

Esta situación ha ocasionado que por parte de los fabricantes no garantice las fechas de entrega de los enchapes; por lo tanto, se hizo necesario cambiar la especificación técnica de la baldosa en cerámica de los ítems 3.27 y 3.28 la cual fue realizada por el contratista de obra con cartas CONS-TUR-SINC-028 del día 24 de mayo de 2022, CONS-TUR-SINC-029 del día 24 de mayo de 2022 y CONS-TUR-SINC-031 del día 27 de mayo de 2022; requerimiento que una vez evaluado y aprobado, esta Interventoría procedió a dar trámite con

* El día 03 de junio de2022 mediante la comunicación GA-DOMI-044-22, esta interventoría de acuerdo con el seguimiento realizado a la Actividad 3 "Ejecución de Obra" que lleva realizando el Consorcio Turquía en la construcción de las unidades sanitarias en las viviendas beneficiarias del Programa de Conexiones Intradomiciliaria de Acueducto y Alcantarillado, observó el inadecuado almacenamiento de los materiales de construcción como varillas expuestas, lo cual deja en evidencia un alto riesgo de posibles accidentes, tanto para los trabajadores como también a los habitantes de las viviendas; por lo tanto, se procedió a solicitar al Contratista de Obra para que se realice la correcta disposición y almacenamiento de cada uno de los materiales de obra, implementando las medidas de señalización y delimitaciones requeridas para prevenir que se presenten accidentes o incidentes a los trabajadores, así como también a terceros involucrados.

* Mediante la comunicación GA-DOMI-045-22 del día 03 de junio de 2022, se procedió a requerir al Consorcio Turquía, teniendo en cuenta que de acuerdo a cada uno de los frentes de obra abierto y a la bodega de acopio de materiales, se ve con preocupación la poca disponibilidad de los materiales e insumos necesarios en campo en cada una de las viviendas para acometer las actividades programadas conforme al cronograma de obra, por lo tanto, se solicitó tomar las acciones correctivas a que haya lugar, con el fin de garantizar en todo momento los materiales necesarios para la construcción de las unidades sanitarias y nivelar el atraso reportado.

* El día 03 de junio de 2022 con la carta GA-DOMI-046-22 se solicitó tomar las medidas y acciones correctivas para subsanar el atraso presentado en las actividades 2 y 3, con el fin de que se nivele las actividades programadas y ejecutadas que están establecidas en el cronograma de obra, debido a que lo reportado por esta Interventoría en el Informe Semanal No. 6 a corte del 29 de mayo de 2022 se tiene un porcentaje de atraso de 2.44%, según el análisis de las actividades pendientes por ejecutar por el Consorcio Turquía.

* Con carta GA-DOMI-047-22 del día 03 de junio de 2022 y de acuerdo con las obligaciones contraídas en el contrato de la referencia y teniendo en cuenta la visita realizada a la obra por parte del Ministerio de Vivienda, ENterritorio y esta Interventoría el día 01 de junio de 2022, en donde se realizó el seguimiento a la Actividad N°. 3 que corresponde a la ejecución de las obras dentro del proyecto, se evidencio diferentes actividades incumpliendo los procedimientos, protocolos y buenas prácticas, por lo tanto, se procedió a requerir al Contratista de Obra tomar las medidas correctivas y se realizó recomendaciones para ser implementadas en la ejecución de cada una de las unidades sanitarias de las viviendas priorizadas.

ACTIVIDADES EN CAMPO

* El día 30 de mayo de 2022, se realizó cinco (5) visitas para diagnósticos de las viviendas priorizadas por parte del contratista de obra.

En las actividades de obra de las viviendas con consecutivo 003, 007, 015 y 016, se realizó las excavaciones para la viga de cimentación y fundida de vigas de cimentación. En dicha tarea se tuvo el acompañamiento de Residente de Obra.

* El día 31 de mayo de 2022 en el acompañamiento realizado por esta Interventoría a las actividades de campo, se realizó por parte del Consorcio Turquía cinco (5) visitas a las viviendas priorizadas con el fin de efectuar los diagnósticos correspondientes. Se tuvo la presencia de tres (3) Sociales del Contratista, Residente de Obra, cinco (5) Encuestadores, dos (2) Inspectores de Obra y Auxiliar Social de Interventoría. Se realizó vista de la ENTerritorio, Ministerio de Vivienda, Alcaldía de Sincelejo y FOVIS con el fin de efectuar el recorrido por las viviendas que están siendo intervenidas y verificar el estado de ejecución.

* El día 1 de junio de 2022 se realizó la actividad en campo de dieciséis (16) visitas para diagnósticos de las viviendas priorizadas, en dicha actividad se tuvo el acompañamiento de tres (3) Sociales del contratista, Residente de obra, dos (2) Inspectores de obra y Auxiliar Social de Interventoría. Por otra parte, se adelantó la construcción de los muros para las viviendas que se están interviniendo.

* El día 2 de junio de 2022 se tuvo la visita en campo por parte del FOVIS, Secretaria de Planeación de la Alcaldía de Sincelejo – Sucre y la Empresa de Servicios Públicos en donde se realizó la revisión de las diferentes solicitudes realizadas por la comunidad para la inclusión al programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado.

El Consorcio Turquía continúo con las actividades de construcción de las viviendas con la fundida de columnas y machones, en las cuales se evidencio que no se utilizó el vibrador para concretos, por lo tanto, esta Interventoría procedió a solicitar al Consorcio Turquía con carta GA-DOMI-047-22 del día 03 de junio de 2022 se tomen las medidas correctivas de las obras adelantadas y se emitió observaciones para ser subsanadas, con el fin de obtener unas obras con altos estándares de calidad.

Se dio inicio con la intervención de la vivienda S-SC-EP-M35-VE-005.

* El día 03 de junio de 2022 se continúo con las intervenciones de las viviendas, en estas actividades se contó con la presencia de dos (2) inspectores de obra, residente de obra, sociales del contratista. En el día de hoy se realizó el comité de aprobación, donde se obtuvo el concepto favorable de 41 diagnósticos emitido por Interventoría, los cuales cumplen con los requerimientos y lineamientos dados por la Entidad.

* El día 4 de junio de 2022, se adelantó trabajos de oficina de digitalización de las encuestas diagnosticadas y se recibió en Interventoría un total de treinta (33) paquetes de encuestas para revisión. La residente de interventoría realizó recorrido en compañía de uno de los veedores y el residente de obra, para verificar y atender algunas quejas de los beneficiarios.

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE


* Se continua con los Diagnósticos de las viviendas en el barrio El Poblado en Sincelejo Sucre.
* Se realizará Comité de seguimiento el día martes 07 de mayo de 2022.
* Se realizará comité de aprobación de Diagnósticos el día jueves 09 de junio de 2022 para verificación que los entregables del contratista sean realizados conforme lo requerido por la Entidad.

6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0


Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	4	2	6	27,3%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%




INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 06

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **30/05/2022** al **05/06/2022** Fecha **06/06/2022**

Otros	0	0		

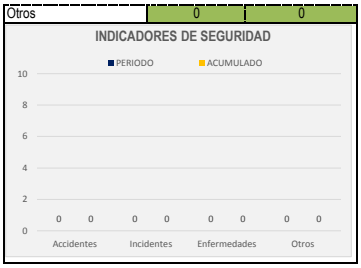

3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0	0,0%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál? Orden público	16	0	16	72,7%
	Total	**20**	**2**	**22**	**100,00%**



OBSERVACIONES

El día 31 de mayo de 2022 se presentaron fuertes lluvias de 1:40 pm hasta las 3:00 pm.

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
N/A						

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
N/A					

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA











9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

El Consorcio Turquía continuó con la Actividad 2 en las visitas de los Diagnósticos de las viviendas objeto del programa de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico en el barrio El Poblado, por lo que a la fecha de corte del presente informe semanal se tiene aprobado ciento cuarenta y dos (142) diagnósticos acumulados, se adjunta la Matriz 3 momentos suministrada por la Entidad. Se tiene proyectado que a partir de la siguiente semana, el Contratista de Obra realice con mayor regularidad la entrega de los paquetes de diagnósticos para poder dar cumplimiento a la programación de obra.

En la presente semana se tiene un porcentaje ejecutado acumulado de 8,27% y una programación acumulada de 0,99%, evidenciando que el contratista de obra tiene una desviación de 7,28%. Cabe resaltar que el Consorcio Turquía está realizando todas las correcciones y digitalizaciones de las encuestas observadas por interventoría, con el fin de entregar para revisión y presentadas en comité de aprobación programada los jueves de cada semana.

Si bien se presenta un atraso, este es ocasionado por el difícil acceso e ingreso al barrio El Poblado, para el transporte de materiales de obra desde la bodega destinada como acopio hasta cada una de las viviendas priorizadas en el programa de conexiones intradomiciliarias, debido al mal estado de la vía de acceso, se ha generado que los rendimientos de las actividades de construcción se vean afectados por no contar con una disponibilidad permanente de insumos y materiales de obra.

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, esta Interventoría en cumplimiento de sus funciones procedió a requerir al Consorcio Turquía mediante la comunicación GA-DOMI-046-22 del día 03 de junio de 2022, para que se tome las medidas correctivas que permitan subsanar los atrasos generados y nivelar el porcentaje entre lo programado versus lo ejecutado.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-06**
		VERSIÓN:	**1**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 06

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **30/05/2022** al **05/06/2022** Fecha **06/06/2022**

Como se tenía programado para esta semana se da inicio a la Actividad 3 "Ejecución de Obras", comienza a intervenir 3 viviendas adicionales a las 10 intervenidas anteriormente, a estas viviendas se les hace entrega de los diferentes materiales, también se comienza a verificar medidas y realizan demarcaciones para realizar excavaciones, por otra parte también se comienza figurar el acero. las 13 viviendas intervenidas se le hacen actividades de fundida de cimentaciones, columnas y machones, como también levante de muros.

Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	**Firma**	**Firma**
Nombre EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO	Nombre HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES	Nombre
Director de Interventoría o Representante legal <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Profesional Costos y Presupuesto <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Supervisor

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

Bogotá D.C, 15 de junio de 2022



Señor
JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
Supervisor
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio
Calle 26 N°. 13-19
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Interventoría N°. 2220585 "Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre"**

Asunto: **Remisión Informe Semanal No. 08 periodo del 06 de junio de 2022 al 12 de junio de 2022**

Apreciado señor,

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, anexo, se remite el informe semanal de Interventoría No. 08 del contrato de la referencia para el período comprendido entre el 06 de junio de 2022 al 12 de junio de 2022.

Anexo se remite como soporte al Informe Semanal N°. 8, Acta de seguimiento, Acta de comité de aprobación de diagnósticos, bitácora de obra, lista de chequeo seguimiento estado de salud, informe social, resumen de avance y Matriz Tres Momentos.

Cordialmente,

EDGAR ALFONSO ARAGÓN OTERO
Director de Interventoría
Anexos: Lo enunciado en sesenta y cuatro (64) folios y archivos en magnético.
C.C.: Ing. Juan David Amón – Supervisor del contrato Convenio Inter administrativo 221005; Enterritorio.
Archivo
Elaboró: MJ
Revisó: EAO

INFORME SEMANAL

Cra. 48 No. 101A – 29 Bogotá, Colombia Tel: (57 1) 236 7974 – 621 5383
E-mail: info@gavinco.com www.gavinco.com

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 07

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **06/06/2022** al **12/06/2022** Fecha **13/06/2022**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CODIGO PROYECTO	2220577
OBJETO DEL PROYECTO	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** SUCRE **MUNICIPIO** SINCELEJO
GERENCIA A CARGO	GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1
SUPERVISOR	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
ESTADO DEL PROYECTO	En ejecución.

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2220577		
Contratista	CONSORCIO TURQUIA		
Valor inicial	$ 5.034.941.972,00		
Valor actual	$ 5.034.941.972,00		
Variación del valor	$ -		
Fecha de Inicio	13/04/2022		
Plazo inicial (Días)	244 Días		
Plazo actual (Días)	244 Días		100,00%
Variación en plazo	Días		
Fecha Contractual de terminación	13/12/2022		
Tiempo Transcurrido (días)	60		24,59%
Días remanentes del Contrato	183		75,00%
Acumulado a última acta pagada	$ -		
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ -		

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.	2220585		
Interventor	GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S.		
Valor inicial	$ 542.723.071,00		
Valor actual	$ 542.723.071,00		
Variación del valor	$ -		
Fecha de Inicio	13/04/2022		
Plazo inicial	244 Días		
Plazo actual	244 Días		100,00%
Variación en plazo	Días		
Fecha Contractual de terminación	13/12/2022		
Ejecución del Contrato	60		24,59%
Días remanentes del Contrato	183		75,00%
Acumulado a última acta pagada	$ -		
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ -		

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 5.034.941.972,00

Semáforo

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 416.620.952,14	8,27%	$ 49.845.925,52	0,99%	-$ 366.775.026,62	-7,28%
Durante el Periodo	$ 158.939.825,48	3,16%	$ 23.204.438,90	0,46%	-$ 135.735.386,59	-2,70%
Acumulado a la Fecha	**$ 575.560.777,62**	**11,43%**	**$ 73.050.364,42**	**1,45%**	**-$ 502.510.413,20**	**-9,98%**

Desviación en días: -24 Días

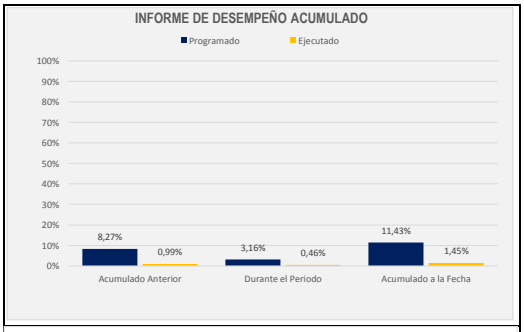

Observaciones al desempeño del proyecto


** **Actividad 1.** Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquia. Aprobado por interventoría con cartas GA-DOMI-040-22 del día 31 de mayo de 2022 y radicado en ENTerritorio bajo el N°. 20224300206752 y GA-DOMI-030-22 radicado N°. 20224300189742.*


** **Actividad 2.** Se han realizado un total de 454 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria, a la fecha de corte del informe semanal se han presentado a esta Interventoria, por el Contratista de obra, un total de 274 diagnósticos, de los cuales se han aprobados 200 diagnósticos acumulados, y 74 que aun no se han revisado . En cuanto a las 180 visitas el Consorcio Turquia se encuentra organizando la documentación.*

** **Actividad 3.** a corte de este informe el contratista lleva intervenidas 17 viviendas, las cuales cuentan con un promedio de ejecución del 20%*

** **Actividad 4.** Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas objeto del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado. por otra parte se han recepcionado 24 solicitudes de inclusión.*

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

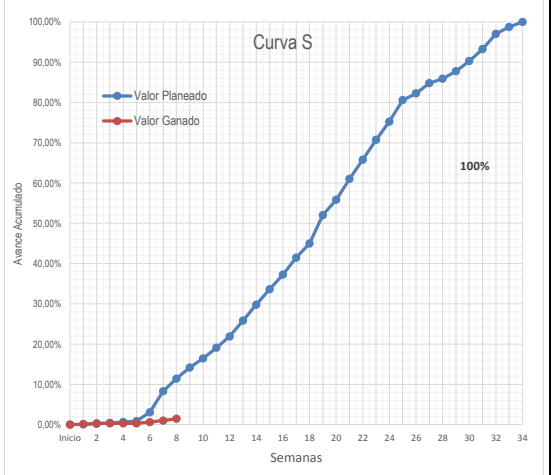

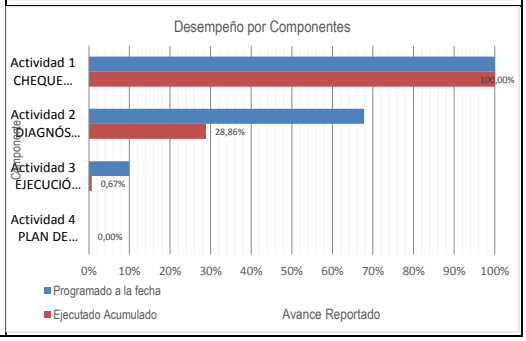

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)

Se ajusta la curva S del proyecto conforme a la capacitación dada el 28 de abril de 2022 por parte del supervisor de ENTerritorio.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	8,27%	0,99%	-7,28%	
Durante el Periodo	3,16%	0,46%	-2,70%	
Acumulado a la Fecha	**11,43%**	**1,45%**	**-9,98%**	




AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 5.034.941.972,00	$ 5.034.941.972,00	$ -	$ 981.956.213,58	$ -	$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
0	$ -	0,00%	0	$ -	0,00%	N/A	$ -







AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR


Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 542.723.071,00	$ 542.723.071,00	$ -	N/A	N/A	#¡VALOR!


No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
0	$ -	0,00%	0	$ -	0,00%	N/A	$ -

ANÁLISIS DE VALOR CONTRACTUAL | ESTADO ANTICIPO | ESTADO FINANCIERO DEL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 07

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **06/06/2022** al **12/06/2022** Fecha **13/06/2022**









OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

Actividad 1. Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, se presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquía.

Actividad 2. Se han realizado un total de 454 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria. De acuerdo a la fecha de corte del presente informe semanal, el Consorcio Turquía ha presentado a esta Interventoría un total de 274 diagnósticos, de los cuales se aprobaron 200 que cumplen con los requisitos exigidos por la Entidad y los 74 restantes aun no se han revisado. En cuanto a las demás visitas que no han sido allegadas a esta Interventoría, el Consorcio Turquía se encuentra organizando la documentación para radicación.

Actividad 3. El contratista se encuentra en intervención de 17 unidades sanitarias y conexiones intradomiciliarias de las viviendas diagnosticadas.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

* El día 07 de junio de 2022 se realizó el comité de seguimiento con la asistencia de los representantes del Contratista de Obra, ENTerritorio, , Interventoría, en donde se trataron los siguientes temas:

ACTIVIDAD 2:

* Se realizó la revisión del estado avance de la Actividad 2, en donde se pudo constatar que el Contratista de Obra tiene 142 diagnósticos aprobados por Interventoría, sin embargo se presenta un atraso debido a que lo revisado en comité y conforme a la programación de obra debe tener un total de 370 diagnósticos aprobados, se solicitó al Consorcio Turquía tomar la medidas correctivas para subsanar el atraso reportado.

ACTIVIDAD 3:

* El contratista menciona que se han tenido diferentes factores que han influido en el atraso de la ejecución y entrega de viviendas, por lluvias en el municipio de Sincelejo y esto ocasionó que las vías se vieran afectadas en el ingreso de los materiales transportados. El Contratista cuenta con la cerámica adquirida, está pendiente el despacho por el proveedor. Se está gestionando en las manzanas 35 y 36 el transporte de los materiales a las viviendas que se van a iniciar.
Se espera que la próxima semana se terminen las viviendas en ejecución.
* El Contratista menciona que se van a iniciar con 16 viviendas y se están transportando materiales.
* Interventoría pregunta si el contratista cuenta con todos los materiales para terminar las viviendas en ejecución y por iniciar.
La Entidad menciona que de acuerdo con la programación se evidencia que en la próxima semana se va a superar el atraso del mayor del 5%, por lo tanto la Interventoría deberá requerir un plan de contingencia, si se supera el 10% interventoría iniciará el proceso de incumplimiento. Por lo tanto se solicitó al contratista tomar las medidas correctivas.
Interventora manifestó que se ha venido realizando las diferentes solicitudes de tomar las medidas correctivas y recomendaciones para subsanar los atrasos. Viviendas iniciadas deben estar terminadas en una semana o como máximo en 10 días, ya que no podemos tomarnos más tiempo en su ejecución.

ACTIVIDAD 4:

1. Se solicitó al contratista de obra instalar el punto de atención en el barrio el poblado o cerca al mismo.
2. Al momento de realizar la entrega de las viviendas al beneficiario, se debe tener acompañamiento del equipo técnico y grupo social para realizar la socialización de la estructura construida.
3. El link lo maneja una empresa de Bogotá, y estos aún no han realizado el diseño, la Alcaldía realiza la solicitud y ellos responden que dentro de un mes estaría listo.
* La Actividad 1. Chequeo y Validación de Prototipos, fue aprobado por interventoría con cartas GA-DOMI-040-22 del día 31 de mayo de 2022 y radicado en ENTerritorio bajo el N°. 20224300206752 y GA-DOMI-030-22 radicado N°. 20224300189742.

* El día 08 de junio de 2022 con la carta GA-DOMI-052-22 se procedió a requerir al Consorcio Turquía dar cumplimiento con los compromisos fijados en el comité de seguimiento No. 8, por lo tanto se procedió a relacionar las fechas límites para su cumplimiento.
* Con la carta GA-DOMI-054-22 del día 09 de junio de 2022 y de acuerdo al seguimiento realizado por esta Interventoría a la Actividad N°. 3 "Ejecución de Obra" que lleva adelantado por el Consorcio Turquía, se procedió a emitir observaciones a la calidad de las obras de construcción, estado de ejecución de las viviendas y fechas límite de entrega y se teniendo en cuenta que el atraso del contrato de obra ha venido en aumento se procedió a solicitar remitir plan de contingencia que permita nivelar el contrato.

ACTIVIDADES EN CAMPO

* El día 06 de junio de 2022, se realizó cinco (5) visitas para diagnósticos de las viviendas priorizadas por parte del contratista de obra, en compañía de las sociales del contratista y 2 encuestadores.

En las actividades de obra de las viviendas con consecutivo 003, 004, 005, 006, 007, 008, 010, 012, 013, 014 y 016, el contratista de obra realizó actividades de obra como el levantamiento de muros, fundida de pedestal para tanque elevado, armado de canastas para vigas coronas, excavaciones para registro sanitario y se fundió columnas.

* El día 07 de junio de 2022 en el acompañamiento realizado por esta Interventoría a las actividades de campo, se realizó por parte del Consorcio Turquía cuatro (4) visitas a las viviendas priorizadas con el fin de efectuar los diagnósticos correspondientes. Se tuvo la presencia de tres (3) Sociales del Contratista, un encuestador.

Se dio inicio con la intervención de la vivienda 001 y para las unidades sentirías con consecutivos 002, 004, 005, 006, 007, 008, 011, 013, 015 y 016 se realizó actividades como el desencofrado de machones y vigas corona, también se efectuó el pañete interior y exterior.

En horas de la mañana se cumplió con el recorrido en compañía del contratista (Director de obra) y la residente de interventoría, para revisar los procedimientos de ejecución de la obra, se encontraron varios procedimientos inadecuados y esta interventoría en cumplimiento de sus funciones reiteró las recomendaciones por medio de la carta GA-DOMI-054-22 del día 09 de junio de 2022, para ser subsanadas por el Consorcio Turquía.

* El día 8 de junio de 2022 se realizó la actividad en campo con la visita de treinta y siete (37) viviendas para efectuar el diagnóstico, en dicha actividad se tuvo el acompañamiento de tres (3) Sociales del contratista, Residente de obra, dos (2) Inspectores de obra y Auxiliar Social de Interventoría. El Contratista de obra continúo con la actividad de construcción de levante de muro hasta viga de amarre, instalación de calados, desencofrado de machones, para las viviendas que están siendo intervenidas.
* El día 9 de junio de 2022 el Consorcio Turquía continúo con las actividades de construcción de las viviendas con el desencofrado de las vigas de coronas, amarre de acero para las vigas y placa de tanque, levante de muros.

Se dio inicio con la intervención de la vivienda S-SC-EP-M35-VE-017. Por otra parte se realiza la primera reunión sectorizada en horas de la mañana, se contó con la presencia de las sociales del contratista e interventoría, director de obra consorcio Turquía, residente de interventoría e inspectores de obra, y los veedores, esta reunión era de carácter informativo, pero no se pudo cumplir con el objetivo ya que la comunidad se alteró y tuvimos que suspender la actividad.

* El día 10 de junio de 2022 se continuó con las intervenciones de las viviendas, en estas actividades se contó con la presencia de dos (2) inspectores de obra, residente de obra, sociales del contratista. En el día de hoy se realizó el comité de aprobación, donde se obtuvo el concepto favorable de 58 diagnósticos emitido por Interventoría, los cuales cumplen con los requerimientos y lineamientos dados por la Entidad. Por otra parte se realizaron cinco (5) visitas de diagnóstico, se realiza en compañía de las sociales del contratista y un encuestador.

* El día 11 de junio de 2022, se adelantó trabajos de oficina de digitalización de las encuestas diagnosticadas y se recibió en Interventoría un total de treinta (30) paquetes de encuestas para revisión. El contratista continúa con las intervenciones de las viviendas.

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

* Se continuará con los Diagnósticos de las viviendas en el barrio El Poblado en Sincelejo Sucre.
* Se realizará Comité de seguimiento el día martes 14 de junio de 2022.
* Se realizará comité de aprobación de Diagnósticos el día jueves 16 de junio de 2022 para verificación que los entregables del contratista sean realizados conforme lo requerido por la Entidad.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	4	10	14	46,7%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0	0,0%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál? Orden público	16	0	16	53,3%
	Total	**20**	**10**	**30**	**100,00%**



enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 07

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **06/06/2022** al **12/06/2022** Fecha **13/06/2022**



OBSERVACIONES

Los días 07 ,08,09 y 10 de junio, se presentaron lluvias en la mañana y en la tarde.

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
N/A						

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
Inclusión	Ana Milena Vergara	06/06/2022	La señora Ana Milena Vergara solicitó la inclusión al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la manzana 20 - Lote 6, ya que no se encontraba en su domicilio cuando se realizó el diagnostico por parte del FOVIS en la etapa inicial donde se focalizaron los posibles beneficiarios del programa.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	José Juaquin Florez	06/06/2022	El señor José Juaquin Flore solicitó la inclusión al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la manzana 22 - Lote 1, ya que no se encontraba en su domicilio cuando se realizó el diagnostico por parte del FOVIS en la etapa inicial donde se focalizaron los posibles beneficiarios del programa.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	María Alejandra Torres	06/06/2022	La señora María Alejandra Torres solicitó la inclusión al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la manzana 21 - Lote 3, ya que no se encontraba en su domicilio cuando se realizó el diagnostico por parte del FOVIS en la etapa inicial donde se focalizaron los posibles beneficiarios del programa.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	Oswaldo Jiménez Ramírez	06/06/2022	El señor Oswaldo Jiménez Ramírez solicitó la inclusión al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la manzana 21 - Lote 2 , ya que no se encontraba en su domicilio cuando se realizó el diagnostico por parte del FOVIS en la etapa inicial donde se focalizaron los posibles beneficiarios del programa.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	Hernán Jiménez Marín	06/06/2022	El señor Hernán Jiménez Marín solicitó la inclusión al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la manzana 14 - Lote 7 , ya que no se encontraba en su domicilio cuando se realizó el diagnostico por parte del FOVIS en la etapa inicial donde se focalizaron los posibles beneficiarios del programa.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	Carmen Carpintero	06/06/2022	La señora Carmen Carpintero solicitó la inclusión al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la manzana 58 - Lote 2, ya que no se encontraba en su domicilio cuando se realizó el diagnostico por parte del FOVIS en la etapa inicial donde se focalizaron los posibles beneficiarios del programa.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	Ana Isabel Florez	06/06/2022	La señora Ana Isabel Florez solicitó la inclusión al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la manzana 22- Lote 2, ya que no se encontraba en su domicilio cuando se realizó el diagnostico por parte del FOVIS en la etapa inicial donde se focalizaron los posibles beneficiarios del programa.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	Edilma Torres	06/06/2022	La señora Edilma Torres solicitó la inclusión al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la manzana 45- Lote 4, ya que no se encontraba en su domicilio cuando se realizó el diagnostico por parte del FOVIS en la etapa inicial donde se focalizaron los posibles beneficiarios del programa.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	Silvio David Morelo	06/06/2022	El señor Silvio David Morelo solicitó la inclusión al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la manzana 57 - Lote 8 , ya que no se encontraba en su domicilio cuando se realizó el diagnostico por parte del FOVIS en la etapa inicial donde se focalizaron los posibles beneficiarios del programa.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	Norelis Zabaleta	06/06/2022	La señora Norelis Zabaleta solicitó la inclusión al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la manzana 59 Lote 5, ya que no se encontraba en su domicilio cuando se realizó el diagnostico por parte del FOVIS en la etapa inicial donde se focalizaron los posibles beneficiarios del programa.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
N/A					

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA







INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 07

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **06/06/2022** al **12/06/2022** Fecha **13/06/2022**





9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

El Consorcio Turquía continuó con la Actividad 2 en las visitas de los Diagnósticos de las viviendas objeto del programa de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico en el barrio El Poblado, por lo que a la fecha de corte del presente informe semanal se tiene aprobado doscientos (200) diagnósticos acumulados, se adjunta la Matriz 3 momentos suministrada por la Entidad. Se tiene proyectado que a partir de la siguiente semana, el Contratista de Obra realice con mayor regularidad la entrega de los paquetes de diagnósticos para poder dar cumplimiento a la programación de obra.

En la presente semana se tiene un porcentaje ejecutado acumulado de 1,45% y una programación acumulada de 11,43%, evidenciando que el contratista de obra tiene una desviación de 9,98%. Cabe resaltar que el Consorcio Turquía está realizando todas las correcciones y digitalizaciones de las encuestas observadas por interventoría, con el fin de entregar para revisión y presentadas en comité de aprobación programada los jueves de cada semana.

Si bien se presenta un atraso, este es ocasionado por el difícil acceso e ingreso al barrio El Poblado, para el transporte de materiales de obra desde la bodega destinada como acopio hasta cada una de las viviendas priorizadas en el programa de conexiones intradomiciliarias, debido al mal estado de la vía de acceso, se ha generado que los rendimientos de las actividades de construcción se vean afectados por no contar con una disponibilidad permanente de insumos y materiales de obra.

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, esta Interventoría en cumplimiento de sus funciones procedió a requerir al Consorcio Turquía mediante la comunicación GA-DOMI-054-22 del día 09 de junio de 2022, para que se tome las medidas correctivas y se entregue un plan de contingencia que permitan subsanar los atrasos generados y nivelar el porcentaje entre lo programado versus lo ejecutado.
El Consorcio Turquía para la Actividad 3 se encuentra ejecutando un total de diecisiete (17) viviendas, de las cuales se realizó la verificación de las medidas, demarcaciones de zonas de excavaciones, figurado de acero, fundida de cimentaciones, columnas y machones y en algunas se realizó el levante de muros.

Respecto a la actividad 4, se han recibido 24 solicitudes de inclusiones.

Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	**Firma**	**Firma**
Nombre EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO	Nombre HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES	Nombre
Director de Interventoría o Representante legal <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Profesional Costos y Presupuesto <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Supervisor

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

Bogotá D.C, 23 de junio de 2022

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial FECHA 23/06/2022 HORA: 11:23:45 a. m.
20224300237852

Señor
JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
Supervisor
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio
Calle 26 N°. 13-19
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Interventoría N°. 2220585 "Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre"**

Asunto: **Remisión Informe Semanal No. 09 periodo del 13 de junio de 2022 al 19 de junio de 2022**

Apreciado señor,

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, anexo, se remite el informe semanal de Interventoría No. 09 del contrato de la referencia para el período comprendido entre el 13 de junio de 2022 al 19 de junio de 2022.

Anexo se remite como soporte al Informe Semanal N°. 9, Acta de seguimiento, Acta de comité de aprobación de diagnósticos, bitácora de obra, lista de chequeo seguimiento estado de salud, informe social, resumen de avance y Matriz Tres Momentos.

Cordialmente,

EDGAR ALFONSO ARAGÓN OTERO
Director de Interventoría
Anexos: Lo enunciado en setenta y cuatro (74) folios y archivos en magnético.
C.C.: Ing. Juan David Amón – Supervisor del contrato Convenio Inter administrativo 221005; Enterritorio.
Archivo
Elaboró: MJ
Revisó: EAO

INFORME SEMANAL

Cra. 48 No. 101A – 29 Bogotá, Colombia Tel: (57 1) 236 7974 – 621 5383
E-mail: info@gavinco.com www.gavinco.com

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 08

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **13/06/2022** al **19/06/2022** Fecha **21/06/2022**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CODIGO PROYECTO	2220577
OBJETO DEL PROYECTO	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** SUCRE **MUNICIPIO** SINCELEJO
GERENCIA A CARGO	GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1
SUPERVISOR	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
ESTADO DEL PROYECTO	En ejecución.

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2220577		
Contratista	CONSORCIO TURQUIA		
Valor inicial	$ 5.034.941.972,00		
Valor actual	$ 5.034.941.972,00		
Variación del valor	$ -		
Fecha de Inicio	13/04/2022		
Plazo inicial (Días)	244 Días		
Plazo actual (Días)	244 Días		100,00%
Variación en plazo	Días		
Fecha Contractual de terminación	13/12/2022		
Tiempo Transcurrido (días)	68		27,87%
Días remanentes del Contrato	175		71,72%
Acumulado a última acta pagada	$ -		
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ -		

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.	2220585		
Interventor	GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S.		
Valor inicial	$ 542.723.071,00		
Valor actual	$ 542.723.071,00		
Variación del valor	$ -		
Fecha de Inicio	13/04/2022		
Plazo inicial	244 Días		
Plazo actual	244 Días		100,00%
Variación en plazo	Días		
Fecha Contractual de terminación	13/12/2022		
Ejecución del Contrato	68		27,87%
Días remanentes del Contrato	175		71,72%
Acumulado a última acta pagada	$ -		
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ -		

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 5.034.941.972,00

Semáforo

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 575.560.777,62	11,43%	$ 73.006.658,59	1,45%	-$ 502.554.119,03	-9,98%
Durante el Periodo	$ 73.059.801,38	1,45%	$ 76.962.263,92	1,53%	$ 3.902.462,54	0,08%
Acumulado a la Fecha	**$ 648.620.579,01**	**12,88%**	**$ 149.968.922,52**	**2,98%**	**-$ 498.651.656,49**	**-9,90%**

Desviación en días: -24 Días

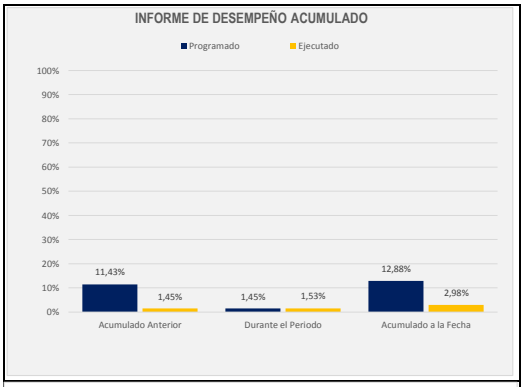

Observaciones al desempeño del proyecto

** **Actividad 1.** Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquia. Aprobado por interventoría con cartas GA-DOMI-040-22 del día 31 de mayo de 2022 y radicado en ENTerritorio bajo el N°. 20224300206752 y GA-DOMI-030-22 radicado N°. 20224300189742.*


** **Actividad 2.** Se han realizado un total de 538 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria, a la fecha de corte del informe semanal se han presentado a esta Interventoria, por el Contratista de obra, un total de 354 diagnósticos, de los cuales se han aprobados 259 diagnósticos acumulados, y 80 están en proceso de revisión y observaciones. En cuanto a las 199 visitas el Consorcio Turquia se encuentra organizando la documentación pertinente para entrega a Interventoria.*


** **Actividad 3.** A corte de este informe el contratista se encuentra interviniendo 23 viviendas, cero (0) viviendas terminadas, 63 no iniciadas y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 259.*

Frente a esta situación está Interventoria con carta GA-DOMI-054-22 del día 09 de junio de 2022 procedió a realizar diferentes requerimientos para que se tomen las medidas correctivas y la presentación de un plan de contingencia que permita subsanar el atraso reportado para nivelar el avance programado versus lo ejecutado. El Consorcio Turquia con la carta CONS-TUR-SINC-045 del día 17 de junio de 2022 remitió el plan de contingencia con el cual pretende nivelar el atraso reportado en un periodo de cuatro semanas, lo cual a corte del día 14 de julio de 2022 estará nivelado respecto a la programación de obra. De acuerdo al documento remitido esta Interventoria realizará el seguimiento de las actividades del contratista de obra y emitirá las alertas pertinentes al evidenciar incumplimientos.

** **Actividad 4.** Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas objeto del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado. Por otro parte se han recepcionado 23 solicitudes de*

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

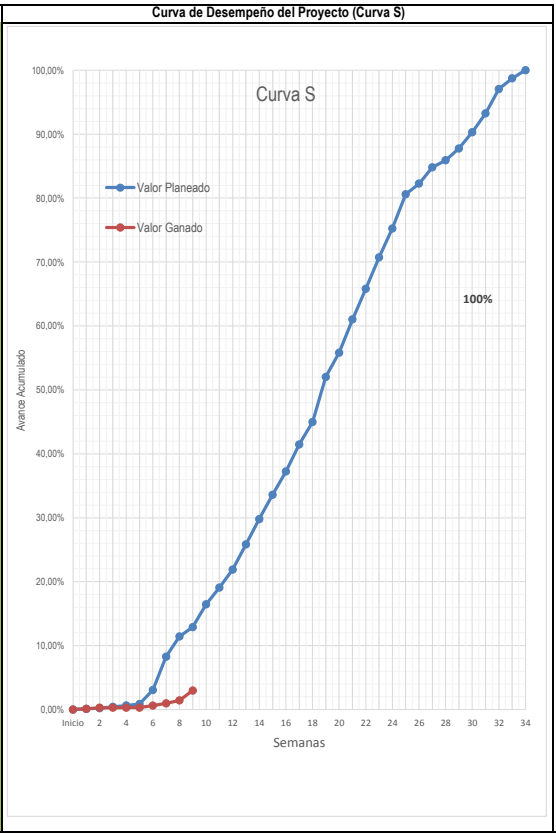

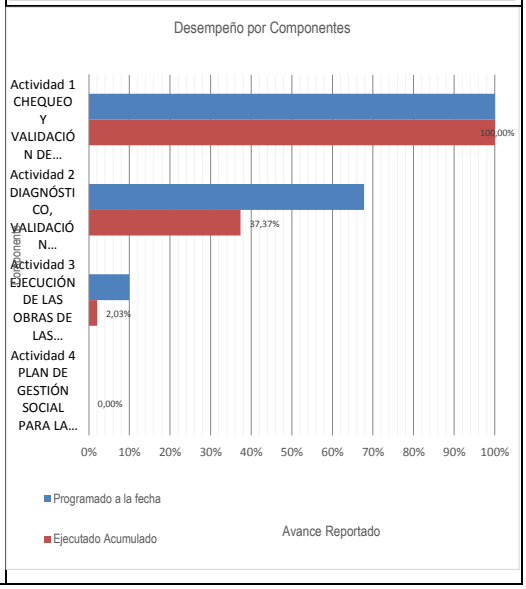

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)

Se ajusta la curva S del proyecto conforme a la capacitación dada el 28 de abril de 2022 por parte del supervisor de ENTerritorio.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	11,43%	1,45%	-9,98%	
Durante el Periodo	1,45%	1,53%	0,08%	
Acumulado a la Fecha	**12,88%**	**2,98%**	**-9,90%**	

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo		
			Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 5.034.941.972,00	$ 5.034.941.972,00	$ -	$ 981.956.213,58	$ -	$ -


No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados		No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados		Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
	Valor en Pesos	%		Valor en Pesos	%		


enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 08

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **13/06/2022** al **19/06/2022** | Fecha **21/06/2022**

0	$ -	0,00%	0	$ -	0,00%	N/A	$ -

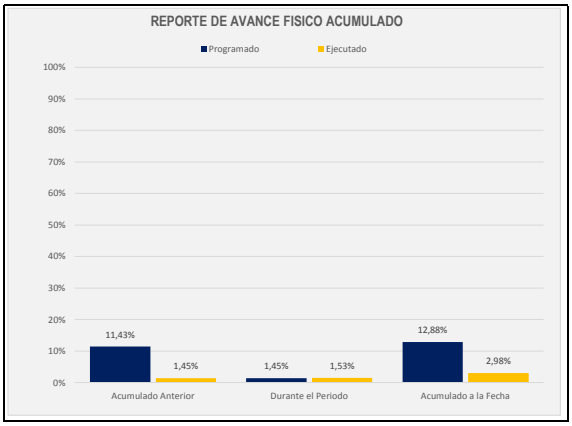








AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo		
			Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 542.723.071,00	$ 542.723.071,00	$ -	N/A	N/A	#¡VALOR!

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados		No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados		Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
	Valor en Pesos	%		Valor en Pesos	%		
0	$ -	0,00%	0	$ -	0,00%	N/A	$ -







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

Actividad 1. Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, se presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquía.

Actividad 2. Se han realizado un total de 538 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria. De acuerdo a la fecha de corte del presente informe semanal, el Consorcio Turquía ha presentado a esta Interventoría un total de 354 diagnósticos, de los cuales se aprobaron 259 que cumplen con los requisitos exigidos por la Entidad y los 80 restantes aun no se han revisado. En cuanto a las demás visitas que no han sido allegadas a esta Interventoría, el Consorcio Turquía se encuentra organizando la documentación para radicación.

Actividad 3. El contratista se encuentra en intervención de 23 unidades sanitarias, sin embargo en el programa de obra se tiene proyectado a corte del presente informe semanal un programado de 86 viviendas terminadas, lo cual representa una diferencia por iniciar y terminar de un total de 63.

Teniendo en cuenta los reportado en el informe semanal 8 en donde presento un atraso del 7,28%, esta Interventoría procedió a requerir al Consorcio Turquía la presentación de un Plan de Contingencia mediante la comunicación GA-DOMI-054-22 del día 09 de junio de 2022 que permita subsanar y nivelar la programación de obra versus lo ejecutado, así como también se requirió tomar las medidas correctivas en la calidad de las obras y tiempos de entrega de las unidades sanitarias. El Contratista de Obra mediante la carta CONS-TUR-SINC-045 del día 17 de junio de 2022 remitió el plan de contingencia con el cual pretende nivelar el atraso reportado en un periodo de cuatro semanas, lo cual a corte del día 14 de julio de 2022 estará subsanado respecto a la programación de obra.

Conforme al documento en mención esta Interventoría realizará el seguimiento de las actividades del contratista de obra y emitirá las alertas pertinentes al evidenciar incumplimientos, si estos se presentasen.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

* El día 14 de junio de 2022 se realizó el comité de seguimiento con la asistencia de los representantes del Contratista de Obra, ENTerritorio, , Interventoría, en donde se trataron los siguientes temas:

ACTIVIDAD 2:

* Se realizó la revisión del estado avance de la Actividad 2, en donde se pudo constatar que el Contratista de Obra tiene 200 diagnósticos aprobados por Interventoría, sin embargo se presenta un atraso debido a que lo revisado en comité y conforme a la programación de obra debe tener un total de 454 diagnósticos aprobados, se solicitó al Consorcio Turquía tomar la medidas correctivas para subsanar el atraso reportado.

ACTIVIDAD 3:

* Estado intervenciones (total programado vs total ejecutado)
Viviendas programadas (Ejecución): 69
Viviendas en ejecución: 17
Viviendas terminadas: 0
Viviendas no iniciadas (Ejecución): 52

* Observaciones ejecución actividades de obra.
El Contratista menciona que se remitirá la respuesta y subsanaciones el día de hoy 14 de junio de 2022
* Inicio intervención contrato acueducto.
Se tuvo reunión con la ESP y por temas de lluvia se han atrasado, se tiene programado iniciar el 22 a 24 de junio de 2022. El contratista de obra menciona que al parecer el tramo que afectaría la obra no se realizaría, sin embargo se confirmara para tener en cuenta y coordinar entre los dos proyectos para el ingreso de materiales de obra, estas obras duran aproximadamente 15 días. Se gestionará por el contratista una bodega satélite para mantener materiales en obra. La Entidad menciona que es importante tener en cuenta que si esas obras inician debe tener los materiales completos y en sitio para terminar las unidades sanitarias.
En cuanto al arreglo de la calle de acceso la ESP mencionó que la máquina que realizaría las obras se dañó, se realizara llamado con el Ing. Oscar para obtener el arreglo de la vía
* Mediante la carta GA-DOMI-055-22 del día 14 de junio de 2022 y una vez revisada la documentación allegada a través de la comunicación CONS-TUR-SINC-035 del día 06 de junio de 2022, se procedió a dar aprobación de las solicitudes de giro No. 01 y 02 por concepto de anticipo para compra de materiales y accesorios destinados para el Programa de Conexiones Intradomiciliaria.

Con carta GA-DOMI-058-22 del día 15 de junio de 2022 se realizó el trámite de 5 PQR´s recibidas la semana anterior, para que la Alcaldía de Sincelejo emita concepto de su pertinencia para el ingreso al Programa de Conexiones Intradomiciliaria y con comunicación GA-DOMI-059-22 del día 15 de junio de 2022 se solicitó dar concepto sobre la inclusión de un predio que se encuentra en zona de riesgo.

ACTIVIDADES EN CAMPO

* El día 13 de junio de 2022, se realizó veintiún (21) visitas para diagnósticos de las viviendas priorizadas por parte del contratista de obra, en compañía de las sociales del contratista y 2 encuestadores.

En las actividades de obra de las viviendas con consecutivo 001, 002, 005, 006, 007, 008, 010, 012, 013 y 016, no se laboró por falta de material. En las demás viviendas se realizaron actividades de levante de muro, pañete interno, instalación de tubería hidrosanitaria, desencofrado de loza de tanque elevado y fundida de machones.

* El día 14 de junio de 2022 se realizó comité de seguimiento de obra con el acompañamiento de interventoría, contratista y la entidad. Se dio inicio con la intervención de las viviendas 005, 006, 007, 008, 011, 013, 015 016 y 007, de las cuales se efectuaron actividades de levante de muro, encofrado y fundida de viga corona.

* El día 15 de junio de 2022 se realizó la actividad en campo con la visita de veinte y cinco (25) viviendas para efectuar el diagnóstico, en dicha actividad se tuvo el acompañamiento de tres (3) Sociales del contratista, Residente de obra, dos (2) Inspectores de obra y Auxiliar Social de Interventoría. El Contratista de obra continúo con la actividad de pañete interno y externo, fundida machones, registros sanitarios.

* El día 16 de junio de 2022 se realizó la actividad en campo con la visita de treinta y ocho (38) viviendas para efectuar el diagnóstico, en dicha actividad se tuvo el acompañamiento de tres (3) Sociales del contratista, Residente de obra, dos (2) Inspectores de obra y Auxiliar Social de Interventoría. El Contratista de obra continúo con la actividad de pañete interno y externo, fundida machones, registros sanitarios.

En horas de la mañana se realizó visita casa a casa con el acompañamiento de la social del contratista, social de interventoría y social por parte de la alcaldía, esto con el fin de informar a los posibles beneficiarios sobre el proyecto.

* El día 17 de junio de 2022 en el día de hoy no se realizaron visitas de diagnóstico. El contratista continua con la ejecución de la viviendas intervenidas, donde se realizaron las siguientes actividades, pañete interno y externo, excavación de zapata y fundida de solado, excavación para tubería sanitaria y registro, instalación de tubería de hidrosanitaria, fundida de columnas. en el día de hoy en horas de la tarde se llevó a cabo el sexto comité de aprobación donde se aprobaron 59 diagnósticos, llegando así a fecha de este corte a 259 diagnósticos aprobados - acumulados.

* El día 18 de junio de 2022, se adelantó trabajos de oficina de digitalización de las encuestas diagnosticadas y se recibió en Interventoría un total de ochenta (80) paquetes de encuestas para revisión. El contratista continúa con las intervenciones de las viviendas. Se realizó un recorrido por parte de la residente de interventoría, y se encuentra que el acero de 3/8" utilizado para las canastas de los machones ya no es de 9,5 mm, si no de 8,5mm, esta interventoría hace la recomendación al contratista para que cumpla con las especificaciones del acero, se deja por escrito que en caso de no cumplir, no se reciben las viviendas donde se utilizó otra especificación del acero.

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

* Se continuará con los Diagnósticos de las viviendas en el barrio El Poblado en Sincelejo Sucre.
* Se realizará Comité de seguimiento el día martes 21 de junio de 2022.
* Se realizará comité de aprobación de Diagnósticos el día viernes 24 de junio de 2022 para verificación que los entregables del contratista sean realizados conforme lo requerido por la Entidad.

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 08

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **13/06/2022** al **19/06/2022** Fecha **21/06/2022**


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0

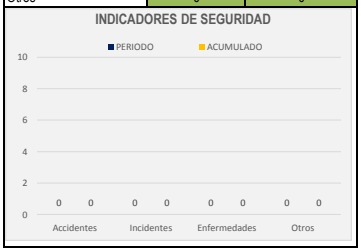

Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	4	12	16	50,0%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0	0,0%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál? Orden público	16	0	16	50,0%
	Total	**20**	**12**	**32**	**100,00%**



OBSERVACIONES

Los días 13 ,14 y 16 de junio, se presentaron lluvias en la mañana y en la tarde.

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
N/A						

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
N/A					

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA











9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

El Consorcio Turquía continuó con la Actividad 2 en las visitas de los Diagnósticos de las viviendas objeto del programa de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico en el barrio El Poblado, por lo que a la fecha de corte del presente informe semanal se tiene aprobado doscientos (259) diagnósticos acumulados, se adjunta la Matriz 3 momentos suministrada por la Entidad. Se tiene proyectado que a partir de la siguiente semana, el Contratista de Obra realice con mayor regularidad la entrega de los paquetes de diagnósticos para poder dar cumplimiento a la programación de obra.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 08

Entidad Contratante: ENTERRITORIO Semana del 13/06/2022 al 19/06/2022 Fecha 21/06/2022

En la presente semana se tiene un porcentaje ejecutado acumulado de 2,98% y una programación acumulada de 12,88%, evidenciando que el contratista de obra tiene una desviación de 9,90%. Cabe resaltar que el Consorcio Turquía está realizando todas las correcciones y digitalizaciones de las encuestas observadas por interventoría, con el fin de entregar para revisión y presentadas en comité de aprobación programada los jueves de cada semana.


Si bien se presenta un atraso, este es ocasionado por el difícil acceso e ingreso al barrio El Poblado, para el transporte de materiales de obra desde la bodega destinada como acopio hasta cada una de las viviendas priorizadas en el programa de conexiones intradomiciliarias, debido al mal estado de la vía de acceso, se ha generado que los rendimientos de las actividades de construcción se vean afectados por no contar con una disponibilidad permanente de insumos y materiales de obra.

Teniendo en cuenta que con carta CONS-TUR-SINC-045 del día 17 de junio de 2022 el Consorcio Turquía remitió el plan de contingencia con el cual pretende nivelar el atraso reportado en un periodo de cuatro semanas, a corte del día 14 de julio de 2022 estará subsanado respecto a la programación de obra, esta Interventoría realizará el seguimiento de las actividades del contratista de obra y emitirá las alertas pertinentes al evidenciar incumplimientos, si estos se presentasen.

El Consorcio Turquía para la Actividad 3 se encuentra ejecutando un total de veintitrés (23) viviendas, de las cuales se realizó la verificación de las medidas, demarcaciones de zonas de excavaciones, figurado de acero, fundida de cimentaciones, columnas y machones y en algunas se realizó el levante de muros.

Respecto a la actividad 4, se han recibido 33 solicitudes de inclusiones., y se continuara con las visitas vivienda por viviendas para dar a conocer toda la información referente a este proyecto a los potenciales beneficiarios.

Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

		
Firma	**Firma**	**Firma**
Nombre EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO	Nombre HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES	Nombre
Director de Interventoría o Representante legal <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Profesional Costos y Presupuesto <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Supervisor

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

Bogotá D.C, 30 de junio de 2022



Señor
JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
Supervisor
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio
Calle 26 N°. 13-19
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Interventoría N°. 2220585 "Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre"**

Asunto: **Remisión Informe Semanal No. 10 periodo del 20 de junio de 2022 al 26 de junio de 2022**

Apreciado señor,

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, anexo, se remite el informe semanal de Interventoría No. 10 del contrato de la referencia para el período comprendido entre el 20 de junio de 2022 al 26 de junio de 2022.

Anexo se remite como soporte al Informe Semanal N°. 10, Acta de seguimiento, Acta de comité de aprobación de diagnósticos, bitácora de obra, lista de chequeo seguimiento estado de salud, informe social, resumen de avance y Matriz Tres Momentos.

Cordialmente,

EDGAR ALFONSO ARAGÓN OTERO
Director de Interventoría
Anexos: Lo enunciado en sesenta y dos (62) folios y archivos en magnético.
C.C.: Ing. Juan David Amón – Supervisor del contrato Convenio Inter administrativo 221005; Enterritorio.
Archivo
Elaboró: MJ
Revisó: EAO

INFORME SEMANAL

Cra. 48 No. 101A – 29 Bogotá, Colombia Tel: (57 1) 236 7974 – 621 5383
E-mail: info@gavinco.com www.gavinco.com

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 10

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **20/06/2022** al **26/06/2022** Fecha **27/06/2022**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CODIGO PROYECTO	2220577
OBJETO DEL PROYECTO	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** SUCRE **MUNICIPIO** SINCELEJO
GERENCIA A CARGO	GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1
SUPERVISOR	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
ESTADO DEL PROYECTO	En ejecución.

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2220577		
Contratista	CONSORCIO TURQUIA		
Valor inicial	$ 5.034.941.972,00		
Valor actual	$ 5.034.941.972,00		
Variación del valor	$ -		
Fecha de Inicio	13/04/2022		
Plazo inicial (Días)	244 Días		
Plazo actual (Días)	244 Días		100,00%
Variación en plazo	Días		
Fecha Contractual de terminación	13/12/2022		
Tiempo Transcurrido (días)	74		30,33%
Días remanentes del Contrato	169		69,26%
Acumulado a última acta pagada	$ -		
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ -		

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.	2220585		
Interventor	GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S.		
Valor inicial	$ 542.723.071,00		
Valor actual	$ 542.723.071,00		
Variación del valor	$ -		
Fecha de Inicio	13/04/2022		
Plazo inicial	244 Días		
Plazo actual	244 Días		100,00%
Variación en plazo	Días		
Fecha Contractual de terminación	13/12/2022		
Ejecución del Contrato	74		30,33%
Días remanentes del Contrato	169		69,26%
Acumulado a última acta pagada	$ -		
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ -		

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 5.034.941.972,00

Semáforo

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 648.620.579,01	12,88%	$ 150.041.270,77	2,98%	-$ 498.579.308,24	-9,90%
Durante el Periodo	$ 179.849.420,94	3,57%	$ 83.704.267,48	1,66%	-$ 96.145.153,46	-1,91%
Acumulado a la Fecha	**$ 828.469.999,95**	**16,45%**	**$ 233.745.538,24**	**4,64%**	**-$ 594.724.461,70**	**-11,81%**

Desviación en días: -29 Días

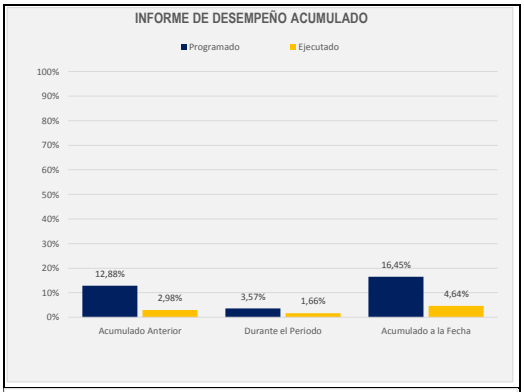

Observaciones al desempeño del proyecto


** **Actividad 1.** Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquia. Aprobado por interventoría con cartas GA-DOMI-040-22 del día 31 de mayo de 2022 y radicado en ENTerritorio bajo el N°. 20224300206752 y GA-DOMI-030-22 radicado N°. 20224300189742.*


** **Actividad 2**. Se han realizado un total de 557 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han presentado a esta Interventoría, por el Contratista de obra, un total de 354 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 323 diagnósticos acumulados, y 22 están en proceso de revisión y 9 con observaciones. En cuanto a las 203 visitas el Consorcio Turquia se encuentra organizando la documentación pertinente para entrega a Interventoría.*

** **Actividad 3**. A corte de este informe el contratista se encuentra interviniendo 27 viviendas, cero (0) viviendas terminadas, 63 no iniciadas y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 325.*

** **Actividad 4.** Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas objeto del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado. Por otra parte se han recepcionado 33 solicitudes de*

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

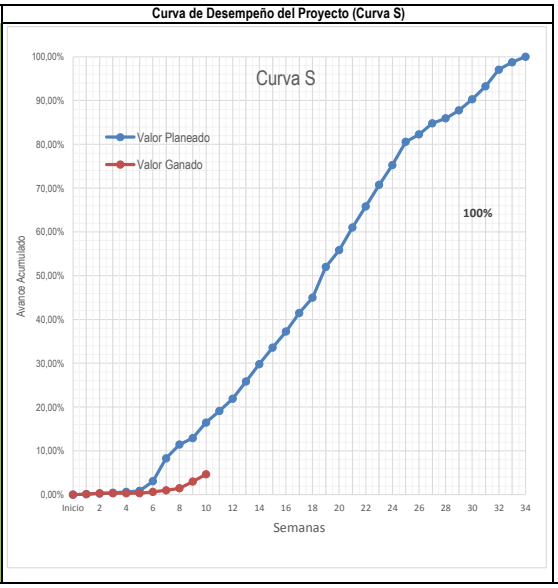

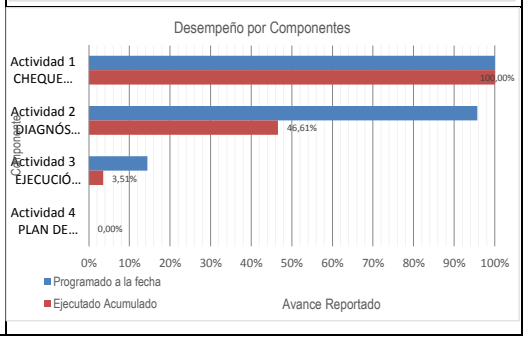

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE


DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)

Se ajusta la curva S del proyecto conforme a la capacitación dada el 28 de abril de 2022 por parte del supervisor de ENTerritorio.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	12,88%	2,98%	-9,90%	
Durante el Periodo	3,57%	1,66%	-1,91%	
Acumulado a la Fecha	**16,45%**	**4,64%**	**-11,81%**	




AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo		
			Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 5.034.941.972,00	$ 5.034.941.972,00	$ -	$ 981.956.213,58	$ -	$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados		No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados		Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
	Valor en Pesos	%		Valor en Pesos	%		
0	$ -	0,00%	0	$ -	0,00%	N/A	$ -








AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR


Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo		
			Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 542.723.071,00	$ 542.723.071,00	$ -	N/A	N/A	#¡VALOR!

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 10

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **20/06/2022** al **26/06/2022** | Fecha **27/06/2022**



No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados		No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados		Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
	Valor en Pesos	%		Valor en Pesos	%		
2	$ 54.272.307,10	10,00%	1	$ 27.136.153,55	5,00%	N/A	$ -







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

Actividad 1. Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, se presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquía.

* Actividad 2. Se han realizado un total de 557 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han presentado a esta Interventoría, por el Contratista de obra, un total de 354 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 323 diagnósticos acumulados, y 22 están en proceso de revisión y 9 con observaciones. En cuanto a las 203 visitas el Consorcio Turquía se encuentra organizando la documentación pertinente para entrega a Interventoría.

* Actividad 3. A corte de este informe el contratista se encuentra interviniendo 27 viviendas, cero (0) viviendas terminadas, 63 no iniciadas y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 325.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

* El día 21 de junio de 2022 se realizó el comité de seguimiento con la asistencia de los representantes del Contratista de Obra, ENTerritorio e Interventoría, en donde se trataron los siguientes temas:

ACTIVIDAD 2:

* Se realizó la revisión del estado del avance de la Actividad 2, en donde se pudo constatar que el Contratista de Obra tiene 323 diagnósticos aprobados por Interventoría, sin embargo se presenta un atraso debido a que lo revisado en comité y conforme a la programación de obra debe tener un total de 663 diagnósticos aprobados, se solicitó al Consorcio Turquía tomar la medidas correctivas para subsanar el atraso reportado.

ACTIVIDAD 3:

* Estado intervenciones (total programado vs total ejecutado)
Viviendas programadas (Ejecución): 56
Viviendas en ejecución: 24
Viviendas terminadas: 0
Viviendas no iniciadas (Ejecución): 67

El contratista se comprometió con la terminación de las viviendas iniciadas al 30 de junio de 2022. Se le reiteró que de acuerdo al Plan de Contingencia para dicha fecha deben tener un total de 56 viviendas terminadas y entregadas.

El compromiso de entregar de la ficha técnica del micro medidor se reprograma para el día 22 de junio de 2022.

Respecto al plan de contingencia, se evidencio por Interventoría que continúa el atraso en la entrega de los materiales para para los enchapes. El Consorcio Turquía manifestó que ocurrió un inconveniente con el proveedor que suministra el material de enchapes, por lo tanto, se reprograma la entrega en obra para el día jueves 23 de 2022, se recalcó que el atraso en la intervención de las viviendas se presenta por el mal estado de la vía principal para el ingreso al barrio El Poblado, sin embargo la Alcaldía de Sincelejo enviará maquinaria para el mejoramiento de las accesos a partir del día 23 de junio de 2022.

* El día 22 de junio de 2022 con carta GA-DOMI-061-22 se procedió a solicitar la disposición en obra los materiales faltantes, así como también recursos de mano de obra necesarios, con el fin de redoblar esfuerzos que permitan dar estricto cumplimiento a los tiempos establecidos en el plan de contingencia entregado con la comunicación CONS-TUR-SINC-045 y lo pactado en el comité de seguimiento No. 10 del 21 de junio de 2022.

* Con carta GA-DOMI-065-22 del día 24 de junio de 2022 se remitió el oficio de ENTerritorio No. 20222200107911, mediante el cual se aprueba el cambio de la especificación de cerámica blanca de 20x20 por cerámica Acuarela Blanco 40X40 para los ítems 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.27 y 3.28.

ACTIVIDADES EN CAMPO

* El día 21 de junio de 2022 el Consorcio Turquía para las 27 unidades sanitarias de las viviendas en ejecución se continuó con las actividades de levante de muro, pañete interno, instalación de tubería hidrosanitaria, desencofrado de losa de tanque elevado y fundida de machones.

En las horas de la tarde se llevó a cabo el comité de seguimiento, en donde se revisaron los temas de avance de obra y atraso reportado fijando compromisos de cumplimiento para el Consorcio Turquía.

* El día 22 de junio de 2022, se dio inicio con la intervención de las viviendas de los consecutivos 029, 030 y 032 con las actividades de excavación para las cimentaciones, figuración de acero y fundida de concreto de dicho elemento.

En horas de la mañana se recibió la visita del director de interventoría el cual realizo un recorrido en la obra en compañía del equipo residente de interventoría, residente de obra, director de obra y representante legal del Consorcio Turquía; se trataron varios temas, entre ellos la solicitud de cumplir con la fecha de entrega de las primeras 17 viviendas iniciadas y la corrección del acero en los machones de la vivienda 019.

Se evidencio la llegada de la maquinaria dispuesta por la Alcaldía de Sincelejo para el mejoramiento de la vía acceso al barrio El Poblado que se encuentra en mal estado.

Se constató por Interventoría que el FOVIS realizó recorrido para verificación de las viviendas de solicitud de inclusión efectuadas para el programa de conexiones intradomiciliaria.
* El día 23 de junio de 2022, el Contratista de obra continúo con la actividad de pañete interno y externo, fundida machones, registros sanitarios, conexiones de puntos sanitarios a las viviendas en intervención.

* El día 24 de junio de 2022, el Contratista de obra continúo con la actividad de pañete interno y externo, fundida machones e instalación de registros sanitarios. En cuanto a la aplicación del carburo a tres manos, Interventoría solicitó en la vivienda 004, realizar el aplique conforme la especificación ya que no se estaba cumpliendo con las cantidades de mezcla que diera el color blanco, por lo tanto, el Contratista de Obra tomó las medidas pertinente para dar solución a lo exigido en los pliegos de condiciones.

El Consorcio Turquía continúo con las visitas para encuestar y realizar los diagnósticos de las viviendas priorizadas según la matriz inicial.

* El día 25 de junio de 2022, el Contratista de Obra continúo con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, encofrado y fundida de machones, pañete interno, encofrado y fundida de columnas y se inició con la instalación del enchape en la vivienda 004.

*El día 26 y 27 de junio de 2022 (domingo y lunes festivo), el contratista laboró en las actividades de enchape y colocación de los aparatos sanitarios.

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

* Se continuará con los Diagnósticos de las viviendas en el barrio El Poblado en Sincelejo Sucre.
* Se realizará Comité de seguimiento el día martes 28 de junio de 2022.
* Se realizará comité de aprobación de Diagnósticos el día viernes 01 de julio de 2022 para verificación que los entregables del contratista sean realizados conforme lo requerido por la Entidad.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	39	7	46	49,5%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	0	31	31	33,3%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál? Orden público	16	0	16	17,2%
	Total	**55**	**38**	**93**	**100,00%**



INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 10

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **20/06/2022** al **26/06/2022** Fecha **27/06/2022**



OBSERVACIONES

* Los días 21, 23, 25 de junio, se presentaron lluvias en la mañana y en la tarde.
* Con respecto a los temas operativos se informa que el contratista ha presentado inconvenientes en el acarreo de los materiales de obra a cada una de las viviendas en intervención desde el pasado 25 de mayo de 2022, debido al mal estado de las vías de acceso al proyecto; esta situación el Consorcio Turquía lo ha manifestado en los diferentes comités de seguimiento.

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
N/A						

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
Inclusión	No. de PQR 1 Yessica Cantello	20 mayo del 2022	El/La señor(a) Yessica Cantello solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 72.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 2 Betilda Gonzales	25 mayo del 2022	El/La señor(a) Betilda Gonzales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 40 - lote 2.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 3 Luz Dary Ruiz	25 mayo del 2022	El/La señor(a) Luz Dary Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 40.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 4 Jorge Guerra Arrieta	25 mayo del 2022	El/La señor(a) Jorge Guerra Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45a 16j - 30.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 5 Emir Elias Pren M	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Emir Elias Pren M solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 15 - lote 21.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 6 Andrea Beltran Vides	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Andrea Beltran Vides solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 4 - lote 5.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 7 Jader Perez Molina	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Jader Perez Molina solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17e 45 - 12.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 8 Oscar Gamarro	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Oscar Gamarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 50 - lote 18.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 9 Manuel Mercado A	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Manuel Mercado A solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17d 45 -06.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 10 Humberto Atencia Sierra	27 mayo del 2022	El/La señor(a) Humberto Atencia Sierra solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 62 - lote 12.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 11 Erika Blanco	27 mayo del 2022	El/La señor(a) Erika Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 13.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 12 Yuris Paola Suarez	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Yuris Paola Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 38 lote 22.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 13 Katerine Benitez Villalba	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Katerine Benitez Villalba solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 50 - lote 16.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 14 Jose Juaquin Florez	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Jose Juaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 15 Ana Isabel Florez	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 16 Marileys Molina Alvarado	01 junio del 2022	El/La señor(a) Marileys Molina Alvarado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 78.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 17 Jeraldine Yepe Lasmar	01 junio del 2022	El/La señor(a) Jeraldine Yepe Lasmar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 15.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 18 Enna Maria Lamar	01 junio del 2022	El/La señor(a) Enna Maria Lamar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 16.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 19 Nauded Alvarez Maurez	02 junio del 2022	El/La señor(a) Nauded Alvarez Maurez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 24.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 20 Henoc Jose Mercado	03 junio del 2022	El/La señor(a) Henoc Jose Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 F 45- 46.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 21 Brenda Galvan Mercado	03 junio del 2022	El/La señor(a) Brenda Galvan Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 61 - lote 13.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 22 Sindy Rodriguez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Sindy Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45 - 05.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 23 Luz Dary Martinez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Dary Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 45.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 24 Jose Juaquin Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Juaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 25 Ana Milena Vergara	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Milena Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 20 - lote 6.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 26 Maria Alejandra Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Alejandra Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 3.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 27 Oswaldo jimenez Ramirez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Oswaldo jimenez Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 2.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 28 Hernan Jimenez Marin	06 junio del 2022	El/La señor(a) Hernan Jimenez Marin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 14 - lote 7.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 29 Carmen Carpintero	06 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 2.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 30 Ana Isabel Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 31 Edilma Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Edilma Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 45 - lote 4.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 32 Silvio David Morelo	06 junio del 2022	El/La señor(a) Silvio David Morelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 57 - lote 8.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 33 Norelis Zabaleta	06 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Zabaleta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 59 - lote 5.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 34 Darin Blanco Fuentes	08 junio del 2022	El/La señor(a) Darin Blanco Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 13.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 35 Deivi Jose Miranda	8 junio del 2022	El/La señor(a) Deivi Jose Miranda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 11.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 36 Gertrudis Lopez Herazo	8 junio del 2022	El/La señor(a) Gertrudis Lopez Herazo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 2.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 37 Sandra Cruz Peña	10 junio del 2022	El/La señor(a) Sandra Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 73.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 38 Gina Salcedo Ruiz	10 junio del 2022	El/La señor(a) Gina Salcedo Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 22.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 39 Yesica Cabrera Lora	10 junio del 2022	El/La señor(a) Yesica Cabrera Lora solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 27.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 40 Walter Arrieta	10 junio del 2022	El/La señor(a) Walter Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 48.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 41 Ana Luisa Contreras	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Luisa Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 32.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 42 Andres Bruno Benavidez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Bruno Benavidez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 21.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 10

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **20/06/2022** al **26/06/2022** Fecha **27/06/2022**

Inclusión	No. de PQR 43 Bertina Montes	15 junio del 2022	El/La señor(a) Bertina Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 39 - lote 4.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 44 Emistocle Bertel Avila	15 junio del 2022	El/La señor(a) Emistocle Bertel Avila solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 14.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 45 Griseida Arrieta Betin	15 junio del 2022	El/La señor(a) Griseida Arrieta Betin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 53 - lote 4.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 46 Nadin Carvajal	15 junio del 2022	El/La señor(a) Nadin Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 3.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 47 Carmen Carpintero	15 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 2.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 48 Martha Regino Herrera	15 junio del 2022	El/La señor(a) Martha Regino Herrera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 2 - lote 19.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 49 Blanca Avilez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Blanca Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 47.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 50 Luz Marina Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Marina Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 22.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 51 Gabriel Julio Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Julio Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 43 - lote 15.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 52 Luis rodriguez Rivero	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luis rodriguez Rivero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 48.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 53 Maria Monroy	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Monroy solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 12.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 54 Dani Velazquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Dani Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 55 Edith Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Edith Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 9.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 56 Nayiris Navarro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Nayiris Navarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 10.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 57 Santiago Troncoso Reyes	16 junio del 2022	El/La señor(a) Santiago Troncoso Reyes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45A - 157.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 58 Milagro Niebles Castro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Milagro Niebles Castro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 28 - lote 5.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 59 Elena Peña Pineda	16 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Peña Pineda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A 45.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 60 Ever Luis Marquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ever Luis Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 121.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 61 Ramona Rosa Diaz	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ramona Rosa Diaz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 42 - lote 17.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 62 Andres Murillo Perez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 54 - lote 2.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 63 Heriberto Fernandez Lopez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Heriberto Fernandez Lopez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 17A 45B 11.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 64 Gabriel Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16I 45C 74.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 65 Denys Herrera Alvarez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Denys Herrera Alvarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A 16.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 66 Alicia Conde Morales	16 junio del 2022	El/La señor(a) Alicia Conde Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45 A 65.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 67 Gregoria Marzan Solar	17 junio del 2022	El/La señor(a) Gregoria Marzan Solar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 01.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 68 Lina Martinez Zuñiga	17 junio del 2022	El/La señor(a) Lina Martinez Zuñiga solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 4.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 69 Carmerlo Castro Novoa	17 junio del 2022	El/La señor(a) Carmerlo Castro Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 48 - lote 3.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 70 Nicolasa Padilla	17 junio del 2022	El/La señor(a) Nicolasa Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 20A.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 71 Jose Miguel Lopez Bravo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Miguel Lopez Bravo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 20.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 72 Vicente Villamizar Campo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Vicente Villamizar Campo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 10.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 73 Ely Causil Martinez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Ely Causil Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 17.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 74 Padro Ramos	17 junio del 2022	El/La señor(a) Padro Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 12.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 75 Dagoberto Mendoza Mercado	17 junio del 2022	El/La señor(a) Dagoberto Mendoza Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 13.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 76 Iris Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 7.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 77 Maria Carlota Menco	17 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Carlota Menco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 47.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 78 Iris Murillo Perez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 11.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 79 Edilsa Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Edilsa Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 3.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 80 Alejandra Loaiza Corrales	17 junio del 2022	El/La señor(a) Alejandra Loaiza Corrales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 29 - lote 11.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 81 Grey Montes Rodriguez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Grey Montes Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 2.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 82 Marlenys arroyo Quintero	21 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenys arroyo Quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 6.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 83 Rodolfo Gonzalez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Rodolfo Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 41 - lote 38.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 84 Elida Pinto Morales	21 junio del 2022	El/La señor(a) Elida Pinto Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 31.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 85 Nelfi Calle Mejia	21 junio del 2022	El/La señor(a) Nelfi Calle Mejia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B 24.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 86 Jorge Ramos Osorio	21 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Ramos Osorio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 87 Manuel Solano Almario	21 junio del 2022	El/La señor(a) Manuel Solano Almario solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B 22.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 88 Carmen Perez Contreras	21 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Perez Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 45.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 89 Estefany Buelvas	21 junio del 2022	El/La señor(a) Estefany Buelvas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 22 - lote 11.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 90 Omaida Villadiego	22 junio de(2022	El/La señor(a) Omaida Villadiego solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 41.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 10

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **20/06/2022** al **26/06/2022** Fecha **27/06/2022**

Inclusión	No. de PQR 91 Rosa Isabel Alba Llanares	22 junio de(2022	El/La señor(a) Rosa Isabel Alba Llanares solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 29.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 92 Carmen Arroyo Ramos	22 junio de(2022	El/La señor(a) Carmen Arroyo Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 28.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 93 Alvaro Macea Rivera	22 junio de(2022	El/La señor(a) Alvaro Macea Rivera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 12 - lote 16.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANALISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
Atraso en las actividades de ejecución de obra	Plan de contingencia	El Contratista mediante carta CONS-TUR-SINC-045 del día 17 de junio de 2022, remitió el plan de contingencia mediante el cual se comprometió a nivelar las actividades de los diagnósticos el día 30 de junio de 2022. Respecto a las actividades de ejecución, el Contratista de obra presenta un plan de trabajo en el cual informa que se nivelará con la programación a más tardar el día 14 de julio de 2022.	Consorcio Turquía	Plan de contingencia carta CONS-TUR-SINC-045	17/06/2022
Mal estado de vías de acceso.	Solicitud adecuación de vías por parte de Alcaldía.	Teniendo en cuenta la reunión realizada el día 31 de mayo de 2022 se concertó con la Alcaldía a través del Ministerio de Vivienda la disponibilidad de la maquinaria para llevar a cabo las adecuaciones de las vías de acceso al barrio El Poblado.	Alcaldía Sincelejo	El 22 de junio 2022 hizo presencia la maquinaria de la Alcaldía de Sincelejo para el inicio de las adecuaciones en la carrera 16 I con	22/06/2022
Contrato de acueducto	Coordinación entre contratos	El Contratista realizo los acercamientos pertinentes, no obstante a la fecha no se ha definido el fecha de inicio y fin de intervención de la vía 16 J	Alcaldía Sincelejo	N/A	N/A

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

El Consorcio Turquía continuó con la Actividad 2 en las visitas de los Diagnósticos de las viviendas objeto del programa de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico en el barrio El Poblado, por lo que a la fecha de corte del presente informe semanal se tiene aprobado trescientas veintitrés (323) diagnósticos acumulados, se adjunta la Matriz 3 momentos suministrada por la Entidad. Se tiene proyectado que a partir de la siguiente semana, el Contratista de Obra realice con mayor regularidad la entrega de los paquetes de diagnósticos para poder dar cumplimiento a la programación de obra.

Para la Actividad 3 se encuentra ejecutando un total de veintisiete (27) viviendas, de las cuales se realizó la verificación de las medidas, demarcaciones de zonas de excavaciones, figurado de acero, fundida de cimentaciones, columnas y machones y en algunas se realizó el levante de muros.

Respecto a la actividad 4, se han recibido 33 solicitudes de inclusiones., y se continuara con las visitas vivienda por viviendas para dar a conocer toda la información referente a este proyecto a los potenciales beneficiarios.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 10

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **20/06/2022** al **26/06/2022** Fecha **27/06/2022**

respecto a la actividad 4, se han recibido 36 solicitudes de indidencia, y se continúa con las visitas virtuales por llamada para dar a conocer toda la información relevante a este proyecto ante posibles beneficiarios.

Conforme lo anterior, en la presente semana se tiene un porcentaje ejecutado acumulado de 4,65% y un porcentaje programado acumulado de 16,45%, lo cual representa un atraso de 11,81% en las actividades de ejecución del Programa de Conexión Intradomiciliaria, sin embargo, esta Interventoría da claridad que por factores climáticos, estado de las vías de acceso al barrio El Poblado para el acarreo de los materiales de obra a cada una de las viviendas en ejecución y orden publico ocasionado por grupos al margen de Ley, se presentaron perdidas en tiempo que impidió la adecuada ejecución de las actividades programadas, por lo tanto, al realizar el análisis de incidencia según el seguimiento a dichos inconvenientes se estableció que el porcentaje no imputable al Consorcio Turquía es de 4.76% y el restante 7.04% si son responsabilidad del contratista de obra.

Teniendo en cuenta dicho porcentaje de atraso de 7.04% imputable al contratista de obra, esta Interventoría en semanas anteriores requirió la entrega de un plan de contingencia el cual fue entregado por el Consorcio Turquía con carta CONS-TUR-SINC-045 del día 17 de junio de 2022 en donde pretende nivelar el atraso reportado en un periodo de cuatro semanas a corte del día 14 de julio de 2022, por lo tanto, esta Interventoría realizará el seguimiento de las actividades del contratista de obra y emitirá las alertas pertinentes al evidenciar incumplimientos, si estos se presentasen.

Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	**Firma**	**Firma**
Nombre EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO	Nombre HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES	Nombre
Director de Interventoría o Representante legal <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Profesional Costos y Presupuesto <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Supervisor

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

Bogotá D.C, 06 de julio de 2022



Señor
JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
Supervisor
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio
Calle 26 N°. 13-19
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Interventoría N°. 2220585 "Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre"**

Asunto: **Remisión Informe Semanal No. 11 periodo del 27 de junio de 2022 al 03 de julio de 2022**

Apreciado señor,

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, anexo, se remite el informe semanal de Interventoría No. 11 del contrato de la referencia para el período comprendido entre el 27 de junio de 2022 al 03 de julio de 2022.

Anexo se remite como soporte al Informe Semanal N°. 11, Acta de seguimiento, Acta de comité de aprobación de diagnósticos, bitácora de obra, lista de chequeo seguimiento estado de salud, informe social, resumen de avance y Matriz Tres Momentos.

Cordialmente,

EDGAR ALFONSO ARAGÓN OTERO
Director de Interventoría
Anexos: Lo enunciado en cuarenta y dos (42) folios y archivos en magnético.
C.C.: Ing. Juan David Amón – Supervisor del contrato Convenio Inter administrativo 221005; Enterritorio.
Archivo
Elaboró: MJ
Revisó: EAO

INFORME SEMANAL

Cra. 48 No. 101A – 29 Bogotá, Colombia Tel: (57 1) 236 7974 – 621 5383
E-mail: info@gavinco.com www.gavinco.com

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 11

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **27/06/2022** al **03/07/2022** Fecha **04/06/2022**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CODIGO PROYECTO	2220577
OBJETO DEL PROYECTO	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** SUCRE **MUNICIPIO** SINCELEJO
GERENCIA A CARGO	GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1
SUPERVISOR	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
ESTADO DEL PROYECTO	En ejecución.

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.		2220577	
Contratista		CONSORCIO TURQUIA	
Valor inicial	$	5.034.941.972,00	
Valor actual	$	5.034.941.972,00	
Variación del valor	$	-	
Fecha de Inicio		13/04/2022	
Plazo inicial (Días)		244 Días	
Plazo actual (Días)	244 Días		100,00%
Variación en plazo		Días	
Fecha Contractual de terminación		13/12/2022	
Tiempo Transcurrido (días)	51		20,90%
Días remanentes del Contrato	192		78,69%
Acumulado a última acta pagada	$	-	
Estimado ejecutado por llevar a acta	$	-	

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.		2220585	
Interventor		GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S.	
Valor inicial	$	542.723.071,00	
Valor actual	$	542.723.071,00	
Variación del valor	$	-	
Fecha de Inicio		13/04/2022	
Plazo inicial		244 Días	
Plazo actual	244 Días		100,00%
Variación en plazo		Días	
Fecha Contractual de terminación		13/12/2022	
Ejecución del Contrato	51		20,90%
Días remanentes del Contrato	192		78,69%
Acumulado a última acta pagada	$	-	
Estimado ejecutado por llevar a acta	$	-	

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 5.034.941.972,00

Semáforo

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 828.469.999,95	16,45%	$ 233.621.307,50	4,64%	-$ 594.848.692,44	-11,81%
Durante el Periodo	$ 132.699.801,64	2,64%	$ 39.887.436,36	0,79%	-$ 92.812.365,28	-1,84%
Acumulado a la Fecha	**$ 961.169.801,58**	**19,09%**	**$ 273.508.743,86**	**5,43%**	**-$ 687.661.057,72**	**-13,66%**

Desviación en días: -33 Días

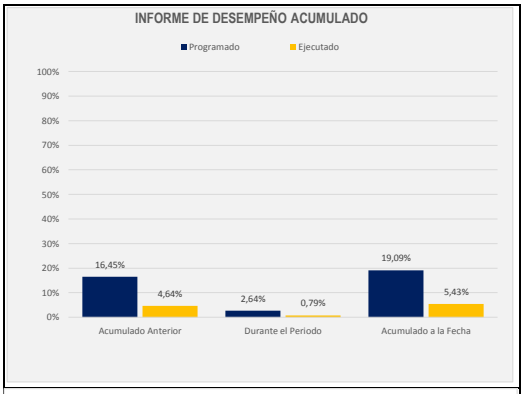

Observaciones al desempeño del proyecto


** **Actividad 1.** Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquia. Aprobado por interventoria con cartas GA-DOMI-040-22 del dia 31 de mayo de 2022 y radicado en ENTerritorio bajo el N°. 20224300206752 y GA-DOMI-030-22 radicado N°. 20224300189742.*


** **Actividad 2**. Se han realizado un total de 557 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han presentado a esta Interventoría, por el Contratista de obra, un total de 435 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 396 diagnósticos acumulados, En cuanto a las 122 visitas el Consorcio Turquia se encuentra organizando la documentación pertinente para entrega a Interventoría.*

** **Actividad 3**. A corte de este informe el contratista se encuentra interviniendo 30 viviendas, 17 terminadas, que seran entregadas a esta interventoria la semana siguiente, 88 no iniciadas y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 380.*

** **Actividad 4.** Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas objeto del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado. Por otra parte se han recepcionado 93 solicitudes de inclusión.*

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

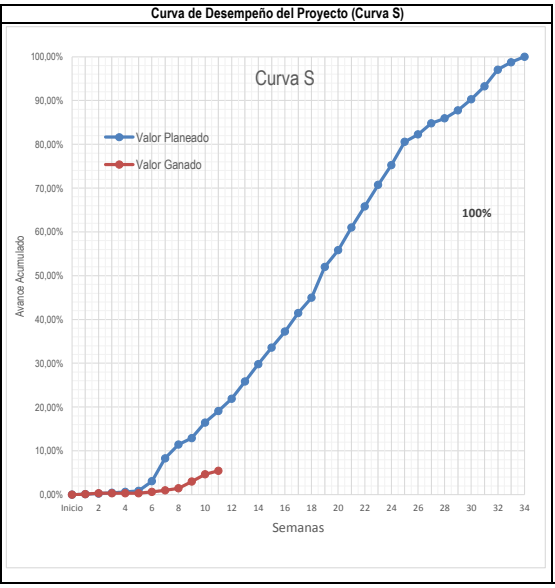

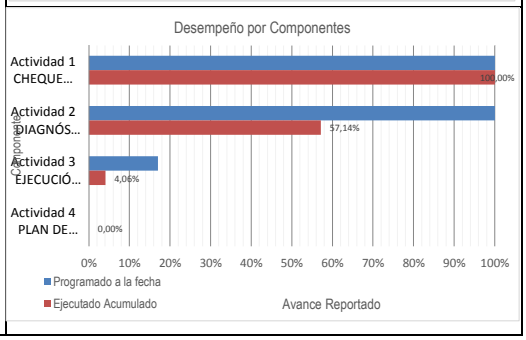

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE


DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)

Se ajusta la curva S del proyecto conforme a la capacitación dada el 28 de abril de 2022 por parte del supervisor de ENTerritorio.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	16,45%	4,64%	-11,81%	
Durante el Periodo	2,64%	0,79%	-1,84%	
Acumulado a la Fecha	**19,09%**	**5,43%**	**-13,66%**	



AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo		
			Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 5.034.941.972,00	$ 5.034.941.972,00	$ -	$ 981.956.213,58	$ -	$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados		No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados		Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
	Valor en Pesos	%		Valor en Pesos	%		
0	$ -	0,00%	0	$ -	0,00%	N/A	$ -




AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR


Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo		
			Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 542.723.071,00	$ 542.723.071,00	$ -	N/A	N/A	#¡VALOR!

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 11

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **27/06/2022** al **03/07/2022** Fecha **04/06/2022**



No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados		No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados		Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
	Valor en Pesos	%		Valor en Pesos	%		
2	$ 54.272.307,10	10,00%	1	$ 27.136.153,55	5,00%	N/A	$ -







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

Actividad 1. Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, se presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquía.

* Actividad 2. Se han realizado un total de 557 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han presentado a esta Interventoría, por el Contratista de obra, un total de 435 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 396 diagnósticos acumulados, En cuanto a las 122 visitas el Consorcio Turquía se encuentra organizando la documentación pertinente para entrega a Interventoría.

* Actividad 3. A corte de este informe el contratista se encuentra interviniendo 30 viviendas, 17 viviendas terminadas, 88 no iniciadas y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 380.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

* El día 28 de junio de 2022 se realizó el comité de seguimiento con la asistencia de los representantes del Contratista de Obra, ENTerritorio e Interventoría, en donde se trataron los siguientes temas:

ACTIVIDAD 2:

* Revisión de diagnósticos a la fecha de comité de seguimiento.

Viviendas programadas con aprobación: 480
Viviendas Efectivas: 533
Viviendas No efectivas: 5
Viviendas visitadas: 538
Viviendas aprobadas: 323

Próxima semana viviendas programadas (Con aprobación):

* Plan de contingencia.

Diangosticos a presentar a corte del 25 de junio de 2022: segun el plan de contingencia se deben tener a corte del 25 de junio de 2022 un total de 205 diagnosticos y en los ultimos dos comites se han aprobado 123. El Contratsita menciona que se han tenido incovenientes con el escaner para la digitalizacion de los diagnoticos para remision oficial, sin embargo se procederá con la toma de las acciones para que en el proximo comite de aprobacion se nivele con la meta establecida en el plan. Se reprograma comite para el día viernes con el fin de que el contratista entregue la mayor cantidad, ya que se debe entregar en interventoria un total de 151 diagnsoticos. Se recomienda por Interventoria remitirlos con tiempo entre el dia miercoles y jueves.

ACTIVIDAD 3:

* Revision estado de ejecuccion obras:

Viviendas programadas : 90
Viviendas en ejecución : 27
Viviendas terminas 0

* Plan de contingencia:

Viviendas porgramdas termindas a corte del 25/06/222: 17
Viviendas terminadas:0
VIviendas iniciadas programadas: 56
Viviendas iniciadas en la semana: 2

* Mediante el oficio de ENTerritorio No. 20222200107911, se dio aprobación por la Entidad del cambio de la especificación de cerámica blanca de 20x20 por cerámica Acuarela Blanco 40X40 para los ítems 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.27 y 3.28, por lo tanto, esta Interventoría dio traslado al Consorcio Turquía con la carta GA-DOMI-065-22 del día 24 de junio de 2022.

* El día 28 de junio de 2022 con carta GA-DOMI-069-22 radicado en ENTerritorio N°. 20224300243432 una vez realizada la revisión de la Hoja de Vida remitida por el Consorcio Turquía, se dio aprobación a la Sra. Estefany Paternina Vitola propuesta para el cargo de profesional Social.

El día 29 de junio de 2022 con carta GA-DOMI-071-22, esta Interventoría realizó balance al plan de contingencia entregado por el Consorcio Turquía remitido con carta CONS-TUR-SINC-045 conforme al seguimiento realizado a las actividades de obra y de entrega de diagnósticos, encontrando que si bien se han presentado inconvenientes que han influido en que se agrave la desviación en lo programado versus lo ejecutado, ocasionado por factores climáticos, estado de las vías de acceso al barrio El poblado para el acareo de los materiales de obra a cada una de las viviendas en ejecución y por orden publico ocasionado por grupos al margen de la Ley, se evidencio que no se está dando cumplimiento a las metas fijadas en el Plan de Contingencia, por lo tanto se solicitó tomar las acciones que permitían dar cumplimiento en los plazos fijados.

ACTIVIDADES EN CAMPO

* El día 27 de junio de 2022 el Consorcio Turquía para las 27 unidades sanitarias de viviendas en ejecución, continuó con las actividades de instalación de tubería hidrosanitaria, colocación de enchape, fundida de plantilla de los baños e instalación de los aparatos sanitarios.

* El día 28 de junio de 2022, se continuó con las actividades de fundida de losa aérea para el tanque elevado, instalación del enchape, fundida de plantilla, pañete interior y exterior, fundida de registros sanitarios, instalación de tubería sanitaria. Por parte de la interventoría se realizó observaciones en dos viviendas ya que el enchape quedo desalineado, recomendación que fue acatada inmediatamente por el contratista. En horas de la tarde se realizó el comité de seguimiento de obra en el cual se hace presente el contratista, interventoría y la entidad ejecutora.

* El día 29 de junio de 2022, el Contratista de obra continúo con la actividad de pañete interno y externo, registros sanitarios, instalación del enchape, fundida de plantilla, conexiones de puntos sanitarios a las viviendas en intervención.

* El día 30 de junio de 2022, el Contratista de obra continuó con la actividad de pañete interno y externo, instalación de registros sanitarios, instalación del enchape, fundida de plantilla, instalación del tanque elevado de 500 litros, instalación de cubiertas. Se dio apertura de intervención de dos viviendas con los consecutivos de S-SC-EP-M35-VE-026 y S-SC-EP-M35-VE-028.

* El día 01 de julio de 2022, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, encofrado y fundida de cimentaciones, instalación del enchape, instalación de cubiertas e instalación de puertas. Se realizó comité de aprobación en donde se aprobaron un total de 73 diagnósticos.

*El día 02 de julio de 2022 el contratista continuó con las actividades de instalación de enchape, instalación de aparatos sanitarios, instalación de las puertas, fundida de cimentaciones, levante de muro y armado de acero para las viga y machones. Se evidencio la llegada a la obra de un minicargador para el trasiego de materiales de obra a cada una de las viviendas, sin embargo por el mal estado de las vías se retrasó varias horas para poder entregar los insumos requeridos.

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

* Se continuará con los Diagnósticos de las viviendas en el barrio El Poblado en Sincelejo Sucre.
* Se realizará Comité de seguimiento el día martes 05 de julio de 2022
* Se realizará comité de aprobación de Diagnósticos el día viernes 08 de julio de 2022 para verificación que los entregables del contratista sean realizados conforme lo requerido por la Entidad.

6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO


DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0

Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	46	4	50	51,5%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%




INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 11

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **27/06/2022** al **03/07/2022** Fecha **04/06/2022**

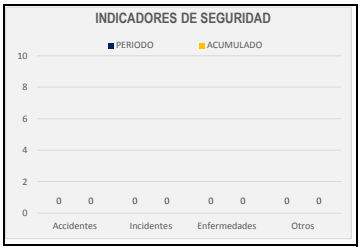

4	Operativos	31	0	31	32,0%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál? Orden público	16	0	16	16,5%
	Total	**93**	**4**	**97**	**100,00%**



OBSERVACIONES

* Los días 27 y 30 de julio, se presentaron lluvias en la mañana y en la tarde.
* Con respecto a los temas operativos se informa que el contratista a través de la comunicación CONS-TUR-SINC-054 del día 02 de julio de 2022, remitió la actualización del plan de contingencia en donde manifiesta que las actividades atrasadas por el acarreo de los materiales dentro del sitio de la obra, así mismo informa con la disponibilidad de materiales para dar apertura de las intervenciones de viviendas en los meses siguientes y se han tomado las acciones correctivas para minimizar los tiempos de transporte de los materiales.

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
N/A						

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
Inclusión	No. de PQR 1 Yessica Cantello	20 mayo del 2022	El/La señor(a) Yessica Cantello solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 72.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 2 Betilda Gonzales	25 mayo del 2022	El/La señor(a) Betilda Gonzales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 40 - lote 2.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 3 Luz Dary Ruiz	25 mayo del 2022	El/La señor(a) Luz Dary Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 40.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 4 Jorge Guerra Arrieta	25 mayo del 2022	El/La señor(a) Jorge Guerra Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45a 16j - 30.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 5 Emir Elias Pren M	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Emir Elias Pren M solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 15 - lote 21.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 6 Andrea Beltran Vides	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Andrea Beltran Vides solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 4 - lote 5.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 7 Jader Perez Molina	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Jader Perez Molina solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17e 45 - 12.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 8 Oscar Gamarro	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Oscar Gamarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 50 - lote 18.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 9 Manuel Mercado A	26 mayo del 2022	El/La señor(a) Manuel Mercado A solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17d 45 -06.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 10 Humberto Atencia Sierra	27 mayo del 2022	El/La señor(a) Humberto Atencia Sierra solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 62 - lote 12.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 11 Erika Blanco	27 mayo del 2022	El/La señor(a) Erika Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 13.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 12 Yuris Paola Suarez	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Yuris Paola Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 38 lote 22.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 13 Katerine Benitez Villalba	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Katerine Benitez Villalba solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 50 - lote 16.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 14 Jose Juaquin Florez	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Jose Juaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 15 Ana Isabel Florez	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 16 Marileys Molina Alvarado	01 junio del 2022	El/La señor(a) Marileys Molina Alvarado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 78.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 17 Jeraldine Yepe Lasmar	01 junio del 2022	El/La señor(a) Jeraldine Yepe Lasmar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 15.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 18 Enna Maria Lamar	01 junio del 2022	El/La señor(a) Enna Maria Lamar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 16.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 19 Nauded Alvarez Maurez	02 junio del 2022	El/La señor(a) Nauded Alvarez Maurez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 24.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 20 Henoc Jose Mercado	03 junio del 2022	El/La señor(a) Henoc Jose Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 F 45- 46.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 21 Brenda Galvan Mercado	03 junio del 2022	El/La señor(a) Brenda Galvan Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 61 - lote 13.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 22 Sindy Rodriguez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Sindy Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45 - 05.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 23 Luz Dary Martinez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Dary Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 45.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 24 Jose Juaquin Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Juaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 25 Ana Milena Vergara	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Milena Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 20 - lote 6.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 26 Maria Alejandra Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Alejandra Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 3.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 27 Oswaldo jimenez Ramirez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Oswaldo jimenez Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 2.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 28 Hernan Jimenez Marin	06 junio del 2022	El/La señor(a) Hernan Jimenez Marin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 14 - lote 7.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 29 Carmen Carpintero	06 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 2.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 30 Ana Isabel Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 31 Edilma Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Edilma Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 45 - lote 4.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 32 Silvio David Morelo	06 junio del 2022	El/La señor(a) Silvio David Morelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 57 - lote 8.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 33 Norelis Zabaleta	06 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Zabaleta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 59 - lote 5.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 34 Darin Blanco Fuentes	08 junio del 2022	El/La señor(a) Darin Blanco Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 13.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 35 Deivi Jose Miranda	8 junio del 2022	El/La señor(a) Deivi Jose Miranda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 11.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 36 Gertrudis Lopez Herazo	8 junio del 2022	El/La señor(a) Gertrudis Lopez Herazo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 2.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 37 Sandra Cruz Peña	10 junio del 2022	El/La señor(a) Sandra Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 73.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 38 Gina Salcedo Ruiz	10 junio del 2022	El/La señor(a) Gina Salcedo Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 22.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 39 Yesica Cabrera Lora	10 junio del 2022	El/La señor(a) Yesica Cabrera Lora solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 27.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 11

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **27/06/2022** al **03/07/2022** Fecha **04/06/2022**

Inclusión	No. de PQR 40 Walter Arrieta	10 junio del 2022	El/La señor(a) Walter Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 48.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 41 Ana Luisa Contreras	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Luisa Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 32.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 42 Andres Bruno Benavidez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Bruno Benavidez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 21.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 43 Bertina Montes	15 junio del 2022	El/La señor(a) Bertina Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 39 - lote 4.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 44 Emistocle Bertel Avila	15 junio del 2022	El/La señor(a) Emistocle Bertel Avila solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 14.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 45 Griseida Arrieta Betin	15 junio del 2022	El/La señor(a) Griseida Arrieta Betin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 53 - lote 4.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 46 Nadin Carvajal	15 junio del 2022	El/La señor(a) Nadin Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 3.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 47 Carmen Carpintero	15 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 2.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 48 Martha Regino Herrera	15 junio del 2022	El/La señor(a) Martha Regino Herrera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 2 - lote 19.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 49 Blanca Avilez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Blanca Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 47.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 50 Luz Marina Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Marina Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 22.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 51 Gabriel Julio Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Julio Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 43 - lote 15.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 52 Luis rodriguez Rivero	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luis rodriguez Rivero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 48.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 53 Maria Monroy	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Monroy solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 12.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 54 Dani Velazquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Dani Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 55 Edith Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Edith Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 9.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 56 Nayiris Navarro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Nayiris Navarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 10.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 57 Santiago Troncoso Reyes	16 junio del 2022	El/La señor(a) Santiago Troncoso Reyes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45A - 157.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 58 Milagro Niebles Castro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Milagro Niebles Castro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 28 - lote 5.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 59 Elena Peña Pineda	16 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Peña Pineda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A 45.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 60 Ever Luis Marquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ever Luis Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 121.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 61 Ramona Rosa Diaz	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ramona Rosa Diaz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 42 - lote 17.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 62 Andres Murillo Perez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 54 - lote 2.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 63 Heriberto Fernandez Lopez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Heriberto Fernandez Lopez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 17A 45B 11.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 64 Gabriel Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16I 45C 74.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 65 Denys Herrera Alvarez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Denys Herrera Alvarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A 16.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 66 Alicia Conde Morales	16 junio del 2022	El/La señor(a) Alicia Conde Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45 A 65.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 67 Gregoria Marzan Solar	17 junio del 2022	El/La señor(a) Gregoria Marzan Solar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 01.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 68 Lina Martinez Zuñiga	17 junio del 2022	El/La señor(a) Lina Martinez Zuñiga solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 4.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 69 Carmerlo Castro Novoa	17 junio del 2022	El/La señor(a) Carmerlo Castro Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 48 - lote 3.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 70 Nicolasa Padilla	17 junio del 2022	El/La señor(a) Nicolasa Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 20A.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 71 Jose Miguel Lopez Bravo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Miguel Lopez Bravo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 20.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 72 Vicente Villamizar Campo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Vicente Villamizar Campo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 10.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 73 Ely Causil Martinez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Ely Causil Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 17.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 74 Padro Ramos	17 junio del 2022	El/La señor(a) Padro Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 12.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 75 Dagoberto Mendoza Mercado	17 junio del 2022	El/La señor(a) Dagoberto Mendoza Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 13.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 76 Iris Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 7.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 77 Maria Carlota Menco	17 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Carlota Menco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 47.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 78 Iris Murillo Perez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 11.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 79 Edilsa Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Edilsa Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 3.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 80 Alejandra Loaiza Corrales	17 junio del 2022	El/La señor(a) Alejandra Loaiza Corrales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 29 - lote 11.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 81 Grey Montes Rodriguez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Grey Montes Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 2.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 82 Marlenys arroyo Quintero	21 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenys arroyo Quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 6.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 83 Rodolfo Gonzalez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Rodolfo Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 41 - lote 38.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 84 Elida Pinto Morales	21 junio del 2022	El/La señor(a) Elida Pinto Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 31.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 85 Nelfi Calle Mejia	21 junio del 2022	El/La señor(a) Nelfi Calle Mejia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B 24.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 86 Jorge Ramos Osorio	21 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Ramos Osorio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 87 Manuel Solano Almario	21 junio del 2022	El/La señor(a) Manuel Solano Almario solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B 22.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 11

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **27/06/2022** al **03/07/2022** Fecha **04/06/2022**

Inclusión	No. de PQR 88 Carmen Perez Contreras	21 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Perez Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 45.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 89 Estefany Buelvas	21 junio del 2022	El/La señor(a) Estefany Buelvas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 22 - lote 11.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 90 Omaida Villadiego	22 junio de(2022	El/La señor(a) Omaida Villadiego solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 41.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 91 Rosa Isabel Alba Llanares	22 junio de(2022	El/La señor(a) Rosa Isabel Alba Llanares solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 29.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 92 Carmen Arroyo Ramos	22 junio de(2022	El/La señor(a) Carmen Arroyo Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 28.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.
Inclusión	No. de PQR 93 Alvaro Macea Rivera	22 junio de(2022	El/La señor(a) Alvaro Macea Rivera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 12 - lote 16.	Área técnica del contratista Consorcio Turquía.

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANALISIS DE CAUSAS


PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
Atraso en las actividades de ejecución de obra	Plan de contingencia	El Contratista mediante carta CONS-TUR-SINC-045 del día 17 de junio de 2022, remitió el plan de contingencia mediante el cual se comprometió a nivelar las actividades de los diagnósticos el día 30 de junio de 2022. Respecto a las actividades de ejecución, el Contratista de obra presenta un plan de trabajo en el cual informa que se nivelará con la programación a más tardar el día 14 de julio de 2022.	Consorcio Turquía	Plan de contingencia carta CONS-TUR-SINC-045	17/06/2022
Mal estado de vías de acceso.	Solicitud adecuación de vías por parte de Alcaldía.	Teniendo en cuenta la reunión realizada el día 31 de mayo de 2022 se concertó con la Alcaldía a través del Ministerio de Vivienda la disponibilidad de la maquinaria para llevar a cabo las adecuaciones de las vías de acceso al barrio El Poblado.	Alcaldía Sincelejo	El 22 de junio 2022 hizo presencia la maquinaria de la Alcaldía de Sincelejo para el inicio de las adecuaciones en la carrera 16 I con	22/06/2022
Contrato de acueducto	Coordinación entre contratos	El Contratista realizo los acercamientos pertinentes, no obstante a la fecha no se ha definido el fecha de inicio y fin de intervención de la vía 16 J	Alcaldía Sincelejo	N/A	N/A

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA







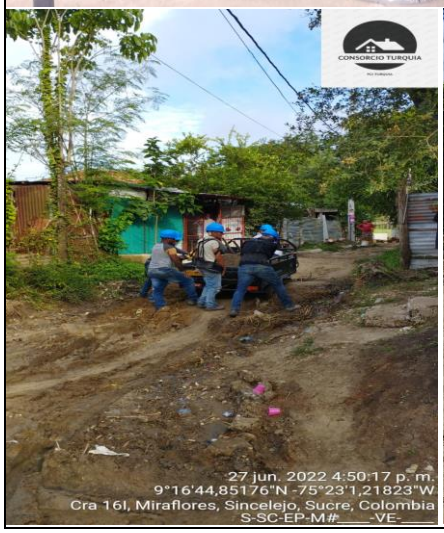





enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-06**
		VERSIÓN:	**1**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 11

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **27/06/2022** al **03/07/2022** Fecha **04/06/2022**

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

El Consorcio Turquía continuó con la Actividad 2 en las visitas de los Diagnósticos de las viviendas objeto del programa de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico en el barrio El Poblado, por lo que a la fecha de corte del presente informe semanal se tiene aprobado trescientos noventa y seis (396) diagnósticos acumulados, se adjunta la Matriz 3 momentos suministrada por la Entidad. Se tiene proyectado que a partir de la siguiente semana, el Contratista de Obra realice con mayor regularidad la entrega de los paquetes de diagnósticos para poder dar cumplimiento a la programación de obra.

Para la Actividad 3 se encuentra ejecutando un total de treinta (30) viviendas, de las cuales se realizó la verificación de las medidas, demarcaciones de zonas de excavaciones, figurado de acero, fundida de cimentaciones, columnas y machones y en algunas se realizó el levante de muros.

Respecto a la actividad 4, se han recibido 33 solicitudes de inclusiones., y se continuara con las visitas vivienda por viviendas para dar a conocer toda la información referente a este proyecto a los potenciales beneficiarios.

Conforme lo anterior, en la presente semana se tiene un porcentaje ejecutado acumulado de 5,43% y un porcentaje programado acumulado de 19,09%, lo cual representa un atraso de 13,66% en las actividades de ejecución del Programa de Conexión Intradomiciliaria, sin embargo, esta Interventoría da claridad que por factores climáticos, estado de las vías de acceso al barrio El Poblado para el acarreo de los materiales de obra a cada una de las viviendas en ejecución y orden publico ocasionado por grupos al margen de Ley, se presentaron perdidas en tiempo que impidió la adecuada ejecución de las actividades programadas, por lo tanto, al realizar el análisis de incidencia según el seguimiento a dichos inconvenientes se estableció que el porcentaje no imputable al Consorcio Turquía es de 4,97% y el restante 8,69% si son responsabilidad del contratista de obra.

Durante la presente semana y en vista de las circunstancias expuestas por el Consorcio Turquía por los inconvenientes en la ejecución de la obra por motivos del estado climático, acceso a la zona de obra por transporte de materiales y orden público, se realizó reunión el día 30 de junio de 2022 en conjunto con ENTerritorio, Interventoría y Contratista de Obra, en donde se llegó a un acuerdo de realizar una actualización al plan de contingencia inicial entregada por el Consorcio Turquía, dándole respuesta al informe de seguimiento de documento entregado con la comunicación de interventoría GA-DOMI-071-22. Conforme a esto, el día 02 de julio de 2022 con carta CONS-TUR-SINC-054 el contratista de obra entregó la actualización del plan de contingencia conforme a las situaciones presentadas en las dos últimas semanas. A continuación se informa el seguimiento a la última versión del plan de contingencia entregado:

Actividad 2:
Viviendas programadas Plan de contingencia: 388 aprobadas.
Viviendas diagnósticos aprobados: 396.

Actividad 3:
Viviendas programadas Plan de contingencia (Terminadas): 17.
Viviendas ejecutadas (Terminadas): 17, el contratista se encuentra atendiendo detalles menores para la entrega a los beneficiarios.

Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	**Firma**	**Firma**
Nombre EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO	Nombre HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES	Nombre
Director de Interventoría o Representante legal <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Profesional Costos y Presupuesto <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Supervisor

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

Anexo 18. Informe de gestión social

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS
PROGRAMA CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

INFORME QUINCENAL No 4.

Dentro de las actividades contempladas en el Plan de Gestión Social del Programa de Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico en el barrio el Poblado durante el periodo del 1 al 15 de junio, en la línea de comunicación se realizó reunión sectorizada con los beneficiarios, que en sus predios se inició la actividad 3 (construcción de casetas).

Se realizó visita casa a casa a 140 viviendas para socialización del PCI para un total de 621 socializaciones casa a casa; reporte de creación del link informativo por parte de la alcaldía; elaboración de carteleras con la información de la fecha límite de recepción de PQRS de inclusión.

En Línea de Participación Comunitaria se recibió la resolución emitida por personería municipal sobre la conformación del comité veedor el viernes 10 de junio. En el punto de atención que se encuentra ubicado en el barrio Puerto Arturo en la Cra 16J #43H- 12 zona de influencia del PCI, solo se recepcionaron 7 PQRS de solicitud de inclusión de las 24 que se tomaron durante el periodo reportado.

Con respecto al componente técnico se continúan realizando visitas diagnósticas; a la fecha se han realizado 463 diagnósticos y aprobados 200; en ejecución se encuentran 17 viviendas, en un aproximado de 60% de avance en intervención.

Debido a las fuertes y constantes lluvias las actividades de tipo social y técnico se han visto limitadas, ya que las condiciones climáticas son un factor que obstaculizan el avance de obra.

Se realizó actividad informativa sobre especificaciones técnicas y sociales al personal de mano de obra sobre el PCI, con el objetivo de sensibilizarlos con respecto a la sana convivencia y comunicación con propietarios de las viviendas intervenidas.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

FECHA DE INICIO DE OBRAS:					
NOMBRE DEL MUNICIPIO	NOMBRE BARRIOS A INTERVENIR	NOMBRE BARRIOS INTERVENIDOS	FECHA DE INFORME	N° DE VIVIENDAS A INTERVENIR POR BARRIO	N° DE VIVIENDAS INTERVENIDAS POR BARRIO
Sincelejo.	El Poblado	El Poblado	15/06/2022	693	17

INFORMACIÓN POR LÍNEA DE INTERVENCIÓN

Línea de Comunicación:

- **Socializaciones** sectorizadas: Debido a la actividad N°3 (ejecución de obra) en 17 viviendas de la manzana 35 del barrio el poblado, para un sano funcionamiento del Programa y cumplimiento de las socializaciones sectorizadas se convocó a los habitantes del sector, a un encuentro con los profesionales técnicos y sociales, con el objetivo de socializar avances, responder a las inquietudes, establecer acuerdos y compromisos con respecto al manejo de materiales; a esta reunión también se invitó a los beneficiarios de la manzana 32 quienes están próximos a intervenir y por ende ya se les ha entregado materiales en sus viviendas. Haciendo participe de esta actividad 33 personas.
  La convocatoria a la reunión se realizó el miércoles 8 de junio, para mayor efectividad en la comunicación se visitó casa a casa se informó lugar, fecha, hora y objetivo del encuentro.

  El jueves 9 de junio, a pesar de las condiciones poco favorables debido al clima lluvioso, inicio la reunión a las 10:49 a.m. por parte de la profesional social del contratista y presentación de los asistentes, de inmediato el arquitecto William Martínez director de obra del contratista de obra Turquía dio paso al tema central de la

Comentario [LO1]: Cuántas personas asistieron a la actividad

sectorizada, como primera medida se socializa nuevamente las características del Programa, nombre, criterios de focalización, tipos de casetas y sus características, mencionó los 5 aparatos hidrosanitarios que hacen parte del tipo de caseta que otorga el Programa de Conexiones Intradomiciliarias a sus beneficiarios.

Explicó la importancia de la visita del equipo encuestador, ya que son quienes aplican el diagnóstico y gracias a este se determina si son efectivas o NO efectiva para la intervención, enfatizó en que cada resultado arrojado por el diagnóstico es diferente para cada vivienda, por ende, el presupuesto requerido para cada una, no es igual y por esta razón la cantidad de materiales varían para cada intervención.

En la anterior afirmación se fue muy reiterativo debido a que algunos beneficiarios a los cuales ya se les está realizando la caseta, al sobrar algún material que por temas logístico llevaron de más, no están dejando retirar ese material, pues refieren que ese material les pertenece y manifiesta que harán uso para otras intervenciones que beneficien la vivienda y que no tiene que ver con los aparatos hidrosanitarios contemplado en el Programa. Estas situaciones han sido reportadas por obreros y residentes de obra.

Seguido una beneficiaria pide la palabra y pregunta:
¿si tengo tanque elevado se omite en el diagnóstico? ¿Y si lo tengo que pasará con el valor del tanque? A estos interrogantes el arquitecto William Martínez responde sobre el monto estipulado por vivienda, además resalto que es agotable según las necesidades y requerimientos que arroje el diagnóstico, con respecto al tanque elevado si la vivienda con el elemento se elabora la columna pertinente para dejar instalado el tanque.

La misma beneficiará pregunta:
¿si la vivienda cuenta con sanitario se cambia o dejan el existente? Se responde: si este se encuentra en buenas condiciones se deja, si es necesario, si no cumple con las especificaciones de calidad debe ser cambiado.

Otro beneficiario pregunta:
¿Qué pasó con la elaboración de las cocinas? Se les explica nuevamente a todos los presentes que el Programa de Conexiones Intradomiciliarias de agua Potable y Saneamiento básico tiene como objetivo mejorar las condiciones sanitarias por medio del mejoramiento de los aparatos hidrosanitarios, los cuales son: Inodoro, lavamanos, ducha, lavaplatos, lavadero.

Con lo anterior se percibe que la comunidad continúa con la confusión, aún cuando se hizo apertura de barrio, socialización masiva y socialización casa a casa con las especificaciones del Programa.

Por lo tanto, se asume el compromiso de realizar sectorizadas con acompañamiento de los profesionales de la Alcaldía que puedan dar claridad sobre los otros proyectos que beneficien a los habitantes del Poblado.

Es necesario convocar a una reunión a los funcionarios de la alcaldía y miembros de la junta de acción comunal ya que alguno de ellos específicamente el vicepresidente Álvaro Montes y Rosa Manjares, delegada de la junta influyen de forma negativa en el proceso, desinforman y generan disociaciones entre los beneficiarios y personal del contratista.

Cuadro 1. Socializaciones

Socialización (Líderes/ Masiva/ Sectorizada)	Fecha	Barrio	N° de Asistentes	Relación de Evidencias
Socialización sectorizada	09/06/2022	El Poblado	33	Listo de asistencia, registro fotográfico, acta de reunión.

Comentario [LO2]: Falta esta evidencia

- Visita Casa a Casa: En el periodo reportado se visitaron 140 viviendas en las cuales se socializó el PCI, se entregó folleto y volante informativo, que describen las características del Programa, requisitos que debe cumplir la vivienda para ser beneficiada, la ubicación del punto de atención y presentación de los actores del Programa: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, ejecutado por Enterritorio con el apoyo de la alcaldía municipal, empresas prestadoras. Y quienes ejecutan las obras, el equipo de interventoría, empresa Gavinco y el equipo del contratista de obra del consorcio Turquía.

Evidencias que se anexan en medio magnético: registro de viviendas visitadas en el formato de asistencia y registro fotográfico.

- Creación del link: Francisco Daza personal de comunicaciones de la alcaldía municipal reportó enlace del link el viernes 10 de junio refiere que es solo el espacio creado y a la fecha el área de sistemas no ha colgado noticias, se compromete a mostrar avances el día jueves 16 de junio.

Comentario [LO3]: Poner el link acá



Evidencias que se anexan en medio magnético:

Comentario [LO4]: Poner un pantallazo del link

Línea de Participación Comunitaria:

En el transcurso de este periodo no se realizó actividades o encuentros con el comité veedor, sin embargo 3 de los veedores asistieron a la reunión sectorizada el pasado jueves 9 de junio, el equipo social estableció compromiso de

fijar una invitación para los recorridos de obras. El día 10 de junio se hizo entrega de la resolución que avala la Veeduría conformada en el barrio el Poblado el día 10 de mayo.

Cabe resaltar que miembros del comité veedor, específicamente el señor José Tuiran Pérez además de sus funciones de vigilar se ha extralimitado en sus actividades generando presión al personal técnico (residente y personal de mano de obra), refiriéndose a ellos de forma grosera, por más que se le han explicado los procesos, el señor persiste en su forma negativa y sin fundamentos para comunicar, exigir y preguntar.

Cuadro 3. Comités veedores

Fecha de Conformación	Barrio	N° Integrantes	Resolución N°	Relación de evidencias
13 de mayo	El Poblado	5	046 de 24 de mayo de 2022	Resolución personería municipal.

- Puntos de Atención: Ubicado en el barrio Puerto Arturo, zona de influencia del Programa de Conexiones Intradomiciliarias, en la Cra 16 J #43H-12. A pesar que el punto se encuentra ubicado muy cerca al Poblado son mínimas las personas que visitan este espacio, las inclusiones que han sido recepcionadas se han tomado en recorridos por el barrio hechos por las profesionales sociales.

Cuadro 5. Puntos de Atención

Dirección del Punto de Atención	Barrio	Horarios de Atención		N° de Buzones Instalados	Relación de Evidencias
		Día	Hora		
Cra 16 J# 43H-12	El Poblado	Lunes a jueves	2:00pm a 4:00pm	1	Fotografías.

- Recepción y trámite de las PQRS: del 1 al 15 de junio se recepcionaron 24 PQRS con asunto solicitud de inclusión para nuevos potenciales beneficiarios, estas personas una vez hecho la actividad de verificación, se constató que

no se encuentra en el listado de la matriz inicial hecha por el FOVIS, por esta razón hacen la solicitud, pues también desean ser beneficiarios del Programa.

Las PQRS N°28 y N°33 son solicitudes inclusión, pero los predios de estas personas según el plano de georreferenciación se encuentran situados en zona de riesgo por deslizamiento, sin embargo, se les hizo la explicación previa de los requisitos que debía cumplir el predio para ser un potencial beneficiario, no obstante, las personas interpusieron su PQRS y por parte del equipo de trabajo se le tomó la solicitud para hacer los trámites pertinentes.

En las PQRS N°10, N°11 Y N°26 se encuentran inconsistencias, después de haber verificado en la matriz inicial y en el plano de georreferenciación se encontró que las direcciones de las PQRS en mención registradas por estas personas no coinciden con las registradas en matriz ni en el plano, por lo anterior se solicita direccionamiento al componente técnico y tener claridad para proceder.
A la fecha no se les ha dado cierre a las solicitudes de inclusión. Ya que la Alcaldía y la entidad prestadora no han dado respuesta.

. **Evidencias que se anexan en medio magnético:** fotografías referenciadas y registro PQR consecutivas de acuerdo a los formatos definidos por FONADE.

Comentario [LO5]: Por qué no se ha dado respuesta? La alcaldía y la entidad prestadora no ha dado respuesta, de ser así, dejar esta claridad.

Por otro lado por favor revisar las PQR, verifiquen que todos los espacios estén diligenciados, en algunos falta el número de cédula y en el espacio de las observaciones se deja la trazabilidad a la interventoría, es necesario dejar la trazabilidad con el envío a la alcaldía

Cuadro 6. Registro de PQR

Periodo Registrado	N° PQR recepcionadas	N° PQR cerradas	N° PQR en tramite	Reporte PQR en trámite del periodo anterior		Observación general / motivo
				N° de PQR	Estado	
3er. Informe	9	0	9			
4° Informe	24	0	24	9	Abiertas.	Solicitudes de inclusión.
TOTAL						

- Recorridos de obra: a la fecha no se han realizado recorridos de obra, están dispuestos para semana del 21 al 24 de junio.

Reporte de Actividades Complementarias

- Capacitación Personal de Obra: 14 de junio se llevó a cabo actividad informativa con el personal de mano de obra que se encuentra trabajando en la elaboración de las casetas del primer sector aperturado, el encuentro se dio antes de iniciar labores aprovechando el espacio de las charlas diarias por parte del profesional se seguridad y salud en el trabajo.

Como tema principal se socializa la generalidad del Programa, principales ejecutores, nombre de contratista de obra, e interventoría, características de las casetas, ubicación del punto de atención y horario de atención.

Se enfatizó en los siguientes puntos:

1. Los trabajadores no podrán cobrar por materiales o mano de obra a los beneficiarios.
2. Los contratistas no asumen las deudas de los trabajadores.
3. Si sobra sobran materiales se utilizan para beneficiar otra vivienda.

Para finalizar se hace una ronda de preguntas e inquietudes o percepción de los trabajadores, manifiestan sentirse cómodos con las actividades hechas hasta la fecha.

Evidencias que se anexan en medio magnético: registro de asistencia, registro fotográfico, acta de reunión.

Comentario [LO6]: Falta el acta de esta reunión

- Conclusiones: Durante el periodo reportado se continuo con la socialización casa a casa, para cerrar a la fecha de este informe con 621 viviendas socializadas; Así mismo se encuentran en ejecución 17 viviendas beneficiadas del Programa.
  La comunidad del barrio el Poblado y miembros de la JAC muestran su apoyo en cuento a los acompañamientos del área social a las actividades de socialización.

Wendy Johana Trujillo Arrieta

Profesional social Contratista.
Consorcio Turquía PCI.
Wendy Johana Trujillo Arrieta.

July Rios Anaya

Profesional social Interventoría.
GAVINCO, Ingenieros Consultores.
July Paulin Ríos Anaya.

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS
PROGRAMA CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS r

INFORME QUINCENAL No 5.

En el barrio el Poblado, lugar donde se ejecuta la obra del Programa de conexiones intradomiciliarias, se han presentaron situaciones que de forma directa atentan con la integridad no solo de los habitantes del barrio si no también con los trabajadores y ejecutores de la obra, cabe resaltar que se han venido presentando problemas de seguridad y orden por personas de la misma comunidad hacia trabajadores y habitantes del sector; como amenazas y robo. Esto se ha denunciado ante las autoridades competentes como la policía nacional que han intervenido en el barrio brindándonos seguridad.

Durante los días 15 al 30 de junio dentro de las actividades contempladas en el plan de gestión social del programa de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico en el barrio el poblado, se llevó a cabo un barrido para la verificación casa a casa por las manzanas 46, 44, 43, 41, 52, 50, 51, 54, 55, 70, 71, 72, 73, 74 con un total de 34 beneficiarios faltantes por aplicación de diagnóstico o documento de tenencia del predio, para proceder a realizar visita diagnostica**.**

Se realizó recorrido con profesional social de alcaldía dirigiéndose casa a casa por manzanas a los beneficiarios que se están interviniendo en obra, realizando visita a cada beneficiario del programa de conexiones intradomiciliaria, con el fin de recordarles los beneficios del programa, igual que el tema de los materiales, donde se acordó que estos se utilizaran para el beneficio de otra vivienda que lo necesite, ya que cada vivienda tiene una necesidad diferente a la otra, también se tocó el tema del presupuesto haciendo la aclaración de este y dejando en claro toda inquietud que se tenía.

El equipo social siguiendo con las actividades en compromiso realizo visita a beneficiarios a los cuales se les intervendrá en sus viviendas, con el fin de concertar con ellos la colaboración para elaborar videos del antes del proceso de construcción de los baños para la memoria social. hasta el momento se han

seleccionado e identificado tres beneficiarios, esta ha sido una actividad poco receptiva por la comunidad, puesto que son por lo general adultos mayores, o beneficiarios poco empáticos al proceso de realizar un video, ya que manifiestan tener nervios, pena o simplemente no se animan a contar su historia.

Seguidamente se realizó visita con funcionarios del fondo de vivienda FOVIS a las personas que interpusieron petición de inclusión para acceder a los beneficios del programa de conexiones intradomiciliaria, el primer día se realizaron once visitas casa a casa con el fin de verificar si cuentan con los criterios y requisitos para poder ser incluidos en el programa, de igual modo se realizó visita con funcionarios de VEOLIA a las mismas personas ya visitadas para verificar si efectivamente contaban con las conexiones pertinentes como registros de agua y alcantarillado.

Se realizó **a**compañamiento al equipo técnico de encuestadores encargados de realizar diagnósticos; con el fin de identificar casa a casa por manzanas a las personas faltantes por aplicación de diagnósticos y faltantes por documentación de tenencia, haciendo un barrido general del barrio donde se encontró un total 20 personas faltantes por aplicar diagnósticos.

Con respecto al componente técnico se continúan realizando visitas diagnósticas, a la fecha se han realizado 546, y aprobados 323 diagnósticos; 26 viviendas abiertas, en ejecución 27, en las cuales están realizando actividades de platilla de piso, plomería, colocación de cerámica, instalación de tubería y cubierta y construcción de losas de tanque.

las actividades de tipo social y técnico se han visto perjudicados debido a las condiciones climáticas limitando el avance de las mismas.

Información del Proyecto

Fecha de Inicio de Obras:					
Nombre del Municipio	**Nombre Barrios a Intervenir**	**Nombre Barrios Intervenidos**	**Fecha de Informe**	**N° de Viviendas a Intervenir por barrio**	**N° de Viviendas Intervenidas por barrio**
Sincelejo.	El Poblado	El Poblado	30/06/2022	693	27

Información por Línea de Intervención

Línea de Comunicación:

Socializaciones (Masivas y Sectorizadas) y reuniones de acercamiento con líderes: el 16 de junio se realizó recorrido con profesional social de la Alcaldía casa a casa en las manzanas donde ya se están llevando a cabo las intervenciones de obra civil, con el fin de recordarles los beneficios del programa, igualmente el tema de los materiales donde se acordó que estos se utilizaran para el beneficio de otra vivienda que lo necesite, ya que cada vivienda tiene una necesidad diferente a la otra, también se tocó el tema del presupuesto haciendo la aclaración de este y dejando en claro toda inquietud que se tenía por parte de los propietarios de las viviendas.

Relación de evidencias: registro fotográfico, acta de reunión

Cuadro 1. Socializaciones

Socialización (Lideres/ Masiva/ Sectorizada)	Fecha	Barrio	N° de Asistentes	Relación de Evidencias
Socialización sectorizada Casa a casa	16/06/2022	El Poblado	17	Registro fotográfico

- Creación del link: a la fecha no ha habido actualización del link.



Calle 18 No. 7 – 59 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: 3818
www.minvivienda.gov.co

Línea de Participación Comunitaria:
El sábado 25 de junio los veedores convocaron a una pequeña reunión, donde asistió el equipo social, técnico e interventoría; en dicha reunión se trataron temas de inconformidad en cuanto a los materiales que sobran en una vivienda, pues los beneficiarios manifiestan que estos no se deben devolver ya que se supone les pertenece, también se habló sobre la seguridad del barrio donde se comprometieron a brindarla y asegurar la permanencia de los trabajadores. se aclararon todas las dudas que se tenían e inconformidades del proyecto comprometiéndose a replicar esta información a toda la comunidad.

Cuadro 3. Comités veedores

Fecha de reunión	Barrio	N° Integrantes	Relación de evidencias
25 de junio	El Poblado	5	Acta de reunión, fotografía.

Puntos de Atención: En el punto de atención ubicado en el barrio puerto Arturo en la carrera 16j #43h- 12 zona de influencia del PCI, se han recepcionado del 15 al 30 de junio 54 PQR de inclusión, para ser remitidas a interventoría.

Después de realizar carteles informativos donde se mostraban las fechas y horarios de atención se ha tenido una buena acogida y los habitantes del barrio el Poblado han tenido más acercamiento a al punto de atención para solicitar la inclusión de las viviendas al Programa.

Cuadro 5. Puntos de Atención

Dirección del Punto de Atención	Barrio	Horarios de Atención		N° de Buzones Instalados	Relación de Evidencias
		Día	Hora		
Cra 16 J# 43H-12	El Poblado	Lunes a jueves	2:pm a 4:pm	1	Fotografías.

- Recepción y trámite de las PQRS: del 15 al 30 de junio se recepcionaron 54 PQRS con asunto solitud de inclusión para nuevos potenciales beneficiarios, estas personas una vez hecho la actividad de verificación se constató que no se encuentra en el listado de la matriz inicial hecha por el FOVIS, por esta razón hace la solitud, pues también desean ser beneficiarios del Programa.

  Las PQRS N°2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19 ya fueron visitas por planeación, FOVIS Y VEOLIA, dando respuestas de la efectividad a las 7 primeras PQRS para ser incluidas en el programa de conexiones intradomiciliarias, las cuales se visitaron y se entrego la respuesta del fovis donde se les explico que sus viviendas son aptas y cumplen con los requisitos para hacer parte del programa.
  Relación de evidencias: PQR diligenciadas, registro fotográfico.

Cuadro 6. Registro de PQR

Periodo Registrado	N° PQR recepcionadas	N° PQR cerradas	N° PQR en tramite	Reporte PQR en trámite del periodo anterior		Observación general / motivo
3er. Informe	9	0	9	N° de PQR	Estado	
4° Informe	24	0	24	9	Abiertas.	Solicitudes de inclusión.
5° Informe	54	7	54	24	Abiertas	Solicitudes de inclusión
TOTAL						

Recorridos de obra: El día 30 de junio se realizó recorrido de obra en compañía del equipo técnico por las viviendas que se encuentran intervenidas y en ejecución; se visitaron las viviendas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 30, 31 y 32, donde encontramos obreros en su labor, y los propietarios manifiestan que hasta el momento no encuentran ninguna inconformidad ni han tenido problema alguno con la ejecución de la obra en sus viviendas.

PERCANCES.

- Conclusiones:

Finalmente a pesar de los altibajos presentados en la ejecución de las actividades sociales y técnicas, podemos decir que; se han llevado a cabalidad gracias al apoyo de algunos miembros de la junta de acción comunal del barrio y a la receptividad por parte de los beneficiarios, ya que se ha trabajado de la mano y manera armoniosa logrando asi sacar adelante cada actividad propuesta, dando así buenos resultados.

Profesional social Contratista.
Consorcio Turquía PCI.
Estefany Paternina Vitola.

Profesional social Interventoría.
GAVINCO, Ingenieros Consultores.
July Paulin Ríos Anaya.

Anexo 19. Diagnósticos aprobados.

Link descarga diagnosticos aprobados.

https://drive.google.com/drive/folders/1UedWltzc57WGRFbRsXgFnVDQCSXi3RF7?usp=sharing

Anexo 20. Certificaciones de materiales.

QUES PLÁSTICOS
COPLAST

FDA

Tanques plásticos fabricados con polietileno de la mejor calidad, para garantizar productos livianos, resistentes y libres de elementos contaminantes, usando materias primas grado FDA


Higiénicos
No se corroen, no sueltan partículas, tienen superficies lisas y fáciles de limpiar

Resistentes
El material de los tanques plásticos esta especificado para estar expuesto a la intemperie



Los Tanques Plásticos Ecoplast son fabricados en dos capas de color negro que impiden el paso de rayos solares inhibiendo el proceso de fotosíntesis necesario para el crecimiento de algas.

Cumplen con la norma técnica colombiana NTC 4384 de Tanques de Polietileno para Almacenamiento Fabricados por el Proceso de Rotomoldeo.

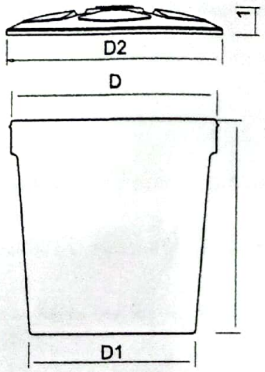

Volumen Bruto Litros	Dimensiones del tanque mm			Dimensiones de la tapa mm	
	D	D1	H	D2	H1
500	931	758	934	975	170
1000	1.232	1.031	1.030	1.275	236
2000	1.520	1.220	1.550	1.585	280

Transporte, almacenamiento y manipulación.

Cantidad máxima por arrume	
Litros	Tanques
2000	5
1000	8
500	12

- Los tanques se pueden transportar en arrumes verticales, en las cantidades indicadas en el cuadro.
- Los arrumes pueden colocarse sobre la plataforma del camión o sobre otros productos teniendo la precaución de hacerlo sobre cartón para evitar daños por rozamiento y vibración durante el viaje.
- Cuando el espacio en la altura no es suficiente, los tanques se pueden cargar acostados y encajados uno entre otro, siempre colocando cartones para evitar daños.


NOTA: En el descargue de los tanques Ecoplast se debe evitar cualquier tipo de golpe, caída o arrastrarlos ya que esto pueden ocasionar fisuras en el producto afectando su desempeño.

Cumplimos con los requisitos exigidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 4384

Garantía
Eternit
CONSTRUCCIÓN EN EVOLUCIÓN

Escaneado con CamScanner

idráulica
instalación hidráulica

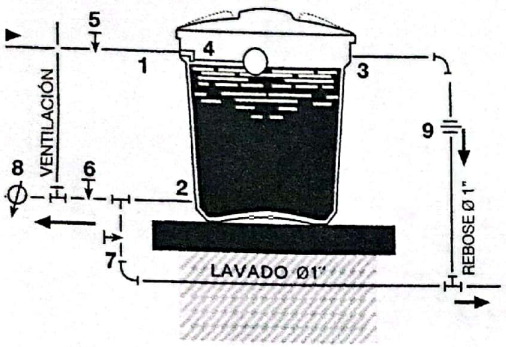

ecesarios:

entrada ø 1/2".

salida ø 1".

rebose ø 1".

ntrada ø 1/2" y flotador.

paso directo para interrumpir la entrada del agua en caso de lavado de tanque.

aso para interrumpir la salida al servicio en caso de reparación o de tanque.

aso, se abre solamente para lavar el tanque.

paso directo o bypass (8A), para aprovechar la presión del acue- ed interna de servicio.

rsal.

-V1 / NOV2021

Instrucciones para la instalación

- Antes de instalar el tanque se recomienda lavar el interior con un desinfectante y enjuagar.
- La superficie que va a soportar el tanque debe ser totalmente horizontal, limpia y sin irregularidades que generen apoyos puntuales que lo deterioren o deformen.
- El área de la plataforma de apoyo debe ser mayor al diámetro de la tapa del tanque para que no queden partes por fuera.
- La estructura de apoyo debe soportar un peso mayor al peso del tanque lleno. (Tener en cuenta la densidad del líquido).
- No almacene líquidos derivados del petróleo o solventes ya que pueden deteriorar el tanque.
- Las tuberías o mangueras empleadas para las instalaciones hidráulicas no deben estar torcidas, ni deben generar fuerzas o tensiones sobre el tanque.
- Siempre utilice las conexiones y accesorios suministrados.
- No hacer conexiones con tuberías torcidas o mangueras que halen el tanque.
- No enterrar el tanque bajo tierra.


NOTA:

- La instalación debe ser realizada por personal calificado y certificado para trabajo en alturas.
- El tanque debe permancer bien tapado y con los conductos de ventilación sin obstrucciones.
- Realice inspecciones al menos una vez al año para verificar el correcto funcionamiento y limpieza.
- No instale los tanques cerca de fuentes de calor.


Para mayor información comuníquese
a nuestra Línea de Servicio al Cliente
018000 1156 60 o visite www.eternit.com.co

Fabricado por:
Eternit
CONSTRUCCIÓN EN EVOLUCIÓN


Conexiones para tanques plásticos
Localización de las conexiones

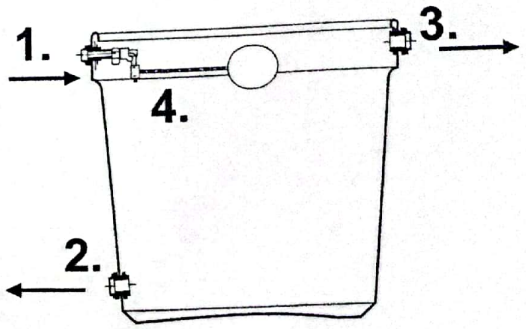

Conexión de entrada Ø 1/2"




2. Conexión de salida al servicio Ø 1"




A. Empaque de caucho
B. Flanche
C. Arandela y empaque
D. Tuerca espigo

Conexión de rebose Ø 1"



4. Válvula con varilla



Escaneado con CamScanner

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO

Expediente: FFU-142

RMN: FFU-142

MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (L 685)

Vigencia Desde: 16/02/2010 Hasta: 16/02/2040

Fecha y Hora de Registro: 16/02/2010 00:00:00

TITULARES: IDENTIFICACIÓN

GRANITOS Y CALIZAS DE COLOMBIA S.A.S. N 9004686153

AREA TOTAL: 109 Hectárea(s) y 7134 mt(s)2 MUNICIPIOS: TOLUVIEJO-SUCRE

MINERALES: DOLOMITA\ ARCILLA\ CALIZA\ GRAVA\ ARENA

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

AREA: 1

PUNTO ARCIFINIO: INTERSECCISN DEL ARROYO GRANDE CON LA VMA QUE VA DE TOLUVIEJO A MACAJANA

NORTE: 1542415,0000

ESTE: 852090,0000

PLANCHA IGAC: 44

ALINDERACIÓN

Coordenada Norte	Coordenada Este
1541529,6330	853373,9360
1539683,9580	853373,9360
1539523,9980	853127,0000
1539457,9990	852709,9990
1539457,6310	852707,0480
1539457,6310	852701,9990
1539459,9980	852701,9990
1539459,9980	852700,0000
1539724,0020	852683,0020
1540060,0010	852662,0020
1540055,9990	852659,9990
1540153,0000	852680,9990
1540965,0000	852852,9980
1541143,9990	852991,0010
1541529,6330	853286,7850

ANOTACIONES

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO	Expediente: FFU-142 RMN: FFU-142
MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (L 685)	
Vigencia Desde: 16/02/2010 Hasta: 16/02/2040	Fecha y Hora de Registro: 16/02/2010 00:00:00

16/02/2010

TIPO ANOTACIÓN:	CONTRATO UNICO DE CONCESION	FECHA EJECUTORIA:	22/01/2010
DOCUMENTO	CONTRATO	NÚMERO:	1113255
EXPEDIDO POR:	REGIONAL BOGOTA	FECHA DOCUMENTO:	22/01/2010
LUGAR:	BOGOTÁ, D.C.		

ESPECIFICACIÓN: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MINERO NACIONAL DEL CONTRATO ÚNICO DE CONCESIÓN No.FFU-142 (EL CONTRATO DE CONCESION MINERA SE SUSCRIBE PARA LOS MINERALES DE CALIZA, DOLOMITA ARCILLA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN CONTRATO FFU-142).

ANOTACIÓN:	2	FECHA ANOTACIÓN:	04/08/2015
TIPO ANOTACIÓN:	MODIFICA ETAPAS CONTRATO /RENUNCIA A ETAPA /EXPT. ANTICIPADA	FECHA EJECUTORIA:	14/09/2012
DOCUMENTO	RESOLUCION	NÚMERO:	GTRM-351
EXPEDIDO POR:	PAR MEDELLIN	FECHA DOCUMENTO:	14/05/2012
LUGAR:	MEDELLÍN		

ESPECIFICACIÓN: ACEPTAR LA RENUNCIA A LAS ETAPAS DE EXPLORACION(PRIMERO Y SEGUNDO AÑO) Y A LA TOTALIDAD DE CONSTRUCCION Y MONTAJE, POR LO CUAL EL PRESENTE TITULO MINERO EN LA ETAPA DE EXPLOTACION DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2012, FECHA EN LA CUAL SE CONCEDIO LA LICENCIA AMBIENTAL.

ANOTACIÓN:	3	FECHA ANOTACIÓN:	28/01/2016
TIPO ANOTACIÓN:	CESION TOTAL DE DERECHOS	FECHA EJECUTORIA:	09/12/2015
DOCUMENTO	RESOLUCION	NÚMERO:	002423
EXPEDIDO POR:	PAR CENTRO	FECHA DOCUMENTO:	06/10/2015
LUGAR:	BOGOTÁ, D.C.		

ESPECIFICACIÓN: ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR PERFECCIONADA LA CESIÓN TOTAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES emanadas del Contrato de Concesión No. FFU-142, que le corresponden a MARIA DEL CARMEN FADUL CHADID a favor de la sociedad GRANITOS Y CALIZAS DE COLOMBIA S.A.S., con Nit. 900.468.615-3.

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez inscrita en el Registro Minero Nacional la presente Resolución téngase a la sociedad GRANITOS Y CALIZAS DE COLOMBIA S.A.S., como ÚNICA TITULAR del Contrato de Concesión No. FFU-142, y responsable ante la Agencia Nacional de Minería, de todas las obligaciones que se deriven del mismo.

De conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la Resolución No. 002423 de fecha 06 de Octubre de 2015.

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO	Expediente: FFU-142 RMN: FFU-142
MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (L 685)	
Vigencia Desde: 16/02/2010 Hasta: 16/02/2040	Fecha y Hora de Registro: 16/02/2010 00:00:00

NOTA ACLARATORIA

De acuerdo con la circular Número 0010 del 18 de junio de 2015 expedida por la Agencia Nacional de Minería ANM -, se fija la directriz relacionada con la inscripción de prendas mineras, donde se determina que "Por disposición de la Ley 1676 de 2013 y el Decreto 400 de 2014 las garantías mineras o cualquier gravamen que recaiga sobre el derecho a explorar y explotar en los términos de la señalada norma, deben ser consultadas en el registro de Garantías Mobiliarias, el cual se desarrollará por parte de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecamaras)".

********** FIN DE ESTE DOCUMENTO **********

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

Ana María González Borrero
Coordinadora de Catastro y Registro Minero

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO
ULTRACEM S.A.S

CEMENTO GRIS TIPO UG DE USO GENERAL

F.V: 01-03-2017

VERSIÓN 3.

Código 205

PLANTA:	ULTRACEM S.A.S
DIRECCIÓN:	Km 2.5 VIA CORDIALIDAD,GALAPA
FECHA DE PRODUCCIÓN:	1/05/2022 — 15/05/2022
PRESENTACIÓN:	GRANEL/ENSACADO
CLIENTE:	

ENSAYOS FÍSICOS	METODO DE ENSAYO	RESULTADO	NTC 121	ASTM C 1157	ULTRACEM
Contenido de Aire en volumen, %	NTC 224	8,55	Max. 12,0	Max. 12,0	Max. 12,0
Finura (permeabilidad al aire), cm^2/g	NTC 33	5248	—	—	—
Finura en tamiz N° 325 (45µm), %	NTC 294	92,60	—	—	—
Expansión en autoclave, %	NTC 107	0,01	Max. 0,80	Max. 0,80	Max. 0,80
Expansión barras de Mortero (14 dias), %	NTC 4927	0,006	Max. 0,020	Max. 0,020	Max. 0,020
Resistencia a la Compresión					
1 Día, MPa (psi)	NTC 220	6,1 (880)	—	—	—
3 Días, MPa (psi)	NTC 220	12,9 (1870)	Min. 8,0 (1160)	Min. 13,0 (1890)	Min. 8,0 (1160)
7 Días, MPa (psi)	NTC 220	18,3 (2660)	Min. 15,0 (2176)	Min. 20,0 (2900)	Min. 15,0 (2176)
28 Dias, MPa (psi)	NTC 220	0 ()	Min. 24,0 (3481)	Min. 28,0 (4060)	Min. 24,0 (3481)
Tiempo de Fraguado (Vicat) METODO A					
Tiempo inicial de fraguado, min	NTC 118	235	Min. 45; Max. 420	Min. 45; Max. 420	Min. 45; Max. 420
Tiempo final de fraguado, min	NTC 118	320	—	—	—

Se certifica que el CEMENTO ULTRACEM GRIS TIPO USO GENERAL cumple con la norma Técnica Colombiana NTC 121 para Cemento tipo UG.

Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los métodos de muestreo y ensayos de acuerdo con las frecuencias e instructivos establecidos en el PLAN DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN PARA LA GESTIÓN DE PRODUCCIÓN DE CEMENTO de Ultracem S.A.S. Aplica para las producciones realizadas durante el periodo comprendido en "Fecha de Producción".

FIRMA: ***Cargo: Gerente de Calidad Cementos***

Escaneado con CamScanner

Certificado

Registro Único de Comercializadores de Minerales
RUCOM

Registro **RUCOM-201607077329**

En cumplimiento del Capítulo 6º del Decreto Único Reglamentario del Sector de Minas y Energía No. 1073 del 25 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería certifica que AGREGADOS Y CANTERAS DEL NORTE S.A.S. con NIT número 900473048 acredita la calidad de comercializador autorizado inscrito en el Registro Único de Comercializadores de Minerales.

La presente certificación permite al comercializador realizar de forma regular la actividad de comprar y vender minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos, intermediarlos, exportarlos o consumirlos y tiene una vigencia del 21-05-2021 hasta el 31-07-2022. Durante el mes de mayo de 2022 el interesado debe realizar los trámites de renovación indicada en el Decreto 1073 de 2015.

Se acredita al comercializador de minerales luego de verificar y validar la información suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - y consultar en la Base de datos de Confecámaras.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO AUTORIZA AL COMERCIALIZADOR A REALIZAR ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE MINERALES.

Dado en Bogotá D.C., a los 21 dias del mes de mayo del año 2021.

PABLO ROBERTO BERNAL LOPEZ
Gerente de Proyecto - Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

EDWIN ALFONSO COY GONZALEZ
21-05-2021 10:42

Este documento ha sido firmado digitalmente con un certificado provisto por una entidad autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28 de la ley 527 de 1999, y 15 del Decreto 1747 de 2000. La firma digital aquí impuesta es el equivalente electrónico de la firma manuscrita.
La autenticidad del presente certificado podrá ser validada ingresando a www.anm.gov.co, con el número Registro RUCOM disponible en este certificado.

Anexo 21. Acta de Vecindad

Link descarga anexos:

https://drive.google.com/drive/folders/1y2kwTxYo7iSYTKJo3GgqE6Xx6D3Iqrt0?usp=sharing

Anexo 22. Actas de concertación

Link de descarga

https://drive.google.com/drive/folders/1wPwW9QrPHy0zEBqZ8v6fdO-cTo9hK6sT?usp=sharing

Anexo 23. Acta de recibo parcial y balance presupuestal de interventoría

	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CÓDIGO:	F-GG-32
eterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

ACTA No. 2

TIPO DE CONTRATO: Interventoría **CONTRATO No.** 2220585

OBJETO: Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre

CONTRATISTA : Gavinco Ingenieros Consultores

SUPERVISOR: JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

PERÍODO A PAGAR: **DEL 13/05/2022 AL 13/06/2022**

En Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de Junio del año 2022 se reunieron Edgar Aragon Otero Director de Interventoría y Juan David Amón Rodriguez Supervisor del Contrato , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	PAGOS MENSUALES IGUALES (40% DEL VALOR DEL CONTRATO)	MESES	8	$ 22.803.490,38	$ 182.427.923,02	1,00	1,00	2,00	$ 22.803.490,38	$ 22.803.490,38	$ 45.606.980,76	6,00	$ 136.820.942,26
2	PAGOS POR AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA (50% DEL VALOR DEL CONTRATO)	GLB	1	$ 228.034.903,78	$ 228.034.903,78	-	-	-	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 228.034.903,78
3	PAGO POR LIQUIDACION (10% DEL VALOR DEL CONTRATO)	GLB	1	$ 45.606.980,756	$ 45.606.980,76	-	-	-	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 45.606.980,76
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 456.069.807,56**				**$ 22.803.490,38**	**$ 22.803.490,38**	**$ 45.606.980,76**		**$ 410.462.826,80**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$ 86.653.263,44**				**$ 4.332.663,17**	**$ 4.332.663,17**	**$ 8.665.326,34**		**$ 77.987.937,10**
	ADMINISTRACIÓN				N/A				N/A	N/A	N/A		N/A
	IMPREVISTOS				N/A				N/A	N/A	N/A		N/A
	UTILIDAD				N/A				N/A	N/A	N/A		N/A
	IVA 19	**19%**			$ 86.653.263,44				$ 4.332.663,17	$ 4.332.663,17	$ 8.665.326,34		$ 77.987.937,10
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					**$ 542.723.071,00**				**$ 27.136.153,55**	**$ 27.136.153,55**	**$ 54.272.307,10**		**$ 488.450.763,90**

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO: $ 542.723.071,00
V/R ADICIONES: $ -
V/R ACTUAL CONTRATO $ 542.723.071,00

V/R ANTICIPO: N/A
% ANTICIPO : N/A
% RETEGARANTIA : N/A

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta No. 01 de pago del 40% del Mes 1 de Interventoría comprendido al periodo del 13 de abril de 2022 al 13 de mayo de 2022		$ 27.136.153,55	5,00%	N/A	N/A	N/A	$ 27.136.153,55	$ 515.586.917,45	5,00%
2	Acta No. 02 de pago del 40% del Mes 2 de Interventoría comprendido al periodo del 13 de mayo de 2022 al 13 de junio de 2022		$ 27.136.153,55	5,00%	N/A	N/A	N/A	$ 27.136.153,55	$ 488.450.763,90	10,00%
	TOTAL		**$ 54.272.307,10**	**10,00%**	**-**	**-**	**-**	**$ 54.272.307,10**	**$ 488.450.763,90**	**10,00%**

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

FECHA DE ELABORACIÓN: 13 de junio de 2022

Elaboró
INTERVENTOR:

Firma:
Nombre: LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
REP. LEGAL DE INTERVENTORIA - GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

Aprobó

Firma:
Nombre: JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
SUPERVISOR

Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:
Nombre: NO APLICA

Nota 1:

a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría. e)Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.

Nota 2: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avaló - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

Anexo 24. Control de equipos

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**CONTROL DE EQUIPOS**	CÓDIGO	**F-GG-22**
		VERSIÓN	**01**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA	**2020-10-19**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL **01/06/2022** **Y EL** **30/06/2022** **FECHA INICIO** **13/04/2022**

CONTRATISTA: CONSORCIO TURQUIA **CONTRATO No.** 2220577

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS **CONTRATO No.** 2220585

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
CORTADORA MARCA MAKITA M 2401 120V-15A (50 -60 Hz)	X	X	X		Bodega ubicada en el Barrio El Poblado.	Corte de acero, alambres, ladrillos, ceramimica	
PULIDORA 1 MARCA INCCO 8600 RPM	X	X	X		Bodega ubicada en el Barrio El Poblado.	Corte de acero, alambres, ladrillos, ceramimica	Este equipo tambien se traslada a las viviendas intervenidas donde se requiera su uso para la actividad descrita.
PULIDORA 2 MARCA INCCO 8600 RPM	X	X	X		Bodega ubicada en el Barrio El Poblado.	Corte de acero, alambres, ladrillos, ceramimica	Este equipo tambien se traslada a las viviendas intervenidas donde se requiera su uso para la actividad descrita.

Firma:

Nombre: Edgar A. Aragon O.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo 25. Control de inspección y ensayos

enterritorio	**CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS**	CÓDIGO:	**F-GG-23**
		VERSIÓN:	**1**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-19**

FECHA DE PRESENTACIÓN:	30-jun-22	**INFORME MENSUAL DEL**	**01-jun-22**	**AL**	**30-jun-22**	
CONTRATO No. :	2220577					
OBJETO:	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en e					
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA					
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES					
SUPERVISOR:	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ					

MEDIANTE EL PRESENTE FORMATO, EL INTERVENTOR CERTIFICA QUE LOS ÍTEMS DE PROYECTO QUE SE PAGARÁN, CUMPLEN EN TODOS LOS CASOS CON TODAS LAS NORMAS TÉCNICAS APLICABLES Y CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1595 DE 2015 LOS QUE LE MODIFIQUEN O SUSTITUYAN

1. Si para el producto (bien o servicio), proceso o procedimiento se exigen requisitos por un Reglamento Técnico, decreto o ley (página web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo), obligatoriamente se declarará la conformidad y será entregable verificado previa presentación del certificado de conformidad de producto, sello de calidad o ensayos en laboratorio acreditado.

2. Si el producto (bien o servicios) proceso o procedimiento no está regido por un Reglamento técnico obligatorio, decreto o ley pero el contrato en su texto, en una especificación, el diseño, los planos u otro documento o requisito contractual cualquiera que sea se indica el cumplimiento de una norma (NTC, internacional, nacional o sectorial) o requisito particular o general, para declarar conforme ese bien o servicio y declararse entregable verificado, debe contar obligatoriamente con ensayo o cumplimiento de protocolo donde conste la conformidad con el requisito exigido.

1. LABORATORIOS ACREDITADOS Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

La Interventoría de Contrato CERTIFICA que la totalidad de los resultados de conformidad que se relacionan en este informe y anexan (anexo digital), se obtuvieron: en laboratorios acreditados cuando el bien o servicio está especificado y/o normado por un Reglamento Técnico Obligatorio, ley o decreto; cuando el proceso, procedimiento, bien o servicio no esta regido por un Reglamento técnico obligatorio, ley o decreto pero el Contrato lo exige, la conformidad de calidad se declaró mediante ensayo realizado con equipos de medición calibrados o verificación de cumplimiento de protocolo, bajo el control y seguimiento de un profesional capacitado e idóneo quien suscribe el registro del ensayo o protocolo en particular (anexo digital); en este último caso, se incluye en este formato la acreditación del laboratorio (anexo digital) si así lo exige el Contrato o acuerdo entre las partes. A continuación se relacionan los laboratorios acreditados y no acreditados donde se realizaron los ensayos y certificados de calibración de equipos utilizados (anexo digital).

1. 1. LABORATORIOS ACREDITADOS -EXIGIDO CUANDO EL BIEN O SERVICIO SE RIGE POR REGLAMENTO TÉCNICO OBLIGATORIO, LEY O DECRETO

Laboratorio		Certificado de Acreditación	Vigencia de la acreditación		Ensayos realizados en este laboratorio
Código (1)	**Nombre**		**Desde**	**Hasta**	
	Adicione las filas necesarias				

(1) Para efectos de trazabilidad y control, asignar a cada laboratorio un código LAC (Laboratorio Acreditado) seguido de un número consecutivo, sin repetir y sin anular desde el inicio del proyecto hasta el final.

1.1.1. EQUIPOS - Certificados de calibración

Laboratorio (3)	Serial equipo (2)	Descripción del equipo	Número de Certificado de Calibración	Vigencia certificado de calibración	
				Desde	**Hasta**
Resisten					

(2) Para efectos de trazabilidad y control, relacionar el serial del equipo calibrado, sin repetir desde el inicio del proyecto hasta el final.
(3) Indique en esta casilla, el código del laboratorio donde se encuentra el equipo cuyo certificado de calibración se está informando.

2. ENSAYOS, SELLOS DE CALIDAD, CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD O REGISTRO DE ENSAYO EN LABORATORIO Y/O PROTOCOLOS APLICADOS

Los resultados de ensayos realizados y que se pagan parcial o totalmente en este periodo o períodos posteriores, son los que a continuación se relacionan.

Con el fin de tener trazabilidad de los ensayos, estos se numeran con dos dígitos XX-YY donde XX es el número del periodo del mes de ejecución del Proyecto y YY es el número en estricto orden cronológico del ensayo o certificado; para el primer informe el número de orden XX será 01, para el segundo informe 02 y así sucesivamente.

2.1. ENSAYOS REALIZADOS y/o PROTOCOLOS APLICADOS EN ESTE PERÍODO

No. de Orden			Ensayo			Resultado del Ensayo
XX	**YY**	**Fecha ensayo o aplicac. protocolo**	**Norma, protocolo o requisito técnico aplicable (exigido)**	**Nombre de la norma, protocolo o requisito**	**Código de Laboratorio donde se realizó el ensayo**	**Observaciones (la observación no pude condicionar la conformidad)**
-	-	21 de junio de 2022	NTC 673 - Resistencia a la compresión de cilindros de concreto INV E 410-13	Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	En proceso	**En el periodo del informe mensual se tomó muestra de concreto el día 21 de junio de 2022, por lo tanto, a corte del presente informe no se cuenta con resultados de ensayos de laboratorio.**

2.2. CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO Y SELLOS DE CALIDAD RECIBIDOS EN ESTE PERIODO

No. de orden		No. Certificado o sello de calidad	Vigencia del Certificado o del sello de calidad		Certificador (entidad acreditada para expedir certificado)	Este sello de calidad o certificado de conformidad ampara los siguientes
XX	YY		Desde	Hasta		
N/A	N/A	Tanque Plastico Ecoplast	N/A	N/A	ECOPLAST	Norma Tecnica Colombiana NTC 4384
N/A	N/A	205 Certificado de calidad cemento gris tipo UG de uso general	N/A	N/A	ULTRACEM	Norma Tecnica Colombiana NTC 121

CONTROL DE CONFORMIDAD DE CALIDAD POR ÍTEMS DE CONTRATO OBJETO DE PAGO

A continuación se relacionan los ítems de contrato que el Interventor avala para pago en este período, para lo cual se requiere como condición previa que la Interventoría los haya declarado entregables verificados mediante certificados de conformidad de producto y/o sellos de calidad recibidos y/o los ensayos que recibió de un laboratorio acreditatado.

A continuación se resumen los requisitos y trazabilidad de conformidad de los ítems que cumplen calidad para pago en el presente período

Ítems de contrato que se incluirán en el acta y/o factura y/o cuenta del presente período		Normas técnicas (ley, decreto, resolución, reglamento) exigidas a cada ítem en particular		La conformidad con la norma se demuestra mediante	Número de orden del documento (certificado, ensayo, sello) que evidencia objetivamente
# del ítem según contrato	Descripción del ítem	Numero de norma (4)	Descripción de la norma, reglamento, ley, decreto, resolución u otro exigible		

(4) Si un ítem está sujeto a mas de una norma o protocolo, utilice tantas filas como sean necesarias e indique una sola norma o protocolo por fila.
(5) El número de orden puede ser de ensayo, protocolo o certificado obtenido en este período o periodos anteriores.
(6) El Interventor llevará control de las cantidades, baches o volúmenes de productos, procesos o procedimientos que certifica que cumplen calidad, de manera que garantice la trazabilidad de calidad para cada entregable evitando que se aplique un certificado vencido, o se aplique un ensayo excediendo su alcance en frecuencia, cantidad o tiempo. El Supervisor ENTerritorio exigirá esta trazabilidad en cualquier momento.

TRAZABILIDAD: Para efectos de trazabilidad, el Interventor anexa a este formato un archivo digital que contiene una carpeta denominada "Control inspección y ensayo Periodo XXX) con la información del período. Esta carpeta contiene tantas subcarpetas como subcapítulos contiene este formato y en cada una de esas subcarpetas se están incluyendo la totalidad de documentos que soportan lo certificado. El Interventor declara que no ha aceptado ningún laboratorio acreditado, calibración de equipo o ensayo del cual no dispone de trazabilidad que anexa a este informe. No se aceptan excepciones ni entregas de trazabilidad posteriores a la radicación de este formato. Este formato incluye como ítems verificados para pago únicamente aquellos que cumplen todos los requisitos establecidos.

Firma	Firma
NOMBRE Edgar A. Aragon O.	NOMBRE: William A. Martinez P.
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA (no se acepta firma "por" o "en nombre de")	DIRECTOR DE OBRA (no se acepta firma "por" o "en nombre de")

Anexo 26. Cambio especificación

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**ACTA DE CAMBIO DE ESPECIFICACIONES**	CÓDIGO:	**F-GG-29**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-20**

Nota: este formato aplicará cuando el cambio de especificacion no implique ajuste al precio. El insumo a modificar debe ser de calidad equivalente al inicialmente propuesto.

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220577 **DE** **OBRA** **FECHA INICIO** **11/04/2022** **FECHA TERMINACIÓ** **11/11/2022**

OBJETO DEL CONTRATO: Chequeo, validación de prototipos y diagnostico, concertación, intervención y gestion social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre

CONTRATISTA: CONSORCIO TURQUIA

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

SUPERVISOR: Ing. Juan David Amón

Me permito solicitar cambio de especificaciones al contrato en referencia de acuerdo con las siguientes consideraciones:

B. ESPECIFICACIÓN INICIAL VS. CAMBIO PROPUESTO

ESPECIFICACIÓN INICIAL					CAMBIO PROPUESTO				
Ítem	Unidad	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Ítem	Unidad	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario
3,1	un	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lava- manos)	1	$ 4.225.606,11	3,1	un	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lava- manos)	1	$ 4.225.606,11
3,2	un	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	1	$ 3.761.340,61	3,2	un	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	1	$ 3.761.340,61
3,3	un	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	1	$ 4.767.497,39	3,3	un	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	1	$ 4.767.497,39
3,4	un	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta	1	$ 4.898.390,93	3,4	un	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta	1	$ 4.898.390,93
3,27	m2	ENCHAPE PARED BLANCO FOR. 20*20	1,05	$ 51.443,02	3,27	m2	ENCHAPE PARED BLANCO ACUARELA BLANCO 40X40	1,05	$ 51.443,02
3,28	m2	ENCHAPE DE PISO - ANTIDESLIZANTE FOR. 20*20	1,05	$ 62.169,00	3,28	m2	ENCHAPE DE PISO - ANTIDESLIZANTE ACUARELA BLANCO 40X40	1,05	$ 62.169,00

C. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS

La instalación de este producto se realizará en la pared de la zona de ducha con 4 hiladas completas desde el piso hacia arriba. (1.60m). En el piso se iniciara desde el piso de la ducha en la pared posterior a la ubicación de los puntos hidraulicos hacia el acceso de baño para garantizar la linea de juntas.

D. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN EL CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN PROPUESTO

Debido a la pandemia que azotó en el año 2020 y 2021 a nivel mundial se presentaron diferentes factores a nivel de producción que afectaron de manera considerable la fabricación de diferentes elementos a sectores productivos. Este fenomeno ha causado inconveniente en la producción en masas de materiales para la construcción, mas especificamente la ceramica y que por demanda el formato con referencia 20,5cm x 20,5cm ha presentado escases en su producción, lo que dificulta el desarrollo y terminación del proyecto que se ejecuta.

E. REGISTROS DE SOLICITUD DE CAMBIO DE ESPECIFICACIONES

Solicitante	No. Oficio	Fecha
CONSORCIO TURQUIA	CONS-TUR-SINC-031	27/05/2022
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		

Firma:

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA

F. AVAL Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, a los seis ( ) días, del mes junio del año 2022.

Firma:

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventor
