CALIBRACIÓN Y CONTROL DE EQUIPOS DEL PROYECTO

enterritorio	**CONTROL DE EQUIPOS**	CÓDIGO	**F-GG-22**
		VERSIÓN	**01**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA	**2020-10-19**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL **1 JUNIO 20222** **Y EL** **30 DE JUNIO 2022** **FECHA INICIO** **1-jun**

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES **CONTRATO No.** 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A **CONTRATO No.** 2220587

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
MEZCLADORA			X		CORDOBA - BOLIVAR	MEZCLA DE CONCRETO	En buen estado
RANA			X		CORDOBA - BOLIVAR	COMPACTAR TERRENO DEBAÑOS	En buen estado

Firma: Marcy A. Correa C

Nombre: Ing. Marcy Correa

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FOTOCOPIA DE LA BITACORA O LIBRO DE OBRA DE TODA LA EJECUCION DEL PROYECTO

FECHA: Miercoles 01 Junio de 2022

Personal en obra: Contratista.
- 1 Residente de obra
- 1 Trabajadora social
- 1 SISO
- 1 ing. Diagnostico

INTERVENTORIA:
- 1 Residente
- Trabajadora social.

Actividades Realizadas.

* Se realizo visita de supervisión por parte de la entidad ENTerritorio y Minvivienda, se realizo recorrido de obra y se evaluaron casos puntuales correspondientes a la aplicacion o no del beneficio.

* Se realiza comité de obra N=5.

* Se realizan 6 levantamientos arquitectonicos

* Se realizan diagnosticos y levantamiento de actas de vencidad, acta de concertacion y propuesta de la intervencion.

ESTADO CLIMA: Soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. Contratista

Escaneado con CamScanner

Jueves 02 junio 2022

PERSONAL EN OBRA:
- Residente Obra
- Ing. Diagnostico
- SISO
- Trabajadora Social

PERSONAL INTERVENTORIA.
- Residente interventoria
- Trabajadora Social

ACTIVIDADES REALIZADAS.

- Se realizo de supervisión de obra contratista, interventoria, delegado empresa prestadora de servicio EOOSAPCOR LTDA.

- Recorrido inicio en la calle 9 con carrera 4A, donde se detecta vivienda que no cuenta con conexión domiciliaria, sin embargo la red alcantarillado si pasa frente a la vivienda.

- En la cll 10 carrera 5A y 8, no cuenta conexión domiciliaria, en la calle 10A y 12 carrera 7A existen 4 casos de viviendas con posibles beneficios pero la red de alcantarillado no esta disponible en ese sector.

- Estado clima: Soleado

Ronald Arrieta
R. interventoria.

Ronald blanco
R. Contratista

Escaneado con CamScanner

Viernes 03 junio 2022

PERSONAL EN OBRA

- Residente de obra
- SISO
- 1 Maestro
- Ing. Diagnostico
- Trabajadora social
- 1 Ayudante.

PERSONAL INTERVENTORIA

- Residente interventora
- Trabajadora Social

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realiza labores de digitalización, levantamiento acta vecindad, presupuestos y acta de concertación

- La interventora emite oficio TEC-013-22 requiriendo tramite para 11 inclusión.

- Se realiza solicitud de gestión para la expedición del certificado autorizado para la intervención de conexión de acometidas domiciliarias de acueducto y alcantarillado mediante TEC-015-22

- COOSEPCOR remite oficio de entrega de certificados de disponibilidad de redes de acueducto y alcantarillado.

Estado clima: Soleado

Ronald Arrieta
R. Interventora

Ronald Blanco
R. contratista

Escaneado con CamScanner

Sabado 04 junio de 2022

PERSONAL EN OBRA
- Residente obra
- SISO
- 3 Maestros
- Ing. Diagnostico
- Trabajadora social
- 6 ayudantes

PERSONAL INTERVENTORIA
- Residente interventoria
- Trabajadora Social

ACTIVIDADES REALIZADAS.

- Se inicia con intervencion en las viviendas 002, 015 y 0
- Se realiza excavacion para cimentacion
- Armado de acero para vigas cimentacion y columnas.
- Se realiza suministro de materiales en las 24 viviendas avaladas en el primer comite de aprobacion
- Se realiza comite de aprobacion mediante el cual se avalan 6 diagnosticos.
- Se sigue con las actividades de digitalizacion.

ESTADO CLIMA: Soleado.

Ronald Arieta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. Contratista

Escaneado con CamScanner

Lunes 06 junio de 2022.

PERSONAL EN OBRA
- Residente Obra
- SISO
- 3 maestros
- Ing. Diagnostico
- Trabajadores social
- 6 ayudantes

PERSONAL INTERVENTORIA.
- Residente interventoria
- Trabajadora social

ACTIVIDADES REALIZADAS

- se solicita diseño de mezcla por medio de oficio TEC-016-22, donde se debe especificar materiales, marca cemento y resistencia correspondiente

- Se avanza en instalacion de acero para vigas de cimentacion y columnetas en caseta tipo 3.

- se realiza actividades de digitalizacion.

- se realiza excavacion para cimentacion de casetas tipo 3

ESTADO CLIMA: Soleado

Ronald Anieta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. Contratista

Escaneado con CamScanner

Martes 07 junio 2022

PERSONAL EN OBRA
- Residente de obra
- SISO
- 4 Maestros
- Ing Diagnostico
- Trabajadora Social
- 7 ayudantes

PERSONAL INTERVENTORIA
- Residente interventoría
- Trabajadora social

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realiza entrega diseño de mezclo, queda pendiente revisión y aprobación de interventoría.

- Se continua con actividades de obra, excavación figurado.

- Se adelanto digitalización, elaboración de diagnostico, levantamiento acta vencidad.
- Se realizo excavacion para caseta tipo 3

ESTADO CLIMA: Soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoría

Ronald Blanco
R. Contratista

Escaneado con CamScanner

MIERCOLES 08 JUNIO 2022

PERSONAL DE OBRA
- Residente de obra
- SISO
- 4 Maestro
- Ing. Diagnostico
- Trabajadora Social
- 10 ayudantes

PERSONAL INTERVENTORIA
- Residente de interventoria
- Trabajadora Social

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realiza comite de obra N=6
- se realiza excavacion para caseta tipo 3
- Se realiza suministro de materiales a viviendas
- Se realiza vaciado de solado
- Se realiza armado de acero para viga de cimentacion y columetas
- se realiza solicitud cuadro de avance de actividad ejecutada
- Se entrego respuesta oficio CCR_cordoba_220576 049

ESTADO CLIMA: SOLEADO.

Ronald Arrieta
R. interventoria

Ronald Blanco
R. contratista

Escaneado con CamScanner

JUEVES 09 JUNIO 2022

PERSONAL OBRA

- Ing. Residente
- SISO
- 4 Maestros
- Ing. Diagnostico
- Trabajadora social
- 17 Ayudantes.

PERSONAL INTERVENTORIA.

- Residente interventoria
- Trabajadora social

ACTIVIDADES REALIZADAS

- la interventoria remite oficio de solicitud respuesta oficio TCC-001-22 informe tecnico especialista HSEQ N-5
- Colishuredes realiza solicitud por medio de oficio CCR_CORDOBA_2220526_2022-046
- Se realiza excavación para cimentación de casetas tipo 3.
- Se realiza figurado de acero para vigas de cimentacion y columnas

Estado Clima: Soleado.

Ronald Arrieta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R contratista

Escaneado con CamScanner

VIERMES 10 JUNIO 2022

PERSONAL EN OBRA
- Ing. Residente
- SISO
- 4 Maestros
- Trabajadora social
- Ing. Diagnostico.
- 12 Ayudantes.

PERSONAL INTERVENTORIA.
- Residente de interventoria
- Trabajo social

ACTIVIDADES REALIZADAS

- La interventoria realiza remisión de informe tecnico especialista reprogramacion y presupuesto N=8 y N=9. mediante TEC-007-22 y TEC-008-22

- Se realiza solicitud de informe mensual N=1. mediante GER-043-22

- Se realiza excavación para cimentacion y figurado de acero para vigas de cimentacion.

- se realiza fundicion de viga de cimentación para casetas tipo 3.

- Estado de clima: Soleado.

Ronal Arrieta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. contratista

Escaneado con CamScanner

SABADO 11 DE JULIO

PERSONAL EN OBRA

- Ing. Residente
- SISO
- 4 Maestros
- Ing. Diagnostico
- Trabajadora social
- 17 Ayudantes

PERSONAL INTERVENTORIA

- Residente Interventoria
- Trabajadora social

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realiza digitalizacion, elaboracion de diagnostico levantamiento, ficha vecindad
- Excavacion para cimentacion de columna para tanque elevado
- fundicion viga de cimentacion
- figurado de acero para columna de tanque, zapata y viga cimentacion.
- ESTADO CLIMA: Soleado.

Ronald Arrieta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. contratista

Escaneado con CamScanner

LUNES 13 DE JUNIO 2022

PERSONAL EN OBRA.

- Ing. Residente.
- SISO
- 4 Maestros
- Ing. Diagnostico
- Trabajadora Social
- 12 ayudantes

PERSONAL INTERVENTORIA.

- Residente interventoria
- Trabajadora Social

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realiza excavacion para viga cimentacion
- figurado de acero para vigas cimentacion
- se realiza pega de bloque de sobrecimiento relleno y compactacion terreno para casetas tipo 3.
- Se realiza fundicion de solado para vigas de cimentacion.

Estado clima: Soleado.

Ronald Amaya
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. contratista

Escaneado con CamScanner

MARTES 19 DE JULIO 2022

PERSONAL DE OBRA.

- Ing. Residente de obra
- SISO
- 4 Maestro
- Ing. Diagnostico
- Trabajo social
- 10 ayudante.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- La interventoria emite oficio TEE-022-22, solicitud entrega diagnostico como compromiso del comite de obra miercoles 03 de julio

- La interventoria solicita intensificacion de esfuerzos en la presentacion de diagnostico, ya que constituyen ruta critica de la programacion.

- Se adelanta digitalizacion, elaboracion de diagnostico levantamiento.

- Se realiza fundicion de viga de cimentacion

- Se realiza figurado de acero para vigas de cimentacion y columnas.

- Se realiza excavacion para columnas de tanque elevado.

Estado clima: Soleado

Ronald Arriata
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. Contratista

Escaneado con CamScanner

MIERCOLES 15 DE JULIO 2022

PERSONAL DE OBRA

- Ing. Residente de obra
- SISO
- 4 Maestro
- Ing. Diagnostico
- Trabajadora social
- 10 ayudante

ACTIVIDADES REALIZADAS

- La interventoria realiza solicitud especificacion tecnica de redes de acueducto y alcantarillado.
- Se realiza respuesta a oficio ccl_contrato-2022-050

- Se realizo pega de bloque sobre cimiento, relleno de material seleccionado.

- Se realiza trazado y localizacion para baños de casetas tipo 3.

- Se realiza intervencion a viviendas con adecuacion

- La interventoria solicita aumento de personal.

ESTADO CLIMA: Soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. contratista

Escaneado con CamScanner

JUEVES 16 - JUNIO 2022

PERSONAL EN OBRA

- Ing Residente
- SISO
- 4 Maestros
- Ing diagnostico
- Trabajadora Social
- 12 ayudantes

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realiza levantamiento de muro en caseta tipo 3

- Se realiza fundicion de zapata y pedestal en columna para tanque elevado.

- Se realiza fundicion de columna de tanque de para tanque elevado.

- Se realiza figurado de acero para columnas y viga de cimentacion

- Se realiza encofrado para losa de columna

- Se realiza suministro de materiales a viviendas

ESTADO CLIMA: Soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. Contratista

Escaneado con CamScanner

VIERNES 17 - JULIO 2020

PERSONAL EN OBRA

- Ing. Residente
- SISO
- 4 Maestros
- Ing. Diagnostico
- Trabajadora social
- 12 ayudantes.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realiza levantamiento de muro en caseta tipo 3.
- se realiza fundicion de zapata y pedestal para tanque elevado.
- se realiza fundicion de columna para tanque.
- se realiza encofrado para columna
- Se realiza levantamiento de muro
- Se realiza suministro de materiales a viviendas
- se realizo fundicion de columnetas y columnas de casetas tipo 3.

estado clima: Soleado.

Ronald Arnoldo Amaya
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. Contratista.

Escaneado con CamScanner

SABADO 18 JUNIO 2022

PERSONAL EN OBRA

- Ing. Residente
- SISO
- 4 Maestro
- Ing. Diagnostico
- Trabajadora Social
- 12 Aguadeante.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realiza levantamiento de muros para caseta tipo 3
- se realiza fundicion de zapatas y pedestales
- se realizo fundicion de losa para tanque
- se realizo fundición de columnetas de muros.
- se realizo pañete de baños caseta tipo 3
- se realiza adecuacion de baños
- se realizo encofrado para columna de tanque
- se realiza pañete de muro en baños de adecuacion o caseta tipo 3

Estado clima: Soleado.

Ronald Arneta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. Contratista

Escaneado con CamScanner

Martes 21 JUNIO 2022

PERSONAL EN OBRA.

- Ing. Residente
- SISO
- 5 Maestro
- Trabajadora social
- Ing. Diagnostico.
- 20 ayudantes

PERSONAL DE INTERVENTORIA.

- Residente interventoria
- Trabajadora social
- Inspectora Interventoria

ACTIVIDADES REALIZADAS

- se integra al equipo de interventoria la ing. Diamy Sanchez para apoyo tecnico de interventoria.

- se realiza levantamiento de muros para caseta tipo 3.

- Fundicion de columnas y columnetas de caseta tipo 3

- Fundicion de losas en columnas de tanque

- se realiza pañete de muros de caseta tipo 3 y adecuaciones.

- se realiza cuchillas para cubiertas

Estados. eliminar: Soleado.
En horas de la tarde se presento lluvia en horas 1:00 pm hasta 4:00 pm

R. Interventoria

R. contratista

Escaneado con CamScanner

MIERCOLES 22 JUNIO 2020

PERSONAL DE OBRA

- Ing. Residente
- SISO
- 5 maestros
- Ing. Diagnostico
- Trabajadora social
- 20 ayudantes

PERSONAL INTERVENTORIA

- Residente interventora
- Trabajadora social
- Inspectora interventora

Actividades Realizadas

- Levantamiento de muro y pañete.
- Fundicion de columnetas, columnas de muro
- Fundicion de viga dintel, levante y cuchilla para cubierta
- Fundicion de zapatas, pedestal, columnas y losa para tanque elevado.
- Se realiza adecuacion de baños viviendas
- Se realiza encofrado para columna.

Estado clima: Soleado.

Ronald Arrieta
R. interventoria

Ronald Blanco
R. contratista.

Escaneado con CamScanner

Jueve 23 Junio 2022

PERSONAL DE OBRA

- Ing. Residente
- SISO
- 5 Maestro
- Ing Diagnostico
- Trabajadora social
- 20 ayudantes

PERSONAL INTERVENTORIA

- Residente interventoria
- Trabajadora social
- Inspectora interventoria

Actividades Realizadas.

- levantamiento de muro y pañete

- Fundicion de columnetas, columnas de muro.

- Fundicion viga dintel, levante, cuchillas para cubierta.

- Se realiza Fundicion de plantilla en baños tipo 3.

- Fundicion de zapatas, pedestal, columnas, losa de tanque elevado.

- Se realiza adecuacion de baños

- Se adelanta con diagnostico, digitalizacion, levantamiento, actas vecindad.

Estado clima: Soleado.

Ronald Arrieta
R. interventoria

Ronald Blanco
R. contratista

Escaneado con CamScanner

VIERNES 24 JUNIO 2022

PERSONAL EN OBRA

- Ing Residente
- 9150
- 4 Maestros
- Ing Diagnostico
- Trabajadora social
- 19 ayudantes

Actividades realizadas

- Fundicion de vigas dintel, columnetas, columnas en casetas tipo 3.
- Se realiza peñete en caseta tipo 3
- Se realiza fundicion pedestal, columna para tanque elevado.
- Se realiza fundicion plantilla.
- Se realiza instalacion de ceramica para pared en adecuaciones y casetas tipo 3
- Se adelanta fundicion de cajas de registro.
- Fundicion de tapa de registro
- Instalacion tuberia sanitaria, y conexion a caja de registro.
- instalacion de tuberia de agua potable en baño

estado clima: soleado

Ronald Arrieta
R. interventoria

R. contratista

Escaneado con CamScanner

SABADO 25 JUNIO 2022

PERSONAL EN OBRA

- Ing Residente
- SISO
- 4 Maestro
- Ing. Diagnostico
- Trabajadora social
- 19 ayudantes

PERSONAL DE INTERVENTORIA.

- Residente interventoria
- Trabajadora social.
- Inspectora interventoria

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Fundicion de vigas dintel, columnetas, columna, en caseta tipo 3

- Se realiza pañete tipo 3

- Se realiza fundicion pedestal, columna para tanque elevado, losa de tanque elevado

- Se realiza fundicion de plantilla

- Se realiza instalacion de ceramica para pared en adecuacion y en caseta tipo 3

- Fundicion cajas de registro.

- Instalacion tuberia sanitaria y conexion a domiciliarias

Ronald Arrieta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. contratista

Escaneado con CamScanner

MARTES 28 - JUNIO

PERSONAL EN OBRA

- Ing. Residente
- SISO
- 4 Maestros
- Ing. diagnostico
- Trabajadora social
- 19 ayudantes.

PERSONAL INTERVENTORIA

- Residente interventoria
- Trabajadora social
- Inspectora interventoria

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Fundición viga dintel, columnetas, columnas para casetas tipo 3.
- Se realiza pañete tipo 3
- Fundición plantilla
- Instalación de ceramica de pared y piso.
- Instalación de accesorios en baño tipo 3 y adecuaciones
- Fundición caja de registro
- Instalación tubería sanitaria

Estado clima = Soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. Contratista

Escaneado con CamScanner

MIERCOLES 29- JUNIO 2022

PERSONAL EN OBRA.

- Ing. Residente
- SISO
- 4 Maestro
- Ing. diagnostico
- Trabajadora social
- 19 ayudantes.

PERSONAL INTERVENTORIA

- Residente interventoria
- Trabajadora Social
- Inspectora interventoria

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Fundición viga dintel, columnetas, columnas para casetas tipo 3.
- Se realiza pañete tipo 3
- Fundición plantilla, e instalación de ceramica de piso.
- Instalación de ceramica en piso y pared en caseta tipo 3 y adecuación.
- Fundición caja de registro.
- Instalación tubería sanitaria.
- instación de accesorios

Estado clima: soleado.

Ronald Arrieta
R. Interventoria

R. contratista
Ronald Blanco

Escaneado con CamScanner

JUEVES 30 JUNIO 2020

PERSONAL EN OBRA

- Ing. Residente de obra
- SISO
- 4 Maestros
- Ing. Diagnostico
- Trabajadora Social
- 19 ayudantes

PERSONAL INTERVENTORIA

- Residente interventoria
- Trabajadora social
- Inspectora interventoria

ACTIVIDADES REALIZADAS.

- Instalacion de cubiertas en baño tipo 3.
- Instalacion ceramica, piso y accesorios.
- Fundicion de plantilla, vigas, columnas, columnetas,
- Fundición caja de registro
- Excavacion para viga de cimentacion y zapatas ole tanque.
- Instalacion tubería sanitaria para cajas de registro
- Estado clima: Lluvioso.

Llovio en horas de la mañana 9:00 am hasta 11:00 am en horas de la tarde desde 2:00 pm hasta 3:30 pm

Ronald Arrieta
R: Interventoria

Ronald Blanco
R: Contratista.

Escaneado con CamScanner

RELACIÓN DEL PERSONAL EMPLEADO

	CONTROL DE PERSONAL	CÓDIGO:	F-GG-10
enterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/06/2020 Y EL 30/06/2022 PLAZO: 5 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES — CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. — CONTRATO No. 2220587

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVACIONES
NOMBRE Y CARGO																																
DUARTE PINEDO - DIRECTOR DE OBRA	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		
RONALD BLANCO - RESIDENTE DE OBRA	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		Resaltados en rojo lo dias Domingo
RAFAEL CASTILLO - RESIDENTE SST	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		
NORELIS ANAYA - TRABAJADORA SOCIAL	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		
OSWALDO GARZON - PROFESIONAL DIAGNOSTICO	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		
SINDY ESCOBAR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		
JOSE ROMERO - ESPECIALSITA ESTRUCTURAL	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		
GUSTAVO CAMARGO - ESPECIALISTA HIDRÀULICO	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		
JUAN MORENO - PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		
KAREN DEL CARMEN MERCADO - PROFESIONAL DE CALIDAD	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		
GENKY ALVAREZ PADILLA-MAESTRO DE OBRA	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		
PERSONAL CONTRATISTA	**10**	**10**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0**	**TOTAL PERIODO** **260**

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE*	SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA		**0**	**0,00%**	
De la región		0	0,00%	
ALVARO JAVER VALETH ROMERO		22	8,46%	
JOSE MIGUEL FLOREZ TAMARA				
JAVIER GALVAN RODRIGUEZ				
FEIVER RIVERA MARTNEZ				
HEIDER PINEDA HENAO		21	8,08%	
JESUS MANUEL VALETH ANDRADE				
SANDRO GONZALEZ SANCHEZ				
ELIECER AHUMADA RODRIGUEZ				
JOSE PEÑA CANTILLO				
De fuera de la región	N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A	0	0,00%	
MANO OBRA CALIFICADA		**0**	**0,00%**	
De la región		0	0,00%	
ALVARO SANCHEZ MEDINA		22	8,46%	
YULDOR VERGARA TOREES		24	9,23%	
YEISON ESCOBAR VERGARA		21	8,08%	
		0	0,00%	
De fuera de la región	N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A	0	0,00%	
GENKY ALVAREZ PADILLA		22	8,46%	
LUIS RIO CORREA		15	5,77%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS	N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A	**0**	**0,00%**	
De la región	N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A	0	0,00%	
De fuera de la región	N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A	0	0,00%	
POBLACIÓN VULNERABLE	N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A	**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social	N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A	0	0,00%	
En condición de desplazamiento	N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A	0	0,00%	
MUJERES	N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A	**0**	**0,00%**	
Mano de Obra no Calificada	N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A	0	0,00%	
Mano de Obra Calificada	N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A	0	0,00%	
Profesionales - Técnicos	N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A	0	0,00%	
PROVEEDORES	N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A			
Local				
Nacional				

enterritorio	**CONTROL DE PERSONAL**	CÓDIGO:	**F-GG-10**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL	1/06/2020	Y EL	30/06/2022	PLAZO:	5 MESES
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES			CONTRATO No.	2220576
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.			CONTRATO No.	2220587

Internacional				

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA: En el presente periodo no se nescito personal de mano de obra teniendo en cuenta que aun no icinia la actividad 3 correspondiente a la ejecución de obra.

Firma: Marcy A. Correa C

Nombre: Ing. Marcy Correa

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONTROL DE PERSONAL	CÓDIGO:	F-GG-10
enterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 26/04/2022 Y EL 31/05/2022 PLAZO: 5 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. CONTRATO No. 2220587

PERSONAL INTERVENTORIA

FECHA	MES: 01 JUNIO AL 30 DE JUNIO 2022																													OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
NOMBRE Y CARGO																																
MARCY CORREA - DIRECTOR INTERVENTORIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		Resaltados en rojo lo dias Domingo
RONALD ARIETA - RESIDENTE INTERVENTORIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		
DIAMYS SANCHEZ - INSPECTORA DE INTERVENTORIA																					1	1	1	1	1		1	1	1	1		
FERNANDA GRIJALBA - PROFESIONAL SOCIAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		
YIRA LEMUS - PROFESIONAL HSEQ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		
LEYDIS HERRERA - AUXILIAR SOCIAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		
JOSE CASTAÑO - ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		
CRISTINA PAEZ - PROFESIONAL HSEQ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		
GREGORIO MARÍN - ESPECIALSITA HIDROSANITARIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		
CARLOS FORERO - PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		
PERSONAL INTERVENTORIA	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**0**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**0**	**9**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0**	**TOTAL PERIODO**	**252**

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

Firma: Marcy A Correa C

Nombre: Ing. Marcy Correa

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

INFORMES SEMANALES PRESENTADOS Y APROBADOS DEL PROYECTO

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

ADMON

Bogotá D.C, 08 de julio de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-063-22

Señores:
Ingeniera
Karol Yulieth Javela
Supervisora
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio
Calle 26 # 13-19 Piso 20
Bogotá. Colombia

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: REMISIÓN INFORMES SEMANALES 10.

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales remitimos informe semanal 10 correspondiente al periodo del 27 de junio del 2022 al 03 de julio del 2022, para fines pertinentes.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.

FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA
Anexo: 18 folios
Proyectó: Jineth Marcela Gordillo – Residente Admón.
Reviso: Ing. Marcy Correa – Directora de Interventoría

INFORME SEMANAL 10

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 10	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 001

Entidad Contratante: ENTERRITORIO | Semana del 27/06/2022 al 3/07/2022 | Fecha 3/07/2022

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO PROYECTO	
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO: BOLÍVAR — MUNICIPIO: CORDOBA
GERENCIA A CARGO	ENTERRITORIO
SUPERVISOR	KAROL YULIETH JAVELA PEREZ
ESTADO DEL PROYECTO	EN EJECUCIÓN ACTIVIDAD 1, 2 Y 3

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2220576
Contratista	CONSORCIO CONSTRUREDES
Valor inicial	$ 1.771.707.945,99
Valor actual	$ 1.771.707.945,99
Variación del valor	$ -
Fecha de Inicio	26/04/2022
Plazo inicial (Días)	150 Días
Plazo actual (Días)	150 Días — 5 MESES - 150 DÍAS
Variación en plazo	Días
Fecha Contractual de terminación	26/09/2022
Tiempo Transcurrido (días)	68 — 45,33%
Días remanentes del Contrato	85,00 — 56,67%
Acumulado a última acta pagada	
Estimado ejecutado por llevar a acta	

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	2220587
Interventor	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS
Valor inicial	$ 202.479.313,00
Valor actual	$ 202.479.313,00
Variación del valor	$ -
Fecha de Inicio	26/04/2022
Plazo inicial	150 Días
Plazo actual	150 Días — 5 MESES - 150 DÍAS
Variación en plazo	Días
Fecha Contractual de terminación	26/09/2022
Ejecución del Contrato	68 — 45,33%
Días remanentes del Contrato	85,00 — 56,67%
Acumulado a última acta pagada	
Estimado ejecutado por llevar a acta	

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC): $ 1.771.707.945,99

Semáforo

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 529.994.982,83	29,91%	$ 212.895.680,48	12,02%	-$ 317.099.302,35	-17,90%
Durante el Periodo	$ 103.476.080,26	5,84%	$ 56.846.524,93	3,21%	-$ 46.629.555,33	-2,63%
Acumulado a la Fecha	**$ 633.471.063,09**	**35,75%**	**$ 269.742.205,40**	**15,22%**	**-$ 363.728.857,69**	**-20,53%**


Desviación en días: 31 Días




Observaciones al desempeño del proyecto:

De acuerdo a la programación de obra el contratista debería tener efectuado un 35,75% de ejecución, sin embargo, su ejecución es de 15,22% indicándonos un 20,53% de atraso; el cual es producto de las demoras en la entrega de los diagnósticos proyectados en los tiempos establecidos.
De acuerdo al plan de contingencia se debería tener un total de 217 diagnósticos aprobados a la fecha, de los cuales se han aprobado 80, indicándonos un atraso de 137 diagnósticos.
En cuanto a la actividad 3 el contratista debería tener 74 viviendas intervenidas, sin embargo, solo ha intervenido 48 viviendas (11 terminadas), el contratista cuenta con 14 frentes de trabajo

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)






CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	29,91%	12,02%	-17,89%	
Durante el Periodo	5,84%	3,20%	-2,64%	
Acumulado a la Fecha	**35,75%**	**15,22%**	**-20,53%**	

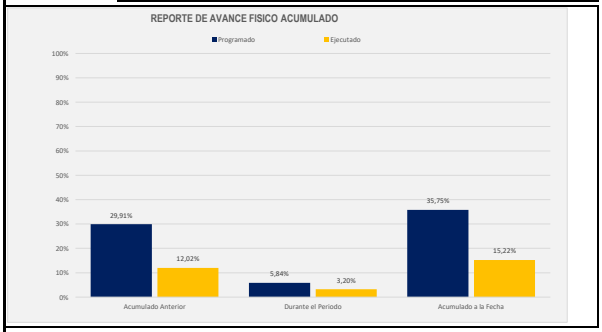

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 1.771.707.945,99	$ 1.771.707.945,99	$ -	$ 345.450.914,11		$ 345.450.914,11

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
		0,00%			0,00%		







AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 202.479.313,00	$ 202.479.313,00	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
		0,00%	1	$ 16.198.345,05	8,00%	$ 16.198.345,05	$ 16.198.346,05







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDAD No. 1
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: Actividad No. 1, la aprobación de la actividad N° 1 se hizo comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-037-22 del 3 de junio de 2022. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
ACTIVIDAD No. 2
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 55,30%
Comentario: La Actividad No. 2 presenta un atraso del 44.70%, por lo cual el Contratista debe reforzar esta actividad abriendo más frentes de trabajos con el fin de cumplir con las metas establecidas en la programación, la Interventoría solicitará al Contratista agilizar la entrega de diagnósticos para aprobación, tal como se solicitó mediante oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-022-22 y ARCA-INT/ENT/276-TEC-031-22
ACTIVIDAD No. 3
PROGRAMADO 34,10% vs 14,06% EJECUTADO
Comentario: La Actividad No. 3 presenta un atraso del 20,04%, sólo se han intervenido 48 viviendas (11 terminadas), de acuerdo al programado deberían estar en ejecución 74 viviendas, el contratista se comprometió a redoblar esfuerzos e incrementar frentes de trabajo.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

En el ítem ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10. El contratista subsanó los diseños de las casetas y el diseño de la estructura para el tanque elevado, también realizó entrega del informe técnico especialista estructural el cual fue aprobado por la interventoría con lo cual esta actividad queda en un 100% de su ejecución. Sin embargo, el Contratista posteriormente solicitó un cambio de especificaciones en algunos ítems, uno de ellos el ladrillo de arcilla por bloque de Concreto, razón por la cual se hace necesario ajustar el diseño estructural con dicho cambio. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
El ítem ACTIVIDAD 2: DIAGNOSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. Esta actividad avanza con el diligenciamiento de los diagnósticos de los cuales ya se sometieron a comité de aprobación 80 diagnósticos, los cuales fueron avalados por la interventoría, se espera que el contratista redoble esfuerzos y reduzca el atraso presentado, la próxima semana debe completar 217 diagnósticos programados según el plan de contingencia.
En el ítem ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS. ACTA DE ENTREGA Y RECIBOS DE LAS OBRAS
A la fecha y de acuerdo al cronograma de actividades el contratista debería tener en proceso constructivo 74 viviendas, sin embargo, sólo se han intervenido 48 viviendas (11 terminadas), el contratista se comprometió a redoblar esfuerzos e incrementar frentes de trabajo.
En las casetas tipo 3 se ha avanzado en actividades como: cimentación, mampostería, fundición de columnas y columnetas, pañetes, instalación de tubería hidrosanitaria, instalación de aparatos sanitarios, instalación de tejas para cubierta, instalación de puertas metálicas, de igual forma se adelantan labores en intervenciones correspondientes a adecuaciones con construcción de estructura para el tanque elevado, cambio de pañete, instalación de enchape de pared y pisos y cambio de equipos sanitarios, para estas actividades el contratista cuenta con 14 frentes de trabajo.

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Para la próxima semana correspondiente al período del 04 al 10 de Julio 2022 y de acuerdo a la Plan de contingencia estaría en la semana 9 de diagnósticos, tiempo en el cual se deberían tener los 217 diagnósticos que corresponden al 100% de esta actividad.
El contratista debe continuar con la ejecución de obra efectuando la intervención en 87 viviendas de acuerdo al plan de contingencia.
Por lo cual la interventoría le recomendó al Contratista el incremento de frentes de trabajo para efectuar trabajos constructivos en un mayor número de viviendas.

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 10	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 001

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **27/06/2022** al **3/07/2022** | Fecha **3/07/2022**


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTIÓN SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD PERIODO	CANTIDAD ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana: Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	11	3	14	66,7%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	7	0	7	33,3%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál?	0	0	0	0,0%
	Total	18	3	21	100,00%



OBSERVACIONES

En el presente periodo se presentaron torrenciales lluvias el dia 29 de junio 2022, se adjunta reporte climatico.

GESTIÓN SOCIAL Y PQR's

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
	28/06/2022	CASA DE LA CULTURA	18	• Realizar acompañamiento a las actividades ejecutadas por el contratista de obra las cuales requieran de apoyo y/o articulación. En este caso se mencionas específicamente el cierre de las PQR (solicitudes de inclusión). • Solicitar acompañamiento cuando se requiera de los miembros de comité de veeduría y demás actores.	CONTRATISTA DE OBRA	3/07/2022

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
INCLUSION 67	NELFIS DEL CARMEN TORRES PEREZ	29/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 68	ELIDA MARIA ROSALES ESCOBAR	30/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 69	PABLA ISABEL NAVARRO DE SERRANO	30/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 70	YESENIA VALETH CRUZATE	30/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 71	PETRONA MEDINA DE CRUZATE	30/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 72	SANDRA CRUZATE MEDINA	30/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 73	ARELIS MARIA VILLAFAÑE CANTILLO	30/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 74	BEATRIZ ELENA ACUÑA ARIZA	30/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 75	IRMA PINEDA CACERES	30/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 76	MARICELA VASQUEZ PINEDA	30/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 77	ROSIRIS MARGOTH FERNANDEZ ANAYA	30/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 78	NELLIS MANJARREZ TOVAR	30/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 79	YULISA PEREZ ROMERO	30/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA

7. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA






CASETA TIPO 3, SE APRECIA AVANCE EN EL PAÑETE DE MAMPOSTERIA, FUNDICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS.






ADECUACIONES DE UNIDADES SANITARIAS, SE APRECIA INSTALACIÓN DE LAVADEROS

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 10	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 001

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **27/06/2022** al **3/07/2022** Fecha **3/07/2022**









CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO-

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-032-22 a la Secretaría de Planeación Municipal con el Tema: SOLICITUD DE INCLUSION, Por medio del cual se remite para su debido tramite Trece (13) solicitudes de inclusión teniendo en cuenta el PROTOCOLO PARA LA INCLUSION DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS AL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, del cual, ya se ha dado los trámites correspondientes por el Contratista, y corresponde al municipio el trámite.

La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-033-22 al contratista Consorcio Construredes con el Tema: RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_060 APROBACION DE DIAGNOSTICOS.

Por medio del presente se realizamos entrega de aval para 13 diagnósticos presentados en comité de aprobación No. 006 los cuales corresponden a los códigos:

B-C-SM-MZ55-VE-056, B-C-SM-M55-VE-061, B-C-SM-MZ69-VE-085, B-C-SM-MZ77-VE-O94, B-C-SM-MZ58-VE-100, B-C-SM-MZ58-VE-101, B-C-SM-MZ87-VE-129, B-C-SM-MZ56-VE-135, B-C-SM-MZ87-VE-145, B-C-SM-MZ- VE-14, B-C-SM-MZ87-VE-147, B-C-SM-MZ87-VE-148 y B-C-SM-MZ91-VE-167

La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-034-22 a la empresa COOSEPCOR LTDA con el tema: SOLICITUD DISPONIBILIDAD DE RESDES, mediante el cual se solicito gestión a la Empresa prestadora del servicio público de acueducto y alcantarillado, COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CÓRDOBA BOLÍVAR - (COOSEPCOR LTDA), Para La Expedición Del Certificado De Autorización para La Intervención De Conexión de las acometidas domiciliarias de acueducto y alcantarillado para Veintisiete (29) Diagnósticos del Barrio San Martin.

La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-035-22 al contratista Consorcio Construredes con el Tema: RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_062 - APROBACION DE DIAGNOSTICOS. Por medio del presente se realizamos entrega de aval para 15 diagnósticos presentados en comité de aprobación No. 007 los cuales corresponden a los códigos:

B-C-SM-MZ59-VE-099, B-C-SM-MZ59-VE-102, B-C-SM-MZ47-VE-103, B-C-SM-MZ47-VE-104, B-C-SM-MZ47-VE-110, B-C-SM-MZ47-VE-111, B-C-SM-MZ47-VE-112, B-C-SM-MZ47-VE-114, B-C-SM-MZ30-VE-120, B-C-SM-MZ87-VE-124, B-C-SM-MZ32-VE-143. B-C-SM-MZ32-VE-144, B-C-SM-MZ76-VE-153, B-C-SM-MZ75-VE-155 y B-C-SM-MZ75-VE-172.

Marcy A. Correa C			
Firma		**Firma**	
Nombre	Marcy Correa castaño	Nombre	Karol Yulieth Javela Pérez
	Directora de la interventoría	Supervisor	Supervisor ENTerritorio

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A		ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA		FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-013	2-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	11	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	2-jun-22	SI	SI	13-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-019	9-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	22	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	9-jun-22	SI	SI	14-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-026	16-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	18	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	14-jun-22	NO	NO	No se ha recibido respuesta
ARCA-INT/FDA276-TEC-032	28-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	13	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	28-jun-22	NO	NO	No se ha recibido respuesta

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA	FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-021	13-jun-22	SOLICITUD RESPUESTA AL CONCEPTO EMITIDO POR COOSEPCOR MEDIANTE ACTA DE REUNION DE OBRA	1	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	13-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta
ARCA-INT/FDA276-TEC-029	21-jun-22	OBRA REQUERIA EN LA VIA PUBLICA PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE LAS VIVIENDAS 001, 085, 088, 163	4	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	21-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA	FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-015	2-jun-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	24	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	2-jun-22	SI	3-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-023	15-jun-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	27	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	15-jun-22	**NO**	
ARCA-INT/FDA276-TEC-034	2-jul-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	29	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	2-jul-22	**NO**	

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA	FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-025	15-jun-22	SOLICITUD ESPECIFICACIÓN TECNICA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	15-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta

INFORME PCI

Fecha de Corte	3/07/2022	PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS																												
Priorización		MATRIZ BASE						INCLUSIONES													TOTALES									
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No.2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Solicitudes de Inclusion	Atendida de la ESP	Atendida por la Alcaldia	Pendientes por atender ESP	Pendientes por atender Alcaldia	Respuesta positiva	Respuesta negativa	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Visitadas	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Recibidas a satisfaccion	Viviendas En ejecución.	Viviendas Programadas actividad No.3
Cordoba Bolivar	San Martin	217	0	206	10	102	1	79	33	11	32	54	5	6	0	0	0	0	217	206	10	102	1	48	11	0	48	0
	TOTAL	**217**	**0**	**206**	**10**	**102**	**1**	**79**	**33**	**11**	**32**	**54**	**5**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**217**	**206**	**10**	**102**	**1**	**48**	**11**	**0**	**48**	**0**

REPORTE CLIMA

clima Colombia

Descarga la APP

Clima en

Córdoba

jueves 30 de junio, 2022

	Hoy 29 JUN	Mañana 30 JUN	Viernes 01 JUL	Sábado 02 JUL	Domingo 03 JUL	Lunes 04 JUL	Martes 05 JUL
Hora	↑ 30° ↓ 24°	↑ 30° ↓ 24°	↑ 30° ↓ 24°	↑ 30° ↓ 24°	↑ 31° ↓ 24°	↑ 31° ↓ 25°	↑ 30° ↓ 25°
08:00	25°	26°	25°	26°	26°	26°	26°
14:00	30°	30°	30°	30°	31°	31°	30°
20:00	25°	25°	25°	26°	25°	25°	25°
Lluvia	14.1 mm	6.6 mm	5.3 mm	13.8 mm	10.8 mm	4.4 mm	4.9 mm
Viento	13 km/h	12 km/h	10 km/h	10 km/h	10 km/h	13 km/h	8 km/h
	05:43	05:43	05:43	05:44	05:44	05:44	05:44
	18:23	18:23	18:23	18:24	18:24	18:24	18:24

Hora por hora en Córdoba

Predicción para las próximas horas

Hoy:

09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
26°	26°	27°	29°	30°	30°	29°	29°	27°	26°	25°	25°	25°	25°	25°

INFORME ESTADO DE COVID-19

enterritorio	**INFORME ESTADO DE COVID - 19**	CÓDIGO:	**F-GG-10**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27/06/2022 Y EL 3/07/2022 PLAZO: 5 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. CONTRATO No. 2220587

PERSONAL DEL CONTRATISTA

	MES: JUNIO			SEMANA:4					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	OBSERVACIONES
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
DUARTE PINEDO - DIRECTOR DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD BLANCO - RESIDENTE DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RAFAEL CASTILLO - RESIDENTE SST	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
NORELIS ANAYA - TRABAJADORA SOCIAL	**ASTRAZENIKA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
OSWALDO GARZÓN - PROFESIONAL DIAGNOSTICO	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
SINDY ESCOBAR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**SINOVAC**		F	NO	NO	NO	SI	SI	

PERSONAL INTERVENTORIA

	MES: JUNIO			SEMANA:4					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	**OBSERVACIONES**
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
MARCY CORREA - DIRECTOR INTERVENTORIA	**PFIZER**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD ARIETA - RESIDENTE INTERVENTORIA	**PFIZER**	**MODERNA**	M	NO	NO	NO	SI	SI	
DIAMYS SANCHEZ PORTILLO - INSPECTORA DE INTERVENTORIA	**PFIZER**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
FERNANDA GRIJALBA - PROFESIONAL SOCIAL	**MODERNA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
YIRA LEMUS - PROFESIONAL HSEQ	**AZTRAZENECA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
LEYDIS HERRERA - AUXILIAR SOCIAL	**JONSSON**	**JONSSON**	F	NO	NO	NO	SI	SI	

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Firma: Marcy A. Correa C

Nombre: Ing. Marcy Correa

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

REPORTE Y EJECUCIÒN DE VIVIENDAS SEMANALES

Ejecución de Actividad en Viviendas al Programa Conexiones Intradomiciliarias con corte a 03/07/2022

BARRIO	ACTA	No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización	Número de días Máximo permitido según tipo de intervención	Número de Dias de la Intervencion por parte del Contratista	Dias de cumplimiento o incumplimiento según tipo de intervención (-) atraso y (+) avance	¿SE ENCUENTRA RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR INTERVENTORÍA?	
															SI (X)	NO (X)
SM	1	1	B-C-SM-MZ29-VE-001		Adecuacion	$7.967.801,13	$0,00		EN EJECUCION	0/01/1900	5/01/1900	0	5	-5		x
SM	1	2	B-C-SM-MZ32-VE-002	100%	Caseta T3	$8.126.190,79	$8.126.190,79	2/06/2022	EN EJECUCION	2/06/2022	10/06/2022	0	8	-8		x
SM	1	3	B-C-SM-MZ32-VE-003	100%	Caseta T3	$7.914.431,13	$7.914.431,13	4/06/2022	EN EJECUCION	4/06/2022	12/06/2022	0	8	-8		x
SM	1	4	B-C-SM-MZ18-VE-004	100%	Adecuacion	$7.372.105,35	$7.372.105,35	4/06/2022	EN EJECUCION	4/06/2022	8/06/2022	0	4	-4		x
SM	1	5	B-C-SM-MZ22-VE-005	100%	Adecuacion	$7.148.052,07	$7.148.052,07	4/06/2022	EN EJECUCION	4/06/2022	7/06/2022	0	3	-3		x
SM	1	6	B-C-SM-MZ34-VE-006	100%	Adecuacion	$7.464.125,94	$7.464.125,94	4/06/2022	EN EJECUCION	4/06/2022	8/06/2022	0	4	-4		x
SM	1	7	B-C-SM-MZ22-VE-007	100%	Adecuacion	$7.159.479,30	$7.159.479,30	4/06/2022	EN EJECUCION	4/06/2022	9/06/2022	0	5	-5		x
SM	1	8	B-C-SM-MZ22-VE-009	100%	Caseta T3	$7.908.010,60	$7.908.010,60	4/06/2022	EN EJECUCION	4/06/2022	8/06/2022	0	4	-4		x
SM	1	9	B-C-SM-MZ21-VE-010	100%	Caseta T3	$8.928.931,81	$8.928.931,81	4/06/2022	EN EJECUCION	4/06/2022	9/06/2022	0	5	-5		x
SM	1	10	B-C-SM-MZ22-VE-011	100%	Adecuacion	$7.911.551,76	$7.911.551,76	8/06/2022	EN EJECUCION	8/06/2022	16/06/2022	0	8	-8		x
SM	1	11	B-C-SM-MZ34-VE-012	100%	Caseta T3	$8.997.603,49	$8.997.603,49	4/06/2022	EN EJECUCION	4/06/2022	9/06/2022	0	5	-5		x
SM	1	12	B-C-SM-MZ21-VE-013	95%	Adecuacion	$5.406.646,10	$5.136.313,80	2/06/2022	EN EJECUCION	2/06/2022	6/06/2022	0	4	-4		x
SM	1	13	B-C-SM-MZ21-VE-014	95%	Caseta T3	$8.562.948,93	$8.134.801,48	4/06/2022	EN EJECUCION	4/06/2022	10/06/2022	0	6	-6		x
SM	1	14	B-C-SM-MZ21-VE-015	95%	Caseta T3	$8.265.079,43	$7.851.825,46	2/06/2022	EN EJECUCION	2/06/2022	7/06/2022	0	5	-5		x
SM	1	15	B-C-SM-MZ21-VE-016	95%	Caseta T3	$9.248.106,91	$8.785.701,56	2/06/2022	EN EJECUCION	2/06/2022	8/06/2022	0	6	-6		x
SM	1	16	B-C-SM-MZ38-VE-017	95%	Caseta T3	$8.481.195,82	$8.057.136,03	2/06/2022	EN EJECUCION	2/06/2022	7/06/2022	0	5	-5		x
SM	2	17	B-C-SM-MZ24-VE-018	90%	Caseta T3	$8.450.841,17	$7.605.757,05	5/06/2022	EN EJECUCION	5/06/2022	9/06/2022	0	4	-4		x
SM	1	18	B-C-SM-MZ24-VE-019	90%	Adecuacion	$6.395.588,06	$5.756.029,25	5/06/2022	EN EJECUCION	5/06/2022	10/06/2022	0	5	-5		x
SM	1	19	B-C-SM-MZ24-VE-020	90%	Adecuacion	$4.593.449,33	$4.134.104,40	5/06/2022	EN EJECUCION	5/06/2022	13/06/2022	0	8	-8		x
SM	2	20	B-C-SM-MZ85-VE-021	90%	Caseta T3	$8.614.688,02	$7.753.219,22	5/06/2022	EN EJECUCION	5/06/2022	14/06/2022	0	9	-9		x
SM	2	21	B-C-SM-MZ85-VE-022	90%	Caseta T3	$8.896.124,14	$8.006.511,73	5/06/2022	EN EJECUCION	5/06/2022	9/06/2022	0	4	-4		x
SM	1	22	B-C-SM-MZ85-VE-023	90%	Adecuacion	$7.191.930,35	$6.472.737,32	5/06/2022	EN EJECUCION	5/06/2022	10/06/2022	0	5	-5		x
SM	1	23	B-C-SM-MZ29-VE-024	90%	Adecuacion	$6.084.490,07	$5.476.041,06	5/06/2022	EN EJECUCION	5/06/2022	10/06/2022	0	5	-5		x
SM	2	24	B-C-SM-MZ31-VE-025	90%	Caseta T3	$8.637.204,10	$7.773.483,69	5/06/2022	EN EJECUCION	5/06/2022	9/06/2022	0	4	-4		x
SM	1	25	B-C-SM-MZ31-VE-026	90%	Adecuacion	$4.822.827,41	$4.340.544,67	5/06/2022	EN EJECUCION	5/06/2022	14/06/2022	0	9	-9		x
SM	1	26	B-C-SM-MZ31-VE-027	90%	Adecuacion	$4.365.339,96	$3.928.805,96	5/06/2022	EN EJECUCION	5/06/2022	9/06/2022	0	4	-4		x
SM	2	27	B-C-SM-MZ31-VE-028	90%	Adecuacion	$7.668.943,14	$6.902.048,83	5/06/2022	EN EJECUCION	5/06/2022	8/06/2022	0	3	-3		x
SM	2	28	B-C-SM-MZ31-VE-029	90%	Caseta T3	$8.468.136,75	$7.621.323,08	5/06/2022	EN EJECUCION	5/06/2022	9/06/2022	0	4	-4		x
SM	1	29	B-C-SM-MZ31-VE-030	90%	Adecuacion	$4.637.820,17	$4.174.038,15	5/06/2022	EN EJECUCION	5/06/2022	11/06/2022	0	6	-6		x
SM	3	30	B-C-SM-MZ30-VE-032	35%	Adecuacion	$7.557.018,99	$2.644.956,65	9/06/2022	EN EJECUCION	9/06/2022	15/06/2022	0	6	-6		x
SM	3	31	B-C-SM-MZ44-VE-034	35%	Adecuacion	$5.519.347,12	$1.931.771,49	9/06/2022	EN EJECUCION	9/06/2022	15/06/2022	0	6	-6		x
SM	3	32	B-C-SM-MZ45-VE-035	35%	Adecuacion	$8.137.626,09	$2.848.169,13	9/06/2022	EN EJECUCION	9/06/2022	15/06/2022	0	6	-6		x
SM	3	33	B-C-SM-MZ56-VE-038	35%	Adecuacion	$8.227.630,94	$2.879.670,83	9/06/2022	EN EJECUCION	9/06/2022	15/06/2022	0	6	-6		x
SM	3	34	B-C-SM-MZ56-VE-039	35%	Adecuacion	$1.443.687,77	$505.290,72	9/06/2022	EN EJECUCION	9/06/2022	15/06/2022	0	6	-6		x
SM	3	35	B-C-SM-MZ46-VE-040	35%	Adecuacion	$6.628.376,66	$2.319.931,83	9/06/2022	EN EJECUCION	9/06/2022	15/06/2022	0	6	-6		x
SM	3	36	B-C-SM-MZ45-VE-041	35%	Adecuacion	$4.845.221,48	$1.695.827,52	9/06/2022	EN EJECUCION	9/06/2022	15/06/2022	0	6	-6		x
SM	3	37	B-C-SM-MZ21-VE-042	35%	Adecuacion	$4.634.812,47	$1.622.184,36	9/06/2022	EN EJECUCION	9/06/2022	15/06/2022	0	6	-6		x
SM	3	38	B-C-SM-MZ31-VE-043	35%	Caseta T3	$6.939.713,07	$2.428.899,57	9/06/2022	EN EJECUCION	9/06/2022	15/06/2022	0	6	-6		x
SM	3	39	B-C-SM-MZ55-VE-046	35%	Caseta T3	$7.344.533,10	$2.570.586,59	9/06/2022	EN EJECUCION	9/06/2022	15/06/2022	0	6	-6		x
SM	3	40	B-C-SM-MZ55-VE-047	35%	Caseta T2	$7.890.285,26	$2.761.599,84	9/06/2022	EN EJECUCION	9/06/2022	15/06/2022	5	6	-1		x
SM	3	41	B-C-SM-MZ56-VE-055	35%	Adecuacion	$3.160.157,78	$1.106.055,22	9/06/2022	EN EJECUCION	9/06/2022	15/06/2022	0	6	-6		x
SM	4	42	B-C-SM-MZ56-VE-062	35%	Caseta T2	$8.362.124,52	$2.926.743,58	14/06/2022	EN EJECUCION	14/06/2022	20/06/2022	5	6	-1		x
SM	4	43	B-C-SM-MZ66-VE-067	35%	Caseta T3	$7.306.146,52	$2.557.151,28	14/06/2022	EN EJECUCION	14/06/2022	20/06/2022	0	6	-6		x
SM	4	44	B-C-SM-MZ66-VE-068	35%	Caseta T3	$7.971.707,31	$2.790.097,56	14/06/2022	EN EJECUCION	14/06/2022	20/06/2022	0	6	-6		x
SM	4	45	B-C-SM-MZ66-VE-069	35%	Adecuacion	$6.509.744,54	$2.278.410,59	14/06/2022	EN EJECUCION	14/06/2022	20/06/2022	0	6	-6		x
SM	4	46	B-C-SM-MZ75-VE-071	35%	Adecuacion	$7.170.024,86	$2.509.508,70	14/06/2022	EN EJECUCION	14/06/2022	20/06/2022	0	6	-6		x

SM	4	47	B-C-SM-MZ75-VE-072	35%	Caseta T3	$8.040.278,46	$2.814.097,46	14/06/2022	**EN EJECUCION**	14/06/2022	20/06/2022	0	**6**	**-6**		**x**
SM	4	48	B-C-SM-MZ75-VE-073	35%	Caseta T4	$8.332.036,11	$2.916.212,64	14/06/2022	**EN EJECUCION**	14/06/2022	20/06/2022	5	**6**	**-1**		**x**
SM	4	49	B-C-SM-MZ75-VE-074	25%	Caseta T5	$7.656.034,05	$1.914.008,51	14/06/2022	**EN EJECUCION**	14/06/2022	20/06/2022	0	**6**	**-6**		**x**
SM	4	50	B-C-SM-MZ89-VE-084		Caseta T6	$8.247.304,21										

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

Bogotá D.C, 07 de julio de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-062-22

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial FECHA 7/07/2022 HORA: 12:53:02 p. m.
20224300252292

ADMON

Señores:
Ingeniera
Karol Yulieth Javela
Supervisora
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio
Calle 26 # 13-19 Piso 20
Bogotá. Colombia

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: REMISIÓN INFORMES SEMANALES 9.

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales remitimos informe semanal 9 correspondiente al periodo del 20 de junio del 2022 al 26 de junio del 2022, para fines pertinentes.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.

FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA
Anexo: 20 folios
Proyectó: Jineth Marcela Gordillo – Residente Admón.
Reviso: Ing. Marcy Correa – Directora de Interventoría

INFORME SEMANAL 9

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 9	CÓDIGO:	F-GG-06
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 001

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **20/06/2022** al **26/06/2022** Fecha **26/06/2022**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO PROYECTO				
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO**	BOLÍVAR	**MUNICIPIO**	CÓRDOBA
GERENCIA A CARGO	ENTERRITORIO			
SUPERVISOR	KAROL YULIETH JAVELA PÉREZ			
ESTADO DEL PROYECTO	EN EJECUCIÓN ACTIVIDAD 1, 2 Y 3			

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2220576	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUREDES	
Valor inicial	$	1.771.707.945,99
Valor actual	$	1.771.707.945,99
Variación del valor	$	-
Fecha de Inicio	26/04/2022	
Plazo inicial (Días)	150 Días	
Plazo actual (Días)	150 Días	5 MESES - 150 DÍAS
Variación en plazo	Días	
Fecha Contractual de terminación	26/09/2022	
Tiempo Transcurrido (días)	61	40,67%
Días remanentes del Contrato	92,00	61,33%
Acumulado a última acta pagada		
Estimado ejecutado por llevar a acta		

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.	2220587	
Interventor	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS.	
Valor inicial	$	202.479.313,00
Valor actual	$	202.479.313,00
Variación del valor	$	-
Fecha de Inicio	26/04/2022	
Plazo inicial	150 Días	
Plazo actual	150 Días	5 MESES - 150 DÍAS
Variación en plazo	Días	
Fecha Contractual de terminación	26/09/2022	
Ejecución del Contrato	61	40,67%
Días remanentes del Contrato	92,00	61,33%
Acumulado a última acta pagada		
Estimado ejecutado por llevar a acta		

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 1.771.707.945,99

Semáforo

Desviación en días: 27 Días

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 426.518.902,57	24,07%	$ 159.808.056,73	9,02%	-$ 266.710.845,84	-15,05%
Durante el Periodo	$ 103.476.080,26	5,84%	$ 53.087.623,75	3,00%	-$ 50.388.456,51	-2,84%
Acumulado a la Fecha	**$ 529.994.982,83**	**29,91%**	**$ 212.895.680,48**	**12,02%**	**-$ 317.099.302,35**	**-17,90%**

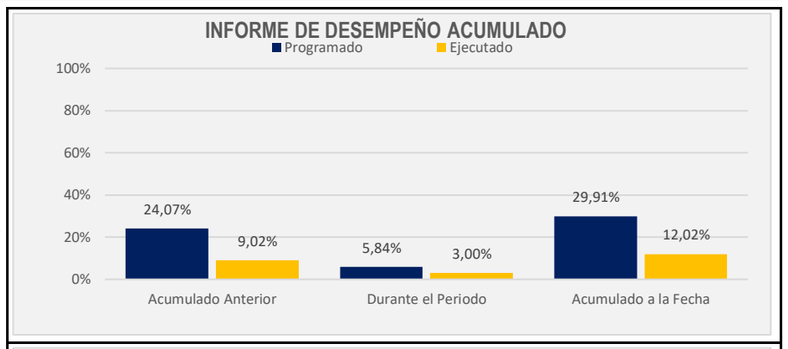


Observaciones al desempeño del proyecto


De acuerdo a la programación de obra el contratista debería tener efectuado un 29,91% de ejecución, sin embargo, su ejecución es de 10,80% indicándonos un 19,12% de atraso; el cual es producto de las demoras en la entrega de los diagnósticos proyectados en los tiempos establecidos.

De acuerdo al plan de contingencia se debería tener un total de 217 diagnósticos aprobados de los cuales a la fecha se han aprobado 67, indicándonos un atraso de 150 diagnósticos.

En cuanto a la actividad 3 el contratista de debería tener 61 viviendas intervenidas, sin embargo, solo ha intervenido 30 y suministrado material a 48 viviendas programadas, el contratista cuenta con 11 frentes de trabajo.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

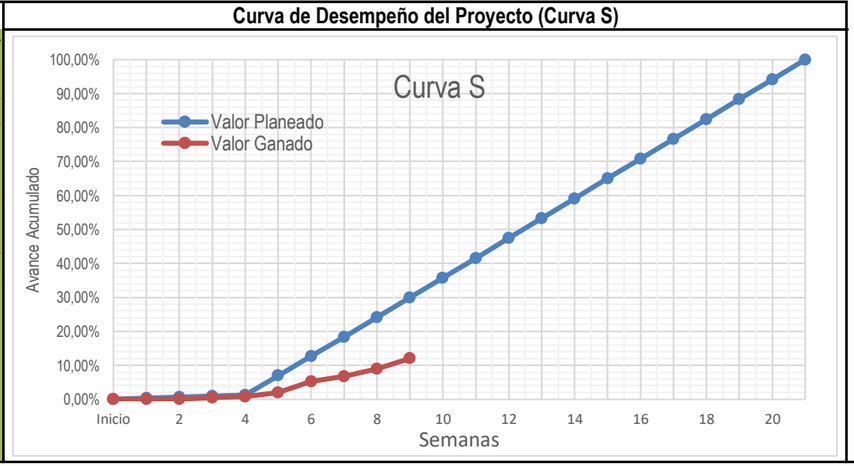

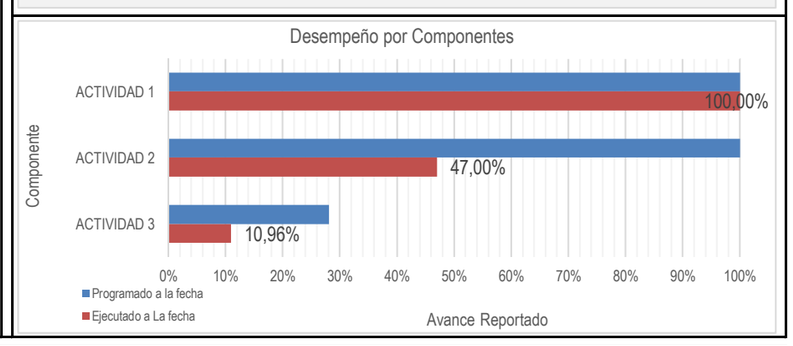


CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	24,07%	9,02%	-15,05%	
Durante el Periodo	5,84%	3,00%	-2,84%	
Acumulado a la Fecha	**29,91%**	**12,02%**	**-17,90%**	

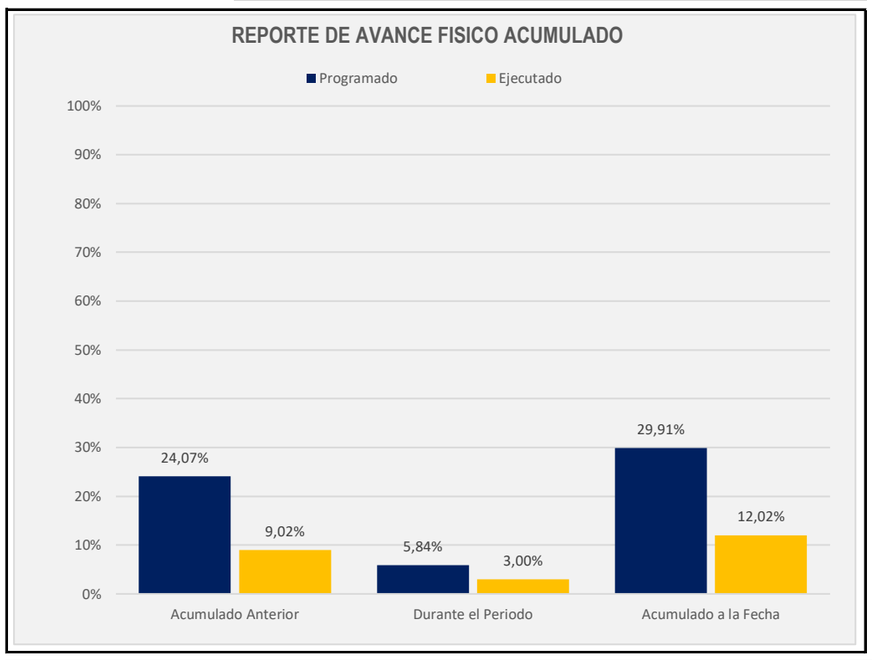


AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 1.771.707.945,99	$ 1.771.707.945,99	$ -	$ 345.450.914,11		$ 345.450.914,11

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
		0,00%			0,00%		









AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 202.479.313,00	$ 202.479.313,00	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
		0,00%	1	$ 16.198.345,05	8,00%	$ 16.198.345,05	$ 16.198.346,05







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 001

Entidad Contratante: ENTERRITORIO | Semana del 20/06/2022 al 26/06/2022 | Fecha 26/06/2022

ACTIVIDAD No. 1
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: Actividad No. 1, la aprobación de la actividad N° 1 se hizo comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-037-22 del 3 de junio de 2022
ACTIVIDAD No. 2
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 47%
Comentario: La Actividad No. 2 presenta un atraso del 53%, por lo cual el Contratista debe reforzar esta actividad abriendo más frentes de trabajos con el fin de cumplir con las metas establecidas en la programación, la Interventoría solicitará al Contratista agilizar la entrega de diagnósticos para aprobación, tal como se solicitó mediante oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-022-22
ACTIVIDAD No. 3
PROGRAMADO 28,11% vs 10,96% EJECUTADO
Comentario: La Actividad No. 3 presenta un atraso del 17,15%, sólo se han intervenido 30 viviendas y suministrado materiales a 18 más, de acuerdo al programado deberían estar en ejecución 61 viviendas, el contratista se comprometió a redoblar esfuerzos e incrementar frentes de trabajo.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

En el ítem ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10. El contratista subsanó los diseños de las casetas y el diseño de la estructura para el tanque elevado, también realizó entrega del informe técnico especialista estructural el cual fue aprobado por la interventoría con lo cual esta actividad queda en un 100% de su ejecución. Sin embargo, el Contratista posteriormente solicitó un cambio de especificaciones en algunos items, uno de ellos el ladrillo de arcilla por bloque de Concreto, razón por la cual se hace necesario ajustar el diseño estructural con dicho cambio, se espera en el transcurso de la sigueinte semana realizar la aprobación de dicho diseño.
El ítem ACTIVIDAD 2: DIAGNOSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. Esta actividad avanza con el diligenciamiento de los diagnósticos de los cuales ya se sometieron a comité de aprobación; para el primer paquete de 67 los cuales fueron aprobados por la interventoría se espera que el contratista redoble esfuerzos y reduzca el atraso presentado, la próxima semana debe completar 175 diagnósticos para someter a comité de aprobación y completar los 217 propuestos en el plan de contingencia.
En el ítem ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS. ACTA DE ENTREGA Y RECIBOS DE LAS OBRAS
A la fecha y de acuerdo al cronograma de actividades el contratista debería tener en proceso constructivo 61 viviendas, sin embargo, sólo se han intervenido 30 viviendas y suministrado materiales a 18 más, de acuerdo al programado deberían estar en ejecución 61 viviendas, el contratista se comprometió a redoblar esfuerzos e incrementar frentes de trabajo.
En las casetas tipo 3 se ha avanzado en actividades como: cimentación, mampostería, fundición de columnas y columnetas, pañetes, instalación de tubería hidrosanitaria, instalación de aparatos sanitarios, de igual forma se adelantan labores en intervenciones correspondientes a adecuaciones con construcción de estructura para el tanque elevado, cambio de pañete, instalación de enchape de pared y pisos y cambio de equipos sanitarios, para estas actividades el contratista cuenta con 9 frentes de trabajo.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Para la próxima semana correspondiente al periodo del 27 de junio al 03 de Julio 2022 y de acuerdo a la programación de obra estaría en la semana 9 de diagnósticos tiempo en el cual se deberían tener los 217 diagnósticos que corresponden al 100% de esta actividad.
El contratista debe continuar con la ejecución de obra efectuando la intervención en 74 viviendas de acuerdo a la programación y plan de contingencia.
Por lo cual la interventoría le recomendó al Contratista el incremento de frentes de trabajo para efectuar trabajos constructivos en un mayor número de viviendas.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTIÓN SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0

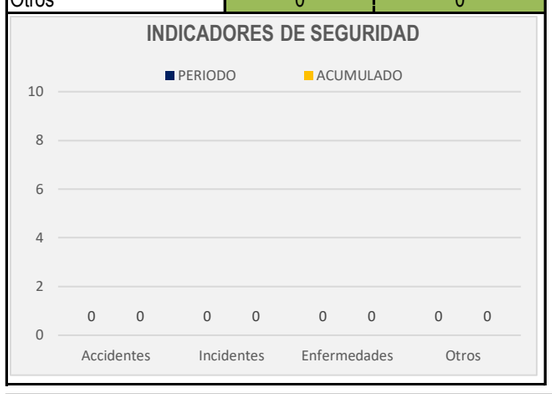

Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	7	4	11	61,1%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	7	0	7	38,9%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál?	0	0	0	0,0%
	Total	**14**	**4**	**18**	**100,00%**

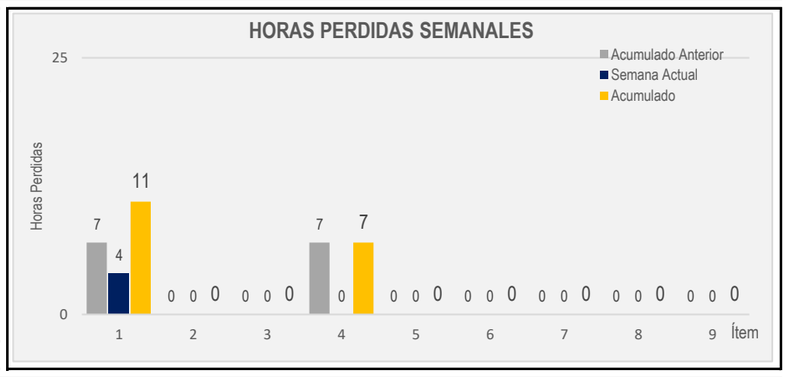

OBSERVACIONES

En el presente periodo se presentaron torrenciales lluvias el dia 21 de junio 2022, se adjunta reporte climatico.

GESTIÓN SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
INCLUSION 64	GERARDO RIVERA BALLESTAS	22/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 65	EULOGIO AMADO VILLAMIZAR SANES	23/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 66	ESTEFANY LUZ RICO GONZALEZ	24/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA

7. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 001

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **20/06/2022** al **26/06/2022** Fecha **26/06/2022**

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA









CASETA TIPO 3, SE APRECIA AVANCE EN LA MAMPOSTERIA, FUNDICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS.









CASETA TIPO 3, SE APRECIA AVANCE EN LA MAMPOSTERIA, PAÑETE, FUNDICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS.









ADECUACIONES Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO-

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 001

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **20/06/2022** al **26/06/2022** Fecha **26/06/2022**

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-029-22 a la Secretaría de Planeación Municipal con el Tema: OBRAS REQUERIDAS EN VÍA PÚBLICA PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMILICIARIAS DE LAS VIVIENDAS 001, 085, 088 Y 163. Por medio del cual se relacionan las viviendas que requieren la conexión a las redes de alcantarillado municipal como requisito indispensable para continuar dentro del programa, estas viviendas son las identificadas con los siguientes consecutivos 001, 085, 088 y 163. Las obras requeridas para estas viviendas son: Rotura de carpeta asfáltica, Excavación y reposición de carpeta, obras que estarían a cargo de la Alcaldía Municipal y de Coosepcor.

La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-030-22 al contratista Consorcio Construredes con el Tema: RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_055 APROBACION DE DIAGNOSTICOS.

Por medio del presente se realizamos entrega de aval para 16 diagnósticos presentados en comité de aprobación No. 005 los cuales corresponden a los códigos: B-C-SM-MZ145-VE-053, B-C-SM-MZ69-VE-087, B-C-SM-MZ69-VE-088, B-C-SM-MZ66-VE-13, B-C-SM-MZ56-VE-136, B-C-SM-MZ56-VE-138, B-C-SM-MZ56-VE-139, B-C-SM-MZ56-VE-140, B-C-SM-MZ89-VE-149, B-C-SM-MZ89-VE-150, B-C-SM-MZ56-VE-152, B-C-SM-MZ75-VE-156, B-C-SM-MZ75-VE-158, B-C-SM-MZ84-VE-165, B-C-SM-MZ84-VE-166 y B-C-SM-MZ92-VE-168.

La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-031-22 al contratista Consorcio Construredes con el Tema: SOLICITUD ENTREGA DE DIAGNOSTICOS COMO COMPROMISO DEL COMITÉ DE OBRA MIERCOLES 15 DE JUNIO 2022

Por medio del cual solicitamos la entrega de los 35 diagnósticos que quedaron como compromiso de la siguiente manera: 15 diagnósticos para el día viernes 17 de junio y otros 20 para día martes 21 de junio 2022, con el fin de someterlos de aprobación y con los cuales según el compromiso se debería llegar a un monto de 102 diagnósticos avalados.

Cabe mencionar que, para la fecha del mencionado comité, se debía contar con 175 diagnósticos aprobados según el plan de contingencia, lo que nos indica que, aunque se realice la entrega de los 35 diagnósticos aun estarían atrasados con la entrega de 73 diagnósticos.

La Interventoría hace un llamado de atención para que se intensifiquen los esfuerzos en la presentación de los diagnósticos, ya que constituyen la ruta crítica de la programación.

Marcy A. Correa C	Karol Javela
Firma	**Firma**
Nombre: Marcy Correa castaño	Nombre: Karol Yulieth Javela Pérez
Directora de la interventoría	Supervisor: Supervisor ENTerritorio

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022-n	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA	FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-013	2-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	**1**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	2-jun-22	SI	13-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-019	9-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	2	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	9-jun-22	SI	14-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-024	14-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	3	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	16-jun-22	SI	14-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-026	16-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	4	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	14-jun-22	SI	21-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-032	28-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	5	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	28-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA	FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-015	2-jun-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	2-jun-22	SI	3-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-023	15-jun-22	SOLICITUD EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE CONEXIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	15-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA	FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-021	13-jun-22	SOLICITUD RESPUESTA AL CONCEPTO EMITIDO POR COOSEPCOR MEDIANTE ACTA DE REUNION DE OBRA	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	13-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta
ARCA-INT/FDA276-TEC-025	15-jun-22	SOLICITUD ESPECIFICACIÓN TECNICA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	15-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta
ARCA-INT/FDA276-TEC-029	21-jun-22	OBRA REQUERIA EN LA VIA PUBLICA PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE LAS VIVIENDAS 001, 085, 088, 163	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	21-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA	FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-001	3-may-22	INFORME ESPECIALISTA HSEQ Nº. 5	DUARTE PINEDO	CONSTRUREDES	3-may-22	SI	4-may-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-002	3-may-22	INFORME ESPECIALISTA PRE Y PROG Nº. 7	DUARTE PINEDO	CONSTRUREDES	3-may-22	SI	4-may-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-003	4-may-22	RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_014, DEL CONSORCIO CONSTRUREDES MEDIANTE EL INFORME TECNICO ESPECIALISTA DE PREGRAMACION Y PRESUPUESTO # 8	DUARTE PINEDO	CONSTRUREDES	4-may-22	SI	9-may-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-004	6-may-22	SOLICITUD PRESENTAR PROGRAMACION DE OBRA EN FORMATO EXCEL	DUARTE PINEDO	CONSTRUREDES	6-may-22	SI	10-may-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-005	6-may-22	SOLICITUD CORRECCIÓN DE LA FECHA DE INICIO DEL FLUJO DE INVERSIÓN DEL CONTRATO.	DUARTE PINEDO	CONSTRUREDES	6-may-22	SI	10-may-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-006	9-may-22	SOLICITUD RESPUESTA AL OFICIO TEC-001-22 CON LA REMISION DEL INFORME TECNICO ESPECIALISTA HSEQ No. 5	DUARTE PINEDO	CONSTRUREDES	9-may-22	SI	10-may-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-007	10-may-22	REMISIÓN DE INFORME TECNICO ESPECIALISTA DE PREGRAMACION Y PRESUPUESTO No. 8	DUARTE PINEDO	CONSTRUREDES	10-may-22	SI	15-may-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-008	10-may-22	REMISIÓN DE INFORME TECNICO ESPECIALISTA DE PREGRAMACION Y PRESUPUESTO No. 9	DUARTE PINEDO	CONSTRUREDES	10-may-22	SI	16-may-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-009	12-may-22	SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA	DUARTE PINEDO	CONSTRUREDES	12-may-22	SI	21-may-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-010	19-may-22	RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_025 CON EL INFORME TECNICO ESPECIALISTA DE PREGRAMACION Y PRESUPUESTO No. 10	DUARTE PINEDO	CONSTRUREDES	19-may-22	SI	24-may-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-011	19-may-22	SOLICITUD DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL TANQUE EN PLATAFORMA INDEPENDIENTE	DUARTE PINEDO	CONSTRUREDES	19-may-22	SI	25-may-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-012	19-may-22	RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_023 CON EL INFORME TECNICO ESPECIALISTA DE PREGRAMACION Y PRESUPUESTO No. 11	DUARTE PINEDO	CONSTRUREDES	19-may-22	SI	26-may-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-013	24-may-22	RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_029 ENTREGA N° 1 DE DIAGNOSTICOS.	DUARTE PINEDO	CONSTRUREDES	24-may-22	SI	24-may-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-014	27-may-22	SOLICITUD CUMPLIR CON LOS CONDUCTOS REGULARES	DUARTE PINEDO	CONSTRUREDES	27-may-22	SI	27-may-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-016	6-jun-22	SOLICITUD DISEÑO DE MEZCLA	DUARTE PINEDO	CONSTRUREDES	6-jun-22	SI	7-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-017	8-jun-22	SOLICITUD CUADRO DE AVANCE DE ACTIVIDAD EJECUTADA	DUARTE PINEDO	CONSTRUREDES	8-jun-22	SI	13-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-018	8-jun-22	RESPUESTA A OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_044	DUARTE PINEDO	CONSTRUREDES	8-jun-22	SI	22-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-020	10-jun-22	RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_049	DUARTE PINEDO	CONSTRUREDES	10-jun-22	SI	10-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-022	13-jun-22	SOLICITUD ENTREGA DE DIAGNOSTICO COMO COMPROMISO DE COMITÉ DE OBRA MIERCOLES 08 DE JUNIO DE 2022	DUARTE PINEDO	CONSTRUREDES	13-jun-22	SI	15-jun-22

ARCA-INT/FDA276-TEC-027	15-jun-22	RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_050 APROBACIÓN DE DIAGNOSTICO	DUARTE PINEDO	CONSTRUREDES	15-jun-22	SI	15-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-028	18-jun-22	SOLICITUD CUMPLIR HORARIO DE COMITÉ DE OBRA	DUARTE PINEDO	CONSTRUREDES	18-jun-22	SI	15-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-030	21-jun-22	RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_055 APROBACIÓN DE DIAGNOSTICO	DUARTE PINEDO	CONSTRUREDES	21-jun-22	SI	21-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-031	22-jun-22	SOLICITUD ENTREGA DE DIAGNOSTICO COMO COMPROMISO DE COMITÉ DE OBRA MIERCOLES 15 DE JUNIO DE 2022	DUARTE PINEDO	CONSTRUREDES	22-jun-22	SI	29-jun-22

INFORME PCI

Fecha de Corte	26/06/2022	PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS																										
Priorización		MATRIZ BASE						INCLUSIONES											TOTALES									
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No.2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Solicitudes de Inclusion	Atendida de la ESP	Atendida por la Alcaldia	Pendientes por atender ESP	Pendientes por atender Alcaldia	Respuesta positiva	Respuesta negativa	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Visitadas	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Recibidas a satisfaccion	Viviendas En ejecución.	Viviendas Programadas actividad No.3
Cordoba Bolivar	San Martin	217	0	206	10	67	1	65	33	11	32	54	5	6	0	0	0	0	217	206	10	67	1	48	0	0	48	0
	TOTAL	**217**	**0**	**206**	**10**	**67**	**1**	**65**	**33**	**11**	**32**	**54**	**5**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**217**	**206**	**10**	**67**	**1**	**48**	**0**	**0**	**48**	**0**

REPORTE CLIMA

clima Colombia

Descarga la APP

Clima en Córdoba

martes 21 de junio, 2022

	Hoy 20 jun	Mañana 21 jun	Miércoles 22 jun	Jueves 23 jun	Viernes 24 jun	Sábado 25 jun	Domingo 26 jun
Hora	↑ 30º ↓ 24º	↑ 29º ↓ 24º	↑ 29º ↓ 24º	↑ 29º ↓ 24º	↑ 29º ↓ 23º	↑ 27º ↓ 24º	↑ 27º ↓ 23º
08:00	26°	25°	26°	25°	25°	24°	24°
14:00	30°	29°	29°	29°	29°	27°	27°
20:00	25°	25°	25°	25°	25°	25°	24°
Lluvia	2.6 mm	4.1 mm	8.7 mm	8.2 mm	36.6 mm	10.4 mm	13.4 mm
Viento	8 km/h	7 km/h	9 km/h	9 km/h	10 km/h	8 km/h	5 km/h
	05:41	05:41	05:41	05:42	05:42	05:42	05:42
	18:22	18:22	18:22	18:22	18:22	18:23	18:23

Hora por hora en Córdoba

Predicción para las próximas horas

Hoy:

06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26°	26°	26°	27°	28°	28°	29°	30°	30°	29°	29°	28°	27°	26°	25°

Impreso el
21 junio 2022 06:55

INFORME ESTADO DE COVID-19

enterritorio	**INFORME ESTADO DE COVID - 19**	CÓDIGO:	**F-GG-10**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20/06/2022 Y EL 26/06/2022 PLAZO: 5 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES — CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. — CONTRATO No. 2220587

PERSONAL DEL CONTRATISTA

	MES: JUNIO			SEMANA:4					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	OBSERVACIONES
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
DUARTE PINEDO - DIRECTOR DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD BLANCO - RESIDENTE DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RAFAEL CASTILLO - RESIDENTE SST	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
NORELIS ANAYA - TRABAJADORA SOCIAL	**ASTRAZENIKA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
OSWALDO GARZÓN - PROFESIONAL DIAGNOSTICO	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
SINDY ESCOBAR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**SINOVAC**		F	NO	NO	NO	SI	SI	

PERSONAL INTERVENTORIA

	MES: JUNIO			SEMANA:4					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	**OBSERVACIONES**
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
MARCY CORREA - DIRECTOR INTERVENTORIA	**PFIZER**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD ARIETA - RESIDENTE INTERVENTORIA	**PFIZER**	**MODERNA**	M	NO	NO	NO	SI	SI	
DIAMYS SANCHEZ PORTILLO - INSPECTORA DE INTERVENTORIA	**PFIZER**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
FERNANDA GRIJALBA - PROFESIONAL SOCIAL	**MODERNA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
YIRA LEMUS - PROFESIONAL HSEQ	**AZTRAZENECA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
LEYDIS HERRERA - AUXILIAR SOCIAL	**JONSSON**	**JONSSON**	F	NO	NO	NO	SI	SI	

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Firma: Marcy A. Correa C

Nombre: Marcy Correa

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

REPORTE Y EJECUCIÒN DE VIVIENDAS SEMANALES

Ejecución de Actividad en Viviendas al Programa Conexiones Intradomiciliarias con corte a 26/06/2022

BARRIO	ACTA	No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización	Número de días Máximo permitido según tipo de intervención	Número de Dias de la Intervencion por parte del Contratista	Dias de cumplimiento o incumplimiento según tipo de intervención (-) atraso y (+) avance	¿SE ENCUENTRA RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR INTERVENTORÍA?	
															SI (X)	NO (X)
SM	1	1	B-C-SM-MZ29-VE-001		Adecuacion	$7.967.801,13	$0,00		**EN EJECUCION**	**0/01/1900**	5/01/1900	0	**5**	**-5**		**X**
SM	1	2	B-C-SM-MZ32-VE-002	85%	Caseta T3	$8.126.190,79	$6.907.262,17	2/06/2022	**EN EJECUCION**	**2/06/2022**	10/06/2022	0	**8**	**-8**		**X**
SM	1	3	B-C-SM-MZ32-VE-003	85%	Caseta T3	$7.914.431,13	$6.727.266,46	4/06/2022	**EN EJECUCION**	**4/06/2022**	12/06/2022	0	**8**	**-8**		**X**
SM	1	4	B-C-SM-MZ18-VE-004	85%	Adecuacion	$7.372.105,35	$6.266.289,55	4/06/2022	**EN EJECUCION**	**4/06/2022**	8/06/2022	0	**4**	**-4**		**X**
SM	1	5	B-C-SM-MZ22-VE-005	85%	Adecuacion	$7.148.052,07	$6.075.844,26	4/06/2022	**EN EJECUCION**	**4/06/2022**	7/06/2022	0	**3**	**-3**		**X**
SM	1	6	B-C-SM-MZ34-VE-006	85%	Adecuacion	$7.464.125,94	$6.344.507,05	4/06/2022	**EN EJECUCION**	**4/06/2022**	8/06/2022	0	**4**	**-4**		**X**
SM	1	7	B-C-SM-MZ22-VE-007	85%	Adecuacion	$7.159.479,30	$6.085.557,41	4/06/2022	**EN EJECUCION**	**4/06/2022**	9/06/2022	0	**5**	**-5**		**X**
SM	1	9	B-C-SM-MZ22-VE-009	85%	Caseta T3	$7.908.010,60	$6.721.809,01	4/06/2022	**EN EJECUCION**	**4/06/2022**	8/06/2022	0	**4**	**-4**		**X**
SM	1	10	B-C-SM-MZ21-VE-010	85%	Caseta T3	$8.928.931,81	$7.589.592,04	4/06/2022	**EN EJECUCION**	**4/06/2022**	9/06/2022	0	**5**	**-5**		**X**
SM	1	11	B-C-SM-MZ22-VE-011	85%	Adecuacion	$7.911.551,76	$6.724.819,00	8/06/2022	**EN EJECUCION**	**8/06/2022**	16/06/2022	0	**8**	**-8**		**X**
SM	1	12	B-C-SM-MZ34-VE-012	85%	Caseta T3	$8.997.603,49	$7.647.962,97	4/06/2022	**EN EJECUCION**	**4/06/2022**	9/06/2022	0	**5**	**-5**		**X**
SM	1	13	B-C-SM-MZ21-VE-013	85%	Adecuacion	$5.406.646,10	$4.595.649,19	2/06/2022	**EN EJECUCION**	**2/06/2022**	6/06/2022	0	**4**	**-4**		**X**
SM	1	14	B-C-SM-MZ21-VE-014	85%	Caseta T3	$8.562.948,93	$7.278.506,59	4/06/2022	**EN EJECUCION**	**4/06/2022**	10/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	1	15	B-C-SM-MZ21-VE-015	85%	Caseta T3	$8.265.079,43	$7.025.317,52	2/06/2022	**EN EJECUCION**	**2/06/2022**	7/06/2022	0	**5**	**-5**		**X**
SM	1	16	B-C-SM-MZ21-VE-016	85%	Caseta T3	$9.248.106,91	$7.860.890,87	2/06/2022	**EN EJECUCION**	**2/06/2022**	8/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	1	17	B-C-SM-MZ38-VE-017	85%	Caseta T3	$8.481.195,82	$7.209.016,45	2/06/2022	**EN EJECUCION**	**2/06/2022**	7/06/2022	0	**5**	**-5**		**X**
SM	2	18	B-C-SM-MZ24-VE-018	75%	Caseta T3	$8.450.841,17	$6.338.130,88	5/06/2022	**EN EJECUCION**	**5/06/2022**	9/06/2022	0	**4**	**-4**		**X**
SM	1	19	B-C-SM-MZ24-VE-019	75%	Adecuacion	$6.395.588,06	$4.796.691,05	5/06/2022	**EN EJECUCION**	**5/06/2022**	10/06/2022	0	**5**	**-5**		**X**
SM	1	20	B-C-SM-MZ24-VE-020	75%	Adecuacion	$4.593.449,33	$3.445.087,00	5/06/2022	**EN EJECUCION**	**5/06/2022**	13/06/2022	0	**8**	**-8**		**X**
SM	2	21	B-C-SM-MZ85-VE-021	75%	Caseta T3	$8.614.688,02	$6.461.016,02	5/06/2022	**EN EJECUCION**	**5/06/2022**	14/06/2022	0	**9**	**-9**		**X**
SM	2	22	B-C-SM-MZ85-VE-022	75%	Caseta T3	$8.896.124,14	$6.672.093,11	5/06/2022	**EN EJECUCION**	**5/06/2022**	9/06/2022	0	**4**	**-4**		**X**
SM	1	23	B-C-SM-MZ85-VE-023	75%	Adecuacion	$7.191.930,35	$5.393.947,76	5/06/2022	**EN EJECUCION**	**5/06/2022**	10/06/2022	0	**5**	**-5**		**X**
SM	1	24	B-C-SM-MZ29-VE-024	75%	Adecuacion	$6.084.490,07	$4.563.367,55	5/06/2022	**EN EJECUCION**	**5/06/2022**	10/06/2022	0	**5**	**-5**		**X**
SM	2	25	B-C-SM-MZ31-VE-025	75%	Caseta T3	$8.637.204,10	$6.477.903,08	5/06/2022	**EN EJECUCION**	**5/06/2022**	9/06/2022	0	**4**	**-4**		**X**
SM	1	26	B-C-SM-MZ31-VE-026	75%	Adecuacion	$4.822.827,41	$3.617.120,56	5/06/2022	**EN EJECUCION**	**5/06/2022**	14/06/2022	0	**9**	**-9**		**X**
SM	1	27	B-C-SM-MZ31-VE-027	75%	Adecuacion	$4.365.339,96	$3.274.004,97	5/06/2022	**EN EJECUCION**	**5/06/2022**	9/06/2022	0	**4**	**-4**		**X**
SM	2	28	B-C-SM-MZ31-VE-028	75%	Adecuacion	$7.668.943,14	$5.751.707,36	5/06/2022	**EN EJECUCION**	**5/06/2022**	8/06/2022	0	**3**	**-3**		**X**
SM	2	29	B-C-SM-MZ31-VE-029	75%	Caseta T3	$8.468.136,75	$6.351.102,56	5/06/2022	**EN EJECUCION**	**5/06/2022**	9/06/2022	0	**4**	**-4**		**X**
SM	1	30	B-C-SM-MZ31-VE-030	75%	Adecuacion	$4.637.820,17	$3.478.365,13	5/06/2022	**EN EJECUCION**	**5/06/2022**	11/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	3	31	B-C-SM-MZ30-VE-032	20%	Adecuacion	$7.557.018,99	$1.511.403,80	9/06/2022	**EN EJECUCION**	9/06/2022	15/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	3	32	B-C-SM-MZ44-VE-034	20%	Adecuacion	$5.519.347,12	$1.103.869,42	9/06/2022	**EN EJECUCION**	9/06/2022	15/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	3	33	B-C-SM-MZ45-VE-035	20%	Adecuacion	$8.137.626,09	$1.627.525,22	9/06/2022	**EN EJECUCION**	9/06/2022	15/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	3	34	B-C-SM-MZ56-VE-038	20%	Adecuacion	$8.227.630,94	$1.645.526,19	9/06/2022	**EN EJECUCION**	9/06/2022	15/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	3	35	B-C-SM-MZ56-VE-039	20%	Adecuacion	$1.443.687,77	$288.737,55	9/06/2022	**EN EJECUCION**	9/06/2022	15/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	3	36	B-C-SM-MZ46-VE-040	15%	Adecuacion	$6.628.376,66	$994.256,50	9/06/2022	**EN EJECUCION**	9/06/2022	15/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	3	37	B-C-SM-MZ45-VE-041	15%	Adecuacion	$4.845.221,48	$726.783,22	9/06/2022	**EN EJECUCION**	9/06/2022	15/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	3	38	B-C-SM-MZ21-VE-042	15%	Adecuacion	$4.634.812,47	$695.221,87	9/06/2022	**EN EJECUCION**	9/06/2022	15/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	3	39	B-C-SM-MZ31-VE-043	15%	Caseta T3	$6.939.713,07	$1.040.956,96	9/06/2022	**EN EJECUCION**	9/06/2022	15/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	3	40	B-C-SM-MZ55-VE-046	15%	Caseta T3	$7.344.533,10	$1.101.679,97	9/06/2022	**EN EJECUCION**	9/06/2022	15/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**

SM	3	41	B-C-SM-MZ55-VE-047	15%	Caseta T2	$7.890.285,26	$1.183.542,79	9/06/2022	**EN EJECUCION**	9/06/2022	15/06/2022	5	**6**	**-1**		**X**
SM	3	42	B-C-SM-MZ56-VE-055	15%	Adecuacion	$3.160.157,78	$474.023,67	9/06/2022	**EN EJECUCION**	9/06/2022	15/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	4	43	B-C-SM-MZ56-VE-062	15%	Caseta T2	$8.362.124,52	$1.254.318,68	14/06/2022	**EN EJECUCION**	14/06/2022	20/06/2022	5	**6**	**-1**		**X**
SM	4	44	B-C-SM-MZ66-VE-067	15%	Caseta T3	$7.306.146,52	$1.095.921,98	14/06/2022	**EN EJECUCION**	14/06/2022	20/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	4	45	B-C-SM-MZ66-VE-068	15%	Caseta T3	$7.971.707,31	$1.195.756,10	14/06/2022	**EN EJECUCION**	14/06/2022	20/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	4	46	B-C-SM-MZ66-VE-069	15%	Adecuacion	$6.509.744,54	$976.461,68	14/06/2022	**EN EJECUCION**	14/06/2022	20/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	4	47	B-C-SM-MZ75-VE-071	15%	Adecuacion	$7.170.024,86	$1.075.503,73	14/06/2022	**EN EJECUCION**	14/06/2022	20/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	4	48	B-C-SM-MZ75-VE-072	15%	Caseta T3	$8.040.278,46	$1.206.041,77	14/06/2022	**EN EJECUCION**	14/06/2022	20/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	4	49	B-C-SM-MZ75-VE-073	15%	Caseta T4	$8.332.036,11	$1.249.805,42	14/06/2022	**EN EJECUCION**	14/06/2022	20/06/2022	5	**6**	**-1**		**X**
SM	4	50	B-C-SM-MZ75-VE-074	15%	Caseta T5	$7.656.034,05	$1.148.405,11	14/06/2022	**EN EJECUCION**	14/06/2022	20/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	4	51	B-C-SM-MZ89-VE-084		Caseta T6	$8.247.304,21										
SM																
SM																
SM																
SM																
SM																
SM																
SM																
SM																
SM																
SM																
SM																
SM																

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

ADMON

Bogotá D.C, 07 de julio de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-061-22

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial FECHA 7/07/2022 HORA: 12:51:22 p. m.
20224300252272

Señores:
Ingeniera
Karol Yulieth Javela
Supervisora
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio
Calle 26 # 13-19 Piso 20
Bogotá. Colombia

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: REMISIÓN INFORMES SEMANALES 8.

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales remitimos informe semanal 8 correspondiente al periodo del 13 de junio del 2022 al 19 de junio del 2022, para fines pertinentes.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.

FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA
Anexo: 15 folios
Proyectó: Jineth Marcela Gordillo – Residente Admón.
Reviso: Ing. Marcy Correa – Directora de Interventoría

INFORME SEMANAL 8

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 8**	CÓDIGO:	**F-GG-06**
		VERSIÓN:	**1**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 001

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **13/06/2022** al **19/06/2022** Fecha **19/06/2022**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO PROYECTO				
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO**	BOLÍVAR	**MUNICIPIO**	CÓRDOBA
GERENCIA A CARGO	ENTERRITORIO			
SUPERVISOR	KAROL YULIETH JAVELA PÉREZ			
ESTADO DEL PROYECTO	EN EJECUCIÓN ACTIVIDAD 1, 2 Y 3			

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2220576	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUREDES	
Valor inicial	$	1.771.707.945,99
Valor actual	$	1.771.707.945,99
Variación del valor	$	-
Fecha de Inicio	26/04/2022	
Plazo inicial (Días)	150 Días	
Plazo actual (Días)	150 Días	5 MESES - 150 DÍAS
Variación en plazo	Días	
Fecha Contractual de terminación	26/09/2022	
Tiempo Transcurrido (días)	54	36,00%
Días remanentes del Contrato	99,00	66,00%
Acumulado a última acta pagada		
Estimado ejecutado por llevar a acta		

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.	2220587	
Interventor	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS.	
Valor inicial	$	202.479.313,00
Valor actual	$	202.479.313,00
Variación del valor	$	-
Fecha de Inicio	26/04/2022	
Plazo inicial	150 Días	
Plazo actual	150 Días	5 MESES - 150 DÍAS
Variación en plazo	Días	
Fecha Contractual de terminación	26/09/2022	
Ejecución del Contrato	54	36,00%
Días remanentes del Contrato	99,00	66,00%
Acumulado a última acta pagada		
Estimado ejecutado por llevar a acta		

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 1.771.707.945,99

Semáforo

Desviación en días: 23 Días

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 325.205.160,55	18,36%	$ 119.049.616,25	6,72%	-$ 206.155.544,30	-11,64%
Durante el Periodo	$ 101.313.742,02	5,72%	$ 40.695.906,77	2,30%	-$ 60.617.835,25	-3,42%
Acumulado a la Fecha	**$ 426.518.902,57**	**24,07%**	**$ 159.745.523,02**	**9,02%**	**-$ 266.773.379,55**	**-15,06%**

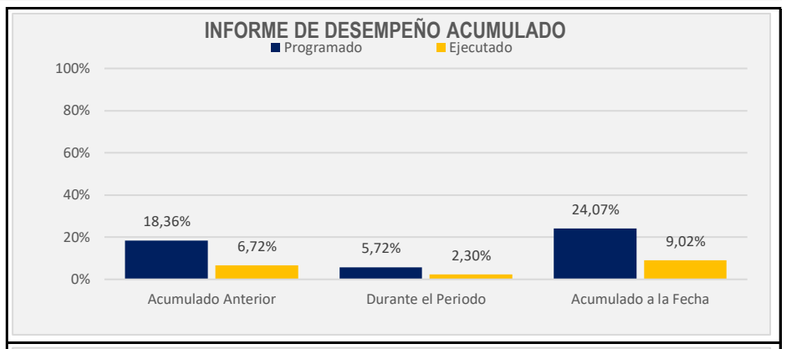


Observaciones al desempeño del proyecto


De acuerdo a la programación de obra el contratista debería tener efectuado un 24,07% de ejecución, sin embargo su ejecución es de 9,02% indicándonos un 15,06% de atraso; el cual es producto de las demoras en la entrega de los diagnósticos proyectados en los tiempos establecidos.

De acuerdo al plan de contingencia se debería tener un total de 175 diagnósticos aprobados de los cuales a la fecha se han aprobado 51, indicándonos un atraso de 124 diagnósticos.

En cuanto a la actividad 3 el contratista de debería tener 48 viviendas intervenidas, sin embargo solo ha intervenido 30 y suministrado material a 48 viviendas programadas, el contratista cuenta con 9 frentes de trabajo.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

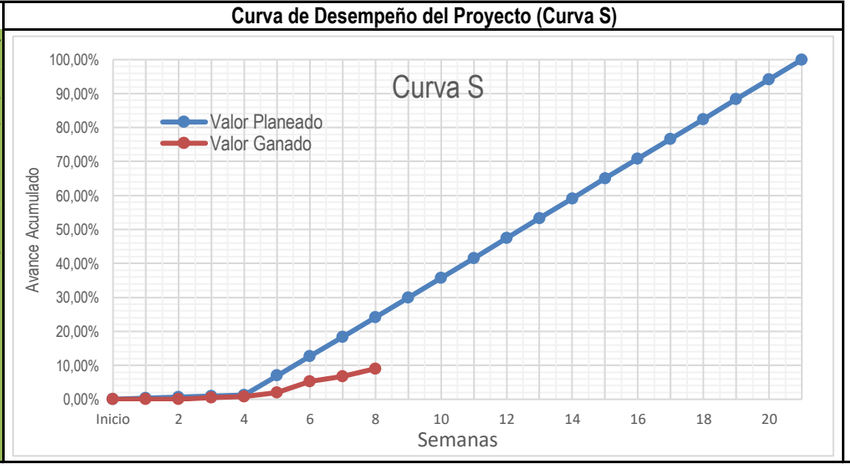

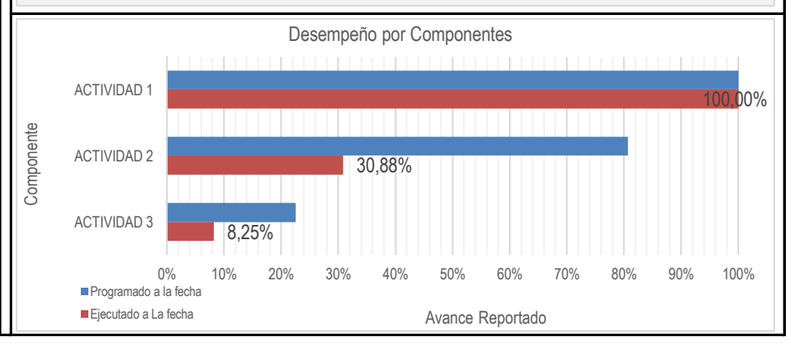


CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	18,36%	6,72%	-11,64%	
Durante el Periodo	5,72%	2,30%	-3,42%	
Acumulado a la Fecha	**24,07%**	**9,02%**	**-15,06%**	

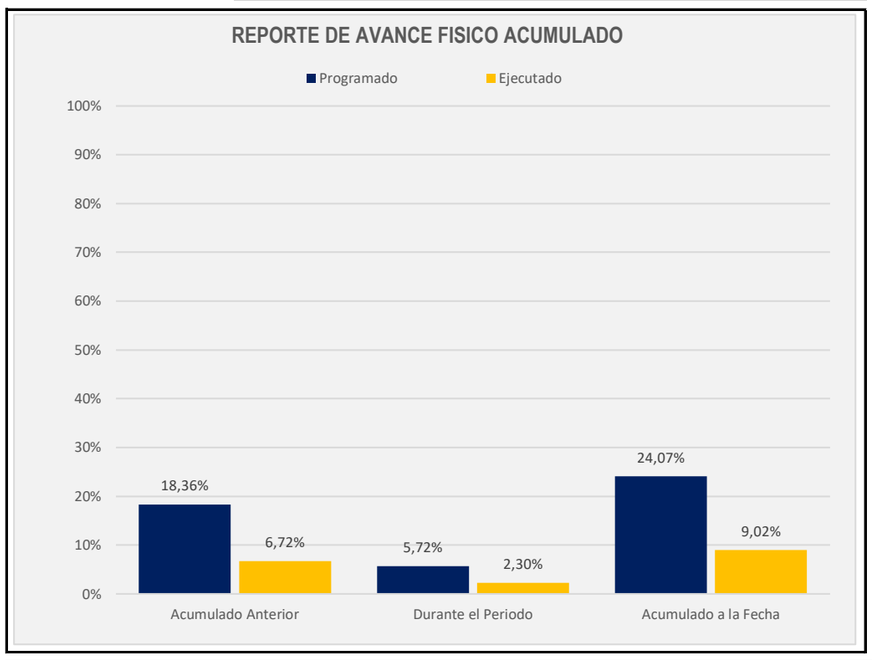


AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 1.771.707.945,99	$ 1.771.707.945,99	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
		0,00%			0,00%		









AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 202.479.313,00	$ 202.479.313,00	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
		0,00%			0,00%		







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 001

Entidad Contratante: ENTERRITORIO | Semana del 13/06/2022 al 19/06/2022 | Fecha 19/06/2022

ACTIVIDAD No. 1
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: Actividad No. 1, la aprobación de la actividad N° 1 se hizo comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-037-22 del 3 de Junio de 2022
ACTIVIDAD No. 2
PROGRAMADO 80,65% vs EJECUTADO 30,88%
Comentario: La Actividad N° 2 presenta un atraso del 49,77%, por lo cual el Contratista debe reforzar esta actividad abriendo más frentes de trabajos con el fin de cumplir con las metas establecidas en la programación, la Interventoría solicitará al Contratista agilizar la entrega de diagnósticos para aprobación, tal como se solicitó mediante oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-022-22
ACTIVIDAD No. 3
PROGRAMADO 22,56% vs 8,25% EJECUTADO
Comentario: La Actividad N° 3 presenta un atraso del 14,31%, sólo se han intervenido 30 viviendas de las 48 que deberían estar en ejecución, sin embargo, el contratista ha hecho entrega de los materiales de construcción en las 48 viviendas.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

El ítem ACTIVIDAD 2: DIAGNOSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. Esta actividad avanza con el diligenciamiento de los diagnósticos de los cuales ya se sometieron a comité de aprobación; para el primer paquete de 51 los cuales fueron aprobados por la interventoría se espera que el contratista redoble esfuerzos y reduzca el atraso presentado, la próxima semana debe completar 124 diagnósticos para someter a comité de aprobación y completar los 175 propuestos en el plan de contingencia.
En el ítem ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS. ACTA DE ENTREGA Y RECIBOS DE LAS OBRAS
A la fecha y de acuerdo al cronograma de actividades el contratista debería tener en proceso constructivo 48 viviendas, sin embargo sólo realizan labores de ejecución de obra en 30 viviendas.
Las casetas tipo 3 ya han avanzado en cimentación, mampostería y fundición de columnas y columnetas, pañetes, instalación de tubería hidrosanitaria, instalación de aparatos sanitarios, de igual forma se adelantan labores en intervenciones correspondientes a adecuaciones con cambio de pañete, instalación de enchape de pared y pisos y cambio de equipos sanitarios, para esta actividades el contratista cuenta con 9 frentes de trabajo.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Para la próxima semana correspondiente al periodo del 20 al 26 de junio 2022 y de acuerdo a la programación de obra estaría en la semana 8 de diagnósticos en la cual se deberían tener los 217 diagnósticos que corresponden al 100% de esta actividad.
El contratista debe continuar con la ejecución de obra efectuando la intervención en 61 viviendas de acuerdo a la programación y plan de contingencia.
Por lo cual la interventoría le recomendó al Contratista el incremento de frentes de trabajo para efectuar trabajos constructivos en un mayor número de viviendas.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTIÓN SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0

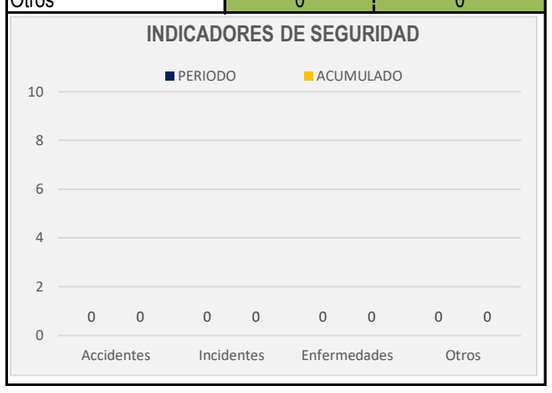

Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	7	0	7	100,0%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0	0,0%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál?	0	0	0	0,0%
	Total	**7**	**0**	**7**	**100,00%**

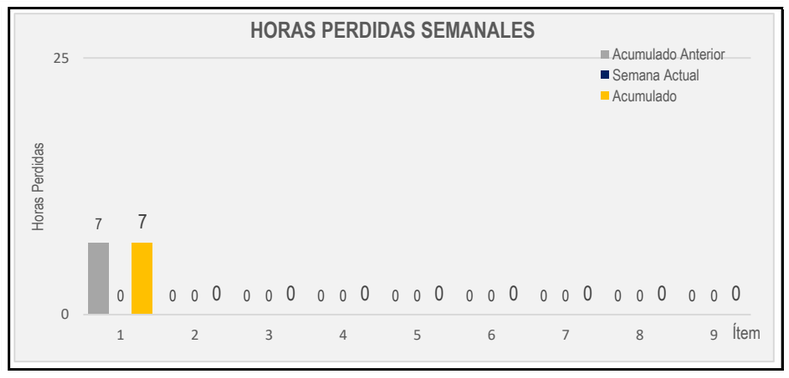

OBSERVACIONES

En el presente periodo NO se presentaron perdida de tiempo a causa de lluvias, predomino el tiempo seco.

GESTIÓN SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
	13/06/2022	CASA DE LA CULTURA	10	Solicitar acompañamiento del Comité de Veedor para el primer recorrido de obra.	CONTRATISTA DE OBRA	20/07/2022

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
INCLUSION 47	Orlando Miguel Teherán Hernandez	13/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 48	Alfonso Manuel Romero Henao	13/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 49	Rosa Isabel de Avila Padilla	13/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 50	Angela del Socorro Martinez Florez	13/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 51	Pedro Pablo Romero Diaz	14/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 52	Yulieth Candelaria Villafañe Escobar	14/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 53	Astrid Mrgarita Medina Fonseca	14/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 54	Jose del Carmen Hena Romero	14/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 55	Rosiris escobar Romero	14/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 56	Braulio Alfonso Medina Torres	14/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 57	Maria Graciela Fernandez Chamorro	15/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 58	Ana Ibis Hernandez Fernandez	15/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 59	Francisco Medina Romero	16/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 60	Pablo Roman Piña Ahumada	16/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 61	Yecenia Maria Valeth Cruzate	17/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 62	Tulia Elena Ocjoa Cruzate	21/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 63	Adolfo Rafael Pineda Cantillo	21/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 37	Justa Matilde Vergara Villa	9/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 38	Martin Manuel Lozano Rivera	9/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 39	Eliani del Carmen Florez Mendoza	9/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 40	Bermuil del Socorro Vergara Causado	9/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 41	Duberlis Torres Anaya	9/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 42	Sirley María Ortega Barboza	9/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 43	Josefina Fernandez Anaya	9/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 44	Marina del Carmen Romero Villa	9/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 45	Miladis del Carmen Pérez Medina	9/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 46	Nulis Margoth Henao Causado	9/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 001

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **13/06/2022** al **19/06/2022** Fecha **19/06/2022**

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA









CASETA TIPO 3, SE APRECIA AVANCE EN LA MAMPOSTERIA, FUNDICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS.

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

Para la ejecución de algunas viviendas se hace necesario la ejecución de conexiones domiciliarias a la red de alcantarillado municipal, para lo cual se requiere el apoyo de la Alcaldía Municipal y COOSEPCOR LTDA en la ejecución de las actividades de rotura de pavimento, excavación y reposición de carpeta asfáltica, ya que estas actividades no se incluye en el presupuesto del proyecto Conexiones Intradomiciliarias Córdoba, Bolívar.

La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-022-22 al contratista con el Tema: SOLICITUD ENTREGA DE DIAGNOSTICOS COMO COMPROMISO DEL COMITÉ DE OBRA MIERCOLES 08 DE JUNIO 2022

Por medio del presente y de acuerdo al comité de obra efectuado el día miércoles 08 de junio de 2022, se solicitó la entrega de los 25 diagnósticos que quedaron como compromiso para el día viernes 10 de junio 2022, con el fin de someterlos de aprobación y con los cuales según el compromiso se debería llegar a un monto de 67 diagnósticos avalados.

La Interventoría hace un llamado de atención para que se intensifiquen los esfuerzos en la presentación de los diagnósticos, ya que constituyen la ruta crítica de la programación.

La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-023-22 a COOSEPCOR LTDA el Tema: SOLICITUD DE TRÁMITE DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VEITISIETE (27) DIAGNÓSTICOS APROBADOS DEL BARRIO SAN MARTIN - CONTRATO: No. 2220576 –CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES OBJETO: “CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005).

Por medio del cual se solicita la expedición del certificado de autorización para la intervención de conexión de las acometidas domiciliarias de acueducto y alcantarillado para veintisiete (27) diagnósticos del barrio San Martín.

La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-025-22 a COOSEPCOR LTD. SOLICITUD ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO (INCLUYE MICROMEDIDOR) Y ALCANTARILLADO por medio del cual se realiza solicitud de gestión para la expedición de las especificaciones técnicas de las redes de acueducto (Incluye micromedidor) y alcantarillado, requisito necesario para la intervención de las conexiones domiciliarias a las que haya lugar en el marco del proyecto: DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR).

La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-027-22 con el tema: RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_050 Por medio del cual realizamos entrega de aval para 09 diagnósticos presentados en comité de aprobación No. 004

La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-028-22 con el tema: SOLICITUD CUMPLIR HORARIO DE LOS COMITES DE OBRA Por medio del cual se solicita muy respetuosamente al contratista cumplir con el horario establecido para la realización de los comités de obra programado los días miércoles a las 10:00 am, con el fin desarrollar a cabalidad todos los temas correspondientes al orden del día, importantes para el buen desarrollo de la ejecución del proyecto.

Marcy A. Correa C		Karol Javela	
Firma		**Firma**	
Nombre	Marcy Correa castaño	Nombre	Karol Yulieth Javela Pérez
	Directora de la interventoría	Supervisor	Supervisor ENTerritorio

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A		ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA	FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-013	2-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES		**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	2-jun-22	SI	13-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-019	9-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES			WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	9-jun-22	SI	14-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-024	14-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES			WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	16-jun-22	SI	14-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-026	16-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES			WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	14-jun-22	SI	21-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-032	28-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES			WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	28-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA	FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-015	2-jun-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	24	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	2-jun-22	SI	3-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-023	15-jun-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	27	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	15-jun-22	NO	

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA	FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-021	13-jun-22	SOLICITUD RESPUESTA AL CONCEPTO EMITIDO POR COOSEPCOR MEDIANTE ACTA DE REUNION DE OBRA	1	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	13-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA						
CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022	**FECHA**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO A**	**ENTIDAD**	**FECHA DE RADICADO**	**RESPUESTA RECIBIDA**	**FECHA DE RESPUESTA**
ARCA-INT/FDA276-TEC-025	15-jun-22	SOLICITUD ESPECIFICACIÓN TECNICA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	15-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta

INFORME PCI

Fecha de Corte	19/06/2022	PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS																										
Priorización		MATRIZ BASE						INCLUSIONES											TOTALES									
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No.2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Solicitudes de Inclusion	Atendida de la ESP	Atendida por la Alcaldia	Pendientes por atender ESP	Pendientes por atender Alcaldia	Respuesta positiva	Respuesta negativa	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Visitadas	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Recibidas a satisfaccion	Viviendas En ejecución.	Viviendas Programadas actividad No.3
Cordoba Bolivar	San Martin	217	0	206	10	67	1	62	33	11	18	40	5	6	0	0	0	0	217	206	10	67	1	48	0	0	48	0
	TOTAL	**217**	**0**	**206**	**10**	**67**	**1**	**62**	**33**	**11**	**18**	**40**	**5**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**217**	**206**	**10**	**67**	**1**	**48**	**0**	**0**	**48**	**0**

INFORME ESTADO DE COVID-19

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**INFORME ESTADO DE COVID - 19**	CÓDIGO:	**F-GG-10**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13/06/2022 Y EL 19/06/2022 PLAZO: 5 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES — CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. — CONTRATO No. 2220587

PERSONAL DEL CONTRATISTA

	MES: JUNIO			SEMANA:4					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	OBSERVACIONES
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
DUARTE PINEDO - DIRECTOR DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD BLANCO - RESIDENTE DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RAFAEL CASTILLO - RESIDENTE SST	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
NORELIS ANAYA - TRABAJADORA SOCIAL	**ASTRAZENIKA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
OSWALDO GARZÓN - PROFESIONAL DIAGNOSTICO	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
SINDY ESCOBAR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**SINOVAC**		F	NO	NO	NO	SI	SI	

PERSONAL INTERVENTORIA

	MES: JUNIO			SEMANA:4					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	**OBSERVACIONES**
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
MARCY CORREA - DIRECTOR INTERVENTORIA	**PFIZER**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD ARIETA - RESIDENTE INTERVENTORIA	**PFIZER**	**MODERNA**	M	NO	NO	NO	SI	SI	
DIAMYS SANCHEZ PORTILLO - INSPECTORA DE INTERVENTORIA	**PFIZER**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
FERNANDA GRIJALBA - PROFESIONAL SOCIAL	**MODERNA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
YIRA LEMUS - PROFESIONAL HSEQ	**AZTRAZENECA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
LEYDIS HERRERA - AUXILIAR SOCIAL	**JONSSON**	**JONSSON**	F	NO	NO	NO	SI	SI	

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Firma: Marcy A. Correa C

Nombre: Ing. Marcy Correa

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

REPORTE Y EJECUCIÒN DE VIVIENDAS SEMANALES

Ejecución de Actividad en Viviendas al Programa Conexiones Intradomiciliarias con corte a 19/06/2022

BARRIO	ACTA	No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización	Número de días Máximo permitido según tipo de intervención	Número de Dias de la Intervencion por parte del Contratista	Dias de cumplimiento o incumplimiento según tipo de intervención (-) atraso y (+) avance	¿SE ENCUENTRA RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR INTERVENTORÍA?	
															SI (X)	NO (X)
SM	1	1	B-C-SM-MZ29-VE-001		Adecuacion	$7.967.801,13	$0,00		**EN EJECUCION**	**0/01/1900**	5/01/1900	0	**5**	**-5**		**X**
SM	1	2	B-C-SM-MZ32-VE-002	75%	Caseta T3	$8.126.190,79	$6.094.643,09	2/06/2022	**EN EJECUCION**	**2/06/2022**	10/06/2022	0	**8**	**-8**		**X**
SM	1	3	B-C-SM-MZ32-VE-003	75%	Caseta T3	$7.914.431,13	$5.935.823,35	4/06/2022	**EN EJECUCION**	**4/06/2022**	12/06/2022	0	**8**	**-8**		**X**
SM	1	4	B-C-SM-MZ18-VE-004	75%	Adecuacion	$7.372.105,35	$5.529.079,01	4/06/2022	**EN EJECUCION**	**4/06/2022**	8/06/2022	0	**4**	**-4**		**X**
SM	1	5	B-C-SM-MZ22-VE-005	75%	Adecuacion	$7.148.052,07	$5.361.039,05	4/06/2022	**EN EJECUCION**	**4/06/2022**	7/06/2022	0	**3**	**-3**		**X**
SM	1	6	B-C-SM-MZ34-VE-006	75%	Adecuacion	$7.464.125,94	$5.598.094,46	4/06/2022	**EN EJECUCION**	**4/06/2022**	8/06/2022	0	**4**	**-4**		**X**
SM	1	7	B-C-SM-MZ22-VE-007	75%	Adecuacion	$7.159.479,30	$5.369.609,48	4/06/2022	**EN EJECUCION**	**4/06/2022**	9/06/2022	0	**5**	**-5**		**X**
SM	1	9	B-C-SM-MZ22-VE-009	75%	Caseta T3	$7.908.010,60	$5.931.007,95	4/06/2022	**EN EJECUCION**	**4/06/2022**	8/06/2022	0	**4**	**-4**		**X**
SM	1	10	B-C-SM-MZ21-VE-010	75%	Caseta T3	$8.928.931,81	$6.696.698,86	4/06/2022	**EN EJECUCION**	**4/06/2022**	9/06/2022	0	**5**	**-5**		**X**
SM	1	11	B-C-SM-MZ22-VE-011	75%	Adecuacion	$7.911.551,76	$5.933.663,82	8/06/2022	**EN EJECUCION**	**8/06/2022**	16/06/2022	0	**8**	**-8**		**X**
SM	1	12	B-C-SM-MZ34-VE-012	75%	Caseta T3	$8.997.603,49	$6.748.202,62	4/06/2022	**EN EJECUCION**	**4/06/2022**	9/06/2022	0	**5**	**-5**		**X**
SM	1	13	B-C-SM-MZ21-VE-013	75%	Adecuacion	$5.406.646,10	$4.054.984,58	2/06/2022	**EN EJECUCION**	**2/06/2022**	6/06/2022	0	**4**	**-4**		**X**
SM	1	14	B-C-SM-MZ21-VE-014	75%	Caseta T3	$8.562.948,93	$6.422.211,70	4/06/2022	**EN EJECUCION**	**4/06/2022**	10/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	1	15	B-C-SM-MZ21-VE-015	75%	Caseta T3	$8.265.079,43	$6.198.809,57	2/06/2022	**EN EJECUCION**	**2/06/2022**	7/06/2022	0	**5**	**-5**		**X**
SM	1	16	B-C-SM-MZ21-VE-016	75%	Caseta T3	$9.248.106,91	$6.936.080,18	2/06/2022	**EN EJECUCION**	**2/06/2022**	8/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	1	17	B-C-SM-MZ38-VE-017	75%	Caseta T3	$8.481.195,82	$6.360.896,87	2/06/2022	**EN EJECUCION**	**2/06/2022**	7/06/2022	0	**5**	**-5**		**X**
SM	2	18	B-C-SM-MZ24-VE-018	60%	Caseta T3	$8.450.841,17	$5.070.504,70	5/06/2022	**EN EJECUCION**	**5/06/2022**	9/06/2022	0	**4**	**-4**		**X**
SM	1	19	B-C-SM-MZ24-VE-019	60%	Adecuacion	$6.395.588,06	$3.837.352,84	5/06/2022	**EN EJECUCION**	**5/06/2022**	10/06/2022	0	**5**	**-5**		**X**
SM	1	20	B-C-SM-MZ24-VE-020	60%	Adecuacion	$4.593.449,33	$2.756.069,60	5/06/2022	**EN EJECUCION**	**5/06/2022**	13/06/2022	0	**8**	**-8**		**X**
SM	2	21	B-C-SM-MZ85-VE-021	60%	Caseta T3	$8.614.688,02	$5.168.812,81	5/06/2022	**EN EJECUCION**	**5/06/2022**	14/06/2022	0	**9**	**-9**		**X**
SM	2	22	B-C-SM-MZ85-VE-022	60%	Caseta T3	$8.896.124,14	$5.337.674,48	5/06/2022	**EN EJECUCION**	**5/06/2022**	9/06/2022	0	**4**	**-4**		**X**
SM	1	23	B-C-SM-MZ85-VE-023	60%	Adecuacion	$7.191.930,35	$4.315.158,21	5/06/2022	**EN EJECUCION**	**5/06/2022**	10/06/2022	0	**5**	**-5**		**X**
SM	1	24	B-C-SM-MZ29-VE-024	60%	Adecuacion	$6.084.490,07	$3.650.694,04	5/06/2022	**EN EJECUCION**	**5/06/2022**	10/06/2022	0	**5**	**-5**		**X**
SM	2	25	B-C-SM-MZ31-VE-025	60%	Caseta T3	$8.637.204,10	$5.182.322,46	5/06/2022	**EN EJECUCION**	**5/06/2022**	9/06/2022	0	**4**	**-4**		**X**
SM	1	26	B-C-SM-MZ31-VE-026	60%	Adecuacion	$4.822.827,41	$2.893.696,45	5/06/2022	**EN EJECUCION**	**5/06/2022**	14/06/2022	0	**9**	**-9**		**X**
SM	1	27	B-C-SM-MZ31-VE-027	60%	Adecuacion	$4.365.339,96	$2.619.203,98	5/06/2022	**EN EJECUCION**	**5/06/2022**	9/06/2022	0	**4**	**-4**		**X**
SM	2	28	B-C-SM-MZ31-VE-028	60%	Adecuacion	$7.668.943,14	$4.601.365,88	5/06/2022	**EN EJECUCION**	**5/06/2022**	8/06/2022	0	**3**	**-3**		**X**
SM	2	29	B-C-SM-MZ31-VE-029	60%	Caseta T3	$8.468.136,75	$5.080.882,05	5/06/2022	**EN EJECUCION**	**5/06/2022**	9/06/2022	0	**4**	**-4**		**X**
SM	1	30	B-C-SM-MZ31-VE-030	60%	Adecuacion	$4.637.820,17	$2.782.692,10	5/06/2022	**EN EJECUCION**	**5/06/2022**	11/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
																X

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 16/06/2022
HORA: 1:46:33 p. m.
20224300229452

ADMON

Bogotá D.C, 16 de junio de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-047-22

Señores:
Ingeniera
Karol Yulieth Javela
Supervisora
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio
Calle 26 # 13-19 Piso 20
Bogotá. Colombia

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: ENTREGA INFORME SEMANAL No. 7

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales remitimos informe semanal No. 7 cuyo periodo es del 06 de junio del 2022 hasta 12 de junio del 2022.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.

FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA
Anexo: 18 folios
Proyectó: Ing. Marcy Correa – Directora de Interventoría.

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 7	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 001

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **6/06/2022** al **12/06/2022** | Fecha **12/06/2022**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO PROYECTO	
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** BOLÍVAR — **MUNICIPIO** CORDOBA
GERENCIA A CARGO	ENTERRITORIO
SUPERVISOR	KAROL YULIETH JAVELA PEREZ
ESTADO DEL PROYECTO	EN EJECUCIÓN ACTIVIDAD 1

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2220576		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUREDES		
Valor inicial	$ 1.771.707.945,99		
Valor actual	$ 1.771.707.945,99		
Variación del valor	$ -		
Fecha de Inicio	26/04/2022		
Plazo inicial (Días)	150 Días		
Plazo actual (Días)	150 Días	5 MESES - 150 DIAS	
Variación en plazo	Días		
Fecha Contractual de terminación	26/09/2022		
Tiempo Transcurrido (días)	47	31,33%	
Días remanentes del Contrato	106,00	70,67%	
Acumulado a última acta pagada			
Estimado ejecutado por llevar a acta			

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.	2220587		
Interventor	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS.		
Valor inicial	$ 202.479.313,00		
Valor actual	$ 202.479.313,00		
Variación del valor	$ -		
Fecha de Inicio	26/04/2022		
Plazo inicial	150 Días		
Plazo actual	150 Días	5 MESES - 150 DIAS	
Variación en plazo	Días		
Fecha Contractual de terminación	26/09/2022		
Ejecución del Contrato	47	31,33%	
Días remanentes del Contrato	106,00	70,67%	
Acumulado a última acta pagada			
Estimado ejecutado por llevar a acta			

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPENO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 1.771.707.945,99

Semáforo

Desviación en días: 17 Días


	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 224.253.753,55	12,66%	$ 92.073.616,87	5,20%	-$ 132.180.136,68	-7,46%
Durante el Periodo	$ 100.951.407,00	5,70%	$ 26.994.428,78	1,52%	-$ 73.956.978,22	-4,17%
Acumulado a la Fecha	**$ 325.205.160,55**	**18,36%**	**$ 119.068.045,65**	**6,72%**	**-$ 206.137.114,91**	**-11,63%**




Observaciones al desempeño del proyecto:

De acuerdo a la programación de obra el contratista debería tener efectuado un 18,36% d eejecución, sin embargo su ejecución es de 6,72% indicándonos un 11,64% de atraso el cual es producto de las no entregas de los diagnósticos proyectados en los tiempos establecidos, de acuerdo al plan de contingencia se debería tener un total de 140 diagnósticos aprobados de los cuales se han aprobado 42, indicandonos un atraso de 98 diagnosticos, en cuanto a la actividad 3 el contratista de debería terner 36 vivientas intervenidas, sin embargo solo ha intervenido a 18 y suministrado material a 24.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

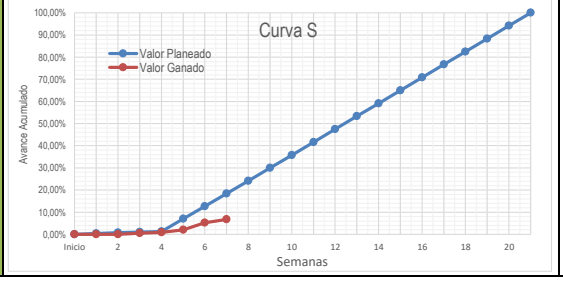




CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	12,66%	5,20%	-7,46%	
Durante el Periodo	5,70%	1,52%	-4,17%	
Acumulado a la Fecha	**18,36%**	**6,72%**	**-11,63%**	

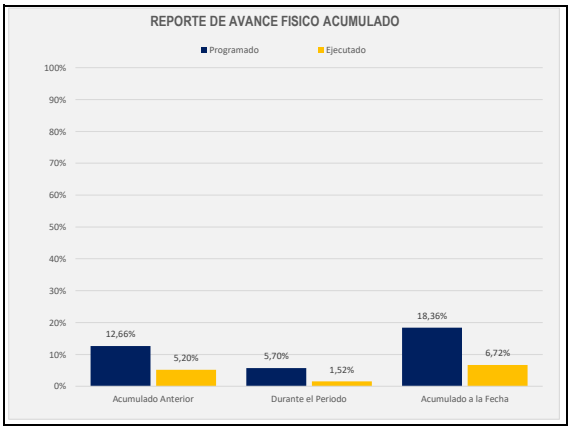

AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo		
			Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 1.771.707.945,99	$ 1.771.707.945,99	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados		No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados		Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
	Valor en Pesos	%		Valor en Pesos	%		
		0,00%			0,00%		









AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo		
			Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 202.479.313,00	$ 202.479.313,00	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados		No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados		Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
	Valor en Pesos	%		Valor en Pesos	%		
		0,00%			0,00%		







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 001

Entidad Contratante: ENTERRITORIO | Semana del 6/06/2022 al 12/06/2022 | Fecha 12/06/2022

ACTIVIDAD No. 1PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: Actividad No. 1, la aprobación de la actividad N° 1 se hizo comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-037-22 del 3 de Junio de 2022
ACTIVIDAD No. 2
PROGRAMADO 64,52% vs EJECUTADO 19,35%
Comentario: La Actividad N° 2 presenta un atraso del 45,17%, por lo cual el Contratista debe reforzar esta actividad con el fin de cumplir con las metas establecidas en la programación, la Interventoría solicitará al Contratista agilizar la entrega de diagnósticos para aprobación tal como se solicitó mediante oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-022-22
CTIVIDAD No. 3
PROGRAMADO 17,06% vs 6,16% EJECUTADO
Comentario: La Actividad N° 3 presenta un atraso del 10,9%, sólo se han iniciado 18 viviendas de las 36 que deberían estar en ejecución, sin embargo, el contratista ha hecho entrega los materiales de construcción en las 24 viviendas.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

En el ítem ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10. El contratista subsano los diseños de las casetas y el diseño de la estructura para el tanque elevado, también realizo entrega del informe técnico especialista estructural el cual fue aprobado por la interventoría con lo cual esta actividad queda en un 100% de su ejecución.
El ítem ACTIVIDAD 2: DIAGNOSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. Esta actividad avanza con el diligenciamiento de los diagnósticos de los cuales ya se sometieron a comité de aprobación el primer paquete de 42 los cuales fueron aprobados por la interventoría, se espera que el contratista redoble esfuerzos y reduzca el atraso presentado la próxima semana 98 diagnósticos para someter a comité de aprobación y completar los 140 propuestos en el plan de contingencia
En el ítem ACTIVIDAD 3: EJECUCION DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS. ACTA DE ENTREGA Y RECIBOS DE LAS OBRAS
A la fecha y de acuerdo al cronograma de actividades el contratista debería tener en proceso constructivo 36 viviendas y sin embargo solo inicio labores de ejecución de obra en 18 viviendas.
En las cuales ya han avanzado en cimentación, mampostería y fundición de columnas y columnetas, también se realizo suministro de materiales a 24 viviendas en el transcurso de este periodo tales como: cemento, acero, alambre, tubería hidráulica y sanitaria, bloques para la mampostería, también conformo los frentes de trabajo con los maestros de obra y ayudantes de albañilería.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

La próxima semana correspondiente al periodo del 13 al 19 de junio 2022 De acuerdo a la programación de obra se debe efectuar el inicio de la semana 8 de diagnósticos que corresponde a:
La entrega de 175 diagnósticos que corresponden al 81% de esta actividad.
El contratista debe continuar con la ejecución de obra efectuando la intervención en 36 viviendas de acuerdo a la programación y plan de contingencia.
Por lo cual la interventoría le recomendó el incremento de frentes de trabajo para efectuar trabajos contractivos en un mayor número de viviendas.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTIÓN SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0

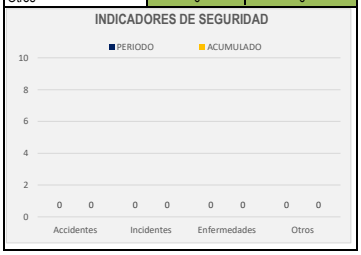

Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	7	0	7	41,2%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	7	3	10	58,8%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál?	0	0	0	0,0%
	Total	14	3	17	100,00%



OBSERVACIONES

En el presente periodo se presentaron 3 horas de lluvias el día 07 de junio 2022, (se adjunto reporte meteorologico del dia en cuestión)

GESTIÓN SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
INCLUSION 21	Amalfi Esther Piña Acuña	7/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 22	Kellys Garcia Contreras	7/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 23	Ilsa Maria Sampayo de Torres	7/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 24	Argenida Rivera Cruzate	7/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 25	Margelis Jimenez Ramirez	7/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 26	Isabel Ramirez Quiroz	7/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 27	Rosa Escobar Fernandez	7/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 28	Sofia Maria Fonseca Gonzalez	7/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 29	Juan Carlos Ochoa Fonseca	7/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 30	Maritza Isabel Alvis Ballestas	7/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 31	Patricia Isabel Anaya Leguia	7/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 32	Alicia Esther Villamizar Rosales	7/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 33	Jose Gabriel Marquez Bolaño	7/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 34	Sixta Bibiana Ahumada Polo	7/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 35	Yesenia Marcela Escobar Madariaga	9/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 36	Elsy Estella Estrada Leguia	9/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 37	Justa Matilde Vergara Villa	9/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 38	Martin Manuel Lozano Rivera	9/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 39	Eliani del Carmen Florez Mendoza	9/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 40	Bermuil del Socorro Vergara Causado	9/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 41	Duberlis Torres Anaya	9/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 42	Sirley Maria Ortega Barboza	9/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 43	Josefina Fernandez Anaya	9/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 44	Marina del Carmen Romero Villa	9/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 45	Miladis del Carmen Pérez Medina	9/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 46	Nulis Margoth Henao Causado	9/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 001

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **6/06/2022** al **12/06/2022** Fecha **12/06/2022**

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA









FUNDICIÓN DE CIMENTACIÓN PARA UNIDADES SANITARIAS TIPO 3









SE APRECIA EL PROCESO DE LEVANTE DE MAMPOSTERIA PARA UNIDADES SENITARIAS TIPO 3

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-016-22 con el Tema: SOLICITUD DISEÑO DE MEZCLAS: Por medio del cual solicitamos presentar diseño de mezclas para los concretos que se van a implementar en los procesos constructivos de las intervenciones como lo son cimentación, columnas, vigas superiores y placas para tanques, el diseño debe especificar los materiales, marca del cemento y la resistencia correspondiente.
La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-017-22 con el Tema: SOLICITUD DE INFORMACIÓN CUADRO DE AVANCE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN PROGRAMA EXCEL, para esta solicitud el contratista realizo la entrega del formato el cual fue diligenciado en conjunto con la interventoría.
La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-018-22 con el Tema: RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_044 mediante el cual se entregó el DISEÑO DE MEZCLAS para los concretos, la interventoría responde:
El diseño de mezclas se encuentra bien realizado y cumple con lo solicitado, sin embargo, antes de efectuar la aprobación se debe contar con los permisos de extracción, licencia y títulos de las conteras de donde proviene el agregado fino y grueso, confirmar el laboratorio donde se realizarán los ensayos y mecanismo de toma de muestras para los ensayos (por tiempo o por cantidades de obra), numero de cilindros, tiempos en el cual se fallarían y cuantos testigos quedan, en caso de ser necesaria la confirmación de algún resultado.
Adicionalmente se debe entregar el diseño de mezclas para morteros de pega de la mampostería y rellenos del bloque 0,15 para sobrecimientos.
La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-019-22 con el Tema: SOLICITUDES DE INCLUSION por medio del cual se remite para su debido tramite veintidós (22) solicitudes de inclusión, teniendo en cuenta el protocolo para la inclusión de nuevos potenciales beneficiarios al programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado.
La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-020-22 con el tema: RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_049 por medio del cual se realiza entrega de aval para 12 diagnósticos presentados en comité de aprobación No. 003

Marcy A. Correa C	Karol Javela
Firma	**Firma**
Nombre: Marcy Correa	Nombre: Karol Yulieth Javela Pérez
Directora de la interventoría	Supervisor: Supervisor ENTerritorio

Original: ENTerritorio

PROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Fin	Predeceso	Sucesoras	Costo	Nombres de los recursos	% completado	%Programado
1		**CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO,**			**132 días**	**mar 26/04/22**	**lun 26/09/22**			**$ 1.771.707.945,99**		**7%**	**18%**
2		**ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACION DE DISEÑO DE LOS**			**14 días**	**mar 26/04/22**	**mié 11/05/22**			**$ 5.140.026,35**		**100%**	**100%**
3		CHEQUEO Y VALIDACION DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE	GL	1	14 días	mar 26/04/22	mié 11/05/22		5CC;253CC	$ 5.140.026,35		100%	100%
4		**ACTIVIDAD 2: DIAGNOSTICO, VALIDACION PRELIMINAR,**			**53 días**	**mar 26/04/22**	**sáb 25/06/22**			**$ 39.313.349,11**		**56%**	**77%**
5		DIAGNOSTICOS SEMANA 1	UND	20	7 días	mar 26/04/22	mar 3/05/22	3CC	6	$ 3.623.350,15		100%	100%
6		DIAGNOSTICOS SEMANA 2	UND	20	7 días	mié 4/05/22	mié 11/05/22	5	7	$ 3.623.350,15		85%	100%
7		DIAGNOSTICOS SEMANA 3	UND	25	6 días	jue 12/05/22	mié 18/05/22	6	8	$ 4.529.187,69		85%	100%
8		DIAGNOSTICOS SEMANA 4	UND	30	6 días	jue 19/05/22	mié 25/05/22	7	9;26;15;16;17;18;19	$ 5.435.025,22		75%	100%
9		DIAGNOSTICOS SEMANA 5	UND	30	6 días	jue 26/05/22	mié 1/06/22	8	10	$ 5.435.025,22		75%	100%
10		DIAGNOSTICOS SEMANA 6	UND	30	7 días	jue 2/06/22	jue 9/06/22	9	11	$ 5.435.025,22		40%	100%
11		DIAGNOSTICOS SEMANA 7	UND	30	7 días	vie 10/06/22	vie 17/06/22	10	12	$ 5.435.025,22		0%	29%
12		DIAGNOSTICOS SEMANA 8	UND	32	7 días	sáb 18/06/22	sáb 25/06/22	11	196	$ 5.797.360,24		0%	0%
13		**ACTIVIDAD 3: EJECUCION DE LAS OBRAS DE LAS**			**106 días**	**jue 26/05/22**	**lun 26/09/22**			**$ 1.727.254.570,53**		**2%**	**14%**
14		**MES 1 (48 VIVIENDAS)**			**24 días**	**jue 26/05/22**	**mié 22/06/22**			**$ 382.065.527,04**		**10%**	**62%**
15		INTERVENCION N°1	UND	1	6 días	jue 26/05/22	mié 1/06/22	8	28	$ 7.959.698,48		0%	100%
16		INTERVENCION N°2	UND	1	6 días	jue 26/05/22	mié 1/06/22	8	29	$ 7.959.698,48		45%	100%
17		INTERVENCION N°3	UND	1	6 días	jue 26/05/22	mié 1/06/22	8	30	$ 7.959.698,48		15%	100%
18		INTERVENCION N°4	UND	1	6 días	jue 26/05/22	mié 1/06/22	8	31	$ 7.959.698,48		15%	100%
19		INTERVENCION N°5	UND	1	6 días	jue 26/05/22	mié 1/06/22	8	32	$ 7.959.698,48		15%	100%
20		INTERVENCION N°6	UND	1	6 días	jue 26/05/22	mié 1/06/22	8	33	$ 7.959.698,48		15%	100%
21		INTERVENCION N°7	UND	1	6 días	jue 26/05/22	mié 1/06/22	8	34	$ 7.959.698,48		15%	100%
22		INTERVENCION N°8	UND	1	6 días	jue 26/05/22	mié 1/06/22	8	35	$ 7.959.698,48		15%	100%
23		INTERVENCION N°9	UND	1	6 días	jue 26/05/22	mié 1/06/22	8	36	$ 7.959.698,48		15%	100%
24		INTERVENCION N°10	UND	1	6 días	jue 26/05/22	mié 1/06/22	8	37	$ 7.959.698,48		35%	100%
25		INTERVENCION N°11	UND	1	6 días	jue 26/05/22	mié 1/06/22	8	38	$ 7.959.698,48		20%	100%
26		INTERVENCION N°12	UND	1	6 días	jue 26/05/22	mié 1/06/22	8	27CC+5 días;39	$ 7.959.698,48		20%	100%
27		ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (1 -	UND	12	1 día	mié 1/06/22	mié 1/06/22	26CC+5	28;29;30;31;32;33;3	$ 0,00		0%	100%
28		INTERVENCION N°13	UND	1	6 días	jue 2/06/22	mié 8/06/22	27;15	41	$ 7.959.698,48		35%	100%
29		INTERVENCION N°14	UND	1	6 días	jue 2/06/22	mié 8/06/22	27;16	42	$ 7.959.698,48		35%	100%
30		INTERVENCION N°15	UND	1	6 días	jue 2/06/22	mié 8/06/22	27;17	43	$ 7.959.698,48		35%	100%
31		INTERVENCION N°16	UND	1	6 días	jue 2/06/22	mié 8/06/22	27;18	44	$ 7.959.698,48		35%	100%
32		INTERVENCION N°17	UND	1	6 días	jue 2/06/22	mié 8/06/22	27;19	45	$ 7.959.698,48		35%	100%
33		INTERVENCION N°18	UND	1	6 días	jue 2/06/22	mié 8/06/22	27;20	46	$ 7.959.698,48		15%	100%
34		INTERVENCION N°19	UND	1	6 días	jue 2/06/22	mié 8/06/22	27;21	47	$ 7.959.698,48		15%	100%
35		INTERVENCION N°20	UND	1	6 días	jue 2/06/22	mié 8/06/22	27;22	48	$ 7.959.698,48		10%	100%
36		INTERVENCION N°21	UND	1	6 días	jue 2/06/22	mié 8/06/22	27;23	49	$ 7.959.698,48		10%	100%
37		INTERVENCION N°22	UND	1	6 días	jue 2/06/22	mié 8/06/22	27;24	50	$ 7.959.698,48		10%	100%
38		INTERVENCION N°23	UND	1	6 días	jue 2/06/22	mié 8/06/22	27;25	51	$ 7.959.698,48		10%	100%

PROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Fin	Predeceso	Sucesoras	Costo	Nombres de los recursos	% completado	%Programado
39		INTERVENCION N°24	UND	1	6 días	jue 2/06/22	mié 8/06/22	27;26	40CC+5 días;52	$ 7.959.698,48		10%	100%
40		ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (13 -	UND	12	1 día	mié 8/06/22	mié 8/06/22	39CC+5	41;42;43;44;45;46;4	$ 0,00		0%	100%
41		INTERVENCION N°25	UND	1	6 días	jue 9/06/22	mié 15/06/22	40;28	54	$ 7.959.698,48		0%	50%
42		INTERVENCION N°26	UND	1	6 días	jue 9/06/22	mié 15/06/22	40;29	55	$ 7.959.698,48		0%	50%
43		INTERVENCION N°27	UND	1	6 días	jue 9/06/22	mié 15/06/22	40;30	56	$ 7.959.698,48		0%	50%
44		INTERVENCION N°28	UND	1	6 días	jue 9/06/22	mié 15/06/22	40;31	57	$ 7.959.698,48		0%	50%
45		INTERVENCION N°29	UND	1	6 días	jue 9/06/22	mié 15/06/22	40;32	58	$ 7.959.698,48		0%	50%
46		INTERVENCION N°30	UND	1	6 días	jue 9/06/22	mié 15/06/22	40;33	59	$ 7.959.698,48		0%	50%
47		INTERVENCION N°31	UND	1	6 días	jue 9/06/22	mié 15/06/22	40;34	60	$ 7.959.698,48		0%	50%
48		INTERVENCION N°32	UND	1	6 días	jue 9/06/22	mié 15/06/22	40;35	61	$ 7.959.698,48		0%	50%
49		INTERVENCION N°33	UND	1	6 días	jue 9/06/22	mié 15/06/22	40;36	62	$ 7.959.698,48		0%	50%
50		INTERVENCION N°34	UND	1	6 días	jue 9/06/22	mié 15/06/22	40;37	63	$ 7.959.698,48		0%	50%
51		INTERVENCION N°35	UND	1	6 días	jue 9/06/22	mié 15/06/22	40;38	64	$ 7.959.698,48		0%	50%
52		INTERVENCION N°36	UND	1	6 días	jue 9/06/22	mié 15/06/22	40;39	53CC+5 días;65	$ 7.959.698,48		0%	50%
53		ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (25 -	UND	12	1 día	mié 15/06/22	mié 15/06/22	52CC+5	54;55;56;57;58;59;6	$ 0,00		0%	0%
54		INTERVENCION N°37	UND	1	6 días	jue 16/06/22	mié 22/06/22	53;41	68	$ 7.959.698,48		0%	0%
55		INTERVENCION N°38	UND	1	6 días	jue 16/06/22	mié 22/06/22	53;42	69	$ 7.959.698,48		0%	0%
56		INTERVENCION N°39	UND	1	6 días	jue 16/06/22	mié 22/06/22	53;43	70	$ 7.959.698,48		0%	0%
57		INTERVENCION N°40	UND	1	6 días	jue 16/06/22	mié 22/06/22	53;44	71	$ 7.959.698,48		0%	0%
58		INTERVENCION N°41	UND	1	6 días	jue 16/06/22	mié 22/06/22	53;45	72	$ 7.959.698,48		0%	0%
59		INTERVENCION N°42	UND	1	6 días	jue 16/06/22	mié 22/06/22	53;46	73	$ 7.959.698,48		0%	0%
60		INTERVENCION N°43	UND	1	6 días	jue 16/06/22	mié 22/06/22	53;47	74	$ 7.959.698,48		0%	0%
61		INTERVENCION N°44	UND	1	6 días	jue 16/06/22	mié 22/06/22	53;48	75	$ 7.959.698,48		0%	0%
62		INTERVENCION N°45	UND	1	6 días	jue 16/06/22	mié 22/06/22	53;49	76	$ 7.959.698,48		0%	0%
63		INTERVENCION N°46	UND	1	6 días	jue 16/06/22	mié 22/06/22	53;50	77	$ 7.959.698,48		0%	0%
64		INTERVENCION N°47	UND	1	6 días	jue 16/06/22	mié 22/06/22	53;51	78	$ 7.959.698,48		0%	0%
65		INTERVENCION N°48	UND	1	6 días	jue 16/06/22	mié 22/06/22	53;52	66CC+5 días;79;80	$ 7.959.698,48		0%	0%
66		ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (37 -	UND	12	1 día	mié 22/06/22	mié 22/06/22	65CC+5	67;68;69;70;71;72;7	$ 0,00		0%	0%
67		**MES 2 (52 VIVIENDAS)**			**24 días**	**jue 23/06/22**	**mié 20/07/22**	**66**		**$ 413.904.320,96**		**0%**	**0%**
68		INTERVENCION N°49	UND	1	6 días	jue 23/06/22	mié 29/06/22	66;54	82	$ 7.959.698,48		0%	0%
69		INTERVENCION N°50	UND	1	6 días	jue 23/06/22	mié 29/06/22	66;55	83	$ 7.959.698,48		0%	0%
70		INTERVENCION N°51	UND	1	6 días	jue 23/06/22	mié 29/06/22	66;56	84	$ 7.959.698,48		0%	0%
71		INTERVENCION N°52	UND	1	6 días	jue 23/06/22	mié 29/06/22	66;57	85	$ 7.959.698,48		0%	0%
72		INTERVENCION N°53	UND	1	6 días	jue 23/06/22	mié 29/06/22	66;58	86	$ 7.959.698,48		0%	0%
73		INTERVENCION N°54	UND	1	6 días	jue 23/06/22	mié 29/06/22	66;59	87	$ 7.959.698,48		0%	0%
74		INTERVENCION N°55	UND	1	6 días	jue 23/06/22	mié 29/06/22	66;60	88	$ 7.959.698,48		0%	0%
75		INTERVENCION N°56	UND	1	6 días	jue 23/06/22	mié 29/06/22	66;61	89	$ 7.959.698,48		0%	0%
76		INTERVENCION N°57	UND	1	6 días	jue 23/06/22	mié 29/06/22	66;62	90	$ 7.959.698,48		0%	0%

PROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Fin	Predeceso	Sucesoras	Costo	Nombres de los recursos	% completado	%Programado
77		INTERVENCION N°58	UND	1	6 días	jue 23/06/22	mié 29/06/22	66;63	91	$ 7.959.698,48		0%	0%
78		INTERVENCION N°59	UND	1	6 días	jue 23/06/22	mié 29/06/22	66;64	92	$ 7.959.698,48		0%	0%
79		INTERVENCION N°60	UND	1	6 días	jue 23/06/22	mié 29/06/22	66;65	93	$ 7.959.698,48		0%	0%
80		INTERVENCION N°61	UND	1	6 días	jue 23/06/22	mié 29/06/22	66;65	94;81CC+5 días	$ 7.959.698,48		0%	0%
81		ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (49 -	UND	13	1 día	mié 29/06/22	mié 29/06/22	80CC+5	82;83;84;85;86;87;8	$ 0,00		0%	0%
82		INTERVENCION N°62	UND	1	6 días	jue 30/06/22	mié 6/07/22	81;68	96	$ 7.959.698,48		0%	0%
83		INTERVENCION N°63	UND	1	6 días	jue 30/06/22	mié 6/07/22	81;69	97	$ 7.959.698,48		0%	0%
84		INTERVENCION N°64	UND	1	6 días	jue 30/06/22	mié 6/07/22	81;70	98	$ 7.959.698,48		0%	0%
85		INTERVENCION N°65	UND	1	6 días	jue 30/06/22	mié 6/07/22	81;71	99	$ 7.959.698,48		0%	0%
86		INTERVENCION N°66	UND	1	6 días	jue 30/06/22	mié 6/07/22	81;72	100	$ 7.959.698,48		0%	0%
87		INTERVENCION N°67	UND	1	6 días	jue 30/06/22	mié 6/07/22	81;73	101	$ 7.959.698,48		0%	0%
88		INTERVENCION N°68	UND	1	6 días	jue 30/06/22	mié 6/07/22	81;74	102	$ 7.959.698,48		0%	0%
89		INTERVENCION N°69	UND	1	6 días	jue 30/06/22	mié 6/07/22	81;75	103	$ 7.959.698,48		0%	0%
90		INTERVENCION N°70	UND	1	6 días	jue 30/06/22	mié 6/07/22	81;76	104	$ 7.959.698,48		0%	0%
91		INTERVENCION N°71	UND	1	6 días	jue 30/06/22	mié 6/07/22	81;77	105	$ 7.959.698,48		0%	0%
92		INTERVENCION N°72	UND	1	6 días	jue 30/06/22	mié 6/07/22	81;78	106	$ 7.959.698,48		0%	0%
93		INTERVENCION N°73	UND	1	6 días	jue 30/06/22	mié 6/07/22	81;79	107	$ 7.959.698,48		0%	0%
94		INTERVENCION N°74	UND	1	6 días	jue 30/06/22	mié 6/07/22	81;80	108;95CC+5 días	$ 7.959.698,48		0%	0%
95		ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (62 -	UND	13	1 día	mié 6/07/22	mié 6/07/22	94CC+5	96;97;98;99;100;10	$ 0,00		0%	0%
96		INTERVENCION N°75	UND	1	6 días	jue 7/07/22	mié 13/07/22	95;82	110	$ 7.959.698,48		0%	0%
97		INTERVENCION N°76	UND	1	6 días	jue 7/07/22	mié 13/07/22	95;83	111	$ 7.959.698,48		0%	0%
98		INTERVENCION N°77	UND	1	6 días	jue 7/07/22	mié 13/07/22	95;84	112	$ 7.959.698,48		0%	0%
99		INTERVENCION N°78	UND	1	6 días	jue 7/07/22	mié 13/07/22	95;85	113	$ 7.959.698,48		0%	0%
100		INTERVENCION N°79	UND	1	6 días	jue 7/07/22	mié 13/07/22	95;86	114	$ 7.959.698,48		0%	0%
101		INTERVENCION N°80	UND	1	6 días	jue 7/07/22	mié 13/07/22	95;87	115	$ 7.959.698,48		0%	0%
102		INTERVENCION N°81	UND	1	6 días	jue 7/07/22	mié 13/07/22	95;88	116	$ 7.959.698,48		0%	0%
103		INTERVENCION N°82	UND	1	6 días	jue 7/07/22	mié 13/07/22	95;89	117	$ 7.959.698,48		0%	0%
104		INTERVENCION N°83	UND	1	6 días	jue 7/07/22	mié 13/07/22	95;90	118	$ 7.959.698,48		0%	0%
105		INTERVENCION N°84	UND	1	6 días	jue 7/07/22	mié 13/07/22	95;91	119	$ 7.959.698,48		0%	0%
106		INTERVENCION N°85	UND	1	6 días	jue 7/07/22	mié 13/07/22	95;92	120	$ 7.959.698,48		0%	0%
107		INTERVENCION N°86	UND	1	6 días	jue 7/07/22	mié 13/07/22	95;93	121	$ 7.959.698,48		0%	0%
108		INTERVENCION N°87	UND	1	6 días	jue 7/07/22	mié 13/07/22	95;94	122;109CC+5 días	$ 7.959.698,48		0%	0%
109		ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (75 -	UND	13	1 día	mié 13/07/22	mié 13/07/22	108CC+5	110;111;112;113;11	$ 0,00		0%	0%
110		INTERVENCION N°88	UND	1	6 días	jue 14/07/22	mié 20/07/22	109;96	125	$ 7.959.698,48		0%	0%
111		INTERVENCION N°89	UND	1	6 días	jue 14/07/22	mié 20/07/22	109;97	126	$ 7.959.698,48		0%	0%
112		INTERVENCION N°90	UND	1	6 días	jue 14/07/22	mié 20/07/22	109;98	127	$ 7.959.698,48		0%	0%
113		INTERVENCION N°91	UND	1	6 días	jue 14/07/22	mié 20/07/22	109;99	128	$ 7.959.698,48		0%	0%
114		INTERVENCION N°92	UND	1	6 días	jue 14/07/22	mié 20/07/22	109;100	129	$ 7.959.698,48		0%	0%

PROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Fin	Predeceso	Sucesoras	Costo	Nombres de los recursos	% completado	%Programado
115		INTERVENCION N°93	UND	1	6 días	jue 14/07/22	mié 20/07/22	109;101	130	$ 7.959.698,48		0%	0%
116		INTERVENCION N°94	UND	1	6 días	jue 14/07/22	mié 20/07/22	109;102	131	$ 7.959.698,48		0%	0%
117		INTERVENCION N°95	UND	1	6 días	jue 14/07/22	mié 20/07/22	109;103	132	$ 7.959.698,48		0%	0%
118		INTERVENCION N°96	UND	1	6 días	jue 14/07/22	mié 20/07/22	109;104	133	$ 7.959.698,48		0%	0%
119		INTERVENCION N°97	UND	1	6 días	jue 14/07/22	mié 20/07/22	109;105	134	$ 7.959.698,48		0%	0%
120		INTERVENCION N°98	UND	1	6 días	jue 14/07/22	mié 20/07/22	109;106	135	$ 7.959.698,48		0%	0%
121		INTERVENCION N°99	UND	1	6 días	jue 14/07/22	mié 20/07/22	109;107	136	$ 7.959.698,48		0%	0%
122		INTERVENCION N°100	UND	1	6 días	jue 14/07/22	mié 20/07/22	109;108	123CC+5 días;137	$ 7.959.698,48		0%	0%
123		ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (88 -	UND	13	1 día	mié 20/07/22	mié 20/07/22	122CC+5	124;125;126;127;12	$ 0,00		0%	0%
124		**MES 3 (52 VIVIENDAS)**			**24 días**	**jue 21/07/22**	**mié 17/08/22**	**123**		**$ 413.904.320,96**		**0%**	**0%**
125		INTERVENCION N°101	UND	1	6 días	jue 21/07/22	mié 27/07/22	123;110	139	$ 7.959.698,48		0%	0%
126		INTERVENCION N°102	UND	1	6 días	jue 21/07/22	mié 27/07/22	123;111	140	$ 7.959.698,48		0%	0%
127		INTERVENCION N°103	UND	1	6 días	jue 21/07/22	mié 27/07/22	123;112	141	$ 7.959.698,48		0%	0%
128		INTERVENCION N°104	UND	1	6 días	jue 21/07/22	mié 27/07/22	123;113	142	$ 7.959.698,48		0%	0%
129		INTERVENCION N°105	UND	1	6 días	jue 21/07/22	mié 27/07/22	123;114	143	$ 7.959.698,48		0%	0%
130		INTERVENCION N°106	UND	1	6 días	jue 21/07/22	mié 27/07/22	123;115	144	$ 7.959.698,48		0%	0%
131		INTERVENCION N°107	UND	1	6 días	jue 21/07/22	mié 27/07/22	123;116	145	$ 7.959.698,48		0%	0%
132		INTERVENCION N°108	UND	1	6 días	jue 21/07/22	mié 27/07/22	123;117	146	$ 7.959.698,48		0%	0%
133		INTERVENCION N°109	UND	1	6 días	jue 21/07/22	mié 27/07/22	123;118	147	$ 7.959.698,48		0%	0%
134		INTERVENCION N°110	UND	1	6 días	jue 21/07/22	mié 27/07/22	123;119	148	$ 7.959.698,48		0%	0%
135		INTERVENCION N°111	UND	1	6 días	jue 21/07/22	mié 27/07/22	123;120	149	$ 7.959.698,48		0%	0%
136		INTERVENCION N°112	UND	1	6 días	jue 21/07/22	mié 27/07/22	123;121	150	$ 7.959.698,48		0%	0%
137		INTERVENCION N°113	UND	1	6 días	jue 21/07/22	mié 27/07/22	123;122	151;138CC+5 días	$ 7.959.698,48		0%	0%
138		ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (101 -	UND	13	1 día	mié 27/07/22	mié 27/07/22	137CC+5	139;140;141;142;14	$ 0,00		0%	0%
139		INTERVENCION N°114	UND	1	6 días	jue 28/07/22	mié 3/08/22	138;125	153	$ 7.959.698,48		0%	0%
140		INTERVENCION N°115	UND	1	6 días	jue 28/07/22	mié 3/08/22	138;126	154	$ 7.959.698,48		0%	0%
141		INTERVENCION N°116	UND	1	6 días	jue 28/07/22	mié 3/08/22	138;127	155	$ 7.959.698,48		0%	0%
142		INTERVENCION N°117	UND	1	6 días	jue 28/07/22	mié 3/08/22	138;128	156	$ 7.959.698,48		0%	0%
143		INTERVENCION N°118	UND	1	6 días	jue 28/07/22	mié 3/08/22	138;129	157	$ 7.959.698,48		0%	0%
144		INTERVENCION N°119	UND	1	6 días	jue 28/07/22	mié 3/08/22	138;130	158	$ 7.959.698,48		0%	0%
145		INTERVENCION N°120	UND	1	6 días	jue 28/07/22	mié 3/08/22	138;131	159	$ 7.959.698,48		0%	0%
146		INTERVENCION N°121	UND	1	6 días	jue 28/07/22	mié 3/08/22	138;132	160	$ 7.959.698,48		0%	0%
147		INTERVENCION N°122	UND	1	6 días	jue 28/07/22	mié 3/08/22	138;133	161	$ 7.959.698,48		0%	0%
148		INTERVENCION N°123	UND	1	6 días	jue 28/07/22	mié 3/08/22	138;134	162	$ 7.959.698,48		0%	0%
149		INTERVENCION N°124	UND	1	6 días	jue 28/07/22	mié 3/08/22	138;135	163	$ 7.959.698,48		0%	0%
150		INTERVENCION N°125	UND	1	6 días	jue 28/07/22	mié 3/08/22	138;136	164	$ 7.959.698,48		0%	0%
151		INTERVENCION N°126	UND	1	6 días	jue 28/07/22	mié 3/08/22	138;137	165;152CC+5 días	$ 7.959.698,48		0%	0%
152		ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (114 -	UND	13	1 día	mié 3/08/22	mié 3/08/22	151CC+5	153;154;155;156;15	$ 0,00		0%	0%

PROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Fin	Predeceso	Sucesoras	Costo	Nombres de los recursos	% completado	%Programado
153		INTERVENCION N°127	UND	1	6 días	jue 4/08/22	mié 10/08/22	152;139	167	$ 7.959.698,48		0%	0%
154		INTERVENCION N°128	UND	1	6 días	jue 4/08/22	mié 10/08/22	152;140	168	$ 7.959.698,48		0%	0%
155		INTERVENCION N°129	UND	1	6 días	jue 4/08/22	mié 10/08/22	152;141	169	$ 7.959.698,48		0%	0%
156		INTERVENCION N°130	UND	1	6 días	jue 4/08/22	mié 10/08/22	152;142	170	$ 7.959.698,48		0%	0%
157		INTERVENCION N°131	UND	1	6 días	jue 4/08/22	mié 10/08/22	152;143	171	$ 7.959.698,48		0%	0%
158		INTERVENCION N°132	UND	1	6 días	jue 4/08/22	mié 10/08/22	152;144	172	$ 7.959.698,48		0%	0%
159		INTERVENCION N°133	UND	1	6 días	jue 4/08/22	mié 10/08/22	152;145	173	$ 7.959.698,48		0%	0%
160		INTERVENCION N°134	UND	1	6 días	jue 4/08/22	mié 10/08/22	152;146	174	$ 7.959.698,48		0%	0%
161		INTERVENCION N°135	UND	1	6 días	jue 4/08/22	mié 10/08/22	152;147	175	$ 7.959.698,48		0%	0%
162		INTERVENCION N°136	UND	1	6 días	jue 4/08/22	mié 10/08/22	152;148	176	$ 7.959.698,48		0%	0%
163		INTERVENCION N°137	UND	1	6 días	jue 4/08/22	mié 10/08/22	152;149	177	$ 7.959.698,48		0%	0%
164		INTERVENCION N°138	UND	1	6 días	jue 4/08/22	mié 10/08/22	152;150	178	$ 7.959.698,48		0%	0%
165		INTERVENCION N°139	UND	1	6 días	jue 4/08/22	mié 10/08/22	152;151	179;166CC+5 días	$ 7.959.698,48		0%	0%
166		ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS	UND	13	1 día	mié 10/08/22	mié 10/08/22	165CC+5	167;168;169;170;17	$ 0,00		0%	0%
167		INTERVENCION N°140	UND	1	6 días	jue 11/08/22	mié 17/08/22	166;153	182	$ 7.959.698,48		0%	0%
168		INTERVENCION N°141	UND	1	6 días	jue 11/08/22	mié 17/08/22	166;154	183	$ 7.959.698,48		0%	0%
169		INTERVENCION N°142	UND	1	6 días	jue 11/08/22	mié 17/08/22	166;155	184	$ 7.959.698,48		0%	0%
170		INTERVENCION N°143	UND	1	6 días	jue 11/08/22	mié 17/08/22	166;156	185	$ 7.959.698,48		0%	0%
171		INTERVENCION N°144	UND	1	6 días	jue 11/08/22	mié 17/08/22	166;157	186	$ 7.959.698,48		0%	0%
172		INTERVENCION N°145	UND	1	6 días	jue 11/08/22	mié 17/08/22	166;158	187	$ 7.959.698,48		0%	0%
173		INTERVENCION N°146	UND	1	6 días	jue 11/08/22	mié 17/08/22	166;159	188	$ 7.959.698,48		0%	0%
174		INTERVENCION N°147	UND	1	6 días	jue 11/08/22	mié 17/08/22	166;160	189	$ 7.959.698,48		0%	0%
175		INTERVENCION N°148	UND	1	6 días	jue 11/08/22	mié 17/08/22	166;161	190	$ 7.959.698,48		0%	0%
176		INTERVENCION N°149	UND	1	6 días	jue 11/08/22	mié 17/08/22	166;162	191	$ 7.959.698,48		0%	0%
177		INTERVENCION N°150	UND	1	6 días	jue 11/08/22	mié 17/08/22	166;163	192	$ 7.959.698,48		0%	0%
178		INTERVENCION N°151	UND	1	6 días	jue 11/08/22	mié 17/08/22	166;164	193	$ 7.959.698,48		0%	0%
179		INTERVENCION N°152	UND	1	6 días	jue 11/08/22	mié 17/08/22	166;165	180CC+5 días;194	$ 7.959.698,48		0%	0%
180		ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (140 -	UND	13	1 día	mié 17/08/22	mié 17/08/22	179CC+5	182;183;184;185;18	$ 0,00		0%	0%
181		**MES 4 (65 VIVIENDAS)**			**34 días**	**jue 18/08/22**	**lun 26/09/22**			**$ 517.380.401,57**		**0%**	**0%**
182		INTERVENCION N°153	UND	1	6 días	jue 18/08/22	mié 24/08/22	180;167	196	$ 7.959.698,48		0%	0%
183		INTERVENCION N°154	UND	1	6 días	jue 18/08/22	mié 24/08/22	180;168	197	$ 7.959.698,48		0%	0%
184		INTERVENCION N°155	UND	1	6 días	jue 18/08/22	mié 24/08/22	180;169	198	$ 7.959.698,48		0%	0%
185		INTERVENCION N°156	UND	1	6 días	jue 18/08/22	mié 24/08/22	180;170	199	$ 7.959.698,48		0%	0%
186		INTERVENCION N°157	UND	1	6 días	jue 18/08/22	mié 24/08/22	180;171	200	$ 7.959.698,48		0%	0%
187		INTERVENCION N°158	UND	1	6 días	jue 18/08/22	mié 24/08/22	180;172	201	$ 7.959.698,48		0%	0%
188		INTERVENCION N°159	UND	1	6 días	jue 18/08/22	mié 24/08/22	180;173	202	$ 7.959.698,48		0%	0%
189		INTERVENCION N°160	UND	1	6 días	jue 18/08/22	mié 24/08/22	180;174	203	$ 7.959.698,48		0%	0%
190		INTERVENCION N°161	UND	1	6 días	jue 18/08/22	mié 24/08/22	180;175	204	$ 7.959.698,48		0%	0%

PROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Fin	Predeceso	Sucesoras	Costo	Nombres de los recursos	% completado	%Programado
191		INTERVENCION N°162	UND	1	6 días	jue 18/08/22	mié 24/08/22	180;176	205	$ 7.959.698,48		0%	0%
192		INTERVENCION N°163	UND	1	6 días	jue 18/08/22	mié 24/08/22	180;177	206	$ 7.959.698,48		0%	0%
193		INTERVENCION N°164	UND	1	6 días	jue 18/08/22	mié 24/08/22	180;178	207	$ 7.959.698,48		0%	0%
194		INTERVENCION N°165	UND	1	6 días	jue 18/08/22	mié 24/08/22	180;179	208;195CC+5 días	$ 7.959.698,48		0%	0%
195		ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (153 -	UND	13	1 día	mié 24/08/22	mié 24/08/22	194CC+5	196;197;198;199;20	$ 0,00		0%	0%
196		INTERVENCION N°166	UND	1	6 días	jue 25/08/22	mié 31/08/22	195;182;	210	$ 7.959.698,48		0%	0%
197		INTERVENCION N°167	UND	1	6 días	jue 25/08/22	mié 31/08/22	195;183	211	$ 7.959.698,48		0%	0%
198		INTERVENCION N°168	UND	1	6 días	jue 25/08/22	mié 31/08/22	195;184	212	$ 7.959.698,48		0%	0%
199		INTERVENCION N°169	UND	1	6 días	jue 25/08/22	mié 31/08/22	195;185	213	$ 7.959.698,48		0%	0%
200		INTERVENCION N°170	UND	1	6 días	jue 25/08/22	mié 31/08/22	195;186	214	$ 7.959.698,48		0%	0%
201		INTERVENCION N°171	UND	1	6 días	jue 25/08/22	mié 31/08/22	195;187	215	$ 7.959.698,48		0%	0%
202		INTERVENCION N°172	UND	1	6 días	jue 25/08/22	mié 31/08/22	195;188	216	$ 7.959.698,48		0%	0%
203		INTERVENCION N°173	UND	1	6 días	jue 25/08/22	mié 31/08/22	195;189	217	$ 7.959.698,48		0%	0%
204		INTERVENCION N°174	UND	1	6 días	jue 25/08/22	mié 31/08/22	195;190	218	$ 7.959.698,48		0%	0%
205		INTERVENCION N°175	UND	1	6 días	jue 25/08/22	mié 31/08/22	195;191	219	$ 7.959.698,48		0%	0%
206		INTERVENCION N°176	UND	1	6 días	jue 25/08/22	mié 31/08/22	195;192	220	$ 7.959.698,48		0%	0%
207		INTERVENCION N°177	UND	1	6 días	jue 25/08/22	mié 31/08/22	195;193	221	$ 7.959.698,48		0%	0%
208		INTERVENCION N°178	UND	1	6 días	jue 25/08/22	mié 31/08/22	195;194	222;209CC+5 días	$ 7.959.698,48		0%	0%
209		ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (166 -	UND	13	1 día	mié 31/08/22	mié 31/08/22	208CC+5	210;211;212;213;21	$ 0,00		0%	0%
210		INTERVENCION N°179	UND	1	6 días	jue 1/09/22	mié 7/09/22	209;196	224	$ 7.959.698,48		0%	0%
211		INTERVENCION N°180	UND	1	6 días	jue 1/09/22	mié 7/09/22	209;197	225	$ 7.959.698,48		0%	0%
212		INTERVENCION N°181	UND	1	6 días	jue 1/09/22	mié 7/09/22	209;198	226	$ 7.959.698,49		0%	0%
213		INTERVENCION N°182	UND	1	6 días	jue 1/09/22	mié 7/09/22	209;199	227	$ 7.959.698,49		0%	0%
214		INTERVENCION N°183	UND	1	6 días	jue 1/09/22	mié 7/09/22	209;200	228	$ 7.959.698,49		0%	0%
215		INTERVENCION N°184	UND	1	6 días	jue 1/09/22	mié 7/09/22	209;201	229	$ 7.959.698,49		0%	0%
216		INTERVENCION N°185	UND	1	6 días	jue 1/09/22	mié 7/09/22	209;202	230	$ 7.959.698,49		0%	0%
217		INTERVENCION N°186	UND	1	6 días	jue 1/09/22	mié 7/09/22	209;203	231	$ 7.959.698,49		0%	0%
218		INTERVENCION N°187	UND	1	6 días	jue 1/09/22	mié 7/09/22	209;204	232	$ 7.959.698,49		0%	0%
219		INTERVENCION N°188	UND	1	6 días	jue 1/09/22	mié 7/09/22	209;205	233	$ 7.959.698,49		0%	0%
220		INTERVENCION N°189	UND	1	6 días	jue 1/09/22	mié 7/09/22	209;206	234	$ 7.959.698,49		0%	0%
221		INTERVENCION N°190	UND	1	6 días	jue 1/09/22	mié 7/09/22	209;207	235	$ 7.959.698,49		0%	0%
222		INTERVENCION N°191	UND	1	6 días	jue 1/09/22	mié 7/09/22	209;208	236;223CC+5 días	$ 7.959.698,49		0%	0%
223		ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (179 -	UND	13	1 día	mié 7/09/22	mié 7/09/22	222CC+5	224;225;226;227;22	$ 0,00		0%	0%
224		INTERVENCION N°192	UND	1	6 días	jue 8/09/22	mié 14/09/22	223;210	238	$ 7.959.698,49		0%	0%
225		INTERVENCION N°193	UND	1	6 días	jue 8/09/22	mié 14/09/22	223;211	239	$ 7.959.698,49		0%	0%
226		INTERVENCION N°194	UND	1	6 días	jue 8/09/22	mié 14/09/22	223;212	240	$ 7.959.698,49		0%	0%
227		INTERVENCION N°195	UND	1	6 días	jue 8/09/22	mié 14/09/22	223;213	241	$ 7.959.698,49		0%	0%
228		INTERVENCION N°196	UND	1	6 días	jue 8/09/22	mié 14/09/22	223;214	242	$ 7.959.698,49		0%	0%

PROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Fin	Predeceso	Sucesoras	Costo	Nombres de los recursos	% completado	%Programado
229		INTERVENCION N°197	UND	1	6 días	jue 8/09/22	mié 14/09/22	223;215	243	$ 7.959.698,49		0%	0%
230		INTERVENCION N°198	UND	1	6 días	jue 8/09/22	mié 14/09/22	223;216	244	$ 7.959.698,49		0%	0%
231		INTERVENCION N°199	UND	1	6 días	jue 8/09/22	mié 14/09/22	223;217	245	$ 7.959.698,49		0%	0%
232		INTERVENCION N°200	UND	1	6 días	jue 8/09/22	mié 14/09/22	223;218	246	$ 7.959.698,49		0%	0%
233		INTERVENCION N°201	UND	1	6 días	jue 8/09/22	mié 14/09/22	223;219	247	$ 7.959.698,49		0%	0%
234		INTERVENCION N°202	UND	1	6 días	jue 8/09/22	mié 14/09/22	223;220	248	$ 7.959.698,49		0%	0%
235		INTERVENCION N°203	UND	1	6 días	jue 8/09/22	mié 14/09/22	223;221	249	$ 7.959.698,49		0%	0%
236		INTERVENCION N°204	UND	1	6 días	jue 8/09/22	mié 14/09/22	223;222	250;237CC+5 días	$ 7.959.698,49		0%	0%
237		ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (192 -	UND	13	1 día	mié 14/09/22	mié 14/09/22	236CC+5	238;239;240;241;24	$ 0,00		0%	0%
238		INTERVENCION N°205	UND	1	6 días	jue 15/09/22	mié 21/09/22	237;224	251	$ 7.959.698,49		0%	0%
239		INTERVENCION N°206	UND	1	6 días	jue 15/09/22	mié 21/09/22	237;225	251	$ 7.959.698,49		0%	0%
240		INTERVENCION N°207	UND	1	6 días	jue 15/09/22	mié 21/09/22	237;226	251	$ 7.959.698,49		0%	0%
241		INTERVENCION N°208	UND	1	6 días	jue 15/09/22	mié 21/09/22	237;227	251	$ 7.959.698,49		0%	0%
242		INTERVENCION N°209	UND	1	6 días	jue 15/09/22	mié 21/09/22	237;228	251	$ 7.959.698,49		0%	0%
243		INTERVENCION N°210	UND	1	6 días	jue 15/09/22	mié 21/09/22	237;229	251	$ 7.959.698,49		0%	0%
244		INTERVENCION N°211	UND	1	6 días	jue 15/09/22	mié 21/09/22	237;230	251	$ 7.959.698,49		0%	0%
245		INTERVENCION N°212	UND	1	6 días	jue 15/09/22	mié 21/09/22	237;231	251	$ 7.959.698,49		0%	0%
246		INTERVENCION N°213	UND	1	6 días	jue 15/09/22	mié 21/09/22	237;232	251	$ 7.959.698,49		0%	0%
247		INTERVENCION N°214	UND	1	6 días	jue 15/09/22	mié 21/09/22	237;233	251	$ 7.959.698,49		0%	0%
248		INTERVENCION N°215	UND	1	6 días	jue 15/09/22	mié 21/09/22	237;234	251	$ 7.959.698,49		0%	0%
249		INTERVENCION N°216	UND	1	6 días	jue 15/09/22	mié 21/09/22	237;235	251	$ 7.959.698,49		0%	0%
250		INTERVENCION N°217	UND	1	6 días	jue 15/09/22	mié 21/09/22	237;236	251	$ 7.959.698,49		0%	0%
251		ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (205 -	UND	13	4 días	jue 22/09/22	lun 26/09/22	238;239;		$ 0,00		**0%**	**0%**
252		**ACTIVIDAD 4: PLAN DE GESTION SOCIAL PARA LA**			**132 días**	**mar 26/04/22**	**lun 26/09/22**			**$ 0,00**		**31%**	**31%**
253		PLAN DE GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DE LAS	GL	1	132 días	mar 26/04/22	lun 26/09/22	3CC		$ 0,00		31%	31%

Ejecución de Actividad en Viviendas al Programa Conexiones Intradomiciliarias con corte a 12/06/2022

BARRIO	ACTA	No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización	Número de días Máximo permitido según tipo de intervención	Número de Dias de la Intervencion por parte del Contratista	Dias de cumplimiento o incumplimiento según tipo de intervención (-) atraso y (+) avance	¿SE ENCUENTRA RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR INTERVENTORÍA?	
															SI (X)	NO (X)
SM	1	1	B-C-SM-MZ29-VE-001		Adecuacion	$7.967.801,13	$0,00		EN EJECUCION	0/01/1900	5/01/1900	0	5	-5		x
SM	1	2	B-C-SM-MZ32-VE-002	50%	Caseta T3	$8.126.190,79	$4.063.095,40	2/06/2022	EN EJECUCION	2/06/2022	10/06/2022	0	8	-8		x
SM	1	3	B-C-SM-MZ32-VE-003	50%	Caseta T3	$7.914.431,13	$3.957.215,57	4/06/2022	EN EJECUCION	4/06/2022	12/06/2022	0	8	-8		x
SM	1	4	B-C-SM-MZ18-VE-004	50%	Adecuacion	$7.372.105,35	$3.686.052,68	4/06/2022	EN EJECUCION	4/06/2022	8/06/2022	0	4	-4		x
SM	1	5	B-C-SM-MZ22-VE-005	52%	Adecuacion	$7.148.052,07	$3.716.987,08	4/06/2022	EN EJECUCION	4/06/2022	7/06/2022	0	3	-3		x
SM	1	6	B-C-SM-MZ34-VE-006	50%	Adecuacion	$7.464.125,94	$3.732.062,97	4/06/2022	EN EJECUCION	4/06/2022	8/06/2022	0	4	-4		x
SM	1	7	B-C-SM-MZ22-VE-007	50%	Adecuacion	$7.159.479,30	$3.579.739,65	4/06/2022	EN EJECUCION	4/06/2022	9/06/2022	0	5	-5		x
SM	1	9	B-C-SM-MZ22-VE-009	50%	Caseta T3	$7.908.010,60	$3.954.005,30	4/06/2022	EN EJECUCION	4/06/2022	8/06/2022	0	4	-4		x
SM	1	10	B-C-SM-MZ21-VE-010	52%	Caseta T3	$8.928.931,81	$4.643.044,54	4/06/2022	EN EJECUCION	4/06/2022	9/06/2022	0	5	-5		x
SM	1	11	B-C-SM-MZ22-VE-011	50%	Adecuacion	$7.911.551,76	$3.955.775,88	8/06/2022	EN EJECUCION	8/06/2022	16/06/2022	0	8	-8		x
SM	1	12	B-C-SM-MZ34-VE-012	50%	Caseta T3	$8.997.603,49	$4.498.801,75	4/06/2022	EN EJECUCION	4/06/2022	9/06/2022	0	5	-5		x
SM	1	13	B-C-SM-MZ21-VE-013	50%	Adecuacion	$5.406.646,10	$2.703.323,05	2/06/2022	EN EJECUCION	2/06/2022	6/06/2022	0	4	-4		x
SM	1	14	B-C-SM-MZ21-VE-014	52%	Caseta T3	$8.562.948,93	$4.452.733,44	4/06/2022	EN EJECUCION	4/06/2022	10/06/2022	0	6	-6		x
SM	1	15	B-C-SM-MZ21-VE-015	55%	Caseta T3	$8.265.079,43	$4.545.793,69	2/06/2022	EN EJECUCION	2/06/2022	7/06/2022	0	5	-5		x
SM	1	16	B-C-SM-MZ21-VE-016	55%	Caseta T3	$9.248.106,91	$5.086.458,80	2/06/2022	EN EJECUCION	2/06/2022	8/06/2022	0	6	-6		x
SM	1	17	B-C-SM-MZ38-VE-017	55%	Caseta T3	$8.481.195,82	$4.664.657,70	2/06/2022	EN EJECUCION	2/06/2022	7/06/2022	0	5	-5		x
SM	2	18	B-C-SM-MZ24-VE-018	50%	Caseta T3	$8.450.841,17	$4.225.420,59	5/06/2022	EN EJECUCION	5/06/2022	9/06/2022	0	4	-4		x
SM	1	19	B-C-SM-MZ24-VE-019	50%	Adecuacion	$6.395.588,06	$3.197.794,03	5/06/2022	EN EJECUCION	5/06/2022	10/06/2022	0	5	-5		x
SM	1	20	B-C-SM-MZ24-VE-020	50%	Adecuacion	$4.593.449,33	$2.296.724,67	5/06/2022	EN EJECUCION	5/06/2022	13/06/2022	0	8	-8		x
SM	2	21	B-C-SM-MZ85-VE-021	50%	Caseta T3	$8.614.688,02	$4.307.344,01	5/06/2022	EN EJECUCION	5/06/2022	14/06/2022	0	9	-9		x
SM	2	22	B-C-SM-MZ85-VE-022	50%	Caseta T3	$8.896.124,14	$4.448.062,07	5/06/2022	EN EJECUCION	5/06/2022	9/06/2022	0	4	-4		x
SM	1	23	B-C-SM-MZ85-VE-023	55%	Adecuacion	$7.191.930,35	$3.955.561,69	5/06/2022	EN EJECUCION	5/06/2022	10/06/2022	0	5	-5		x
SM	1	24	B-C-SM-MZ29-VE-024	50%	Adecuacion	$6.084.490,07	$3.042.245,04	5/06/2022	EN EJECUCION	5/06/2022	10/06/2022	0	5	-5		x
SM	2	25	B-C-SM-MZ31-VE-025	50%	Caseta T3	$8.637.204,10	$4.318.602,05	5/06/2022	EN EJECUCION	5/06/2022	9/06/2022	0	4	-4		x
SM	1	26	B-C-SM-MZ31-VE-026	55%	Adecuacion	$4.822.827,41	$2.652.555,08	5/06/2022	EN EJECUCION	5/06/2022	14/06/2022	0	9	-9		x
SM	1	27	B-C-SM-MZ31-VE-027	50%	Adecuacion	$4.365.339,96	$2.182.669,98	5/06/2022	EN EJECUCION	5/06/2022	9/06/2022	0	4	-4		x
SM	2	28	B-C-SM-MZ31-VE-028	50%	Adecuacion	$7.668.943,14	$3.834.471,57	5/06/2022	EN EJECUCION	5/06/2022	8/06/2022	0	3	-3		x
SM	2	29	B-C-SM-MZ31-VE-029	50%	Caseta T3	$8.468.136,75	$4.234.068,38	5/06/2022	EN EJECUCION	5/06/2022	9/06/2022	0	4	-4		x
SM	1	30	B-C-SM-MZ31-VE-030	51%	Adecuacion	$4.637.820,17	$2.365.288,29	5/06/2022	EN EJECUCION	5/06/2022	11/06/2022	0	6	-6		x
																x

Córdoba

Bolívar



26° ↙ 10 km/h

Cubierto, tormenta

Hora observación 07:15

Días | Por horas | Más info | Fin de semana | Próxima semana >

	Hoy 7 Jun	Mañana 8 Jun	Jue 9 Jun	Vie 10 Jun	Sáb 11 Jun	Dom 12 Jun	Lun 13 Jun
	↑ 30° ↓ 23°	↑ 29° ↓ 23°	↑ 30° ↓ 23°	↑ 31° ↓ 24°	↑ 29° ↓ 24°	↑ 28° ↓ 24°	↑ 28° ↓ 24°
08:00	27°	25°	25°	25°	25°	25°	24°
14:00	30°	29°	30°	31°	29°	28°	28°
20:00	25°	25°	25°	25°	25°	25°	25°
Lluvias	17.4 mm	17.3 mm	19.6 mm	15.6 mm	12.8 mm	14 mm	7.2 mm

PLANILLA DE
CONDICIONES DE SALUD COVID 19

LUGAR DE TRABAJO	CONSORCIO CONSTRUREDES

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO	FECHA	ESTADO DE SALUD INICIAL (CS, SS)	ESTADO DE SALUD ALEATORIO (CS,SS)	ESTADO DE SALUD FINAL (CS,SS)	FIRMA DE QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO
Jose M florez	1049.452936	06-06-22	SS	SS	SS	Rafael
Alvaro Valeth	1049.452.096	06-06-22	SS	SS	SS	Rafael
Alvaro sanchez	73.315.286	06-06-22	SS	SS	SS	Rafael
Javier Galvan	1.049.453.627	06-06-22	SS	SS	SS	Rafael
Yulder Vergara	1049.452.632	06-06-22	SS	SS	SS	Rafael
Genky Alvarez	10.774.359	06-06-22	SS	SS	SS	Rafael
Edgar Blanco	15.672.378	06-06-22	SS	SS	SS	Rafael
Heider Pineda	1.049.453.497	06-06-22	SS	SS	SS	Rafael
Yeison escobar	1049.452.239	06-06-22	SS	SS	SS	Rafael
Sandro gonzales	1.049.453.942	06-06-22	SS	SS	SS	Rafael
Jesus Valeth	1.049.453.345	06-06-22	SS	SS	SS	Rafael
Feiber Rivera	73.316.976	06-06-22	SS	SS	SS	Rafael

Indicaciones de formato	Se debe diligenciar diariamente por la persona asignada (Responsable de obra, Brigadista, Auxiliar SST, Responsable SG SST, Gerente), el formato debe permanecer en la obra o lugar de trabajo y solo deberá ser entregado al responsable del SG SST para la revisión.
	El estado de salud corresponde a CS (con síntomas) o SS (Sin síntomas) esto refiere a los síntomas relacionados con el COVID 19 (Fiebre, Dolor de garganta, congestión nasal, Tos, Dificultad para respirar, Fatiga, Escalofrío, Dolor muscular) en caso de que el colaborador presente alguno de estos síntomas deberá ser llevado al área de salud asignada para la atención e informar al SST

Escaneado con CamScanner

	PLANILLA DE CONDICIONES DE SALUD COVID 19
LUGAR DE TRABAJO	CONSORCIO CONSTRUREDES

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO	FECHA	ESTADO DE SALUD INICIAL (CS, SS)	ESTADO DE SALUD ALEATORIO (CS,SS)	ESTADO DE SALUD FINAL (CS,SS)	FIRMA DE QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO
Jose M flores	1049452936	07-06-22	SS	SS	SS	
Alvaro Valeth	1049.452.096	07-06-22	SS	SS	SS	
Alvaro sanchez	73.315.286	07-06-22	SS	SS	SS	
Javier Galvan	1.049.453.627	07-06-22	SS	SS	SS	
Yulder Vergara	1049.452.632	07-06-22	SS	SS	SS	
Genky Alvarez	10.774.359	07-06-22	SS	SS	SS	
Edgar Blanco	15.672.378	07-06-22	SS	SS	SS	
Heider Pineda	1.049.453.497	07-06-22	SS	SS	SS	
Yeison escobar	1049.452.239	07-06-22	SS	SS	SS	
Sandro gonzales	1.049.453.942	07-06-22	SS	SS	SS	
Jesus Valeth	1.049.453.345	07-06-22	SS	SS	SS	
Feiber Rivera	73.316.976	07-06-22	SS	SS	SS	

Indicaciones de formato	Se debe diligenciar diariamente por la persona asignada (Responsable de obra, Brigadista, Auxiliar SST, Responsable SG SST, Gerente), el formato debe permanecer en la obra o lugar de trabajo y solo deberá ser entregado al responsable del SG SST para la revisión.
	El estado de salud corresponde a CS (con síntomas) o SS (Sin síntomas) esto refiere a los síntomas relacionados con el COVID 19 (Fiebre, Dolor de garganta, congestión nasal, Tos, Dificultad para respirar, Fatiga, Escalofrío, Dolor muscular) en caso de que el colaborador presente alguno de estos síntomas deberá ser llevado al área de salud asignada para la atención e informar al SST

Escaneado con CamScanner

PLANILLA DE
CONDICIONES DE SALUD COVID 19

LUGAR DE TRABAJO	CONSORCIO CONSTRUREDES

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO	FECHA	ESTADO DE SALUD INICIAL (CS, SS)	ESTADO DE SALUD ALEATORIO (CS,SS)	ESTADO DE SALUD FINAL (CS,SS)	FIRMA DE QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO
Jose M florez	1049452936	08-06-22	SS	SS	SS	
Alvaro Valeth	1049.452.096	08-06-22	SS	SS	SS	
Alvaro sanchez	73.315.286	08-06-22	SS	SS	SS	
Javier Galvan	1.049.453.627	08-6-22	SS	SS	SS	
Yoldor Vergara	1049.452.632	08-6-22	SS	SS	SS	
Genky Alvarez	10.774.359	08-6-22	SS	SS	SS	
Edgar Blanco	15.672.378	8-6-22	SS	SS	SS	
Heidor Pineda	1.049.453.447	8-6-22	SS	SS	SS	
Yeison escobar	1049.452.239	8-6-22	SS	SS	SS	
Sandro gonzales	1.049.453.942	8-6-22	SS	SS	SS	
Jesus Valeth	1.049.453.345	8-6-22	SS	SS	SS	
Feiber Rivera	73.316.976	8-6-22	SS	SS	SS	
						1

Indicaciones de formato	Se debe diligenciar diariamente por la persona asignada (Responsable de obra, Brigadista, Auxiliar SST, Responsable SG SST, Gerente), el formato debe permanecer en la obra o lugar de trabajo y este deberá ser entregado al responsable del SG SST para la revisión
	El estado de salud corresponde a CS (con síntomas) o SS (Sin síntomas) esto refiere a los síntomas relacionados con el COVID 19 (Fiebre, Dolor de garganta, congestión nasal, Tos, Dificultad para respirar, Fatiga, Escalofrío, Dolor muscular) en caso de que el colaborador presente alguno de estos síntomas deberá ser llevado al área de salud asignada para la atención e informar al SST

Escaneado con CamScanner

	PLANILLA DE CONDICIONES DE SALUD COVID 19
LUGAR DE TRABAJO	CONSORCIO CONSTRUREDES

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO	FECHA	ESTADO DE SALUD INICIAL (CS, SS)	ESTADO DE SALUD ALEATORIO (CS,SS)	ESTADO DE SALUD FINAL (CS,SS)	FIRMA DE QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO
Jose M florez	1049452936	9-6-22	SS	SS	SS	
Alvaro Valeth	1049.452.096	9-6-22	SS	SS	SS	
Alvaro sanchez	73.315.286	9-6-22	SS	SS	SS	
Javier Galvan	1.049.453.627	9-6-22	SS	SS	SS	
Yulder Vergara	1049.452.632	9-6-22	SS	SS	SS	
Genky Alvarez	10.774.359	9-6-22	SS	SS	SS	
Edgar Blanco	15.672.378	9-6-22	SS	SS	SS	
Heider Pineda	1.049.453.497	9-6-22	SS	SS	SS	
yeison escobar	1049.452.239	9-6-22	SS	SS	SS	
Sandro gonzales	1.049.453.942	9-6-22	SS	SS	SS	
Jesus Valeth	1.049.453.345	9-6-22	SS	SS	SS	
feiber rivera	73.316.976	9-6-22	SS	SS	SS	

Indicaciones de formato	Se debe diligenciar diariamente por la persona asignada (Responsable de obra, Brigadista, Auxiliar SST, Responsable SG SST, Gerente), el formato debe permanecer en la obra o lugar de trabajo y solo deberá ser entregado al responsable del SG SST para la revisión.
	El estado de salud corresponde a CS (con síntomas) o SS (Sin síntomas) esto refiere a los síntomas relacionados con el COVID 19 (Fiebre, Dolor de garganta, congestión nasal, Tos, Dificultad para respirar, Fatiga, Escalofrío, Dolor muscular) en caso de que el colaborador presente alguno de estos síntomas deberá ser llevado al área de salud asignada para la atención e informar al SST

Escaneado con CamScanner

	PLANILLA DE CONDICIONES DE SALUD COVID 19
LUGAR DE TRABAJO	CONSORCIO CONSTRUREDES

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO	FECHA	ESTADO DE SALUD INICIAL (CS, SS)	ESTADO DE SALUD ALEATORIO (CS,SS)	ESTADO DE SALUD FINAL (CS,SS)	FIRMA DE QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO
Jose M florez	1049.452936	10-06-22	SS	SS	SS	
Alvaro Valeth	1049.452.096	10-6-22	SS	SS	SS	
Alvaro sanchez	73.315.286	10-6-22	SS	SS	SS	
Javier Galvan	1.049.453.627	10-6-22	SS	SS	SS	
Yulder Vergara	1049.452.632	10-6-22	SS	SS	SS	
Genky Alvarez	10.774.359	10-6-22	SS	SS	SS	
Edgar Blanco	15.672.378	10-6-22	SS	SS	SS	
Heider Pineda	1.049.453.497	10-6-22	SS	SS	SS	
Yeison escobar	1049.452.239	10-6-22	SS	SS	SS	
Sandro gonzales	1.049.453.942	10-6-22	SS	SS	SS	
Jesus Valeth	1.049.453.345	10-6-22	SS	SS	SS	
Feiber Rivera	73.316.976	10-6-22	SS	SS	SS	

Indicaciones de formato	Se debe diligenciar diariamente por la persona asignada (Responsable de obra, Brigadista, Auxiliar SST, Responsable SG SST, Gerente), el formato debe permanecer en la obra o lugar de trabajo y solo deberá ser entregado al responsable del SG SST para la revisión.
	El estado de salud corresponde a CS (con síntomas) o SS (Sin síntomas) esto refiere a los síntomas relacionados con el COVID 19 (Fiebre, Dolor de garganta, congestión nasal, Tos, Dificultad para respirar, Fatiga, Escalofrío, Dolor muscular) en caso de que el colaborador presente alguno de estos síntomas deberá ser llevado al área de salud asignada para la atención e informar al SST

Escaneado con CamScanner

	PLANILLA DE CONDICIONES DE SALUD COVID 19
LUGAR DE TRABAJO	CONSORCIO CONSTRUREDES

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO	FECHA	ESTADO DE SALUD INICIAL (CS, SS)	ESTADO DE SALUD ALEATORIO (CS,SS)	ESTADO DE SALUD FINAL (CS,SS)	FIRMA DE QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO
Jose M flores	1049452936	11-6-22	SS	SS	SS	
Alvaro Valeth	1049.452.096	11-6-22	SS	SS	SS	
Alvaro sanchez	73.315.286	11-6-22	SS	SS	SS	
Javier Galvan	1.049.453.627	11-6-22	SS	SS	SS	
Yulder Vergara	1049.452.632	11-6-22	SS	SS	SS	
GENKY ALVAREZ	10.774.359	11-6-22	SS	SS	SS	
Edgar Blanco	15.672.378	11-6-22	SS	SS	SS	
Heider Pineda	1.049.453.497	11-6-22	SS	SS	SS	
Yeison escobar	1049.452.239	11-6-22	SS	SS	SS	
Sandro gonzales	1049.453.942	11-6-22	SS	SS	SS	
Jesus Valeth	1.049.453.345	11-6-22	SS	SS	SS	
Feiber Rivera	73.316.976	11-6-22	SS	SS	SS	

Indicaciones de formato	Se debe diligenciar diariamente por la persona asignada (Responsable de obra, Brigadista, Auxiliar SST, Responsable SG SST, Gerente), el formato debe permanecer en la obra o lugar de trabajo y solo deberá ser entregado al responsable del SG SST para la revisión.
	El estado de salud corresponde a CS (con síntomas) o SS (Sin síntomas) esto refiere a los síntomas relacionados con el COVID 19 (Fiebre, Dolor de garganta, congestión nasal, Tos, Dificultad para respirar, Fatiga, Escalofrío, Dolor muscular) en caso de que el colaborador presente alguno de estos síntomas deberá ser llevado al área de salud asignada para la atención e informar al SST

Escaneado con CamScanner

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 16/06/2022
HORA: 1:20:38 p. m.
20224300229372

ADMON

Bogotá D.C, 16 de junio de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-046-22

Señores:
Ingeniera
Karol Yulieth Javela
Supervisora
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio
Calle 26 # 13-19 Piso 20
Bogotá. Colombia

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: ENTREGA INFORME SEMANAL No. 6

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales remitimos informe semanal No. 6 cuyo periodo es del 30 de mayo del 2022 hasta 05 de junio del 2022.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.

FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA
Anexo: 12 folios
Proyectó: Ing. Marcy Correa – Directora de Interventoría.

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 6	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 001

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **30/05/2022** al **5/06/2022** | Fecha **5/06/2022**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO PROYECTO	
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** BOLÍVAR — **MUNICIPIO** CÓRDOBA
GERENCIA A CARGO	ENTERRITORIO
SUPERVISOR	KAROL YULIETH JAVELA PEREZ
ESTADO DEL PROYECTO	EN EJECUCIÓN ACTIVIDAD 1

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2220576
Contratista	CONSORCIO CONSTRUREDES
Valor inicial	$ 1.771.707.945,99
Valor actual	$ 1.771.707.945,99
Variación del valor	$ -
Fecha de Inicio	26/04/2022
Plazo inicial (Días)	150 Días
Plazo actual (Días)	150 Días — 5 MESES - 150 DIAS
Variación en plazo	Días
Fecha Contractual de terminación	26/09/2022
Tiempo Transcurrido (días)	40 — 26,67%
Días remanentes del Contrato	113,00 — 75,33%
Acumulado a última acta pagada	
Estimado ejecutado por llevar a acta	

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.	2220587
Interventor	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS.
Valor inicial	$ 202.479.313,00
Valor actual	$ 202.479.313,00
Variación del valor	$ -
Fecha de Inicio	26/04/2022
Plazo inicial	150 Días
Plazo actual	150 Días — 5 MESES - 150 DIAS
Variación en plazo	Días
Fecha Contractual de terminación	26/09/2022
Ejecución del Contrato	40 — 26,67%
Días remanentes del Contrato	113,00 — 75,33%
Acumulado a última acta pagada	
Estimado ejecutado por llevar a acta	

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPENO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 1.771.707.945,99

Semáforo

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 123.302.346,55	6,96%	$ 35.434.158,92	2,00%	-$ 87.868.187,63	-4,96%
Durante el Periodo	$ 100.951.407,00	5,70%	$ 56.639.457,95	3,20%	-$ 44.311.949,05	-2,50%
Acumulado a la Fecha	**$ 224.253.753,55**	**12,66%**	**$ 92.073.616,87**	**5,20%**	**-$ 132.180.136,68**	**-7,46%**


Desviación en días: **11 Días**




Observaciones al desempeño del proyecto:

NOTA: A PARTIR DE ESTE INFORME SE REAJUSTAN LOS COMPONETES DE LOS DATOS DE LA CURVA DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO – (CURVA S) TENIENDO EN CUENTA LA REPROGRAMACION ESTIPULADA EN PLAN DE CONTINGENCIA.Y APROBADA POR LA INTERVENTORIA.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

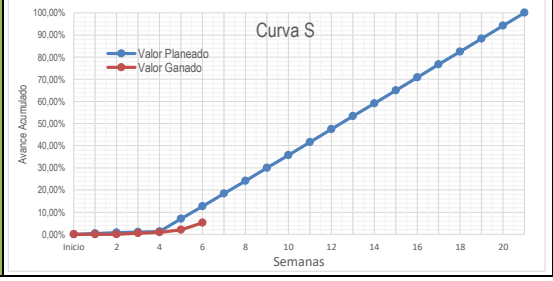




CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado %	Ejecutado %	Desviación %	Semáforo
Acumulado Anterior	6,96%	2,00%	-4,96%	
Durante el Periodo	5,70%	3,20%	-2,50%	
Acumulado a la Fecha	**12,66%**	**5,20%**	**-7,46%**	

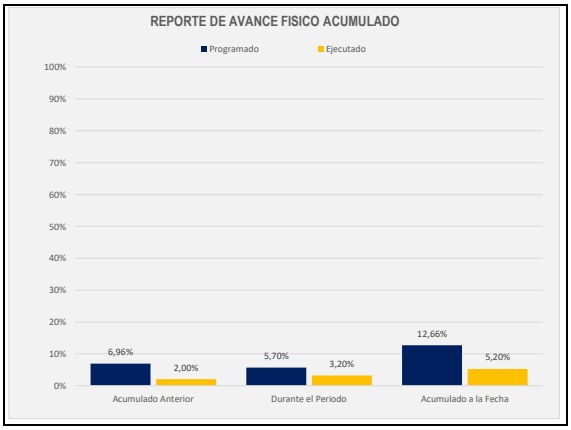


AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 1.771.707.945,99	$ 1.771.707.945,99	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
		0,00%			0,00%		








AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 202.479.313,00	$ 202.479.313,00	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
		0,00%			0,00%		







enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 6	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 001

Entidad Contratante: ENTERRITORIO | Semana del 30/05/2022 al 5/06/2022 | Fecha 5/06/2022

OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

La programación de obra nos muestra los siguientes avances generales para el proyecto, un programado del 13% frente a un ejecutado del 6%, estos avances de discriminan por actividades como se muestra a continuación:
programación vs ejecución:
ACTIVIDAD No. 1PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: Actividad No. 1, la aprobación de la actividad N° 1 se hizo comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-037-22 del 3 de Junio de 2022
ACTIVIDAD No. 2
PROGRAMADO 48,39% vs EJECUTADO 13,82%
Comentario: La Actividad N° 2 presenta un atraso del 34,57%, por lo cual el Contratista debe reforzar esta actividad con el fin de cumplir con las metas establecidas en la programación, la Interventoría solicitará al Contratista agilizar la entrega de diagnósticos para aprobación
CTIVIDAD No. 3
PROGRAMADO 11,58% vs 4,72 EJECUTADO %
Comentario: La Actividad N° 3 presenta un atraso del 6,86%, sólo se han iniciado 6 viviendas de las 24 que deberían estar en ejecución, sin embargo, el contratista ha hecho entrega los materiales de construcción en las 24 viviendas.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

En el ítem ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10. El contratista subsano los diseños de las casetas y el diseño de la estructura para el tanque elevado, también realizo entrega del informe técnico especialista estructural el cual fue aprobado por la interventoría con lo cual esta actividad queda en un 100% de su ejecución.
El ítem ACTIVIDAD 2: DIAGNOSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. Esta actividad avanza con el diligenciamiento de los diagnósticos de los cuales ya se sometieron a comité de aprobación el primer paquete de 30 los cuales fueron aprobados por la interventoría, se espera que el contratista redoble esfuerzos y reduzca el atraso presentado la próxima semana 70 diagnósticos para someter a comité de aprobación.
En el ítem ACTIVIDAD 3: EJECUCION DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS. ACTA DE ENTREGA Y RECIBOS DE LAS OBRAS
A la fecha y de acuerdo al cronograma de actividades el contratista debería tener en proceso constructivo 24viviendas y sin embargo solo inicio labores de ejecución de obra en 6 viviendas.
El contratista realizo suministro de materiales a 24 viviendas en el transcurso de este periodo tales como: cemento, acero, alambre, tubería hidráulica y sanitaria, bloques para la mampostería, también conformo los frentes de trabajo con los maestros de obra y ayudantes de albañilería.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

La próxima semana correspondiente al periodo del 6 al 12 de junio 2022 De acuerdo a la programación de obra se debe efectuar la semana 7 de diagnósticos que corresponde a:
La entrega de 165 diagnósticos que corresponden al 76% de esta actividad.
El contratista debe iniciar con la ejecución de obra efectuando la intervención en 18 viviendas de acuerdo a la programación.
Por lo cual la interventoría le recomendó el incremento de frentes de trabajo para efectuar trabajos contractivos en un mayor número de viviendas.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTIÓN SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0

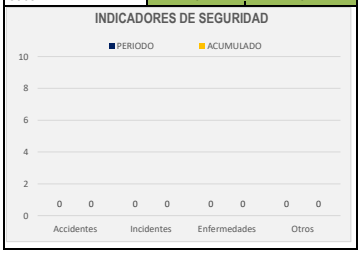

Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	7	0	7	50,0%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	7	0	7	50,0%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál?	0	0	0	0,0%
	Total	14	0	14	100,00%



OBSERVACIONES

En el presente periodo no se presentaron lluvias ni contratiempos por causa de cortes eléctricos.

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
	N/A					
	31/05/2022	CASA DE LA CULTURA	7,00	Acompañamiento a las actividades a ejecutar por parte del Proyecto	Comité Veedor	hasta finalizar contrato

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
PETICIÓN	Jose Gregorio Martinez Meza	1/06/2022	SOLCITUD DE INFORMACION DEL PROYECTO	CONTRATISTA
INCLUSIÓN 13	Donairo Escobar Romero	2/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSIÓN	CONTRATISTA
INCLUSIÓN 14	Maria Tejedor Pajaro	2/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSIÓN	CONTRATISTA
INCLUSIÓN 15	Beatriz Ochoa Piña	2/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSIÓN	CONTRATISTA
INCLUSIÓN 16	Ana Isabel Ortega Bohorquez	2/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSIÓN	CONTRATISTA
INCLUSIÓN 17	Digna Ortega Bohorquez	2/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSIÓN	CONTRATISTA
INCLUSIÓN 18	Luz Estela Paternina Escobar	2/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSIÓN 19	Esther Idalvi Lozano Esquea	2/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSIÓN 20	Gregoria Esther Paternina Escobar	2/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA

enterritorio	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 6**	CÓDIGO:	**F-GG-06**
		VERSIÓN:	**1**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 001

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **30/05/2022** al **5/06/2022** Fecha **5/06/2022**

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



REPLANTEO PARA CONSTRUCCION CASETA TIPO 3



REPLANTEO PARA CONSTRUCCION CASETA TIPO 3



EXCAVACION PARA CONSTRUCCION CASETA TIPO 3



RECORRIDO CON FUNCIONARIO DE COOSEPCOR PARA VERIFICAR DISPONIBILIDAD DE REDES



ATENCION A LIDER DE LA CUMUNIDAD



CENTRO DE ACOPIO DE MATERIALES PETREOS Y MAMPOSTERIA



ACOPIO DE MATERIALES PETREOS

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

El contratista remite OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_035 Por medio del cual presenta hoja de vida para el cambio de profesional en Diagnósticos, para su revisión y aprobación
La interventoría emite oficio RESPUESTA A OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_035 informando que el profesional presentado para el cargo de Profesional Costos y Presupuestos, responsable de la revisión o elaboración de presupuestos en proyectos de obra civil, no cumple para el cargo asignado ya que no se aportan certificaciones específicas para la labor indicada.
El contratista remite OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_039 Por medio de la presente se solicita la gestión de la interventoría con la Empresa prestadora del servicio público de acueducto y alcantarillado, COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CÓRDOBA BOLÍVAR, (COOSEPCOR LTDA),Para La Expedición Del Certificado De Autorización para La Intervención De Conexión de las acometidas domiciliarias de acueducto y alcantarillado para Veinticuatro (24) Diagnósticos del Barrio San Martin, aprobados por la Interventoría en comité de aprobación del día 27 de Mayo del presente Año para la intervención del Programa.
La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-015-22 con el Tema: SOLICITUD DE TRÂMITE DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VEITICUATRO (24) DIAGNÓSTICOS APROBADOS DEL BARRIO SAN MARTIN - CONTRATO: No. 2220576 – CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES OBJETO: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005).
La empresa prestadora de servicios públicos COOSEPCOR LTDA emite oficio con REFERENCIA: respuesta a solitud de trámite de expedición de certificados de autorización de conexión de acometidas domiciliarias de acueducto y alcantarillado. por medio de la presente informó que, realizadas las visitas a las viviendas relacionadas en la solicitud, COOSEPCOR LTDA., certifica que estas mismas se encuentran aptas para intervención del programa en cuanto a redes de acueducto y alcantarillado.

Marcy A. Correa C		Karol Javela	
Firma		**Firma**	
Nombre	Marcy Correa	Nombre	Karol Yulieth Javela Pérez
	Directora de la interventoría	Supervisor	Supervisor ENTerritorio

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

PROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Fin	Predeceso	Sucesoras	Costo	Nombres de los recursos	% completado	%Programado
1		**CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO,**			**132 días**	**mar 26/04/22**	**lun 26/09/22**			**$ 1.771.707.945,99**		**6%**	**13%**
2		**ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACION DE DISEÑO DE LOS**			**14 días**	**mar 26/04/22**	**mié 11/05/22**			**$ 5.140.026,35**		**100%**	**100%**
3		CHEQUEO Y VALIDACION DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE	GL	1	14 días	mar 26/04/22	mié 11/05/22		5CC;253CC	$ 5.140.026,35		100%	100%
4		**ACTIVIDAD 2: DIAGNOSTICO, VALIDACION PRELIMINAR,**			**53 días**	**mar 26/04/22**	**sáb 25/06/22**			**$ 39.313.349,11**		**53%**	**66%**
5		DIAGNOSTICOS SEMANA 1	UND	20	7 días	mar 26/04/22	mar 3/05/22	3CC	6	$ 3.623.350,15		100%	100%
6		DIAGNOSTICOS SEMANA 2	UND	20	7 días	mié 4/05/22	mié 11/05/22	5	7	$ 3.623.350,15		80%	100%
7		DIAGNOSTICOS SEMANA 3	UND	25	6 días	jue 12/05/22	mié 18/05/22	6	8	$ 4.529.187,69		80%	100%
8		DIAGNOSTICOS SEMANA 4	UND	30	6 días	jue 19/05/22	mié 25/05/22	7	9;26;15;16;17;18;19	$ 5.435.025,22		70%	100%
9		DIAGNOSTICOS SEMANA 5	UND	30	6 días	jue 26/05/22	mié 1/06/22	8	10	$ 5.435.025,22		70%	100%
10		DIAGNOSTICOS SEMANA 6	UND	30	7 días	jue 2/06/22	jue 9/06/22	9	11	$ 5.435.025,22		35%	43%
11		DIAGNOSTICOS SEMANA 7	UND	30	7 días	vie 10/06/22	vie 17/06/22	10	12	$ 5.435.025,22		0%	0%
12		DIAGNOSTICOS SEMANA 8	UND	32	7 días	sáb 18/06/22	sáb 25/06/22	11	196	$ 5.797.360,24		0%	0%
13		**ACTIVIDAD 3: EJECUCION DE LAS OBRAS DE LAS**			**106 días**	**jue 26/05/22**	**lun 26/09/22**			**$ 1.727.254.570,53**		**1%**	**8%**
14		**MES 1 (48 VIVIENDAS)**			**24 días**	**jue 26/05/22**	**mié 22/06/22**			**$ 382.065.527,04**		**6%**	**37%**
15		INTERVENCION N°1	UND	1	6 días	jue 26/05/22	mié 1/06/22	8	28	$ 7.959.698,48		0%	100%
16		INTERVENCION N°2	UND	1	6 días	jue 26/05/22	mié 1/06/22	8	29	$ 7.959.698,48		20%	100%
17		INTERVENCION N°3	UND	1	6 días	jue 26/05/22	mié 1/06/22	8	30	$ 7.959.698,48		10%	100%
18		INTERVENCION N°4	UND	1	6 días	jue 26/05/22	mié 1/06/22	8	31	$ 7.959.698,48		10%	100%
19		INTERVENCION N°5	UND	1	6 días	jue 26/05/22	mié 1/06/22	8	32	$ 7.959.698,48		10%	100%
20		INTERVENCION N°6	UND	1	6 días	jue 26/05/22	mié 1/06/22	8	33	$ 7.959.698,48		10%	100%
21		INTERVENCION N°7	UND	1	6 días	jue 26/05/22	mié 1/06/22	8	34	$ 7.959.698,48		10%	100%
22		INTERVENCION N°8	UND	1	6 días	jue 26/05/22	mié 1/06/22	8	35	$ 7.959.698,48		10%	100%
23		INTERVENCION N°9	UND	1	6 días	jue 26/05/22	mié 1/06/22	8	36	$ 7.959.698,48		10%	100%
24		INTERVENCION N°10	UND	1	6 días	jue 26/05/22	mié 1/06/22	8	37	$ 7.959.698,48		10%	100%
25		INTERVENCION N°11	UND	1	6 días	jue 26/05/22	mié 1/06/22	8	38	$ 7.959.698,48		10%	100%
26		INTERVENCION N°12	UND	1	6 días	jue 26/05/22	mié 1/06/22	8	27CC+5 días;39	$ 7.959.698,48		10%	100%
27		ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (1 -	UND	12	1 día	mié 1/06/22	mié 1/06/22	26CC+5	28;29;30;31;32;33;3	$ 0,00		0%	100%
28		INTERVENCION N°13	UND	1	6 días	jue 2/06/22	mié 8/06/22	27;15	41	$ 7.959.698,48		20%	50%
29		INTERVENCION N°14	UND	1	6 días	jue 2/06/22	mié 8/06/22	27;16	42	$ 7.959.698,48		20%	50%
30		INTERVENCION N°15	UND	1	6 días	jue 2/06/22	mié 8/06/22	27;17	43	$ 7.959.698,48		20%	50%
31		INTERVENCION N°16	UND	1	6 días	jue 2/06/22	mié 8/06/22	27;18	44	$ 7.959.698,48		20%	50%
32		INTERVENCION N°17	UND	1	6 días	jue 2/06/22	mié 8/06/22	27;19	45	$ 7.959.698,48		10%	50%
33		INTERVENCION N°18	UND	1	6 días	jue 2/06/22	mié 8/06/22	27;20	46	$ 7.959.698,48		10%	50%
34		INTERVENCION N°19	UND	1	6 días	jue 2/06/22	mié 8/06/22	27;21	47	$ 7.959.698,48		10%	50%
35		INTERVENCION N°20	UND	1	6 días	jue 2/06/22	mié 8/06/22	27;22	48	$ 7.959.698,48		10%	50%
36		INTERVENCION N°21	UND	1	6 días	jue 2/06/22	mié 8/06/22	27;23	49	$ 7.959.698,48		10%	50%
37		INTERVENCION N°22	UND	1	6 días	jue 2/06/22	mié 8/06/22	27;24	50	$ 7.959.698,48		10%	50%
38		INTERVENCION N°23	UND	1	6 días	jue 2/06/22	mié 8/06/22	27;25	51	$ 7.959.698,48		10%	50%

PROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Fin	Predeceso	Sucesoras	Costo	Nombres de los recursos	% completado	%Programado
39		INTERVENCION N°24	UND	1	6 días	jue 2/06/22	mié 8/06/22	27;26	40CC+5 días;52	$ 7.959.698,48		10%	50%
40		ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (13 -	UND	12	1 día	mié 8/06/22	mié 8/06/22	39CC+5	41;42;43;44;45;46;4	$ 0,00		0%	0%
41		INTERVENCION N°25	UND	1	6 días	jue 9/06/22	mié 15/06/22	40;28	54	$ 7.959.698,48		0%	0%
42		INTERVENCION N°26	UND	1	6 días	jue 9/06/22	mié 15/06/22	40;29	55	$ 7.959.698,48		0%	0%
43		INTERVENCION N°27	UND	1	6 días	jue 9/06/22	mié 15/06/22	40;30	56	$ 7.959.698,48		0%	0%
44		INTERVENCION N°28	UND	1	6 días	jue 9/06/22	mié 15/06/22	40;31	57	$ 7.959.698,48		0%	0%
45		INTERVENCION N°29	UND	1	6 días	jue 9/06/22	mié 15/06/22	40;32	58	$ 7.959.698,48		0%	0%
46		INTERVENCION N°30	UND	1	6 días	jue 9/06/22	mié 15/06/22	40;33	59	$ 7.959.698,48		0%	0%
47		INTERVENCION N°31	UND	1	6 días	jue 9/06/22	mié 15/06/22	40;34	60	$ 7.959.698,48		0%	0%
48		INTERVENCION N°32	UND	1	6 días	jue 9/06/22	mié 15/06/22	40;35	61	$ 7.959.698,48		0%	0%
49		INTERVENCION N°33	UND	1	6 días	jue 9/06/22	mié 15/06/22	40;36	62	$ 7.959.698,48		0%	0%
50		INTERVENCION N°34	UND	1	6 días	jue 9/06/22	mié 15/06/22	40;37	63	$ 7.959.698,48		0%	0%
51		INTERVENCION N°35	UND	1	6 días	jue 9/06/22	mié 15/06/22	40;38	64	$ 7.959.698,48		0%	0%
52		INTERVENCION N°36	UND	1	6 días	jue 9/06/22	mié 15/06/22	40;39	53CC+5 días;65	$ 7.959.698,48		0%	0%
53		ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (25 -	UND	12	1 día	mié 15/06/22	mié 15/06/22	52CC+5	54;55;56;57;58;59;6	$ 0,00		0%	0%
54		INTERVENCION N°37	UND	1	6 días	jue 16/06/22	mié 22/06/22	53;41	68	$ 7.959.698,48		0%	0%
55		INTERVENCION N°38	UND	1	6 días	jue 16/06/22	mié 22/06/22	53;42	69	$ 7.959.698,48		0%	0%
56		INTERVENCION N°39	UND	1	6 días	jue 16/06/22	mié 22/06/22	53;43	70	$ 7.959.698,48		0%	0%
57		INTERVENCION N°40	UND	1	6 días	jue 16/06/22	mié 22/06/22	53;44	71	$ 7.959.698,48		0%	0%
58		INTERVENCION N°41	UND	1	6 días	jue 16/06/22	mié 22/06/22	53;45	72	$ 7.959.698,48		0%	0%
59		INTERVENCION N°42	UND	1	6 días	jue 16/06/22	mié 22/06/22	53;46	73	$ 7.959.698,48		0%	0%
60		INTERVENCION N°43	UND	1	6 días	jue 16/06/22	mié 22/06/22	53;47	74	$ 7.959.698,48		0%	0%
61		INTERVENCION N°44	UND	1	6 días	jue 16/06/22	mié 22/06/22	53;48	75	$ 7.959.698,48		0%	0%
62		INTERVENCION N°45	UND	1	6 días	jue 16/06/22	mié 22/06/22	53;49	76	$ 7.959.698,48		0%	0%
63		INTERVENCION N°46	UND	1	6 días	jue 16/06/22	mié 22/06/22	53;50	77	$ 7.959.698,48		0%	0%
64		INTERVENCION N°47	UND	1	6 días	jue 16/06/22	mié 22/06/22	53;51	78	$ 7.959.698,48		0%	0%
65		INTERVENCION N°48	UND	1	6 días	jue 16/06/22	mié 22/06/22	53;52	66CC+5 días;79;80	$ 7.959.698,48		0%	0%
66		ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (37 -	UND	12	1 día	mié 22/06/22	mié 22/06/22	65CC+5	67;68;69;70;71;72;7	$ 0,00		0%	0%
67		**MES 2 (52 VIVIENDAS)**			**24 días**	**jue 23/06/22**	**mié 20/07/22**	**66**		**$ 413.904.320,96**		**0%**	**0%**
68		INTERVENCION N°49	UND	1	6 días	jue 23/06/22	mié 29/06/22	66;54	82	$ 7.959.698,48		0%	0%
69		INTERVENCION N°50	UND	1	6 días	jue 23/06/22	mié 29/06/22	66;55	83	$ 7.959.698,48		0%	0%
70		INTERVENCION N°51	UND	1	6 días	jue 23/06/22	mié 29/06/22	66;56	84	$ 7.959.698,48		0%	0%
71		INTERVENCION N°52	UND	1	6 días	jue 23/06/22	mié 29/06/22	66;57	85	$ 7.959.698,48		0%	0%
72		INTERVENCION N°53	UND	1	6 días	jue 23/06/22	mié 29/06/22	66;58	86	$ 7.959.698,48		0%	0%
73		INTERVENCION N°54	UND	1	6 días	jue 23/06/22	mié 29/06/22	66;59	87	$ 7.959.698,48		0%	0%
74		INTERVENCION N°55	UND	1	6 días	jue 23/06/22	mié 29/06/22	66;60	88	$ 7.959.698,48		0%	0%
75		INTERVENCION N°56	UND	1	6 días	jue 23/06/22	mié 29/06/22	66;61	89	$ 7.959.698,48		0%	0%
76		INTERVENCION N°57	UND	1	6 días	jue 23/06/22	mié 29/06/22	66;62	90	$ 7.959.698,48		0%	0%

PROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Fin	Predeceso	Sucesoras	Costo	Nombres de los recursos	% completado	%Programado
77		INTERVENCION N°58	UND	1	6 días	jue 23/06/22	mié 29/06/22	66;63	91	$ 7.959.698,48		0%	0%
78		INTERVENCION N°59	UND	1	6 días	jue 23/06/22	mié 29/06/22	66;64	92	$ 7.959.698,48		0%	0%
79		INTERVENCION N°60	UND	1	6 días	jue 23/06/22	mié 29/06/22	66;65	93	$ 7.959.698,48		0%	0%
80		INTERVENCION N°61	UND	1	6 días	jue 23/06/22	mié 29/06/22	66;65	94;81CC+5 días	$ 7.959.698,48		0%	0%
81		ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (49 -	UND	13	1 día	mié 29/06/22	mié 29/06/22	80CC+5	82;83;84;85;86;87;8	$ 0,00		0%	0%
82		INTERVENCION N°62	UND	1	6 días	jue 30/06/22	mié 6/07/22	81;68	96	$ 7.959.698,48		0%	0%
83		INTERVENCION N°63	UND	1	6 días	jue 30/06/22	mié 6/07/22	81;69	97	$ 7.959.698,48		0%	0%
84		INTERVENCION N°64	UND	1	6 días	jue 30/06/22	mié 6/07/22	81;70	98	$ 7.959.698,48		0%	0%
85		INTERVENCION N°65	UND	1	6 días	jue 30/06/22	mié 6/07/22	81;71	99	$ 7.959.698,48		0%	0%
86		INTERVENCION N°66	UND	1	6 días	jue 30/06/22	mié 6/07/22	81;72	100	$ 7.959.698,48		0%	0%
87		INTERVENCION N°67	UND	1	6 días	jue 30/06/22	mié 6/07/22	81;73	101	$ 7.959.698,48		0%	0%
88		INTERVENCION N°68	UND	1	6 días	jue 30/06/22	mié 6/07/22	81;74	102	$ 7.959.698,48		0%	0%
89		INTERVENCION N°69	UND	1	6 días	jue 30/06/22	mié 6/07/22	81;75	103	$ 7.959.698,48		0%	0%
90		INTERVENCION N°70	UND	1	6 días	jue 30/06/22	mié 6/07/22	81;76	104	$ 7.959.698,48		0%	0%
91		INTERVENCION N°71	UND	1	6 días	jue 30/06/22	mié 6/07/22	81;77	105	$ 7.959.698,48		0%	0%
92		INTERVENCION N°72	UND	1	6 días	jue 30/06/22	mié 6/07/22	81;78	106	$ 7.959.698,48		0%	0%
93		INTERVENCION N°73	UND	1	6 días	jue 30/06/22	mié 6/07/22	81;79	107	$ 7.959.698,48		0%	0%
94		INTERVENCION N°74	UND	1	6 días	jue 30/06/22	mié 6/07/22	81;80	108;95CC+5 días	$ 7.959.698,48		0%	0%
95		ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (62 -	UND	13	1 día	mié 6/07/22	mié 6/07/22	94CC+5	96;97;98;99;100;10	$ 0,00		0%	0%
96		INTERVENCION N°75	UND	1	6 días	jue 7/07/22	mié 13/07/22	95;82	110	$ 7.959.698,48		0%	0%
97		INTERVENCION N°76	UND	1	6 días	jue 7/07/22	mié 13/07/22	95;83	111	$ 7.959.698,48		0%	0%
98		INTERVENCION N°77	UND	1	6 días	jue 7/07/22	mié 13/07/22	95;84	112	$ 7.959.698,48		0%	0%
99		INTERVENCION N°78	UND	1	6 días	jue 7/07/22	mié 13/07/22	95;85	113	$ 7.959.698,48		0%	0%
100		INTERVENCION N°79	UND	1	6 días	jue 7/07/22	mié 13/07/22	95;86	114	$ 7.959.698,48		0%	0%
101		INTERVENCION N°80	UND	1	6 días	jue 7/07/22	mié 13/07/22	95;87	115	$ 7.959.698,48		0%	0%
102		INTERVENCION N°81	UND	1	6 días	jue 7/07/22	mié 13/07/22	95;88	116	$ 7.959.698,48		0%	0%
103		INTERVENCION N°82	UND	1	6 días	jue 7/07/22	mié 13/07/22	95;89	117	$ 7.959.698,48		0%	0%
104		INTERVENCION N°83	UND	1	6 días	jue 7/07/22	mié 13/07/22	95;90	118	$ 7.959.698,48		0%	0%
105		INTERVENCION N°84	UND	1	6 días	jue 7/07/22	mié 13/07/22	95;91	119	$ 7.959.698,48		0%	0%
106		INTERVENCION N°85	UND	1	6 días	jue 7/07/22	mié 13/07/22	95;92	120	$ 7.959.698,48		0%	0%
107		INTERVENCION N°86	UND	1	6 días	jue 7/07/22	mié 13/07/22	95;93	121	$ 7.959.698,48		0%	0%
108		INTERVENCION N°87	UND	1	6 días	jue 7/07/22	mié 13/07/22	95;94	122;109CC+5 días	$ 7.959.698,48		0%	0%
109		ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (75 -	UND	13	1 día	mié 13/07/22	mié 13/07/22	108CC+5	110;111;112;113;11	$ 0,00		0%	0%
110		INTERVENCION N°88	UND	1	6 días	jue 14/07/22	mié 20/07/22	109;96	125	$ 7.959.698,48		0%	0%
111		INTERVENCION N°89	UND	1	6 días	jue 14/07/22	mié 20/07/22	109;97	126	$ 7.959.698,48		0%	0%
112		INTERVENCION N°90	UND	1	6 días	jue 14/07/22	mié 20/07/22	109;98	127	$ 7.959.698,48		0%	0%
113		INTERVENCION N°91	UND	1	6 días	jue 14/07/22	mié 20/07/22	109;99	128	$ 7.959.698,48		0%	0%
114		INTERVENCION N°92	UND	1	6 días	jue 14/07/22	mié 20/07/22	109;100	129	$ 7.959.698,48		0%	0%

PROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Fin	Predeceso	Sucesoras	Costo	Nombres de los recursos	% completado	%Programado
115		INTERVENCION N°93	UND	1	6 días	jue 14/07/22	mié 20/07/22	109;101	130	$ 7.959.698,48		0%	0%
116		INTERVENCION N°94	UND	1	6 días	jue 14/07/22	mié 20/07/22	109;102	131	$ 7.959.698,48		0%	0%
117		INTERVENCION N°95	UND	1	6 días	jue 14/07/22	mié 20/07/22	109;103	132	$ 7.959.698,48		0%	0%
118		INTERVENCION N°96	UND	1	6 días	jue 14/07/22	mié 20/07/22	109;104	133	$ 7.959.698,48		0%	0%
119		INTERVENCION N°97	UND	1	6 días	jue 14/07/22	mié 20/07/22	109;105	134	$ 7.959.698,48		0%	0%
120		INTERVENCION N°98	UND	1	6 días	jue 14/07/22	mié 20/07/22	109;106	135	$ 7.959.698,48		0%	0%
121		INTERVENCION N°99	UND	1	6 días	jue 14/07/22	mié 20/07/22	109;107	136	$ 7.959.698,48		0%	0%
122		INTERVENCION N°100	UND	1	6 días	jue 14/07/22	mié 20/07/22	109;108	123CC+5 días;137	$ 7.959.698,48		0%	0%
123		ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (88 -	UND	13	1 día	mié 20/07/22	mié 20/07/22	122CC+5	124;125;126;127;12	$ 0,00		0%	0%
124		**MES 3 (52 VIVIENDAS)**			**24 días**	**jue 21/07/22**	**mié 17/08/22**	**123**		**$ 413.904.320,96**		**0%**	**0%**
125		INTERVENCION N°101	UND	1	6 días	jue 21/07/22	mié 27/07/22	123;110	139	$ 7.959.698,48		0%	0%
126		INTERVENCION N°102	UND	1	6 días	jue 21/07/22	mié 27/07/22	123;111	140	$ 7.959.698,48		0%	0%
127		INTERVENCION N°103	UND	1	6 días	jue 21/07/22	mié 27/07/22	123;112	141	$ 7.959.698,48		0%	0%
128		INTERVENCION N°104	UND	1	6 días	jue 21/07/22	mié 27/07/22	123;113	142	$ 7.959.698,48		0%	0%
129		INTERVENCION N°105	UND	1	6 días	jue 21/07/22	mié 27/07/22	123;114	143	$ 7.959.698,48		0%	0%
130		INTERVENCION N°106	UND	1	6 días	jue 21/07/22	mié 27/07/22	123;115	144	$ 7.959.698,48		0%	0%
131		INTERVENCION N°107	UND	1	6 días	jue 21/07/22	mié 27/07/22	123;116	145	$ 7.959.698,48		0%	0%
132		INTERVENCION N°108	UND	1	6 días	jue 21/07/22	mié 27/07/22	123;117	146	$ 7.959.698,48		0%	0%
133		INTERVENCION N°109	UND	1	6 días	jue 21/07/22	mié 27/07/22	123;118	147	$ 7.959.698,48		0%	0%
134		INTERVENCION N°110	UND	1	6 días	jue 21/07/22	mié 27/07/22	123;119	148	$ 7.959.698,48		0%	0%
135		INTERVENCION N°111	UND	1	6 días	jue 21/07/22	mié 27/07/22	123;120	149	$ 7.959.698,48		0%	0%
136		INTERVENCION N°112	UND	1	6 días	jue 21/07/22	mié 27/07/22	123;121	150	$ 7.959.698,48		0%	0%
137		INTERVENCION N°113	UND	1	6 días	jue 21/07/22	mié 27/07/22	123;122	151;138CC+5 días	$ 7.959.698,48		0%	0%
138		ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (101 -	UND	13	1 día	mié 27/07/22	mié 27/07/22	137CC+5	139;140;141;142;14	$ 0,00		0%	0%
139		INTERVENCION N°114	UND	1	6 días	jue 28/07/22	mié 3/08/22	138;125	153	$ 7.959.698,48		0%	0%
140		INTERVENCION N°115	UND	1	6 días	jue 28/07/22	mié 3/08/22	138;126	154	$ 7.959.698,48		0%	0%
141		INTERVENCION N°116	UND	1	6 días	jue 28/07/22	mié 3/08/22	138;127	155	$ 7.959.698,48		0%	0%
142		INTERVENCION N°117	UND	1	6 días	jue 28/07/22	mié 3/08/22	138;128	156	$ 7.959.698,48		0%	0%
143		INTERVENCION N°118	UND	1	6 días	jue 28/07/22	mié 3/08/22	138;129	157	$ 7.959.698,48		0%	0%
144		INTERVENCION N°119	UND	1	6 días	jue 28/07/22	mié 3/08/22	138;130	158	$ 7.959.698,48		0%	0%
145		INTERVENCION N°120	UND	1	6 días	jue 28/07/22	mié 3/08/22	138;131	159	$ 7.959.698,48		0%	0%
146		INTERVENCION N°121	UND	1	6 días	jue 28/07/22	mié 3/08/22	138;132	160	$ 7.959.698,48		0%	0%
147		INTERVENCION N°122	UND	1	6 días	jue 28/07/22	mié 3/08/22	138;133	161	$ 7.959.698,48		0%	0%
148		INTERVENCION N°123	UND	1	6 días	jue 28/07/22	mié 3/08/22	138;134	162	$ 7.959.698,48		0%	0%
149		INTERVENCION N°124	UND	1	6 días	jue 28/07/22	mié 3/08/22	138;135	163	$ 7.959.698,48		0%	0%
150		INTERVENCION N°125	UND	1	6 días	jue 28/07/22	mié 3/08/22	138;136	164	$ 7.959.698,48		0%	0%
151		INTERVENCION N°126	UND	1	6 días	jue 28/07/22	mié 3/08/22	138;137	165;152CC+5 días	$ 7.959.698,48		0%	0%
152		ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (114 -	UND	13	1 día	mié 3/08/22	mié 3/08/22	151CC+5	153;154;155;156;15	$ 0,00		0%	0%

PROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Fin	Predeceso	Sucesoras	Costo	Nombres de los recursos	% completado	%Programado
153		INTERVENCION N°127	UND	1	6 días	jue 4/08/22	mié 10/08/22	152;139	167	$ 7.959.698,48		0%	0%
154		INTERVENCION N°128	UND	1	6 días	jue 4/08/22	mié 10/08/22	152;140	168	$ 7.959.698,48		0%	0%
155		INTERVENCION N°129	UND	1	6 días	jue 4/08/22	mié 10/08/22	152;141	169	$ 7.959.698,48		0%	0%
156		INTERVENCION N°130	UND	1	6 días	jue 4/08/22	mié 10/08/22	152;142	170	$ 7.959.698,48		0%	0%
157		INTERVENCION N°131	UND	1	6 días	jue 4/08/22	mié 10/08/22	152;143	171	$ 7.959.698,48		0%	0%
158		INTERVENCION N°132	UND	1	6 días	jue 4/08/22	mié 10/08/22	152;144	172	$ 7.959.698,48		0%	0%
159		INTERVENCION N°133	UND	1	6 días	jue 4/08/22	mié 10/08/22	152;145	173	$ 7.959.698,48		0%	0%
160		INTERVENCION N°134	UND	1	6 días	jue 4/08/22	mié 10/08/22	152;146	174	$ 7.959.698,48		0%	0%
161		INTERVENCION N°135	UND	1	6 días	jue 4/08/22	mié 10/08/22	152;147	175	$ 7.959.698,48		0%	0%
162		INTERVENCION N°136	UND	1	6 días	jue 4/08/22	mié 10/08/22	152;148	176	$ 7.959.698,48		0%	0%
163		INTERVENCION N°137	UND	1	6 días	jue 4/08/22	mié 10/08/22	152;149	177	$ 7.959.698,48		0%	0%
164		INTERVENCION N°138	UND	1	6 días	jue 4/08/22	mié 10/08/22	152;150	178	$ 7.959.698,48		0%	0%
165		INTERVENCION N°139	UND	1	6 días	jue 4/08/22	mié 10/08/22	152;151	179;166CC+5 días	$ 7.959.698,48		0%	0%
166		ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS	UND	13	1 día	mié 10/08/22	mié 10/08/22	165CC+5	167;168;169;170;17	$ 0,00		0%	0%
167		INTERVENCION N°140	UND	1	6 días	jue 11/08/22	mié 17/08/22	166;153	182	$ 7.959.698,48		0%	0%
168		INTERVENCION N°141	UND	1	6 días	jue 11/08/22	mié 17/08/22	166;154	183	$ 7.959.698,48		0%	0%
169		INTERVENCION N°142	UND	1	6 días	jue 11/08/22	mié 17/08/22	166;155	184	$ 7.959.698,48		0%	0%
170		INTERVENCION N°143	UND	1	6 días	jue 11/08/22	mié 17/08/22	166;156	185	$ 7.959.698,48		0%	0%
171		INTERVENCION N°144	UND	1	6 días	jue 11/08/22	mié 17/08/22	166;157	186	$ 7.959.698,48		0%	0%
172		INTERVENCION N°145	UND	1	6 días	jue 11/08/22	mié 17/08/22	166;158	187	$ 7.959.698,48		0%	0%
173		INTERVENCION N°146	UND	1	6 días	jue 11/08/22	mié 17/08/22	166;159	188	$ 7.959.698,48		0%	0%
174		INTERVENCION N°147	UND	1	6 días	jue 11/08/22	mié 17/08/22	166;160	189	$ 7.959.698,48		0%	0%
175		INTERVENCION N°148	UND	1	6 días	jue 11/08/22	mié 17/08/22	166;161	190	$ 7.959.698,48		0%	0%
176		INTERVENCION N°149	UND	1	6 días	jue 11/08/22	mié 17/08/22	166;162	191	$ 7.959.698,48		0%	0%
177		INTERVENCION N°150	UND	1	6 días	jue 11/08/22	mié 17/08/22	166;163	192	$ 7.959.698,48		0%	0%
178		INTERVENCION N°151	UND	1	6 días	jue 11/08/22	mié 17/08/22	166;164	193	$ 7.959.698,48		0%	0%
179		INTERVENCION N°152	UND	1	6 días	jue 11/08/22	mié 17/08/22	166;165	180CC+5 días;194	$ 7.959.698,48		0%	0%
180		ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (140 -	UND	13	1 día	mié 17/08/22	mié 17/08/22	179CC+5	182;183;184;185;18	$ 0,00		0%	0%
181		**MES 4 (65 VIVIENDAS)**			**34 días**	**jue 18/08/22**	**lun 26/09/22**			**$ 517.380.401,57**		**0%**	**0%**
182		INTERVENCION N°153	UND	1	6 días	jue 18/08/22	mié 24/08/22	180;167	196	$ 7.959.698,48		0%	0%
183		INTERVENCION N°154	UND	1	6 días	jue 18/08/22	mié 24/08/22	180;168	197	$ 7.959.698,48		0%	0%
184		INTERVENCION N°155	UND	1	6 días	jue 18/08/22	mié 24/08/22	180;169	198	$ 7.959.698,48		0%	0%
185		INTERVENCION N°156	UND	1	6 días	jue 18/08/22	mié 24/08/22	180;170	199	$ 7.959.698,48		0%	0%
186		INTERVENCION N°157	UND	1	6 días	jue 18/08/22	mié 24/08/22	180;171	200	$ 7.959.698,48		0%	0%
187		INTERVENCION N°158	UND	1	6 días	jue 18/08/22	mié 24/08/22	180;172	201	$ 7.959.698,48		0%	0%
188		INTERVENCION N°159	UND	1	6 días	jue 18/08/22	mié 24/08/22	180;173	202	$ 7.959.698,48		0%	0%
189		INTERVENCION N°160	UND	1	6 días	jue 18/08/22	mié 24/08/22	180;174	203	$ 7.959.698,48		0%	0%
190		INTERVENCION N°161	UND	1	6 días	jue 18/08/22	mié 24/08/22	180;175	204	$ 7.959.698,48		0%	0%

PROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Fin	Predeceso	Sucesoras	Costo	Nombres de los recursos	% completado	%Programado
191		INTERVENCION N°162	UND	1	6 días	jue 18/08/22	mié 24/08/22	180;176	205	$ 7.959.698,48		0%	0%
192		INTERVENCION N°163	UND	1	6 días	jue 18/08/22	mié 24/08/22	180;177	206	$ 7.959.698,48		0%	0%
193		INTERVENCION N°164	UND	1	6 días	jue 18/08/22	mié 24/08/22	180;178	207	$ 7.959.698,48		0%	0%
194		INTERVENCION N°165	UND	1	6 días	jue 18/08/22	mié 24/08/22	180;179	208;195CC+5 días	$ 7.959.698,48		0%	0%
195		ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (153 -	UND	13	1 día	mié 24/08/22	mié 24/08/22	194CC+5	196;197;198;199;20	$ 0,00		0%	0%
196		INTERVENCION N°166	UND	1	6 días	jue 25/08/22	mié 31/08/22	195;182;	210	$ 7.959.698,48		0%	0%
197		INTERVENCION N°167	UND	1	6 días	jue 25/08/22	mié 31/08/22	195;183	211	$ 7.959.698,48		0%	0%
198		INTERVENCION N°168	UND	1	6 días	jue 25/08/22	mié 31/08/22	195;184	212	$ 7.959.698,48		0%	0%
199		INTERVENCION N°169	UND	1	6 días	jue 25/08/22	mié 31/08/22	195;185	213	$ 7.959.698,48		0%	0%
200		INTERVENCION N°170	UND	1	6 días	jue 25/08/22	mié 31/08/22	195;186	214	$ 7.959.698,48		0%	0%
201		INTERVENCION N°171	UND	1	6 días	jue 25/08/22	mié 31/08/22	195;187	215	$ 7.959.698,48		0%	0%
202		INTERVENCION N°172	UND	1	6 días	jue 25/08/22	mié 31/08/22	195;188	216	$ 7.959.698,48		0%	0%
203		INTERVENCION N°173	UND	1	6 días	jue 25/08/22	mié 31/08/22	195;189	217	$ 7.959.698,48		0%	0%
204		INTERVENCION N°174	UND	1	6 días	jue 25/08/22	mié 31/08/22	195;190	218	$ 7.959.698,48		0%	0%
205		INTERVENCION N°175	UND	1	6 días	jue 25/08/22	mié 31/08/22	195;191	219	$ 7.959.698,48		0%	0%
206		INTERVENCION N°176	UND	1	6 días	jue 25/08/22	mié 31/08/22	195;192	220	$ 7.959.698,48		0%	0%
207		INTERVENCION N°177	UND	1	6 días	jue 25/08/22	mié 31/08/22	195;193	221	$ 7.959.698,48		0%	0%
208		INTERVENCION N°178	UND	1	6 días	jue 25/08/22	mié 31/08/22	195;194	222;209CC+5 días	$ 7.959.698,48		0%	0%
209		ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (166 -	UND	13	1 día	mié 31/08/22	mié 31/08/22	208CC+5	210;211;212;213;21	$ 0,00		0%	0%
210		INTERVENCION N°179	UND	1	6 días	jue 1/09/22	mié 7/09/22	209;196	224	$ 7.959.698,48		0%	0%
211		INTERVENCION N°180	UND	1	6 días	jue 1/09/22	mié 7/09/22	209;197	225	$ 7.959.698,48		0%	0%
212		INTERVENCION N°181	UND	1	6 días	jue 1/09/22	mié 7/09/22	209;198	226	$ 7.959.698,49		0%	0%
213		INTERVENCION N°182	UND	1	6 días	jue 1/09/22	mié 7/09/22	209;199	227	$ 7.959.698,49		0%	0%
214		INTERVENCION N°183	UND	1	6 días	jue 1/09/22	mié 7/09/22	209;200	228	$ 7.959.698,49		0%	0%
215		INTERVENCION N°184	UND	1	6 días	jue 1/09/22	mié 7/09/22	209;201	229	$ 7.959.698,49		0%	0%
216		INTERVENCION N°185	UND	1	6 días	jue 1/09/22	mié 7/09/22	209;202	230	$ 7.959.698,49		0%	0%
217		INTERVENCION N°186	UND	1	6 días	jue 1/09/22	mié 7/09/22	209;203	231	$ 7.959.698,49		0%	0%
218		INTERVENCION N°187	UND	1	6 días	jue 1/09/22	mié 7/09/22	209;204	232	$ 7.959.698,49		0%	0%
219		INTERVENCION N°188	UND	1	6 días	jue 1/09/22	mié 7/09/22	209;205	233	$ 7.959.698,49		0%	0%
220		INTERVENCION N°189	UND	1	6 días	jue 1/09/22	mié 7/09/22	209;206	234	$ 7.959.698,49		0%	0%
221		INTERVENCION N°190	UND	1	6 días	jue 1/09/22	mié 7/09/22	209;207	235	$ 7.959.698,49		0%	0%
222		INTERVENCION N°191	UND	1	6 días	jue 1/09/22	mié 7/09/22	209;208	236;223CC+5 días	$ 7.959.698,49		0%	0%
223		ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (179 -	UND	13	1 día	mié 7/09/22	mié 7/09/22	222CC+5	224;225;226;227;22	$ 0,00		0%	0%
224		INTERVENCION N°192	UND	1	6 días	jue 8/09/22	mié 14/09/22	223;210	238	$ 7.959.698,49		0%	0%
225		INTERVENCION N°193	UND	1	6 días	jue 8/09/22	mié 14/09/22	223;211	239	$ 7.959.698,49		0%	0%
226		INTERVENCION N°194	UND	1	6 días	jue 8/09/22	mié 14/09/22	223;212	240	$ 7.959.698,49		0%	0%
227		INTERVENCION N°195	UND	1	6 días	jue 8/09/22	mié 14/09/22	223;213	241	$ 7.959.698,49		0%	0%
228		INTERVENCION N°196	UND	1	6 días	jue 8/09/22	mié 14/09/22	223;214	242	$ 7.959.698,49		0%	0%

PROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Fin	Predeceso	Sucesoras	Costo	Nombres de los recursos	% completado	%Programado
229		INTERVENCION N°197	UND	1	6 días	jue 8/09/22	mié 14/09/22	223;215	243	$ 7.959.698,49		0%	0%
230		INTERVENCION N°198	UND	1	6 días	jue 8/09/22	mié 14/09/22	223;216	244	$ 7.959.698,49		0%	0%
231		INTERVENCION N°199	UND	1	6 días	jue 8/09/22	mié 14/09/22	223;217	245	$ 7.959.698,49		0%	0%
232		INTERVENCION N°200	UND	1	6 días	jue 8/09/22	mié 14/09/22	223;218	246	$ 7.959.698,49		0%	0%
233		INTERVENCION N°201	UND	1	6 días	jue 8/09/22	mié 14/09/22	223;219	247	$ 7.959.698,49		0%	0%
234		INTERVENCION N°202	UND	1	6 días	jue 8/09/22	mié 14/09/22	223;220	248	$ 7.959.698,49		0%	0%
235		INTERVENCION N°203	UND	1	6 días	jue 8/09/22	mié 14/09/22	223;221	249	$ 7.959.698,49		0%	0%
236		INTERVENCION N°204	UND	1	6 días	jue 8/09/22	mié 14/09/22	223;222	250;237CC+5 días	$ 7.959.698,49		0%	0%
237		ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (192 -	UND	13	1 día	mié 14/09/22	mié 14/09/22	236CC+5	238;239;240;241;24	$ 0,00		0%	0%
238		INTERVENCION N°205	UND	1	6 días	jue 15/09/22	mié 21/09/22	237;224	251	$ 7.959.698,49		0%	0%
239		INTERVENCION N°206	UND	1	6 días	jue 15/09/22	mié 21/09/22	237;225	251	$ 7.959.698,49		0%	0%
240		INTERVENCION N°207	UND	1	6 días	jue 15/09/22	mié 21/09/22	237;226	251	$ 7.959.698,49		0%	0%
241		INTERVENCION N°208	UND	1	6 días	jue 15/09/22	mié 21/09/22	237;227	251	$ 7.959.698,49		0%	0%
242		INTERVENCION N°209	UND	1	6 días	jue 15/09/22	mié 21/09/22	237;228	251	$ 7.959.698,49		0%	0%
243		INTERVENCION N°210	UND	1	6 días	jue 15/09/22	mié 21/09/22	237;229	251	$ 7.959.698,49		0%	0%
244		INTERVENCION N°211	UND	1	6 días	jue 15/09/22	mié 21/09/22	237;230	251	$ 7.959.698,49		0%	0%
245		INTERVENCION N°212	UND	1	6 días	jue 15/09/22	mié 21/09/22	237;231	251	$ 7.959.698,49		0%	0%
246		INTERVENCION N°213	UND	1	6 días	jue 15/09/22	mié 21/09/22	237;232	251	$ 7.959.698,49		0%	0%
247		INTERVENCION N°214	UND	1	6 días	jue 15/09/22	mié 21/09/22	237;233	251	$ 7.959.698,49		0%	0%
248		INTERVENCION N°215	UND	1	6 días	jue 15/09/22	mié 21/09/22	237;234	251	$ 7.959.698,49		0%	0%
249		INTERVENCION N°216	UND	1	6 días	jue 15/09/22	mié 21/09/22	237;235	251	$ 7.959.698,49		0%	0%
250		INTERVENCION N°217	UND	1	6 días	jue 15/09/22	mié 21/09/22	237;236	251	$ 7.959.698,49		0%	0%
251		ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (205 -	UND	13	4 días	jue 22/09/22	lun 26/09/22	238;239;		$ 0,00		**0%**	**0%**
252		**ACTIVIDAD 4: PLAN DE GESTION SOCIAL PARA LA**			**132 días**	**mar 26/04/22**	**lun 26/09/22**			**$ 0,00**		**27%**	**27%**
253		PLAN DE GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DE LAS	GL	1	132 días	mar 26/04/22	lun 26/09/22	3CC		$ 0,00		27%	27%

Ejecución de Actividad en Viviendas al Programa Conexiones Intradomiciliarias con corte a 05/06/2022

BARRIO	ACTA	No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización	Número de días Máximo permitido según tipo de intervención	Número de Dias de la Intervencion por parte del Contratista	Dias de cumplimiento o incumplimiento según tipo de intervención (-) atraso y (+) avance	¿SE ENCUENTRA RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR INTERVENTORÍA?	
															SI (X)	NO (X)
SM	1	1	B-C-SM-MZ29-VE-001		Adecuacion	$7.967.801,13	$0,00		EN EJECUCION	0/01/1900	5/01/1900	0	5	-5		x
SM	1	2	B-C-SM-MZ32-VE-002	45%	Caseta T3	$8.126.190,79	$3.656.785,86	2/06/2022	EN EJECUCION	2/06/2022	10/06/2022	0	8	-8		x
SM	1	3	B-C-SM-MZ32-VE-003	45%	Caseta T3	$7.914.431,13	$3.561.494,01	4/06/2022	EN EJECUCION	4/06/2022	12/06/2022	0	8	-8		x
SM	1	4	B-C-SM-MZ18-VE-004	45%	Adecuacion	$7.372.105,35	$3.317.447,41	4/06/2022	EN EJECUCION	4/06/2022	8/06/2022	0	4	-4		x
SM	1	5	B-C-SM-MZ22-VE-005	45%	Adecuacion	$7.148.052,07	$3.216.623,43	4/06/2022	EN EJECUCION	4/06/2022	7/06/2022	0	3	-3		x
SM	1	6	B-C-SM-MZ34-VE-006	45%	Adecuacion	$7.464.125,94	$3.358.856,67	4/06/2022	EN EJECUCION	4/06/2022	8/06/2022	0	4	-4		x
SM	1	7	B-C-SM-MZ22-VE-007	45%	Adecuacion	$7.159.479,30	$3.221.765,69	4/06/2022	EN EJECUCION	4/06/2022	9/06/2022	0	5	-5		x
SM	1	9	B-C-SM-MZ22-VE-009	45%	Caseta T3	$7.908.010,60	$3.558.604,77	4/06/2022	EN EJECUCION	4/06/2022	8/06/2022	0	4	-4		x
SM	1	10	B-C-SM-MZ21-VE-010	45%	Caseta T3	$8.928.931,81	$4.018.019,31	4/06/2022	EN EJECUCION	4/06/2022	9/06/2022	0	5	-5		x
SM	1	11	B-C-SM-MZ22-VE-011	45%	Adecuacion	$7.911.551,76	$3.560.198,29	8/06/2022	EN EJECUCION	8/06/2022	16/06/2022	0	8	-8		x
SM	1	12	B-C-SM-MZ34-VE-012	45%	Caseta T3	$8.997.603,49	$4.048.921,57	4/06/2022	EN EJECUCION	4/06/2022	9/06/2022	0	5	-5		x
SM	1	13	B-C-SM-MZ21-VE-013	45%	Adecuacion	$5.406.646,10	$2.432.990,75	2/06/2022	EN EJECUCION	2/06/2022	6/06/2022	0	4	-4		x
SM	1	14	B-C-SM-MZ21-VE-014	45%	Caseta T3	$8.562.948,93	$3.853.327,02	4/06/2022	EN EJECUCION	4/06/2022	10/06/2022	0	6	-6		x
SM	1	15	B-C-SM-MZ21-VE-015	45%	Caseta T3	$8.265.079,43	$3.719.285,74	2/06/2022	EN EJECUCION	2/06/2022	7/06/2022	0	5	-5		x
SM	1	16	B-C-SM-MZ21-VE-016	45%	Caseta T3	$9.248.106,91	$4.161.648,11	2/06/2022	EN EJECUCION	2/06/2022	8/06/2022	0	6	-6		x
SM	1	17	B-C-SM-MZ38-VE-017	45%	Caseta T3	$8.481.195,82	$3.816.538,12	2/06/2022	EN EJECUCION	2/06/2022	7/06/2022	0	5	-5		x
SM	2	18	B-C-SM-MZ24-VE-018	35%	Caseta T3	$8.450.841,17	$2.957.794,41	4/06/2022	EN EJECUCION	4/06/2022	8/06/2022	0	4	-4		x
SM	1	19	B-C-SM-MZ24-VE-019	35%	Adecuacion	$6.395.588,06	$2.238.455,82	4/06/2022	EN EJECUCION	4/06/2022	9/06/2022	0	5	-5		x
SM	1	20	B-C-SM-MZ24-VE-020	35%	Adecuacion	$4.593.449,33	$1.607.707,27	4/06/2022	EN EJECUCION	4/06/2022	12/06/2022	0	8	-8		x
SM	2	21	B-C-SM-MZ85-VE-021	35%	Caseta T3	$8.614.688,02	$3.015.140,81	4/06/2022	EN EJECUCION	4/06/2022	13/06/2022	0	9	-9		x
SM	2	22	B-C-SM-MZ85-VE-022	30%	Caseta T3	$8.896.124,14	$2.668.837,24	4/06/2022	EN EJECUCION	4/06/2022	8/06/2022	0	4	-4		x
SM	1	23	B-C-SM-MZ85-VE-023	30%	Adecuacion	$7.191.930,35	$2.157.579,11	4/06/2022	EN EJECUCION	4/06/2022	9/06/2022	0	5	-5		x
SM	1	24	B-C-SM-MZ29-VE-024	30%	Adecuacion	$6.084.490,07	$1.825.347,02	4/06/2022	EN EJECUCION	4/06/2022	9/06/2022	0	5	-5		x
SM	2	25	B-C-SM-MZ31-VE-025	30%	Caseta T3	$8.637.204,10	$2.591.161,23	4/06/2022	EN EJECUCION	4/06/2022	8/06/2022	0	4	-4		x
SM	1	26	B-C-SM-MZ31-VE-026	30%	Adecuacion	$4.822.827,41	$1.446.848,22	4/06/2022	EN EJECUCION	4/06/2022	13/06/2022	0	9	-9		x
SM	1	27	B-C-SM-MZ31-VE-027	30%	Adecuacion	$4.365.339,96	$1.309.601,99	4/06/2022	EN EJECUCION	4/06/2022	8/06/2022	0	4	-4		x
SM	2	28	B-C-SM-MZ31-VE-028	30%	Adecuacion	$7.668.943,14	$2.300.682,94	4/06/2022	EN EJECUCION	4/06/2022	7/06/2022	0	3	-3		x
SM	2	29	B-C-SM-MZ31-VE-029	30%	Caseta T3	$8.468.136,75	$2.540.441,03	4/06/2022	EN EJECUCION	4/06/2022	8/06/2022	0	4	-4		x
SM	1	30	B-C-SM-MZ31-VE-030	29%	Adecuacion	$4.637.820,17	$1.344.967,85	4/06/2022	EN EJECUCION	4/06/2022	10/06/2022	0	6	-6		x
																x

	PLANILLA DE CONDICIONES DE SALUD COVID 19
LUGAR DE TRABAJO	CONSORCIO CONSTRUREDES

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO	FECHA	ESTADO DE SALUD INICIAL (CS, SS)	ESTADO DE SALUD ALEATORIO (CS,SS)	ESTADO DE SALUD FINAL (CS,SS)	FIRMA DE QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO
Alvaro Sanchez	73.315286	04-6-22	SS	SS	SS	
Alvaro Valeth	1049.452.096	04-6-22	SS	SS	SS	
Jose miguel flores	1.049.452.936	4-6-22	SS	SS	SS	
Yoldor Vergara	1049.452.632	4-6-22	SS	SS	SS	
Javier Eduardo	1049.453.627	4-6-22	SS	SS	SS	

Indicaciones de formato

Se debe diligenciar diariamente por la persona asignada (Responsable de obra, Brigadista, Auxiliar SST, Responsable SG SST, Gerente), el formato debe permanecer en la obra o lugar de trabajo y solo debera ser entregado al responsable del SG SST para la revisión.

El estado de salud corresponde a CS (con síntomas) o SS (Sin síntomas) esto refiere a los síntomas relacionados con el COVID 19 (Fiebre, Dolor de garganta, congestión nasal, Tos, Dificultad para respirar, Fatiga, Escalofrío, Dolor muscular) en caso de que el colaborador presenta alguno de estos síntomas deberá ser llevado al área de salud asignada para la atención e informar a SST

Scanned with CamScanner

COMPONENTE HSE DEL PROYECTO

EL SUSCRITO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA DE ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A., CERTIFICA;

Que durante el periodo comprendido del 1 al 30 de junio del 2022, ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A con NIT: 800173768-1, evidencia que el contratista CONSORCIO CONSTRUREDES de acuerdo con las obligaciones del contrato 2220576 con objeto "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓ DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.)., da el cumplimiento normatividad ambiental, se evidencia la implementación del Plan de Manejo Ambiental diseñado para el proyecto, evidenciando la implementación de los programas mediante las fichas de manejo ambiental.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., al primer día (1) días del mes de julio de 2022.

Marcy Alejandra Correa Castaño
Director de Interventoría
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.

Formato
Control De Licencias Ambientales
IN-FO-53 V:3

OBRA: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓ DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

PERMISO	LOCALIZACIÓN	MATERIAL	NO LICENCIA / PERMISO	AUTORIDAD AMBIENTAL	VIGENCIA / LICENCIA / PERMISO
Cantera Triturados y Agregados del Caribe S.A.S Licencia Ambiental	Bosconia Cesar	Por medio de la cual se otorga a A& G Constructores S.A.S. con identificación tributaria N° 900193651-7 Licencia Ambiental Global, para la explotación de un yacimineto de materiales de construcción, en jurisdicción del Municipio de Bosconia Cesar, en desarrollo del contrato de conseción minera KHE -08121 del 24 de noviembre del 2009.	Resolución 743 del 2018	CORPOCESAR	30 años

YIRA LEMUS GÓMEZ. ESP. AMBIENTAL
Diligencia

Formato
Informe HSE Interventoría No 01
IN-F0-11 V:1

PROYECTO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓ DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.	PERIODO	1 al 30 dejunio de 2022				
ITEM	ASPECTOS PARA DESTACAR EN LA GESTIÓN MENSUAL (CONTRATISTA)	CUMPLIMIENTO			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	ASPECTOS A MEJORAR
		CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO CUMPLE			
IMPLEMENTACIÓN DEL SG SST	El contratista cuenta con Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo, el cual fue avalado mediante el informe tecnico de especialista HSE # 4 emitido el 25 de abril del 2022, en el transcurso del periodo se evidencia la afiliaciones del personal que esta realizando el diagnóstico de las viviendas. Se implementó el PAPSO, actualmente se encuentra en un porcentaje de cumplimiento del 100%. Se continúa con la implementación de las medidas de bioseguridad: toma de temperatura, encuesta de auto condiciones, limpieza y desinfección de puestos de trabajo y oficinas con hipoclorito diluido y alcohol. El personal del contratista cuenta con los EPP requeridos y los utiliza de manera correcta. Se tienen publicadas las políticas y normas de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo. Se cuenta con elementos para atención de emergencias y la brigada de emergencias. Plan de trabajo anual 100%. Programa de capacitaciones ejecutado en un 100% Programa de inspecciones ejecutado en un 100%. Implementación del PAPSO en un 100%.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Continuar con la implementación de la interventoria
AFILIACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	El CONSORCIO CONSTRUREDES en el periodo reportado continua presentando los soporte de pago de seguridad social y/ o afiliaciones del personal administrativo y operativo que trabajo y que ingreso en el periodo de 17 personas, estas son revisadas y avaladas por el profesional PGIO del contratista, de igual manera son verificados por la interventoría donde se evidencia que se realizaron las afiliaciones correspondientes en caso de no presentarse la información pertinente se restringe el ingreso a obra del personal que no cuente con afiliaciones o pagos vigentes por parte de interventoria.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Hacer la entrega de la información completa para el ingreso del personal de acuerdo a los lineamientos establecidos por la interventoria.
DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	En recorridos diarios realizados por Interventoría, se evidencia la entrega y reposición de los EPP , uso de dotación, en el periodo se mantiene la entrega de tapabocas como medida preventiva para el peligro biológico presente por covid -19 , se exige el uso adecuado, se reitera al contratista realizar inspección diaria, verificando las condiciones de la dotación y porte de la misma de acuerdo al manual de imagen de Enterritorio.		X		50%	Profesional PGIO del Contratista	Hacer la entrega de Elementos de protección personal y la dotación al personal de obra y asegurar el uso por parte del contratista.
PLAN DE EMERGENCIAS, EQUIPOS DE ATENCION DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION	En el periodo se realiza ubicación de señalización preventiva, de obligatoriedad y de salvamento, se establecen salidas de emergencias, de acuerdo a la dinámica y avance de la obra ,así mismo se mantienen punto de encuentro, puntos con elementos de atención a emergencias con camilla, botiquín, extintor , ubicado en el campamento de obra, se tiene pendiente la conformación de labrigada para atención de emergencias, en el periodo no se presentaron emergencias.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	En el momento que se encuentre el personal de obra se debe realizar la conformación de la brigada de emergencia.
PLAN DE TRABAJO ANUAL, CAPACITACIONES Y CHARLAS	El contratista inicia con la realización de charlas diarias por parte del profesional PGIO. Interventoría realiza la revisión y seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo establecido en el SG-SST, se evidencia el cumplimiento del 71,9 % , se recomienda al contratista realizar todas las actividades planeadas.		X		50%	Profesional PGIO del Contratista	Hacer entrega de los soportes del informe, y realizar todas actividades planificadas.
CONFORMACION Y REUNIONES DE COMITÉ COPASST Y CONVIVENCIA.	El CONSORCIO CONSTRUREDES en el periodo reportado, realizo la conformación del Copasst el 13 de junio del 2022, así mismo se evidencia la conformación del comité de convivencia laboral el 13 de juno del 2022, así mismo se realiza la primera reunión en cada uno de los comites.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Hacer la reuniones mensuales y trimestrales de cada uno de los comites.
PAZ Y SALVOS TRABAJADORES	El CONSORCIO CONSTRUREDES en el periodo reportado, no realizo retiro de personal.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	En el momento de salida de personal realizar la entrega de paz y salvo
PERMISOS DE TRABAJO (ALTURA, CALIENTE, ESPACIO CONFINADO)	De acuerdo al avance de obra el contratista continua realizando tareas de alto riesgo entrabajo en alturas (TSA) , por lo cual implementa los formatos requeridos de acuerdo a los procedimientos establecidos para dichas actividades como (permisos, inspecciones preoperacionales y análisis de trabajo seguro (ATS) de la diferente maquinaria, equipos y herramientas electromecánicas) estos firmados y avalados por profesional de apoyo PGIO del contratista, interventoría sugiere realizar seguimiento a las medidas preventivas establecidas en los ATS realizados para las actividades.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Realizar el diligenciamiento de los permisos de acuerdo a las actividades de alto de riesgo ejecutadas(Trabajo en Altura)
ASPECTOS AMBIENTALES (AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE)	• La Interventoría evidencia que el contratista ha implementado las medidas de manejo ambiental establecidas en el contrato se debe reforzar las mejoras en los acopios de material, en cuanto a señalización señalizados y demarcados, se solicita el constante orden y aseo en espacios exteriores, por lo que el contratista toma las medidas necesarias y realiza las respectivas jornadas, el área de la ZMPA se encuentra organizada y aseada. • Se cuenta con la documentación de los materiales como insumos, equipos, maquinaria, volquetas, entre otros. Se solicito al contratista hacer refuerzo en el acopio, en el manejo de suelo reforzar las hojas de seguridad y las etiquetas. • En este periodo ingresó material granular a obra. Los certificados y permisos ambientales de los proveedores de estos materiales fueron presentados Licencia Ambiental de la Resolución 743 del 2018 se evidencia que Triturados y Agregados del Caribe S.A.S, esta avalado para explotación y comercialización de material petreo. En cuanto al titulo minero KHE-08121 se verifico en catastro minero, evidenciando que esta vigente hasta el 31 de Julio del 2022, por lo cual en el mes de Agosto se debe pasar la renovación del mismo. • La obra cuenta con un punto ecológico el cual fue adecuado con la nueva normatividad en colores, dichos puntos están señalizados y demarcados, de tal manera que los trabajadores identifiquen donde deben realizar el depósito de los residuos. Solamente fue necesario realizar el retiro de residuos sólidos ordinarios de obra. • La Interventoría sugiere mantener y mejorar los puntos de acopio de los materiales granulares que se encuentran en obra, en cuanto señalización , demarcación y protección. • La Interventoría solicita de manera permanente el orden y aseo dentro del proyecto, se insistió en la generación de una brigada de orden y aseo para mantener los espacios organizados.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Darle cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental diseñado para el proyecto.
PLAN DE GESTION DE RESIDUOS DE DEMOLICION Y CONSTRUCCION	Para este periodo solo se generaron Residuos de Construcción y Demolición, el material es reutilizado como relleno en las mismas excavaciones realizadas, es importante aclarar que la excavación es minima.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Se debe realizar clasificación en los frentes de trabajo.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADOS EN OBRA	El CONSORCIO CONSTRUREDES en el periodo reportado, se evidencia que todos los vehículos, herramientas que se encuentran en obra cuentan con la documentación reglamentaria y aprobación de la interventoría. A la fecha de corte de este periodo informado se cuenta con la autorización de acceso para:-1 volquetas.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Realizar todas las inspecciones realizadas en el proyecto
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DENTRO DE LA OBRA	Actualmente el Contratista cuenta con un punto ecológico en obra y con un recipiente rojo adicional destinado solo a la disposición de los residuos generados por la implementación del PAPSO en obra. Se entregaron los residuos ordinarios generados en obra al recolector autorizado del municipio.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Se debe realizar clasificación en los frentes de trabajo.
MANEJO DE CAMPAMENTO (SERVICIOS SANITARIOS)	El proyecto de obra cuenta con el respectivo campamento, el mismo se encuentra señalizado, se tiene 1 unidad sanitaria para el servicio del personal femenino y masculino, se cuenta con área de almacén y punto de atención al ciudadano.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Verificar el uso de baño de los trabajadores en los frentes de trabajo.
OTROS CUALES	En recorridos diarios realizados por interventoría se evidencia la presencia de condiciones inseguras y la ocurrencia actos inseguros por parte de los trabajadores, los cuales son direccionados al profesional SST del contratista para que sean subsanados de manera inmediata, mejorando así las condiciones y controlando los peligros presente durante la ejecución de la actividades, a los cuales el contratista realiza la gestión necesaria para atender las solicitudes realizadas. En el periodo no se presentaron casos positivos para covid-19.						

	ASPECTOS PARA DESTACAR (INTERVENTORÍA)
SEGUIMIENTO A NIVEL CUMPLIMIENTO FRENTE A NORMATIVA EN SST (Evaluación inicial, Certificado de 50 horas, Licencia en Seguridad y salud en el Trabajo, Designación de Responsable, Matriz de peligros, Plan de formación anual, Plan de trabajo anual, Diagnostico de Condiciones, estadisticas de incidentes, niveles de cumplimiento del decreto 1072 del 2015 y Resolución 312 del 2019)	Interventoría cuenta con la documentación del SGSST para la implementación en obra , Certificado de 50 horas, Licencia en Seguridad y salud en el Trabajo, Designación de Responsable, Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos . Actualmente se cuenta con 12 profesionales asesores de interventoría quienes apoyan el proceso desde sus áreas , todos cuentan con pagos de parafiscales con afiliaciones vigentes a la EPS, ARL , AFP y CCF ; a todos los profesionales se les han realizado los exámenes médicos de ingreso, conocen las políticas, procedimientos y protocolos establecidos en el SG-SST a si mismo el PAPSO establecido por la empresa y el aprobado para la obra ,se realizan capacitaciones mensuales a través de boletines informativos . Durante este periodo no se presentaron accidentes laborales , para este periodo no se presentó ausentismo por enfermedad general, el personal se encuentra capacitado de acuerdo los peligros asociados y presentes durante la ejecución de sus actividades.
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA (Señalización de obras, Manejo de aguas superficiales, Manejo y disposición de escombros, Transporte de materiales y escombros, Manejo de maquinaria y equipo, Almacenamiento y manejo de materiales de construcción, Manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas de emisiones atmosféricas, Control de plagas. Licencias, permisos y trámites, Manejo de campamentos transitorios, Control de plagas)	Para este periodo la interventoría cuenta con un campamento, el mismo está debidamente señalizado, Se fomenta el orden y aseo y desinfección en cada puesto de trabajo de manera periódica. Se utiliza de manera responsable los recursos de energía, agua y papelería. Se cuenta con cartelera informativa. se realizan capacitaciones mensuales a través de boletines informativos.
	La Interventoría verifica y controla todos los aspectos mediante inspecciones diarias, verificación documental de los informes mensuales, RCD, maquinaria y equipos, documentación de licencias y certificados generados para el proyecto, las apreciaciones generadas se transmiten al contratista mediante informes técnicos, oficios, notas en bitácora y correos electrónicos.

INDICADORES RESULTADO SST

CONSTANTE K: 100

PERIODO	No TOTAL DE PERSONAS MENSUAL		No TOTAL DE HORAS MENSUALES				TOTAL HORAS TRABAJADAS		INCIDENTES LABORALES		No DIAS DE ENFERMEDADES COMUNES		No ACCIDENTES		No ACCIDENTES MORTALES		No. DÍAS PERDIDOS POR ACCIDENTES LABORALES		DIAS CARGADOS PCLY/O MUERTE		ENFERMEDAD LABORAL	
	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTV. HORA EXTRA	INTV HORA MENS	CONTRA HORA EXTRA	CONTRA HORA MES	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA
MAYO	3	6	0	576	0	1152	576	576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUNIO	6	23	0	1152	0	4416	1152	1152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Formato
Informe HSE Interventoría No 01
IN-F0-11 V:1

PROYECTO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓ DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.	PERIODO	1 al 30 dejunio de 2022

JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	

PERIODO	SEVERIDAD DE LOS ACCIDENTES LABORALES		FRECUENCIA DE LOS ACCIDENTES LABORALES		FRECUENCIA DE LOS INCIDENTES LABORALES		MORTALIDAD DE LOS ACCIDENTES LABORALES		PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL		INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL		AUSENTISMO LABORAL		AUSENTISMO COMÚN		INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES		OBSERVACION INDICADORES INTERVENTORÍA	OBSERVACION INDICADORES CONTRATISTA
	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA		
MAYO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	En el periodo no se presentaron accidentes de trabajo ,ni incidentes laborales.	En el periodo no se presentaron accidentes de trabajo ,ni incidentes laborales.
JUNIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
JULIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
AGOSTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
SEPTIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
OCTUBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		

INDICADORES ESTRUCTURA Y PROCESO DE INTERVENTORÍA SST

PERIODO	POLITICA SG SST				FUNCIONAMIENTO COPASST				CUMPLIMIENTO DE PLAN DE TRABAJO ANUAL				INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES			
	N.° de trabajadores que conocen la Política	No. Total de Trabajadores	RESULTADO	ANALISIS	No de actas de reunión realizadas	No total de actas al mes	RESULTADO	ANALISIS	Actividades Ejecutadas x 100	No. Actividades Programadas.	RESULTADO	ANALISIS	No de accidentes y/o incidentes investigados	No accidentes y/o incidentes reportados	RESULTADO	ANALISIS
MAYO	3	3	100%	Todo el personal cuenta con una inducción y tiene conocimiento de la política	1	1	100%	Se realiza la reunión de COPASST del mes.	1	1	100%	Se realizan las actividades previstas para el mes	0	0	0%	No se han reportado accidentes de trabajo para el período
JUNIO	6	6	100%	Todo el personal cuenta con una inducción y tiene conocimiento de la política	1	1	100%	Se realiza la reunión de COPASST del mes.	1	1	100%	Se realizan las actividades previstas para el mes	0	0	0%	No se han reportado accidentes de trabajo para el período
JULIO	0		0%													
AGOSTO	0		0%													
SEPTIEMBRE	0		0%													
OCTUBRE	0		0%													

REPORTE DE ACCIDENTES Y/O INCIDENTES DE TRABAJO

FECHA	INCIDENTE	ACCIDENTE	CEDULA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CARGO	DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE O ACCIDENTE	PARTE DEL CUERPO AFECTADA	DÍAS DE INCAPACIDAD
N/A				N/A				N/A		

CAPACITACIONES Y CHARLAS

FECHA DE CAPACITACIÓN	TEMAS DE LA CAPACITACIÓN Y/O CHARLA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA
junio-22	PROCEDIMIENTO DE EXCAVACIONES	X	
junio-22	DIVULGACION PLAN DE EMERGENCIAS		
junio-22	MANEJO ADECUCIDO DE HERRAMIENTA	X	
junio-22	ORDEN Y LIMPIEZA		

CONTROL AMBIENTAL

PERIODO	RELACION DE MATERIAL DE PETREO			DISPOSICION RESIDUOS SOLIDOS				RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCCIÓN				ACCIDENTE E INCIDENTE AMBIENTAL				OBSERVACIONES DE AMBIENTALES
	Tipo de material	Cantidad	Cantera	RECICLABLES (papel, plástico, vidrio, chatarra)	ORDINARIO	PELIGROSOS	OTROS	DESCAPOTE	EXCAVACION	ESCOMBRO	ESCOMBRERA	FECHA	LUGAR	DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN	
MAYO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
JUNIO	ARENA DE RIO	35	Licencia Ambiental de la Resolución 743 del 2018 se evidencia que Triturados y Agregados del Caribe S.A.S	0	0	0	0	0		0	Reutilización de material de excavación en relleno .	N/A	N/A	N/A	N/A	Para el periodo no se presentaron accidentes de emergencia, , se ingreso material granular, y no se realizo retiro de material RCD, pero se realizo reutilización en el proyecto.
	GRAVA	35														
JULIO																
AGOSTO																
SEPTIEMBRE																
OCTUBRE																

FOTOGRAFÍA





UBICACIÓN: CORDOBA-BOLIVAR
COMENTARIOS: VERIFICACION DE CONDICIONES HSE

FOTOGRAFÍA





UBICACIÓN: CORDOBA-BOLIVAR
COMENTARIOS: VERIFICACION DE CONDICIONES HSE

FOTOGRAFÍA




UBICACIÓN: CORDOBA-BOLIVAR
COMENTARIO: VERIFICACION DE CONDICIONES HSE

OBSERVACIÓN Y/O CONCLUSIÓN: En este período se evidencio que dentro de los requerimientos hechos al contratista se ha cumplido en un 88,9 % con los aspectos de Seguridad industrial, Salud en el trabajo, Medio ambiente, se debe hacer la entrega de toda la documentación completa del personal que ingresa al proyecto, se evidencia la falta del buen uso de los elementos de protección personal y dotación establecida en el proyecto, por lo tanto la interventoría genera un llamado de atención al contratista para que le de cumplimiento a estos requerimientos, de igual manera hasta el momento el contatista no ha entregado los planes establecidos para el contrato, en los aspectos que hasta la fecha están pendiente se realizará un estricto control para que en este proyecto se minimicen los factores de riesgo de accidentes, se le solicita al contratista una gestión permanente, se realizó con el contratista mesas de trabajo donde se debe realizar comités de seguimiento para mejorar en los aspectos donde se cuenta con falencias de acuerdo a la recomendaciones dadas. La interventoría verifica y controla todos estos aspectos mediante inspecciones diarias, verificación documental de los planes generados para el proyecto y la normatividad vigente en cuanto seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente.

7.	VERIFICACIÓN	APROBACIÓN
INSPECTOR Y/O RESIDENTE	COORDINADOR DE GESTIÓN HSEQ PROYECTO	DIRECTOR

PLANILLA CONTRATISTA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901568676	5	CONSORCIO CONSTRUREDES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 24 15 17 BARRIO CENTRO	SAN MARCOS-SUCRE	2953041	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1488842144	9435845110	E	2022/06/17	2022/06/06	BANCOLOMBIA	0	$4,597,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1093752620	ANAYA NORELIS	25-14	30	$2,000,000	$320,000	ESSC07	30	$2,000,000	$80,000	CCF41	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
2	CC	1102815039	BLANCO RONAL	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF41	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
3	CC	1066181984	CASTILLO RAFAEL	230201	30	$1,800,000	$288,000	ESSC07	30	$1,800,000	$72,000	CCF41	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
4	CC	92497702	DE LA OSSA EDMUNDO	230301	27	$2,700,000	$432,000	EPS037	27	$2,700,000	$108,000	CCF41	27	$2,700,000	$108,000	14-11	27	$2,700,000	$188,000	27	$0	$0
5	CC	1049453183	ESCOBAR SINDY	230301	17	$850,000	$136,000	ESSC07	17	$850,000	$34,000	CCF41	17	$850,000	$34,000	14-11	17	$850,000	$59,200	17	$0	$0
6	CC	85474042	GUTIERREZ CARLOS	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF41	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
7	CC	1069464406	PINEDO DUARTE	230301	30	$3,000,000	$480,000	ESSC07	30	$3,000,000	$120,000	CCF41	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
Total			**Afiliados(7)**			$14,850,000	$2,376,000			$14,850,000	$594,000			$14,850,000	$594,000			$14,850,000	$1,033,700		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$2,376,000	$0	$0	$2,376,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$720,000	$0	$0	$720,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,368,000	$0	$0	$1,368,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$288,000	$0	$0	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1,033,700	$0	$0	$1,033,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$1,033,700	$0	$0	$1,033,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$594,000	$0	$0	$594,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	$594,000	$0	$0	$594,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$594,000	$0	$0	$594,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	$306,000	$0	$0	$306,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$188,000	$0	$0	$188,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$100,000	$0	$0	$100,000
TOTAL				7	$4,597,700	$0	$0	$4,597,700

PLANILLAS DE PAGO INTERVENTORIA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 78380772
DESDE JUNIO 2022 HASTA JUNIO 2022

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800173768
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AVENIDA 28 # 37-38	TELÉFONO:	2442900
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	78380772
APELLLIDOS:	ARRIETA MONTERROZA	NOMBRES:	RONALD JAVIER
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7840088751	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	mayo - 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	junio - 2022	FECHA DE PAGO:	10/06/2022	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	INTRA 01 - INTRADOMICILIARIAS

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES						
																	PENSIÓN								SALUD						ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																									
$ 3.000.000	02																	231001-COLFONDOS	29	$ 2.900.000	$ 464.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 464.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	29	$ 2.900.000	$ 116.000	$ 0	$ 116.000	14-11 - ARL SURA	29	$ 2.900.000		$ 201.900	29	$ 2.900.000	CCF16-COMFACOR	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 897.900

Planilla Pagada
ach SOI

Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 43160977
DESDE JUNIO 2022 HASTA JUNIO 2022

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800173768		
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL		
DIRECCIÓN:	AVENIDA 28 # 37-38	TELÉFONO:	2442900		
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI		

DATOS DEL COTIZANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	43160977		
APELLLIDOS:	CORREA CASTAÑO	NOMBRES:	MARCY ALEJANDRA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA		
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:			
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO		
TIPO DE SALARIO:	FIJO				
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI		

PLANILLA No:	7838571168	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	mayo - 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	junio - 2022	FECHA DE PAGO:	08/06/2022	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	65 - OFICINA MEDELLIN

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																	PENSIÓN									SALUD					ARP				CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
$ 4.673.760																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.673.760	$ 747.900	$ 23.400	$ 23.400	$ 0	$ 0	Normal	$ 794.700	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 4.673.760	$ 187.000	$ 0	$ 187.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.673.760		$ 325.300	30	$ 4.673.760	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 187.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 1.494.000

Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 78039054
DESDE JUNIO 2022 HASTA JUNIO 2022

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800173768		
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL		
DIRECCIÓN:	AVENIDA 28 # 37-38	TELÉFONO:	2442900		
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI		

DATOS DEL COTIZANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	78039054		
APELLLIDOS:	CASTAÑO QUINTANA	NOMBRES:	JOSE STALIN		
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA		
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:			
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO		
TIPO DE SALARIO:	FIJO				
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI		

PLANILLA No:	7838574612	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	mayo - 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	junio - 2022	FECHA DE PAGO:	10/06/2022	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	27 - ARCA CARCELES

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES						
																	PENSIÓN								SALUD					ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
$ 3.000.000																		230201-PROTECCION	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.000.000		$ 208.800	30	$ 3.000.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 928.800

Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 79533765
DESDE JUNIO 2022 HASTA JUNIO 2022

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800173768
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AVENIDA 28 # 37-38	TELÉFONO:	2442900
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79533765
APELLLIDOS:	MARIN URIBE	NOMBRES:	GREGORIO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7838574612	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	mayo - 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	junio - 2022	FECHA DE PAGO:	10/06/2022	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	27 - ARCA CARCELES

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES						
																	PENSIÓN								SALUD					ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
$ 3.500.000																		231001-COLFONDO	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS008-COMPENSA	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 1.083.600

Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1085294161
DESDE JUNIO 2022 HASTA JUNIO 2022

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901108740		
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARCA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL		
DIRECCIÓN:	AC CRA 28 # 37-38	TELÉFONO:	2442900		
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI		

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1085294161
APELLLIDOS:	GRIJALBA BOLAÑOS	NOMBRES:	EMMA FERNANDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7839714191	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	mayo - 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	junio - 2022	FECHA DE PAGO:	08/06/2022	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	01 - ADMINISTRACION

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																	PENSIÓN								SALUD					ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
$ 1.798.500																		230301-PORVENIR	30	$ 1.798.500	$ 287.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.800	EPS008-COMPENSA	30	$ 1.798.500	$ 72.000	$ 0	$ 72.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.798.500		$ 9.400	30	$ 1.798.500	CCF24-COMPENSAR	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 441.200



Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 80192920
DESDE JUNIO 2022 HASTA JUNIO 2022

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901108740
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARCA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AC CRA 28 # 37-38	TELÉFONO:	2442900
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80192920
APELLLIDOS:	FORERO ANAYA	NOMBRES:	CARLOS ANDRES
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7839714191	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	mayo - 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	junio - 2022	FECHA DE PAGO:	08/06/2022	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	01 - ADMINISTRACION

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																	PENSIÓN								SALUD					ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																									
$ 2.559.391														13-13				230301-PORVENIR	1	$ 85.314	$ 13.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 13.700	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 85.314	$ 3.500	$ 0	$ 3.500	14-11 - ARL SURA	1	$ 85.314		$ 0	1	$ 85.314	CCF24-COMPENSAR	$ 3.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 2.559.391																		230301-PORVENIR	29	$ 2.474.078	$ 395.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 395.900	EPS005-SANITAS S.A.	29	$ 2.474.078	$ 99.000	$ 0	$ 99.000	14-11 - ARL SURA	29	$ 2.474.078		$ 13.000	29	$ 2.474.078	CCF24-COMPENSAR	$ 99.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 627.600

Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1016065352
DESDE JUNIO 2022 HASTA JUNIO 2022

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800173768
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AVENIDA 28 # 37-38	TELÉFONO:	2442900
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1016065352
APELLLIDOS:	SANCHEZ PEREZ	NOMBRES:	BRYAN ALFONSO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7838573241	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	mayo - 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	junio - 2022	FECHA DE PAGO:	08/06/2022	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	ST 01 - SANTA TERESITA

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES						
																	PENSIÓN								SALUD					ARP				CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
$ 1.500.000												25-26						230301-PORVENIR	2	$ 100.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 16.000	EPS008-COMPENSA	2	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 4.000	14-11 - ARL SURA	2	$ 100.000		$ 0	2	$ 100.000	CCF24-COMPENSAR	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 1.500.000												27-27						230301-PORVENIR	1	$ 33.334	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 5.400	EPS008-COMPENSA	1	$ 33.334	$ 1.400	$ 0	$ 1.400	14-11 - ARL SURA	1	$ 33.334		$ 0	1	$ 33.334	CCF24-COMPENSAR	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 1.500.000																		230301-PORVENIR	27	$ 1.350.000	$ 216.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 216.000	EPS008-COMPENSA	27	$ 1.350.000	$ 54.000	$ 0	$ 54.000	14-11 - ARL SURA	27	$ 1.350.000		$ 94.000	27	$ 1.350.000	CCF24-COMPENSAR	$ 54.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 450.200

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

INFORME DE GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

“CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL 2.
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022
CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTORÍA

ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.

JULIO 01 DE 2022

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL 2.
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

Municipio	Córdoba	**Contrato:**		2220576	
Contratista de obra	Consorcio Construredes	**Contratista de interventoría**		Arca Arquitectura e Ingeniería S.A.	
Fecha:	30 de junio de 2022	**Elaboró:**	Norelis Anaya Pérez Profesional Social - contratista	**Revisó:**	

TABLA DE CONTENIDO

1. 42.
53.
64.
74.1.
74.1.1 Socializaciones:
7
4.1.2 Visitas Casa a Casa: 9
4.1.3. Piezas de Divulgación: 10
4.2. 164.2.1. 174.2.2. 184.2.3. 184.2.4. 224.2.5. 234.2.6.
234.3. 234.4. 244.5. 25

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Información del proyecto 6
Tabla 2 Material divulgativo 11
Tabla 3 Punto de atención a la Comunidad 12

1. INTRODUCCIÓN

Mediante el presente informe, se dan a conocer las actividades desarrolladas en cada uno de las líneas de intervención del Plan de Gestión Social, que se ejecutaron en el marco del contrato de obra **N.º 2220576** cuyo objeto corresponde a "**CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA (BOLÍVAR)"** en el periodo comprendido entre 1 al 30 de junio del 2022, en el cumplimiento de los parámetros establecidos por el **VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO - DIRECCIÓN DE PROGRAMAS - PROGRAMA CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS**, es

importante mencionar que las actividades aquí plasmadas contaron con el acompañamiento de la Interventoría.

2. ANTECEDENTES

El Programa de Conexiones Intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico, es un programa del Ministerio de Vivienda y ejecutado por ENTerritorio, con el cual se busca garantizar el acceso a los servicios mencionados a poblaciones vulnerables que no cuenten con estos servicios. -

El municipio de Córdoba departamento de Bolívar, ha sido beneficiario en el marco de este programa, con la priorización de uno de sus barrios, cumpliendo con los criterios de focalización, el barrio San Martín, este se encuentra situado en el centro de la cabecera municipal, debido a su ubicación, este es un sector comercial, que es visitado diariamente por un gran número de personas en búsqueda de los productos y servicios que aquí se ofrecen,

adicional, se cuenta con infraestructura vial en buen estado, que facilitan el tránsito vehicular y peatonal.

3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

A continuación, se presenta la información más relevante del proyecto.

Tabla 1 Información del proyecto

FECHA DE INICIO DE OBRAS:					
NOMBRE DEL MUNICIPIO	**NOMBRE BARRIOS A INTERVENIR**	**NOMBRE BARRIOS INTERVENIDOS**	**FECHA DE INFORME**	**N° DE VIVIENDAS A**	**N° DE VIVIENDAS**

				INTERVENIR POR BARRIO	INTERVENIDAS POR BARRIO
CORDOBA BOLIVAR	SAN MARTÍN	SAN MARTÍN	Del 1 al 30 de junio de 2022	217	42

4. LÍNEAS DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

El componente de gestión social, se implementa desde el inicio del proyecto, bajo tres líneas estratégicas, este se encuentra enfocado en el trabajo directo con la comunidad, a través de actividades de socialización y participación, promoviendo la corresponsabilidad de las familias beneficiadas de los barrios focalizados.

4.1. Línea de Comunicación

Esta línea contempla una serie de actividades relacionadas con la transmisión y divulgación de la información del programa de Conexiones Intradomiciliarias a los potenciales beneficiarios del Barrio San Martín, en el marco de esta línea se pretende dar a conocer a través de estrategias comunicativas y metodologías participativas las particularidades del programa, en este sentido es vital que la comunidad conozca y se interese por solicitar información que promuevan el conocimiento y la apropiación de este programa.

Las actividades desarrolladas en el marco de esta línea de intervención, son vitales para la ejecución del programa, debido a que la comunidad contará con el conocimiento necesario, lo cual favorecerá el desarrollo de acciones de las demás líneas de acción. Por ello, es necesario la implementación de estrategias que contribuyan a la fácil comprensión de los objetivos del programa. Teniendo en cuenta la idea anterior, a continuación, se detallan las actividades realizadas bajo el enfoque de esta línea.

4.1.1 Socializaciones:

Es importante anotar, que el día lunes 13 de junio, con el objetivo de dar respuesta de la PQRS Nº 12, (recibida el 1 de junio de 2022, más adelante se detallará) se programó un espacio de socialización con los miembros del Comité veedor, líderes comunitarios y miembros de la Junta de Acción Comunal, evento realizado en las instalaciones de la Casa de la Cultura, contando con la participación de: ingeniero residente, las profesionales sociales del contratista y de interventoría y los diferentes miembros del Comité de Veeduría del PCI, Rubén Alvis, Cristóbal Anaya, Orlando Teherán, Maira Rosales y Melissa Durango, también se contó con el acompañamiento de la delegada social del prestador de los servicios de acueducto y alcantarillado, Yuranis Serrano, el presidente de la Junta de Acción Comunal José Gregorio

Martínez (peticionario PQRS 12) y demás miembros como, Diana Paternina Navarro, Raúl Alberto Ochoa Crúzate y la secretaria de la misma, Doris Jiménez Ramírez. Cabe destacar, que se le extendió la invitación a la delegada social del municipio, sin embargo, no asistió al espacio de socialización.

El encuentro estuvo a cargo de las profesionales del equipo social del Contratista de obra e Interventoría, explicando el objetivo de la reunión, información del PCI y temas relevantes del mismo, mencionados anteriormente durante el primer encuentro con los miembros del Comité Veedor, se denotó la importancia de reforzar esta información, cuáles son los requisitos para acceder al beneficio además se llevó a cabo el abordaje de los temas puntuales. Se resaltó que el PCI, su fundamento es en pro de la comunidad, este proyecto proviene del Ministerio de Vivienda y supervisado por Enterritorio, se expresó que cualquier inquietud por parte de la comunidad deben comunicarles que se dirijan al personal técnico y social y/o al punto de atención al ciudadano.

Se precisó que el contrato de obra o información del proyecto se encuentra registrado en la plataforma del Secop II, a la cual pueden acceder para obtener dicha información, ya que es de conocimiento público.

Por otra parte, El martes 28 de junio, se llevó a un espacio de socialización dirigido a los miembros del Comité veedor, miembros de la Organización de Acción Comunal del Barrio San Martín, Miembros del Comité Veedor, Personero Municipal, Miembros de la Administración y actores relevantes de la comunidad, en las instalaciones de la Casa de la Cultura, contando con la participación de: el ingeniero residente del contratista de obra, la profesional social del contratista de obra, apoyo social de interventoría.

Entre los miembros del Comité de Veeduría del PCI, se encontraron: Rubén Alvis, presidente del comité y Maira Rosales. También se contó con el acompañamiento de Luis Uribe, representante de la entidad prestadora, delegada social del municipio,

profesional universitario de la Secretaría de Planeación Municipal y habitantes del Barrio San Martin, beneficiarios del programa. Por parte de la Organización de Acción Comunal se contó con la presencia de la secretearía Doris Jiménez Ramírez.

Cabe enfatizar que se le extendió la invitación al gerente general de la empresa prestadora de los servicios de acueducto y alcantarillado. Sin embargo, no asistió al espacio de socialización.

Se inicia la reunión por parte de las profesionales del equipo social del Contratista de obra e Interventoría, explicando el objetivo de la reunión, resaltando los temas a abordar, recordando los temas abordados durante los encuentros realizados los días 31 de marzo y 13 de junio del año en curso, el primero definido como el primer encuentro con los miembros del Comité Veedor y el segundo con el mismo objetivo y como respuesta a la pqr número 12 de solicitud de información del proyecto. Luego se llevó a cabo el abordaje de los diferentes puntos como: ampliación del plazo de cierre de inclusiones hasta el día 30 de junio de 2022, recepción de hojas de vida en el punto de atención ubicado en la calle 3, carrera 5 barrio abajo, martes y jueves de 8 a.m. a 12 m. Línea telefónica: 3205747617, viviendas intervenidas hasta el momento, cantidad de personal laborando/contratado de mano de obra local, compromisos que debe tener el personal para la calidad de las obras, información del proyecto: plataforma SECOP II, requisitos para tener en cuenta en las inclusiones, por parte del municipio y el prestador y trámite de cierre de inclusiones por parte del contratista de obra.

Se destacó que el Programa de Conexiones Intradomiciliarias, está dirigido a proveer bienestar social basado en que la vivienda cuente con los aparatos hidrosanitarios correspondientes y que se estarán recibiendo solicitudes de inclusión hasta el día 30 de junio de 2022, indicando que aquellas personas que consideren que sus viviendas tienen una necesidad sentida referente a la ausencia de unidad sanitaria, pueden dirigirse al punto de atención a realizar su petición los martes y jueves de 8 a.m. a 12 m. a su vez se reiteró que por parte del contratista de obra se están recibiendo hojas de vida de personal de mano de

obra no calificada en el punto de atención, ubicado en la calle 3, carrera 5 barrio abajo, lo cual está sujeto a condiciones y disposiciones por parte del contratista.

Así mismo, se invitó a la comunidad, especialmente a los beneficiarios que frente a cualquier interrogante, dudas, queja e inquietud deben dirigirse al personal técnico y social y/o al punto de atención al ciudadano. También que la información del contrato de obra o el proyecto se encuentra colgada en la plataforma del Secop II, la cual es de acceso público, si se requiere de la documentación del mismo.

Ver evidencias

4.1.2 Visitas Casa a Casa:

Las actividades de visita casa a casa que se han desarrollado durante este periodo hacen referencia a:

-El día 3 de junio se realizó visita a los potenciales beneficiarios que han expresado rechazo voluntario al beneficio, debido a que en sus viviendas ya cuentan con todos los aparatos sanitarios ofertados por el PCI, por tanto, el equipo social visita a cada una de estas viviendas con el fin de constatar la información y diligenciar el acta de rechazo de potenciales beneficiarios. Cabe resaltar que previo a la firma del acta, se les otorgó información del proyecto, especialmente de los objetivos del mismo y que situaciones posibles se pueden generar frente al rechazo, posiblemente se podrá vincular a otra persona que no esté incluida en la matriz de beneficiarios.

-Debido a la importancia de recibir las percepciones por parte de los beneficiarios, se realizaron visitas a 13 viviendas intervenidas, debido a que algunos expresaron dudas referentes a la intervención, se les invita a dirigirse al personal técnico durante el trabajo de campo o el centro de atención, para recibir información relacionada con la intervención en la

vivienda.

-En la actividad de establecer la debida identificación de las viviendas donde ya se han realizado los diagnósticos, el equipo social realiza visita casa a casa, con el fin de instalar los sticker, inicialmente, se socializa al beneficiario el objetivo de la actividad y se solicita el permiso correspondiente para su respectiva instalación en la puerta o entrada de la vivienda. Cabe destacar que los beneficiarios se muestran prestos a colaborar y no manifiestan inconvenientes con este ejercicio. En su totalidad durante este periodo se han instalado 66 stikers, nueve (9) sticker, el día 7 de junio de 2022. Dicha identificación de las viviendas efectivas, se realiza de la siguiente manera: Ej: C – B – SM – MNZ – VE – (001) y se continúa con esta actividad, el día 24 de junio de 2022, al realizar la instalación de los sticker de identificación de las viviendas efectivas, en este caso identificadas de la siguiente manera: Ej: C – B – SM – MNZ – VE – (010).

Ver evidencias

4.1.3. Piezas de Divulgación:

- **Volantes y folletos**

Con el fin de darle cumplimiento a las actividades, se elaborarán dos (2) piezas comunicativas (oficio de invitación N°3 Y N°4), estas fueron revisadas y avaladas por Interventoría y posteriormente por ENterritorio, el contenido de cada una de estas corresponde a:

Oficios de invitación N° 3: este documento está dirigido a extenderle invitación cordial a los miembros del comité veedor, entidad prestadora y municipio, a un espacio de socialización el cual estuvo dirigido a dar a conocer información relacionada con las actividades que se están ejecutando en el marco del programa, definido para el día

Oficios de invitación N°4: dirigidos a interesados (Comité veedor, Junta de Acción Comunal, delegados del Municipio y Prestador y personero municipal, dar a conocer los avances del

proyecto, sus características y requisitos, para el espacio de socialización llevado a cabo el 28 de junio de 2022.

Cabe resaltar que estas piezas informativas son elaboradas con el propósito de invitar a los miembros del comité veedor, entidad prestadora, municipio, y actores relevantes de la comunidad, luego de su revisión y aprobación por el ente supervisor, son entregadas a cada uno de ellos.

El día 10 de junio se hizo entrega del oficio de invitación (N° 3). A cada uno de los integrantes del comité veedor, delegada social del municipio, delegada social y representante legal de la entidad prestadora, a un espacio de socialización con el fin de entregar información del PCI, en las instalaciones de la Casa de la Cultura, ubicada en el barrio Abajo. Para ello, fue necesario dirigirse a cada una de las viviendas donde residen cada uno de ellos.

El día 23 de junio se hizo entrega del oficio de invitación N° 4 al espacio de socialización a cada uno de los integrantes del comité veedor, delegada social del municipio, delegada social y representante legal de la entidad prestadora, personero municipal y secretario de planeación, con el fin de entregar información del PCI, en las instalaciones de la Casa de la Cultura, ubicada en el barrio Abajo. Para ello, fue necesario dirigirse a cada una de las viviendas donde residen cada uno de ellos.

Ver evidencias

- **Valla Informativa**

La Valla Informativa, continúa instalada en un punto estratégico de la cabecera municipal; ubicada en la entrada del Barrio San Martín, específicamente a la entrada del municipio, por la vía que conduce al Municipio de Zambrano, Bolívar y se encuentra en estado favorable.

Ver Evidencias.

- **Perifoneo**

En cuanto a estas actividades se realiza:

-Transmisión de información de inclusiones, se realizó el 3 de junio a través de la emisora comunitaria, siendo este un medio de comunicación al cual las personas tienen fácil acceso y es sintonizada por la mayoría de la población Cordobés, el objetivo de esta actividad se relaciona con brindar información a la comunidad del barrio San Martín, acerca del proceso de inclusión al Programa de Conexiones Intradomiciliarias, se da a conocer la fecha de cierre de recepción de solicitudes de los posibles beneficiarios, de igual manera se les informa que existe un punto de atención a la comunidad, donde se entrega información a las personas que lo requieran, de igual forma, se refiere que en el punto de atención se reciben las hojas de vidas para la oferta laboral de personal de mano de obra no calificada, se aclara, que esto está sujeto a verificaciones por parte del contratista de obra.

Una nueva transmisión se llevó a cabo, nuevamente el día 23 de junio de 2022, a través de la emisora comunitaria, teniendo en cuenta las particularidades de la población y la acogida de este medio de comunicación se procedió a otorgar información del proceso de inclusión del Programa de Conexiones Intradomiciliarias, relacionada con la fecha de cierre de recepción de inclusiones, a su vez, se brindó información relacionada con la oferta laboral dirigida a personal de mano de obra no calificada y se extendió invitación a la comunidad del barrio San Martín a la reunión programada para el 28 de junio, la cual tiene la finalidad de retomar información del PCI y dar a conocer los avances del proyecto a la fecha, esta actividad estuvo a cargo del personal técnico y social del contratista de obra e interventoría.
Ver evidencias

- **Cartelera Informativa**

La cartelera informativa, se encuentra instalada en la alcaldía municipal, la cual contiene información de sumo interés en ella se consigna la información de las entidades encargada de desarrollar el Programa de Conexiones Intradomiciliarias, entre las que se encuentra el Ministerio de Vivienda, La Gobernación de Bolívar, El Municipio de Córdoba, el Consorcio CONSTRUREDES, Enterritorio, e Interventoría, entre otras, asimismo, los canales de

atención a la comunidad y el puesto de atención físico, donde serán atendidos por el equipo de profesionales sociales de contratista de obra e interventoría, evidenciando la información que deben aportar los posibles beneficiarios y los criterios de focalización que contempla el programa.

-El día 8 de junio se realiza actualización de información en la cartelera que se encuentra ubicada en la Alcaldía Municipal, la cual contiene información básica del PCI, las piezas publicada se atribuye a la oferta laboral que el Contratista de obra da a conocer a la población (Maestros de obra, oficiales y ayudantes de construcción) esto debido a que la importancia de contar con talento humano de la zona, además que la generación de empleo se traduce en la mejora de calidad de vida para la población.

-El día 29 de junio se actualiza nuevamente la cartelera debido a que por condiciones del clima se deterioró, cabe resaltar que uno de los compromisos contemplados dentro del acta de instalación de la misma se atribuye a su cuidado y/o protección por parte del municipio. Actualmente, se halla instalada en el lugar estratégico que inicialmente se dispuso para su instalación.

De acuerdo en reunión con la Profesional Social de Enterritorio, se sugirió la instalación de una cartelera informativa en lugar de afluencia de personas en el Barrio San Martín, teniendo en cuenta esto, se solicita la autorización al propietario de la tienda ubicada en la Carrera 4 # 10 -13, donde se instala dicha información, en este espacio se da a conocer la información del Punto de Atención a la comunidad, características del programa, y la oferta laboral de mano de obra no calificada. Esta actividad se realizará el 30 de junio de 2022.

Ver evidencias

Tabla 2 Material divulgativo

Núm de pieza	Material Utilizado	Descripción medio de divulgación	Fecha de Divulgación	Relación Evidencias
1	Instalación valla informativa	Valla Instalada	29-06-2022	-Registro fotográfico

Núm de pieza	Material Utilizado	Descripción medio de divulgación	Fecha de Divulgación	Relación Evidencias
2	Material Informativo y/o de convocatoria	Oficio de invitación 3 - respuesta PQR n° 12	10-06-2022	-Registro fotográfico -Planilla Entrega de información.
3	Material Informativo y/o de convocatoria	Oficio de invitación 4 - Informativo PCI	24-06-2022	-Registro Fotográfico -Entrega de información.
4	Material Informativo y/o de convocatoria	Volante 3 Convocatoria personal mano de obra local.	08-06-2022	-Registro Fotográfico
5	Otras actividades de divulgación: perifoneo	Transmisión inclusiones PCI – aviso radial	03-06-2022	-Registro Fotográfico
6	Otras actividades de divulgación: perifoneo	Transmisión – aviso radial, información de interés comunitario.	23-06-2022	-Registro Fotográfico
7	Cartelera Informativa	Adecuación de Cartelera con la información del PCI, instalada en la Alcaldía Municipal de Córdoba, Bolívar.	8 y 29-06-2022	Registro fotográfico

4.2. Línea de Participación Comunitaria:

Esta línea tiene como objetivo incentivar la participación y responsabilidad ciudadana en la gestión del Control social sobre el Programa de Conexiones Intradomiciliarias, por ello se han apoyado las actividades realizadas por los demás entes comprometidos e inmiscuidos con el programa. A continuación se describen las actividades realizadas bajo el marco de esta línea de intervención.

4.2.1. Conformación del Comité Veedor:

De acuerdo con el acta de conformación del comité veedor, se evidencia que fue creado el día 7 de abril que corresponde a la realización de la jornada de socialización de apertura de barrio, en ese espacio se definieron los participantes de este comité y el día 16 de mayo se procedió a la elección del presidente de la veeduría, la cual está integrada por cinco (5) integrantes y representada por el miembro anteriormente mencionado. Es de resaltar que a la fecha de corte del presente informe la Alcaldía Municipal no ha realizado la entrega de la copia de resolución de conformación del Comité Veedor.

4.2.1.1 Reuniones Comité Veedor

Durante este periodo, se realiza una reunión descrita en la línea de Comunicación, en la actividad de socializaciones, que contó con el acompañamiento del Comité Veedor, esta corresponde a la tercera reunión que asiste el Comité. (ver ítem socializaciones).

Es de resaltar que, la participación del Comité en los espacios participativos ha sido activa, se evidencia el compromiso de estos para con el programa.

Por otra parte, es de anotar que en este espacio se socializo que, dentro de los conceptos emitidos por el municipio sobre las solicitudes de inclusión por parte de la comunidad del Barrio San Martín, han existido inconvenientes con algunas personas que reciben la respuesta de no favorabilidad, se comentó que dentro de las funciones / obligaciones del componente social está el diligenciamiento del formato de recepción de PQRS (para estos casos solicitudes de inclusión al PCI) y que se debe reportar a la Entidad Contratante el debido cierre de este documento, el cual consta de la firma del peticionario cuando se entrega la respuesta, teniendo en cuenta que algunos peticionarios recibieron el concepto de que no cumplían con los requisitos, manifiestan no estar de acuerdo con dicha respuesta y que por tal razón no firmaran el mencionado formato, presentada esta situación se solicita al Comité Veedor que sirvan como testigos de dicha situación, los mismos manifestaron su

colaboración frente a estos casos, con el compromiso de entregar copia de la PQRS y la respuesta emitida por el Municipio para su respectiva revisión.

4.2.2. Punto de Atención a la Comunidad:

El Punto de Atención a la comunidad, continúa ubicado en un lugar de fácil acceso para la ciudadanía, específicamente a la vía de acceso que conduce a la zona rural, ubicado en la Calle 3 Carrera 5 Barrio Abajo, cuenta con la debida identificación (Pendón), con los datos requeridos y el horario de atención establecido es de ocho (8) horas semanales, los días martes y jueves de 8 a.m. a 12.m.

Este espacio se implementa con la finalidad de que las personas interesadas, se acerquen depositen sus dudas, quejas o soliciten información.

A continuación, se da a conocer la información del PAC.

Tabla 3 Punto de atención a la Comunidad

Dirección del Punto de Atención	**Barrio**	**Horarios de Atención**		**Línea Telefónica y correo**	**N° de Buzones Instalados**	**Relación de Evidencias**
		Día	Hora			
Calle. 3 Carrera 5. Córdoba—Bolívar	Barrio Abajo.	Martes Y Jueves	8:00 am a 12 m	320 5747617 ccontruredes@gmail.com	1	Registro Fotográfico

Ver evidencias.

4.2.3. Recepción y trámite de las PQRS:

Al realizar las visitas casa a casa, algunas personas se acercan al equipo social con el fin de exponer diferentes situaciones en algunos casos relacionadas con aspectos técnicos, por ende,

se direcciona al área técnica y se le invita a acercarse al punto de atención al ciudadano. Si es relacionada con el área social se procede a brindar el acompañamiento oportuno para dar trámite al interrogante por parte del beneficiario. En el caso de las dudas referente al proceso de inclusión, se les invita a acercarse al punto de atención y realizar el respectivo trámite de inclusión al programa.

De acuerdo con lo anterior, es necesario corroborar en la matriz de potenciales beneficiarios que no hallaran consignados ahí. Para el día 1 de junio se recibió una PQRS por parte del presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio San Martín, a través de la cual solicitó información relacionada con la contratación del personal de obra e información relevante del Programa de Conexiones Intradomiciliarias. A dicha solicitud se le dio respuesta el día 13 de junio, a través de la programación de un espacio de socialización mediante el cual se le brindaría información del PCI, para finalizar con el respectivo cierre de la PQRS.

Posteriormente, el 2 de junio, se recepcionaron ocho (8) PQRS, peticiones por parte de habitantes del barrio San Martín, el día 7 de junio se recepcionaron catorce (14) peticiones de inclusión por parte de habitantes que argumentaron residir en el barrio San Martín y tener falencias en cuanto a unidad sanitaria en sus viviendas, el 9 de junio, se recepcionaron doce (12) PQRS y para el día 13 de junio cuatro (4) PQRS.
El día 14 de junio se recibieron seis (6) solicitudes de inclusión, el día 15 de junio dos (2), el día 16 de junio dos (2), el día 17 de junio una (1), el día 21 dos (2), el día 22 de junio se recibió una (1), el día 23 de junio una (1), el día 24 de junio (1) solicitud de inclusión y el día 25 se recibió una (1) solicitud de inclusión, y el 30 de junio se reciben doce (12), los habitantes del barrio San Martín se acercaron al punto de atención y expresaron que sus viviendas no cuentan con unidades sanitarias en condiciones adecuadas y exponen que cumplen con los criterios de focalización definidos por Minvivienda.

A cada uno de los peticionarios se les brinda información sobre el trámite de inclusión al programa dejando clara la función que desarrolla el contratista en este proceso, que se envía

dicha información a la Alcaldía Municipal y el área encargada revisa y verifica la información suministrada y emite un concepto, favorable o no favorable.

En conclusión, durante el presente periodo se reciben 67 solicitudes de inclusión y una (1) petición.

En cuanto a las PQRS recibidas en el mes de mayo, siendo once (11) se ha dado cierre a 8 de ellas, teniendo en cuenta que algunas personas manifiestan no estar de acuerdo con el concepto dado por la Alcaldía y otra persona no se encuentra en el municipio. Se espera que, en el próximo periodo se pueda remitir los respectivos cierres, la PQRS Nº 12, recibida en el mes de junio se realiza el cierre en este mismo periodo.

Ver evidencias

A continuación, se relaciona el estado de las PQRS.

Tabla 4 Relación PQRS

Solicitud De Inclusión Nº	Fecha de recepción	Peticionario	Nº Identificación	Estado de PQRS
1	24/05/2022	Ana Esther Crúzate Daza	1.049.453.967	Cerrada
2	24/05/2022	Cielo del Carmen medina Fonseca	22.854.534	Abierto
3	24/05/2022	Delfina Elena Ochoa Romero	22.853.996	Abierto
4	26/05/2022	Islena Del Carmen Martínez Puerta	22.855.942	Cerrada
5	26/05/2022	José David Teherán Hernández	73.315.288	Cerrada
6	26/05/2022	Ana Rodríguez De Mendoza	22.854.276	Cerrada
7	26/05/2022	Tatiana Herrera Vergara	1.049.453.341	Cerrada
8	26/05/2022	Rosario Vergara Castro	22.855.153	Abierto
9	31/05/2022	Sol María Puerta Bohórquez	22.854.032	Cerrada
10	31/05/2022	Rosa Escobar de Ahumada	22.853.781	Cerrada
11	31/05/2022	María Ramos Vásquez	22.855.515	Cerrada
12	02/06/2022	José Gregorio Martinez Meza	73352002	Cerrada
13	02/06/2022	Donairo Escobar Romero	1.115.852.669	Abierto
14	02/06/2022	Maria Tejedor Pajaro	22.855.106	Abierto
15	02/06/2022	Beatriz Ochoa Piña	1.002.302.054	Abierto
16	02/06/2022	Ana Isabel Ortega Bohorquez	22.854.576	Abierto
17	02/06/2022	Digna Ortega Bohorquez	22.854.558	Abierto
18	02/06/2022	Luz Estela Paternina Escobar	22856876	Abierto
19	02/06/2022	Esther Idalvi Lozano Esquea	44.160.575	Abierto
20	02/06/2022	Gregoria Paternina Escobar	22.855.753	Abierto
21	07/06/2022	Amalfi Esther Piña Acuña	22.854.624	Abierto
22	07/06/2022	Kellys Garcia Contreras	1.049.452.499	Abierto

Solicitud De Inclusión Nº	Fecha de recepción	Peticionario	Nº Identificación	Estado de PQRS
23	07/06/2022	Ilsa Maria Sampayo de Torres	33.297.022	Abierto
24	07/06/2022	Argenida Rivera Cruzate	22.854.180	Abierto
25	07/06/2022	Margelis Jimenez Ramirez	22.854.946	Abierto
26	07/06/2022	Isabel Ramirez Quiroz	22.854.444	Abierto
27	07/06/2022	Rosa Escobar Fernandez	22.854.436	Abierto
28	07/06/2022	Sofia Maria Fonseca Gonzalez	22.854.294	Abierto
29	07/06/2022	Juan Carlos Ochoa Fonseca	1.049.453.664	Abierto
30	07/06/2022	Maritza Isabel Alvis Ballestas	22.854.450	Abierto
31	07/06/2022	Patricia Isabel Anaya Leguía	22.854.100	Abierto
32	07/06/2022	Alicia Esther Villamizar Rosales	22.854.828	Abierto
33	07/06/2022	José Gabriel Márquez Bolaño	3.831.517	Abierto
34	07/06/2022	Sixta Bibiana Ahumada Polo	22.854.025	Abierto
35	09/06/2022	Yesenia Marcela Escobar Madariaga	1.049.453.629	Abierto
36	09/06/2022	Elsy Estella Estrada Leguía	22.854.755	Abierto
37	09/06/2022	Justa Matilde Vergara Villa	22.853.742	Abierto
38	09/06/2022	Martín Manuel Lozano Rivera	12.587.120	Abierto
39	09/06/2022	Eliani del Carmen Flores Mendoza	22.856.909	Abierto
40	09/06/2022	Bermuil del Socorro Vergara Causado	22.854.230	Abierto
41	09/06/2022	Duberlis Torres Anaya	22.856.866	Abierto
42	09/06/2022	Sirley María Ortega Barboza	22.855.342	Abierto
43	09/06/2022	Josefina Fernández Anaya	22.855.756	Abierto
44	09/06/2022	Marina del Carmen Romero Villa	22.854.569	Abierto
45	09/06/2022	Miladis del Carmen Pérez Medina	22.854.417	Abierto
46	09/06/2022	Nulis Margoth Henao Causado	22.856.863	Abierto
47	13/06/2022	Orlando Miguel Teherán Hernández	9.092.547	Abierto
48	13/06/2022	Alfonso Manuel Romero Henao	73.315.070	Abierto
49	13/06/2022	Rosa Isabel de Avila Padilla	26.840.974	Abierto
50	13/06/2022	Angela del Socorro Martínez Flores	22.853.964	Abierto
51	14/06/2022	Pedro Pablo Romero Diaz	3.831.879	Abierto
52	14/06/2022	Yulieth Candelaria Villafañe Escobar	1.049.454.585	Abierto
53	14/06/2022	Astrid Margarita Medina Fonseca	22.855.439	Abierto
54	14/06/2022	José del Carmen Hena Romero	4.031.762	Abierto
55	14/06/2022	Rosiris escobar Romero	22.854.927	Abierto
56	14/06/2022	Braulio Alfonso Medina Torres	3.831.575	Abierto
57	15/06/2022	María Graciela Fernández Chamorro	22.855.851	Abierto
58	15/06/2022	Ana Ibis Hernández Fernández	1.049.452.719	Abierto
59	16/06/2022	Francisco Medina Romero	3.831.242	Abierto
60	16/06/2022	Pablo Roman Piña Ahumada	3.831.873	Abierto
61	17/06/2022	Yecenia María Valeth Crúzate	22.854.432	Abierto
62	21/06/2022	Tulia Elena Ochoa Crúzate	22.854.199	Abierto
63	21/06/2022	Adolfo Rafael Pineda Cantillo	73.315.242	Abierto
64	22/06/2022	Gerardo Rivera Ballestas	3.831.333	Abierto
65	23/06/2022	Eulogio Amado Villamizar Sanes	3.831.698	Abierto
66	24/06/2022	Estefany Luz Rico González	1.049.452.865	Por Remitir
67	15/06/2022	NELFIS DEL CARMEN TORRES PÉREZ		Por Remitir
68	30/06/2022	ELIDA MARIA ROSALES ESCOBAR		Por Remitir

Solicitud De Inclusión Nº	Fecha de recepción	Peticionario	Nº Identificación	Estado de PQRS
69	30/06/2022	PABLA ISABEL NAVARRO DE SERRANO		Por Remitir
70	30/06/2022	YESENIA VALETH CRUZATE		Por Remitir
71	30/06/2022	PETRONA MEDINA DE CRUZATE		Por Remitir
72	30/06/2022	SANDRA CRUZATE MEDINA		Por Remitir
73	30/06/2022	ARELIS MARIA VILLAFAÑE CANTILLO		Por Remitir
74	30/06/2022	BEATRIZ ELENA ACUÑA ARIZA		Por Remitir
75	30/06/2022	IRMA PINEDA CACERES		Por Remitir
76	30/06/2022	MARICELA VASQUEZ PINEDA		Por Remitir
77	30/06/2022	ROSIRIS MARGOTH FERNANDEZ ANAYA		Por Remitir
78	30/06/2022	NELLIS MANJARREZ TOVAR		Por Remitir
79	30/06/2022	YULISA PEREZ ROMERO		Por Remitir

4.2.4. Buzón de PQRS:

Este buzón cumple una función importante porque a través de él todos los posibles beneficiarios del Programa de Conexión Intradomiciliarias, solicitan o exponen situaciones favorables o desfavorables, ante el Consorcio Construredes por razones de interés general o interés particular. Este mecanismo les permite para elevar solicitudes respetuosas de información y/o consulta y para obtener pronta resolución de las mismas, cabe resaltar que se ha informado a los posibles beneficiarios, cuál es la función de este buzón de PQRS, que mediante él podía hacer relaciones, quejas, denuncias, etc., asimismo se abrió el espacio para indicarles cómo se debe hacer un procedimiento en el buzón PQRS.

A la fecha de este corte, se encuentra instalado el buzón de PQRS en el punto de atención y no se han recibido PQRS.

Ver Evidencias

4.2.5. Recorridos de obra

En el presente periodo no se realizan recorridos.

4.2.6. Otras reuniones

El día 22 de junio de 2022 se realizó reunión en las instalaciones de la Casa de la Cultura, a las 10:00 a.m. con la participación de: Secretario de Planeación Municipal, ingeniero residente del contratista de obra, representante de la entidad prestadora y profesional social del contratista, con el fin de conocer los mecanismos de evaluación utilizados por el municipio y la entidad prestadora de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, para determinar o emitir su respuesta, referente al proceso de inclusiones, su respuesta se encuentra enfocada en el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Córdoba Bolívar y realizan visitas con el fin de corroborar la ubicación de la vivienda, es decir si se encuentra dentro de los límites del barrio San Martín.
Ver Evidencias.

4.3. Línea de Capacitación

Los días 10, 11,13 y 23 de de junio se realizaron capacitaciones al personal de obra que está ejecutando las intervenciones en las viviendas priorizadas, las profesionales sociales con el fin de resaltar la importancia de la comunicación asertiva del personal de obra con los beneficiarios, la transmisión de información precisa y veraz del proyecto por parte de estos y el compromiso con la calidad de las obras, se resaltó la importancia de dirigir a los beneficiarios al personal técnico y social en caso de tener dudas, inquietudes o preguntas con relación a la intervención, todo ello con el fin de evitar transmitir información errada del proyecto y prevenir situaciones conflictivas con los beneficiarios, para ello fue necesario

realizar durante 15 minutos a las 7: 00 antes de iniciar labores una socialización mediante la cual se les otorgó información relacionada con:

- ⇒ La importancia de consultar al propietario de la vivienda donde se desarrollan labores si se requiere de cualquier elemento o situación común.
- ⇒ Si el beneficiario requiere de información es necesario que se dirija al personal técnico o social del contratista de obra.
- ⇒ La importancia de ejecutar de manera eficiente las labores, lo cual se reflejará en la calidad de obras para la población.

Ver Evidencias

4.4. Reporte de Actividades Complementarias

Durante este periodo no se realizaron actividades complementarias.

4.5. Reporte de Informes

El día 16 de junio de 2022, se elaboró y se envió el informe quincenal N.º 3, de actividades a Interventoría, para su revisión, con el fin de determinar el correcto procedimiento del desarrollo del programa por parte de los Profesionales Sociales y de hacer las respectivas correcciones de ser el caso.

El día 30 de junio de 2022, se elaboró y se envió el informe quincenal N.º4 de actividades a Interventoría, para su revisión, con el fin de determinar el correcto procedimiento del desarrollo del programa por parte de los Profesionales Sociales y de hacer las respectivas correcciones de ser el caso.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las actividades realizadas en el marco del Plan de Gestión Social se han desarrollado de acuerdo al plan de trabajo y a los lineamientos y directrices entregados por ENTerritorio

Es preciso destacar que se han presentado diferentes situaciones que dificultan el desarrollo de actividades de entrega de información y diagnóstico, por ejemplo, en algunos casos los posibles beneficiarios no residen en las viviendas en las cuales fueron encuestados inicialmente.

La implementación del Plan de Gestión Social ha permitido que se generen estrategias de comunicación directa con la comunidad, permitiendo que la población directamente impactada se informe, reciba de manera activa el programa y se apropie del proyecto, para esto se han dispuesto de espacios para la participación de la comunidad.

Dentro de las diferentes estrategias implementadas, se encuentra el Punto de Atención a la Comunidad, espacio destinado para que las personas soliciten información y/o depositen sus peticiones, quejas y demás, y de esta misma forma se realice el trámite pertinente para dar respuesta.

Por último, se pretende ejecutar o llevar a cabo las actividades consignadas en el cronograma de actividades teniendo en cuenta las líneas de intervención del Plan de Gestión Social, definidas por el contratista de acuerdo a los tiempos definidos, considerando todas aquellas situaciones externas que se suelen presentar.

Es importante que se tenga en cuenta por parte de las entidades correspondientes a aquellas viviendas que presentan condiciones desfavorables en relación al déficit de los aparatos hidrosanitarios para que se les realice una completa Conexión Intradomiciliaria, a fin de que sean beneficiadas de este programa.

El proceso de cierre de PQRS puede ser dificultoso teniendo en cuenta que algunos

peticionario no quedan conformes con la respuesta entregada a ellos, donde el Municipio expresa que no son favorables de acuerdo a la revisión de aquellas solicitudes, para esto es imprescindible el trabajo mancomunado con esta Entidad, es de resaltar que las profesionales sociales de obra e Interventoría han dado a conocer su disposición frente a cualquier requerimiento.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE EL AVANCE O ATRASOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

RECOMENDACIONES GENERALES Y CONCLUSIONES

El presente informe contiene los avances realizados durante el periodo comprendido entre el 1 y 30 de junio de 2022, a continuación se muestra por cada actividad del proyecto los avances más significativos:

Actividad 1:

Chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según la norma sismo resistente NSR-10.

Durante el periodo se hizo la revisión de la información entregada por el Contratista, la Interventoría mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-037-22 del 3 de junio de 2022 emitió el informe de revisión y validación de los planos y diseños.

Posteriormente, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio mediante comunicación con radicado No. 20224300206282 del 31 de mayo de 2022 hizo observaciones a los diseños, las cuales fueron remitidas al Contratista para los respectivos ajustes. Adicionalmente, el contratista solicitó un cambio de especificación técnica del ladrillo en arcilla a bloque en concreto. Lo cual también requería de un ajuste al diseño presentado.

El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.

Actividad 2:

Diagnóstico, validación preliminar, concertación de la intervención y planeación de la intervención

Durante el periodo el contratista presentó los siguientes diagnósticos para aprobación:

Mediante los siguientes comunicados No CCR_CORDOBA_2220576_2022_049, No CCR_CORDOBA_2220576_2022_050, No CCR_CORDOBA_2220576_2022_055, No CCR_CORDOBA_2220576_2022_060 y No CCR_CORDOBA_2220576_2022_062, el contratista hizo entrega de 56 diagnósticos, completando a la fecha de corte del presente informe un acumulado de 80 diagnósticos aprobados.

Esta actividad presenta un atraso de 175 diagnósticos, teniendo en cuenta que de acuerdo al plan de contingencia se bebería contar con los 217 diagnósticos terminados, el contratista de obra presentará una reprogramación amparado en varios cambios de especificaciones técnicas autorizados por la entidad.

Actividad 3:

Ejecución de las obras de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias. Acta de entrega y recibos de las obras.

A la fecha del actual informe y de acuerdo al plan de contingencia el contratista debería tener en proceso constructivo 61 viviendas, sin embargo, sólo se han intervenido 48 viviendas.

La Interventoría solicitó reforzar el personal operativo con el fin de dar inicio a un mayor número de viviendas en ejecución de obras.

Actividad 4:

El detalle de los avances en esta actividad están en el numeral 2.3.1 Plan de Gestión Social.

INFORME DE DESEMPEÑO


A corte del 3 de julio de 2022 el avance programado del proyecto es del 35,75% contra un ejecutado del 15,22%, lo cual representa un atraso del 20,53% equivalente a 31 días.

En los diferentes comités realizados con el Contratista se le ha solicitado implementar acciones que permitan disminuir los atrasos, también se solicitó presentar una reprogramación de obra que se ajuste a las metas y fechas establecidas contractualmente.

La Interventoría estará atenta a la reprogramación presentada por el Contratista, con el fin de implementar acciones que permitan mejorar los rendimientos tanto en la aprobación de los diagnósticos como en la ejecución de las intervenciones.

El Contratista se ha comprometido a reforzar el personal para la intervención de las viviendas y a entregar semanalmente 30 diagnósticos para aprobación.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

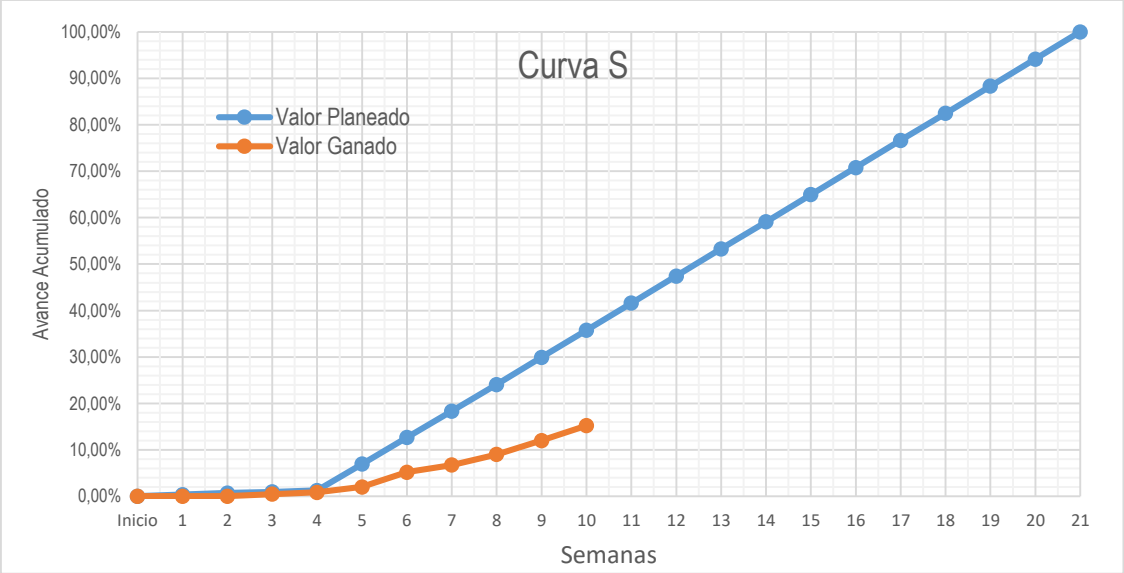

CONCLUSIONES:

- Para la fecha de corte del informe la actividad N° 1 se encuentra al 100%, ya que los diseños fueron aprobados por la Interventoría.

  Se espera la respuesta emitida por el Ministerio de Vivienda al informe entregado.

- Las actividades 2, 3 y 4 se vienen desarrollando con normalidad, a pesar de que no se han logrado las metas establecidas en la programación el Contratista ha ejecutado las actividades cumpliendo con las especificaciones del contrato de obra.

- Se continúa con la implementación de los protocolos de bioseguridad por parte de las profesionales sociales y del equipo técnico que se encuentran trabajando en campo, manteniendo el distanciamiento social en las visitas de capacitación y socialización casa a casa, implementando el uso del tapabocas, el uso de alcohol. Cabe resaltar que se ha generado cultura en los beneficiarios referente al uso de tapabocas y autocuidado. Esto con el fin de evitar los contagios por COVID-19.

RECOMENDACIONES:

Se recomendó al Contratista presentar lo antes posible la reprogramación de obra para continuar con el seguimiento a partir del mes de Julio, adicionalmente se solicitó reforzar los esfuerzos para incrementar el número de diagnósticos presentados y las viviendas intervenidas semanalmente.

Se le recomienda al contratista atender de manera oportuna los requerimientos realizados por la Interventoría para darle celeridad a todos los procesos dentro de la ejecución del Contrato.

DIFICULTADES:

Una de las dificultades que se han presentado en la entrega de los diagnósticos es la entrega de los documentos por parte de los beneficiarios, lo cual ha demorado el proceso de aprobación.

ACREDITACIÓN QUE SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES PARAFISCALES

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F6B3095 0AF5521 90

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OSCAR DARIO SOTO SOTO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 78702431 de MONTERIA (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 63631-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CONSORCIO CONSTRUREDES


Cra 24 No. 15 - 17 Centro
Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com
Teléfono: 311 4143542
San Marcos - SUCRE

CERTIFICADO DE APORTES

Los suscritos, **CARLOS ALBERTO GUTIERREZ URIBE** identificado con cedula de ciudadanía Nº.85.474.042, en nombre y representación legal del **CONSORCIO CONSTRUREDES** y OSCAR DARIO SOTO SOTO identificado con cedula de ciudadanía N.º 78.702.431en calidad de contador público del **CONSORCIO CONSTRUREDES** con NIT 901568676-5.CERTIFICAMOS BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO, que el consorcio se encuentra al día en el pago al sistema integral de seguridad social y riesgos laborales, en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1150 de 2007, que modifico el inciso segundo y el parágrafo 1º del articulo 41 de la ley 80 de 1993,y el articulo 50 ley 789 de 2002, se ha dado el cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad integral y la de carácter parafiscal (CAJA DE COMPENSACIONES FAMILIAR,SENA,ICBF),cuando a ella hubiere lugar, en relación con todos mis empleados.

En constancia se expide en Montería a los (27) días del mes de mayo de 2022

Cordialmente




CARLOS ALBERTO GUTIERREZ URIBE
CC. 85.474.042
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO CONSTRUREDES
Nit.901.568.676-5



OSCAR DARIO SOTO SOTO
C.C.: 78.702.431
CONTADOR PUBLICO
T.P: 63631-T

INMAQ SAS

SOLO VALIDO PARA EL AÑO 2022

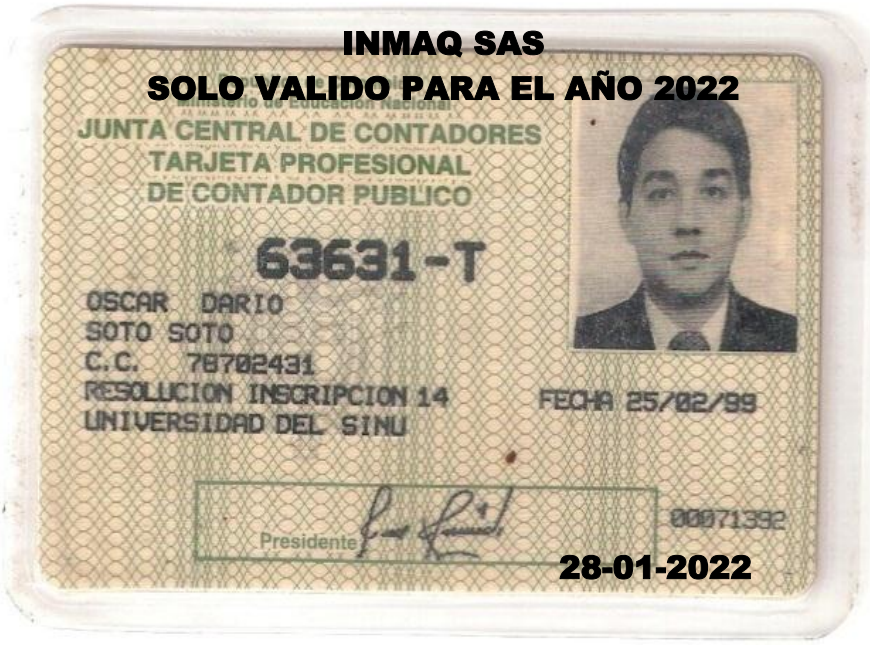

28-01-2022

INMAQ SAS

SOLO VALIDO PARA EL AÑO 2022



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0A97329650AA5C1C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS ALBERTO MAYORGA ALMEIDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79512539 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 74455-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79512539

MAYORGA ALMEIDA
APELLIDOS

CARLOS ALBERTO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-MAY-1970
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

29-JUL-1988 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-1500101-42094053-M-0079512539-20020122 04434 02022A 01 114495920

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



74455-T

CARLOS ALBERTO
MAYORGA ALMEIDA
C.C. 79512539
RESOLUCION INSCRIPCION 124 FECHA 22/09/2000
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

Presidente

83087

CARVAJAL S.A.

05/2000-24469

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

079512539

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá, 08 de julio de 2022

Yo, **CARLOS ALBERTO MAYORGA ALMEIDA**, identificado con cedula de ciudadanía No 79512539 de BOGOTA y tarjeta profesional No 74455-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **ARCA-ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.** identificada con Nit 800.173.768-1, ,manifiesto que dicha empresa ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del Sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje –Sena.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Cordialmente,



CARLOS ALBERTO MAYORGA ALMEIDA
C.C. 79.512.539 de BOGOTA
Revisor Fiscal

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA DEL PROYECTO

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA**	CÓDIGO:	**F-GG-11**
		VERSIÓN:	**02**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-12-07**

Informe No. **2** **Fecha Informe** **30/06/2022** **Periodo comprendido entre** **1/06/2022** **y** **30/06/2022**

TIPO DE CONTRATO:	Interventoría
NÚMERO DE CONTRATO:	2220587
OBJETO:	GRUPO IV: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A
SUPERVISOR:	ING. KAROL JAVELA

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
1/06/2022	CCR_CORDOBA_2220576_2022_035	SOLICITUD DE CAMBIO DE PROFESIONAL EN DIAGNÓSTICO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1/06/2022	CCR_CORDOBA_2220576_2022_041	ENTREGA DE AFILIACIONES DE INGRESO DEL PERSONAL	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
1/06/2022	CCR_CORDOBA_2220576_2022_042	ENTREGA DEL INFORME MENSUAL PGIO MES DE MAYO 2022	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
6/06/2022	CCR_CORDOBA_2220576_2022_043	CAMBIO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
6/06/2022	CCR_CORDOBA_2220576_2022_044	CAMBIO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 2	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
6/06/2022	CCR_CORDOBA_2220576_2022_045	CAMBIO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 2	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
7/06/2022	20225000080153	REVISIÓN Y APROBACIÓN AL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL PARA EL MANEJO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA No. 2220576	ENTIDAD	INTERVENTORIA
7/06/2022	CORREO 7 DE JUNIO DEL 2022	RESPUESTA GER32-E INFORME DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS	ENTIDAD	INTERVENTORIA
7/06/2022	CORREO 7 DE JUNIO DEL 2022	RESPUESTA GER33-E ENTREGA INFORME PRECONTRACTUAL	ENTIDAD	INTERVENTORIA
8/06/2022	20222200104611	APROBACIÓN CAMBIO DE DIRECTOR DE INTERVENTORIA	ENTIDAD	INTERVENTORIA
8/06/2022	CCR_CORDOBA_2220576_2022_046	VALIDACIÓN INFORMACIÓN PARA TRAMITE DE ANTICIPO CONSORICIO CONSTRUREDES	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
9/06/2022	CCR_CORDOBA_2220576_2022_047	APROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA No. 2220576	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
15/06/2022	CCR_CORDOBA_2220576_2022_050	REMISIÓN DE DIAGNÒSTICOS PARA REVISIÒN Y APROBACIÒN DE LA INTERVENTORÌA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
16/06/2022	CCR_CORDOBA_2220576_2022_053	CARTA DE PROVEEDORES BLOQUE Y CALADO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
18/06/2022	CCR_CORDOBA_2220576_2022_055	REMISIÒN DEDIAGNOSTICOS PARA REVISIÒN Y APROBACIÒN DE LA INTERVENTORÌA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
22/06/2022	CCR_CORDOBA_2220576_2022_056	INFORME ESTRUCTURAL CASETA No. 2	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
22/06/2022	CCR_CORDOBA_2220576_2022_057	ENTREGA DE LICENCIA AMBIENTAL DE CANTERA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
28/06/2022	CCR_CORDOBA_2220576_2022_058	SOLICITUD CAMBIO DE MAESTRO DE OBRA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA

Firma: Marcy A. Correa C

Nombre: Ing. Marcy Correa

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CONSTRUREDES
Cra 24 No. 15 - 17 Centro
Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com
Teléfono: 311 4143542
San Marcos - SUCRE

Carrera 24 #15-17 San Marcos-Sucre
Cel. 3114143542
Correo electrónico: cconstruredes@gmail.com

Bogotá, 27 de Mayo del 2022 **CCR_CORDOBA_2220576_2022_035**

Señor:
Ing Marly Alcalá.
Directora de Interventoría
Arca Arquitectura e Ingeniería
Email: marly.alcala@grupoarca.com.co
E. S. D.

REFERENCIA: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005"

ASUNTO: CAMBIO DE PROFESIONAL EN COSTO Y PRESUPUESTO

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito remitir hoja de vida de cambio de profesional en costos y presupuesto, para su revisión y aprobación.

Atentamente,

CARLOS GUTIERREZ
Representante legal
Consorcio Construredes

CONSORCIO CONSTRUREDES
Cra 24 No. 15 - 17 Centro
Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com
Teléfono: 311 4143542
San Marcos - SUCRE

Carrera 24 #15-17 San Marcos-Sucre
Cel. 3114143542
Correo electrónico: cconstruredes@gmail.com

Bogotá, 01 de Junio del 2022 **CCR_CORDOBA_2220576_2022_041**

Señor:
Ing Marly Alcalá. Directora de Interventoría
Arca Arquitectura e ingeniería
Email: marly.alcala@grupoarca.com.co
E. S. D.

REFERENCIA: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005"

ASUNTO: ENTREGA DE AFILIACIONES DE INGRESO DEL PERSONAL

Por medio de la presente hacemos entrega de las Afiliaciones del Ingreso del Personal Operativo en Obra, para su revisión y aprobación.

Atentamente,

CARLOS GUTIERREZ
Representante legal
Consorcio
Construredes

CONSORCIO CONSTRUREDES
Cra 24 No. 15 - 17 Centro
Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com
Teléfono: 311 4143542
San Marcos - SUCRE

Carrera 24 #15-17 San Marcos-Sucre
Cel. 3114143542
Correo electrónico: cconstruredes@gmail.com

Bogotá, 01 de Junio del 2022 **CCR_CORDOBA_2220576_2022_035**

Señor:
Ing Marly Alcalá.
Directora de
Interventoría
Arca Arquitectura e Ingeniería
Email: marly.alcala@grupoarca.com.co
E. S. D.

REFERENCIA: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005"

ASUNTO: SOLICITUD DE CAMBIO DE PROFESIONAL EN DIAGNÓSTICO

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito remitir hoja de vida de cambio de profesional en Diagnósticos, para su revisión y aprobación, con referencia al Contrato de Obra Nro. 2220576

por lo anterior se remite el siguiente Documento.

No.	Título del Documento
1	HOJA DE VIDA INGENIERO OSWALDO GARZON RIOS

Atentamente,

CARLOS GUTIERREZ
Representante legal
Consorcio Construredes

CONSORCIO
CONSTRUREDES
Cra 24 No. 15 - 17 Centro
Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com
Teléfono: 311 4143542
San Marcos - SUCRE

Carrera 24 #15-17 San Marcos-Sucre
Cel. 3114143542
Correo electrónico: cconstruredes@gmail.com

Bogotá, D.C. 27de Mayo de 2022 CCR_CORDOBA_2220576_2022_039

Señor:
Ing Marly Alcalá. Directora de Interventoría
Arca Arquitectura e Ingeniería
Email: marly.alcala@grupoarca.com.co
E. S. D.

REFERENCIA: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005

ASUNTO: SOLICITUD DE TRÁMITE DE EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VEITICUATRO (24) DIAGNÓSTICOS APROBADOS DEL BARRIO SAN MARTIN - CONTRATO: No. 2220576 –CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES OBJETO: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005).

Cordial Saludo,

Por medio de la presente solicitamos amablemente su gestión con la Empresa prestadora del servicio público de acueducto y alcantarillado, COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CÓRDOBA BOLÍVAR, (**COOSEPCOR LTDA)**,Para La Expedición Del Certificado De Autorización para La Intervención De Conexión de las acometidas domiciliarias de acueducto y alcantarillado para Veinticuatro (24) Diagnósticos del Barrio San Martin, aprobados por la Interventoría en comité de aprobación del día 27 de Mayo del presente Año para la intervención del Programa:

CONSORCIO
CONSTRUREDES
Cra 24 No. 15 - 17 Centro
Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com
Teléfono: 311 4143542
San Marcos - SUCRE

Carrera 24 #15-17 San Marcos-Sucre
Cel. 3114143542
Correo electrónico: cconstruredes@gmail.com

Adjuntamos listado de los 24 diagnosticos :

N°.	CODIGO	Dirección	Beneficiario	CEDULA
1	B-C-SM-MZ29-VE-001	CRA 4A CL 9-10	ALCIDES MIGUEL VERGARA VERGARA	3831560
2	B-C-SM-MZ32-VE-002	CL 10 4A-33	DEIVIS DEL CARMEN HERNANDEZ ESCOBAR	73317194
3	B-C-SM-MZ32-VE-003	CL 9 4A-5	EDUARDO LUIS VILLAMIZAR HERNANDEZ	1049453110
4	B-C-SM-MZ18-VE-004	CRA 3 CL 7-4	AGUEDA MARIA ORTEGA MEDINA	22856925
5	B-C-SM-MZ22-VE-005	CRA 4 CL 7-26	MERYS MARINA MEDINA MORANTE	22854333
6	B-C-SM-MZ34-VE-006	CRA 9 11-34	ROBIINSON RAFAEL BENITEZ PRIETO	12561694
7	B-C-SM-MZ22-VE-007	CRA 4 CL 7-44 APTO 1	ARMANDO DE JESUS ROSALES MERCADO	7452211
8	B-C-SM-MZ34-VE-008	CRA 4 CL 7-41	ENITH MARIA FONSECA PALENCIA	22433009
9	B-C-SM-MZ22-VE-009	CRA 4 CL 7-70	SEBASTIAN GONZALEZ ACOSTA	3831796
10	B-C-SM-MZ21-VE-010	CL 8 3-10	ANICIA ISABEL BARRIOS ROMERO	22854288
11	B-C-SM-MZ22-VE-011	CL 8	JOSE DE JESUS ANAYA HENAO	1049453412
12	B-C-SM-MZ34-VE-012	CRA 4 CL 8-139	MARCO RAFAELHENAO MERCADO	3831384
13	B-C-SM-MZ21-VE-013	CRA 4 CL 8-42	INGRIS JOHANA VILLAMIZAR HERNANDEZ	1049452023
14	B-C-SM-MZ21-VE-014	CRA 4 CL 8-34	MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ ESCOBAR	22854599
15	B-C-SM-MZ21-VE-015	CL 8 CRA 6-21	LILIANA DIAZ MARTINEZ	22856915
16	B-C-SM-MZ21-VE-016	CL 9	YEIRA LUCIA REGINO DIAZ	1065292058
17	B-C-SM-MZ38-VE-017	CL 9 4-30	ALVARO DE JESUS PEREZ ESCOBAR	73316976
18	B-C-SM-MZ24-VE-019	CRA 4 CL 9-23	DEIBIS DE JESUS PIÑA SIERRA	72295531
19	B-C-SM-MZ24-VE-020	CL 10 4-1	FRANCISCO MIGUEL MEDINA RODRIGUEZ	73315248
20	B-C-SM-MZ85-VE-023	CL 10 4-30	TERESA DE JESUS BARBOSA RODRIGUEZ	36635051
21	B-C-SM-MZ29-VE-024	CL 10 4-57	CARMEN EDITH ACOSTA LOPEZ	22854309
22	B-C-SM-MZ31-VE-026	CL 10 4A-17	PETRONA EMILIA GUERRERO OSPINO	22855165
23	B-C-SM-MZ31-VE-027	CL 10 CRA 4A-13	YOLANDA ESTHER MIRANDA FUNES	22856997
24	B-C-SM-MZ31-VE-030	CL 10 4A-20	MANUEL DEL CRISTO PEREZ MEDINA	73315866

Atentamente,

ING. RONAL BLANCO ARROYO
Residente consorcio construredes

CONSORCIO CONSTRUREDES
Cra 24 No. 15 - 17 Centro
Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com
Teléfono: 311 4143542
San Marcos - SUCRE

Carrera 24 #15-17 San Marcos-Sucre
Cel. 3114143542
Correo electrónico: cconstruredes@gmail.com

Bogotá, 27 de Mayo del 2022 **CCR_CORDOBA_2220576_2022_036**

Señor:
Ing Marly Alcalá.
Directora de Interventoría
Arca Arquitectura e Ingeniería
Email: marly.alcala@grupoarca.com.co
E. S. D.

REFERENCIA: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005"

ASUNTO: INFORME ESTRUCTURAL DE LAS CASETAS 1,2,3,4 Y TANQUE

Cordial Saludo,

Por medio de la presente hacemos la entrega de las casetas 1,2,3,4 y tanque, para su revisión y aprobación.

Atentamente,

CARLOS GUTIERREZ
Representante legal
Consorcio Construredes

20225000080153

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20225000080153

Pública ☐ **Pública Reservada** ☐ **Pública Clasificada** ☐

Bogotá D.C, 06-06-2022

MEMORANDO

PARA: **DIEGO FERNANDO ALZA ALZA**
Gerente Grupo de Desarrollo Proyectos 1

CARLOS ANDRES BRAVO
Gerente Cto Interadministrativo 221005

DE: **CAROLINA OTILIA MONTEALEGRE CASTILLO**
Subgerente de Operaciones

ASUNTO: Revisión y aprobación al Contrato de Fiducia Mercantil para el manejo del anticipo del Contrato de Obra No. 2220576.

En atención a la solicitud del asunto, referente a la revisión y aprobación del contrato de Fiducia Mercantil cuyo objeto es *"Constituir una fiducia mercantil de carácter irrevocable para la administración de los recursos que constituyen el ANTICIPO."*, para la administración del anticipo del Contrato de Obra No. 2220569 cuyo objeto consiste en el *"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR."*, nos permitimos informar que los documentos contienen las condiciones señaladas en el Contrato de Obra en mención y sus documentos precontractuales los cuales hacen parte integral del mismo.

La anterior aprobación se emite en cumplimiento a lo establecido en la CLÁUSULA 9.- ANTICIPO: del documento ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES GRUPO 4 CÓRDOBA - BOLIVAR, del PROCESO DE CONTRATACIÓN ABIERTA INA 032-2021, que dio origen Contrato de Obra No. 2220576.

Atentamente,

CAROLINA OTILIA MONTEALEGRE CASTILLO
Subgerente de Operaciones

Preparó: Diego Fernando Rodríguez Garzón — Abogado Contratista Grupo de Gestión Contractual. - Subgerencia de Operaciones.
Revisó: "Eryca Giovanna Vallejo Villarreal — Gerente Grupo de Gestión Contractual (e) - Subgerencia de Operaciones.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co
@ENTerritorio @enterritorioco @ENTerritorioCo @ENTerritorioCo

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20222200104611

Pública ☐ **Pública Reservada** ☐ **Pública Clasificada** ☐

Bogotá D.C, 03-06-2022

Señor
FEDERICO CARDONA PABÓN
Representante legal
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A
Interventoría del Programa de Conexiones Intradomiciliarias – Córdoba, Bolívar
Carrera 28 # 37 -38
luisa.morales@grupoarca.com.co marly.alcala@grupoarca.com.co
Bogotá D.C

Referencia: Contrato de Interventoría No. 2220587 cuyo objeto es "*INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR*".

Asunto: Aprobación cambio de director de Interventoría - contrato de Interventoría No. 2220587.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Cordial Saludo,

En atención a la comunicación con radicado No. 20224300209172 del 02 de junio de 2022, por medio de la cual la firma interventora ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A solicita el cambio del director de interventoría, requerido en el marco del contrato No.2220587, nos permitimos informar que, una vez realizada la revisión del perfil profesional por parte de la supervisión de ENTerritorio, éste cumple con los criterios solicitados en el documento de planeación del proceso de selección INA-036 DE 2022. El director de interventoría aprobado a partir de la firma de este oficio se relaciona a continuación:

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	PROFESIÓN	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA
Director de Interventoría	Marcy Alejandra Correa Castaño	Ingeniera civil	18 Años (Cumple)	4 Proyectos (Cumple)

Corolario a lo anterior, se anexa formato F-GG-18 ACTA DE APROBACIÓN DE PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, y hoja de vida del profesional (14 folios), dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Supervisión e interventoría de ENTerritorio MMI002.

Sin perjuicio de lo anterior, ENTerritorio podrá solicitar realizar cambios en el personal aquí aprobado.

Cordialmente

Ing. DIEGO FERNANDO ALZA ALZA
Gerente de Unidad
Grupo de Desarrollo de Proyectos 1

Ing. CARLOS ANDRES BRAVO
Gerente Contrato Interadministrativo

Ing. KAROL YULIETH JAVELA PÉREZ
Supervisora contrato de interventoría 2220587

Preparó: Karol Yulieth Javela Pérez
Revisó: Juan David Londoño – Coordinador Cto Interadministrativo

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co
@ENTerritorio @enterritorioco @ENTerritorioCo @ENTerritorioCo

20222200117141

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20222200117141

Pública ☐ **Pública Reservada** ☐ **Pública Clasificada** ☐

Bogotá D.C, 22-06-2022

Ingeniera
Marcy Alejandra Correa
Directora de Interventoría
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A
Interventoría del Programa de Conexiones Intradomiciliarias – Córdoba, Bolívar
Carrera 28 # 37 -38
luisa.morales@grupoarca.com.co marcy.correa@grupoarca.com.co
Bogotá D.C

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Referencia: Contrato de Interventoría No. 2220587 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

.

Asunto: Aprobación Informe mensual de Interventoría No. 1, correspondiente al mes de Mayo (26 de abril al 31 de mayo de 2022)

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, acusamos recibo de la siguiente información:

- Comunicación ARCA-INT/ENT276-GER-040-22 con asunto; "Entrega Informe Mensual No. 1" con radicado EN-Territorio No. 20224300217112 del 08 de junio de 2022.
- Comunicación ARCA-INT/ENT276-GER-050-22 con asunto; "Subsanación Entrega Informe Mensual No. 1" con radicado ENTerritorio No. 20224300232762 del 21 de junio de 2022.

Mediante los cuales, la interventoría remitió a la Entidad el informe mensual No.1 correspondiente al mes de Mayo (26 de abril al 31 de mayo de 2022) y atención a las observaciones informadas por la supervisión en correo electrónico del 10 de junio de 2022. Así las cosas, indicamos que una vez dicho informe mensual ajustado fue revisado por parte de la

supervisión designada por ENTerritorio, se evidencia que este atendió en su totalidad las observaciones presentadas y; en consecuencia, es aprobado.

Cordialmente,

Ing. DIEGO FERNANDO ALZA ALZA
Gerente de Unidad
Grupo de Desarrollo de Proyectos

Ing. CARLOS ANDRES BRAVO
Gerente Contrato Interadministrativo

KAROL YULIETH JAVELA PEREZ
Supervisora

LINA PATRICIA OTALVARO LOPEZ
Supervisora social

Anexo: F-GG-07 "APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA"

Preparó: Karol Yulieth Javela Pérez
Revisó: Juan David Londoño Giraldo-Coordinador Contrato Interadministrativo

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co
@ENTerritorio @enterritorioco @ENTerritorioCo @ENTerritorioCo

20222200120541

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20222200120541

Pública ☐ **Pública Reservada** ☐ **Pública Clasificada** ☐

Bogotá D.C, 29-06-2022

Ingeniera
Marcy Alejandra Correa
Directora de Interventoría
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A
Interventoría del Programa de Conexiones Intradomiciliarias – Córdoba, Bolívar
Carrera 28 # 37 -38
marcy.correa@grupoarca.com.co
Bogotá D.C

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Referencia: Contrato de Interventoría No. 2220587 cuyo objeto es "*INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR*".

Asunto: Aprobación cambio de inspectora de Interventoría - contrato de Interventoría No. 2220587.

Cordial Saludo,

En atención a la comunicación con radicado No. 20224300240942 del 22 de junio de 2022, por medio de la cual la firma interventora ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A solicita el cambio del inspector de interventoría, requerido en el marco del contrato No.2220587, nos permitimos informar que, una vez realizada la revisión del perfil profesional por parte de la supervisión de ENTerritorio, éste cumple con los criterios solicitados en el documento de planeación del proceso de selección INA-036 DE 2022. La inspectora de interventoría de interventoría aprobado a partir de la firma de este oficio se relaciona a continuación:

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	PROFESIÓN	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA
inspectora de Interventoría	DIAMYS EMELLY SANCHEZ PORTILLO	Ingeniera civil	N.A	N.A

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co
@ENTerritorio @enterritorioco @ENTerritorioCo @ENTerritorioCo

Corolario a lo anterior, se anexa formato F-GG-18 ACTA DE APROBACIÓN DE PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, y hoja de vida del profesional (9 folios), dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Supervisión e interventoría de ENTerritorio MMI002.

Sin perjuicio de lo anterior, ENTerritorio podrá solicitar realizar cambios en el personal aquí aprobado.

Cordialmente

Ing. DIEGO FERNANDO ALZA ALZA
Gerente de Unidad
Grupo de Desarrollo de Proyectos 1

Ing. CARLOS ANDRES BRAVO
Gerente Contrato Interadministrativo

Ing. KAROL YULIETH JAVELA PÉREZ
Supervisora contrato de interventoría 2220587

Preparó: Karol Yulieth Javela Pérez
Revisó: Juan David Londoño – Coordinador Cto Interadministrativo

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co
@ENTerritorio @enterritorioco @ENTerritorioCo @ENTerritorioCo

CONSORCIO CONSTRUREDES
Cra 24 No. 15 - 17 Centro
Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com
Teléfono: 311 4143542
San Marcos - SUCRE

Carrera 24 #15-17 San Marcos-Sucre
Cel. 3114143542
Correo electrónico: cconstruredes@gmail.com

Bogotá, 01 de Junio del 2022 **CCR_CORDOBA_2220576_2022_042**

Señor:
Ing Marly Alcalá.
Directora de
Interventoría
Arca Arquitectura e Ingeniería
Email: marly.alcala@grupoarca.com.co
E. S. D.

REFERENCIA: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005"

ASUNTO: ENTREGA DEL INFORME MENSUAL PGIO MES DE MAYO 2022

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito remitir el informe mensual del PGIO, Correspondiente al mes de mayo del presente año.

por lo anterior se remite el siguiente Documento.

No.	Título del Documento
1	INFORME MENSUAL PGIO

Atentamente,

CARLOS GUTIERREZ
Representante legal
Consorcio Construredes

CONSORCIO CONSTRUREDES
Cra 24 No. 15 - 17 Centro
Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com
Teléfono: 311 4143542
San Marcos - SUCRE

Carrera 24 #15-17 San Marcos-Sucre
Cel. 3114143542
Correo electrónico: cconstruredes@gmail.com

Bogotá D.C 28 de Junio del 2022 **CCR_CORDOBA_2220576_2022_058**

Señor:
Ing Marcy Correa.
Directora de Interventoría
Arca Arquitectura e Ingeniería
Email: marcy.correa@grupoarca.com.co
E. S. D.

REFERENCIA: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005"

ASUNTO: SOLICITUD CAMBIO DE MAESTRO DE OBRA

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito remitir hoja de vida referente al cambio de Maestro de Obra, para su revisión y aprobación, con referencia al Contrato de Obra Nro. 2220576.

Por lo anterior se remite el siguiente Documento.

No.	Título del Documento
1	HOJA DE VIDA MAESTRO DE OBRA GENKY ÁLVAREZ

Atentamente,

CARLOS GUTIERREZ
Representante legal
Consorcio Construredes

CONSORCIO CONSTRUREDES
Cra 24 No. 15 - 17 Centro
Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com
Teléfono: 311 4143542
San Marcos - SUCRE

Carrera 24 #15-17 San Marcos-Sucre
Cel. 3114143542
Correo electrónico: cconstruredes@gmail.com

Bogotá D.C, 22 de Junio del 2022 **CCR_CORDOBA_2220576_2022_057**

Señor:
Ing Marcy Correa
Directora de Interventoría
Arca Arquitectura e Ingeniería
Email: marcy.crrea@grupoarca.com.co
E. S. D.

REFERENCIA: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005"

ASUNTO: ENTREGA DE LICENCIA AMBIENTAL DE CANTERA

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos adjuntar la licencia ambiental, de la cantera la cual nos suministra el material de triturado y arena para el proyecto, con relacion al Oficio **ARCA – INT/ENT/276-TEC- 018-22.**

por lo anterior se remite el siguiente Documento.

No.	Título del Documento
1	**LICENCIA AMBIENTAL DE CANTERA**

Sin otro particular

Atentamente,

CARLOS GUTIERREZ
Representante Legal
Consorcio Construredes

CONSORCIO CONSTRUREDES
Cra 24 No. 15 - 17 Centro
Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com
Teléfono: 311 4143542
San Marcos - SUCRE

Carrera 24 #15-17 San Marcos-Sucre
Cel. 3114143542
Correo electrónico: cconstruredes@gmail.com

Bogotá D.C, 22 de Junio del 2022 **CCR_CORDOBA_2220576_2022_056**

Señor:
Ing Marcy Correa
Directora de Interventoría
Arca Arquitectura e Ingeniería
Email: marcy.crrea@grupoarca.com.co
E. S. D.

REFERENCIA: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005"

ASUNTO: INFORME ESTRUCTURAL CASETAS #2

Cordial Saludo,
Por medio de la presente me permito remitir el informe estructural caseta #2, para su revisión y aprobación.

por lo anterior se remiten los siguientes Documentos.

No.	Título del Documento
1	PLANO 1
2	PLANO 2
3	INFORME ESTRUCTURAL DE CASETA # 2

Sin otro particular

Atentamente,

CARLOS GUTIERREZ
Representante legal
Consorcio Construredes

CONSORCIO
CONSTRUREDES
Cra 24 No. 15 - 17 Centro
Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com
Teléfono: 311 4143542
San Marcos - SUCRE

Carrera 24 #15-17 San Marcos-Sucre
Cel. 3114143542
Correo electrónico: cconstruredes@gmail.com

Bogotá D.C. 18 de Junio de 2022 CCR_CORDOBA_2220576_2022_055

Señor:
Ing Marcy Correa.
Directora de Interventoría
Arca Arquitectura e Ingeniería
Email: marcy.correa@grupoarca.com.co
E. S. D.

REFERENCIA: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) Y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO NO. 221005

ASUNTO: REMISIÓN DE DIAGNÓSTICOS PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA INTERVENTORÍA.

Cordial Saludo,

Por medio del presente nos permitimos remitir los siguientes diagnósticos del Barrio San martín, para su revisión y respectivo trámite de aprobación:

CONSECUTIVO	DIAGNOSTICOS	OBSERVACION
1	053	Nuevo
2	087	Nuevo
3	088	Nuevo
4	131	Nuevo
5	136	Nuevo
6	138	Nuevo
7	139	Nuevo
8	140	Nuevo
9	149	Nuevo
10	150	Nuevo
11	152	Nuevo
12	156	Nuevo
13	158	Nuevo
14	165	Nuevo
15	166	Nuevo
16	168	Nuevo

De igual forma se presenta el control de diagnósticos remitidos a la fecha:

Diagnostico Nuevos Remitidos	016
Acumulado de Diagnosticos Remitidos	067
Diagnósticos subsanados remitidos en el presente	0

Atentamente,

DUARTE JOSÉ PINEDO DURANGO
Director de Obra
CONSORCIO CONSTRUREDES

CONSORCIO CONSTRUREDES
Cra 24 No. 15 - 17 Centro
Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com
Teléfono: 311 4143542
San Marcos - SUCRE

Carrera 24 #15-17 San Marcos-Sucre
Cel. 3114143542
Correo electrónico: cconstruredes@gmail.com

Bogotá D.C, 16 de Junio del 2022 **CCR_CORDOBA_2220576_2022_053**

Señor:
Ing Marcy Correa
Directora de Interventoría
Arca Arquitectura e Ingeniería
Email: marcy.crrea@grupoarca.com.co
E. S. D.

REFERENCIA: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005"

ASUNTO: CARTA DE PROVEEDORES BLOQUE Y CALADO

Cordial Saludo,
Por medio de la presente me permito remitir cartas de los proveedores de Bloque y Calado, para su revisión y aprobación

por lo anterior se remiten los siguientes Documentos.

No.	Título Del Documento
1	CARTA DE BLOQUE TIPO CALADO
2	CARTA DEL BLOQUE EN ARCILLA

Atentamente,

CARLOS GUTIERREZ
Representante legal
Consorcio Construredes

CONSORCIO CONSTRUREDES
Cra 24 No. 15 - 17 Centro
Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com
Teléfono: 311 4143542
San Marcos - SUCRE

Carrera 24 #15-17 San Marcos-Sucre
Cel. 3114143542
Correo electrónico: cconstruredes@gmail.com

Bogotá, D.C. 15 de Junio de 2022 CCR_CORDOBA_2220576_2022_050

Señor:
Ing Marcy Correa.
Directora de Interventoría
Arca Arquitectura e Ingeniería
Email: marcy.correa@grupoarca.com.co
E. S. D.

REFERENCIA: **"**CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005

ASUNTO: : **REMISIÓN DE DIAGNÓSTICOS PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA INTERVENTORÍA.**

Cordial Saludo,

Por medio del presente nos permitimos remitir los siguientes diagnósticos del San Martin, para su revisión y respectivo trámite de aprobación:

CONSECUTIVO	DIAGNOSTICOS	OBSERVACION
1	062	Nuevo
2	067	Nuevo
3	068	Nuevo
4	069	Nuevo
5	071	Nuevo
6	072	Nuevo
7	073	Nuevo
8	074	Nuevo
9	084	Nuevo

De igual forma se presenta el control de diagnósticos remitidos a la fecha:

Diagnostico Nuevos Remitidos	009
Acumulado de Diagnosticos Remitidos	051
Diagnósticos subsanados remitidos en el presente	0

CONSORCIO CONSTRUREDES
Cra 24 No. 15 - 17 Centro
Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com
Teléfono: 311 4143542
San Marcos - SUCRE

Carrera 24 #15-17 San Marcos-Sucre
Cel. 3114143542
Correo electrónico: cconstruredes@gmail.com

Atentamente,



DUARTE JOSE PINEDO DURANGO
Director de Obra
Consorcio Construredes

CONSORCIO CONSTRUREDES
Cra 24 No. 15 - 17 Centro
Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com
Teléfono: 311 4143542
San Marcos - SUCRE

Carrera 24 #15-17 San Marcos-Sucre
Cel. 3114143542
Correo electrónico: cconstruredes@gmail.com

Bogotá, D.C. 09 de Junio de 2022 CCR_CORDOBA_2220576_2022_047

Señor
JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
Supervisor de Contrato - 2220576
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
ENTERRITORIO
Email: jamon@enterritorio.gov.co
Calle 26 # 13-19 Piso 26
Bogotá, D.C. – Colombia.

REFERENCIA: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005

ASUNTO: Aprobación de documentación para Anticipo del Contrato de Obra No. 2220576

Estimado Ingeniero Amon,

Por medio de la presente nos permitimos APROBAR la documentación entregada por parte del contratista de obra CONSORCIO CONSTRUREDES para el respectivo trámite del anticipo del Contrato de obra No. 2210544 que tiene por objeto "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005.

Lo anterior teniendo en cuenta que la misma cumple con lo requerido para su respectiva aprobación.

Sin otro particular,

Cordialmente,

CARLOS GUTIERREZ
Representante legal
CONSORCIO CONSTRUREDES

CONSORCIO CONSTRUREDES
Cra 24 No. 15 - 17 Centro
Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com
Teléfono: 311 4143542
San Marcos - SUCRE

Carrera 24 #15-17 San Marcos-Sucre
Cel. 3114143542
Correo electrónico: cconstruredes@gmail.com

Bogotá D.C. 08 de junio del 2022 **CCR_CORDOBA_2220576_2022_046**

Señor:
INTERVENTORIA
Ing Marly Alcala
Directora de Interventoria.
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.
Email: marly.alcala@grupoarca.com.co
E. S. D.

REFERENCIA: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005"–validacion inofrmacion para tramite de anticipo consorcio construredes.

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos recopilar la informacion necesaria por parte del consorcio Construredes, para los tramites de reclamacion de anticipo para el Contrato de Obra No.2220576 de 2022, lo cual se adjuntan a la presente los siguietes docuentos que van en carpeta comprimida ZIP denominada "Documentos para reclamacion de anticipo Consorcio Construredes"

1. F-F-106"Certificado de cumplimiento para el pago.
2. Cuenta de cobro de anticipo
3. Certificacion bancaria cuenta fiducia
4. Plan de inversion del anticipo
5. Cronograma de obra
6. Aprovacion del plan de inversion del anticipo y cronograma por parte de la firma interventora, previo a la firma del acta de inicio
7. Resolusion de facura elelctronica
8. RUT del consosrcio y sus integrantes
9. Docuemnto de conformidad del consorcio
10. Certificado de existencia y representacion del consorcio
11. Cedula del representante legal de los consorciados
12. Acta de inicio del contrato
13. Garantias aprobadas

CONSORCIO CONSTRUREDES
Cra 24 No. 15 - 17 Centro
Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com
Teléfono: 311 4143542
San Marcos - SUCRE

Carrera 24 #15-17 San Marcos-Sucre
Cel. 3114143542
Correo electrónico: cconstruredes@gmail.com

14. Certificacion de pago de parafiscales del cto de obra.(consorcio y consorciados)
15. Planillas de seguridad social minimo aprovado del cto de obra
16. Aprovacion del contrato de fiducia
17. Contrato de fiducia
18. Formato de vinculacion F-RI-01

Agradezco la atencion prestada y quedo atento.

Atentamente,



CARLOS GUTIERREZ
Representante legal
CONSORCIO CONSTRUREDES

CONSORCIO CONSTRUREDES
Cra 24 No. 15 - 17 Centro
Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com
Teléfono: 311 4143542
San Marcos - SUCRE

Carrera 24 #15-17 San Marcos-Sucre
Cel. 3114143542
Correo electrónico: cconstruredes@gmail.com

Córdoba, 6 de junio del 2022 CCR_CORDOBA_2220576_2022_045

Señor:
INTERVENTORIA
Ing Marly Alcalá.
Directora de Interventoria.
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.
Email: marly.alcala@grupoarca.com.co

REFERENCIA: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005"

ASUNTO: CAMBIO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 2

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que los diseños estructurales de las Casetas Tipo 1, 2, 3 y 4 se encuentran revisados y aprobados por la interventoría del Proyecto, CONSTRUREDES., donde se garantiza el cumplimiento de la Norma NSR-10 siguiendonos en las especificaciones técnicas nos permitimos solicitar los siguientes cambios de especificación técnica en lo concerniente al tipo de enchape usado para la construcción de tales casetas establecidos en los ítems 40 y 41 y las especificaciones técnicas del proyecto:

40: Enchape pared blanco (0.20 X 0.20) metros
41: Enchape piso antideslizante blanco (0,20 x 0,20) metros

Donde expone la siguiente consideración (ENCHAPE DE PARED):

Esta solicitud se encuentra basada en la dificultad en la cual no hay disponibilidad de entrega inmediata de echape de 0.2x0.2 en el mercado, ya que estos provedores y/o vendedores manifiestan me diante cotizaciones presenciales que dicho producto tardaria un tiempo aproximado de 4 meses a apartir de la compra inicial, lo cual nos afecta diectamente en nuestro proceso de ejecucion de la obra, ya que este se envuentra hagotado en el mercado.

De acuerdo a esta necesidad se buscó en las ciudades aledañas y departamentos cerca de la región y solo encontramos echape para pared de 45.5x30.5, lo cual para nosotros como contratistas nos suple esta necesidad.

Argumentos, de apoyo al cambio de especificación:
los cuales presentan características de mejor calidad y similares a los requeridos en las especificaciones del proyecto.

Donde expone la siguiente consideración (ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE):

Esta solicitud se encuentra basada en la dificultad en la cual no hay disponibilidad de entrega inmediata de echape de 0.2x0.2 en el mercado, ya que estos provedores y/o vendedores manifiestan me diante cotizaciones presenciales que dicho producto tardaria un tiempo aproximado de 4 meses a apartir de la compra inicial, lo cual nos afecta diectamente en nuestro proceso de ejecucion de la obra, ya que este se envuentra hagotado en el mercado.

De acuerdo a esta necesidad se buscó en las ciudades aledañas y departamentos cerca de la región y solo encontramos echape para pared de 30.5x30.5 metros, lo cual para nosotros como contratistas nos suple esta necesidad.

Argumentos, de apoyo al cambio de especificación:
Estas presentan características de mejor calidad y similares a los requeridos en las especificaciones del proyecto.

Por lo anterior, se permite remitir ante la interventoria, la solicitud para que sea aprobado el cambio de especificación de los item: 40:echape para pared de 40.5x30.5 y 41: Enchape piso antideslizante de 30.5x30.5, para la construcción de las unidades sanitarias de los tipo 3 del proyecto en mension.

Atentamente,

CARLOS GUTIERREZ
Representante legal
CONSORCIO CONSTRUREDES

CONSORCIO CONSTRUREDES
Cra 24 No. 15 - 17 Centro
Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com
Teléfono: 311 4143542
San Marcos - SUCRE

Carrera 24 #15-17 San Marcos-Sucre
Cel. 3114143542
Correo electrónico: cconstruredes@gmail.com

Córdoba, 6 de junio del 2022 **CCR_CORDOBA_2220576_2022_044**

Señor:
INTERVENTORIA
Ing Marly Alcalá.
Directora de Interventoria.
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.
Email: marly.alcala@grupoarca.com.co

REFERENCIA: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005"

ASUNTO: CAMBIO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 2

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que los diseños estructurales de las Casetas Tipo 1, 2, 3 y 4 se encuentran revisados y aprobados por la interventoría del Proyecto, CONSTRUREDES., donde se garantiza el cumplimiento de la Norma NSR-10 siguiendonos en las especificaciones técnicas nos permitimos solicitar los siguientes cambios de especificación técnica en lo concerniente al tipo de enchape usado para la construcción de tales casetas establecidos en los ítems 40 y 41 y las especificaciones técnicas del proyecto:

40: Enchape pared blanco (0.20 X 0.20) metros
41: Enchape piso antideslizante blanco (0,20 x 0,20) metros

Donde expone la siguiente consideración (ENCHAPE DE PARED):

Esta solicitud se encuentra basada en la dificultad en la cual no hay disponibilidad de entrega inmediata de echape de 0.2x0.2 en el mercado, ya que estos provedores y/o vendedores manifiestan me diante cotizaciones presenciales que dicho producto tardaria un tiempo aproximado de 4 meses a apartir de la compra inicial, lo cual nos afecta diectamente en nuestro proceso de ejecucion de la obra, ya que este se envuentra hagotado en el mercado.

De acuerdo a esta necesidad se buscó en las ciudades aledañas y departamentos cerca de la región y solo encontramos echape para pared de 45.5x30.5, lo cual para nosotros como contratistas nos suple esta necesidad.

Argumentos, de apoyo al cambio de especificación:
los cuales presentan características de mejor calidad y similares a los requeridos en las especificaciones del proyecto.

Donde expone la siguiente consideración (ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE):

Esta solicitud se encuentra basada en la dificultad en la cual no hay disponibilidad de entrega inmediata de echape de 0.2x0.2 en el mercado, ya que estos provedores y/o vendedores manifiestan me diante cotizaciones presenciales que dicho producto tardaria un tiempo aproximado de 4 meses a apartir de la compra inicial, lo cual nos afecta diectamente en nuestro proceso de ejecucion de la obra, ya que este se envuentra hagotado en el mercado.

De acuerdo a esta necesidad se buscó en las ciudades aledañas y departamentos cerca de la región y solo encontramos echape para pared de 30.5x30.5 metros, lo cual para nosotros como contratistas nos suple esta necesidad.

Argumentos, de apoyo al cambio de especificación:
Estas presentan características de mejor calidad y similares a los requeridos en las especificaciones del proyecto.

Por lo anterior, se permite remitir ante la interventoria, la solicitud para que sea aprobado el cambio de especificación de los item: 40:echape para pared de 40.5x30.5 y 41: Enchape piso antideslizante de 30.5x30.5, para la construcción de las unidades sanitarias de los tipo 3 del proyecto en mension.

Atentamente,

CARLOS GUTIERREZ
Representante legal
CONSORCIO CONSTRUREDES

Córdoba, 6 de junio del 2022 **CCR_CORDOBA_2220576_2022_043**

Señor:
INTERVENTORIA
Ing Marly Alcalá.
Directora de Interventoria.
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.
Email: marly.alcala@grupoarca.com.co

REFERENCIA: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005"

ASUNTO: CAMBIO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que los diseños estructurales de las Casetas Tipo 1, 2, 3 y 4 se encuentran revisados y aprobados por la interventoría del Proyecto, CONSTRUREDES., donde se garantiza el cumplimiento de la Norma NSR-10 y que en tales diseños la mampostería que se propone es bloque de concreto 10x20x40cm y no bloque de arcilla No. 4 como aparece en las especificaciones técnicas nos permitimos solicitar los siguientes cambios de especificación técnica en lo concerniente al tipo de mampostería usado para la construcción de tales casetas establecidos en los ítems 25,14, 15, 16, 17 y 26,y las especificaciones técnicas del proyecto:

25. Mampostería en bloque de Arcilla No. 4 o Similar, incluye mortero de pega.
26. suministro e instalación calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega.
14. Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos).
15. Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna-sin cubierta. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos).
16. Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos).
17. Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)

Así mismo, notificamos que el cambio del tipo de mampostería está motivado por causas ajenas al contratista tales como:
1). Inconveniente para conseguir proveedores en la zona del Cordoba Bolívar que suministren bloques de arcillas y la entrega no es inmediata.
2) La mayoría de las fábricas tienen su nivel de producción al máximo en el suministro a clientes ya existentes y en su defecto en otro tipo de material en arcilla. Es por ello que los tiempos para garantizar la entrega del producto no son inferiores a 70 días para cotizaciones nuevas.

Donde expone la siguiente consideración (CALADO):
La solicitud se encuentra basada en la dificultad que se presenta en la región para adquirir elementos en arcilla y a nivel nacional se presentan dificultades de mercadeo del producto debido a que su produccion es baja.

Se propone el siguiente cambio:
De acuerdo a esta necesidad se buscó en la región elementos con los cuales pudiese suplirse esta necesidad, encontrando calados construidos en mortero de cemento tipo rejilla.
Argumentos, de apoyo al cambio de especificación:
los cuales presentan características similares a los requeridos y con los cuales prestan la misma función de ventilación a las unidades sanitarias.
Calado en mortero de cemento con dimensiones 0,40x0,20,0,10 m los cuales con un calado se suplen dos calados de 0,40x0,20,0,10 m
Siendo su estructura de mortero de cemento presenta una resistencia y durabilidad que exige la estructura de acuerdo a la norma NTC 4205. UNIDADES (BLOQUES Y LADRILLOS)DE CONCRETO, PARA MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL

En este orden de ideas, y con aras de avanzar en la ejecución del proyecto solicitamos el cambio de especificación técnica para usar bloque de concreto estructural, el cual brinda las mismas características y requisitos técnicos, cumpliendo con la norma sismo resistente NSR- 10. Así mismo, reiteramos que los diseños y planos estructurales utilizando en bloque de concreto ya fueron revisados por la interventoría del proyecto como figura en el acta de verificación de estudios y adjunta.

Igualmente manifestamos que el cambio propuesto de bloque de arcilla a bloque de concreto no implicaría ningún cambio en el valor del precio unitario actualmente establecido, como tampoco conllevaría ningún costo adicional al actualmente establecido en el contrato, lo significa que no existe la necesidad de realidad una modificación adicional de costos unitarios de la actividad. Se anexan los APUS concernientes a este tipo de especificaciones. Así mismo se anexan los ensayos sobre unidades de mampostería en concreto.

Agradecemos su pronta y oportuna colaboración

Cordialmente,



CARLOS GUTIERREZ
Representante legal
CONSORCIO CONSTRUREDES

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA**	CÓDIGO:	**F-GG-11**
		VERSIÓN:	**02**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-12-07**

Informe No. **2** **Fecha Informe** **30/06/2022** **Periodo comprendido entre** **1/06/2022** **y** **30/06/2022**

TIPO DE CONTRATO:	Interventoría
NÚMERO DE CONTRATO:	2220587
OBJETO:	GRUPO IV: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A
SUPERVISOR:	ING. KAROL JAVELA

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
1/06/2022	GER-34-22/ CORREO ELECTRONICO 01/06/22	RESPUESTA A OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_035	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
2/06/2022	GER-35-22/ CORREO ELECTRÓNICO 02/06/22	RESPUESTA A OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_041 AFILIACIONES PERSONAL DE OBRA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
2/06/2022	GER-36-22/ 20224300209172	REMISIÓN HV CAMBIO DIRECTORA DE INTERVENTORIA	INTERVENTORIA	ENTIDAD
3/06/2022	GER-37-22/ 20224300212322	CONCEPTO DE APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD No. 1 - CONTRATO DE OBRA No. 2220576	INTERVENTORIA	ENTIDAD
3/06/2022	GER-38-22/ 20224300212252	VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS - ACTIVIDAD 1 - CONTRATO DE OBRA No. 2220576	INTERVENTORIA	ENTIDAD
7/06/2022	GER-39-22/ 20224300214612	ENTREGA INFORME SEMANAL No. 5	INTERVENTORIA	ENTIDAD
8/06/2022	GER-40-22/ 20224300217112	ENTREGA INFORME MENSUAL No. 1	INTERVENTORIA	ENTIDAD
8/06/2022	GER-41-22/ 20224300217742	ALCANCE AL OFICIO ARCA-INT/ENT276-GER-032-22	INTERVENTORIA	ENTIDAD
9/06/2022	GER-42-22/ CORREO ELECTRÓNICO 10/06/22	RESPUESTA A CCR_CORDOBA_2220576_2022_043 y CCR_CORDOBA_2220576_2022_044	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
9/06/2022	GER-43-22/ CORREO ELECTRÓNICO 10/06/22	SOLICITUD INFORME MENSUAL No. 1	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
9/06/2022	GER-44-22/ CORREO ELECTRÓNICO 10/06/22	OBSERVACIONES DOCUMENTOS ANTICIPO	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
15/06/2022	GER-45-22/ CORREO ELECTRONICO 15/06/2022	GER45-E VALIDACIÓN DOCUMENTACIÓN PARA TRAMITE ANTICIPO CONSORCIO CONSTRUREDES	INTERVENTORIA	ENTIDAD
16/06/2022	GER-46-22/ 20224300229372	INFORME SEMANAL No. 6	INTERVENTORIA	ENTIDAD
16/06/2022	GER-47-22/ 20224300229452	INFORME SEMANAL No. 7	INTERVENTORIA	ENTIDAD
16/06/2022	GER-48-22/ CORREO ELECTRONICO 16/06/2022	REMISIÓN DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA ENTIDAD A LA DOCUMENTACIÓN DEL ANTICIPO	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
21/06/2022	GER-49-22/ CORREO ELECTRONICO 21/06/2022	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO CON LOS COMPONENTES HSEQ.	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
21/06/2022	GER-50-22/ 20224300232762	SUBSANACIÓN INFORME MENSUAL No. 1	INTERVENTORIA	ENTIDAD
21/06/2022	GER-51-22/ CORREO ELECTRONICO 21/06/2022	REMISIÓN OBSERVACIONES INFORME MENSUAL No. 1 CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
21/06/2022	GER-52-22/ 20224300233032	ALCANCE AL OFICIO ARCA-INT/ENT276-GER-045-22	INTERVENTORIA	ENTIDAD
22/06/2022	GER-53-22/ 20224300235292	REMISION ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 DE INTERVENTORIA PERIODO FACTURADO DEL 26 DE ABRIL AL 26 DE MAYO DEL 2022	INTERVENTORIA	ENTIDAD
22/06/2022	GER-54-22/ 20224300236782	ENTREGA DE APROBACIÓN HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	INTERVENTORIA	ENTIDAD
23/06/2022	GER-55-22/ 20224300240942	REMISIÓN HV INSPECTORA DE INTERVENTORIO	INTERVENTORIA	ENTIDAD
29/06/2022	GER-56-22/ 20224300244492	REMISIÓN ACTAS DE COMITÉ SEGUIMIENTO DEL PROYECTO	INTERVENTORIA	ENTIDAD
29/06/2022	GER-57-22/ CORREO ELECTRONICO 29/06/2022	REITERACIÓN ENTREGA INFORME MENSUAL No. 1 CONTRATISTA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
29/06/2022	GER-58-22/ 20224300244522	ALCANCE AL COMUNICADO ARCA-INT/ENT276-GER-037-22 CONCEPTO DE APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD 1 - CONTRATO DE OBRA No. 2220576 VERSION AJUSTE POR CAMBIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	INTERVENTORIA	ENTIDAD

Firma: Marcy A. Correa C

Nombre: Ing Marcy Correa

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

ADMON

Bogotá D.C, 1 de junio de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-034-22

SEÑORES:
CONSORCIO CONSTRUREDES
Ing. CARLOS GUTIERREZ
Montería – Córdoba.

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)


TEMA: RESPUESTA A OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_035

Cordial saludo,

Una vez analizada la información entregada en el oficio de la referencia, esta interventoría se permite informar que el profesional presentado para el cargo de Profesional Costos y Presupuestos, responsable de la revisión o elaboración de presupuestos en proyectos de obra civil, no cumple para el cargo asignado ya que no se aportan certificaciones especificas para la labor indicada.

Favor hacer llegar la certificación donde se especifique la labor indicada para proceder a validar y aprobar el profesional.

Agradecemos su atención.



FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA

Anexo: Cuadro de revisión profesionales contratista

Proyecto: Ing. Marly Alcala
Reviso:

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

ADMON

Bogotá D.C, 27 de mayo de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-035-22

Señores:
Ingeniera
Karol Yulieth Javela
Supervisora
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio
Calle 26 # 13-19 Piso 20
Bogotá. Colombia

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: REPUESTA A OFICIO CCR_CORDIBA_2220576_2022_041 – AFILIACIONES PERSONAL DE OBRA

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales remitimos las siguientes observaciones a la información enviada:

- Conforme al Informe Técnico de especialista HSE # 5 remitido por parte de la interventoría el 3 de mayo del 2022, donde se presentó los lineamientos HSE entre ellos, los documentos del ingreso para personal al proyecto, de acuerdo a estos lineamientos se evidencia que la documentación remitida es incompleta evidenciando la falta de entrega de los siguientes documentos:

  - Seguridad social y/o Afiliaciones a (EPS y AFP)
  - Examen de Aptitud Médica en este se debe evidenciar el nombre de la empresa, licencia Ocupacional del médico y firma del trabajador.

- Entrega Elementos de protección personal.
- Entrega de Dotación
- Inducción SST- MA Empresa

A continuación, se evidencia los documentos faltantes por personal:

ITEM	IDENTIFICACIÓN PERSONAL				ARL			EPS			AFP			FECHA DE INGRESO			FECHA DE EGRESO			INDUCCIÓN	CURSO DE ALTURAS		EXAMEN DE INGRESO		EXAMEN DE EGRESO	PAZ Y SALVO
	NOMBRE	N° DE C.C	CARGO	SALARIO PROPUESTA Y/O CONTRATADO	NOMBRE	FECHA AFILIACIÓN	FECHA ÚLTIMO PAGO	NOMBRE	FECHA AFILIACIÓN	FECHA ÚLTIMO PAGO	NOMBRE	FECHA AFILIACIÓN	FECHA ÚLTIMO PAGO	DD	MM	AA	DD	MM	AA	SI/NO	SI/NO	FECHA	SI/NO	FECHA	SI/NO	SI/NO
1	DUARTE JOSE PINEDO DURANGO	1.069.454.406	DIRECTOR DE OBRA	$ 3.000.000,00	SURA	9-may-22		PORVENIR	9-may-22		PORVENIR	9-may-22		2	5	2022				NO	NO		SI	29/04/2022		
2	RONALD ANDRES BLANCO ARROYO	1.102.815.839	ING. RESIDENTE		SURA	10-abr-22								2	5	2022				NO	NO		SI	29/04/2022		
3	NORELIS DEL CARMEN AHAYA PEREZ	1.043.792.620	TRABAJADORA SOCIAL	$ 1.500.000,00	SURA	10-abr-22		PROTECCIÓN	9-may-22		COLPENSIONES	9-may-22		2	5	2022				NO	NO		SI	29/04/2022		
4	RAFAEL FRANCISCO CASTILLO LOBO	1.066.591.904	HSE RESIDENTE	$ 1.800.000,00	SURA	10-abr-22		PROTECCIÓN	9-may-22		PROTECCIÓN	9-may-22		2	5	2022				NO	NO		SI	29/04/2022		
5	EDMUNDO CARLOS DE LA OSSA CHAVEZ	92.497.702,	ING. DIAGNÓSTICO	$ 2.000.000,00	SURA	9-may-22		PROTECCIÓN	7-may-22		PORVENIR	9-may-22		2	5	2022				NO	NO		NO			
6	ALVARO JAVIER VALETH ROMERO	1.049.452.096				6-jun-22														NO	NO		NO			
7	JOSE MIGUEL FLOREZ TAMARA	1.049.452.936				6-jun-22														NO	NO		NO			
8	ALVARO ENRIQUE SANCHEZ MEDINA	73.215.216				6-jun-22														NO	NO		NO			
9	FERNEY MAURICIO FLOREZ OCHOA	1.049.453.122				6-jun-22														NO	NO		NO			
10	HEIDER MANUEL PINEDA HENAO	1.049.453.497				6-jun-22														NO	NO		NO			
11	JOSE BELISARIO CAPELA DE AVILA	73.215.075				6-jun-22														NO	NO		NO			
12	JULIO RAFAEL SERRANO OLANO	1.049.453.939				6-jun-22														NO	NO		NO			
13	JACOB SANTOS NAVARRO	72.431.092				6-jun-22														NO	NO		NO			
14	FEYER DE JESUS RIVERA MARTINEZ	73.216.964				6-jun-22														NO	NO		NO			

De acuerdo a lo anterior no se da el aval para el ingreso de personal hasta que no se complete la información de acuerdo a los lineamientos generados.

Así mismo se solicita subir la información del personal al link del drive (https://drive.google.com/drive/folders/1NcUk1G_a5Dz0nEa7zZI2DWEyvgJZJqN9?usp=sharing) que se creó para el manejo HSE del proyecto, conforme a la mesa de trabajo realizada el 13 de mayo del 2022 con el profesional PGIO Rafael Castillo.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.

FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA
Anexo:
Proyectó: Yira Lemus Gómez – Coordinadora HSE

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

ADMON

Bogotá D.C, 02 de junio de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-036-22

Señores:
Ingeniera
Karol Yulieth Javela
Supervisora
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio
Calle 26 # 13-19 Piso 20
Bogotá. Colombia

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: REMISIÓN HV DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales queremos informar que la Ingeniera Marly Alcalá quien desempeña el cargo de Directora de Interventoría nos acompañan hasta el día 10 de junio del 2022, por tal motivo remitimos la Hoja de vida de la Ingeniera Marcy Alejandra Correa para que sea evaluada en dicho cargo.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.

FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA
Anexo: 13 folios
Proyectó: Jineth Marcela Gordillo – Residente Admón.,

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 6/06/2022
HORA: 2:57:58 p. m.
20224300212322

ADMON

Bogotá D.C, 03 de junio de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-037-22

Señores:
Ingeniera
Karol Yulieth Javela
Supervisora
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio
Calle 26 # 13-19 Piso 20
Bogotá. Colombia

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: CONCEPTO DE APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD No. 1 – CONTRATO DE OBRA No. 2220576

Cordial saludo,


En cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, conforme a la establecido en el Capítulo 5, ALCANCE DEL OBJETO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR del DOCUMENTO DE PLANEACIÓN, anexo que hace parte integral del contrato del asunto, nos permitimos remitir los informes de aprobación de la ACTIVIDAD 1, consistente en EL CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10.

Lo anterior, para el trámite de aval por parte de ENTerritorio, con el que se da cumplimiento cabal a la Actividad No. 1

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.



FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA
Anexo: 166 folios
Proyectó: Jineth Marcela Gordillo – Residente Admón.
Reviso: Ing. Marcy Correa – Directora de Interventoría

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

ADMON

Bogotá D.C, 03 de junio de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-038-22

Señores:
Ingeniera
Karol Yulieth Javela
Supervisora
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio
Calle 26 # 13-19 Piso 20
Bogotá. Colombia

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÈCNICO – ACTIVIDAD 1 – CONTRATO DE OBRA No. 2220576

Cordial saludo,

En cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, conforme a la establecido en el Capítulo 5, ALCANCE DEL OBJETO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR del DOCUMENTO DE PLANEACIÒN, anexo que hace parte integral del contrato del asunto, para la Verificación de la ACTIVIDAD 1, consistente en EL CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10; nos permitimos remitir los formatos F-GG-30-VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS y F-GG-20-RELACIÓN DE PLANOS debidamente suscritos.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.



FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA
Anexo: 2 folios
Proyectó: Jineth Marcela Gordillo – Residente Admón.
Reviso: Ing. Marcy Correa – Directora de Interventoría

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

ADMON

Bogotá D.C, 07 de junio de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-039-22

Señores:
Ingeniera
Karol Yulieth Javela
Supervisora
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio
Calle 26 # 13-19 Piso 20
Bogotá. Colombia

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: ENTREGA INFORME SEMANAL No. 5

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales remitimos informe semanal No. 5 cuyo periodo es del 23 de mayo del 2022 hasta 29 de mayo del 2022.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.

FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA
Anexo: 01 folios
Proyectó: Ing. Marly Alcalá – Directora de Interventoría.

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

ADMON

Bogotá D.C, 08 de junio de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-040-22

Señores:
Ingeniera
Karol Yulieth Javela
Supervisora
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio
Calle 26 # 13-19 Piso 20
Bogotá. Colombia

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: ENTREGA INFORME MENSUAL No. 1

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales remitimos informe mensual No. 1 cuyo periodo es del 26 de abril del 2022 hasta 30 de mayo del 2022 para fines pertinentes.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.

FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA
Anexo: 36 folios
Proyectó: Ing. Marly Alcalá – Directora de Interventoría.

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

ADMON

Bogotá D.C, 08 de junio de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-041-22

Señores:
Ingeniera
Karol Yulieth Javela
Supervisora
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio
Calle 26 # 13-19 Piso 20
Bogotá. Colombia

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: ALCANCE AL OFICIO ARCA-INT/ENT276-GER-032-22

Cordial saludo,

El pasado 27 de mayo de 2022 se radicó comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-032-22 con radicado N° 20224300205832 y asunto trazabilidad de compromisos adquiridos por el Contratista en comité N° 4, en este comunicado la Interventoría recomendaba a la Entidad dar inicio al proceso de presunto incumplimiento al Contratista de obra por la demora en la atención a los compromisos pactados y de sus obligaciones contractuales, las cuales se relacionan a continuación:

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

COMPROMISO	ESTADO
• Informe final actividad 1	PENDIENTE
• Cantidades de casetas en especial caseta 3	ENTREGARON CASETA 3
• Entrega de diagnósticos ajustados	PENDIENTE
• Realizar de manera inmediata el comité de aprobación de diagnósticos una vez subsanados los pendientes	PENDIENTE

Conforme a la programación entregada por el Contratista, la Actividad N° 1 Chequeo y validación de diseños de los prototipos de obras, tenía una fecha de inicio del 26 de abril de 2022 y una fecha fin del 11 de mayo de 2022, es decir, a la fecha del comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-032-22 presentaba 17 días de atraso.

Al día de hoy la actividad N° 1 está ejecutada a un 100%, ya se realizó la validación de los diseños de los prototipos y se hizo entrega a la Entidad de la aprobación por parte de la Interventoría, estamos a la espera de la respuesta y emisión de observaciones por parte del Ministerio de Vivienda, sin embargo las responsabilidades del Contratista frente a esta actividad están cumplidas, en caso de recibir observaciones serán remitidas al Contratista para su atención inmediata.

Aunque la Actividad N° 1 al día de hoy está al 100%, con corte al informe semanal N° 6 se registran atrasos en las Actividades 2 y 3, tal como se evidencia a continuación:

ACTIVIDAD 2: DIAGNOSTICO, VALIDACION PRELIMINAR, CONCERTACION DE LA INTERVENCION Y PLANEACION DE LA INTERVENCION			**53 días**	**mar 26/04/22**	**sáb 25/06/22**	**53%**	**66%**
DIAGNOSTICOS SEMANA 1	UND	20	7 días	mar 26/04/22	mar 3/05/22	100%	100%
DIAGNOSTICOS SEMANA 2	UND	20	7 días	mié 4/05/22	mié 11/05/2	80%	100%
DIAGNOSTICOS SEMANA 3	UND	25	6 días	jue 12/05/22	mié 18/05/2	80%	100%
DIAGNOSTICOS SEMANA 4	UND	30	6 días	jue 19/05/22	mié 25/05/2	70%	100%
DIAGNOSTICOS SEMANA 5	UND	30	6 días	jue 26/05/22	mié 1/06/22	70%	100%
DIAGNOSTICOS SEMANA 6	UND	30	7 días	jue 2/06/22	jue 9/06/22	35%	43%
DIAGNOSTICOS SEMANA 7	UND	30	7 días	vie 10/06/22	vie 17/06/22	0%	0%
DIAGNOSTICOS SEMANA 8	UND	32	7 días	sáb 18/06/22	sáb 25/06/22	0%	0%


La actividad 2, correspondiente al diagnóstico, validación preliminar, concertación y planeación de la Intervención presenta un atraso del 13%, a la fecha solo se tienen aprobados 30 diagnósticos de los 155 programados. El Contratista presentó un plan de contingencia, pero las metas de dicho plan tampoco se han cumplido, pues a la fecha debería tener 125 diagnósticos entregados.

ACTIVIDAD 3: EJECUCION DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS. ACTA DE ENTREGA Y RECIBOS DE LAS OBRAS			**106 días**	**jue 26/05/22**	**lun 26/09/22**	**1%**	**8%**
MES 1 (48 VIVIENDAS)			**24 días**	**jue 26/05/22**	**mié 22/06/2**	**6%**	**37%**
INTERVENCION N°1	UND	1	6 días	jue 26/05/22	mié 1/06/22	0%	100%
INTERVENCION N°2	UND	1	6 días	jue 26/05/22	mié 1/06/22	20%	100%
INTERVENCION N°3	UND	1	6 días	jue 26/05/22	mié 1/06/22	10%	100%
INTERVENCION N°4	UND	1	6 días	jue 26/05/22	mié 1/06/22	10%	100%
INTERVENCION N°5	UND	1	6 días	jue 26/05/2	mié 1/06/22	10%	100%
INTERVENCION N°6	UND	1	6 días	jue 26/05/22	mié 1/06/22	10%	100%
INTERVENCION N°7	UND	1	6 días	jue 26/05/22	mié 1/06/22	10%	100%
INTERVENCION N°8	UND	1	6 días	jue 26/05/22	mié 1/06/22	10%	100%
INTERVENCION N°9	UND	1	6 días	jue 26/05/22	mié 1/06/22	10%	100%
INTERVENCION N°10	UND	1	6 días	jue 26/05/22	mié 1/06/22	10%	100%
INTERVENCION N°11	UND	1	6 días	jue 26/05/22	mié 1/06/22	10%	100%
INTERVENCION N°12	UND	1	6 días	jue 26/05/22	mié 1/06/22	10%	100%
ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (1 - 12)	UND	12	1 día	mié 1/06/22	mié 1/06/22	0%	100%

La actividad 3, correspondiente a la ejecución de las obras presenta un atraso del 7%, conforme a la programación el 1 de Junio se debía hacer la entrega de las primeras 12 viviendas y a la fecha sólo están en ejecución 6 viviendas con un avance que no supera el 20%.

En atraso general del Contrato es del 7%, equivalente a 3 días, es importante tener en cuenta que la curva de desempeño del proyecto conforme a la programación presentada por el Contratista tiene un crecimiento constante semanalmente, que de no tomarse los correctivos necesarios a tiempo los atrasos se incrementaran sustancialmente, tal como se evidencia en la siguiente imagen.

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

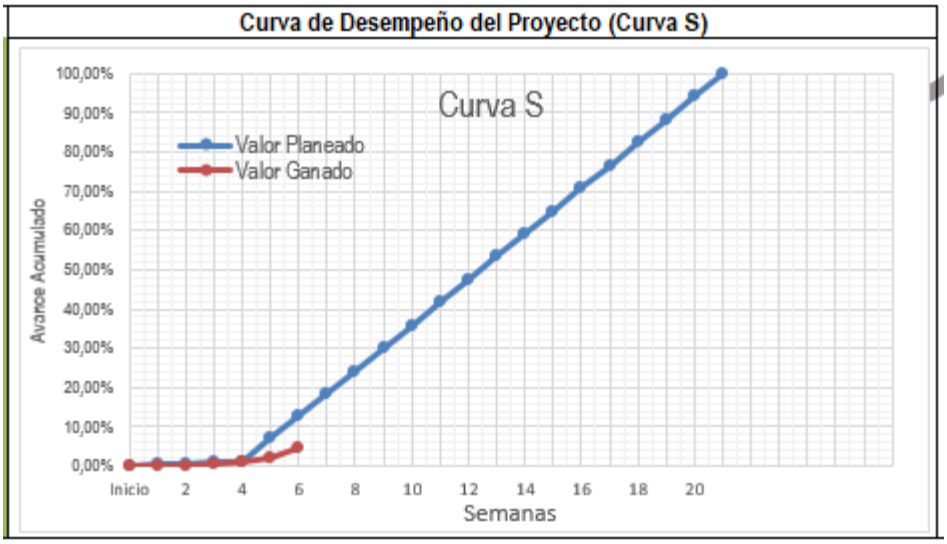


Por esta razón se solicita al Contratista tomar las medidas de contingencia necesarias para controlar los atrasos del proyecto hasta nivelar los avances programados con los ejecutados en las actividades 2 y 3, incrementando el número de diagnósticos a aprobar y el personal de obra para iniciar con la ejecución de todas las viviendas que tienen diagnósticos aprobados al día de hoy.

Con base en lo expuesto anteriormente, se deja a consideración de la Entidad contratante para que se analice si es proceden dar inicio al proceso de presunto incumplimiento conforme a lo establecido en las condiciones contractuales, por los atrasos generados en las actividades 2 y 3 del contrato de obra.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.



ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA

Anexo: NA
Proyectó: Ing. Marcy Correa – Directora de Interventoría.

C.C. CONSORCIO CONSTRUREDES - Ing. Carlos Alberto Gutiérrez

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

ADMON

Bogotá D.C, 09 de junio de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-042-22

SEÑORES:
CONSORCIO CONSTRUREDES
Ing. CARLOS GUTIERREZ
Montería – Córdoba.

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: RESPUESTA OFICIOS CCR_CORDOBA_2220576_2022_043 y CCR_CORDOBA_2220576_2022_044

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales remitimos respuesta a los oficios CCR_CORDOBA_2220576_2022_043 y CCR_CORDOBA_2220576_2022_044 en los cuales se solicita el cambio de especificaciones 1 y 2 para los siguientes materiales:

- ITEM 25. Mampostería en bloque de Arcilla N° 4 o similar, incluye mortero de pega
- ITEM 26. Suministro e instalación calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega
- ITEM 40. Enchape pared blanco (0.20x0.20) metros
- ITEM 41. Enchape piso antideslizante blanco (0.20x0.20) metros

La interventoría solicita que se aporten los soportes que justifiquen los argumentos presentados por el Contratista para el cambio de especificaciones, tales como

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

certificaciones de proveedores o correos que evidencien la no disponibilidad de estos materiales en la zona.


Adicionalmente para el caso del Ítem 25, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Se debe enviar la especificación técnica (ficha técnica) del muro en bloque de concreto 10x20x40 cm, por el que se desea hacer el cambio de especificación.
- Se debe realizar nuevamente el diseño y la memoria de cálculo, con el cambio de especificación.

Estas observaciones serían las relevantes a la parte de diseño estructural de las casetas sanitarias del proyecto.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.



FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA

Anexo: NA
Proyectó: Ing. Marcy Correa – Directora de Interventoría.

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

ADMON

Bogotá D.C, 09 de junio de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-043-22

SEÑORES:
CONSORCIO CONSTRUREDES
Ing. CARLOS GUTIERREZ
Montería – Córdoba.

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: SOLICITUD INFORME MENSUAL No. 1

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales solicitamos hacer llegar el informe mensual No. 1, conforme al Documento de Planeación contractual, que hace parte integral del Contrato de obra, en su numeral 7.2.7 obligaciones de Información indica lo siguiente:

7.2.7.OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN

1. Presentar informes de avance mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener lo siguiente:
   a. Avance de cada una de las actividades programadas.
   b. Cantidades de obra ejecutadas.
   c. Registros fotográficos (todas las fotos que se tomen dentro del desarrollo del proyecto deben ser tomadas con cámara de 8 megapíxeles o más, de tal forma que se garantice la calidad de dichas fotos y puedan ser utilizadas en publicaciones, cabe anotar que estas deben venir debidamente fechadas y se deben tomar desde el mismo sitio de referencia.)
   d. Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas.

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

e. Fotocopia de la bitácora o libro de obra.
f. Resumen de las actividades realizadas en el mes.
g. Relación del personal empleado en la ejecución de la obra.
h. Informe de seguridad y salud en el trabajo.
i. Informe de manejo ambiental.
j. Informe de manejo e inversión del anticipo con los respectivos soportes.
k. Informe de gestión social.
l. Actualización del programa de ejecución de obra.
m. Acreditación de que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.

Es de resaltar que sin la aprobación de dicho informe y remisión del mismo a la Entidad no podemos facturar como lo establece el Anexo 5 condiciones contractuales Clausula 8 Forma de pago - parágrafo segundo. Requisitos para el pago en donde se indica:

"ENTerritorio no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato"

Por lo anterior solicitamos sea entregado a más tardar el día 13 de junio del 2022, ya que la no entrega del mismo es un incumplimiento a las obligaciones contractuales.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.



FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA

Anexo: NA
Proyectó: Ing. Marcy Correa – Directora de Interventoría.

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

ADMON

Bogotá D.C, 09 de junio de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-044-22

SEÑORES:
CONSORCIO CONSTRUREDES
Ing. CARLOS GUTIERREZ
Montería – Córdoba.

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: OBSERVACIONES DOCUMENTOS ANTICIPO

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales remitimos observaciones al oficio CCR_CORDOBA_2220576_2022_047 del 09 de junio del 2022 correspondiente a la documentación para el trámite del Anticipo del contrato de obra No. 2220575:

- Actualizar los certificados de existencia y representación legal de los consorciados con fecha de expedición no mayor a 30 días.
- Corregir en la cuenta de cobro el concepto aclarando que el 20% correspondiente al anticipo e incluir el número de cuenta de ahorros establecida en el documento carta cuenta y constitución de anticipo

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.

FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA
Anexo: NA
Proyectó: Ing. Marcy Correa – Directora de Interventoría.

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

ADMON

Bogotá D.C, 15 de junio de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-045-22

SEÑORES:
CONSORCIO CONSTRUREDES
Ing. CARLOS GUTIERREZ
Montería – Córdoba.

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: VALIDACIÓN DOCUMENTACIÓN PARA TRAMITE ANTICIPO CONTRATO DE OBRA No. 2220576

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales remitimos documentación enviada por el contratista CONSORCIO CONSTRUREDES para realizar los tramites del desembolso del Anticipo para el contrato en referencia, esta interventoría se permite validar el lleno de requisitos, por lo cual, adjunto al presente escrito, aportamos los siguientes documentos:

1. F-F-I06 "Certificado de cumplimiento para el pago"
2. Cuenta de cobro de anticipo.
3. Certificación bancaria cuenta Fiducia.
4. Plan de inversión del anticipo
5. Cronograma de obra
6. Aprobación del plan de inversión del anticipo y cronograma por parte de la firma interventora, previo a la firma del acta de inicio.
7. Resolución de factura electrónica.
8. RUT del consorcio y sus integrantes.
9. Documento de conformación del consorcio.
10. Certificado de existencia y representación legal de los consorciados.
11. Cedula del representante legal del consorcio
12. Acta de inicio del contrato de obra

13. Garantías aprobadas.
14. Certificación de pago de parafiscales del contrato obra (consorcio y consorciado)
15. Planillas de seguridad social personal mínimo aprobado del contrato de obra.
16. Aprobación del contrato de fiducia.
17. Contrato de fiducia.
18. Formato de vinculación F-RI-01 (Consorcio y Consorciados)

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.



FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA
Anexo: NA
Proyectó: Ing. Marcy Correa – Directora de Interventoría.

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

ADMON

Bogotá D.C, 16 de junio de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-046-22

Señores:
Ingeniera
Karol Yulieth Javela
Supervisora
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio
Calle 26 # 13-19 Piso 20
Bogotá. Colombia

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: ENTREGA INFORME SEMANAL No. 6

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales remitimos informe semanal No. 6 cuyo periodo es del 30 de mayo del 2022 hasta 05 de junio del 2022.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.

FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA
Anexo: 12 folios
Proyectó: Ing. Marcy Correa – Directora de Interventoría.

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

ADMON

Bogotá D.C, 16 de junio de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-047-22

Señores:
Ingeniera
Karol Yulieth Javela
Supervisora
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio
Calle 26 # 13-19 Piso 20
Bogotá. Colombia

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: ENTREGA INFORME SEMANAL No. 7

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales remitimos informe semanal No. 7 cuyo periodo es del 06 de junio del 2022 hasta 12 de junio del 2022.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.

FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA
Anexo: 18 folios
Proyectó: Ing. Marcy Correa – Directora de Interventoría.

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

ADMON

Bogotá D.C, 16 de junio de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-048-22

SEÑORES:
CONSORCIO CONSTRUREDES
Ing. CARLOS GUTIERREZ
Montería – Córdoba.

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: REMISIÓN DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA ENTIDAD A LA DOCUMENTACIÓN DEL ANTICIPO.

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales remitimos observaciones realizadas por la supervisora a la documentación del anticipo enviada el día 15 de junio del 2022:

1. Observaciones realizadas al Formato F-FI-06

a. En la parte inferior del formato F-FI-06 Se debe incluir la firma del gerente del convenio 221005, el Ing. Carlos Andres Bravo
b. Se debe incluir los datos de la supervisión en la parte Verifica y/o autoriza, Karol Yulieth Javela Pérez CC 1006794925
c. Incluir No del convenio - 221005 de 2021
d. Incluir No. del proceso contractual - INA-032 DE 2021
e. El periodo de cobro corresponde al periodo del contrato
f. Se debe incluir la nota "20 aplicado sobre la actividad No. 3", en el porcentaje del anticipo.

2. Cuenta de cobro

a. Corregir ortografía
b. Corregir redacción del concepto
