Fecha:	06	07	2022	**Hora Inicio:**	4:00 p.m.	**Hora Final:**	5:30 p.m.
Lugar:	FINDETER			**Acta N. ª:**	07 – SEGUIMIENTO CONTRATO COI-1364	**N.º de Páginas:**	17

ASISTENTES	CARGO/ENTIDAD	E-MAIL	FIRMA
Leslie Martínez	**SUPERVISORA MINDEPORTE**	**lemartinez@mindeporte.gov.co**	
Claudia Rodríguez	**GESTORA TECNICA /FINDETER**	cjrodriguez@findeter.gov.co	

*Inserte las celdas necesarias para el diligenciamiento del acta.

TEMAS TRATADOS

REUNION No. 7 DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO COI – 1364 – 2021.

Siendo las 4:00 p.m. del 6 de julio del corriente, se da inicio a la reunión de seguimiento del Contrato Interadministrativo COI -1364- 2022, en las instalaciones de FINDETER, presentes la Arquitecta Claudia Rodríguez, Gestora Técnica de Findeter y La ingeniera Leslie Martínez, como supervisora del contrato interadministrativo COI – 1364 – 2021 por parte del Ministerio de Deporte.

El equipo de FINDETER, realiza la siguiente presentación donde explica el estado actual del contrato COI 1364- 2021, así:

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1364-2021 – MINDEPORTE
CONTRATOS DE INTERVENTORÍA

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

78

Contratos de interventoría (*) contemplados inicialmente

-15

TERMINADOS POR ORDEN JUDICIAL ESTABLECIDA POR LA CORTE CONSTITUCIONAL MEDIANTE SENTENCIA C- 153 DE 2022 QUE DECLARÓ LA INEXEQUIBILIDAD DEL ARTÍCULO 124 DE LA LEY 2159 DE 2021.

63

EN EJECUCIÓN	**54**	**86%**
ETAPA 2	15	28%
ETAPA 1	7	13%
SUSPENDIDOS	32	59%
POR INICIAR	**4**	**6%**
EN CONVOCATORIA	**3**	**5%**
POR CONFIRMAR	**2**	**3%**

** Contratos de Interventoría para realizar seguimiento a Convenios suscritos entre el Ministerio del Deporte y municipios a nivel nacional.*

Proyectos en obra:

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1364-2021 – MINDEPORTE

Findeter Banca de Desarrollo Territorial

CONTRATOS DE INTERVENTORÍA

15 ETAPA 2 [OBRA]

No.	MUNICIPIO/ ENTE EJECUTOR	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% DIFERENCIA
1	Placa deportiva cubierta - Arboletes	10%	10%	0%
2	Pista de Ciclo montañismo y Senderismo - Barranquilla	0%	0%	0%
3	Cancha barrio San Luis - Villanueva	3%	2%	-1%
4	Mejoramiento Polideportivo - Olaya Herrera	1%	1%	0%
5	Parque y cancha recreo deportiva - Sabanalarga	11%	6%	-5%
6	Cancha Sintética - Quinchía	2%	3%	1%
7	Complejo Deportivo - Chipaque	1%	1%	0%
8	Mejoramiento cancha de fútbol - Yarumal	10%	7%	-3%
9	Parque Paraíso - Ariguaní	5%	2%	-4%
10	Remodelación estadio de fútbol - Córdoba	3%	3%	0%
11	Adecuación pista de atletismo - Cali	87%	65%	-22%
12	Polideportivo cubierto - San José del Guaviare	3%	3%	0%
13	Adecuación coliseo - Cumaral	1%	1%	0%
14	Construcción de Estadio de Softbol en el Municipio de Clemencia, Departamento de Bolívar.	0%	0%	0%
15	Construcción Parque Catalino Varela Municipio Palmar de Varela, Departamento del Atlántico	0%	0%	0%

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1364-2021 – MINDEPORTE

CONTRATOS DE INTERVENTORÍA

15 ETAPA 2 [OBRA] – REGISTRO FOTOGRÁFICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial



Pista de Atletismo - Cali



Placa deportiva - Arboletes



Estadio - Quinchía



Cancha - Villanueva

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1364-2021 – MINDEPORTE
CONTRATOS DE INTERVENTORÍA
7 ETAPA 1 [REVISIÓN NORMATIVIDAD ESTUDIOS Y DISEÑOS]

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

#	NOMBRE	FECHA INICIO REVISIÓN NORMATIVIDAD	FECHA TERMINACIÓN ETAPA REVISIÓN NORMATIVIDAD
1	Mejoramiento Unidad Deportiva - Gómez Plata	1/07/2022	15/07/2022
2	Montelíbano	17/06/2022	16/07/2022
3	Construcción de Patinódromo el conde de Cuchicute en el Municipio de San Gil	6/07/2022	20/07/2022
4	Construcción y Adecuación de la Cancha Sintética de Fútbol del Lago la Pradera, Municipio de Dosquebradas Risaralda	6/07/2022	20/07/2022
5	Cancha sintética - Piendamó	6/07/2022	20/07/2022
6	Cancha sintética - Galapa	29/06/2022	13/07/2022
7	Complejo deportivo Girón	11/04/2022	10/07/2022
7			

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1364-2021 – MINDEPORTE

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

CONTRATOS POR INICIAR Y POR DEFINIR EJECUCIÓN

9 CONTRATOS

CONTRATOS POR INICIAR

#	NOMBRE	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Polideportivo cubierto Quiroz - La Unión II	Adjudicado	Hojas de vida Inicia semana 8 de julio
2	Santa Rosa de cabal	Adjudicado	En espera documentación para inicio Inicia semana 15 de julio
3	Marsella	Adjudicado	Pólizas Inicia semana 8 de julio
4	La Virginia	Adjudicado	Pólizas Inicia semana 15 de julio
4			

CONTRATOS EN CONVOCATORIA

#	NOMBRE	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Adecuación cancha de fútbol - Samaná	En convocatoria	En proceso
2	Alto Baudó[Interventoría]	En convocatoria	En proceso
3	Támesis	En convocatoria	Suspendido
3			

CONTRATOS POR DEFINICIÓN

#	NOMBRE	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Placa Polideportiva Puerto López	Pendiente	-
2	Cancha sintética - Risaralda	Pendiente	-
2			

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1364-2021 – MINDEPORTE

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

CONTRATOS DE INTERVENTORÍA TERMINADOS POR LEY DE GARANTÍAS

15 contratos

CONTRATOS INTERVENTORÍAS					
#	MUNICIPIO	ESTADO ALCANZADO	ACCIÓN DEFINIDA	ESTADO ACCIÓN DEFINIDA	-
1	Cancha sintética - Linares	Adjudicado	Cierre proceso	Comunicado de cierre	✓
2	Mejoramiento polideportivo - Morroa	Adjudicado	Cierre proceso	Comunicado de cierre	✓
3	Escenarios deportivos - Tadó -	Adjudicado	Cierre proceso	Comunicado de cierre	✓
4	Escenario deportivo - San Diego	Adjudicado	Cierre proceso	Comunicado de cierre	✓
5	Bojayá	Adjudicado	Cierre proceso	Comunicado de cierre	✓
6	Cancha multifuncional - Los Córdoba	Contrato Suscrito	Terminación Anticipada	Pendiente de firma Acción: Liquidación unilateral	✗
7	Escenario deportivo - Sucre	Contrato Suscrito	Terminación Anticipada	Pendiente de firma Acción: Liquidación unilateral	✗
8	Cancha sintética - Sabanas de San Angel	Contrato Suscrito	Terminación Anticipada	En trámite fiduciaria para envío	▶
9	Pista de Patinaje - Entrerrios	Contrato Suscrito	Terminación Anticipada – Con etapa 1 ejecutada	OK – Acta de terminación En proceso de liquidación	▶
10	Parque recreodeportivo - Los Patios	Contrato Suscrito	Terminación Anticipada	En trámite fiduciaria para envío	▶
11	Polideportivo y Ornato público - Sácama	Contrato Suscrito	Terminación Anticipada	En trámite fiduciaria para envío	▶
12	Panque Princial El Bosque - Pailitas	Contrato Suscrito	Terminación Anticipada	OK – Acta de terminación	✓
13	Escenarios deportivos - Mitú	Contrato Suscrito	Terminación Anticipada	OK – Acta de terminación	✓
14	Cancha sintética - Samaná	Contrato Suscrito	Terminación Anticipada	En trámite fiduciaria para envío	▶
15	Barrancabermeja	Sin estructurar	N/A	N/A	N/A
15					

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1364-2021 – MINDEPORTE

CONTRATOS INTERVENTORÍA – SUSPENDIDOS Y ETAPA SUSPENSIVA

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

10 CONTRATOS EN ETAPA SUSPENSIVA

#	MUNICIPIO/ ENTE EJECUTOR	CANTIDAD DE SUSPENSIONES	TOTAL DIAS SUSPENSIÓN	OBSERVACIONES
1	NARIÑO/ MUNICIPIO	1S+3PS	67 d 24 de junio	- Componentes técnicos cumplen con normativa - Pendiente entrega del área por parte del municipio para intervención.
2	REMOLINO/ MUNICIPIO	1S+2PS	75 d 3 de julio	- Componentes técnicos cumplen con normativa - Situación particular: el proyecto cuenta con $822 millones y de la revisión del componente presupuestal se requiere una adición por **$792 millones** que corresponde al 86%
3	SAMANIEGO/ MUNICIPIO	1S+4PS	73 d 30 de junio	- Componentes técnicos cumplen con normativa - Compromisos de entrega por parte del Municipio: - informe patológico muro de contención área para graderías que certifique que el muro se debe demoler - **Componente presupuestal en ajuste**
4	FRANCISCO PIZARRO/MUNICIPIO	1S+1PS	65 d 20 de junio	- Componentes técnicos cumplen con normativa - Adición **$250 millones** para filtros y accesos
5	CHIGORODÓ/ MUNICIPIO – Construcción coliseo	1S+3PS	60 d 3 de julio	- Componentes técnicos cumplen con normativa - Situación particular: el presupuesto del proyecto contempla una bomba de red contraincendios que no cumple con la capacidad. - Pendiente del municipio el ajuste de la bomba en los diseños y existe la posibilidad de un **mayor costo de la bomba**
6	SAN BENITO ABAD	1S+3PS	57 d 21 de junio	- Componentes técnicos cumplen con normativa - Situación particular: Cota de inundación sobre el nivel de diseño, por lo tanto se contempló elevar la cota del proyecto, lo cual genera mayores recursos para el relleno de la misma – aprox. **$200 millones**
7	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE/ MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	N/A	N/A 30 de junio	- Componentes técnicos cumplen con normativa - Se inicia el 13 de julio

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1364-2021 – MINDEPORTE

CONTRATOS INTERVENTORÍA – SUSPENDIDOS Y ETAPA SUSPENSIVA

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

10 CONTRATOS EN ETAPA SUSPENSIVA

#	MUNICIPIO/ ENTE EJECUTOR	CANTIDAD DE SUSPENSIONES	TOTAL DIAS SUSPENSIÓN	OBSERVACIONES
8	LLORÓ/ MUNICIPIO	1S+0PS	30 d 21 de junio	- Componentes técnicos aún en subsanación - **Alcalde ha manifestado inconformidad por las observaciones, atendiendo que ya había sido viabilizado por el Ministerio y no autoriza actualización argumentando posible detrimento y falta de planeación.** - Faltan memorias componente eléctrico, suelos y estructural, se aportarán por parte del Ministerio - Pendiente ajuste a componente hidrosanitario – fuera de norma [NTC2004 vs RAS2017]
9	MALAMBO/ MUNICIPIO SAN FERNANDO	1S+1PS	30 d 9 de junio	- Componentes técnicos cumplen con normativa - Situación particular: El Municipio se encuentra con embargo en sus cuentas.
10	SAN VICENTE FERRER /MUNICIPIO	1S+1PS	30 d 17 de junio	- Componentes técnicos cumplen con normativa - Se inicia el 11 de julio

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1364-2021 – MINDEPORTE

CONTRATOS INTERVENTORÍA – SUSPENDIDOS Y ETAPA SUSPENSIVA

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

10 CONTRATOS SUSPENDIDOS [=>60d | 1S+1-4PS]

#	MUNICIPIO/ ENTE EJECUTOR	CANTIDAD DE SUSPENSIONES	TOTAL DIAS SUSPENSIÓN	DÍAS TRANSCURRIDOS SUSPENSIÓN	DÍAS FALTANTES FECHA TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
1	HELICONIA/ MUNICIPIO	1S+4PS	93 d	69 d	24 d 29 de julio	- Observaciones componente eléctrico – Transformador se encuentra diseñado, pero no presupuestado. - Opción 1. Adicionar para el transformador – municipio manifiesta no tener recursos - Opción 2: Suministrar un transformador existente – No certificado.
2	GUACAMAYAS/ MUNICIPIO	1S+4PS	85 d	62 d	23 d 29 de julio	- En principio Alcalde manifestó inconformidad por las observaciones, atendiendo que ya había sido viabilizado por el Ministerio - Municipio presentó cronograma con última fecha de entrega de productos el 22 de julio – Compromisos entrega: - Ambiental y eléctrico: 1 de julio – Incumplido - Topografía – 5 de julio – Incumplido - Geotécnico – 6 de julio – incumplido
3	LA UNIÓN - MARISCAL/ MUNICIPIO	1S+2PS	75 d	60 d	15 d 21 de julio	- Proyecto reformulado cambio de recreacional a alta competencia y giro de la cancha de futbol de estadio Mariscal Sucre - Radicado en el Ministerio desde 30 junio para revisión Interventoría de todos los componentes.
4	APARTADÓ/ MUNICIPIO	1S+2PS	75 d	66 d	9 d 14 de julio	- No se cuenta con escrituras ni certificado de tradición y libertad de uno de los predios para el coliseo de combate - Sin disponibilidad para descarga de aguas residuales. - Municipio propone construcción en 2 fases en reunión 6 julio
6	SAN LUIS / MUNICIPIO	1S+0PS	75 d	58 d	19 d 25 de julio	- 13 junio: visita al municipio y reunión con Alcalde - 1 y 5 julio: subsanaciones eléctrico, ambiental, topográfico, hidrosanitario, geotécnico, presupuestal y licencia. - Pendiente: subsanación arquitectónico 9 julio y estructural (pendiente ARQ)

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1364-2021 – MINDEPORTE

CONTRATOS INTERVENTORÍA – SUSPENDIDOS Y ETAPA SUSPENSIVA

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

10 CONTRATOS SUSPENDIDOS [=>60d | 1S+1-4PS]

#	MUNICIPIO/ ENTE EJECUTOR	CANTIDAD DE SUSPENSIONES	TOTAL DIAS SUSPENSIÓN	DÍAS TRANSCURRIDOS SUSPENSIÓN	DÍAS FALTANTES FECHA TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
7	SIPÍ	1S+1PS	60 d	50 d	10 d 16 de julio	- Ningún componente subsanado - Componente estructural: faltan memorias de cálculo y hay incongruencias entre el diseño estructural y el estudio de suelos (pilotes vs zapatas) - Falta diseño estructural de cubierta - Pendiente ajuste a componente hidrosanitario – fuera de norma [NTC2004 vs RAS2017]
8	MAHATES/ MUNICIPIO	1S+1PS	60 d	55 d	5 d 11 de julio	- La topografía inicial entregada tenía discrepancia con cambios de nivel de 2 metros, pero en campo se verificó que era de 9 m. - Cambio de implantación - En solución localización de PMR, de acuerdo a NTC. - Falta revisión componente presupuestal
9	FRESNO - Sacúdete	1S+0PS	60 d	53 d	7 d 13 de julio	- Subsanaciones entregadas el 28 de junio – En revisión por parte de la interventoría
10	NECOCLÍ/ MUNICIPIO	1S+0PS	60 d	46 d	14 d 21 de julio	- Consultoría no ha cumplido tiempos para respuesta a observaciones - Observaciones: componente estructural – ajustar diseños a condiciones de salinidad de la zona - Sin factibilidad de servicios eléctricos - Sin presupuesto

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1364-2021 – MINDEPORTE

CONTRATOS INTERVENTORÍA – SUSPENDIDOS Y ETAPA SUSPENSIVA

13 CONTRATOS SUSPENDIDOS [<60d | 1S+1PS]

#	MUNICIPIO/ ENTE EJECUTOR	CANTIDAD DE SUSPENSIONES	TOTAL DIAS SUSPENSIÓN	DÍAS TRANSCURRIDOS SUSPENSIÓN	DÍAS FALTANTES FECHA TERMINACIÓN	OBSERVACIONES
1	AMALFI	1S+1PS	60 d	30 d	30 d 6 de agosto	
2	VALENCIA/ MUNICIPIO	1S+1PS	57 d	56 d	1 d 7 de julio	-
3	ANAPOIMA/ MUNICIPIO	1S+1PS	45 d	34 d	11 d 17 de julio	
4	PEDRAZA/ MUNICIPIO	1S+1PS	45 d	5 d	40 d 14 de agosto	
5	CHIPAQUE/ DEPTO Y MPIO	1S+1PS	40 d	25 d	15 d 21 de julio	
6	CERETÉ /MUNICIPIO	1S+1PS	45 d	30 d	15 d 21 de julio	
7	SAMPUES/ MUNICIPIO	1S+0PS	30 d	19 d	11 d 17 de julio	
8	VIOTÁ/ MUNICIPIO	1S+0PS	30 d	19 d	11 d 17 de julio	
9	FUSAGASUGÁ/ MUNICIPIO	1S+0PS	30 d	19 d	11 d 17 de julio	
10	GUTIERREZ/ MUNICIPIO	1S+0PS	30 d	19 d	11 d 17 de julio	
11	SAN MARCOS	1S+1PS	30 d	19 d	11 d 17 de julio	
12	APIA	1S+0PS	30 d	13 d	17 d 23 de julio	
13	MALAMBO/ MUNICIPIO	1S+0PS	25 d	12 d	13 d	

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1364-2021 – MINDEPORTE
CONVENIOS DE OBRA TERMINADOS POR LEY DE GARANTÍAS

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

14 CONVENIOS

#	CONVENIO		CONTRATACIÓN DERIVADA			CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		
	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	PROCESO	ESTADO ALCANZADO	ACCIÓN DEFINIDA	ESTADO ALCANZADO	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN – 15 junio	-
1	MUTATÁ	ANTIOQUIA	OBRA	Estructurado	N/A	Convenio suscrito	Pendiente firma Acta de Terminación y Liquidación suscrita. Acción: Liquidación Unilateral	✗
			INTERVENTORÍA	Estructurado	N/A			
2	TRINIDAD	CASANARE	OBRA	Estructurado	N/A	Convenio suscrito	Acta suscrita el 15/06/2022	✓
			INTERVENTORÍA	Estructurado	N/A			
3	CARMEN DE ATRATO	CHOCÓ	OBRA	Estructurado	N/A	Convenio suscrito	Acta suscrita el 24/06/2022	✓
			INTERVENTORÍA	Sin estructurar	N/A			
4	BUCARAMANGA	SANTANDER	OBRA	Publicado	Cierre proceso	Convenio suscrito	Acta suscrita el 17/06/2022	✓
			INTERVENTORÍA	Estructurado	N/A			
5	SANTIAGO	NORTE DE SANTANDER	OBRA	Publicado	Cierre proceso	Convenio suscrito	Acta suscrita el 17/06/2022	✓
			INTERVENTORÍA	Estructurado	N/A			
6	VALLEDUPAR	CESAR	OBRA	Sin confirmación	N/A	Convenio suscrito	Pendiente firma Acta de Terminación y Liquidación suscrita. Acción: Liquidación Unilateral	✗
			INTERVENTORÍA	Sin confirmación	N/A			
7	PLATO	MAGDALENA	OBRA	Estructurado	N/A	Convenio suscrito	Acta suscrita el 01/07/2022	✓
			INTERVENTORÍA	Estructurado	N/A			
8	NEIRA	CALDAS	OBRA	Estructurado	N/A	Convenio suscrito	Acta suscrita el 15/06/2022	✓
			INTERVENTORÍA	Estructurado	N/A			
9	PITALITO	HUILA	OBRA	Publicado	Cierre proceso	Convenio suscrito	Acta suscrita el 15/06/2022	✓
			INTERVENTORÍA	Estructurado	N/A			
10	CUMBITARA	NARIÑO	OBRA	Estructurado	N/A	Convenio suscrito	Acta suscrita el 24/06/2022	✓
			INTERVENTORÍA	Estructurado	N/A			
11	CUMARAL	META	OBRA	Estructurado	N/A	Convenio suscrito	Acta suscrita el 21/06/2022	✓
			INTERVENTORÍA	Estructurado	N/A			
12	ATRATO	CHOCÓ	OBRA	Estructurado	N/A	Convenio suscrito	Acta suscrita el 16/06/2022	✓
			INTERVENTORÍA	Estructurado	N/A			
13	CERTEGUI	CHOCÓ	OBRA	Sin estructurar	N/A	Convenio suscrito	Acta suscrita el 17/06/2022	✓
			INTERVENTORÍA	Sin estructurar	N/A			
14	VILLA DEL ROSARIO	NORTE DE SANTANDER	OBRA	Sin estructurar	N/A	Convenio suscrito	Pendiente firma Acta de Terminación y Liquidación suscrita. Acción: Liquidación Unilateral	✗
			INTERVENTORÍA	Sin estructurar	N/A			

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1364-2021 – MINDEPORTE

Findeter Banca de Desarrollo Territorial

CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE CCD - BOGOTÁ

PAF-ATMINDEPORTE-O-028-2022
PAF-ATMINDEPORTE-I-116-2022

OBJETO	**ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE CCD EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN BOGOTÁ D.C**
$	OBRA: **$ 1.379.673.038,00** INTERVENTORÍA: **$ 124.396.038,00**
PLAZO	OBRA: SEIS (6) MESES INTERVENTORÍA: OCHO (8) MESES
ESTADO	**ETAPA I** FECHA DE INICIO: 06-07-2022


CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1364-2021 – MINDEPORTE

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- Diseño Arquitectónico
- Diseño Redes Hidráulicas
- Diseño Redes Sanitarias
- Diseño Redes Eléctricas
- Diseño Redes Contra Incendios
- Presupuesto


PLANTA GENERAL

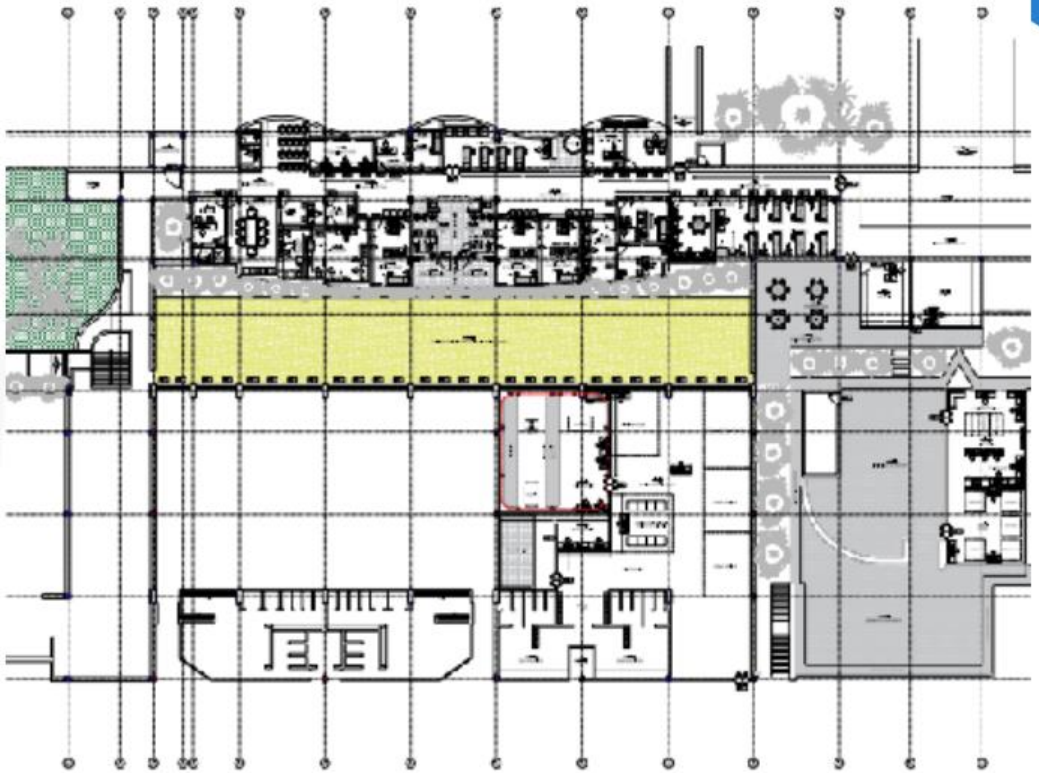

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1364-2021 – MINDEPORTE

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

PLANTA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA CCD

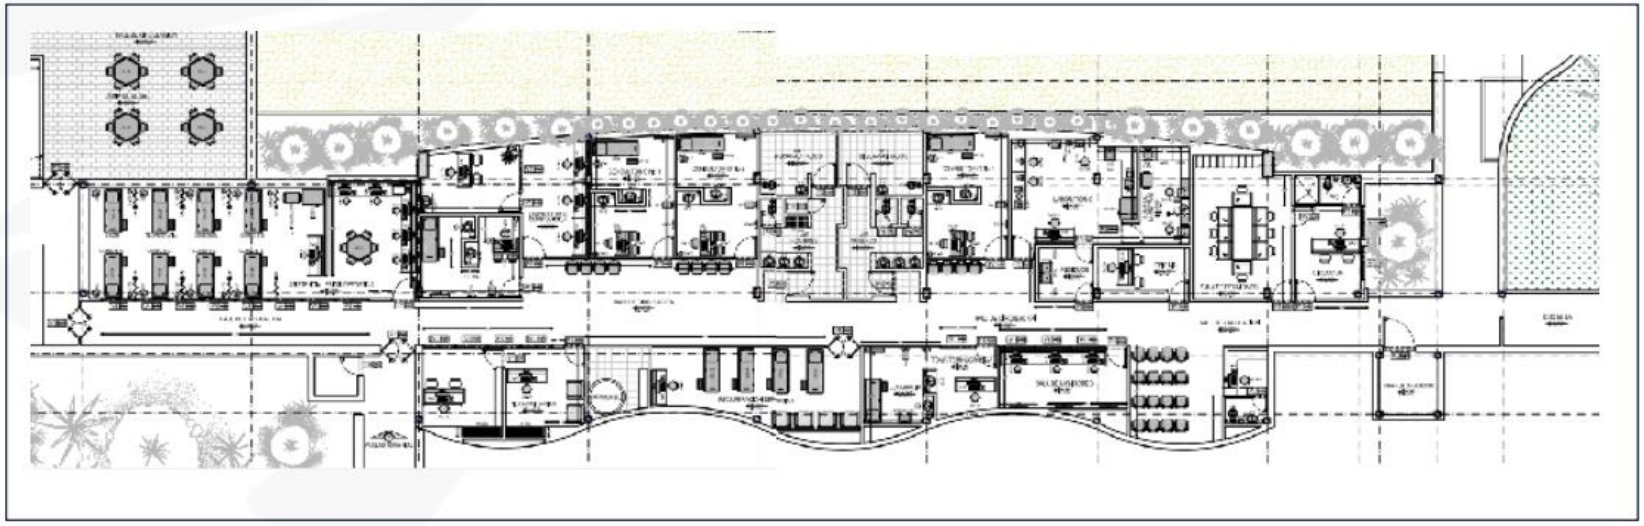

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Inicio Etapa 1 de los proyectos pendientes.	Claudia Rodríguez- FINDETER	Antes de 22 julio 2022
Visita al CAR	FINDETER- MINDEPORTE	Antes de 22 julio 2022
Envío de soportes documentales pendiente FINDETER	Claudia Rodríguez- FINDETER	Antes de 22 julio 2022

*Inserte las celdas necesarias para el diligenciamiento del acta.
