

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	**MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS PAZ DEL NORTE, 20 DE JULIO, LAS PARCELAS Y MOCARI EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**	**178,13 días**	**lun 2/05/22**	**sáb 31/12/22**	
2	TRAMITES AMBIENTALES	89 días	lun 2/05/22	jue 1/09/22	
3	INICIO DE OBRAS	0 días	jue 1/09/22	jue 1/09/22	2
4	PAPSO	89,75 días	jue 1/09/22	sáb 31/12/22	3
5	TRAMITES Y LEGALIZACION AFINIA	89,75 días	jue 1/09/22	sáb 31/12/22	3
6	IMPLEMENTACIÓN DE GESTION DE OBRA (Seguridad y salud en el Trabajo, Plan de manejo Ambiental y Plan de aseguramiento de calidad-plan manejo de trafico)	89,75 días	jue 1/09/22	sáb 31/12/22	3
7	**PRELIMINARES**	**88,5 días**	**jue 1/09/22**	**vie 30/12/22**	
8	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	5 días	jue 1/09/22	jue 8/09/22	3
9	CORTE DE PISO EN TABLON Y PLANTILLA DE CONCRETO E= 0.10M/0.15M CON CORTADORA	5 días	jue 1/09/22	jue 8/09/22	8CC
10	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	5 días	jue 8/09/22	mié 14/09/22	9
11	INSTALACIÓN DE CERCA EN MADERA DE ASTILLA DE 3"X3" Y 2.2 M DE ALTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	5 días	jue 1/09/22	jue 8/09/22	3
12	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	2 días	jue 8/09/22	sáb 10/09/22	10CC
13	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	30 días	jue 8/09/22	mié 19/10/22	10CC+10%
14	EXCAVACIONES MECÁNICAS CON EXCAVADORA PARA FALLOS EN SUB RASANTE. PROFUNDIDAD > 50 CM. NO INCLUYE RETIRO	30 días	jue 8/09/22	mié 19/10/22	13CC
15	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	30 días	jue 8/09/22	mié 19/10/22	13CC
16	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	3 días	jue 1/09/22	mar 6/09/22	3
17	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	5 días	jue 1/09/22	jue 8/09/22	16CC
18	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	1 día	jue 1/09/22	vie 2/09/22	17CC
19	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	10 días	lun 19/12/22	vie 30/12/22	125FC-10 días
20	FIN PRELIMINARES	0 días	vie 30/12/22	vie 30/12/22	19
21	**SUBRASANTE Y SUBBASE**	**39 días**	**mar 13/09/22**	**jue 3/11/22**	
22	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	30 días	mar 13/09/22	lun 24/10/22	13CC+10%
23	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	30 días	vie 16/09/22	jue 27/10/22	22CC+10%
24	SUBBASE GRANULAR CLASE C	30 días	mié 21/09/22	lun 31/10/22	23CC+10%
25	TERRAPLEN	30 días	sáb 24/09/22	jue 3/11/22	24CC+10%
26	FIN SUBRASANTE Y SUBBASE	0 días	jue 3/11/22	jue 3/11/22	25
27	**PAVIMENTO, BORDILLOS Y ANDENES**	**59 días**	**mié 28/09/22**	**mar 20/12/22**	
28	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	40 días	mié 28/09/22	mié 23/11/22	25CC+10%
29	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR (3.8 Mpa)	50 días	mar 4/10/22	mar 13/12/22	28CC+10%
30	ADECUACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN (MANHOLES) EN CONCRETO DE 3000 PSI	50 días	mar 4/10/22	mar 13/12/22	29CC
31	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	50 días	lun 10/10/22	mar 20/12/22	29CC+10%
32	FIN PAVIMENTO, BORDILLOS Y ANDENES	0 días	mar 20/12/22	mar 20/12/22	31
33	**SEÑALIZACION**	**9 días**	**mar 20/12/22**	**vie 30/12/22**	
34	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETRORREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	3 días	mar 20/12/22	vie 23/12/22	32
35	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON DOBLE LAMINA RETRORREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	2 días	mar 20/12/22	jue 22/12/22	34CC
36	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	5 días	mar 20/12/22	lun 26/12/22	35CC
37	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	8 días	mar 20/12/22	jue 29/12/22	36CC
38	REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PLÁSTICO PERNADO	9 días	mar 20/12/22	vie 30/12/22	37CC
39	FIN SEÑALIZACIÓN	0 días	vie 30/12/22	vie 30/12/22	34;35;36;37;38
40	**CUNETAS Y SUMIDEROS**	**46 días**	**lun 10/10/22**	**mié 14/12/22**	
41	EXCAVACION MANUAL	25 días	lun 10/10/22	mar 15/11/22	29CC+10%
42	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	25 días	lun 10/10/22	mar 15/11/22	41CC
43	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	25 días	jue 13/10/22	vie 18/11/22	41CC+10%
44	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	25 días	mar 18/10/22	mar 22/11/22	43CC+10%
45	RELLENO PARA FILTROS EN GRAVA TIPO ARENA	25 días	vie 21/10/22	vie 25/11/22	44CC+10%
46	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	30 días	mar 25/10/22	lun 5/12/22	45CC+10%
47	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	30 días	vie 28/10/22	vie 9/12/22	46CC+10%
48	SUMIDERO LATERAL TIPO VENTANA VACIADO IN SITU, INCLUYE REFUERZO	30 días	vie 28/10/22	vie 9/12/22	47CC
49	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA CLASE G (PARA PIEDRA PEGADA)	3 días	vie 9/12/22	mié 14/12/22	47

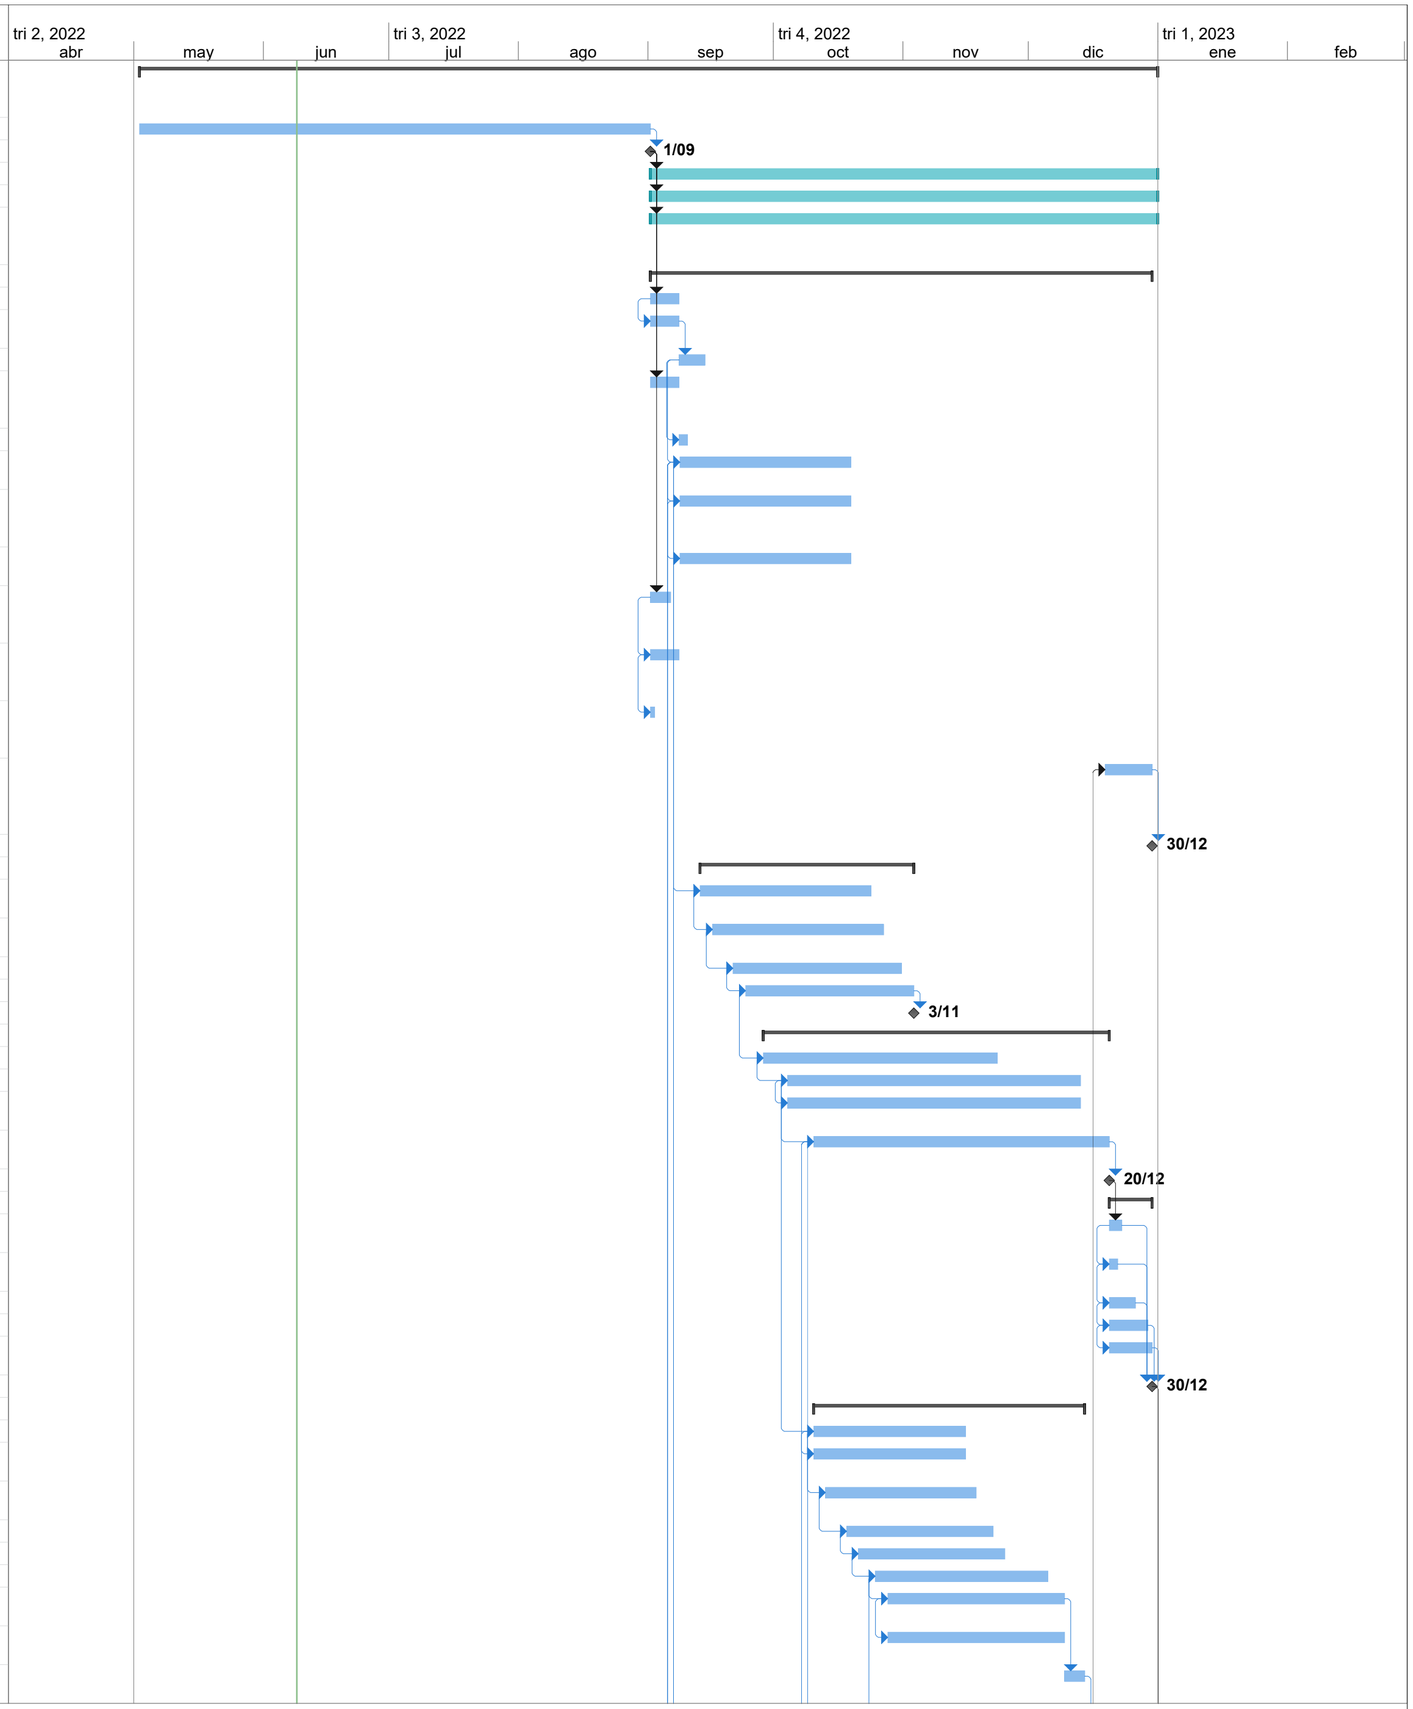

Proyecto: PAZ DEL NORTE
Fecha: jue 9/06/22

Tarea	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Fecha límite	
División	Tareas externas	Resumen inactivo	Resumen manual	Progreso	
Hito	Hito externo	Tarea manual	Sólo el comienzo	Progreso manual	
Resumen	Tarea inactiva	Sólo duración	Sólo fin		


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
50	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	30 días	vie 28/10/22	vie 9/12/22	46CC+10%
51	FIN CUNETAS Y SUMIDEROS	0 días	mié 14/12/22	mié 14/12/22	49
52	**ESPACIO PUBLICO ANDENES Y MOBILIARIOS**	**32,5 días**	**lun 10/10/22**	**vie 25/11/22**	
53	RAMPA PEATONAL INCLUYE BORDILLOS DE CAMBIO DE NIVEL, SARDINEL, ADOQUÍN TÁCTIL TIPO ALERTA Y PLANTILLA EN CONCRETO	15 días	lun 10/10/22	lun 31/10/22	31CC
54	RAMPA PARA USO VEHICULAR DE 4.20M X 1.20M, INCLUYE BORDILLO DE CONCRETO DE CAMBIO DE NIVEL, LOSETA TOPEROL, ADOQUIN EN CONCRETO DE 20CM X 10CM X 6CM COLOR AMARILLO, PLACA ENCONCRETO 0.15MTS DE ESPESOR, EXCAVACIONMANUAL, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	10 días	lun 10/10/22	mar 25/10/22	53CC
55	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M63 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	15 días	mié 12/10/22	mié 2/11/22	53CC+10%;54CC+
56	S/I TABLETA GUÍA PREF. TÁCTIL PARA DISCAP. EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO TIPO ACANALADA (UNA HILERA) CON MORTERO 1:4, INCLUYE ARENA H.=0.04 m, RELLENO CON MATERIAL COMPACTADO SELECCIONADO DE 0.20m Y JUNTAS SELLADAS	25 días	mar 18/10/22	mar 22/11/22	31CC+10%
57	FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN EN CONCRETO DE 20cm X 10cm X 6cm COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO 1:4, ARENA H.=4 CM, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN, JUNTAS SELLADAS CON ARENA	25 días	mar 18/10/22	mar 22/11/22	56CC
58	CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO ESTAMPADO TIPO RONDA, 21 MPA (3.000 PSI). E=0,08M FUNDIDO ENSITIO, JUNTAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE EXCAVACIÓN, SUBBASE, Y TODO LO NECESARIO PARA SUCORRECTA CONSTRUCCIÓN.	25 días	vie 21/10/22	vie 25/11/22	56CC+10%;57CC+
59	FIN ESPACIO PUBLICO, ANDENES Y MOBILIARIO	0 días	vie 25/11/22	vie 25/11/22	58
60	**OTRAS ACTIVIDADES**	**64,5 días**	**jue 8/09/22**	**mar 6/12/22**	
61	S/I TUBERÍA PARA PROLONGACIÓN DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIA EN 4". INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	30 días	jue 13/10/22	vie 25/11/22	41CC+10%
62	REPARACIÓN DE DOMICILIARIAS DEL ACUEDUCTO.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	30 días	jue 8/09/22	mié 19/10/22	14CC;13CC
63	REUBICACIÓN TÍPICA MEDIDORES DE GAS RED DOMICILIARIA.	30 días	jue 8/09/22	mié 19/10/22	62CC
64	BARANDA METÁLICA PARA TRÁFICO VEHICULAR	8 días	vie 25/11/22	mar 6/12/22	59
65	FIN OTRAS ACTIVIDADES	0 días	mar 6/12/22	mar 6/12/22	61;62;63;64
66	**RED DE MEDIA TENSION (13.200) VOL.**	**29 días**	**lun 10/10/22**	**lun 21/11/22**	
67	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE MEDIA TENSION.	10 días	lun 10/10/22	mar 25/10/22	31CC
68	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 M - 750 KGF).	5 días	mar 25/10/22	lun 31/10/22	67
69	SUMINISTRO. INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 M - 750 KGF).	6 días	lun 31/10/22	mié 9/11/22	68
70	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (12 M - 1050 KGF).	7 días	mar 25/10/22	mié 2/11/22	68CC
71	SUMINISTRO, INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (12 M - 1050 KGF).	4 días	mié 2/11/22	mié 9/11/22	70
72	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN DERIVACION COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	4 días	mié 9/11/22	mar 15/11/22	69;71
73	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	1 día	mié 9/11/22	jue 10/11/22	72CC
74	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION CON DISPOSICIÓN EN BANDERA BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	1 día	mié 9/11/22	jue 10/11/22	73CC
75	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANGULO CON DISPOSICIÓN EN BANDERA A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	5 días	mié 9/11/22	mié 16/11/22	74CC
76	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	1 día	mié 9/11/22	jue 10/11/22	75CC
77	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN FIN DE LINEA COMPACTA CON DISPOSICIÓN CENTRAL BIFASICO A 13.2 KV., E INCLUYE: PUESTA A TIERRA EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	1 día	mié 9/11/22	jue 10/11/22	76CC
78	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 12 M.	1 día	mié 9/11/22	jue 10/11/22	77CC
79	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9m	6 días	mié 9/11/22	jue 17/11/22	78CC
80	INSTALACION CON TENSION A 13.2 KV. DE POSTE EN CONCRETO	8 días	mié 9/11/22	lun 21/11/22	79CC
81	FIN RED DE MEDIA TENSION	0 días	lun 21/11/22	lun 21/11/22	72;73;74;75;76;77;
82	**RED DE BAJA TENSION (240/120) VOL.**	**27 días**	**lun 10/10/22**	**jue 17/11/22**	
83	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSION.	10 días	lun 10/10/22	mar 25/10/22	53CC

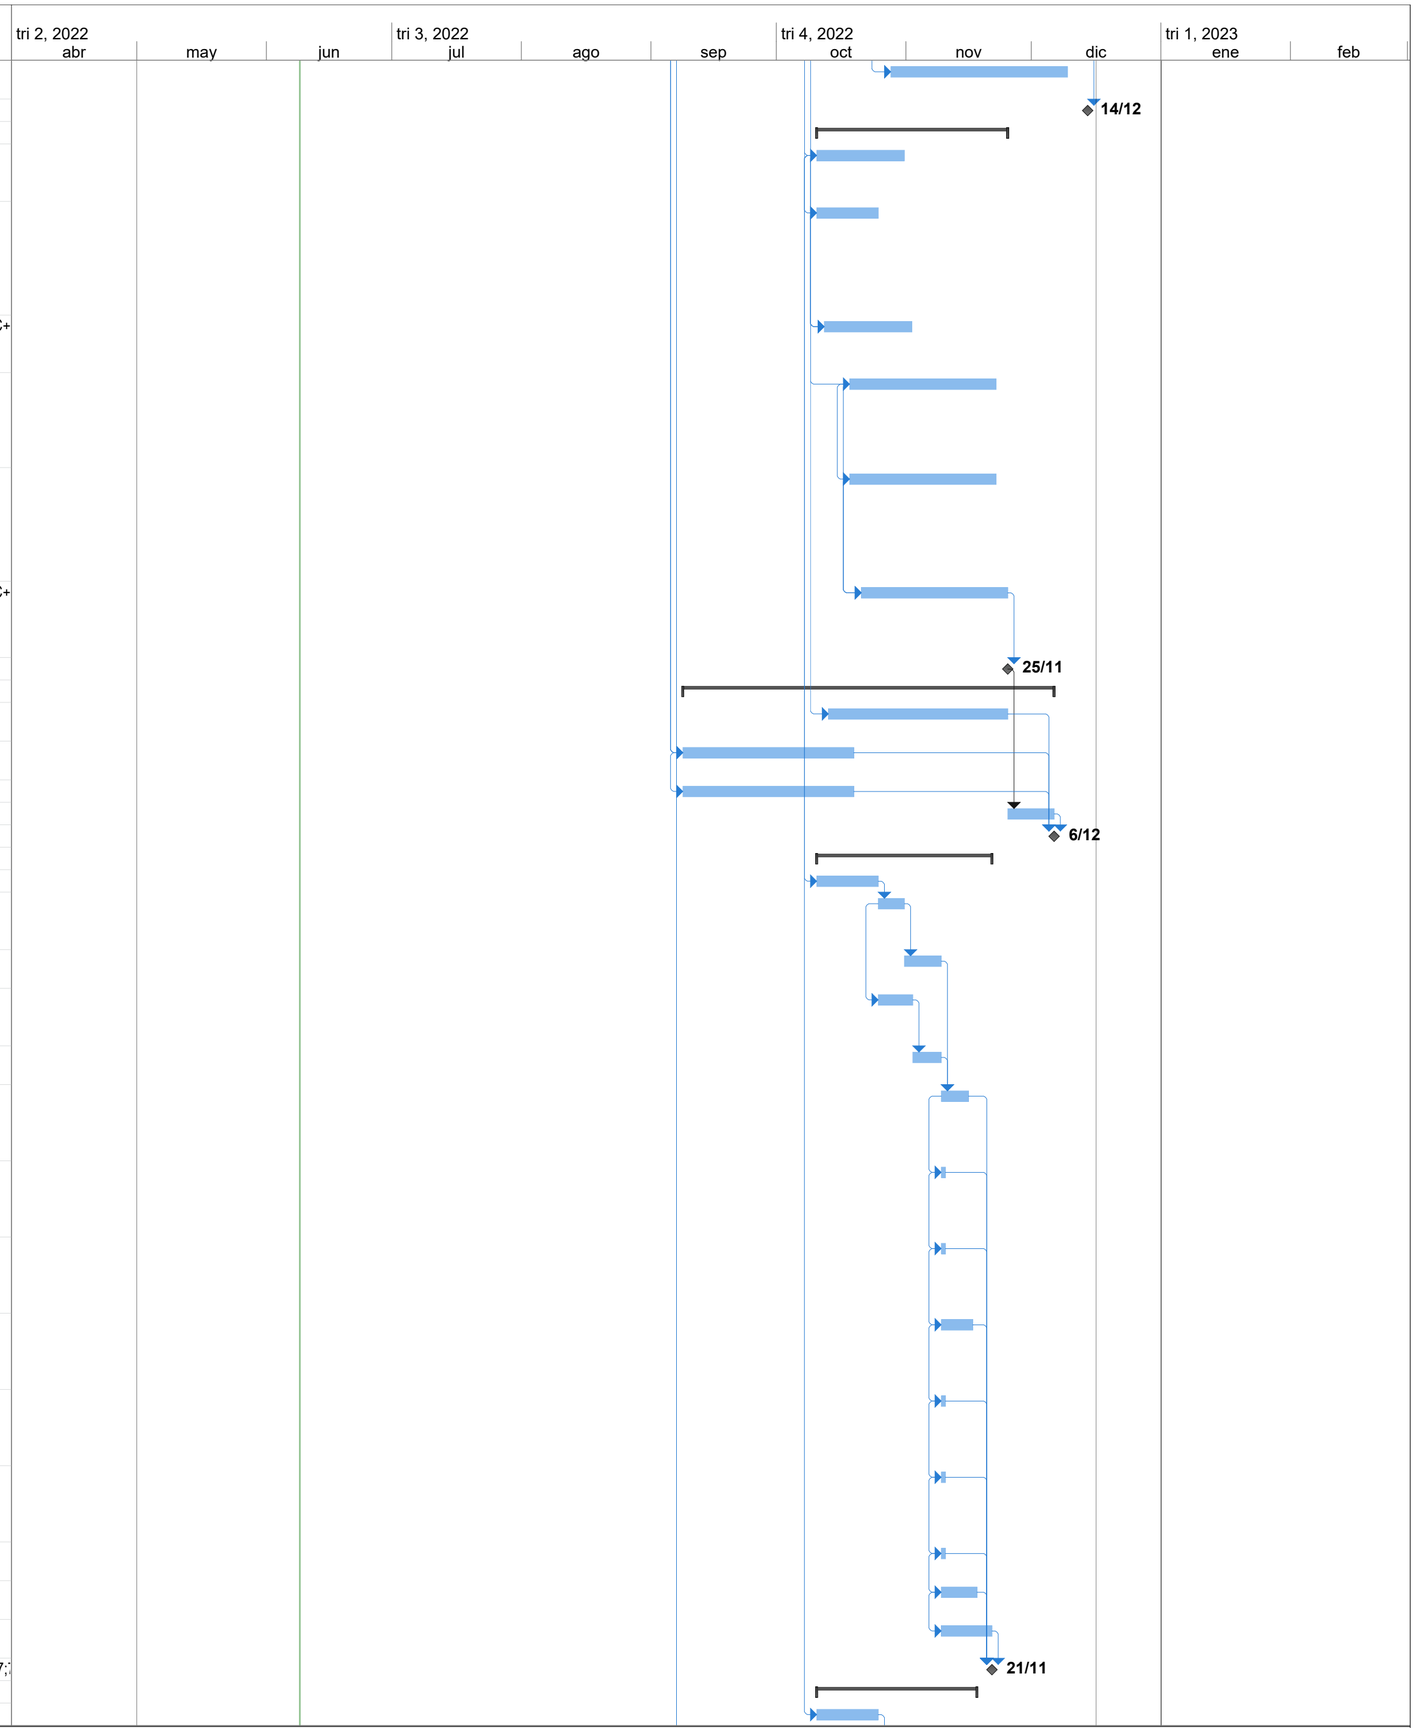

Proyecto: PAZ DEL NORTE
Fecha: jue 9/06/22

Tarea	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Fecha límite
División	Tareas externas	Resumen inactivo	Resumen manual	Progreso
Hito	Hito externo	Tarea manual	Sólo el comienzo	Progreso manual
Resumen	Tarea inactiva	Sólo duración	Sólo fin	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
84	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CILINDRICA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE (9 M - 510 KGF).	5 días	mar 25/10/22	lun 31/10/22	83
85	SUMINISTRO. INSTALACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE (9 M - 510 KGF).	5 días	lun 31/10/22	mar 8/11/22	84
86	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ALINEACION - ANGULO - FINAL DE CIRCUITO PARA BT A 240/120 VOL.	7 días	mar 8/11/22	jue 17/11/22	85
87	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN ANCLAJE PARA BT A 240/120 VOL.	5 días	mar 8/11/22	mar 15/11/22	86CC
88	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 2 AWG.	4 días	mar 8/11/22	sáb 12/11/22	87CC
89	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE RED PARA BT BIFASICA AEREA EN CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO - No. 1/0 AWG.	6 días	mar 8/11/22	mié 16/11/22	88CC
90	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 M.	4 días	mar 8/11/22	sáb 12/11/22	89CC
91	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA DE RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL., EN CINTA DE ACERO INOXIDABLE.	5 días	mar 8/11/22	mar 15/11/22	90CC
92	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIÓN (4 USUARIOS) A RED TRENSADA DE BT A 120/240 VOL.	4 días	mar 8/11/22	sáb 12/11/22	91CC
93	FIN RED DE BAJA TENSION	0 días	jue 17/11/22	jue 17/11/22	86;87;88;89;90;91;9
94	**SUBESTACIONES ELECTRICAS (13.200/240/120) VOL.**	**11 días**	**vie 18/11/22**	**vie 2/12/22**	
95	SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENSIONADO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2xNo. 6 + 1xNo. 6) AWG.	10 días	vie 18/11/22	jue 1/12/22	93
96	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REUBICACION DE MEDIDOR (240/120) VOL.	6 días	jue 24/11/22	vie 2/12/22	95CC+50%
97	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	6 días	jue 24/11/22	vie 2/12/22	96CC
98	FIN SUBESTACIONES ELECTRICAS	0 días	vie 2/12/22	vie 2/12/22	96;97
99	**OBRAS DE ALCANTARILLADO**	**46 días**	**mar 13/09/22**	**mar 15/11/22**	
100	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	10 días	mar 13/09/22	lun 26/09/22	13CC+10%
101	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN BAJO AGUA (A MAQUINA)	30 días	lun 26/09/22	vie 4/11/22	100
102	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	30 días	lun 26/09/22	vie 4/11/22	101CC
103	S/I DE ENTIBADO (APUNTALAMIENTO EN LAMINA METALICA) x 3 USOS	4 días	vie 14/10/22	vie 21/10/22	101CC+50%
104	CAMARA DE INSPECCION PREFABRICADA ALCANTARILLADO EN CONCRETO	30 días	jue 29/09/22	jue 10/11/22	101CC+10%
105	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS Y CAPAS GRANULARES	30 días	jue 29/09/22	jue 10/11/22	101CC+10%
106	RELLENO CON MATERIAL TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR	30 días	mar 4/10/22	mar 15/11/22	105CC+10%
107	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	30 días	jue 29/09/22	jue 10/11/22	101CC+10%
108	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO	30 días	jue 29/09/22	jue 10/11/22	107CC
109	RELLENO PARA FILTROS EN GRAVA TIPO ARENA	30 días	jue 29/09/22	jue 10/11/22	107CC
110	S/I TUBERIA ALCANTARILLADO CORRUGADA DE 10" (250mm)	30 días	mar 4/10/22	mar 15/11/22	109CC+10%
111	S/I DOMICILIARIA ALCANTARILLADO	30 días	mar 4/10/22	mar 15/11/22	109CC+10%
112	FIN OBRAS DE ALCANTARILLADO	0 días	mar 15/11/22	mar 15/11/22	111
113	**OBRAS DE ACUEDUCTO**	**49 días**	**mar 13/09/22**	**vie 18/11/22**	
114	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	10 días	mar 13/09/22	lun 26/09/22	13CC+10%
115	EXCAVACION MANUAL	30 días	lun 26/09/22	vie 4/11/22	114
116	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	30 días	jue 29/09/22	jue 10/11/22	115CC+10%
117	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	30 días	jue 29/09/22	jue 10/11/22	115CC+10%
118	RELLENO CON MATERIAL DE SITIO	30 días	jue 29/09/22	jue 10/11/22	117CC
119	RELLENO PARA FILTROS EN GRAVA TIPO ARENA	30 días	mar 4/10/22	mar 15/11/22	117CC+10%
120	S/I TUBERIA PEAD PE 100 / PN 8 (RDE 21) - D = 160 mm	30 días	vie 7/10/22	vie 18/11/22	119CC+10%
121	S/I ACCESORIOS DETALLE 1 - DERIVACION	2 días	mar 11/10/22	jue 13/10/22	120CC+10%
122	S/I ACCESORIOS DETALLE 2 - TAPON	2 días	mar 11/10/22	jue 13/10/22	121CC
123	S/I ACCESORIOS DETALLE 3 - HIDRANTE	2 días	mar 11/10/22	jue 13/10/22	122CC
124	FIN OBRAS DE ACUEDUCTO	0 días	vie 18/11/22	vie 18/11/22	120
125	FIN OBRAS	0 días	vie 30/12/22	vie 30/12/22	39

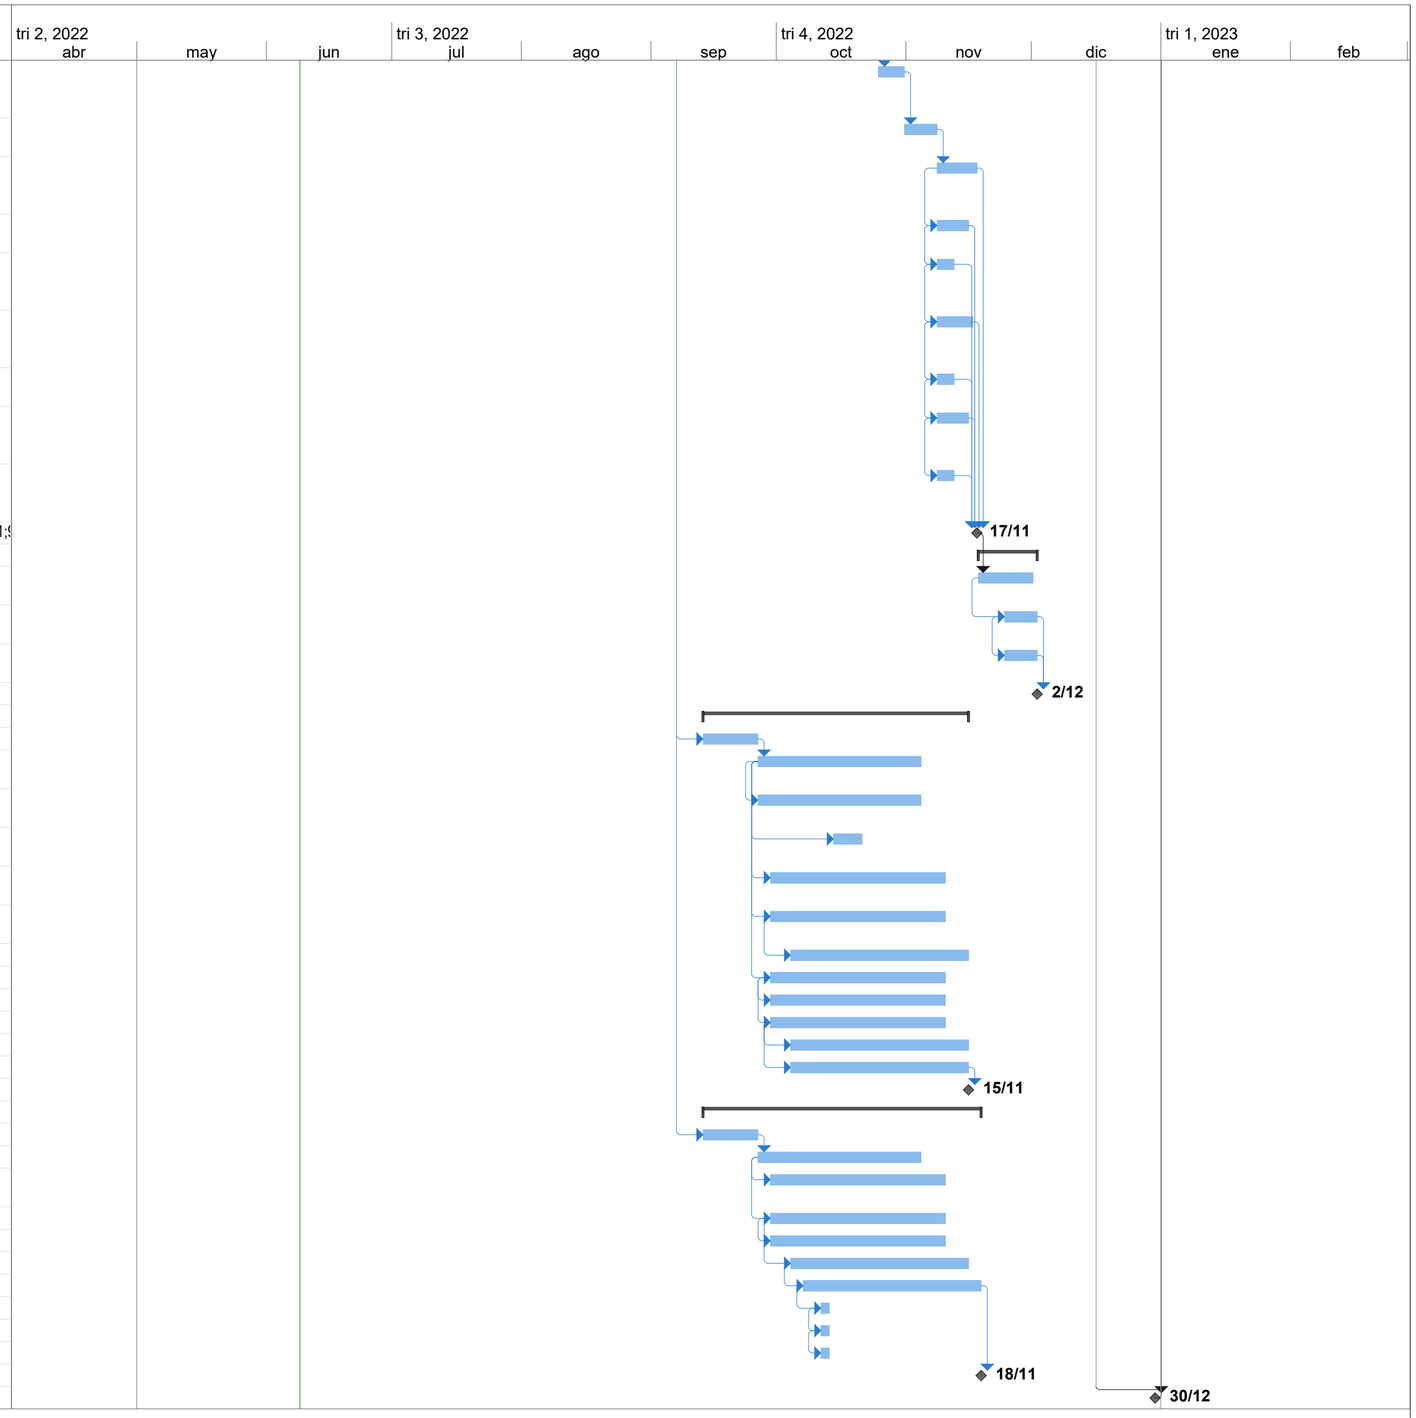

Proyecto: PAZ DEL NORTE
Fecha: jue 9/06/22

Tarea	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Fecha límite
División	Tareas externas	Resumen inactivo	Resumen manual	Progreso
Hito	Hito externo	Tarea manual	Sólo el comienzo	Progreso manual
Resumen	Tarea inactiva	Sólo duración	Sólo fin	
