5934 – 5935.

	OFICIO REMISORIO DE RADICACIÓN	Código: GC-FPA-058 Versión: 1 Fecha adopción:02-06-2011 Página 1 de 2

12.991

24 MAY 2022

SPGR.

Valledupar, 23 de mayo de 2022

Señores
Secretaría de Hacienda – Área de Contabilidad – Central de Cuentas
Atn: OLGA LUCIA IGLESIAS IBARRA
Líder Central de Cuentas
Gobernación del Cesar

Asunto: Remisión de documentos soportes de pago.

Cordial saludo.

En cumplimiento de lo establecido en el Procedimiento para pagos a terceros vigente, remito para los fines pertinentes los documentos requeridos para que se proceda a emitir la Orden de Pago correspondiente al contrato de obra No 2021040002

SECTORIAL QUE ELABORÓ EL ESTUDIO PREVIO	INFRAESTRUCTURA
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR"
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.
NIT	890115406-0
SUPERVISOR	ANDRES ALMARALES MELO / JORGE OLIVEROS GALINDO
N° DE ACTA O INFORME CONCEPTO DEL PAGO	ACTA PARCIAL DE OBRAS No 5

Para lo anterior, se adjunta al presente los siguientes documentos:

DOCUMENTO	N° DE FOLIOS
Oficio remisorio de Radicación	
Informe de Supervisión para pago	
Informe de actividades contratista	

	OFICIO REMISORIO DE RADICACIÓN	Código: GC-FPA-058 Versión: 1 Fecha adopción:02-06-2011 Página 1 de 2

12-9-01

DOCUMENTO	Nº DE FOLIOS
Oficio remisorios acta Interventoria	
Certificados Interventoria	
Factura No. FE1284	
Parafiscales contratistas + Planillas de seguridad social	
Certificados de disponibilidad presupuesta	
Registros presupuestales	
Certificación Bancaria	
Cedula RP Legal	
RUT contratista	
Acta Parcial No 5	
Pre Acta	
Memoria de Cantidades	
Contrato	
Pólizas	
Informe de gestión del Contratista	
Copia de Bitácora	

Atentamente,

ANDRES ALFONSO ALMARALES MELO
VO. BO. SUPERVISOR

12997

GOBERNACIÓN DEL CESAR
INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA PARA PAGO

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA
NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN	LOP-SIN-0002-2021
NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN SECOP II	CO1.BDOS.1797395
TIPO DE CONTRATACIÓN	OBRA
JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN	ARTÍCULO 30, LEY 80 DE 1993
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	2021040002
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	12 DE MAYO DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	890115408-0
REPRESENTANTE LEGAL	IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	85475046
DATOS DE LA CUENTA BANCARIA	BANCO DAVIVIENDA S.A. Cuenta CORRIENTE Nro. 0560027569991238
DATOS DE LA CUENTA BANCARIA AFC	$ 0,00; Cuenta Nro.
Clasificación P.N: N/A ¿Tiene Dependientes?: NO ¿Es Pensionado?: NO ¿Es Declarante de Renta?: SI	
Régimen: NO RESPONSABLE DE IVA Valor Aportado a Pensiones Voluntarias: $ 0,00 Valor Intereses de Vivienda: $ 0,00	
¿SUS INGRESOS EN EL 2021 SUPERARON $ 50.831.000,00? NO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 138.817.668.949,11
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 0,00
VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 138.817.668.949,11
ANTICIPO(S) DEL CONTRATO	$ 0,00
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS ANTICIPO: NO HABRÁ LUGAR AL DESEMBOLSO DE ANTICIPO SEGÚN LO PREVISTO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACIÓN. FORMA DE PAGO: EL 100% MEDIANTE ACTAS PARCIALES O FINAL DE OBRA (ANEXANDO Y PRESENTANDO PRE ACTAS) FIRMADAS POR EL CONTRATISTA, EL RESIDENTE Y DIRECTOR DE OBRA, APROBADAS POR EL INTERVENTOR, VISTO BUENO DEL SUPERVISOR Y DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, SEGÚN EL PORCENTAJE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN ESE MOMENTO Y QUE ESTÉN CUMPLIENDO CON EL PROGRAMA DE INVERSIÓN FINANCIERA Y DE ACTIVIDADES DE OBRA. LAS OBRAS QUE ENTREGUE EL CONTRATISTA DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROYECTO CONTIENE O LAS PRE ESCRITAS A NIVEL NACIONAL. PARAGRAFO 1: PARA EL PAGO DE LA ÚLTIMA ACTA DE OBRA SE DEBE PRESENTAR EL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DEL CONTRATO. LAS ACTAS DE OBRA DEBERÁN PRESENTARSE DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES AL MES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, EL CONTRATISTA DEBERÁ RADICAR EN LA DEPENDENCIA COMPETENTE DEL DEPARTAMENTO LAS CORRESPONDIENTES FACTURAS DE PAGO, DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL RECIBO DE LAS ACTAS DE OBRA DEBIDAMENTE APROBADAS POR DEPARTAMENTO, Y EL DEPARTAMENTO LAS PAGARÁ DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS MISMAS O, SI SE EVIDENCIAN ERRORES EN LAS CUENTAS PRESENTADAS O INSUFICIENCIA EN LOS SOPORTES, LOS TREINTA (30) DÍAS HÁBILES PARA EL PAGO SE CONTARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL CONTRATISTA SUBSANE LAS GLOSAS QUE SE FORMULEN. . SI EL CONTRATISTA NO PRESENTA LA CUENTA CON SUS SOPORTES RESPECTIVOS, DENTRO DE LA VIGENCIA FISCAL CORRESPONDIENTE, NO PODRÁ HACER NINGUNA RECLAMACIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL DE ACTUALIZACIONES, INTERESES O SOBRECOSTOS SOBRE EL VALOR DE LA CUENTA.	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	22 MES(ES)
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A
PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO	N/A
PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	22 MES(ES)
FECHA DE INICIO	12 DE JULIO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	11 DE MAYO DE 2023
INTERVENTOR / IDENTIFICACIÓN INTERVENTOR	901493970

Formato No. 1070 | Sircc II V1.0 © Todos los derechos reservados.
Impreso por ANDRES ALFONSO ALMARALES MELO el día: 24 de mayo de 2022

NOMBRE DEL INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR
FECHA DE DESIGNACIÓN	7 DE JULIO DE 2021

SUPERVISORES DEL CONTRATO

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FECHA DESIGNACIÓN
85156055	ANDRES ALFONSO ALMARALES MELO	17 DE ENERO DE 2022

2. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

N°	8521	VALOR	$ 44.207.808.221,10	FECHA	17 DE MARZO DE 2021
N°	8121	VALOR	$ 95.292.076.215,90	FECHA	12 DE MARZO DE 2021

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP

N°	3238	VALOR	$ 43.699.960.728,21	FECHA	2 DE JULIO DE 2021
N°	3237	VALOR	$ 95.117.708.220,90	FECHA	2 DE JULIO DE 2021
N°	2021013238	VALOR	$ 43.699.960.728,21	FECHA	2 DE JULIO DE 2021
N°	2021013237	VALOR	$ 95.117.708.220,90	FECHA	2 DE JULIO DE 2021

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	99 - 8 - 1.3.8.5.2.1 - 10-7 - 2021002200022 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS HISTORICOS Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR; 99 - 8 - 1.3.8.5.2.1 - 15-2 - 2021002200022 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS HISTORICOS Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR; 99 - 8.1.3.08.05.002.01 - 10-7 - 2021002200022 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS HISTORICOS Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR; 99 - 8.1.3.08.05.002.01 - 15-2 - 2021002200022 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS HISTORICOS Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP (SGR)

N°	9221	VALOR	$ 43.699.960.728,21	FECHA	2 DE JULIO DE 2021
N°	9121	VALOR	$ 95.117.708.220,90	FECHA	2 DE JULIO DE 2021

3. PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

IMPUESTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	NÚMERO LIQUIDACIÓN	FECHA DE PAGO
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	$ 138.817.668.949,00	0,5 %	$ 694.088.000,00	32021012775	06/07/2021
ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL	$ 138.817.668.949,00	1,0 %	$ 1.388.177.000,00	32021012772	-
ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO	$ 138.817.668.949,00	1,5 %	$ 2.082.265.000,00	32021012772	-
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	$ 138.817.668.949,00	1,0 %	$ 1.388.177.000,00	32021012772	-
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR	$ 138.817.668.949,00	0,5 %	$ 694.088.000,00	32021012772	-

4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE
COLPATRIA	4817	CUMPLIMIENTO	$ 41.645.300.685,00	12/05/2021 AL 12/07/2023	2021040002
COLPATRIA	4817	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES	$ 6.940.883.448,00	12/05/2021 AL 12/03/2026	2021040002
COLPATRIA	4817	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 41.645.300.685,00	12/03/2023 AL 12/03/2026	2021040002
COLPATRIA	4817	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	$ 16.658.120.274,00	12/03/2023 AL 12/03/2026	2021040002
COLPATRIA	1000834	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	$ 6.940.883.448,00	12/05/2021 AL 12/03/2023	2021040002
COLPATRIA	4817	CUMPLIMIENTO	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 AL 11/09/2023	2021040002-ACT01
COLPATRIA	4817	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 AL 11/05/2026	2021040002-ACT01

Formato No. 1070 | Sirce II V1.0 © Todos los derechos reservados.
Impreso por ANDRES ALFONSO ALMARALES MELO el día: 24 de mayo de 2022

COLPATRIA	4817	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 41.645.300.685,00	11/05/2023 AL 11/05/2028	2021040002-ACT01
COLPATRIA	4817	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 AL 11/05/2026	2021040002-ACT01
COLPATRIA	1000834	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 AL 11/05/2023	2021040002-ACT01
APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA			0050 DEL 6 DE JULIO DE 2021		
APROBACIÓN DE GARANTÍAS ACTUALIZACIÓN No. 2021040002-ACT01 - RESOLUCIÓN Y FECHA			0050-A DEL 27 DE JULIO DE 2021		

5. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA

NOMBRE O TIPO	FECHA SUSCRIPCIÓN	MOTIVO DEL ACTA
INICIO	12-07-2021	DA POR INICIADO EL CONTRATO

6. RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA

NÚMERO DE LA MODIFICACIÓN	OBJETO DE LA MODIFICACIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN
2021040002-01	MODIFICATORIO	23-09-2021	SE CORRIGE AL AIU DE ACUERDO A LO OFERTADO POR EL PROPONENTE

7. RELACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA

N° INFORME	FECHA	PERIODO CORRESPONDIENTE
acta parcial #01	25-10-2021	DEL 12/07/2021 AL 30/08/2021
acta parcial #02	23-12-2021	DEL 01/09/2021 AL 10/11/2021
acta parcial #03	23-12-2021	DEL 11/11/2021 AL 15/12/2021
acta parcial #04	11-03-2022	DEL 16/12/2021 AL 01/03/2022

8. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

N°	TIPO	VALOR BRUTO	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	MENOS GLOSAS	VALOR NETO	N° ORDEN PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO	
							N°	FECHA
1	PAGO	$ 989.095.946,99			$ 989.095.946,99	10885, 10886	512, 513	27/10/2021, 27/10/2021
2	PAGO	$ 1.084.213.520,28			$ 1.084.213.520,28	16375, 16376	689, 688	28/12/2021, 28/12/2021
3	PAGO	$ 6.749.214.394,91			$ 6.749.214.394,91	16377, 16853	691, 693	29/12/2021, 29/12/2021
4	PAGO	$ 1.664.472.075,32			$ 1.664.472.075,32	2430, 2431	107, 108	15/03/2022, 15/03/2022
TOTAL:		$ 10.486.995.937,50						

9. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISALES

NÚMERO PLANILLA	MES AL QUE CORRESPONSE EL APORTE	SALUD	PENSION	ARL	PARAFISCALES	TOTAL APORTE
9422956709	MES DE JULIO DE 2021	$ 409.400,00	$ 1.703.400,00	$ 712.500,00	$ 409.400,00	$ 3.234.700,00
9422956788	MES DE JULIO DE 2021	$ 96.000,00	$ 384.000,00	$ 167.100,00	$ 96.000,00	$ 743.100,00
9422956788	MES DE JULIO DE 2021	$ 2.175.000,00	$ 3.097.200,00	$ 1.211.100,00	$ 1.566.000,00	$ 8.049.300,00
9424216631	MES DE AGOSTO DE 2021	$ 149.400,00	$ 597.400,00	$ 259.900,00	$ 149.400,00	$ 1.156.100,00
9424216631	MES DE AGOSTO DE 2021	$ 2.175.000,00	$ 3.097.200,00	$ 1.211.100,00	$ 1.566.000,00	$ 8.049.300,00
9424217396	MES DE AGOSTO DE 2021	$ 22.000,00	$ 88.000,00	$ 38.300,00	$ 22.000,00	$ 170.300,00

Formato No. 1070 | Sircc II V1.0 © Todos los derechos reservados.
Impreso por ANDRES ALFONSO ALMARALES MELO el día: 24 de mayo de 2022

9424224767	MES DE AGOSTO DE 2021	$ 663.700,00	$ 2.719.500,00	$ 1.147.900,00	$ 659.900,00	$ 5.191.000,00
9424671615	MES DE AGOSTO DE 2021	$ 1.062.000,00	$ 4.238.400,00	$ 1.820.300,00	$ 1.047.200,00	$ 8.167.900,00
9423448119	MES DE JULIO DE 2021	$ 810.700,00	$ 3.238.000,00	$ 1.403.400,00	$ 807.000,00	$ 6.259.100,00
9424224767	MES DE AGOSTO DE 2021	$ 663.700,00	$ 2.719.500,00	$ 1.147.900,00	$ 659.900,00	$ 5.191.000,00
9424216631	MES DE AGOSTO DE 2021	$ 2.175.000,00	$ 3.097.200,00	$ 1.211.100,00	$ 1.566.000,00	$ 8.049.300,00
9424671615	MES DE AGOSTO DE 2021	$ 1.062.000,00	$ 4.238.400,00	$ 1.820.300,00	$ 1.047.200,00	$ 8.167.900,00
9424216631	MES DE AGOSTO DE 2021	$ 149.400,00	$ 597.400,00	$ 259.900,00	$ 149.400,00	$ 1.156.100,00
9425498928	MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	$ 200.000,00	$ 800.000,00	$ 348.000,00	$ 200.000,00	$ 1.548.000,00
9425499001	MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	$ 60.000,00	$ 240.000,00	$ 104.400,00	$ 60.000,00	$ 464.400,00
9425499146	MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	$ 815.100,00	$ 3.325.500,00	$ 1.418.100,00	$ 815.100,00	$ 6.373.800,00
9425498928	MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	$ 2.175.000,00	$ 3.097.200,00	$ 1.211.100,00	$ 1.566.000,00	$ 8.049.300,00
9425572597	MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	$ 1.841.600,00	$ 7.349.600,00	$ 3.105.400,00	$ 1.788.600,00	$ 14.083.200,00
9426660920	MES DE OCTUBRE DE 2021	$ 200.000,00	$ 800.000,00	$ 348.000,00	$ 200.000,00	$ 1.548.000,00
9426656314	MES DE OCTUBRE DE 2021	$ 61.000,00	$ 243.800,00	$ 106.100,00	$ 61.000,00	$ 471.900,00
9426660789	MES DE OCTUBRE DE 2021	$ 901.300,00	$ 3.669.200,00	$ 1.493.000,00	$ 858.300,00	$ 6.921.800,00
9427792155	MES DE NOVIEMBRE DE 2021	$ 907.000,00	$ 3.692.400,00	$ 1.522.700,00	$ 880.600,00	$ 7.002.700,00
9427793079	MES DE NOVIEMBRE DE 2021	$ 200.000,00	$ 800.000,00	$ 348.000,00	$ 200.000,00	$ 1.548.000,00
9427793079	MES DE NOVIEMBRE DE 2021	$ 2.175.000,00	$ 3.097.200,00	$ 1.211.100,00	$ 1.566.000,00	$ 8.049.300,00
9428479084	MES DE NOVIEMBRE DE 2021	$ 2.462.500,00	$ 9.813.100,00	$ 4.287.000,00	$ 2.465.300,00	$ 19.147.900,00
9428956666	MES DE DICIEMBRE DE 2021	$ 1.069.200,00	$ 4.341.400,00	$ 1.660.100,00	$ 1.069.200,00	$ 8.339.900,00
9428956775	MES DE DICIEMBRE DE 2021	$ 82.600,00	$ 330.300,00	$ 143.700,00	$ 82.600,00	$ 639.200,00
9428956423	MES DE DICIEMBRE DE 2021	$ 200.000,00	$ 800.000,00	$ 348.000,00	$ 200.000,00	$ 1.548.000,00
9428956423	MES DE DICIEMBRE DE 2021	$ 2.175.000,00	$ 2.784.000,00	$ 1.211.100,00	$ 1.566.000,00	$ 7.736.100,00
9429595708	MES DE DICIEMBRE DE 2021	$ 280.600,00	$ 1.120.200,00	$ 467.400,00	$ 280.600,00	$ 2.148.800,00
9429708251	MES DE DICIEMBRE DE 2021	$ 2.413.500,00	$ 9.633.500,00	$ 4.164.600,00	$ 2.398.100,00	$ 18.607.700,00
9429566240	MES DE DICIEMBRE DE 2021	$ 414.300,00	$ 1.653.300,00	$ 719.800,00	$ 104.200,00	$ 2.891.600,00
9430424775	MES DE ENERO DE 2022	$ 1.111.300,00	$ 4.518.200,00	$ 1.933.600,00	$ 1.111.300,00	$ 8.672.400,00
9430424629	MES DE ENERO	$ 83.500,00	$ 333.700,00	$ 145.200,00	$ 83.500,00	$ 645.900,00

Formato No. 1070 | Sircc II V1.0 © Todos los derechos reservados.

	DE 2022					
9430424417	MES DE ENERO DE 2022	$ 200.000,00	$ 800.000,00	$ 348.000,00	$ 200.000,00	$ 1.548.000,00
9430424417	MES DE ENERO DE 2022	$ 2.175.000,00	$ 2.784.000,00	$ 1.211.100,00	$ 1.566.000,00	$ 7.736.100,00
9430933052	MES DE ENERO DE 2022	$ 223.100,00	$ 891.100,00	$ 387.900,00	$ 223.100,00	$ 1.725.200,00
9430985629	MES DE ENERO DE 2022	$ 2.036.000,00	$ 8.140.000,00	$ 3.537.900,00	$ 1.953.900,00	$ 15.667.800,00
9431680885	MES DE ENERO DE 2022	$ 233.400,00	$ 933.000,00	$ 406.000,00	$ 58.500,00	$ 1.630.900,00
9431717540	MES DE FEBRERO DE 2022	$ 1.184.500,00	$ 4.802.400,00	$ 2.080.700,00	$ 1.184.500,00	$ 9.232.100,00
9431717287	MES DE FEBRERO DE 2022	$ 92.000,00	$ 368.000,00	$ 160.100,00	$ 92.000,00	$ 712.100,00
9431717185	MES DE FEBRERO DE 2022	$ 242.700,00	$ 970.400,00	$ 422.300,00	$ 242.700,00	$ 1.878.100,00
9431717185	MES DE FEBRERO DE 2022	$ 2.682.500,00	$ 3.433.600,00	$ 1.130.400,00	$ 1.931.400,00	$ 9.177.900,00
9432079258	MES DE FEBRERO DE 2022	$ 176.200,00	$ 704.200,00	$ 306.500,00	$ 176.200,00	$ 1.363.100,00
9433112447	MES DE MARZO DE 2022	$ 241.500,00	$ 965.500,00	$ 401.500,00	$ 230.700,00	$ 1.839.200,00
9433112597	MES DE MARZO DE 2022	$ 153.700,00	$ 614.500,00	$ 267.300,00	$ 153.700,00	$ 1.189.200,00
9433390818	MES DE MARZO DE 2022	$ 665.500,00	$ 2.661.500,00	$ 1.157.900,00	$ 665.500,00	$ 5.150.400,00
9433112688	MES DE MARZO DE 2022	$ 1.477.900,00	$ 6.020.800,00	$ 2.571.000,00	$ 1.477.900,00	$ 11.547.600,00
9433598957	MES DE MARZO DE 2022	$ 444.000,00	$ 1.798.500,00	$ 772.200,00	$ 222.100,00	$ 3.236.800,00
9433740329	MES DE MARZO DE 2022	$ 2.077.400,00	$ 8.305.400,00	$ 3.590.800,00	$ 2.049.500,00	$ 16.023.100,00
9433112447	MES DE MARZO DE 2022	$ 2.175.000,00	$ 2.871.000,00	$ 1.211.100,00	$ 696.000,00	$ 6.953.100,00
9434475506	MES DE ABRIL DE 2022	$ 244.000,00	$ 976.000,00	$ 424.600,00	$ 244.000,00	$ 1.888.600,00
9434475621	MES DE ABRIL DE 2022	$ 77.800,00	$ 311.100,00	$ 135.400,00	$ 77.800,00	$ 602.100,00
9434475786	MES DE ABRIL DE 2022	$ 1.433.400,00	$ 5.842.100,00	$ 2.443.900,00	$ 1.409.900,00	$ 11.129.300,00
9434620892	MES DE ABRIL DE 2022	$ 365.100,00	$ 1.457.100,00	$ 634.100,00	$ 365.100,00	$ 2.821.400,00
9434475506	MES DE ABRIL DE 2022	$ 2.392.500,00	$ 3.158.100,00	$ 1.332.200,00	$ 765.600,00	$ 7.648.400,00

10. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS FACTURADOS POR EL CONTRATISTA Y SUS CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN, PRODUCTO O SERVICIO	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD SUMINISTRADA EN EL PERÍODO	VALOR PARCIAL	FECHA DE ENTREGA

OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL SUPERVISOR

En atención a la autorización de descuento directo acogido por el contratista A CONSTRUIR S.A con relación a lo estipulado en la ordenanza No. 226 del 26 de febrero de 2021 para el pago de los impuestos de PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL, PRO DESARROLLO FRONTERIZO, PRO CULTURA Y PRO ADULTO MAYOR. Se AUTORIZA a la entidad contratante para que de la presente acta parcial No 5 SE DESCUENTE EL SALDO TOTAL PENDIENTE POR CONCEPTOS DE ESTAPILLAS EL CUAL EQUIVALE A LA SUMA DE $2,406,605,000. Los cuales se distribuyen de la siguiente forma: PRO DESARROLLO DPTAL: $601,653,000 PRO DESARROLLO FRONTERIZO: $902,476,000 PRO CULTURA: $601,652,000 PRO ADULTO MAYOR: $300,824,000 Nuevo Saldo valor estampillas después de acta parcial 5: $0,00. Con el presente descuento, el contratista se encuentra a paz y salvo por el concepto del pago de las estampillas.

RELACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

- Se realizaron inspecciones de mantenimiento de la máquina, así como también si se han aplicado todas las medidas de seguridad, se hizo entrega de EPP a todo el personal

Formato No. 1070 | Sircc II V1.0 © Todos los derechos reservados.

Impreso por ANDRES ALFONSO ALMARALES MELO el día: 24 de mayo de 2022

- Se presenta formato de vinculación de mano de obra, con el fin de presentar los ingresos del personal durante el mes de marzo y abril de 2022.
- Se adelantaron labores de orden aseo y limpieza, se gestiono permiso de poda de árboles a corpocesar, delimitación , señalización y cubrimiento de materiales
- El auxiliar de tráfico aseguró el flujo normal de circulación vehicular y peatonal

OBLIGACIONES DEL CONTRATRISTA

- Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
- Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.
- Implementar acciones tendentes a que en la ejecución del contrato se mitigue los riesgos de desastres en cumplimiento de lo establecido en la ley 1523 del 24 de abril de 2012, y de sus normas que la modifican o complementan.
- Implementación del Plan de Manejo de Transito. (Si aplica) 7.19. Desarrollar acciones propias para contribuir a la gestión del cambio climático con arreglo a lo dispuesto en la Ley 1931 del 27 de julio de 2018, y en armonía con las acciones desplegadas por las entidades públicas.
- Implementación del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA), en cumplimiento de normas constitucionales y legales que regula la protección al medio ambiente (Si aplica).
- Cumplir con la resolución No 00541 del 14 de Diciembre de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, las que la modifiquen, sustituyan y/o complementen, por medio del cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, etc
- Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.
- Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
- Informar cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, el de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial.
- Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
- Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
- Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
- Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad
- Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
- Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
- Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones y condiciones de los anexos del Pliego de Condiciones.
- Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación
- Garantizar la vinculación de mano de obra no calificada de población vulnerable perteneciente al respectivo Municipio donde se esté ejecutando la obra y reportar mensualmente a la entidad contratante la relación y duración de los empleos generados para la ejecución del contrato de obra
- Durante la ejecución del contrato deberá cumplir con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) propuesto y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
- Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

Formato No. 1070 | Sirce II V1.0 © Todos los derechos reservados.
Impreso por ANDRES ALFONSO ALMARALES MELO el día: 24 de mayo de 2022

11. INVERSIÓN MUNICIPALIZADA

#	MUNICIPIO	TOTAL FACTURADO
1	Valledupar	$ 9.409.019.956,18
TOTAL:		$ 9.409.019.956,18

12. DESCUENTOS REALIZADOS AL CONTRATO

DESCUENTO	NÚMERO OP	FECHA	TOTAL DESCONTADO
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPTAL	10885	27-10-2021	$ 37.091.000,00
	10886	27-10-2021	$ 37.091.000,00
	16375	28-12-2021	$ 40.658.000,00
	16376	28-12-2021	$ 40.658.000,00
	16377	29-12-2021	$ 253.096.000,00
	16853	29-12-2021	$ 253.095.000,00
TOTAL ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPTAL			$ 661.689.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	10885	27-10-2021	$ 18.546.000,00
	10886	27-10-2021	$ 18.546.000,00
	16375	28-12-2021	$ 20.329.000,00
	16376	28-12-2021	$ 20.329.000,00
	16377	29-12-2021	$ 126.548.000,00
	16853	29-12-2021	$ 126.547.000,00
TOTAL ESTAMPILLA ADULTO MAYOR			$ 330.845.000,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO FRONTERIZO	10885	27-10-2021	$ 55.637.000,00
	10886	27-10-2021	$ 55.637.000,00
	16375	28-12-2021	$ 60.987.000,00
	16376	28-12-2021	$ 60.988.000,00
	16377	29-12-2021	$ 379.843.000,00
	16853	29-12-2021	$ 379.844.000,00
TOTAL ESTAMPILLA PRODESARROLLO FRONTERIZO			$ 992.536.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	10885	27-10-2021	$ 37.091.000,00
	10886	27-10-2021	$ 37.091.000,00
	16375	28-12-2021	$ 40.658.000,00
	16376	28-12-2021	$ 40.658.000,00
	16377	29-12-2021	$ 253.096.000,00
	16853	29-12-2021	$ 253.096.000,00
TOTAL ESTAMPILLA PRO CULTURA			$ 661.690.000,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO FRONTERIZO	2430	15-03-2022	$ 93.626.000,00
	2431	15-03-2022	$ 93.627.000,00
TOTAL ESTAMPILLA PRODESARROLLO FRONTERIZO			$ 187.253.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPTAL	2430	15-03-2022	$ 62.418.000,00
	2431	15-03-2022	$ 62.417.000,00
TOTAL ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPTAL			$ 124.835.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2430	15-03-2022	$ 62.418.000,00
	2431	15-03-2022	$ 62.417.000,00
TOTAL ESTAMPILLA PRO CULTURA			$ 124.835.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	2430	15-03-2022	$ 31.209.000,00
	2431	15-03-2022	$ 31.210.000,00
TOTAL ESTAMPILLA ADULTO MAYOR			$ 62.419.000,00
TOTAL DESCONTADO			$ 3.146.102.000,00

El suscrito Interventor y/o Supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista:

SI [X] Valor Total Aprobado en este Documento: $ 9.409.019.956,18

Formato No. 1070 | Sirec II V1.0 © Todos los derechos reservados.
Impreso por ANDRES ALFONSO ALMARALES MELO el día: 24 de mayo de 2022

13001

Valor Amortización Anticipo: $ 0,00

Valor neto a Cobrar: $ 9.409.019.956,18

se da visto bueno para realizar el pago de NUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 18/100.- PESOS M/CTE ($ 9.409.019.956,18), el cual se discrimina a continuación:

NÚMERO RP	RUBRO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
3238 del 2021 (9221 del 2021)	99 - 8 - 1.3.8.5.2.1 - 10-7 - 2021002200022 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS HISTORICOS Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	$ 4.704.509.978,09	2021040002
3237 del 2021 (9121 del 2021)	99 - 8 - 1.3.8.5.2.1 - 15-2 - 2021002200022 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS HISTORICOS Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	$ 4.704.509.978,09	2021040002
	TOTAL	$ 9.409.019.956,18	

Por concepto de ACTA PARCIAL #05 correspondiente al pago del periodo *del 02/03/2022 al 30/04/2022*, del contrato 2021040002.

NO

Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones:

CERTIFICO que en cumplimiento de mis obligaciones como Interventor y/o Supervisor, recibí, revisé y aprobé personalmente los documentos que aportó el contratista y que fueron la base de los datos que suministro en este informe por medio del cual autorizo realizar el pago del valor antes expresado; así mismo dejo constancia que el contratista realizó los pagos por los valores correspondientes a los impuestos y publicaciones requeridos para la legalización del contrato y que he verificado que el contratista ha cumplido con el pago de los aportes a seguridad social y que existe una correcta relación entre las sumas canceladas con las que fueron cotizadas por el contratista, además que el valor cotizado corresponda al porcentaje y sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE052422006	FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE052422010
ANDRES ALFONSO ALMARALES MELO SUPERVISOR SUPERVISOR DESIGNADO	ROCIO MARIA ACOSTA ARGOTE Rep. legal de UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR INTERVENTOR
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II #FE052422012	
ESTHER MENDOZA PEINADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	

Formato No. 1070 | Sircc II V1.0 © Todos los derechos reservados.

Impreso por ANDRES ALFONSO ALMARALES MELO el día: 24 de mayo de 2022

GOBERNACIÓN DEL CESAR
INFORME DE ACTIVIDADES

13.665

Documento No. INAC-SIN-0611-2022

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos	A CONSTRUIR S.A.	c.c o NIT	890115406-0	Teléfono	353855098
Clasificación P.N	N/A	Dependientes	NO	¿Es Pensionado?	NO
Régimen	NO RESPONSABLE DE IVA	Pens. Voluntarias	$ 0,00	¿Es Declarante de Renta?	SI
No. Cuenta Bancaria	0580027569991236			Intereses Vivienda	$ 0,00
Tipo de Cuenta	CORRIENTE	Aportes AFC	$ 0,00	Tipo de Cuenta AFC	
Banco el cual Consignar	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta AFC No.		Entidad Bancaria AFC	
			¿Sus Ingresos en el 2021 Superaron $ 50.831.000,00?		NO

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

No. del contrato	2021040002	No. RP	3238, 3237, 2021013238, 2021013237 9221, 9121	Modalidad Contratación	LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA	Informe No.	5 de 5
No. del Proceso SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104	Periodo Cobrado	del 02/03/2022 al 30/04/2022		¿Factor Multiplicador en Retefuente?		NO
Tipo de Contrato	OBRA	Justificación de la Modalidad			ARTÍCULO 30, LEY 80 DE 1993		

OBJETO
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS
ANTICIPO: No habrá lugar al desembolso de anticipo según lo previsto en el pliego de condiciones de la licitación. FORMA DE PAGO: El 100% mediante actas parciales o final de obra (anexando y presentando pre actas) firmadas por el contratista, el residente y director de obra, aprobadas por el interventor, visto bueno del Supervisor y del Secretario de Infraestructura, según el porcentaje de las actividades ejecutadas en ese momento y que estén cumpliendo con el programa de inversión financiera y de actividades de obra. Las obras que entregue el contratista deberán cumplir con las especificaciones que el proyecto contiene o las pre escritas a nivel nacional. PARAGRAFO 1: Para el pago de la última acta de obra se debe presentar el Acta de Recibo Definitivo del Contrato. Las actas de obra deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de las obras, EL CONTRATISTA deberá radicar en la dependencia competente del Departamento las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por Departamento, y el Departamento las pagará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si se evidencian errores en las cuentas presentadas o insuficiencia en los soportes, los treinta (30) días hábiles para el pago se contarán a partir de la fecha en que el contratista subsane las glosas que se formulen. . Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta.

No. de Poliza	Amparo	Valor Amparado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
4617	CUMPLIMIENTO	$ 41.645.300.685,00	12/05/2021	12/07/2023
4617	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES	$ 6.940.883.448,00	12/05/2021	12/03/2026
4617	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 41.645.300.685,00	12/03/2023	12/03/2026
4617	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	$ 16.658.120.274,00	12/03/2023	12/03/2026
1000834	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	$ 6.940.883.448,00	12/05/2021	12/03/2023
4617	CUMPLIMIENTO	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021	11/09/2023
4617	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021	11/05/2026
4617	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$ 41.645.300.685,00	11/05/2023	11/05/2026
4617	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023	11/05/2026
1000834	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021	11/05/2023

Valor Antes de Iva	$ 9.409.019.956,16
Más: IVA	$ 0,00
Valor Total	$ 9.409.019.956,16
Menos: Amortización	$ 0,00
Menos: Glosa	$ 0,00
Valor Neto a Cobrar	$ 9.409.019.956,16

DOCUMENTO SOPORTE DEL COBRO	
Cuenta de Cobro	☐
Factura	☒
Inf. de Actividades	☐

SOLO PARA CONTRATOS DE OBRA		
Administración	21,00 %	$ 1.975.694.190,80
Imprevistos	4,00 %	$ 376.360.798,25
Utilidades	5,00 %	$ 376.360.798,25

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Mes Cotizado	No. Planilla	Salud	Pensión	ARL	Parafiscales	Total
MARZO - 2022	9433112447	$ 241.500,00	$ 965.500,00	$ 401.500,00	$ 230.700,00	$ 1.839.200,00
MARZO - 2022	9433112597	$ 153.700,00	$ 614.500,00	$ 267.300,00	$ 153.700,00	$ 1.189.200,00
MARZO - 2022	9433390818	$ 665.500,00	$ 2.661.500,00	$ 1.157.900,00	$ 665.500,00	$ 5.150.400,00
MARZO - 2022	9433112666	$ 1.477.900,00	$ 6.020.800,00	$ 2.571.000,00	$ 1.477.900,00	$ 11.547.600,00
MARZO - 2022	9433596957	$ 444.000,00	$ 1.798.500,00	$ 772.200,00	$ 222.100,00	$ 3.236.800,00
MARZO - 2022	9433740329	$ 2.077.400,00	$ 8.305.400,00	$ 3.590.800,00	$ 2.049.500,00	$ 16.023.100,00
MARZO - 2022	9433112447	$ 2.175.000,00	$ 2.671.000,00	$ 1.211.100,00	$ 696.000,00	$ 6.953.100,00
ABRIL - 2022	9434475506	$ 244.000,00	$ 976.000,00	$ 424.600,00	$ 244.000,00	$ 1.888.600,00
ABRIL - 2022	9434475621	$ 77.600,00	$ 311.100,00	$ 135.400,00	$ 77.600,00	$ 602.100,00
ABRIL - 2022	9434475786	$ 1.433.400,00	$ 5.642.100,00	$ 2.443.900,00	$ 1.409.900,00	$ 11.129.300,00
ABRIL - 2022	9434820892	$ 365.100,00	$ 1.457.100,00	$ 634.100,00	$ 365.100,00	$ 2.821.400,00
ABRIL - 2022	9434475506	$ 2.392.500,00	$ 3.158.100,00	$ 1.332.200,00	$ 765.600,00	$ 7.648.400,00

PAGO DE IMPUESTOS

Impuesto	No. Liquidación	Valor Base	Tarifa	Valor Impuesto
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD	32021012775	$ 138.817.666.949,00	0,5 %	$ 694.088.000,00
ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL	32021012772	$ 138.817.666.949,00	1,0 %	$ 1.388.177.000,00
ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO	32021012772	$ 138.817.666.949,00	1,5 %	$ 2.082.265.000,00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	32021012772	$ 138.817.666.949,00	1,0 %	$ 1.388.177.000,00
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR	32021012772	$ 138.817.666.949,00	0,5 %	$ 694.088.000,00

PARA LOS EFECTOS LEGALES Y BAJO GRAVEDAD DEL JURAMENTO, MANIFIESTO QUE

1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual descritas en el formato anexo.
2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, que los aportes Voluntarios a cuentas AFC y FVP, corresponden a los ingresos provenientes del contrato objeto del presente pago y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato.
3. Que pertenezco a la categoría descrita en la casilla "Clasificación P.N."

RADICADO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II
#FE052322011
A CONSTRUIR S.A.
CONTRATISTA

4. Toda la información aquí suministrada es verídica.	

DATOS DEL CONTRATISTA							
Nombres y apellidos	A CONSTRUIR S.A.			c.c o NIT	890115408-0	Teléfono	353855098
DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO							
No. del contrato	2021040002	No. RP	3238, 3237, 2021013238, 2021013237, 9221, 9121	Modalidad Contratación	LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA	Informe No.	5 de 5
No. del Proceso SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104	Periodo Cobrado	del 02/03/2022 al 30/04/2022	¿Factor Multiplicador en Retefuente?		NO	
Tipo de Contrato	OBRA	Justificación de la Modalidad		ARTÍCULO 30, LEY 80 DE 1993			

ITEM	OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES
1	Durante la ejecución del contrato deberá cumplir con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) propuesto y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).	Se realizaron inspecciones de mantenimiento de la máquina, así como también se ee han aplicado todas las medidas de seguridad, se hizo entrega de EPP a todo el personal
2	Garantizar la vinculación de mano de obra no calificada de población vulnerable perteneciente al respectivo Municipio donde se esté ejecutando la obra y reportar mensualmente a la entidad contratante la relación y duración de los empleos generados para la ejecución del contrato de obra	Se presenta formato de vinculación de mano de obra, con el fin de presentar los ingresos del personal durante el mes de marzo y abril de 2022.
3	Cumplir con la resolución No 00541 del 14 de Diciembre de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, las que la modifiquen, sustituyen y/o complementen, por medio del cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, etc	Se adelantaron labores de orden aseo y limpieza, se gestiono permiso de poda de árboles a corpocesar, delimitación , señalización y cubrimiento de materiales
4	Implementación del Plan de Manejo de Transito, (Si aplica) 7.19. Desarrollar acciones propias para contribuir a la gestión del cambio climático con arreglo a lo dispuesto en la Ley 1931 del 27 de julio de 2018, y en armonía con las acciones desplegadas por las entidades públicas.	El auxiliar de tráfico aseguró el flujo normal de circulación vehicular y peatonal

1300

UNIÓN TEMPORAL
INTERMUSEO VALLEDUPAR
NIT. 901.493.970-2

Valledupar, 19 de mayo de2022

2022-UTIV-059

Señores
GOBERNACION DEL CESAR
Atn. ESTHER MENDOZA PEINADO
Secretaria de Infraestructura

REF. CONTRATO DE OBRA No. 2021040002 DE 2021 – CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

Asunto: Radicación acta parcial de obra No. 05

Cordial saludo

Por medio de la presente, hacemos entrega del acta No. 05 revisadas las memorias y acta consolidada por la Interventoría para su análisis y aprobación.
Se relacionan los siguientes documentos:

- Pre-acta parcial No. 05
- Acta parcial de obra No. 05
- Memoria de obra del acta parcial No. 05
- Certificación de cantidades
- Certificación de parafiscales
- Factura de venta
- Certificación revisor fiscal parafiscales del contratista
- Autorización de descuentos de impuestos contractual
- Planillas de pago de Seguridad Social
- Copia de certificado de disponibilidad presupuestal del departamento
- Copia de certificado de disponibilidad presupuestal de regalías
- Informe de gestión del contratista
- Copia de póliza y su aprobación según acta de inicio

Atentamente,

EDISON A. MARTINEZ CUESTA
Director de Obra
UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR

C.C. IVAN A. JIMENEZ AGUIRRE – R.L A CONSTRUIR

	CERTIFICADO DE SEGURIDAD	LO HACEMOS MEJOR GOBIERNO DEL CESAR

V3009

EL SUSCRITO REPRESENTANTE – INTERVENTOR DEL CONTRATO No. 2021-02-0007

CERTIFICA:

Que **A CONSTRUIR S.A** identificado con NIT.890115406-0 representada legalmente por el Dr. **IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE**, con quien el Departamento del Cesar suscribió el CONTRATO DE OBRA No. 2021-04-0002 cuyo objeto es **CONSTRUCCION DEL CENTRO EVENTOS, HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR**, se encuentra al día en el pago correspondiente a **SALUD, PENSION, ARL** de los meses de marzo, abril, según consta en las certificaciones que forman parte del presente informe.

Para mayor constancia se firma a los (9) nueve días del mes de mayo de 2022.

ROCIO ACOSTA ARGOTE
Representante legal
INTERMUSEO VALLEDUPAR

Dirección: CARRERA 13A No 7B – 48
Email: toralconstruccionessas@gmail.com
Teléfono: 313-5392449
Valledupar, Colombia

13.010

A CONSTRUIR S.A. NIT: 890115406-0
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 9061 del 10 de Diciembre 2020
Responsables de IVA
Autorización Numeración de Facturación DIAN
18764023054052 de 2021-12-20
Desde 1225 hasta 2000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE1284

CLIENTE: GOBERNACION DEL CESAR
NIT: 892399999-1
TELÉFONO: 5748230
DIRECCIÓN: Cl 16 No 12 120
200001 Valledupar

FECHA FACTURA: 18/05/2022 17:25:47
FECHA VENCIMIENTO: 17/06/2022

DESCRIPCIÓN

Cobro de ACTA PARCIAL DE OBRAS No. 005 - CONTRATO DE OBRA N° 2021040002 "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR"

1	VTA001	UND	SERVICIOS DE CONSTRUCCION		$	7.217.028.812,95
2	AIU0004	UND	A.I.U.	30%	$	2.165.108.643,89
3	VTA008	UND	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		$	8.903.184,00
4	VTA005	UND	IMPLEMENTACION PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD		$	17.979.315,34
			SUBTOTAL ANTES DE IVA		**$**	**9.409.019.956,18**
			IVA sobre Utilidad	19%	$	0,00
			TOTAL		**$**	**9.409.019.956,18**

VALOR EN LETRAS

NUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M.L.

OBSERVACIONES

FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA DE LA SIGUIENTE MANERA:
BANCO DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE No. 0275-6999-123-8
TITULAR DE LA CUENTA: A CONSTRUIR S.A.
NIT: 890.115.406-0

FAVOR NO EFECTUAR RETENCIONES POR CONCEPTO DE IVA E ICA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONOMICA 4210
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO Y ES TITULO VALOR SEGÚN LA LEY 1231 DE 2008

CUFE: 64a69206a97b735013ffdd19463bd7993cfdc72acb0ab91046ff345a160941512969c2946299b57d441626306ef59c80

13.011

A CONSTRUIR S.A.

Barranquilla, 27 de Abril de 2022 **2022-034**

Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales
Artículo 50 Ley 789 de 2002

JAIME ALBERTO CANDAMA HERRERA identificado con la cédula de ciudadanía **72.233.314**, en mi condición de Revisor Fiscal de la sociedad **A CONSTRUIR S.A.**, identificada con NIT **890.115.406-0**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que la Empresa ha pagado los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Servicios Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) durante los últimos seis (6) meses, y que dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dicho período.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Jaime Candama.

JAIME ALBERTO CANDAMA HERRERA
T.P. No. 116940-T
REVISOR FISCAL

Calle 77B Nº 59-61 - Oficina 203 - Centro Empresarial Las Américas II
Teléfono: (57) 605 3855098 E-Mail: ac@aconstruir.co
Barranquilla - Colombia

13-012

A CONSTRUIR S.A.

Barranquilla, Mayo 18 de 2022 **2021-CVUP-115**

Señores
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR
Atn. Arq. Rocío Acosta Argote
Representante Legal

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA N° 2021040002**
"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR"

Asunto: Radicación de Acta Parcial de obra # 5

Cordial saludo,

Por medio de este oficio se hace entrega de la siguiente documentación para su posterior revisión y aprobación:

1. Certificación revisor fiscal parafiscales del contratista.
2. Planillas de pago de seguridad social.
3. Copia del certificado de disponibilidad presupuestal de regalías.
4. Copia del certificado de disponibilidad presupuestal del Departamento.
5. Pre-acta parcial No.5.
6. Acta parcial de cobro No. 5.
7. Memorias de cálculo de acta parcial de cobro No. 5.
8. Informe de gestión del contratista.
9. Copia del contrato de obra.
10. Copia de pólizas y su aprobación según su acta de inicio.

Quedo atento a sus comentarios, salvedades o cualquier observación pertinente.

Atentamente,

Recibí
Vanessa Moreno
18/Mayo/2022
9:15 am

IVAN ALBERTO JIMENEZ AGUIRRE
Representante legal
A CONSTRUIR S.A.

Calle 77B Nº 59-61 – Oficina 203 - Centro Empresarial Las Américas II
Teléfono: (57) (5) 3855098 E-Mail: ac@aconstruir.co
Barranquilla - Colombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890115406	0	A CONSTRUIR S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	Cll e 77b 59 61 Of 203	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3855098	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Plantilla	Plantilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-04	28051756	9433112447	E	2022/04/04	2022/04/04	BANCO DE OCCIDENTE		$81,698,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: ADMINISTRACION (3 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (3 Afiliados)																																
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (3 Afiliados)																																
1	CC	1065996647	GALINDO BARRIOS JOSE DAVID											X								230301	2	EPS005	2	CCF15	2	14-7	2	0.000%	2	SI
2	CC	1065996647	GALINDO BARRIOS JOSE DAVID											X								230301	3	EPS005	3	CCF15	3	14-7	3	0.000%	3	SI
3	CC	1065996647	GALINDO BARRIOS JOSE DAVID																			230301	25	EPS005	25	CCF15	25	14-7	25	6.960%	25	SI
4	CC	1065828777	MADURO GARCIA LIZMARY ROSA																			230301	30	EPS037	30	CCF15	30	14-7	30	6.960%	30	SI
5	CC	1030582813	MUÑOZ MENESES VICTOR MANUEL																			25-14	30	EPS005	30	CCF15	30	14-7	30	6.960%	30	SI
Total Afiliados(3)																																

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$965,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$240,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$725,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$401,500
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	3	$401,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$230,700
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	$230,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$241,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$104,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$137,500
TOTAL				3	$1,839,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890115406	0	A CONSTRUIR S.A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	Clle 77b 59 61 Of 203	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3855098	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-04	28051756	9433112997	E	2022/04/04	2022/04/04	BANCO DE OCCIDENTE		$32,958,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vto		Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: ADMINISTRACION (2 Afiliados)																															
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (2 Afiliados)																															
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (2 Afiliados)																															
1	CC	11154633	ARGUMEDO OMEDO OROSMAN ENRIQUE									X									25-14	30	EPS037	30	CCF15	30	14-7	30	6.960%	30	SI
2	CC	1018344605	RODRIGUEZ CASTILLO IVAN ALEXI		X							X									23030 1	6	EPS037	6	CCF15	6	14-7	6	6.960%	6	SI
Total Afiliados(2)																															

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$614,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$281,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$333,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$267,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	2	$267,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$153,700
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	$153,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$153,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$153,700
TOTAL				2	$1,189,200

2022/05/04 10:41 AM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901318620	1	SANCHEZ GRONSKI INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 12 # 16 A - 51 Barrio Loperena	VALLEDUPAR-CESAR	5899958	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-04	1401967932	5433390818	E	2022/04/06	2022/04/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$5,150,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (19 Afiliados)						$16,633,335	$2,661,500			$16,633,335	$665,500			$16,633,335	$665,500			$16,633,335	$1,157,900		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (19 Afiliados)						$16,633,335	$2,661,500			$16,633,335	$665,500			$16,633,335	$665,500			$16,633,335	$1,157,900		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (19 Afiliados)						$16,633,335	$2,661,500			$16,633,335	$665,500			$16,633,335	$665,500			$16,633,335	$1,157,900		$0	$0
1	CC	1065851625	AVELLANEDA LUIS	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
2	CC	1128110949	BENAVIDES RAFAEL	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
3	CC	1121302852	BRITO ENDER	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
4	CC	1193242676	BRITO RUYERIS	230301	30	$1,000,000	$160,000	CCFC23	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
5	CC	1003230672	DEAVILA WILSON	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
6	CC	1065675277	FONSECA JOEL	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
7	CC	1065837168	GUILLEN ROSAEL	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
8	CC	1101816790	JIMENEZ JADER	230301	15	$500,000	$80,000	EPS017	15	$500,000	$20,000	CCF15	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	$34,800	15	$0	$0
9	CC	1065827510	MAESTRE PEDRO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
10	CC	1065808389	OROZCO LUIS	231001	30	$1,000,000	$160,000	CCFC55	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
11	CC	1065574758	PACHECO JOEL	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
12	CC	92190747	PEÑA JORGE	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
13	CC	92191386	PEÑA LUIS	230301	2	$66,667	$10,700	ESSC07	2	$66,667	$2,700	CCF15	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	$4,700	2	$0	$0
14	CC	84039386	RONDON IVAN	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
15	CC	1104008383	SALCEDO JULIO	230301	16	$533,334	$85,400	EPS017	16	$533,334	$21,400	CCF15	16	$533,334	$21,400	14-11	16	$533,334	$37,200	16	$0	$0
16	CC	77190931	SANCHEZ ADRIAN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
17	CC	1067592666	TORRES CARLOS	230301	30	$1,000,000	$160,000	CCFC55	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
18	CC	1065846590	TROYA JAIR	230301	16	$533,334	$85,400	EPS002	16	$533,334	$21,400	CCF15	16	$533,334	$21,400	14-11	16	$533,334	$37,200	16	$0	$0
19	PE	815629118071991	VILLAMIZAR KATHERINE	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
Total Afiliados(19)						$16,633,335	$2,661,500			$16,633,335	$665,500			$16,633,335	$665,500			$16,633,335	$1,157,900		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901318620	1	SANCHEZ GRONSKI INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 12 # 16 A - 51 Barrio Loperena	VALLEDUPAR-CESAR	5899958	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-04	1401967932	9433390818	E	2022/04/06	2022/04/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$5,150,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				19	$2,661,500	$0	$0	$2,661,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$1,381,500	$0	$0	$1,381,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$800,000	$0	$0	$800,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,157,900	$0	$0	$1,157,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	$1,157,900	$0	$0	$1,157,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$665,500	$0	$0	$665,500
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	19	$665,500	$0	$0	$665,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				19	$665,500	$0	$0	$665,500
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	$80,000	$0	$0	$80,000
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCFC23	892,115,006	5	1	$40,000	$0	$0	$40,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$201,400	$0	$0	$201,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$2,700	$0	$0	$2,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$40,000	$0	$0	$40,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$101,400	$0	$0	$101,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				19	$5,150,400	$0	$0	$5,150,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890115406	0	A CONSTRUIR S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	Cll¢ 77b 59 61 Of 203	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3855098	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-04	28051756	9433112688	E	2022/04/04	2022/04/04	BANCO DE OCCIDENTE		$95,723,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: ADMINISTRACION (16 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (16 Afiliados)																																
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (16 Afiliados)																																
1	CC	77090391	AHUMADA MENA CESAR AUGUSTO									X										23100 1	30	EPS005	30	CCF15	30	14-7	30	6.960%	30	SI
2	CC	77185729	BOLAÑO ACOSTA ALEXANDER DARWING																			23100 1	30	EPS002	30	CCF15	30	14-7	30	6.960%	30	SI
3	CC	1065591193	BRACHO VARGAS LORENA ROCIO																			25-14	30	EPS037	30	CCF15	30	14-7	30	6.960%	30	SI
4	CC	1140863665	CAMARGO SERNA ALEXANDRA DE JESUS																			23020 1	30	EPS005	30	CCF15	30	14-7	30	6.960%	30	SI
5	CC	1010151202	CASTELLANOS TROYA ARMANDO DANIEL									X										23030 1	30	EPS002	30	CCF15	30	14-7	30	6.960%	30	SI
6	CC	1235339075	CASTILLA CASALINS JUAN DANIEL																			23030 1	30	EPS005	30	CCF15	30	14-7	30	6.960%	30	SI
7	CC	1046813906	CONTRERAS GARCIA LILIANA PATRICIA																			23030 1	30	EPS005	30	CCF15	30	14-7	30	6.960%	30	SI
8	CC	19594764	LOPEZ POSADA FABIO JOAQUIN																			23030 1	30	EPS005	30	CCF15	30	14-7	30	6.960%	30	SI
9	CC	1121338097	MARRIAGA LOPEZ EDIER JOHAN									X										23030 1	30	EPS017	30	CCF15	30	14-7	30	6.960%	30	SI
10	CC	1032467253	MARTINEZ ARIZA IVAN ENRIQUE		X							X										25-14	29	EPSIC1	29	CCF15	29	14-7	29	6.960%	29	SI
11	CC	1065641212	OSPINO PACHECO ANDRES EDUARDO									X										25-14	30	EPS002	30	CCF15	30	14-7	30	6.960%	30	SI
12	CC	49787228	PEÑALOZA TORRES ADA LUZ									X										23030 1	30	EPS017	30	CCF15	30	14-7	30	6.960%	30	SI
13	CC	1065568630	TERNERA MOZO JAIME JOSE									X										23030 1	30	EPS037	30	CCF15	30	14-7	30	6.960%	30	SI
14	CC	1063971741	TORRES ALGINA LEINER RAFAEL									X										23030 1	30	EPS002	30	CCF15	30	14-7	30	6.960%	30	SI
15	CC	1065806888	VASQUEZ VIVES MIGUEL ANGEL									X										23100 1	30	EPS017	30	CCF15	30	14-7	30	6.960%	30	SI
16	CC	15171031	YANCE ARRIETA NESTOR MANUEL									X										25-14	30	CCFC5 5	30	CCF15	30	14-7	30	6.960%	30	SI
Total Afiliados(16)																																

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$6,020,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$850,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,331,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$3,074,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$765,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$2,571,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	16	$2,571,000

2022/05/04 10:42 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,477,900
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	16	$1,477,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				16	$1,477,900
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$54,800
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$121,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$180,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$152,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$295,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$673,100
TOTAL				16	$11,547,600

2022/05/04 10:42 AM

13-617

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901458961	6	A&M CONSTRURENTING S.A.S	C - MIPYMES	PRINCIPAL	CALLE 5B # 38-37 TORRE 6 APARTAMENTO 304	VALLEDUPAR-CESAR	5880600	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-04	1414912123	9433598957	E	2022/04/18	2022/04/18	BANCOLOMBIA	0	$3.236.800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																																
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha Ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct
Sucursal: PRINCIPAL (13 Afiliados)																																								
Centro de Trabajo: MUSEO DE VALLEDUPAR(13 Afiliados)																																								
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR(13 Afiliados)																																								
1	CC	1065626880	ACOSTA MEJIA MIGUEL ANGEL	Dependiente	0	No	No																																		
2	CC	1065602999	BORNACELLY TOSCANO VICTOR ALFONSO	Dependiente	0	No	No		X	2022/03/02	X	2022/03/02																														
3	CC	15172217	CUDRIZ LARA ELVER ALFONSO	Dependiente	0	No	No		X	2022/03/23																																
4	CC	15172217	CUDRIZ LARA ELVER ALFONSO	Dependiente	0	No	No														X	2022/03/23	2022/03/27																		
5	CC	1007182856	HERNANDEZ ALARZA LUIS ANGEL	Dependiente	0	No	No																																		
6	CC	7993480	LOPEZ MARTINEZ ZAEDIS	Dependiente	0	No	No		X	2022/03/01	X	2022/03/12																														
7	CC	1065649934	OLIVEROS SOLANO EDUARDO ANGEL	Dependiente	0	No	No		X	2022/03/01	X	2022/03/30																														
8	CC	18972708	PALOMINO OLIVEROS ERNESTO JOSE	Dependiente	0	No	No		X	2022/03/05	X	2022/03/06																														
9	CC	1007610001	PEREZ PEREZ DILAN ANDRES	Dependiente	0	No	No																																		
10	CC	1065623252	POLO RAMIREZ ELIGIO JOSE	Dependiente	0	No	No																																		
11	CC	1065563288	SALAS SANTANA IVAN CARLOS	Dependiente	0	No	No																																		
12	CC	12441410	SALAS SANTANA JOSE MIGUEL	Dependiente	0	No	No				X	2022/03/28																														
13	CC	77091686	SALAS SANTANA UVALDO ENRIQUE	Dependiente	0	No	No				X	2022/03/25																														
14	CC	1002323363	YEPES PASO ADRIAN JOSE	Dependiente	0	No	No				X	2022/03/28																														
Total		**Afiliados(13)**																																						

2022/04/16 12:56 p.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irt	Fecha Inicio Irt	Fecha Fin Irt	Vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				[illegible]						[illegible]	
																				$1,798,500						$444,000	
																				$1,798,500						$444,000	
						$2,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,000,000	16%	SIN RIESGO	$320,000	$0	$0	$0	$0	$0	$320,000		SANITAS	30	$2,000,000	4%	$80,000	
						$1,000,000	No	Fijo	PORVENIR	1	$33,334	16%	SIN RIESGO	$5,400	$0	$0	$0	$0	$0	$5,400		CAJACOPI ATLANTICO	1	$33,334	4%	$1,400	
						$1,207,262	No	Fijo	PORVENIR	3	$120,727	16%	SIN RIESGO	$19,400	$0	$0	$0	$0	$0	$19,400		SALUD TOTAL	3	$120,727	4%	$4,900	
						$1,207,262	No	Fijo	PORVENIR	5	$201,211	12%	SIN RIESGO	$24,200	$0	$0	$0	$0	$0	$24,200		SALUD TOTAL	5	$201,211	0%	$0	
						$1,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,000,000	16%	SIN RIESGO	$160,000	$0	$0	$0	$0	$0	$160,000		CAJACOPI ATLANTICO	30	$1,000,000	4%	$40,000	
						$1,207,262	No	Fijo	PROTECCION	12	$482,905	16%	SIN RIESGO	$77,300	$0	$0	$0	$0	$0	$77,300		FAMISANAR	12	$482,905	4%	$19,400	
						$1,682,828	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,682,828	16%	SIN RIESGO	$269,300	$0	$0	$0	$0	$0	$269,300		SALUD TOTAL	30	$1,682,828	4%	$67,400	
						$1,000,000	No	Fijo	COLFONDOS	2	$66,667	16%	SIN RIESGO	$10,700	$0	$0	$0	$0	$0	$10,700		COOSALUD MOVILIDAD	2	$66,667	4%	$2,700	
						$1,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,000,000	16%	SIN RIESGO	$160,000	$0	$0	$0	$0	$0	$160,000		CAJACOPI ATLANTICO	30	$1,000,000	4%	$40,000	
						$1,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,000,000	16%	SIN RIESGO	$160,000	$0	$0	$0	$0	$0	$160,000		COOSALUD MOVILIDAD	30	$1,000,000	4%	$40,000	
						$1,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,000,000	16%	SIN RIESGO	$160,000	$0	$0	$0	$0	$0	$160,000		COOSALUD EPS	30	$1,000,000	4%	$40,000	
						$1,000,000	No	Fijo	PORVENIR	28	$933,334	16%	SIN RIESGO	$149,400	$0	$0	$0	$0	$0	$149,400		CAJACOPI ATLANTICO	28	$933,334	4%	$37,400	
						$1,000,000	No	Fijo	PORVENIR	25	$833,334	16%	SIN RIESGO	$133,400	$0	$0	$0	$0	$0	$133,400		NUEVA E.P.S.	25	$833,334	4%	$33,400	
						$1,000,000	No	Fijo	PROTECCION	28	$933,334	16%	SIN RIESGO	$149,400	$0	$0	$0	$0	$0	$149,400		SALUD TOTAL	28	$933,334	4%	$37,400	
																				$1,798,500						$444,000	

2022/04/16 12:56 p.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$444,000						$222,100						$772,200				$0		$0		$0		$0	
	$444,000						$222,100						$772,200				$0		$0		$0		$0	
$0	$80,000		COMFACESAR	30	$2,000,000	2%	$40,000	ARL SURA	30	$2,000,000	6.96%	5	$139,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$1,400		COMFACESAR	1	$33,334	2%	$700	ARL SURA	1	$33,334	6.96%	5	$2,400	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$4,900		COMFACESAR	3	$120,727	2%	$2,500	ARL SURA	3	$120,727	6.96%	5	$8,900	3	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$0		COMFACESAR	5	$201,211	0%	$0	ARL SURA	5	$201,211	0%	5	$0	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$40,000		COMFACESAR	30	$1,000,000	2%	$20,000	ARL SURA	30	$1,000,000	6.96%	5	$69,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$19,400		COMFACESAR	12	$482,905	2%	$9,700	ARL SURA	12	$482,905	6.96%	5	$33,700	12	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$67,400		COMFACESAR	30	$1,682,828	2%	$33,700	ARL SURA	30	$1,682,828	6.96%	5	$117,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$2,700		COMFACESAR	2	$66,667	2%	$1,400	ARL SURA	2	$66,667	6.96%	5	$4,700	2	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$40,000		COMFACESAR	30	$1,000,000	2%	$20,000	ARL SURA	30	$1,000,000	6.96%	5	$69,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$40,000		COMFACESAR	30	$1,000,000	2%	$20,000	ARL SURA	30	$1,000,000	6.96%	5	$69,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$40,000		COMFACESAR	30	$1,000,000	2%	$20,000	ARL SURA	30	$1,000,000	6.96%	5	$69,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$37,400		COMFACESAR	28	$933,334	2%	$18,700	ARL SURA	28	$933,334	6.96%	5	$65,000	28	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$33,400		COMFACESAR	25	$833,334	2%	$16,700	ARL SURA	25	$833,334	6.96%	5	$58,100	25	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$37,400		COMFACESAR	28	$933,334	2%	$18,700	ARL SURA	28	$933,334	6.96%	5	$65,000	28	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$444,000						$222,100						$772,200				$0		$0		$0		$0	

2022/04/16 12:56 p.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901458961	8	A&M CONSTRURENTING S.A.S	C - MIPYMES	PRINCIPAL	CALLE 5B # 38-37 TORRE 6 APARTAMENTO 304	VALLEDUPAR-CESAR	5880600	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-04	1414912123	9433598957	E	2022/04/18	2022/04/18	BANCOLOMBIA	0	$3,236,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$1,798,500	$0	$0	$1,798,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$10,700	$0	$0	$10,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$1,561,100	$0	$0	$1,561,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$226,700	$0	$0	$226,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$772,200	$0	$0	$772,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$772,200	$0	$0	$772,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$222,100	$0	$0	$222,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	13	$222,100	$0	$0	$222,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				13	$444,000	$0	$0	$444,000
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	4	$118,800	$0	$0	$118,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$40,000	$0	$0	$40,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$42,700	$0	$0	$42,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$19,400	$0	$0	$19,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$33,400	$0	$0	$33,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$109,700	$0	$0	$109,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$80,000	$0	$0	$80,000
TOTAL				13	$3,236,800	$0	$0	$3,236,800

2022/04/16 12:56 p.m.

13-021

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901171572	2	RVK CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACESAR	CLL 54 32 22	VALLEDUPAR-CESAR	5888957	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-04	1421414452	9433740329	E	2022/04/20	2022/04/21	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	$16,023,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: COMFACESAR (62 Afiliados)						$47,900,014	$7,665,400			$47,900,014	$1,917,400			$47,200,783	$1,889,500			$47,900,014	$3,312,400		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (62 Afiliados)						$47,900,014	$7,665,400			$47,900,014	$1,917,400			$47,200,783	$1,889,500			$47,900,014	$3,312,400		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (62 Afiliados)						$47,900,014	$7,665,400			$47,900,014	$1,917,400			$47,200,783	$1,889,500			$47,900,014	$3,312,400		$0	$0
1	CC	10879887	ALEAN EDUIS	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS048	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
2	CC	84091317	ALFARO INGLYS	230301	15	$500,000	$80,000	EPS005	15	$500,000	$20,000	CCF15	15	$500,000	$20,000	14-7	15	$500,000	$34,800	15	$0	$0
3	CC	1003038100	ALVAREZ YAMIL	230301	14	$466,667	$74,700	EPS002	14	$466,667	$18,700	CCF15	14	$466,667	$18,700	14-7	14	$466,667	$32,500	14	$0	$0
4	CC	1003038100	ALVAREZ YAMIL	230301	1	$33,334	$5,400	EPS002	1	$33,334	$1,400	CCF15	0	$0	$0	14-7	1	$33,334	$0	0	$0	$0
5	CC	1003038100	ALVAREZ YAMIL	230301	4	$133,334	$21,400	EPS002	4	$133,334	$5,400	CCF15	0	$0	$0	14-7	4	$133,334	$0	0	$0	$0
6	CC	1048327416	BALOCO JOSE	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
7	CC	8569960	BARCELO JAIRO	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
8	CC	1042445918	BARRIOS ANTHONY	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
9	CC	72182155	BARROS FABIAN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
10	CC	1001892974	CAMACHO JONIS	230301	4	$133,334	$21,400	CCFC55	4	$133,334	$5,400	CCF15	4	$133,334	$5,400	14-7	4	$133,334	$9,300	4	$0	$0
11	CC	80105069	CASADIEGO NELSON	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
12	CC	1065631459	CORDOBA JORGE	230301	30	$1,000,000	$160,000	CCFC55	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
13	CC	1121959107	CRUZ LOUIS	230201	21	$700,000	$112,000	CCFC55	21	$700,000	$28,000	CCF15	21	$700,000	$28,000	14-7	21	$700,000	$48,800	21	$0	$0
14	CC	12642635	CUJIA EFRAIN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
15	CC	1065668544	ESCORCIA JORGE	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
16	CC	85166707	FLOREZ ANDRES	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
17	CC	1143397533	GARCIA MIGUEL	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$908,526	$35,400	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
18	CC	94399162	GOMEZ GEOVANNY	25-14	26	$866,667	$138,700	EPS017	26	$866,667	$34,700	CCF15	26	$866,667	$34,700	14-7	26	$866,667	$60,400	26	$0	$0
19	CC	72235486	GONZALEZ EDWIN	230301	1	$33,334	$5,400	EPS048	1	$33,334	$1,400	CCF15	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$33,334	$2,400	1	$0	$0
20	CC	1003231053	GONZALEZ GREYLER	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
21	CC	1065648842	GUERRA JUAN	230301	26	$866,667	$138,700	CCFC55	26	$866,667	$34,700	CCF15	26	$866,667	$34,700	14-7	26	$866,667	$60,400	26	$0	$0
22	CC	1003378711	GUERRERO HEINER	230301	13	$433,334	$69,400	ESSC24	13	$433,334	$17,400	CCF15	13	$433,334	$17,400	14-7	13	$433,334	$30,200	13	$0	$0
23	CC	1048933395	GUERRERO KEVIN	230301	30	$1,000,000	$160,000	ESSC07	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
24	CC	72344503	GUZMAN JHON	230301	1	$33,334	$5,400	EPS002	1	$33,334	$1,400	CCF15	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$33,334	$2,400	1	$0	$0
25	CC	1065814019	HERNANDEZ KEINER	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
26	CC	72141543	HERRERA FLORENTINO	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
27	CC	1065834093	HINOJOSA YARLEDYS	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
28	CC	8789104	JARAMILLO ELKIS	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
29	CC	17974849	KAMMERER EDINSON	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
30	CC	1048941161	LUNA JOSE	230301	18	$600,000	$96,000	ESSC24	18	$600,000	$24,000	CCF15	18	$600,000	$24,000	14-7	18	$600,000	$41,800	18	$0	$0
31	CC	1064711685	MEJIA JUAN	230301	30	$1,000,000	$160,000	ESSC07	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
32	CC	72294917	MONTERROSA ELKIS	231001	1	$33,334	$5,400	EPS002	1	$33,334	$1,400	CCF15	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$33,334	$2,400	1	$0	$0
33	CC	1101872994	MONTERROZA EDILSON	230301	1	$33,334	$5,400	EPS017	1	$33,334	$1,400	CCF15	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$33,334	$2,400	1	$0	$0
34	CC	1143436176	MORALES KEZIA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
35	CC	1003240509	MUÑOZ VICTOR	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
36	CC	1066093583	NARVAEZ DEIDER	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
37	CC	12693763	NOVOA ARBIND	230301	14	$466,667	$74,700	EPS002	14	$466,667	$18,700	CCF15	14	$466,667	$18,700	14-7	14	$466,667	$32,500	14	$0	$0

V3-023

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
38	CC	1052080418	OLIVERA CARLOS	230301	30	$1,000,000	$160,000	ESSC07	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
39	CC	10768626	OROZCO BEDER	231001	1	$33,334	$5,400	EPS037	1	$33,334	$1,400	CCF15	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$33,334	$2,400	1	$0	$0
40	CC	1003235676	ORTIZ JORGE	230301	20	$666,667	$106,700	CCFC55	20	$666,667	$26,700	CCF15	20	$666,667	$26,700	14-7	20	$666,667	$46,500	20	$0	$0
41	CC	1092356591	PABA EDIER	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
42	CC	1062879721	PACHECO JAMES	230301	26	$866,667	$138,700	EPS005	26	$866,667	$34,700	CCF15	26	$866,667	$34,700	14-7	26	$866,667	$60,400	26	$0	$0
43	CC	1043118807	PACHECO JOHAN	230301	1	$33,334	$5,400	EPS017	1	$33,334	$1,400	CCF15	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$33,334	$2,400	1	$0	$0
44	CC	72214246	PEREZ WILBER	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
45	CC	1065661897	POLO DEIMER	230301	30	$1,000,000	$160,000	CCFC55	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
46	CC	1143241494	POLO GEISON	230301	30	$1,000,000	$160,000	ESSC07	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
47	CC	85484146	PUELLO MANUEL	231001	23	$766,667	$122,700	CCFC55	23	$766,667	$30,700	CCF15	23	$766,667	$30,700	14-7	23	$766,667	$53,400	23	$0	$0
48	CC	1047214300	RIVERA ALEXANDER	230301	1	$33,334	$5,400	EPS002	1	$33,334	$1,400	CCF15	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$33,334	$2,400	1	$0	$0
49	CC	18876528	RIVERO JOSE	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
50	CC	73508369	RODELO JAMM	231001	23	$766,667	$122,700	ESSC07	23	$766,667	$30,700	CCF15	23	$766,667	$30,700	14-7	23	$766,667	$53,400	23	$0	$0
51	CC	15259883	RODRIGUEZ DANIEL	25-14	2	$66,667	$10,700	EPS041	2	$66,667	$2,700	CCF15	2	$66,667	$2,700	14-7	2	$66,667	$4,700	2	$0	$0
52	CC	1002129736	ROJANO ARNOL	231001	25	$833,334	$133,400	EPS037	25	$833,334	$33,400	CCF15	25	$833,334	$33,400	14-7	25	$833,334	$58,100	25	$0	$0
53	CC	1002129736	ROJANO ARNOL	231001	5	$166,667	$26,700	EPS037	5	$166,667	$6,700	CCF15	0	$0	$0	14-7	5	$166,667	$0	0	$0	$0
54	CC	1129530481	ROJANO GREISON	231001	1	$33,334	$5,400	EPS037	1	$33,334	$1,400	CCF15	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$33,334	$2,400	1	$0	$0
55	CC	1143337722	SALAS JOSE	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
56	CC	72294692	SANABRIA ALBER	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
57	CC	19935180	SANMARTIN PEDRO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
58	CC	1143129980	SANMIGUEL HANS	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
59	CC	73506761	SARMIENTO FREDYS	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
60	CC	1010107468	SOTO LUIS	230301	22	$733,334	$117,400	CCFC55	22	$733,334	$29,400	CCF15	22	$733,334	$29,400	14-7	22	$733,334	$51,100	22	$0	$0
61	CC	1127079154	TOMASES RUBEN	230301	26	$866,667	$138,700	EPS017	26	$866,667	$34,700	CCF15	26	$866,667	$34,700	14-7	26	$866,667	$60,400	26	$0	$0
62	CC	1003375807	TORRES LUIS	230301	25	$833,334	$133,400	EPS017	25	$833,334	$33,400	CCF15	25	$833,334	$33,400	14-7	25	$833,334	$58,100	25	$0	$0
63	CC	1065670174	TORRES YOENDER	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$908,526	$36,400	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
64	CC	1235338349	VERGARA JOSE	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
65	CC	85485631	ZURITA YEISON	230301	26	$866,667	$138,700	EPS002	26	$866,667	$34,700	CCF15	26	$866,667	$34,700	14-7	26	$866,667	$60,400	26	$0	$0
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMBARRANQUILLA (4 Afiliados)						$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$278,400		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (4 Afiliados)						$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$278,400		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (4 Afiliados)						$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$278,400		$0	$0
66	CC	72210593	CABALLERO JORGE	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF06	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
67	CC	72163267	MORALES EDGARD	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF06	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
68	CC	1007451199	MORALES REGGIE	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF06	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
69	CC	1143465288	MORALES VERUSCA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF06	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
Total Afiliados(66)						$51,900,014	$8,305,400			$51,900,014	$2,077,400			$51,200,783	$2,049,500			$51,900,014	$3,590,800		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901171572	2	RVK CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACESAR	CLL 54 32 22	VALLEDUPAR-CESAR	5888957	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-04	1421414452	9433740329	E	2022/04/20	2022/04/21	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	$16,023,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				66	$8,305,400	$0	$0	$8,305,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$741,700	$0	$0	$741,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$149,400	$0	$0	$149,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	49	$6,342,300	$0	$0	$6,342,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,072,000	$0	$0	$1,072,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				66	$3,590,800	$0	$0	$3,590,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	66	$3,590,800	$0	$0	$3,590,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				66	$2,049,500	$0	$0	$2,049,500
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	4	$160,000	$0	$0	$160,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	62	$1,889,500	$0	$0	$1,889,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				66	$2,077,400	$0	$0	$2,077,400
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	8	$234,900	$0	$0	$234,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$41,400	$0	$0	$41,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$41,400	$0	$0	$41,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	$305,600	$0	$0	$305,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	$190,700	$0	$0	$190,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$282,900	$0	$0	$282,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$2,700	$0	$0	$2,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	24	$803,100	$0	$0	$803,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$174,700	$0	$0	$174,700
TOTAL				66	$16,023,100	$0	$0	$16,023,100

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que A CONSTRUIR S.A. identificado(a) con NI 890115406 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para EDUARDO ENRIQUE CEPEDA CAMACHO identificado(a) con CC 72127336

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9433112447	28051756	E	2022-04-04	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-04	30																		$17,400,000	12.5%	$2,175,000
9433112447	28051756	E	2022-04-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-03	30																		$17,400,000	16%	$2,784,000
9433112447	28051756	E	2022-04-04	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-03	30																		$17,400,000		$87,000
9433112447	28051756	E	2022-04-04	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-03	30																		$17,400,000		$156,600
9433112447	28051756	E	2022-04-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-03	30																		$0	0%	$0
9433112447	28051756	E	2022-04-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-03	30																		$0	0%	$0
9433112447	28051756	E	2022-04-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-03	30																		$17,400,000	6.96%	$1,211,100
9433112447	28051756	E	2022-04-04	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-03	30																		$17,400,000	4%	$696,000
9433112447	28051756	E	2022-04-04	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-03	30																		$17,400,000	2%	$348,000
9433112447	28051756	E	2022-04-04	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-03	30																		$17,400,000	3%	$522,000

Este certificado se expide el día 2022-05-04 a las 11:15.

6.953.100.

13-026

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890115406	0	A CONSTRUIR S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	Cll 77b 59 61 Of 203	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3855098	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla-	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-05	28521027	9434475506	E	2022/05/03	2022/05/03	BANCO DAVIVIENDA		$89,573,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	sde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	evp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: ADMINISTRACION (3 Afiliados)																																	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (3 Afiliados)																																	
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (3 Afiliados)																																	
1	CC	1065996647	GALINDO BARRIOS JOSE DAVID																		230301	30	EPS005	30	CCF15	30	14-7	30	6.960%	30	SI
2	CC	1065828777	MADURO GARCIA LIZMARY ROSA																		230301	30	EPS037	30	CCF15	30	14-7	30	6.960%	30	SI
3	CC	1030582813	MUÑOZ MENESES VICTOR MANUEL																		25-14	30	EPS005	30	CCF15	30	14-7	30	6.960%	30	SI
Total Afiliados(3)																																	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$976,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$240,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$736,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$424,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	3	$424,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$244,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	$244,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$244,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$104,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$140,000
TOTAL				3	$1,888,600

13027

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890115406	0	A CONSTRUIR S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	Cll 77b 59 61 Of 203	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3855098	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-05	28521027	9434475621	E	2022/05/03	2022/05/03	BANCO DAVIVIENDA		$35,171,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: ADMINISTRACION (1 Afiliados)																															
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)																															
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)																															
1	CC	11154633	ARGUMEDO OVIEDO ORDSMAN ENRIQUE									X									25-14	30	EPS037	30	CCF15	30	14-7	30	6.960%	30	SI
Total Afiliados(1)																															

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$311,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$311,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$135,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$135,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$77,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$77,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$77,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$77,800
TOTAL				1	$602,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890115406	0	A CONSTRUIR S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	Cll 77b 59 61 Of 203	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3855098	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-05	28521027	9434475786	E	2022/05/03	2022/05/03	BANCO DAVIVIENDA		$101,436,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
			tng	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: ADMINISTRACION (18 Afiliados)																															
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (18 Afiliados)																															
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (18 Afiliados)																															
1	CC	77090391	AHUMADA MENA CESAR AUGUSTO									X									23100 1	30	EPS005	30	CCF15	30	14-7	30	6.960%	30	SI
2	CC	1065675357	AMAYA GONZALEZ ANGEL GRABIEL	X																	23030 1	12	EPS002	12	CCF15	12	14-7	12	6.960%	12	SI
3	CC	77185729	BOLAÑO ACOSTA ALEXANDER DARWING																		23100 1	30	EPS002	30	CCF15	30	14-7	30	6.960%	30	SI
4	CC	1065591193	BRACHO VARGAS LORENA ROCIO																		25-14	30	EPS037	30	CCF15	30	14-7	30	6.960%	30	SI
5	CC	1140863665	CAMARGO SERNA ALEXANDRA DE JESUS																		23020 1	30	EPS005	30	CCF15	30	14-7	30	6.960%	30	SI
6	CC	1010151202	CASTELLANOS TROYA ARMANDO DANIEL									X									23030 1	30	EPS002	30	CCF15	30	14-7	30	6.960%	30	SI
7	CC	1235339075	CASTILLA CASALINS JUAN DANIEL																		23030 1	30	EPS005	30	CCF15	30	14-7	30	6.960%	30	SI
8	CC	1046813906	CONTRERAS GARCIA LILIANA PATRICIA												X						23030 1	2	EPS005	2	CCF15	2	14-7	2	0.000%	2	SI
9	CC	1046813906	CONTRERAS GARCIA LILIANA PATRICIA																		23030 1	28	EPS005	28	CCF15	28	14-7	28	6.960%	28	SI
10	CC	19594764	LOPEZ POSADA FABIO JOAQUIN										X								23030 1	1	EPS005	1	CCF15	1	14-7	1	0.000%	1	SI
11	CC	19594764	LOPEZ POSADA FABIO JOAQUIN										X								23030 1	2	EPS005	2	CCF15	2	14-7	2	0.000%	2	SI
12	CC	19594764	LOPEZ POSADA FABIO JOAQUIN																		23030 1	27	EPS005	27	CCF15	27	14-7	27	6.960%	27	SI
13	CC	1121338097	MARRIAGA LOPEZ EDER JOHAN									X									23030 1	30	EPS017	30	CCF15	30	14-7	30	6.960%	30	SI
14	CC	1065641212	OSPINO PACHECO ANDRES EDUARDO									X									25-14	30	EPS002	30	CCF15	30	14-7	30	6.960%	30	SI
15	CC	49787228	PEÑALOZA TORRES ADA LUZ									X									23030 1	30	EPS017	30	CCF15	30	14-7	30	6.960%	30	SI
16	CC	1121335911	PINTO MARRIAGA TURJO ENRIQUE	X																	23030 1	12	EPS005	12	CCF15	12	14-7	12	6.960%	12	SI
17	CC	1065623254	POLO RAMIREZ LUIS JAVIER	X																	23030 1	12	CCFC55	12	CCF15	12	14-7	12	6.960%	12	SI
18	CC	1065568630	TERNERA MOZO JAIME JOSE						X			X									23030 1	30	EPS037	30	CCF15	30	14-7	30	6.960%	30	SI
19	CC	1063971741	TORRES ALCINA LEINER RAFAEL									X									23030 1	30	EPS002	30	CCF15	30	14-7	30	6.960%	30	SI
20	CC	1065806858	VASQUEZ VIVES MIGUEL ANGEL						X			X									23100 1	30	EPS017	30	CCF15	30	14-7	30	6.960%	30	SI
21	CC	15171031	YANCE ARRIETA NESTOR MANUEL									X									25-14	30	CCFC55	30	CCF15	30	14-7	30	6.960%	30	SI
Total Afiliados(18)																															

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$5,842,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$901,000

17029

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$842,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$3,333,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$765,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$2,443,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	18	$2,443,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,409,900
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	18	$1,409,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				18	$1,433,400
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	$77,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$214,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$162,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$306,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$673,600
TOTAL				18	$11,129,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901318620	1	SANCHEZ GRONSKI INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 12 # 16 A - 51 Barrio Loperena	VALLEDUPAR-CESAR	5899958	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-05	1444708700	94346206 92	E	2022/05/05	2022/05/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,821,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (19 Afiliados)						$9,100,011	$1,457,100			$9,100,011	$365,100			$9,100,011	$365,100			$9,100,011	$634,100		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (19 Afiliados)						$9,100,011	$1,457,100			$9,100,011	$365,100			$9,100,011	$365,100			$9,100,011	$634,100		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (19 Afiliados)						$9,100,011	$1,457,100			$9,100,011	$365,100			$9,100,011	$365,100			$9,100,011	$634,100		$0	$0
1	CC	1065851625	AVELLANEDA LUIS	230201	13	$433,334	$69,400	EPS017	13	$433,334	$17,400	CCF15	13	$433,334	$17,400	14-11	13	$433,334	$30,200	13	$0	$0
2	CC	1128110949	BENAVIDES RAFAEL	231001	13	$433,334	$69,400	EPS002	13	$433,334	$17,400	CCF15	13	$433,334	$17,400	14-11	13	$433,334	$30,200	13	$0	$0
3	CC	1121302852	BRITO ENDER	230301	13	$433,334	$69,400	EPS017	13	$433,334	$17,400	CCF15	13	$433,334	$17,400	14-11	13	$433,334	$30,200	13	$0	$0
4	CC	1193242676	BRITO RUYERIS	230301	13	$433,334	$69,400	CCFC23	13	$433,334	$17,400	CCF15	13	$433,334	$17,400	14-11	13	$433,334	$30,200	13	$0	$0
5	CC	1069476998	BRU EDUAR	230301	5	$166,667	$26,700	EPS017	5	$166,667	$6,700	CCF15	5	$166,667	$6,700	14-11	5	$166,667	$11,700	5	$0	$0
6	CC	1003230672	DEAVILA WILSON	230201	13	$433,334	$69,400	EPS017	13	$433,334	$17,400	CCF15	13	$433,334	$17,400	14-11	13	$433,334	$30,200	13	$0	$0
7	CC	1065675277	FONSECA JOEL	230201	13	$433,334	$69,400	EPS005	13	$433,334	$17,400	CCF15	13	$433,334	$17,400	14-11	13	$433,334	$30,200	13	$0	$0
8	CC	1065837168	GUILLEN ROSMEL	230201	13	$433,334	$69,400	EPS041	13	$433,334	$17,400	CCF15	13	$433,334	$17,400	14-11	13	$433,334	$30,200	13	$0	$0
9	CC	1101816790	JIMENEZ JADER	230301	13	$433,334	$69,400	EPS017	13	$433,334	$17,400	CCF15	13	$433,334	$17,400	14-11	13	$433,334	$30,200	13	$0	$0
10	CC	1065827510	MAESTRE PEDRO	230301	13	$433,334	$69,400	EPS002	13	$433,334	$17,400	CCF15	13	$433,334	$17,400	14-11	13	$433,334	$30,200	13	$0	$0
11	CC	1065808389	OROZCO LUIS	231001	13	$433,334	$69,400	CCFC55	13	$433,334	$17,400	CCF15	13	$433,334	$17,400	14-11	13	$433,334	$30,200	13	$0	$0
12	CC	1065574758	PACHECO JOEL	230301	13	$433,334	$69,400	EPS017	13	$433,334	$17,400	CCF15	13	$433,334	$17,400	14-11	13	$433,334	$30,200	13	$0	$0
13	CC	92190747	PEÑA JORGE	25-14	13	$433,334	$69,400	EPS005	13	$433,334	$17,400	CCF15	13	$433,334	$17,400	14-11	13	$433,334	$30,200	13	$0	$0
14	CC	92191586	PEÑA LUIS	230301	13	$433,334	$69,400	ESSC07	13	$433,334	$17,400	CCF15	13	$433,334	$17,400	14-11	13	$433,334	$30,200	13	$0	$0
15	CC	84039386	RONDON IVAN	230201	13	$433,334	$69,400	EPS005	13	$433,334	$17,400	CCF15	13	$433,334	$17,400	14-11	13	$433,334	$30,200	13	$0	$0
16	CC	1104008383	SALCEDO JULIO	230301	13	$433,334	$69,400	EPS017	13	$433,334	$17,400	CCF15	13	$433,334	$17,400	14-11	13	$433,334	$30,200	13	$0	$0
17	CC	77190931	SANCHEZ ADRIAN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
18	CC	1067592666	TORRES CARLOS	230301	13	$433,334	$69,400	CCFC55	13	$433,334	$17,400	CCF15	13	$433,334	$17,400	14-11	13	$433,334	$30,200	13	$0	$0
19	PE	815629118071 991	VILLAMIZAR KATHERINE	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF15	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
Total Afiliados(19)						$9,100,011	$1,457,100			$9,100,011	$365,100			$9,100,011	$365,100			$9,100,011	$634,100		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901318620	1	SANCHEZ GRONSKI INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 12 # 16 A - 51 Barrio Loperena	VALLEDUPAR-CESAR	5899958	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-05	1444708700	9434620892	E	2022/05/05	2022/05/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,821,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				19	$1,457,100	$0	$0	$1,457,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$138,800	$0	$0	$138,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$69,400	$0	$0	$69,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$901,900	$0	$0	$901,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$347,000	$0	$0	$347,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$634,100	$0	$0	$634,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	$634,100	$0	$0	$634,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$365,100	$0	$0	$365,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	19	$365,100	$0	$0	$365,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				19	$365,100	$0	$0	$365,100
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	$34,800	$0	$0	$34,800
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCFC23	892,115,006	5	1	$17,400	$0	$0	$17,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$111,100	$0	$0	$111,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$17,400	$0	$0	$17,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$17,400	$0	$0	$17,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$34,800	$0	$0	$34,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$132,200	$0	$0	$132,200
TOTAL				19	$2,821,400	$0	$0	$2,821,400

13-34

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que A CONSTRUIR S.A. identificado(a) con NI 890115406 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para EDUARDO ENRIQUE CEPEDA CAMACHO identificado(a) con CC 72127336

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										irp	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	ri	vip			
9434475506	28521027	E	2022-05-03	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-05	30							X											$19,140,000	12.5%	$2,392,500
9434475506	28521027	E	2022-05-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-04	30							X											$19,140,000	16%	$3,062,400
9434475506	28521027	E	2022-05-03	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-04	30							X											$19,140,000		$95,700
9434475506	28521027	E	2022-05-03	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-04	30							X											$19,140,000		$248,900
9434475506	28521027	E	2022-05-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-04	30							X											$0	0%	$0
9434475506	28521027	E	2022-05-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-04	30							X											$0	0%	$0
9434475506	28521027	E	2022-05-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-04	30							X											$19,140,000	6.96%	$1,332,200
9434475506	28521027	E	2022-05-03	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-04	30							X											$19,140,000	4%	$765,600
9434475506	28521027	E	2022-05-03	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-04	30							X											$19,140,000	2%	$382,800
9434475506	28521027	E	2022-05-03	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-04	30							X											$19,140,000	3%	$574,200

Este certificado se expide el día 2022-05-04 a las 11:14.

: $ 7.648.400,

13.033

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BARRANQUILLA, , ATLÁNTICO, 28/06/2021

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **A CONSTRUIR SA** con NIT **8901154060** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE
Número 0560027569991238

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRA 05

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - GIN - 0002 - 2021	NUMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.868.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/05/2028
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901433970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE 2/03/2021 — HASTA 30/04/2022

FECHA PRESENTE ACTA 5/05/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 05 de Mayo de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma interventora, ANDRES ALMARALES MELO y JORGE OLIVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

			CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL			CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 005		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
1,00	CAPITULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 308.235.984,20		$ 306.930.981,02		$ 306.724.091,82		$ -		$ 306.724.091,82		$ 206.890,10	99,95%	0,05%
1,10	Localizacion y replanteo con equipo	m2	7.366,00	$ 3.863,00	28.602.178,00	14.383,50	55.851.130,50	14.383,50	55.851.130,50			14.383,50	55.851.130,50		-	100,00%	
1,20	Cerramiento en lona verde H=2.00m	ml	480,00	$ 17.530,00	8.418.720,00	480,00	8.418.720,00	468,29	8.213.250,82			468,29	8.213.250,82	11,72	205.469,39	97,56%	2,44%
1,30	Descapote a maquina espesor 20cm	m2	11.974,93	$ 6.880,00	82.387.518,40	-	-	-	-			-	-	-	-		
1,40	Acometida provisional agua 50mt	und.	1,00	$ 950.000,00	950.000,00	1,00	950.000,00	1,00	950.000,00			1,00	950.000,00	-	-	100,00%	
1,50	Acometida provisional electrica 100ml	und.	1,00	$ 5.800.000,00	5.800.000,00	1,00	5.800.000,00	1,00	5.800.000,00		-	1,00	5.800.000,00	-	-	100,00%	
1,60	Acometida provisional telefonos	und.	1,00	$ 950.000,00	950.000,00	1,00	950.000,00	1,00	950.000,00			1,00	950.000,00	-	-	100,00%	
1,70	Demoliciones	m3	1.276,15	$ 141.972,00	181.177.567,80	2.288,91	324.959.710,80	2.288,90	324.959.710,80			2.288,90	324.959.710,80	0,01	1.419,72	100,00%	0,00%
2,00	CAPITULO 2. EXCAVACIONES Y RELLENO				$ 843.241.884,50		$ 425.318.642,86		$ 388.729.866,64		$ 20.238.538,28		$ 408.968.404,90		$ 18.348.237,96	95,69%	4,31%
2,10	Excavacion mecanica a nivel bajo placa de subpresion, con retiro hasta 10 km	m3	48.518,40	$ 18.355,00	793.485.722,00	22.963,04	375.580.480,36	21.706,78	355.014.348,08	910,82	14.893.190,10	22.617,40	369.907.538,18	345,64	5.652.942,20	98,49%	1,51%
2,20	Excavacion manual para zapatas	m3	825,00	$ 18.248,00	15.052.950,00	825,00	15.052.950,00	460,02	8.393.531,31	292,96	5.345.348,18	752,98	13.738.879,47	72,02	1.314.070,53	91,27%	8,73%
2,30	Cargue y retiro de sobrantes hasta 10 km	m3	1.072,50	$ 15.089,00	16.181.502,50	1.072,50	16.181.502,50	598,03	9.011.768,13		-	598,03	9.011.768,13	474,47	7.149.736,37	55,78%	44,24%
2,40	Rellenos con material seleccionado de aiu	m3	990,00	$ 18.729,00	18.541.710,00	990,00	18.541.710,00	764,07	14.310.221,14		-	764,07	14.310.221,14	225,93	4.231.488,86	77,18%	22,82%
3,00	CIMENTACION				$ 4.748.920.878,00	$ -	$ 851.003.608,02		$ 851.203.828,62		$ -		$ 851.203.828,62		$ 3.798.777,40	99,56%	0,44%
3,10	Concreto pobre e =5cm	m2	7.683,00	$ 24.563,00	188.717.529,00	2.935,73	72.110.421,96	2.854,78	70.121.371,63		-	2.854,78	70.121.371,63	80,96	1.989.050,33	97,24%	2,76%
3,20	ZAPATAS EN CONCRETO DE 4000 SPI	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
3,2,1	Concreto de 4000 psi para Zapatas	m3	330,00	$ 899.508,00	296.837.970,00	475,11	427.368.250,86	473,48	425.881.531,14		-	473,48	425.881.531,14	1,65	1.486.719,72	99,65%	0,35%
3,2,2	Acero de refuerzo fy 60.000psi	kg	18.500,00	$ 5.905,00	97.432.500,00	60.707,44	355.524.933,20	60.152,57	355.200.925,85		-	60.152,57	355.200.925,85	54,87	324.007,35	99,91%	0,09%
3,30	LOSA ALIGERADA DE CIMENTACION E=60CM	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
3,3,1	Concreto 4000Psi para losa aligerada	m3	3.007,00	$ 857.976,00	2.579.031.732,00	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
3,3,2	Aligeramiento en casetón de lona	m2	5.420,00	$ 32.402,00	175.618.840,00	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
3,3,3	Acero de refuerzo fy 60.000psi	kg	181.000,00	$ 5.905,00	1.068.805.000,00	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
3,3,4	Malla electrosoldada 15x15cm 7,0x6,5mm	kg	58.612,00	$ 5.809,00	340.477.108,00	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
3,40	ACTIVIDADES ADICIONALES PARA CIMENTACION		-		-	-	$ 4.052.725.998,05	-	$ 2.473.965.709,60		$ 753.756.000,72	-	$ 3.229.741.800,32	-	$ 822.984.195,73	79,69%	20,31%
NP 01	Concreto pobre e=15cm	m2	-	$ 73.407,00	-	532,59	39.095.834,13	532,59	39.095.834,13		-	532,59	39.095.834,13	0,00	183,52	100,00%	0,00%
NP 02	Acero de refuerzo fy 60.000psi	kg	-	$ 5.905,00	-	184.338,99	1.088.519.976,29	138.549,92	818.137.277,80	41.085,00	242.606.925,00	179.634,92	1.060.744.202,80	4.703,77	27.775.773,68	97,45%	2,55%
NP 03	Concreto 4000Psi Losa de cimentación	m3	-	$ 857.976,00	-	1.142,94	980.275.636,14	-	-	595,97	511.149.165,72	595,97	511.149.165,72	546,97	469.126.472,42	52,14%	47,86%
NP 04	Concreto 4000Psi vigs de cimentación	m3	-	$ 991.354,24	-	1.689,87	1.655.435.734,91	1.832,87	1.818.752.597,87		-	1.832,87	1.818.752.597,87	37,00	36.683.137,04	97,78%	2,22%
NP 05	Malla electrosoldada	kg	-	$ 5.809,00	-	49.819,01	289.398.629,09	-	-		-	-	-	49.819,01	289.398.629,09		100,00%
4,00	COLUMNAS Y PANTALLAS DE CONCRETO				$ 4.323.953.325,00	$ -	$ 3.901.084.437,20		$ 1.515.782.921,49		$ 286.488.748,13		$ 1.802.271.669,62		$ 2.098.792.747,58	46,20%	53,80%
4,10	COLUMNAS DE CONCRETO Y MUROS CORTINA																
4,1,1	Concreto 4000psi	m3	1.487,00	$ 1.155.437,00	1.695.029.079,00	1.564,58	1.830.867.158,52	309,29	357.350.332,56	224,23	259.083.638,51	533,52	616.442.971,06	1.051,07	1.214.444.185,47	33,67%	66,33%
4,1,2	Acero de refuerzo fy 60.000psi	kg	358.745,00	$ 5.905,00	2.185.829.225,00	276.220,06	1.642.889.958,70	125.981,36	743.919.930,80	2.478,68	14.625.976,40	128.458,24	758.545.907,20	149.761,84	884.343.051,50	46,17%	53,83%
4,20	MURO DE CONTENCION																
4,2,1	Concreto 4000psi	m3	333,00	$ 1.155.437,00	384.780.521,00	241,78	279.363.868,73	230,72	266.579.824,91	11,06	12.779.133,22	241,78	279.358.958,13	0,00	4.910,61	100,00%	0,00%
4,2,2	Acero de refuerzo fy 60.000psi	kg	13.300,00	$ 5.905,00	78.536.500,00	15.796,21	93.276.620,05	15.796,21	93.276.620,05		-	15.796,21	93.276.620,05	-	-	100,00%	
4,30	ACTIVIDADES ADICIONALES		-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
NP 08	SUELO CEMENTO PERIMETRAL	M3	-	$ 178.965,13	-	305,30	54.647.213,19	305,30	54.647.213,19		-	305,30	54.647.213,19	-	-	100,00%	
5,00	PLACAS DE SOTANO				$ 3.225.228.312,00		$ 3.225.228.312,00		$ 1.687.723.010,00		$ 911.604.424,29		$ 2.599.327.434,29		$ 625.900.877,72	80,59%	19,10%
5,1,1	Concreto 4000Psi para losa aligerada E=60cm	m3	1.759,00	$ 1.028.440,00	1.809.025.960,00	1.759,00	1.809.025.960,00	797,00	819.686.680,00	660,79	679.582.867,80	1.457,79	1.499.249.547,80	301,21	309.776.412,40	82,88%	17,12%
5,1,2	Aligeramiento en casetón de icopor removible	m2	5.280,00	$ 67.407,00	381.495.320,00	5.660,00	381.495.320,00	2.633,82	177.524.736,84	2.345,42	158.085.998,84	4.979,24	335.610.734,48	680,76	45.884.585,52	87,97%	12,03%
5,1,3	Acero de refuerzo fy 60.000psi	kg	140.487,00	$ 5.905,00	829.457.535,00	140.487,00	829.457.535,00	98.612,17	570.494.863,85		-	98.612,17	570.494.863,85	43.854,83	258.962.771,15	68,78%	31,22%
5,1,4	Malla electrosoldada 15x15 8mm	kg	35.333,00	$ 5.809,00	205.249.397,00	35.333,00	205.249.397,00	22.395,39	130.098.730,51	12.727,78	73.935.567,84	35.113,15	203.972.258,35	219,85	1.277.106,65	99,38%	0,62%
6,00	PLACAS DE ENTREPISO				$ 2.098.971.497,46	$ -	$ 2.098.971.497,46		$ -		$ -		$ -		$ 2.098.971.497,46		100,00%
6,10	TP - 1 SISTEMA LAMINA COLABORANTE				-												
6,1,1	Concreto para losa maciza E=15cm	m3	521,37	$ 1.028.440,00	536.197.782,80	521,37	536.197.782,80		-		-		-	521,37	536.197.782,80		100,00%
6,1,2	Malla Electrosoldada fy 60.000psi M-158	kg	18.148,00	$ 5.809,00	105.410.114,00	18.148,00	105.410.114,00		-		-		-	18.148,00	105.410.114,00		100,00%
6,1,3	Metaldeck 3" calibre 22	m2	4.667,00	$ 58.842,00	276.380.874,00	4.667,00	276.380.874,00		-		-		-	4.667,00	276.380.874,00		100,00%
6,20	TP - 2 Y 2A SISTEMA LAMINA COLABORANTE				-												
6,2,1	Concreto para losa maciza E=15cm	m3	394,81	$ 1.028.440,00	405.832.706,40	394,81	405.832.706,40		-		-		-	394,81	405.832.706,40		100,00%
6,2,2	Malla Electrosoldada fy 60.000psi M-188	kg	13.504,00	$ 5.809,00	78.444.736,00	13.504,00	78.444.736,00		-		-		-	13.504,00	78.444.736,00		100,00%
6,2,3	Metaldeck 3" calibre 22	m2	3.555,00	$ 58.842,00	209.183.310,00	3.555,00	209.183.310,00		-		-		-	3.555,00	209.183.310,00		100,00%
6,30	TP - 3 SISTEMA LAMINA COLABORANTE		705,00		-	705,00	-							705,00	-		
6,3,1	Concreto para losa maciza E=15cm	m3	78,26	$ 1.028.440,00	80.485.714,40	78,26	80.485.714,40		-		-		-	78,26	80.485.714,40		100,00%
6,3,2	Malla Electrosoldada fy 60.000psi M-188	kg	2.954,00	$ 5.809,00	17.159.786,00	2.954,00	17.159.786,00		-		-		-	2.954,00	17.159.786,00		100,00%
6,3,3	Metaldeck 3" calibre 22	m2	705,00	$ 58.842,00	41.483.810,00	705,00	41.483.810,00		-		-		-	705,00	41.483.810,00		100,00%
6,40	TP - 4 SISTEMA LAMINA COLABORANTE		-		-	-	-							-	-		

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS N. 05

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2429154
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115405-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.868.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
2/03/2021	30/04/2022

FECHA PRESENTE ACTA

5/05/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPAROS	Nº POLIZA		VR. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/08/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, al dia 05 de Mayo de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y JORGE OLIVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación.

	CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 005		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
6,7,1	Concreto para losa maciza E=15cm	m3	266,73	$ 1.026.440,00	274.315.801,20	266,73	274.315.801,20		-		-		-	266,73	274.315.801,20		100,00%
6,7,2	Malla Electrosoldada lv 80,000psi M-188	kg	9.706,00	$ 5.809,00	56.382.154,00	9.706,00	56.382.154,00		-		-		-	9.706,00	56.382.154,00		100,00%
6,7,3	Metaldeck 3" calibre 22	m2	266,73	$ 58.842,00	15.694.926,66	266,73	15.694.926,66		-		-		-	266,73	15.694.926,66		100,00%
7,00	ESTRUCTURA METALICA				$ 34.624.796.005,34	$ -	$ 34.722.190.108,14		$ -		$ 4.816.309.445,41		$ 4.816.309.445,41		$ 29.905.880.662,73	13,87%	86,13%
7,10	Estructura metálica (Inc. Pitches, pernos y demás)	kg	2.736.124,00	$ 12.108,00	33.126.859.392,00	2.727.649,81	33.025.351.494,80		-	397.779,11	4.816.309.445,41	397.779,11	4.816.309.445,41	2.329.870,50	28.210.072.049,39	14,58%	85,42%
7,20	Pintura intumescente	m2	13.680,82	$ 123.957,00	1.695.805.813,34	13.680,82	1.695.805.813,34		-		-		-	13.680,82	1.695.805.813,34		100,00%
9,00	DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS				$ 437.474.737,70	$ -	$ 1.131.441.864,45		$ 573.161.073,36		$ 206.305.785,79		$ 779.466.859,15		$ 351.975.053,30	68,89%	31,11%
9,10	CAJAS Y POZOS DE INSPECCION				-		-		-		-		-		-		
9,1,1	CAJA DE INSPECCIÓN	und	11,00	$ 715.121,00	7.866.331,00	11,00	7.866.331,00		-		-		-	11,00	7.866.331,00		100,00%
9,1,2	TUBERIA PERFORADA PARA DRENAJE 4"	mt	527,91	$ 147.160,00	77.687.235,60	-	-		-		-		-	-	-		
9,1,3	TUBERIA PERFORADA PARA DREHAJE 6"	mt	81,29	$ 195.705,00	15.908.859,45	992,20	194.176.501,00	992,19	194.176.543,95		-	992,19	194.176.543,95	0,01	1.957,05	100,00%	0,00%
9,1,4	CONEXIÓN A RED SANITARIA 12"	und	1,00	$ 1.331.346,00	1.331.346,00	1,00	1.331.346,00		-		-		-	1,00	1.331.346,00		100,00%
9,1,5	CONEXIÓN A RED SANITARIA 10"	und	1,00	$ 1.207.553,00	1.207.553,00	1,00	1.207.553,00		-		-		-	1,00	1.207.553,00		100,00%
9,1,6	ACTIVIDADES ADICIONALES				-		-		-		-		-		-		
NP 07	RELLENO CON SUBBASE	M3	-	$ 92.037,22	-	1.112,90	102.428.222,14	633,71	58.324.906,69	477,02	43.977.224,46	1.111,53	102.302.131,15	1,37	126.090,99	99,88%	0,12%
NP 08	PEDRAPLEN	M3	-	$ 133.476,32	-	3.040,40	405.821.536,80	1.824,24	243.492.842,60	1.216,16	162.328.561,33	3.040,40	405.821.403,33	0,00	133,48	100,00%	0,00%
NP 09	FILTRO PERIMETRAL MURO DE CONTENCION	ML	-	$ 142.269,84	-	435,91	62.025.564,86	379,91	54.057.333,73		-	379,91	54.057.333,73	56,00	7.968.231,13	87,15%	12,85%
NP 10	CAJAS DE INTERSECCION DE TUBERIA DE 8" PERFORADA	UNID	-	$ 343.450,89	-	37,00	12.596.663,00	37,00	12.596.663,00		-	37,00	12.596.663,00	-	-	100,00%	
NP 11	TUBERIA SANITARIA DE 8"	ML	-	$ 175.211,90	-	60,00	10.512.714,00	60,00	10.512.714,00		-	60,00	10.512.714,00	-	-	100,00%	
9,20	BAJANTES AGUAS LLUVIAS Y AGUAS NEGRAS				-		-		-		-		-		-		
9,2,1	BAJANTE AGUAS NEGRAS PVC-S 4"	mt	8,18	$ 56.270,00	460.268,60	8,18	460.268,60		-		-		-	8,18	460.268,60		100,00%
9,2,2	BAJANTE AGUAS NEGRAS PVC-S 6"	mt	49,89	$ 114.129,00	5.695.308,71	49,89	5.705.308,71		-		-		-	49,89	5.705.308,71		100,00%
9,2,3	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC-S 4"	mt	570,52	$ 50.291,00	28.674.905,72	570,52	28.674.905,72		-		-		-	570,52	28.674.905,72		100,00%
9,2,4	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC-S 6"	mt	120,38	$ 122.801,00	14.782.784,38	120,38	14.782.784,38		-		-		-	120,38	14.782.784,38		100,00%
9,30	SALIDAS SANITARIAS				-		-		-		-		-		-		
9,3,1	PUNTO DESAGUE PVC 2"	und	87,00	$ 59.800,00	5.185.200,00	87,00	5.185.200,00		-		-		-	87,00	5.185.200,00		100,00%
9,3,2	PUNTO DESAGUE PVC 3"	und	7,00	$ 84.478,00	591.346,00	7,00	591.346,00		-		-		-	7,00	591.346,00		100,00%
9,3,3	PUNTO DESAGUE PVC 4"	und	48,00	$ 111.807,00	5.367.136,00	48,00	5.367.136,00		-		-		-	48,00	5.367.136,00		100,00%
9,3,4	VALVULA DE ADMISION DE AIRE	und	98,00	$ 325.811,00	31.929.478,00	98,00	31.929.478,00		-		-		-	98,00	31.929.478,00		100,00%
9,40	RED SANITARIA, VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS INTERNA				-		-		-		-		-		-		
9,4,1	TUBERIA PVC-S 4" VENTILACION	mt	76,04	$ 58.918,00	4.480.124,72	76,04	4.480.124,72		-		-		-	76,04	4.480.124,72		100,00%
9,4,2	TUBERIA PVC-S 3"	mt	25,89	$ 68.055,00	1.761.843,95	25,89	1.761.843,95		-		-		-	25,89	1.761.843,95		100,00%
9,4,3	TUBERIA PVC-S 1 1/2"	mt	569,81	$ 23.896,00	13.272.129,46	569,81	13.272.129,46		-		-		-	569,81	13.272.129,46		100,00%
9,4,4	TUBERIA PVC-S 2"	mt	174,87	$ 41.055,00	7.179.267,85	174,87	7.179.267,85		-		-		-	174,87	7.179.267,85		100,00%
9,4,5	TUBERIA PVC-S 4"	mt	1.237,83	$ 60.210,00	74.529.744,30	1.237,83	74.529.744,30		-		-		-	1.237,83	74.529.744,30		100,00%
9,4,6	TUBERIA PVC-S 6"	mt	714,24	$ 99.472,00	71.046.881,28	714,24	71.046.881,28		-		-		-	714,24	71.046.881,28		100,00%
9,4,7	TRAGANTE AGUAS LLUVIAS 6X4" METALICO	und	25,00	$ 96.183,00	2.413.124,00	25,00	2.413.124,00		-		-		-	25,00	2.413.124,00		100,00%
9,50	SUMIDEROS, REJILLAS Y TRAMPAS DE GRASAS				-		-		-		-		-		-		
9,5,1	REJILLA Aluminio 4 x 2"	und	35,00	33.463,00	1.171.205,00	35,00	1.171.205,00		-		-		-	35,00	1.171.205,00		100,00%
9,5,2	CARCAMO CONCRETO 3.000 PSI	mt	11,08	268.845,00	2.991.001,68	11,08	2.991.001,68		-		-		-	11,08	2.991.001,68		100,00%
9,5,3	TRAMPA DE GRASAS	und	2,00	2.860.272,00	5.720.544,00	2,00	5.720.544,00		-		-		-	2,00	5.720.544,00		100,00%
9,5,4	GRUPO DE BOMBEO PARA AGUAS NEGRAS	und	1,00	24.962.197,00	24.962.197,00	1,00	24.962.197,00		-		-		-	1,00	24.962.197,00		100,00%
9,5,5	GRUPO DE BOMBEO PARA AGUAS DE NIVEL FREATICO	und	1,00	31.256.782,00	31.256.782,00	1,00	31.256.782,00		-		-		-	1,00	31.256.782,00		100,00%
10,00	INSTALACIONES HIDRAULICAS	und			$ 351.591.545,93	$ -	$ 351.591.545,93		$ -		$ -		$ -		$ 351.591.545,93		100,00%
10,10	INSTALACION HIDRAULICA				-		-		-		-		-		-		
10,1,1	CONEXIÓN A RED HIDRAULICA PVC-P 3"	und	1,00	442.813,00	442.813,00	1,00	442.813,00		-		-		-	1,00	442.813,00		100,00%
10,1,2	CONEXIÓN A RED HIDRAULICA PVC-P 4"	und	2,00	490.043,00	980.086,00	2,00	980.086,00		-		-		-	2,00	980.086,00		100,00%
10,1,3	VALVULA BOLA 3"	und	5,00	774.277,00	3.871.385,00	5,00	3.871.385,00		-		-		-	5,00	3.871.385,00		100,00%
10,1,4	VALVULA BOLA 4"	und	6,00	1.277.325,00	7.663.950,00	6,00	7.663.950,00		-		-		-	6,00	7.663.950,00		100,00%
10,1,5	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 3"	und	4,00	1.156.876,00	4.627.504,00	4,00	4.627.504,00		-		-		-	4,00	4.627.504,00		100,00%
10,1,6	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 1 1/2"	und	5,00	620.368,00	3.101.840,00	5,00	3.101.840,00		-		-		-	5,00	3.101.840,00		100,00%
10,1,7	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 1"	und	6,00	330.195,00	1.981.170,00	6,00	1.981.170,00		-		-		-	6,00	1.981.170,00		100,00%
10,1,8	VALVULA CHECK 3"	und	9,00	1.267.609,00	11.408.481,00	9,00	11.408.481,00		-		-		-	9,00	11.408.481,00		100,00%
10,1,9	VALVULA CHECK 1"	und	3,00	149.999,00	449.997,00	3,00	449.997,00		-		-		-	3,00	449.997,00		100,00%
10,1,10	GRUPO DE PRESION PARA AGUA POTABLE 180GPM, 62 m.c.a.	und	1,00	58.758.859,00	58.758.859,00	1,00	58.758.859,00		-		-		-	1,00	58.758.859,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS N° 005

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115409-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.617.688.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901423870-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE 26/3/2021 HASTA 30/04/2022

FECHA PRESENTE ACTA

5/05/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	Nº POLIZA		VR. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.545.300.685,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.545.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	18.858.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

En la Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 05 de Mayo de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARDOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventoria, ANDRES ALMARALES MELO y JORGE OLIVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 005		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
10,1,11	CONEXIÓN A TANQUE EN 1 1/2". INCLUYE FLOTADORA 1.1/2"	und	1,00	1 395 089,00	1.395 089,00	1,00	1 395 089,00		-				-	1,00	1.395 089,00		100,00%
10,1,12	CONJUNTO DE VACIADO DE DEPOSITOS DE AGUA	und	1,00	4 479,116,00	4.479.116,00	1,00	4 479.116,00		-				-	1,00	4 479.116,00		100,00%
10,1,13	TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2"	ml	154,23	15.354,00	2.368 047,42	154,23	2 368 047,42		-				-	154,23	2.368 047,42		100,00%
10,1,14	TUBERIA PVC-P RDE 21 1"	ml	579,36	20 387,00	11 817 205,92	579,36	11 817 205,92		-				-	579,36	11.817.205,92		100,00%
10,1,15	TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/2"	ml	294,47	44.177,00	12.567.031,19	294,47	12.567 031,19		-				-	294,47	12.567.031,19		100,00%
10,1,16	TUBERIA PVC-P RDE 21 2"	ml	129,27	60 305,00	7.735.322,35	129,27	7,735.322,35		-				-	129,27	7.735 322,35		100,00%
10,1,17	TUBERIA PVC-P RDE 21 2 1/2"	ml	37,00	79 803,00	2.952.711,00	37,00	2.952.711,00		-				-	37,00	2.952.711,00		100,00%
10,1,18	TUBERIA PVC-P RDE 21 3"	ml	18,27	94 415,00	1.724 982,05	18,27	1.724 982,05		-				-	18,27	1.724 982,05		100,00%
10,1,19	TUBERIA PVC-P RDE 21 4"	ml	282,00	155 338,00	43 804.752,00	282,00	43 804.752,00		-				-	282,00	43 804.752,00		100,00%
10,1,20	REGISTRO Red White o Similar 1/2"	und	3,00	96.180,00	288 540,00	3,00	288 540,00		-				-	3,00	288 540,00		100,00%
10,1,21	REGISTRO Red White o Similar 1"	und	10,00	134.580,00	1.345 800,00	10,00	1 345.800,00		-				-	10,00	1.345 800,00		100,00%
10,1,22	REGISTRO Red White o Similar 1 1/2"	und	16,00	230 889,00	3 694 224,00	16,00	3 694.224,00		-				-	16,00	3 694.224,00		100,00%
10,1,23	REGISTRO Red White o Similar 2"	und	2,00	371 276,00	742.552,00	2,00	742.552,00		-				-	2,00	742.552,00		100,00%
10,1,24	PUNTO AGUA FRIA 1/2"	und	61,00	31 274,00	1.907.714,00	61,00	1.907.714,00		-				-	61,00	1.907.714,00		100,00%
10,1,25	PUNTO AGUA FRIA 1"	und	58,00	39 994,00	2.319 652,00	58,00	2.319 652,00		-				-	58,00	2.319 652,00		100,00%
10,1,26	TRAMITE ANTE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA ACCEDER AL SERVICIO DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES DEL PROYECTO	und	1,00	15 225.145,00	15 225.145,00	1,00	15.225.145,00		-				-	1,00	15 225.145,00		100,00%
10,30	MEDIDORES, ACOMETIDAS Y CONEXIONES		-		-	-	-		-				-	-	-		
10,3,1	MEDIDOR AGUA 2"	und	1,00	4 048.311,00	4.048.311,00	1,00	4 048 311,00		-				-	1,00	4 048.311,00		100,00%
10,3,2	MEDIDOR AGUA 1 1/2"	und	1,00	549 566,00	549 566,00	1,00	549 566,00		-				-	1,00	549 566,00		100,00%
10,3,3	MEDIDOR AGUA 1"	und	3,00	434.770,00	1.304.310,00	3,00	1 304.310,00		-				-	3,00	1.304 310,00		100,00%
10,40	SANITARIOS		-		-	-	-		-				-	-	-		
10,4,1	SANITARIO CON FLUXOMETRO	und	37,00	1.720.715,00	63 666 455,00	37,00	63 666.455,00		-				-	37,00	63 666 455,00		100,00%
10,4,2	SANITARIO PARA DISCAPACITADO ELONGADO. INCLUYE BARRAS DE SEGURIDAD EN U	und	11,00	2 250 983,00	24 760 583,00	11,00	24.760.583,00		-				-	11,00	24 760 583,00		100,00%
10,50	ORINALES		-		-	-	-		-				-	-	-		
10,5,1	ORINAL CON FLUXOMETRO	und	10,00	1 604 829,00	16 048 290,00	10,00	16 048 290,00		-				-	10,00	16 048 290,00		100,00%
10,60	LAVAMANOS		-		-	-	-		-				-	-	-		
10,6,1	LAVAMANOS SOBREPONER	und	36,00	312 260,00	11.241.360,00	36,00	11 241.360,00		-				-	36,00	11.241.360,00		100,00%
10,6,2	LAVAMANOS DE COLGAR FREE	und	11,00	530.787,00	5 838 657,00	11,00	5 838.657,00		-				-	11,00	5 838 657,00		100,00%
10,70	GRIFERIA		-		-	-	-		-				-	-	-		
10,10,1	GRIFERIA LAVAMANOS TIPO PUSH ANTIVANDALICA	und	47,00	277.965,00	13.064 355,00	47,00	13.064.355,00		-				-	47,00	13.064 358,00		100,00%
10,10,2	LAVADERO PREFABRICADO DE 80x50x50cm EN ACRILICO	und	4,00	536 692,00	2.154 768,00	4,00	2,154.768,00		-				-	4,00	2.154 768,00		100,00%
10,10,3	GRIFERIA DUCHA BALANCE DE PRESIÓN	und	7,00	180.166,00	1 261,162,00	7,00	1 261,162,00		-				-	7,00	1 261,162,00		100,00%
11,00	RED DE GAS	und			$ 19.014.790,80	$ -	$ 19.014.790,80		$ -		$ -		$ -		$ 19.014.790,80		100,00%
11,10	RED DE GAS		-		-	-	-		-				-	-	-		
11,1,1	ACOMETIDA DE GAS	und	1,00	1 460 077,00	1 460 077,00	1,00	1 460 077,00		-				-	1,00	1 460.077,00		100,00%
11,1,2	TUBERÍA 3/4" PE 80 RDE 11 PARA INSTALACIÓN COMÚN DE GAS	ml	26,98	17.220,00	464 595,60	26,98	464 595,60		-				-	26,98	464 595,60		100,00%
11,1,3	CONTADOR PARA GAS DE MEMBRANA	und	2,00	1.345 355,00	2.690 710,00	2,00	2 690.710,00		-				-	2,00	2.690.710,00		100,00%
11,1,4	RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 3/4"	und	278,55	23 644,00	6 538.748,20	278,55	6.538.748,20		-				-	278,55	6.538.748,20		100,00%
11,1,5	VALVULA TIPO BOLA	und	2,00	53 656,00	107.312,00	2,00	107.312,00		-				-	2,00	107.312,00		100,00%
11,1,6	ESTACIÓN REGULADORA DE PRESIÓN	und	2,00	3.471.116,00	6 942.232,00	2,00	6 942.232,00		-				-	2,00	6 942.232,00		100,00%
11,1,7	TRAMITE ANTE LA EMPRESA SUMINISTRADORA DE GAS PARA ACCEDER AL SERVICIO, PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, ETC.	und	1,00	611.116,00	611.116,00	1,00	611.116,00		-				-	1,00	611.116,00		100,00%
12,00	PROTECCION CONTRA INCENDIOS	und			$ 1.221.084.805,79	$ -	$ 1.221.084.805,79		$ -		$ -		$ -		$ 1.221.084.805,79		100,00%
12,20	EXTINCIÓN		-		-	-	-		-				-	-	-		
12,1,1	GRUPO DE PRESIÓN CONTRA INCENDIOS SI/NFPA20	und	1,00	546.543 324,00	546 543.324,00	1,00	546.543 324,00		-				-	1,00	546 543.324,00		100,00%
12,1,2	CONEXION SIAMESA PARA BOMBEROS CUERPO 4"	und	3,00	3.129 806,00	9 389.418,00	3,00	9.389.418,00		-				-	3,00	9 389 418,00		100,00%
12,1,3	MANOMETRO DE 0 A 200 PSI	und	8,00	57.963,00	463.704,00	8,00	463.704,00		-				-	8,00	463.704,00		100,00%

13.034

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS N° 005

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115408-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493670-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
2/03/2021	30/04/2022

FECHA PRESENTE ACTA

5/05/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPAROS	N° POLIZA		VR. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000534	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 05 de Mayo de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma interventora, ANDRES ALMARALES MELO y JORGE OLIVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 005		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
12,1,4	MEDIDOR DE CAUDAL	und	1,00	5.193.067,00	5.193.067,00	1,00	5.193.067,00		-				-	1,00	5.193.067,00		100,00%
12,1,5	TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN CON COSTURA SCH10 COLMENA 6" INCLUYE SOPORTERIA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION	ml	438,21	254.893,00	111.709.019,53	438,21	111.709.019,53		-				-	438,21	111.709.019,53		100,00%
12,1,6	TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN CON COSTURA SCH10 COLMENA 4" INCLUYE SOPORTERIA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION	ml	9,58	210.559,00	2.017.155,22	9,58	2.017.155,22		-				-	9,58	2.017.155,22		100,00%
12,1,7	TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN CON COSTURA SCH10 COLMENA 3"	ml	127,68	129.096,00	16.099.937,28	127,68	16.099.937,28		-				-	127,68	16.099.937,28		100,00%
12,1,8	TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN CON COSTURA SCH10 COLMENA 2 1/2" INCLUYE SOPORTERIA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION	ml	338,85	101.566,00	34.423.093,80	338,85	34.423.093,80		-				-	338,85	34 423 093,80		100,00%
12,1,9	TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN CON COSTURA SCH10 COLMENA 1 1/2" INCLUYE SOPORTERIA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION	ml	1.887,18	59.297,00	111.885.240,66	1.887,18	111.885.240,66		-				-	1.887,18	111.885 240,66		100,00%
12,1,10	TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN CON COSTURA SCH10 COLMENA 1" INCLUYE SOPORTERIA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION	ml	1.227,05	50.206,00	61.605.272,30	1.227,05	61.605.272,30		-				-	1.227,05	61.605 272,30		100,00%
12,1,11	VÁLVULA MARIPOSA 1 1/2" TIPO TTV	und	4,00	479.799,00	1.919.196,00	4,00	1.919.196,00		-				-	4,00	1.919,196,00		100,00%
12,1,12	VÁLVULA MARIPOSA 6" CON REDUCTOR Y VOLANTE TIPO TTV	und	5,00	1.889.087,00	9.445.435,00	5,00	9.445.435,00		-				-	5,00	9.445.435,00		100,00%
12,1,13	VÁLVULA MARIPOSA 8" CON REDUCTOR Y VOLANTE TIPO TTV	und	1,00	3.068.984,00	3.068.984,00	1,00	3.068.984,00		-				-	1,00	3.068.984,00		100,00%
12,1,14	VÁLVULA SUPERVISADA OS&Y 6"	und	1,00	2.180.640,00	2.180.640,00	1,00	2.180.640,00		-				-	1,00	2.180.640,00		100,00%
12,1,15	VÁLVULA SUPERVISADA OS&Y 8"	und	1,00	3.154.160,00	3.154.160,00	1,00	3.154.160,00		-				-	1,00	3.154.160,00		100,00%
12,1,16	BRIDA 4"	und	4,00	237.022,00	948.088,00	4,00	948.088,00		-				-	4,00	948.088,00		100,00%
12,1,17	BRIDA 6"	und	12,00	355.533,00	4.266.396,00	12,00	4.266.396,00		-				-	12,00	4.266.396,00		100,00%
12,1,18	BRIDA 8"	und	6,00	544.730,00	3.268.380,00	6,00	3.268.380,00		-				-	6,00	3.268.380,00		100,00%
12,1,19	PLATINA ANTIVORTICE O VORTEX DE 8" - EQUIPO CONTRAINCENDIOS	und	1,00	1.881.015,00	1.881.015,00	1,00	1.881.015,00		-				-	1,00	1.881.015,00		100,00%
12,1,20	VÁLVULA CHECK 1 1/2"	und	1,00	693.923,00	693.923,00	1,00	693.923,00		-				-	1,00	693 923,00		100,00%
12,1,21	VÁLVULA SEGURIDAD 1 1/2"	und	2,00	618.134,00	1.236.268,00	2,00	1.236.268,00		-				-	2,00	1.236.268,00		100,00%
12,1,22	ROCIADOR COLGANTE INCLUYE ESCUDO	und	511,00	92.683,00	47.361.013,00	511,00	47.361.013,00		-				-	511,00	47.361.013,00		100,00%
12,1,23	ROCIADOR MONTANTE	und	558,00	78.153,00	43.609.374,00	558,00	43.609.374,00		-				-	558,00	43.609 374,00		100,00%
12,1,24	CONEXION PARA ROCIADORES	und	1.069,00	40.809,00	43.621.614,00	1.069,00	43.621.614,00		-				-	1.069,00	43.621.614,00		100,00%
12,1,25	PUESTO DE CONTROL DE 6"	und	4,00	6.524.185,00	26.096.740,00	4,00	26.096.740,00		-				-	4,00	26 096 740,00		100,00%
12,1,26	PUESTO DE CONTROL DE 3"	und	11,00	2.362.982,00	25.882.802,00	11,00	25.882.802,00		-				-	11,00	25 882.802,00		100,00%
12,1,27	PUNTO DE PRUEBA/LIMPIEZA 1", ORIFICIO 1/2".	und	11,00	933.975,00	10.273.725,00	11,00	10.273.725,00		-				-	11,00	10.273 725,00		100,00%
12,1,28	HIDRANTE CHICAGO 4" EXTREMO LISO	und	2,00	6.034.112,00	12.068.224,00	2,00	12.068.224,00		-				-	2,00	12.068.224,00		100,00%
12,30	GABINETES CONTRAINCENDIO Y EXTINTORES				-		-		-				-	-	-		-
12,2,1	GABINETE CONTRAINCENDIO CLASE III	und	16,00	1.920.241,00	30.723.856,00	16,00	30.723.856,00		-				-	16,00	30.723 856,00		100,00%
12,2,2	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO ABC	und	109,00	272.327,00	29.683.643,00	109,00	29.683.643,00		-				-	109,00	29 683.643,00		100,00%
12,2,3	EXTINTOR DE CO2	und	7,00	648.782,00	4.541.474,00	7,00	4.541.474,00		-				-	7,00	4 541 474,00		100,00%

14.038

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS N. 05

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SEN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2439104	
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:				
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11					
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA	
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4617	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND	4617	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4617	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2026
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4617	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
2/03/2021	30/04/2022

FECHA PRESENTE ACTA

5/05/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 05 de Mayo de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y JORGE OLIVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

			CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL			CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 005		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
12,2,4	CONEXION PARA BOMBEROS 2 1/2", EN ESCALERAS	und	13,00	1.227.108,00	15.952.404,00	13,00	15.952.404,00							13,00	15.952.404,00		100,00%
13,00	SISTEMAS DE COMUNICACIONES				$ 2.930.192.260,00	$ -	$ 2.930.192.260,00		$ -		$ -		$ -		$ 2.930.192.260,00		100,00%
13,10	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS				-	-	-		-		-		-		-		-
13,1,1	Suministro e instalación de Panel de detección de incendios direccionable, capaz de soportar mínimo 4 lazos y 4 circuitos de notificación. Certificación UL 864 9 edición. Debe permitir secuencia de alarma positiva. Incluye marcación y ficho de identificación, todas las tarjetas, conectores, cables y todos los elementos necesarios para conectar 4 lazos, 5 anunciadores remotos y conexión en red. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	1,00	13.658.899,00	13.658.899,00	1,00	13.658.899,00		-		-		-	1,00	13.658.899,00		100,00%
13,1,2	Suministro e instalación de anunciador remoto de detección de incendios, con pantalla LCD. Certificación UL. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	4,00	7.414.267,00	29.657.068,00	4,00	29.657.068,00		-		-		-	4,00	29.657.068,00		100,00%
13,1,3	Suministro e instalación de fuente de alimentación auxiliar de 8A. Certificado UL. Mínimo 4 circuitos de notificación. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	5,00	3.790.667,00	18.954.335,00	5,00	18.954.335,00		-		-		-	5,00	18.954.335,00		100,00%
13,1,4	Suministro e instalación de Batería 12V 18 Ah, recargable, Certificación UL. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	12,00	363.228,00	4.358.736,00	12,00	4.358.736,00		-		-		-	12,00	4.358.736,00		100,00%
13,1,5	Suministro e instalación de estrobo multicandela con sirena electrónica, intensidad seleccionable, montura pared, color rojo, Fuego en español. Certificación UL. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	19,00	527.569,00	10.023.611,00	19,00	10.023.611,00		-		-		-	19,00	10.023.611,00		100,00%
13,1,6	Suministro e instalación de Estrobo multicandela con sirena electrónica, intensidad seleccionable, montura de techo, color rojo. Fuego en español Certificación UL. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	139,00	540.594,00	75.184.266,00	139,00	75.184.266,00		-		-		-	139,00	75.184.266,00		100,00%
13,1,7	Suministro e instalación de multisensor de humo y temperatura (doble tecnología), Incluye base. Certificación UL. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	6,00	523.127,00	3.138.762,00	6,00	3.138.762,00		-		-		-	6,00	3.138.762,00		100,00%
13,1,8	Suministro e instalación de sensor de humo fotoeléctrico, Incluye base. Certificación UL. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	247,00	412.096,00	101.785.242,00	247,00	101.785.242,00		-		-		-	247,00	101.785.242,00		100,00%
13,1,9	Suministro e instalación de sensor de temperatura fija e incremental, Incluye base. Certificación UL. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	61,00	436.736,00	26.642.896,00	61,00	26.642.896,00		-		-		-	61,00	26.642.896,00		100,00%
13,1,10	Suministro e instalación de sensor de humo de haz proyectado, controlador y reflector.Certificación UL. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	2,00	4.808.334,00	9.616.668,00	2,00	9.616.668,00		-		-		-	2,00	9.616.668,00		100,00%
13,1,11	Suministro e instalación de sensor de humo direccionable para ducto de aire, incluye ducto de muestreo e indicador LED remoto Certificación UL. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	4,00	1.175.063,00	4.700.252,00	4,00	4.700.252,00		-		-		-	4,00	4.700.252,00		100,00%
13,1,12	Suministro e instalación de estación manual, Incluye Stopper. Certificación UL. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	50,00	817.304,00	40.865.200,00	50,00	40.865.200,00		-		-		-	50,00	40.865.200,00		100,00%
13,1,13	Suministro e instalación de modulo de entrada, monitoreo o supervisión simple para conexión a un contacto normalmente abierto. Certificación UL. Incluye caja, tapa protectora y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	78,00	576.427,00	44.961.306,00	78,00	44.961.306,00		-		-		-	78,00	44.961.306,00		100,00%
13,1,14	Suministro e instalación de modulo de entrada de señal para conexión de señales de telefonia y notificación. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	10,00	576.427,00	5.764.270,00	10,00	5.764.270,00		-		-		-	10,00	5.764.270,00		100,00%

13.A39

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS . .05

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104	
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:				
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.617.663.949,11					
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA	
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4617	$ 41.845.300.885,00	12/07/2021	A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND	4617	$ 6.940.683.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4617	$ 41.845.300.885,00	12/07/2021	A 11/05/2026
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4617	$ 18.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.940.683.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
2/03/2021	30/04/2022

FECHA PRESENTE ACTA

5/05/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 05 de Mayo de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firme Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y JORGE OLIVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación.

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 005		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
13.1.15	Suministro e instalación de modulo salida de control de señales externas. Contiene un relevo clase C. Certificación UL. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	36,00	483 152,00	17.393.472,00	36,00	17.393.472,00		-		-		-	36,00	17.393.472,00		100,00%
13.1.16	Suministro e instalación de Cable FPLR 2x16. Certificación UL	ml	1.525,00	4.683,00	7.141.575,00	1.525,00	7.141.575,00		-		-		-	1.525,00	7.141.575,00		100,00%
13.1.17	Suministro e instalación de Cable FPLR 2x18. Certificación UL	ml	7.930,00	3.519,00	27.898.670,00	7.930,00	27.898.670,00		-		-		-	7.930,00	27.898.670,00		100,00%
13.1.18	Suministro e instalación de tubería EMT 3/4", incluye uniones, codos, terminales, cajas aluminio 2400 tipo rawelt con tapa, chazos, abrazaderas dobles, tornillos y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	ml	3.332,00	22.733,00	75.746.356,00	3.332,00	75.746.356,00		-		-		-	3.332,00	75.746.356,00		100,00%
13,20	SISTEMA DE CCTV		-	-	-	-	-		-		-		-	-	-		
13.2.1	Suministro e instalación de grabador de video en red de 128 canales rackeable, doble salida OS HDC, fuente de alimentación redundante, soporte de cameras multimarca por protocolo ONVIF, incluye arreglo de discos duros especiales para CCTV de mínimo 120TB, salida por VGA y HDMI 4K. Capacidad de grabación mínimo de 12 MPX.	un	2,00	17.903.802,00	35.807.604,00	2,00	35.807.604,00		-		-		-	2,00	35.807.604,00		100,00%
13.2.2	Suministro e instalación de Switch para cctv de 24 Puertos PoE, 802.3af, 802.3at, 802.3az, mínimo 2 puertos SFP de 1000Mbps. Incluye los transceptores con conectores LC	un	10,00	3.164.809,00	31.648.090,00	10,00	31.648.090,00		-		-		-	10,00	31.648.090,00		100,00%
13.2.3	Suministro e instalación de Cámara IP tipo domo, de resolución mínima 1920X1080P 30FPS, lente varifocal 2.8-12mm, sensor 1/2.8", sistema de compresión H.265 o superior, función día/noche con rango IR de mínimo 30m. Grado de protección IP67 IK10, alimentación por PoE. Incluye soporte, caja de conexión adaptador u otro elemento que sea necesario para su correcta instalación.	un	126,00	874.018,00	110.126.268,00	126,00	110.126.268,00		-		-		-	126,00	110.126.268,00		100,00%
13.2.4	Suministro e instalación de Cámara IP tipo bala, de resolución mínima 1920X1080P 30FPS, lente varifocal 2.8-12mm o superior, sensor 1/2.8", sistema de compresión H.265 o superior, función día/noche con rango IR de mínimo 50m. Grado de protección IP67, alimentación por PoE. Incluye soporte, caja de conexión adaptador u otro elemento que sea necesario para su correcta instalación.	un	65,00	1.100.542,00	71.535.230,00	65,00	71.535.230,00		-		-		-	65,00	71.535.230,00		100,00%
13.2.5	Suministro e instalación de Cámara IP PTZ de mínimo 30X ópticos, de resolución mínima 1920X1080P 30FPS, sistema de compresión H.265 o superior, funci-on día/noche con rango IR o laser de de m-inimo 150m .Grado de protección IP67, incluye soporte, caja de conexión adaptador u otro elemento que sea necesario para su correcta instalación.	un	3,00	3.164.923,00	9.494.769,00	3,00	9.494.769,00		-		-		-	3,00	9.494.769,00		100,00%
13.2.6	Suministro e instalación de Cámara IP Fish Eye de 360 grados, de resolución mínima 1920X1080P 30FPS, sistema de compresión H.265 o superior, función día/noche con rango IR de mínimo 10m .Grado de protección IP66, IK10 incluye soporte, caja de conexión adaptador u otro elemento que sea necesario para su correcta instalación.	un	2,00	1.238.233,00	2.476.466,00	2,00	2.476.466,00		-		-		-	2,00	2.476.466,00		100,00%
13.2.7	Suministro e instalación de Cámara IP tipo domo, de resolución mínima 1920X1080P 30FPS, lente tipo especial para ascensores, sistema de compresión H.265 o superior, función día/noche con rango IR de mínimo 15m. Grado de protección IP67 IK10, alimentación por PoE. Incluye soporte, caja de conexión adaptador u otro elemento que sea necesario para su correcta instalación	un	6,00	918.434,00	5.510.604,00	6,00	5.510.604,00		-		-		-	6,00	5.510.604,00		100,00%
13.2.8	Suministro e instalación de teclado o joystick, basado en redes IP, soporte multiples permisos de usuario, interoperabilidad con NVR y cámaras	un	1,00	1.267.548,00	1.267.548,00	1,00	1.267.548,00		-		-		-	1,00	1.267.548,00		100,00%
13.2.9	Suministro e instalación de decodificador de video con mínimo 12 interfaces HDMI e salida, 2 interfaces HDMI de entrada y 2 interfaces DVI de entrada, capacidad de decodificación de mínimo 12MPX, capaz de decodificar H.265 o superior, H.264 y MPEG incluye todos los elementos necesarios para su correctaimstalación.	un	1,00	17.001.653,00	17.001.653,00	1,00	17.001.653,00		-		-		-	1,00	17.001.653,00		100,00%
13.2.10	Suministro e instalación de unidad de visualización de empalme para videowall, de 55" o superior, tecnología LCD o LED, resolución 1920X1080 o superior, para interior, soporte trabajo 24/7, mínimo una interfaz de conexión HDMI, 1 VGA y 1 DVI. Incluye soporte de pared y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	8,00	10.594.160,00	84.753.280,00	8,00	84.753.280,00		-		-		-	8,00	84.753.280,00		100,00%

175

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS . .05

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SDN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115405-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.617.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE 2/03/2021 — HASTA 30/04/2022

FECHA PRESENTE ACTA

5/05/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				VIGENCIA	
AMPAROS	Nº POLIZA		VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.845.300.685,00	12/07/2021 A	11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.940.683.448,00	12/07/2021 A	11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.845.300.685,00	12/07/2021 A	11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	18.858.120.274,00	11/05/2023 A	11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.940.683.448,00	12/07/2021 A	11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 05 de Mayo de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y JORGE OLIVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 005		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
13,2,11	Suministro e instalación de estación de trabajo para control de monitoreo, capaz de correr el software según los requerimientos mínimos del software cliente instalado. Se debe entregar instalado, funcional e interconectado con el sistema de vigilancia. Incluye licencia de windows 10 pro	un	3,00	4.740.960,00	14.222.880,00	3,00	14.222.880,00		-		-		-	3,00	14.222.880,00		100,00%
13,2,12	Suministro, transporte e instalación de cable UTP Categoría 6A de cuatro pares, cumple normas EIA/TIA568. Incluye plug RJ-45, certificación y resultados en medio impreso y magnético. Marcación y ficho de identificación según norma EIA/TIA606 y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	14.350,00	4.865,00	69.812.750,00	14.350,00	69.812.750,00		-		-		-	14.350,00	69.812.750,00		100,00%
13,2,13	Suministro e instalación de tubería EMT 3/4", incluye uniones, codos, terminales, cajas 2400 con tapa, chazos, abrazaderas dobles, tornillos y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje. (Reflejado en la canalización de la red de datos)	ml	100,00	22.733,00	2.273.300,00	100,00	2.273.300,00		-		-		-	100,00	2.273.300,00		100,00%
13,30	SISTEMA DE INSTRUSIÓN		-		-	-	-		-		-		-	-	-		
13,3,1	Suministro e instalación de panel central de intrusión 8-248 zonas, 8 particiones, incluye gabinete con llave, 1 Transformador Plug-in rated 16.5VAC, 40 VA y Backup Battery.	un	1,00	3.169.529,00	3.169.529,00	1,00	3.169.529,00		-		-		-	1,00	3.169.529,00		100,00%
13,3,2	Suministro e instalación de Teclado de control LCD.	un	4,00	1.136.917,00	4.547.668,00	4,00	4.547.668,00		-		-		-	4,00	4.547.663,00		100,00%
13,3,3	Suministro e instalación de magnético Inviseno N.A para circuitos N.C gap 25mm. Para aplicaciones en puertas comerciales o acero detección superior.	un	135,00	172.730,00	23.318.550,00	135,00	23.318.550,00		-		-		-	135,00	23.318.550,00		100,00%
13,3,4	Suministro, transporte e instalación de cable UTP Categoría 6A de cuatro pares, cumple normas EIA/TIA568. Incluye plug RJ-45, certificación y resultados en medio impreso y magnético. Marcación y ficho de identificación según norma EIA/TIA606 y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	250,00	4.865,00	1.216.250,00	250,00	1.216.250,00		-		-		-	250,00	1.216.250,00		100,00%
13,3,5	Suministro e instalación de Cable 2x18AWG apantallado.	ml	3.460,00	3.712,00	12.843.520,00	3.460,00	12.843.520,00		-		-		-	3.460,00	12.843.520,00		100,00%
13,3,6	Suministro e instalación de tubería EMT 3/4", incluye uniones, codos, terminales, cajas 2400 con tapa, chazos, abrazaderas dobles, tornillos y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje (El recio se encuentra reflejado en la canalización de incendios y de datos)	ml	95,00	22.733,00	2.159.635,00	95,00	2.159.635,00		-		-		-	95,00	2.159.635,00		100,00%
13,40	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO		-		-	-	-		-		-		-	-	-		
13,4,1	Suministro e instalación de panel control de acceso Ethernet para mínimo 4 puertas. puerto comunicación 10/100 Base-T, puerto comunicación RS-23 y/o, RS485, mínimo 12 entradas, selección de piso aplicación elevador, mínimo 4 salidas y 4 entradas para lectora, incluye gabinete, baterías, fuente de poder y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	14,00	7.340.239,00	102.763.346,00	14,00	102.763.346,00		-		-		-	14,00	102.763.346,00		100,00%
13,4,2	Suministro e instalación de electroimán 600 lb con antiremanente o armadura electrónica, incluye soporte ZL, Soporte U Y/O todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	70,00	465.386,00	32.577.020,00	70,00	32.577.020,00		-		-		-	70,00	32.577.020,00		100,00%
13,4,3	Suministro e instalación de brazo hidráulico, visagra hidraulica o cualquier otro componente que garantice el cierre automatico de la puerta. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación	un	70,00	268.892,00	18.808.440,00	70,00	18.808.440,00		-		-		-	70,00	18.808.440,00		100,00%
13,4,4	Suministro e instalación de lectora de proximidad RFID 125KHz, y/o MIFARE 13.56MHz y/o HID iClass 13.56/6MZ, adicionalmente cuenta con lector de huella dactilar, grado de protección IP65	un	92,00	820.052,00	75.444.784,00	92,00	75.444.784,00		-		-		-	92,00	75.444.784,00		100,00%
13,4,5	Suministro Instalación Consola Dispensadora de tarjetas Uso Interior, Mueble en Coil Roll, incluye: pantalla a color, chip de voz, computador embebido. Incluye obra, configuración y puesta en marcha del equipo	Un	1,00	10.047.636,00	10.047.636,00	1,00	10.047.636,00		-		-		-	1,00	10.047.636,00		100,00%
13,4,6	Suministro e instalación Consola recolectora de tarjetas Uso Interior, Mueble en Coil Roll, incluye: pantalla a color, chip de voz, computador embebido. Incluye obra, configuración y puesta en marcha del equipo	Un	1,00	10.047.636,00	10.047.636,00	1,00	10.047.636,00		-		-		-	1,00	10.047.636,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS . 05

CONTRATO N°	2021043002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.617.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493670-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
2/03/2021	30/04/2022

FECHA PRESENTE ACTA

5/05/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				VIGENCIA	
AMPAROS	Nº POLIZA		VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	18.858.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 05 de Mayo de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARDOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y JORGE OLIVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021043002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 005		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
13,4,7	Suministro transporte e instalación tabanquera vehicular derecha/izquierda de 5m, de alto tráfico, con apertura rápida en menos de 5 segundos, barrera con; mástil, bandas reflectantes, cordón luminoso, luz intermitente, fotocelda, soporte para fotocelda, columna para fotocelda, apoyo fijo para tabanquera, bobina para detección de campo vehicular, obra civil y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	2,00	5 257.896,00	10.515.792,00	2,00	10 515 792,00		-		-		-	2,00	10 515 792,00		100,00%
13,4,8	Suministro e instalación de punto de pago automático, debe soportar billetes y monedas colombianas, permitir configuración de tarifas diferenciales por día e horario, ingreso sin cobro a clientes tarjetas o placas. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion.	un	3,00	29 337.060,00	88 011.180,00	3,00	88 011.180,00		-		-		-	3,00	88.011.180,00		100,00%
13,4,9	Suministro e instalación de punto de pago manual, debe soportar billetes y monedas colombianas, permitir configuración de tarifas diferenciales por día e horario, ingreso sin cobro a clientes tarjetas o placas. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	un	4,00	11.261.550,00	45.046.200,00	4,00	45 046 200,00		-		-		-	4,00	45.046.200,00		100,00%
13,4,10	Suministro e instalación de cable UTP Categoria 6A de cuatro pares, cumple normas EIA/TIA568 incluye plug RJ-45, certificación y resultados en medio impreso y magnético, marcación y ficho de identificación según norma EIA/TIA606 y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	2.780,00	4 865,00	13.527.400,00	2.780,00	13 427.400,00		-		-		-	2.780,00	13 427.400,00		100,00%
13,4,11	Suministro e instalación de Cable 2x16AWG apantallado	ml	2.100,00	3.713,00	7.797.300,00	2.100,00	7,797.300,00		-		-		-	2.100,00	7.797.300,00		100,00%
13,4,12	Suministro e instalación de tuberia EMT 3/4", incluye uniones, codos, terminales, cajas 2400 con tapa, chazos, abrazaderas dobles, tornillos y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje	ml	1.391,00	22.733,00	31.621.603,00	1.391,00	31 621.603,00		-		-		-	1.391,00	31.621.603,00		100,00%
13,50	SISTEMA RED DE DATOS		-		-	-	-		-		-		-	-	-		
13,5,1	Suministro e instalación de Rack cerrado de 42 unidades, en lámina cold rolled calibre 16. Incluye, bandeja portacable de 15x3 cm con peldaños, multitoma de 6 salidas 1800 vatios como mínimo, pernos expansivos de fijación, y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	un	9,00	4.398.582,00	39 587.238,00	9,00	39.587.238,00		-		-		-	9,00	39.587.238,00		100,00%
13,5,2	Suministro e instalación de bandeja portacables para rack. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	9,00	77.454,00	697.086,00	9,00	697.086,00		-		-		-	9,00	697.086,00		100,00%
13,5,3	Suministro e instalación de organizador horizontal de cables 40x40 para instalar en Rack. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	40,00	143.028,00	5 721.120,00	40,00	5 721.120,00		-		-		-	40,00	5 721.120,00		100,00%
13,5,4	Suministro e instalación de Switch Core de mínimo 24 puertos SFP 100/1000Mbps, 2 puertos 10 Gigabit de Uplink. Incluye los transceptores con conectores LC y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento Incluye la marcación de los puertos en el switch según TIA606	un	2,00	17.992.800,00	35.985.600,00	2,00	35.985.600,00		-		-		-	2,00	35.985.600,00		100,00%
13,5,5	Suministro e instalación de switch Ethernet, 10/100/1000 Mbps de 24 puertos, capa 3, con 2 puertos a 1000 Mbps + 2 slot SFP a 10000 Mbps para fibra Incluye la marcación de los puertos en el switch según TIA606. Incluye los transceptores con conectores LC	un	5,00	4.345.689,00	21.728.445,00	5,00	21.728.445,00		-		-		-	5,00	21.728.445,00		100,00%
13,5,6	Suministro e instalación de Cable de Fibra Óptica de 6 hilos, Interior, Tight Buffer, No Conductiva (Dieléctrica), Plenum, Multimodo OM3 50/125 optimizada, debe cumplir con estándares ISO/IEC 11801:2002 OM3, ANSI/TIA/EIA-568-C.3, ANSI/TIA-598-C, ANSI/TIA-492 AAAC, Telcordia GR-409-CORE. Incluye módulos, elementos asociados,conectores, marcación con placa en acrílico o lámina según norma TIA606, ducto pvc, curvas, adaptadores terminal, pega pvc, obra civil y demás elementos necesarios para su correcta instalación	ml	980,00	84.786,00	83 070 680,00	980,00	83.070.680,00		-		-		-	980,00	83 070 680,00		100,00%
13,5,7	Suministro e instalación Panel de Conexión de Fibra para Rack de 19in, Bandeja Fija, Acepta mínimo 72 Fibras, 1 UR. Incluye de Placa acopladora de Fibra Óptica Quick-Pack, Con 6 Conectores LC Duplex (12 Fibras), Para Fibra Multimodo, Placa adaptadora ciega, elementos asociados,conectores, marcación con placa en acrílico o lámina según norma TIA606, y demás elementos necesarios para su correcta instalación	un	9,00	2.159.136,00	19 432.224,00	9,00	19.432.224,00		-		-		-	9,00	19.432.224,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS N.. 005

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 136.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND	4817	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4817	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/05/2026
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 18.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
2/03/2021	30/04/2022

FECHA PRESENTE ACTA

5/05/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 05 de Mayo de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firme Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y JORGE OLIVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 005		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
13,5,8	Suministro e instalación de salida doble de voz y datos RJ 45 cat 6A, aplicable a normas TIA 568, cumple standares industriales y están en el listado UL y además sean marca reconocida en el mercado. Incluye el toma de voz y datos, caja 4x4 con tapa suplemento, faceplates, módulos, elementos asociados, marcación con placa en acrílico o térmica segun norma TIA606, ducto pvc, curves, adaptadores terminal, pega pvc, obra civil y demás elementos necesarios para su correcta instalación.(Salida promedio 3 metros)	un	80,00	257.040,00	20.563.200,00	80,00	20.563.200,00		-		-		-	80,00	20.563.200,00		100,00%
13,5,9	Suministro e instalación de salida sencilla de datos RJ 45 Categoria 6A, aplicable a normas TIA 568, cumple estandares industriales y están en el listado UL y además sean marca reconocida en el mercado. Incluye: toma de voz o datos, caja metálica 12x5cm con tapa troquel, faceplate, módulo, elementos asociados, marcación con placa en acrílico o térmica segun norma TIA 606, ducto EMT, curves, uniones, adaptadores, grapas y demás elementos necesarios para su correcta instalación.(Salida promedio 3 metros). No incluye cable	un	284,00	226.195,00	64.239.380,00	284,00	64.239.380,00		-		-		-	284,00	64.239.380,00		100,00%
13,5,10	Suministro, transporte e instalación de Patch panel preensamblado en fábrica con capacidad para 24 puertos UTP, RJ-45, categoría 6A, incluye elementos de fijación y marcación de los puertos de los puertos según norma TIA 606. Incluye patch cord cable flexible 4 pares con conectores RJ-45 en ambos extremos, cat 6A del tamaño indicado para interconectarlo correctamente; preensamblado en fábrica. Incluye marcación en ambos extremos y color según la norma TIA 606	un	27,00	1.119.638,00	30.203.226,00	27,00	30.203.226,00		-		-		-	27,00	30.203.226,00		100,00%
13,5,11	Suministro e instalación de patch cord cable flexible 4 pares con conectores RJ-45 en ambos extremos, cat 6A de 90 cm; preensamblado en fábrica. Incluye marcación en ambos extremos y color según la norma TIA 606	ml	468,00	82.701,00	38.704.068,00	468,00	38.704.068,00		-		-		-	468,00	38.704.068,00		100,00%
13,5,12	Suministro e instalación de Jumper de Fibra Óptica Multimodo 50/125 OM3 XGLO, LC-LC Duplex, del tamaño adecuado para conexión de switches en cuartos de comunicaciones. Incluye marcación en ambos extremos y color según la norma TIA 606	un	23,00	97.332,00	2.238.636,00	23,00	2.238.636,00		-		-		-	23,00	2.238.636,00		100,00%
13,5,13	Suministro e instalación de switch Ethernet, 10/100/1000 Mbps de 24 puertos, con 2 puertos a 1000 Mbps + 2 slot SFP a 10000 Mbps para fibra. Incluye la marcación de los puertos en el switch según TIA606. Incluye los transceptores con conectores LC	un	12,00	3.431.769,00	41.181.228,00	12,00	41.181.228,00		-		-		-	12,00	41.181.228,00		100,00%
13,5,14	Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A de cuatro pares, cumple normas EIA/TIA568. Incluye plug RJ-45, certificación y resultados en medio impreso y magnético, marcación y ficho de identificación según norma EIA/TIA606 y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	12.880,00	4.865,00	62.661.200,00	12.880,00	62.661.200,00		-		-		-	12.880,00	62.661.200,00		100,00%
13,5,15	Suministro e instalación de tuberia EMT 3/4", incluye uniones, codos, terminales, cajas 2400 con tapa, chazos, abrazaderas dobles, tornillos y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje	ml	1.782,00	22.733,00	40.510.206,00	1.782,00	40.510.206,00		-		-		-	1.782,00	40.510.206,00		100,00%
13,5,16	Suministro e instalación piso falso antiestático, de gran resistencia y tratado contra el fuego, incluye pedestal de aluminio con una altura entre 20 y 60 cms y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	m2	72,00	746.655,00	53.773.560,00	72,00	53.773.560,00		-		-		-	72,00	53.773.560,00		100,00%
13,5,17	Suministro e instalación de Rack cerrado de 12 unidades, en lámina cold rolled calibre 18, incluye, bandeja portacable de 15x3 cm con peldaños, multitoma de 6 salidas 1800 vatios como mínimo, pernos expansivos de fijación, y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	Un	2,00	897.500,00	1.795.000,00	2,00	1.795.000,00		-		-		-	2,00	1.795.000,00		100,00%
13,5,18	Suministro e instalación de tuberia EMT 1 1/2", incluye uniones, codos, terminales, cajas 2400 con tapa, chazos, abrazaderas dobles, tornillos y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje	ml	235,00	58.900,00	13.841.500,00	235,00	13.841.500,00		-		-		-	235,00	13.841.500,00		100,00%
13,5,19	Suministro e instalación de bandeja portacables tipo escalera, de 300mm X 60mm, incluye curvas de 90 grados, uniones en T, uniones lineales, soportes, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	1.630,00	207.220,00	337.768.600,00	1.630,00	337.768.600,00		-		-		-	1.630,00	337.768.600,00		100,00%
13,6	SISTEMA DE RED INALAMBRICA WIFI		-	-	-	-	-		-		-		-	-	-		

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS . 05

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	800115405-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.868.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4617	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4617	$ 8.940.893.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4617	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/05/2026
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4617	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901439370-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000634	$ 8.940.893.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
2/03/2021	30/04/2022

FECHA PRESENTE ACTA

5/05/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 05 de Mayo de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y JORGE OLIVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

	CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 005		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
13,6,1	Suministro e instalación punto de acceso WiFi empresarial, para interior y/o exterior, compatible con el estandar 802.11AC wave 2 de doble banda, alcance mínimo de 120m o superior, cuenta con mínimo 2 puertos Ethernet 10/100/1000 Mbps, cuenta con la capacidad de radiar en las frecuencias de 2.5GHz y 5GHz, la alimentación debe ser PoE, compatible con 802.3at Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	57,00	1.544.707,00	88.048.299,00	57,00	88.048.299,00		-		-		-	57,00	88.048.299,00		100,00%
13,6,2	Suministro e instalación de switch Ethernet, 10/100/1000 Mbps de 24 puertos PoE 802.3af - 802.3at, 802.3bt PoE++, con 2 puertos a 1000 Mbps + 2 slot SFP a 10000 Mbps, para fibra. Incluye la marcación de los puertos en el switch según TIA606. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Incluye los transceptores con conectores LC	un	5,00	4.320.099,00	21.600.495,00	5,00	21.600.495,00		-		-		-	5,00	21.600.495,00		100,00%
13,6,3	Suministro e instalación de controladora Wi-Fi y gateway de seguridad con mínimo 2 puertos SFP a 10Gbps, mínimo 8 puertos LAN 10/100/1000. Incluye la marcación de los puertos en el switch según TIA606. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	1,00	2.854.172,00	2.854.172,00	1,00	2.854.172,00		-		-		-	1,00	2.854.172,00		100,00%
13,6,4	Suministro e instalación de cable UTP categoria 6A de cuatro pares, cumple normas EIA/TIA568. Incluye plug RJ-45, certificación y resultados en medio impreso y magnético, marcación y ficho de identificación según norma EIA/TIA606 y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	3.990,00	4.865,00	19.411.350,00	3.990,00	19.411.350,00		-		-		-	3.990,00	19.411.350,00		100,00%
13,6,5	Suministro e instalación de tuberia EMT 3/4", incluye uniones, codos, terminales, cajas 2400 con tapa, chazos, abrazaderas dobles, formillos y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje. (Refrigado en canalización de red de datos)	ml	100,00	22.733,00	2.273.300,00	100,00	2.273.300,00		-		-		-	100,00	2.273.300,00		100,00%
13,70	SISTEMA SONIDO AMBIENTAL Y AUDIO EVACUACUACION		-		-	-	-		-		-		-	-	-		
13,7,1	Suministro e instalación de controlador de audio de mínimo 8 entradas y 4 salidas, certificado EN para audioevacuacion, supervición interna y monitoreo de señales, debe permitir grabar almenos 50 minutos de mensajes internos y permitir dar prioridad a señales de emergencia con respecto al resto de entradas de audio y tener interconexión con estaciones de llamado para voceo. Incluye fuente de alimentación, marcación, ficho de identificación y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje	un	1,00	9.866.431,00	9.866.431,00	1,00	9.866.431,00		-		-		-	1,00	9.866.431,00		100,00%
13,7,2	Suministro e instalación matriz de audio DSP mínimo 8 zonas, certificado EN safety, debe permitir manipulación desde PC, dispositivo movil, tablets y/o teclado de control. Incluye marcación, ficho de identificación y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	un	1,00	6.720.053,00	6.720.053,00	1,00	6.720.053,00		-		-		-	1,00	6.720.053,00		100,00%
13,7,3	Suministro e instalación de amplificador DSP de mínimo 4 canales de 220W, salidas de 100V/70V/8ohms y 4ohms Debe ser compatible con la matriz Incluye marcación, ficho de identificación y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	un	5,00	8.738.537,00	43.692.685,00	5,00	43.692.685,00		-		-		-	5,00	43.692.685,00		100,00%
13,7,4	Suministro e instalación estación de llamado compatible con la matriz de 7.02, debe permitir programación de grabación de zonas. Incluye marcación, ficho de identificación y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	un	4,00	2.688.021,00	10.752.084,00	4,00	10.752.084,00		-		-		-	4,00	10.752.084,00		100,00%
13,7,5	Suministro e instalación teclado de gestion de volumen y fuente de audio compatible con la matriz de 7.02, debe permitir programación de grabación de zonas. Incluye marcación, ficho de identificación y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje	un	4,00	1.253.664,00	5.014.656,00	4,00	5.014.656,00		-		-		-	4,00	5.014.656,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS N° 005

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A	OBJETO:			
NIT:	890115405-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.568.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493670-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
2/03/2021	30/04/2022

FECHA PRESENTE ACTA

5/05/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				VIGENCIA	
AMPAROS	Nº POLIZA		VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	18.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 05 de Mayo de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y JORGE OLIVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

	CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 005		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
13,7,6	Suministro e instalación amplificador profesional DSP para sonido en vivo,de mínimo dos salidas de 1800w, debe permitir procesamiento profesional de altavoces con tecnología FIR drive, y supervición y control a traves de display LC ubicado en la aperte delantera. Incluye marcación, ficho de identificación y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje	un	3,00	7.726.828,00	23.180.484,00	3,00	23.180.484,00		-		-		-	3,00	23.180.484,00		100,00%
13,7,7	Suministro e instalación modulo de arreglo lineal para aplicaciones de sonido, debe contener mínimo dos arreglos en cada modulo, dos woofers de 8" de baja distorsión, cuatro dodrigmes de titanio con driver HF de 1.25", sensibilidad e mínimo 104 decibeles, manejo de energia de mínimo 350w continuos, 1400w pico . Incluye marcación, ficho de identificación y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	un	6,00	16.912.820,00	135.302.580,00	8,00	135.302.560,00		-		-		-	8,00	135.302.560,00		100,00%
13,7,8	Suministro e instalación modulo de subwoofer de arreglo lineal para aplicaciones de sonido, debe contener mínimo dos subwoofers de 15" para baja distrución y alto SPL con una sensibilidad de 100db, manejo de energia de 1000w continuos y 4000w pico y un SPL máximo de 130 dB. Incluye marcación, ficho de identificación y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	un	4,00	18.472.333,00	73.889.332,00	4,00	73.889.332,00		-		-		-	4,00	73.889.332,00		100,00%
13,7,9	Suministro e instalación de altavoz modulet de 24 Vatios para ontaje en techo, para reproducción de música ambiental y voz. certificado UL 2043, UL 1426 y EN54-24 para audio evacuación, debe contener transformador de derivación de alimentación de 70/100V con funcionamiento a mínima potencia, a potencia media, a un cuarto de potincia o a un octavo de potencia. Incluye soporte para montaje en escenarios, marcación y ficho de identificación y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	un	109,00	604.558,00	65.896.822,00	109,00	65.896.822,00		-		-		-	109,00	65.896.822,00		100,00%
13,7,10	Suministro e instalación de cable de cobre 2X16AWG especialmente diseñado para sonido, de alta pureza y sin orígeno para un amplio rango de frecuencia. baja pérdida de señal y mayor ántasta en el extremo bajo para una reproducción de audio fuerte, clara y audaz. Incluye conectores, marcación, ficho de identificación y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	3.270,00	7.745,00	25.326.150,00	3.270,00	25.326.150,00		-		-		-	3.270,00	25.326.150,00		100,00%
13,7,11	Suministro e instalación de cable de cobre 2X10AWG especialmente diseñado para sonido, de alta pureza y sin orígeno para un amplio rango de frecuencia. baja pérdida de señal y mayor ántasta en el extremo bajo para una reproducción de audio fuerte, clara y audaz. Incluye conectores, marcación, ficho de identificación y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	360,00	10.224,00	3.680.640,00	360,00	3.680.640,00		-		-		-	360,00	3.680.640,00		100,00%
13,7,12	Suministro e instalación de Tuberia EMT 3/4", incluye uniones, codos, terminales, cajas 2400 con tapa, chazos, abrazaderas dobles, tornillos y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	un	495,00	22.733,00	11.252.835,00	495,00	11.252.835,00		-		-		-	495,00	11.252.835,00		100,00%
14,00	SISTEMA HVAC - HEATING - VENTILATION - AIR CONDITIONING				$ 2.052.962.119,00	$ -	$ 2.052.962.119,00		$ -				$ -		$ 2.052.962.119,00		100,00%
14,10	EQUIPOS		-		-	-	-		-		-		-	-	-		
14,1,1	UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 520.000 BTU, 220 V, 3 PH, R-410A	Und	1,00	48.585.856,00	48.585.856,00	1,00	48.585.856,00		-		-		-	1,00	48.585.856,00		100,00%
14,1,2	UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 440.000 BTU, 220 V, 3 PH, R-410A	Und	1,00	43.930.354,00	43.930.354,00	1,00	43.930.354,00		-		-		-	1,00	43.930.354,00		100,00%
14,1,3	UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 540.000 BTU, 220 V, 3 PH, R-410A	Und	1,00	56.147.075,00	56.147.075,00	1,00	56.147.075,00		-		-		-	1,00	56.147.075,00		100,00%
14,1,4	UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 320.000 BTU, 220 V, 3 PH, R-410A	Und	1,00	34.656.288,00	34.656.288,00	1,00	34.656.288,00		-		-		-	1,00	34.656.288,00		100,00%
14,1,5	UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 140.000 BTU, 220 V, 3 PH, R-410A	Und	1,00	18.405.677,00	18.405.677,00	1,00	18.405.677,00		-		-		-	1,00	18.405.677,00		100,00%
14,1,6	UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE CIRCULAR DE 12.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	2,00	2.095.407,00	4.190.814,00	2,00	4.190.814,00		-		-		-	2,00	4.190.814,00		100,00%
14,1,7	UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE CIRCULAR DE 18.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	1,00	2.189.577,00	2.189.577,00	1,00	2.189.577,00		-		-		-	1,00	2.189.577,00		100,00%
14,1,8	UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE CIRCULAR DE 24.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	2,00	2.167.062,00	4.334.124,00	2,00	4.334.124,00		-		-		-	2,00	4.334.124,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS N. 005

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SEN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115408-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 136.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050037				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
2/03/2021	30/04/2022

FECHA PRESENTE ACTA

5/05/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	N° POLIZA		VR. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.985,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	8.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4817	$	41.645.300.985,00	12/07/2021	A 11/05/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	18.858.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	8.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 05 de Mayo de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y JORGE OLIVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de formar la presente acta parcial No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

	CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 005		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
14,1,9	UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE CIRCULAR DE 30 000 BTU, 220 V,2 PH	Und	1,00	2.317.049,00	2.317.049,00	1,00	2.317.049,00		-				-	1,00	2.317.049,00		100,00%
14,1,10	UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE CIRCULAR DE 36 000 BTU, 220 V,2 PH	Und	5,00	2 440 250,00	12 201 250,00	5,00	12.201.250,00		-				-	5,00	12.201.250,00		100,00%
14,1,11	UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE CIRCULAR DE 48 000 BTU, 220 V,2 PH	Und	19,00	2.664.151,00	50 618.869,00	19,00	50 618.869,00		-				-	19,00	50 618.869,00		100,00%
14,1,12	UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE 1 VIA DE 7 000 BTU, 220 V,2 PH	Und	1,00	1 208.708,00	1 208.708,00	1,00	1.208.708,00		-				-	1,00	1.208.708,00		100,00%
14,1,13	UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE 1 VIA DE 9 000 BTU, 220 V,2 PH	Und	5,00	1.252.005,00	6 260.025,00	5,00	6.260.025,00		-				-	5,00	6.260.025,00		100,00%
14,1,14	UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE 1 VIA DE 12 000 BTU, 220 V,2 PH	Und	1,00	1.330.472,00	1 330 472,00	1,00	1.330.472,00		-				-	1,00	1.330.472,00		100,00%
14,1,15	UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE 1 VIA DE 18 000 BTU, 220 V,2 PH	Und	1,00	1.720.765,00	1.720.765,00	1,00	1.720.765,00		-				-	1,00	1.720.765,00		100,00%
14,1,16	UNIDAD EVAPORADORA TIPO PARED DE 12.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	8,00	926.070,00	7 424.560,00	8,00	7 424.560,00		-				-	8,00	7 424.560,00		100,00%
14,1,17	UNIDAD EVAPORADORA TIPO PARED DE 18.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	2,00	1.098.680,00	2.197.360,00	2,00	2.197.360,00		-				-	2,00	2.197.360,00		100,00%
14,1,18	UNIDAD FANCOIL OCULTA DEDICADA DE AIRE EXTERIOR DE 48 000 BTU, 220 V,2 PH	Und	8,00	3 719 540,00	29.756 320,00	8,00	29 756.320,00		-				-	8,00	29.756.320,00		100,00%
14,1,19	CONTROL CENTRALIZADO PANTALLA TÁCTIL / 128 UNIDADES INTERIORES / 10 HORARIOS DE PROGRAMACIÓN	Und	1,00	2.078.892,00	2.078.892,00	1,00	2.078.892,00		-				-	1,00	2.078.892,00		100,00%
14,1,20	CONTROL REMOTO ALAMBRADO TÁCTIL / SENSOR DETEMPERATURA INTEGRADO Y RECEPTOR DE SEÑAL INALAMBRICA	Und	8,00	264.631,00	2.117.048,00	8,00	2.117.048,00		-				-	8,00	2.117.048,00		100,00%
14,1,21	CONTROL REMOTO INALAMBRICO PARA CASSETTE CIRCULAR	Und	5,00	102.595,00	512.975,00	5,00	512.975,00		-				-	5,00	512.975,00		100,00%
14,1,22	CONTROL REMOTO INALAMBRICO PARA CASSETTE 1 VIA	Und	8,00	76 704,00	613 632,00	8,00	613.632,00		-				-	8,00	613 632,00		100,00%
14,1,23	ENFRIADOR DE AGUA CONDENSADO POR AIRE DE 40 TR, 208/230 V, 3 PH, COMPRESORES INVERTER	Und	1,00	81.070 000,00	81.070 000,00	1,00	81 070.000,00		-				-	1,00	81.070.000,00		100,00%
14,1,24	ENFRIADOR DE AGUA CONDENSADO POR AIRE DE 80 TR, 208/230 V, 3 PH, COMPRESORES INVERTER	Und	1,00	114 950 000,00	114.950 000,00	1,00	114 950 000,00		-				-	1,00	114 950 000,00		100,00%
14,1,25	BOMBA DE AGUA FRIA DE 223 GPM, CABEZA 90 FT	Und	2,00	11.495 000,00	22 990 000,00	2,00	22 990 000,00		-				-	2,00	22 990 000,00		100,00%
14,1,26	UNIDAD MANEJADORA AGUA HELADA DE 6 800 CFM, 202 400 BTU, 208/230 V, 3 PH	Und	3,00	30 250 000,00	90.750.000,00	3,00	90 750 000,00		-				-	3,00	90.750 000,00		100,00%
14,1,27	UNIDAD MANEJADORA (DEDICADA DE AIRE EXTERIOR) AGUA HELADA DE 8.400 CFM, 575 323 BTU, 208/230 V, 3 PH	Und	1,00	173 030 000,00	173 030 000,00	1,00	173 030 000,00		-				-	1,00	173 030 000,00		100,00%
14,1,28	UNIDAD MANEJADORA AGUA HELADA DE 4000 CFM, 109 000 BTU, 208/230 V, 3 PH	Und	1,00	18.150 000,00	18.150 000,00	1,00	18.150 000,00		-				-	1,00	18.150 000,00		100,00%
14,1,29	EXTRACTOR AXIAL TUBULAR DE 14 400 CFM, 208/230 V, 3 PH	Und	3,00	9 202 050,00	27.606.150,00	3,00	27.606.150,00		-				-	3,00	27.606.150,00		100,00%
14,1,30	VENTILADOR JET FAN BAJO PERFIL DE 5 497 CFM, 208/230 V, 3 PH	Und	10,00	9 365 400,00	93.654 000,00	10,00	93 654 000,00		-				-	10,00	93 654 000,00		100,00%
14,1,31	EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO DE 640 CFM, 120 V, 1 PH	Und	1,00	2.123.550,00	2.123.550,00	1,00	2.123.550,00		-				-	1,00	2.123.550,00		100,00%
14,1,32	EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO DE 800 CFM, 120 V, 1 PH	Und	1,00	2.668.050,00	2.668.050,00	1,00	2.668.050,00		-				-	1,00	2.668.050,00		100,00%
14,1,33	EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO DE 580 CFM, 120 V, 1 PH	Und	1,00	1.308 800,00	1.308 800,00	1,00	1.308 800,00		-				-	1,00	1.308 800,00		100,00%
14,1,34	EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO DE 400 CFM, 120 V, 1 PH	Und	1,00	1.308 800,00	1.308 800,00	1,00	1.308 800,00		-				-	1,00	1.308 800,00		100,00%
14,1,35	EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO DE 320 CFM, 120 V, 1 PH	Und	1,00	1.308 800,00	1.308 800,00	1,00	1.308 800,00		-				-	1,00	1.308 800,00		100,00%
14,1,36	EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO DE 720 CFM, 120 V, 1 PH	Und	1,00	2.668.050,00	2.668.050,00	1,00	2.668.050,00		-				-	1,00	2.668.050,00		100,00%
14,1,37	EXTRACTOR DE BAÑO TIPO PLAFON DE 80 CFM, 120 V 1 PH	Und	1,00	108 900,00	108 900,00	1,00	108 900,00		-				-	1,00	108 900,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS ... 005

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LDP - SZN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2439104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-6	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 139 817.858 849,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901433970-2				

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				VIGENCIA	
AMPAROS	Nº POLIZA		VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.845.300.685,00	12/07/2021	A 11/08/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.940.693.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.845.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000534	$	6.940.693.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
2/03/2021	30/04/2022

FECHA PRESENTE ACTA

5/05/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 05 de Mayo de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y JORGE OLIVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 005		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
14,1,38	EXTRACTOR TIPO HONGO DE TEJADO DE 6800 CFM, 208/230 V, 3 PH	Und	2,00	6 043 950,00	12.087.900,00	2,00	12.087.900,00		-		-		-	2,00	12.087.900,00		100,00%
14,1,39	VENTILADOR DE SUMINISTRO TIPO PENTHOUSE DE 6 400 CFM, 208/230 V, 3 PH	Und	2,00	6 261 750,00	12.523.500,00	2,00	12.523.500,00		-		-		-	2,00	12.523.500,00		100,00%
14,20	CONDUCTOS			-	-		-							-	-		
14.2.1	DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA TDF, INCLUYE (LAMINA, CLIPS, ESQUINEROS, TORNILLO DE CARRIAJE, SOPORTERIA, MANO DE OBRA FABRICACION E INSTALACION)	Kg	12.856,20	22 738,00	292.324.275,60	12.856,20	292.324.275,60		-		-		-	12.856,20	292.324.275,60		100,00%
14.2.2	AISLAMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO DUCT WRAP, INCLUYE (AISLAMIENTO, CINTA FOIL, PEGANTE, SOPORTERIA, MANO DE OBRA FABRICACION E INSTALACION)	mt	898,43	52.364,00	47.063.357,12	898,43	47.063.357,12		-		-		-	898,43	47.063.357,12		100,00%
14.2.3	DUCTO EN FIBRA DEVIDRIO DUCTO GLASS NETO, INCLUYE (LAMINA DE FIBRA, PEGANTE, MANO DE OBRA DE INSTALACION)	mt	92,48	121.236,00	11.211.905,28	92,48	11.211.905,28		-		-		-	92,48	11.211.905,28		100,00%
14.2.4	DUCTO FLEXIBLE DE 14" DE DIAMETRO, INCLUYE (DUCTO FLEXIBLE, CINTA FOIL, PEGANTE MANO DE OBRA FABRICACION E INSTALACION)	m	85,00	48.235,00	4.099.975,00	85,00	4.099.975,00		-		-		-	85,00	4.099.975,00		100,00%
14.2.5	ACOPLE FLEXIBLE A EQUIPOS CON LONA	und	44,00	79.672,00	3.505.568,00	44,00	3.505.568,00		-		-		-	44,00	3.505.568,00		100,00%
14,30	TUBERIA DE REFRIGERACION			-	-		-							-	-		
14,3,1	TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4", INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	151,00	36 735,00	5.546.985,00	151,00	5.546.985,00		-		-		-	151,00	5.546.985,00		100,00%
14,3,2	TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 3/8" TIPO L INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	326,00	42 035,00	13.703.410,00	326,00	13.703.410,00		-		-		-	326,00	13.703.410,00		100,00%
14,3,3	TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 1/2" TIPO L INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	289,00	49.085,00	14.156.665,00	289,00	14.156.665,00		-		-		-	289,00	14.156.665,00		100,00%
14,3,4	TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 5/8", INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	367,00	54.885,00	20.059.395,00	367,00	20.059.395,00		-		-		-	367,00	20.059.395,00		100,00%
14,3,5	TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 7/8" TIPO L INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	395,00	68 150,00	26.919.250,00	395,00	26.919.250,00		-		-		-	395,00	26.919.250,00		100,00%
14,3,6	TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 1 1/8" TIPO K, INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	98,00	106.130,00	10.400.740,00	98,00	10.400.740,00		-		-		-	98,00	10.400.740,00		100,00%
14,3,7	TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 1 3/8" TIPO K, INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	85,00	122 445,00	10 407.825,00	85,00	10 407.825,00		-		-		-	85,00	10 407.825,00		100,00%
14,3,8	TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 1 5/8" TIPO K, INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	211,00	146 081,00	30.823.091,00	211,00	30.823.091,00		-		-		-	211,00	30.823.091,00		100,00%
14,3,9	TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 2 1/8" TIPO K, INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	59,00	221.961,00	13.095.699,00	59,00	13.095.699,00		-		-		-	59,00	13.095.699,00		100,00%
14,3,10	TERMOSTATO DIGITAL 1 ETAPA PRO 2000	Und	5,00	234.000,00	1.170.000,00	5,00	1.170.000,00		-		-		-	5,00	1.170.000,00		100,00%
14,3,11	GAS REFRIGERANTE R-410A	Lb	410,00	24 985,00	10.233.800,00	410,00	10.233.800,00		-		-		-	410,00	10.233.800,00		100,00%
14,3,12	GASES DE SOLDADURA INCLUYE (GASES OXIACETILENICOS Y NITROGENO)	unb	1,00	3 840 000,00	3.840.000,00	1,00	3.840.000,00		-		-		-	1,00	3.840.000,00		100,00%
14,40	ACCESORIOS TIPO Y-BRACH Y CONTROLES			-	-		-							-	-		
14.4.1	Y-JOINT UNIDAD EXTERIOR PARA CAPACIDADES MAYORES A 456KBTU	m	2,00	635.954,00	1.271.908,00	2,00	1.271.908,00		-		-		-	2,00	1.271.908,00		100,00%
14.4.2	Y-JOINT UNIDAD EXTERIOR PARA CAPACIDADES MENORES A 456KBTU	m	3,00	510.916,00	1.532.748,00	3,00	1.532.748,00		-		-		-	3,00	1.532.748,00		100,00%
14.4.3	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES MAYORES A 481KBTU	m	3,00	954.552,00	2.863.656,00	3,00	2.863.656,00		-		-		-	3,00	2.863.656,00		100,00%
14.4.4	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 61KBTU - 136KBTU	m	22,00	322.608,00	7.097.376,00	22,00	7.097.376,00		-		-		-	22,00	7.097.376,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS ... 005

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	892115405-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 139 817 058.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 41 645.300 885,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND	4817	$ 6 940.883 448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4817	$ 41.645.300 885,00	12/07/2021 A 11/05/2028
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 16 658.120 274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901463970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000634	$ 6 940.883 448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
2/03/2021	30/04/2022

FECHA PRESENTE ACTA

5/05/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 05 de Mayo de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y JORGE OLIVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES ESPECIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 005		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
14,4,5	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 336KBTU - 461KBTU	m	3,00	655 620,00	1.966 860,00	3,00	1.966.860,00		-				-	3,00	1.966 860,00		100,00%
14,4,6	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES MENORES A 51KBTU	m	6,00	211 492,00	1.691.936,00	6,00	1.691.936,00		-				-	6,00	1.691.936,00		100,00%
14,4,7	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 240KBTU - 336KBTU	m	4,00	588.234,00	2 352 936,00	4,00	2.352.936,00		-				-	4,00	2.352.936,00		100,00%
14,4,8	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 154KBTU - 240KBTU	m	6,00	460.826,00	2.764 956,00	6,00	2.764 956,00		-				-	6,00	2.764 956,00		100,00%
14,4,8	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 135KBTU - 154KBTU	m	5,00	393 287,00	1 966 435,00	5,00	1.966 435,00		-				-	5,00	1.966 435,00		100,00%
14,50	TUBERIA DE PVC				-		-								-		
14,5,1	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 1",INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, TEE, ADAPTADOR MACHO Y HEMBRA, UNION UNIVERSAL, SOLDADURA, LIMPIADOR, CAÑUELA PREFORMADA, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	1,00	178 031,00	178 031,00	1,00	178 031,00		-				-	1,00	178 031,00		100,00%
14,5,2	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 2",INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, TEE, ADAPTADOR MACHO Y HEMBRA, UNION UNIVERSAL, SOLDADURA, LIMPIADOR, CAÑUELA PREFORMADA, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	55,00	425 765,00	23 582 240,00	55,00	23 582.240,00		-				-	55,00	23.582 240,00		100,00%
14,5,3	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 2 1/2",INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, TEE, ADAPTADOR MACHO Y HEMBRA, UNION UNIVERSAL, SOLDADURA, LIMPIADOR, CAÑUELA PREFORMADA, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	12,00	494 384,00	5 932 608,00	12,00	5.932.608,00		-				-	12,00	5.932 608,00		100,00%
14,5,4	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 3",INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, TEE, ADAPTADOR MACHO Y HEMBRA, UNION UNIVERSAL, SOLDADURA, LIMPIADOR, CAÑUELA PREFORMADA, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	20,00	583 391,00	11 667.820,00	20,00	11 667.820,00		-				-	20,00	11.667.820,00		100,00%
14,5,5	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 4",INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, TEE, ADAPTADOR MACHO Y HEMBRA, UNION UNIVERSAL, SOLDADURA, LIMPIADOR, CAÑUELA PREFORMADA, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	170,00	550 816,00	93 638 720,00	170,00	93.638.720,00		-				-	170,00	93 638.720,00		100,00%
14,60	VALVULAS DE CORTE				-		-								-		
14,6,1	VALVULA DE CORTE DE 2", INCLUYE (VALVULA, ADAPTADOR MACHO, SOLDADURA, LIMPIADOR Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	Und	12,00	219 886,00	2.638 632,00	12,00	2.638 632,00		-				-	12,00	2.638 632,00		100,00%
14,6,2	VALVULA MARIPOSA DE 3", INCLUYE (VALVULA, ADAPTADOR MACHO, SOLDADURA, LIMPIADOR Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	Und	4,00	576 892,00	2.307.568,00	4,00	2.307.568,00		-				-	4,00	2.307.568,00		100,00%
14,6,3	VALVULA MARIPOSA DE 4", INCLUYE (VALVULA, ADAPTADOR MACHO, SOLDADURA, LIMPIADOR Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	Und	6,00	581.728,00	3 490.368,00	6,00	3.490.368,00		-				-	6,00	3.490 368,00		100,00%
14,70	VALVULAS DE GLOBO				-		-								-		
14,7,1	VALVULA GLOBO DE 2", INCLUYE (VALVULA, ADAPTADOR MACHO, SOLDADURA, LIMPIADOR Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	Und	12,00	416 856,00	5.002.272,00	12,00	5 002.272,00		-				-	12,00	5.002.272,00		100,00%
14,7,2	VALVULA GLOBO DE 3", INCLUYE (VALVULA, ADAPTADOR MACHO, SOLDADURA, LIMPIADOR Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	Und	2,00	1.302 292,00	2.604 584,00	2,00	2.604 584,00		-				-	2,00	2.604.584,00		100,00%
14,80	VALVULAS TRES VIAS				-		-								-		
14,8,1	VALVULA TRES VIAS DE 1 1/2", INCLUYE (VALVULA, ADAMPATADOR MACHO, SOLDADURA, LIMPIADOR Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	Und	8,00	1.847.658,00	11.085 936,00	8,00	11.085.936,00		-				-	8,00	11.085 936,00		100,00%
14,90	ACCESORIOS PARA EQUIPOS AGUA HELADA				-		-								-		
14,9,1	TANQUE DE EXPASION CERRADO	Und	1,00	6 303 648,00	6.303.648,00	1,00	6.303 649,00		-				-	1,00	6 303.648,00		100,00%
14,9,2	CODO DIFUSOR DE SUCCION DE 4"	Und	2,00	2.715 648,00	5.431.296,00	2,00	5.431.295,00		-				-	2,00	5.431.296,00		100,00%
14,9,3	DES - AIREADOR	Und	1,00	5 118 048,00	5.118 048,00	1,00	5.118 048,00		-				-	1,00	5 118.048,00		100,00%
14,9,4	VORTEX	Und	1,00	1.171.248,00	1.171.248,00	1,00	1.171.248,00		-				-	1,00	1.171.248,00		100,00%
14,9,5	CONEXIONES ANTI-VIBRATORIAS	Und	2,00	469.426,00	938.856,00	2,00	938.856,00		-				-	2,00	938 856,00		100,00%
14,9,6	FILTRO EN Y	Und	2,00	2.712 528,00	5 425 056,00	2,00	5 425 056,00		-				-	2,00	5 425 056,00		100,00%
14,9,7	MANOMETRO DE CARATULA	Und	4,00	491 090,00	1.964 360,00	4,00	1.964 360,00		-				-	4,00	1.964 360,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS ... 005

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0022 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2496104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115405-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.669.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493870-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE 2/03/2021 — HASTA 30/04/2022

FECHA PRESENTE ACTA

5/05/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPARO	Nº POLIZA		VR. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/08/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	8.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	8.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 05 de Mayo de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma interventora, ANDRES ALMARALES MELO y JORGE OLIVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

		CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL				CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 005		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
14,9,6	TERMOMETRO DE COLUMNA	Und	4,00	648.973,00	2.595.892,00	4,00	2.595.892,00		-		-		-	4,00	2.595.892,00		100,00%
14,10	TABLEROS ELECTRICOS DE POTENCIA		-		-	-	-		-		-		-	-	-		
14,10,1	TABLERO ELECTRICO TE-01	Und	1,00	6.669.000,00	6.669.000,00	1,00	6.669.000,00		-		-		-	1,00	6.669.000,00		100,00%
14,10,2	TABLERO ELECTRICO TE-02	Und	1,00	6.669.000,00	6.669.000,00	1,00	6.669.000,00		-		-		-	1,00	6.669.000,00		100,00%
14,10,3	TABLERO ELECTRICO TE-03	Und	1,00	9.789.000,00	9.789.000,00	1,00	9.789.000,00		-		-		-	1,00	9.789.000,00		100,00%
14,10,4	VARIADOR DE VELOCIDAD DE 11 5 KW	Und	1,00	7.137.000,00	7.137.000,00	1,00	7.137.000,00		-		-		-	1,00	7.137.000,00		100,00%
14,10,5	VARIADOR DE VELOCIDAD DE 7 5 KW	Und	1,00	3.363.000,00	3.363.000,00	1,00	3.363.000,00		-		-		-	1,00	3.363.000,00		100,00%
14,10,6	VARIADOR DE VELOCIDAD DE 2 KW	Und	1,00	2.925.000,00	2.925.000,00	1,00	2.925.000,00		-		-		-	1,00	2.925.000,00		100,00%
14,11	SISTEMA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL		-		-	-	-		-		-		-	-	-		
14,11,1	AUTOMATIZACION Y CONTROL	Und	1,00	135.408.000,00	135.408.000,00	1,00	135.408.000,00		-		-		-	1,00	135.408.000,00		100,00%
14,12	DIFUSORES		-		-	-	-		-		-		-	-	-		
14,12,1	DIFUSOR DE SUMINITRO 4 VIAS DE 20"X20"	Und	8,00	279.084,00	2.232.672,00	8,00	2.232.672,00		-		-		-	8,00	2.232.672,00		100,00%
14,12,2	DIFUSOR DE SUMINISTRO 3 CONOS Ø14 C.D.	Und	36,00	469.404,00	16.898.544,00	36,00	16.898.544,00		-		-		-	36,00	16.898.544,00		100,00%
14,15	REJILLAS DE SUMINISTRO		-		-	-	-		-		-		-	-	-		
14,15,1	REJILLA DE SUMINISTRO LINEAL DE 60"X6"	Und	8,00	341.848,00	2.734.784,00	8,00	2.734.784,00		-		-		-	8,00	2.734.784,00		100,00%
14,16	REJILLAS DE RETORNO O EXTRACCION		-		-	-	-		-		-		-	-	-		
14,16,1	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 8"X4" C.D.	Und	44,00	52.884,00	2.326.896,00	44,00	2.326.896,00		-		-		-	44,00	2.326.896,00		100,00%
14,16,2	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 54"X8" C.D.	Und	15,00	336.804,00	5.052.060,00	15,00	5.052.060,00		-		-		-	15,00	5.052.060,00		100,00%
14,16,3	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 32"X18" C.D.	Und	18,00	335.244,00	6.034.392,00	18,00	6.034.392,00		-		-		-	18,00	6.034.392,00		100,00%
14,17	REJILLAS TIPO LOUVER		-		-	-	-		-		-		-	-	-		
14,17,1	REJILLA TIPO LOUVER DE 18"X6" C.D.	Und	2,00	124.644,00	249.288,00	2,00	249.288,00		-		-		-	2,00	249.288,00		100,00%
14,17,2	REJILLA TIPO LOUVER DE 24"X6" C.D.	Und	1,00	168.324,00	168.324,00	1,00	168.324,00		-		-		-	1,00	168.324,00		100,00%
14,17,3	REJILLA TIPO LOUVER DE 28"X6" C.D.	Und	1,00	193.284,00	193.284,00	1,00	193.284,00		-		-		-	1,00	193.284,00		100,00%
14,17,4	REJILLA TIPO LOUVER DE 36"X6" C.D.	Und	1,00	235.404,00	235.404,00	1,00	235.404,00		-		-		-	1,00	235.404,00		100,00%
14,17,5	REJILLA TIPO LOUVER DE 50"X14" C.D.	Und	8,00	444.444,00	3.555.552,00	8,00	3.555.552,00		-		-		-	8,00	3.555.552,00		100,00%
14,17,6	REJILLA TIPO LOUVER DE 6"X4" C.D.	Und	1,00	57.564,00	57.564,00	1,00	57.564,00		-		-		-	1,00	57.564,00		100,00%
14,17,7	REJILLA TIPO LOUVER DE 32"X6" C.D.	Und	1,00	212.004,00	212.004,00	1,00	212.004,00		-		-		-	1,00	212.004,00		100,00%
14,18	DAMPERS		-		-	-	-		-		-		-	-	-		
14,18,1	DAMPER MANUAL UNA ALETA DE 20"X18"	Und	4,00	258.196,00	1.032.784,00	4,00	1.032.784,00		-		-		-	4,00	1.032.784,00		100,00%
14,18,2	DAMPER MANUAL UNA ALETA DE 18"X14"	Und	4,00	211.100,00	844.400,00	4,00	844.400,00		-		-		-	4,00	844.400,00		100,00%
14,19	TRANSPORTE DE MATERIALES , UBICACIÓN DE EQUIPOS, INGENIERIA Y ARRANQUE		-		-	-	-		-		-		-	-	-		
14,19,1	BASES Y SOPORTES PARA EQUIPOS	undS	1,00	6.895.200,00	6.895.200,00	1,00	6.895.200,00		-		-		-	1,00	6.895.200,00		100,00%
14,19,2	MANO DE OBRA INSTALACION DE EQUIPOS	undS	1,00	27.572.220,00	27.572.220,00	1,00	27.572.220,00		-		-		-	1,00	27.572.220,00		100,00%
14,19,3	IZAJE Y UBICACIÓN DE EQUIPOS	undS	1,00	8.736.000,00	8.736.000,00	1,00	8.736.000,00		-		-		-	1,00	8.736.000,00		100,00%
14,19,4	ARRANQUE DEL SISTEMA	undS	1,00	27.823.224,00	27.823.224,00	1,00	27.823.224,00		-		-		-	1,00	27.823.224,00		100,00%
14,19,5	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS	undS	1,00	26.379.800,00	26.379.800,00	1,00	26.379.800,00		-		-		-	1,00	26.379.800,00		100,00%
14,19,6	INGENIERIA Y SUPERVISION	undS	1,00	29.484.000,00	29.484.000,00	1,00	29.484.000,00		-		-		-	1,00	29.484.000,00		100,00%
15,00	INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 2.594.231.573,00	$ -	$ 2.594.231.573,00		$ -		$ 2.603.097,90		$ 2.603.097,90		$ 2.591.628.473,10	0,10%	99,90%
15,10	OBRAS CIVILES EN VIA PÚBLICA (CANTIDADES APROXIMADAS, ESTAN AJUSTARÁN CON LA APROBACION DEL PROYECTO POR PARTE DE ELECTROCARIBE (AFINIA))		-		-	-	-		-		-		-	-	-		
15,1,1	Caja de paso en piso duro, para energía Norma Electricaribe Afinia	un	2,00	3.275.380,00	6.550.760,00	2,00	6.550.760,00		-		-		-	2,00	6.550.760,00		100,00%
15,20	ACOMETIDA PRIMARIA CANALIZADA (CANTIDADES APROXIMADAS, ESTAN AJUSTARÁN CON LA APROBACION DEL PROYECTO POR PARTE DE ELECTROCARIBE (AFINIA))		-		-	-	-		-		-		-	-	-		
15,2,1	Tubería PVC canalizada de 4"Ø desde la caja de paso exterior hasta la caja de paso metalica interior, incluye terminales campana, cinta peligro y demas accesorios para su correcta instalacion.	mt	80,00	152.600,00	12.208.000,00	80,00	12.208.000,00		-		-		-	80,00	12.208.000,00		100,00%
15,2,2	Caja de paso metalica 100x100, norma para cambio nivel, incluye acrilico peligro alta tension, tornillos para sello y demas accesorios para su correcta instalación.	un	1,00	836.800,00	836.800,00	1,00	836.800,00		-		-		-	1,00	836.800,00		100,00%
15,2,3	Caja de paso metalica 100x100, norma para cambio de tubería PVC a tubería EMC, incluye acrilico peligro alta tensión, tornillos para sello y demas accesorios para su correcta instalación,	un	2,00	660.400,00	1.320.800,00	2,00	1.320.800,00		-		-		-	2,00	1.320.800,00		100,00%
15,2,4	Tubería EMC 6" expuesta desde la caja de paso metalica hasta el equipo de medida, incluye curvas, uniones, soportes y demas accesorios para su correcta instalacion.	ml	20,00	534.800,00	10.696.000,00	20,00	10.696.000,00		-		-		-	20,00	10.696.000,00		100,00%
15,2,5	Acometida en 3x4/0 Al-XLPE-15 kV desde punto de conexión asignado por operador de red a subestación (Medida aproximada)	ml	150,00	134.149,00	20.122.350,00	150,00	20.122.350,00		-		-		-	150,00	20.122.350,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS ... 005

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCONTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115405-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817,668.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 41.645.300.695,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4817	$ 41.645.300.695,00	12/07/2021 A 11/05/2026
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000634	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
2/03/2021	30/04/2022

FECHA PRESENTE ACTA

5/05/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 05 de Mayo de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y JORGE OLIVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

		CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL				CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 005		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
15,2,6	Estructura de subterrenización/soterramiento (incluye cajas primarias/concéntricas, seccionamiento, cruceras, herrajes, poste de concreto 12m 1050 Kgf)	Un	1,00	3.332.000,00	3.332.000,00	1,00	3.332.000,00		-				-	1,00	3.332.000,00		100,00%
15,2,7	Terminales premoldeados uso exterior-15kV (Juego completo de conos) Incluye conectores, accesorios y elementos para su correcta instalacion hasta las pruebas finales	Jgo	2,00	637.873,00	1.275.746,00	2,00	1.275.746,00		-				-	2,00	1.275.746,00		100,00%
15,30	SUBESTACIÓN INTERIOR DE MEDIA TENSIÓN		-		-	-	-		-				-	-	-		
15,3,1	Cable Cu No. 2/0 AWG desnudo	ml	40,00	22.610,00	904.400,00	40,00	904.400,00		-	37,99	858.953,90	37,99	858.953,90	2,01	45.446,10	94,98%	5,02%
15,3,2	Soldadura exotérmica 150 ó 200g (cable-cable en T)	un	16,00	78.900,00	1.262.400,00	16,00	1.262.400,00		-	11,00	867.900,00	11,00	867.900,00	5,00	394.500,00	68,75%	31,25%
15,3,3	Borna terminal estañada 2/0	un	16,00	9.832,00	157.312,00	16,00	157.312,00		-		-		-	16,00	157.312,00		100,00%
15,3,4	Cela de inspección 30x30	un	4,00	214.600,00	858.400,00	4,00	858.400,00		-		-		-	4,00	858.400,00		100,00%
15,3,5	Electrodo de Cu para puesta a tierra de 5/8"x2,4m	un	9,00	127.200,00	1.144.800,00	9,00	1.144.800,00		-	4,00	508.800,00	4,00	508.800,00	5,00	636.000,00	44,44%	55,56%
15,3,6	Suministro, montaje, instalación y puesta en servicio de: CELDA MEDIDA SF6 según diagrama Unifilar (Incluye Medidor electrónico, multifanta, multimango, (3) transformadores de corriente 40-5A, (3) PTs de 13200V/3:120V/V3 y demás accesorios)	un	1,00	22.582.102,00	22.582.102,00	1,00	22.582.102,00		-				-	1,00	22.582.102,00		100,00%
15,3,7	Suministro, montaje, instalación y puesta en servicio de: Celda de protección en SF6 /Incluye fusibles HH 63 A) según diagrama Unifilar	un	1,00	27.000.000,00	27.000.000,00	1,00	27.000.000,00		-				-	1,00	27.000.000,00		100,00%
15,3,8	Suministro, montaje, instalación y puesta en servicio de: Seccionador de 17,5 kV-630A bajo carga, cuchilla de puesta a tierra.	un	2,00	9.090.875,00	18.181.750,00	2,00	18.181.750,00		-				-	2,00	18.181.750,00		100,00%
15,3,9	Suministro, montaje, instalación y puesta en servicio de: Gabinete metalico para encerrar el transformador de acuerdo con normativas Electricaribe y RETIE.	un	1,00	11.748.400,00	11.748.400,00	1,00	11.748.400,00		-				-	1,00	11.748.400,00		100,00%
15,3,10	Suministro, montaje, instalación y puesta en servicio de: Transformador tipo seco de 800 kVA, 13.800 a 208/120, Clase F, ahorrador de energía, con termocuples por devanado y termometro Incluye DPS, extractor, chequeo y transporte y puesta en sitio	un	1,00	61.130.000,00	61.130.000,00	1,00	61.130.000,00		-				-	1,00	61.130.000,00		100,00%
15,3,11	Riel Transformador	un	1,00	290.000,00	290.000,00	1,00	290.000,00		-				-	1,00	290.000,00		100,00%
15,3,12	Manguillado y pintura	un	1,00	4.265.300,00	4.265.300,00	1,00	4.265.300,00		-				-	1,00	4.265.300,00		100,00%
15,3,13	Puesta tierra de cuarto S/E, puertas y elementos metalicos	un	1,00	2.450.000,00	2.450.000,00	1,00	2.450.000,00		-				-	1,00	2.450.000,00		100,00%
15,3,14	Suministro, montaje, instalación y puesta en servicio de: Interconexiones primarias entre Celda de medida - TRF 1 (barras de cobre forradas en funda termoencogible)	un	1,00	5.897.787,00	5.897.787,00	1,00	5.897.787,00		-				-	1,00	5.897.787,00		100,00%
15,3,15	Suministro, montaje, instalación y puesta en servicio de: Interconexiones primarias entre transformador de 800 kVA y Tablero general Distribucion 10,8 m (Bus de barras tridasico para 3000 A + neutro y tierra, trimo recto, incluye accesorios, carros y soportes)	un	1,00	29.696.710,00	29.696.710,00	1,00	29.696.710,00		-				-	1,00	29.696.710,00		100,00%
15,3,16	Conductor de puesta a tierra para aterrizaje de blindobarra, en cable Cu No. 2, incluye elementos de conexión	ml	12,00	12.500,00	150.000,00	12,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	12,00	150.000,00		100,00%
15,40	TABLEROS GENERALES DE BAJA TENSIÓN		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15,4,1	Tablero General de Distribucion de BT 208 V, para alojar los siguientes equipos. Incluye barraje (Interruptores de caja moldeada 25kA). Fabricar según D.U.	un	1,00	107.784.682,00	107.784.682,00	1,00	107.784.682,00	-	-	-	-	-	-	1,00	107.784.682,00		100,00%
15,4,2	Celda de BT 208 V , para alojar los siguientes equipos, Incluye barraje (Interruptores de caja moldeada 25kA) según Diagrama Unifilar	un	1,00	21.196.686,00	21.196.686,00	1,00	21.196.686,00	-	-	-	-	-	-	1,00	21.196.686,00		100,00%
15,4,3	Celda de BT 208 V, para alojar los siguientes equipos, Incluye barraje, Según Diagrama Unifilar	un	1,00	19.613.453,00	19.613.453,00	1,00	19.613.453,00	-	-	-	-	-	-	1,00	19.613.453,00		100,00%
15,50	SALIDAS ELECTRICAS		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	SOTANO 1		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15,5,1	Salida para iluminación en tubería EMT, Luminaria Hermetica Led 2x18 (No incluida)	un	154,00	162.500,00	25.025.000,00	154,00	25.025.000,00	-	-	-	-	-	-	154,00	25.025.000,00		100,00%
15,5,2	Salida para iluminación, que incluye: tubería PVC, accesorios, cajas, tapa fosa, cable LSHF, prensacable, conector de resorte y encauchetado (3x18) de la caja a la luminaria. Luminaria Beta LED 18W	un	23,00	57.087,00	1.313.001,00	23,00	1.313.001,00	-	-	-	-	-	-	23,00	1.313.001,00		100,00%
15,5,3	Salida para iluminación de emergencia en tubería EMT, incluye, accesorios, fijación, cajas, cable LSHF, conectores de resorte, trimo de encauchetado 3x18, Juego de conectores macho y hembra para desconexión rapida certificada (bornes de conexión). Luminaria Lotus 13W LED.	un	45,00	108.964,00	4.903.380,00	45,00	4.903.380,00	-	-	-	-	-	-	45,00	4.903.380,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS N.. 005

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1 PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115409-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901463970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE 2/03/2021 — HASTA 30/04/2022

FECHA PRESENTE ACTA

5/05/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				VIGENCIA	
AMPAROS	Nº POLIZA		VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.545.300.685,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2029
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.545.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	18.858.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000534	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 05 de Mayo de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARDOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma interventora, ANDRES ALMARALES MELO y JORGE OLIVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 lo cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 005		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
15,5,4	Salida para control iluminacion, incluye basicamente 2 cables de control No 18 THHN a instalar en las tuberias de las salidas de iluminacion anteriores con sus respectivos empalmes y derivaciones	un	222,00	36.794,00	8.168.268,00	222,00	8.168.268,00	-	-			-	-	222,00	8.168.268,00		100,00%
15,5,5	Salida para sensor de presencia en tuberia EMT de 1/2", caja metalica, cable LSHF, incluye accesorios, tornillos, tapa liso (No incluye sensor) en circulaciones	un	8,00	98.580,00	788.640,00	8,00	788.640,00	-	-			-	-	8,00	788.640,00		100,00%
15,5,6	Suministro e instalacion de Sensor de movimiento 360° Techo 6mts de Radio OSC15-IDV1 con Unidad de Control Sugerido	un	8,00	128.689,00	1.029.512,00	8,00	1.029.512,00	-	-			-	-	8,00	1.029.512,00		100,00%
15,5,7	Salida eléctrica para toma corriente 120 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tuberia EMT, accesorios, fijación, cajas, tapa troqueada, cable LSH, empalme y aparato.	un	31,00	114.760,00	3.557.560,00	31,00	3.557.560,00	-	-			-	-	31,00	3.557.560,00		100,00%
15,5,8	Salida eléctrica, para toma corriente 120 V con polo a tierra, 15 A, en canalizacion superficial, que incluye: tapa troqueada, cable LSHF, empalme y aparato. No incluyes la canalizacion.	un	10,00	529.949,00	5.299.490,00	10,00	5.299.490,00	-	-			-	-	10,00	5.299.490,00		100,00%
15,5,9	Salida eléctrica, para toma corriente 120 V con polo a tierra aislada, 15 A, en canalizacion superficial, que incluye: tapa troqueada, cable LSHF, empalme y aparato. No incluye la canalizacion.	un	2,00	68.564,00	137.128,00	2,00	137.128,00	-	-			-	-	2,00	137.128,00		100,00%
15,5,10	Salida eléctrica para toma corriente, 220 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tuberia EMT, accesorios, fijación, cajas, tapa troqueada, cable LSHF, empalme y aparato.	un	1,00	67.387,00	67.387,00	1,00	67.387,00	-	-			-	-	1,00	67.387,00		100,00%
15,5,11	Salida para spiche sencillo en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, tapa lisa, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	ml	13,00	120.857,00	1.571.531,00	13,00	1.571.531,00	-	-			-	-	13,00	1.571.531,00		100,00%
15,60	INSTALACION CON SUMINISTRO DE LUMINARIAS		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
	EN SOTANO 1		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15,6,1	Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. LED 2x18W Hermética	un	154,00	248.762,00	38.001.348,00	154,00	38.001.348,00	-	-			-	-	154,00	38.001.348,00		100,00%
15,6,2	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado Luminaria EM2 60LEDS.	un	45,00	199.840,00	8.992.800,00	45,00	8.992.800,00	-	-			-	-	45,00	8.992.800,00		100,00%
15,6,3	Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado Aplique	un	5,00	41.972,00	209.860,00	5,00	209.860,00	-	-			-	-	5,00	209.860,00		100,00%
15,6,4	Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado Lotus 18W LED.	un	23,00	145.812,00	3.353.676,00	23,00	3.353.676,00	-	-			-	-	23,00	3.353.676,00		100,00%
15,70	SALIDAS ELECTRICAS		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
	EN NIVEL 1 PISO 1		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15,7,1	Salida para iluminación en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, cable LSHF, conectores de resorte. Bafe Lotus 1x13W. (No Incluido).	un	42,00	101.889,00	4.279.338,00	42,00	4.279.338,00	-	-			-	-	42,00	4.279.338,00		100,00%
15,7,2	Salida para iluminación en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, cable LSHF, conectores de resorte. Pendora LED 18W. (No Incluida).	un	22,00	117.909,00	2.593.998,00	22,00	2.593.998,00	-	-			-	-	22,00	2.593.998,00		100,00%
15,7,3	Salida para iluminación en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, cable LSHF, conectores de resorte. LED 60x60 36W. (No Incluida).	un	13,00	117.697,00	1.532.661,00	13,00	1.532.661,00	-	-			-	-	13,00	1.532.661,00		100,00%
15,7,4	Salida para iluminación en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, cable LSHF, conectores de resorte. Cubik LED 12ROS 10BW 6.0m. (No Incluida).	un	85,00	106.009,00	9.010.765,00	85,00	9.010.765,00	-	-			-	-	85,00	9.010.765,00		100,00%
15,7,5	Salida para iluminación en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, cable LSHF, conectores de resorte. Cubik LED 6ROS 5aW 3.6m. (No Incluida).	un	12,00	106.009,00	1.272.108,00	12,00	1.272.108,00	-	-			-	-	12,00	1.272.108,00		100,00%
15,7,6	Salida para iluminación en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, cable LSHF, conectores de resorte. Plao LED 7W (No Incluida).	un	43,00	101.003,00	4.343.129,00	43,00	4.343.129,00	-	-			-	-	43,00	4.343.129,00		100,00%
15,7,8	Salida para iluminación de emergencia en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, toma corriente, cable LSHF, conectores de resorte. Luminaria EM2 60LEDS (No Incluida).	un	38,00	120.659,00	4.585.042,00	38,00	4.585.042,00	-	-			-	-	38,00	4.585.042,00		100,00%
15,7,9	Salida para iluminación, que incluye: tuberia PVC, accesorios, cajas, tapa lisa, cable LSHF, prensacable, conector de resorte y encauchetado (3x16) de la caja a la luminaria. Luminaria AP1 plafon en muro (No Incluida).	un	2,00	65.772,00	131.544,00	2,00	131.544,00	-	-			-	-	2,00	131.544,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No. 005

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2439104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115405-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.628.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
26/3/2021	30/04/2022

FECHA PRESENTE ACTA

5/05/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	Nº POLIZA		VR. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/08/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	18.658.135.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 05 de Mayo de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y JORGE OLIVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

			CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL			CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 005		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
15,7,10	Salida para iluminación, que incluye: tubería PVC, accesorios, cajas, tapa lisa, alambre, prensacable, conector de resorte y encauchetado (3x16) de la caja a la luminaria. Luminaria Riel estudio de grabacion (No incluida).	un	50,00	79.438,00	3.971.950,00	50,00	3.971.950,00	-	-	-	-	-	-	50,00	3.971.950,00		100,00%
15,7,11	Salida para iluminación, que incluye: tubería PVC, accesorios, cajas, tapa lisa, alambre, prensacable, conector de resorte y encauchetado (3x16) de la caja a la luminaria. Luminaria Riel Galeria de arte (No incluida).	un	30,00	79.438,00	2.383.140,00	30,00	2.383.140,00	-	-	-	-	-	-	30,00	2.383.140,00		100,00%
15,7,12	Salida para iluminación, que incluye: tubería PVC, accesorios, caja 4"x4", tapa lisa, alambre, prensacable, conector de resorte y encauchetado (3x15) de la caja a la luminaria. Luminaria AP1 aplique en pared (No incluida).	un	80,00	65.772,00	5.261.760,00	80,00	5.261.760,00	-	-	-	-	-	-	80,00	5.261.760,00		100,00%
15,7,13	Salida para sensor de presencia en tubería EMT de 1/2", caja metálica de 10x10cm con doble fondo, cable LSHF, incluye accesorios, tornillos, tapa flux (No incluye sensor) en Escaleras	un	9,00	99.580,00	857.220,00	9,00	857.220,00	-	-	-	-	-	-	9,00	857.220,00		100,00%
15,7,14	Suministro e Instalacion de Sensor de movimiento 360° Techo 6mts de Radio OSC15-I0W con Unidad de Control Sugerido	un	6,00	128.690,00	772.140,00	6,00	772.140,00	-	-	-	-	-	-	6,00	772.140,00		100,00%
15,7,15	Salida para control iluminacion, incluye basicamente 2 cables No 18 THHN e instalar en las tuberias de las salidas de iluminacion anteriores con sus respectivos empalmes y derivaciones	un	432,00	25.044,00	10.819.008,00	432,00	10.819.008,00	-	-	-	-	-	-	432,00	10.819.008,00		100,00%
15,7,16	Salida eléctrica para toma corriente 120 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tubería EMT, accesorios, fijación, cajas metálica, tapa troquelada, cable LSHF, empalme y aparato.	un	13,00	118.597,00	1.541.761,00	13,00	1.541.761,00	-	-	-	-	-	-	13,00	1.541.761,00		100,00%
15,7,17	Salida eléctrica empotrada para toma corriente GFCI 120 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	2,00	156.405,00	312.810,00	2,00	312.810,00	-	-	-	-	-	-	2,00	312.810,00		100,00%
15,7,18	Salida eléctrica empotrada para toma corriente 120 V con polo a tierra aislado 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	5,00	117.420,00	587.100,00	5,00	587.100,00	-	-	-	-	-	-	5,00	587.100,00		100,00%
15,7,19	Salida eléctrica de piso, para toma corriente polo a tierra aislada, 15 A, que incluye: caja especial, tubería EMT, cable LSHF, conector de resorte y aparatos.	un	5,00	1.398.120,00	6.990.600,00	5,00	6.990.600,00	-	-	-	-	-	-	5,00	6.990.600,00		100,00%
15,7,20	Salida eléctrica de piso, para (1) toma corriente 120 V con polo a tierra aislado, (1) toma corriente polo a tierra aislada, 15 A, que incluye: caja especial, tubería EMT, cable LSHF, conector de resorte y aparatos.	un	8,00	562.109,00	4.496.872,00	8,00	4.496.872,00	-	-	-	-	-	-	8,00	4.496.872,00		100,00%
15,7,21	Salida eléctrica para sensor, de puertas, que incluye: tubería EMT, accesorios, fijación, cajas, cable LSHF, (No incluye sensor),	un	10,00	117.173,00	1.171.730,00	10,00	1.171.730,00	-	-	-	-	-	-	10,00	1.171.730,00		100,00%
15,7,22	Salida para suiche sencillo en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	5,00	117.173,00	585.865,00	5,00	585.865,00	-	-	-	-	-	-	5,00	585.865,00		100,00%
15,7,23	Salida para suiche doble en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable HF, conector de resorte y aparato.	un	5,00	135.757,00	678.785,00	5,00	678.785,00	-	-	-	-	-	-	5,00	678.785,00		100,00%
15,7,24	Salida para suiche triple en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable HF, conector de resorte y aparato.	un	4,00	141.066,00	564.264,00	4,00	564.264,00	-	-	-	-	-	-	4,00	564.264,00		100,00%
15,80	INSTALACION CON SUMINISTRO DE LUMINARIAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	EN NIVEL 1 PISO 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15,8,1	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Bala Lotus 1x13W.	un	42,00	145.812,00	6.124.104,00	42,00	6.124.104,00	-	-	-	-	-	-	42,00	6.124.104,00		100,00%
15,8,2	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Pandora LED 18W.	un	22,00	174.603,00	3.841.266,00	22,00	3.841.266,00	-	-	-	-	-	-	22,00	3.841.266,00		100,00%
15,8,3	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. 60x60 LED 36W.	un	13,00	246.762,00	3.207.906,00	13,00	3.207.906,00	-	-	-	-	-	-	13,00	3.207.906,00		100,00%
15,8,4	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Cubik LED 12ROS 108W 6.0m.	un	85,00	879.429,00	74.751.465,00	85,00	74.751.465,00	-	-	-	-	-	-	85,00	74.751.465,00		100,00%
15,8,5	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Cubik LED 6ROS 54W 3.6m.	un	12,00	564.988,00	6.779.856,00	12,00	6.779.856,00	-	-	-	-	-	-	12,00	6.779.856,00		100,00%
15,8,6	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Piso LED Exterior,	un	43,00	36.839,00	1.584.077,00	43,00	1.584.077,00	-	-	-	-	-	-	43,00	1.584.077,00		100,00%
15,8,8	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado Luminaria EM2 60LEDS,	un	38,00	199.840,00	7.593.920,00	38,00	7.593.920,00	-	-	-	-	-	-	38,00	7.593.920,00		100,00%
15,8,9	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Luminaria AP1 platon en muro.	un	2,00	41.972,00	83.944,00	2,00	83.944,00	-	-	-	-	-	-	2,00	83.944,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No. 005

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SEN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115408-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 135.817.868.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4617	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4617	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4617	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/05/2026
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4617	$ 19.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901439970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE: 2/03/2021 — HASTA: 30/04/2022

FECHA PRESENTE ACTA: 5/05/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 05 de Mayo de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARDOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y JORGE OLIVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

		CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL				CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 005		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
15,8,10	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Luminaria AP1 aplique de pared.	un	50,00	41.972,00	2.098.600,00	50,00	2.098.600,00	-	-	-	-	-	-	50,00	2.098.600,00		100,00%
15,90	SALIDAS ELECTRICAS		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	EN NIVEL 2 PISO 2		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15,9,1	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metálica cms, cable LSHF, conectores de resorte Bala Lotus 1x13W. (No incluido).	un	195,00	101.889,00	19.868.355,00	195,00	19.868.355,00	-	-	-	-	-	-	195,00	19.868.355,00		100,00%
15,9,2	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metálica, cable LSHF, conectores de resorte Pandora LED 18W. (No incluido)	un	16,00	117.909,00	1.886.544,00	16,00	1.886.544,00	-	-	-	-	-	-	16,00	1.886.544,00		100,00%
15,9,3	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metálica, cable LSHF, conectores de resorte Pandora LED 8W. (No Incluido).	un	38,00	117.897,00	4.480.086,00	38,00	4.480.086,00	-	-	-	-	-	-	38,00	4.480.086,00		100,00%
15,9,4	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metálica, cable LSHF, conectores de resorte. Cubik LED 12R06 108W 6 0m. (No Incluido).	un	60,00	106.009,00	6.360.540,00	60,00	6.360.540,00	-	-	-	-	-	-	60,00	6.360.540,00		100,00%
15,9,5	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metálica, cable LSHF, conectores de resorte. Cubik LED 6R06 54W 3,6m. (No Incluido).	un	80,00	106.009,00	8.480.720,00	80,00	8.480.720,00	-	-	-	-	-	-	80,00	8.480.720,00		100,00%
15,9,6	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metálica,cable LSHF, conectores de resorte. Gyro LED GU10 7W 420 4000K (No Incluido).	un	20,00	101.003,00	2.020.060,00	20,00	2.020.060,00	-	-	-	-	-	-	20,00	2.020.060,00		100,00%
15,9,7	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja 12x12x5 cms, cable LSHF, conectores de resorte. Cubik LED 6R06 72W 4,8m. (No Incluido).	un	15,00	106.008,00	1.590.120,00	15,00	1.590.120,00	-	-	-	-	-	-	15,00	1.590.120,00		100,00%
15,9,8	Salida para iluminación de emergencia en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metálica, toma corriente, cable LSHF, conectores de resorte Luminaria EM2 EXLED6 (No Incluido)	un	71,00	120.659,00	8.566.789,00	71,00	8.566.789,00	-	-	-	-	-	-	71,00	8.566.789,00		100,00%
15,9,9	Salida para iluminación, que incluye: tubería PVC, accesorios, caja 4"x4", tapa liso, cable LSHF, preinsecable, conector de resorte y encauchetado (2x18) de la caja a la luminaria. Luminaria AP1 plafon en muro.	un	8,00	67.886,00	543.088,00	8,00	543.088,00	-	-	-	-	-	-	8,00	543.088,00		100,00%
15,9,10	Salida para sensor de presencia en tubería EMT de 1/2", caja metálica, cable LSHF, incluye accesorios, tornillos, tapa flux (No incluye sensor) en circulaciones	un	18,00	98.579,00	1.774.422,00	18,00	1.774.422,00	-	-	-	-	-	-	18,00	1.774.422,00		100,00%
15,9,11	Suministro e Instalacion de Sensor de movimiento 360° Techo 6mts de Radio OSC15-IDW con Unidad de Control Sugerido	un	18,00	128.660,00	2.316.420,00	18,00	2.316.420,00	-	-	-	-	-	-	18,00	2.316.420,00		100,00%
15,9,12	Salida para control iluminacion, incluye basicamente 2 cables No 18 THHN a instalar en las tuberias de las salidas de iluminacion anteriores con sus respectivos empalmes y derivaciones	un	521,00	25.044,00	13.047.924,00	521,00	13.047.924,00	-	-	-	-	-	-	521,00	13.047.924,00		100,00%
15,9,13	Salida eléctrica para toma corriente 120 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tubería EMT, accesorios, fijación, cajas, tapa troqueteda, cable LSHF, empalme y aparato.	un	63,00	118.567,00	7.471.611,00	63,00	7.471.611,00	-	-	-	-	-	-	63,00	7.471.611,00		100,00%
15,9,14	Salida eléctrica empotrada para toma corriente GFCI 120 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento,cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	3,00	156.405,00	469.215,00	3,00	469.215,00	-	-	-	-	-	-	3,00	469.215,00		100,00%
15,9,15	Salida eléctrica empotrada para toma corriente 120 V con polo a tierra aislado, 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	49,00	117.420,00	5.753.580,00	49,00	5.753.580,00	-	-	-	-	-	-	49,00	5.753.580,00		100,00%
15,9,16	Salida eléctrica para toma corriente trifilar 220 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, empalme y aparato.	un	12,00	124.722,00	1.496.664,00	12,00	1.496.664,00	-	-	-	-	-	-	12,00	1.496.664,00		100,00%
15,9,19	Salida eléctrica para toma corriente trifilar 220 V con polo a tierra, 15 A, cafeteria y tienda, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, empalme y aparato.	un	12,00	124.722,00	1.496.664,00	12,00	1.496.664,00	-	-	-	-	-	-	12,00	1.496.664,00		100,00%
15,9,20	Salida para suiche sencillo en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	12,00	117.173,00	1.406.076,00	12,00	1.406.076,00	-	-	-	-	-	-	12,00	1.406.076,00		100,00%
15,9,21	Salida para suiche doble en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	1,00	135.757,00	135.757,00	1,00	135.757,00	-	-	-	-	-	-	1,00	135.757,00		100,00%
15,9,22	Salida para suiche triple en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	4,00	141.066,00	564.264,00	4,00	564.264,00	-	-	-	-	-	-	4,00	564.264,00		100,00%
15,10	INSTALACIÓN CON SUMINISTRO DE LUMINARIAS		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS 1... 005

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - GN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.3499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.868.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901423970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
2/03/2021	30/04/2022

FECHA PRESENTE ACTA

5/05/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				VIGENCIA	
AMPAROS	Nº POLIZA		VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.845.300.885,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4817	$	41.845.300.885,00	12/07/2021	A 11/05/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.858.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000634	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 05 de Mayo de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y JORGE OLIVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

		CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL				CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 005		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
	EN NIVEL 2 PISO 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15,10,1	Suministro e Instalación de luminaria, Incluye elementos de fijación, cable encauchetado Bala Lotus 1x13W.	un	195,00	145.812,00	28.433.340,00	195,00	28.433.340,00	-	-	-	-	-	-	195,00	28.433.340,00		100,00%
15,10,2	Suministro e Instalación de luminaria, Incluye elementos de fijación, cable encauchetado, Pandora LED 18W.	un	16,00	174.803,00	2.793.648,00	16,00	2.793.648,00	-	-	-	-	-	-	16,00	2.793.648,00		100,00%
15,10,3	Suministro e Instalación de luminaria, Incluye elementos de fijación, cable encauchetado, Pandora LED 8W	un	38,00	246.782,00	9.378.958,00	38,00	9.378.958,00	-	-	-	-	-	-	38,00	9.378.958,00		100,00%
15,10,4	Suministro e Instalación de luminaria, Incluye elementos de fijación, cable encauchetado, Cubik LED 12ROS 108W 6.0m.	un	60,00	879.429,00	52.765.740,00	60,00	52.765.740,00	-	-	-	-	-	-	60,00	52.765.740,00		100,00%
15,10,5	Suministro e Instalación de luminaria, Incluye elementos de fijación, cable encauchetado, Cubik LED 6ROS 54W 3.6m.	un	80,00	564.988,00	45.199.040,00	80,00	45.199.040,00	-	-	-	-	-	-	80,00	45.199.040,00		100,00%
15,10,6	Suministro e Instalación de luminaria, Incluye elementos de fijación, cable encauchetado, Gyro LED GU10 7W 40D 4000K	un	20,00	36.839,00	736.780,00	20,00	736.780,00	-	-	-	-	-	-	20,00	736.780,00		100,00%
15,10,7	Suministro e Instalación de luminaria, Incluye elementos de fijación, cable encauchetado, Cubik LED 6ROS 72W 4,8m.	un	15,00	669.452,00	10.041.780,00	15,00	10.041.780,00	-	-	-	-	-	-	15,00	10.041.780,00		100,00%
15,10,8	Suministro e Instalación de luminaria, Incluye elementos de fijación, cable encauchetado Luminaria EM2 6XLED6	un	71,00	199.840,00	14.188.640,00	71,00	14.188.640,00	-	-	-	-	-	-	71,00	14.188.640,00		100,00%
15,10,9	Suministro e Instalación de luminaria, Incluye elementos de fijación, cable encauchetado Luminaria AP1 plafon en muro	un	8,00	41.972,00	335.776,00	8,00	335.776,00	-	-	-	-	-	-	8,00	335.776,00		100,00%
15,11	SALIDAS ELÉCTRICAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	EN NIVEL 3 PISO 3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15,11,1	Salida para iluminación en tubería EMT, Incluye: accesorios, fijación, caja metalica cms, cable LSHF, conectores de resorte Bala Lotus 1x13W. (No Incluida).	un	69,00	135.825,00	9.371.925,00	69,00	9.371.925,00	-	-	-	-	-	-	69,00	9.371.925,00		100,00%
15,11,2	Salida para iluminación en tubería EMT, Incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. Pandora LED 18W. (No Incluida).	un	12,00	135.825,00	1.629.900,00	12,00	1.629.900,00	-	-	-	-	-	-	12,00	1.629.900,00		100,00%
15,11,3	Salida para iluminación, que incluye tubería PVC, accesorios, caja metalica, tapa lisa, alambre, prensacable, conector de resorte y encauchetado (3x18) de la caja a la luminaria Luminaria AP1 plafon en muro (No Incluida)	un	12,00	90.300,00	1.083.600,00	12,00	1.083.600,00	-	-	-	-	-	-	12,00	1.083.600,00		100,00%
15,11,4	Salida para iluminación de emergencia en tubería EMT, Incluye: accesorios, fijación, caja metalica, toma corriente, cable LSHF, conectores de resorte Luminaria EM2 6XLED6 (No Incluida).	un	26,00	154.783,00	4.024.358,00	26,00	4.024.358,00	-	-	-	-	-	-	26,00	4.024.358,00		100,00%
15,11,5	Salida para sensor de presencia en tubería EMT de 1/2", caja metálica, cable LSHF, incluye accesorios, tornillos, tapa liza (No incluye sensor) en circulaciones	un	8,00	135.825,00	1.086.600,00	8,00	1.086.600,00	-	-	-	-	-	-	8,00	1.086.600,00		100,00%
15,11,6	Suministro e Instalacion de Sensor de movimiento 360° Techo 6mts de Radio OSC15-IDW con Unidad de Control Segorlio	un	8,00	90.300,00	722.400,00	8,00	722.400,00	-	-	-	-	-	-	8,00	722.400,00		100,00%
15,11,8	Salida para iluminación en tubería EMT, Incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Cubik LED 12ROS 108W 6.0m. (No incluida)	un	11,00	135.825,00	1.494.075,00	11,00	1.494.075,00	-	-	-	-	-	-	11,00	1.494.075,00		100,00%
15,11,9	Salida para iluminación en tubería EMT, Incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. DESC-6OBR 4ROS 54W . (No Incluida).	un	4,00	135.825,00	543.300,00	4,00	543.300,00	-	-	-	-	-	-	4,00	543.300,00		100,00%
15,11,10	Salida para iluminacion a 6 metros, en tuberia EMT, Incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF , conectores de resorte, Inerno de encauchetado 3x16, Juego de conectores macho y hembra para desconexión rapida certificada (bornenes de conexion). Luminaria AP3 LED 45W.	un	12,00	151.343,00	1.816.116,00	12,00	1.816.116,00	-	-	-	-	-	-	12,00	1.816.116,00		100,00%
15,11,11	Salida para control iluminacion, incluye basicamente 2 cables No 10 THHN a instalar en las tuberias de las salidas de iluminacion anteriores con sus respectivos empalmes y derivaciones	un	152,00	31.945,00	5.175.578,00	152,00	5.175.578,00	-	-	-	-	-	-	152,00	5.175.578,00		100,00%
15,11,12	Salida eléctrica para toma corriente 120 V con polo a tierra, 15 A, que incluye tubería EMT, accesorios, fijación, caja metalica, tapa troquelada, cable LSHF, empalme y aislamiento.	un	5,00	152.719,00	763.595,00	5,00	763.595,00	-	-	-	-	-	-	5,00	763.595,00		100,00%
15,11,13	Salida eléctrica empotrada para toma corriente 120 V con polo a tierra aislado, 15 A, que incluye tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aislamiento.	un	20,00	151.543,00	3.030.860,00	20,00	3.030.860,00	-	-	-	-	-	-	20,00	3.030.860,00		100,00%
15,11,14	Salida eléctrica empotrada en piso para toma corriente 120 V con polo a tierra aislado 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aislamiento	un	3,00	414.130,00	1.242.390,00	3,00	1.242.390,00	-	-	-	-	-	-	3,00	1.242.390,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS [illegible]05

CONTRATO Nº	2021043002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115405-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 136.617.868.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4617	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4617	$ 6.840.833.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4617	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/05/2026
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4617	$ 18.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901439078-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000634	$ 6.840.833.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
2/03/2021	30/04/2022

FECHA PRESENTE ACTA

5/05/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, al dia 05 de Mayo de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARDOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y JORGE OLIVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021043002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 005		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
15,11,15	Salida eléctrica empotrada en piso para toma corriente 120 V con polo a tierra 15 A, que incluye tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato	un	3,00	408.917,00	1.226.751,00	3,00	1.226.751,00	-	-			-	-	3,00	1.226.751,00		100,00%
15,11,16	Salida eléctrica tipo intemperie empotrada para toma corriente GFCI 120 V con polo a tierra a 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato	un	4,00	173.796,00	695.184,00	4,00	695.184,00	-	-			-	-	4,00	695.184,00		100,00%
15,11,17	Salida eléctrica empotrada para toma corriente trifilar 220 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, empalme y aparato.	un	5,00	158.845,00	794.225,00	5,00	794.225,00	-	-			-	-	5,00	794.225,00		100,00%
15,11,18	Salida eléctrica para video beam, para (1) toma corriente 120 V con polo a tierra, (2) toma corriente polo a tierra aislada, 15 A, que incluye: caja especial, tubería EMT, cable LSHF, conector de resorte y aparatos	un	4,00	1.833.886,00	7.335.544,00	4,00	7.335.544,00	-	-			-	-	4,00	7.335.544,00		100,00%
15,11,19	Salida para salida sencillo en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato	un	31,00	155.132,00	4.809.092,00	31,00	4.809.092,00	-	-			-	-	31,00	4.809.092,00		100,00%
15,11,20	Salida para salida doble en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato	un	1,00	135.757,00	135.757,00	1,00	135.757,00	-	-			-	-	1,00	135.757,00		100,00%
15,11,21	Salida eléctrica empotrada, para lavamanos y puerta levadiza de teatro, que incluye tubería 1.1/2 PVC, accesorios, fijación, caja metálica, No incluye cableado y aparato	un	4,00	205.853,00	823.412,00	4,00	823.412,00	-	-			-	-	4,00	823.412,00		100,00%
15,11,22	Suministro e Instalación de luminaria tipo Bala, Ref. Start track spot small 14W 3k ra90 nb black	un	6,00	341.067,00	2.728.536,00	6,00	2.728.536,00	-	-			-	-	6,00	2.728.536,00		100,00%
15,11,23	Suministro e Instalación de luminaria tipo Bala, Ref. Rama led r 800 ho 40 four-pri esc w gen2	un	156,00	333.333,00	51.999.948,00	156,00	51.999.948,00	-	-			-	-	156,00	51.999.948,00		100,00%
15,11,24	Suministro e Instalación de luminaria tipo Bala, Ref. LYTEFRAM Recessed 2x70 W HI-PAR 111 24°	un	48,00	291.667,00	14.000.016,00	48,00	14.000.016,00	-	-			-	-	48,00	14.000.016,00		100,00%
15,12	INSTALACIÓN CON SUMINISTRO DE LUMINARIAS		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
	EN NIVEL 3 PISO 3		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15,12,1	Suministro e Instalación de luminaria, Incluye elementos de fijación, cable encauchetado Bala Lotus 1x13W.	un	69,00	181.624,00	12.532.056,00	69,00	12.532.056,00	-	-			-	-	69,00	12.532.056,00		100,00%
15,12,2	Suministro e Instalación de luminaria, Incluye elementos de fijación, cable encauchetado Bala Lotus 1x13W	un	12,00	145.812,00	1.749.744,00	12,00	1.749.744,00	-	-			-	-	12,00	1.749.744,00		100,00%
15,12,3	Suministro e Instalación de luminaria, Incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Luminaria AP1 platon en muro.	un	12,00	41.972,00	503.664,00	12,00	503.664,00	-	-			-	-	12,00	503.664,00		100,00%
15,12,4	Suministro e Instalación de luminaria, Incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Luminaria EM2 6XLEDS.	un	26,00	199.840,00	5.195.840,00	26,00	5.195.840,00	-	-			-	-	26,00	5.195.840,00		100,00%
15,12,5	Suministro e Instalación de luminaria, Incluye elementos de fijación, cable encauchetado. TLLED - 40Z 7W	un	8,00	199.840,00	1.598.720,00	8,00	1.598.720,00	-	-			-	-	8,00	1.598.720,00		100,00%
15,12,7	Suministro e Instalación de luminaria, Incluye elementos de fijación, cable encauchetado libre de halogenos. Pandora LED 29W.	un	85,00	174.603,00	14.841.255,00	85,00	14.841.255,00	-	-			-	-	85,00	14.841.255,00		100,00%
15,12,8	Suministro e Instalación de luminaria, Incluye elementos de fijación, cable encauchetado. DESC-60BR 4ROS 108W.	un	11,00	246.762,00	2.714.382,00	11,00	2.714.382,00	-	-			-	-	11,00	2.714.382,00		100,00%
15,12,9	Suministro e Instalación de luminaria, Incluye elementos de fijación, cable encauchetado. DESC-60BR 4ROS 36W.	un	4,00	566.735,00	2.266.940,00	4,00	2.266.940,00	-	-			-	-	4,00	2.266.940,00		100,00%
15,12,10	Suministro e Instalación de luminaria, Incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Luminaria AP3 LED 48W.	un	12,00	205.459,00	2.465.508,00	12,00	2.465.508,00	-	-			-	-	12,00	2.465.508,00		100,00%
15,13	SALIDAS ELÉCTRICAS		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
	EN NIVEL 4 PISO 4		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.13.1	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica cms, cable LSHF, conectores de resorte. Bala Lotus 1x13W. (No incluida).	un	13,00	135.825,00	1.765.725,00	13,00	1.765.725,00	-	-			-	-	13,00	1.765.725,00		100,00%
15.13.2	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. Pandora LED 18W. (No Incluida).	un	8,00	135.825,00	1.086.600,00	8,00	1.086.600,00	-	-			-	-	8,00	1.086.600,00		100,00%
15.13.3	Salida para iluminación en tubería EMT. Luminaria Lad 1x28 Hermetica (No Incluida)	un	6,00	90.300,00	541.800,00	6,00	541.800,00	-	-			-	-	6,00	541.800,00		100,00%
15.13.4	Salida para iluminación de emergencia en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, toma corriente, cable LSHF, conectores de resorte Luminaria EM2 6XLEDS (No Incluida).	un	12,00	154.783,00	1.857.396,00	12,00	1.857.396,00	-	-			-	-	12,00	1.857.396,00		100,00%
15.13.5	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte Panel LED 60x06 36W (No Incluida)	un	2,00	135.825,00	271.650,00	2,00	271.650,00	-	-			-	-	2,00	271.650,00		100,00%

13055

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS .. 05

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2439104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115408-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138 817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 41.645.309.685,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 6.949.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4817	$ 41.645.309.685,00	12/07/2021 A 11/05/2028
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 18.858.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901493979-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.949.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE: 3/03/2021 HASTA: 30/04/2022

FECHA PRESENTE ACTA: 5/05/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 05 de Mayo de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma interventora, ANDRES ALMARALES MELO y JORGE OLIVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 005		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
15.13.6	Salida para sensor de presencia en tuberia EMT de 1/2", caja metálica, cable LSHF, incluye accesorios, tornillos, tapa 8ux (No incluye sensor) en circulaciones	un	8,00	98 579,00	788.632,00	8,00	788.632,00	-	-	-	-	-	-	8,00	788.632,00		100,00%
15.13.7	Suministro e instalacion de Sensor de movimiento 360° Techo 8mts de Radio OSC15-I0V con Unidad de Control Sugerido	un	8,00	128 690,00	1.029.520,00	8,00	1.029.520,00	-	-	-	-	-	-	8,00	1.029.520,00		100,00%
15.13.8	Salida para iluminación en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, cable LSHF, conectores de resorte. Cubik LED 12ROS 10BW 6 0m. (No incluido).	un	25,00	135 825,00	3.395.625,00	25,00	3.395.625,00	-	-	-	-	-	-	25,00	3.395.625,00		100,00%
15.13.9	Salida para iluminación en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. DESC-90BR 4ROS 54W . (No incluido).	un	34,00	135 825,00	4 618.050,00	34,00	4.618.050,00	-	-	-	-	-	-	34,00	4 618.050,00		100,00%
15.13.10	Salida para iluminacion a 6 metros, en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF , conectores de resorte, tramo de encauchetado 3x16, Juego de conectores macho y hembra para desconexion rapida certificada (borneres de conexion). Luminaria AP3 LED 48W.	un	25,00	151.343,00	3.783.575,00	25,00	3.783.575,00	-	-	-	-	-	-	25,00	3.783 575,00		100,00%
15.13.11	Salida para control iluminacion, incluye basicamente 2 cables No 18 THHN a instalar en las tuberias de las salidas de iluminacion anteriores con sus respectivos empalmes y derivaciones	un	141,00	31.948,00	4 504 668,00	141,00	4 504 668,00	-	-	-	-	-	-	141,00	4 504 668,00		100,00%
15.13.12	Salida eléctrica para toma corriente 120 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tuberia EMT, accesorios, fijación, caja metalica, tapa troquelada, cable LSHF, empalme y aislante.	un	38,00	152.719,00	5 803.322,00	38,00	5.803.322,00	-	-	-	-	-	-	38,00	5 803.322,00		100,00%
15.13.13	Salida eléctrica para toma corriente 120 V con polo a tierra aislado 15 A, que incluye: tuberia PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, alambre THHN, conector de resorte y aislante.	un	28,00	151 343,00	4 237 604,00	28,00	4 237.604,00	-	-	-	-	-	-	28,00	4 237.604,00		100,00%
15.13.14	Salida eléctrica en techo Centro de Eventos para toma corriente 120 V con polo a tierra aislado 15 A, que incluye: tuberia EMT, accesorios, fijación, caja metalica con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aislante.	un	18,00	414.130,00	7 454.340,00	18,00	7.454.340,00	-	-	-	-	-	-	18,00	7 454.340,00		100,00%
15.13.15	Salida eléctrica empotrada en piso para toma corriente 120 V con polo a tierra 15 A, que incluye: tuberia PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aislante.	un	30,00	408.917,00	12 267.510,00	30,00	12 267.510,00	-	-	-	-	-	-	30,00	12.267.510,00		100,00%
15.13.16	Salida eléctrica tipo intemperie empotrada para toma corriente GFCI 120 V con polo a tierra a 15 A, que incluye: tuberia PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aislante.	un	45,00	173.796,00	7 820.820,00	45,00	7.820.820,00	-	-	-	-	-	-	45,00	7.820.820,00		100,00%
15.13.17	Salida eléctrica en techo Centro de Eventos para toma corriente intemperie 220 V con polo a tierra, 20 A, que incluye: tuberia EMT, accesorios, fijación, caja Metalica, cable LSHF, empalme y aislante.	un	5,00	158.845,00	794.225,00	5,00	794.225,00	-	-	-	-	-	-	5,00	794.225,00		100,00%
15.13.18	Salida eléctrica para video beam, para (1) toma corriente 120 V con polo a tierra, (2) toma corriente polo a tierra aislada, 15 A, que incleye: caja especial, tuberia EMT,cable LSHF, conector de resorte y aislantes.	un	4,00	1 833.886,00	7.335.544,00	4,00	7.335.544,00	-	-	-	-	-	-	4,00	7 335.544,00		100,00%
15.13.19	Salida para sulche sencillo en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aislante.	un	17,00	155.132,00	2.637.244,00	17,00	2.637.244,00	-	-	-	-	-	-	17,00	2 637.244,00		100,00%
15.13.20	Salida para sulche doble en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aislante.	un	2,00	135 757,00	271.514,00	2,00	271.514,00	-	-	-	-	-	-	2,00	271.514,00		100,00%
15.13.21	Salida para sulche conmutable sencillo en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aislante.	un	4,00	205 853,00	823 412,00	4,00	823 412,00	-	-	-	-	-	-	4,00	823 412,00		100,00%
15,14	INSTALACION CON SUMINISTRO DE LUMINARIAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	EN NIVEL 4 PISO 4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.14.1	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Bala Lotus 1x13W.	un	13,00	181 624,00	2.361.112,00	13,00	2.361.112,00	-	-	-	-	-	-	13,00	2.361.112,00		100,00%
15.14.2	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Pandora LED 18W.	un	8,00	145 812,00	1.166 496,00	8,00	1.166.496,00	-	-	-	-	-	-	8,00	1.166.496,00		100,00%
15.14.3	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado, 1x28 Hermetica LED	un	6,00	41.972,00	251.832,00	6,00	251.832,00	-	-	-	-	-	-	6,00	251.832,00		100,00%
15.14.4	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado, Luminaria EM2 60LEDS,	un	12,00	199 840,00	2.398.080,00	12,00	2.398.080,00	-	-	-	-	-	-	12,00	2 398.080,00		100,00%
15.14.5	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Panel LED 60x60W	un	2,00	199 840,00	399 680,00	2,00	399 680,00	-	-	-	-	-	-	2,00	399 680,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS N.. 005

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115405-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4617	$ 41.645.300.595,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4617	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4617	$ 41.645.300.595,00	12/07/2021 A 11/05/2028
INTERVENTORÍA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4617	$ 19.858.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901433970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000634	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE 3/03/2021 — HASTA 30/04/2022

FECHA PRESENTE ACTA

5/05/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 05 de Mayo de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARDOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y JORGE OLIVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

					CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL		CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 005		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
15.14.7	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. DESC-SOBR 4RO3 36W.	un	34,00	566.735,00	19.268.990,00		34,00	19.268.990,00	-	-			-	-	34,00	19.268.990,00		100,00%
15.14.8	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Luminaria AP3 LED 45W.	un	25,00	205.459,00	5.136.475,00		25,00	5.136.475,00	-	-			-	-	25,00	5.136.475,00		100,00%
15,15	SALIDAS ELECTRICAS				-			-								-		
	EN NIVEL 5 PISO 5				-			-								-		
15.15.1	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica cms, cable LSHF, conectores de resorte. Bala Lotus 1x13W. (No Incluida).	un	78,00	135.825,00	10.594.350,00		78,00	10.594.350,00	-	-			-	-	78,00	10.594.350,00		100,00%
15.15.2	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. Pandora LED 18W. (No Incluida).	un	8,00	135.825,00	1.086.600,00		8,00	1.086.600,00	-	-			-	-	8,00	1.086.600,00		100,00%
15.15.3	Salida para iluminación en tubería EMT, Luminaria Led 1x26 Hermetica (No Incluida)	un	7,00	90.300,00	632.100,00		7,00	632.100,00	-	-			-	-	7,00	632.100,00		100,00%
15.15.4	Salida para iluminación de emergencia en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, toma corriente, cable LSHF, conectores de resorte. Luminaria EM2 60LEDS (No Incluida).	un	19,00	154.783,00	2.940.877,00		19,00	2.940.877,00	-	-			-	-	19,00	2.940.877,00		100,00%
15.15.5	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. Aplique LED 18W (No Incluida).	un	5,00	135.825,00	679.125,00		5,00	679.125,00	-	-			-	-	5,00	679.125,00		100,00%
15.15.6	Salida para sensor de presencia en tubería EMT de 1/2", caja metálica, cable LSHF, incluye accesorios, tornillos, tapa 8cx (No incluye sensor) en circulaciones	un	5,00	98.579,00	492.895,00		5,00	492.895,00	-	-			-	-	5,00	492.895,00		100,00%
15.15.7	Suministro e instalacion de Sensor de movimiento 360° Techo 6mts de Radio OSC15-00W con Unidad de Control Sugerido	un	5,00	128.690,00	643.450,00		5,00	643.450,00	-	-			-	-	5,00	643.450,00		100,00%
15.15.8	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. Tipo Poste Tabaco LED 54W. (No Incluida)	un	8,00	135.825,00	1.086.600,00		8,00	1.086.600,00	-	-			-	-	8,00	1.086.600,00		100,00%
15.15.9	Salida para control iluminacion, incluye basicamente 2 cables No 18 THHN e instalar en las tuberias de las salidas de iluminacion exteriores con sus respectivos empalmes y derivaciones	un	133,00	31.948,00	4.249.084,00		133,00	4.249.084,00	-	-			-	-	133,00	4.249.084,00		100,00%
15.15.10	Salida eléctrica para toma corriente 120 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tubería EMT, accesorios, fijación, caja metálica, tapa troquelada, cable LSHF, empalme y aparato,	un	12,00	152.719,00	1.832.628,00		12,00	1.832.628,00	-	-			-	-	12,00	1.832.628,00		100,00%
15.15.11	Salida eléctrica tipo intemperie empotrada para toma corriente GFCI 120 V con polo a tierra a 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato,	un	5,00	173.796,00	868.980,00		5,00	868.980,00	-	-			-	-	5,00	868.980,00		100,00%
15.15.12	Salida para suiche sencillo en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato,	un	10,00	155.132,00	1.551.320,00		10,00	1.551.320,00	-	-			-	-	10,00	1.551.320,00		100,00%
15.15.13	Salida para suiche doble en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato,	un	2,00	135.757,00	271.514,00		2,00	271.514,00	-	-			-	-	2,00	271.514,00		100,00%
15.15.14	Salida para suiche triple en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato,	un	4,00	205.853,00	823.412,00		4,00	823.412,00	-	-			-	-	4,00	823.412,00		100,00%
15,16	INSTALACION CON SUMINISTRO DE LUMINARIAS				-			-								-		
	EN NIVEL 5 PISO 5				-			-								-		
15.16.1	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Bala Lotus 1x13W.	un	76,00	181.624,00	13.803.424,00		76,00	13.803.424,00	-	-			-	-	76,00	13.803.424,00		100,00%
15.16.2	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Pandora LED 18W.	un	8,00	145.812,00	1.166.496,00		8,00	1.166.496,00	-	-			-	-	8,00	1.166.496,00		100,00%
15.16.3	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. 1x26 Hermetica LED	un	7,00	41.972,00	293.804,00		7,00	293.804,00	-	-			-	-	7,00	293.804,00		100,00%
15.16.4	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Luminaria EM2 60LEDS.	un	19,00	199.840,00	3.796.960,00		19,00	3.796.960,00	-	-			-	-	19,00	3.796.960,00		100,00%
15.16.5	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Aplique LED	un	5,00	199.840,00	999.200,00		5,00	999.200,00	-	-			-	-	5,00	999.200,00		100,00%
15.16.6	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Tipo Poste Tabaco LED 54W	un	8,00	147.292,00	1.178.336,00		8,00	1.178.336,00	-	-			-	-	8,00	1.178.336,00		100,00%
15,17	CONEXIÓN DE EQUIPOS ESPECIALES HIDRÁULICOS				-			-								-		

12-054

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS N.. 005

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138 817.868 849,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901453970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
2/03/2021	30/04/2022

FECHA PRESENTE ACTA

5/05/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				VIGENCIA	
AMPAROS	Nº POLIZA		VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4917	$	41.845.300 685,00	12/07/2021 A	11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4917	$	6 840 853 448,00	12/07/2021 A	11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4917	$	41.845.300 685,00	12/07/2021 A	11/05/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4917	$	16 858 120 274,00	11/05/2023 A	11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6 840 853 448,00	12/07/2021 A	11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 05 de Mayo de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A , Contratista de Obra. ROCIO ACOSTA ARDOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y JORGE OLIVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

			CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL			CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 005		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
	SALIDAS DE FUERZA, INCLUYENDO; TUBERIAS EMT CON ACCESORIOS Y ANCLAJES, CABLES, ACOPLES FLEXIBLES, CONECTORES, ETC, DESDE EL TABLERO HASTA LA BOMBAS SEGÚN PLANOS																
15.17.1	- Bomba Equipo de Presion Agua Potable, en cable 3x1/0 1/0(F)+1x1/0 1/0(F)+1x1/0 8(T) AWG Cu	ML	95,00	307.494,00	29 211.930,00	95,00	29.211.930,00	-	-	-	-	-	-	95,00	29.211.930,00		100,00%
15.17.2	- Bomba Equipo Red Contra Incendio, en cable 3x(3x1/0 4/0(F)+1x1/0 4/0(N)+1x1/0 1/0(T) AWG Cu	ML	100,00	632 485,00	63.248.500,00	100,00	63.248.500,00	-	-	-	-	-	-	100,00	63.248.500,00		100,00%
15.17.3	- Bomba Equipo pozo Eyector aguas freáticas, en cable 3x1/0 2(F)+1x1/0 2(N)+1x1/0 8(T) AWG Cu	ML	130,00	155 078,00	20 250 140,00	130,00	20.250.140,00	-	-	-	-	-	-	130,00	20.250.140,00		100,00%
15.17.4	- Bomba Equipo pozo Eyector aguas negras, en cable 3x1/0 6(F)+1x1/0 6(N)+1x1/0 10(T) AWG Cu	ML	120,00	109 866,00	13 159 920,00	120,00	13 159.920,00	-	-	-	-	-	-	120,00	13.159 920,00		100,00%
15,18	CONEXIÓN DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	SALIDA COMPLETA PARA UNIDADES VENTILADORAS, MANEJADORAS, EVAPORADORAS, INCLUYE TUBERIA EMT CON AACCESORIOS Y ANCLAJES, ACOPLES FLEXIBLES, CONECTORES DESDE EL TABLERO HASTA EL EQUIPO SEGUN PLANOS.		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	SOTANO 2		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.18.1	- Unidad ventiladora # 13, en cable # 12	un	1,00	186.241,00	186 241,00	1,00	186.241,00	-	-	-	-	-	-	1,00	186.241,00		100,00%
15.18.2	- Unidad ventiladora # 14, en cable 12	un	1,00	432.489,00	432.489,00	1,00	432.489,00	-	-	-	-	-	-	1,00	432.489,00		100,00%
15.18.3	- Unidad ventiladora # 15, en cable # 12	un	1,00	307.494,00	307.494,00	1,00	307.494,00	-	-	-	-	-	-	1,00	307.494,00		100,00%
15.18.4	- Unidad jet fan #1, en cable 12,	un	9,00	261.553,00	2.353 977,00	9,00	2.353.977,00	-	-	-	-	-	-	9,00	2.353 977,00		100,00%
	Sotano 1		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.18.5	- Unidad ventiladora # 10-11, en cable # 12	un	2,00	112.178,00	224 356,00	2,00	224.356,00	-	-	-	-	-	-	2,00	224.356,00		100,00%
15.18.6	- Unidad jet fan #1, en cable 12,	un	9,00	261.553,00	2.353 977,00	9,00	2.353.977,00	-	-	-	-	-	-	9,00	2.353 977,00		100,00%
	Nivel 1		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.18.7	- Unidad FCC 360, en cable # 12	un	7,00	349.092,00	2 443.644,00	7,00	2.443.644,00	-	-	-	-	-	-	7,00	2 443.644,00		100,00%
15.18.8	- Unidad ventiladora # 201, en cable # 12	un	1,00	92.678,00	92 678,00	1,00	92.678,00	-	-	-	-	-	-	1,00	92.678,00		100,00%
	NIVEL 2		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.18.9	- Unidad FCC 360, en cable # 12	un	15,00	349 092,00	5 236 380,00	15,00	5.236.380,00	-	-	-	-	-	-	15,00	5 236.380,00		100,00%
15.18.10	- Unidad aire exterior UDA, en cable # 10	un	8,00	456.735,00	3 653 880,00	8,00	3.653.880,00	-	-	-	-	-	-	8,00	3.653.880,00		100,00%
	NIVEL 3		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.18.11	- UMA # 1, en cable # 8	un	1,00	78 986,00	78 986,00	1,00	78.986,00	-	-	-	-	-	-	1,00	78.986,00		100,00%
15.18.12	- UMA # 2, en cable # 8	un	1,00	78 986,00	78 986,00	1,00	78.986,00	-	-	-	-	-	-	1,00	78.986,00		100,00%
15.18.13	- UMA # 3, en cable # 8	un	1,00	81 896,00	81 896,00	1,00	81.896,00	-	-	-	-	-	-	1,00	81.896,00		100,00%
15.18.14	- UMA # 3, en cable # 6	un	1,00	530 674,00	530 674,00	1,00	530.674,00	-	-	-	-	-	-	1,00	530.674,00		100,00%
15.18.15	- Unidad fancoil pared en cable # 12	un	10,00	530 674,00	5 306 740,00	10,00	5.306.740,00	-	-	-	-	-	-	10,00	5.306 740,00		100,00%
	NIVEL 4		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.18.16	- Unidad fancoil cassette 1 via FCV en cable # 12	un	8,00	92.678,00	741.424,00	8,00	741.424,00	-	-	-	-	-	-	8,00	741.424,00		100,00%
15.18.17	- Unidad fancoil cassette 360, FCC 360, en cable # 12	un	5,00	349 092,00	1.745 460,00	5,00	1.745.460,00	-	-	-	-	-	-	5,00	1.745.460,00		100,00%
	NIVEL 5		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.18.18	- Unidad fancoil cassette 360, FCC 360, en cable # 12	un	3,00	349 092,00	1 047.276,00	3,00	1.047.276,00	-	-	-	-	-	-	3,00	1.047.276,00		100,00%
	CUBIERTA		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.18.19	- Unidad condensadora UCA # 301, en cable # 6	un	10,00	92.678,00	926.780,00	10,00	926.780,00	-	-	-	-	-	-	10,00	926.780,00		100,00%
15.18.20	- Bomba aqua trio BAF en cable # 10	un	2,00	92.678,00	185.356,00	2,00	185.356,00	-	-	-	-	-	-	2,00	185.356,00		100,00%
15.18.21	- Extractor tipo hongo EXT, en cable # 8	un	2,00	102.571,00	205.142,00	2,00	205.142,00	-	-	-	-	-	-	2,00	205.142,00		100,00%
15.18.22	- Unidad Chiller, en cable # 250	un	2,00	552.297,00	1.104.594,00	2,00	1.104.594,00	-	-	-	-	-	-	2,00	1.104.594,00		100,00%
15,19	ALIMENTADORES		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.19.1	Alimentador en cable 3x5, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , Incluye elementos de fijacion. T. TD_ILUM SOTANO 1	ml	58,00	38 150,00	2.212.700,00	58,00	2.212.700,00	-	-	-	-	-	-	58,00	2.212.700,00		100,00%
15.19.2	Alimentador en cable 3x5, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , Incluye elementos de fijacion. T. TD_TOMAS SOTANO 1	ml	55,00	33.556,00	1 845 690,00	55,00	1.845.690,00	-	-	-	-	-	-	55,00	1.845.690,00		100,00%
15.19.3	Alimentador en cable 3x2, 1x2, 1x4 AWG, por tuberia EMT 2" , Incluye elementos de fijacion. TD_AA B1	ml	15,00	49 648,00	744.720,00	15,00	744.720,00	-	-	-	-	-	-	15,00	744 720,00		100,00%
15.19.4	Alimentador en cable 3x5, 1x8, 1x8 AWG, por tuberia EMT 1 1/4" , Incluye elementos de fijacion. TD_ILUM P1	ml	82,00	38.150,00	3.128.300,00	82,00	3,128.300,00	-	-	-	-	-	-	82,00	3.128 300,00		100,00%
15.19.5	Alimentador en cable 3x5, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , Incluye elementos de fijacion. TD_TOMAS P1	ml	83,00	38.150,00	3.166.450,00	83,00	3 166,450,00	-	-	-	-	-	-	83,00	3 166 451,00		100,00%
15.19.6	Alimentador en cable 3x5, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , Incluye elementos de fijacion. TD_AA P1	ml	105,00	38.150,00	4.005 750,00	105,00	4 005 750,00	-	-	-	-	-	-	105,00	4 005 750,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS . .05

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIM - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2439104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115408-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
2/03/2021	30/04/2022

FECHA PRESENTE ACTA

5/05/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				VIGENCIA	
AMPAROS	Nº POLIZA		VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.643.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	8.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.545.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2023
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	8.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 05 de Mayo de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y JORGE OLIVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No, 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 005		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
15.19.7	Alimentador en cable 3x4, 1x4, 1x6 AWG, por tuberia EMT 1 1/4" , incluye elementos de fijacion. TD_ILUM P2	mt	20,00	38.150,00	763.000,00	20,00	763.000,00	-	-			-	-	20,00	763.000,00		100,00%
15.19.8	Alimentador en cable 3x8, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. TD_TOMAS P2	mt	67,00	38.150,00	2.556.050,00	67,00	2.556.050,00	-	-			-	-	67,00	2.556.050,00		100,00%
15.19.9	Alimentador en cable 3x2, 1x2, 1x8 AWG, por tuberia EMT 2" , incluye elementos de fijacion. TD_TOMAS CE	mt	69,00	38.150,00	2.632.350,00	69,00	2.632.350,00	-	-			-	-	69,00	2.632.350,00		100,00%
15.19.10	Alimentador en cable 3x16, 1x10, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. TD_ILUM CE	mt	71,00	38.150,00	2.708.650,00	71,00	2.708.650,00	-	-			-	-	71,00	2.708.650,00		100,00%
15.19.11	Alimentador en cable 3x8, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. TD_AA P2	mt	55,00	38.150,00	2.098.250,00	55,00	2.098.250,00	-	-			-	-	55,00	2.098.250,00		100,00%
15.19.12	Alimentador en cable 3x8, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. TD_P3	mt	55,00	38.150,00	2.098.250,00	55,00	2.098.250,00	-	-			-	-	55,00	2.098.250,00		100,00%
15.19.13	Alimentador en cable 3x1/0, 1x1/0, 1x6 AWG, por tuberia EMT 2" , incluye elementos de fijacion. TD_AA P3	mt	25,00	129.509,00	3.162.725,00	25,00	3.162.725,00	-	-			-	-	25,00	3.162.725,00		100,00%
15.19.14	Alimentador en cable 3x8, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. TD_P4	mt	85,00	25.911,00	2.202.435,00	85,00	2.202.435,00	-	-			-	-	85,00	2.202.435,00		100,00%
15.19.15	Alimentador en cable 3x8, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. TD_AA P4	mt	44,00	33.559,00	1.476.596,00	44,00	1.476.596,00	-	-			-	-	44,00	1.476.596,00		100,00%
15.19.16	Alimentador en cable 3x8, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. TD_P5	mt	50,00	33.559,00	1.677.950,00	50,00	1.677.950,00	-	-			-	-	50,00	1.677.950,00		100,00%
15.19.17	Alimentador en cable 3x4/0, 1x4/0, 1x2 AWG, por tuberia EMT 3" , incluye elementos de fijacion. TD_AA CHILLER	mt	54,00	230.423,00	12.442.842,00	54,00	12.442.842,00	-	-			-	-	54,00	12.442.842,00		100,00%
15.19.18	Alimentador en cable 3x250, 1x250, 1x4 AWG, por tuberia EMT 3" , incluye elementos de fijacion. TD_AA CUBIERTA	mt	35,00	258.129,00	8.984.515,00	35,00	8.984.515,00	-	-			-	-	35,00	8.984.515,00		100,00%
15.19.19	Alimentador en cable 3x8, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. TD_LOCAL BANCARIO	mt	35,00	38.150,00	1.335.250,00	35,00	1.335.250,00	-	-			-	-	35,00	1.335.250,00		100,00%
15.19.20	Alimentador en cable 3x8, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. TD_CAFÉ	mt	35,00	38.150,00	1.335.250,00	35,00	1.335.250,00	-	-			-	-	35,00	1.335.250,00		100,00%
15.19.21	Alimentador en cable 3x8, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. TD_ESC EL 1	mt	35,00	38.150,00	1.335.250,00	35,00	1.335.250,00	-	-			-	-	35,00	1.335.250,00		100,00%
15.19.22	Alimentador en cable 3x8, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. TD_ESC EL 2	mt	35,00	38.150,00	1.335.250,00	35,00	1.335.250,00	-	-			-	-	35,00	1.335.250,00		100,00%
15.19.23	Alimentador en cable 3x8, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. TD_ESC EL 3	mt	35,00	38.150,00	1.335.250,00	35,00	1.335.250,00	-	-			-	-	35,00	1.335.250,00		100,00%
15.19.24	Alimentador en cable 3x4, 1x4, 1x8 AWG, por tuberia EMT 2" , incluye elementos de fijacion. TD_N Ascensor 1	mt	23,00	69.362,00	1.595.326,00	23,00	1.595.326,00	-	-			-	-	23,00	1.595.326,00		100,00%
15.19.25	Alimentador en cable 3x4, 1x4, 1x8 AWG, por tuberia EMT 2" , incluye elementos de fijacion. TD_N Ascensor 2	mt	58,00	69.362,00	4.022.996,00	58,00	4.022.996,00	-	-			-	-	58,00	4.022.996,00		100,00%
15.19.26	Alimentador en cable 3x4, 1x4, 1x8 AWG, por tuberia EMT 2" , incluye elementos de fijacion. TD_N Ascensor 3	mt	40,00	69.362,00	2.774.480,00	40,00	2.774.480,00	-	-			-	-	40,00	2.774.480,00		100,00%
15.19.27	Alimentador en cable 3x4, 1x4, 1x8 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. TD_N Ascensor montacargas	mt	42,00	38.150,00	1.602.300,00	42,00	1.602.300,00	-	-			-	-	42,00	1.602.300,00		100,00%
15.19.28	Alimentador en cable 3x4, 1x4, 1x8 AWG, por tuberia EMT 2" , incluye elementos de fijacion. TD_N Ascensor 4	mt	99,00	38.150,00	3.776.850,00	99,00	3.776.850,00	-	-			-	-	99,00	3.776.850,00		100,00%
15.19.29	Alimentador en cable 3x4, 1x4, 1x8 AWG, por tuberia EMT 2" , incluye elementos de fijacion. TD_N Ascensor 5	mt	108,00	38.150,00	4.120.200,00	108,00	4.120.200,00	-	-			-	-	108,00	4.120.200,00		100,00%
15.19.30	Alimentador en cable 3x8, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. TD_N Bombe Jockey	mt	96,00	38.150,00	3.662.400,00	96,00	3.662.400,00	-	-			-	-	96,00	3.662.400,00		100,00%
15.19.31	Alimentador en cable 3x250, 1x250, 1x1/0 Al, por tuberia EMT 3" , incluye elementos de fijacion, UPS	mt	23,00	75.718,00	1.741.468,00	23,00	1.741.468,00	-	-			-	-	23,00	1.741.468,00		100,00%
15.19.32	Alimentador en cable 3x8, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. Tablero Regulado 1	mt	50,00	32.791,00	1.639.550,00	50,00	1.639.550,00	-	-			-	-	50,00	1.639.550,00		100,00%
15.19.33	Alimentador en cable 3x8, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. Tablero Regulado 2	mt	6,00	32.791,00	196.746,00	6,00	196.746,00	-	-			-	-	6,00	196.746,00		100,00%
15.19.34	Alimentador en cable 3x8, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. Tablero Regulado 3	mt	25,00	32.791,00	819.775,00	25,00	819.775,00	-	-			-	-	25,00	819.775,00		100,00%
15.19.35	Alimentador en cable 3x8, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. Tablero Regulado 4	mt	55,00	32.791,00	1.803.505,00	55,00	1.803.505,00	-	-			-	-	55,00	1.803.505,00		100,00%
15.19.36	Alimentador en cable 3x8, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. Tablero Regulado 5	mt	33,00	32.791,00	1.082.103,00	33,00	1.082.103,00	-	-			-	-	33,00	1.082.103,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS . .05

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S A	OBJETO:			
NIT:	890115405-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 139.817.868.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
2/03/2021	30/04/2022

FECHA PRESENTE ACTA

5/05/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	Nº POLIZA		VR. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.845.300.685,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	8.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4817	$	41.845.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000634	$	8.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 05 de Mayo de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y JORGE OLIVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

	CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 005		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
15.19.33	Alimentador en cable 3x6, 1x6, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. Tablero Regulado 6	ml	43,00	32.761,00	1.410.013,00	43,00	1.410.013,00	-	-			-	-	43,00	1.410.013,00		100,00%
15.19.35	Interconexion con la planta de emergencia en 3x(3x500, 1x500, 1x250), Cu embebida en placa A BCI	ml	95,00	267.657,00	25.430.265,00	95,00	25.430.265,00	-	-			-	-	95,00	25.430.265,00		100,00%
15.19.36	Interconexion con la planta de emergencia y transferencia en Electrobarra 3000 A	ml	18,00	29.898.710,00	534.576.780,00	18,00	534.576.780,00	-	-			-	-	18,00	534.576.780,00		100,00%
15.19.40	Cable de cobre desnudo, # 2 AWG, para puesta a tierra equipos. Incluye grapas	ml	210,00	10.080,00	2.112.600,00	210,00	2.112.600,00	-	-			-	-	210,00	2.112.600,00		100,00%
15.20	TABLEROS E INTERRUPTORES		-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.20.1	Tablero eléctrico de distribución de 30 circuitos trifásico para interruptores enchufables, con espacio para totalizador, 5 hilos (barras de neutro y tierra independientes), con puerta y chapa	un	2,00	449.686,00	899.372,00	2,00	899.372,00	-	-			-	-	2,00	899.372,00		100,00%
15.20.2	Tablero eléctrico de distribución de 24 circuitos trifásico para interruptores enchufables, con espacio para totalizador, 5 hilos (barras de neutro y tierra independientes), con puerta y chapa	un	9,00	342.639,00	3.083.751,00	9,00	3.083.751,00	-	-			-	-	9,00	3.083.751,00		100,00%
15.20.3	Tablero eléctrico de distribución de 12 circuitos trifásico para interruptores enchufables, con espacio para totalizador, 5 hilos (barras de neutro y tierra independientes), con puerta y chapa	un	9,00	243.890,00	2.195.010,00	9,00	2.195.010,00	-	-			-	-	9,00	2.195.010,00		100,00%
15.20.4	Tablero eléctrico de distribución de 18 circuitos trifásico para interruptores enchufables, con espacio para totalizador, 5 hilos (barras de neutro y tierra independientes), con puerta y chapa	un	8,00	283.594,00	2.268.752,00	8,00	2.268.752,00	-	-			-	-	8,00	2.268.752,00		100,00%
15.20.5	Caja para control de iluminacion en todas las zonas con telerruptores	un	9,00	342.638,00	3.083.742,00	9,00	3.083.742,00	-	-			-	-	9,00	3.083.742,00		100,00%
15.20.6	M/L de 10 puestos, para A/A en terraza - SP, tipo intemperie, para interruptor industrial, trifásico, barras de 600 A, con puerta y chapa.	un	2,00	2.793.490,00	5.586.980,00	2,00	5.586.980,00	-	-			-	-	2,00	5.586.980,00		100,00%
15.20.7	M/L de 10 puestos ,para A/A en sotano, para interruptor industrial, trifásico, barras de 225 A, con puerta y chapa.	un	1,00	2.558.590,00	2.558.590,00	1,00	2.558.590,00	-	-			-	-	1,00	2.558.590,00		100,00%
15.20.8	M/L de 6 puestos para AA en sotano, para interruptor industrial, trifásico, barras de 225 A, con puerta y chapa.	un	1,00	2.359.921,00	2.359.921,00	1,00	2.359.921,00	-	-			-	-	1,00	2.359.921,00		100,00%
15.20.9	SISTEMA UPS DE 50 KVA	un	1,00	83.300.000,00	83.300.000,00	1,00	83.300.000,00	-	-			-	-	1,00	83.300.000,00		100,00%
15.20.10	Cofre o tablero para ubicar protecciones de entrada y salida de UPS	un	1,00	567.895,00	567.895,00	1,00	567.895,00	-	-			-	-	1,00	567.895,00		100,00%
15.20.11	Bypass de mantenimiento manual externo para la UPS, con todos sus accesorios.	un	1,00	1.350.876,00	1.350.876,00	1,00	1.350.876,00	-	-			-	-	1,00	1.350.876,00		100,00%
15.20.12	Interruptores tipo industrial de 3x40A, como mínimo 25KA a 240V, con unidades térmico ajustable de disparo	un	10,00	179.900,00	1.799.000,00	10,00	1.799.000,00	-	-			-	-	10,00	1.799.000,00		100,00%
15.20.13	Interruptores tipo industrial de 3x150A, como mínimo de 25KA a 240V, con unidades térmico ajustable de disparo.	un	1,00	564.480,00	564.480,00	1,00	564.480,00	-	-			-	-	1,00	564.480,00		100,00%
15.20.14	Interruptor automático (breaker) enchufable 1x20 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	400,00	12.617,00	5.046.800,00	400,00	5.046.800,00	-	-			-	-	400,00	5.046.800,00		100,00%
15.20.15	Interruptor automático (breaker) enchufable 2x20 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	2,00	18.023,00	36.046,00	2,00	36.046,00	-	-			-	-	2,00	36.046,00		100,00%
15.20.16	Interruptor automático (breaker) enchufable 2x40 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	2,00	16.949,00	33.898,00	2,00	33.898,00	-	-			-	-	2,00	33.898,00		100,00%
15.20.17	Interruptor automático (breaker) enchufable 3x30 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	7,00	41.155,00	288.085,00	7,00	288.085,00	-	-			-	-	7,00	288.085,00		100,00%
15.20.18	Interruptor automático (breaker) enchufable 3x40 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	1,00	41.155,00	41.155,00	1,00	41.155,00	-	-			-	-	1,00	41.155,00		100,00%
15.20.19	Interruptor automático (breaker) enchufable 3x60 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	1,00	58.670,00	58.670,00	1,00	58.670,00	-	-			-	-	1,00	58.670,00		100,00%
15.20.20	Interruptor automático (breaker) industrial 3x20 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	1,00	129.991,00	129.991,00	1,00	129.991,00	-	-			-	-	1,00	129.991,00		100,00%
15.20.21	Interruptor automático (breaker) industrial 3x30 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	12,00	129.919,00	1.559.028,00	12,00	1.559.028,00	-	-			-	-	12,00	1.559.028,00		100,00%
15.20.22	Interruptor automático (breaker) industrial 3x40 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	6,00	129.919,00	779.514,00	6,00	779.514,00	-	-			-	-	6,00	779.514,00		100,00%
15.20.23	Interruptor automático (breaker) industrial 3x60 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	3,00	152.742,00	458.226,00	3,00	458.226,00	-	-			-	-	3,00	458.226,00		100,00%
15.20.24	Interruptor automático (breaker) industrial 3x80 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	3,00	189.093,00	567.279,00	3,00	567.279,00	-	-			-	-	3,00	567.279,00		100,00%
15.20.25	Interruptor automático (breaker) industrial 3x100 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	1,00	189.093,00	189.093,00	1,00	189.093,00	-	-			-	-	1,00	189.093,00		100,00%

12.440

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS . .05

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115405-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 139.617.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 41.845.300.685,00	12/07/2021 A 11/08/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND	4817	$ 6.843.683.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4817	$ 41.845.300.685,00	12/07/2021 A 11/05/2026
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901493870-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.843.683.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE 2/03/2021 — HASTA 30/04/2022

FECHA PRESENTE ACTA

6/05/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 05 de Mayo de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARDOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y JORGE OLIVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

		CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL				CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 005		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
15.20.25	Interruptor automático (breaker) industrial 3x400 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	3,00	1.740.000,00	5.220.000,00	3,00	5.220.000,00	-	-	-	-	-	-	3,00	5.220.000,00		100,00%
15,21	BANDEJAS PORTACABLE Y CANALIZACIONES SUPERFICIALES		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE:		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.21.1	Bandeja portacables tipo malla de 5.4x150 mm, Incluye accesorios y elementos de fijación.	ml	71,00	91.570,00	6.501.470,00	71,00	6.501.470,00	-	-	-	-	-	-	71,00	6.501.470,00		100,00%
15.21.2	Bandeja portacables tipo malla 300 mm, Incluye accesorios y elementos de fijación.	ml	30,00	54.672,00	1.640.160,00	30,00	1.640.160,00	-	-	-	-	-	-	30,00	1.640.160,00		100,00%
15.21.3	Canalización superficial metálica 12x5 cm con división, incluye accesorios y elementos de fijación.	ml	272,00	35.267,00	9.590.064,00	272,00	9.590.064,00	-	-	-	-	-	-	272,00	9.590.064,00		100,00%
15,22	APANTALLAMIENTO		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.22.1	Punta Franklin 150 cms en acero inox	un	9,00	79.040,00	711.360,00	9,00	711.360,00	-	-	-	-	-	-	9,00	711.360,00		100,00%
15.22.2	Alambron 8 mm	ml	564,00	8.713,00	4.914.132,00	564,00	4.914.132,00	-	-	-	-	-	-	564,00	4.914.132,00		100,00%
15.22.3	Cable de Aluminio 2/0 AWG THNN instalado, para anillos, bajada e interconexiones.	ml	24,00	8.713,00	209.112,00	24,00	209.112,00	-	-	-	-	-	-	24,00	209.112,00		100,00%
15.22.4	Cable de Cobre 2/0 AWG AWG desnudo, desde la caja de conexión hasta la malla de tierra	ml	104,00	14.564,00	1.514.656,00	104,00	1.514.656,00	-	-	-	-	-	-	104,00	1.514.656,00		100,00%
15.22.5	Tuberia PVC de 1", Incluye accesorios prefabricados y soldadura PVC.	ml	468,00	7.782,00	3.641.976,00	468,00	3.641.976,00	-	-	-	-	-	-	468,00	3.641.976,00		100,00%
15.22.6	Varilla copperweld 5/8"X2,4 mts	un	8,00	38.889,00	311.112,00	8,00	311.112,00	-	-	4,00	155.556,00	4,00	155.556,00	4,00	155.556,00	50,00%	50,00%
15.22.7	Conector de compresion en aluminio Al-Al. Incluye la instalación y encintada	un	14,00	8.216,00	115.024,00	14,00	115.024,00	-	-	-	-	-	-	14,00	115.024,00		100,00%
15.22.8	Conector bimetalico tipo H1010 para empalme Al-Cu. Incluye la instalación y encintada	un	71,00	25.709,00	1.825.339,00	71,00	1.825.339,00	-	-	-	-	-	-	71,00	1.825.339,00		100,00%
15.22.9	Soldadura exotermica	sn	21,00	26.486,00	556.206,00	21,00	556.206,00	-	-	8,00	211.888,00	8,00	211.888,00	13,00	344.318,00	38,10%	61,90%
15.22.10	Caja de inspección 30x30 cm en concreto	un	5,00	241.600,00	1.208.000,00	5,00	1.208.000,00	-	-	-	-	-	-	5,00	1.208.000,00		100,00%
15.22.11	Caja metálica de 15x15 cm aprox. Para empalme entre el cable Al 2/0 bajante y el cable Cu 2/0 de tierra.	un	37,00	31.705,00	1.173.085,00	37,00	1.173.085,00	-	-	-	-	-	-	37,00	1.173.085,00		100,00%
15,23	OTROS TRABAJOS		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	SUMINISTRO DE HORAS HOMBRE, INCLUYENDO HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y DIRECCIÓN, PARA TODOS LOS RETIROS DE LA INSTALACIÓN SOBRANTE Y OTRAS OBRAS NO CONTEMPLADAS EN LOS ANTERIORES PUNTOS.		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.23.1	- Hora oficial	un	40,00	13.453,00	538.120,00	40,00	538.120,00	-	-	-	-	-	-	40,00	538.120,00		100,00%
15.23.2	- Hora ayudante	un	40,00	9.800,00	384.000,00	40,00	384.000,00	-	-	-	-	-	-	40,00	384.000,00		100,00%
15,24	INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES REDES EXTERNAS CABLEADO ESTRUCTURADO		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.24.1	Suministro e instalación de herraje para cámara de entrada 60X60 cm de telecomunicaciones subterráneo. Incluye. Ductería PVC 4x2" Pasada tipo DB desde red de alimentación hasta Caja de Paso en muro y accesorios para la instalacion. (Prom - m x 12).	un	1,00	258.963,00	258.963,00	1,00	258.963,00	-	-	-	-	-	-	1,00	258.963,00		100,00%
15,25	INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES NIVEL SOTANO		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.25.1	Suministro e instalación salida para toma voz y datos en tuberia EMT de 1", caja 12x12 cm. Incluye tuberia EMT desde Rack, accesorios, soldadura EMT, guia en alambre 16 galvanizado y tapa floux. No Incluye Aparatos (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	1,00	45.401,00	45.401,00	1,00	45.401,00	-	-	-	-	-	-	1,00	45.401,00		100,00%
15.25.2	Suministro e instalación salida para toma datos sencilla en tuberia EMT de 1", caja 12x12 cm. Incluye tuberia EMT desde Rack, accesorios, soldadura EMT, guia en alambre 16 galvanizado y tapa floux. No Incluye Aparatos (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	1,00	45.401,00	45.401,00	1,00	45.401,00	-	-	-	-	-	-	1,00	45.401,00		100,00%
15,26	INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES NIVEL -1		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.26.1	Suministro e instalación salida para toma voz y datos en piso con tuberia PVC de 1", caja 4x4" doble fondo. Incluye tuberia PVC desde bandeja portacable, accesorios, soldadura PVC, guia en alambre 16 galvanizado y tapa floux. No Incluye Aparatos (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	4,00	66.589,00	266.356,00	4,00	266.356,00	-	-	-	-	-	-	4,00	266.356,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS . J5

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - 021 - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	860115405-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.842,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE 2/03/2021 HASTA 30/04/2022

FECHA PRESENTE ACTA

5/05/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				VIGENCIA	
AMPAROS	N° POLIZA		VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.845.300.885,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND	4817	$	6.840.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4817	$	41.845.300.885,00	12/07/2021	A 11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.858.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.840.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 05 de Mayo de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firme Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y JORGE OLIVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

			CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL			CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 005		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
15.26.2	Suministro e instalación salida para toma voz y datos en tubería PVC de 1", caja 4x4" doble fondo incluye tubería PVC desde bandeja portacable, accesorios, soldadura PVC, guía en alambre 18 galvanizado y tapa llaux. No incluye Aparatos (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	74,00	45.401,00	3.359.674,00	74,00	3.359.674,00	-	-	-	-	-	-	74,00	3.359.674,00		100,00%
15.26.3	Suministro e instalación salida para toma datos sencilla en tubería PVC de 1", caja 4x4" doble fondo incluye tubería PVC desde bandeja portacable, accesorios, soldadura PVC, guía en alambre 18 galvanizado y tapa llaux. No incluye Aparatos (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	7,00	45.401,00	317.807,00	7,00	317.807,00	-	-	-	-	-	-	7,00	317.807,00		100,00%
15.26.4	Suministro e instalación salida para Access Point sencilla en tubería PVC de 3/4", caja 4x4", incluye tubería PVC desde bandeja portacable, accesorios, soldadura PVC, guía en alambre 18 galvanizado y tapa llaux. No incluye Aparatos. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	3,00	84.596,00	253.788,00	3,00	253.788,00	-	-	-	-	-	-	3,00	253.788,00		100,00%
15.26.5	Suministro e instalación salida para Caja de Telecomunicaciones 20x20 cm con tubería PVC de 3/4", caja 4x4". Incluye tubería PVC desde bultrón en punto fijo, accesorios, soldadura PVC, guía en alambre 18 galvanizado y tapa llaux, No incluye Aparatos.	un	3,00	74.142,00	222.426,00	3,00	222.426,00	-	-	-	-	-	-	3,00	222.426,00		100,00%
15.26.6	Suministro e instalación de Bandeja Metálica porta cable 30x5cm, incluye anclaje y accesorios hasta bultrón cuarto técnico de telecomunicaciones	ml	96,00	89.175,00	8.560.800,00	96,00	8.560.800,00	-	-	-	-	-	-	96,00	8.560.800,00		100,00%
15.26.7	Suministro e instalación salida para TV con tubería PVC de 3/4", caja 4x4", incluye tubería PVC desde bultrón en punto fijo, accesorios, soldadura PVC, guía en alambre 18 galvanizado y tapa llaux. No incluye Aparatos. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	1,00	45.401,00	45.401,00	1,00	45.401,00	-	-	-	-	-	-	1,00	45.401,00		100,00%
15,27	INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES NIVEL 0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.27.1	Suministro e instalación salida para toma voz y datos en piso con tubería PVC de 1", caja 4x4" doble fondo incluye tubería PVC desde bandeja portacable, accesorios, soldadura PVC, guía en alambre 18 galvanizado y tapa llaux. No incluye Aparatos. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	1,00	39.810,00	39.810,00	1,00	39.810,00	-	-	-	-	-	-	1,00	39.810,00		100,00%
15.27.2	Suministro e instalación salida para toma voz y datos en tubería PVC de 1", caja 4x4" doble fondo. Incluye tubería PVC desde bandeja portacable, accesorios, soldadura PVC, guía en alambre 18 galvanizado y tapa llaux. No incluye Aparatos (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	6,00	45.401,00	272.406,00	6,00	272.406,00	-	-	-	-	-	-	6,00	272.406,00		100,00%
15.27.3	Suministro e instalación salida para toma datos sencilla en tubería PVC de 1", caja 4x4" doble fondo incluye tubería PVC desde bandeja portacable, accesorios, soldadura PVC, guía en alambre 18 galvanizado y tapa llaux. No incluye Aparatos. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	18,00	45.401,00	817.218,00	18,00	817.218,00	-	-	-	-	-	-	18,00	817.218,00		100,00%
15.27.4	Suministro e instalación salida para Access Point sencilla en tubería PVC de 3/4", caja 4x4", incluye tubería PVC desde bandeja portacable, accesorios, soldadura PVC, guía en alambre 18 galvanizado y tapa llaux. No incluye Aparatos. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	2,00	84.596,00	169.192,00	2,00	169.192,00	-	-	-	-	-	-	2,00	169.192,00		100,00%
15.27.5	Suministro e instalación salida para TV con tubería PVC de 3/4", caja 4x4", incluye tubería PVC desde bultrón en punto fijo, accesorios, soldadura PVC, guía en alambre 18 galvanizado y tapa llaux. No incluye Aparatos. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	15,00	45.401,00	681.015,00	15,00	681.015,00	-	-	-	-	-	-	15,00	681.015,00		100,00%
15,28	INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES NIVEL +1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.28.1	Suministro e instalación salida para toma voz y datos en tubería PVC de 1", caja 4x4" doble fondo incluye tubería PVC desde bandeja portacable, accesorios, soldadura PVC, guía en alambre 18 galvanizado y tapa llaux. No incluye Aparatos. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	7,00	45.401,00	317.807,00	7,00	317.807,00	-	-	-	-	-	-	7,00	317.807,00		100,00%
15.28.2	Suministro e instalación salida para Access Point sencilla en tubería PVC de 3/4", caja 4x4", incluye tubería PVC desde bandeja portacable, accesorios, soldadura PVC, guía en alambre 18 galvanizado y tapa llaux. No incluye Aparatos. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	1,00	84.596,00	84.596,00	1,00	84.596,00	-	-	-	-	-	-	1,00	84.596,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS . .05

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - STN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.3499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 136.817.868.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE 2/03/2021 — HASTA 30/04/2022

FECHA PRESENTE ACTA

5/05/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	Nº POLIZA		VR. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.845.300.685,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND	4817	$	6.840.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4817	$	41.845.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.858.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.840.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 05 de Mayo de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y JORGE OLIVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

			CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL			CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 005		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
15.29	INFRAESTRUCTURA VERTICAL TELECOMUNICACIONES		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.29.1	Suministro e Instalación de Bandeja Metálica porta cable 60x5 cm, entre sotano 1 y Piso 4 Incluye anclaje y accesorios	ml	12,00	18.963,00	227.556,00	12,00	227.556,00	-	-			-	-	12,00	227.556,00		100,00%
15.29.2	Troquel para salida voz y datos en canaleta 12x5 de presion.	un	20,00	3.027,00	60.540,00	20,00	60.540,00	-	-			-	-	20,00	60.540,00		100,00%
15.29.3	Marcacion de gabinetes de seguridad, sensores, detectores, luberias y demas elementos que conforman el sistema con cinta en Impresión Termica	un	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1,00	1.500.000,00	-	-			-	-	1,00	1.500.000,00		100,00%
15.29.4	Documentacion " Diagramas de Conexión, Planos de Rutas" de toda la instalacion.	un	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1,00	2.500.000,00	-	-			-	-	1,00	2.500.000,00		100,00%
15.30	INFRAESTRUCTURA DETECCION DE INCENDIOS. TODOS LOS NIVELES		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.30.1	Suministro de salida para sensor de temperatura en cielo en tuberia EMT de 3/4", caja 4x4". Incluye tuberia EMT entre sensores, accesorios, soldadura, guia en alambre 18 galvanizado, caja y tapa metálica según detalles de plano. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	40,00	54.873,00	2.194.920,00	40,00	2.194.920,00	-	-			-	-	40,00	2.194.920,00		100,00%
15.30.2	Suministro de salida para sensor de humo foto electrico en cielo en tuberia EMT de 3/4", caja 4x4". Incluye tuberia EMT entre sensores, accesorios, soldadura, guia en alambre 18 galvanizado, caja y tapa metálica según detalles de plano. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	115,00	77.765,00	8.945.275,00	115,00	8.945.275,00	-	-			-	-	115,00	8.945.275,00		100,00%
15.30.3	Suministro de salida para sensor opto-térmico en cielo en tuberia EMT de 3/4", caja 4x4". Incluye tuberia EMT entre sensores, accesorios, soldadura, guia en alambre 18 galvanizado, caja y tapa metálica según detalles de plano (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	12,00	54.873,00	658.476,00	12,00	658.476,00	-	-			-	-	12,00	658.476,00		100,00%
15.30.4	Suministro de salida para estación manual en muro con tuberia EMT de 3/4", caja 4x4". Incluye tuberia EMT entre sensores; accesorios, soldadura, guia en alambre 18 galvanizado, caja y tapa metálica según detalles de plano (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	16,00	54.873,00	877.968,00	16,00	877.968,00	-	-			-	-	16,00	877.968,00		100,00%
15.30.5	Suministro de salida para strane estroboscopico en muro con tuberia EMT de 3/4", caja 4x4". Incluye tuberia EMT entre sensores, accesorios, soldadura, guia en alambre 18 galvanizado, caja y tapa metálica según detalles de plano. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	15,00	54.873,00	823.095,00	15,00	823.095,00	-	-			-	-	15,00	823.095,00		100,00%
15.30.6	Suministro de salida para módulo direccionable en muro con tuberia EMT de 3/4", caja 4x4". Incluye tuberia EMT entre sensores, accesorios, soldadura, guia en alambre 18 galvanizado, caja y tapa metálica según detalles de plano. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	4,00	54.873,00	219.492,00	4,00	219.492,00	-	-			-	-	4,00	219.492,00		100,00%
15.30.7	Suministro de salida para receptor beam en muro con tuberia EMT de 3/4", caja 4x4". Incluye tuberia EMT entre sensores; accesorios, soldadura, guia en alambre 18 galvanizado, caja y tapa metálica según detalles de plano (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	4,00	78.873,00	315.492,00	4,00	315.492,00	-	-			-	-	4,00	315.492,00		100,00%
15.30.8	Suministro de salida para transmisor beam en muro con tuberia EMT de 3/4", caja 4x4". Incluye tuberia EMT entre sensores; accesorios, soldadura, guia en alambre 18 galvanizado, caja y tapa metálica según detalles de plano.	un	4,00	97.873,00	391.492,00	4,00	391.492,00	-	-			-	-	4,00	391.492,00		100,00%
15,31	INFRAESTRUCTURA SONIDO, NIVEL SOTANO		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS . 05

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LDP - SSN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCONTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115408-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.617.868.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
2/03/2021	30/04/2022

FECHA PRESENTE ACTA

5/05/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				VIGENCIA	
AMPAROS	Nº POLIZA		VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021 A	11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021 A	11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021 A	11/05/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023 A	11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000634	$	6.940.883.448,00	12/07/2021 A	11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 05 de Mayo de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARDOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y JORGE OLIVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 005		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
15.31.1	Suministro e Instalación salida para Sonido en Muro en tuberia EMT de 3/4", caja 4x4". Incluye tuberia PVC desde cuarto de comunicaciones, accesorios, soldadura EMT, guia en alambre 18 galvanizado, caja y tapa lisa. No incluye cableado ni aparatos(Canalización solamente y cableado por aparte)	un	4,00	77.785,00	311.140,00	4,00	311.140,00	-	-	-	-	-	-	4,00	311.140,00		100,00%
15,32	INFRAESTRUCTURA SONIDO Y VIDEO. NIVEL PISO -1		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.32.1	Suministro e Instalación salida para Sonido en Cielo en tuberia PVC de 3/4", caja 4x4". Incluye tuberia PVC desde la bandeja portacable; accesorios, soldadura PVC, guia en alambre 16 galvanizado, caja y tapa lisa. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	21,00	54.873,00	1.152.333,00	21,00	1.152.333,00	-	-	-	-	-	-	21,00	1.152.333,00		100,00%
15.32.2	Suministro e Instalación salida para Sonido en muro en tuberia PVC de 3/4", caja 4x4". Incluye tuberia PVC desde la bandeja portacable; accesorios, soldadura PVC, guia en alambre 16 galvanizado, caja y tapa lisa. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	2,00	51.578,00	103.156,00	2,00	103.156,00	-	-	-	-	-	-	2,00	103.156,00		100,00%
15.32.3	Suministro e Instalación salida para Caja de Video en muro con tuberia PVC de 3/4", caja 4x4" doble fondo. Incluye tuberia PVC desde la bandeja portacable, accesorios, soldadura PVC, guia en alambre 16 galvanizado, caja y tapa doux. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	4,00	54.873,00	219.492,00	4,00	219.492,00	-	-	-	-	-	-	4,00	219.492,00		100,00%
15.32.4	Suministro e Instalación salida para proyector en muro con tuberia PVC de 3/4", caja 4x4". Incluye tuberia PVC desde la bandeja portacable; accesorios, soldadura PVC, guia en alambre 16 galvanizado, caja y tapa lisa.	un	4,00	54.873,00	219.492,00	4,00	219.492,00	-	-	-	-	-	-	4,00	219.492,00		100,00%
15.32.5	Suministro e Instalación salida para placa multimedia en tuberia PVC de 3/4", caja 4x4" doble fondo Incluye tuberia PVC desde bandeja portacable, accesorios, soldadura PVC, guia en alambre 16 galvanizado y tapa lisa. No incluye Aparatos.	un	25,00	54.873,00	1.371.825,00	25,00	1.371.825,00	-	-	-	-	-	-	25,00	1.371.825,00		100,00%
15.32.6	Suministro e Instalación salida para control de aire en cielo en tuberia PVC de 3/4", caja 4x4" doble fondo. Incluye tuberia PVC desde bandeja portacable, accesorios, soldadura PVC, guia en alambre 16 galvanizado y tapa lisa. No incluye Aparatos	un	2,00	89.541,00	179.082,00	2,00	179.082,00	-	-	-	-	-	-	2,00	179.082,00		100,00%
15,33	INFRAESTRUCTURA SONIDO Y VIDEO. NIVEL PISO 0		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.33.1	Suministro e Instalación salida para Sonido en Cielo en tuberia PVC de 3/4", caja 4x4". Incluye tuberia PVC desde la bandeja portacable; accesorios, soldadura PVC, guia en alambre 16 galvanizado, caja y tapa lisa.	un	13,00	54.873,00	713.349,00	13,00	713.349,00	-	-	-	-	-	-	13,00	713.349,00		100,00%
15.33.2	Suministro e Instalación salida para Sonido en Muro en tuberia PVC de 3/4", caja 4x4". Incluye tuberia PVC desde la bandeja portacable; accesorios, soldadura PVC, guia en alambre 16 galvanizado, caja y tapa lisa.	un	2,00	51.578,00	103.156,00	2,00	103.156,00	-	-	-	-	-	-	2,00	103.156,00		100,00%
15.33.3	Suministro e Instalación salida para Caja de Video en muro con tuberia PVC de 3/4", caja 4x4" doble fondo Incluye tuberia PVC desde la bandeja portacable; accesorios, soldadura PVC, guia en alambre 16 galvanizado, caja y tapa doux	un	4,00	54.873,00	219.492,00	4,00	219.492,00	-	-	-	-	-	-	4,00	219.492,00		100,00%

1396

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS . 05

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCONTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 136.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493670-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
2/03/2021	30/04/2022

FECHA PRESENTE ACTA

5/05/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A				VIGENCIA	
AMPAROS	Nº POLIZA		VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	18.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 05 de Mayo de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y JORGE OLIVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación.

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 005		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
15.33.4	Suministro e instalación salida para micrófono en muro con tubería PVC de 3/4", caja 4x4" doble fondo. Incluye tubería PVC desde la bandeja portacable, accesorios, soldadura PVC, guía en alambre 16 galvanizado, caja y tapa lisa.	un	4,00	65.874,00	263.496,00	4,00	263.496,00	-	-	-	-	-	-	4,00	263.496,00		100,00%
15,34	INFRAESTRUCTURA SONIDO Y VIDEO. NIVEL PISO +1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.34.1	Suministro e instalación salida para Sonido en Cielo en tubería PVC de 3/4", caja 4x4". Incluye tubería PVC desde la bandeja portacable; accesorios, soldadura PVC, guía en alambre 16 galvanizado, caja y tapa lisa.	un	16,00	54.873,00	877.968,00	16,00	877.968,00	-	-	-	-	-	-	16,00	877.968,00		100,00%
15,35	INFRAESTRUCTURA CONTROLES DE ACCESO TODOS LOS NIVELES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.35.1	Salidas para tecleras en tubería EMT de 3/4" con sus uniones, curvas y cajas. No incluye cableado ni aparatos (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	38,00	89.873,00	3.415.174,00	38,00	3.415.174,00	-	-	-	-	-	-	38,00	3.415.174,00		100,00%
15.35.2	Suministro de salida para pulsador de salida en pared en tubería EMT de 3/4", caja 4x4". Incluye tubería EMT desde la bandeja portacable, accesorios, soldadura, guía en alambre 16 galvanizado, caja y tapa lisa. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	20,00	112.584,00	2.251.680,00	20,00	2.251.680,00	-	-	-	-	-	-	20,00	2.251.680,00		100,00%
15.35.3	Suministro e instalación salida para Electroimán en dintel de la puerta con tubería EMT de 3/4", caja 4x4" doble fondo. Incluye tubería EMT desde la bandeja portacable, accesorios, soldadura, guía en alambre 16 galvanizado, caja y tapa flous. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	27,00	112.584,00	3.039.768,00	27,00	3.039.768,00	-	-	-	-	-	-	27,00	3.039.768,00		100,00%
15.35.4	Suministro de salida para Pulsador de liberación general en pared en tubería PVC de 3/4", caja 4x4". Incluye tubería PVC desde panel; accesorios, soldadura PVC, guía en alambre 16 galvanizado, caja y tapa lisa. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	2,00	54.873,00	109.746,00	2,00	109.746,00	-	-	-	-	-	-	2,00	109.746,00		100,00%
15.35.5	Suministro de salida para gabinete control acceso, incluye toma Regulada	un	11,00	175.830,00	1.934.130,00	11,00	1.934.130,00	-	-	-	-	-	-	11,00	1.934.130,00		100,00%
15,36	INFRAESTRUCTURA CCTV TODOS LOS NIVELES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.36.1	Suministro de salida para cámara tipo domo en tubería EMT de 3/4", caja 4x4". Incluye tubería EMT desde la bandeja portacable; accesorios, soldadura EMT, guía en alambre 16 galvanizado, caja y tapa lisa. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	24,00	89.873,00	2.156.952,00	24,00	2.156.952,00	-	-	-	-	-	-	24,00	2.156.952,00		100,00%
15.36.2	Suministro de salida para cámara tipo bala en tubería EMT de 3/4", caja 4x4". Incluye tubería EMT desde la bandeja portacable; accesorios, soldadura EMT, guía en alambre 16 galvanizado, caja y tapa lisa. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	8,00	89.873,00	718.984,00	8,00	718.984,00	-	-	-	-	-	-	8,00	718.984,00		100,00%
15.36.3	Suministro e instalacion de tubería EMT 3/4 con sus respectivos accesorios como uniones, curvas, grapas, marcacion etc. Esta tubería es la adicional a la incluida en las salidas anteriores	ML	400,00	15.496,00	6.198.400,00	400,00	6.198.400,00	-	-	-	-	-	-	400,00	6.198.400,00		100,00%
15,37	INFRAESTRUCTURA EQUIPOS ELECTROMECANICOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.37.1	Suministro e instalacion de tubería EMT 3/4 con sus respectivos accesorios como uniones, curvas, grapas, marcacion etc	ML	500,00	15.496,00	7.748.000,00	500,00	7.748.000,00	-	-	-	-	-	-	500,00	7.748.000,00		100,00%
15,38	OTROS VARIOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.38.3	Planta Electrica 600KVA eFectivos Valledupar	un	1,00	248.500.000,00	248.500.000,00	1,00	248.500.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	248.500.000,00		100,00%
15.38.4	Transformador Base-Bnk Tipo Seco 225kVA, 208V/480V	un	2,00	25.000.000,00	50.000.000,00	2,00	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	2,00	50.000.000,00		100,00%
16,00	ARQUITECTÓNICOS				$ 38.912.168.484,21	$ -	$ 38.912.168.484,21		$ 37.693.629,36		$ 219.722.662,45		$ 257.606.311,82		$ 38.654.562.172,39	0,66%	99,34%
16,10	CUBIERTAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16.1.1	CUBIERTA TIPO 1 (P7) PISO FLOTADO DE MADERA	m2	1.183,71	477.479,00	565.647.087,09	1.183,71	565.647.087,09	-	-	-	-	-	-	1.183,71	565.647.087,09		100,00%
16.1.2	CUBIERTA TIPO 2 (P10) MULCH DE CORTEZA VEGETAL	m2	2.945,65	277.785,00	818.257.385,25	2.945,65	818.257.385,25	-	-	-	-	-	-	2.945,65	818.257.385,25		100,00%
16.1.3	CUBIERTA TIPO 3 (P11) VEGETACIÓN + SUSTRATO PARA VEGETACIÓN	m2	958,20	345.885,00	331.427.007,00	958,20	331.427.007,00	-	-	-	-	-	-	958,20	331.427.007,00		100,00%
16,20	MAMPOSTERIA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 005

CONTRATO N°	2021043002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115405-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 139.817.858.849,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901433870-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE 2/03/2021 — HASTA 30/04/2022

FECHA PRESENTE ACTA

5/05/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				VIGENCIA	
AMPAROS	N° POLIZA		VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1600834	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el día 05 de Mayo de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y JORGE OLIVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021043002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 005		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
16.2.1	MURO BLOQUE nº5 DE ARCILLA 33X11,5X23 CM, E=11,5CM	M2	673,00	85.471,00	57.521.983,00	673,00	57.521.983,00	-	-	-	-	-	-	673,00	57.521.983,00		100,00%
16.2.2	MURO DRYWALL CON LÁMINA DE FIBROCEMENTO de 8mm 106/900 (5+90+5)	M2	4.343,00	106.524,00	462.633.732,00	4.343,00	462.633.732,00	-	-	-	-	-	-	4.343,00	462.633.732,00		100,00%
16.2.3	MURO DOBLE DRYWALL CON LÁMINA DE FIBROCEMENTO de 8mm 206/900 (5+90+5+90+5)	M2	2.055,00	244.694,00	503.462.670,00	2.055,00	503.462.670,00	-	-	-	-	-	-	2.055,00	503.462.670,00		100,00%
16.2.4	MURO BLOQUE DE CONCRETO ESTRUCTURAL RF 40X20X20 CM, E=20CM	M2	983,00	141.249,00	138.847.767,00	983,00	138.847.767,00	-	-	-	-	-	-	983,00	138.847.767,00		100,00%
16.2.5	TRASDOS DRYWALL 72,7/600 (12,7+60)	m2	445,54	53.749,00	23.945.992,84	445,54	23.945.992,84	-	-	-	-	-	-	445,54	23.945.992,84		100,00%
16.2.6	TRASDOS DRYWALL RH 72,7/600 (12,7+60)	m2	129,82	61.313,00	7.959.653,66	129,82	7.959.653,66	-	-	-	-	-	-	129,82	7.959.653,66		100,00%
16.2.7	MURO DRYWALL CON AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA 85,4/600 (12,7+60LR+12,7)	m2	266,41	159.929,00	42.606.884,89	266,41	42.606.884,89	-	-	-	-	-	-	266,41	42.606.884,89		100,00%
16.2.8	TRASDOS SALA DE GRABACIÓN 84,4/400 (60LR+12,7+LBM+12,7) CON LAMINA BETUN MODIFICADO	m2	567,50	185.277,00	105.144.697,50	567,50	105.144.697,50	-	-	-	-	-	-	567,50	105.144.697,50		100,00%
16.2.9	MURO SALA EVENTOS 216,7/400 (5+60LR+12,7+60LR+8+8)	m2	780,58	337.009,00	268.432.575,22	780,58	268.432.575,22	-	-	-	-	-	-	780,58	268.432.575,22		100,00%
16.30	ENVOLVENTE Y CIERRES COMPUESTOS DE FACHADA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16.3.1	C12 ENVOLVENTE EDIFICIO MEDIANTE MALLA METALICA METALSCREEN HUNTER DOUGLAS	M2	9.500,00	930.000,00	8.835.000.000,00	9.500,00	8.835.000.000,00	-	-	-	-	-	-	9.500,00	8.835.000.000,00		100,00%
16.3.2	F1/BLOQUE CONCRETO 40X30X20 + PAÑETE HIDROFUGO + PINTURA INTUMESCENTE	M2	1.141,75	351.369,00	401.209.808,25	1.141,75	401.209.808,25	-	-	-	-	-	-	1.141,75	401.209.808,25		100,00%
16.3.3	F2/BLOQUE CONCRETO 40X30X20+PAÑETE HIDROFUGO+PINTURA INTUMESCENTE+TRASDOS DRYWALL RH 72,7/600 (12,7+60)	M2	41,09	412.712,00	16.958.336,08	41,09	16.958.336,08	-	-	-	-	-	-	41,09	16.958.336,08		100,00%
16.3.4	F3/BLOQUE CONCRETO 40X20X20+PAÑETE HIDROFUGO+PINTURA INTUMESCENTE+TRASDOS DRYWALL RH 72,7/600 (12,7+60)	M2	621,18	409.562,00	254.411.723,16	621,18	254.411.723,16	-	-	-	-	-	-	621,18	254.411.723,16		100,00%
16.3.5	RECUBRIMIENTO DE MURO CON PALO Haematoxylum brasiletto (PALOS DE BRASIL)	M2	423,24	617.852,00	261.499.680,48	423,24	261.499.680,48	-	-	-	-	-	-	423,24	261.499.680,48		100,00%
16.3.6	RECUBRIMIENTO DE MURO CON PALO Haematoxylum brasiletto (PALOS DE BRASIL)Y SUBESTRUCTURA AUTOPORTANTE	M2	419,31	690.618,00	289.583.033,58	419,31	289.583.033,58	-	-	-	-	-	-	419,31	289.583.033,58		100,00%
16.3.7	FACHADA EN VIDRIO FLOTANTE DE P1° SISTEMA SPIDER	M2	419,04	827.891,00	346.919.444,64	419,04	346.919.444,64	-	-	-	-	-	-	419,04	346.919.444,64		100,00%
16.3.8	FACHADA EN VIDRIO FLOTANTE DE P2° CON LAMAS Y VIDRIO LAMINADO 6+6	M2	226,50	857.709,00	196.271.506,50	226,50	196.271.506,50	-	-	-	-	-	-	226,50	196.271.506,50		100,00%
16.3.9	FACHADA EN VIDRIO FLOTANTE DE P4° CON VIDRIO LAMINADO 6+6	M2	105,84	854.808,00	90.472.878,72	105,84	90.472.878,72	-	-	-	-	-	-	105,84	90.472.878,72		100,00%
16.3.10	FACHADA EN VIDRIO PERFILES DE ACERO DE P5° CON VIDRIO LAMINADO 6+6	M2	338,93	892.105,00	302.361.147,65	338,93	302.361.147,65	-	-	-	-	-	-	338,93	302.361.147,65		100,00%
16.3.11	VENTANA V1	M2	5,11	454.170,00	2.331.028,70	5,11	2.331.028,70	-	-	-	-	-	-	5,11	2.331.028,70		100,00%
16.3.12	VENTANA V2	M2	5,11	492.336,00	2.515.847,18	5,11	2.515.847,18	-	-	-	-	-	-	5,11	2.515.847,18		100,00%
16.3.13	VENTANA V3	M2	1,82	530.718,00	962.286,76	1,82	962.286,76	-	-	-	-	-	-	1,82	962.286,76		100,00%
16.3.14	VENTANA V5	M2	22,50	685.864,00	15.431.940,00	22,50	15.431.940,00	-	-	-	-	-	-	22,50	15.431.940,00		100,00%
16.3.15	VENTANA V7	M2	13,16	644.972,00	8.487.173,52	13,16	8.487.173,52	-	-	-	-	-	-	13,16	8.487.173,52		100,00%
16.3.16	VENTANA V9	M2	0,65	595.353,00	386.979,45	0,65	386.979,45	-	-	-	-	-	-	0,65	386.979,45		100,00%
16.3.17	PUERTA DE VIDRIO DOBLE EN FACHADA SISTEMA SPIDER	UD	5,00	3.921.826,00	19.609.130,00	5,00	19.609.130,00	-	-	-	-	-	-	5,00	19.609.130,00		100,00%
16.3.18	PUERTA DE VIDRIO DOBLE EN FACHADA P5°	UD	5,00	2.594.156,00	12.970.780,00	5,00	12.970.780,00	-	-	-	-	-	-	5,00	12.970.780,00		100,00%
16.40	RECUBRIMIENTO EN MUROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16.4.1	ESTUCO Y PINTURA 3 MANOS VINILTEX ACRILTEX RAL SEGUN PLANOS (M1+M2+M3+M5+M9+M10+M14--cortina malla metalica)	M2	13.248,22	41.801,00	553.139.200,22	13.248,22	553.139.200,22	-	-	-	-	-	-	13.248,22	553.139.200,22		100,00%
16.4.2	PAÑETE E=20MM, MALLA CON VENA (M5+M9+M10+M14+M24)	M2	3.312,00	37.586,00	124.484.832,00	3.312,00	124.484.832,00	-	-	-	-	-	-	3.312,00	124.484.832,00		100,00%
16.4.3	M18 / LISTONES TIPO LAMITECH SILENCIA 2400X125MM	M2	440,68	439.751,00	193.789.470,68	440,68	193.789.470,68	-	-	-	-	-	-	440,68	193.789.470,68		100,00%
16.4.4	M20 / ENCHAPE DE CERAMICA BRILLANTE CORONA MARIPOSAS	M2	1.171,42	72.576,00	85.134.119,92	1.171,42	85.134.119,92	-	-	-	-	-	-	1.171,42	85.134.119,92		100,00%
16.4.5	M22+M23 / RECUBRIMIENTO MADERA CONTRACHAPADA DE PINO E=12MM BARNIZADO	M2	144,15	207.629,00	29.929.720,35	144,15	29.929.720,35	-	-	-	-	-	-	144,15	29.929.720,35		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS . .05

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 136.817.868.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4617	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4617	$ 6.949.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4617	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/05/2026
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4617	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000534	$ 6.949.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE 2/03/2021 — HASTA 30/04/2022

FECHA PRESENTE ACTA

5/05/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 05 de Mayo de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventoria, ANDRES ALMARALES MELO y JORGE OLIVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion.

		CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL				CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 005		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
16.4.6	M24 / TEXTIL VINILICO EN ROLLO+ADHESIVO DE CEM CONTACTO	M2	534,91	202.593,00	108.369.021,63	534,91	108.369.021,63	-	-			-	-	534,91	108.369.021,63		100,00%
16.4.7	M41205/PANEL ACUSTICO RANURADO EN MADERA DE 15MM (M44+M25)	M2	511,93	520.473,00	266.445.742,89	511,93	266.445.742,89	-	-			-	-	511,93	266.445.742,89		100,00%
16,50	PISOS			-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
16.5.1	ALISTADO DE PISO DE MORTERO 1:4, E=50M (P1+P2+P3+P4+P6+P18+P19)	M2	5.323,48	33.644,00	179.103.161,12	5.323,48	179.103.161,12	-	-			-	-	5.323,48	179.103.161,12		100,00%
16.5.2	P1 / PISO TEXTIL VINILICO ROLLO E=4MM Y ADHESIVO PVA BASE AQUA (P1+P18)	M2	3.633,09	271.954,00	988.033.357,86	3.633,09	988.033.357,86	-	-			-	-	3.633,09	988.033.357,86		100,00%
16.5.3	P1B / PISO TEXTIL VINILICO E=4MM+ADHESIVO PVA BASE AQUA+PELDAÑOS CON TERRAZO 2"	M2	337,84	358.454,00	121.100.099,36	337,84	121.100.099,36	-	-			-	-	337,84	121.100.099,36		100,00%
16.5.4	P2 / LISTONES DE MADERA E=5MM ACQUAFLOOR (ROBLE ARENA)+LAMINA ANTI-IMPACTO (P2+P6)	M2	1.039,71	189.436,00	196.960.582,96	1.039,71	196.960.582,96	-	-			-	-	1.039,71	196.960.582,96		100,00%
16.5.5	P4 / BALDOSA PORCELANATO SOHO GRIS DE CORONA, DIMENSIONES 568X568X9.5MM (P4+P19)	M2	275,79	99.323,00	27.392.290,17	275,79	27.392.290,17	-	-			-	-	275,79	27.392.290,17		100,00%
16.5.6	P5/TERRAZO GRIS 30X30X25MM TOMADO CON MORTERO EN ESCALERAS	M2	224,48	172.877,00	38.807.428,96	224,48	38.807.428,96	-	-			-	-	224,48	38.807.428,96		100,00%
16.5.7	P6 / LAMINA DE POLIETILENO + PANEL RIGIDO DE LANA ROCA E=30MM Y 120K/M3 + LAMINA POLIETILENO	M2	60,41	76.341,00	4.611.759,81	60,41	4.611.759,81	-	-			-	-	60,41	4.611.759,81		100,00%
16.5.8	P6/ ALISTADO DE PISO CEMORTERO ALTA RESISTENCIA + EPOXI DE ALTO DESEMPEÑO SIKAGUARD 63N RAL7036	M2	763,42	190.975,00	145.794.134,50	763,42	145.794.134,50	-	-			-	-	763,42	145.794.134,50		100,00%
16.5.9	P9 / EPOXI DE ALTO DESEMPEÑO SIKAGUAD 63N RAL7036 ANTIDESLIZANTE CON ARIDO ARENOSO EN LA MEZCLA.	M2	267,88	153.101,00	41.012.695,88	267,88	41.012.695,88	-	-			-	-	267,88	41.012.695,88		100,00%
16.5.10	P15 / ACABADO PULIDO EN LOSA DE CONCRETO CON ENDURECEDOR DE CUARZO	M2	8.444,27	44.628,00	377.357.537,76	8.444,27	377.357.537,76	-	-	3.724,23	166.428.390,24	3.724,23	166.428.390,24	4.720,04	210.929.147,52	44,10%	55,90%
16.5.11	P17 / ACABADO PULIDO + EPOXI DE ALTO DESEMPEÑO SIKAGUARD 63N RAL7036	M2	853,55	173.954,00	113.657.836,70	853,55	113.657.836,70	-	-			-	-	853,55	113.657.836,70		100,00%
16.5.12	P20 / ACABADO RANURADO DE LOSA DE CONCRETO	M2	582,89	13.637,00	7.948.143,53	582,89	7.948.143,53	-	-			-	-	582,89	7.948.143,53		100,00%
16.5.13	SOLERA SOBRE ELEVADA DE 10CM CON EPS ICOPOR DENSIDAD 20 (50-100CM)	M2	540,81	149.848,00	81.039.296,88	540,81	81.039.296,88	-	-			-	-	540,81	81.039.296,88		100,00%
16.5.14	SOLERA SOBRE ELEVADA DE 15CM CON EPS ICOPOR DENSIDAD 20 (50-100CM)	M2	540,48	169.831,00	91.790.258,88	540,48	91.790.258,88	-	-			-	-	540,48	91.790.258,88		100,00%
16.5.15	LOSA SOBRE-ELEVADA EN SOTANO -2 DE 7-8CM + LAMINA DRENANTE DE 2CM	M2	5.424,27	85.813,00	465.472.881,51	5.424,27	465.472.881,51	-	-			-	-	5.424,27	465.472.881,51		100,00%
16,60	CIELOS RASOS			-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
16.6.1	C1 / TECHO EN MALLA METÁLICA HUNTER DOUGLAS METALSCREEN	M2	5.500,00	910.000,00	5.005.000.000,00	5.500,00	5.005.000.000,00	-	-			-	-	5.500,00	5.005.000.000,00		100,00%
16.6.2	C3 / CIELO SUSPENDIDO PANEL ACUSTICO MDF RANURADO TIPO D+002 DECUSTIX O SIMILAR	M2	32,01	587.786,00	18.815.029,86	32,01	18.815.029,86	-	-			-	-	32,01	18.815.029,86		100,00%
16.6.3	C5 / PINTURA VINILTEX RAL SEGUN PLANOS (C1+C5+C7+C9+C10+C11+C15)	M2	10.339,05	33.732,00	348.756.834,60	10.339,05	348.756.834,60	-	-			-	-	10.339,05	348.756.834,60		100,00%
16.6.4	C6 / PANELES DE ALUZINC DE HUNTER DOUGLAS TIPO 64R DE 150X25X0,6MM Y PASO 100MM + PINTURA POLIESTER	M2	543,53	200.096,00	108.741.872,98	543,53	108.741.872,98	-	-			-	-	543,53	108.741.872,98		100,00%
16.6.5	C7 / CIELO RASO SUSPENDIDO DOBLE DRYWALL CON AISLAMIENTO Y CUELGUES DE MUELLE (C7+C8)	M2	60,41	132.331,00	7.994.115,71	60,41	7.994.115,71	-	-			-	-	60,41	7.994.115,71		100,00%
16.6.6	C8 / CIELO SUSPENDIDO FONOABSORVENTE TIPO LAMITHEC 60X60	M2	33,42	253.891,00	8.485.037,22	33,42	8.485.037,22	-	-			-	-	33,42	8.485.037,22		100,00%
16.6.7	C9 / CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL RH	M2	416,41	62.896,00	26.232.164,36	416,41	26.232.164,36	-	-			-	-	416,41	26.232.164,36		100,00%
16.6.8	C10 / PAÑETE HIDROFUGO	M2	199,86	32.073,60	6.410.109,78	199,86	6.410.109,78	-	-			-	-	199,86	6.410.109,78		100,00%
16.6.9	C11 / CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL RESISTENTE AL FUEGO	M2	995,44	62.996,00	62.708.738,24	995,44	62.708.738,24	-	-			-	-	995,44	62.708.738,24		100,00%
16.6.10	C13 / PINTURA VINILTEX ANTIHUMEDAD	M2	8.266,27	31.295,00	258.318.819,65	8.266,27	258.318.819,65	-	-			-	-	8.266,27	258.318.819,65		100,00%
16.6.11	C15 / LOSA DE CONCRETO SOBRE PLACA NERVADA DE ACERO GALV. + CIELO RASO DRYWALL 15,8+ZLR	M2	42,60	265.275,00	11.300.715,00	42,60	11.300.715,00	-	-			-	-	42,60	11.300.715,00		100,00%
16.6.12	C4 / CIELO RASO ACÚSTICO LMD-I, 601 DE LINEAR GRID DE LINDNER	M2	933,60	686.132,00	642.440.035,20	933,60	642.440.035,20	-	-			-	-	933,60	642.440.035,20		100,00%
16,70	VARIOS			-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
16.7.1	CORTINA ALUMINIO AHOGADO KRISKADECOR, ARAHUACA	M2	478,35	849.055,00	406.145.459,25	478,35	406.145.459,25	-	-			-	-	478,35	406.145.459,25		100,00%

13-067

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS 05

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.3499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4617	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND	4617	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021250007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4617	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/05/2026
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4617	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901493670-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
2/03/2021	30/04/2022

FECHA PRESENTE ACTA

5/05/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 05 de Mayo de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y JORGE OLIVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 005		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
16.14.10	DISPENSADOR DE JABON EN ENCIMERA-MESÓN EN ACERO INOXIDABLE	UD	35,00	250.225,00	8.757.875,00	35,00	8.757.875,00	-	-			-	-	35,00	8.757.875,00		100,00%
16.14.11	DISPENSADOR DE JABON EN PARED EN ACERO INOXIDABLE	UD	12,00	270.225,00	3.242.700,00	12,00	3.242.700,00	-	-			-	-	12,00	3.242.700,00		100,00%
16.14.12	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA EN ACERO INOXIDABLE	UD	33,00	370.225,00	12.217.425,00	33,00	12.217.425,00	-	-			-	-	33,00	12.217.425,00		100,00%
16.14.13	RECIPIENTE DE DESECHOS	UD	33,00	432.283,00	14.265.339,00	33,00	14.265.339,00	-	-			-	-	33,00	14.265.339,00		100,00%
16,15	URBANIZACION		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
16.15.1	SUBBASE GRANULAR COMPACTADA	M3	1.042,39	84.477,00	88.481.880,03	1.042,39	88.481.880,03	-	-			-	-	1.042,39	88.481.880,03		100,00%
16.15.2	BASE GRANULAR B-200	M3	1.547,17	86.677,00	134.104.054,09	1.547,17	134.104.054,09	-	-			-	-	1.547,17	134.104.054,09		100,00%
16.15.3	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFÁLTICO	M2	4.925,06	105.218,00	518.204.983,08	4.925,06	518.204.983,08	-	-			-	-	4.925,06	518.204.983,08		100,00%
16.15.4	LOSA 3000 PSI REFORZADO CON MALLA 7MM 15X15 M-262	m2	1.203,89	122.231,00	147.152.678,59	1.203,89	147.152.678,59	-	-			-	-	1.203,89	147.152.678,59		100,00%
16.15.5	CONCRETO PARA CIMENTACION LUMINARIAS	m3	1,87	683.981,00	1.279.044,47	1,87	1.279.044,47	-	-			-	-	1,87	1.279.044,47		100,00%
16.15.6	GEOTEXTIL HT 1800	m2	11.200,00	7.682,00	86.036.400,00	11.200,00	86.036.400,00	4.931,48	37.883.629,36	5.218,45	40.085.209,72	10.149,94	77.971.839,08	1.050,06	8.064.560,92	90,62%	9,38%
16.15.7	POLIETILENO (impermeabilizacion de piso)	m2	10.530,47	5.392,00	56.774.989,54	10.530,47	56.774.989,54	-	-	2.453,75	13.206.982,50	2.453,75	13.206.982,50	8.076,72	43.568.007,04	23,30%	76,70%
16.15.8	ANDEN DE CONCRETO REFORZADO ESCOBEADO	m2	1.121,89	90.743,00	101.803.664,27	1.121,89	101.803.664,27	-	-			-	-	1.121,89	101.803.664,27		100,00%
16.15.9	BOLARDO LUMINOSO	UD	42,00	1.190.714,00	50.009.988,00	42,00	50.009.988,00	-	-			-	-	42,00	50.009.988,00		100,00%
16.15.10	PINTADO DE LINEAS Y FLECHAS CALLE	m2	257,00	36.382,00	9.350.174,00	257,00	9.350.174,00	-	-			-	-	257,00	9.350.174,00		100,00%
16.15.11	ADOQUIN EN HUELLAS 6X15X15cm	m2	37,44	98.562,00	3.615.261,28	37,44	3.615.261,28	-	-			-	-	37,44	3.615.261,28		100,00%
16.15.12	ADOQUIN EN CONTRAHUELLAS 6x10x15cm	m2	19,89	85.312,00	1.696.865,68	19,89	1.696.865,68	-	-			-	-	19,89	1.696.865,68		100,00%
16.15.13	ARENA ESPACIO PUBLICO	M2	1.656,60	116.005,00	192.173.883,00	1.656,60	192.173.883,00	-	-			-	-	1.656,60	192.173.883,00		100,00%
16.15.14	LISTONES DE CONCRETO 14,5 X 4,5 X 120 CM PREFABRICADO EN SITIO	m2	3.227,00	82.296,00	265.543.378,00	3.227,00	265.543.378,00	-	-			-	-	3.227,00	265.543.378,00		100,00%
16.15.15	CIERRE DE TUBOS DE ACERO GALVANIZADO LACADO DE 2"	m2	77,80	434.294,00	33.781.214,40	77,80	33.781.214,40	-	-			-	-	77,80	33.781.214,40		100,00%
16.15.16	BORDILLO PARA ALCORQUE TIPO A	m	30,00	90.180,00	2.704.800,00	30,00	2.704.800,00	-	-			-	-	30,00	2.704.800,00		100,00%
16.15.17	BORDILLO PARA ALCORQUE TIPO B	m	61,80	116.807,00	7.195.311,20	61,80	7.195.311,20	-	-			-	-	61,80	7.195.311,20		100,00%
16.15.18	BORDILLO BARRERA RECTANGULAR	m	1.232,73	83.283,00	102.665.452,59	1.232,73	102.665.452,59	-	-			-	-	1.232,73	102.665.452,59		100,00%
16.15.19	BORDILLO BARRERA RECTO	m	266,10	75.255,00	21.680.965,50	266,10	21.680.965,50	-	-			-	-	266,10	21.680.965,50		100,00%
16.15.20	EMPRADIZACION (inc capa de 20cm de tierra negra)	m2	5.820,00	48.600,00	282.852.000,00	5.820,00	282.852.000,00	-	-			-	-	5.820,00	282.852.000,00		100,00%
16.15.21	CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA E=10cm	M2	47,26	47.361,00	2.238.226,86	47,26	2.238.226,86	-	-			-	-	47,26	2.238.226,86		100,00%
16.15.22	AISLAMIENTO DE EPS	m2	2.000,00	66.132,00	132.264.000,00	2.000,00	132.264.000,00	-	-			-	-	2.000,00	132.264.000,00		100,00%
16.15.23	MURO BLOQUE DE CONCRETO ESTRUCTURAL RF 40X20X20 CM, E=20CM	M2	163,35	164.711,00	26.905.541,85	163,35	26.905.541,85	-	-			-	-	163,35	26.905.541,85		100,00%
16.15.24	ARBOL MANGIFERA	UD	130,00	342.958,00	44.584.540,00	130,00	44.584.540,00	-	-			-	-	130,00	44.584.540,00		100,00%
16.15.25	LOSA CONCRETO CALZADA	M2	3.009,23	193.085,00	581.037.174,55	3.009,23	581.037.174,55	-	-			-	-	3.009,23	581.037.174,55		100,00%
16.15.26	MORTERO IMPERMEABILIZADO CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE MANTO ASFÁLTICO CON FOIL DE ALUMINIO	M2	3.173,00	149.190,00	473.379.870,00	3.173,00	473.379.870,00	-	-			-	-	3.173,00	473.379.870,00		100,00%
16.15.27	ADOQUIN FRANJA PODOTÁCTIL SOBRE BASE DE ARENA	ML	450,20	68.136,00	29.774.427,20	450,20	29.774.427,20	-	-			-	-	450,20	29.774.427,20		100,00%
16.15.28	FILTROS Y DRENAJES PARA OBRAS DE URBANISMOS	ML	973,00	57.135,00	50.727.355,00	973,00	50.727.355,00	-	-			-	-	973,00	50.727.355,00		100,00%
16,16	MOBILIARIO DE URBANIZACION		-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
16.16.1	MODULO DE PUESTO DE VENTA EN ACERPO INOXIDABLE	ud	15,00	18.908.683,00	283.630.245,00	15,00	283.630.245,00	-	-			-	-	15,00	283.630.245,00		100,00%
16.16.2	BANCO TIPO ESCOFET TWIG O SIMILAR	UD	27,00	6.841.071,00	184.708.917,00	27,00	184.708.917,00	-	-			-	-	27,00	184.708.917,00		100,00%
16.16.3	BINOCULARES VIC	UD	4,00	14.041.071,00	56.164.284,00	4,00	56.164.284,00	-	-			-	-	4,00	56.164.284,00		100,00%
17,00	CONTROL DE ACCESO				$ 606.257.400,00	$ -	$ 606.257.400,00		$ -		$ -		$ -		$ 606.257.400,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS 05

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493870-2				

SECRETARIA DE DEFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
2/03/2021	30/04/2022

FECHA PRESENTE ACTA

5/05/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA	
AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4817	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 05 de Mayo de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma interventora, ANDRES ALMARALES MELO y JORGE OLIVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 005		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
19.7.2	CORTINA DE MALLA METALICA HUNTER DOUGLAS METALSCREEN	M2	450,00	917.951,00	413.077.950,00	450,00	413.077.950,00	-	-			-	-	450,00	413.077.950,00		100,00%
19.80	PUERTAS DE MADERA		-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
19.8.1	Puerta de madera tipo PM1.1C/PM1.1Ca, de 1 hoja batiente,DE 1020 MM DE ANCHURA X 2100 MM DE ALTURA y 35 mm de espesor	UD	4,00	701.191,00	2.804.764,00	4,00	2.804.764,00	-	-			-	-	4,00	2.804.764,00		100,00%
19.8.2	Puerta de madera tipo PM1.1D/PM1.1Da, de 1 hoja batiente, DE 1040 MM DE ANCHURA X 2100 MM DE ALTURA y 35 mm de espesor	UD	6,00	697.424,00	4.184.544,00	6,00	4.184.544,00	-	-			-	-	6,00	4.184.544,00		100,00%
19.8.3	Puerta de madera tipo TIPO PM1.2F/PM1.2Fa, de una hoja batiente, DE 1020 MM DE ANCHURA X 2600 MM DE ALTURA y 72 mm de espesor	UD	6,00	1.169.136,00	7.014.828,00	6,00	7.014.828,00	-	-			-	-	6,00	7.014.828,00		100,00%
19.8.4	Puerta de madera tipo PM1.3D/PM1.3Da, de una hoja batiente,DE 840 MM DE ANCHURA X 2500 MM DE ALTURA y 35 mm de espesor	UD	9,00	734.806,00	6.613.254,00	9,00	6.613.254,00	-	-			-	-	9,00	6.613.254,00		100,00%
19.8.5	Puerta de madera tipo PM1.4F/PM1.4Fa, de una hoja batiente, DE 700 MM DE ANCHURA X 2100 MM DE ALTURA y 72 mm de espesor	UD	8,00	1.073.349,00	8.586.792,00	8,00	8.586.792,00	-	-			-	-	8,00	8.586.792,00		100,00%
19.8.6	Puerta de madera tipo PM1.5D, de una hoja batiente de 920X2100MM y tablero superior DE 920X1530 mm y 35 mm de espesor	UD	1,00	633.635,00	633.635,00	1,00	633.635,00	-	-			-	-	1,00	633.635,00		100,00%
19.8.7	Puerta corrediza de madera tipo PMC1.11Y/PMC1.11Ya, DE 1100mm de anchura x 2500 MM de altura y 35 mm de espesor	UD	19,00	954.492,00	18.135.348,00	19,00	18.135.348,00	-	-			-	-	19,00	18.135.348,00		100,00%
19.8.8	Puerta corrediza de madera tipo PMC1.6R/PMC1.6Ra, de 1050mm de anchura x 2500 MM de altura y 35 mm de espesor	UD	14,00	999.170,00	13.988.380,00	14,00	13.988.380,00	-	-			-	-	14,00	13.988.380,00		100,00%
19.8.9	Puerta corrediza de madera tipo PMC1.9Pa, de 2550 mm de anchura x 2540 MM de altura y 38 mm de espesor	UD	1,00	2.593.042,00	2.593.042,00	1,00	2.593.042,00	-	-			-	-	1,00	2.593.042,00		100,00%
19.8.10	Puerta corrediza de madera tipo PMC1.1CP, de 2550 mm de anchura x 3730 MM de altura y 36 mm de espesor	UD	1,00	3.048.720,00	3.048.720,00	1,00	3.048.720,00	-	-			-	-	1,00	3.048.720,00		100,00%
19.8.11	Puerta de madera tipo PM1.17C, de 1 hoja batiente,DE 1020 MM DE ANCHURA X 2600 MM DE ALTURA y 36 mm de espesor	UD	1,00	822.878,00	822.878,00	1,00	822.878,00	-	-			-	-	1,00	822.878,00		100,00%
19.8.12	Puerta doble de madera tipo PM2.12G, de 2 hojas batientes, DE 2500 MM DE ANCHURA X 2600 MM DE ALTURA y 36 mm de espesor	UD	2,00	2.360.262,00	4.720.524,00	2,00	4.720.524,00	-	-			-	-	2,00	4.720.524,00		100,00%
19.8.13	Puerta doble de madera tipo PM2.11H, de 2 hojas batientes, DE 2200 MM DE ANCHURA X 2800 MM DE ALTURA y 72 mm de espesor	UD	6,00	3.634.019,00	21.804.114,00	6,00	21.804.114,00	-	-			-	-	6,00	21.804.114,00		100,00%
19.8.14	Puerta doble de madera tipo PM2.10K, de 2 hojas batientes, DE 2500 MM DE ANCHURA X 2800 MM DE ALTURA y 36 mm de espesor	UD	2,00	2.214.463,00	4.428.926,00	2,00	4.428.926,00	-	-			-	-	2,00	4.428.926,00		100,00%
19.8.15	Puerta de madera tipo PM1.13L/PM1.13La, de 1 hoja batiente,DE 1020 MM DE ANCHURA X 2700 MM DE ALTURA y 36 mm de espesor	UD	18,00	1.289.521,00	20.792.338,00	18,00	20.792.338,00	-	-			-	-	18,00	20.792.338,00		100,00%
19.8.16	Puerta de madera tipo PM1.15L, de 1 hoja batiente,DE 1020 MM DE ANCHURA X 2100 MM DE ALTURA y 36 mm de espesor	UD	5,00	691.355,00	3.456.775,00	5,00	3.456.775,00	-	-			-	-	5,00	3.456.775,00		100,00%
19.8.17	Puerta plegable de paneles de madera tipo PM1.18, de 3750 mm de anchura x 2500 MM de altura y 36 mm de espesor	UD	4,00	3.166.781,00	12.667.124,00	4,00	12.667.124,00	-	-			-	-	4,00	12.667.124,00		100,00%
19.8.18	Puerta doble de madera, de gran tamaño, tipo PM2.14X_A y PM2.14X_B, de 2 hojas batientes, DE 1529 MM DE ANCHURA X 8950 MM DE ALTURA y 18 mm de espesor total	UD	4,00	14.046.751,00	56.187.004,00	4,00	56.187.004,00	-	-			-	-	4,00	56.187.004,00		100,00%
19.8.19	Conjunto de madera tipo CM1, de hojas batientes y fija, DE 3605 MM DE ANCHURA X 3730 MM DE ALTURA y 18 mm de espesor	UD	1,00	3.514.338,00	3.514.338,00	1,00	3.514.338,00	-	-			-	-	1,00	3.514.338,00		100,00%
19.8.20	Conjunto de madera tipo CM2, de hojas batientes y fija, DE 18735 MM DE ANCHURA X 3730 MM DE ALTURA y 18 mm de espesor	UD	1,00	17.496.671,00	17.496.671,00	1,00	17.496.671,00	-	-			-	-	1,00	17.496.671,00		100,00%
19.8.21	Conjunto de madera tipo CM3, de hojas batientes y fijas, DE 19401 MM DE ANCHURA X 1190 MM DE ALTURA mínima y 18mm de espesor	UD	1,00	4.364.718,00	4.364.718,00	1,00	4.364.718,00	-	-			-	-	1,00	4.364.718,00		100,00%
19.8.22	Conjunto de madera tipo CM4, de hojas batientes, DE 6500 MM DE ANCHURA X 2600 MM DE ALTURA y 18 mm de espesor	UD	1,00	3.736.541,00	3.736.541,00	1,00	3.736.541,00	-	-			-	-	1,00	3.736.541,00		100,00%
19.8.23	Tabique móvil de madera MDF-E1 tipo PMOV1, de 6990 mm de anchura x 2810 MM de altura y 108 mm de espesor	UD	1,00	9.109.046,00	9.109.046,00	1,00	9.109.046,00	-	-			-	-	1,00	9.109.046,00		100,00%
19.8.24	Tabique acústico móvil tipo PMOV2, serie 843E de hufcor o similar, motorizado, con modulos acabados en panel decofit roble 012 o similar, de 26500 mm de anchura x 8600 MM de altura y 90 mm de espesor	UD	2,00	690.248.409,00	1.380.496.818,00	2,00	1.380.496.818,00	-	-			-	-	2,00	1.380.496.818,00		100,00%
19.8.25	Enfarinado de escenario a base de triple tablero de plywood con acabado en pino, tipo P3, con un espesor total de 36 mm, sobre rastreles de pino de 80x90 cm	M2	314,48	837.116,00	263.258.239,68	314,48	263.258.239,68	-	-			-	-	314,48	263.258.239,68		100,00%
19.8.26	Conjunto de peldañeado de acceso a escenario a base de tablero de plywood con acabado en pino, de 15 mm de espesor, sobre rastreles de pino de 80x90 cm	UD	2,00	1.555.211,00	3.110.422,00	2,00	3.110.422,00	-	-			-	-	2,00	3.110.422,00		100,00%

13-069

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS .05

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115408-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.068.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/05/2026
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901493979-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE: 2/03/2021 HASTA: 30/04/2022

FECHA PRESENTE ACTA: 5/05/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 05 de Mayo de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y JORGE OLIVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEDNADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

			CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL			CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 005		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
16.8.27	Frente de madera en el lateral de la escalera de subida al escenario, a base de tablero MDF-E1	UD	1,00	1.348.334,00	1.348.334,00	1,00	1.348.334,00	-	-	-	-	-	-	1,00	1.348.334,00		100,00%
16.8.28	TIPO C	UD	5,00	758.364,00	3.791.820,00	5,00	3.791.820,00	-	-	-	-	-	-	5,00	3.791.820,00		100,00%
16.8.29	TIPO D	UD	16,00	1.221.364,00	19.541.824,00	16,00	19.541.824,00	-	-	-	-	-	-	16,00	19.541.824,00		100,00%
16.8.30	TIPO F	UD	6,00	434.632,00	2.607.792,00	6,00	2.607.792,00	-	-	-	-	-	-	6,00	2.607.792,00		100,00%
16.8.31	TIPO G	UD	2,00	4.174.513,00	8.349.026,00	2,00	8.349.026,00	-	-	-	-	-	-	2,00	8.349.026,00		100,00%
16.8.32	TIPO H	UD	6,00	4.504.593,00	27.027.558,00	6,00	27.027.558,00	-	-	-	-	-	-	6,00	27.027.558,00		100,00%
16.8.33	TIPO K	UD	1,00	1.536.238,00	1.536.238,00	1,00	1.536.238,00	-	-	-	-	-	-	1,00	1.536.238,00		100,00%
16.8.34	TIPO L	UD	21,00	1.157.426,00	24.305.946,00	21,00	24.305.946,00	-	-	-	-	-	-	21,00	24.305.946,00		100,00%
16.8.35	TIPO P	UD	1,00	3.968.892,00	3.968.892,00	1,00	3.968.892,00	-	-	-	-	-	-	1,00	3.968.892,00		100,00%
16.8.36	TIPO R	UD	14,00	1.201.686,00	16.823.604,00	14,00	16.823.604,00	-	-	-	-	-	-	14,00	16.823.604,00		100,00%
16.8.37	TIPO Y	UD	19,00	1.201.686,00	22.832.034,00	19,00	22.832.034,00	-	-	-	-	-	-	19,00	22.832.034,00		100,00%
16.8.38	TIPO X	UD	4,00	2.164.977,00	8.659.708,00	4,00	8.659.708,00	-	-	-	-	-	-	4,00	8.659.708,00		100,00%
16.9.0	PUERTAS METALICAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
16.9.1	PUERTA METALICA DE ACERO - TIPO PA1.1A / PA1.1Ag	UD	11,00	1.225.821,00	13.481.831,00	11,00	13.481.831,00	-	-	-	-	-	-	11,00	13.481.831,00		100,00%
16.9.2	PUERTA METALICA DE ACERO - TIPO PA1.1Q / PA1.1Qa	UD	5,00	1.365.821,00	6.828.105,00	5,00	6.828.105,00	-	-	-	-	-	-	5,00	6.828.105,00		100,00%
16.9.3	PUERTA METALICA DE ACERO - TIPO PA1.3E / PA1.3Es	UD	6,00	1.555.821,00	9.333.726,00	6,00	9.333.726,00	-	-	-	-	-	-	6,00	9.333.726,00		100,00%
16.9.4	PUERTA METALICA DE ACERO - TIPO PA1.10N / PA1.10Ns	UD	21,00	1.155.821,00	24.268.041,00	21,00	24.268.041,00	-	-	-	-	-	-	21,00	24.268.041,00		100,00%
16.9.5	PUERTA METALICA DE ACERO - TIPO PA2.4M	UD	24,00	2.165.821,00	51.974.904,00	24,00	51.974.904,00	-	-	-	-	-	-	24,00	51.974.904,00		100,00%
16.9.6	PUERTA METALICA DE ACERO - TIPO PA2.5J	UD	2,00	2.165.821,00	4.331.242,00	2,00	4.331.242,00	-	-	-	-	-	-	2,00	4.331.242,00		100,00%
16.9.7	PUERTA METALICA DE ACERO - TIPO PA2.6J	UD	5,00	2.765.821,00	13.828.105,00	5,00	13.828.105,00	-	-	-	-	-	-	5,00	13.828.105,00		100,00%
16.9.8	PUERTA METALICA DE ACERO - TIPO PA2.7J	UD	1,00	1.765.821,00	1.765.821,00	1,00	1.765.821,00	-	-	-	-	-	-	1,00	1.765.821,00		100,00%
16.9.9	PUERTA METALICA DE ACERO - TIPO PA2.8M	UD	3,00	3.085.621,00	9.256.863,00	3,00	9.256.863,00	-	-	-	-	-	-	3,00	9.256.863,00		100,00%
16.9.10	PUERTA METALICA DE ACERO - TIPO PA2.9M	UD	6,00	2.905.621,00	17.433.726,00	6,00	17.433.726,00	-	-	-	-	-	-	6,00	17.433.726,00		100,00%
16.9.11	PUERTA METALICA DE ACERO - TIPO PA2.16N	UD	4,00	2.065.621,00	8.262.484,00	4,00	8.262.484,00	-	-	-	-	-	-	4,00	8.262.484,00		100,00%
16.9.12	PUERTA METALICA CORREDIZA DE ACERO - TIPO PA9.11Z	UD	1,00	25.380.294,00	25.380.294,00	1,00	25.380.294,00	-	-	-	-	-	-	1,00	25.380.294,00		100,00%
16.9.13	PUERTA METALICA DE TRONCOS - TIPO PA2.13M	UD	4,00	4.722.082,00	18.888.328,00	4,00	18.888.328,00	-	-	-	-	-	-	4,00	18.888.328,00		100,00%
16.9.14	PUERTA METALICA DE TRONCOS - TIPO PA2.14M	UD	1,00	5.253.330,00	5.253.330,00	1,00	5.253.330,00	-	-	-	-	-	-	1,00	5.253.330,00		100,00%
16.9.15	PUERTA METALICA DE TRONCOS - TIPO PA1.15O / PA1.15Os	UD	3,00	3.244.601,00	9.734.403,00	3,00	9.734.403,00	-	-	-	-	-	-	3,00	9.734.403,00		100,00%
16.9.16	PUERTA METALICA DE TRONCOS - TIPO PA1.19B	UD	17,00	3.142.536,00	53.423.112,00	17,00	53.423.112,00	-	-	-	-	-	-	17,00	53.423.112,00		100,00%
16.9.17	PUERTA METALICA MOTORIZADA - TIPO PA.PL 1	UD	1,00	20.826.092,00	20.826.092,00	1,00	20.826.092,00	-	-	-	-	-	-	1,00	20.826.092,00		100,00%
16.9.18	PUERTA METALICA MOTORIZADA - TIPO PA.PL 2	UD	1,00	22.716.092,00	22.716.092,00	1,00	22.716.092,00	-	-	-	-	-	-	1,00	22.716.092,00		100,00%
16.9.19	PUERTA METALICA DE ACERO ENREJILLADA - TIPO PA2.18J	UD	1,00	3.824.450,00	3.824.450,00	1,00	3.824.450,00	-	-	-	-	-	-	1,00	3.824.450,00		100,00%
16.9.20	PUERTA MET. CORREDIZA BASTIDOR ALUM. Y COMPOSITE ALUMINIO PERFORADO - TIPO PA9.17	UD	1,00	119.278.485,00	119.278.485,00	1,00	119.278.485,00	-	-	-	-	-	-	1,00	119.278.485,00		100,00%
16.9.21	TIPO A	UD	11,00	512.475,00	5.637.225,00	11,00	5.637.225,00	-	-	-	-	-	-	11,00	5.637.225,00		100,00%
16.9.22	TIPO B	UD	1,00	1.037.087,00	1.037.087,00	1,00	1.037.087,00	-	-	-	-	-	-	1,00	1.037.087,00		100,00%
16.9.23	TIPO E	UD	6,00	3.551.035,00	21.306.210,00	6,00	21.306.210,00	-	-	-	-	-	-	6,00	21.306.210,00		100,00%
16.9.24	TIPO J	UD	12,00	1.419.211,00	17.030.532,00	12,00	17.030.532,00	-	-	-	-	-	-	12,00	17.030.532,00		100,00%
16.9.25	TIPO M	UD	40,00	4.377.396,00	175.094.640,00	40,00	175.094.640,00	-	-	-	-	-	-	40,00	175.094.640,00		100,00%
16.9.26	TIPO N	UD	14,00	1.013.611,00	14.190.554,00	14,00	14.190.554,00	-	-	-	-	-	-	14,00	14.190.554,00		100,00%
16.9.27	TIPO Q	UD	7,00	3.238.745,00	22.671.222,00	7,00	22.671.222,00	-	-	-	-	-	-	7,00	22.671.222,00		100,00%
16.9.28	TIPO Z	UD	1,00	10.279.809,00	10.279.809,00	1,00	10.279.809,00	-	-	-	-	-	-	1,00	10.279.809,00		100,00%
16.10	HERRERIA Y METALISTERIA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
16.10.1	BARANDA TIPO H1	ML	668,71	331.399,00	221.609.825,29	668,71	221.609.825,29	-	-	-	-	-	-	668,71	221.609.825,29		100,00%
16.10.2	BARANDA TIPO H2	ML	30,40	840.266,00	25.544.694,40	30,40	25.544.694,40	-	-	-	-	-	-	30,40	25.544.694,40		100,00%
16.10.3	BARANDA TIPO H3	ML	276,10	1.418.482,00	391.642.880,20	276,10	391.642.880,20	-	-	-	-	-	-	276,10	391.642.880,20		100,00%
16.10.4	BARANDA TIPO H4	ML	156,14	2.314.151,00	361.331.537,14	156,14	361.331.537,14	-	-	-	-	-	-	156,14	361.331.537,14		100,00%
16.10.5	BARANDA TIPO H4B	ML	32,18	2.129.193,00	68.378.366,88	32,18	68.378.366,88	-	-	-	-	-	-	32,18	68.378.366,88		100,00%
16.10.6	BARANDA TIPO H5	ML	102,23	1.671.468,00	170.874.173,64	102,23	170.874.173,64	-	-	-	-	-	-	102,23	170.874.173,64		100,00%
16.10.7	BARANDA TIPO H5B	ML	44,92	341.706,00	15.349.523,36	44,92	15.349.523,36	-	-	-	-	-	-	44,92	15.349.523,36		100,00%
16.10.8	LAMINA GALVANIZADA LACADA PERFORADA TIPO H6	M2	81,94	783.000,00	62.520.220,00	81,94	62.520.220,00	-	-	-	-	-	-	81,94	62.520.220,00		100,00%
16.10.9	PASARELA TIPO H8	M2	63,53	932.874,00	59.265.485,22	63,53	59.265.485,22	-	-	-	-	-	-	63,53	59.265.485,22		100,00%
16.10.10	BARANDA TIPO H9	ML	47,12	409.745,00	19.307.184,40	47,12	19.307.184,40	-	-	-	-	-	-	47,12	19.307.184,40		100,00%
16.10.11	BARANDA TIPO H10	ML	114,99	957.260,00	110.075.327,40	114,99	110.075.327,40	-	-	-	-	-	-	114,99	110.075.327,40		100,00%
16.10.12	PASARELA TIPO H11	ML	225,25	1.513.264,00	340.867.221,00	225,25	340.867.221,00	-	-	-	-	-	-	225,25	340.867.221,00		100,00%
16.10.13	SOPORTE MALLA CAMUFLAJE TIPO A	UD	20,00	371.845,00	7.436.900,00	20,00	7.436.900,00	-	-	-	-	-	-	20,00	7.436.900,00		100,00%
16.10.14	SOPORTE MALLA CAMUFLAJE TIPO B	UD	20,00	357.276,00	7.145.520,00	20,00	7.145.520,00	-	-	-	-	-	-	20,00	7.145.520,00		100,00%
16.10.15	SOPORTE MALLA CAMUFLAJE TIPO C	UD	43,00	558.660,00	24.022.380,00	43,00	24.022.380,00	-	-	-	-	-	-	43,00	24.022.380,00		100,00%

ESP.

139

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS .05

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	800115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901433970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				VIGENCIA	
AMPAROS	Nº POLIZA		VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.940.883.449,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2029
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.940.883.449,00	12/07/2021	A 11/05/2023

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
2/03/2021	30/04/2022

FECHA PRESENTE ACTA

5/05/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 05 de Mayo de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y JORGE OLIVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 005		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
16.10.10	SOPORTE MALLA CAMUFLAJE TIPO D	UD	7,00	346.251,00	2.423.757,00	7,00	2.423.757,00	-	-			-	-	7,00	2.423.757,00		100,00%
16.10.11	CASETON TIPO H12	UD	1,00	11.705.793,00	11.705.793,00	1,00	11.705.793,00	-	-			-	-	1,00	11.705.793,00		100,00%
16.10.12	CASETON TIPO H13	UD	1,00	12.942.806,00	12.942.806,00	1,00	12.942.806,00	-	-			-	-	1,00	12.942.806,00		100,00%
16.10.13	CASETON TIPO H14	UD	1,00	8.956.570,00	8.956.570,00	1,00	8.956.570,00	-	-			-	-	1,00	8.956.570,00		100,00%
16.10.20	CASETON TIPO H15	UD	1,00	8.534.884,00	8.534.884,00	1,00	8.534.884,00	-	-			-	-	1,00	8.534.884,00		100,00%
16.10.21	ESCALERA DE GATO	ML	62,92	4.103.483,00	258.191.150,36	62,92	258.191.150,36	-	-			-	-	62,92	258.191.150,36		100,00%
16.10.22	ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO H17	M2	3,33	4.784.357,00	15.935.208,81	3,33	15.935.208,81	-	-			-	-	3,33	15.935.208,81		100,00%
16,11	VIDRIO		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
16.11.1	PUERTA DE VIDRIO DOBLE EN FACHADA SISTEMA SPIDER	UD	2,00	3.990.410,00	7.980.820,00	2,00	7.980.820,00	-	-			-	-	2,00	7.980.820,00		100,00%
16.11.2	CIERRE DE VIDRIO INTERIOR FLOTANTE DE P1° SISTEMA SPIDER	M2	96,87	1.006.724,00	97.521.353,88	96,87	97.521.353,88	-	-			-	-	96,87	97.521.353,88		100,00%
16.11.3	CIERRE DE VIDRIO INTERIOR SISTEMA PIE DE AMIGO ACERO INOXIDABLE	M2	68,27	755.181,00	51.556.206,87	68,27	51.556.206,87	-	-			-	-	68,27	51.556.206,87		100,00%
16.11.4	PUERTA DE VIDRIO DOBLE EN CIERRE DE VIDRIO SISTEMA PIE DE AMIGO	UD	3,00	4.973.147,00	14.799.441,00	3,00	14.799.441,00	-	-			-	-	3,00	14.799.441,00		100,00%
16.11.5	PUERTA DE VIDRIO SIMPLE EN CIERRE DE VIDRIO SISTEMA PIE DE AMIGO 2,80X0,90M	UD	3,00	3.123.314,00	9.369.942,00	3,00	9.369.942,00	-	-			-	-	3,00	9.369.942,00		100,00%
16.11.6	PUERTA DE VIDRIO SIMPLE EN CIERRE DE VIDRIO SISTEMA PIE DE AMIGO 2,10X0,90M	UD	1,00	2.917.191,00	2.917.191,00	1,00	2.917.191,00	-	-			-	-	1,00	2.917.191,00		100,00%
16.11.7	PUERTA CORREDERA AUTOMATICA	UD	2,00	29.831.050,00	59.662.100,00	2,00	59.662.100,00	-	-			-	-	2,00	59.662.100,00		100,00%
16.11.8	VENTANA V4	M2	4,80	978.225,00	4.695.480,00	4,80	4.695.480,00	-	-			-	-	4,80	4.695.480,00		100,00%
16.11.9	VENTANA V6 y V6B	M2	4,50	1.127.691,00	5.074.609,50	4,50	5.074.609,50	-	-			-	-	4,50	5.074.609,50		100,00%
16,12	TRANSPORTE VERTICAL		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
16.12.1	ASCENSOR 1 y 2, Principal	ud	2,00	243.914.560,00	487.829.120,00	2,00	487.829.120,00	-	-			-	-	2,00	487.829.120,00		100,00%
16.12.2	ASCENSOR 3 y 4, Principal	ud	2,00	212.094.560,00	424.189.120,00	2,00	424.189.120,00	-	-			-	-	2,00	424.189.120,00		100,00%
16.12.3	ASCENSOR 5	ud	1,00	207.099.560,00	207.099.560,00	1,00	207.099.560,00	-	-			-	-	1,00	207.099.560,00		100,00%
16.12.4	MONTACARGAS	ud	1,00	468.399.560,00	468.399.560,00	1,00	468.399.560,00	-	-			-	-	1,00	468.399.560,00		100,00%
16.12.5	ESCALERA MECANICA	ud	3,00	354.668.227,00	1.063.998.681,00	3,00	1.063.998.681,00	-	-			-	-	3,00	1.063.998.681,00		100,00%
16,13	MOBILIARIO		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
16.13.1	SILLA APILABLE	UD	840,00	608.584,00	511.193.760,00	840,00	511.193.760,00	-	-			-	-	840,00	511.193.760,00		100,00%
16.13.2	CARRO PARA SILLA	UD	21,00	1.273.564,00	26.744.844,00	21,00	26.744.844,00	-	-			-	-	21,00	26.744.844,00		100,00%
16.13.3	GRADERIAS TELESCOPICAS / RETRACTILES	UD	1,00	457.146.700,00	457.146.700,00	1,00	457.146.700,00	-	-			-	-	1,00	457.146.700,00		100,00%
16,14	EQUIPAMIENTO		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
16.14.1	CABINA SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE	M2	69,40	955.271,00	66.295.807,40	69,40	66.295.807,40	-	-			-	-	69,40	66.295.807,40		100,00%
16.14.2	ESPEJOS EN BAÑOS	M2	57,78	267.972,00	15.480.533,16	57,78	15.480.533,16	-	-			-	-	57,78	15.480.533,16		100,00%
16.14.3	ENCIMERA-MESON EN BAÑOS FONDO 60 CM EN CUARZO	ML	33,15	618.186,00	20.492.794,06	33,15	20.492.794,06	-	-			-	-	33,15	20.492.794,06		100,00%
16.14.4	ENCIMERA-MESON EN BAÑOS FONDO 51 CM EN CUARZO	ML	2,64	560.265,00	1.479.099,60	2,64	1.479.099,60	-	-			-	-	2,64	1.479.099,60		100,00%
16.14.5	BARRA FIJA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE	UD	12,00	140.225,00	1.682.700,00	12,00	1.682.700,00	-	-			-	-	12,00	1.682.700,00		100,00%
16.14.6	BARRA ABATIBLE DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE	UD	10,00	650.225,00	6.502.250,00	10,00	6.502.250,00	-	-			-	-	10,00	6.502.250,00		100,00%
16.14.7	ESPEJO DISCAPACITADOS INCLINADO, MARCO ACERO INOXIDABLE	UD	12,00	356.254,00	4.275.048,00	12,00	4.275.048,00	-	-			-	-	12,00	4.275.048,00		100,00%
16.14.8	SILLA BAÑO PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE	UD	2,00	1.124.195,00	2.248.390,00	2,00	2.248.390,00	-	-			-	-	2,00	2.248.390,00		100,00%
16.14.9	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO EN ACERO INOXIDABLE	UD	47,00	180.225,00	8.470.575,00	47,00	8.470.575,00	-	-			-	-	47,00	8.470.575,00		100,00%

ECP

13.091

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS .05

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCONTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 139 817.555.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				VIGENCIA	
AMPAROS	Nº POLIZA		VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41 645.300.685,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6 940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41 645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6 940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
2/03/2021	30/04/2022

FECHA PRESENTE ACTA

5/05/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 05 de Mayo de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARDOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma interventora, ANDRES ALMARALES MELO y JORGE OLIVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

				CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL			CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 005		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
17.1	AENP2000: Dispensador de tiquetes de papel con OR, incluye sistema para usuarios mensuales, pantalla grafica de 7", mensajes de voz, logo entrada retroiluminado. Control con PC Industrial de alto rendimiento.	und	2,00	20 468 000,00	40.936 000,00		2,00	40 936 000,00	-	-			-	-	2,00	40.936.000,00		100,00%
17.2	AEXP2000: Verificador de salida tiquetes de papel con OR incluye sistema para usuarios mensuales, pantalla grafica de 7", mensajes de voz, logo salida retroiluminado. Control con PC Industrial de alto rendimiento	und	2,00	18 623.500,00	37.247 000,00		2,00	37 247 000,00	-	-			-	-	2,00	37 247 000,00		100,00%
17.3	Barrera de control de acceso para alto trafico con brazo de 3 metros. Con sensor óptico en inductivo incluido INCLEYE UNIDADES DE SEGURIDAD DE RESPALDO	und	4,00	8.211 000,00	32.844 000,00		4,00	32 844 000,00	-	-			-	-	4,00	32.844 000,00		100,00%
17.4	Sistema de reconocimiento de placas para carriles de entrada	und	4,00	5.890.500,00	23 562 000,00		4,00	23.562 000,00	-	-			-	-	4,00	23.562.000,00		100,00%
17.5	PC Industrial Fanless Disco de estado solido 256GB, RAM 8GB Bajo consumo con licencia Windows 8 profesional	und	1,00	3.748.500,00	3.748 500,00		1,00	3.748.500,00	-	-			-	-	1,00	3 748 500,00		100,00%
17.6	Licencia de uso software SOFTPARK (Uso en dos equipos modelo cliente-servidor)	und	1,00	2 879.800,00	2.879 800,00		1,00	2.879 800,00	-	-			-	-	1,00	2.879 800,00		100,00%
17.7	Lector para tarjeta inteligente Mifare® Codificación tarjetas mensuales	und	1,00	487 900,00	487.900,00		1,00	487 900,00	-	-			-	-	1,00	487.900,00		100,00%
17.8	UPS de protección PC TRPP LITE 550 VA	und	1,00	452.200,00	452 200,00		1,00	452.200,00	-	-			-	-	1,00	452.200,00		100,00%
17.9	Sistema de guiado por medio de video para estacionamiento según planos y cupos, 1 Displays externo, 4 Displays internos de direccionamiento.	und	1,00	464.100 000,00	464,100.000,00		1,00	464,100.000,00	-	-			-	-	1,00	464.100 000,00		100,00%
	SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 99.504.378.203,93			$ 99 504.378.203,93		$ 7.935.194.060,99		$ 7.217.028.812,95	-	$ 15.152.222.893,94		$ 84.352.153.309,99	15,23%	84,77%
18.1	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PAGA)	UD	1,00	244.836.361,00	244.836.361,00		1,00	244 836 361,00	0,38	94 942.433,07	0,04	8 903 184,00	0,42	103.845 617,07	0,58	140 990.743,93	42,41%	57,59%
18.2	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	UD	1,00	255.487.000,00	255.487 000,00		1,00	255.487 000,00	0,30	78.301.198,78	0,07	17 979.315,34	0,37	96 280.514,12	0,63	- 161 206 485,88	36,80%	63,10%
18.3	PLAN DE MANEO DE TRÁNSITO (PMT)	UD	1,00	240.132.394,00	240,132.394,00		1,00	240,132.394,00	-	-			-	-	1,00	240.132.394,00		100,00%
18.4	MUSEOGRÁFICO		1,00	5 873.295.717,80	5.873 295.717,80		1,00	5 873.295.717,80	-	-			-	-	1,00	5 873.295.717,80		100,00%
18.5	MOBILIARIO		1,00	560.770 818,20	560.770 818,20		1,00	560.770 818,20	-	-			-	-	1,00	560 770 818,20		100,00%
18.6	EQUIPOS ESPECIALES PARA ESCENARIO Y TELONERIA		1,00	2 270.279.850,00	2 270 279 850,00		1,00	2 270.279 850,00	-	-			-	-	1,00	2.270 279 850,00		100,00%
18.7	TRAMITES ANTE OPERADORES DE SERVICIOS		1,00	17,177.745,00	17,177.745,00		1,00	17,177.745,00	-	-			-	-	1,00	17,177.745,00		100,00%
	SUB TOTAL OTROS COSTOS				9.461.979.884,00		-	9.461.979.884,00		$ 171.243.632		$ 25 882.499		$ 198.126.131	-	$ 9.263.853.753	2,09%	97,91%
	VALOR COSTOS DIRECTOS CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO				$ 99.504.378.203,93		$	99.504.378.203,93	$	7.935.194.060,99	$	7.217.028.812,95	$	15.152.222.893,94	$	84.352.153.309,99	PORCENTAJES	

179

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 005

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SDI - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115408-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493670-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	Nº POLIZA		VR. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	8.940.863.448,00	12/07/2021	11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	11/05/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023	11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	8.940.863.448,00	12/07/2021	11/05/2023

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
2/03/2021	30/04/2022

FECHA PRESENTE ACTA

5/05/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 05 de Mayo de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, ROCIO ACOSTA ARGOTE, como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma interventora, ANDRES ALMARALES MELO y JORGE OLIVEROS GALINDO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 005 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001 CANT.	CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001 VR. TOTAL	ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES CANT.	ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES VR. TOTAL	PRESENTE ACTA PARCIAL No. 005 CANT.	PRESENTE ACTA PARCIAL No. 005 VR. TOTAL	ACUMULADO TOTAL CANT.	ACUMULADO TOTAL VR. TOTAL	POR EJECUTAR CANT.	POR EJECUTAR VR. TOTAL
	VALOR COSTOS ADMINISTRATIVOS A.I.U 30%		ADMINISTRACION(21%)		$ 20.895.919.003	A.I.U 30%	$ 21.890.982.764,85	A.I.U 30%	$ 1.745.742.697,82	A.I.U 30%	$ 1.515.576.051	A.I.U 30%	$ 3.181.966.808	A.I.U 30%	$ 17.713.952.195
			IMPREVISTOS(4%)		$ 3.960.175.045		$ 4.975.218.810,20		$ 398.759.704,05		$ 268.681.153		$ 606.068.918		$ 3.374.086.132
			UTILIDAD(5%)		$ 4.975.218.810		$ 2.985.131.286,12		$ 238.055.822,43		$ 360.851.441		$ 757.611.145		$ 4.217.607.665
			TOTAL A/U		$ 29.831.312.861		$ 29.851.312.861,18		$ 2.380.558.224,30		$ 2.155.108.644		$ 4.545.666.868		$ 25.305.645.992
	VALOR COSTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO				$ 129.355.689.063,11		$ 129.355.689.065		$ 10.315.752.305,73		$ 9.382.137.456,64		$ 19.697.889.762,12		$ 109.657.799.302,99
	VALOR COSTO TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO				$ 138.817.668.949,11		$ 138.817.668.949		$ 10.496.895.937,14		$ 9.409.019.956,18		$ 19.896.015.893,32		$ 118.921.653.055,79

PORCENTAJE	
% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
EJECUTADO DEL CONTRATO	POR EJECUTAR DEL CONTRATO
15,23%	84,77%

RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR BRUTO
VALOR DEL CONTRATO	$ 138.817.668.949,11
ANTICIPO ENTREGADO	N/A

DESCRIPCIÓN	VALOR BRUTO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO	% FACTURADO
ACTA PARCIAL DE OBRAS No 1	$ 989.895.946,99	$ -	$ 989.895.946,99	0,71%
ACTA PARCIAL DE OBRAS No 2	$ 1.084.213.519,92	$ -	$ 1.084.213.519,92	0,78%
ACTA PARCIAL DE OBRAS No 3	$ 6.749.214.394,91	$ -	$ 6.749.214.394,91	4,86%
PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRAS No 4	$ 1.664.472.075,32	$ -	$ 1.664.472.075,32	1,20%
PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRAS No 5	$ 9.409.019.956,18	$ -	$ 9.409.019.956,18	6,78%
ACUMULADO TOTAL	$ 19.896.015.893,32	$ -	$ 19.896.015.893,32	14,33%
SALDOS POR FACTURAR	$ 118.921.653.055,79	$ -	$ 118.921.653.055,6	85,67%

VALOR A PAGAR EN LETRAS PRESENTE ACTA:

NUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES, DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRAS PLASMADAS EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL No 5, SON PRODUCTO DE LAS MEDICIONES DE CAMPO, VERIFICADAS EN CONJUNTO ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORIA, POR CONSIGUIENTE LAS CANTIDADES ENTREGADAS Y RECIBIDAS SON RESPONSABILIDAD DE AMBAS PARTES

Vo Bo
Nombre: JORGE OLIVEROS GALINDO
Supervisor del contrato
Gobernación del Cesar

Vo Bo
Nombre: ANDRES ALMARALES MELO
Supervisor del contrato
Gobernación del Cesar

Nombre: IVAN JIMENEZ AGUIRRE
Representante Legal
A CONSTRUIR S.A.
Contratista

Nombre: ROCIO ACOSTA ARGOTE
Representante Legal
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR
Interventoria

Nombre: ESTHER MENDOZA PEINADO
Secretaria de Infraestructura
Gobernación del Cesar

13.035

PRE - ACTA DE OBRA No 005

CONTRATO DE OBRA No	2021040002		
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR		
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No	2021050007
NIT:	890115405-0	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR
FECHA DE INICIO	12/07/2021	NIT:	901493970-2
FECHA DE TERMINACIÓN	11/05/2023	PERIODO:	02/03/2022 AL 04/05/2022

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA SEGÚN ACTA MODIFICATORIA #1	CANTIDAD ACTA PARCIAL No 1	CANTIDAD ACTA PARCIAL No 2	CANTIDAD ACTA PARCIAL No 3	CANTIDAD ACTA PARCIAL No 4	CANTIDAD ACTA PARCIAL No 5	ACUMULADO TOTAL	PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUTADO DEL ITEM
1,00	CAPITULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES											
1,10	Localizacion y replanteo con equipo	m2	7.366,00	14.383,50	7.366,00		7.017,50			14.383,50	-	100%
1,20	Cerramiento en lona verde H=2.00m	ml	480,00	480,00	468,29					468,29	11,72	98%
1,30	Descapote e maquina espesor 20cm	m2	11.974,93	-	-					-	-	
1,40	Acometida provisional agua 50ml	und.	1,00	1,00	1,00					1,00	-	100%
1,50	Acometida provisional electrica 100ml	und.	1,00	1,00	-			1,00		1,00	-	100%
1,60	Acometida provisional telefonos	und.	1,00	1,00	1,00					1,00	-	100%
1,70	Demoliciones	m3	1.276,15	2.288,91	1.260,43		1.028,47			2.288,90	0,01	100%
2,00	CAPITULO 2. EXCAVACIONES Y RELLENO				-					-	-	
2,10	Excavacion mecanica a nivel bajo placa de subpresion, con retiro hasta 10 km	m3	46.516,40	22.963,04	20.828,00	878,78			910,82	22.617,40	345,64	98%
2,20	Excavacion manual para zapatas	m3	825,00	825,00	288,06	158,95		13,01	292,96	752,98	72,02	91%
2,30	Cargue y retiro de sobrantes hasta 10 km	m3	1.072,50	1.072,50	374,48	206,63		16,92		588,03	474,47	56%
2,40	Rellenos con material seleccionado de sitio	m3	990,00	990,00	-	55,28	702,09	6,70		764,07	225,93	77%
3,00	CIMENTACION									-	-	
3,10	Concreto pobre e =5cm	m2	7.683,00	2.935,73	308,97	963,90	1.519,66	62,23		2.854,76	80,97	97%
3,20	ZAPATAS EN CONCRETO DE 4000 SPI									-	-	
3,2,1	Concreto de 4000 psi para Zapatas	m3	330,00	475,11	74,60	255,40	142,31	1,15		473,46	1,65	100%
3,2,2	Acero de refuerzo fy 60,000psi	kg	16.500,00	60.207,44	3.097,94	13.402,06	43.606,16	46,41		60.152,57	54,87	100%
3,30	LOSA ALIGERADA DE CIMENTACIÓN E=60CM									-	-	
3,3,1	Concreto 4000Psi para losa aligerada	m3	3.007,00	-	-					-	-	0%
3,3,2	Aligeramiento en casetón de lona	m2	5.420,00	-	-					-	-	0%
3,3,3	Acero de refuerzo fy 60,000psi	kg	181.000,00	-	-					-	-	0%
3,3,4	Malla electrosoldada 15x15cm 7,0x6,5mm	kg	58.612,00	-	-					-	-	0%
3,40	ACTIVIDADES ADICIONALES									-	-	
NP 01	Concreto pobre e=15cm	m2	532,59	532,59			532,59			532,59	-	100%
NP 02	Acero de refuerzo fy 60,000psi	kg	184.338,69	184.338,69			133.952,79	4.597,13	41.085,00	179.634,92	4.703,77	97%
NP 03	Concreto 4000Psi Losa de cimentación	m3	1.142,94	1.142,94			-		595,97	595,97	546,97	52%
NP 04	Concreto 4000Psi viga de cimentación	m3	1.669,87	1.669,87			1.584,95	47,92		1.632,87	37,00	98%
NP 05	Malla electrosoldada	kg	49.819,01	49.819,01						-	49.819,01	0%
4,00	COLUMNAS Y PANTALLAS DE CONCRETO									-	-	
4,10	COLUMNAS DE CONCRETO Y MUROS CORTINA				-					-	-	
4,1,1	Concreto 4000psi	m3	1.467,00	1.584,58	-	86,36	210,33	12,60	224,23	533,51	1.051,07	34%
4,1,2	Acero de refuerzo fy 60,000psi	kg	366.745,00	278.220,08	16.706,56	10.483,31	97.299,70	1.491,79	2.476,88	128.458,24	149.761,84	46%
4,20	MURO DE CONTENCIÓN				-					-	-	
4,2,1	Concreto 4000psi	m3	333,00	241,78		133,77	96,95		11,06	241,78	0,00	100%
4,2,2	Acero de refuerzo fy 60,000psi	kg	13.300,00	15.796,21		11.916,85	3.879,36			15.796,21	-	100%
4,30	ACTIVIDADES ADICIONALES									-	-	
NP 06	Suelo cemento Perimetral	M3	305,30	305,30			305,30			305,30	-	100%
5,00	PLACAS DE SOTANO									-	-	
5,10	LOSA DE ENTREPISO ALIGERADA NIVEL N+0,50									-	-	
5,1,1	Concreto 4000Psi para losa aligerada E=60cm	m3	1.759,00	1.759,00				797,00	660,79	1.457,79	301,21	83%
5,1,2	Aligeramiento en casetón de icopor removible	m2	5.660,00	5.660,00				2.633,82	2.345,42	4.979,24	680,76	88%
5,1,3	Acero de refuerzo fy 60,000psi	kg	140.467,00	140.467,00			96.612,17			96.612,17	43.854,83	69%
5,1,4	Malla electrosoldada 15x15 8mm	kg	35.333,00	35.333,00				22.385,39	12.727,76	35.113,15	219,85	99%
6,00	PLACAS DE ENTREPISO									-	-	
6,10	TP - 1 SISTEMA LAMINA COLABORANTE									-	-	
6,1,1	Concreto para losa maciza E=15cm	m3	521,37	521,37						-	521,37	0%
6,1,2	Mallas Electrosoldada fy 60,000psi M-188	kg	18.146,00	18.146,00						-	18.146,00	0%
6,1,3	Metaldeck 3" calibre 22	m2	4.697,00	4.697,00						-	4.697,00	0%
6,20	TP - 2 Y 2A SISTEMA LAMINA COLABORANTE									-	-	
6,2,1	Concreto para losa maciza E=15cm	m3	394,61	394,61						-	394,61	0%
6,2,2	Mallas Electrosoldada fy 60,000psi M-188	kg	13.504,00	13.504,00						-	13.504,00	0%
6,2,3	Metaldeck 3" calibre 22	m2	3.555,00	3.555,00						-	3.555,00	0%
6,30	TP - 3 SISTEMA LAMINA COLABORANTE									-	-	
6,3,1	Concreto para losa maciza E=15cm	m3	78,26	78,26						-	78,26	0%
6,3,2	Mallas Electrosoldada fy 60,000psi M-188	kg	2.954,00	2.954,00						-	2.954,00	0%
6,3,3	Metaldeck 3" calibre 22	m2	705,00	705,00						-	705,00	0%
6,40	TP - 4 SISTEMA LAMINA COLABORANTE									-	-	
6,7,1	Concreto para losa maciza E=15cm	m3	266,73	266,73						-	266,73	0%
6,7,2	Mallas Electrosoldada fy 60,000psi M-188	kg	9.706,00	9.706,00						-	9.706,00	0%
6,7,3	Metaldeck 3" calibre 22	m2	266,73	266,73						-	266,73	0%
7,00	ESTRUCTURA METALICA									-	-	
7,10	Estructura metálica (Inc. Platinas, pernos y demás)	kg	2.736.124,00	2.727.649,61					397.779,11	397.779,11	2.329.870,50	15%
7,20	Pintura Intumescente	m2	13.680,62	13.680,62						-	13.680,62	0%
9,00	DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS	und								-	-	
9,10	CAJAS Y POZOS DE INSPECCION									-	-	
9,1,1	CAJA DE INSPECCIÓN	und	11,00	11,00						-	11,00	0%
9,1,2	TUBERIA PERFORADA PARA DRENAJE 4"	ml	527,91	-						-	-	
9,1,3	TUBERIA PERFORADA PARA DRENAJE 6"	ml	81,29	992,20		81,29	910,90			992,19	0,01	100%

PRE - ACTA DE OBRA No 005

CONTRATO DE OBRA No	2021040002		
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR		
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	CONTRATO DE INTERVENTORIA No	2021050007
NIT:	890115406-0	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR
FECHA DE INICIO	12/07/2021	NIT:	901493870-2
FECHA DE TERMINACIÓN	11/05/2023	PERIODO:	02/03/2022 AL 04/05/2022

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA SEGÚN ACTA MODIFICATORIA #1	CANTIDAD ACTA PARCIAL No 1	CANTIDAD ACTA PARCIAL No 2	CANTIDAD ACTA PARCIAL No 3	CANTIDAD ACTA PARCIAL No 4	CANTIDAD ACTA PARCIAL No 5	ACUMULADO TOTAL	PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUTADO DEL ITEM
9,1,6	ACTIVIDADES ADICIONALES									-	-	
NP 07	RELLENO CON SUBBASE	M3	1.112,90	1.112,90			633,71		477,82	1.111,53	1,37	100%
NP 08	PEDRAPLEN	M3	3.040,40	3.040,40			1.824,24		1.216,16	3.040,40	0,00	100%
NP 09	FILTRO PERIMETRAL MURO DE CONTENCION	ML	435,91	435,91			379,91			379,91	56,00	87%
NP 10	CAJAS DE INTERSECCION DE TUBERIA DE 8" PERFORADA	UNID	37,00	37,00			37,00			37,00	-	100%
NP 11	TUBERIA SANITARIA DE 8"	ML	60,00	60,00			60,00			60,00	-	100%
9,1,4	CONEXIÓN A RED SANITARIA 12"	und	1,00	1,00						-	1,00	0%
15,30	SUBESTACIÓN INTERIOR DE MEDIA TENSIÓN									-	-	
15,3,1	Cable Cu No. 2/0 AWG desnudo	ml	40,00	40,00					37,99	37,99	2,01	95%
15,3,2	Soldadura exotérmica 150 ó 200g (cable-cable en T)	un	16,00	16,00					11,00	11,00	5,00	69%
15,3,3	Borna terminal estañada 2/0	un	16,00	16,00						-	16,00	0%
15,3,4	Caja de inspección 30x30	un	4,00	4,00						-	4,00	0%
15,3,5	Electrodo de Cu para puesta a tierra de 5/8"x2,4m	un	9,00	9,00					4,00	4,00	5,00	44%
16.5.9	P9 / EPOXI DE ALTO DESEMPEÑO SIKAGUAD 63N RAL7038 ANTIDESLIZANTE CON ARIDO ARENOSO EN LA MEZCLA.	M2	267,88	267,88						-	267,88	0%
16.5.10	P15 / ACABADO PULIDO EN LOSA DE CONCRETO CON ENDURECEDOR DE CUARZO	M2	8.444,27	8.444,27					3.724,84	3.724,84	4.719,43	44%
16,15	URBANIZACION									-	-	
16.15.1	SUBBASE GRANULAR COMPACTADA	M3	1.042,39	1.042,39						-	1.042,39	0%
16.15.2	BASE GRANULAR B-200	M3	1.547,17	1.547,17						-	1.547,17	0%
16.15.3	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFÁLTICO	M2	4.925,06	4.925,06						-	4.925,06	0%
16.15.4	LOSA 3000 PSI REFORZADO CON MALLA 7MM 15X15 M-262	m2	1.203,89	1.203,89						-	1.203,89	0%
16.15.5	CONCRETO PARA CIMENTACION LUMINARIAS	m3	1,87	1,87						-	1,87	0%
16.15.6	GEOTEXTIL NT 1600	m2	11.200,00	11.200,00			4.931,48		5.218,46	10.149,94	1.050,06	91%
16.15.7	POLIETILENO (impermeabilizacion de piso)	m2	10.530,47	10.530,47					2.453,75	2.453,75	8.076,72	
17.8	UPS de protección PC TRIPP LITE 550 VA	und	1,00	1,00						-	1,00	0%
17.9	Sistema de guiado por medio de video para estacionamiento según planos y cupos, 1 Displays externo, 4 Displays internos de direccionamiento.	und	1,00	1,00						-	1,00	0%
	Por fuera de AIU		-							-	-	
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PAGA)	UD	1,00	1,00		0,27	0,04	0,08	0,04	0,43	0,57	43%
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	UD	1,00	1,00		0,14		0,16	0,07	0,37	0,63	37%
	PLAN DE MANEO DE TRÁNSITO (PMT)	UD	1,00	1,00						-	1,00	0%
	MUSEOGRÁFICO		1,00	1,00						-	1,00	0%
	MOBILIARIO		1,00	1,00						-	1,00	0%
	EQUIPOS ESPECIALES PARA ESCENARIO Y TELONERIA		1,00	1,00						-	1,00	0%
	TRAMITES ANTE OPERADORES DE SERVICIOS		1,00	1,00						-	1,00	0%
										-	-	
										-	-	

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRAS PLASMADAS EN LA PRESENTE PRE - ACTA, SON PRODUCTO DE LAS MEDICIONES DE CAMPO Y VERIFADAS EN CONJUNTO ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORIA, POR CONSIGUIENTE LAS CANTIDADES ENTREGADAS Y RECIBIDAS SON RESPONSABILIDAD DE AMBAS PARTES

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: IVAN JIMENEZ AGUIRRE
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: ROCIO ACOSTA ARGOTE
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 02

PERIODO DE EVALUACIÓN: 02/03/2021 AL 30/04/2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007

CAPÍTULO	2	ITEM	2,1	Excavación mecánica a nivel bajo placa de subpresión, con retiro hasta 10 km		UNID.	M3

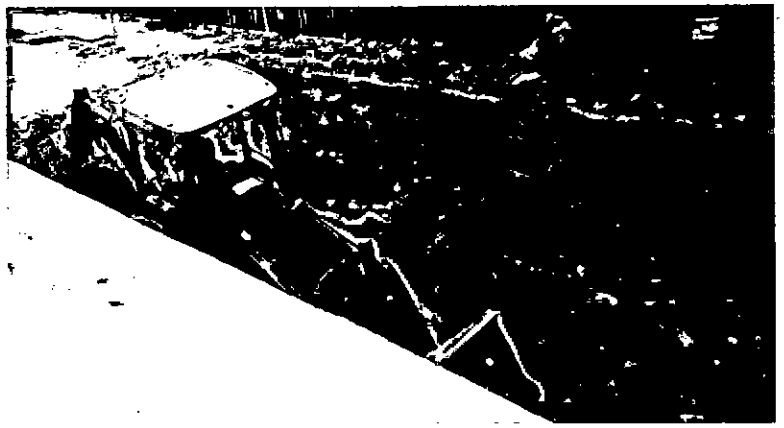

LOCALIZACIÒN	DIMENSIONES REF	LARGO	ANCHO	H	sobre ancho	CANT	M3
VER CARTERA ADJUNTA						910,62	910,62
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
						SUBTOTAL	910,62

CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 1	20.828,00
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 2	878,78
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 5	910,62
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	22.617,40
CANTIDAD CONTRACTUAL	22.963,04
PENDIENTE POR PAGAR	345,64
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	910,62


Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

1076

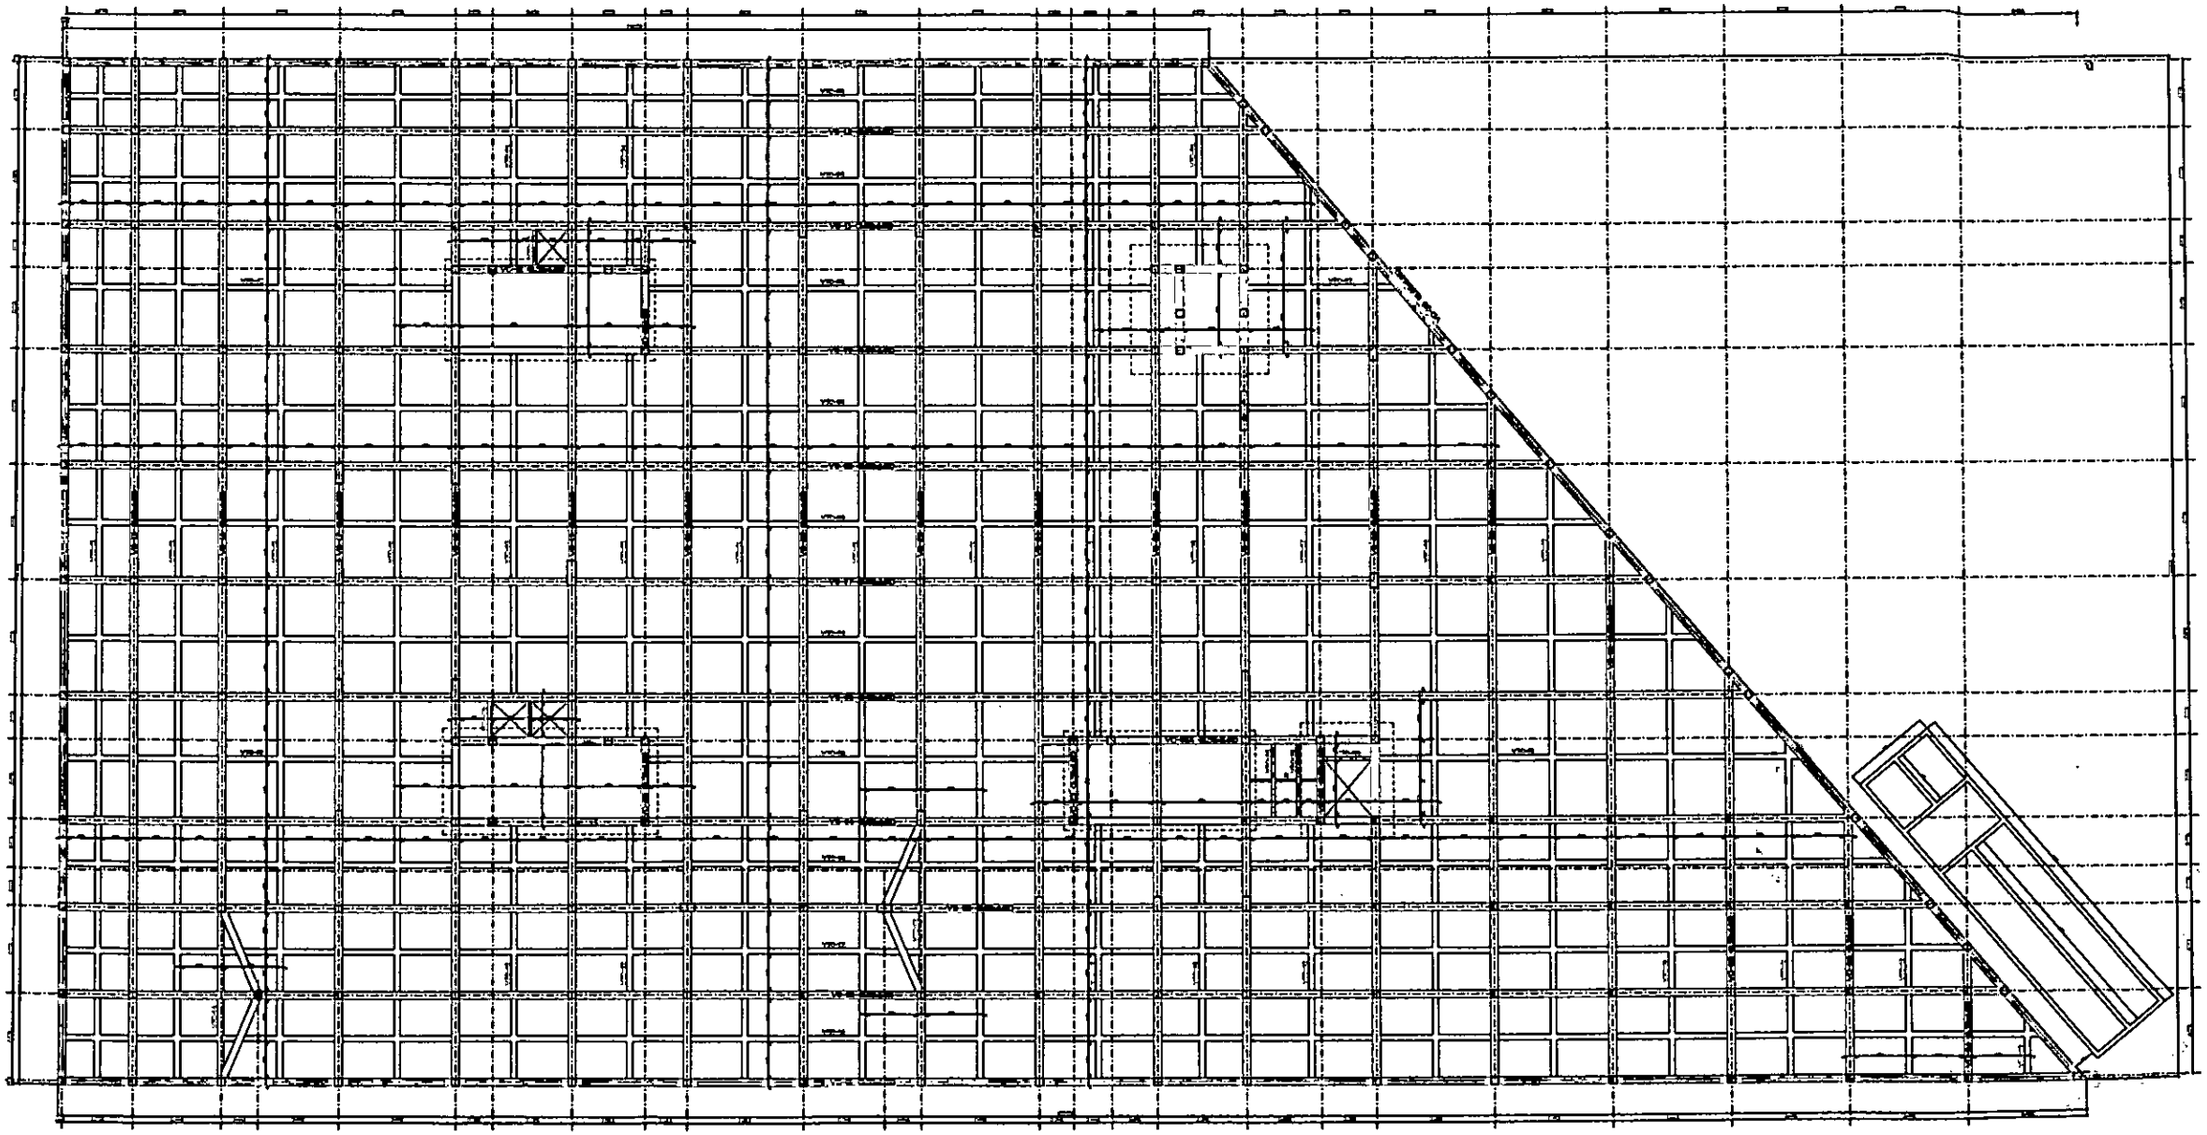

FORMALETA NIVEL No. -2.90
CIMENTACION

13077

0+000.00
0+004.00
0+008.00
0+001.00
0+005.00
0+009.00
0+002.00
0+006.00
0+008.58
0+003.00
0+007.00

13.079

INFORME DE VOLUMENES				
Proyecto: C:\	VOLUMEN EXCAVACION MECANICA TANQUE DE ALMACENAMIENTO			
Alineación: EJE_2				
Grupo de líneas de muestreo: EJE_2 - 3				
P.K. inicial: 0+000.000				
P.K. final: 0+009.575				
P.K.	Área de terraplén	Volumen de terraplén	Vol. terraplén acumul.	Vol. neto acumul.
0+000.000	0	0	0	0
0+001.000	0	0	0	0
0+002.000	119.26	59.63	59.63	-59.63
0+003.000	118.05	118.66	178.29	-178.29
0+004.000	117.12	117.58	295.87	-295.87
0+005.000	116.34	116.73	412.6	-412.6
0+006.000	115.92	116.13	528.73	-528.73
0+007.000	115.9	115.91	644.64	-644.64
0+008.000	116.23	116.06	760.7	-760.7
0+009.000	116.55	116.39	877.09	-877.09
0+009.575	0	33.53	910.62	-910.62

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 05


PERIODO DE EVALUACIÓN

02/03/2021 AL 30/04/2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007

CAPÍTULO	2	ITEM	2,2	Excavacion manual para zapatas	UNID.	M3

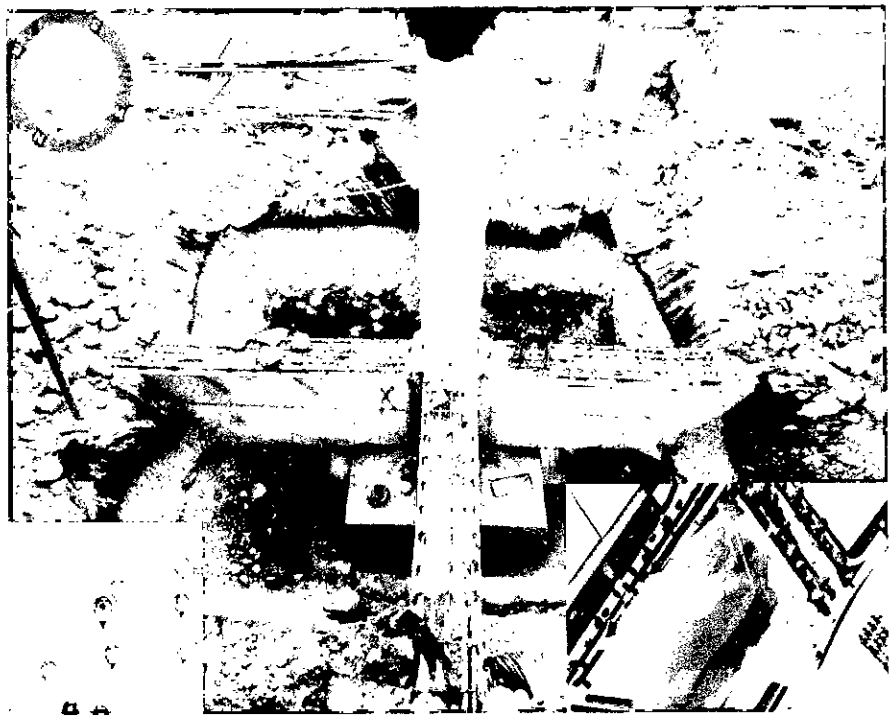

LOCALIZACIÓN	REF	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	H	sobre ancho	CANT	M3
Eje '(S3,Sj) Recalce	Z-41	3,20	2,70	1,60	0,20	1	17,86
Eje '(S3,Sk') Recalce	Z-42	2,45	2,00	1,60	0,20	1	10,94
Eje '(S3,Sm) Recalce	Z-43	3,55	3,05	1,60	0,20	1	21,80
Eje '(S3,Sp) Recalce	Z-44	2,90	2,40	1,60	0,20	1	14,78
Eje '(S3,J) Recalce	Z-45	3,35	2,85	1,60	0,20	1	19,50
Eje '(3',Sd) Recalce	Z-46	3,80	3,30	1,60	0,20	1	24,86
Eje '(3',Sk)(3',Sl) Recalce	Z-47	3,50	3,00	1,60	0,20	2	42,43
Eje '(S7,Sd) Recalce	Z-48	4,30	3,30	1,60	0,20	1	27,82
Eje '(S8,K) Recalce	Z-49	3,95	3,45	1,60	0,20	1	26,80
Eje '(S9,Sd) Recalce	Z-50	4,35	3,35	1,60	0,20	1	28,50
Eje '(7,K) Recalce	Z-51	3,65	3,15	1,60	0,20	1	23,00
Eje '(S12,Sl) (S12, Sm) Recalce	Z-52	3,15	2,65	1,60	0,20	2	34,65
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
					SUBTOTAL		292,96

CANTIDAD ACTA Parcial No 1	288,06	
CANTIDAD ACTA Parcial No 2	158,95	
CANTIDAD ACTA Parcial No 3	-	
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 4	13,01	
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 5	292,96	
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	752,98	
CANTIDAD CONTRACTUAL	825,00	
PENDIENTE POR PAGAR	72,02	
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		**292,96**

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.


Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

RECALCE ZAPATAS

EXCAVACIÓN

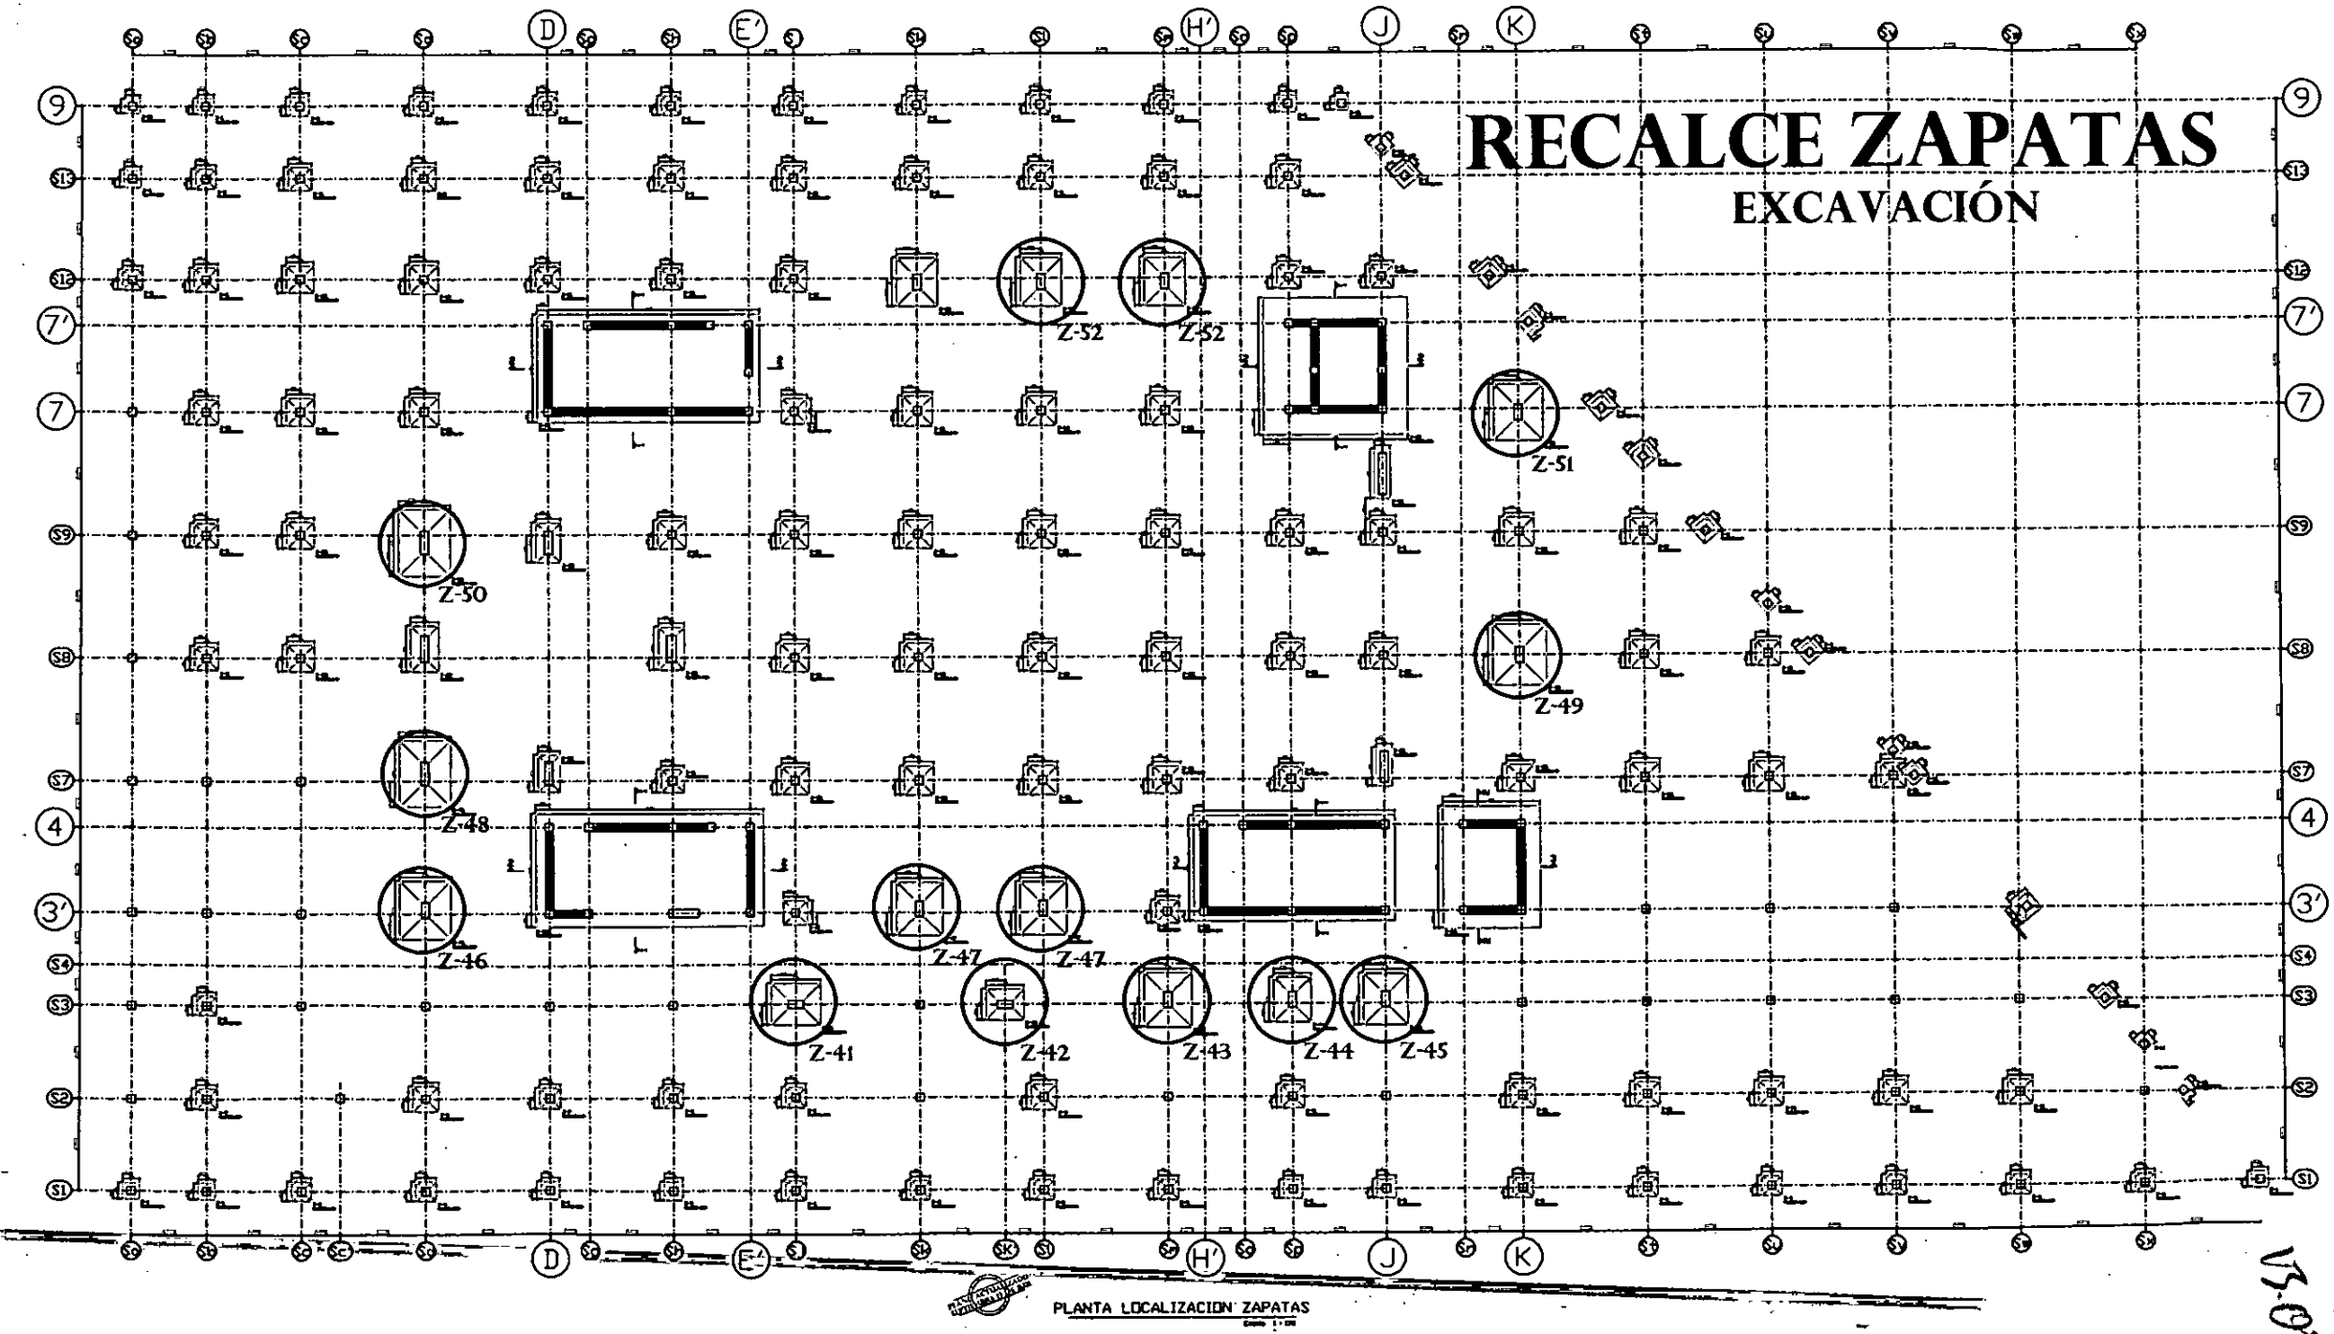

PLANTA LOCALIZACION ZAPATAS

V3.081

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 05

PERIODO DE EVALUACIÓN

02/03/2022 AL 30/04/2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		2021050007
CAPÍTULO	3	ITEM	NP 02	Acero de refuerzo fy 60,000psi	UNID. KG

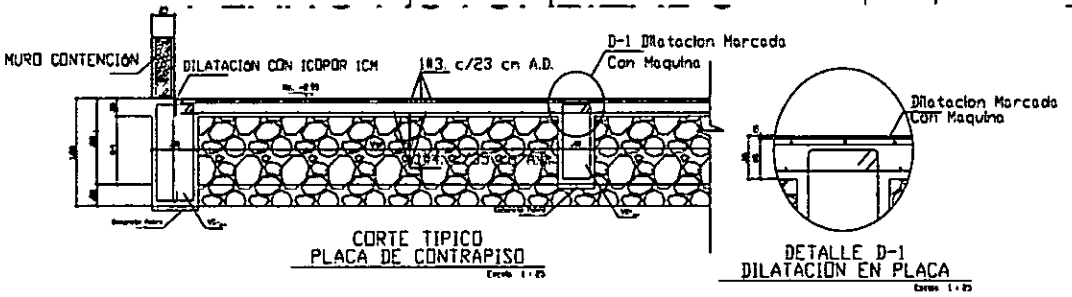





LOCALIZACIÓN	REF	M2	KG/M2	KG
ACERO DE LOSA DE CONTRAPISO				
Ejes (Sa- Sb)→Ejes (S1 -9)	FRANJA "A"	346,36	11,03	3.820,38
Ejes (Sb- Sc)→Ejes (S1 -9)	FRANJA "B"	440,12	11,03	4.854,53
Ejes (Sc- Sd)→Ejes (S1 -9)	FRANJA "C"	542,99	11,03	5.989,21
Ejes (Sd- D)→Ejes (S1 -9)	FRANJA "D"	553,68	11,03	6.107,09
Ejes (J-K) →Ejes (S1 -3')(4-Diagonal)	FRANJA "L"	490,35	11,03	5.408,53
Ejes (K- St) →Ejes (S1 -Diagonal)	FRANJA "M"	413,85	11,03	4.564,71
Ejes (St- Su)→Ejes (S1 -Diagonal)	FRANJA "N"	340,56	11,03	3.756,38
Ejes (Su- Sv)→Ejes (S1 -Diagonal)	FRANJA "O"	263,97	11,03	2.911,64
Ejes (Sv- S1 Diagonal)→Ejes (S1 -Diagonal)	FRANJA "P"	332,96	11,03	3.672,53
			SUBTOTAL	
			SUBTOTAL	41.084,99

CANTIDAD ACTA Parcial No 1	0,00
CANTIDAD ACTA Parcial No 2	0,00
CANTIDAD ACTA Parcial No 3	133.952,79
CANTIDAD ACTA Parcial No 4	4.597,13
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 5	41.084,99
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	179.634,91
CANTIDAD CONTRACTUAL	184.338,69
PENDIENTE POR PAGAR	4.703,78
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	41.084,99

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

13.082

ACERO- LOSA DE CONTRAPISO

MALLA 3/8

	KG/M	LONG	CANT	TOTAL KG
VARILLA 3/8	0,559	5,5	308	946,946
	0,559	12	126	845,208
	0,559	1,3	22	15,9874
	0,559	0,5	100	27,95
		TOTAL KG		1836,0914

AREA PROMEDIO	346,356
PROMEDIO/ M2	5,30

CONCRETO FUNDIDO	3724,8406

TOTAL ACERO 3/8	19741,66

Kg/m2
11,03

41.085,00

MALLA 1/2

	KG/M	LONG	CANT	TOTAL KG
VARILLA 1/2	0,996	5,5	200	1095,6
	0,996	12	73	872,496
	0,996	1,3	12	15,5376
		TOTAL KG		1983,6336


AREA PROMEDIO	346,356
PROMEDIO/ M2	5,73

CONCRETO FUNDIDO	3724,8406

TOTAL ACERO 1/2	21343,34

NOTA: El ejercicio se realizó en campo en la franja A de la Losa de contrapiso que cubre un área de 346,36m2, se obtuvo una cantidad representativa de 11,03 Kg/m2

17083

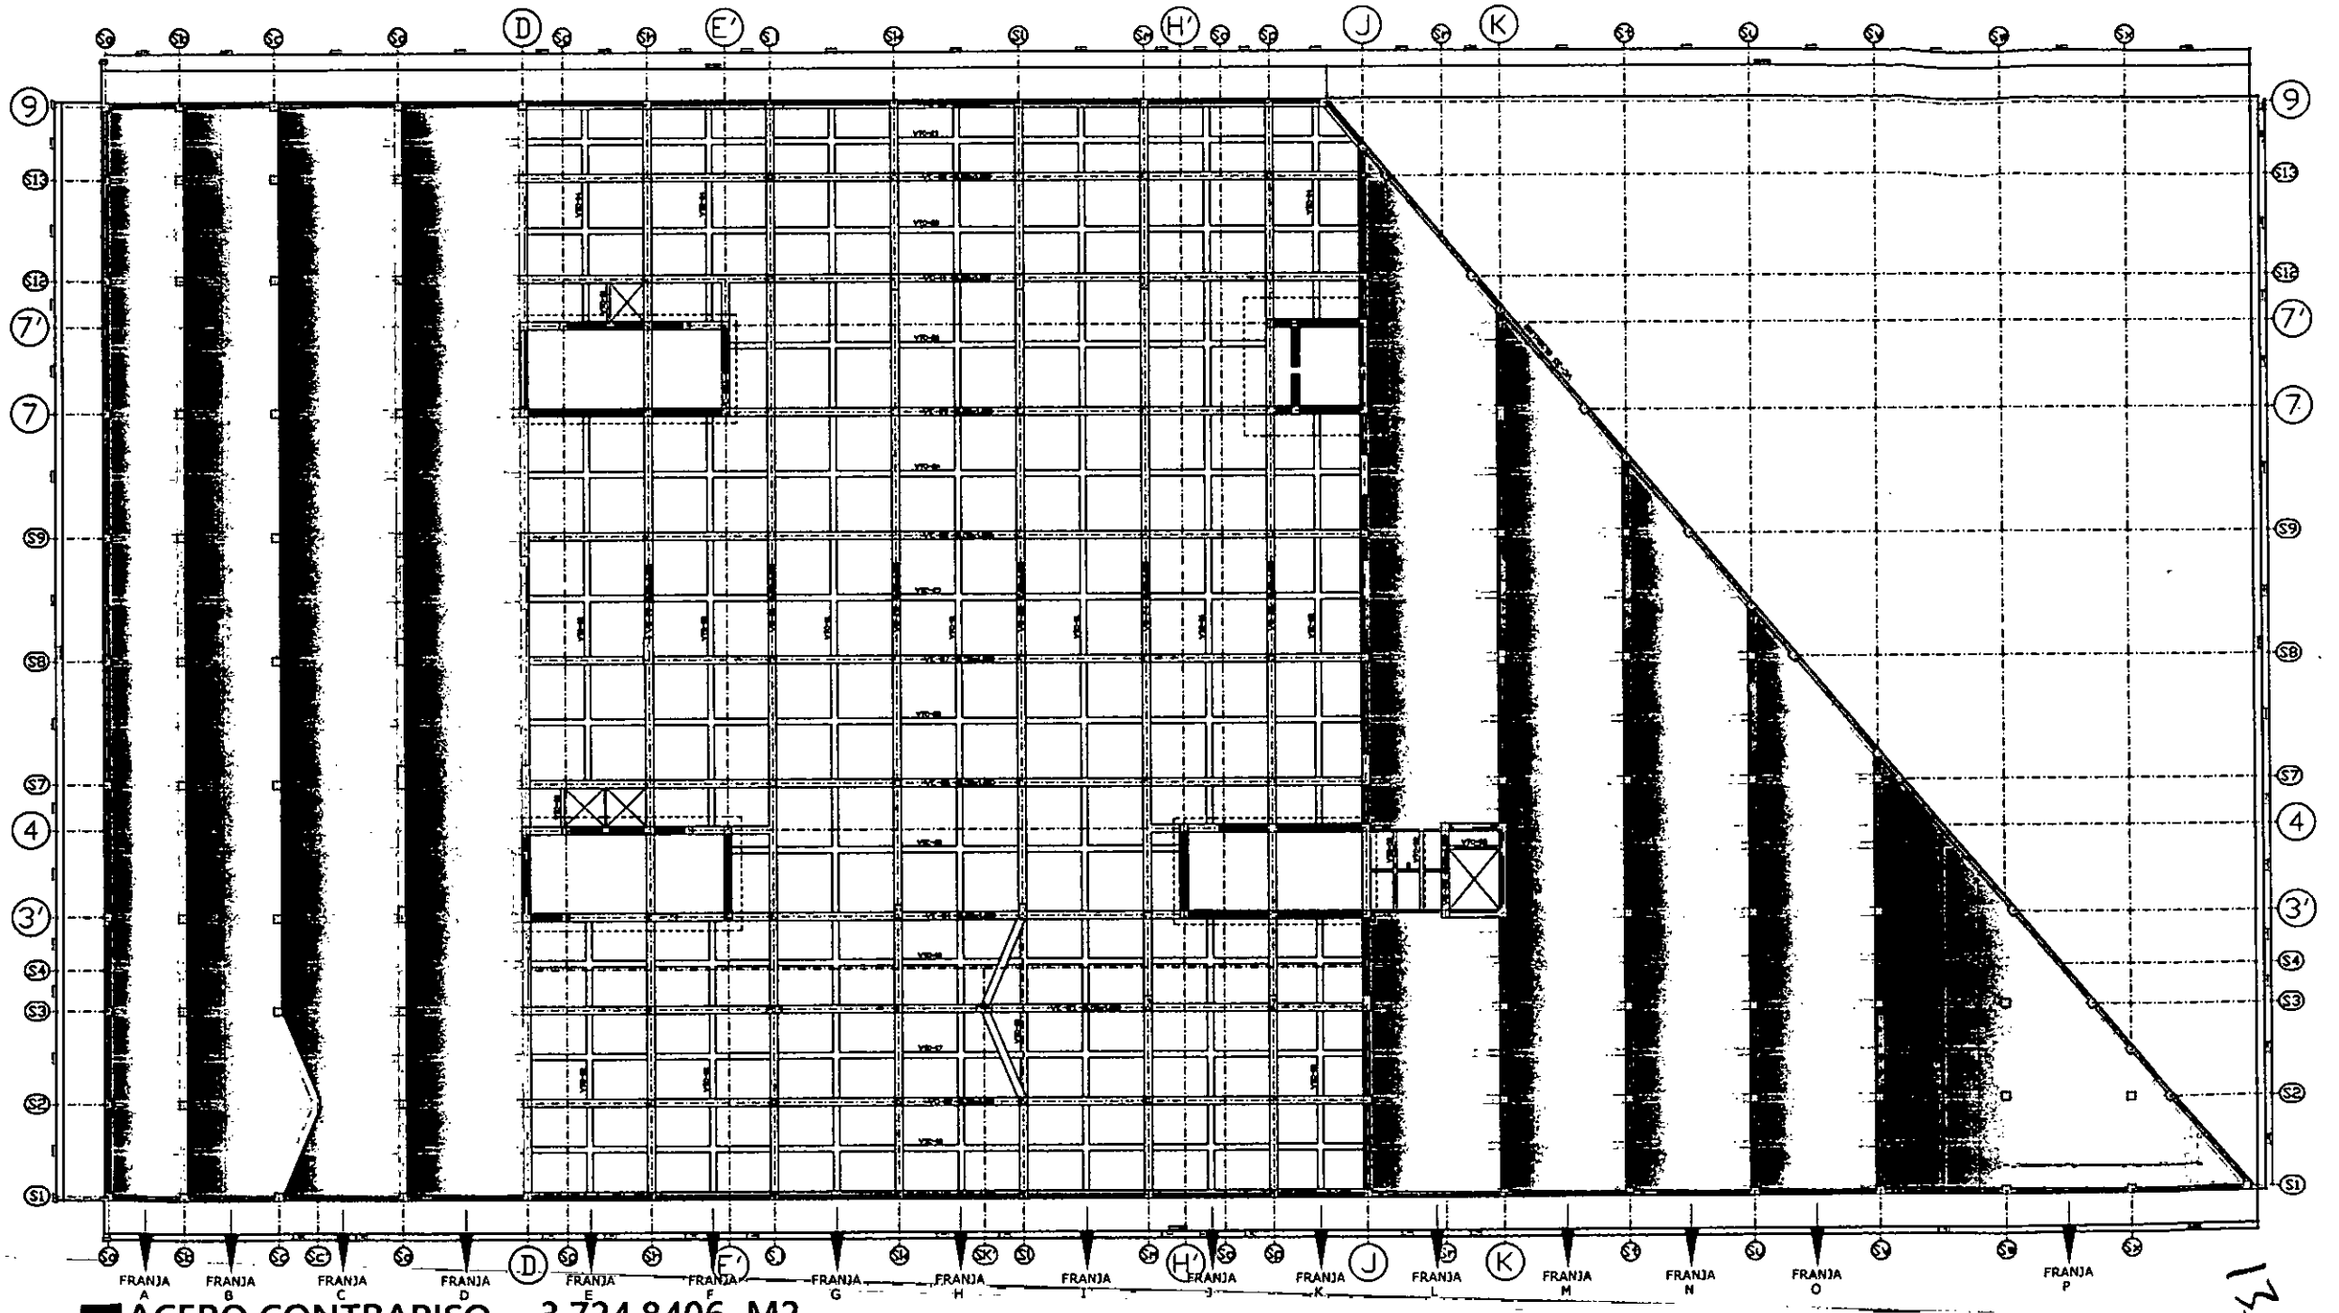

ACERO CONTRAPISO 3.724,8406 M2

48031

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR


SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 05

PERIODO DE EVALUACIÓN: 02/03/2022 AL 30/04/2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR						
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		2021040002		
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		2021050007		
CAPÍTULO	5	ITEM	NP03	Concreto 4000Psi Losa de cimentación		UNID.	M3

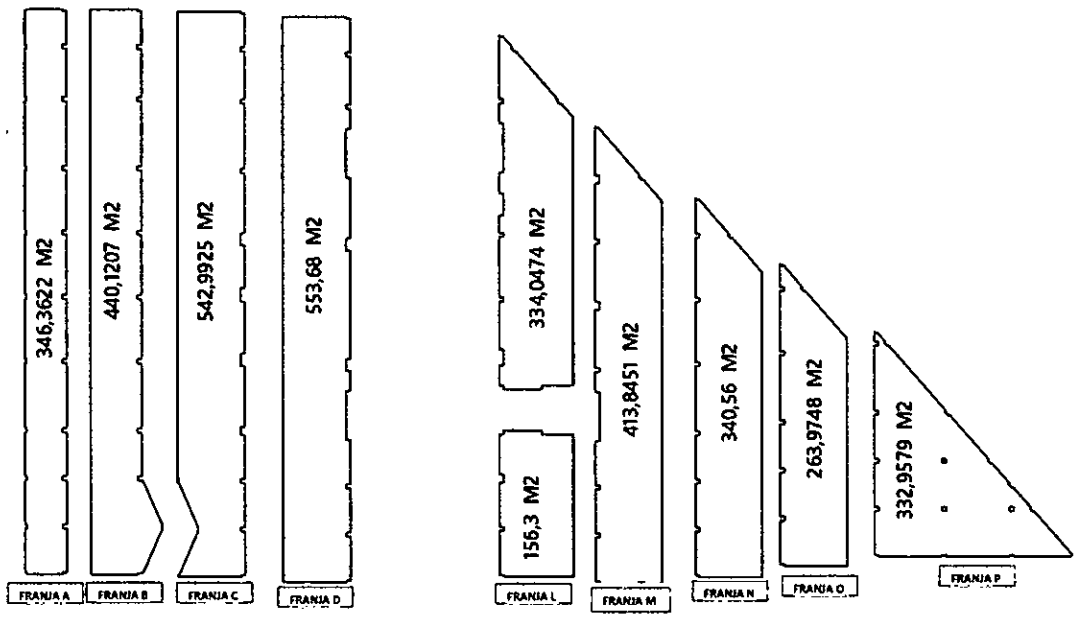

Áreas calculadas por AutoCAD con descuento de áreas de columnas

LOCALIZACIÓN	REF	ÁREA M2	ALTURA	M3
LOSA DE CONTRAPISO				
Ejes (Sa- Sb)→Ejes (S1 -9)	FRANJA "A"	346,36	0,16	55,42
Ejes (Sb- Sc)→Ejes (S1 -9)	FRANJA "B"	440,12	0,16	70,42
Ejes (Sc- Sd)→Ejes (S1 -9)	FRANJA "C"	542,99	0,16	86,88
Ejes (Sd- D)→Ejes (S1 -9)	FRANJA "D"	553,68	0,16	88,59
Ejes (J-K) →Ejes (S1 -3')(4-Diagonal)	FRANJA "L"	490,35	0,16	78,46
Ejes (K- St) →Ejes (S1 -Diagonal)	FRANJA "M"	413,85	0,16	66,22
Ejes (St- Su)→Ejes (S1 -Diagonal)	FRANJA "N"	340,56	0,16	54,49
Ejes (Su- Sv)→Ejes (S1 -Diagonal)	FRANJA "O"	263,97	0,16	42,24
Ejes (Sv- S1 Diagonal)→Ejes (S1 -Diagonal)	FRANJA "P"	332,96	0,16	53,27
			SUBTOTAL LOSA	595,97
			SUBTOTAL	595,97
		CANTIDAD ACTA Parcial No 1	0,00	
		CANTIDAD ACTA Parcial No 2	0,00	
		CANTIDAD ACTA Parcial No 3	0,00	
		CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 4	0,00	
		CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 5	595,97	
		TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	0,00	
		CANTIDAD CONTRACTUAL	1189,94	
		PENDIENTE POR PAGAR	593,97	
		TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		595,97

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.


Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

13.685


346,3622 M2

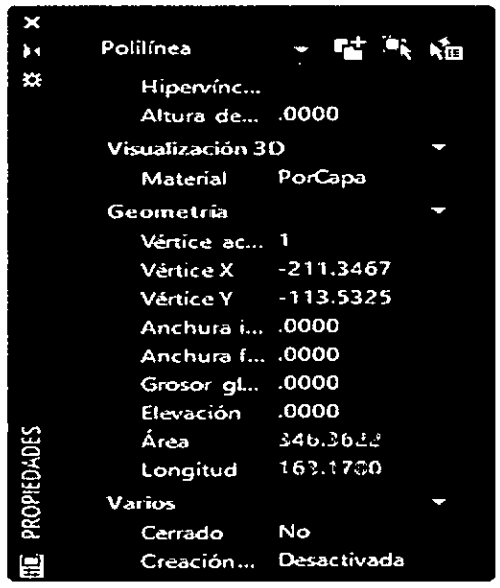


440,1207 M2



542,9925 M2

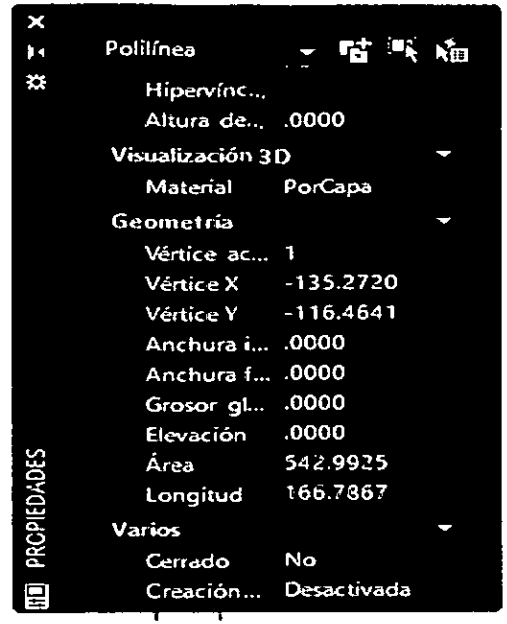


553,68 M2

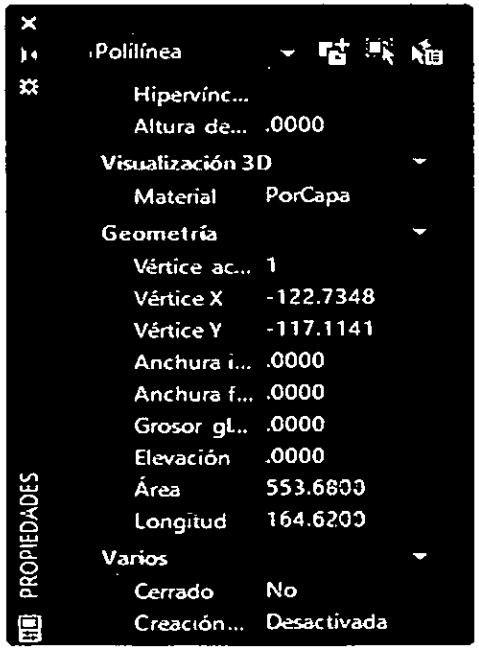



334,0474 M2

156,3 M2

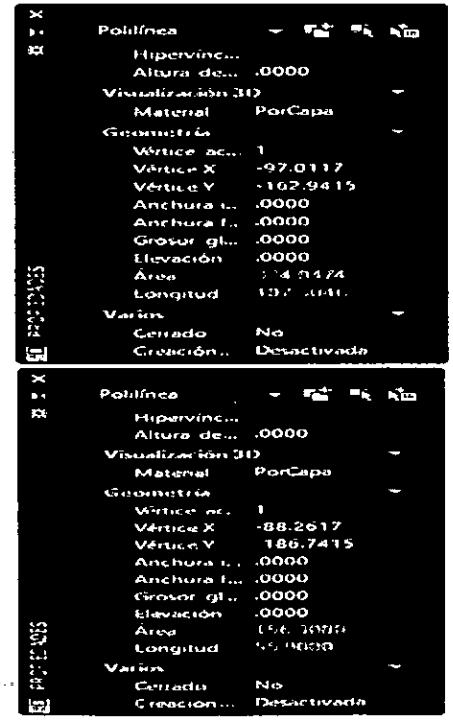

413,8451 M2

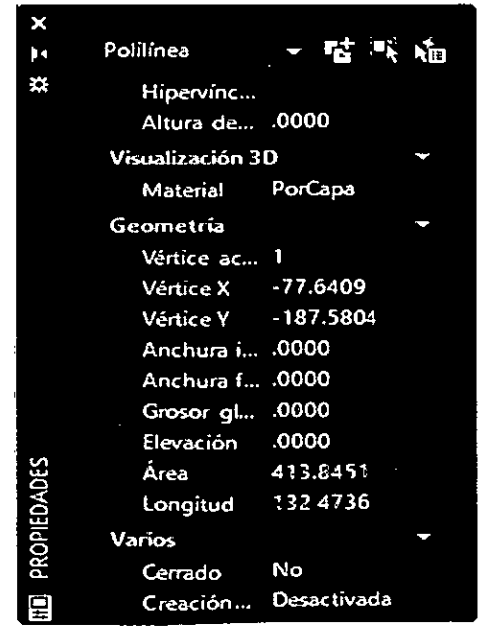




PROPIEDADES

Polilínea


Hipervínc...	
Altura de...	.0000
Visualización 3D	
Material	PorCapa
Geometría	
Vértice ac...	1
Vértice X	-65.6008
Vértice Y	-186.8465
Anchura i...	.0000
Anchura f...	.0000
Grosor gL..	.0000
Elevación	.0000
Área	340.5600
Longitud	112.2648
Varios	
Cerrado	No
Creación...	Desactivada



PROPIEDADES

Polilínea


Hipervínc...	
Altura de...	.0000
Visualización 3D	
Material	PorCapa
Geometría	
Vértice ac...	1
Vértice X	-55.4313
Vértice Y	-185.4911
Anchura i...	.0000
Anchura f...	.0000
Grosor gL..	.0000
Elevación	.0000
Área	263.9748
Longitud	92.0560
Varios	
Cerrado	No
Creación...	Desactivada

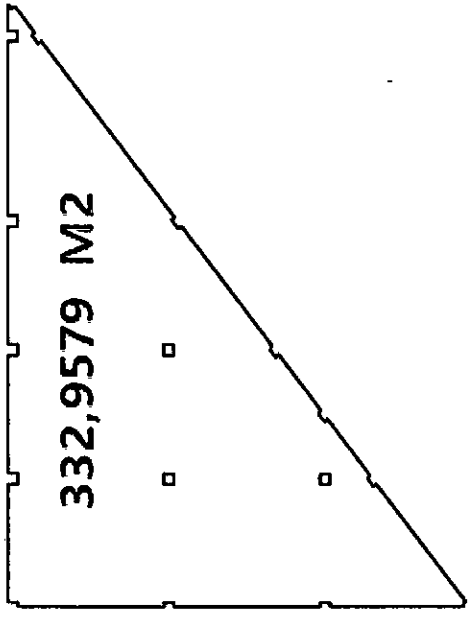

PROPIEDADES

Polilínea

Hipervínc...	
Altura de...	.0000
Visualización 3D	
Material	PorCapa
Geometría	
Vértice ac...	1
Vértice X	-28.8182
Vértice Y	-184.3102
Anchura i...	.0000
Anchura f...	.0000
Grosor gL..	.0000
Elevación	.0000
Área	333.7079
Longitud	95.2016
Varios	
Cerrado	No
Creación...	Desactivada

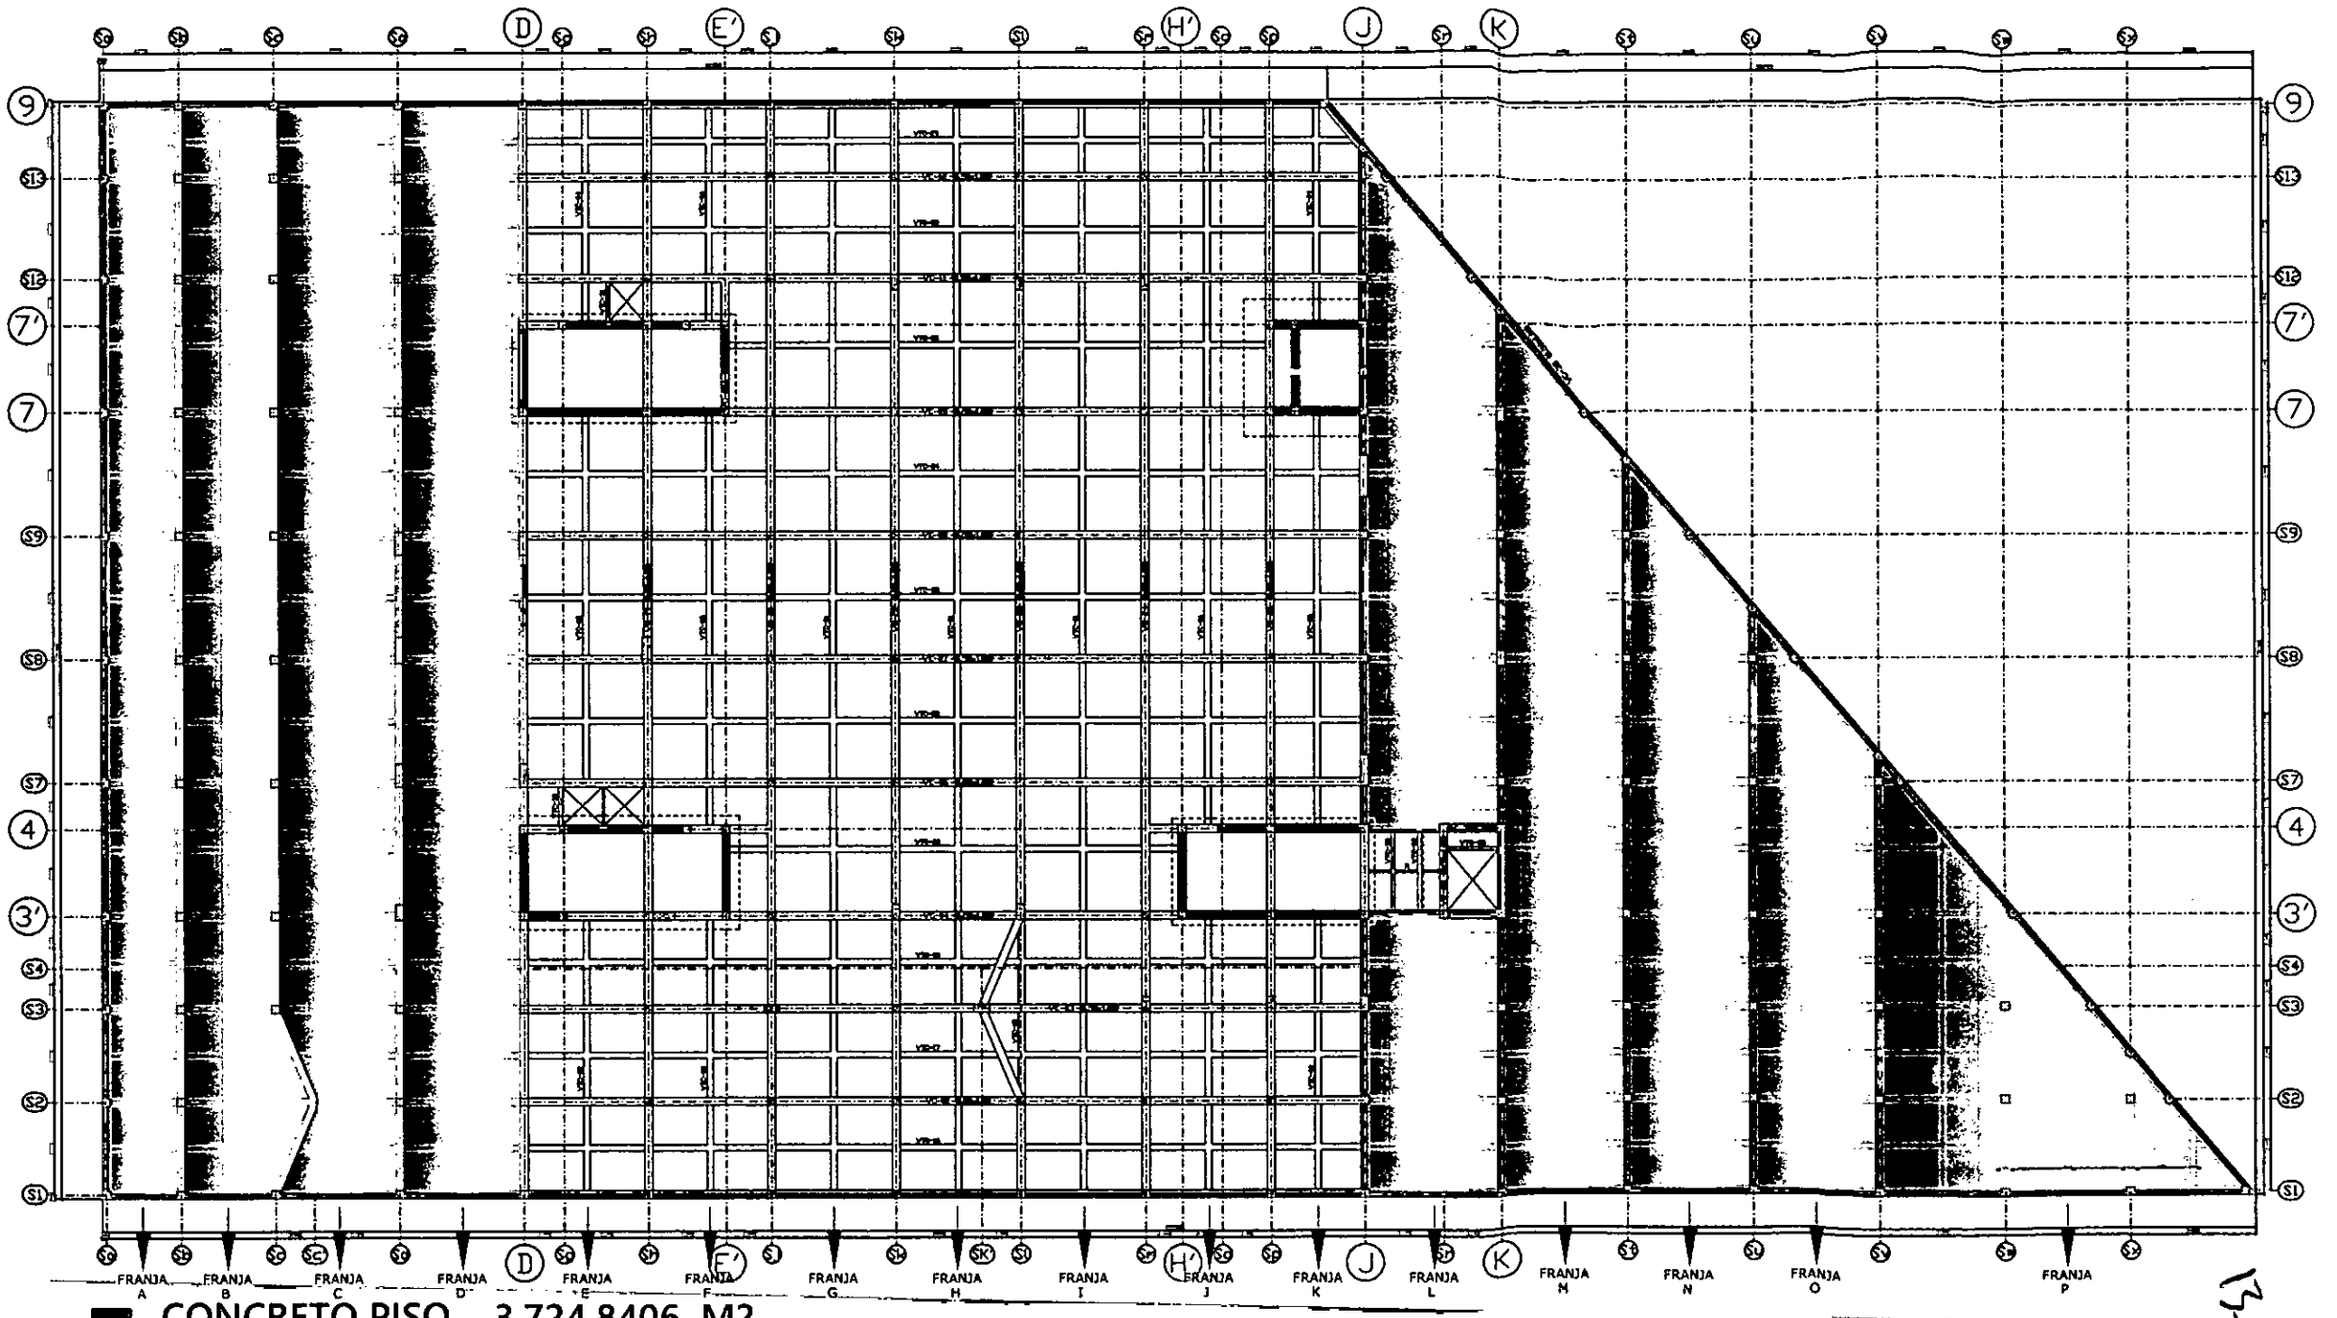

CONCRETO PISO 3.724,8406 M2

13.098

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR


SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 05

PERIODO DE EVALUACIÓN: 02/03/2022 AL 30/04/2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR						
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002	
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007	
CAPÍTULO	4	ITEM	4.1.1	Concreto 4000Psi para columnas y muros cortina		UNID.	M3

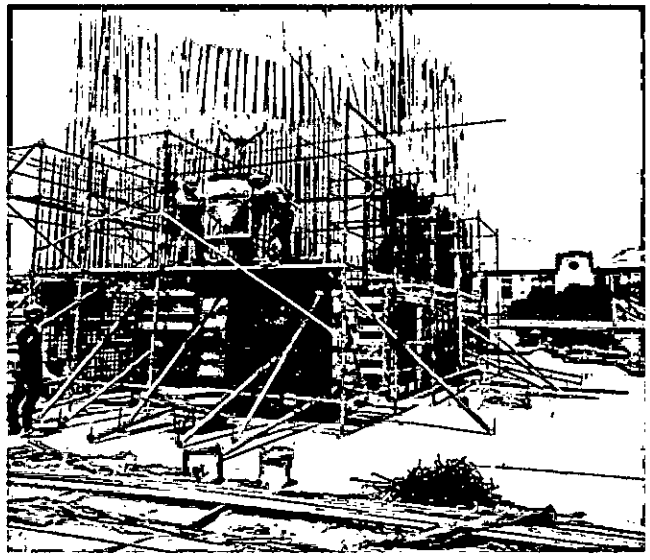

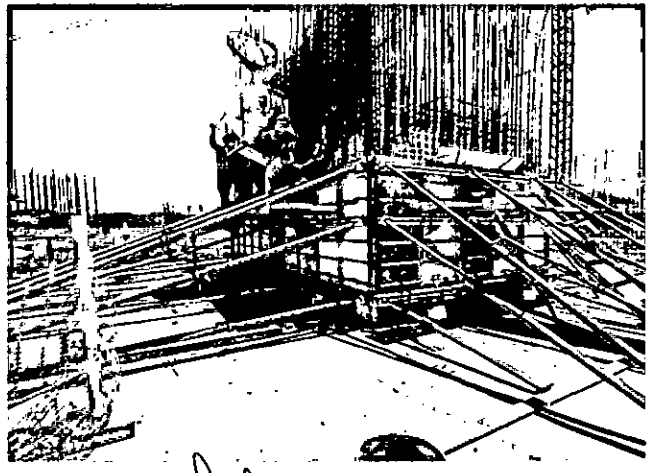

LOCALIZACIÓN	REF	DIMENSIONES LADO	DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES H	CANT	M3
COLUMNAS						
Eje (9, Sk) (S13, Sk)	C1	0,50	0,50	2,95	2	1,48
Eje (S12, Sl) (S12, Sm) (3', Sl)	C11	1,00	0,50	2,95	3	4,43
				SUB TOTAL COLUMNAS		5,90
COLUMNAS CORTINAS						
Eje (7,E') (7,Sh) (7,D)	C9	0,50	0,50	3,60	3	2,70
Eje (7',Sp-J)	C-10A	0,50	0,50	3,60	1	0,90
Eje (7',J)	C-10B	0,50	0,50	3,60	1	0,90
Eje (7', Sp-J)	C-9A	0,50	0,50	3,60	1	0,90
Eje (7-7', J)	C-9C	0,50	0,50	3,60	1	0,90
Eje (Sp-J, 7)	C-9A	0,50	0,50	3,60	1	0,90
Eje (7,J)	C-9B	0,50	0,50	3,60	1	0,90
Ejes (4,Sr)(4, K) (3',Sr) (3',K)	C8	0,50	0,50	3,60	4	3,60
Eje (3') → (3'-Sh)	C2	0,50	1,95	3,60	1	3,51
Eje (3',Sg) (3',D) (4-D) (4,Sg) (4, Sh) (4,Sh-2,5m)	C8	0,50	0,50	3,60	6	5,40
Eje (4, E') (3',E')	C8A	0,50	0,50	3,60	2	1,80
			SUB TOTAL COLUMNAS CORTINAS			22,41
MUROS CORTINAS						
Eje (K)→ (3'-4) (Pendiente en Acta 3)	M-08	0,50	5,10	2,95	1	7,52
Eje (7') → (Sp-J)	M-07A	0,50	3,82	3,60	1	6,88
Eje (7) → (Sp-J)	M-07	0,50	3,82	3,60	1	6,88
Eje 7-7'	M-10	0,50	4,60	3,60	1	8,28
Eje(J) →7-7'	M-10A	0,50	4,60	3,60	1	8,28
Eje (3') → (D-Sg)	M-01	0,50	2,00	3,60	1	3,60
Eje (D)→ (3'- 4)	M-08	0,50	5,10	3,60	1	9,18
Eje (4) → (Sg-Sh+2,5m)	M-04	0,50	6,95	3,60	1	12,51
Eje (E')→ (3'- 4)	M-08A	0,50	5,10	3,60	1	9,18
Eje (4)→ (Sr-K)	M-03	0,50	3,20	3,60	1	5,76
Eje (3')→ (Sr-K)	M-03	0,50	3,20	3,60	1	5,76
Eje (K)→ (3'-4)	M-08	0,50	5,10	3,60	1	9,18
Eje (7)→ (D-E')	M-06	0,50	12,05	3,60	1	21,69
Eje (D) →(7-7')	M-08B	0,50	5,10	3,60	1	9,18
Eje (7') → (Sg-Sh+2,5m)	M-04A	0,50	6,95	3,60	1	12,51
Eje (E')→ (7',7-0,8m)	M-09	0,50	2,55	3,60	1	4,59
Eje (H')→ (3'-4)	M-08A	0,50	5,10	3,60	1	9,18
Eje (3')→ (H'-J)	M-02	0,50	10,65	3,60	1	19,17
Eje (4)→ (So-J)	M-05	0,50	8,10	3,60	1	14,58
RECALCE DE COLUMNAS VIENE DE MEMORIA ANTERIOR						12,02
			SUB TOTAL MUROS CORTINAS			183,90
					SUBTOTAL	224,23

CANTIDAD ACTA Parcial No 1	-	
CANTIDAD ACTA Parcial No 2	86,36	
CANTIDAD ACTA Parcial No 3	210,33	
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 4	12,60	
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 5	224,23	
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	533,52	
CANTIDAD CONTRACTUAL	1.584,58	
PENDIENTE POR PAGAR	1.051,06	
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		224,23

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

13 de 29

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CA. ÁDES DE OBRA


DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 05


PERIODO DE EVALUACIÓN: 02/03/2022 AL 30/04/2022


OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007

CAPÍTULO	3	ITEM	4.1.1	Concreto de 4000 psi para Columna	UNID.	M3






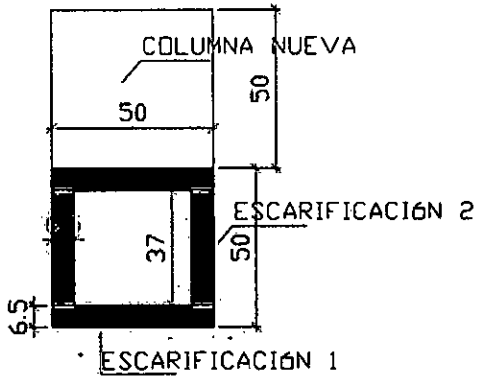

LOCALIZACIÓN	REF	Elemento	DIMENSIONES ANCHO	LARGO	H	CANT	CANT RECAL	M3
Eje '(S3,Sm)(S3,Sp)(S3,J)(3',Sk) Recalce	TIPO 1	Columna Nueva	0,50	0,50	2,95	1	4	2,95
		Escarificación 1	0,065	0,50	2,80	2		0,73
		Escarificación 2	0,065	0,37	2,80	2		0,54
Eje '(S3,Sj)(S3,Sk')(S8,K) Recalce	TIPO 2	Columna Nueva	0,25	0,50	2,95	2	3	2,21
		Escarificación 1	0,07	0,50	2,80	2		0,55
		Escarificación 2	0,07	0,37	2,80	2		0,40
Eje '(3',Sd) Recalce	TIPO 3	Columna Nueva	0,50	0,50	2,95	1	1	0,74
		Escarificación 1	0,07	0,50	2,80	2		0,18
		Escarificación 2	0,07	0,37	2,80	2		0,13
Eje '(Sd,S7) Recalce	TIPO 5	Columna Nueva	0,50	1,00	2,95	1	1	1,48
		Escarificación 1	0,07	0,50	2,80	2		0,18
		Escarificación 2	0,07	0,37	2,80	2		0,13
Eje '(S9,Sd) Recalce	TIPO 6	Columna Nueva	0,50	1,00	2,95	1	1	1,48
		Escarificación 1	0,07	0,50	2,80	2		0,18
		Escarificación 2	0,07	0,37	2,80	2		0,13
							SUBTOTAL	12,02

CANTIDAD ACTA Parcial No 1		
CANTIDAD ACTA Parcial No 2		
CANTIDAD ACTA Parcial No 3		
CANTIDAD ACTA Parcial No 4		
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 5		12,02
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		12,02
CANTIDAD CONTRACTUAL		
PENDIENTE POR PAGAR		
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		12,02

V3.090

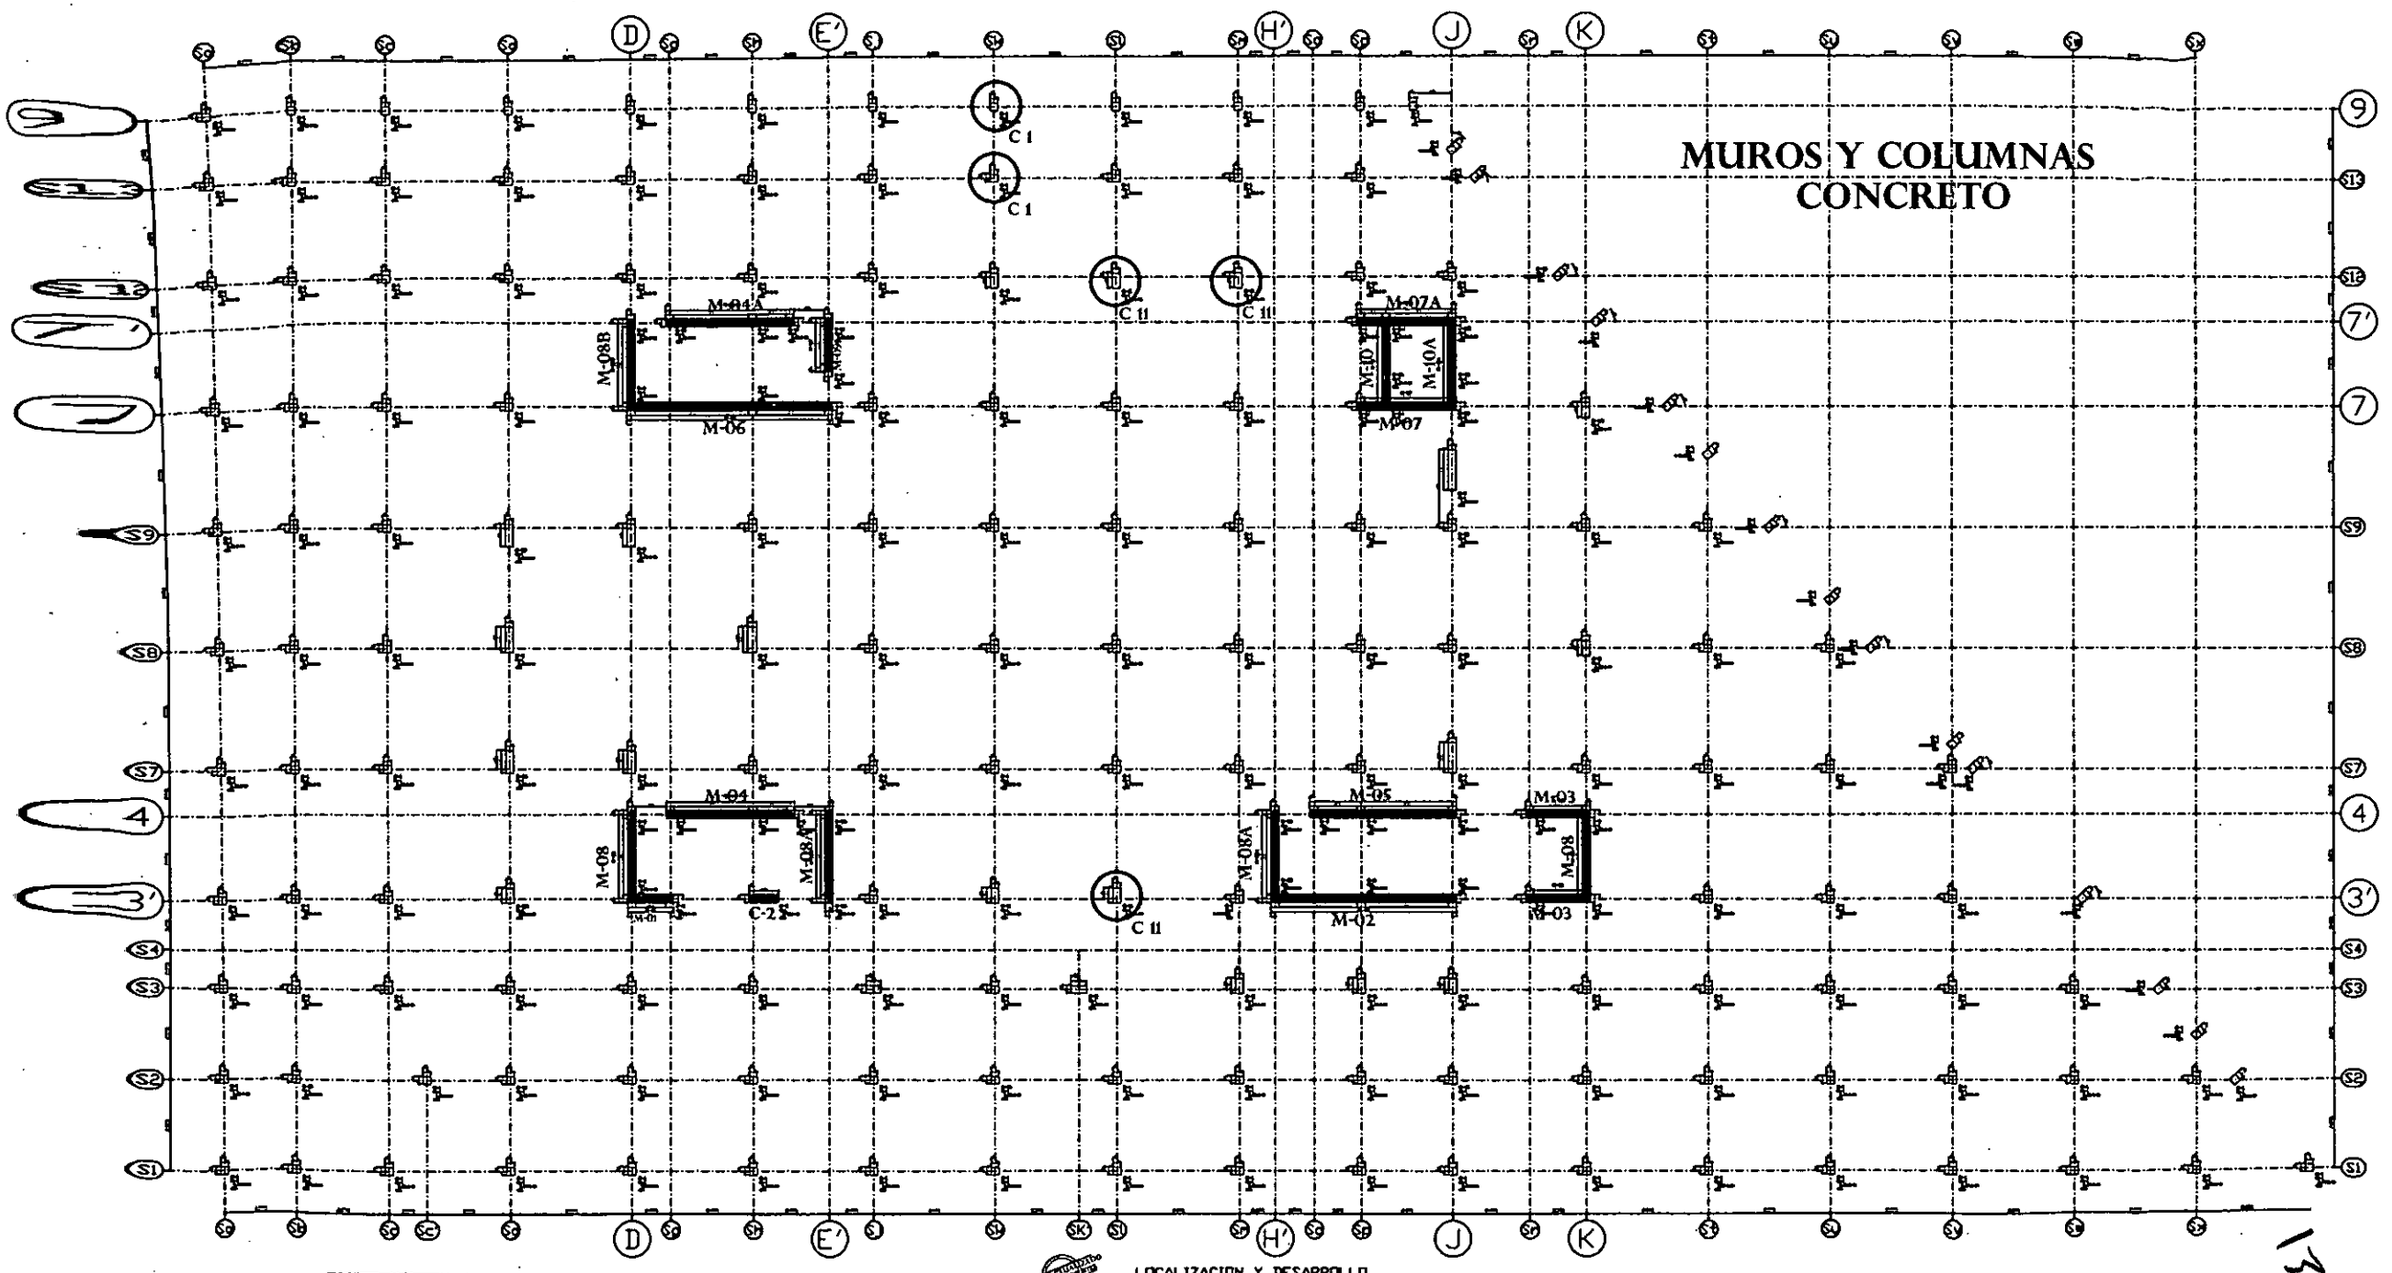


LOCALIZACION Y DESARROLLO
DE COLUMNAS

13.01

RECALCE COLUMNAS

CONCRETO

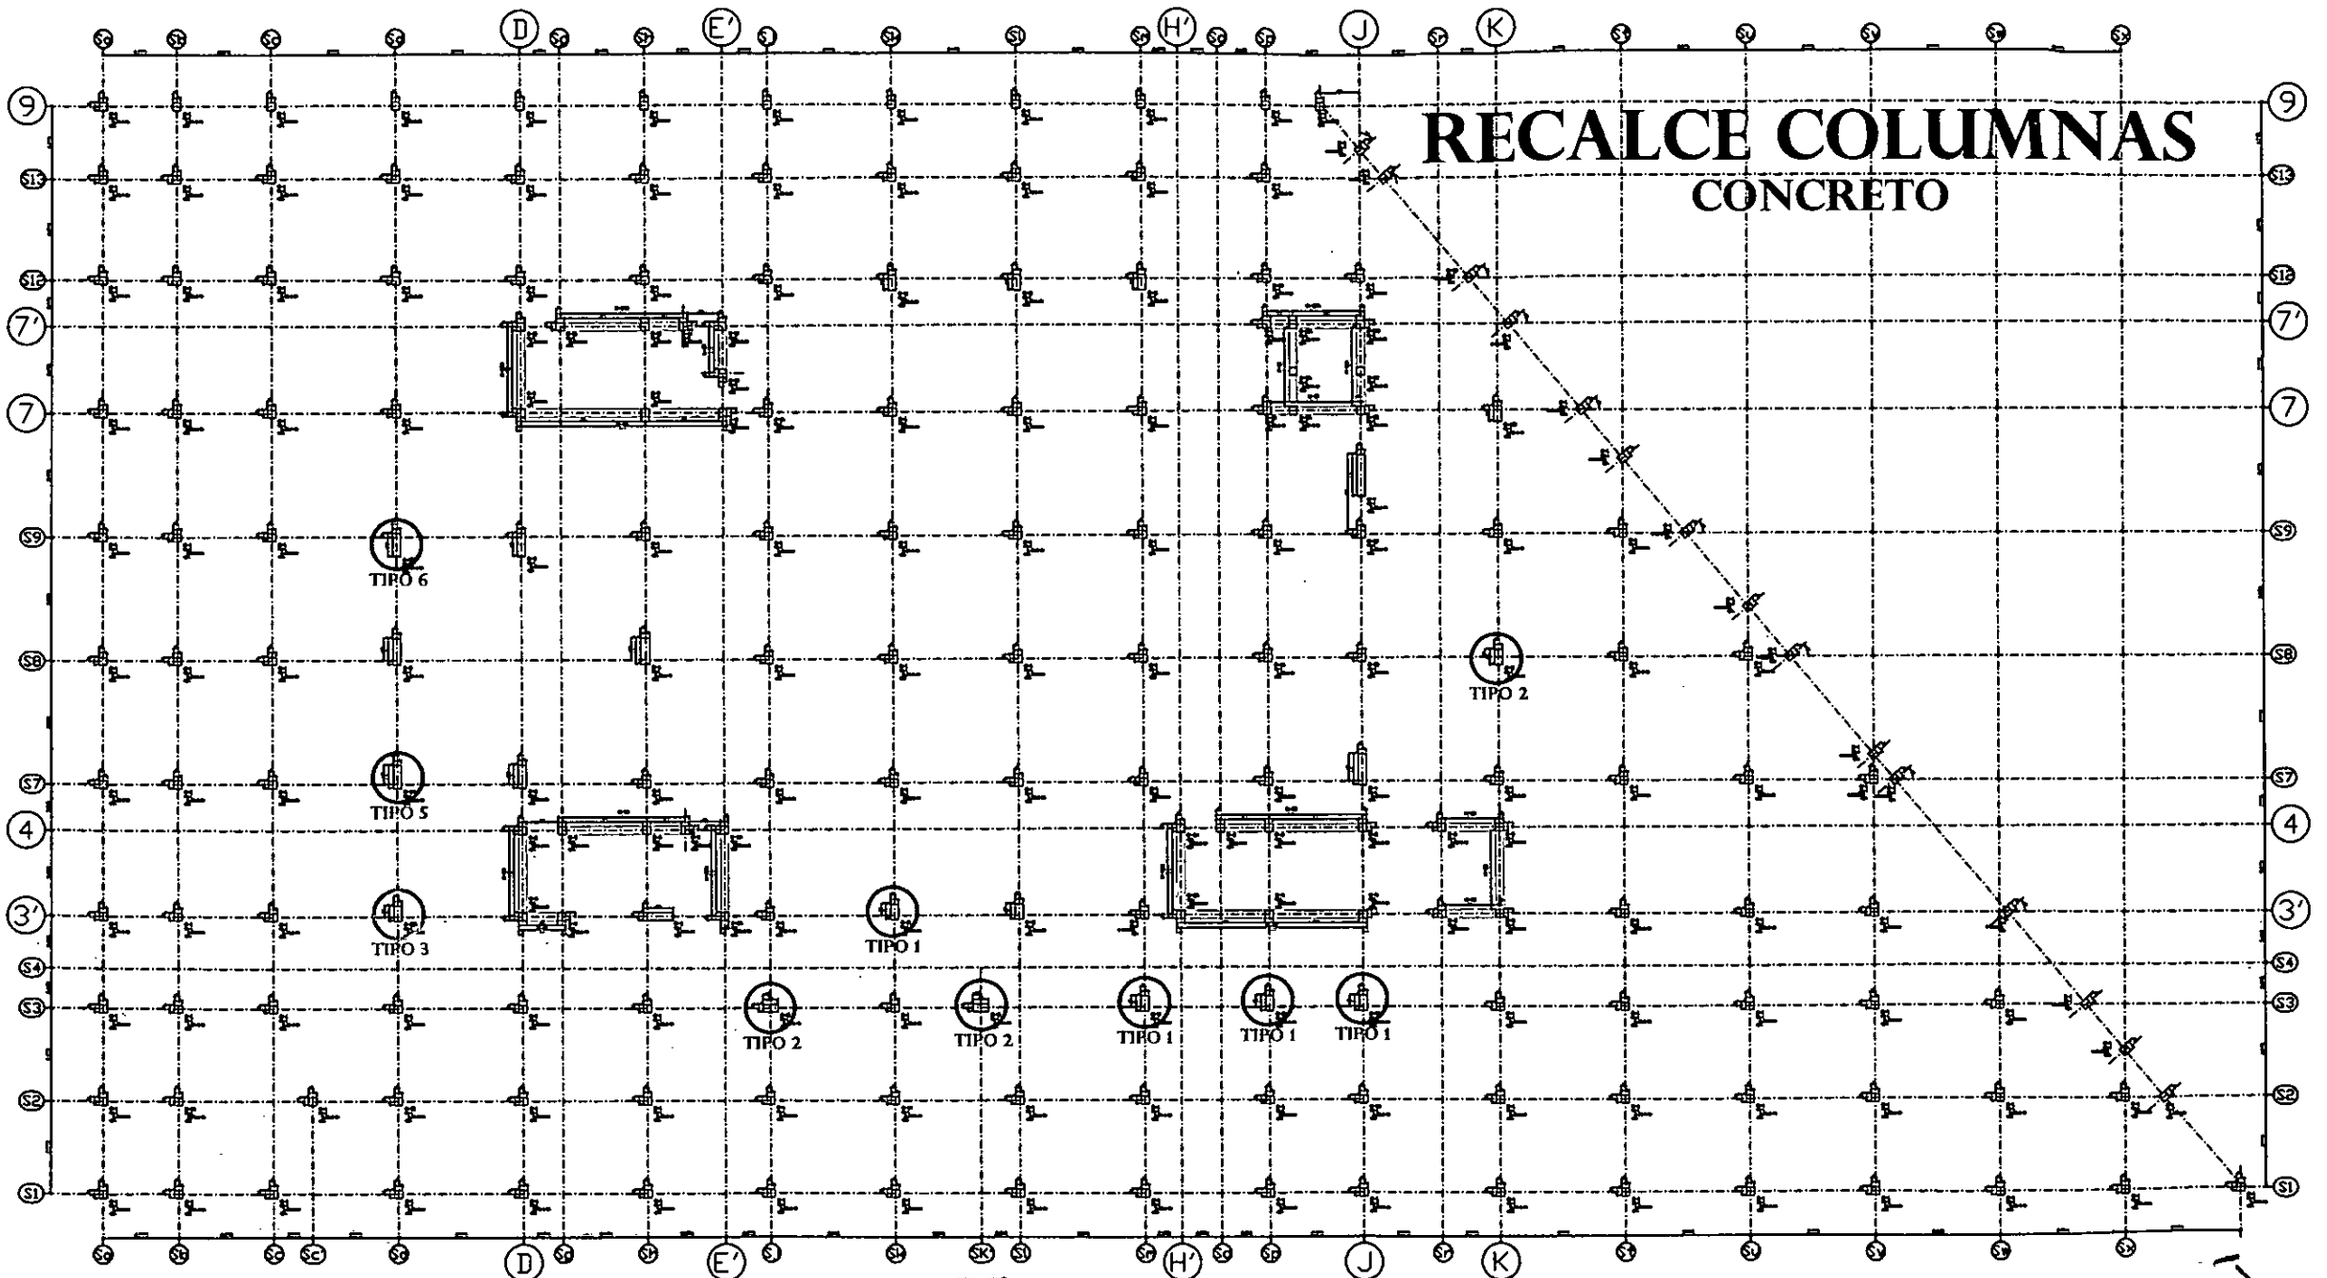

LOCALIZACION Y DESARROLLO DE COLUMNAS

13.09

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA


MEMORIA DE CÁLCULO DE TIDADES DE OBRA


PERIODO DE EVALUACIÓN: 02/03/2022 AL 30/04/2022


DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 05

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	4	ITEM	4,1,2	Acero de refuerzo fy 60,000psi	UNID. KG

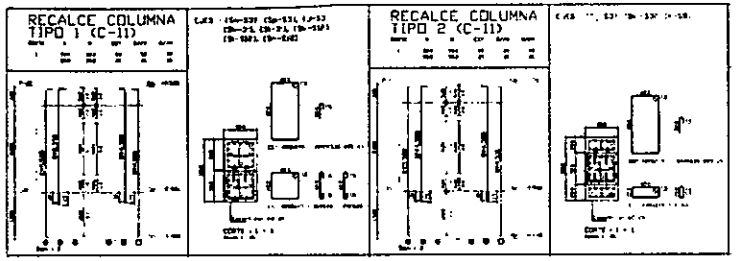

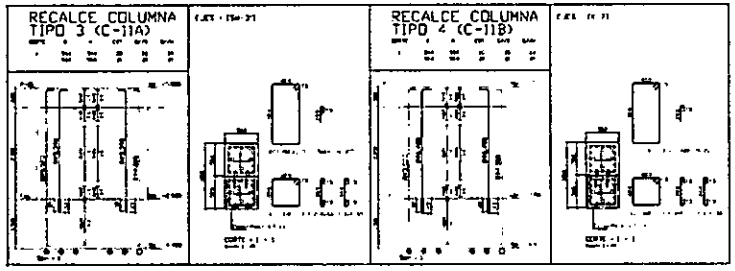



LOCALIZACION	DIMENSIONES TIPO	DIMENSIONES KG	CANT	KG
RECALCE DE COLUMNA				
'Eje '(S3,Sm)(S3,Sp)(S3,J)(3',Sk)(3',Sl)(S12,Sl)(S12,Sm) Recalce	TIPO 1	142,99	7	1.000,91
'Eje '(S3,Sj)(S3,Sk')(S8,K) Recalce	TIPO 2	149,05	3	447,15
'Eje '(3',Sd) Recalce	TIPO 3	161,19	1	161,19
Eje '(7,K) Recalce	TIPO 4	207,39	1	207,39
'Eje '(Sd,S7) Recalce	TIPO 5	307,03	1	307,03
'Eje '(S9,Sd) Recalce	TIPO 6	353,22	1	353,22
				-
				-
			SUBTOTAL	2.476,88
		CANTIDAD ACTA Parcial No 1	16.706,56	
		CANTIDAD ACTA Parcial No 2	10.483,31	
		CANTIDAD ACTA Parcial No 3	97.299,71	
		CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 4	1.491,79	
		CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 5	2.476,88	
		TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	128.458,25	
		CANTIDAD CONTRACTUAL	312.439,49	
		PENDIENTE POR PAGAR	183.981,2	
		TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		2.476,88


Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

13.09

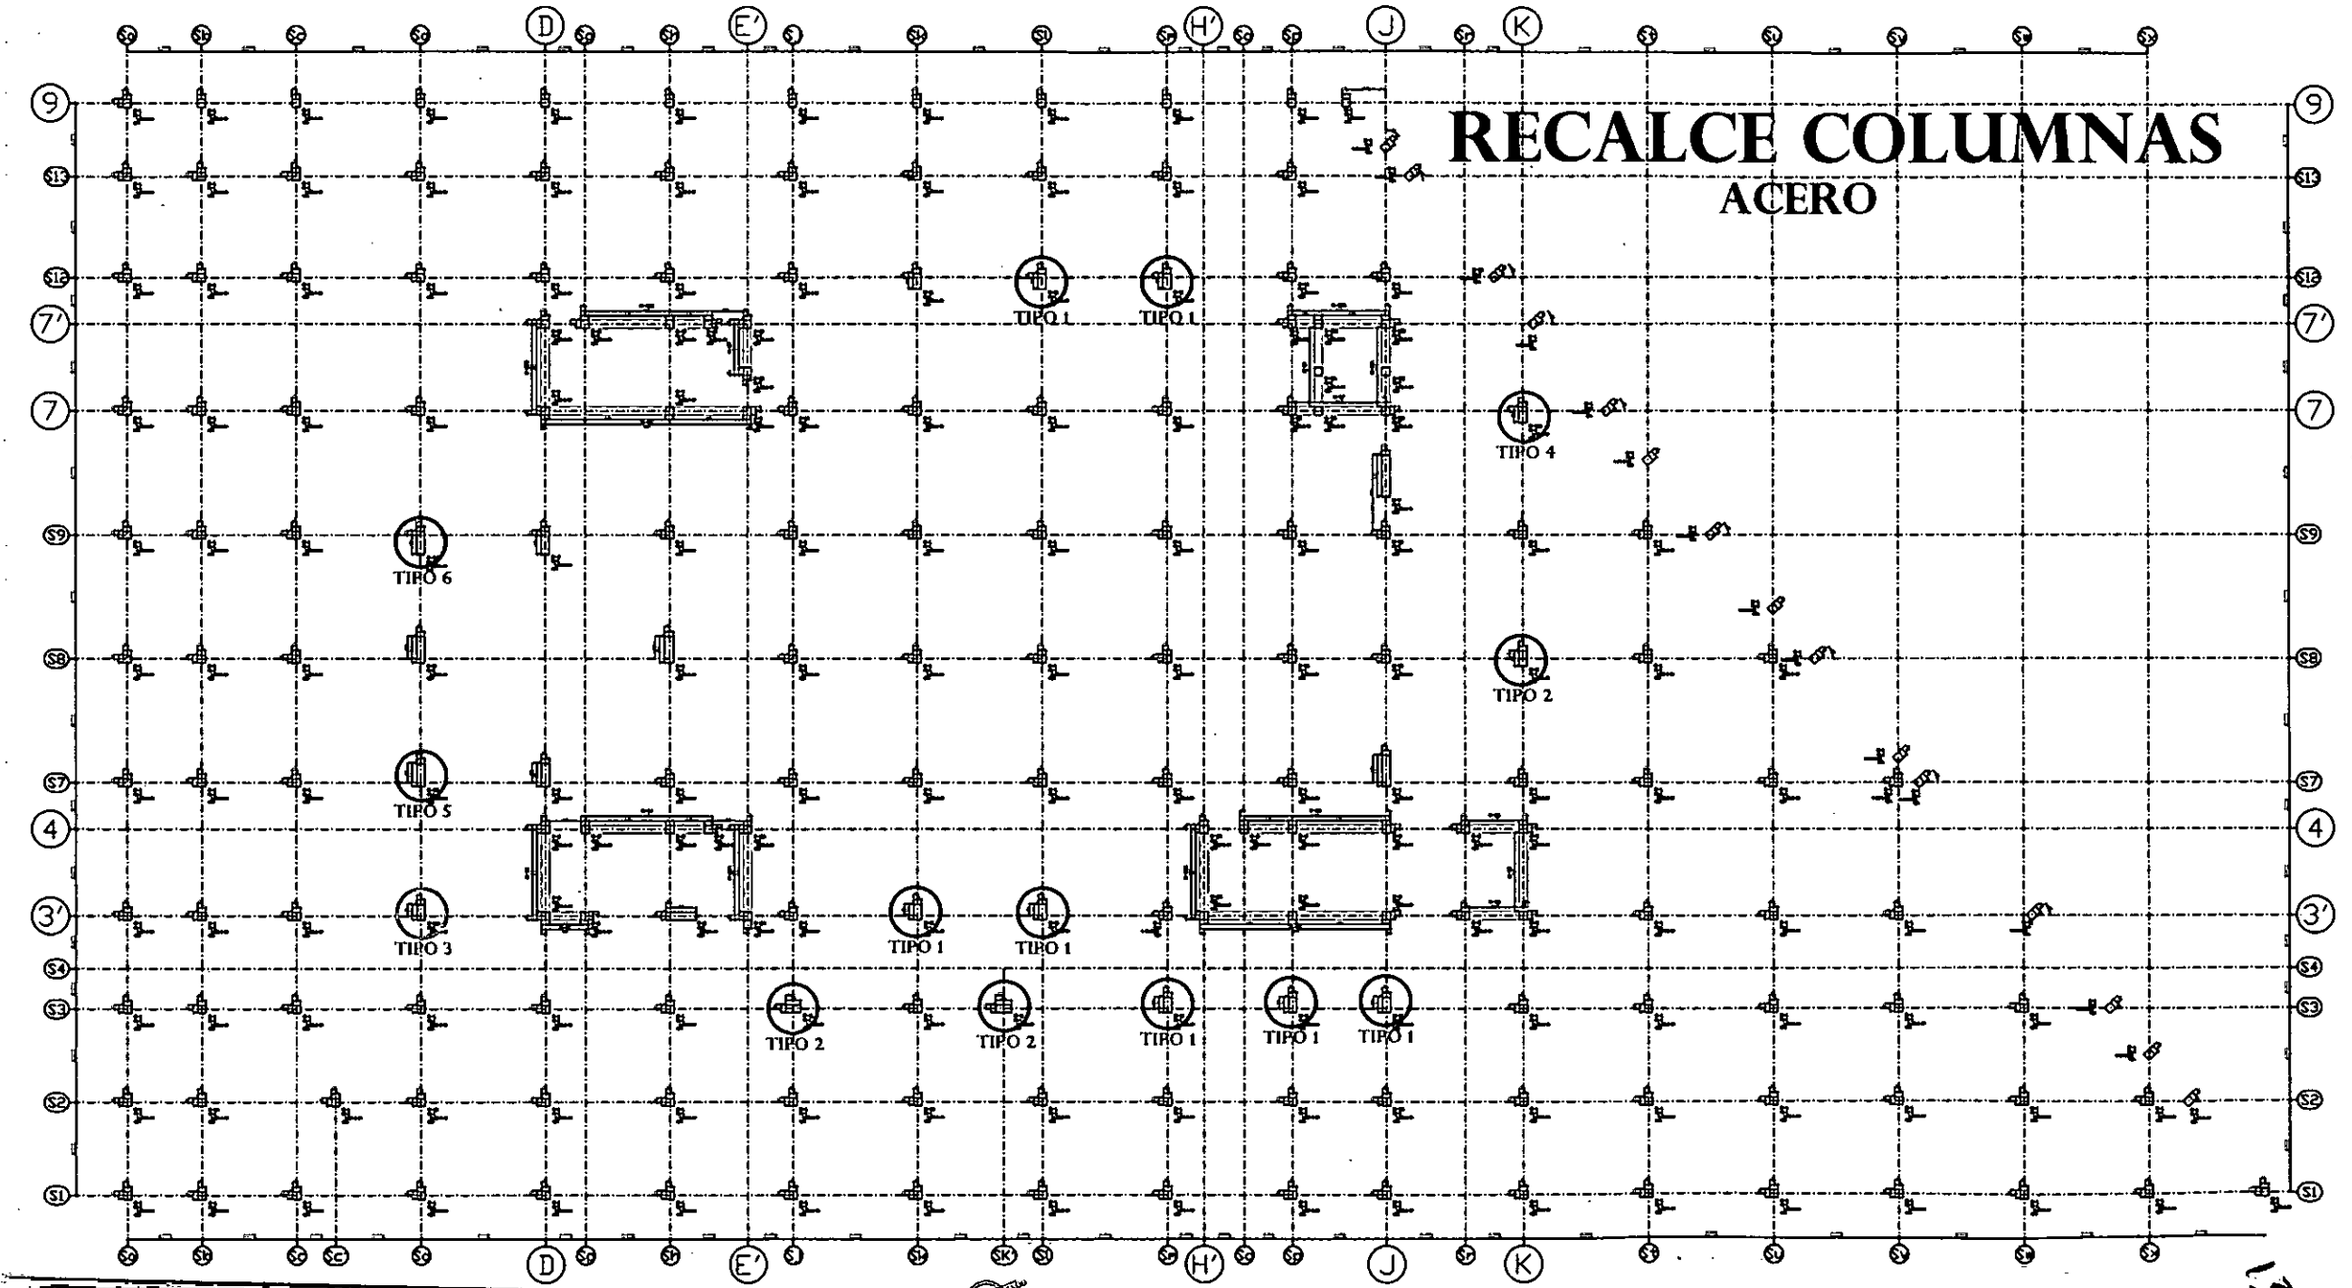
RECALCE COLUMNAS
ACERO
TIPO 1
TIPO 2
TIPO 3
TIPO 4
TIPO 5
TIPO 6
LOCALIZACION Y DESARROLLO DE COLUMNAS

ID	Ø ACERO	ESQUEMA	LONGITUD EN METROS	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL EN METROS	Peso Total (KG)	OBSERVACIONES
ACERO RECALCE DE COLUMNA							
COLUMNA TIPO1 GANCHO	3	0,075 0,44 0,075	0,59	42	24,8	13,85	
COLUMNA TIPO1 LONGITUDINAL 1	5	0,200 3,70	3,90	8	31,20	48,4	
COLUMNA TIPO1 LONGITUDINAL 2	4	0,150 3,65	3,80	8	30,40	30,2	
COLUMNA TIPO1 ESTRIBO EXTERNO	3	0,92 0,42 0,075 0,075 0,42 0,92	2,83	15	42,45	23,7	
COLUMNA TIPO1 ESTRIBO INTERNO	3	0,42 0,42 0,075 0,075 0,42 0,42	1,83	21	38,43	21,5	
ANCLAJE	3	0,075 0,24	0,32	30	9,45	5,3	
					TOTAL REFUERZO Z50	**142,99**	
					TOTAL REFUERZO	**1.000,91**	

ID	Ø ACERO	ESQUEMA	LONGITUD EN METROS	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL EN METROS	Peso Total (KG)	OBSERVACIONES
ACERO RECALCE DE COLUMNA							
COLUMNA TIPO2 GANCHO	3	0,075 0,19 0,075	0,34	42	14,3	7,98	
COLUMNA TIPO2 LONGITUDINAL 1	4	0,150 3,65	3,80	12	45,60	45,3	
COLUMNA TIPO2 LONGITUDINAL 2	4	0,150 3,65	3,80	8	30,40	30,2	
COLUMNA TIPO2 ESTRIBO EXTERNO	3	0,92 0,42 0,075 0,075 0,42 0,92	2,83	15	42,45	23,7	
COLUMNA TIPO2 ESTRIBO INTERNO	3	0,17 0,42 0,075 0,075 0,42 0,17	1,33	42	55,86	31,2	
ANCLAJE	3	0,075 0,24	0,32	60	18,90	10,6	
					TOTAL REFUERZO Z50	**149,05**	
					TOTAL REFUERZO	**447,14**	

ID	Ø ACERO	ESQUEMA	LONGITUD EN METROS	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL EN METROS	Peso Total (KG)	OBSERVACIONES
ACERO RECALCE DE COLUMNA							
COLUMNA TIPO3 GANCHO	3	0,075 — 0,44 — 0,075	0,59	42	24,8	13,85	
COLUMNA TIPO3 LONGITUDINAL 1	5	0,200 — 3,70	3,90	8	31,20	48,4	
COLUMNA TIPO3 LONGITUDINAL 2	5	0,200 — 3,70	3,90	8	31,20	48,4	
COLUMNA TIPO3 ESTRIBO EXTERNO	3	0,92 0,42 0,075 0,075 / 0,42 0,92	2,83	15	42,45	23,7	
COLUMNA TIPO3 ESTRIBO INTERNO	3	0,42 0,42 0,075 0,075 / 0,42 0,42	1,83	21	38,43	21,5	
ANCLAJE	3	0,075 — 0,24	0,32	30	9,45	5,3	
					TOTAL REFUERZO Z50	**161,19**	
					TOTAL REFUERZO	**161,19**	






ID	Ø ACERO	ESQUEMA	LONGITUD EN METROS	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL EN METROS	Peso Total (KG)	OBSERVACIONES
ACERO RECALCE DE COLUMNA							
COLUMNA TIPO4 GANCHO	3	0,075 — 0,44 — 0,075	0,59	42	24,8	13,85	
COLUMNA TIPO4 LONGITUDINAL 1	6	0,250 — 3,75	4,00	8	32,00	71,5	
COLUMNA TIPO4 LONGITUDINAL 2	6	0,250 — 3,75	4,00	8	32,00	71,5	
COLUMNA TIPO4 ESTRIBO EXTERNO	3	0,92 0,42 0,075 0,075 / 0,42 0,92	2,83	15	42,45	23,7	
COLUMNA TIPO4 ESTRIBO INTERNO	3	0,42 0,42 0,075 0,075 / 0,42 0,42	1,83	21	38,43	21,5	
ANCLAJE	3	0,075 — 0,24	0,32	30	9,45	5,3	
					TOTAL REFUERZO Z50	**207,39**	
					TOTAL REFUERZO	**207,39**	

13.096

ID	Ø ACERO	ESQUEMA	LONGITUD EN METROS	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL EN METROS	Peso Total (KG)	OBSERVACIONES
ACERO RECALCE DE COLUMNA							
COLUMNA TIPO5 GANCHO	3	0,075 0,44 0,075	0,59	63	37,2	20,78	
COLUMNA TIPO5 GANCHO	3	0,075 1,44 0,075	1,59	21	33,4	18,67	
COLUMNA TIPO5 LONGITUDINAL 2	5	0,200 3,70	3,90	24	93,60	145,3	
COLUMNA TIPO5 LONGITUDINAL 2	4	0,150 3,65	3,80	8	30,40	30,2	
COLUMNA TIPO5 ESTRIBO EXTERNO	3	0,92 0,42 0,075 0,075 0,42 0,92	2,83	21	59,43	33,2	
COLUMNA TIPO5 ESTRIBO INTERNO	3	0,42 0,42 0,075 0,075 0,42 0,42	1,83	21	38,43	21,5	
COLUMNA TIPO5 ESTRIBO INTERNO	3	1,42 0,42 0,075 0,075 0,42 1,42	3,83	15	57,45	32,1	
ANCLAJE	3	0,075 0,24	0,32	30	9,45	5,3	
					TOTAL REFUERZO Z50	**307,03**	
					TOTAL REFUERZO	**307,03**	

ID	Ø ACERO	ESQUEMA	LONGITUD EN METROS	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL EN METROS	Peso Total (KG)	OBSERVACIONES
ACERO RECALCE DE COLUMNA							
COLUMNA TIPO6 GANCHO	3	0,075 0,44 0,075	0,59	63	37,2	20,78	
COLUMNA TIPO6 LONGITUDINAL 1	6	0,250 3,75	4,00	16	64,00	143,0	
COLUMNA TIPO6 LONGITUDINAL 2	5	0,200 3,70	3,90	8	31,20	48,4	
COLUMNA TIPO6 LONGITUDINAL 2	4	0,150 3,65	3,80	8	30,40	30,2	

13917

COLUMNA TIPO6 GANCHO	3		1,59	21	33,4	18,67	
COLUMNA TIPO6 ESTRIBO EXTERNO	3		2,83	21	59,43	33,2	
COLUMNA TIPO6 ESTRIBO INTERNO	3		1,83	21	38,43	21,5	
COLUMNA TIPO6 ESTRIBO INTERNO	3		3,83	15	57,45	32,1	
ANCLAJE	3		0,32	30	9,45	5,3	
					TOTAL REFUERZO Z50	353,22	
					TOTAL REFUERZO	353,22	

TOTAL REFUERZO	2.476,88

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 05

PERIODO DE EVALUACIÓN: 02/03/2022 AL 30/04/2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007

CAPÍTULO	4	ITEM	4,2,1	Concreto 4000Psi	UNID.	M3

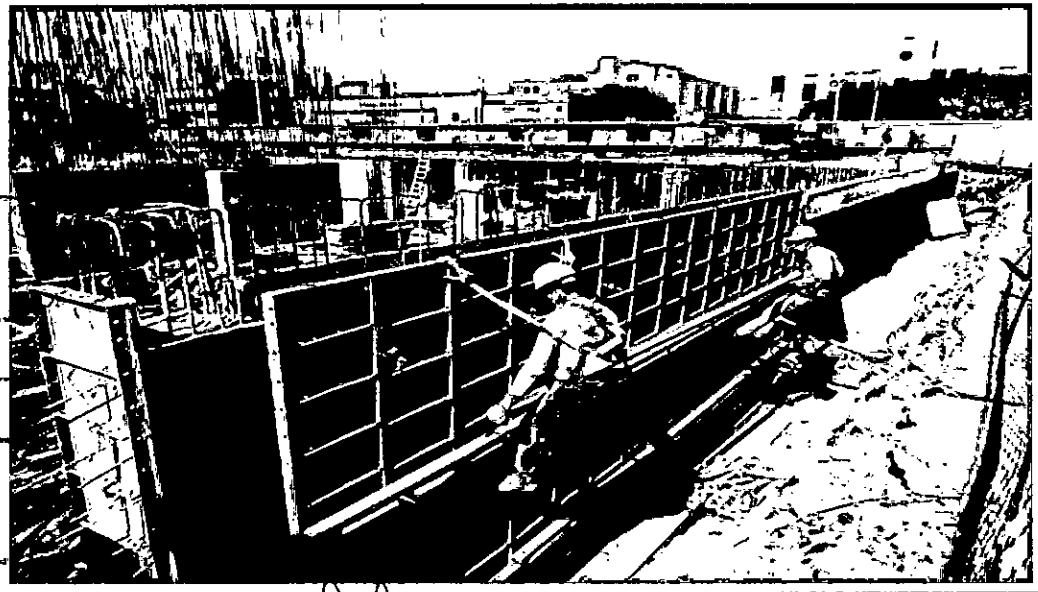

LOCALIZACIÓN	REF	DIMENSIONES ANCHO	LARGO	AREA	ALTURA	M3
Ejes (9)→Ejes (S) -Sk)	Muro contencion	0,25	7,50	1,88	2,95	5,53
Ejes (9)→Ejes (Sk -S!)	Muro contencion	0,25	7,50	1,88	2,95	5,53
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
				SUBTOTAL LOSA		11,06
					SUBTOTAL	11,06
				CANTIDAD ACTA Parcial No 1	0,00	
				CANTIDAD ACTA Parcial No 2	0,00	
				CANTIDAD ACTA Parcial No 3	230,72	
				CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 4	0,00	
				CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 5	11,06	
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	241,78	
				CANTIDAD CONTRACTUAL	241,78	
				PENDIENTE POR PAGAR	0,00	
				TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		11,06


Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

13 Folios

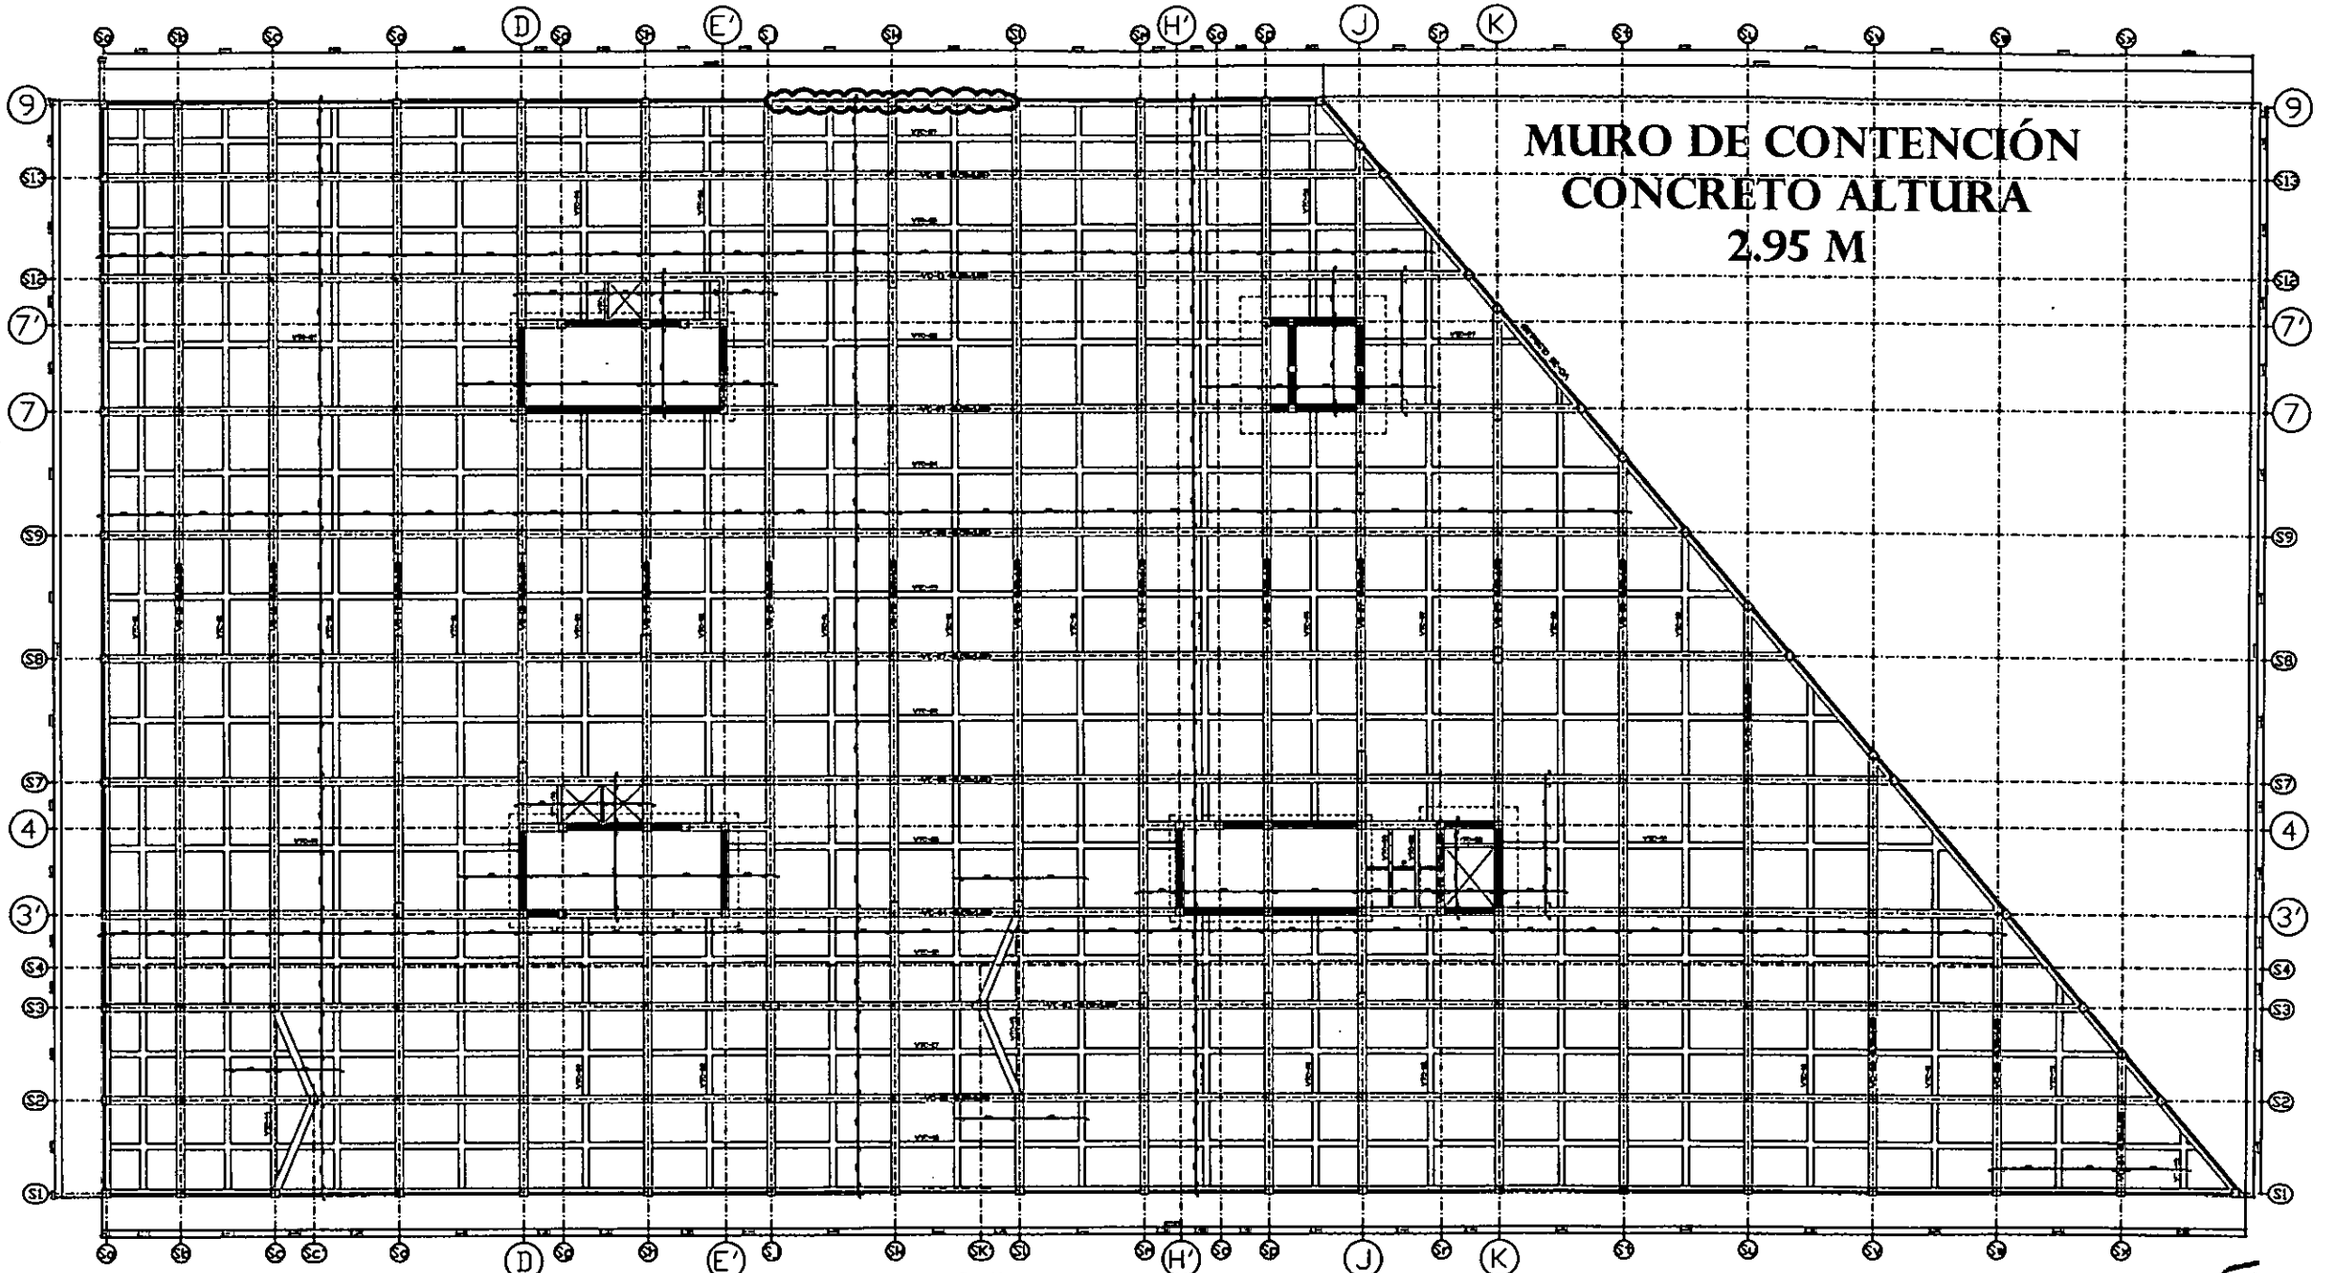

FORMALETA NIVEL Ne. -2.90
CIMENTACION

13.100

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR


SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 05

PERIODO DE EVALUACIÓN: 02/03/2022 AL 30/04/2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR				
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	5	ITEM	5,1,1	Concreto 4000Psi para losa aligerada E=60cm	UNID. M3

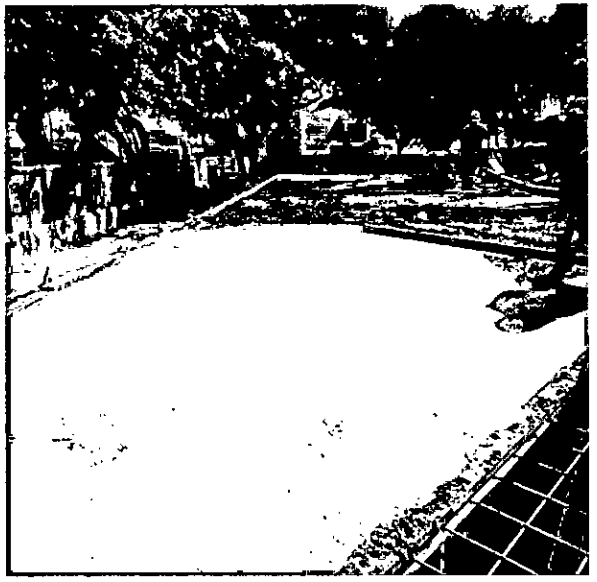

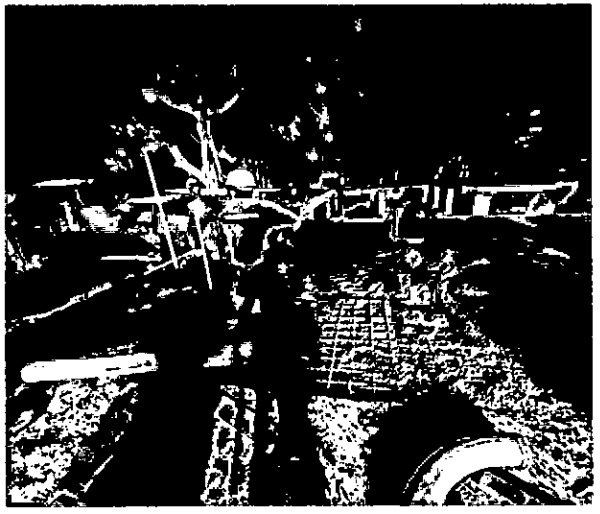

LOCALIZACIÓN	REF	DIMENSIONES ANCHO	ML	H	CANT	M3
VIGAS						
Eje S1→ Ejes (SK- Su)	VG-101A	0,50	54,75	0,60	1	16,43
Eje S2→ Ejes (SJ- Su)	VG-102	0,50	62,25	0,60	1	18,68
Eje S3→ Ejes (SJ- Su)	VG-103	0,50	62,25	0,60	1	18,68
Eje 3'→ Ejes (SJ- Su)	VG-104	0,50	62,25	0,60	1	18,68
Eje 4→ Ejes (Sm- K)	VG-105A	0,50	22,75	0,60	1	6,83
Eje S7→ Ejes (SJ- Sk)(Sm-Su)	VG-106	0,50	46,75	0,60	1	14,03
Eje S8→ Ejes (SJ- Sk)(Sm-Su)	VG-107A	0,50	46,75	0,60	1	14,03
Eje 7→ Ejes (SJ- Sk)(Sm-S9 diagonal)	VG-108	0,50	36,23	0,60	1	10,87
Eje S9→ Ejes (Sp- J)	VG-110A	0,50	6,50	0,60	1	1,95
Ejes (Sp- J)	VG-110B	0,50	4,85	0,60	1	1,46
Eje S12→ Ejes (SJ- Sk)(Sm- S12 diagonal)	VG-111	0,50	29,06	0,60	1	8,72
Eje S13→ Ejes (SJ- Sk)(Sm- S13 diagonal)	VG-112	0,50	23,65	0,60	1	7,10
Eje 9→ Ejes (SJ- Sk)(Sm- 9 diagonal)	VG-113	0,50	19,97	0,60	1	5,99
Eje Sk→ Ejes (S1- 9)	VG-122	0,50	65,41	0,60	1	19,62
Eje Sl→ Ejes (S1- 3')	VG-123	0,50	17,50	0,60	1	5,25
Eje Sm→ Ejes (S1- 9')	VG-124	0,50	65,41	0,60	1	19,62
Eje H'→ Ejes (3'- 4)	VG-125	0,50	5,10	0,60	1	1,53
Eje Sp→ Ejes (S1- 3')	VG-126	0,50	16,50	0,60	1	4,95
Eje Sp→ Ejes (4- 9)	VG-126A	0,50	42,81	0,60	1	12,84
Ejes (7- 7')	VG-126B	0,50	4,55	0,60	1	1,37
Eje Sj→ Ejes (S1- J diagonal)	VG-127	0,50	61,19	0,60	1	18,36
Eje Sr→ Ejes (3'- 4)	VG-128	0,50	5,10	0,60	1	1,53
Eje K→ Ejes (S1-K diagonal)	VG-129	0,50	52,69	0,60	1	15,81
Eje St→ Ejes (S1-St diagonal)	VG-130	0,50	44,08	0,60	1	13,22
Eje diagonal → Ejes (Su diagonal-9 diagonal)	VG-135	0,50	42,28	0,60	1	12,68
				SUBTOTAL VIGAS		270,19

LOCALIZACIÓN	REF	DIMENSIONES ANCHO	ML	H	CANT	M3
VIGUETAS						
Eje (Sk-Sl)→ Ejes (S1- 3')	VT-101	0,20	16,50	0,60	2	3,96
Eje (Sl-Sm)→ Ejes (S1- 3')	VT-101	0,20	16,50	0,60	3	5,94
Eje (Sk-Sl)→ Ejes (S1- 3')	VT-101C	0,20	14,14	0,60	1	1,70
Eje Sl→ Ejes (S2- 3')	VT-101D	0,20	11,00	0,60	1	1,32
Eje (SJ-Sk)→ Ejes (S2- 9)	VT-128	0,20	59,91	0,60	3	21,57
Eje (Sm-Sc)→ Ejes (S1- 3')	VT-129	0,20	16,50	0,60	3	5,94
Eje (Sp-J)→ Ejes (S1- 3')	VT-129	0,20	16,50	0,60	2	3,96
Eje (J-K)→ Ejes (S1- 3')	VT-129	0,20	16,50	0,60	2	3,96
Eje (Sm-Sp) - Ejes (4-9)	VT-130	0,20	43,31	0,60	3	15,59
Eje (Sp-J)→ Ejes (4- diagonal)	VT-131	0,20	41,86	0,60	1	5,02
Eje (Sp-J)→ Ejes (4- 7)	VT-131A	0,20	25,00	0,60	1	3,00
Eje (Sp-J)→ Ejes (7'- 9)	VT-131B	0,20	12,26	0,60	1	1,47
Eje (J-K)→ Ejes (S1- Diagonal)	VT-132	0,20	60,30	0,60	1	7,24
Eje (J-K)→ Ejes (S1- Diagonal)	VT-132A	0,20	58,29	0,60	1	6,99
Eje (J-K)→ Ejes (4- Diagonal)	VT-133	0,20	51,15	0,60	1	6,14
Eje (J-K)→ Ejes (4- Diagonal)	VT-134	0,20	49,61	0,60	1	5,95
Eje (K-St)→ Ejes (S1- Diagonal)	VT-135	0,20	50,52	0,60	1	6,06
Eje (K-St)→ Ejes (S1- Diagonal)	VT-136	0,20	48,21	0,60	1	5,79
Eje (K-St)→ Ejes (S1- Diagonal)	VT-137	0,20	46,40	0,60	1	5,57
Eje (St-Su)→ Ejes (S1- Diagonal)	VT-138	0,20	41,41	0,60	1	4,97
Eje (St-Su)→ Ejes (S1- Diagonal)	VT-139	0,20	39,61	0,60	1	4,75
Eje (St-Su)→ Ejes (S1- Diagonal)	VT-140	0,20	37,29	0,60	1	4,47
Eje (J-K)→ (3'- 4)	VT-152	0,20	3,20	0,60	1	0,38

(3/10)

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 05

PERIODO DE EVALUACIÓN: 02/03/2022 AL 30/04/2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A. — NIT 890115406-0 — CONTRATO No. 2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR — NIT 901493970-2 — CONTRATO No. 2021050007
CAPÍTULO	5 — ITEM 5,1,1 — Concreto 4000Psi para losa aligerada E=60cm

					UNID.	M3
Eje (Sm-Sp)→ Ejes (3'-4)	VT-E01	0,15	6,13	0,60	1	0,55
Eje (Sm-Sp)→ Ejes (3'-4)	VT-E02	0,15	5,10	0,60	2	0,92
					SUBTOTAL VIGUETA	133,22

	REF	DIMENSIONES ANCHO	DIMENSIONES ML	DIMENSIONES H	CANT	M3
RIOSTRA						
Ejes '(S1-S2)→ Ejes (Sk-Su)	R	0,10	47,05	0,60	1	2,82
Ejes '(S2-S3)→ Ejes (Sj-Su)	R	0,10	53,76	0,60	1	3,23
Ejes '(S3-3')→ Ejes (Sj-Su)	R	0,10	53,76	0,60	1	3,23
Ejes '(3'-S7)→ Ejes (Sj-Sk) (Sm-Su)	R	0,10	27,65	0,60	1	1,66
Ejes '(3'-S7)→ Ejes (Sj-Sk) (Sm-Su)	R	0,10	20,70	0,60	1	1,24
Ejes '(S7-S8)→ Ejes (Sj-Sk) (Sm-Su)	R	0,10	40,15	0,60	1	2,41
Ejes '(S8-S9) →Ejes (Sj-Sk) (Sm-diagonal)	R	0,10	39,46	0,60	1	2,37
Ejes '(S9-7) → Ejes (Sj-Sk) (Sm-diagonal)	R	0,10	33,25	0,60	1	2,00
Ejes '(7-S12) → Ejes (Sj-Sk) (Sm-diagonal)	R	0,10	23,63	0,60	1	1,42
Ejes '(S12-S13) → Ejes (Sj-Sk) (Sm-diagonal)	R	0,10	22,79	0,60	1	1,37
Ejes '(S13-9) → Ejes (Sj-Sk) (Sm-diagonal)	R	0,10	18,43	0,60	1	1,11
					SUBTOTALRIOSTRA	22,84

LOSA — LOCALIZACION	REF	M2	ESPESOR	CANTIDAD	TOTAL
Eje (Sj- Sk)→Ejes (S2 -9)	FRANJA #7	406,48	0,10	1	40,65
Eje (Sk- Sl)→Ejes (S1 -3')	FRANJA #8	98,62	0,10	1	9,86
Eje (Sl- Sm)→Ejes (S1 -3')	FRANJA #9	122,87	0,10	1	12,29
Eje (Sm- Sp)→Ejes (S1 -9)	FRANJA #10	425,93	0,10	1	42,59
Eje (Sp- J)→Ejes (S1 -9)	FRANJA #11	294,82	0,10	1	29,48
Eje (J- K)→Ejes (S1 -9)	FRANJA #12	403,28	0,10	1	40,33
Eje (K- Sl)→Ejes (S1 -diagonal)	FRANJA #13	327,42	0,10	1	32,74
Eje (Sl- Su)→Ejes (S1 -diagonal)	FRANJA #14	266,04	0,10	1	26,60
				SUBTOTAL LOSA		234,55

SUBTOTAL		660,79
CANTIDAD ACTA Parcial No 1	0,00	
CANTIDAD ACTA Parcial No 2	0,00	
CANTIDAD ACTA Parcial No 3	0,00	
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 4	797,00	
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 5	660,79	
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1457,79	
CANTIDAD CONTRACTUAL	1759,00	
PENDIENTE POR PAGAR	301,21	
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		660,79

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

13.107

FRANJA 11

	ANCHO (m	LARGO (m	CANTIDAD	AREA (m2)
	(9-S13)(Sp-J)			
64	1,7	2,05	3	10,46
64A	Geometría Irregular			3,41
64B	Geometría Irregular			0,79
64C	Geometría Irregular			3,35
	(S13-S12)(Sp-J)			
65	1,7	3,1	3	15,81
66	1,7	2,8	3	14,28
	(S12-7)(Sp-J)			
67	1,7	2,5	3	12,75
67A	1,15	2,5	2	5,75
67B	1,95	2,55	1	4,97
67C	1,7	2,55	1	4,34
67D	1,95	2,05	1	4,00
67E	1,7	2,05	1	3,49
	(7-S9)(Sp-J)			
68	1,7	3,7	5	31,45
69	1,7	2,55	1	4,34
	(S9-S8)(Sp-J)			
68	1,7	3,7	6	37,74
	(S8-S7)(Sp-J)			
68	1,7	3,7	6	37,74
	(S7-3')(Sp-J)			
70	1,7	2,51	3	12,80
73	0,95	2,5	2	4,75
	(3'-S3)(Sp-J)			
74	1,7	2,7	6	27,54
	(S3-S2)(Sp-J)			
74	1,7	2,7	6	27,54
	(S2-S1)(Sp-J)			
74	1,7	2,7	6	27,54
				294,816

FRANJA 12

	ANCHO (m	LARGO (m	CANTIDAD	AREA (m2)
	(9-S13)(J-K)			
75	Geometría Irregular			0,33
	(S13-S12)(J-K)			
76	Geometría Irregular			4,55
77	Geometría Irregular			2,32
78	Geometría Irregular			0,08
79	Geometría Irregular			3,51
80	Geometría Irregular			0,70
81	1,49	2,8	2	8,34
	(S12-7)(J-K)			
82	1,49	4	9	53,64
	Geometría Irregular			4,28
	(7-S9)(J-K)			
83	1,49	3,7	10	55,13
	(S9-S8)(J-K)			
83	1,49	3,7	10	55,13
	(S8-S7)(J-K)			
83	1,49	3,7	10	55,13
	(S7-3')(J-K)			
84	1,49	2,51	5	18,70
85	1,49	2,5	4	14,90
86	1,17	2,5	2	5,85
	(3'-S3)(J-K)			
87	1,49	2,7	10	40,23
	(S3-S2)(J-K)			
87	1,49	2,7	10	40,23
	(S2-S1)(J-K)			
87	1,49	2,7	10	40,23
				403,279

FRANJA 13

	ANCHO (m)	LARGO (m	CANTIDAD	ÁREA (m2)
	(7'-7)(K-St)			
88	Geometría Irregular			0,79
89	Geometría Irregular			6,75
90	Geometría Irregular			3,68
91	Geometría Irregular			0,31
	(7-S9)(K-St)			
22	1,725	3,7	6	38,30
92	Geometría Irregular			6,17
93	Geometría Irregular			2,95
	(S9-S8)(K-St)			
22	1,725	3,7	8	51,06
	(S8-S7)(K-St)			
22	1,725	3,7	8	51,06
	(S7-3')(K-St)			
23	1,725	2,64	4	18,22
24	1,725	2,63	4	18,15
23	1,725	2,64	4	18,22
	(3'-S3)(K-St)			
25	1,725	2,7	8	37,26
	(S3-S2)(K-St)			
25	1,725	2,7	8	37,26
	(S2-S1)(K-St)			
25	1,725	2,7	8	37,26
				327,42

FRANJA 14

	ANCHO (m	LARGO (m	CANTIDAD	ÁREA (m2)
	(7-S9)(St-Su)			
94	Geometría Irregular			4,88
95	Geometría Irregular			1,02
	(S9-S8)(St-Su)			
22	1,725	3,7	5	31,91
96	Geometría Irregular			4,17
97	Geometría Irregular			0,54
98	Geometría Irregular			6,10
	(S8-S7)(St-Su)			
22	1,725	3,7	8	51,06
	(S7-3')(St-Su)			
23	1,725	2,64	4	18,22
24	1,725	2,63	4	18,15
23	1,725	2,64	4	18,22
	(3'-S3)(St-Su)			
25	1,725	2,7	8	37,26
	(S3-S2)(St-Su)			
25	1,725	2,7	8	37,26
	(S2-S1)(St-Su)			
25	1,725	2,7	8	37,26
				266,04

TOTAL	2.345,41

FRANJA 7

	ANCHO (m	ARGO (m	CANTIDAD	ÁREA (m2)
	(9-S13)(Sj-Sk)			
18	1,725	2,05	8	28,29
	(S13-S12)(Sj-Sk)			
19	1,725	3,1	4	21,39
20	1,725	2,8	4	19,32
	(S12-7)(Sj-Sk)			
21	1,725	4	8	55,20
	(7-S9)(Sj-Sk)			
22	1,725	3,7	8	51,06
	(S9-S8)(Sj-Sk)			
22	1,725	3,7	8	51,06
	(S8-S7)(Sj-Sk)			
22	1,725	3,7	8	51,06
	(S7-3')(Sj-Sk)			
23	1,725	2,64	4	18,22
24	1,725	2,63	4	18,15
23	1,725	2,64	4	18,22
	(3'-S3)(Sj-Sk)			
25	1,725	2,7	8	37,26
	(S3-S2)(Sj-Sk)			
25	1,725	2,7	8	37,26
				406,479

FRANJA 8

	ANCHO (m	ARGO (m	CANTIDAD	ÁREA (m2)
	(3'-S3)(Sk-Sl)			
25	1,725	2,7	5	23,29
36	Geometría Irregular			4,37
34	Geometría Irregular			2,80
35	Geometría Irregular			0,23
	(S3-S2)(Sk-Sl)			
25	1,725	2,7	5	23,29
36	Geometría Irregular			4,37
35	Geometría Irregular			0,23
34	Geometría Irregular			2,80
	(S2-S1)(Sk-Sl)			
25	1,725	2,7	8	37,26
				98,62


FRANJA 9

	ANCHO (m	ARGO (m	CANTIDAD	ÁREA (m2)
	(3'-S3)(Sl-Sm)			
25	1,725	2,7	8	37,26
32	Geometría Irregular			1,22
33	Geometría Irregular			4,33
	(S3-S2)(Sl-Sm)			
25	1,725	2,7	8	37,26
33	Geometría Irregular			4,33
32	Geometría Irregular			1,22
	(S2-S1)(Sl-Sm)			
25	1,725	2,7	8	37,26
				122,87

FRANJA 10

	ANCHO (m	ARGO (m	CANTIDAD	ÁREA (m2)
	(9-S13)(Sm-Sp)			
18	1,725	2,05	8	28,29
	(S13-S12)(Sm-Sp)			
19	1,725	3,1	4	21,39
20	1,725	2,8	4	19,32
	(S12-7)(Sm-Sp)			
21	1,725	4	8	55,2
	(7-S9)(Sm-Sp)			
22	1,725	3,7	8	51,06
	(S9-S8)(Sm-Sp)			
22	1,725	3,7	8	51,06
	(S8-S7)(Sm-Sp)			
22	1,725	3,7	8	51,06
	(S7-3')(Sm-Sp)			
54	1,725	2,51	4	17,319
60	1,85	2,25	1	4,1625
61	1,85	2,75	1	5,0875
62	1,025	2,225	2	4,56125
63	1,025	2,725	2	5,58625
	(3'-S3)(Sm-Sp)			
25	1,725	2,7	8	37,26
	(S3-S2)(Sm-Sp)			
25	1,725	2,7	8	37,26
	(S2-S1)(Sm-Sp)			
25	1,725	2,7	8	37,26
				425,88

1076.7

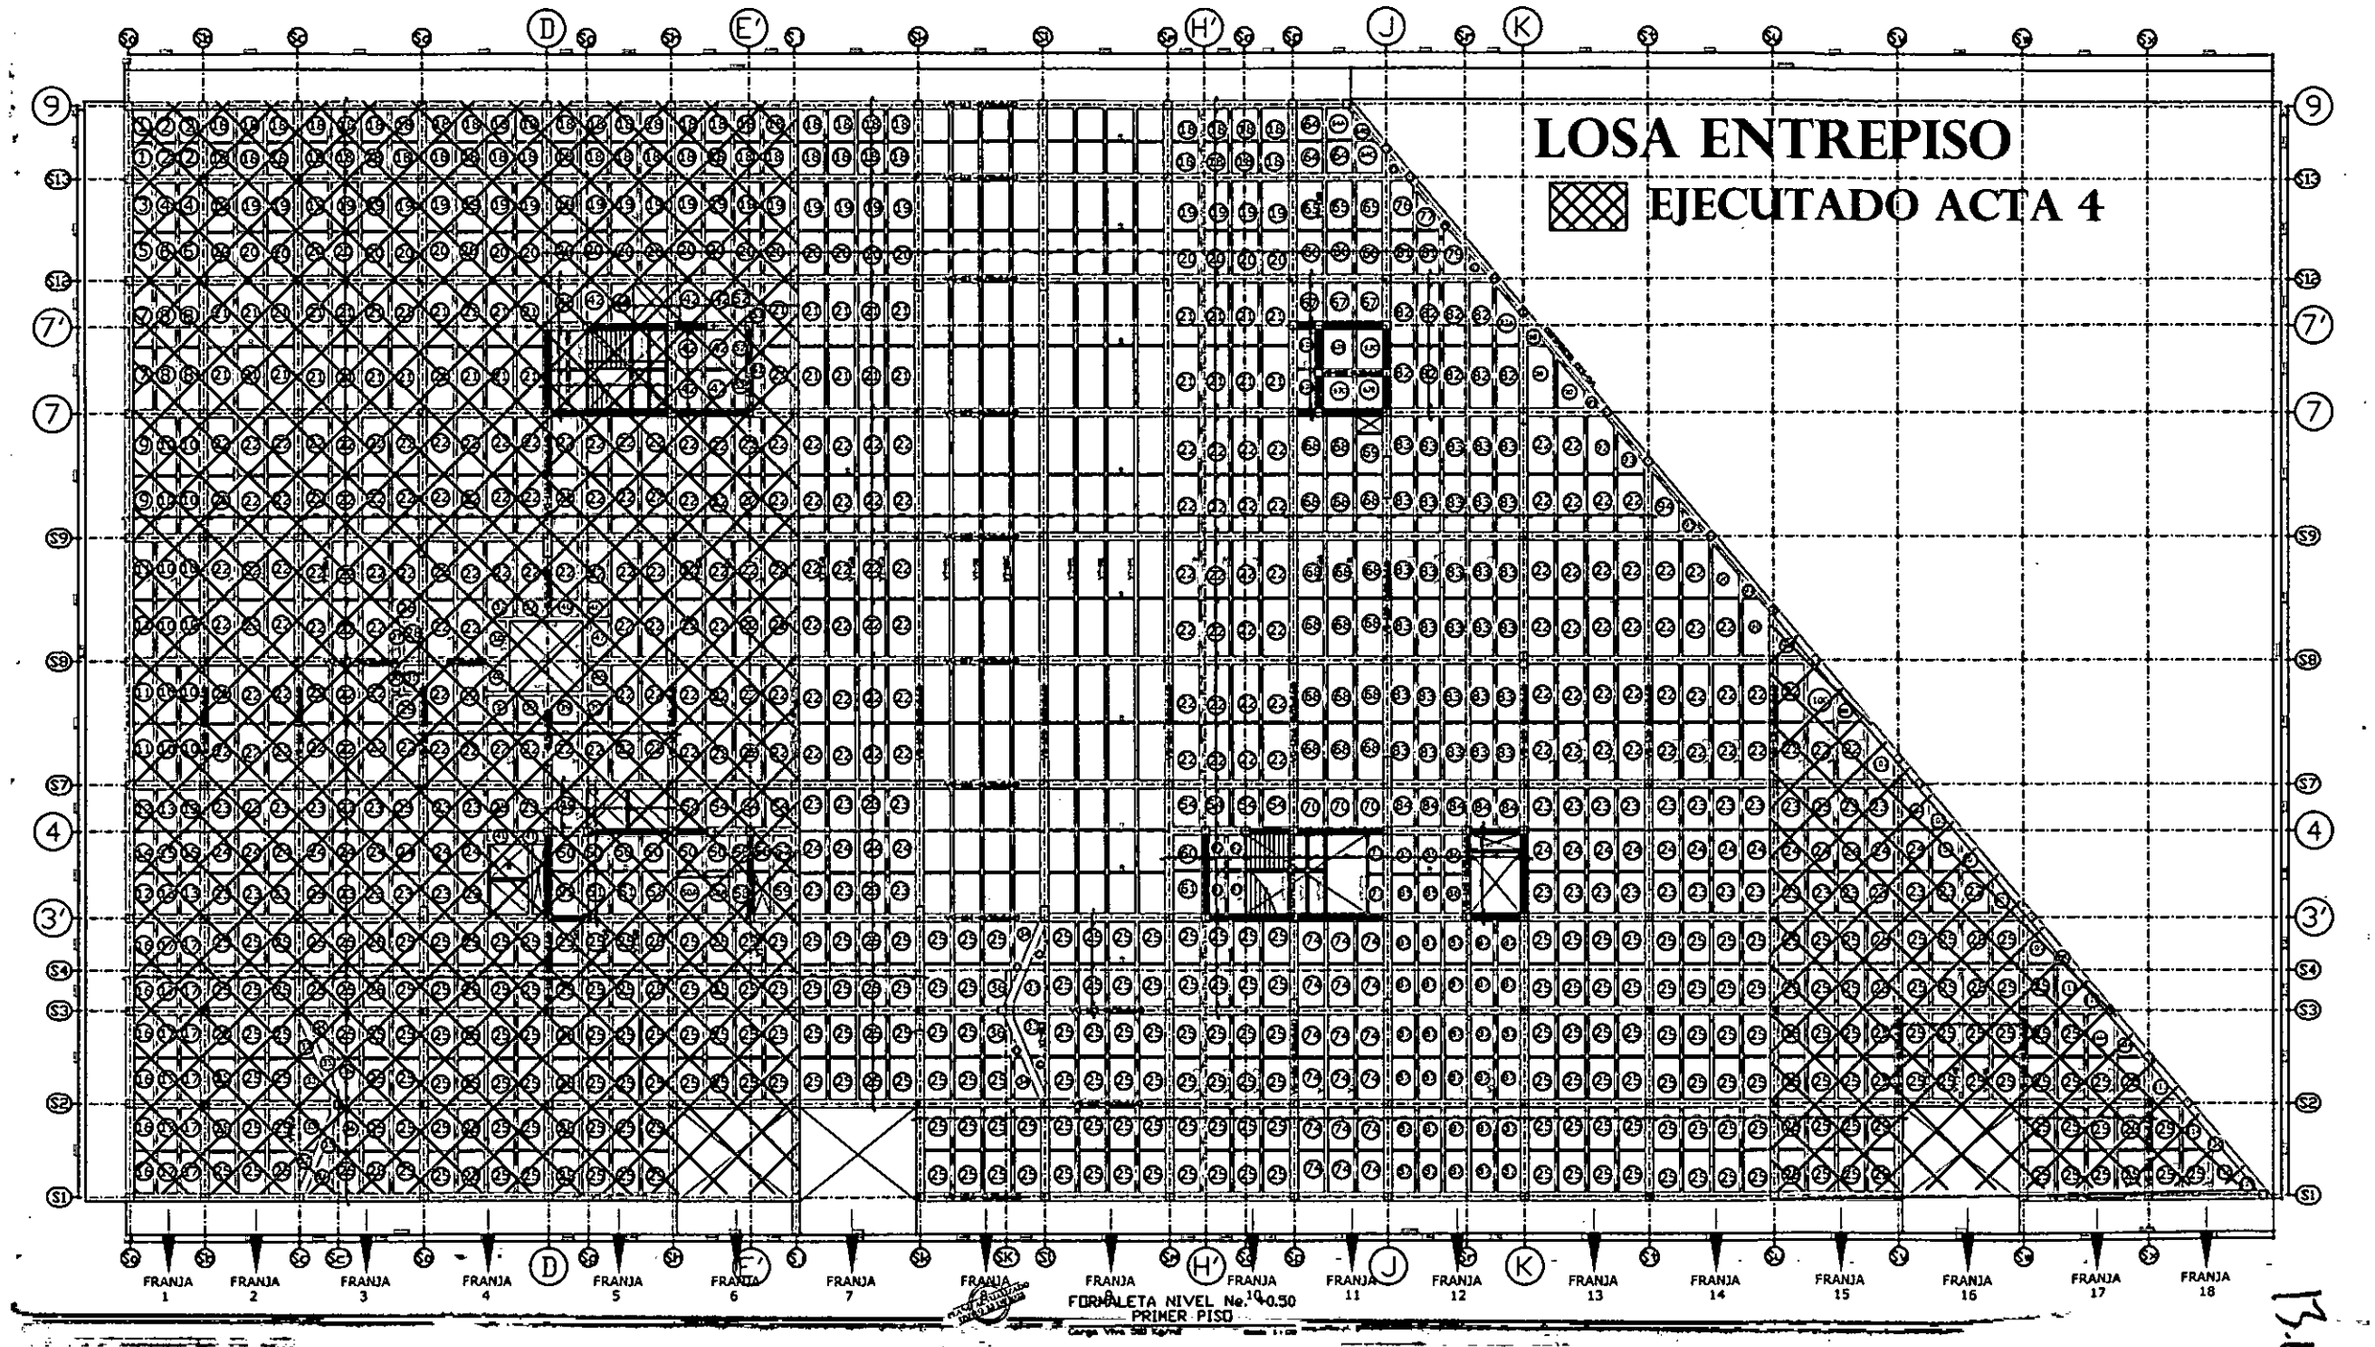
LOSA ENTREPISO
EJECUTADO ACTA 4
FRANJA 1
FRANJA 2
FRANJA 3
FRANJA 4
FRANJA 5
FRANJA 6
FRANJA 7
FRANJA 8
FRANJA 9
FRANJA 10
FRANJA 11
FRANJA 12
FRANJA 13
FRANJA 14
FRANJA 15
FRANJA 16
FRANJA 17
FRANJA 18
FORMALETA NIVEL No. 10.50
PRIMER PISO

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 05

PERIODO DE EVALUACIÓN: 02/03/2022 AL 30/04/2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	5	ITEM	5,1,2	Aligeramiento en casetón de icopor removible	UNID.	M2

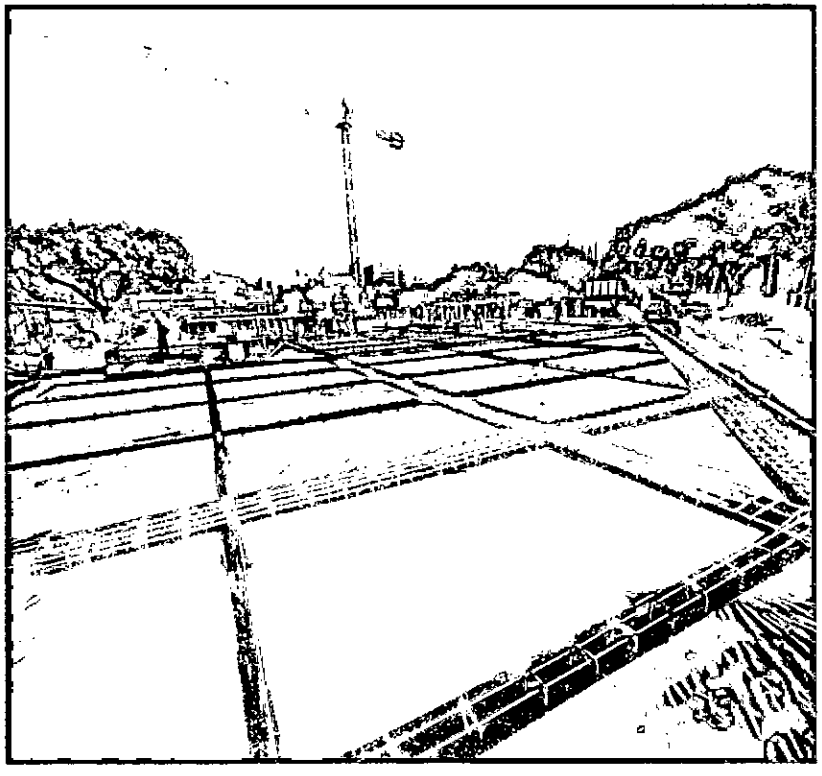

LOCALIZACIÓN	REF			AREA	CANT	M2
						-
						-
Eje (Sj- Sk)→Ejes (S2 -9)	FRANJA #7			406,48	1	406,48
Eje (Sk- Sl)→Ejes (S1 -3')	FRANJA #8			98,62	1	98,62
Eje (Sl- Sm)→Ejes (S1 -3')	FRANJA #9			122,87	1	122,87
Eje (Sm- Sp)→Ejes (S1 -9)	FRANJA #10			425,88	1	425,88
Eje (Sp- J)→Ejes (S1 -9)	FRANJA #11			294,82	1	294,82
Eje (J- K)→Ejes (S1 -9)	FRANJA #12			403,28	1	403,28
Eje (K- Sl)→Ejes (S1 -diagonal)	FRANJA #13			327,42	1	327,42
Eje (Sl- Su)→Ejes (S1 -diagonal)	FRANJA #14			266,04	1	266,04
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	2.345,42
				CANTIDAD ACTA Parcial No 1	-	
				CANTIDAD ACTA Parcial No 2	-	
				CANTIDAD ACTA Parcial No 3	-	
				CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 4	2.633,82	
				CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 5	2.345,42	
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	4.979,23	
				CANTIDAD CONTRACTUAL	5.660,00	
				PENDIENTE POR PAGAR	680,77	
				TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		2.345,42

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

13.106

FRANJA 7

	ANCHO (m	LARGO (m	CANTIDAD	AREA (m2)
	(9-S13)(SJ-Sk)			
18	1,725	2,05	8	28,29
	(S13-S12)(SJ-Sk)			
19	1,725	3,1	4	21,39
20	1,725	2,8	4	19,32
	(S12-7)(SJ-Sk)			
21	1,725	4	8	55,20
	(7-S9)(SJ-Sk)			
22	1,725	3,7	8	51,06
	(S9-S8)(SJ-Sk)			
22	1,725	3,7	8	51,06
	(S8-S7)(SJ-Sk)			
22	1,725	3,7	8	51,06
	(S7-3')(SJ-Sk)			
23	1,725	2,64	4	18,22
24	1,725	2,63	4	18,15
23	1,725	2,64	4	18,22
	(3'-S3)(SJ-Sk)			
25	1,725	2,7	8	37,26
	(S3-S2)(SJ-Sk)			
25	1,725	2,7	8	37,26
				406,479

FRANJA 8

	ANCHO (m	LARGO (m	CANTIDAD	AREA (m2)
	(3'-S3)(Sk-Sl)			
25	1,725	2,7	5	23,29
36	Geometría Irregular			4,37
34	Geometría Irregular			2,80
35	Geometría Irregular			0,23
	(S3-S2)(Sk-Sl)			
25	1,725	2,7	5	23,29
36	Geometría Irregular			4,37
35	Geometría Irregular			0,23
34	Geometría Irregular			2,80
	(S2-S1)(Sk-Sl)			
25	1,725	2,7	8	37,26
				98,62

FRANJA 9

	ANCHO (m	LARGO (m	CANTIDAD	ÁREA (m2)
	(3'-S3)(Sl-Sm)			
25	1,725	2,7	8	37,26
32	Geometría Irregular			1,22
33	Geometría Irregular			4,33
	(S3-S2)(Sl-Sm)			
25	1,725	2,7	8	37,26
33	Geometría Irregular			4,33
32	Geometría Irregular			1,22
	(S2-S1)(Sl-Sm)			
25	1,725	2,7	8	37,26
				122,87

FRANJA 10

	ANCHO (m	LARGO (m	CANTIDAD	ÁREA (m2)
	(9-S13)(Sm-Sp)			
18	1,725	2,05	8	28,29
	(S13-S12)(Sm-Sp)			
19	1,725	3,1	4	21,39
20	1,725	2,8	4	19,32
	(S12-7)(Sm-Sp)			
21	1,725	4	8	55,2
	(7-S9)(Sm-Sp)			
22	1,725	3,7	8	51,06
	(S9-S8)(Sm-Sp)			
22	1,725	3,7	8	51,06
	(S8-S7)(Sm-Sp)			
22	1,725	3,7	8	51,06
	(S7-3')(Sm-Sp)			
54	1,725	2,51	4	17,319
60	1,85	2,25	1	4,1625
61	1,85	2,75	1	5,0875
62	1,025	2,225	2	4,56125
63	1,025	2,725	2	5,58625
	(3'-S3)(Sm-Sp)			
25	1,725	2,7	8	37,26
	(S3-S2)(Sm-Sp)			
25	1,725	2,7	8	37,26
	(S2-S1)(Sm-Sp)			
25	1,725	2,7	8	37,26
				425,88

13.104

FRANJA 11

	ANCHO (m	LARGO (m	CANTIDAD	AREA (m2)
	(9-S13)(Sp-J)			
64	1,7	2,05	3	10,46
64A	Geometría Irregular			3,41
64B	Geometría Irregular			0,79
64C	Geometría Irregular			3,35
	(S13-S12)(Sp-J)			
65	1,7	3,1	3	15,81
66	1,7	2,8	3	14,28
	(S12-7)(Sp-J)			
67	1,7	2,5	3	12,75
67A	1,15	2,5	2	5,75
67B	1,95	2,55	1	4,97
67C	1,7	2,55	1	4,34
67D	1,95	2,05	1	4,00
67E	1,7	2,05	1	3,49
	(7-S9)(Sp-J)			
68	1,7	3,7	5	31,45
69	1,7	2,55	1	4,34
	(S9-S8)(Sp-J)			
68	1,7	3,7	6	37,74
	(S8-S7)(Sp-J)			
68	1,7	3,7	6	37,74
	(S7-3')(Sp-J)			
70	1,7	2,51	3	12,80
73	0,95	2,5	2	4,75
	(3'-S3)(Sp-J)			
74	1,7	2,7	6	27,54
	(S3-S2)(Sp-J)			
74	1,7	2,7	6	27,54
	(S2-S1)(Sp-J)			
74	1,7	2,7	6	27,54
				294,816

FRANJA 12

	ANCHO (m	LARGO (m	CANTIDAD	AREA (m2)
	(9-S13)(J-K)			
75	Geometría Irregular			0,33
	(S13-S12)(J-K)			
76	Geometría Irregular			4,55
77	Geometría Irregular			2,32
78	Geometría Irregular			0,08
79	Geometría Irregular			3,51
80	Geometría Irregular			0,70
81	1,49	2,8	2	8,34
	(S12-7)(J-K)			
82	1,49	4	9	53,64
	Geometría Irregular			4,28
	(7-S9)(J-K)			
83	1,49	3,7	10	55,13
	(S9-S8)(J-K)			
83	1,49	3,7	10	55,13
	(S8-S7)(J-K)			
83	1,49	3,7	10	55,13
	(S7-3')(J-K)			
84	1,49	2,51	5	18,70
85	1,49	2,5	4	14,90
86	1,17	2,5	2	5,85
	(3'-S3)(J-K)			
87	1,49	2,7	10	40,23
	(S3-S2)(J-K)			
87	1,49	2,7	10	40,23
	(S2-S1)(J-K)			
87	1,49	2,7	10	40,23
				403,279

FRANJA 13


	ANCHO (m)	LARGO (m	CANTIDAD	ÁREA (m2)
	(7'-7)(K-St)			
88	Geometría Irregular			0,79
89	Geometría Irregular			6,75
90	Geometría Irregular			3,68
91	Geometría Irregular			0,31
	(7-S9)(K-St)			
22	1,725	3,7	6	38,30
92	Geometría Irregular			6,17
93	Geometría Irregular			2,95
	(S9-S8)(K-St)			
22	1,725	3,7	8	51,06
	(S8-S7)(K-St)			
22	1,725	3,7	8	51,06
	(S7-3')(K-St)			
23	1,725	2,64	4	18,22
24	1,725	2,63	4	18,15
23	1,725	2,64	4	18,22
	(3'-S3)(K-St)			
25	1,725	2,7	8	37,26
	(S3-S2)(K-St)			
25	1,725	2,7	8	37,26
	(S2-S1)(K-St)			
25	1,725	2,7	8	37,26
				327,42

FRANJA 14

	ANCHO (m	LARGO (m	CANTIDAD	ÁREA (m2)
	(7-S9)(St-Su)			
94	Geometría Irregular			4,88
95	Geometría Irregular			1,02
	(S9-S8)(St-Su)			
22	1,725	3,7	5	31,91
96	Geometría Irregular			4,17
97	Geometría Irregular			0,54
98	Geometría Irregular			6,10
	(S8-S7)(St-Su)			
22	1,725	3,7	8	51,06
	(S7-3')(St-Su)			
23	1,725	2,64	4	18,22
24	1,725	2,63	4	18,15
23	1,725	2,64	4	18,22
	(3'-S3)(St-Su)			
25	1,725	2,7	8	37,26
	(S3-S2)(St-Su)			
25	1,725	2,7	8	37,26
	(S2-S1)(St-Su)			
25	1,725	2,7	8	37,26
				266,04

TOTAL	2.345,41

13.108

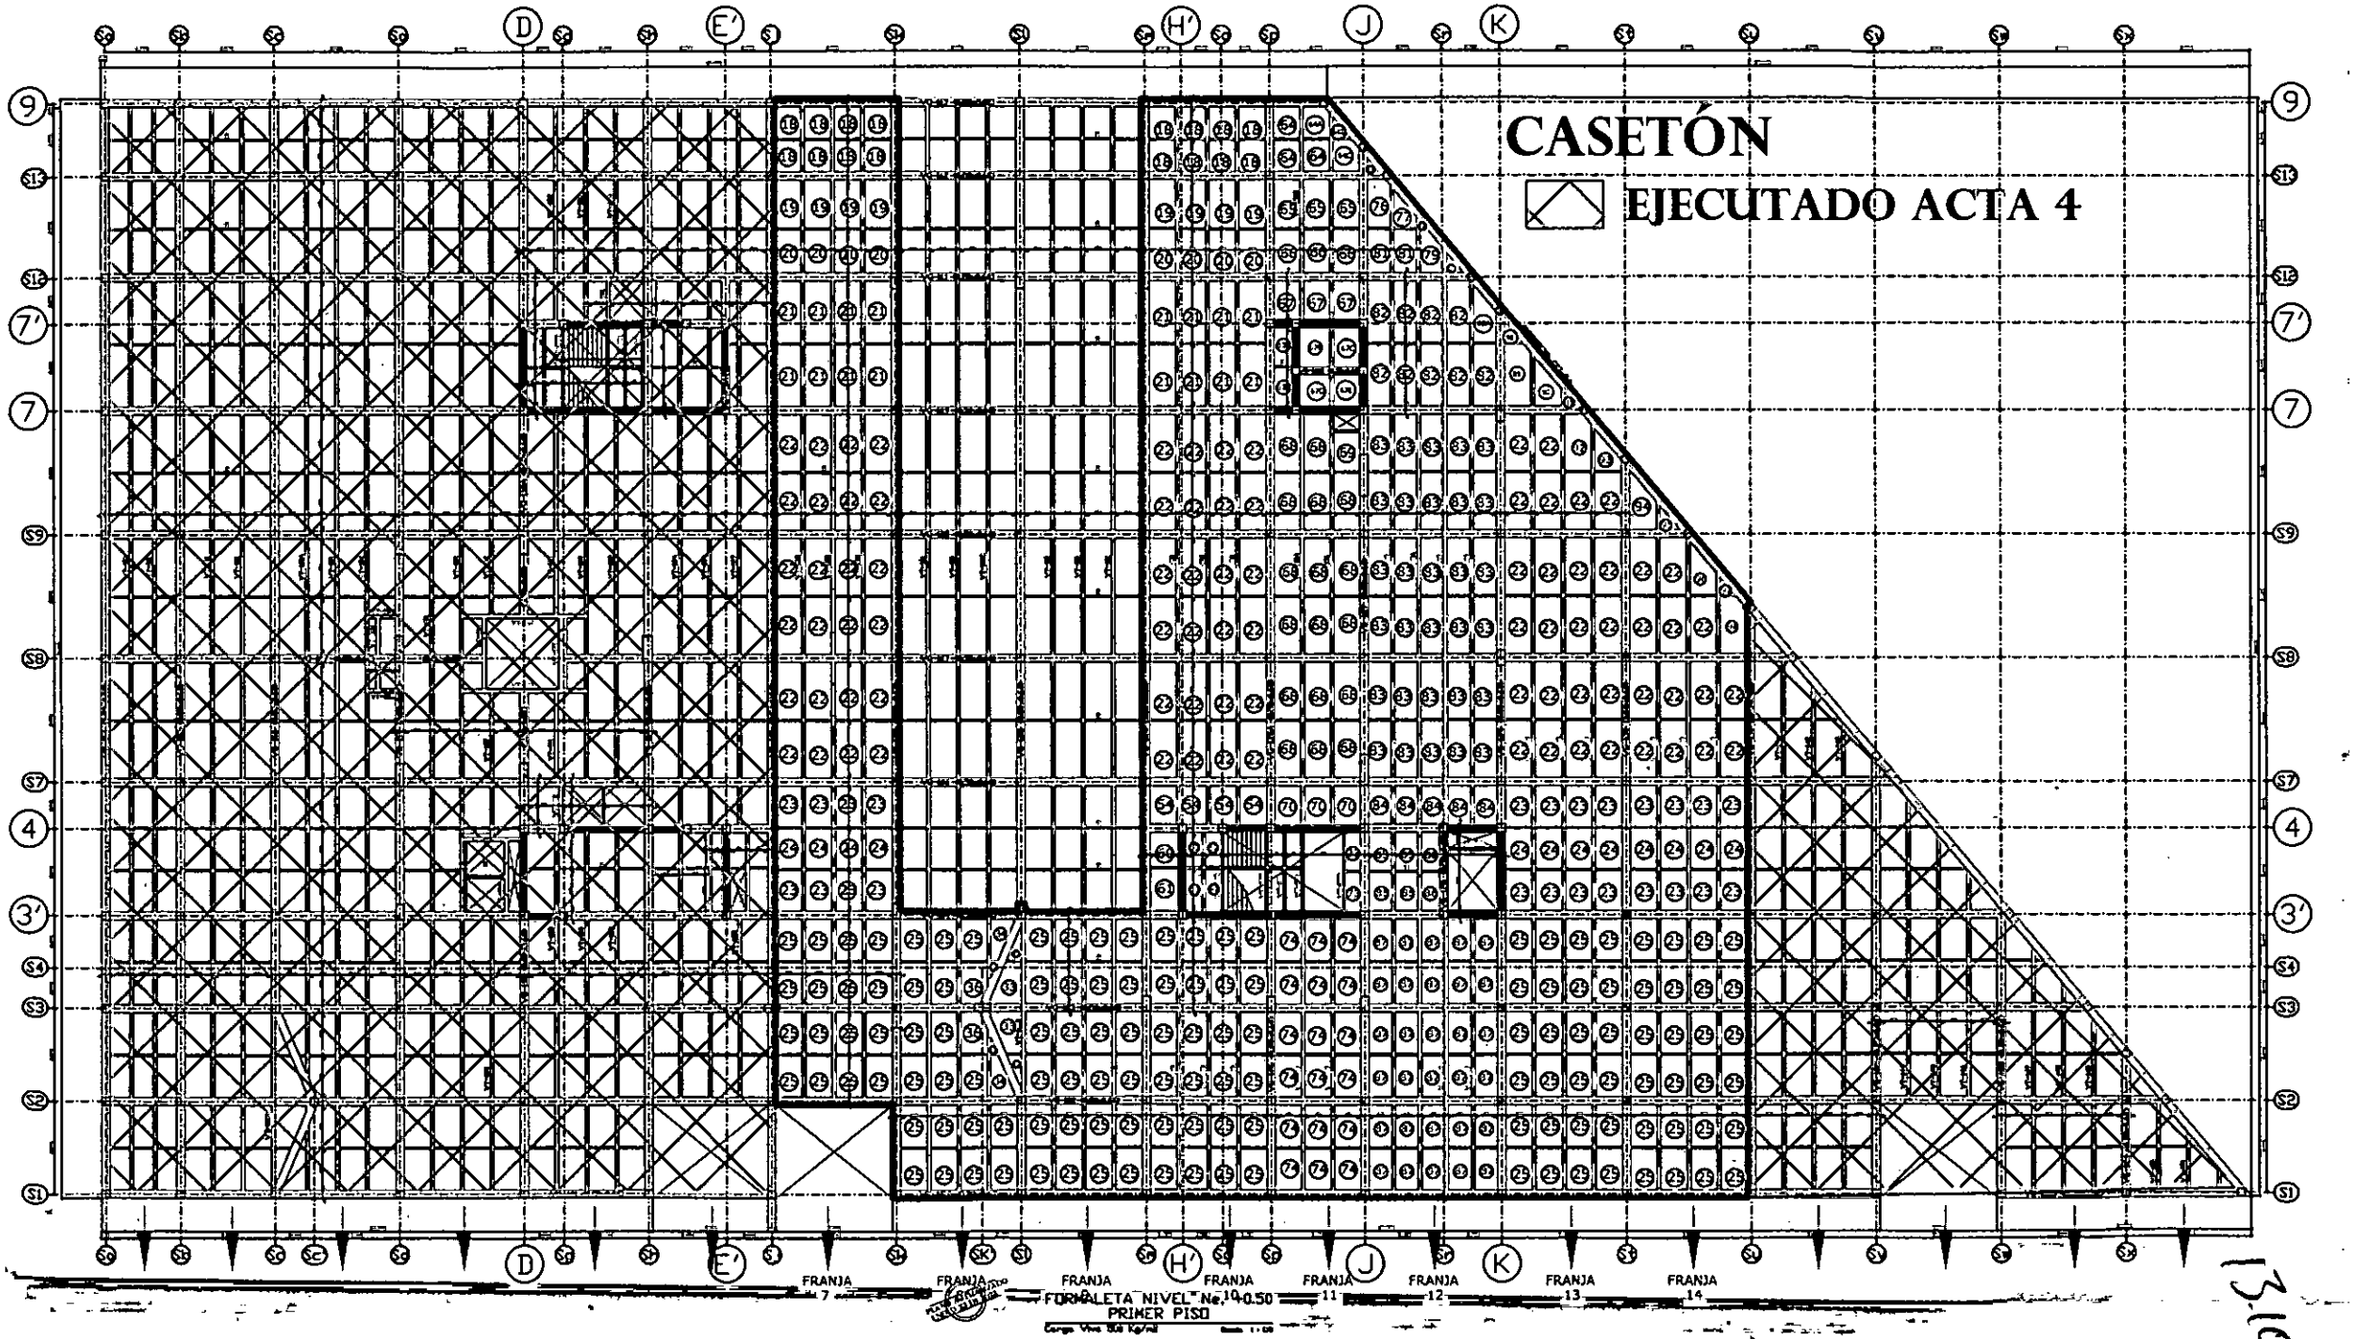
CASETÓN
EJECUTADO ACTA 4
FRANJA 7
FRANJA 8
FRANJA 9
FRANJA 10
FRANJA 11
FRANJA 12
FRANJA 13
FRANJA 14
FORMALETA NIVEL Ne. 10.50
PRIMER PISO

13109

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR


SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 05

PERIODO DE EVALUACIÓN: 02/03/2022 AL 30/04/2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR						
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002	
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007	
CAPÍTULO	5	ITEM	5,1,4	Malla electrosoldada 15x15 8mm		UNID.	KG

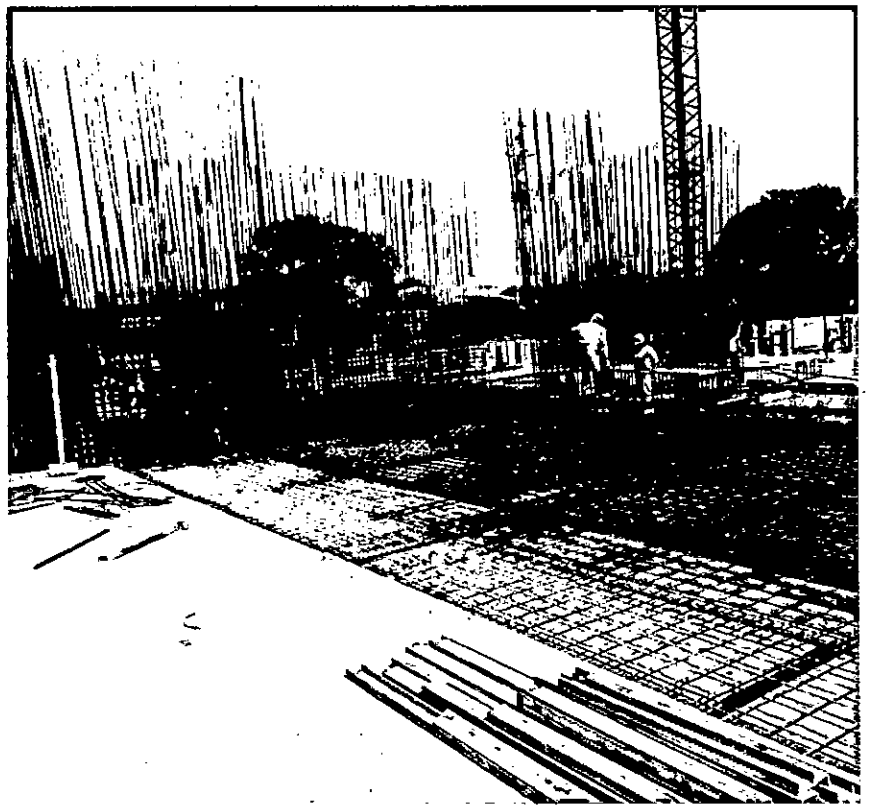

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES LARGO	DIMENSIONES KG/ML		CANT	KG
						-
						-
VER CARTILLA ADJUNTA						12.727,76
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					SUBTOTAL	12.727,76
				CANTIDAD ACTA Parcial No 1	-	
				CANTIDAD ACTA Parcial No 2	-	
				CANTIDAD ACTA Parcial No 3		
				CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 4	22.385,39	
				CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 5	12.727,76	
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	35.113,15	
				CANTIDAD CONTRACTUAL	35.333,00	
				PENDIENTE POR PAGAR	219,85	
				TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		12.727,76

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.


Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR


Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

13.110

ID	Ø ACERO (mm)	ESQUEMA	M2 DE MALLA EFECTIVA	PESO DE LA MALLA 6*2.35 KG	PESO Kg/M2 Area efectiva	ÁREA A COBRAR M2	PESO DE MALLAS A COBRAR KG	OBSERVACIONES
ACERO MALLA ENTREPISO								
Malla Electrosoldada	8	2,35  6,00	11,685	75,1	6,427	1.980,3	12.727,76	
					TOTAL REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA		12.727,76	
					TOTAL REFUERZO			

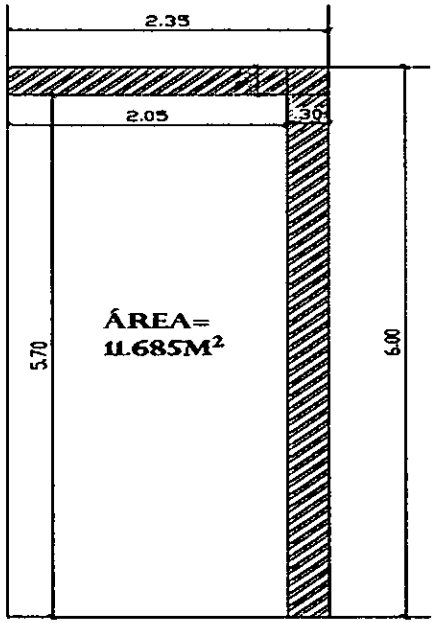

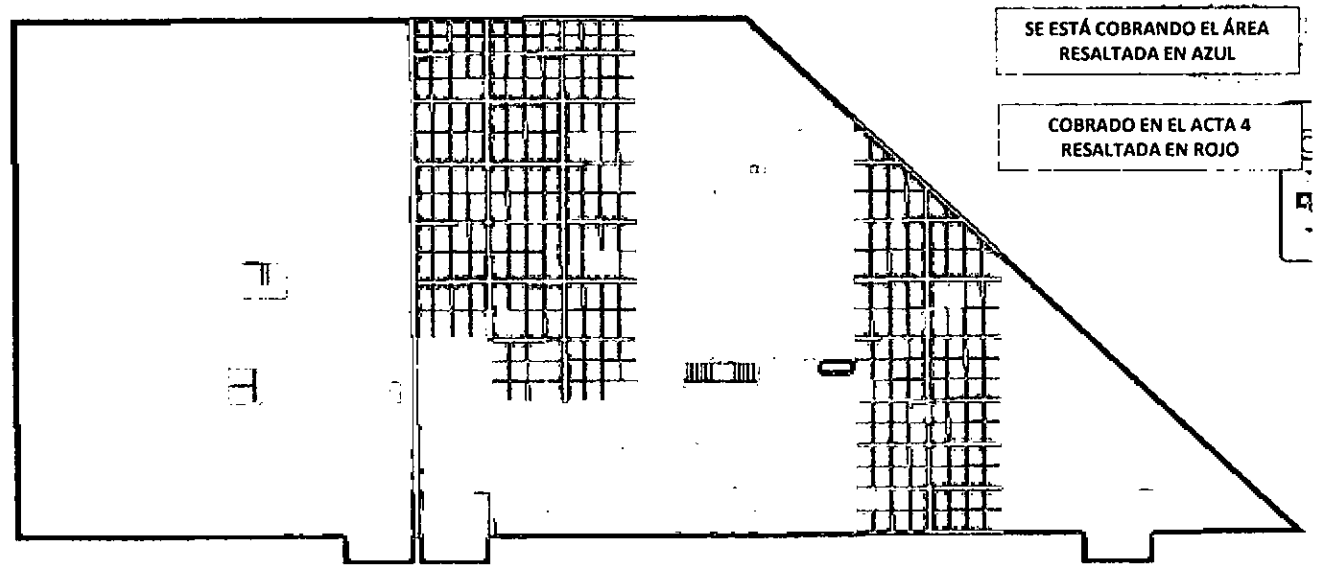

13.111

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CAN...DADES DE OBRA


DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 05


PERIODO DE EVALUACIÓN: 02/03/2022 AL 30/04/2022


OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR


CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007

CAPÍTULO	7	ITEM	7.1	Estructura metálica (Incluye platina, pernos y demás)	TOTAL





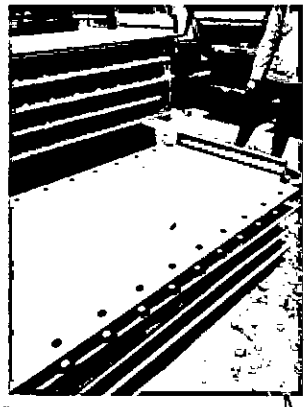

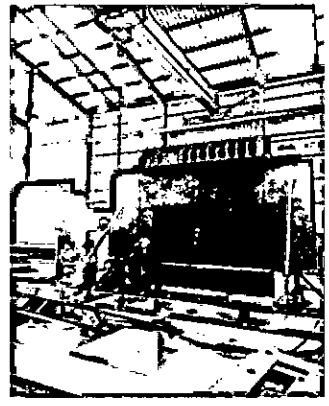ELEMENTO	REQUERIDAS		FABRICADAS		Peso Und (Kg)	Kg
	CANT	PESO (Kg)	CANT	PESO (Kg)		
Viga 1	1	14112	1		14112	14112
Viga 2	1	14112	1		14112	14112
Viga 3	1	8829	1		8829	8829
Viga 4	1	8829	1		8829	8829
Viga 9	10	58004	10		5800	58004
Viga 10	2	8836	2		4418	8836
Plantillas de ménsulas	144	2690	144		19	2690
Col 2	10	39620	5		3962	19810
VS 1	51	22622	47		444	20848
VS 4	4	1774	1		444	444
VS 5	87	32315	81		371	30088
VS 6	11	4086	0		371	0
VS 7	12	25101	12		2092	25101
(D1) TUB30"X19MM	8	22100	2		2763	5353
VCA-2 VC2300X22X400X50	32	268262	32		8383	268262
VCA-1 VC2300X19X250X38	40	117340	40		2934	117340
MENSU 1	38	65811	38		1732	65811
MENSU 2	22	37928	22		1724	37928
MENSU 3	4	4243	4		1061	4243
MENSU 4	4	4716	4		1179	4714
MENSU 5	3	3182	3		1061	3182
V-1 IA1750X19X350X32	12	30829	3		2607	7820
VT-1 IA1500X19X250X32	143	592745	77		4119	317116
V-2 IA500X9X250X32	375	210533	305		562	171316
V-3 CA500X9X300X12	58	43694	30		753	22652
(D1) TUB30"X19MM	10	20628	2		2094	5142
Soldadura (3%)						37277
					SUBTOTAL	1279858
					AVANCE	397779,11
					SUBTOTAL	397.779,11
				CANTIDAD ACTA Parcial No 1		
				CANTIDAD ACTA Parcial No 2		
				CANTIDAD ACTA Parcial No 3		
				CANTIDAD ACTA Parcial No 4		
				CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 5		397.779,11
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		397.779,11
				CANTIDAD CONTRACTUAL		2.350.000,00
				PENDIENTE POR PAGAR		1.952.220,89
				TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		397.779,11

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

13.112

13.113

Smart Steel
Estructuras Metálicas

A CONSTRUIR S.A.

INFORME DE AVANCE

CENTRO CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA

SMARTSTEEL ESTRUCTURAS METÁLICAS

Fecha: 12 DE MAYO DE 2022

13-M

Smart Steel
Estructuras Metálicas

A CONSTRUIR S.A.

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN DE AVANCE 3

Acero Estructural Recibido por Smarsteel 4

PERSONAL EN LA PLANTA 7

AVANCE EN VIGAS ARMADAS 8

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS VIGAS 8

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO 20

CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES 21

CERTIFICADOS DE CALIDAD DE ACERO ESTRUCTURAL 21

CERTIFICADOS DE CALIDAD DE ELECTRODOS DE SOLDADURA UTILIZADOS 21

ESPECIFICACIONES DE PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA (WPS) 23

CALIFICACIÓN DE SOLDADORES 23

INSPECCIÓN DE SOLDADURA 23

Smart Steel
Estructuras Metálicas

A CONSTRUIR S.A.

RESUMEN DE AVANCE

En el presente informe se detalla el avance de fabricación del proyecto "Centro Cultural de la Música Vallenata en la ciudad de Valledupar, departamento del Cesar. En la siguiente tabla se puede evidencia el avance de cada uno de los perfiles de la estructura, con respecto a la cantidad contratada.

Tabla 1. Resumen de fabricación de vigas armadas.

ID PIEZA	CANTIDAD REQUERIDA	Peso Requerido	Piezas Fabricadas	Peso Unidad	Peso Fabricado
Viga 1	1	14.112	1	14.112	14.112
Viga 2	1	14.112	1	14.112	14.112
Viga 3	1	8.829	1	8.829	8.829
Viga 4	1	8.829	1	8.829	8.829
Viga 9	10	58.004	10	5.800	58.004
Viga 10	2	8.836	2	4.418	8.836
Plantillas de ménsulas	144	2.690	144	19	2.690
Col 2	10	39.620	5	3.962	19.810
VS 1	51	22.622	47	444	20.848
VS 4	4	1.774	1	444	444
VS 5	87	32.315	81	371	30.087
VS 6	11	4.086	0	371	0
VS 7	12	25.101	12	2.092	25.101
(D1) TUB30"X19MM	8	22.100	2	2.763	5.353
VCA-2 VC2300x22x400x50			32	8.466	268.262
VCA-1 VC2300x19x250x38	35	102.516	40	2.933	117.340
Mensu 1			38	1.732	65.811
Mensu 2			22	1.732	37.928
Mensu 3			4	1.061	4.243
Mensu 4			4	1.179	4.716
Mensu 5			3	1.061	3.182
V-1 IA1750x19x350x32	12	30.894	3	2.607	7.820
VT-1 IA1500x19x250x32	143	592.745	77	4.145	317.116
V-2 IA500x9x250x15	375	210.533	305	562	171.316
V-3 CA500x9x300x12	58	43.694	30	755	22.652
(D1) TUB30"X19MM	10	20.628	2	2.094	5.142
				SUBTOTAL	1.242.580
				3% SOLD.	37.277
				TOTAL	1.279.858

13.116

Smart Steel
Estructuras Metálicas

A CONSTRUIR S.A.

Tabla 5. Acero estructural recibido en planta

REMISION	MATERIAL - LAMINAS	CANT	PESO UNIDAD	TOTAL
8100067535	LAMINA 19MM X 2440X6096 AE50 - A572	15	2216,67446	33.250,117
1580	LAMINA HR 25MM 2440X6096 A572 GRADP 50	6	2919,0696	17.514,418
1580	LAMINA HR 12MM 2440X6096 A572 GRADP 50	15	1401,153408	21.017,301
8100067580	LAMINA 15.00 X 2438,00X6096,00 AE50 - A 572	15	1750,006152	26.250,092
8100067584	LAMINA 19MM X 2440X6096 AE50 - A572	15	2216,674459	33.250,117
1586	LAMINA HR 50MM 2440X6096 - A572 GR 50	6	5838,1392	35.028,835
1586	LAMINA HR 38MM 2440X6096 - A572 GR 50	1	4436,985792	4.436,986
1608	LAMINA HR 38MM 2440X6096 - A572 GR 50	7	4436,985792	31.058,901
1613	LAMINA HR 50MM 2440X6096 - A572 GR 50	3	5838,1392	17.514,418
1620	LAMINA 15.00 X 2438,00X6096,00 AE50 - A 572	17	1750,006152	29.750,105
1620	LAMINA HR 32MMX2440X6,096 A572	1	3736,409088	3.736,409
1618	LAMINA HR 32MMX2440X6,096 A572	9	3736,409088	33.627,682
1625	LAMINA 19MM X 2440X6096 AE50 - A572	15	2216,674459	33.250,117
1626	LAMINA HR 9MM 2440X6,96 A 572 GR50	32	1050,865056	33.627,682
1639	LAMINA HR 9MM 2440X6,96 A 572 GR50	32	1050,865056	33.627,682
1652	LAMINA 19MM X 2440X6096 AE50 - A572	9	2216,674459	19.950,070
1652	LAMINA HR 9MM 2440X6,96 A 572 GR50	13	1050,865056	13.661,246
8100068177	LAMINA 19MM X 2440X6096 AE50 - A572	6	2216,674459	13.300,047
8100068177	LAMINA 15.00 X 2438,00X6096,00 AE50 - A 572	12	1750,006152	21.000,074
8100068170	LAMINA 15.00 X 2438,00X6096,00 AE50 - A 572	20	1750,006152	35.000,123
1683	LAMINA 15.00 X 2438,00X6096,00 AE50 - A 572	13	1750,006152	22.750,080
1683	LAMINA HR 9MM 2440X6,96 A 572 GR50	11	1050,865056	11.559,516
8100068211	LAMINA 19MM X 2440X6096 AE50 - A572	4	2216,674459	8.866,698
8100068067	LAMINA 19MM X 2440X6096 AE50 - A572	16	2216,674459	35.466,791
1751	LAMINA HR 22MM 2440X6096 A588 GR50	2	2568,781248	5.137,562
1751	LAMINA HR 22MM 2440X6096 A709 GR50	14	2568,781248	35.962,937
77887	LAMINA HR 22MM 2440X6096 A588 GR50	17	2568,781248	43.669,281
2203	LAMINA 19MM X 2440X6096 AE50 - A572	15	2216,674459	33.250,117
2194	LAMINA 19MM X 2440X6096 AE50 - A572	15	2216,674459	33.250,117
2229	LAMINA HR 38MM 2440X6096 - A572 GR 50	7	4436,985792	31.058,901
2229	LAMINA 19MM X 2440X6096 AE50 - A572	1	2216,674459	2.216,674
2224	LAMINA HR 50MM 2440X6096 - A572 GR 50	5	5838,1392	29.190,696
2224	LAMINA 19MM X 2440X6096 AE50 - A572	2	2216,674459	4.433,349
2211	LAMINA HR 50MM 2440X6096 - A572 GR 50	5	5838,1392	29.190,696
2210	LAMINA HR 50MM 2440X6096 - A572 GR 50	6	5838,1392	35.028,835
2214	LAMINA 19MM X 2440X6096 AE50 - A572	15	2216,674459	33.250,117

13.107

Smart Steel
Estructuras Metálicas

A CONSTRUIR S.A.

REMISION	MATERIAL - LAMINAS	CANT	PESO UNIDAD	TOTAL
2228	LAMINA HR 38MM 2440X6096 - A572 GR 50	7	4436,985792	31.058,901
2228	LAMINA 19MM X 2440X6096 AE50 - A572	1	2216,674459	2.216,674
2256	LAMINA HR 38MM 2440X6096 - A572 GR 50	5	4436,985792	22.184,929
2256	LAMINA 15.00 X 2438,00X6096,00 AE50 - A 572	6	1750,006152	10.500,037
2260	LAMINA HR 32MMX2440X6,096 A572	9	3736,409088	33.627,682
2263	LAMINA HR 32MMX2440X6,096 A572	8	3736,409088	29.891,273
2267	LAMINA HR 32MMX2440X6,096 A572	9	3736,409088	33.627,682
0083	LAMINA HR 22MM 2440X6096 A572	13	2568,781248	33.394,156
2374	LAMINA HR 22MM 2440X6096 A572	13	2568,781248	33.394,156
2375	LAMINA 19MM X 2440X6096 AE50 - A572	15	2216,674459	33.250,117
2378	LAMINA 19MM X 2440X6096 AE50 - A572	15	2216,674459	33.250,117
2379	LAMINA 19MM X 2440X6096 AE50 - A572	15	2216,674459	33.250,117
2381	LAMINA 19MM X 2440X6096 AE50 - A572	15	2216,674459	33.250,117
2394	LAMINA HR 22MM 2440X6096 A588 GR50	13	2568,781248	33.394,156
2393	LAMINA HR 22MM 2440X6096 A588 GR50	13	2568,781248	33.394,156
2401	LAMINA 19MM X 2440X6096 AE50 - A572	15	2216,674459	33.250,117
2402	LAMINA HR 22MM 2440X6096 A572	13	2568,781248	33.394,156
2403	LAMINA 19MM X 2440X6096 AE50 - A572	14	2216,674459	31.033,442
6	LAMINA HR 50MM 2440X6096 - A572 GR 50	7	5838,1392	40.866,974
7	LAMINA HR 50MM 2440X6096 - A572 GR 50	7	5838,1392	40.866,974
27	LAMINA HR 50MM 2440X6096 - A572 GR 50	4	5838,1392	23.352,557
27	LAMINA 19MM X 2440X6096 AE50 - A572	7	2216,674459	15.516,721
26	LAMINA HR 32MMX2440X6,096 A572	11	3736,409088	41.100,500
37	LAMINA 19MM X 2440X6096 AE50 - A572	18	2216,674459	39.900,140
38	LAMINA 19MM X 2440X6096 AE50 - A572	18	2216,674459	39.900,140
96590	LAMINA HR 38MM 2440X6096 - A572 GR 50	1	4436,985792	4.436,986
228	LAMINA HR 25MM 2440X6096 A572 GRADP 50	13	2919,0696	37.947,905
228	LAMINA HR 25MM 2440X6096 A572 GRADP 50	1	2919,0696	2.919,070
228	LAMINA 15.00 X 2438,00X6096,00 AE50 - A 572	20	1750,006152	35.000,123
241	LAMINA 19MM X 2440X6096 AE50 - A572	17	2216,674459	37.683,466
242	LAMINA 19MM X 2440X6096 AE50 - A572	17	2216,674459	37.683,466
259	LAMINA HR 9MM 2440X6,96 A 572 GR50	15	1050,865056	15.762,976
260	LAMINA HR 25MM 2440X6096 A572 GRADP 50	5	2919,0696	14.595,348
260	LAMINA HR 22MM 2440X6096 A572	1	2568,781248	2.568,781
272	LAMINA HR 32MMX2440X6,096 A572	10	3736,409088	37.364,091
274	LAMINA 19MM X 2440X6096 AE50 - A572	14	2216,674459	31.033,442
275	LAMINA HR 32MMX2440X6,096 A572	1	3736,409088	3.736,409
299	LAMINA HR 50MM 2440X6096 - A572 GR 50	6	5838,1392	35.028,835
300	LAMINA HR 50MM 2440X6096 - A572 GR 50	6	5838,1392	35.028,835
308	LAMINA HR 50MM 2440X6096 - A572 GR 50	3	5838,1392	17.514,418
308	LAMINA HR 38MM 2440X6096 - A572 GR 50	4	4436,985792	17.747,943
309	LAMINA HR 38MM 2440X6096 - A572 GR 50	8	4436,985792	35.495,886
314	LAMINA HR 38MM 2440X6096 - A572 GR 50	1	4436,985792	4.436,986
315	LAMINA HR 32MMX2440X6,096 A572	3	3736,409088	11.209,227
316	LAMINA HR 38MM 2440X6096 - A572 GR 50	8	4436,985792	35.495,886
104488	LAMINA HR 6MM 1200 X 6000 A-36	10	339,12	3.391,200
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	12.109.082,059

PERSONAL EN LA PLANTA

Se labora en dos turnos de 39 y 33 trabajadores para duplicar la producción de la estructura distribuidos así:

Tabla 6. Personal operativo para el proyecto.

TURNO DIURNO		TURNO NOCTURNO	
Armador	9	Armadores	5
Soldador	8	Soldadores	8
Operador CNC	3	Operadores CNC	1
Ayudante	17	Ayudantes	17
Ingeniero de producción	1	Supervisor de producción	1
Inspector de calidad	1	Inspector de calidad	1

17.419

Smart Steel
Estructuras Metálicas




A CONSTRUIR S.A.


AVANCE EN VIGAS ARMADAS

De las vigas que conforman la estructura se han fabricado a la fecha 1.279,86 de 2.417,18 toneladas aproximadas que fueron contratadas, para un avance hasta el momento del 52.9% del total de estructura.


REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS VIGAS

Se presenta a continuación el registro fotográfico del proceso de fabricación y de las vigas fabricadas.

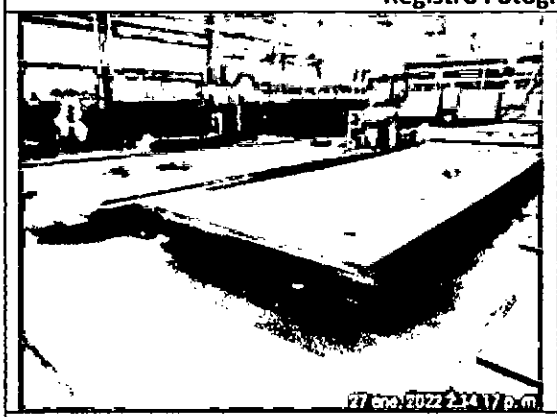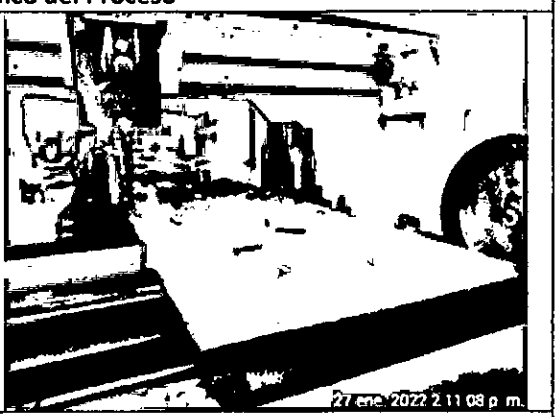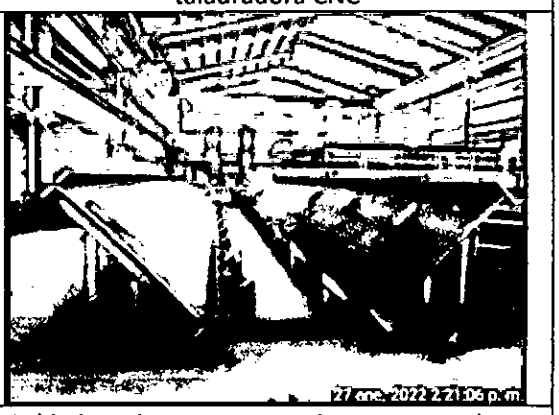
Registro Fotográfico del Proceso	
	
Corte de Almas para viga tipo VCA1 en plasma CNC	Perforación de almas para tipo VCA1 en taladradora CNC
	
Soldadura de arco sumergido semiautomático para viga tipo VCA2	Soldadura de arco sumergido semiautomático para Vigas tipo VT1

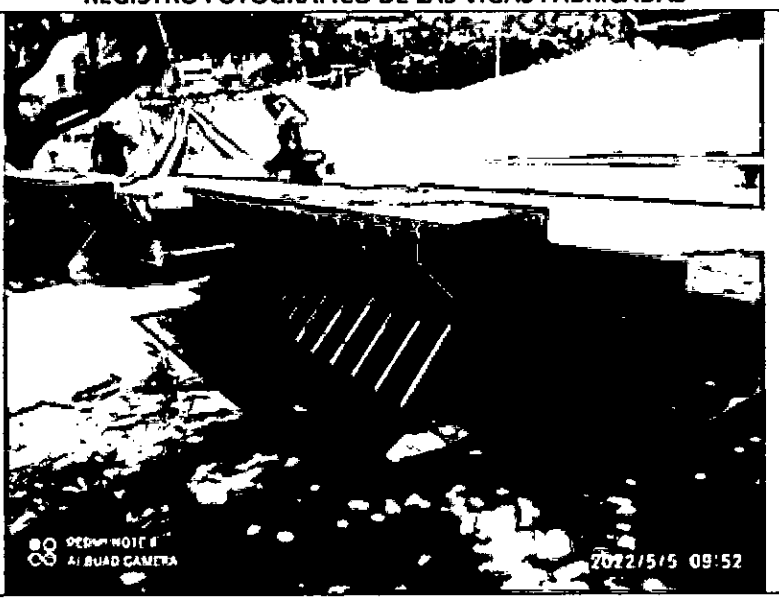REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS VIGAS FABRICADAS

Vigas en obra V9 - 2300X19X250x38x4508mm con ménsulas

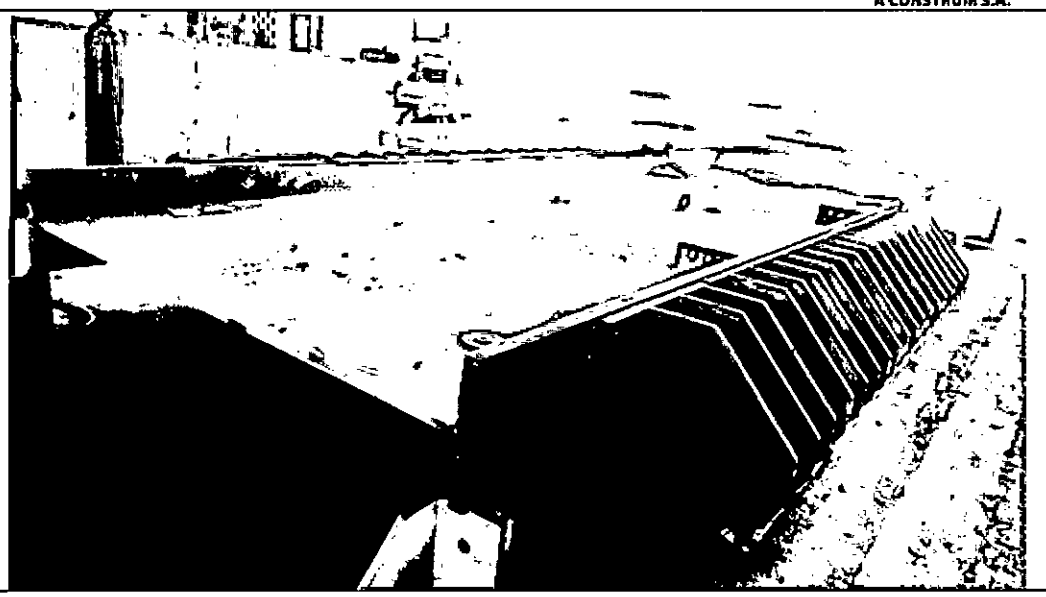
Viga V2 - 2300X22X400X50x12200mm con ménsulas

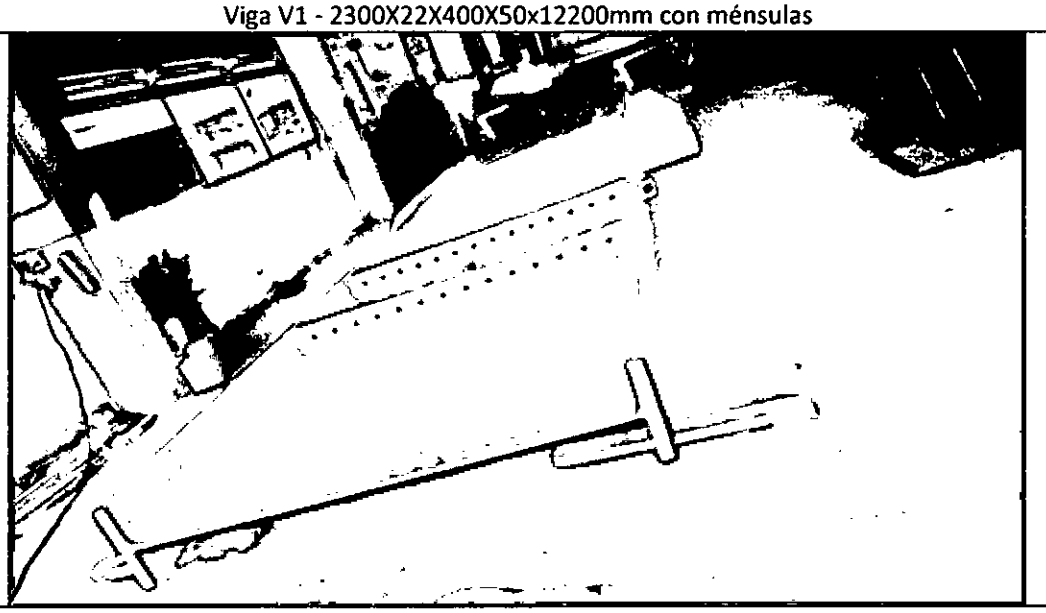


Viga V1 - 2300X22X400X50x12200mm con ménsulas



Viga V3 Pintada - 2300X22X400X50 x 8000 con ménsula

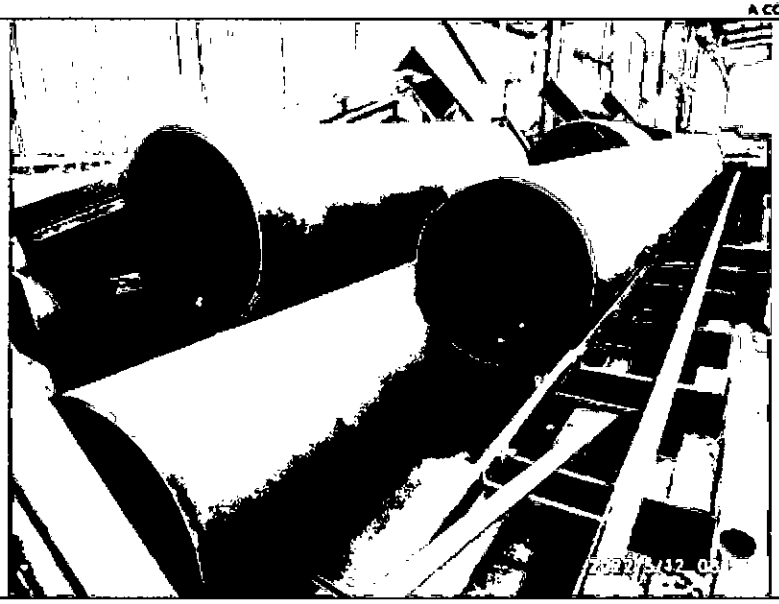


Columnas tipo Col D1- Diámetro 700mm.

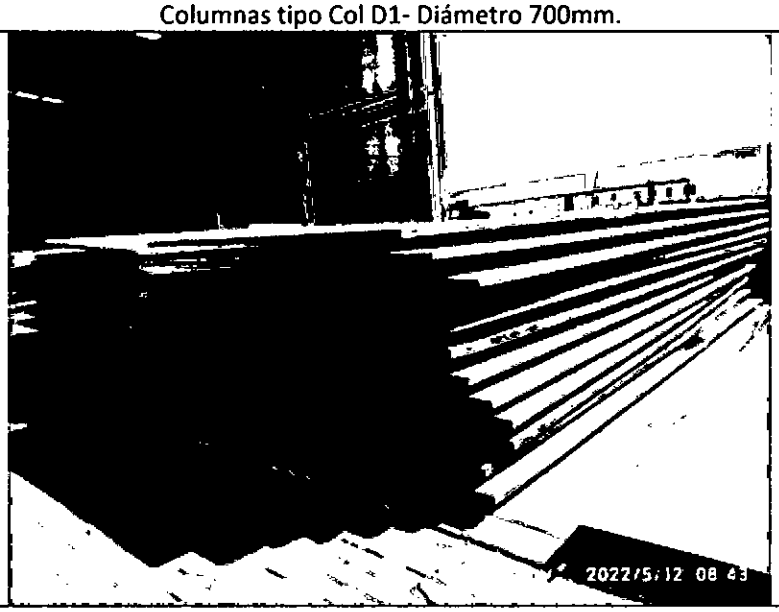


Láminas de acero estructural e=38mm y e=32mm

Smart Steel
Estructuras Metálicas

A CONSTRUIR S.A.

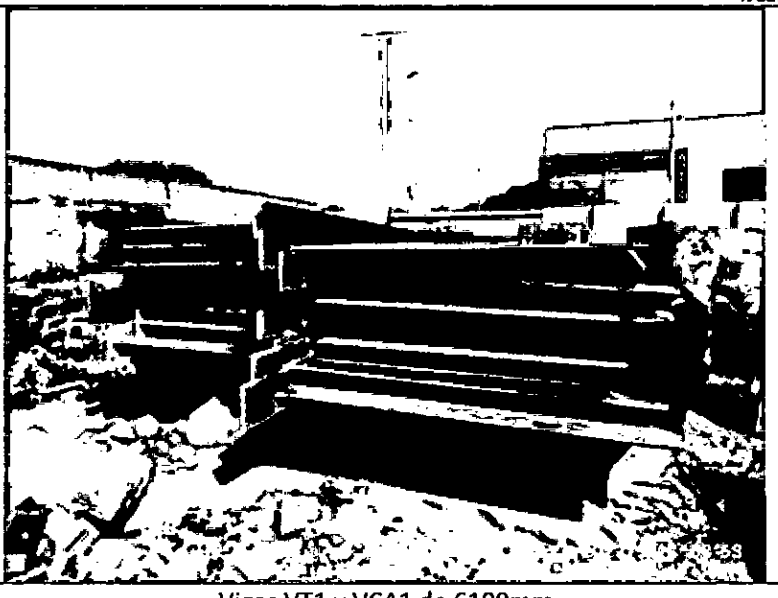

Vigas VT1 y VCA1 de 6100mm

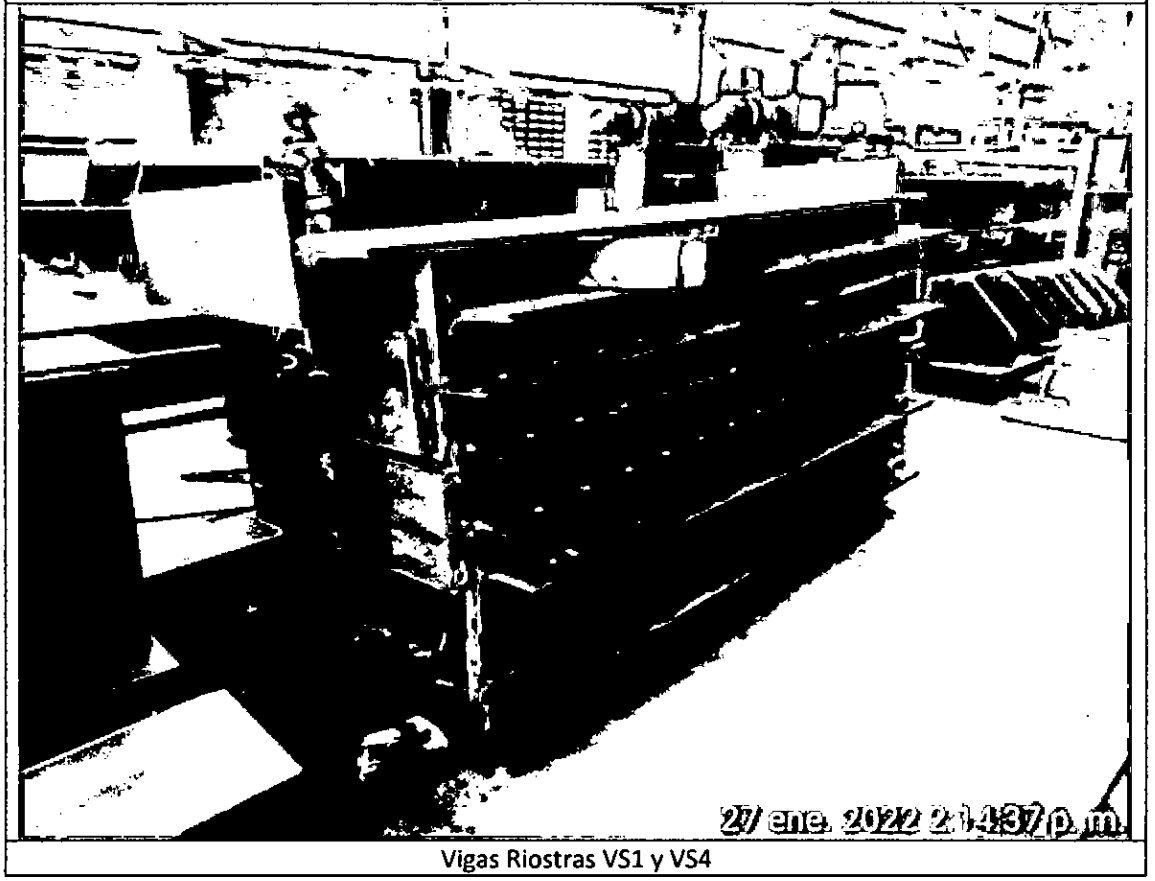


Vigas Riostras VS1 y VS4


13.VES

Smart Steel
Estructuras Metálicas

A CONSTRUIR S.A.

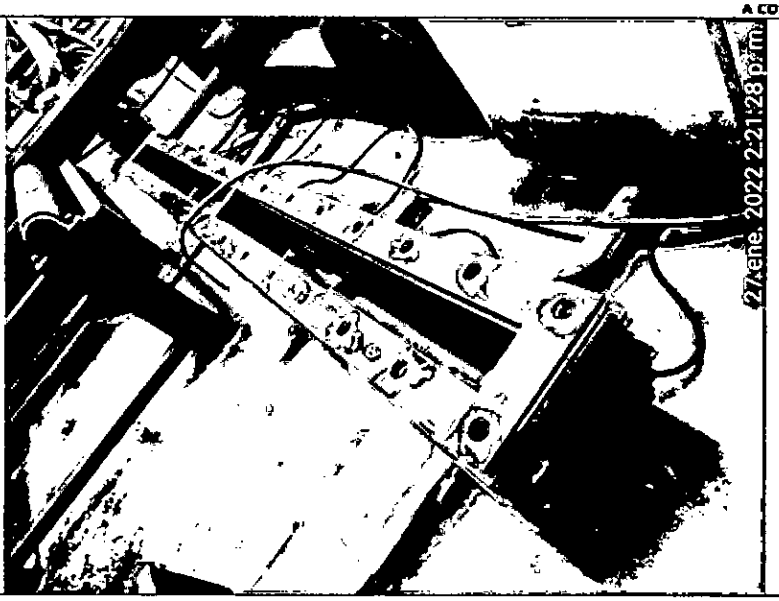


Plantillas Fabricadas para Instalación de Ménsulas

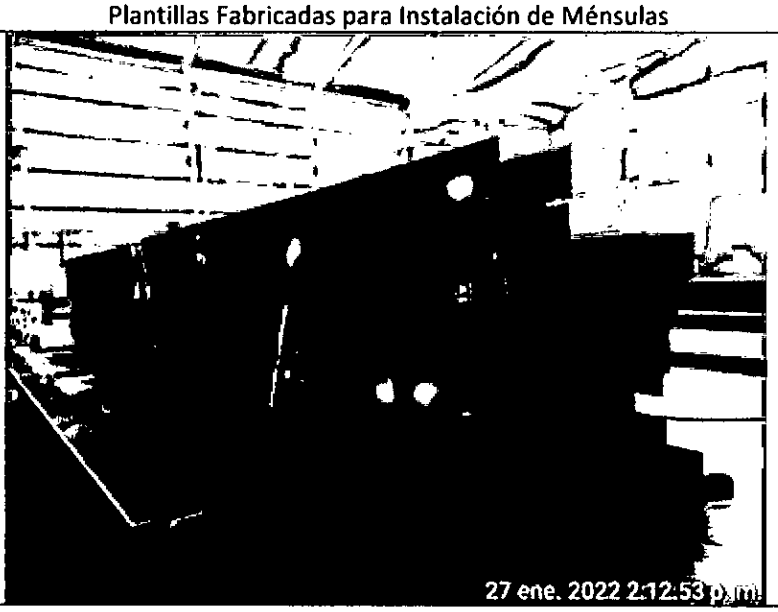


Vigas V2 500X9X250X15 X 12200 mm

Smart Steel
Estructuras Metálicas


A CONSTRUIR S.A.

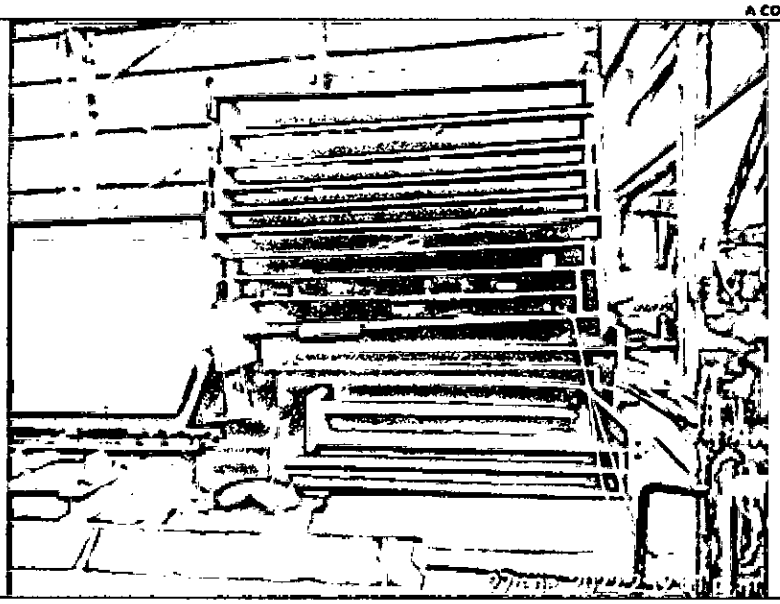


Vigas VCA1 2300X19X250X38 X 6100mm

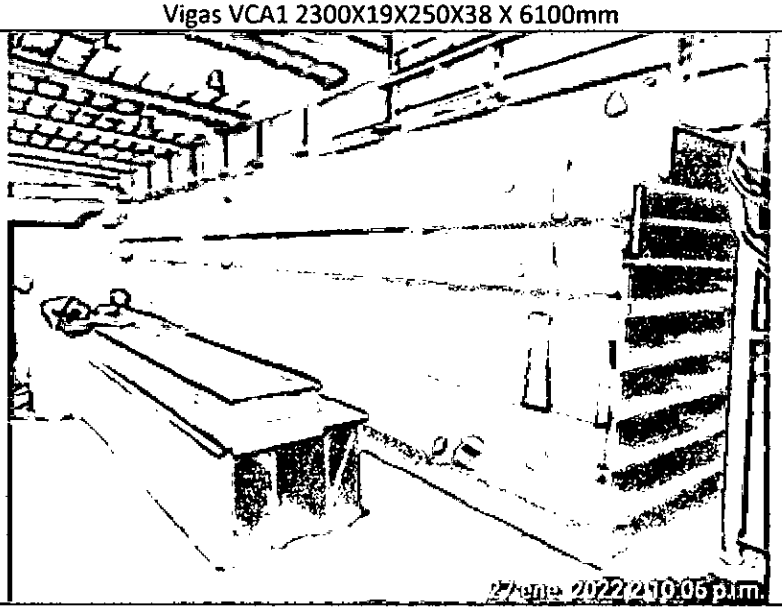

Vigas VCA1 2300X19X25X38 Y VCA2 2300X22X400X50 x 12200 mm

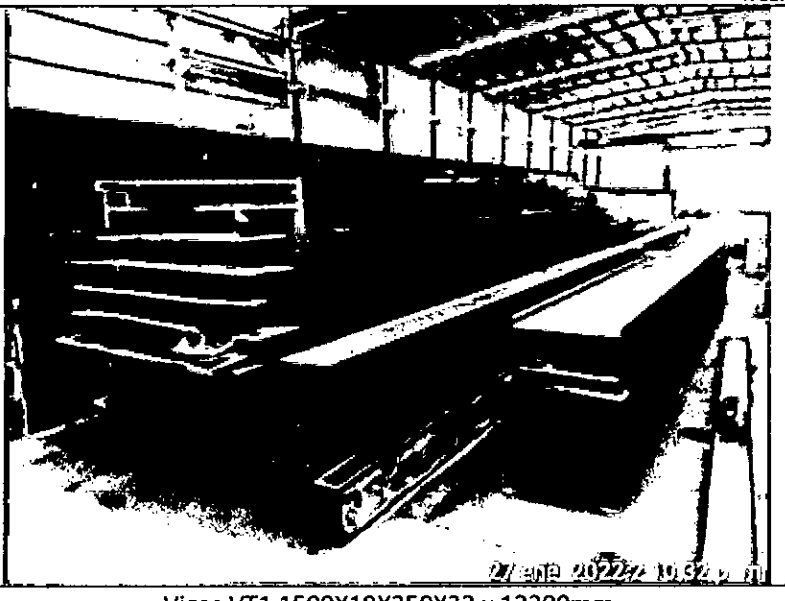


Vigas VT1 1500X19X250X32 x 12200mm

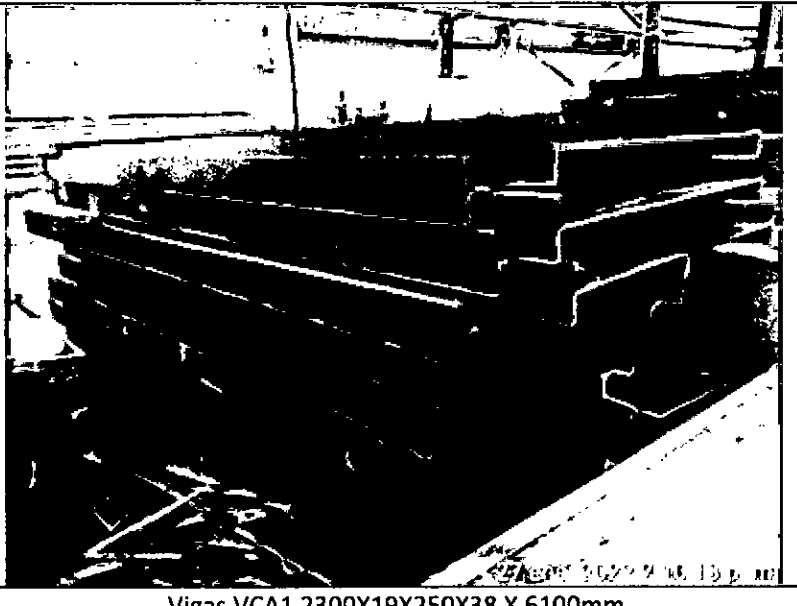


Vigas VCA1 2300X19X250X38 X 6100mm

Smart Steel
Estructuras Metálicas

A CONSTRUIR S.A.

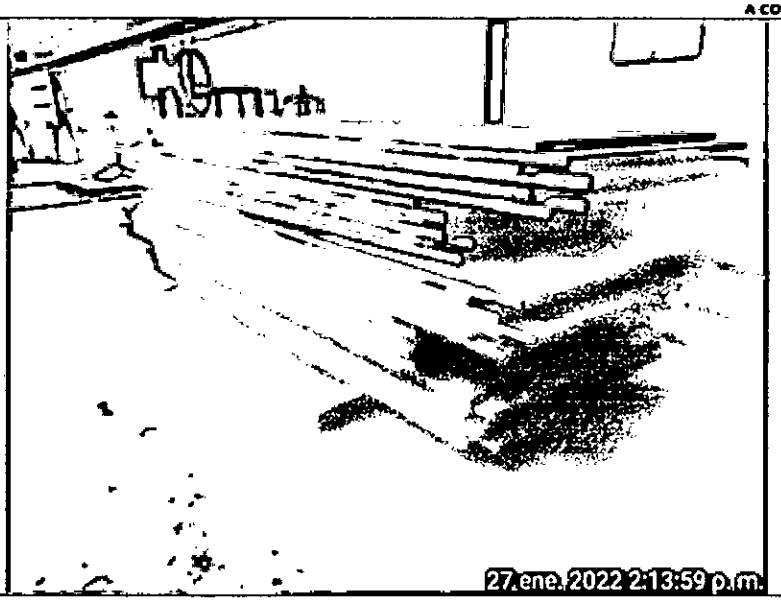

Corte de Almas para viga tipo VCA1 en plasma CNC

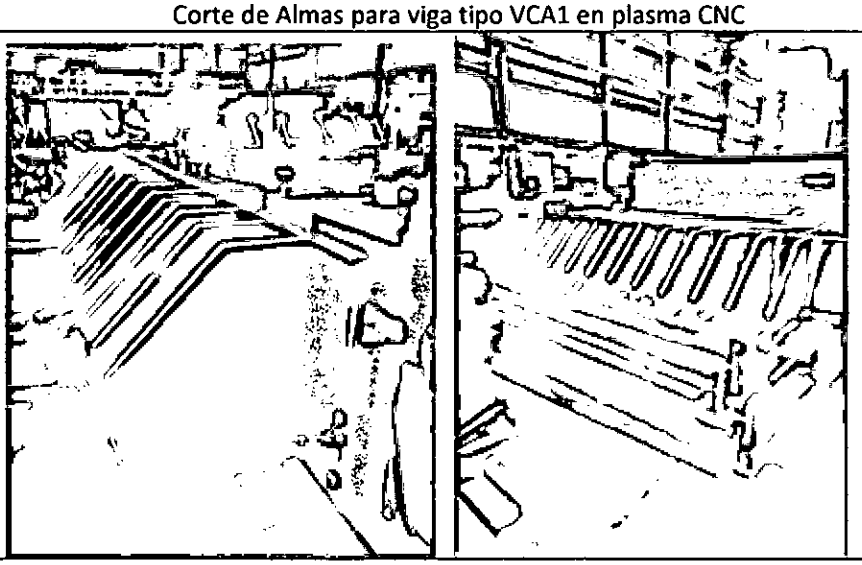


Ménsulas Fabricadas (Apoyos sobre los muros del concreto)


13.129

Smart Steel
Estructuras Metálicas

A CONSTRUIR S.A.

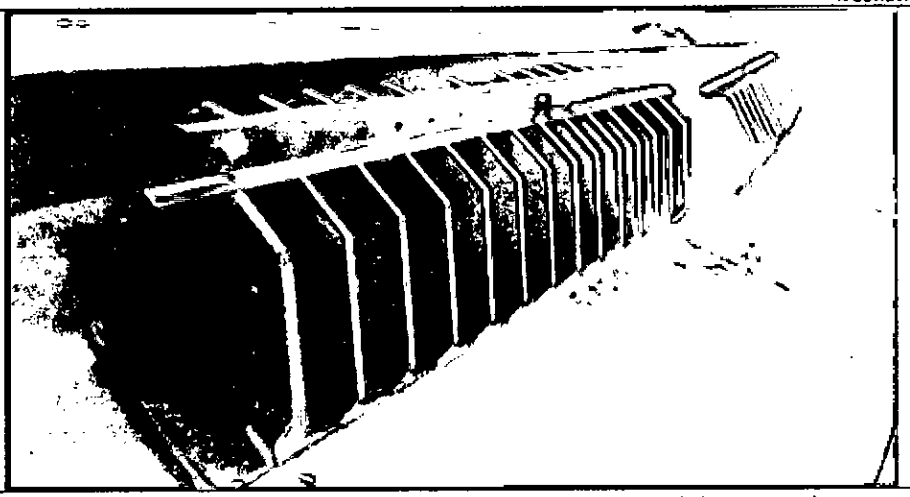


Ménsulas Fabricadas (Apoyos sobre los muros del concreto)

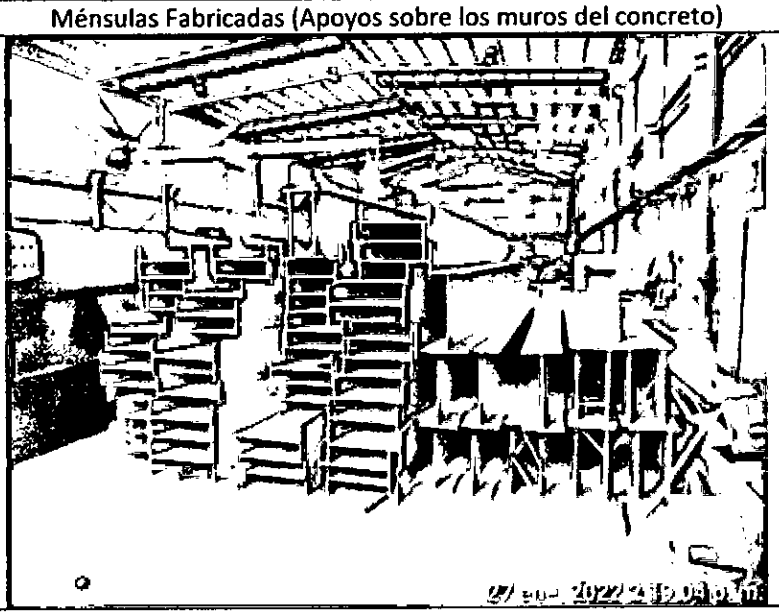


Vigas V2 500X9X250X15 X 12200 mm

Smart Steel
Estructuras Metálicas

A CONSTRUIR S.A.

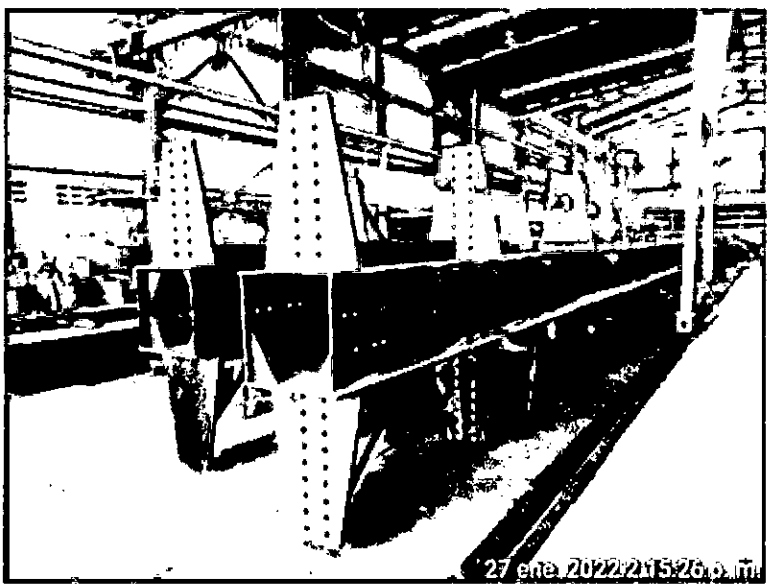

Columnas COL 2 x 11678mm

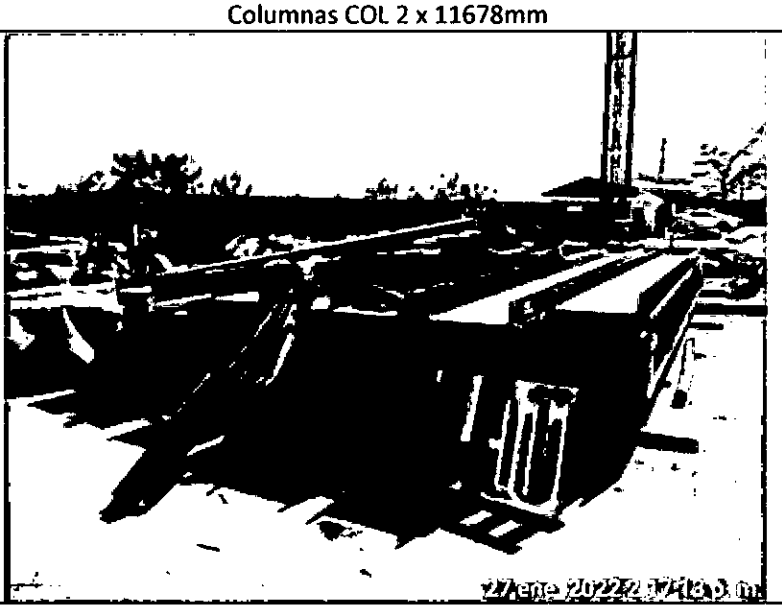

Vigas V2 500X9X250X15 X 12200 mm

Smart Steel
Estructuras Metálicas

PLAN DE DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

		OBRA	CENTRO CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN VALLEDUPAR, CESAR			
		Fecha:	24-08-2021	CLIENTE:	GOBERNACIÓN DEL CESAR	
	ACTIVIDAD A INSPECCIONAR	ESPECIFICACION Y/O CÓDIGO DE REFERENCIA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	FORMATO	PORCENTAJE Y TIPO DE INSPECCIÓN	PORCENTAJE Y TIPO DE INSPECCIÓN DEL CLIENTE
1	Diseño y Calculo Estructural	NSR 2010 Titulo F	NSR 2010 Parte F	N.A	N.A	R.D
2	Revision de Planos de Fabricacion	AWS D1.1:2020	AWS D.1.1:2015 Cap. 5 Planos de Diseño	N.A.	100% Aprobación en Planta	R.D Revisión de Interventoría
3	Certificados de calidad de consumibles	AWS D1.1.2020	AWS D1.1.2015 Cap. 5 Fabricación	N.A.	100%	Frecuencia según NSR 10, parámetros acorde a AWS D1.1. 2020
3	Recepcion de Materiales	Normas ASTM	ASTM A6 ASTM A572 y A588 AWS D.1.1:2020 Cap. 5	Orden de compra Certificados de Calidad Entrada de Almacen	E.D.P. 100%	R.D Según NSR 10
4	Elaboracion y Calificacion de WPS/PQR	AWS D1.1:2020	AWS D.1.1:2020 Cap. 3 Precalificación y Cap.4 Calificación	WPS /PQR /WPQ	E.D.P. 100%	R.D Frecuencia según NSR 10, parámetros acorde a AWS D1.1. 2020
5	Corte, Rotado y Perforación	Planos de taller AWS D1.1.2020	Tolerancias AWS D.1.1:2015 Cap. 5 Fabricación	Protocolo Dimensional FOR-PROD-008	E.D.P. 100%	R.D parámetros acorde NSR 10 parte F y NTC 5832
6	Inspeccion de Armado	Planos de taller AWS D1.1.2020	NTC 5832 Prácticas de Fabricación y Montaje Planos de taller Longitud: +/-3mm Alineamiento: 1/1000mm Plomo: 1/500mm AWS D.1.1.2015 Cap. 5 Fabricación	Protocolo Dimensional FOR-PROD-008	E.D.P. 100%	R.D. Frecuencia según NSR 10, parámetros acorde a AWS D1.1. 2020, NTC 5832 y NSR 10 Titulo F
7	Control Dimensional	AWS D1.1.2020	NTC 5832 Prácticas de Fabricación y Montaje Longitud: +/-3mm Alineamiento: 1/1000mm Plomo: 1/500mm AWS D1.1.2015 Cap. 5 Fabricación	Protocolo Dimensional FOR-PROD-008	E.D.P. 100%	R.D. Según NSR 10
8	Inspeccion Visual de Soldadura	AWS D.1.1.2020	AWS D1.1.2015 Numeral 6.8	Formato de Inspección Visual FOR-PROD-007	E.D.P. 100%	R.D
9	Inspeccion con Tintas Penetrantes	AWS D1.1.2020 y Requerimientos del Cliente	AWS D1.1.2015 Numeral 6.10	Formato de Inspección por Tintas Penetrantes FOR-PROD-006	30% en soldaduras diferentes a las solicitadas a tensión	R.D
10	Inspeccion con Ensayo de Ultrasonido	AWS D1.1.2020 y Requerimientos del Cliente	AWS D1.1.2015 Numeral 6.11 Instructivo de UT	Formatos de Inspección por Ultrasonido	Fabricante: 50% de juntas solicitadas a tensión Constructor: 25% de juntas solicitadas a tensión	25% de juntas solicitadas a tensión R.D + P
11	Inspeccion de Limpieza de Pintura	SSPC	SSPC SP6	Informe de Calidad de Pintura	E.D.P (Spot SSPC)	R.D.
12	Medición de espesores de Pintura	SSPC	ASTM D6132 - 13 3 mils de imprimente 3 mils de acabado	Informe de Calidad de Pintura	3 muestras cada 100 metros cuadrados	R.D.
13	Prueba de Adherencia de Pintura	SSPC	Presión de desprendimiento indicada por el proveedor	Informe de Calidad de Pintura	1 muestra cada 100 metros cuadrados	R.D.
2	Izaje, Alineacion y Plomos	NSR 2010 Titulo F NTC 5832 Prácticas de Fabricación y Montaje	NTC 5832 Prácticas de Fabricación y Montaje NSR 2010 Parte F	Protocolo Dimensional	E.D.P. 100%	RD + P
3	Inspección a Juntas Pernadas, alineación, perforaciones y procedimiento de torque	NSR 10 Titulo F NTC 5832 Prácticas de Fabricación y Montaje	NTC 5832 Prácticas de Fabricación y Montaje RCSC 2014 Especificación para Juntas Pernadas, NSR 10	Protocolo Dimensional	E.D.P. 50%	R.D. Aleatoriamente

TIPO DE INSPECCIÓN		FRECUENCIA		ELABORÓ	OBRA	INTERVENTORIA
R.D.	Revisión Documentos	Al Inicio	I			
M	Monitoreo	Durante Proceso	D.P			
P	Presenciar	Al despacho	F			
E	Ejecutar	WPS	Especificación del Procedimiento de Soldadura			
N.A.	No Aplica	WPQ	Registro de calificación de soldadores	ING. DIEGO PABÓN	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE
S.L.	Cargas de servicio	PQR	Registro de Calificación de Procedimiento	QA/QC		

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO

Smart Steel
Estructuras Metálicas

A CONSTRUIR S.A.

LINCOLN ELECTRIC

LINCOLN SOLDADURAS DE COLOMBIA LTDA.

DEPARTAMENTO DE CALIDAD
LINCOLN SOLDADURAS DE COLOMBIA LTDA.

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE METALES DE APORTE

LINCOLN CITOCOR 15 [illegible] E 7018

LOTE LSC Nº 17372089

COMPOSICIÓN QUÍMICA [illegible]

	C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo	V
Especificación AWS A 5.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
LSC	[illegible]	[illegible]	44	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROPIEDADES MECÁNICAS

Punto de Fluencia (N/mm2)	Resistencia a la Tracción (N/mm2)	Alargamiento (%)	Energía Absorbida J (Temp °C)	Dureza
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	N/R

LINCOLN SOLDADURAS DE COLOMBIA LTDA

[illegible] de Calidad

LINCOLN ELECTRIC

LINCOLN SOLDADURAS DE COLOMBIA LTDA.

DEPARTAMENTO DE CALIDAD
LINCOLN SOLDADURAS DE COLOMBIA LTDA.

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE METALES DE APORTE

LINCOLN CITOCOR 15 [illegible] E 7018

LOTE LSC Nº 17372089

COMPOSICIÓN QUÍMICA [illegible]

	C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo	V
Especificación AWS A 5.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
LSC	[illegible]	[illegible]	44	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROPIEDADES MECÁNICAS

Punto de Fluencia (N/mm2)	Resistencia a la Tracción (N/mm2)	Alargamiento (%)	Energía Absorbida J (Temp °C)	Dureza
[illegible]	[illegible]	24	[illegible]	N/R

LINCOLN SOLDADURAS DE COLOMBIA LTDA

[illegible] de Calidad

Smart Steel
Estructuras Metálicas

A CONSTRUIR S.A.

ESPECIFICACIONES DE PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA (WPS)

Se anexan las especificaciones de procedimiento de soldadura usados en el proceso de fabricación de la estructura, se incluyen los ensayos y certificados que respaldan dichas calificaciones.

CALIFICACIÓN DE SOLDADORES

Se anexan los registros de calificación de soldadores que laboran en el proceso de fabricación de la estructura, se incluyen los ensayos y certificados que respaldan dichas calificaciones.

INSPECCIÓN DE SOLDADURA

Se anexan los informes de inspección de soldadura por ultrasonido y certificaciones de los inspectores que realizan los ensayos, certificados de calibración de equipos, los cuales cumplen con los requerimientos de la práctica recomendada SNT-TC-1A de la American Society For Nondestructive Testing ASNT, estos son:


- Inspector Visual
- Inspectores por tintas penetrantes
- Inspectores Dimensionales
- Inspector por Ultrasonido

13-135

A CONSTRUIR S.A.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA ESTRUCTURA CON LA BASE EPOXICA COLOCADA EN OBRA




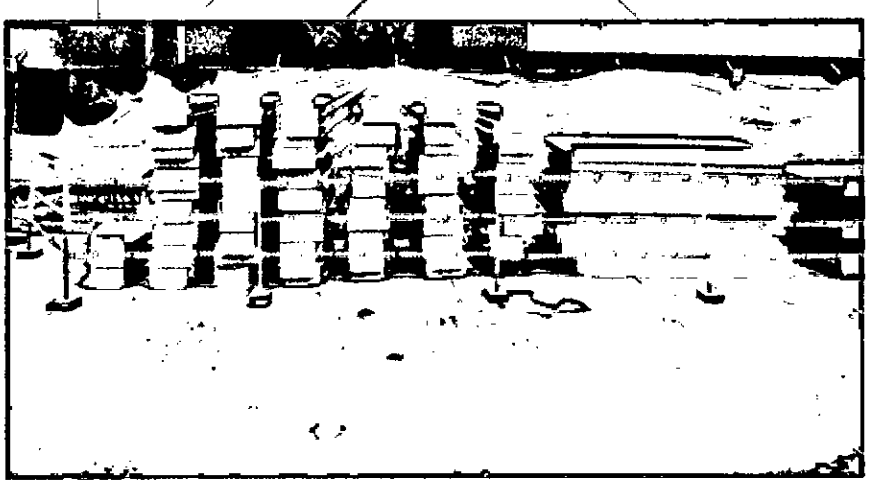


Calle 77B Nº 59-61 – Oficina 203 - Centro Empresarial Las Américas II
Teléfono: (57) (5) 3855098 E-Mail: ac@aconstruir.co
Barranquilla - Colombia

13-136



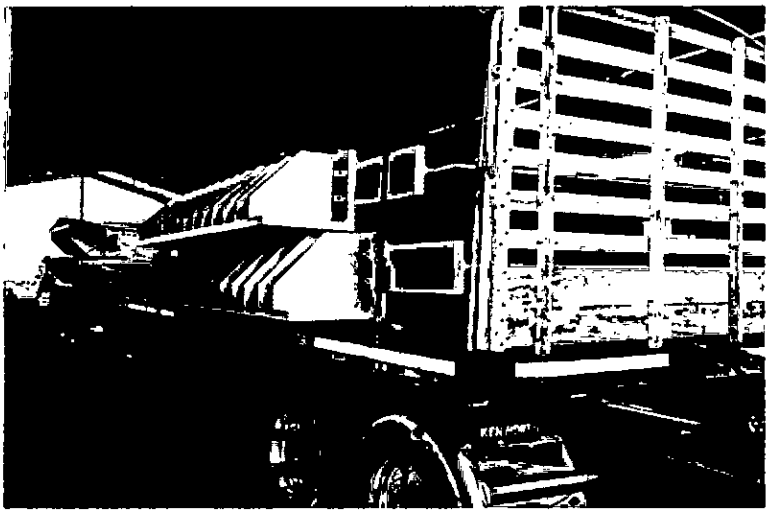

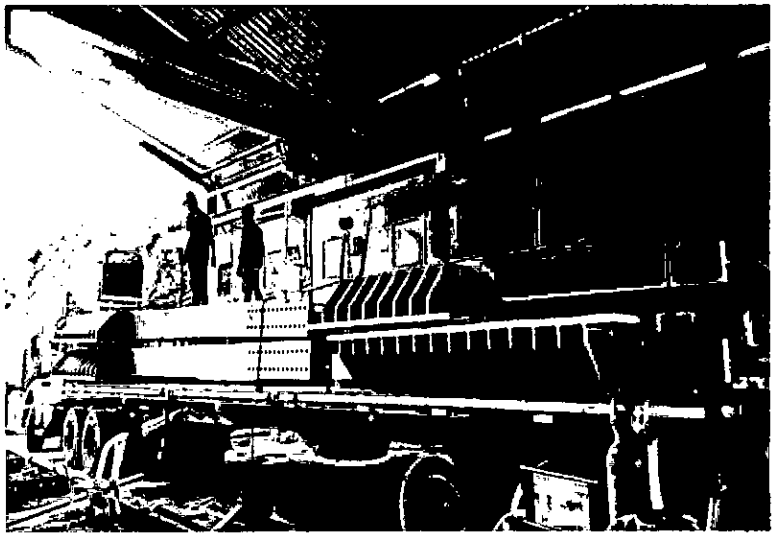

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 05

PERIODO DE EVALUACIÓN

02/03/2022 AL 30/04/2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR						
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002		
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007		
CAPÍTULO	9	ITEM	NP 07	Relleno con Sub - Base de H:20cm INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION		UNID.	M3

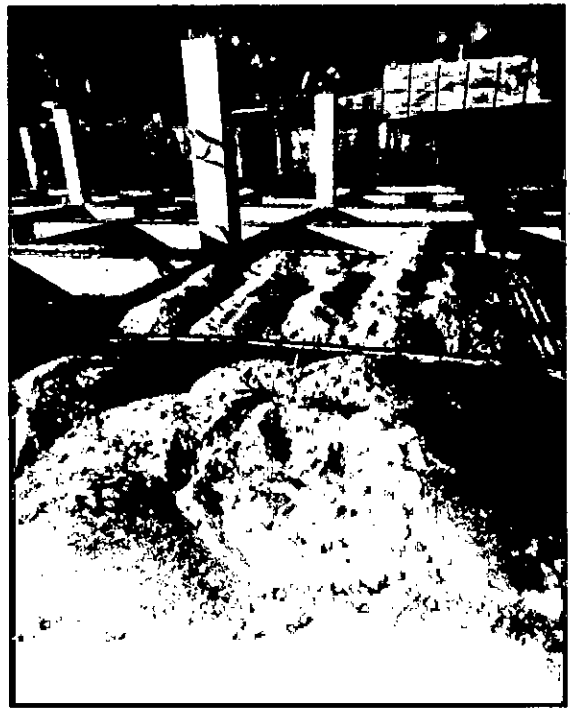

REFERENCIA	ALTURA H	AREA DESCONTANDO VIGAS	CANTIDAD	M3
Ejes (S7-3') →Ejes (Sa-Diagonal)	0,20	653,34		130,67
Ejes (3'-S3) →Ejes (Sa-Diagonal)	0,20	556,53		111,31
Ejes (S3-S2) →Ejes (Sa-Diagonal)	0,20	577,13		115,43
Ejes (S2-S1) →Ejes (Sa-Diagonal)	0,20	602,08		120,42
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
			SUBTOTAL	477,82

CANTIDAD ACTA Parcial No 1	0
CANTIDAD ACTA Parcial No 2	0
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 3	**633,72**
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 4	**-**
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 5	**477,82**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1111,54
CANTIDAD CONTRACTUAL	**1.112,90**
PENDIENTE POR PAGAR	1,36
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	**477,82**

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

17,138

13-138


MEMORIA SUBBASE- ACTA 5			
ANCHO (m)	LARGO (m)	CANTIDAD	ÁREA (m2)
S7-3'			
1,9375	3,855	4	29,87625
2,5875	3,855	4	39,89925
3,55	3,855	4	54,741
3,55	3,855	4	54,741
2	2,51	1	5,02
3,55	2,51	2	17,821
2,45	0,845	1	2,07025
2,45	3,855	1	9,44475
3,55	3,855	4	54,741
3,55	3,855	4	54,741
3,55	3,855	4	54,741
1,85	0,845	1	1,56325
1,85	3,855	1	7,13175
3,55	2,51	1	8,9105
3,55	2,51	1	8,9105
2,55	2,51	2	12,801
3,925	2,51	2	19,7035
1,49	2,475	4	14,751
1,17	2,475	2	5,7915
3,55	3,855	4	54,741
3,55	3,855	4	54,741
3,55	3,855	4	54,741
3,55	3,855	1	13,68525
			9,6924
			8,3371
SUBTOTAL			653,33725
3´-S3			
1,9375	2,55	4	19,7625
2,5875	2,55	4	26,3925
3,55	2,55	4	36,21
3,55	2,55	4	36,21
3,55	2,55	4	36,21
3,55	2,55	4	36,21
3,55	2,55	4	36,21
3,55	2,55	2	18,105
			7,3791
			4,2447
			0,6675
			3,6816
3,55	2,55	4	36,21
3,55	2,55	4	36,21
2,55	2,55	4	26,01

13.139

MEMORIA SUBBASE- ACTA 5			
ANCHO (m)	LARGO (m)	CANTIDAD	ÁREA (m2)
3,925	2,55	4	40,035
3,55	2,55	4	36,21
3,55	2,55	4	36,21
3,55	2,55	4	36,21
3,55	2,55	4	36,21
			3,0718
			8,5106
			0,36
SUBTOTAL			556,5303
S3-S2			
1,9375	2,55	4	19,7625
2,5875	2,55	4	26,3925
			0,6675
			3,6816
			7,3791
			4,2447
3,55	2,55	2	18,105
3,55	2,55	4	36,21
3,55	2,55	4	36,21
3,55	2,55	4	36,21
3,55	2,55	4	36,21
3,55	2,55	2	18,105
			4,2447
			7,3791
			3,6816
			0,6675
3,55	2,55	4	36,21
3,55	2,55	4	36,21
2,55	2,55	4	26,01
3,925	2,55	4	40,035
3,55	2,55	4	36,21
3,55	2,55	4	36,21
3,55	2,55	4	36,21
3,55	2,55	4	36,21
3,55	2,55	3	27,1575
			5,7435
			1,7791
SUBTOTAL			577,1359
S2-S1			
1,9375	2,55	4	19,7625
2,5875	2,55	4	26,3925
			3,6816
			0,6675

MEMORIA SUBBASE- ACTA 5			
ANCHO (m)	LARGO (m)	CANTIDAD	ÁREA (m2)
			7,3791
			4,2447
3,55	2,55	2	18,105
3,55	2,55	4	36,21
3,55	2,55	4	36,21
3,55	2,55	4	36,21
3,55	2,55	4	36,21
3,55	2,55	4	36,21
3,55	2,55	4	36,21
3,55	2,55	4	36,21
2,55	2,55	4	26,01
3,925	2,55	4	40,035
3,55	2,55	4	36,21
3,55	2,55	4	36,21
3,55	2,55	4	36,21
3,55	2,55	4	36,21
3,55	2,55	4	36,21
3,5682	2,55	1	9,09891
			7,8712
			4,312
SUBTOTAL			602,08001

TOTAL	2.389,08

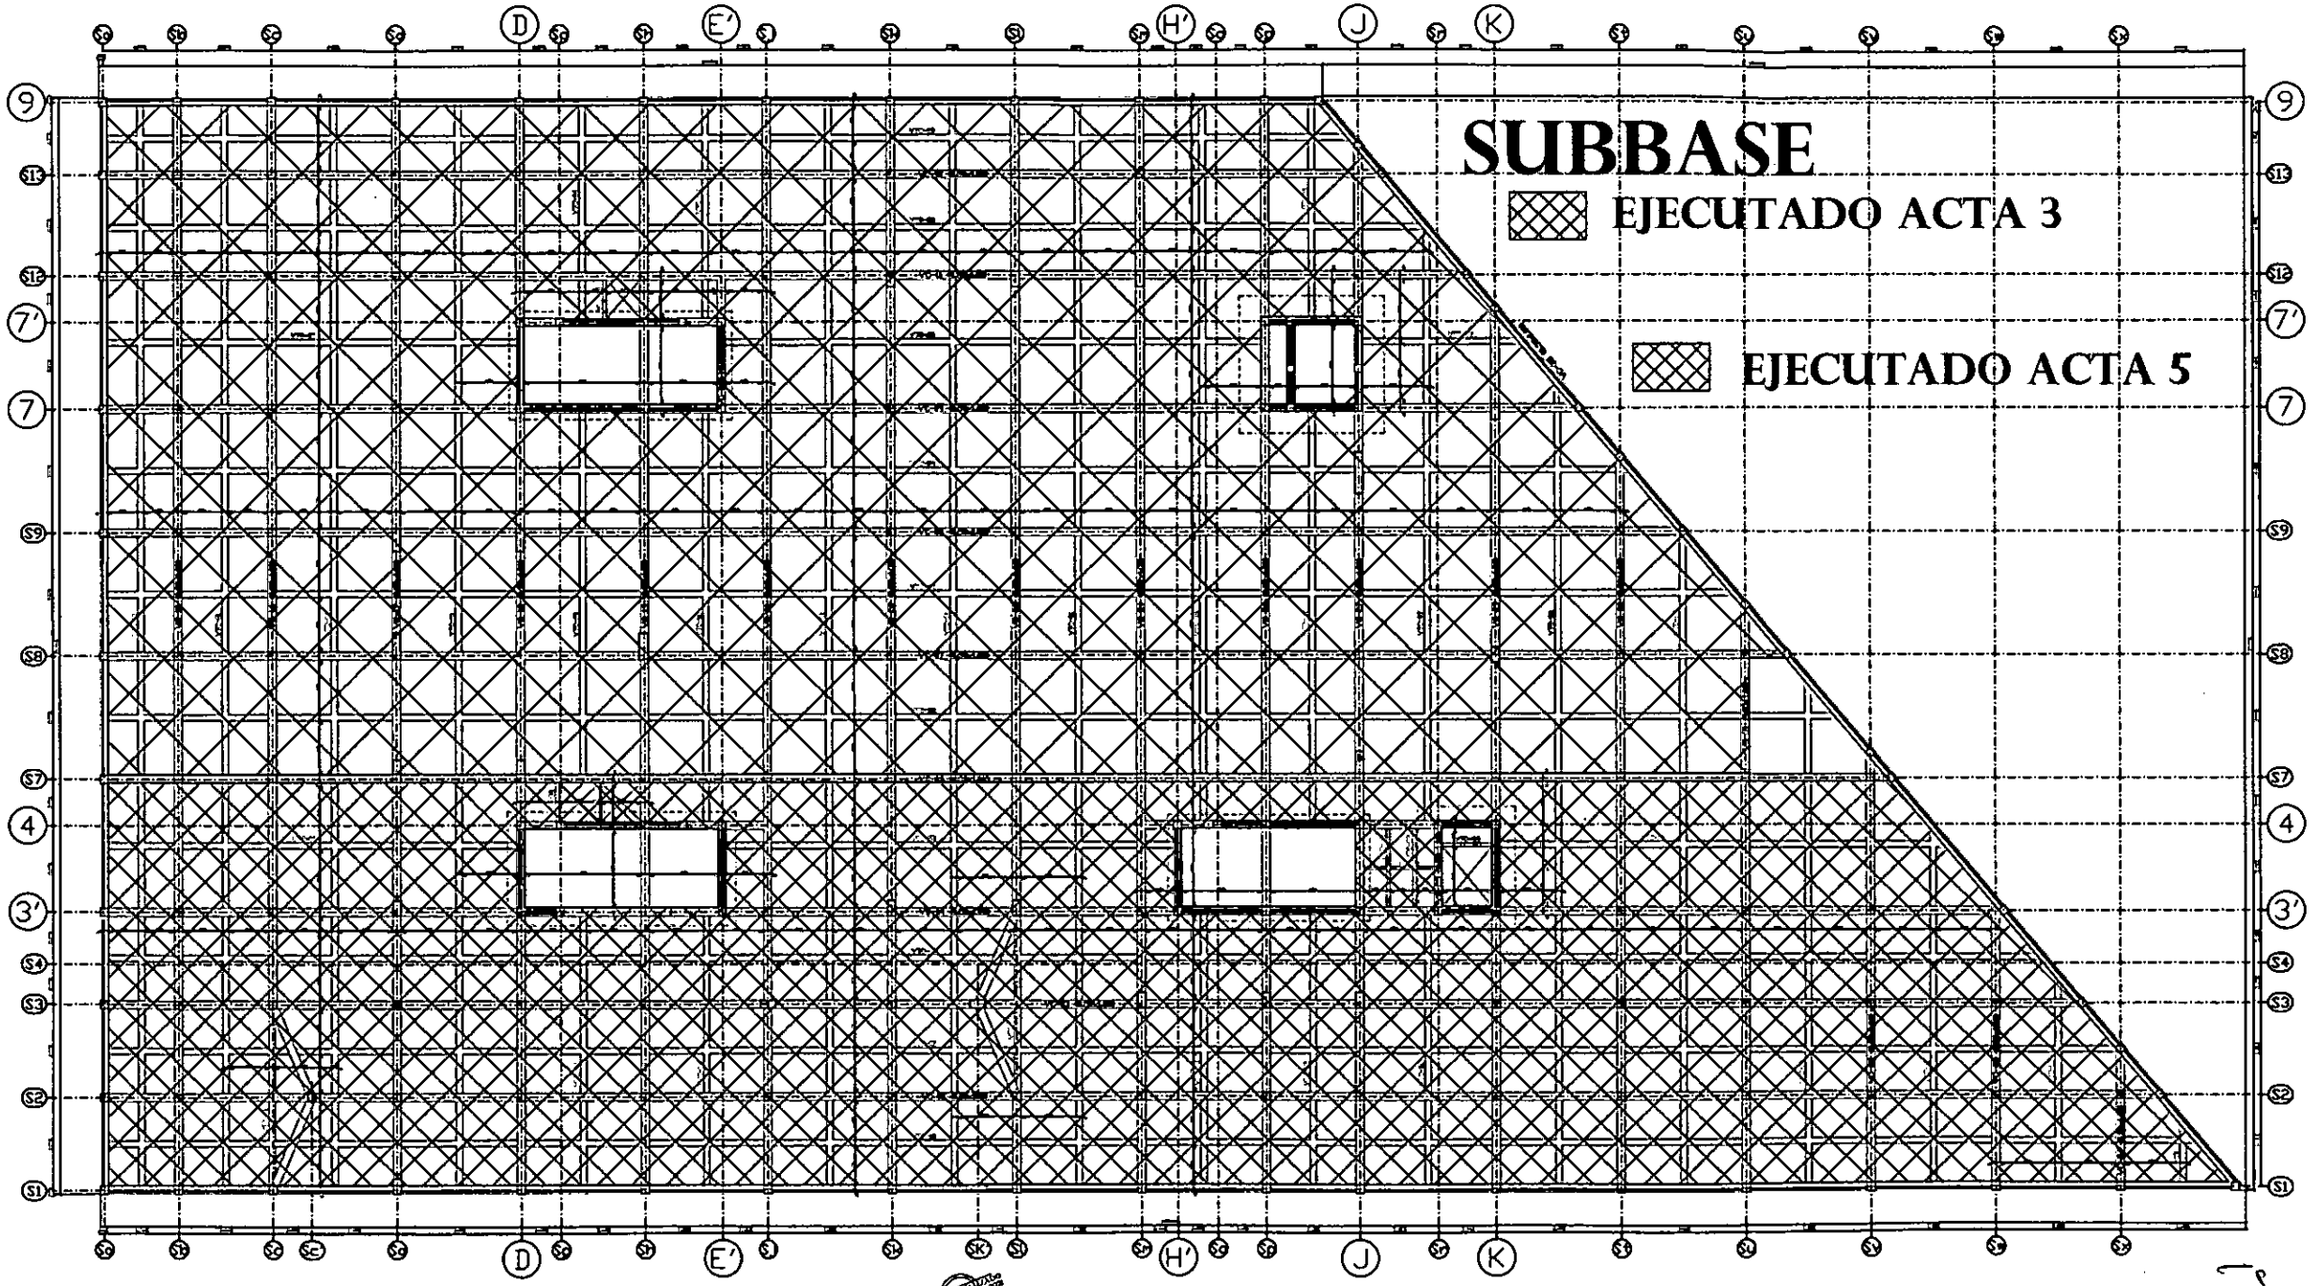

FORMALETA NIVEL Ne. -2.90
CIMENTACION

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 05

PERIODO DE EVALUACIÓN

02/03/2022 AL 30/04/2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007

CAPÍTULO	9	ITEM	NP 08	Pedraplén con piedra de 3/4" y H: 60cm	UNID.	M3



REFERENCIA					M3
VER CARTERA TOPOGRAFICA ADJUNTA					1.216,16
				SUBTOTAL	1.216,16
				CANTIDAD ACTA Parcial No 1	0
				CANTIDAD ACTA Parcial No 2	0
				CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 3	1.824,24
				CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 4	
				CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 5	1.216,16
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	3040,4
				CANTIDAD CONTRACTUAL	3.040,40
				PENDIENTE POR PAGAR	0,00
				TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	1.216,16

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

MEMORIA TRITURADO

EJE S7 A 3'''

COTA TRITURADO	ALTURA	COTA TERRENO	AREA	VOL.	AREA GEOTEXTIL
169,18	0,56	168,62	13,685	7,66	18,48
169,18	0,52	168,66	13,685	7,12	18,48
169,18	0,59	168,59	8,91	5,26	12,85
169,18	0,59	168,59	8,91	5,26	12,85
169,18	0,56	168,62	6,4	3,58	9,80
169,18	0,52	168,66	6,4	3,33	9,80
169,18	0,59	168,59	9,85	5,81	13,98
169,18	0,56	168,62	9,85	5,52	13,98
169,18	0,58	168,6	13,685	7,94	18,48
169,18	0,44	168,74	13,685	6,02	18,48
169,18	0,56	168,62	13,685	7,66	18,48
169,18	0,59	168,59	13,685	8,07	18,48
169,18	0,56	168,62	13,685	7,66	18,48
169,18	0,52	168,66	13,685	7,12	18,48
169,18	0,59	168,59	9,692	5,72	13,79
TOTAL			**169,492**	**93,73**	**234,91**

EJE S7 A 3''''

COTA TRITURADO	ALTURA	COTA TERRENO	AREA	VOL.	AREA GEOTEXTIL
169,18	0,48	168,7	7,459	3,58	11,10
169,18	0,52	168,66	7,459	3,88	11,10
169,18	0,6	168,58	9,975	5,98	14,12
169,18	0,58	168,6	9,975	5,79	14,12
169,18	0,59	168,59	13,667	8,06	18,46
169,18	0,6	168,58	13,667	8,20	18,46
169,18	0,54	168,64	13,667	7,38	18,46
169,18	0,44	168,74	13,667	6,01	18,46
169,18	0,59	168,59	9,44	5,57	13,49
169,18	0,58	168,6	13,685	7,94	18,48
169,18	0,44	168,74	13,685	6,02	18,48
169,18	0,56	168,62	13,685	7,66	18,48
169,18	0,59	168,59	13,685	8,07	18,48
169,18	0,56	168,62	13,685	7,66	18,48
169,18	0,52	168,66	13,685	7,12	18,48
169,18	0,59	168,59	7,13	4,21	10,69
169,18	0,59	168,59	8,91	5,26	12,85
169,18	0,56	168,62	6,4	3,58	9,80
169,18	0,52	168,66	6,4	3,33	9,80

169,18	0,59	168,59	7,376	4,35	11,00
169,18	0,56	168,62	7,376	4,13	11,00
169,18	0,58	168,6	7,376	4,28	11,00
169,18	0,44	168,74	12,57	5,53	17,18
169,18	0,56	168,62	13,685	7,66	18,48
169,18	0,59	168,59	13,685	8,07	18,48
169,18	0,56	168,62	13,685	7,66	18,48
169,18	0,52	168,66	13,685	7,12	18,48
169,18	0,59	168,59	13,685	8,07	18,48
169,18	0,56	168,62	13,685	7,66	18,48
169,18	0,52	168,66	13,685	7,12	18,48
169,18	0,59	168,59	8,337	4,92	12,16
TOTAL			**348,756**	**191,89**	**483,55**

EJE 3´-S3					
COTA TRITURADO	**ALTURA**	**COTA TERRENO**	**AREA**	**VOL.**	**AREA GEOTEXTIL**
169,18	0,54	168,64	4,941	2,67	7,97
169,18	0,55	168,63	4,941	2,72	7,97
169,18	0,53	168,65	6,598	3,50	10,04
169,18	0,56	168,62	6,598	3,69	10,04
169,18	0,6	168,58	9,05	5,43	13,02
169,18	0,49	168,69	9,05	4,43	13,02
169,18	0,48	168,7	9,05	4,34	13,02
169,18	0,52	168,66	9,05	4,71	13,02
169,18	0,6	168,58	9,05	5,43	13,02
169,18	0,58	168,6	9,05	5,25	13,02
169,18	0,59	168,59	9,05	5,34	13,02
169,18	0,6	168,58	9,05	5,43	13,02
169,18	0,54	168,64	9,05	4,89	13,02
169,18	0,44	168,74	9,05	3,98	13,02
169,18	0,59	168,59	9,05	5,34	13,02
169,18	0,58	168,6	8,047	4,67	11,81
169,18	0,44	168,74	9,05	3,98	13,02
169,18	0,56	168,62	9,05	5,07	13,02
169,18	0,59	168,59	9,05	5,34	13,02
169,18	0,56	168,62	9,05	5,07	13,02
169,18	0,52	168,66	6,502	3,38	9,92
169,18	0,59	168,59	6,502	3,84	9,92
169,18	0,59	168,59	10,009	5,91	14,17
169,18	0,56	168,62	10,009	5,61	14,17
169,18	0,52	168,66	9,05	4,71	13,02
169,18	0,59	168,59	9,05	5,34	13,02
169,18	0,56	168,62	9,05	5,07	13,02
169,18	0,58	168,6	9,05	5,25	13,02

169,18	0,44	168,74	9,05	3,98	13,02
169,18	0,56	168,62	9,05	5,07	13,02
169,18	0,59	168,59	9,05	5,34	13,02
169,18	0,56	168,62	9,05	5,07	13,02
TOTAL			**272,297**	**149,82**	**395,46**

EJE 3´-S3					
COTA TRITURADO	**ALTURA**	**COTA TERRENO**	**AREA**	**VOL.**	**AREA GEOTEXTIL**
169,18	0,44	168,74	4,941	2,17	7,97
169,18	0,58	168,6	4,941	2,87	7,97
169,18	0,52	168,66	6,598	3,43	10,04
169,18	0,61	168,57	6,598	4,02	10,04
169,18	0,58	168,6	9,05	5,25	13,02
169,18	0,53	168,65	9,05	4,80	13,02
169,18	0,48	168,7	9,05	4,34	13,02
169,18	0,52	168,66	9,05	4,71	13,02
169,18	0,6	168,58	9,05	5,43	13,02
169,18	0,58	168,6	9,05	5,25	13,02
169,18	0,59	168,59	9,05	5,34	13,02
169,18	0,6	168,58	9,05	5,43	13,02
169,18	0,54	168,64	9,05	4,89	13,02
169,18	0,44	168,74	9,05	3,98	13,02
169,18	0,59	168,59	9,05	5,34	13,02
169,18	0,58	168,6	8,047	4,67	11,81
169,18	0,44	168,74	9,05	3,98	13,02
169,18	0,56	168,62	9,05	5,07	13,02
169,18	0,59	168,59	9,05	5,34	13,02
169,18	0,56	168,62	9,05	5,07	13,02
169,18	0,52	168,66	6,502	3,38	9,92
169,18	0,59	168,59	6,502	3,84	9,92
169,18	0,59	168,59	10,009	5,91	14,17
169,18	0,56	168,62	10,009	5,61	14,17
169,18	0,52	168,66	9,05	4,71	13,02
169,18	0,59	168,59	9,05	5,34	13,02
169,18	0,56	168,62	9,05	5,07	13,02
169,18	0,58	168,6	9,05	5,25	13,02
169,18	0,44	168,74	9,05	3,98	13,02
169,18	0,56	168,62	9,05	5,07	13,02
169,18	0,59	168,59	9,05	5,34	13,02
169,18	0,56	168,62	9,05	5,07	13,02
169,18	0,52	168,66	8,511	4,43	12,37
169,18	0,52	168,66	0,36	0,19	1,44
TOTAL			**281,168**	**154,53**	**409,27**

13.146

EJE´ S3-S2					
COTA TRITURADO	**ALTURA**	**COTA TERRENO**	**AREA**	**VOL.**	**AREA GEOTEXTIL**
169,18	0,44	168,74	4,941	2,17	7,97
169,18	0,58	168,6	4,941	2,87	7,97
169,18	0,52	168,66	6,598	3,43	10,04
169,18	0,61	168,57	6,598	4,02	10,04
169,18	0,58	168,6	8,07	4,68	11,84
169,18	0,53	168,65	9,05	4,80	13,02
169,18	0,48	168,7	9,05	4,34	13,02
169,18	0,52	168,66	9,05	4,71	13,02
169,18	0,6	168,58	9,05	5,43	13,02
169,18	0,58	168,6	9,05	5,25	13,02
169,18	0,59	168,59	9,05	5,34	13,02
169,18	0,6	168,58	9,05	5,43	13,02
169,18	0,54	168,64	9,05	4,89	13,02
169,18	0,44	168,74	9,05	3,98	13,02
169,18	0,59	168,59	9,05	5,34	13,02
169,18	0,58	168,6	7,927	4,60	11,67
169,18	0,44	168,74	9,05	3,98	13,02
169,18	0,56	168,62	9,05	5,07	13,02
169,18	0,59	168,59	9,05	5,34	13,02
169,18	0,56	168,62	9,05	5,07	13,02
169,18	0,52	168,66	6,502	3,38	9,92
169,18	0,59	168,59	6,502	3,84	9,92
169,18	0,59	168,59	10,009	5,91	14,17
169,18	0,56	168,62	10,009	5,61	14,17
169,18	0,52	168,66	9,05	4,71	13,02
169,18	0,59	168,59	9,05	5,34	13,02
169,18	0,56	168,62	9,05	5,07	13,02
169,18	0,58	168,6	9,05	5,25	13,02
169,18	0,44	168,74	9,05	3,98	13,02
169,18	0,56	168,62	9,05	5,07	13,02
169,18	0,59	168,59	9,05	5,34	13,02
169,18	0,56	168,62	9,05	5,07	13,02
169,18	0,52	168,66	5,74	2,98	8,97
TOTAL			**276,937**	**152,27**	**403,11**

EJE´ S3-S2					
COTA TRITURADO	ALTURA	COTA TERRENO	AREA	VOL.	AREA GEOTEXTIL
169,18	0,44	168,74	4,941	2,17	7,97
169,18	0,58	168,6	4,941	2,87	7,97
169,18	0,52	168,66	6,598	3,43	10,04
169,18	0,61	168,57	6,598	4,02	10,04
169,18	0,58	168,6	7,927	4,60	11,67
169,18	0,53	168,65	9,05	4,80	13,02
169,18	0,48	168,7	9,05	4,34	13,02
169,18	0,52	168,66	9,05	4,71	13,02
169,18	0,6	168,58	9,05	5,43	13,02
169,18	0,58	168,6	9,05	5,25	13,02
169,18	0,59	168,59	9,05	5,34	13,02
169,18	0,6	168,58	9,05	5,43	13,02
169,18	0,54	168,64	9,05	4,89	13,02
169,18	0,44	168,74	9,05	3,98	13,02
169,18	0,59	168,59	9,05	5,34	13,02
169,18	0,58	168,6	8,07	4,68	11,84
169,18	0,44	168,74	9,05	3,98	13,02
169,18	0,56	168,62	9,05	5,07	13,02
169,18	0,59	168,59	9,05	5,34	13,02
169,18	0,56	168,62	9,05	5,07	13,02
169,18	0,52	168,66	6,502	3,38	9,92
169,18	0,59	168,59	6,502	3,84	9,92
169,18	0,59	168,59	10,009	5,91	14,17
169,18	0,56	168,62	10,009	5,61	14,17
169,18	0,52	168,66	9,05	4,71	13,02
169,18	0,59	168,59	9,05	5,34	13,02
169,18	0,56	168,62	9,05	5,07	13,02
169,18	0,58	168,6	9,05	5,25	13,02
169,18	0,44	168,74	9,05	3,98	13,02
169,18	0,56	168,62	9,05	5,07	13,02
169,18	0,59	168,59	9,05	5,34	13,02
169,18	0,56	168,62	9,05	5,07	13,02
169,18	0,52	168,66	9,05	4,71	13,02
169,18	0,52	168,66	1,779	0,93	3,74
TOTAL			**282,026**	**154,91**	**410,90**


EJE´ S2-S1

COTA TRITURADO	ALTURA	COTA TERRENO	AREA	VOL.	AREA GEOTEXTIL
169,18	0,44	168,74	4,941	2,17	7,97
169,18	0,58	168,6	4,941	2,87	7,97
169,18	0,52	168,66	6,598	3,43	10,04
169,18	0,61	168,57	6,598	4,02	10,04
169,18	0,58	168,6	7,927	4,60	11,67
169,18	0,53	168,65	9,05	4,80	13,02
169,18	0,48	168,7	9,05	4,34	13,02
169,18	0,52	168,66	9,05	4,71	13,02
169,18	0,6	168,58	9,05	5,43	13,02
169,18	0,58	168,6	9,05	5,25	13,02
169,18	0,59	168,59	9,05	5,34	13,02
169,18	0,6	168,58	9,05	5,43	13,02
169,18	0,54	168,64	9,05	4,89	13,02
169,18	0,44	168,74	9,05	3,98	13,02
169,18	0,59	168,59	9,05	5,34	13,02
169,18	0,58	168,6	8,07	4,68	11,84
169,18	0,44	168,74	9,05	3,98	13,02
169,18	0,56	168,62	9,05	5,07	13,02
169,18	0,59	168,59	9,05	5,34	13,02
169,18	0,56	168,62	9,05	5,07	13,02
169,18	0,52	168,66	6,502	3,38	9,92
169,18	0,59	168,59	6,502	3,84	9,92
169,18	0,59	168,59	10,009	5,91	14,17
169,18	0,56	168,62	10,009	5,61	14,17
169,18	0,52	168,66	9,05	4,71	13,02
169,18	0,59	168,59	9,05	5,34	13,02
169,18	0,56	168,62	9,05	5,07	13,02
169,18	0,58	168,6	9,05	5,25	13,02
169,18	0,44	168,74	9,05	3,98	13,02
169,18	0,56	168,62	9,05	5,07	13,02
169,18	0,59	168,59	9,05	5,34	13,02
169,18	0,56	168,62	9,05	5,07	13,02
169,18	0,52	168,66	9,05	4,71	13,02
169,18	0,52	168,66	7,87	4,09	11,60
169,18	0,52	168,66	0,05	0,03	0,68
TOTAL			**288,167**	**158,11**	**419,43**

EJE´ S2-S1					
COTA TRITURADO	**ALTURA**	**COTA TERRENO**	**AREA**	**VOL.**	**AREA GEOTEXTIL**

169,18	0,44	168,74	4,941	2,17	7,97
169,18	0,58	168,6	4,941	2,87	7,97
169,18	0,52	168,66	6,598	3,43	10,04
169,18	0,61	168,57	6,598	4,02	10,04
169,18	0,58	168,6	7,927	4,60	11,67
169,18	0,53	168,65	9,05	4,80	13,02
169,18	0,48	168,7	9,05	4,34	13,02
169,18	0,52	168,66	9,05	4,71	13,02
169,18	0,6	168,58	9,05	5,43	13,02
169,18	0,58	168,6	9,05	5,25	13,02
169,18	0,59	168,59	9,05	5,34	13,02
169,18	0,6	168,58	9,05	5,43	13,02
169,18	0,54	168,64	9,05	4,89	13,02
169,18	0,44	168,74	9,05	3,98	13,02
169,18	0,59	168,59	9,05	5,34	13,02
169,18	0,58	168,6	8,07	4,68	11,84
169,18	0,44	168,74	9,05	3,98	13,02
169,18	0,56	168,62	9,05	5,07	13,02
169,18	0,59	168,59	9,05	5,34	13,02
169,18	0,56	168,62	9,05	5,07	13,02
169,18	0,52	168,66	6,502	3,38	9,92
169,18	0,59	168,59	6,502	3,84	9,92
169,18	0,59	168,59	10,009	5,91	14,17
169,18	0,56	168,62	10,009	5,61	14,17
169,18	0,52	168,66	9,05	4,71	13,02
169,18	0,59	168,59	9,05	5,34	13,02
169,18	0,56	168,62	9,05	5,07	13,02
169,18	0,58	168,6	9,05	5,25	13,02
169,18	0,44	168,74	9,05	3,98	13,02
169,18	0,56	168,62	9,05	5,07	13,02
169,18	0,59	168,59	9,05	5,34	13,02
169,18	0,56	168,62	9,05	5,07	13,02
169,18	0,52	168,66	9,05	4,71	13,02
169,18	0,52	168,66	9	4,68	12,96
169,18	0,52	168,66	4,3	2,24	7,15
TOTAL			**293,547**	**160,90**	**427,26**

TOTAL M3 TRITURADO:	**1.216,16**

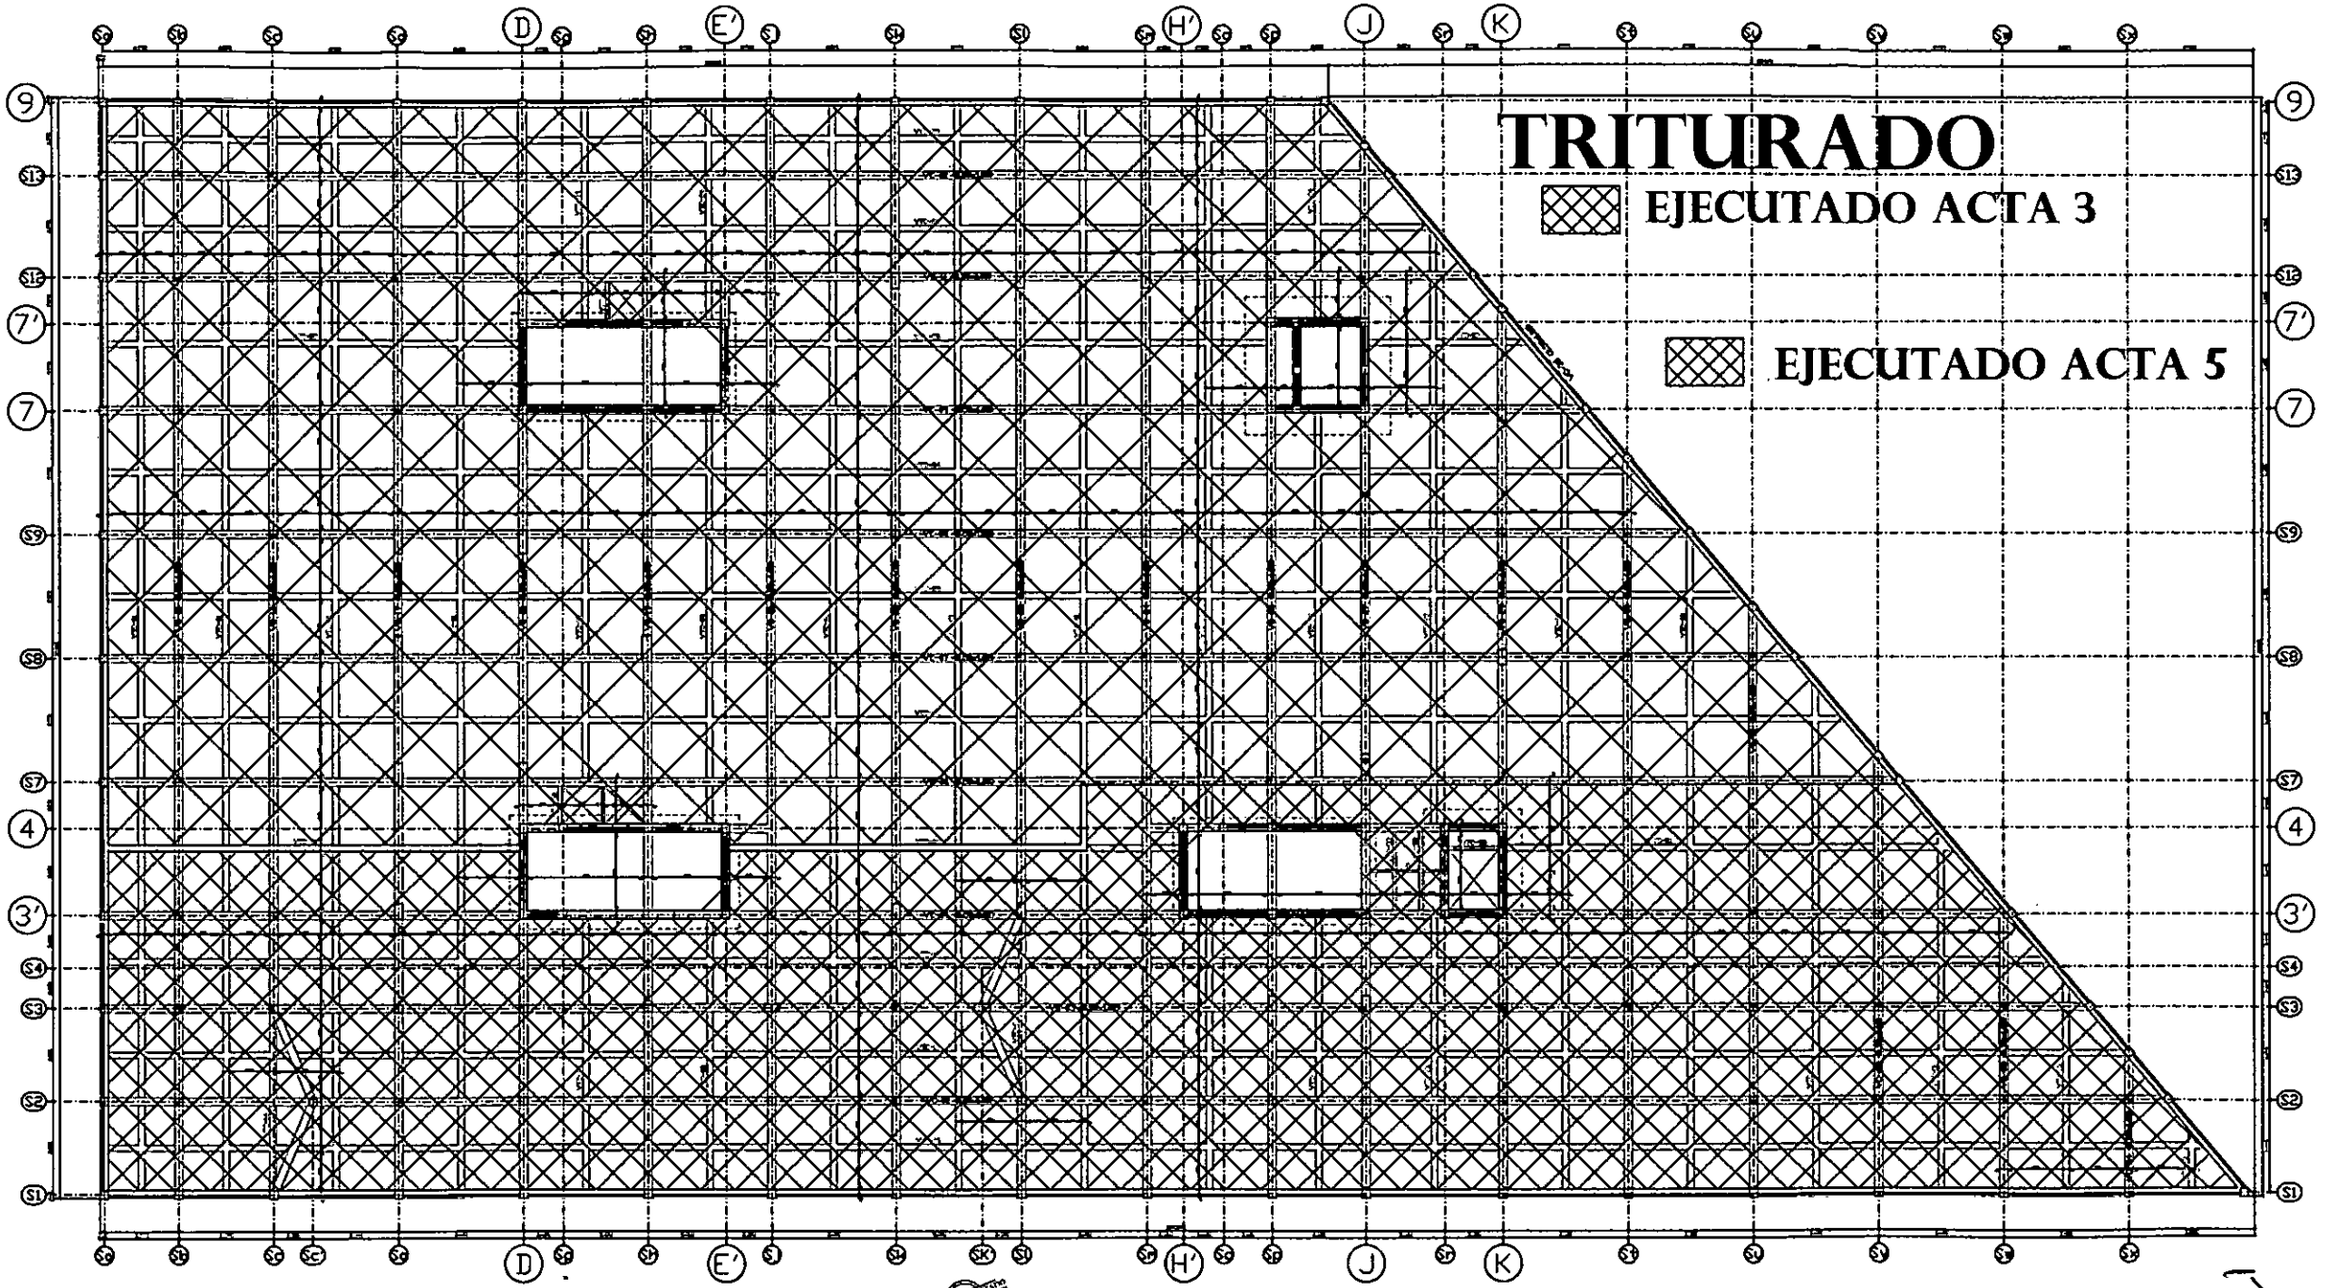

FORMALETA NIVEL Ne. -2.90
CIMENTACION

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 5 — 02/03/2022 AL 30/04/2022


OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR				
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	15,3	ITEM	15.3.1	Cable Cu No. 2/0 AWG desnudo	UNID. ML


PLANOS

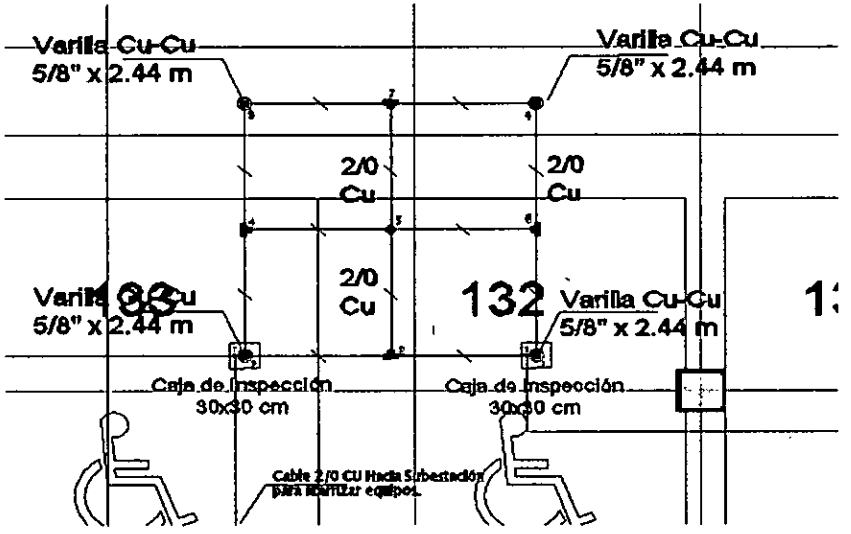

PLANO 1: MALLA DE SPT
Números en Amarilla corresponde a la numeración de los puntos de soldadura Cable-Cable
Números en Naranja corresponden a la numeración de las Varillas con puntos de soldadura Cable-Varilla

REGISTRO FOTOGRÁFICO

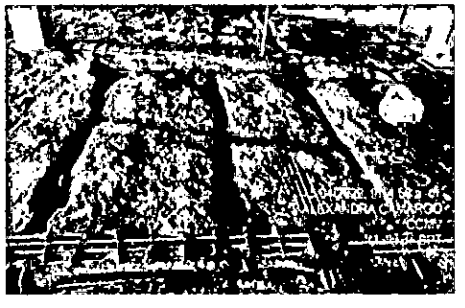

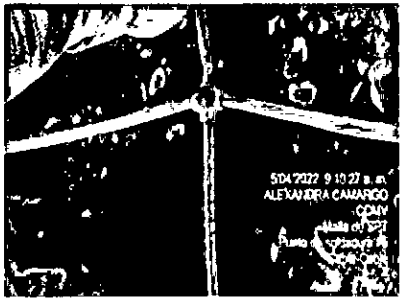

LOCALIZACIÒN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	sobre ancho	CANT	UND
Malla SPT - de Varilla 1(Entre ejes E' a sj & s7 a s8) a Varilla 2 (Entre ejes sh a E' & s7 a s8)	3,9				1	3,90
Malla SPT - de Varilla 2 (Entre ejes sh a E' & s7 a s8) a Varilla 3 (Entre ejes sh a E' & s7 a s8)	3,88				1	3,88
Malla SPT - de Varilla 3 (Entre ejes sh a E' & s7 a s8) a Varilla 4 (Entre ejes E' a sj & s7 a s8)	4,56				1	4,56
Malla SPT - de Varilla 4 (Entre ejes E' a sj & s7 a s8) a Varilla 1 (Entre ejes E' a sj & s7 a s8)	2,85				1	2,85
Malla de Punto de soldadura Cable-Cable 2 (Entre ejes sh a E' & s7 a s8) a Punto de soldadura Cable-Cable 7 (Entre ejes sh a E' & s7 a s8)	3,80				1	3,80
Malla de Punto de soldadura 4 (Entre ejes E' a sj & s7 a s8) a Punto de soldadura 6 (Entre ejes E' a sj & s7 a s8)	3,60				1	3,60
Cola Desde Registro 2 de SPT (Entre ejes Sh a E' & s7 a s8) hacia Subestación eléctrica (Entre ejes Sg a Sh & 3' a 4)	12,00				1	12,00
Cable en Registros 1 Malla SPT (Entre ejes E' a sj & s7 a s8)	0,74				1	0,74
Cable en Registros 2 Malla SPT (Entre ejes sh a E' & s7 a s8)	1,59				1	1,59
Cable en Punto de soldadura Varilla 3 Malla SPT (Entre ejes sh a E' & s7 a s8)	0,64				1	0,64
Cable en Punto de soldadura Varilla 4 Malla SPT (Entre ejes E' a sj & s7 a s8)	0,43				1	0,43

1571

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 5 — 02/03/2022 AL 30/04/2022


OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR		
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0
CONTRATO No.	2021040002		
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2
CONTRATO No.	2021050007		
CAPÍTULO	15,3	ITEM	15.3.1

Cable Cu No. 2/0 AWG desnudo — UNID. ML

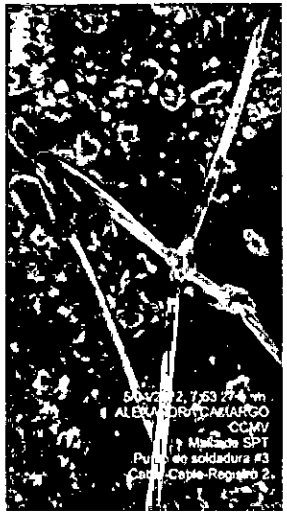







LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	sobre ancho	CANT	UND
					SUBTOTAL	37,99
				CANTIDAD ACTA Parcial No 1	-	
				CANTIDAD ACTA Parcial No 2	-	
				CANTIDAD ACTA Parcial No 3	-	
				CANTIDAD ACTA Parcial No 4	-	
				CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 5	37,99	
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	37,99	
				CANTIDAD CONTRACTUAL	40,00	
				PENDIENTE POR PAGAR	2,01	
				TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		37,99


Nombre: ALEXANDRA CAMARGO SERNA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: CARLOS FRANCO
ASESOR TECNICO INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR


Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

12.152

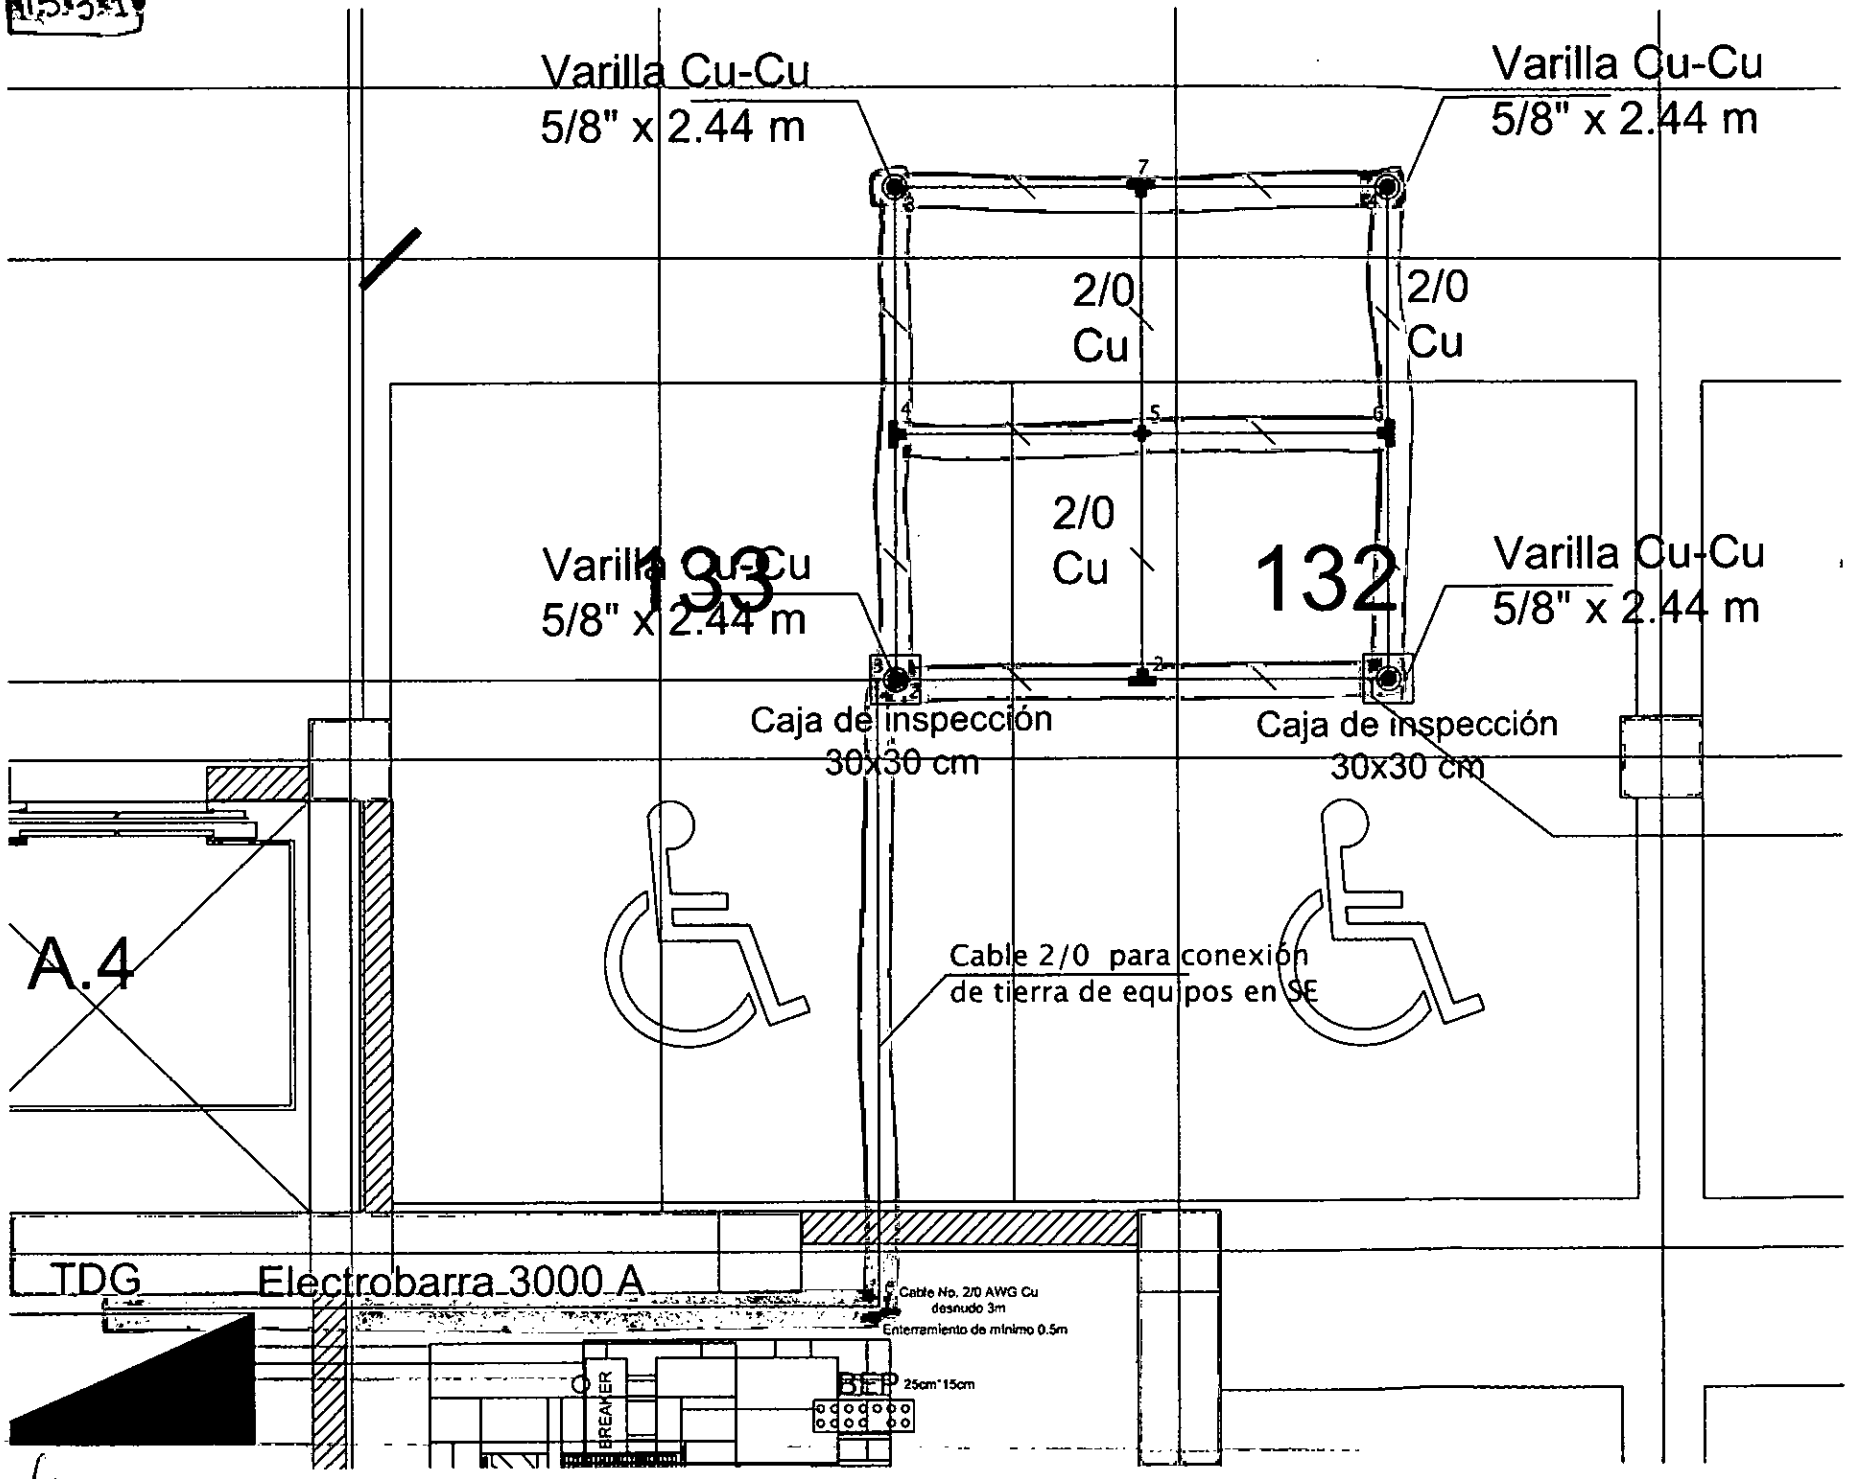
Varilla Cu-Cu
5/8" x 2.44 m
Varilla Cu-Cu
5/8" x 2.44 m
2/0
Cu
2/0
Cu
2/0
Cu
133
132
Varilla Cu-Cu
5/8" x 2.44 m
Varilla Cu-Cu
5/8" x 2.44 m
Caja de inspección
30x30 cm
Caja de inspección
30x30 cm
A.4
Cable 2/0 para conexión
de tierra de equipos en SE
TDG
Electrobarra 3000 A
Cable No. 2/0 AWG Cu
desnudo 3m
Enterramiento de mínimo 0.5m
BREAKER
BEP
25cm*15cm

13.154

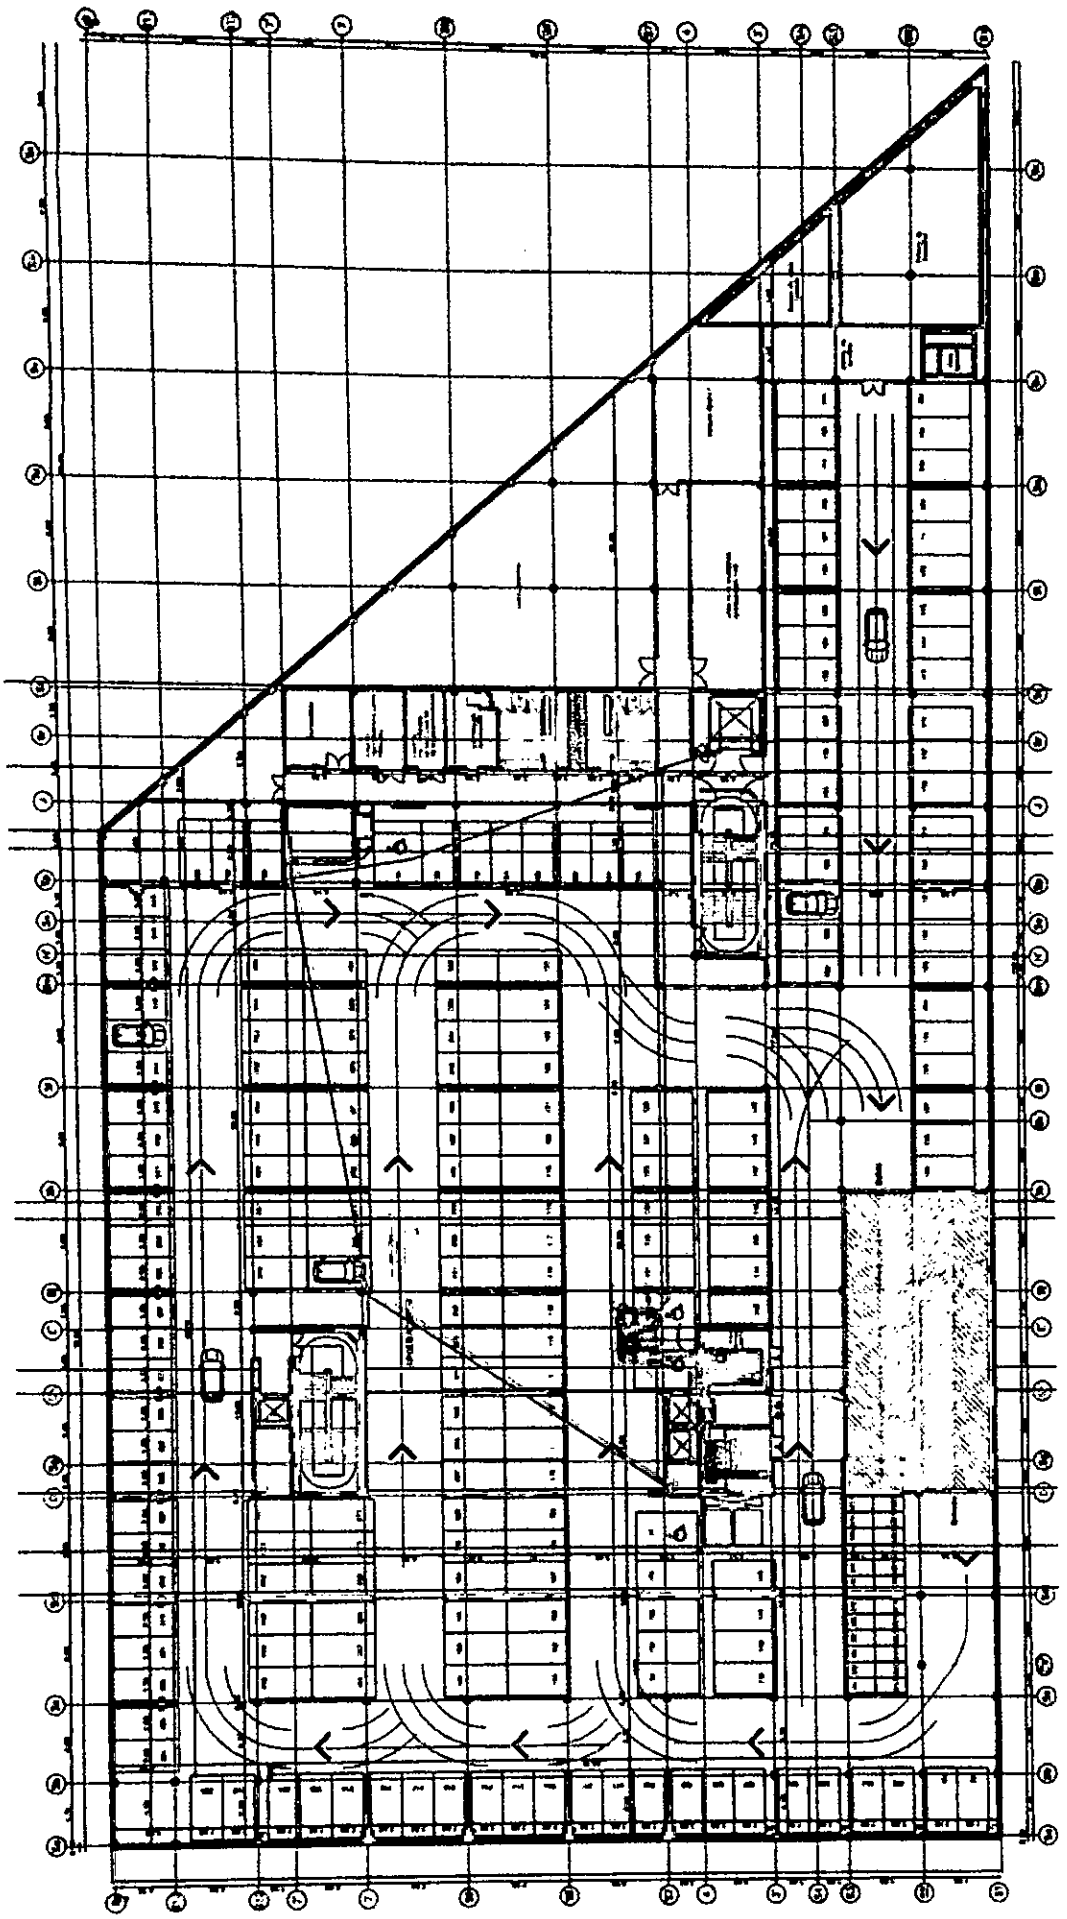

5.3.1

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CA. ADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 5


02/03/2022 AL 30/04/2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007

CAPÍTULO	15,3	ITEM	15.3.2	Soldadura exotérmica 150 ó 200g (cable-cable en T	UNID.	UND

PLANOS

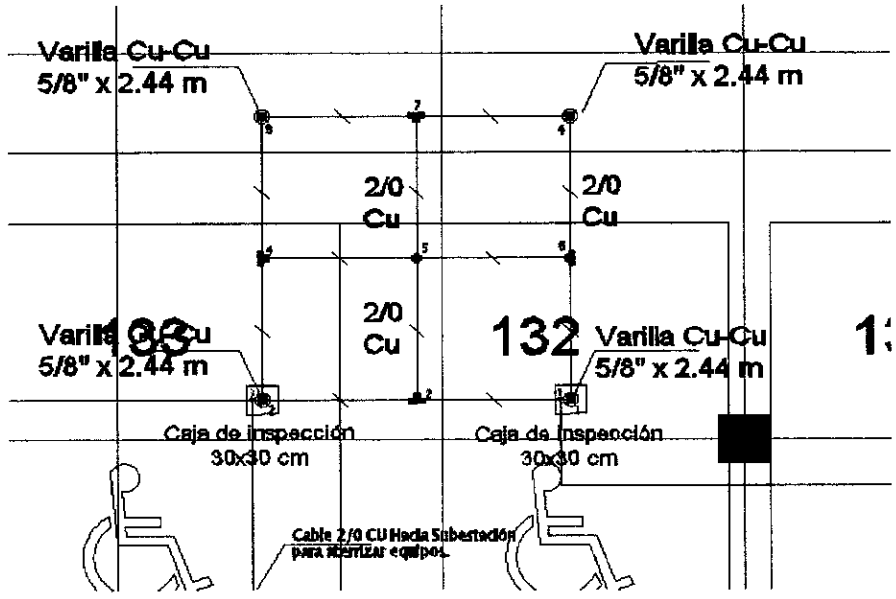

PLANO 1: MALLA DE SPT

Números en Amarillo corresponden a la numeración de los puntos de soldadura Cable-Cable

Números en Naranja corresponden a la numeración de las puntos de soldadura Varilla-Cable

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	sobre ancho	CANT	UND
Malla SPT - Varilla 1(Entre ejes E' a sj & s7 a s8)					1	1,00
Malla SPT - Varilla 2 (Entre ejes sh a E' & s7 a s8)					1	1,00
Malla SPT - Varilla 3 (Entre ejes sh a E' & s7 a s8)					1	1,00
Malla SPT - Varilla 4 (Entre ejes E' a sj & s7 a s8)					1	1,00
Malla SPT -Punto de Soldadura Cable-Cable 1 (Entre ejes E' a sj & s7 a s8)					1	1,00
Malla SPT -Punto de Soldadura Cable-Cable 2 (Entre ejes sh a E' & s7 a s8)					1	1,00
Malla SPT -Punto de Soldadura Cable-Cable 3(Entre ejes sh a E' & s7 a s8)					1	1,00
Malla SPT -Punto de Soldadura Cable-Cable 4 (Entre ejes E' a sj & s7 a s8)					1	1,00
Malla SPT -Punto de Soldadura Cable-Cable 5 (Entre ejes sh a E' & s7 a s8)					1	1,00
Malla SPT -Punto de Soldadura Cable-Cable 6 (Entre ejes E' a sj & s7 a s8)					1	1,00
Malla SPT -Punto de Soldadura Cable-Cable 7 (Entre ejes sh a E' & s7 a s8)					1	1,00

17.55

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CA[illegible]ADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 5


02/03/2022 AL 30/04/2022


OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR						
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.		NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002	
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR		NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007	
CAPÍTULO	15,3	ITEM	15.3.2	Soldadura exotérmica 150 ó 200g (cable-cable en T		UNID.	UND


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANT	UND
	LARGO	ANCHO	ALTO	sobre ancho		

















13456

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CAN[illegible]ADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 5


02/03/2022 AL 30/04/2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007

CAPÍTULO	15,3	ITEM	15.3.2	Soldadura exotérmica 150 ó 200g (cable-cable en T	UNID.	UND







LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	sobre ancho	CANT	UND
					SUBTOTAL	11,00
					CANTIDAD ACTA Parcial No 1	-
					CANTIDAD ACTA Parcial No 2	-
					CANTIDAD ACTA Parcial No 3	-
					CANTIDAD ACTA Parcial No 4	-
					CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 5	11,00
					TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	11,00
					CANTIDAD CONTRACTUAL	16,00
					PENDIENTE POR PAGAR	5,00
					TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	11,00


Nombre: ALEXANDRA CAMARGO SERNA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: CARLOS FRANCO
ASESOR TECNICO INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR


Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

13-158

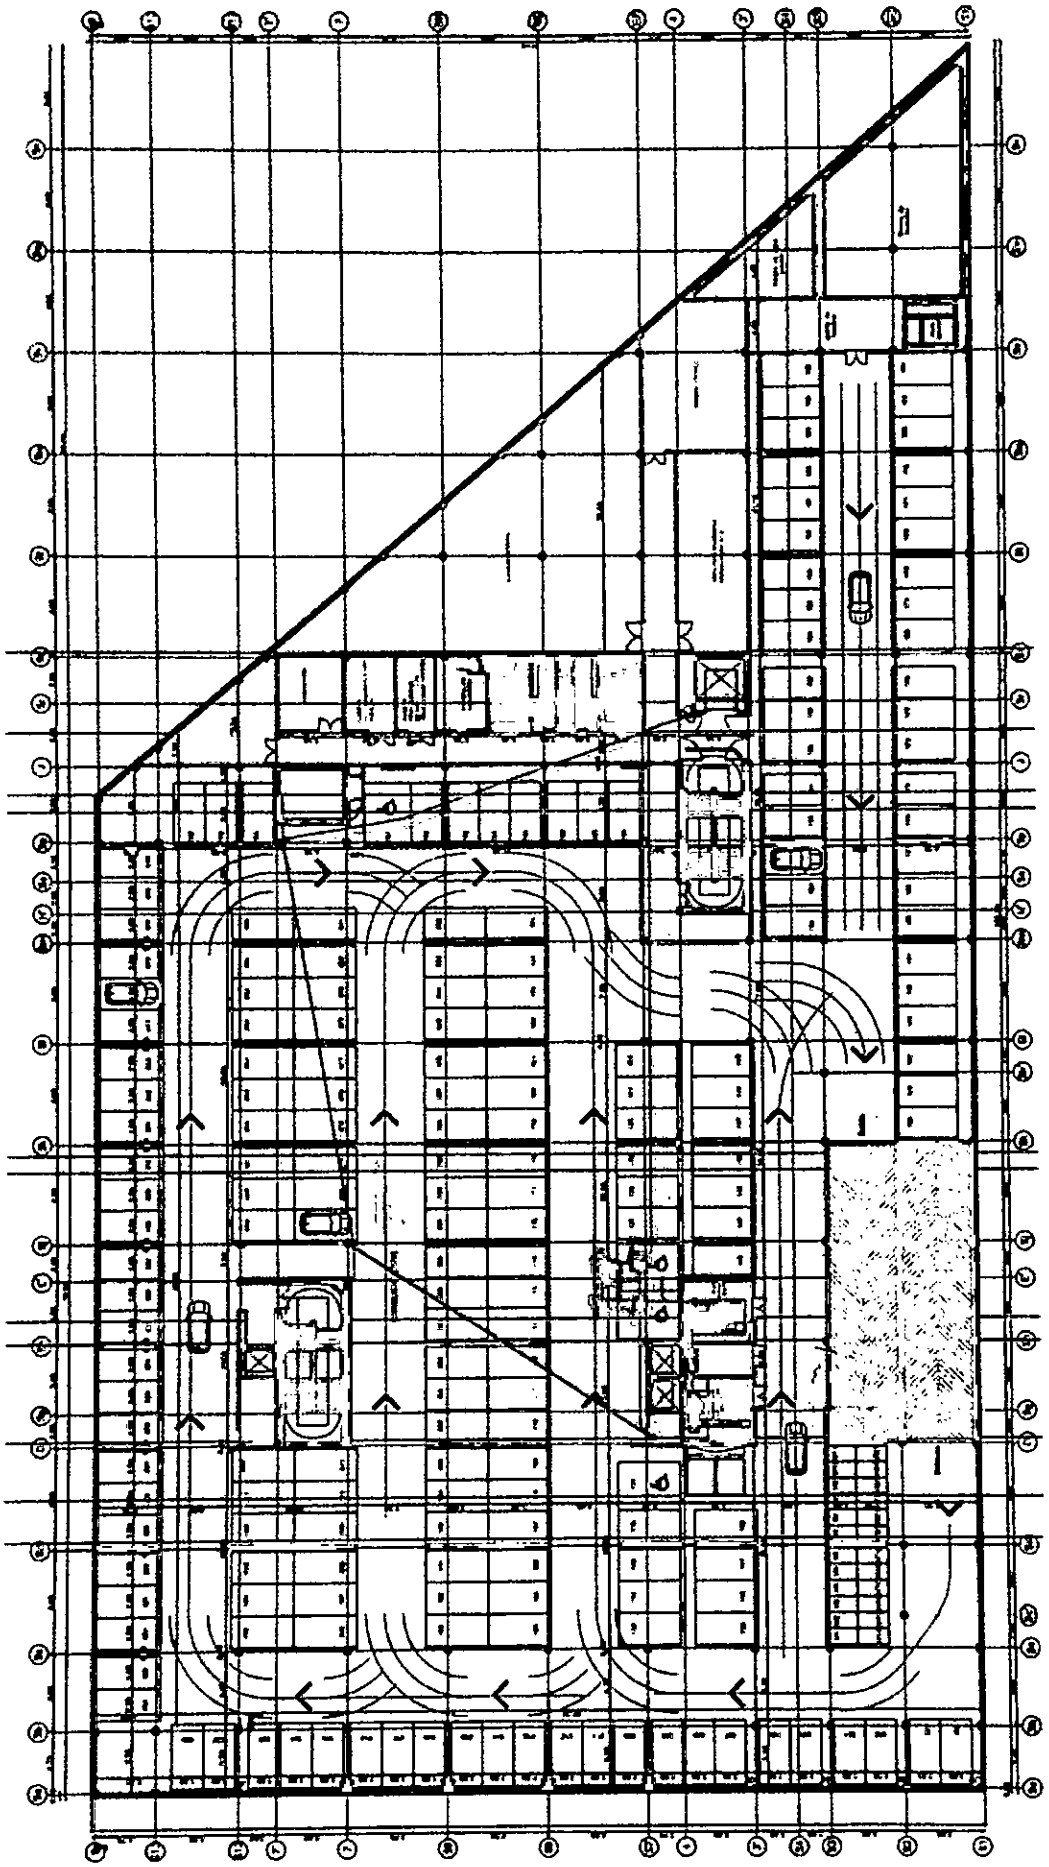

15.3.2

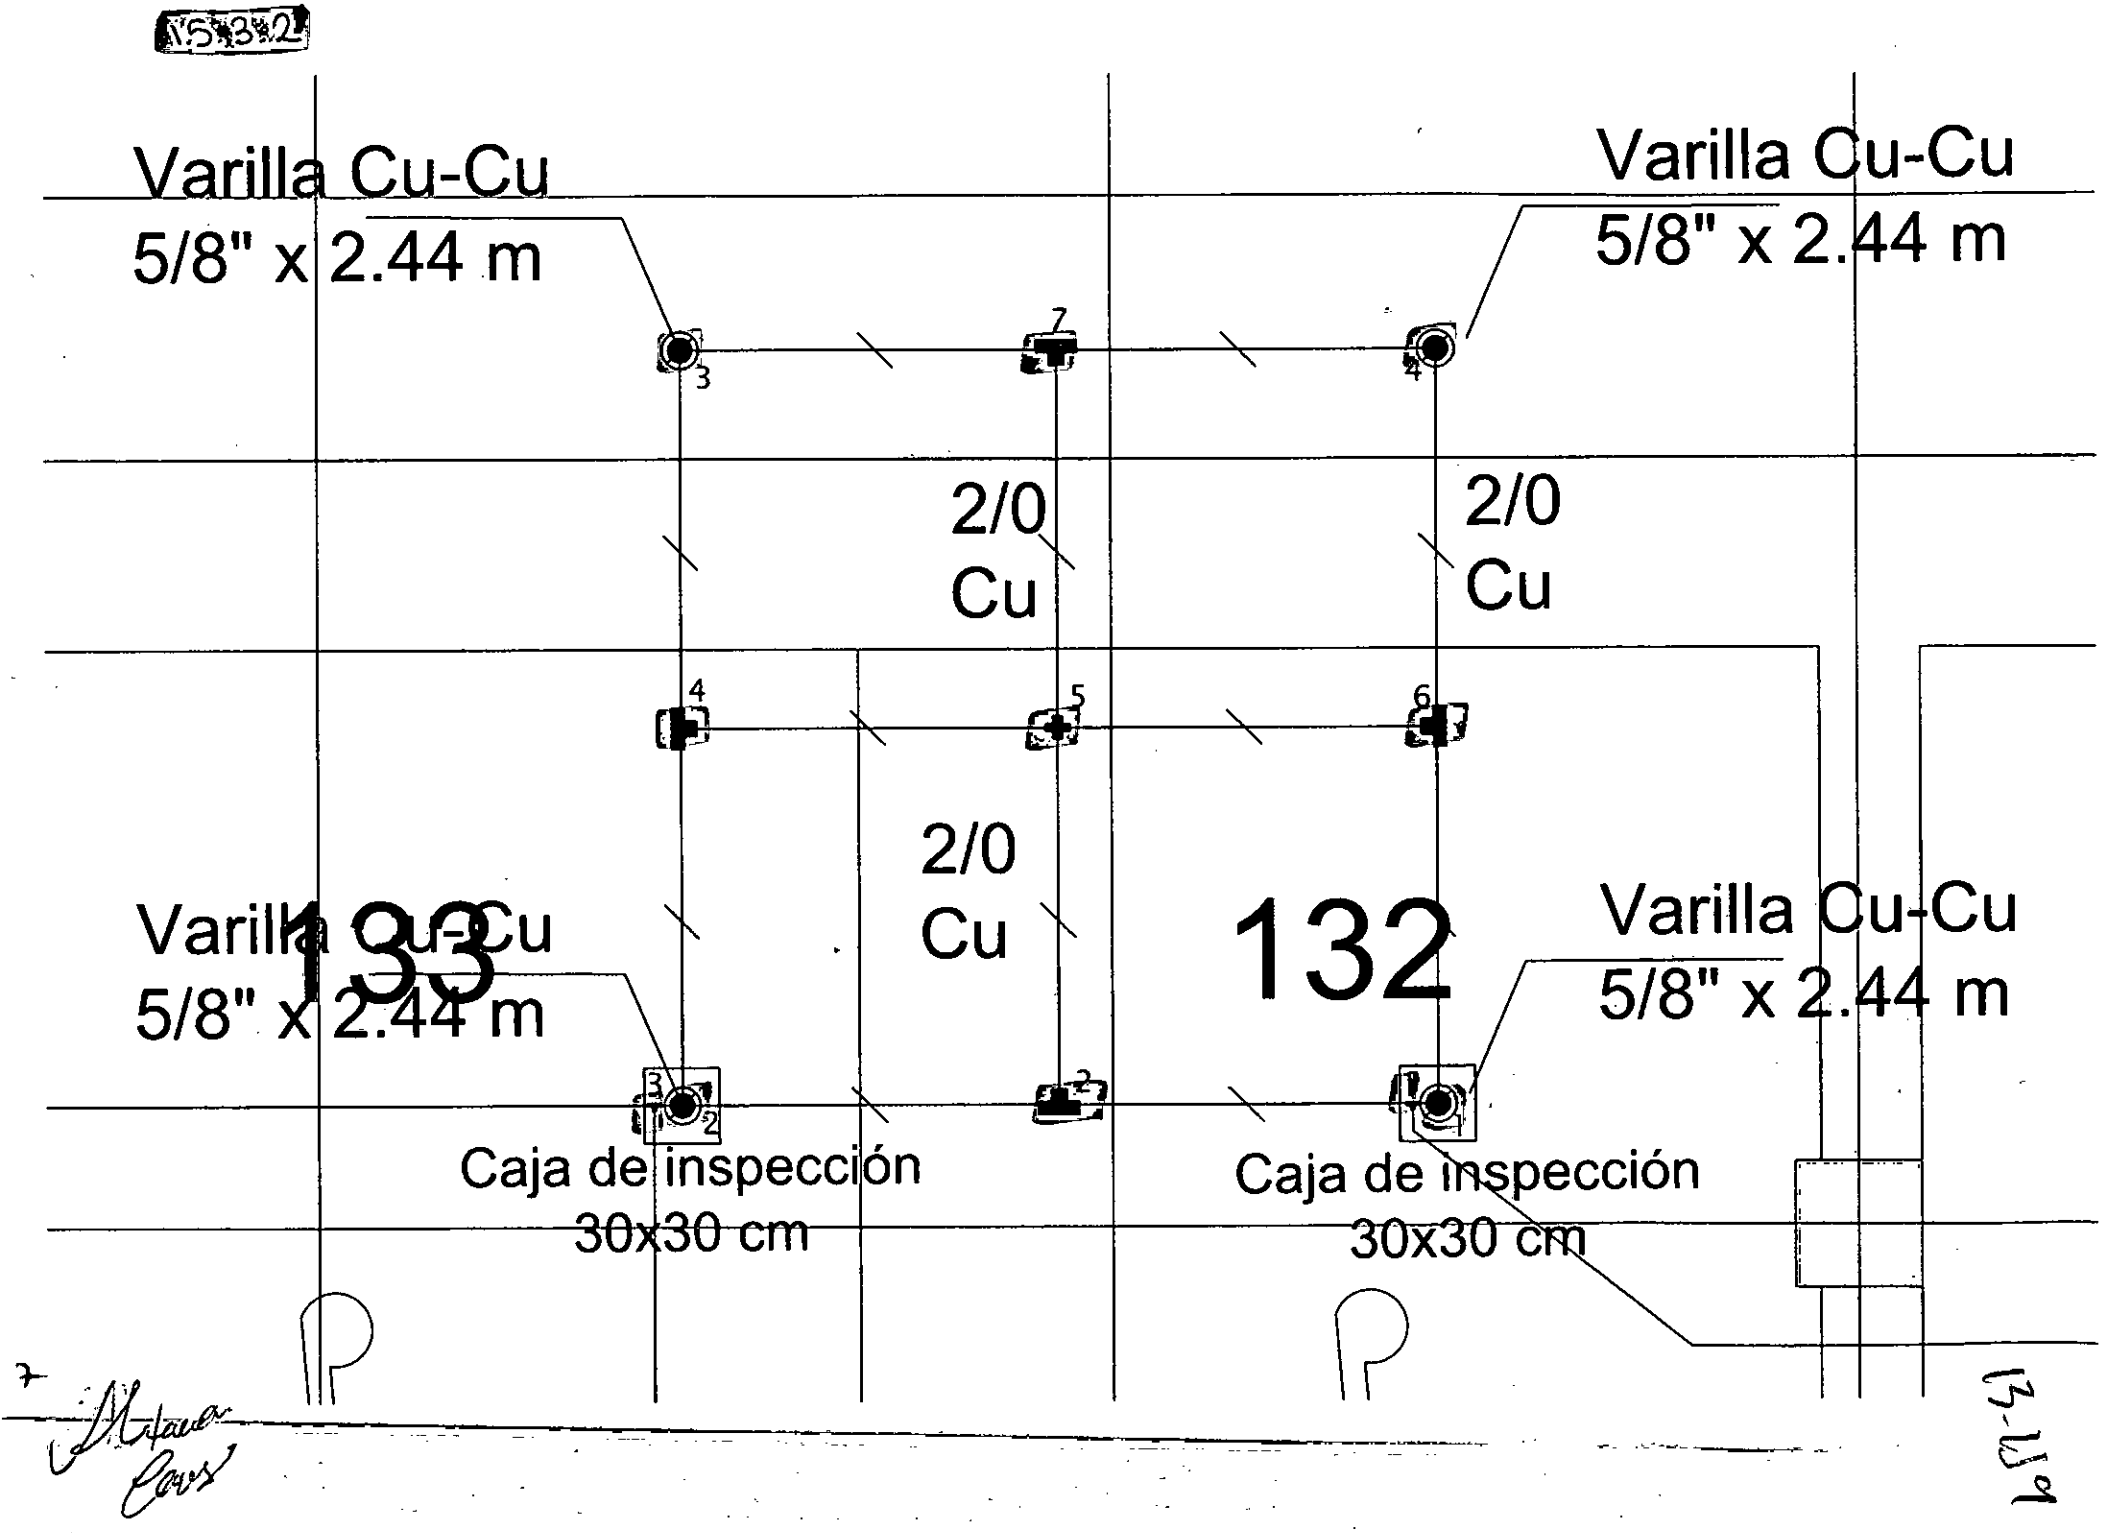
Varilla Cu-Cu
5/8" x 2.44 m
Varilla Cu-Cu
5/8" x 2.44 m
2/0
Cu
2/0
Cu
2/0
Cu
133
132
Varilla Cu-Cu
5/8" x 2.44 m
Varilla Cu-Cu
5/8" x 2.44 m
Caja de inspección
30x30 cm
Caja de inspección
30x30 cm

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIL ES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 5 | 02/03/2022 AL 30/04/2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A. — NIT 890115406-0 — CONTRATO No. 2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR — NIT 901493970-2 — CONTRATO No. 2021050007
CAPÍTULO	15,3 — ITEM 15.3.5 — Electrodo de Cu para puesta a tierra de 5/8"x2,4m — UNID. UND

PLANOS

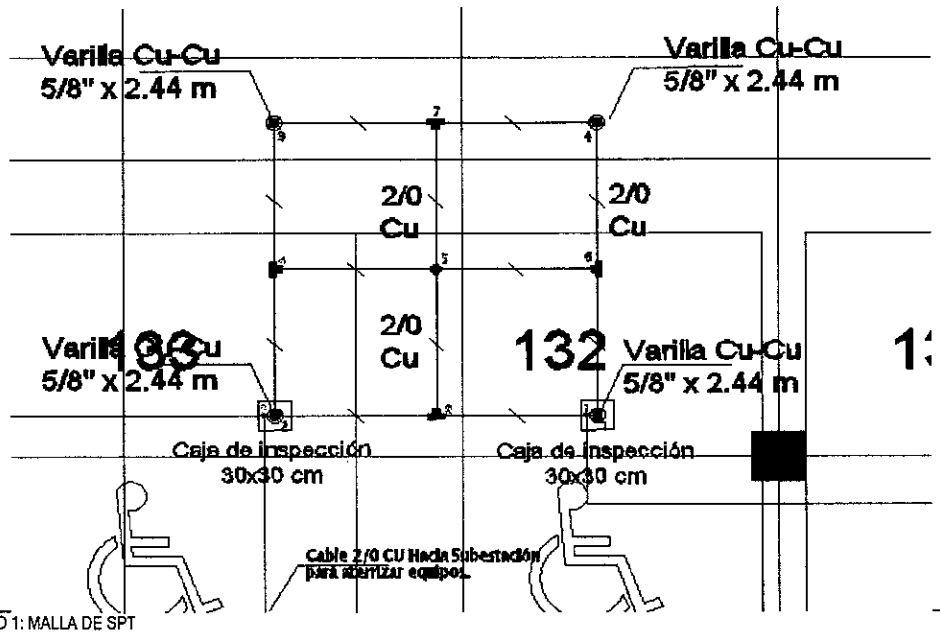

PLANO 1: MALLA DE SPT
Números en Amarilla corresponde a la numeración de los puntos de soldadura
Números en Naranja corresponden a la numeración de las Varillas

REGISTRO FOTOGRÁFICO



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	sobre ancho	CANT	UND
Varilla 1 (Entre ejes E' a sj & s7 a s8)					1	1,00
Varilla 2 (Entre ejes sh a E' & s7 a s8)					1	1,00
Varilla 3 (Entre ejes sh a E' & s7 a s8)					1	1,00
Varilla 4 (Entre ejes E' a sj & s7 a s8)					1	1,00

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTII ES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 5

02/03/2022 AL 30/04/2022


OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR


CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007


CAPÍTULO	15,3	ITEM	15.3.5	Electrodo de Cu para puesta a tierra de 5/8"x2,4m	UNID.	UND

LOCALIZACIÒN	DIMENSIONES				CANT	UND
	LARGO	ANCHO	ALTO	sobre ancho		
					SUBTOTAL	4,00
					CANTIDAD ACTA Parcial No 1	-
					CANTIDAD ACTA Parcial No 2	-
					CANTIDAD ACTA Parcial No 3	-
					CANTIDAD ACTA Parcial No 4	-
					CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 5	4,00
					TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	4,00
					CANTIDAD CONTRACTUAL	9,00
					PENDIENTE POR PAGAR	5,00
					TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	4,00







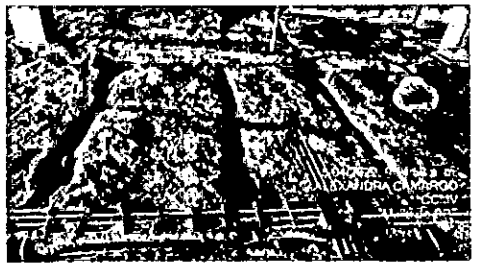


Nombre: ALEXANDRA CAMARGO SERNA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: CARLOS FRANCO
ASESOR TECNICO INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR


Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Folio 23

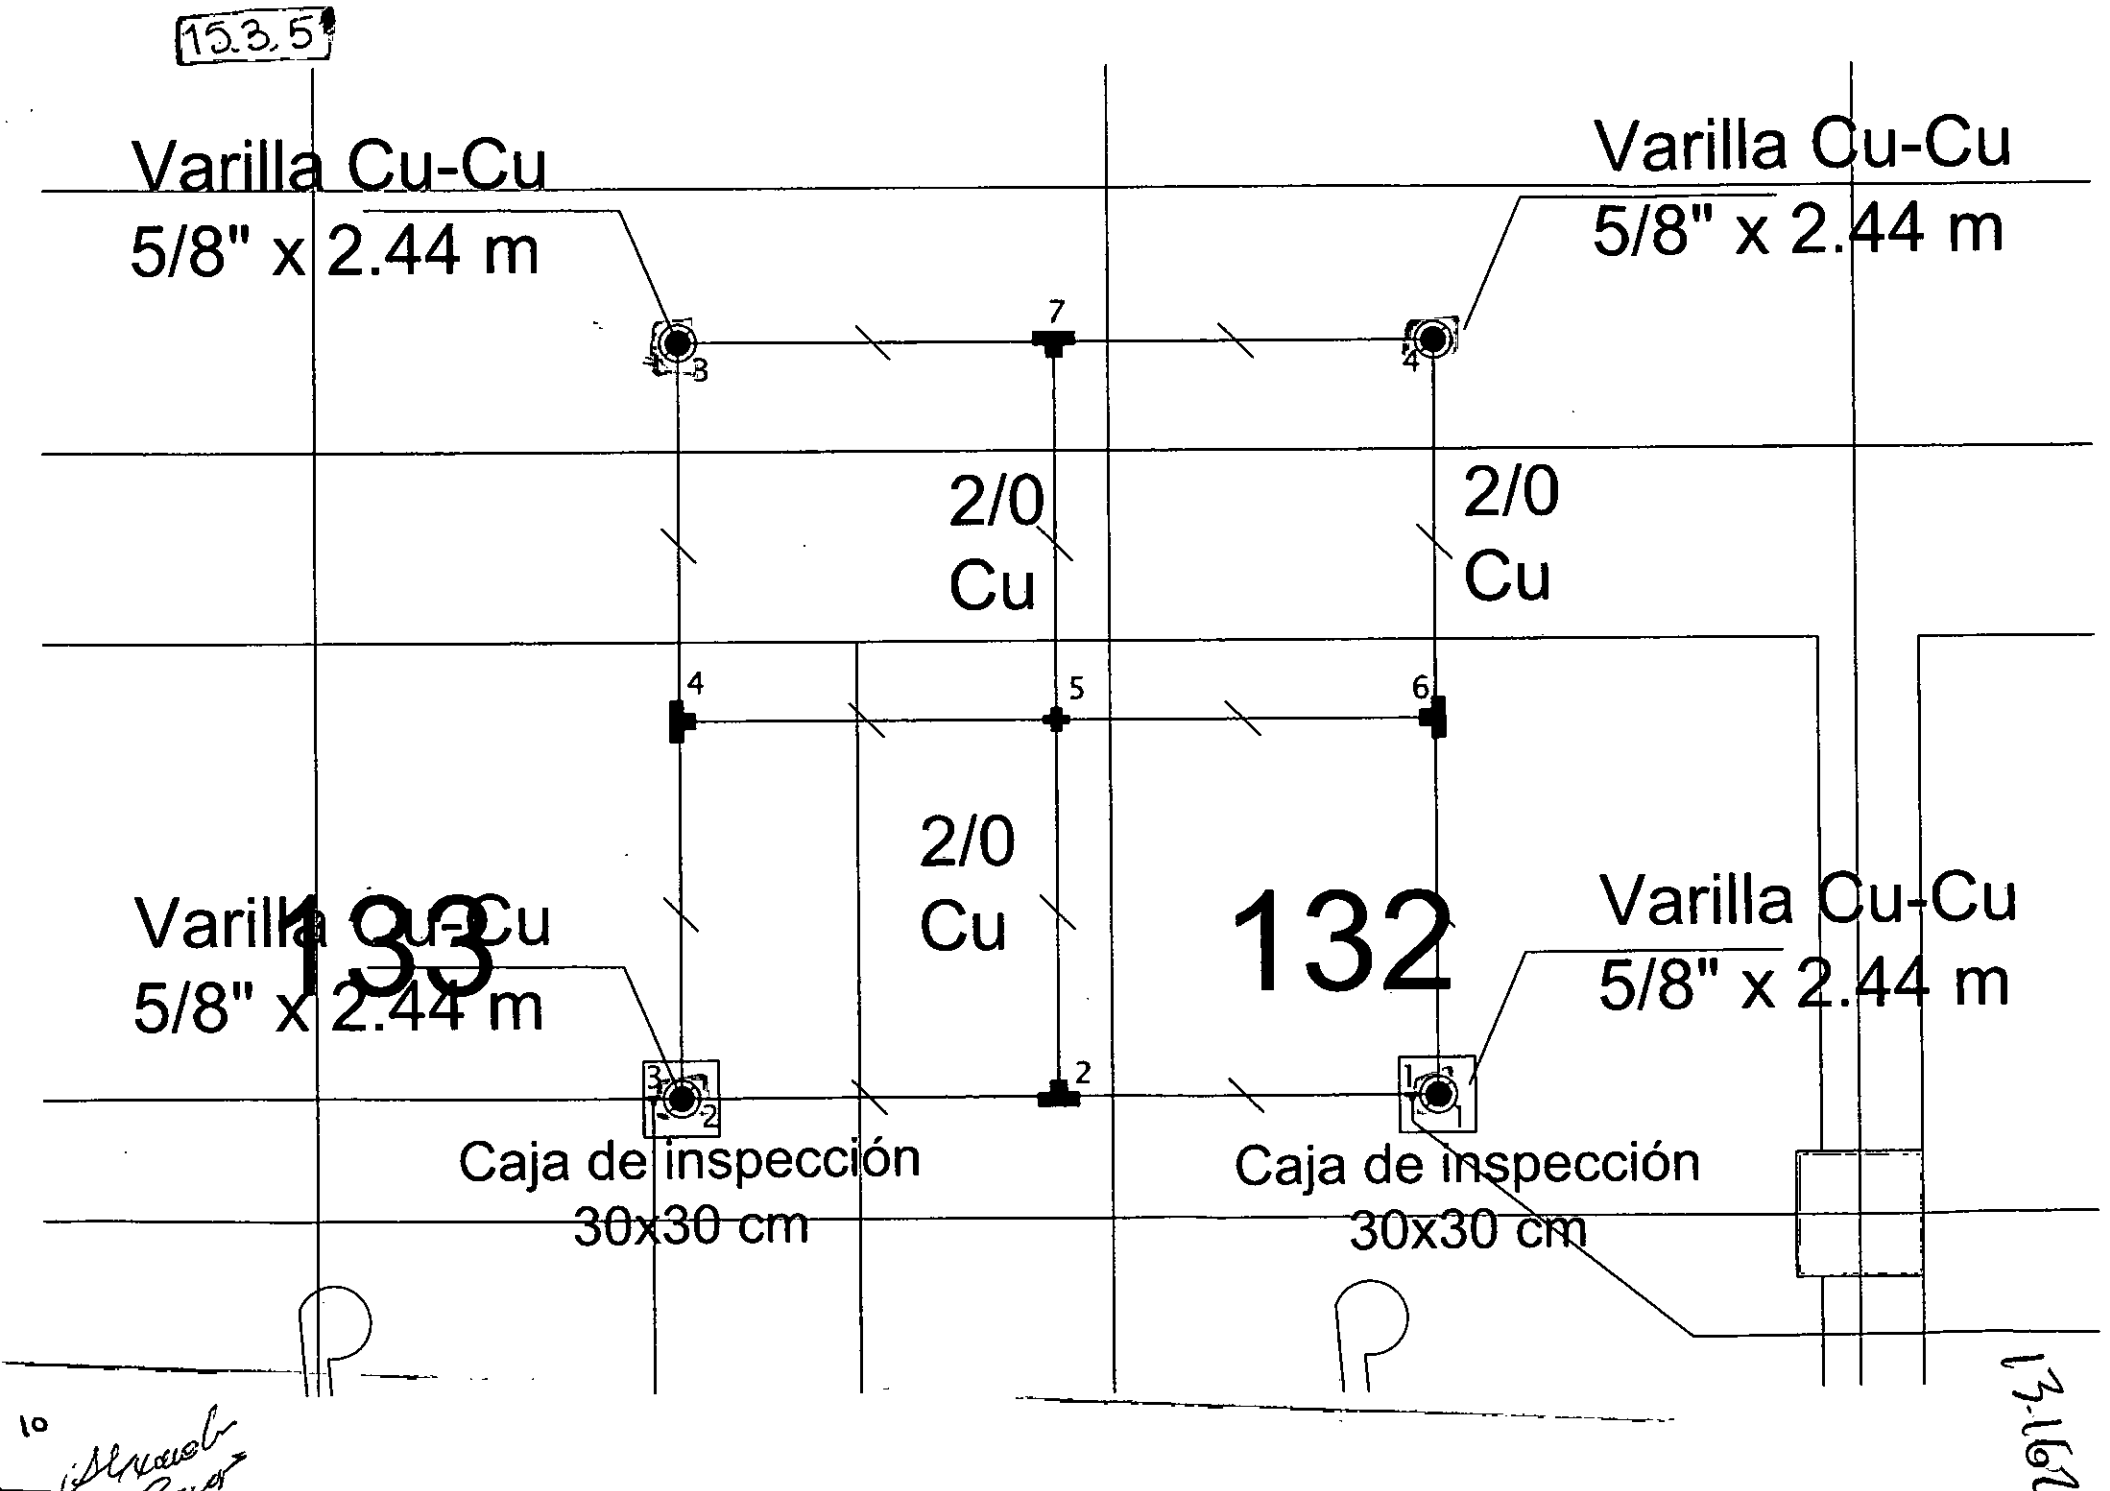
15.3.5
Varilla Cu-Cu
5/8" x 2.44 m
Varilla Cu-Cu
5/8" x 2.44 m
7
3
4
2/0
Cu
2/0
Cu
4
5
6
2/0
Cu
133
132
Varilla Cu-Cu
5/8" x 2.44 m
Varilla Cu-Cu
5/8" x 2.44 m
2
Caja de inspección
30x30 cm
Caja de inspección
30x30 cm

13-163

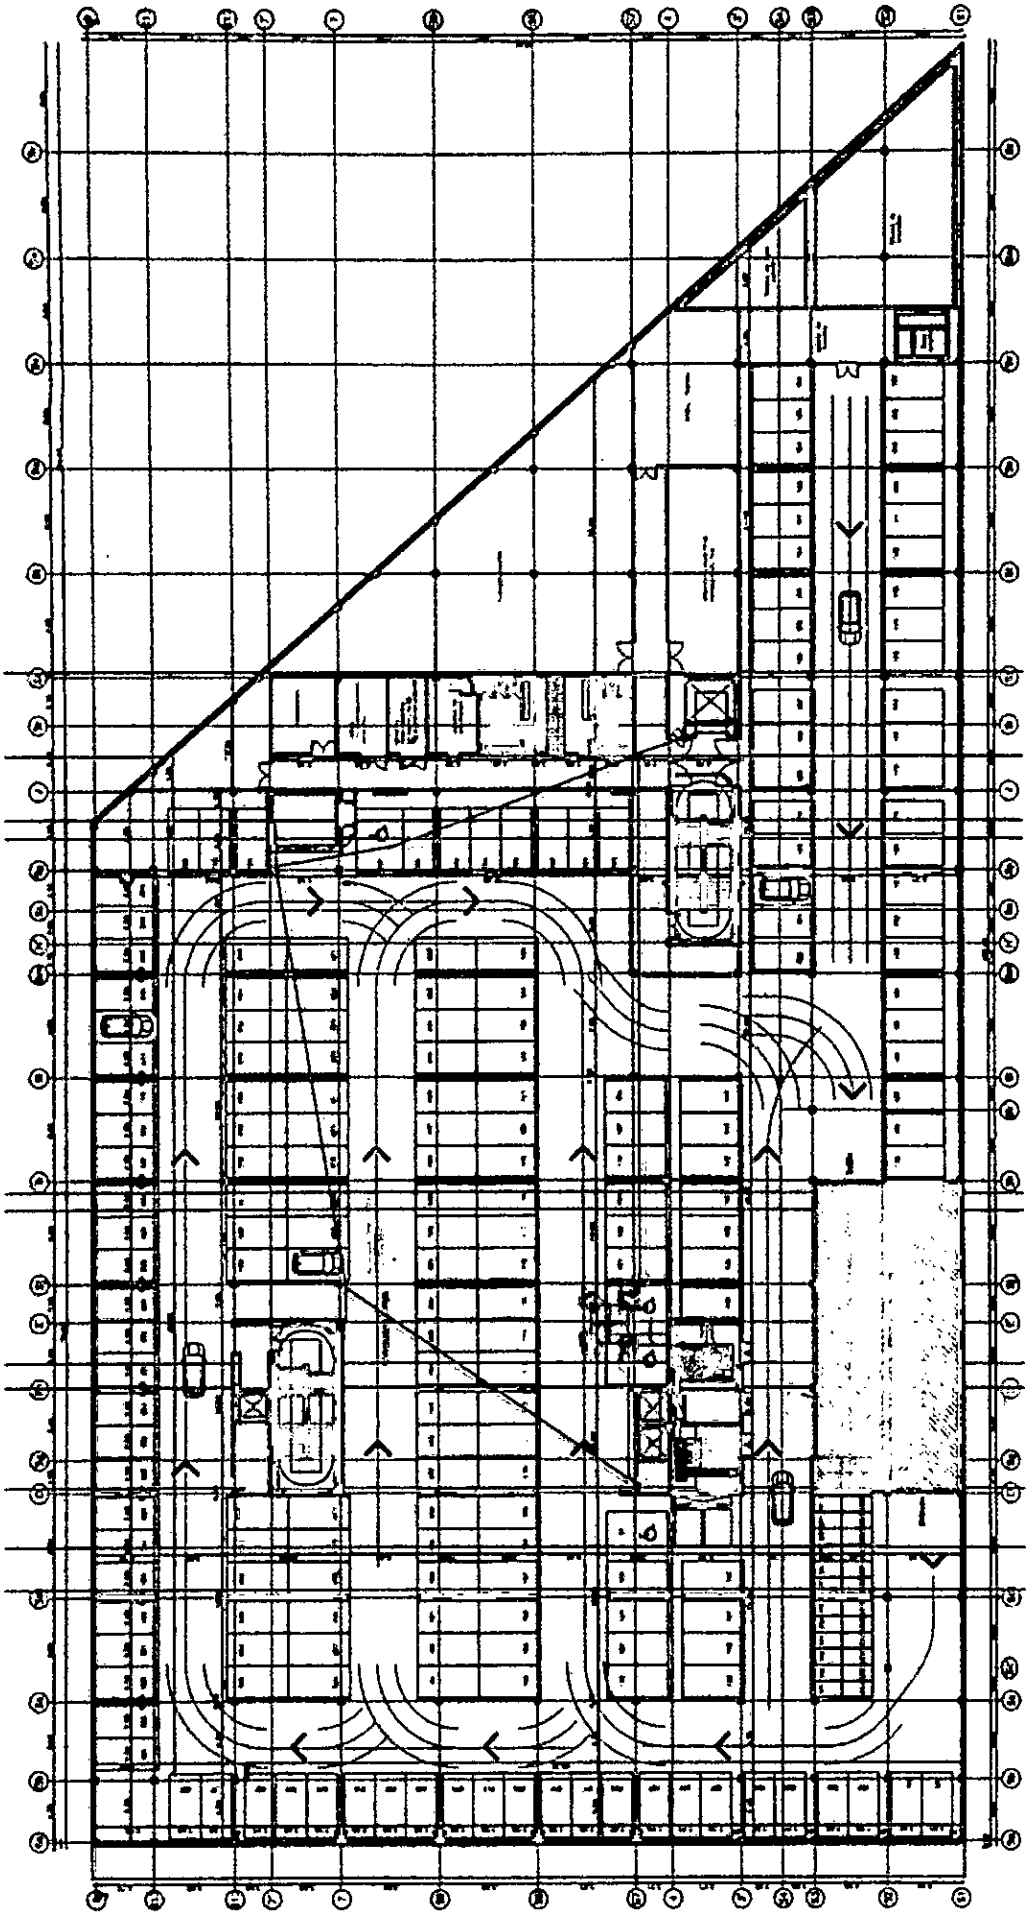

15.3.5

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 5

02/03/2022 AL 30/04/2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR


CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007

CAPÍTULO	15,3	ITEM	15.22.6

Varilla copperweld 5/8"x2,4 mts

UNID. UND

PLANOS

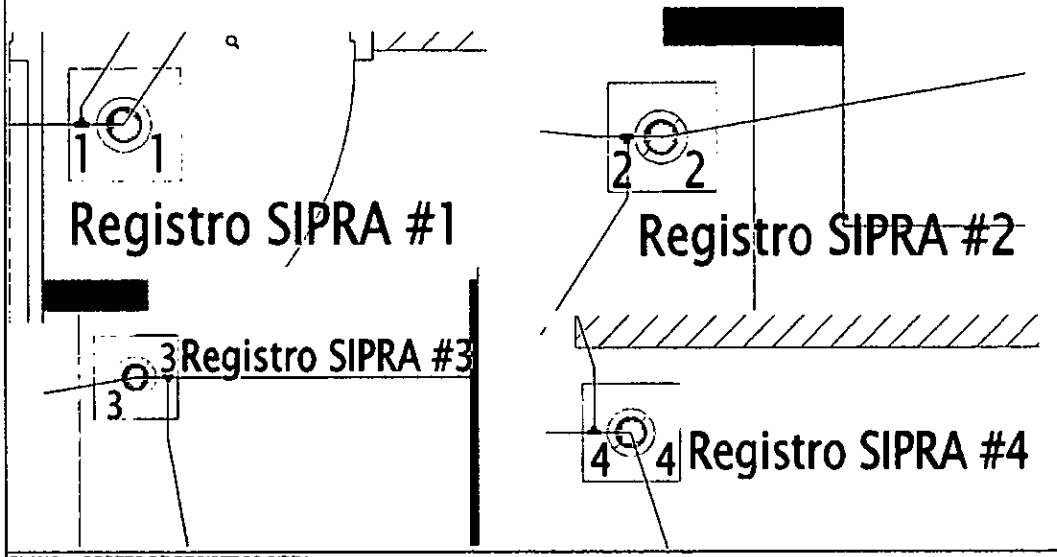

PLANO 1: CORTES DE REGISTROS SIPRA
La Numeración azul corresponde a los punntos de soldadura Varilla-Cable
La Numertación Violeta corresponde a los puntos de soldadura cable-cable

REGISTRO FOTOGRAFICO



LOCALIZACIÒN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	sobre ancho	CANT	UND
Registro 1 SIPRA (Entre ejes D a sg & 4 a s7)					1	1,00
Registro 2 SIPRA (Entre ejes E' a Sj & sg a 7)					1	1,00
Registro 3 SIPRA (Entre ejes Sp a J & 7 a 7')					1	1,00
Registro 4 SIPRA (Entre ejes J a Sr & 4 a s7)					1	1,00

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 5 — 02/03/2022 AL 30/04/2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007

CAPÍTULO	15,3	ITEM	15.22.6	Varilla copperweld 5/8"x2,4 mts	UNID.	UND







LOCALIZACIÒN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	sobre ancho	CANT	UND
					SUBTOTAL	4,00
				CANTIDAD ACTA Parcial No 1	-	
				CANTIDAD ACTA Parcial No 2	-	
				CANTIDAD ACTA Parcial No 3	-	
				CANTIDAD ACTA Parcial No 4	-	
				CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 5	4,00	
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	4,00	
				CANTIDAD CONTRACTUAL	8,00	
				PENDIENTE POR PAGAR	4,00	
				TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		4,00

Nombre: ALEXANDRA CAMARGO SERNA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.


Nombre: CARLOS FRANCO
ASESOR TECNICO INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

13.165

15.22.6

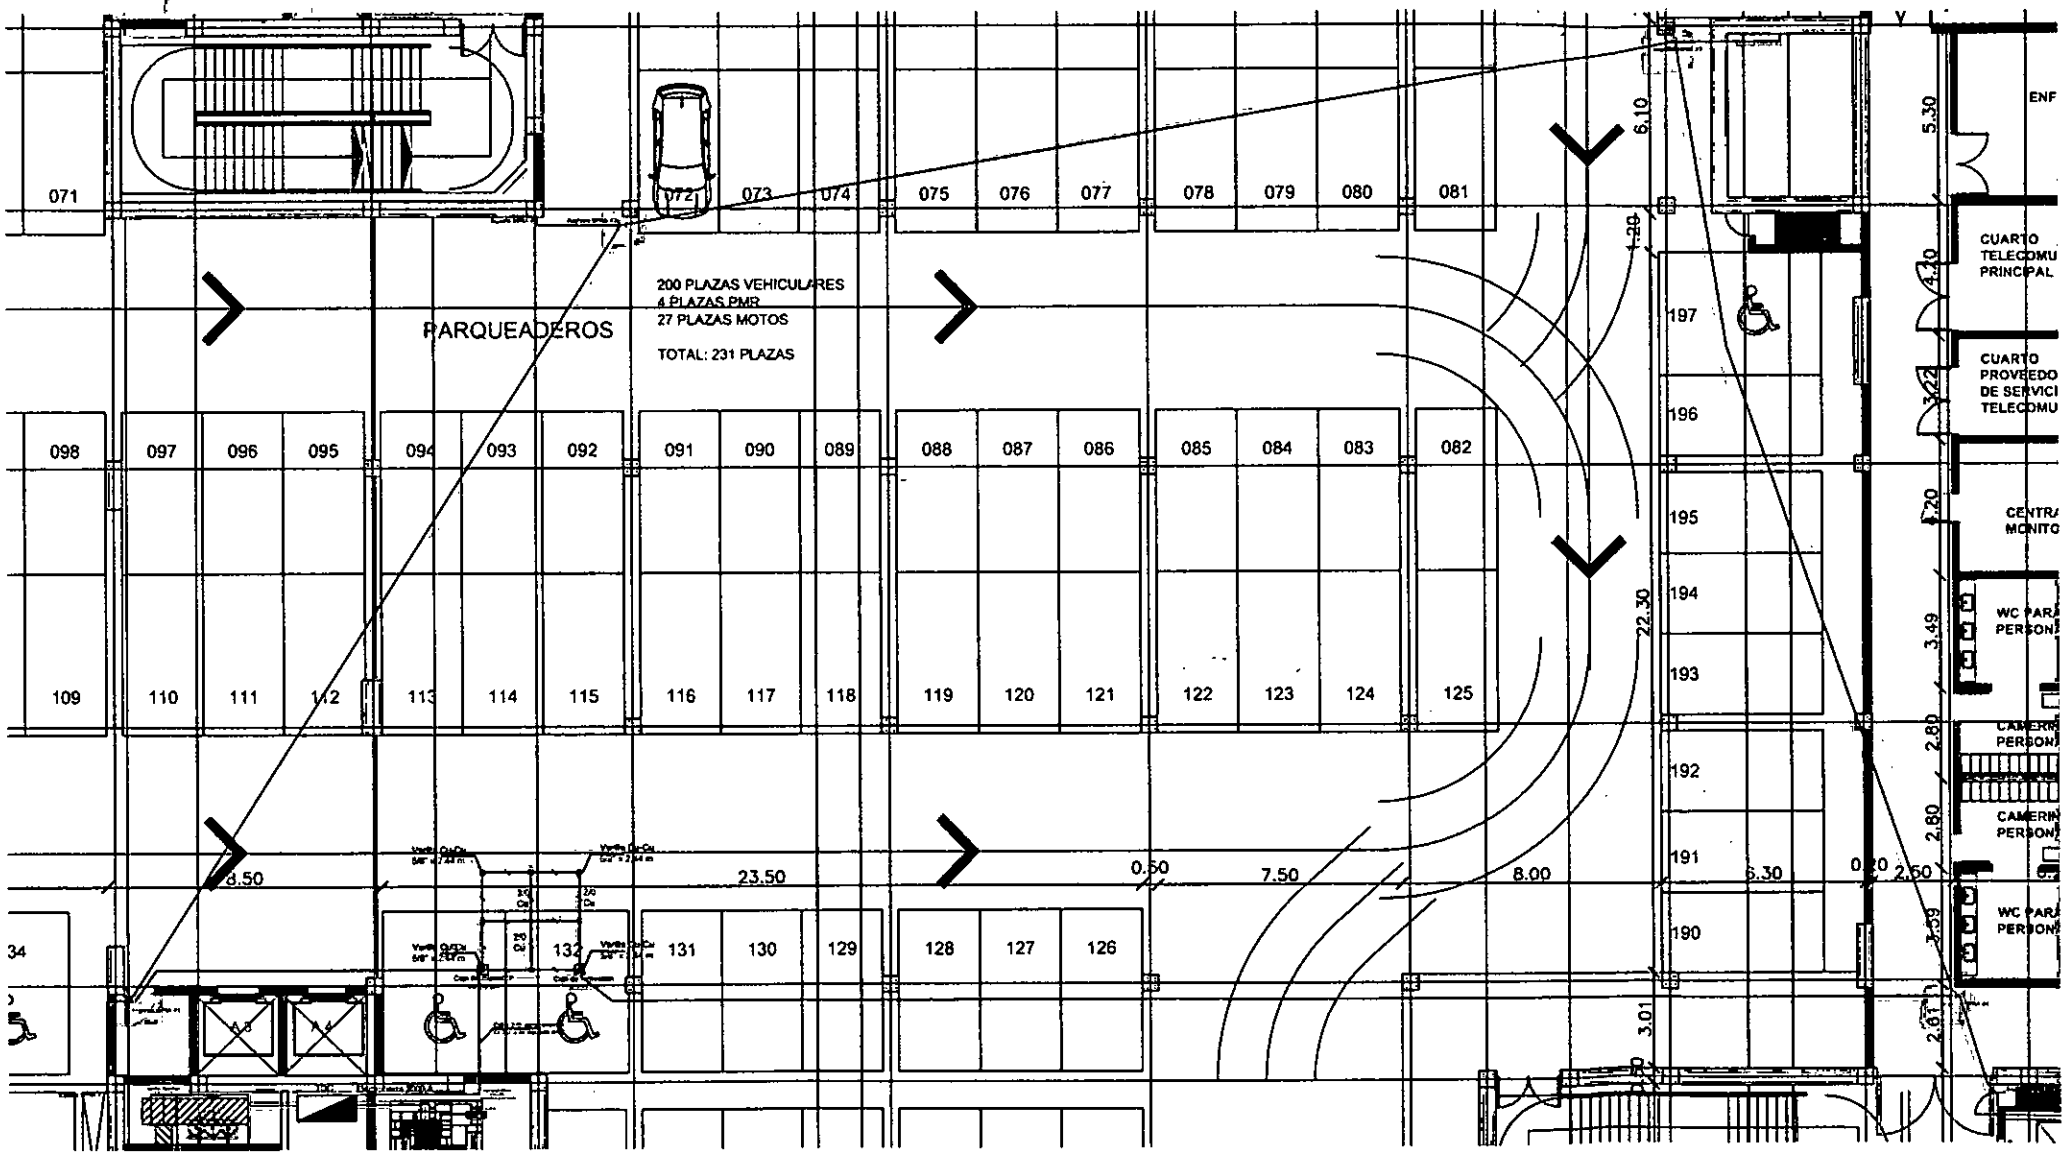



B


Marcel Cano

13-169

115.22.6

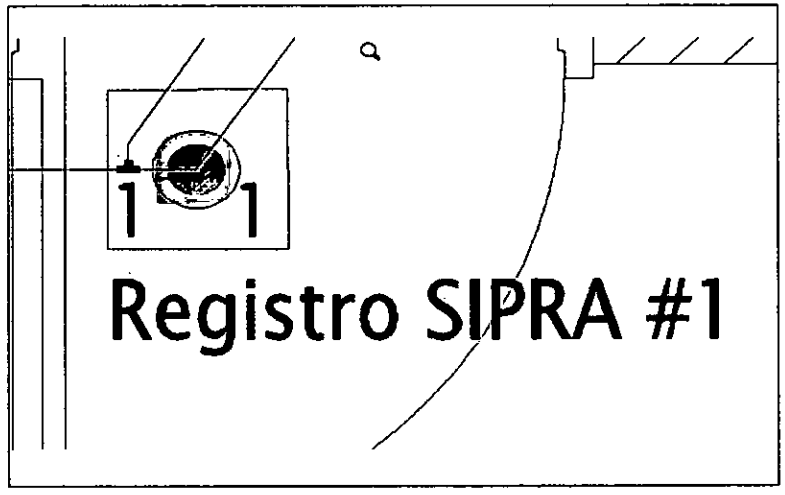

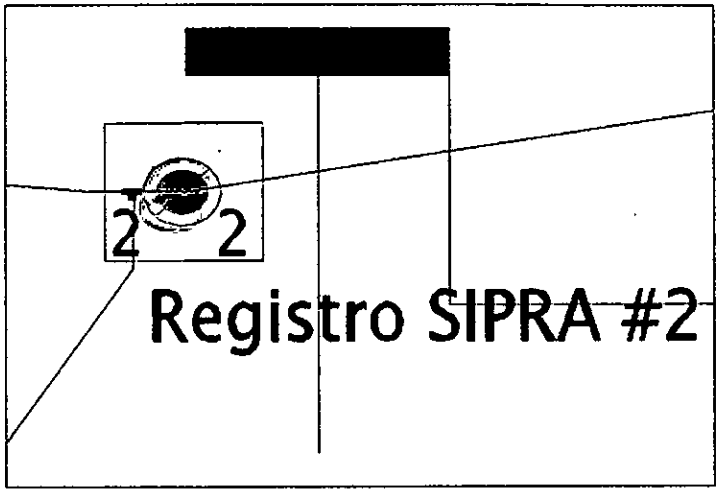

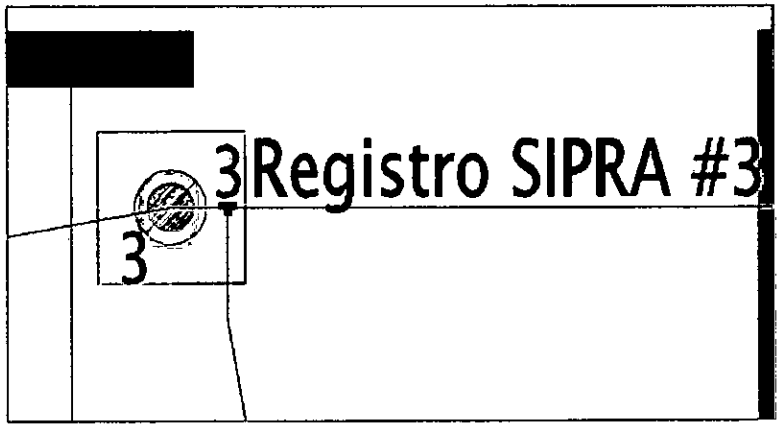




14

13-167

[15326]

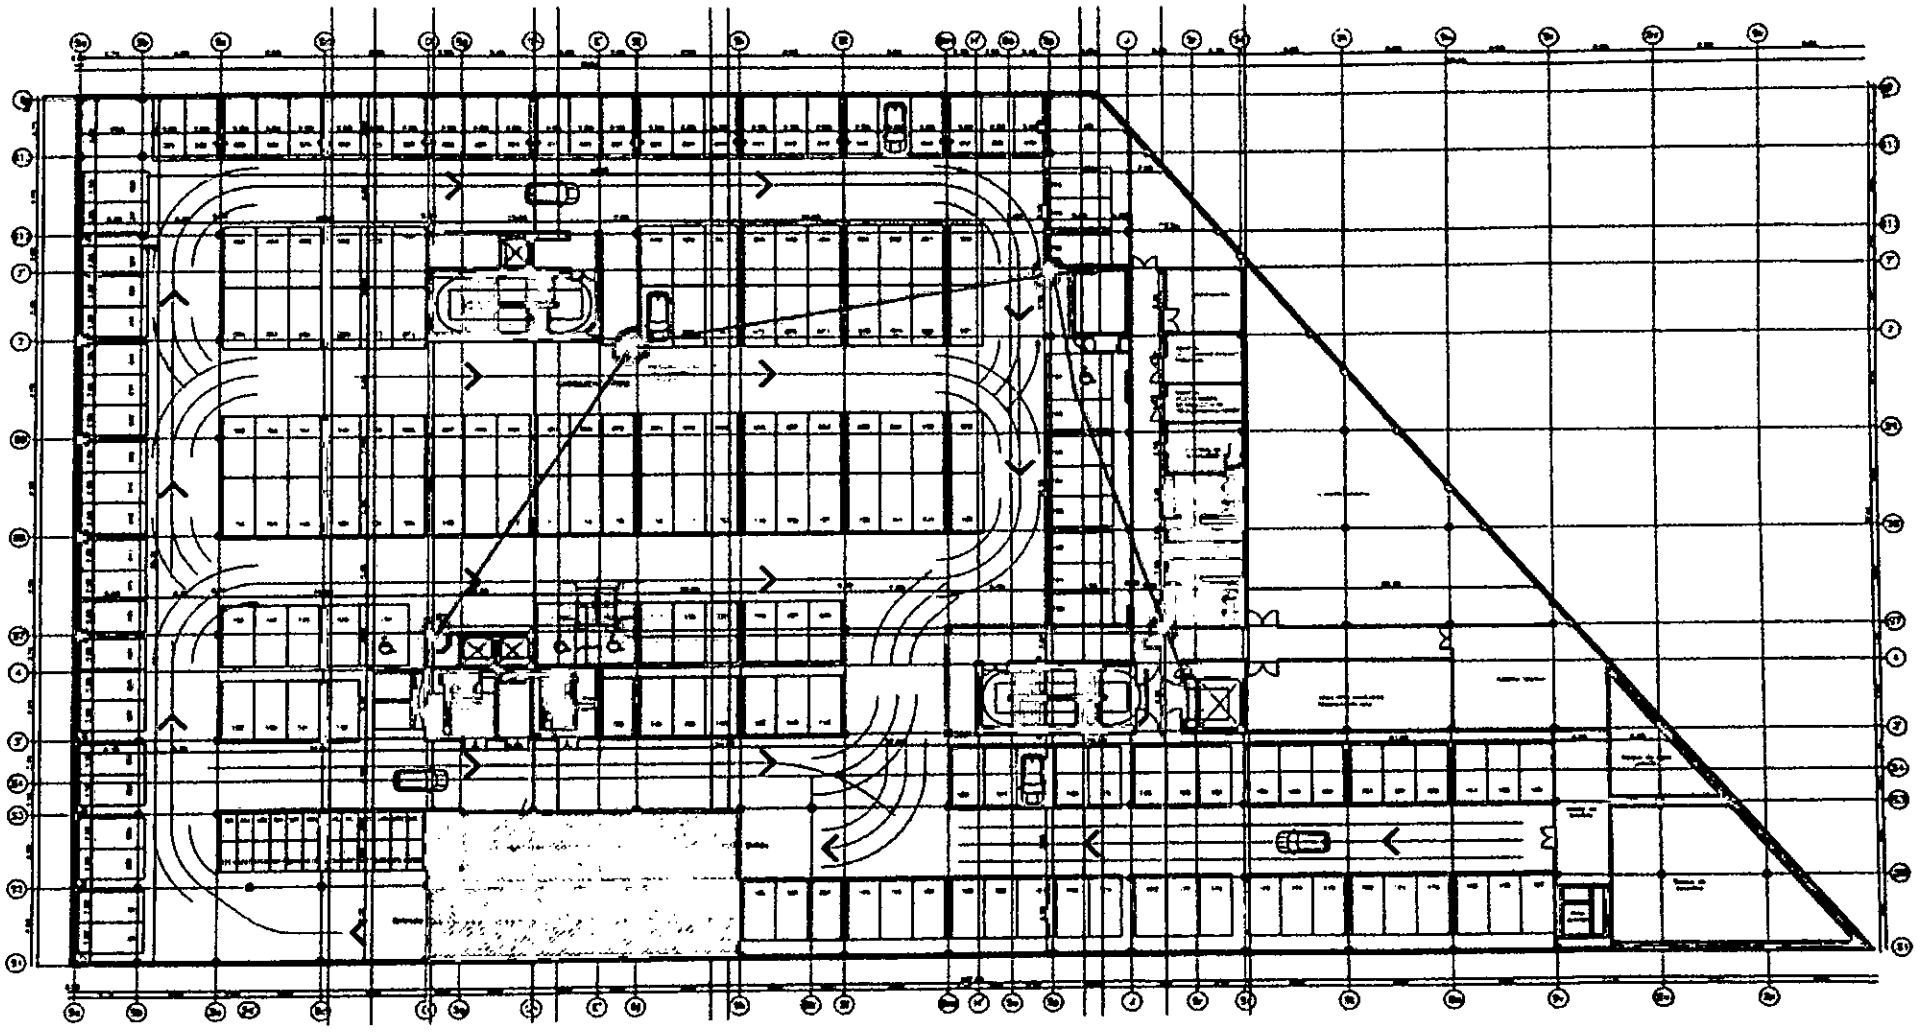

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTI ES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 5


02/03/2022 AL 30/04/2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007

CAPÍTULO	15,3	ITEM	15.22.9

PLANOS

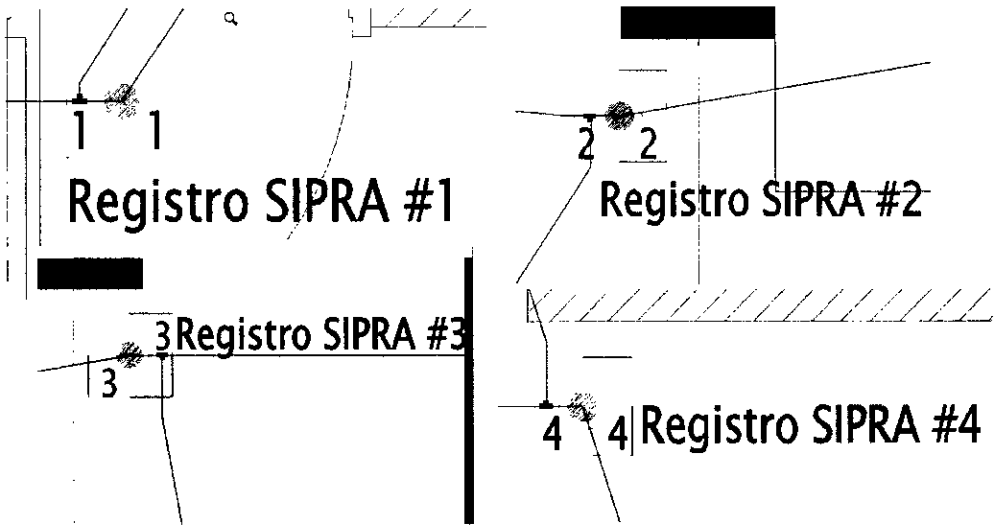

PLANO 1: CORTES DE REGISTROS SIPRA
La Numeración azul corresponde a los punntos de soldadura Varilla-Cable
La Numertación Violeta corresponde a los puntos de soldadura cable-cable

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Soldadura exótermica

LOCALIZACIÒN	DIMENSIONES LARGO	ANCHO	ALTO	sobre ancho	UNID. CANT	UND
Registro 1 SIPRA (Entre ejes D a sg & 4 a s7)					2	2,00
Registro 2 SIPRA (Entre ejes E' a Sj & sg a 7)					2	2,00
Registro 3 SIPRA (Entre ejes Sp a J & 7 a 7')					2	2,00
Registro 4 SIPRA (Entre ejes J a Sr & 4 a s7)					2	2,00

15,169

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTI[illegible]ES DE OBRA


DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 5


02/03/2022 AL 30/04/2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002	
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007	
CAPÍTULO	15,3	ITEM	15.22.9	Soldadura exótermica	UNID.	UND

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANT	UND
	LARGO	ANCHO	ALTO	sobre ancho		
					SUBTOTAL	8,00
					CANTIDAD ACTA Parcial No 1	-
					CANTIDAD ACTA Parcial No 2	-
					CANTIDAD ACTA Parcial No 3	-
					CANTIDAD ACTA Parcial No 4	-
					CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 5	8,00
					TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	8,00
					CANTIDAD CONTRACTUAL	21,00
					PENDIENTE POR PAGAR	13,00
					TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	







Nombre: ALEXANDRA CAMARGO SERNA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.


Nombre: CARLOS FRANCO
ASESOR TECNICO INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR


Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.


Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

13,20

15.21.9

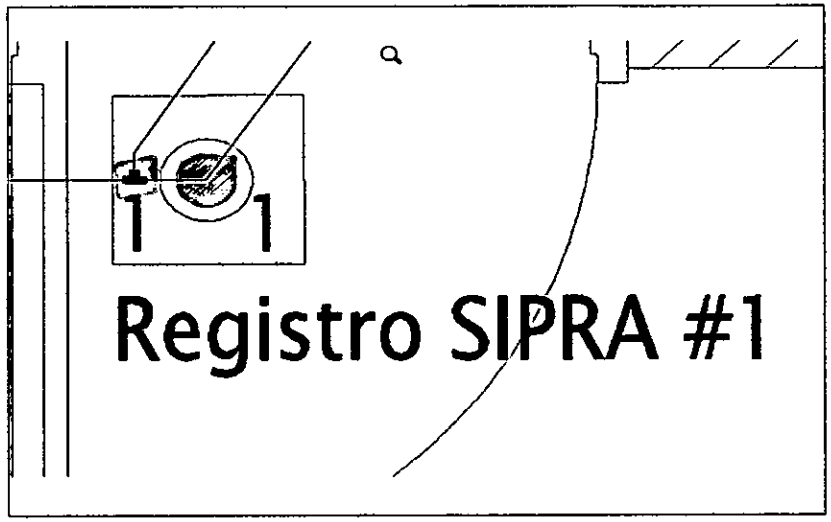

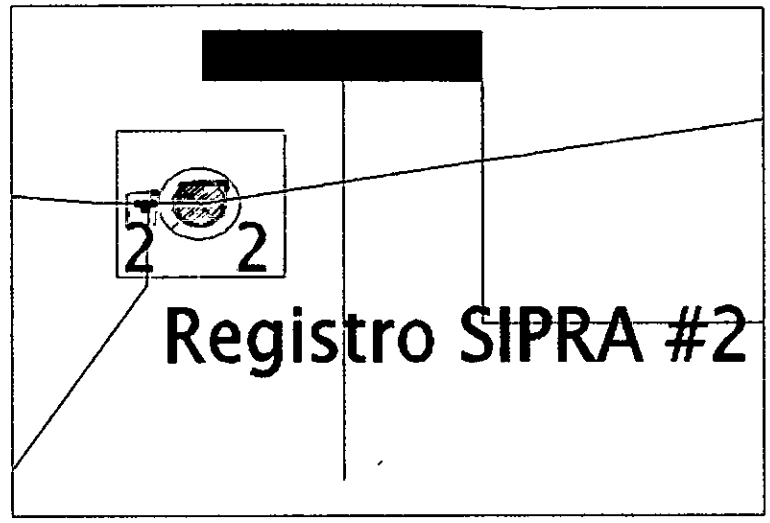


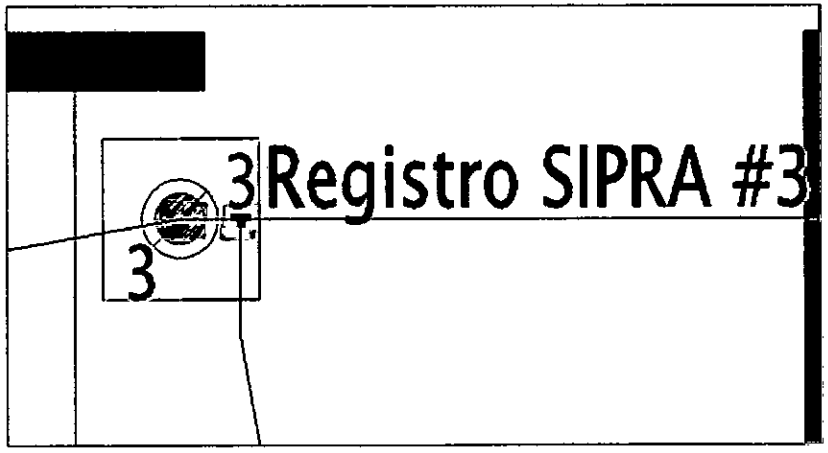



Abrazadera Cerrojo

13/171

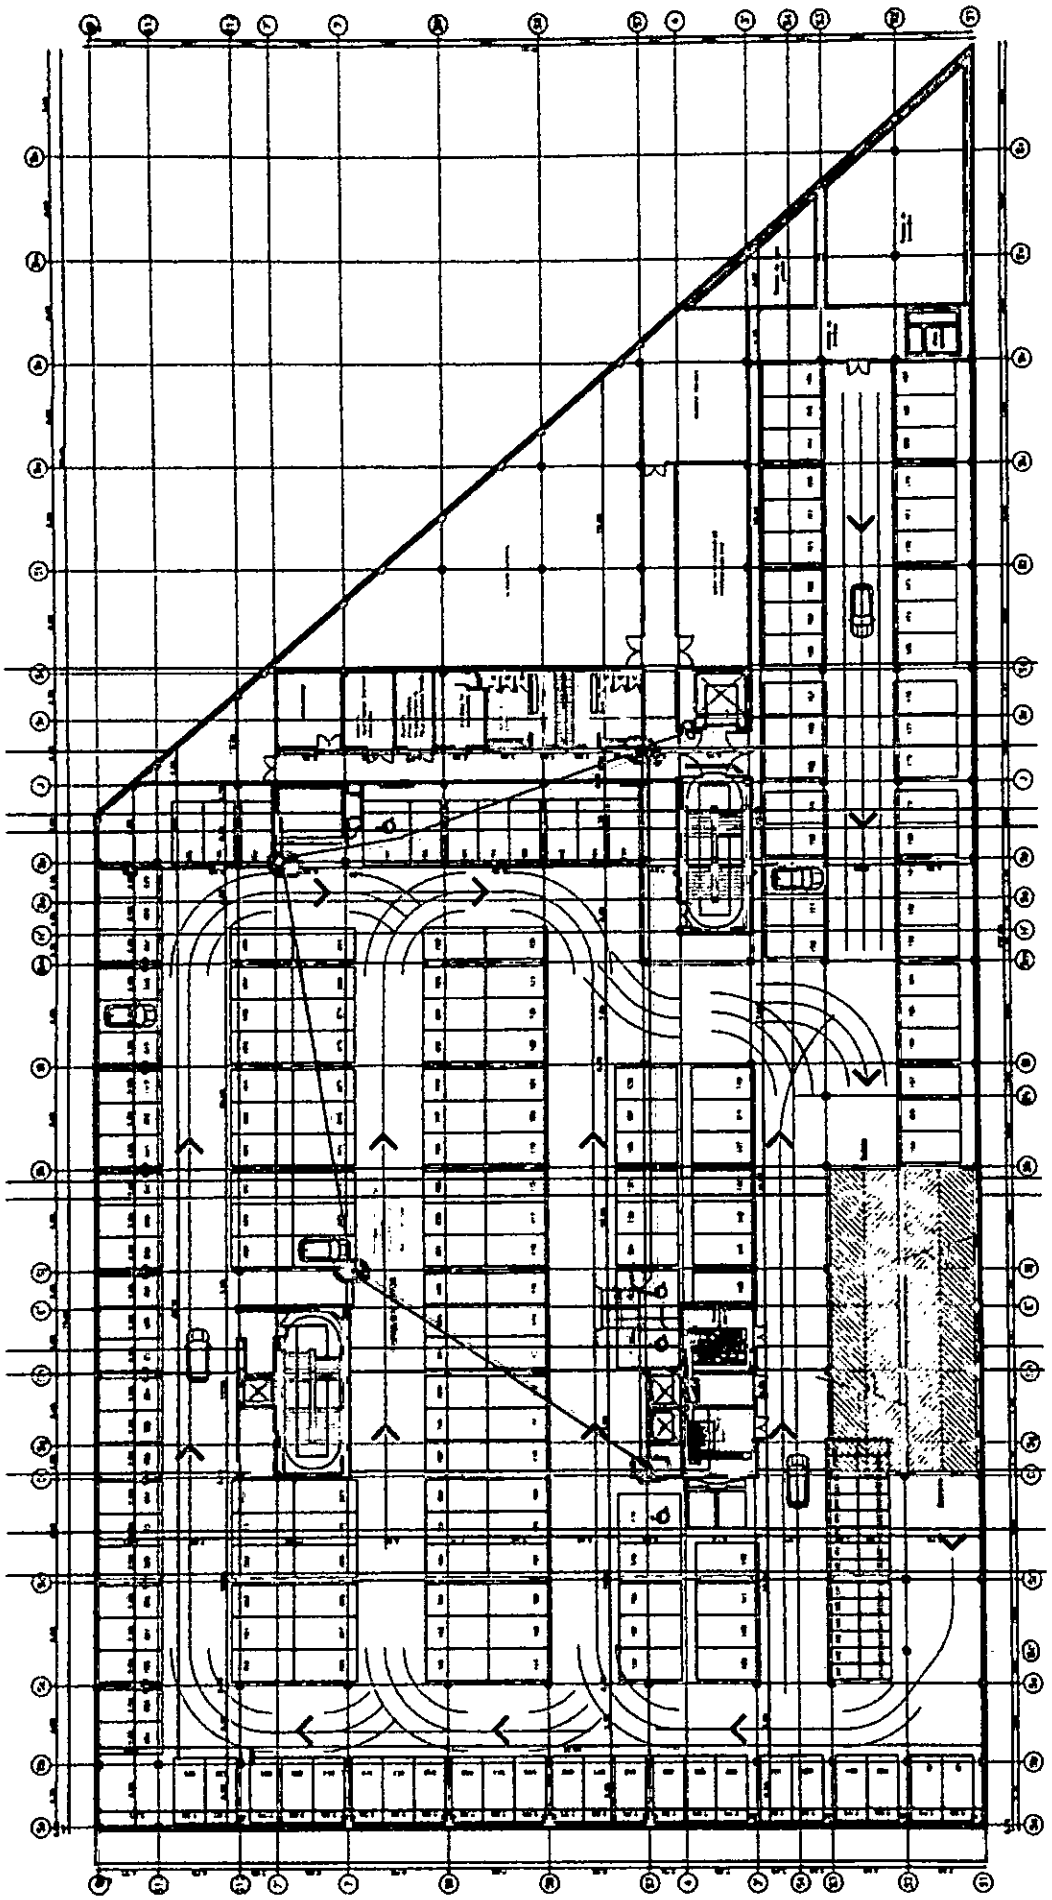

13.172

15.229

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 05

PERIODO DE EVALUACIÓN: 02/03/2022 AL 30/04/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		2021050007
CAPÍTULO	16	ITEM	5.10	P15 / ACABADO PULIDO EN LOSA DE CONCRETO CON ENDURECEDOR DE CUARZO	UNID. M2

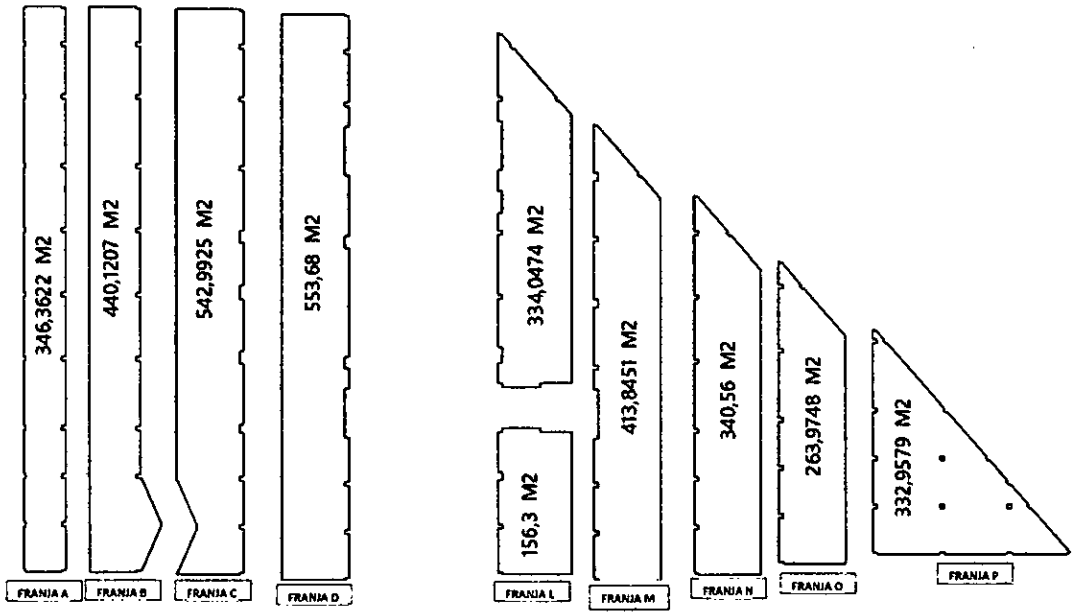

LOCALIZACIÓN	REF	ÁREA M2	CANT.	M2
	LOSA			
Ejes (Sa- Sb)→Ejes (S1 -9)	FRANJA "A"	346,36	1,00	346,36
Ejes (Sb- Sc)→Ejes (S1 -9)	FRANJA "B"	440,12	1,00	440,12
Ejes (Sc- Sd)→Ejes (S1 -9)	FRANJA "C"	542,99	1,00	542,99
Ejes (Sd- D)→Ejes (S1 -9)	FRANJA "D"	553,68	1,00	553,68
Ejes (J-K) →Ejes (S1 -3')(4-Diagonal)	FRANJA "L"	490,35	1,00	490,35
Ejes (K- St) →Ejes (S1 -Diagonal)	FRANJA "M"	413,85	1,00	413,85
Ejes (St- Su)→Ejes (S1 -Diagonal)	FRANJA "N"	340,56	1,00	340,56
Ejes (Su- Sv)→Ejes (S1 -Diagonal)	FRANJA "O"	263,97	1,00	263,97
Ejes (Sv- S1 Diagonal)→Ejes (S1 -Diagonal)	FRANJA "P"	332,96	1,00	332,96
			SUBTOTAL LOSA	3724,84
			SUBTOTAL	3724,84
		CANTIDAD ACTA Parcial No 1	0,00	
		CANTIDAD ACTA Parcial No 2	0,00	
		CANTIDAD ACTA Parcial No 3	0,00	
		CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 4	0,00	
		CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 5	3724,84	
		TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	0,00	
		CANTIDAD CONTRACTUAL	1189,94	
		PENDIENTE POR PAGAR	-2534,90	
		TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		3724,84

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: MONICA DE LA ROSA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

173

346,3622 M2

PROPIEDADES

Polilínea

Hipervínc...	
Altura de...	.0000
Visualización 3D	
Material	PorCapa
Geometría	
Vértice ac...	1
Vértice X	-211.3467
Vértice Y	-113.5325
Anchura i...	.0000
Anchura f...	.0000
Grosor gl...	.0000
Elevación	.0000
Área	346.3622
Longitud	163.1700
Varios	
Cerrado	No
Creación...	Desactivada

440,1207 M2

PROPIEDADES

Polilínea

Hipervínc...	
Altura de...	.0000
Visualización 3D	
Material	PorCapa
Geometría	
Vértice ac...	1
Vértice X	-145.6111
Vértice Y	-116.1635
Anchura i...	.0000
Anchura f...	.0000
Grosor gl...	.0000
Elevación	.0000
Área	440.1207
Longitud	161.9367
Varios	
Cerrado	No
Creación...	Desactivada

542,9925 M2

PROPIEDADES

Polilínea

Hipervínc...	
Altura de...	.0000
Visualización 3D	
Material	PorCapa
Geometría	
Vértice ac...	1
Vértice X	-135.2720
Vértice Y	-116.4641
Anchura i...	.0000
Anchura f...	.0000
Grosor gl...	.0000
Elevación	.0000
Área	542.9925
Longitud	166.7867
Varios	
Cerrado	No
Creación...	Desactivada

553,68 M2

PROPIEDADES

Polilínea

Hipervínc...	
Altura de...	.0000
Visualización 3D	
Material	PorCapa
Geometría	
Vértice ac...	1
Vértice X	-122.7348
Vértice Y	-117.1141
Anchura i...	.0000
Anchura f...	.0000
Grosor gl...	.0000
Elevación	.0000
Área	553.6800
Longitud	164.6200
Varios	
Cerrado	No
Creación...	Desactivada

334,0474 M2

PROPIEDADES

Polilínea

Hipervínc...	
Altura de...	.0000
Visualización 3D	
Material	PorCapa
Geometría	
Vértice ac...	1
Vértice X	-97.0117
Vértice Y	-162.9415
Anchura i...	.0000
Anchura f...	.0000
Grosor gl...	.0000
Elevación	.0000
Área	334.0474
Longitud	167.3940
Varios	
Cerrado	No
Creación...	Desactivada

156,3 M2

PROPIEDADES

Polilínea

Hipervínc...	
Altura de...	.0000
Visualización 3D	
Material	PorCapa
Geometría	
Vértice ac...	1
Vértice X	-88.2617
Vértice Y	-186.7415
Anchura i...	.0000
Anchura f...	.0000
Grosor gl...	.0000
Elevación	.0000
Área	156.3000
Longitud	57.0000
Varios	
Cerrado	No
Creación...	Desactivada

413,8451 M2

PROPIEDADES

Polilínea


Hipervínc...	
Altura de...	.0000
Visualización 3D	
Material	PorCapa
Geometría	
Vértice ac...	1
Vértice X	-77.6409
Vértice Y	-187.5804
Anchura i...	.0000
Anchura f...	.0000
Grosor gl...	.0000
Elevación	.0000
Área	413.8451
Longitud	132.4736
Varios	
Cerrado	No
Creación...	Desactivada

340,56 M2
PROPIEDADES
Polilínea
Hipervínc...
Altura de... .0000
Visualización 3D
Material PorCapa
Geometría
Vértice ac... 1
Vértice X -65.6008
Vértice Y -186.8465
Anchura i... .0000
Anchura f... .0000
Grosor gl... .0000
Elevación .0000
Área 340.5600
Longitud 112.2648
Varios
Cerrado No
Creación... Desactivada

332,9579 M2
PROPIEDADES
Polilínea
Hipervínc...
Altura de... .0000
Visualización 3D
Material PorCapa
Geometría
Vértice ac... 1
Vértice X -28.8182
Vértice Y -184.3102
Anchura i... .0000
Anchura f... .0000
Grosor gl... .0000
Elevación .0000
Área 333.7079
Longitud 95.2016
Varios
Cerrado No
Creación... Desactivada

263,9748 M2
PROPIEDADES
Polilínea
Hipervínc...
Altura de... .0000
Visualización 3D
Material PorCapa
Geometría
Vértice ac... 1
Vértice X -55.4313
Vértice Y -185.4911
Anchura i... .0000
Anchura f... .0000
Grosor gl... .0000
Elevación .0000
Área 263.9748
Longitud 92.0560
Varios
Cerrado No
Creación... Desactivada

13.135

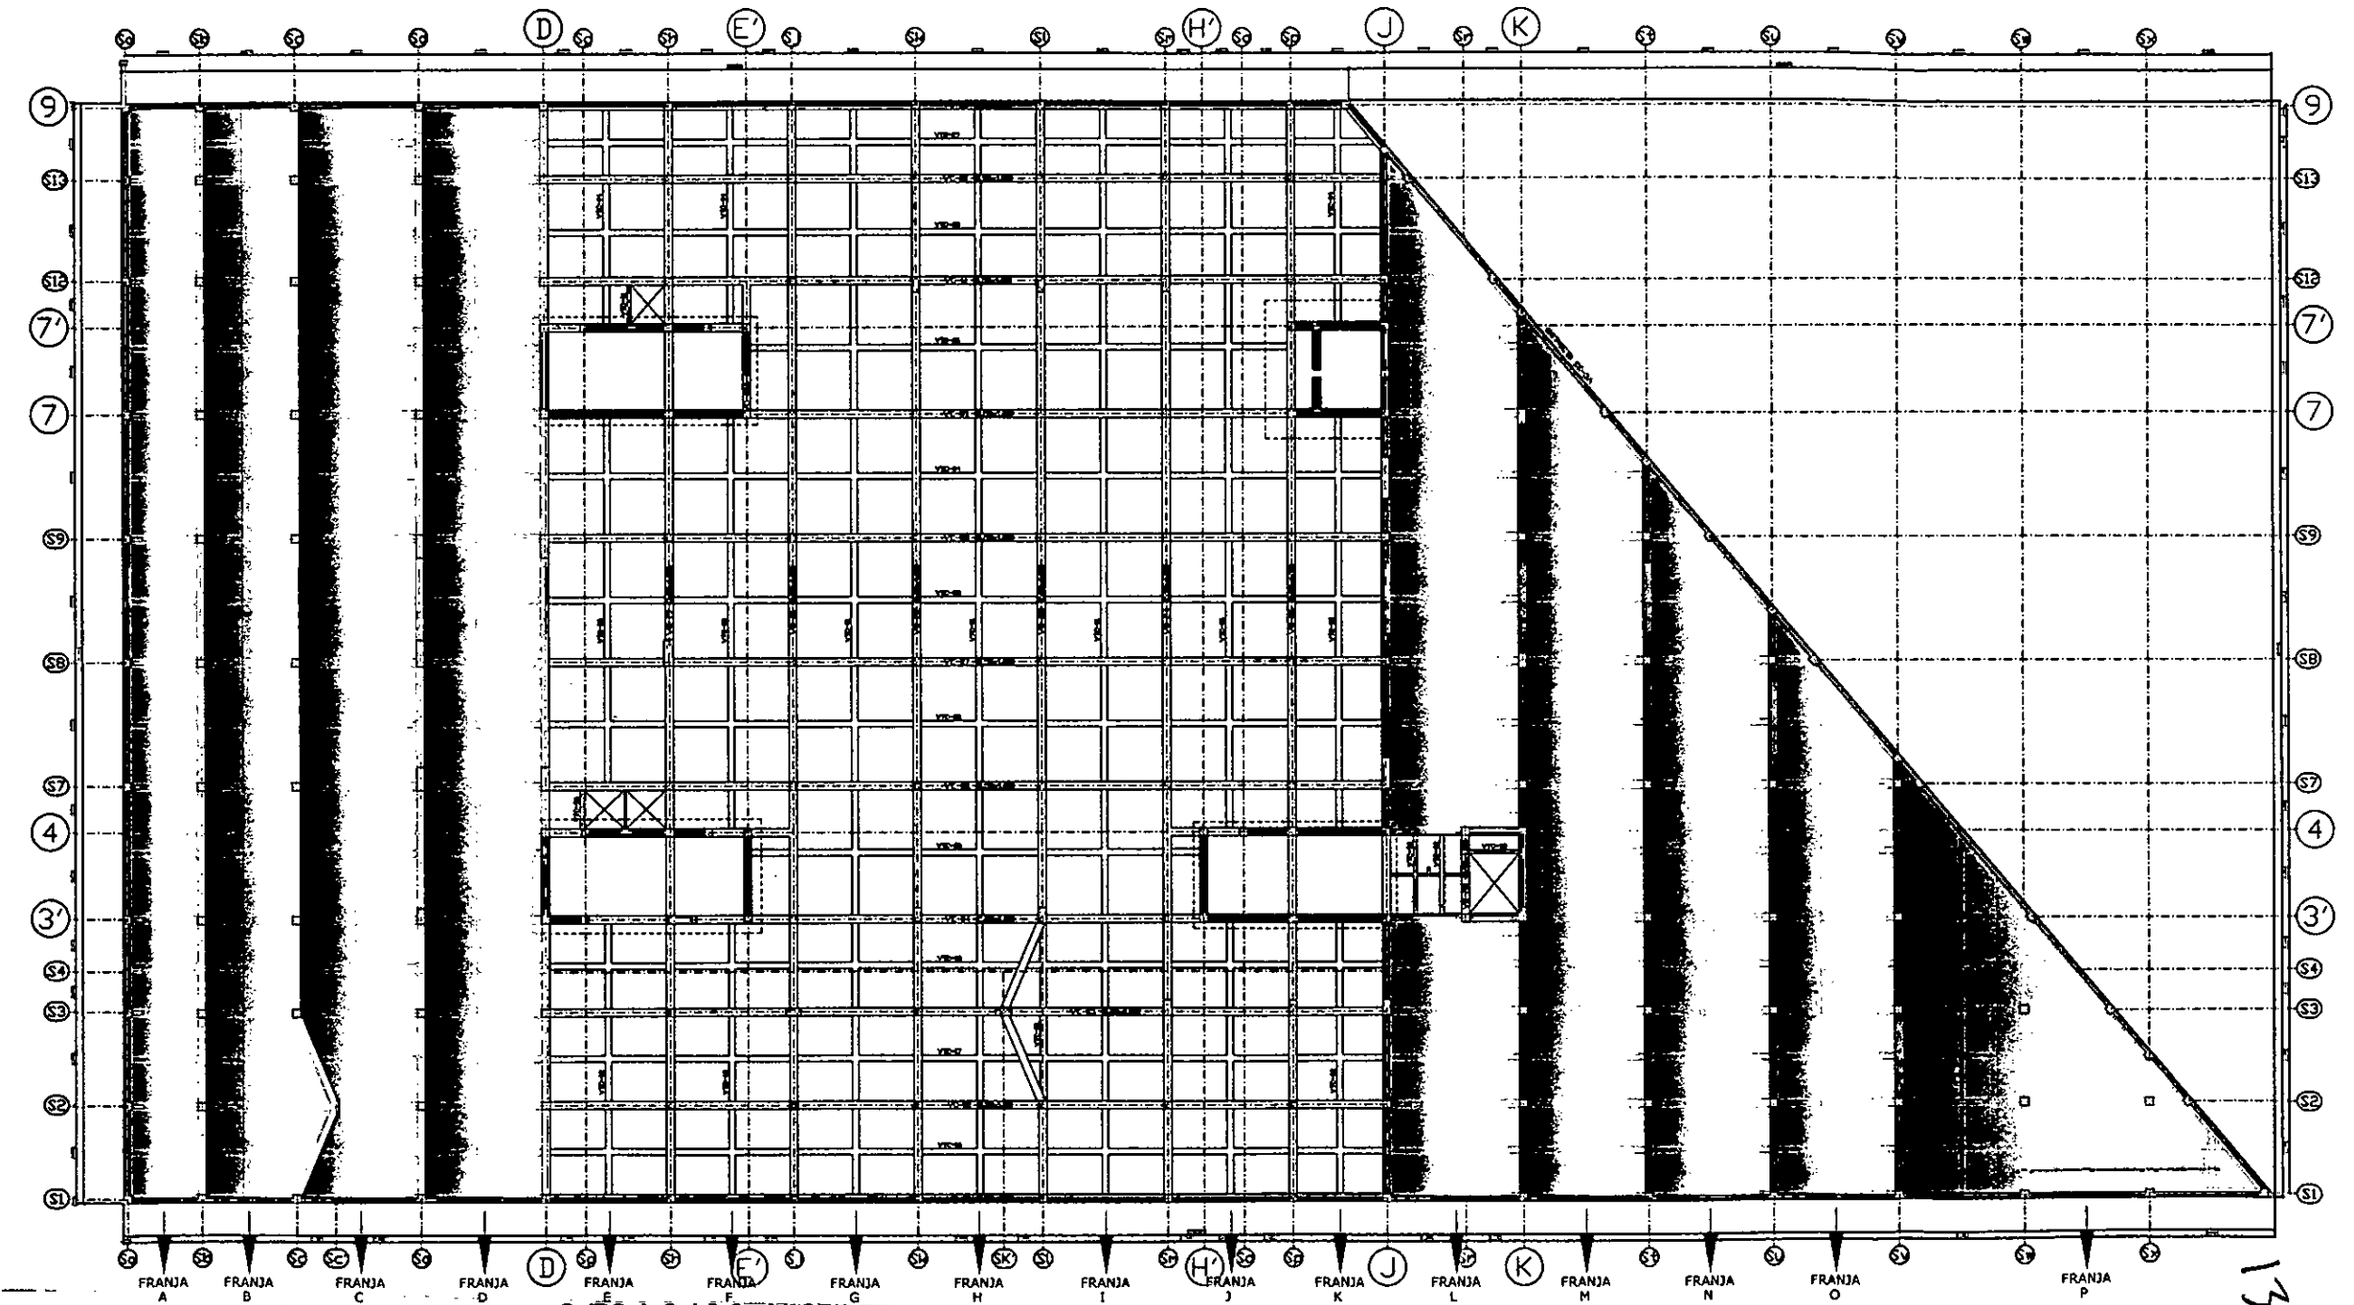

ENDURECEDOR PISO 3.724,8406 M2

13-176

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORI. .E CÁLCULO DE NTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 05

PERIODO DE EVALUACIÓN

02/03/2022 AL 30/04/2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	16	ITEM	16,15,6	GEOTEXTIL	UNID. M2



REFERENCIA	CANT	M2
Ejes (S8-S7) →Ejes (D-Diagonal)	1	592,50
Ejes (S7-3') →Ejes (Sa-Diagonal)	1	1.114,48
Ejes (3'-S3) →Ejes (Sa-Diagonal)	1	1.020,12
Ejes (S3-S2) →Ejes (Sa-Diagonal)	1	1.065,11
Ejes (S2-S1) →Ejes (Sa-Diagonal)	1	1.098,60
NODOS		
Ejes (3'-4) →Ejes (D-E')	1	89,55
Ejes (3'-4) →Ejes (H'-J)	1	77,70
Ejes (7'-7) →Ejes (D-E')	1	90,30
Ejes (7'-7) →Ejes (Sp-J')	1	45,76
Ejes (3'-4) →Ejes (Sr-K)	1	25,20
SUBTOTAL		5.219,32

CANTIDAD ACTA Parcial No 1	0	
CANTIDAD ACTA Parcial No 2	0	
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 3	4.931,48	
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 4	-	
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 5	5.219,32	
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	10.150,80	
CANTIDAD CONTRACTUAL	10.309,23	
PENDIENTE POR PAGAR	158,43	
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		5.219,32

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: MONICA DE LA ROSA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

13.144

13.138

MEMORIA GEOTEXTIL- ACTA 5

ANCHO (m)	LARGO (m)	CANTIDAD	ÁREA (m2)	SOBREANCHO (m)	ÁREA GEOTEXTIL (m2)
S8-S7					
3,55	3,55	2	25,205	0,5	41,41
3,55	3,55	4	50,41	0,5	82,81
3,55	3,55	4	50,41	0,5	82,81
2,55	3,55	4	36,21	0,5	64,61
3,925	3,55	4	55,735	0,5	89,64
3,55	3,55	4	50,41	0,5	82,81
3,55	3,55	4	50,41	0,5	82,81
3,55	3,55	1	12,6025	0,5	20,70
			11,6755	0,5	19,34
			1,0369	0,5	4,98
			10,4297	0,5	17,88
			0,1845	0,5	2,70
SUBTOTAL			354,7191		592,50
S7-3'					
1,9375	3,855	4	29,87625	0,5	57,05
2,5875	3,855	4	39,89925	0,5	69,67
3,55	3,855	4	54,741	0,5	88,36
3,55	3,855	4	54,741	0,5	88,36
2	2,51	1	5,02	0,5	10,53
3,55	2,51	2	17,821	0,5	31,94
2,45	0,845	1	2,07025	0,5	6,37
2,45	3,855	1	9,44475	0,5	16,75
3,55	3,855	4	54,741	0,5	88,36
3,55	3,855	4	54,741	0,5	88,36
3,55	3,855	4	54,741	0,5	88,36
1,85	0,845	1	1,56325	0,5	5,26
1,85	3,855	1	7,13175	0,5	13,84
3,55	2,51	1	8,9105	0,5	15,97
3,55	2,51	1	8,9105	0,5	15,97
2,55	2,51	2	12,801	0,5	24,92
3,925	2,51	2	19,7035	0,5	34,57
1,49	2,475	4	14,751	0,5	34,61
1,17	2,475	2	5,7915	0,5	15,08
3,55	3,855	4	54,741	0,5	88,36
3,55	3,855	4	54,741	0,5	88,36
3,55	3,855	4	54,741	0,5	88,36
3,55	3,855	1	13,68525	0,5	22,09
			9,6924	0,5	17,23
			8,3371	0,5	15,75
SUBTOTAL			653,33725		1114,48
3´-S3					

13.179

MEMORIA GEOTEXTIL- ACTA 5

ANCHO (m)	LARGO (m)	CANTIDAD	ÁREA (m2)	SOBREANCHO (m)	ÁREA GEOTEXTIL (m2)
1,9375	2,55	4	19,7625	0,5	41,71
2,5875	2,55	4	26,3925	0,5	50,94
3,55	2,55	4	36,21	0,5	64,61
3,55	2,55	4	36,21	0,5	64,61
3,55	2,55	4	36,21	0,5	64,61
3,55	2,55	4	36,21	0,5	64,61
3,55	2,55	4	36,21	0,5	64,61
3,55	2,55	2	18,105	0,5	32,31
			7,3791	0,5	13,97
			4,2447	0,5	9,61
			0,6675	0,5	4,78
			3,6816	0,5	8,82
3,55	2,55	4	36,21	0,5	64,61
3,55	2,55	4	36,21	0,5	64,61
2,55	2,55	4	26,01	0,5	50,41
3,925	2,55	4	40,035	0,5	69,94
3,55	2,55	4	36,21	0,5	64,61
3,55	2,55	4	36,21	0,5	64,61
3,55	2,55	4	36,21	0,5	64,61
3,55	2,55	4	36,21	0,5	64,61
			3,0718	0,5	8,36
			8,5106	0,5	15,27
			0,36	0,5	3,29
SUBTOTAL			556,5303		1020,11
S3-S2					
1,9375	2,55	4	19,7625	0,5	41,71
2,5875	2,55	4	26,3925	0,5	50,94
			0,6675	0,5	4,78
			3,6816	0,5	8,82
			7,3791	0,5	13,97
			4,2447	0,5	9,61
3,55	2,55	2	18,105	0,5	32,31
3,55	2,55	4	36,21	0,5	64,61
3,55	2,55	4	36,21	0,5	64,61
3,55	2,55	4	36,21	0,5	64,61
3,55	2,55	4	36,21	0,5	64,61
3,55	2,55	2	18,105	0,5	32,31
			4,2447	0,5	9,61
			7,3791	0,5	13,97
			3,6816	0,5	8,82
			0,6675	0,5	4,78
3,55	2,55	4	36,21	0,5	64,61

13.180

MEMORIA GEOTEXTIL- ACTA 5

ANCHO (m)	LARGO (m)	CANTIDAD	ÁREA (m2)	SOBREANCHO (m)	ÁREA GEOTEXTIL (m2)
3,55	2,55	4	36,21	0,5	64,61
2,55	2,55	4	26,01	0,5	50,41
3,925	2,55	4	40,035	0,5	69,94
3,55	2,55	4	36,21	0,5	64,61
3,55	2,55	4	36,21	0,5	64,61
3,55	2,55	4	36,21	0,5	64,61
3,55	2,55	4	36,21	0,5	64,61
3,55	2,55	3	27,1575	0,5	48,46
			5,7435	0,5	12,08
			1,7791	0,5	6,49
SUBTOTAL			577,1359		1065,10
S2-S1					
1,9375	2,55	4	19,7625	0,5	41,71
2,5875	2,55	4	26,3925	0,5	50,94
			3,6816	0,5	8,82
			0,6675	0,5	4,78
			7,3791	0,5	13,97
			4,2447	0,5	9,61
3,55	2,55	2	18,105	0,5	32,31
3,55	2,55	4	36,21	0,5	64,61
3,55	2,55	4	36,21	0,5	64,61
3,55	2,55	4	36,21	0,5	64,61
3,55	2,55	4	36,21	0,5	64,61
3,55	2,55	4	36,21	0,5	64,61
3,55	2,55	4	36,21	0,5	64,61
3,55	2,55	4	36,21	0,5	64,61
2,55	2,55	4	26,01	0,5	50,41
3,925	2,55	4	40,035	0,5	69,94
3,55	2,55	4	36,21	0,5	64,61
3,55	2,55	4	36,21	0,5	64,61
3,55	2,55	4	36,21	0,5	64,61
3,55	2,55	4	36,21	0,5	64,61
3,55	2,55	4	36,21	0,5	64,61
3,5682	2,55	1	9,09891	0,5	16,22
			7,8712	0,5	14,49
			4,312	0,5	10,08
SUBTOTAL			602,08001		1098,60

ZAPATA 32					
1,95	4,95	2	19,305	0,5	35,11
2,125	4,95	2	21,0375	0,5	37,19

13.181

MEMORIA GEOTEXTIL- ACTA 5

ANCHO (m)	LARGO (m)	CANTIDAD	ÁREA (m2)	SOBREANCHO (m)	ÁREA GEOTEXTIL (m2)
1,9	4,95	1	9,405	0,5	17,26
SUBTOTAL			49,7475		89,55

ZAPATA 33

1,9	5	1	9,5	0,5	17,40
2,4	5	1	12	0,5	20,40
2,325	5	2	23,25	0,5	39,90
SUBTOTAL			44,75		77,70

ZAPATA 34

1,95	5	2	19,5	0,5	35,4
2,125	5	2	21,25	0,5	37,5
1,9	5	1	9,5	0,5	17,4
SUBTOTAL			50,25		90,3


ZAPATA 35

1	2,45	1	2,45	0,5	6,90
1	1,95	1	1,95	0,5	5,90
1,575	2,45	2	7,7175	0,5	17,77
1,575	1,95	2	6,1425	0,5	15,19
SUBTOTAL			18,26		45,76

ZAPATA 36

3,2	4,8	1	15,36	0,5	24,36
SUBTOTAL			15,36		24,36

TOTAL	5.218,46

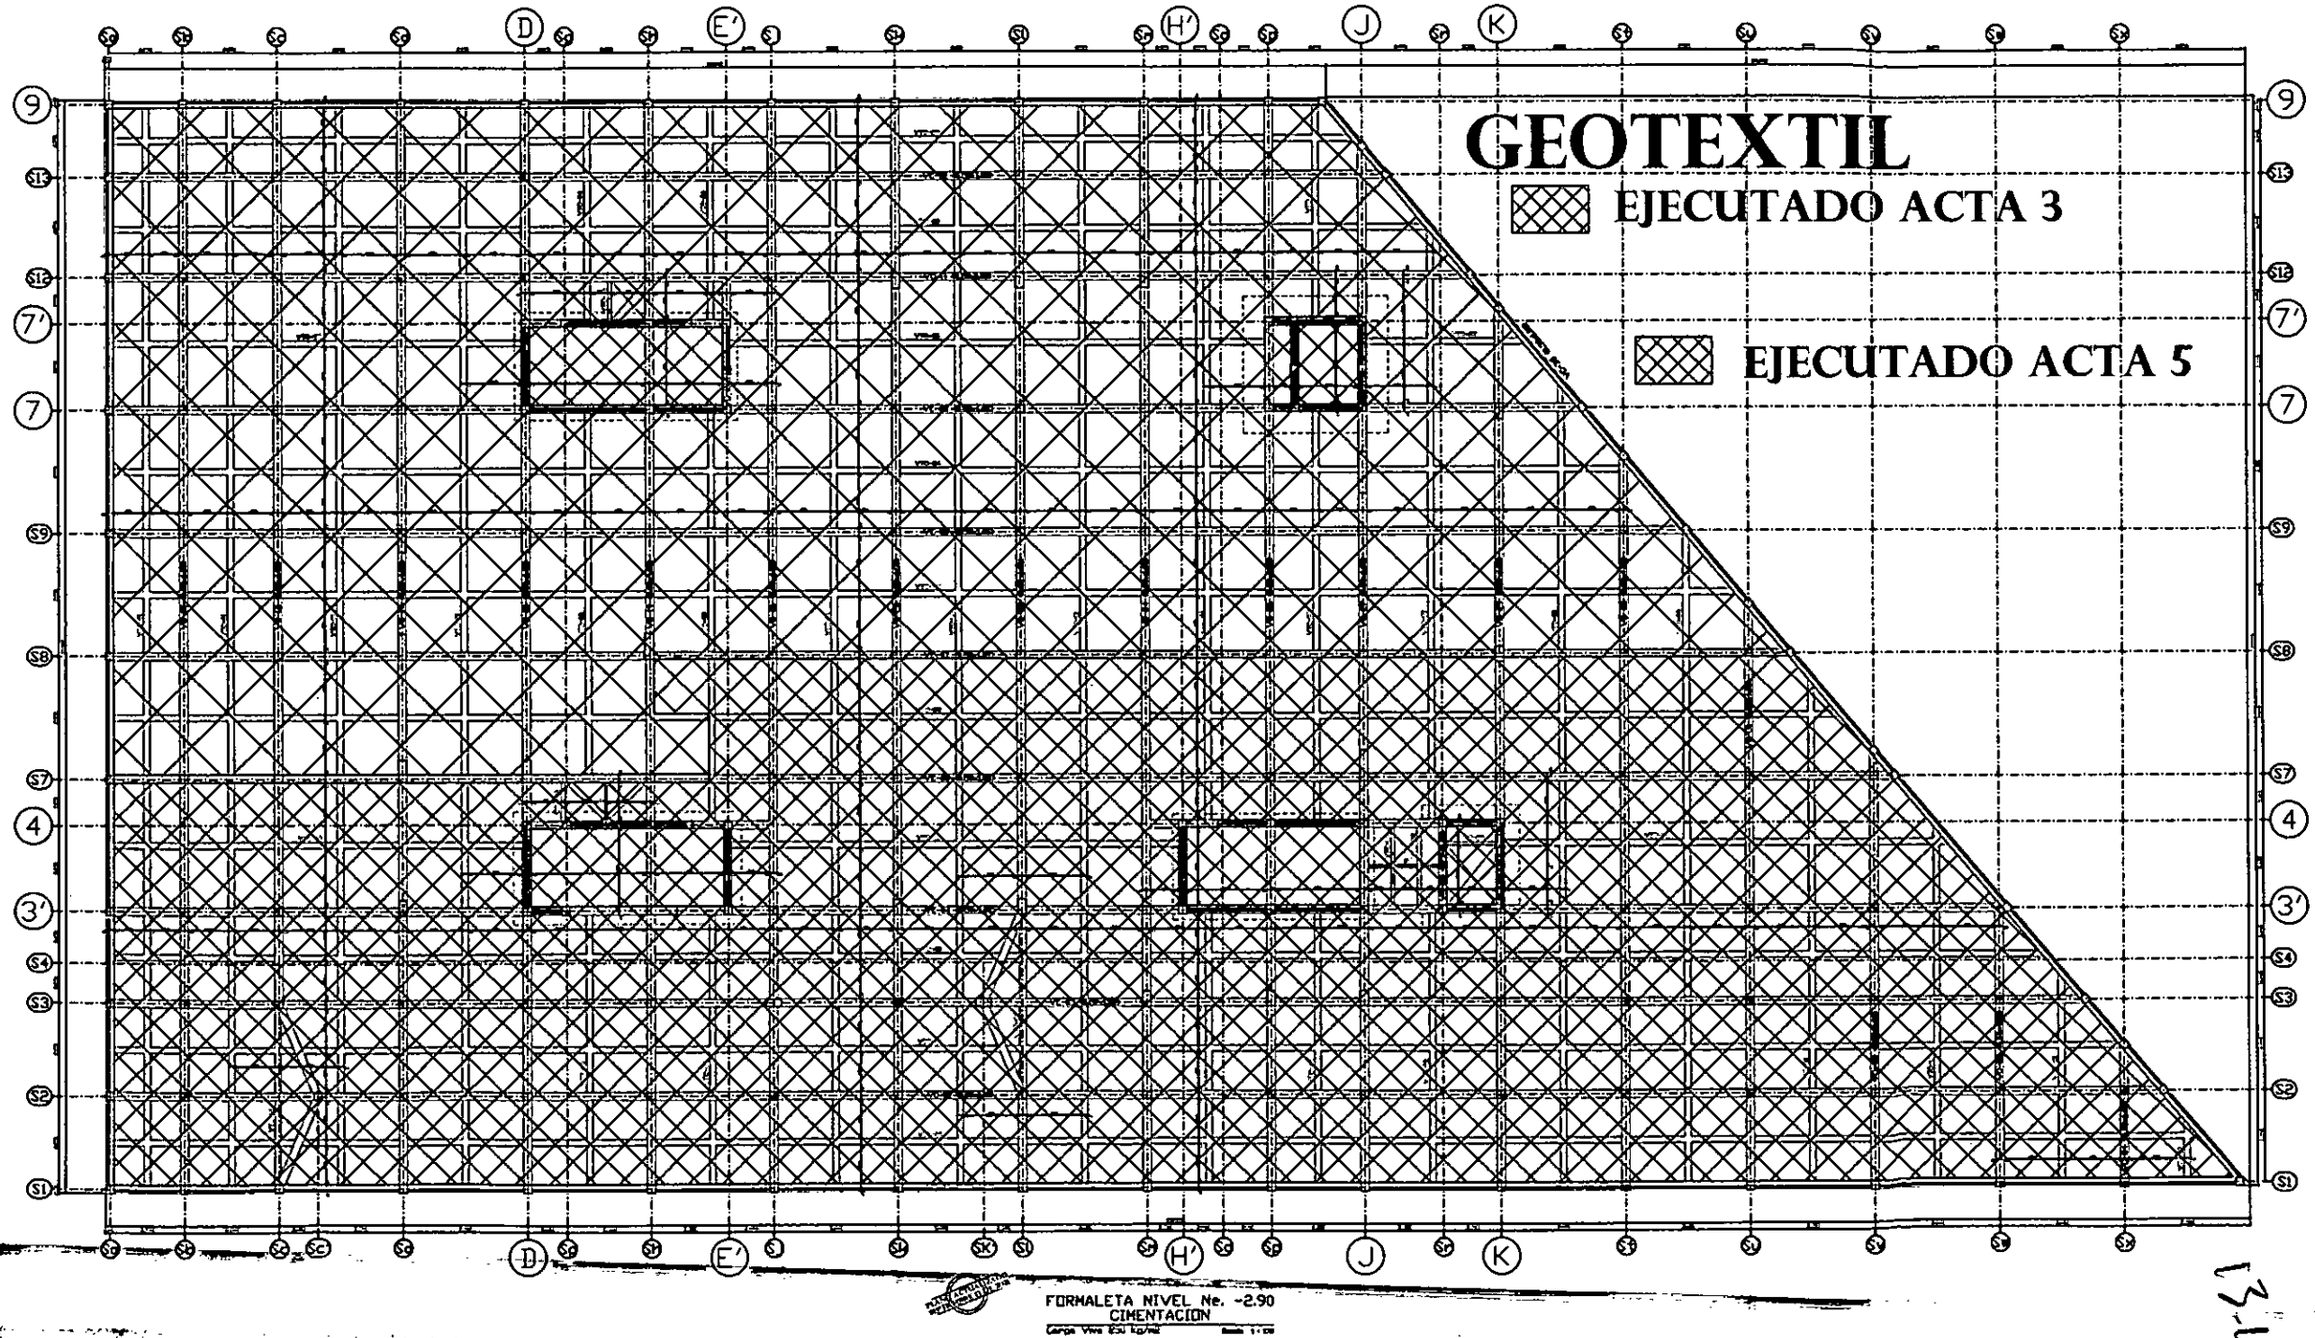
GEOTEXTIL
EJECUTADO ACTA 3
EJECUTADO ACTA 5
D
E'
H'
J
K
9
S13
S12
7'
7
S9
S8
S7
4
3'
S4
S3
S2
S1
FORMALETA NIVEL Ne. -2.90
CIMENTACION

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEM **DE CÁLCULO DE C/** **ADES DE OBRA**

DEL ACTA PARCIAL DE OBR... rio 05

PERIODO DE EVALUACIÓN: 02/03/2022 AL 30/04/2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002	
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007	
CAPÍTULO	16	ITEM	16,15,7	POLIETILENO (impermeabilizacion de piso)	UNID.	M2



REFERENCIA	AREA M2	CANT	M2
Ejes (9-S13) →Ejes (Sa-D)	88,35	1	88,35
Ejes (S13-S12) →Ejes (Sa-D)	130,20	1	130,20
Ejes (S12-7) →Ejes (Sa-D)Ejes (S12-7) →Ejes (K-S1 Diagonal)	190,74	1	190,74
Ejes (7-S9) →Ejes (Sa-D) Ejes (7-S9) →Ejes (K-S1 Diagonal)	217,88	1	217,88
Ejes (S9-S8) →Ejes (Sa-D) Ejes (S9-S8) →Ejes (K-S1 Diagonal)	258,46	1	258,46
Ejes (S8-S7) →Ejes (Sa-D) Ejes (S8-S7) →Ejes (K-S1 Diagonal)	301,82	1	301,82
Ejes (S7-3') →Ejes (Sa-D) Ejes (S7-3') →Ejes (K-S1 Diagonal)	375,20	1	375,20
Ejes (3'-S3) →Ejes (Sa-D) Ejes (3'-S3) →Ejes (K-S1 Diagonal)	275,36	1	275,36
Ejes (S3-S2) →Ejes (Sa-D) Ejes (S3-S2) →Ejes (K-S1 Diagonal)	295,96	1	295,96
Ejes (S2-S1) →Ejes (Sa-D) Ejes (S2-S1) →Ejes (K-S1 Diagonal)	318,78	1	318,78
		1	-
		SUBTOTAL	2.453,75

CANTIDAD ACTA Parcial No 1	0
CANTIDAD ACTA Parcial No 2	0
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 3	-
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 4	-
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 5	2.453,75
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	2.453,75
CANTIDAD CONTRACTUAL	5.758,14
PENDIENTE POR PAGAR	3.304,39
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	2.453,75

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: MONICA DE LA ROSA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

413


13-184

MEMORIA PLASTICO PARA LOSA ACTA 5			
ANCHO (m)	LARGO (m)	CANTIDAD	ÁREA (m2)
9-S13 *(Sa a D)*			
1,9375	1,9	4	14,725
2,5875	1,9	4	19,665
3,55	1,9	4	26,98
3,55	1,9	4	26,98
SUBTOTAL			88,35
S13-S12 *(Sa a D)*			
1,9375	2,95	2	11,43125
1,9375	2,65	2	10,26875
2,5875	2,95	2	15,26625
2,5875	2,65	2	13,71375
3,55	2,95	2	20,945
3,55	2,65	2	18,815
3,55	2,95	2	20,945
3,55	2,65	2	18,815
SUBTOTAL			130,2
S12-7 *(Sa a D)*			
1,9375	3,85	4	29,8375
2,5875	3,85	4	39,8475
3,55	3,85	4	54,67
3,55	3,85	4	54,67
S12-7 *(K a S1 Diagonal)*			
Geometría irregular			0,6289
Geometría irregular			10,7799
Geometría irregular			0,3057
SUBTOTAL			190,7395
7-S9 *(Sa a D)*			
1,9375	3,55	4	27,5125
2,5875	3,55	4	36,7425
3,55	3,55	4	50,41
3,55	3,55	4	50,41
7-S9 *(K a S1 Diagonal)*			
3,55	3,55	3	37,8075
Geometría irregular			8,7907
Geometría irregular			6,208
SUBTOTAL			217,8812
S9-S8 *(Sa a D)*			
1,9375	3,55	4	27,5125
2,5875	3,55	4	36,7425
3,55	3,55	4	50,41

3,55	3,55	4	50,41
S9-S8 (K a S1 Diagonal)			
3,55	3,55	4	50,41
3,55	3,55	2	25,205
Geometría irregular			4,2175
Geometría irregular			12,4101
Geometría irregular			2,1471
SUBTOTAL			259,4647
S8-S7 (Sa a D)			
1,9375	3,55	4	27,5125
2,5875	3,55	4	36,7425
3,55	3,55	4	50,41
3,55	3,55	4	50,41
S8-S7 (K a S1 Diagonal)			
3,55	3,55	4	50,41
3,55	3,55	4	50,41
3,55	3,55	1	12,6025
Geometría irregular			11,6755
Geometría irregular			1,0369
Geometría irregular			10,4297
Geometría irregular			0,1845
SUBTOTAL			301,8241
S7-3' (Sa a D)			
1,9375	3,855	4	29,87625
2,5875	3,855	4	39,89925
3,55	3,855	4	54,741
3,55	3,855	4	54,741
S7-3' (K a S1 Diagonal)			
3,55	3,855	4	54,741
3,55	3,855	4	54,741
3,55	3,855	4	54,741
3,55	3,855	1	13,68525
Geometría irregular			9,6924
Geometría irregular			8,3371
SUBTOTAL			375,19525
3´-S3 (Sa a D)			
1,9375	2,55	4	19,7625
2,5875	2,55	4	26,3925
3,55	2,55	4	36,21
3,55	2,55	4	36,21
3´-S3 (K a S1 Diagonal)			
3,55	2,55	4	36,21
3,55	2,55	4	36,21
3,55	2,55	4	36,21
3,55	2,55	4	36,21

Geometría irregular			3,0718
Geometría irregular			8,5106
Geometría irregular			0,36
SUBTOTAL			275,3574
S3-S2 *(Sa a D)*			
1,9375	2,55	4	19,7625
2,5875	2,55	4	26,3925
Geometría irregular			0,6675
Geometría irregular			3,6816
Geometría irregular			7,3791
Geometría irregular			4,2447
3,55	2,55	2	18,105
3,55	2,55	4	36,21
S3-S2 *(K a S1 Diagonal)*			
3,55	2,55	4	36,21
3,55	2,55	4	36,21
3,55	2,55	4	36,21
3,55	2,55	4	36,21
3,55	2,55	3	27,1575
Geometría irregular			5,7435
Geometría irregular			1,7791
SUBTOTAL			295,963
S2-S1 *(Sa a D)*			
1,9375	2,55	4	19,7625
2,5875	2,55	4	26,3925
Geometría irregular			3,6816
Geometría irregular			0,6675
Geometría irregular			7,3791
Geometría irregular			4,2447
3,55	2,55	2	18,105
3,55	2,55	4	36,21
S2-S1 *(K a S1 Diagonal)*			
3,55	2,55	4	36,21
3,55	2,55	4	36,21
3,55	2,55	4	36,21
3,55	2,55	4	36,21
3,55	2,55	4	36,21
3,5682	2,55	1	9,09891
Geometría irregular			7,8712
Geometría irregular			4,312
SUBTOTAL			318,77501

TOTALES	**2.453,75**

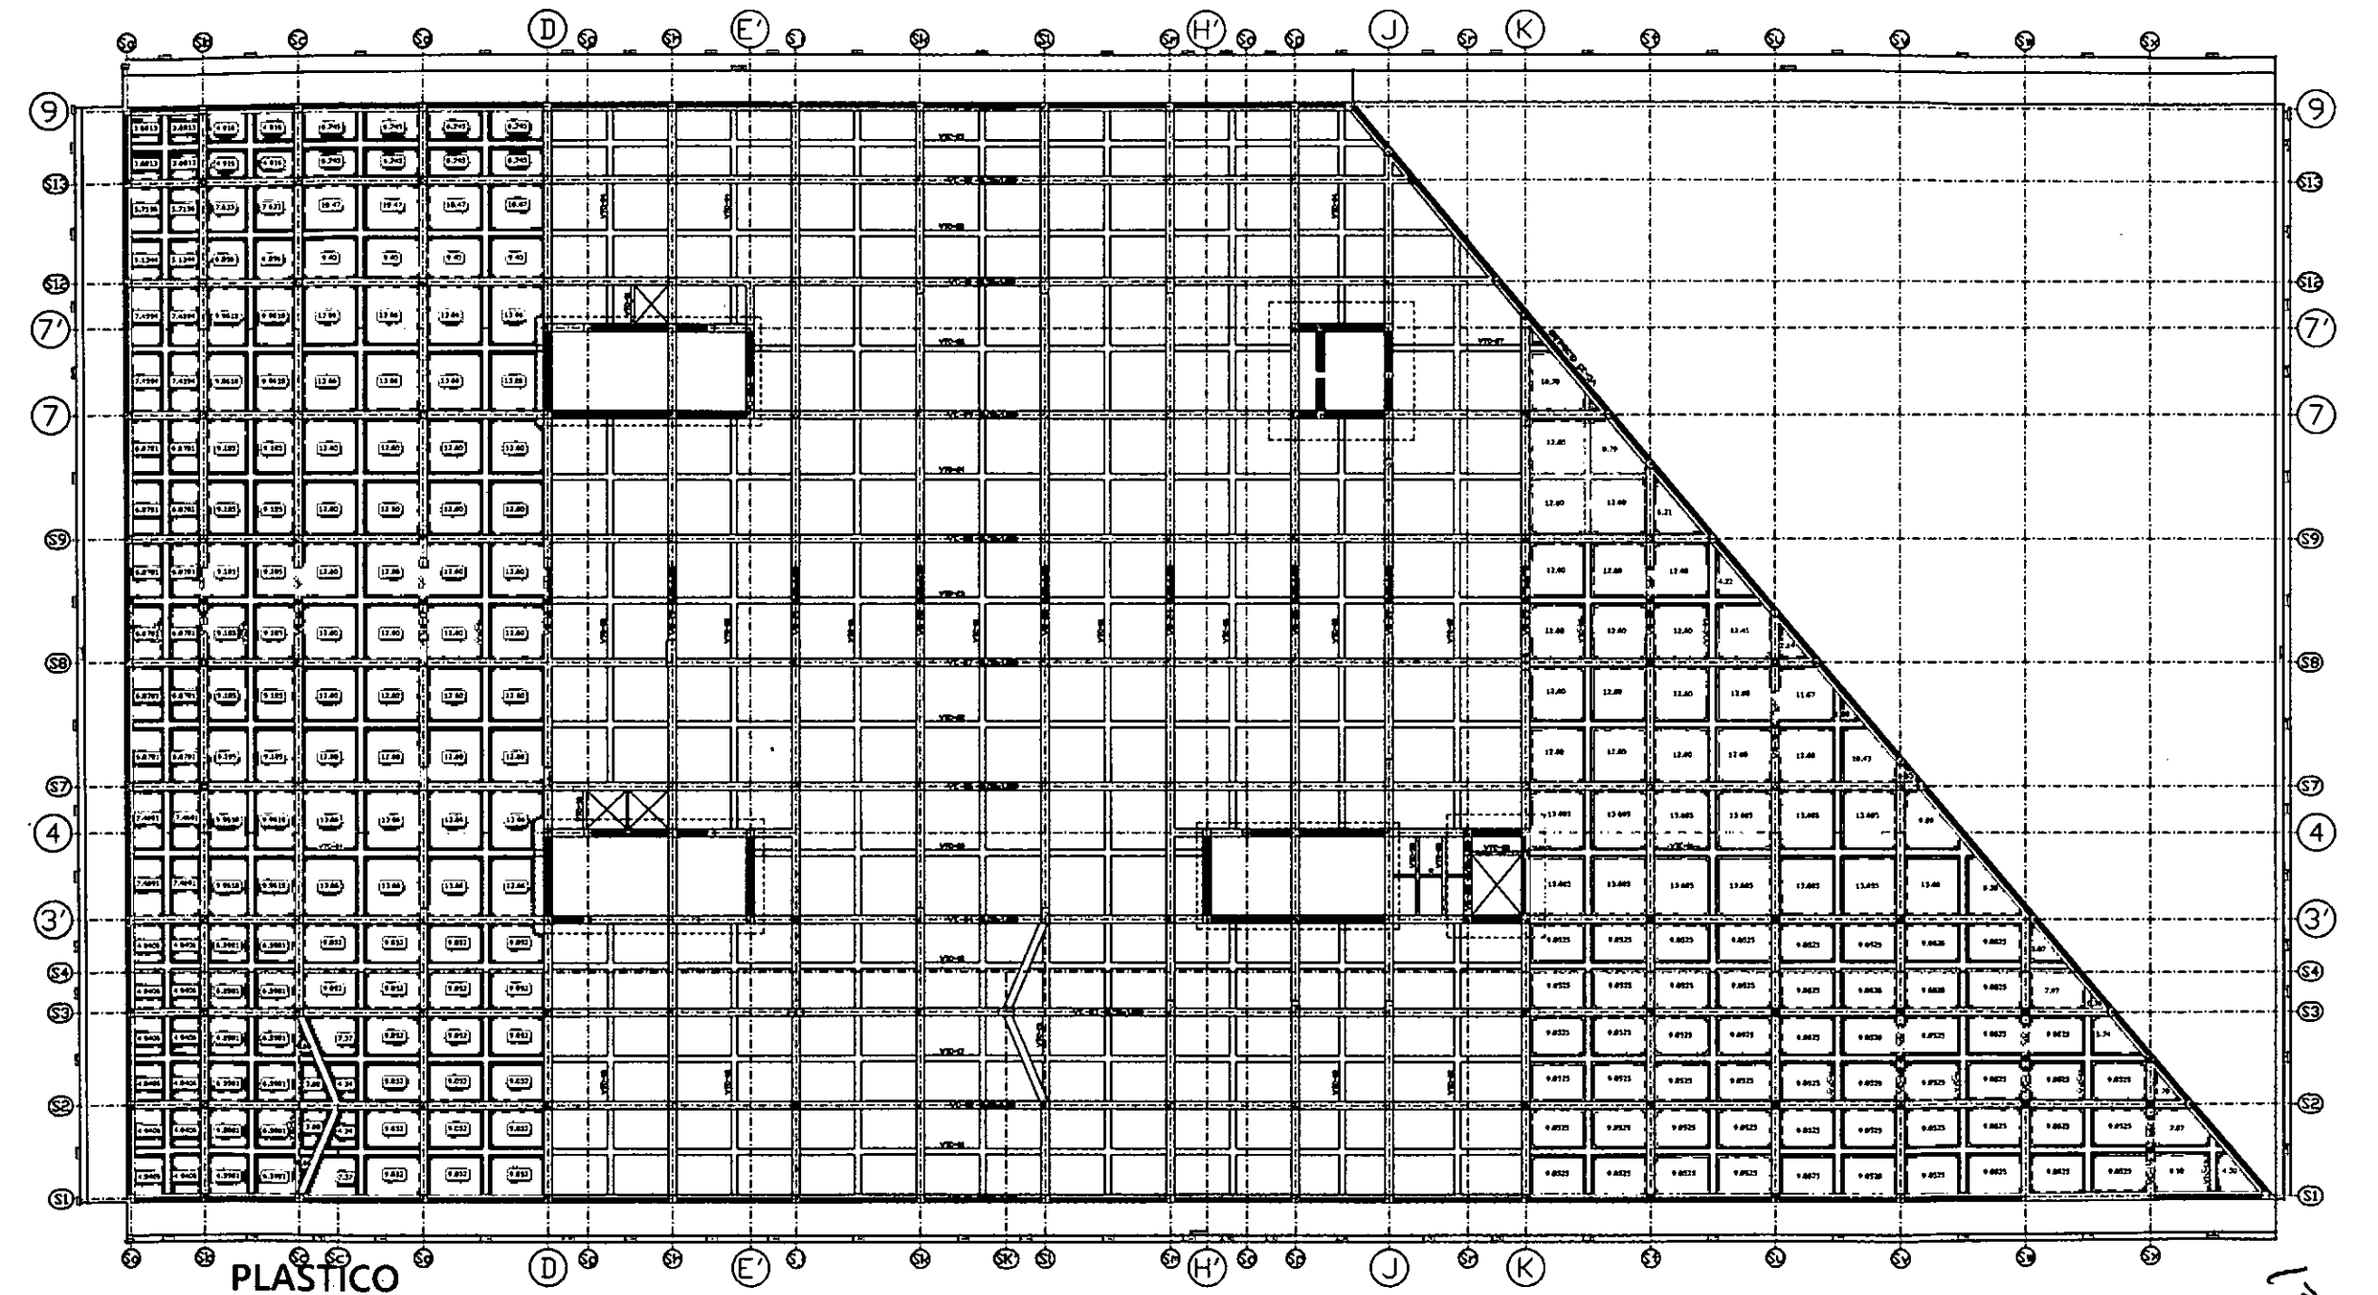

13.187

A CONSTRUIR S.A.

RESUMEN ITEM 18.2 COMPONENTE BIOSEGURIDAD

PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2022

TOTAL DEL COMPONENTE DE BIOSEGURIDAD	**VALOR**
TOTAL DESDE 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2022	17.979.315,34
VALOR A COBRAR EN ACTA #5	**17.979.315,34**

A CONSTRUIR S.A.

13.189

BIOSEGURIDAD

PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2022

VALOR TOTAL $17.979.315,34

BIOSEGURIDAD	TOTAL
ALCOHOL, JABON LIQUIDO,TOALLAS DESECHABLES, TAPABOCAS	2.625.463,34
SEÑALIZACION	
CINTA DE SEÑALIZACION, MALLA DE SEGURIDAD, SEÑALIZACION INFORMATIVA, COLOMBINAS	1.938.960,00
ENTREGA DE EPP	
GUANTES (NITRILO Y TIPO INGENIERO), GAFAS, CASCOS,CAMISETAS)	$ 3.722.892
NOMINA DE PERSONAL	
SUPERVISOR SST, INSPECTORES	$ 9.692.000
TOTAL COMPONENTE BIOSEGURIDAD	**17.979.315,34**

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 05 BIOSEGURIDAD | 2 DE MARZO AL 31 DE MARZO

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18	ITEM	18.2	DESCRIPCION:	NOMINA DE PERSONAL





Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	Valor Total
Supervisor SST	Unidad	1	$ 2.300.000,00	$ 2.300.000,00
Inspector SST	Unidad	2	$ 1.273.000,00	$ 2.546.000,00
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL	4.846.000,00
			CANTIDAD PRESENTE ACTA	4.846.000,00
			agosto	4.600.000,00
			septiembre	2.300.000,00
			octubre	2.300.000,00
			noviembre	2.300.000,00
			diciembre	2.300.000,00
			enero	2.300.000,00
			febrero	4.846.000,00
			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	25.792.000,00
			CANTIDAD CONTRACTUAL	69.695.000,00
			PENDIENTE POR PAGAR	43.903.000,00
			TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	4.846.000,00

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 05 BIOSEGURIDAD | 2 DE MARZO AL 31 DE MARZO

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18	ITEM	18.2	DESCRIPCION	BIOSEGURIDAD





Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	Valor Total
Alcohol Glicerado al 70% x 20 litros	Galon	1.057	$ 106,000.00	$ 112,009
Jabon liquido x 20 litros	Litro	7	$ 79,000.00	$ 553,000
Toallas desechables x 100 unidades	Paquete	3	$ 2,949.00	$ 8,847
Tapabocas Desechable	Paquete	61	$ 10,000.00	$ 610,000
			SUBTOTAL	1,283,856.14
			CANTIDAD PRESENTE ACTA	1,283,856.14
			agosto	325,795.00
			septiembre	1,112,725.00
			octubre	1,064,694.00
			noviembre	1,392,813.00
			diciembre	1,046,754.00
			enero	2,018,483.64
			febrero	1,714,392.00
			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	5,179,883.14
			CANTIDAD CONTRACTUAL	14,172,400.00
			PENDIENTE POR PAGAR	8,992,516.86
			TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	1,283,856.14

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

13.171

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR


SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 06 BIOSEGUIRIDAD | 2 DE MARZO AL 31 DE MARZO

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.			NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO			NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18	ITEM	18.2	DESCRIPCION:		SEÑALIZACION (Informativas, Preventivas y Obligatorias)	

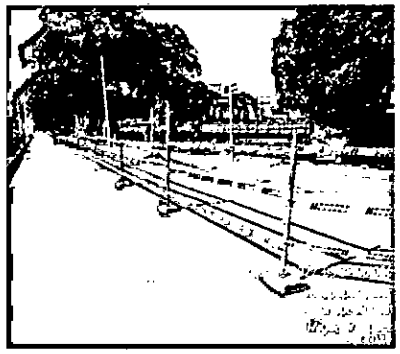

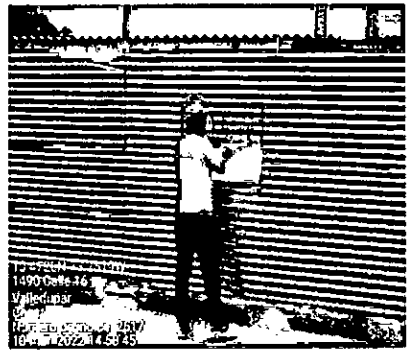

Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	Valor Total
Cinta de Señalizacion Amarilla con negro X 500mts	UN	27	$ 21.420,00	$ 578.340
Malla de seguridad Naranja X 50 mts	UN	0	$ 73.780,00	$ 0
Señalizacion (Informativas, Preventivas y Obligatorias)	UN	15	$ 45.000,00	$ 675.000
Colombinas	UN	0	$ 38.000,00	$ 0
			SUBTOTAL	$ 1.253.340
			CANTIDAD PRESENTE ACTA	1.253.340,00
			agosto	5.836.000,00
			septiembre	3.823.000,00
			octubre	847.360,00
			noviembre	2.768.000,00
			diciembre	1.028.160,00
			enero	1.437.760,00
			febrero	2.453.720,00
			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	22.047.360,00
			CANTIDAD CONTRACTUAL	24.695.200,00
			PENDIENTE POR PAGAR	2.647.840,00
			TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	1.253.340,00

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

13.192

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 05 BIOSEGURIDAD

periodo: 2 DE MARZO AL 31 DE MARZO

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR				
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18.0	ITEM	18.2	DESCRIPCION	ENTREGA DE EPP





Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	Valor Total
Guantes Tipo Ingeniero Reforzados	Pares	176	$ 7.735,00	$ 1.361.360,00
Guantes de Nitrilo 13"	Pares	167	$ 4.736,00	$ 790.912,00
Gafas Lentes Oscuras	Unidad	70	$ 2.300,00	$ 161.000,00
Gafas Lentes Claros	Unidad	0	$ 2.300,00	$ 0,00
Casco de Seguridad Certificado	Unidad	5	$ 11.900,00	$ 59.500,00
Proteccion Auditiva de Insercion	Unidad	0	$ 1.785,00	$ 0,00
Protector Para careta de pulidora	Unidad	0	$ 6.500,00	$ 0,00
Botas de Seguridad con Puntera	Pares	0	$ 73.661,00	$ 0,00
Botas de Caucho con Puntera	Pares	0	$ 34.391,00	$ 0,00
Chaleco Reflectivos	Unidad	0	$ 12.495,00	$ 0,00
Camiseta tipo Buzo	Unidad	0	$ 15.000,00	$ 0,00
			SUBTOTAL	2.372.772,00

CANTIDAD PRESENTE ACTA	2.372.772,00
agosto	3.951.923,00
septiembre	4.481.081,00
octubre	4.912.953,00
noviembre	4.410.617,00
diciembre	4.445.748,00
enero	3.426.443,00
febrero	3.674.556,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	31.676.093,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	217.026.072,00
PENDIENTE POR PAGAR	185.349.979,00
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	2.372.772,00

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

193

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 05 BIOSEGURIDAD

periodo: 1 DE abril AL 30 DE abril

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR				
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18.0	ITEM	18.2	DESCRIPCION	ENTREGA DE EPP





Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	Valor Total
Guantes Tipo Ingeniero Reforzados	Pares	52	$ 7.735,00	$ 402.220,00
Guantes de Nitrilo 13"	Pares	150	$ 4.736,00	$ 710.400,00
Gafas Lentes Oscuras	Unidad	36	$ 2.300,00	$ 82.800,00
Gafas Lentes Claros	Unidad	0	$ 2.300,00	$ 0,00
Casco de Seguridad Certificado	Unidad	12	$ 11.900,00	$ 142.800,00
Proteccion Auditiva de Insercion	Unidad	0	$ 1.785,00	$ 0,00
Protector Para careta de pulidora	Unidad	0	$ 6.500,00	$ 0,00
Botas de Seguridad con Puntera	Pares	0	$ 73.661,00	$ 0,00
Botas de Caucho con Puntera	Pares	0	$ 34.391,00	$ 0,00
Chaleco Reflectivos	Unidad	0	$ 12.495,00	$ 0,00
Camiseta tipo Buzo	Unidad	0	$ 15.000,00	$ 0,00
			SUBTOTAL	1.338.220,00

CANTIDAD PRESENTE ACTA	1.338.220,00
agosto	3.951.923,00
septiembre	4.481.081,00
octubre	4.912.953,00
noviembre	4.410.617,00
diciembre	4.445.748,00
enero	3.426.443,00
febrero	3.674.556,00
marzo	2.372.772,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	33.014.313,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	217.026.072,00
PENDIENTE POR PAGAR	184.011.759,00
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	1.338.220,00

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A

EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR


SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 06 BIOSEGURIDAD | 1 DE abril AL 30 DE abril

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR					
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002	
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007	
CAPÍTULO	18	ITEM	18.2	DESCRIPCION	BIOSEGURIDAD	



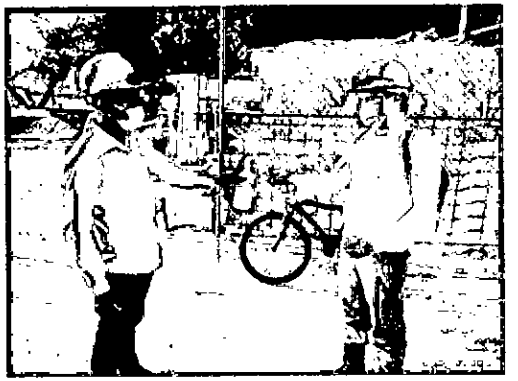

Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	Valor Total
Alcohol Glicerado al 70% x 20 litros	Galon	1,849	$ 106.000,00	$ 196.015
Jabon liquido x 20 litros	Litro	8	$ 79.000,00	$ 632.000
Toallas desechables x 100 unidades	Paquete	8	$ 2.949,00	$ 23.592
Tapabocas Desechable	Paquete	49	$ 10.000,00	$ 490.000
			SUBTOTAL	1.341.607,20
			CANTIDAD PRESENTE ACTA	1.341.607,20
			agosto	325.795,00
			septiembre	1.112.725,00
			octubre	1.064.694,00
			noviembre	1.392.813,00
			diciembre	1.046.754,00
			enero	2.018.483,64
			febrero	1.714.392,00
			marzo	1.283.856,14
			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	11.301.119,98
			CANTIDAD CONTRACTUAL	14.172.400,00
			PENDIENTE POR PAGAR	2.871.280,02
			TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	1.341.607,20

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

13.195

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 05 BIOSEGURIDAD | 1 DE abril AL 30 DE abril

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR				
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18	ITEM	18.2	DESCRIPCION:	SEÑALIZACION (Informativas, Preventivas y Obligatorias)





Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	ValorTotal
Cinta de Señalizacion Amarilla con negro X 500mts	UN	11	$ 21.420,00	$ 235.620
Malla de seguridad Naranja X 50 mts	UN	0	$ 73.780,00	$ 0
Señalizacion (Informativas, Preventivas y Obligatorias)	UN	10	$ 45.000,00	$ 450.000
Colombinas	UN	0	$ 38.000,00	$ 0
			SUBTOTAL	$ 685.620

CANTIDAD PRESENTE ACTA	685.620,00
agosto	8.836.000,00
septiembre	3.623.000,00
octubre	847.360,00
noviembre	2.758.000,00
diciembre	1.028.160,00
enero	1.437.780,00
febrero	2.453.720,00
marzo	1.253.340,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	22.732.980,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	24.695.200,00
PENDIENTE POR PAGAR	1.962.220,00
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	685.620,00

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

13-196

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 06 BIOSEGURIDAD | 1 DE abril AL 30 DE abril

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002	
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007	
CAPÍTULO	18	ITEM	18.2	DESCRIPCION:	NOMINA DE PERSONAL	





Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	Valor Total
Supervisor SST	Unidad	1	$ 2.300.000,00	$ 2.300.000,00
Inspector SST	Unidad	2	$ 1.273.000,00	$ 2.646.000,00
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL	4.846.000,00

CANTIDAD PRESENTE ACTA	4.846.000,00	
agosto	4.600.000,00	
septiembre	2.300.000,00	
octubre	2.300.000,00	
noviembre	2.300.000,00	
diciembre	2.300.000,00	
enero	2.300.000,00	
febrero	4.846.000,00	
marzo	4.846.000,00	
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	30.638.000,00	
CANTIDAD CONTRACTUAL	69.695.000,00	
PENDIENTE POR PAGAR	39.057.000,00	
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		4.846.000,00

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

13.197

13.198

A CONSTRUIR S.A.

PMA

COMPONENTE AMBIENTAL

PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2022

VALOR TOTAL $ $ 6.927.184,00

MANEJO DE CAMPAMENTOS ALMACEN Y ACOPIOS TEMPORALES	**TOTAL**
BOLSAS PARA RESIDUOS	$ 104.100,00
BRIGADA BOAL	$ 993.084,00
CONFORMACION DEL GRUPO SOCIO-AMBIENTAL	
RESIDENTES DE OBRA	$ 5.300.000,00
CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE OBRA	
CAPACITACION	$30.0000
MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES	
BAÑOS PORTATILES Y MTO	$ 500.000
TOTAL COMPONENTE AMBIENTAL	**$ 6.927.184**

COMPONENTE SOCIAL

PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2022

VALOR TOTAL $296.000,00

COSTO PLAN DE GESTION SOCIAL	**TOTAL**
FUNCIONAMIENTO DE SAU	$156.000
CARTELERAS Y VALLAS	$ 40.000
VOLANTES Y COMUNICADO	$ 100.000
TOTAL COMPONENTE SOCIAL	**$296.000**

PMA- COMPONENTE SST

PERIODO DEL02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2022

VALOR TOTAL : $ 1.680.000

EXAMENES DE INGRESO	**TOTAL**
EXAMENES OCUPACIONALES DE INGRESO	$ 1.680.000
TOTAL COMPONENTE PMA-SST	**$ 1.680.000**

A CONSTRUIR S.A.

13.199

RESUMEN ITEM 18.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL .

PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2022

TOTAL DE LOS COMPONENTES A COBRAR	**VALOR**
TOTAL COMPONENTE AMBIENTAL	$ 6.927.184
TOTAL COMPONENTE SOCIAL	$ 296.000
TOTAL COMPONENTE PMA-SST	$ 1.680.000
VALOR A COBRAR EN ACTA #5	**$ 8.903.184**

13.199

RESUMEN ITEM 18.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL .

PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2022

TOTAL DE LOS COMPONENTES A COBRAR	**VALOR**
TOTAL COMPONENTE AMBIENTAL	$ 6.927.184
TOTAL COMPONENTE SOCIAL	$ 296.000
TOTAL COMPONENTE PMA-SST	$ 1.680.000
VALOR A COBRAR EN ACTA #5	**$ 8.903.184**

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No5

PERIODO DE EVALUACIÓN

02/03/2022 AL 31/03/2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18.0	ITEM	18.1	DESCRIPCION	PDAGA-02 Capacitación para el personal de obra





Elemento	Unidad	Cantidad	Tiempo	Vr unitario	Valor Total
Capacitación Personal	Unidad	1	1	$ 15,000	$ 15,000
				SUBTOTAL	15,000

CANTIDAD INFORMEL N°1	$	59,254
CANTIDAD INFORME N°2	$	15,000
CANTIDAD INFORME N°3	$	25,264
CANTIDAD INFORME N°4	$	15,000
CANTIDAD INFORME N°5	$	15,000
CANTIDAD INFORME N°6	$	15,000
CANTIDAD INFORME N°7	$	15,000
CANTIDAD INFORME N°8	$	15,000
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$	174,518
CANTIDAD CONTRACTUAL	$	330,000
PENDIENTE POR PAGAR	$	155,482
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		15,000

Nombre:LORENA BRACHO VARGAS)
RESIDENTE AMBIENTAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:SVETLANA FUENTES DIAZ
RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:EDISON MARINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

17-00

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR


SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 05

PERIODO DE EVALUACIÓN: 02/03/2022 AL 31/03/2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR						
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002	
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007	
CAPÍTULO	18	ITEM	18.1	DESCRIPCION		PITME-01 Manejo de Campamentos, almacenes, y acopios temporales.	





Elemento	UNIDAD	Cantidad	TIEMPO	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
BOLSAS PARA RESIDUOS	UND	167	1	$ 300	$ 50,100
				SUBTOTAL	$ 50,100

CANTIDAD INFORME Nº1	$ 19,596	
CANTIDAD INFORME Nº2	$ 18,000	
CANTIDAD INFORME Nº3	$ 30,000	
CANTIDAD INFORME Nº4	$ 39,900	
CANTIDAD INFORME Nº5	$ 43,500	
CANTIDAD INFORME Nº6	$ 43,500	
CANTIDAD INFORME Nº7	$ 45,000	
CANTIDAD INFORME Nº8	$ 50,100	
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 289,596	
CANTIDAD CONTRACTUAL	$ 4,930,200	
PENDIENTE POR PAGAR	$ 4,640,604	
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		$ 50,100

Nombre:LORENA BRACHO VARGAS
RESIDENTE AMBIENTAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: SVETLANA FUENTES DIAZ
RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDINSON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDAD[illegible]E OBRA

PERIODO DE EVALUACIÓN: 02/03/2022 AL 31/02/2022

ACTA PARCIAL Nº5

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR					
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002	
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007	
CAPÍTULO	18	ITEM	18.1	DESCRIPCION	PITME-01 Manejo de Campamentos, almacenes, y acopios temporales.	





Elemento	Cantidad	Dedicación (Hom/mes)	Tiempo (meses)	Costo mensual	Costo Total
Brigada de orden, aseo y limpieza (BOAL) 2 Obreros	2	0.2	1	$ 1,241,356	$ 496,542
				SUBTOTAL	$ 496,542
				CANTIDAD ACTA INFORMEN°1	$ 824,260
				CANTIDAD ACTA INFORME N°2	$ 496,542
				CANTIDAD ACTA INFORME N°3	$ 496,542
				CANTIDAD ACTA INFORME N°4	$ 496,542
				CANTIDAD ACTA INFORME N°5	$ 496,542
				CANTIDAD ACTA INFORME N°6	$ 496,542
				CANTIDAD ACTA INFORME N°7	$ 496,542
				CANTIDAD ACTA INFORME N°8	$ 496,542
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 4,300,057
				CANTIDAD CONTRACTUAL	$ 11,238,937
				PENDIENTE POR PAGAR	$ 6,938,880
				TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	$ 496,542

Nombre:LORENA BRACHO VARGAS
RESIDENTE AMBIENTAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: SVETLANA FUENTES DIAZ
RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:EDINSON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

13-701

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 05

PERIODO DE EVALUACIÓN

02/03/22 al 31/03/2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007

CAPÍTULO	16	ITEM	16.1	DESCRIPCION	PDAGA-01: Conformación de grupo socio ambiental





Item	Unidad	Cantidad	Tiempo	% Dedicación	Valor mensual	Valor parcial
Residente Ambiental	Persona	1	1	50%	$ 2,500,000.00	$ 1,250,000.00
Residente SISO	Persona	1	1	50%	$ 2,000,000.00	$ 1,000,000.00
Residente Social	Persona	1	1	20%	$ 2,000,000.00	$ 400,000.00
				SUBTOTAL		2,650,000.00

CANTIDAD INFORME Nº1	$	4,328,325
CANTIDAD INFORME Nº2	$	2,650,000
CANTIDAD INFORME Nº3	$	2,650,000
CANTIDAD INFORME Nº4	$	2,650,000
CANTIDAD INFORME Nº5	$	2,650,000
CANTIDAD INFORME Nº6	$	2,650,000
CANTIDAD INFORME Nº7	$	2,650,000
CANTIDAD INFORME Nº8	$	2,650,000
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$	22,878,325
CANTIDAD CONTRACTUAL	$	58,300,000
PENDIENTE POR PAGAR	$	35,421,676
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		2,650,000.00

Nombre:LORENA BRACHO VARGAS
RESIDENTE AMBIENTAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre SVETLANA FUENTES DIAZ
RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

17.109

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No5

PERIODO DE EVALUACIÓN: 01/04/2022 AL 30/04/2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR					
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002	
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007	
CAPÍTULO	18.0	ITEM	18.1	DESCRIPCION	PDAGA-02 Capacitación para el personal de obra	



Elemento	Unidad	Cantidad	Tiempo	Vr unitario	Valor Total
Capacitación Personal	Unidad	1	1	$ 15,000	$ 15,000
				SUBTOTAL	15,000

CANTIDAD INFORMEL N°1	$	59,254
CANTIDAD INFORME N°2	$	15,000
CANTIDAD INFORME N°3	$	25,264
CANTIDAD INFORME N°4	$	15,000
CANTIDAD INFORME N°5	$	15,000
CANTIDAD INFORME N°6	$	15,000
CANTIDAD INFORME N°7	$	15,000
CANTIDAD INFORME N°8	$	15,000
CANTIDAD INFORME N°9	$	15,000
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$	189,518
CANTIDAD CONTRACTUAL	$	330,000
PENDIENTE POR PAGAR	$	140,482
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		15,000

Nombre:LORENA BRACHO VARGAS
RESIDENTE AMBIENTAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:SVETLANA FUENTES DIAZ
RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDUARDO CERERDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:EDISON MARINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

13.204

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 05

PERIODO DE EVALUACIÓN

01/04/22 al 30/04/2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR				
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18	ITEM	18.1	DESCRIPCION	PDAGA-01: Conformación de grupo socio ambiental





Item	Unidad	Cantidad	Tiempo	% Dedicación	Valor mensual	Valor parcial
Residente Ambiental	Persona	1	1	50%	$ 2,500,000.00	$ 1,250,000.00
Residente SISO	Persona	1	1	50%	$ 2,000,000.00	$ 1,000,000.00
Residente Social	Persona	1	1	20%	$ 2,000,000.00	$ 400,000.00
				SUBTOTAL		2,650,000.00

CANTIDAD INFORME Nº1	$	4,328,325
CANTIDAD INFORME Nº2	$	2,650,000
CANTIDAD INFORME Nº3	$	2,650,000
CANTIDAD INFORME Nº4	$	2,650,000
CANTIDAD INFORME Nº5	$	2,650,000
CANTIDAD INFORME Nº6	$	2,650,000
CANTIDAD INFORME Nº7	$	2,650,000
CANTIDAD INFORME Nº8	$	2,650,000
CANTIDAD INFORME Nº9	$	2,650,000
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$	25,528,325
CANTIDAD CONTRACTUAL	$	58,300,000
PENDIENTE POR PAGAR	$	32,771,676
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		2,650,000.00

Nombre:LORENA BRACHO VARGAS
RESIDENTE AMBIENTAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre SVETLANA FUENTES DIAZ
RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

13.105

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 05

PERIODO DE EVALUACIÓN: 01/04/2022 AL 30/04/2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR						
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.		NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO		NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18	ITEM	18.1	DESCRIPCION		PITME-01 Manejo de Campamentos, almacenes, y acopios temporales.	





Elemento	UNIDAD	Cantidad	TIEMPO	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL
BOLSAS PARA RESIDUOS	UND	180	1	$ 300	$ 54,000
				SUBTOTAL	$ 54,000

CANTIDAD INFORME N°1	$	19,596
CANTIDAD INFORME N°2	$	15,000
CANTIDAD INFORME N°3	$	30,000
CANTIDAD INFORME N°4	$	39,900
CANTIDAD INFORME N°5	$	43,500
CANTIDAD INFORME N°6	$	43,500
CANTIDAD INFORME N°7	$	45,000
CANTIDAD INFORME N°8	$	50,100
CANTIDAD INFORME N°9	$	54,000.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$	343,596
CANTIDAD CONTRACTUAL	$	4,930,000
PENDIENTE POR PAGAR	$	4,586,404
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	$	54,000

Nombre:LORENA BRACHO VARGAS
RESIDENTE AMBIENTAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: SVETLANA FUENTES DIAZ
RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:EDINSON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

376

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL N°5

PERIODO DE EVALUACIÓN: 01/04/2022 AL 30/04/2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR				
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18	ITEM	18.1	DESCRIPCION	PITME-01 Manejo de Campamentos, almacenes, y acopios temporales.







Elemento	Cantidad	Dedicación (Hom/mes)	Tiempo (meses)	Costo mensual	Costo Total
Brigada de orden, aseo y limpieza (BOAL) 2 Obreros	2	0.2	1	$ 1,241,356	$ 496,542
				SUBTOTAL	$ 496,542

CANTIDAD ACTA INFORMEN°1	$	824,260
CANTIDAD ACTA INFORME N°2	$	496,542
CANTIDAD ACTA INFORME N°3	$	496,542
CANTIDAD ACTA INFORME N°4	$	496,542
CANTIDAD ACTA INFORME N°5	$	496,542
CANTIDAD ACTA INFORME N°6	$	496,542
CANTIDAD ACTA INFORME N°7	$	496,542
CANTIDAD ACTA INFORME N°8	$	496,542
CANTIDAD ACTA INFORME N°9	$	496,542
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$	4,796,600
CANTIDAD CONTRACTUAL	$	10,923,933
PENDIENTE POR PAGAR	$	6,127,333
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	$	496,542

Nombre:LORENA BRACHO VARGAS
RESIDENTE AMBIENTAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: SVETLANA FUENTES DIAZ
RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:EDINSON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ACTA PARCIAL N°5	PERIODO DE EVALUACIÓN: 01/04/2022 AL 30/04/2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR					
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002	
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007	
CAPÍTULO	18	ITEM	18.1	DESCRIPCION	PITME-01 Proyecto manejo de aguas superficiales y subterraneas	





Elemento	Cantidad	tiempo (mes)	valor unitario	valor total
Baños portatiles	1	1	$ 300,000	$ 300,000
Mantenimiento	1	1	$ 200,000	$ 200,000
			SUBTOTAL	$ 500,000

CANTIDAD ACTA INFORMEN°1	$ 1,633,000	
CANTIDAD ACTA INFORME N°2	$ 500,000	
CANTIDAD ACTA INFORME N°9	$ 500,000	
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 2,633,000	
CANTIDAD CONTRACTUAL	$ 22,000,000	
PENDIENTE POR PAGAR	$ 19,367,000	
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		$ 500,000

Nombre:LORENA BRACHO VARGAS
RESIDENTE AMBIENTAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: SVETLANA FUENTES DIAZ
RESIDENTE AMBIENTAL DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:EDINSON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

13708

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 05.

PERIODO DE EVALUACIÓN

2 de marzo al 31 de marzo

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18.0	ITEM	18.1			



DESCRIPCION — PDAGA-02 COSTO PLAN DE GESTION SOCIAL

Elemento	Unidad	Cantidad	Tiempo	V. unitario	Valor Total.
Funcionamiento de SAU	Mes	1,00	1,00	$ 78.000,00	$ 78.000,00
				SUBTOTAL	$ 78.000,00
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 4					$ 78.000,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					$ 624.000,00
CANTIDAD CONTRACTUAL					$ 1.716.000,00
PENDIENTE POR PAGAR					$ 1.136.000,00
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA					$ 78.000,00

Nombre: Liliana Contreras G.

SOCIAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: Claudia Hurtado

RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA.
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA.
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

47.769

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 05.


PERIODO DE EVALUACIÓN

2 de marzo al 31 de marzo

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.		NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR		NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18.0	ITEM	18.1	DESCRIPCION			PDAGA-02 COSTO PLAN DE GESTION SOCIAL





Elemento	Unidad	Cantidad	Tiempo	V. unitario	Valor Total.
Cartelera y vallas	1	1,00	1,00	$ 20.000,00	$ 20.000,00
				SUBTOTAL	$ 20.000,00
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 4					**$ 20.000,00**
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					$ 160.000,00
CANTIDAD CONTRACTUAL					$ 420.000,00
PENDIENTE POR PAGAR					**$ 260.000,00**
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA					**$ 20.000,00**

Yiliana Contreras G.

Nombre:

SOCIAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Claudia Hinojosa

Nombre:

RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA.
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA.
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

13,210

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.


DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 05.

PERIODO DE EVALUACIÓN: 2 de marzo al 31 de marzo

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.		NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR		NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18.0	ITEM	18.1	DESCRIPCION			PDAGA-02 COSTO PLAN DE GESTION SOCIAL





Elemento	Unidad	Cantidad	Temp	V. unitario	Valor Total.
Volante y comunicados	1	1,00	1,00	$ 50.000,00	$ 50.000,00
				SUBTOTAL	$ 50.000,00
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 4					$ 50.000,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					$ 400.000,00
CANTIDAD CONTRACTUAL					$ 1.100.000,00
PENDIENTE POR PAGAR					$ 700.000,00
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA					$ 50.000,00

Liliana Contreras G.

Nombre:

SOCIAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Claudia Hugues

Nombre:

RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA.
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA.
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

17,21

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 05.

PERIODO DE EVALUACIÓN: 1 de abril al 30 de abril

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18.0	ITEM	18.1	DESCRIPCION		PDAGA-02 COSTO PLAN DE GESTION SOCIAL



Elemento	Unidad	Cantidad	Tiempo	V. unitario	Valor Total.
Cartelera y vallas	1	1,00	1,00	$ 20.000,00	$ 20.000,00
				SUBTOTAL	$ 20.000,00
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 5					$ 20.000,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					$ 160.000,00
CANTIDAD CONTRACTUAL					$ 420.000,00
PENDIENTE POR PAGAR					$ 260.000,00
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA					$ 20.000,00

Liliana Contreras García

Nombre:

SOCIAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Claudia Hugo

Nombre:

RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA.
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA.
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

13,742

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 05.

PERIODO DE EVALUACIÓN: 1 de abril al 30 de abril

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18.0	ITEM	18.1	DESCRIPCION		PDAGA-02 COSTO PLAN DE GESTION SOCIAL



Elemento	Unidad	Cantidad	Temp	V. unitario	Valor Total.
Funcionamiento de SAU	Mes	1,00	1,00	$ 78.000,00	$ 78.000,00
				SUBTOTAL	$ 78.000,00

CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 5	$ 78.000,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 702.000,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	$ 1.716.000,00
PENDIENTE POR PAGAR	$ 1.058.000,00
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	$ 78.000,00

Liliana Contreras García
Nombre:
SOCIAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Claudia Thupan
Nombre:
RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA.
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA.
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

13,75

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA.

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 05.

PERIODO DE EVALUACIÓN: 1 de abril al 30 de abril

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18.0	ITEM	18.1	DESCRIPCION		PDAGA-02 COSTO PLAN DE GESTION SOCIAL



Elemento	Unidad	Cantidad	Itemp	V. unitario	Valor Total.
Volante y comunicados	1	1,00	1,00	$ 50.000,00	$ 50.000,00
				SUBTOTAL	$ 50.000,00

CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 5	$ 50.000,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 450.000,00
CANTIDAD CONTRACTUAL	$ 1.100.000,00
PENDIENTE POR PAGAR	$ 650.000,00
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	$ 50.000,00

Liliana Contreras García.

Nombre:

SOCIAL DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Claudia Hugon

Nombre:

RESIDENTE SOCIAL DE INTERVENTORIA.
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA.
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

1344

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA


MEMORIA DE CÁLCULO DE CA...IDADES DE OBRA


DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 05 PMA

2 DE MARZO AL 31 DE MARZO

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18	ITEM	18.1	DESCRIPCION:	EXAMENES

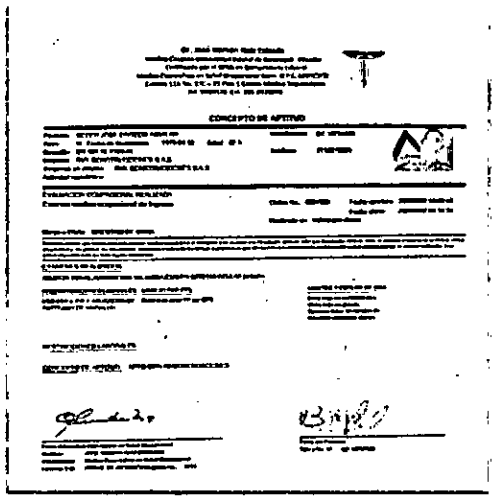

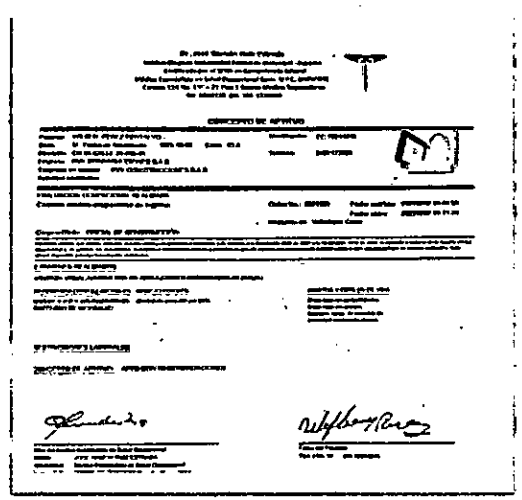

Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	ValorTotal
Optometria	UN	16	$ 11.970,00	$ 191.520
espirometria	UN	16	$ 13.440,00	$ 215.040
audiometria	UN	16	$ 11.340,00	$ 181.440
examenes medicos general	UN	16	$ 15.750,00	$ 252.000
examen de retira	UN	0	$ 18.000,00	$ 0
			SUBTOTAL	$ 840.000
			CANTIDAD PRESENTE ACTA	$ 840.000
			agosto	4.357.500,00
			septiembre	577.000,00
			octubre	945.000,00
			noviembre	3.990.000,00
			diciembre	$ 1.837.500
			enero	$ 2.152.500
			febrero	$ 2.992.500
			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 17.692.000
			CANTIDAD CONTRACTUAL	24.695.200,00
			PENDIENTE POR PAGAR	7.003.200,00
			TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	840.000,00

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

13.715

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR


SECRETARÍA DE INFRAESTRUTURA


MEMORIA DE CÁLCULO DE CA...DADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 06 BIOSEGURIDAD | 1 DE abril AL 30 DE abril

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.		NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO		NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007
CAPÍTULO	18	ITEM	18.2	DESCRIPCION:	EXAMENES	

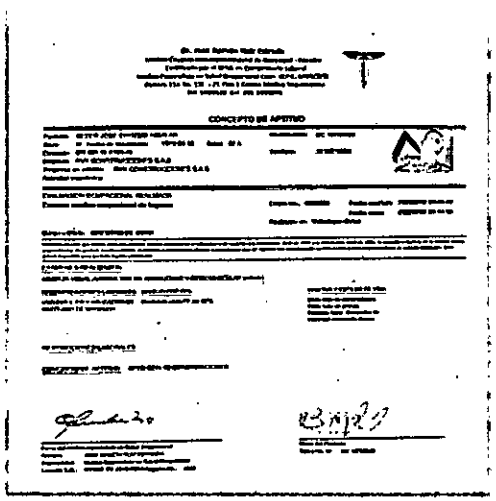

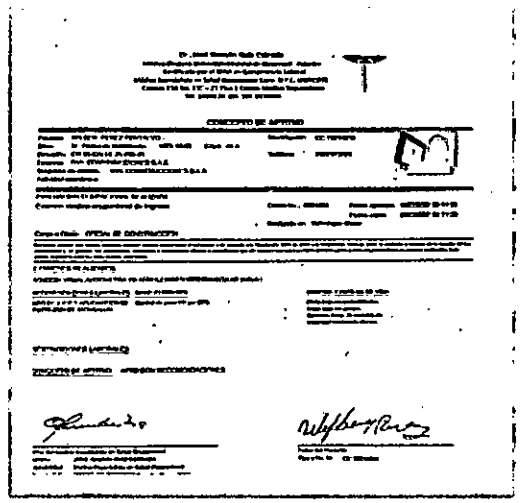

Elemento	Unidad	Cantidad	Vr unitario	ValorTotal
Optometria	UN	16	$ 11.970,00	$ 191.520
espirometria	UN	16	$ 13.440,00	$ 215.040
audiometria	UN	16	$ 11.340,00	$ 181.440
examenes medicos general	UN	16	$ 15.750,00	$ 252.000
examen de retira	UN	0	$ 18.000,00	$ 0
			SUBTOTAL	$ 840.000
			CANTIDAD PRESENTE ACTA	$ 840.000
			agosto	4.357.500,00
			septiembre	577.000,00
			octubre	945.000,00
			noviembre	3.990.000,00
			diciembre	$ 1.837.500
			enero	$ 2.152.500
			febrero	$ 2.992.500
			marzo	$ 840.000
			TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 18.532.000
			CANTIDAD CONTRACTUAL	24.695.200,00
			PENDIENTE POR PAGAR	6.163.200,00
			TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	840.000,00

Nombre: ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA
SUPERVISOR DE SST
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre:KATHERINE GARCIA
SUPERVISOR SST DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre:EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR


13.216

A CONSTRUIR S.A.

INFORME DE GESTIÓN DEL CONTRATISTA

INFORME DE OBRA #5

FECHA DE CORTE: 2 DE MARZO DE 2022 – 30 DE ABRIL DE 2022

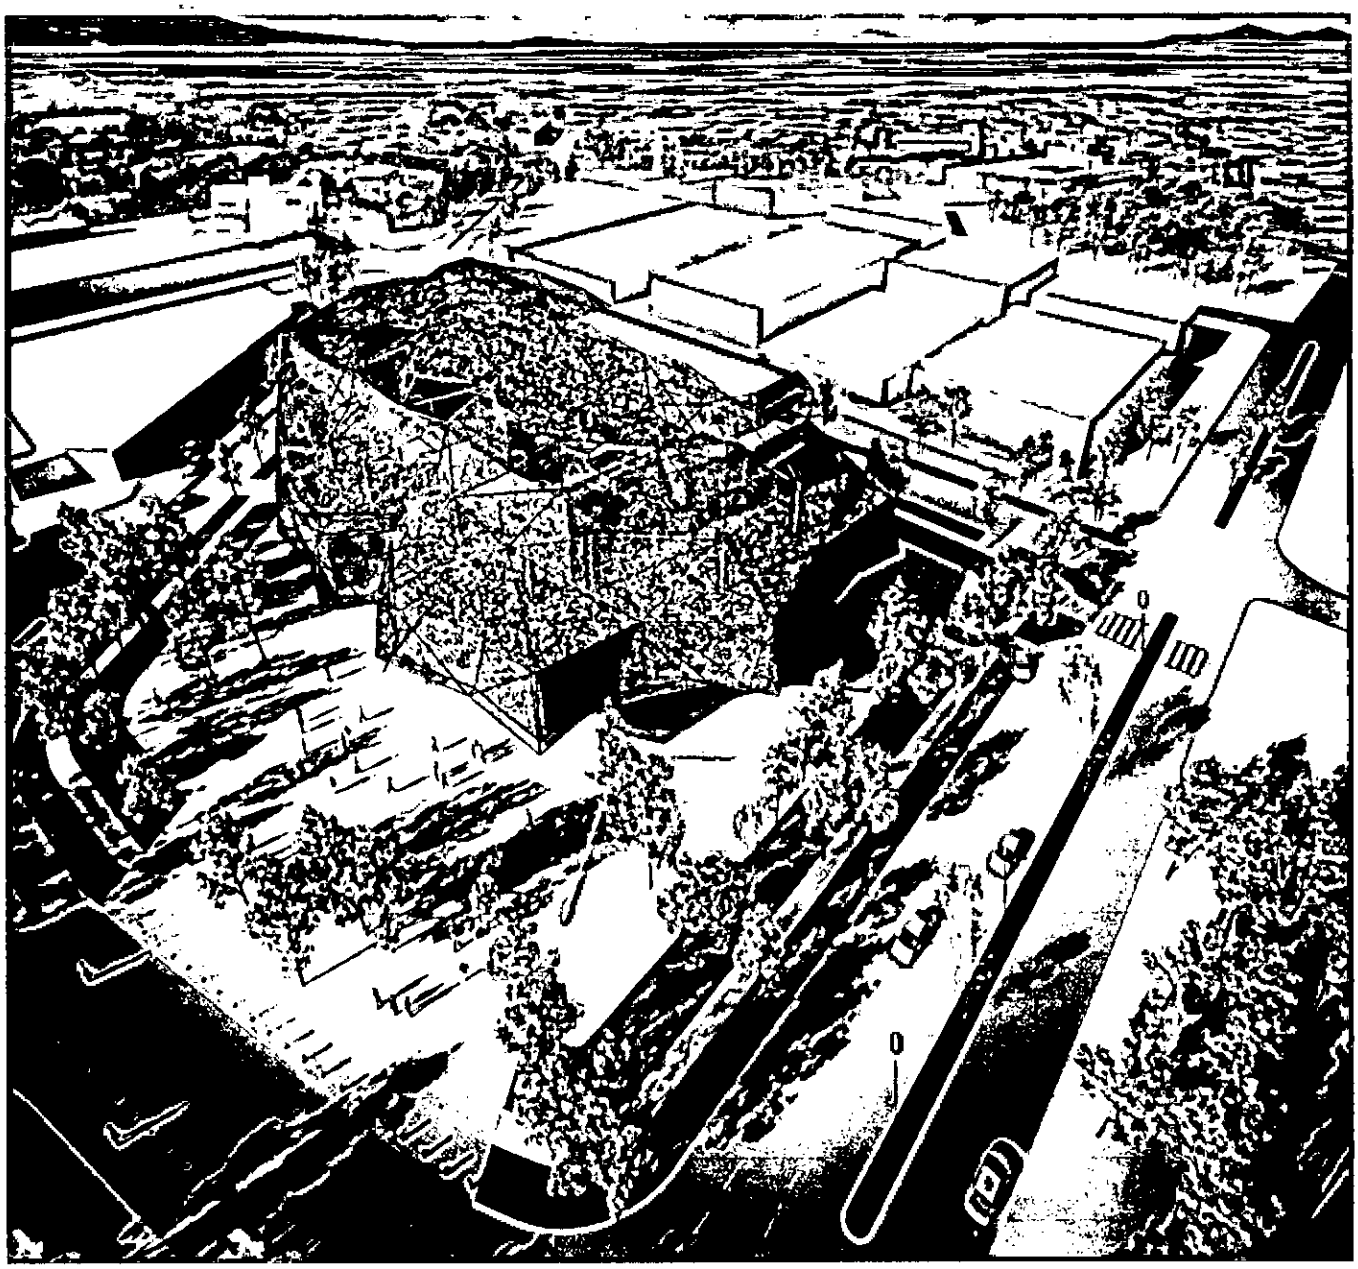

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

1378

1. INFORME DE GESTIÓN DE OBRA #5

1.1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

1.1.1. Número de contrato: 2021040002

1.1.2. Objeto: Construcción del Centro de eventos, histórico y cultural de la música vallenata en el municipio de Valledupar, departamento del Cesar.

1.1.3. Vr. contrato: $ 138.817.668.949,109

1.1.4. Plazo: 22 MESES

1.1.5. Fecha de Inicio: 12 de Julio de 2021

1.2. AVANCE DE OBRA

1.2.1. Cronograma de actividades programadas y ejecutadas para este corte

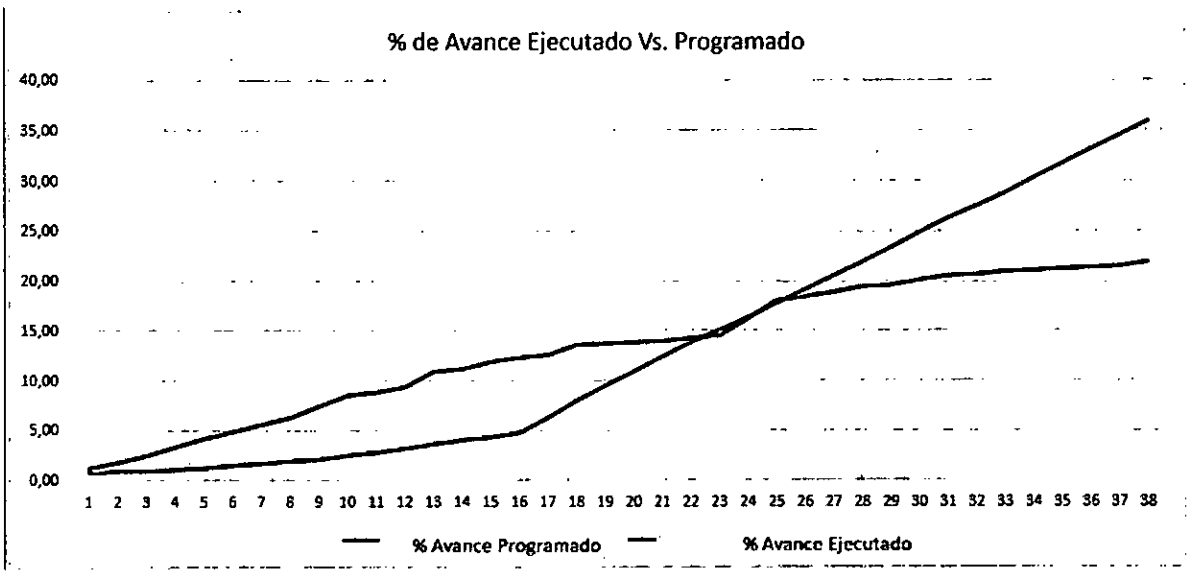


Imagen No. 1. Gráfico programado vs ejecutado


A la fecha se tiene un avance de obra **ejecutado de 21.85%** con un avance de obra **programado de 35.08%.**

1.2.2. Actividades Técnicas

1.2.2.1. Excavaciones y Relleno

1.2.2.1.1. Excavación Zapatas:

Se cobra para este periodo la excavación de todas las zapatas a las cuales se les hizo recalce o recrecimiento. El volumen para esta acta es de 292.96 m3 aproximadamente.

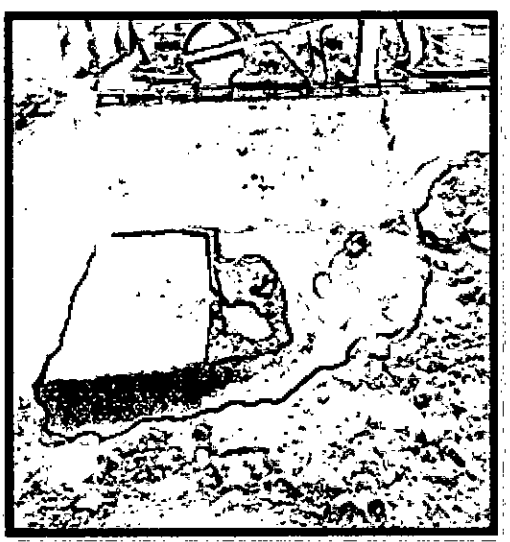


1.2.2.2. Cimentación

1.2.2.2.1. Actividades para Cimentación


1.2.2.2.1.1. Acero de refuerzo fy 60,000psi

La cantidad ejecutada a este momento es de 40780.33 Kg el cual fue suministrado y armado con alambre negro.

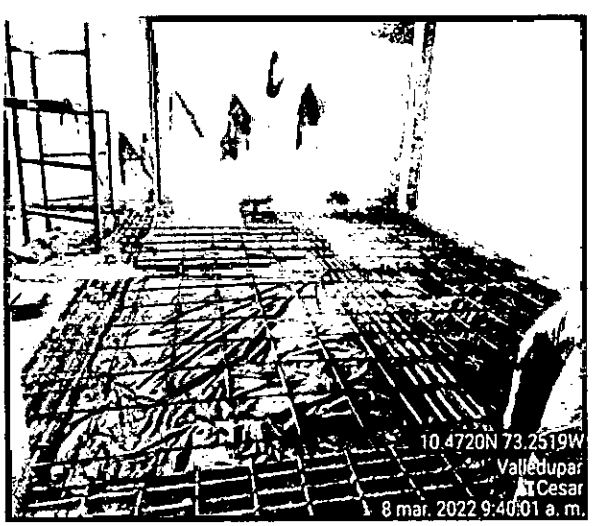

1.2.2.2.1.2. Concreto 4000Psi Losa de cimentación

Debido a los cambios presentados en la cimentación, los cuales fueron generados por el aumento del nivel de la edificación; se reevaluó la cimentación, por lo que se produce una cantidad de 595.97 m3 de losa de cimentación.

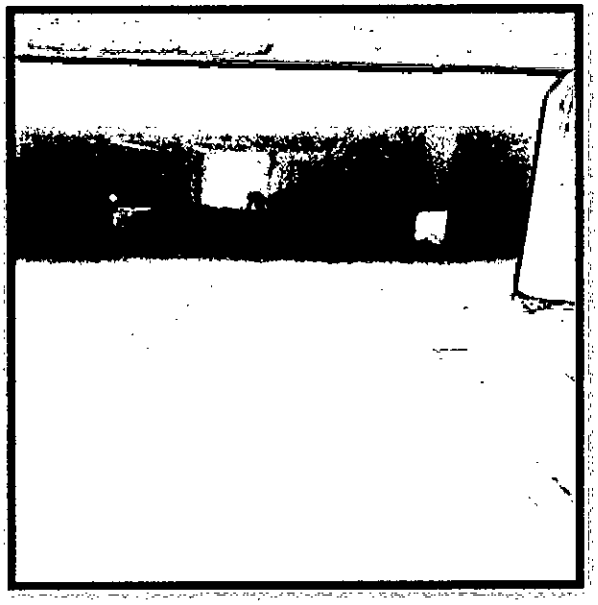

1.2.2.3. Columnas y pantallas de concreto:

1.2.2.3.1. Columnas y muros:


Para estos muros se usó un concreto de 4000psi con grava de ¾", se usó luego de desencofrar antisol blanco para asegurar un correcto curado de la estructura. En total para este periodo se usó 224.23 m3.

1.2.2.4. Placas de Sótano

1.2.2.4.1. Losa de entrepiso aligerada nivel N+0,50


1.2.2.4.1.1. Aligeramiento en casetón de icopor removible

Se prepara la superficie sobre la cual se va a fundir la losa donde se incluye instalación y nivelación de chazas, parales y cerchas, además de otras actividades subyacentes para un total ejecutado 2.345,42 m².

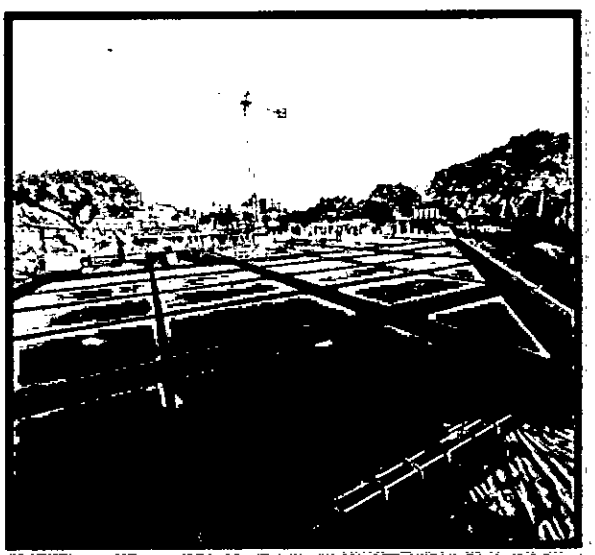


1.2.2.4.1.2. Malla electro soldada Losa

Para esta actividad Se usó malla de 8mmx8mm espaciadas 15x15cm, tal como lo indica el diseño para un total de 12727.76 Kg.

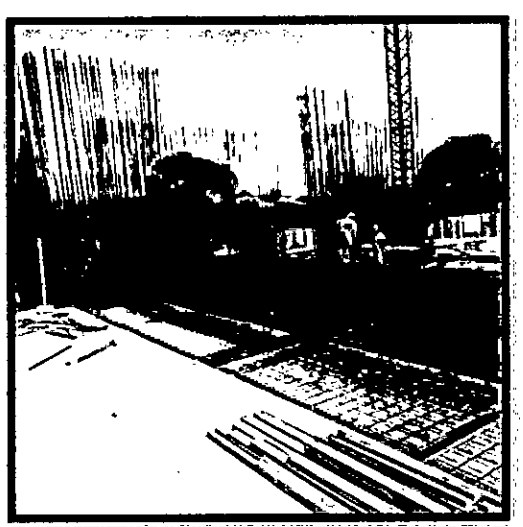

1.2.3.4.1.3 Concreto 4000Psi para losa aligerada E=60cm

Se vaciaron para la losa para un total de 660,79 m3 con concreto de 4000 psi según indicaciones en los planos

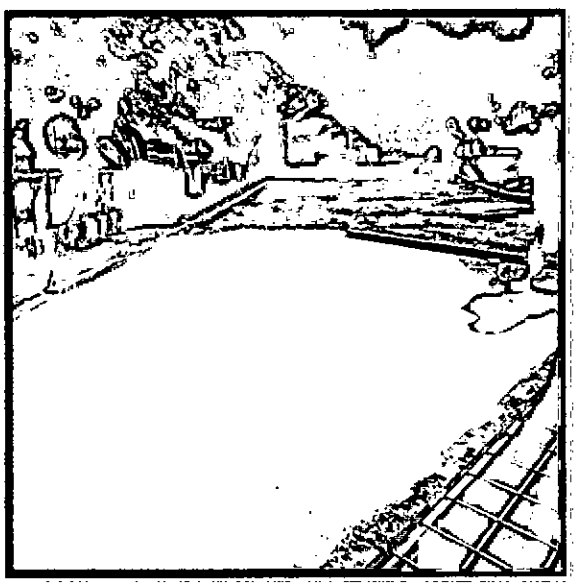

1.2.3.4.1.4 GEOTEXTIL NT 1600

Este geotextil tiene buena adaptabilidad a las des uniformidades de los terrenos, unas excelentes propiedades para protección y muy buenas funciones de filtración y separación, la cantidad a cobrar es de 5218.46 m2.




1.2.3.4.1.5 POLIETILENO (impermeabilización de piso)

En esta actividad se cobrará el valor de 2453,75m2.

1.2.3.4.1.6 Instalaciones Eléctricas

- Cable Cu No. 2/0 AWG desnudo
- Soldadura exotérmica 150 ó 200g (cable-cable en T)
- Electrodo de Cu para puesta a tierra de 5/8"x2,4m
- Varilla copperweld 5/8"x2,4 mts
- Soldadura exótermica

Estas actividades se realizaron para la malla de puesta a tierra de la subestación (SPT) y el anillo del sistema de protección contra rayos (SIPRA).

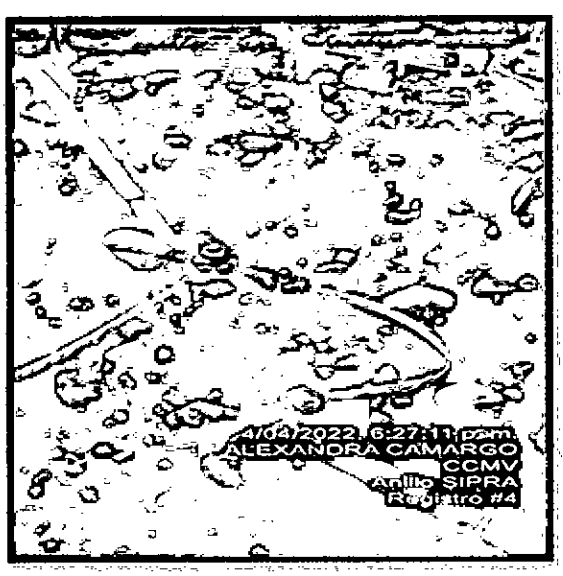




En este periodo se incluyeron actividades no prevista en el contrato generando modificaciones estas actividades son las siguientes:

7.1. ESTRUCTURA METÁLICA (INC. PLATINAS, PERNOS Y DEMÁS)

Para esta actividad previamente se comenzó la fabricación de los perfiles en la ciudad de Barranquilla donde se transportan a la ciudad de Valledupar donde serán izados, para este periodo se estará cobrando el 35% de la fabricación de la estructura con un valor de 2447350,13 Kg.

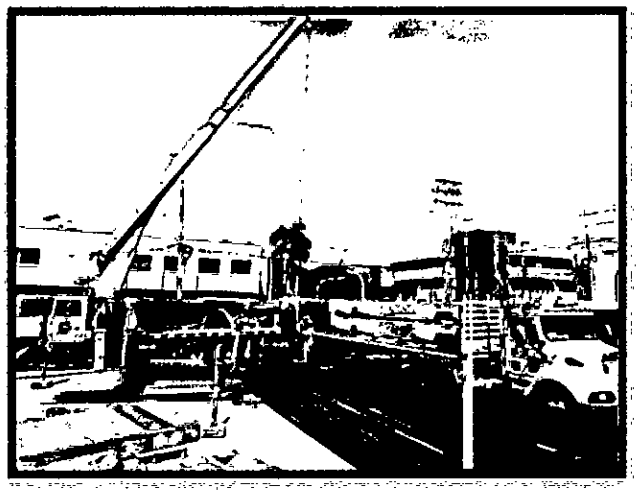

Estas actividades de anclaje se realizan para la unión del acero en columnas y zapatas a las cuales se le hizo un recalce y según los diseños son necesarios para su buen funcionamiento.

En el mes de marzo y abril la alcaldía municipal dependencia de espacio público entrega permiso para ampliación del cerramiento de la obra, acopio de estructuras metálicas y proceso de siembre de individuos arbóreos.

2.1 PROGRAMA 01: INFORMACION A LA COMUNIDAD.

2.1.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

El día 10 de marzo de 2022, se realiza acompañamiento a la gobernación del Cesar en reunión con los vendedores informales estacionarios.


El día 17 de marzo de 2022, se realiza acompañamiento a gobernación del Cesar en mesa de trabajo junto a la oficina de espacio público de la alcaldía municipal de Valledupar.

El día 7 de marzo de 2022, se realiza recorrido con la gobernación del Cesar en acompañamiento de identificación de los vendedores informales estacionarios.

El día 22 de marzo de 2022, se asistió a mesa de trabajo por parte de la gobernación del Cesar secretaria de infraestructura, junto a la interventoría con el fin de programar actividades del plan de gestión social.



Acompañamiento a reunión reubicación temporal de los vendedores informales estacionarios del CCMV

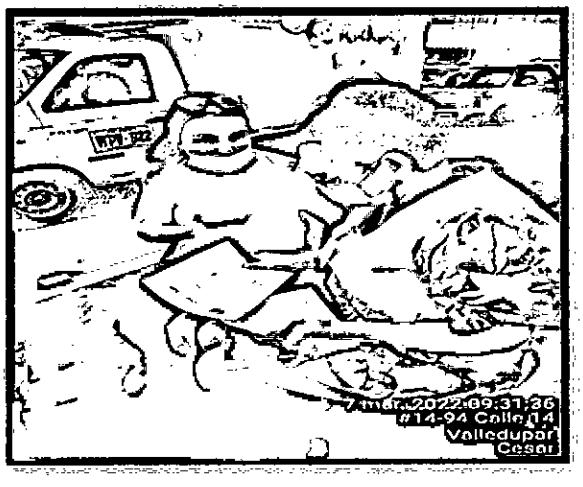

Acompañamiento a la gobernación del Cesar en identificación de los vendedores informales estacionarios reubicados voluntariamente.



Visita a la obra de grupo de periodistas de la gobernación del Cesar



Folleto de obra

2.2 PROGRAMA 02: PGS- divulgación.


2.2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

El día 16, 17, 22 y 25 de marzo de 2022, se realizó entrega de volante No. 13 de pedagogía para el uso de senderos peatonales.


Durante el mes de marzo se distribuyó folleto del proyecto en obra en donde se ilustra los lugares a construir.

13-127


El día 15 de marzo de 2022, se recibe por parte de la gobernación del cesar, secretaria de infraestructura letreros a publicar del traslado de los comerciantes y el día 24 de marzo se realiza su instalación.

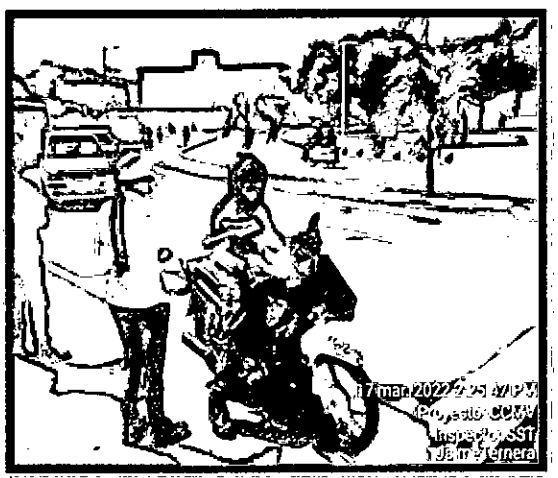


Entrega de volante informativo No. 13.

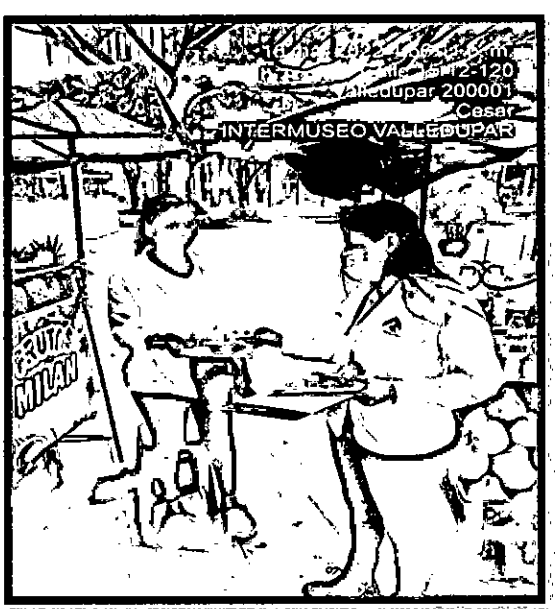

Entrega de volante informativo No. 13.

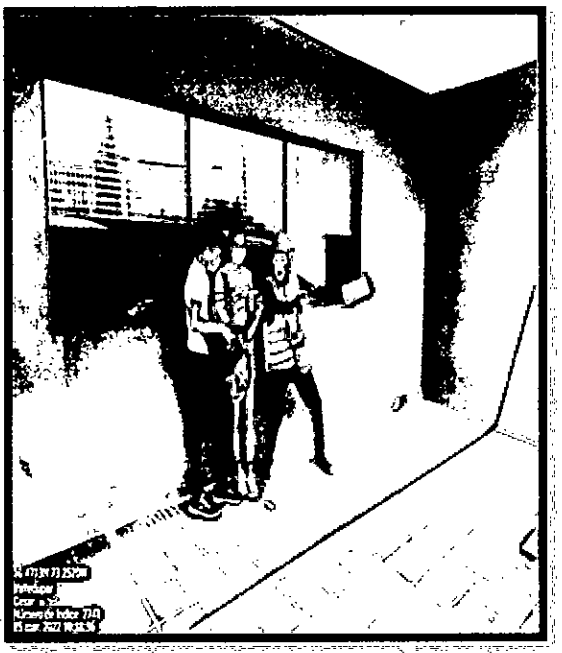

Entrega de volante informativo No. 13, por mimo.

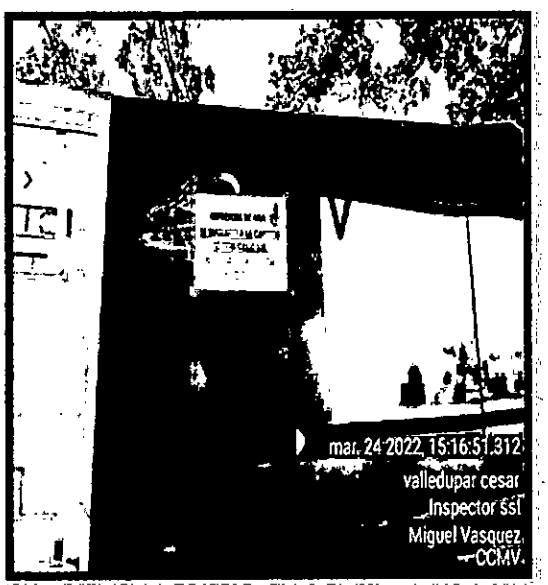

Publicación de letreros por parte de la Gobernación del Cesar.

13.279

2.3 PROGRAMA 03: PGS- RESTITUCION DE BIENES AFECTADOS.

2.3.1 ACTIVIDADES A DESARROLLADAS:

Indicadores de cumplimiento mes de marzo de 2022: No aplica

2.4. PROGRAMA 04: PGS-ATENCIÓN Y PARTICIPACION CIUDADANA.

2.4.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Durante el mes de marzo se realizó atención a la comunidad.

El día 4 de marzo de 2022, se realiza atención a la visita de la veeduría especializada del Cesar.

El día 11 de marzo de 2022, se realiza revisión buzones de pqrs y buzón de hojas de vida del proyecto.

El día 16 de marzo de 2022, se recibe vista de la veeduría especializada del Cesar y se realiza recorrido de obra y entrevista a trabajadores y contratista del proyecto.

El día 11 de marzo de 2022, se recibe solicitud de la veeduría especializada del cesar de la ampliación del cerramiento de obra.




Atención a la comunidad.


El día 15 de marzo de 2022 se realiza reunión mensual del grupo de gestión socio ambiental.




Durante el periodo comprendido desde el 01 de marzo al 31 de marzo de 2022, se realizó capacitación ambiental al personal que se encuentra vinculado al proyecto sobre: Orden, aseo y limpieza/ Manejo de sustancias químicas y control de derrames.



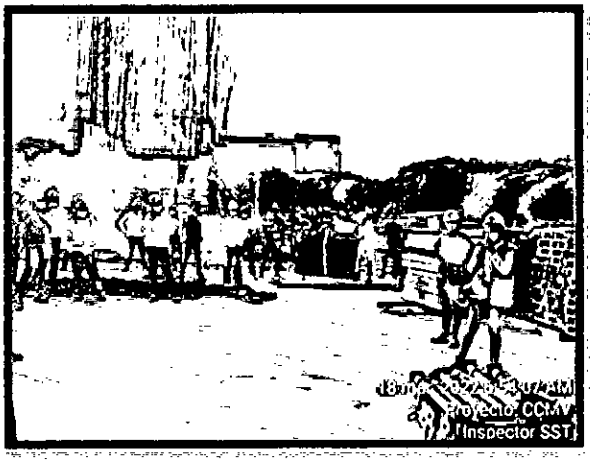

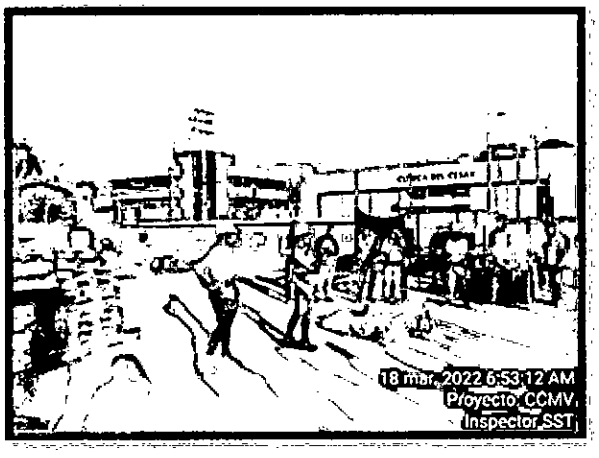



1. Se señalizó totalmente el área de trabajo (se delimitó el área con cinta peligro o malla), para delimitación del sendero peatonal y para las intervenciones se realizó con cinta peligro, sobre párales o señalizadores tubulares.

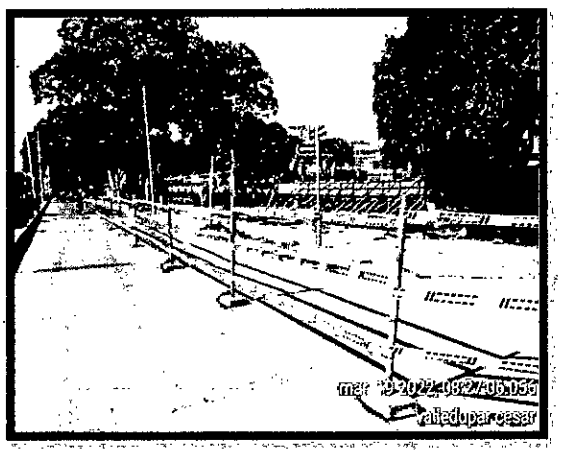




En el sitio de obra se dispusieron de canecas para el manejo de los residuos convencionales, todos con sus respectivas bolsas. La empresa de servicio público de aseo, ASEO DEL NORTE realizó la recolección residuos de forma oportuna.

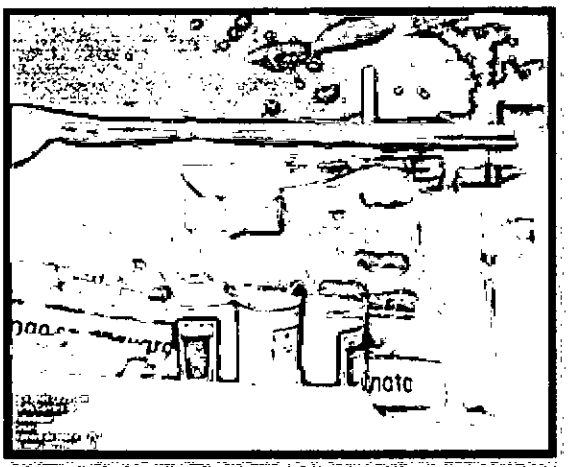

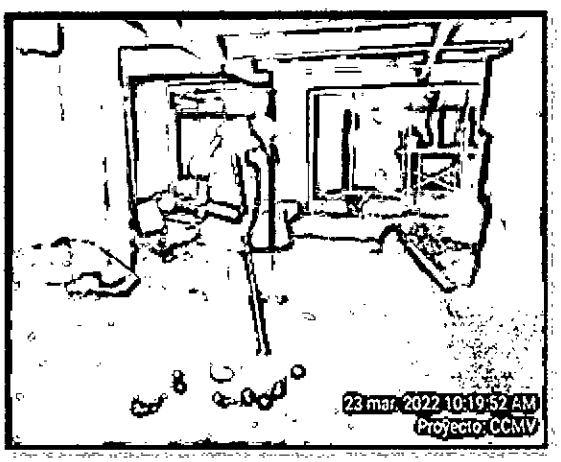

El bandillero y / o auxiliar de tráfico aseguró el flujo normal de circulación vehicular y peatonal

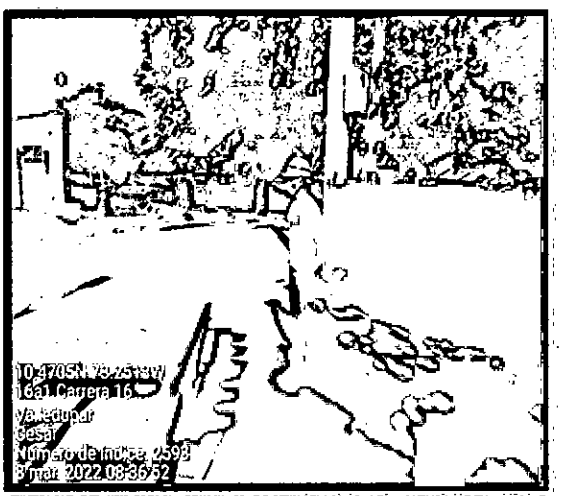

Se humedeció en caso de ser necesario, el área con el fin de evitar que el material particulado.



Se realizaron inspecciones de mantenimiento de la máquina, así como también si se han aplicado todas las medidas de seguridad.



talación de cerramiento perimetral del proyecto. Continua con armado de acero para (soportes) muro de contención. Continua adecuación de losa (de) que cubre sotano. Continua adecuación de relleno en zona del sotano. El contratista continua relleno de gravilla, subbase compactación, humectación entre vigas y viguetas. El contratista continua con desencofrado de losa. Continua con actividades de recalce de zapatas. continua actas de proceso constructivo, instalación de acero armado de formaleta para muro contención.

233 02-03-2022

ESTADO DEL TIEMPO:

Dia nublado.

Actividades ejecutadas

El contratista continua con actividades de recalce de zapata, desencofrado de recalce de columnas. Continua con armado de acero para vigas, viguetas, riostras en losa de primer piso y continua extensión de plataforma o chazas en ambos frentes de trabajo. Continua con el cerramiento perimetral, recubicación del mismo en el perimetro exterior de la obra. El contratista continua con relleno de gravilla, subbase, instalación de geotextil entre vigas y viguetas. Continua con relleno alrededor de recalce de zapatas. Continua con ajustes para encofrado de muro contención, ejes Sj — SK. El contratista realiza fundida de muro de contención entre ejes Sj - SK. El contratista continua adecuación de cielo de losa del primer piso. Continua con adecuación de relleno entre vigas y viguetas del sotano.

234 -03-03-2022.

ESTADO DEL TIEMPO

Dia soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

La interventoría realiza la revisión de localización y ubicación de casetones para proceder a realizar la

1,09

revisión y liberación del tramo #10 de la losa del primer piso. La interventoría libera localización de acero entre sitio de vigas y viguetas. Verificando el recubrimiento de las mismas. La INTERVENTORIA realiza chequeo de localización y retiro de encofrado y aplome de formaletería del muro perimetral modulo ubicado entre los ejes SK-SL. El Contratista continua instalación de cerramiento perimetral. Se realiza fundida de concreto en tramo #10 de la losa del primer piso con el proveedor Agos. El Contratista continua armado de acero para vigas, viguetas, viguetas, viguetas, viguetas para losa de primer piso en ambos frentes de trabajo. El Contratista realiza relleno de subbase, gravilla entre vigas y viguetas de cimentación. Continua con armado de formaleta para muro de contención. El Contratista continua armado de acero para recalce de columna y proceso constructivo para recalce de zapatas. Continua con adecuación de subbase en relleno de semisotano. Continuan con detalles de adecuación para vigas, viguetas de losa de 1er piso/cielo de sotano. El contratista continua armado de acero para muros contras de zapatas 32 y 231 en el primer piso. En la presente fecha se recibe visita en obra del C.C.N.V. de los diferentes medios de comunicación = Televista = telecaribe - RTA - La calle - Caracol stereo - Fillon - Atl innovaciones y el señor Gobernador (e) Andrés Felipe Plaza. Se funde muro Contención entre ejes SJ-SK.

235 04-03-2022.

ESTADO DEL TIEMPO

Dia Soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

El Contratista continua con adecuación de placa que cubre sotano, detallando vigas, viguetas, muros. Continua con adecuación de subbase en piso sotano para preparación de fundido de piso parqueadero.

13.749

El Contratista continua proceso constructivo de Recalces de columnas y recalce de zapatas. El Contratista Continua con cerramiento perimetral de la obra CCMV. El Contratista Continua con armado de acero en vigas, vigueras, riostras, casetones en ambos frentes de trabajo. El contratista realiza encofrado de muro continua de zapata Z32 en 1er piso entre eje' d muro M08 esta ubicado en el eje D entre 3'-4 y el muro P2 esta ubicado en el eje 3 entre d-5g. A obra llega acero para fundida de losa.

236 05-03-2022

ESTADO DEL TIEMPO

Dia soleado

ACTIVIDADES EJECUTADAS

En la siguiente fecha llega a obra formaletería para encofrado de recalce continua. El contratista continua con adecuación de muros, vigas, vigueras, columnas en losa de primer piso, ciclo que cubre sotano. El Contratista continua adecuación de subbase en piso sotano para fundida de piso parqueadero. Continuan relleno de subbase, compactación de subbase. Continuan con recalce de columna, recalce de zapatas. Continuan con armado de formaleta para losa de 1er piso = armado de chazos, armado de acero para viga, vigueras, riostras, instalación de gabs, o punibles, cerchas. Continuan con el cerramiento perimetral del proyecto, instalando mallas y tubos para cerramiento. El Contratista realiza excavación para vigas-vigueras en piso sotano, continuan con corte de acero y figurado de acero en obra. INTERVENTORIA recibe contrato, verifica calidad y aplome de formaleteria de la columna o Recalce de columna ubicada entre los ejes 512-5L.

237 06-03-2022. DOMINGO.

ESTADO DEL TIEMPO

Día Soleado.
ACTIVIDADES EJECUTADAS
El Contratista realiza actividades de relleno entre vigas, viguetas. Continua limpieza en obra. Contratista realiza detalles de armado de losa = instalación de malla electrosoldada, falconer, y distanciadores.
238 07-03-2022.
ESTADO DEL TIEMPO
Día Soleado
ACTIVIDADES EJECUTADAS.
El Contratista continua relleno de gravilla, instalación geotextil, relleno de subbase, compactación entre vigas y vigue-tas de cimentación. Continuan actividades de procesos constructivos de columnas de recalce y recalce de zapatas. Contratista Continua armado de acero para vigas, viguetas, riostras en ambos frentes de trabajo, sobre el armado de losa del primer piso; el Contratista continua con el desencofre de falconer, Casetones de losa fundida. El Contratista retoma actividades de relleno de (vigas) fisuras y/o grietas en vigas de cimentación con el producto CONCREFIX PE y CONCREFIX IE. El Contratista Continua adecuación de subbase en piso sotano preparando zona para fundida de piso parqueadero. El Contratista inicia proceso constructivo para fundida de piso Sotano = instalación de plastico. El Contratista Continua Excavación para Solado y armado de viga en zona de cimentación. El Contratista Continua adecuación de cielo-vigas, viguetas riostras con retiro de resabas de concreto, resane, pulida de superficie, detallado de angulos y chaflan de vigas/viguetas, detallado de columnas y muros. El contratista continua proceso constructivo para fundido de piso sotano o septimo piso: instalación de plastico, ubicación de armado de acero, distanciadores. El Contratista realiza fundida de

losa de primer piso con el proveedor Argos. Continuan con instalación de casetones, malla electrosoldada para losa de primer piso antes de fundida de losa del tramo #11, ubicado entre los ejes 5K-5J/ Eje 9-54 area de liberación 522.28m². El Contratista continua armado de acero para Muro cortina en zapatas Z32 del Muro-M08 y Muro-M01, y de la zapata Z34. Se instala formaleta para muro cortina en zapatas Z32 Muro M08 y Muro M01.

239 08-03-2022.

ESTADO del tiempo.

Dia soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

El Contratista Continua con la instalación del plastico, acero, distanciadores para piso sotapo para actividad de proxima fundida.

El Contratista continua adecuación de losa de primer piso y/o cielo de primer piso. Continua con relleno de gravilla, instalación de geotextil relleno de subbase, compactación entre vigas y viguetas. Continuan con armado de mesa y/o chafos para armado de losa de primer piso, continuan armado de acero para Vigas, Viguetas de ambas fuentes para losa de primer piso.

El Contratista Continua armado de acero para muro cortina de zapata Z. El contratista Continua fundido de Concreto con proveedor Argos para muro Cortina ubicado en zapata Z32, muro M08. ubicado en eje D entre 3'4 y el M01 ubicado en el eje 3' entre D-Sq.

240 09-03-2022

ESTADO del TIEMPO.

Dia. Soleado

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

El contratista Continua relleno de gravilla, instalación de geotextil subbase

El contratista continua con armado de acero para vigas de cimentación. Continuan con instalación de acero en piso parqueadero. Continuan con armado de losa en ambos frentes de trabajo: armado de losa de primer piso; un frente trabajando vigas y riostras S1-K. El contratista continua armando acero en muro cortina ubicado en el eje K entre 3'-4 de zapata en 1er piso. Continua colocación de cielo que cubre sotano: resane, retiro de rebabas de concreto, organizan filos de vigas.

241 10-03-2022.

ESTADO DEL TIEMPO

Dia Soleado. En las Horas de la tarde entre 1:30pm y 6:30pm se generaron lluvias.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista realizo actividades de instalación del encofrado, acero del muro cortina de la zapata 34- muro 1A ubicado en el 7', se revisa. El contratista continua instalación de acero de acero e instalación de formaleta en el muro cortina 1-4 ubicado en la zapata Z32. El contratista continua instalación de acero, distanciadores para actividades de fundida del entrepiso en el sotano entre el eje Sa y Sb. El contratista ejecuto actividades de adecuación y resane de la losa que cubre el sotano: retiran rebabas de concreto, resanes en vigas, viguetas, filos de vigas, columnas entre los ejes Sc y Sd hasta el eje S3. El contratista continua armando plataforma para armado de losa, armando acero para vigas, viguetas, riostras, casetones entre el eje S1 y SK. Continua armando acero en (zapatas) muro cortinas de las zapatas Z36-Z33, ubicados en la losa del primer piso.

242 11-03-2022

ESTADO DEL TIEMPO

Dia Soleado

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El Contratista Continua instalación de acero, distanciadores para actividades de la fundido del entrepiso en el sotano. Continua preparación de zona Subbase en sotano: limpieza y recompactación entre vigas, Vigueles para fundida de entre piso entre ejes Sb y Sc. El Contratista continua adecuación de losa que cubre sotano: vigas viguetas; resanes, retiro de rebabas del Concreto, debilitado de filos de vigas entre los ejes Sc y Sd. Continua armado de acero para muros contiguos ubicados en primer piso en zona de zapatas Z-32 / Z34 / Z33-Z36 / Z-35. Se realiza fundida en Concreto con proveedor agpos para el muro 4 ubicado entre los ejes D, E' en el eje 4. El Contratista Continua armado de losa para primer piso entre los ejes Sk y Sk.

248 12-03-2022. Sabado.

ESTADO DEL TIEMPO

Dia Soleado. Se Generaron lluvias en la noche desde 11:00pm hasta 2:00

ACTIVIDADES EJECUTADAS

La INTERVENTORIA Recibe localización, replanteo, Armado de acero de Columnas recubrimiento y aplome de muro Cortina ubicado en el eje E' entre los ejes 7-71 para proceder a (fundido) armado de formaleta para muro. El Contratista continua armado de plataforma para primer piso entre los ejes Sk y Sk, continua armado de acero para vigas, viguetas. Continua con Armado de acero para muros cortinas ubicados en el primer piso en las zapatas Z32 / Z34 / Z33-Z36 / Z35. El Contratista continua con la adecuación de la losa que cubre el sotano: vigas, viguetas, losa, retiro de rebabas del concreto, resanes resanes en filos de vigas, entre los ejes Sc y Sd. El Contratista continua preparación de Subbase en sotano: limpieza y recompactación entre vigas para fundido del entre piso entre ejes Sb y Eje Sc.

244 13-03-2022. Domingo.

ESTADO DEL TIEMPO

Se generaron lluvias en la mañana desde 5:00 am hasta 11:40 am.

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

En la presente fecha no se realizaron actividades laborales.

245 14-03-2022.

ESTADO DEL TIEMPO.

Dia Soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

La INTERVENTORIA realiza, recibe localización, replanteo centrado de acero, recubrimiento, se recibe plomo del muro cortina ubicado en el eje E' entre los ejes 3'-4. El contratista realiza actividades de adecuación de Subbase - Recompactación para piso Sotano. El contratista Continua adecuación de cielo que cubre el sotano: en vigas, viguetas, losa retira de rebabas de concreto, resane en filo de vigas entre los ejes 5C y 5d. El contratista realiza ajustes de formaleta de muro Cortina ubicado en el eje F' entre los ejes 3'-4 de la zapata Z32 ubicado en el primer piso. El contratista Continua armado de acero, instalación de formaletas para losa de primer piso. El Contratista Continua instalación de acero en muros cortinas ubicado en las zapatas Z33-Z36/Z-35. Se realizan pruebas de densidades entre vigas y viguetas, en zona de relleno con subbase en piso Sotano.

246 15-03-2022.

ESTADO DEL TIEMPO

Dia Soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El Contratista Continua armado de acero, instalación de formaleta para losa de primer piso, instalación de chazos, puntales, cerchas, acero para vigas, viguetas, riostras. El contratista termina ajustes de instalaciones de malla, cosedores, distanciadores para fundir losa.

El Contratista Realiza fundida del tramo #12 desde el eje K-S1, S1 hasta (S2)/7'-S12. El contratista Continua adecuación de losa que cubre el sobre, actividades de limpieza de rebabas de concreto, pegues, pulida de filos de vigas, viguetas. El Contratista continua con actividades del proceso constructivo para el piso del sobre - recompactación entre vigas y viguetas de cimentación, pruebas de densidad. El Contratista continua con armado de acero en muros de cortinas de las zapatas 7-33-7-36-7-35 en el primer piso. El Contratista continua instalación de encofrado de formaleta para muros cortinas de las zapatas 7-32-7-34. En la presente fecha se recibe visita de la fiscalia, visita de funcionarios de la gobernación y se realiza visita a obra en conjunto con el Contratista y la Interventoría.

247 16-03-2022

ESTADO DEL TIEMPO

Dia Soleado

2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se realizan actividades de pruebas de densidades.
Interventoría recibe localización, replanteo, alineamiento horizontal y vertical de formaleteria centrado de acero, recubrimiento y aplome de los muros cortina de la zapata nucleo 732, 734 ubicados sobre losa. primera etapa. 2.40m muro cortina ubicado en el eje 3' entre Sh-E' muro cortina ubicado en el eje 3' entre sh-E' muro cortina ubicado en el eje 7 entre D-E' mismo el muro cortina ubicado en el eje D entre 7-7'. El Contratista continua con fundicación de cerramiento perimetral refuerzo del borde de anden. El Contratista realiza fundida de muros y cortinas de las zapatas 732-734. El Contratista continua con contrafigurado y armado de acero.

Se realizo visita a la obra con acompañamiento de constructora e Interventoría.

Gracias por la atencion.

Cordo

Oscar Orjuela

13.016

El contratista continua con las actividades de adecuación en losa de primer piso: Limpieza de rebabas de concreto en vigas viguetas, resanes en chaflan de vigas. realiza recompactación de subbase para preparación de la fundida del piso sotano entre eje S13-S12. El contratista continua instalación de proceso constructivo del piso sotano: instalación del plastico entre eje S13-S12, instalación de malla para empalme entre el empalme entre eje 9 a S13 y entre eje S13 a S12. El Contratista realiza limpieza de vigas entre el eje S9-S13 en piso sotano para preparación de piso a fundir en piso sotano. En la presente fecha el contratista inicia fundida de piso sotano con el proveedor Argos con un concreto de 4.000 PSI. El contratista continua armado de acero para vigas viguetas, riostras, armado de formaleta instalación de tuboconduit en el tramo 13 de la losa del primer piso entre los ejes K-J, S1-S13. El contratista continua armado de acero despues del relleno, compactación, prueba de densidad, instalación de malla electrosoldada, instalación de disociador plastico, alrededor de los muros cortinas de la zapata Z33 en zona de cimentación. El contratista instala gumbolon en perimetro del muro de contención y de columnas. En la fecha 17 MARZO/2022 la INTERVENTORIA le sugiere al contratista realizar mayor limpieza a vigas de cimentación para liberar esta actividad y asi poder iniciar fundida de piso sotano. El contratista responde al llamado y se da liberación de la actividad. El contratista realiza proceso constructivo para la fundida del piso sotano: 17 Mar 2022 concreto plastico 4000 PSI grava 3/8, se allana, se aplica Sikafloor 3 Quartz top endurecedor superficial para pisos, se utiliza el helicoptero. El contratista realiza fundida en viga de cimentación en el eje SC hasta el eje S3. El contratista trabaja actividad de piso sotano hasta las 11:pm y continuan actividades de relleno, fundida hasta las 9:00 pm. En la presente fecha 17-03-2022 llega a obra maqueta del proyecto CCMV, cedida cultural Musica Vallenata

248 17-03-2022

ESTADO DEL TIEMPO

Día soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS: En esta presente fecha se realiza fundida de piso público en piso sotano. El contratista realiza instalación de acero de los muros cortinas y encofrado del mismo de la za. para Z32. El contratista continua actividades del proceso constructivo: instalación de casetones, acero para vigas, viguetas, losetas, formaleta en el tramo 13 de la losa del primer piso entre los ejes K-J y S1-S13, La Interventoría recibe localización y replanteo, alineamiento horizontal y vertical de formaletería centrado de acero, recubrimiento y aplome de la construcción de los muros cortinas ubicados sobre loza zapatas nucleo Z32, Z34; Muro cortina ubicado en el eje D entre S'-4 muro cortina ubicado en el eje 3' entre D-Sg muro cortina ubicado en el eje E entre 7-7'. El contratista le aplica antisol a la fundida del piso sotano del mismo ubicado en eje Sa, y Sb, desde el eje 9 hasta el eje S7, y realizan trazados de dilataciones por tend estructural. El contratista continua recompactación de subbase en ejes entre SC y Sd y entre SC y Sb. El contratista continua adecuación de vigas, viguetas con lijado, limpieza de rebabas y de resane en el mismo en los ejes entre Sd y D y entre D y Sb. El contratista continua actividades del proceso constructivo del piso fundido entre el eje Sa y Sb en el piso sotano: realizan corte a las dilataciones sembradas. El contratista inicia limpieza y verificación de nivel de subbase para recompactación en zona norte del piso sotano entre los ejes S1 y 3'. El contratista realiza armado de acero para muros cortinas en las zapatas Z33-Z34 ubicado en el entrepiso +0.50, primer piso. El contratista continua armado de acero para muros cortinas de las zapatas Z32-Z34. El contratista continua cerramiento perimetral ubicado a 1.15 m.

13.118

249 | 18-03-2022

ESTADO DEL TIEMPO

Dia Soleado

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El Contratista continua actividades de recuperación de Subbase en sotano. Continua actividades de adecuación de sotano de tijado y resane. Continua con armado de acero para vigas, viguetas, riostras, casetones en el tramo #13 Eje K-J/51-513 del primer piso. Continua con actividades de acero en muros cortinas para zapatas Z32-Z34-Z33 en el primer piso. Continua con actividades del proceso constructivo del piso fundido en el piso sotano, nivelado, trazado de distribución, corte de dilatación. Contratista Continua reubicación a 1.15 ml del bordillo del anden hacia dentro de la obra.

250 | 19-03-2022. SABADO.

ESTADO DEL TIEMPO

DIA Soleado

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El Contratista continua con actividades de armado de acero, formaleta, Lavado y limpieza de vigas para el piso sotano entre el eje 5b-5C. Continuan reconformación entre eje 5C-5C'. Continuan con Resanado y resane de vigas y viguetas en cielo de sotano. Continuan con armado de acero en Muros cortinas de zapatas 33/36/34 en 1er piso. Continua con actividades de armado de acero de los ajustes para el tramo # 13 Eje K-J/51-511 para fundida de losa del primer piso.

El Contratista realiza fundida de losa con concreto de 4000 PSI del tramo #13 Eje K-J/51-511 del primer piso.

250 | 20-03-2022 Domingo.

ESTADO DEL TIEMPO

Dia Soleado

ACTIVIDADES EJECUTADAS
Se realizan actividades de aseo.

251 21-03-2022. LUNES FESTIVO.
ESTADO DEL TIEMPO
Dia Soleado.
ACTIVIDADES EJECUTADAS
El Contratista programa actividades para la losa de Contrapiso= instalación de acero, de formaleta y su limpieza.

252 22-03-2022.
ESTADO DEL TIEMPO.
Dia Soleado
ACTIVIDADES EJECUTADAS
El Contratista Continua instalación de acero en muros. Cortinas ubicados en las zapatas Z32/Z36/Z35/Z34/ del primer piso. El Contratista continua con armado de losa para el entrepiso N+0.50 o primer piso realizando armado de viga de acero, viguetas de acero, riostras; Continuan con la instalación de estibas o chazos para poner la mesa que soportas vigas y demás en acero. El Contratista Continua limpieza y recompactación en Subsuelo del sotano. Continua con adecuación de losa, que cubre primer p) Sotano = resane en vigas-viguetas, retiro de rebabas de concreto. El Contratista realiza fundida de losa de primer piso. La Interventoria recibe localización, replanteo. alineamiento horizontal y vertical centrado de hierro recubrimiento y aplome de la Continuidad del muro Cortina. Sobre losa zapata Z34 1.20 m para un total de 3.60 m Muros. Cortinas ubicado en el eje 7 y el muro ubicado en el eje D entre 7-7'. El Contratista Continua fundida piso sotano del Eje 57 a Eje 51.

253 23-03-2022.
ESTADO DEL TIEMPO
Dia Soleado.
ACTIVIDADES EJECUTADAS=
El contratista realiza adecuacion de losa que cubre Sotano=lijado y resanes en el Eje 5D y el eje D entre 57 y 59. El Contratista Continua actividades de recompactación de subsuelo en piso

Sotano entre ejes SC y Sd. El Contratista realiza fundida de piso sotano de 1000 PSI entre el Eje Sb y sc hasta el Eje 3'. El Contratista continua armado de acero para muros cortinas en zapatas Z-32/Z-34/Z-33-Z36/Z-35. El Contratista continua armado de vigas, viguetas, riostras, instalación de tuliconos, instalación de casetones cubl armado de losa entre los ejes SP y SJ. Se continua armado de acero y continuan el armado del piso sotano ubicado entre los ejes SC y Sd.

254 24-03-2022

ESTADO DEL TIEMPO

Dia Soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Continuan con aseo, limpieza de vigas recomposición de Subbase para el piso sotano entre los ejes SC y Sd. Ejecutan adecuación del cielo que cubre el Sotano, Realizando pulidas y resane en vigas, viguetas, riostras. Contratista Continua armado de acero para muros cortinas en zapatas Z-32/Z-34/Z-33/Z-36/Z35 Ubicadas en el Primer piso. El Contratista Continua armado de acero para vigas, viguetas, riostras, instalación de casetones tuliconos para primer piso entre los ejes SP y SJ. La Interventoría realiza chequeo y verificación de los cortes de dilataciones generados en piso fundido del sotano notificandole al Contratista = Residente de obra, supervisor, Ing. de calidad; detalles de cortes desalineados y otros) zonas fuera del lugar indicando en sitio al Contratista; El Contratista dice poderse en frente del tema. El Contratista realiza fundida de losa de contrapiso del piso sotano entre los ejes Sb y SC desde el eje 9 hasta el eje 3'.

255 25-03-2022

ESTADO DEL TIEMPO

Dia Soleado

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista Continua armado de vigas viguetas riostras, instala-

ción de Casetones, malla, tolicones para la losa del primer piso entre los ejes Sp y SJ. Continua armado de acero para muros cortinas en las zapatas z-32/z-34/z-33 - z-36/z-35. El contratista continua proceso constructivo de la fundida del piso pulido ubicado en el sotano entre los ejes Sb y SC hasta el eje 3' Curado, cortes de dilataciones estructurales. Continua con preparación del frente Eje SC y Sd y entre los ejes Sb y SC desde el eje 3' hasta el eje S1 limpieza de acero en vigas, viguetas, armado de malla, instalación de plastico, recompactación de Subbase, desencofre. Contratista continua con adecuación de pulida y resane en losa que cubre el sotano entre los ejes D y Sh/entre los ejes 7 y 4. El CONTRATISTA inicia excavación para la malla electrica del CCNN, en la fecha se da inicio con las actividades electricas. En la presente fecha llega a obra puntales, formaletas, andamios. En la presente fecha la INTERVENTORIA INSPECCION TRABAJOS DE ADECUACION DE LOSA QUE CUBRE SOTANO EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA NOTIFICANDOLE detalles de resanes que aun se presentan en los ejes entre los ejes Sa y D. para El CONTRATISTA Continua actividades de limpieza de vigas, viguetas, Recompactación del Subbase entre los ejes de la diagonal S1 y Eje SX y entre el eje x y el eje Sw. El contratista continua armado y figurado de Acero en sitio. La INTERVENTORIA recibe localización, replanteo, alineamiento vertical y horizontal de formaletería, centrado recubrimiento de hierro y aplome de los muros cortina ubicados en la zapata nucleo z36. SE REALIZA COMITE SST-AMBIENTAL-SOCIAL-CALIDAD.

25b 26-03-2022. Sábado.

ESTADO DEL TIEMPO

Dia Soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista continua recompactación de Subbase entre ejes Sb y SC desde el eje S1 hasta Eje S.3. Continuan con el proceso constructivo de armado del piso pulido del sotano

13252

ubicado entre los ejes SC y SD desde el eje 9 hasta el eje 8 armado de malla, instalación de distanciadores. El Contratista Continua adecuaciones de resane y pulida en losa que cubre el sotano entre los ejes 7 y 4 de los ejes D y E. El CONTRATISTA Continuan con las actividades Electricas: Excavaciones para la malla electrica del CCMV en zona piso Sotano. La INTERVENTORIA nuevamente en conjunto con el contratista revisa y verifica el corte ejecutado de dilataciones en el piso pulido fundido del 2do tramo fundido: Eje SB y SC donde se visualiza que se estan atendiendo las observaciones entregadas, pero se le recomienda al Contratista que continuen con el mejoramiento del Corte de dilataciones por presentar detalles en menores zonas, el contratista manifiesta que estara más atento al lavado de la zona de corte antes de iniciar el proceso con la cortadora de piso concreto para lograr mayor estabilidad del mismo. El Contratista Continua recompactacion de subbase en zona norte entre los ejes Diagonal S1 y SX y entre eje SX y SW, y Continuan limpieza de vigas, viguetas entre ejes SC y SW. El Contratista Ejecuta fundida de Concreto de la losa ubicado entre ejes D y eje SP con el proveedor argos y un Concreto de 4000 PST en zona de primer piso, nivel primer piso Continuan con armado de acero para zapatas Z-32. y Continua armado de acero de vigas entre eje SP y eje SM.

257 24-03-2022

ESTADO DEL TIEMPO.

Dia Soleado. Lluvias generadas en la tarde de 4:00 a 6:00 pm.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se realizaron actividades de aseo en obra.

258 28-03-2022

ESTADO DEL TIEMPO

Dia Soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

En la presente fecha se realizan por parte del contratista

13.055

Extracción de nucleos y almacenado de la zapata 34. El contratista continua armado y ajuste de malla para piso del armado del piso pulido en el tramo de eje SC y Sd. El contratista continua recompactación de subbase en tramos de ejes SV y SW y limpieza en area de vigas en ejes SV y SW. El contratista continua armado de acero en zapatas 233-236-235-234-232, en losa del primer piso. El contratista continua armado de acero para vigas, viguetas, nostras en el tramo del eje SP y Sm de la losa del primer piso. El contratista continua adecuación de fijado y resane de la losa inferior del primer piso que cubre el sotano entre los ejes 7 y 4 y entre los ejes D y E. Continuan actividades en la excavación para la malla electrica.

259 29-03-2022

ESTADO DEL TIEMPO

Dia Soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

El Contratista ejecuta armado de acero para muros cortinas de las zapatas 233-236-235-234-232 en losa de primer piso. El contratista continua armado de acero de vigas, viguetas, riostras en la losa del primer piso en los ejes Sm a Sp. El contratista continua limpieza y nivelacion y recompactación de subbase en piso sotano en los ejes de la S1 diagonal hasta la SW. El contratista continua limpieza y recompactación en vigas de cimiento y subbase de los ejes Sd y D. El Contratista continua con adecuación de la losa, cara inferior con fijas y resanes en ejes Sd a Con 53'3.

260 30-03-2022

ESTADO DEL TIEMPO

Dia Soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El Contratista continua adecuación de losa de primer piso, que cubre el sotano más exactamente la cara inferior- adecuación de fijado y resanes. El contratista continua limpieza y recompactación de subbase en ejes Sd y D en sotano y desde SC-Sd con resanes a S1 de

El contratista continua ajustes de armado de malla del piso pulido del sotano, encofrado en los ejes del SC al Sd. El contratista continua recompactacion de Subbase en sotano en los ejes del S1 diagonal a SV. El contratista continua armado de acero de vigas, viguetas, riostras, ubicacion de casetones en los ejes Sm-Sp. El contratista continua instalacion de acero en los muros cortinas de los zapatos = Z33 - Z36 - Z35 - Z34 - Z32. El contratista continua armado y figurado de acero en sitio.

261 31-03-2022

ESTADO DEL TIEMPO.

Dia soleado

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista realiza actividades de adecuacion de la losa cara inferior que cubre el sotano - ligado y resane. El contratista realiza fundida de concreto de 4000 PSI para piso sotano entre los ejes SC y Sd hasta el eje S7. El contratista continua con el descofre de la losa del primer piso. Contratista continua con limpieza, adecuacion de subbase y recompactacion de subbase en piso sotano entre los ejes S1 diagonal hasta el eje S1. El contratista continua con armado de acero de muros cortinas de los zapatos Z33-Z36-Z35-Z34-Z32 del primer piso. El contratista continua armado de acero para las vigas, viguetas, riostras del primer piso en el tramo S1 y Sm e instalar casetones y ajustes de acero en el tramo Sm y Sp del primer piso. La INTERVENTORIA recibe y revisa sobre la marcha, niveles y espesores de fosa sotano contrapiso tramo 13 entre los ejes SC y Sd hasta el Eje S7.

262 01-04-2022

ESTADO DEL TIEMPO.

Dia soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

13.255

entre ejes S1 diagonal hasta el eje S1. y entre los ejes S6 y S8 hasta el eje S3. El contratista continua armado de acero en muros cortinas ubicados en zapatas Z36-Z35-Z33-Z34-Z32 sobre el primer piso. El contratista continua con los procesos constructivos de la fundida de piso sotano entre los ejes SC y SG hasta el eje S7 realizando curado y cortes de dilatación estructurales. El contratista continua armado de acero para el armado de malla en el piso sotano para la fundida del piso sotano. Contratista continua con adecuación de losa cara inferior del primer piso, que cubre el sotano, resanando ligado y resanes, retiro de rebabas, retiro de falconer. El contratista continua con corte y figurado de acero en obra.

263 02-04-2022. Sabado.

ESTADO DEL TIEMPO

Dia Soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista continua armado de acero para vigas, viguetas, riostras, instalan falconer ubicado en los ejes de SK a SM hasta 3'. El contratista realiza fundida de concreto en el tanco desde el eje SM a SP del Eje S1 a eje 9. El contratista continua armado de acero para muros cortinas en las zapatas Z36-Z35-Z33-Z34-Z32 sobre el primer piso. Contratista continua adecuación de losa en los tramos del eje D hasta SJ cara inferior que cubre sotano realizando ligado, resane, retiro de rebabas de concreto falconer y aseo de losa. El contratista continua limpieza de vigas de cimentación y recompactación de subbase en los ejes de S1 a S3 entre SG y D continuan armado de proceso constructivo del piso sotano en el mismo. El contratista realiza pruebas de depsidores en piso sotano. El contratista retoma actividades del aporticamiento y la malla para la puesta a tierra con la instalación de varillas de cobre correspondiente a bajantes de aporticamiento y malla puesta a tierra. El contratista continua con recompac-

Escaneado con CamScanner

13.256

ficción de Sobbase en ejes desde SW hasta SV, y Continuan con el proceso constructivo para fundida de piso sotano entre los ejes desde diagonal S1 hasta el eje SW, realizando la instalación del plastico.

264 03-04-2022. DOMINGO.

ESTADO DEL TIEMPO

Dia Soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El Contratista no programa actividades laborales.

265 04-04-2022

ESTADO DEL TIEMPO

Dia Soleado. lluvia desde 4:00pm a 4:30 pm

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

El contratista Continua con la adecuación de la losa, cara inferior que cubre el sotano: Ajuste-resane-retiro de residuos de concreto. Continuan con armado de acero/malla para piso sotano. Continuan con la Limpieza de vigas y viguetas de cimentación en el Sotano. El Contratista Continua con la instalación de vastillas de cabe correspondiente a bajantes de apantallamiento y malla puesta a tierra. El Contratista continua con la recepción de la sobbase para el piso pulido Sotano. El Contratista Continua armado de acero para muros cortinas en las zapatas Z36-Z35-Z33-Z34-Z32 sobre nivel del primer piso. Contratista Continua armado de acero para vigas, viguetas, riostras en el tramo SK a SM hasta 3. El Contratista realiza pruebas de densidades. la interventoria realiza pruebas de densidades en piso sotano. Visita de Veedor. Se realizo visita tecnica a la obra.

en compañia de Fabio Lopez.

Gracias por el acompañamiento

Dario

266 05-04-2022.

ESTADO DEL TIEMPO.

Dia soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

Escaneado con CamScanner

13.257

El Contratista realiza pruebas de densidades. El Contratista Continua con adecuación de losa, cara inferior que cubre el sotano. El contratista Continua con la instalación de vasillos de cobre correspondiente a bajantes de apantallamiento y malla puesta a tierra, elaboracion de cajas de registros electricos. El contratista continua con la recompactación de subbase en sotano; continua armado de malla en acero para piso sotano; El Contratista Continua armado de acero en muros cortinas para zapatas Z-35; El Contratista realiza armado de formaleta para muros cortinas de zapata Z-36; Realiza fundido de concreto para muros cortinas de zapata Z-36 Sobre Nivel primer piso. El contratista Continua con corte y figurado de acero. Continua armado losa primer piso.

267 06-04-2022

ESTADO DEL TIEMPO

Dia Soleado. Lluvias generadas desde 6:00pm hasta 8:30pm.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El Contratista Continua armado de acero en muros cortinas de zapata Z-35/Z-33/Z-32. El Contratista Continua armado de acero, vigas-riostras-losa de primer piso del tramo 5K-5m hasta 3. El Contratista Continua recompactación de subbase en zona del piso sotano desde S1 diagonal hasta eje 5t. Contratista Continua adecuación de losa cara Inferior: lijado y resane. El Contratista Continua armado de acero para piso pulido en eje diagonal S1 hasta eje S10. El Contratista Continua armado figurado y corte de acero. El contratista realiza fundido de losa del piso sotano en el eje Sb hasta S, del Eje 3' hasta Eje SC, desde Eje SC hasta S7, desde Eje S7 hasta Eje Sd y desde eje Sd hasta Eje S7. El contratista corte y figurado de acero en obra.

268 07-04-2022

ESTADO DEL TIEMPO

Dia Soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

El Contratista continua armado, figurado y corte de acero en obra.

Escaneado con CamScanner

El contratista continua armado de acero: para muros cortinas en zapatas Z-35 - Z33 - Z32/. El contratista realiza fundido de concreto del tramo de la losa para el primer piso del eje SK-SM hasta eje 3'. El contratista continua recompactación de subbase y armado de acero/malla para piso pulido en los ejes desde el S1 diagonal hasta eje S1. El contratista continua adecuación de losa-casa inferior: lijado y resane. El contratista, la interventoría y supervisores de la gobernación realizaron visita y comité Electrico. El contratista realizan cortes de dilataciones en piso fundido del sotano.

260. 08-04-2022

ESTADO DEL TIEMPO

Dia soleado. lluvias desde las 3:00 am hasta las 6:00 am. lluvias fuertes.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista continua armado de acero y formaleta para muros cortina ubicado en zapatas Z-35 - Z33 - Z32. Continuan instalación de casetones, malla-ajustes del tramo del primer piso del tramo SK-SM hasta 3'. Continuan armado de acero y proceso constructivo para piso pulido en sotano. Contratista continua adecuación de losa: limpieza - lijado - resane. Continuo recompactación de subbase en zona de sotano. El contratista realiza fundida de concreto en tramo del primer piso del eje SK-SM hasta 3'.

269 09-04-2022

ESTADO DEL TIEMPO -

Dia soleado

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista realiza recompactación de subbase entre eje S1 y eje SV. El contratista realiza fundida de contrato desde el eje diagonal S1 hasta eje SV. El contratista continua armado de acero para (Colum) muros cortinas ubicado en zapatas Z-33/Z35. El contratista realiza fundida de concreto, pulida de piso con helicopteros desde el eje diagonal S1 hasta eje SV. Continuan con corte y figurado de acero en obra.

Escaneado con CamScanner

13.259

270 10-04-2022
ESTADO DEL TIEMPO.
Dia Soleado
ACTIVIDADES EJECUTADAS.
En la presente fecha no se realizaron actividades laborales.

271 11-04-2022
ESTADO DEL TIEMPO.
Dia soleado
ACTIVIDADES EJECUTADAS
En la obra se realizan actividades de armado de acero para muros cortinas en zapatas Z-33-Z36 Z-32-Z34. El contratista continua adecuación de losa-cara inferior que cubre el sotano: limpieza-lijado. resane. El contratista realiza proceso constructivo para el armado del piso pulido del parqueadero del sotano ubicado desde el eje SV al SV y re-compactación entre el eje SV y el eje St.

272 12-04-2022.
ESTADO DEL TIEMPO.
Dia soleado.
ACTIVIDADES EJECUTADAS.
El Contratista realiza actividades de armado de acero para muros Cortinas de las zapatas Z-34/Z-32/Z-33/Z-36. El Contratista realiza adecuación de la losa, del primer piso - cara inferior - que cubre el sotano con resane, lijado, limpieza, en los ejes del SJ al SK. El contratista realiza armado de malla, instalación de plástico, instalación de disfanciadores entre los ejes St y SV del piso sotano. El Contratista realiza Recompactación de Subbase en el piso sotano entre los ejes K. (K) y eje St.

273 13-04-2022
ESTADO DEL TIEMPO
Dia Soleado
ACTIVIDADES EJECUTADAS

Escaneado con CamScanner

13.160

El Contratista realiza adecuación de la losa del primer piso en su cara inferior: resanes, lijado, limpieza entre los ejes del SJ al SK. El contratista continua con armado de malla, instalación de plastico, acero, distanciadores entre los ejes ST y SU del piso sotano. El Contratista continua Recompactación de subbase en el piso sotano entre los ejes K y eje ST. El Contratista realiza armado de acero para muros cortinas de las zapatas Z32-Z34-Z33-Z36. La Interventoría realiza recibo de localización y replanteo alineamiento horizontal y vertical, recubrimiento y posecionamiento de acero de columnas en sitio. Del muro cortina ubicado en la zapata nucleo Z33 en el eje 4 entre ejes J-SD. El contratista realiza fundida de concreto del muro cortina M-05 de la zapata Z33. Durante la fundida se sabre concreto en parte inferior del muro, mostrando que la formaleta se desajusta o se abre en su parte inferior del M05-Z33.

274 14-04-2022. JUEVES SANTO FESTIVO.

ESTADO DEL TIEMPO

Dia Soleado. Lluvias entre 4:30pm – 6:30 p.m.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El Contratista programa actividades hasta la 1:00pm / 1:00pm de la tarde; realizando actividades de nivelación y compactacion (piso de abajo) y armado de muro en el piso sotano en los ejes SU-ST y SD-D. El Contratista continua ejecuccion del armado de acero del muro cortina en la zapata 34.

275 15-04-2022. VIERNES SANTO FESTIVO.

ESTADO DEL TIEMPO

Dia soleado. Lluvias en la tarde entre 3:00pm – 5:00pm.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El Contratista programa actividades hasta la 1:00pm. El Contratista realiza actividades en el armado de acero del muro cortina de la zapata 34. y ejecuta actividades de nivelación y compactación en el piso sotano entre los ejes SU-ST y entre ejes SD-D.

276 16-04-2022. SABADO DE GLORIA

ESTADO DEL TIEMPO=

Escaneado con CamScanner

Dia soleado. Lluvias en la tarde entre 4:00-6:00pm.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

En la presente fecha no se realizan actividades laborales.

277. (20 17-04-2022. DOMINGO.

ESTADO DEL TIEMPO

Dia soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

EN la presente fecha no se realizan actividades laborale

278 18-04-2022. LUNES

ESTADO DEL TIEMPO

Dia soleado. Lluvias entre 6:00 pm - 8:30 pm.

El Contratista realiza armado de acero para muros cortinas 1er piso ubicados en las zapatas Z36-Z34-Z32-Z33-Z35. El Contratista continua con limpieza de vigas cimentación, El contratista continua con armado de malla para piso Sotano, plastico entre ejes 5d y D. El contratista continua adecuación: resane en cielo de sotano entre eje D y SJ.

279 19-04-2022.

ESTADO DEL TIEMPO.

Dia soleado

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El Contratista realiza localización y demarcación del tanque del almacenamiento para dar inicio a la escavación en acompañamiento con la interventoría El Contratista continua Armado de acero para muros cortinas ubicado en la zapata Z35, Z32, Z33

El Contratista Continua con la adecuación de resanes en el cielo-Cara Inferior de la losa que cubre el sotano en los ejes SJ-SK. El Contratista Continua armado de mallas, ajustes, instalación plastico para piso sotano en ejes 5d y D. El Contratista Continua con limpieza entre Vigas de cimentación entre los ejes SK-K El Contratista realizo corte de dilataciones en piso fundido de sotano o losa de entrepiso entre los ejes ST-SU y desde S1 diagonal = eje S8-5a.

278. 18-04-2022, LUNES.

Escaneado con CamScanner

ACTIVIDADES EJECUTADAS
El Contratista Realiza fundida de losa de entrepiso o piso Sotano entre los ejes ST-U y desde diagonal S1= eje S8-S9.

280 20-04-2022

ESTADO DEL TIEMPO
Dia Soleado. Lluvias desde 5:30 a 8:00 pm.

ACTIVIDADES EJECUTADAS
El Contratista Continua adecuación en losa que cubre sotano: resanes, limpieza. El Contratista Continua armado de malla para losa de entrepiso entre eje Sd-D. El contratista continua Limpieza en zona de Vigas preparando zona para fundido de la losa de entre piso del piso Sotano. entre ejes K-St. El Contratista realiza aplicación del cemento sobre la Sublase humeda a causa de las lluvias con el fin de restarle humedad. El Contratista Continua excavación para el tanque de almacenamiento del agua. El Contratista en Conjunto con la Interventoría se realiza levantamiento de cajillas electricas instaladas hasta el momento. El Contratista Continua armado de acero para muros cortinas ubicados en las zapatas Z-33 y Z-35.

281 21-04-2022

ESTADO DEL TIEMPO
Dia Soleado. lluvias desde 5:00pm - 6:00pm y de 6:30pm - 8:00pm

ACTIVIDADES EJECUTADAS
El Contratista Continua adecuación en resanes de la losa que cubre el sotano. El Contratista continua armado de acero en zapatas Z-33 Z-35 para los muros cortinas. se realiza Comite de obra: con el Contratista, gobernación e interventoría. se realiza comite electrico virtual con el contratista, Gobernación e interventoría. El Contratista realiza aseo y orden en el sotano: revicando y retirando formaleta, estibas.

282 22-04-2022

ESTADO DEL TIEMPO

Escaneado con CamScanner

13.263

Dia soleado. Lluvias desde las 4:00 pm - 9:00 pm, lluvia fuerte.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El Contratista realiza fundida de piso sotano entre eje Sd y D, desde el eje S7 hasta eje 9 con concreto plastificante de 4.000 PSI. El Contratista continua Excavación con retro excavadora para el tanque de abastecimiento de agua. El Contratista continua limpieza entre vigas de cimentación, adecuación de subbase, instalación de plastico, acero para mallas, entre los ejes SS y SU. El Contratista continua con la adecuación de la losa del primer piso, cara superior que cubre el sotano: Con resanes, retiro de rebabas. El contratista realiza adecuación de subbase afirmada por causa de las lluvias entre los ejes Sd y D hasta el eje 3'. El Contratista realiza desencofre de muro cortina ubicado en zapata 35 del primer piso. El Contratista continua armado de acero para muros cortinas de las zapatas Z35 - Z33 Z-34 - Z32.

283 23-04-2022. Sabado.

ESTADO DEL TIEMPO

Dia soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El Contratista continua armado de acero para muros cortinas ubicado en la zapata Z32 - Z35 - Z34 y en la zapata 35 es ben formaleteando muros cortinas ubicado en el primer piso. El Contratista inicia fundida a las 11:36 am con proveedor Argos con un concreto de 6.000 PSI en los Muros Cortinas MC04 el muro cortina MC2 de la zapata Z33 en el primer piso a una altura de 2.40 desde el nivel Ne: +0.50 hasta el Ne: +2.90. El Contratista realiza limpieza y retiro de sobrantes del terreno que se desliso o desmorono a causa de la lluvia entre los ejes Sh y SK y entre los ejes SV y SW correspondiente a los accesos vehiculares del sotano del proyecto. El Contratista realiza armado de acero para mallas del pi-

Escaneado con CamScanner

1.164

ceso Constructivo para el armado del piso del sotano, entre eje S1 y eje SU.

284 24-04-2022. Domingo.

ESTADO DEL TIEMPO.

Dia Soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El Contratista Continua con armado del proceso constructivo para el piso sotano entre los ejes S1 y SU: instalación de plastico, armado de acero para malla, limpieza entre Vigas y Viguetas. El Contratista realiza adecuación de subbase saturada por causa de las lluvias, entre los ejes K y S1, aplicandole cemento y/o cal. y tambien entre los ejes SD y D desde el eje S1 hasta el eje 4. El Contratista continua adecuación de la losa del primer piso cara inferior que cubre el sotano: resane en Losa y resane en columnas, resane en vigas. El Contratista Continua armado de acero para muros cortinas ubicados en las zapatas Z32, Z34, Z-35, Z33, Z36.

285 25-04-2022.

ESTADO DEL TIEMPO.

Dia soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista realiza adecuación de la losa del primer piso, cara inferior que cubre el sotano; resane en losa, resane en vigas. El contratista Continua armado de acero para muros cortinas ubicados en las zapatas Z32- Z34- Z35- Z33- Z36. El Contratista continua con recompactación de subbase en piso sotano. El Contratista Continua armado de acero para el armado del piso. pulido del sotano.

286 26-04-2022.

ESTADO DEL TIEMPO.

Dia soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El Contratista Realiza fundida de piso sotano entre los ejes S1 y SU. El Contratista realiza excavación para el

Escaneado con CamScanner

13,76

Tanque de abastecimiento de agua. El contratista realiza armado de acero para muros cortinas de los zapatas Z34-Z32-Z33-Z35. El contratista realiza armado de formaleta para muro (contención) cortina de la zapata Z33 El contratista realiza adecuación de vigas y viguetas con resanes en cara inferior de la losa del primer piso, que cubre el Sótano. La Interventoría realiza pruebas de densidad para subbase del piso Sótano. El Contratista funde losa de contrapiso o piso Sótano entre ejes SU-ST. para lo cual se programan 7 mixer de 6.0 m³ más concreto, el mixer #4 llega con asentamiento de 4,5" pero la remisión indica 6" ± 1", se procede adicionar plastificante; se repite la prueba de Slump arrojando un valor de 6.5"; por parte de Interventoría se toman las respectivas muestras con cilindros para posterior ensayo y verificación de resistencia del concreto, se repite por tercera vez la prueba de slump arrojando un resultado de 3,6" lo que indica que el concreto se endurece de nuevo; el concreto endurecido es aplicado entre los ejes SU-ST y 8'-S7, se debe realizar seguimiento para verificar patologías que se puedan presentar en el concreto.
En cuanto a las vigas de losa de entrepiso el diseño contempla instalación de barras de acero de refuerzo #5, en el mes de febrero el Contratista no tiene dicho acero disponible en campo, en el mes de febrero el ingeniero estructural, ingeniero Julio Martínez autoriza y avala telefónicamente instalar 2 barras de acero #4 como reemplazo al acero contemplado en el diseño.

287 27-04-2022

ESTADO DEL TIEMPO

Día soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

El Contratista continuo con armado de acero en muros cortinas de las zapatas Z33-Z34-Z32-Z33-Z35 y apoyos de formaleta para muros cortinas de las zapatas Z33-Z35-

Escaneado con CamScanner

13,266

Z-36. El Contratista realizo limpieza y ajustes en la Subbase entre Vigas y viguetas en el sotano aplicando cemento sobre el porque la subbase se encuentra muy Saturada entre los ejes 5C y D. El Contratista realizo cortes de dilatacion sobre piso fundido del sotano. El Contratista realiza excavacion para organizar caja de registro para fibra de drenaje. El Contratista continua excavacion para tanque de abastecimiento de agua. El Contratista continua adecuacion de cara inferior de losa que cubre sotano: resane de vigas, resane en viguetas. El Contratista realiza fundido de concreto de 4000 PSI con el proveedor Argos en los muros continuos M07A - M10/M07/M10A de la zapata Z35 y los muros continuos M084 - M02 de la zapata Z33.

Se Solicita visita tecnica del Ingeniero Edwin Rubio, de la Empresa Bioproyecto, en donde se realiza el requerimiento de Poda de árboles de Caucho en la Diagonal 21 y la Carrera 15. se le explica las actividades ejecutadas para la Construccion del tanque de Almacenamiento, el Ing. Rubio dictamino que estas No interfieren en el estado de los árboles, más sin embargo recomienda solicitar ante la autoridad ambiental Competente (Corpocesar) el permiso para realizar la poda de los mismos.

NOTA: Bioproyecto es la empresa contratada para ejecutar actividades de tala y aprovechamiento forestal

la Visita a obra fue realizada en horas [illegible] - A Construi S.A.
de la mañana, por el Ingeniero Edwin Rubio.

209 28-04-2022

ESTADO DEL TIEMPO

Dia Soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El Contratista Continua adecuacion de Vigas, viguetas, losa, cara inferior del primer piso que cubre el sotano = resanes.

El Contratista realiza armado de sello, instalacion de plastico para el proceso constructivo del (la losa) piso del sotano

Escaneado con CamScanner

13,267

El Contratista Continua armado de acero de los muros cortinas ubicado en las zapatas Z-34/Z32/Z 33/Z35.
El Contratista continua corte y figurado de acero en obra.

290 29-04-2022.

ESTADO DEL TIEMPO.
Dia Soleado.
ACTIVIDADES EJECUTADAS
El Contratista Ejecuta actividades de armado de acero de muros cortinas ubicado en los zapatas Z34-Z32-Z33 Z35. El Contratista continua armado de acero para malla e instalación de plastico para piso del sotano a losa de entrepiso del sotano.

291 30-04 2022. Sabado.

ESTADO DEL TIEMPO.
Dia Soleado.
ACTIVIDADES EJECUTADAS
El Contratista (ejecuta) no programa actividades laborales.

292 01-05-2022. Domingo.

ESTADO DEL TIEMPO
Dia soleado.
ACTIVIDADES EJECUTADAS
No se realizan actividades laborales.

993 02-05-2022

ESTADO DEL TIEMPO
Dia Soleado.
ACTIVIDADES EJECUTADAS.
El Contratista Continua armado de acero para muros cortinas en zapatas Z34-Z32- Z33- Z35. El Contratista continua con resanes en la losa del primer piso cara inferior que cubre el sotano. El Contratista adecua y realiza limpieza entre vigas de cimentación para instalar plastico y acero para losa de contrapiso Continuan con proceso constructivo para el armado de la losa de contrapiso entre los ejes K-S1. Continuan preparando subbase- recompactación en la zona del Sotano entre ejes K-S1.

Escaneado con CamScanner

PERSONAL A CONSTRUIR S.A MES ABRIL

No.	IDENTIFICACION	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	AFILIACION ARL	EMPRESA	TIPO DE VINCULO	EPS	ARL	PENSION	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
1	19594764	FABIO LOPEZ ROSADO	RESIDENTE OBRA	21 DE JUNIO DE 2021	A CONSTRUIR	DIRECTO	SANITAS	SEGUROS BOLIVAR	PORVENIR	COMFACESAR
2	1046813906	LILIANA CONTRERAS GARCIA	PROFESIONAL SOCIAL	6 DE JULIO DE 2021	A CONSTRUIR	DIRECTO	SURA	SEGUROS BOLIVAR	PORVENIR	COMFACESAR
3	77185729	ALEXANDER BOLAÑO ACOSTA	SUPERVISOR SST	21 E JULIO DE 2021	A CONSTRUIR	DIRECTO	SALUD TOTAL	SEGUROS BOLIVAR	COLFONDOS	COMFACESAR
4	49787228	ADA LUZ PEÑALOZA	ALMACENISTA	7 DE JULIO DE 2021	A CONSTRUIR	DIRECTO	FAMISANAR	SEGUROS BOLIVAR	PORVENIR	COMFACESAR
5	1063971741	LEINER TORRES	AUXILIAR ALMACEN	9 DE AGOSTO DE 2021	A CONSTRUIR	DIRECTO	SALUD TOTAL	SEGUROS BOLIVAR	PROTECCION	COMFACESAR
6	1065828777	LIZMARY MADURO	RESIDENTE ADMINISTRATIVO	8 DE FEBRERO DE 2022	A CONSTRUIR	DIRECTO	NUEVA EPS	SEGUROS BOLIVAR	PORVENIR	COMFACESAR
7	1030582813	VICTOR MANUEL MUÑOZ MENESES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	15 DE FEBRERO DE 2022	A CONSTRUIR	DIRECTO	SANITAS	SEGUROS BOLIVAR	COLPENSIONES	COMFACESAR
8	1065591193	LORENA BRACHO	PROFESIONAL AMBIENTAL	9 DE AGOSTO DE 2021	A CONSTRUIR	DIRECTO	NUEVA EPS	SEGUROS BOLIVAR	COLPENSIONES	COMFACESAR
9	1065996647	JOSE DAVID GALINDO BARRIOS	PROFESIONAL DISEÑO	20 DE AGOSTO DE 2021	A CONSTRUIR	DIRECTO	CAJA COPI	SEGUROS BOLIVAR	PORVENIR	COMFACESAR
10	77090391	CESAR AUGUSTO AHUMADA MENA	LABORATORISTA	17 DE AGOSTO DE 2021	A CONSTRUIR	DIRECTO	SANITAS	SEGUROS BOLIVAR	COLPENSIONES	COMFACESAR
11	15171031	NESTOR MANUEL YANCE ARRIETA	AYUDANTE DE OBRA	17 DE AGOSTO DE 2021	A CONSTRUIR	DIRECTO	CAJA COPI	SEGUROS BOLIVAR	COLFONDOS	COMFACESAR
12	85470281	EDUARDO ESCOBAR	AYUDANTE DE OBRA	13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	A CONSTRUIR	DIRECTO	SANITAS	SEGUROS BOLIVAR	COLFONDOS	COMFACESAR
13	72127336	EDUARDO CEPEDA	DIRECTOR DE OBRA	1 JUNIO DE 2021	A CONSTRUIR	DIRECTO	SURA	SEGUROS BOLIVAR	COLPENSIONES	COMFAMILIAR
14	1065641212	ANDRES OSPINO	AUXILIAR TORRE GRUA	4 DE OCTUBRE DE 2021	A CONSTRUIR	DIRECTO	DUKASAWI	SEGUROS BOLIVAR	COLPENSIONES	COMFACESAR
15	1032467253	IVAN MARTINEZ	INSPECTOR DE OBRA	25 DE NOVIEMBRE DE 2021	A CONSTRUIR	DIRECTO	DUKASAWI	SEGUROS BOLIVAR	COLPENSIONES	COMFACESAR
16	1235339075	JUAN DANIEL CASTILLA CASALINS	PROFESIONAL DE CALIDAD	1 DE DICIEMBRE DE 2021	A CONSTRUIR	DIRECTO	SANITAS	SEGUROS BOLIVAR	PORVENIR	COMFACESAR
17	11154633	OROSMAN ENRIQUE ARGUMEDO OVIEDO	OPERADOR TORRE GRUA	15 DE FEBRERO DE 2022	A CONSTRUIR	DIRECTO	SANITAS	SEGUROS BOLIVAR	PORVENIR	COMFACESAR
18	1140863665	ALEXANDRA DE JESUS CAMARGO SERNA	PROFESIONAL ELECTRICO	24 DE FEBRERO DE 2022	A CONSTRUIR	DIRECTO	SANITAS	SEGUROS BOLIVAR	PORVENIR	COMFACESAR
19	1010151202	ARMANDO DANIEL CASTELLANOS TROYA	SUPERVISOR DE OBRA	11 FEBRERO DE 2022	A CONSTRUIR	DIRECTO	SALUD TOTAL	SEGUROS BOLIVAR	PORVENIR	COMFACESAR
20	1121338097	EDIER JOHAN MARRIAGA LOPEZ	AYUDANTE DE OBRA	3 FEBRERO DE 2022	A CONSTRUIR	DIRECTO	FAMISANAR	SEGUROS BOLIVAR	PORVENIR	COMFACESAR
21	1065568630	JAIME JOSE TERNERA MOZO	INSPECTOR SISO	15 DE FEBRERO DE 2022	A CONSTRUIR	DIRECTO	NUEVA EPS	SEGUROS BOLIVAR	COLFONDOS	COMFACESAR
22	1065806888	MIGUEL ANGELN VASQUEZ VIVES	INSPECTOR SISO	15 DE FEBRERO DE 2022	A CONSTRUIR	DIRECTO	NUEVA EPS	SEGUROS BOLIVAR	PORVENIR	COMFACESAR
23	1043004377	Maria José Castellanos Sarmiento	Profesional de Ingeniería	2 DE MARZO DE 2022	A CONSTRUIR	DIRECTO	SANITAS	SEGUROS BOLIVAR	PROTECCION	COMFACESAR
24	1065675357	AMAYA ANGEL	AYUDANTE DE OBRA	19 DE ABRIL DE 2022	A CONSTRUIR	DIRECTO	SALUD TOTAL	SEGUROS BOLIVAR	PORVENIR	COMFACESAR
25	1121335911	PINTO TULIO	AYUDANTE DE OBRA	19 DE ABRIL DE 2022	A CONSTRUIR	DIRECTO	SANITAS	SEGUROS BOLIVAR	PORVENIR	COMFACESAR
26	1065623264	POLO LUIS JAVIER	AYUDANTE DE OBRA	19 DE ABRIL DE 2022	A CONSTRUIR	DIRECTO	SALUD TOTAL	SEGUROS BOLIVAR	PORVENIR	COMFACESAR

17368

14.169

LISTADO DE MAQUINARIA EN OBRA

CANTIDAD	EQUIPOS MAYORES	CANTIDAD	EQUIPOS MENORES
2	MINICARGADORES	4	PULIDORA
1	RETROEXCAVADORES	3	RANAS
		1	TRONZADORA
		3	CANGUROS
		2	TROMPOS
		2	MOTOBOMBA
		2	VIBRADORES
