ING. WILSON BLANDON
CRECIENDO CON CALIDAD

INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA FINAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Wilson Yuber Blandón Cortes	**NIT/CÉDULA:** 7.552.271	**CORREO DEL CONTRATISTA:** ingyuber@hotmail.com
INTERVENTOR/SUPERVISOR: Gobernación del Quindío **REPRESENTANTE:** Milton Cesar Torres Hernandez	**NIT/CÉDULA:** 4.376.958	**CORREO DEL INTERVENTOR/SUPERVISOR** tecnicopda@gmail.com
CLASE DE CONTRATO, NÚMERO Y FECHA: Contrato de Obra No. 002-2022 21 Febrero 2022		**TELÉFONO DEL CONTRATISTA:** 3155333926
OBJETO DEL CONTRATO: “OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SALENTO, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO”		
PERÍODO DEL INFORME: Febrero-Marzo-Abril-Mayo		
SITIO DE EJECUCION: Calle 8 entre Calles 7, 8 y 8. Salento Quindío		

El presente informe tiene como función exponer las actividades realizadas durante el desarrollo del contrato 002 de 2022 para el corte del Acta No 2. Se informan las cantidades ejecutadas para la ejecución total con su respectivo porcentaje de ejecución de cada actividad conforme los requerimientos en el proceso de ejecución.

FOTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	% DE EJECUCIÓN	% RESTANTE
	1	**PRELIMINARES**				
	1,1	Localización y replanteo	ML	166,60	100%	0%

	1,2	Señalización preventiva con tela pp	ML	357,00	100%	0%
	1,3	Corte pavimento con máquina, hasta 7 cm	ML	40,78	100%	0%
	1,4	Demolición de pisos y andenes de concreto e=7 a 12 cm	M2	1,11	100%	0%
	1,5	Demolición de pavimento a mano hasta 25 cm de espesor	M2	34,44	100%	0%

CARRERA 14 No. 27-20 OFICINA 101 BALCONES DEL PARQUE, Armenia Quindío Colombia
email: ingyuber@hotmail.com
Celular 3155333926

FOTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	% DE EJECUCIÓN	% RESTANTE
	1,6	Demolición de estructuras en concreto (cámaras, pozos, cajas de inspección, bases, cañuelas existentes)	M3	6,02	100%	0%
	1,7	Manejo de aguas	ML	172,40	100%	0%
	2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				
	2,1	Excavación en material común a mano entre 0-2 m (No incluye cargue y retiro de sobrantes)	M3	655,46	100%	0%

FOTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	% DE EJECUCIÓN	% RESTANTE
	2,2	Excavación en material común a mano entre 2-4 m (No incluye cargue y retiro de sobrantes)	M3	266,81	100%	0%
	2,3	Excavación en material común a mano entre 4-6 m (No incluye cargue y retiro de sobrantes)	M3	7,40	100%	0%
	2,4	Lleno compactado con material de sitio	M3	474,56	100%	0%

CARRERA 14 No. 27-20 OFICINA 101 BALCONES DEL PARQUE, Armenia Quindío Colombia
email: ingyuber@hotmail.com
Celular 3155333926

FOTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	% DE EJECUCIÓN	% RESTANTE
	2,5	Lleno compactado incluye suministro de material de préstamo de cantera y/o río	M3	279,20	100%	0%
	2,7	Encamado triturado 3/4" para soporte de tubería. E=0,15m a 1/2 tubo	M3	89,53	100%	0%
	2,8	Entibado en madera	M2	410,08	100%	0%

CARRERA 14 No. 27-20 OFICINA 101 BALCONES DEL PARQUE, Armenia Quindío Colombia
email: ingyuber@hotmail.com
Celular 3155333926

FOTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	% DE EJECUCIÓN	% RESTANTE
	3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO				
	3,1	Suministro e instalación tubería perfilada PVC de 12"	ML	119,00	100%	0%
	3,2	Suministro e instalación tubería perfilada PVC de 20"	ML	41,4	100%	0%
	3,3	Suministro e instalación YEE 12" a 6"	UND	19,00	100%	0%

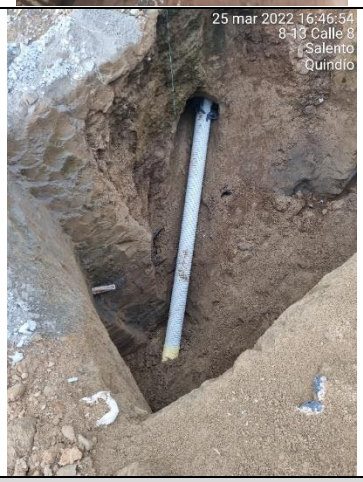
FOTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	% DE EJECUCIÓN	% RESTANTE
	3,4	Suministro e instalación YEE 20" a 6"	UND	4,00	100%	0%
	3,7	Suministro e instalación tubería perfilada PVC de 6"	ML	74,02	100%	0%
	4	**OBRAS EN CONCRETO**				
	4,1	Cámara + cuerpo + cono + peldaños D= 1,20 mts	ML	7,45	100%	0%

FOTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	% DE EJECUCIÓN	% RESTANTE
	4,2	Placa tapa cámara en manhole polimérico. Losa 1,60 x 1,60	UND	2,00	100%	0%
	4,3	Base y cañuela	UND	4,00	100%	0 %
	4,4	Peldaños para cámara	UND	24	100%	0%

CARRERA 14 No. 27-20 OFICINA 101 BALCONES DEL PARQUE, Armenia Quindío Colombia
email: ingyuber@hotmail.com
Celular 3155333926

FOTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	% DE EJECUCIÓN	% RESTANTE
	4,6	Empalme cámaras existentes	UND	4,00	100%	0%
	5	**PAVIMENTOS Y REPOSICIONES**				
	5,2	Suministro, Figurado y amarre Acero de refuerzo 60000PSI 420Mpa	KG	335,01	100%	0%
	5,3	Pavimento rígido premezclado MR 42 kg/cm2, e=20cms	M2	31,4	100%	0%
	5,4	Sub base granular compactada e=20	M3	41,9746	100%	0%

FOTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	% DE EJECUCIÓN	% RESTANTE
	5,6	Anden concreto simple de 21 Mpa, e=0,07 m	M2	1,09	100%	0%
	6	**OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS**				
	6,1	Cargue y retiro de material sobrante hasta 25 km	M3	273,33	100%	0%
		ITEMS NO CONTEMPLADOS				
		BARRERA DE PROTECCION Y CONTROL DE EXCAVACION EN GUADUA PROVISIONAL	ML	97,70	100%	0%

CARRERA 14 No. 27-20 OFICINA 101 BALCONES DEL PARQUE, Armenia Quindío Colombia
email: ingyuber@hotmail.com
Celular 3155333926

FOTO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	% DE EJECUCIÓN	% RESTANTE
		IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO MEDIANTE SEÑALIZACION (MALETINES,BARRERAS Y SEÑALES)	GLB	1,00	100%	0%
		SOBREACARREO MATERIAL DE EXCAVACION Y DEMOLICION	M3	279,93	100%	0%
		DEMOLICION Y RETIRO DE TUBERIA ALCANTARILLADO EXISTENTE	ML	160,40	100%	0%



WILSON YUBER BLANDON CORTES
CC. 7.552.271
315 5333926

CARRERA 14 No. 27-20 OFICINA 101 BALCONES DEL PARQUE, Armenia Quindío Colombia
email: ingyuber@hotmail.com
Celular 3155333926
