ANEXOS

ANEXO 1
CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO

ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME MENSUAL 2

MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

INP SERVICIOS SAS

FECHA: 6/06/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA DE POPAYAN **DEPARTAMENTO** CAUCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2022

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

CONTRATO No. 20211800024217 de diciembre del 2021 **CONTRATISTA:** EDIFICACIONES Y VÍAS S.A

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 20221800011697 de marzo del 2021 **INTERVENTORÍA:** INP SERVICIOS S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				MES DE MAYO 2022																										MES DE JUNIO 2022					
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
CAMION TIPO TURBO 1 WLL 595	FOTON	6 TON	FRENTE 1	I	I	A	A	I	A	A	I	I	A	A	I	A	I	A	A	I	A	A	A	A	I	I	I	A	A	I	A	A	I	A
CAMION TIPO TURBO 2	FOTON		FRENTE 1	I	I	A	A	I	A	A	I	I	A	A	I	A	I	A	A	I	A	A	A	A	I	I	I	A	A	I	A	A	I	A
CARROTANQUE DE AGUA	CHEVROLET	7TON	FRENTE 1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	I	A	A	A	I	I	I	I	A	A	I	A	A	I	A
MOTONIVELADORA			FRENTE 1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MINICARGADOR			FRENTE 1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
FINISHER	BARBER-GREENE	200 SERIES	FRENTE 1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	I	A	A	A	I	I	I	I	A	A	I	A	A	I	A
VIBROCOMPACTADOR LLANTAS	HAMM	10TN	FRENTE 1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	I	A	A	A	I	I	I	I	A	A	I	A	A	I	A
VIBROCOMPACTADOR RODILLO	HAMM HD	10TN	FRENTE 1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	I	A	A	A	I	I	I	I	A	A	I	A	A	I	A
FRESADORA	WIRTGEN	W1000	FRENTE 1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	I	A	A	A	I	I	I	I	A	A	I	A	A	I	A
MARMITA	TURBO	3TN	FRENTE 1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	I	A	A	A	I	I	I	I	A	A	I	A	A	I	A
LUMINARIA	NIGHT HAWK LT12		FRENTE 1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	I	A	A	A	I	I	I	I	A	A	I	A	A	I	A
VOLQUETA DOBLETROQUE FRESADO (1)		14M3	FRENTE 1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	I	A	A	A	I	I	I	I	A	A	I	A	A	I	A
VOLQUETAS DOBLETROQU ASFALTO (4)		14M3	FRENTE 1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	I	A	A	A	I	I	I	I	A	A	I	A	A	I	A
VOLQUETAS SENCILLAS ASFALTO		7M3	FRENTE 1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	I	A	A	A	I	I	I	I	A	A	I	A	A	I	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
TOTAL ACTIVO				0	0	2	2	0	2	2	0	0	2	2	0	2	0	12	12	0	12	12	12	2	0	0	0	12	12	0	12	12	0	12
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				14	14	12	12	14	12	12	14	14	12	12	14	12	14	2	2	14	2	2	2	12	14	14	14	2	2	14	2	2	14	2

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	14	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	2	14%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	13	93%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: En el presente mes solo se realizaron visitas de campo para priorizacion de vias a intervenir, por lo tanto el equipo se reporta como inactivo

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: JAIME OSWALDO PRECIADO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-124740

Firma
Nombre: PEDRO MIGUEL MUÑOZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-65493 CAU

ANEXO 2

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME MENSUAL 2
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

INP SERVICIOS SAS

FECHA 6/06/2022
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA DE POPAYAN **DEPARTAMENTO** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 20211800024217 de diciembre del 2021 **CONTRATISTA:** EDIFICACIONES Y VÍAS S.A

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2022 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 20221800011697 de marzo del 2022 **INTERVENTOR:** INP SERVICIOS S.A.S.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	MES DE MAYO 2022																									MES DE JUNIO						Total
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	
Seco	22	23	24	23	23	24	24	21	24	24	24	19	24	21	24	24	24	24	24	24	24	22	24	22	19	21	20	20	22	17	24	699
Lluvias moderadas	2	1	0	1	1	0	0	3	0	0	0	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	5	3	4	4	2	7	0	45
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: **JAIME OSWALDO PRECIADO**
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: **19202-124740**

Firma
Nombre: **PEDRO MIGUEL MUÑOZ**
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **19202-65493 CAU**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 3

ENSAYOS DE LABORATORIO

INP SERVICIOS SAS	INSPECCION Y VERIFICACION DE MATERIALES DE OBRA	FP-515-02 (30/12/2021)

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

CONTRATISTA: EDIFICACIONES Y VÍAS S.A

FECHA	MATERIAL	CANTIDAD	PROCEDENCIA	CERTIFICADO CONFORMIDAD	METODO VERIFICACION	CUMPLE	DESTINO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
21/05/2022	MDC-19	1	PLANTA POPAYAN	NORMA I.N.V. E - 732 / 13 Y 782/13	GRANULOMETRIA	SI	PLANTA POPAYAN	BRIQUETAS 1, 2, 3 Y 4 ASFALTO 5% RELACION LLENANTE/LIGANTE 1.14	SEBASTIAN BELLO NOVOA
21/05/2022	MDC-19	1	PLANTA POPAYAN	NORMA I.N.V. E - 732 / 13 Y 782/13	ESTABILIDAD MINIMO 900kgf	SI	PLANTA POPAYAN	ESTABILIDAD 1.565kgf	SEBASTIAN BELLO NOVOA
21/05/2022	MDC-19	1	PLANTA POPAYAN	NORMA I.N.V. E - 732 / 13 Y 782/13	FLUJO 2.0 A 3.5 mm	SI	PLANTA POPAYAN	FLUJO 3.3mm	SEBASTIAN BELLO NOVOA
21/05/2022	MDC-19	1	PLANTA POPAYAN	NORMA I.N.V. E - 732 / 13 Y 782/13	VACIOS CON AIRE CAPA DE RODADURA 4 A 6	SI	PLANTA POPAYAN	VACIOS CON AIRE 4.4	SEBASTIAN BELLO NOVOA
21/05/2022	MDC-19	1	PLANTA POPAYAN	NORMA I.N.V. E - 732 / 13 Y 782/13	VACIOS LLENOS DE ASFALTO 65 A 75	SI	PLANTA POPAYAN	% VACIOS LLENOS DE ASFALTO 71.5%	SEBASTIAN BELLO NOVOA
21/05/2022	MDC-19	1	PLANTA POPAYAN	NORMA I.N.V. E - 732 / 13 Y 782/13	VACIOS MINIMOS AGREGADOS MINERALES >15%	SI	PLANTA POPAYAN	% VACIOS AGREGADOS MINERALES 15.3%	SEBASTIAN BELLO NOVOA
21/05/2022	MDC-19	1	PLANTA POPAYAN	NORMA I.N.V. E - 732 / 13 Y 782/13	RELACION ESTABILIDAD/FLUJO 300 - 600	SI	PLANTA POPAYAN	RELACION ESTABILIDAD FLUJO 471kg/mm	SEBASTIAN BELLO NOVOA
25/05/2022	MDC-19	1	PLANTA POPAYAN	NORMA I.N.V. E - 732 / 13 Y 782/13	GRANULOMETRIA	SI	PLANTA POPAYAN	BRIQUETAS 1, 2, 3 Y 4 ASFALTO 5% RELACION LLENANTE/LIGANTE 1.12	SEBASTIAN BELLO NOVOA
25/05/2022	MDC-19	1	PLANTA POPAYAN	NORMA I.N.V. E - 732 / 13 Y 782/13	ESTABILIDAD MINIMO 900kgf	SI	PLANTA POPAYAN	ESTABILIDAD 1.754kgf	SEBASTIAN BELLO NOVOA
25/05/2022	MDC-19	1	PLANTA POPAYAN	NORMA I.N.V. E - 732 / 13 Y 782/13	FLUJO 2.0 A 3.5 mm	SI	PLANTA POPAYAN	FLUJO 3.4mm	SEBASTIAN BELLO NOVOA
25/05/2022	MDC-19	1	PLANTA POPAYAN	NORMA I.N.V. E - 732 / 13 Y 782/13	VACIOS CON AIRE CAPA DE RODADURA 4 A 6	SI	PLANTA POPAYAN	VACIOS CON AIRE 4.4	SEBASTIAN BELLO NOVOA
25/05/2022	MDC-19	1	PLANTA POPAYAN	NORMA I.N.V. E - 732 / 13 Y 782/13	VACIOS LLENOS DE ASFALTO 65 A 75	SI	PLANTA POPAYAN	% VACIOS LLENOS DE ASFALTO 71.3%	SEBASTIAN BELLO NOVOA
25/05/2022	MDC-19	1	PLANTA POPAYAN	NORMA I.N.V. E - 732 / 13 Y 782/13	VACIOS MINIMOS AGREGADOS MINERALES >15%	SI	PLANTA POPAYAN	% VACIOS AGREGADOS MINERALES 15.3%	SEBASTIAN BELLO NOVOA
25/05/2022	MDC-19	1	PLANTA POPAYAN	NORMA I.N.V. E - 732 / 13 Y 782/13	RELACION ESTABILIDAD/FLUJO 300 - 600	SI	PLANTA POPAYAN	RELACION ESTABILIDAD FLUJO 524kg/mm	SEBASTIAN BELLO NOVOA
3/06/2022	MDC-19	1	PLANTA POPAYAN	NORMA I.N.V. E - 732 / 13 Y 782/13	GRANULOMETRIA	SI	PLANTA POPAYAN	BRIQUETAS 1, 2, 3 Y 4 ASFALTO 5.05% RELACION LLENANTE/LIGANTE 1.08	SEBASTIAN BELLO NOVOA
3/06/2022	MDC-19	1	PLANTA POPAYAN	NORMA I.N.V. E - 732 / 13 Y 782/13	ESTABILIDAD MINIMO 900kgf	SI	PLANTA POPAYAN	ESTABILIDAD 1.715kgf	SEBASTIAN BELLO NOVOA
3/06/2022	MDC-19	1	PLANTA POPAYAN	NORMA I.N.V. E - 732 / 13 Y 782/13	FLUJO 2.0 A 3.5 mm	SI	PLANTA POPAYAN	FLUJO 3.5mm	SEBASTIAN BELLO NOVOA
3/06/2022	MDC-19	1	PLANTA POPAYAN	NORMA I.N.V. E - 732 / 13 Y 782/13	VACIOS CON AIRE CAPA DE RODADURA 4 A 6	SI	PLANTA POPAYAN	VACIOS CON AIRE 4.1	SEBASTIAN BELLO NOVOA
3/06/2022	MDC-19	1	PLANTA POPAYAN	NORMA I.N.V. E - 732 / 13 Y 782/13	VACIOS LLENOS DE ASFALTO 65 A 75	SI	PLANTA POPAYAN	% VACIOS LLENOS DE ASFALTO 73.2%	SEBASTIAN BELLO NOVOA

INP SERVICIOS SAS	INSPECCION Y VERIFICACION DE MATERIALES DE OBRA	FP-515-02 (30/12/2021)

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

CONTRATISTA: EDIFICACIONES Y VÍAS S.A

FECHA	MATERIAL	CANTIDAD	PROCEDENCIA	CERTIFICADO CONFORMIDAD	METODO VERIFICACION	CUMPLE	DESTINO	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
3/06/2022	MDC-19	1	PLANTA POPAYAN	NORMA I.N.V. E - 732 / 13 Y 782/13	VACIOS MINIMOS AGREGADOS MINERALES >15%	SI	PLANTA POPAYAN	% VACIOS AGREGADOS MINERALES 15.3%	SEBASTIAN BELLO NOVOA
3/06/2022	MDC-19	1	PLANTA POPAYAN	NORMA I.N.V. E - 732 / 13 Y 782/13	RELACION ESTABILIDAD/FLUJO 300 - 600	SI	PLANTA POPAYAN	RELACION ESTABILIDAD FLUJO 497kg/mm	SEBASTIAN BELLO NOVOA
6/06/2022	MDC-19	1	PLANTA POPAYAN	NORMA I.N.V. E - 732 / 13 Y 782/13	GRANULOMETRIA	SI	PLANTA POPAYAN	BRIQUETAS 1, 2, 3 Y 4 ASFALTO 5.1% RELACION LLENANTE/LIGANTE 1.13	SEBASTIAN BELLO NOVOA
6/06/2022	MDC-19	1	PLANTA POPAYAN	NORMA I.N.V. E - 732 / 13 Y 782/13	ESTABILIDAD MINIMO 900kgf	SI	PLANTA POPAYAN	ESTABILIDAD 1.311kgf	SEBASTIAN BELLO NOVOA
6/06/2022	MDC-19	1	PLANTA POPAYAN	NORMA I.N.V. E - 732 / 13 Y 782/13	FLUJO 2.0 A 3.5 mm	SI	PLANTA POPAYAN	FLUJO 3.4mm	SEBASTIAN BELLO NOVOA
6/06/2022	MDC-19	1	PLANTA POPAYAN	NORMA I.N.V. E - 732 / 13 Y 782/13	VACIOS CON AIRE CAPA DE RODADURA 4 A 6	SI	PLANTA POPAYAN	VACIOS CON AIRE 4.3	SEBASTIAN BELLO NOVOA
6/06/2022	MDC-19	1	PLANTA POPAYAN	NORMA I.N.V. E - 732 / 13 Y 782/13	VACIOS LLENOS DE ASFALTO 65 A 75	SI	PLANTA POPAYAN	% VACIOS LLENOS DE ASFALTO 72.2%	SEBASTIAN BELLO NOVOA
6/06/2022	MDC-19	1	PLANTA POPAYAN	NORMA I.N.V. E - 732 / 13 Y 782/13	VACIOS MINIMOS AGREGADOS MINERALES >15%	SI	PLANTA POPAYAN	% VACIOS AGREGADOS MINERALES 15.5%	SEBASTIAN BELLO NOVOA
6/06/2022	MDC-19	1	PLANTA POPAYAN	NORMA I.N.V. E - 732 / 13 Y 782/13	RELACION ESTABILIDAD/FLUJO 300 - 600	SI	PLANTA POPAYAN	RELACION ESTABILIDAD FLUJO 391kg/mm	SEBASTIAN BELLO NOVOA
26/05/2022	MDC-19	1	PLANTA POPAYAN	NORMA I.N.V. E - 732 / 13 Y 782/13	GRANULOMETRIA	SI	PLANTA POPAYAN	BRIQUETAS 1, 2, 3 Y 4 ASFALTO 5.75%	INTERVENTORIA
26/05/2022	MDC-19	1	PLANTA POPAYAN	NORMA I.N.V. E - 732 / 13 Y 782/13	ESTABILIDAD MINIMO 900kgf	NO	PLANTA POPAYAN	ESTABILIDAD 804kgf	INTERVENTORIA
26/05/2022	MDC-19	1	PLANTA POPAYAN	NORMA I.N.V. E - 732 / 13 Y 782/13	FLUJO 2.0 A 3.5 mm	SI	PLANTA POPAYAN	FLUJO 3.7mm	INTERVENTORIA
26/05/2022	MDC-19	1	PLANTA POPAYAN	NORMA I.N.V. E - 732 / 13 Y 782/13	VACIOS CON AIRE CAPA DE RODADURA 4 A 6	SI	PLANTA POPAYAN	VACIOS CON AIRE 4.32	INTERVENTORIA
26/05/2022	MDC-19	1	PLANTA POPAYAN	NORMA I.N.V. E - 732 / 13 Y 782/13	RELACION ESTABILIDAD/FLUJO 300 - 600	NO	PLANTA POPAYAN	RELACION ESTABILIDAD FLUJO 217kg/mm	INTERVENTORIA

Firma
Nombre: RUGOBERTO QUILINDO CEPEDA
Residente de interventoria
Matrícula Profesional No.: 19202-67664 CAU

INGENIERÍA DE VÍAS SAS
INGENIEROS CONTRATISTAS

EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DE ASFALTO Y GRANULOMETRIA DE MEZCLA ASFÁLTICA


NORMA I.N.V. E - 732 / 13 I.N.V. E - 782 / 13

PROYECTO:	CONTRATO MALLA VIAL POPAYÁN
LOCALIZACIÓN:	PLANTA POPAYAN
PROCEDENCIA:	PLANTA POPAYAN
FECHA:	3-jun-22

EXTRACCION No. 1	
PESO INICIAL MATERIAL (g.)	2.506,6
PESO INICIAL FLITRO (g.)	14,5
PESO FINAL MATERIAL (g.)	2.378,2
PESO FINAL FLITRO (g.)	16,5
PESO MAT. ADHERIDO AL FRILTRO (g)	2,0
% ASFALTO	**5,1**

EXTRACCION No. 1	
PESO INICIAL MATERIAL (g.)	2.508,5
PESO INICIAL FLITRO (g.)	14,6
PESO FINAL MATERIAL (g.)	2.382,2
PESO FINAL FLITRO (g.)	16,2
PESO MAT. ADHERIDO AL FRILTRO (g)	1,6
% ASFALTO	**5,0**

GRADACIÓN					
P1=	2.378,2	P2=	2.253,4	**NORMA (%)**	
Tamiz	Peso Retenido	% Retenido	% Pasa	**MIN.**	**MAX.**
3/4"	0,0	0,0	100,0	**100**	**100**
1/2"	223,2	9,4	90,6	**80**	**95**
3/8"	288,5	12,1	78,5	**70**	**88**
No. 4	493,2	20,7	57,7	**49**	**65**
No. 10	444,1	18,7	39,1	**29**	**45**
No. 40	503,0	21,2	17,9	**14**	**25**
No. 80	179,2	7,5	10,4	**8**	**17**
No. 200	122,2	5,1	5,2	**4**	**8**
Pasa 200	124,8	5,2			
RELACION LLENANTE / LIGANTE					**1,08**

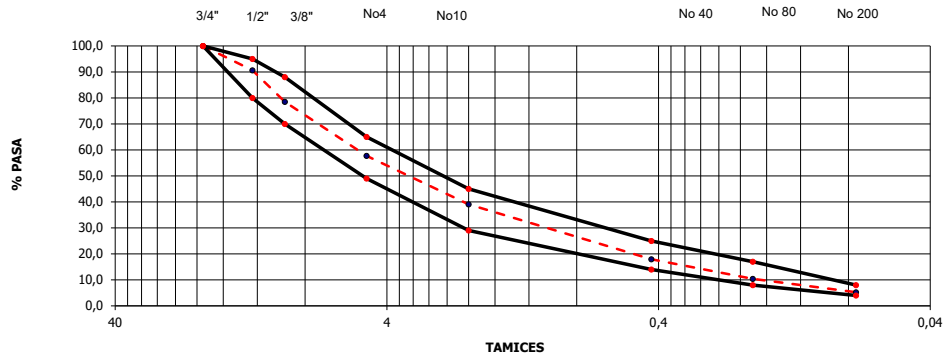

CUMPLIENDO CON LA NORMA OK

Rice (Gmm)	
No. Muestra	1
A. Masa en el aire de la muestra seca (g)	2500
D. Masa frasco Lleno con Agua a 25 °C (g)	7425
E. Masa frasco con Agua + Muestra a 25°C (g)	8902
Peso Específico Máximo. Gmm	2,444

OBSERVACIONES: PARCHEO CAUCA BRIQUETAS **1** **2** **3** **4**

LUIS FERNANDO SALAZAR YANES
Elaboró: Laboratorista

SEBASTIAN BELLO NOVOA
Revisó: Ing. Residente de Calidad

REPORTE DE ENSAYOS REALIZADOS PARA EL DISEÑO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS - METODO MARSHALL

PROYECTO: CONTRATO MALLA VIAL POPAYÁN
LOCALIZACIÓN: PLANTA POPAYAN
PROCEDENCIA: PLANTA POPAYAN

TIPO DE ASFALTO: 60/70
NIVEL DE TRÁFICO: NT-3
Compactación (Golpes/Cara): 75

PESO ESPECIFICO DE LOS AGREGADOS Gsb: 2,624
PESO ESPECIFICO DEL ASFALTO: 1,020
FECHA: 3-jun-22

Muestra No.	% Asfalto	Peso (g)			Volúmen (cm3)	Peso Específico			Gravedad especifica efectiva.	% Asfalto Absorbido	Volúmen (% del Total)			% Vacíos		% Asfalto Efectivo	Relacion Llenante /Ligante	Estabilidad				Flujo	Relacion Estabilidad Fllujo (kg/mm)
		Seco al aire	Saturada al aire	Sumergido al Agua		Gmb	Gmm Calculo	Gmm Medido			Agregados	Vacíos con Aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de Asfalto			Medida Kgf.	Fact Corr	Espesor	Estabilidad Corregida		
	Pb					Bulk		Rice	Gse	Pba		Va	Pbe	VAM	VFA	Pbe				(mm)	kgf.	(mm)	
1		1198,5	1199,8	687,4	512,4	2,336												1615	1,00	63,8	1615	3,5	461
2		1196,6	1197,5	688,5	509,0	2,348												1733	1,00	63,9	1733	3,5	495
3		1194,5	1196,6	688,8	507,8	2,349												1720	1,04	63,7	1789	3,4	526
4		1195,5	1197,5	687,9	509,6	2,343												1721	1,00	63,8	1721	3,4	506
Promedio	**5,1**					**2,344**	**2,444**	**2,444**	**2,643**	**0,28**	**84,7**	**4,1**	**11,2**	**15,3**	**73,2**	**4,9**	**1,08**				**1715**	**3,5**	**497**

Contenido de Asfalto Norma - Diseño Marshall	
Estabilidad Mínima Norma =	900 Kg - 0.90 Et ≥ Em ≥ 1.25 Et
Flujo Criterio Norma =	2,0 a 3,5 mm - 0.80 Ft ≥ Fm ≥ 1.20 Ft
Vacíos con Aire Capa de Rodadura Norma =	4 A 6
Vacíos Llenos de Asfalto Norma =	65 A 75
Vacíos Mínimos Agregados Minerales Norma =	>= 15%
Relacion Estabilidad / Flujo (Kgf/mm)	300 - 600
T.S.R. Norma =	>= 80%

ESPECIFICACIÓN INV E-13Art.450.4.2 y 450.5.2.4

CUMPLIENDO CON LA NORMA OK

OBSERVACIONES: **PARCHEO CAUCA**

LUIS FERNANDO SALAZAR YANES
Elaboró: Laboratorista

SEBASTIAN BELLO NOVOA
Revisó: Ing. Residente de Calidad

INGENIERÍA DE VÍAS SAS
INGENIEROS CONTRATISTAS

EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DE ASFALTO Y GRANULOMETRIA DE MEZCLA ASFÁLTICA


NORMA I.N.V. E - 732 / 13 I.N.V. E - 782 / 13

PROYECTO:	CONTRATO MALLA VIAL POPAYÁN
LOCALIZACIÓN:	PLANTA POPAYAN
PROCEDENCIA:	PLANTA POPAYAN
FECHA:	6-jun-22

EXTRACCION No. 1	
PESO INICIAL MATERIAL (g.)	2.506,1
PESO INICIAL FLITRO (g.)	16,0
PESO FINAL MATERIAL (g.)	2.375,4
PESO FINAL FLITRO (g.)	18,0
PESO MAT. ADHERIDO AL FRILTRO (g)	2,0
'% ASFALTO	**5,2**

EXTRACCION No. 1	
PESO INICIAL MATERIAL (g.)	2.506,6
PESO INICIAL FLITRO (g.)	14,5
PESO FINAL MATERIAL (g.)	2.381,2
PESO FINAL FLITRO (g.)	16,9
PESO MAT. ADHERIDO AL FRILTRO (g)	2,4
'% ASFALTO	**5,0**

GRADACIÓN					
P1=	2.375,4	P2=	2.244,4	**NORMA (%)**	
Tamiz	Peso Retenido	% Retenido	% Pasa	**MIN.**	**MAX.**
3/4"	0,0	0,0	100,0	**100**	**100**
1/2"	225,6	9,5	90,5	**80**	**95**
3/8"	324,8	13,7	76,8	**70**	**88**
No. 4	495,8	20,9	56,0	**49**	**65**
No. 10	402,7	17,0	39,0	**29**	**45**
No. 40	533,3	22,5	16,6	**14**	**25**
No. 80	156,5	6,6	10,0	**8**	**17**
No. 200	105,7	4,4	5,5	**4**	**8**
Pasa 200	131,0	5,5			
RELACION LLENANTE / LIGANTE					**1,13**

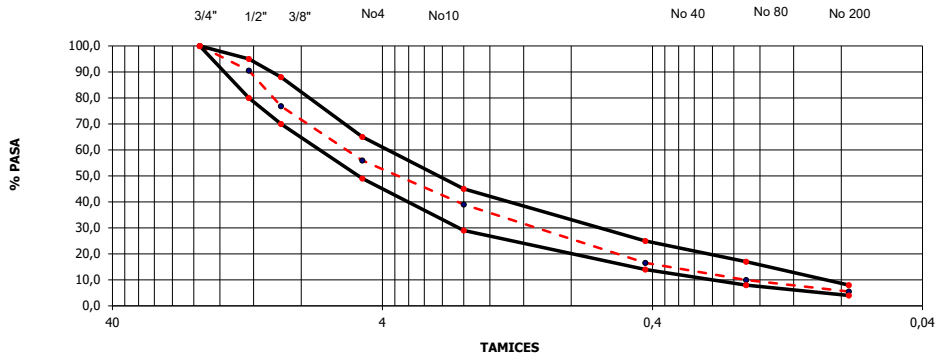



Rice (Gmm)	
No. Muestra	1
A. Masa en el aire de la muestra seca (g)	1500
D. Masa frasco Lleno con Agua a 25 °C (g)	7424
E. Masa frasco con Agua + Muestra a 25°C (g)	8308
Peso Específico Máximo. Gmm	2,435

OBSERVACIONES: PARCHE ING DE VIAS **1** **2** **3** **4**

LUIS FERNANDO SALAZAR YANES
Elaboró: Laboratorista

SEBASTIAN BELLO NOVOA
Revisó: Ing. Residente de Calidad

REPORTE DE ENSAYOS REALIZADOS PARA EL DISEÑO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS - METODO MARSHALL

PROYECTO: CONTRATO MALLA VIAL POPAYÁN
LOCALIZACIÓN: PLANTA POPAYAN
PROCEDENCIA: PLANTA POPAYAN
TIPO DE ASFALTO: 60/70
NIVEL DE TRÁFICO: NT-3
Compactación (Golpes/Cara): 75
PESO ESPECIFICO DE LOS AGREGADOS Gsb: 2,613
PESO ESPECIFICO DEL ASFALTO: 1,021
FECHA: 6-jun-22

Muestra No.	% Asfalto	Peso (g)			Volúmen (cm3)	Peso Específico			Gravedad especifica efectiva.	% Asfalto Absorbido	Volúmen (% del Total)			% Vacíos		% Asfalto Efectivo	Relacion Llenante /Ligante	Estabilidad				Flujo	Relacion Estabilidad Fllujo (kg/mm)
		Seco al aire	Saturada al aire	Sumergido al Agua		Gmb	Gmm Calculo	Gmm Medido			Agregados	Vacíos con Aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de Asfalto			Medida Kgf.	Fact Corr	Espesor	Estabilidad Corregida		
	Pb					Bulk		Rice	Gse	Pba		Va	Pbe	VAM	VFA	Pbe				(mm)	kgf.	(mm)	
1		1195,5	1197,5	685,5	512,0	2,332												1256	1,00	63,6	1256	3,4	369
2		1196,5	1198,6	685,4	513,2	2,328												1366	1,00	63,5	1366	3,3	414
3		1197,4	1199,5	686,6	512,9	2,331												1276	1,00	63,5	1276	3,4	375
4		1198,5	1199,2	685,5	513,7	2,330												1346	1,00	63,7	1346	3,3	408
Promedio	**5,2**					**2,330**	**2,435**	**2,435**	**2,636**	**0,34**	**84,5**	**4,3**	**11,2**	**15,5**	**72,2**	**4,9**	**1,13**				**1311**	**3,4**	**391**

Contenido de Asfalto Norma - Diseño Marshall

Estabilidad Mínima Norma =	900 Kg - 0.90 Et ≥ Em ≥ 1.25 Et
Flujo Criterio Norma =	2,0 a 3,5 mm - 0.80 Ft ≥ Fm ≥ 1.20 Ft
Vacíos con Aire Capa de Rodadura Norma =	4 A 6
Vacíos Llenos de Asfalto Norma =	65 A 75
Vacíos Mínimos Agregados Minerales Norma =	>= 15%
Relacion Estabilidad / Flujo (Kgf/mm)	300 - 600
T.S.R. Norma =	>= 80%

ESPECIFICACIÓN INV E-13Art.450.4.2 y 450.5.2.4

CUMPLIENDO CON LA NORMA OK

OBSERVACIONES: **PARCHE ING DE VIAS**

LUIS FERNANDO SALAZAR YANES
Elaboró: Laboratorista

SEBASTIAN BELLO NOVOA
Revisó: Ing. Residente de Calidad


INGENIERIA DE VIAS S.A.S.	**EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DE ASFALTO Y GRANULOMETRIA DE MEZCLA ASFÁLTICA** **NORMA I.N.V. E - 732 / 13 I.N.V. E - 782 / 13**	

PROYECTO:	MALLA VIAL POPAYAN
LOCALIZACIÓN:	PLANTA POPAYAN
PROCEDENCIA:	PLANTA POPAYAN
FECHA:	21-may-22

EXTRACCION No. 1	
PESO INICIAL MATERIAL (g.)	2.505,4
PESO INICIAL FLITRO (g.)	16,4
PESO FINAL MATERIAL (g.)	2.379,8
PESO FINAL FLITRO (g.)	17,6
PESO MAT. ADHERIDO AL FRILTRO (g)	1,2
'% ASFALTO	**5,0**

EXTRACCION No. 1	
PESO INICIAL MATERIAL (g.)	2.509,1
PESO INICIAL FLITRO (g.)	16,2
PESO FINAL MATERIAL (g.)	2.382,8
PESO FINAL FLITRO (g.)	18,1
PESO MAT. ADHERIDO AL FRILTRO (g)	1,9
'% ASFALTO	**5,0**

GRADACIÓN					
P1=	2.379,8	P2=	2.250,8	**NORMA (%)**	
Tamiz	Peso Retenido	% Retenido	% Pasa	**MIN.**	**MAX.**
3/4"	0,0	0,0	100,0	**100**	**100**
1/2"	215,4	9,1	90,9	**80**	**95**
3/8"	306,4	12,9	78,1	**70**	**88**
No. 4	523,6	22,0	56,1	**49**	**65**
No. 10	468,3	19,7	36,4	**29**	**45**
No. 40	446,6	18,8	17,6	**14**	**25**
No. 80	164,3	6,9	10,7	**8**	**17**
No. 200	126,2	5,3	5,4	**4**	**8**
Pasa 200	129,0	5,4			
RELACION LLENANTE / LIGANTE					**1,14**

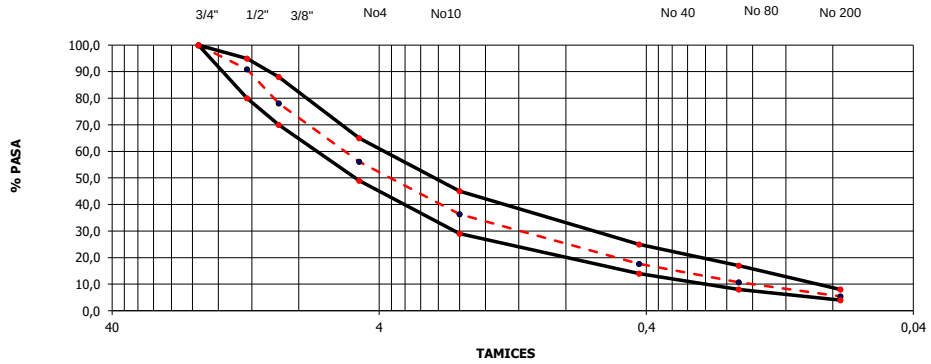

Rice (Gmm)	
No. Muestra	1
A. Masa en el aire de la muestra seca (g)	2500
D. Masa frasco Lleno con Agua a 25 °C (g)	7425
E. Masa frasco con Agua + Muestra a 25°C (g)	8903
Peso Específico Máximo. Gmm	2,446

CUMPLIENDO CON LA NORMA OK

OBSERVACIONES: TIMBIO CAUCA BRIQUETA: 1-2-3-4

LUIS FERNANDO SALAZAR YANES
Elaboró: Laboratorista

SEBASTIAN BELLO NOVOA
Revisó: Ing. Residente de Calidad

REPORTE DE ENSAYOS REALIZADOS PARA EL DISEÑO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS - METODO MARSHALL

PROYECTO: MALLA VIAL POPAYAN
LOCALIZACIÓN: PLANTA POPAYAN
PROCEDENCIA: PLANTA POPAYAN
TIPO DE ASFALTO: 60/70
NIVEL DE TRÁFICO: NT-3
Compactación (Golpes/Cara): 75

PESO ESPECIFICO DE LOS AGREGADOS Gsb: 2,624
PESO ESPECIFICO DEL ASFALTO: 1,020
FECHA: 21-may-22

Muestra No.	% Asfalto	Peso (g)			Volúmen (cm3)	Peso Específico			Gravedad especifica efectiva.	% Asfalto Absorbido	Volúmen (% del Total)			% Vacíos		% Asfalto Efectivo	Relacion Llenante /Ligante	Estabilidad				Flujo	Relacion Estabilidad Fllujo (kg/mm)
		Seco al aire	Saturada al aire	Sumergido al Agua		Gmb	Gmm Calculo	Gmm Medido			Agregados	Vacíos con Aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de Asfalto			Medida Kgf.	Fact Corr	Espesor	Estabilidad Corregida		
	Pb					Bulk		Rice	Gse	Pba		Va	Pbe	VAM	VFA	Pbe				(mm)	kgf.	(mm)	
1		1197,1	1198,5	688,6	509,9	2,344												1611	1,00	63,2	1611	3,4	474
2		1196,6	1197,6	687,4	510,2	2,342												1479	1,00	63,0	1479	3,4	435
3		1195,5	1196,3	686,5	509,8	2,342												1570	1,00	63,5	1570	3,2	491
4		1196,6	1197,4	684,5	512,9	2,330												1601	1,00	63,0	1601	3,3	485
Promedio	**5,0**					**2,339**	**2,446**	**2,446**	**2,641**	**0,25**	**84,7**	**4,4**	**11,0**	**15,3**	**71,5**	**4,8**	**1,14**				**1565**	**3,3**	**471**

Contenido de Asfalto Norma - Diseño Marshall	
Estabilidad Mínima Norma =	900 Kg - 0.90 Et ≥ Em ≥ 1.25 Et
Flujo Criterio Norma =	2,0 a 3,5 mm - 0.80 Ft ≥ Fm ≥ 1.20 Ft
Vacíos con Aire Capa de Rodadura Norma =	4 A 6
Vacíos Llenos de Asfalto Norma =	65 A 75
Vacíos Mínimos Agregados Minerales Norma =	>= 15%
Relacion Estabilidad / Flujo (Kgf/mm)	300 - 600
T.S.R. Norma =	>= 80%

ESPECIFICACIÓN INV E-13Art.450.4.2 y 450.5.2.4

OBSERVACIONES: **TIMBIO CAUCA**

LUIS FERNANDO SALAZAR YANES
Elaboró: Laboratorista

SEBASTIAN BELLO NOVOA
Revisó: Ing. Residente de Calidad


INGENIERIA DE VIAS S.A.S.	**EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DE ASFALTO Y GRANULOMETRIA DE MEZCLA ASFÁLTICA** **NORMA I.N.V. E - 732 / 13 I.N.V. E - 782 / 13**	

PROYECTO:	MALLA VIAL POPAYAN
LOCALIZACIÓN:	PLANTA POPAYAN
PROCEDENCIA:	PLANTA POPAYAN
FECHA:	25-may-22

EXTRACCION No. 1	
PESO INICIAL MATERIAL (g.)	2.510,4
PESO INICIAL FLITRO (g.)	16,3
PESO FINAL MATERIAL (g.)	2.384,3
PESO FINAL FLITRO (g.)	18,1
PESO MAT. ADHERIDO AL FRILTRO (g)	1,8
'% ASFALTO	**5,0**

EXTRACCION No. 1	
PESO INICIAL MATERIAL (g.)	
PESO INICIAL FLITRO (g.)	
PESO FINAL MATERIAL (g.)	
PESO FINAL FLITRO (g.)	
PESO MAT. ADHERIDO AL FRILTRO (g)	
'% ASFALTO	

GRADACIÓN					
P1=	2.384,3	P2=	2.257,9	**NORMA (%)**	
Tamiz	Peso Retenido	% Retenido	% Pasa	**MIN.**	**MAX.**
3/4"	0,0	0,0	100,0	**100**	**100**
1/2"	221,7	9,3	90,7	**80**	**95**
3/8"	228,9	9,6	81,1	**70**	**88**
No. 4	581,6	24,4	56,7	**49**	**65**
No. 10	448,2	18,8	37,9	**29**	**45**
No. 40	491,3	20,6	17,3	**14**	**25**
No. 80	165,0	6,9	10,4	**8**	**17**
No. 200	121,2	5,1	5,3	**4**	**8**
Pasa 200	126,4	5,3			
RELACION LLENANTE / LIGANTE					**1,12**

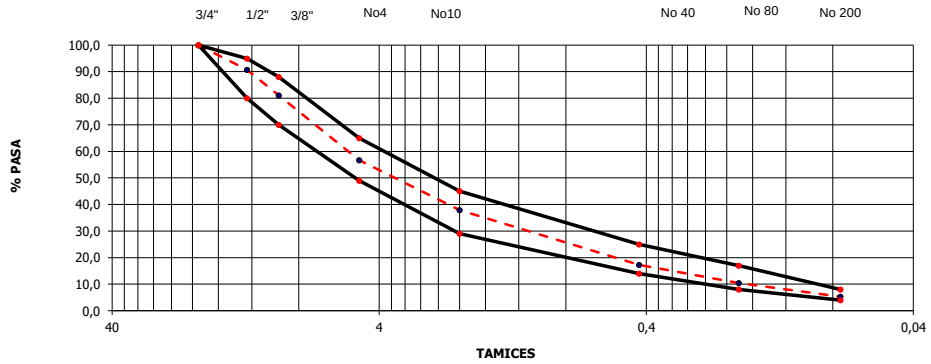



Rice (Gmm)	
No. Muestra	1
A. Masa en el aire de la muestra seca (g)	2500
D. Masa frasco Lleno con Agua a 25 °C (g)	7425
E. Masa frasco con Agua + Muestra a 25°C (g)	8904
Peso Específico Máximo. Gmm	2,449

OBSERVACIONES: PARCHEO POPAYAN BRIQUETAS

LUIS FERNANDO SALAZAR YANES
Elaboró: Laboratorista

SEBASTIAN BELLO NOVOA
Revisó: Ing. Residente de Calidad

REPORTE DE ENSAYOS REALIZADOS PARA EL DISEÑO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS - METODO MARSHALL

PROYECTO: MALLA VIAL POPAYAN
LOCALIZACIÓN: PLANTA POPAYAN
PROCEDENCIA: PLANTA POPAYAN
TIPO DE ASFALTO: 60/70
NIVEL DE TRÁFICO: NT-3
Compactación (Golpes/Cara): 75

PESO ESPECIFICO DE LOS AGREGADOS Gsb: 2,624
PESO ESPECIFICO DEL ASFALTO: 1,020
FECHA: 25-may-22

Muestra No.	% Asfalto	Peso (g)			Volúmen (cm3)	Peso Específico			Gravedad especifica efectiva.	% Asfalto Absorbido	Volúmen (% del Total)			% Vacíos		% Asfalto Efectivo	Relacion Llenante /Ligante	Estabilidad				Flujo	Relacion Estabilidad Fllujo (kg/mm)
		Seco al aire	Saturada al aire	Sumergido al Agua		Gmb	Gmm Calculo	Gmm Medido			Agregados	Vacíos con Aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de Asfalto			Medida Kgf.	Fact Corr	Espesor	Estabilidad Corregida		
	Pb					Bulk		Rice	Gse	Pba		Va	Pbe	VAM	VFA	Pbe				(mm)	kgf.	(mm)	
1		1199,4	1201,6	689,5	512,1	2,339												1684	1,00	64,9	1684	3,4	495
2		1196,4	1200,7	690,2	510,5	2,340												1775	1,00	64,4	1775	3,4	522
3		1198,4	1200,6	688,9	511,7	2,339												1759	1,00	63,9	1759	3,3	533
4		1195,4	1198,7	690,1	508,6	2,347												1728	1,04	63,8	1798	3,3	545
Promedio	**5,0**					**2,341**	**2,449**	**2,449**	**2,644**	**0,30**	**84,7**	**4,4**	**10,9**	**15,3**	**71,3**	**4,7**	**1,12**				**1754**	**3,4**	**524**

Contenido de Asfalto Norma - Diseño Marshall

Estabilidad Mínima Norma =	900 Kg - 0.90 Et ≥ Em ≥ 1.25 Et
Flujo Criterio Norma =	2,0 a 3,5 mm - 0.80 Ft ≥ Fm ≥ 1.20 Ft
Vacíos con Aire Capa de Rodadura Norma =	4 A 6
Vacíos Llenos de Asfalto Norma =	65 A 75
Vacíos Mínimos Agregados Minerales Norma =	>= 15%
Relacion Estabilidad / Flujo (Kgf/mm)	300 - 600
T.S.R. Norma =	>= 80%

ESPECIFICACIÓN INV E-13Art.450.4.2 y 450.5.2.4

CUMPLIENDO CON LA NORMA OK

OBSERVACIONES: PARCHEO POPAYAN

LUIS FERNANDO SALAZAR YANES
Elaboró: Laboratorista

SEBASTIAN BELLO NOVOA
Revisó: Ing. Residente de Calidad

Citec Ltda.
Ingeniería y Geotecnia

Diagonal 26 N°26-58 Yanaconas
citecpopayan@gmail.com
Popayán - Cauca

Citec Ltda. Ingeniería y Geotecnia	DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE ASFALTO Y GRADACION DEL MATERIAL DE CARPETA TIPO MDC-2		Código:	GT-CE29
	NORMAS REFERENCIA:	INV E-731, E-732, E-734, E-748	Versión:	0

ECHA INFORME: 26-may-2022
OBRA: INTERVENTORÍA PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL MUNICIPIO DE POPAYÁN (Reparcheo)"
OBJETO: CONTROL DE CALIDAD DE MEZCLA ASFÁLTICA INSTALADA
LOCALIZACION: GLORIETA CALLE 78N PR 0+045 / PR 0+065 M.I CAPA 1 (7,5cm)
CONTRATISTA: EDIFICACIONES Y VÍAS S.A.S
INTERVENTOR: INP SERVICIOS S.A.S
SOLICITÓ: INP SERVICIOS S.A.S

ECHA ENTRADA: 23-may-2022
MATERIAL: MDC19
CANTERA: PLANTA POPAYÁN, INGENIERIA DE VÍAS S.A.S
DESCRIPCION: MUESTRA MDC EN BLOQUE
REMITE: MUESTRA TOMADA EN CAMPO POR EL CLIENTE


ODS Nº:
MUESTRA N° 1
FECHA DE TOMA: 22-may
FECHA DE ENSAYO: 27-may
TEMPERATURA ºC: 120

CARPETA MDC-2

Win:	Wfi:
1.879,12	1.833,68

Tamiz	Peso retenido	% pasa	Esp.
1" (25,4)	0,0	100	
3/4" (19,05)	0,0	100,0	100
1/2" (12,5)	200,5	89,3	80-100
3/8" (9,5)	224,5	77,4	70-88
N°4 (4,75)	441,0	53,9	49-65
N°12 (1,70)	366,2	34,4	29-45
N°40 (0,425)	411,6	12,5	14-25
N°80 (0,180)	120,3	6,1	8-17
N°200 (0,075)	69,5	2,4	4-8
P200	45,4		
%P # 200			

PORCENTAJE DE ASFALTO	
W MUESTRA INICIAL (g):	2000
W FILTRO INICIAL (g).	13,2
W FILTRO FINAL (g).	19,0
W MUESTRA FINAL (g):	1879,1
% ASFALTO: (g)	5,75%

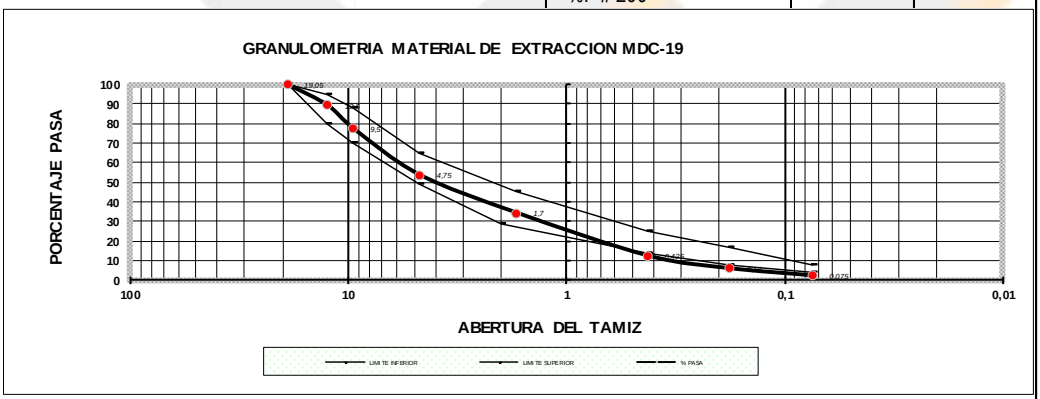

OBSERVACIONES: MUESTRA TOMADA EN CAMPO POR EL CLIENTE

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL INGENIERO DE CALIDAD DE CITEC Ltda.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Geot. Luis Carlos Ponce	Ing. Hugo Daza Delgado	

Citec Ltda.
Ingeniería y Geotecnia

Diagonal 26 N°26-58 Yanaconas
citecpopayan@gmail.com
Popayán - Cauca

Citec Ltda. Ingeniería y Geotecnia	REPORTE DE PESOS UNITARIOS, % VACIOS Y ESTABILIDAD Y FLUJO MATERIAL DE CARPETA TIPO MDC-2		Código:	GT-CE30
	NORMAS REFERENCIA:	INV E-731, E-732, E-734, E-748	Versión:	0

FECHA INFORME: 26-may-2022 **ODS Nº:**

OBRA: INTERVENTORÍA PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL MUNICIPIO DE POPAYÁN (Reparcheo)"

OBJETO: CONTROL CALIDAD MEZCLA DENSA EN CALIENTE

LOCALIZACION: GLORIETA CALLE 78N PR 0+045 / PR 0+065 M.I CAPA 1 (7,5cm)

CONTRATISTA: EDIFICACIONES Y VÍAS S.A.S

INTERVENTOR: INP SERVICIOS S.A.S

SOLICITÓ: INP SERVICIOS S.A.S

FECHA ENTRADA: 23-may-2022

MATERIAL: MDC19 **MUESTRA N°** 1

CANTERA: PLANTA POPAYÁN, INGENIERIA DE VÍAS S.A.S **FECHA DE TOMA:** 22-may

DESCRIPCION: BRIQUETAS DE MDC COMPACTADAS EL LABORATORIO **FECHA DE ENSAYO:** 27-may

REMITE: MUESTRA TOMADA EN CAMPO POR EL CLIENTE **TEMPERATURA ºC:** 136

PESO UNITARIO						LECTURA MEDIDA EN cm			
BRIQUETA Nº	1	2	3			1	2	3	
ABSCISA	CALLE 78N	CALLE 78N	CALLE 78N						
W MUESTRA AIRE (g):	1230	1290	1262						
W MUESTRA AIRE + PARAF (g):	1230	1290	1262			6,576	7,036	6,886	
W MUESTRA AGUA (g):	705	737	719			6,566	7,099	6,993	
VOLUMEN (cm^3)	525	553	543			6,769	7,036	6,904	
P.U. (g/cm^3):	2,343	2,333	2,324			6,756	6,985	6,807	
ALTURA CALCULADA (cm)	6,44	6,79	6,66			*6,67*	*7,04*	*6,90*	

PORCENTAJE DE VACÍOS					
BRIQUETA Nº	1	2	3		
P.U. (g/cm^3):	2,343	2,333	2,324		
GMM	2,439	2,439	2,439		
% DE VACÍOS MEZCLA TOTAL	3,9	4,3	4,7		

ESTABILIDAD Y FLUJO					
ESTABILIDAD LEIDA (N):	9155	9718	7641		
ESTABILIDAD CORREGIDA (N).	8606	8163	6647		
FLUJO: mm	3,8	3,8	3,6		

RESULTADOS PROMEDIO		
Contenido de asfalto	5,75%	
Peso unitario (g/cm^3):	2,333	
Estabilidad (N) - (Kgf)	7806	804
Flujo (mm)	3,7	
% de Vacios	4,32	

OBSERVACIONES: *MUESTRA TOMADA EN CAMPO POR EL CLIENTE*

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL INGENIERO DE CALIDAD DE CITEC Ltda.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Geot. Luis Carlos Ponce	Ing. Hugo Daza Delgado	

Citec Ltda.
Ingeniería y Geotecnia

Diagonal 26 N°26-58 Yanaconas
citecpopayan@gmail.com
Popayán - Cauca

Citec Ltda. Ingeniería y Geotecnia	DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE ASFALTO Y GRADACION DEL MATERIAL DE CARPETA TIPO MDC-2		Código:	GT-CE29
	NORMAS REFERENCIA:	INV E-731, E-732, E-734, E-748	Versión:	0

ECHA INFORME: 26-may-2022
OBRA: INTERVENTORÍA PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL MUNICIPIO DE POPAYÁN (Reparcheo)"
OBJETO: CONTROL DE CALIDAD DE MEZCLA ASFÁLTICA INSTALADA
LOCALIZACION: CALLE 78 PARCHE 8 M.D AUTOPISTA CALZADA ORIENTAL
CONTRATISTA: EDIFICACIONES Y VÍAS S.A.S
INTERVENTOR: INP SERVICIOS S.A.S
SOLICITÓ: INP SERVICIOS S.A.S

ECHA ENTRADA: 7-jun-2022
MATERIAL: MDC19
CANTERA: PLANTA POPAYÁN, INGENIERIA DE VÍAS S.A.S
DESCRIPCION: MUESTRA MDC EN BLOQUE
REMITE: MUESTRA TOMADA EN CAMPO POR EL CLIENTE


ODS Nº:
MUESTRA N° 1
FECHA DE TOMA: 31-may
FECHA DE ENSAYO: 5-jun
TEMPERATURA ºC: 130

CARPETA MDC-2

Win:	Wfi:
1.895,16	1.860,41

Tamiz	Peso retenido	% pasa	Esp.
1" (25,4)	0,0	100	
3/4" (19,05)	0,0	100,0	100
1/2" (12,5)	120,3	93,7	80-100
3/8" (9,5)	165,7	84,9	70-88
N°4 (4,75)	462,4	60,5	49-65
N°12 (1,70)	401,0	39,4	29-45
N°40 (0,425)	473,1	14,4	14-25
N°80 (0,180)	147,0	6,6	8-17
N°200 (0,075)	90,9	1,8	4-8
P200	34,7		
%P # 200			

PORCENTAJE DE ASFALTO	
W MUESTRA INICIAL (g):	2000
W FILTRO INICIAL (g).	18,8
W FILTRO FINAL (g).	19,0
W MUESTRA FINAL (g):	1895,2
% ASFALTO: (g)	5,23%

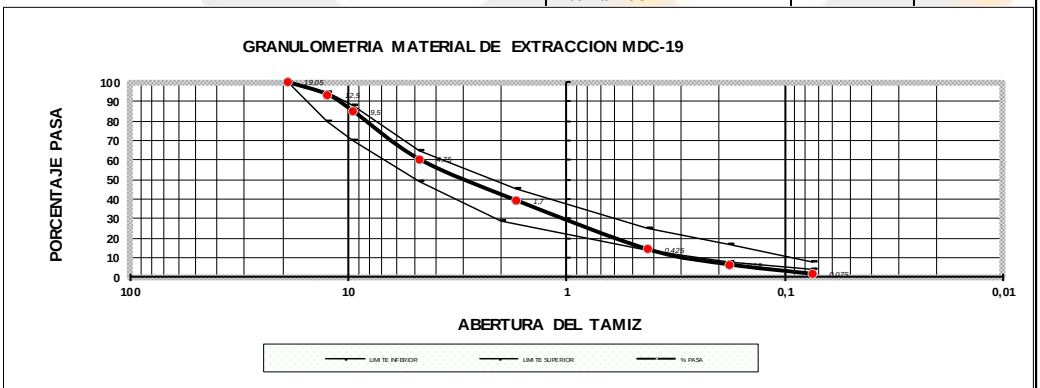

OBSERVACIONES: MUESTRA TOMADA EN CAMPO POR EL CLIENTE

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL INGENIERO DE CALIDAD DE CITEC Ltda.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Geot. Luis Carlos Ponce	Ing. Hugo Daza Delgado	

Citec Ltda.
Ingeniería y Geotecnia

Diagonal 26 N°26-58 Yanaconas
citecpopayan@gmail.com
Popayán - Cauca

Citec Ltda. Ingeniería y Geotecnia	REPORTE DE PESOS UNITARIOS, % VACIOS Y ESTABILIDAD Y FLUJO MATERIAL DE CARPETA TIPO MDC-2		Código:	GT-CE30
	NORMAS REFERENCIA:	INV E-731, E-732, E-734, E-748	Versión:	0

FECHA INFORME: 26-may-2022 **ODS Nº:** 0

OBRA: INTERVENTORÍA PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL MUNICIPIO DE POPAYÁN (Reparcheo)"

OBJETO: CONTROL CALIDAD MEZCLA DENSA EN CALIENTE

LOCALIZACION: CALLE 78 PARCHE 8 M.D AUTOPISTA CALZADA ORIENTAL

CONTRATISTA: EDIFICACIONES Y VÍAS S.A.S

INTERVENTOR: INP SERVICIOS S.A.S

SOLICITÓ: INP SERVICIOS S.A.S

FECHA ENTRADA: 7-jun-2022

MATERIAL: MDC19 **MUESTRA N°** 1

CANTERA: PLANTA POPAYÁN, INGENIERIA DE VÍAS S.A.S **FECHA DE TOMA:** 31-may

DESCRIPCION: BRIQUETAS DE MDC COMPACTADAS EL LABORATORIO **FECHA DE ENSAYO:** 5-jun

REMITE: MUESTRA TOMADA EN CAMPO POR EL CLIENTE **TEMPERATURA ºC:** 136

PESO UNITARIO						LECTURA MEDIDA EN cm			
BRIQUETA Nº	1	2	3			1	2	3	
ABSCISA	CALLE 78	CALLE 78	CALLE 78						
W MUESTRA AIRE (g):	1284	1378	1239						
W MUESTRA AIRE + PARAF (g):	1284	1378	1239			7,148	7,488	6,589	
W MUESTRA AGUA (g):	731	794	706			7,041	7,305	6,688	
VOLUMEN (cm^3)	553	584	533			6,899	7,242	6,858	
P.U. (g/cm^3):	2,322	2,360	2,325			6,985	7,442	6,789	
ALTURA CALCULADA (cm)	6,79	7,17	6,54			*7,02*	*7,37*	*6,73*	

PORCENTAJE DE VACÍOS					
BRIQUETA Nº	1	2	3		
P.U. (g/cm^3):	2,322	2,360	2,325		
GMM	2,456	2,456	2,456		
% DE VACÍOS MEZCLA TOTAL	5,5	3,9	5,3		

ESTABILIDAD Y FLUJO					
ESTABILIDAD LEIDA (N):	17728	15932	17825		
ESTABILIDAD CORREGIDA (N).	14892	13224	16577		
FLUJO: mm	5,3	3,3	3,0		

RESULTADOS PROMEDIO		
Contenido de asfalto	5,23%	
Peso unitario (g/cm^3):	2,335	
Estabilidad (N) - (Kgf)	14898	1534
Flujo (mm)	3,9	
% de Vacíos	4,90	

OBSERVACIONES: *MUESTRA TOMADA EN CAMPO POR EL CLIENTE*

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL INGENIERO DE CALIDAD DE CITEC Ltda.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Geot. Luis Carlos Ponce	Ing. Hugo Daza Delgado	

Citec Ltda.
Ingeniería y Geotecnia

Diagonal 26 N°26-58 Yanaconas
citecpopayan@gmail.com
Popayán - Cauca

Citec Ltda. Ingeniería y Geotecnia	DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE ASFALTO Y GRADACION DEL MATERIAL DE CARPETA TIPO MDC-2		Código:	GT-CE29
	NORMAS REFERENCIA:	INV E-731, E-732, E-734, E-748	Versión:	0

ECHA INFORME: 24-jun-2022
OBRA: INTERVENTORÍA PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL MUNICIPIO DE POPAYÁN (Reparcheo)"
OBJETO: CONTROL DE CALIDAD DE MEZCLA ASFÁLTICA INSTALADA
LOCALIZACION: CALLE 4 CON CARRERA 9 VIA LENTA Y 10 TERMINAL M.I
CONTRATISTA: EDIFICACIONES Y VÍAS S.A.S
INTERVENTOR: INP SERVICIOS S.A.S
SOLICITÓ: INP SERVICIOS S.A.S


ECHA ENTRADA: 13-jun-2022
MATERIAL: MDC19
CANTERA: PLANTA POPAYÁN, INGENIERIA DE VÍAS S.A.S
DESCRIPCION: MUESTRA MDC EN BLOQUE
REMITE: MUESTRA TOMADA EN CAMPO POR EL CLIENTE

ODS Nº:
MUESTRA N° 1
FECHA DE TOMA: 9-jun
FECHA DE ENSAYO: 22-jun
TEMPERATURA ºC: 130

CARPETA MDC-2

PORCENTAJE DE ASFALTO	
W MUESTRA INICIAL (g):	2000
W FILTRO INICIAL (g).	12,7
W FILTRO FINAL (g).	18,3
W MUESTRA FINAL (g):	1889,8
% ASFALTO: (g)	5,23%

Win:	Wfi:		
1.889,81	1.831,01		
Tamiz	Peso retenido	% pasa	Esp.
1" (25,4)	0,0	100	
3/4" (19,05)	0,0	100,0	100
1/2" (12,5)	243,2	87,1	80-100
3/8" (9,5)	197,8	76,7	70-88
N°4 (4,75)	529,3	48,7	49-65
N°12 (1,70)	310,1	32,2	29-45
N°40 (0,425)	352,8	13,6	14-25
N°80 (0,180)	141,7	6,1	8-17
N°200 (0,075)	56,1	3,1	4-8
P200	58,8		
%P # 200			

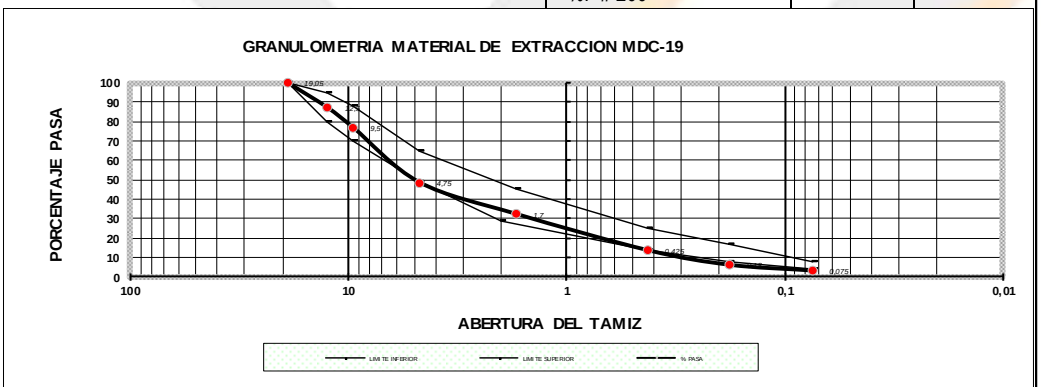

OBSERVACIONES: MUESTRA TOMADA EN CAMPO POR EL CLIENTE

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL INGENIERO DE CALIDAD DE CITEC Ltda.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Geot. Luis Carlos Ponce	Ing. Hugo Daza Delgado	

Citec Ltda.
Ingeniería y Geotecnia

Diagonal 26 N°26-58 Yanaconas
citecpopayan@gmail.com
Popayán - Cauca

Citec Ltda. Ingeniería y Geotecnia	REPORTE DE PESOS UNITARIOS, % VACIOS Y ESTABILIDAD Y FLUJO MATERIAL DE CARPETA TIPO MDC-2		Código:	GT-CE30
	NORMAS REFERENCIA:	INV E-731, E-732, E-734, E-748	Versión:	0

FECHA INFORME: 24-jun-2022 **ODS Nº:**

OBRA: INTERVENTORÍA PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL MUNICIPIO DE POPAYÁN (Reparcheo)"

OBJETO: CONTROL CALIDAD MEZCLA DENSA EN CALIENTE

LOCALIZACION: CALLE 4 CON CARRERA 9 VIA LENTA Y 10 TERMINAL M.I

CONTRATISTA: EDIFICACIONES Y VÍAS S.A.S

INTERVENTOR: INP SERVICIOS S.A.S

SOLICITÓ: INP SERVICIOS S.A.S

FECHA ENTRADA: 13-jun-2022

MATERIAL: MDC19 **MUESTRA N°** 1

CANTERA: PLANTA POPAYÁN, INGENIERIA DE VÍAS S.A.S **FECHA DE TOMA:** 9-jun

DESCRIPCION: BRIQUETAS DE MDC COMPACTADAS EL LABORATORIO **FECHA DE ENSAYO:** 22-jun

REMITE: MUESTRA TOMADA EN CAMPO POR EL CLIENTE **TEMPERATURA ºC:** 130

PESO UNITARIO						LECTURA MEDIDA EN cm			
BRIQUETA Nº	1	2	3			1	2	3	
ABSCISA	CALLE 4 CRA 9	CALLE 4 CRA 9	CALLE 4 CRA 9						
W MUESTRA AIRE (g):	1172	1168	1218						
W MUESTRA AIRE + PARAF (g):	1172	1168	1218			6,096	6,144	6,665	
W MUESTRA AGUA (g):	673	668	696			6,375	6,228	6,614	
VOLUMEN (cm^3)	499	500	522			6,469	6,378	6,398	
P.U. (g/cm^3):	2,349	2,336	2,333			6,218	6,294	6,416	
ALTURA CALCULADA (cm)	6,12	6,14	6,41			*6,29*	*6,26*	*6,52*	

PORCENTAJE DE VACÍOS					
BRIQUETA Nº	1	2	3		
P.U. (g/cm^3):	2,349	2,336	2,333		
GMM	2,456	2,456	2,456		
% DE VACÍOS MEZCLA TOTAL	4,4	4,9	5,0		

ESTABILIDAD Y FLUJO					
ESTABILIDAD LEIDA (N):	9311	9971	10631		
ESTABILIDAD CORREGIDA (N).	9497	10170	10100		
FLUJO: mm	3,6	3,8	3,6		

RESULTADOS PROMEDIO		
Contenido de asfalto	5,23%	
Peso unitario (g/cm^3):	2,339	
Estabilidad (N) - (Kgf)	9922	1022
Flujo (mm)	3,6	
% de Vacíos	4,74	

OBSERVACIONES: *MUESTRA TOMADA EN CAMPO POR EL CLIENTE*

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL INGENIERO DE CALIDAD DE CITEC Ltda.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Geot. Luis Carlos Ponce	Ing. Hugo Daza Delgado	

Citec Ltda.
Ingeniería y Geotecnia

Diagonal 26 N°26-58 Yanaconas
citecpopayan@gmail.com
Popayán - Cauca

	DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE ASFALTO Y GRADACION DEL MATERIAL DE CARPETA TIPO MDC-2		Código:	GT-CE29
Citec Ltda. Ingeniería y Geotecnia	NORMAS REFERENCIA:	INV E-731, E-732, E-734, E-748	Versión:	0

ECHA INFORME: 24-jun-2022
OBRA: INTERVENTORÍA PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL MUNICIPIO DE POPAYÁN (Reparcheo)"
OBJETO: CONTROL DE CALIDAD DE MEZCLA ASFÁLTICA INSTALADA
LOCALIZACION: CARRERA 9 VIA LENTA FRENTE COLEGIO INEM M.D
CONTRATISTA: EDIFICACIONES Y VÍAS S.A.S
INTERVENTOR: INP SERVICIOS S.A.S
SOLICITÓ: INP SERVICIOS S.A.S

ECHA ENTRADA: 13-jun-2022
MATERIAL: MDC19
CANTERA: PLANTA POPAYÁN, INGENIERIA DE VÍAS S.A.S
DESCRIPCION: MUESTRA MDC EN BLOQUE
REMITE: MUESTRA TOMADA EN CAMPO POR EL CLIENTE


ODS Nº:
MUESTRA N° 1
FECHA DE TOMA: 11-jun
FECHA DE ENSAYO: 22-jun
TEMPERATURA ºC: 130

CARPETA MDC-2

Win:	Wfi:
1.895,16	1.844,37

Tamiz	Peso retenido	% pasa	Esp.
1" (25,4)	0,0	100	
3/4" (19,05)	0,0	100,0	100
1/2" (12,5)	168,4	91,1	80-100
3/8" (9,5)	189,8	81,1	70-88
N°4 (4,75)	441,0	57,8	49-65
N°12 (1,70)	366,2	38,5	29-45
N°40 (0,425)	433,0	15,7	14-25
N°80 (0,180)	171,1	6,6	8-17
N°200 (0,075)	74,8	2,7	4-8
P200	50,8		
%P # 200			

PORCENTAJE DE ASFALTO	
W MUESTRA INICIAL (g):	1998
W FILTRO INICIAL (g).	17,5
W FILTRO FINAL (g).	19,2
W MUESTRA FINAL (g):	1895,2
% ASFALTO: (g)	5,06%

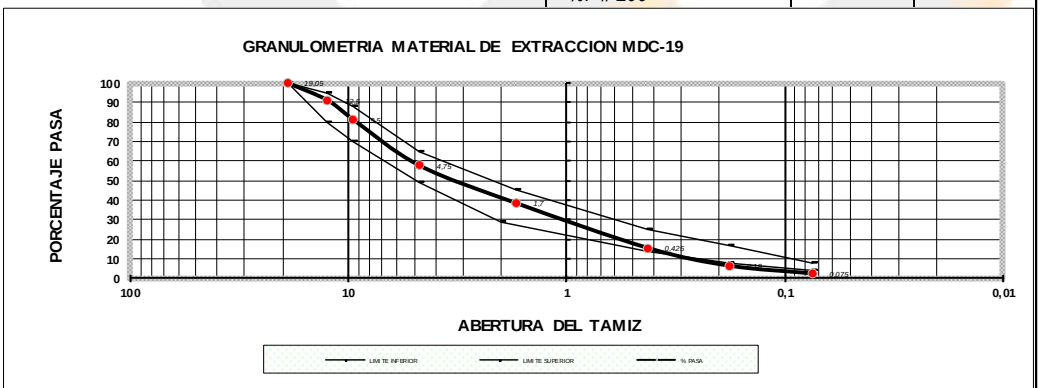

OBSERVACIONES: MUESTRA TOMADA EN CAMPO POR EL CLIENTE

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL INGENIERO DE CALIDAD DE CITEC Ltda.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Geot. Luis Carlos Ponce	Ing. Hugo Daza Delgado	

Citec Ltda.
Ingeniería y Geotecnia

Diagonal 26 N°26-58 Yanaconas
citecpopayan@gmail.com
Popayán - Cauca

Citec Ltda. Ingeniería y Geotecnia	REPORTE DE PESOS UNITARIOS, % VACIOS Y ESTABILIDAD Y FLUJO MATERIAL DE CARPETA TIPO MDC-2		Código:	GT-CE30
	NORMAS REFERENCIA:	INV E-731, E-732, E-734, E-748	Versión:	0

FECHA INFORME: 24-jun-2022 **ODS Nº:** 0

OBRA: INTERVENTORÍA PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL MUNICIPIO DE POPAYÁN (Reparcheo)"

OBJETO: CONTROL CALIDAD MEZCLA DENSA EN CALIENTE

LOCALIZACION: CARRERA 9 VIA LENTA FRENTE COLEGIO INEM M.D

CONTRATISTA: EDIFICACIONES Y VÍAS S.A.S

INTERVENTOR: INP SERVICIOS S.A.S

SOLICITÓ: INP SERVICIOS S.A.S

FECHA ENTRADA: 13-jun-2022

MATERIAL: MDC19 **MUESTRA N°** 1

CANTERA: PLANTA POPAYÁN, INGENIERIA DE VÍAS S.A.S **FECHA DE TOMA:** 11-jun

DESCRIPCION: BRIQUETAS DE MDC COMPACTADAS EL LABORATORIO **FECHA DE ENSAYO:** 22-jun

REMITE: MUESTRA TOMADA EN CAMPO POR EL CLIENTE **TEMPERATURA ºC:** 130

PESO UNITARIO						LECTURA MEDIDA EN cm			
BRIQUETA Nº	1	2	3			1	2	3	
ABSCISA	CARRERA 9	CARRERA 9	CARRERA 9						
W MUESTRA AIRE (g):	1334	1274	1224						
W MUESTRA AIRE + PARAF (g):	1334	1274	1224			6,922	6,767	6,637	
W MUESTRA AGUA (g):	769	733	701			6,916	6,701	6,513	
VOLUMEN (cm^3)	565	541	523			7,010	6,698	6,353	
P.U. (g/cm^3):	2,361	2,355	2,340			7,061	6,713	6,472	
ALTURA CALCULADA (cm)	6,93	6,64	6,42			*6,98*	*6,72*	*6,49*	

PORCENTAJE DE VACÍOS					
BRIQUETA Nº	1	2	3		
P.U. (g/cm^3):	2,361	2,355	2,340		
GMM	2,461	2,461	2,461		
% DE VACÍOS MEZCLA TOTAL	4,1	4,3	4,9		

ESTABILIDAD Y FLUJO					
ESTABILIDAD LEIDA (N):	19767	19039	17893		
ESTABILIDAD CORREGIDA (N).	17000	17706	17177		
FLUJO: mm	4,1	4,1	3,8		

RESULTADOS PROMEDIO		
Contenido de asfalto	5,06%	
Peso unitario (g/cm^3):	2,352	
Estabilidad (N) - (Kgf)	17294	1781
Flujo (mm)	4,0	
% de Vacíos	4,44	

OBSERVACIONES: *MUESTRA TOMADA EN CAMPO POR EL CLIENTE*

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL INGENIERO DE CALIDAD DE CITEC Ltda.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Geot. Luis Carlos Ponce	Ing. Hugo Daza Delgado	

Citec Ltda.
Ingeniería y Geotecnia

Diagonal 26 N°26-58 Yanaconas
citecpopayan@gmail.com
Popayán - Cauca

Citec Ltda. Ingeniería y Geotecnia	DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE ASFALTO Y GRADACION DEL MATERIAL DE CARPETA TIPO MDC-2		Código:	GT-CE29
	NORMAS REFERENCIA:	INV E-731, E-732, E-734, E-748	Versión:	0

ECHA INFORME: 30-jun-2022
OBRA: INTERVENTORÍA PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL MUNICIPIO DE POPAYÁN (Reparcheo)"
OBJETO: CONTROL DE CALIDAD DE MEZCLA ASFÁLTICA INSTALADA
LOCALIZACION: CARRERA 9 CALZADA IZQ PARCHE DEMARCADO COMO #16 FRENTE A EDIFICIO MIRAVALLE
CONTRATISTA: EDIFICACIONES Y VÍAS S.A.S
INTERVENTOR: INP SERVICIOS S.A.S
SOLICITÓ: INP SERVICIOS S.A.S

ECHA ENTRADA: 23-jun-2022
MATERIAL: MDC19
CANTERA: PLANTA POPAYÁN, INGENIERIA DE VÍAS S.A.S
DESCRIPCION: MUESTRA MDC EN BLOQUE
REMITE: MUESTRA TOMADA EN CAMPO POR EL CLIENTE


ODS Nº: 009
MUESTRA N° 1
FECHA DE TOMA: 17-jun
FECHA DE ENSAYO: 28-jun
TEMPERATURA ºC: 145

CARPETA MDC-2

Win:	Wfi:
1.879,12	1.820,31

Tamiz	Peso retenido	% pasa	Esp.
1" (25,4)	0,0	100	
3/4" (19,05)	0,0	100,0	100
1/2" (12,5)	211,2	88,8	80-100
3/8" (9,5)	216,5	77,2	70-88
N°4 (4,75)	339,5	59,2	49-65
N°12 (1,70)	350,2	40,5	29-45
N°40 (0,425)	368,9	20,9	14-25
N°80 (0,180)	219,2	9,2	8-17
N°200 (0,075)	114,9	3,1	4-8
P200	58,8		
%P # 200			

PORCENTAJE DE ASFALTO	
W MUESTRA INICIAL (g):	1992
W FILTRO INICIAL (g).	18,3
W FILTRO FINAL (g).	19,7
W MUESTRA FINAL (g):	1879,1
% ASFALTO: (g)	5,60%

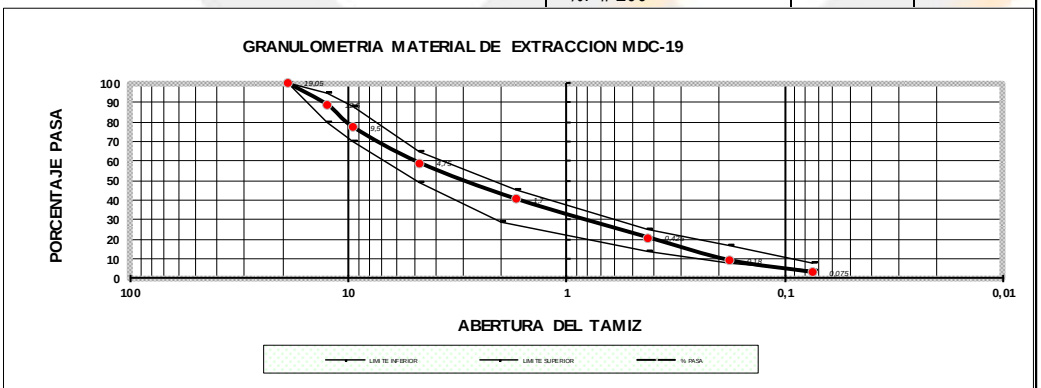

OBSERVACIONES: MUESTRA TOMADA EN CAMPO POR EL CLIENTE

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL INGENIERO DE CALIDAD DE CITEC Ltda.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Geot. Luis Carlos Ponce	Ing. Hugo Daza Delgado	

Citec Ltda.
Ingeniería y Geotecnia

Diagonal 26 N°26-58 Yanaconas
citecpopayan@gmail.com
Popayán - Cauca

Citec Ltda. Ingeniería y Geotecnia	REPORTE DE PESOS UNITARIOS, % VACIOS Y ESTABILIDAD Y FLUJO MATERIAL DE CARPETA TIPO MDC-2		Código:	GT-CE30
	NORMAS REFERENCIA:	INV E-731, E-732, E-734, E-748	Versión:	0

FECHA INFORME: 30-jun-2022 **ODS Nº:** 009

OBRA: INTERVENTORÍA PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL MUNICIPIO DE POPAYÁN (Reparcheo)"

OBJETO: CONTROL CALIDAD MEZCLA DENSA EN CALIENTE

LOCALIZACION: CARRERA 9 CALZADA IZQ PARCHE DEMARCADO COMO #16 FRENTE A EDIFICIO MIRAVALLE

CONTRATISTA: EDIFICACIONES Y VÍAS S.A.S

INTERVENTOR: INP SERVICIOS S.A.S

SOLICITÓ: INP SERVICIOS S.A.S

FECHA ENTRADA: 23-jun-2022

MATERIAL: MDC19 **MUESTRA N°** 1

CANTERA: PLANTA POPAYÁN, INGENIERIA DE VÍAS S.A.S **FECHA DE TOMA:** 17-jun

DESCRIPCION: BRIQUETAS DE MDC COMPACTADAS EL LABORATORIO **FECHA DE ENSAYO:** 28-jun

REMITE: MUESTRA TOMADA EN CAMPO POR EL CLIENTE **TEMPERATURA °C:** 145

PESO UNITARIO						LECTURA MEDIDA EN cm			
BRIQUETA Nº	1	2	3			1	2	3	
ABSCISA	CRA 9 MIRAVALLE	CRA 9 MIRAVALLE	CRA 9 MIRAVALLE						
W MUESTRA AIRE (g):	1334	1213	1220						
W MUESTRA AIRE + PARAF (g):	1334	1213	1220			7,021	6,454	6,563	
W MUESTRA AGUA (g):	766	693	697			7,031	6,393	6,515	
VOLUMEN (cm^3)	568	520	523			6,998	6,571	6,406	
P.U. (g/cm^3):	2,349	2,333	2,333			7,008	6,581	6,5	
ALTURA CALCULADA (cm)	6,97	6,38	6,42			*7,01*	*6,50*	*6,50*	

PORCENTAJE DE VACÍOS					
BRIQUETA Nº	1	2	3		
P.U. (g/cm^3):	2,349	2,333	2,333		
GMM	2,444	2,444	2,444		
% DE VACÍOS MEZCLA TOTAL	3,9	4,5	4,5		

ESTABILIDAD Y FLUJO					
ESTABILIDAD LEIDA (N):	17602	10350	12068		
ESTABILIDAD CORREGIDA (N).	14962	9936	11585		
FLUJO: mm	3,6	3,8	3,3		

RESULTADOS PROMEDIO		
Contenido de asfalto	5,60%	
Peso unitario (g/cm^3):	2,338	
Estabilidad (N) - (Kgf)	12161	1253
Flujo (mm)	3,6	
% de Vacios	4,32	

OBSERVACIONES: *MUESTRA TOMADA EN CAMPO POR EL CLIENTE*

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL INGENIERO DE CALIDAD DE CITEC Ltda.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Geot. Luis Carlos Ponce	Ing. Hugo Daza Delgado	

Citec Ltda.
Ingeniería y Geotecnia

Diagonal 26 N°26-58 Yanaconas
citecpopayan@gmail.com
Popayán - Cauca

Citec Ltda. Ingeniería y Geotecnia	DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE ASFALTO Y GRADACION DEL MATERIAL DE CARPETA TIPO MDC-2		Código:	GT-CE29
	NORMAS REFERENCIA:	INV E-731, E-732, E-734, E-748	Versión:	0

ECHA INFORME: 18-jul-2022
OBRA: INTERVENTORÍA PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL MUNICIPIO DE POPAYÁN (Reparcheo)"
OBJETO: CONTROL DE CALIDAD DE MEZCLA ASFÁLTICA INSTALADA
LOCALIZACION: CARRERA 8 CON CALLES 2N Y 3N SECTOR OLIMPICA Y COMFACAUCA
CONTRATISTA: EDIFICACIONES Y VÍAS S.A.S
INTERVENTOR: INP SERVICIOS S.A.S
SOLICITÓ: INP SERVICIOS S.A.S

ECHA ENTRADA: 1-jul-2022
MATERIAL: MDC19
CANTERA: PLANTA POPAYÁN, INGENIERIA DE VÍAS S.A.S
DESCRIPCION: MUESTRA MDC EN BLOQUE
REMITE: MUESTRA TOMADA EN CAMPO POR EL CLIENTE


ODS Nº: 028
MUESTRA N° 1
FECHA DE TOMA: 30-jun
FECHA DE ENSAYO: 13-jul
TEMPERATURA ºC: 135

CARPETA MDC-2

Win:	Wfi:
1.892,48	1.841,70

Tamiz	Peso retenido	% pasa	Esp.
1" (25,4)	0,0	100	
3/4" (19,05)	0,0	100,0	100
1/2" (12,5)	181,8	90,4	80-100
3/8" (9,5)	157,7	82,1	70-88
N°4 (4,75)	433,0	59,2	49-65
N°12 (1,70)	384,9	38,8	29-45
N°40 (0,425)	433,0	16,0	14-25
N°80 (0,180)	131,0	9,0	8-17
N°200 (0,075)	120,3	2,7	4-8
P200	50,8		
%P # 200			

PORCENTAJE DE ASFALTO	
W MUESTRA INICIAL (g):	2001
W FILTRO INICIAL (g).	18,3
W FILTRO FINAL (g).	19,5
W MUESTRA FINAL (g):	1892,5
% ASFALTO: (g)	5,36%

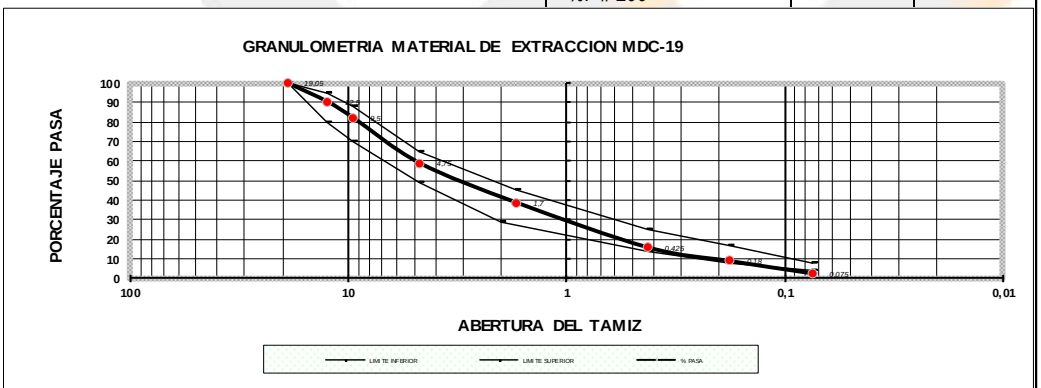

OBSERVACIONES: MUESTRA TOMADA EN CAMPO POR EL CLIENTE

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL INGENIERO DE CALIDAD DE CITEC Ltda.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Geot. Luis Carlos Ponce	Ing. Hugo Daza Delgado	

Citec Ltda.
Ingeniería y Geotecnia

Diagonal 26 N°26-58 Yanaconas
citecpopayan@gmail.com
Popayán - Cauca

Citec Ltda. Ingeniería y Geotecnia	REPORTE DE PESOS UNITARIOS, % VACIOS Y ESTABILIDAD Y FLUJO MATERIAL DE CARPETA TIPO MDC-2		Código:	GT-CE30
	NORMAS REFERENCIA:	INV E-731, E-732, E-734, E-748	Versión:	0

FECHA INFORME: 18-jul-2022 **ODS Nº:** 028

OBRA: INTERVENTORÍA PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL MUNICIPIO DE POPAYÁN (Reparcheo)"

OBJETO: CONTROL CALIDAD MEZCLA DENSA EN CALIENTE

LOCALIZACION: CARRERA 8 CON CALLES 2N Y 3N SECTOR OLIMPICA Y COMFACAUCA

CONTRATISTA: EDIFICACIONES Y VÍAS S.A.S

INTERVENTOR: INP SERVICIOS S.A.S

SOLICITÓ: INP SERVICIOS S.A.S

FECHA ENTRADA: 1-jul-2022

MATERIAL: MDC19 **MUESTRA N°** 1

CANTERA: PLANTA POPAYÁN, INGENIERIA DE VÍAS S.A.S **FECHA DE TOMA:** 30-jun

DESCRIPCION: BRIQUETAS DE MDC COMPACTADAS EL LABORATORIO **FECHA DE ENSAYO:** 13-jul

REMITE: MUESTRA TOMADA EN CAMPO POR EL CLIENTE **TEMPERATURA °C:** 135

PESO UNITARIO						LECTURA MEDIDA EN cm			
BRIQUETA Nº	1	2	3			1	2	3	
ABSCISA	CRA 8 CALLE 2N Y 3N	CRA 8 CALLE 2N Y 3N	CRA 8 CALLE 2N Y 3N						
W MUESTRA AIRE (g):	1273	1243	1299						
W MUESTRA AIRE + PARAF (g):	1273	1243	1299			6,848	6,726	6,82	
W MUESTRA AGUA (g):	723	710	751			6,876	6,678	6,772	
VOLUMEN (cm^3)	550	533	548			6,929	6,581	6,812	
P.U. (g/cm^3):	2,315	2,332	2,370			6,881	6,647	6,863	
ALTURA CALCULADA (cm)	6,75	6,54	6,73			*6,88*	*6,66*	*6,82*	

PORCENTAJE DE VACÍOS					
BRIQUETA Nº	1	2	3		
P.U. (g/cm^3):	2,315	2,332	2,370		
GMM	2,456	2,456	2,456		
% DE VACÍOS MEZCLA TOTAL	5,8	5,0	3,5		

ESTABILIDAD Y FLUJO					
ESTABILIDAD LEIDA (N):	11252	12447	14670		
ESTABILIDAD CORREGIDA (N).	9565	11700	13056		
FLUJO: mm	3,6	3,6	3,8		

RESULTADOS PROMEDIO		
Contenido de asfalto	5,36%	
Peso unitario (g/cm^3):	2,339	
Estabilidad (N) - (Kgf)	11440	1178
Flujo (mm)	3,6	
% de Vacíos	4,75	

OBSERVACIONES: *MUESTRA TOMADA EN CAMPO POR EL CLIENTE*

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SIN LA AUTORIZACIÓN DEL INGENIERO DE CALIDAD DE CITEC Ltda.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Geot. Luis Carlos Ponce	Ing. Hugo Daza Delgado	

ANEXO 4
PAGO SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA

ALCALDIA DE POPAYAN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME MENSUAL 2
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

INP SERVICIOS SAS

FECHA 6/06/2022
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDIA DE POPAYAN **DEPARTAMENTO** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 20211800024217 de diciembre del 2021 **CONTRATISTA:** EDIFICACIONES Y VÍAS S.A

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2022 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN 2021".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 20221800011697 de marzo del 2022 **INTERVENTOR:** INP SERVICIOS S.A.S.

NOMBRE ARL: COLPATRIA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACAUCA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JHON VLADIMIR BRAVO	76.325.063	RESIDENTE DE OBRA	$ 4.250.000	X X X X X X X X X X X X X X	EDIFICACIONES Y VIAS SA	1.841.667	$ 80.100	V	SANITAS	1045675770	$ 73.700	COLPENSIONES	1045675770	$ 294.700	$ 73.700	$ -	$ -	
2	JAIME OSWALDO PRECIADO	4.615.854	RESIDENTE DE OBRA	$ 4.250.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		4.250.000	$ 184.900	V	NUEVA EPS	1045675770	$ 170.000	PORVENIR	1045675770	$ 680.000	$ 170.000	$ -	$ -	
3	SIRLENA MEDINA PLAZA	1.061.713.662	RESIDENTE AMBIENTAL	$ 2.720.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		2.720.000	$ 118.300	V	NUEVA EPS	1045675770	$ 108.800	PORVENIR	1045675770	$ 435.200	$ 108.800	$ -	$ -	
4	JOVANNA UZURIAGA SOLIS	25.287.879	RESIDENTE SST	$ 1.800.000	x x x x x x x x x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1.800.000	$ 78.300	V	ASMET SALUD	1045675770	$ 72.000	COLPENSIONES	1045675770	$ 288.000	$ 72.000	$ -	$ -	
5	ANYELO YAMITH SANCHEZ ALVAREZ	10.295.742	INSPECTOR DE OBRA	$ 1.690.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1.690.000	$ 73.500	V	NUEVA EPS	1045675770	$ 67.600	COLPENSIONES	1045675770	$ 270.400	$ 67.600	$ -	$ -	
6	EDINSON ANDRES QUIÑONES AGREDO	1.061.699.008	INSPECTOR DE OBRA	$ 1.690.000	X X X X X X		338.000	$ 14.700	V	SANITAS	1045675770	$ 13.500	PORVENIR	1045675770	$ 54.100	$ 13.500	$ -	$ -	
7	EMILIO CHILITO MACIAS	1.061.797.781	OFICIOS VARIOS	$ 1.000.000	X X X X X X		200.000	$ 8.700	V	SANITAS	1045675770	$ 8.000	PORVENIR	1045675770	$ 32.000	$ 8.000	$ -	$ -	
8	DAVID SANTIAGO LEITON	1.002.921.357	CONDUCTOR MARMITA	$ 1.565.462	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1.565.462	$ 68.100	V	ASMET SALUD	1045675770	$ 62.600	COLPENSIONES	1045675770	$ 250.500	$ 62.600	$ -	$ -	
9	EDGAR YAMITH NAÑEZ VARELA	1.061.016.999	OPERARIO FINISHER	$ 2.415.625	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		2.415.625	$ 105.100	V	ASMET SALUD	1045675770	$ 96.600	PORVENIR	1045675770	$ 386.500	$ 96.600	$ -	$ -	
10	WILDER FERNANDO VELASCO	1.002.954.050	OFICIOS VARIOS	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1.768.430	$ 76.900	V	ASMET SALUD	1045675770	$ 70.700	PORVENIR	1045675770	$ 282.900	$ 70.700	$ -	$ -	
11	JAIRO TALAGA ZEMATATE	76.150.449	OFICIOS VARIOS	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1.774.159	$ 77.200	V	NUEVA EPS	1045675770	$ 71.000	PORVENIR	1045675770	$ 283.900	$ 71.000	$ -	$ -	
12	ANDERSON FABIAN OBANDO BOLAÑOS	1.003.163.614	OFICIOS VARIOS	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1.825.718	$ 79.400	V	AIC	1045675770	$ 73.000	PORVENIR	1045675770	$ 292.100	$ 73.000	$ -	$ -	
13	CARLOS ANDRES VELASCO ORTEGA	1.079.409.048	OFICIOS VARIOS	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1.742.352	$ 75.800	V	ASMET SALUD	1045675770	$ 69.700	PORVENIR	1045675770	$ 278.800	$ 69.700	$ -	$ -	
14	JHON ALBERTO OBANDO CABRERA	1.061.599.352	OFICIOS VARIOS	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1.675.471	$ 72.900	V	ASMET SALUD	1045675770	$ 67.000	PORVENIR	1045675770	$ 268.100	$ 67.000	$ -	$ -	
15	OSCAR EDUARDO MENESES ORDOÑEZ	10.616.011.364	OFICIOS VARIOS	$ 1.000.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		1.554.628	$ 67.600	V	ASMET SALUD	1045675770	$ 62.200	PORVENIR	1045675770	$ 248.700	$ 62.200	$ -	$ -	
16	EDUARDO VARGAS RENGIFO	1.061.598.700	OFICIOS VARIOS	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1.431.499	$ 10.700	V	AIC	1045675770	$ 57.300	PORVENIR	1045675770	$ 229.000	$ 57.300	$ -	$ -	
17	MAURICIO MERA ARMERO	1.081.592.066	OFICIOS VARIOS	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1.607.757	$ 69.900	V	NUEVA EPS	1045675770	$ 64.300	PORVENIR	1045675770	$ 257.200	$ 64.300	$ -	$ -	
18	JOSE DIDIER CABERA VIVERO	1.061.598.259	OFICIOS VARIOS	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1.675.471	$ 72.900	V	NUEVA EPS	1045675770	$ 67.000	PORVENIR	1045675770	$ 268.100	$ 67.000	$ -	$ -	
19	BRAYAN STIVEN DIAZ LASSO	1.061.821.026	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	$ 1.768.713	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1.768.713	$ 76.900	V	NUEVA EPS	1045675770	$ 70.700	PORVENIR	1045675770	$ 283.000	$ 70.700	$ -	$ -	
20	DANNY ALEXIS URIBE ANDRADE	1.061.780.010	OFICIOS VARIOS	$ 1.000.000	X X X X X X		200.000	$ 8.700	V	NUEVA EPS	9430710472	$ 8.000	COLPENSIONES	9430710472	$ 32.000	$ 8.000	$ -	$ -	
21	SCHARLIS ACOSTA GUERRERO	1.061.701.342	OFICIOS VARIOS	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1.774.159	$ 77.200	V	NUEVA EPS	9430710472	$ 71.000	PORVENIR	9430710472	$ 283.900	$ 71.000	$ -	$ -	
22	JHON ALEXANDER JIMENEZ	1.058.788.777	OFICIOS VARIOS	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		1.675.471	$ 72.900	V	SANITAS	9430710472	$ 67.000	COLPENSIONES	9430710472	$ 268.100	$ 67.000	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JAIME OSWALDO PRECIADO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: **19202-124740**

Firma
Nombre: PEDRO MIGUEL MUÑOZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **19202-65493 CAU**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Alcaldía de Popayán | Creo en POPAYÁN

AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Edivi
EDIFICACIONES

Fecha:

MES	DIA	AÑO
5		2022

FORMATO No. 10 - AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÒN, REHABILITACIÒN Y /O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÒN VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÀN

CONTRATISTA: EDIFICACIONES Y VIAS SA

INTERVENTOR: INP SERVICIOS SAS

FECHA: may-22

No	CONTRATISTA	NOMBRE	CEDULA	EDAD	CARGO	RESIDENCIA	TELEFONO	ARP	FECHA AFILIACIÓN O ULTIMO PAGO	EPS	FECHA AFILIACION O ULTIMO PAGO	AFP	FECHA AFILIACION O ULTIMO PAGO	CAJA COMPENSACION
1	EDIFICACIONES Y VIAS SA	EDGAR JAVIER CAICEDO	76314250		DIRECTOR DE OBRA	POPAYAN		COLPATRIA	1/04/2022	SANITAS	1/04/2022	COLPENSIONES	1/04/2022	COMFACAUCA
2	EDIFICACIONES Y VIAS SA	JAIME A. ORTEGA CERÓN	1085660465		RESIDENTE DE OBRA	POPAYAN		COLPATRIA	19/04/2022	NUEVA EPS	19/04/2022	PORVENIR	19/04/2022	COMFACAUCA
3	EDIFICACIONES Y VIAS SA	CLAUDED PACHECO GUERRERO	52494521		RESIDENTE SST	BOGOTA		COLPATRIA	1/04/2022	SANITAS	1/04/2022	COLPENSIONES	1/04/2022	COMFACAUCA
4	EDIFICACIONES Y VIAS SA	ANDERSON ALVARO LIBERO CERON	15816639		DIRECTOR DE OBRA	POPAYAN	3158940704	COLPATRIA	25/05/2022	SANITAS	25/05/2022	COLFONDOS	25/05/2022	COMFACAUCA
5	EDIFICACIONES Y VIAS SA	JHON VLADIMIR BRAVO	76325063		INGENIERO AUXILIAR	POPAYAN	3177653995	COLPATRIA	18/04/2022	SANITAS	18/04/2022	COLPENSIONES	18/04/2022	COMFACAUCA
6	EDIFICACIONES Y VIAS SA	JAIME OSWALDO PRECIADO	4615854		RESIDENTE DE OBRA	POPAYAN	3162546425	COLPATRIA	1/04/2022	NUEVA EPS	1/04/2022	PORVENIR	1/04/2022	COMFACAUCA
7	EDIFICACIONES Y VIAS SA	SIRLENA MEDINA PLAZA	1061713662		RESIDENTE AMBIENTAL	POPAYAN	3164983492	COLPATRIA	1/04/2022	NUEVA EPS	1/04/2022		1/04/2022	COMFACAUCA
8	EDIFICACIONES Y VIAS SA	JOVANNA UZURIAGA SOLIS	25287879		RESIDENTE SST	POPAYAN	3164983492	COLPATRIA	1/04/2022	ASMET SALUD	1/04/2022	COLPENSIONES	1/04/2022	COMFACAUCA
9	EDIFICACIONES Y VIAS SA	LIZETH CRISTINA QUILINDO ARBOLEDA	1061747020		RESIDENTE SOCIAL	TIMBIO	3146427734	COLPATRIA	16/05/2022	SANITAS	16/05/2022	PORVENIR	16/05/2022	COMFACAUCA
10	EDIFICACIONES Y VIAS SA	ANYELO YAMITH SANCHEZ ALVAREZ	10295742		INSPECTOR DE OBRA	POPAYAN	3184638095	COLPATRIA	1/04/2022	NUEVA EPS	1/04/2022	COLPENSIONES	1/04/2022	COMFACAUCA
11	EDIFICACIONES Y VIAS SA	EDINSON ANDRES QUIÑONES AGREDO	1061699008		INSPECTOR DE OBRA	POPAYAN	3116747974	COLPATRIA	1/04/2022	SANITAS	1/04/2022	PORVENIR	1/04/2022	COMFACAUCA
12	EDIFICACIONES Y VIAS SA	ELDER LENIN CUENE ALCALO	1064431522		OFICIOS VARIOS	POPAYAN	3157677724	COLPATRIA	11/05/2022	NUEVA EPS	11/05/2022	PROTECCIÓN	11/05/2022	COMFACAUCA
13	EDIFICACIONES Y VIAS SA	BRAYAN FELIPE QUINAYAS CHITO	1061769278		OFICIOS VARIOS	POPAYAN		COLPATRIA	5/05/2022	EMSSANAR	5/05/2022	PORVENIR	5/05/2022	COMFACAUCA
14	EDIFICACIONES Y VIAS SA	LUIS CARLOS HERNANDEZ OREJUELA	1061742623		OFICIOS VARIOS	ROSAS		COLPATRIA	5/05/2022	EMSSANAR	5/05/2022	PORVENIR	5/05/2022	COMFACAUCA
15	EDIFICACIONES Y VIAS SA	EMILIO CHILITO MACIAS	1061797781		OFICIOS VARIOS	POPAYAN	3137334223	COLPATRIA	1/04/2022	SANITAS	1/04/2022	PORVENIR	1/04/2022	COMFACAUCA

No.	CONTRATISTA	NOMBRE	CEDULA	EDAD	CARGO	RESIDENCIA	TELEFONO	ARP	FECHA AFILIACION O ULTIMO PAGO	EPS	FECHA AFILIACION O ULTIMO PAGO	AFP	FECHA AFILIACION O ULTIMO PAGO	CAJA COMPENSACION
16	EDIFICACIONES Y VIAS SA	ARLEX NARVAEZ ARBOLEDA	1007706113		OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	ROSAS	3226810314	COLPATRIA	2/05/2022	ASMET SALUD	2/05/2022	PORVENIR	2/05/2022	COMFACAUCA
17	EDIFICACIONES Y VIAS SA	DAVID SANTIAGO LEITON	1002961357		CONDUCTOR MARMITA	POPAYAN	3113792936	COLPATRIA	1/04/2022	ASMET SALUD	1/04/2022	COLPENSIONES	1/04/2022	COMFACAUCA
18	EDIFICACIONES Y VIAS SA	EDGAR YAMITH ÑAÑEZ VARELA	1061016999		OPERARIO FINISHER	ROSAS		COLPATRIA	1/04/2022	ASMET SALUD	1/04/2022		1/04/2022	COMFACAUCA
19	EDIFICACIONES Y VIAS SA	WILDER FERNANDO VELASCO MERA	1002954050		OFICIOS VARIOS	ROSAS	3198330947	COLPATRIA	1/04/2022	ASMET SALUD	1/04/2022	PORVENIR	1/04/2022	COMFACAUCA
20	EDIFICACIONES Y VIAS SA	SCHARLIS ACOSTA GUERRERO	1061701342		OFICIOS VARIOS	TIMBIO		COLPATRIA	1/04/2022	NUEVA EPS	1/04/2022	PORVENIR	1/04/2022	COMFACAUCA
21	EDIFICACIONES Y VIAS SA	JAIRO TALAGA ZEMATATE	76150449		OFICIOS VARIOS	ROSAS	3145377367	COLPATRIA	1/04/2022	NUEVA EPS	1/04/2022	PORVENIR	1/04/2022	COMFACAUCA
22	EDIFICACIONES Y VIAS SA	ANDERSON FABIAN OBANDO BOLAÑOS	1003163614		OFICIOS VARIOS	ROSAS	3003590230	COLPATRIA	1/04/2022	AIC	1/04/2022	PORVENIR	1/04/2022	COMFACAUCA
23	EDIFICACIONES Y VIAS SA	CARLOS ANDRES VELASCO ORTEGA	1079409048		OFICIOS VARIOS			COLPATRIA	1/04/2022	ASMET SALUD	1/04/2022	PORVENIR	1/04/2022	COMFACAUCA
24	EDIFICACIONES Y VIAS SA	JHON ALBERTO OBANDO CABRERA	1061599352		OFICIOS VARIOS	ROSAS	3006735447	COLPATRIA	1/04/2022	ASMET SALUD	1/04/2022	PORVENIR	1/04/2022	COMFACAUCA
25	EDIFICACIONES Y VIAS SA	OSCAR EDUARDO MENESES ORDOÑEZ	1061601364		OFICIOS VARIOS	ROSAS	3147708448	COLPATRIA	1/04/2022	ASMET SALUD	1/04/2022	PORVENIR	1/04/2022	COMFACAUCA
26	EDIFICACIONES Y VIAS SA	EDUARDO VARGAS RENGIFO	1061598700		OFICIOS VARIOS	ROSAS	3142675841	COLPATRIA	1/04/2022	AIC	1/04/2022	PORVENIR	1/04/2022	COMFACAUCA
27	EDIFICACIONES Y VIAS SA	MAURICIO MERA ARMERO	1061592066		OFICIOS VARIOS	ROSAS	3202988104	COLPATRIA	1/04/2022	NUEVA EPS	1/04/2022	PORVENIR	1/04/2022	COMFACAUCA
28	EDIFICACIONES Y VIAS SA	JESUS LLANTEN	10291656		OPERADOR VIBROCOMPACTADOR		3138868194	COLPATRIA	1/04/2022	NUEVA EPS	1/04/2022	PORVENIR	1/04/2022	COMFACAUCA
29	EDIFICACIONES Y VIAS SA	OMAR ALEJANDRO AGREDO HURTADO	1061598911		OPERADOR VIBROCOMPACTADOR			COLPATRIA	3/05/2022	SANITAS	3/05/2022	PORVENIR	3/05/2022	COMFACAUCA
30	EDIFICACIONES Y VIAS SA	DIEGO FERNANDO MOPAN GOMEZ	1061697400		CONDUCTOR VOLQUETA			COLPATRIA	1/04/2022	SANITAS	1/04/2022	PORVENIR	1/04/2022	COMFACAUCA
31	EDIFICACIONES Y VIAS SA	BAYRON ESTIVEN ZAPATA TORRES	1005160386		CONDUCTOR CARROTANQUE			COLPATRIA	1/04/2022		1/04/2022		1/04/2022	COMFACAUCA
32	EDIFICACIONES Y VIAS SA	JOSE DIDIER CABERA VIVERO	1061598259		OFICIOS VARIOS	TIMBIO	3162520741	COLPATRIA	1/04/2022	NUEVA EPS	1/04/2022	PORVENIR	1/04/2022	COMFACAUCA
33	EDIFICACIONES Y VIAS SA	WILSON YAMIT PALENCIA VASQUEZ	15674487		OPERADOR FRESADORA	CARMEN DE BOLIVAR	3162936461	COLPATRIA	6/05/2022	MUTUAL SER	6/05/2022	PORVENIR	6/05/2022	COMFACAUCA
34	EDIFICACIONES Y VIAS SA	BRAYAN STIVEN DIAZ LASSO	1061821026	23	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	CALLE 17N # 4 -36	3153019689	COLPATRIA	1/04/2022	NUEVA EPS	1/04/2022	PORVENIR	1/04/2022	COMFACAUCA
35	EDIFICACIONES Y VIAS SA	DANNY ALEXIS URIBE ANDRADE	1061780010		OFICIOS VARIOS	POPAYAN	3117751203	COLPATRIA	25/04/2022	PORVENIR	25/04/2022	COLPENSIONES	25/04/2022	COMFACAUCA
36	EDIFICACIONES Y VIAS SA	JHON ALEXANDER JIMENEZ ITAZ	1058788777		OFICIOS VARIOS	LA VEGA		COLPATRIA	1/04/2022	SANITAS	1/04/2022	COLPENSIONES	1/04/2022	COMFACAUCA
37	EDIFICACIONES Y VIAS SA	OSCAR EDUARDO SEGUE BOYOCUE	1087521020		OFICIAL	POPAYAN	3162536954	COLPATRIA	11/05/2022	AIC	11/05/2022	COLPENSIONES	11/05/2022	COMFACAUCA
38	EDIFICACIONES Y VIAS SA	FABIAN ANDRES AGREDO POLINDARA	1061737458		OFICIOS VARIOS	POPAYAN		COLPATRIA	11/05/2022	NUEVA EPS	11/05/2022	PORVENIR	11/05/2022	COMFACAUCA
39	EDIFICACIONES Y VIAS SA	HERNANDO CHILITO CASTILLO	1061986498		OFICIOS VARIOS	POPAYAN	3137334223	COLPATRIA	11/05/2022	EMSSANAR E.S.S.	11/05/2022	PORVENIR	11/05/2022	COMFACAUCA

Alcaldía de Popayán | Creo en POPAYÁN

AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Edi

EDIFICACIO

Fecha:

MES	DIA	AÑO
5		2022

FORMATO No. 10 - AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PROYECTO:

MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÒN, REHABILITACIÒN Y /O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÒN VIAL N EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYÀN

CONTRATISTA: VOLVOS DEL SUR

INTERVENTOR:

FECHA: may-22

No	CONTRATISTA	NOMBRE	CEDULA	EDAD	CARGO	RESIDENCIA	TELEFONO	ARP	FECHA AFILIACIÓN O ULTIMO PAGO	EPS	FECHA AFILIACION O ULTIMO PAGO	AFP	FECHA AFILIACION O ULTIMO PAGO	CAJA COMPENSACION
1	VOLVOS DEL SUR	EDIER HANIER MUÑOZ	10662749	38	CONDUCTOR VOLQUETA	CALLE 78N # 9-198	3107130862	POSITIVA	1/02/2022	NUEVA EPS	1/02/2022	PORVENIR	1/02/2022	COMFACAUCA
2	VOLVOS DEL SUR	ALBARO SAMBONI	76335007	45	CONDUCTOR VOLQUETA	CALLE 15 # 21 - 82	3108473205	POSITIVA	1/02/2022	AIC	1/02/2022	PORVENIR	1/02/2022	COMFACAUCA
3	VOLVOS DEL SUR	LUIS SUAREZ	79391187	57	CONDUCTOR VOLQUETA	CALLE 56 AN # 10 - 63	3214568827	POSITIVA	1/02/2022	FAMISANAR	1/02/2022	COLPENSIONES	1/02/2022	COMFACAUCA

OBSERVACIONES:

(Firma) Cristina Durlindo Diboleda

Contratista de Obra

(Firma)

Interventoría

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: miércoles, 29 de junio de 2022 11:55:56 AM

Período del Informe: 202205

Pagada 07/06/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIERIA DE VIAS S A S	**Sucursal**	01 PRINCIPAL
Documento	NI800186228	**Dirección**	CLL 36 N 1823 OFC 201
Tipo de Empresa		**Teléfono**	3204820
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	CONTECHA CARRILLO JESUS ANTONIO	**Identificación**	CC19265798

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (Pin) / Número planilla	Fecha de Pago	Periodo de Cot.	Periodo Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SUS	RDE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 1085660485	ORTEGA CERON JAIME ALBERTO	1046361219	07/06/2022	202205	202206																		30	30	30	30	25-14	EPS037	14-4	CCF14	$4.100.000	$4.100.000	$4.100.000	$4.100.000	$697.000	$164.000	$295.400	$164.000	$0	$0	$0	$0	$1.310.400
CC 52484521	GUERRERO PACHECO CLAUDIO	1046361219	07/06/2022	202205	202206																		30	30	30	30	250301	EPS005	14-4	CCF22	$4.140.000	$4.140.000	$4.140.000	$4.140.000	$703.800	$165.600	$298.200	$165.600	$0	$0	$0	$0	$1.323.200
CC 79314250	CAICEDO RENDON EDGAR JAVIER	1046361219	07/06/2022	202205	202206																		30	30	30	30	25-14	EPS005	14-4	CCF14	$14.000.000	$14.000.000	$14.000.000	$14.000.000	$2.380.000	$1.750.000	$1.974.400	$560.000	$280.000	$420.000	$0	$0	$6.384.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | Informe Histórico . .esumido

Fecha de Creación del Informe: viernes, 17 de junio de 2022 02:56:55 PM

Período del Informe: 202205
Pagada 09/06/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO TRONCAL DE OCCIDENTE		
Documento	NI901548239	**Dirección**	CL 36 #18 - 23 OFC 201
Tipo de Empresa		**Teléfono**	3204820
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	MENDEZ LEDEZMA CARLOS FERNANDO	**Identificación**	CC14270552

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras					IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Periodo de Cot.	Periodo Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 10291856	LLANTEN JESUS ANDRES	1048318417	09/06/2022	202205	202206										X								30	30	30	30	230301	EPS037	14-4	CCF14	$1.257.220	$1.257.220	$1.257.220	$1.257.220	$201.200	$50.300	$37.600	$50.300	$0	$0	$0	$0	$389.400
CC 1061598911	AGREDO HURTADO OMAR ALEJANDRO	1048318417	09/06/2022	202205	202206	X									X								27	27	27	27	230301	EPS005	14-4	CCF14	$1.277.519	$1.277.519	$1.277.519	$1.277.519	$204.500	$51.200	$38.000	$51.200	$0	$0	$0	$0	$395.900
CC 1061697490	MOPAN GOMEZ DIEGO FERNANDO	1048318417	09/06/2022	202205	202206										X								30	30	30	30	230301	EPS005	14-4	CCF14	$1.470.078	$1.470.078	$1.470.078	$1.470.078	$235.300	$58.900	$44.000	$58.900	$0	$0	$0	$0	$417.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: jueves, 09 de junio de 2022 05:32:27 PM

Período del Informe: 202205
Pagada 07/06/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIERIA DE VIAS S A S	**Sucursal**	01 PRINCIPAL
Documento	NI800186228	**Dirección**	CLL 36 N 1823 OFC 201
Tipo de Empresa		**Teléfono**	3204820
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	CONTECHA CARRILLO JESUS ANTONIO	**Identificación**	CC19265798

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Periodo de Col.	Periodo Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SOR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días AFP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 1061742823	HERNANDEZ ORJUELA LUIS CARLOS	1048381219	07/06/2022	202205	202206	X																	28	28	28	28	230301	ESSC18	14-4	CCF14	$953,334	$953,334	$953,334	$953,334	$152,600	$38,200	$66,400	$38,200	$0	$0	$0	$0	$295,400
CC 15818839	VIVEROS CERON ANDERSON ALVARO	1048381219	07/06/2022	202205	202206	X																	5	5	5	5	231001	EPS005	14-4	CCF14	$1,000,000	$1,000,000	$1,000,000	$1,000,000	$160,000	$40,000	$99,600	$40,000	$0	$0	$0	$0	$309,600
CC 1061599352	OBANDO CABRERA JHON ALBERTO	1048381219	07/06/2022	202205	202206										X								30	30	30	30	230301	ESSC62	14-4	CCF14	$1,235,436	$1,235,436	$1,235,436	$1,235,436	$197,700	$49,500	$86,000	$49,500	$0	$0	$0	$0	$382,700
CC 1061899008	DUÑONES AGREDO EDINSON ANDRES	1048381219	07/06/2022	202205	202206																		30	30	30	30	230301	EPS005	14-4	CCF14	$1,690,000	$1,690,000	$1,690,000	$1,690,000	$270,400	$67,600	$117,700	$67,600	$0	$0	$0	$0	$523,300
CC 16674487	PALENCIA VASQUEZ WILSON YAMIT	1048381219	07/06/2022	202205	202206	X									X								25	25	25	25	230301	ESSC07	14-4	CCF14	$1,756,982	$1,756,982	$1,756,982	$1,756,982	$281,200	$70,300	$122,300	$70,300	$0	$0	$0	$0	$544,100
CC 1061747020	DURLINDO ARBOLEDA LIZETH CRISTINA	1048381219	07/06/2022	202205	202206	X																	16	16	16	16	230301	EPS005	14-4	CCF14	$1,050,000	$1,050,000	$1,050,000	$1,050,000	$168,000	$42,000	$73,100	$42,000	$0	$0	$0	$0	$326,100
CC 1061780010	URIBE ANDRADE DANNY ALEXIS	1048381219	07/06/2022	202205	202206																		30	30	30	30	230301	EPS037	14-4	CCF14	$1,000,000	$1,000,000	$1,000,000	$1,000,000	$160,000	$40,000	$69,600	$40,000	$0	$0	$0	$0	$309,600
CC 1061713862	MEDINA PLAZA BIRLENA	1048381219	07/06/2022	202205	202206																		30	30	30	30	230301	EPS037	14-4	CCF14	$2,720,000	$2,720,000	$2,720,000	$2,720,000	$435,200	$108,800	$189,400	$108,800	$0	$0	$0	$0	$842,200
CC 1002954050	VELASCO MERA WILDER FERNANDO	1048381219	07/06/2022	202205	202206										X								30	30	30	30	230301	ESSC62	14-4	CCF14	$1,370,397	$1,370,397	$1,370,397	$1,370,397	$219,300	$54,900	$95,400	$54,900	$0	$0	$0	$0	$424,500
CC 1061592066	MERA ARMERO MAURICIO	1048381219	07/06/2022	202205	202206										X								30	30	30	30	230301	EPS041	14-4	CCF14	$1,245,853	$1,245,853	$1,245,853	$1,245,853	$199,400	$49,900	$86,800	$49,900	$0	$0	$0	$0	$386,000
CC 1061701342	ACOSTA GUERRERO RICHARLIS	1048381219	07/06/2022	202205	202206										X								30	30	30	30	230301	EPSIC3	14-4	CCF14	$1,370,397	$1,370,397	$1,370,397	$1,370,397	$219,300	$54,900	$95,400	$54,900	$0	$0	$0	$0	$424,500
CC 1061789278	QUINAYAS CHITO BRAYAN FELIPE	1048381219	07/06/2022	202205	202206	X																	28	28	28	28	230301	ESSC18	14-4	CCF14	$953,334	$953,334	$953,334	$953,334	$152,600	$38,200	$66,400	$38,200	$0	$0	$0	$0	$295,400
CC 1061599700	VARGAS RENGIFO EDUARDO	1048381219	07/06/2022	202205	202206										X								30	30	30	30	230301	EPSIC3	14-4	CCF14	$1,235,436	$1,235,436	$1,235,436	$1,235,436	$197,700	$49,500	$86,000	$49,500	$0	$0	$0	$0	$382,700
CC 1061797781	CHILITO MACIAS EMILIO	1048381219	07/06/2022	202205	202206																		30	30	30	30	230301	EPS005	14-4	CCF14	$1,000,000	$1,000,000	$1,000,000	$1,000,000	$160,000	$40,000	$69,600	$40,000	$0	$0	$0	$0	$309,600
CC 1061821026	DIAZ LASSO BRAYAN STIVEN	1048381219	07/06/2022	202205	202206										X								30	30	30	30	230301	EPS005	14-4	CCF14	$1,475,859	$1,475,859	$1,475,859	$1,475,859	$236,200	$59,100	$102,800	$59,100	$0	$0	$0	$0	$457,200
CC 10295742	SANCHEZ ALVAREZ ANYELO YAMITH	1048381219	07/06/2022	202205	202206																		30	30	30	30	25-14	EPS037	14-4	CCF14	$1,690,000	$1,690,000	$1,690,000	$1,690,000	$270,400	$67,600	$117,700	$67,600	$0	$0	$0	$0	$523,300
CC 1064431522	CUENE ACALO ELDER LENIN	1048381219	07/06/2022	202205	202206	X									X								20	20	20	20	230301	EPS037	14-4	CCF14	$1,668,313	$1,668,313	$1,668,313	$1,668,313	$267,000	$66,800	$116,200	$66,800	$0	$0	$0	$0	$516,800
CC 76150449	PALAGA ZEMANATE JAIRO	1048381219	07/06/2022	202205	202206										X								30	30	30	30	230301	EPS037	14-4	CCF14	$1,370,397	$1,370,397	$1,370,397	$1,370,397	$219,300	$54,900	$95,400	$54,900	$0	$0	$0	$0	$424,500
CC 1003163814	OBANDO BOLAÑOS ANDERSON FABIAN	1048381219	07/06/2022	202205	202206										X								30	30	30	30	230301	EPSIC3	14-4	CCF14	$1,370,397	$1,370,397	$1,370,397	$1,370,397	$219,300	$54,900	$95,400	$54,900	$0	$0	$0	$0	$424,500
CC 1061018999	NAÑEZ VARELA EDGAR YAMITH	1048381219	07/06/2022	202205	202206										X								30	30	30	30	230301	ESSC62	14-4	CCF14	$1,976,563	$1,976,563	$1,976,563	$1,976,563	$316,300	$79,100	$137,500	$79,100	$0	$0	$0	$0	$612,100
CC 1061598259	CABRERA VIVEROS JOSE DIDIER	1048381219	07/06/2022	202205	202206										X								30	30	30	30	230301	EPS037	14-4	CCF14	$1,235,436	$1,235,436	$1,235,436	$1,235,436	$197,700	$49,500	$86,000	$49,500	$0	$0	$0	$0	$382,700
CC 1079409048	VELASCO ORTEGA CARLOS ANDRES	1048381219	07/06/2022	202205	202206										X								30	30	30	30	230301	ESSC62	14-4	CCF14	$1,271,897	$1,271,897	$1,271,897	$1,271,897	$203,600	$50,900	$88,600	$50,900	$0	$0	$0	$0	$394,000
CC 1058788777	JIMENEZ ITAZ JHON ALEXANDER	1048381219	07/06/2022	202205	202206										X								30	30	30	30	25-14	ESSC62	14-4	CCF14	$1,235,436	$1,235,436	$1,235,436	$1,235,436	$197,700	$49,500	$86,000	$49,500	$0	$0	$0	$0	$382,700
CC 26267879	UZURIAGA SOLIS JOVANNA	1048381219	07/06/2022	202205	202206																		30	30	30	30	230301	ESSC62	14-4	CCF14	$1,800,000	$1,800,000	$1,800,000	$1,800,000	$288,000	$72,000	$125,300	$72,000	$0	$0	$0	$0	$557,300
CC 76326083	BRAVO ILLERA JOHN VLADIMIR	1048381219	07/06/2022	202205	202206																		30	30	30	30	25-14	EPS005	14-4	CCF14	$4,250,000	$4,250,000	$4,250,000	$4,250,000	$722,500	$170,000	$295,800	$170,000	$0	$0	$0	$0	$1,358,400
CC 1005180388	ZAPATA TORRES BAYRON ESTIVEN	1048381219	07/06/2022	202205	202206										X								30	30	30	30	230301	ESSC62	14-4	CCF14	$1,306,483	$1,306,483	$1,306,483	$1,306,483	$209,100	$52,300	$90,900	$52,300	$0	$0	$0	$0	$370,800
CC 4515854	PRECIADO URBANO JAIME OSWALDO	1048381219	07/06/2022	202205	202206																		30	30	30	30	230301	EPS037	14-4	CCF14	$4,250,000	$4,250,000	$4,250,000	$4,250,000	$722,500	$170,000	$295,800	$170,000	$0	$0	$0	$0	$1,358,400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: viernes, 17 de junio de 2022 02:43:02 PM

Periodo del Informe: 202205
Pagada 07/06/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIERIA DE VIAS S A S	**Sucursal**	01 PRINCIPAL
Documento	NI800186228	**Dirección**	CLL 36 N 1823 OFC 201
Tipo de Empresa		**Teléfono**	3204820
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	CONTECHA CARRILLO JESUS ANTONIO	**Identificación**	CC19265798

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades														Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Periodo de Col.	Periodo Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 1061601364	MENESES ORDOÑEZ OSCAR EDUARDO	1048361219	07/06/2022	202205	202205										X								30	30	30	30	230301	ESSC62	14-4	CCF14	$1.235.436	$1.235.436	$1.235.436	$1.235.436	$197.700	$49.500	$88.000	$49.500	$0	$0	$0	$0	$382.700
CC 1007706113	NARVAEZ ARBOLEDA ARLEX	1048361219	07/06/2022	202205	202205	X																	29	29	29	29	230301	ESSC62	14-4	CCF14	$976.334	$976.334	$976.334	$976.334	$156.300	$39.100	$69.600	$39.100	$0	$0	$0	$0	$302.500
CC 1067521620	BECUE BOYOCUE OSCAR EDUARDO	1048361219	07/06/2022	202205	202205	X									X								20	20	20	20	25-14	EPSI03	14-4	CCF14	$1.668.313	$1.668.313	$1.668.313	$1.668.313	$267.000	$66.800	$118.200	$66.800	$0	$0	$0	$0	$518.800
CC 1061986498	CHITO CASTILLO HERNANDO	1048361219	07/06/2022	202205	202205	X									X								20	20	20	20	230301	ESSC18	14-4	CCF14	$916.667	$916.667	$916.667	$916.667	$146.700	$36.700	$63.900	$36.700	$0	$0	$0	$0	$284.000
CC 1002981357	LEITON HERNANDEZ DAVID SANTIAGO	1048361219	07/06/2022	202205	202205										X								30	30	30	30	230301	ESSC62	14-4	CCF14	$1.282.314	$1.282.314	$1.282.314	$1.282.314	$205.200	$51.300	$55.600	$51.300	$0	$0	$0	$0	$383.600
CC 1051737456	AGREDO POLINDARA FABIAN ANDRES	1048361219	07/06/2022	202205	202205	X									X								20	20	20	20	230301	EPS037	14-4	CCF14	$916.667	$916.667	$916.667	$916.667	$146.700	$36.700	$63.900	$36.700	$0	$0	$0	$0	$284.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900866939	1	VOLCOS DEL SUR SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 78 norte 9 198	POPAYAN-CAUCA	8361434	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-05	1453189255	9434767741	E	2022/05/10	2022/05/11	BANCOLOMBIA	1	$2,324,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (8 Afiliados)						$8,622,273	$1,379,600			$8,622,273	$345,000			$8,241,947	$330,000			$8,622,273	$269,800		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)						$2,755,606	$440,900			$2,755,606	$110,300			$2,755,606	$110,300			$2,755,606	$14,500		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (2 Afiliados)						$2,755,606	$440,900			$2,755,606	$110,300			$2,755,606	$110,300			$2,755,606	$14,500		$0	$0
1	CC	34574519	MUÑOZ ANI	230301	30	$1,755,606	$280,900	EPS037	30	$1,755,606	$70,300	CCF14	30	$1,755,606	$70,300	14-23	30	$1,755,606	$9,200	30	$0	$0
2	CC	34558781	RENGIFO OLGA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS018	30	$1,000,000	$40,000	CCF14	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (6 Afiliados)						$5,866,667	$938,700			$5,866,667	$234,700			$5,486,341	$219,700			$5,866,667	$255,300		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (6 Afiliados)						$5,866,667	$938,700			$5,866,667	$234,700			$5,486,341	$219,700			$5,866,667	$255,300		$0	$0
3	CC	76325815	LOPEZ JOSE	25-14	30	$1,000,000	$160,000	ESSC62	30	$1,000,000	$40,000	CCF14	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
4	CC	10662749	MUÑOZ EDIER	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF14	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
5	CC	1060989027	MUÑOZ HAMILTON	230301	26	$866,667	$138,700	EPS037	26	$866,667	$34,700	CCF14	26	$760,763	$30,500	14-23	26	$866,667	$37,800	26	$0	$0
6	CC	76334732	QUISOBONI GALVIS	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF14	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
7	CC	76335007	SAMBONI ALBARO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPSIC3	30	$1,000,000	$40,000	CCF14	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
8	CC	79391187	SUAREZ LUIS	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF14	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(8)**			$8,622,273	$1,379,600			$8,622,273	$345,000			$8,241,947	$330,000			$8,622,273	$269,800		$0	$0

ANEXO 5
PAGO SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORÍA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901300211	3	INP SERVICIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 77 B NO 57-103 OF 907	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3686110	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	28967645	9435836917	E	2022/06/03	2022/06/06	BANCOLOMBIA		$26,774,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1049622334	ARIAS MORALES AURA MARIA	230201	30	$2,900,000	$464,000	EPS005	30	$2,900,000	$116,000	CCF10	30	$2,900,000	$116,000	14-25	30	$2,900,000	$201,900	30	$0	$0
2	CC	17957001	BENAVIDES NEGRETE CRISTHIAN	25-14	30	$3,800,000	$608,000	EPS037	30	$3,800,000	$152,000	CCF07	30	$3,800,000	$152,000	14-25	30	$3,800,000	$264,500	30	$0	$0
3	CC	1051475628	CHAPARRO RUIZ DIEGO ANDRES	230301	30	$1,750,000	$280,000	EPS008	30	$1,750,000	$70,000	CCF10	30	$1,750,000	$70,000	14-25	30	$1,750,000	$121,800	30	$0	$0
4	CC	1140884780	CHIMA ACOSTA ALEJANDRA LUCIA	230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS010	30	$2,400,000	$96,000	CCF07	30	$2,400,000	$96,000	14-25	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
5	CC	3745341	DE LA HOZ DE CASTRO JOSE EUSEBIO	25-14	5	$1,516,667	$257,900	EPS010	5	$1,516,667	$189,600	CCF07	5	$1,516,667	$60,700	14-25	5	$1,516,667	$0	5	$1,516,667	$76,000
6	CC	3745341	DE LA HOZ DE CASTRO JOSE EUSEBIO	25-14	25	$7,583,334	$1,289,400	EPS010	25	$7,583,334	$948,000	CCF07	25	$7,583,333	$303,400	14-25	25	$7,583,334	$527,900	25	$7,583,333	$379,200
7	CC	92261014	DIAZ ESCOBAR CARMELO JOSE	230301	30	$4,500,000	$765,000	ESSC07	30	$4,500,000	$180,000	CCF07	30	$4,500,000	$180,000	14-25	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0
8	CC	1049647713	ECHAVARRIA CADENA JEISSON HERNANDO	230301	29	$1,691,667	$270,700	EPS008	29	$1,691,667	$67,700	CCF10	29	$1,691,667	$67,700	14-25	29	$1,691,667	$117,800	29	$0	$0
9	CC	1049653463	GONZALEZ LARGO MAGALY YOHANA	230301	30	$1,750,000	$280,000	EPS005	30	$1,750,000	$70,000	CCF10	30	$1,750,000	$70,000	14-25	30	$1,750,000	$121,800	30	$0	$0
10	CC	1140875728	JULIAO PATIÑO JUAN DAVID	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF07	30	$2,200,000	$88,000	14-25	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
11	CC	17349793	LEON RIVEROS FRANKY YEZID	230201	30	$2,900,000	$464,000	EPS005	30	$2,900,000	$116,000	CCF24	30	$2,900,000	$116,000	14-25	30	$2,900,000	$201,900	30	$0	$0
12	CC	1140852713	LINARES TAFURT ALBA LUZ	230301	30	$5,000,000	$850,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF07	30	$5,000,000	$200,000	14-25	30	$5,000,000	$26,100	30	$0	$0
13	CC	15039421	LOPEZ RAMIREZ ANTOLIANO JOSE	230301	30	$6,003,000	$1,020,700	EPS037	30	$6,003,000	$240,200	CCF07	30	$6,003,000	$240,200	14-25	30	$6,003,000	$417,900	30	$0	$0
14	CC	1233906999	MONROY RAMIREZ JOHNY SEBASTIAN	230301	30	$1,750,000	$280,000	ESSC24	30	$1,750,000	$70,000	CCF10	30	$1,750,000	$70,000	14-25	30	$1,750,000	$121,800	30	$0	$0
15	CC	76314645	MUÑOZ ZUÑIGA PEDRO MIGUEL	230301	30	$3,800,000	$608,000	EPS005	30	$3,800,000	$152,000	CCF14	30	$3,800,000	$152,000	14-25	30	$3,800,000	$264,500	30	$0	$0
16	CC	55301847	OLIVERO SANJUANELO ELENA DEL CARMEN PILAR	230301	30	$5,200,000	$884,000	EPS005	30	$5,200,000	$208,000	CCF07	30	$5,200,000	$208,000	14-25	30	$5,200,000	$362,000	30	$0	$0
17	CC	71589151	OTERO GUERRA JAVIER JOSE	25-14	30	$4,000,000	$680,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF39	30	$4,000,000	$160,000	14-25	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
18	CC	1140895190	PALACIO DE LA ROSA LINDA ADRIANA	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF07	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
19	CC	1052314356	PEREZ RINCON CLAUDIA MILENA	230301	29	$1,691,667	$270,700	EPS037	29	$1,691,667	$67,700	CCF10	29	$1,691,667	$67,700	14-25	29	$1,691,667	$117,800	29	$0	$0
20	CC	1047346261	PETIT CASTRO ALEXANDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
21	CC	76314126	QUILINDO CEPEDA RUGOBERTO	25-14	8	$1,013,334	$162,200	EPS005	8	$1,013,334	$40,600	CCF14	8	$1,013,333	$40,600	14-25	8	$1,013,334	$70,600	8	$0	$0
22	CC	17953250	SUAREZ HERRERA FABIAN JHOVANY	25-14	30	$9,100,000	$1,547,000	EPS010	30	$9,100,000	$1,137,500	CCF07	30	$9,100,000	$364,000	14-25	30	$9,100,000	$633,400	30	$9,100,000	$455,000
23	CC	39046307	VILLEGAS ANDRADE CYNTHIA LORENA	230901	30	$5,200,000	$884,000	EPS010	30	$5,200,000	$208,000	CCF07	30	$5,200,000	$208,000	14-25	30	$5,200,000	$362,000	30	$0	$0
Total	**Afiliados(22)**					**$79,049,669**	**$13,129,600**			**$79,049,669**	**$4,709,300**			**$79,049,667**	**$3,162,300**			**$79,049,669**	**$4,862,900**		**$18,200,000**	**$910,200**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$13,129,600	$0	$13,129,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$4,864,500	$0	$4,864,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$6,453,100	$0	$6,453,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$928,000	$0	$928,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$884,000	$0	$884,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$4,862,900	$0	$4,862,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	22	$4,862,900	$0	$4,862,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				22	$3,162,300	$0	$3,162,300
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	1	$160,000	$0	$160,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	6	$461,400	$0	$461,400
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	$192,600	$0	$192,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	12	$2,232,300	$0	$2,232,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$116,000	$0	$116,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				22	$4,709,300	$0	$4,709,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$137,700	$0	$137,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$70,000	$0	$70,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$2,631,100	$0	$2,631,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$180,000	$0	$180,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$459,900	$0	$459,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$80,000	$0	$80,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$1,150,600	$0	$1,150,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$546,100	$0	$546,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$546,100	$0	$546,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$364,100	$0	$364,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$364,100	$0	$364,100
TOTAL				**22**	**$26,774,300**	**$0**	**$26,774,300**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901300211	3	INP SERVICIOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 77 B NO 57-103 OF 907	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3686110	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-07	29443772	9437107692	E	2022/07/06	2022/07/07	BANCOLOMBIA		$30,702,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1049622334	ARIAS MORALES AURA MARIA	230201	30	$2,900,000	$464,000	EPS005	30	$2,900,000	$116,000	CCF10	30	$2,900,000	$116,000	14-25	30	$2,900,000	$201,900	30	$0	$0
2	CC	17957001	BENAVIDES NEGRETE CRISTHIAN	25-14	30	$3,800,000	$608,000	EPS037	30	$3,800,000	$152,000	CCF07	30	$3,800,000	$152,000	14-25	30	$3,800,000	$264,500	30	$0	$0
3	CC	1051475628	CHAPARRO RUIZ DIEGO ANDRES	230301	30	$1,750,000	$280,000	EPS008	30	$1,750,000	$70,000	CCF10	30	$1,750,000	$70,000	14-25	30	$1,750,000	$121,800	30	$0	$0
4	CC	1140884780	CHIMA ACOSTA ALEJANDRA LUCIA	230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS010	30	$2,400,000	$96,000	CCF07	30	$2,400,000	$96,000	14-25	30	$2,400,000	$167,100	30	$0	$0
5	CC	3745341	DE LA HOZ DE CASTRO JOSE EUSEBIO	25-14	30	$9,100,000	$1,547,000	EPS010	30	$9,100,000	$1,137,500	CCF07	30	$9,100,000	$364,000	14-25	30	$9,100,000	$633,400	30	$9,100,000	$455,000
6	CC	25280584	DELGADO IMBACHI JENNY ESTHER	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF14	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
7	CC	92261014	DIAZ ESCOBAR CARMELO JOSE	230301	30	$4,500,000	$765,000	ESSC07	30	$4,500,000	$180,000	CCF07	30	$4,500,000	$180,000	14-25	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0
8	CC	76322857	DIAZ JARA EDWAR ANDRES	230301	28	$2,333,334	$373,400	EPS037	28	$2,333,334	$93,400	CCF14	28	$2,333,333	$93,400	14-25	28	$2,333,334	$162,500	28	$0	$0
9	CC	1049647713	ECHAVARRIA CADENA JEISSON HERNANDO	230301	30	$1,750,000	$280,000	EPS008	30	$1,750,000	$70,000	CCF10	30	$1,750,000	$70,000	14-25	30	$1,750,000	$121,800	30	$0	$0
10	CC	1049653463	GONZALEZ LARGO MAGALY YOHANA	230301	30	$1,750,000	$280,000	EPS005	30	$1,750,000	$70,000	CCF10	30	$1,750,000	$70,000	14-25	30	$1,750,000	$121,800	30	$0	$0
11	CC	1140875728	JULIAO PATIÑO JUAN DAVID	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF07	30	$2,200,000	$88,000	14-25	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
12	CC	17349793	LEON RIVEROS FRANKY YEZID	230201	30	$2,900,000	$464,000	EPS005	30	$2,900,000	$116,000	CCF24	30	$2,900,000	$116,000	14-25	30	$2,900,000	$201,900	30	$0	$0
13	CC	1140852713	LINARES TAFURT ALBA LUZ	230301	1	$166,667	$28,500	EPS005	1	$166,667	$6,700	CCF07	1	$166,667	$6,700	14-25	1	$166,667	$0	1	$0	$0
14	CC	1140852713	LINARES TAFURT ALBA LUZ	230301	29	$4,833,334	$821,800	EPS005	29	$4,833,334	$193,400	CCF07	29	$4,833,333	$193,400	14-25	29	$4,833,334	$25,300	29	$0	$0
15	CC	15039421	LOPEZ RAMIREZ ANTOLIANO JOSE	230301	30	$6,003,000	$1,020,700	EPS037	30	$6,003,000	$240,200	CCF07	30	$6,003,000	$240,200	14-25	30	$6,003,000	$417,900	30	$0	$0
16	CC	1233906999	MONROY RAMIREZ JOHNY SEBASTIAN	230301	30	$1,750,000	$280,000	ESSC24	30	$1,750,000	$70,000	CCF10	30	$1,750,000	$70,000	14-25	30	$1,750,000	$121,800	30	$0	$0
17	CC	76314645	MUÑOZ ZUÑIGA PEDRO MIGUEL	230301	30	$3,800,000	$608,000	EPS005	30	$3,800,000	$152,000	CCF14	30	$3,800,000	$152,000	14-25	30	$3,800,000	$264,500	30	$0	$0
18	CC	55301847	OLIVERO SANJUANELO ELENA DEL CARMEN PILAR	230301	30	$5,200,000	$884,000	EPS005	30	$5,200,000	$208,000	CCF07	30	$5,200,000	$208,000	14-25	30	$5,200,000	$362,000	30	$0	$0
19	CC	71589151	OTERO GUERRA JAVIER JOSE	25-14	30	$4,000,000	$680,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF39	30	$4,000,000	$160,000	14-25	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
20	CC	1140895190	PALACIO DE LA ROSA LINDA ADRIANA	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF07	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
21	CC	1052314356	PEREZ RINCON CLAUDIA MILENA	230301	30	$1,750,000	$280,000	EPS037	30	$1,750,000	$70,000	CCF10	30	$1,750,000	$70,000	14-25	30	$1,750,000	$121,800	30	$0	$0
22	CC	1047346261	PETIT CASTRO ALEXANDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
23	CC	59821382	PIANDA MEJIA SANDRA LILIANA		0	$0	$0	EPS005	28	$969,547	$38,800	CCF14	28	$969,547	$38,800	14-25	28	$969,547	$67,500	28	$0	$0
24	CC	76314126	QUILINDO CEPEDA RUGOBERTO	25-14	30	$3,800,000	$608,000	EPS005	30	$3,800,000	$152,000	CCF14	30	$3,800,000	$152,000	14-25	30	$3,800,000	$264,500	30	$0	$0
25	CC	76317468	RUIZ SOLARTE CARLOS ARTURO	230201	28	$1,773,334	$283,800	EPS005	28	$1,773,334	$71,000	CCF14	28	$1,773,333	$71,000	14-25	28	$1,773,334	$123,500	28	$0	$0
26	CC	1065648244	SANCHEZ ESCOBAR CINDY JULIETH	230301	24	$1,920,000	$307,200	EPS002	24	$1,920,000	$76,800	CCF07	24	$1,920,000	$76,800	14-25	24	$1,920,000	$10,100	24	$0	$0
27	CC	1061715058	SARRIA MOSQUERA ANGELA PATRICIA	25-14	17	$850,000	$136,000	EPS005	17	$850,000	$34,000	CCF14	17	$850,000	$34,000	14-25	17	$850,000	$59,200	17	$0	$0
28	CC	17953250	SUAREZ HERRERA FABIAN JHOVANY	25-14	30	$9,100,000	$1,547,000	EPS010	30	$9,100,000	$1,137,500	CCF07	30	$9,100,000	$364,000	14-25	30	$9,100,000	$633,400	30	$9,100,000	$455,000
29	CC	39046307	VILLEGAS ANDRADE CYNTHIA LORENA	230901	30	$5,200,000	$884,000	EPS010	30	$5,200,000	$208,000	CCF07	30	$5,200,000	$208,000	14-25	30	$5,200,000	$362,000	30	$0	$0

Resumen General de Pago

Total	**Afiliados(28)**	$91,329,669	$15,094,400			$92,299,216	$5,239,300			$92,299,213	$3,692,300			$92,299,216	$5,766,300		$18,200,000	$910,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				27	$15,094,400	$0	$15,094,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$5,846,000	$0	$5,846,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$7,152,600	$0	$7,152,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,211,800	$0	$1,211,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$884,000	$0	$884,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$5,766,300	$0	$5,766,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	28	$5,766,300	$0	$5,766,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				28	$3,692,300	$0	$3,692,300
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	1	$160,000	$0	$160,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	6	$466,000	$0	$466,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	7	$641,200	$0	$641,200
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	13	$2,309,100	$0	$2,309,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$116,000	$0	$116,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				28	$5,239,300	$0	$5,239,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$140,000	$0	$140,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$70,000	$0	$70,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$2,631,000	$0	$2,631,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$180,000	$0	$180,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$655,600	$0	$655,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$156,800	$0	$156,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	$1,405,900	$0	$1,405,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$546,000	$0	$546,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$546,000	$0	$546,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$364,000	$0	$364,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$364,000	$0	$364,000
TOTAL				**28**	**$30,702,300**	**$0**	**$30,702,300**

ANEXO 6
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATISTA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101372699	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	04	2022	07	04	2022	00:00	06	10	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
EDIFICACIONES Y VIAS S A	NIT: 800.059.675-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Av. Carrera 24 No. 40-69 Of 303	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	9371221

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891.580.006-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 N NRO. 4 - 21 EDIFC CAM	POPAYAN, CAUCA	8243075

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO, CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA, BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20211800024217 DE DICIEMBRE DE 2021. OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACION VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN 2021.

POLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA : 21-44-101368207

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/04/2022	06/02/2023	$848,678,911.00	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	07/04/2022	06/02/2023	$1,697,357,822.00	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$1,697,357,822.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	07/04/2022	06/10/2025	$424,339,455.50	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

ESTE ANEXO HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA. SE TRASLADA LA VIGENCIA DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2022. CONTRATO DE OBRA No. 20211800024217 DEL 2021

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **14,025,290.00	$ ******25,000.00	$ ***2,669,555.00	$ ********16,719,846.00	$ ****4,667,734,010.50	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
STRATEGY SEGUROS LTDA	123318	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101372699

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 7
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CONTRATISTA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101179920	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	04	2022	07	04	2022	00:00	11	10	2022	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
EDIFICACIONES Y VIAS S A	NIT: 800.059.675-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Av. Carrera 24 No. 40-69 Of 303	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	9371221

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE POPAYAN	NIT: 891.580.006-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 N NRO. 4 - 21 EDIFC CAM	POPAYAN, CAUCA	8243075

BENEFICIARIO: 891580006 - MUNICIPIO DE POPAYAN ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 20211800024217 DE DICIEMBRE DE 2021. OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO APOYO AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCION,
REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACION VIAL EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN 2021.

ASEGURADOS/BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y/O MUNICIPIO DE POPAYAN NIT: 891.580.006-4

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	07/04/2022	11/10/2022	$500,000,000.00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	07/04/2022	11/10/2022	$500,000,000.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	07/04/2022	11/10/2022	$500,000,000.00	

ACLARACIONES

ESTE ANEXO HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA. SE TRASLADA LA VIGENCIA DE ACUERDO AL ACTA DE INICIO DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2022. CONTRATO DE OBRA No. 20211800024217 DEL 2021

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***3,073,972.00	$ ******20,000.00	$ *****587,854.00	$ *********3,681,827.00	$ ******500,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
STRATEGY SEGUROS LTDA	123318	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101179920

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101179920	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
27	04	2022	07	04	2022	00:00	11	10	2022	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
EDIFICACIONES Y VIAS S A		**NIT: 800.059.675-8**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
Av. Carrera 24 No. 40-69 Of 303	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	9371221

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE POPAYAN	**NIT: 891.580.006-4**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 6 N NRO. 4 - 21 EDIFC CAM	POPAYAN, CAUCA	8243075

BENEFICIARIO: 891580006 - MUNICIPIO DE POPAYAN

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/04/2022	11/10/2022	$500,000,000.00	
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/04/2022	11/10/2022	$500,000,000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/04/2022	11/10/2022	$500,000,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101179920

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
