Al contestar cite Radicado 20182110273873 Id: 351850
Folios: 17 Fecha: 18-diciembre-2018 9:08:58
Anexos: 0
Remitente: GERENCIA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO
Destinatario: VICEPRESIDENCIA TECNICA

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 520 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- BGP INC SUCURSAL NUEVA GRANADA

FECHA DEL INFORME: diciembre 18 de 2018

CONTRATO NÚMERO	520 DE 2018	**FECHA DE FIRMA (ADJUDICACION)**	11-09-2018
		FECHA DE INICIO	24-09-2018
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**BGP INC Sucursal Nueva Granada**		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT	NIT: 901.113.609-9		
OBJETO DEL CONTRATO	***"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE DATOS MAGNETOTELÚRICOS EN LA CORDILLERA ORIENTAL"*, para el SUBPROYECTO 5**		
CDP No.	51118	**FECHA CDP**	04/04/2018
RP No.	136318	**FECHA RP**	14/09/2018
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta 31 de diciembre de 2018	**FECHA DE TERMINACION**	31/12/2018
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	24/09/2018	**MODIFICACIONES AL CONTRATO**	Ninguna
VALOR DEL CONTRATO	$ 7.240.257.937	**FORMA DE PAGO**	Anticipo-contra entrega productos
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	NOVIEMBRE 2018		

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

1.2 Resumen

Se presentan en este informe las actividades realizada por el grupo de trabajo de la empresa BGP INC Sucursal Nueva Granada en el periodo transcurrido entre el 1 de noviembre hasta el 30 de noviembre del 2018 en el desarrollo del Contrato No. 520 del 2018 suscrito con la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

1.2 Generalidades del Contrato

En fecha 11 de septiembre mediante Acta de Adjudicación la Agencia Nacional de Hidrocarburos decide aadjudicar la Licitación Pública No ANH-03-LP-2018 cuyo objeto es "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE DATOS MAGNETOTELÚRICOS EN LA CORDILLERA ORIENTAL", para el SUBPROYECTO 5, a la empresa BGP INC SUCURSAL NUEVA GRANADA, identificada con Nit. 901.113.609-9, representada legalmente por el doctor XU ZHONGJUN, identificado con cédula de extranjería No. 737358, por un valor de **SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($7.240.257.937)**, incluidos todos los costos logísticos, administrativos, financieros y técnicos indispensables para la ejecución del proyecto, así como el Impuesto al Valor Agregado -IVA- y demás costos directos e indirectos.

En fecha 25 de Septiembre se firma el acta de inicio del Contrato No. 520 del 2018 teniendo en cuenta que:


Las partes suscribieron contrato No, 520 del2018 el 14 de Septiembre de 2018

Las garantías del contrato fueron aprobadas el 17 de Septiembre del 2018.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE


Área Técnica

Se presentan opciones para realizar los sondeos adicionales sobre la Línea 8, la supervisión aprueba adicionales a partir de la estación 140 a menores hasta llegar al flanco del Rio Magdalena sin salir del municipio de Guataquí. Se realizaron 50 sondeos magnetotelúricos adicionales de los 116 en total densificando al área entre Tocaima - Guataquí, a lo largo de la línea, cada 150 metros inter estaciones, logrando así más información en una zona catalogada como fallada y plegada.

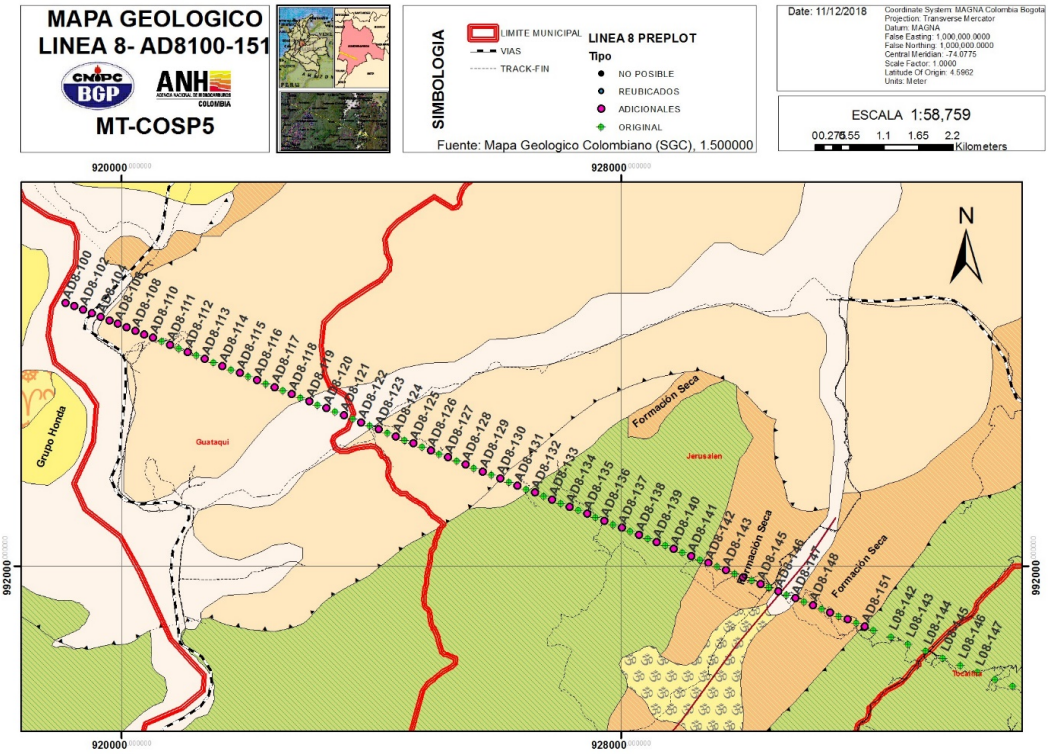


Ubicación de 60 estaciones adicionales sobre la línea 8 entre Guataquí – Tocaima. BGP INC Sucursal Nueva Granada

Se realiza prueba de respuesta geológica para la Línea 7 y se comienza la adquisición. La prueba de respuesta geológica se realizó en el municipio de Valle de San José, en el flanco oriental del sinclinal del Valle (L7_296 a L7_317) afectada en su extremo Oriental por la falla de las Cruces (entre estaciones L7-312 a L7-317).

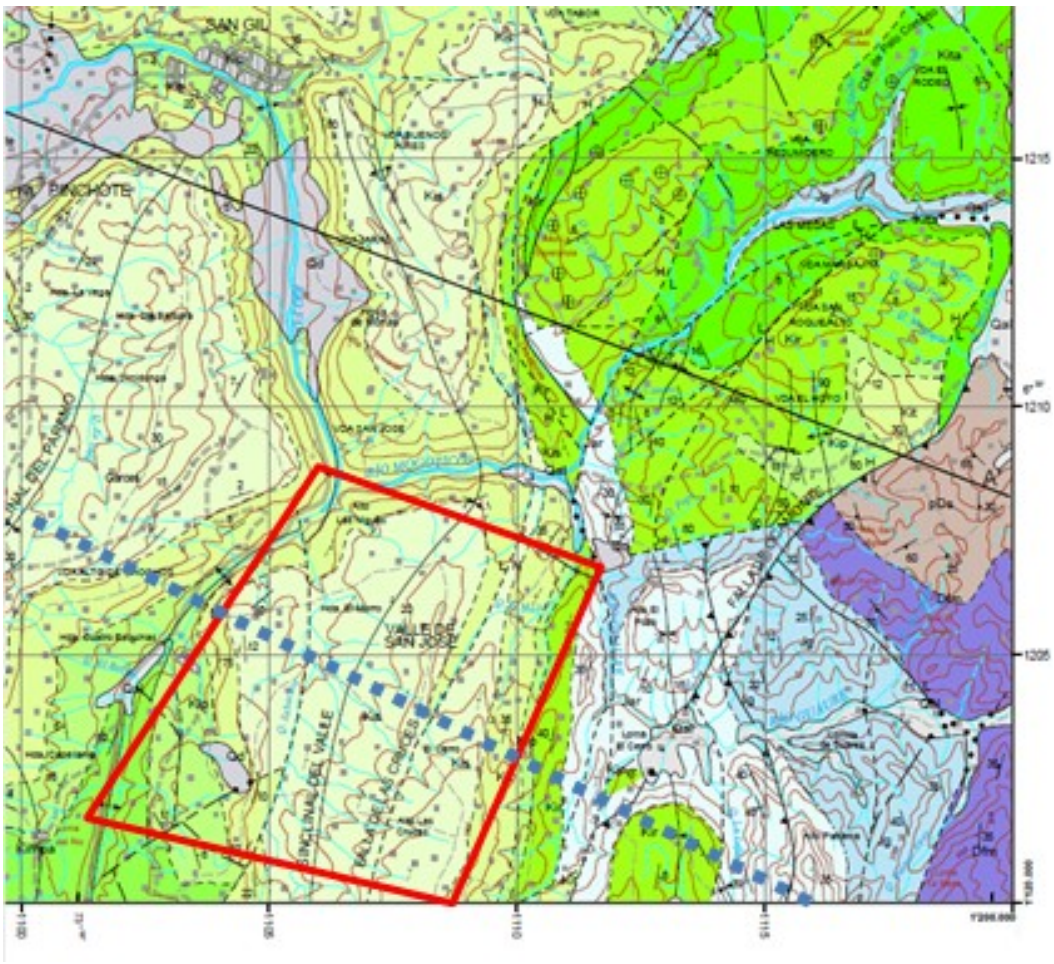


Ubicación de la línea de prueba de respuesta geológica, en el flanco occidental del Sinclinal del Valle, y Falla de las Cruces, Sobre litologías de las formaciones Simití, Tablazo, Paja y Rosablanca (INGEOMINAS, 2009).

Se solicita reubicación de la estación 233 a 240 en la Línea 8 en el municipio de Viotá, Vereda Alto palmar y Alto Ceilan, son reubicadas en la Vereda Palestina a 10 km al Sur de la Línea 8 dentro del mismo Municipio con dos estaciones adicionales a lado y lado para traslapo, la supervisión aprueba mediante el acta de reunión.

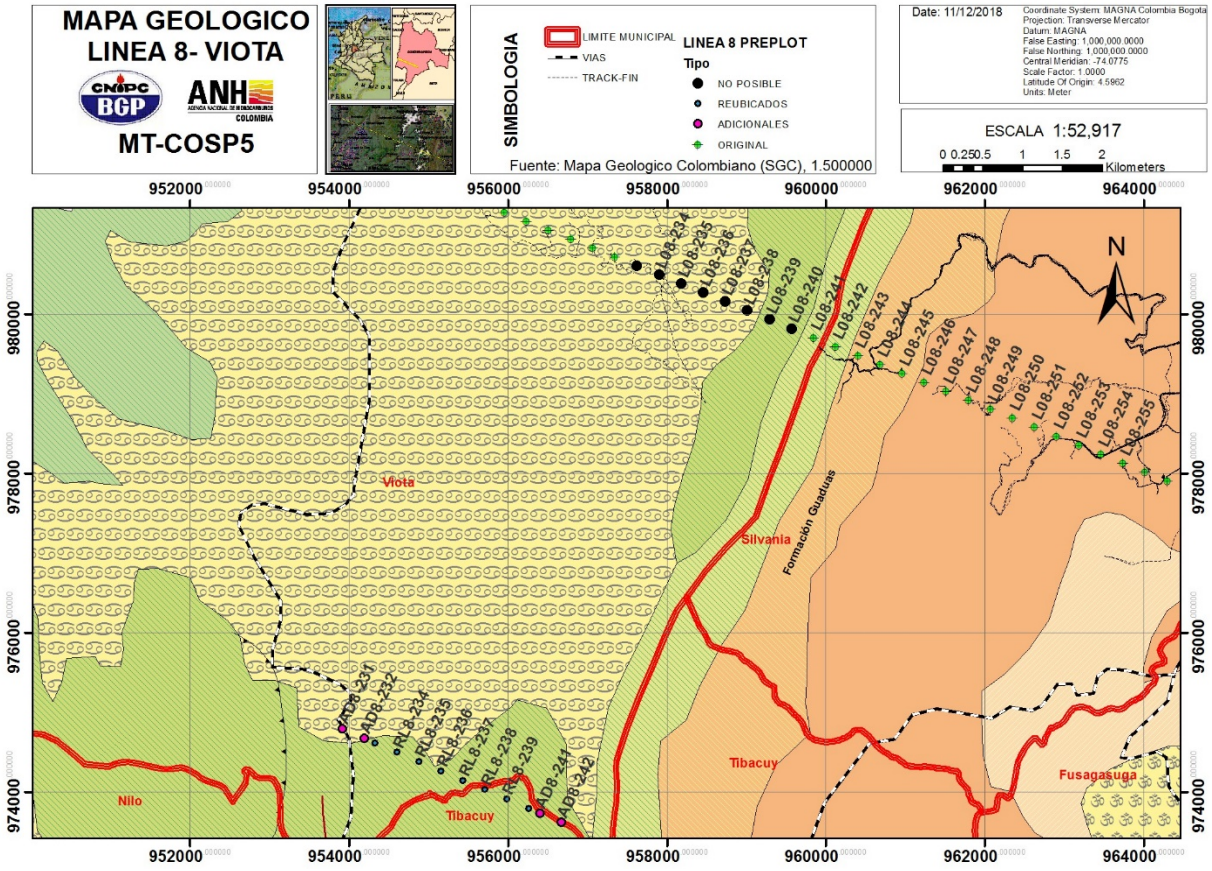


Línea 8. Reubicación estaciones 233 – 240 de Alto Palmar y Alto Ceilan – Viota a la Vereda Palestina en el mismo municipio de Viota.

Se solicita reubicación de las estaciones que atraviesan el Parque Nacional Serranía de Yariguies por información del Jefe de Parques no se puede atravesar el parque por esa área, socialmente peligroso. Se propone reubicación a 10 km al norte de la Línea 7 dentro del mismo Municipio con dos estaciones adicionales a lado y lado para traslapo, la supervisión aprueba mediante el acta de reunión.

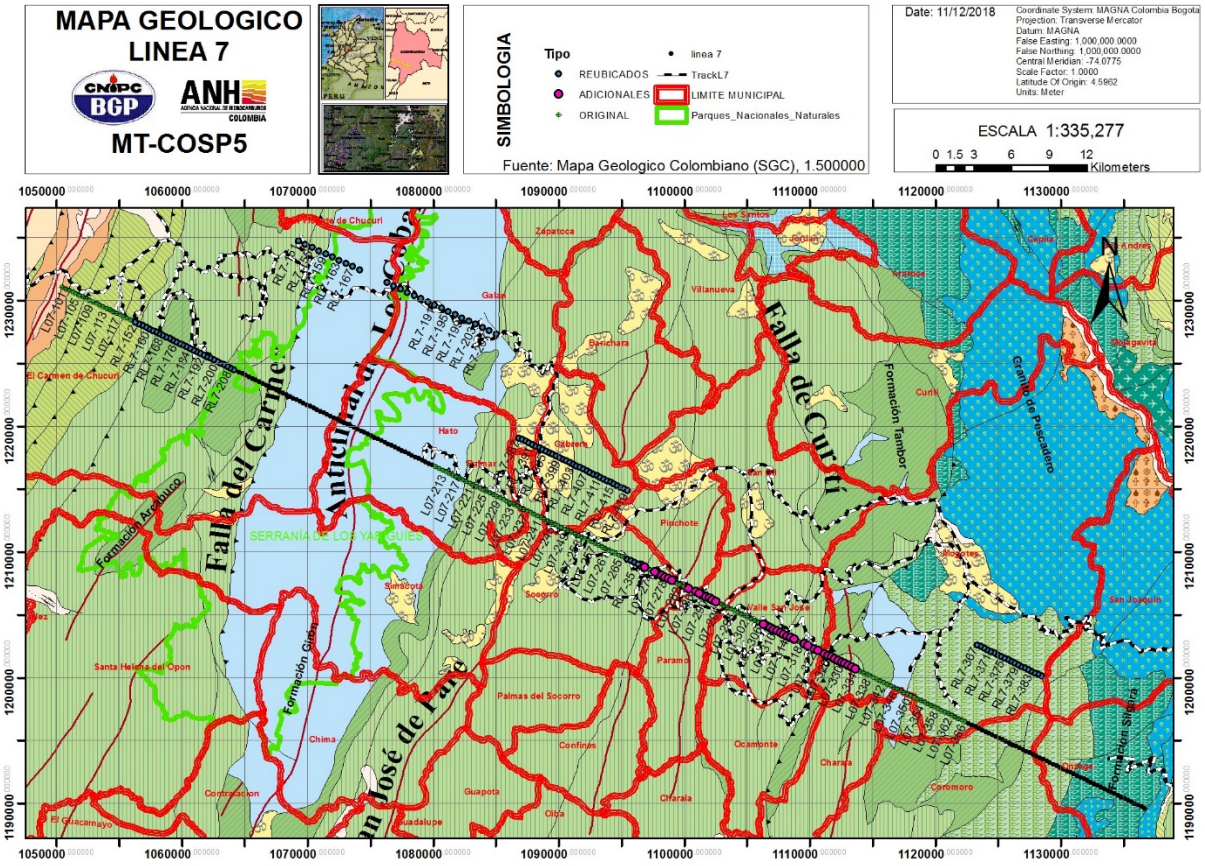


Línea 7. Reubicación estaciones PNN Serranía de Yarigiues por motivos de seguridad.

A fecha 29 de Noviembre se hace entrega para aprobación por supervisión de 159 sondeos magnetotelúricos dela Línea 8 con 52 adicionales y las repeticiones contractuales correspondientes a la Línea 8, se anexa ACTA.

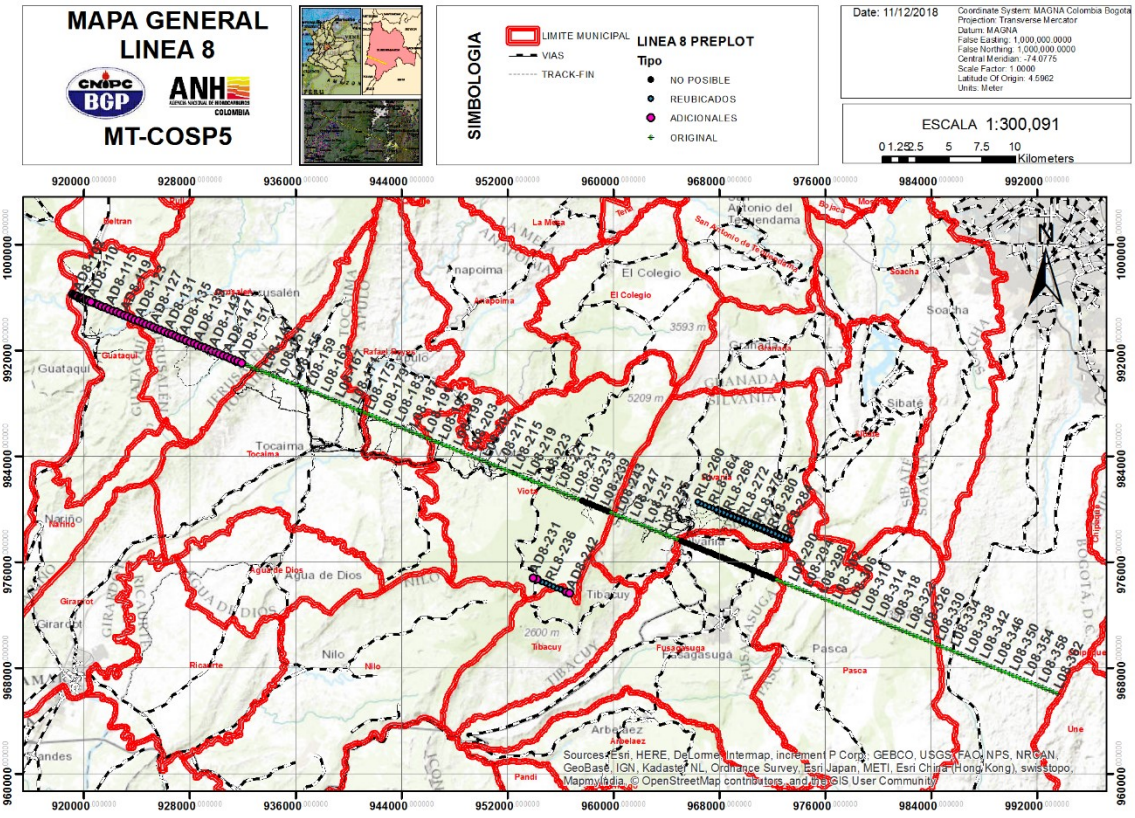


Línea 8. Ubicaciones de 152 estaciones mas adicionales entregadas a la ANH.


Se solicita cambio de 33 estaciones en el municipio de Onzaga, la comunidad no permitió el ingreso, esta adquisición se realizaran en una paralela en los Municipios de cabrera y Galan

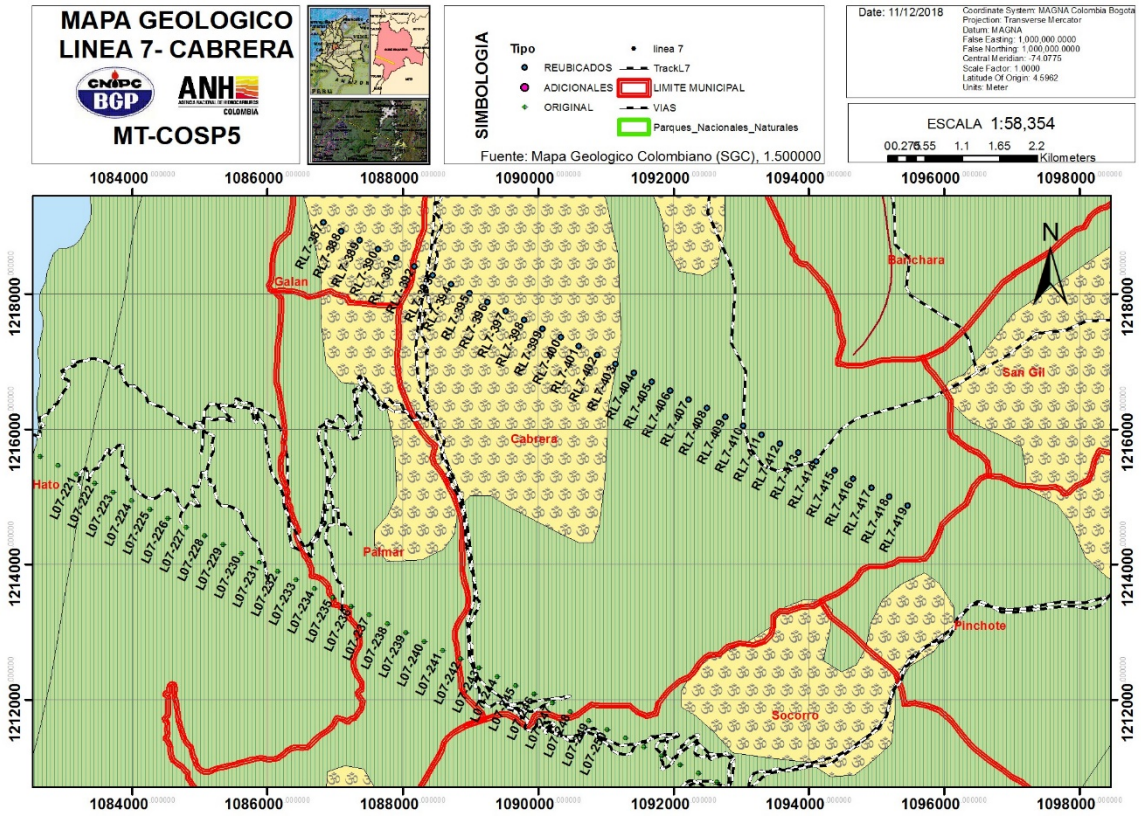


A 30 de Noviembre se lleva un total de 158 estaciones de la Línea 8.

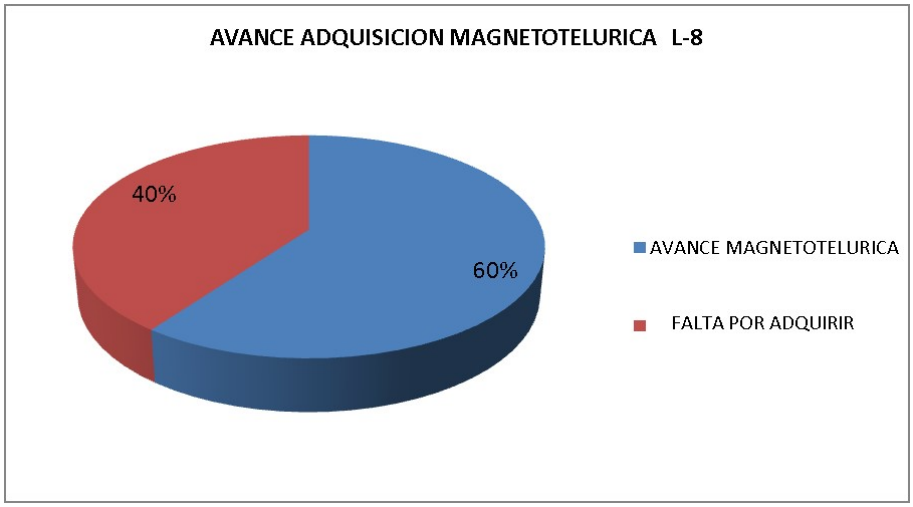


A 30 de Noviembre se lleva un total de 54 estaciones adicionales en la Línea 8.

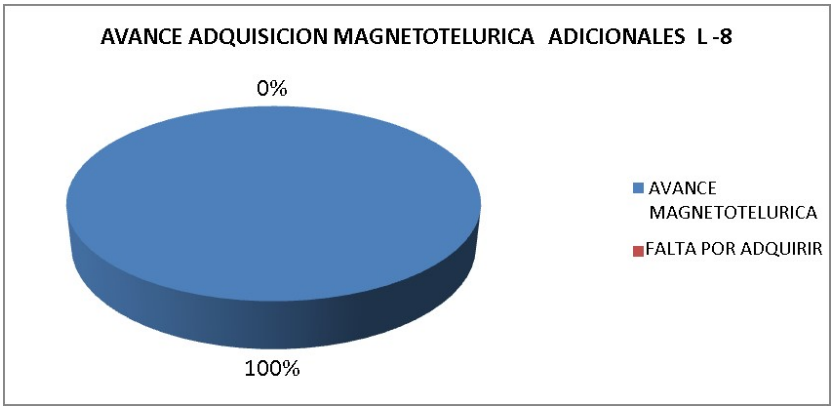


A 30 de Noviembre se lleva un total de 132 estaciones en la Línea 7.

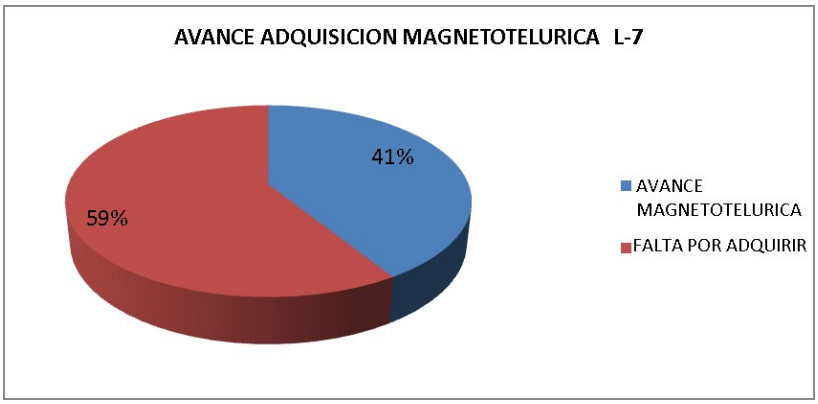


A 30 de Noviembre se lleva un total de 38 estaciones adicionales en la Línea 7.

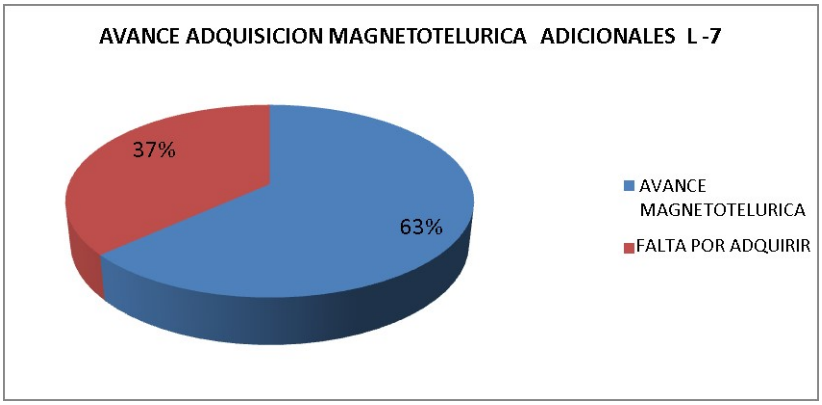

AVANCE DE ADQUISICION GENERAL DEL CONTRATO

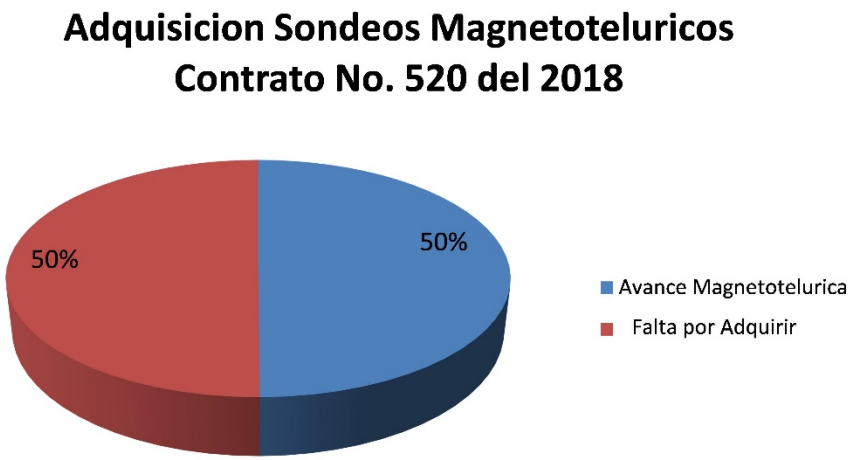

Área Social

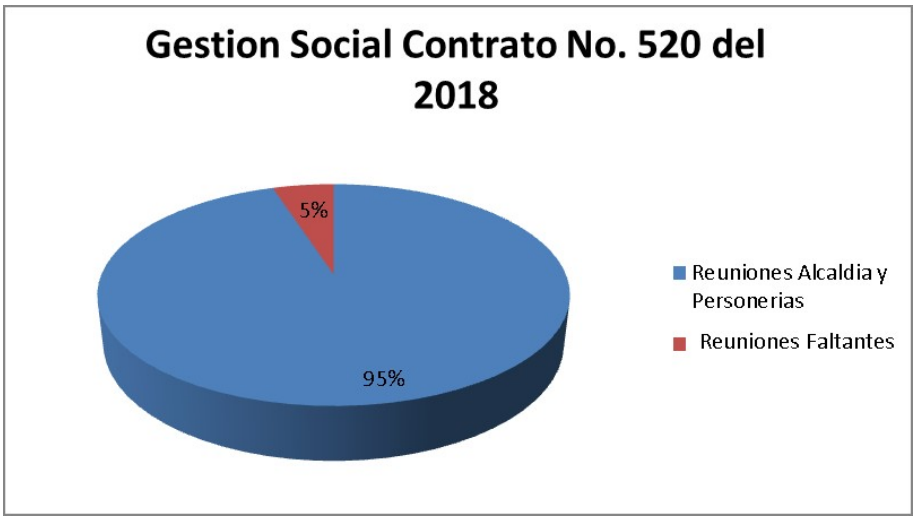

Se encuentra pendiente reunión con la Alcaldía Local de Usme

Se encuentra pendiente reunión con los presidentes de la JAL de Pasca

Se encuentra pendiente reunión con representantes de la comunidad de Fusagasuga

Se han generado alertas por la situation en Onzaga

Se ha generado alertas por la situación en Coromoro

Se han tomados todas las medidas sociales para el Ingreso a Carmen de Chucuri.

Área de HSE

Se realizaron 5 charla pre operacional a 51 personas, y se realizó calistenia, se practicaron 32 pruebas de alcoholimetrías 12 a conductores, personal staff y personal roll se realizó inducción general de HSE y evaluación a 8 personas que ingresan al proyecto, se izó monitoreo de las comunicaciones con las cuadrillas y vehículos, se prestó apoyo con montañista, Delta1 al grupo MT5 en la línea 8 en los puntos, 171-170-188-, Delta2 con MT 1 en la línea 8 en los puntos 100-101.

Se realizaron 6 charla pre operacional a personas, y, se practicaron 33 pruebas de alcoholimetrías 11 a conductores, personal staff y personal roll se realizó Breafing de HSE a 5 personas staff que ingresan al proyecto, coordinador de HSE visita cuadrilla en campo línea 8 punto 131,veificando uso correcto de los EPP y las herramientas, se izó monitoreo de las comunicaciones con las cuadrillas y vehículos en el serró Capote , se prestó apoyo con montañista, Delta1 al grupo MT4-MT5 en la línea 8 en los puntos,

198-199-200-166-167,terreno quebrado Delta2 con MT 1 en la línea 8 en los puntos 102-103.terreno quebrado.

Se realizaron 5 charla pre operacional a 45 personas, se realizaron 27 pruebas de alcoholimetrías a conductores, personal roll y staff, se realizó calistenia, se realizó breafing de seguridad a dos visitantes de la gerencia de HSE, se izó acompañamiento con visitantes cuadrilla MT4 verificando procedimiento seguro de trabajo, se prestó apoyo con montañista, Delta1 al grupo MT4 y en la línea 8 en los puntos, 196-1191-1190-186 Delta2 con MT5 en la línea 8 en los puntos 169,170.

Se realizaron 8 charla pre operacional a 60 personas, y, se practicaron 32 pruebas de alcoholimetrías 11 a conductores, personal staff y personal roll, , se izó monitoreo de las comunicaciones con las cuadrillas y vehículos en la vereda Cotama, se realizó reconocimiento de las vías con el móvil de reacción en el sector de Jerusalén, Guataquí, vereda Gallinazo se prestó apoyo con montañista, Delta1 al grupo MT5 en la línea 8 en los puntos, 165-164-161-160 terreno quebrado utilización de línea de vida Delta2 con MT 1 en la línea 8 en los puntos 105-106-.terreno quebrado realizo descenso del personal y equipos.

Área de Gestión Ambiental

Actualización documentación actas PREMT. Inducción general a 8 personas. Inducción específica a 5personas. 1 Charla manejo integral de residuos sólidos. 1 charla sobre orden y aseo.

Gestion documentos actas de cierre MT.

Assitencia a la reuniones con la CAS y obtención de autorización de Ingreso Serrania de Yariguies.

Apoyo a grupo de trabajo MT 5 y MT 3. 1 charla sobre manejo de residuos. 1 charla sobre programas de gestión ambiental.

Actualización base datos y documentación actas- reacondicionamiento estaciones MT. Salida Tocaima – Bogotá.

Área Protección Industrial

Se realizan los oficios para radicar ante la Fuerza Pública; Ejército nacional correspondientes a la Línea 7.


Se entabla comunicación vía telefónica con los miembros de la Fuerza Pública en la ciudad de Bucaramanga sobre cómo se debe hacer el proceso de socialización del proyecto.

Radicado del oficio de la Policía Nacional del municipio informando la llegada del personal de la empresa nacional y extranjero

Se implementa la charla de 5 minutos diaria sobre minas A/P, AEI y recomendaciones en el área, acompañamiento al personal en campo y reconocimiento del terreno

Área Gestión Inmobiliaria

La actividad se ha visto con dificultades por la negación de la comunidad en algunas áreas.

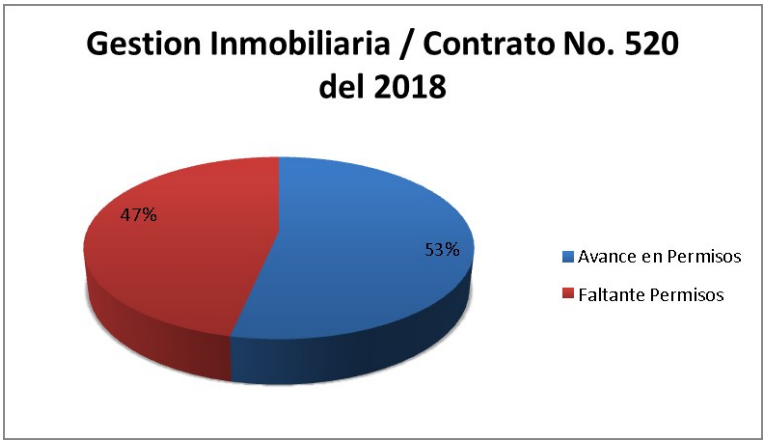

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato – (Valor de acuerdo al acta de inicio firmada).	$ 7.240.257.937,00
Valor por desembolso	0
No. de desembolsos realizados a la fecha	0
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	0
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	$ 7.240.257.937,00

3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

3.1Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

3.2 Observaciones

Nota: El contratista presento buen avance a la fecha del 30 de noviembre, fue necesario el ajuste de varias estaciones o segmentos de línea (tanto Línea 7 como Línea 8) por aspectos externos como la parte social con la presencia de resistencia de algunas comunidades, es el caso de Onzaga - Santander, El Carmen de Chucuri – Santander, Viota - Cundinamarca, y áreas con ausencia de seguridad física como en la Serranía de Yariguies en Santander.

Siempre se ha concertado los ajustes con el contratista y respetando los aspectos contractuales y técnicos del programa, como número de estaciones, separaciones entre las mismas y rumbo.

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato 195 de 2018, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 400 del 22 de junio de 2015, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que:

1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

3.3 Recomendaciones

Ninguna

Atentamente,



Hugo Hernán Buitrago Garzón
Gestor T1.
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH

Hugo Hernán Buitrago Garzón
Supervisor de contrato No. 520 de 2018
