## REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE 14/06/2022

| | |
|---|---|
|  |  |
| CONTINUACION DE REMATES DE INSTLACIONES ELECTRICAS SEGUNDO NIVEL | ESTADO DE LA VIA DE ACCESO, SOBRE LA QUE SE HIZO REQUERIMIENTO ALCALDIA LOCAL TEUSAQUILLO PARA PAVIMENTO |
|  |  |
| VIA EN AVANZADO ESTADO DE DETERIORO, LA CUAL DEBE PAVIMENTARSE ANTES DE DICIEMBRE, TODA VEZ QUE CORRESPONDE AL UNICO ACCESO DE LAS INSTALACIONES DEL NUEVO COMANDO | ELEMENTOS DE ACERO, PARA SER UTILIZADOS EN EL REFORZAMIENTO DE LAS CERCHAS DEL AUDITORIO, ACTIVIDAD QUE ESTA EN CURSO |



APUNTALAMIENTO NECESARIO PAR AL EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO DE CERCHAS AUDITORIO




ACTIVIDAD DE COLOCACION DE PINTURA DE PROTECCION CONTRA EL FUEGO INTUMECENTE, CMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL




OTRA VISTA DE LA ACTIVIDAD DE PINTURA SOBRE LOS ELEMENTOS EXTERNOS DE FACHADA,LOS CALES SON EN SU TOTALIDAD EN ACERO





VISTA DE LAS PRIMERAS CELOSIAS, COLOCADAS A NIVEL INFERIOR, COMO PARTE DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DEL AUDITORIO
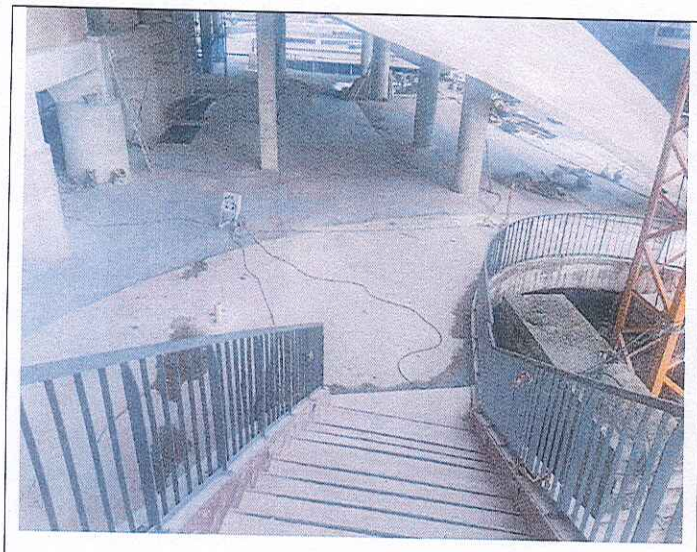
| | |
|---|---|
|  |  |
| VISTA DESDE LA ESCALERA DE ACCESO A LA ZONA DE INGRESO DEL AUDIORIO, SE VISUALIZA EL CASCARON DE CONCRETO EN PROCES DE CURADO | EN LA ZONA DEL EDIFICIO PRINCIPAL, ZONA CENTRAL, PUNTO FIJO, ACTIVIDADES DE REMATES DE PISOS, CIELORRASOS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y LAS OBRAS DE DIVISIONES EN VIDRIO DENOMINADAS MAMPARAS |
|  |  |
| VISTA DESDE LA PARTE SUPERIOR DEL PUNTO FIJO, PISOS INFERIORES, ACTIVIDADES FINALES | PISO QUINTO Y SEXTOS, DISPUESTA COMO ZONAS DE ALOJAMIENTO, LOS CUALES ESTAN FINALIZADOS Y SE HACEN ACITIVIDADES DE SUBSANE DE OBSERVACIONES A NIVEL DE ACABADOS |
| | |


| | |
|---|---|
|  |  |
| PISO QUINTO, ZONA PARA COLOCACION DE MAMPARAS, PARA LAS FUTURAS OFICINAS, LAS CUALES SE CONFORMAN CON DIVISIONES DE VIDRIO, DENOMINADAS MAMPORAS | VISTA AL INTERIOR DE UN ALOJAMIENTO TIPICO TOTALMENTE TERMINADO, CON SJU BATERIA DE BAÑO, PISOS EN ALFOMBRA, INSTALACIONES TERMINADAS |
|  |  |
| CASINO DE SUB OFICIALES, DISPUESTO ARQUITECTONICAMENTE, PARA INCORPORAR MOBILIARIO ACORTE CON EL FUTURO FUNCIONAMIENTO, EN LA ACTUALIDAD PRACTICAMENTE FINALIZADO | MAMPARAS FINALIZADAS, FUTURAS OFICINAS DISPUESTAS SOBRE ESTOS PISOS, A LA ESPERA DEL MOBILIARIO, ACTIVIDAD QUE ES LA PROXIMA A INIICIAR |
| | |
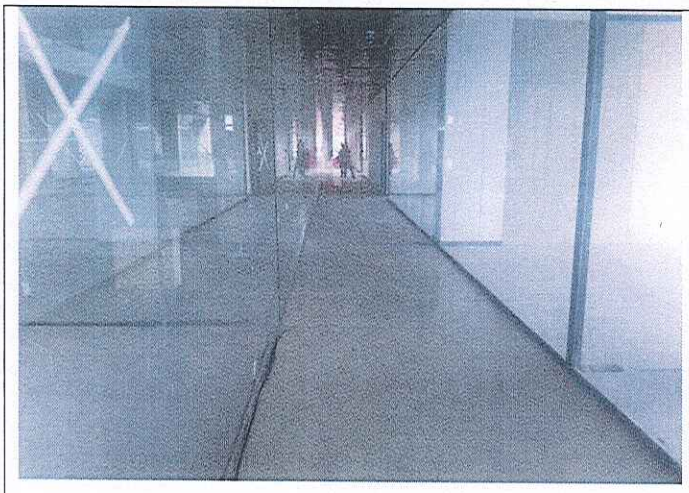
| | |
|---|---|
|  |  |
| ZONA DE CIRCULACION, MAMPARAS FINALIZADAS, EN ACTIVIDADES DE REMATES Y ASEO FINAL, | VISTA DEL PUNTO FIJO, PISO CUARTO, EVIDENCIADO ACTIVIDADES DE ACABADOS EN PROCESO DE FINALIZACIO N |
|  |  |
| OTRO COMPARTIMIENTO FINALIZADO | INFRAESTRUCTURA ELECTICA PARA MUEBLES |
|  |  |
| SE DEJA LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA, Y DE REDES PARA LA DISPOSICION DE MOBILIARIO | ZONAS DE OFICINAS TERMINADAS, ESPACIOS DISTRIBUIDOS, DE ACUERDO AL PROGRAMA TECNICO ARQUITECTONICO |
| | |
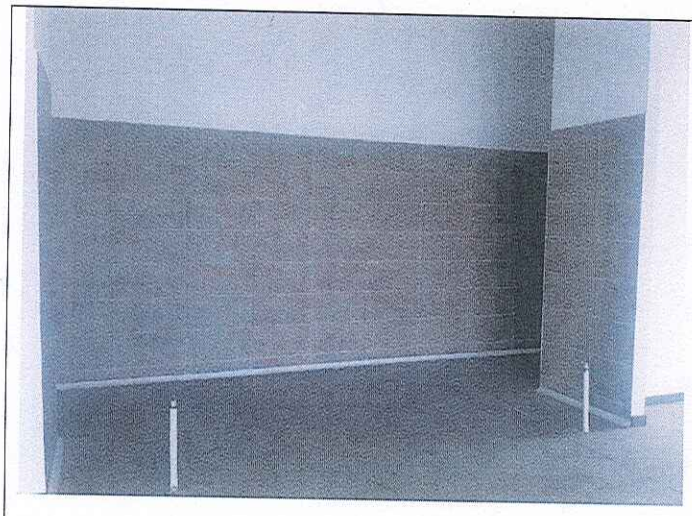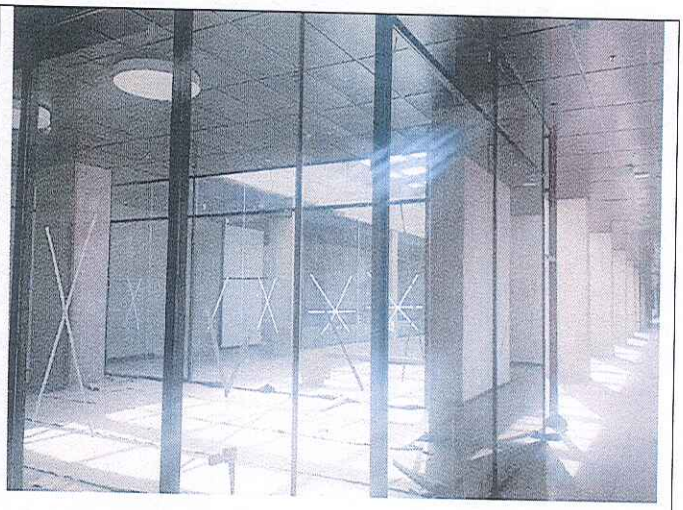
| | |
|---|---|
|  |  |
| QUINTO NIVIEL, ESPACIO DE ZONA DE COCINA, FINALIZADO, DONDE SE COLOCARAN TODO EL MOBILIARIO DE ESTE ESPACIO, SE HACEN ALGUNAS CORRECCIONES A NIVEL DE INSTALACIONES DE GAS, COMO SOLICITUD DE LA EMPRESA PRESTADORA DE ESTE SERVICIO, AVANTI, | OBRAS DE DIVISIONES EN VIDRIO, YA EN LA FASE DE FINALIZACION, A LA ESPERA DE LA DISPOSICION DEL MOBILIARIO DE CONFORMIDAD AL INVENTARIO Y SITIO DE COLOCACION,. |

| | |
|---|---|
|  |  |
| VISTA DE FINALIZACION DE MAMPARAS, TERCER PISO, PARA DISPOSICION DE ESPACIOS | PUNTO FIJO ZONA DE CIRCULACION, ACTIVIDADES FINALES DE REMATES Y ASEO |
|  |  |
| PUNTO FIJO ZONA CENTRAL SE DESTACA ILUMINACION NATURAL A AMBOS COSTADOS DE LA EDIFICACION | DIVISIONES DE OFICINA, MAMPARAS EN ALUMINIO, ESTRUCTURA DE SOPORTE DEL VIDRIO, ELEMENTO NO ESTRUCTURAL, EL CUAL SE CORROBORA CON CALCULO ESTRUCTURAL |

| | |
|---|---|
|  |  |
| ESTADO ACTUAL DE PLAZOLETA, SE DESTACA LA COLOCACION DE POSTERIA ILUMINACION CENTRAL... | ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LA ZONA DE PLAZOLETA, MOBILIARIO EN CONCRFETO Y LUMINARIAS |
|  |  |
| ACCESO A DIJIN, ESCALERA QUE CONDUCE A ZONA INFERIOR | VISTA DE LA TERMINACION DE COLOCACION MAMPARAS Y CIELORRASO EN TODAS SUS TIPOLOGIAS, AVANCE SIGNIFICATIVO EN ESTA PARTE DE ACABADOS |
| | |
| | |

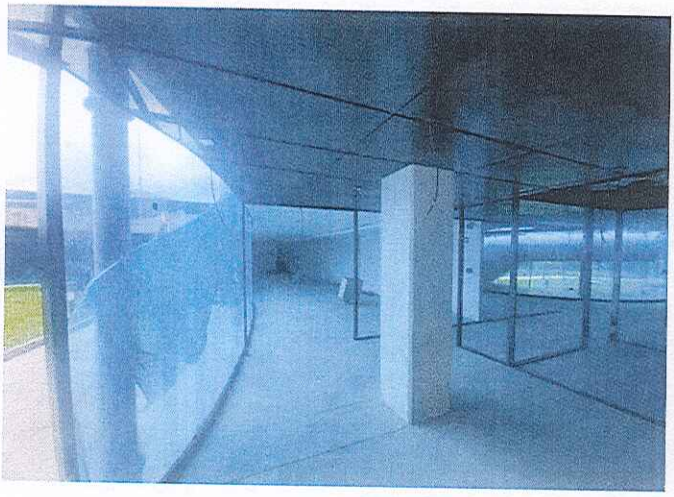
| | |
|---|---|
|  |  |
| VISTA DE LA ZONA DE DIJIN, CON LAS OBRAS DE EMPRADIZACION FINALZIADAS | DESDE EL INTERIOR, VISTA A ZONA CENTRAL DE LA AMEBA, GENERAR ILUMINACION INTERIOR |
|  |  |
| CIELORRASOS FINALIZADOS, MAMPARAS EN EJECUCION | COLOCACION DEL ESTRUCTURADO DE LA MAMPARA DIJIN |



COLOCACION DE LOS VIDRIOS, MAMPARAS EN EJECUCION ACTIVIDAD PROXIMA A FINALIZARSE



ESTRUCTURA METALICA DE CIELORRASO CAPILLA, ACTIVIDAD EN EJECUCION, REMATES, DE CONEXIONES DE INSTALACIONES

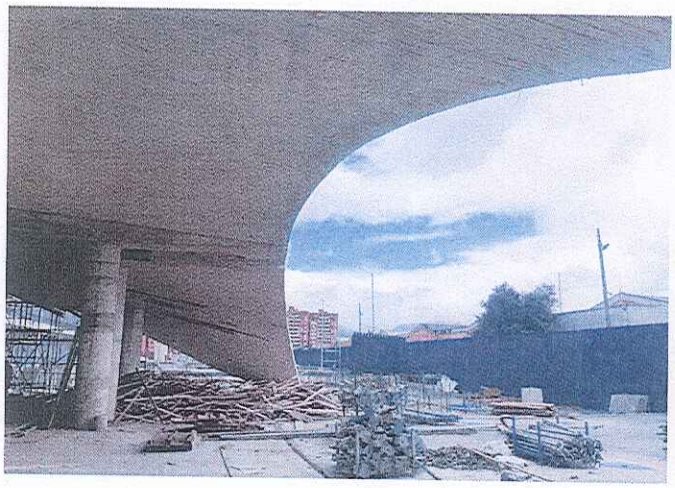

DESENCOFRE DE LA CUPULA EN CONCRETO



VIASTA DESDE EL AUDITORIO,





| | |
|---|---|
| SECUECIA DE LA ACTIVIDAD DE PROTECCION CO PINTURA ANTIFUEGO, PROTOCOLO DE CONFORMIDAD AL CAPITULO K DEL NSR 10, PINTURA INTUMECENTE ESTO POR LA CARACTERISTICA DE LA ESTRUCTURA, LA CUAL ES EN SU TOTALIDAD METALICA | CONTINUACION DE LA COLOCACION DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LAS INSTALACIONES DEL AIRE ACONDICIONADO |
|  |  |
| CUPULA, ES SU CONDICION ACTUAL, PENDIENTE OBRAS DE IMPERMEABILIZACION. | MADERA DE LA FORMALETA QUE CONFORMO LA ESTRUCTURA |
|  |  |
| INCIO COLOCACION DE CIELORRADO EN MADERA ZONA DE CIRCULACION EXTERIOR, IMPORTANTE GENERAR OFICIO, PARA VERIFICAR CONDICIONES DE VIDA UTIL, POR PROCESOS DE INTEMPERISMO. | MADERA AUN PENDIENTE DE RETIRAR, DE LA CUPULA, PROCESO DE DESENCOFRE |
| | |

| | |
|---|---|
|  |  |
| PRIMER NIVEL DE OPERACIÓN, MAMPARAS EN PROCEOS, COLOCACION DEL ESTRUCTURADO PARA COLOCACION DE VIDRIO | VISTA DE LA PARTE SUR DE ESTE PRIMER NIVEL. |


NOTAS PARA LA PRESENTE SEMANA DE ANALISIS DE AVANCE

ESTADO DE AVANCE DE OBRA SEMANA ANTERIOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Preliminares y obras Generales** | **100,00%** | **100,00%** | | **100,00%** | * |
| **Estructura** | **94,42%** | **94,65%** | | **94,84%** | * |
| **Obra gris** | **97,88%** | **97,91%** | | **97,91%** | * |
| **Acabados** | **68,80%** | **68,67%** | | **69,95%** | * |
| | **PROGRAMA CONSOLIDADO** | | | | * |
| **reprogramación 3 v19** | **79,68%** | **79,05%** | **-0,02%** | **79,69%** | **(-) 1 días** |

ESTADO DE AVANCE PRESENTE SEMANA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Preliminares y obras Generales** | **100,00%** | **100,00%** | | **100,00%** | * |
| **Estructura** | **94,88%** | **94.84%** | | **94,98%** | * |
| **Obra gris** | **97,88%** | **97,91%** | | **97,91%** | * |
| **Acabados** | **68,89%** | **69.95%** | | **71.20%** | * |
| | **PROGRAMA CONSOLIDADO** | | | | * |
| **reprogramación 3 v19** | **80.34%** | **79,69%** | **-0,01%** | **80.35%** | **(-) 1 días** |

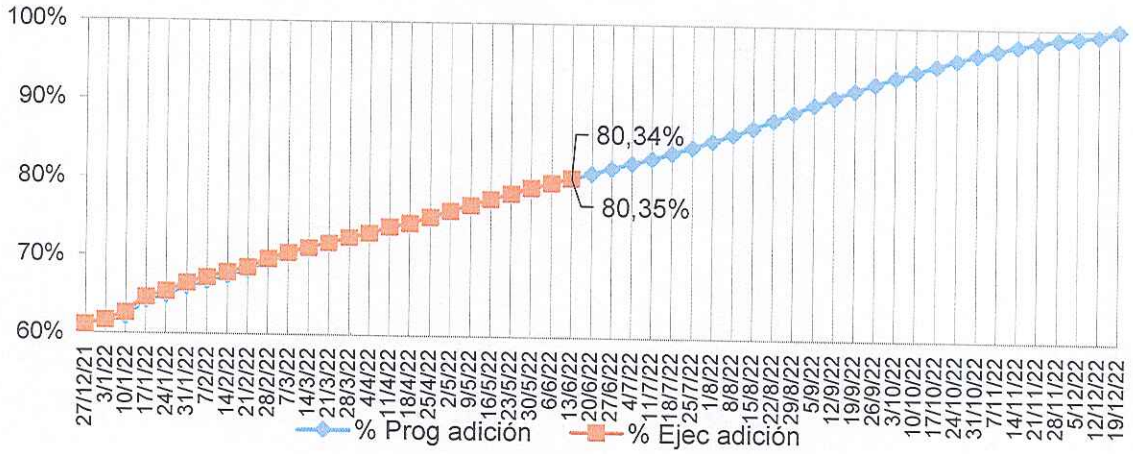


PROGRAMADO: 80.34 %

EJECUTADO : 80.5 %

OBSERVACION:ADELANTO UN (1) DIA


En el análisis de la programación, bajo las condiciones de programación de actividades aprobadas a la fecha, no se verifican atrasos críticos, de acuerdo al informe presentado en el comité, dando inclusive adelanto. La obra gris, se mantuvo en el mismo porcentaje de la semana pasada.


En los procedimientos y protocolos entre la secretaria de Seguridad, aspectos de aprobación de precios no previstos, se dan situaciones que son de resorte interno entre secretaria, Interventoría y contratista de obra.



Frente del Auditorio: Se inicio reforzamiento del auditorio.

Se recalca aspectos de la incidencia de la contratación de mobiliario, con el fin de analizar afectaciones de la terminación de la obra en los tiempos previstos del programa y planeación.


Otros aspectos, el tema de licencia de urbanismo, tramites de servicios públicos, con el fin de poder tener la obra, con la totalidad de los servicios para poder disponer de su uso, dentro de la planificación prevista. Importante lo de retie y retilab, analizar las excepciones, con la descripción de uso de la edificación, de conformidad a la normativa existente.
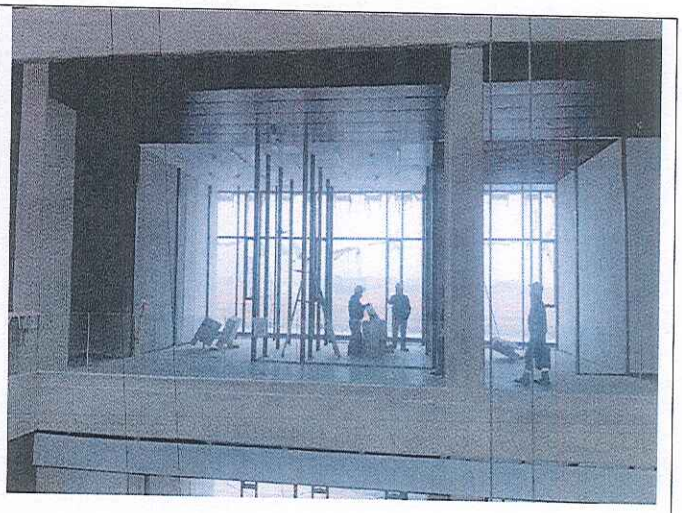
| | |
|---|---|
|  |  |
| CIELORRASOS SE DESTACA EL DE MADERA | TERFMINACIONES FINALES,COLOCCION DE ESTRUCTURADO DE LAS MAMPARAS |
|  |  |
| ESTADO ACTUAL DE LA ZONA DE SOTANO, FUTURA CONEXIÓN DESAGUES AL CANAL Y VISTA DE LOS ELEMENTOS DE VENTILACION NATURAL ESTRUCTURA METALICA | CORREDOR LATERANL DE ACCESO A PLAZA DE ARMAS, AL FONDO ELEMENTO ARQUITECTONICO, CUPULA EN CONCRETO FINALIZADA |

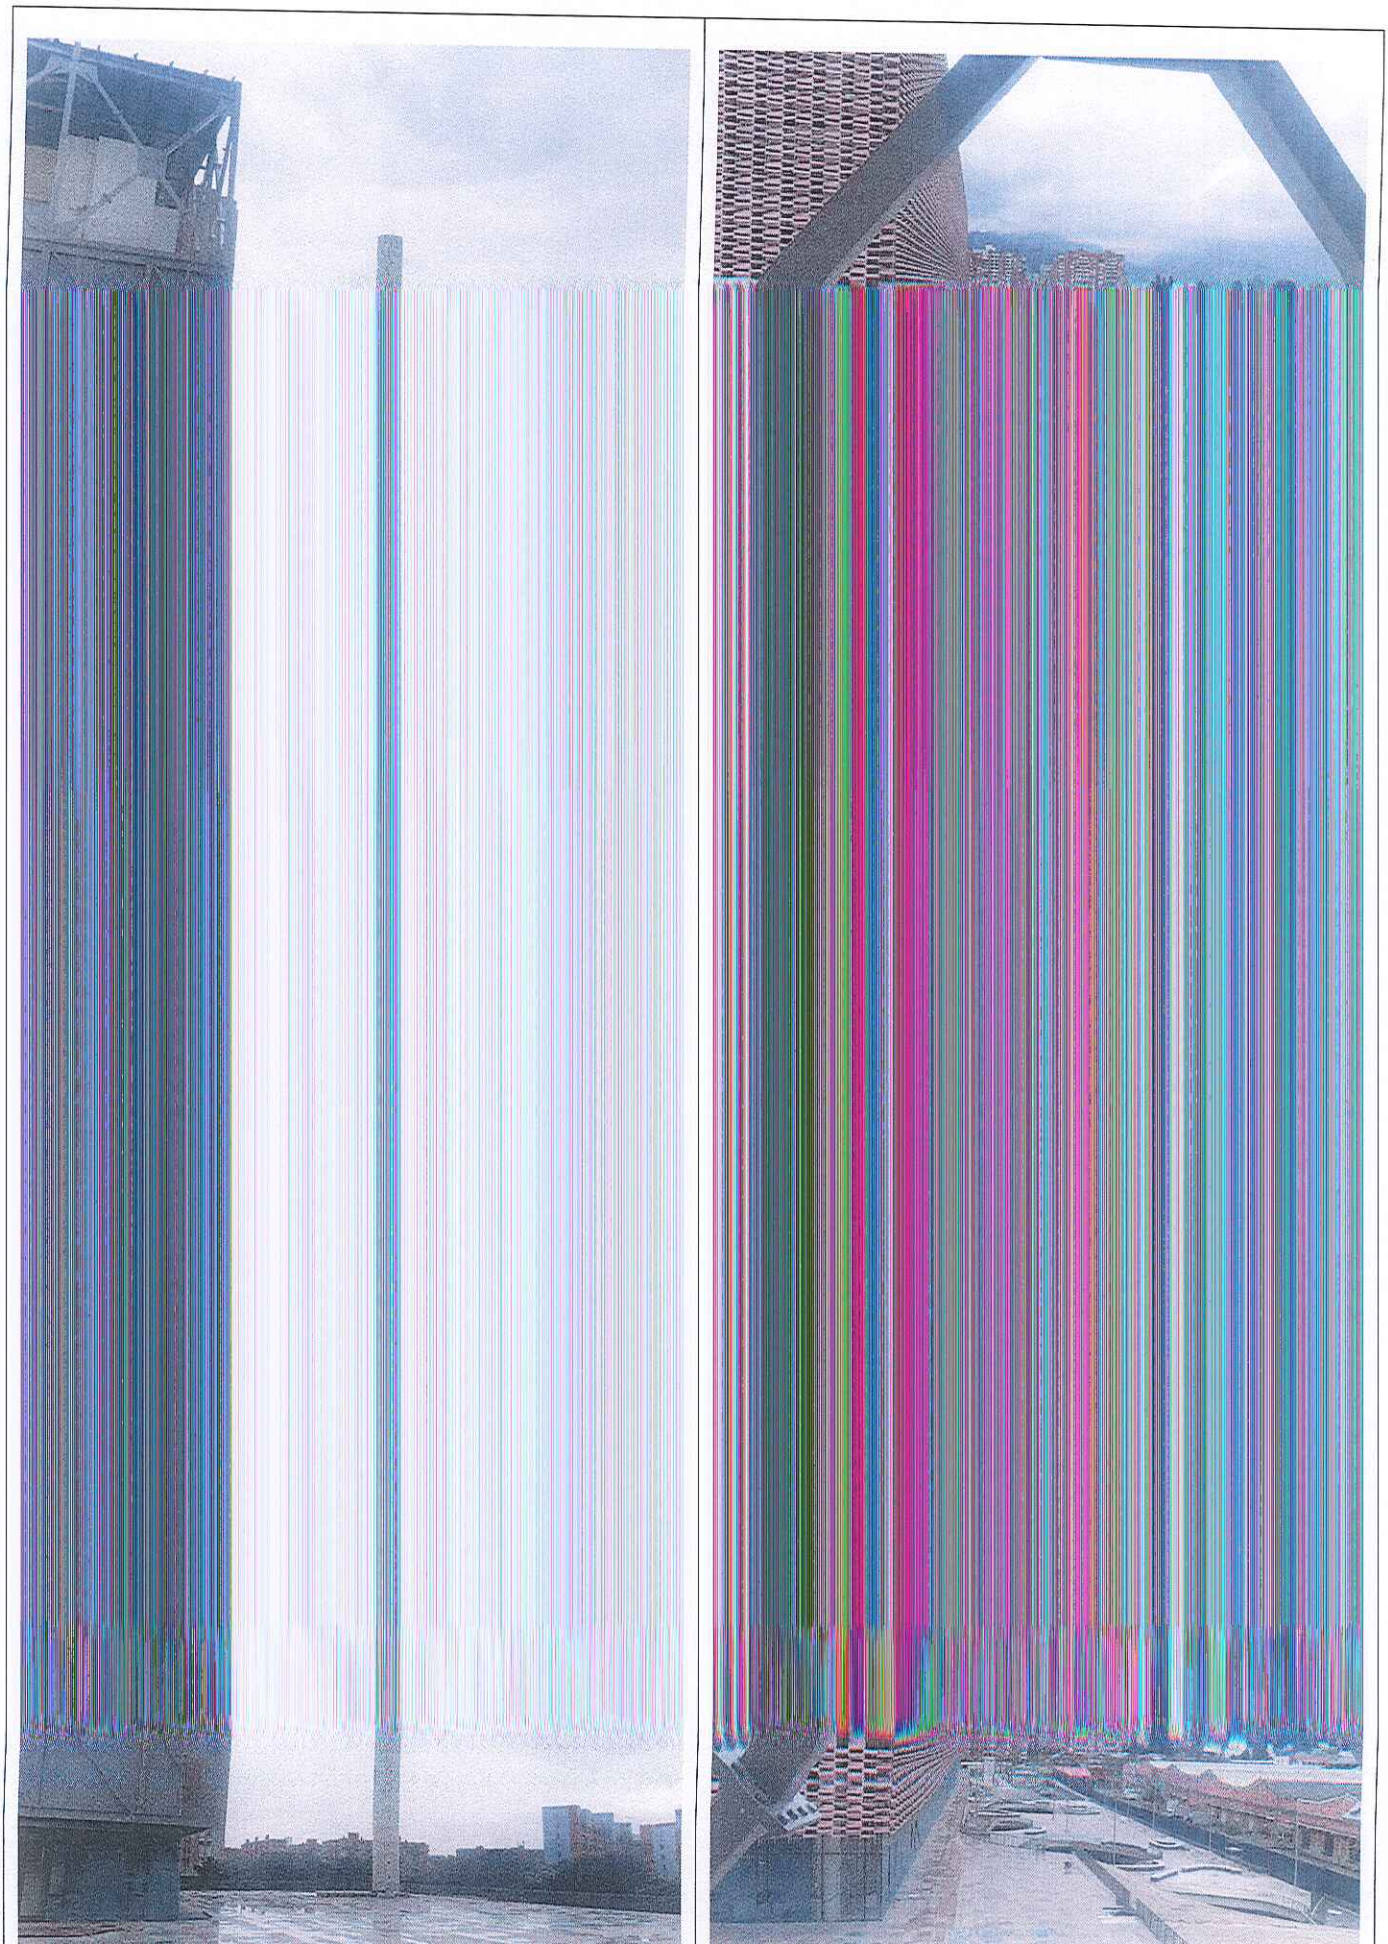
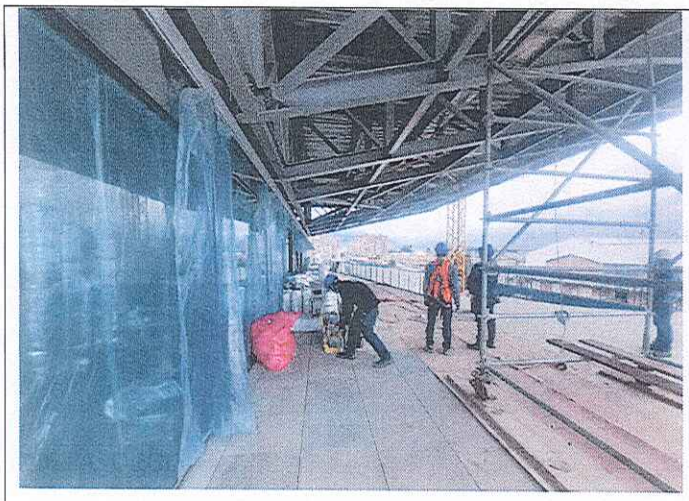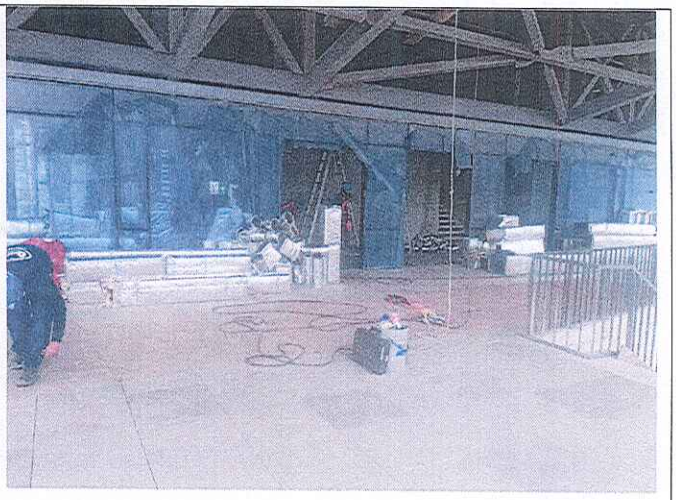
| | |
|---|---|
|  |  |
| LABORES EN LA ZONA INFERIOR DEL AUDITORIO, PARA LA COLOCACION DE LA DUCTERIA DE AIRE ACONDICIONADO | ALISTAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CONDUCCCION TUBERIAS Y ACCESORIOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO |
|  |  |
| VISTA DESDE LA ZONA SUPERIOR DESCANSO ACCESO AL AUDITORIO, FINALIZADA | EN LA ZONA DE SOTANOS, SE VERIFICA AVANCE SIGNIFICATIVOS DE CIELORRASOS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE REDES |
| | |

| | |
|---|---|
|  |  |
| ESTRUCTURADO DE CIELORRASOS, MAMPARAS SOTANO FUTURA DIJIN | ZONA CENTRAL DE DIJIN, DONDE INICIAN COLOCACION DE MAMPARAS, TERMINACION DE CIELORRASO, DANDO UN AVANCE SIGNIFICATIVO A ESTA PARTE DE LA OBRA |
|  |  |
| OTRA VISTA DDONDE SE DESTACA LA TERMINACION DE LOS CIELORRASOS | ESTRUCTURADO DE LAS MAMPARAS, FUTURAS OFICINA OPERTIVAS DEL LADO ORIENTAL DE LA DIJIN |
| | |
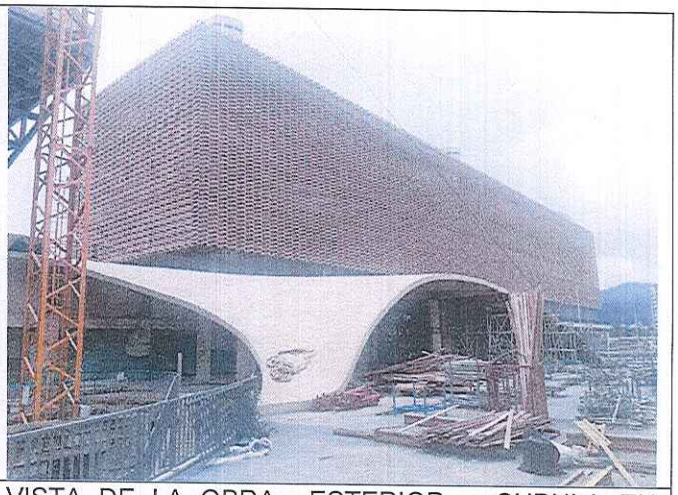
| | |
|---|---|
|  |  |
| COLOCACION DEL ESTRUCTURADO DEL CIELORRASO, DE LA IGELSIA | VISTA DE LA OBRA ESTERIOR CUPULA EN CONCRETO, EN PROCESO DE DESENCOFRE. |

ESTADO DE AVANCE DE OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Preliminares y obras Generales** | **100,00%** | **100,00%** | | **100,00%** | * |
| **Estructura** | **94,42%** | **94,65%** | | **94,84%** | * |
| **Obra gris** | **97,88%** | **97,91%** | | **97,91%** | * |
| **Acabados** | **68,80%** | **68,67%** | | **69,95%** | * |
| | **PROGRAMA CONSOLIDADO** | | | | * |
| **reprogramación 3 v19** | **79,68%** | **79,05%** | **-0,02%** | **79,69%** | **(-) 1 días** |

En el análisis de la programación, bajo las condiciones de programación de actividades aprobadas a la fecha, no se verifican atrasos críticos, de acuerdo al informe presentado en el comité, dando inclusive adelanto.

En los procedimientos y protocolos entre la Secretaria de Seguridad, aspectos de aprobación de precios no previstos, se dan situaciones que son de resorte interno entre Secretaria, Interventoría y contratista de obra.

Frente del Aditorio:Se informa actividades de reforzamiento en el auditorio, donde se verifican actividades secuenciales de protección de la estructura metálica, esto es retiro de la pintura existente y colocación de pintura de conformidad al diseño y recomendación. Protocolo de modificatorio en curso.

En la parte de obras exteriores, análisis, se refieren a trámites ante la Aero civil, para la colocación de la torre de comunicaciones, trámite que está en proceso de acuerdo a la trazabilidad

Se hace énfasis en la parte de las futuras conexiones de redes, las cuales deben estar debidamente certificadas, para que la actividad de mobiliario se haga con el lleno de los requisitos de conformidad a lo expresado en las especificaciones y se pueda operar los equipos sin ningún tipo de inconvenientes para el servicio.


A este respecto el cronograma debe estar en simultaneidad con la contratación del mobiliario, por lo cual una vez se defina, se hará los análisis correspondientes para proceder a definir las fechas de terminación.

La importancia de los tramites ante la curaduría, tanto en las obras de urbanismos y los requisitos solicitados por la entidad prestadora de servicio CODENSA, toda vez que se hace necesario, tener las licencias con el lleno de los requisitos, para que no se dificulte, la fase final de instalación de los servicios.

Otros aspectos, que aún permanecen en la parte de trámites, la autorización por parte de la empresa de Acueducto, para el permiso de vertimiento u ocupación del cauce, lo cual tiene unos requisitos de obligatorio cumplimiento.

El personal de obra está dentro de las necesidades de las actividades en ejecución, esto es acabados enchapes, redes eléctricas, instalaciones especiales, remates de pisos, instalaciones hidráulicas y sanitarias, aseo etc. En la presente semana hay 95 obreros y operativos.

Dado el estado actual de la obra, se recomienda generar un oficio a la Secretaria de Seguridad, para que se nos informe el estado de tramite ante las entidades prestadoras de servicio, para tener la trazabilidad precisa de que el Nuevo Comando, dispondrá de la totalidad de los servicios públicos, en la fecha estimada de terminacion.

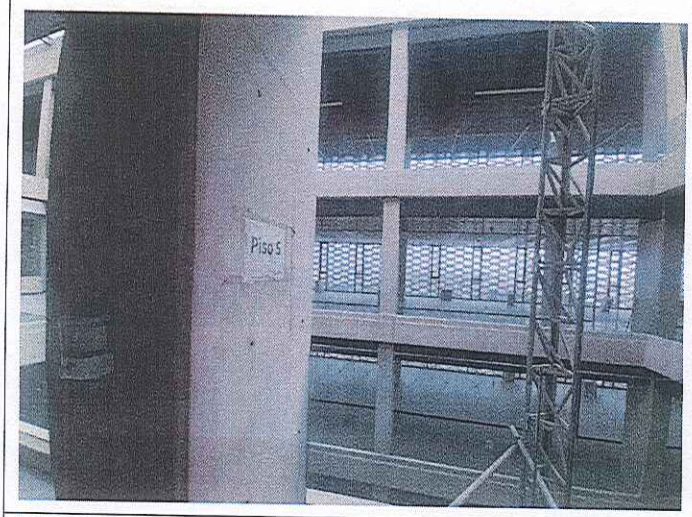



DETALLES ZONA CENTRAL, PISOS SUPERIORES FINALIZADOS



ESTADO ACTUAL DE LA CUBIERTA, ZONA FINALIZADA



PUNTO FIJO, MARQUESINSA, ILUMINACION CENTRAL, LUZ NATURAL FINALIZADA

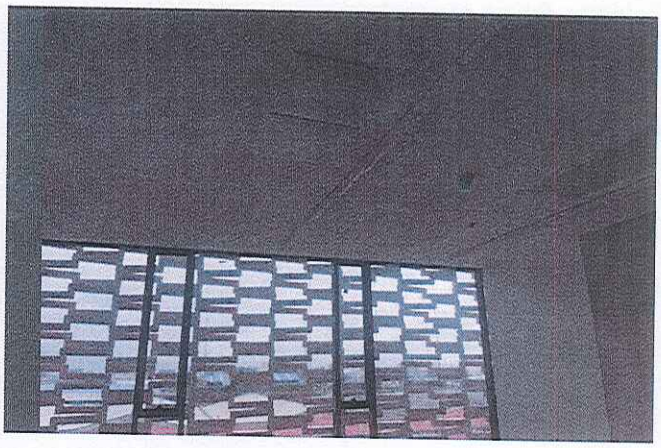


DETALLE DESDE EL INTERIOR DE LA FACHADA, DOBLE PIEL, ELEMENTOS EN ARCILLA






CIELORRASO EN MADERA, SOBRE ALGUNAS OFICINAS



SECUENCA DE INSTALACION CIELORRASO EN MADERA
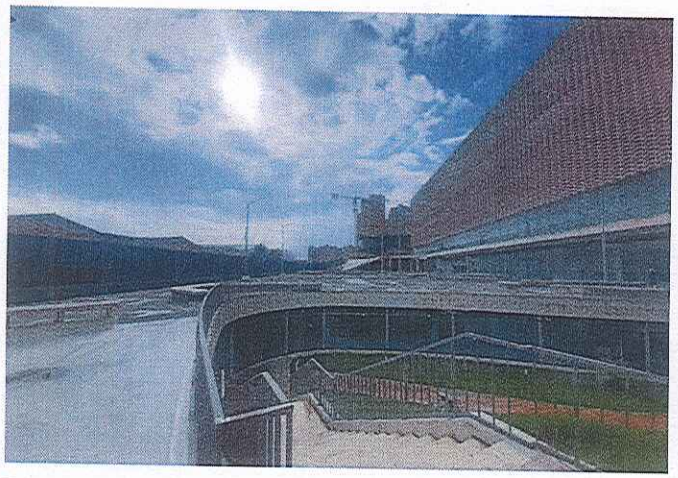
| | |
|---|---|
|  |  |
| VISTA GENERAL ZONA DE PLAZOLETA | PARTE INFERIOR DEL SOTANO, SIJIN EN ACTIVIDAD DE ACACABADOS FINALES |
|  |  |
| MAMPARAS, EN PROCESO ZONA DE DIJIN | ACTIVIDADES DE ACABADOS FINALES DIJIN |
|  |  |
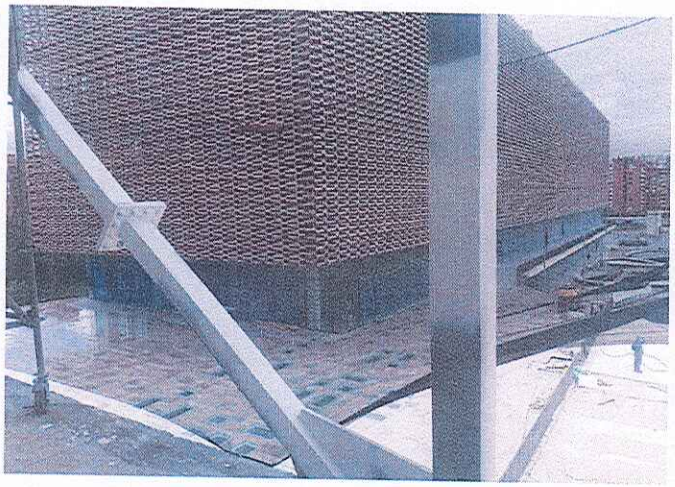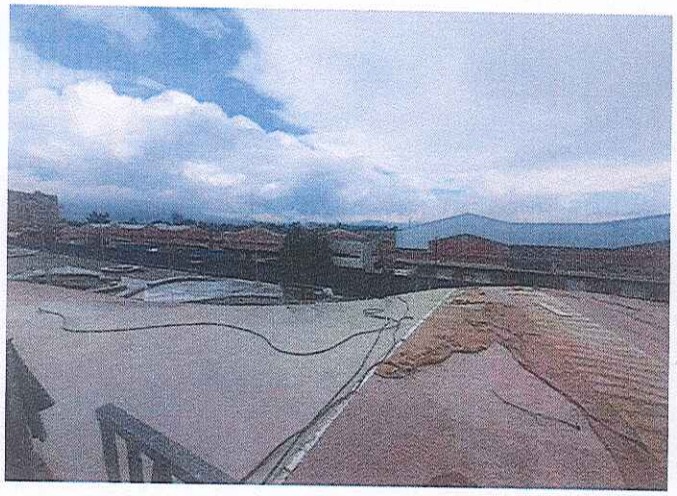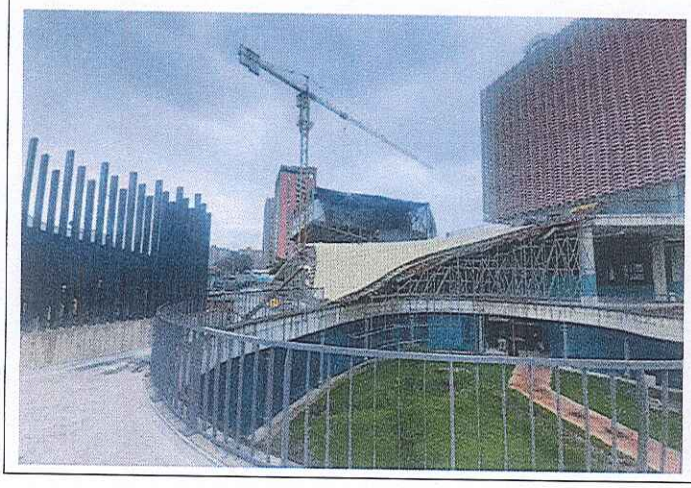
| | |
|---|---|
| CUPULA EN CONCRETO, FINALIZADA, | VERIFICACION ESPESOR PINTURA PROTECCION CONTRA EL FUEGO ZONA AUDITORIO |
|  |  |
| VISTA APLICACIÓN PINTURA ANTIFUEGO (INTUMECENTE) ADITORIO | VISTA PLAZOLETA DE ARMAS, AL FONDO TORRE DE LA IGLESIA |
|  |  |
| CASCARON DE CONCRETO O CUPULA FINALIZADA | FACHADA SUR OCCIDENTAL, TERMINADA |
|  |  |

| | |
|---|---|
| ELEMENTO ARQUITECTONICO QUE SE DESTACA, POR SU GEOMETRIA Y COMPLEJIDAD CONSTRUCTIVA, LO CUAL RESALTA | ESTE ELEMENTO ARQUITECTONICO, LOCALIZADO SOBRE EL FUTURO ACCESO A LA IGLESIA Y EL AUDITORIO. |

**VERIFICACION OBSERVACIONES ACABADOS POLIGONO CHAPINERO**



Se hicieron observaciones en los bloques de recibo de impactos.

Estos bloques construidos en caucho, con un espesor de trece (13) ms, presentan degradación prematura, ante las pruebas realizadas con armas de diferentes calibres



Panorámica, del polígono, donde se le indico al contratista, procedimientos de cómo debe sustentar las observaciones realizadas e iniciar procedimientos de arreglo de conformidad a las observaciones de campo

**VERIFICACION OBSERVACIONES ACABADOS POLIGONO CHAPINERO**




Aspecto de ventilación, duración y maniobra de procedimiento de tiro, fueron evaluadas, como parte del procedimiento de análisis de las condiciones de funcionamiento del. El contratista debe subsanar, cambia no las unidades de bloques en caucho deteriorada, colocar un acabado que permita incrementar la vida útil, por ciclo de impactos, dado que, en análisis efectuado, se deben realizar mantenimientos periódicos, cada dos meses.

Bogotá D.C.,25 de mayo de 2022

Señores
**CONSORCIO INTEROCCIDENTE**
**ING. GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHÓN**
**Representante Legal**
Bogotá

**OFICIO N° TEC406 CONSTRUSAF**

Ref.: **CONTRATO SCJ-1526-2021**


Objeto: **Realizar el mantenimiento y mejoramiento de los equipamientos de infraestructura a cargo de la SDSCJ y agencias.**

Asunto: **CONCEPTO FISURAS Y GRIETAS ESTACIÓN DE POLICÍA QUINTA DE USME.**

Respetado ingeniero

Cordial saludo,

Durante la visita técnica programada el día sábado 24 de mayo de 2022 se identificaron una serie de fisuras y grietas en las fachadas y en algunos muros internos de la edificación como se muestra a continuación:

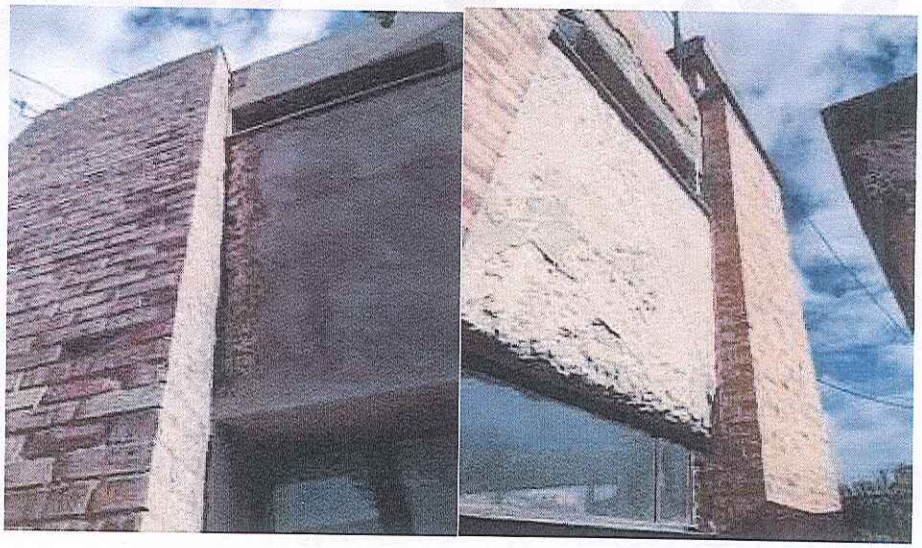


Tv. 21Bis N° 59 - 57 Bogotá - Colombia
PBX: (601) 757 6146
Móvil: 311 288 7795 - 310 200 6783
safridingenieria
safridingenieria@gmail.com
www.safridingenieria.co



*Imagen 1. Fisuras en estructura*

Los elementos que se ven afectados pertenecen al sistema no estructural de la edificación, por lo que la estabilidad y seguridad del sistema principal sismo resistente no se ve afectado (pórticos de concreto en buen estado, sin presencia de fisuras).


Sin embargo, estos daños en los elementos no estructurales que se localizan en algunos muros de las fachadas extruidas y en algunos muros internos de la edificación son de especial cuidado como se explica en los siguientes párrafos.

Las fisuras y grietas presenten en las fachadas extruidas se evidencian en forma de desprendimiento y desplome de los muretes, es decir que las fachadas extruidas se están desconectando de la estructura principal y por lo tanto son elementos inestables que dependen de la trabe original de la construcción.

En ese sentido, al realizar la inspección de dichas trabes se evidencia que la construcción original tiene problemas desde su concepción y que las trabes no fueron ejecutadas de manera correcta como se muestra a continuación:


Tv. 21Bis N° 59 - 57 Bogotá - Colombia
PBX: (601) 757 6146
Móvil: 311 288 7795 - 310 200 6783
safridingenieria
safridingenieria@gmail.com
www.safridingenieria.co

PATOLOGIA DE ESTACION DE POLICIA DE USME

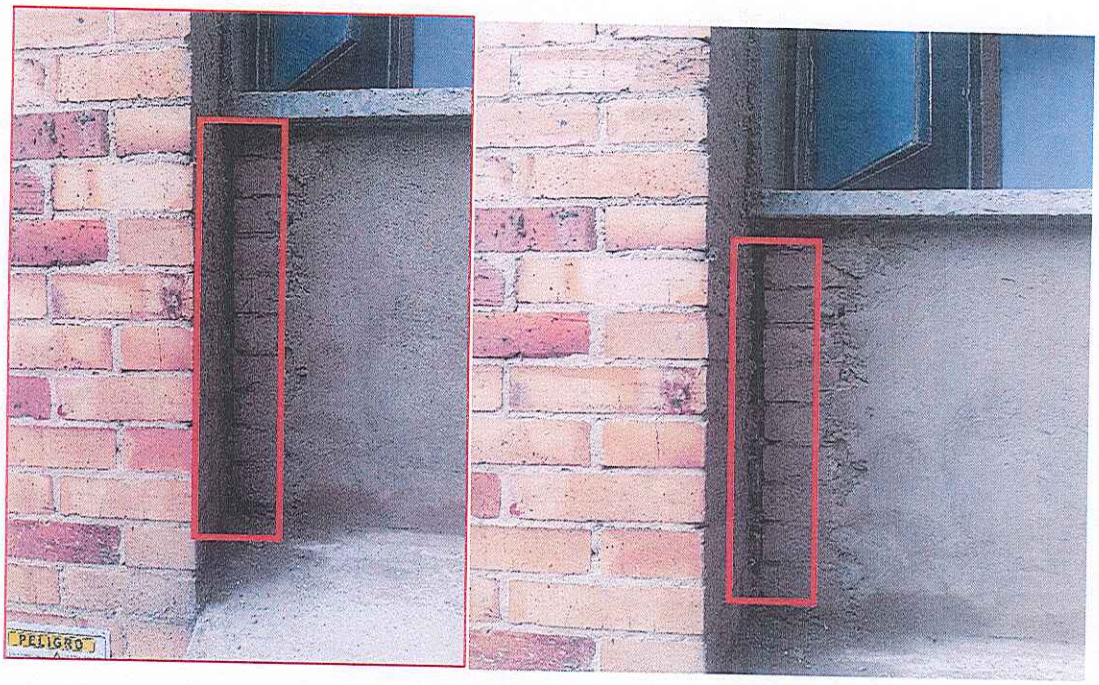



FACHADA COSTADO ORIENTAL PRIMER PISO, CERCA A LA ZONA DE RETENIDOS

Algunos muros perimetrales, se presenta dilataciones, propias del sistema constructivo original, no obstante, estas con el tiempo se han incrementado, por lo cual se hace necesario, generar un monitoreo en un tiempo no menor a seis (6) meses. De acuerdo a instrucciones en la visita y recorrido de obra, se hacen recomendaciones básicas de procedimientos típicos para manejo de juntas constructivas, entre ellas la aplicación de morteros o elementos que no rigidicen la estructura, pero que igualmente, este dentro de los parámetros de seguridad



o

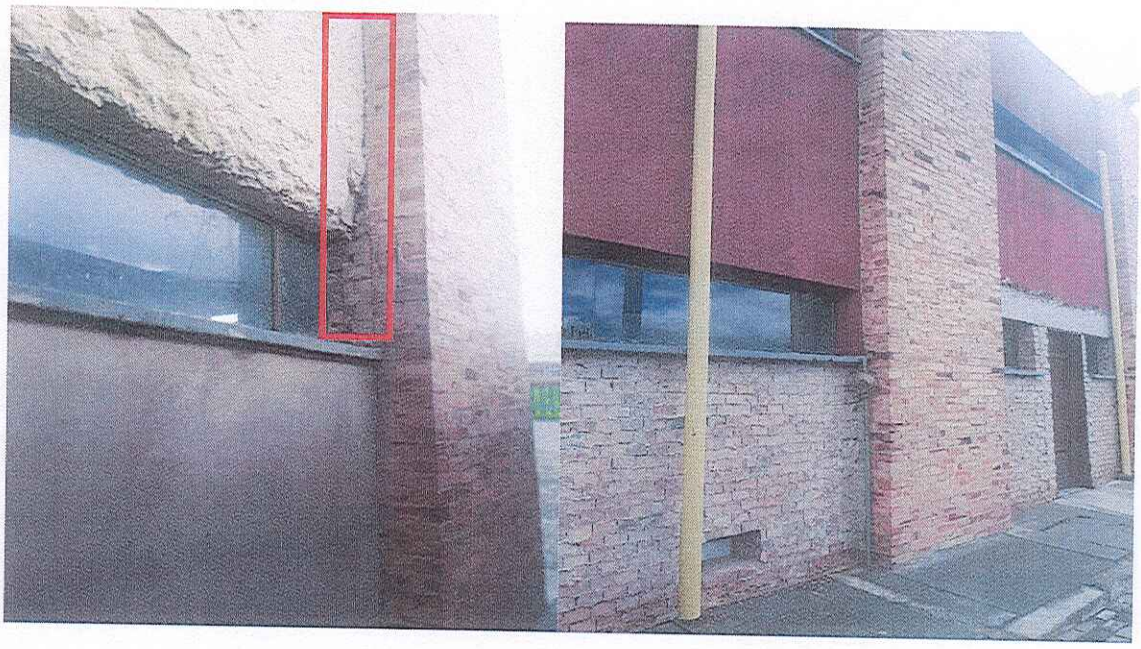

La modulación de la mampostería, con los machones de los vanos de venta, los antepechos de la ventanera, aunado el tiempo de construcción, muy posiblemente asentamientos diferenciales los cuales ya debieron finalizar, generan estas dilataciones entre los componentes o módulos de colocación de la mampostería

PATOLOGIA DE ESTACION DE POLICIA DE USME





Personal en comité técnico y evaluación del avance de obras de mantenimiento en cada una de las estaciones de policía, se evalúa programación, personal en obra, estado de intervención, calidad de la obra, observaciones a loso procedimientos en cada uno de los frentes de trabajo

PATOLOGIA DE ESTACION DE POLICIA DE USME



**Personal adicional, con presencia de profesionales de la oficina de bienes raíces y comando de Estación de Policía Usme**



Estado de la dilatación posterior, donde se debe generar un tratamiento in situ, mediante anclajes, colocación de mortero con malla gallinero, el cual debe envolver el machón de mampostería dilatado




*Imagen 5. Grietas en estructura*

Debido a que los elementos de las fachadas se están moviendo, este movimiento genera desplazamientos relativos en los en los muros divisorios internos que se evidencian en forma de fisuras escalonadas a través de las juntas de mortero de pega.

Esta situación estaba oculta tras el pañete de espesor variable (de 5 a 10 cm de espesor) que fue retirado durante la ejecución de este contrato, por lo que era casi imposible detectar el problema en etapas previas.

En ese sentido se concluye que las fachadas extruidas deben ser intervenidas (ya sea reforzándolas o reconstruyéndolas) bajo una licencia de reforzamiento estructural, la cual se sale del alcance de este contrato.

Por otra parte, cabe aclarar que los daños que se presentan en los elementos no estructurales seguirán un proceso deterioro, ya que posiblemente los desplazamientos de las fachadas seguirán ocurriendo hasta llegar al colapso parcial o total de estos elementos.


Tv. 21 Bis N° 59 - 57 Bogotá - Colombia
PBX: (601) 757 6146
Móvil: 311 288 7795 - 310 200 6783
safridingenieria
safridingenieria@gmail.com
www.safridingenieria.co

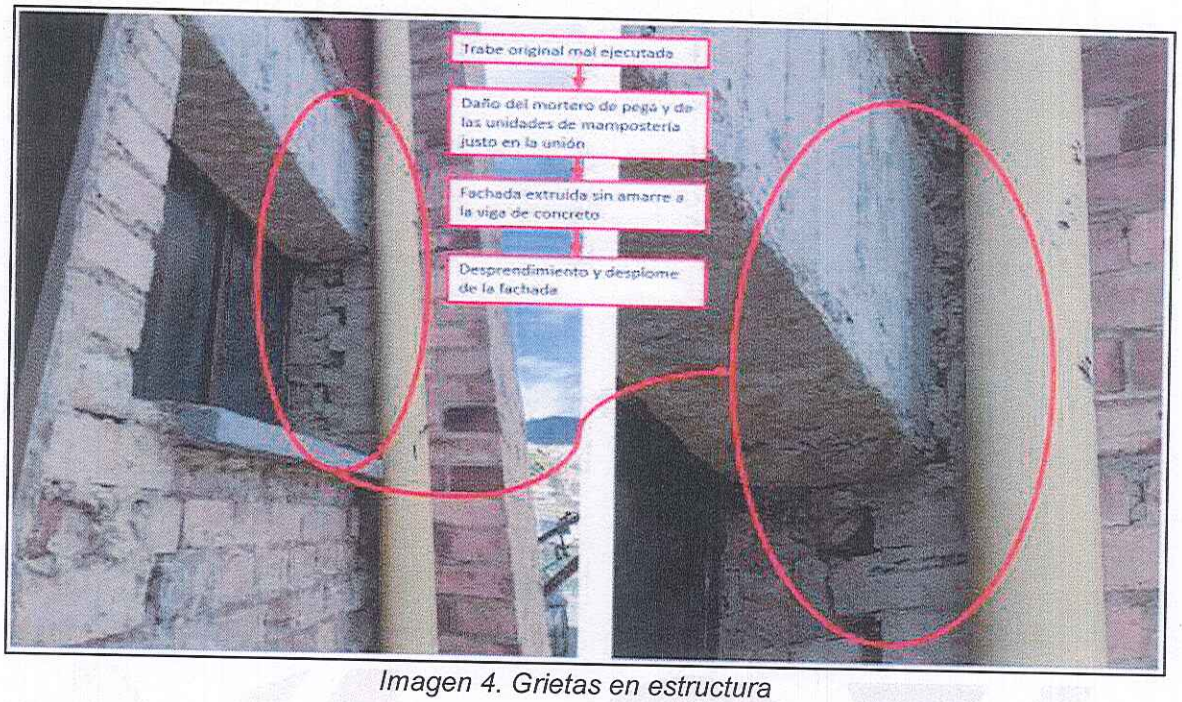



*Imagen 4. Grietas en estructura*

Este tipo de falla es progresivo y puede llevar al colapso parcial o total de las fachadas extruidas que presentan daños como se muestra en la siguiente imagen:


Tv. 21Bis N° 59 - 57 Bogotá - Colombia
PBX: (601) 757 6146
Móvil: 311 288 7795 - 310 200 6783
safridingenieria
safridingenieria@gmail.com
www.safridingenieria.co




*Imagen 5. Grietas en estructura*

Debido a que los elementos de las fachadas se están moviendo, este movimiento genera desplazamientos relativos en los en los muros divisorios internos que se evidencian en forma de fisuras escalonadas a través de las juntas de mortero de pega.

Esta situación estaba oculta tras el pañete de espesor variable (de 5 a 10 cm de espesor) que fue retirado durante la ejecución de este contrato, por lo que era casi imposible detectar el problema en etapas previas.

En ese sentido se concluye que las fachadas extruidas deben ser intervenidas (ya sea reforzándolas o reconstruyéndolas) bajo una licencia de reforzamiento estructural, la cual se sale del alcance de este contrato.


Por otra parte, cabe aclarar que los daños que se presentan en los elementos no estructurales seguirán un proceso deterioro, ya que posiblemente los desplazamientos de las fachadas seguirán ocurriendo hasta llegar al colapso parcial o total de estos elementos.


Tv. 21Bis N° 59 - 57 Bogotá - Colombia
PBX: (601) 757 6146
Móvil: 311 288 7795 - 310 200 6783
safridingenieria
safridingenieria@gmail.com
www.safridingenieria.co

**Conclusiones y recomendaciones**

1. Se debe gestionar una licencia de reforzamiento estructural para intervenir las fachadas extruidas.
2. Se deben colocar testigos de yeso en las zonas afectas y llevar el control de los desplazamientos cada semana.
3. Se debe realizar un plano de fisuras y grietas con la localización, fotografía y fecha de cada uno de los daños presentes en la edificación.

Cordialmente.




David Mauricio Rosero Alvarez
Ingeniero Civil – Magister en Estructuras
Asesor Estructural
M.P. 25202-304377 CND

**Conclusiones y recomendaciones**

1. Se debe gestionar una licencia de reforzamiento estructural para intervenir las fachadas extruidas.
2. Se deben colocar testigos de yeso en las zonas afectas y llevar el control de los desplazamientos cada semana.
3. Se debe realizar un plano de fisuras y grietas con la localización, fotografía y fecha de cada uno de los daños presentes en la edificación.

Cordialmente.



David Mauricio Rosero Alvarez
Ingeniero Civil – Magister en Estructuras
Asesor Estructural
M.P. 25202-304377 CND


Tv. 21 Bis N° 59 - 57 Bogotá - Colombia
PBX: (601) 757 6146
Móvil: 311 288 7795 - 310 200 6783
safridingenieria
safridingenieria@gmail.com
www.safridingenieria.co

BOGOTÁ

**SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**

**INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN**

**SEMANA No 179 de 208 DEL 29-may-22 AL 05-jun-2022**

**Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG**

| Id | Actividad | Duración días | Comienzo | Fin | % programado | % Completado sem Ant | % De desviación | % completado | (-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **601** | **Piso 1 y plaza de acceso** | **0** | **3-01-22** | **14-12-22** | **43,00%** | **45,00%** | **-3,00%** | **46,00%** | **(-) 7 días** | **Actividad Capítulo** |
| 607 | Fragüe de bóveda y descimbrado de formaleta | 20 | 17-06-22 | 9-07-22 | 0,00% | 30,00% | -100,00% | 100,00% | Finalizado | Fragüe de bóveda y descimbrado de formaleta: Piso 2: Descimbrado de placa y acopio de equipo placa curva bóveda ejes 7-11/H-J, Finalizado |
| 608 | Impermeabilización en zona de bóveda y juntas | 30 | 11-07-22 | 13-08-22 | 0,00% | 2,00% | -2,00% | 2,00% | (-) -35 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -35 días |
| 609 | Instalaciones eléctricas | 60 | 17-06-22 | 25-08-22 | 0,00% | 2,00% | -2,00% | 2,00% | (-) -13 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -13 días |
| 612 | Instalaciones climatización | 60 | 17-06-22 | 25-08-22 | 0,00% | 10,00% | -10,00% | 10,00% | (-) -18 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -18 días |
| 613 | Instalaciones red incendio | 60 | 17-06-22 | 25-08-22 | 0,00% | 10,00% | -10,00% | 10,00% | (-) -18 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -18 días |
| 621 | Sellos cortafuego | 30 | 14-03-22 | 19-04-22 | 100,00% | 15,00% | 85,00% | 15,00% | (+) 78 días | Atraso neto duración restante 78 días |
| 624 | Cielo rasos especiales | 101 | 14-03-22 | 11-07-22 | 69,00% | 63,00% | 0,00% | 69,00% | (-) 0 días | Cielo rasos especiales: Piso 1: cielo raso en aluzinc y detallado en tuberías, Con el programa, adelanto 0 días |
| 625 | Carpinteria Metálica | 60 | 14-03-22 | 24-05-22 | 100,00% | 97,00% | 3,00% | 97,00% | (+) 14 días | Atraso neto duración restante 14 días |
| 626 | Pisos húmedos | 30 | 25-05-22 | 28-06-22 | 33,00% | 13,00% | 0,00% | 33,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |
| 627 | Aparatos sanitarios y accesorios | 30 | 25-05-22 | 28-06-22 | 33,00% | 13,00% | 0,00% | 33,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |
| 628 | Pintura | 80 | 26-08-22 | 26-11-22 | 0,00% | 25,00% | -25,00% | 25,00% | (-) -100 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -100 días |
| 629 | Remates generales | 80 | 26-08-22 | 26-11-22 | 0,00% | 2,00% | -2,00% | 2,00% | (-) -80 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -80 días |
| 630 | Pisos plazoletas | 60 | 15-08-22 | 22-10-22 | 0,00% | 5,00% | -5,00% | 5,00% | (-) -71 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -71 días |
| 632 | Luminarias | 50 | 3-08-22 | 29-09-22 | 0,00% | 2,00% | -2,00% | 2,00% | (-) -57 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -57 días |
| **645** | **Sótano** | **0** | **3-01-22** | **14-12-22** | **36,00%** | **37,00%** | **-2,00%** | **38,00%** | **(-) 7 días** | **Actividad Capítulo** |
| 647 | Instalaciones eléctricas | 60 | 11-07-22 | 17-09-22 | 0,00% | 10,00% | -10,00% | 10,00% | (-) -41 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -41 días |
| 649 | Instalaciones seguridad y control | 60 | 11-07-22 | 17-09-22 | 0,00% | 5,00% | -5,00% | 5,00% | (-) -37 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -37 días |
| 650 | Instalaciones climatización | 60 | 11-07-22 | 17-09-22 | 0,00% | 2,00% | -2,00% | 2,00% | (-) -35 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -35 días |
| 651 | Instalaciones red incendio | 60 | 11-07-22 | 17-09-22 | 0,00% | 10,00% | -10,00% | 10,00% | (-) -41 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -41 días |
| 658 | Muros secos | 60 | 3-01-22 | 12-03-22 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | Finalizado | Muros secos: Sótano: Instalación y soldadura de celosías muro curvo ejes 2-5/B-C, Finalizado |
| 662 | Sellos cortafuego | 60 | 14-03-22 | 24-05-22 | 100,00% | 15,00% | 85,00% | 15,00% | (+) 72 días | Atraso neto duración restante 72 días |
| 664 | Cielo rasos especiales | 40 | 15-08-22 | 29-09-22 | 0,00% | 30,00% | -50,00% | 50,00% | (-) -89 días | cielo rasos especiales: Sótano: cuelgas para cielo raso en madera adelanto -89 días |
| 665 | Carpinteria Metálica | 40 | 15-08-22 | 29-09-22 | 0,00% | 20,00% | -20,00% | 20,00% | (-) -76 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -76 días |
| 666 | Pintura | 90 | 15-08-22 | 26-11-22 | 0,00% | 15,00% | -20,00% | 20,00% | (-) -87 días | Pintura: Sótano: Masillado y pintura cielo raso y muros fibrocemento ejes 2-6/C-E, adelanto -87 días |
| 667 | Remates generales | 90 | 15-08-22 | 26-11-22 | 0,00% | 5,00% | -5,00% | 5,00% | (-) -72 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -72 días |
| 669 | Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio) | 60 | 20-08-22 | 28-10-22 | 0,00% | 15,00% | -15,00% | 15,00% | (-) -82 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -82 días |
| 670 | Luminarias | 30 | 30-09-22 | 3-11-22 | 0,00% | 15,00% | -15,00% | 15,00% | (-) -116 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -116 días |
| 672 | Divisiones de oficina | 50 | 30-09-22 | 26-11-22 | 0,00% | 25,00% | -25,00% | 25,00% | (-) -125 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -125 días |

BOGOTÁ

**SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**

**INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN**

**SEMANA No 179 de 208 DEL 29-may-22 AL 05-jun-2022**

**Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG**

| Id | Actividad | Duración días | Comienzo | Fin | % programado | % Completado sem Ant | % De desviación | % completado | (-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Atrio frente 2 y 3 - Consolidado** | | **28-12-18** | **17-12-22** | **81,76%** | **82,65%** | **-1,87%** | **83,63%** | **(-) 8 días** | **Actividad Capítulo** |
| | **Atrio F2 - Consolidado** | | **28-12-18** | **14-12-22** | **86,60%** | **87,05%** | **-1,09%** | **87,69%** | **(-) 8 días** | **Actividad Capítulo** |
| **682** | **Cubierta** | **0** | **14-03-22** | **19-04-22** | **100,00%** | **0,00%** | **100,00%** | **0,00%** | **(+) 63 días** | **Actividad Capítulo** |
| 0 | Radicado factibilidad PONAL | 0 | 30-05-22 | 30-05-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 6 días | Atraso neto duracion retante 6 días |
| 0 | Radicado permiso FAC 60 dias | 0 | 30-05-22 | 30-05-22 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | Finalizado | Terminado |
| 683 | Torre de comunicación | 30 | 14-03-22 | 19-04-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 83 días | Atraso neto duración restante 83 días |
| **716** | **Piso 5** | **0** | **25-01-22** | **26-11-22** | **57,00%** | **59,00%** | **-4,00%** | **61,00%** | **(-) 12 días** | **Actividad Capítulo** |
| 725 | Sellos cortafuego | 30 | 26-01-22 | 1-03-22 | 100,00% | 55,00% | 45,00% | 55,00% | (+) 111 días | Atraso neto duración restante 111 días |
| 729 | Enchapes | 20 | 19-05-22 | 10-06-22 | 75,00% | 45,00% | 0,00% | 75,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |
| 730 | Aparatos sanitarios y accesorios | 30 | 11-06-22 | 15-07-22 | 0,00% | 25,00% | -25,00% | 25,00% | (-) -14 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -14 días |
| 731 | Cielo rasos especiales | 60 | 6-04-22 | 16-06-22 | 83,00% | 73,00% | 0,00% | 83,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |
| 732 | Carpinteria Metálica | 60 | 6-04-22 | 16-06-22 | 83,00% | 73,00% | 0,00% | 83,00% | (-) 0 días | Carpinteria Metálica: Piso 5: tapa gotero fachada oriente ejes 12/B-G, Con el programa, adelanto 0 días |
| 733 | Pintura | 60 | 6-04-22 | 16-06-22 | 83,00% | 73,00% | 0,00% | 83,00% | (-) 0 días | Pintura: Piso 5: Remates en muro de superboard ejes 13-14/D, Con el programa, adelanto 0 días |
| 734 | Remates generales | 80 | 6-04-22 | 9-07-22 | 63,00% | 55,00% | 8,00% | 55,00% | (+) 8 días | Atraso neto duración restante 8 días |
| 735 | Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio) | 30 | 17-06-22 | 21-07-22 | 0,00% | 10,00% | -10,00% | 10,00% | (-) -15 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -15 días |
| 736 | Luminarias | 60 | 17-06-22 | 25-08-22 | 0,00% | 40,00% | -40,00% | 40,00% | (-) -38 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -38 días |
| 737 | Divisiones de oficina | 60 | 17-06-22 | 25-08-22 | 0,00% | 60,00% | -70,00% | 70,00% | (-) -57 días | Divisiones de oficina: Piso 5: Apertura huecos en piso para pivotes puertas ejes 24/C-D, adelanto -57 días |
| 739 | Pisos secos | 45 | 22-07-22 | 12-09-22 | 0,00% | 5,00% | -5,00% | 5,00% | (-) -47 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -47 días |
| **748** | **Piso 4** | **0** | **17-02-22** | **13-12-22** | **53,00%** | **54,00%** | **-6,00%** | **59,00%** | **(-) 14 días** | **Actividad Capítulo** |
| 758 | Sellos cortafuego | 30 | 18-02-22 | 24-03-22 | 100,00% | 55,00% | 45,00% | 55,00% | (+) 88 días | Atraso neto duración restante 88 días |
| 762 | Aparatos sanitarios y accesorios | 30 | 7-05-22 | 10-06-22 | 83,00% | 63,00% | 0,00% | 83,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |
| 763 | Cielo rasos especiales | 60 | 2-05-22 | 9-07-22 | 50,00% | 40,00% | 0,00% | 50,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |
| 764 | Carpinteria Metálica | 60 | 2-05-22 | 9-07-22 | 50,00% | 40,00% | 0,00% | 50,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |
| 765 | Pintura | 120 | 2-05-22 | 17-09-22 | 25,00% | 20,00% | -25,00% | 50,00% | (-) 69 días | Pintura: Piso 4: Pintura en muros cuarto técnico ejes 17-18/B-C, adelanto 69 días |
| 766 | Remates generales | 80 | 2-05-22 | 2-08-22 | 38,00% | 30,00% | 3,00% | 35,00% | (+) 3 días | Resanes generales: Piso 4: Remates en punto fijo escalera ejes 21-22/E-F, Remates en punto fijo escalera ejes 28-29/E-F, Atraso neto duración restante 3 días |
| 767 | Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio) | 30 | 11-07-22 | 13-08-22 | 0,00% | 10,00% | -10,00% | 10,00% | (-) -37 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -37 días |
| 768 | Luminarias | 30 | 11-07-22 | 13-08-22 | 0,00% | 40,00% | -45,00% | 45,00% | (-) -48 días | luminarias: Piso 4: Apertura de huecos en cielo raso para balas iluminación ejes 12-13/C-D, Apertura de huecos para balas iluminación ejes 13-22/E-F, 13-22/C-D, adelanto -48 días |
| 770 | Divisiones de oficina | 60 | 11-07-22 | 17-09-22 | 0,00% | 60,00% | -70,00% | 70,00% | (-) -79 días | Divisiones de oficina: Piso 4: sellado de vidrios mamparas, perfiles mamparas ejes 29/E-F, adelanto -79 días |
| 771 | Pisos secos | 45 | 12-09-22 | 2-11-22 | 0,00% | 5,00% | -5,00% | 5,00% | (-) -96 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -96 días |
| **779** | **Piso 3** | **0** | **12-03-22** | **14-12-22** | **48,00%** | **54,00%** | **-8,00%** | **56,00%** | **(-) 14 días** | **Actividad Capítulo** |
| 789 | Sellos cortafuego | 30 | 14-03-22 | 19-04-22 | 100,00% | 40,00% | 60,00% | 40,00% | (+) 69 días | Atraso neto duración restante 69 días |
| 793 | Aparatos sanitarios y accesorios | 30 | 31-05-22 | 4-07-22 | 17,00% | 20,00% | -3,00% | 20,00% | (-) 28 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto 28 días |

BOGOTÁ

**SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**

**INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN**

**SEMANA No 179 de 208 DEL 29-may-22 AL 05-jun-2022**

**Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG**

| Id | Actividad | Duración días | Comienzo | Fin | % programado | % Completado sem Ant | % De desviación | % completado | (-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 794 | Cielo rasos especiales | 60 | 25-05-22 | 2-08-22 | 17,00% | 55,00% | -43,00% | 60,00% | (-) 28 días | Cielo rasos especiales: Piso 3: anclaje de varillas cielo raso en madera ejes 18-19/B-D, cielo raso en madera ejes 28-29/D-E, cielo raso en madera ejes 19-22/B-D, varillas y tornillo cielo raso en madera ejes 18-2/C-D, adelanto 28 días |
| 795 | Carpinteria Metálica | 60 | 25-05-22 | 2-08-22 | 17,00% | 25,00% | -8,00% | 25,00% | (-) 52 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto 52 días |
| 796 | Pintura | 140 | 25-05-22 | 3-11-22 | 7,00% | 25,00% | -18,00% | 25,00% | (-) 122 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto 122 días |
| 797 | Remates generales | 80 | 25-05-22 | 25-08-22 | 13,00% | 15,00% | -4,00% | 17,00% | (-) 77 días | Resanes generales: Piso 3: Remates punto fijo escalera ejes 13-14/C-D, Sellado de módulos piralu ejes 18-2/D-E, adelanto 77 días |
| 798 | Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio) | 30 | 3-08-22 | 6-09-22 | 0,00% | 10,00% | -10,00% | 10,00% | (-) -59 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -59 días |
| 799 | Divisiones de oficina | 60 | 3-08-22 | 11-10-22 | 0,00% | 60,00% | -80,00% | 80,00% | (-) -108 días | Divisiones de oficina: Piso 3: perfiles mamparas ejes 13/C-D, vidrios mamparas ejes 28-29/D-E, adelanto -108 días |
| 800 | Luminarias | 30 | 3-08-22 | 6-09-22 | 0,00% | 20,00% | -20,00% | 20,00% | (-) -63 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -63 días |
| 802 | Pisos secos | 30 | 12-10-22 | 15-11-22 | 0,00% | 10,00% | -10,00% | 10,00% | (-) -126 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -126 días |
| 804 | Carpinteria Madera | 30 | 12-10-22 | 15-11-22 | 0,00% | 10,00% | -12,00% | 12,00% | (-) -126 días | Carpintería Madera: Piso 3: Enchape frente ascensores, puertas en madera sala de crisis ejes 27-28/D-E, adelanto -126 días |
| | **Atrio F3 - Consolidado** | | **28-12-18** | **17-12-22** | **74,77%** | **76,29%** | **-3,00%** | **77,76%** | **(-) 8 días** | **Actividad Capítulo** |
| **684** | **Piso 6** | **0** | **3-01-22** | **26-11-22** | **55,00%** | **58,00%** | **-7,00%** | **62,00%** | **(-) 14 días** | **Actividad Capítulo** |
| 695 | Sellos cortafuego | 30 | 14-01-22 | 17-02-22 | 100,00% | 75,00% | 25,00% | 75,00% | (+) 117 días | Atraso neto duración restante 117 días |
| 700 | Aparatos sanitarios y accesorios | 30 | 31-05-22 | 4-07-22 | 17,00% | 5,00% | 0,00% | 17,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |
| 701 | Dotación equipos de cocina | 30 | 31-05-22 | 4-07-22 | 17,00% | 0,00% | 17,00% | 0,00% | (+) 6 días | Atraso neto duración restante 6 días |
| 702 | Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio) | 30 | 25-05-22 | 28-06-22 | 33,00% | 13,00% | 0,00% | 33,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |
| 703 | Luminarias | 50 | 25-05-22 | 21-07-22 | 20,00% | 40,00% | -20,00% | 40,00% | (-) 35 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto 35 días |
| 705 | Divisiones de oficina | 60 | 25-05-22 | 2-08-22 | 17,00% | 55,00% | -43,00% | 60,00% | (-) 28 días | Divisiones de oficina: Piso 6: Aplicación silicona vidrios mamparas ejes 28-29/ED-E, Aplicación silicona vidrios mamparas ejes 12-13/F-G, vidrios mamparas ejes 23/C-D, Apertura huecos en piso para pivotes puertas ejes 24/C-D, adelanto 28 días |
| 706 | Pintura | 90 | 5-07-22 | 17-10-22 | 0,00% | 22,00% | -50,00% | 50,00% | (-) -78 días | Pintura: Piso 6: Pintura en muros cuarto técnico ejes 17-18/B-C, adelanto -78 días |
| 707 | Remates generales | 60 | 5-07-22 | 12-09-22 | 0,00% | 20,00% | -50,00% | 50,00% | (-) -61 días | Resanes generales: Piso 6: Remates de muros en lavandería ejes 21-22/D-E, adelanto -61 días |
| 708 | Pisos secos | 45 | 28-07-22 | 17-09-22 | 0,00% | 2,00% | -2,00% | 2,00% | (-) -51 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -51 días |
| 710 | Carpinteria Madera | 30 | 1-09-22 | 5-10-22 | 0,00% | 5,00% | -5,00% | 5,00% | (-) -85 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -85 días |
| **810** | **Piso 2** | **0** | **5-04-22** | **14-12-22** | **38,00%** | **41,00%** | **-7,00%** | **45,00%** | **(-) 14 días** | **Actividad Capítulo** |
| 813 | Instalaciones eléctricas | 45 | 6-04-22 | 30-05-22 | 100,00% | 98,00% | 2,00% | 98,00% | (+) 7 días | Atraso neto duración restante 7 días |
| 814 | Instalaciones voz y datos | 60 | 6-04-22 | 16-06-22 | 83,00% | 73,00% | 0,00% | 83,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |
| 815 | Instalaciones seguridad y control | 60 | 6-04-22 | 16-06-22 | 83,00% | 73,00% | 0,00% | 83,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |
| 816 | Instalaciones climatización | 60 | 6-04-22 | 16-06-22 | 83,00% | 73,00% | 0,00% | 83,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |
| 817 | Instalaciones red incendio | 60 | 6-04-22 | 16-06-22 | 83,00% | 73,00% | 0,00% | 83,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |

BOGOTÁ

**SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**

**INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN**

**SEMANA No 179 de 208 DEL 29-may-22 AL 05-jun-2022**

**Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG**

| Id | Actividad | Duración días | Comienzo | Fin | % programado | % Completado sem Ant | % De desviación | % completado | (-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1026 | Jardines y mobiliario urbano | 78 | 16-09-22 | 16-12-22 | 0,00% | 20,00% | -25,00% | 25,00% | (-) -119 días | Jardines y mobiliario urbano: Obras exteriores (parqueadero): rejilla bajo bancas, Limpieza de tubulares de cerramiento y retiro de sobrante antepecho ejes 1-2/A, adelanto -119 días |
| **1029** | **Obras exteriores (Volteadero)** | **0** | **25-03-22** | **17-12-22** | **28,00%** | **0,00%** | **28,00%** | **0,00%** | **(+) 49 días** | **Actividad Capítulo** |
| 1030 | Rellenos | 60 | 25-03-22 | 4-06-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 72 días | Atraso neto duración restante 72 días |
| 1031 | Redes | 60 | 2-05-22 | 9-07-22 | 50,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | (+) 34 días | Atraso neto duración restante 34 días |
| **1037** | **Obras exteriores (zonas verdes de cesión)** | **0** | **11-05-22** | **1-12-22** | **19,00%** | **0,00%** | **19,00%** | **0,00%** | **(+) 21 días** | **Actividad Capítulo** |
| 0 | Aprobación actualización plano urbanístico aprobado por curaduría (Fuente: SDCSJ) | 0 | 2-05-22 | 2-05-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 34 días | Atraso neto duración restante 34 días |
| 0 | Pago acutualización plano urbanistico | 0 | 2-05-22 | 2-05-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 34 días | Atraso neto duración restante 34 días |
| 0 | Radicado IDRD (U Nacional) | 0 | 2-05-22 | 9-07-22 | 40,00% | 0,00% | 40,00% | 0,00% | (+) 27 días | Atraso neto duración restante 27 días |
| 0 | Radicado IDU glorieta de retorno (U Nacional) | 0 | 2-05-22 | 27-07-22 | 32,00% | 0,00% | 32,00% | 0,00% | (+) 28 días | Atraso neto duración restante 28 días |
| 0 | Radicado IDU verificación plazoleta de acceso Cr 60 (CSUDC) | 0 | 2-05-22 | 27-07-22 | 32,00% | 0,00% | 32,00% | 0,00% | (+) 28 días | Atraso neto duración restante 28 días |
| 1038 | Inicio | 0 | 11-05-22 | 11-05-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 25 días | Atraso neto duración restante 25 días |
| 1039 | Movimiento de tierras | 30 | 11-05-22 | 15-06-22 | 71,00% | 0,00% | 71,00% | 0,00% | (+) 25 días | Atraso neto duración restante 25 días |
| 1040 | Conexión desagües | 30 | 11-05-22 | 15-06-22 | 71,00% | 0,00% | 71,00% | 0,00% | (+) 25 días | Atraso neto duración restante 25 días |
| 1042 | Obras de arte y concretos | 40 | 20-07-22 | 5-09-22 | 0,00% | 1,00% | -1,00% | 1,00% | (-) -43 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -43 días |
| 1044 | Jardines y mobiliario urbano | 45 | 16-09-22 | 8-11-22 | 0,00% | 1,00% | -1,00% | 1,00% | (-) -98 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -98 días |
| **482** | **TRAMITES OBTENCION DE SERVICIOS PÚBLICOS** | **0** | **19-07-21** | **5-12-22** | **84,00%** | **64,00%** | **20,00%** | **64,00%** | **(+) 49 días** | **Actividad Capítulo** |
| **484** | **Tramites para servicios de EAAB** | **0** | **19-07-21** | **28-03-22** | **100,00%** | **99,00%** | **1,00%** | **99,00%** | **(+) 49 días** | **Actividad Capítulo** |
| **493** | **Permiso de ocupación de cauce ante la Secretaria de Ambiente** | **0** | **19-07-21** | **28-03-22** | **100,00%** | **97,00%** | **3,00%** | **97,00%** | **(+) 49 días** | **Actividad Capítulo** |
| 498 | trámite interno SDA (Estudio) | 90 | 13-12-21 | 28-03-22 | 100,00% | 93,00% | 7,00% | 93,00% | (+) 76 días | Atraso neto duración restante 76 días |
| 499 | Obtención permiso de ocupación de cauce | 0 | 28-03-22 | 28-03-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 69 días | Atraso neto duración restante 69 días |
| **513** | **Trámites domiciliarias energía eléctrica CODENSA** | **0** | **19-07-21** | **5-12-22** | **63,00%** | **57,00%** | **6,00%** | **57,00%** | **(+) 63 días** | **Actividad Capítulo** |
| 518 | Tramite CODENSA aprobación proyecto serie 6 | 96 | 3-01-22 | 26-04-22 | 100,00% | 75,00% | 25,00% | 75,00% | (+) 68 días | Atraso neto duración restante 68 días |
| 395 | Aseo general de obra | 634 | 9-11-20 | 29-12-21 | 77,00% | 76,00% | 0,00% | 77,00% | (-) 0 días | Aseo general de obra: Piso 3: Aseo general de piso, Con el programa, adelanto 0 días |
| | | | | | | | | | * | R. Critica:35 días |
| | | | | | | | | | * | R. Critica Ant:28 días |

El porcentaje programado es 79,68% y el ejecutado es 79,69% con un adelanto de -1 días. El porcentaje de influencia de las zonas de cesión en el acumulado seria si se estuvieran ejecutando de 0,20% para un total ejecutado de 79,89%.

La programación presenta las siguientes alarmas para ser atendidas lo antes posible y corregir la desviación que puede llegar a influenciar la terminación del proyecto:
-En el frente 1 Auditorio: Ejecutar el reforzamiento de la estructura de la cubierta, previo modificatorio.
-En el Frente 2 y 3 Atrio y 4 Plazoleta: Radicar la solicitud de torre de comunicaciones en el municipio. Ejecutar los remates generales terminar pisos de arriba hacia abajo, corregir desviación de la ejecución de sellos corta fuego. Plantear una estrategia para culminar conexiones de sistemas posteriores a montaje de mobiliario.
-En el Frente 5 exteriores: la solución se genera con la aprobación del plano urbano en curaduría para poder iniciar procesos de análisis del proyecto serie 6 en condesa, precisar el diseño urbano e hidráulico del acceso vehicular por la Cr 56. Obtener el permiso de ocupación del cauce para poder conectar redes de EAAB.

El personal programado en obra es de 95 y el real es de 94.

*

Actividad Capítulo

| Descripción | Oficial en obra Sem 179 | Ayudante en obra Sem 179 | Oficial Programado Sem 179 | Ayudante programado Sem 179 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acabados | 19 | 10 | 21 | 14 | * |
| Carpintería Metálica | 3 | 0 | 7 | 5 | * |
| Cielo | 10 | 0 | 12 | 8 | * |
| Climatización | 4 | 0 | 2 | 1 | * |

BOGOTÁ


**SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**

**INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN**

**SEMANA No** **179 de 208** DEL **29-may-22** AL **05-jun-2022**

**Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG**

| Id | Actividad | Duración días | Comienzo | Fin | % programado | % Completado sem Ant | % De desviación | % completado | (-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Divisiones | | 14 | 0 | 1 | 1 | | | * | |
| | Eléctrico | | 4 | 4 | 0 | 0 | | | * | |
| | Estructura | | 10 | 1 | 4 | 2 | | | * | |
| | Fachada | | 6 | 0 | 1 | 1 | | | * | |
| | Hidrosanitarias | | 1 | 0 | 1 | 1 | | | * | |
| | Incendio | | 3 | 0 | 2 | 1 | | | * | |
| | Luminarias | | 3 | 0 | 1 | 1 | | | * | |
| | Vias | | 2 | 0 | 1 | 1 | | | * | |
| | Total | | 94,00 | | 95,00 | | | | * | |

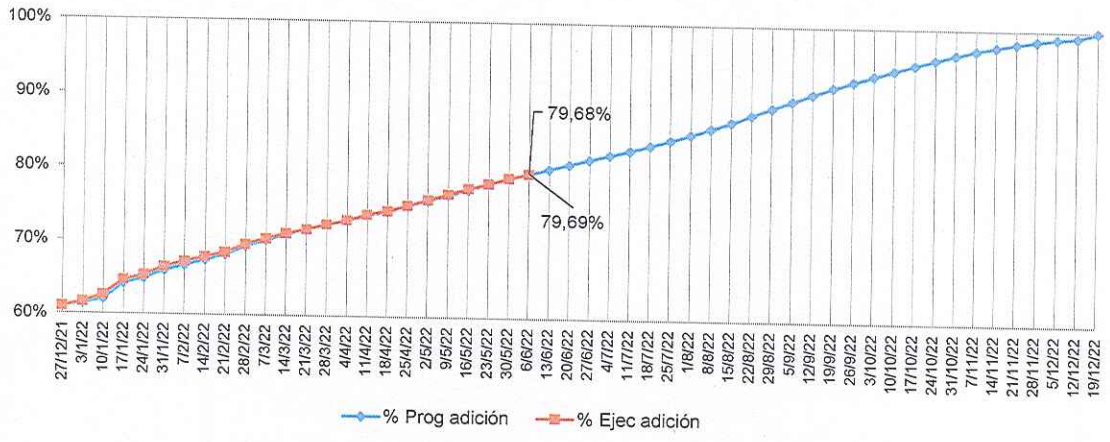


*

*

BOGOTÁ

**SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**

**INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN**

**SEMANA No** **179 de 208** DEL **29-may-22** AL **05-jun-2022**

**Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG**

| Id | Actividad | Duración días | Comienzo | Fin | % programado | % Completado sem Ant | % De desviación | % completado | (-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PROGRAMA AVANCE PORCENTUAL POR CAPÍTULO | | | | | * | |
| | **Preliminares y obras Generales** | | | | **100,00%** | **100,00%** | | **100,00%** | * | **Actividad Capítulo** |
| | **Estructura** | | | | **94,42%** | **94,65%** | | **94,84%** | * | **Actividad Capítulo** |
| | **Obra gris** | | | | **97,88%** | **97,91%** | | **97,91%** | * | **Actividad Capítulo** |
| | **Acabados** | | | | **68,80%** | **68,67%** | | **69,95%** | * | **Actividad Capítulo** |
| | | | | PROGRAMA CONSOLIDADO | | | | | * | |
| 0 | reprogramacion 3 v19 | | 28-12-18 | 17-12-22 | 79,68% | 79,05% | -0,02% | 79,69% | (-) 1 días | Actividad Capítulo |
| | | | | PROGRAMA CONSOLIDADO POR FRENTES | | | | | * | |
| | **Auditorio F1 - Consolidado** | | 28-12-18 | 14-12-22 | 73,27% | 69,38% | 3,39% | 69,88% | (+) 30 días | Actividad Capítulo |
| 535 | **Piso 3** | **0** | **3-01-22** | **14-12-22** | **41,00%** | **8,00%** | **33,00%** | **8,00%** | **(+) 77 días** | **Actividad Capítulo** |
| 537 | Posible reforzamiento cubierta | 60 | 26-01-22 | 5-04-22 | 100,00% | 60,00% | 40,00% | 60,00% | (+) 89 días | Atraso neto duración restante 89 días |
| 538 | Cubierta auditorio (remate) | 32 | 6-04-22 | 14-05-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 60 días | Atraso neto duración restante 60 días |
| 539 | Fachada auditorio | 120 | 14-03-22 | 2-08-22 | 58,00% | 44,00% | 9,00% | 49,00% | (+) 13 días | Fachada auditorio: Piso 3: pulida de estructura metálica, retiro de pintura estructura metálica, Atraso neto duración restante 13 días |
| 540 | Instalaciones hidrosanitarias | 30 | 6-04-22 | 12-05-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 60 días | Atraso neto duración restante 60 días |
| 541 | Instalaciones eléctricas | 90 | 6-04-22 | 21-07-22 | 56,00% | 0,00% | 56,00% | 0,00% | (+) 59 días | Atraso neto duración restante 59 días |
| 542 | Instalaciones voz y datos | 90 | 6-04-22 | 21-07-22 | 56,00% | 0,00% | 56,00% | 0,00% | (+) 59 días | Atraso neto duración restante 59 días |
| 543 | Instalaciones seguridad y control | 90 | 6-04-22 | 21-07-22 | 56,00% | 0,00% | 56,00% | 0,00% | (+) 59 días | Atraso neto duración restante 59 días |
| 544 | Instalaciones climatización | 90 | 6-04-22 | 21-07-22 | 56,00% | 36,00% | 20,00% | 36,00% | (+) 21 días | Atraso neto duración restante 21 días |
| 545 | Instalaciones red incendio | 90 | 6-04-22 | 21-07-22 | 56,00% | 0,00% | 56,00% | 0,00% | (+) 59 días | Atraso neto duración restante 59 días |
| 546 | Muros secos | 60 | 6-04-22 | 16-06-22 | 83,00% | 0,00% | 83,00% | 0,00% | (+) 59 días | Atraso neto duración restante 59 días |
| 547 | Sellos cortafuego | 30 | 6-04-22 | 12-05-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 60 días | Atraso neto duración restante 60 días |
| 548 | Cielo rasos en fibrocemento | 60 | 6-04-22 | 16-06-22 | 83,00% | 0,00% | 83,00% | 0,00% | (+) 59 días | Atraso neto duración restante 59 días |
| 549 | Cielo rasos especiales | 60 | 6-04-22 | 16-06-22 | 83,00% | 2,00% | 81,00% | 2,00% | (+) 58 días | Atraso neto duración restante 58 días |
| 550 | Carpinteria Metálica | 60 | 6-04-22 | 16-06-22 | 83,00% | 5,00% | 78,00% | 5,00% | (+) 55 días | Atraso neto duración restante 55 días |
| 556 | Pisos húmedos | 50 | 13-05-22 | 9-07-22 | 40,00% | 0,00% | 40,00% | 0,00% | (+) 23 días | Atraso neto duración restante 23 días |
| **566** | **Piso 2 y plaza armas** | **0** | **3-01-22** | **8-12-22** | **55,00%** | **50,00%** | **4,00%** | **51,00%** | **(+) 14 días** | **Actividad Capítulo** |
| 569 | Impermeabilización remate en perimetro de auditorio | 60 | 25-05-22 | 2-08-22 | 17,00% | 7,00% | 0,00% | 17,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |
| 570 | Instalaciones hidrosanitarias | 120 | 3-01-22 | 24-05-22 | 100,00% | 95,00% | 5,00% | 95,00% | (+) 19 días | Atraso neto duración restante 19 días |
| 571 | Instalaciones eléctricas | 120 | 3-01-22 | 24-05-22 | 100,00% | 95,00% | 5,00% | 95,00% | (+) 19 días | Atraso neto duración restante Con el programa, adelanto 19 días |
| 572 | Instalaciones voz y datos | 120 | 3-01-22 | 24-05-22 | 100,00% | 95,00% | 5,00% | 95,00% | (+) 19 días | Atraso neto duración restante Con el programa, adelanto 19 días |
| 573 | Instalaciones seguridad y control | 120 | 3-01-22 | 24-05-22 | 100,00% | 95,00% | 5,00% | 95,00% | (+) 19 días | Atraso neto duración restante 19 días |
| 574 | Instalaciones climatización | 120 | 3-01-22 | 24-05-22 | 100,00% | 95,00% | 5,00% | 95,00% | (+) 19 días | Atraso neto duración restante Con el programa, adelanto 19 días |
| 575 | Instalaciones red incendio | 120 | 3-01-22 | 24-05-22 | 100,00% | 95,00% | 5,00% | 95,00% | (+) 19 días | Atraso neto duración restante Con el programa, adelanto 19 días |
| 579 | Pisos plazoletas remates perimetro auditorio | 60 | 3-08-22 | 11-10-22 | 0,00% | 5,00% | -5,00% | 5,00% | (-) -59 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -59 días |
| 580 | Enchapes | 60 | 25-05-22 | 2-08-22 | 17,00% | 7,00% | 0,00% | 17,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |
| 581 | Sellos cortafuego | 45 | 12-04-22 | 4-06-22 | 100,00% | 47,00% | 53,00% | 47,00% | (+) 29 días | Atraso neto duración restante 29 días |
| 582 | Cielo rasos en fibrocemento | 60 | 13-05-22 | 21-07-22 | 33,00% | 23,00% | 0,00% | 33,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |
| 583 | Cielo rasos especiales | 60 | 13-05-22 | 21-07-22 | 33,00% | 23,00% | 10,00% | 23,00% | (+) 7 días | Atraso neto duración restante 7 días |
| 584 | Carpinteria Metálica | 60 | 13-05-22 | 21-07-22 | 33,00% | 23,00% | 10,00% | 23,00% | (+) 7 días | Atraso neto duración restante 7 días |
| 585 | Pintura | 120 | 25-05-22 | 11-10-22 | 8,00% | 3,00% | 5,00% | 3,00% | (+) 7 días | Atraso neto duración restante 7 días |
| 586 | Remates generales | 80 | 29-06-22 | 29-09-22 | 0,00% | 1,00% | -1,00% | 1,00% | (-) -24 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -24 días |
| 588 | Pisos húmedos | 30 | 25-05-22 | 28-06-22 | 33,00% | 15,00% | 0,00% | 33,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |

BOGOTÁ

**SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**

**INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN**

**SEMANA No 180 de 208 DEL 05-jun-22 AL 12-jun-2022**

**Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG**

| Id | Actividad | Duración días | Comienzo | Fin | % programado | % Completado sem Ant | % De desviación | % completado | (-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PROGRAMA AVANCE PORCENTUAL POR CAPÍTULO | | | | | * | |
| | **Preliminares y obras Generales** | | | | **100,00%** | **100,00%** | | **100,00%** | * | **Actividad Capítulo** |
| | **Estructura** | | | | **94,88%** | **94,84%** | | **94,98%** | * | **Actividad Capítulo** |
| | **Obra gris** | | | | **97,88%** | **97,91%** | | **97,91%** | * | **Actividad Capítulo** |
| | **Acabados** | | | | **69,89%** | **69,95%** | | **71,20%** | * | **Actividad Capítulo** |
| | | | | PROGRAMA CONSOLIDADO | | | | | * | |
| **0** | **reprogramacion 3 v19** | | **28-12-18** | **17-12-22** | **80,34%** | **79,69%** | **-0,01%** | **80,35%** | **(-) 1 días** | **Actividad Capítulo** |
| | | | | PROGRAMA CONSOLIDADO POR FRENTES | | | | | * | |
| | **Auditorio F1 - Consolidado** | | **28-12-18** | **14-12-22** | **74,13%** | **69,88%** | **3,37%** | **70,76%** | **(+) 37 días** | **Actividad Capítulo** |
| **535** | **Piso 3** | **0** | **3-01-22** | **14-12-22** | **45,00%** | **8,00%** | **36,00%** | **9,00%** | **(+) 84 días** | **Actividad Capítulo** |
| 537 | Posible reforzamiento cubierta | 60 | 26-01-22 | 5-04-22 | 100,00% | 60,00% | 40,00% | 60,00% | (+) 96 días | Atraso neto duración restante 96 días |
| 538 | Cubierta auditorio (remate) | 32 | 6-04-22 | 14-05-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 67 días | Atraso neto duración restante 67 días |
| 0 | Reparación pintura intumescente | 18 | 6-06-22 | 25-06-22 | 33,00% | 0,00% | 0,00% | 33,00% | (+) 0 días | Reparación pintura intumescente: Piso 2: Aplicación de pintura intumescente fachadas sur, Raspado de estructura metálica fachada sur, Retiro de pintura fachada sur eje F, Con el programa, adelanto 0 días |
| 539 | Fachada auditorio | 120 | 14-03-22 | 2-08-22 | 63,00% | 49,00% | 0,00% | 63,00% | (+) 0 días | Fachada auditorio: Piso 2: parapeto en cubierta, Aplicación de pintura acabado estructura metálica fachada oriente, Hechura de parapeto oriental en cubierta, Con el programa, adelanto 0 días |
| 540 | Instalaciones hidrosanitarias | 30 | 6-04-22 | 12-05-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 67 días | Atraso neto duración restante 67 días |
| 541 | Instalaciones eléctricas | 90 | 6-04-22 | 21-07-22 | 62,00% | 0,00% | 62,00% | 0,00% | (+) 66 días | Atraso neto duración restante 66 días |
| 542 | Instalaciones voz y datos | 90 | 6-04-22 | 21-07-22 | 62,00% | 0,00% | 62,00% | 0,00% | (+) 66 días | Atraso neto duración restante 66 días |
| 543 | Instalaciones seguridad y control | 90 | 6-04-22 | 21-07-22 | 62,00% | 0,00% | 62,00% | 0,00% | (+) 66 días | Atraso neto duración restante 66 días |
| 544 | Instalaciones climatización | 90 | 6-04-22 | 21-07-22 | 62,00% | 36,00% | 26,00% | 36,00% | (+) 28 días | Atraso neto duración restante 28 días |
| 545 | Instalaciones red incendio | 90 | 6-04-22 | 21-07-22 | 62,00% | 0,00% | 62,00% | 0,00% | (+) 66 días | Atraso neto duración restante 66 días |
| 546 | Muros secos | 60 | 6-04-22 | 16-06-22 | 93,00% | 0,00% | 93,00% | 0,00% | (+) 66 días | Atraso neto duración restante 66 días |
| 547 | Sellos cortafuego | 30 | 6-04-22 | 12-05-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 67 días | Atraso neto duración restante 67 días |
| 548 | Cielo rasos en fibrocemento | 60 | 6-04-22 | 16-06-22 | 93,00% | 0,00% | 93,00% | 0,00% | (+) 66 días | Atraso neto duración restante 66 días |
| 549 | Cielo rasos especiales | 60 | 6-04-22 | 16-06-22 | 93,00% | 2,00% | 91,00% | 2,00% | (+) 65 días | Atraso neto duración restante 65 días |
| 550 | Carpinteria Metálica | 60 | 6-04-22 | 16-06-22 | 93,00% | 5,00% | 88,00% | 5,00% | (+) 62 días | Atraso neto duración restante 62 días |
| 556 | Pisos húmedos | 50 | 13-05-22 | 9-07-22 | 52,00% | 0,00% | 52,00% | 0,00% | (+) 30 días | Atraso neto duración restante 30 días |
| **566** | **Piso 2 y plaza armas** | **0** | **3-01-22** | **8-12-22** | **57,00%** | **51,00%** | **2,00%** | **55,00%** | **(+) 28 días** | **Actividad Capítulo** |
| 569 | Impermeabilización remate en perimetro de auditorio | 60 | 25-05-22 | 2-08-22 | 27,00% | 17,00% | 0,00% | 27,00% | (-) 0 días | Con el programa, adelanto 0 días |
| 570 | Instalaciones hidrosanitarias | 120 | 3-01-22 | 24-05-22 | 100,00% | 95,00% | 3,00% | 97,00% | (+) 23 días | Atraso neto duración restante 23 días |
| 571 | Instalaciones eléctricas | 120 | 3-01-22 | 24-05-22 | 100,00% | 95,00% | 3,00% | 97,00% | (+) 23 días | Atraso neto duración restante Con el programa, adelanto 23 días |
| 572 | Instalaciones voz y datos | 120 | 3-01-22 | 24-05-22 | 100,00% | 95,00% | 3,00% | 97,00% | (+) 23 días | Atraso neto duración restante Con el programa, adelanto 23 días |
| 573 | Instalaciones seguridad y control | 120 | 3-01-22 | 24-05-22 | 100,00% | 95,00% | 3,00% | 97,00% | (+) 23 días | Atraso neto duración restante 23 días |
| 574 | Instalaciones climatización | 120 | 3-01-22 | 24-05-22 | 100,00% | 95,00% | 3,00% | 97,00% | (+) 23 días | Instalaciones climatización: Piso 2: ducto A/C eje H-I/2-6, Atraso neto duración restante Con el programa, adelanto 23 días |
| 579 | Pisos plazoletas remates perimetro auditorio | 60 | 3-08-22 | 11-10-22 | 0,00% | 5,00% | -5,00% | 5,00% | (-) -53 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -53 días |
| 580 | Enchapes | 60 | 25-05-22 | 2-08-22 | 27,00% | 17,00% | 0,00% | 27,00% | (-) 0 días | Con el programa, adelanto 0 días |
| 581 | Sellos cortafuego | 45 | 12-04-22 | 4-06-22 | 100,00% | 47,00% | 53,00% | 47,00% | (+) 36 días | Atraso neto duración restante 36 días |

BOGOTÁ

**SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**

**INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN**

**SEMANA No 180 de 208 DEL 05-jun-22 AL 12-jun-2022**

**Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG**

| Id | Actividad | Duración días | Comienzo | Fin | % programado | % Completado sem Ant | % De desviación | % completado | (-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 582 | Cielo rasos en fibrocemento | 60 | 13-05-22 | 21-07-22 | 43,00% | 33,00% | 0,00% | 43,00% | (-) 0 días | Con el programa, adelanto 0 días |
| 583 | Cielo rasos especiales | 60 | 13-05-22 | 21-07-22 | 43,00% | 23,00% | 0,00% | 43,00% | (+) 0 días | Con el programa, adelanto 0 días |
| 584 | Carpinteria Metálica | 60 | 13-05-22 | 21-07-22 | 43,00% | 23,00% | 0,00% | 43,00% | (+) 0 días | Con el programa, adelanto 0 días |
| 585 | Pintura | 120 | 25-05-22 | 11-10-22 | 13,00% | 3,00% | 0,00% | 13,00% | (+) 0 días | Con el programa, adelanto 0 días |
| 586 | Remates generales | 80 | 29-06-22 | 29-09-22 | 0,00% | 1,00% | -1,00% | 1,00% | (-) -17 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -17 días |
| 588 | Pisos húmedos | 30 | 25-05-22 | 28-06-22 | 53,00% | 33,00% | 0,00% | 53,00% | (-) 0 días | Con el programa, adelanto 0 días |
| **601** | **Piso 1 y plaza de acceso** | **0** | **3-01-22** | **14-12-22** | **45,00%** | **46,00%** | **-2,00%** | **47,00%** | **(-) 7 días** | **Actividad Capítulo** |
| 607 | Fragüe de bóveda y descimbrado de formaleta | 20 | 17-06-22 | 9-07-22 | 0,00% | 100,00% | -100,00% | 100,00% | Finalizado | Terminado |
| 608 | Impermeabilización en zona de bóveda y juntas | 30 | 11-07-22 | 13-08-22 | 0,00% | 2,00% | -2,00% | 2,00% | (-) -28 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -28 días |
| 609 | Instalaciones eléctricas | 60 | 17-06-22 | 25-08-22 | 0,00% | 2,00% | -2,00% | 2,00% | (-) -6 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -6 días |
| 612 | Instalaciones climatización | 60 | 17-06-22 | 25-08-22 | 0,00% | 10,00% | -15,00% | 15,00% | (-) -15 días | Instalaciones climatización: Piso 1: soportes de tubería cobre para A/C eje 2-6/F-H, tubería cobre refrigerante para A/C, alojamientos, tubería de cobre forrada en rubatex A/C 3/4y 5/8 11/4, adelanto -15 días |
| 613 | Instalaciones red incendio | 60 | 17-06-22 | 25-08-22 | 0,00% | 10,00% | -10,00% | 10,00% | (-) -11 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -11 días |
| 621 | Sellos cortafuego | 30 | 14-03-22 | 19-04-22 | 100,00% | 15,00% | 85,00% | 15,00% | (+) 85 días | Atraso neto duración restante 85 días |
| 624 | Cielo rasos especiales | 101 | 14-03-22 | 11-07-22 | 75,00% | 69,00% | 0,00% | 75,00% | (-) 0 días | Cielo rasos especiales: Piso 1: cielo raso en aluzinc baños, cielo raso en madera eje 23-6/F-H, cielo raso en madera eje F-H'/1-5, Maquillaje estructuras en concreto e instalación de cielo raso en madera eje 2-6/F-H', Con el programa, adelanto 0 días |
| 625 | Carpinteria Metálica | 60 | 14-03-22 | 24-05-22 | 100,00% | 97,00% | 3,00% | 97,00% | (+) 21 días | Atraso neto duración restante 21 días |
| 626 | Pisos húmedos | 30 | 25-05-22 | 28-06-22 | 53,00% | 33,00% | 0,00% | 53,00% | (-) 0 días | Con el programa, adelanto 0 días |
| 627 | Aparatos sanitarios y accesorios | 30 | 25-05-22 | 28-06-22 | 53,00% | 33,00% | 0,00% | 53,00% | (-) 0 días | Con el programa, adelanto 0 días |
| 628 | Pintura | 80 | 26-08-22 | 26-11-22 | 0,00% | 25,00% | -30,00% | 30,00% | (-) -97 días | Pintura: Piso 1: Detallado de muros secos para aplicación pintura eje F-H'/1-5, Remate de masillado de muros fibrocemento eje 2-6/F-H, adelanto -97 días |
| 629 | Remates generales | 80 | 26-08-22 | 26-11-22 | 0,00% | 2,00% | -5,00% | 5,00% | (-) -76 días | Resanes generales: Piso 1: Sellado de fisuras en mortero eje F-H'/1-5, adelanto -76 días |
| 630 | Pisos plazoletas | 60 | 15-08-22 | 22-10-22 | 0,00% | 5,00% | -5,00% | 5,00% | (-) -64 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -64 días |
| 632 | Luminarias | 50 | 3-08-22 | 29-09-22 | 0,00% | 2,00% | -2,00% | 2,00% | (-) -50 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -50 días |
| **645** | **Sótano** | **0** | **3-01-22** | **14-12-22** | **36,00%** | **38,00%** | **-3,00%** | **39,00%** | **(-) 7 días** | **Actividad Capítulo** |
| 647 | Instalaciones eléctricas | 60 | 11-07-22 | 17-09-22 | 0,00% | 10,00% | -10,00% | 10,00% | (-) -34 días | adelanto -34 días |
| 649 | Instalaciones seguridad y control | 60 | 11-07-22 | 17-09-22 | 0,00% | 5,00% | -5,00% | 5,00% | (-) -31 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -31 días |
| 650 | Instalaciones climatización | 60 | 11-07-22 | 17-09-22 | 0,00% | 2,00% | -2,00% | 2,00% | (-) -29 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -29 días |
| 651 | Instalaciones red incendio | 60 | 11-07-22 | 17-09-22 | 0,00% | 10,00% | -10,00% | 10,00% | (-) -34 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -34 días |

BOGOTÁ

**SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**

**INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN**

**SEMANA No 180 de 208 DEL 05-jun-22 AL 12-jun-2022**

**Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG**

| Id | Actividad | Duración días | Comienzo | Fin | % programado | % Completado sem Ant | % De desviación | % completado | (-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 658 | Muros secos | 60 | 3-01-22 | 12-03-22 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | Finalizado | Muros secos: Sótano: Instalación y soldadura de perfilería horizontal muro curvo eje 2-7/B-C, Finalizado |
| 662 | Sellos cortafuego | 60 | 14-03-22 | 24-05-22 | 100,00% | 15,00% | 85,00% | 15,00% | (+) 79 días | Atraso neto duración restante 79 días |
| 664 | Cielo rasos especiales | 40 | 15-08-22 | 29-09-22 | 0,00% | 50,00% | -60,00% | 60,00% | (-) -86 días | Cielo rasos especiales: Sótano: aluzinc y remate contra mamparas eje 1-7/F-H, celosía muro curvo eje 2-7/B-C, cielo raso e y remate contra amuro y mamparas eje 1-8/F-H, estructura cielo raso ,aluzinc blanco eje 7-11/I-J, Instalación y remate de cielo raso contra mamparas eje 1-8/F, adelanto -86 días |
| 665 | Carpinteria Metálica | 40 | 15-08-22 | 29-09-22 | 0,00% | 20,00% | -20,00% | 20,00% | (-) -69 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -69 días |
| 666 | Pintura | 90 | 15-08-22 | 26-11-22 | 0,00% | 20,00% | -20,00% | 20,00% | (-) -80 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -80 días |
| 667 | Remates generales | 90 | 15-08-22 | 26-11-22 | 0,00% | 5,00% | -5,00% | 5,00% | (-) -66 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -66 días |
| 669 | Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio) | 60 | 20-08-22 | 28-10-22 | 0,00% | 15,00% | -15,00% | 15,00% | (-) -75 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -75 días |
| 670 | Luminarias | 30 | 30-09-22 | 3-11-22 | 0,00% | 15,00% | -15,00% | 15,00% | (-) -109 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -109 días |
| 672 | Divisiones de oficina | 50 | 30-09-22 | 26-11-22 | 0,00% | 25,00% | -25,00% | 25,00% | (-) -118 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -118 días |
| 673 | Pisos secos | 40 | 15-08-22 | 29-09-22 | 0,00% | 0,00% | -25,00% | 25,00% | (-) -71 días | Pisos secos: Sótano: Alistado y corte de mármol para gradas capilla eje 2-3/C-E, mármol en gradas de capilla y Baptisterio eje 3-4/C, mármol en gradas escalera capilla eje 2-3/C-E, adelanto -71 días |
| 675 | Carpinteria Madera | 30 | 12-10-22 | 15-11-22 | 0,00% | 0,00% | -5,00% | 5,00% | (-) -118 días | Carpinteria Madera: Sótano: marcos de madera y puerta seje 7-11/J-K, puertas de madera eje 7-11/J-K, Remate de marcos puertas eje 3-7/F-G, adelanto -118 días |
| | **Atrio frente 2 y 3 - Consolidado** | | **28-12-18** | **17-12-22** | **82,51%** | **83,63%** | **-1,88%** | **84,39%** | **(-) 8 días** | **Actividad Capítulo** |
| | **Atrio F2 - Consolidado** | | **28-12-18** | **14-12-22** | **87,10%** | **87,69%** | **-1,03%** | **88,13%** | **(-) 8 días** | **Actividad Capítulo** |
| **682** | **Cubierta** | **0** | **14-03-22** | **19-04-22** | **100,00%** | **0,00%** | **100,00%** | **0,00%** | **(+) 70 días** | **Actividad Capítulo** |
| 0 | Radicado factibilidad PONAL | 0 | 30-05-22 | 30-05-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 13 días | Atraso neto duracion retante 13 días |
| 0 | Radicado permiso FAC 60 dias | 0 | 30-05-22 | 30-05-22 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | Finalizado | Terminado |
| 683 | Torre de comunicación | 30 | 14-03-22 | 19-04-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 90 días | Atraso neto duración restante 90 días |
| **716** | **Piso 5** | **0** | **25-01-22** | **26-11-22** | **59,00%** | **61,00%** | **-5,00%** | **64,00%** | **(-) 12 días** | **Actividad Capítulo** |
| 725 | Sellos cortafuego | 30 | 26-01-22 | 1-03-22 | 100,00% | 55,00% | 45,00% | 55,00% | (+) 118 días | Atraso neto duración restante 118 días |
| 729 | Enchapes | 20 | 19-05-22 | 10-06-22 | 100,00% | 75,00% | 0,00% | 100,00% | (-) 0 días | Terminado |
| 730 | Aparatos sanitarios y accesorios | 30 | 11-06-22 | 15-07-22 | 3,00% | 25,00% | -22,00% | 25,00% | (-) 26 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto 26 días |
| 731 | Cielo rasos especiales | 60 | 6-04-22 | 16-06-22 | 93,00% | 83,00% | 0,00% | 93,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |

BOGOTÁ

**SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**

**INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN**

**SEMANA No** **180 de 208** DEL **05-jun-22** AL **12-jun-2022**

**Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG**

| Id | Actividad | Duración días | Comienzo | Fin | % programado | % Completado sem Ant | % De desviación | % completado | (-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732 | Carpinteria Metálica | 60 | 6-04-22 | 16-06-22 | 93,00% | 83,00% | 0,00% | 93,00% | (-) 0 días | Carpinteria Metálica: Piso 5: Silicona en tapa gotero fachada occidente eje 12/B-G, Tapa gotero en fachada sur eje 3-29/G, Con el programa, adelanto 0 días |
| 733 | Pintura | 60 | 6-04-22 | 16-06-22 | 93,00% | 83,00% | 0,00% | 93,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |
| 734 | Remates generales | 80 | 6-04-22 | 9-07-22 | 70,00% | 55,00% | 0,00% | 70,00% | (+) 0 días | Resanes generales: Piso 5: Remates de enchape en baño eje 29/D-E, Con el programa, adelanto 0 días |
| 735 | Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio) | 30 | 17-06-22 | 21-07-22 | 0,00% | 10,00% | -10,00% | 10,00% | (-) -8 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -8 días |
| 736 | Luminarias | 60 | 17-06-22 | 25-08-22 | 0,00% | 40,00% | -40,00% | 40,00% | (-) -31 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -31 días |
| 737 | Divisiones de oficina | 60 | 17-06-22 | 25-08-22 | 0,00% | 70,00% | -80,00% | 80,00% | (-) -57 días | Divisiones de oficina: Piso 5: Aplicación de silicona en vidrios mamparas ejes 27-29/D-E, Silicona en vidrios mamparas eje 27-28/*D-E, adelanto -57 días |
| 739 | Pisos secos | 45 | 22-07-22 | 12-09-22 | 0,00% | 5,00% | -5,00% | 5,00% | (-) -40 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -40 días |
| **748** | **Piso 4** | **0** | **17-02-22** | **13-12-22** | **55,00%** | **59,00%** | **-6,00%** | **61,00%** | **(-) 14 días** | **Actividad Capítulo** |
| 758 | Sellos cortafuego | 30 | 18-02-22 | 24-03-22 | 100,00% | 55,00% | 45,00% | 55,00% | (+) 95 días | Atraso neto duración restante 95 días |
| 762 | Aparatos sanitarios y accesorios | 30 | 7-05-22 | 10-06-22 | 100,00% | 83,00% | 0,00% | 100,00% | (-) 0 días | Terminado |
| 763 | Cielo rasos especiales | 60 | 2-05-22 | 9-07-22 | 60,00% | 50,00% | 0,00% | 60,00% | (-) 0 días | Cielo rasos especiales: Piso 4: cielo raso en madera eje 23-24/B-D, 28-29/D-E, Con el programa, adelanto 0 días |
| 764 | Carpinteria Metálica | 60 | 2-05-22 | 9-07-22 | 60,00% | 50,00% | 0,00% | 60,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |
| 765 | Pintura | 120 | 2-05-22 | 17-09-22 | 30,00% | 50,00% | -20,00% | 50,00% | (-) 69 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto 69 días |
| 766 | Remates generales | 80 | 2-05-22 | 2-08-22 | 45,00% | 35,00% | 10,00% | 35,00% | (+) 9 días | Atraso neto duración restante 9 días |
| 767 | Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio) | 30 | 11-07-22 | 13-08-22 | 0,00% | 10,00% | -15,00% | 15,00% | (-) -32 días | Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio): Piso 4: sensores de movimiento eje 15-16/C-D, adelanto -32 días |
| 768 | Luminarias | 30 | 11-07-22 | 13-08-22 | 0,00% | 45,00% | -45,00% | 45,00% | (-) -42 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -42 días |
| 770 | Divisiones de oficina | 60 | 11-07-22 | 17-09-22 | 0,00% | 70,00% | -80,00% | 80,00% | (-) -79 días | Divisiones de oficina: Piso 4: Aplicación silicona en vidrios mamparas eje 15-17/E-F, Aplicación silicona en vidrios mamparas eje 22-24/E-G, Perforaciones para bisagras de piso, vidrio mamparas eje 26-28/C-D, adelanto -79 días |
| 771 | Pisos secos | 45 | 12-09-22 | 2-11-22 | 0,00% | 5,00% | -5,00% | 5,00% | (-) -90 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -90 días |
| **779** | **Piso 3** | **0** | **12-03-22** | **14-12-22** | **50,00%** | **56,00%** | **-6,00%** | **56,00%** | **(-) 14 días** | **Actividad Capítulo** |
| 789 | Sellos cortafuego | 30 | 14-03-22 | 19-04-22 | 100,00% | 40,00% | 60,00% | 40,00% | (+) 76 días | Atraso neto duración restante 76 días |
| 793 | Aparatos sanitarios y accesorios | 30 | 31-05-22 | 4-07-22 | 37,00% | 20,00% | 0,00% | 37,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |
| 794 | Cielo rasos especiales | 60 | 25-05-22 | 2-08-22 | 27,00% | 60,00% | -33,00% | 60,00% | (-) 28 días | Cielo rasos especiales: Piso 3: cielo raso en madera y fibra a térmica eje B-D/2-22, Nivelación cielo raso en madera eje 22-24/B-D, adelanto 28 días |
| 795 | Carpinteria Metálica | 60 | 25-05-22 | 2-08-22 | 27,00% | 25,00% | 0,00% | 27,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |

BOGOTÁ

**SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**

**INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN**

**SEMANA No 180 de 208 DEL 05-jun-22 AL 12-jun-2022**

**Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG**

| Id | Actividad | Duración días | Comienzo | Fin | % programado | % Completado sem Ant | % De desviación | % completado | (-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1026 | Jardines y mobiliario urbano | 78 | 16-09-22 | 16-12-22 | 0,00% | 25,00% | -30,00% | 30,00% | (-) -117 días | Jardines y mobiliario urbano: Obras exteriores (parqueadero): Limpieza de tubulares y muro cerramiento eje 18-22/A, Limpieza e tubulares y muro cerramiento eje 16-18/A, Extendida de tierra negra en jardineras zona parqueadero, Extendida y nivelación de tierra en bahías parqueadero, adelanto -117 días |
| **1029** | **Obras exteriores (Volteadero)** | **0** | **25-03-22** | **17-12-22** | **32,00%** | **0,00%** | **32,00%** | **0,00%** | **(+) 56 días** | **Actividad Capítulo** |
| 1030 | Rellenos | 60 | 25-03-22 | 4-06-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 79 días | Atraso neto duración restante 79 días |
| 1031 | Redes | 60 | 2-05-22 | 9-07-22 | 60,00% | 0,00% | 60,00% | 0,00% | (+) 41 días | Atraso neto duración restante 41 días |
| 1032 | Base granular | 60 | 6-06-22 | 13-08-22 | 10,00% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | (+) 7 días | Atraso neto duración restante 7 días |
| **1037** | **Obras exteriores (zonas verdes de cesión)** | **0** | **11-05-22** | **1-12-22** | **24,00%** | **0,00%** | **23,00%** | **1,00%** | **(+) 28 días** | **Actividad Capítulo** |
| 0 | Revalidación de licencia de urbanismo existente (SDSCJ) | 0 | 13-06-22 | 9-07-22 | 42,86% | 0,00% | -0,14% | 43,00% | (-) 27 días | Con el programa, adelanto 27 días |
| 0 | Aprobación actualización plano urbanistico aprobado por curaduía (Fuente: SDCSJ) | 0 | 2-05-22 | 2-05-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 41 días | Atraso neto duración restante 41 días |
| 0 | Pago acutualización plano urbanistico | 0 | 2-05-22 | 2-05-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 41 días | Atraso neto duración restante 41 días |
| 0 | Radicado IDRD (U Nacional) | 0 | 2-05-22 | 9-07-22 | 60,00% | 0,00% | 60,00% | 0,00% | (+) 41 días | Atraso neto duración restante 41 días |
| 0 | Radicado IDU glorieta de retorno (U Nacional) | 0 | 2-05-22 | 27-07-22 | 48,00% | 0,00% | 48,00% | 0,00% | (+) 41 días | Atraso neto duración restante 41 días |
| 0 | Radicado IDU verificación plazoleta de acceso Cr 60 (CSUDC) | 0 | 2-05-22 | 27-07-22 | 48,00% | 0,00% | 48,00% | 0,00% | (+) 41 días | Atraso neto duración restante 41 días |
| 1038 | Inicio | 0 | 11-05-22 | 11-05-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 32 días | Atraso neto duración restante 32 días |
| 1039 | Movimiento de tierras | 30 | 11-05-22 | 15-06-22 | 91,00% | 0,00% | 91,00% | 0,00% | (+) 32 días | Atraso neto duración restante 32 días |
| 1040 | Conexión desagües | 30 | 11-05-22 | 15-06-22 | 91,00% | 0,00% | 91,00% | 0,00% | (+) 32 días | Atraso neto duración restante 32 días |
| 1042 | Obras de arte y concretos | 40 | 20-07-22 | 5-09-22 | 0,00% | 1,00% | -1,00% | 1,00% | (-) -37 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -37 días |
| 1044 | Jardines y mobiliario urbano | 45 | 16-09-22 | 8-11-22 | 0,00% | 1,00% | -1,00% | 1,00% | (-) -92 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -92 días |
| **482** | **TRAMITES OBTENCION DE SERVICIOS PÚBLICOS** | **0** | **19-07-21** | **5-12-22** | **84,00%** | **64,00%** | **20,00%** | **64,00%** | **(+) 56 días** | **Actividad Capítulo** |
| **484** | **Tramites para servicios de EAAB** | **0** | **19-07-21** | **28-03-22** | **100,00%** | **99,00%** | **1,00%** | **99,00%** | **(+) 56 días** | **Actividad Capítulo** |
| **493** | **Permiso de ocupación de cauce ante la Secretaria de Ambiente** | **0** | **19-07-21** | **28-03-22** | **100,00%** | **97,00%** | **3,00%** | **97,00%** | **(+) 56 días** | **Actividad Capítulo** |
| 498 | trámite interno SDA (Estudio) | 90 | 13-12-21 | 28-03-22 | 100,00% | 93,00% | 7,00% | 93,00% | (+) 83 días | Atraso neto duración restante 83 días |
| 499 | Obtención permiso de ocupación de cauce | 0 | 28-03-22 | 28-03-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 76 días | Atraso neto duración restante 76 días |
| **513** | **Trámites domiciliarias energía eléctrica CODENSA** | **0** | **19-07-21** | **5-12-22** | **63,00%** | **57,00%** | **6,00%** | **57,00%** | **(+) 70 días** | **Actividad Capítulo** |
| 518 | Tramite CODENSA aprobación proyecto serie 6 | 96 | 3-01-22 | 26-04-22 | 100,00% | 75,00% | 25,00% | 75,00% | (+) 75 días | Atraso neto duración restante 75 días |
| 395 | Aseo general de obra | 634 | 9-11-20 | 29-12-21 | 78,00% | 77,00% | 0,00% | 78,00% | (-) 0 días | Aseo general de obra: Auditorio: Piso 1: Aseo generalLimpieza de tubería y marcación de las mismas casa curalAtrio: Piso 2: Aseo general de piso Piso 3: Aseo general de pisoPiso 6: Aseo general de piso Con el programa, adelanto 0 días |
| | | | | | | | | | * | R. Critica: 42 días |
| | | | | | | | | | * | R. Critica Ant:35 días |

BOGOTÁ

**SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**


**INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN**

**SEMANA No** **180 de 208** DEL **05-jun-22** AL **12-jun-2022**

**Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG**

| Id | Actividad | Duración días | Comienzo | Fin | % programado | % Completado sem Ant | % De desviación | % completado | (-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | El porcentaje programado es 80,34% y el ejecutado es 80,35% con un adelanto de -1 días.<br>Alarmas en ruta crítica<br>-En el frente 1 Auditorio: Ejecutar el reforzamiento de la estructura de la cubierta, previo modificatorio. influencia en acabados iternos del auditorio y fachada interna<br>-En el Frente 2 y 3 Atrio y 4 Plazoleta: Radicar la solicitud de torre de comunicaciones en el municipio. Ejecutar los remates generales terminar pisos de arriba hacia abajo, corregir desviación de la ejecución de sellos corta fuego. Plantear una estrategia para culminar conexiones de sistemas posteriores a montaje de mobiliario.<br>-En el Frente 5 exteriores: la solución se genera con la aprobación del plano urbano en curaduría para poder iniciar procesos de análisis del proyecto serie 6 en condesa, precisar el diseño urbano e hidráulico del acceso vehicular por la Cr 56. Obtener el permiso de ocupación del cauce para poder conectar redes de EAAB. | | | | | | | | * | Actividad Capítulo |

| Descripción | Oficial en obra Sem 180 | Ayudante en obra Sem 180 | Oficial Programado Sem 180 | Ayudante programado Sem 180 |
|---|---|---|---|---|
| Acabados | 15 | 0 | 21 | 14 |
| Carpintería Metálica | 5 | 0 | 6 | 4 |
| Cielo | 12 | 2 | 11 | 7 |
| Climatización | 15 | 0 | 2 | 1 |
| Divisiones | 15 | 0 | 2 | 1 |
| Eléctrico | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Estructura | 15 | 0 | 2 | 1 |
| Fachada | 7 | 0 | 1 | 1 |
| Hidrosanitarias | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Incendio | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Luminarias | 5 | 0 | 2 | 1 |
| Vias | 2 | 0 | 5 | 3 |
| Total | 100,00 | | 88,00 | |

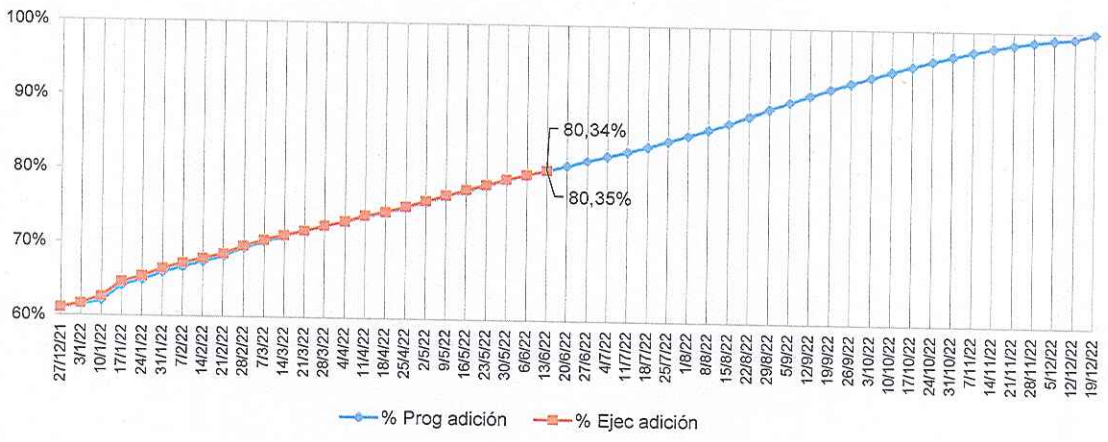

BOGOTÁ

**SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**

**INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN**

**SEMANA No** **181 de 208** DEL **12-jun-22** AL **19-jun-2022**

**Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG**

| Id | Actividad | Duración días | Comienzo | Fin | % programado | % Completado sem Ant | % De desviación | % completado | (-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PROGRAMA AVANCE PORCENTUAL POR CAPÍTULO | | | | | * | |
| | **Preliminares y obras Generales** | | | | **100,00%** | **100,00%** | | **100,00%** | * | **Actividad Capítulo** |
| | **Estructura** | | | | **95,30%** | **94,98%** | | **94,99%** | * | **Actividad Capítulo** |
| | **Obra gris** | | | | **97,88%** | **97,91%** | | **97,99%** | * | **Actividad Capítulo** |
| | **Acabados** | | | | **70,99%** | **71,20%** | | **72,52%** | * | **Actividad Capítulo** |
| | | | | PROGRAMA CONSOLIDADO | | | | | * | |
| **0** | **reprogramacion 3 v19** | | **28-12-18** | **17-12-22** | **81,03%** | **80,35%** | **0,00%** | **81,03%** | **(-) 0 días** | **Actividad Capítulo** |
| | | | | PROGRAMA CONSOLIDADO POR FRENTES | | | | | * | |
| | **Auditorio F1 - Consolidado** | | **28-12-18** | **14-12-22** | **75,05%** | **70,76%** | **3,52%** | **71,54%** | **(+) 44 días** | **Actividad Capítulo** |
| **535** | **Piso 3** | **0** | **3-01-22** | **14-12-22** | **49,00%** | **9,00%** | **39,00%** | **10,00%** | **(+) 91 días** | **Actividad Capítulo** |
| 537 | Posible reforzamiento cubierta | 60 | 26-01-22 | 5-04-22 | 100,00% | 60,00% | 38,00% | 62,00% | (+) 101 días | Atraso neto duración restante 101 días |
| 538 | Cubierta auditorio (remate) | 32 | 6-04-22 | 14-05-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 74 días | Atraso neto duración restante 74 días |
| 0 | Reparación pintura intumescente | 18 | 6-06-22 | 25-06-22 | 66,00% | 33,00% | 0,00% | 66,00% | (-) 0 días | Reparación pintura intumescente: Piso 3: pintura acabado fachada norte y armada andamios fachada sur, Piso 2: Retiro de pintura estructura metálica fachada sur y occidente, Con el programa, adelanto 0 días |
| 539 | Fachada auditorio | 120 | 14-03-22 | 2-08-22 | 68,00% | 63,00% | 0,00% | 68,00% | (-) 0 días | Fachada auditorio: Piso 3: parapeto en cubierta fachada occidental, Toma de medidas para terminado fachadas, Piso 2: Replanteo para instalación de fachadas, Con el programa, adelanto 0 días |
| 540 | Instalaciones hidrosanitarias | 30 | 6-04-22 | 12-05-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 74 días | Atraso neto duración restante 74 días |
| 541 | Instalaciones eléctricas | 90 | 6-04-22 | 21-07-22 | 69,00% | 0,00% | 69,00% | 0,00% | (+) 73 días | Atraso neto duración restante 73 días |
| 542 | Instalaciones voz y datos | 90 | 6-04-22 | 21-07-22 | 69,00% | 0,00% | 69,00% | 0,00% | (+) 73 días | Atraso neto duración restante 73 días |
| 543 | Instalaciones seguridad y control | 90 | 6-04-22 | 21-07-22 | 69,00% | 0,00% | 69,00% | 0,00% | (+) 73 días | Atraso neto duración restante 73 días |
| 544 | Instalaciones climatización | 90 | 6-04-22 | 21-07-22 | 69,00% | 36,00% | 33,00% | 36,00% | (+) 35 días | Atraso neto duración restante 35 días |
| 545 | Instalaciones red incendio | 90 | 6-04-22 | 21-07-22 | 69,00% | 0,00% | 69,00% | 0,00% | (+) 73 días | Atraso neto duración restante 73 días |
| 546 | Muros secos | 60 | 6-04-22 | 16-06-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 74 días | Atraso neto duración restante 74 días |
| 547 | Sellos cortafuego | 30 | 6-04-22 | 12-05-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 74 días | Atraso neto duración restante 74 días |
| 548 | Cielo rasos en fibrocemento | 60 | 6-04-22 | 16-06-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 74 días | Atraso neto duración restante 74 días |
| 549 | Cielo rasos especiales | 60 | 6-04-22 | 16-06-22 | 100,00% | 2,00% | 90,00% | 10,00% | (+) 67 días | Cielo rasos especiales: Piso 3: refuerzo tipo T en cercha No 3, Atraso neto duración restante 67 días |
| 550 | Carpinteria Metálica | 60 | 6-04-22 | 16-06-22 | 100,00% | 5,00% | 95,00% | 5,00% | (+) 70 días | Atraso neto duración restante 70 días |
| 553 | Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio) | 30 | 17-06-22 | 21-07-22 | 7,00% | 0,00% | 7,00% | 0,00% | (+) 2 días | Atraso neto duración restante 2 días |
| 554 | Luminarias | 60 | 17-06-22 | 25-08-22 | 3,00% | 0,00% | 3,00% | 0,00% | (+) 2 días | Atraso neto duración restante 2 días |
| 556 | Pisos húmedos | 50 | 13-05-22 | 9-07-22 | 64,00% | 0,00% | 64,00% | 0,00% | (+) 36 días | Atraso neto duración restante 36 días |
| **566** | **Piso 2 y plaza armas** | **0** | **3-01-22** | **8-12-22** | **59,00%** | **55,00%** | **2,00%** | **57,00%** | **(+) 32 días** | **Actividad Capítulo** |
| 569 | Impermeabilización remate en perimetro de auditorio | 60 | 25-05-22 | 2-08-22 | 37,00% | 27,00% | 0,00% | 37,00% | (-) 0 días | Con el programa, adelanto 0 días |
| 570 | Instalaciones hidrosanitarias | 120 | 3-01-22 | 24-05-22 | 100,00% | 97,00% | 2,00% | 98,00% | (+) 29 días | Atraso neto duración restante 29 días |
| 571 | Instalaciones eléctricas | 120 | 3-01-22 | 24-05-22 | 100,00% | 97,00% | 2,00% | 98,00% | (+) 29 días | Atraso neto duración restante Con el programa, adelanto 29 días |
| 572 | Instalaciones voz y datos | 120 | 3-01-22 | 24-05-22 | 100,00% | 97,00% | 2,00% | 98,00% | (+) 29 días | Atraso neto duración restante Con el programa, adelanto 29 días |
| 573 | Instalaciones seguridad y control | 120 | 3-01-22 | 24-05-22 | 100,00% | 97,00% | 2,00% | 98,00% | (+) 29 días | Atraso neto duración restante 29 días |
| 574 | Instalaciones climatización | 120 | 3-01-22 | 24-05-22 | 100,00% | 97,00% | 2,00% | 98,00% | (+) 29 días | Instalaciones climatización: Piso 2: Instalación de ductos A/C, Atraso neto duración restante Con el programa, adelanto 29 días |
| 579 | Pisos plazoletas remates perimetro auditorio | 60 | 3-08-22 | 11-10-22 | 0,00% | 5,00% | -5,00% | 5,00% | (-) -46 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -46 días |
| 580 | Enchapes | 60 | 25-05-22 | 2-08-22 | 37,00% | 27,00% | 0,00% | 37,00% | (-) 0 días | Con el programa, adelanto 0 días |
| 581 | Sellos cortafuego | 45 | 12-04-22 | 4-06-22 | 100,00% | 47,00% | 53,00% | 47,00% | (+) 43 días | Atraso neto duración restante 43 días |
| 582 | Cielo rasos en fibrocemento | 60 | 13-05-22 | 21-07-22 | 53,00% | 43,00% | 0,00% | 53,00% | (-) 0 días | Con el programa, adelanto 0 días |

BOGOTÁ

**SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**

**INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN**

**SEMANA No 181 de 208 DEL 12-jun-22 AL 19-jun-2022**

**Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG**

| Id | Actividad | Duración días | Comienzo | Fin | % programado | % Completado sem Ant | % De desviación | % completado | (-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 583 | Cielo rasos especiales | 60 | 13-05-22 | 21-07-22 | 53,00% | 43,00% | 0,00% | 53,00% | (-) 0 días | Cielo rasos especiales: Piso 2: Reforzamiento de cercha No 3, Con el programa, adelanto 0 días |
| 584 | Carpinteria Metálica | 60 | 13-05-22 | 21-07-22 | 53,00% | 43,00% | 0,00% | 53,00% | (-) 0 días | Carpinteria Metálica:Piso 2: rejilla bajo bancas, Con el programa, adelanto 0 días |
| 585 | Pintura | 120 | 25-05-22 | 11-10-22 | 18,00% | 13,00% | 0,00% | 18,00% | (-) 0 días | Con el programa, adelanto 0 días |
| 586 | Remates generales | 80 | 29-06-22 | 29-09-22 | 0,00% | 1,00% | -1,00% | 1,00% | (-) -10 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -10 días |
| 588 | Pisos húmedos | 30 | 25-05-22 | 28-06-22 | 73,00% | 53,00% | 0,00% | 73,00% | (-) 0 días | Con el programa, adelanto 0 días |
| **601** | **Piso 1 y plaza de acceso** | **0** | **3-01-22** | **14-12-22** | **47,00%** | **47,00%** | **-2,00%** | **49,00%** | **(-) 7 días** | **Actividad Capítulo** |
| 607 | Fragüe de bóveda y descimbrado de formaleta | 20 | 17-06-22 | 9-07-22 | 10,00% | 100,00% | -90,00% | 100,00% | Finalizado | Terminado |
| 608 | Impermeabilización en zona de bóveda y juntas | 30 | 11-07-22 | 13-08-22 | 0,00% | 2,00% | -5,00% | 5,00% | (-) -22 días | Impermeabilización en zona de bóveda y juntas: Piso 1: Hechura de salida de agua plazoleta, adelanto -22 días |
| 609 | Instalaciones eléctricas | 60 | 17-06-22 | 25-08-22 | 3,00% | 2,00% | -2,00% | 5,00% | (-) 66 días | adelanto 66 días |
| 610 | Instalaciones voz y datos | 60 | 17-06-22 | 25-08-22 | 3,00% | 0,00% | -2,00% | 5,00% | (-) 66 días | adelanto 66 días |
| 611 | Instalaciones seguridad y control | 60 | 17-06-22 | 25-08-22 | 3,00% | 0,00% | -2,00% | 5,00% | (-) 66 días | adelanto 66 días |
| 612 | Instalaciones climatización | 60 | 17-06-22 | 25-08-22 | 3,00% | 15,00% | -17,00% | 20,00% | (-) 55 días | Instalaciones climatización: Piso 1: Instalación de circuitos para fan coil en tubería cobre, adelanto 55 días |
| 613 | Instalaciones red incendio | 60 | 17-06-22 | 25-08-22 | 3,00% | 10,00% | -7,00% | 10,00% | (-) 62 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto 62 días |
| 621 | Sellos cortafuego | 30 | 14-03-22 | 19-04-22 | 100,00% | 15,00% | 85,00% | 15,00% | (+) 92 días | Atraso neto duración restante 92 días |
| 624 | Cielo rasos especiales | 101 | 14-03-22 | 11-07-22 | 81,00% | 75,00% | 0,00% | 81,00% | (-) 0 días | Cielo rasos especiales: Piso 1: cielo raso en madera eje 23-6/F-H, F-H'/1-5, 2-6/F-H', Con el programa, adelanto 0 días |
| 626 | Pisos húmedos | 30 | 25-05-22 | 28-06-22 | 73,00% | 53,00% | 0,00% | 73,00% | (-) 0 días | Con el programa, adelanto 0 días |
| 627 | Aparatos sanitarios y accesorios | 30 | 25-05-22 | 28-06-22 | 73,00% | 53,00% | 0,00% | 73,00% | (-) 0 días | Con el programa, adelanto 0 días |
| 628 | Pintura | 80 | 26-08-22 | 26-11-22 | 0,00% | 30,00% | -35,00% | 35,00% | (-) -95 días | Pintura: Piso 1: Aplicación de pintura en cielo raso y paredes ejes 1-5/F-H, adelanto -95 días |
| 629 | Remates generales | 80 | 26-08-22 | 26-11-22 | 0,00% | 5,00% | -10,00% | 10,00% | (-) -73 días | Resanes generales: Piso 1: Reparación de enchape e instalación de griferías baños alojamientos, Piso 1: Resanes de estructura en concreto, adelanto -73 días |
| 630 | Pisos plazoletas | 60 | 15-08-22 | 22-10-22 | 0,00% | 5,00% | -5,00% | 5,00% | (-) -57 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -57 días |
| 631 | Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio) | 30 | 12-07-22 | 15-08-22 | 0,00% | 0,00% | -10,00% | 10,00% | (-) -25 días | Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio): Piso 1: Cableado para sonido , cámaras y control de incendios, adelanto -25 días |
| 632 | Luminarias | 50 | 3-08-22 | 29-09-22 | 0,00% | 2,00% | -5,00% | 5,00% | (-) -45 días | luminarias: Piso 1: guayas para luminarias cielo raso ejes 1-1/G-H, Instalación de luminarias en oficina de seguridad, lámparas led 4watt, adelanto -45 días |
| **645** | **Sótano** | **0** | **3-01-22** | **14-12-22** | **36,00%** | **39,00%** | **-4,00%** | **40,00%** | **(-) 11 días** | **Actividad Capítulo** |
| 647 | Instalaciones eléctricas | 60 | 11-07-22 | 17-09-22 | 0,00% | 10,00% | -10,00% | 10,00% | (-) -27 días | adelanto -27 días |
| 649 | Instalaciones seguridad y control | 60 | 11-07-22 | 17-09-22 | 0,00% | 5,00% | -5,00% | 5,00% | (-) -24 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -24 días |
| 650 | Instalaciones climatización | 60 | 11-07-22 | 17-09-22 | 0,00% | 2,00% | -2,00% | 2,00% | (-) -22 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -22 días |

BOGOTÁ

**SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**

**INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN**

**SEMANA No 181 de 208 DEL 12-jun-22 AL 19-jun-2022**

**Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG**

| Id | Actividad | Duración días | Comienzo | Fin | % programado | % Completado sem Ant | % De desviación | % completado | (-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | Instalaciones red incendio | 60 | 11-07-22 | 17-09-22 | 0,00% | 10,00% | -10,00% | 10,00% | (-) -27 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -27 días |
| 658 | Muros secos | 60 | 3-01-22 | 12-03-22 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | Finalizado | Muros secos: Sótano: superboard muro curvo ejes 2-7/B-C, Finalizado |
| 662 | Sellos cortafuego | 60 | 14-03-22 | 24-05-22 | 100,00% | 15,00% | 85,00% | 15,00% | (+) 86 días | Atraso neto duración restante 86 días |
| 664 | Cielo rasos especiales | 40 | 15-08-22 | 29-09-22 | 0,00% | 60,00% | -65,00% | 65,00% | (-) -82 días | Cielo rasos especiales:Sótano: estructura capilla para cielo raso ejes 2-6/B-C, estructura metálica descolgada para el cielo raso en capilla ejes 2-6/C-D, Remate de cielo raso contra muro y mamparas ejes 6-8/G-H, adelanto -82 días |
| 665 | Carpinteria Metálica | 40 | 15-08-22 | 29-09-22 | 0,00% | 20,00% | -20,00% | 20,00% | (-) -63 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -63 días |
| 666 | Pintura | 90 | 15-08-22 | 26-11-22 | 0,00% | 20,00% | -30,00% | 30,00% | (-) -84 días | Pintura: Sótano: Masillado y pintura muro seco ejes 1-8/K-L, adelanto -84 días |
| 667 | Remates generales | 90 | 15-08-22 | 26-11-22 | 0,00% | 5,00% | -5,00% | 5,00% | (-) -59 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -59 días |
| 669 | Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio) | 60 | 20-08-22 | 28-10-22 | 0,00% | 15,00% | -15,00% | 15,00% | (-) -69 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -69 días |
| 670 | Luminarias | 30 | 30-09-22 | 3-11-22 | 0,00% | 15,00% | -20,00% | 20,00% | (-) -104 días | luminarias: Sótano: perfil guía iluminación ejes 7-9/G-H, riel guía iluminación ejes 7-9/G-H, adelanto -104 días |
| 672 | Divisiones de oficina | 50 | 30-09-22 | 26-11-22 | 0,00% | 25,00% | -30,00% | 30,00% | (-) -114 días | Divisiones de oficina:Sótano: vidrios ejes 6-7/F, vidrios mamparas oficinas ejes 7-8/D-F, adelanto -114 días |
| 673 | Pisos secos | 40 | 15-08-22 | 29-09-22 | 0,00% | 25,00% | -30,00% | 30,00% | (-) -67 días | Pisos secos: Sótano: Corte y alistado de mármol para gradas capilla ejes 2-3/C-E, adelanto -67 días |
| 675 | Carpinteria Madera | 30 | 12-10-22 | 15-11-22 | 0,00% | 5,00% | -10,00% | 10,00% | (-) -112 días | Carpinteria Madera: Sótano: marcos de madera y puerta seje 7-11/J-K, Remate de marcos puertas eje 3-7/F-G, adelanto -112 días |
| | **Atrio frente 2 y 3 - Consolidado** | | **28-12-18** | **17-12-22** | **83,25%** | **84,39%** | **-1,95%** | **85,19%** | **(-) 8 días** | **Actividad Capítulo** |
| | **Atrio F2 - Consolidado** | | **28-12-18** | **14-12-22** | **87,60%** | **88,13%** | **-1,00%** | **88,61%** | **(-) 7 días** | **Actividad Capítulo** |
| **682** | **Cubierta** | **0** | **14-03-22** | **19-04-22** | **100,00%** | **0,00%** | **100,00%** | **0,00%** | **(+) 77 días** | **Actividad Capítulo** |
| 0 | Radicado factibilidad PONAL | 0 | 30-05-22 | 30-05-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 20 días | Atraso neto duracion retante 20 días |
| 0 | Radicado permiso FAC 60 dias | 0 | 30-05-22 | 30-05-22 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | Finalizado | Terminado |
| 683 | Torre de comunicación | 30 | 14-03-22 | 19-04-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 97 días | Atraso neto duración restante 97 días |
| **716** | **Piso 5** | **0** | **25-01-22** | **26-11-22** | **62,00%** | **64,00%** | **-3,00%** | **65,00%** | **(-) 12 días** | **Actividad Capítulo** |
| 722 | Instalaciones climatización | 60 | 26-01-22 | 5-04-22 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | Finalizado | Instalaciones climatización: Piso 5: Instalación modulo de control y cableado monitoreo A/C ejes 13-14/B-C, 24-25/F-G, Finalizado |
| 723 | Instalaciones red incendio | 60 | 26-01-22 | 5-04-22 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | Finalizado | Instalaciones red incendio: Piso 5: rejillas en tubería de presurización ejes 28-29/D-E, Finalizado |
| 725 | Sellos cortafuego | 30 | 26-01-22 | 1-03-22 | 100,00% | 55,00% | 45,00% | 55,00% | (+) 125 días | Atraso neto duración restante 125 días |
| 730 | Aparatos sanitarios y accesorios | 30 | 11-06-22 | 15-07-22 | 23,00% | 25,00% | -2,00% | 25,00% | (-) 25 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto 25 días |
| 732 | Carpinteria Metálica | 60 | 6-04-22 | 16-06-22 | 100,00% | 93,00% | 5,00% | 95,00% | (+) 7 días | Carpinteria Metálica: Piso 5: Silicona en Tapa gotero en fachada sur eje 3-29/G, Atraso neto duración restante 7 días |
| 734 | Remates generales | 80 | 6-04-22 | 9-07-22 | 78,00% | 70,00% | 8,00% | 70,00% | (+) 8 días | Atraso neto duración restante 8 días |

BOGOTÁ

**SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**

**INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN**

**SEMANA No** **181 de 208** DEL **12-jun-22** AL **19-jun-2022**

**Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG**

| Id | Actividad | Duración días | Comienzo | Fin | % programado | % Completado sem Ant | % De desviación | % completado | (-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 | Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio) | 30 | 17-06-22 | 21-07-22 | 7,00% | 10,00% | -3,00% | 10,00% | (-) 31 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto 31 días |
| 736 | Luminarias | 60 | 17-06-22 | 25-08-22 | 3,00% | 40,00% | -37,00% | 40,00% | (-) 41 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto 41 días |
| 737 | Divisiones de oficina | 60 | 17-06-22 | 25-08-22 | 3,00% | 80,00% | -87,00% | 90,00% | (-) 7 días | Divisiones de oficina:Piso 5: Aplicación de silicona en mamparas ejes 13-17/E-G, adelanto 7 días |
| 739 | Pisos secos | 45 | 22-07-22 | 12-09-22 | 0,00% | 5,00% | -5,00% | 5,00% | (-) -34 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -34 días |
| **748** | **Piso 4** | **0** | **17-02-22** | **13-12-22** | **57,00%** | **61,00%** | **-6,00%** | **63,00%** | **(-) 18 días** | **Actividad Capítulo** |
| 755 | Instalaciones red incendio | 60 | 18-02-22 | 30-04-22 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | Finalizado | Instalaciones red incendio: Piso 4: rejilla en tubería de presurización ejes 13-14/C-D, Finalizado |
| 758 | Sellos cortafuego | 30 | 18-02-22 | 24-03-22 | 100,00% | 55,00% | 45,00% | 55,00% | (+) 102 días | Atraso neto duración restante 102 días |
| 759 | Cielo rasos en fibrocemento | 60 | 18-02-22 | 30-04-22 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | Finalizado | Cielo rasos en fibrocemento: Piso 4: Masillado de cielo raso en superboard ejes 15/E-G, Finalizado |
| 763 | Cielo rasos especiales | 60 | 2-05-22 | 9-07-22 | 70,00% | 60,00% | -20,00% | 90,00% | (-) 6 días | Cielo rasos especiales:Piso 4: Nivelación cielo raso en madera ejes 22-23/B-D, Nivelación de cielo raso en madera ejes 23-24/B-D, adelanto 6 días |
| 764 | Carpinteria Metálica | 60 | 2-05-22 | 9-07-22 | 70,00% | 60,00% | 0,00% | 70,00% | (-) 0 días | Carpinteria Metálica:Piso 4: Aplicación de silicona tapa gotero fachada norte ejes B/12-3, Sellado de tapa gotero en fachada norte ejes 12-3/B, Con el programa, adelanto 0 días |
| 765 | Pintura | 120 | 2-05-22 | 17-09-22 | 35,00% | 50,00% | -15,00% | 50,00% | (-) 69 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto 69 días |
| 766 | Remates generales | 80 | 2-05-22 | 2-08-22 | 53,00% | 35,00% | 18,00% | 35,00% | (+) 17 días | Atraso neto duración restante 17 días |
| 767 | Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio) | 30 | 11-07-22 | 13-08-22 | 0,00% | 15,00% | -30,00% | 30,00% | (-) -30 días | Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio): Piso 4: sensores de movimiento eje 15-16/C-D, adelanto -30 días |
| 768 | Luminarias | 30 | 11-07-22 | 13-08-22 | 0,00% | 45,00% | -45,00% | 45,00% | (-) -35 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -35 días |
| 770 | Divisiones de oficina | 60 | 11-07-22 | 17-09-22 | 0,00% | 80,00% | -90,00% | 90,00% | (-) -79 días | Divisiones de oficina:Piso 4: Empaque inferior en mamparas ejes 26-28/D-E, perfil superior mamparas ejes 25-28/C-D, adelanto -79 días |
| 771 | Pisos secos | 45 | 12-09-22 | 2-11-22 | 0,00% | 5,00% | -5,00% | 5,00% | (-) -83 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -83 días |
| **779** | **Piso 3** | **0** | **12-03-22** | **14-12-22** | **52,00%** | **56,00%** | **-7,00%** | **59,00%** | **(-) 21 días** | **Actividad Capítulo** |
| 789 | Sellos cortafuego | 30 | 14-03-22 | 19-04-22 | 100,00% | 40,00% | 60,00% | 40,00% | (+) 83 días | Atraso neto duración restante 83 días |
| 793 | Aparatos sanitarios y accesorios | 30 | 31-05-22 | 4-07-22 | 57,00% | 37,00% | 0,00% | 57,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |
| 794 | Cielo rasos especiales | 60 | 25-05-22 | 2-08-22 | 37,00% | 60,00% | -33,00% | 70,00% | (-) 21 días | Cielo rasos especiales: Piso 3: cielo raso en madera ejes C/19-22, adelanto 21 días |
| 795 | Carpinteria Metálica | 60 | 25-05-22 | 2-08-22 | 37,00% | 27,00% | 0,00% | 37,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |
| 796 | Pintura | 140 | 25-05-22 | 3-11-22 | 16,00% | 25,00% | -9,00% | 25,00% | (-) 122 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto 122 días |
| 797 | Remates generales | 80 | 25-05-22 | 25-08-22 | 28,00% | 20,00% | 0,00% | 28,00% | (-) 0 días | Con el programa, adelanto 0 días |
| 798 | Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio) | 30 | 3-08-22 | 6-09-22 | 0,00% | 10,00% | -10,00% | 10,00% | (-) -46 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -46 días |

BOGOTÁ

**SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**

**INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN**

**SEMANA No** **181 de 208** DEL **12-jun-22** AL **19-jun-2022**

**Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG**

| Id | Actividad | Duración días | Comienzo | Fin | % programado | % Completado sem Ant | % De desviación | % completado | (-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 799 | Divisiones de oficina | 60 | 3-08-22 | 11-10-22 | 0,00% | 80,00% | -90,00% | 90,00% | (-) -102 días | Divisiones de oficina:Piso 3: perfiles mamparas ejes E/13-15, vidrio mamparas ejes C/13-15, vidrios mampara ejes E/12-14, adelanto -102 días |
| 800 | Luminarias | 30 | 3-08-22 | 6-09-22 | 0,00% | 25,00% | -30,00% | 30,00% | (-) -52 días | luminarias: Piso 3: balas luminarias ejes 14-17/B-C, adelanto -52 días |
| 802 | Pisos secos | 30 | 12-10-22 | 15-11-22 | 0,00% | 10,00% | -10,00% | 10,00% | (-) -112 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -112 días |
| 804 | Carpinteria Madera | 30 | 12-10-22 | 15-11-22 | 0,00% | 15,00% | -20,00% | 20,00% | (-) -116 días | Carpinteria Madera: Piso 3: estructura en madera fachada ascensores eje 27-28/F, estructura en madera para fachada ascensor eje 27-28/F, adelanto -116 días |
| | **Atrio F3 - Consolidado** | | **28-12-18** | **17-12-22** | **76,95%** | **78,99%** | **-3,31%** | **80,27%** | **(-) 8 días** | **Actividad Capítulo** |
| **684** | **Piso 6** | **0** | **3-01-22** | **26-11-22** | **59,00%** | **64,00%** | **-9,00%** | **68,00%** | **(-) 14 días** | **Actividad Capítulo** |
| 695 | Sellos cortafuego | 30 | 14-01-22 | 17-02-22 | 100,00% | 75,00% | 10,00% | 90,00% | (+) 125 días | Sellos cortafuego: Piso 6: sello cortafuego en muros ejes 27-29/F-G, Atraso neto duración restante 125 días |
| 700 | Aparatos sanitarios y accesorios | 30 | 31-05-22 | 4-07-22 | 57,00% | 37,00% | 0,00% | 57,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |
| 701 | Dotación equipos de cocina | 30 | 31-05-22 | 4-07-22 | 57,00% | 0,00% | 0,00% | 57,00% | (-) 0 días | Con el programa, adelanto 0 días |
| 702 | Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio) | 30 | 25-05-22 | 28-06-22 | 73,00% | 53,00% | 0,00% | 73,00% | (-) 0 días | Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio): Piso 6: extintores automáticos en cocina ejes 13-14/D-E, Cubierta: Conexión de potencia condensadores en curto de A/C ejes 15-19/C-D, Conexión de potencia condensadores en curto de A/C ejes 25-27/E-G, Con el programa, adelanto 0 días |
| 703 | Luminarias | 50 | 25-05-22 | 21-07-22 | 44,00% | 40,00% | 0,00% | 44,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |
| 705 | Divisiones de oficina | 60 | 25-05-22 | 2-08-22 | 37,00% | 80,00% | -53,00% | 90,00% | (-) 7 días | Divisiones de oficina:Piso 6: Aplicación de silicona vidrio mamparas ejes 18-2/D-E, 28-269/D-E, vidrios mamparas ejes 12-13/E-G, adelanto 7 días |
| 706 | Pintura | 90 | 5-07-22 | 17-10-22 | 0,00% | 50,00% | -50,00% | 50,00% | (-) -65 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -65 días |
| 707 | Remates generales | 60 | 5-07-22 | 12-09-22 | 0,00% | 55,00% | -55,00% | 55,00% | (-) -51 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -51 días |
| 708 | Pisos secos | 45 | 28-07-22 | 17-09-22 | 0,00% | 2,00% | -2,00% | 2,00% | (-) -38 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -38 días |
| 710 | Carpinteria Madera | 30 | 1-09-22 | 5-10-22 | 0,00% | 5,00% | -5,00% | 5,00% | (-) -72 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -72 días |
| **810** | **Piso 2** | **0** | **5-04-22** | **14-12-22** | **45,00%** | **51,00%** | **-10,00%** | **55,00%** | **(-) 14 días** | **Actividad Capítulo** |
| 819 | Sellos cortafuego | 30 | 6-04-22 | 12-05-22 | 100,00% | 30,00% | 70,00% | 30,00% | (+) 63 días | Atraso neto duración restante 63 días |
| 823 | Enchapes | 20 | 31-05-22 | 22-06-22 | 85,00% | 55,00% | 0,00% | 85,00% | (-) 0 días | Con el programa, adelanto 0 días |
| 825 | Aparatos sanitarios y accesorios | 30 | 23-06-22 | 27-07-22 | 0,00% | 10,00% | -10,00% | 10,00% | (-) -7 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -7 días |
| 826 | Pisos plazoletas | 41 | 17-06-22 | 3-08-22 | 5,00% | 5,00% | 0,00% | 5,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |
| 827 | Cielo rasos especiales | 60 | 17-06-22 | 25-08-22 | 3,00% | 70,00% | -77,00% | 80,00% | (-) 14 días | Cielo rasos especiales: Piso 2: cielo raso en madera ejes F/19-2, Instalación de cielo raso en madera ejes F/23-21, adelanto 14 días |

BOGOTÁ

**SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**

**INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN**

**SEMANA No** **181 de 208** DEL **12-jun-22** AL **19-jun-2022**

**Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG**

| Id | Actividad | Duración días | Comienzo | Fin | % programado | % Completado sem Ant | % De desviación | % completado | (-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040 | Conexión desagües | 30 | 11-05-22 | 15-06-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 39 días | Atraso neto duración restante 39 días |
| 1041 | Rellenos | 30 | 15-06-22 | 20-07-22 | 11,00% | 0,00% | 11,00% | 0,00% | (+) 4 días | Atraso neto duración restante 4 días |
| 1042 | Obras de arte y concretos | 40 | 20-07-22 | 5-09-22 | 0,00% | 1,00% | -1,00% | 1,00% | (-) -30 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -30 días |
| 1044 | Jardines y mobiliario urbano | 45 | 16-09-22 | 8-11-22 | 0,00% | 1,00% | -1,00% | 1,00% | (-) -85 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -85 días |
| **482** | **TRAMITES OBTENCION DE SERVICIOS PÚBLICOS** | **0** | **19-07-21** | **5-12-22** | **84,00%** | **64,00%** | **20,00%** | **64,00%** | **(+) 63 días** | **Actividad Capítulo** |
| **484** | **Tramites para servicios de EAAB** | **0** | **19-07-21** | **28-03-22** | **100,00%** | **99,00%** | **1,00%** | **99,00%** | **(+) 63 días** | **Actividad Capítulo** |
| **493** | **Permiso de ocupación de cauce ante la Secretaria de Ambiente** | **0** | **19-07-21** | **28-03-22** | **100,00%** | **97,00%** | **3,00%** | **97,00%** | **(+) 63 días** | **Actividad Capítulo** |
| 498 | trámite interno SDA (Estudio) | 90 | 13-12-21 | 28-03-22 | 100,00% | 93,00% | 7,00% | 93,00% | (+) 90 días | Atraso neto duración restante 90 días |
| 499 | Obtención permiso de ocupación de cauce | 0 | 28-03-22 | 28-03-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 83 días | Atraso neto duración restante 83 días |
| **513** | **Trámites domiciliarias energía eléctrica CODENSA** | **0** | **19-07-21** | **5-12-22** | **63,00%** | **57,00%** | **6,00%** | **57,00%** | **(+) 77 días** | **Actividad Capítulo** |
| 518 | Tramite CODENSA aprobación proyecto serie 6 | 96 | 3-01-22 | 26-04-22 | 100,00% | 75,00% | 25,00% | 75,00% | (+) 82 días | Atraso neto duración restante 82 días |
| 395 | Aseo general de obra | 634 | 9-11-20 | 29-12-21 | 79,00% | 78,00% | 0,00% | 79,00% | (-) 0 días | Aseo general de obra: Atrio: Piso 6: Piso 5: Piso 4: Piso 3: Piso 2: Con el programa, adelanto 0 días |
| | | | | | | | | | * | R. Critica: 49 días |
| | | | | | | | | | * | R. Critica Ant:42 días |

El porcentaje programado es 81,03% y el ejecutado es 81,03% con el programa.
Alarmas en ruta crítica
-En el frente 1 Auditorio: Continua la influencia del reforzamiento de las cerchas de la estructura de la cubierta, previo modificatorio principalmente por su influencia en fachada interna.
-En el Frente 2 y 3 Atrio y 4 Plazoleta: Se hace énfasis sobre la importancia de tener la conexión de redes de alcantarillado por su influencia en acabados de sótano. Continúa la incidencia del permiso para torre de comunicaciones en el municipio. En estos frentes el aspecto más incidente en ruta crítica es la instalación del mobiliario.
-En el Frente 5 exteriores: Continúa la incidencia de la radicación y aprobación de diseños ante IDRD e IDU.

El personal programado en obra es de 119 y el real es de 157.

*

Actividad Capítulo

| Descripción | Oficial en obra Sem 181 | Ayudante en obra Sem 181 | Oficial Programado Sem 181 | Ayudante programado Sem 181 |
|---|---|---|---|---|
| Acabados | 33 | 10 | 26 | 18 |
| Carpintería Metálica | 7 | 0 | 6 | 4 |
| Cielo | 6 | 0 | 10 | 6 |
| Climatización | 17 | 0 | 2 | 2 |
| Divisiones | 16 | 0 | 2 | 2 |
| Eléctrico | 8 | 2 | 7 | 5 |
| Estructura | 18 | 0 | 1 | 1 |
| Fachada | 8 | 0 | 1 | 1 |
| Hidrosanitarias | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Incendio | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Muros secos | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Luminarias | 7 | 0 | 4 | 2 |
| Vias | 7 | 1 | 5 | 3 |
| Pisos | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Sellos Corta fuego | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 157,00 | | 119,00 | |

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


BOGOTÁ

**SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**

**INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN**

**SEMANA No** **181 de 208** DEL **12-jun-22** AL **19-jun-2022**

**Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG**
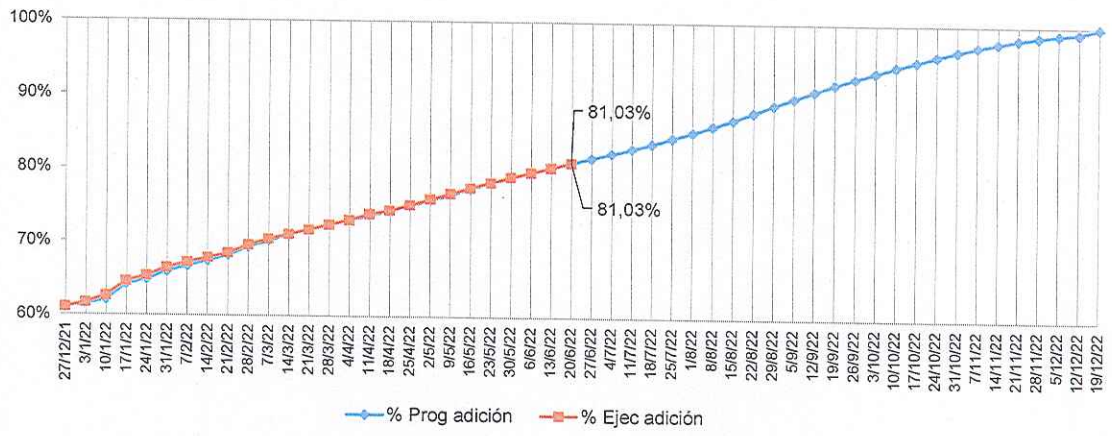
| Id | Actividad | Duración días | Comienzo | Fin | % programado | % Completado sem Ant | % De desviación | % completado | (-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * |  | | | | | | | | | |



*

BOGOTÁ

**SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**

**INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN**

**SEMANA No 183 de 208 DEL 26-jun-22 AL 03-jul-2022**

**Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG**

| Id | Actividad | Duración días | Comienzo | Fin | % programado | % Completado sem Ant | % De desviación | % completado | (-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PROGRAMA AVANCE PORCENTUAL POR CAPÍTULO | | | | | * | |
| | **Preliminares y obras Generales** | | | | **100,00%** | **100,00%** | | **100,00%** | * | **Actividad Capítulo** |
| | **Estructura** | | | | **95,95%** | **94,99%** | | **95,02%** | * | **Actividad Capítulo** |
| | **Obra gris** | | | | **97,88%** | **97,99%** | | **98,36%** | * | **Actividad Capítulo** |
| | **Acabados** | | | | **73,13%** | **74,06%** | | **75,34%** | * | **Actividad Capítulo** |
| | | | | PROGRAMA CONSOLIDADO | | | | | * | |
| **0** | **reprogramacion 3 v19** | | **28-12-18** | **17-12-22** | **82,37%** | **81,74%** | **-0,10%** | **82,47%** | **(-) 1 días** | **Actividad Capítulo** |
| | | | | PROGRAMA CONSOLIDADO POR FRENTES | | | | | * | |
| | **Auditorio F1 - Consolidado** | | **28-12-18** | **14-12-22** | **76,98%** | **72,45%** | **3,87%** | **73,11%** | **(+) 46 días** | **Actividad Capítulo** |
| **535** | **Piso 3** | **0** | **3-01-22** | **14-12-22** | **56,00%** | **11,00%** | **45,00%** | **11,00%** | **(+) 96 días** | **Actividad Capítulo** |
| 537 | Posible reforzamiento cubierta | 60 | 26-01-22 | 5-04-22 | 100,00% | 62,00% | 34,00% | 66,00% | (+) 112 días | Posible reforzamiento cubierta: Piso 3: aplicación cordones cercha 3 y tubulares verticales en cercha 4 (Adelanto contingencia programación), Atraso neto duración restante 112 días |
| 538 | Cubierta auditorio (remate) | 32 | 6-04-22 | 14-05-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 88 días | Atraso neto duración restante 88 días |
| 0 | Reparación pintura intumescente | 18 | 6-06-22 | 25-06-22 | 100,00% | 95,00% | 4,00% | 96,00% | (+) 9 días | Reparación pintura intumescente: Piso 3: lectura para acabado de pintura en fachada norte y occidente, medición de condiciones climáticas para aplicar pintura intumescente, pintura de acabado fachada norte y occidental, raspado de correas de techo para repintar, raspado de pintura en fachada norte, Atraso neto duración restante 9 días |
| 539 | Fachada auditorio | 120 | 14-03-22 | 2-08-22 | 78,00% | 70,00% | 5,00% | 73,00% | (+) 7 días | Fachada auditorio: Piso 2: Soporte fachada flotante en fachada norte, soportes fachada flotante fachada occidental, soportes fachada flotante fachada oriental, primer para peto fachada norte y sur, Atraso neto duración restante 7 días |
| 540 | Instalaciones hidrosanitarias | 30 | 6-04-22 | 12-05-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 88 días | Atraso neto duración restante 88 días |
| 541 | Instalaciones eléctricas | 90 | 6-04-22 | 21-07-22 | 82,00% | 0,00% | 82,00% | 0,00% | (+) 87 días | Atraso neto duración restante 87 días |
| 542 | Instalaciones voz y datos | 90 | 6-04-22 | 21-07-22 | 82,00% | 0,00% | 82,00% | 0,00% | (+) 87 días | Atraso neto duración restante 87 días |
| 543 | Instalaciones seguridad y control | 90 | 6-04-22 | 21-07-22 | 82,00% | 0,00% | 82,00% | 0,00% | (+) 87 días | Atraso neto duración restante 87 días |
| 544 | Instalaciones climatización | 90 | 6-04-22 | 21-07-22 | 82,00% | 36,00% | 46,00% | 36,00% | (+) 49 días | Atraso neto duración restante 49 días |
| 545 | Instalaciones red incendio | 90 | 6-04-22 | 21-07-22 | 82,00% | 0,00% | 82,00% | 0,00% | (+) 87 días | Atraso neto duración restante 87 días |
| 546 | Muros secos | 60 | 6-04-22 | 16-06-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 88 días | Atraso neto duración restante 88 días |
| 547 | Sellos cortafuego | 30 | 6-04-22 | 12-05-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 88 días | Atraso neto duración restante 88 días |
| 548 | Cielo rasos en fibrocemento | 60 | 6-04-22 | 16-06-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 88 días | Atraso neto duración restante 88 días |
| 549 | Cielo rasos especiales | 60 | 6-04-22 | 16-06-22 | 100,00% | 10,00% | 90,00% | 10,00% | (+) 81 días | Atraso neto duración restante 81 días |
| 550 | Carpinteria Metálica | 60 | 6-04-22 | 16-06-22 | 100,00% | 10,00% | 90,00% | 10,00% | (+) 81 días | Atraso neto duración restante 81 días |
| 553 | Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio) | 30 | 17-06-22 | 21-07-22 | 47,00% | 0,00% | 47,00% | 0,00% | (+) 16 días | Atraso neto duración restante 16 días |
| 554 | Luminarias | 60 | 17-06-22 | 25-08-22 | 23,00% | 0,00% | 23,00% | 0,00% | (+) 16 días | Atraso neto duración restante 16 días |
| 555 | Automatizacion de iluminación | 60 | 29-06-22 | 6-09-22 | 7,00% | 0,00% | 7,00% | 0,00% | (+) 5 días | Atraso neto duración restante 5 días |
| 556 | Pisos húmedos | 50 | 13-05-22 | 9-07-22 | 88,00% | 0,00% | 88,00% | 0,00% | (+) 50 días | Atraso neto duración restante 50 días |
| **566** | **Piso 2 y plaza armas** | **0** | **3-01-22** | **8-12-22** | **63,00%** | **59,00%** | **1,00%** | **62,00%** | **(+) 36 días** | **Actividad Capítulo** |
| 569 | Impermeabilización remate en perimetro de auditorio | 60 | 25-05-22 | 2-08-22 | 57,00% | 47,00% | 0,00% | 57,00% | (-) 0 días | Impermeabilización en zona de bóveda y juntas: Piso 1: impermeabilización con danopol HS 1.5, impermeabilización de terraza con geotextil y membrana danopol, Con el programa, adelanto 0 días |
| 570 | Instalaciones hidrosanitarias | 120 | 3-01-22 | 24-05-22 | 100,00% | 98,00% | 2,00% | 98,00% | (+) 43 días | Atraso neto duración restante 43 días |
| 571 | Instalaciones eléctricas | 120 | 3-01-22 | 24-05-22 | 100,00% | 98,00% | 2,00% | 98,00% | (+) 43 días | Atraso neto duración restante Con el programa, adelanto 43 días |
| 572 | Instalaciones voz y datos | 120 | 3-01-22 | 24-05-22 | 100,00% | 98,00% | 2,00% | 98,00% | (+) 43 días | Atraso neto duración restante Con el programa, adelanto 43 días |

BOGOTÁ

**SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**

**INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN**

**SEMANA No 183 de 208 DEL 26-jun-22 AL 03-jul-2022**

**Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG**

| Id | Actividad | Duración días | Comienzo | Fin | % programado | % Completado sem Ant | % De desviación | % completado | (-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573 | Instalaciones seguridad y control | 120 | 3-01-22 | 24-05-22 | 100,00% | 98,00% | 2,00% | 98,00% | (+) 43 días | Atraso neto duración restante 43 días |
| 574 | Instalaciones climatización | 120 | 3-01-22 | 24-05-22 | 100,00% | 98,00% | 1,00% | 99,00% | (+) 41 días | Instalaciones climatización: Piso 2: ductos para aire acondicionado, tubería en cobre cubierta con rubaex de 7/8 y 3/8 de pulgada, Casa cural desmonte cielo raso para conectar ducto de aire a equipo, Atraso neto duración restante 41 días |
| 579 | Pisos plazoletas remates perimetro auditorio | 60 | 3-08-22 | 11-10-22 | 0,00% | 5,00% | -5,00% | 5,00% | (-) -33 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -33 días |
| 580 | Enchapes | 60 | 25-05-22 | 2-08-22 | 57,00% | 47,00% | 0,00% | 57,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |
| 581 | Sellos cortafuego | 45 | 12-04-22 | 4-06-22 | 100,00% | 47,00% | 53,00% | 47,00% | (+) 57 días | Atraso neto duración restante 57 días |
| 582 | Cielo rasos en fibrocemento | 60 | 13-05-22 | 21-07-22 | 73,00% | 63,00% | 0,00% | 73,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |
| 583 | Cielo rasos especiales | 60 | 13-05-22 | 21-07-22 | 73,00% | 63,00% | 0,00% | 73,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |
| 584 | Carpinteria Metálica | 60 | 13-05-22 | 21-07-22 | 73,00% | 63,00% | 0,00% | 73,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |
| 585 | Pintura | 120 | 25-05-22 | 11-10-22 | 28,00% | 23,00% | 0,00% | 28,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |
| 586 | Remates generales | 80 | 29-06-22 | 29-09-22 | 5,00% | 1,00% | 0,00% | 5,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |
| 588 | Pisos húmedos | 30 | 25-05-22 | 28-06-22 | 100,00% | 93,00% | 0,00% | 100,00% | (-) 0 días | Finalizado |
| **601** | **Piso 1 y plaza de acceso** | **0** | **3-01-22** | **14-12-22** | **52,00%** | **51,00%** | **-1,00%** | **53,00%** | **(-) 1 días** | **Actividad Capítulo** |
| 607 | Fragüe de bóveda y descimbrado de formaleta | 20 | 17-06-22 | 9-07-22 | 70,00% | 100,00% | -30,00% | 100,00% | Finalizado | Terminado |
| 608 | Impermeabilización en zona de bóveda y juntas | 30 | 11-07-22 | 13-08-22 | 0,00% | 5,00% | -5,00% | 5,00% | (-) -9 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -9 días |
| 609 | Instalaciones eléctricas | 60 | 17-06-22 | 25-08-22 | 23,00% | 13,00% | 0,00% | 23,00% | (-) 0 días | Instalaciones eléctricas: Piso 1: tubería EmT 3/4" para cable no blindado casa cural, Con el programa, adelanto 0 días |
| 610 | Instalaciones voz y datos | 60 | 17-06-22 | 25-08-22 | 23,00% | 13,00% | 0,00% | 23,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |
| 611 | Instalaciones seguridad y control | 60 | 17-06-22 | 25-08-22 | 23,00% | 13,00% | 0,00% | 23,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |
| 612 | Instalaciones climatización | 60 | 17-06-22 | 25-08-22 | 23,00% | 20,00% | 0,00% | 23,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |
| 613 | Instalaciones red incendio | 60 | 17-06-22 | 25-08-22 | 23,00% | 13,00% | 0,00% | 23,00% | (-) 0 días | Instalaciones red incendio: Piso 1: pruebas provisionales del sistema de detención de incendios en cuarto técnico 1, Con el programa, adelanto 0 días |
| 620 | Muros secos | 60 | 3-01-22 | 12-03-22 | 100,00% | 100,00% | 1,00% | 99,00% | (+) 114 días | Muros secos: Piso 1: cierre muros casa cural 8mm, Finalizado |
| 621 | Sellos cortafuego | 30 | 14-03-22 | 19-04-22 | 100,00% | 15,00% | 85,00% | 15,00% | (+) 106 días | Atraso neto duración restante 106 días |
| 622 | Cielo rasos en fibrocemento | 60 | 7-02-22 | 19-04-22 | 100,00% | 99,00% | 1,00% | 99,00% | (+) 76 días | Terminado |
| 624 | Cielo rasos especiales | 101 | 14-03-22 | 11-07-22 | 93,00% | 87,00% | 5,00% | 88,00% | (+) 6 días | Cielo rasos especiales: Piso 1: cielo raso en madera chapilla eje 1-11 F-H, cielo raso en madera tipo chapilla eje 1-11/G-H, Atraso neto duración restante 6 días |
| 626 | Pisos húmedos | 30 | 25-05-22 | 28-06-22 | 100,00% | 93,00% | 0,00% | 100,00% | (-) 0 días | Finalizado |
| 627 | Aparatos sanitarios y accesorios | 30 | 25-05-22 | 28-06-22 | 100,00% | 93,00% | 0,00% | 100,00% | (-) 0 días | Finalizado |
| 628 | Pintura | 80 | 26-08-22 | 26-11-22 | 0,00% | 40,00% | -45,00% | 45,00% | (-) -91 días | Pintura: Piso 1: maquillaje estructura en concreto, adelanto -91 días |
| 629 | Remates generales | 80 | 26-08-22 | 26-11-22 | 0,00% | 10,00% | -10,00% | 10,00% | (-) -60 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -60 días |
| 630 | Pisos plazoletas | 60 | 15-08-22 | 22-10-22 | 0,00% | 5,00% | -5,00% | 5,00% | (-) -44 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -44 días |
| 631 | Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio) | 30 | 12-07-22 | 15-08-22 | 0,00% | 10,00% | -10,00% | 10,00% | (-) -12 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -12 días |

BOGOTÁ

**SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**

**INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN**

**SEMANA No** **183 de 208** DEL **26-jun-22** AL **03-jul-2022**

**Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG**

| Id | Actividad | Duración días | Comienzo | Fin | % programado | % Completado sem Ant | % De desviación | % completado | (-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 | Luminarias | 50 | 3-08-22 | 29-09-22 | 0,00% | 5,00% | -5,00% | 5,00% | (-) -32 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -32 días |
| 635 | Ventanería | 45 | 19-09-22 | 9-11-22 | 0,00% | 0,00% | -5,00% | 5,00% | (-) -77 días | Ventanería: Piso 1: perforaciones para anclajes bordillo contorno bóveda para ventanería spider, adelanto -77 días |
| 636 | Divisiones de oficina | 30 | 19-09-22 | 22-10-22 | 0,00% | 0,00% | -5,00% | 5,00% | (-) -76 días | Divisiones de oficina: Piso 1: anclaje tipo u bordillo de mamparas en bóveda, adelanto -76 días |
| 639 | Carpinteria Madera | 30 | 30-09-22 | 3-11-22 | 0,00% | 20,00% | -20,00% | 20,00% | (-) -91 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -91 días |
| **645** | **Sótano** | **0** | **3-01-22** | **14-12-22** | **36,00%** | **43,00%** | **-8,00%** | **44,00%** | **(-) 7 días** | **Actividad Capítulo** |
| 647 | Instalaciones eléctricas | 60 | 11-07-22 | 17-09-22 | 0,00% | 10,00% | -10,00% | 10,00% | (-) -14 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -14 días |
| 649 | Instalaciones seguridad y control | 60 | 11-07-22 | 17-09-22 | 0,00% | 5,00% | -5,00% | 5,00% | (-) -11 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -11 días |
| 650 | Instalaciones climatización | 60 | 11-07-22 | 17-09-22 | 0,00% | 2,00% | -2,00% | 2,00% | (-) -9 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -9 días |
| 651 | Instalaciones red incendio | 60 | 11-07-22 | 17-09-22 | 0,00% | 10,00% | -10,00% | 10,00% | (-) -14 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -14 días |
| 656 | Instalaciones climatización | 60 | 3-01-22 | 12-03-22 | 100,00% | 99,00% | 1,00% | 99,00% | (+) 114 días | Instalaciones climatización: Sótano: ductos de aire acondicionado eje 1-4 A-C, ductos para salidas de rejillas de aire acondicionado ejes 7-11 A-F, rejillas de aire acondicionado ejes 10-11 C-F, Finalizado |
| 658 | Muros secos | 60 | 3-01-22 | 12-03-22 | 100,00% | 99,00% | 1,00% | 99,00% | (+) 114 días | Muros secos: Sótano: instalación superboard y frescasa de muro curvo 2-7 B-C, instalación y soldadura muro curvo eje 5-7 B-C, soldadura de perfiles metálicos de muro curvo bajo escalera eje 6-7 D-C, Finalizado |
| 662 | Sellos cortafuego | 60 | 14-03-22 | 24-05-22 | 100,00% | 15,00% | 85,00% | 15,00% | (+) 100 días | Atraso neto duración restante 100 días |
| 664 | Cielo rasos especiales | 40 | 15-08-22 | 29-09-22 | 0,00% | 70,00% | -70,00% | 70,00% | (-) -71 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -71 días |
| 665 | Carpinteria Metálica | 40 | 15-08-22 | 29-09-22 | 0,00% | 20,00% | -20,00% | 20,00% | (-) -49 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -49 días |
| 666 | Pintura | 90 | 15-08-22 | 26-11-22 | 0,00% | 50,00% | -60,00% | 60,00% | (-) -100 días | Pintura: Sótano: lijado estuco y pintura muro seco eje 1-11 G-H, masillado de muro curvo eje 2-7 B-C, remate y resane de columnas No 9, 10 ejes 11-H, |
| 667 | Remates generales | 90 | 15-08-22 | 26-11-22 | 0,00% | 5,00% | -5,00% | 5,00% | (-) -46 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -46 días |
| 669 | Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio) | 60 | 20-08-22 | 28-10-22 | 0,00% | 15,00% | -15,00% | 15,00% | (-) -55 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -55 días |
| 670 | Luminarias | 30 | 30-09-22 | 3-11-22 | 0,00% | 50,00% | -50,00% | 50,00% | (-) -101 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -101 días |
| 672 | Divisiones de oficina | 50 | 30-09-22 | 26-11-22 | 0,00% | 80,00% | -85,00% | 85,00% | (-) -131 días | Divisiones de oficina: Sótano: pisa vidrios mamparas de caucho ejes 7-8/C-E, vidrios mamparas ejes 1-3/H-I, adelanto -131 días |
| 673 | Pisos secos | 40 | 15-08-22 | 29-09-22 | 0,00% | 30,00% | -30,00% | 30,00% | (-) -54 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -54 días |

BOGOTÁ

**SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**

**INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN**

**SEMANA No 183 de 208 DEL 26-jun-22 AL 03-jul-2022**

**Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG**

| Id | Actividad | Duración días | Comienzo | Fin | % programado | % Completado sem Ant | % De desviación | % completado | (-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 675 | Carpinteria Madera | 30 | 12-10-22 | 15-11-22 | 0,00% | 10,00% | -20,00% | 20,00% | (-) -102 días | Carpinteria Madera: Sótano: puerta de madera eje 1-2 B-C, adelanto -102 días |
| | **Atrio frente 2 y 3 - Consolidado** | | **28-12-18** | **17-12-22** | **84,64%** | **85,92%** | **-2,17%** | **86,81%** | **(-) 7 días** | **Actividad Capítulo** |
| | **Atrio F2 - Consolidado** | | **28-12-18** | **14-12-22** | **88,63%** | **89,13%** | **-0,90%** | **89,53%** | **(-) 4 días** | **Actividad Capítulo** |
| **682** | **Cubierta** | **0** | **14-03-22** | **19-04-22** | **100,00%** | **0,00%** | **100,00%** | **0,00%** | **(+) 82 días** | **Actividad Capítulo** |
| 0 | Radicado factibilidad PONAL | 0 | 30-05-22 | 30-05-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 34 días | Atraso neto duracion retante 34 días |
| 0 | Radicado permiso FAC 60 dias | 0 | 30-05-22 | 30-05-22 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | Finalizado | Terminado |
| 683 | Torre de comunicación | 30 | 14-03-22 | 19-04-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 111 días | Atraso neto duración restante 111 días |
| **716** | **Piso 5** | **0** | **25-01-22** | **26-11-22** | **66,00%** | **68,00%** | **-4,00%** | **70,00%** | **(-) 7 días** | **Actividad Capítulo** |
| 722 | Instalaciones climatización | 60 | 26-01-22 | 5-04-22 | 100,00% | 99,00% | 1,00% | 99,00% | (+) 90 días | Instalaciones climatización: Piso 5: abertura de hueco en muro cuarto técnico para tubería de aire eje 24-25 F-G, conexión cableado de aire en cuarto técnico ejes 13-14 B-C, Finalizado |
| 723 | Instalaciones red incendio | 60 | 26-01-22 | 5-04-22 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | Finalizado | Terminado |
| 725 | Sellos cortafuego | 30 | 26-01-22 | 1-03-22 | 100,00% | 100,00% | 1,00% | 99,00% | (+) 124 días | Sellos cortafuego: Piso 5: sello corta fuego cuarto técnico eje 13-14/B-C, Finalizado |
| 730 | Aparatos sanitarios y accesorios | 30 | 11-06-22 | 15-07-22 | 63,00% | 43,00% | 0,00% | 63,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |
| 734 | Remates generales | 80 | 6-04-22 | 9-07-22 | 93,00% | 70,00% | 13,00% | 80,00% | (+) 12 días | Resanes generales: Piso 5: remate de enchape en muro en baño ejes 29-D 29-E, Atraso neto duración restante 12 días |
| 735 | Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio) | 30 | 17-06-22 | 21-07-22 | 47,00% | 27,00% | 0,00% | 47,00% | (-) 0 días | Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio): Piso 5: aparatos señalización de salida ejes 26-29/E-G, Con el programa, adelanto 0 días |
| 736 | Luminarias | 60 | 17-06-22 | 25-08-22 | 23,00% | 50,00% | -32,00% | 55,00% | (-) 31 días | luminarias: Piso 5: asegurando luminarias ejes 18-22 D-E, luminarias ejes 18-19 D-E, adelanto 31 días |
| 737 | Divisiones de oficina | 60 | 17-06-22 | 25-08-22 | 23,00% | 91,00% | -69,00% | 92,00% | (-) 5 días | Divisiones de oficina: Piso 5: empaques en mamparas entre ejes 18-20 D-E, adelanto 5 días |
| 739 | Pisos secos | 45 | 22-07-22 | 12-09-22 | 0,00% | 5,00% | -5,00% | 5,00% | (-) -21 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -21 días |
| 742 | Carpinteria Madera | 30 | 26-08-22 | 29-09-22 | 0,00% | 10,00% | -15,00% | 15,00% | (-) -56 días | Carpinteria Madera: Piso 5: estructura en madera frente ascensores ejes 27-F 28-F, adelanto -56 días |
| **748** | **Piso 4** | **0** | **17-02-22** | **13-12-22** | **61,00%** | **65,00%** | **-6,00%** | **67,00%** | **(-) 18 días** | **Actividad Capítulo** |
| 751 | Instalaciones eléctricas | 60 | 18-02-22 | 30-04-22 | 100,00% | 100,00% | 1,00% | 99,00% | (+) 65 días | Instalaciones eléctricas: Piso 4: cableado puertas en cuartos técnicos, Finalizado |
| 755 | Instalaciones red incendio | 60 | 18-02-22 | 30-04-22 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | Finalizado | Terminado |
| 758 | Sellos cortafuego | 30 | 18-02-22 | 24-03-22 | 100,00% | 70,00% | 10,00% | 90,00% | (+) 104 días | Sellos cortafuego: Piso 4: sello corta fuego en cuarto técnico ejes 28-29/F-G y 13-14/B-C, Atraso neto duración restante 104 días |
| 759 | Cielo rasos en fibrocemento | 60 | 18-02-22 | 30-04-22 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | Finalizado | Terminado |
| 763 | Cielo rasos especiales | 60 | 2-05-22 | 9-07-22 | 90,00% | 90,00% | 0,00% | 90,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |
| 764 | Carpinteria Metálica | 60 | 2-05-22 | 9-07-22 | 90,00% | 80,00% | 0,00% | 90,00% | (-) 0 días | Carpinteria Metálica: Piso 4: sello tapa gotero fachada sur eje 12-G 30-G, Con el programa, adelanto 0 días |
| 765 | Pintura | 120 | 2-05-22 | 17-09-22 | 45,00% | 50,00% | -5,00% | 50,00% | (-) 69 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto 69 días |
| 766 | Remates generales | 80 | 2-05-22 | 2-08-22 | 68,00% | 50,00% | 18,00% | 50,00% | (+) 17 días | Atraso neto duración restante 17 días |

BOGOTÁ

**SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**

**INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN**

**SEMANA No** **183 de 208** DEL **26-jun-22** AL **03-jul-2022**

**Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG**

| Id | Actividad | Duración días | Comienzo | Fin | % programado | % Completado sem Ant | % De desviación | % completado | (-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395 | Aseo general de obra | 634 | 9-11-20 | 29-12-21 | 81,00% | 80,00% | 0,00% | 81,00% | (-) 0 días | Aseo general de obra: Auditorio: Piso 1: casa cural aseo general, Piso 2: aseo general, Atrio: Piso 6: Piso 5: Piso 4: Piso 3: Piso 2: aseo general, Con el programa, adelanto 0 días |
| | | | | | | | | | * | R. Critica: 56 días |
| | | | | | | | | | * | R. Critica Ant:56 días |

El porcentaje programado es 82,37% y el ejecutado es 82,47% adelanto 3 días
Inicio de actividades proximas: Cuarto de control bajo bóveda, acta de vanos fabricación ventanería spider bóveda
Alarmas en ruta crítica
-Teniendo en cuenta que la fecha programada para inicio de instalación de mobiliario continua aplazandose y este hecho influencia el final de instalaciones electricas voz, datos, seguridad y control, planear una posible finalizacion de estas actividades en el tiempo programado si no se tiene el mobiliario antes de la fecha final del contrato.
-En el frente 1 Auditorio: Construcciones internas en Bóveda.
-En el Frente 2 y 3 Atrio y 4 Plazoleta: Corrección de la desviación de las siguientes actividades. Atrio F2: Cubierta: Torre de comunicación, Instalaciones climatización adicionales.
-En el Frente 5 exteriores: Continúa la incidencia de la radicación y aprobación de diseños ante IDRD e IDU.
El personal programado en obra es de 106 y el real es de 152.

*


*

Actividad Capítulo

| Descripción | Oficial en obra Sem 183 | Ayudante en obra Sem 183 | Oficial Programado Sem 183 | Ayudante programado Sem 183 |
|---|---|---|---|---|
| Acabados | 28 | 10 | 21 | 14 |
| Carpintería Metálica | 14 | 0 | 6 | 4 |
| Cielo | 10 | 0 | 10 | 6 |
| Climatización | 18 | 0 | 2 | 2 |
| Divisiones | 16 | 0 | 4 | 2 |
| Eléctrico | 4 | 3 | 8 | 5 |
| Estructura | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Fachada | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Hidrosanitarias | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Incendio | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Muros secos | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Luminarias | 6 | 0 | 4 | 2 |
| Gas | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Vias | 7 | 0 | 4 | 2 |
| Pisos | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sellos Corta fuego | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 152,00 | | 106,00 | |

3 0

*

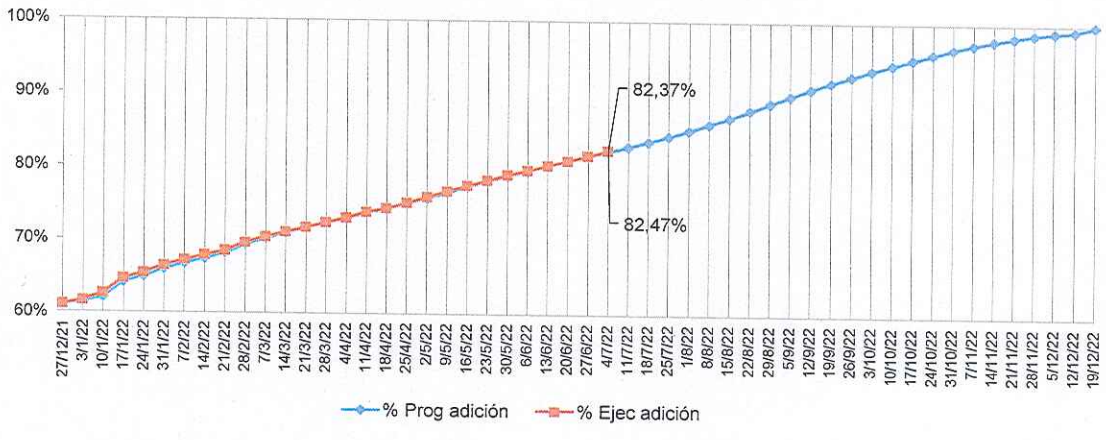


*

*

BOGOTÁ

**SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**

**INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN**

**SEMANA No** **182 de 208** DEL **19-jun-22** AL **26-jun-2022**

**Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG**

| Id | Actividad | Duración días | Comienzo | Fin | % programado | % Completado sem Ant | % De desviación | % completado | (-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PROGRAMA AVANCE PORCENTUAL POR CAPÍTULO | | | | | * | |
| | **Preliminares y obras Generales** | | | | **100,00%** | **100,00%** | | **100,00%** | * | **Actividad Capítulo** |
| | **Estructura** | | | | **95,66%** | **94,99%** | | **94,99%** | * | **Actividad Capítulo** |
| | **Obra gris** | | | | **97,88%** | **97,99%** | | **97,99%** | * | **Actividad Capítulo** |
| | **Acabados** | | | | **72,08%** | **72,52%** | | **74,06%** | * | **Actividad Capítulo** |
| | | | | PROGRAMA CONSOLIDADO | | | | | * | |
| **0** | **reprogramacion 3 v19** | | **28-12-18** | **17-12-22** | **81,72%** | **81,03%** | **-0,02%** | **81,74%** | **(-) 1 días** | **Actividad Capítulo** |
| | | | | PROGRAMA CONSOLIDADO POR FRENTES | | | | | * | |
| | **Auditorio F1 - Consolidado** | | **28-12-18** | **14-12-22** | **76,04%** | **71,54%** | **3,60%** | **72,45%** | **(+) 44 días** | **Actividad Capítulo** |
| **535** | **Piso 3** | **0** | **3-01-22** | **14-12-22** | **52,00%** | **10,00%** | **41,00%** | **11,00%** | **(+) 95 días** | **Actividad Capítulo** |
| 537 | Posible reforzamiento cubierta | 60 | 26-01-22 | 5-04-22 | 100,00% | 62,00% | 38,00% | 62,00% | (+) 108 días | Atraso neto duración restante 108 días |
| 538 | Cubierta auditorio (remate) | 32 | 6-04-22 | 14-05-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 81 días | Atraso neto duración restante 81 días |
| 0 | Reparación pintura intumescente | 18 | 6-06-22 | 25-06-22 | 100,00% | 66,00% | 5,00% | 95,00% | (-) 2 días | Reparación pintura intumescente: Piso 3: Lectura de espesor de primer fachada occidental y aplicación de pintura intumescente, Remoción de pintura suelta en estructura fachada norte y occidente, Atraso neto duración restante 2 días |
| 539 | Fachada auditorio | 120 | 14-03-22 | 2-08-22 | 73,00% | 68,00% | 3,00% | 70,00% | (-) -33 días | Fachada auditorio: Piso 2: soporte fachada segunda piel fachada norte, Toma de espesores de acabado en parapeto, Toma de espesores de acabado pintura en fachada occidente, sur, oriente, esquineros remate de parapetos, Atraso neto duración restante -33 días |
| 540 | Instalaciones hidrosanitarias | 30 | 6-04-22 | 12-05-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 81 días | Atraso neto duración restante 81 días |
| 541 | Instalaciones eléctricas | 90 | 6-04-22 | 21-07-22 | 76,00% | 0,00% | 76,00% | 0,00% | (+) 81 días | Atraso neto duración restante 81 días |
| 542 | Instalaciones voz y datos | 90 | 6-04-22 | 21-07-22 | 76,00% | 0,00% | 76,00% | 0,00% | (+) 81 días | Atraso neto duración restante 81 días |
| 543 | Instalaciones seguridad y control | 90 | 6-04-22 | 21-07-22 | 76,00% | 0,00% | 76,00% | 0,00% | (+) 81 días | Atraso neto duración restante 81 días |
| 544 | Instalaciones climatización | 90 | 6-04-22 | 21-07-22 | 76,00% | 36,00% | 40,00% | 36,00% | (+) 42 días | Atraso neto duración restante 42 días |
| 545 | Instalaciones red incendio | 90 | 6-04-22 | 21-07-22 | 76,00% | 0,00% | 76,00% | 0,00% | (+) 81 días | Atraso neto duración restante 81 días |
| 546 | Muros secos | 60 | 6-04-22 | 16-06-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 81 días | Atraso neto duración restante 81 días |
| 547 | Sellos cortafuego | 30 | 6-04-22 | 12-05-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 81 días | Atraso neto duración restante 81 días |
| 548 | Cielo rasos en fibrocemento | 60 | 6-04-22 | 16-06-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 81 días | Atraso neto duración restante 81 días |
| 549 | Cielo rasos especiales | 60 | 6-04-22 | 16-06-22 | 100,00% | 10,00% | 90,00% | 10,00% | (+) 74 días | Atraso neto duración restante 74 días |
| 550 | Carpinteria Metálica | 60 | 6-04-22 | 16-06-22 | 100,00% | 5,00% | 90,00% | 10,00% | (+) 74 días | Carpinteria Metálica: Piso 3:Reforzamiento de cerchas 2 y 3, Atraso neto duración restante 74 días |
| 553 | Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio) | 30 | 17-06-22 | 21-07-22 | 27,00% | 0,00% | 27,00% | 0,00% | (+) 9 días | Atraso neto duración restante 9 días |
| 554 | Luminarias | 60 | 17-06-22 | 25-08-22 | 13,00% | 0,00% | 13,00% | 0,00% | (+) 9 días | Atraso neto duración restante 9 días |
| 556 | Pisos húmedos | 50 | 13-05-22 | 9-07-22 | 76,00% | 0,00% | 76,00% | 0,00% | (+) 43 días | Atraso neto duración restante 43 días |
| **566** | **Piso 2 y plaza armas** | **0** | **3-01-22** | **8-12-22** | **61,00%** | **57,00%** | **2,00%** | **59,00%** | **(+) 35 días** | **Actividad Capítulo** |
| 569 | Impermeabilización remate en perimetro de auditorio | 60 | 25-05-22 | 2-08-22 | 47,00% | 37,00% | 0,00% | 47,00% | (-) 0 días | Con el programa, adelanto 0 días |
| 570 | Instalaciones hidrosanitarias | 120 | 3-01-22 | 24-05-22 | 100,00% | 98,00% | 2,00% | 98,00% | (+) 36 días | Atraso neto duración restante 36 días |
| 571 | Instalaciones eléctricas | 120 | 3-01-22 | 24-05-22 | 100,00% | 98,00% | 2,00% | 98,00% | (+) 36 días | Atraso neto duración restante Con el programa, adelanto 36 días |
| 572 | Instalaciones voz y datos | 120 | 3-01-22 | 24-05-22 | 100,00% | 98,00% | 2,00% | 98,00% | (+) 36 días | Atraso neto duración restante Con el programa, adelanto 36 días |
| 573 | Instalaciones seguridad y control | 120 | 3-01-22 | 24-05-22 | 100,00% | 98,00% | 2,00% | 98,00% | (+) 36 días | Atraso neto duración restante 36 días |
| 574 | Instalaciones climatización | 120 | 3-01-22 | 24-05-22 | 100,00% | 98,00% | 2,00% | 98,00% | (+) 36 días | Instalaciones climatización: Piso 2: ductos A/C y cuellos en baños, Atraso neto duración restante Con el programa, adelanto 36 días |
| 579 | Pisos plazoletas remates perimetro auditorio | 60 | 3-08-22 | 11-10-22 | 0,00% | 5,00% | -5,00% | 5,00% | (-) -39 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -39 días |
| 580 | Enchapes | 60 | 25-05-22 | 2-08-22 | 47,00% | 37,00% | 0,00% | 47,00% | (-) 0 días | Con el programa, adelanto 0 días |

BOGOTÁ

**SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**

**INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN**

**SEMANA No** **182 de 208** DEL **19-jun-22** AL **26-jun-2022**

**Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG**

| Id | Actividad | Duración días | Comienzo | Fin | % programado | % Completado sem Ant | % De desviación | % completado | (-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | Sellos cortafuego | 45 | 12-04-22 | 4-06-22 | 100,00% | 47,00% | 53,00% | 47,00% | (+) 50 días | Atraso neto duración restante 50 días |
| 582 | Cielo rasos en fibrocemento | 60 | 13-05-22 | 21-07-22 | 63,00% | 53,00% | 0,00% | 63,00% | (-) 0 días | Con el programa, adelanto 0 días |
| 583 | Cielo rasos especiales | 60 | 13-05-22 | 21-07-22 | 63,00% | 53,00% | 0,00% | 63,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |
| 584 | Carpinteria Metálica | 60 | 13-05-22 | 21-07-22 | 63,00% | 53,00% | 0,00% | 63,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |
| 585 | Pintura | 120 | 25-05-22 | 11-10-22 | 23,00% | 18,00% | 0,00% | 23,00% | (-) 0 días | Con el programa, adelanto 0 días |
| 586 | Remates generales | 80 | 29-06-22 | 29-09-22 | 0,00% | 1,00% | -1,00% | 1,00% | (-) -4 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -4 días |
| 588 | Pisos húmedos | 30 | 25-05-22 | 28-06-22 | 93,00% | 73,00% | 0,00% | 93,00% | (-) 0 días | Con el programa, adelanto 0 días |
| **601** | **Piso 1 y plaza de acceso** | **0** | **3-01-22** | **14-12-22** | **49,00%** | **49,00%** | **-2,00%** | **51,00%** | **(-) 4 días** | **Actividad Capítulo** |
| 607 | Frague de bóveda y descimbrado de formaleta | 20 | 17-06-22 | 9-07-22 | 40,00% | 100,00% | -60,00% | 100,00% | Finalizado | Terminado |
| 608 | Impermeabilización en zona de bóveda y juntas | 30 | 11-07-22 | 13-08-22 | 0,00% | 5,00% | -5,00% | 5,00% | (-) -16 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -16 días |
| 609 | Instalaciones eléctricas | 60 | 17-06-22 | 25-08-22 | 13,00% | 5,00% | 0,00% | 13,00% | (-) 0 días | Con el programa, adelanto 0 días |
| 610 | Instalaciones voz y datos | 60 | 17-06-22 | 25-08-22 | 13,00% | 5,00% | 0,00% | 13,00% | (-) 0 días | Con el programa, adelanto 0 días |
| 611 | Instalaciones seguridad y control | 60 | 17-06-22 | 25-08-22 | 13,00% | 5,00% | 0,00% | 13,00% | (-) 0 días | Con el programa, adelanto 0 días |
| 612 | Instalaciones climatización | 60 | 17-06-22 | 25-08-22 | 13,00% | 20,00% | -7,00% | 20,00% | (-) 55 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto 55 días |
| 613 | Instalaciones red incendio | 60 | 17-06-22 | 25-08-22 | 13,00% | 10,00% | 0,00% | 13,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |
| 621 | Sellos cortafuego | 30 | 14-03-22 | 19-04-22 | 100,00% | 15,00% | 85,00% | 15,00% | (+) 99 días | Atraso neto duración restante 99 días |
| 622 | Cielo rasos en fibrocemento | 60 | 7-02-22 | 19-04-22 | 100,00% | 100,00% | 1,00% | 99,00% | (-) 69 días | Terminado |
| 624 | Cielo rasos especiales | 101 | 14-03-22 | 11-07-22 | 87,00% | 81,00% | 0,00% | 87,00% | (-) 0 días | Cielo rasos especiales: Piso 1: Cerramiento de muro para instalación cielo raso, cielo raso en madera ejes 1-10/G-H, Con el programa, adelanto 0 días |
| 626 | Pisos húmedos | 30 | 25-05-22 | 28-06-22 | 93,00% | 73,00% | 0,00% | 93,00% | (-) 0 días | Con el programa, adelanto 0 días |
| 627 | Aparatos sanitarios y accesorios | 30 | 25-05-22 | 28-06-22 | 93,00% | 73,00% | 0,00% | 93,00% | (-) 0 días | Con el programa, adelanto 0 días |
| 628 | Pintura | 80 | 26-08-22 | 26-11-22 | 0,00% | 35,00% | -40,00% | 40,00% | (-) -93 días | Pintura: Piso 1: Resanes de estructura en concreto ejes 5-7/H, Resanes de estructuras en concreto ejes 12-13/H-I, Resanes de estructuras en concreto ejes H/3-5, 10-11/I-J, adelanto -93 días |
| 629 | Remates generales | 80 | 26-08-22 | 26-11-22 | 0,00% | 10,00% | -10,00% | 10,00% | (-) -67 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -67 días |
| 630 | Pisos plazoletas | 60 | 15-08-22 | 22-10-22 | 0,00% | 5,00% | -5,00% | 5,00% | (-) -51 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -51 días |
| 631 | Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio) | 30 | 12-07-22 | 15-08-22 | 0,00% | 10,00% | -10,00% | 10,00% | (-) -18 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -18 días |
| 632 | Luminarias | 50 | 3-08-22 | 29-09-22 | 0,00% | 5,00% | -5,00% | 5,00% | (-) -39 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -39 días |
| **645** | **Sótano** | **0** | **3-01-22** | **14-12-22** | **36,00%** | **40,00%** | **-7,00%** | **43,00%** | **(-) 11 días** | **Actividad Capítulo** |
| 647 | Instalaciones eléctricas | 60 | 11-07-22 | 17-09-22 | 0,00% | 10,00% | -10,00% | 10,00% | (-) -21 días | adelanto -21 días |
| 649 | Instalaciones seguridad y control | 60 | 11-07-22 | 17-09-22 | 0,00% | 5,00% | -5,00% | 5,00% | (-) -17 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -17 días |
| 650 | Instalaciones climatización | 60 | 11-07-22 | 17-09-22 | 0,00% | 2,00% | -2,00% | 2,00% | (-) -16 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -16 días |

BOGOTÁ

**SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**

**INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN**

**SEMANA No 182 de 208** DEL **19-jun-22** AL **26-jun-2022**

**Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG**

| Id | Actividad | Duración días | Comienzo | Fin | % programado | % Completado sem Ant | % De desviación | % completado | (-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | Instalaciones red incendio | 60 | 11-07-22 | 17-09-22 | 0,00% | 10,00% | -10,00% | 10,00% | (-) -21 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -21 días |
| 656 | Instalaciones climatización | 60 | 3-01-22 | 12-03-22 | 100,00% | 100,00% | 1,00% | 99,00% | (-) 107 días | Instalaciones climatización: Sótano: Instalación y salida de rejillas ventilación a exterior costado norte ejes 10-11/A-B, Finalizado |
| 658 | Muros secos | 60 | 3-01-22 | 12-03-22 | 100,00% | 100,00% | 1,00% | 99,00% | (+) 107 días | Muros secos: Sótano: Masilladoo de muro curvo ejes 2-6/B-C, superboard y aislante muro curvo, masillado ejes 2-7/B-C, Finalizado |
| 661 | Aparatos sanitarios y accesorios | 30 | 20-04-22 | 24-05-22 | 100,00% | 100,00% | 1,00% | 99,00% | (+) 33 días | Aparatos sanitarios y accesorios: Sótano: sanitario ejes 2-6/A-B, Finalizado |
| 662 | Sellos cortafuego | 60 | 14-03-22 | 24-05-22 | 100,00% | 15,00% | 85,00% | 15,00% | (+) 93 días | Atraso neto duración restante 93 días |
| 664 | Cielo rasos especiales | 40 | 15-08-22 | 29-09-22 | 0,00% | 65,00% | -70,00% | 70,00% | (-) -77 días | Cielo rasos especiales: Sótano: cielo raso y remates contra muros y mamparas ejes 1-11/H-L, adelanto -77 días |
| 665 | Carpinteria Metálica | 40 | 15-08-22 | 29-09-22 | 0,00% | 20,00% | -20,00% | 20,00% | (-) -56 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -56 días |
| 666 | Pintura | 90 | 15-08-22 | 26-11-22 | 0,00% | 30,00% | -50,00% | 50,00% | (-) -96 días | Pintura: Sótano: Lijado y pintura d e muro seco ejes 1-11/H-L, adelanto -96 días |
| 667 | Remates generales | 90 | 15-08-22 | 26-11-22 | 0,00% | 5,00% | -5,00% | 5,00% | (-) -52 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -52 días |
| 669 | Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio) | 60 | 20-08-22 | 28-10-22 | 0,00% | 15,00% | -15,00% | 15,00% | (-) -62 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -62 días |
| 670 | Luminarias | 30 | 30-09-22 | 3-11-22 | 0,00% | 20,00% | -50,00% | 50,00% | (-) -107 días | luminarias: Sótano: lámparas de iluminación ejes 1-11/H-L, lámparas de iluminación ejes 1-7/H-L, luminarias ejes 7-11/I-L, luminarias exterior en vacío 1, riel guía a iluminación ejes 6-8/G-H, adelanto -107 días |
| 672 | Divisiones de oficina | 50 | 30-09-22 | 26-11-22 | 0,00% | 30,00% | -80,00% | 80,00% | (-) -135 días | Divisiones de oficina: Sótano: pisa vidrios mamparas de caucho ejes 7-8/C-E, vidrios mamparas ejes 1-3/H-I, adelanto -135 días |
| 673 | Pisos secos | 40 | 15-08-22 | 29-09-22 | 0,00% | 30,00% | -30,00% | 30,00% | (-) -60 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -60 días |
| 675 | Carpinteria Madera | 30 | 12-10-22 | 15-11-22 | 0,00% | 10,00% | -10,00% | 10,00% | (-) -106 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -106 días |
| | **Atrio frente 2 y 3 - Consolidado** | | **28-12-18** | **17-12-22** | **83,95%** | **85,19%** | **-1,97%** | **85,92%** | **(-) 7 días** | **Actividad Capítulo** |
| | **Atrio F2 - Consolidado** | | **28-12-18** | **14-12-22** | **88,11%** | **88,61%** | **-1,02%** | **89,13%** | **(-) 4 días** | **Actividad Capítulo** |
| **682** | **Cubierta** | **0** | **14-03-22** | **19-04-22** | **100,00%** | **0,00%** | **100,00%** | **0,00%** | **(+) 81 días** | **Actividad Capítulo** |
| 0 | Radicado factibilidad PONAL | 0 | 30-05-22 | 30-05-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 27 días | Atraso neto duracion retante 27 días |
| 0 | Radicado permiso FAC 60 dias | 0 | 30-05-22 | 30-05-22 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | Finalizado | Terminado |
| 683 | Torre de comunicación | 30 | 14-03-22 | 19-04-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 104 días | Atraso neto duración restante 104 días |
| **716** | **Piso 5** | **0** | **25-01-22** | **26-11-22** | **64,00%** | **65,00%** | **-4,00%** | **68,00%** | **(-) 11 días** | **Actividad Capítulo** |
| 722 | Instalaciones climatización | 60 | 26-01-22 | 5-04-22 | 100,00% | 100,00% | 1,00% | 99,00% | (+) 83 días | Instalaciones climatización: Piso 5: Cableado a tablero A/C ejes 28-29/F-G, equipo A/C en cuarto técnico ejes 13-14/B-C, Finalizado |
| 723 | Instalaciones red incendio | 60 | 26-01-22 | 5-04-22 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | Finalizado | Terminado |
| 730 | Aparatos sanitarios y accesorios | 30 | 11-06-22 | 15-07-22 | 43,00% | 25,00% | 0,00% | 43,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |
| 734 | Remates generales | 80 | 6-04-22 | 9-07-22 | 85,00% | 70,00% | 15,00% | 70,00% | (+) 14 días | Atraso neto duración restante 14 días |

BOGOTÁ

**SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**

**INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN**

**SEMANA No** **182 de 208** DEL **19-jun-22** AL **26-jun-2022**

**Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG**

| Id | Actividad | Duración días | Comienzo | Fin | % programado | % Completado sem Ant | % De desviación | % completado | (-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 | Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio) | 30 | 17-06-22 | 21-07-22 | 27,00% | 10,00% | 0,00% | 27,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |
| 736 | Luminarias | 60 | 17-06-22 | 25-08-22 | 13,00% | 40,00% | -37,00% | 50,00% | (-) 34 días | luminarias: Piso 5: avisos de evacuación luminosos ejes 26-E-G, adelanto 34 días |
| 737 | Divisiones de oficina | 60 | 17-06-22 | 25-08-22 | 13,00% | 90,00% | -78,00% | 91,00% | (-) 6 días | Divisiones de oficina: Piso 5: silicona en marcos puertas mamparas ejes 23-23/E-F, silicona en vidrios mamparas ejes s18-19/D-E, adelanto 6 días |
| 739 | Pisos secos | 45 | 22-07-22 | 12-09-22 | 0,00% | 5,00% | -5,00% | 5,00% | (-) -27 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -27 días |
| **748** | **Piso 4** | **0** | **17-02-22** | **13-12-22** | **59,00%** | **63,00%** | **-6,00%** | **65,00%** | **(-) 18 días** | **Actividad Capítulo** |
| 753 | Instalaciones seguridad y control | 60 | 18-02-22 | 30-04-22 | 100,00% | 100,00% | 1,00% | 99,00% | (+) 58 días | Instalaciones seguridad y control: Piso 4: Cableado para puerta de cuarto técnico ejes 17-18/B-C, Cableado para puertas cuarto técnico ejes 24-25/F-G, Finalizado |
| 755 | Instalaciones red incendio | 60 | 18-02-22 | 30-04-22 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | Finalizado | Terminado |
| 758 | Sellos cortafuego | 30 | 18-02-22 | 24-03-22 | 100,00% | 55,00% | 30,00% | 70,00% | (+) 104 días | Sellos cortafuego: Piso 4: Sello cortafuego cuarto técnico ejes 27-29/F-G, Atraso neto duración restante 104 días |
| 759 | Cielo rasos en fibrocemento | 60 | 18-02-22 | 30-04-22 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | Finalizado | Terminado |
| 763 | Cielo rasos especiales | 60 | 2-05-22 | 9-07-22 | 80,00% | 90,00% | -10,00% | 90,00% | (-) 6 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto 6 días |
| 764 | Carpinteria Metálica | 60 | 2-05-22 | 9-07-22 | 80,00% | 70,00% | 0,00% | 80,00% | (-) 0 días | Carpinteria Metálica: Piso 4: Sellado de tapa gotero fachada sur ejes G/12-30, Con el programa, adelanto 0 días |
| 765 | Pintura | 120 | 2-05-22 | 17-09-22 | 40,00% | 50,00% | -10,00% | 50,00% | (-) 69 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto 69 días |
| 766 | Remates generales | 80 | 2-05-22 | 2-08-22 | 60,00% | 35,00% | 10,00% | 50,00% | (+) 9 días | Atraso neto duración restante 9 días |
| 767 | Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio) | 30 | 11-07-22 | 13-08-22 | 0,00% | 30,00% | -30,00% | 30,00% | (-) -24 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -24 días |
| 768 | Luminarias | 30 | 11-07-22 | 13-08-22 | 0,00% | 45,00% | -45,00% | 45,00% | (-) -28 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -28 días |
| 770 | Divisiones de oficina | 60 | 11-07-22 | 17-09-22 | 0,00% | 90,00% | -91,00% | 91,00% | (-) -73 días | Divisiones de oficina: Piso 4: perfiles puerta ejes 28-29/C, silicona en vidrios mampara ejes 26-29/C-D, 19-20/E, silicona vidrio mamparas ejes 26-28/C-D, 21-22/D-E, adelanto -73 días |
| 771 | Pisos secos | 45 | 12-09-22 | 2-11-22 | 0,00% | 5,00% | -5,00% | 5,00% | (-) -77 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -77 días |
| **779** | **Piso 3** | **0** | **12-03-22** | **14-12-22** | **54,00%** | **59,00%** | **-6,00%** | **60,00%** | **(-) 21 días** | **Actividad Capítulo** |
| 789 | Sellos cortafuego | 30 | 14-03-22 | 19-04-22 | 100,00% | 40,00% | 60,00% | 40,00% | (+) 90 días | Atraso neto duración restante 90 días |
| 793 | Aparatos sanitarios y accesorios | 30 | 31-05-22 | 4-07-22 | 77,00% | 57,00% | 0,00% | 77,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |
| 794 | Cielo rasos especiales | 60 | 25-05-22 | 2-08-22 | 47,00% | 70,00% | -33,00% | 80,00% | (-) 14 días | Cielo rasos especiales: Piso 3:Nivelación de cielo raso en madera ejes 16-18/F, 15-17/C, Nivelación de cielo raso en madera ejes 28-29/D-E, adelanto 14 días |
| 795 | Carpinteria Metálica | 60 | 25-05-22 | 2-08-22 | 47,00% | 37,00% | 0,00% | 47,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |
| 796 | Pintura | 140 | 25-05-22 | 3-11-22 | 20,00% | 25,00% | -5,00% | 25,00% | (-) 122 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto 122 días |
| 797 | Remates generales | 80 | 25-05-22 | 25-08-22 | 35,00% | 28,00% | 5,00% | 30,00% | (-) -55 días | Atraso neto duración restante -55 días |

BOGOTÁ

**SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**

**INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN**

**SEMANA No** **182 de 208** DEL **19-jun-22** AL **26-jun-2022**

**Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG**

| Id | Actividad | Duración días | Comienzo | Fin | % programado | % Completado sem Ant | % De desviación | % completado | (-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 798 | Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio) | 30 | 3-08-22 | 6-09-22 | 0,00% | 10,00% | -10,00% | 10,00% | (-) -39 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -39 días |
| 799 | Divisiones de oficina | 60 | 3-08-22 | 11-10-22 | 0,00% | 90,00% | -90,00% | 90,00% | (-) -95 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -95 días |
| 800 | Luminarias | 30 | 3-08-22 | 6-09-22 | 0,00% | 30,00% | -30,00% | 30,00% | (-) -46 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -46 días |
| 802 | Pisos secos | 30 | 12-10-22 | 15-11-22 | 0,00% | 10,00% | -10,00% | 10,00% | (-) -106 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -106 días |
| 804 | Carpinteria Madera | 30 | 12-10-22 | 15-11-22 | 0,00% | 20,00% | -20,00% | 20,00% | (-) -109 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -109 días |
| | **Atrio F3 - Consolidado** | | **28-12-18** | **17-12-22** | **77,94%** | **80,27%** | **-3,35%** | **81,29%** | **(-) 7 días** | **Actividad Capítulo** |
| **684** | **Piso 6** | **0** | **3-01-22** | **26-11-22** | **62,00%** | **68,00%** | **-7,00%** | **69,00%** | **(-) 14 días** | **Actividad Capítulo** |
| 690 | Instalaciones climatización | 60 | 3-01-22 | 12-03-22 | 100,00% | 100,00% | 1,00% | 99,00% | (-) 107 días | Instalaciones climatización: Piso 6: Conexión desagües de A/C cuarto técnico ejes 17-18/B-C, Finalizado |
| 695 | Sellos cortafuego | 30 | 14-01-22 | 17-02-22 | 100,00% | 90,00% | 0,00% | 100,00% | (+) 0 días | Finalizado |
| 700 | Aparatos sanitarios y accesorios | 30 | 31-05-22 | 4-07-22 | 77,00% | 57,00% | 0,00% | 77,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |
| 701 | Dotación equipos de cocina | 30 | 31-05-22 | 4-07-22 | 77,00% | 57,00% | 20,00% | 57,00% | (-) -1 días | Atraso neto duración restante -1 días |
| 702 | Aparatos (eléctricos, comunicaciones, climatización, incendio) | 30 | 25-05-22 | 28-06-22 | 93,00% | 73,00% | 0,00% | 93,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |
| 703 | Luminarias | 50 | 25-05-22 | 21-07-22 | 56,00% | 44,00% | 0,00% | 56,00% | (-) 0 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 0 días |
| 705 | Divisiones de oficina | 60 | 25-05-22 | 2-08-22 | 47,00% | 90,00% | -44,00% | 91,00% | (-) 7 días | Divisiones de oficina: Piso 6: perfiles mamparas ejes s15/C-D, 24/E-F, adelanto 7 días |
| 706 | Pintura | 90 | 5-07-22 | 17-10-22 | 0,00% | 50,00% | -50,00% | 50,00% | (-) -58 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -58 días |
| 707 | Remates generales | 60 | 5-07-22 | 12-09-22 | 0,00% | 55,00% | -60,00% | 60,00% | (-) -48 días | Resanes generales: Cubierta: Remates en cuarto técnico ejes 15-19/BH-D, adelanto -48 días |
| 708 | Pisos secos | 45 | 28-07-22 | 17-09-22 | 0,00% | 2,00% | -2,00% | 2,00% | (-) -31 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -31 días |
| 710 | Carpinteria Madera | 30 | 1-09-22 | 5-10-22 | 0,00% | 5,00% | -5,00% | 5,00% | (-) -65 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -65 días |
| **810** | **Piso 2** | **0** | **5-04-22** | **14-12-22** | **47,00%** | **55,00%** | **-10,00%** | **57,00%** | **(-) 14 días** | **Actividad Capítulo** |
| 816 | Instalaciones climatización | 60 | 6-04-22 | 16-06-22 | 100,00% | 100,00% | 1,00% | 99,00% | (-) 11 días | Instalaciones climatización: Piso 2: fan coil en cuarto técnico ejes 24-25/F-G, Finalizado |
| 819 | Sellos cortafuego | 30 | 6-04-22 | 12-05-22 | 100,00% | 30,00% | 70,00% | 30,00% | (+) 70 días | Atraso neto duración restante 70 días |
| 823 | Enchapes | 20 | 31-05-22 | 22-06-22 | 100,00% | 85,00% | 0,00% | 100,00% | (-) 0 días | Finalizado |
| 825 | Aparatos sanitarios y accesorios | 30 | 23-06-22 | 27-07-22 | 10,00% | 10,00% | 0,00% | 10,00% | (-) 3 días | Avance equivalente al programado, Con el programa, adelanto 3 días |
| 826 | Pisos plazoletas | 41 | 17-06-22 | 3-08-22 | 20,00% | 5,00% | 0,00% | 20,00% | (-) 0 días | Con el programa, adelanto 0 días |
| 827 | Cielo rasos especiales | 60 | 17-06-22 | 25-08-22 | 13,00% | 80,00% | -68,00% | 81,00% | (-) 13 días | Cielo rasos especiales: Piso 2: cielo raso en madera ejes 28-29/D, Nivelación cielo raso en aluzinc ejes 28/D, Nivelación y alineación cielo raso en madera ejes 28-30/E-F, adelanto 13 días |

BOGOTÁ

**SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**

**INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN**

**SEMANA No** **182 de 208** DEL **19-jun-22** AL **26-jun-2022**

**Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG**

| Id | Actividad | Duración días | Comienzo | Fin | % programado | % Completado sem Ant | % De desviación | % completado | (-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Radicado IDU verificación plazoleta de acceso Cr 60 (CSUDC) | 0 | 2-05-22 | 27-07-22 | 64,00% | 0,00% | 64,00% | 0,00% | (+) 55 días | Atraso neto duración restante 55 días |
| 1038 | Inicio | 0 | 11-05-22 | 11-05-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 46 días | Atraso neto duración restante 46 días |
| 1039 | Movimiento de tierras | 30 | 11-05-22 | 15-06-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 46 días | Atraso neto duración restante 46 días |
| 1040 | Conexión desagües | 30 | 11-05-22 | 15-06-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 46 días | Atraso neto duración restante 46 días |
| 1041 | Rellenos | 30 | 15-06-22 | 20-07-22 | 31,00% | 0,00% | 31,00% | 0,00% | (+) 11 días | Atraso neto duración restante 11 días |
| 1042 | Obras de arte y concretos | 40 | 20-07-22 | 5-09-22 | 0,00% | 1,00% | -1,00% | 1,00% | (-) -23 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -23 días |
| 1044 | Jardines y mobiliario urbano | 45 | 16-09-22 | 8-11-22 | 0,00% | 1,00% | -1,00% | 1,00% | (-) -78 días | No reporta avance en la presente semana, conserva el adelanto anterior, adelanto -78 días |
| **482** | **TRAMITES OBTENCION DE SERVICIOS PÚBLICOS** | **0** | **19-07-21** | **5-12-22** | **84,00%** | **64,00%** | **20,00%** | **64,00%** | **(+) 70 días** | **Actividad Capítulo** |
| **484** | **Tramites para servicios de EAAB** | **0** | **19-07-21** | **28-03-22** | **100,00%** | **99,00%** | **1,00%** | **99,00%** | **(+) 70 días** | **Actividad Capítulo** |
| **493** | **Permiso de ocupación de cauce ante la Secretaria de Ambiente** | **0** | **19-07-21** | **28-03-22** | **100,00%** | **97,00%** | **3,00%** | **97,00%** | **(+) 70 días** | **Actividad Capítulo** |
| 498 | trámite interno SDA (Estudio) | 90 | 13-12-21 | 28-03-22 | 100,00% | 93,00% | 7,00% | 93,00% | (+) 97 días | Atraso neto duración restante 97 días |
| 499 | Obtención permiso de ocupación de cauce | 0 | 28-03-22 | 28-03-22 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | (+) 90 días | Atraso neto duración restante 90 días |
| **513** | **Trámites domiciliarias energía eléctrica CODENSA** | **0** | **19-07-21** | **5-12-22** | **63,00%** | **57,00%** | **6,00%** | **57,00%** | **(+) 84 días** | **Actividad Capítulo** |
| 518 | Tramite CODENSA aprobación proyecto serie 6 | 96 | 3-01-22 | 26-04-22 | 100,00% | 75,00% | 25,00% | 75,00% | (+) 89 días | Atraso neto duración restante 89 días |
| 395 | Aseo general de obra | 634 | 9-11-20 | 29-12-21 | 80,00% | 79,00% | 0,00% | 80,00% | (-) 0 días | Aseo general de obra: Piso 1: Aseo general ejes 12-24/A-G, Aseo general de obra: Piso 2: Piso 4: Piso 6: Con el programa, adelanto 0 días |
| | | | | | | | | | * | R. Critica: 56 días |
| | | | | | | | | | * | R. Critica Ant:49 días |
| | El porcentaje programado es 81,72% y el ejecutado es 81,74% con el programa.<br><br>Alarmas en ruta crítica<br>-En el frente 1 Auditorio: Reparación pintura intumescente<br>-En el Frente 2 y 3 Atrio y 4 Plazoleta: Corrección de la desviación de las siguientes actividades. Atrio F2: Cubierta: Torre de comunicación, piso 5, 4 y 3 Remates generales. Atrio F3 – Consolidado Piso 2 y 1 Sellos cortafuego.<br>-En el Frente 5 exteriores: Continúa la incidencia de la radicación y aprobación de diseños ante IDRD e IDU.<br>El personal programado en obra es de 119 y el real es de 153. | | | | | | | | * | Actividad Capítulo |

| Descripción | Oficial en obra Sem 182 | Ayudante en obra Sem 182 | Oficial Programado Sem 182 | Ayudante programado Sem 182 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acabados | 20 | 20 | 26 | 18 | | | * |
| Carpintería Metálica | 4 | 0 | 6 | 4 | | | * |
| Cielo | 7 | 0 | 10 | 6 | | | * |
| Climatización | 16 | 0 | 2 | 2 | | | * |
| Divisiones | 16 | 0 | 2 | 2 | | | * |
| Eléctrico | 4 | 3 | 7 | 5 | | | * |
| Estructura | 18 | 0 | 1 | 1 | | | * |
| Fachada | 10 | 2 | 1 | 1 | | | * |
| Hidrosanitarias | 4 | 0 | 1 | 0 | | | * |
| Incendio | 1 | 0 | 2 | 2 | | | * |
| Muros secos | 6 | 2 | 0 | 0 | | | * |
| Luminarias | 6 | 0 | 4 | 2 | | | * |
| Gas | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | * |
| Vias | 6 | 1 | 5 | 3 | | | * |
| Pisos | 0 | 0 | 2 | 2 | | | * |
| Sellos Corta fuego | 4 | 0 | 1 | 1 | | | * |
| Total | 153,00 | | 119,00 | | | | * |

BOGOTÁ


**SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**

**INFORME SEMANAL DE PROGRAMACIÓN**

**SEMANA No** **182 de 208** DEL **19-jun-22** AL **26-jun-2022**

**Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental al contrato de obra mediante el que se realice la Construcción del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá – MEBOG**

| Id | Actividad | Duración días | Comienzo | Fin | % programado | % Completado sem Ant | % De desviación | % completado | (-)Adelanto (+)Atraso Días Calendario | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

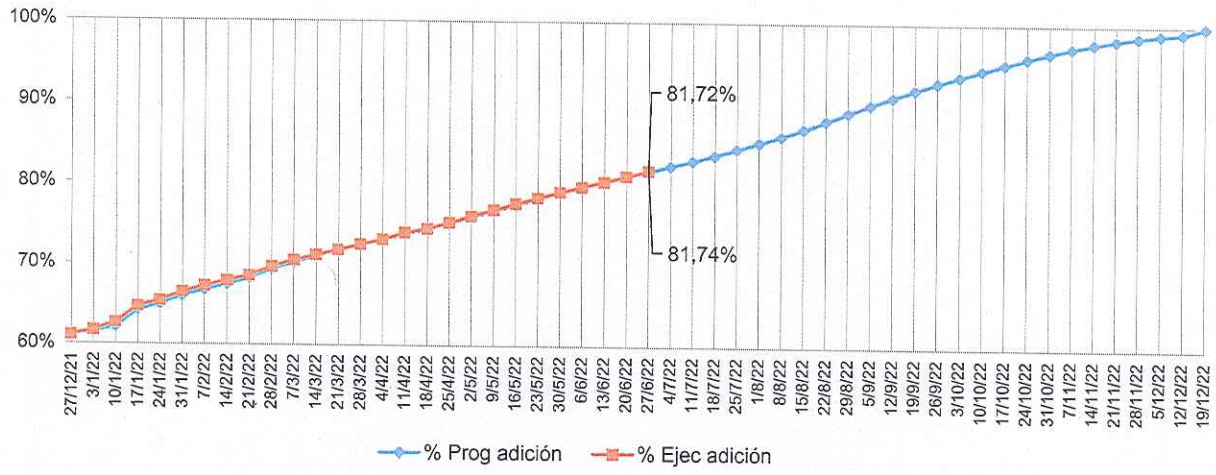


*

*
