INFORME DE SUPERVISIÓN N° 02 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 657 DEL 30 DE MARZO DE 2022


TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No. Y FECHA:	657 DEL 30 DE MARZO DE 2022
CONTRATISTA:	**GILBERTO PARRA PATIÑO**
Nit o C.C. No.	91.231.841 DE BUCARAMANGA
OBJETO:	**"ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA POR INUNDACION Y REALIZACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y OPTIMIZACION TECNOLOGICA PARA EL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER.**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($39.000.000)
PLAZO INICIAL:	NUEVE (09) MESES
SUPERVISOR	CRISTIAN GENARO CALDERON PINTO, SECRETARIO DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y GESTION DEL RIESGO
FECHA DE INICIACION:	01 DE ABRIL DE 2022
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2022
MUNICIPIO:	GIRON SANTANDER
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y GESTION DEL RIESGO
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL # 02	$10.000.000
PERIODO A COBRAR	06 DE JUNIO AL 05 DE AGOSTO DE 2022



Con base en los informes presentado por el contratista respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato de Prestación de servicios y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Girón, tomando como base la presente acta de recibo N°01 por valor de **DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE ($10.000.000,00)**, correspondiente al valor del acta parcial de pago número 02 de 2022.

CERTIFICO QUE


De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato me permito adjuntar y dando cumplimiento con el objeto contractual del mismo, en el periodo comprendido del periodo del 06-06-2022 al 05-08-2022 del presente CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 657 DEL 30 DE MARZO DE 2022, cumpliendo con los parámetros legales y determinando el cumplimiento de los compromisos: Factura Cuenta de cobro Régimen simplificado N° 015 de fecha 08 de agosto de 2022, informe de actividades del periodo del 06 de junio al 05 de agosto de 2022, además acredita sus compromisos frente al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión de los meses de junio y julio de 2022 mediante planillas de pago del mes de junio de seguridad social N° 8620008033 de fecha de pago 5 de julio de 2022 y planilla mes de julio número 8620008063 de fecha de pago 04 de agosto de 2022, , Certificado de la Cuenta de ahorros del Bancolombia número 28891354080. Anexo cuadro de lo suministrado por el contratista:

ITEM	DESCRIPCION	ACTIVIADES GENERALES	EVIDENCIAS
1	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA COMPLETO Y SOSTENIBILIDAD DEL CONTRATO	- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMADE ALERTAS TEMPRANAS DEL	- mantenimiento novel de agua Riofrío - PROCESO: - • Se saco el medidor de nivel del puente. - • Se verificó el sensor ultrasónico y no se encontró suciedad - • Se cambió batería sellada

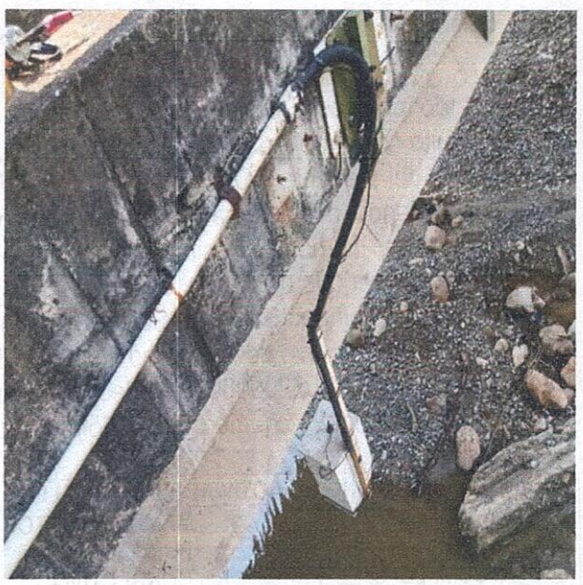
		MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRON. - REMPLAZO DE TODAS LAS BATERÍAS: SE REEMPLAZARÁN LAS BATERÍAS DE LOS SISTEMAS LIMPIEZA POR MANTENIMIENTO SE LIMPIARÁN LOS PANELES SOLARES DE TODOS LOSSISTEMAS ANTIGUOS SE LIMPIARÁN LOS ELEMENTOS ELECTRÓNICOS INTERNOSDETODOS LOS SISTEMAS ANTIGUOS SE LIMPIARÁN LOS PLUVIÓMETROS EN SU PARTE EXTERNAE INTERNA. INCLUYENDO SU SISTEMA DE BALANCÍN Y MEDICIÓN DE PULSOS. - SE LIMPIARÁN LAS CORNETAS Y UNIDADES DE SONIDO DE LOS SISTEMAS DE PERIFONEO ANTIGUOS SE LIMPIARÁN LOS MEDIDORES ULTRASÓNICOS DE LOSSISTEMAS DE MEDICIÓN DE NIVEL ANTIGUOS SE LIMPIARÁN LOS SOPORTES Y HERRAJES DETODOS LOSSISTEMAS ANTIGUOS REMPLAZO DE ELEMENTOS: SE REEMPLAZARÁN LOS ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DEFECTUOSOS DE TODOS LOS SISTEMAS	- • Se encontró problemas en cableado del panel (lo habían roto antes al colocar una manguera de agua), y por tanto se procedió a colocar un tubo para proteger el cable nuevamente reconectado. - • Se volvió a instalar el medidor en el puente - • Se verifico el funcionamiento en Plataforma.   

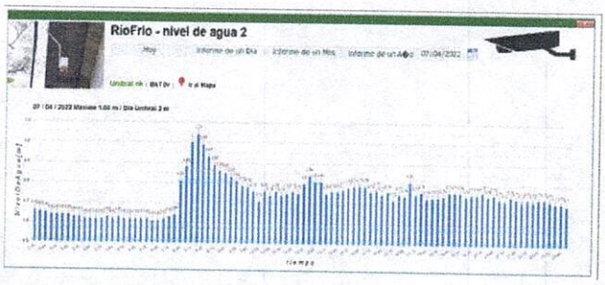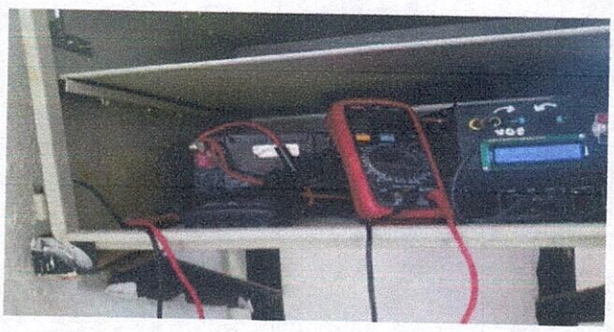			ANTIGUOS Y NUEVOS (SI LOS HUBIERA) ASÍ: CIRCUITOS DE CONTROL, REGULADORES SOLARES, CABLES, CONECTORES ELÉCTRICOS, INTERFACES, CHIPS MÓDEMS. SE REEMPLAZARÁN LOS ELEMENTOS INTERNOS DEFECTUOSOS DE LOS PLUVIÓMETROS, COMO EL MEDIDORDE PULSOS O EL BALANCÍN (SI LOS HUBIERA). INCLUSIÓN DE LOS NUEVOS PUNTOS DE MONITOREO DE AGUA E IMAGEN POR DEMANDA EN LA PLATAFORMA DE ALERTAS TEMPRANAS. EXTENSIÓN DEL HOSTING DE LA PLATAFORMA DURANTE NUEVE (9) MESES. EXTENSIÓN DEL SERVICIO DE DATOS DE SIMCARD POR UN AÑO	  *PROCESO:* • *Se reviso el estado de la batería de 18amp 12v y está a plena carga, las celdas están bien* • *Se reviso el radio modem que recibe llamadas y está en buen estado de funcionamiento* • *Se limpio la antena del radio modem* • *Se reviso el regulador solar y está funcionando bien* • *Se reviso el amplificador y esta en buen estado de funcionamiento* • *Se reviso el voltaje del panel solar y esta en el nivel adecuado* • *Se hizo prueba de funcionamiento y el sonido de sirena y voz está bien* 

INFORME DEL SUPERVISOR

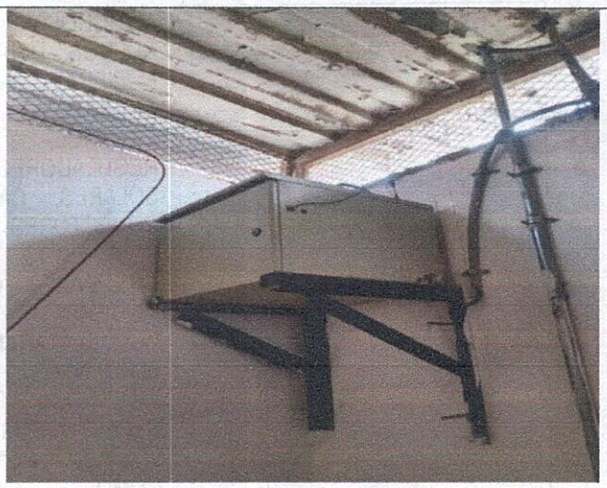




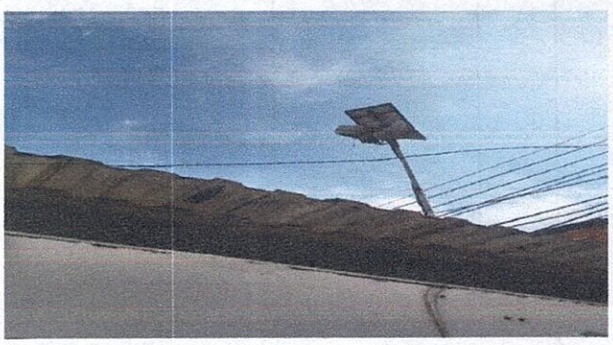

PROCESO:

- Se reviso el estado de la batería de 18amp 12v y está a plena carga, con vida útil por delante
- Se reviso el radio modem que recibe llamadas y está en buen estado de funcionamiento
- Se limpio la antena del radio modem
- Se reviso el regulador solar y está funcionando bien
- Se reviso el amplificador y esta en buen estado de funcionamiento
- Se reviso el voltaje del panel solar y esta en el nivel adecuado
- Se hizo prueba de funcionamiento y el sonido de sirena y voz está bien.

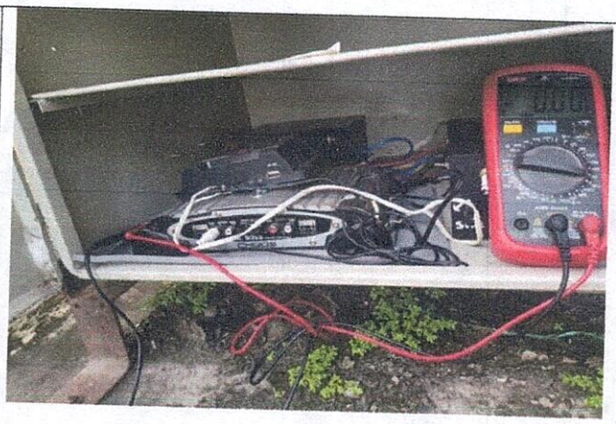






PROCESO:

- Se optimizó el pluviómetro que se había desinstalado de la vía al acueducto altos de Floridablanca
- Se colocó un panel solar nuevo, se colocó una batería nueva, se colocó un soporte nuevo, se colocó un chip modem nuevo y se colocó una caja de equipos nueva.
- Se limpio el balancín y el embudo del pluviómetro.
- Se instaló el pluviómetro en poste de iluminación del barrio jardín del limoncito
- Se coloco un collarín de púas para protección del pluviómetro
- Se socializó la instalación con la Junta del barrio para que lo cuiden
- Se verifico la transmisión correcta en la plataforma.






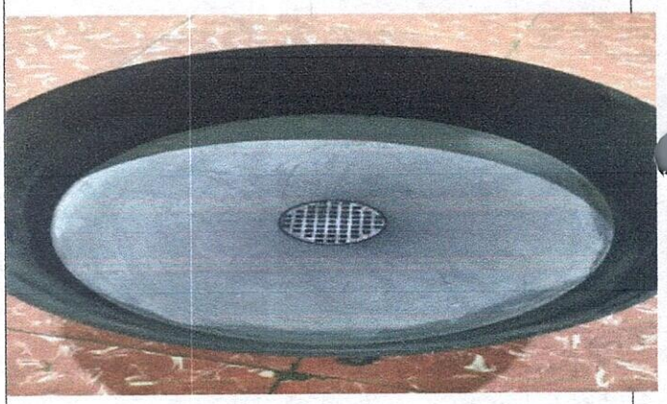



INFORME DEL SUPERVISOR

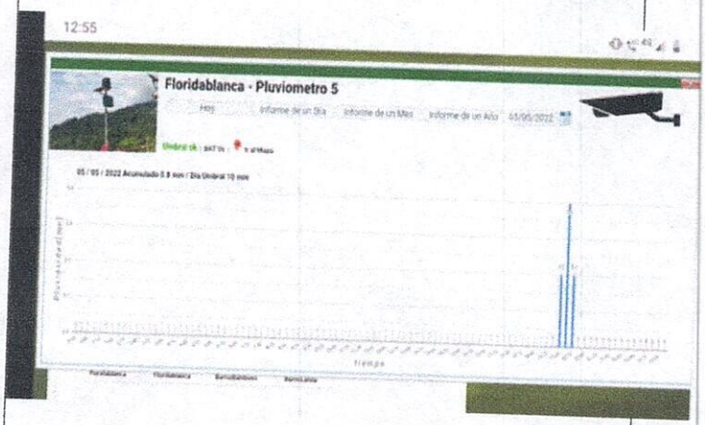

PROCESO:

- Se limpio el balancín del pluviómetro
- Se limpio el embudo del pluviómetro
- Se cambio la batería sellada
- Se limpio por fuera el chasis del equipo
- Se comprobó transmisión normal en plataforma.








INFORME DEL SUPERVISOR





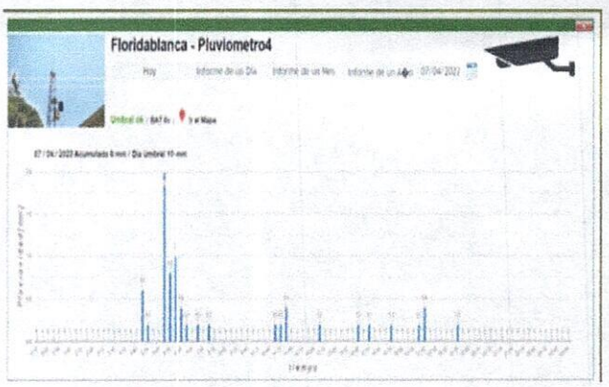


PROCESO:


- Se limpio el balancín del pluviómetro
- Se limpio el embudo del pluviómetro
- Se cambio la batería sellada
- Se limpio por fuera el chasis del equipo
- Se comprobó transmisión normal en plataforma



INFORME DEL SUPERVISOR



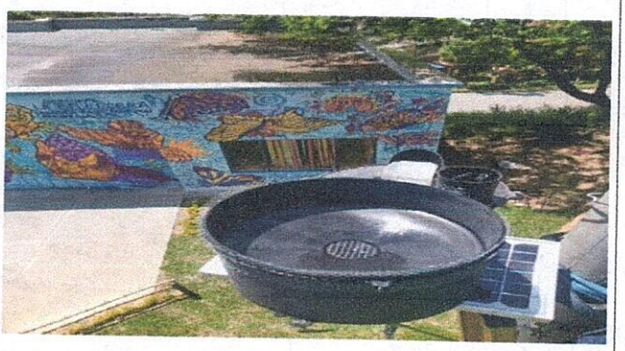

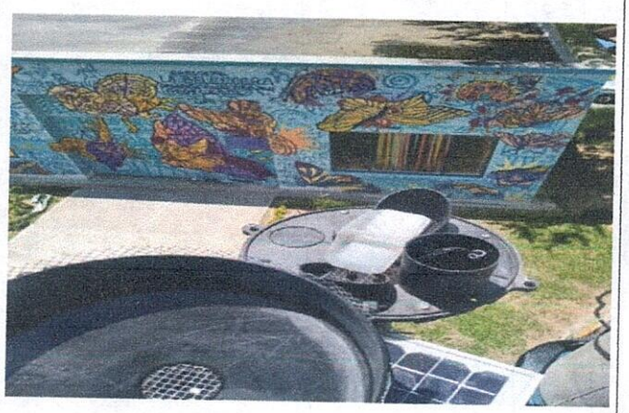




- Se encontró el pluviómetro tapado por el techo que construyeron, no permite hacerle mantenimiento y tapa el sol para el panel en horas de la tarde.
- Se bajó el pluviómetro

INFORME DEL SUPERVISOR

- Se almacenó el pluviómetro temporalmente
- Se inició el proceso de transformación en un chasis más liviano y funcional
- En próximos días se instalará nuevamente en el mismo sitio, sin que sea afectado por el techo.




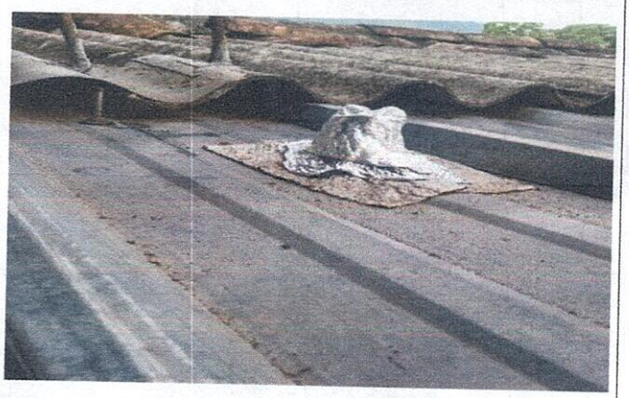



PROCESO:


- Se limpio el balancín del pluviómetro
- Se limpio el embudo del pluviómetro
- Se cambio la batería sellada
- Se limpio por fuera el chasis del equipo
- Se comprobó transmisión normal en plataforma

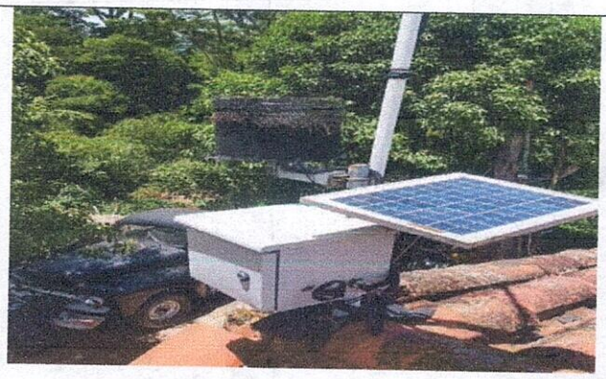







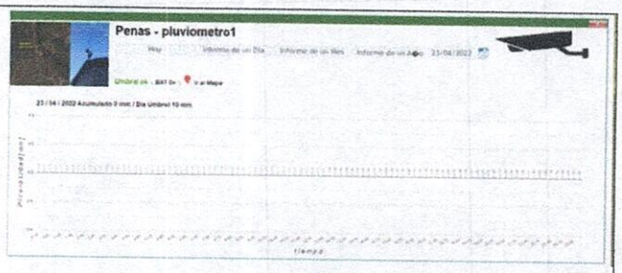


- Se adicionó el logo del Alcalde actual
- Se usó el color azul que acompaña el logo del Alcalde actual.



PROCESO:

- Se optimizó el pluviómetro que se había desinstalado el 11 de abril.
- Se colocó un panel solar nuevo, se colocó una batería nueva, se colocó un soporte nuevo, se colocó un chip modem nuevo y se colocó una caja de equipos nueva.
- Se limpio el balancín y el embudo del pluviómetro.
- Se usó un soporte en curva que alejó el panel y el pluviómetro del techo.
- Se verifico la transmisión correcta en la plataforma.

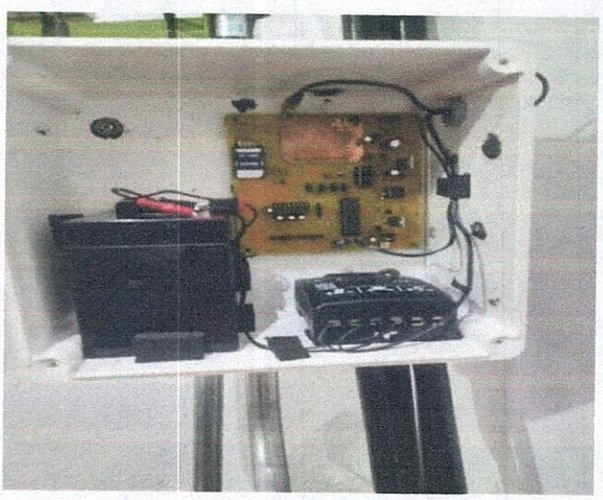







Así mismo se deja constancia de los siguientes pagos:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**JUNIO DE 2022**	**JULIO DE 2022**
	Fecha de pago	05-07-2022	04-08-2022
	N° de Planilla	8620008033	8620008063
	IBC	**$1.000.000**	**$1.000.000**
	Valor liquidado	**$125.000**	**$125.000**
	EPS	NUEVA EPS S.A	NUEVA EPS S.A
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**JUNIO DE 2022**	**JULIO DE 2022**
	Fecha de pago	08-06-2022	04-08-2022
	N° de Planilla	8620008033	8620008063
	IBC	**$1.000.000**	**$1.000.000**
	Valor liquidado	**$160.000**	**$160.000**
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES	COLPENSIONES
APORTE RIESGOS "ARL"	Periodo de cotización	**JUNIO DE 2022**	**JULIO DE 2022**
	Fecha de pago	08-06-2022	04-08-2022
	N° de Planilla	8620008033	8620008063
	IBC	$1.000.000	**$1.000.000**

INFORME DEL SUPERVISOR

	Valor liquidado	**$5.300**	**$5.300**
	ARL	**POSITIVA**	**POSITIVA**
APORTES PARAFISCALES	Periodo de cotización	N/A	**N/A**
	Fecha de pago		
	Nº de Planilla		
	IBC		
	Valor liquidado		
	SENA, CAJA DE COMPESANCION, ICBF		

Por lo anterior, el suscrito Supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los ocho (08) días del mes de agosto de 2022.

CRISTIAN GENARO CALDERON PINTO
Secretario de Seguridad, Convivencia y Gestión del Riesgo
Supervisor

Proyecto: Fredy Lupo Silva Rondón – Técnico Riesgos
Elaboro y reviso: AMCR
