IMPERIAL ELEVADORES S.A.S.

900828771-1

Orden de Trabajo

N°: OT-5105

Fecha: **2022-07-22**

Calificación:

GENERÓ: HAROL STEVEN GARCES AVENDAÑO

RESPONSABLE: HAROL STEVEN GARCES AVENDAÑO

DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00

NOTAS:

ACTIVOS

DESCRIPCIÓN: TERMINAL SANTA ROSA DE OSOS

UBICADO EN Ó ES PARTE DE: // ANTIOQUIA/ SANTA ROSA/ TERMINAL SANTA ROSA/

CLASIFICACIÓN 1: OTROS CLIENTES

TIPO: TRACCION

CLASIFICACIÓN 2:

PRIORIDAD:

CENTRO DE COSTO:

CÓDIGO DE BARRAS / QR:

TAREAS PLANIFICADAS

DESCRIPCIÓN: MTTO MENSUAL ITERACION 11

FECHA PROGRAMADA: 2023-06-09

FECHA Y HORA DE INICIO: 2022-07-22 16:45

TIPO DE TAREA: PREVENTIVA

FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN: 2022-07-22 17:31

PRIORIDAD: Media

DURACIÓN ESTIMADA: 02:00:00

ACTIVADOR: Fecha Cada 1 Año(s)

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 00:46:45

CLASIFICACIÓN 1: Mensual

TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO: 00:00:00

CLASIFICACIÓN 2:

SUBTAREAS

	INICIO DE ACTIVIDAD	Cra. 28a #32-17 Local 102, Santa Rosa de Osos, Antioquia, Colombia 6.6503797 -75.4584674 22/7/2022, 4:45:05 p. m.
INTERIOR CABINA	PRESENTARSE CON EL CLIENTE	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ILUMINACION CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	INDICADOR CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	LLAMADAS CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	PANELES CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	FOTOCELDA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	NIVELACION	☑ Si ☐ No ☐ N/A

Todos los derechos reservados

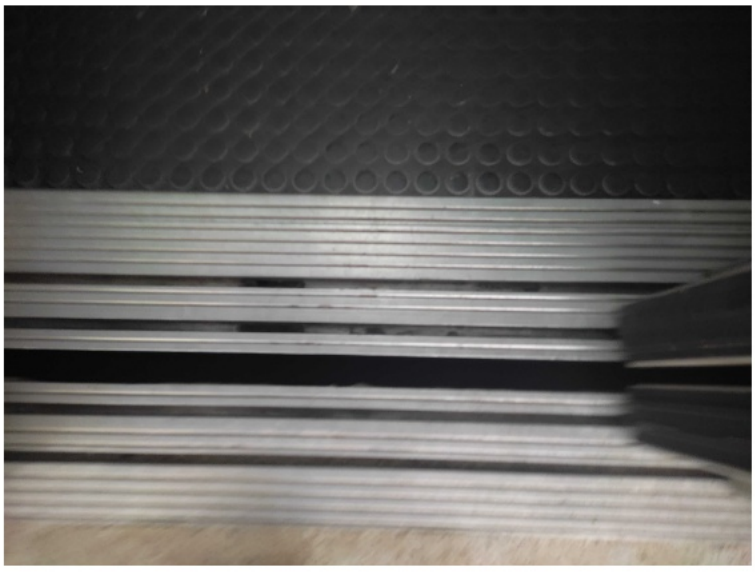
INTERIOR CABINA	CITOFONO Y ALARMA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ESTADO DEL PISO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	ALAS DE PUERTA CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
INTERIOR CABINA	APERTURA Y CIERRE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	ALAS PUERTA DE HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	QUICIOS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	APERTURA Y CIERRE PUERTAS HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
EXTERIOR DE ASCENSOR	LLAVIN EN HALL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ACCESO C. DE M.	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	ILUMINACION CM	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	CONTROL MANIOBRA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	FRENO MAQUINA(1)	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	STOP BANCADA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
CUARTO DE MAQUINAS	LIMITADOR VELOCIDAD CM	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	BALAUSTRADA O CORRAL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	LUZ DE TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	STOP DE TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	VENTILADOR TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	DESLIZADERAS CONTRAPESO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	OPERADOR DE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	MOTOR DE PUERTAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	TECHO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
TECHO DE CABINA	PUNTO DE ANCLAJE	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	ESCALERA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	STOP DE FOSO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	LUZ BAJO CABINA	☑ Si ☐ No ☐ N/A
FOSO	LUZ DE POZO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
	OBSERVACIONES	Se realiza limpieza de control , se revisa estado de quicios , se revisa estado de operadores de cabina y Hall, se realiza limpieza en Pitt, se evidencia humedad en cuarto de máquinas, se revisan pulsadores en cabina y holl. La cabina cuenta con iluminación defectuosay debe cambiarse
	FINALIZACION DE ACTIVIDAD	Cra. 28a #32-17 Local 102, Santa Rosa de Osos, Antioquia, Colombia 6.6504526 -75.4586828 22/7/2022, 4:46:15 p. m.

 Todos los derechos reservados

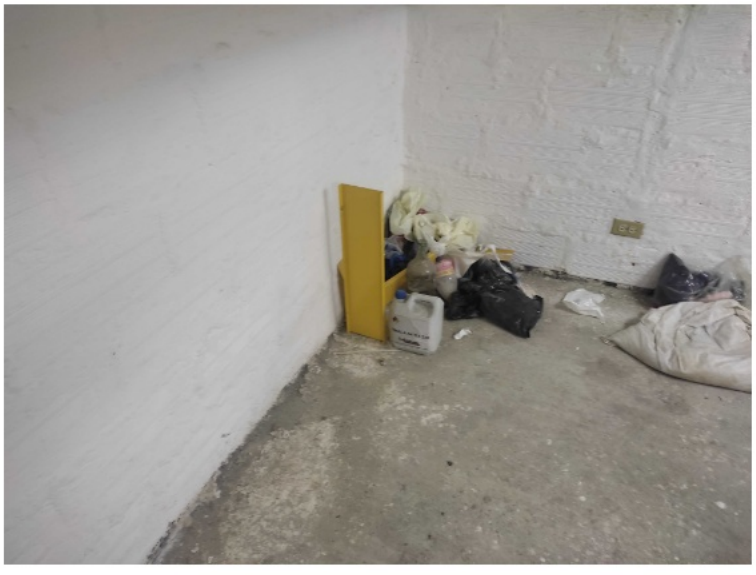
ADJUNTOS DE LA TAREA

Descripción	Detalles
	
	

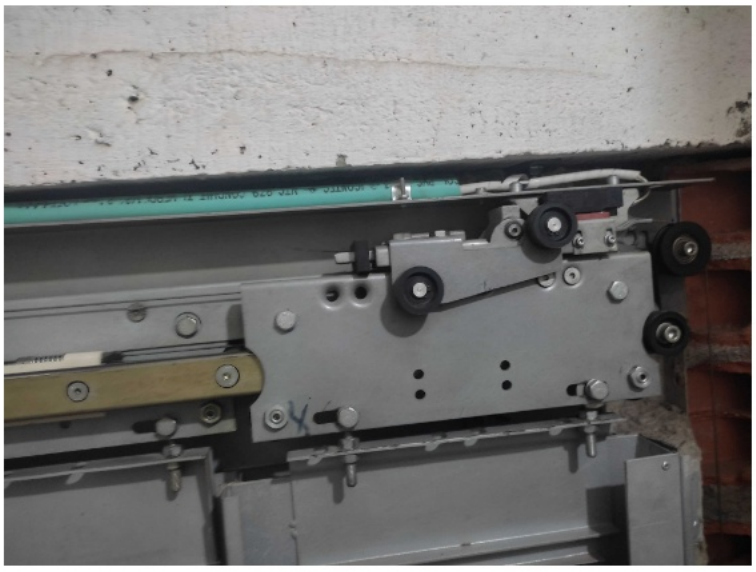
 Todos los derechos reservados

 Todos los derechos reservados

 Todos los derechos reservados

 Todos los derechos reservados

Mauricio medina	CARLOS ANDRES MEJIA RAMIREZ	HAROL STEVEN GARCES AVENDAÑO
ACEPTADO POR	**VALIDADO POR**	**REALIZADO POR**

Todos los derechos reservados
