
enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576					Hoja	1	de	1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	118	FECHA	2022	6	29	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

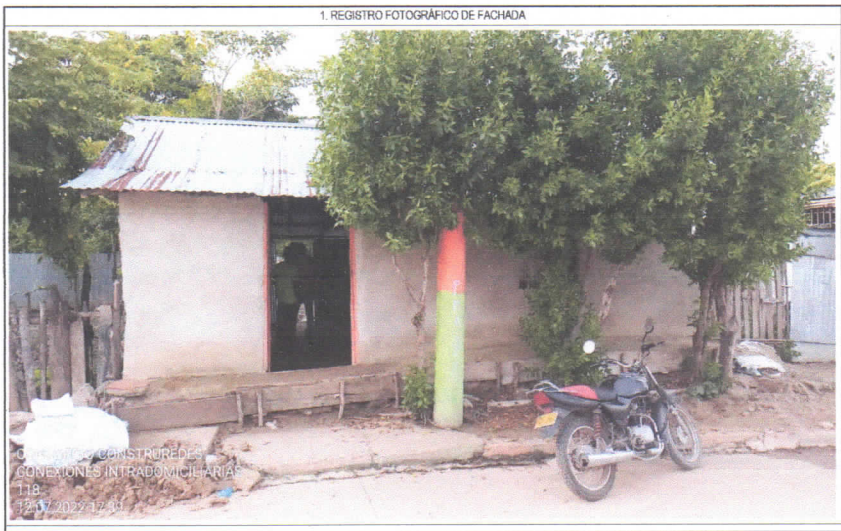

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	JAIDER SENCIO BARRIOS		
DIRECCIÓN	CL 8 3 - 4		
TELÉFONO	3217304777	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	10,40	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS


RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION: <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada de la vivienda cuenta con andén en arena y muros con pañete sin pintura. La puerta principal es de madera. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en arena y muros de bahareque sin pañete.

4. ANEXO FOTOGRAFICO

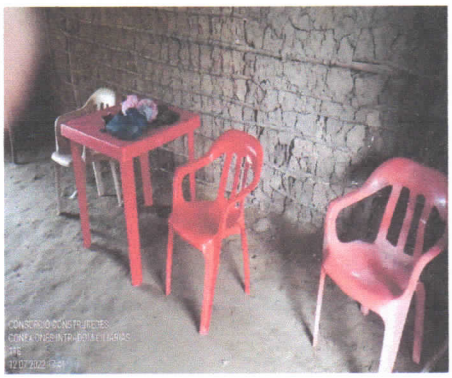



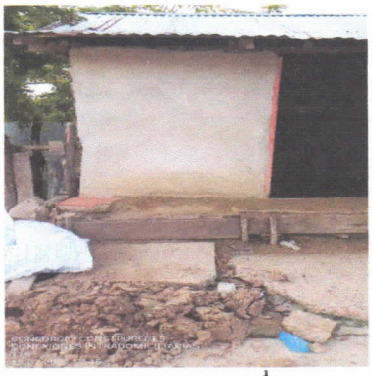

Firma
Nombre: JAIDER SENCIO BARRIOS
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 73.317.318

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	128	FECHA	2022	6	28	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



PROPIETARIO	JOSE MARTINEZ MEZA		
DIRECCIÓN	CL 9 4A - 39		
TELÉFONO	3106030331	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	4,30	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS		
	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		


CLASIFICACIÓN DE PREDIOS			
RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO ¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada de la vivienda cuenta con terraza de acabado en concreto y pintura en muros en regular estado. La puerta principal es de metal y las ventanas son corredizas de vidrio con protectores de hierro. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en concreto y muros con pañete sin pintura.

4. ANEXO FOTOGRAFICO

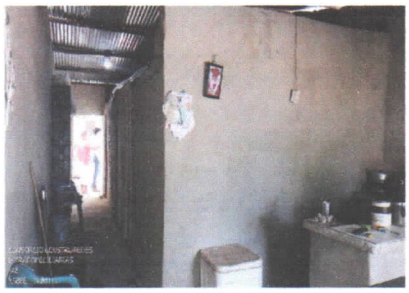





Firma
Nombre: JOSE MARTINEZ MEZA
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 73.352.082

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576					Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO									
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES									
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A									
REGISTRO No.	119	FECHA	2022	7	6	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

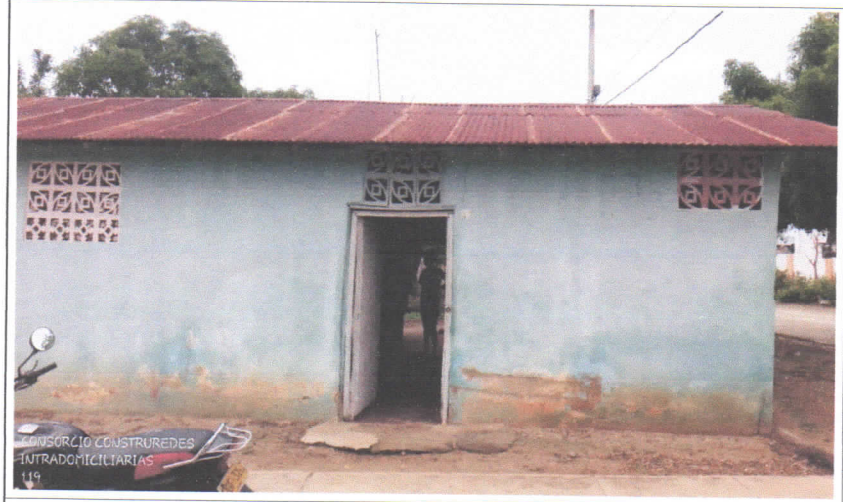

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	DIONISIA BOHORQUEZ DURAN		
DIRECCIÓN	CL 8 4 - 49		
TELÉFONO	3024194188	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	16,80	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS


RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO ¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con andén en arena y pintura en muros en mal estado. La puerta principal es de madera. Al interior de la vivienda, cuenta con andén en concreto y pintura en muros en regular estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO

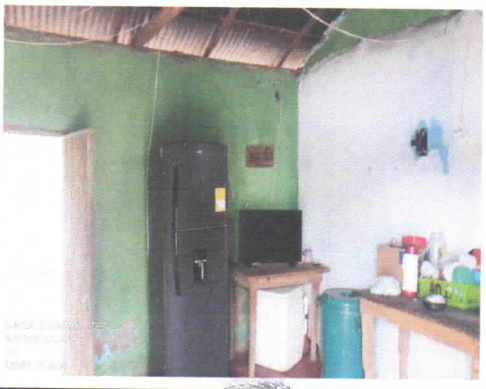





Firma
Nombre: DIONISIA BOHORQUEZ DURAN
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 22.853.588

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:			CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO								
CONTRATISTA:			CONSORCIO CONSTRUREDES								
INTERVENTOR:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A								
REGISTRO No.	190	FECHA	2022	7	6	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

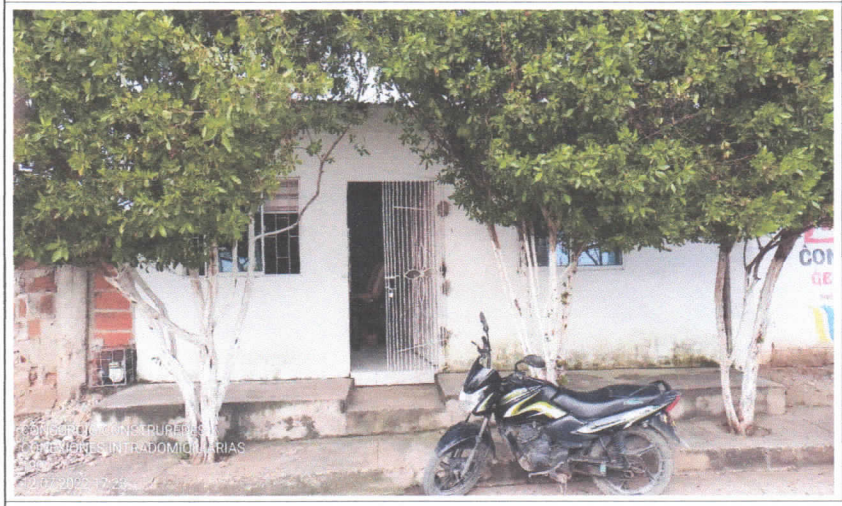

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	YEISON PALOMINO MARRUGO		
DIRECCIÓN	CL 10 KR 6 - 93		
TELÉFONO	3004319642	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	7,30	ESTRATO	1

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con andén en concreto y pintura en muros en regular estado. La puerta principal es de metal con rejas de hierro y las ventanas corredizas de vidrio con protectores de hierro. Al interior de la vivienda cuenta con acabado de piso en baldosa y pintura en muros en buen estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre: YEISON PALOMINO MARRUGO
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 73.316.825

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	195	FECHA	2022	6	28	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



PROPIETARIO	SANTANDER PIÑA ORTEGA		
DIRECCIÓN	CL 9 4 - 3		
TELÉFONO	3012226784	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	8,00	ESTRATO	1

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS					
RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	


OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada de la vivienda cuenta con andén en concreto y muros con pañete sin pintar. La puerta principal es de madera y la ventana de vidrio con pro tectores de hierro. Al interior de la vivienda cuenta con acabado de piso en concreto y baldosa y pintura en muros en mal estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO



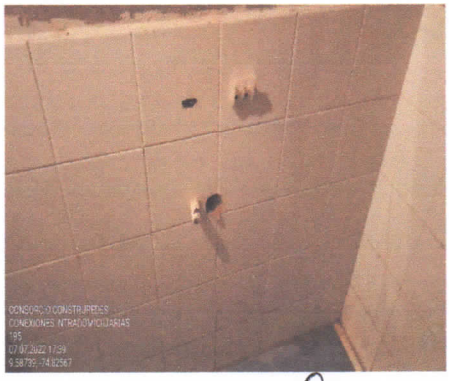

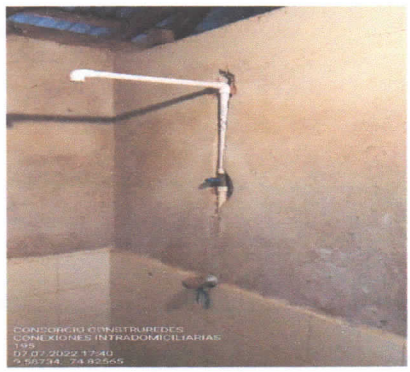

Firma X SANTANDER PIÑA
Nombre: SANTANDER PIÑA ORTEGA
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 73.317.097

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576					Hoja	1	de	1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	134	FECHA	2022	6	28	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	MYRIAM MARLENE TEHERAN DE CAUSADO		
DIRECCIÓN	CL 9 7-46		
TELÉFONO	313 560 0083	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	16,01	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS


RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION :<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con acabado de andén en concreto y pintura en muros en regular estado. La puerta principal es de madera . Al interior de la vivienda cuenta con acabado de piso en concreto y pintura en muros en regular estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre: MYRIAM MARLENE TEHERAN DE CAUSADO
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 22.853.475

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:			CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO								
CONTRATISTA:			CONSORCIO CONSTRUREDES								
INTERVENTOR:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A								
REGISTRO No.	123	FECHA	2022	7	6	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

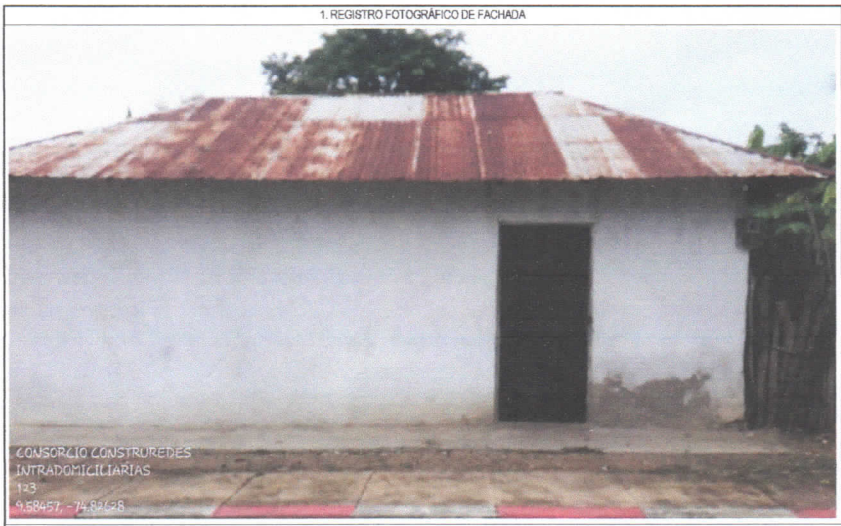

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	MARIA MARTINEZ CASTILLO		
DIRECCIÓN	CL 11 4A -45		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	15,30	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?


OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con andén en concreto y pintura en muros en mal estado. La puerta principal es de madera. Al interior de la vivienda cuenta con acabado de piso en arena y pintura en muros en mal estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO



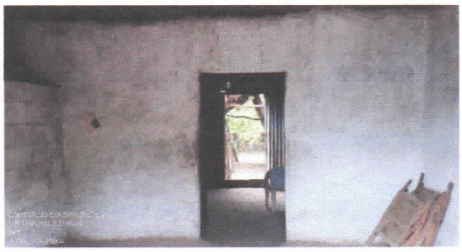



Firma
Nombre: MARIA MARTINEZ CASTILLO
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 22,854,421

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576					Hoja	1	de	1
OBJETO:			CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO								
CONTRATISTA:			CONSORCIO CONSTRUREDES								
INTERVENTOR:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A								
REGISTRO No.	124	FECHA	2022	6	6	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	FRANCISCO CABARCAS DE LA HOZ		
DIRECCIÓN	CL 11 4A - 70		
TELÉFONO	3045363052	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	8,12	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION: <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con terraza con acabado de arena y muros de bahareque con pañete y pintura en regular estado. La puerta principal es de lámina de zinc. Al interior de la vivienda, los pisos cuentan con acabado en arena y los muros son de bahareque sin pañetar. La vivienda no cuen ta con unidad sanitaria.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre: FRANCISCO CABARCAS DE LA HOZ
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 85.485.870.

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:			CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO								
CONTRATISTA:			CONSORCIO CONSTRUREDES								
INTERVENTOR:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A								
REGISTRO No.	144	FECHA	2022	6	6	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	JUAN ALVIS VERGARA		
DIRECCIÓN	CR 4A CL 8 - 39		
TELÉFONO	3205278414	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	6,64	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS


RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada de la vivienda cuenta con pintura en muros en mal estado con presencia de humedad y terraza en concreto rustico. La puerta principal es de metal con rejas de hierro y las ventanas son corredizas de vidrio con protectores de hierro. Al interior de la vivienda, el acabado de piso es en concret o y los muros de bloques no cuentan con pañete.

4. ANEXO FOTOGRAFICO

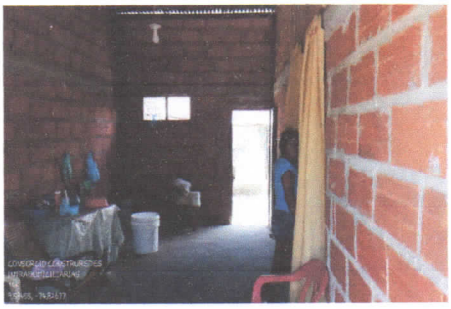





Firma

Nombre: JUAN ALVIS VERGARA
PROPIETARIO DEL PREDIO

C.C. / NIT 3.831.520

Firma

Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma

Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576					Hoja	1	de	1
OBJETO:			CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO								
CONTRATISTA:			CONSORCIO CONSTRUREDES								
INTERVENTOR:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A								
REGISTRO No.	126	FECHA	2022	6	28	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



PROPIETARIO	MELISSA DURANGO HERNANDEZ		
DIRECCIÓN	CL 11 4A - 29		
TELÉFONO	3045596217	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	7,00	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS		
	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS					
RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada de la vivienda cuenta con muros en mal estado, con pañete dañado, sin ventanas y puerta principal de zinc. Al interior de la vivienda cuenta con acabado de piso en arena.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre: MELISSA DURANGO HERNANDEZ
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1.049.454.476

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	127	FECHA	2022	6	28	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



PROPIETARIO	FELIPE VERGARA VILLA		
DIRECCIÓN	CL 11 4A - 32		
TELÉFONO	3117023362	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	13,08	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS		
	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS			
RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada de la vivienda cuenta con andén en concreto y pintura en muros en regular estado. La puerta principal es de madera con reja d e hierro y la ventana es de madera con protectores de hierro. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en concreto y pintura en muros en estado de des gaste por uso.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre: FELIPE VERGARA VILLA
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 3.831.622

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	133	FECHA	2022	6	29	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	MANUEL BOHORQUEZ ALVAREZ		
DIRECCIÓN	CL 9 7 - 53		
TELÉFONO	314 687 5529	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	20,50	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con acabado de piso en baldosa y pintura en muros enr regular estado. La puerta princip al es de metal con rejas de hierro y ventanas de vidrio con protectores de hierro. Al interior de la vivienda cuenta con acabado de piso en baldosa y pintura en muros en regular estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma

Nombre: MANUEL BOHORQUEZ ALVAREZ
PROPIETARIO DEL PREDIO

C.C. / NIT 3.831.621

Firma

Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma

Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576					Hoja	1	de	1
OBJETO:			CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO								
CONTRATISTA:			CONSORCIO CONSTRUREDES								
INTERVENTOR:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A								
REGISTRO No.	137	FECHA	2022	7	6	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	ISIDRO HENAO ESCOBAR		
DIRECCIÓN	CL 9 6 - 66		
TELÉFONO	3135395970	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	12,03	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS				
RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con andén en arena y concreto y pintura en muros en regular estado. La puerta principal y la ve ntana son de madera. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en concreto y pintura en muros en regular estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma Isidro Henao E.
Nombre: ISIDRO HENAO ESCOBAR
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 73.316.151

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	192	FECHA	2022	6	28	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	YON VALETH SOTO		
DIRECCIÓN	CL 10 8 - 1 P APTO 1		
TELÉFONO	3006303601	No. PISOS	2
FRENTE (Mts)	12,20	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada de la vivienda cuenta con pintura en muros en buen estado y acabado de piso en baldosa. La puerta principal es de metal y hierro y las ventanas son corredizas de vidrio. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en baldosa y pintura en muros en buen estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre: YON VALETH SOTO
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 79.317.273

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	160	FECHA	2022	6	29	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	ANA AYDEE MEDINA DE URIBE		
DIRECCIÓN	CL 10 7 - 2		
TELÉFONO	3128535316	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	8,00	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION :<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con andén en concreto y pintura en muros en regular estado. La puerta principal es de metal con vidrio y la ventana es de vidrio con protectores de hierro. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en concreto y muros con pañete sin pintura.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma: Ana aydee Medina
Nombre: ANA MEDINA DE URIBE
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 22.853.289

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	143	FECHA	2022	6	6	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

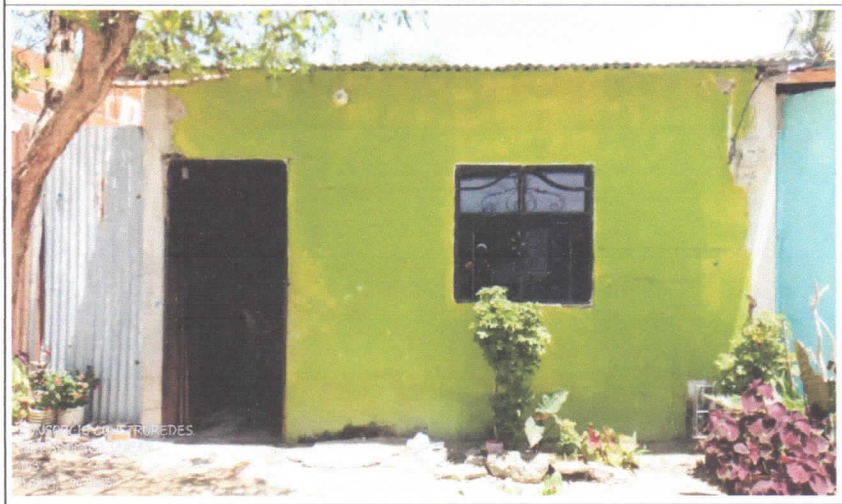

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	EDWIN PUELLO CHAMORRO		
DIRECCIÓN	CR 4A CL 8 - 45		
TELÉFONO	3108534040	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	5,00	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS		
	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS					
RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con andén en arena y muros de bloque con pañete y pintura en regular estado. La puerta principal es de metal y la ventana es corrediza de vidrio con protector de hierro. Al interior de la vivienda, los pisos cuentan con acabado de piso en concreto rustico y muros de bloques sin pañetar.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma EDWIN PUELLO
Nombre: EDWIN PUELLO CHAMORRO
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 73.316.258

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONAL JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:			CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO								
CONTRATISTA:			CONSORCIO CONSTRUREDES								
INTERVENTOR:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A								
REGISTRO No.	153	FECHA	2022	6	6	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

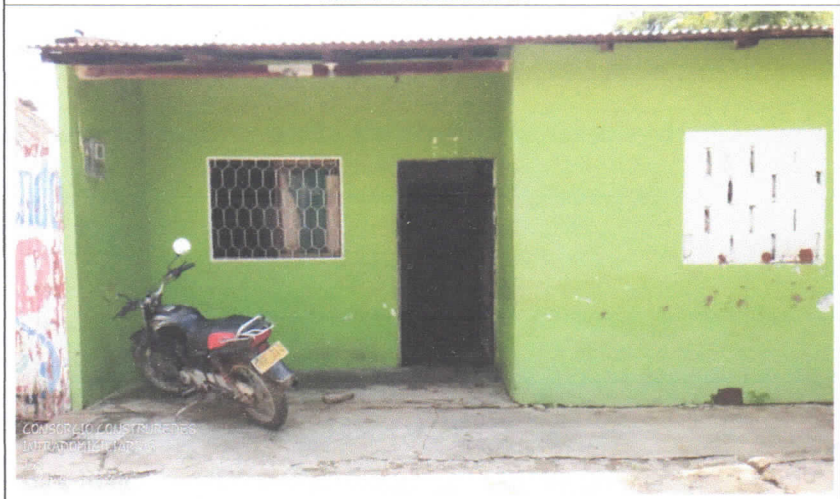

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	OSCAR TORRES CANTILLO		
DIRECCIÓN	CL 7 8 - 30		
TELÉFONO	3126222601	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	7,91	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS


RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION :<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con pintura en regular estado y acabado de terraza en concreto con presencia de algunas grietas. La puerta principal es de madera y las ventanas de vidrio con protectores de hierro. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en concreto y pintura en muros en regular estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO

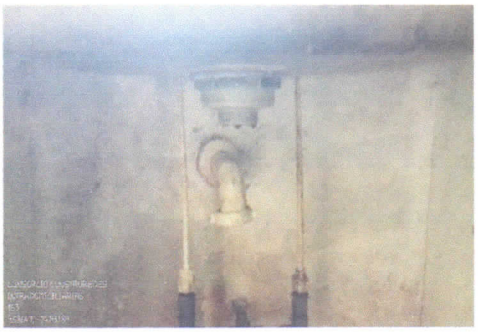





Firma
Nombre: OSCAR TORRES CANTILLO
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 73.315.785

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576					Hoja	1	de	1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	155	FECHA	2022	6	6	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

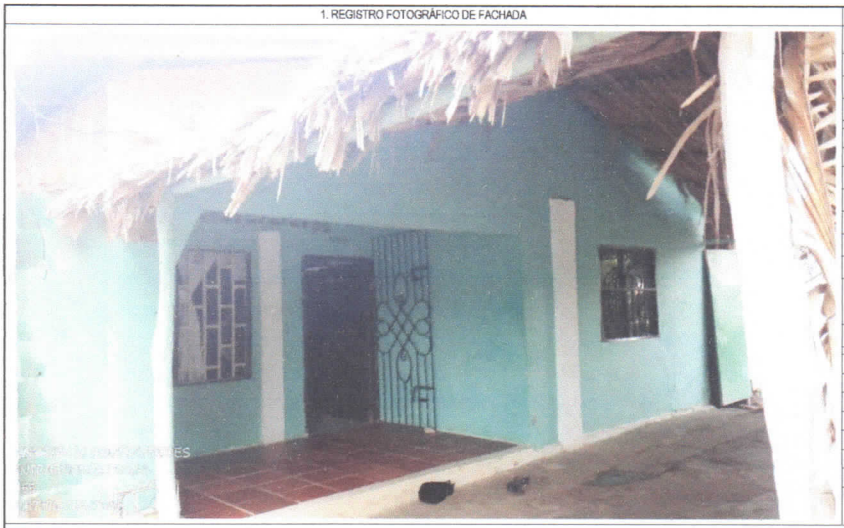

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	ONEIDA DIPPE DE FRANCO		
DIRECCIÓN	CR 9 CL 8 - 70		
TELÉFONO	3016564361	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	9,10	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con pintura en muros en regular estado y acabado de piso de terraza en baldosa. La puerta principal es de madera con rejas de hierro y ventana de vidrio con protectores de hierro. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en baldosa y pintura en m uros en regular estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre: ONEIDA DIPPE DE FRANCO
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 29.207.395

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	162	FECHA	2022	7	6	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	IDALUZ GUERRA VEGA		
DIRECCIÓN	CL 10 7 - 44		
TELÉFONO	300 465 9009	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	12,15	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS


RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION: <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con terraza de acabado en baldosa y pintura en muros en regular. La puerta principaly las ventanas son de madera y vidrio. Al interior de la vivienda cuenta con acabado de piso en baldosa y pintura en muros en buen estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO

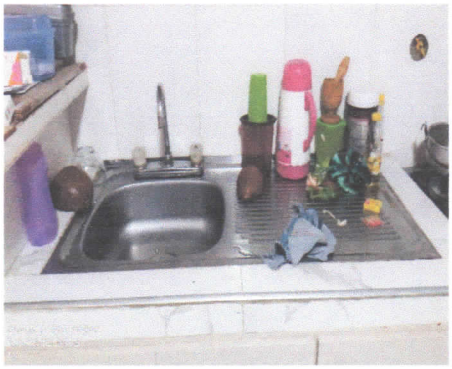





Firma
Nombre: IDALUZ GUERRA VEGA
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 22.854.656

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576					Hoja	1	de	1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	157	FECHA	2022	7	6	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	MAIRA ROSALES QUIROZ		
DIRECCIÓN	CL 10 KR 7		
TELÉFONO	3045531673	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	12,90	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS


RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con andén de acabado en concreto y muros sin pañete. No posee ventanas ni puerta. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en arena y piedra y muros sin pañete.

4. ANEXO FOTOGRAFICO

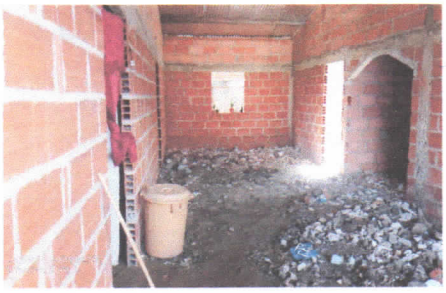





Firma: Maira Rosales Quiroz
Nombre: MAIRA ROSALES QUIROZ
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 22.855.489

Firma:
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma:
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	164	FECHA	2022	7	6	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

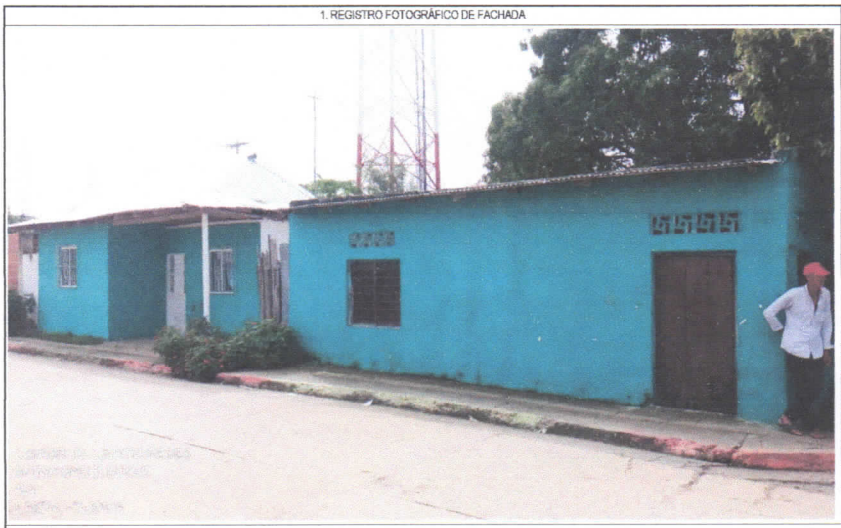

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	FRANCISCO MEDINA CAUSADO		
DIRECCIÓN	CL 8 CR 7 - 65		
TELÉFONO	3205100014	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	19,90	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS		
	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		


CLASIFICACIÓN DE PREDIOS			
RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con andén en concreto y pintura en muros en regular estado. La puerta de acceso es de lamina de zinc. Al interior de la vivienda, la zona común de patio es usada como sala-comedor.

4. ANEXO FOTOGRAFICO

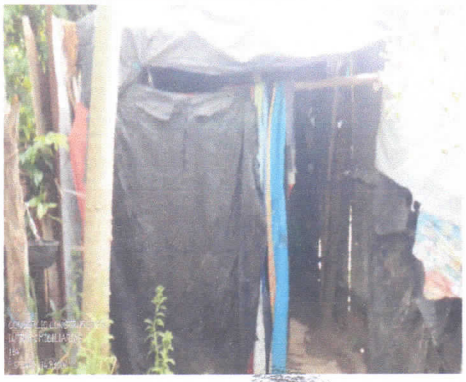





Firma
Nombre: FRANCISCO MEDINA CAUSADO
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 909.454

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	169	FECHA	2022	6	9	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

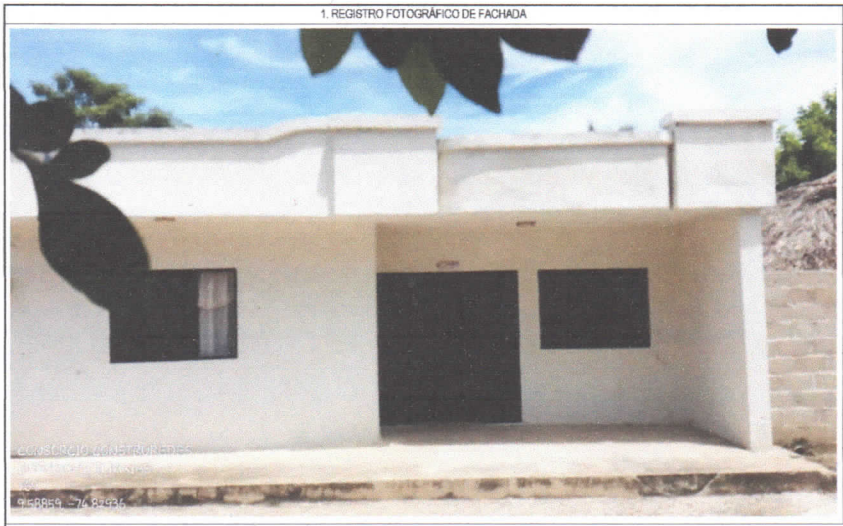

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	WISMAN SANCHEZ GARCIA		
DIRECCIÓN	CR 8 11 - 29		
TELÉFONO	3234223964	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	10,09	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION: <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada de la vivienda cuenta con terraza en concreto y pintura en muros en buen estado. La puerta principal es de madera y v idrio y las ventanas son de madera y vidrio. Al interior de la vivienda, los pisos en su mayoria cuentan con acabado en concreto y algunos muros sin pañetar.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre: WISMAN SANCHEZ GARCIA
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 12.596.289

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la linea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :											
OBJETO:	2220576								Hoja	1	de 1
	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	171	FECHA	2022	6	6	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	ARGEMIRO ORELLANO CARDENAS		
DIRECCIÓN	CL 12 7A - 41		
TELÉFONO	3135115833	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	19,50	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS			
RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCIÓN <Describir segun tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con piso de acabado en concreto y pintura en muros en mal estado. La puerta principal es de madera y ventanas de vidrio. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en concreto y pintura en muros en regular estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre: ARGEMIRO ORELLANO CARDENAS
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 3.831.867

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576					Hoja	1	de	1
OBJETO:			CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO								
CONTRATISTA:			CONSORCIO CONSTRUREDES								
INTERVENTOR:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A								
REGISTRO No.	175	FECHA	2022	6	28	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	ELISA OCHOA RIVERA		
DIRECCIÓN	CL 10 CR 8 - 36		
TELÉFONO	3013530297	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	17,95	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS


RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda, cuenta con terraza de acabado en baldosa y pintura en muros en regular estado. La puerta prin cipal es de metal con rejas de hierro y ventanas de vidrio con protectores de hierro. Al interior de la vivienda, cuenta con pintura en muros en regular estado y pintura en muro s en regular estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma: Elisa Ochoa Rivera
Nombre: ELISA OCHOA RIVERA
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 22.853.843

Firma: Ronal Blanco Arroyo
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma: Ronald Arrieta
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	179	FECHA	2022	6	28	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

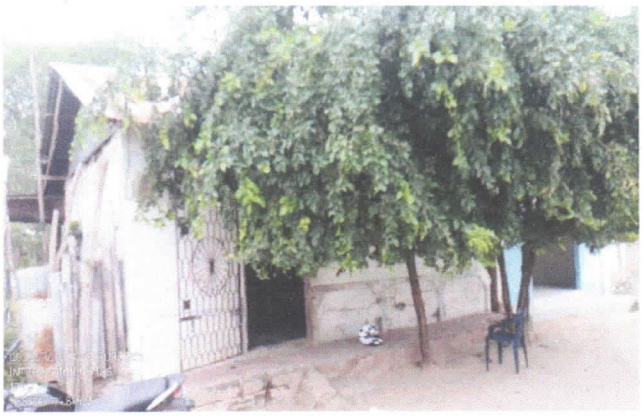

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	MARIS LUZ JULIO VERGARA		
DIRECCIÓN	CR 8 CL 6 - 23		
TELÉFONO	3023811050	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	8,10	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		X	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL			URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO			NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL			RURAL		
DOTACIONAL			RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS			OTRO	¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada de la vivienda cuenta con andén en concreto y pintura en muros en mal estado, la puerta principal es de madera y rejas de hierro. Al interior de la vivienda cuenta con acabado de piso en concreto y muros de bahareque con pintura en mal estado con presencia de grietas. La vivienda no cuenta co n unidad sanitaria, se proyecta instalación de caseta tipo 3.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre: MARIS LUZ JULIO VERGARA
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 45.523.464

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	180	FECHA	2022	6	28	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	IGNACIA CRUZ ROMERO		
DIRECCIÓN	CR 8 CL 8 - 40		
TELÉFONO	3023500710	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	8,75	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada de la vivienda cuenta con terraza en concreto y pintura en muros en mal estado, la puerta principal es de madera. Al interior de la vivienda cuenta con acabado de piso en concreto y pintura en muros en reegular estado. La vivienda no cuenta con unidad sanitaria, se proyecta instalación de caseta tipo 3.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre: IGNACIA CRUZ ROMERO
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 22.853.408

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:			CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO								
CONTRATISTA:			CONSORCIO CONSTRUREDES								
INTERVENTOR:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A								
REGISTRO No.	184	FECHA	2022	7	6	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	OSCAR CAMPO ACUÑA		
DIRECCIÓN	CR 8 CL 7 - 66 P		
TELÉFONO	304 613 9318	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	7,10	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con terraza de acabado en concreto y pintura en muros en regular estado. La puerta principal es de metal con rejas de hierro y las ventanas son de vidrio corredizas con protectores de hierro. A l interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en concreto y muros con pañete sin pintura.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma OSCAR CAMPO
Nombre: OSCAR CAMPO ACUÑA
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1.081.908.062

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576					Hoja	1	de	1
OBJETO:			CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO								
CONTRATISTA:			CONSORCIO CONSTRUREDES								
INTERVENTOR:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A								
REGISTRO No.	187	FECHA	2022	7	6	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

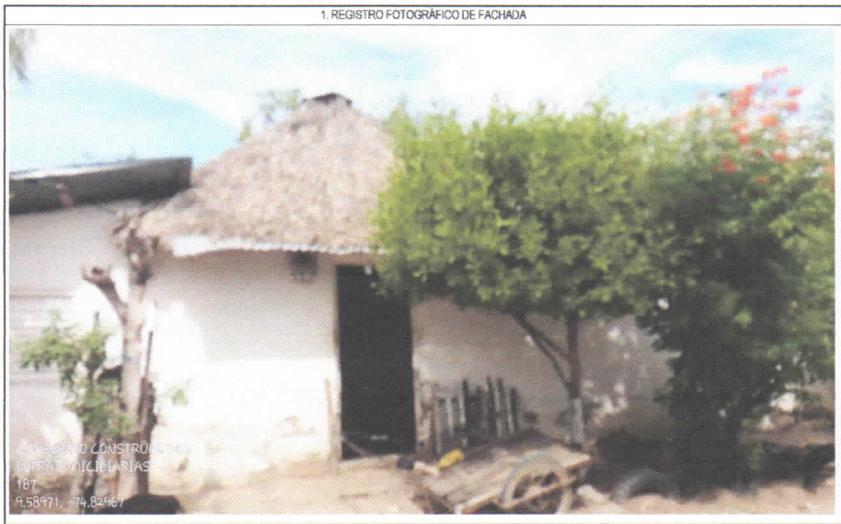

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	PEDRO VERGARA RIVERA		
DIRECCIÓN	CL 6 CR 6 - 180		
TELÉFONO	3009647827	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	23,50	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?


OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con andén en arena y pintura en muros en mal estado. La puerta principal es de madera. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en arena y pintura en muros de bahareque en mal estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO



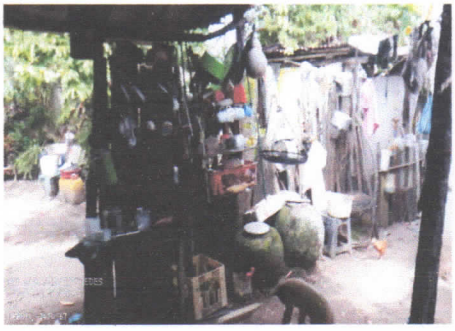



Firma
Nombre: PEDRO VERGARA RIVERA
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 3.831.929

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:			CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO								
CONTRATISTA:			CONSORCIO CONSTRUREDES								
INTERVENTOR:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A								
REGISTRO No.	194	FECHA	2022	6	28	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

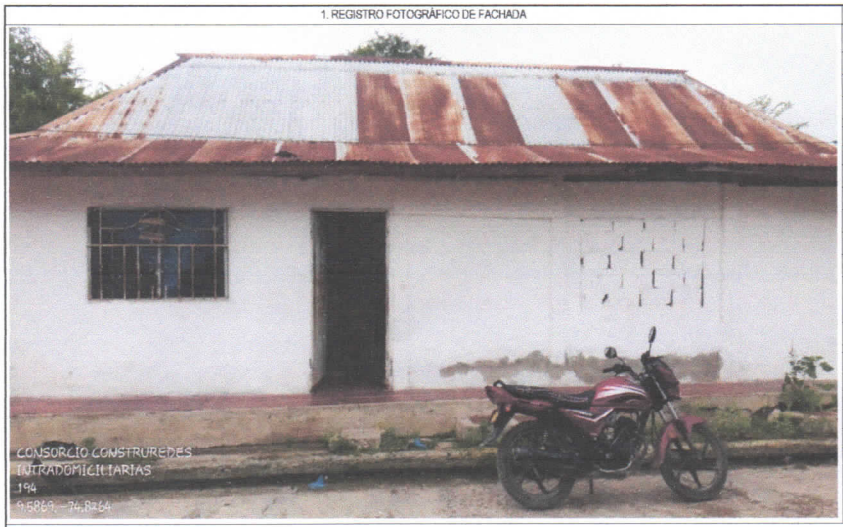

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	JHON JAIRO SANES VALETH		
DIRECCIÓN	CL 9 4-49		
TELÉFONO	324 372 1852	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	16,52	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?


OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con andén de acabado de baldosa y pintura en muros en mal estado. La puerta principal es de metal con rejas de hierro y las ventanas s on de vidrio con protectores de hierro. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en baldosa y pintura en muros en regular estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO



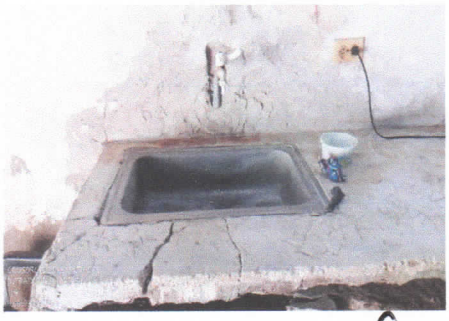



Firma JHON SANES.V
Nombre: JHON JAIRO SANES VALETH.
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 73.316.748

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:			CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO								
CONTRATISTA:			CONSORCIO CONSTRUREDES								
INTERVENTOR:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A								
REGISTRO No.	196	FECHA	2022	7	6	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

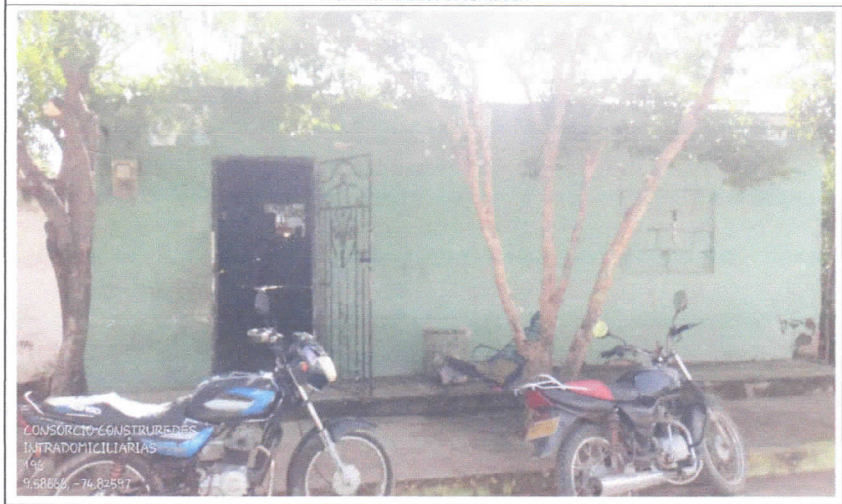

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	MANUEL ROMERO GUERRA		
DIRECCIÓN	CR 4 CL 8 - 25		
TELÉFONO	305 286 1916	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	10,80	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS		
	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		


CLASIFICACIÓN DE PREDIOS			
RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION: <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con andén en concreto y pintura en muros en regular estado. La puerta principal es de metal con rejas de hierro. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en concreto y muros sin pañete.

4. ANEXO FOTOGRAFICO

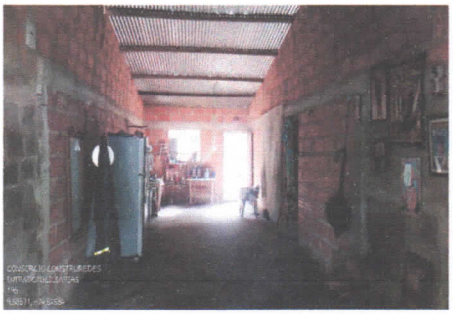





Firma
Nombre: MANUEL ROMERO GUERRA
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 3.831.054

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:			CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO								
CONTRATISTA:			CONSORCIO CONSTRUREDES								
INTERVENTOR:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A								
REGISTRO No.	197	FECHA	2022	6	28	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	JAIME MERCADO CANTILLO		
DIRECCIÓN	CL 9 5A - 2		
TELÉFONO	3052859338	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	14,80	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con terraza de acabado en concreto y pintura en muros en regular estado. La puerta pri ncipal es de metal con reja de hierro y las ventanas son corredizas de vidrio con protectores de hierro. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en concreto con pr esencia de grietas y muros con pintura en regular estado, con presencia de grietas.

4. ANEXO FOTOGRAFICO





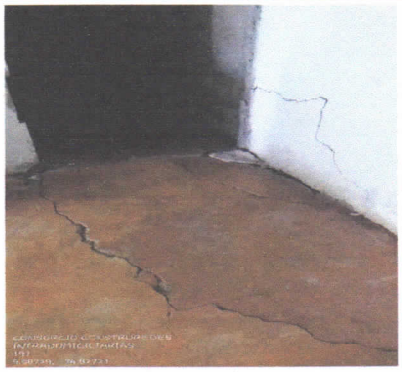

Firma
Nombre: JAIME MERCADO CANTILLO
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 3.831.131

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576					Hoja	1	de	1
OBJETO:			CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO								
CONTRATISTA:			CONSORCIO CONSTRUREDES								
INTERVENTOR:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A								
REGISTRO No.	198	FECHA	2022	7	6	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	KENI MEDINA FRANCO		
DIRECCIÓN	CL 10 7 - 13		
TELÉFONO	3022509941	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	10,10	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con terraza de acabado en baldosa y pintura en muros en buen estado. La puerta principal es de metal con vidrio y las ventanas son corredizas de vidrio. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en baldosa y pintura en muros en buen estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma KENNY MEDINA F

Nombre: KENI MEDINA FRANCO
PROPIETARIO DEL PREDIO

C.C. / NIT 1.002.301.923

Firma

Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma

Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:			CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO								
CONTRATISTA:			CONSORCIO CONSTRUREDES								
INTERVENTOR:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A								
REGISTRO No.	203	FECHA	2022	6	28	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

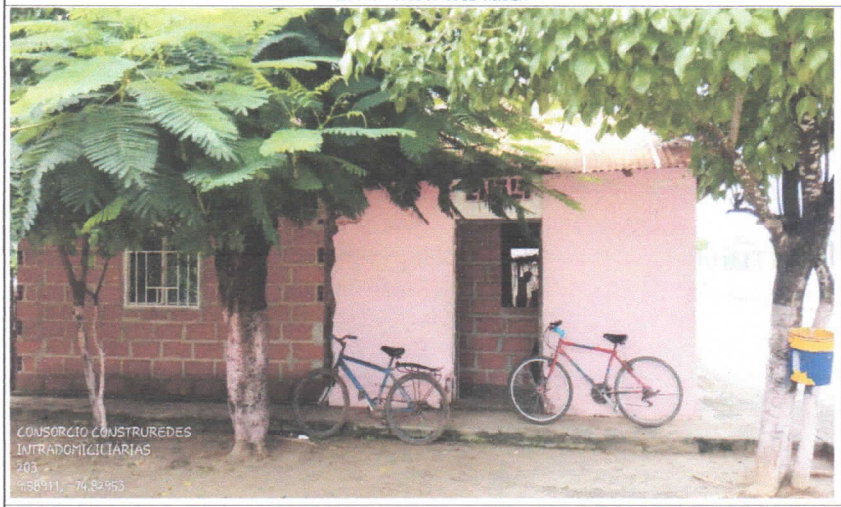

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	EMERSON SANCHEZ HENAO		
DIRECCIÓN	CL 12 CR 8 - 33		
TELÉFONO	302 434 5114	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	12, 45	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION :<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con andén en concreto y pintura en la mayoria de los muros en mal estado. La puerta principal e s de madera y la ventana es de vidrio con protectores de hierro. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en concreto y muros sin pañete.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma: Emerson Sanchez
Nombre: EMERSON SANCHEZ HENAO
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 73.316.943

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576					Hoja	1	de	1
OBJETO:			CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO								
CONTRATISTA:			CONSORCIO CONSTRUREDES								
INTERVENTOR:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A								
REGISTRO No.	205	FECHA	2022	6	28	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	JOSE ESQUEA POLO		
DIRECCIÓN	CL 11 KR 7A - 4		
TELÉFONO	3135682942	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	12,33	ESTRATO	1

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS


RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?


OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada de la vivienda cuenta con acabado de piso en concreto y pintura en muros en mal estado. La puerta principal es de metal con rejas de hierro, y ventanas de vidrio con protectores de hierro. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en concreto y pintura en muros en regular estad o.

4. ANEXO FOTOGRAFICO



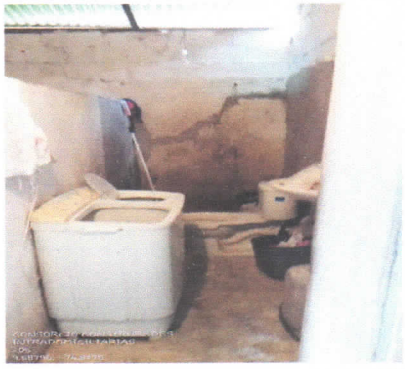



Firma
Nombre: JOSE ESQUEA POLO
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 77.019.127

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576					Hoja	1	de	1
OBJETO:			CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO								
CONTRATISTA:			CONSORCIO CONSTRUREDES								
INTERVENTOR:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A								
REGISTRO No.	206	FECHA	2022	6	28	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	SANDRA BENAVIDES ORTEGA		
DIRECCIÓN	KR 7A CL 11 - 27		
TELÉFONO	3135158060	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	12,20	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS


RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con terraza de acabado en concreto y pintura en muros en regular estado. La puerta principal es de metal y rejas de hierro, ventanas de vidrio y protectores de hierro. Al interior de la vivienda, cuenta con pintura en muros en regular estado y acabado de piso e n baldosa.

4. ANEXO FOTOGRAFICO

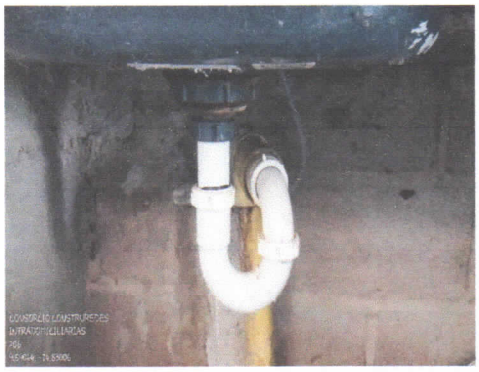





Firma Sandra Benavides
Nombre: SANDRA BENAVIDES ORTEGA
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1.049.452.097

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576					Hoja	1	de	1
OBJETO:			CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO								
CONTRATISTA:			CONSORCIO CONSTRUREDES								
INTERVENTOR:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A								
REGISTRO No.	209	FECHA	2022	6	28	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	FIDELIA RAMOS RODRIGUEZ		
DIRECCIÓN	CR 4A CL 7 - 2		
TELÉFONO	300 270 1785	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	20,01	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con terraza de acabado en baldosa y pintura en muros en regular estado. La puerta principal es de madera con rejas de hierro y las ventan as son de madera con protectores de hierro. Al interior de la vivienda cuenta con acabado de piso en baldosa y pintura en muros en regular estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma Fidelia Ramos
Nombre: FIDELIA RAMOS RODRIGUEZ
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 22.855.911

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:			CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO								
CONTRATISTA:			CONSORCIO CONSTRUREDES								
INTERVENTOR:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A								
REGISTRO No.	210	FECHA	2022	6	28	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	ROSA IDALIADURAN PASO		
DIRECCIÓN	CR 4A CL 7 - 26		
TELÉFONO	300 303 8675	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	11,10	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con andén en concreto y pintura en muros en regular estado. La puerta principal y la ve ntanaes de madera. Al interior de la viviend, cuenta con acabado de piso en concreto y pintura en muros en mal estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma x
Nombre: ROSA DURAN PASO
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 22.855.736

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:			CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO								
CONTRATISTA:			CONSORCIO CONSTRUREDES								
INTERVENTOR:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A								
REGISTRO No.	211	FECHA	2022	6	28	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

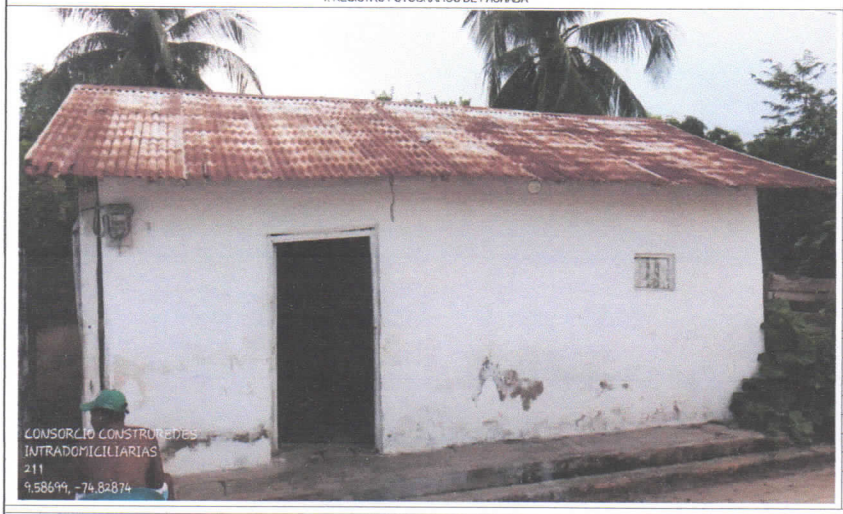

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	NICOLASA MEDINA ARRIETA		
DIRECCIÓN	CR 5A CL 8 - 31		
TELÉFONO	3226012702	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	12,80	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con andén en concreto y pintura en muros de bahareque en mal estado. La puerta principal es de madera. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en concreto y pintura en muros en regular estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre: NICOLASA MEDINA ARRIETA
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 22.855.812

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :	2220576							Hoja	1	de	1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	216	FECHA	2022	7	6	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

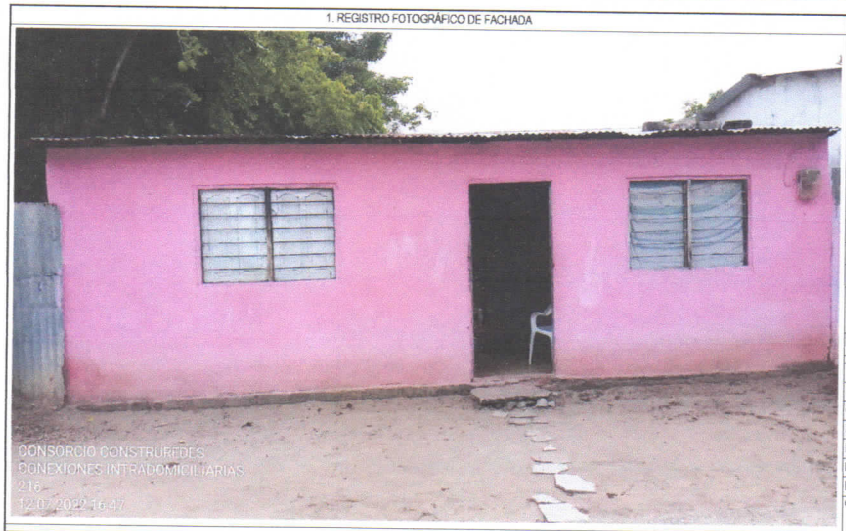

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	ELISA REYES VERGARA		
DIRECCIÓN	CR 8 CL 7 - 70		
TELÉFONO	3106028433	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	10,25	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con andén en arena y pintura en muros en regular estado. La puerta principal y las ventanas sonde madera. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en concreto y muros sin pañete con pintura en regular estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre: ELISA REYES VERGARA
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 22.854.864

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

AVANCE DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PROYECTO

SEMANA 11 DEL 04 AL 10 DE JULIO DEL 2022

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 1.771.707.945,99

Semáforo

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 633.471.063,09	35,75%	$ 269.742.205,40	15,22%	-$ 363.728.857,69	-20,53%
Durante el Periodo	$ 360.758.401,34	20,36%	$ 18.319.454,97	1,03%	-$ 342.438.946,37	-19,33%
Acumulado a la Fecha	**$ 272.712.661,75**	**15,39%**	**$ 288.061.660,37**	**16,26%**	**$ 15.348.998,62**	**0,87%**

Desviación en días: -1 Días

SEMANA 12 DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2022

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 1.771.707.945,99

Semáforo

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 272.712.661,75	15,39%	$ 288.061.660,37	16,26%	$ 15.348.998,62	0,87%
Durante el Periodo	$ 112.673.553,69	6,36%	$ 51.630.353,69	2,91%	-$ 61.043.200,00	-3,45%
Acumulado a la Fecha	**$ 385.386.215,44**	**21,75%**	**$ 339.692.014,07**	**19,17%**	**-$ 45.694.201,37**	**-2,58%**

Desviación en días: 4 Días

SEMANA 13 DEL 18 AL 24 DE JULIO DEL 2022

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 1.771.707.945,99

Semáforo

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 385.386.215,44	21,75%	$ 339.692.014,07	19,17%	-$ 45.694.201,37	-2,58%
Durante el Periodo	$ 116.055.550,16	6,55%	$ 60.237.340,75	3,40%	-$ 55.818.209,41	-3,15%
Acumulado a la Fecha	**$ 501.441.765,60**	**28,30%**	**$ 399.929.354,82**	**22,57%**	**-$ 101.512.410,78**	**-5,73%**

Desviación en días: 9 Días

SEMANA 14 DEL 25 AL 31 DE JULIO DEL 2022

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 1.771.707.945,99

Semáforo

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 501.441.765,60	28,30%	$ 399.929.354,82	22,57%	-$ 101.512.410,78	-5,73%
Durante el Periodo	$ 124.069.598,90	7,00%	$ 66.026.074,63	3,73%	-$ 58.043.524,27	-3,28%
Acumulado a la Fecha	**$ 625.511.364,50**	**35,31%**	**$ 465.955.429,45**	**26,30%**	**-$ 159.555.935,05**	**-9,01%**

Desviación en días: 14 Días

MEMORIAS DE CALCULO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES

NO APLICA
PARA ESTE
PERIODO



RELACIÓN DE PLANOS DEL PROYECTO

enterritorio	**RELACIÓN DE PLANOS**	CÓDIGO	**F-GG-20**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-12**

CONTRATO No. :	2220576
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.
SUPERVISOR:	KAROLL YULIETH JAVELA

No.	Plano #	Versión	Fecha	Contenido	Remplaza Plano #	Nueva Versión	Aprobado por	Observaciones
1	EST-01	1	3-may-22	ESPECIFICACIONES TECNICAS				CORESPONDEN A CASETA T3
2	EST-02	1	3-may-22	PLANTA ESTRUCTTURAL DESPIECE DE COLUMNAS DESPIECE DE VIGAS CORTES Y DETALLES				CORESPONDEN A CASETA T3
3	EST-01	1	9-may-22	ESPECIFICACIONES TECNICAS				CORESPONDEN A CASETA T1
4	EST-02	1	12-may-22	PLANTA ESTRUCTTURAL DESPIECE DE COLUMNAS DESPIECE DE VIGAS CORTES Y DETALLES				CORESPONDEN A CASETA T1
5	EST-01	1	12-may-22	ESPECIFICACIONES TECNICAS				CORESPONDEN A CASETA T2
6	EST-02	1	12-may-22	PLANTA ESTRUCTTURAL DESPIECE DE COLUMNAS DESPIECE DE VIGAS CORTES Y DETALLES				CORESPONDEN A CASETA T2
7	EST-01	1	12-may-22	ESPECIFICACIONES TECNICAS				CORESPONDEN A CASETA T4
8	EST-02	1	12-may-22	PLANTA ESTRUCTTURAL DESPIECE DE COLUMNAS DESPIECE DE VIGAS CORTES Y DETALLES				CORESPONDEN A CASETA T4
9	EST-01	1	23-may-22	ESPECIFICACIONES TECNICAS				CORRESPONDEN A TANQUE
10	EST-02	1	23-may-22	PLANTA ESTRUCTTURAL DESPIECE DE COLUMNAS DESPIECE DE VIGAS CORTES Y DETALLES				CORRESPONDEN A TANQUE
11	EST-	1	1-jul-22	PLANTA DE CIMIENTOS, PLANTAS DE VIGAS DE CUBIERTA, DETALLES DE VIGAS DE CIMIENTO Y DE CUBIERTA, CORTE ESTRUCTURAL,PLANTILLA LOSA MACIZA Y MACHONES DE CASETAS T1,T2,T3,T4 Y TANQUE				CORRESPONDE A CASTEAS T1,T2,T3,T4 Y TANQUE

Para constancia de lo anterior, se firma en ___CORDOBA____ a los ____31_ días del mes ___JULIO___ del ___2022___.

ENTREGA	**RECIBE**
Firma 	Firma 
NOMBRE: ALEXANDER ROMERO	**NOMBRE Jose Stalin Castaño**
Fecha: 31/07/2022	Fecha: 31/07/2022

ING. JOSÉ ALEXANDER ROMERO CETINA
T.P. 25202-177284 CND

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA – BOLIVAR
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE CORDOBA BOLIVAR, BARRIO SAN MARTÍN
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES
CONTRATO DE OBRA No.:	2220576
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	2220587
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022

FOTOGRAFÍA (1)



Descripción.
Se realiza construcción de caseta tipo 3, se puede apreciar levante de muro, fundición de columnetas y columnas para tanque, viga dintel, fundición de losa para tanque e instalación de cubierta.

FOTOGRAFÍA (2)



Descripción.
Se aprecia fundición de viga de cimentación en concreto de 3000 PSI en caseta tipo 3, armado de acero para columna de tanque.

FOTOGRAFÍA (3)



Descripción.
Se realiza intervención en vivienda de adecuación, se aprecia aplicación de pintura por parte externa del baño, construcción de lavadero.

FOTOGRAFÍA (4)




Descripción.
Se realiza levante de muro en caseta tipo 2, fundición de columnetas y viga dintel.

FOTOGRAFÍA (5)



Descripción.
Se observa caseta tipo 3 con levante de muro, fundición de columnas, encofrado para losa de tanque, se observa muro altura de viga dintel.

FOTOGRAFÍA (6)

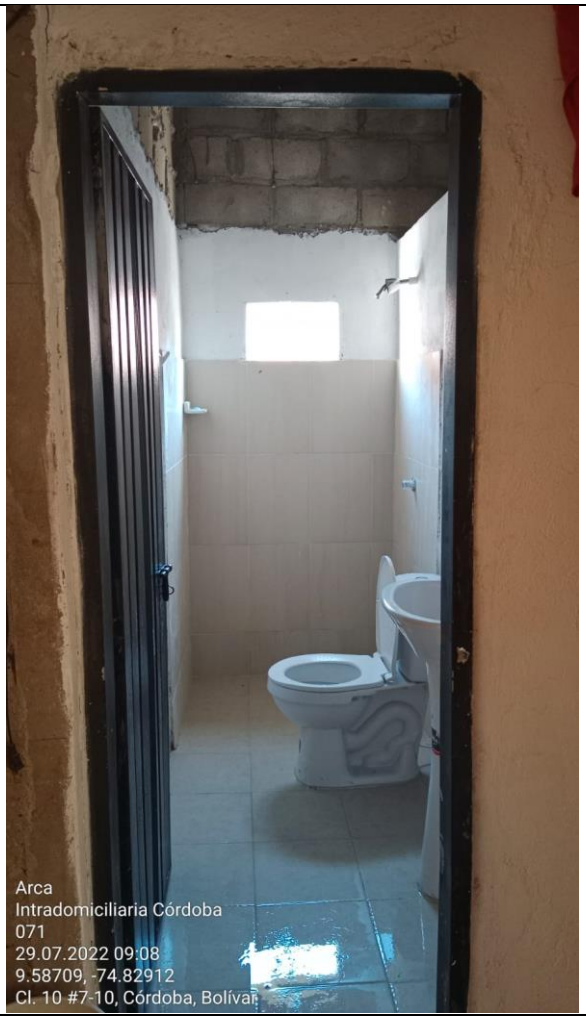

Descripción.
Se observa en adecuación de baño instalación de cerámica de pared y piso, instalación de sanitario, lavamanos con pedestal, accesorios de pared.

FOTOGRAFÍA (7)



Descripción.
Se observa caseta tipo 3 terminada, con instalación de tanque, de cubierta, cerámica, instalación de puerta y equipos sanitario.

FOTOGRAFÍA (8)



Descripción.
Se observa fundición de columna para tanque elevado en intervención de adecuación.

FOTOGRAFÍA (9)



Descripción.
Se observa caseta tipo 3 en un 90%, con aplicación de pintura, instalación de cubierta, cerámica, tanque elevado, instalación de puerta, faltando instalación de equipos sanitario.

FOTOGRAFÍA (10)



Descripción.
Se observa construcción de columna e instalación de tanque en intervención de adecuación.

FOTOGRAFÍA (11)



Descripción.
Se observa en adecuación de vivienda instalación de lavadero.

FOTOGRAFÍA (12)



Descripción.
Se observa en intervención de adecuación de vivienda construcción de muros e instalación de lavaplatos.

VIDEOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

SE ADJUNTAN EN CARPETA DIGITAL

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS ENSAYOS DE MATERIALES Y DEMÁS PRUEBAS

enterritorio	**CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS**	CÓDIGO:	**F-GG-23**
		VERSIÓN:	**1**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-19**

FECHA DE PRESENTACIÓN:	(31/07/2022)	**INFORME MENSUAL DEL**	**(01/07/2022)**	**AL**	**(31/07/2022)**	
CONTRATO No. :	2220587					
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)					
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES					
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A					
SUPERVISOR:	ENTERRITORIO					

MEDIANTE EL PRESENTE FORMATO, EL INTERVENTOR CERTIFICA QUE LOS ÍTEMS DE PROYECTO QUE SE PAGARÁN, CUMPLEN EN TODOS LOS CASOS CON TODAS LAS NORMAS TÉCNICAS APLICABLES Y CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1595 DE 2015 LOS QUE LE MODIFIQUEN O SUSTITUYAN

1. Si para el producto (bien o servicio), proceso o procedimiento se exigen requisitos por un Reglamento Técnico, decreto o ley (página web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo), obligatoriamente se declarará la conformidad y será entregable verificado previa presentación del certificado de conformidad de producto, sello de calidad o ensayos en laboratorio acreditado.

2. Si el producto (bien o servicios) proceso o procedimiento no está regido por un Reglamento técnico obligatorio, decreto o ley pero el contrato en su texto, en una especificación, el diseño, los planos u otro documento o requisito contractual cualquiera que sea se indica el cumplimiento de una norma (NTC, internacional, nacional o sectorial) o requisito particular o general, para declarar conforme ese bien o servicio y declararse entregable verificado, debe contar obligatoriamente con ensayo o cumplimiento de protocolo donde conste la conformidad con el requisito exigido.

1. LABORATORIOS ACREDITADOS Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

La Interventoría de Contrato CERTIFICA que la totalidad de los resultados de conformidad que se relacionan en este informe y anexan (anexo digital), se obtuvieron: en laboratorios acreditados cuando el bien o servicio está especificado y/o normado por un Reglamento Técnico Obligatorio, ley o decreto; cuando el proceso, procedimiento, bien o servicio no esta regido por un Reglamento técnico obligatorio, ley o decreto pero el Contrato lo exige, la conformidad de calidad se declaró mediante ensayo realizado con equipos de medición calibrados o verificación de cumplimiento de protocolo, bajo el control y seguimiento de un profesional capacitado e idóneo quien suscribe el registro del ensayo o protocolo en particular (anexo digital); en este último caso, se incluye en este formato la acreditación del laboratorio (anexo digital) si así lo exige el Contrato o acuerdo entre las partes. A continuación se relacionan los laboratorios acreditados y no acreditados donde se realizaron los ensayos y certificados de calibración de equipos utilizados (anexo digital).

1. 1. LABORATORIOS ACREDITADOS -EXIGIDO CUANDO EL BIEN O SERVICIO SE RIGE POR REGLAMENTO TÉCNICO OBLIGATORIO, LEY O DECRETO

Laboratorio		Certificado de Acreditación	Vigencia de la acreditación		Ensayos realizados en este laboratorio
Código (1)	**Nombre**		**Desde**	**Hasta**	
N/A	N/A PARA EL PRESENTE INFORME	N/A	N/A	N/A	N/A
	Adicione las filas necesarias				

(1) Para efectos de trazabilidad y control, asignar a cada laboratorio un código LAC (Laboratorio Acreditado) seguido de un número consecutivo, sin repetir y sin anular desde el inicio del proyecto hasta el final.

1.1.1. EQUIPOS - Certificados de calibración

Laboratorio (3)	Serial equipo (2)	Descripción del equipo	Número de Certificado de Calibración	Vigencia certificado de calibración	
				Desde	**Hasta**
Laboratorio Hernán Ramos Villamil S.A.S	2124	CAZUELA CASAGRANDE	NA-24532-001 R0	3/12/2021	
Laboratorio Hernán Ramos Villamil S.A.S	N/A	MANOMETRO HUMEDÓMETRO	NA-23741-001 R0	16/07/2021	
Hernán Ramos Villamil S.A.S	B-001/LCD/2-X	Máquina de ensayo a compresion (Marco Cilindros)	F1305	30/03/2022	
Laboratorio Hernán Ramos Villamil S.A.S	N/A	Máquina de ensayo a compresion (Cilindros)	F1304	30/03/2022	

(2) Para efectos de trazabilidad y control, relacionar el serial del equipo calibrado, sin repetir desde el inicio del proyecto hasta el final.
(3) Indique en esta casilla, el código del laboratorio donde se encuentra el equipo cuyo certificado de calibración se está informando.

2. ENSAYOS, SELLOS DE CALIDAD, CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD O REGISTRO DE ENSAYO EN LABORATORIO Y/O PROTOCOLOS APLICADOS

Los resultados de ensayos realizados y que se pagan parcial o totalmente en este periodo o períodos posteriores, son los que a continuación se relacionan.

Con el fin de tener trazabilidad de los ensayos, estos se numeran con dos dígitos XX-YY donde XX es el número del periodo del mes de ejecución del Proyecto y YY es el número en estricto orden cronológico del ensayo o certificado; para el primer informe el número de orden XX será 01, para el segundo informe 02 y así sucesivamente.

2.1. ENSAYOS REALIZADOS y/o PROTOCOLOS APLICADOS EN ESTE PERÍODO

No. de Orden			Ensayo			Resultado del Ensayo
XX	**YY**	**Fecha ensayo o aplicac. protocolo**	**Norma, protocolo o requisito técnico aplicable (exigido)**	**Nombre de la norma, protocolo o requisito**	**Código de Laboratorio donde se realizó el ensayo**	**Observaciones (la observación no pude condicionar la conformidad)**
03	01	9/07/2022	I.N.V.E 410 NTC-673-1513	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDRO DE CONCRETO	FC-10 VERSIÓN 2	LOS ELEMENTOS SOMETIDOS AL ENSAYO A COMPRESIÓN, COMO LO FUERON LA COLUMNA, LOSA DE TANQUE Y VIGA PRESENTAN UN 70% DE RESISTENCIA A LOS 7 DIAS DE TOMADA LA MUESTRA
03	02	30/07/2020	I.N.V.E 410 NTC-673-1514	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDRO DE CONCRETO	FC-10 VERSIÓN 2	LOS ELEMENTOS SOMETIDOS AL ENSAYO A COMPRESIÓN, COMO LO FUERON LA COLUMNA, LOSA DE TANQUE Y VIGA PRESENTAN MAS DEL 100% DE RESISTENCIA A LOS 28 DIAS DE TOMADA LA MUESTRA

2.2. CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO Y SELLOS DE CALIDAD RECIBIDOS EN ESTE PERIODO

No. de orden		No. Certificado o sello de calidad	Vigencia del Certificado o del sello de calidad		Certificador (entidad acreditada para expedir certificado)	Este sello de calidad o certificado de conformidad ampara los siguientes
XX	**YY**		**Desde**	**Hasta**		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A PARA EL PRESENTE INFORME

CONTROL DE CONFORMIDAD DE CALIDAD POR ÍTEMS DE CONTRATO OBJETO DE PAGO

A continuación se relacionan los ítems de contrato que el Interventor avala para pago en este período, para lo cual se requiere como condición previa que la Interventoría los haya declarado entregables verificados mediante certificados de conformidad de producto y/o sellos de calidad recibidos y/o los ensayos que recibió de un laboratorio acreditatado.

A continuación se resumen los requisitos y trazabilidad de conformidad de los ítems que cumplen calidad para pago en el presente período

Ítems de contrato que se incluirán en el acta y/o factura y/o cuenta del presente período		Normas técnicas (ley, decreto, resolución, reglamento) exigidas a cada ítem en particular		La conformidad con la norma se demuestra mediante	Número de orden del documento (certificado, ensayo, sello) que evidencia objetivamente
# del ítem según contrato	**Descripción del ítem**	**Numero de norma (4)**	**Descripción de la norma, reglamento, ley, decreto, resolución u otro exigible**		
N/A	N/A PARA EL PRESENTE INFORME	N/A	N/A PARA EL PRESENTE INFORME		N/A

(4) Si un ítem está sujeto a mas de una norma o protocolo, utilice tantas filas como sean necesarias e indique una sola norma o protocolo por fila.
(5) El número de orden puede ser de ensayo, protocolo o certificado obtenido en este período o periodos anteriores.

(6) El Interventor llevará control de las cantidades, baches o volúmenes de productos, procesos o procedimientos que certifica que cumplen calidad, de manera que garantice la trazabilidad de calidad para cada entregable evitando que se aplique un certificado vencido, o se aplique un ensayo excediendo su alcance en frecuencia, cantidad o tiempo. El Supervisor ENTerritorio exigirá esta trazabilidad en cualquier momento.

TRAZABILIDAD: Para efectos de trazabilidad, el Interventor anexa a este formato un archivo digital que contiene una carpeta denominada "Control inspección y ensayo Periodo XXX) con la información del período. Esta carpeta contiene tantas subcarpetas como subcapítulos contiene este formato y en cada una de esas subcarpetas se están incluyendo la totalidad de documentos que soportan lo certificado. El Interventor declara que no ha aceptado ningún laboratorio acreditado, calibración de equipo o ensayo del cual no dispone de trazabilidad que anexa a este informe. No se aceptan excepciones ni entregas de trazabilidad posteriores a la radicación de este formato. Este formato incluye como ítems verificados para pago únicamente aquellos que cumplen todos los requisitos establecidos.

Marcy A. Correa C	
Firma	**Firma**
NOMBRE	NOMBRE
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA (no se acepta firma "por" o "en nombre de")	DIRECTOR DE OBRA (no se acepta firma "por" o "en nombre de")

ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
INGENIERIA CIVIL- ESTUDIOS DE SUELO.

OFICINA Y LABORATORIO
Calle 12 No. 24B – 17 Barrio La Palma
Telef. y Fax 095-282 58 08 - SINCELEJO

Sincelejo, 1 de julio de 2022
Señores
ENTerritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
Ref. Certificación para realización de ensayos de geotecnia

Cordial saludo,

Yo, **HERNAN RAMOS VILLAMIL**, identificado con la cedula de ciudadanía número 9.053.862 de Cartagena y la Matricula profesional 494 de S.I.A.B. que me acredita como ingeniero civil, en calidad de representante legal de la empresa **HERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S. Nit. 900.565.151-3**, laboratorio con más de 50 años de experiencia en el campo de la geotecnia, certifico que seremos los encargados de realizar todos los ensayos pertinentes que garanticen el control y el aseguramiento de la calidad de la obra *"ejecución de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el Municipio de Córdoba, Departamento de Bolívar"* la cual está a cargo de la firma **Consorcio Construredes Nit 901.568.676-5**.

Firma Electrónica
ID Firma: 67c37f62-3496-469f-b5c0-733a2abbe22b

HERNAN RAMOS VILLAMIL
C.C. 9.053.862 de Cartagena.
T.P. 494 S.I.A.B.
Representante Legal

CONSORCIO CONSTRUREDES

Cra 24 No. 15 - 17 Centro

Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com

Teléfono: 311 4143542

«CIUDAD_PROPONENTE»

El consorcio Construredes Se hace responsables de todos los ensayos emitidos por la empresa **Hernán Ramos Villamil S.A.S Nit 901.565.151-3**, laboratorio con más de 50 años de experiencia en el campo de la geotecnia y los cuales poseen la calibración de los equipos, cuyo proveedor si está acreditado para realizar las calibraciones correspondientes y es un respaldo a nuestro trabajo. Estarán encargados de realizar los ensayos pertinentes que garanticen el control y aseguramiento de la calidad de la obra “ejecución de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de cordoba, departamento de bolívar”

REPRESENTANTE LEGAL

ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
INGENIERIA CIVIL- ESTUDIOS DE SUELO.

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
I.N.V. E-410

FC - 19

VERSIÓN 02

Fecha
31/05/2013


CLIENTE CONSORCIO CONSTRUREDES
OBRA INTERDOMICILIARIOS MUNICIPIO DE CORDOBA DPTO DE BOLIVAR
LOCALIZACION DEPARTAMENTO DE CORDOBA -BOLIVAR
FECHA 30/07/2022

NORMAS

I.N.V.E.-410
NTC-673-1513

IDENT.	ELEMENTO	FECHA FUNDICIÓN	FECHA ROTURA	EDAD MUESTRA (Días)	RESISTENCIA REQUERIDA (PSI)	ASENT. PULG	CARGA (KN)	TIPO DE FALLA (1-6)	RESISTENCIA A LA FECHA (PSI)	% DE RESISTENCIA DESARROLLADO
	COLUMNAS	02/07/2022	30/07/2022	28	3000		185,1	5	3190,9	106,3%
	VIGA	02/07/2022	30/07/2022	28	3000		175,2	5	3165,5	105,5%
	PLACA	02/07/2022	30/07/2022	28	3000		189,4	5	3250,5	108,3%

TIPOS DE FALLA



FORMA DE PROBETAS		Area (cm2)
CILINDRICA NORMAL 4"	10,20	81,75
CILINDRICA NORMAL 6"	15,24	176,115

OBSERVACIONES:

ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
NIT N° 900.565.151-3
INGENIERIA CIVIL - ESTUDIOS DE SUELO.

DIR. TÉCNICO

LABORATORISTA

ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
INGENIERIA CIVIL- ESTUDIOS DE SUELO.

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
I.N.V. E-410

FC - 19

VERSIÓN 02

Fecha
31/05/2013


CLIENTE CONSORCIO CONSTRUREDES
OBRA INTERDOMICILIARIOS MUNICIPIO DE CORDOBA DPTO DE BOLIVAR
LOCALIZACION DEPARTAMENTO DE CORDOBA -BOLIVAR
FECHA 09/07/2022

NORMAS

I.N.V.E.-410
NTC-673-1513

IDENT.	ELEMENTO	FECHA FUNDICIÓN	FECHA ROTURA	EDAD MUESTRA (Días)	RESISTENCIA REQUERIDA (PSI)	ASENT. PULG	CARGA (KN)	TIPO DE FALLA (1-6)	RESISTENCIA A LA FECHA (PSI)	% DE RESISTENCIA DESARROLLADO
	COLUMNAS	02/07/2022	09/07/2022	7	3000		135,1	5	2125,8	70,8%
	VIGA	02/07/2022	09/07/2022	7	3000		131,2	5	2234,6	74,4%
	PLACA	02/07/2022	09/07/2022	7	3000		129,4	5	2237,4	74,5%

TIPOS DE FALLA



FORMA DE PROBETAS		Area (cm2)
CILINDRICA NORMAL 4"	10,20	81,75
CILINDRICA NORMAL 6"	15,24	176,115

OBSERVACIONES:

ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
NIT N° 900.565.151-3
INGENIERIA CIVIL - ESTUDIOS DE SUELO.

DIR. TÉCNICO

LABORATORISTA

PINZUAR
LABORATORIO DE METROLOGÍA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN – LABORATORIO PRESIÓN

NA-23741-001 R0

CALIBRATION CERTIFICATE – LABORATORY OF PRESSURE

INSTRUMENTO *Instrument*	*MANÓMETRO HUMEDÓMETRO*
INTERVALO DE MEDIDA *Measurement range*	*0 %HR - 20 %HR*
FABRICANTE *Manufaturer*	*RYR*
MODELO *Model*	*DI*
SERIE *Identification number*	*No Presenta*
CODIGO INTERNO *Internal Code*	*23741-001*
SOLICITANTE *Customer*	*HERNAN RAMOS VILLAMIL SAS*
DIRECCIÓN *Address*	*Calle 12 No. 24 B - 17*
CIUDAD *City*	*Sincelejo - Sucre*
FECHA DE CALIBRACIÓN *Date of calibration*	2021 - 07 - 14
FECHA DE EXPEDICIÓN *Date of Issue*	2021 - 07 - 16

NÚMERO DE PÁGINAS DEL CERTIFICADO INCLUYENDO ANEXOS ***3***
Number of pages of this certificate and documents attached

Firmas que autorizan el certificado
Signatures authorizing the certificate

Ing. Sergio Martínez
Director Laboratorio de Metrología

Tecg. Francisco Durán Romero
Metrólogo Laboratorio de Metrología

DETALLES DE LA CALIBRACIÓN

MÉTODO DE CALIBRACIÓN Comparación directa. **Documento de Referencia** DKD R 6 - 1 del 2014

FACTOR DE CONVERSIÓN 1 psi = 6,89476 kPa Nota: Factor de conversión tomado del NIST Special Publication 811 2008 Edition

DATOS DE LA CALIBRACIÓN

INTERVALO A CALIBRAR 0 %HR - 20 %HR **DIVISIÓN DE ESCALA** 0,2 %HR **RESOLUCIÓN** 0,1 %HR

	Indicación del IBC	indicaciones del instrumento patrón	
		M1 - asc	M2 - desc
%	% HR	psi	psi
0	0,00	0,000	0,000
20	4,00	6,166	5,972
40	8,00	12,136	11,988
60	12,00	17,966	17,689
80	16,00	23,934	23,899
100	20,00	29,988	29,988

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN

Indicación del IBC		Promedio Patrón	Desviación	Histeresis	Incertidumbre Expandida
%	psi	psi	psi	psi	psi
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
4,00	6,00	6,07	-0,07	0,19	0,25
8,00	12,00	12,06	-0,06	0,15	0,21
12,00	18,00	17,83	0,17	0,28	0,34
16,00	24,00	23,92	0,08	0,04	0,13
20,00	30,00	29,99	0,01	0,00	0,12

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

La desviación máxima encontrada durante la calibración entre el instrumento sometido a prueba y el patrón es:

0,172 psi

La desviación máxima encontrada, respecto al valor máximo de la escala en porcentaje es:

% Desviación = 0,6

INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN

La incertidumbre expandida de la medición esta dada en la tabla de resultados de la página No. 2, para cada punto de calibración. La incertidumbre de medición fue calculada utilizando un factor de cobertura k = 2 para un nivel de confianza aproximado del 95,45% para una distribución "t-student" y fue estimada con el documento: JCGM 100:2008. GUM 1995 with minor corrections. Evaluation of measurement data Guide to the expression of uncertainty in measurement. First Edition. September 2008.

CONDICIONES AMBIENTALES

Max. Temp.	*20,3 °C*	***Min. Temp.***	*19,6 °C*
Max. Hum. (%)	*55 HR*	***Min. Hum. (%)***	*53 HR*

TRAZABILIDAD

El Laboratorio de Metrología de Pinzuar Ltda. asegura el mantenimiento de la trazabilidad de los patrones de trabajo utilizados en las mediciones.

PATRÓN UTILIZADO	Manómetro Digital		
CERT.DE CALIBRACIÓN	7337 de Flexilatina S.A.S.	**CLASE DE EXACTITUD**	0,050%
INTERVALO DE MEDIDA	30 psi	**SERIE**	3227038

OBSERVACIONES .

1. Se realizó una inspección general del instrumento encontrándose en buen estado de funcionamiento
2. Los Certificados de calibración sin las firmas no tienen validez .
3. El usuario es responsable de la recalibración de los instrumentos de medición.
4. Los resultados contenidos parcialmente en este informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos.
5. Se adjunta estampilla de calibración adherida al instrumento No. **NA-23741-001**

Fin de Certificado

Certificado de Calibración - Laboratorio de Longitud

NA-24532-001 R0

Calibration Certificate - Dimensional Metrology Laboratory

Equipo *Instrument*	CAZUELA CASAGRANDE
Fabricante *Manufacturer*	PINZUAR
Modelo *Model*	PS-11
Número de Serie *Serial Number*	2124
Identificación Interna *Internal Identification*	No presenta
Intervalo de Medición *Measurement Range*	Ver tabla de resultados
Solicitante *Customer*	HERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
Dirección *Address*	Calle 12 No24 B - 17
Ciudad *City*	Sincelejo - Sucre
Fecha de Calibración *Date of Calibration*	2021 – 12 – 03
Fecha de Emisión *Date of Issue*	2021 – 12 – 13
Número de páginas del certificado, incluyendo anexos *Number of pages of the certificate and documents attached*	02

Los resultados emitidos en este certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. Dichos resultados solo coresponden al item que se relaciona en esta página. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos y/o de la información suministrada por el solicitante.

Este certificado de calibración documenta y asegura la trazabilidad a patrones nacionales e internacionales, que reproducen las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

El usuario es responsable de la calibración de los intrumentos en apropiados intervalos de tiempo.

The results issued in this certificate relates to the time and conditions under which the measurements. These results correspond to the item that relates on page number one. The laboratory, which will not be liable for any damages that may arise from the improper use of the instruments and/or the information provided by the customer.

This calibration certificate documents and ensures the traceability to national and internationals standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI).

The user is responsable for recalibrating the measuring instruments at appropriate time intervals.

Sin la aprobación del Laboratorio de Metrología Pinzuar. no se puede resproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad, ya que proporciona la seguridad que las partes del certificado no se sacan de contexto. Los certificados de calibración sin firma no son válidos.

Without the approval of the Pinzuar Metrology Laboratory, the report can not be reproduced, except when it is reproduced in its entirety, since it provides the security that the parts of the certificate are not taken out of context. Unsigned calibration certificates are not valid.

Firmas Autorizadas

Authorized signatureS

Ing. Sergio Iván Martínez
Director Laboratorio de Metrología

Tecg. Jaiver Arnulfo López
Metrólogo Laboratorio de Metrología


DATOS TÉCNICOS

Método Empleado	Comparación Directa
Instrumentos de Referencia	Pie de Rey
Certificado No.	L-21980-001 de Pinzuar
Documento de Referencia	INVIAS E – 125/13 Numeral 5

TABLA DE RESULTADOS

Cazuela

Letra*	Especificación	Valor Medido
	mm	mm
A	54 ± 0.5	54,03
B	2 ± 0.1	2,08
C	27 ± 0.5	27,36
K	50 ±2	51,33
L	150 ± 2	151,24
M	125 ± 2	126,05
U	47 ± 1	46,95
P	28	27,33
R	24	23,95
T	45	45,04

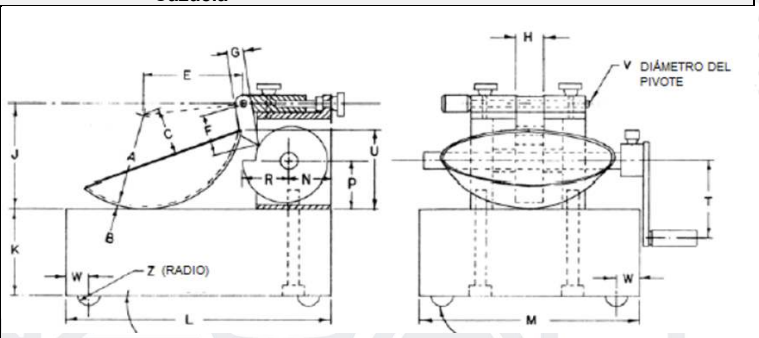

CONDICIONES AMBIENTALES

La verificación se llevó a cabo en en las instalaciones del Laboratorio de Metrología Pinzuar., las condiciones ambientales durante la ejecución fueron las siguientes:

Temperatura Máxima:	19,8 °C	**Humedad Máxima:**	56 %
Temperatura Mínima:	19,5 °C	**Humedad Mínima:**	53 %

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre expandida de la medición reportada (Tablas de resultados), se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura k y la probabilidad de cobertura aproximadamente al 95 %. Basados en el documento: JCGM 100:2008. GUM 1995 with minor corrections. Evaluation of measurement data Guide to the expression of uncertainty in measurement. First Edition. September 2008.
* La incertidumbre máxima encontrada en la medición de dimensiones es 12 µm para un factor de cobertura k=2.

OBSERVACIONES

1. Se usa la coma como separador decimal.
2. Se adjunta la estampilla de calibracón.

NA-24532-001

Fin de Certificado

ROSSEMBERG
LABORATORY EQUIPMENT
CEL.:(057)3016256345 - 3157815444
www.rossemberg.com.co

Laboratorio de Metrología

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1304**
Number

Número de páginas incluyendo anexos
Number of pages and documents attached 3

Objeto: Máquina de ensayo a compresion (Cilindros)
Object

Fabricante: N/P
Manufacturer

Modelo: N/P
Model

Número de identificación: N/P
Identificación number

Rango de mediciòn: 100,0 kN …….. 1200,0 kN
Range of measurement

Usuario final del certificado: Hernan ramos villamil SAS
Certificate end user

Dirección del usuario: Calle 12 # 24b - 170 Barrio las palmas Sincelejo (Sucre)
User´s address

Lugar de calibración: Laboratorio
Calibration site

Fecha de calibración: miércoles, 30 de marzo de 2022
Calibración date

Este certificado documenta la trazabilidad a los patrones nacionales o internacionales, los cuales representan las unidades de medida en concordancia con el sistema internacional de unidades (SI). Este certificado de calibración no podrá ser reproducido total ni parcialmente sin autorización escrita de Sistemas de Ensayo y Calibración RYR. Los resultados, consignados en este certificado se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. RYR SAS, no se responsabiliza por los perjuicios que pueden derivarse del uso inadecuado de los objetos calibrados o de este certificado. Este certificado no tiene valides sin las firmas y el sello de RYR SAS.

This certificate declares the traceability to the National Standards, which represent the units of measurament that are in agreement with the International System Units (SI). This certificate of calibration could not be reproduced partially without written authorization of the RYR SAS. The sesult of this certificate is for the object of calibration, at the conditions in which the measurements were made. The RYR SAS does not take responsibility from the inadequate use of the calibrated objects or this certificate. The calibration certificate is not valid without the signatures and the seal of the RYR SAS


Fecha de emisión: viernes, 20 de agosto de 2021
Date of issue

Número: **F 1304**
Number

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)
AUTORIZED SIGNATURE (S)



Leonard González M.
Realizado por:
Performed by



Rossemberg Indaburo M
Verificado por:
reviewed by

ROSSEMBERG
LABORATORY EQUIPMENT
CEL.:(057)3016256345 - 3157815444
www.rossemberg.com.co

Laboratorio de Metrología

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1304**
Number

Fecha de calibración: miércoles, 30 de marzo de 2022

Método de calibración
Calibration method
Fuerza indicada constante, Norma Tecnica Colombiana NTC 7500-1/2002-09-18

Condiciones ambientales
Environmental conditions

Temperatura Ambiente	Inicial/*Initial*	32,0	°C
	Final/*End*	33,0	°C

Resultados
Results

	Limite inferior de la escala del instrumento de medición	20,0 kN
	Resolución **(r)**	0,1 kN
Dirección de la carga: Compresión	Resolución relativa de la máquina de ensayo **(a)** %	al 10% = 0,08
Indicación de la máquina: Digital		al 20% = 0,04

CARGA (%)	Indicación del Instrumento Patrón (F) en kN					PROMEDIO L1,L2 Y L3	Indicación del instrumento a calibrar **(Fi)**	Errores encontrados %					Incertidumbre Expandida	k
	L1	Girar Celda 120° L2	Girar Celda 120° L3	L4	Reversibilidad Fó F' L2 Descendente			Resolución relativa **(a)**	Reversibilidad **(v)**	Repetibilidad **(b)**	Exactitud **(q)**	Accesorios		
8	100,00	100,40	100,30			100,23	100,0	0,10		0,40	-0,23		5,7,E-01	2,00
17	200,00	200,00	200,20			200,07	200,0	0,05		0,10	-0,03		3,7,E-01	1,96
25	300,00	300,00	301,00			300,33	300,0	0,03		0,33	-0,11		3,7,E-01	1,96
33	401,00	401,00	400,00			400,67	400,0	0,03		0,25	-0,17		3,7,E-01	1,96
42	501,00	501,00	500,00			500,67	500,0	0,02		0,20	-0,13		3,7,E-01	1,96
50	600,00	601,00	601,00			600,67	600,0	0,02		0,17	-0,11		3,7,E-01	1,96
58	700,00	702,00	702,00			701,33	700,0	0,01		0,29	-0,19		3,7,E-01	1,96
67	800,00	801,00	801,00			800,67	800,0	0,01		0,12	-0,08		3,7,E-01	1,96
83	1001,00	1002,00	1004,00			1002,33	1000,0	0,01		0,30	-0,23		3,7,E-01	1,96
100	1201,00	1205,30	1203,00			1203,10	1200,0	0,01		0,36	-0,26		3,7,E-01	1,96

0,033	0,40	0,30	0,20		Indicación Residual de la maquina de ensayo sin carga **(F_{i0})**:


	Cero F_0	Reversibilidad (v)	Repetibilidad (b)	Exactitud (q)	Accesorios
Máximos errores encontrados (%)	0,033	No se determino	0,4	-0,23	No se determino
Máximos errores permitido para clase : 1	± 0,1	± 1,5	1,0	± 1,0	1,50
Norma Tecnica Colombiana NTC 7500-1/2002-09-18, Numeral:	6.4.5	6.4.8	6.5.2	6.5.1	6.4.6

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1305**
Number

Fecha de calibración miércoles, 30 de marzo de 2022

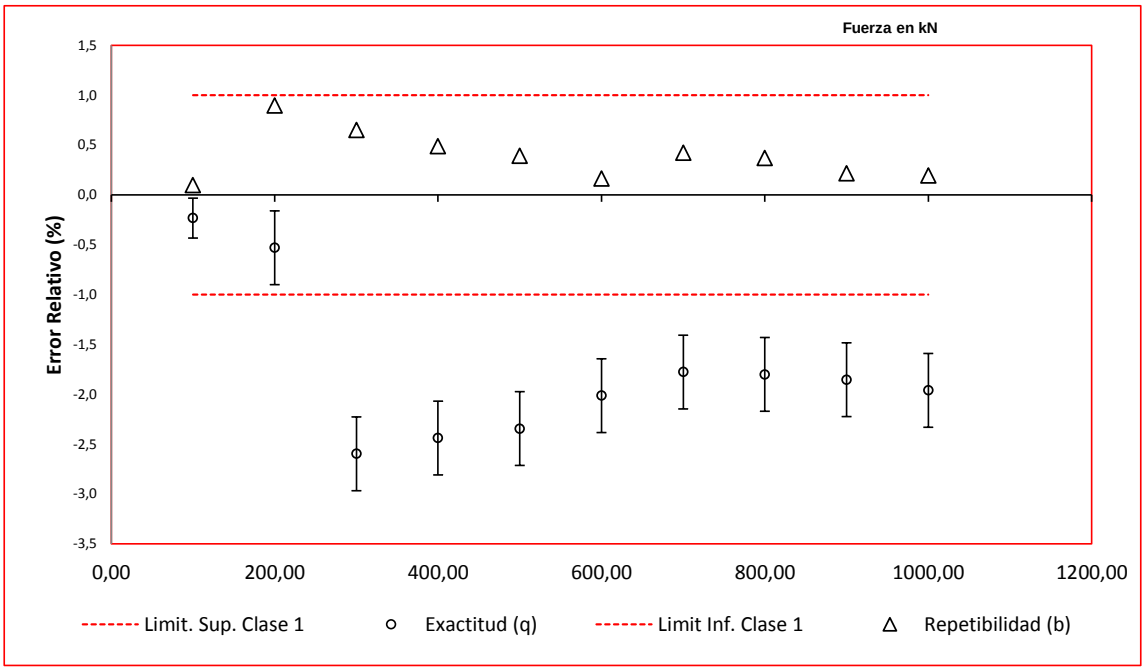

DE ACUERDO A LOS ERRORES RELATIVOS MAXIMOS PRESENTADOS Y SEGUN LAS PRESCRIPCIONES DE LA NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 7500-1, LA MAQUINA DE ENSAYO CALIBRADA SE CLASIFICA COMO:

Clase 1 DEL 10% AL 100% DE SU CAPACIDAD MAXIMA

TRAZABILIDAD :

EL LABORATORIO DE METROLOGÍA DE RYR SAS , ASEGURA EL MANTENIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD

Equipos utilizados en la calibraciòn

Equipo	*Fabricante*	*Modelo*	*Serie*	*Capacidad*	*Cert. No*	*Fecha Cal.*	*Entidad Cert.*
Celda de carga	AEP	KAL2000KN	901080	1000 kN	MF-172-18	2018/01/11	SIMIM
Celda de carga	AEP	KAL300KN	903408	300 kN	MF-174-18	2018/01/13	SIMIM

OBSERVACIONES :

1. La máquina de ensayos deberá ser calibrada inmediatamente despues de cualquier reparación ya que la sustitución de elementos del sistema mecánico o eléctrico afectan la operación del sistema de medida.
2. Si la máquina de ensayos es reubicada, se deberá repetir la calibración. Igualmente, cuando exista razón de duda con respecto a la exactitud de la carga, independientemente del tiempo transcurrido desde la última calibración,
3. Los datos emitidos en el presente certificado, se ajustan al momento y condiciones dadas en la calibración RYR SAS. no se hace responsable por daños ocasionados al equipo debido al uso inadecuado.

ROSSEMBERG
LABORATORY EQUIPMENT
CEL.:(057)3016256345 - 3157815444
www.rossemberg.com.co

Laboratorio de Metrología

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1305**
Number

Página /Pages 1 de 3

Número de páginas incluyendo anexos 3
Number of pages and documents attached

Objeto: Máquina de ensayo a compresion (Marco Cilindros)
Object

Fabricante: Alfa
Manufacturer

Modelo: B-001/LCD/2-X
Model

Número de identificación: 170225/33
Identificación number

Rango de mediciòn: 100,0 kN …….. 1000,0 kN
Range of measurement

Usuario final del certificado: Hernan ramos villamil SAS
Certificate end user

Dirección del usuario: Calle 12 # 24b -17 Barrio las palmas Sincelejo (Sucre)
User´s address

Lugar de calibración: Laboratorio
Calibration site

Fecha de calibración: miércoles, 30 de marzo de 2022
Calibración date

Este certificado documenta la trazabilidad a los patrones nacionales o internacionales, los cuales representan las unidades de medida en concordancia con el sistema internacional de unidades (SI). Este certificado de calibración no podrá ser reproducido total ni parcialmente sin autorización escrita de Sistemas de Ensayo y Calibración RYR. Los resultados, consignados en este certificado se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. RYR SAS, no se responsabiliza por los perjuicios que pueden derivarse del uso inadecuado de los objetos calibrados o de este certificado. Este certificado no tiene valides sin las firmas y el sello de RYR SAS.

This certificate declares the traceability to the National Standards, which represent the units of measurament that are in agreement with the International System Units (SI). This certificate of calibration could not be reproduced partially without written authorization of the RYR SAS. The sesult of this certificate is for the object of calibration, at the conditions in which the measurements were made. The RYR SAS does not take responsibility from the inadequate use of the calibrated objects or this certificate. The calibration certificate is not valid without the signatures and the seal of the RYR SAS


Fecha de emisión: miércoles, 06 de abril de 2022
Date of issue

Número: **F 1305**
Number

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)
AUTORIZED SIGNATURE (S)



Leonard González M.
Realizado por:
Performed by



Rossemberg Indaburo M.
Verificado por:
reviewed by

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1305**
Number

Fecha de calibración: miércoles, 30 de marzo de 2022

Método de calibración
Calibration method

Fuerza indicada constante, Norma Tecnica Colombiana NTC 7500-1/2002-09-18

Condiciones ambientales
Environmental conditions

Temperatura Ambiente	Inicial/*Initial*	20,2	°C
	Final/*End*	21,0	°C

Resultados
Results

	Limite inferior de la escala del instrumento de medición	20,0	kN
	Resolución **(r)**	0,1	kN
Dirección de la carga: Compresión	Resolución relativa de la máquina de ensayo **(a)** %	al 10% =	0,10
Indicación de la máquina: Digital		al 20% =	0,05

CARGA (%)	Indicación del Instrumento Patrón (F) en kN					PROMEDIO L1,L2 Y L3	Indicación del instrumento a calibrar **(Fi)**	Errores encontrados %					Incertidumbre Expandida	k
	L1	Girar Celda 120° L2	Girar Celda 120° L3	L4	Reversibilidad Fó F' L2 Descendente			Resolución relativa **(a)**	Reversibilidad **(v)**	Repetibilidad **(b)**	Exactitud **(q)**	Accesorios		
10	100,20	100,30	100,20			100,23	100,0	0,10		0,10	-0,23		2,0,E-01	2,00
20	201,00	202,00	200,20			201,07	200,0	0,05		0,90	-0,53		3,7,E-01	1,96
30	309,00	308,00	307,00			308,00	300,0	0,03		0,65	-2,60		3,7,E-01	1,96
40	410,00	411,00	409,00			410,00	400,0	0,03		0,49	-2,44		3,7,E-01	1,96
50	512,00	511,00	513,00			512,00	500,0	0,02		0,39	-2,34		3,7,E-01	1,96
60	612,00	613,00	612,00			612,33	600,0	0,02		0,16	-2,01		3,7,E-01	1,96
70	714,00	713,00	711,00			712,67	700,0	0,01		0,42	-1,78		3,7,E-01	1,96
80	816,00	813,00	815,00			814,67	800,0	0,01		0,37	-1,80		3,7,E-01	1,96
90	916,00	918,00	917,00			917,00	900,0	0,01		0,22	-1,85		3,7,E-01	1,96
100	1020,00	1019,00	1021,00			1020,00	1000,0	0,01		0,20	-1,96		3,7,E-01	1,96

0,040	0,40	0,30	0,20		Indicación Residual de la maquina de ensayo sin carga **(F_{i0})**:


	Cero F_0	**Reversibilidad (v)**	**Repetibilidad (b)**	**Exactitud (q)**	**Accesorios**
Máximos errores encontrados (%)	0,040	No se determino	0,9	-2,60	No se determino
Máximos errores permitido para clase : 1	± 0,1	± 1,5	1,0	± 1,0	1,50
Norma Tecnica Colombiana NTC 7500-1/2002-09-18, Numeral:	6.4.5	6.4.8	6.5.2	6.5.1	6.4.6

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1305** *Number*

Fecha de calibración miércoles, 30 de marzo de 2022

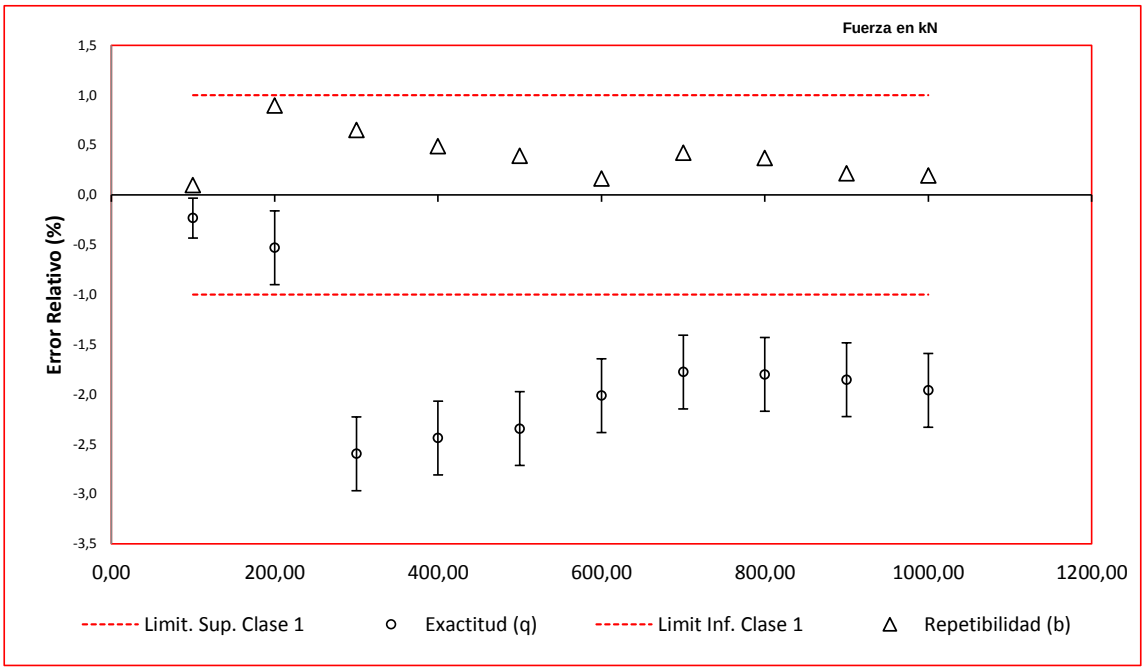

DE ACUERDO A LOS ERRORES RELATIVOS MAXIMOS PRESENTADOS Y SEGUN LAS PRESCRIPCIONES DE LA NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 7500-1, LA MAQUINA DE ENSAYO CALIBRADA SE CLASIFICA COMO:

Clase 1 DEL 10% AL 100% DE SU CAPACIDAD MAXIMA

TRAZABILIDAD :

EL LABORATORIO DE METROLOGÍA DE RYR SAS , ASEGURA EL MANTENIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD

Equipos utilizados en la calibraciòn

Equipo	*Fabricante*	*Modelo*	*Serie*	*Capacidad*	*Cert. No*	*Fecha Cal.*	*Entidad Cert.*
Celda de carga	AEP	KAL2000KN	901080	1000 kN	MF-172-18	2018/01/11	SIMIM
Celda de carga	AEP	KAL300KN	903408	300 kN	MF-174-18	2018/01/13	SIMIM

OBSERVACIONES :

1. La máquina de ensayos deberá ser calibrada inmediatamente despues de cualquier reparación ya que la sustitución de elementos del sistema mecánico o eléctrico afectan la operación del sistema de medida.
2. Si la máquina de ensayos es reubicada, se deberá repetir la calibración. Igualmente, cuando exista razón de duda con respecto a la exactitud de la carga, independientemente del tiempo transcurrido desde la última calibración,
3. Los datos emitidos en el presente certificado, se ajustan al momento y condiciones dadas en la calibración RYR SAS. no se hace responsable por daños ocasionados al equipo debido al uso inadecuado.

CALIBRACIÓN Y CONTROL DE EQUIPOS DEL PROYECTO

enterritorio	**CONTROL DE EQUIPOS**	CÓDIGO	**F-GG-22**
		VERSIÓN	**01**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA	**2020-10-19**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL **1 JULIO 20222** **Y EL** **31 DE JULIO 2022** **FECHA INICIO** **1-jun**

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES **CONTRATO No.** 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A **CONTRATO No.** 2220587

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
MEZCLADORA			X		CORDOBA - BOLIVAR	MEZCLA DE CONCRETO	En buen estado
RANA			X		CORDOBA - BOLIVAR	COMPACTAR TERRENO DEBAÑOS	En buen estado
MOTO CARRO			X		CORDOBA - BOLIVAR	TRANSPORTE DE MATERIALES	En buen estado

Marcy A. Correa C

Firma:

Nombre: Ing. Marcy Correa

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FOTOCOPIA DE LA BITACORA O LIBRO DE OBRA DE TODA LA EJECUCION DEL PROYECTO

Viernes 05 Julio 2022

Personal en obra
- Ing. Residente Obra
- Siso
- 10 Maestros
- Ing. Diagnostico
- Trabajadora Social
- 20 ayudantes

Personal Interventoria
- Residente interventoria
- Trabajadora Social
- Inspectora de interventoria

- Actividades Realizadas
- La interventora solicita el uso de epp en personal de obra.
- Se realiza pañata, instalación de ceramica, pintura, instalación de accesorios de baño, instalación de cubierta.
Se realiza intervención en nuevos frentes, se inicia con replanteo, excavación para viga de cimentación, armado de acero, fundición de vigas cimentación, levante de muro.
- Se realiza adecuaciones en baño de vivienda.
- Construcción de cajas de registros o inspección.

- Estados del clima: Soleado.

ROCIO ARRIETA
R. INTERVENTORIA

RONAL BLANCO
R. OBRA

Escaneado con CamScanner

Sabado 02 Julio 2022

Personal en obra
- Ing. Residente obra
- SISO
- 10 Maestros
- Ing Diagnostico
- Trabajadora Social
- 20 Ayudantes

Personal Interventoria
- Ing. Residente
- Trabajadora Social
- Inspectora de Interventoria

ACTIVIDADES REALIZADAS
- Se realiza levante de muro, pañete de muros, fundicion de plantilla

- Instalacion de cubierta
- Se realiza Fundicion de losa para lavadero, levante de muro e instalacion de lavadero.

- Instalacion de ceramicas y accesorios.

- Excavacion para zapatas de columna de tanque.

- Fundicion de viga y losa para tanque.

- Se realiza instalacion de lavaplatos.

- Estado del tiempo: Muy soleado.

RODOLFO ARRIETA M.
R. INTERVENTORIA

RONAL BLANCO
R. OBRA

Escaneado con CamScanner

Martes 05 julio 2022

PERSONAL EN OBRA

- Ing Residente Obra.
- SISO
- 10 Maestros
- Ing. Diagnostico
- Trabajadora social
- 20 Ayudantes

PERSONAL INTERVENTORIA

- Ing. Residente
- Trabajadora Social
- Inspectora de interventoria.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realizo armado de acero para vigas dintel
- Se realiza encofrado de columnetas y vigas.
- Se realizo Fundicion de las mismo.
- Se realiza pañete en muros.
- Instalacion de accesorios de baño
- Excavacion y fundicion de cajas de registro
- Se realizo instalacion de tubaria 4" sanitaria
- Se realiza instalacion tubaria de 1/2 y 2".
- Se realiza instalacion de puertas
- Se realiza adecuacion en baños existente
- Instalacion de lavaplatos.

Estado del tiempo: Muy soleado.

RONALD ARRIETA
R. INTERVENTORIA

RONAL BLANCO
R. OBRA.

Escaneado con CamScanner

Miercoles 06 de julio 2022

Personal en obra
- Ing Residente
- SISO
- 10 Maestros
- Ing. Diagnostico
- Trabajadora Social
- 20 ayudantes.

PERSONAL INTERVENTORIA
- Residente Interventoria
- Trabajadora Social
- Ing. Inspectora.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realiza excavacion para viga de cimentacion
- se realiza levante de muro y parete instalación de cubierta.
- Instalacion de ceramica y accesorios.
- Instalacion de tanque elevado
- Aplicacion de acabado en carburo mezclado con acronal
- Excavación y construcción de cajas de registro
- Instalación de tuberia sanitaria.
- Se realiza construcción de muro para lavadero.

Estado del tiempo: Muy soleada

RONALD ARRIETA
R. INTERVENTORIA

RONAL BLANCO
R. OBRA.

Escaneado con CamScanner

Jueves 07 de julio 2022

PERSONAL EN OBRA

- Ing. Residente
- SISO
- 10 maestros
- Ing. Diagnostico
- Trabajadora social
- 20 ayudante.

PERSONAL INTERVENTORIA

- Residente interventoria
- Trabajadora Social
- Ing. Inspectora.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realiza armado para viga dintel.
- se realiza encofrado para columna y viga dintel.
- Instalación de ceramica y accesorio
- Instalación de tanque elevado.
- Aplicación de acabado en carburo mezclado con acrenal.
- Excavación y construcción de caja de registro.
- Instalación de tubería sanitaria
- Se realiza. construcción de muro para lavadero
- Instalación de lavadero y lavaplato.

RONAL ARRIETA
R. INTERVENTORIA

RONAL BLANCO
R. OBRA

Escaneado con CamScanner

Viana 08 de julio 2022

PERSONAL EN OBRA

- Ing. Residente
- SISO
- 10 Maestro
- Ing. Diagnostico
- Trabajadora Social.
- 20 Ayudante

PERSONAL INTERVENTORIA.

- Residente interventoria
- Trabajadora social
- Ing. Inspectora

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realizo fundicion de viga de cimentacion
- Se realiza levante de muro, pañete e instalación de cubierta
- Instalacion de ceramica y accesorio.
- Instalacion de tanque elevado
- Aplicación de acabado en carburo mezclado con acronal
- Excavacion y construccion de caja de registro.
- Instalacion tubería sanitaria
- Se realiza construccion de muro para lavadero
- Instalacion de lavadero y lavaplato.

Estado del clima = Muy soleado

RONALD ARRIETA.
R. INTERVENTORIA

RONALD BLANCO
R. OBRA

Escaneado con CamScanner

Sabado 09 de julio 2022

PERSONAL EN OBRA

- Ing Residente
- SISO
- 10 Maestro
- Ing. Diagnostico
- Trabajadora Social
- 20 Ayudantes

PERSONAL INTERVENTORIA

- Residente interventora
- Trabajadora Social
- Ing. Inspectora.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realiza fundicion de viga de cimentacion
- Instalacion de tanque elevado.
- Se realiza levante de muro, pañete e instalacion de cubierta.
- Instalacion de ceramica y accesorio
- Aplicacion de acabado en carburo mezclado con acronal.
- Excavacion y construccion de caja de registro
- Instalacion tuberia sanitaria
- Se realiza construcción de muro para lavadero
- Instalacion de lavadero y lavaplato.

Estado del clima: Muy soleado.

RONAL ARRIETA.
R. INTERVENTORIA

RONAL BLANCO
R. OBRA

Escaneado con CamScanner

LUNES 11 DE JULIO 2022

PERSONAL EN OBRA
- Ing. Residente
- SISO
- 10 Maestro
- Ing. Diagnostico
- Trabajadora social
- 20 Ayudantes.

PERSONAL EN INTERVENTORIA
- Arq. Residente
- Trabajadora Social
- Ing. Inspectora

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realiza levante de muro
- Fundicion de columnetas y viga dintel
- Excavacion y fundicion de caja de inspeccion
- Instalacion de ceramica y accesorios
- Aplicacion en acabado carbono mezclado con cemento.
- Instalacion de tanque elevado.
- Excavacion y fundicion de caja de registro.
- Instalacion tubería sanitaria
- Instalacion de micromedidores
- Se construccion de muro para lavadero
- Instalacion de lavadero y lavaplato

Estado del clima: Muy soleado

RONALD ARRIETA
R. INTERVENTORIA

RONAL BLANCO
RESIDENTE

Escaneado con CamScanner

MARTES 12 DE JULIO 2022

PERSONAL EN OBRA

- Ing. Residente
- SISO
- 10 Maestro
- Ing. Diagnostico
- Trabajadora social
- 20 ayudantes.

PERSONAL EN INTERVENTORIA

- Ing. Residente.
- Trabajadora Social
- Ing. Inspector

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realiza levante de muro en nuevos frentes.

- Se realiza fundicion de columnetas y viga dintel.
- Instalacion de tanque elevado
- Excavacion y fundicion de cajas de inspeccion

- Excavacion para cimentacion de columnas para tanque.

- Instalacion de ceramica y accesorios

- Acabado en carburo mezclado con acronal.

- Instalacion tuberia sanitaria
- Instalacion de micromedidores
- Instalaccion de lavadero y lavaplato.

Estado del clima.: Muy soleado.

RONALD ARRIETA
R. INTERVENTORIA.

RONAL BLANCO
R. OBRA.

Escaneado con CamScanner

MIERCOLES 13 DE JULIO 2022

PERSONAL EN OBRA
- Ing. Residente
- SISO
- 10 Maestros
- Ing. Diagnostico
- Trabajadora social
- 20 Ayudantes

PERSONAL INTERVENTORIA
- Arq. Residente
- Trabajadora Social
- Ing. Inspectora

ACTIVIDADES REALIZADAS.

- Se realizo recorrido, revisión de viviendas terminadas. 30 viviendas entre ellas caseta tipo 2 y 3 adecuaciones, se realizan observaciones y se procede a corregir las observaciones dadas por la interventoria.

- Se realizo toma de detalle de pintura en puertas metalica.

- Se realizo instalación de ceramica y accesorio
- Instalación de tanque elevados
- Se realizo pañete e instalacion de puertas metalicas
- Instalacion de micromedidores
- Construccion de cajas de inspeccion

Estado del tiempo: Muy soleado

RONALD ARRIETA
R. INTERVENTORIA

RONAL BLANCO
R. OBRA.

Escaneado con CamScanner

JUEVES 14 DE JULIO 2022.

PERSONAL EN OBRA
- Ing. Residente, Ing. Diagnostico, SISO, trabajadora social, Representante legal, Director de obra 10 maestro, 20 ayudantes.

PERSONAL INTERVENTORIA
- Arq. Residente, Ing. inspectora, trabajadora Social, Especial de trabajadora social, Directora de obra.
- Supervisora ENTEMPORO, supervisora Ministerio

ACTIVIDADES REALIZADAS
- Se realizo comite N=11, con supervisora Entamtoro, contratista e interventora.

- se realizo comite en alcaldia con supervisora del Ministerio de vivienda, supervisora ENTAMTORO, contratista, interventora, personero, Aguas de bolivar, prestador servicio coopsecor, Planeacion.

- Se realizo recorrido de obra, se visitaron viviendas terminadas, vivienda en construccion, se realizo observacion de acabados por parte de la supervisora de ministerio.

- Se realizó trabajos en obra, como excavacion en nuevos frentes, para viga de cimantación, fundicion de las mismas, levante de muro.

Estado del tiempo: Muy Soleado.

RONALD ARRIETA
R. INTERVENTORIA.

RONAL BLANCO
R. OBRA.

Escaneado con CamScanner

VIERNES 15 DE JULIO 2022.

PERSONAL EN OBRA.
- Ing. Residente
- SISO
- Ing. diagnostico
- Trabajadora social

PERSONAL DE INTERVENTORIA
- Arq. Residente
- Trabajadora social
- Ing. Inspectora.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realizo levante de muro
- Fundicion de columnetas y viga dintel
- Instalacion de tanque elevado
- Excavacion fundicion cajon de registro
- Instalacion tuberia sanitaria
- Excavacion para zapatas de columnas de tanque.
- Construccion de muro para lavadero
- Instalacion de lavadero y lavaplato.

Estado del tiempo: Muy soleado

RONALD ARRIETA
R. INTERVENTORIA

OMAR BLANCO
R. OBRA

Escaneado con CamScanner

SABADO 16 JULIO 2022

PERSONAL EN OBRA
- Ing Residente
- SISO
- Ing - diagnostico
- Trabajadora social

PERSONAL DE INTERVENTORIA.
- Arq. Residente
- Ing. Inspectora.
- Trabajadora social

ACTIVIDADES REALIZADAS

- se realizo levante de muro

- Fundicion de tanque elevado

- Fundicion de columnetas y viga dintel.

- Excavacion e instalacion de tuberia sanitaria.

- la interventoria solicita al contratista el uso de los epp en obra por parte de los trabajadores.

Estado del tiempo: Mayormente soleado

RONALD ARRIETA
R. INTERVENTORIA

RONAL BLANCO
R. OBRA

Escaneado con CamScanner

LUNES 18 DE JULIO 2022

PERSONAL EN OBRA
- Ing. Residente
- SISO
- Ing. Diagnostico
- Trabajadora Social

PERSONAL INTERVENTORIA
- Arq. Residente
- Trabajadora social
- Ing. Diagnostico

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realizo excavacion para cimentacion de viga de cimentacion.
- Armado de acero
- levante de muro y pañete.
- Estructura para lavadero, pañete e instalacion de lavadero.
- Excavacion para zapata de columna tanque
- Instalacion tubera sanitaria.
- Estado del clima: Medianamente soleado

RONALD ARRIETA
R-INTERVENTORIA.

RONAL BLANCO
R. OBRA

Escaneado con CamScanner

MARTES 19 DE JULIO 2022.

PERSONAL EN OBRA.

- Ing. Residente C.
- SISO
- Ing. Diagnostico
- Trabajadora social

PERSONAL INTERVENTORIA.

- Arq. Residente
- Trabajadora social
- Ing. Diagnostico

ACTIVIDADES REALIZADAS.

- La interventoria realizo observaciones en la intervencion 072 la cual el contratista procedio a resolver

- Se realizo levante de muro, armado de acero para columnetas.

- Se realizo adecuaciones

- Instalacion de ceramica.

- Excavacion y construccion de caja de registro.

Estado del tiempo: Mayormente soleado.

RONALD ARRIETA
R. INTERVENTORIA.

RONAL BLANCO
R. OBRA.

Escaneado con CamScanner

MIERCOLES 20 JULIO 2022

PERSONAL EN OBRA

- Ing. Residente
- SISO
- 10 Maestros
- Ing. Diagnostico
- Trabajadora Social
- 20 ayudantes.

PERSONAL INTERVENTORIA

- Arq. Residente
- Trabajadora Social.
- Ing. Inspectora

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se laboro hasta las 2:00 pm por ser dia festivo.

- Se realizo levante de muro, pañete, instalación de cubierta.

- se realizo encofrado de columnas y fundicion de las misma.
- Se realizo levante muro para lavadero.
- se realizo instalación de lavaplatos.
- se realizo cajas de registro.
- Se realizo armado de acero.

Estado del clima: Mayormente soleado.

la interventora reitera el usos de los EPP en los trabajadores.

RONALD ARRIETA
R. INTERVENTORIA

RONAL BLANCO
R. OBRA

Escaneado con CamScanner

JUEVES 21 JULIO 2022

PERSONAL EN OBRA

- Ing. Residente
- SISO
- 10 Maestros
- Ing. Diagnostico
- Trabajadora Social
- 20 ayudantes

PERSONAL INTERVENTORIA

- Arq. Residente
- Trabajadora Social
- Ing. Inspectora.

ACTIVIDADES REALIZADAS.

- Se realizo armado de acero para viga de cimentacion.

- Se realizo levante de muro, pañete.

- Se realizo fundicion de zapata y pedestal.

- se realizo fundicion de losa para tanque elevado

- se realizo excavacion para caja de inspeccion.

- Se realizo instalación de ceramica, instalación de aparatos sanitarios. Se realizo aplicacion pintura, instalacion de cubierta.

Estado clima: Mayormente Soleado

RONALD ARRIETA
R. INTERVENTORIA

RONAL BLANCO
R. OBRA.

Escaneado con CamScanner

VIERNES 22 DE JULIO

PERSONAL EN OBRA

- Ing. Residente
- Trabajadora social
- 10 Maestros
- Ing diagnostico
- SISO
- 20 ayudantes

PERSONAL INTERVENTORIA

- Arquitecto Residente
- Trabajadora social.
- Ing. inspectora

ACTIVIDADES REALIZALADAS

- Se realizo armado de acero para viga cimentación, viga dintel, columna para tanque.

- Se realizo levante de muro, aplicación de pañete.

- Se realizo fundición de zapata y pedestal.

- Se realizo excavación para tubería, excavación para caja de inspección.

- Fundición de caja de inspección.

Estado del tiempo: Mayormente soleado.

RONALD ARRIETA
R. INTERVENTORIA

RONAL BLANCO
R. OBRA.

Escaneado con CamScanner

SABADO 23 DE JULIO

PERSONAL EN OBRA

- Ing. Residente
- Trabajadora social
- 10 Maestros
- Ing. Diagnostico
- SISO
- 18 ayudantes.

PERSONAL INTERVENTORIA.

- Arquitecto Residente
- Trabajadora social.
- Ing. Inspectora.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realizo armado de acero para viga cimentacion viga dintal, columna para tanque.
- Se realizo levante de muro, aplicacion de pañete.
- Se realizo fundicion de zapata y padestal.
- Se realizo excavacion para tubaria, excavacion para caja de inspeccion.
- Se realizaron instalacion de lavadero y lavaplato
- Fundicion de caja de inspeccion.
- Instalacion de cubierta.

Estado del clima: Mayormente soleado.

RONALD ARRIETA
R: INTERVENTORIA

RONAL BLANCO.
R. OBRA

Escaneado con CamScanner

LUNES 25 - JULIO 2022

PERSONAL EN OBRA
- Ing. Residente
- SISO
- 10 Maestro
- Ing. Diagnostico
- Trabajadora Social
- 18 ayudante

PERSONAL DE INTERVENTORIA
- Arquitecto residente
- Trabajadora Social
- Ing. Inspectora

ACTIVIDADES REALIZADAS

- se realizo fundicion de columna para tanque elevado

- Fundicion de columna y viga cintal para escala tipo 3.

- Se realizo fundicion de pedestal.

- se realizo fundicion de columnetas y vigas de inspeccion

- Se realizo levante de muro y pañete.

- Se realizo instalación de tubería sanitaria.

- Se instalo tanque elevado

- la interventora reitera el uso de los EPP.

Estado del tiempo: Soleado.

RONALD ARRIETA
R. INTERVENTORIA

RONAL BLANCO
R: OBRA.

Escaneado con CamScanner

MARTES 26 JULIO 2022.

PERSONAL EN OBRA.

- Ing residante
- SISO
- 10 Maestros
- Ing. Diagnostico
- Trabajadora social
- 18 ayudante

PERSONAL INTERVENTORIA

- Arquitecto Residante
- Trabajadora social.
- Ing. Inspectora

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realizo fundicion de columna para tanque elevado.

- Fundicion de columna y viga dintal para casata tipo 3.

- Se realizo fundicion de padastal.

- Se realizo fundicion de columnatas y caja de inspeccion.

- Se realizo levante de muro y pañete.

- Se realizo instalacion de tubaria sanitaria.

- Se realizo levante de muro para lavadero.

Estado del tiempo: Se presentaron fuertes lluvias

ROYALD ARRIETA
R. INTERVENTORIA

RONAL BLANCO
R. OBRA.

Escaneado con CamScanner

MIERCOLES 27 - JULIO 2022.

PERSONAL EN OBRA
- Ing. Residente
- SISO
- 10 Maestros
- Ing. Diagnostico
- Trabajadora Social
- 18 ayudantes

PERSONAL DE INTERVENTORIA
- Arquitecto Residente
- Trabajadora Social.
- Ing. Inspectora

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realizo armado y encofrado para viga y losa en columna para tanque elevado.
- Armado de acero
- Se realizo aplicacion de pañete.
- Se realizo levante de muro
- Se realizo instalacion de ceramicas con adecuacion.
- Se instalo aparatos sanitarios.

Estado del clima: Parcialmente soleado.

RONAL ARRIETA
R. INTERVENTORIA.

RONAL BLANCO
R. OBRA.

Escaneado con CamScanner

JUEVES 28 - JULIO 2022

PERSONAL EN OBRA

- Ing. Residente
- SISO
- 10 Maestro
- Ing. Diagnostico
- Trabajadora social
- 18 ayudantes.

PERSONAL DE INTERVENTORIA.

- Arquitecto Residente
- Trabajadora Social.
- Ing. Inspectora

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realizo armado y encofrado para viga y losa en columna para tanque elevado
- Se realizo fundicion de columnas, columnatas, viga dintel.
- Se realizo aplicación de pañete.
- Se realizo levanta de muro.
- Se realizo instalacion de ceramico en adecuación y colsata tipo 3.
- Instalación de equipos sanitarios
- Estado del tiempo: Se presentaron fuertes lluvias.

RONALD ARRIETA
R. INTERVENTORIA

ROMAC BLANCO
R. OBRA.

Escaneado con CamScanner

VIERNES 29 - JULIO 2022

PERSONAL EN OBRA.

- Ing. Residente
- SISO
- 10 Maestros
- Ing. Diagnostico
- Trabajadora social
- 18 ayudantes

PERSONAL INTERVENTORIA

- Arq. Residente
- Trabajadora Social
- Ing. Inspectora.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realizo armado de acero para columnas.
- Se realizo levante muro, pañete.
- instalación de puerta.
- Se realizo instalación de ceramica, instalacion de aparatos sanitarios
- Se realizo instalación de cubierta
- Se realizo construccion de lavaderos y lavamanos

ESTADO DEL TIEMPO: Mayormente soleado
- No hubo servicio de energia.

RONALD ARRIETA
R. INTERVENTORIA.

RONAL BLANCO
R. OBRA.

Escaneado con CamScanner

SABADO 30- JULIO 2022

PERSONAL EN OBRA.
- Ing. Residente
- SISO
- 10 Maestro
- Ing. Diagnostico
- Trabajadora Social
- 18 ayudantes.

PERSONAL INTERVENTORIA
- Arq. Residente
- Trabajadora Social
- Ing. Inspectora.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realizo pañete en caseta tipo 2
- Se realizo excavación para tubería Sanitaria
- Se realizo levante de muro
- Se realizo instalación de ceramica y aparatos sanitarios
- Se realizo Excavación a caja de inspección

Estado del clima: Se presentaron lluvias.

RONALD ARRIETA
R. INTERVENTORIA

RONAL BLANCO
R. OBRA.

Escaneado con CamScanner

RELACIÓN DEL PERSONAL EMPLEADO

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**CONTROL DE PERSONAL**	CÓDIGO:	**F-GG-10**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/07/2020 Y EL 31/07/2022 PLAZO: 5 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. CONTRATO No. 2220587

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVACIONES
NOMBRE Y CARGO																																
DUARTE PINEDO - DIRECTOR DE OBRA	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
RONALD BLANCO - RESIDENTE DE OBRA	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		Resaltados en rojo lo dias Domingo
RAFAEL CASTILLO - RESIDENTE SST	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
NORELIS ANAYA - TRABAJADORA SOCIAL	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
OSWALDO GARZON - PROFESIONAL DIAGNOSTICO	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
SINDY ESCOBAR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
JOSE ROMERO - ESPECIALSITA ESTRUCTURAL	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
GUSTAVO CAMARGO - ESPECIALISTA HIDRÁULICO	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
JUAN MORENO - PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
KAREN DEL CARMEN MERCADO - PROFESIONAL DE CALIDAD	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
PERSONAL CONTRATISTA	**9**	**9**	**0**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**0**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**0**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**0**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**0**	**TOTAL PERIODO** **234**

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	**MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE***	**SUMATORIA**	**PORCENTAJE**	**CUMPLE S/N**
MANO OBRA NO CALIFICADA		**0**	**0,00%**	
De la región		0	0,00%	
RODOLFO JOSE TORRES ANAYA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	26	11,11%	
YOVANNI CHAMORRO FLOREZ	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	26	11,11%	
JULIO SANCHEZ BLANCO	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	26	11,11%	
ERIS ALFONSO HERNANDEZ ESCOBAR	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	26	11,11%	
CRISTIAN GARIZA FLOREZ	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	26	11,11%	
AGUSTIN BALLESTA LIBERNAL OFICIAL	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	26	11,11%	
JOSE LUIS AHUMADA MARTINEZ OFICIAL	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	26	11,11%	
		0	0,00%	
		0	0,00%	
De fuera de la región	N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A	0	0,00%	
JOSE CARLOS PEREZ ATENENCIA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	26	11,11%	
EDGARDO CANO ROMERO	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	26	11,11%	
CARLOS JOSE ESCOBAR PIÑA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	26	11,11%	
WALBERTO GUETTE PACHECO	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	26	11,11%	
ROBERTO ENRIQUE BRITO APIAYU	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	26	11,11%	
CRISTIAN JOSE ESCOBAR PIÑA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	26	11,11%	
RAFAEL MARTINEZ GONZALEZ	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	26	11,11%	
RAFAEL ISIDRO PACHECO HORTA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	26	11,11%	
LUIS EDUARDO MEDINA FONTALVO	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	26	11,11%	
DEIVI BARRAGAN ROJANO	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	26	11,11%	
HERIBERTO VALENCIA PEREZ	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	26	11,11%	
LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ OFICIAL	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	26	11,11%	
PEDRO PABLO GOMEZ DOMINGUEZ OFICIAL	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	26	11,11%	
TOMAS DE AVILA ROJANO OFICIAL	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	26	11,11%	
		0	0,00%	
		0	0,00%	

enterritorio	**CONTROL DE PERSONAL**	CÓDIGO:	**F-GG-10**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/07/2020 Y EL 31/07/2022 PLAZO: 5 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES — CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. — CONTRATO No. 2220587

MANO OBRA CALIFICADA																																**0**	**0,00%**	
De la región																																0	0,00%	
DONAIRO ALFONSO ESCOBAR ROMERO MAESTRO	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		26	11,11%	
YULDOR VERGARA TOREES MAESTRO	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		26	11,11%	
YEISON ESCOBAR VERGARA MAESTRO	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		26	11,11%	
JESUS ESCOBAR VERGARA MAESTRO	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		26	11,11%	
																																0	0,00%	
De fuera de la región	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0,00%	
GENKY ALVAREZ PADILLA MAESTRO	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		26	11,11%	
ALEXI CORDOBA CUESTA MAESTRO	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		26	11,11%	
JHON JEIDER SANCHEZ PADILLA MAESTRO	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		26	11,11%	
MAICOL RIOS ARANGO MAESTRO	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		26	11,11%	
CRISTIAN PACHECO HORTA MAESTRO	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		26	11,11%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	**0**	**0,00%**	
De la región	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0,00%	
De fuera de la región	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0,00%	
POBLACIÓN VULNERABLE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0,00%	
En condición de desplazamiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0,00%	
MUJERES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	**0**	**0,00%**	
Mano de Obra no Calificada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0,00%	
Mano de Obra Calificada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0,00%	
Profesionales - Técnicos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0,00%	
PROVEEDORES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
Local																																		
Nacional																																		
Internacional																																		

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA: En el presente periodo no se nescito personal de mano de obra teniendo en cuenta que aun no icinia la actividad 3 correspondiente a la ejecución de obra.

Firma: Marcy A. Correa C

Nombre: Ing. Marcy Correa

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	CONTROL DE PERSONAL	CÓDIGO:	F-GG-10
enterritorio		VERSIÓN:	01
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/07/2022 Y EL 31/07/2022 PLAZO: 5 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. CONTRATO No. 2220587

PERSONAL INTERVENTORIA

FECHA	MES: 01 JULIO AL 31 DE JULIO 2022																													OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
NOMBRE Y CARGO																																
MARCY CORREA - DIRECTOR INTERVENTORIA	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		Resaltados en rojo lo dias Domingo
RONALD ARIETA - RESIDENTE INTERVENTORIA	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
DIAMYS SANCHEZ - INSPECTORA DE INTERVENTORIA	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
FERNANDA GRIJALBA - PROFESIONAL SOCIAL	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
YIRA LEMUS - PROFESIONAL HSEQ	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
LEYDIS HERRERA - AUXILIAR SOCIAL	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
JOSE CASTAÑO - ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
CRISTINA PAEZ - PROFESIONAL HSEQ	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
GREGORIO MARÍN - ESPECIALSITA HIDROSANITARIO	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
CARLOS FORERO - PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
PERSONAL INTERVENTORIA	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0**	**TOTAL PERIODO**	**260**

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

Firma: Marcy A. Correa C

Nombre: Ing. Marcy Correa

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

INFORMES SEMANALES PRESENTADOS Y APROBADOS DEL PROYECTO

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 19/07/2022
HORA: 3:50:42 p. m.
20224300270072

ADMON

Bogotá D.C, 19 de julio de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-070-22

Señores:
Ingeniera
Karol Yulieth Javela
Supervisora
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio
Calle 26 # 13-19 Piso 20
Bogotá. Colombia

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: REMISIÓN INFORMES SEMANALES 11.

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales remitimos informe semanal 11 correspondiente al periodo del 04 de julio del 2022 al 10 de julio del 2022, para fines pertinentes.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.

FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA
Anexo: 17 folios
Proyectó: Jineth Marcela Gordillo – Residente Admón.
Reviso: Ing. Marcy Correa – Directora de Interventoría

INFORME SEMANAL 11

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 11**	CÓDIGO:	**F-GG-06**
		VERSIÓN:	**1**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 011

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **4/07/2022** al **10/07/2022** Fecha **10/07/2022**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO PROYECTO				
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO**	BOLÍVAR	**MUNICIPIO**	CÓRDOBA
GERENCIA A CARGO	ENTERRITORIO			
SUPERVISOR	KAROL YULIETH JAVELA PÉREZ			
ESTADO DEL PROYECTO	EN EJECUCIÓN ACTIVIDAD 1, 2 Y 3			

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2220576	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUREDES	
Valor inicial	$	1.771.707.945,99
Valor actual	$	1.771.707.945,99
Variación del valor	$	-
Fecha de Inicio	26/04/2022	
Plazo inicial (Días)	150 Días	
Plazo actual (Días)	150 Días	5 MESES - 150 DÍAS
Variación en plazo	Días	
Fecha Contractual de terminación	26/09/2022	
Tiempo Transcurrido (días)	75	50,00%
Días remanentes del Contrato	78,00	52,00%
Acumulado a última acta pagada		
Estimado ejecutado por llevar a acta	**$ 110.413.263,61**	

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.	2220587	
Interventor	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS.	
Valor inicial	$	202.479.313,00
Valor actual	$	202.479.313,00
Variación del valor	$	-
Fecha de Inicio	26/04/2022	
Plazo inicial	150 Días	
Plazo actual	150 Días	5 MESES - 150 DÍAS
Variación en plazo	Días	
Fecha Contractual de terminación	26/09/2022	
Ejecución del Contrato	75	50,00%
Días remanentes del Contrato	78,00	52,00%
Acumulado a última acta pagada	$	16.198.345,05
Estimado ejecutado por llevar a acta	**$**	**16.198.345,05**

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 1.771.707.945,99

Semáforo

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 633.471.063,09	35,75%	$ 269.742.205,40	15,22%	-$ 363.728.857,69	-20,53%
Durante el Periodo	$ 360.758.401,34	20,36%	$ 18.319.454,97	1,03%	-$ 342.438.946,37	-19,33%
Acumulado a la Fecha	**$ 272.712.661,75**	**15,39%**	**$ 288.061.660,37**	**16,26%**	**$ 15.348.998,62**	**0,87%**


Desviación en días: -1 Días

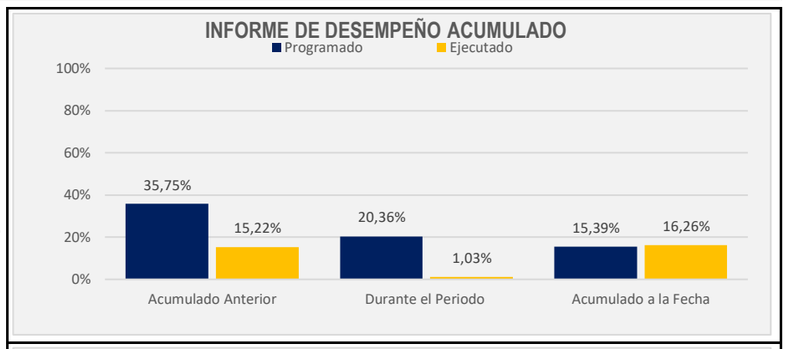


Observaciones al desempeño del proyecto

De acuerdo a la **reprogramación de obra** el contratista ha efectuado un 16,26% de ejecución frente a un programado del 15,39% indicándonos que se han nivelado los porcentajes.
De acuerdo a la r**eprogramación de obra** se debería tener un total de 127 diagnósticos aprobados a la fecha, de los cuales se han aprobado 127, indicándonos que se han nivelado.
En cuanto a la actividad 3 el contratista de acuerdo a la **reprogramación de obra** debería tener 38 viviendas intervenidas, sin embargo, ha intervenido 56 viviendas (15 terminadas), el contratista cuenta con 14 frentes de trabajo

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

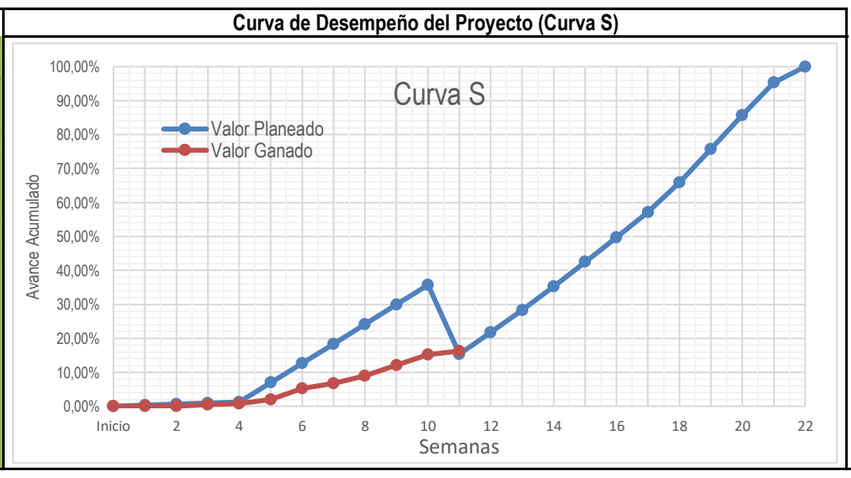

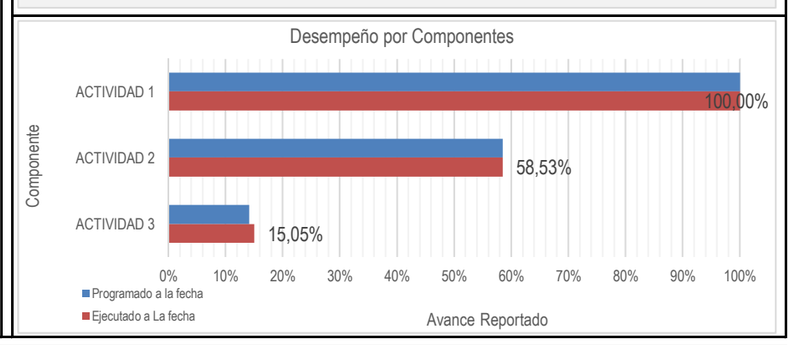


CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	35,75%	15,22%	-20,53%	
Durante el Periodo	20,36%	1,04%	-19,32%	
Acumulado a la Fecha	**15,39%**	**16,26%**	**0,86%**	

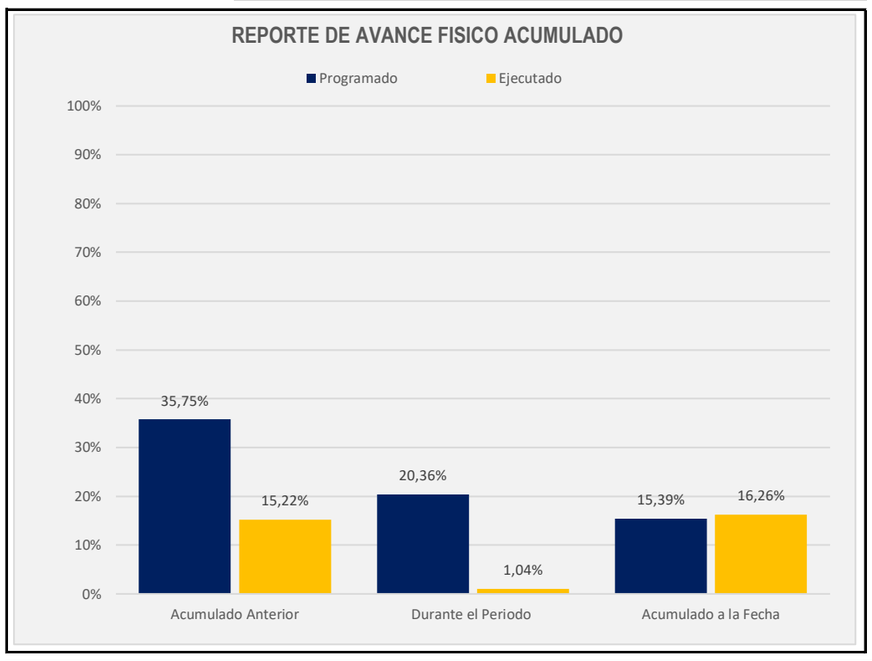


AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 1.771.707.945,99	$ 1.771.707.945,99	$ -	$ 345.450.914,11		$ 345.450.914,11

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
		0,00%			0,00%		









AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 202.479.313,00	$ 202.479.313,00	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
1	$ 16.198.345,05	8,00%	1	$ 16.198.345,05	8,00%	$ 16.198.345,05	$ 16.198.346,05







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 011

Entidad Contratante: ENTERRITORIO Semana del 4/07/2022 al 10/07/2022 Fecha 10/07/2022

ACTIVIDAD No. 1
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: Actividad No. 1, la aprobación de la actividad N° 1 se hizo comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-037-22 del 3 de junio de 2022. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
ACTIVIDAD No. 2
PROGRAMADO 58,93% vs EJECUTADO 58,93%
Comentario: La Actividad No. 2 nos indica que se han nivelado de acuerdo a la reprogramación de obra en la cual se han avalado mediante comité de aprobación 127 diagnósticos los mismos en la reprogramación.
ACTIVIDAD No. 3
PROGRAMADO 14,16% vs 15,05% EJECUTADO
Comentario: La Actividad No. 3 de acuerdo a la reprogramación de obra debería tener 38 viviendas intervenidas, sin embargo, ha intervenido 56 viviendas (15 terminadas), el contratista cuenta con 14 frentes de trabajo.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

En el ítem ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10. El contratista subsanó los diseños de las casetas y el diseño de la estructura para el tanque elevado, también realizó entrega del informe técnico especialista estructural el cual fue aprobado por la interventoría con lo cual esta actividad queda en un 100% de su ejecución. Sin embargo, el Contratista posteriormente solicitó un cambio de especificaciones en algunos ítems, uno de ellos el ladrillo de arcilla por bloque de Concreto, razón por la cual se hace necesario ajustar el diseño estructural con dicho cambio. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
El ítem ACTIVIDAD 2: DIAGNOSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. Esta actividad avanza con el diligenciamiento de los diagnósticos de los cuales ya se sometieron a comité de aprobación 127 diagnósticos, los cuales fueron avalados por la interventoría, la próxima semana el contratista debe presentar 30 diagnósticos más para completar 157 diagnósticos programados de acuerdo la reprogramación de obra.
En el ítem ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS. ACTA DE ENTREGA Y RECIBOS DE LAS OBRAS
A la fecha y de acuerdo la reprogramación de obra el contratista debería tener en proceso constructivo 38 viviendas, sin embargo, se han intervenido 56 viviendas (15 terminadas), el contratista se comprometió a redoblar esfuerzos e incrementar frentes de trabajo.
En las casetas tipo 3 se ha avanzado en actividades como: cimentación, mampostería, fundición de columnas y columnetas, pañetes, instalación de tubería hidrosanitaria, instalación de aparatos sanitarios, instalación de tejas para cubierta, instalación de puertas metálicas, instalación de tanque elevado de 500 Lts, de igual forma se adelantan labores en intervenciones correspondientes a adecuaciones, construcción de estructura para el tanque elevado, cambio de pañete, instalación de enchape de pared y pisos y cambio de equipos sanitarios, para estas actividades el contratista cuenta con 14 frentes de trabajo.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Para la próxima semana correspondiente al periodo del 11 al 17 de Julio 2022 y de acuerdo la reprogramación de obra la actividad 2, ítem de diagnósticos la próxima semana el contratista debe presentar 30 diagnósticos más para completar 157 diagnósticos programados de acuerdo la reprogramación de obra.
El contratista debe continuar con la ejecución de obra efectuando la intervención de 38 viviendas de acuerdo la reprogramación de obra.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTIÓN SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	11	0	11	61,1%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	7	0	7	38,9%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál?	0	0	0	0,0%
	Total	**18**	**0**	**18**	**100,00%**

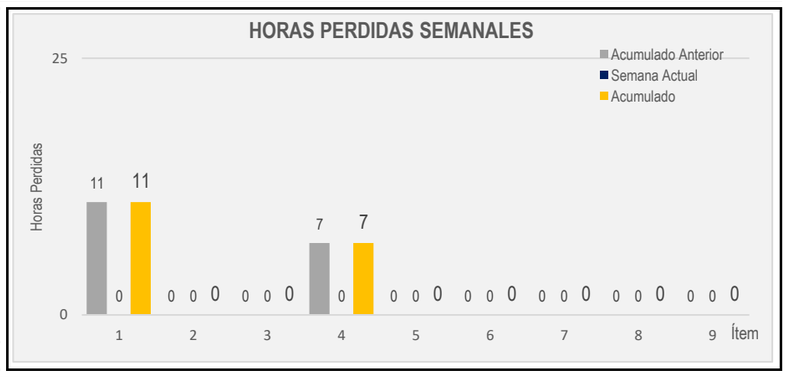

OBSERVACIONES

En el presente periodo NO se presentaron llevias, predomino el tiempo seco.

GESTIÓN SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
	N/A					

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
INCLUSION 80	REGINA DEL CARMEN MERCADO	30/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 81	JAVIER CASERES PADILLA	30/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 82	EDINSON MANUEL NAVARRO MEDINA	30/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 83	EDINSON MANUEL NAVARRO MEDINA	30/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 84	MOISES VERGARA VEGA	30/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 85	PEDRO PORTO ORTEGA	30/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 86	ADRIANA MARGARITA OCHOA MENDEZ	30/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 87	JUAN DE JESUS BALETA CONTRERAS	30/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 88	FRANCISCO MEDINA ROMERO	30/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 89	FEDERICO BARRIOS ROMERO	30/06/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 90	LUIS DAVID MEDINA TORRES	1/07/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 91	SINDY PAOLA RMIREZ GALINDO	1/07/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 92	LAURA VANESA CAMPO SALAZAR	1/07/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 93	SANDRO GONZALEZ LAMBRAÑO	1/07/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 94	ROBERTO CARLOS FONSECA RODRIGUEZ	1/07/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA

7. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 011

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **4/07/2022** al **10/07/2022** Fecha **10/07/2022**

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA









CASETA TIPO 3, SE APRECIA AVANCE EN EL PAÑETE DE MAMPOSTERIA, FUNDICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS.









ADECUACIONES DE UNIDADES SANITARIAS, SE APRECIA INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS









CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO-

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 011

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **4/07/2022** al **10/07/2022** Fecha **10/07/2022**

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-036-22 al contratista Consorcio Construredes con el Tema: RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_063 - APROBACION DE DIAGNOSTICOS. Por medio del presente se realizamos entrega de aval para 06 diagnósticos presentados en comité de aprobación No. 008 los cuales corresponden a los códigos:
B-C-SM-MZ55-VE-060, B-C-SM-MZ47-VE-113, B-C-SM-MZ47-VE-115, B-C-SM-MZ30-VE-122, B-C-SM-MZ89-VE-151, B-C-SM-MZ92-VE-169
La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-037-22 al contratista Consorcio Construredes con el Tema: Remisión informe de especialista PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN # 14 mediante el cual se hizo la revisión de la reprogramación de obra presentada por el Contratista, adjunto a la presente hacemos entrega del informe con las observaciones realizadas por el especialista de Interventoría, Agradecemos la atención a la presente y la entrega lo más pronto posible del documento subsanado.
La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-038-22 al contratista Consorcio Construredes con el Tema: RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_066 - APROBACION DE DIAGNOSTICOS. Por medio del presente se realizamos entrega de aval para 12 diagnósticos presentados en comité de aprobación No. 009 los cuales corresponden a los códigos:
B-C-SM-MZ30-VE-121, B-C-SM-MZ3O-VE-125, B-C-SM-MZ30-VE-126, B-C-SM-MZ87-VE-127, B-C-SM-MZ87-VE-128, B-C-SM-MZ31-VE-142, B-C-SM-MZ075-VE-154, B-C-SM-MZ92-VE-170, B-C-SM-MZ77-VE-179, B-C-SM-MZ-VE87-180, B-C-SM-MZ-VE56-192, B-C-SM-MZ-VE56-212.
La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-039-22 al contratista Consorcio Construredes con el Tema: SOCICITUDES DE INCLUSIÓN, mediante el cual se remite para su debido tramite Veintinueve (29) solicitudes de inclusión teniendo en cuenta el PROTOCOLO PARA LA INCLUSION DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS AL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, del cual, ya se ha dado los trámites correspondientes por el Contratista, y corresponde al municipio el siguiente trámite.

Marcy A. Correa C		Karol Javela	
Firma		**Firma**	
Nombre	Marcy Correa castaño	Nombre	Karol Yulieth Javela Pérez
	Directora de la interventoría	Supervisor	Supervisor ENTerritorio

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría

Enviar Informe para validación

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022-n	FECHA	X ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A		ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA		FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-013	2-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	**11**	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	2-jun-22	SI	SI	13-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-019	9-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	22	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	9-jun-22	SI	SI	14-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-026	16-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	18	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	14-jun-22	NO	NO	No se ha recibido respuesta
ARCA-INT/FDA276-TEC-032	28-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	13	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	28-jun-22	NO	NO	No se ha recibido respuesta
ARCA-INT/FDA276-TEC-039	8-jul-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	29	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	8-jul-22	NO	NO	No se ha recibido respuesta

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022-n	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA	FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-015	2-jun-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	24	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	2-jun-22	SI	3-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-023	15-jun-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	27	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	15-jun-22	**NO**	
ARCA-INT/FDA276-TEC-034	2-jul-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	29	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	2-jul-22	**NO**	

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022-n	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA	FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-021	13-jun-22	SOLICITUD RESPUESTA AL CONCEPTO EMITIDO POR COOSEPCOR MEDIANTE ACTA DE REUNION DE OBRA	1	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	13-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta
ARCA-INT/FDA276-TEC-029	21-jun-22	OBRA REQUERIA EN LA VIA PUBLICA PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE LAS VIVIENDAS 001, 085, 088, 163	4	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	21-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA						
CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022-n	**FECHA**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO A**	**ENTIDAD**	**FECHA DE RADICADO**	**RESPUESTA RECIBIDA**	**FECHA DE RESPUESTA**
ARCA-INT/FDA276-TEC-025	15-jun-22	SOLICITUD ESPECIFICACIÓN TECNICA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	15-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta

INFORME PCI

Fecha de Corte	3/07/2022	PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS																									
Priorización		MATRIZ BASE						INCLUSIONES											TOTALES								
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No.2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Solicitudes de Inclusion	Atendida de la ESP	Atendida por la Alcaldia	Pendientes por atender ESP	Pendientes por atender Alcaldia	Respuesta positiva	Respuesta negativa	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Visitadas	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Recibidas a satisfaccion	Viviendas En ejecución.	Viviendas Programadas actividad No.3
Cordoba Bolivar	San Martin	217	0	206	10	127	1	94	33	33	60	60	16	17	0	0	0	0	217	206	10	127	1	56	15	0	31	0
	TOTAL	**217**	**0**	**206**	**10**	**127**	**1**	**94**	**33**	**33**	**60**	**60**	**16**	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**217**	**206**	**10**	**127**	**1**	**56**	**25**	**0**	**31**	**0**

INFORME ESTADO DE COVID-19

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**INFORME ESTADO DE COVID - 19**	CÓDIGO:	**F-GG-10**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 4/07/2022 Y EL 10/07/2022 PLAZO: 5 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES — CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. — CONTRATO No. 2220587

PERSONAL DEL CONTRATISTA

	MES: JUNIO			SEMANA:4					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	OBSERVACIONES
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
DUARTE PINEDO - DIRECTOR DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD BLANCO - RESIDENTE DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RAFAEL CASTILLO - RESIDENTE SST	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
NORELIS ANAYA - TRABAJADORA SOCIAL	**ASTRAZENIKA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
OSWALDO GARZÓN - PROFESIONAL DIAGNOSTICO	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
SINDY ESCOBAR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**SINOVAC**		F	NO	NO	NO	SI	SI	

PERSONAL INTERVENTORIA

	MES: JUNIO			SEMANA:4					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	**OBSERVACIONES**
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
MARCY CORREA - DIRECTOR INTERVENTORIA	**PFIZER**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD ARIETA - RESIDENTE INTERVENTORIA	**PFIZER**	**MODERNA**	M	NO	NO	NO	SI	SI	
DIAMYS SANCHEZ PORTILLO - INSPECTORA DE INTERVENTORIA	**PFIZER**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
FERNANDA GRIJALBA - PROFESIONAL SOCIAL	**MODERNA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
YIRA LEMUS - PROFESIONAL HSEQ	**AZTRAZENECA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
LEYDIS HERRERA - AUXILIAR SOCIAL	**JONSSON**	**JONSSON**	F	NO	NO	NO	SI	SI	

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Firma: Marcy A. Correa C

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

REPORTE Y EJECUCIÒN DE VIVIENDAS SEMANALES

Ejecución de Actividad en Viviendas al Programa Conexiones Intradomiciliarias con corte a 10/07/2022

BARRIO	ACTA	No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización	Número de días Máximo permitido según tipo de intervención	Número de Dias de la Intervencion por parte del Contratista	Dias de cumplimiento o incumplimiento según tipo de intervención (-) atraso y (+) avance	¿SE ENCUENTRA RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR INTERVENTORÍA?	
															SI (X)	NO (X)
SM	1	1	B-C-SM-MZ29-VE-001		Adecuacion	$7.967.801,13	$0,00			**0/01/1900**	5/01/1900	0	**5**	**-5**		**x**
SM	1	2	B-C-SM-MZ32-VE-002	100%	Caseta T3	$8.126.190,79	$8.126.190,79	2/06/2022	**TERMINADA**	**2/06/2022**	10/06/2022	0	**8**	**-8**		**x**
SM	1	3	B-C-SM-MZ32-VE-003	100%	Caseta T3	$7.914.431,13	$7.914.431,13	4/06/2022	**TERMINADA**	**4/06/2022**	12/06/2022	0	**8**	**-8**		**x**
SM	1	4	B-C-SM-MZ18-VE-004	100%	Adecuacion	$7.372.105,35	$7.372.105,35	4/06/2022	**TERMINADA**	**4/06/2022**	8/06/2022	0	**4**	**-4**		**x**
SM	1	5	B-C-SM-MZ22-VE-005	100%	Adecuacion	$7.148.052,07	$7.148.052,07	4/06/2022	**TERMINADA**	**4/06/2022**	7/06/2022	0	**3**	**-3**		**x**
SM	1	6	B-C-SM-MZ34-VE-006	100%	Adecuacion	$7.464.125,94	$7.464.125,94	4/06/2022	**TERMINADA**	**4/06/2022**	8/06/2022	0	**4**	**-4**		**x**
SM	1	7	B-C-SM-MZ22-VE-007	100%	Adecuacion	$7.159.479,30	$7.159.479,30	4/06/2022	**TERMINADA**	**4/06/2022**	9/06/2022	0	**5**	**-5**		**x**
SM	1	8	B-C-SM-MZ22-VE-009	100%	Caseta T3	$7.908.010,60	$7.908.010,60	4/06/2022	**TERMINADA**	**4/06/2022**	8/06/2022	0	**4**	**-4**		**x**
SM	1	9	B-C-SM-MZ21-VE-010	100%	Caseta T3	$8.928.931,81	$8.928.931,81	4/06/2022	**TERMINADA**	**4/06/2022**	9/06/2022	0	**5**	**-5**		**x**
SM	1	10	B-C-SM-MZ22-VE-011	100%	Adecuacion	$7.911.551,76	$7.911.551,76	8/06/2022	**TERMINADA**	**8/06/2022**	16/06/2022	0	**8**	**-8**		**x**
SM	1	11	B-C-SM-MZ34-VE-012	100%	Caseta T3	$8.997.603,49	$8.997.603,49	4/06/2022	**TERMINADA**	**4/06/2022**	9/06/2022	0	**5**	**-5**		**x**
SM	1	12	B-C-SM-MZ21-VE-013	100%	Adecuacion	$5.406.646,10	$5.406.646,10	2/06/2022	**TERMINADA**	**2/06/2022**	6/06/2022	0	**4**	**-4**		**x**
SM	1	13	B-C-SM-MZ21-VE-014	100%	Caseta T3	$8.562.948,93	$8.562.948,93	4/06/2022	**TERMINADA**	**4/06/2022**	10/06/2022	0	**6**	**-6**		**x**
SM	1	14	B-C-SM-MZ21-VE-015	100%	Caseta T3	$8.265.079,43	$8.265.079,43	2/06/2022	**TERMINADA**	**2/06/2022**	7/06/2022	0	**5**	**-5**		**x**
SM	1	15	B-C-SM-MZ21-VE-016	100%	Caseta T3	$9.248.106,91	$9.248.106,91	2/06/2022	**TERMINADA**	**2/06/2022**	8/06/2022	0	**6**	**-6**		**x**
SM	1	16	B-C-SM-MZ38-VE-017	95%	Caseta T3	$8.481.195,82	$8.057.136,03	2/06/2022	**EN EJECUCION**	**2/06/2022**	7/06/2022	0	**5**	**-5**		**x**
SM	2	17	B-C-SM-MZ24-VE-018	92%	Caseta T3	$8.450.841,17	$7.774.773,88	5/06/2022	**EN EJECUCION**	**5/06/2022**	9/06/2022	0	**4**	**-4**		**x**
SM	1	18	B-C-SM-MZ24-VE-019	92%	Adecuacion	$6.395.588,06	$5.883.941,02	5/06/2022	**EN EJECUCION**	**5/06/2022**	10/06/2022	0	**5**	**-5**		**x**
SM	1	19	B-C-SM-MZ24-VE-020	92%	Adecuacion	$4.593.449,33	$4.225.973,38	5/06/2022	**EN EJECUCION**	**5/06/2022**	13/06/2022	0	**8**	**-8**		**x**
SM	2	20	B-C-SM-MZ85-VE-021	92%	Caseta T3	$8.614.688,02	$7.925.512,98	5/06/2022	**EN EJECUCION**	**5/06/2022**	14/06/2022	0	**9**	**-9**		**x**
SM	2	21	B-C-SM-MZ85-VE-022	92%	Caseta T3	$8.896.124,14	$8.184.434,21	5/06/2022	**EN EJECUCION**	**5/06/2022**	9/06/2022	0	**4**	**-4**		**x**
SM	1	22	B-C-SM-MZ85-VE-023	92%	Adecuacion	$7.191.930,35	$6.616.575,92	5/06/2022	**EN EJECUCION**	**5/06/2022**	10/06/2022	0	**5**	**-5**		**x**
SM	1	23	B-C-SM-MZ29-VE-024	92%	Adecuacion	$6.084.490,07	$5.597.730,86	5/06/2022	**EN EJECUCION**	**5/06/2022**	10/06/2022	0	**5**	**-5**		**x**
SM	2	24	B-C-SM-MZ31-VE-025	92%	Caseta T3	$8.637.204,10	$7.946.227,77	5/06/2022	**EN EJECUCION**	**5/06/2022**	9/06/2022	0	**4**	**-4**		**x**
SM	1	25	B-C-SM-MZ31-VE-026	92%	Adecuacion	$4.822.827,41	$4.437.001,22	5/06/2022	**EN EJECUCION**	**5/06/2022**	14/06/2022	0	**9**	**-9**		**x**
SM	1	26	B-C-SM-MZ31-VE-027	92%	Adecuacion	$4.365.339,96	$4.016.112,76	5/06/2022	**EN EJECUCION**	**5/06/2022**	9/06/2022	0	**4**	**-4**		**x**
SM	2	27	B-C-SM-MZ31-VE-028	92%	Adecuacion	$7.668.943,14	$7.055.427,69	5/06/2022	**EN EJECUCION**	**5/06/2022**	8/06/2022	0	**3**	**-3**		**x**
SM	2	28	B-C-SM-MZ31-VE-029	92%	Caseta T3	$8.468.136,75	$7.790.685,81	5/06/2022	**EN EJECUCION**	**5/06/2022**	9/06/2022	0	**4**	**-4**		**x**
SM	1	29	B-C-SM-MZ31-VE-030	92%	Adecuacion	$4.637.820,17	$4.266.794,56	5/06/2022	**EN EJECUCION**	**5/06/2022**	11/06/2022	0	**6**	**-6**		**x**
SM	3	30	B-C-SM-MZ30-VE-032	40%	Adecuacion	$7.557.018,99	$3.022.807,60	9/06/2022	**EN EJECUCION**	9/06/2022	15/06/2022	0	**6**	**-6**		**x**
SM	3	31	B-C-SM-MZ44-VE-034	40%	Adecuacion	$5.519.347,12	$2.207.738,85	9/06/2022	**EN EJECUCION**	9/06/2022	15/06/2022	0	**6**	**-6**		**x**
SM	3	32	B-C-SM-MZ45-VE-035	40%	Adecuacion	$8.137.626,09	$3.255.050,44	9/06/2022	**EN EJECUCION**	9/06/2022	15/06/2022	0	**6**	**-6**		**x**
SM	3	33	B-C-SM-MZ56-VE-038	40%	Adecuacion	$8.227.630,94	$3.291.052,38	9/06/2022	**EN EJECUCION**	9/06/2022	15/06/2022	0	**6**	**-6**		**x**
SM	3	34	B-C-SM-MZ56-VE-039	40%	Adecuacion	$1.443.687,77	$577.475,11	9/06/2022	**EN EJECUCION**	9/06/2022	15/06/2022	0	**6**	**-6**		**x**
SM	3	35	B-C-SM-MZ46-VE-040	40%	Adecuacion	$6.628.376,66	$2.651.350,66	9/06/2022	**EN EJECUCION**	9/06/2022	15/06/2022	0	**6**	**-6**		**x**

SM	3	36	B-C-SM-MZ45-VE-041	40%	Adecuacion	$4.845.221,48	$1.938.088,59	9/06/2022	**EN EJECUCION**	9/06/2022	15/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	3	37	B-C-SM-MZ21-VE-042	40%	Adecuacion	$4.634.812,47	$1.853.924,99	9/06/2022	**EN EJECUCION**	9/06/2022	15/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	3	38	B-C-SM-MZ31-VE-043	40%	Caseta T3	$6.939.713,07	$2.775.885,23	9/06/2022	**EN EJECUCION**	9/06/2022	15/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	3	39	B-C-SM-MZ55-VE-046	40%	Caseta T3	$7.344.533,10	$2.937.813,24	9/06/2022	**EN EJECUCION**	9/06/2022	15/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	3	40	B-C-SM-MZ55-VE-047	40%	Caseta T2	$7.890.285,26	$3.156.114,10	9/06/2022	**EN EJECUCION**	9/06/2022	15/06/2022	5	**6**	**-1**		**X**
SM	3	41	B-C-SM-MZ56-VE-055	40%	Adecuacion	$3.160.157,78	$1.264.063,11	9/06/2022	**EN EJECUCION**	9/06/2022	15/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	4	42	B-C-SM-MZ56-VE-062	40%	Caseta T2	$8.362.124,52	$3.344.849,81	14/06/2022	**EN EJECUCION**	14/06/2022	20/06/2022	5	**6**	**-1**		**X**
SM	4	43	B-C-SM-MZ66-VE-067	40%	Caseta T3	$7.306.146,52	$2.922.458,61	14/06/2022	**EN EJECUCION**	14/06/2022	20/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	4	44	B-C-SM-MZ66-VE-068	40%	Caseta T3	$7.971.707,31	$3.188.682,92	14/06/2022	**EN EJECUCION**	14/06/2022	20/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	4	45	B-C-SM-MZ66-VE-069	40%	Adecuacion	$6.509.744,54	$2.603.897,82	14/06/2022	**EN EJECUCION**	14/06/2022	20/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	4	46	B-C-SM-MZ75-VE-071	40%	Adecuacion	$7.170.024,86	$2.868.009,94	14/06/2022	**EN EJECUCION**	14/06/2022	20/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	4	47	B-C-SM-MZ75-VE-072	40%	Caseta T3	$8.040.278,46	$3.216.111,38	14/06/2022	**EN EJECUCION**	14/06/2022	20/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	4	48	B-C-SM-MZ75-VE-073	40%	Caseta T4	$8.332.036,11	$3.332.814,44	14/06/2022	**EN EJECUCION**	14/06/2022	20/06/2022	5	**6**	**-1**		**X**
SM	4	49	B-C-SM-MZ75-VE-074	40%	Caseta T5	$7.656.034,05	$3.062.413,62	14/06/2022	**EN EJECUCION**	14/06/2022	20/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	4	50	B-C-SM-MZ89-VE-084	10%	Caseta T6	$8.247.304,21	$824.730,42	14/06/2022	**EN EJECUCION**	14/06/2022	20/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	5	51	B-C-SM-MZ145-VE-053	10%	Caseta T3	$8.262.443,76	$826.244,38	21/06/2022	**EN EJECUCION**	21/06/2022	27/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	5	52	B-C-SM-MZ69-VE-087	10%	Adecuacion	$7.074.492,71	$707.449,27	21/06/2022	**EN EJECUCION**	21/06/2022	27/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	5	53	B-C-SM-MZ69-VE-088	10%	Adecuacion	$7.465.862,82	$746.586,28	21/06/2022	**EN EJECUCION**	21/06/2022	27/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	5	54	B-C-SM-MZ66-VE-131	10%	Caseta T3	$8.139.325,77	$813.932,58	21/06/2022	**EN EJECUCION**	21/06/2022	27/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	5	55	B-C-SM-MZ56-VE-136	10%	Adecuacion	$7.922.709,35	$792.270,94	21/06/2022	**EN EJECUCION**	21/06/2022	27/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	5	56	B-C-SM-MZ56-VE-138	10%	Adecuacion	$7.984.245,73	$798.424,57	21/06/2022	**EN EJECUCION**	21/06/2022	27/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	5	57	B-C-SM-MZ56-VE-139	10%	Caseta T3	$7.415.285,53	$741.528,55	21/06/2022	**EN EJECUCION**	21/06/2022	27/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM																

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 27/07/2022
HORA: 4:31:23 p. m.
20224300280872

ADMON

Bogotá D.C, 27 de julio de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-077-22

Señores:
Ingeniera
Karol Yulieth Javela
Supervisora
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio
Calle 26 # 13-19 Piso 20
Bogotá. Colombia

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: REMISIÓN INFORMES SEMANALES 12.

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales remitimos informe semanal 12 correspondiente al periodo del 11 de julio del 2022 al 17 de julio del 2022, para fines pertinentes.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.

FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA
Anexo: 20 folios
Proyectó: Jineth Marcela Gordillo – Residente Admón.
Reviso: Ing. Marcy Correa – Directora de Interventoría

INFORME SEMANAL 12

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 12	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 012

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **11/07/2022** al **17/07/2022** | Fecha **17/07/2022**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO PROYECTO	
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO**: BOLIVAR — **MUNICIPIO**: CÓRDOBA
GERENCIA A CARGO	ENTERRITORIO
SUPERVISOR	KAROL YULIETH JAVELA PEREZ
ESTADO DEL PROYECTO	EN EJECUCIÓN ACTIVIDAD 1, 2 Y 3

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2220576		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUREDES		
Valor inicial	$ 1.771.707.945,99		
Valor actual	$ 1.771.707.945,99		
Variación del valor	$ -		
Fecha de Inicio	26/04/2022		
Plazo inicial (Días)	150 Días		
Plazo actual (Días)	150 Días	5 MESES - 150 DIAS	
Variación en plazo	Días		
Fecha Contractual de terminación	26/09/2022		
Tiempo Transcurrido (días)	82	54,67%	
Días remanentes del Contrato	71,00	47,33%	
Acumulado a última acta pagada			
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ 220.798.208,21		

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.	2220587		
Interventor	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS.		
Valor inicial	$ 202.479.313,00		
Valor actual	$ 202.479.313,00		
Variación del valor	$ -		
Fecha de Inicio	26/04/2022		
Plazo inicial	150 Días		
Plazo actual	150 Días	5 MESES - 150 DIAS	
Variación en plazo	Días		
Fecha Contractual de terminación	26/09/2022		
Ejecución del Contrato	82	54,67%	
Días remanentes del Contrato	71,00	47,33%	
Acumulado a última acta pagada	$ 16.198.345,05		
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ 16.198.345,05		

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPENO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC): $ 1.771.707.945,99

Semáforo

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 272.712.661,75	15,39%	$ 288.061.660,37	16,26%	$ 15.348.998,62	0,87%
Durante el Periodo	$ 112.673.553,69	6,36%	$ 51.630.353,69	2,91%	-$ 61.043.200,00	-3,45%
Acumulado a la Fecha	**$ 385.386.215,44**	**21,75%**	**$ 339.692.014,07**	**19,17%**	-$ 45.694.201,37	-2,58%

Desviación en días: **4 Días**




Observaciones al desempeño del proyecto:


De acuerdo a la reprogramación de obra el contratista ha efectuado un 21,75% de ejecución frente a un programado del 19,17% indicándonos un atraso de 2,58%

De acuerdo a la reprogramación de obra en la actividad 2 se debería tener un total de 187 diagnósticos aprobados a la fecha, de los cuales se han aprobado 141, indicándonos un atraso de 46 diagnósticos.

En cuanto a la actividad 3 el contratista de acuerdo a la reprogramación de obra debería tener 50 viviendas terminadas, sin embargo el contratista ha ejecutado 30 intervenciones al 100%, y adelanta labores constructivas en otras 26 más, el contratista cuenta con 14 frentes de trabajo.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

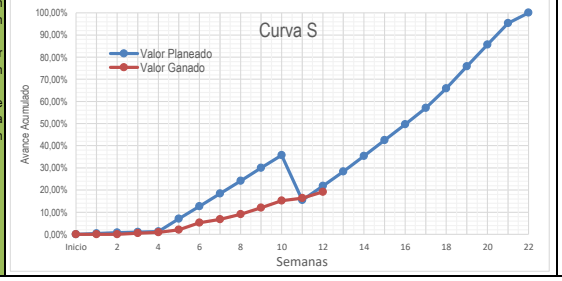




CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	15,39%	16,26%	0,87%	
Durante el Periodo	6,36%	2,91%	-3,45%	
Acumulado a la Fecha	**21,75%**	**19,17%**	**-2,58%**	

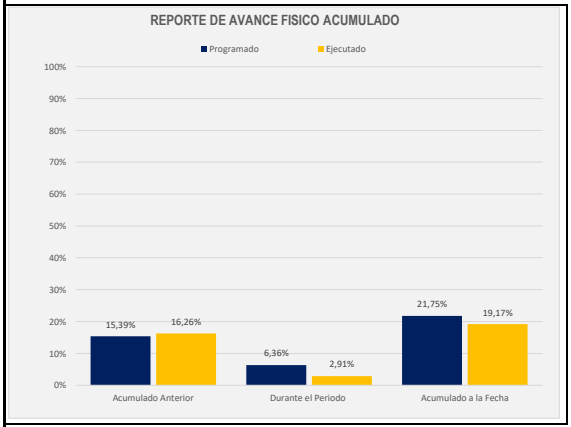

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 1.771.707.945,99	$ 1.771.707.945,99	$ -	$ 345.450.914,11		$ 345.450.914,11

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
		0,00%	1	$ 191.218.812,00	10,79%		








AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 202.479.313,00	$ 202.479.313,00	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
1	$ 16.198.345,05	8,00%	1	$ 16.198.345,05	8,00%	$ 16.198.345,05	$ 16.198.346,05







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 012

Entidad Contratante: ENTERRITORIO | Semana del 11/07/2022 al 17/07/2022 | Fecha 17/07/2022

ACTIVIDAD No. 1
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: Actividad No. 1, la aprobación de la actividad N° 1 se hizo comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-037-22 del 3 de junio de 2022. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
ACTIVIDAD No. 2
PROGRAMADO 76,04% vs EJECUTADO 64,98%
La Actividad No. 2 nos indica un atraso del 11,06% de acuerdo a la reprogramación de obra el programado nos muestra 187 diagnósticos frente a 141 diagnósticos avalados en comités de aprobación por parte de la interventoría, el contratista debe redoblar esfuerzos y alcanzar las metas trazadas en la reprogramación de obra.
ACTIVIDAD No. 3
PROGRAMADO 20,28% vs 17,89% EJECUTADO
Comentario: La Actividad No. 3 de acuerdo a la reprogramación de obra debería tener 50 viviendas terminadas, sin embargo, se han efectuado 30 intervenciones al 100% y adelanta labores constructivas en otras 26 más, el contratista cuenta con 14 cuadrillas de trabajo. Esto representa un atraso en la actividad N° 3 del 2,39%

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

En el ítem ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10. El contratista subsanó los diseños de las casetas y el diseño de la estructura para el tanque elevado, también realizó entrega del informe técnico especialista estructural el cual fue aprobado por la interventoría con lo cual esta actividad queda en un 100% de su ejecución. Sin embargo, el Contratista posteriormente solicitó un cambio de especificaciones en algunos ítems, uno de ellos el ladrillo de arcilla por bloque de Concreto, razón por la cual se hace necesario ajustar el diseño estructural con dicho cambio. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
El ítem ACTIVIDAD 2: DIAGNOSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. Esta actividad avanza con el diligenciamiento de los diagnósticos de los cuales ya se sometieron a comité de aprobación 141 diagnósticos, los cuales fueron avalados por la interventoría, la próxima semana el contratista debe presentar 46 diagnósticos más para completar 187 diagnósticos programados de acuerdo la reprogramación de obra.
En el ítem ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS. ACTA DE ENTREGA Y RECIBOS DE LAS OBRAS
A la fecha y de acuerdo la reprogramación de obra el contratista debería tener en proceso constructivo de 50 intervenciones al 100%, sin embargo, se han terminado 30 viviendas, mientras adelanta labores en otras 26 intervenciones, el contratista se comprometió a redoblar esfuerzos e incrementar frentes de trabajo.
En las casetas tipo 3 se ha avanzado en actividades como: cimentación, mampostería, fundición de columnas y columnetas, pañetes, instalación de tubería hidrosanitaria, instalación de aparatos sanitarios, instalación de tejas para cubierta, instalación de puertas metálicas, instalación de tanque elevado de 500 Lts, de igual forma se adelantan labores en intervenciones correspondientes a adecuaciones, construcción de estructura para el tanque elevado, cambio de pañete, instalación de enchape de pared y pisos y cambio de equipos sanitarios, para estas actividades el contratista cuenta con 14 frentes de trabajo.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Para la próxima semana correspondiente al periodo del 18 al 24 de Julio 2022 y de acuerdo la reprogramación de obra la actividad 2, que corresponde al ítem de diagnósticos se tiene programado que el contratista presente 49 diagnósticos más, para completar 195 diagnósticos de acuerdo la reprogramación de obra.
El contratista en la actividad 3 debe continuar con la ejecución de obra completando la intervención de 60 viviendas terminadas de acuerdo la reprogramación de obra.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTIÓN SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	11	0	11	61,1%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	7	0	7	38,9%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál?	0	0	0	0,0%
	Total	18	0	18	100,00%

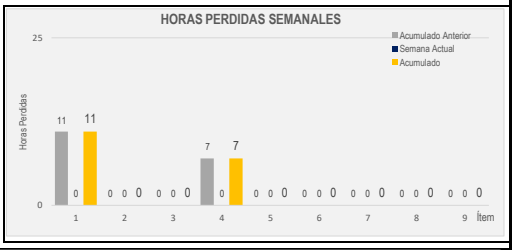

OBSERVACIONES

En el presente periodo NO se presentaron llevias, predomino el tiempo seco.

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
	N/A					

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
INCLUSION 95	FRANCISCO ROMERO HERRERA	7/07/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 96	FRANCISCO MARTINEZ DE AVILA	7/07/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 97	JOSEFA COHEN	7/07/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 98	RUBEN TORRES SANABRIA	7/07/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 99	ESTER JUDITH VERGARA RIVERA	7/07/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 100	LUIS MANUEL URIBE MEDINA	7/07/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA

7. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 012

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **11/07/2022** al **17/07/2022** Fecha **17/07/2022**

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA






CASETA TIPO 3, SE APRECIA AVANCE EN EL PAÑETE DE MAMPOSTERIA, FUNDICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS.






ADECUACIONES DE UNIDADES SANITARIAS, SE APRECIA INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, LAVAPLATOS Y LAVADEROS






CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO-

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 012

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **11/07/2022** al **17/07/2022** Fecha **17/07/2022**

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-038-22 al contratista Consorcio Construredes con el Tema: RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_066 - APROBACION DE DIAGNOSTICOS. Por medio del presente realizamos entrega de aval para 12 diagnósticos presentados en comité de aprobación No. 009 los cuales corresponden a los códigos:
B-C-SM-MZ30-VE-121, B-C-SM-MZ3O-VE-125, B-C-SM-MZ30-VE-126, B-C-SM-MZ87-VE-127, B-C-SM-MZ87-VE-128, B-C-SM-MZ31-VE-142, B-C-SM-MZ075-VE-154, B-C-SM-MZ92-VE-170, B-C-SM-MZ77-VE-179, B-C-SM-MZ-VE87-180, B-C-SM-MZ-VE56-192, B-C-SM-MZ-VE56-212.
La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-039-22 al contratista Consorcio Construredes con el Tema: SOLICITUDES DE INCLUSIÓN, mediante el cual se remite para su debido tramite Veintinueve (29) solicitudes de inclusión teniendo en cuenta el PROTOCOLO PARA LA INCLUSION DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS AL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, del cual, ya se ha dado los trámites correspondientes por el Contratista, y corresponde al municipio el siguiente trámite.
La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-040-22 al contratista Consorcio Construredes con el Tema: RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_068 - APROBACION DE DIAGNOSTICOS. Por medio del presente se realizamos entrega de aval para 14 diagnósticos presentados en comité de aprobación No. 010 los cuales corresponden a los códigos:
B-C-SM-MZ31-VE-031, B-C-SM-MZ145-VE-044, B-C-SM-MZ91-VE-054, B-C-SM-MZ68-VE-097, B-C-SM-MZ58-VE-107, B-C-SM-MZ66-VE-134, B-C-SM-MZ91-VE-171, B-C-SM-MZ84-VE-175, B-C-SM-MZ33-VE-194, B-C-SM-MZ33-VE-195, B-C-SM-MZ41-VE-197, B-C-SM-MZ91-VE-205, B-C-SM-MZ91-VE-206, B-C-SM-MZ46-VE-211.
La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-041-22 a la empresa Coopsecor Ltda. Mediante la cual se solicitó certificado de disponibilidad de redes y de autorización para la Intervención de conexión de las acometidas domiciliarias de acueducto y alcantarillado para cuarenta y siete (47) diagnósticos en el Barrio San Martín.

Marcy A. Correa C		Karol Javela	
Firma		**Firma**	
Nombre	Marcy Correa castaño	Nombre	Karol Yulieth Javela Pérez
	Directora de la interventoría	Supervisor	Supervisor ENTerritorio

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría

Enviar Informe para validación

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA	FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-015	2-jun-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	24	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	2-jun-22	SI	3-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-023	15-jun-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	27	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	15-jun-22	**NO**	
ARCA-INT/FDA276-TEC-034	2-jul-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	29	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	2-jul-22	**NO**	
ARCA-INT/FDA276-TEC-041	13-jul-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	47	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	13-jul-22	**NO**	

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022-n	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA	FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-021	13-jun-22	SOLICITUD RESPUESTA AL CONCEPTO EMITIDO POR COOSEPCOR MEDIANTE ACTA DE REUNION DE OBRA	1	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	13-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta
ARCA-INT/FDA276-TEC-029	21-jun-22	OBRA REQUERIA EN LA VIA PUBLICA PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE LAS VIVIENDAS 001, 085, 088, 163	4	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	21-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA						
CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022	**FECHA**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO A**	**ENTIDAD**	**FECHA DE RADICADO**	**RESPUESTA RECIBIDA**	**FECHA DE RESPUESTA**
ARCA-INT/FDA276-TEC-025	15-jun-22	SOLICITUD ESPECIFICACIÓN TECNICA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	15-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022-n	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A		ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA		FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-013	2-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	**11**	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	2-jun-22	SI	SI	13-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-019	9-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	22	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	9-jun-22	SI	SI	14-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-026	16-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	18	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	14-jun-22	SI	SI	11-jul-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-032	28-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	13	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	28-jun-22	SI	SI	11-jul-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-039	8-jul-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	29	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	8-jul-22	SI	SI	13-jul-22

INFORME PCI

Fecha de Corte	3/07/2022	PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS																											
Priorización		MATRIZ BASE						INCLUSIONES												TOTALES									
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No.2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Solicitudes de Inclusion	Atendida de la ESP	Atendida por la Alcaldia	Pendientes por atender ESP	Pendientes por atender Alcaldia	Respuesta positiva	Respuesta negativa	En Espera	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Visitadas	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Recibidas a satisfaccion	Viviendas En ejecución.	Viviendas Programadas actividad No.3
Cordoba Bolivar	San Martin	217	0	206	10	141	1	100	93	93	0	0	61	29	3	0	0	0	0	217	206	10	141	1	56	30	0	26	0
	TOTAL	**217**	**0**	**206**	**10**	141	**1**	**100**	**93**	**33**	**0**	**0**	**61**	**29**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**217**	**206**	**10**	**141**	**1**	**56**	**30**	**0**	**26**	**0**

INFORME ESTADO DE COVID-19

	INFORME ESTADO DE COVID - 19	CÓDIGO:	F-GG-10
enterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18/07/2022 Y EL 24/07/2022 PLAZO: 5 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. CONTRATO No. 2220587

PERSONAL DEL CONTRATISTA

	MES: JUNIO			SEMANA:4					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	OBSERVACIONES
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
DUARTE PINEDO - DIRECTOR DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD BLANCO - RESIDENTE DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RAFAEL CASTILLO - RESIDENTE SST	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
NORELIS ANAYA - TRABAJADORA SOCIAL	**ASTRAZENIKA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
OSWALDO GARZÓN - PROFESIONAL DIAGNOSTICO	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
SINDY ESCOBAR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**SINOVAC**		F	NO	NO	NO	SI	SI	

PERSONAL INTERVENTORIA

	MES: JUNIO			SEMANA:4					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	**OBSERVACIONES**
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
MARCY CORREA - DIRECTOR INTERVENTORIA	**PFIZER**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD ARIETA - RESIDENTE INTERVENTORIA	**PFIZER**	**MODERNA**	M	NO	NO	NO	SI	SI	
DIAMYS SANCHEZ PORTILLO - INSPECTORA DE INTERVENTORIA	**PFIZER**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
FERNANDA GRIJALBA - PROFESIONAL SOCIAL	**MODERNA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
YIRA LEMUS - PROFESIONAL HSEQ	**AZTRAZENECA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
LEYDIS HERRERA - AUXILIAR SOCIAL	**JONSSON**	**JONSSON**	F	NO	NO	NO	SI	SI	

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:



Firma:

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

REPORTE Y EJECUCIÒN DE VIVIENDAS SEMANALES

Ejecución de Actividad en Viviendas al Programa Conexiones Intradomiciliarias con corte a 17/07/2022

BARRIO	ACTA	No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización	Número de días Máximo permitido según tipo de intervención	Número de Dias de la Intervencion por parte del Contratista	Dias de cumplimiento o incumplimiento según tipo de intervención (-) atraso y (+) avance	¿SE ENCUENTRA RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR INTERVENTORÍA?	
															SI (X)	NO (X)
SM	1	1	B-C-SM-MZ29-VE-001		Adecuacion	$7.967.801,13	$0,00			0/01/1900	5/01/1900	0	5	-5		X
SM	1	2	B-C-SM-MZ32-VE-002	100%	Caseta T3	$8.126.190,79	$8.126.190,79	2/06/2022	TERMINADA	2/06/2022	10/06/2022	0	8	-8		X
SM	1	3	B-C-SM-MZ32-VE-003	100%	Caseta T3	$7.914.431,13	$7.914.431,13	4/06/2022	TERMINADA	4/06/2022	12/06/2022	0	8	-8		X
SM	1	4	B-C-SM-MZ18-VE-004	100%	Adecuacion	$7.372.105,35	$7.372.105,35	4/06/2022	TERMINADA	4/06/2022	8/06/2022	0	4	-4		X
SM	1	5	B-C-SM-MZ22-VE-005	100%	Adecuacion	$7.148.052,07	$7.148.052,07	4/06/2022	TERMINADA	4/06/2022	7/06/2022	0	3	-3		X
SM	1	6	B-C-SM-MZ34-VE-006	100%	Adecuacion	$7.464.125,94	$7.464.125,94	4/06/2022	TERMINADA	4/06/2022	8/06/2022	0	4	-4		X
SM	1	7	B-C-SM-MZ22-VE-007	100%	Adecuacion	$7.159.479,30	$7.159.479,30	4/06/2022	TERMINADA	4/06/2022	9/06/2022	0	5	-5		X
SM	1	8	B-C-SM-MZ22-VE-009	100%	Caseta T3	$7.908.010,60	$7.908.010,60	4/06/2022	TERMINADA	4/06/2022	8/06/2022	0	4	-4		X
SM	1	9	B-C-SM-MZ21-VE-010	100%	Caseta T3	$8.928.931,81	$8.928.931,81	4/06/2022	TERMINADA	4/06/2022	9/06/2022	0	5	-5		X
SM	1	10	B-C-SM-MZ22-VE-011	100%	Adecuacion	$7.911.551,76	$7.911.551,76	8/06/2022	TERMINADA	8/06/2022	16/06/2022	0	8	-8		X
SM	1	11	B-C-SM-MZ34-VE-012	100%	Caseta T3	$8.997.603,49	$8.997.603,49	4/06/2022	TERMINADA	4/06/2022	9/06/2022	0	5	-5		X
SM	1	12	B-C-SM-MZ21-VE-013	100%	Adecuacion	$5.406.646,10	$5.406.646,10	2/06/2022	TERMINADA	2/06/2022	6/06/2022	0	4	-4		X
SM	1	13	B-C-SM-MZ21-VE-014	100%	Caseta T3	$8.562.948,93	$8.562.948,93	4/06/2022	TERMINADA	4/06/2022	10/06/2022	0	6	-6		X
SM	1	14	B-C-SM-MZ21-VE-015	100%	Caseta T3	$8.265.079,43	$8.265.079,43	2/06/2022	TERMINADA	2/06/2022	7/06/2022	0	5	-5		X
SM	1	15	B-C-SM-MZ21-VE-016	100%	Caseta T3	$9.248.106,91	$9.248.106,91	2/06/2022	TERMINADA	2/06/2022	8/06/2022	0	6	-6		X
SM	1	16	B-C-SM-MZ38-VE-017	100%	Caseta T3	$8.481.195,82	$8.481.195,82	2/06/2022	TERMINADA	2/06/2022	7/06/2022	0	5	-5		X
SM	2	17	B-C-SM-MZ24-VE-018	100%	Caseta T3	$8.450.841,17	$8.450.841,17	5/06/2022	TERMINADA	5/06/2022	9/06/2022	0	4	-4		X
SM	1	18	B-C-SM-MZ24-VE-019	100%	Adecuacion	$6.395.588,06	$6.395.588,06	5/06/2022	TERMINADA	5/06/2022	10/06/2022	0	5	-5		X
SM	1	19	B-C-SM-MZ24-VE-020	100%	Adecuacion	$4.593.449,33	$4.593.449,33	5/06/2022	TERMINADA	5/06/2022	13/06/2022	0	8	-8		X
SM	2	20	B-C-SM-MZ85-VE-021	100%	Caseta T3	$8.614.688,02	$8.614.688,02	5/06/2022	TERMINADA	5/06/2022	14/06/2022	0	9	-9		X
SM	2	21	B-C-SM-MZ85-VE-022	100%	Caseta T3	$8.896.124,14	$8.896.124,14	5/06/2022	TERMINADA	5/06/2022	9/06/2022	0	4	-4		X
SM	1	22	B-C-SM-MZ85-VE-023	100%	Adecuacion	$7.191.930,35	$7.191.930,35	5/06/2022	TERMINADA	5/06/2022	10/06/2022	0	5	-5		X
SM	1	23	B-C-SM-MZ29-VE-024	100%	Adecuacion	$6.084.490,07	$6.084.490,07	5/06/2022	TERMINADA	5/06/2022	10/06/2022	0	5	-5		X
SM	2	24	B-C-SM-MZ31-VE-025	100%	Caseta T3	$8.637.204,10	$8.637.204,10	5/06/2022	TERMINADA	5/06/2022	9/06/2022	0	4	-4		X
SM	1	25	B-C-SM-MZ31-VE-026	100%	Adecuacion	$4.822.827,41	$4.822.827,41	5/06/2022	TERMINADA	5/06/2022	14/06/2022	0	9	-9		X
SM	1	26	B-C-SM-MZ31-VE-027	100%	Adecuacion	$4.365.339,96	$4.365.339,96	5/06/2022	TERMINADA	5/06/2022	9/06/2022	0	4	-4		X
SM	2	27	B-C-SM-MZ31-VE-028	100%	Adecuacion	$7.668.943,14	$7.668.943,14	5/06/2022	TERMINADA	5/06/2022	8/06/2022	0	3	-3		X
SM	2	28	B-C-SM-MZ31-VE-029	100%	Caseta T3	$8.468.136,75	$8.468.136,75	5/06/2022	TERMINADA	5/06/2022	9/06/2022	0	4	-4		X
SM	1	29	B-C-SM-MZ31-VE-030	100%	Adecuacion	$4.637.820,17	$4.637.820,17	5/06/2022	TERMINADA	5/06/2022	11/06/2022	0	6	-6		X
SM	3	30	B-C-SM-MZ30-VE-032	100%	Adecuacion	$7.557.018,99	$7.557.018,99	9/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	15/06/2022	0	6	-6		X
SM	3	31	B-C-SM-MZ44-VE-034	100%	Adecuacion	$5.519.347,12	$5.519.347,12	9/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	15/06/2022	0	6	-6		X
SM	3	32	B-C-SM-MZ45-VE-035	55%	Adecuacion	$8.137.626,09	$4.475.694,35	9/06/2022	EN EJECUCION	9/06/2022	15/06/2022	0	6	-6		X
SM	3	33	B-C-SM-MZ56-VE-038	55%	Adecuacion	$8.227.630,94	$4.525.197,02	9/06/2022	EN EJECUCION	9/06/2022	15/06/2022	0	6	-6		X
SM	3	34	B-C-SM-MZ56-VE-039	55%	Adecuacion	$1.443.687,77	$794.028,27	9/06/2022	EN EJECUCION	9/06/2022	15/06/2022	0	6	-6		X
SM	3	35	B-C-SM-MZ46-VE-040	55%	Adecuacion	$6.628.376,66	$3.645.607,16	9/06/2022	EN EJECUCION	9/06/2022	15/06/2022	0	6	-6		X
SM	3	36	B-C-SM-MZ45-VE-041	55%	Adecuacion	$4.845.221,48	$2.664.871,81	9/06/2022	EN EJECUCION	9/06/2022	15/06/2022	0	6	-6		X
SM	3	37	B-C-SM-MZ21-VE-042	55%	Adecuacion	$4.634.812,47	$2.549.146,86	9/06/2022	EN EJECUCION	9/06/2022	15/06/2022	0	6	-6		X
SM	3	38	B-C-SM-MZ31-VE-043	55%	Caseta T3	$6.939.713,07	$3.816.842,19	9/06/2022	EN EJECUCION	9/06/2022	15/06/2022	0	6	-6		X
SM	3	39	B-C-SM-MZ55-VE-046	55%	Caseta T3	$7.344.533,10	$4.039.493,21	9/06/2022	EN EJECUCION	9/06/2022	15/06/2022	0	6	-6		X
SM	3	40	B-C-SM-MZ55-VE-047	55%	Caseta T2	$7.890.285,26	$4.339.656,89	9/06/2022	EN EJECUCION	9/06/2022	15/06/2022	5	6	-1		X
SM	3	41	B-C-SM-MZ56-VE-055	55%	Adecuacion	$3.160.157,78	$1.738.086,78	9/06/2022	EN EJECUCION	9/06/2022	15/06/2022	0	6	-6		X
SM	4	42	B-C-SM-MZ56-VE-062	55%	Caseta T2	$8.362.124,52	$4.599.168,49	14/06/2022	EN EJECUCION	14/06/2022	20/06/2022	5	6	-1		X

SM	4	43	B-C-SM-MZ66-VE-067	55%	Caseta T3	$7.306.146,52	$4.018.380,59	14/06/2022	**EN EJECUCION**	14/06/2022	20/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	4	44	B-C-SM-MZ66-VE-068	55%	Caseta T3	$7.971.707,31	$4.384.439,02	14/06/2022	**EN EJECUCION**	14/06/2022	20/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	4	45	B-C-SM-MZ66-VE-069	55%	Adecuacion	$6.509.744,54	$3.580.359,50	14/06/2022	**EN EJECUCION**	14/06/2022	20/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	4	46	B-C-SM-MZ75-VE-071	55%	Adecuacion	$7.170.024,86	$3.943.513,67	14/06/2022	**EN EJECUCION**	14/06/2022	20/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	4	47	B-C-SM-MZ75-VE-072	55%	Caseta T3	$8.040.278,46	$4.422.153,15	14/06/2022	**EN EJECUCION**	14/06/2022	20/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	4	48	B-C-SM-MZ75-VE-073	55%	Caseta T4	$8.332.036,11	$4.582.619,86	14/06/2022	**EN EJECUCION**	14/06/2022	20/06/2022	5	**6**	**-1**		**X**
SM	4	49	B-C-SM-MZ75-VE-074	55%	Caseta T5	$7.656.034,05	$4.210.818,73	14/06/2022	**EN EJECUCION**	14/06/2022	20/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	4	50	B-C-SM-MZ89-VE-084	35%	Caseta T6	$8.247.304,21	$2.886.556,47	14/06/2022	**EN EJECUCION**	14/06/2022	20/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	5	51	B-C-SM-MZ145-VE-053	35%	Caseta T3	$8.262.443,76	$2.891.855,32	21/06/2022	**EN EJECUCION**	21/06/2022	27/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	5	52	B-C-SM-MZ69-VE-087	35%	Adecuacion	$7.074.492,71	$2.476.072,45	21/06/2022	**EN EJECUCION**	21/06/2022	27/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	5	53	B-C-SM-MZ69-VE-088	35%	Adecuacion	$7.465.862,82	$2.613.051,99	21/06/2022	**EN EJECUCION**	21/06/2022	27/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	5	54	B-C-SM-MZ66-VE-131	35%	Caseta T3	$8.139.325,77	$2.848.764,02	21/06/2022	**EN EJECUCION**	21/06/2022	27/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	5	55	B-C-SM-MZ56-VE-136	35%	Adecuacion	$7.922.709,35	$2.772.948,27	21/06/2022	**EN EJECUCION**	21/06/2022	27/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	5	56	B-C-SM-MZ56-VE-138	35%	Adecuacion	$7.984.245,73	$2.794.486,01	21/06/2022	**EN EJECUCION**	21/06/2022	27/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	5	57	B-C-SM-MZ56-VE-139	35%	Caseta T3	$7.415.285,53	$2.595.349,94	21/06/2022	**EN EJECUCION**	21/06/2022	27/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM																

CUADRO DE PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PROGRAMAS Y EJECUTADAS

EJECUTADO

Fechas de Corte		Actividad 1		Actividad 2			Actividad 3			Actividad 4		Total	
			$ 5.140.026,35			$ 39.313.349,11			$ 1.727.254.570,53		$ -		$ 1.771.707.945,99
											$ -		$ -
			$ 5.140.026,35			$ 39.313.349,11			$ 1.727.254.570,53		$ -		$ 1.771.707.945,99
	Semana 0	0,00%	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		$ -	**0,00%**	**$ -**
2/05/2022	**Semana 1**	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,15%**	**$ 2.570.013,18**
9/05/2022	**Semana 2**	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,15%**	**$ 2.570.013,18**
16/05/2022	**Semana 3**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
23/05/2022	**Semana 4**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
30/05/2022	**Semana 5**	100,00%	$ 5.140.026,35	11,06%	24	$ 4.348.020,18	1,38%	3	$ 22.883.102,57		$ -	**1,83%**	**$ 32.371.149,10**
6/06/2022	**Semana 6**	100,00%	$ 5.140.026,35	24,88%	30	$ 9.783.045,40	1,38%	6	$ 22.883.102,57		$ -	**2,13%**	**$ 37.806.174,32**
13/06/2022	**Semana 7**	100,00%	$ 5.140.026,35	44,24%	42	$ 17.392.080,71	1,84%	10	$ 30.510.803,42		$ -	**2,99%**	**$ 53.042.910,49**
20/06/2022	**Semana 8**	100,00%	$ 5.140.026,35	67,74%	51	$ 26.631.623,59	1,84%	14	$ 30.510.803,42		$ -	**3,52%**	**$ 62.282.453,36**
27/06/2022	**Semana 9**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,46%	71	$ 39.494.516,62	1,84%	18	$ 30.510.803,42		$ -	**4,24%**	**$ 75.145.346,39**
4/07/2022	**Semana 10**	100,00%	$ 5.140.026,35	143,78%	94	$ 56.524.262,31	1,84%	22	$ 30.510.803,42		$ -	**5,20%**	**$ 92.175.092,09**
11/07/2022	**Semana 11**	100,00%	$ 5.140.026,35	196,77%	115	$ 77.358.525,67	1,84%	26	$ 30.510.803,42		$ -	**6,38%**	**$ 113.009.355,44**
18/07/2022	**Semana 12**	**100,00%**	**$ 5.140.026,35**	**261,75%**	**141**	**$ 102.903.144,21**	**1,84%**	30	**$ 30.510.803,42**		$ -	**7,82%**	**$ 138.553.973,99**
25/07/2022	**Semana 13**	100,00%	$ 5.140.026,35			$ -	0,00%		$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
1/08/2022	**Semana 14**	100,00%	$ 5.140.026,35			$ -	0,00%		$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
8/08/2022	**Semana 15**	100,00%	$ 5.140.026,35			$ -	0,00%		$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
15/08/2022	**Semana 16**	100,00%	$ 5.140.026,35			$ -	0,00%		$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
22/08/2022	**Semana 17**	100,00%	$ 5.140.026,35			$ -	0,00%		$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
29/08/2022	**Semana 18**	100,00%	$ 5.140.026,35			$ -	0,00%		$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
5/09/2022	**Semana 19**	100,00%	$ 5.140.026,35			$ -	0,00%		$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
12/09/2022	**Semana 20**	100,00%	$ 5.140.026,35			$ -	0,00%		$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
19/09/2022	**Semana 21**	100,00%	$ 5.140.026,35			$ -	0,00%		$ 1.727.254.570,53		$ -	**100,00%**	**$ 1.771.707.945,99**
26/09/2022	**Semana 22**												

PROGRAMADAS

Fechas de Corte		Actividad 1		Actividad 2			Actividad 3			Actividad 4		Total	
		$ 5.140.026,35		$ 39.313.349,11			$ 1.727.254.570,53			$ -		$ 1.771.707.945,99	
										$ -		$ -	
		$ 5.140.026,35		$ 39.313.349,11			$ 1.727.254.570,53			$ -		$ 1.771.707.945,99	
	Semana 0	0,00%	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		$ -	**0,00%**	**$ -**
2/05/2022	**Semana 1**	100,00%	$ 5.140.026,35	5,07%	11	$ 1.992.842,58	0,00%	0	$ -		$ -	**0,40%**	**$ 7.132.868,93**
9/05/2022	**Semana 2**	100,00%	$ 5.140.026,35	10,14%	22	$ 3.985.685,16	0,00%	0	$ -		$ -	**0,52%**	**$ 9.125.711,51**
16/05/2022	**Semana 3**	100,00%	$ 5.140.026,35	15,21%	33	$ 5.978.527,74	0,00%	0	$ -		$ -	**0,63%**	**$ 11.118.554,09**
23/05/2022	**Semana 4**	100,00%	$ 5.140.026,35	20,28%	44	$ 7.971.370,33	0,92%	2	$ 15.919.396,96		$ -	**1,64%**	**$ 29.030.793,64**
30/05/2022	**Semana 5**	100,00%	$ 5.140.026,35	25,35%	55	$ 9.964.212,91	1,84%	4	$ 31.838.793,93		$ -	**2,65%**	**$ 46.943.033,18**
6/06/2022	**Semana 6**	100,00%	$ 5.140.026,35	30,41%	66	$ 11.957.055,49	2,30%	5	$ 39.798.492,41		$ -	**3,21%**	**$ 56.895.574,25**
13/06/2022	**Semana 7**	100,00%	$ 5.140.026,35	35,48%	77	$ 13.949.898,07	2,76%	6	$ 47.758.190,89		$ -	**3,77%**	**$ 66.848.115,31**
20/06/2022	**Semana 8**	100,00%	$ 5.140.026,35	40,09%	87	$ 15.761.573,15	4,15%	9	$ 71.637.286,34		$ -	**5,22%**	**$ 92.538.885,83**
27/06/2022	**Semana 9**	100,00%	$ 5.140.026,35	44,70%	97	$ 17.573.248,22	5,07%	11	$ 87.556.683,30		$ -	**6,22%**	**$ 110.269.957,87**
4/07/2022	**Semana 10**	100,00%	$ 5.140.026,35	58,53%	127	$ 23.008.273,44	11,06%	24	$ 191.032.763,56		$ -	**12,37%**	**$ 219.181.063,35**
11/07/2022	**Semana 11**	100,00%	$ 5.140.026,35	72,35%	157	$ 28.443.298,66	17,05%	37	$ 294.508.843,82		$ -	**18,52%**	**$ 328.092.168,84**
18/07/2022	**Semana 12**	100,00%	$ 5.140.026,35	86,18%	**187**	**$ 33.878.323,89**	**23,04%**	**50**	**$ 397.984.924,09**		$ -	**24,67%**	**$ 437.003.274,32**
25/07/2022	**Semana 13**	100,00%	$ 5.140.026,35	92,00%	200	$ 36.168.281,18	27,65%	60	$ 477.581.908,90	54%	$ -	**29,29%**	**$ 518.890.216,43**
1/08/2022	**Semana 14**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	32,26%	70	$ 557.178.893,72	63%	$ -	**33,96%**	**$ 601.632.269,18**
8/08/2022	**Semana 15**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	39,63%	86	$ 684.534.069,43	67%	$ -	**41,15%**	**$ 728.987.444,89**
15/08/2022	**Semana 16**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	47,00%	102	$ 811.889.245,13	72%	$ -	**48,33%**	**$ 856.342.620,59**
22/08/2022	**Semana 17**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	54,84%	119	$ 947.204.119,32	87%	$ -	**55,97%**	**$ 991.657.494,78**
29/08/2022	**Semana 18**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	64,98%	141	$ 1.122.317.485,92	81%	$ -	**65,86%**	**$ 1.166.770.861,38**
5/09/2022	**Semana 19**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	75,12%	163	$ 1.297.430.852,52	86%	$ -	**75,74%**	**$ 1.341.884.227,98**
12/09/2022	**Semana 20**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	85,25%	185	$ 1.472.544.219,12	90%	$ -	**85,62%**	**$ 1.516.997.594,58**
19/09/2022	**Semana 21**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	95,39%	207	$ 1.647.657.585,71	99%	$ -	**95,51%**	**$ 1.692.110.961,17**
26/09/2022	**Semana 22**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	100,00%	217	$ 1.727.254.570,53	100%	$ -	**100,00%**	**$ 1.771.707.945,99**

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 27/07/2022
HORA: 4:32:38 p. m.
20224300280892

ADMON

Bogotá D.C, 27 de julio de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-078-22

Señores:
Ingeniera
Karol Yulieth Javela
Supervisora
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio
Calle 26 # 13-19 Piso 20
Bogotá. Colombia

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: REMISIÓN INFORMES SEMANALES 13.

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales remitimos informe semanal 13 correspondiente al periodo del 18 de julio del 2022 al 24 de julio del 2022, para fines pertinentes.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.

FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA
Anexo: 20 folios
Proyectó: Jineth Marcela Gordillo – Residente Admón.
Reviso: Ing. Marcy Correa – Directora de Interventoría

INFORME SEMANAL 13

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 13	CÓDIGO:	F-GG-06
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 013

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **18/07/2022** al **24/07/2022** | Fecha **24/07/2022**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO PROYECTO	
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** BOLIVAR — **MUNICIPIO** CORDOBA
GERENCIA A CARGO	ENTERRITORIO
SUPERVISOR	KAROL YULIETH JAVELA PEREZ
ESTADO DEL PROYECTO	EN EJECUCIÓN ACTIVIDAD 1, 2 Y 3

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2220576		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUREDES		
Valor inicial	$ 1.771.707.945,99		
Valor actual	$ 1.771.707.945,99		
Variación del valor	$ -		
Fecha de Inicio	26/04/2022		
Plazo inicial (Días)	150 Días		
Plazo actual (Días)	150 Días	5 MESES - 150 DIAS	
Variación en plazo	Días		
Fecha Contractual de terminación	26/09/2022		
Tiempo Transcurrido (días)	89	59,33%	
Días remanentes del Contrato	64,00	42,67%	
Acumulado a última acta pagada			
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ 310.199.975,72		

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.	2220587		
Interventor	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS.		
Valor inicial	$ 202.479.313,00		
Valor actual	$ 202.479.313,00		
Variación del valor	$ -		
Fecha de Inicio	26/04/2022		
Plazo inicial	150 Días		
Plazo actual	150 Días	5 MESES - 150 DIAS	
Variación en plazo	Días		
Fecha Contractual de terminación	26/09/2022		
Ejecución del Contrato	89	59,33%	
Días remanentes del Contrato	64,00	42,67%	
Acumulado a última acta pagada	$ 16.198.345,05		
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ 16.198.345,05		

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPENO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 1.771.707.945,99

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 385.386.215,44	21,75%	$ 339.692.014,07	19,17%	-$ 45.694.201,37	-2,58%
Durante el Periodo	$ 116.055.550,16	6,55%	$ 60.237.340,75	3,40%	-$ 55.818.209,41	-3,15%
Acumulado a la Fecha	**$ 501.441.765,60**	**28,30%**	**$ 399.929.354,82**	**22,57%**	**-$ 101.512.410,78**	**-5,73%**

Semáforo


Desviación en días: 9 Días




Observaciones al desempeño del proyecto:

De acuerdo a la reprogramación de obra el programado nos indica un 28,30% frente a un ejecutado del 22,57% indicándonos un atraso de 5,73%
De acuerdo a la reprogramación de obra se debería tener un total de 200 diagnósticos aprobados a la fecha, de los cuales se han aprobado 141, indicándonos un atraso de 59. Durante la semana del presente informe no se aprobaron diagnosticos.
En cuanto a la actividad 3 el contratista de acuerdo a la reprogramación de obra debería tener 60 viviendas terminadas, sin embargo, de las 60 intervenidas solo se han terminado 45 y se adelantan labores constructivas en 15 más, el contratista cuenta con 14 frentes de trabajo.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

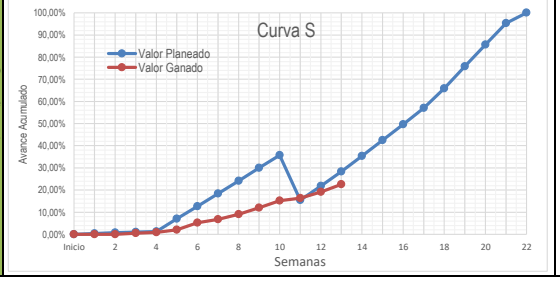




CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

A la fecha del presente informe no se han presntado cambios en la LINEA BASE.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	21,75%	19,17%	-2,58%	
Durante el Periodo	6,55%	3,40%	-3,15%	
Acumulado a la Fecha	**28,30%**	**22,57%**	**-5,73%**	

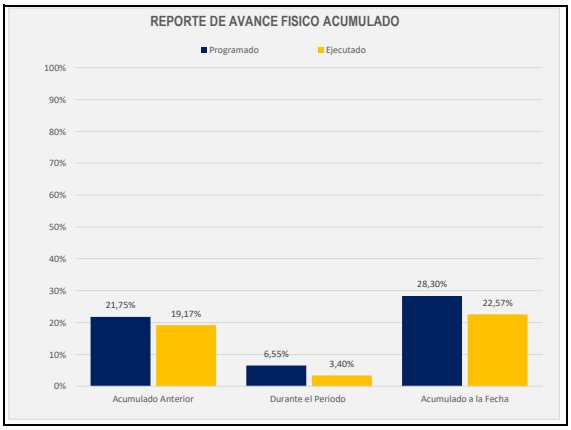

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 1.771.707.945,99	$ 1.771.707.945,99	$ -	$ 345.450.914,11		$ 345.450.914,11

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
		0,00%	1	$ 191.218.812,00	10,79%		







AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 202.479.313,00	$ 202.479.313,00	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
1	$ 16.198.345,05	8,00%	1	$ 16.198.345,05	8,00%	$ 16.198.345,05	$ 16.198.346,05







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 013

Entidad Contratante: ENTERRITORIO | Semana del 18/07/2022 al 24/07/2022 | Fecha 24/07/2022

ACTIVIDAD No. 1
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: Actividad No. 1, la aprobación de la actividad N° 1 se hizo comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-037-22 del 3 de junio de 2022. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
ACTIVIDAD No. 2
PROGRAMADO 89,86% vs EJECUTADO 64,98%
Comentario: La Actividad No. 2 nos indica un atraso del 24,88% de acuerdo a la reprogramación de obra, la interventoría ha otorgado aval mediante comités de aprobación a 141 diagnósticos, durante la semana del presente informe no se hicieron aprobaciones de diagnósticos. El contratista debe incrementar los esfuerzos y alcanzar las metas trazadas en la reprogramación de obra, que a la fecha de corte del presente informe es de 200 viviendas aprobadas.
ACTIVIDAD No. 3
PROGRAMADO 28,30% vs 22,57% EJECUTADO
Comentario: La Actividad No. 3 nos indica un atraso de 5,73%, de acuerdo a la reprogramación de obra debería tener 60 viviendas terminadas, sin embargo, ha intervenido 65 viviendas de las cuales solo 45 están terminadas y se adelantan trabajos constructivos en otras 15 más, el contratista cuenta con 14 cuadrillas de trabajo.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

En el ítem ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10. El contratista subsanó los diseños de las casetas y el diseño de la estructura para el tanque elevado, también realizó entrega del informe técnico especialista estructural el cual fue aprobado por la interventoría con lo cual esta actividad queda en un 100% de su ejecución. Sin embargo, el Contratista posteriormente solicitó un cambio de especificaciones en algunos ítems, uno de ellos el ladrillo de arcilla por bloque de Concreto, razón por la cual se hace necesario ajustar el diseño estructural con dicho cambio. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
El ítem ACTIVIDAD 2: DIAGNOSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. Esta actividad avanza con el diligenciamiento de los diagnósticos de los cuales ya se sometieron a comité de aprobación 141 diagnósticos, los cuales fueron avalados por la interventoría, la próxima semana el contratista debe presentar la totalidad de los diagnósticos pendientes para completar la meta, ya que conforme a la reprogramacion la etapa de diagnósticos finaliza en la semana 14.
En el ítem ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS. ACTA DE ENTREGA Y RECIBOS DE LAS OBRAS
A la fecha y de acuerdo la reprogramación de obra el contratista debería tener 60 viviendas terminadas, sin embargo, se han intervenido 65 viviendas, de las cuales solo 45 están terminadas indicándonos un atraso de 15, estás intervenciones avanzan en su proceso constructivo. A esto se suma que para la siguiente semana se debería tener terminadas 70 viviendas, es decir, el contratista se comprometió a redoblar esfuerzos e incrementar frentes de trabajo para reducir el atraso.
En las casetas tipo 3 se ha avanzado en actividades como: cimentación, mamposteria, fundición de columnas y columnetas, pañetes, instalación de tubería hidrosanitaria, instalación de aparatos sanitarios, instalación de tejas para cubierta, instalación de puertas metálicas, instalación de tanque elevado de 500 Lts, de igual forma se adelantan labores en intervenciones correspondientes a adecuaciones, construcción de estructura para el tanque elevado, cambio de pañete, instalación de enchape de pared y pisos y cambio de equipos sanitarios, para estas actividades el contratista cuenta con 14 frentes de trabajo.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Para la próxima semana correspondiente al periodo del 25 al 31 de Julio 2022 y de acuerdo la reprogramación de obra la actividad 2, que corresponde al ítem de diagnósticos se tiene programado que el contratista presente 76 diagnósticos más, para completar 217 diagnósticos de acuerdo la reprogramación de obra.
El contratista en la actividad 3 debe continuar con la ejecución de obra completando la intervención de 70 viviendas 100% de acuerdo la reprogramación de obra.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTIÓN SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0

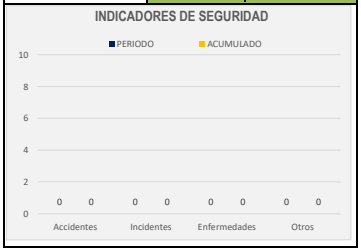

Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	11	0	11	61,1%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	7	0	7	38,9%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cual?	0	0	0	0,0%
	Total	18	0	18	100,00%



OBSERVACIONES

En el presente periodo NO se presentaron llevias, predomino el tiempo seco.

GESTIÓN SOCIAL Y PQR's

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
	N/A					

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
INCLUSION 101	Ediberto Rafael Fonseca Gonzalez	19/07/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 102	Juan del Cristo Torres Anaya	19/07/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 103	Carmen Cecilia Caceres Meza	19/07/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 104	Yadira Zuñiga Morante	19/07/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA

7. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 013

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **18/07/2022** al **24/07/2022** Fecha **24/07/2022**

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA






CASETA TIPO 3, SE APRECIA AVANCE EN EL PAÑETE DE MAMPOSTERIA, FUNDICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS.






ADECUACIONES DE UNIDADES SANITARIAS, SE APRECIA INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, LAVAPLATOS Y LAVADEROS






CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO-

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 013

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **18/07/2022** al **24/07/2022** Fecha **24/07/2022**

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-039-22 al contratista Consorcio Construredes con el Tema: SOLICITUDES DE INCLUSIÓN, mediante el cual se remite para su debido tramite Veintinueve (29) solicitudes de inclusión teniendo en cuenta el PROTOCOLO PARA LA INCLUSION DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS AL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, del cual, ya se ha dado los trámites correspondientes por el Contratista, y corresponde al municipio el siguiente trámite.

La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-040-22 al contratista Consorcio Construredes con el Tema: RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_068 - APROBACION DE DIAGNOSTICOS. Por medio del presente se realizamos entrega de aval para 14 diagnósticos presentados en comité de aprobación No. 010 los cuales corresponden a los códigos:

B-C-SM-MZ31-VE-031, B-C-SM-MZ145-VE-044, B-C-SM-MZ91-VE-054, B-C-SM-MZ68-VE-097, B-C-SM-MZ58-VE-107, B-C-SM-MZ66-VE-134, B-C-SM-MZ91-VE-171, B-C-SM-MZ84-VE-175, B-C-SM-MZ33-VE-194, B-C-SM-MZ33-VE-195, B-C-SM-MZ41-VE-197, B-C-SM-MZ91-VE-205, B-C-SM-MZ91-VE-206, B-C-SM-MZ46-VE-211.

La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-041-22 a la empresa Coopsecor Ltda. Mediante la cual se solicitó certificado de disponibilidad de redes y de autorización para la Intervención de conexión de las acometidas domiciliarias de acueducto y alcantarillado para cuarenta y siete (47) diagnósticos en el Barrio San Martín.

La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-042-22 al contratista Consorcio Construredes con el Tema: RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_070 - APROBACION DE DIAGNOSTICOS. Por medio del presente se realizamos entrega de aval para 14 diagnósticos presentados en comité de aprobación No. 011 los cuales corresponden a los códigos:

B-C-SM-MZ21-VE-118, B-C-SM-MZ66-VE-132, B-C-SM-MZ67-VE-133, B-C-SM-MZ145-VE-157, B-C-SM-MZ-VE145-160, B-C-SM-MZ-VE145-162, B-C-SM-MZ145-VE-184, B-C-SM-MZ59-VE-187, B-C-SM-MZ87-VE-189, B-C-SM-MZ56-VE-190, B-C-SM-MZ33-VE-196, B-C-SM-MZ92-VE-203,B-C-SM-MZ34-VE-209 y B-C-SM-MZ34-VE-210

	Marcy A. Correa C		Karol Javela
	Firma		**Firma**
Nombre	Marcy Correa castaño	Nombre	Karol Yulieth Javela Pérez
	Directora de la interventoría	Supervisor	Supervisor ENTerritorio

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría

Enviar Informe para validación

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A		ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA		FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-013	2-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	**11**	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	2-jun-22	SI	SI	13-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-019	9-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	22	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	9-jun-22	SI	SI	14-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-026	16-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	18	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	14-jun-22	SI	SI	11-jul-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-032	28-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	13	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	28-jun-22	SI	SI	11-jul-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-039	8-jul-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	29	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	8-jul-22	SI	SI	13-jul-22

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA	FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-025	15-jun-22	SOLICITUD ESPECIFICACIÓN TECNICA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	15-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA	FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-021	13-jun-22	SOLICITUD RESPUESTA AL CONCEPTO EMITIDO POR COOSEPCOR MEDIANTE ACTA DE REUNION DE OBRA	1	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	13-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta
ARCA-INT/FDA276-TEC-029	21-jun-22	OBRA REQUERIA EN LA VIA PUBLICA PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE LAS VIVIENDAS 001, 085, 088, 163	4	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	21-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA	FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-015	2-jun-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	24	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	2-jun-22	SI	3-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-023	15-jun-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	27	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	15-jun-22	**NO**	
ARCA-INT/FDA276-TEC-034	2-jul-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	29	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	2-jul-22	**NO**	
ARCA-INT/FDA276-TEC-041	13-jul-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	47	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	13-jul-22	**NO**	

INFORME PCI

Fecha de Corte	24/07/2022	PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS																										
Priorización		MATRIZ BASE						INCLUSIONES											TOTALES									
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No.2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Solicitudes de Inclusion	Atendida de la ESP	Atendida por la Alcaldia	Pendientes por atender ESP	Pendientes por atender Alcaldia	Respuesta positiva	Respuesta negativa	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Visitadas	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Recibidas a satisfaccion	Viviendas En ejecución.	Viviendas Programadas actividad No.3
Cordoba Bolivar	San Martin	217	0	206	10	141	1	103	93	93	0	0	64	29	0	0	0	0	217	206	10	141	1	65	45	0	20	0
	TOTAL	**217**	**0**	**206**	**10**	141	**1**	**103**	**93**	**93**	**0**	**0**	**64**	**29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**217**	**206**	**10**	**141**	**1**	**65**	**45**	**0**	**20**	**0**

INFORME ESTADO DE COVID-19

	INFORME ESTADO DE COVID - 19	CÓDIGO:	F-GG-10
enterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18/07/2022 Y EL 24/07/2022 PLAZO: 5 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. CONTRATO No. 2220587

PERSONAL DEL CONTRATISTA

	MES: JUNIO			SEMANA:4					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	OBSERVACIONES
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
DUARTE PINEDO - DIRECTOR DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD BLANCO - RESIDENTE DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RAFAEL CASTILLO - RESIDENTE SST	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
NORELIS ANAYA - TRABAJADORA SOCIAL	**ASTRAZENIKA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
OSWALDO GARZÓN - PROFESIONAL DIAGNOSTICO	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
SINDY ESCOBAR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**SINOVAC**		F	NO	NO	NO	SI	SI	

PERSONAL INTERVENTORIA

	MES: JUNIO			SEMANA:4					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	**OBSERVACIONES**
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
MARCY CORREA - DIRECTOR INTERVENTORIA	**PFIZER**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD ARIETA - RESIDENTE INTERVENTORIA	**PFIZER**	**MODERNA**	M	NO	NO	NO	SI	SI	
DIAMYS SANCHEZ PORTILLO - INSPECTORA DE INTERVENTORIA	**PFIZER**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
FERNANDA GRIJALBA - PROFESIONAL SOCIAL	**MODERNA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
YIRA LEMUS - PROFESIONAL HSEQ	**AZTRAZENECA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
LEYDIS HERRERA - AUXILIAR SOCIAL	**JONSSON**	**JONSSON**	F	NO	NO	NO	SI	SI	

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:



Firma:

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

REPORTE Y EJECUCIÒN DE VIVIENDAS SEMANALES

Ejecución de Actividad en Viviendas al Programa Conexiones Intradomiciliarias con corte a 24/07/2022

BARRIO	ACTA	No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización	Número de días Máximo permitido según tipo de intervención	Número de Dias de la Intervencion por parte del Contratista	Dias de cumplimiento o incumplimiento según tipo de intervención (-) atraso y (+) avance	¿SE ENCUENTRA RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR INTERVENTORÍA?	
															SI (X)	NO (X)
SM	1	1	B-C-SM-MZ29-VE-001		Adecuacion	$7.967.801,13	$0,00			**0/01/1900**	5/01/1900	0	**5**	**-5**		**x**
SM	1	2	B-C-SM-MZ32-VE-002	100%	Caseta T3	$8.126.190,79	$8.126.190,79	2/06/2022	**TERMINADA**	**2/06/2022**	10/06/2022	0	**8**	**-8**		**x**
SM	1	3	B-C-SM-MZ32-VE-003	100%	Caseta T3	$7.914.431,13	$7.914.431,13	4/06/2022	**TERMINADA**	**4/06/2022**	12/06/2022	0	**8**	**-8**		**x**
SM	1	4	B-C-SM-MZ18-VE-004	100%	Adecuacion	$7.372.105,35	$7.372.105,35	4/06/2022	**TERMINADA**	**4/06/2022**	8/06/2022	0	**4**	**-4**		**x**
SM	1	5	B-C-SM-MZ22-VE-005	100%	Adecuacion	$7.148.052,07	$7.148.052,07	4/06/2022	**TERMINADA**	**4/06/2022**	7/06/2022	0	**3**	**-3**		**x**
SM	1	6	B-C-SM-MZ34-VE-006	100%	Adecuacion	$7.464.125,94	$7.464.125,94	4/06/2022	**TERMINADA**	**4/06/2022**	8/06/2022	0	**4**	**-4**		**x**
SM	1	7	B-C-SM-MZ22-VE-007	100%	Adecuacion	$7.159.479,30	$7.159.479,30	4/06/2022	**TERMINADA**	**4/06/2022**	9/06/2022	0	**5**	**-5**		**x**
SM	1	8	B-C-SM-MZ22-VE-009	100%	Caseta T3	$7.908.010,60	$7.908.010,60	4/06/2022	**TERMINADA**	**4/06/2022**	8/06/2022	0	**4**	**-4**		**x**
SM	1	9	B-C-SM-MZ21-VE-010	100%	Caseta T3	$8.928.931,81	$8.928.931,81	4/06/2022	**TERMINADA**	**4/06/2022**	9/06/2022	0	**5**	**-5**		**x**
SM	1	10	B-C-SM-MZ22-VE-011	100%	Adecuacion	$7.911.551,76	$7.911.551,76	8/06/2022	**TERMINADA**	**8/06/2022**	16/06/2022	0	**8**	**-8**		**x**
SM	1	11	B-C-SM-MZ34-VE-012	100%	Caseta T3	$8.997.603,49	$8.997.603,49	4/06/2022	**TERMINADA**	**4/06/2022**	9/06/2022	0	**5**	**-5**		**x**
SM	1	12	B-C-SM-MZ21-VE-013	100%	Adecuacion	$5.406.646,10	$5.406.646,10	2/06/2022	**TERMINADA**	**2/06/2022**	6/06/2022	0	**4**	**-4**		**x**
SM	1	13	B-C-SM-MZ21-VE-014	100%	Caseta T3	$8.562.948,93	$8.562.948,93	4/06/2022	**TERMINADA**	**4/06/2022**	10/06/2022	0	**6**	**-6**		**x**
SM	1	14	B-C-SM-MZ21-VE-015	100%	Caseta T3	$8.265.079,43	$8.265.079,43	2/06/2022	**TERMINADA**	**2/06/2022**	7/06/2022	0	**5**	**-5**		**x**
SM	1	15	B-C-SM-MZ21-VE-016	100%	Caseta T3	$9.248.106,91	$9.248.106,91	2/06/2022	**TERMINADA**	**2/06/2022**	8/06/2022	0	**6**	**-6**		**x**
SM	1	16	B-C-SM-MZ38-VE-017	100%	Caseta T3	$8.481.195,82	$8.481.195,82	2/06/2022	**TERMINADA**	**2/06/2022**	7/06/2022	0	**5**	**-5**		**x**
SM	2	17	B-C-SM-MZ24-VE-018	100%	Caseta T3	$8.450.841,17	$8.450.841,17	5/06/2022	**TERMINADA**	**5/06/2022**	9/06/2022	0	**4**	**-4**		**x**
SM	1	18	B-C-SM-MZ24-VE-019	100%	Adecuacion	$6.395.588,06	$6.395.588,06	5/06/2022	**TERMINADA**	**5/06/2022**	10/06/2022	0	**5**	**-5**		**x**
SM	1	19	B-C-SM-MZ24-VE-020	100%	Adecuacion	$4.593.449,33	$4.593.449,33	5/06/2022	**TERMINADA**	**5/06/2022**	13/06/2022	0	**8**	**-8**		**x**
SM	2	20	B-C-SM-MZ85-VE-021	100%	Caseta T3	$8.614.688,02	$8.614.688,02	5/06/2022	**TERMINADA**	**5/06/2022**	14/06/2022	0	**9**	**-9**		**x**
SM	2	21	B-C-SM-MZ85-VE-022	100%	Caseta T3	$8.896.124,14	$8.896.124,14	5/06/2022	**TERMINADA**	**5/06/2022**	9/06/2022	0	**4**	**-4**		**x**
SM	1	22	B-C-SM-MZ85-VE-023	100%	Adecuacion	$7.191.930,35	$7.191.930,35	5/06/2022	**TERMINADA**	**5/06/2022**	10/06/2022	0	**5**	**-5**		**x**
SM	1	23	B-C-SM-MZ29-VE-024	100%	Adecuacion	$6.084.490,07	$6.084.490,07	5/06/2022	**TERMINADA**	**5/06/2022**	10/06/2022	0	**5**	**-5**		**x**
SM	2	24	B-C-SM-MZ31-VE-025	100%	Caseta T3	$8.637.204,10	$8.637.204,10	5/06/2022	**TERMINADA**	**5/06/2022**	9/06/2022	0	**4**	**-4**		**x**
SM	1	25	B-C-SM-MZ31-VE-026	100%	Adecuacion	$4.822.827,41	$4.822.827,41	5/06/2022	**TERMINADA**	**5/06/2022**	14/06/2022	0	**9**	**-9**		**x**
SM	1	26	B-C-SM-MZ31-VE-027	100%	Adecuacion	$4.365.339,96	$4.365.339,96	5/06/2022	**TERMINADA**	**5/06/2022**	9/06/2022	0	**4**	**-4**		**x**
SM	2	27	B-C-SM-MZ31-VE-028	100%	Adecuacion	$7.668.943,14	$7.668.943,14	5/06/2022	**TERMINADA**	**5/06/2022**	8/06/2022	0	**3**	**-3**		**x**
SM	2	28	B-C-SM-MZ31-VE-029	100%	Caseta T3	$8.468.136,75	$8.468.136,75	5/06/2022	**TERMINADA**	**5/06/2022**	9/06/2022	0	**4**	**-4**		**x**
SM	1	29	B-C-SM-MZ31-VE-030	100%	Adecuacion	$4.637.820,17	$4.637.820,17	5/06/2022	**TERMINADA**	**5/06/2022**	11/06/2022	0	**6**	**-6**		**x**
SM	3	30	B-C-SM-MZ30-VE-032	100%	Adecuacion	$7.557.018,99	$7.557.018,99	9/06/2022	**TERMINADA**	9/06/2022	15/06/2022	0	**6**	**-6**		**x**
SM	3	31	B-C-SM-MZ44-VE-034	100%	Adecuacion	$5.519.347,12	$5.519.347,12	9/06/2022	**TERMINADA**	9/06/2022	15/06/2022	0	**6**	**-6**		**x**
SM	3	32	B-C-SM-MZ45-VE-035	100%	Adecuacion	$8.137.626,09	$8.137.626,09	9/06/2022	**TERMINADA**	9/06/2022	15/06/2022	0	**6**	**-6**		**x**
SM	3	33	B-C-SM-MZ56-VE-038	100%	Adecuacion	$8.227.630,94	$8.227.630,94	9/06/2022	**TERMINADA**	9/06/2022	15/06/2022	0	**6**	**-6**		**x**
SM	3	34	B-C-SM-MZ56-VE-039	100%	Adecuacion	$1.443.687,77	$1.443.687,77	9/06/2022	**TERMINADA**	9/06/2022	15/06/2022	0	**6**	**-6**		**x**
SM	3	35	B-C-SM-MZ46-VE-040	100%	Adecuacion	$6.628.376,66	$6.628.376,66	9/06/2022	**TERMINADA**	9/06/2022	15/06/2022	0	**6**	**-6**		**x**
SM	3	36	B-C-SM-MZ45-VE-041	100%	Adecuacion	$4.845.221,48	$4.845.221,48	9/06/2022	**TERMINADA**	9/06/2022	15/06/2022	0	**6**	**-6**		**x**
SM	3	37	B-C-SM-MZ21-VE-042	100%	Adecuacion	$4.634.812,47	$4.634.812,47	9/06/2022	**TERMINADA**	9/06/2022	15/06/2022	0	**6**	**-6**		**x**
SM	3	38	B-C-SM-MZ31-VE-043	100%	Caseta T3	$6.939.713,07	$6.939.713,07	9/06/2022	**TERMINADA**	9/06/2022	15/06/2022	0	**6**	**-6**		**x**
SM	3	39	B-C-SM-MZ55-VE-046	100%	Caseta T3	$7.344.533,10	$7.344.533,10	9/06/2022	**TERMINADA**	9/06/2022	15/06/2022	0	**6**	**-6**		**x**
SM	3	40	B-C-SM-MZ55-VE-047	100%	Caseta T2	$7.890.285,26	$7.890.285,26	9/06/2022	**TERMINADA**	9/06/2022	15/06/2022	5	**6**	**-1**		**x**
SM	3	41	B-C-SM-MZ56-VE-055	100%	Adecuacion	$3.160.157,78	$3.160.157,78	9/06/2022	**TERMINADA**	9/06/2022	15/06/2022	0	**6**	**-6**		**x**
SM	4	42	B-C-SM-MZ56-VE-062	100%	Caseta T2	$8.362.124,52	$8.362.124,52	14/06/2022	**TERMINADA**	14/06/2022	20/06/2022	5	**6**	**-1**		**x**

SM	4	43	B-C-SM-MZ66-VE-067	100%	Caseta T3	$7.306.146,52	$7.306.146,52	14/06/2022	**TERMINADA**	14/06/2022	20/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	4	44	B-C-SM-MZ66-VE-068	100%	Caseta T3	$7.971.707,31	$7.971.707,31	14/06/2022	**TERMINADA**	14/06/2022	20/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	4	45	B-C-SM-MZ66-VE-069	100%	Adecuacion	$6.509.744,54	$6.509.744,54	14/06/2022	**TERMINADA**	14/06/2022	20/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	4	46	B-C-SM-MZ75-VE-071	100%	Adecuacion	$7.170.024,86	$7.170.024,86	14/06/2022	**TERMINADA**	14/06/2022	20/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	4	47	B-C-SM-MZ75-VE-072	70%	Caseta T3	$8.040.278,46	$5.628.194,92	14/06/2022	**EN EJECUCION**	14/06/2022	20/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	4	48	B-C-SM-MZ75-VE-073	70%	Caseta T4	$8.332.036,11	$5.832.425,28	14/06/2022	**EN EJECUCION**	14/06/2022	20/06/2022	5	**6**	**-1**		**X**
SM	4	49	B-C-SM-MZ75-VE-074	70%	Caseta T5	$7.656.034,05	$5.359.223,84	14/06/2022	**EN EJECUCION**	14/06/2022	20/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	4	50	B-C-SM-MZ89-VE-084	45%	Caseta T6	$8.247.304,21	$3.711.286,89	14/06/2022	**EN EJECUCION**	14/06/2022	20/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	5	51	B-C-SM-MZ145-VE-053	45%	Caseta T3	$8.262.443,76	$3.718.099,69	21/06/2022	**EN EJECUCION**	21/06/2022	27/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	5	52	B-C-SM-MZ69-VE-087	45%	Adecuacion	$7.074.492,71	$3.183.521,72	21/06/2022	**EN EJECUCION**	21/06/2022	27/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	5	53	B-C-SM-MZ69-VE-088	45%	Adecuacion	$7.465.862,82	$3.359.638,27	21/06/2022	**EN EJECUCION**	21/06/2022	27/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	5	54	B-C-SM-MZ66-VE-131	45%	Caseta T3	$8.139.325,77	$3.662.696,60	21/06/2022	**EN EJECUCION**	21/06/2022	27/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	5	55	B-C-SM-MZ56-VE-136	45%	Adecuacion	$7.922.709,35	$3.565.219,21	21/06/2022	**EN EJECUCION**	21/06/2022	27/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	5	56	B-C-SM-MZ56-VE-138	45%	Adecuacion	$7.984.245,73	$3.592.910,58	21/06/2022	**EN EJECUCION**	21/06/2022	27/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	5	57	B-C-SM-MZ56-VE-139	45%	Caseta T3	$7.415.285,53	$3.336.878,49	21/06/2022	**EN EJECUCION**	21/06/2022	27/06/2022	0	**6**	**-6**		**X**
SM	5	58	B-C-SM-MZ56-VE-140	10%	Caseta T3	$8.097.289,18	$809.728,92	22/06/2022	**EN EJECUCION**	21/06/2022	27/06/2022	0	**5**	**-5**		**X**
SM	5	59	B-C-SM-MZ89-VE-149	10%	Caseta T3	$8.178.886,20	$817.888,62	23/06/2022	**EN EJECUCION**	21/06/2022	27/06/2022	0	**4**	**-4**		**X**
SM	5	60	B-C-SM-MZ89-VE-150	10%	Caseta T3	$8.339.015,83	$833.901,58	24/06/2022	**EN EJECUCION**	21/06/2022	27/06/2022	0	**3**	**-3**		**X**
SM	5	61	B-C-SM-MZ56-VE-152	10%	Caseta T2	$8.292.567,48	$829.256,75	25/06/2022	**EN EJECUCION**	21/06/2022	27/06/2022	5	**2**	**3**		**X**
SM	5	62	B-C-SM-MZ75-VE-156	10%	Adecuacion	$8.011.976,60	$801.197,66	26/06/2022	**EN EJECUCION**	21/06/2022	27/06/2022	0	**1**	**-1**		**X**
SM	5	63	B-C-SM-MZ75-VE-158	10%	Adecuacion	$6.846.229,60	$684.622,96	27/06/2022	**EN EJECUCION**	21/06/2022	27/06/2022	0	**0**	**0**		**X**
SM	5	64	B-C-SM-MZ84-VE-165	10%	Caseta T3	$8.259.418,86	$825.941,89	28/06/2022	**EN EJECUCION**	21/06/2022	27/06/2022	0	**-1**	**1**		**X**
SM	5	65	B-C-SM-MZ84-VE-166	10%	Adecuacion	$6.744.749,39	$674.474,94	29/06/2022	**EN EJECUCION**	21/06/2022	27/06/2022	0	**-2**	**2**		**X**
SM	5	66	B-C-SM-MZ92-VE-168	10%	Adecuacion	$6.476.015,92	$647.601,59	30/06/2022	**EN EJECUCION**	21/06/2022	27/06/2022	0	**-3**	**3**		**X**
SM																
SM																
SM																

CUADRO DE PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PROGRAMAS Y EJECUTADAS

PROGRAMADAS

Fechas de Corte		Actividad 1		Actividad 2			Actividad 3			Actividad 4		Total	
			$ 5.140.026,35			$ 39.313.349,11			$ 1.727.254.570,53		$ -		$ 1.771.707.945,99
											$ -		$ -
			$ 5.140.026,35			$ 39.313.349,11			$ 1.727.254.570,53		$ -		$ 1.771.707.945,99
	Semana 0	0,00%	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		$ -	**0,00%**	**$ -**
2/05/2022	**Semana 1**	100,00%	$ 5.140.026,35	5,07%	11	$ 1.992.842,58	0,00%	0	$ -		$ -	**0,40%**	**$ 7.132.868,93**
9/05/2022	**Semana 2**	100,00%	$ 5.140.026,35	10,14%	22	$ 3.985.685,16	0,00%	0	$ -		$ -	**0,52%**	**$ 9.125.711,51**
16/05/2022	**Semana 3**	100,00%	$ 5.140.026,35	15,21%	33	$ 5.978.527,74	0,00%	0	$ -		$ -	**0,63%**	**$ 11.118.554,09**
23/05/2022	**Semana 4**	100,00%	$ 5.140.026,35	20,28%	44	$ 7.971.370,33	0,92%	2	$ 15.919.396,96		$ -	**1,64%**	**$ 29.030.793,64**
30/05/2022	**Semana 5**	100,00%	$ 5.140.026,35	25,35%	55	$ 9.964.212,91	1,84%	4	$ 31.838.793,93		$ -	**2,65%**	**$ 46.943.033,18**
6/06/2022	**Semana 6**	100,00%	$ 5.140.026,35	30,41%	66	$ 11.957.055,49	2,30%	5	$ 39.798.492,41		$ -	**3,21%**	**$ 56.895.574,25**
13/06/2022	**Semana 7**	100,00%	$ 5.140.026,35	35,48%	77	$ 13.949.898,07	2,76%	6	$ 47.758.190,89		$ -	**3,77%**	**$ 66.848.115,31**
20/06/2022	**Semana 8**	100,00%	$ 5.140.026,35	40,09%	87	$ 15.761.573,15	4,15%	9	$ 71.637.286,34		$ -	**5,22%**	**$ 92.538.885,83**
27/06/2022	**Semana 9**	100,00%	$ 5.140.026,35	44,70%	97	$ 17.573.248,22	5,07%	11	$ 87.556.683,30		$ -	**6,22%**	**$ 110.269.957,87**
4/07/2022	**Semana 10**	100,00%	$ 5.140.026,35	58,53%	127	$ 23.008.273,44	11,06%	24	$ 191.032.763,56		$ -	**12,37%**	**$ 219.181.063,35**
11/07/2022	**Semana 11**	100,00%	$ 5.140.026,35	72,35%	157	$ 28.443.298,66	17,05%	37	$ 294.508.843,82		$ -	**18,52%**	**$ 328.092.168,84**
18/07/2022	**Semana 12**	100,00%	$ 5.140.026,35	86,18%	187	$ 33.878.323,89	23,04%	50	$ 397.984.924,09		$ -	**24,67%**	**$ 437.003.274,32**
25/07/2022	**Semana 13**	100,00%	$ 5.140.026,35	92,00%	**200**	**$ 36.168.281,18**	**27,65%**	**60**	**$ 477.581.908,90**	**54%**	$ -	**29,29%**	**$ 518.890.216,43**
1/08/2022	**Semana 14**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	32,26%	70	$ 557.178.893,72	63%	$ -	**33,96%**	**$ 601.632.269,18**
8/08/2022	**Semana 15**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	39,63%	86	$ 684.534.069,43	67%	$ -	**41,15%**	**$ 728.987.444,89**
15/08/2022	**Semana 16**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	47,00%	102	$ 811.889.245,13	72%	$ -	**48,33%**	**$ 856.342.620,59**
22/08/2022	**Semana 17**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	54,84%	119	$ 947.204.119,32	87%	$ -	**55,97%**	**$ 991.657.494,78**
29/08/2022	**Semana 18**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	64,98%	141	$ 1.122.317.485,92	81%	$ -	**65,86%**	**$ 1.166.770.861,38**
5/09/2022	**Semana 19**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	75,12%	163	$ 1.297.430.852,52	86%	$ -	**75,74%**	**$ 1.341.884.227,98**
12/09/2022	**Semana 20**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	85,25%	185	$ 1.472.544.219,12	90%	$ -	**85,62%**	**$ 1.516.997.594,58**
19/09/2022	**Semana 21**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	95,39%	207	$ 1.647.657.585,71	99%	$ -	**95,51%**	**$ 1.692.110.961,17**
26/09/2022	**Semana 22**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	100,00%	217	$ 1.727.254.570,53	100%	$ -	**100,00%**	**$ 1.771.707.945,99**

EJECUTADO

Fechas de Corte		Actividad 1		Actividad 2			Actividad 3			Actividad 4		Total	
			$ 5.140.026,35			$ 39.313.349,11			$ 1.727.254.570,53		$ -		$ 1.771.707.945,99
											$ -		$ -
			$ 5.140.026,35			$ 39.313.349,11			$ 1.727.254.570,53		$ -		$ 1.771.707.945,99
	Semana 0	0,00%	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		$ -	**0,00%**	**$ -**
2/05/2022	**Semana 1**	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,15%**	**$ 2.570.013,18**
9/05/2022	**Semana 2**	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,15%**	**$ 2.570.013,18**
16/05/2022	**Semana 3**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
23/05/2022	**Semana 4**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
30/05/2022	**Semana 5**	100,00%	$ 5.140.026,35	11,06%	24	$ 4.348.020,18	1,38%	3	$ 22.883.102,57		$ -	**1,83%**	**$ 32.371.149,10**
6/06/2022	**Semana 6**	100,00%	$ 5.140.026,35	24,88%	30	$ 9.783.045,40	1,38%	6	$ 22.883.102,57		$ -	**2,13%**	**$ 37.806.174,32**
13/06/2022	**Semana 7**	100,00%	$ 5.140.026,35	44,24%	42	$ 17.392.080,71	1,84%	10	$ 30.510.803,42		$ -	**2,99%**	**$ 53.042.910,49**
20/06/2022	**Semana 8**	100,00%	$ 5.140.026,35	67,74%	51	$ 26.631.623,59	1,84%	14	$ 30.510.803,42		$ -	**3,52%**	**$ 62.282.453,36**
27/06/2022	**Semana 9**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,46%	71	$ 39.494.516,62	1,84%	18	$ 30.510.803,42		$ -	**4,24%**	**$ 75.145.346,39**
4/07/2022	**Semana 10**	100,00%	$ 5.140.026,35	143,78%	94	$ 56.524.262,31	1,84%	22	$ 30.510.803,42		$ -	**5,20%**	**$ 92.175.092,09**
11/07/2022	**Semana 11**	100,00%	$ 5.140.026,35	196,77%	115	$ 77.358.525,67	1,84%	26	$ 30.510.803,42		$ -	**6,38%**	**$ 113.009.355,44**
18/07/2022	**Semana 12**	100,00%	$ 5.140.026,35	261,75%	141	$ 102.903.144,21	1,84%	30	$ 30.510.803,42		$ -	**7,82%**	**$ 138.553.973,99**
25/07/2022	**Semana 13**	**100,00%**	**$ 5.140.026,35**	**326,73%**	**141**	**$ 128.447.762,76**	**6,91%**	**45**	**$ 114.415.512,84**		$ -	**14,00%**	**$ 248.003.301,95**
1/08/2022	**Semana 14**	100,00%	$ 5.140.026,35	326,73%		$ 128.447.762,76	0,00%	0	$ -		$ -	**7,54%**	**$ 133.587.789,11**
8/08/2022	**Semana 15**	100,00%	$ 5.140.026,35	326,73%		$ 128.447.762,76	0,00%	0	$ -		$ -	**7,54%**	**$ 133.587.789,11**
15/08/2022	**Semana 16**	100,00%	$ 5.140.026,35	326,73%		$ 128.447.762,76	0,00%	0	$ -		$ -	**7,54%**	**$ 133.587.789,11**
22/08/2022	**Semana 17**	100,00%	$ 5.140.026,35	326,73%		$ 128.447.762,76	0,00%	0	$ -		$ -	**7,54%**	**$ 133.587.789,11**
29/08/2022	**Semana 18**	100,00%	$ 5.140.026,35	326,73%		$ 128.447.762,76	0,00%	0	$ -		$ -	**7,54%**	**$ 133.587.789,11**
5/09/2022	**Semana 19**	100,00%	$ 5.140.026,35	326,73%		$ 128.447.762,76	0,00%	0	$ -		$ -	**7,54%**	**$ 133.587.789,11**
12/09/2022	**Semana 20**	100,00%	$ 5.140.026,35	326,73%		$ 128.447.762,76	0,00%	0	$ -		$ -	**7,54%**	**$ 133.587.789,11**
19/09/2022	**Semana 21**	100,00%	$ 5.140.026,35	326,73%		$ 128.447.762,76	0,00%	0	$ 1.727.254.570,53		$ -	**100,00%**	**$ 1.771.707.945,99**
26/09/2022	**Semana 22**												

INFORME SEMANAL 14

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 14	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 014

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **25/07/2022** al **31/07/2022** | Fecha **31/07/2022**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO PROYECTO	
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** BOLIVAR — **MUNICIPIO** CORDOBA
GERENCIA A CARGO	ENTERRITORIO
SUPERVISOR	KAROL YULIETH JAVELA PEREZ
ESTADO DEL PROYECTO	EN EJECUCIÓN ACTIVIDAD 1, 2 Y 3

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2220576
Contratista	CONSORCIO CONSTRUREDES
Valor inicial	$ 1.771.707.945,99
Valor actual	$ 1.771.707.945,99
Variación del valor	$ -
Fecha de Inicio	26/04/2022
Plazo inicial (Días)	150 Días
Plazo actual (Días)	150 Días — 5 MESES - 150 DIAS
Variación en plazo	Días
Fecha Contractual de terminación	26/09/2022
Tiempo Transcurrido (días)	96 — 64,00%
Días remanentes del Contrato	57,00 — 38,00%
Acumulado a última acta pagada	
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ 342.523.433,94

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.	2220587
Interventor	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS.
Valor inicial	$ 202.479.313,00
Valor actual	$ 202.479.313,00
Variación del valor	$ -
Fecha de Inicio	26/04/2022
Plazo inicial	150 Días
Plazo actual	150 Días — 5 MESES - 150 DIAS
Variación en plazo	Días
Fecha Contractual de terminación	26/09/2022
Ejecución del Contrato	96 — 64,00%
Días remanentes del Contrato	57,00 — 38,00%
Acumulado a última acta pagada	$ 16.198.345,05
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ 16.198.345,05

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPENO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 1.771.707.945,99

Semáforo

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 501.441.765,60	28,30%	$ 399.929.354,82	22,57%	-$ 101.512.410,78	-5,73%
Durante el Periodo	$ 124.069.598,90	7,00%	$ 66.026.074,63	3,73%	-$ 58.043.524,27	-3,28%
Acumulado a la Fecha	**$ 625.511.364,50**	**35,31%**	**$ 465.955.429,45**	**26,30%**	**-$ 159.555.935,05**	**-9,01%**


Desviación en días: 14 Días




Observaciones al desempeño del proyecto:

De acuerdo a la reprogramación de obra el programado nos indica un 35,31% frente a un ejecutado del 26,30% indicándonos un atraso de 9,01%
De acuerdo a la reprogramación de obra se debería tener un total de 217 diagnósticos aprobados a la fecha, durante la semana del presente informe se aprobaron 19 diagnósticos, completando 160 avalados, lo cual nos indica un atraso de 57 diagnósticos.
En cuanto a la actividad 3 el contratista de acuerdo a la reprogramación de obra debería tener 70 viviendas terminadas, sin embargo, a la fecha se tienen 68 viviendas intervenidas, de las cuales se han terminado 48 y se adelantan labores constructivas en 20 más, el contratista cuenta con 14 frentes de trabajo.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

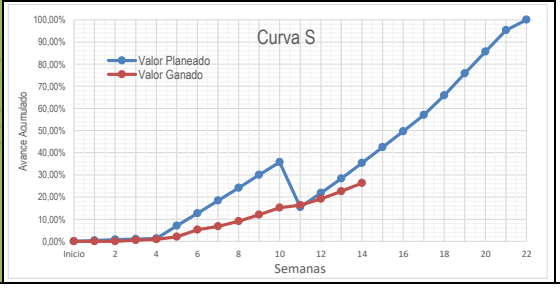




CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

A la fecha del presente informe no se han presntado cambios en la LINEA BASE.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	28,30%	22,57%	-5,73%	
Durante el Periodo	7,00%	3,73%	-3,27%	
Acumulado a la Fecha	**35,31%**	**26,30%**	**-9,01%**	

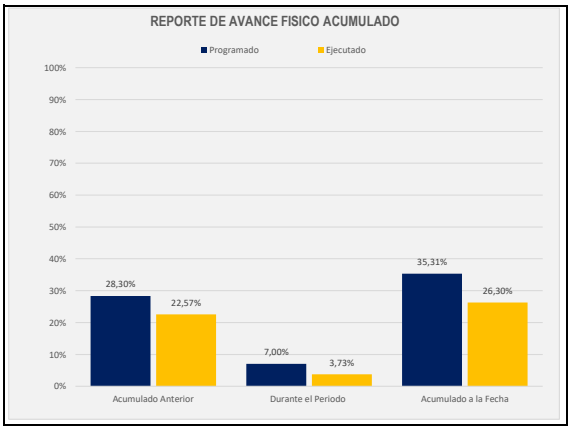

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 1.771.707.945,99	$ 1.771.707.945,99	$ -	$ 345.450.914,11		$ 345.450.914,11

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
		0,00%			0,00%		







AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 202.479.313,00	$ 202.479.313,00	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
2	$ 16.198.345,05	8,00%	1	$ 16.198.345,05	8,00%	$ 16.198.345,05	$ 16.198.346,05







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 014

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **25/07/2022** al **31/07/2022** Fecha **31/07/2022**

ACTIVIDAD No. 1
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: Actividad No. 1, la aprobación de la actividad N° 1 se hizo comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-037-22 del 3 de junio de 2022. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
ACTIVIDAD No. 2
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 73,73%
Comentario: La Actividad No. 2, De acuerdo a la reprogramación de obra este ítems debería estas con la totalidad de los diagnósticos terminados, durante la semana del presente informe se hicieron 19 aprobaciones de diagnósticos, completando 160, lo cual nos indica un atraso del 26,27% según la reprogramación de obra, equivalentes a 57 diagnósticos pendientes, el contratista debe incrementar los esfuerzos y alcanzar las metas trazadas en la reprogramación de obra, que a la fecha de corte del presente informe es de 217 viviendas aprobadas.
ACTIVIDAD No. 3
PROGRAMADO 33,64% vs 25% EJECUTADO
Comentario: La Actividad No. 3 nos indica un atraso de 8,64%, de acuerdo a la reprogramación de obra debería tener 70 viviendas terminadas, sin embargo, ha intervenido 68 viviendas de las cuales solo 48 están terminadas y se adelantan trabajos constructivos en otras 20 más, el contratista cuenta con 14 cuadrillas de trabajo.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

En el ítem ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10. El contratista subsanó los diseños de las casetas y el diseño de la estructura para el tanque elevado, también realizó entrega del informe técnico especialista estructural el cual fue aprobado por la interventoría con lo cual esta actividad queda en un 100% de su ejecución. Sin embargo, el Contratista posteriormente solicitó un cambio de especificaciones en algunos ítems, uno de ellos el ladrillo de arcilla por bloque de Concreto, razón por la cual se hace necesario ajustar el diseño estructural con dicho cambio. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
El ítem ACTIVIDAD 2: DIAGNOSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. Esta actividad avanza con el diligenciamiento de los diagnósticos de los cuales ya se sometieron a comité de aprobación 160 diagnósticos, los cuales fueron avalados por la interventoría, la próxima semana el contratista debe presentar la totalidad de los diagnósticos pendientes para completar la meta de los 217, ya que conforme a la reprogramación la etapa de diagnósticos finaliza en la semana 14.
En el ítem ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS. ACTA DE ENTREGA Y RECIBOS DE LAS OBRAS
A la fecha y de acuerdo la reprogramación de obra el contratista debería tener 70 viviendas terminadas, sin embargo, se han intervenido 68 viviendas, de las cuales solo 48 están terminadas indicándonos un atraso de 20, estás intervenciones avanzan en su proceso constructivo. A esto se suma que para la siguiente semana se debería tener terminadas 86 viviendas, es decir, el contratista debe redoblar esfuerzos e incrementar frentes de trabajo para reducir el atraso, tal como se solicitó en el pasado comité de seguimiento.
En las casetas tipo 3 se ha avanzado en actividades como: cimentación, mampostería, fundición de columnas y columnetas, pañetes, instalación de tubería hidrosanitaria, instalación de aparatos sanitarios, instalación de tejas para cubierta, instalación de puertas metálicas, instalación de tanque elevado de 500 Lts, de igual forma se adelantan labores en intervenciones correspondientes a adecuaciones, construcción de estructura para el tanque elevado, cambio de pañete, instalación de enchape de pared y pisos y cambio de equipos sanitarios, para estas actividades el contratista cuenta con 14 frentes de trabajo.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Para la próxima semana correspondiente al periodo del 01 al 07 de agosto 2022 y de acuerdo la reprogramación de obra la actividad 2, que corresponde al ítem de diagnósticos se tiene programado que el contratista presente 57 diagnósticos más, para completar 217 diagnósticos, esta actividad debió estar al 100% a corte del 31 de julio 2022.
El contratista en la actividad 3 debe continuar con la ejecución de obra completando la intervención de 86 viviendas 100% de acuerdo a la reprogramación de obra.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTIÓN SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0

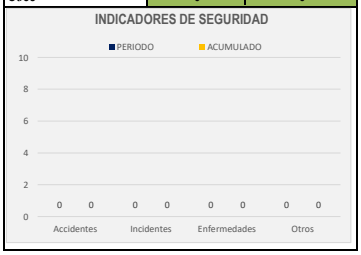

Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	11	9	20	74,1%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	7	0	7	25,9%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál?	0	0	0	0,0%
	Total	**18**	**9**	**27**	**100,00%**



OBSERVACIONES

En el presente periodo se presentaron lluvias terrenciales los días 26, 28 y 30 de Julio 2022 (se anexan reportes climaticos)

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 14	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 014

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **25/07/2022** al **31/07/2022** Fecha **31/07/2022**

GESTIÓN SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
	25/07/2022	CASA DE LA CULTURA	7	Acompañamiento del comité veedor para el proximo recorrido de obra.	CONTRATISTA	

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
INCLUSION 105	Carlos Alberto madarriaga Florez	26/07/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 106	Carmen Cecilia Arrieta Castillo	29/07/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA

7. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA










CASETA TIPO 3, SE APRECIA AVANCE EN EL PAÑETE DE MAMPOSTERIA, FUNDICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS.








ADECUACIONES DE UNIDADES SANITARIAS, SE APRECIA INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, LAVAPLATOS Y LAVADEROS






INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 014

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **25/07/2022** al **31/07/2022** Fecha **31/07/2022**









CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO-

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 14	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 014

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **25/07/2022** al **31/07/2022** Fecha **31/07/2022**

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-041-22 a la empresa Coopsecor Ltda. Mediante la cual se solicitó certificado de disponibilidad de redes y de autorización para la Intervención de conexión de las acometidas domiciliarias de acueducto y alcantarillado para cuarenta y siete (47) diagnósticos en el Barrio San Martín.

La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-042-22 al contratista Consorcio Construredes con el Tema: RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_070 - APROBACION DE DIAGNOSTICOS. Por medio del presente se realizamos entrega de aval para 14 diagnósticos presentados en comité de aprobación No. 011 los cuales corresponden a los códigos:

B-C-SM-MZ21-VE-118, B-C-SM-MZ66-VE-132, B-C-SM-MZ67-VE-133, B-C-SM-MZ145-VE-157, B-C-SM-MZ-VE145-160, B-C-SM-MZ-VE145-162, B-C-SM-MZ145-VE-184, B-C-SM-MZ59-VE-187, B-C-SM-MZ87-VE-189, B-C-SM-MZ56-VE-190, B-C-SM-MZ33-VE-196, B-C-SM-MZ92-VE-203,B-C-SM-MZ34-VE-209 y B-C-SM-MZ34-VE-210

La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-043-22 a la alcaldía municipal con el tema SOLICITUD DE INCLUSIONES, mediante el cual se remite para su debido tramite Diez (10) solicitudes de inclusión teniendo en cuenta el PROTOCOLO PARA LA INCLUSION DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS AL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, del cual, ya se ha dado los trámites correspondientes por el Contratista.

La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-044-22 al contratista Consorcio Construredes con el Tema: RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_073 - APROBACION DE DIAGNOSTICOS. Por medio del presente se realizamos entrega de aval para 19 diagnósticos presentados en comité de aprobación No. 012 los cuales corresponden a los códigos:

B-C-SM-MZ45-VE-033, B-C-SM-MZ55-VE-036, B-C-SM-MZ-VE-058, B-C-SM-MZ-VE-059, B-C-SM-MZ-VE-076, B-C-SM-MZ-VE-082, B-C-SM-MZ69-VE-086, B-C-SM-MZ-VE-089, B-C-SM-MZ-VE-091, B-C-SM-MZ-VE-092, B-C-SM-MZ-VE-093, B-C-SM-MZ-VE-096, B-C-SM-MZ34-VE-119, B-C-SM-MZ30-VE-123, B-C-SM-MZ-VE-137, B-C-SM-MZ-VE-164, B-C-SM-MZ-VE-173, B-C-SM-MZ-VE-198 y el B-C-SM-MZ-VE-216.

Marcy A. Correa C			
Firma		**Firma**	
Nombre	Marcy Correa castaño	Nombre	Karol Yulieth Javela Pérez
	Directora de la interventoría	Supervisor	Supervisor ENTerritorio

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría

Enviar Informe para validación

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022-n	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA	FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-015	2-jun-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	24	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	2-jun-22	SI	3-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-023	15-jun-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	27	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	15-jun-22	**NO**	
ARCA-INT/FDA276-TEC-034	2-jul-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	29	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	2-jul-22	**NO**	
ARCA-INT/FDA276-TEC-041	13-jul-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	47	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	13-jul-22	**NO**	

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022-n	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA	FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-021	13-jun-22	SOLICITUD RESPUESTA AL CONCEPTO EMITIDO POR COOSEPCOR MEDIANTE ACTA DE REUNION DE OBRA	1	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	13-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta
ARCA-INT/FDA276-TEC-029	21-jun-22	OBRA REQUERIA EN LA VIA PUBLICA PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE LAS VIVIENDAS 001, 085, 088, 163	4	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	21-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA						
CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022-n	**FECHA**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO A**	**ENTIDAD**	**FECHA DE RADICADO**	**RESPUESTA RECIBIDA**	**FECHA DE RESPUESTA**
ARCA-INT/FDA276-TEC-025	15-jun-22	SOLICITUD ESPECIFICACIÓN TECNICA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	15-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022-n	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A		ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA		FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-013	2-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	**11**	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	2-jun-22	SI	SI	13-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-019	9-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	22	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	9-jun-22	SI	SI	14-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-026	16-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	18	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	14-jun-22	SI	SI	11-jul-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-032	28-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	13	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	28-jun-22	SI	SI	11-jul-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-039	8-jul-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	29	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	8-jul-22	SI	SI	13-jul-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-043	26-jul-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	10	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	26-jul-22	NO	NO	

INFORME PCI

Fecha de Corte	31/07/2022	PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS																										
Priorización		MATRIZ BASE						INCLUSIONES													TOTALES								
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No.2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Solicitudes de Inclusion	Atendida de la ESP	Atendida por la Alcaldia	Pendientes por atender ESP	Pendientes por atender Alcaldia	Respuesta positiva	Respuesta negativa	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Visitadas	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Recibidas a satisfaccion	Viviendas En ejecución.	Viviendas Programadas actividad No.3
Cordoba Bolivar	San Martin	217	0	206	10	160	1	105	93	93	0	0	64	29	0	0	0	0	217	206	10	160	1	68	48	0	20	0
	TOTAL	**217**	**0**	**206**	**10**	**160**	**1**	**105**	**93**	**93**	**0**	**0**	**64**	**29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**217**	**206**	**10**	**160**	**1**	**68**	**48**	**0**	**20**	**0**

INFORME ESTADO DE COVID-19

enterritorio	**INFORME ESTADO DE COVID - 19**	CÓDIGO:	**F-GG-10**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25/07/2022 Y EL 31/07/2022 PLAZO: 5 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. CONTRATO No. 2220587

PERSONAL DEL CONTRATISTA

	MES: JUNIO			SEMANA:4					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	OBSERVACIONES
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
DUARTE PINEDO - DIRECTOR DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD BLANCO - RESIDENTE DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RAFAEL CASTILLO - RESIDENTE SST	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
NORELIS ANAYA - TRABAJADORA SOCIAL	**ASTRAZENIKA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
OSWALDO GARZÓN - PROFESIONAL DIAGNOSTICO	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
SINDY ESCOBAR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**SINOVAC**		F	NO	NO	NO	SI	SI	

PERSONAL INTERVENTORIA

	MES: JUNIO			SEMANA:4					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	**OBSERVACIONES**
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
MARCY CORREA - DIRECTOR INTERVENTORIA	**PFIZER**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD ARIETA - RESIDENTE INTERVENTORIA	**PFIZER**	**MODERNA**	M	NO	NO	NO	SI	SI	
DIAMYS SANCHEZ PORTILLO - INSPECTORA DE INTERVENTORIA	**PFIZER**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
FERNANDA GRIJALBA - PROFESIONAL SOCIAL	**MODERNA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
YIRA LEMUS - PROFESIONAL HSEQ	**AZTRAZENECA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
LEYDIS HERRERA - AUXILIAR SOCIAL	**JONSSON**	**JONSSON**	F	NO	NO	NO	SI	SI	

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Marcy A. Correa C

Firma:

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

REPORTE Y EJECUCIÒN DE VIVIENDAS SEMANALES

enterritorio	**INFORME ESTADO DE COVID - 19**	CÓDIGO:	**F-GG-10**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25/07/2022 Y EL 31/07/2022 PLAZO: 5 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. CONTRATO No. 2220587

PERSONAL DEL CONTRATISTA

	MES: JUNIO			SEMANA:4					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	OBSERVACIONES
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
DUARTE PINEDO - DIRECTOR DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD BLANCO - RESIDENTE DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RAFAEL CASTILLO - RESIDENTE SST	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
NORELIS ANAYA - TRABAJADORA SOCIAL	**ASTRAZENIKA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
OSWALDO GARZÓN - PROFESIONAL DIAGNOSTICO	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
SINDY ESCOBAR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**SINOVAC**		F	NO	NO	NO	SI	SI	

PERSONAL INTERVENTORIA

	MES: JUNIO			SEMANA:4					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	**OBSERVACIONES**
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
MARCY CORREA - DIRECTOR INTERVENTORIA	**PFIZER**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD ARIETA - RESIDENTE INTERVENTORIA	**PFIZER**	**MODERNA**	M	NO	NO	NO	SI	SI	
DIAMYS SANCHEZ PORTILLO - INSPECTORA DE INTERVENTORIA	**PFIZER**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
FERNANDA GRIJALBA - PROFESIONAL SOCIAL	**MODERNA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
YIRA LEMUS - PROFESIONAL HSEQ	**AZTRAZENECA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
LEYDIS HERRERA - AUXILIAR SOCIAL	**JONSSON**	**JONSSON**	F	NO	NO	NO	SI	SI	

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Marcy A. Correa C

Firma:

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CUADRO DE PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PROGRAMAS Y EJECUTADAS

Ejecución de Actividad en Viviendas al Programa Conexiones Intradomiciliarias con corte a 31/07/2022

BARRIO	ACTA	No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización	Número de días Máximo permitido según tipo de intervención	Número de Dias de la Intervencion por parte del Contratista	Dias de cumplimiento o incumplimiento según tipo de intervención (-) atraso y (+) avance	¿SE ENCUENTRA RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR INTERVENTORÍA?	
															SI (X)	NO (X)
SM	1	1	B-C-SM-MZ29-VE-001		Adecuacion	$7.967.801,13	$0,00			0/01/1900	5/01/1900	0	5	-5		x
SM	1	2	B-C-SM-MZ32-VE-002	100%	Caseta T3	$8.126.190,79	$8.126.190,79	2/06/2022	TERMINADA	2/06/2022	10/06/2022	0	8	-8		x
SM	1	3	B-C-SM-MZ32-VE-003	100%	Caseta T3	$7.914.431,13	$7.914.431,13	4/06/2022	TERMINADA	4/06/2022	12/06/2022	0	8	-8		x
SM	1	4	B-C-SM-MZ18-VE-004	100%	Adecuacion	$7.636.382,30	$7.636.382,30	4/06/2022	TERMINADA	4/06/2022	8/06/2022	0	4	-4		x
SM	1	5	B-C-SM-MZ22-VE-005	100%	Adecuacion	$7.148.052,07	$7.148.052,07	4/06/2022	TERMINADA	4/06/2022	7/06/2022	0	3	-3		x
SM	1	6	B-C-SM-MZ34-VE-006	100%	Adecuacion	$7.826.891,21	$7.826.891,21	4/06/2022	TERMINADA	4/06/2022	8/06/2022	0	4	-4		x
SM	1	7	B-C-SM-MZ22-VE-007	100%	Adecuacion	$7.415.092,49	$7.415.092,49	4/06/2022	TERMINADA	4/06/2022	9/06/2022	0	5	-5		x
SM	1	8	B-C-SM-MZ22-VE-009	100%	Caseta T3	$7.908.010,60	$7.908.010,60	4/06/2022	TERMINADA	4/06/2022	8/06/2022	0	4	-4		x
SM	1	9	B-C-SM-MZ21-VE-010	100%	Caseta T3	$8.928.931,81	$8.928.931,81	4/06/2022	TERMINADA	4/06/2022	9/06/2022	0	5	-5		x
SM	1	10	B-C-SM-MZ22-VE-011	100%	Adecuacion	$8.088.174,13	$8.088.174,13	8/06/2022	TERMINADA	8/06/2022	16/06/2022	0	8	-8		x
SM	1	11	B-C-SM-MZ34-VE-012	100%	Caseta T3	$9.305.276,37	$9.305.276,37	4/06/2022	TERMINADA	4/06/2022	9/06/2022	0	5	-5		x
SM	1	12	B-C-SM-MZ21-VE-013	100%	Adecuacion	$5.457.782,54	$5.457.782,54	2/06/2022	TERMINADA	2/06/2022	6/06/2022	0	4	-4		x
SM	1	13	B-C-SM-MZ21-VE-014	100%	Caseta T3	$8.614.149,98	$8.614.149,98	4/06/2022	TERMINADA	4/06/2022	10/06/2022	0	6	-6		x
SM	1	14	B-C-SM-MZ21-VE-015	100%	Caseta T3	$8.265.079,43	$8.265.079,43	2/06/2022	TERMINADA	2/06/2022	7/06/2022	0	5	-5		x
SM	1	15	B-C-SM-MZ21-VE-016	100%	Caseta T3	$9.299.320,83	$9.299.320,83	2/06/2022	TERMINADA	2/06/2022	8/06/2022	0	6	-6		x
SM	1	16	B-C-SM-MZ38-VE-017	100%	Caseta T3	$8.532.396,85	$8.532.396,85	2/06/2022	TERMINADA	2/06/2022	7/06/2022	0	5	-5		x
SM	2	17	B-C-SM-MZ24-VE-018	100%	Caseta T3	$8.502.042,22	$8.502.042,22	5/06/2022	TERMINADA	5/06/2022	9/06/2022	0	4	-4		x
SM	1	18	B-C-SM-MZ24-VE-019	100%	Adecuacion	$6.921.383,30	$6.921.383,30	5/06/2022	TERMINADA	5/06/2022	10/06/2022	0	5	-5		x
SM	1	19	B-C-SM-MZ24-VE-020	100%	Adecuacion	$4.593.449,33	$4.593.449,33	5/06/2022	TERMINADA	5/06/2022	13/06/2022	0	8	-8		x
SM	2	20	B-C-SM-MZ85-VE-021	100%	Caseta T3	$8.614.688,02	$8.614.688,02	5/06/2022	TERMINADA	5/06/2022	14/06/2022	0	9	-9		x
SM	2	21	B-C-SM-MZ85-VE-022	100%	Caseta T3	$8.896.124,14	$8.896.124,14	5/06/2022	TERMINADA	5/06/2022	9/06/2022	0	4	-4		x
SM	1	22	B-C-SM-MZ85-VE-023	100%	Adecuacion	$8.133.478,61	$8.133.478,61	5/06/2022	TERMINADA	5/06/2022	10/06/2022	0	5	-5		x
SM	1	23	B-C-SM-MZ29-VE-024	100%	Adecuacion	$7.072.986,22	$7.072.986,22	5/06/2022	TERMINADA	5/06/2022	10/06/2022	0	5	-5		x
SM	2	24	B-C-SM-MZ31-VE-025	100%	Caseta T3	$8.637.204,11	$8.637.204,11	5/06/2022	TERMINADA	5/06/2022	9/06/2022	0	4	-4		x
SM	1	25	B-C-SM-MZ31-VE-026	100%	Adecuacion	$5.113.367,92	$5.113.367,92	5/06/2022	TERMINADA	5/06/2022	14/06/2022	0	9	-9		x
SM	1	26	B-C-SM-MZ31-VE-027	100%	Adecuacion	$4.365.339,96	$4.365.339,96	5/06/2022	TERMINADA	5/06/2022	9/06/2022	0	4	-4		x
SM	2	27	B-C-SM-MZ31-VE-028	100%	Adecuacion	$7.668.943,15	$7.668.943,15	5/06/2022	TERMINADA	5/06/2022	8/06/2022	0	3	-3		x
SM	2	28	B-C-SM-MZ31-VE-029	100%	Caseta T3	$8.468.136,75	$8.468.136,75	5/06/2022	TERMINADA	5/06/2022	9/06/2022	0	4	-4		x
SM	1	29	B-C-SM-MZ31-VE-030	100%	Adecuacion	$4.637.820,16	$4.637.820,16	5/06/2022	TERMINADA	5/06/2022	11/06/2022	0	6	-6		x
SM	3	30	B-C-SM-MZ31-VE-031	100%	Caseta T2	$8.119.008,44	$8.119.008,44	9/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	15/06/2022	5	6	-1		x
SM	3	31	B-C-SM-MZ56-VE-038	100%	Adecuacion	$8.227.630,94	$8.227.630,94	9/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	15/06/2022	0	6	-6		x
SM	3	32	B-C-SM-MZ56-VE-039	100%	Adecuacion	$1.443.687,77	$1.443.687,77	9/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	15/06/2022	0	6	-6		x
SM	3	33	B-C-SM-MZ46-VE-040	100%	Adecuacion	$6.628.376,66	$6.628.376,66	9/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	15/06/2022	0	6	-6		x
SM	3	34	B-C-SM-MZ45-VE-041	100%	Adecuacion	$4.845.221,48	$4.845.221,48	9/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	15/06/2022	0	6	-6		x
SM	3	35	B-C-SM-MZ21-VE-042	100%	Adecuacion	$4.634.812,47	$4.634.812,47	9/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	15/06/2022	0	6	-6		x
SM	3	36	B-C-SM-MZ31-VE-043	100%	Caseta T3	$6.939.713,07	$6.939.713,07	9/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	15/06/2022	0	6	-6		x
SM	3	37	B-C-SM-MZ145-VE-044	100%	Caseta T3	$7.980.826,25	$7.980.826,25	9/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	15/06/2022	0	6	-6		x
SM	3	38	B-C-SM-MZ55-VE-046	100%	Caseta T3	$7.344.533,10	$7.344.533,10	9/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	15/06/2022	0	6	-6		x
SM	3	39	B-C-SM-MZ55-VE-047	100%	Caseta T2	$7.890.285,26	$7.890.285,26	9/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	15/06/2022	5	6	-1		x
SM	3	40	B-C-SM-MZ145-VE-053	100%	Caseta T3	$8.262.443,76	$8.262.443,76	9/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	15/06/2022	0	6	-6		x
SM	3	41	B-C-SM-MZ91-VE-054	100%	Caseta T2	$8.230.167,20	$8.230.167,20	9/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	15/06/2022	5	6	-1		x
SM	4	42	B-C-SM-MZ56-VE-055	100%	Adecuacion	$3.160.157,78	$3.160.157,78	14/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	0	6	-6		x
SM	4	43	B-C-SM-MZ55-VE-056	100%	Adecuacion	$8.215.661,11	$8.215.661,11	14/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	0	6	-6		x
SM	4	44	B-C-SM-M55-VE-061	100%	Adecuacion	$7.040.722,29	$7.040.722,29	14/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	0	6	-6		x
SM	4	45	B-C-SM-MZ56-VE-062	100%	Caseta T2	$8.362.124,52	$8.362.124,52	14/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	6	-1		x
SM	4	46	B-C-SM-MZ66-VE-067	100%	Caseta T3	$7.306.146,52	$7.306.146,52	14/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	0	6	-6		x
SM	4	47	B-C-SM-MZ66-VE-068	100%	Caseta T3	$7.971.707,31	$7.971.707,31	14/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	0	6	-6		x
SM	4	48	B-C-SM-MZ75-VE-071	100%	Adecuacion	$7.170.024,86	$7.170.024,86	14/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	0	6	-6		x
SM	4	49	B-C-SM-MZ75-VE-072	100%	Caseta T3	$8.040.278,46	$8.040.278,46	14/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	0	6	-6		x
SM	4	50	B-C-SM-MZ75-VE-073	65%	Caseta T3	$8.332.036,11	$5.415.823,47	14/06/2022	EN EJECUCION	14/06/2022	20/06/2022	0	6	-6		x
SM	5	51	B-C-SM-MZ75-VE-074	65%	Caseta T3	$7.656.034,05	$4.976.422,13	21/06/2022	EN EJECUCION	21/06/2022	27/06/2022	0	6	-6		x
SM	5	52	B-C-SM-MZ89-VE-084	65%	Caseta T3	$8.247.304,21	$5.360.747,74	21/06/2022	EN EJECUCION	21/06/2022	27/06/2022	0	6	-6		x
SM	5	53	B-C-SM-MZ69-VE-087	65%	Adecuacion	$7.074.492,71	$4.598.420,26	21/06/2022	EN EJECUCION	21/06/2022	27/06/2022	0	6	-6		x
SM	5	54	B-C-SM-MZ69-VE-O88	65%	Adecuacion	$7.465.862,82	$4.852.810,83	21/06/2022	EN EJECUCION	21/06/2022	27/06/2022	0	6	-6		x
SM	5	55	B-C-SM-MZ77-VE-O94	65%	Adecuacion	$3.585.305,08	$2.330.448,30	21/06/2022	EN EJECUCION	21/06/2022	27/06/2022	0	6	-6		x
SM	5	56	B-C-SM-MZ68-VE-097	65%	Caseta T3	$8.172.428,90	$5.312.078,79	21/06/2022	EN EJECUCION	21/06/2022	27/06/2022	0	6	-6		x
SM	5	57	B-C-SM-MZ59-VE-099	65%	Adecuacion	$6.098.594,42	$3.964.086,37	21/06/2022	EN EJECUCION	21/06/2022	27/06/2022	0	6	-6		x
SM	5	58	B-C-SM-MZ84-VE-166	45%	Adecuacion	$6.744.749,39	$3.035.137,23	22/06/2022	EN EJECUCION	21/06/2022	27/06/2022	0	5	-5		x
SM	5	59	B-C-SM-MZ84-VE-175	45%	Adecuacion	$6.901.938,50	$3.105.872,33	23/06/2022	EN EJECUCION	21/06/2022	27/06/2022	0	4	-4		x
SM	5	60	B-C-SM-MZ55-VE-060	45%	Caseta T4	$9.444.985,92	$4.250.243,66	24/06/2022	EN EJECUCION	21/06/2022	27/06/2022	5	3	2		x
SM	5	61	B-C-SM-MZ66-VE-069	45%	Adecuacion	$6.509.744,54	$2.929.385,04	25/06/2022	EN EJECUCION	21/06/2022	27/06/2022	0	2	-2		x
SM	5	62	B-C-SM-MZ30-VE-032	35%	Adecuacion	$7.557.018,99	$2.644.956,65	26/06/2022	EN EJECUCION	21/06/2022	27/06/2022	0	1	-1		x
SM	5	63	B-C-SM-MZ44-VE-034	35%	Adecuacion	$5.519.347,12	$1.931.771,49	27/06/2022	EN EJECUCION	21/06/2022	27/06/2022	0	0	0		x
SM	5	64	B-C-SM-MZ44-VE-035	35%	Adecuacion	$8.137.626,09	$2.848.169,13	28/06/2022	EN EJECUCION	21/06/2022	27/06/2022	0	-1	1		x
SM	5	65	B-C-SM-MZ69-VE-085	35%	Adecuacion	$6.566.494,56	$2.298.273,10	29/06/2022	EN EJECUCION	21/06/2022	27/06/2022	0	-2	2		x
SM	5	66	B-C-SM-MZ58-VE-100	35%	Caseta T2	$7.970.674,94	$2.789.736,23	30/06/2022	EN EJECUCION	21/06/2022	27/06/2022	5	-3	8		x
SM		67	B-C-SM-MZ47-VE-104	15%	Adecuacion	$8.247.586,36	$1.237.137,95	30/06/2022	EN EJECUCION	22/06/2022	28/06/2022	0	-2	2		x
SM		68	B-C-SM-MZ58-VE-107	15%	Adecuacion	$7.990.185,62	$1.198.527,84	30/06/2022	EN EJECUCION	23/06/2022	29/06/2022	0	-1	1		x
SM		69	B-C-SM-MZ58-VE-110	15%	Adecuacion	$6.954.066,54	$1.043.109,98	30/06/2022	EN EJECUCION	24/06/2022	30/06/2022	0	0	0		x

REPORTE DEL CLIMA

clima Colombia

Descarga la APP

Clima en

Córdoba

jueves 30 de junio, 2022

	Hoy 29 JUN	Mañana 30 JUN	Viernes 01 JUL	Sábado 02 JUL	Domingo 03 JUL	Lunes 04 JUL	Martes 05 JUL
Hora	↑ 30° ↓ 24°	↑ 30° ↓ 24°	↑ 30° ↓ 24°	↑ 30° ↓ 24°	↑ 31° ↓ 24°	↑ 31° ↓ 25°	↑ 30° ↓ 25°
08:00	25°	26°	25°	26°	26°	26°	26°
14:00	30°	30°	30°	30°	31°	31°	30°
20:00	25°	25°	25°	26°	25°	25°	25°
Lluvia	14.1 mm	6.6 mm	5.3 mm	13.8 mm	10.8 mm	4.4 mm	4.9 mm
Viento	13 km/h	12 km/h	10 km/h	10 km/h	10 km/h	13 km/h	8 km/h
	05:43	05:43	05:43	05:44	05:44	05:44	05:44
	18:23	18:23	18:23	18:24	18:24	18:24	18:24

Hora por hora en Córdoba

Predicción para las próximas horas

Hoy:

09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
26°	26°	27°	29°	30°	30°	29°	29°	27°	26°	25°	25°	25°	25°	25°

clima Colombia

Descarga la APP

Clima en

Córdoba

jueves 28 de julio, 2022

	Hoy 27 JUL	Mañana 28 JUL	Viernes 29 JUL	Sábado 30 JUL	Domingo 31 JUL	Lunes 01 AGO	Martes 02 AGO
Hora	↑ 28° ↓ 23°	↑ 30° ↓ 23°	↑ 32° ↓ 24°	↑ 31° ↓ 24°	↑ 29° ↓ 24°	↑ 30° ↓ 24°	↑ 30° ↓ 24°
08:00	25°	25°	27°	26°	26°	26°	25°
14:00	28°	30°	32°	31°	29°	30°	30°
20:00	24°	27°	27°	26°	25°	25°	25°
Lluvia	29.1 mm	1.3 mm	0.6 mm	4.4 mm	2.5 mm	17.8 mm	13.3 mm
Viento	11 km/h	7 km/h	10 km/h	11 km/h	11 km/h	9 km/h	8 km/h
	05:49	05:49	05:49	05:50	05:50	05:50	05:50
	18:23	18:22	18:22	18:22	18:22	18:21	18:21

Hora por hora en Córdoba

Predicción para las próximas horas

Hoy:

09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
26°	27°	28°	28°	28°	28°	28°	28°	26°	25°	24°	24°	24°	24°	24°

clima Colombia

Descarga la APP

Clima en

Córdoba

martes 26 de julio, 2022

	Hoy 25 JUL	Mañana 26 JUL	Miércoles 27 JUL	Jueves 28 JUL	Viernes 29 JUL	Sábado 30 JUL	Domingo 31 JUL
Hora	↑ 30° ↓ 23°	↑ 29° ↓ 23°	↑ 29° ↓ 23°	↑ 29° ↓ 23°	↑ 32° ↓ 24°	↑ 31° ↓ 24°	↑ 29° ↓ 24°
08:00	25°	24°	25°	25°	26°	26°	25°
14:00	30°	29°	29°	29°	32°	31°	29°
20:00	25°	25°	24°	25°	27°	27°	25°
Lluvia	8.7 mm	12.6 mm	14.2 mm	4.2 mm	0.2 mm	1.5 mm	6.8 mm
Viento	↘ 8 km/h	↑ 9 km/h	↑ 9 km/h	↓ 8 km/h	← 9 km/h	← 12 km/h	↑ 11 km/h
	05:49	05:49	05:49	05:49	05:49	05:50	05:50
	18:23	18:23	18:23	18:22	18:22	18:22	18:22

Hora por hora en Córdoba

Predicción para las próximas horas

Hoy:														Mañana:
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00
28°	28°	29°	30°	30°	29°	29°	27°	26°	25°	25°	25°	25°	25°	24°

COMPONENTE HSE DEL PROYECTO

EL SUSCRITO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA DE ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A., CERTIFICA;

Que durante el periodo comprendido del 1 al 31 de julio del 2022, ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A con NIT: 800173768-1, evidencia que el contratista CONSORCIO CONSTRUREDES de acuerdo con las obligaciones del contrato 2220576 con objeto "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓ DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.)., da el cumplimiento normatividad ambiental, se evidencia la implementación del Plan de Manejo Ambiental diseñado para el proyecto, evidenciando la implementación de los programas mediante las fichas de manejo ambiental.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., al primer día (1) días del mes de agosto de 2022.

Marcy Alejandra Correa Castaño
Director de Interventoría
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.

Formato
Control De Licencias Ambientales
IN-FO-53 V:3

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

OBRA: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓ DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

PERMISO	LOCALIZACIÓN	MATERIAL	NO LICENCIA / PERMISO	AUTORIDAD AMBIENTAL	VIGENCIA / LICENCIA / PERMISO
Cantera Triturados y Agregados del Caribe S.A.S Licencia Ambiental	Bosconia Cesar	Por medio de la cual se otorga a A& G Constructores S.A.S. con identificación tributaria N° 900193651-7 Licencia Ambiental Global, para la explotación de un yacimineto de materiales de construcción, en jurisdicción del Municipio de Bosconia Cesar, en desarrollo del contrato de conseción minera KHE -08121 del 24 de noviembre del 2009.	Resolución 743 del 2018	CORPOCESAR	30 años

YIRA LEMUS GÓMEZ. ESP. AMBIENTAL
Diligencia

Formato
Informe HSE Interventoría No 01
IN-F0-11 V:1

PROYECTO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓ DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.	PERIODO			1 al 31 dejulio de 2022		
		CUMPLIMIENTO					
ITEM	ASPECTOS PARA DESTACAR EN LA GESTIÓN MENSUAL (CONTRATISTA)	CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO CUMPLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	ASPECTOS A MEJORAR
IMPLEMENTACIÓN DEL SG SST	El contratista cuenta con Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo, el cual fue avalado mediante el informe tecnico de especialista HSE # 4 emitido el 25 de abril del 2022, en el transcurso del periodo se evidencia la afiliaciones del personal que esta realizando el diagnóstico de las viviendas. Se implementó el PAPSO, actualmente se encuentra en un porcentaje de cumplimiento del 100%. Se continúa con la implementación de las medidas de bioseguridad: toma de temperatura, encuesta de auto condiciones, limpieza y desinfección de puestos de trabajo y oficinas con hipoclorito diluido y alcohol. El personal del contratista cuenta con los EPP requeridos y los utiliza de manera correcta. Se tienen publicadas las políticas y normas de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo. Se cuenta con elementos para atención de emergencias y la brigada de emergencias. Plan de trabajo anual 96%. Programa de capacitaciones ejecutado en un 100% Programa de inspecciones ejecutado en un 100%. Implementación del PAPSO en un 100%.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Continuar con la implementación de la interventoria
AFILIACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	El CONSORCIO CONSTRUREDES en el periodo reportado continua presentando los soporte de pago de seguridad social y/ o afiliaciones del personal administrativo y operativo que trabajo y que ingreso en el periodo de 17 personas, estas son revisadas y avaladas por el profesional PGIO del contratista, de igual manera son verificados por la interventoría donde se evidencia que se realizaron las afiliaciones correspondientes en caso de no presentarse la información pertinente se restringe el ingreso a obra del personal que no cuente con afiliaciones o pagos vigentes por parte de interventoria.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Hacer la entrega de la información completa para el ingreso del personal de acuerdo a los lineamientos establecidos por la interventoria.
DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	En recorridos diarios realizados por Interventoría, se evidencia la entrega y reposición de los EPP , uso de dotación, en el periodo se mantiene la entrega de tapabocas como medida preventiva para el peligro biológico presente por covid -19 , se exige el uso adecuado, se reitera al contratista realizar inspección diaria, verificando las condiciones de la dotación y porte de la misma de acuerdo al manual de imagen de Enterritorio.		X		50%	Profesional PGIO del Contratista	Hacer la entrega de Elementos de protección personal y la dotación al personal de obra y asegurar el uso por parte del contratista.
PLAN DE EMERGENCIAS, EQUIPOS DE ATENCION DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION	En el periodo se realiza ubicación de señalización preventiva, de obligatoriedad y de salvamento, se establecen salidas de emergencias, de acuerdo a la dinámica y avance de la obra ,así mismo se mantienen punto de encuentro, puntos con elementos de atención a emergencias con camilla, botiquín, extintor , ubicado en el campamento de obra, se tiene pendiente la conformación de labrigada para atención de emergencias, en el periodo no se presentaron emergencias.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	En el momento que se encuentre el personal de obra se debe realizar la conformación de la brigada de emergencia.
PLAN DE TRABAJO ANUAL, CAPACITACIONES Y CHARLAS	El contratista inicia con la realización de charlas diarias por parte del profesional PGIO. Interventoría realiza la revisión y seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo establecido en el SG-SST, se evidencia el cumplimiento del 71,9 % , se recomienda al contratista realizar todas las actividades planeadas.		X		50%	Profesional PGIO del Contratista	Hacer entrega de los soportes del informe, y realizar todas actividades planificadas.
CONFORMACION Y REUNIONES DE COMITE COPASST Y CONVIVENCIA.	El CONSORCIO CONSTRUREDES en el periodo reportado, realizo reunión del Copasst el 13 de junio del 2022, así mismo se evidencia la conformación del comité de convivencia laboral el 13 de juno del 2022, así mismo se realiza la primera reunión en cada uno de los comites.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Hacer la reuniones mensuales y trimestrales de cada uno de los comites.
PAZ Y SALVOS TRABAJADORES	El CONSORCIO CONSTRUREDES en el periodo reportado, no realizo retiro de personal.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	En el momento de salida de personal realizar la entrega de paz y salvo
PERMISOS DE TRABAJO (ALTURA, CALIENTE, ESPACIO CONFINADO)	De acuerdo al avance de obra el contratista continua realizando tareas de alto riesgo entrabajo en alturas (TSA) , por lo cual implementa los formatos requeridos de acuerdo a los procedimientos establecidos para dichas actividades como (permisos, inspecciones preoperacionales y análisis de trabajo seguro (ATS) de la diferente maquinaria, equipos y herramientas electromecánicas) estos firmados y avalados por profesional de apoyo PGIO del contratista, interventoría sugiere realizar seguimiento a las medidas preventivas establecidas en los ATS realizados para las actividades.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Realizar el diligenciamiento de los permisos de acuerdo a las actividades de alto de riesgo ejecutadas(Trabajo en Altura)
ASPECTOS AMBIENTALES (AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE)	• La Interventoría evidencia que el contratista ha implementado las medidas de manejo ambiental establecidas en el contrato se debe reforzar las mejoras en los acopios de material, en cuanto a señalización señalizados y demarcados, se solicita el constante orden y aseo en espacios exteriores, por lo que el contratista toma las medidas necesarias y realiza las respectivas jornadas, el área de la ZMPA se encuentra organizada y aseada. • Se cuenta con la documentación de los materiales como insumos, equipos, maquinaria, volquetas, entre otros. Se solicito al contratista hacer refuerzo en el acopio, en el manejo de suelo reforzar las hojas de seguridad y las etiquetas. • En este periodo ingresó material granular a obra. Los certificados y permisos ambientales de los proveedores de estos materiales fueron presentados Licencia Ambiental de la Resolución 743 del 2018 se evidencia que Triturados y Agregados del Caribe S.A.S, esta avalado para explotación y comercialización de material petreo. En cuanto al titulo minero KHE-08121 se verifico en catastro minero, evidenciando que esta vigente hasta el 31 de Julio del 2022, por lo cual en el mes de Agosto se debe pasar la renovación del mismo. • La obra cuenta con un punto ecológico el cual fue adecuado con la nueva normatividad en colores, dichos puntos están señalizados y demarcados, de tal manera que los trabajadores identifiquen donde deben realizar el depósito de los residuos. Solamente fue necesario realizar el retiro de residuos sólidos ordinarios de obra. • La Interventoría sugiere mantener y mejorar los puntos de acopio de los materiales granulares que se encuentran en obra, en cuanto señalización , demarcación y protección. • La Interventoría solicita de manera permanente el orden y aseo dentro del proyecto, se insistió en la generación de una brigada de orden y aseo para mantener los espacios organizados.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Darle cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental diseñado para el proyecto.
PLAN DE GESTION DE RESIDUOS DE DEMOLICION Y CONSTRUCCION	Para este periodo solo se generaron Residuos de Construcción y Demolición, el material es reutilizado como relleno en las mismas excavaciones realizadas, es importante aclarar que la excavación es minima.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Se debe realizar clasificación en los frentes de trabajo.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADOS EN OBRA	El CONSORCIO CONSTRUREDES en el periodo reportado, se evidencia que todos los vehículos, herramientas que se encuentran en obra cuentan con la documentación reglamentaria y aprobación de la interventoría. A la fecha de corte de este periodo informado se cuenta con la autorización de acceso para:-1 volquetas.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Realizar todas las inspecciones realizadas en el proyecto
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DENTRO DE LA OBRA	Actualmente el Contratista cuenta con un punto ecológico en obra y con un recipiente rojo adicional destinado solo a la disposición de los residuos generados por la implementación del PAPSO en obra. Se entregaron los residuos ordinarios generados en obra al recolector autorizado del municipio.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Se debe realizar clasificación en los frentes de trabajo.
MANEJO DE CAMPAMENTO (SERVICIOS SANITARIOS)	El proyecto de obra cuenta con el respectivo campamento, el mismo se encuentra señalizado, se tiene 1 unidad sanitaria para el servicio del personal femenino y masculino, se cuenta con área de almacén y punto de atención al ciudadano.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Verificar el uso de baño de los trabajadores en los frentes de trabajo.
OTROS CUALES	En recorridos diarios realizados por interventoría se evidencia la presencia de condiciones inseguras y la ocurrencia actos inseguros por parte de los trabajadores, los cuales son direccionados al profesional SST del contratista para que sean subsanados de manera inmediata, mejorando así las condiciones y controlando los peligros presente durante la ejecución de la actividades, a los cuales el contratista realiza la gestión necesaria para atender las solicitudes realizadas. En el periodo no se presentaron casos positivos para covid-19.						

	ASPECTOS PARA DESTACAR (INTERVENTORÍA)
SEGUIMIENTO A NIVEL CUMPLIMIENTO FRENTE A NORMATIVA EN SST (Evaluación inicial, Certificado de 50 horas, Licencia en Seguridad y salud en el Trabajo, Designación de Responsable, Matriz de peligros, Plan de formación anual, Plan de trabajo anual, Diagnostico de Condiciones, estadisticas de incidentes, niveles de cumplimiento del decreto 1072 del 2015 y Resolución 312 del 2019)	Interventoría cuenta con la documentación del SGSST para la implementación en obra , Certificado de 50 horas, Licencia en Seguridad y salud en el Trabajo, Designación de Responsable, Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos . Actualmente se cuenta con 12 profesionales asesores de interventoría quienes apoyan el proceso desde sus áreas , todos cuentan con pagos de parafiscales con afiliaciones vigentes a la EPS, ARL , AFP y CCF ; a todos los profesionales se les han realizado los exámenes médicos de ingreso, conocen las políticas, procedimientos y protocolos establecidos en el SG-SST a si mismo el PAPSO establecido por la empresa y el aprobado para la obra ,se realizan capacitaciones mensuales a través de boletines informativos . Durante este periodo no se presentaron accidentes laborales , para este periodo no se presentó ausentismo por enfermedad general, el personal se encuentra capacitado de acuerdo los peligros asociados y presentes durante la ejecución de sus actividades.
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA (Señalización de obras, Manejo de aguas superficiales, Manejo y disposición de escombros, Transporte de materiales y escombros, Manejo de maquinaria y equipo, Almacenamiento y manejo de materiales de construcción, Manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas de emisiones atmosféricas, Control de plagas. Licencias, permisos y trámites, Manejo de campamentos transitorios, Control de plagas)	Para este periodo la interventoría cuenta con un campamento, el mismo está debidamente señalizado, Se fomenta el orden y aseo y desinfección en cada puesto de trabajo de manera periódica. Se utiliza de manera responsable los recursos de energía, agua y papelería. Se cuenta con cartelera informativa. se realizan capacitaciones mensuales a través de boletines informativos.
	La Interventoría verifica y controla todos los aspectos mediante inspecciones diarias, verificación documental de los informes mensuales, RCD, maquinaria y equipos, documentación de licencias y certificados generados para el proyecto, las apreciaciones generadas se transmiten al contratista mediante informes técnicos, oficios, notas en bitácora y correos electrónicos.

INDICADORES RESULTADO SST																								
CONSTANTE K		100																						
PERIODO	No TOTAL DE PERSONAS MENSUAL		No TOTAL DE HORAS MENSUALES				TOTAL HORAS TRABAJADAS		INCIDENTES LABORALES		No DIAS DE ENFERMEDADES COMUNES		No ACCIDENTES		No ACCIDENTES MORTALES		No. DÍAS PERDIDOS POR ACCIDENTES LABORALES		DIAS CARGADOS PCLY/O MUERTE		ENFERMEDAD LABORAL	
	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTV HORA EXTRA	INTV HORA MENS	CONTRA HORA EXTRA	CONTRA HORA MES	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA		
MAYO	3	6	0	576	0	1152	576	576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUNIO	6	23	0	1152	0	4416	1152	1152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Formato
Informe HSE Interventoría No 01
IN-F0-11 V:1

PROYECTO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓ DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.	PERIODO	1 al 31 dejulio de 2022

JULIO	6	23	0	1152	0	4416	1152	1152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGOSTO																						
SEPTIEMBRE																						
OCTUBRE																						

PERIODO	SEVERIDAD DE LOS ACCIDENTES LABORALES		FRECUENCIA DE LOS ACCIDENTES LABORALES		FRECUENCIA DE LOS INCIDENTES LABORALES		MORTALIDAD DE LOS ACCIDENTES LABORALES		PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL		INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL		AUSENTISMO LABORAL		AUSENTISMO COMÚN		INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES		OBSERVACION INDICADORES INTERVENTORÍA	OBSERVACION INDICADORES CONTRATISTA
	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA		
MAYO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	En el periodo no se presentaron accidentes de trabajo ,ni incidentes laborales.	En el periodo no se presentaron accidentes de trabajo ,ni incidentes laborales.
JUNIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
JULIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
AGOSTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
SEPTIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
OCTUBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		

INDICADORES ESTRUCTURA Y PROCESO DE INTERVENTORÍA SST

PERIODO	POLITICA SG SST				FUNCIONAMIENTO COPASST				CUMPLIMIENTO DE PLAN DE TRABAJO ANUAL				INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES			
	N.° de trabajadores que conocen la Política	No. Total de Trabajadores	RESULTADO	ANALISIS	No de actas de reunión realizadas	No total de actas al mes	RESULTADO	ANALISIS	Actividades Ejecutadas x 100	No. Actividades Programadas.	RESULTADO	ANALISIS	No de accidentes y/o incidentes investigados	No accidentes y/o incidentes reportados	RESULTADO	ANALISIS
MAYO	3	3	100%	Todo el personal cuenta con una inducción y tiene conocimiento de la política	1	1	100%	Se realiza la reunión de COPASST del mes.	1	1	100%	Se realizan las actividades previstas para el mes	0	0	0%	No se han reportado accidentes de trabajo para el período
JUNIO	6	6	100%	Todo el personal cuenta con una inducción y tiene conocimiento de la política	1	1	100%	Se realiza la reunión de COPASST del mes.	1	1	100%	Se realizan las actividades previstas para el mes	0	0	0%	No se han reportado accidentes de trabajo para el período
JULIO	6	6	100%	Todo el personal cuenta con una inducción y tiene conocimiento de la política	1	1	100%	Se realiza la reunión de COPASST del mes.	1	1	100%	Se realizan las actividades previstas para el mes	0	0	0%	No se han reportado accidentes de trabajo para el período
AGOSTO	0		0%													
SEPTIEMBRE	0		0%													
OCTUBRE	0		0%													

REPORTE DE ACCIDENTES Y/O INCIDENTES DE TRABAJO

FECHA	INCIDENTE	ACCIDENTE	CEDULA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CARGO	DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE O ACCIDENTE	PARTE DEL CUERPO AFECTADA	DÍAS DE INCAPACIDAD
N/A				N/A				N/A		

CAPACITACIONES Y CHARLAS

FECHA DE CAPACITACIÓN	TEMAS DE LA CAPACITACIÓN Y/O CHARLA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA
julio-22	Manejo de residuos aprovechables y no aprovechable	X	
julio-22	Actos y condiciones inseguridad	X	
julio-22	Charlas EPP	X	
julio-22	Charlas posturas ergonómicas	X	

CONTROL AMBIENTAL

PERIODO	RELACION DE MATERIAL DE PETREO			DISPOSICION RESIDUOS SOLIDOS				RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN				ACCIDENTE E INCIDENTE AMBIENTAL				OBSERVACIONES DE AMBIENTALES
	Tipo de material	Cantidad	Cantera	RECICLABLES (papel, plástico, vidrio, chatarra)	ORDINARIO	PELIGROSOS	OTROS	DESCAPOTE	EXCAVACION	ESCOMBRO	ESCOMBRERA	FECHA	LUGAR	DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN	
MAYO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Para el periodo no se presentaron accidentes de emergencia, , se ingreso material granular, y no se realizo retiro de material RCD, pero se realizo reutilización en el proyecto.
JUNIO	ARENA DE RIO	35	Licencia Ambiental de la Resolución 743 del 2018 se evidencia que Triturados y Agregados del Caribe S.A.S	0	0	0	0	0	0	32	Reutilización de material de excavación en relleno .	N/A	N/A	N/A	N/A	
	GRAVA	35														
JULIO	ARENA DE RIO	35	Licencia Ambiental de la Resolución 743 del 2018 se evidencia que Triturados y Agregados del Caribe S.A.S	0	0	0	0	0	0	65	Reutilización de material de excavación en relleno .	N/A	N/A	N/A	N/A	
	GRAVA	30														
AGOSTO																
SEPTIEMBRE																
OCTUBRE																

FOTOGRAFIA





UBICACIÓN. CORDOBA-BOLIVAR
COMENTARIOS. VERIFICACIÓN DE CONDICIONES HSE

FOTOGRAFIA






UBICACIÓN. CORDOBA-BOLIVAR
COMENTARIOS. VERIFICACIÓN DE CONDICIONES HSE

FOTOGRAFIA






UBICACIÓN. CORDOBA-BOLIVAR
COMENTARIO. VERIFICACIÓN DE CONDICIONES HSE

OBSERVACIÓN Y/O CONCLUSIÓN: En este período se evidencio que dentro de los requerimientos hechos al contratista se ha cumplido en un 88,9 % con los aspectos de Seguridad industrial, Salud en el trabajo, Medio ambiente, se debe hacer la entrega de toda la documentación completa del personal que ingresa al proyecto, se evidencia la falta del buen uso de los elementos de protección personal y dotación establecida en el proyecto, por lo tanto la interventoría genera un llamado de atención al contratista para que le de cumplimiento a estos requerimientos, de igual manera hasta el momento el contatista no ha entregado los planes establecidos para el contrato, en los aspectos que hasta la fecha están pendiente se realizará un estricto control para que en este proyecto se minimicen los factores de riesgo de accidentes, se le solicita al contratista una gestión permanente, se realizó con el contratista mesas de trabajo donde se debe realizar comités de seguimiento para mejorar en los aspectos donde se cuenta con falencias de acuerdo a la recomendaciones dadas. La interventoría verifica y controla todos estos aspectos mediante inspecciones diarias, verificación documental de los planes generados para el proyecto y la normatividad vigente en cuanto seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente.

7.	VERIFICACIÓN	APROBACIÓN
INSPECTOR Y/O RESIDENTE	COORDINADOR DE GESTIÓN HSEQ PROYECTO	DIRECTOR

PLANILLA CONTRATISTA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901568676	5	CONSORCIO CONSTRUREDES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 24 15 17 BARRIO CENTRO	SAN MARCOS-SUCRE	2953041	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-07	1570135165	9437869990	E	2022/07/21	2022/07/26	BANCOLOMBIA	5	$6,752,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1049453937	AHUMADA RODRIGUEZ ELIECER JULIO	230301	6	$200,000	$32,000	CCFC55	6	$200,000	$8,000	CCF41	6	$200,000	$8,000	14-11	6	$200,000	$14,000	6	$0	$0
2	CC	10774359	ALVAREZ PADILLA GENKY SAIMER	231001	23	$766,667	$122,700	CCFC55	23	$766,667	$30,700	CCF41	23	$766,667	$30,700	14-11	23	$766,667	$53,400	23	$0	$0
3	CC	1093752620	ANAYA PEREZ NORELIS DEL CARMEN	25-14	30	$2,000,000	$320,000	ESSC07	30	$2,000,000	$80,000	CCF41	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
4	CC	15672378	BLANCO MARTINEZ EDGAR TOBIAS	230301	8	$266,667	$42,700	ESSC07	8	$266,667	$10,700	CCF41	8	$266,667	$10,700	14-11	8	$266,667	$18,600	8	$0	$0
5	CC	1102815039	BLANCO ARROYO RONAL ANDRES	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF41	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
6	CC	73315075	CAPELA DE AVILA JOSE BELISARIO	25-14	2	$66,667	$10,700	ESSC07	2	$66,667	$2,700	CCF41	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	$4,700	2	$0	$0
7	CC	1066181984	CASTILLO LOBO RAFAEL FRANCISCO	230201	30	$1,800,000	$288,000	ESSC07	30	$1,800,000	$72,000	CCF41	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
8	CC	1049453183	ESCOBAR VERGARA SINDY PAOLA	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS048	30	$1,500,000	$60,000	CCF41	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
9	CC	1049452239	ESCOBAR VERGARA YEISON JOSE	231001	23	$766,667	$122,700	ESSC07	23	$766,667	$30,700	CCF41	23	$766,667	$30,700	14-11	23	$766,667	$53,400	23	$0	$0
10	CC	1049453122	FLOREZ OCHOA FERNEY MAURICIO	230301	8	$266,667	$42,700	EPS037	8	$266,667	$10,700	CCF41	8	$266,667	$10,700	14-11	8	$266,667	$18,600	8	$0	$0
11	CC	1049452936	FLOREZ TAMARA JOSE MIGUEL	230301	8	$266,667	$42,700	ESSC07	8	$266,667	$10,700	CCF41	8	$266,667	$10,700	14-11	8	$266,667	$18,600	8	$0	$0
12	CC	1049453627	GALVAN RODRIGUEZ JAVIER EDUARDO	230301	8	$266,667	$42,700	ESSC07	8	$266,667	$10,700	CCF41	8	$266,667	$10,700	14-11	8	$266,667	$18,600	8	$0	$0
13	CC	1118528862	GARZON RIOS OSWALDO	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF41	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
14	CC	1049453942	GONZALEZ SANCHEZ SANDRO DE JESUS	230201	8	$266,667	$42,700	ESSC07	8	$266,667	$10,700	CCF41	8	$266,667	$10,700	14-11	8	$266,667	$18,600	8	$0	$0
15	CC	85474042	GUTIERREZ URIBE CARLOS ALBERTO	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF41	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
16	CC	72253038	PEÑA CANTILLO JOSE DE JESUS	230201	1	$33,334	$5,400	EPS048	1	$33,334	$1,400	CCF41	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$33,334	$2,400	1	$0	$0
17	CC	1049453497	PINEDA HENAO HEIDER MANUEL	230301	30	$1,000,000	$160,000	CCFC55	30	$1,000,000	$40,000	CCF41	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
18	CC	1069464406	PINEDO DURANGO DUARTE JOSE	230301	30	$3,000,000	$480,000	ESSC07	30	$3,000,000	$120,000	CCF41	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
19	CC	3956970	RIOS CORREA LUIS MANUEL	231001	8	$266,667	$42,700	ESSC07	8	$266,667	$10,700	CCF41	8	$266,667	$10,700	14-11	8	$266,667	$18,600	8	$0	$0
20	CC	10884740	RIOS MOLINA PEDRO LUIS	230301	2	$66,667	$10,700	ESSC07	2	$66,667	$2,700	CCF41	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	$4,700	2	$0	$0
21	CC	73316966	RIVERA MARTINEZ FEIVER DE JESUS	25-14	2	$66,667	$10,700	ESSC07	2	$66,667	$2,700	CCF41	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	$4,700	2	$0	$0
22	CC	73315286	SANCHEZ MEDINA ALVARO ENRIQUE	25-14	8	$266,667	$42,700	ESSC07	8	$266,667	$10,700	CCF41	8	$266,667	$10,700	14-11	8	$266,667	$18,600	8	$0	$0
23	CC	72431092	SANTOS NAVARRO JACOB	231001	2	$66,667	$10,700	EPS048	2	$66,667	$2,700	CCF41	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	$4,700	2	$0	$0
24	CC	1049452939	SERRANO OLANO JULIO RAFAEL	231001	2	$66,667	$10,700	ESSC07	2	$66,667	$2,700	CCF41	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	$4,700	2	$0	$0
25	CC	1049452096	VALETH ROMERO ALVARO JAVIER	230301	8	$266,667	$42,700	ESSC07	8	$266,667	$10,700	CCF41	8	$266,667	$10,700	14-11	8	$266,667	$18,600	8	$0	$0
26	CC	1049453345	VALETH ANDRADE JESUS MANUEL	230301	23	$766,667	$122,700	ESSC07	23	$766,667	$30,700	CCF41	23	$766,667	$30,700	14-11	23	$766,667	$53,400	23	$0	$0
Total	**Afiliados(26)**					**$21,800,006**	**$3,488,600**			**$21,800,006**	**$872,600**			**$21,800,006**	**$872,600**			**$21,800,006**	**$1,518,200**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				26	$3,488,600	$0	$0	$3,488,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$309,500	$0	$0	$309,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$784,100	$0	$0	$784,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$2,058,900	$0	$0	$2,058,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$336,100	$0	$0	$336,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$1,518,200	$0	$0	$1,518,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	26	$1,518,200	$0	$0	$1,518,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$872,600	$0	$0	$872,600
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	26	$872,600	$0	$0	$872,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				26	$872,600	$0	$0	$872,600
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	3	$78,700	$0	$0	$78,700
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	$64,100	$0	$0	$64,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	16	$419,100	$0	$0	$419,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$210,700	$0	$0	$210,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$100,000	$0	$0	$100,000
TOTAL				**26**	**$6,752,000**	**$0**	**$0**	**$6,752,000**

PLANILLAS DE PAGO INTERVENTORIA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 52885857
DESDE JULIO 2022 HASTA JULIO 2022

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901108740
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARCA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AC CRA 28 # 37-38	TELÉFONO:	2442900
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	52885857
APELLLIDOS:	LEMUS GOMEZ	NOMBRES:	YIRA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7843147730	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	junio - 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	julio - 2022	FECHA DE PAGO:	08/07/2022	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	01 - ADMINISTRACION

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES						
																	PENSIÓN								SALUD					ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
$ 3.561.600												13-14						25-14 COLPENSIONES	2	$ 237.440	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 38.000	EPS008-COMPENSAR	2	$ 237.440	$ 9.500	$ 0	$ 9.500	14-11 - ARL SURA	2	$ 237.440		$ 0	2	$ 237.440	CCF24-COMPENSAR	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 3.561.600																		25-14 COLPENSIONES	28	$ 3.324.160	$ 531.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 531.900	EPS008-COMPENSAR	28	$ 3.324.160	$ 133.000	$ 0	$ 133.000	14-11 - ARL SURA	28	$ 3.324.160		$ 231.400	28	$ 3.324.160	CCF24-COMPENSAR	$ 133.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 1.086.300

Planilla Pagada
ach SOI
Pagos de Seguridad Social

Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 78380772
DESDE JULIO 2022 HASTA JULIO 2022

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800173768
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AVENIDA 28 # 37-38	TELÉFONO:	2442900
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	78380772
APELLLIDOS:	ARRIETA MONTERROZA	NOMBRES:	RONALD JAVIER
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7841582502	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	junio - 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	julio - 2022	FECHA DE PAGO:	08/07/2022	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	INTRA 01 - INTRADOMICILIARIAS

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES					
																	PENSIÓN								SALUD					ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
$ 3.000.000																		231001-COLFONDOS	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.000.000		$ 208.800	30	$ 3.000.000	CCF16-COMFACOR	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 928.800

Planilla Pagada
ach SOI

Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 43160977
DESDE JULIO 2022 HASTA JULIO 2022

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800173768
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AVENIDA 28 # 37-38	TELÉFONO:	2442900
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	43160977
APELLLIDOS:	CORREA CASTAÑO	NOMBRES:	MARCY ALEJANDRA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7841310189	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	junio - 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	julio - 2022	FECHA DE PAGO:	08/07/2022	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	65 - OFICINA MEDELLIN

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																	PENSIÓN								SALUD					ARP						CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																									
$ 4.673.760																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.673.760	$ 747.900	$ 23.400	$ 23.400	$ 0	$ 0	Normal	$ 794.700	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 4.673.760	$ 187.000	$ 0	$ 187.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.673.760		$ 325.300	30	$ 4.673.760	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 187.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 1.494.000

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1049454594
DESDE JULIO 2022 HASTA JULIO 2022

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		800173768
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:					ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:		BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	
DIRECCIÓN:	AVENIDA 28 # 37-38	TELÉFONO:		2442900	
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:		Actividades de arquitectura e ingeniería y otras	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				SI	

DATOS DEL COTIZANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		1049454594	
APELLLIDOS:	HERRERA PALOMINO	NOMBRES:		LEYDIS KATHERINE	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:		CORDOBA	
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:			
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:		NO	
TIPO DE SALARIO:	FIJO				
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				SI	

PLANILLA No:	7841582502	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	junio - 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	julio - 2022	FECHA DE PAGO:	08/07/2022	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	INTRA 01 - INTRADOMICILIARIAS

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES						
																	PENSIÓN								SALUD					ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
$ 1.400.000																		230301-PORVENIR	30	$ 1.400.000	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 56.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.400.000		$ 97.500	30	$ 1.400.000	CCF16-COMFACOR	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 433.500

Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 79533765
DESDE JULIO 2022 HASTA JULIO 2022

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800173768		
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL		
DIRECCIÓN:	AVENIDA 28 # 37-38	TELÉFONO:	2442900		
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI		

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79533765
APELLLIDOS:	MARIN URIBE	NOMBRES:	GREGORIO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7841599170	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	junio - 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	julio - 2022	FECHA DE PAGO:	08/07/2022	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	27 - ARCA CARCELES

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES						
																	PENSIÓN								SALUD					ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
$ 3.500.000		30																231001-COLFONDO	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS008-COMPENSA	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 4.083.333	CCF24-COMPENSAR	$ 163.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 1.107.000



Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1085294161
DESDE JULIO 2022 HASTA JULIO 2022

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901108740		
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARCA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL		
DIRECCIÓN:	AC CRA 28 # 37-38	TELÉFONO:	2442900		
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI		

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1085294161
APELLLIDOS:	GRIJALBA BOLAÑOS	NOMBRES:	EMMA FERNANDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7843147730	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	junio - 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	julio - 2022	FECHA DE PAGO:	08/07/2022	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	01 - ADMINISTRACION

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES						
																	PENSIÓN								SALUD					ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
$ 1.798.500																		230301-PORVENIR	30	$ 1.798.500	$ 287.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.800	EPS008-COMPENSA	30	$ 1.798.500	$ 72.000	$ 0	$ 72.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.798.500		$ 9.400	30	$ 1.798.500	CCF24-COMPENSAR	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 441.200



Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1233339123
DESDE JULIO 2022 HASTA JULIO 2022

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800173768		
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL		
DIRECCIÓN:	AVENIDA 28 # 37-38	TELÉFONO:	2442900		
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI		

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1233339123
APELLLIDOS:	SANCHEZ PORTILLO	NOMBRES:	DIAMYS EMELLY
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7841582502	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	junio - 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	julio - 2022	FECHA DE PAGO:	08/07/2022	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	INTRA 01 - INTRADOMICILIARIAS

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES					
																	PENSIÓN								SALUD					ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																									
$ 1.500.000	21																	230201-PROTECCION	10	$ 500.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 80.000	EPS005-SANITAS S.A.	10	$ 500.000	$ 20.000	$ 0	$ 20.000	14-11 - ARL SURA	10	$ 500.000		$ 34.800	10	$ 500.000	CCF16-COMFACOR	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 154.800

Planilla Pagada

Entregado por:

Recibido por:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 80192920
DESDE JULIO 2022 HASTA JULIO 2022

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901108740		
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARCA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL		
DIRECCIÓN:	AC CRA 28 # 37-38	TELÉFONO:	2442900		
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI		

DATOS DEL COTIZANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80192920		
APELLLIDOS:	FORERO ANAYA	NOMBRES:	CARLOS ANDRES		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL		
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:			
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO		
TIPO DE SALARIO:	FIJO				
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI		

PLANILLA No:	7843147730	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	junio - 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	julio - 2022	FECHA DE PAGO:	08/07/2022	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	01 - ADMINISTRACION

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES						
																	PENSIÓN									SALUD					ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																									
$ 2.559.391																		230301-PORVENIR	30	$ 2.559.391	$ 409.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 409.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.559.391	$ 102.400	$ 0	$ 102.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.559.391		$ 13.400	30	$ 2.559.391	CCF24-COMPENSAR	$ 102.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 627.800

Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

INFORME DE GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

“CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL 3.
DEL 1 AL 30 DE JULIO DE 2022
CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTORÍA

ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.

AGOSTO 1 DE 2022

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

INFORME MENSUAL 3.
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

Municipio	Córdoba	Contrato:		22200576	
Contratista de obra	Consorcio Construredes	Contratista de interventoría		Arca Arquitectura e Ingeniería S.A.	
Fecha:	Agosto 1	Elaboró:	Norelis Anaya Pérez Profesional Social – contratista	Revisó:	Fernanda Grijalba P. Social Interventoría.

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. ANTECEDENTES 5
3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 6
4. LÍNEAS DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 7
4.1. Línea de Comunicación 8
4.1.1 Socializaciones: 8
4.1.3. Piezas de Divulgación: 12
4.2. Línea de Participación Comunitaria: 16
4.2.1. Conformación del Comité Veedor: 17
4.2.1.1 Reuniones Comité Veedor 17
4.2.2. Punto de Atención a la Comunidad: 18
4.2.3. Recepción y trámite de las PQRS: 19
4.2.4. Buzón de PQRS: 22
4.2.5. Recorridos de obra 23
4.2.6. Otras reuniones 23
4.3. Línea de Capacitación 23
4.4. Reporte de Actividades Complementarias 24
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 25

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Información del proyecto 6
Tabla 2 Material divulgativo 11
Tabla 3 Punto de atención a la Comunidad 12

1. INTRODUCCIÓN

Mediante el presente informe, se dan a conocer las actividades desarrolladas en cada uno de las líneas de intervención del Plan de Gestión Social, que se ejecutaron en el marco del contrato de obra **N.º 2220576** cuyo objeto corresponde a "**CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA (BOLÍVAR)"** en el periodo comprendido entre 1 al 31 de julio del 2022, en el cumplimiento de los parámetros establecidos por el **VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO - DIRECCIÓN DE PROGRAMAS - PROGRAMA CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS**, es importante mencionar que las actividades aquí plasmadas contaron con el acompañamiento de la Interventoría.

2. ANTECEDENTES

El Programa de Conexiones Intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico, es un programa del Ministerio de Vivienda y ejecutado por ENTerritorio, con el cual se busca garantizar el acceso a los servicios mencionados a poblaciones vulnerables que no cuenten con estos servicios.

El municipio de Córdoba departamento de Bolívar, ha sido beneficiario en el marco de este programa, con la priorización de uno de sus barrios, cumpliendo con los criterios de focalización, el barrio San Martín, este se encuentra situado en el centro de la cabecera municipal, debido a su ubicación, este es un sector comercial, que es visitado diariamente por un gran número de personas en búsqueda de los productos y servicios que aquí se ofrecen, adicional, se cuenta con infraestructura vial en buen estado, que facilitan el tránsito vehicular y peatonal.

3. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

A continuación, se presenta la información más relevante del proyecto.

Tabla 1 Información del proyecto

Fecha de Inicio de Obras:					
Nombre del Municipio	**Nombre Barrios a Intervenir**	**Nombre Barrios Intervenidos**	**Fecha de Informe**	**N° de Viviendas a Intervenir por barrio**	**N° de Viviendas Intervenidas por barrio**
CÓRDOBA BOLÍVAR	SAN MARTÍN	SAN MARTÍN	Del 1 al 31 de julio de 2022	217	42

4. LÍNEAS DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

El componente de gestión social, se implementa desde el inicio del proyecto, bajo tres líneas estratégicas, este se encuentra enfocado en el trabajo directo con la comunidad, a través de actividades de socialización y participación, promoviendo la corresponsabilidad de las familias beneficiadas de los barrios focalizados.

4.1. Línea de Comunicación

Esta línea contempla una serie de actividades relacionadas con la transmisión y divulgación de la información del programa de Conexiones Intradomiciliarias a los potenciales beneficiarios del Barrio San Martín, en el marco de esta línea se pretende dar a conocer a través de estrategias comunicativas y metodologías participativas las particularidades del programa, en este sentido es vital que la comunidad conozca y se interese por solicitar información que promuevan el conocimiento y la apropiación de este programa.

Las actividades desarrolladas en el marco de esta línea de intervención, son vitales para la ejecución del programa, debido a que la comunidad contará con el conocimiento necesario, lo cual favorecerá el desarrollo de acciones de las demás líneas de acción. Por ello, es necesario la implementación de estrategias que contribuyan a la fácil comprensión de los objetivos del programa. Teniendo en cuenta la idea anterior, a continuación, se detallan las actividades realizadas bajo el enfoque de esta línea.

4.1.1 Socializaciones:

Durante este periodo no se desarrollan socializaciones, puesto que no fueron requeridas.

Tabla 2. Socializaciones.

Reuniones de Acercamiento y de socialización masiva	Fecha	Barrios	Asistentes	Lugar de la actividad	Principales resultados	Ejecutó	Evidencias
N/A							

4.1.2 Visitas Casa a Casa:

Las actividades de visita casa a casa que se han desarrollado durante este periodo hacen referencia a:

- El día 7 de julio, se realizan visitas en acompañamiento al profesional técnico de diagnósticos a dos (2) viviendas, con la finalidad de registrar la información correspondiente a esta área, donde se informa que las visitas a las viviendas por parte de este profesional tiene un orden y las viviendas registradas en la matriz, se visitarán de acuerdo a los tiempos establecidos.
- En la actividad de establecer la debida identificación de las viviendas donde ya se han realizado los diagnósticos, el equipo social realiza visita casa a casa, con el fin de instalar los sticker, inicialmente, se socializa al beneficiario el objetivo de la actividad y se solicita el permiso correspondiente para su respectiva instalación en la puerta o entrada de la vivienda. Cabe destacar que los beneficiarios se muestran prestos a colaborar y no manifiestan inconvenientes con este ejercicio. En su totalidad durante este periodo se han instalado 81 stickers. Dicha identificación de las viviendas efectivas, se realiza de la siguiente manera: Ej: C – B – SM – MNZ66 – VE – (067) y se continúa con
