Superintendencia Financiera de Colombia	**PROFORMA INTERNA**	A-PI-GCT-035
	CERTIFICADO E INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Versión 3.0

1.- ASPECTOS GENERALES

COMSISTEL SAS

Identificado con: NIT [X] CC [ ] CE [ ] No. 805024771-4 en desarrollo de

Contrato [X] Carta de Aceptación [ ] Otro [ ] No. **SF.2-006-2022** de fecha 10/06/2022

Por valor de **$** 66.500.000.00 Cuyo objeto es:

Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de dos (2) bancos de baterías para la UPS Mitsubishi modelo 9800A de 100 kva, cada uno conformado por 30 unidades de 12V, 100 A/H, para la Superintendencia Financiera de Colombia.

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del contrato será de hasta NOVENTA (90) DÍAS calendario, contados a partir de la comunicación que acerca del inicio del contrato efectúe el supervisor al contratista, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Fecha de Inicio: 17/06/2022 Fecha de Terminación: 17/09/2022

Modificaciones en plazo (Si las hubo):

Valor inicial el contrato **$** 66.500.000.00 Valor total del contrato **$** 66.500.000.00

Adiciones en valor (Si las hubo):

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO (CONFORME LO ESTABLECE LA FICHA TÉCNICA Y EL CONTRATO)	ACCIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO
Las descritas en la ficha técnica del proceso respecto a el tiempo de garantía el cual esta establecido por 48 meses a partir de la fecha de recibo de la instalación.	Realización de estricto seguimiento por parte de la supervisión del contrato respecto del cumplimiento de garantía de los bienes adquiridos.

2.- ASPECTOS CONTRACTUALES

INFORMACIÓN SOBRE OBJETO Y OBLIGACIONES

CUMPLE [X] **NO CUMPLE** [ ]

1. **Indicación sobre el cumplimiento o incumplimiento del objeto del contrato y de las condiciones técnicas del mismo en el respectivo periodo** (Detallar en relación a las actividades desarrolladas en el periodo)

Alvaro Ancelmo Delgado Albarracin: El contratista instalo y coloco en funcionamiento de dos (2) bancos de baterías para la UPS Mitsubishi modelo 9800A de 100 kva, cada uno conformado por 30 unidades de 12V, 100 A/H, para la Superintendencia Financiera de Colombia.

Hermindo Hernandez Vega: El contratista COMSISTELS.A.S. suministro e instalo y cumplió con la ejecución del objeto del contrato y lo establecido en la ficha técnica del proceso así:
El 17 de junio de 2022 fue formalizada y firmada con el contratista la comunicación de inicio y este entrego los documentos solicitados de que trata la ficha técnica como requisito para el inicio de ejecución del contrato.
El contratista realizo la entrega física de las baterías en sitio (Superintendencia Financiera de Colombia) el 1 de julio de 2022 y ejecuto el alistamiento técnico para las actividades de instalación de baterías y cableado de acuerdo al cronograma establecido de común acuerdo entre el contratista COMSISTELS.A.S. y la supervisión del contrato.
El día 9 de julio de 2022, el personal técnico designado por el contratista desmonto las baterías existentes (usadas) y procedió con el montaje, acopló y conectorizo electricamente las baterias nuevas que conforman los Dos (2) bancos para el servicio de la UPS MITSUBISHI Modelo 9800A, cumpliendo con las condiciones y procedimientos tecnicos requeridos en la ficha tecnica del proceso; el mismo día 9 de julio de 2022, el contratista COMSISTELS.A.S. realizo mediciones, pruebas correspondientes a la operación e instalación, confirmando todos los parámetros técnicos de funcionamiento de las nuevas baterías suministradas, junto con el conexionado del respectivo cableado eléctrico, dejando en servicio y correcto funcionamiento los Dos (2) bancos de baterias para la mencionada UPS,
Las actividades de suministro e instalación fueron desarrolladas sin novedad, quedando en correcto funcionamiento y se recibieron a satisfacción de acuerdo a los parámetros técnicos y administrativos solicitados en el contrato y de acuerdo con las obligaciones del contratista.
Las baterías suministradas, el cableado, terminales y demás accesorios instalados por la empresa contratista, entran en garantía por un tiempo de 48 meses a partir de la fecha de instalación, de acuerdo a lo solicitado por la Superintendencia Financiera en la ficha técnica y demás condiciones establecidas para el contrato SF.2-006-2022.
Se adjunta al presente informe, los documentos que soportan los procedimientos de inicio, ejecución, instalación, pruebas de las baterías nuevas y así mismo, los del proceso de tramite y disposición final realizado a las baterías usadas que fueron desmontadas y retiradas de la entidad para tal fin el día 11 de julio de 2022, así dando cumplimiento a los compromisos adquiridos con el contrato y a la normatividad ambiental vigente.

Id del informe : 21629

Porcentaje de avance físico del objeto del contrato	Programado	100%	Real	100%

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

2. Obligaciones pendientes para cumplir durante el periodo de la garantía, (cuando a ello haya lugar).

Las descritas en la ficha técnica del proceso respecto a el tiempo de garantía el cual esta establecido por 48 meses a partir de la fecha de recibo de la instalación.

3. Manifestación sobre el recibo a satisfacción de los bienes con indicación de fecha

Fecha e Recibo	**Fecha Ingreso** almacén	Descripción del Bien

3.- ASPECTOS FINANCIEROS

Para efectos de pago, el(los) suscritos supervisor(es)

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista prestó sus servicios a satisfacción de la Nación (Superintendencia Financiera de Colombia) consistentes en:

El supervisor manifiesta que el contratista ha cumplido a satisfacción con las actividades y las obligaciones a realizar en el periodo reportado y por tanto, autoriza el pago correspondiente.

La firma COMSISTELS.A.S., en cumplimiento del objeto del contrato y su ficha técnica; instaló y puso en correcto funcionamiento Dos (2) bancos de baterías para el respaldo y autonomía de la unidad de potencia Ininterrumpida UPS marca Mitsubishi 9800A, conformados por 60 unidades de 12 V, 100 A/H. La firma contratista sumisito e instaló, puso en funcionamiento las baterías, cableado y demás accesorios de acuerdo con el objeto de contrato, los cuales entraron en servicio y fueron recibido a satisfacción el día 9 de julio de 2022.

Por el periodo comprendido entre el 17/06/2022 y el 17/09/2022 por valor de:

($66.500.000.00) sesenta y seis millones quinientos mil pesos colombianos

La presente constancia se expide, con el fin de que se reconozca el correspondiente pago a los 19 días del mes

AGOSTO de 2022

Porcentaje de ejecución presupuestal del contrato

Programado	100%	Real	100%

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

Valor del contrato a la firma del informe	**66.500.000.00**
Valor pagado incluido el autorizado en el informe	**66.500.000.00**
Saldo por pagar	**0.00**

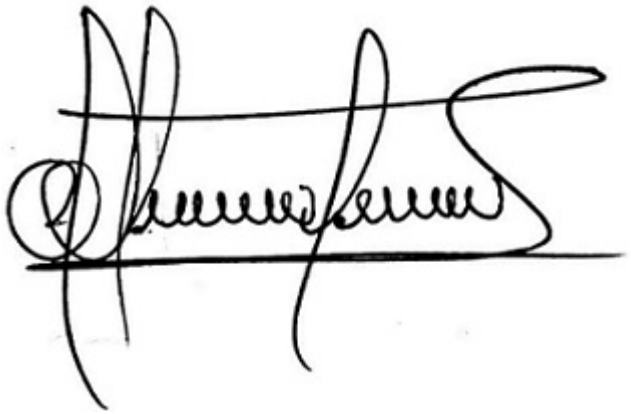
Liberación de saldos no ejecutados:
Nota: El supervisor autoriza la liberación de saldo, manifestando conocer y estar enterado de los términos establecidos en el contrato. NO APLICA PARA PROCESOS CELEBRADOS A TRAVES DE INSTRUMENTOS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (Acuerdo Marco, Grandes Superficies y Agregaciones por demanda). Se deberá incluir de la liberación justificación en documento suscrito por los supervisores del contrato y rubro a ser afectado (si aplica).

Solicitud Liberación de Saldos no Ejecutados	N/A

4. ACLARACIÓN ALCANCE INFORME

FIRMA(S)

Registro Supervisor(es) Designado(s)	Registro Supervisor(es) Designado(s)
	

			
Firma		Firma	
Nombre(s) y Apellidos:	Alvaro Ancelmo Delgado Albarracin	Nombre(s) y Apellidos:	Hermindo Hernandez Vega
Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Cargo:	TÉCNICO
Dependencia:	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Dependencia:	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Fecha de Firma:	11/08/2022	Fecha de Firma:	19/08/2022

Nota:
Cuando exista un número plural de supervisores, el informe se presentará en forma conjunta

DOCUMENTOS ANEXOS

ID DOCUMENTO	NOMBRE	DESCRIPCION
248	Contratos - Factura	Copia de factura y rotulo d radicado de soportes para tramite de pago
249	Contratos - CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES	Certificación de cumplimiento de seguridad social-Parafiscales.
250	Contratos - Conciliación de pagos ante área financiera	Valor contrato según Secop y Orion.
