INFORME DE GESTIÓN DE INTERVENTORÍA

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 220005 DE 2020
JULIO 2022

Objetivo del informe: Presentarle al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA de manera clara y puntual, la gestión de la Interventoría asignada en el logro de la ejecución del proyecto de obras de adecuación que incluya estudios, diseños y licenciamiento de espacios administrativos y de formación en distintas regionales del SENA.

En la etapa de Consultoría para los estudios y diseños, se presenta la gestión de la Interventoría para cada uno de los departamentos, que conforman los grupos CARIBE, CAUCA -PUTUMAYO, ANDINA 1 y ANDINA 2.

En la etapa de obra, se presenta la gestión de la Interventoría asignada a la ejecución del proyecto de Reconstrucción de la Sede Providencia. Todo lo anterior en el marco del Contrato Interadministrativo No. 220005 de 2020.

En concordancia con lo establecido en el anexo técnico del contrato interadministrativo No. 1769204 DE 2020, en el capítulo 3.1.1. PARTICULARIDADES DENTRO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE GERENCIA INTEGRAL Numeral 4 Presentar al SENA un informe técnico, jurídico, administrativo mensual del contrato interadministrativo, donde se incluya el avance de los proyectos de acuerdo con los informes de la interventoría, y el cual será entregado el mes siguiente al que se reporta.

GRUPO ANDINA 1
INFORME DE LA GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA CONTRATO No. 2210001 (SUSCRITO ENTRE ENTerritorio Y SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA – SODINSA SA)
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

CONTENIDO

Objetivo del informe: Presentarle al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA de manera clara y puntual, la gestión de la Interventoría asignada en el logro de la ejecución del proyecto de obras de adecuación que incluya estudios, diseños y licenciamiento de espacios administrativos y de formación en distintas regionales del SENA de los departamentos del **Grupo Andina 1**, en el marco del Contrato Interadministrativo No. 220005 de 2020.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:
Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y legal para la elaboración de Diagnósticos, Estudios, Diseños y Trámite para la expedición de licencias que sean requeridas en las intervenciones para cada una de las sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, en el marco del contrato interadministrativo no. 220005, del grupo Andina 1.

- **Contratos derivados**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CONTRATO DE CONSULTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE CONSULTORIA	
CONTRATO No.:	2210007 DE 2021	CONTRATO No.:	2210001 DE 2021
CONTRATISTA:	Soluciones Integrales de Ingeniería SODINSA S.A.	CONTRATISTA:	CONSORCIO PROCESO CC.
PLAZO INICIAL (En meses)	5	PLAZO INICIAL:	5
PLAZO ADICION 1 (En meses)	2,5	PLAZO ADICION:	2,5
PLAZO ADICION 2 (En meses)	0,5	PLAZO ADICION:	0,5
PLAZO ADICION 3 (En meses)	1	PLAZO ADICION:	1
PLAZO ADICION 4 (En meses)	1	PLAZO ADICION:	1
PLAZO ADICION 5 (En meses)	1	PLAZO ADICION:	1
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	1 de agosto de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	1 de agosto de 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	1 de marzo de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	1 de marzo de 2021
*FECHA INICIO DE SUSPENSIÓN 1:	27 de enero 2022	*FECHA INICIO DE SUSPENSIÓN:	27 de enero 2022
*FECHA FINAL DE SUSPENSIÓN 1:	14 de marzo de 2022	*FECHA FINAL DE SUSPENSIÓN:	14 de marzo de 2022
*FECHA INICIO DE PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN 2:	15 de marzo de 2022	*FECHA INICIO DE PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN:	15 de marzo de 2022
*FECHA FINAL DE PRÓRROGA SUSPENSIÓN 2:	28 de abril de 2022	*FECHA FINAL DE PRÓRROGA SUSPENSIÓN:	28 de abril de 2022
*FECHA INICIO DE PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN 3:	28 de abril de 2022	*FECHA FINAL DE PRÓRROGA SUSPENSIÓN:	28 de abril de 2022
*FECHA FINAL DE PRÓRROGA SUSPENSIÓN 3:	28 de Julio de 2022		28 de Julio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	2 de Agosto de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	2 de Agosto de 2022
*FECHA DE REINICIO:	29 de Julio de 2022	*FECHA DE REINICIO:	29 de Julio de 2022
FECHA INICIO DE PRORROGA:	2 de agosto de 2022	FECHA INICIO DE PRORROGA:	2 de agosto de 2022
FECHA FINAL DE PRORROGA:	2 de septiembre de 2022	FECHA FINAL DE PRORROGA	2 de septiembre de 2022
PLAZO ACTUALIZADO (En meses)	17	PLAZO ACTUALIZADO (En meses)	17
VALOR INICIAL ($):	$174.663.785,02	VALOR INICIAL:	$ 695.073.513,62
VALOR ADICION 1 ($):	$106.283.095,24	VALOR ADICION 1:	$ 104.157.411,15
VALOR ADICION 2 ($):	$ 34.364.669,71	VALOR ADICION 2:	$ 239.392.300,00
VALOR ADICION 3 ($):	$ 26,273,902.83	VALOR ADICION 3:	0
VALOR TOTAL+ ADICIONES ($):	$341.585.452,80	VALOR TOTAL+ ADICIONES($):	$1.038.623.224,777
VALOR PAGADO ($):	$273.268.364,24	VALOR PAGADO:	$ 830.898.579,81
VALOR POR PAGAR ($):	$102.400.628,63	VALOR POR PAGAR:	$ 207.724.644,96

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO EN EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Continúa en desarrollo del seguimiento a la ejecución de la actividad No. 4, trámite de licencias para los proyectos que lo requieran, para lo cual se suscribió una prórroga a la suspensión, debido a que las dependencias responsables de los trámites de licenciamiento continúan en la revisión de

los respectivos documentos radicados por el contratista consultor, algunas han presentado observaciones a los documentos presentados y otras han reportaron observaciones.

En este mes se informan que de las 9 licencias requeridas para el grupo, al corte del mes de Junio se cuenta con 6 licencias aprobadas y 1 rechazadas. Las otras 2 licencias se encuentran en trámite actual en curaduría.

- **Novedades contractuales estructuradas o suscritas en el periodo del informe:**

Durante el periodo se tramita una novedades contractual encaminada al reinicio del contrato el día 29 de Julio y a una prórroga por 30 días calendarios, iniciando el 2 de agosto del 2022 hasta el 2 de septiembre del 2022.

El estado actual de la actividad 4 es el siguiente:

ESTADO ACTIVIDAD 4 - ANDINA 1					
N°	**CODIGO SEDE**	**CIUDAD (ALCANCE)**	**FECHA RADICACIÓN DEBIDA FORMA**	**FECHA ENTREGA ACTA OBSERVACIONES**	**OBSERVACIONES**
1	9543	CARTAGO (LICENCIA CONSTRUCCIÓN - Gimnasio)	**16/12/2021**	**16/02/2022**	APROBADA
2	9504	APARTADÓ (LICENCIA CONSTRUCCIÓN - Kiosko)	**3/01/2022**	**08/03/2022** (Proyectada)	APROBADA
3	1010(5)	MEDELLÍN (LICENCIA CONSTRUCCIÓN - Escalera)	**07/01/2021** (Debida Forma)		- Se cuenta con Viabilidad del 14 de Julio del 2022 Con No 05001-1-21-2682 Radicado CP-2946/2022. Se tramito el pago de expensas de curaduría y delineación urbana ante la fiducia.
4	912710	EL BAGRE (LICENCIA CONSTRUCCIÓN - Sala Instructores)	**1/12/2021**	**04/02/2022** (Proyectada)	APROBADA
5	9526	CAMPO ALEGRE (LICENCIA CONSTRUCCIÓN - Restaurante)	**6/12/2021**	**7/02/2022**	APROBADA
6	9528	PITALITO (LICENCIA CONSTRUCCIÓN - Edificio Aulas)	**01/02/2022** (Radicación Físico)	**05/04/2022** (Proyectada)	APROBADA
7	119	GARZÓN (LICENCIA CONSTRUCCIÓN - Laboratorio Café)	**1/12/2021**	No presenta observaciones	APROBADA
8	9226	IBAGUÉ (LICENCIA CONSTRUCCIÓN - Cerramiento)	**23/11/2021**	**29/12/2021**	NEGADA

9	9223	DOSQUEBRADAS (LICENCIA CONSTRUCCIÓN - Hangar Automotriz)	29/03/2022	13/06/2022, la entidad tomó un plazo superior a los 45 días establecidos por la ley para la revisión inicial del proyecto	Después del reparto hecho por la Curaduría Urbana N° 2, el proyecto quedó radicado en la Curaduría N° 1 de Dosquebradas. - La Curaduría entregó cotización para pago de Cargo Fijo en las últimas semanas de diciembre del 2021, sin embargo, ENTERRITORIO no alcanzó a cancelar dicho pago por temas administrativos, por lo tanto fue necesario solicitar una nueva cotización en la primera semana de enero del 2022. A raíz del cambio de año por nueva resolución del Ministerio de Vivienda fue necesario cambiar Formulario Único Nacional. - El 11 de enero del 2022 se remitió al SENA y ENTERRITORIO nuevo formulario para firma del Arquitecto Edgar de la Hoz, pero a la fecha no ha sido entregado el formulario para radicación. - El 09 de febrero del 2022 finalmente el Arquitecto Edgar de la Hoz firmó el formulario de manera digital y lo entregó a la Consultoría. - El 14 de febrero del 2022 la Consultoría radica el formulario en la Curaduría, luego de conseguir las firmas originales del Subdirector del SENA y el apoderado. - El 21 de febrero del 2022 la Curaduría emite "Cotización" para pagar el Cargo Fijo de la Licencia, el mismo día la Consultoría remite el documento a ENTERRITORIO para que se realice dicho pago. - Hasta tanto no se realice el pago en mención el proyecto no queda radicado en debida forma y por tanto los tiempos de revisión no empiezan a correr oficialmente. - El 22 de marzo del 2022, la Supervisión remite a la Consultoría el comprobante del pago del Cargo Fijo, el mismo día la Consultoría lo remite a la Curaduría para la radicación en debida forma. - El 23 de marzo del 2022, la Curaduría comunica a la Consultoría, que el Certificado de Tradición y Libertad se encuentra vencido por 1 día, ante esto la Consultoría solicita actualizar el Certificado a la sede de del SENA de Dosquebradas, ya que la Consultoría ya lo había generado por sus propios costos 1 vez. El 28 de marzo del 2022, la Consultoría en vista de que la sede aún no entregaba el Certificado de Tradición y Libertad, nuevamente con sus propios costos descarga el certificado y lo remite a la Curaduría. -29/04/2022 radicación en debida forma - 13/06/2022 remisión de acta de observaciones (los 45 días hábiles se cumplieron el 3 de junio de 2022) Se ha trabajado conjuntamente con la Curaduría Primera de Dosquebradas, en la revisión de digital de los productos para tener un aval de los mismos antes de la radicación

De igual forma el consultor ha realizado los siguientes al trámite ante entidades prestadoras de Servicios (energía):

RADICACIONES ANTE ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS				
PROYECTOS DE REDISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS DE LA SEDE COMPLETA				
N°	SEDE	INTERVENCIÓN	CIUDAD	ESTADO
9203	Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción.	Diseño de la Red Eléctrica.	Medellín	Se radicó la solicitud de disponibilidad ante EPM, esta empresa pidió hacer una visita, la cual se llevó a cabo el 22 de febrero de 2022, el funcionario de EPM indicó que nos y requiere hacer un trámite ya que el cambio de transformador y redes es interno, nos encontramos a la espera de un documento escrito con esta información de parte de EPM

9528	Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Sur colombiano.	infraestructura Eléctrica.	Pitalito	No requiere tramite dado que la capacidad instalada de la sede es suficiente y las intervenciones son internas.
9121	Centro Atención Sector Agropecuario Risaralda.	Diseño Sistema Eléctrico.	Pereira	Se radicó la solicitud de disponibilidad ante la empresa de energía de Parreira el 10 de febrero de 2022, la cual fue observada el 16 de febrero, la consultoría se encuentra resolviendo las observaciones para radicar nuevamente. Ya fue aprobada la factibilidad falta pago por parte de ENTerritorio para iniciar fase final del proceso
9538	Despacho Regional Quindío.	Rediseño Redes Eléctricas.	Armenia	Se solicitaron los documentos a la sede sí que se haya obtenido respuesta, hace falta el documento de representación legal y la factura de energía. Ya fue aprobada la factibilidad falta pago por parte de ENTerritorio para iniciar fase final del proceso
EDIFICACIONES				
9528	Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Sur colombiano.	Elaboración de Estudios y Diseños.	Pitalito	Ya se cuenta con un trámite aprobado de disponibilidad, se requiere la licencia de construcción para realizar el segundo trámite que es la factibilidad.

Respecto a la actividad No. 3 la interventoría en su oficio remisorio manifiesta lo siguiente:

(…) *Adicional a lo anterior, es importante que la supervisión y/o ENTerritorio tenga un tiempo prudencial para realizar los pagos por concepto de expensas de las curadurías urbanas de Dos quebradas y Medellín una vez se expidan las respectivas licencias de construcción, las cuales en todo caso para su ejecutoria se requiere el pago antes citado, el cual se debe surtir ante el comité fiduciario.*

Finalmente, la consultoría está realizando la entrega de la segunda versión de las entregas impresas de los planos y documentos, de cada proyecto, hasta la fecha se han entregado y radicado en ENTerritorio 12 proyectos de 28, es decir que faltan por entregar 16 proyectos, a continuación, se presenta la programación de entrega de dichos productos:

Programación de entrega de proyectos impresos		
Semana	*Cant. De Proyectos*	*Proyectos*
Proyectos entregados	*12*	
Semana 1 (22 de julio)	*2*	*9527-Neiva, 9306 Manizales*
Semana 2 (29 de julio)	*3*	*1010(17) Manizales, 9543 Cartago, 1010(5) Medellín*
Semana 3 (5 de agosto)	*3*	*912710 El bagre, 9226 Ibagué Cafetería, 9121 Santa Rosa*
Semana 4 (12 de agosto)	*3*	*9203 Medellín elec, 9528 Pitalito, 9528 Pitalito edif.*
Semana 5 (19 de agosto)	*3*	*9121 Pereira elec, 9538 Armenia, 9223 Dosquebradas*
Semana 6 (26 de agosto)	*2*	*9311 Astin, 9526 Campo alegre*
Total	*28*	

Conforme lo anterior, no estamos de acuerdo con la afirmación del contratista "Es de precisar que, los plazos fueron estimados por contractualmente sin corresponder con lo establecido en la normatividad aplicable; tanto el plazo de la presente solicitud de la prórroga, así como el de la suspensión y los costos a ellos asociados no son imputables al Consorcio Proceso CC" ya que el incumplimiento reiterado del contratista a los compromisos genero retrasos en la correcta ejecución del contrato, por lo que la interventoría necesita reactivar el contrato para hacer el correcto seguimiento y poder finiquitar el objeto contratado o iniciar las acciones pertinentes que culminen

su cumplimiento, por lo cual el tiempo se considera prudente para finalizar las entregas físicas y los tramites de licencias de Medellín y de dos quebradas, toda vez que esta primera ya se encuentra en trámite de liquidación de expensas e impuestos Municipales para su expedición y dos quebradas se encuentra en proceso de una segunda revisión, quedando únicamente el pago de las expensas y la expedición de la licencia de construcción, nos permitimos manifestar que, el reinicio y la prórroga del contrato solicitada por el contratista, equivalente a TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, la presente interventoría emite CONCEPTO FAVORABLE y RECOMIENDA Reiniciar el contrato y prorrogar el tiempo de ejecución del contrato en los términos solicitados por el contratista, el cual consideramos congruente y proporcional a las actividades finales requeridas para culminar la totalidad del objeto contractual, resultando como fecha de reinicio a partir del 29 de julio de 2022 y se prorrogue el plazo contractual por un término de un (1) mes, es decir, hasta el 02 de septiembre de 2022. garantizando que la presente solicitud de prórroga contractual no implica una adición en recursos ni costos adicionales a la entidad contratante ENTerritorio (…)

- **Comités de seguimiento**

NA

- **Estudios y diseños**

La actividad de Elaboración Estudios y diseños se finalizada; se recibieron de forma digital todos los estudios y diseños y se hizo devolución física total de todos los impresos por presentar observaciones generadas por la Supervisión. Para el grupo Andina 1, se entregarán al SENA 28 estudios y diseños. Cabe señalar, que se realizarán para 20 centros de formación SENA.

Cinco (5) proyectos, son objeto de revisión por parte de la Interventoría debido a observaciones realizadas por los especialistas eléctricos y estructural de ENTerritorio.

- **Priorización para los proyectos que continúan a contratación de Obra.**

Contando con los presupuestos estimados en primera versión, se realiza por parte del SENA la siguiente priorización de 9 de la adecuación, pasan a etapa de la obra. La priorización se lleva a cabo por parte del SENA debido a que los recursos disponibles existentes en el PLAN OPERATIVO son insuficientes para ejecutar la totalidad de las obras que se encuentran en la Etapa de consultoría del Grupo Andina 1.

GRUPO	ALCANCES DE LAS CONSULTORÍAS DE LOS PROYECTOS	CUIDAD – DEPARTAMENTO	RADICADO	FECHA
Andina 1	Construcción y adecuación de los kioscos de formación de la Sede Complejo Tecnológico Agroindustrial Pecuario y Turístico.	Apartadó (Antioquia)	20214300507602	28/01/2022
	Cambio cubierta aula múltiple Sede Complejo Tecnológico Agroindustrial Pecuario y Turístico.	Apartadó (Antioquia)	20224300008332	12/01/2022
	Adecuaciones cubiertas Sede Centro Textil y de Gestión Industrial.	Medellín (Antioquia)	20224300000592	03/01/2022

	Adecuación la nueva sala de instructores Sede Centro de Automatización Industrial.	Manizales (Caldas)	20224300003772	06/01/2022
	Adecuaciones para el laboratorio de Calidad del café y construcción del módulo de Barismo en la Sede del Centro Agroempresarial y de Desarrollo Pecuario.	Garzón (Huila)	20214300499062	16/12/2021

- **Actividad 4 Licencias**

Con respecto al desarrollo de la Actividad No. 4, la interventoría reporta el avance detallado de la Actividad No. 4, así:

No	No Sede	Ciudad	Obra	Estado
1	9543	Cartago	Ampliación restaurante y cafetería	Licencia de construcción No 493-2022 de Junio 15 de 2022.
2	9504	Apartadó	construcción Kiosco	Licencia de construcción No. 059 de 2022.
3	1010(5)	Medellín	Mejora de accesibilidad y Escalera de emergencia	Con viabilidad y en tramite con fiducia
4	912710	El Bagre	Construcción sala de instructores	Licencia con RESOLUISÓN N° C1-009 del 25 de febrero del 2022.
5	117	Garzón	Adecuación del Laboratorio del café	Licencia de construcción obtenida el 07/03/2022 mediante resolución No. 042 del 03 de marzo de 2022
6	9226	Ibagué	Construcción de Cerramiento nuevo	Licencia rechazada mediante Resolución No. 73001-2-22-0136 del 11-03-2022.
7	9528	Pitalito	Diseños ampliación de cafetería aprendices, ambientes formación, baterías sanitarias	Licencia de Construcción 11327 del 14 de junio 2022
8	9526	Campo Alegre	Construcción de un restaurante	Resolución No 200 de 2022.
9	9223	Dos Quebradas	Construcción Hangar 2	En trámite, con subsanación de información
10	9121	Pitalito	Bodega	No se realiza trámite

- **Definiciones pendientes por parte del SENA**

En el presente periodo, no se tienen pendientes de definiciones por parte del Sena.

- **Otras actividades de gestión**

Desembolsos Contrato de Consultoría No. 2210007

Desembolso No. 1: Actividades 1 y 2 correspondiente al 13.38% del valor del contrato inicial, por un valor de **$139,014,702.72. CUMPLIDO**

Desembolso No. 2: Un Valor de DOSCIENTOS OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CINCUENTA Y CUATRO Y OCHO CENTAVOS **($208.522.054,09)** que corresponde al treinta por ciento (30%) del valor inicial del contrato, se pagará una vez el consultor entregue el cincuenta por ciento (50%) de los estudios y diseños correspondientes a cada proyecto, previo recibo a satisfacción de la interventoría. **CUMPLIDO**

Desembolso No. 3: Un valor de SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE **($71.817.690.00)** IVA incluido que corresponde al treinta por ciento (30%) del valor inicial de la adición No. 2 del contrato, se pagará una vez el consultor realice la Fase 1 para la perforación exploratoria y prueba de Bombeo: que comprende la

perforación exploratoria del pozo hasta la profundidad establecida en el permiso de exploración emitido por la entidad ambiental, y el sondeo eléctrico y la entrega informe técnico del contratista si las posibilidades de captación de agua son seguras en calidad y cantidad, previo recibo a satisfacción de la interventoría. Y la interventoría aprobará el inicio de la Fase 2. **CUMPLIDO**

Desembolso No. 4: Un valor de CIENTO DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE **($119,696,150.00)** IVA incluido que corresponde al cincuenta por ciento (50%) del valor de la adición No. 2 que equivalen a la sumatoria del 50% de cada pozo discriminado así: POZO 1 (70 METROS) PITALITO – HUILA CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS MCTE ($ 55,783,348.24), POZO 2 (40 METROS) BUGA - VALLE DEL CAUCA TREINTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($38,092,588.55) y POZO 3 (25 METROS) BUGA - VALLE DEL CAUCA VEINTI CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS CON VEINTE CENTAVOS MCTE ($25,820,213.20), se pagarán de acuerdo a la cantidad de pozos aprobados por la interventoría para dar inicio la Fase 2, y una vez el consultor realice la Fase 2 para la perforación exploratoria y prueba de Bombeo: que comprendería la ampliación de la perforación, encamisado, construcción del filtro, lavado, prueba de bombeo y análisis físico-químico del agua y entregue los estudios y diseños correspondientes a cada proyecto, previo recibo a satisfacción de la interventoría. **CUMPLIDO**

Desembolso No. 5: Un valor DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON UN CENTAVO **($291.847.983,01)** equivalente a: DOSCIENTOS OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($208,522,054.09) que corresponde al treinta por ciento (30%) del valor inicial del contrato, y un valor de OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (83.325.928,92) que corresponde al ochenta por ciento (80%) del valor de la adición 1 del contrato, se pagarán una vez el consultor entregue el cien por ciento (100%) de la totalidad los estudios y diseños, previo recibo a satisfacción de la interventoría. **CUMPLIDO**

A la fecha se ha desembolsado al contrato de consultoría No 221007 de 2021m el 80% del valor del contrato, es decir, un valor de OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE **($ 830.898.579,81).**

Desembolsos Contrato de Interventoría No.2210001

Desembolso No. 1: Actividades 1 y 2 correspondiente al 10.23% del valor del contrato inicial, por un valor de **34.932.757,00.CUMPLIDO**

Desembolso No. 2: Un valor de CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE **($52,399.135.51)** que corresponde al treinta por ciento (30%) del valor inicial del contrato, se pagará una vez se cumpla los siguientes requisitos: - El Interventor reciba a satisfacción la entrega realizada por parte del consultor sobre el cincuenta por ciento (50%) de los estudios y diseños correspondientes a cada Proyecto. - La entrega por parte del interventor y recibo a satisfacción de la supervisión, del informe parcial de la Actividad 3. **CUMPLIDO**

Desembolso No. 3: Un valor de DIEZ MILLONES DE PESOS TRESCIENTOS NUEVE MIL

CUATROCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE **($10.309.401.91)** IVA incluido que corresponde al treinta por ciento (30%) del valor inicial de la adición No. 2 del contrato, se pagará una vez se cumpla los siguientes requisitos: La entrega por parte del interventor y recibo a satisfacción de la supervisión del informe de la Fase 1. **CUMPLIDO**

Desembolso No. 4: Un valor de DIECISIETE MILLONES CIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE **($17,182,335.86)** que corresponde al cincuenta por ciento (50%) del valor inicial de la adición No. 2 del contrato, se pagará una vez se cumpla los siguientes requisitos: La entrega por parte del interventor y recibo a satisfacción de la supervisión, del informe de la Fase 2. **CUMPLIDO**

Desembolso No. 5: Un valor de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE **($158.444.733,96)** equivalentes a: CINCUENTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($ 52,399.135.51) que corresponde al treinta por ciento (30%) del valor inicial del contrato, un valor de OCHENTA Y CINCO MILLONES VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 85.026.476,19) que corresponde al ochenta por ciento (80%) del valor de la adición No. 1 del contrato y un valor de VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIDÓS PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS M/CTE ($ 21.259.122,26), que corresponde al ochenta por ciento (80%) del valor de la adición No. 3 del contrato, se pagarán una vez se cumplan los siguientes requisitos: - El Interventor reciba a satisfacción la entrega realizada por parte del consultor sobre el cien por ciento (100%) de la totalidad de los estudios y diseños correspondientes a cada Proyecto. - La entrega por parte del interventor y recibo a satisfacción de la supervisión, del informe final de la Actividad 3. **CUMPLIDO**

A la fecha se ha desembolsado al contrato de interventoría No 221001 de 2021, el 80% del valor del contrato, es decir, un valor de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE **($ 273.268.364,24).**

- **Informes de Interventoría**

Para el presente periodo no aplica la entrega de informes semanales dado que los contratos se encuentran suspendidos. El último informe de Interventoría fue el radicado No 20224300038232 del 4 de febrero de 2022, periodo de enero 2022 (1/01/2021 al 27/01/2022).

GRUPO ANDINA 2
INFORME DE LA GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA CONTRATO No. _2210002
ENTerritorio y SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA – SODINSA S.A
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2022.

Objetivo del informe: Presentarle al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA de manera clara y puntual, la gestión de la Interventoría asignada en el logro de la ejecución del proyecto de obras de adecuación que incluya estudios, diseños y licenciamiento de espacios administrativos y de formación en distintas regionales del SENA de los departamentos del **Grupo Andina 2**, en el marco del Contrato Interadministrativo No. 220005 de 2020.

Contrato No 2210002 de 2021, cuyo objeto es realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y legal para la elaboración de Diagnósticos, Estudios, Diseños y Trámite para la expedición de licencias que sean requeridas en las intervenciones para cada una de las sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, en el marco del contrato interadministrativo No. 220005, del grupo andina 2 que corresponde a las sedes priorizadas, ubicadas en Arauca, Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Guainía, Meta y Vaupés.

- . **Información general de los contratos:**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE CONSULTORÍA**	
CONTRATO No.:	2210002 DE 2021	CONTRATO No.:	2210008 DE 2021
CONTRATISTA:	Soluciones Integrales de Ingeniería SODINSA S.A.	CONTRATISTA:	CONSORCIO PROCESO CC.
PLAZO INICIAL (En meses)	5 meses	PLAZO INICIAL:	5 meses
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	1 de agosto de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	1 de agosto de 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	1 de marzo de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	1 de marzo de 2021
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	14 de febrero de 2022	*FECHA DE SUSPENSIÓN:	14 de febrero de 2022
*FECHA DE REINICIO:	26 de abril de 2022	*FECHA DE REINICIO:	26 de abril de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	29 de abril de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	29 de abril de 2022
PLAZO ACTUALIZADO (En meses)	10 meses y 15 días	PLAZO ACTUALIZADO (En meses)	10 meses y 15 días
VALOR INICIAL ($):	175.372.010,35	VALOR INICIAL ($):	769.271.875.97
VALOR ADICIÓN 1 ($):	50.765.311,26	VALOR ADICIÓN 1 ($):	98.834.451,13
VALOR ADICIÓN 2 ($)	14.404.062,76	VALOR ADICIÓN 2 ($)	50.538.684,40
VALOR ADICIÓN 3 ($)	13.395.704,47		-
VALOR ACTUALIZADO ($):	253.937.088,84	VALOR ACTUALIZADO ($):	918.645.011,50
VALOR PAGADO ($):	203.149.671,11	VALOR PAGADO ($):	721.520.304,72

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO EN EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

- **Novedades contractuales durante el periodo:**

Durante este periodo no se realizaron novedades contractuales. Teniendo en cuenta que, el contrato de Interventoría No.2210002 y Consultoría No.2210008 terminaron el 29 de abril de 2022.

En este sentido, el estado es el siguiente:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	**REVISIÓN, VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD 1 (VISITA A LAS SEDES CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE IN-FORMACIÓN TÉCNICA Y RECOLECTAR LOS DATOS ESENCIALES PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO).**				
1,1	Visita 9111 - Centro Minero 4 Remodelación y ampliación de la cafetería y restaurante del centro de formación. Sogamoso	1	1	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoría el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en el acta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoría SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-31-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9111-1-CAFETERIA Y RESTAURANTE R-20214300128692 del 20/04/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 12)
1,2	Visita 9111 - Centro Minero 4 Adecuación de ambientes de formación Sogamoso	1	1	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoría el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en el acta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoría SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-36-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9111-2 R-20214300138462 del 26/04/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 13)
1,3	Visita 9111 - Centro Minero 4 Adecuación de la cubierta de los ambientes de formación Sogamoso	1	1	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoria el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en el acta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoría SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-32-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9111-3-ADEC CUBIERTA R-20214300128642 del 20/04/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 14)

1,4	Visita 9111 - Centro Minero 4 Construcción del cerramiento perimetral de la sede Morca Sogamoso	1	1	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoria el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en el acta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-29-REMISIÓN APROB.INF DIAG 9111-4-CONST CERRAMIENTO R-20214300128612 del 20/04/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 15)
1,5	Visita 9111 - Centro Minero 4 Construcción de la PTAR doméstica y no domestica Sogamoso	1	1	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoria el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en el acta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-55-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9111-05 R-20214300164382 del 14 de mayo de 2021, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-55-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9111-05 R-20214300164382 del 14/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 16)
1,6	Visita 9514 - Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura 2 Construcción de un punto de acceso controlado SENA-CIMM Sogamoso	1	1	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoria el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en el acta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-34-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9514-6-ACCESO APREND R-20214300128942 del 20704/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 17)
1,7	Visita 9514 - Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura 2 Construcción de la zona de confort y gimnasio de empleados públicos CIMMM Sogamoso	1	1	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoria el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en el acta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-35-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9514-7 R-20214300137142 del 23/04/2022 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 18)
1,8	Visita: 1010(15) - Despacho Regional Boyacá Adecuación, ampliación y actualización del almacén central de regional Boyacá Sogamoso	1	1	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoria el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en el acta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-51-REMISIÓN APROB. INF DIAG 1010(15)-08 R-20214300163872 del 13/05/2021,emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-51-REMISIÓN APROB. INF DIAG 1010(15)-08 R-20214300163872

					del 13/05/2021 físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 19)
1,9	Visita:9514 - Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura 2 consultoría general, ampliación almacén grupo administrativo de apoyo mixto Sogamoso	1	1	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoria el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en el acta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-52-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9514-09 R-20214300163822 del 13/05/2021, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-52-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9514-09 R-20214300163822 del 13/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 20)
1,10	Visita 9232 - Centro Industrial y Desarrollo Empresarial Adecuación de los ambientes de Electrónica, Diseño, ingeniería y Física Soacha	1	1	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoria el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en el acta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-40-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9232-10 R-20214300145432 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 21)
1,11	Visita 9512 - Centro de Biotecnología Agropecuaria Adecuación de sedes sindicales Mosquera	1	1	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoria el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en el acta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-41-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9512-11 R-20214300148752 del 4/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 22)
1,12	Visita 9513 - Centro De Desarrollo Agroempresarial Construcción del Cerramiento entrega de Cesión tipo A - Chía	1	1	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoria el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en el acta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-53-REMISIÓN DIAG 9513-12 R-20214300164432 del 14/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 23)

1,13	Visita 9513 - Centro De formación del Servicio Nacional de aprendizaje Construcción de la Sede del SENA Proyecto por metodología BIM La Calera	1	1	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoria el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en el acta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-50-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9513-13 R-20214300163892 del 13/05/2021, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-50-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9513-13 R-20214300163892 del 13/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 11)
1,14	Visita 9117 - Centro Agroindustrial del Meta 2 Remodelación centro de convivencia, casino, ambientes de formación, cubiertas y baterías sanitarias Villavicencio	1	1	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoria el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en el acta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-60-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9117-14 R-20214300180612 del 25/05/2021, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-60-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9117-14 R-20214300180612 del 25/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 10)
1,15	Visita 9117 - Centro Agroindustrial del Meta 2 Construcción de tanques de almacenamiento de agua potables Villavicencio	1	1	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoria el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en el acta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-56-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9117-15 R-20214300165412 del 14/05/2021, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-56-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9117-15 R-20214300165412 del 14/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 9)
1,16	Visita 9210 - Centro de Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones Adecuación del Ambiente del Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones perteneciente al Complejo Sur ubicado en la carrera 30 No 17 B-25 sur de la Regional Distrito Capital del SENA. Bogotá	1	1	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoria el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en el acta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-64-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9210-16 R-20214300180502 del 25/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 8)

1,17	Visita1001 - Dirección Administrativa y Financiera Adecuación de la cubierta de la Dirección General incluye la impermeabilización Bogotá	1	1	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoria el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en el acta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-65-REMISIÓN APROB. INF DIAG 1001-17 R-20214300180482 del 25/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 7)
1,18	Visita 9404 - Centro de Gestión Administrativa Adecuación cubierta terraza y rampa tercer piso. Bogotá	1	1	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoria el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en el acta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-62-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9404-18 R-20214300180652 del 25/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 6)
1,19	Visita 9547 - Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico 3 Construcción de la biblioteca para la sede principal de la regional Guainía Inírida	1	1	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoria el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en el acta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-45-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9547-19 R-20214300158962 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 5)
1,20	Visita 9547 - Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico 3 Construcción de la sala de instructores y espacios de confort del centro de la regional Inírida	1	1	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoria el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en el acta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-46-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9547-20 R-20214300159022 del 11/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 4)
1,21	Visita 9547 - Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico 3 Adecuación de cubiertas de los pasillos del centro y pago de trámites Inírida	1	1	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoria el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en el acta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-47-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9547-21 R-20214300159002 del 11/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 3)

1,22	Visita 9548 - Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jiri jirimo Adecuaciones de las áreas administrativa, bienestar, ambientes de formación, sala de instructores y espacio de confort del Centro. Mitú	1	1	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoria el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en el acta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-61-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9548-22 R-20214300180632 del 25/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 1).
1,23	Visita 9547 -9530 - Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca	1	1	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoria el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en el acta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-63-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9530-23 R-20214300180552 del 25/05/2022 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 2)
1,24	Visita: 1234 --Escuela Nacional de Instructores Rodolfo Martinez Tono – Reparaciones locativas Casa Teusaquillo	1	1	100%	
2	**REVISIÓN, VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD 2 (ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE ACUERDO CON LA INTERVENCIÓN ESTABLECIDA EN LA MATRIZ DE CADA GRUPO).**				
2,1	Diagnostico 9111 - Centro Minero 4 Remodelación y ampliación de la cafetería y restaurante del centro de formación. Sogamoso	1	1	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio No. SODI-002-21-CPCC-G2-33-APROBACIÓN INF DIAG 9111-1-CAFETERIA Y RESTAURANTE 20214300127002 del 19/04/2021, emitido por la interventoría SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-31-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9111-1-CAFETERIA Y RESTAURANTE R-20214300128692 del 20/04/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FÍSICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 12) Alternativa No.1 aprobada por el SENA, mediante comunicado radicado No.20214300271302.
2,2	Diagnostico 9111 - Centro Minero 4 Adecuación de ambientes de formación Sogamoso	1	1	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio NoSODI-002-21-CPCC-G2-39-APROBACIÓN INF DIAG 9111-02 V2 radicado en ENTerritorio No.20214300137772 del 23/04/2022, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-36-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9111-2 R-20214300138462 del 26/04/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 13) Alternativa No.2 aprobada por el SENA, mediante comunicado radicado No.20214300271302.

2,3	Diagnostico 9111 - Centro Minero 4 Adecuación de la cubierta de los ambientes de formación Sogamoso	1	1	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio No.SODI-002-21-CPCC-G2-34-APROBACIÓN INF DIAG 9111-3-ADEC CUBIERTA radicado en ENTerritorio No.20214300127052 del 19/04/2022, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-32-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9111-3-ADEC CUBIERTA R-20214300128642 del 20/04/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 14) Alternativa No.1 aprobada por el SENA, mediante comunicado radicado No.20214300270992.
2,4	Diagnostico 9111 - Centro Minero 4 Construcción del cerramiento perimetral de la sede Morca Sogamoso	1	1	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio No. SODI-002-21-CPCC-G2-32-APROBACIÓN INF DIAG 9111-4-CONST CERRAMIENTO radicado en ENTerritorio No.20214300126012 del 16/04/2021, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-29-REMISIÓN APROB.INF DIAG 9111-4-CONST CERRAMIENTO R-20214300128612 del 20/04/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 15) Alternativa No.3 aprobada por el SENA, mediante comunicado radicado No.20214300270992.
2,5	Diagnostico 9111 - Centro Minero 4 Construcción de la PTAR doméstica y no domestica Sogamoso	1	1	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio No. SODI-002-21-CPCC-G2-76-APROBACIÓN INF DIAG 9111-05 V2 radicado en ENTerritorio No.20214300163882 del 13/05/2021, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-55-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9111-05 R-20214300164382 del 14/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 16) Alternativa No.2 aprobada por el SENA, mediante comunicado radicado No.20214300271312.
2,6	9514 - Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura 2Construcción de un punto de acceso controlado SENA-CIMM Sogamoso	1	1	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio No. SODI-002-21-CPCC-G2-35-APROBACIÓN INF DIAG 9514-6-ACCESO APREND radicado en ENTerritorio No.20214300128632 del 20/04/2021, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-34-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9514-6-ACCESO APREND R-20214300128942 del 20704/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 17) Alternativa No.1 aprobada por el SENA, mediante comunicado radicado No.20214300271302.
2,7	Diagnostico 9514 - Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura 2 Construcción de la zona de confort y gimnasio de empleados públicos CIMMM Sogamoso	1	1	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio No. SODI-002-21-CPCC-G2-37-APROBACIÓN INF DIAG 9514-7-CONST GIMNASIO radicado en ENTerritorio No.20214300130052 del 20/04/2021, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-35-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9514-7 R-20214300137142 del 23/04/2022 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA

					18) Alternativa No.1 aprobada por el SENA, mediante comunicado radicado No.20214300271302.
2,8	Diagnóstico: 1010(15) - Despacho Regional Boyacá Adecuación, ampliación y actualización del almacén central de regional Boyacá Sogamoso	1	1	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio No. SODI-002-21-CPCC-G2-71-APROBACIÓN INF DIAG1010(15)-08 V2. radicado en ENTerritorio No.20214300163112 del 13/05/2021, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-51-REMISIÓN APROB. INF DIAG 1010(15)-08 R-20214300163872 del 13/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 19). Alternativa No.3 aprobada por el SENA, mediante comunicado radicado No.20214300271312.
2,9	Diagnóstico: 9514 - Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura 2 consultoría general, ampliación almacén grupo administrativo de apoyo mixto Sogamoso	1	1	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio No. SODI-002-21-CPCC-G2-72-APROBACIÓN INF DIAG 9514-09 V2 radicado en ENTerritorio No.20214300163132 del 13 de mayo de 2021, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-52-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9514-09 R-20214300163822 del 13/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 20) De conformidad con la comunicación del SENA del 27 de mayo de 2021 y lo comunicado por el supervisor mediante correo electrónico del 29 de mayo de 2021, el proyecto en referencia ya cuenta con estudios y diseños con licenciamiento.
2,10	Diagnostico 9232 - Centro Industrial y Desarrollo Empresarial Adecuación de los ambientes de Electrónica, Diseño, ingeniería y Física Soacha	1	1	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio No. SODI-002-21-CPCC-G2-50-APROBACIÓN INF DIAG 9232-10 V2 radicada en ENTerritorio No.20214300144922 del 30/04/2021, emitido por la interventoría SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-40-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9232-10 R-20214300145432 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FÍSICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 21) Alternativa No.2 aprobada por el SENA, mediante comunicado radicado No.20214300271032.
2,11	Diagnostico 9512 - Centro de Biotecnología Agropecuaria Adecuación de sedes sindicales Mosquera	1	1	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio No. SODI-002-21-CPCC-G2-52-APROBACIÓN INFORME DIAGNOSTICO 9512-11 V2 radicado en ENTerritorio No.20214300145232 del 3/05/2021, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-41-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9512-11 R-20214300148752 del 4/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 22) Alternativa No.2 aprobada por el SENA, mediante

					comunicado radicado No.20214300271032.
2,12	Diagnostico 9513 - Centro De Desarrollo Agroempresarial Construcción del Cerramiento entrega de Cesión tipo A - Chía	1	1	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio No. SODI-002-21-CPCC-G2-69-APROBACIÓN INF DIAG 9513-12 V2 radicado en ENTerritorio No.20214300161292 del 12/05/2021, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-53-REMISIÓN DIAG 9513-12 R-20214300164432 del 14/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 23). Alternativa No.1 aprobada por el SENA, mediante comunicado radicado No.20214300271312.
2,13	Diagnostico 9513 - Centro De formación del Servicio Nacional de aprendizaje Construcción de la Sede del SENA Proyecto por metodología BIM La Calera	1	1	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio No. SODI-002-21-CPCC-G2-70-APROBACIÓN INF DIAG 9513-13 V2, radicado en ENTerritorio No.20214300162042 del 12/05/2021, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-50-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9513-13 R-20214300163892 del 13/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 11) Descartados por el Sena conforme lo comunicado por ENTerritorio mediante radicado No.20212200126771 del 28/06/2021.
2,14	Diagnóstico: 9117 - Centro Agroindustrial del Meta 2 Remodelación centro de convivencia, casino, ambientes de formación, cubiertas y baterías sanitarias Villavicencio	1	1	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio No. SODI-002-21-CPCC-G2-80-APROBACIÓN INF DIAG 9117-14 V2 radicado en ENTerritorio No.20214300170992 del 20/05/2021, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-60-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9117-14 R-20214300180612 del 25/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 10) Alternativa No.1 aprobada por el SENA, mediante comunicado radicado No.20214300271442.
2,15	Diagnóstico:9117 - Centro Agroindustrial del Meta 2 Construcción de tanques de almacenamiento de agua potable Villavicencio	1	1	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio No. SODI-002-21-CPCC-G2-77-APROBACIÓN INF DIAG 9117-15 V2 radicado en ENTerritorio No.20214300164632 del 14 de mayo de 2021, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-56-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9117-15 R-20214300165412 del 14/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 9) Alternativa No.2 aprobada por el SENA, mediante comunicado radicado No.20214300271312.
2,16	Diagnóstico:9210 - Centro de Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones Adecuación del Ambiente del Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones perteneciente al Complejo Sur ubicado en la carrera 30 No 17 B-25 sur de la Regional Distrito Capital del SENA.	1	1	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio No. SODI-002-21-CPCC-G2-84-APROBACIÓN INF DIAG 9210-16 V2 radicado en ENTerritorio No.20214300172872 del 21/05/2021, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-64-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9210-16 R-20214300180502 del 25/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-

					20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 8) Alternativa No.1 aprobada por el SENA, mediante comunicado radicado No.20214300270872.
2,17	Diagnóstico:1001 - Dirección Administrativa y Financiera Adecuación de la cubierta de la Dirección General incluye la impermeabilización Bogotá	1	1	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio No. SODI-002-21-CPCC-G2-86-APROBACIÓN INF DIAG 1001-17 V2 radicado en ENTerritorio No.20214300174542 del 21/05/2022, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-65-REMISIÓN APROB. INF DIAG 1001-17 R-20214300180482 del 25/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 7) Alternativa No.1 aprobada por el SENA, mediante comunicado radicado No.20214300270872.
2,18	Diagnóstico: 9404 - Centro de Gestión Administrativa Adecuación cubierta terraza y rampa tercer piso. Bogotá	1	1	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio No. SODI-002-21-CPCC-G2-82-APROBACIÓN INF DIAG. 9404-18 V2 radicado en ENTerritorio No.20214300172842 del 21/05/2021, emitido por la interventoría SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-62-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9404-18 R-20214300180652 del 25/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FÍSICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 6) Alternativa No.1 aprobada por el SENA, mediante comunicado radicado No.20214300271442.
2,19	Diagnostico 9547 - Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico 3 Construcción de la biblioteca para la sede principal de la regional Guainía Inírida	1	1	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio No. SODI-002-21-CPCC-G2-61-APROBACIÓN INF DIAG. 9547-19 V4 radicado en ENTerritorio No.20214300155582 del 7/05/2021, emitido por la interventoría SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-45-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9547-19 R-20214300158962 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 5). Alternativa No.3 aprobada por el SENA, mediante comunicado radicado No.20214300271062.
2,20	Diagnostico 9547 - Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico 3 Construcción de la sala de instructores y espacios de confort del centro de la regional Inírida	1	1	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio No. SODI-002-21-CPCC-G2-62-APROBACIÓN INF DIAG 9547-20 V3 radicado en ENTerritorio No.20214300154622 del 7/05/2021, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-46-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9547-20 R-20214300159022 del 11/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 4) Alternativa No.3 aprobada por el SENA, mediante comunicado radicado No.20214300271062.

2,21	Diagnostico 9547 - Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico 3 Adecuación de cubiertas de los pasillos del centro y pago de trámites Inírida	1	1	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio No. SODI-002-21-CPCC-G2-65-APROBACIÓN INF DIAG 9547-21 V2 radicado en ENTerritorio No.20214300155732 del 7/05/2021, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-47-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9547-21 R-20214300159002 del 11/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 3). Alternativa No.3 aprobada por el SENA, mediante comunicado radicado No.20214300271092.
2,22	Diagnóstico: 9548 - Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jiri jirimo Adecuaciones de las áreas administrativa, bienestar, ambientes de formación, sala de instructores y espacio de confort del Centro. Mitú	1	1	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio No. SODI-002-21-CPCC-G2-81-APROBACIÓN INF DIAG 9548-22 V2 radicado en ENTerritorio No.20214300171012 del 20/05/2021, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-61-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9548-22 R-20214300180632 del 25/05/202 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 1). Alternativa No.1 aprobada por el SENA, mediante comunicado radicado No.20214300271442.
2,23	Diagnóstico: 9530 - Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca Construcción de la nueva sala de instructores del centro. Arauca	1	1	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio No.SODI-002-21-CPCC-G2-83-APROBACIÓN INF DIAG 9530-23 V2 radicado en ENTerritorio No.20214300172882 del 21/05/2021, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-63-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9530-23 R-20214300180552 del 25/05/2022 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 2) Alternativa No.3 aprobada por el SENA, mediante comunicado radicado No.20214300271442.
2,24	Diagnóstico: 1234 --Escuela Nacional de Instructores Rodolfo Martinez Tono – Reparaciones locativas Casa Teusaquillo	1	1	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio No. SODI-002-21-CPCC-G2-369-Remision diagnósticos aprobados Casa Teusaquillo-R-20214300418512, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-138-REMISIÓN APROB. INF Casa Teusaquillo R-20214300361012
3	**REVISIÓN, VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD 3 (ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CORRESPONDIENTES A CADA INTERVENCIÓN).**				
3,1	Estudios y diseños firmados y aprobados Sede 01_9111 – Centro Minero 4 – Remodelación y ampliación de la cafetería y restaurante del centro de formación.	9	9	96%	Se remitieron los productos de la actividad 3 estudios y diseños firmados y aprobados por la Interventoría, de manera física y digital mediante comunicado radicado No.20224300243212 del 28 de junio de 2022.

3,2	Estudios y diseños firmados y aprobados Sede 02_9111 – Centro Minero 4 – Adecuación de ambientes de formación	9	9	96%	Se remitieron los productos de la actividad 3 estudios y diseños firmados y aprobados por la Interventoría, de manera física y digital mediante comunicado radicado No.20224300266862 del 18 de julio de 2022.
3,3	Estudios y diseños firmados y aprobados Sede 03_9111 " Adecuación de la cubierta de los ambientes de formación "	5	5	98%	Se remitieron los productos de la actividad 3 estudios y diseños firmados y aprobados por la Interventoría, de manera física y digital mediante comunicado radicado No.20224300250472 del 6 de julio de 2022.
3,4	Estudios y diseños firmados y aprobados Sede 04_9111 "Construcción del cerramiento perimetral de la sede morca".	6	6	100%	Se hace entrega al SENA mediante comunicado radicado No.20222200112481 del 15 de junio de 2022, consecutivo SENA No.01-1-2022-001164.
3,5	Estudios y diseños firmados y aprobados Sede 05_9111 "Revisión y ajuste de diseños: Construcción de la PTAR doméstica y no doméstica"	8	8	98%	Se hace entrega al SENA mediante comunicado radicado No.20222200133171 del 22 de julio de 2022.
3,6	Estudios y diseños firmados y aprobados Sede 06_9514 Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura 2 – Construcción de un punto de acceso controlado SENA-CIMM.	8	8	98%	Se remitieron los productos de la actividad 3 estudios y diseños firmados y aprobados por la Interventoría, de manera física y digital mediante comunicado radicado No.20224300250422 del 06 de julio de 2022.

3,7	Estudios y diseños firmados y aprobados Sede 07_9514 – Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura 2 – Construcción de la zona de confort y gimnasio de empleados públicos CIMM	8	8	96%	Se remitieron los productos de la actividad 3 estudios y diseños firmados y aprobados por la Interventoría, de manera física y digital mediante comunicado radicado No.20224300245552 del 30 de junio de 2022.
3,8	Estudios y diseños firmados y aprobados Sede 08_1010(15) – Despacho Regional Boyacá – Adecuación, ampliación y actualización del almacén central de regional Boyacá.	5	5	98%	Se remitieron los productos de la actividad 3 estudios y diseños firmados y aprobados por la Interventoría, de manera física y digital mediante comunicado radicado No.20224300250512 del 6 de julio de 2022.
3,9	Estudios y diseños firmados y aprobados sede 09_9514 - Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura 2 Consultoría general, ampliación almacén grupo administrativo de apoyo mixto Sogamoso	0	0	N/A	De conformidad con la comunicación del SENA del 27 de mayo de 2021 y lo comunicado por el supervisor mediante correo electrónico del 29 de mayo de 2021, el proyecto en referencia ya cuenta con estudios y diseños con licenciamiento.
3,10	Estudios y diseños firmados y aprobados Sede 10_9232 – Centro Industrial y Desarrollo Empresarial de Soacha – Adecuación de los ambientes de Electrónica, Diseño, ingeniería y Física	9	9	98%	Se remitieron los productos de la actividad 3 estudios y diseños firmados y aprobados por la Interventoría, de manera física y digital mediante comunicado radicado No.20224300245582 del 30 de junio de 2022.
3,11	Estudios y diseños firmados y aprobados Sede 11_9512 – Centro de Biotecnología Agropecuaria – Adecuación de sedes sindicales.	8	8	98%	Se hace entrega al SENA mediante comunicado radicado No.20222200135791 del 26 de julio de 2022.

3,12	Estudios y diseños firmados y aprobados Sede 12_9513 – Centro De Desarrollo Agroempresarial Construcción del Cerramiento entrega de Cesión tipo A - Chía.	6	6	96%	Se remitieron los productos de la actividad 3 estudios y diseños firmados y aprobados por la Interventoría, de manera física y digital mediante comunicado radicado No.20224300266842 del 18 de julio de 2022.
3,13	Estudios y diseños firmados y aprobados sede 13_9513 – La Calera ubicado en la sede del centro de formación del servicio nacional de aprendizaje en La Calera, cuyo alcance es “Construcción de la Sede del SENA Proyecto por metodología BIM”.	0	0	N/A	Descartados por el Sena conforme lo comunicado por ENTerritorio mediante radicado No.20212200126771 del 28/06/2021.
3,14	Estudios y diseños firmados y aprobados Sede 14_9117 – Centro Agroindustrial del Meta 2 – Remodelación centro de convivencia, casino, ambientes de formación, cubiertas y baterías sanitarias.	8	8	96%	Se remitieron los productos de la actividad 3 estudios y diseños firmados y aprobados por la Interventoría, de manera física y digital mediante comunicado radicado No.20224300250442 del 06 de julio de 2022.
3,15	Estudios y diseños firmados y aprobados Sede 15_9117 "Revisión y ajuste de los diseños: Construcción de tanques de almacenamiento de agua potable"	5	5	98%	Se hace entrega al SENA mediante comunicado radicado No. 20222200133231 del 22 de julio de 2022,
3,16	Estudios y diseños firmados y aprobados Sede 16_9210 Centro de Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones - Adecuación del Ambiente del Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones perteneciente al Complejo Sur ubicado en la carrera 30 No 17B-25 sur de la Regional Distrito Capital del SENA.	4	4	94%	Se hace entrega al SENA mediante comunicado radicado No. 20222200126711 del 13 de julio de 2022.
3,17	Estudios y diseños firmados y aprobados Sede 17_1001 – Dirección Administrativa y Financiera – Adecuación de la cubierta de la Dirección General incluye la impermeabilización.	5	5	98%	Se hace entrega al SENA mediante comunicado radicado No. 20222200126691 del 13 de julio de 2022.
3,18	Estudios y diseños firmados y aprobados Sede 18_9404: Adecuación cubierta terraza y rampa tercer piso.	5	5	94%	Se hace entrega al SENA mediante comunicado radicado No. 20222200126701 del 13 de julio de 2022.

3,19	Estudios y diseños firmados y aprobados Sede 19 y 20_9547 – Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico 2- (Construcción de la biblioteca para la sede principal de la regional Guainía) y Construcción de la sala de instructores y espacios de confort del centro de la regional.	8	8	100%	Se hace entrega al SENA mediante comunicado radicado No.20222200112511 del 15 de junio de 2022, consecutivo SENA No.01-1-2022-001163.
3,20	Estudios y diseños firmados y aprobados Sede 21_9547 – Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico 2– Adecuación de cubiertas de los pasillos del centro y pago de trámites.	5	5	100%	Se hace entrega al SENA mediante comunicado radicado No.20222200104811 del 03 de junio de 2022, consecutivo SENA No.01-1-2022-001127.
3,21	Estudios y diseños firmados y aprobados Sede 22_9548 Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jiri jirimo – Adecuaciones de las áreas administrativa, bienestar, ambientes de formación, sala de instructores y espacio de confort del Centro.	8	8	94%	Se remitieron los productos de la actividad 3 estudios y diseños firmados y aprobados por la Interventoría, de manera física y digital mediante comunicado radicado No.202243002550492 del 6 de julio de 2022.
3,22	Estudios y diseños firmados y aprobados Sede 23_9530 Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca – Construcción de la nueva sala de instructores del centro.	8	8	94%	Se remitieron los productos de la actividad 3 estudios y diseños firmados y aprobados por la Interventoría, de manera física y digital mediante comunicado radicado No.20224300243252 del 28 de junio de 2022. Sin embargo, fue devuelto por ENTerritorio mediante comunicado radicado No.20222200126401 del 13 de julio.
3,23	Estudios y diseños firmados y aprobados Sede 1234 – Escuela Nacional de Instructores – Rodolfo Martínez Toro –Casa Teusaquillo.	8	8	100%	Se hace entrega al SENA mediante comunicado radicado No.20222200112011 del 14 de junio de 2022, consecutivo SENA No.01-1-2022-001289.
4	**REVISIÓN, VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD 4 (TRÁMITE PARA LA EXPEDICIÓN DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE).**				

4,1	Licencia de Modificación Sede 01_9111 – Centro Minero 4 – Remodelación y ampliación de la cafetería y restaurante del centro de formación.	N/A	N/A	N/A	No tramitada de conformidad con lo indicado por el SENA mediante comunicado radicado en ENTerritorio No.20224300136122 del 8/04/2022.
4,2	Licencia de Ampliación Sede 02_9111 – Centro Minero 4 – Adecuación de ambientes de formación	1	1	98%	Aprobada por la curaduría Nº2 de Sogamoso. Radicada en ENTerritorio No.20224300210882.
4,3	Licencia de cerramiento Sede 04_9111 "Construcción del cerramiento perimetral de la sede morca".	1	1	98%	Aprobada por la curaduría Nº2 de Sogamoso mediante la resolución Nº15759-2-22-0244 del 1 de abril de 2022. Radicada en ENTerritorio No.20224300210882.
4,4	Sede 03_9111 " Adecuación de la cubierta de los ambientes de formación "	N/A	N/A	N/A	No requiere tramites de permisos o licencias.
4,5	Trámite de permiso de ocupación de cauce Sede 05_9111 "Revisión y ajuste de diseños: Construcción de la PTAR doméstica y no doméstica"	1	1	90%	Pendiente entregar los siguientes documentos al Centro Minero el 17 de mayo de 2022, referentes al trámite para el permiso de ocupación del cauce: -Presentar descripción de la obra objeto de ocupación de cauce y documento técnico donde se describa el manejo ambiental durante la construcción de dicha obra. -Diseño de la obra objeto de ocupación de cauce y 9. Cronograma de ejecución de la obra.
4,6	Licencia de construcción Obra Nueva Sede 06_9514 Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura 2 –Construcción de un punto de acceso controlado SENA-CIMM.	1	1	98%	Aprobada por la curaduría Nº2 de Sogamoso mediante la resolución Nº15759-2-22-0173 del 1 de marzo de 2022. Radicada en ENTerritorio No.20224300210882.
4,7	Licencia de construcción Obra Nueva Sede 07_9514 – Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura 2 – Construcción de la zona de confort y gimnasio de empleados públicos CIMM	1	1	98%	Aprobada por la curaduría Nº2 de Sogamoso mediante la resolución Nº15759-2-22-0173 del 1 de marzo de 2022 Radicada en ENTerritorio No.20224300210882.
4,8	Sede 08_1010(15) – Despacho Regional Boyacá – Adecuación, ampliación y actualización del almacén central de regional Boyacá.	N/A	N/A	N/A	No requiere tramites de permisos o licencias.
4,9	Licencia de Modificación Sede 10_9232 – Centro Industrial y Desarrollo Empresarial de Soacha –Adecuación de los ambientes de Electrónica, Diseño, ingeniería y Física	N/A	N/A	N/A	No tramitada de conformidad con lo indicado por el SENA mediante comunicado radicado en ENTerritorio No.20224300136122 del 8/04/2022.
4,10	Licencia de reconocimiento Sede 11_9512 – Centro de Biotecnología Agropecuaria – Adecuación de sedes sindicales.	N/A	N/A	N/A	No tramitada de conformidad con lo indicado por el SENA mediante comunicado radicado en ENTerritorio No.20224300136122 del 8/04/2022.
4,11	Licencia de construcción cerramiento Sede 12_9513 – Centro De Desarrollo Agroempresarial Construcción del Cerramiento entrega de Cesión tipo A - Chía.	1	1	95%	Aprobada por la Dirección de Urbanismo de Chía mediante licencia No.20221060 del 21 de junio de 2022 Radicada en ENTerritorio No.20224300245532.
4,12	Licencia de construcción Obra Nueva Sede 14_9117 – Centro Agroindustrial del Meta 2 – Remodelación centro de convivencia, casino, ambientes de formación, cubiertas y baterías sanitarias.	1	1	N/A	No tramitada de conformidad con lo indicado por el SENA mediante comunicado radicado en ENTerritorio No.20224300136122 del 8/04/2022.
4,13	Sede 15_9117 "Revisión y ajuste de los diseños: Construcción de tanques de almacenamiento de agua potable"	N/A	N/A	N/A	No requiere tramites de permisos o licencias.

4,14	Sede 16_9210 Centro de Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones - Adecuación del Ambiente del Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones perteneciente al Complejo Sur ubicado en la carrera 30 No 17B-25 sur de la Regional Distrito Capital del SENA.	N/A	N/A	N/A	No requiere tramites de permisos o licencias.
4,15	Sede 17_1001 – Dirección Administrativa y Financiera – Adecuación de la cubierta de la Dirección General incluye la impermeabilización.	N/A	N/A	N/A	No requiere tramites de permisos o licencias.
4,16	Sede 18_9404: Adecuación cubierta terraza y rampa tercer piso.	N/A	N/A	N/A	No requiere tramites de permisos o licencias.
4,17	Licencia de construcción Obra Nueva Sede19 y 20_9547 – Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico 2- (Construcción de la biblioteca para la sede principal de la regional Guainía) y Construcción de la sala de instructores y espacios de confort del centro de la regional.	1	1	98%	Aprobada por la Secretaria de Planeación de Inírida mediante la resolución Nº0210 del 24 de marzo de 2022. Radicada en ENTerritorio No.20224300210882.
4,18	Sede 21_9547 – Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico 2– Adecuación de cubiertas de los pasillos del centro y pago de trámites.	N/A	N/A	N/A	No requiere tramites de permisos o licencias.
4,19	Licencia de Reconocimiento / Ampliación Sede 22_9548 Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jiri jirimo – Adecuaciones de las áreas administrativa, bienestar, ambientes de formación, sala de instructores y espacio de confort del Centro.	N/A	N/A	N/A	No tramitada de conformidad con lo indicado por el SENA mediante comunicado radicado en ENTerritorio No.20224300136122 del 8/04/2022.
4,20	Estudios y diseños firmados y aprobados Sede 23_9530 Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca – Construcción de la nueva sala de instructores del centro.	1	1	98%	Pendiente Radicación ENTerritorio.
4,21	Concepto Técnico de Autorización para Reparaciones Locativas. Sede 1234 – Escuela Nacional de Instructores – Rodolfo Martínez Toro –Casa Teusaquillo.	1	1	100%	Aprobado por el Instituto distrital de patrimonio Cultural el 21 de octubre de 2021 mediante el radicado 20213060056891
5	**PRODUCTOS A ENTREGAR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA**				
5,1	Informes Finales	1	0	0%	Pendiente entrega del Informe Final de Interventoría. Pendiente entrega del Informe Final de Consultoría con su respectiva aprobación.

Nota:

- Los estudios y diseños entregados por la Interventoría, se encuentra en validación documental por la supervisión.

Con respecto al desarrollo de la Actividad No. 4, se encuentra completada la expedición de las resoluciones de licenciamiento por las respectivas entidades, sin embargo, se aclara que, las resoluciones de licenciamiento y planos aprobados por la Curaduría o Secretaria de Planeación, se devolvieron al Consultor e Interventor mediante comunicado radicado No.20222200113451 del 16 de junio.

- **Comités de seguimiento**

Durante el presente período no se realizó comités de seguimiento, teniendo en cuenta que el contrato finalizo el 29 de abril, sin embargo, se realizó mesas de trabajo con la Consultoría e Interventoría con el fin de socializar las observaciones correspondientes y el avance de entregas para el cumplimiento de la entrega final.

- **Avance general del grupo Andina 2:**

La Interventoría reporta un avance de la Consultoría para el grupo Andina 2 del 98,80%.

La interventoría ha certificado el cumplimiento del consultor CONSORCIO PROCESO CC, Contrato 220008 y en la suscripción del Acta de Terminación se dejan establecidos los pendientes que deben ser subsanados por el contratista, para la suscripción del Acta de Entrega y recibo final del Contrato.

La Supervisión ha certificado el cumplimiento del interventor SODINSA S.A, Contrato 220002 y en la suscripción del Acta de Terminación se dejan establecidos los pendientes que deben ser subsanados por el contratista, para la suscripción del Acta de Entrega y recibo final del Contrato de Interventoría.

- **Definiciones pendientes por parte del SENA**

De conformidad con los proyectos entregados por parte de ENTerritorio, se requiere la suscripción del Acta de Recibo por parte del SENA.

- **Otras actividades de gestión**

Durante el presente periodo no se generaron pagos.

GRUPO CARIBE
INFORME DE GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA CONTRATO No. 2210016 (SUSCRITO ENTRE ENTerritorio E INGENIERIA DEL FUTURO SAS)
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2022

Objetivo del informe: presentarle al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA de manera clara y puntual, la gestión de la Interventoría asignada en el logro de la ejecución del proyecto de obras de adecuación que incluya estudios, diseños y licenciamiento de espacios administrativos y de formación en distintas regionales del SENA de los departamentos del **Grupo Caribe**, en el marco del Contrato Interadministrativo No. 220005 de 2020.

Contrato 2210016 de 2021, cuyo objeto es realizar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y LEGAL PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y TRÁMITE PARA LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS QUE SEAN REQUERIDAS EN LAS INTERVENCIONES PARA CADA UNA DE LAS SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 220005, DEL GRUPO CARIBE QUE CORRESPONDE A LAS SEDES PRIORIZADAS, UBICADAS EN CÓRDOBA, GUAJIRA, SANTANDER, MAGDALENA, ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SAN ANDRÉS, CESAR, SUCRE.

- **Información general de los contratos:**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2210016		CONTRATO DE CONSULTORÍA 2210005	
CONTRATO No.:	2210016 DE 2021	CONTRATO No.:	2210005 DE 2021
CONTRATISTA:	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	CONTRATISTA:	CONSORCIO PROCESO CC.
PLAZO INICIAL (En meses)	5	PLAZO INICIAL:	5
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	25 de julio de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	25 de julio de 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	25 de febrero de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	25 de febrero de 2021
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	21 de enero de 2022	*FECHA DE SUSPENSIÓN:	21 de enero de 2022
*FECHA DE REINICIO:	28 de mayo de 2022	*FECHA DE REINICIO:	28 de mayo de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	22 de agosto de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	22 de agosto de 2022
PLAZO ACTUALIZADO (En meses)	17 meses y 26 días	PLAZO ACTUALIZADO (En meses)	17 meses y 26 días
VALOR INICIAL ($):	174.378.185,06	VALOR INICIAL:	684.102.379,98
VALOR ADICION (($):	159.582.554,59	VALOR ADICION(ES):	577.956.348,91
VALOR ACTUALIZADO ($):	333.960.739,65	VALOR ACTUALIZADO:	1.262.058.731,89
VALOR PAGADO ($):	166,980,369.82	VALOR PAGADO:	631,029,365.95
VALOR POR PAGAR ($):	166,980,369.83	VALOR POR PAGAR:	631,029,365.93

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO EN EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

- **Novedades durante el periodo**.

Durante el periodo se realizó la novedad contractual No. 9 del contrato de consultoría 2210005 de 2021 y de interventoría 2210016 de 2021, la cual consta de una prórroga por un plazo de 30 días calendario modificando la fecha de terminación del contrato al 22 de agosto de 2022. El estado de los contratos de consultoría 2210005 e interventoría 2210016 actualmente está en ejecución. Se encuentran en la prórroga desde el 22 de julio de 2022 y la fecha actual de terminación del contrato 22 de agosto de 2022.

Durante esta prórroga, los contratistas tienen compromisos de subsanaciones de entregas físicas de los productos de la actividad 3 y entrega de licencias y factibilidades ante empresas públicas. Para culminación de la actividad 3 quedo de manera contractual el siguiente cronograma de entregas:

FECHA	INTERVENCIÓN
22/07/2022	Construcción sala de instructores - Vélez
	Adecuación segundo piso ambientes - Barbosa
	Adecuación casa Santa Cruz - Gaira
	Construcción de casino - Montería
	Cambio de cubierta - Vélez
	Adecuación de cubiertas – Santa Marta

29/07/2022	Construcción PTAP - Riohacha
	Construcción PTAP - Maicao
	Adecuación de cerramiento - Cartagena
	Adecuación de Agencia Pública de Empleo – San Andrés
5/08/2022	Escuela de Gastronomía - Gaira
	construcción de cerramiento en malla - Montería
	Adecuación de biblioteca - Montería
	Construcción nueva sala de instructores – Valledupar
	Construcción de bodega - Sincelejo
	Adecuación de cerramiento perimetral - Barranquilla
12/08/2022	Adecuación de 5 bloques de dormitorios – Playón, Santander
	Suministro e instalación de cortasoles - Bucaramanga
	Construcción de cerramiento perimetral - Gaira
	Construcción de almacenes - Gaira
	Construcción de servicio médico asistencial - Riohacha
	Reconstrucción SENA Providencia – Providencia isla
16/08/2022	Construcción de ambientes de formación – Vélez, Santander
	Adecuación de cubiertas de parqueaderos y corredor central – Cartagena

La entrega del 22 de julio de 2022 fue realizada según lo pactado y radicado a ENTerritorio el 27 de julio de 2022.

- 20224300280382 – Adecuaciones aulas Villa Luz.
- 20224300280372 – Adecuaciones Casa Santa Cruz.
- 20224300280362 – Construcción de casino Montería.
- 20224300280352 – Construcción de sala de instructores de Vélez.

El estado de avance de los productos del alcance contractual de la actividad 4, correspondiente al trámite y obtención de licencias se resume a continuación:

No	No Sede	Ciudad	Obra	Gestión realizada
1	9546	Vélez	Construcción de ambientes de Formación, áreas administrativas y áreas de bienestar	Aprobado con resolución 046-2020
			Construcción de sala de instructores	
2	1010(5)	Barbosa	Adecuación de aulas - Granja Villaluz.	Aprobado con resolución 110.111.20-01-057-2022
3	9118	Santa Marta	Construcción del muro de cerramiento perimetral	Aprobada con resolución 47001-2-0401
			Construcción de almacén	
			Adecuación de la casa Santa Cruz	

			Construcción Escuela de Gastronomía, Hotelería y Turismo Regional del Magdalena	
4	1010 (44)	Guajira	Construcción de servicio médico asistencial y gimnasio	Aprobado y pendiente de emisión de resolución.
5	1010 (70)	Sucre	Construcción de bodega	Aprobada con resolución 70001-2-22-0076
6	9115	Córdoba	Construcción de un casino para el Centro de Formación	en trámite de pago ante la fiducia, pendiente substanció de documentación de RUT y certificación bancaria de la alcaldía la cual no han enviado.
7	9523	Córdoba	Ampliación de biblioteca	en trámite de pago ante la fiducia, pendiente substanció de documentación de RUT y certificación bancaria de la alcaldía la cual no han enviado.

- **Comités de seguimiento**

Durante la vigencia los comités se han enfocaron en las subsanaciones de los componentes estructurales, eléctricos, geotécnicos y presupuestales del proyecto Escuela de Gastronomía, Hotelería y Turismo del Magdalena, los cuales dieron como producto el cierre y radicación de los componentes:

- ✓ Componente eléctrico: 601 – ADM con radicado 2022430027729.
- ✓ Componente geotécnico: IDF – 597 – ADM con radicado 20224300275052
- ✓ Componente estructural: IDF – 599 – ADM con radicado 2022430027727.
- ✓ Presupuestal: IDF – 598 – ADM con radicado 2022430027723.

- **Estudios y diseños**

En la Actividad No. 03.Elaboración de los estudios y diseños de detalle correspondientes a cada proyecto, se han realizado y avanzado en las siguientes actividades:

	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	SEDE	INTERVENCIÓN	ESTUDIOS Y DISEÑOS	OBRA
1	SANTANDER	9546	CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES D AMBIENTES DE FORMACIÓN	100% APROBADO POR INTERVENTORÍA	N.A
2	SANTANDER	9546	CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE INSTRUCTORES Y ADECUACIÓN DE SEGUNDO PISO DE LOS AMBIENTES GRANJA VILLALUZ	100% APROBADO POR INTERVENTORÍA	N.A

3	SANTANDER	9546	CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE	ADECUACIÓN DE CUBIERTAS	100% APROBADO POR INTERVENTORÍA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
4	SANTANDER	9122	CENTRO DE ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO	ADECUACIÓN DE 5 BLOQUES DE DORMITORIOS	100% APROBADO POR INTERVENTORÍA	N.A
5	SANTANDER	9309	CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURÍSTICOS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTASOLES SOBRE FECHADA	100% APROBADO POR INTERVENTORÍA	N.A
6	MAGDALENA	9118	CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL	100% APROBADO POR INTERVENTORÍA	N.A
7	MAGDALENA	9118 - 9529	CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA Y CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA	CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN.	100% APROBADO POR INTERVENTORÍA	N.A
8	MAGDALENA	9118	CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA	ADECUACIÓN CASA SANTACRUZ	100% APROBADO POR INTERVENTORÍA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
9	MAGDALENA	9529	CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA	ADECUACIÓN DE CUBIERTAS	100% APROBADO POR INTERVENTORÍA	N.A
10	GUAJIRA	1010(44)	DESPACHO REGIONAL GUAJIRA	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO	100% APROBADO POR INTERVENTORÍA	N.A
	GUAJIRA	1010(44)	DESPACHO REGIONAL GUAJIRA	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO MEDICO	100% APROBADO POR INTERVENTORÍA	N.A
11	GUAJIRA	9222	CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.	100% APROBADO POR INTERVENTORÍA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
12	GUAJIRA	9222	CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.	100% APROBADO POR INTERVENTORÍA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
13	CÓRDOBA	9115	CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR	CONSTRUCCIÓN DE UN CASINO PARA EL CENTRO.	100% APROBADO POR INTERVENTORÍA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
16	CÓRDOBA	1010(23)	DESPACHO REGIONAL CÓRDOBA	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO	100% APROBADO POR INTERVENTORÍA	N.A

17	CÓRDOBA	9523	CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	ADECUACIÓN DE BIBLIOTECA	100% APROBADO POR INTERVENTORÍA	N.A
18	BOLÍVAR	1010(13)	DESPACHO REGIONAL BOLÍVAR	ADECUACIÓN DE CUBIERTAS	100% APROBADO POR INTERVENTORÍA	N.A
19	BOLÍVAR	9218	CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA	ADECUACIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL	100% APROBADO POR INTERVENTORÍA	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
20	SAN ANDRÉS	1010(88)	DESPACHO REGIONAL SAN ANDRÉS	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE REVESTIMIENTO EXTERIOR	100% APROBADO POR INTERVENTORÍA	EN EJECUCIÓN
21	CESAR	1010(20)	DESPACHO REGIONAL CESAR	CONSTRUCCIÓN SALA DE INSTRUCTORES	100% APROBADO POR INTERVENTORÍA	N.A
22	SUCRE	1010(70)	DESPACHO REGIONAL SUCRE	CONSTRUCCIÓN DE ARCHIVO	100% APROBADO POR INTERVENTORÍA	N.A
23	ATLÁNTICO	9207	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN	ADECUACIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL	100% APROBADO POR INTERVENTORÍA	N.A
24	MAGDALENA	9546	ADSCRITA AL CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA – PREDIO SANTA CRUZ DEL PARAÍSO	CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE GASTRONOMÍA, HOTELERÍA Y TURISMO DEL MAGDALENA.	97% PENDIENTE APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS FINAL	
25	SAN ANDRÉS	9122	CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS – SEDE PROVIDENCIA.	DEMOLICIÓN Y OBRA NUEVA DEL CENTRO DE FORMACIÓN - PROVIDENCIA	100% APROBADO POR INTERVENTORÍA	EN EJECUCIÓN

Para el grupo Caribe, se desarrollan 25 estudios y diseños; sin embargo, los proyectos 8 – 9 y 11 - 12 se fusionan en 1 solo proyecto. Es decir, se tienen 24 estudios y diseños para entregar al SENA.

el proyecto de Escuela de Gastronomía y Hotelería de Gaira Magdalena, se presentaron avances para dar inicio de proceso de contratación de la siguiente manera:

- ✓ Proceso de contratación de obra: Publicado en plataforma SECOP II – https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.3072736
- ✓ Proceso de contratación de interventoría: En proceso de publicación interna en página de ENTerritorio.

- **Avance general del grupo Caribe:**

La Interventoría reporta un avance de la Consultoría para el grupo Caribe del 98,30%.

La interventoría ha certificado el cumplimiento del consultor CONSORCIO PROCESO CC, Contrato 220005 y en la suscripción de la novedad contractual No. 9 la entrega de los siguientes proyectos de manera contractual:

FECHA	INTERVENCIÓN
22/07/2022	Construcción sala de instructores - Vélez
	Adecuación segundo piso ambientes - Barbosa
	Adecuación casa Santa Cruz - Gaira
	Construcción de casino - Montería
29/07/2022	Cambio de cubierta - Vélez
	Adecuación de cubiertas – Santa Marta
	Construcción PTAP - Riohacha
	Construcción PTAP - Maicao
	Adecuación de cerramiento - Cartagena
	Adecuación de Agencia Pública de Empleo – San Andrés
5/08/2022	Escuela de Gastronomía - Gaira
	construcción de cerramiento en malla - Montería
	Adecuación de biblioteca - Montería
	Construcción nueva sala de instructores – Valledupar
	Construcción de bodega - Sincelejo
	Adecuación de cerramiento perimetral - Barranquilla
12/08/2022	Adecuación de 5 bloques de dormitorios – Playón, Santander
	Suministro e instalación de cortasoles - Bucaramanga
	Construcción de cerramiento perimetral - Gaira
	Construcción de almacenes - Gaira
	Construcción de servicio médico asistencial - Riohacha
	Reconstrucción SENA Providencia – Providencia isla
16/08/2022	Construcción de ambientes de formación – Vélez, Santander
	Adecuación de cubiertas de parqueaderos y corredor central – Cartagena

- **Definiciones pendientes por parte del SENA**

Comunicación de link de SharePoint para el cargue de los proyectos de manera digital.

- **Otras actividades de gestión**

Para el contrato de consultoría 2210005, hasta la presente se han realizado 5 desembolsos por los siguientes conceptos:

DESEMBOLSOS		
CONTRATO INICIAL - DIAGNOSTICO	20%	$ 136,820,476.000000
CONTRATO INICIAL - 50% INICIAL ESTUDIOS Y DISEÑOS	30%	$ 205,230,713.990000
ADICION 1 PROVIDENCIA Y GAIRA - DIAGNOSTICO	20%	$ 67,579,186.400000
ADICION 2 - ALCANCE DIAGNOSTICO GAIRA	20%	$ 48,012,083.980000
ADICION 1 Y 2 PROVIDENCIA Y GAIRA- 50% INICIAL ESTUDIOS Y DISEÑOS	30%	$ 173,386,905.570000

VALOR POR PAGAR	VALOR PAGADO
$ 631,029,365.93	$ 631,029,365.95

Para el contrato de interventoría 2210016, hasta la presente se han realizado 5 desembolsos por los siguientes conceptos:

METODO DE PAGO		
Contrato inicial visita y diagnosticos	20%	$ 34,875,637.000000
Contrato inicial 50% inicial de estudios y diseños	30%	$ 52,313,455.520000
adicion 1 Providencia y Gaira - diagnostico	20%	$ 18,283,279.140000
Adicion 2 - Alcance diagnostico Gaira	20%	$ 13,633,231.780000
Adicion 1 y 2 Providencia y Gaira 50% inicial de estudios y diseños	30%	$ 47,874,766.380000

VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR
$ 166,980,369.82	$ 166,980,369.83

GRUPO CAUCA – PUTUMAYO
INFORME DE LA GESTION DE LA INTERVENTORÍA CONTRATO No. 2210015 (SUSCRITO ENTRE ENTERRITORIO E INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S.)
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2022

CONTENIDO

Objetivo del informe: Presentarle al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA de manera clara y puntual, la gestión de la Interventoría asignada en el logro de la ejecución del proyecto de obras de adecuación que incluya estudios, diseños y licenciamiento de espacios administrativos y de formación en distintas regionales del SENA de los departamentos del Grupo CAUCA - PUTUMAYO en el marco del Contrato Interadministrativo No. 220005 de 2020.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:
Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y legal para la elaboración de Diagnósticos, Estudios, Diseños y Trámite para la expedición de licencias que sean requeridas en las intervenciones para cada una de las sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, en el marco del contrato interadministrativo no. 220005, del Grupo Cauca – Putumayo.

1.1 CONTRATOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE CONSULTORIA	
CONTRATO No.:	2210015 DE 2021	**CONTRATO No.:**	2210006 DE 2021
CONTRATISTA:	Ingeniería del Futuro	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO PROCESO CC.
PLAZO INICIAL (En meses)	5	**PLAZO INICIAL:**	5
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	23 de julio de 2021	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**	23 de julio de 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	23 de febrero de 2021	**FECHA DE INICIACIÓN:**	23 de febrero de 2021
***FECHA DE SUSPENSIÓN No.01:**	31 de agosto de 2021	***FECHA DE SUSPENSIÓN No.01:**	31 de agosto de 2021
***FECHA DE REINICIO No.01:**	11 de octubre de 2021	***FECHA DE REINICIO No.01:**	11 de octubre de 2021
***FECHA DE SUSPENSIÓN No.02:**	26 de noviembre de 2021	***FECHA DE SUSPENSIÓN No.02:**	26 de noviembre de 2021
***FECHA DE PRORROGA No.1 SUSPENSIÓN No.02:**	10 de enero de 2022	***FECHA DE PRORROGA 1 SUSPENSIÓN No.02:**	10 de enero de 2022
***FECHA DE PRORROGA No.2 SUSPENSIÓN No.02:**	17 de febrero de 2022	***FECHA DE PRORROGA 1 SUSPENSIÓN No.02:**	17 de febrero de 2022
***FECHA DE REINICIO No.02:**	01 de abril de 2022	***FECHA DE REINICIO No.02:**	01 de abril de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	05 de abril 2022	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL**	05 de abril 2022
PLAZO ACTUALIZADO (En meses)	7.93	**PLAZO ACTUALIZADO (En meses)**	7.93
VALOR INICIAL ($):	172.712.185,06	**VALOR INICIAL:**	728.556.127,79
VALOR ADICION (($):	23.372.325,51	**VALOR ADICION(ES):**	49.604.843,96
VALOR ACTUALIZADO ($):	196.084.510,57	**VALOR ACTUALIZADO:**	778.160.971,75
VALOR PAGADO ($):	86.356.092,52	**VALOR PAGADO:**	622.528.777,41
VALOR POR PAGAR ($):	109.728.418,05	**VALOR POR PAGAR:**	155.632.194,34

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

2.1 DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

Cumpliendo los requisitos previos al inicio, durante el periodo los contratos derivados de Consultoría No. 2210006 suscrito con el CONSORCIO PROCESOS CC e INTERVENTORÍA No. 22100015 suscritos con INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S. con EN Territorio, tenemos que el contrato fue finalizado el pasado 05 de abril de 2022, a la fecha se encuentra pendiente la entrega del presupuesto y especificaciones técnicas por parte de la consultoría respectivamente aprobado por la interventoría.

Esta Etapa, contempla cuatro (4) actividades, así:

Actividad	VIGENCIA	PROGRAMACION/ EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Actividad No. 1: VISITA A LAS SEDES INSTITUCIONALES CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN TÉCNICA Y	El Consultor da inicio a la ejecución de esta actividad con el acta de inicio del contrato. Duración: Quince (15) días-	Terminada Fecha de terminación programada: 15 de marzo de 2021 Fecha de terminación	Se realizaron las visitas completas en el tiempo pactado.

Actividad	VIGENCIA	PROGRAMACION/ EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
RECOLECTAR LOS DATOS ESENCIALES PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO.	Calendario	ejecutada: 15 de marzo de 2021	
Actividad No. 2: ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO DE ACUERDO CON LA INTERVENCION ESTABLECIDA EN LA MATRIZ DE CADA GRUPO.	El Consultor inicia la ejecución de esta actividad una vez se haya realizado la visita a la sede. Duración: Un mes (1) mes*	Fecha de terminación: 16 de abril de 2021 20 de abril de 2021	Se presentan variaciones en los alcances de algunas intervenciones, derivadas de situaciones encontradas en las visitas realizadas. Alcances definidos por el SENA. Para el Alto Cauca se optó por una cuarta alternativa que requirió más tiempo para llegar a una decisión.
Actividad No. 3: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE CORRESPONDIENTES A CADA PROYECTO.	El Consultor deberá iniciar la ejecución de esta actividad en el momento en que el diagnóstico fue aprobado por el Comité Operativo Duración: Tres (3) meses*	Pendiente finalización Edificio Alto Cauca y Polideportivo.	El 15 de junio de 2022, se reciben los proyectos Adecuación cubiertas CPTI, Puerto Asís y Guapi, en debida forma, aprobados por interventoría luego de diferentes mesas de trabajo. El proyecto de Puerto Leguizamo en recibido por EN Territorio el pasado 24 de junio de 2022. Durante el periodo de julio se efectúan mesas de trabajo y revisión con el fin de cerrar el edificio Alto Cauca y polideportivo; sin embargo, a la fecha el mismo no ha podido ser cerrado.

Actividad	VIGENCIA	PROGRAMACION/ EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Actividad No. 4: TRAMITE PARA LA EXPEDICIÓN DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE.	Una vez se completen los estudios y diseños se radicarán los documentos completos ante las entidades gubernamentales. Duración: Dos meses (2) meses*	Puerto Leguizamo Resolución No.224 30 de julio de 2021. El 27 de agosto de 2021 fue radicados los documentos ante la Curaduría Urbana No.02 requeridos para la expedición de la Licencia de Construcción. El 18 de noviembre de 2021, fueron allegadas a la consultoría las observaciones al componente estructural por parte de la Curaduría Urbana de Popayán. El día 23 de diciembre la consultoría radico la subsanación de observaciones ante la Curaduría Urbana de Popayán	Proyecto Edificio Alto Cauca: el día 04 de marzo de 2022, mediante correo electrónico se recibe la "RESOLUCIÓN No.19001-1-21-E-186-FEBRERO 01/2022. Por la cual se otorga aprobación al proyecto de construcción-modalidad: *AMPLIACIÓN (OBRA NUEVA) – PROYECTO AMPLIACIÓN DE AMBIENTES DE FORMACIÓN DEL CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL SENA DE LA REGIONAL CAUCA.* La interventoría remite a EN Territorio los planos y licencia de construcción sellados por la curaduría Urbana No.1 de la ciudad de Popayán. A la fecha se encuentra pendiente la entrega del CD, con las copias de los planos definitivos sellados.

2.2 DESARROLLO

Los contratos de consultoría No.2210006 e Interventoría No.2210015 de 2021, fueron finalizados el 05 de abril de 2022 y con fecha para la subsanación de pendientes al 04 de mayo de 2022. Durante el presente periodo, y luego de la verificación de la incorporación de los requisitos de la aprobación de la factibilidad eléctrica se realizaron mesas de trabajo y de revisión durante las cuales se evidencio el cumplimiento de la norma técnica y las correcciones en presupuestos de obra y especificaciones técnicas. Así mismo, la consultoría e interventoría efectuaron reuniones técnicas separadas de revisión.

La interventoría adelanto revisiones posteriores a la aprobación de la factibilidad eléctrica y los ajustes estructurales para el edificio Alto Cauca y Polideportivo, por lo cual debió nuevamente revisar la metodología BIM y validar sus respectivos ajustes.

- Mediante oficio con radicado No.20224300250032 de julio 06 de 2022, la interventoría remite a ENTerritorio la validación del ajuste de planos y memorias de cálculo enviadas

para subsanar observaciones de diseños eléctricos del edificio Principal y el polideportivo, del proyecto edificio Alto Cauca y Polideportivo.

- Mediante oficio con radicado No. 20224300257702 de julio 11 de 2022, la interventoría remitió la actualización de la aprobación del modelo BIM, para el edificio Alto Cauca.

- Mediante oficio con radicado No.20224300256442 de julio 11 de 2022, la interventoría remite la aprobación del BIM que involucró los ajustes estructurales del polideportivo.

- Mediante oficio con radicado No.20224300260242 de julio 12 de 2022, la interventoría realizó la entrega a ENTerritorio de los planos originales de la licencia de construcción debidamente sellados.

- Mediante oficio con radicado No.2024300268272 de julio 18 de 2022, la interventoría entrega a EN Territorio el informe de cierre al acta de terminación de acuerdo con los puntos que aplican para el proyecto de Puerto Leguizamo.

- Mediante oficio con radicado No.20224300281862 de julio 28 de 2022, la interventoría radica las copias de la licencia de construcción sellados en medio magnético.

MESAS DE TRABAJO.

- 2022-07-25 Mesa de trabajo revisión estado de liquidación del contrato y sus proyectos respectivos.

- 2022-07-21 Mesa de trabajo revisión informes finales y documentación interventoría

2.3 OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

Durante el presente periodo la interventoría presenta la solicitud para el trámite del tercer desembolso, por un Treinta por ciento (30%) del valor inicial del contrato No. 2210015, la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 51.813.655,52); y un ochenta por ciento (80%) del valor de la adición No. 01 la suma de DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($18.697.860,41); así mismo presentó, el informe final correspondiente a la actividad No.3 el cual a su vez, se presenta como informes para la respectiva liquidación.

La interventoría mediante correo electrónico presento los informes finales del proyecto como soporte del cierre de los estudios y diseños y la consultoría.

INTERVENTORÍA RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS SUBSEDE DEL SENA EN LA ISLA DE PROVIDENCIA

INFORME DE GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA CONTRATO No. 2210720 DE 2021 (SUSCRITO ENTRE ENTerritorio y CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRÉS) PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

Objetivo del informe: presentarle al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA de manera clara y puntual, la gestión de la Interventoría asignada en el logro de la ejecución del proyecto de obras de reconstrucción de la sede SENA - Providencia, en el marco del Contrato Interadministrativo No. 220005 de 2020.

Contrato 2210720 de 2021, cuyo objeto es realizar la INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS SUBSEDE DEL SENA EN LA ISLA DE PROVIDENCIA, INCLUIDA EN EL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO, DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - VERSIÓN N°2 EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL 2020 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO

Información general de los contratos:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2210720		CONTRATO DE OBRA 2210719	
CONTRATO No.:	2210720 DE 2021	CONTRATO No.:	2210719 DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRÉS	CONTRATISTA:	CONSORCIO SENA PROVIDENCIA
PLAZO INICIAL (En meses)	7	PLAZO INICIAL:	7
PLAZO ACTUAL	8 meses y 27 días	PLAZO ACTUAL	8 meses y 27 días
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	7 de julio de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	7 de julio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	5 de septiembre de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	5 de septiembre de 2022
FECHA DE INICIACIÓN:	9 de diciembre de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	9 de diciembre de2021
NOVEDAD CONTRACTUAL 1 PRORROGA.	1 mes y 27 días.	NOVEDAD CONTRACTUAL 1 PRORROGA	1 mes y 27 días.
NOVEDAD CONTRACTUAL 1 ADICIÓN	$ 86.271.725,71	N.A	N.A
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A	FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A
*FECHA DE REINICIO:	N.A	*FECHA DE REINICIO:	N.A
VALOR INICIAL ($):	$ 794,608,000.00	VALOR INICIAL ($):	$ 9,408,078,946.47
VALOR ACTUAL ($):	$ 881.645.034,77	VALOR INICIAL ($):	N.A
ANTICIPO ($):	N.A	ANTICIPO ($):	$ 1,881,615,789.29
ANTICIPO AMORTIZADO	N.A	ANTICIPO AMORTIZADO ($)	$ 365,275,676.76

($)			
VALOR PAGADO ($):	$ 258,695,986.00	VALOR PAGADO ($):	$ 1,826,378,383.82
VALOR POR PAGAR ($):	$ 622,949,048.77	VALOR POR PAGAR ($):	$ 7,581,700,562.65

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO EN EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

- **Comités de seguimiento**


Durante la vigencia del periodo se realizaron comités de seguimiento para el contrato de obra 2210719. En términos generales los temas a tratar y compromisos presentados son los siguientes.


1. Entrega de no previstos para el 02 de agosto de 2022.
2. Problemas y atrasos con el transporte de materiales provenientes de Costa Rica.
3. Adoquines están en proceso de compra, y las cubiertas en proceso de fabricación, a finales del mes de julio o inicios del mes de agosto serán despachados.
4. Entrega de la ventanería anti-huracanes y proceso logístico de envío a obra.
5. Novedad contractual No. 1.
6. Recepción de materiales.
7. Cumplimiento de hitos de seguimiento y control para preentrega Presidencial.

- **Avances de obra.**

Durante la vigencia del mes de abril se realizaron las siguientes actividades:

- Figurado Acero Refuerzo
- Cortes y armado de Guarderas
- Armado camilla placa 2 bloque 2
- Armado de acero de escalera interna
- Vaciado de concreto escalera interna.
- Armado andamios para camilla de placa de cubierta bloque 1.
- Mampostería bloque

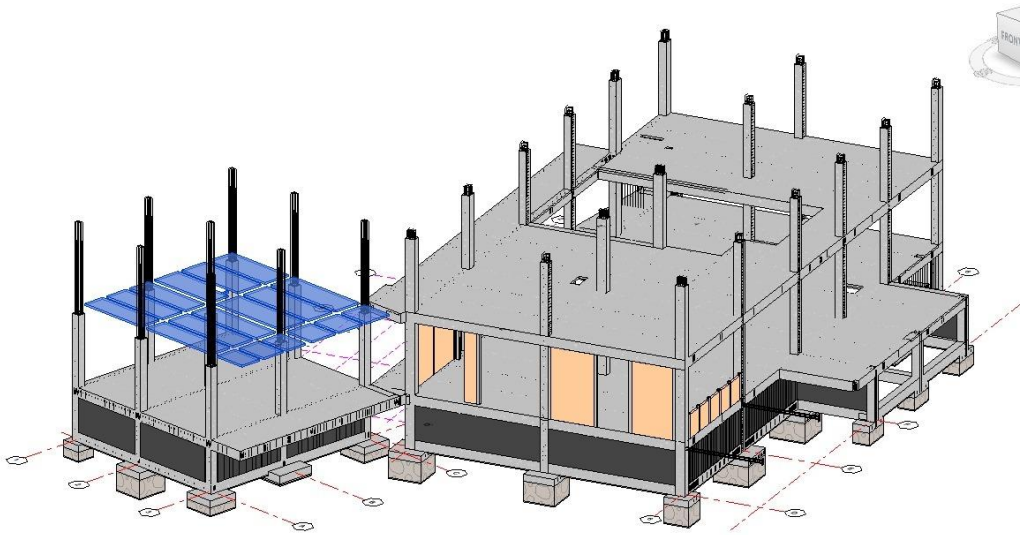

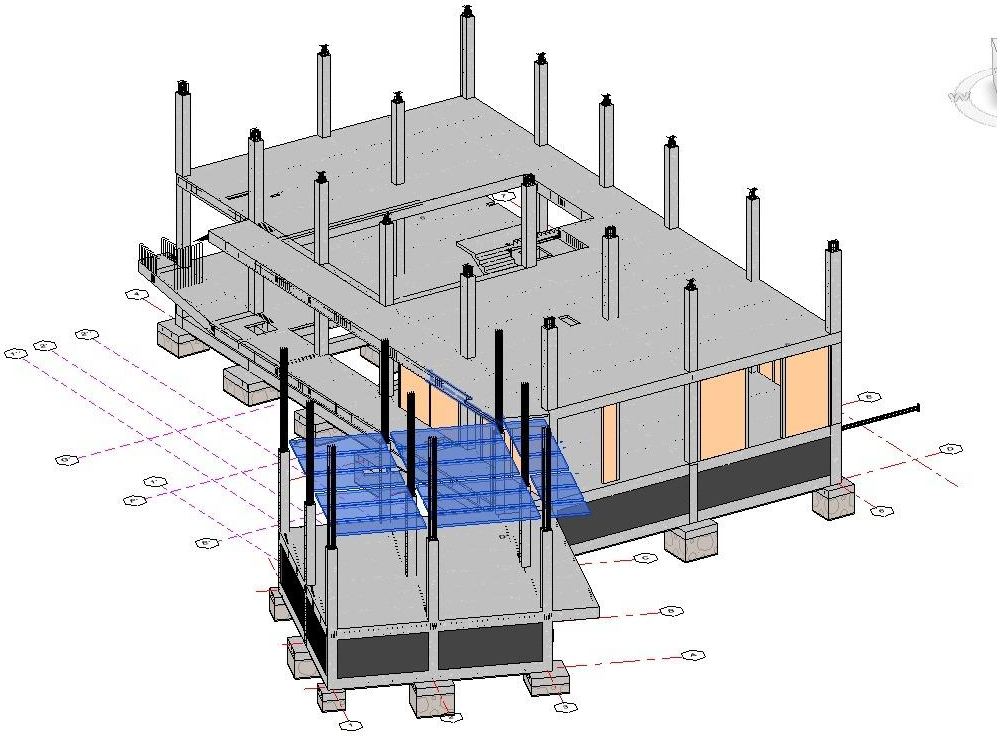

Como actividades paralelas a la obra se realizó:

Suministro de materiales:

- ✓ 18/07/2022 18 bolsones de arena.
- ✓ 18/07/2022 6 bolsones de grava.
- ✓ 20/07/2022 60 unidades malla electrosoldadas de 4mm.
- ✓ 20/07/2022 19 unidades de malla de gallinero.
- ✓ 20/07/2022 50 unidades de canecas y bultos de recubrimiento TOC armadura.
- ✓ 20/07/2022 66 unidades de placas de eterboard.

- **Avance general de la obra Reconstrucción SENA Providencia:**

Acorde al informe semanal de interventoría No 28 (corte al 31 de julio de 2022), presentado a la Supervisión de ENTerritorio, por parte de la Interventoría CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRÉS, presenta un avance de ejecución del contrato es del 33,37% ($ 2,364,775,635.95) ejecutado VS el 48.76% ($ 3,455,566,025.48) programado, es decir, el cronograma de actividades presenta un atraso del -15.39% ($ - 1,090,790,389.53).

- **Otras actividades de gestión**

Para el contrato de interventoría 2210720, hasta la presente se ha hecho efectivo el quinto desembolso por un valor de $ 60.583.184,23 de la siguiente manera:

VALOR DEL CONTRATO	$ 794.608.000,00
ACTA 1 COSTO FIJO	$ 45,406,171.00
ACTA 2 COSTO FIJO	$ 45,406,171.00

ACTA 3 COSTO FIJO	$ 45,406,171.51
ACTA 4 COSTO FIJO + VARIABLE	$ 61,894,287.43
PRESENTE ACTA 5 COSTO FIJO + VARIABLE	$ 60.583.184,23
VALOR ACUMULADO	$ 258.695.986.00
SALDO POR PAGAR	$ 535,912,014.00

Para el contrato de obra 2210719, hasta la presente se ha hecho efectivo el cuarto desembolso por un valor de $ 522,620,740.49 de la siguiente manera:

VALOR DEL CONTRATO	$ 9.408.078.946,47
ACTA No. 1	$ 390,208,571.00
ACTA No. 2	$ 359,375,975.14
ACTA No. 3	$ 554,173,097.20
PRESENTE ACTA No. 4	$ 522,620,740.49
SALDO ACUMULADO	$ 1,826,378,383.82
SALDO POR PAGAR	$ 7,581,700,562.65
VALOR AMORTIZADO DE ANTICIPO ACUMULADO	$ 365,275,676.76

- **Registro Fotográfico**









INTERVENTORÍA ADECUACIONES AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO DEL DESPACHO REGIONAL SAN ANDRÉS EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS

INFORME DE GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA CONTRATO No. 2220598 DE 2022 (SUSCRITO ENTRE ENTerritorio y C&E ENGINEERING S.A.S) PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

Objetivo del informe: presentarle al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA de manera clara y puntual, la gestión de la Interventoría asignada en el logro de la ejecución del proyecto de obras de adecuación de la Agencia Pública de Empleo del Despacho Regional San Andrés – isla de San Andrés, en el marco del Contrato Interadministrativo No. 220005 de 2020.

Contrato 2220598 de 2022, cuyo objeto es realizar la INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO EN CUANTO AL REVESTIMIENTO EXTERIOR, INTERIOR, CUBIERTAS Y CIELO RASO DEL DESPACHO REGIONAL SAN ANDRÉS EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL 2020.

Información general de los contratos:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2210720		CONTRATO DE OBRA 2210719	
CONTRATO No.:	2220598 DE 2022	CONTRATO No.:	2220599 DE 2022
CONTRATISTA:	C&E ENGINEERING S.A.S	CONTRATISTA:	ENRIQUE LOURIDO CAICEDO
PLAZO INICIAL (En meses)	2 meses	PLAZO INICIAL:	2 meses
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	26 de septiembre de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	26 de septiembre de 2022
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de julio de 2022	FECHA DE INICIACIÓN:	26 de julio de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A	FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A
*FECHA DE REINICIO:	N.A	*FECHA DE REINICIO:	N.A
VALOR INICIAL ($):	$ 18.586.397,9	VALOR INICIAL ($):	$ 151.679.499,55
VALOR PAGADO ($):	$ 0.00	VALOR PAGADO ($):	$ 0.00
VALOR POR PAGAR ($):	$ 18.586.397,9	VALOR POR PAGAR ($):	$ 151.679.499,55

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO EN EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

- **Comités de seguimiento**
- **Avances de obra.**
- **Avance general de la obra Reconstrucción SENA Providencia:**
- **Otras actividades de gestión**
- **Registro Fotográfico**



ING. DIEGO FERNANDO ALZA ALZA
Gerente Grupo De Desarrollo De Proyectos1 Coordinación:

Margarita Rosa Bello: Coordinación SENA

Supervisores: Joyce Rojas.
Andrés Traslaviña
Jesús Torres.
Miladys Prieto.
Darwin Chaparro.
Jessica Meneses
Efraín Orduz
