MUNICIPIO DE NEIVA
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN 03

Nombre del Contratista: **LIBARDO CONDE LASSO** **Cedula: 4.884.664**	**VALOR INICIAL:** $353.386.558,75 **ADICIONAL No.1:** $ **VALOR TOTAL:** $ 353.386.558,75
Certificado de Disponibilidad No. 2106 , 2151 y 2795 de 2018 **Registro Presupuestal Nro. 3763 del 17/08/2018** **Forma de Pago:** acta(s) de recibo parcial. recibidas, aprobadas y certificadas por el interventor y/o supervisor de acuerdo al avance hasta el 90% y el restante 10% a la terminación del objeto contratado, previa entrega y recibo a satisfacción, liquidación del contrato y aprobación del interventor y/o supervisor.	**Periodo de Ejecución:** Dos (02) meses, contados a partir del acta de inicio sin superar el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).

Objeto:
CONSTRUCCIÓN VALLAS DE PROTECCIÓN PARA LOS BARRIOS VICENTE ARAUJO, VILLA URBE, BONILLA Y SAN CARLOS III ETAPA DEL MUNICIPIO DE NEIVA – HUILA

FECHA DEL ACTA DE INICIO:

FECHA DEL SUSCRIPCIÓN CONTRATO: **Diecisiete (17) de Agosto de 2018**.

FECHA DE ACTA DE INICIO: **Diez (10) De Septiembre de 2018**

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN 1: **Trece (13) de Septiembre de 2018**

FECHA ACTA DE REINICIO 1 : **Dos (2) de Octubre de 2018**

FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA: Veintiocho (28) de Agosto de 2018
FECHA DE TERMINACIÓN: Veintisiete (27) de Noviembre de 2018
PAZ Y SALVO PARA CONTRATACIÓN: 335119
Registro Banco de Proyectos:2016410010050

1. RESUMEN

1.1 Información sobre estado y avance del contrato de prestación de servicios


En desarrollo del objeto contratado y revisado el informe final de actividades del período comprendido del 17 al 27 de Noviembre de 2018, el contratista Libardo Conde Lasso, desarrolló las actividades que se derivan del contrato de obra No. 1061 de 2018 del cual soy Supervisor y con el Apoyo Técnico y Administrativo del Ingeniero JAIRO RODRÍGUEZ BOCANEGRA se presentan los siguientes ejecuciones de acuerdo a las obligaciones junto

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva


con las acciones y soportes correspondientes :

- La ejecución de las obras se ha centrado en el campo deportivo del Barrio Bonilla, desarrollando las siguientes actividades:
- Terminación de excavaciones. Concreto ciclópeo, construcción de zapatas, suministro y construcción de vigas de amarre, columnetas.
- Construcción de alfajías.
- Construcción vallas de protección.
- Construcción de apoyos para vallas.
- Suministro y construcción de porterías.
- Suministro y aplicación de pinturas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
BARRIO BONILLA

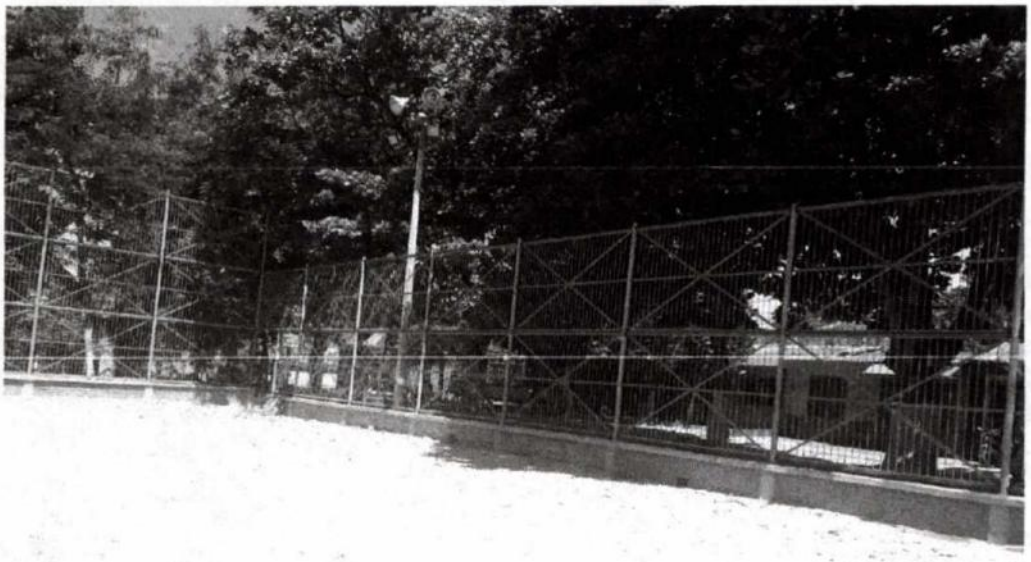

REGISTRO FOTOGRÁFICO
BARRIO BONILLA

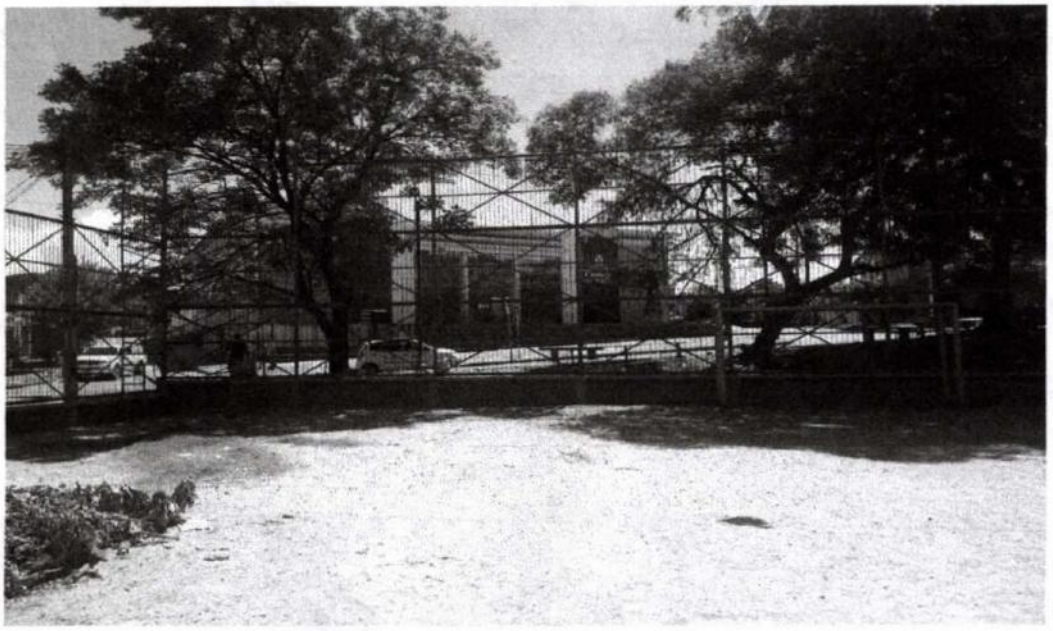



La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SAN CARLOS OBRA TERMINADA



La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

REGISTRO FOTOGRÁFICO
VILLA URBE OBRA FINALIZADA




La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

REGISTRO FOTOGRÁFICO
VICENTE ARAÚJO




La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

REGISTRO FOTOGRÁFICO
POLIDEPORTIVO BARRIO BONILLA

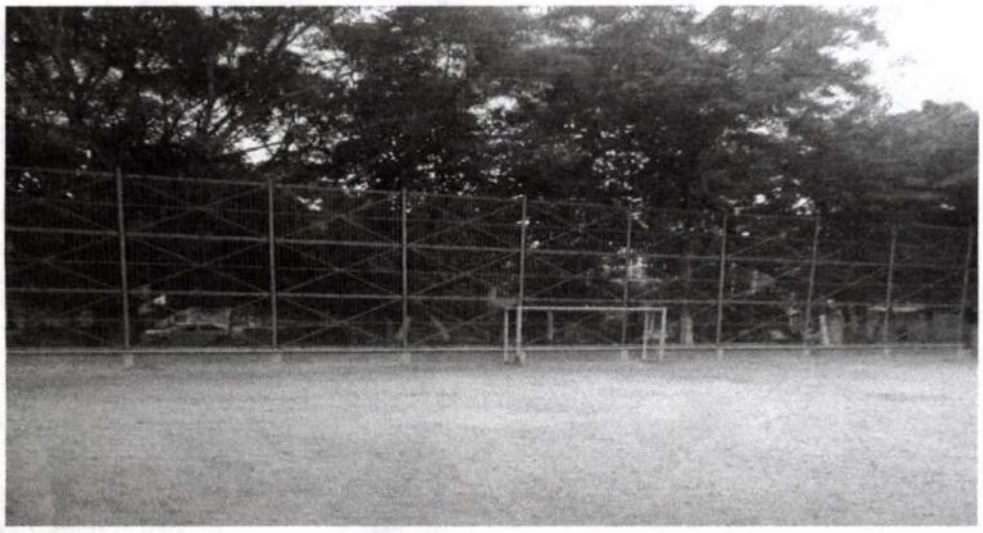


Alfajía y Vallas terminadas

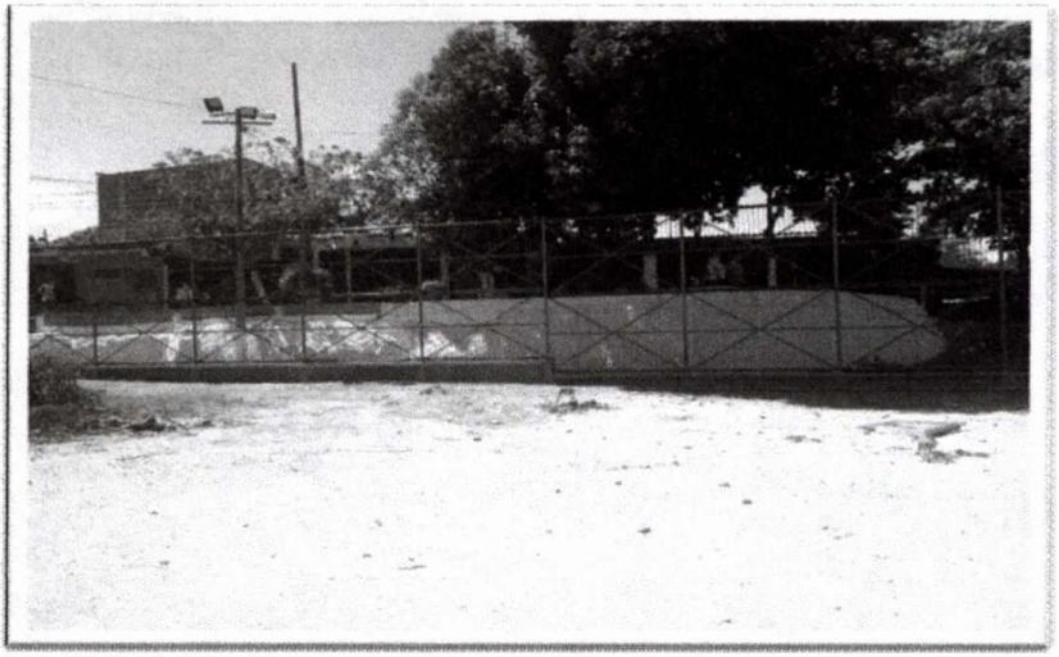

Pintura y vallas

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

REGISTRO FOTOGRÁFICO
POLIDEPORTIVO BARRIO BONILLA

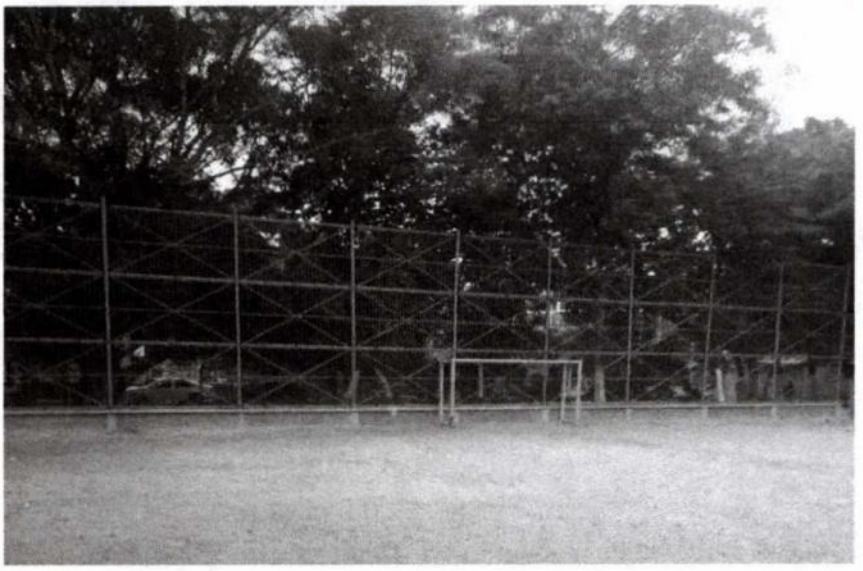

Pintura alfajía y suministro de cancha






Construcción de viga, muro y sardineles.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

REGISTRO FOTOGRÁFICO
BARRIO BONILLA

Construcción muro en ladrillo a la vista



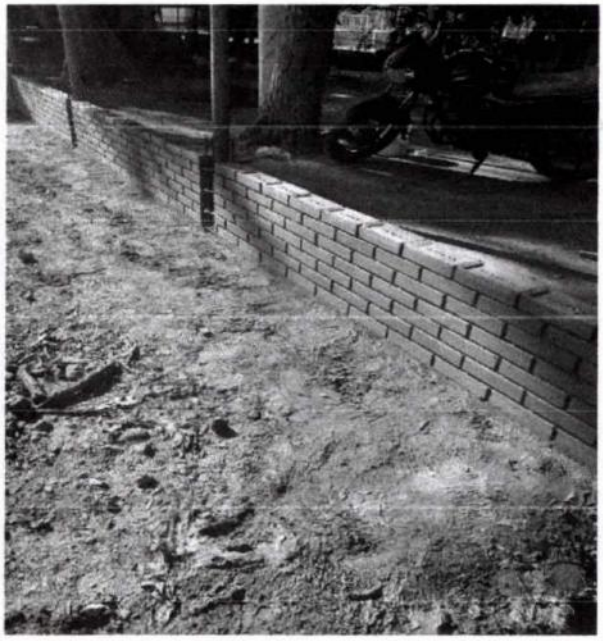

ACTAS

TIPO DE ACTA	No	FECHA
ACTA DE INICIO	1	10 De Septiembre de 2018
ACTA DE SUSPENSIÓN 1	2	13 De Septiembre de 2018
ACTA DE REINICIO 1	3	2 de octubre de 2018
ACTA PARCIAL No. 1	4	01 de Noviembre de 2018
ACTA PARCIAL No. 2	5	19 de Noviembre de 2018
ACTA FINAL	6	27 de Noviembre de 2018

1.2. Recomendaciones y Conclusiones

En cumplimiento de la cláusula Sexta**; FORMA DE PAGO, El** Municipio de Neiva se obliga a cancelar al contratista Libardo Conde Lasso las actividades desarrolladas del tercer informe del período comprendido del 20 al 27 de Noviembre de 2018 y correspondiente al pago final

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

por valor de $38.622.460,63 con un avance acumulado del 99,99%.

2. INFORME BÁSICO

2.1. Estado Financiero del Contrato

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO
Comprobante de Egreso No. 319227	21/11/2018	$176.032.526,25	$176.032.526,25	$177.354.032,50
En trámite	En trámite	$138.731.388,75	$314.763.915,00	$ 38.622.643,75
En trámite	En trámite	$38.622.460,63	$353.386.375,63	$ 183,12
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$353.386.558,75	$0	$353.386.558,75	$353.386.375,63	$ 183,12

3. ASPECTOS CONTRACTUALES

3.1. Verificación de Pólizas y pagos de Salud, Pensión y Riesgos profesionales (y parafiscales si el contrato lo exige).

- ✓ En cumplimiento de la CLAUSULA NOVENA - GARANTIAS del contrato, se verifica que la Póliza de cumplimiento No 2953404 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual **N° 689616** fueron aprobadas el día 28 de Agosto de 2018 por la administración municipal.
- ✓ Cláusula **Décima Novena** - Perfeccionamiento y Ejecución, se verifica el pago de los derechos de contratación con Recibo **de Tesorería Municipal N° 2018902000002156.**

Publicación gaceta.....$0,oo

Estampilla Bienestar adulto mayor.....$7.068.000,oo

Estampilla Pro Deporte.....$5.306.000,oo

Estampilla Pro Usco.....$1.762.000,oo

Estampilla Procultura.....$1.767.000,oo

Contrato Adicional.....$0,oo

TOTAL PAGO.....$15.903.000,oo

- ✓ En cumplimiento de la **Cláusula Decima primera** - Sistema Integral de Seguridad Social Integral, se verifican los pagos correspondientes al mes de Noviembre de 2018 según planillas discriminadas así:

Planilla No. Planilla No. 8657250811- Noviembre 2018 (Contratista)

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
SALUD	Noviembre /2018	$106.300
PENSIÓN	Noviembre /2018	$136.000
RIESGOS PROFESIONALES	Noviembre /2018	$4.500
	TOTAL	$246.800

Planilla No. 8656654535 noviembre 2018 (Director de obra)

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
SALUD	Noviembre /2018	$97.700
PENSIÓN	Noviembre /2018	$125.000
RIESGOS PROFESIONALES	Noviembre /2018	$4.100
	TOTAL	$226.800

Planilla No. 13804158 - Noviembre 2018 (Residente de obra)

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
SALUD	Noviembre /2018	$97.700
PENSIÓN	Noviembre /2018	$125.000
RIESGOS PROFESIONALES	Noviembre /2018	$4.100
	TOTAL	$226.800

Planilla No. 8486464132 - Noviembre 2018 (HSQ)

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
SALUD	Noviembre /2018	$31.300
PENSIÓN	Noviembre /2018	$125.000
RIESGOS PROFESIONALES	Noviembre /2018	$54.400
	TOTAL	$210.700

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Planilla No. 8656693661 - Noviembre 2018 (Trabajadores)

APORTES	PERÍODO DE PAGO	VALOR
SALUD	Noviembre /2018	$125.200
PENSIÓN	Noviembre /2018	$500.000
RIESGOS PROFESIONALES	Noviembre /2018	$76.400
	TOTAL	$701.600

3.2. Certificado de Cumplimiento

Por lo anterior la suscrita Supervisora y Apoyo Técnico Administrativo y Financiero a la Supervisión del **CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 1061 de 2018** certifica que el contrato en mención se ejecutó satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo, durante el período comprendido del 20 al 27 de Noviembre de 2018 por lo que se recibe a satisfacción y se autoriza el pago del Acta Final al contrato por valor de $**38.622.460,63.**

C.D.P	REGISTRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR A CANCELAR
2106 , 2151 y 2795 de 2018	**3763 del 17/08/2018**	0206, 0210, 0101	**$38.622.460,63**
Valor a Pagar.			**$38.622.460,63**

La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el pago del Acta Final del Contrato No. 1061 de 2018.

Informe presentado en Neiva, a los veintinueve (29) días del mes de Noviembre de 2018.

Ing. JAIRO RODRIGUEZ BOCANEGRA
Apoyo Técnico Administrativo
y Financiero a la Supervisión

Dra. LILIANA MARÍA OCAMPO MARTÍNEZ
Directora Deportes y recreación
Supervisora

Vo. Bo. Jorge Horacio Guzmán Hermida
Abogado Contratista SDR

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva
