PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA SUPERVISION EN INFRAESTRUCTURA

CONTRATO 292 DE 2022

INFORME JULIO 22 – AGOSTO 21

el 22 de JULIO de 2022 se inició con el contrato No 292 de 2022, el cual tiene por objeto: servicios profesionales a la supervisión técnica, administrativa, financiera y ambiental de los contratos de obras públicas de la secretaria de infraestructura física en: pavimentos urbanos y rurales, programa de pavimentación por autoconstrucción, construcción y mantenimiento escenarios deportivos, y edificaciones en general.

En este periodo del contrato 292 de 2022 se ha realizado apoyo permanente a todos los procesos encomendados, este apoyo a consistido en visitas física a las obras, revisión documental de las carpetas de los contratos y convenios, proyección de documentos y oficios, ajustes y acompañamientos que le han permitido al secretario de infraestructura tomar decisiones expeditas y prudentes, todas lo más acordes posible a la legislación y situación pertinente.

También se ha realizado el seguimiento y liquidación de contratos y convenios

Me permito describir los acompañamientos realizados durante el periodo 1 comprendido entre el 22 de julio y el 21 de agosto de 2022.

1. **(contrato 477 obra y 457 interventoría ambos de 2019**) AMPLIACION DEL PUENTE PRINCIPAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE LA CARRERA 100.

Tanto la obra como la interventoría se encuentran reiniciados, se realizó otro si en adición de tiempo y valor a los contratos tanto de obra como de interventoría, ambos quedaron con fecha de terminación para el 4 de diciembre de 2022.

Esta obra es con recursos propios (CREDITO) del municipio de APARTADO.

Durante este periodo se inició con las actividades adicionales que hay que realizar al puente y los contratistas actualizaron pólizas.

		
Se aprecia el inicio de las labores de campamento para el reinicio de los trabajos	Estado actual de uso del puente principal	Reinicio de la ejecución de los trabajos para puesta en funcionamiento del puente principal

2. **CONTRATO 332 DE 2020** cuyo objeto: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

Se realizó trámites administrativos con invias durante julio de 2022, solicitando información respecto al avance de la situación del embargo, se realizaron comités virtuales para estar al tanto y reiniciar una vez se levante el embargo

Este contrato se encuentra suspendido desde el 1ro de diciembre de 2021, el plazo por ejecutar es de 15 días, el tramo de mandarinos que tiene una longitud de 646 ml ya se encuentra terminado en un 100%. El tramo de zungo arriba queda pendiente para terminar su ejecución una vez se reinicie las actividades en el 2022, A esta obra se le realizo recorrido

con el secretario de infraestructura, interventoría invias y contratista para garantizar el acceso una vez se reinicie.

N/A fotos la obra está suspendida		N/A fotos la obra está suspendida

3. **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 287 DEL 2021**, cuyo objeto es: contrato interadministrativo de mandato sin representación para la construcción de placa huella en vías rurales para mejorar la conectividad vial y contribuir a alcanzar una paz estable y duradera en el municipio de apartado, Antioquia.
4. **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 301 DE 2021,** cuyo objeto es: aunar esfuerzos para realizar la interventoría técnica, ambiental, administrativa y financiera para la construcción de placa huella en vías rurales para mejorar la conectividad vial y contribuir a alcanzar una paz estable y duradera en el municipio de apartado, Antioquia

Este contrato el 287 se firmó el 20 de agosto de 2021 y fue aprobado en el secop 2 por las partes (municipio de apartado y la empresa para el desarrollo urbano y hábitat del municipio apartado EDUH), e1 acta de inició se firmó el 30 de agosto de 2021, el 9 de septiembre se realiza otro si al contrato en el cual se reduce en tres (3) meses el plazo inicial de doce (12) meses a nueve (9) meses, quedando como fecha de terminación el 30 de mayo de 2022, se realizó adición de 4 meses quedando como fecha de terminación 30 de septiembre de 2022, este contrato cuenta con una interventoría 301 de 2021 firmado con la asociación de municipios del Urabá antioqueño ASOMURA, el 14 de septiembre de 2021 con un plazo de nueve (9) meses, fecha de inicio el 27 de septiembre y fecha de terminación actual el 30 de septiembre de 2022.
Estos contratos se encuentran en ejecución, en este periodo reportado ya se han ejecutado actividades contractuales y de interventoría. En el frente del guineo llevan ejecutados aproximadamente 2.500 ml de pavimento y en el frente del reposo se han ejecutado aproximadamente otros 1.300 ml.
La interventoría envió los informes de reporte mensual por correo electrónico ya que se requirieron para soportar la información que se subió al gesproy, las cantidades reportadas requieren de una verificación exhaustiva ya que se han tomado como avance parcial la supervisión en visitas de campo constato la ejecución a la fecha.

		
Se observa el avance de la obra con la colocación de la subbase en los tramos finales del reposo	Tramo donde se aprecia el ancho total de la calzada construida	Avance del pavimento en el tramo del guineo

5. **CONTRATO 363 de 2021** cuyo objeto es: construcción de pavimento rígido urbano en zona de población vulnerable y desplazados del municipio de apartado Antioquia.

Este contrato se inició el 4 de febrero de 2022, es por valor de $1.977´359.429 tiene un plazo de ejecución de 6 mes, tuvo una suspensión de 23 días y actualmente se encuentra en ejecución el último tramo de aproximadamente 120ml y se han desarrollado actividades como topografía, cajeo de excavación, remplazo en material pétreo grueso, colocación de geotextil y aplicación de material de subbase y pavimento en concreto. La interventoría se encuentra contratado por el DPS.

En este periodo de julio - agosto se han realizado comités virtuales, seguimiento a balance de obra, acompañamiento con visitas y las aclaraciones y expedición de la documentación requerida.

Se tramito el acta parcial 4 equivalente al 70% de la obra. La interventoría la realiza el DPS

		
Realización del cajeo para mejoramiento de la estabilización	Colocación de subbase en el último tramo	Acabado del tramo final de pavimento

6. **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 286 DEL 2021**, cuyo objeto es: convenio interadministrativo entre el municipio de apartado y empresas públicas de apartado s.a.s esp "EMPAPA para la construcción de unidades sanitarias con pozo séptico en el marco de la implementación de los acuerdos de paz para población dispersa, vulnerable, victimas y desplazados del municipio"
7. **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 300 DE 2021,** cuyo objeto es: convenio interadministrativo para la interventoría técnica, administrativa y financiera para la construcción de unidades sanitarias con pozo séptico en el marco de la implementación de los acuerdos de paz para población dispersa vulnerable, victimas y desplazados del municipio de apartado.

Ambos contratos se iniciaron el 24 de noviembre de 2022 y tienen fecha de terminación el 23 de septiembre de 2022, se encuentran en ejecución y a la fecha las obras no llevan un avance de más del 20% físicamente.

		
Se aprecia el levantamiento de la mampostería para la unidad sanitaria	Se aprecia el revoque y la instalación del techo en la unidad sanitaria	Se aprecia como se termina la infraestructura de la unidad sanitaria, se le da acabado y se pone en funcionamiento

Aparte del seguimiento a estos contratos asignados bajo la supervisión se realizó acompañamiento en otros aspectos del cumplimiento de funciones en la secretaria de infraestructura como son: acompañamiento a revisión de estructuras de puentes (la libertad, san Fernando), visita a los pavimentos del SENA, visita y revisión de trabajos en la sede administrativa municipal

Cronograma semanal del mes de agosto de 2022

APOYO A LA SUPERVISION
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SEMANAS

	1					2					3					4				
	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V
	RD	DN	EO	DN	VO	RD	DN	EO	DN	VO	RD	DN	EO	DN	VO	RD	DN	EO	DN	VO
	EO	DN	RD	DN	CO	EO	DN	RD	DN	CO	EO	DN	RD	DN	CO	EO	DN	RD	DN	CO
	CO	DN	DN	DN	JU	CO	DN	DN	DN	JU	CO	DN	DN	DN	JU	CO	DN	DN	DN	JU

Convensión

RD	Revisión Documental	Comprende la revisión de oficios, actas, apu, modificaciones, planos
VO	Visitas a Obras	Consiste en llegar hasta los lugares de las obras bajo encargo y constatar los avances fisicos y tecnicos
EO	Elaboración Oficios	Consiste en la proyección de oficios de respuestas, peticiones, informes y aprobaciones
CO	Comites	Reuniones técnicas de obras bajo encargo, con contratistas, interventores y personal de infraestructura
JU	Juntas	Reuniones internas de la SIF o con otras dependencias de orden administrativos
DN	Disponible alguna Necesidad	

ING. FRANCI STIVINTH GONZALEZ MORENO
Contratista OPS 148 de 2022
Apoyo a la Supervisión

Cronograma de actividades ejecutadas en el mes de agosto de 2022



Agosto 2022

lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
1 se estuvo en las instalaciones y se proyecto oficio para cadicom y se autorizo la	2 se realizo reunion con contratista del gas para reiniciar obras y se realizo reunion con	3	4	5 se realizo comité virtual con dps sobre pavimentos	6	7
8 se realizo comité en el despacho del alcalde para informar sobre situacion de obras	9 se asistio a las instalaciones y se realizo recorrido en obras con el secretario	10 se asistio a las instalaciones de la secretaria y se realizaron multiples	11 se asistio a las instalaciones y se realizo aclaraciones a interventoria puente	12 se realizo comité virtual con dps sobre pavimentos	13	14
15 festtivo	16 se realizo recorrido para verificacion de puentes, principal, libertad, san fernando, se visito	17	18 se asistio a las instalaciones y se hizo actividades administrativas	19 en la mañana se realizo comité virtual con dps sobre pavimentos y en la tarde se realizo	20	21
22	23	24	25	26	27	28

Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre

Listo


Anexos

Comités administrativos SIF y otros


		
Comité en secretaria de infraestructura	Comité de reporte semanales en la sif	Comité de reportes semanales en despacho
		
Comité de actualización al alcalde en el despacho	Comité de rendición de informe al dps con varias secretarias de despacho	

Algunos Comités virtuales realizados durante el mes de agosto de 2022



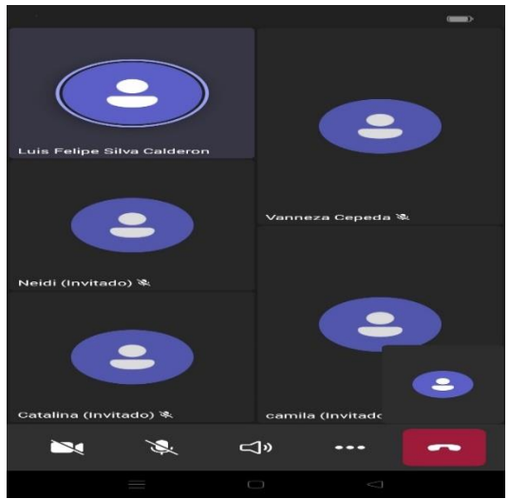

Comités virtuales realizados con dps para soporte y seguimiento al contrato 363 de 2021, pavimentos urbanos, contrato 332 de 2021 placa huella el gas y otros comités de otros contratos se adjuntan hojas con los reportes



FIRMA DEL CONTRATISTA
Ing. FRANCI STIVINTH GONZALEZ MORENO
C.C.79´599.713
Calle 101 # 109-74 apartado
Teléfono 3104143540
Email: sgmi12@gmail.com
