



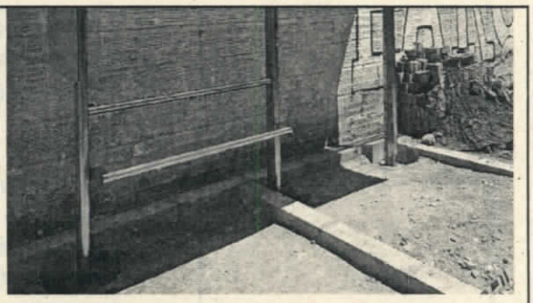
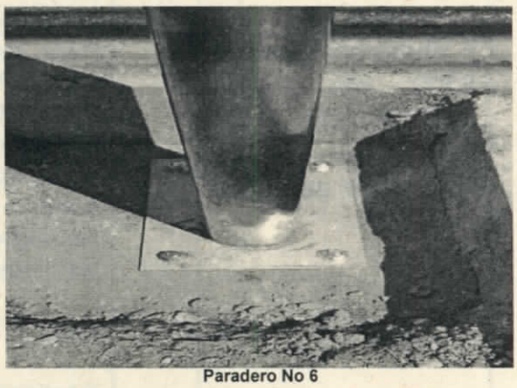
VERIFICACION DOCUMENTAL EN EL AVANCE DE EJECUCIÓN
Período del informe: Según actividades ejecutadas desde el **(14/07/2022) al (16/08/2022)**
Nombre del Contratista: **AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S.**
Nombre Supervisor y/o Interventor: **Ing. MILTON CONTRERAS HERNÁNDEZ**
DATOS DEL CONTRATO
Contrato/ No. **642 - 2022 de fecha: (11/07/2022)**
Objeto: **IMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO INTEGRAL DE MOVILIDAD EN PARADEROS DE SERVICIO PÚBLICO DE PASAJEROS EN EL SECTOR "ENTRE RÍOS" DEL MUNICIPIO DE CHÍA**
Plazo de Ejecución Total: Dos (02) Meses Valor total del Contrato: (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE) ($144.210.000) Fecha de Inicio (14/07/2022) Fecha de Terminación inicial: (13/09/2022) Fecha de Terminación con prorroga: N/A
Porcentaje de ejecución financiera a la fecha: ($ Ejecutado / $ Total) **40 %** Porcentaje de ejecución en tiempo: (tiempo de avance / tiempo total de ejecución) **55 %**
En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información: Anticipo (Valor total) $ _____N/A_____ Ejecución de Anticipo (Valor amortizado) $ _____N/A_____ Saldo por amortizar $ N/A_____

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES (ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO) DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

ACTIVIDADES CONTRACTUALES	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	SOPORTE

1. "PARADERO TIPO IDU: El paradero deberá tener las siguientes características: a) Ancho 4.80 metros b) Altura 2.60 metros c) Elaborado en lamina de acero inoxidable SAE-304 calibre 18, resistente a la intemperie, con banca elaborada en lamina de acero inoxidable SAE 304 calibre 16, techo en lamina de policarbonato, ancho de 4,80mts una altura de 2,60mts, a la vista y fondo de 1,90mts, acabado satinado de gran presentación. "	6	Para dar cumplimiento a este ítem AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS realizo visita técnica interdisciplinaria, con los funcionarios de la secretaria de movilidad, en compañía del Señor Supervisor del Contrato; Ing. MILTON CONTRERAS y un , Representante del IDUVI con el fin de hacer el reconocimiento de los seis (06) puntos, para la implementación de la infraestructura de los paraderos de servicio público de pasajeros en el sector "entre ríos" del municipio de chía, así: a. Calle 19 con Carrera 15 b. Carrera 12 con Calle 7 c. Carrera 10 con Calle 3 d. Vía Guaymaral con Calle 10 sur e. Calle 29 con Carrera 4 f. Carrera 13 con Calle 11 En virtud de lo anterior se instaló la estructura que continuación se detalla: Paradero Carrera 13 con Calle 11 de: • Ancho 3.80 metros • Altura 2.60 metros • Profundo 1.70 metros • Fabricado en lamina y tubería tipo acero inoxidable ref. 304 satinado cal 18 con soporte techo resistente a la intemperie, banca fabricada en lamina de acero inoxidable cal 16 según modelo - Techo en lamina de policarbonato 8mm color blanco opalSe realiza la instalación del paradero que se ubica en la carrera 13 con calle 11, se resalta que los paraderos	 Paradero No 5 Calle 29 con Carrera 4  Paradero No 5 Calle 29 con Carrera 4   Paradero No 6 Calle 11 con Carrera 13

		restantes se encuentran en fabricación y ensamblaje en taller para su debida instalación. De la misma manera se encuentra en fabricación dentro de las instalaciones de la empresa los cinco (05) paraderos pendientes por instalar en los puntos acordados con el supervisor del contrato	
5. Dado en concreto 3500 psi según requerimiento estructural para fijación del paradero	3	Para dar cumplimiento a este ítem AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS realizo la fundición de la cimentación aprobada por el supervisor del contrato a través de las respectivas fases de acuerdo a las siguientes especificaciones: Paso 1: Realizar las excavaciones correspondientes según distancia requerida donde cada excavación tiene 300 mm de ancho, 400 mm largo y 500 mm de profundidad Paso 2: Fundir 300 mm de altura con concreto de 3000 psi y dejar fraguar por 4 días Paso 3: Armar el paradero y anclarlo al dado de concreto con chazos expansivos de 5/8" x 3" Paso 4 Fundir 200 mm de altura restante con concreto de 3000 psi y dejando a nivel del suelo.	Paso 1  Paso 2  Paso 3  Paso 4 

		De acuerdo a lo expuesto se ejecutó la cimentación correspondiente a tres (03) dados en concreto de 3500 psi para la fijación del paradero de la calle 11 con carrera 13	  Paradero No 6 Calle 11 con Carrera 13

Productos a entregar (con la ejecución del contrato)	Productos entregados	Cantidad de producto acumulado o % ejecución.

Observaciones:

_____

Anexos:

Otros: _____

Fecha de presentación de este informe **(22/08/2022)**

Aprobación:

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
NIT. 830123577-7
RL. CAMILO ANDRÉS ROSARIO RUBIO

MILTON CONTRERAS HERNANDEZ
Cargo: DIRECTOR SERVICIOS DE MOVILIDAD Y GESTIÓN DE TRANSPORTE
Vo.Bo. Supervisor
