CONTRATO CSE-20220003 "SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO APOYO A LAS OBRAS DE PARCHEO EJECUTADAS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA"

ACTA PARCIAL 2

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES MODIFICADAS			ACTA PARCIAL 1		CONDICIONES MODIFICADAS # 2			PRESENTE ACTA PARCIAL 2		ACUMULADO		
		UND	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	MAY Y MEN + / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	MAY Y MEN + / -	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	UND	CANT	V. TOTAL
1	APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES (INCLUYE CORTE)	M3	1.611,00	$ 88.874,61	$ 143.176.996,71	0,00	1.611,00	$ 143.176.996,71	320,00	$ 28.439.875,20	0,00	1.611,00	$ 143.176.996,71	174,99	$ 15.551.816,33	M3	494,99	$ 43.991.691,53
2	EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIAMETRO DE 2" Y UN INDICE PLASTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM (**)	M3	585,20	$ 24.354,50	$ 14.252.253,40	-193,95	391,25	$ 9.528.699,70	0,00	$ 0,00	-249,23	142,02	$ 3.458.721,92	0,00	$ 0,00	M3	0,00	$ 0,00
3	IMPRIMACION INCLUYE BARRIDO Y SOPLADO	M2	10.740,00	$ 1.374,98	$ 14.767.231,50	0,00	10.740,00	$ 14.767.285,20	2.450,00	$ 3.368.701,00	0,00	10.740,00	$ 14.767.285,20	1.123,31	$ 1.544.529,20	M2	3.573,31	$ 4.913.230,20
4	EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO	M3	895,00	$ 108.849,99	$ 97.420.741,05	0,00	895,00	$ 97.420.741,05	352,00	$ 38.315.196,48	0,00	895,00	$ 97.420.741,05	174,99	$ 19.047.229,03	M3	526,99	$ 57.362.425,51
5	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA	M3/KM	11.194,73	$ 1.699,41	$ 19.024.436,11	0,00	11.194,73	$ 19.024.436,11	7.392,00	$ 12.562.038,72	11.180,27	22.375,00	$ 38.024.298,75	4.374,65	$ 7.434.325,78	M3/KM	11.766,65	$ 19.996.364,50
6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUES DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCION DE DISEÑO)	M3/KM	2.433,3	$ 1.699,59	$ 4.135.612,35	0,00	2.433,30	$ 4.135.612,35	0,0	$ 0,00	-2.433,30	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	M3/KM	0,00	$ 0,00
7	HORAS VIBROCOMPACTADOR	HR	13,00	$ 91.150,00	$ 1.184.950,00	0,00	13,00	$ 1.184.950,00	3,00	$ 273.450,00	27,00	40,00	$ 3.646.000,00	18,00	$ 1.640.700,00	HR	21,00	$ 1.914.150,00
8	HORAS RETROEXCAVADORA	HR	13,00	$ 100.500,00	$ 1.306.500,00	47,00	60,00	$ 6.030.000,00	30,00	$ 3.015.000,00	-5,00	65,00	$ 6.532.500,00	15,00	$ 1.507.500,00	HR	45,00	$ 4.522.500,00
9	HORAS MOTONIVELADORA	HR	10,00	$ 150.000,00	$ 1.500.000,00	0,00	10,00	$ 1.500.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	10,00	$ 1.500.000,00	0,00	$ 0,00	HR	0,00	$ 0,00


TOTAL COSTO DIRECTO	$ 296.768.721,12	$ 296.768.721,12	$ 85.974.261,40	$ 308.526.543,63	$ 46.726.100,34	$ 132.700.361,74
ADMINISTRACION (22%)	$ 65.289.118,65	$ 65.289.118,65	$ 18.914.337,51	$ 67.875.839,60	$ 10.279.742,07	$ 29.194.079,58
IMPREVISTOS (2%)	$ 5.935.374,42	$ 5.935.374,42	$ 1.719.485,23	$ 6.170.530,87	$ 934.522,01	$ 2.654.007,23
UTILIDAD (1%)	$ 2.967.687,21	$ 2.967.687,21	$ 859.742,61	$ 3.085.265,44	$ 467.261,00	$ 1.327.003,62
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO	$ 74.192.180,28	$ 74.192.180,28	$ 21.493.565,35	$ 77.131.635,91	$ 11.681.525,08	$ 33.175.090,43
VALOR COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO	$ 370.960.901,40	$ 370.960.901,40	$ 107.467.826,75	$ 385.658.179,54	$ 58.407.625,42	$ 165.875.452,17
COMPONENTE AMBIENTAL	$ 13.568.302,54	$ 13.568.302,54	$ 6.784.151,27	$ 6.784.151,27	$ 0,00	$ 6.784.151,27
COMPONENTE BIOSEGURIDAD	$ 11.342.914,33	$ 11.342.914,33	$ 5.671.457,17	$ 7.671.457,17	$ 2.000.000,00	$ 7.671.457,17
COMPONENTE PMT	$ 12.948.339,40	$ 12.948.339,40	$ 6.474.169,70	$ 8.474.169,70	$ 2.000.000,00	$ 8.474.169,70
COSTO TOTAL	$ 408.820.457,67	$ 408.820.457,67	$ 126.397.604,89	$ 408.587.957,67	$ 62.407.625,42	$ 188.805.230,31


HUGO MONTAÑA
C.C. 1.055.228.532
SUPERVISOR


JOSE JULIAN LOPEZ PEÑALOZA
C.C. 74.376.933 de Duitama
R.L . FERIEL S.A.S. NIT. 900497897-7
CONTRATISTA


		Volumen m3	15,535566	ELABORO	
		Area Recuperada	86,3087	FeRiel SAS	
FECHA DEL PARCHEO	09 de Junio				
PARCHES N°	3	PARCHEO		PAGINA N°	1
DIRECCION	Avenida circunvalar				

PARCHE	DIMENCIONES	AREA(M2)	ESPESOR PROMEDIO	VOLUMEN (M3)
1	Según Esquema	29,3667	0,18	5,286006
2	Según Esquema	12,59	0,18	2,2662
3	Según Esquema	44,352	0,18	7,98336

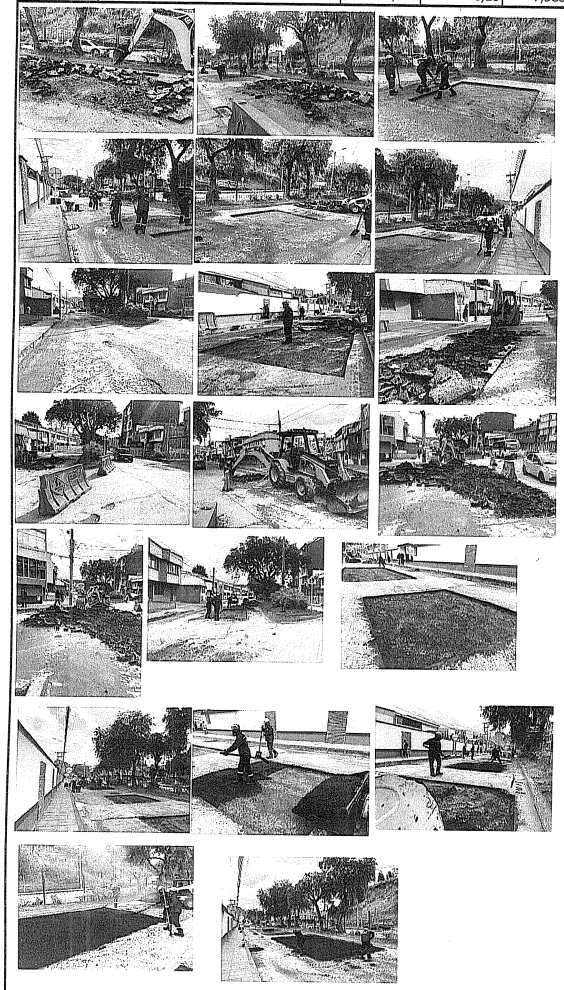









	Volumen m3	28,147976	ELABORO	
	Area Recuperada	201,0011	FeRiel SAS	
FECHA DEL PARCHEO	10 de junio			
PARCHES N°	9	PARCHEO	PAGINA N°	2
DIRECCION	Avenida Circunvalar			


PARCHE	DIMENCIONES	AREA(M2)	ESPESOR PROMEDIO	VOLUMEN (M3)
1	Según Esquema	17,861	0,11	1,96471
2	Según Esquema	80,454	0,18	14,48172
3	Según Esquema	20,661	0,13	2,68593
4	Según Esquema	3,26	0,12	0,3912
5	Según Esquema	13,8595	0,14	1,94033
6	Según Esquema	18,48	0,14	2,5872
7	Según Esquema	1,68	0,14	0,2352
8	Según Esquema	11,662	0,09	1,04958
9	Según Esquema	33,0836	0,085	2,812106

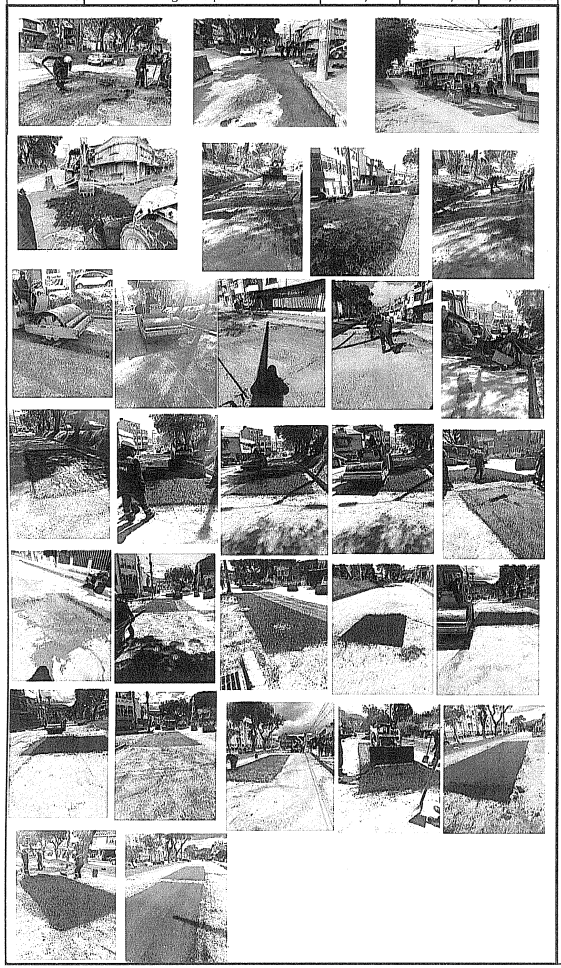





		Volumen m3	12,2825	ELABORO	
		Area Recuperada	72,25	FeRiel SAS	
FECHA DEL PARCHEO	11-jun-22				
PARCHES N°	2	PARCHEO		PAGINA N°	3
DIRECCION	Avenida Circunvalar				

PARCHE	DIMENCIONES	AREA(M2)	ESPESOR PROMEDIO	VOLUMEN (M3)
1	Según Esquema	55,1	0,17	9,367
2	Según Esquema	17,15	0,17	2,9155


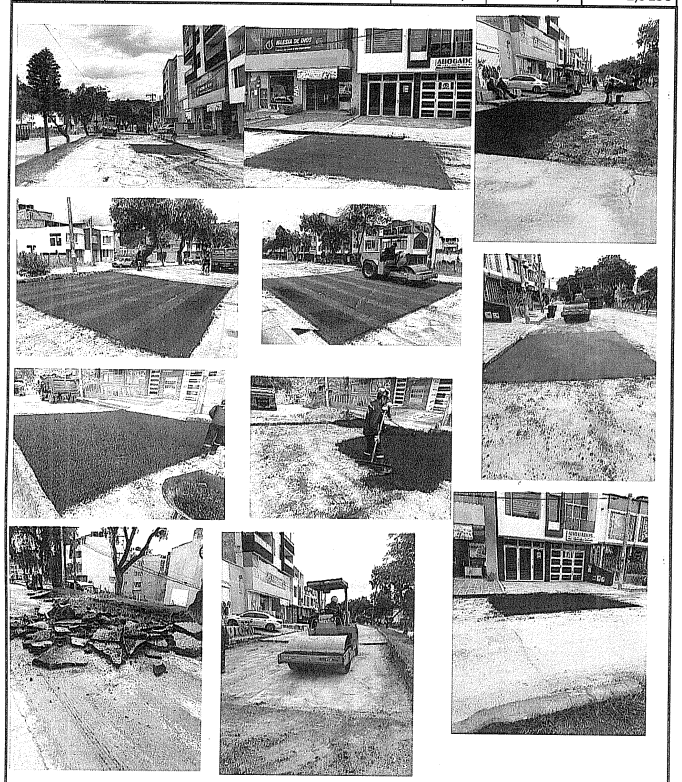


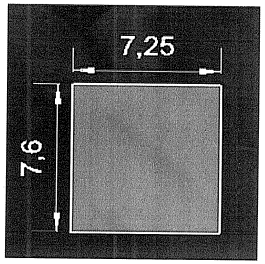









	Volumen m3	9,8719	ELABORO	
	Area Recuperada	58,07	FeRiel SAS	
FECHA DEL PARCHEO	13-jun-22			
PARCHES N°	2	PARCHEO	PAGINA N°	4
DIRECCION	Avenida Circunvalar			


PARCHE	DIMENCIONES	AREA(M2)	ESPESOR PROMEDIO	VOLUMEN (M3)
1	Según Esquema	5,33	0,17	0,9061
2	Según Esquema	52,74	0,17	8,9658












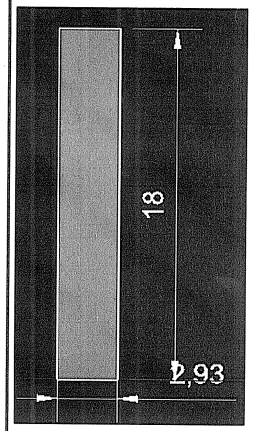

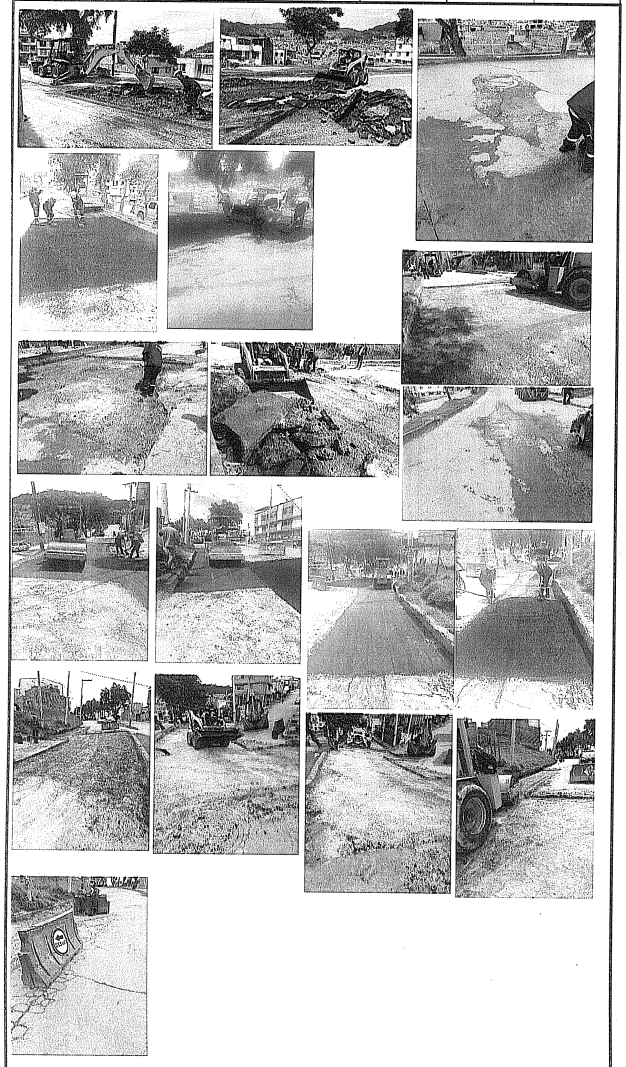

		Volumen m3	24,051365	ELABORO	
		Area Recuperada	185,0105	FeRiel SAS	
FECHA DEL PARCHEO	14-jun				
PARCHES N°	6	PARCHEO		PAGINA N°	5
DIRECCION	Avenida Circunvalar				


PARCHE	DIMENCIONES	AREA(M2)	ESPESOR PROMEDIO	VOLUMEN (M3)
1	Según Esquema	30,29	0,13	3,9377
2	Según Esquema	29,1005	0,13	3,783065
3	Según Esquema	62,37	0,13	8,1081
4	Según Esquema	10,83	0,13	1,4079
5	Según Esquema	26,752	0,13	3,47776
6	Según Esquema	25,668	0,13	3,33684






	Volumen m3	55,3287	ELABORO	
	Area Recuperada	263,47	FeRiel SAS	
FECHA DEL PARCHEO	15-jun-22			
PARCHES N°	1	PARCHEO	PAGINA N°	6
DIRECCION	Rotonda Avenida de las americas			



PARCHE	DIMENCIONES	AREA(M2)	ESPESOR PROMEDIO	VOLUMEN (M3)
1	Según Esquema	263,47	0,21	55,3287






















	Volumen m3	2,3049	ELABORO	
	Area Recuperada	15,366	FeRiel SAS	
FECHA DEL PARCHEO	16-jun-22			
PARCHES N°	2	PARCHEO	PAGINA N°	7
DIRECCION	Avenida de las Americas			


PARCHE	DIMENCIONES	AREA(M2)	ESPESOR PROMEDIO	VOLUMEN (M3)
1	Según Esquema	8,31	0,15	1,2465
2	Según Esquema	7,056	0,15	1,0584







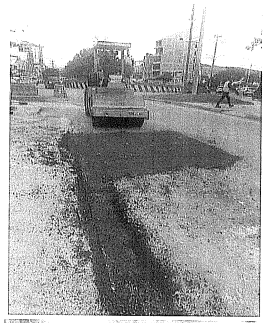


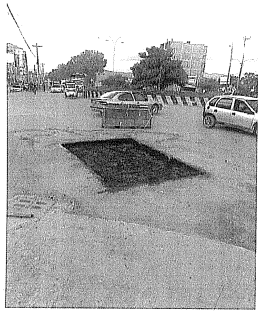

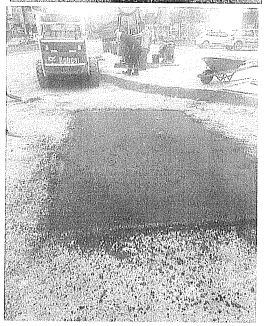









	Volumen m3	12,742496	ELABORO	
	Area Recuperada	98,0192	FeRiel SAS	
FECHA DEL PARCHEO	21 de Junio			
PARCHES N°	7	PARCHEO	PAGINA N°	8
DIRECCION	Avenida de las americas			


PARCHE	DIMENCIONES	AREA(M2)	ESPESOR PROMEDIO	VOLUMEN (M3)
1	Según Esquema	49,7952	0,13	6,473376
2	Según Esquema	1,4375	0,13	0,186875
3	Según Esquema	10,106	0,13	1,31378
4	Según Esquema	3,5	0,13	0,455
5	Según Esquema	8,6	0,13	1,118
6	Según Esquema	9,45	0,13	1,2285
7	Según Esquema	15,1305	0,13	1,966965

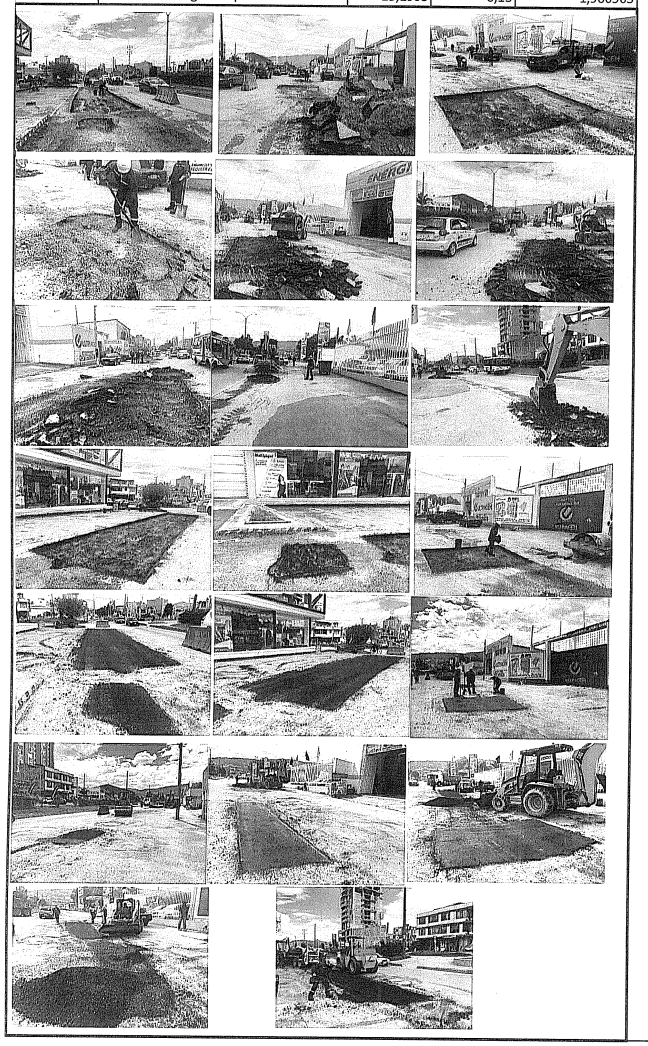




	Volumen m3	14,72064	ELABORO	
	Area Recuperada	86,592	FeRiel SAS	
FECHA DEL PARCHEO	22-Jun-22			
PARCHES N°	1	PARCHEO	PAGINA N°	9
DIRECCION	Avenida de las americas			


PARCHE	DIMENCIONES	AREA(M2)	ESPESOR PROMEDIO	VOLUMEN (M3)
1	Según Esquema	86,592	0,17	14,72064

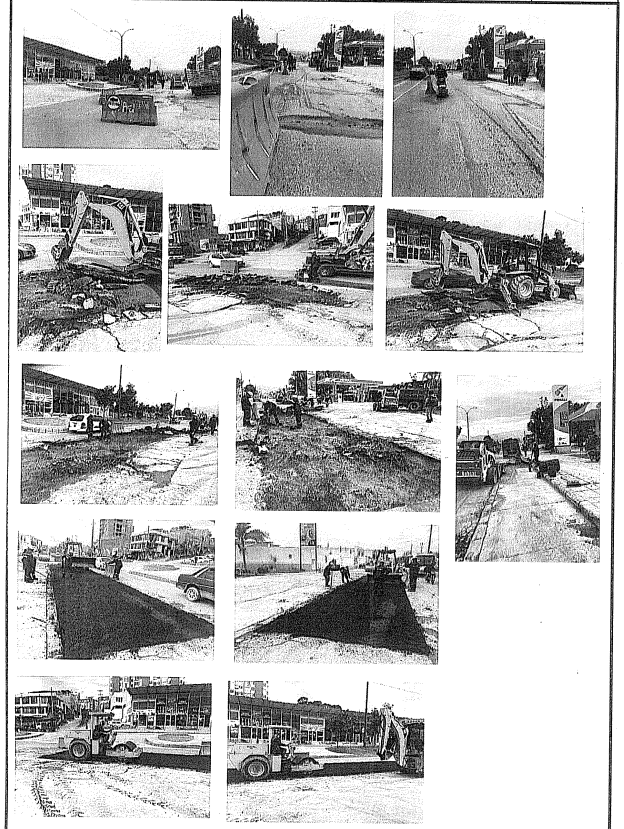





	Volumen m3	8,41332		ELABORO
	Area Recuperada	57,2228		FeRiel SAS
FECHA DEL PARCHEO	29 de Junio			
PARCHES N°	2	PARCHEO		PAGINA N° 10
DIRECCION	Avenida de las Americas			

PARCHE	DIMENCIONES	AREA(M2)	ESPESOR PROMEDIO	VOLUMEN (M3)
1	Según Esquema	53,8208	0,15	8,07312
2	Según Esquema	3,402	0,1	0,3402

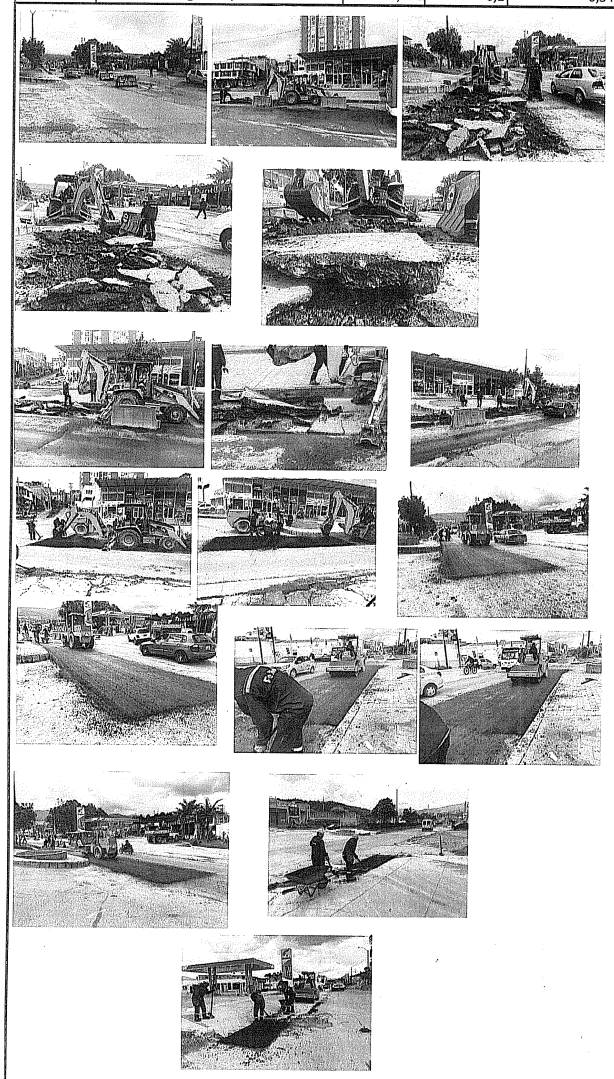





CONTRATO DE SERVICIOS No CSE-20220003

OBJETO: *SERVICIOS DE MANO DE OBRA COMO APOYO A LAS OBRAS DE PARCHEO EJECUTADAS POR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.*

INFORME PARCIAL 2

CONTRATISTA: FERIEL S.A.S.
NIT. 900497897-7

R.L. JOSE JULIAN LOPEZ PEÑALOZA

DUITAMA
AGOSTO 2022

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE SERVICIOS No CSE-20220003
ACTA No.	(DOS) MES JUNIO-JULIO
OBJETO	*SERVICIOS DE MANO DE OBRA COMO APOYO A LAS OBRAS DE PARCHEO EJECUTADAS POR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.*
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	FERIEL S.A.S. NIT. 900497897-7 R.L JOSE JULIAN LOPEZ PEÑALOZA C.C 74.376.933 DE DUITAMA
VALOR DEL CONTRATO	$ 408.820.457,67
DURACIÓN DEL CONTRATO	4 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN QUE SUPERE LA VIGENCIA 2022
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	09 DE MAYO DE 2022
FECHA DE INICIO	19 DE MAYO DE 2022
FECHA DE TERMINACION	10 DE SEPTIEMBRE DE 2022
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING. HUGO ARMANDO MONTAÑA SANABRIA TECNICO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME PARCIAL 2 CONTRATO DE SERVICIOS No CSE-20220003 cuyo objeto es "SERVICIOS DE MANO DE OBRA COMO APOYO A LAS OBRAS DE PARCHEO EJECUTADAS POR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA"


ASPECTOS TECNICOS

En el contrato de servicios no CSE-20220003 se ha realizado las siguientes actividades de obra con el fin de ejecutar el objeto del contrato "***SERVICIOS DE MANO DE OBRA COMO APOYO A LAS OBRAS DE PARCHEO EJECUTADAS POR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA***", tal como se describen a continuación:

ITEM 1. APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES (INCLUYE CORTE)


El servicio de mano de obra en este ítem se ejecutó para la apertura de la caja con retiro de sobrantes, actividad que se ejecuta previa definición de las áreas a intervenir por parte del supervisor del contrato de obra, las cuales obedecen a una afectación en su estructura, priorizada de acuerdo a la severidad de los daños que se presentan en la carpeta asfáltica. Se ha realizado la intervención de sectores de la ciudad como las avenidas principales dentro de las cuales se encuentran: Avenida circunvalar y Avenida de las Américas, siendo estas dos vías corredores viales primarios de la malla vial urbana del Municipio de Duitama.

Una vez se marcan las áreas a intervenir, definidas y aprobadas por el Supervisor, se procede a realizar el corte del pavimento, para el retiro de la capa de rodadura afectada, logrando así el área de cajeo y posterior alistamiento de su estructura, tal como se registra a continuación:

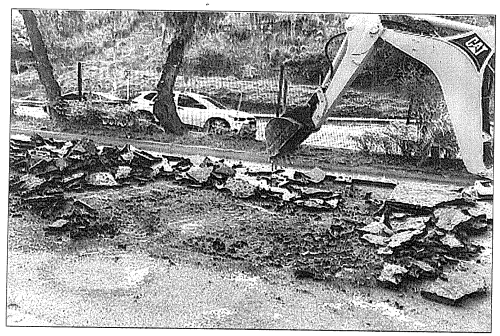

Fe.Riel S.A.S.

INFORME PARCIAL 2 CONTRATO DE SERVICIOS No CSE-20220003 cuyo objeto es "SERVICIOS DE MANO DE OBRA COMO APOYO A LAS OBRAS DE PARCHEO EJECUTADAS POR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA"

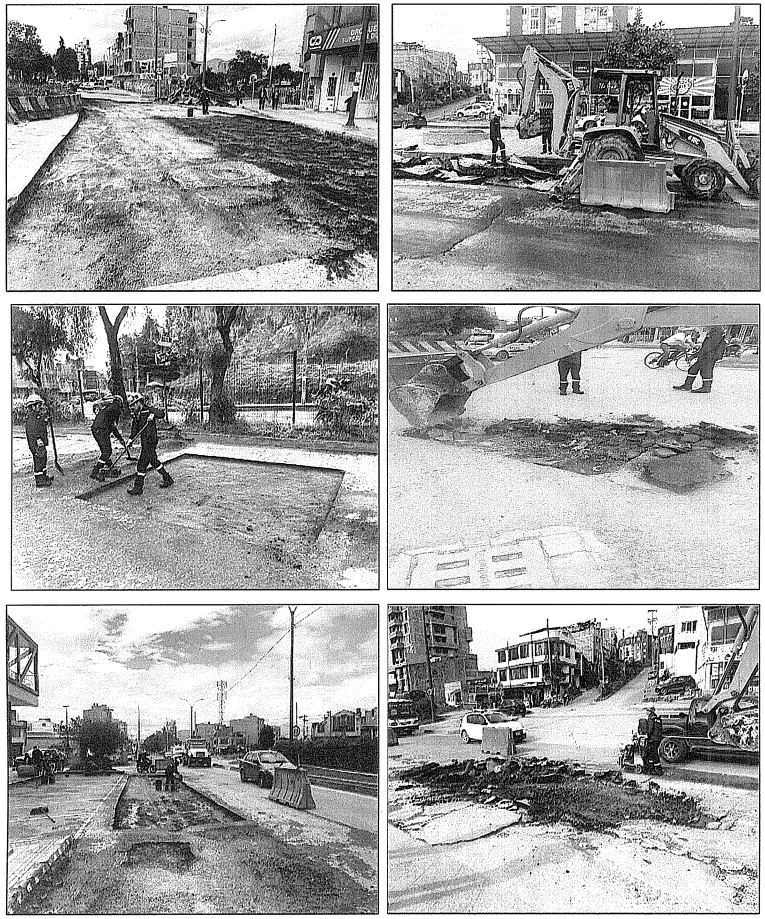



FERIEL S.A.S..

***NIT.* 900497897-7**

ITEM 3. IMPRIMACION INCLUYE BARRIDO Y SOPLADO

Con el fin de recuperar áreas de la malla vial de las Avenidas principales como son Avenida Américas y Avenida Circunvalar se llevo a cabo posterior a realizar la apertura mecánica de la caja se procede a realizar la imprimación, con material suministrado por la Alcaldía, en las áreas ya definidas con anterioridad. Para la ejecución de esta actividad se procedió a realizar la limpieza del área a intervenir incluyendo barrido y soplado con el fin de garantizar que la imprimación quede técnicamente bien aplicada, cumpliendo así su función de obtener una capa impermeable, logrando las condiciones optimas para la adherencia entre la estructura expuesta y la capa asfáltica.

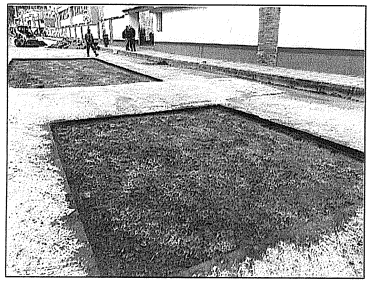

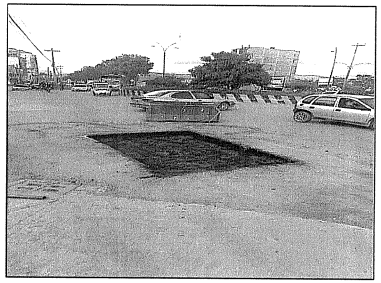






ITEM 4. EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO.

Completadas en su totalidad, las anteriores actividades de apertura de caja e imprimación, en las áreas definidas, en los corredores viales principales tales como Avenida de las Américas y Avenida Circunvalar se procede a realizar la ejecución de la actividad para la extendida y compactación de la mezcla asfáltica para parcheo. En la misma se garantiza que los niveles y espesores empalmen de acuerdo con las áreas existentes. Una vez se tiene instalada la mezcla asfáltica, se procede a realizar la compactación con el equipo idóneo para este tipo de trabajos, tal como se registra a continuación:

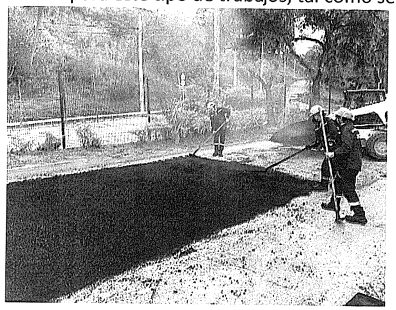







INFORME PARCIAL 2 CONTRATO DE SERVICIOS No CSE-20220003 cuyo objeto es: "SERVICIOS DE MANO DE OBRA COMO APOYO A LAS OBRAS DE PARCHEO EJECUTADAS POR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA"








FERIEL S.A.S..

NIT. **900497897-7**

INFORME PARCIAL 2 CONTRATO DE SERVICIOS No CSE-20220003 cuyo objeto es "SERVICIOS DE MANO DE OBRA COMO APOYO A LAS OBRAS DE PARCHEO EJECUTADAS POR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA"

ASPECTOS FINANCIEROS:

A continuación, se relaciona los aspectos financieros del ***CONTRATO DE SERVICIOS No CSE-20220003***, dentro de los cuales se ha realizado el pago de un acta parcial tal como sigue:

ITEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	VALOR INICIAL	**$ 408.820.457,67**
	* APORTE ALCALDIA	
	* APORTE ENTIDAD CONVENIENTE	
2	VALOR ADICIONADO	
3	VALOR TOTAL (1+2)	**$ 408.820.457,67**
4	VALOR PRESENTE ACTA	**$ 62.407.625,42**
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	**$ 126.397.604,89**
6	VALOR EJECUTADO	**$ 188.805.230,31**
7	SALDO POR EJECUTAR	**$ 220.015.227,36**

Atentamente,

JOSE JULIAN LOPEZ PEÑALOZA
R.L. FERIEL S.A.S

FERIEL S.A.S..
***NIT.* 900497897-7**

CIUDAD Y FECHA	DUITAMA, 03 DE AGOSTO DE 2022
TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE SERVICIOS No CSE-20220003
OBJETO	SERVICIOS DE MANO DE OBRA COMO APOYO A LAS OBRAS DE PARCHEO EJECUTADAS POR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	FERIEL S.A.S. NIT. 900497897-7 R.L JOSE JULIAN LOPEZ PEÑALOZA C.C 74.376.933 DE DUITAMA
NOMBRE DEL SUPERVISOR	HUGO ARMANDO MONTAÑA SANABRIA TECNICO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FRENTE A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

Las cantidades, valores, y aspectos técnicos consignados en el acta parcial 02 son responsabilidad exclusiva del contratista. El pago de la presente acta se realiza con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con las que el contratista ejecuto las obras, realizo las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte del supervisor de la fecha, en el periodo comprendido entre el 09 de junio y 29 de junio de 2022.

ASPECTOS TECNICOS:

De acuerdo con la información suministrada por el secretario de infraestructura se evidenciaron los siguientes aspectos técnicos, durante la ejecución de las obras.

- El personal empleado en la obra fue el adecuado para la ejecución del contrato.
- Se verificó el cumplimiento de las obligaciones laborales y demás obligaciones contractuales y legales por parte del contratista
- Para el desarrollo de la obra el contratista ha utilizado el recurso técnico y administrativo idóneo requerido para la cabal ejecución del contrato
- Se realizó el control de la programación física y financiera, velando por que el proyecto se desarrolle según lo programado y presupuestado, enfocado en la parte técnica del mismo.
- Se llevó a cabo el control en la ejecución de las actividades de obra, con el fin de cumplir las condiciones técnicas de cada una.

Con la ejecución de este contrato de servicio se ha llevado a cabo la recuperación de algunos sitios de las avenidas principales de la malla vial del Municipio de Duitama, dentro de las cuales se encuentra la Avenida Circunvalar y Avenida Américas, las cuales están catalogadas como vías primarias y de acuerdo a su movilidad deben contar con un mantenimiento periódico respecto a la capa de rodadura.

A la fecha se ha realizado la ejecución de las actividades contratadas y necesarias para la ejecución de obras de parcheo en diferentes sectores del municipio, logrando así un 46.18 % de ejecución aproximadamente. Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

ITEM 1. APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES (INCLUYE CORTE)

Este ítem se ejecutó con el servicio de mano de obra para la apertura de la caja con retiro de sobrantes, se ha ejecutado previa a la definición de las áreas a intervenir. Se realizó la intervención de la Avenida Américas y Avenida Circunvalar. Se ejecutó una cantidad de 174.99 m3 aproximadamente.











ITEM 2. EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**)

Para la presente acta no se ejecutaron actividades de este ITEM.

ITEM 3. IMPRIMACION INCLUYE BARRIDO Y SOPLADO

Al intervenir la malla vial principal del Municipio de Duitama, como son las avenidas principales Avenida de las Américas y Avenida Circunvalar, el contratista de obra realizo el servicio para la imprimación en las áreas definidas por esta dependencia, tomando como referencia la afectación de los daños de la capa de rodadura, de acuerdo a su severidad, para posterior instalación de la mezcla asfáltica, con el quipo idóneo y personal exigido para este tipo de actividades, registrado a continuación:











ITEM 4. EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO

Se realizó la recuperación mediante obras de parcheo, en las Avenidas principales, vías que descongestionan la ciudad y son arterias principales que deben ser intervenidas de inmediato, generando así una mejor movilidad y seguridad para los automotores y usuarios de estas vías. Esta actividad se realizó uno vez culminadas las anteriores actividades y de acuerdo ha visto bueno por parte de la supervisión, se procede a realizar las actividades de extendida y compactación de la mezcla asfáltica suministrada por el municipio. Es decir, una vez se tienen las áreas listas con actividades de cajeo e imprimación, se procede a realizar la ejecución de la mano de obra para la instalación y compactación de la mezcla asfáltica para las áreas definidas a recuperar con parcheo.

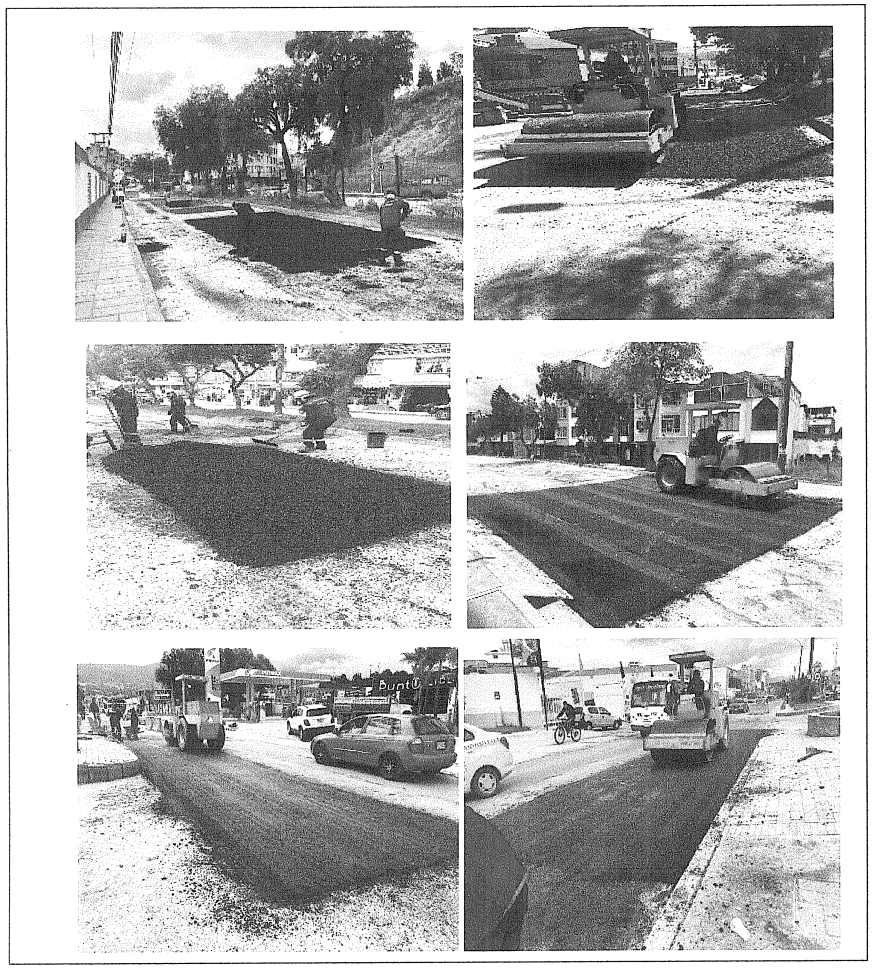

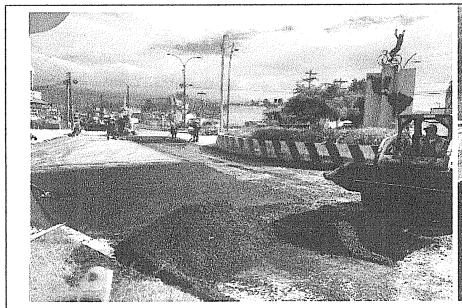


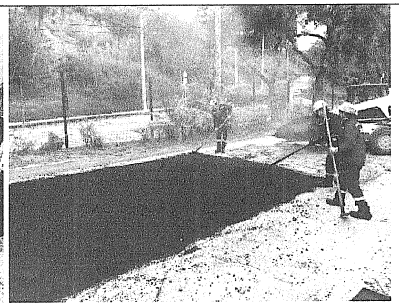

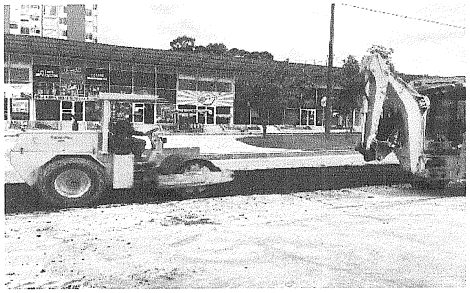

ITEM 5. TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA

Se presto el servicio de transporte de mezcla asfáltica desde el lugar indicado por el contratante, hasta los lugares de instalación para el parcheo, en una cantidad aproximada de 4374.65 m3/km.

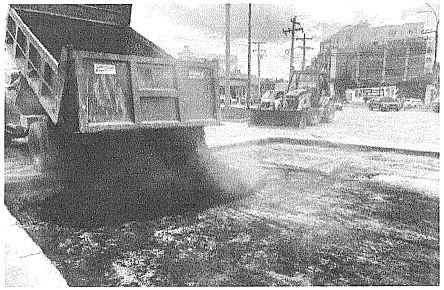

ITEM 6. TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO)

Para la presente acta no se ejecutaron actividades de ITEM.

ITEM 7. HORAS VIBROCOMPACTADOR

De acuerdo con la información entregada por el contratista y corroborada por el secretario de infraestructura en los comités de obra desarrollados la cantidad de horas prestadas y soportadas para el presente ITEM es de 18 Horas.

ITEM 8. HORAS RETROEXCAVADORA

Al igual que en el ITEM anterior de acuerdo con la información entregada por el contratista y corroborada por el secretario de infraestructura en los comités de obra desarrollados la cantidad de horas prestadas y soportadas para el presente ITEM es de 15 Horas.

ITEM 9. HORAS MOTONIVELADORA

Para la presente acta no se ejecutaron actividades de este ITEM.

ASPECTOS FINANCIEROS:

Al contratista de obra a ejecutado a la fecha el 46.18 %.

ITEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	VALOR INICIAL	$ 408.820.457,67
	* APORTE ALCALDIA	
	* APORTE ENTIDAD CONVENIENTE	
2	VALOR ADICIONADO	
3	VALOR MODIFICADO	
4	VALOR TOTAL (1+2)	$ 408.820.457,67
5	VALOR PRESENTE ACTA	$ 62.407.625,42
6	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$ 126.397.604,89
7	VALOR EJECUTADO	$ 188.805.230,31
8	SALDO POR EJECUTAR (3-5)	$ 220.015.227,36

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

Se realizó el respectivo control. Seguimiento y evaluación de las condiciones y procesos relacionados con la ejecución del contrato de obra pública cuyo objeto es "REALIZAR LA SERVICIOS DE MANO DE OBRA COMO APOYO A LAS OBRAS DE PARCHEO EJECUTADAS POR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. Así mismo se verificó que los trabajadores que laboran en la ejecución del contrato se encontraran afiliados al sistema de seguridad social y tuvieran las condiciones y los elementos adecuados para la realización de las diferentes actividades. Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista establecidas en el

contrato, igualmente se realizó el seguimiento a la ejecución del contrato verificando principalmente la calidad de los materiales y mano de obra usados en el desarrollo del contrato.

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y/ O SUGERENCIAS

DOCUMENTOS ANEXOS:

- ACTA PARCIAL No 2
- INFORME CONTRATISTA ACTA PARCIAL 02
- SABANA DE CANTIDADES ACTA PARCIAL 02
- SEGURIDAD SOCIAL

HUGO ARMANDO MONTAÑA SANABRIA
TECNICO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

Nota: Todos los informes originales presentados por los supervisores e interventores deberán reposar en la carpeta contractual respectiva.
