CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 6

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	5 DE JULIO DE 2022
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	4,20%
% DE AVANCE ACUMULADO	20,93%

				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
01	**OBRAS PRELIMINARES**										
5513	EDU. CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES (VER DISEÑO)	MES	$4.872.830	16,00	$77.965.280,00	6,00	$ 29.236.980,00	1,00	$ 4.872.830,00	7,00	$ 34.109.810,00
CM-01	COMISIÓN TOPOGRÁFICA MENSUAL, INCLUYE 1 COORDINADOR DE TOPOGRAFÍA, 1 TOPÓGRAFO, CADENEROS, DIBUJANTES, LANCHA PARA REPLANTEO EN AGUA, ESTACIÓN TOTAL Y NIVEL.	MES	$8.848.570	32,00	$283.154.240,00	10,00	$ 88.485.700,00	2,00	$ 17.697.140,00	12,00	$ 106.182.840,00
1069	CERRAMIENTO EN TELA VERDE, O MALLA DE LONA, (POLISOMBRA), CON ALTURA DE 2.00 METROS, BASE PARA FIJACION DE ESTACONES 0.20 X 0.20 X 0.50 METROS EN CONCRETO DE 1500 PSI, ESTACONES DE MADERA DE 2" X 2", APUNTILLADA Y AMARRADA A LOS POSTES CON	ML	$21.990	1724,00	$37.910.760,00				$ -		$ -
CM-02	DESMONTE Y DESCAPOTE MECÁNICO DE MATERIAL EXISTENTE, E = 0.25 M, INCLUYE RETIRO	M2	$8.280	9380,00	$77.666.400,00	975,84	$ 8.079.980,04		$ -	975,84	$ 8.079.980,04
3819	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA METÁLICA DE 4.(	UND	$3.212.960	1,00	$3.212.960,00	1,00	$ 3.212.960,00		$ -	1,00	$ 3.212.960,00
02	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**										
5913	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	M3	$23.460	3694,63	$86.676.111,59		$ -		$ -		$ -
198	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	$86.420	5590,25	$483.109.405,00		$ -		$ -		$ -
3013	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO	M3	$112.560	938,41	$105.627.429,60		$ -		$ -		$ -
3015	RELLENO EN MATERIAL DE BASE GRANULAR COMPACTADO	M3	$137.010	902,68	$123.676.186,80		$ -		$ -		$ -
CM-03	MURO EN TIERRA ARMADA REFORZADO, INCLUYE GEOMALLAS Y COLCHONETAS	ML	$1.133.920	617,32	$699.991.494,40		$ -		$ -		$ -
03	**PILOTAJE EN MADERA**										
CM-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PILOTE DIÁMETRO 20, INCLUYE COMPLEMENTO SUPERIOR	ML	$817.300	7911,97	$6.466.454.211,45	4907,54	$ 4.010.932.442,00	542,10	$ 443.058.330,00	5449,64	$ 4.453.990.772,00
CM-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PILOTE DIÁMETRO 25, INCLUYE COMPLEMENTO SUPERIOR	ML	$961.780	10397,91	$10.000.501.879,80	5047,09	$ 4.854.190.220,20	560,20	$ 538.789.156,00	5607,29	$ 5.392.979.376,20
CM-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D15	ML	$313.110	6338,17	$1.984.544.408,70	924,00	$ 289.313.640,00	957,00	$ 299.646.270,00	1881,00	$ 588.959.910,00
CM-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D17	ML	$357.285	6132,09	$2.190.903.775,65	784,40	$ 280.254.354,00	943,40	$ 337.062.669,00	1727,80	$ 617.317.023,00
04	**PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA**										
CM-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA CCA 08X30, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL	ML	$478.270	6151,94	$2.942.288.343,80	1376,90	$ 658.529.963,00	713,57	$ 341.279.123,90	2090,47	$ 999.809.086,90
CM-09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA CCA 08X36, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL	ML	$560.600	4123,44	$2.311.600.464,00	588,00	$ 329.632.800,00	689,24	$ 386.387.944,00	1277,24	$ 716.020.744,00
CM-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTREPISO - SECCIÓN CURVA, INCLUYE VIGUETAS, FRISOS Y LISTÓN DE DECK	M2	$971.650	1737,43	$1.688.173.859,50		$ -		$ -		$ -
CM-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTREPISO - SECCIÓN RECTA, INCLUYE VIGUETAS, FRISOS Y LISTÓN DE DECK	M2	$840.360	8678,17	$7.292.786.941,20		$ -	333,83	$ 280.537.378,80	333,830	$ 280.537.378,80
05	**BARANDAS EN MADERA**										
CM-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA - SECCIÓN CURVA, INCLUYE PARAL ESTRUCTURAL, PASAMANOS Y MARCO CON BARROTES	ML	$845.480	754,38	$637.813.202,40		$ -		$ -		$ -

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 6

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	5 DE JULIO DE 2022
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	4,20%
% DE AVANCE ACUMULADO	20,93%

				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
CM-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA - SECCIÓN RECTA, INCLUYE PARAL ESTRUCTURAL, PASAMANOS Y MARCO CON BARROTES	ML	$818.100	3589,85	$2.936.856.285,00		$ -		$ -		$ -
06	EDIFICACIONES EN MADERA										
CM-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO EXTERIOR, INCLUYE AMARRE INFERIOR, PARAL VERTICAL, UNIONES Y AMARRE SUPERIOR	M2	$1.582.470	606,39	$959.593.983,30		$ -		$ -		$ -
CM-15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DINTEL MURO EXTERIOR	ML	$244.270	29,19	$7.130.241,30		$ -		$ -		$ -
CM-16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGUETA 4X18 -PENDIENTE VARIABLE, INCLUYE VIGUETA EN I, FRISOS Y ANCLAJE A VIGAS	M2	$674.540	376,61	$254.038.509,40		$ -		$ -		$ -
CM-17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO ESTRUCTURAL MURO INTERIOR, INCLUYE AMARRE INFERIOR, PARAL VERTICAL, UNIONES Y AMARRE SUPERIOR	M2	$241.180	545,49	$131.561.278,20		$ -		$ -		$ -
CM-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DINTEL MURO INTERIOR	ML	$175.730	22,30	$3.918.779,00		$ -		$ -		$ -
CM-19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN SUPERBOARD EN ACRILURETANO, INCLUYE SELLANTE DE JUNTAS EN POLIURETANO	M2	$86.570	545,18	$47.196.232,60		$ -		$ -		$ -
CM-20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN SUPERBOARD 20 MM	M2	$112.810	545,18	$61.501.755,80		$ -		$ -		$ -
CM-21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLUMNA EN CRUZ PÓRTICO 45X45, INCLUYE ANCLAJE AL PILOTE	ML	$2.011.190	305,28	$613.976.083,20		$ -		$ -		$ -
CM-22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA PÓRTICO - 13X50, INCLUYE ANCLAJE A COLUMNA	ML	$1.208.560	542,87	$656.090.967,20		$ -		$ -		$ -
CM-23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGUETA 6X36, INCLUYE ANCLAJE A VIGA	ML	$759.880	2736,45	$2.079.373.626,00		$ -		$ -		$ -
CM-24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN POSTES DE 12 CMS DE DIÁMETRO, AMARRE INFERIOR Y SUPERIOR, FLANCHES, HERRAJES Y FIJACIONES EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE PINTURA LASUR.	M2	$359.970	1697,50	$611.049.075,00		$ -		$ -		$ -
07	ESTRUCTURAS EN CONCRETO										
7,1	CIMENTACIONES										
377	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	$34.750	28,35	$985.162,50		$ -		$ -		$ -
198	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	$86.420	10,70	$924.694,00		$ -		$ -		$ -
1201	SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI E = 0.10 METROS	M3	$481.690	28,95	$13.944.925,50		$ -		$ -		$ -
7651	ZAPATA Y PEDESTAL EN CONCRETO DE 3500 PSI PREMEZCLADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$475.260	41,05	$19.509.423,00		$ -		$ -		$ -
7652	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$617.220	70,70	$43.637.454,00		$ -		$ -		$ -
CM-25	CONCRETO DE 3500 PSI PLACA DE CONTRAPISO	M3	$467.470	9,10	$4.253.977,00		$ -		$ -		$ -
2677	CIMIENTO EN CONCRETO CICLÓPEO E= 0.50 METROS, EN UN 50% DE CONCRETO DE 3000 PSI Y 50% EN PIEDRA CICLÓPEA	M3	$229.160	61,55	$14.104.798,00		$ -		$ -		$ -

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 6

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	5 DE JULIO DE 2022
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	4,20%
% DE AVANCE ACUMULADO	20,93%

				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
2219	MURO DE CONTENCIÓN, MURO PARA SOPORTE O ESTRIBOS DE PUENTE, Y BOX CULVERT EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$675.770	51,48	$34.788.639,60		$ -		$ -		$ -
7,2	ESTRUCTURA										
3092	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$ 829.330,00	28,00	$23.221.240,00		$ -		$ -		$ -
3093	VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$ 790.210,00	3,05	$2.410.140,50		$ -		$ -		$ -
2214	PLACA PARA LOSAS SUPERIORES DE 3500 PSI, E = 0.15 METROS	M2	$127.830	38,00	$4.857.540,00		$ -		$ -		$ -
362	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	M2	$30.050	80,35	$2.414.517,50		$ -		$ -		$ -
7,3	TANQUE										
6020	TANQUE EN CONCRETO PARA SISTEMA DE RIEGO F"C = 28 MPA (4000 PSI)-VER DISEÑO	M3	$1.016.570	216,50	$220.087.405,00		$ -		$ -		$ -
4405	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE SIKA FILL O SIMILAR.	M2	$31.480	568,76	$17.904.564,80		$ -		$ -		$ -
7,4	ACERO DE REFUERZO										
78,0	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	$6.700	49703,74	$333.015.058,00		$ -		$ -		$ -
08	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS										
8,1	LISTONES EN MADERA										
8,2	MESONES										
CM-26	CUBIERTA NUEVA REFERENCIA CORIAN NEUTRAL AGGREGATE PARA 12MM MESÓN BAÑOS 3,6M X 0,65 M X 0,012 M.	UND	$8.960.100	4,00	$35.840.400,00		$ -		$ -		$ -
CM-27	CUBIERTA NUEVA REFERENCIA CORIAN NEUTRAL AGGREGATE PARA 12MM MESÓN LOCALES DE ATENCIÓN DE SUPERFICIE EN CONCRETO DE 3,3M X 0,65 M X 0,012 M.	UND	$8.259.560	1,00	$8.259.560,00		$ -		$ -		$ -
CM-28	CUBIERTA NUEVA REFERENCIA CORIAN NEUTRAL AGGREGATE PARA 12MM MESÓN DE LAVAMANOS SOPORTADO EN SUPERFICIE CONCRETO DE 0,56 M X 0,60 M X 0,012 M.	UND	$2.587.220	3,00	$7.761.660,00		$ -		$ -		$ -
8,3	MUROS MAMPOSTERÍA										
133	LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	M2	$42.440	240,00	$10.185.600,00		$ -		$ -		$ -
8,4	MUROS INTERNOS EQUIPAMIENTOS										
2180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DRYWALL EN LÁMINA SUPERBOARD DE 6 MM POR AMBAS CARAS	M2	$66.100	237,60	$15.705.360,00		$ -		$ -		$ -
8,5	ACABADOS SOBRE MUROS										
344	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	M2	$18.390	480,00	$8.827.200,00		$ -		$ -		$ -
435	PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	M2	$21.170	58,76	$1.243.949,20		$ -		$ -		$ -
432	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	M2	$9.770	480,00	$4.689.600,00		$ -		$ -		$ -

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 6

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	5 DE JULIO DE 2022
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	4,20%
% DE AVANCE ACUMULADO	20,93%

				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
152	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	M2	$12.400	480,00	$5.952.000,00		$ -		$ -		$ -
CM-29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN ECOWOOD H40-60 EPC TEKA SEPARADO CADA 10 CM	M2	$260.080	240,00	$62.419.200,00		$ -		$ -		$ -
09	**PISOS Y ENCHAPES**										
CM-30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN SUPERBOARD. INCLUYE ESTRUCTURA DE MADERA PARA EL PISO	M2	$590.490	293,76	$173.462.342,40		$ -		$ -		$ -
CM-31	PISO ALLANADO EN CONCRETO ENDURECIDO Y SEMIPULIDO, E= 8 CM, JUNTAS EN PVC COLOR NEGRO	M2	$86.820	75,00	$6.511.500,00		$ -		$ -		$ -
2691	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 17.5 MPA IMPERMEABILIZADO E = 0.05 MTS	M2	$25.110	87,00	$2.184.570,00		$ -		$ -		$ -
CM-32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MOSAICO VERDE MATE DE HOJAS O MALLAS DE 31,5 X 3,15 CM. MATERIAL MOSAICO EN VIDRIO. FORMATO DE CADA MOSAICO: 3,8 X 3,8 CM. ESPESOR 2MM. INCLUYE JUNTA DE DIVISIÓN PLÁSTICA COLOR NEGRO DE 3 MM DE ESPESOR.	M2	$362.830	76,74	$27.843.574,20		$ -		$ -		$ -
CM-33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARED EN MOSAICO VERDE MATE DE HOJAS O MALLAS DE 31,5 X 3,15 CM. MATERIAL MOSAICO EN VIDRIO. FORMATO DE CADA MOSAICO: 3,8 X 3,8 CM. ESPESOR 2MM. INCLUYE JUNTA DE DIVISIÓN PLÁSTICA COLOR NEGRO DE 3 MM DE ESPESOR.	M2	$375.020	116,61	$43.731.082,20		$ -		$ -		$ -
CM-34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PORCELANATO TIPO MADERA 20X120 CM ALABAMA FAGGIO O SIMILAR	M2	$206.050	205,86	$42.417.453,00		$ -		$ -		$ -
CM-35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE MOSAICO KLIPEN O SIMILAR	M2	$308.860	12,36	$3.817.509,60		$ -		$ -		$ -
10	**CIELOS RASOS**										
CM-36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PLACA DE YESO SOPORTADA EN PERFIL TIPO RH O SIMILAR PARA ZONAS HÚMEDAS	M2	$33.700	76,74	$2.586.138,00		$ -		$ -		$ -
CM-37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PLACA DE YESO SOPORTADA EN PERFIL TIPO ST O SIMILAR PARA ZONAS SECAS	M2	$28.910	205,86	$5.951.412,60		$ -		$ -		$ -
11	**PAVIMENTOS Y ANDENES**										
5759	EDU. TRITURADO (VER DISEÑO)	M3	$97.590	235,30	$22.962.927,00		$ -		$ -		$ -
8035	PAVIMENTO ASFALTICO MDC - 25	M3	$772.540	295,26	$228.100.160,40		$ -		$ -		$ -
CM-38	CONCRETO ASFALTICO MDC-10 PARA CICLORRUTA	M3	$749.740	129,15	$96.828.921,00		$ -		$ -		$ -
4742	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANDEN EN LOSETAS PREPULIDA LISA, TACTIL Y GUIA DE 0.40X0.40X0.06 METROS, INCLUYE CENEFA EN CONCRETO DE 3000 PSI (VER DISEÑO).	M2	$130.020	1610,18	$209.355.603,60		$ -		$ -		$ -
CM-39	LOSETA TÁCTIL GUÍA TIPO A 58. PIEZA ALIGERADA PREFABRICADA EN CONCRETO ACABADO ANTIDESLIZANTE EN COLOR GRIS OSCURO. DIMENSIONES 20X20X6CMS.	M2	$98.600	123,86	$12.212.596,00		$ -		$ -		$ -

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 6

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	5 DE JULIO DE 2022
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	4,20%
% DE AVANCE ACUMULADO	20,93%

				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
CM-40	LOSETA TÁCTIL ALERTA. PIEZA ALIGERADA PREFABRICADA EN CONCRETO ACABADO ANTIDESLIZANTE EN COLOR GRIS OSCURO. DIMENSIONES 20X20X6CMS.	M2	$98.600	123,86	$12.212.596,00		$ -		$ -		$ -
3872	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPELLANTAS	UND	$85.900	24,00	$2.061.600,00		$ -		$ -		$ -
1752	DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA Y EN ZONA DE TRÁFICO O PARQUEO	ML	$2.880	1857,90	$5.350.752,00		$ -		$ -		$ -
125	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15 X 0,30 MTS	ML	$51.840	1857,90	$96.313.536,00		$ -		$ -		$ -
12	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS										
3037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA TOALLAS DE PAPEL DE SOBREPONER A LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO 304, CAPACIDAD 300 TOALLAS O DOS (2) PAQUETES, CERRADURA CON LLAVE	UND	$179.650	7,00	$1.257.550,00		$ -		$ -		$ -
3039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR PARA PAPEL HIGIÉNICO DE SOBREPONER EN LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO PARA ROLLO DE 200/400 METROS, CERRADURA CON LLAVE	UND	$141.450	13,00	$1.838.850,00		$ -		$ -		$ -
3035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR PARA JABÓN LÍQUIDO PARA INSTALAR EN PARED, CON TORNILLOS ESCONDIDOS, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, BOTÓN PULSADOR EN ABS RESISTENTE, CAPACIDAD 1.2 LTS, VENTANILLA DE DESCARGA SUPERIOR CON LLAVE, NIVEL DE JABÓN, PUSH FRONTAL	UND	$166.550	19,00	$3.164.450,00		$ -		$ -		$ -
3054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR DE MANO ELÉCTRICO 1AA ECO SRA TURBO DE SOBREPONER EN LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO CON SENSOR	UND	$831.580	6,00	$4.989.480,00		$ -		$ -		$ -
CM-41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO. INCLUYE ACCESORIO DE MONTAJE PARED	UND	$430.480	2,00	$860.960,00		$ -		$ -		$ -
CM-42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD FUA EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO DE 1 1/4". INCLUYE ACCESORIO DE MONTAJE PARED.	UND	$141.480	2,00	$282.960,00		$ -		$ -		$ -
CM-43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIADOR DE PAÑALES HORIZONTAL, EN POLIPROPILENO COLOR GRIS, DE SOBREPONER EN LA PARED.	UND	$1.603.060	4,00	$6.412.240,00		$ -		$ -		$ -
1940	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL SANTA FÉ O SIMILAR PARA FLUXÓMETRO, INCLUYE GRIFERÍA PUSH ANTIVANDÁLICA	UND	$352.680	6,00	$2.116.080,00		$ -		$ -		$ -
CM-44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL DE CORONA, CON GRIFERÍA TIPO PUSH ANTIVANDÁLICA. COLOR BLANCO	UND	$1.041.250	11,00	$11.453.750,00		$ -		$ -		$ -

DRA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 6

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	5 DE JULIO DE 2022
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	4,20%
% DE AVANCE ACUMULADO	20,93%

				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
CM-45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INSTITUCIONAL ALONGADO PARA PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES, ALTA EFICIENCIA 4.8 LITROS O SIMILAR Y FLUXÓMETRO PARA SANITARIO, MANOS LIBRES CON SENSOR, INCRUSTADO EN LA PARED	UND	$1.047.250	2,00	$2.094.500,00		$ -		$ -		$ -
351	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	UND	$239.030	19,00	$4.541.570,00		$ -		$ -		$ -
CM-46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DUCHA 8 PULGADAS TIPO VAAL SSB O SIMILAR	UND	$420.100	9,00	$3.780.900,00		$ -		$ -		$ -
1106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO BISELADO DE 4 MM	M2	$98.040	5,76	$564.710,40		$ -		$ -		$ -
CM-47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES SANITARIAS EN PANEL LAMINADO COMPACTO DE 12.7MM, EN MELAMINA PERILLO CON ACABADO UP. CERROJO CON AVISO DE OCUPACIÓN, BISAGRA CIERRE AUTOMÁTICO, BORDE TRASLAPADO, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE DE DISEÑO EXCLUSIVO.	M2	$634.260	29,72	$18.850.207,20		$ -		$ -		$ -
CM-48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA ORINALES EN PANEL LAMINADO COMPACTO DE 12.7MM, EN MELAMINA PERILLO CON ACABADO UP. HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE DE DISEÑO EXCLUSIVO.	M2	$612.910	2,16	$1.323.885,60		$ -		$ -		$ -
CM-49	CANECA AUTOSERVICIO, EN ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON CANECA INTERNA PLÁSTICA. DIMENSIONES: 56 CM X 110 CM X 56 CM. RUEDAS Y TOPES, TAPA PUSH Y COMPUERTA PARA CANECA INTERNA PLÁSTICA	UND	$2.753.660	4,00	$11.014.640,00		$ -		$ -		$ -
1948	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATRAPEROS EN GRANITO PREFABRICADO DE 0.35 X 0.35 METROS	UND	$192.420	2,00	$384.840,00		$ -		$ -		$ -
CM-50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA REDONDA DE PEDAL CON TAPA CAÍDA SUAVE, CAPACIDAD 9 LITROS, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO ANTIHUELLAS.	UND	$89.250	13,00	$1.160.250,00		$ -		$ -		$ -
13	URBANISMO Y EXTERIORES										
CM-51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTENEDOR PUNTO ECOLÓGICO DE TRES DIVISIONES. FRENTE EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CALIBRE 18 RESPALDO EN LÁMINA COLD ROLL CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BORDES EN CORTE LÁSER AROS SUJETADORES INTERNOS SEÑALIZACIÓN CON ILUSTRACIÓN O SÍMBOLOS RUEDAS MACIZAS EN CAUCHO. DIMENSIONES: 80X70X30 CM.	UND	$1.536.260	15,00	$23.043.900,00		$ -		$ -		$ -
CM-52	ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS EN ACERO GALVANIZADO COLOR NEGRO ESPACIO PARA 3 CELDAS DE PARQUEO. SEGÚN DISEÑO Y DIMENSIONES.	UND	$238.430	11,00	$2.622.730,00		$ -		$ -		$ -

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 6

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	5 DE JULIO DE 2022
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	4,20%
% DE AVANCE ACUMULADO	20,93%

				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
14	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI										
14,00	REDES HIDROSANITARIAS	GLB	$1.700.000.000	1,00	$1.700.000.000,00		$ -		$ -		$ -
15	INSTALACIONES ELECTRICAS	GLB	3300000000								
15,1	SALIDAS ELECTRICAS Y CIRCUITOS RAMALES DE USO FINAL										
15,1,1	Suministro e instalacion de salida para iluminacion interior ubicada en cielo raso en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas ocotogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	$282.988	159,00	$44.995.092,00		$ -		$ -		$ -
15,1,2	Suministro e instalacion de salida para iluminacion exterior ubicada en fachada de edificaciones en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas ocotogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	$282.988	38,00	$10.753.544,00		$ -		$ -		$ -
15,1,3	Suministro e instalacion de salida para iluminacion exterior ubicada en pisos de edificaciones en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas ocotogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	$282.988	78,00	$22.073.064,00		$ -		$ -		$ -
15,1,4	Suministro e instalacion de salida para iluminacion en pasarelas en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye caja pvc 15x15 cm, conectores tipo gel , curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	$492.196	794,00	$390.803.624,00		$ -		$ -		$ -
15,1,5	Suministro e instalacion de circuito ramal para iluminacion en pasarelas en tuberia SCH 40 Kraloy 1", incluye cajas ocotogonales, conectores, curvas, cable N. 6 Aluminio Serie 8000 AWG (F-F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	$72.690	2260,00	$164.279.400,00		$ -		$ -		$ -

DRA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 6

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	5 DE JULIO DE 2022
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	4,20%
% DE AVANCE ACUMULADO	20,93%

				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15,1,6	Suministro e instalacion de circuito ramal para iluminacion en pasarelas en tuberia SCH 40 Kraloy 1 1/2", incluye cajas ocotogonales, conectores, curvas, cable N. 2 Aluminio Serie 8000 AWG (F-F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	$137.058	1655,00	$226.830.990,00		$ -		$ -		$ -
15,1,7	Suministro e instalacion de salida para iluminacion tipo poste, incluye cable encauchetado de 3x10 AWG, empalme de derivacion GHFC1 de 3M	UND	$1.111.743	11,00	$12.229.173,00		$ -		$ -		$ -
15,1,8	Suministro e instalacion de circuito ramal para iluminacion de postes en tuberia PVC A 3/4", incluye curvas, cable N. 10 AWG (F-F-F-T) y excavacion tape y compactacion.	ML	$54.106	230,00	$12.444.380,00		$ -		$ -		$ -
15,1,9	Suministro e instalacion de salida para interrruptor sencillo, incluye tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", caja 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-T), conectores de resorte e interruptor sencillo. (Tuberia empotrada). Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	$169.870	29,00	$4.926.230,00		$ -		$ -		$ -
15,1,10	Suministro e instalacion de salida para interrruptor doble, incluye tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", caja 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-T), conectores de resorte e interruptor doble. (Tuberia empotrada). Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	$194.917	1,00	$194.917,00		$ -		$ -		$ -
15,1,11	Suministro e instalacion de salida para sensor en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas ocotogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a sensor por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	$258.231	14,00	$3.615.234,00		$ -		$ -		$ -
15,1,12	Suministro e instalacion de caja de paso de 20x20cm, incluye contactor de 20A-AC1, tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	$675.253	6,00	$4.051.518,00		$ -		$ -		$ -
15,1,13	Suministro e instalacion de salida para UPS 6 KVA en tuberia PVC SCH 40 1", incluye cajas 4x4" con suplemento, cable N. 8 AWG (F-F-N) + N.10(T). IN UPS	UND	$530.543	2,00	$1.061.086,00		$ -		$ -		$ -
15,1,14	Suministro e instalacion de salida para UPS 6 KVA en tuberia PVC SCH 40 1", incluye cajas 4x4" con suplemento, cable N. 8 AWG (F-F-N) + N.10(T). OUT UPS	UND	$530.543	2,00	$1.061.086,00		$ -		$ -		$ -

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 6

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	5 DE JULIO DE 2022
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	4,20%
% DE AVANCE ACUMULADO	20,93%

				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15,1,15	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de UPS 6 KVA en tuberia PVC SCH 40 1", incluye cajas 4x4" con suplemento, conectores, curvas, cable N. 8 AWG (F-F-N) + N.10(T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	$111.231	47,00	$5.227.857,00		$ -		$ -		$ -
15,1,16	Suministro e instalacion de salida para UPS 3 KVA en tuberia PVC SCH 40 3/4", incluye cajas 4x4" con suplemento, cable N. 10 AWG (F-N) + N.10(T). IN UPS	UND	$350.909	2,00	$701.818,00		$ -		$ -		$ -
15,1,17	Suministro e instalacion de salida para UPS 3 KVA en tuberia PVC SCH 40 3/4", incluye cajas 4x4" con suplemento, cable N. 10 AWG (F-F-N) + N.10(T). OUT UPS	UND	$350.909	2,00	$701.818,00		$ -		$ -		$ -
15,1,18	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de UPS 3 KVA en tuberia PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 10 AWG (F-N) + N.10(T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	$54.559	20,00	$1.091.180,00		$ -		$ -		$ -
15,1,19	Suministro e instalacion de salida para extractor en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, coraza LT de 3/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	$374.266	7,00	$2.619.862,00		$ -		$ -		$ -
15,1,20	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de extractores en tuberia PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	$55.097	73,00	$4.022.081,00		$ -		$ -		$ -
15,1,21	Suministro e instalacion de salida para evaporador en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, coraza LT de 3/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	$379.618	6,00	$2.277.708,00		$ -		$ -		$ -
15,1,22	Suministro e instalacion de salida para condensador en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, coraza LT de 3/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	$399.576	2,00	$799.152,00		$ -		$ -		$ -

DRS

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 6

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	5 DE JULIO DE 2022
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	4,20%
% DE AVANCE ACUMULADO	20,93%

				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15,1,23	Suministro e instalacion de salida para condensador en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x4", conectores, curvas, cable N. 10 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, coraza LT de 3/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	$431.223	3,00	$1.293.669,00		$ -		$ -		$ -
15,1,24	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de equipos de aire en tuberia PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	$63.698	50,00	$3.184.900,00		$ -		$ -		$ -
15,1,25	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de equipos de aire en tuberia PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 10 AWG (F-N-T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	$64.672	75,00	$4.850.400,00		$ -		$ -		$ -
15,1,26	Suministro e instalacion de salida para ventilador en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas ocotogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	$205.664	5,00	$1.028.320,00		$ -		$ -		$ -
15,1,27	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de EBAR en tuberia PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (3F-T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	$56.071	85,00	$4.766.035,00		$ -		$ -		$ -
15,1,28	Suministro e instalacion de salida para tomacorriente en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, Tomacorriente 15A-120V. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	$215.948	59,00	$12.740.932,00		$ -		$ -		$ -
15,1,29	Suministro e instalacion de salida para tomacorriente en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, Tomacorriente 15A-120V GFCI. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	$322.907	12,00	$3.874.884,00		$ -		$ -		$ -

DRA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 6

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	5 DE JULIO DE 2022
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	4,20%
% DE AVANCE ACUMULADO	20,93%

				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15,1,30	Suministro e instalacion de salida para tomacorriente en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, Tomacorriente 15A-120V tierra aislada. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	$246.170	28,00	$6.892.760,00		$ -		$ -		$ -
15,2	PANELES DE DISTRIBUCION E INTERRUPTORES										
15,2,1	Suministro e instalacion de panel parcial de distribucion con espacio para 12 circuitos, 5 hilos : 3F+N+T. Corriente de corto :10KA. Encerramiento IP20. Tension Nominal 240VAC. Debe contar con certificacion RETIE	UND	$678.689	6,00	$4.072.134,00		$ -		$ -		$ -
15,2,2	Suministro e instalacion de panel parcial de distribucion con espacio para 42 circuitos, 5 hilos : 3F+N+T. Corriente de corto :10KA. Encerramiento IP20. Tension Nominal 240VAC. Debe contar con certificacion RETIE	UND	$1.339.110	3,00	$4.017.330,00		$ -		$ -		$ -
15,2,3	Suministro e instalacion de panel parcial de distribucion con espacio para 12 circuitos, 3 hilos : F+N+T. Corriente de corto :10KA. Encerramiento IP20. Tension Nominal 240VAC. Debe contar con certificacion RETIE	UND	$292.204	2,00	$584.408,00		$ -		$ -		$ -
15,2,4	Suministro e instalacion de panel parcial de distribucion con espacio para 12 circuitos, 4 hilos : 2F+N+T. Corriente de corto :10KA. Encerramiento IP20. Tension Nominal 240VAC. Debe contar con certificacion RETIE	UND	$536.546	2,00	$1.073.092,00		$ -		$ -		$ -
15,2,5	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos monopolares (enchufables) capacidad nominal 20A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	$34.197	60,00	$2.051.820,00		$ -		$ -		$ -
15,2,6	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos monopolares (enchufables) capacidad nominal 30A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	$34.197	5,00	$170.985,00		$ -		$ -		$ -
15,2,7	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos bipolares (enchufables) capacidad nominal 20A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	$66.656	12,00	$799.872,00		$ -		$ -		$ -
15,2,8	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos bipolares (enchufables) capacidad nominal 30A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	$66.656	5,00	$333.280,00		$ -		$ -		$ -
15,2,9	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos bipolares (enchufables) capacidad nominal 40A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	$66.656	2,00	$133.312,00		$ -		$ -		$ -
15,2,10	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos tripolares (enchufables) capacidad nominal 20A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	$141.815	5,00	$709.075,00		$ -		$ -		$ -

DRA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 6

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	5 DE JULIO DE 2022
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	4,20%
% DE AVANCE ACUMULADO	20,93%

				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15,2,11	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos tripolares (enchufables) capacidad nominal 30A, 10KA. **Debe contar con certificacion RETIE**	UND	$141.815	15,00	$2.127.225,00		$ -		$ -		$ -
15,2,12	Suministro e instalacion de UPS bifasica 3KVA - 220VAC.	UND	$7.364.041	2,00	$14.728.082,00		$ -		$ -		$ -
15,2,13	Suministro e instalacion de UPS trifasica 10KVA - 220VAC.	UND	$42.117.991	2,00	$84.235.982,00		$ -		$ -		$ -
15,3	**LUMINARIAS Y POSTES**										-
15,3,1	Suministro e instalacion de luminaria LED de sobreponer circular. Grado de proteccion IP20. Potencia Nominal 42W. Eficiencia luminica 2914lm. Tensión Nominal 120VAC. Carcasa fabricada en chapa de acero. Marca Iluminaciones Tecnicas Ref. Coral Lens 400x120mm. o similar en especificaciones. Debe contar con certificacion RETILAP	UND	$ 926.575,00	113,00	$104.702.975,00		$ -		$ -		$ -
15,3,2	Suministro e instalacion de luminaria LED de emergencia de sobreponer. Grado Proteccion IP20. Potencia Nominal 4W. Eficiencia Luminica 223lm. Tensión Nominal 120VAC. Fabricada en termoplastica inyectado. Marca Iluminaciones Tecnicas Ref. ALENA600L o similar en especificaciones. **Debe contar con certificacion RETILAP**	UND	$ 281.439,00	20,00	$5.628.780,00		$ -		$ -		$ -
15,3,3	Suministro e instalacion de luminaria LED hermetica de sobreponer. Grado Proteccion IP65. Potencia Nominal 117W. Eficicencia luminica: 7125lm. Tensión Nominal 120VAC. Carcasa fabricada en policarbonato. Marca Iluminaciones Tecnicas Ref. o similar en especificaciones. **Debe contar con certificacion RETILAP**	UND	$ 689.318,00	26,00	$17.922.268,00		$ -		$ -		$ -
15,3,4	Suministro e instalacion de luminaria LED tipo proyector de sobreponer de 1 metro de longitud. IP 66. Potencia Nominal 28W. Eficiencia luminica 2900lm. Tensión Nominal 120VAC. Carcasa fabricada en aluminio. Marca Schreder Ref SculpLine o similar en especficaciones. **Debe contar con certificacion RETILAP**	UND	$ 8.631.747,00	38,00	$328.006.386,00		$ -		$ -		$ -
15,3,5	Suministro e instalacion de luminaria LED tipo proyector de sobreponer de 1 metro de longitud. IP 66. Potencia Nominal 28W. Eficiencia luminica 2900lm. Tensión Nominal 120VAC. Carcasa fabricada en aluminio. Marca Schreder Ref InduLine o similar en especficaciones. **Debe contar con certificacion RETILAP**	UND	$ 1.720.345,00	794,00	$1.365.953.930,00		$ -		$ -		$ -
15,3,6	Suministro e instalacion de luminaria LED de alumbrado publico. Grado Proteccion IP65. Potencia Nominal 106W. Eficiencia Luminica 14005lm. Tensión Nominal 220VAC. Marca Schreder Ref Avento 1 144LEDS o similar en especificaciones. **Debe contar con certificacion RETILAP**	UND	$ 3.022.718,00	22,00	$66.499.796,00		$ -		$ -		$ -
15,3,7	Suministro e instalacion de poste de poliester reforzado en fibra de vidrio. Referencia 8metros - 510KgF. Norma ASTM D4923 Clase 2 con acabado superficial listo uniforme. incluye brazo sencillo de 1mts para montaje de luminaria. **Debe contar con certificacion RETILAP**	UND	$ 3.177.507,00	11,00	$34.952.577,00		$ -		$ -		$ -

DRA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 6

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	5 DE JULIO DE 2022
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	4,20%
% DE AVANCE ACUMULADO	20,93%

				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15,3,8	Suministro e instalacion de luminaria LED de incrustar en piso. Grado de proteccion IP65. Potencia Nominal 7W. Eficiencia luminica 600lm. Tensión Nominal 220VAC. Chasis en acero inoxidable. Marca Iluminaciones Tecnicas Ref Baliza98/139 o similar en especificaciones. Debe contar con certificacion RETILAP	UND	$ 3.542.806,00	78,00	$276.338.868,00		$ -		$ -		$ -
15,4	**ALIMENTADORES ELECTRICOS BAJA TENSION**										
15,4,1	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.250F+N.250N+N.2/0T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2 **Alimentador para recorrido desde:** **- Tablero de Distribucion CGD-1 hasta transformador seco 150KVA** **- Tablero de Distribucion CGD-1 hasta motogenerador 150 KVA**	ML	$ 810.324,00	25,00	$20.258.100,00		$ -		$ -		$ -
15,4,2	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.6F+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. **Alimentador para recorrido desde CGD-1 hasta Tablero de Distribucion CGD-2 - Transformador 30 KVA (IN/460VAC) .**	ML	$ 93.781,00	10,00	$937.810,00		$ -		$ -		$ -
15,4,3	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.1/0F+N.1/0N+N.8T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. **Alimentador para recorrido desde CGD-2 - Transformador 30 KVA (OUT/208VAC) hasta Tablero de Distribucion CGD-2**	ML	$ 418.076,00	5,00	$2.090.380,00		$ -		$ -		$ -
15,4,4	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.8F+N.8N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. **Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-2 hasta PP-SUB**	ML	$ 83.354,00	10,00	$833.540,00		$ -		$ -		$ -
15,4,5	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.1/0F+N.1/0N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: ConduCtores de aluminio para fases y neutro, cobre para tierra, aislamiento THHN THWN-2 **Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-2 hasta PP-EST-III**	ML	$ 103.782,00	70,00	$7.264.740,00		$ -		$ -		$ -
15,4,6	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.4/0F+N.4/0N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Condcutores de aluminio para fases y neutro, cobre para tierra, aislamiento THHWN. **Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-2 hasta PP-PP-PARQ**	ML	$ 128.455,00	170,00	$21.837.350,00		$ -		$ -		$ -
15,4,7	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.6F+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. **Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion PP-PARQ hasta TC-BOMBAS AGUA POTABLE**	ML	$ 92.978,00	80,00	$7.438.240,00		$ -		$ -		$ -
15,4,8	Suministro e instalacion de alimentador en 2x(3N.500F+2N.500n+N.6T). Incluye terminales de compresion. NOTA: Condcutores de aluminio para fases y neutro, cobre para tierra, aislamiento THHWN. **Alimentador para recorrido desde CGD-1 hasta Tablero de Distribucion CGD-3 - Transformador 30 KVA (IN/460VAC) .**	ML	$ 552.762,00	670,00	$370.350.540,00		$ -		$ -		$ -

DPA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 6

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	5 DE JULIO DE 2022
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	4,20%
% DE AVANCE ACUMULADO	20,93%

				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15,4,9	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.6F+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. **Alimentador para recorrido desde CGD-3 - Transformador 30 KVA (IN/480VAC) hasta Tablero de Distribucion CGD-3**	ML	$ 95.164,00	5,00	$475.820,00		$ -		$ -		$ -
15,4,10	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.1/0F+N.1/0N+N.8T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. **Alimentador para recorrido desde CGD-3 - Transformador 30 KVA (OUT/208VAC) hasta Tablero de Distribucion CGD-3**	ML	$ 417.849,00	5,00	$2.089.245,00		$ -		$ -		$ -
15,4,11	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.8F+N.8N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. **Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-3 hasta PP-LOCAL-1**	ML	$ 84.141,00	10,00	$841.410,00		$ -		$ -		$ -
15,4,12	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.8F+N.8N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2 **Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-3 hasta PP-LOCAL-2**	ML	$ 83.801,00	15,00	$1.257.015,00		$ -		$ -		$ -
15,4,13	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.8F+N.8N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. **Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-3 hasta PP-GR-P**	ML	$ 84.141,00	10,00	$841.410,00		$ -		$ -		$ -
15,4,14	Suministro e instalacion de alimentador en 2x(3N.500F+2N.500n+N.6T). Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de aluminio para fases y neutro, cobre para tierra, aislamiento THHWN. **Alimentador para recorrido desde CGD-3 hasta Tablero de Distribucion CGD-4 - Transformador 45 KVA (IN/460VAC) .**	ML	$ 552.762,00	450,00	$248.742.900,00		$ -		$ -		$ -
15,4,15	Transformador 45 KVA (OUT), CGD-4. Suministro e instalacion de alimentador en 3N.1/0F+N.1/0N+N.8T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. **Alimentador para recorrido desde CGD-4 hasta Tablero de Distribucion CGD-4 - Transformador 45 KVA OUT/208VAC) .**	ML	$ 417.849,00	5,00	$2.089.245,00		$ -		$ -		$ -
15,4,16	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.6F+N.6N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. **Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-4 hasta PP-LOCAL-3**	ML	$ 116.505,00	20,00	$2.330.100,00		$ -		$ -		$ -
15,4,17	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.6F+N.6N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. **Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-4 hasta PP-LOCAL-4**	ML	$ 117.459,00	25,00	$2.936.475,00		$ -		$ -		$ -

DRA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 6

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	5 DE JULIO DE 2022
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	4,20%
% DE AVANCE ACUMULADO	20,93%

				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15,4,18	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.6F+N.6N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. **Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-4 hasta PP-EQ-D**	ML	$ 117.247,00	10,00	$1.172.470,00		$ -		$ -		$ -
15,4,19	Suministro e instalacion de tuberia PVC A de 1", incluye excavacion tape y compactacion.	ML	$ 42.995,00	160,00	$6.879.200,00		$ -		$ -		$ -
15,4,20	Suministro e instalacion de tuberia PVC A de 2", incluye excavacion tape y compactacion.	ML	$ 124.140,00	150,00	$18.621.000,00		$ -		$ -		$ -
15,4,21	Suministro e instalacion de tuberia PVC A de 3", incluye excavacion tape y compactacion.	ML	$ 86.276,00	195,00	$16.823.820,00		$ -		$ -		$ -
15,4,22	Suministro e instalacion de tuberia PVC SCH 40 Kraloy de 1", incluye soporteria por medio de perfil estructural galvanizado en caliente, grapa perpendicular galvanizada en caliente y varillas roscadas galvanizadas en caliente.	ML	$ 38.964,00	90,00	$3.506.760,00		$ -		$ -		$ -
15,4,23	Suministro e instalacion de tuberia PVC SCH 40 Kraloy de 3", incluye soporteria por medio de perfil estructural galvanizado en caliente, grapa perpendicular galvanizada en caliente y varillas roscadas galvanizadas en caliente.	ML	$ 232.830,00	2360,00	$549.478.800,00		$ -		$ -		$ -
15,4,24	Suministro e instalacion de caja de paso de fabricacion especial en acero inoxidable de 100x60x40cm, incluye soporteria por medio de perfil estructural galvanizado en caliente y varillas roscadas galvanizadas en caliente.	UND	$ 6.370.585,00	41,00	$261.193.985,00		$ -		$ -		$ -
15,4,25	Suministro e instalacion de tuberia PVC A de 1-1/2", incluye excavacion tape y compactacion.	ML	$ 50.693,00	400,00	$20.277.200,00		$ -		$ -		$ -
15,4,26	**Construccion de caja de inspeccion SB325:** Medidas 0.72 m X 0.86 m X 0.9 m (profundidad) en concreto impermeable de 3500PSI con espesor de pared 15cm. Tapa en marco metalico 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16". Con drenaje en tuberia PVC 4"	UND	$ 3.530.347,00	18,00	$63.546.246,00		$ -		$ -		$ -
15,4,27	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.500F+N.500N+N.4T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de aluminio con aislamiento THHN THWN-2 **Alimentador para recorrido desde transformador hasta TabBombaContraIncendio** **Alimentador para recorrido desde motogenerador hasta TabBombaContraIncendio**	ML	$ 261.814,00	400,00	$104.725.600,00		$ -		$ -		$ -
15,5	**PUNTO DE CONEXIÓN MEDIA TENSION**										
15,5,1	Suministro e instalacion de apoyo de hormigon 12m x1050kg. Incluye transporte y cimentacion.	UND	$ 3.888.033,00	1,00	$3.888.033,00		$ -		$ -		$ -
15,5,2	Suministro e instalacion de crucetas, herrajes y aisladores para vestida de apoyo en disposicion de alineacion.	UND	$ 3.675.263,00	1,00	$3.675.263,00		$ -		$ -		$ -
15,5,3	Suministro e instalacion de sistema de puesta a tierra para punto de conexión (electrodo de 5/8" x 2.4m, Cable de cobre N. 2 AWG, Soldadura exotermica)	UND	$ 1.532.928,00	1,00	$1.532.928,00		$ -		$ -		$ -
15,5,4	Suministro e instalacion de sistema de equipo de medida Nivel II Homologado por Air-e, capacidades de equipos según diagrama unifilar; incluye crucetas, herrajes, cable de cobre N. 2 AWG para interconexiones, puentes en caliente, elementos de derivacion y conexion.	UND	$ 43.602.847,00	1,00	$43.602.847,00		$ -		$ -		$ -

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 6

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	5 DE JULIO DE 2022
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	4,20%
% DE AVANCE ACUMULADO	20,93%

				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15,5,5	Suministro e instalacion de protecciones de media tension (Cortacircuitos 15KV con fusibles 10Amp, DPS 15 KV, Cruceta metalica, herrajes)	UND	$ 6.039.808,00	1,00	$6.039.808,00		$ -		$ -		$ -
15,5,6	Suministro e instalacion de canalizacion IMC de 3" (Bajante en poste de hormigon)	ML	$ 372.353,00	6,00	$2.234.118,00		$ -		$ -		$ -
15,5,7	Suministro e instalacion de canalizacion PVC de 2 x 3" (Tuberia de Reserva). Incluye excavacion y compactacion del terreno	ML	$ 222.858,00	80,00	$17.828.640,00		$ -		$ -		$ -
15,5,8	Servicio de topo de con equipo de perforacion horizontal para tuberia PVC de 2x3" - Cruce de via. Incluye permisos requeridos. El cruce debe ser realizado con un equipo de perforacion horizontal y deteccion de sondas, para evitar complicaciones en la torura y relleno de la via.	ML	$ 584.600,00	52,00	$30.399.200,00		$ -		$ -		$ -
15,5,9	**Construccion de caja de inspeccion SB300:** Medidas 1.13 m X 1.13 m X 1.43 m (profundidad) en concreto impermeable de 3500PSI con espesor de pared 15cm. Tapa en marco metalico 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16". Con drenaje en tuberia PVC 4"	UND	$ 6.471.668,00	4,00	$25.886.672,00		$ -		$ -		$ -
15,5,10	Suministro e instalacion de alimentador en 3N. 2 AWG, aislamiento XLPE al 133% **(Recorrido desde punto de conexión hasta Subestacion Principal)**	ML	$ 379.207,00	92,00	$34.887.044,00		$ -		$ -		$ -
15,5,11	Suministro e instalacion de terminales premoldeados para uso exterior (Instalacion en punto de conexión)	UND	$ 742.245,00	3,00	$2.226.735,00		$ -		$ -		$ -
15,5,12	Suministro e instalacion de terminales premoldeados para uso interior (Instalacion en celda de seccionador y transformador)	UND	$ 667.910,00	6,00	$4.007.460,00		$ -		$ -		$ -
15,5,13	Suministro e instalacion de puentes en cable N. 2 AWG, aislamiento XLPE al 133%	UND	$ 210.477,00	6,00	$1.262.862,00		$ -		$ -		$ -
15,6	**EQUIPOS SUBESTACION ELECTRICA : CELDAS MEDIA TENSIÓN, TABLEROS DE DISTRIBUCION, ENTRE OTROS**										
15,6,1	Suministro e instalacion de celda de remonte autosoportada 15 KV. Fabricada en lamina galvanizada calibre 16, acabado en pintura electrostatica. Grado Proteccion IP 20, Incluye barra de tierra. **Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)**	UND	$ 5.536.051,00	1,00	$5.536.051,00		$ -		$ -		$ -
15,6,2	Suministro e instalacion de celda para seccionador de operación bajo carga 630Amp en SF6, Incluye base portafusibles, fusibles HH de 10 amperios, juego de barras tripolar para conexión superior 630Amp, indicador de presencia de tensión, varillaje para disparo tripolar por fusion. **Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)**	UND	$ 45.040.230,00	1,00	$45.040.230,00		$ -		$ -		$ -
15,6,3	Suministro e instalacion de celda metalica para transformador de 150 KVA. Fabricada en lamina galvanizada calibre 16, Grado Proteccion IP20. **Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)**	UND	$ 12.686.661,00	1,00	$12.686.661,00		$ -		$ -		$ -
15,6,4	Suministro e instalacion de transformador seco de 150 KVA encapsulado en resina epoxica clase F, 13200/460V. Incluye DPS 15 KV, sistema de ventilacion forzada, ruedas orientables. **Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)**	UND	$ 80.684.147,00	1,00	$80.684.147,00		$ -		$ -		$ -

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 6

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	5 DE JULIO DE 2022
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	4,20%
% DE AVANCE ACUMULADO	20,93%

				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15,6,5	Suministro e instalacion de cuadro general de distribucion N. 1 en lamina galvanizada calibre 2+ y pintura electrostatica (CGD-1), equipamento según diagrama unifilar. **Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)**	UND	$ 31.603.409,00	1,00	$31.603.409,00		$ -		$ -		$ -
15,6,6	Suministro e instalacion de cuadro general de distribucion N. 2 en lamina galvanizada y pintura electrostatica (CGD-2), equipamento según diagrama unifilar. **Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)**	UND	$ 7.988.534,00	1,00	$7.988.534,00		$ -		$ -		$ -
15,6,7	Suministro e instalacion de cuadro general de distribucion N. 3 en lamina galvanizada y pintura electrostatica (CGD-3), equipamento según diagrama unifilar. **Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Graderias Playa)**	UND	$ 12.949.660,00	1,00	$12.949.660,00		$ -		$ -		$ -
15,6,8	Suministro e instalacion de cuadro general de distribucion N. 4 en lamina galvanizada y pintura electrostatica (CGD-4), equipamento según diagrama unifilar. **Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Equipamiento Deportivo)**	UND	$ 12.544.197,00	1,00	$12.544.197,00		$ -		$ -		$ -
15,6,9	Suministro e instalacion de cuadro general fabricado en lamina galvanizada calibre 16 y pintrua electrostatica para albergar el banco de condensasores 30 KVAR (6 pasos moviles de 5 KVAR cada uno) según diagrama unifilar **Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)**	UND	$ 18.573.236,00	1,00	$18.573.236,00		$ -		$ -		$ -
15,6,10	Suministro e instalacion de transformador seco de 30 KVA, 460/208-120V clase H . Incluye celda metalica de transformador IP22. **Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Graderias Playa y Subestacion Principal)**	UND	$ 17.464.412,00	1,00	$17.464.412,00		$ -		$ -		$ -
15,6,11	Suministro e instalacion de transformador de 45 KVA, 460/208-120V clae H. Incluye celda metalica de transformador IP22. **Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Equipamiento Deportivo)**	UND	$ 21.837.617,00	2,00	$43.675.234,00		$ -		$ -		$ -
15,6,12	Suministro e instalacion de motogenerador de potencia Stand By de 150 KVA hasta 1500 metros sobre el nivel del mar. Tensión Nominal 460 VAC. Incluye servicio de arranque y capacitacion. Inlsuye breaker totalizador, silenciador tipo critico, baterais de servicio pesado, soporte antivibratorios, tanque de combustible para 7 horas de autonomina. **Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)**	UND	################	1,00	$221.449.346,00		$ -		$ -		$ -
15,6,13	Suministro e instalacion de tablero de transferencia bomba contra incendio lamina galvanizada calibre 16 y pintura electrostatica, equipamento según diagrama unifilar. **Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Cuarto de Bombas)**	UND	$ 22.464.729,00	1,00	$22.464.729,00		$ -		$ -		$ -
15,6,14	Suministro e instalacion de ctablero de agua potable en lamina galvanizada y pintura electrostatica, equipamento según diagrama unifilar. **Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Cuarto de Bombas)**	UND	$ 9.032.863,00	1,00	$9.032.863,00		$ -		$ -		$ -
15,7	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA**										
15,7,1	Suministro e instalacion de sistema de puesta a tierra disposicion cuadrada de 5x5m. Incluye cuatro electrodos de 5/8" x 2.4m, cable 2/0 AWG, soldadura exotermica, registro de inspeccion. **(Ubicados en la Subestacion Principal, Graderia Playa y Sendero Loop Aves)**	UND	$ 7.631.633,00	3,00	$22.894.899,00		$ -		$ -		$ -

DPD

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 6

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	5 DE JULIO DE 2022
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	4,20%
% DE AVANCE ACUMULADO	20,93%

				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15,7,2	Suministro e instalacion de barraje equipotencial. Barra de cobre perforada en cobre con recubrimiento electro plateado. Capacidad de Corriente: 564A. Incluye sistema de soporte : aisladores, tornillos, tuercas y arandelas. **(Ubicados en la Subestacion Principal, Graderia Playa y Sendero Loop Aves)**	UND	$ 889.710,00	3,00	$2.669.130,00		$ -		$ -		$ -
15,7,3	Suministro e instalacion de linea equipotencial en cable de cobre 1/0 AWG **(Recorrido desde Loop Aves hasta Equip. Deportivo)**	ML	$ 95.718,00	200,00	$19.143.600,00		$ -		$ -		$ -
15,7,4	Suministro e instalacion de tuberia PVC SCH 40 Kraloy de 1", incluye soporteria por medio de perfil estructural y grape perpendicular. **(Ubicados en la Subestacion Principal, Graderia Playa y Sendero Loop Aves)**	ML	$ 38.964,00	200,00	$7.792.800,00		$ -		$ -		$ -
15,7,5	Suministro e instalacion de puentes de conexión en cable 2/0 AWG para puesta a tiera de equipos	UND	$ 188.235,00	6,00	$1.129.410,00		$ -		$ -		$ -
15,7,6	Suministro e instalacion de puentes de conexión en cable 1/0 AWG para puesta a tiera de equipos	UND	$ 169.891,00	2,00	$339.782,00		$ -		$ -		$ -
15,8	SISTEMA ELECTRICO PUNTOS AISLADOS REGULADOS										
15,8,1	**Suministro e instalacion de punto de energia aislado para puntos regulados. Incluye:** - Poste en fibra de vidrio de 12Mx750KGF. - Sistema fotovoltaico que incluye: Paneles Solares, Inversor, Bateria Solar en gel, cable fotovoltaico. - Tomacorriente tierra aislada 120VAC - 15A con caja PVC SCH 40 - Soporteria y herrajes	UND	$ 16.909.244,00	6,00	$101.455.464,00		$ -		$ -		$ -
15,8,2	**Construccion de caja de inspeccion SB325:** Medidas 0.72 m X 0.86 m X 0.9 m (profundidad) en concreto impermeable de 3500PSI con espesor de pared 15cm. Tapa en marco metalico 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16". Con drenale en tuberia PVC 4"	UND	$ 3.530.841,00	6,00	$21.185.046,00		$ -		$ -		$ -
15,9	TRAMITES Y SERVICIOS										
15,9,1	Servicio de inspeccion RETIE: Distribucion para redes de media tensión, Subestacion Ellectrica, Uso Final	GL	$ 23.120.625,00	1,00	$23.120.625,00		$ -		$ -		$ -
15,9,2	Servicio de inspeccion RETILAP para iluminacion interior / exterior	GL	$ 36.506.250,00	1,00	$36.506.250,00		$ -		$ -		$ -
15,9,3	Servicio de pagos para tramites ante el operador de Red. Incluye pago para aprobacion de diseño electrico, revision de materiales, descargo de energizacion	GL	$ 6.690.135,00	1,00	$6.690.135,00		$ -		$ -		$ -
16	INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS										
16,00	REDES DE AIRES ACONDICIONADOS	GLB	$3.300.000.000	1	$3.300.000.000,00		$ -		$ -		$ -
17	INSTALACIONES VOZ Y DATOS										
17,00	REDES DE VOZ Y DATOS	GLB	$3.300.000.000	1	$3.300.000.000,00		$ -		$ -		$ -
18	PRESUPUESTO SEÑALIZACION										
18,00	SEÑALIZACION	GLB	$ 9.471.000	1	$9.471.000,00		$ -		$ -		$ -

DPA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 6

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	5 DE JULIO DE 2022
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	4,20%
% DE AVANCE ACUMULADO	20,93%

				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
19	PROVISIONES										
19,01	PMA	GLB	$ 662.125.000	1	$662.125.000,00	0,095	$ 62.620.178,53	0,021	$ 13.709.885,47	0,115	$ 76.330.064,00
19,02	PMT	GLB	$ 65.700.606	1	$65.700.606,00		$ -		$ -		$ -
19,03	CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP (TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED)	GLB	$ 22.419.600	1	$22.419.600,00		$ -		$ -		$ -
19,04	TOTEMS DE INFORMACION	UND	$ 8.687.000	10	$86.870.000,00		$ -		$ -		$ -
19,05	PROVISION PUERTAS Y VENTANAS	GLB	$ 400.000.000	1	$400.000.000,00		$ -		$ -		$ -
19,06	SISTEMA DE RIEGO	GLB	$ 67.146.784	1	$67.146.784,00		$ -		$ -		$ -
	TOTAL COSTO DIRECTO				$63.434.049.707,69		$ 10.614.489.217,77		$ 2.663.040.727,17		$ 13.277.529.944,94
	ADMINISTRACIÓN		20,00%		$ 12.686.809.941,54		$ 2.122.897.843,56		$ 532.608.145,43		$ 2.655.505.988,99
	IMPREVISTOS		5,00%		$ 3.171.702.485,38		$ 530.724.460,89		$ 133.152.036,36		$ 663.876.497,25
	UTILIDAD		5,00%		$ 3.171.702.485,38		$ 530.724.460,89		$ 133.152.036,36		$ 663.876.497,25
	COSTO TOTAL PROYECTO (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)				$ 82.464.264.620,00		$ 13.798.835.983,11		$ 3.461.952.945,32		$ 17.260.788.928,43

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlantico a los cinco (5) dias del mes de julio de 2022

ADALBERTO VIVERO CORONEL
REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO JCO MALLORQUIN
CONTRATISTA

DIEGO RADA ALTAHONA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
EDUBAR S.A.

RAFAEL LAFONT DE SALAS
SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS
SUPERVISOR

PEDRO ANTONIO GUTIERREZ VISBAL
REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
INTERVENTOR

ANGELLY CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A.

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

PREACTA N° 6

ITEM	ACTIVIDAD	UN	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA
01	**OBRAS PRELIMINARES**		
5513	EDU. CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES (VER DISEÑO)	MES	1,00
CM-01	COMISIÓN TOPOGRÁFICA MENSUAL, INCLUYE 1 COORDINADOR DE TOPOGRAFÍA, 1 TOPÓGRAFO, CADENEROS, DIBUJANTES, LANCHA PARA REPLANTEO EN AGUA, ESTACIÓN TOTAL Y NIVEL.	MES	2,00
1069	CERRAMIENTO EN TELA VERDE, O MALLA DE LONA, (POLISOMBRA), CON ALTURA DE 2.00 METROS, BASE PARA FIJACION DE ESTACONES 0.20 X 0.20 X 0.50 METROS EN CONCRETO DE 1500 PSI, ESTACONES DE MADERA DE 2" X 2", APUNTILLADA Y AMARRADA A LOS POSTES CON ALAMBRE NEGRO PARA RIGIDIZACION.	ML	
CM-02	DESMONTE Y DESCAPOTE MECÁNICO DE MATERIAL EXISTENTE, E = 0.25 M, INCLUYE RETIRO	M2	
3819	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA METÁLICA DE 4.00X2.50M.	UND	
02	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**		
5913	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	M3	
198	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	
3013	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO	M3	
3015	RELLENO EN MATERIAL DE BASE GRANULAR COMPACTADO	M3	
CM-03	MURO EN TIERRA ARMADA REFORZADO, INCLUYE GEOMALLAS Y COLCHONETAS	ML	
03	**PILOTAJE EN MADERA**		
CM-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PILOTE DIÁMETRO 20, INCLUYE COMPLEMENTO SUPERIOR	ML	542,10
CM-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PILOTE DIÁMETRO 25, INCLUYE COMPLEMENTO SUPERIOR	ML	560,20
CM-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D15	ML	957,00
CM-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D17	ML	943,40
04	**PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA**		
CM-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA CCA 08X30, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL	ML	713,57
CM-09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA CCA 08X36, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL	ML	689,24
CM-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTREPISO - SECCIÓN CURVA, INCLUYE VIGUETAS, FRISOS Y LISTÓN DE DECK	M2	
CM-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTREPISO - SECCIÓN RECTA, INCLUYE VIGUETAS, FRISOS Y LISTÓN DE DECK	M2	333,83
05	**BARANDAS EN MADERA**		
CM-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA - SECCIÓN CURVA, INCLUYE PARAL ESTRUCTURAL, PASAMANOS Y MARCO CON BARROTES	ML	
CM-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA - SECCIÓN RECTA, INCLUYE PARAL ESTRUCTURAL, PASAMANOS Y MARCO CON BARROTES	ML	
06	**EDIFICACIONES EN MADERA**		
CM-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO EXTERIOR, INCLUYE AMARRE INFERIOR, PARAL VERTICAL, UNIONES Y AMARRE SUPERIOR	M2	
CM-15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DINTEL MURO EXTERIOR	ML	
CM-16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGUETA 4X18 -PENDIENTE VARIABLE, INCLUYE VIGUETA EN I, FRISOS Y ANCLAJE A VIGAS	M2	
CM-17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO ESTRUCTURAL MURO INTERIOR, INCLUYE AMARRE INFERIOR, PARAL VERTICAL, UNIONES Y AMARRE SUPERIOR	M2	
CM-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DINTEL MURO INTERIOR	ML	
CM-19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN SUPERBOARD EN ACRILURETANO, INCLUYE SELLANTE DE JUNTAS EN POLIURETANO	M2	
CM-20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN SUPERBOARD 20 MM	M2	
CM-21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLUMNA EN CRUZ PÓRTICO 45X45, INCLUYE ANCLAJE AL PILOTE	ML	
CM-22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA PÓRTICO - 13X50, INCLUYE ANCLAJE A COLUMNA	ML	
CM-23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGUETA 6X36, INCLUYE ANCLAJE A VIGA	ML	

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

PREACTA N° 6

			OBRA EJECUTADA
			PRESENTE ACTA
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UN**	**CANTIDAD**
CM-24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN POSTES DE 12 CMS DE DIÁMETRO, AMARRE INFERIOR Y SUPERIOR, FLANCHES, HERRAJES Y FIJACIONES EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE PINTURA LASUR.	M2	
07	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**		
7,1	**CIMENTACIONES**		
377	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	
198	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	
1201	SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI E = 0.10 METROS	M3	
7651	ZAPATA Y PEDESTAL EN CONCRETO DE 3500 PSI PREMEZCLADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	
7652	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	
CM-25	CONCRETO DE 3500 PSI PLACA DE CONTRAPISO	M3	
2677	CIMIENTO EN CONCRETO CICLÓPEO E= 0.50 METROS, EN UN 50% DE CONCRETO DE 3000 PSI Y 50% EN PIEDRA CICLÓPEA	M3	
2219	MURO DE CONTENCIÓN, MURO PARA SOPORTE O ESTRIBOS DE PUENTE, Y BOX CULVERT EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	
7,2	**ESTRUCTURA**		
3092	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	
3093	VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	
2214	PLACA PARA LOSAS SUPERIORES DE 3500 PSI, E = 0.15 METROS	M2	
362	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	M2	
7,3	**TANQUE**		
6020	TANQUE EN CONCRETO PARA SISTEMA DE RIEGO F"C = 28 MPA (4000 PSI)-VER DISEÑO	M3	
4405	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE SIKA FILL O SIMILAR.	M2	
7,4	**ACERO DE REFUERZO**		
78,0	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	
08	**MAMPOSTERÍA Y ACABADOS**		
8,1	**LISTONES EN MADERA**		
8,2	**MESONES**		
CM-26	CUBIERTA NUEVA REFERENCIA CORIAN NEUTRAL AGGREGATE PARA 12MM MESÓN BAÑOS 3,6M X 0,65 M X 0,012 M.	UND	
CM-27	CUBIERTA NUEVA REFERENCIA CORIAN NEUTRAL AGGREGATE PARA 12MM MESÓN LOCALES DE ATENCIÓN DE SUPERFICIE EN CONCRETO DE 3,3M X 0,65 M X 0,012 M.	UND	
CM-28	CUBIERTA NUEVA REFERENCIA CORIAN NEUTRAL AGGREGATE PARA 12MM MESÓN DE LAVAMANOS SOPORTADO EN SUPERFICIE CONCRETO DE 0,56 M X 0,60 M X 0,012 M.	UND	
8,3	**MUROS MAMPOSTERÍA**		
133	LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	M2	
8,4	**MUROS INTERNOS EQUIPAMIENTOS**		
2180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DRYWALL EN LÁMINA SUPERBOARD DE 6 MM POR AMBAS CARAS	M2	
8,5	**ACABADOS SOBRE MUROS**		
344	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	M2	
435	PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	M2	
432	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	M2	
152	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	M2	
CM-29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN ECOWOOD H40-60 EPC TEKA SEPARADO CADA 10 CM	M2	
09	**PISOS Y ENCHAPES**		
CM-30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN SUPERBOARD. INCLUYE ESTRUCTURA DE MADERA PARA EL PISO	M2	
CM-31	PISO ALLANADO EN CONCRETO ENDURECIDO Y SEMIPULIDO, E= 8 CM, JUNTAS EN PVC COLOR NEGRO	M2	
2691	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 17.5 MPA IMPERMEABILIZADO E = 0.05 MTS	M2	

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2	**PREACTA N° 6**		**OBRA EJECUTADA**
			PRESENTE ACTA
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UN**	**CANTIDAD**
CM-32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MOSAICO VERDE MATE DE HOJAS O MALLAS DE 31,5 X 3,15 CM. MATERIAL MOSAICO EN VIDRIO. FORMATO DE CADA MOSAICO: 3,8 X 3,8 CM. ESPESOR 2MM. INCLUYE JUNTA DE DIVISIÓN PLÁSTICA COLOR NEGRO DE 3 MM DE ESPESOR.	M2	
CM-33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARED EN MOSAICO VERDE MATE DE HOJAS O MALLAS DE 31,5 X 3,15 CM. MATERIAL MOSAICO EN VIDRIO. FORMATO DE CADA MOSAICO: 3,8 X 3,8 CM. ESPESOR 2MM. INCLUYE JUNTA DE DIVISIÓN PLÁSTICA COLOR NEGRO DE 3 MM DE ESPESOR.	M2	
CM-34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PORCELANATO TIPO MADERA 20X120 CM ALABAMA FAGGIO O SIMILAR	M2	
CM-35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE MOSAICO KLIPEN O SIMILAR	M2	
10	**CIELOS RASOS**		
CM-36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PLACA DE YESO SOPORTADA EN PERFIL TIPO RH O SIMILAR PARA ZONAS HÚMEDAS	M2	
CM-37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PLACA DE YESO SOPORTADA EN PERFIL TIPO ST O SIMILAR PARA ZONAS SECAS	M2	
11	**PAVIMENTOS Y ANDENES**		
5759	EDU. TRITURADO (VER DISEÑO)	M3	
8035	PAVIMENTO ASFALTICO MDC - 25	M3	
CM-38	CONCRETO ASFALTICO MDC-10 PARA CICLORRUTA	M3	
4742	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANDEN EN LOSETAS PREPULIDA LISA, TACTIL Y GUIA DE 0.40X0.40X0.06 METROS, INCLUYE CENEFA EN CONCRETO DE 3000 PSI (VER DISEÑO).	M2	
CM-39	LOSETA TÁCTIL GUÍA TIPO A 58. PIEZA ALIGERADA PREFABRICADA EN CONCRETO ACABADO ANTIDESLIZANTE EN COLOR GRIS OSCURO. DIMENSIONES 20X20X6CMS.	M2	
CM-40	LOSETA TÁCTIL ALERTA. PIEZA ALIGERADA PREFABRICADA EN CONCRETO ACABADO ANTIDESLIZANTE EN COLOR GRIS OSCURO. DIMENSIONES 20X20X6CMS.	M2	
3872	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPELLANTAS	UND	
1752	DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA Y EN ZONA DE TRÁFICO O PARQUEO	ML	
125	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15 X 0,30 MTS	ML	
12	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**		
3037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA TOALLAS DE PAPEL DE SOBREPONER A LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO 304, CAPACIDAD 300 TOALLAS O DOS (2) PAQUETES, CERRADURA CON LLAVE	UND	
3039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR PARA PAPEL HIGIÉNICO DE SOBREPONER EN LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO PARA ROLLO DE 200/400 METROS, CERRADURA CON LLAVE	UND	
3035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR PARA JABÓN LÍQUIDO PARA INSTALAR EN PARED, CON TORNILLOS ESCONDIDOS, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, BOTÓN PULSADOR EN ABS RESISTENTE, CAPACIDAD 1.2 LTS, VENTANILLA DE DESCARGA SUPERIOR CON LLAVE, NIVEL DE JABÓN, PUSH FRONTAL	UND	
3054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR DE MANO ELÉCTRICO 1AA ECO SRA TURBO DE SOBREPONER EN LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO CON SENSOR	UND	
CM-41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO. INCLUYE ACCESORIO DE MONTAJE PARED	UND	
CM-42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD FIJA EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO DE 1 1/4". INCLUYE ACCESORIO DE MONTAJE PARED.	UND	
CM-43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIADOR DE PAÑALES HORIZONTAL, EN POLIPROPILENO COLOR GRIS, DE SOBREPONER EN LA PARED.	UND	
1940	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL SANTA FÉ O SIMILAR PARA FLUXÓMETRO, INCLUYE GRIFERÍA PUSH ANTIVANDÁLICA	UND	
CM-44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL DE CORONA, CON GRIFERÍA TIPO PUSH ANTIVANDÁLICA. COLOR BLANCO	UND	

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2	**PREACTA N° 6**		**OBRA EJECUTADA**
			PRESENTE ACTA
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UN**	**CANTIDAD**
CM-45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INSTITUCIONAL ALONGADO PARA PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES, ALTA EFICIENCIA 4.8 LITROS O SIMILAR Y FLUXÓMETRO PARA SANITARIO, MANOS LIBRES CON SENSOR, INCRUSTADO EN LA PARED	UND	
351	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	UND	
CM-46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DUCHA 8 PULGADAS TIPO VAAL SSB O SIMILAR	UND	
1106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO BISELADO DE 4 MM	M2	
CM-47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES SANITARIAS EN PANEL LAMINADO COMPACTO DE 12.7MM, EN MELAMINA PERILLO CON ACABADO UP. CERROJO CON AVISO DE OCUPACIÓN, BISAGRA CIERRE AUTOMÁTICO, BORDE TRASLAPADO, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE DE DISEÑO EXCLUSIVO.	M2	
CM-48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA ORINALES EN PANEL LAMINADO COMPACTO DE 12.7MM, EN MELAMINA PERILLO CON ACABADO UP. HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE DE DISEÑO EXCLUSIVO.	M2	
CM-49	CANECA AUTOSERVICIO, EN ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON CANECA INTERNA PLÁSTICA. DIMENSIONES: 56 CM X 110 CM X 56 CM. RUEDAS Y TOPES, TAPA PUSH Y COMPUERTA PARA CANECA INTERNA PLÁSTICA	UND	
1948	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATRAPEROS EN GRANITO PREFABRICADO DE 0.35 X 0.35 METROS	UND	
CM-50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA REDONDA DE PEDAL CON TAPA CAÍDA SUAVE, CAPACIDAD 9 LITROS, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO ANTIHUELLAS.	UND	
13	**URBANISMO Y EXTERIORES**		
CM-51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTENEDOR PUNTO ECOLÓGICO DE TRES DIVISIONES. FRENTE EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CALIBRE 18 RESPALDO EN LÁMINA COLD ROLL CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BORDES EN CORTE LÁSER AROS SUJETADORES INTERNOS SEÑALIZACIÓN CON ILUSTRACIÓN O SÍMBOLOS RUEDAS MACIZAS EN CAUCHO. DIMENSIONES: 80X70X30 CM.	UND	
CM-52	ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS EN ACERO GALVANIZADO COLOR NEGRO ESPACIO PARA 3 CELDAS DE PARQUEO. SEGÚN DISEÑO Y DIMENSIONES.	UND	
14	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI**		
14,00	REDES HIDROSANITARIAS	GLB	
15	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		
15,1	**SALIDAS ELECTRICAS Y CIRCUITOS RAMALES DE USO FINAL**		
15,1,1	Suministro e instalacion de salida para iluminacion interior ubicada en cielo raso en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas ocotogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,2	Suministro e instalacion de salida para iluminacion exterior ubicada en fachada de edificaciones en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas ocotogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2	**PREACTA N° 6**		**OBRA EJECUTADA** **PRESENTE ACTA**
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UN**	**CANTIDAD**
15,1,3	Suministro e instalacion de salida para iluminacion exterior ubicada en pisos de edificaciones en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas ocotogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,4	Suministro e instalacion de salida para iluminacion en pasarelas en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye caja pvc 15x15 cm, conectores tipo gel , curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,5	Suministro e instalacion de circuito ramal para iluminacion en pasarelas en tuberia SCH 40 Kraloy 1", incluye cajas ocotogonales, conectores, curvas, cable N. 6 Aluminio Serie 8000 AWG (F-F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	
15,1,6	Suministro e instalacion de circuito ramal para iluminacion en pasarelas en tuberia SCH 40 Kraloy 1 1/2", incluye cajas ocotogonales, conectores, curvas, cable N. 2 Aluminio Serie 8000 AWG (F-F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	
15,1,7	Suministro e instalacion de salida para iluminacion tipo poste, incluye cable encauchetado de 3x10 AWG, empalme de derivacion GHFC1 de 3M	UND	
15,1,8	Suministro e instalacion de circuito ramal para iluminacion de postes en tuberia PVC A 3/4", incluye curvas, cable N. 10 AWG (F-F-F-T) y excavacion tape y compactacion.	ML	
15,1,9	Suministro e instalacion de salida para interrruptor sencillo, incluye tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", caja 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-T), conectores de resorte e interruptor sencillo. (Tuberia empotrada). Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,10	Suministro e instalacion de salida para interrruptor doble, incluye tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", caja 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-T), conectores de resorte e interruptor doble. (Tuberia empotrada). Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,11	Suministro e instalacion de salida para sensor en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas ocotogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a sensor por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,12	Suministro e instalacion de caja de paso de 20x20cm, incluye contactor de 20A-AC1, tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2	PREACTA N° 6		OBRA EJECUTADA
			PRESENTE ACTA
ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD
15,1,13	Suministro e instalacion de salida para UPS 6 KVA en tuberia PVC SCH 40 1", incluye cajas 4x4" con suplemento, cable N. 8 AWG (F-F-N) + N.10(T). IN UPS	UND	
15,1,14	Suministro e instalacion de salida para UPS 6 KVA en tuberia PVC SCH 40 1", incluye cajas 4x4" con suplemento, cable N. 8 AWG (F-F-N) + N.10(T). OUT UPS	UND	
15,1,15	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de UPS 6 KVA en tuberia PVC SCH 40 1", incluye cajas 4x4" con suplemento, conectores, curvas, cable N. 8 AWG (F-F-N) + N.10(T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	
15,1,16	Suministro e instalacion de salida para UPS 3 KVA en tuberia PVC SCH 40 3/4", incluye cajas 4x4" con suplemento, cable N. 10 AWG (F-N) + N.10(T). IN UPS	UND	
15,1,17	Suministro e instalacion de salida para UPS 3 KVA en tuberia PVC SCH 40 3/4", incluye cajas 4x4" con suplemento, cable N. 10 AWG (F-F-N) + N.10(T). OUT UPS	UND	
15,1,18	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de UPS 3 KVA en tuberia PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 10 AWG (F-N) + N.10(T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	
15,1,19	Suministro e instalacion de salida para extractor en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, coraza LT de 3/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,20	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de extractores en tuberia PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	
15,1,21	Suministro e instalacion de salida para evaporador en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, coraza LT de 3/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,22	Suministro e instalacion de salida para condensador en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, coraza LT de 3/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,23	Suministro e instalacion de salida para condensador en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x4", conectores, curvas, cable N. 10 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, coraza LT de 3/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2	**PREACTA N° 6**		**OBRA EJECUTADA** **PRESENTE ACTA**
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UN**	**CANTIDAD**
15,1,24	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de equipos de aire en tuberia PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	
15,1,25	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de equipos de aire en tuberia PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 10 AWG (F-N-T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	
15,1,26	Suministro e instalacion de salida para ventilador en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas ocotogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,27	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de EBAR en tuberia PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (3F-T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	
15,1,28	Suministro e instalacion de salida para tomacorriente en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, Tomacorriente 15A-120V. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,29	Suministro e instalacion de salida para tomacorriente en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, Tomacorriente 15A-120V GFCI. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,1,30	Suministro e instalacion de salida para tomacorriente en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, Tomacorriente 15A-120V tierra aislada. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	
15,2	**PANELES DE DISTRIBUCION E INTERRUPTORES**		
15,2,1	Suministro e instalacion de panel parcial de distribucion con espacio para 12 circuitos, 5 hilos : 3F+N+T. Corriente de corto :10KA. Encerramiento IP20. Tension Nominal 240VAC. Debe contar con certificacion RETIE	UND	
15,2,2	Suministro e instalacion de panel parcial de distribucion con espacio para 42 circuitos, 5 hilos : 3F+N+T. Corriente de corto :10KA. Encerramiento IP20. Tension Nominal 240VAC. Debe contar con certificacion RETIE	UND	
15,2,3	Suministro e instalacion de panel parcial de distribucion con espacio para 12 circuitos, 3 hilos : F+N+T. Corriente de corto :10KA. Encerramiento IP20. Tension Nominal 240VAC. Debe contar con certificacion RETIE	UND	

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2	**PREACTA N° 6**		**OBRA EJECUTADA** **PRESENTE ACTA**
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UN**	**CANTIDAD**
15,2,4	Suministro e instalacion de panel parcial de distribucion con espacio para 12 circuitos, 4 hilos : 2F+N+T. Corriente de corto :10KA. Encerramiento IP20. Tension Nominal 240VAC. Debe contar con certificacion RETIE	UND	
15,2,5	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos monopolares (enchufables) capacidad nominal 20A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	
15,2,6	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos monopolares (enchufables) capacidad nominal 30A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	
15,2,7	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos bipolares (enchufables) capacidad nominal 20A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	
15,2,8	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos bipolares (enchufables) capacidad nominal 30A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	
15,2,9	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos bipolares (enchufables) capacidad nominal 40A, 10KA. **Debe contar con certificacion RETIE**	UND	
15,2,10	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos tripolares (enchufables) capacidad nominal 20A, 10KA. **Debe contar con certificacion RETIE**	UND	
15,2,11	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos tripolares (enchufables) capacidad nominal 30A, 10KA. **Debe contar con certificacion RETIE**	UND	
15,2,12	Suministro e instalacion de UPS bifasica 3KVA - 220VAC.	UND	
15,2,13	Suministro e instalacion de UPS trifasica 10KVA - 220VAC.	UND	
15,3	**LUMINARIAS Y POSTES**		
15,3,1	Suministro e instalacion de luminaria LED de sobreponer circular. Grado de proteccion IP20. Potencia Nominal 42W. Eficiencia luminica 2914lm. Tensión Nominal 120VAC. Carcasa fabricada en chapa de acero. Marca Iluminaciones Tecnicas Ref. Coral Lens 400x120mm. o similar en especificaciones. Debe contar con certificacion RETILAP	UND	
15,3,2	Suministro e instalacion de luminaria LED de emergencia de sobreponer. Grado Proteccion IP20. Potencia Nominal 4W. Eficiencia Luminica 223lm. Tensión Nominal 120VAC. Fabricada en termoplastica inyectado. Marca Iluminaciones Tecnicas Ref. ALENA600L o similar en especificaciones. **Debe contar con certificacion RETILAP**	UND	
15,3,3	Suministro e instalacion de luminaria LED hermetica de sobreponer. Grado Proteccion IP65. Potencia Nominal 117W. Eficicencia luminica: 7125lm. Tensión Nominal 120VAC. Carcasa fabricada en policarbonato. Marca Iluminaciones Tecnicas Ref. o similar en especificaciones. **Debe contar con certificacion RETILAP**	UND	
15,3,4	Suministro e instalacion de luminaria LED tipo proyector de sobreponer de 1 metro de longitud. IP 66. Potencia Nominal 28W. Eficiencia luminica 2900lm. Tensión Nominal 120VAC. Carcasa fabricada en alumincio. Marca Schreder Ref SculpLine o similar en especficaciones. **Debe contar con certificacion RETILAP**	UND	
15,3,5	Suministro e instalacion de luminaria LED tipo proyector de sobreponer de 1 metro de longitud. IP 66. Potencia Nominal 28W. Eficiencia luminica 2900lm. Tensión Nominal 120VAC. Carcasa fabricada en alumincio. Marca Schreder Ref InduLine o similar en especficaciones. **Debe contar con certificacion RETILAP**	UND	
15,3,6	Suministro e instalacion de luminaria LED de alumbrado publico. Grado Proteccion IP65. Potencia Nominal 106W. Eficiencia Luminica 14005lm. Tensión Nominal 220VAC. Marca Schreder Ref Avento 1 144LEDS o similar en especificaciones. **Debe contar con certificacion RETILAP**	UND	

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2	**PREACTA N° 6**		OBRA EJECUTADA
			PRESENTE ACTA
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UN**	**CANTIDAD**
15,3,7	Suministro e instalacion de poste de poliester reforzado en fibra de vidrio. Referencia 8metros - 510KgF. Norma ASTM D4923 Clase 2 con acabado superficial listo uniforme. incluye brazo sencillo de 1mts para montaje de luminaria. **Debe contar con certificacion RETILAP**	UND	
15,3,8	Suministro e instalacion de luminaria LED de incrustar en piso. Grado de proteccion IP65. Potencia Nominal 7W. Eficiencia luminica 600lm. Tensión Nominal 220VAC. Chasis en acero inoxidable. Marca Iluminaciones Tecnicas Ref Baliza98/139 o similar en especificaciones. **Debe contar con certificacion RETILAP**	UND	
15,4	**ALIMENTADORES ELECTRICOS BAJA TENSION**		
15,4,1	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.250F+N.250N+N.2/0T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2 **Alimentador para recorrido desde:** **- Tablero de Distribucion CGD-1 hasta transformador seco 150KVA** **- Tablero de Distribucion CGD-1 hasta motogenerador 150 KVA**	ML	
15,4,2	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.6F+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. **Alimentador para recorrido desde CGD-1 hasta Tablero de Distribucion CGD-2 - Transformador 30 KVA (IN/460VAC) .**	ML	
15,4,3	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.1/0F+N.1/0N+N.8T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. **Alimentador para recorrido desde CGD-2 - Transformador 30 KVA (OUT/208VAC) hasta Tablero de Distribucion CGD-2**	ML	
15,4,4	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.8F+N.8N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. **Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-2 hasta PP-SUB**	ML	
15,4,5	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.1/0F+N.1/0N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: ConduCtores de aluminio para fases y neutro, cobre para tierra, aislamiento THHN THWN-2 **Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-2 hasta PP-EST-III**	ML	
15,4,6	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.4/0F+N.4/0N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Condcutores de aluminio para fases y neutro, cobre para tierra, aislamiento THHWN. **Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-2 hasta PP-PP-PARQ**	ML	
15,4,7	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.6F+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. **Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion PP-PARQ hasta TC-BOMBAS AGUA POTABLE**	ML	
15,4,8	Suministro e instalacion de alimentador en 2x(3N.500F+2N.500n+N.6T). Incluye terminales de compresion. NOTA: Condcutores de aluminio para fases y neutro, cobre para tierra, aislamiento THHWN. **Alimentador para recorrido desde CGD-1 hasta Tablero de Distribucion CGD-3 - Transformador 30 KVA (IN/460VAC) .**	ML	
15,4,9	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.6F+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. **Alimentador para recorrido desde CGD-3 - Transformador 30 KVA (IN/480VAC) hasta Tablero de Distribucion CGD-3**	ML	
15,4,10	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.1/0F+N.1/0N+N.8T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. **Alimentador para recorrido desde CGD-3 - Transformador 30 KVA (OUT/208VAC) hasta Tablero de Distribucion CGD-3**	ML	

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2	**PREACTA N° 6**		OBRA EJECUTADA
			PRESENTE ACTA
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UN**	**CANTIDAD**
15,4,11	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.8F+N.8N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. **Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-3 hasta PP-LOCAL-1**	ML	
15,4,12	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.8F+N.8N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2 **Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-3 hasta PP-LOCAL-2**	ML	
15,4,13	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.8F+N.8N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. **Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-3 hasta PP-GR-P**	ML	
15,4,14	Suministro e instalacion de alimentador en 2x(3N.500F+2N.500n+N.6T). Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de aluminio para fases y neutro, cobre para tierra, aislamiento THHWN. **Alimentador para recorrido desde CGD-3 hasta Tablero de Distribucion CGD-4 - Transformador 45 KVA (IN/460VAC) .**	ML	
15,4,15	Transformador 45 KVA (OUT), CGD-4. Suministro e instalacion de alimentador en 3N.1/0F+N.1/0N+N.8T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. **Alimentador para recorrido desde CGD-4 hasta Tablero de Distribucion CGD-4 - Transformador 45 KVA OUT/208VAC) .**	ML	
15,4,16	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.6F+N.6N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. **Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-4 hasta PP-LOCAL-3**	ML	
15,4,17	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.6F+N.6N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. **Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-4 hasta PP-LOCAL-4**	ML	
15,4,18	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.6F+N.6N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. **Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-4 hasta PP-EQ-D**	ML	
15,4,19	Suministro e instalacion de tuberia PVC A de 1", incluye excavacion tape y compactacion.	ML	
15,4,20	Suministro e instalacion de tuberia PVC A de 2", incluye excavacion tape y compactacion.	ML	
15,4,21	Suministro e instalacion de tuberia PVC A de 3", incluye excavacion tape y compactacion.	ML	
15,4,22	Suministro e instalacion de tuberia PVC SCH 40 Kraloy de 1", incluye soporteria por medio de perfil estructural galvanizado en caliente, grapa perpendicular galvanizada en caliente y varillas roscadas galvanizadas en caliente.	ML	
15,4,23	Suministro e instalacion de tuberia PVC SCH 40 Kraloy de 3", incluye soporteria por medio de perfil estructural galvanizado en caliente, grapa perpendicular galvanizada en caliente y varillas roscadas galvanizadas en caliente.	ML	
15,4,24	Suministro e instalacion de caja de paso de fabricacion especial en acero inoxidable de 100x60x40cm, incluye soporteria por medio de perfil estructural galvanizado en caliente y varillas roscadas galvanizadas en caliente.	UND	
15,4,25	Suministro e instalacion de tuberia PVC A de 1-1/2", incluye excavacion tape y compactacion.	ML	

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2	**PREACTA N° 6**		OBRA EJECUTADA
			PRESENTE ACTA
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UN**	**CANTIDAD**
15,4,26	**Construccion de caja de inspeccion SB325:** Medidas 0.72 m X 0.86 m X 0.9 m (profundidad) en concreto impermeable de 3500PSI con espesor de pared 15cm. Tapa en marco metalico 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16". Con drenaje en tuberia PVC 4"	UND	
15,4,27	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.500F+N.500N+N.4T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de aluminio con aislamiento THHN THWN-2 **Alimentador para recorrido desde transformador hasta TabBombaContraIncendio** **Alimentador para recorrido desde motogenerador hasta TabBombaContraIncendio**	ML	
15,5	**PUNTO DE CONEXIÓN MEDIA TENSION**		
15,5,1	Suministro e instalacion de apoyo de hormigon 12m x1050kg. Incluye transporte y cimentacion.	UND	
15,5,2	Suministro e instalacion de crucetas, herrajes y aisladores para vestida de apoyo en disposicion de alineacion.	UND	
15,5,3	Suministro e instalacion de sistema de puesta a tierra para punto de conexión (electrodo de 5/8" x 2.4m, Cable de cobre N. 2 AWG, Soldadura exotermica)	UND	
15,5,4	Suministro e instalacion de sistema de equipo de medida Nivel II Homologado por Air-e, capacidades de equipos según diagrama unifilar; incluye crucetas, herrajes, cable de cobre N. 2 AWG para interconexiones, puentes en caliente, elementos de derivacion y conexion.	UND	
15,5,5	Suministro e instalacion de protecciones de media tension (Cortacircuitos 15KV con fusibles 10Amp, DPS 15 KV, Cruceta metalica, herrajes)	UND	
15,5,6	Suministro e instalacion de canalizacion IMC de 3" (Bajante en poste de hormigon)	ML	
15,5,7	Suministro e instalacion de canalizacion PVC de 2 x 3" (Tuberia de Reserva). Incluye excavacion y compactacion del terreno	ML	
15,5,8	Servicio de topo de con equipo de perforacion horizontal para tuberia PVC de 2x3" - Cruce de via. Incluye permisos requeridos. El cruce debe ser realizado con un equipo de perforacion horizontal y deteccion de sondas, para evitar complicaciones en la torura y relleno de la via.	ML	
15,5,9	**Construccion de caja de inspeccion SB300:** Medidas 1.13 m X 1.13 m X 1.43 m (profundidad) en concreto impermeable de 3500PSI con espesor de pared 15cm. Tapa en marco metalico 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16". Con drenaje en tuberia PVC 4"	UND	
15,5,10	Suministro e instalacion de alimentador en 3N. 2 AWG, aislamiento XLPE al 133% **(Recorrido desde punto de conexión hasta Subestacion Principal)**	ML	
15,5,11	Suministro e instalacion de terminales premoldeados para uso exterior **(Instalacion en punto de conexión)**	UND	
15,5,12	Suministro e instalacion de terminales premoldeados para uso inerior **(Instalacion en celda de seccionador y transformador)**	UND	
15,5,13	Suministro e instalacion de puentes en cable N. 2 AWG, aislamiento XLPE al 133%	UND	
15,6	**EQUIPOS SUBESTACION ELECTRICA : CELDAS MEDIA TENSIÓN, TABLEROS DE DISTRIBUCION, ENTRE OTROS**		
15,6,1	Suministro e instalacion de celda de remonte autosoportada 15 KV. Fabricada en lamina galvanizada calibre 16, acabado en pintura electrostatica. Grado Proteccion IP 20, Incluye barra de tierra. **Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)**	UND	
15,6,2	Suministro e instalacion de celda para seccionador de operación bajo carga 630Amp en SF6, Incluye base portafusibles, fusibles HH de 10 amperios, juego de barras tripolar para conexión superior 630Amp, indicador de presencia de tensión, varillaje para disparo tripolar por fusion. **Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)**	UND	
15,6,3	Suministro e instalacion de celda metalica para transformador de 150 KVA. Fabricada en lamina galvanizada calibre 16, Grado Proteccion IP20. **Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)**	UND	

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2	**PREACTA N° 6**		OBRA EJECUTADA
			PRESENTE ACTA
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UN**	**CANTIDAD**
15,6,4	Suministro e instalacion de transformador seco de 150 KVA encapsulado en resina epoxica clase F, 13200/460V. ncluye DPS 15 KV, sistema de ventilacion forzada, ruedas orientablles. **Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)**	UND	
15,6,5	Suministro e instalacion de cuadro general de distribucion N. 1 en lamina galvanizada calibre 2+ y pintura electrostatica (CGD-1), equipamento según diagrama unifilar. **Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)**	UND	
15,6,6	Suministro e instalacion de cuadro general de distribucion N. 2 en lamina galvanizada y pintura electrostatica (CGD-2), equipamento según diagrama unifilar. **Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)**	UND	
15,6,7	Suministro e instalacion de cuadro general de distribucion N. 3 en lamina galvanizada y pintura electrostatica (CGD-3), equipamento según diagrama unifilar. **Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Graderias Playa)**	UND	
15,6,8	Suministro e instalacion de cuadro general de distribucion N. 4 en lamina galvanizada y pintura electrostatica (CGD-4), equipamento según diagrama unifilar. **Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Equipamiento Deportivo)**	UND	
15,6,9	Suministro e instalacion de cuadro general fabricado en lamina galvanizada calibre 16 y pintrua electrostatica para albergar el banco de condensasores 30 KVAR (6 pasos moviles de 5 KVAR cada uno) según diagrama unfilar **Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)**	UND	
15,6,10	Suministro e instalacion de transformador seco de 30 KVA, 460/208-120V clase H . Incluye celda metalica de transformador IP22. **Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Graderias Playa y Subestacion Principal)**	UND	
15,6,11	Suministro e instalacion de transformador de 45 KVA, 460/208-120V clae H. Incluye celda metalica de transformador IP22. **Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Equipamiento Deportivo)**	UND	
15,6,12	Suministro e instalacion de motogenerador de potencia Stand By de 150 KVA hasta 1500 metros sobre el nivel del mar. Tensión Nominal 460 VAC. Incluye servicio de arranque y capacitacion. Inlsuye breaker totalizador, silenciador tipo critico, baterais de servicio pesado, soporte antivibratorios, tanque de combustible para 7 horas de autonomina. **Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)**	UND	
15,6,13	Suministro e instalacion de tablero de transferencia bomba contra incendio lamina galvanizada calibre 16 y pintura electrostatica, equipamento según diagrama unifilar. **Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Cuarto de Bombas)**	UND	
15,6,14	Suministro e instalacion de ctablero de agua potable en lamina galvanizada y pintura electrostatica, equipamento según diagrama unifilar. **Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Cuarto de Bombas)**	UND	
15,7	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA**		
15,7,1	Suministro e instalacion de sistema de puesta a tierra disposicion cuadrada de 5x5m. Incluye cuatro electrodos de 5/8" x 2.4m, cable 2/0 AWG, soldadura exotermica, registro de inspeccion. **(Ubicados en la Subestacion Principal, Graderia Playa y Sendero Loop Aves)**	UND	
15,7,2	Suministro e instalacion de barraje equipotencial. Barra de cobre perforada en cobre con recubrimiento electro plateado. Capacidad de Corriente: 564A. Incluye sistema de soporte : aisladores, tornillos, tuercas y arandelas. **(Ubicados en la Subestacion Principal, Graderia Playa y Sendero Loop Aves)**	UND	
15,7,3	Suministro e instalacion de linea equipotencial en cable de cobre 1/0 AWG **(Recorrido desde Loop Aves hasta Equip. Deportivo)**	ML	
15,7,4	Suministro e instalacion de tuberia PVC SCH 40 Kraloy de 1", incluye soporteria por medio de perfil estructural y grapa perpendicular. **(Ubicados en la Subestacion Principal, Graderia Playa y Sendero Loop Aves)**	ML	

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2	**PREACTA N° 6**		**OBRA EJECUTADA** **PRESENTE ACTA**
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UN**	**CANTIDAD**
15,7,5	Suministro e instalacion de puentes de conexión en cable 2/0 AWG para puesta a tiera de equipos	UND	
15,7,6	Suministro e instalacion de puentes de conexión en cable 1/0 AWG para puesta a tiera de equipos	UND	
15,8	**SISTEMA ELECTRICO PUNTOS AISLADOS REGULADOS**		
15,8,1	**Suministro e instalacion de punto de energia aislado para puntos regulados. Incluye:** - Poste en fibra de vidrio de 12Mx750KGF, - Sistema fotovoltaico que incluye: Paneles Solares, Inversor, Bateria Solar en gel, cable fotovoltaico. - Tomacorriente tierra aislada 120VAC - 15A con caja PVC SCH 40 - Soporteria y herrajes	UND	
15,8,2	**Construccion de caja de inspeccion SB325:** Medidas 0.72 m X 0.86 m X 0.9 m (profundidad) en concreto impermeable de 3500PSI con espesor de pared 15cm. Tapa en marco metalico 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16". Con drenaje en tuberia PVC 4"	UND	
15,9	**TRAMITES Y SERVICIOS**		
15,9,1	Servicio de inspeccion RETIE: Distribucion para redes de media tensión, Subestacion Ellectrica, Uso Final	GL	
15,9,2	Servicio de inspeccion RETILAP para iluminacion interior / exterior	GL	
15,9,3	Servicio de pagos para tramites ante el operador de Red. Incluye pago para aprobacion de diseño electrico, revision de materiales, descargo de energizacion	GL	
16	**INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS**		
16,00	REDES DE AIRES ACONDICIONADOS	GLB	
17	**INSTALACIONES VOZ Y DATOS**		
17,00	REDES DE VOZ Y DATOS	GLB	
18	**PRESUPUESTO SEÑALIZACION**		
18,00	SEÑALIZACION	GLB	
19	**PROVISIONES**		
19,01	PMA	GLB	0,021
19,02	PMT	GLB	
19,03	CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP (TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED)	GLB	
19,04	TOTEMS DE INFORMACION	UND	
19,05	PROVISION PUERTAS Y VENTANAS	GLB	
19,06	SISTEMA DE RIEGO	GLB	

JHORVIS DE LUQUE
RESIDENTE DE OBRA
M.P. # 68202-267439 STD

CYNTHIA VILLEGAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. # 08202-092612 ATL

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

PROGRAMA DE INVERSION

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO	$ 82.464.264.620,00
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	180 DIAS
FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADADA	30 DE ABRIL DE 2023

ITEM	ACTIVIDAD	VALOR TOTAL	Acumulado a 30 de junio de 2022	JULIO DE 2022	AGOSTO DE 2022	SEPTIEMBRE DE 2022	OCTUBRE DE 2022	NOVIEMBRE DE 2022	DICIEMBRE DE 2022	ENERO DE 2023	FEBRERO DE 2023	MARZO DE 2023	ABRIL DE 2023
01	OBRAS PRELIMINARES	$ 623.882.532,00	$ 197.061.267,05	$ 29.340.961,00	$ 29.340.961,00	$ 29.340.961,00	$ 29.340.961,00	$ 46.418.613,14	$ 46.418.613,14	$ 46.418.613,14	$ 46.418.613,14	$ 61.891.484,19	$ 61.891.484,19
02	MOVIMIENTOS DE TIERRA	$ 1.948.804.815,61			$ 97.440.240,78	$ 194.880.481,56	$ 97.440.240,78	$ 233.856.577,87	$ 233.856.577,87	$ 233.856.577,87	$ 233.856.577,87	$ 311.808.770,50	$ 311.808.770,50
03	PILOTAJE EN MADERA	$ 26.835.125.558,28	$ 14.369.221.205,56	$ 1.246.590.435,27	$ 1.495.908.522,33	$ 1.745.226.609,38	$ 1.745.226.609,38	$ 1.869.885.652,91	$ 1.869.885.652,91	$ 2.493.180.870,54			
04	PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA	$ 18.505.304.491,05	$ 2.595.277.372,61	$ 954.601.627,11	$ 1.272.802.169,48	$ 1.591.002.711,84	$ 1.591.002.711,84	$ 1.591.002.711,84	$ 1.591.002.711,84	$ 1.591.002.711,84	$ 1.591.002.711,84	$ 2.068.303.525,40	$ 2.068.303.525,40
05	BARANDAS EN MADERA	$ 4.647.070.333,62					$ 278.824.220,02	$ 464.707.033,36	$ 650.589.846,71	$ 650.589.846,71	$ 743.531.253,38	$ 743.531.253,38	$ 1.115.296.880,07
06	EDIFICACIONES EN MADERA	$ 7.053.059.690,30				$ 352.652.984,52	$ 705.305.969,03	$ 846.367.162,84	$ 846.367.162,84	$ 916.897.759,74	$ 916.897.759,74	$ 1.410.611.938,06	$ 1.057.958.953,55
07	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	$ 956.877.401,22			$ 47.843.870,06	$ 47.843.870,06	$ 66.981.418,09	$ 124.394.062,16	$ 124.394.062,16	$ 124.394.062,16	$ 124.394.062,16	$ 133.962.836,17	$ 162.669.158,21
08	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS	$ 209.149.887,96						$ 34.858.314,66	$ 34.858.314,66	$ 34.858.314,66	$ 34.858.314,66	$ 34.858.314,66	$ 34.858.314,66
09	PISOS Y ENCHAPES	$ 389.958.440,82						$ 64.993.073,47	$ 64.993.073,47	$ 64.993.073,47	$ 64.993.073,47	$ 64.993.073,47	$ 64.993.073,47
10	CIELOS RASOS	$ 11.098.815,78						$ 1.849.802,63	$ 1.849.802,63	$ 1.849.802,63	$ 1.849.802,63	$ 1.849.802,63	$ 1.849.802,63
11	PAVIMENTOS Y ANDENES	$ 891.018.299,60			$ 44.550.914,98	$ 44.550.914,98	$ 62.371.280,97	$ 115.832.378,95	$ 115.832.378,95	$ 115.832.378,95	$ 115.832.378,95	$ 124.742.561,94	$ 161.473.110,93
12	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	$ 98.919.370,16									$ 32.973.123,39	$ 32.973.123,39	$ 32.973.123,39
13	URBANISMO Y EXTERIORES	$ 33.366.619,00											$ 33.366.619,00
14	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI	$ 2.210.000.000,00									$ 729.300.000,00	$ 729.300.000,00	$ 751.400.000,00
15	INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 7.762.775.477,69								$ 931.533.057,31	$ 2.173.577.133,73	$ 2.328.832.643,28	$ 2.328.832.643,28
16	INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS	$ 4.290.000.000,00										$ 2.145.000.000,00	$ 2.145.000.000,00
17	INSTALACIONES VOZ Y DATOS	$ 4.290.000.000,00								$ 643.500.000,00	$ 1.072.500.000,00	$ 1.072.500.000,00	$ 1.501.500.000,00
18	PRESUPUESTO SEÑALIZACION	$ 12.312.300,00									$ 4.063.059,00	$ 4.186.182,00	$ 4.063.059,00
19	PROVISIONES												
	PMA	$ 860.762.500,00	$ 99.229.083,20	$ 22.846.002,50	$ 22.846.002,50	$ 22.846.002,50	$ 22.846.002,50	$ 22.846.002,50	$ 22.846.002,50	$ 22.846.002,50	$ 22.846.002,50	$ 289.382.698,38	$ 289.382.698,38
	PMT	$ 85.410.787,80			$ 9.490.087,53	$ 9.490.087,53	$ 9.490.087,53	$ 9.490.087,53	$ 9.490.087,53	$ 9.490.087,53	$ 9.490.087,53	$ 9.490.087,53	$ 9.490.087,53
	CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP (TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED)	$ 29.145.480,00											$ 29.145.480,00
	TOTEMS DE INFORMACION	$ 112.931.000,00									$ 37.267.230,00	$ 37.267.230,00	$ 38.396.540,00
	PROVISION PUERTAS Y VENTANAS	$ 520.000.000,00									$ 171.600.000,00	$ 171.600.000,00	$ 176.800.000,00
	SISTEMA DE RIEGO	$ 87.290.819,20									$ 43.645.409,60	$ 43.645.409,60	

	INVERSION MENSUAL		$ 2.253.379.025,88	$ 3.020.222.768,66	$ 4.037.834.623,38	$ 4.608.829.501,15	$ 5.426.501.473,87	$ 5.612.284.287,21	$ 7.881.243.159,06	$ 8.170.896.593,60	$ 11.820.730.934,58	$ 12.371.453.324,18
	% DE INVERSION MENSUAL		2,73%	3,66%	4,90%	5,59%	6,58%	6,81%	9,56%	9,91%	14,33%	15,00%
	INVERSION ACUMULADA	$ 17.260.788.928,42	$ 19.514.167.954,30	$ 22.534.390.722,96	$ 26.572.225.346,34	$ 31.181.054.847,49	$ 36.607.556.321,36	$ 42.219.940.608,57	$ 50.101.183.767,64	$ 58.272.080.361,23	$ 70.092.811.295,82	$ 82.464.264.620,00
	% DE INVERSION ACUMULADA	20,93%	23,66%	27,33%	32,22%	37,81%	44,39%	51,20%	60,76%	70,66%	85,00%	100,00%

MEMORIAS DE OBRA


INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA



CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Fecha: 30/06/2022

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	**Acta No.**	**Ítem No.**	**Unidad**
Capítulo:	01 - OBRAS PRELIMINARES			
Actividad:	EDU. CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES (VER DISEÑO)	6	5513	MES

Área para Dibujo o Fotografía




Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
			Longitud (m)	Ancho (m)	Altura (m)		
Mayo de 2022						1,00	1,00

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA **1,00**

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Fecha: 30/06/2022

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	01 - OBRAS PRELIMINARES			
Actividad:	COMISIÓN TOPOGRÁFICA MENSUAL, INCLUYE 1 COORDINADOR DE TOPOGRAFÍA, 1 TOPÓGRAFO, CADENEROS, DIBUJANTES, LANCHA PARA REPLANTEO EN AGUA, ESTACIÓN TOTAL Y NIVEL.	6	CM-01	MES

Área para Dibujo o Fotografía







Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
			Longitud (m)	Ancho (m)	Altura (m)		
Junio de 2022	Frente tierra					1,00	1,00
Junio de 2022	Frente Agua					1,00	1,00

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA **2,00**

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA


CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Fecha: 30/06/2022

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	**Acta No.**	**Ítem No.**	**Unidad**
Capítulo:	03 - PILOTAJE EN MADERA			
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PILOTE DIÁMETRO 20, INCLUYE COMPLEMENTO	6	CM-04	ML

Área para Dibujo o Fotografía

PILOTES D20 MODULO 49

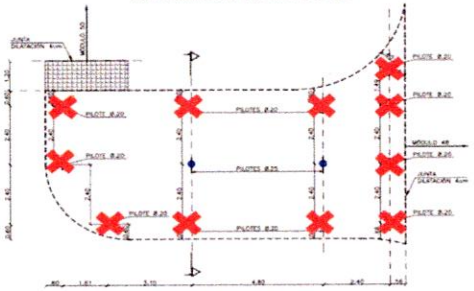

PLANTA LOCALIZACIÓN DE ARRIOSTRAMIENTOS
MÓDULO T38 (M49)

Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Long de tacos (ml)	Medida Total
			Longitud (m)	Ancho (m)	Altura (m)		
1D		49	12,8				12,80
1C		49	12,8				12,80
1B		49	12,8				12,80
1A		49	12,8				12,80
2C		49	12,8				12,80
2A		49	12,8				12,80
3C		49	12,8				12,80
3A		49	12,8				12,80
4A		49	12,8				12,80
5C		49	12,8				12,80
5B		49	12,8				12,80
1A		50	12,65				12,65
1B		50	12,65				12,65
2A		50	12,2				12,20
2B		50	12,2				12,20
3A		50	11,75				11,75
3B		50	11,75				11,75
						SUBTOTAL EJECUTADO	**214,00**

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT. 901.561.273-2

Fecha: 30/06/2022

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	**Acta No.**	**Ítem No.**	**Unidad**
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	03 - PILOTAJE EN MADERA			
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PILOTE DIÁMETRO 20, INCLUYE COMPLEMENTO	6	CM-04	ML

Área para Dibujo o Fotografía



Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Long de tacos (ml)	Medida Total
			Longitud (m)	Ancho (m)	Altura (m)		
4A		50	11,75				11,75
4B		50	11,75				11,75
5A		50	11,3				11,30
5B		50	11,3				11,30
6A		50	10,7				10,70
6B		50	10,7				10,70
7A		50	10,3				10,30
7B		50	10,3				10,30
8C		50	10,3				10,30
8D		50	10,3				10,30
9C		50	10,3				10,30
9D		50	10,3				10,30
10A		50	10,3				10,30
10B		50	10,3				10,30
11A'		50	10,3				10,30
11A''		50	10,3				10,30
12A'		50	10,3				10,30
						SUBTOTAL EJECUTADO	**180,80**

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

Fecha: 30/06/2022

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	**Acta No.**	**Ítem No.**	**Unidad**
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	03 - PILOTAJE EN MADERA			
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PILOTE DIÁMETRO 20, INCLUYE COMPLEMENTO	6	CM-04	ML

Área para Dibujo o Fotografía



Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Long de tacos (ml)	Medida Total
			Longitud (m)	Ancho (m)	Altura (m)		
12A''		50	10,3				10,30
13A		50	10,3				10,30
13B		50	10,3				10,30
14C		50	10,3				10,30
14D		50	10,3				10,30
15C		50	10,3				10,30
15D		50	10,3				10,30
16A		50	10,3				10,30
16B		50	10,3				10,30
17A		50	10,3				10,30
17B		50	10,3				10,30
Modulo completo		9				22,00	22,00
Modulo completo		15				10,00	10,00
Modulo completo		14				2,00	2,00

SUBTOTAL EJECUTADO	**147,30**
TOTAL EJECUTADO	**542,10**

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA


CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Fecha: 30/06/2022

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	**Acta No.**	**Ítem No.**	**Unidad**
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	03 - PILOTAJE EN MADERA			
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PILOTE DIÁMETRO 25, INCLUYE COMPLEMENTO	6	CM-05	ML

Área para Dibujo o Fotografía

PILOTES D25 MODULO 48

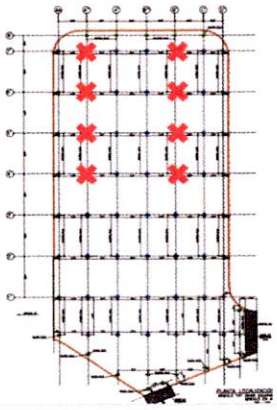

Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Long de tacos (ml)	Medida Total
			Longitud (m)	Ancho (m)	Altura (m)		
4'A''		48	15,4				15,40
4'B'		48	15,4				15,40
5'A''		48	15,4				15,40
5'B'		48	15,4				15,40
6'A''		48	15,4				15,40
6'B'		48	15,4				15,40
7'A''		48	15,4				15,40
7'B'		48	15,4				15,40
2B		49	12,8				12,80
3B		49	12,8				12,80
101A		11	10,3				10,30
101B		11	11,3				11,30
101C		11	10,3				10,30
102A		11	10,3				10,30
102B		11	11,3				11,30
102C		11	11,3				11,30
102D		11	10,3				10,30

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA **223,90**

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

MEMORIAS DE OBRA


INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Fecha: 30/06/2022

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	**Acta No.**	**Ítem No.**	**Unidad**
Capítulo:	03 - PILOTAJE EN MADERA			
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PILOTE DIÁMETRO 25, INCLUYE COMPLEMENTO	6	CM-05	ML

Área para Dibujo o Fotografía



Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Long de tacos (ml)	Medida Total
			Longitud (m)	Ancho (m)	Altura (m)		
103E		11	10,3				10,30
104A		11	10,3				10,30
104B		11	11,3				11,30
104C		11	11,3				11,30
104E		11	11,3				11,30
104F		11	10,3				10,30
105A		11	10,3				10,30
105B		11	11,3				11,30
105C		11	11,3				11,30
105E		11	11,3				11,30
105F		11	10,3				10,30
106A		11	10,3				10,30
106B		11	11,3				11,30
106C		11	11,3				11,30
106E		11	11,3				11,30
106F		11	10,3				10,30
						CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA	**173,80**

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Fecha: 30/06/2022

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	**Acta No.**	**Ítem No.**	**Unidad**
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	03 - PILOTAJE EN MADERA			
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PILOTE DIÁMETRO 25, INCLUYE COMPLEMENTO	6	CM-05	ML

Área para Dibujo o Fotografía



Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Long de tacos (ml)	Medida Total
			Longitud (m)	Ancho (m)	Altura (m)		
Modulo completo		9				11,00	11,00
Modulo completo		15				11,00	11,00
Modulo completo		14				64,00	64,00
Modulo completo		8				70,00	70,00
	5 (detalle101G)	8				6,50	6,50

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA	**162,50**
TOTAL EJECUTADO	**560,20**

MEMORIAS DE OBRA


INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
Nit: 901.501.273-2

Fecha: 30/06/2022

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	**Acta No.**	**Ítem No.**	**Unidad**
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	03 - PILOTAJE EN MADERA			
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D15	6	CM-06	ML

Área para Dibujo o Fotografía



Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
			Longitud (m)	Ancho (m)	Altura (m)		
63 (A-B)		8	3,30			2,00	6,60
63 (B-C)		8	3,30			2,00	6,60
64 (A'-A)		8	3,30			2,00	6,60
64 (A-B)		8	3,30			2,00	6,60
64 (B-C)		8	3,30			2,00	6,60
65 (D-A')		8	3,30			2,00	6,60
65 (A'-A)		8	3,30			2,00	6,60
65 (A-B)		8	3,30			2,00	6,60
65 (B-C)		8	3,30			2,00	6,60
66 (E-D)		8	3,30			2,00	6,60
66 (A'-A)		8	3,30			2,00	6,60
66 (A-B)		8	3,30			2,00	6,60
66 (B-C)		8	3,30			2,00	6,60
67 (E-D)		8	3,30			2,00	6,60
67 (A'-A)		8	3,30			2,00	6,60
67 (A-B)		8	3,30			2,00	6,60
67 (B-C)		8	3,30			2,00	6,60
68 (E-D)		8	3,30			2,00	6,60
					CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA		**118,80**

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

MEMORIAS DE OBRA


INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Fecha: 30/06/2022

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	**Acta No.**	**Ítem No.**	**Unidad**
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	03 - PILOTAJE EN MADERA			
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D15	6	CM-06	ML

Área para Dibujo o Fotografía



Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
			Longitud (m)	Ancho (m)	Altura (m)		
68 (A'-A)		8	3,30			2,00	6,60
68 (A-B)		8	3,30			2,00	6,60
68 (B-C)		8	3,30			2,00	6,60
69 (A'-A)		8	3,30			2,00	6,60
69 (A-B)		8	3,30			2,00	6,60
69 (B-C)		8	3,30			2,00	6,60
71 (E-D)		8	3,30			2,00	6,60
71 (A-B)		8	3,30			2,00	6,60
71 (B-C)		8	3,30			2,00	6,60
73 (A'-A)		8	3,30			2,00	6,60
73 (A-B)		8	3,30			2,00	6,60
73 (B-C)		8	3,30			2,00	6,60
74 (E-D)		8	3,30			2,00	6,60
74 (A'-A)		8	3,30			2,00	6,60
74 (A-B)		8	3,30			2,00	6,60
74 (B-C)		8	3,30			2,00	6,60
75 (E-D)		8	3,30			2,00	6,60
75 (A'-A)		8	3,30			2,00	6,60
					CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA		**118,80**

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

MEMORIAS DE OBRA


INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.279-2

Fecha: 30/06/2022

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	**Acta No.**	**Ítem No.**	**Unidad**
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	03 - PILOTAJE EN MADERA			
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D15	6	CM-06	ML

Área para Dibujo o Fotografía



Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
			Longitud (m)	Ancho (m)	Altura (m)		
75 (A-B)		8	3,30			2,00	6,60
75 (B-C)		8	3,30			2,00	6,60
76 (E-D)		8	3,30			2,00	6,60
76 (A'-A)		8	3,30			2,00	6,60
76 (A-B)		8	3,30			2,00	6,60
76 (B-C)		8	3,30			2,00	6,60
77 (E-D)		8	3,30			2,00	6,60
77 (A'-A)		8	3,30			2,00	6,60
77 (A-B)		8	3,30			2,00	6,60
77 (B-C)		8	3,30			2,00	6,60
78 (E-A)		8	3,30			2,00	6,60
78 (A-B)		8	3,30			2,00	6,60
78 (B-C)		8	3,30			2,00	6,60
79 (A-B)		8	3,30			2,00	6,60
79 (B-C)		8	3,30			2,00	6,60
80(A-B)		9	3,30			2,00	6,60
80(B-C)		9	3,30			2,00	6,60
81(A-B)		9	3,30			2,00	6,60
						CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA	**118,80**

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA


CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Fecha: 30/06/2022

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	**Acta No.**	**Ítem No.**	**Unidad**
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	03 - PILOTAJE EN MADERA			
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D15	6	CM-06	ML

Área para Dibujo o Fotografía

RIOSTRAS D15 MODULO 9



Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
			Longitud (m)	Ancho (m)	Altura (m)		
81(B-C)		9	3,30			2,00	6,60
82(A-B)		9	3,30			2,00	6,60
82(B-C)		9	3,30			2,00	6,60
83(A-B)		9	3,30			2,00	6,60
83(B-C)		9	3,30			2,00	6,60
84(A-B)		9	3,30			2,00	6,60
84(B-C)		9	3,30			2,00	6,60
85(A-B)		9	3,30			2,00	6,60
85(B-C)		9	3,30			2,00	6,60
86(A-B)		9	3,30			2,00	6,60
86(B-C)		9	3,30			2,00	6,60
87(A-B)		9	3,30			2,00	6,60
87(B-C)		9	3,30			2,00	6,60
88(A-B)		9	3,30			2,00	6,60
88(B-C)		9	3,30			2,00	6,60
89(A-B)		9	3,30			2,00	6,60
89(B-C)		9	3,30			2,00	6,60
90(A-B)		9	3,30			2,00	6,60
						CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA	**118,80**

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA


CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.279-2

Fecha: 30/06/2022

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	03 - PILOTAJE EN MADERA			
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D15	6	CM-06	ML

Área para Dibujo o Fotografía

RIOSTRAS D15 MODULO 10



Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
			Longitud (m)	Ancho (m)	Altura (m)		
90(B-C)		9	3,3			2,00	6,60
91(A-B)		10	3,3			2,00	6,60
91(B-C)		10	3,3			2,00	6,60
92(A-B)		10	3,3			2,00	6,60
92(B-C)		10	3,3			2,00	6,60
93(A-B)		10	3,3			2,00	6,60
93(B-C)		10	3,3			2,00	6,60
94(A-B)		10	3,3			2,00	6,60
94(B-C)		10	3,3			2,00	6,60
95(A-B)		10	3,3			2,00	6,60
95(B-C)		10	3,3			2,00	6,60
96(A-B)		10	3,3			2,00	6,60
96(B-C)		10	3,3			2,00	6,60
97(A-B)		10	3,3			2,00	6,60
97(B-C)		10	3,3			2,00	6,60
98(A-B)		10	3,3			2,00	6,60
98(B-C)		10	3,3			2,00	6,60
99(A-B)		10	3,30			2,00	6,60
						CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA	**118,80**

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA


CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Fecha: 30/06/2022

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	**Acta No.**	**Ítem No.**	**Unidad**
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	03 - PILOTAJE EN MADERA			
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D15	6	CM-06	ML

Área para Dibujo o Fotografía

RIOSTRAS D15 MODULO 14

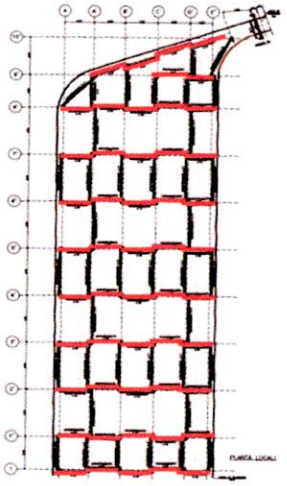

Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
			Longitud (m)	Ancho (m)	Altura (m)		
99(B-C)		10	3,30			2,00	6,60
100(A-B)		10	3,30			2,00	6,60
100(B-C)		10	3,30			2,00	6,60
1(E'-D')		14	3,30			2,00	6,60
1(D'-C')		14	3,30			2,00	6,60
1(C'-B')		14	3,30			2,00	6,60
1(B'-A')		14	3,30			2,00	6,60
1(A'-A)		14	3,30			2,00	6,60
1'(E'-D')		14	3,30			2,00	6,60
1'(D'-C')		14	3,30			2,00	6,60
1'(C'-B')		14	3,30			2,00	6,60
1'(B'-A')		14	3,30			2,00	6,60
1'(A'-A)		14	3,30			2,00	6,60
2'(E'-D')		14	3,30			2,00	6,60
2'(D'-C')		14	3,30			2,00	6,60
2'(C'-B')		14	3,30			2,00	6,60
2'(B'-A')		14	3,30			2,00	6,60
2'(A'-A)		14	3,30			2,00	6,60
					CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA		**118,80**

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

MEMORIAS DE OBRA


INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.279-2

Fecha: 30/06/2022

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	**Acta No.**	**Ítem No.**	**Unidad**
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	03 - PILOTAJE EN MADERA			
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D15	6	CM-06	ML

Área para Dibujo o Fotografía

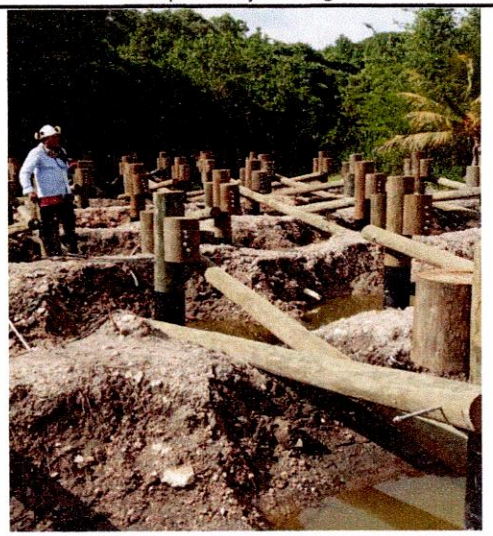

Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
			Longitud (m)	Ancho (m)	Altura (m)		
3'(E'-D')		14	3,30			2,00	6,60
3'(D'-C')		14	3,30			2,00	6,60
3'(C'-B')		14	3,30			2,00	6,60
3'(B'-A')		14	3,30			2,00	6,60
3'(A'-A)		14	3,30			2,00	6,60
4'(E'-D')		14	3,30			2,00	6,60
4'(D'-C')		14	3,30			2,00	6,60
4'(C'-B')		14	3,30			2,00	6,60
4'(B'-A')		14	3,30			2,00	6,60
4'(A'-A)		14	3,30			2,00	6,60
5'(E'-D')		14	3,30			2,00	6,60
5'(D'-C')		14	3,30			2,00	6,60
5'(C'-B')		14	3,30			2,00	6,60
5'(B'-A')		14	3,30			2,00	6,60
5'(A'-A)		14	3,30			2,00	6,60
6'(E'-D')		14	3,30			2,00	6,60
6'(D'-C')		14	3,30			2,00	6,60
6'(C'-B')		14	3,30			2,00	6,60
					CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA		**118,80**

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Fecha: 30/06/2022

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	**Acta No.**	**Ítem No.**	**Unidad**
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	03 - PILOTAJE EN MADERA			
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D15	6	CM-06	ML

Área para Dibujo o Fotografía



Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
			Longitud (m)	Ancho (m)	Altura (m)		
6'(B'-A')		14	3,30			2,00	6,60
6'(A'-A)		14	3,30			2,00	6,60
7'(E'-D')		14	3,30			2,00	6,60
7'(D'-C')		14	3,30			2,00	6,60
7'(C'-B')		14	3,30			2,00	6,60
7'(B'-A')		14	3,30			2,00	6,60
7'(A'-A)		14	3,30			2,00	6,60
8'(E'-D')		14	3,30			2,00	6,60
8'(D'-C')		14	3,30			2,00	6,60
8'(C'-B')		14	3,30			2,00	6,60
8'(B'-A')		14	3,30			2,00	6,60
8'(A'-A)		14	3,30			2,00	6,60
9'(E'-D')		14	3,30			2,00	6,60
9'(D'-C')		14	3,30			2,00	6,60
(A'-B')		14	3,30			2,00	6,60
(B'-C')		14	3,30			2,00	6,60
(C'-D')		14	3,30			2,00	6,60
(D'-E')		14	3,30			2,00	6,60
					CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA		**118,80**

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA


CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.503.273-2

Fecha: 30/06/2022

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
Capítulo:	03 - PILOTAJE EN MADERA
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D15

Acta No.	**Ítem No.**	**Unidad**
6	CM-06	ML

Área para Dibujo o Fotografía

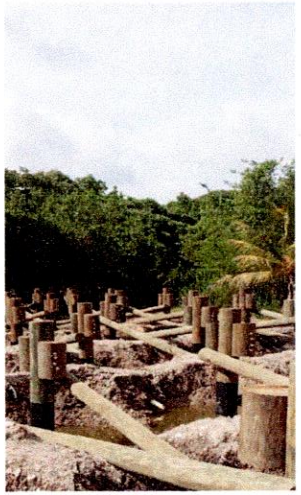

Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
			Longitud (m)	Ancho (m)	Altura (m)		
F'		14	3,30			2,00	6,60

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA	**6,60**
TOTAL EJECUTADO	**957,00**

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2


Fecha: 30/06/2022

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
Capítulo:	03 - PILOTAJE EN MADERA
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D17

Acta No.	**Ítem No.**	**Unidad**
6	CM-07	ML

Área para Dibujo o Fotografía

RIOSTRAS D17 MODULO 8



Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
			Longitud (m)	Ancho (m)	Altura (m)		
D(64-65)		8	5,30			2,00	10,60
A(64-65)		8	5,30			2,00	10,60
B(64-65)		8	5,30			2,00	10,60
C(64-65)		8	5,30			2,00	10,60
E(67-68)		8	5,30			2,00	10,60
D(67-68)		8	5,30			2,00	10,60
A'(67-68)		8	5,30			2,00	10,60
A(67-68)		8	5,30			2,00	10,60
B(67-68)		8	5,30			2,00	10,60
C(67-68)		8	5,30			2,00	10,60
A'(69-73)		8	5,30			2,00	10,60
A(69-70)		8	5,30			2,00	10,60
B(69-70)		8	5,30			2,00	10,60
C(70-71)		8	5,30			2,00	10,60
C(70-71)		8	5,30			2,00	10,60
A(71-73)		8	5,30			2,00	10,60
B(71-73)		8	5,30			2,00	10,60
C(71-72)		8	5,30			2,00	10,60
						CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA	**190,80**

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:


Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

EDUBAR	**MEMORIAS DE OBRA**	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2
	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA	**Fecha:** 30/06/2022

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	**Acta No.**	**Ítem No.**	**Unidad**
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	03 - PILOTAJE EN MADERA			
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D17	6	CM-07	ML

Área para Dibujo o Fotografía

RIOSTRAS D17 MODULO 9



Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
			Longitud (m)	Ancho (m)	Altura (m)		
C(72-73)		8	5,30			2,00	10,60
E(74-75)		8	5,30			2,00	10,60
D(74-75)		8	5,30			2,00	10,60
A'(74-75)		8	5,30			2,00	10,60
A(74-75)		8	5,30			2,00	10,60
B(74-75)		8	5,30			2,00	10,60
C(74-75)		8	5,30			2,00	10,60
D(77-78)		8	5,30			2,00	10,60
A(77-78)		8	5,30			2,00	10,60
B(77-78)		8	5,30			2,00	10,60
C(77-78)		8	5,30			2,00	10,60
A(80-81)		9	5,30			2,00	10,60
B(80-81)		9	5,30			2,00	10,60
C(80-81)		9	5,30			2,00	10,60
A(83-84)		9	5,30			2,00	10,60
B(83-84)		9	5,30			2,00	10,60
C(83-84)		9	5,30			2,00	10,60
A(86-87)		9	5,30			2,00	10,60
						CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA	**190,80**

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA


CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Fecha: 30/06/2022

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	**Acta No.**	**Ítem No.**	**Unidad**
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	03 - PILOTAJE EN MADERA			
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D17	6	CM-07	ML

Área para Dibujo o Fotografía

RIOSTRAS D17 MODULO 10



Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
			Longitud (m)	Ancho (m)	Altura (m)		
B(86-87)		9	5,30			2,00	10,60
C(86-87)		9	5,30			2,00	10,60
A(89-90)		9	5,30			2,00	10,60
B(89-90)		9	5,30			2,00	10,60
C(89-90)		9	5,30			2,00	10,60
A (92-93)		10	5,30			2,00	10,60
B (92-93)		10	5,30			2,00	10,60
C (92-93)		10	5,30			2,00	10,60
A (95-96)		10	5,30			2,00	10,60
B (95-96)		10	5,30			2,00	10,60
C (95-96)		10	5,30			2,00	10,60
A (98-99)		10	5,30			2,00	10,60
B (98-99)		10	5,30			2,00	10,60
C (98-99)		10	5,30			2,00	10,60
A(1-1')		14	5,30			2,00	10,60
A'(1-1')		14	5,30			2,00	10,60
B'(1-1')		14	5,30			2,00	10,60
C'(1-1')		14	5,30			2,00	10,60
					CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA		**190,80**

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA


CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.275-2

Fecha: 30/06/2022

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	**Acta No.**	**Ítem No.**	**Unidad**
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	03 - PILOTAJE EN MADERA			
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D17	6	CM-07	ML

Área para Dibujo o Fotografía

RIOSTRAS D17 MODULO 14

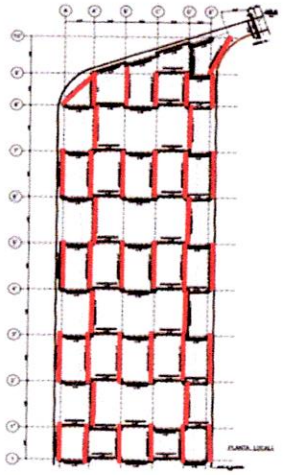

Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
			Longitud (m)	Ancho (m)	Altura (m)		
D'(1-1')		14	5,30			2,00	10,60
E'(1-1')		14	5,30			2,00	10,60
A'(1'-2')		14	5,30			2,00	10,60
D'(1'-2')		14	5,30			2,00	10,60
A(2'-3')		14	5,30			2,00	10,60
A'(2'-3')		14	5,30			2,00	10,60
B'(2'-3')		14	5,30			2,00	10,60
C'(2'-3')		14	5,30			2,00	10,60
D'(2'-3')		14	5,30			2,00	10,60
E'(2'-3')		14	5,30			2,00	10,60
A'(3'-4')		14	5,30			2,00	10,60
D'(3'-4')		14	5,30			2,00	10,60
A(4'-5')		14	5,30			2,00	10,60
A'(4'-5')		14	5,30			2,00	10,60
B'(4'-5')		14	5,30			2,00	10,60
C'(4'-5')		14	5,30			2,00	10,60
D'(4'-5')		14	5,30			2,00	10,60
E'(4'-5')		14	5,30			2,00	10,60
					CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA		**190,80**

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

MEMORIAS DE OBRA


INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Fecha: 30/06/2022

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	03 - PILOTAJE EN MADERA	**Acta No.**	**Ítem No.**	**Unidad**
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D17	6	CM-07	ML

Área para Dibujo o Fotografía

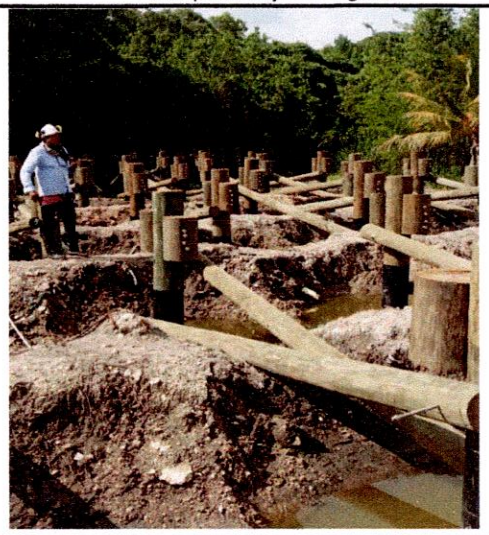

Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
			Longitud (m)	Ancho (m)	Altura (m)		
A'(5'-6')		14	5,30			2,00	10,60
D'(5'-6')		14	5,30			2,00	10,60
A(6'-7')		14	5,30			2,00	10,60
A'(6'-7')		14	5,30			2,00	10,60
B'(6'-7')		14	5,30			2,00	10,60
C'(6'-7')		14	5,30			2,00	10,60
D'(6'-7')		14	5,30			2,00	10,60
E'(6'-7')		14	5,30			2,00	10,60
A'(7'-8')		14	5,30			2,00	10,60
D'(7'-8')		14	5,30			2,00	10,60
A(8'-9')		14	5,30			2,00	10,60
A'(8'-9')		14	5,30			2,00	10,60
B'(8'-9')		14	5,30			2,00	10,60
C'(8'-9')		14	5,30			2,00	10,60
D'(8'-9')		14	5,30			2,00	10,60
E'(8'-9')		14	5,30			2,00	10,60
E'(9'-10')		14	5,30			2,00	10,60

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA	**180,20**
TOTAL EJECUTADO	**943,40**

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.503.273-2

Fecha: 30/06/2022

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	04 - PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA			
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA CCA 08X30, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL	6	CM-08	ML

Área para Dibujo o Fotografía



Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
			Longitud (m)	Long voladizos	N° de voladizos		
		8	28,8	1,2	1	2	60
		8	24	1,2	1	2	50,4
		8	56,49	1,2	2	2	117,78
		8	31,99	0	0	2	63,98
		8	28,8	1,2	1	2	60
		8	24	1,2	1	2	50,4
		8	12	0	0	2	24
		8	2,32	0	0	2	4,64
		9	48	1,2	2	2	100,8
		9	48	1,2	2	2	100,8
E'externo		14	41,58	0	0	1	41,58
E'interno		14	39,19	0	0	1	39,19

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA	**713,57**
TOTAL EJECUTADO	**713,57**

MEMORIAS DE OBRA


INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Fecha: 30/06/2022

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	**Acta No.**	**Ítem No.**	**Unidad**
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	04 - PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA			
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA CCA 08X36, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL	6	CM-09	ML

Área para Dibujo o Fotografía



Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
			Longitud (m)	Long voladizos	N° de voladizos		
		8	48	1,2	1	2	98,4
		8	48	1,2	1	2	98,4
		8	48	1,2	1	2	98,4
		8	48	1,2	1	2	98,4
		8	8,15	0	0	2	16,3
		8	5,27	0	0	2	10,54
		9	48	1,2	2	2	100,8
		14	41,47	0	0	2	82,94
		14	42,53	0	0	2	85,06

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA	**689,24**
TOTAL EJECUTADO	**689,24**

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

MEMORIAS DE OBRA

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA


CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Fecha: 30/06/2022

		Acta No.	Ítem No.	Unidad
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Inteventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN			
Capítulo:	04 - PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA			
Actividad:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTREPISO - SECCIÓN RECTA, INCLUYE VIGUETAS, FRISOS Y LISTÓN DE DECK	6	CM-011	ML

Área para Dibujo o Fotografía

DECK – MODULO 1





Detalle	Ubicación	Modulo	Dimensiones			Cantidad	Medida Total
			Longitud (m)	Ancho (m)	Area (m2)		
		1	50,4	6	302,4		302,4
		1			31,43		31,43

CANTIDAD SUBTOTAL EJECUTADA	**333,83**
TOTAL EJECUTADO	**333,83**

Quien Recibe:

Cynthia Villegas Andrade
Residente de Interventoría
M.P. # 08202-092612 ATL

Quien Entrega:

Jhorvis De Luque
Residente de Obra
M.P. # 68202-267439 STD

Barranquilla, 18 de julio de 2022
CINP–504–121–2874

Señores
CONSORCIO JCO MALLORQUIN
Atn. Adalberto Vivero Coronell
Representante Legal
Cra 59 No 64-125
Barranquilla, Atlántico

REF.: CONTRATO DE OBRA N° EDU-561-2021. INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Estimados Señores:

Acusamos recibido de su comunicado JCO-076-2022 de fecha 5 de julio de 2022 en el cual se remiten el Acta de obra No. 6 y sus soportes:

- Acta parcial de obra No. 6
- Preacta No. 6
- Memorias de obra acta No. 6
- Informe de obra junio 2022
- Programa de inversiones

En respuesta a los documentos enviados, se hace devolución debidamente firmada el acta y se notifica que la Interventoría una vez revisado los adjuntos emite la No objeción de los mismos.

Atentamente,

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

FABIAN SUAREZ HERRERA
Gerente de proyectos

Adjunto: Lo mencionado

CC. Ing Diego Rada – Supervisor Edubar

Elaboró: DRA-CVA
Aprobó: FSH

Feb 2022

SAKATECH SAS
NIT 901.216.902-
CRA 59#64-125
Tel: (035) 3682818 - Ext. 105
Barranquilla - Colombia
sakatechsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FESA-494

Señores	CONSORCIO JCO MALLORQUIN		
NIT	901.501.273-2	**Teléfono**	(605) 3682818
Dirección	CARRERA 59 No. 64 - 125	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/03/2022, 14:58
Expedición	01/03/2022, 14:59
Vencimiento	31/03/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Servicio Transporte	4.00	500,000.00	2,000,000.00
2	Servicio Transporte	2.00	500,000.00	1,000,000.00

Total items: 2

Total Bruto	3,000,000.00
Retefuente 1%	30,000.00
Total a Pagar	2,970,000.00

Valor en Letras:
Dos millones novecientos setenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-03-31 por $ 2,970,000.00

Observaciones:
4 SERVICIOS DE TRANSPORTES DE AGUA RESIDUALES PROV. DE CABINAS

2 SERVICIOS DE TRANSPORTES DE AGUA RESIDUALES PROV. DE LAVAMANOS PERIODO 01 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022, ORDEN DE COMPRA No. 10162.

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SAKATECH S.A.S. O CONSIGNAR EN CUENTA DE CORRIENTE No. 477- 000111-92 BANCOLOMBIA, ENVIAR CONSIGNACION VIA FAX AL 3682818.

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764016900176 aprobado en 20210824 prefijo FESA desde el número 311 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 3900 Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos Tarifa
CUFE: 210391ff83af0b5037e5aa2c6553b6a260ca087c4782b90fd46d50848c72c419a9b00029bba1d7f8996ced5be97b0ff5

Abril 2022

SAKATECH
ALTERNATIVAS AMBIENTALES
DIVISION DE MAQUINARIA

SAKATECH SAS
NIT 901.216.902-5
CRA 59#64-125
Tel: (035) 3682818 - Ext. 105
Barranquilla - Colombia
sakatechsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FESA-549

Señores	CONSORCIO JCO MALLORQUIN		
NIT	901.501.273-2	**Teléfono**	(605) 3682818
Dirección	CARRERA 59 No. 64 - 125	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/05/2022, 09:48
Expedición	03/05/2022, 09:48
Vencimiento	18/05/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Servicio Transporte	3.00	353,535.00	1,060,605.00
2	Servicio Transporte	2.00	353,535.00	707,070.00

Total items: 2

Total Bruto	1,767,675.00
Retefuente 1%	17,676.75
Total a Pagar	1,749,998.25

Valor en Letras:
Un millón setecientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y ocho pesos m/cte con veinticinco cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-05-18 por $ 1,749,998.25

Observaciones:
3 SERVICIOS DE TRANSPORTES DE AGUA RESIDUALES PROV. DE CABINAS PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022

2 SERVICIOS DE TRANSPORTES DE AGUA RESIDUALES PROV. DE LAVAMANOS PERIODO 01 ABRIL AL 31 DE ABRIL 2022.

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SAKATECH S.A.S. O CONSIGNAR EN CUENTA DE CORRIENTE No. 477- 000111-92 BANCOLOMBIA, ENVIAR CONSIGNACION VIA FAX AL 3682818.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764016900176 aprobado en 20210824 prefijo FESA desde el número 311 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3900 Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos Tarifa
CUFE: 2d9faa4c3a86ad43025c4c6308c4bbd3d4ce61c7c43f3c7dfa9585841cf563919e5cb2ca1ed166ff7a1e9e549369dfb7

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Marzo 2022

SAKATECH SAS
NIT 901.216.902-5
CRA 59#64-125
Tel: (035) 3682818 - Ext. 105
Barranquilla - Colombia
sakatechsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FESA-519

Señores	CONSORCIO JCO MALLORQUIN		
NIT	901.501.273-2	**Teléfono**	(605) 3682818
Dirección	CARRERA 59 No. 64 - 125	**Ciudad**	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/04/2022, 12:27
Expedición	02/04/2022, 12:27
Vencimiento	08/04/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Servicio Transporte	4.00	353,535.00	1,414,140.00
2	Servicio Transporte	2.00	353,535.00	707,070.00

Total items: 2

Total Bruto	2,121,210.00
Retefuente 1%	21,212.10
Total a Pagar	2,099,997.90

Valor en Letras:
Dos millones noventa y nueve mil novecientos noventa y siete pesos m/cte con noventa cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-04-08 por $ 2,099,997.90

Observaciones:
4 SERVICIOS DE TRANSPORTES DE AGUA RESIDUALES PROV. DE CABINAS PERIODO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

2 SERVICIOS DE TRANSPORTES DE AGUA RESIDUALES PROV. DE LAVAMANOS PERIODO 01 MARZO AL 31 DE MARZO 2022.

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE SAKATECH S.A.S. O CONSIGNAR EN CUENTA DE CORRIENTE No. 477- 000111-92 BANCOLOMBIA, ENVIAR CONSIGNACION VIA FAX AL 3682818.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764016900176 aprobado en 20210824 prefijo FESA desde el número 311 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3900 Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos Tarifa
CUFE: dbed26c82aa9d42693ff9f5a20854f11fb114ccb5221489244530c77f8bb6ea256464f28f17a27f098d3e64de32ced51

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-6

ACTA DE COBRO SOCIO AMBIENTAL #1

PROYECTO: Intervenciones necesarias para la ejecución de los proyectos ECOPARQUE UF1 distrito familiar en el marco de la recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín en la ciudad de Barranquilla.

PERIODO COBRADO JUNIO DE 2022

PRESUPUESTO TOTAL $ 662.125.000,00 **ACUMULADO** $ 76.330.064,00

VALOR ACTA $ 13.709.885,00 **EN BOLSA** $ 585.794.936,00

MEDIO	FICHA CÓDIGO	ÍTEM	PROGRAMA	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	SOPORTE DE COBRO
	FMA-1	**1**	**PROGRAMA PARA EL MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS, MATERIAL PARTICULADO Y RUIDO**					
		2	**PROGRAMA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS ORDINARIOS, PELIGROSOS Y ESPECIALES**					
		2,4	Manejo RCD según Resolución No. 472 de febrero 28 de 2018					
	FMA-2	2,4,1	Inscripción al proyecto como generador de RCD ante AutoridadCompetente	0,25% S.M.M.L.V	$ 253.745,00	0	$ 0,00	
		2,5	Brigada de Orden, Aseo y Limpieza BOAL	UND	$ 1.750.000,00	0	$ 0,00	
		2,6,2	Disposición final de Residuos de Construcción y Demolición RCD	M3	$ 6.500,00	0	$ 0,00	
		2,7	Kit de derrame 10 Gal MALE	UND	$ 260.000,00	0	$ 0,00	
		4	**PROGRAMA PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTO Y GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO**					
		4,1	Gestión solicitud permiso de Ocupación de Cauce					
		4,1,1	Evaluaciión ambiental según AUTO No. 464 de oct/27/2021	GLOBAL	$ 13.921.517,00	0	$ 0,00	
		4,1,2	Publicación AUTO 464 de oct/27/2021	GLOBAL	$ 208.000,00	0	$ 0,00	
		4,1,3	Cobro por concepto de seguimiento ambiental anual según Resolución CRA No. 641 de nov/19/2021	GLOBAL	$ 8.614.326,00	0	$ 0,00	
Abiotico		4,2	Publicación Resolución CRA No. 641 de nov/19/2021	GLOBAL	$ 208.000,00	0	$ 0,00	
		4,3	Cobro seguimiento ambiental DIMAR	MES	$ 6.821.000,00	1	$ 6.821.000,00	ANEXO 01
		4,4	Cobro por cesión de permisos ambientales	GLOBAL	$ 30.000.000,00	0	$ 0,00	
	FMA-4	4,5	Alquiler de baños portátiles (servicio de transporte agua residual)	UND		0		
		4,5,1	Mes febrero 2022	UND	$ 500.000,00	4	$ 2.000.000,00	ANEXO 02
		4,5,2	Mes marzo 2022	UND	$ 353.535,00	4	$ 1.414.140,00	ANEXO 03
		4,5,3	Mes abril 2022	UND	$ 353.535,00	3	$ 1.060.605,00	ANEXO 04
		4,6	Alquiler de lavamanos (servicio de transporte agua residual)	UND		0	$ 0,00	
		4,6,1	Mes febrero 2022	UND	$ 500.000,00	2	$ 1.000.000,00	ANEXO 02
		4,6,2	Mes marzo 2022	UND	$ 353.535,00	2	$ 707.070,00	ANEXO 03
		4,6,3	Mes abril 2022	UND	$ 353.535,00	2	$ 707.070,00	ANEXO 04
		4,7	Bolsa plástica 35x349 PQ*18 UND	UND	$ 21.200,00	0	$ 0,00	
		4,8	Bolsa plástica 35x349 PQ*25 UND	UND	$ 33.600,00	0	$ 0,00	
		4,9	Punto ecológico 55 LT (colores blanco-verde-negro)	UND	$ 400.000,00	0	$ 0,00	
	FMA-5	**5**	**PROGRAMA PARA EL CONTROL DE SEDIMENTOS Y MANEJO DE SUELO**					
	FMA-6	**6**	**PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN**					
		6,1	Señales de seguridad en el trabajo	GLOBAL	$ 1.589.916,00	0	$ 0,00	
		7	**PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LA COBERTURA VEGETAL**					
		7,1	Evaluaciión ambiental según AUTO No. 737 de dic/18/2021	GLOBAL	$ 15.671.275,00	0	$ 0,00	
		7,2	Publicación AUTO No. 737 de dic/18/2021	GLOBAL	$ 208.000,00	0	$ 0,00	
		7,3	Cobro por concepto de seguimiento ambiental anual según permiso (77 árboles)	GLOBAL	$ 15.671.275,00	0	$ 0,00	
	FMB-1	7,4	Publicación según permiso	GLOBAL	$ 208.000,00		$ 0,00	
		7,5	Compensaciones ambientales	GLOBAL	$ 305.316.763,00	0	$ 0,00	
Biotico		7,6	Especialista Forestal	CLOBAL	$ 20.000.000,00	0	$ 0,00	
		7,7	Tratamientos silviculturales	GLOBAL	$ 30.000.000,00	0	$ 0,00	
		7,8	Disposición de residuos provenientes tratamientos silviculturales	M3	$ 6.500,00	0	$ 0,00	
	FMB-2	**8**	**PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DE LA FLORA**					
		9	**PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DE LA FAUNA ACUÁTICA**	GLOBAL				
	FMB-3	9,1	Barrera absorvente Oleofílica 100% Poliro 1,2mx3pul	UND	$ 41.000,00	0	$ 0,00	
		9,2	Tela Oleofílica para derrames de sustancias químicas 76cmx46m	UND	$ 524.000,00	0	$ 0,00	
	FMB-5	**10**	**PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DE LA FAUANA TERRESTRE**	GLOBAL				
	FMS-1	**12**	**PROGRAMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN A LOS GRUPOS A LOS GRUPOS DE INTERÉS**					
	FMS-2	**13**	**PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN A LA COMUNIDAD ALEDAÑA AL PROYECTO**					
	FMS-3	**14**	**PROGRAMA PARA LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL, BIENES Y SERVICIOS**					
Socio económico	FMS-4	**15**	**PROGRAMA PARA EL APOYO A LA CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA**					
	FMS-5	**16**	**PROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVArograma de Arqueología preventiva**					
		16,1	Diseño e implementación	GLOBAL	$ 5.500.000,00	0	$ 0,00	
	FMS-6	**17**	**PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y DE SERVICIOS PÚBLICOS**					
		18	**PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST**					
		18,1	Camilla en polietileno	UND	$ 170.000,00	0	$ 0,00	
		18,2	Botiquín Morral Tipo B REF 3-011	UND	$ 130.000,00	0	$ 0,00	
			TOTAL				**$ 13.709.885,00**	

Firma
Nombre: CARLOS LEONARDO DUSSÁN GARCÍA
Cargo: Residente Ambiental
Contratita: CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

Firma
Nombre: LILIANA GALLARDO
Cargo: Residente Ambiental
Interventoría: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
