DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14770166832

(415)7707212489984(8020) 000001477016683 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 0 1 2 7 3	2	Impuestos de Barranquilla 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO JCO MALLORQUIN

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

41. Dirección principal
CR 59 64 125

42. Correo electrónico proveedores@grupojacur.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3682818	3690275

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 1 0 6 3 0	4 2 1 0	2 0 2 1 0 6 3 0					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	4	2	1	0	1	4	4	8																	

07- Retención en la fuente a título de rent
42- Obligado a llevar contabilidad
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 3	2 2																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	3	57. Modo	1		
		58. CPC	9 7		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 2 61. Fecha 2021 - 07 - 13 / 21 : 38: 52

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SAÑUDO ORTIZ ARMAND HERBERTH
985. Cargo Gestor I

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONTRATO DE OBRA N° EDU-561-2021

OBJETO: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

CONTRATISTA: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

IDENTIFICACIÓN: 901.501.273-2

Entre los suscritos, **ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL**, mayor de edad, vecina de Barranquilla, identificada con cédula de ciudadanía Nº 55.221.166, quien actúa en su calidad de Representante legal de **LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A.**, con NIT 800.091.140-4, por una parte, que en el texto de este documento se denominará **EL CONTRATANTE** y por la otra **ADALBERTO VIVERO CORONEL,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 72.291.185, en Representación Legal de CONSORCIO JCO MALLORQUIN, identificado con NIT: 901.501.273-2, estructura plural integrada por: JACUR S.A.S., identificado con NIT: 802.000.666-4, con un porcentaje de participación del 75%, y OBRACI CONSTRUCCIONES S.A.S., con NIT: 901.355.251-4, con un porcentaje de participación del 25%, quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar el contrato de Obra, que se regulará por las siguientes cláusulas, previa las siguientes consideraciones: **1.** Que entre el DISTRITO Y EDUBAR S.A., se suscribió Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de proyectos N° CD-12-2020-2435, cuyo objeto es: "GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA." **2.** Que para cumplir con las obligaciones del contrato interadministrativo de Gerencia Integral de proyectos N° CD-12-2020-2435, **EDUBAR S.A.** consideró necesario y oportuno realizar el proceso de contratación orientado a contratar las INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA. **3.** Que la Gerencia General de **EDUBAR S.A.,** procedió a adelantar el trámite contractual, acorde con lo dispuesto en el Manual de contratación para lo cual publicó en la página WEB de EDUBAR S.A. y en la plataforma SECOP I, el proceso de Selección Abierta N° SA-04-2021. **4.** Que una vez surtidas todas las etapas del proceso de contratación, el comité evaluador rindió informe recomendando aceptar la oferta para del CONSORCIO JCO MALLORQUIN, identificado con NIT: 901.501.273-2. Durante el término de traslado del informe de evaluación se presentaron observaciones que fueron debidamente atendidas por la entidad, tras lo cual se publicó el informe de evaluación final y la decisión de adjudicación, documentos que fueron publicados en la página WEB de EDUBAR S.A. y en la plataforma SECOP I. **5.** Que de acuerdo con lo anterior, se procedió a aceptar la oferta presentada por CONSORCIO JCO MALLORQUIN, identificado con NIT: 901.501.273-2, quien obtuvo la mayor calificación y cumplió con todos los requisitos jurídicos, técnicos y financieros establecidos en la Convocatoria, resultando favorable a los intereses de la Sociedad. **6.** Que una vez cumplidas cada una de las etapas del Proceso de Selección, corresponde a las partes, sujetándose a la convocatoria del mismo y la propuesta presentada por el Contratista, celebrar el Contrato que se regirá por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA. – OBJETO: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA. CLAUSULA SEGUNDA.- ALCANCE:** El objeto del presente contrato incluye las actividades y especificaciones indicadas en los términos de referencia, estudios previos, especificaciones técnicas y demás documentos inherentes al proceso elaborados por **EDUBAR S.A.** y en la propuesta presentada por el **CONTRATISTA**, los cuales forman parte integral del presente contrato. **CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** El plazo para la ejecución del contrato será hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, una vez se aprueben las garantías exigidas, y se suscriba la respectiva acta de inicio. **CLÁUSULA CUARTA. - VALOR DEL CONTRATO:** Para todos los efectos fiscales y legales el valor del presente contrato se fija en la suma de **OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y**

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($82.464.264.620.oo) incluido AIU, y todos impuestos y tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del Contrato. **CLÁUSULA QUINTA. - APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** El presente contrato se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 210000505 del 11 de mayo de 2021, por valor de **OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($82.480.158.947.oo) CLÁUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO:** EDUBAR S.A. pagará al CONTRATISTA el valor del mediante la presentación de actas parciales de obra dentro de los 60 días siguientes a la presentación de la factura, refrendadas por el Contratista y el Interventor, avalada por el Supervisor, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes. Cada pago debe estar precedido de recibido a satisfacción expedido por el interventor del contrato y avalado por el supervisor del mismo, el cual debe incluir: memorias de cálculo, registro fotográfico, bitácora, resultados de laboratorio realizados, informe de gestión ambiental (Debe incluir el certificado de disposición de residuos sólidos en el caso de haber generado R.C.D) informe de gestión social y planos. EDUBAR S.A., pagará al contratista, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de presentación de la factura en debida forma en las condiciones pactadas en el respectivo contrato. Adicionalmente, deberá acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra al día con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales del personal vinculado laboralmente con el CONTRATISTA. Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra son de responsabilidad exclusiva del Interventor y del Contratista. Como requisito para la presentación de la última Acta de obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes. En ningún caso el valor del Acta Final debe ser inferior al 10% del valor del contrato. Como requisito para la presentación de la última Acta de obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes. **PARAGRAFO:** Los pagos al contratista estarán sujetos a la transferencia de los recursos económicos que realizará el Distrito especial, industrial y portuario de Barranquilla a EDUBAR S.A. **CLÁUSULA SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**: Además de las obligaciones específicas derivadas de la propuesta y aquellas contenidas en el Estudio Previo, los términos de referencia y demás documentos inherentes al proceso SA-04-2021, el **CONTRATISTA** se obliga con **EDUBAR S.A.** a lo siguiente: **1)** Vincular para el desarrollo del presente contrato, a personas víctimas del conflicto, en una cantidad mínima del quince por ciento (15%) de la nómina requerida para el proyecto. **2)** Vincular para el desarrollo del contrato y durante todo el plazo de ejecución de la obra, a mínimo dos (02) Mujeres de las registradas en el Centro de Oportunidades del Distrito de Barranquilla u otra Dependencia del DISTRITO que se encargue de proyectos relacionados con la mujer, de la nómina requerida para el proyecto. **3)** El contratista deberá contar con los frentes de trabajo necesarios, los cuales deben cumplir con los requisitos y capacidades establecidas en los términos de referencia del respectivo proceso de selección. **4)** Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre otras, las cantidades de obras, presupuesto, programación, y aquellas actividades que le permitan establecer la logística necesaria para el inicio de las obras. **5)** Validar, revisar, complementar, adicionar, modificar, corregir y ajustar los estudios y/o diseños, para lo cual contará con un plazo hasta de un (01) mes, a partir del acta de inicio del contrato. **6)** Presentar un informe de todo lo anterior, el cual debe contener como mínimo la siguiente información: *Revisión de los estudios y/o diseños técnicos. *Levantamiento topográfico del objeto de intervención. *Vulnerabilidad ambiental. *Cantidades de obras. *Presupuesto de ejecución. *Especificaciones técnicas. *Programación de obras y *Socialización del resultado de esta primera etapa. Una vez verificado por el contratista el alcance de la intervención en obra y hecha las observaciones respectivas, previa aprobación del informe técnico, por parte de la interventoría y la supervisión, se podrá dar inicio a la ejecución de la obra hasta su terminación final. **7)** Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementará todas las medidas de control durante la etapa de ejecución contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralización o inadecuada ejecución de la obra. **8)** Constituir la garantía de cumplimiento que ampare la calidad de los materiales, la estabilidad de la obra y el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, así como la garantía de responsabilidad civil extracontractual en los términos que establece la ley. **9)** Instalar vallas informativas sobre el proyecto, de acuerdo con el manual de comunicaciones del DISTRITO y la autorización escrita por parte del supervisor del contrato. **10)** Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de señalización y movimiento de máquinas. **11)** Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecución del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, no podrá apartarse de ellos sin la autorización escrita del Supervisor del contrato y el concepto previo del Interventor, en caso contrario perderá el

derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obras adicionales y/o mayores cantidades de obras, que resulten de la modificación de las especificaciones. **12)** Acreditar el aporte al Sistema de Seguridad Social (Pensión, Salud y ARL). Si es persona Jurídica debe adjuntar Certificación firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal en la que se especifique que la empresa cumplió con el pago de los Aportes a Seguridad Social y Parafiscales. Si se trata de personas Naturales independientes sin empleados a su cargo, deberán acreditar con los documentos que correspondan que se encuentran al día en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social. **13)** Considerar los costos indirectos de los ensayos de control de calidad que le solicitará la Interventoría y/o el supervisor para garantizar los trabajos por ejecutar o ejecutados. **14)** Realizar el control de calidad a las obras y/o materiales utilizados en la obra a través de un laboratorio; si el contratista no lo lleva a cabo, la Interventoría procederá a su ejecución y los costos serán descontados del Acta de Recibo de Obras. **15)** Mantener en todo momento informada a la comunidad del alcance del proyecto y de las consecuencias que este tenga para ellos, a través de folletos y similares. El Contratista junto con la Interventoría, mantendrán cuando sea necesario o conveniente reuniones con los representantes de la Comunidad. **16)** Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, autorizaciones, costos de traslado, instalación de acometidas de servicios públicos y/o similares que sean necesarios para la ejecución y puesta en funcionamiento de la obra. El contratista se obliga a la presentación de los planes de manejo de tráfico ante la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial en los casos en los que haya cierres de vías para la ejecución de sus trabajos, con el objetivo de que dicha entidad revise, haga observaciones y apruebe dichos planes. **17)** Señalizar todos los frentes de trabajo que conforman la obra, teniendo en cuenta las instrucciones que reciba de la interventoría y modelos estipulados en el contrato. La señalización debe ser para uso diurno y nocturno. De igual manera, queda obligado a implementar los planes de manejo de tráfico mencionados (señalización de obra, entre otros) de acuerdo con lo aprobado por la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial, Esto, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 101 de la ley 769 de 2002. **18)** Dotar durante el plazo de ejecución de las obras, a los trabajadores de uniformes y elementos para su seguridad. En un lugar visible del uniforme, deberá tener la imagen institucional de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, EDUBAR S.A. y la del contratista. **19)** Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio de las obras, de los equipos y herramientas ofrecidas para la ejecución del contrato. **20)** Mantener en el lugar de los trabajos a los residentes de obra exigidos, que representen al contratista en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con amplios poderes para actuar dentro de la obra. **21)** Suministrar la mano de obra requerida incluyendo operadores de los equipos necesarios para la ejecución de los trabajos. **22)** Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la ejecución. **23)** Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. **24)** Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. **25)** Pagar los tributos que para tal efecto requiera la Ley 80/93 y la normatividad colombiana vigente. **26)** Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el Interventor o el Supervisor del contrato. **27)** Garantizar la calidad de las obras contratadas y responder por ellos de conformidad con lo estipulado en el Artículo 5o. numeral 4 de la Ley 80 de 1993. **28)** Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, a juicio del interventor o Supervisor de las Obras. **29)** Elaborar y presentar oportunamente informes mensuales de avances de obras. El informe debe incluir: las actividades realizadas con memorias de cálculo, resultado de las pruebas de laboratorio realizadas a los materiales utilizados, registro fotográfico, copia de la bitácora y esquemas de ubicación. **30)** Presentar dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes a la aprobación de los sitios a intervenir por parte de la Secretaría Distrital de Obras Públicas, a través de EDUBAR SA, el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el Plan de Manejo de Tráfico (PMT). Dichos planes deben ser aprobados por la Secretaría Distrital de Obras Públicas, a través de EDUBAR SA (PMA y PMT), Barranquilla Verde (PMA) y Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial (PMT). **30.1)** En lo atinente al PMA, el cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos será de exclusivo costo y riesgo del contratista. Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la tramitación y obtención de los Permisos y Concesiones, etc., necesarios para la ejecución de las actividades contractuales, entre otras explotación de fuentes de materiales, disposición de material sobrante de las excavaciones, explotación de zonas de préstamo y de disposición de materiales sobrantes, explotación de fuentes de agua bien sea superficial o subterránea, ocupación temporal o definitiva de cauces, vertimientos, etc, en el caso que se generen estas actividades. El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de influencia

en el cual se desarrollan. Deberá revisar y ajustar los Programas y actividades del Plan de Manejo Ambiental para el alcance del contrato, realizar y entregar durante el primer mes de inicio del contrato, un cronograma de implementación del PMA para que sea aprobado por la Interventoría y avalado por la Secretaria de Obras Públicas, a través de EDUBAR. Cualquier cambio o ajuste en el alcance del PMA deberá ser revisado y aprobado por la Interventoría y avalado por la Secretaria Distrital de Obras Públicas, a través de EDUBAR. **30.1.1)** El contratista deberá presentar de manera mensual, en caso de haber producido residuos sólidos, el Certificado de Disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), expedido por el gestor debidamente autorizado por la autoridad ambiental competente. **30.2)** En lo atinente al PMT, Se debe presentar ante la Secretaría de Obras Públicas, a través de EDUBAR para la aprobación, posteriormente se debe tramitar el permiso de cierre de vías por obras ante la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial, con todos los requisitos solicitados por esta secretaria en su manual de trámites. Vale la pena destacar que cualquier cambio en los cierres viales deberá tener su debido permiso de cierre de vías por obras. **31)** Presentar dentro de los veinte (20) días siguientes a la suscripción del Acta de Inicio, el recibido del Plan de Gestión Social. El propósito principal de este componente en la etapa de construcción es el de identificar, describir y valorar los impactos (positivos y negativos) socioeconómicos y culturales, entre otros, que puede ocasionar la construcción del proyecto objeto de los presentes pliegos, así como de establecer las medidas de manejo de acuerdo con los tipos de población ubicados en el área de influencia social. El Contratista deberá elaborar una propuesta metodológica que permita la consecución de los objetivos propuestos, para lo cual atenderá a los siguientes lineamientos: a) Los productos solicitados en esta etapa, deben desarrollarse de manera particular para el proyecto. b) Atender al criterio de menor impacto social. c) Para la elaboración de los productos debe referirse a la particularidad que guarda el proyecto de infraestructura urbana; en este sentido el diagnóstico, los indicadores, variables y planes de gestión deben ser valorados en integralidad, tomando en consideración el contexto social. d) Identificar, definir y emitir concepto sobre los posibles impactos sociales (positivos y negativos) generados antes, durante y posterior a la ejecución del proyecto. f) Sensibilizar a la población del área de influencia acerca de los beneficios del futuro proyecto. g) Desarrollar las actividades de gestión social relacionadas en los presentes pliegos, sistematizando los resultados de las mismas, y realizando la retroalimentación permanente para el logro de los objetivos propuestos. h) El componente social desarrollado debe aportar a las demás áreas del contrato (técnica, ambiental, tránsito, etc.), en la mirada integral del proyecto. i) El personal social será el encargado de liderar las relaciones con la comunidad, en este sentido, deben acompañar las actividades que adelanta el Contratista. j) Los productos entregados deben garantizar calidad, cumplimiento y oportunidad. k) Considerar y manifestar las dificultades encontradas en el componente social de estudios sociales. **32)** Implementar el Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Manejo de Tráfico y Plan de Gestión Social aprobados por la Interventoría y avalados por la Secretaría Distrital de Obras Públicas, a través de EDUBAR. **33)** Presentar la siguiente información detallada antes del inicio de los trabajos: Análisis de precios unitarios de cada ítem contenido en el presupuesto y cronograma de ejecución de los trabajos a realizar. Así mismo deberá presentar la siguiente información detallada al momento de suscribir el contrato: **33.1)** ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: El contratista deberá incluir en la organización de los trabajos, como mínimo lo siguiente: a) Organigrama General del Proyecto: 1. Frentes de Trabajo requeridos. 2. Líneas de Mando y coordinación. 3. Niveles de Decisión. 4. Número de profesionales y demás recurso humano ofrecido en la propuesta y requerido para la ejecución de los trabajos. 5. Funciones y responsabilidades del personal mínimo requerido. b) Metodología para la ejecución de actividades objeto del contrato. Se deberá presentar una descripción detallada de la metodología a seguir para la ejecución de los trabajos, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. La metodología para la ejecución de los trabajos deberá considerar los aspectos organizacionales, equipos, relación contractual, comunicaciones e interrelación con el interventor, procesos, procedimientos y controles técnicos y administrativos. Este documento debe incluir la estructura de acuerdo con el organigrama propuesto, el método con el cual se desarrollarán los trabajos, incluyendo, entre otros, las actividades preliminares y el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional. En el documento es necesario precisar: 1. Organización y Control: Describe la forma como el proponente elegido organizará todas las actividades para cumplir con el objeto del contrato. 2. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar los trabajos en el plazo contractual previsto. 3. Manejo de materiales, adquisición, fabricación, ensayos, transporte, almacenamiento, protección y distribución. 4. Mantenimiento y control de la calidad y cantidad de los equipos y herramientas. c) Cronograma de los trabajos: se debe presentar el cronograma de los trabajos teniendo en cuenta los siguientes factores: - Frentes de trabajo: se realizará el cronograma teniendo en cuenta cada frente de trabajo descrito en el organigrama general del proyecto, con su respectivo listado de actividades, - Horario

de trabajo de los turnos propuestos y requeridos. Rendimientos. - Plazo del contrato. - Holgura libre y total para cada una de las actividades. - Ruta crítica para los subprogramas y el programa general. **33.2)** PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS El contratista deberá proponer el plan de aseguramiento de calidad de los trabajos propuesto. Se deberá incluir en el plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos, como mínimo, los siguientes componentes: 1. Alcance 2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 3. Objetivos de la calidad. 4. Responsabilidades de la Dirección 5. Control de Documentos y Datos 6. Control de Registros. 7. Recursos. 8. Provisión de recursos 9. Materiales 10. Recursos Humanos 11. Infraestructura y Ambiente de Trabajo 12. Requisitos 13. Comunicación con el Cliente 14. Diseño y Desarrollo 15. Proceso de Diseño y Desarrollo 16. Control de cambios de Diseño y desarrollo 17. Compras 18. Producción y prestación del Servicio 19. Identificación y trazabilidad 20. Propiedad del cliente 21. Preservación del Producto 22. Seguimiento y Medición 23. Auditoría. **34)** Tener en obra una comisión topográfica completa permanente durante la duración del proyecto. **35)** Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de servicios públicos y con los concesionarios del Distrito encargados del Alumbrado y Señalización de Vías, para los debidos traslados, instalaciones y reinstalaciones de redes y de mobiliario urbano. **36)** Ajustar algún estudio o diseño, si durante el curso de la ejecución se requiere debe realizarlos o ajustarlos, entregándole al interventor los documentos técnicos necesarios para su correspondiente revisión y aprobación. Estos Estudios y Diseños deberán cumplir con los requerimientos de contenido y metodología de las especificaciones particulares. **37)** Elaborar y presentar, dentro del primer mes de ejecución de las obras, una vez se hayan revisado los estudios y diseños, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 1523 de 2012, el estudio del riesgo, el cual deberá atender los lineamientos del Plan de Gestión del Riesgo del Distrito. Dicho plan deberá ser presentado a la Oficina de Gestión del Riesgo para su respectiva aprobación. **38)** Antes del inicio de las obras de construcción de cualquier proyecto de infraestructura, el contratista deberá entregar al interventor y/o supervisor una copia de la evaluación de impacto ambiental y social, y del plan de gestión ambiental y social correspondiente a dicho proyecto de infraestructura. Y en caso de requerirlo el contratante, un plan de gestión de la construcción. **39)** El contratista deberá cumplir con las normas ambientales y sociales en todos los aspectos correspondientes. Este deberá cumplir con el sistema de gestión ambiental y social desarrollado de acuerdo con las normas medio ambientales y sociales, o en su defecto, la norma ISO 14001. **40)** En caso de desencadenarse un evento medio ambiental y social, EDUBAR S.A, podrá requerir al contratista para que éste proporcione un plan de acción correctivo medio ambiental y social una sola vez o periódicamente. **41)** Las demás establecidas en la Ley y propias del presente contrato y las dispuestas en el Contrato Interadministrativo N° N°CD-12-2020-2435 suscrito entre EDUBAR y el DISTRITO DE BARRANQUILLA, como obligaciones a trasladarse a los ejecutores de las obras. **PARÁGRAFO ÚNICO:** El incumplimiento de estas obligaciones por parte del **CONTRATISTA,** dará lugar a las sanciones establecidas en el presente contrato. **CLÁUSULA OCTAVA. - OBLIGACIONES DE EDUBAR S.A.**: **EDUBAR S.A.** se compromete a: **1)** Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato. **2)** Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de sus obligaciones contractuales. **3)** Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista en la ejecución del contrato. **4)** Exigir del Contratista la entrega oportuna del objeto contratado y con las calidades requeridas. **5)** Realizar la supervisión del contrato. **6)** Las demás propias para la correcta ejecución del contrato. **CLÁUSULA NOVENA.- SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA:-** Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, la supervisión, vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones del **CONTRATISTA,** será ejercida por un interventor externo, quien deberá certificar el cumplimiento de las obligaciones del **CONTRATISTA**. No obstante, **EDUBAR S.A.** vigilará permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor el cual será designado mediante oficio por la Gerencia General. Tanto el contratista como el supervisor serán informados mediante oficio de dicha designación. El supervisor designado deberá certificar el cumplimiento de las obligaciones del **CONTRATISTA,** y cumplir entre otras funciones las siguientes: a) Colaborar y coordinar en la ejecución del contrato. b) Exigir el cumplimiento del contrato de los términos pactados. c) Certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista. d) Dar aviso por escrito de cualquier inconsistencia e incumplimiento del Objeto del contrato y su ejecución. e) Informar las situaciones que requieran suspensión, prorroga o modificación, para someterlas a aprobación de la Gerencia General. f) Certificar por escrito el cumplimiento periódico de la ejecución del contrato. g) Las demás necesarias para el fiel cumplimiento del objeto contratado. **PARÁGRAFO PRIMERO:** La Gerente General podrá en cualquier momento cambiar a la persona que ejerza la supervisión sin que sea necesario modificar el contrato. **CLÁUSULA DECIMA. - GARANTÍAS**: **EL CONTRATISTA**

otorgará a favor de **EL CONTRATANTE** las siguientes garantías: **Póliza de Cumplimiento:** El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas que se le impongan, por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y una vigencia igual a la duración del mismo y seis (6) meses más. **Póliza de Salarios y prestaciones sociales:** Equivalente al 15% del valor del contrato y una vigencia igual a la duración del mismo y tres (3) años más. **Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción:** Por una cuantía equivalente al 30% del valor del contrato. Por una vigencia de cinco (5) años contado a partir de la suscripción del acta de recibo final. **Póliza de responsabilidad civil extracontractual:** El cubrimiento de la póliza debe ser equivalente al 20% del valor del contrato y debe constituirse por un tiempo igual a la duración del contrato y tres (3) meses más. **PARÁGRAFO:** En cumplimiento de lo señalado en las obligaciones del Contrato Interadministrativo de Gerencia Nº CD-12-2020-2435, las garantías aquí exigidas al contratista deberán incluir como beneficiario adicional al DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA identificado con NIT: 890.102.018-1. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA** mantendrá libre a **EDUBAR S.A.,** de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros, y que se deriven de sus actuaciones. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. – RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS LABORALES:** Para efectos de dar cumplimiento al artículo 282 de la Ley 100 de 1993, subrogado por el artículo 114 del Decreto 2150 de 1995, concordante con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, **EL CONTRATISTA** deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión; así mismo, deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones frente al Sistema General de Riesgos Laborales, en atención a lo dispuesto por la Ley 1562 de julio 11 de 2012. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - CESIÓN Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA** se obliga a no ceder ni subcontratar el presente contrato a persona natural o jurídica alguna, sin previa autorización de **EDUBAR S.A. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - MULTAS**: Si durante la ejecución del contrato **EL CONTRATISTA** incumple alguna o algunas de las obligaciones derivadas del presente contrato, **EDUBAR S.A.** le impondrá multas diarias y sucesivas equivalentes al cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato, sin exceder el diez por ciento (10%) de ese mismo valor total. El pago o la deducción de las multas, no exonerará al **CONTRATISTA** de terminar la ejecución, ni demás obligaciones derivadas del presente contrato. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007, las partes, pactan multas por el incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del **CONTRATISTA** y que se presenten dentro del curso de la ejecución del contrato. El procedimiento de imposición de la multa y la declaratoria de incumplimiento, se sujetará a lo previsto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. **PARAGRAFO: EL CONTRATISTA** autoriza a EDUBAR S.A., la deducción de los saldos a favor, ante la imposición de las multas aquí pactadas. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:** En caso de incumplimiento del contrato, **El CONTRATISTA** se hará acreedor a una sanción a título de cláusula penal pecuniaria, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del presente contrato, suma que se hará efectiva directamente por **EDUBAR S.A.**, considerándose como pago parcial de los perjuicios que pudieran ocasionársele. **El CONTRATISTA** autoriza a **EDUBAR S.A.** para descontar y tomar el valor de la cláusula penal y de las multas mencionadas en la citada cláusula, de cualquier suma que le adeude a **EDUBAR S.A.** por éste u otro contrato o concepto, sin perjuicio de efectuar el cobro conforme a la ley. El pago o la deducción de las multas, no exonerará al **CONTRATISTA** de terminar la ejecución, ni demás obligaciones nacidas del contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. MANEJO DE LA INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE: EL CONTRATISTA** tratará en forma estrictamente confidencial toda información que llegue a su conocimiento relacionada con los asuntos y negocios de **EL CONTRATANTE** y de forma expresa se compromete a guardar en el desempeño de las actividades asignadas y fuera de ellas, la discreción, reserva y sigilo que exige la confidencialidad de la información perteneciente a **EL CONTRATANTE**. Por lo dicho, se abstendrá de revelar en detrimento de los intereses de **EL CONTRATANTE**, información confidencial o secreta que llegue a su conocimiento en el desempeño de sus funciones o por fuera de ellas. Se aclara que los documentos, datos e información de todo tipo tales como secretos industriales, patentes e inventos, know-how y software desarrollado o licenciado por **EL CONTRATANTE** es material clasificado, y en consecuencia **EL CONTRATISTA** tiene la obligación de guardar la confidencialidad a la que se ha comprometido en todo momento, aún después de terminada la prestación del servicio. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL**: **EL CONTRATISTA** ejecutará el objeto de este contrato con plena autonomía técnica y administrativa, sin relación de subordinación o dependencia, por lo cual no se generará ningún tipo de vínculo laboral entre **EDUBAR S.A.** y **El CONTRATISTA**. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: ETAPA DE**

ARREGLO DIRECTO. Las controversias que surjan entre **EL CONTRATISTA** y **EDUBAR S.A.,** con ocasión a la celebración, ejecución, ampliación, o liquidación del contrato, incluyendo las consecuencias económicas de los actos contractuales expedidos en ejercicio de la ejecución contractual, serán resueltas por las partes mediante la figura del arreglo directo en un término máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha en que cualquiera de las partes le comunique a la otra la existencia de una diferencia y manifieste la intención de iniciar la etapa de arreglo directo. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA** manifiesta bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la firma de este documento, que no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en el artículo 127 de la Constitución Política ni en los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, concordantes con el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, artículos 1°, 2°, 4° y 90 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas vigentes sobre la materia o dentro de las prohibiciones especiales para contratar. **CLÁUSULA VIGÉSIMA. - LIQUIDACIÓN:** Este contrato deberá liquidarse de mutuo acuerdo entre las partes, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación. **CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. – NOTIFICACIONES:** Los avisos, solicitudes, comunicaciones que deban hacerse las partes en el desarrollo de este contrato, se podrán enviar por medio físico o por correo electrónico, a las personas y direcciones indicadas en la solicitud de la propuesta y en la propuesta del contratista. **CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. - ANEXOS DEL CONTRATO:** Constituyen parte integral del presente Contrato, los siguientes documentos: a) Oferta presentada por EL CONTRATISTA. b) Certificado de Disponibilidad Presupuestal. c) Registro Presupuestal. d) Documentos del proceso de selección SA-04-2021. e) Constancia del pago de los impuestos y contribuciones que correspondan. f) Estudios previos. g) Cuadro de asignación de riesgos. h) Las actas y demás documentos que suscriban las partes. **VIGESIMA TERCERA. - LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL:** Las actividades previstas en el presente contrato, se desarrollarán en el Distrito de Barranquilla, y para todos los efectos legales el domicilio contractual será la ciudad de Barranquilla. **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requerirá de la existencia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal y el Registro Presupuestal correspondiente, la aprobación de las garantías exigidas y la suscripción del Acta de inicio. **PARAGRAFO:** El contratista asumirá el pago de todos los impuestos a que haya lugar.

Una vez leído y aprobado en todos sus términos y condiciones por las partes, se suscribe en Barranquilla el veintiuno (21) de julio de 2021.

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
Representante Legal
EDUBAR S.A.

ADALBERTO VIVERO CORONEL
Representante Legal – Contratista

Proyectó: Albeiro García Ariza
Revisó: Mauricio Valdeblanquez Tamara

CONTRATO EDU-561-2021

CONTRATO DE OBRA	X	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		**CONTRATO DE SUMINISTRO**	
PRESTACIÓN DE SERVICIO		**OTRO**			

CONTRATO No:	*EDU-561-2021*
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN (NIT: 901.501.273-2)
SUPERVISOR:	*SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A.*
INTERVENTOR:	*CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN (NIT: 901.502.533-7)*
OBJETO:	*INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.*
VALOR INICIAL:	*OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS ($82.464.264.620,oo)*
PLAZO INICIAL:	*HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.*
FECHA DE INICIACIÓN:	*1 DE SEPTIEMBRE DE 2021*

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario siendo las 09:30 horas del día 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 se reunieron ANGELLY MELISSA CRIALES quien actúa en nombre y representación **EDUBAR S.A.,** en calidad de Representante Legal, ALVARO FERNÁNDEZ DIAZGRANADOS, subgerente de proyectos, en calidad de Supervisor del Contrato y ADALBERTO VIVERO CORONEL, quien actúa en nombre y representación legal de CONSORCIO JCO MALLORQUIN, identificado con NIT: 901.501.273-2, en calidad de contratista, con el fin de dar inicio al contrato de obra No. EDU-561-2021 cuyo objeto es la "*INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.*"de acuerdo con las siguientes consideraciones:

- Que a la fecha en que se suscribe la presente acta se han cumplido los requisitos relativos al perfeccionamiento y ejecución, es decir, la expedición del Certificado de Disponibilidad

Presupuestal No. 210000505 del 11 de mayo de 2021 y la aprobación de las garantías de cumplimiento No. BQ-100043007 y de responsabilidad civil extracontractual No. BQ-100011003, de modo que el Contrato de Obra No. EDU-561-2021 se encuentra totalmente legalizado.

- Que EDUBAR S.A. y el Distrito de Barranquilla, hacen entrega formal del predio denominado "LA INMACULADA", identificado con referencia catastral No. 00-01-0000-0446-000, en el que se ejecutará parte del objeto del contrato mediante el acta de entrega suscrita el cuatro (04) de agosto de 2021 suscrita por MARÍA MÓNICA HERNÁNDEZ UCRÓS en calidad de secretaria general del Distrito de Barranquilla, Angelly Melissa Criales Aníbal en calidad de Representante Legal de EDUBAR S.A. y ADALBERTO VIVERO CORONEL en calidad de representante legal del Consorcio JCO Mallorquín.
- Que tal como se estableció en la propuesta, el contratista de la obra dispone actualmente de un (01) gerente de proyecto, un (1) director de obra, dos (02) residentes de obra, un (1) ingeniero especialista en estructuras, un (1) ingeniero ambiental y un (1) ingeniero hidráulico; cuenta con la maquinaria y equipo, los cuales se encuentran descritos en la propuesta, que hace parte integral del contrato.
- Que se hace entrega formal al contratista de los siguientes documentos: Especificaciones Técnicas, Presupuesto, Formulario de cantidades, formatos del plan de ejecución de la guía socioambiental, estudios y diseños y planos del proyecto.

Se firma en Barranquilla, Atlántico al primer (1) día del mes de septiembre de 2021.

ANGELLY CRIALES ANÍBAL
Representante Legal
EDUBAR S.A.

ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS
Supervisor del contrato
EDUBAR S.A.

PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ VISBAL
Representante Legal
CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN
Interventor

ADALBERTO VIVERO CORONEL
Representante legal
CONSORCIO JCO MALLORQUIN
Contratista

PRORROGA N° 1 AL CONTRATO DE OBRA N° EDU-561-2021

OBJETO: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF 1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

CONTRATISTA: CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Entre los suscritos, **ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL**, mayor de edad, vecina de Barranquilla, identificada con cédula de ciudadanía N° 55.221.166, quien actúa en su calidad de Representante legal de **LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A.**, con NIT 800.091.140-4, por una parte, que en el texto de este documento se denominará **EL CONTRATANTE** y por la otra **ADALBERTO VIVERO CORONEL**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 72.291.185, en Representación del **CORSORCIO JCO MALLORQUIN,** identificado con NIT: 901.501.273-2, estructura plural integrada por: JACUR S.A.S., identificado con NIT: 802.000.666-4, con un porcentaje de participación del 75%, y OBRACI CONSTRUCCIONES S.A.S., con NIT: 901.355.251-4, con un porcentaje de participación del 25%, quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar Prorroga N° 1 al Contrato de obra **N° EDU-561-2021,** suscrito el día veintiuno (21) de julio de 2021, el cual se encuentra regido por las leyes aplicables, el manual de contratación de EDUBAR S.A., y en especial en las cláusulas que a continuación se enuncian, previa las siguientes consideraciones: **1.-** Que el día veintiuno (21) de julio de 2021, se suscribió Contrato de obra **N° EDU-561-2021,** cuyo objeto es: "INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF 1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA." **2.-** Que el plazo de ejecución del contrato se estableció hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, una vez se aprueben las garantías exigidas, y se suscriba la respectiva acta de inicio. **3.-** Que el valor del Contrato se estableció en la suma de **OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 82.464.264.620.oo)** Incluido AIU, y todos los impuestos y tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. **4.-** Que el veintisiete (27) de agosto de 2021 se aprobaron las garantías exigidas en el contrato. **5.-** Que el día primero (01) de septiembre de 2021 se suscribió Acta de inicio al Contrato de obra **N° EDU-561-2021. 6.-** Que mediante oficio OF-008 con radicado N° R-0001765-2021 de fecha veintinueve (29) de noviembre de 2021, el contratista solicita a la interventoría ampliación del plazo de ejecución al contrato de obra **N° EDU-561-2021**, por el termino de seis (6) meses. **7.-** Que mediante oficio CINP-504-030-4544 de fecha Veintinueve (29) de noviembre de 2021, la Interventoría del contrato de obra **N° EDU-561-2021**, avala la solicitud de prorrogar el plazo de ejecución del contrato por el termino de seis (6) meses, es decir, hasta el treinta (30) de junio de 2022, contados a partir de la fecha de terminación estipulada en el contrato principal. **8.-** Que el supervisor del contrato remitió a Gerencia General oficio de fecha diecisiete (17) de diciembre de 2021, solicitando Prorrogar el plazo de ejecución al contrato de obra **N° EDU-561-2021**, en los siguientes términos: *"En mi calidad de supervisor del contrato me permito solicitar una prórroga a los contratos de la referencia teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1. La madera detallada en las especificaciones técnicas es pino amarillo del sur (Southern Yellow Pine). Este material fue adquirido por el contratista con un proveedor en Estados Unidos en el estado de la Florida. 2. La situación referente a los plazos de entrega oportuna de estos insumos se ha visto afectada por la situación del comercio exterior a causa de la crisis de contenedores, un hecho real que ha sido noticia en los medios de comunicación nacional e internacional. De acuerdo con lo anterior, se han generado retrasos en la llegada oportuna del insumo principal del proyecto al sitio de la obra. 3. Que teniendo en cuenta el plan de entregas del proveedor del contratista, se requiere de un plazo adicional de seis (6) meses para poder cumplir con el alcance del contrato."* **9.-** Que en consideración a lo expuesto, la Gerencia General de EDUBAR S.A., atendiendo la solicitud del supervisor del contrato, previa verificación del expediente contractual, y teniendo en cuenta que el contrato

EDUBAR

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

PRORROGA N° 1 AL CONTRATO DE OBRA N° EDU-561-2021

OBJETO: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS EXOPARQUE UF 1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

CONTRATISTA: CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2
se encuentra vigente, procede a realizar la presente **PRORROGA N° 1** al contrato de obra **N° EDU-561-2021**, en atención a las consideraciones expuestas y en desarrollo de la autonomía de la voluntad, las partes acuerdan lo siguiente: **CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO:** El presente tiene por objeto prorrogar el plazo de ejecución del contrato de obra **N° EDU-561-2021**, suscrito entre las partes el día veintiuno (21) de julio de 2021. **CLÁUSULA SEGUNDA. - PLAZO A PRORROGAR:** El plazo a prorrogar será por el termino de seis (6) meses, es decir, hasta el treinta (30) de junio de 2022, contado a partir del día siguiente a la finalización del plazo establecido en el contrato principal. **CLÁUSULA TERCERA. - GARANTIAS:** EL CONTRATISTA se compromete a ampliar las pólizas originales otorgadas, establecida en el contrato principal en los mismos términos allí pactados y de acuerdo con la Prorroga N° 1 aquí estipulada. **CLÁUSULA CUARTA: EQUILIBRIO ECONÓMICO:** La presente modificación no afecta el equilibrio económico del contrato, tal como lo reconoce el contratista con la suscripción de este documento. **CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente documento, continúan vigentes y su exigibilidad permanece. **CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** La presente Prorroga N° 1 quedará perfeccionada con la firma de las partes.

Una vez leído y aprobado en todos sus términos y condiciones por las partes, se suscribe en Barranquilla, el día veinte (20) de diciembre de 2021.

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
Representante Legal
EDUBAR S.A.

ADALBERTO VIVERO CORONEL
Representante Legal - CONTRATISTA

Proyectó: Albeiro García
Revisó: Mauricio Valdeblanquez

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860 037 013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2021.12.31 11:26:51 -05:00

Código de Seguridad: xrdZXp19V3XrTSJatv0Iug==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N° 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 36-03-2021-1317-P-05-PPSUS6R000000827-D001

No. PÓLIZA	BQ-100011003	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	28290564	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	31/12/2021	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	01/09/2021	24:00 Horas Del	30/09/2022		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	No. DOC. IDENTIDAD	901.501.273-2
DIRECCIÓN	CARRERA 59 N 64 125	TELÉFONO	3682818
ASEGURADO	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	No. DOC. IDENTIDAD	901.501.273-2
DIRECCIÓN	CARRERA 59 N 64 125	TELÉFONO	3682818
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	99.018.722.973-7
DIRECCIÓN	...	TELÉFONO	.....

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A LA PRORROGA N°1 AL CONTRATO DE OBRA N°EDU-561.2021, SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.EDU 561 2021,CUYO OBJETO ES INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE SAS EDUBAR SA IDENTIFICADO CON NIT.800.091.140 - 4 Y EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA IDENTIFICADO CON EL NIT. 890.102.018-1 COMO

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	16,492,852,924.00	16,492,852,924.00	16.492.852.924,00	24.807.058,23
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	4,947,855,877.00	4,947,855,877.00	4.947.855.877,00	0,00
PATRONAL	4,947,855,877.00	4,947,855,877.00	4.947.855.877,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	4,947,855,877.00	4,947,855,877.00	4.947.855.877,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 16.492.852.924,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AON COLOMBIA S.A.CORREDORES DE SEGUROS.	CORREDOR	70,00
JACQUELINE MARIA TURBAY DAGER	AGENTES	30,00

PRIMA BRUTA	$	24.807.058,23
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	24.807.058,23
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	4.713.341,06
TOTAL A PAGAR	$	29.520.399,29

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN
SEGUROS DEL ESTADO S. A.	CEDIDO			33

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/12/2021

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CODIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	BQ-100011003	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	28290564	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	31/12/2021	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	01/09/2021	24:00 Horas Del	30/09/2022		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO JCO MALLORQUIN, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE SAS EDUBAR SA Y EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE SAS EDUBAR SA IDENTIFICADO CON NIT.800.091.140-4 Y DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA IDENTIFICADO CON EL NIT. 890.102.018-1 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

CONTRATISTAS/SUBCONTRATISTAS: OPERA EN EXCESO DE LAS PÓLIZAS DE RC DE LOS CONTRATISTAS SUBCONTRATISTAS Y SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE LOS MISMOS ASÍ COMO LAS EMPRESAS DE VIGILANCIA.

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL: OPERA EN EXCESO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SE EXCLUYEN LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES

VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS: SOLO TENDRÁ ALCANCE A LOS DAÑOS CAUSADOS POR UN VEHÍCULO DE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA O SUBCONTRATISTAS Y POR HECHOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS LABORES QUE SE DETERMINAN EN EL CONTRATO.

OPERARÁ EN EXCESO DE SU COBERTURA DE AUTOMÓVILES, CONTRATADA POR CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS. SE EXCLUYE DE ESTA COBERTURA, LA MAQUINARIA Y EQUIPOS JUNTO CON LAS DEMÁS EXCLUSIONES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CLAUSULADO GENERAL DE MUNDIAL DE SEGUROS S.A DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.

ESTA COBERTURA OPERA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN EXCESO DE POLIZA DE AUTOMOVIL (CONTRATADA O NO), CON LIMITES MINIMOS EN RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EVENTO $50.000.000/$50.000.000/$100.000.000.

EL AMPARO BÁSICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES (PLO)- CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE PÓLIZA Y DENTRO DE LOS LIMITES Y SUBLIMITES ESTABLECIDOS EN LA CARÁTULA DE LA MISMA, LA COMPAÑÍA CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE) Y EXTRAPATRIMONIALES (DAÑOS MORALES, FISIOLOGICOS Y VIDA EN RELACIÓN)CAUSADOS A TERCEROS POR EL TOMADOR DE LA POLIZA (CONTRATISTA) CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DESCRITO EN LA CARÁTULA, POR LOS CUALES RESULTE CIVILMENTE RESPONSABLE LA ENTIDAD CONTRATANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2347 DEL CÓDIGO CIVIL.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 8.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 6.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 6.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 6.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AF-0015 - LA COMPAÑIA COLOMBIANA DE LA INFORMACIÓN PUEDE CONSULTAR Y PAGA ARP

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860 037 013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2021.12.31 11:28:51 -05:00

Código de Seguridad: oMtR51b1S0mpT8H55d/3Jg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTA
TELÉFONO 2855600 FAX 2851226 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-95-PPSU52R000000859-D001

No. PÓLIZA	BQ-100043007	No. ANEXO 5		No. CERTIFICADO	28290563	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	31/12/2021	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	01/09/2021	24:00 Horas Del	11/08/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	No. DOC. IDENTIDAD	901.501.273-2
DIRECCIÓN	CARRERA 59 N 64 125	TELÉFONO	3682818
ASEGURADO	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE SAS EDUBAR SA	No. DOC. IDENTIDAD	800.091.140-4
DIRECCIÓN	CENTRO DE NEGOCIOS MIX VIA 40 NO. 73-290 P 9	TELÉFONO	3685148
BENEFICIARIO	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE SAS EDUBAR SA	No. DOC. IDENTIDAD	800.091.140-4
DIRECCIÓN	CENTRO DE NEGOCIOS MIX VIA 40 NO. 73-290 P 9	TELÉFONO	3685148

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A LA PRORROGA N°1 AL CONTRATO DE OBRA N°EDU-561.2021, SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.EDU-561-2021, CUYO OBJETO ES INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA
DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DDE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 31/12/2021	24:00 Horas Del 30/12/2022	16.492.852.924,00	24.807.058,23
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 31/12/2021	24:00 Horas Del 30/06/2025	12.369.639.693,00	18.401.957,13
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/06/2022	24:00 Horas Del 30/06/2027	24.739.279.386,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 53.601.772.003,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AON COLOMBIA S.A.CORREDORES DE SEGUROS.	CORREDOR	70,00
JACQUELINE MARIA TURBAY DAGER	AGENTES	30,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN
SEGUROS DEL ESTADO S. A.	CEDIDO			33

PRIMA BRUTA	$	43.209.015,36
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	43.209.015,36
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	8.209.712,92
TOTAL A PAGAR	$	51.418.728,28

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/12/2021

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082


VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BQ-100043007	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	28290563	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	31/12/2021	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	01/09/2021	24:00 Horas Del	11/08/2027		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

LA PRESENTE POLIZA TIENE COMO BENEFICIARIO ADICIONAL A : DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA IDENTIFICADO CON NIT.890.102.018-1



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

SOY BARRANQUILLA BAQ

GERENCIA DE GESTION DE INGRESOS

RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS VARIOS — Usuario APENATE

Declarante:	N 901501273	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	Fecha Emision:	17-08-2021	No. Recibo Pago
Asociada:	EDUBAR S.A	CONT OBRA No EDU-561-2021	Fecha Vence:	31-08-2021	585187

Impuesto: 95 ESTAMPILLA ITSA — Base / Cantidad **82,464,264,620**

Concepto	Descripcion Concepto	Tarifa	Banco	Numero Cuenta	Total Concepto
999	INTERESES MORATORIOS	4732000	BANCO DE OCCIDENTE	800-95494-3	$4,732,000
C95	ESTAMPILLA ITSA	0.3%	BANCO DE OCCIDENTE	800-95494-3	$247,392,794

CONTRIBUYENTE

* Interes de moratorios calculados desde fecha suscripción 21/07/2021 hasta 31/08/2021, sobre una estampilla por valor de: $247,392,794

Valor Total a Pagar: $252,124,794

(415)7707277260214(8020)000000585187(3900)00000252124794(96)20210831

CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A NIT 860.525.148-5

BANCO DE OCCIDENTE 47722 337
RECAUDO CODIGO BARRAS ******4943
14:58:21 2021/08/17 Normal 802
7707277260214 252,124,794.00 D

82540693
252,124,794.00 CH

Referencia1 :
Referencia2 :


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 72.291.185
VIVERO CORONEL
APELLIDOS
ADALBERTO DE JESUS
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 16-ABR-1984
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75
ESTATURA
B+
G.S. RH
M
SEXO
20-MAY-2002 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-2107900-00447697-M-0072291185-20130710
0033920058A 1
39762976

PRORROGA N° 2 AL CONTRATO DE OBRA N° EDU-561-2021

OBJETO: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF 1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

CONTRATISTA: CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Entre los suscritos, **ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL**, mayor de edad, vecina de Barranquilla, identificada con cédula de ciudadanía Nº 55.221.166, quien actúa en su calidad de Representante legal de **LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A.**, con NIT 800.091.140-4, por una parte, que en el texto de este documento se denominará **EL CONTRATANTE** y por la otra **ADALBERTO VIVERO CORONEL,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 72.291.185, en Representación del **CORSORCIO JCO MALLORQUIN,** identificado con NIT: 901.501.273-2, estructura plural integrada por: JACUR S.A.S., identificado con NIT: 802.000.666-4, con un porcentaje de participación del 75%, y OBRACI CONSTRUCCIONES S.A.S., con NIT: 901.355.251-4, con un porcentaje de participación del 25%, quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar Prorroga N° 2 al Contrato de obra **N° EDU-561-2021,** suscrito el día veintiuno (21) de julio de 2021, el cual se encuentra regido por las leyes aplicables, el manual de contratación de EDUBAR S.A., y en especial en las cláusulas que a continuación se enuncian, previa las siguientes consideraciones: **1.-** Que el día veintiuno (21) de julio de 2021, se suscribió Contrato de obra **N° EDU-561-2021,** cuyo objeto es: "INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF 1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA." **2.-** Que el plazo de ejecución del contrato se estableció hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, una vez se aprueben las garantías exigidas, y se suscriba la respectiva acta de inicio. **3.-** Que el valor del Contrato se estableció en la suma de **OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 82.464.264.620.oo)** Incluido AIU, y todos los impuestos y tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. **4.-** Que el veintisiete (27) de agosto de 2021 se aprobaron las garantías exigidas en el contrato. **5.-** Que el día primero (01) de septiembre de 2021 se suscribió Acta de inicio al Contrato de obra **N° EDU-561-2021**. **6.-** Que el veinte (20) de diciembre de 2021 se suscribió Prórroga Nº 1 al contrato de obra **Nº EDU-561-2021,** ampliando el plazo de ejecución del contrato hasta el treinta (30) de junio de 2022. **7.-** Que mediante oficio JCO-060-2022 de fecha once (11) de mayo de 2022, el contratista solicita a la interventoría ampliación del plazo de ejecución al contrato de obra **N° EDU-561-2021**, por el termino de diez (10) meses, debido al impacto que ha sufrido el cronograma de la obra con ocasión a la escasez de materia prima para la fabricación de materiales requeridos para el proyecto, así como, los cambios que se han realizado al diseño de la obra en ejecución. **8.-** Que mediante oficio CINP-504-103-2040 de fecha veintitrés (23) de mayo de 2022, la Interventoría del contrato de obra **N° EDU-561-2021**, avala la solicitud de prorrogar el plazo de ejecución del contrato por el termino de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de terminación estipulada en el contrato principal y la prórroga Nº 1. **9.-** Que el supervisor del contrato remitió a Gerencia General oficio de fecha veintitrés (23) de junio de 2022, solicitando Prorrogar el plazo de ejecución al contrato de obra **N° EDU-561-2021**, en los siguientes términos: *"En mi calidad de supervisor del contrato me permito solicitar una prórroga al contrato de la referencia teniendo en cuenta lo siguiente: Que el pasado once (11) de mayo de 2022, la interventoría de obra (Consorcio UF1 Mallorquín), recibió del contratista de obra (Consorcio JCO Mallorquín) el comunicado JCO-060-2022, en donde solicitan una prórroga de diez (10) meses al plazo de ejecución establecido en la cláusula tercera contractual, en el cual expresan los argumentos y motivos para realizar dicha solicitud. Que la interventoría (Consorcio UF1 Mallorquín), luego de revisar los argumentos y motivaciones expuestas por el contratista de obra, mediante el comunicado CINP-504-103-2040 de fecha veintitrés (23) de mayo de 2022, remitido a la supervisión del contrato, se permite precisar las*

PRORROGA N° 2 AL CONTRATO DE OBRA N° EDU-561-2021

OBJETO: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF 1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

CONTRATISTA: CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

*siguientes consideraciones: 1. Es cierto que, el contratista adquirió en China el suministro de los herrajes, platinas y tornillerías necesarios para la construcción de las plataformas en acero inoxidable. 2. Que la situación referente a la entrega oportuna de las mercancías objeto del comercio exterior a causa de la crisis de contenedores, es un hecho real, lo cual ha sido reportado por todos los medios de comunicación, por lo que esta situación efectivamente está afectando el proyecto ante la demora en la entrega oportuna de los insumos que se requiere para la ejecución en la ciudad de Barranquilla. 3. Que de acuerdo con los ajustes y/o modificaciones que hubo que realizarles a los diseños ante las condiciones encontradas al momento de replantear el proyecto, condiciones que fueron estudiadas por parte de la entidad contratante y por el Consultor del proyecto durante el mes de marzo/22, emitiendo el aval al ajuste, por lo que durante este tiempo que se empleó para definir este ajuste, no fue posible iniciar el proceso de corte de pilotes e instalación de tacos, riostras y vigas laminadas. 4. Que ante el pronunciamiento que hizo la Autoridad Ambiental respecto a la ubicación de la zona de parqueadero, la cual estaba dentro de una zona ambientalmente protegida, hubo la necesidad de plantear una nueva ubicación de la zona del parqueadero. Esta modificación implicó el traslado de la zona del parqueadero hacia la zona colindante con la Estación III lo que obligó al ajuste de los diseños estructurales, arquitectónicos y de redes hidrosanitarias, generando esto retrasos en la programación de obra. 5. Que a la fecha no se encuentra firmado el convenio interadministrativo entre el distrito y la Concesión Costera, trámite que aún se encuentra en la ANI, lo que no ha permitido iniciar la intervención en la vía para la construcción del carril de desaceleración, el andén y la ciclorruta. 6. Que ante lo descrito por el Contratista y ante el hecho que el contrato se encuentra próximo a vencer, se hace necesario prorrogar el plazo contractual por el tiempo solicitado (10 meses) con el fin de prevenir la paralización del proyecto y poder así cumplir con el objeto contractual, para lo cual el Contratista presente el Cronograma de Obra y el Programa de Inversiones ajustado a este nuevo plazo. 7. Que la prórroga de diez (10) meses permitirá que el Contratista pueda tener una programación acorde a las entregas insumos y rendimientos de la obra. 8. Que al ampliarse el plazo al Contrato de Obra Nº EDU-561-2021, se requiere ampliar el plazo del Contrato de Interventoría Nº EDU-566-2021, con el fin que se garantice la supervisión de las obras ejecutadas por el Contratista en estos diez (10) meses. Esta supervisión, luego de revisar los documentos presentados por la interventoría y contratista, se permite solicitar, amablemente adelantar los trámites administrativos necesarios para prorrogar el Contrato de la referencia, por **diez (10) meses**. Lo anterior teniendo en cuenta que los argumentos expuestos por el contratista y refrendados por la interventoría evidencian la necesidad de aumentar el plazo del contrato para el cumplimiento del objeto contractual.* **10.-** Que en consideración a lo expuesto, la Gerencia General de EDUBAR S.A., atendiendo la solicitud del supervisor del contrato, previa verificación del expediente contractual, y teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vigente, procede a realizar la presente **PRORROGA N° 2** al contrato de obra **N° EDU-561-2021**, en atención a las consideraciones expuestas y en desarrollo de la autonomía de la voluntad, las partes acuerdan lo siguiente: **CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO:** El presente tiene por objeto prorrogar el plazo de ejecución del contrato de obra **N° EDU-561-2021**, suscrito entre las partes el día veintiuno (21) de julio de 2021. **CLÁUSULA SEGUNDA. - PLAZO A PRORROGAR:** El plazo a prorrogar será por el término de diez (10) meses, contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo establecido en el contrato principal y la prórroga Nº 1. **CLÁUSULA TERCERA.- GARANTIAS:** EL CONTRATISTA se compromete a ampliar las pólizas originales otorgadas, establecida en el contrato principal en los mismos términos allí pactados y de acuerdo con la Prorroga N° 2 aquí estipulada. **CLÁUSULA CUARTA: EQUILIBRIO ECONÓMICO:** La presente modificación no afecta el equilibrio económico del contrato, tal como lo reconoce el contratista con la suscripción de este documento. **CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal,

PRORROGA N° 2 AL CONTRATO DE OBRA N° EDU-561-2021

OBJETO: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF 1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

CONTRATISTA: CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2
no modificadas por el presente documento, continúan vigentes y su exigibilidad permanece.
CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente Prorroga N° 2 quedará perfeccionada con la firma de las partes.

Una vez leído y aprobado en todos sus términos y condiciones por las partes, se suscribe en Barranquilla, el día veintitrés (23) de junio de 2022.

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
Representante Legal
EDUBAR S.A.

ADALBERTO VIVERO CORONEL
Representante Legal - CONTRATISTA

Proyectó: Albeiro García
Revisó: Mauricio Valdeblanquez

INFORME GESTIÓN AMBIENTAL No. 6

Periodo: junio de 2022



Contrato de Obra No. EDU 561 – 2021

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

BARRANQUILLA, JUNIO DE 2022

Tabla de Contenido

INTRODUCCIÓN 3
1. AVANCE DE OBRA 4
2. FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL 6
2.1. Ficha No. 1. Programa para el manejo de emisiones atmosféricas, material particulado y ruido. 6
2.2. FICHA No. 2. Programa para el manejo integral de residuos ordinarios, peligrosos y especiales 7
2.3. FICHA No. 3 Programa para el manejo de materiales de construcción 9
2.4. FICHA No. 4. Programa para el manejo de vertimientos y gestión del recurso hídrico 9
2.5. FICHA No. 5. Programa para el control de sedimentos y manejo del suelo 9
2.6. FICHA No. 6. Programa de señalización 10
2.7. FICHA No. 7. Programa para el manejo de la cobertura vegetal 10
2.8. FICHA No. 8. Programa para la protección de la flora 11
2.9. FICHA No. 9. Programa para la protección de la fauna acuática 11
2.10. FICHA No. 10. Programa para la protección de la fauna terrestre 11
3. INDICADORES 12
4. ESTADO DE PERMISOS 20

INTRODUCCIÓN

El presente informe describe las medidas ambientales y sociales implementadas durante la ejecución del proyecto **INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA,** en el periodo comprendido del mes de junio de 2022.

El Plan de Manejo Ambiental permite identificar los impactos y/ o afectaciones ambientales que conlleva el proyecto por la ejecución de las obras, además, permite definir las medidas ambientales a implementar para realizar los controles durante el desarrollo de las obras.

Conforme con el criterio de valoración de impactos, la fase de construcción del proyecto se clasifica como "**irrelevante**". Esto indica que la acción moderada sobre el área permite desarrollar el proyecto vial, dado que son terrenos planos, intervenidos. Si bien es cierto que en la zona existen ya puertos fluviales aguas arriba, para el área de estudio sería la primera intervención directa sobre la ribera de La Ciénaga de Mallorquín, sin embargo, se destacan algunas acciones dentro del proceso constructivo y algunos factores ambientales que presentaran una intervención severa como producto de los impactos generados por el proyecto.

Entre los factores ambientales que sufrieron impactos estaría los suelos, aire y cuerpos de agua como receptor de sedimentos (calidad) que, a su vez, producen los cambios de concentración local con la consecuente contaminación. La disminución de la cobertura vegetal por el aprovechamiento forestal o la posible fragmentación que debe hacerse; las expectativas en la comunidad sobre este tipo de proyectos, lo que genera un conflicto con aquellas personas desinformadas o que no hacen parte de alguna organización o en defecto, las que hacen parte de las mismas, por tanto, el manejo de comunidades es importante y de especial atención en cada fase del proyecto; la calidad del aire.

1. AVANCE DE OBRA



Pasarela:








2. FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL

2.1. Ficha No. 1. Programa para el manejo de emisiones atmosféricas, material particulado y ruido.

PROGRAMA DEL MEDIO ABIOTICO	FICHA No. 1
Programa para el manejo de emisiones atmosféricas, material particulado y ruido	**Cod: FMA-1**
MEDIDAS DE MANEJO IMPLEMENTADAS	

MEDIDAS DE MANEJO DE MATERIAL PARTICULADO

- En el periodo no existieron acopios de materiales granulares ni RCD, solo se acopio la madera, actividad registrada en el formato FAM-01 INSPECCIÓN DE ACOPIO DE MATERIALES. **Ver anexo 1**.
- No se generó Residuos de Construcción y Demolición RCD, actividad registrada en los formatos FAM-04 REGISTRO DIARIO POR VOLQUETA y FAM-07 BALANCE CONSOLIDADO DE RESIDUOS DÍA A DÍA. **Ver anexos 2 y 3.**
- No se requiere el control de velocidad de los vehículos ya que en los frentes de obras no vías de circulación.
- No se usaron vehículos para el transporte (materiales que emitan partículas y RCD), ingrese y salga de la obra cubierto.
- No se realizó humectación, ya que no existen vías de circulación y/o áreas desprovistas de acabados, actividad registrada en el formato FAM-06 HUMECTACIÓN. **Ver anexo 4.**
- No es necesarios instalar cerramiento perimetral de mínimo 2m con tela polimérica o poli sombra, no existen vectores que dispersan material particulado.
- A diario se Inspeccionan los accesos del proyecto para verificar que no se están esparciendo sedimentos ni polvo en las zonas externas de la construcción. Actividad registrada en el formato FAM-36 INSPECCIÓN DE VÍAS. **Ver anexo 5**.
- No se ha realizado limpieza de la vía exterior de la obra, no hay fuga de material.
- El horario de la jornada es de 8:00 a.m a 12:00 m y de 1:00 p.m a 5:00 p.m esto con el objeto de emitir emisiones en horario nocturno, no obstante, no existen comunidad aledaña a los frentes de obra.
- El personal que opera equipos y maquinaria que genera ruido, utiliza los elementos de protección personal definidos en la Matriz de EPP.
- No se han registrado quejas por ruido.

2.2. FICHA No. 2. Programa para el manejo integral de residuos ordinarios, peligrosos y especiales

PROGRAMA DEL MEDIO ABIOTICO	FICHA No. 2
Programa para el manejo integral de residuos ordinarios, peligrosos y especiales	**Cod: FMA-2**

MEDIDAS DE MANEJO IMPLEMENTADAS

Se dictaron charlas y capacitaciones al personal del proyecto, en los siguientes temas: **Ver anexo 6**

- Manejo Kit Antiderrames para el control de sustancias químicas.
- Manejo integral de residuos líquidos, RCD y peligrosos.
- Protección a ecosistemas.
- Manejo a sustancias químicas.
- Plan de manejo ambiental y social.
- Emisiones atmosféricas.
- Sanciones ambientales.

En el periodo no hubo generación de residuos provenientes de mantenimientos de maquinaria o de derrames de sustancias químicas. **Ver anexo 7** FAM-15 GENERACIÓN DE RESIDUOS PROVENIENTES DE ACEITES USADOS.

Residuos Generados:

- Aceites usados: 0 Gal.
- Filtros de aceites: 0 Kg.
- Residuos contaminados: 0 Kg.

Se instalaron tres (3) baños, dos (2) en la zona de las oficinas y uno en el frente de obra denominado tierra firma, suministrado por la empresa SAKATECH, **ver anexo 8 CERTIFICADO.**



Almacén y oficinas



Frente de obra Tierra Firme

PROGRAMA DEL MEDIO ABIOTICO	FICHA No. 2
Programa para el manejo integral de residuos ordinarios, peligrosos y especiales	**Cod: FMA-2**

MEDIDAS DE MANEJO IMPLEMENTADAS

Se instalaron los puntos ecológicos, uno en el área de las oficinas y campamentos y uno en el frente denominado Tierra Firme.



Almacén y oficinas



Frente de obra Tierra Firme

2.3. FICHA No. 3 Programa para el manejo de materiales de construcción

PROGRAMA DEL MEDIO ABIOTICO	FICHA No. 3
Programa para el manejo de materiales de construcción	**Cod: FMA-3**
MEDIDAS DE MANEJO IMPLEMENTADAS	
• Se mantienen disponibles las licencias y permisos de explotación minera de todos los proveedores que suministren materiales pétreos a la obra, según anexo 07 PROVEEDORES DE MATERIALES Y OTROS SERVICIOS del PMA. • No se ubicaron los acopios de madera sobre zonas verdes. • Las áreas de almacenamiento cuentan con un acceso seguro y señalizado. • No se preparó mezclas directamente sobre el suelo o sobre superficies acabadas. • No almacenamiento de cemento. • No hubo elaboración de concreto premezclado.	

2.4. FICHA No. 4. Programa para el manejo de vertimientos y gestión del recurso hídrico

PROGRAMA DEL MEDIO ABIOTICO	FICHA No. 4
Programa para el manejo de vertimientos y gestión del recurso hídrico	**Cod: FMA- 4**
MEDIDAS DE MANEJO IMPLEMENTADAS	
• Diariamente se realizan jornadas de orden, aseo y limpieza • En las actividades de hincado de pilotes no se usan barreras o membranas de contención de sedimentos o turbiedad con el fin de aislar la zona de hincado de los pilotes del resto del cuerpo de agua, ya que no se genera ningún tipo de sedimento • No se requiere instalar geomembranas en zonas desprotegidas que puedan tener contacto con el cuerpo de agua, pues, la actividad de hincado se realiza por medio de una balsa, esta no permite el contacto al suelo. • En el periodo no se colocó concretos. • En el periodo no hubo consumo de agua para las actividades de obra. • No se mezclaron las Aguas Lluvias, Aguas Residuales Domésticas (ARD) y Aguas Residuales no Domésticas (ARnD) • Se evitó el vertimiento de residuos y/o desperdicios sólidos u oleosos directamente en causes de agua o sumideros.	

2.5. FICHA No. 5. Programa para el control de sedimentos y manejo del suelo

PROGRAMA DEL MEDIO ABIOTICO	FICHA No. 5
Programa para el control de sedimentos y manejo del suelo	**Cod: FMA-5**
MEDIDAS DE MANEJO IMPLEMENTADAS	
En el periodo no se ha realizado descapote de la cobertura vegetal, por consiguiente, no se generaron residuos de construcción y demolición RCD. Se realizó trazado y replanteo en tierra y sobre la ciénaga, Solo se ejecutarán excavaciones que posean secciones, diseños específicos o planeación por parte de la interventoría de obra, esto con el fin de evitar corte en áreas destinadas a la conservación. No se van a utilizar durante la etapa de construcción en las actividades de hincado de pilotes barreras o membranas de contención de sedimentos o turbiedad con el fin de aislar la zona de hincado de los pilotes del resto del cuerpo de agua para evitar posible incremento de sedimentos o alteración de sus características fisicoquímicas, ya que el proceso no genera residuos sólidos ni líquidos.	

2.6. FICHA No. 6. Programa de señalización

PROGRAMA DEL MEDIO ABIOTICO	FICHA No. 6
Programa de señalización	**Cod: FMA-6**
MEDIDAS DE MANEJO A IMPLEMENTAR	
No se requiere instalar cerramiento en todas las áreas de trabajo, demarcando completamente el sitio de la obra con cinta de señalización de mínimo 12 cm de ancho con franjas amarillas y negras, ya que los dos frentes de obra están aislados por barreras vivas, unas por vegetación y la otra por el cuerpo de agua de la Ciénaga de Mallorquín. No obstante, se demarcan y señalizan las actividades de riesgo. Todos los elementos utilizados en la demarcación de la obra se encuentran limpios y bien colocados, diariamente se inspeccionan y se les realiza mantenimiento. En el transcurso del periodo no se realizaron excavaciones. A la fecha no se han establecidos senderos peatonales de mínimo de un metro de ancho, con piso antideslizante, sin obstáculos y a un mismo nivel que impidan la fácil movilidad de los transeúntes. Los materiales ubicados en los frentes de obra se acordonaron dentro de la señalización del frente de obra y no obstaculizaron el tránsito vehicular y peatonal.	

2.7. FICHA No. 7. Programa para el manejo de la cobertura vegetal

PROGRAMA DEL MEDIO BIOTICO	FICHA No. 7
Programa para el manejo de la cobertura vegetal	**Cod: FMB-1**
MEDIDAS DE MANEJO IMPLEMENTADAS	
La Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA, profirió el AUTO No. 288 de marzo 17 de 2022, por medio del cual acepta un desistimiento solicitado mediante **Radicado CRA 202214000022572 14-MAR-2022.** Mediante radicado CRA número 2022140000033622 de abril 19 de 2022, presentamos Recurso de Reposición contra el AUTO No. 288 de marzo 17 de 2022 por medio del cual se acepta un desistimiento expreso del proceso de solicitud de Aprovechamiento Forestal Único, admitido bajo el AUTO No. 737 de diciembre 18 de 2021. A la fecha la CRA no resuelto Recurso Reposición.	

2.8. FICHA No. 8. Programa para la protección de la flora

PROGRAMA DEL MEDIO BIOTICO	FICHA No. 8
Programa para la protección de la flora	**Cod: FMB-2**
MEDIDAS DE MANEJO IMPLEMENTADAS	
En el periodo se continuo con las actividades de pilotaje en el Ecosistema de Manglar, para lo cual se tomaron las siguientes medidas de protección: El proyecto fue diseñado para evitar la afectación a la cobertura de árboles de mangle, los accesos complementarios al ecoparque han sido dispuestos en zonas donde no se tiene especies vegetales. Está prohibida cualquier afectación al manglar en individuos y zonas diferentes a las señaladas por parte de las actividades de construcción. A la fecha no se ha reubicado algún individuo de manglar. Las actividades de construcción en el periodo, no afectó individuos de manglar.	

2.9. FICHA No. 9. Programa para la protección de la fauna acuática

PROGRAMA DEL MEDIO BIOTICO	FICHA No. 9
Programa para la protección de la fauna acuática	**Cod: FMBA-3**
MEDIDAS DE MANEJO IMPLEMENTADAS	
Se realizaron charlas de sensibilización a todo el personal participante del proyecto relacionado con temas inherentes al manejo y conservación del recurso hídrico e hidrobiológico. La localizaron los baños a más de 50 metros del cuerpo de agua.	

2.10. FICHA No. 10. Programa para la protección de la fauna terrestre

PROGRAMA DEL MEDIO BIOTICO	FICHA No. 10
Programa para la protección de la fauna terrestre	**Cod: FMB-4**
MEDIDAS DE MANEJO IMPLEMENTADAS	
MANEJO DE FAUNA • Se identificaron la existencia de fauna en el lote y de nidos en los árboles, que puedan ser impactados por el desarrollo de las actividades de obra. • Se mantiene la prohibición de maltrato, eliminación, tráfico o comercialización de especies animales. • A la fecha no se ha encontrado un animal muerto. • En las actividades de ahuyentamiento, no se capturó ningún animal.	

3. INDICADORES

PROGRAMA DEL MEDIO ABIOTICO					FICHA No. 1
Programa para el manejo de emisiones atmosféricas, material particulado y ruido					**Cod: FMA-1**
INDICADORES					
ACTIVIDAD (MEDIDA)	**INDICADOR CUMPLIMIENTO**	**INDICADOR DE EFECTIVIDAD**	**META DE INDICADOR CUMPLIMIENTO**	**META DE INDICADOR EFECTIVIDAD**	**ANÁLISIS DE RESULTADO**
Control de generación de Material Particulado	(N° de riegos realizados en vías / N° de riegos programados en vías) *100	N/A	≥90	N/A	No aplica este indicador, en el periodo no se intervino vía alguna.
Revisión y mantenimiento de vehículos y maquinaria del proyecto	(N° vehículos con revisión técnico-mecánica vigente / N° vehículos utilizados en el proyecto) *100	(N° vehículos con revisión técnico-mecánica aprobada / N° vehículos utilizados en el proyecto) *100	≥90 **1/1*100= 100%**	=100 **1/1*100= 100%**	Cumplido con la meta de los indicadores
	(N° de mantenimientos preventivos realizados / N° de mantenimientos preventivos programados) *100	N/A	≥90 **0/0*100= 100%**	N/A	Cumplido con la meta de indicador
Cumplimiento con los requerimientos ambientales de ruido	No. de quejas de ruido atendidas satisfactoriamente / Número de quejas recibidas x 100	N/A	≥90 **0/0*100=100%**	N/A	No se recepcionaron PQR

PROGRAMA DEL MEDIO ABIOTICO					FICHA No. 2
Programa para el manejo integral de residuos ordinarios, peligrosos y especiales					**Cod: FMA-2**
INDICADORES					
ACTIVIDAD (MEDIDA)	**INDICADOR CUMPLIMIENTO**	**INDICADOR DE EFECTIVIDAD**	**META DE INDICADOR CUMPLIMIENTO**	**META INDICADOR DE EFECTIVIDAD**	**ANÁLISIS DE RESULTADO**
Manejo de Residuos Sólidos Domésticos	(Capacitaciones ejecutadas /Capacitaciones programadas) * 100	N/A	≥90 **3/3*100=100%**	N/A	Cumplido

	(Capacitaciones en manejo de residuos de prevención Covid 19 ejecutadas /Capacitaciones en manejo de residuos de prevención Covid 19 programadas) * 100	N/A	≥90 **0/0*100=100%**	N/A	Cumplido
Manejo de Residuos Sólidos Domésticos	(Puntos ecológicos instalados / Puntos ecológicos proyectados a instalar) * 100	N/A	≥90 **2/2x100=0%**	N/A	Cumplido
	(Volumen de residuos reciclables donados o reutilizados / Volumen de residuos reciclables generados)*100	N/A	≥90 **0/0x100=100%**	N/A	No se generó residuos
	(Volumen de residuos sólidos especiales dispuestos adecuadamente / Volumen de residuos especiales generados) *100	N/A	≥90 **0/0x100=100%**	N/A	Cumplido
	(Volumen de residuos recolectados /Volumen de residuos generados)*100	N/A	=100% **0/0x100=100%**	N/A	No se generó residuos
	(Volumen de residuos entregados al gestor autorizado / Volumen de residuos generados) *100	N/A	=100% **0/0x100=100%**	N/A	No se generó residuos

	(Volumen de residuos peligrosos dispuestos / Volumen de residuos generados) * 100	N/A	≥90 **0/0x100=100%**	N/A	Cumplido

PROGRAMA DEL MEDIO ABIOTICO	**FICHA No. 3**
Programa para el manejo de materiales de construcción	**Cod: FMA-3**

INDICADORES

ACTIVIDAD (MEDIDA)	INDICADOR CUMPLIMIENTO	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	META DE INDICADOR CUMPLIMIENTO	META INDICADOR DE EFECTIVIDAD	ANÁLISIS DE RESULTADO
Manejo de materiales de construcción	(Volumen de material requerido a fuentes con licencia / Volumen de material utilizado) * 100	N/A	=100 **0/0x100=100%**	N/A	No se requirió
	(Área delimitada y señalizada para almacenamiento/ Área total a intervenir) * 100	N/A	≥90 **120/120= 120%**	N/A	Se cumple con el indicador
	(Volumen de material cubierto / Volumen total de material)	N/A	≥90 **0/0x100=100%**	N/A	No hubo material granular
Manejo de áreas de acopio	(Área adaptada para mantenimientos / Área destinada para mantenimientos) * 100	N/A	≥90 **0/0x100=100%**	N/A	No aplico en el periodo
	(Área adecuada con geomembrana / Área a intervenir) * 100	N/A	≥90 **0/0x100=100%**	N/A	No aplico en el periodo
	(Área revegetalizada / Área intervenida) * 100	N/A	≥90 **0/0x100=100%**	N/A	No aplico en el periodo

PROGRAMA DEL MEDIO ABIOTICO	FICHA No. 4
Programa para el manejo de vertimientos y gestión del recurso hídrico	**Cod: FMA- 4**

INDICADORES

ACTIVIDAD (MEDIDA)	INDICADOR CUMPLIMIENTO	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	META DE INDICADOR CUMPLIMIENTO	META INDICADOR DE EFECTIVIDAD	ANÁLISIS DE RESULTADO
Medidas para la gestión del recurso hídrico	(Número de capacitaciones sobre manejo de residuos y prevención de contaminación realizadas/ Número de capacitaciones sobre manejo de residuos y prevención de contaminación programadas) *100	N/A	≥90 **1/1x100= 100%**	N/A	
	(Volumen de residuos que son recolectados y dispuestos / Volumen de residuos que son generados) * 100	N/A	≥90 **0/0x100= 100%**	N/A	Cumplido
Medidas para la gestión del recurso hídrico	(Número de inspecciones diarias realizadas durante la etapa de construcción/ Número de inspecciones diarias programadas durante la etapa de construcción) *100	N/A	≥90 **8/8x100= 100%**	N/A	Se cumple
	(Número de mantenimientos realizados en las ocupaciones/ Número de mantenimientos programados en las ocupaciones) *100	N/A	≥90 **0/0x100= 100%**	N/A	No aplica
	(Longitud de taludes protegidos geotécnicamente) / (Longitud de taludes de más de 30% de pendiente) * 100	(Longitud de taludes protegidos geotécnicam e nte) / (Longitud de taludes recuperados y sin problemas de estabilidad) x 100	≥90 **0/0x100= 100%**	N/A	No aplica
Manejo de Residuos Líquidos Domésticos	(Volumen de aguas residuales domésticas generadas / Volumen de agua residual dispuesta) * 100	N/A	=100 **1.6/1.6x100=100%**	N/A	Se ha generado aguas residuales provenientes de baños
	(Baños portátiles con mantenimiento y registro / Baños portátiles instalados) * 100	N/A	=100 **0/0x100= 100%**	N/A	No aplica

	(Volumen de residuos líquidos generados / Volumen de residuos líquidos recolectados) * 100	N/A	=100 **1.6/1.6x100=100%**	N/A	Se ha generado aguas residuales provenientes de baños
Manejo de Residuos Líquidos Industriales	(Volumen de residuos líquidos etiquetados / Volumen de residuos líquidos generados) * 100	N/A	=100 **0/0x100= 100%**	N/A	No aplica
Acciones generales	(Número de kits instalados / Número de puntos de almacenamiento de sustancias) * 100	N/A	≥90 **0/0x100= 100%**	N/A	No aplica

PROGRAMA DEL MEDIO ABIOTICO	**FICHA No. 5**
Programa para el control de sedimentos y manejo del suelo	**Cod: FMA-5**

INDICADORES

ACTIVIDAD (MEDIDA)	INDICADOR CUMPLIMIENTO	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	META DE INDICADOR CUMPLIMIENTO	META INDICADOR DE EFECTIVIDAD	ANÁLISIS DE RESULTADO
Instalación de geomallas	(m2 de geomalla instalados / m2 de terreno a reforzar) * 100	N/A	≥90	N/A	**No aplica No se generan residuos sólidos ni líquidos**
Instalación de barreras anti-turbidez	(número de barreras instaladas / número total de berreras a instalar) * 100	N/A	≥90	N/A	**No aplica No se generan residuos sólidos ni líquidos**
Manejo y disposición de material sobrante de descapote y excavaciones	(Volumen de residuos peligrosos dispuestos / Volumen de residuos generados) * 100	N/A	≥90 **0/0x100= 100%**	N/A	Se generó producto de mantenimiento de camión y recolección de derrame de sustancia química
Manejo y disposición de material sobrante de descapote y excavaciones	(Volumen de residuos peligrosos dispuestos / Volumen de residuos generados) * 100	N/A	≥90 **0/0x100= 100%**	N/A	Se generó producto de mantenimiento de camión y recolección de derrame de sustancia química

PROGRAMA DEL MEDIO ABIOTICO	**FICHA No. 6**
Programa de señalización	**Cod: FMA-6**

INDICADORES

ACTIVIDAD (MEDIDA)	INDICADOR CUMPLIMIENTO	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	META DE INDICADOR CUMPLIMIENTO	META INDICADOR DE EFECTIVIDAD	ANÁLISIS DE RESULTADO

Instalación de señalizaciones	(número de señalización es requeridos / número de señalización instalado) * 100	N/A	100 **0/0x100= 100%**	N/A	Según necesidad
Mantenimiento de señalizaciones	(número de mantenimiento a señalización es requeridos / número de mantenimiento a señalización es programados) *100	N/A	100 **0/0x100= 100%**	N/A	Anual

PROGRAMA DEL MEDIO BIOTICO	**FICHA No. 7**
Programa para el manejo de la cobertura vegetal	**Cod: FMB-1**

INDICADORES

ACTIVIDAD (MEDIDA)	INDICADOR CUMPLIMIENTO	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	META DE INDICADOR CUMPLIMIENTO	META INDICADOR DE EFECTIVIDAD	ANÁLISIS DE RESULTADO
Capacitación del personal	(Personal capacitado/Personal contratado) x100	N/A	≥90 **32/32*100 %=100**	N/A	Se cumple con el indicador
Establecimiento y divulgación de procedimientos de manejo de flora	(Actividades de manejo de flora documentadas y divulgadas al personal / Actividades de manejo de flora	N/A	≥90 **1/1*100%=1 00%**	N/A	Se cumple con el indicador
Revegetalización	(Área de suelo revegetalizada / Área de suelo intervenida) * 100	N/A	≥90	N/A	No aplica en el periodo
Actividades preliminares de verificación	(Área intervenida / Área proyectada) * 100	N/A	≥90	N/A	**Aplica al final del proyecto**
	(Área en m2 señalizadas / Área en m2 intervenidas) *100	N/A	≥90 **120/120*10 0%=100**	N/A	Se cumple
	(No de capacitaciones realizadas/N° de capacitaciones programadas) * 100	N/A	≥90	N/A	Mensual
Manejo del descapote	(Volumen (m3) de suelo orgánico cubierto y regado / Volumen (m3) total de suelo orgánico removido)	N/A	≥90	N/A	**No aplica no hubo remoción de cobertura vegetal**
	(Volumen (m3) de suelo orgánico removido implementado en la reconformación final / Volumen (m3) total de suelo orgánico removido) * 100	N/A	≥90	N/A	**No aplica no hubo remoción de cobertura vegetal**

PROGRAMA DEL MEDIO BIOTICO					FICHA No. 8
Programa para la protección de la flora					**Cod: FMB-2**
INDICADORES					
ACTIVIDAD (MEDIDA)	**INDICADOR CUMPLIMIENTO**	**INDICADOR DE EFECTIVIDAD**	**META DE INDICADOR CUMPLIMIENTO**	**META INDICADOR DE EFECTIVIDAD**	**ANÁLISIS DE RESULTADO**
Manejo de flora	(Personal capacitado/Personal contratado) x100	N/A	≥90 **31/31x100=100%**	N/A	Cumplido
	((Área intervenida (ha)/ Área de diseño (ha)) x 100	N/A	≥90 **0/0x100=100%**	N/A	**No aplica no hubo remoción de cobertura vegetal**
Normas de protección para la Flora	Volumen de madera comprada /Volumen de madera certificada) x100	N/A	≥90 **0/0x100=100%**	N/A	**No aplica no hubo remoción de cobertura vegetal**

PROGRAMA DEL MEDIO BIOTICO					FICHA No. 9
Programa para la protección de la fauna acuática					**Cod: FMBA-3**
INDICADORES					
ACTIVIDAD (MEDIDA)	**INDICADOR CUMPLIMIENTO**	**INDICADOR DE EFECTIVIDAD**	**META DE INDICADOR CUMPLIMIENTO**	**META INDICADOR DE EFECTIVIDAD**	**ANÁLISIS DE RESULTADO**
Sensibilización ambiental	No. de charlas realizadas / No. de charlas programadas	N/A	≥90 **3/3x100=100%**	N/A	Mensual
Normas de protección de especies ícticas	N/A	(No. de personal infractor de normas / No. del personal capacitado en normas ambientales) x 100	N/A	≤10 **0/0x100=100%**	Mensual

PROGRAMA DEL MEDIO BIOTICO					FICHA No. 10
Programa para la protección de la fauna terrestre					**Cod: FMB-4**
INDICADORES					
ACTIVIDAD (MEDIDA)	**INDICADOR CUMPLIMIENTO**	**INDICADOR DE EFECTIVIDAD**	**META DE INDICADOR CUMPLIMIENTO**	**META INDICADOR DE EFECTIVIDAD**	**ANÁLISIS DE RESULTADO**
Ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna	No. de jornadas de ahuyentamiento realizadas / No. de sitios proyectados a intervenir) x 100	N/A **0/0*100%=100**	≥90 **0/0*100%=100**	N/A	Cada vez que se realice una nueva intervención **Se cumple con el indicativo**

Ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna	N/A	(Riqueza y/o Abundancia relativa registrada posterior al ahuyentamient o y rescate / Riqueza y/o Abundancia relativa registrada durante el ahuyentamient o y rescate en los sitios de intervención) x 100	N/A	Ahuyentar mínimo el 80% de la fauna presente en el área **209/209*100%=100**	Cada vez que se realice una nueva intervención **Se cumple con el indicativo**
Señalización y control en las vías	(No. de sitios señalizados sobre pasos de fauna / No. de sitios detectados como críticos por riesgo de atropellamiento) x 100	N/A	≥90	N/A	Diario **No aplica. En los frentes de obra no existen sitios de riesgo de atropellamiento**
	N/A	(No. de eventos de atropellamiento de fauna silvestre / No. de eventos de observación de fauna por conductores) x 100	N/A	≥10	Eventos **No aplica. En los frentes de obra no existen sitios de riesgo de atropellamiento**
Normas de protección de fauna silvestre	(No. de señales instaladas / No. de señales programadas de prohibición de caza) x 100	N/A	≥90	N/A	Inicio de la etapa de construcción **No aplica. Se usa vigilancia privada**
	N/A	No. de personal infractor de normas / No. del personal capacitado en normas ambientales) x 100	N/A	≥10 **0/0*100%=100**	Según necesidad **No se ha generado la necesidad**
Sensibilización ambiental	(No. de trabajadores en charlas ambientales / No. total, de trabajadores de la actividad a desarrollar) x 100	N/A	≥70 **32/32*100%=100**	N/A	Semestral
	N/A	(No. de encuestas con compresión y/o apropiación hacia la conservación de la fauna silvestre / No. de encuestas realizadas de las actividades de sensibilización) x 100	N/A	≥70	Semestral **A la fecha no aplica**

4. ESTADO DE PERMISOS

ESTADO PERMISOS PROYECTO ECOPARQUE UF1 CIÉNAGA DE MALLORQUÍN					
DESCRIPCIÓN	**ENTIDAD QUE LO EMITE**	**ESTADO DE SOLICITUD O PERMISO**			**RESPONSABLE**
		radicado / permiso	**fecha de radicado**	**estado actual**	
Concesión del área para desarrollar el proyecto	DIMAR	Res 0041-2021	FEB/26/2021	Aprobado	ALACALDÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Aprueba Programa de Antropología	ICAH	Res 452	ABR/20/2021	Aprobado	PUERTA DE ORO
Viabilidad ambiental del proyecto	CRA	Res 257	MAY/25/2021	Aprobado	PUERTA DE ORO
Plan de Manejo de Tránsito	Movilidad	EXT-QUILLA-21-166521		En trámite	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
Permiso intervención de vía	ANI			En trámite	EDUBAR
Entrega lote Parqueadero	EDUBAR			Pendiente	EDUBAR
Permiso ocupación de cuace	CRA	Res 641-2021	NOV/22/2021	Aprobado	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
Inscripción a CONSORCIO JCO MALLORQUÍN como genrador de Residuos de Construcción y Demolición RCD	QUILLA VERDE	Res 3085-2021	NOV/08/2021	Aprobado	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
Evaluación Plan de Manejo Ambiental PMA	QUILLA VERDE	RAD21717	SEP/30/2021	En trámite	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
Aprovechamiento forestal (TALA)	CRA	Auto 737-2021	DIC/18/2021	Admite solicitud, se cumple con requisitos de ley	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
Permiso de rescate de fauna	CRA	Comunicado 005417	OCT/19/2021	El proyecto no requiere permiso	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
Plan de Gestión del Riesgo	INTERVENTORÍA OFICNA DE RIESGO DEL DISTRITO	JCO-006-2021	SEP/02/2021	Acogiendo observaciones de Interventoría	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

Anexo 1

Formato FAM-01 INSPECCIÓN DE ACOPIO DE MATERIALES

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2	**INSPECCIÓN DE ACOPIOS DE MATERIALES**	CÓDIGO: FAM-01
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 06/02/12

PROYECTO: Intervenciones necesarias para la ejecución de los proyectos ECOPARQUE UF1 distrito familiar en el marco de la recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín en la ciudad de Barranquilla.

PERÍODO: JUNIO DE 2022

FECHA	UBICACIÓN	INSPECCIÓN	TIPO DE MATERIAL	VOL. APROX. M^3/UND	CONTENEDOR METÁLICO		CONFINADO		CANALES PERIMETRALES		CUBIERTO		SEÑALIZACIÓN		OBSERVACIONES
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
jun-01	Frente casa Argos - Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera Pilote 10tx40	31		X		X		X		X	X		
jun-02	Frente casa Argos - Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera Pilote 10tx35	24		X		X		X		X	X		
jun-03	Frente casa Argos - Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera Pilote 10tx45	8		X		X		X		X	X		
jun-04	Frente casa Argos - Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera Pilote 10tx55	9		X		X		X		X	X		
jun-05	Frente casa Argos - Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera Pilote 8tx40	7		X		X		X		X	X		
jun-06	Frente casa Argos - Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera Pilote 8tx45	21		X		X		X		X	X		
jun-07	Frente casa Argos - Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera Pilote 8tx35	44		X		X		X		X	X		
jun-08	Frente casa Argos - Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera Pilote 6tx10	11		X		X		X		X	X		
jun-09	Frente casa Argos - Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera tabla 4x4x10	17		X		X		X		X	X		
jun-10	Frente casa Argos - Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera tabla 2x10x12	20		X		X		X		X	X		
jun-11	Frente casa Argos - Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera tabla 2x10x14	20		X		X		X		X	X		
jun-12	Frente casa Argos - Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera tabla 3x14x16	25		X		X		X		X	X		
jun-13	Frente casa Argos - Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera tabla 2x4x16	29		X		X		X		X	X		
jun-14	Frente casa Argos - Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera tabla 3x8x12	36		X		X		X		X	X		
jun-15	Frente casa Argos - Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera tabla 2x6x8	45		X		X		X		X	X		
jun-16	Frente casa Argos - Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera tabla 2x10x20	9		X		X		X		X	X		
jun-17	Frente casa Argos - Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera tabla 2x6x16	7		X		X		X		X	X		
jun-18	Frente casa Argos - Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera tabla 2x10x10	11		X		X		X		X	X		
jun-19	Frente casa Argos - Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera tabla 3x14x12	14		X		X		X		X	X		
jun-20	Frente casa Argos - Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera tabla 3x12x12	14		X		X		X		X	X		
jun-21	Frente casa Argos - Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera tabla 2x10x16	9		X		X		X		X	X		
jun-22	Frente casa Argos - Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera tabla 2x10x16	9		X		X		X		X	X		
jun-23	Frente casa Argos - Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera tabla 2x10x16	11		X		X		X		X	X		
jun-24	Frente casa Argos - Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera tabla 2x10x16	14		X		X		X		X	X		
jun-25	Frente casa Argos - Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera tabla 2x10x16	19		X		X		X		X	X		
jun-26	Frente casa Argos - Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera tabla 2x4x10	23		X		X		X		X	X		
jun-27	Frente casa Argos - Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera tabla 3x10x10	42		X		X		X		X	X		
jun-28	Frente casa Argos - Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera tabla 2x10x20	35		X		X		X		X	X		
jun-29	Frente casa Argos - Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera tabla 2x4x10	24		X		X		X		X	X		
jun-30	Frente casa Argos - Tierra firme	Residente ambiental y SST	Madera tabla 3x10x10	12		X		X		X		X	X		

NOMBRE:	Carlos Dussán García
CARGO:	Residente Ambiental
ELABORÓ	

NOMBRE:	Carlos Dussán García
CARGO:	Residente Ambiental
REVISÓ	

NOMBRE:	Carlos Dussán García
CARGO:	Residente Ambiental
APROBÓ	

Anexo 2

Formato FAM-04 REGISTRO DIARIO POR VOLQUETA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2	**REGISTRO DIARIO POR VOLQUETA**	CÓDIGO: FAM-04 VERSIÓN: 1 FECHA: 06/02/12

PROYECTO: Intervenciones necesarias para la ejecución de los proyectos ECOPARQUE UF1 distrito familiar en el marco de la recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín en la ciudad de Barranquilla. PERÍODO: JUNIO DE 2022

DATOS GENERALES

PLACA VOLQUETA: _____ PROPIETARIO: _____

NOMBRE CONDUCTOR: _____ TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO: DIESEL - ACPM: ☐ GASOLINA: ☐

VENCIMIENTO DE REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE GASES: _____ VENCIMIENTO SOAT: _____ ALTURA TUBO DE ESCAPE: _____

FECHA	No. RECIBO	ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA	VOLÚMEN (M^3)	TIPO DE MATERIAL	PUNTO DE CARGA	HORA SALIDA DE OBRA	HORA LLEGADA A ESCOMBRERA	CARPADO (30 CMS DEBAJO DEL NIVEL DEL PLATÓN)	ALTURA DE LLENADO A RAS	HORA DE RETORNO A OBRA	FIRMA RECIBIDOR DE OBRA	OBSERVACIONES
												NO HUBO ACTIVIDAD

NOMBRE:	Carlos Dussán García
CARGO:	Residente Ambiental
ELABORÓ	

NOMBRE:	Carlos Dussán García
CARGO:	Residente Ambiental
REVISÓ	

NOMBRE:	Carlos Dussán García
CARGO:	Residente Ambiental
APROBÓ	

Anexo 3

Formato FAM-07 BALANCE CONSOLIDADO DE RESIDUOS DÍA A DÍA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2	**BALANCE CONSOLIDADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DÍA A DÍA**	CÓDIGO: FAM-07
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 06/02/12

PROYECTO: Intervenciones necesarias para la ejecución de los proyectos ECOPARQUE UF1 distrito familiar en el marco de la recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín en la ciudad de Barranquilla.

PERÍODO: MAYO DE 2022

SEMANA	TIPO DE MATERIAL	PUNTO DE GENERACIÓN	VOLÚMEN GENERADO	FACTOR DE EXPANSIÓN	VOLÚMEN TOTAL (M^3)	VOLÚMEN RECICLADO	VOLÚMEN REUTILIZADO	VOLÚMEN DISPOSICIÓN FINAL
Del 1 al 6 de febrero de 2022			0	1,25	0	0	0	0
Del 7 al 13 de febrero de 2022			0	1,25	0	0	0	0
Del 14 al 20 de febrero de 2022			0	1,25	0	0	0	0
Del 21 al 28 de febrero de 2022			0	1,25	0	0	0	0
Del 1 al 6 de marzo de 2022			0	1,25	0	0	0	0
Del 7 al 13 de marzo de 2022			0	1,25	0	0	0	0
Del 14 al 20 de marzo de 2022			0	1,25	0	0	0	0
Del 21 al 28 de marzo de 2022			0	1,25	0	0	0	0
Del 29 al 31 de marzo de 2022			0	1,25	0	0	0	0
Del 1 al 3 de abril de 2022			0	1,25	0	0	0	0
Del 4 al 10 de abril de 2022			0	1,25	0	0	0	0
Del 11 al 17 de abril de 2022			0	1,25	0	0	0	0
Del 18 al 24 de abril de 2022			0	1,25	0	0	0	0
Del 25 al 30 de abril de 2022			0	1,25	0	0	0	0
Del 1 al 8 de mayo de 2022			0	1,25	0	0	0	0
Del 9 al 15 de mayo de 2022			0	1,25	0	0	0	0
Del 16 al 22 de mayo de 2022			0	1,25	0	0	0	0
Del 23 al 29 de mayo de 2022			0	1,25	0	0	0	0
Del 30 al 31 de mayo de 2022			0	1,25	0	0	0	0
		TOTAL	0		0			0

NOMBRE:	Carlos Dussán García	NOMBRE:	Carlos Dussán García	NOMBRE:	Carlos Dussán García
CARGO:	Residente Ambiental	CARGO:	Residente Ambiental	CARGO:	Residente Ambiental
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2	**BALANCE CONSOLIDADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DÍA A DÍA**	CÓDIGO: FAM-07 VERSIÓN: 1 FECHA: 06/02/12

PROYECTO: Intervenciones necesarias para la ejecución de los proyectos ECOPARQUE UF1 distrito familiar en el marco de la recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín en la ciudad de Barranquilla.

PERÍODO: JUNIO DE 2022

SEMANA	TIPO DE MATERIAL	PUNTO DE GENERACIÓN	VOLÚMEN GENERADO	FACTOR DE EXPANSIÓN	VOLÚMEN TOTAL (M^3)	VOLÚMEN RECICLADO	VOLÚMEN REUTILIZADO	VOLÚMEN DISPOSICIÓN FINAL
Del 1 al 5 de junio de 2022			0	1,25	0	0	0	0
Del 6 al 12 de junio de 2022			0	1,25	0	0	0	0
Del 13 al 19 de junio de 2022			0	1,25	0	0	0	0
Del 20 al 26 de junio de 2022			0	1,25	0	0	0	0
Del 27 al 30 de junio de 2022			0	1,25	0	0	0	0
TOTAL			0		0			0

NOMBRE:	Carlos Dussán García
CARGO:	Residente Ambiental
ELABORÓ	

NOMBRE:	Carlos Dussán García
CARGO:	Residente Ambiental
REVISÓ	

NOMBRE:	Carlos Dussán García
CARGO:	Residente Ambiental
APROBÓ	

Anexo 4

Formato FAM-06 HUMECTACIÓN

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2	**HUMECTACIÓN**	CÓDIGO: FAM-06
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 06/02/12

PROYECTO: Intervenciones necesarias para la ejecución de los proyectos ECOPARQUE UF1 distrito familiar en el marco de la recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín en la ciudad de Barranquilla.

PERÍODO: JUNIO DE 2022

FECHA	TIPO DE MATERIAL	UBICACIÓN DE HUMECTACIÓN	ESTADO DEL TIEMPO	VOLÚMEN AGUA (LITROS)	TRAMO	ÁREA A HUMECTAR (M^2)	OBSERVACIONES
jun-01	No hubo	No aplica	LLUVIA	0	Campamento - Casa Argos	0	No existen vías de acceso, salida, circulación y áreas desprovistas de acabados
jun-02	No hubo	No aplica	LLUVIA	0	Campamento - Casa Argos	0	
jun-03	No hubo	No aplica	LLUVIA	0	Campamento - Casa Argos	0	
jun-04	No hubo	No aplica	LLUVIA	0	Campamento - Casa Argos	0	
jun-05	No hubo	No aplica	LLUVIA	0	Campamento - Casa Argos	0	
jun-06	No hubo	No aplica	LLUVIA	0	Campamento - Casa Argos	0	
jun-07	No hubo	No aplica	LLUVIA	0	Campamento - Casa Argos	0	
jun-08	No hubo	No aplica	LLUVIA	0	Campamento - Casa Argos	0	
jun-09	No hubo	No aplica	LLUVIA	0	Campamento - Casa Argos	0	
jun-10	No hubo	No aplica	LLUVIA	0	Campamento - Casa Argos	0	
jun-11	No hubo	No aplica	LLUVIA	0	Campamento - Casa Argos	0	
jun-12	No hubo	No aplica	LLUVIA	0	Campamento - Casa Argos	0	
jun-13	No hubo	No aplica	LLUVIA	0	Campamento - Casa Argos	0	
jun-14	No hubo	No aplica	LLUVIA	0	Campamento - Casa Argos	0	
jun-15	No hubo	No aplica	LLUVIA	0	Campamento - Casa Argos	0	
jun-16	No hubo	No aplica	LLUVIA	0	Campamento - Casa Argos	0	
jun-17	No hubo	No aplica	LLUVIA	0	Campamento - Casa Argos	0	
jun-18	No hubo	No aplica	LLUVIA	0	Campamento - Casa Argos	0	
jun-19	No hubo	No aplica	LLUVIA	0	Campamento - Casa Argos	0	
jun-20	No hubo	No aplica	LLUVIA	0	Campamento - Casa Argos	0	
jun-21	No hubo	No aplica	LLUVIA	0	Campamento - Casa Argos	0	
jun-22	No hubo	No aplica	LLUVIA	0	Campamento - Casa Argos	0	
jun-23	No hubo	No aplica	LLUVIA	0	Campamento - Casa Argos	0	
jun-24	No hubo	No aplica	LLUVIA	0	Campamento - Casa Argos	0	
jun-25	No hubo	No aplica	LLUVIA	0	Campamento - Casa Argos	0	
jun-26	No hubo	No aplica	LLUVIA	0	Campamento - Casa Argos	0	
jun-27	No hubo	No aplica	LLUVIA	0	Campamento - Casa Argos	0	
jun-28	No hubo	No aplica	LLUVIA	0	Campamento - Casa Argos	0	
jun-29	No hubo	No aplica	LLUVIA	0	Campamento - Casa Argos	0	
jun-30	No hubo	No aplica	LLUVIA	0	Campamento - Casa Argos	0	

NOMBRE:	Carlos Dussán García
CARGO:	Residente Ambiental
ELABORÓ	

NOMBRE:	Carlos Dussán García
CARGO:	Residente Ambiental
REVISÓ	

NOMBRE:	Carlos Dussán García
CARGO:	Residente Ambiental
APROBÓ	

Anexo 5

Formato FAM-36 INSPECCIÓN DE VÍAS

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2	INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE VÍAS DE ACCESO Y SALIDAD DE OBRA	CÓDIGO: FAM-36
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 17/03/15

PROYECTO: Intervenciones necesarias para la ejecución de los proyectos ECOPARQUE UF1 distrito familiar en el marco de la recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín en la ciudad de Barranquilla.

PERÍODO: JUNIO DE 2022

ÉPOCA DE LLUVIA [ ] ÉPOCA DE NO LLUVIA [x] FECHA:

FECHA	FRENTE DE OBRA	UBICACIÓN SALIDA	PRESENCIA DE RESIDUOS POR LA OBRA		TIPO DE RESIDUO RECOLECTADO	VOLUMEN	TRAMO		DISTANCIA DE LIMPIEZA MTS	OBSERVACIONES
			SI	NO			desde	hasta		
jun-01	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
jun-02	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
jun-03	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
jun-04	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
jun-05	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
jun-06	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
jun-07	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
jun-08	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
jun-09	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
jun-10	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
jun-11	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
jun-12	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
jun-13	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
jun-14	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
jun-15	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
jun-16	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
jun-17	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
jun-18	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
jun-19	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
jun-20	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
jun-21	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
jun-22	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
jun-23	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
jun-24	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
jun-25	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
jun-26	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
jun-27	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
jun-28	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
jun-29	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	
jun-30	Campamento - Casa Argos	Principal		X		0			0	

NOMBRE:	Carlos Dussán García
CARGO:	Residente Ambiental
ELABORÓ	

NOMBRE:	Carlos Dussán García
CARGO:	Residente Ambiental
REVISÓ	

NOMBRE:	Carlos Dussán García
CARGO:	Residente Ambiental
APROBÓ	

Anexo 6

REGISTRO DE CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2	REGISTRO DE CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO	CÓDIGO: FRP - 02
		VERSIÓN: 3
		FECHA: 18/07/18

TEMA: MANEJO RCD - KIT ANTIDERRAME - PROTECCIÓN ECOSISTEMA.

DOCENTE: ING. CARLOS DOSSAN FECHA: JUNIO / 10 / 2022

LUGAR: FRENTE OBRA / CAMPAMENTO. PÁGINA 1 DE 1

Nº	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FUE EFICAZ? SI	FUE EFICAZ? NO
1	Melissa Ramírez Ahumada	Ing. Administrativa	Melissa Ramírez Ahum	X	
2	YASSIRENRIQUES	AUXILIAR		X	
3	MARLON	AYUDANTE		X	
4	Carlos Dossan	PROFOS. SOMA.		X	
5	Isabella Monterroza Vasquez	Psi. Social		X	
6	DEIVIS ZUÑIGA	CONDUCTOR		X	
7	ROBERTO CUMPIAN	CAT		X	
8	ENRIQUE ECHEVERRIA	ADT		X	
9	Cristian David Osma	Ayudante		X	
10	DAIRO ALVAREZ	OF		X	
11	Damian G Blanco	Ofigl carpintero		X	
12	Manuel Antonio Bueno	Topografo		X	
13	JESUS MENDOZA	AYUDANTE		X	
14	Carlos Pertuz	OPERADOR.		X	
15	LUIS FELIPE JIMENEZ	AUXILIAR		X	
16	HERNAN ECHEVERRIA	AYUDANTE		X	
17	RONALD MEJIA	OFICIAL		X	
18	JOSE ALONSO SUAREZ	OPERARIO		X	
19	[illegible]	BRIGADISTA		X	
20	JESUS [illegible]	AYUDANTE		X	
21	FERMIN PEREZ	AYUDANTE		X	
22	[illegible]	AYUDANTE		X	
23		CONTRATISTA		X	
24	JAVIER DIAZ	AYUDANTE DE OBRA		X	
25	HENRY CABRERA.	AYUD. ALBAÑIL		X	
26	PEDRO	MAESTRO		X	

OBSERVACIONES: SE REALIZO SIMULACRO DE DERRAME DE SUSTANCIA QUÍMICA EN TIERRA Y AGUA, CON EL OBJETO DE PROTEGER EL ECOSISTEMA.

FIRMA DOCENTE

Scanned with CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.279-2	REGISTRO DE CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO	CÓDIGO: FRP - 02
		VERSIÓN: 3
		FECHA: 18/07/18

TEMA: PROTECCIÓN ECOSISTEMA - MANEJO SUSTANCIA QUÍMICA

DOCENTE: ING CARLOS DUSSAN. FECHA: JUNIO / 18 / 2022.

LUGAR: FRENTE DE OBRA PÁGINA 1 DE 1.

Nº	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FUE EFICAZ? SI	FUE EFICAZ? NO
1	Melissa Ramírez Ahumada	Ing. Administrativo.	Melissa Ramírez A.	X	
2	XASSIR ENRIQUE	AUXILIAR		X	
3	Ernesto Echeverría M	Aydante	Ernesto Ech	X	
4	MARLON	Ayudante		X	
5	Cristian David Osma	Ayudante		X	
6	DAIRO ALVAREZ	OFM		X	
7	Manuel Antonio Bruno	Topografo		X	
8	Carlos Dussan.	Profesional	Manuel Bruno	X	
9	Isabella Monterroza V.	Psicologa Social	Isabella M	X	
10	Delvis Zuñiga	Conductor		X	
11	Bagdasto Cusmon	SST		X	
12	Dominy E Blanco	oficial carpintero	Dominy E Blanco	X	
13	Jesus M. Ofeda Atencio	Ayudante	Jesus M. Ofeda	X	
14	Cesar Perez	Operador	Cesar Perez	X	
15	Jose Atencio	operador		X	
16	Yimmis Perez	ayudante		X	
17	Ramon Mora	OFICIAL	Ramon	X	
18	JESUS JULIO JINETE	AUXILIAR		X	
19	Yesmen Echeverria	Ayudante	Yesmen	X	
20	Jesus Pirela	ayudante	Jesus Pirela	X	
21	Hader Rondon	ayudante	Hader	X	
22	Jaime Ulloa C	Director de Obra		X	
23	HENRY CABRERA	AYUDANTE		X	
24	EDDO	MAESTRO		X	
25	LUIS ANGEL	BRIGADISTA		X	
26		Celador		Y	

OBSERVACIONES: INDUCCION DE MANEJO SUSTANCIAS SEGÚN HOJA DE SEGURIDAD

FIRMA DOCENTE

Scanned with CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.503.278-2	REGISTRO DE CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO	CÓDIGO: FRP - 02
		VERSIÓN: 3
		FECHA: 18/07/18

TEMA: PMA - PGS - EMISIONES ATMOSFÉRICA - SANCIONES AMBIENTALES

DOCENTE: ING. CARLOS DUSSÁN. FECHA: JUNIO 22/2022.

LUGAR: FRENTE DE OBRA. PÁGINA 1 DE 1.

Nº	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FUE EFICAZ? SI	NO
1	Melissa Ramirez Ahumada	Ing. Administrativo	Melissa Ramirez Ahumada	X	
2	Isabella Monterroza Vasquez	Psi. Social	Isabella	X	
3	Carlos Dussán.	PROFES. SSMA.		X	
4	Delky Zuñiga	Conductor		X	
5	Deisy Beatriz Carmona	SAT		X	
6	YASSIR ENRIQUE	AUXILIAR		X	
7	Eduardo Echeverria M	Ayudante	Eduardo	X	
8	MARLON	Ayudante		X	
9	Cristian David Osma	Ayudante		X	
10	ORLANDO ALVAREZ	OFM		X	
11	Dorian E Blanco	Oficial carpintero	Dorian	X	
12	Manuel Antonio Bruno	topografo	Manuel Bruno	X	
13	Jesus Julio Jinete	Auxiliar		X	
14	Hernan Echeverria	Ayudante	Hernan	X	
15	Ronal muñoz	OFISIAL	Ronal	X	
16	Carlos perturo.	Operador.	Carlos perturo	X	
17	Jesus Diz ofeda	ayudante	Jesus Diz	X	
18	Jose Alonso Jaramillo	ayudante		X	
19	Jimmy Perez	Ayudante	Jimmy Perez	X	
20		Contratista		X	
21	Limpieza #1	Brigadista	Limpieza	X	
22	Jose Freyle	ayudante	Jose	X	
23	Yoder toledo	Ayudante	Yoder	X	
24	Jaime Vda C	Dpto de Obra		X	
25	HENRY CAbrera	AYUDANTE		X	
26	PEDRO	MAESTRO		X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DOCENTE

Scanned with CamScanner

Anexo 7

Formato FAM-15 GENERACIÓN DE RESIDUOS PROVENIENTES DE ACEITES USADOS

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2	**GENERACIÓN DE RESIDUOS PROVENIENTES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, VEHÍCULOS Y/O MAQUINARIA**	CODIGO: FAM-15 VERSION: 1 FECHA: 06/02/12

PROYECTO: Intervenciones necesarias para la ejecución de los proyectos ECOPARQUE UF1 distrito familiar en el marco de la recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín en la ciudad de Barranquilla.

PERÍODO: JUNIO DE 2022

TIPO DE RESIDUOS	CANTIDAD (Kg - Gal)	COLOR DE CANECA DISPUESTO	EMPRESA O ENTIDAD RECOLECTORA	OBSERVACIONES
	0			

NOMBRE:	Carlos Dussán García	
CARGO:	Residente Ambiental	
ELABORÓ		

NOMBRE:	Carlos Dussán García	
CARGO:	Residente Ambiental	
REVISÓ		

NOMBRE:	Carlos Dussán García	
CARGO:	Residente Ambiental	
APROBÓ		

Anexo 8

CERTIFICADO SAKATECH

SAKATECH

Barranquilla, 28 JUNIO DE 2022

CERTIFICACIÓN

SAKATECH S.A.S. identificado con NIT 901.216.902-5, certifica que realiza TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL de aguas residuales provenientes de mantenimiento de baños portátiles a la empresa **CONSORCIO JCO MARLLORQUÍN** identificado con NIT 901.501.273-2 ubicado en la Ciénaga de Mallorquín.

SAKATECH S.A.S. cuenta con autorización otorgada por CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO (C.R.A.) bajo las RESOLUCIONES NO. 4189 del 19 de junio 2020. Se certifica que se recogió **uno coma seis 1.6 Metros cúbicos (m3) correspondiente a tres (3) baños portátiles del periodo de 1 JUNIO – 28 JUNIO 2022.** La disposición final se realiza en la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de la empresa AGUACARIBE COLOMBIA S.A.S. E.S.P. identificado con NIT 901.231.847-0 ubicada en GALAPA.

Contamos con personal capacitado y equipos necesarios para el desarrollo de nuestras actividades.

Cordialmente,

SAKATECH
NIT. 901.216.902-5

Ing. Santiago Pérez Moscote
Gerente

INFORME DE GESTIÓN SOCIAL No 06

JUNIO DEL 2022

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

CONTRATO No. EDU- 561/2021

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

TABLA DE CONTENIDO 2

1. INTRODUCCION 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4

2.1. LOCALIZACIÓN 4

3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION SOCIAL –ACTIVIDADES SOCIALES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA 5

3.1. PROGRAMA 1. PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL 5

3.1.1. PROYECTO 1. DE ATENCION A LA COMUNIDAD 5

PROYECTO 2. INFORMACION Y DIVULGACION 5

Actividades desarrolladas: 5

1.-Realización de Reuniones programadas (Inicio, Finalización y/o extraordinaria) 5

2.2.-Socializaciones a la comunidad 6

PROYECTO 4. RECUPERACION DEL DERECHO DE VIA. 6

Actividades desarrolladas: 6

PROYECTO 5. CULTURA AMBIENTAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA 6

PROYECTO 6. CONTRATACION DE MANO DE OBRA. 8

PROYECTO 7. PROYECTOS PRODUCTIVOS 11

4. TABLA DE INDICADORES 11
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 13

1. INTRODUCCION

El presente informe describe las actividades del Plan de Gestión Social a implementar con el fin de prevenir, mitigar y compensar los impactos para las comunidades del área de influencia directa del proyecto, generados durante la ejecución de las obras del **CONTRATO No. EDU-561/2021INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.**

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

La ciénaga de Mallorquín está ubicada en su totalidad en el extremo norte del distrito de Barranquilla, sobre el margen izquierda de la desembocadura del rio Magdalena (Bocas de Ceniza) en el Mar Caribe, en la Costa Caribe Colombiana. A continuación, una ilustración que muestra la localización del área levantada.



3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION SOCIAL –ACTIVIDADES SOCIALES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA.

3.1. PROGRAMA 1. PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL

3.1.1. PROYECTO 1. DE ATENCION A LA COMUNIDAD.

Actividades desarrolladas:

- Seguimiento y cierre de queja: En este periodo no se realizaron reportes de quejas.

Registro de cumplimiento: VER ANEXOS

- Formato de recepción de quejas y reclamos (código FAM 25)

PROYECTO 2. INFORMACION Y DIVULGACION

Actividades desarrolladas: **VER ANEXOS**

1.-Realización de Reuniones programadas (Inicio, Finalización y/o extraordinaria)

- En este periodo no se realizaron reuniones con la comunidad

2.- Elaboración y distribución de las piezas de comunicación

- En este periodo no elaboraron piezas de comunicación.

2.1.-Comunicaciones escritas:

- En este periodo no se enviaron comunicados escritos.

2.2.-Socializaciones a la comunidad:

 En este periodo no se realizaron socializaciones.

PROYECTO 3. MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PUBLICOS.

1.- Levantamiento de Actas de Vecindad

En este periodo no se realizaron actas de vecindad.

2.- Levantamiento de Acta de compromiso

En este periodo no se realizaron actas de compromiso.
Registro de cumplimiento: (No Aplica)

PROYECTO 4. RECUPERACION DEL DERECHO DE VIA.

Actividades desarrolladas:

No aplica para el periodo.

PROYECTO 5. CULTURA AMBIENTAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA: VER ANEXOS

1. **Estructuración y desarrollo de Talleres Pedagógicos:**

   En este periodo se realizaron 3 talleres basados en el plan de gestión social donde el primero se caracterizó por ser enfocado al medio ambiente y las especies de la zona de la Ciénega de Mallorquín el cual recibió el nombre de “protectores de Mallorquín”, el segundo se caracterizó por estar enfocado en el cuidado de las emociones y el compañerismo, el cual recibió el nombre de “los niños florecen como las flores” y el tercero y último se caracterizó por estar enfocado en la cultura ambiental y social y este recibió el nombre de “cultura socio ambiental”. Todos estos realizados y aplicados en niños entre los 7 y 13 años en la fundación Bocas De Ceniza del barrio Las Flores de la ciudad de Barranquilla.

- **Taller medioambiental protectores de Mallorquín:** este taller se llevó acabo en la fundación Bocas de Ceniza, dirigido a niños entre los 7 y 13 años de edad y bajo la supervisión de la líder Edilsa Hebrad se utilizó el método Montessori el cual se caracteriza por tener un énfasis en la actividad dirigida por el niño y guiada por el adulto. Esto con el fin de adaptar el entorno de aprendizaje del niño a su nivel de desarrollo, dándole así al contenido del taller un protagonismo y fin didáctico.
  El taller estuvo compuesto por temas como lo son: cuidado de plantas, cuidado del agua, reciclaje, tipos de mangle y cangrejos.
- **Taller los niños florecen como las Flores:** se llevó acabo en la fundación bocas de ceniza ubicada en el barrio Las Flores, dirigidos por el docente Julio Hebrad y la líder comunitaria Edilsa Hebrad dirigido a niños entre los 7 y 13 años, este taller se caracterizó por llevar temas como: la autoestima, compañerismo, factores de respeto y compartir. Estos basados en el método catedrático con pausas activas el cual tiene como objetivo brindar una información optima y resumida.
- **Taller cultura socio ambiental:** se llevó acabo en la fundación bocas de ceniza ubicada en el barrio Las Flores, dirigidos por el docente Julio Hebrad y la líder comunitaria Edilsa Hebrad dirigido a niños entre los 7 y 13 años, este taller se caracterizó por llevar temas como: cultura ciudadana, cultura de grupos y cuidado del medio ambiente.

Conformación y consolidación del Comité Participación Comunitaria:

- En este periodo no hubo reuniones del comité comunitario

PROYECTO 6. CONTRATACION DE MANO DE OBRA.

1.- Inscripción de la empresa ante el centro de oportunidades

La empresa se encuentra inscrita en el centro de oportunidades y actualmente nos encontramos a la espera de los certificados que garantizan que nuestros trabajadores pertenecen al centro de oportunidades y fueron escogidos desde su punto de ofertas

laborales.

2.- Personal Activo en este periodo.

PERSONAL CONTRATADO MANO DE OBRA	
Personal Mano de Obra Calificada	6
Personal Mano de Obra No Calificada	74
Total, Personal	80

PERSONAL POR SEXO	
Hombres	77
Mujeres	3


PERSONAL CONTRATADO MANO DE OBRA
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
6
39
Personal mano de obra calificada
Personal mano de obra no calificada


PERSONAL POR GENERO
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
77
3
Hombres
Mujeres



C.C	NOMBRES	1ER APELLIDO	2DO APELLIDO
72.180.332	ELIAS SAMUEL	GALVAN	LASCARRO
1.140.875.232	MANUEL ANTONIO	BRIEVA	PASO
1.047.216.296	MARCO ANTONIO	GOMEZ	MARTINEZ
85.082.369	YOHONY ENRIQUE	RUIZ	PAREJO
72.180.332	ELIAS SAMUEL	GALVAN	LASCARRO
1.140.875.232	MANUEL ANTONIO	BRIEVA	PASO
1.047.216.296	MARCO ANTONIO	GOMEZ	MARTINEZ
85.082.369	YOHONY ENRIQUE	RUIZ	PAREJO
7.595.499	CARLOS MANUEL	PERTUZ	CABARCAS
10.782.301	JOSE MARIO	JIMENEZ	VELEZ
1.089.924.463	JHOLMANS CRISTIAN	ALEGUYAR	
73.269.466	ALBERTO ALFONSO	LLERENA	OSPINO
73.575.878	CAMILO ENRIQUE	PUELLO	CARMONA
73.205.797	CARLOS FERNADO	PUELLO	CARMONA
72.161.506	DAGOBERTO	GUZMAN	RODRIGUEZ
1.043.121.528	DIEGO ANDRES	GUZMAN	BERTEL
85.372.581	FRANCISCO JAVIER	CHAMORRO	URANGO
1.129.532.711	GEOVANNY ENRIQUE	ALANDETE	ROBLES
1.047.389.798	GEOVANNY	PUELLO	ACUÑA
92.275.796	JOSE FULGENCIO	CONTRERAS	MONTEROSA
1004130948	JOSE LUIS	BELTRAN	CHAVERA
72.338.009	LUIS EDUARDO	GARCIA	MARTINEZ
1.042.446.820	OSNAIDER ENRIQUE	ECHEVERRIA	GARCIA
1.004.131.184	RAMON ALBERTO	GARCIA	FERRER

C.C	NOMBRES	1ER APELLIDO	2DO APELLIDO
1.005.680.047	ISABELLA	MONTERROZA	VASQUEZ
72.289.751	ALVARO ENRIQUE	MARTES	ORTEGA
1.044.433.835	GERMAN	ECHEVERRIA	BARRAZA
112.623.242	CARLOS	FERNANDEZ	PEÑA
1.444.618	JUAN CARLOS	BERMUDEZ	RAMIREZ
1.001.853.973	CAMILO ANDRES	TOLEDO	VIÑA
79.244.484	PEDRO	PAMPLONA	SUAREZ
1.020.825.448	JULIAN FRANCISCO	PAMPLONA	LEAL
1.122.627.267	HARLEY	RODRIGUEZ	RAMIREZ
1.143.160.286	JONATHAN	MONTERO	REYES
1.083.432.476	MARLON	MERIÑO	AFERAZO
85.487.023	DAIRON	ALVAREZ	VEGA
72.311.170	JIMMY	PEREZ	DE LA HOZ
80.470.077	NEVARDO	MENDIVELSO	
12.448.524	JESUS ENRIQUE	FREILEY	ALTONA
1.046.692.562	CAMILO	ANGULO	AVILA
1.002.231.148	JESUS	OJEDA	ATENCIO
7.213.589	JUAN BAUTISTA	KLEE	BORREGOS
1.044.424.000	SAITH	MARTINEZ	SUAREZ
1.006.534.231	CRISTIAN	OSMA	RAMIREZ
1.043.130.200	ALBENIS	DIAZ	
1.008.001.128	ORLANDO	CANTILLO	
72.436.026	JORGE	LLANOS	
3.747.881	ENERGIO	ECHEVERRIA	
1.001.799.346	SAMIR	ALTAMAR	
1.001.916.650	JESUS	JULIO	
72.436.706	JAIR	PACHECO	

C.C	NOMBRES	1ER APELLIDO	2DO APELLIDO
1.002.235.350	RUBEN DARIO	GUERRERO	VILLANUEVA
8.498.166	WEIMAR RAFAEL	SANJUAN	URBINA
73.106.539	WILFRIDO JOSE	PEREZ	DIAZ
1.080.013.243	ALEXANDER	LLANOS	RODRIGUEZ
1.042.428.549	FABIO NELSON	ARAUJO	NIEBLES
1.007.900.169	LUIS FERNANDO	VILLANUEVA	MUÑOZ
1.043.587.985	WILSON ENRIQUE	PEREZ	REALES
1.042.449.279	JULIO	CANTILLO	SUAREZ
1.193.436.313	WILSON DOSANTOS	SAUMETH	CHAVEZ
1.193.436.317	JAIME JOSE	SAUMETH	MENDOZA
1.007.187.391	JASSIR ENRIQUE	MARENCO	ROJANO
3.817.768	GEOVANIS	RUIZ	SOTO
73.268.775	ELIECER	JIMENEZ	TORRES
1.044.910.911	EDWIN	RODRIGUEZ	HERNANDEZ
7.693.002	CARLOS LEONARDO	DUSSAN	GARCIA
1.143.130.109	DEIVIS RICARDO	ZUÑIGA	CASTRO
8.706.660	JAVIER ENRIQUE	VELEZ	CAMARGO
1.123.991.100	JHORVIS JOVAN	DE LUQUE	ARIZA
72.340.503	JOSE GREGORIO	ATENCIO	SIERRA
72.215.192	LUIS ALBERTO	NUÑEZ	HERNANDEZ
1.140.828.816	MARYURIS DEL CARMEN	LOZANO	GARCIA
1.140.888.631	MELISSA	RAMIREZ	AHUMADA
1.083.020.901	ANDREA CAROLINA	MAIGUEL	RAMOS
1.129.572.070	EDER ENRIQUE	AGAMEZ	SALAS
1.098.648.986	DIANA MARCELA	DAZA	BECERRA

PROYECTO 7. PROYECTOS PRODUCTIVOS.

Este Proyecto no Aplica

4. TABLA DE INDICADORES

PROYECTO	INDICADOR (%)	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	
			SI	NO
PROGRAMA 6. PROGRAMA DE GESTION SOCIAL				
ATENCION A LA COMUNIDAD.	Número de quejas presentadas (0) / Número de quejas atendidas (0)	0/0*100= 100%	x	
INFORMACION Y DIVULGACION	Número de reuniones informativas con las comunidades y autoridades locales realizadas (0) Número de reuniones informativas programadas (0)	0/0*100= 100%	X	
	Número de volantes informativos y/o convocatorias entregadas (0) Número de	0/0*100= 100%	X	

	volantes y/o requeridos En el tramo (0).			
MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PUBLICOS.	Número actas de vecindad realizadas en el tramo (0) / total predios objeto de acta de vecindad en el primer tramo (0)	0/0*100= 100%	X	
	(0) Total compromisos adquiridos/ (0) total compromisos cumplidos (0)	0/0*100= 100%	X	
RECUPERACION DEL DERECHO VIAL.	No aplica en este periodo.			
CULTURA VIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	No se realizó reunión con comité de participación.	0/0*100= 100%	X	
	Número de talleres de sostenibilidad realizados (3) / número de talleres de sostenibilidad programados durante la ejecución de la obra (7)	3/7*100= 42.8%	X	
CONTRATACION DE MANO DE OBRA	Trabajadores contratados padres cabeza de familia (16) /	16/16*100= 100%	X	

Sur-norte Vía a La Playa
Email: resocialmallorquin@gmail.com

	mujeres cabeza de familia de centro de oportunidades (0)			
PROYECTOS PRODUCTIVOS	No aplica			

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Durante este periodo se llevaron a cabo actividades del Plan de Gestión Social, con el fin de minimizar los impactos que ocasionen las actividades constructivas del eco parque Mallorquín y que a la vez nos permite contribuir con la educación ambiental, laboral y emocional de la comunidad aledaña al proyecto Eco parque Mallorquín UF1.

ANEXOS

ANEXOS

PLAN DE GESTION SOCIAL

PROYECTO 1. DE ATENCION A LA COMUNIDAD.

- Seguimiento y cierre de queja: En este periodo no se realizaron reportes de quejas.

	REGISTRO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD (PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS)									
NOMBRE DEL PROYECTO: ECOPARQUE MALLORQUIN UF1			CONTRATISTA: CONSORCIO JCO MALLORQUIN		DEPARTAMENTO: ATLANTICO				CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2	
NÚMERO DEL CONTRATO: EDU- 561/2021			INTERVENTORÍA: ING PROYECTOS		CIUDAD MUNICIPIO: BARRANQUILLA					
FECHA DE RECIBO (DD-MM-AA)	NOMBRE PETICIONARIO	TELEFONO	TIPO DE PQRS	MOTIVO	MEDIO	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN TOMADA/SOLUCIÓN	FECHA DE SOLUCIÓN (DD-MM- AA)	EL PETICIONARIO MANIFIESTA SATISFACCIÓN	OBSERVACIONES

PROYECTO 5. CULTURA AMBIENTAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA

- **Taller medio ambiental importancia y conservación del mangle:** este taller se llevó acabo en la fundación Bocas de Ceniza, dirigido a niños entre los 7 y 13 años de edad y bajo la supervisión de la líder Edilsa Hebrad se utilizó el método Montessori el cual se caracteriza por tener un énfasis en la actividad dirigida por el niño y guiada por el adulto. Esto con el fin de adaptar el entorno de aprendizaje del niño a su nivel de desarrollo, dándole así al contenido del taller un protagonismo y fin didáctico.
  El taller estuvo compuesto por temas como lo son: cuidado de plantas, cuidado del agua, reciclaje, tipos de mangle y cangrejos.



Taller los niños florecen como las Flores: se llevó acabo en la fundación bocas de ceniza ubicada en el barrio Las Flores, dirigidos por el docente Julio Hebrad y la líder comunitaria Edilsa Hebrad dirigido a niños entre los 7 y 13 años, este taller se caracterizó por llevar temas como: la autoestima, compañerismo, factores de respeto y compartir. Estos basados en el método catedrático con pausas activas el cual tiene como objetivo brindar una información optima y resumida.







- **Taller cultura socio ambiental:** se llevó acabo en la fundación bocas de ceniza ubicada en el barrio Las Flores, dirigidos por el docente Julio Hebrad y la líder comunitaria Edilsa Hebrad dirigido a niños entre los 7 y 13 años, este taller se caracterizó por llevar temas como: cultura ciudadana, cultura de grupos y cuidado del medio ambiente.










PROYECTO 6. CONTRATACION DE MANO DE OBRA.

1.- Inscripción de la empresa ante el centro de oportunidades

La empresa se encuentra inscrita en el centro de oportunidades y actualmente nos encontramos a la espera de los certificados que garantizan que nuestros trabajadores pertenecen al centro de oportunidades y fueron escogidos desde su punto de ofertas laborales.

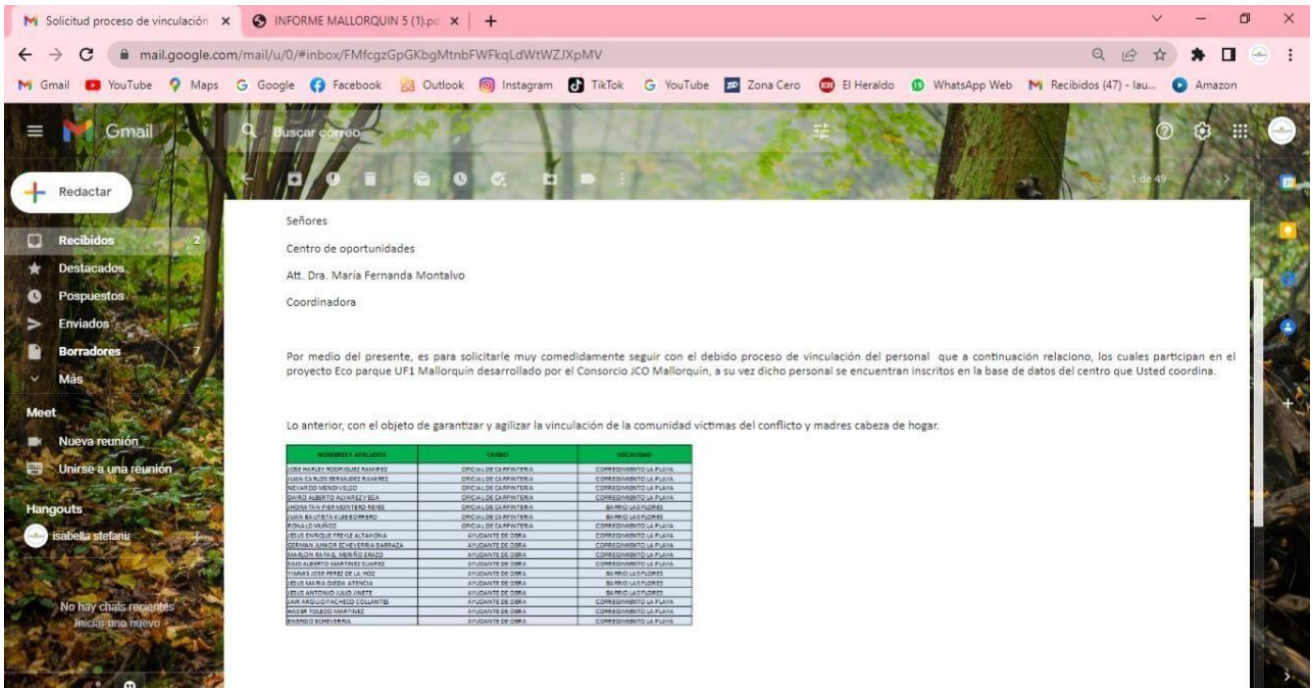

01-JUNIO-2022 MIERCOLES

Clima: Soleado por la mañana. Por la tarde se precentan fuertes lluvias desde las 12:40 a 13:30.

PERSONAL TIERRA:

1. Topografo
1. Cadenero
3 ayudante.
1. Op. Cabria
5. Oficios varios
1. Inspector

PERSONAL AGUA:

1. Topografo.
1. Cadenero
4. ayudantes
1. Oficial
1. Op. Cabria.

PERSONAL AGUA FRENTE #3

1. operador. Cabria
1. oficial
4. ayudantes
1. Topografo
1. Cadenero
1. Director de obra
1. Esp-Ambiental

EQUIPOS TIERRA:

1. Nivel	8-Horas
1. Estacion Total	8-Horas
1. Cabria 1300 kg	4. Horas
1. Cabria	(HALA)

EQUIPOS AGUA:

1. CABRIA	8-Horas
1. Estacion Total	8-Horas
1. Nivel	8-Horas

EQUIPOS AGUA FRENTE #3

1. Nivel	8-Horas
1. Estacion Total	8-Horas
1. Cabria	4. Horas

Pilotes Tierra

#	Prof	Fecha	Local
1"-F"	08.00	0	MOD-13
1"-B"	08.00	0	MOD-13
1"C"	08.00	0	MOD-13
1"D-E"	08.00	0	MOD-13

Pilotes Agua

#	Prof	Fecha	Local
2-D	08.10	0	MOD-46
2-C	08.10	0	MOD-46

Pilotes Agua Frente #3

#	Prof	Fecha	Local
94-B	08.80	0	Mód-10

En el frente de tierra se realizo hincado de pilotes 4 pilotes los cuales no presentaron novedades.

En el frente de agua se realizo hincado de 2 pilotes lo cuales no presentaron novedades.

Scan with Exploración rápida

EN EL FRENTE DE AGUA #3 SE REALIZO HINCADO DE (1) PILOTE EL CUAL NO PRESENTA NOVEDADES.

SE FINALIZAN ACTIVIDADES A LAS 17:00

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

02-JUNIO-2022 JUEVES

Clima: Por la mañana nublado Por la tarde se presentan fuertes lluvias desde las 12:00 14:00.

PERSONAL TIERRA

1. Topografo
1. cadenero
1. Inspector
5 Oficios Varios
3 ayudantes
1. Op. Cabeza

PERSONAL AGUA

1 operador
1 oficial
4 ayudantes.
1. Topografo
1. Cadenero

PERSONAL AGUA FRENTE #3

1. operador
4. ayudantes
1. oficial
1 topografo
1. cadenero.

EQUIPOS TIERRA:

1. Estacion total	08:00	He
1. Nivel	08:00	He
1. cabeza 1.500 kg	08:00	He
1. cabeza	00:00	He

EQUIPOS AGUAS:

1. cabrica 08:00 Horas
1. Estacion total 08:00 Horas
1. Nivel 08:00 Horas

EQUIPOS AGUAS FRENTE #3

1. Nivel 08:00 Horas
1. Estacion total 08:00 Horas
1. cabeza 08:00 Horas

PILOTES TIERRA:

#	Prof	Fecha	Local
C-117	08.00	00:30	Mod-12

PILOTES AGUA:

#	Prof	Fecha	Local
4-C	08.10	0	Mod-46
3-C	08.10	0	Mod-46
3-D	08.10	0	Mod-46
4-D	08.10	0	Mod-46
5-C	08.10	0	Mod-46

Scan with Exploración rápida

5-D	08.10	0	MOD-46

PILOTE AGUA FRENTE #3

#	PROF	RECHA	Loca
95-C	07.80	0	MOD-10
96-B	08.80	0	MOD-10

EN EL FRENTE DE TIERRA SE REALIZO HINCADO DE PILOTES
(1) PILOTE NO PRESENTO NOVEDADES.
EN EL FRENTE DE AGUA SE REALIZO HINCADO DE 6 PILOTES NO PRESENTAN NOVEDADES.
EN EL FRENTE DE AGUA # 3 SE REALIZO HINCADO DE 2 PILOTES LOS CUALES NO PRESENTAN NOVEDADES.
SE FINALIZAN ACTIVIDADES A LAS 17:00. CONTRATISTA INTERVENTORIA

03-JUNIO-2022 VIERNES.

Clima: SOLEADO POR LA MAÑANA. POR LA TARDE SE PRESENTAN LLUVIAS MODERADAS DESDE LAS 13:05 A 13:40.
SE INICIAN ACTIVIDADES A LAS 08:00

PERSONAL TIERRA

1. VIGILANTE
1. SUPERVISOR
4. AUXILIARES
4. OF. VARIOS
1. TOPOGRAFO
1. CADENERO

PERSONAL AGUA.

1. OPERADOR
1. OFICIAL
5. AYUDANTES
1. TOPOGRAFO
1. CADERO

PERSONAL AGUA FRENTE #3

4. AYUDANTES
3. OF. VARIOS
1. OPERADOR
1. OFICIAL
1. TOPOGRAFO
1. CADENERO

EQUIPOS TIERRA:

1. CABRIA 1300 KG	08:00 HR
1. ESTACION TOTAL	08:00 HR
1. NIVEL	08:00 HR
1. CABRIA 1300 KG	00:00 HR

EQUIPOS AGUA:

1. CABRIA	08:00 HR
1. ESTACION TOTAL	08:00 HR
1. NIVEL	08:00 HR

Scan with Exploración rápida

EQUIPOS AGUA FRENTE #3

1. NIVEL	08:00	He
1. ESTACION TOTAL	08:00	He
1. CABRIA	08:00	He

PILOTES TIERRA

#	PROF	RECHA	LOCAL
116-C	0830	0	H-12
116-C"	08.30	0	H-12
116C"."	08.30	0	H-12

PILOTES AGUA

#	PROF	RECHA	LOCAL
6-C	08.10	0	MOD-46
6-D	08.10	0	MOD-46
7-C	08.10	0	MOD-46
7-D	08.10	0	MOD-46
8-C	08.10	0	MOD-46
8-D	08.10	0	MOD-46
9-C	08.10	0	MOD-46
9-D	08.10	0	MOD-46
10-C	0850	0	MOD-46

PILOTES AGUA FRENTE #3

#	PROF	RECHA	LOCAL
96-C	07.80	0	MOD-10
96-B	08.80	0	MOD-10
96 A	07.80	0	MOD-10

EN EL FRENTE DE TIERRA SE REALIZO HINCADO DE 3 PILOTES SIN NOVEDADES
EN EL FRENTE DE AGUA SE REALIZO HINCADO DE 9 PILOTES SIN NOVEDADES
EN EL FRENTE DE AGUA FRENTE #3 SE REALIZO HINCADO DE 3 PILOTES SIN PRESENTAR NOVEDADES.
SE FINALIZAN ACTIVIDADES A LAS 17:00

CONTRATISTA INTERVENTORIA

04-JUNIO-2022 SABADO

CLIMA: SE PRESENTAN LLUVIAS FUERTES POR LA MAÑANA DESDE LAS 09:00-10:3
POR LA TAR DE PERMANECE NUBLADO
SE INICIAN ACTIVIDADES A LAS 08:00

PERSONAL AGUA

1. Operador
1. oficial
4. ayudantes
1. topografo
1. cabenero

EQUIPOS AGUA:

1 cabria	05:00	He
1 estacion total	05:00	He
1. NIVEL	05:00	He

Scan with Exploración rápida

PILOTES AGUA:

#	PROF	RECHAZ	LOCAL
10-D	08.50	0	H00-46
11-C	08.90	0	H00-46
11-D	08.90	0	H00-46

- EN EL FRENTE DE AGUA SE REALIZA HINCADO DE 3 PILOTES SIN NOVEDADES
- EN EL FRENTE DE TIERRA NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE HINCADO POR DAÑOS EN EL CABEZOTE LO DESMONTARON PARA REALIZARLE TRABAJOS EN CALIENTE.
- EN EL FRENTE DE AGUA #3 NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE HINCADO POR DAÑOS EN LA ..... TORRE DESMONTA PESA PARA REALIZARLE TRABAJOS
- Se ~~FINALIZAN~~ ACTIVIDADES A LAS 17:00

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

05-JULIO-2022 Domingo.

Clima: NUBLADO POR LA MAÑANA Y TARDE. SE PRESENTAN LLUVIAS FUERTES DESPUES DE LA JORNADA LABORAL.

SE INICIAN ACTIVIDADES A LAS 08:00

PERSONAL TIERRA:

1. VIGILANTE
1. SUPERVISOR
4. AUXILIARES
4. OFICIOS VARIOS
1. TOPOGRAFO
1. CADENERO

EQUIPOS TIERRA:

1. CABRIA	00:00
1. ESTACION TOTAL	06:00
1. NIVEL	06:00
1. CABRIA 1300 KG	06:00

PERSONAL AGUA FRENTE #3

4. ayudante
3 OFICIOS VARIOS
1. OPERADOR
1. OFICIAL
1. TOPOGRAFO
1. CADENERO

EQUIPOS AGUA #3

1. NIVEL	06:00
1. ESTACION TOTAL	06:00
1. CABRIA	06:00

Scan with Exploración rápida

Pilotes Tierra

#	Prof	Fecha	Local
115-F	07.60	0.70	MOD-12
114-E	08.30	0	MOD-12
114-D	08.30	0	MOD-12

Pilote Agua Frente #3

#	Prof	Fecha	Local
97-B	08.88	0	MOD.10
97-A	08.88	0	MOD-10

En el frente de tierra se realizo hincado de 3 pilotes sin presentar novedades.

En el frente de agua #3 se realizo hincado de 2 pilotes sin presentar novedades.

En el frente de agua no se realiza hincado de pilotes por movilizacion de un punto a otro a barcaza. Pero al final se suspende la labor por marea baja.

Se ~~realizan~~ actividades a las 17:00

Contratista

Interventoria

06-Junio-2022 Lunes.

Clima. Nublado por la mañana por la tarde se presentan fuertes lluvias desde las 12:28 - 13:40 y 16:35 - 18:00

Se inician actividades a las 08:00

Personal Tierra:

1. Vigilante
1. supervisor
4. auxiliares
4. of. varios
1. topografo
1. cadenero

Personal Agua:

1. Operador
1. oficial
6. ayudantes
1. topografo
1. cadenero

Personal Agua Frente #3

1. operador
1. soldador
4. ayudantes
1. topografo
1. cadenero

Scan with Exploración rápida

EQUIPOS TIERRA:

1. CABRIA	00:00 Hr
1. ESTACION TOTAL	07:00 Hr
1. NIVEL	00:00 Hr
1 CABRIA 1300 KG	07:00 Hr

EQUIPOS AGUA:

1. CABRIA	00:00 Hr
1. ESTACION TOTAL	00:00 Hr
1. NIVEL	00:00 Hr

EQUIPOS AGUA FRENTE #3

1. CABRIA	08:00 Hr
1. ESTACION TOTAL	08: Hr
1. CABRIA	08:00 Hr

PILOTES AGUA:

#	PROF	RECHA	Local
1-C	08.10	0	H00-46

PILOTES AGUA FRENTE #3

#	PROF	RECHA	local
97-C	07.80	0	H00-10

PILOTES TIERRA

#	PROF	RECHAZ	local
114-C	08.30	0	H00-12
113-C	0830	0	H00-12

EN EL FRENTE DE TIERRA SE REALIZA HINCADO DE 2 PILOTES SIN PRESENTAR NOVEDADES.

EN EL FRENTE DE AGUA #3 SE REALIZO HINCADO DE 1 PILOTE SIN PRESENTAR NOVEDADES.

EN EL FRENTE DE AGUA NO SE REALIZA HINCADO DE PILOTES POR TRASLADO DE BARCAZA LA MAREA SE MANTUVO BAJA.

SE FINALIZA ACTIVIDADES A LAS 17:00

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

07-JUNIO-2022 MARTES

Clima: NUBLADO por LA MAÑANA y SOLEADO por LA TARDE

SE INICIAN ACTIVIDADES A LAS 08:00

PERSONAL TIERRA.

1. VIGILANTE
4. AYUDANTES
6. OF. VARIOS
1. OPERADOR
1. TOPOGRAFO
1. CADENERO

PERSONAL AGUA:

1. Operador
1. OFICIAL
6. AYUDANTE
1. TOPOGRAFO
1. CADENERO

Scan with Exploración rápida

Equipos Tierra:

1. Nivel	00:00 Hr
1 Estacion Total	08:00 Hr
1 Cabria	08:00 Hr
1 Cabria	00:00 Hr

Pilotes Tierra:

#	Prof	Local	Rech
113-B	09:30	H00-12	0
113-A	08.30	H00-12	0
114-A	08.30	H00-12	0
114-B	09:30	H00-12	0

Personal Agua Frente #3

1 Operador
1. Topografo
1 Cadenero
4. Ayudantes

Equipos Agua:

1. Cabria	08:00 Hr
1. Estacion Total	08:00 Hr
1. Nivel	08:00 Hr

Equipos Agua Frente #3

1. Nivel
1 Estacion Total
1. Cabria

Pilotes Agua:

#	Prof	Rech	Local
	08.90	0	H00-42
	08.90	0	H00-42

Pilotes Agua Frente #3

#	Prof	Rech	Local
98-C	07.80	0	H00-10

Se realiza hincado de pilotes en los 3 frentes de trabajos sin presentar novedades en el dia se hincaron 7 pilotes se finalizan actividades a las 17:00

Contratista

Interventoria

08 Junio 2022 Miercoles

Clima: Soleado por la mañana y tarde
Se inician actividades a las 08:00

Personal Tierra

1 Vigilante
1 Supervisor
1 Operador
4 Auxiliares
4 Of. varios
1 topografo

1. CADENERO
1. SISO

EQUIPOS TIERRA

1. CABRIA 1300 KG	00:00	HORAS
1. CABRIA 1300 KG	05:00	HORAS
1. ESTACION TOTAL	08:00	HORAS
1. NIVEL	08:00	HORAS

PILOTES TIERRA

#	PROF	RECHAZ	LOCAL
116 A	08:30	0	H-12
117 B	09:30	0	H-12
116 B	09:30	0	H.12

PERSONAL AGUA

1. OPERADOR
1. OFICIAL
4. AYUDANTES
1. TOPOGRAFO
1. CADENERO

EQUIPOS AGUA

1. CABRIA	08:00 HR
1. ESTACION TOTAL	08:00 HR
1. NIVEL	08:00 HR

PILOTES AGUA

#	PROF	RECHAZ	LOCAL
1-D	0810	0	H00-46
1-C1	10.30	0	H00-47
1-B'	10.30	0	H00-48

EN EL FRENTE DE TIERRA Y FRENTE DE AGUA SE REALIZA HINCADO DE PILOTES SIN PRESENTAR NOVEDADES SE HINCARON 6 PILOTES EN EL FRENTE DE AGUA # 3 NO SE REALIZO HINCADO DE PILOTES POR DAÑOS EN EL EQUIPOS.

SE FINALIZAN ACTIVIDADES A LAS 17:00

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

09-JUNIO-2022 JUEVES

CLIMA: NUBLADO POR LA MAÑANA Y TARDE SE PRESENTAN LLUVIAS MODERADAS DESDE LAS 11:50 A 14:30

PERSONAL AGUA:

1. OPERADOR
1. OFICIAL
4. AYUDANTES
1. TOPOGRAFO
1. CADENERO

PERSONAL AGUA FRENTE # 3

1. OPERADOR
1. AYUDANTE
1. OFICIAL
1. TOPOGRAFO
1. CADENERO

Scan with Exploración rápida

EQUIPOS AGUAS

1. CABRIA 08:00 HR
1. ESTACION TOTAL 08:00 HR
1. NIVEL 08:00 HR

PILOTES AGUA

#	PROF	RECHA	LOCAL
1-A"	10.30	0	MOD-48
1-A'	10.30	0	MOD-48
1-B"	10.30	0	MOD-48
0-B"	10:30	0	MOD-48
0-B'	10.30	0	MOD-48

EQUIPOS AGUAS FRENTE #3

1. NIVEL 08:00 HR
1. ESTACION TOTAL 08:00 HR
1. CABRIA 08:00 HR

PILOTES AGUA FRENTE #3

#	PROF	RECHAZO	LOCAL
98-B	08.80	0	MOD-10

EN EL FRENTE DE AGUA Y FRENTE DE AGUA #3 SE REALIZARON HINCADO DE PILOTES SIN PRESENTAR NOVEDADES HINCANDOSE UN TOTAL DE 6 PILOTES.

EN EL FRENTE DE TIERRA #3 NO SE REALIZA HINCADO DE PILOTES POR DAÑOS EN EL EQUIPO

SE FINALIZAN ACTIVIDADES A LAS 17:00

CONTRATISTA

Leptthia Villegas.
INTERVENTORIA

10-JUNIO-2022 VIERNES

CLIMA: NUBLADO POR LA MAÑANA Y TARDE.

SE INICIAN ACTIVIDADES A LAS 08:00

PERSONAL AGUA

1. OPERADOR
1. OFICIAL
4. AYUDANTES
1. TOPOGRAFO
1. CADENERO

PERSONAL AGUA FRENTE #3

1. OPERADOR
1. OFICIAL
4. AYUDANTES
1. CADENERO
1. TOPOGRAFO

EQUIPOS AGUA

1. CABRIA 08:00 HR
1. ESTACION TOTAL 08:00 HR
1. NIVEL 08:00 HR

EQUIPOS AGUA FRENTE #3

1. NIVEL 08:00 HR
1. ESTACION TOTAL 08:00 HR
1. CABRIA 08:00 HR

PILOTES AGUA

#	PROF	RECHA	LOCAL
2-C'	10.80	0	MOD-48

PILOTES AGUA FRENTE #3

#	PROF	RECHAZO	LOCAL
98A	07.80	0	MOD-10

Scan with Exploración rápida

2-B"	10.30	0	H00-48	99-A	07.80	0	H00-10
2-B"	10.30	0	H00-48				
2-A'	1030	0	H00-48				

EN EL FRENTE DE AGUA Y FRENTE DE AGUA #3 SE REALIZA HINCADO DE PILOTES SIN NOVEDADES 6 PILOTES HINCADO EN EL DIA

EN EL FRENTE DE TIERRA NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE HINCADO POR DAÑOS EN EL EQUIPO.

SE FINALIZAN ACTIVIDADES A LAS 17:00

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

11-JUNIO-2022 SABADO

Clima: NUBLADO por la mañana y Tarde.

PERSONAL TIERRA:

1. SUPERVISOR
1. VIGILANTE.
1 OPERADOR
4. AUXILIARES
5. OFICIOS VARIOS
1. TOPOGRAFO
1. CADENERO

PERSONAL AGUA:

1. OPERADOR
1. OFICIAL
4. AYUDANTES
1. TOPOGRAFO
1. CADENERO

PERSONAL AGUA FRENTE #3

1. OPERADOR
4. AYUDANTES
1. TOPOGRAFO
1. CADENERO

EQUIPOS TIERRA:

1. CABRIA	00:00 HORAS
1. CABRIA	05:00 HORAS
1. ESTACION TOTAL	05:00 Horas
1. NIVEL	05:00 Horas.

EQUIPOS AGUA:

1. CABRIA	05:00 HORAS
1. ESTACION TOTAL	05:00 HORAS
1. NIVEL	05:00 HORAS

EQUIPOS AGUA FRENTE #3

1. NIVEL	05:00 HORAS
1. ESTACION total	05:00 HORAS
1. CABRIA	05:00 HORAS

PILOTES TIERRA:

#	Prof	Fecha	Local
17-A	08.30	0	H00-12
0"-1"4	08:30	0	H00-13

PILOTES AGUA:

#	Prof	Fecha	Local
2-A"	10.30	0	H00-48
2-AA	1030	0	H00-48

Scan with Exploración rápida

Pilotes Agua Frente #3

#	Prof	Recha	Local
99-B	08.80	0	MOD-10
99-C	07.80	0	MOD-10

-En los diferentes de trabajo se realizo hincado sin presentar novedades se hincaron 6 pilotes
-Se finalizaron actividades a las 17:00

Contratista

Cynthia Villegas
Interventoria

12-Junio-2022 Domingo

Clima: Nublado por la mañana y tarde.

Personal Tierra:

1. Supervisor
1. Vigilante
1. Operador
4. Auxiliares
5. Of. varios
1. Topografo
1. Cadenero

Personal Agua Frente #3

1. Operador
1. Soldador
4. Ayudantes
1. Cadero
1. topografo

Equipos Tierra:

1. Cabria 1500 kg	04:00	Hr
1. Nivel	05:00	Hr
1. Estacion Total	05:00	Hr

Equipos Agua Frente #3

1. Nivel	00:00 Horas
1. Estacion Total	04:00 "
1 Cabria	04:00 "
1. Cabria	00:00 "

Pilotes Tierra

#	Prof	Recha	Local
0"6	08.30	0	MOD 12
0"-1"E"	08.30	0	MOD 12

Pilotes Agua Frente #3

#	Prof	Recha	Local
100 C	07.80	0	MOD-10

- En frente de tierra y frente de agua se realiza hincado de pilotes sin presentar novedades por el dia se hincaron 3 pilotes
- En el frente de agua no se realizan actividades de hincado por falta de pilotes los cuales no tienen geomembrana.
- Se finalizaron actividades a los 17:00

Contratista

Cynthia Villegas
Interventoria

Scan with Exploración rápida

13-JUNIO-2022 LUNES

CLIMA: SOLEADO POR LA MAÑANA Y TARDE.

PERSONAL TIERRA

1. OPERADOR
7. AYUDANTES
1. TOPOGRAFO
1. CADENERO

EQUIPOS TIERRA:

1. CABRIA
1. ESTACION TOTAL

PILOTES TIERRA:

#	PROF	RECHA	LOCAL
1"-F	08.00	0	MOD-13
1"-G	08.00	0	MOD-13
1-E	08.00	0	MOD-13

PERSONAL AGUA FRENTE #3

1. OPERADOR
1. OFICIAL
6. AYUDANTES
1. TOPOGRAFO
1. CADENERO

EQUIPOS AGUA FRENTE #3

1. CABRIA
1. ESTACION TOTAL
1. NIVEL

PILOTES AGUA FRENTE #3

#	PROF	RECHA	LOCAL
100-B	08.80	0	MOD-10
100-A	07.80	0	MOD-10

EN EL FRENTE DE TIERRA Y FRENTE DE AGUA #3 SE REALIZO HINCADO DE PILOTES SIN PRESENTAR NOVEDADES SE REALIZO HINCADO DE 5 PILOTES. EN EL FRENTE DE AGUA NO SE REALIZO HINCADO DE PILOTES POR FALTA DE PILOTES QUE NO ESTABAN LISTOS PARA SER HINCADOS SE FINALIZAN ACTIVIDADES A LAS 17:00

CONTRATISTA

INTERVENTORIA.

14-JUNIO-2022 MARTES

CLIMA: POR LA MAÑANA SE PRESENTAN LLUVIAS MODERADAS DESDE LAS 08:20 - 09:10 POR LA TARDE PERMANECE NUBLADO.

SE INICIAN ACTIVIDADES A LAS 08:00

PERSONAL TIERRA

1. SUPERVISOR
1. VIGILANTE.
1. OPERADOR
4. AUXILIARES
5 OP. VARIOS
1. TOPOGRAFO
1 CADENERO

PERSONAL AGUA

1. OPERADOR
1. OFICIAL
5. AYUDANTES
1. TOPOGRAFO
1. CADENERO.

PERSONAL AGUA FRENTE #3

1. OPERADOR
1. OFICIAL
6 AYUDANTES
1. TOPOGRAFO
1 CADENERO

EQUIPOS TIERRA:

1. NIVEL	08:00	He
1. ESTACION TOTAL	08:00	He
1. CABRIA	08:00	He
1. CABRIA	08:00	He

EQUIPOS AGUA:

1 CABRIA
1. ESTACION TOTAL
1 NIVEL

EQUIPOS AGUA FRENTE #3

1. CABRIA
1. ESTACION TOTAL
1. NIVEL

Pilotes Tierra

#	Prof	Recha	Local
0"-1"F	08.00	0	H-13
1"-E"	08.00	0	H-13

Pilotes Agua

#	Prof	Recha	Local
1'-C'	10.30	0	MOD-48
1'-B"	10.30	0	MOD-48
1'-AA	10.30	0	MOD-48
1"-A'	10.30	0	MOD-48

Pilotes TIERRA FRENTE #3

#	Prof	Recha	Local
101-A	08.30	0	MOD-11
101-B	09.30	0	MOD-11

-EN LOS DIFERENTES DE TRABAJO SE REALIZO HINCADO DE PILOTES SIN PRESENTAR NOVEDADES EN EL DIA SE HINCARON 8 PILOTES
-SE FINALIZAN ACTIVIDADES A LAS 17:00

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

15-JUNIO-2022 MIERCOLES

Clima: Soleado por la mañana y tarde

PERSONAL TIERRA

1. VIGILANTE
1. SUPERVISOR
1. OPERADOR

PERSONAL AGUA

1. operador
1. OFICIAL
1. AYUDANTES

1. topografo
1. CADERO
4 AUXILIARES
5 OF. VARIOS

EQUIPOS TIERRA

1. CABRIA	00:00	Hr
1. CABRIA	07:00	4
1. ESTACION TOTAL	07:00	4
1. NIVEL	07:00	4

PILOTES TIERRA:

#	PROF	LOCAL	RECHA
1"D"	10.05	MOD13	0.95

1. TOPOGRAFO
1. CADENERO

EQUIPOS AGUA:

1. CABRIA
1. ESTACION TOTAL
1. NIVEL

PILOTES AGUA:

#	PROF	RECHA	LOCAL
2'-D'	10.30	0	MOD-48
1-A	09.70	0	MOD-49
1-B	09.70	0	MOD-49
1-C	09.70	0	MOD-49
1-D	09.70	0	MOD-49

EN EL FRENTE DE TIERRA Y FRENTE DE AGUA SE REALIZO HINCADO DE PILOTES SIN PRESENTAR NOVEDADES SE HINCARON 6 PILOTES.
EN EL FRENTE DE AGUA #3 NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE HINCADO EQUIPO CABRIA SE LE REALIZARON MANTENIMIENTO.
- SE FINALIZAR ACTIVIDADES A LAS 17:00

CONTRATISTA

Cepeda Villegas A.
INTERVENTORIA

16-JUNIO-2022 JUEVES

Clima: SOLEADO por la mañana y NUBLADO por la TARDE

FRENTE TIERRA -PERSONAL-

1. Vigilante
1. Supervisor
1. Operador
1. Topografo
1. Cadenero
4. Auxiliares
4. OF. VARIOS

PERSONAL AGUA:

1. operador
1. oficial
4. AYUDANTES
1. Topografo
1. CADENERO

PERSONAL AGUA FRENTE #3

1. operador
1. oficial
4. Ayudantes
1. Topografo
1. cadenero

Scan with Exploración rápida

EQUIPOS TIERRA

1. CABRIA 1300 kg 00:00 Hr
1. CABRIA 1200 kg 08:00 "
1. ESTACION TOTAL 08:00 "
1. NIVEL 08:00 "

PILOTES TIERRA

#	PROF	RECHA	local
1"-C"	11 00 HRS	0	H-13
2"-B"	09:94	01:06	H-13

EQUIPOS AGUA

1. CABRIA
1. ESTACION TOTAL
1. NIVEL

EQUIPOS AGUA FRENTE #3

1. CABRIA
1. ESTACION TOTAL
1. NIVEL.

PILOTES AGUA:

#	PROF	RECHA	local
2-A	09:70	0	MOD-49
2-B	09:70	0	MOD-49
2-C	09:70	0	MOD-49

-SE REALIZO HINCADO DE PILOTES EN LOS DIFERENTES DE TRABAJO SIN PRESENTAR NOVEDADES POR EL DIA DE HOY SE HINCARON 7 PILOTES

PILOTES AGUA FRENTE #3

#	PROF	local	RECHAZ
101-A	08:30	MOD-11	0
102-B	09:30	MOD-11	0

SE FINALIZAN ACTIVIDADES A las 17:00

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

17-JUNIO-2022 VIERNES

Clima: Soleado por la mañana y TARDE.

Se inician actividades a las 08:00

PERSONAL TIERRA

1. supervisor
1. operador
1. topografo
1. cadenero
9. ayudantes

PERSONAL AGUA.

1. operador
1. oficial
4. ayudantes
1. topografo
1. cadenero

PERSONAL AGUA frente #3

1. operador
5. ayudantes
1. topografo
1. CADENERO

Scan with Exploración rápida

EQUIPOS TIERRA

1. CABRIA	08:00	Hr
1. ESTACION TOTAL	08:00	Hr
1. NIVEL	08:00	Hr

EQUIPOS AGUA

1. CABRIA	08:00	Hr
1. ESTACION TOTAL	08:00	Hr
1. NIVEL	08:00	Hr

EQUIPOS AGUA FRENTE #3

1. CABRIA	08:00 Hr
1. ESTACION TOTAL	08:00 Hr
1. NIVEL	08:00 Hr

PILOTES TIERRA:

#	PROF	RECHA	LOCAL
2"-C"	08.00	0	MOD-13
2"-B"	10.13	0.87	MOD13

PILOTES AGUA:

#	PROF	RECHAZ	LOCAL
3-A	09.70	0	MOD-49
3-B	09.70	0	MOD-49
3-C	09.70	0	MOD-49
4-A	09.70	0	MOD-49
5-B	09.70	0	MOD-49
5-C	09.70	0	MOD-49

EN EL FRENTE DE TIERRA Y FRENTE DE AGUA SE REPLIZO HINCADO DE PILOTES SIN PRESENTAR NOVEDADES EN EL DIA SE HINCARON 8 PILOTES.

EN EL FREN DE AGUA #3 SE HINCARON 2 PILOTES

#	PROF	RECHA	LOCAL
102-A	08.30	0	MOD-4
102-C	08.30	0	MOD-4

SE FINALIZAN ACTIVIDADES A LAS 17:00

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

18-JUNIO-2022 SABADO.

Clima: Soleado por la mañana y tarde.

Se inician actividades a las 08:00

PERSONAL TIERRA

1. Supervisor
1. operador
1. Topografo
1. Cadenero
4. Auxiliares
4. OF. VARIOS

PERSONAL AGUA FRENTE #3

1. Operador
1. Oficial
4. AYUDANTES
1. topografo
1. CADENERO.

Scan with Exploración rápida

EQUIPOS TIERRA
1 CABRIA
1 Estación TOTAL
1 NIVEL

EQUIPOS AGUA FRENTE #3
1 CABRIA
1 ESTACION total
1 NIVEL

PILOTES TIERRA

#	PROF	Local	RECHAZ
2"-E"	0800	HOD-13	O

PILOTES AGUA frente #3

#	PROF	DECHA	Local
102d	0830	O	HOD-11

EN EL FRENTE DE TIERRA y FRENTE DE agua #3 SE realizaron actividades de Hincado 2 PILOTES EN el DIA.
EN EL FRENTE DE AGUA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE HINCADO El PERSONAL Realizo RETIROS DE TRONCOS los Cuales NO permitian Continuar con las labores de Hincado.
Se finalizan actividades a las 17:00

CONTRATISTA

Leynettia Villegas
INTERVENTORIA

19-20 - JUNIO - 2022
NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN OBRA elecciones Presidenciales y lunes festivo.

CONTRATISTA

Leynettia Villegas
INTERVENTORIA

21-JUNIO-2022 MARTES
Clima: Por la mañana permanece NUBLADO por la TARDE SE Presentan lluvias MODERADAS Desde las 12:00 - 13:00
se INICIAN ACTIVIDADES a las 08:00

PERSONAL TIERRA
1 operador
4 ayudantes
1 inspector
5 OF varios
1 topografo
1 cadenero

PERSONAL AGUA
1 operador
1 OFICIAL
4 ayudantes
1 topografo
1 cadenero

PERSONAL AGUA frente #3
1 operador
1 TORRERO
5 ayudantes

Scan with Exploración rápida

1. Topógrafo
1. Cadenero.

EQUIPOS TIERRA:

1. Cabria 08:00 Hr
1. Estación total 08:00 Hr
1. Nivel 08:00 Hr

EQUIPOS AGUA:

1. Cabria 08:00 Hr
1. Estación total 08:00 Hr
1. Nivel 08:00 Hr

EQUIPOS AGUA FRENTE #3

1. Cabria 08:00 Hr
1. Estación total 08:00 Hr
1. Nivel 08:00 Hr

PILOTES TIERRA:

#	Prof	Recha	Local
2"-F	08.00	0	HOD-13
2"-6	08.00	0	HOD-13
3"-6	08.00	0	HOD-13

PILOTES AGUA:

#	Prof	Recha	Local
1-A	09.50	0	HOD-80
1-B	09.50	0	HOD-80
2-A	09.04	0.46	HOD-80
2-B	09.04	0	HOD-80
3-A	0960	0	HOD-80

PILOTES AGUA FRENTE #3

#	Prof	Recha	Local
103-D	08.30	0	HOD-11

EN EL FRENTE DE TRABAJO # 3 FRENTE DE TIERRA Y FRENTE DE AGUA SE REALIZA HINCADO DE PILOTES SIN PRESENTAR NOVEDADES EN EL DIA SE HINCARON 9 PILOTES

- SE FINALIZAN ACTIVIDADES A LAS 17:00

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

22-JUNIO-2022 MIERCOLES.

CLIMA: SOLEADO por la mañana y TARDE

Se inician actividades a las 08:00

PERSONAL TIERRA:

1. Operador
1. Torrero
1. Inspector
4. Ayudantes
5 OF. varios

PERSONAL AGUA:

1. Operador
1. Torrero
3. Ayudantes
1. Topógrafo
1. Cadenero

Scan with Exploración rápida

1 topografo
1 cadenero

EQUIPOS TIERRA
1 cabeza 08:00 Hr
1 Estacion total 08:00 Hr

PERSONAL AGUA FRENTE #3
1 Operador
1 Tornero
5 Ayudantes
1 topografo
1 cadenero

EQUIPOS AGUA.
1 Cabeza 08:00 Hr
1 Estacion Total 08:00 Hr
1 Nivel 08:00 Hr

EQUIPOS AGUA FRENTE #3
1 Cabeza 08:00 Hr
1 Estacion total 08:00 Hr
1 Nivel 08:00 Hr

PILOTES TIERRA

#	Prof	Fecha	Local
3"-F"	0800	0	MOD-13
3"-E"	08.00	0	MOD-13
3"-D"	10.20	0.80	MOD-13
3"-C"	08.00	0	MOD-13

PILOTES AGUA

#	Prof	Fecha	Local
3-B	09.60	0	MOD-SO
4-B	09.60	0	MOD-SO
4-A	09.60	0	MOD-SO
5-A	09.50	0	MOD-SO
5-B	09.50	0	MOD-SO
6-B	09.00	0	MOD-SO
6-A	09.00	0	MOD-SO
7-A	09.00	0	MOD-SO
7-13	09.00	0	MOD-SO

PILOTES AGUA FRENTE #3

#	Prof	Fecha	Local
104-F	08.30	0	MOD-M

- EN LOS 3 FRENTES DE TRABAJO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE HINCADO SIN NOVEDADES EN EL DIA SE HINCARON 14 PILOTES
- Se finalizan ACTIVIDADES A LAS 17:00

Contratista

Guillermo Villegas
INTERVENTORIA

23-JUNIO-2022 JUEVES

CLIMA: SOLEADO POR la mañana y TARDE.

PERSONAL TIERRA

5 OFICIOS VARIOS
4 AYUDANTES
1. OPERADOR
1. topografo
1 CADENERO
1. Vigilante

PERSONAL AGUA:

1 Operador
1. Oficial
4. AYUDANTES
1. TOPOGRAFO
1. CADENERO

PERSONAL AGUA FRENTE #3

4. AYUDANTES
1. OFICIAL
1. OPERADOR
1. TOPOGRAFO
1. CADENERO

EQUIPOS TIERRA

1. NIVEL	00:00	HR
1. ESTACION total	08:00	HR
1. CABRIA	08:00	HR
1 CABRIA	00:00	HR

EQUIPOS AGUA:

1 CABRIA	08:00	HR
1. ESTACION TOTAL	08:00	HR
1. NIVEL	08:00	HR

EQUIPOS AGUAS FRENTE #3

1. NIVEL
1. ESTACION TOTAL
1. CABRIA.

PILOTES TIERRA

#	PROF	RECHA	Local
3"B"	08:00	0	MOD-13
4"-B"	08:00	0	" MOD-13

PILOTES AGUA

#	PROF	RECHA	Local
8-C	09.00	0	MOD-SO
8-D	09:00	0	MOD-SO
9-D	09.00	0	MOD-SO
9-C	09.00	0	MOD-SO
10-B	09.00	0	MOD-SO
10-A	09.00	0	MOD-SO
11-A	09.00	0	MOD-SO

PILOTES AGUA FRENTE #3

#	PROF	RECHA	Local
104-E	09.15	0.15	MOD-11
104-C	09.30	0	MOD-11

EN los DIFERENTES frentes de trabajo se Realizo Hincado de pilotes sin Presentar novedades se Hincaron 11 Pilotes en el dia
se Analizan actividades a las 13:00

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

Scan with Exploración rápida

24-JUNIO-2022 VIERNES

Clima: Por la mañana se presentan lluvias moderadas desde las 10:00 - 10:30, por lo tarde permanece nublado.

Se inician actividades a las 08:00

PERSONAL TIERRA:

1. Operador
1. Supervisor
4. Auxiliares
1. Topografo
1. Cadenero
4. Of. varios

PERSONAL AGUA:

1. Operador
1. Torrero
4. Ayudantes.

PERSONAL AGUA FRENTE #3

1. Operador
4. Ayudantes
3. Oficios Varios
1. Cadenero

EQUIPOS TIERRA

1. NIVEL	08:00 HR
1. ESTACION TOTAL	08:00 HR
1. CABRIA	08:00 HR
1. CABRIA	08:00 HR

EQUIPOS AGUA

1. CABRIA	08:00 HR
1. ESTACION TOTAL	08:00 HR
1. NIVEL	08:00 HR

EQUIPOS AGUA FRENTE #3

1. OPERADOR
4. AYUDANTES
1. OFICIAL
1. Topografo.

PILOTES TIERRA:

#	PROF	RECHAZ	LOCAL
4"C"	08.00	0	HOD-13
4"D"	10.22	0.78	HOD-13
4"E"	08.00	0	HOD-13
4"F	08.00	0	HOD-13

PILOTES AGUA FRENTE #3

#	PROF	RECHAZ	LOCAL
104-B	09.30	0	HOD-11
104-A	08.30	0	HOD-11

PILOTES AGUA:

#	PROF	RECHAZ	LOCAL
11-A"	09.00	0	HOD-SO
12-A"	09.00	0	HOD-SO
12-A'	09.00	0	HOD-SO
13-A'	09.00	0	HOD-SO
13-B	09.00	0	HOD-SO
14-D	09.00	0	HOD-SO
14-C	09.00	0	HOD-SO
15-C	09.00	0	HOD-SO
15-D	09.00	0	HOD-SO
16-B	09.00	0	HOD-SO
16-A	09.00	0	HOD-SO
17-A	0900	0	HOD-SO
17-B	09.00	0	HOD-SO

Scan with Exploración rápida

EN EL FRENTE DE TIERRA, DE AGUA Y FRENTE #3 SE REALIZO HINCADO DE PILOTES SIN PRESENTAR NOVEDADES EN EL DIA SE HINCARON 19 PILOTES

SE FINALIZAN ACTIVIDADES A LAS 17:00

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

25 JUNIO - 2022 SABADO

CLIMA: Permanece Soleado Por la mañana y Tarde.

SE INICIAN ACTIVIDADES A LAS 08:00

PERSONAL TIERRA:

8 OF. VARIOS
4 AYUDANTES
1 OPERADOR
1 TOPOGRAFO
1 CADENERO
1 VIGILANTE

EQUIPOS TIERRA:

1 NIVEL	05:00 HR
1 COBRA	05:00 HR
1 ESTACION TOTAL	05:00 HR
1 COBRA	05:00 HR

PILOTES TIERRA:

#	PROF	DESCHO	LOCAL
4"6	08:00	0	MOD-13
4"5"6	08:00	0	MOD-13
4"5"6	08:00	0	MOD-13

PERSONAL AGUA FRENTE #3

4 AYUDANTES
1 OPERADOR
1 OFICIAL
4 OF. VARIOS
1 TOPOGRAFO
1 CADENERO

EQUIPOS AGUA FRENTE #3

1 NIVEL	05:00 HR
1 ESTACION TOTAL	05:00 HR
1 COBRA	05:00 HR

PILOTES AGUA FRENTE #3

#	PROF	DESCHO	LOCAL
LOSA	08:33	0	MOD-11

"EN EL FRENTE DE TIERRA Y EN EL FRENTE DE AGUA #3 SE REALIZARON ACTIVIDADES DE HINCADO DE PILOTES SIN PRESENTAR NOVEDADES EN EL DIA SE HINCARON 4 PILOTES.

"EN EL FRENTE DE AGUA NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EL PERSONAL SE ENCUENTRA EN DESMONTE DE TORRE LA CUAL VA HACER REMPLAZADA.

SE FINALIZAN ACTIVIDADES A LAS 17:00

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

26-JUNIO-2022 Domingo

CLIMA: NUBLADO por la mañana, EN la TARDE se PRESENTAN FUERTES lluvias DESDE las 12:20 A 17:00

Se INICIAN ACTIVIDADES a las 08:00

PERSONAL TIERRA

1. Operador
2. AYUDANTES
6 OF. VARIOS
1 Topografo
1. CADENERO

EQUIPOS TIERRA

1. CABRIA	00:00	Hr
1. ESTACION TOTAL	00:00	Hr
1. NIVEL	00:00	Hr
1. cabria	00:00	Hr

PILOTES AGUA FRENTE # 3

#	Prof	Rechaz	Local
105-B	09:30	0	MOD-A1

-EN EL FRENTE DE AGUA #3 se REALIZO HINCADO DE PILOTES SIN NOVEDADES se REALIZO HINCADO DE 1 PILOTE.

-EN EL FRENTE DE AGUA #0 SE REALIZO HINCADO DE PILOTES la MAQUINA CABRIA SE ENCUENTRA EN MANTENIMIENTO.

-EN EL FRENTE DE TIERRA NO SE REALIZO HINCADO DE PILOTES Por DAÑOS en el CABEZOTE DE la TORRE.

-Se FINALIZAN ACTIVIDADES A las 17:00

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

PERSONAL AGUA FRENTE #3

8. OF. VARIOS
4. AYUDANTES
1. OPERADOR
1. TOPOGRAFO
1. CADENERO
1. Vigilante

EQUIPOS AGUA FRENTE #3

1. NIVEL	05:00 Hr
1. ESTACION TOTAL	05:00 Hr
1. Cabria	02:00 H

27-JUNIO-2022 LUNES

Clima: Por la mañana se presentan lluvias moderadas 09:300-11:00 Por la TARDE Permanece NUBLADO.

Se INICIAN ACTIVIDADES A las 08:00

PERSONAL TIERRA

8. OF. VARIOS
4. AYUDANTES
1. OPERADOR

PERSONAL AGUA FRENTE #3

1 Operador
1. AYUDANTE
4 OF. VARIOS

Scan with Exploración rápida

1. Topografo
1. Cadenero
1. Vigilante

EQUIPOS TIERRA

1. CABRIA
1. ESTACION TOTAL
1. NIVEL
1. CABRIA

PILOTES AGUA FRENTE #3

#	PROF	RECHA	LOCAL
105-0	9.30	0	HOD-11

1. Topografo
1. Cadenero

EQUIPOS AGUA #3

1. CABRIA
1. NIVEL
1. ESTACION TOTAL

PILOTES TIERRA

#	PROF	RECHA	LOCAL
E"-5"	08.00	0	HOD-13
D"-5"	11.00	0	HOD-13
C"-5"	08.00	0	HOD-13
B"-5"	08.00	0	HOD-13

-EN EL FRENTE DE TIERRA SE REALIZO HINCADO DE 4 PILOTES SIN PRESENTAR NOVEDADES.

-EN EL FRENTE DE AGUA # RIO SE REALIZO ACTIVIDADES EL PERSONAL SE ENCUENTRA REALIZANDO MANTENIMIENTO A LA MAQUINA CABRIA.

-EN EL FRENTE DE AGUA # 3 SE REALIZO HINCADO DE 1 PILOTE PORQUE EL CABEZOTE NUEVAMENTE SE PARTIO

SE FINALIZAN ACTIVIDADES A LAS 17:00

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

28-JULIO-2022 MARTES

CLIMA: SOLEADO POR LA MAÑANA Y TARDE

PERSONAL TIERRA

1. OPERADOR
4. AYUDANTES
7 OF. VARIOS
1. TOPOGRAFO
1. CADENERO
1. VIGILANTE
1. OFICIAL CORTE
2. AYUDANTE CORTE

EQUIPOS TIERRA

1. CABRIA 1. NIVEL 1. TALADRO
1. ESTACION TOTAL 1. CUBRIA

PERSONAL AGUA FRENTE #3

1. OPERADOR
4. AYUDANTES
3. OF. VARIOS
1. CADENERO.

EQUIPOS AGUA FRENTE #3

1. NIVEL 00:00 HR
1. ESTACION TOTAL 00:00 HR
1. CABRIA 00:30 HR

Scan with Exploración rápida

Pilotes Tierra

#	Prof	Fecha	Local
6"-0"	08:00	0	Mod-13
6"-0"	08:00	0	Mod-13
6"-0"	08:00	0	Mod-13

Pilotes Agua

#	Prof	Fecha	Local
105-D	09:30	0	Mod-11

-En el frente de tierra se realizo Hincado de 3 Pilotes en el modulo #13 y a su vez se Realizo instalacion de Riostras (40)

-En el frente de agua #3 se realizo Hincado de 1 solo pilote se encontraban Realizando trabajos en caliente al cabezote.

-En el frente de agua no se realizan actividades de Hincado Continua maquina cabrita en mantenimiento.

Vigas Laminadas

Eje	Alto	Long	Mod
A(45-55)	.30	100,8	6
B(23-33)	.36	50.4	4
C(45-55)	.30	50.4	6
A(34-44)	.30	50.4	5
C(34-44)	.30	50.4	5
B(34-44)	.36	100.8	5
B(45-55)	.36	100.8	6
A(56-62)	.30	62.40	7
C(56-62)	.30	62.40	7
B-(56-62)	.36	62.40	7

Riostras

Diame	Tipo.	Modu	Cant
17	Long	8	40
15	Trans	8	36
15	Trans	9	8
17	Long	9	24
17	Long	10	6
17	Long	E3	60
17	Long	E3	12

Total acumulado de V.L (.30) = 1.065.2 ML

Total acumulado de V.L (.36) = 581 ML

Total acumulado Riostras (.17) = 290 unidades

Total acumulado Riostras (.15) = 308 unidades

Se finalizan actividades a las 17:00

Contratista

Interventoria

29-Junio-2022 Miercoles

Clima: Soleado por la mañana Nublado por la tarde

Se inician actividades a las 08:00

Personal Tierra

1 Operador

Personal Agua Frente #3

1 Soldador

Scan with Exploración rápida

6. Of. Varios
4. Ayudantes
1. Topografo
1. Cadenero

EQUIPOS TIERRA
1. CABRIA 08:00 Hr
1. NIVEL 08:00 Hr
1. Estacion total 08:00 Hr

PILOTES TIERRA

#	Prof	Fecha	Local
6"-E"	08:00	0	HUD-13
7"-C"	08:00	0	HUD-13
7"-D"	11.00	0	HUD-13
7"-C"	08:00	0	HUD-13

5. Oyudantes
4. Of. Varios
1. Operador
1. Topografo
1. Cadenero
1. Oficial

EQUIPOS AGUA FRENTE #3
1. NIVEL 08:00 Hr
1. Estacion Total 08:0 Hr
1 cabria 08:00 Hr

PILOTES AGUA FRENTE #3

#	Prof	Fecha	Local
105-F	08:00	0	HUD-11
106 F	08:30	0	HUD-11

-EN EL FRENTE DE AGUA #3 SE REALIZO HINCADO DE 2 PILOTES LOS CUALES NO PRESENTARON NOVEDADES.
-EN EL FRENTE DE TIERRA SE REALIZO HINCADO DE 4 PILOTES LOS CUALES NO PRESENTARON NOVEDADES.
-EN EL FRENTE DE AGUA NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE HINCADO HASTA CABRIA CONTINUA EN MANTENIMIENTO.
-SE FINALIZAN ACTIVIDADES A LAS 17:00

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

30-JUNIO-2022 JUEVES

Clima: Se presentan lluvias moderadas por la mañana desde las 10:00 - 10:30
Se inician actividades a las 08:00

Personal Tierra
1. operador
1. Supervisor
4. Auxiliares
1. Topografo
1. Cadenero
4. Of. Varios

Equipos Tierra
1. CABRIA 1300 kg 00:00 Hr
1. CABRIA 1300 kg 07:30 Hr
1. Estacion Total 07:30 Hr
1 NIVEL 07:30 Hr

Scan with Exploración rápida

Pilotes Tigrana

#	Prof	Fecha	Local
7°-B'	10.55	O	M-13

-En el frente de tierra se realizo Hincado de 1 pilote a las 09:30 durante el izaje del primer pilote, uno de los bases que soportaba la maquina se partio, ocacionando que la maquina se inclinara unos grados a la derecha y el pilote pardo callera.

- En el frente # 3 no se realizan actividades se encuentran realizando trabajos en adyente a cabezote.

-En el frente de agua no se realizan actividades de Hincado ya que continua maquina cabrin en mantenimiento

Contratista

Ingeniera Villegas
Interventoria

01-Julio-2022 Viernes.

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

NIT: 901.501.273-2

INFORME GENERAL DE OBRA N° 009

CONTRATO DE OBRA Nª EDU-561-2021. INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÒN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÒN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

JUNIO DE 2022

Contenido

1. Introducción 4
2. Objetivos 5
2.1 Objetivo General 5
2.2 Objetivos Específicos 5
3. Información Contractual 6
3.1 Pólizas del contrato. 6
3.2 Pólizas del contrato actualizadas conforme a prorroga N° 1 8
4. Alcance del Informe 9
5. Localización del Proyecto 9
6. Descripción de ejecución de las actividades. 10
6.1 Campamento. 10
6.2 Topografía mes de junio del proyecto. 12
6.3 Hincado de pilotes. 13
6.4 Instalación de riostras. 15
6.5 Instalación de Viga Laminada 17
6.6 Suministro e instalación de entre piso – sección recta – incluye viguetas, frisos y listón Deck. 19
6.7 Recepción de materiales. 20
6.4. Correspondencia. 21
6.5. Seguimiento al flujo de inversión 21
6.6. ANEXOS. 22

Contenido de Ilustraciones

Ilustración 1. Ubicación del proyecto Ecoparque Ciénaga Mallorquín – UF1 Distrito Familiar. Fuente: SINTH S.A.S. 10
lustración 2, 3 y 4 Campamento Fecha: 24/05/2022. Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN 11
Ilustración 5 y 6 Topografía del proyecto mes de junio. Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN. 12
Ilustración 7 Hincado de pilotes Fecha: 29/06/2022. Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN 14
Ilustración 8 Hincado de pilotes Fecha: 29/06/2022. Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN 14

Ilustración 9 hinca de pilotes Fecha: 21/06/2022. Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN 15
Ilustración 10 Instalación de riostras Fecha: 21/06/2022. Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN 16
Ilustración 11 Instalación de riostras Fecha: 21/06/2022. Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN 16
Ilustración 12 Viga laminada instalada. Fecha:29/06/2022. Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN 17
lustración 13 Viga laminada instaladas. Fecha: 29/06/2022. Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN. 18
Ilustración 14 Instalación de entrepiso sección recta. Fecha:23/06/2022. Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN 19
Ilustración 15 Instalación de entrepiso sección recta. Fecha:23/06/2022. Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN 20

Contenido de Tablas

Tabla 1. Información general del contrato de obra. 6
Tabla 2. Información general de la póliza 7
Tabla 3. Información general de la póliza 8
Tabla 4. Información general de la póliza conforme a la prorroga N° 1 8
Tabla 5. Información general de la póliza conforme a la prorroga N° 1 9
Tabla 6. Relación metros de pilotes hincados hasta 31 de mayo de 2022 13
Tabla 7. Relación metros de pilotes en el mes de junio de 2022. 13
Tabla 8. Relación metros de riostras instaladas mes de junio de 2022. 17
Tabla 9. Relación metros de riostras instaladas acumuladas al mes de junio de 2022. 17
Tabla 10. Relación metros de viga laminada instaladas mes de junio de 2022. 18
Tabla 11. Relación metros de viga laminada instaladas acumuladas al mes de junio de 2022. 18
Tabla 12. Relación metros de viga laminada instaladas mes de junio de 2022. 20
Tabla 13. Correspondencia enviada mes de junio CONSORCIO JCO MALLORQUIN 21
Tabla 14. Correspondencia recibida mes junio CONSORCIO JCO MALLORQUIN 21

1. Introducción

La ciénaga de mallorquín es una laguna costera y ecosistema lagunero que está ubicada en su totalidad en el extremo norte del distrito de Barranquilla, sobre la margen izquierda de la desembocadura del río Magdalena (Bocas de Ceniza) en el Mar Caribe. Es uno de los ecosistemas más valiosos que tenemos en la ciudad. En la ciénaga habitan 15 especies de invertebrados marinos, nueve de peces, otras tantas de anfibios, siete de reptiles y 81 de aves. También podemos encontrar hasta cuatro especies de mangles.

La Ciénaga de Mallorquín es el único ecosistema de este tipo en el Distrito de Barranquilla, su importancia biológica está dada por el ecosistema de manglar, playas arenosas y fondos que lo integran brindando importantes recursos eco sistémicos e hidrobiológicos tales como peces, ostras, chipi chipi y caracol; Por lo anterior se ha tomado la decisión de voltear la cara hacia esta importante ciénaga y hace varios años se viene desarrollando un plan maestro para la recuperación de espacios públicos dentro de la ciudad; con la ayuda del Plan de Ordenamiento Territorial, se han trabajado diversos proyectos, los cuales han hecho que los ciudadanos puedan gozar de más espacios que ayuden a la recreación, deporte y movilidad. El Eco parqué Ciénaga de Mallorquín, es un proyecto de interés regional desde el punto de vista del desarrollo y de turismo, además, de ser uno de los componentes principales para convertir a Barranquilla en la primera Biodiverciudad de Colombia. El Ecoparque Ciénaga Mallorquín – UF1 Distrito Familiar, se propone como un espacio para el encuentro con la naturaleza, que promueva la cultura ambiental e incremente la biodiversidad de fauna y flora local. Está pensado para el disfrute de actividades de contemplación a través de recorridos ecológicos por senderos entre el manglar y el agua de la ciénaga, que permiten apreciar la flora local, respirar aire fresco y observar el ecosistema en el que confluye río y mar. El avistamiento de aves también hace parte de las actividades que se pueden realizar en este distrito, por lo que se plantean paradas o estaciones en medio del recorrido que permiten el encuentro con las especies de aves de la región. El recorrido del distrito termina dentro de la ciénaga con un muelle y un equipamiento deportivo, pensado para prácticas de ecoturismo y excursiones.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

- Recopilar mensualmente la información necesaria para determinar el estado real de la ejecución del CONTRATO DE OBRA **EDU-561-2021.**

2.2 Objetivos Específicos

- Hacer seguimiento a los planes Ambientales, Trafico, SST, Social y de calidad presentados.
- Presentar un resumen detallado de las actividades ejecutadas durante el periodo del informe.
- Determinar los avances y/o retrasos tomando como base la programación de obra presentada.
- Dejar evidencia fotográfica de las actividades ejecutadas y su proceso constructivo.

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

3. Información Contractual

Contratante	Empresa de desarrollo urbano de barranquilla y la región Caribe S.A "EDUBARS.A."
Contratista	Consorcio JCO Mallorquin
Interventoría	CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN
Objeto del contrato	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÒN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÒN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
Contrato No.	EDU-561-2021.
Valor del contrato	$82.464.264.620
Fecha de contrato	21 de Julio del 2021
Fecha de inicio	01 de Septiembre de 2021
Plazo de ejecución inicial	31 de Diciembre de 2021
Prorroga N° 1	180 dias
Fecha de acorde a prorroga N°1	30 de junio de 2022
Prorroga N° 2	10 meses
Fecha de terminación actualizada	30 de Abril de 2023.

Tabla 1. Información general del contrato de obra.

3.1 Pólizas del contrato.

El contratista configuro Garantía Única de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual. La configuración de estas pólizas se resume de acuerdo con el

siguiente cuadro:

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL							
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros Mundial						
CUBRIMIENTO	Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada del cumplimiento						
PÓLIZA No.	BQ–100011003						
FECHA DE EXPEDICIÓN	09/09/2021						
COBERTURA	**VIGENCIA DE COBERTURA**						**SUMA ASEGURADA**
	INICIACIÓN			**TERMINACIÓN**			
	DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**	
Predios, labores y operaciones.	01	09	2021	12	05	2022	$ 16,492,852,924.00

Tabla 2. Información general de la póliza

POLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO							
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros Mundial						
CUBRIMIENTO	Póliza de seguro de cumplimiento estatal						
PÓLIZA No.	BQ–100043007						
FECHA DE EXPEDICIÓN	09/09/2021						
COBERTURA	**VIGENCIA DE COBERTURA**						**SUMA ASEGURADA**
	INICIACIÓN			**TERMINACIÓN**			
	DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**	
Cumplimiento del contrato	01	09	2022	30	06	2022	$ 16,492,852,924
Estabilidad de la Obra	31	12	2022	31	12	2026	$ 24,739,279,386

Salarios y prestaciones sociales	01	09	2022	31	12	2024	$ 12,369,639,693

Tabla 3. Información general de la póliza

3.2 Pólizas del contrato actualizadas conforme a prorroga N° 1

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CONFORME A PRORROGA N° 1							
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros Mundial						
CUBRIMIENTO	Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada del cumplimiento						
PÓLIZA No.	BQ–100011003						
FECHA DE EXPEDICIÓN	31/12/2021						
COBERTURA	**VIGENCIA DE COBERTURA**						**SUMA ASEGURADA**
	INICIACIÓN			**TERMINACIÓN**			
	DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**	
Predios, labores y operaciones.	01	09	2021	30	09	2022	$ 16,492,852,924.00

Tabla 4. Información general de la póliza conforme a la prorroga N° 1

POLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO CONFORME A PRORROGA N° 1		
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros Mundial	
CUBRIMIENTO	Póliza de seguro de cumplimiento estatal	
PÓLIZA No.	BQ–100043007	
FECHA DE EXPEDICIÓN	31/12/2021	
	VIGENCIA DE COBERTURA	

COBERTURA	INICIACIÓN			TERMINACIÓN			SUMA ASEGURADA
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
Cumplimiento del contrato	01	09	2022	30	12	2022	$ 16,492,852,924
Estabilidad de la Obra	30	12	2022	30	06	2027	$ 24,739,279,386
Salarios y prestaciones sociales	31	12	2022	30	06	2025	$ 12,369,639,693

Tabla 5. Información general de la póliza conforme a la prorroga N° 1

4. Alcance del Informe

- Brindar la información necesaria para determinar avances y/o retrasos en la ejecución de lo contratado.

  Entregar de manera formal y organizada la documentación solicitada y establecida en las especificaciones como lo son los resultados de ensayos de laboratorios a los diferentes materiales a utilizar, entrega de reporte de afiliaciones a seguridad social del personal en obra, seguimiento a los planes de manejo establecidos como requisitos de inicio de actividades etc.

5. Localización del Proyecto

La ciénaga de mallorquín está ubicada en su totalidad en el extremo norte del distrito de Barranquilla, sobre la margen izquierda de la desembocadura del río Magdalena (Bocas de Ceniza) en el Mar Caribe, en la Costa Caribe colombiana. A continuación, una ilustración que muestra la localización del área levantada:

CONSORCIO JCO MALLORQUIN



Ilustración 1. Ubicación del proyecto Ecoparque Ciénaga Mallorquín – UF1 Distrito Familiar. Fuente: SINTH S.A.S.

6. Descripción de ejecución de las actividades.

6.1 Campamento.

Durante el mes de mayo se dio el correspondiente uso a los campamentos tanto en obra (contenedores de oficinas y almacén) como en las bodegas ubicadas en el Parque Industrial de Caribe verde y en Volcanes (Bodegas donde se tiene el acopio de materiales).







lustración 2, 3 y 4 Campamento Fecha: 24/05/2022. Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

6.2 Topografía mes de junio del proyecto.

Se finalizó la localización de los puntos en los módulos 11, 48, 49 Y 50. Para la localización, la topografía, se rige por las referencias de planimetría y altimetría suministradas en el proyecto.

Para el trabajo de topografía se usaron equipos de precisión cuyos certificados de calibración se adjuntan en el informe de topografía que es complemento del presente informe. A la fecha, se cuenta con dos cuadrillas de topografía, una en agua y una en tierra.





Ilustración 5 y 6 Topografía del proyecto mes de junio. Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN.

6.3 Hincado de pilotes.

Una vez verificado el estudio de suelos, características del pilote y estrato donde debe quedar o la función que cumple el pilote, se verificó el plano y las recomendaciones del ingeniero estructural, posteriormente se identificaron la longitudes efectivas y diámetros, seguidamente, se trazaron los ejes en terreno por medio de referencias en el mismo, luego se ubicaron las coordenadas de los pilotes, y una vez ubicadas las coordenadas, se midieron las distancias entre ellas para cotejarlas con las distancias establecidas en el plano de georreferenciación, las cuales deben coincidir.

Para empezar la hinca de los pilotes, se hace un pre-hueco que tenga el diámetro del pilote a una profundidad de 0.80 m, luego se sitúa la maquina piloteadora y se procede al hincado para llegar a la profundidad requerida del proyecto.

Hasta la fecha se cuenta con dos frentes de trabajo en agua y un frente en tierra, y se cuenta con el avance presentado en la siguiente tabla:

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

Longitud de pilotes D25 instalados al 31 de mayo	5047,09 m
Longitud de pilotes D20 instalados al 31 de mayo	4907,54 m

Tabla 6. Relación metros de pilotes hincados hasta 31 de mayo de 2022

N° de pilotes hincados mes de junio	126 Pilotes
Longitud de pilotes D25 instalados mes junio	560,20 m
Longitud de pilotes D20 instalados mes junio	542,10 m

Tabla 7. Relación metros de pilotes en el mes de junio de 2022.



Ilustración 7 Hincado de pilotes Fecha: 29/06/2022. Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN



Ilustración 8 Hincado de pilotes Fecha: 29/06/2022. Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN



Ilustración 9 hinca de pilotes Fecha: 21/06/2022. Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

6.4 Instalación de riostras.

Se inició con la instalación del arriostramiento en sentido transversal riostras de 15 cm de diámetro y en sentido longitudinal riostras de 17 cm de diámetro, según las cantidades, ubicaciones y especificaciones establecidas en los planos.

Esta actividad, inicia con el replanteo de la posición de los pernos de unión con pilote y se alista la madera rolliza para el arriostramiento, cortándola en caso de ser necesario e instalando la protección con polietileno de alta densidad para posteriormente proceder a la instalación de la misma



Ilustración 10 Instalación de riostras Fecha: 21/06/2022. Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN



Ilustración 11 Instalación de riostras Fecha: 21/06/2022. Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

N° de riostras instaladas mes de junio	468 unds
Longitud de riostras D15 instalados mes de junio de 2022	957,00 m
Longitud de pilotes D17 instalados mes de junio de 2022	943,40 m

Tabla 8. Relación metros de riostras instaladas mes de junio de 2022.

Longitud de riostras D15 acumulados a junio de 2022	1881,00 m
Longitud de pilotes D17 acumulados a junio de 2022	1727,80 m

Tabla 9. Relación metros de riostras instaladas acumuladas al mes de junio de 2022.

6.5 Instalación de Viga Laminada

Se hace el replanteo de la posición de los pernos de unión con pilote y localización del elemento tipo viga, se alista la madera de viga laminada haciendo el corte de la misma en caso de necesitarse, se procede a la instalación de la viga laminada verificando la posición y ajuste de conexiones.



Ilustración 12 Viga laminada instalada. Fecha:29/06/2022. Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN



lustración 13 Viga laminada instaladas. Fecha: 29/06/2022. Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN.

VIGA LAMINADA EJECUTADA MES DE JUNIO DE 2022		
MODULO	ML VIGA LAMINADA 08X30	ML VIGA LAMINADA 08X36
8	431,2 m	420,44
9	201,6 m	100,8
14	80,77 m	168
Subtotal:	**713,57 m**	**689,24 m**

Tabla 10. Relación metros de viga laminada instaladas mes de junio de 2022.

Longitud viga laminada 08x30 acumulados a junio de 2022	2090,47 m
Longitud viga laminada 08x36 acumulados a junio de 2022	1277,24 m

Tabla 11. Relación metros de viga laminada instaladas acumuladas al mes de junio de 2022.

6.6 Suministro e instalación de entre piso – sección recta – incluye viguetas, frisos y listón Deck.

Esta actividad consiste en la instalación de cada uno de los elementos que conforman el entrepiso de las plataformas o pasarelas en los tramos rectos en planta, contempla viguetas de 36x180 mm en dirección transversal a la pasarela, listón deck de espesor 36 mm (mínimo) y frisos de borde o remate. Incluye fijaciones en acero inoxidable, accesorios, pintura e inmunización, al igual que el suministro y transporte de estos materiales.



Ilustración 14 Instalación de entrepiso sección recta. Fecha:23/06/2022. Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN



Ilustración 15 Instalación de entrepiso sección recta. Fecha:23/06/2022. Fuente: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

MODULO	ML SECCION RECTA DECK
1	333,83
Subtotal:	**333,83 m**

Tabla 12. Relación metros de viga laminada instaladas mes de junio de 2022.

6.7 Recepción de materiales.

Los días 18 y 21 de junio de 2022 se recibió madera en el campamento de Caribe Verde, y el 22 de junio se recibió tornillería.

6.4. Correspondencia.

CORRESPONDENCIA ENVIADA PROYECTO MALLORQUIN				
Datos de salida			Destinatario	Asunto
Oficio N°	Radicado	Fecha (dd/mm/yy	Nombre o Razon social	
JCO-068-2022		1/06/2022	EDUBAR S.A.	Remision Acta Parcial de bra N 4 para facturacion
JCO-069-2022		4/06/2022	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	Alcance comunicado CINP-504-108-22052 Observación Acta de Cobro Ambiental #1.
JCO-070-2022		13/06/2022	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	Solicitud de planos actualizados modulos 36, 37, 41 y 50
JCO-071-2022		13/06/2022	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	Remision UF1 acta parcial de obra N 5
JCO-072-2022		13/06/2022	EDUBAR S.A.	Remision EDUBAR acta parcial de obra N 5 - gestion de firma
JCO-073-2022		23/06/2022	EDUBAR S.A.	Remision EDUBAR documento de prorroga debidamente firmado
JCO-074-2022		23/06/2022	GRUPO JACUR	Remision GRUPO JACUR documento de prorroga debidamente firmado

Tabla 13. Correspondencia enviada mes de junio CONSORCIO JCO MALLORQUIN

CORRESPONDENCIA RECIBIDA PROYECTO MALLORQUIN			
Datos de entrada		Remitente	Asunto
Oficio N°	(dd/mm/yy)	Nombre o Razon social	
CINP–504–108–2205	3/06/2022	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	observaciones cobro 001 ambiental
CINP-504-111-2354	13/06/2022	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	CC UF1-EDUBAR solicictud de planos estructurales actualizados
CINP-504-112-2369	14/06/2022	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	Oficio no objecion acta de obra n° 5

Tabla 14. Correspondencia recibida mes junio CONSORCIO JCO MALLORQUIN

6.5.Seguimiento al flujo de inversión

Tal como se presentó en el presente informe, durante el mes de junio se realizaron las actividades de Comisión topográfica mensual con dos frentes y campamento, que corresponden al capítulo 01 (Preliminares), las actividades de Suministro e instalación de pilote de diámetro de 20cm, Suministro e Instalación de pilotes de diámetro de 25cm, suministro e instalación de arriostramiento D15 y suministro e instalación de arriostramiento D17 que hacen parte del capítulo 03 (Pilotaje en madera), las actividades de suministro e instalación viga laminada cca 08x30, suministro e instalación viga laminada cca 08x36, suministro e instalación entrepiso – sección recta correspondientes al capítulo 04 (Plataformas y Pasarelas en Madera), y un porcentaje del PMA, dichas actividades realizadas en el mes, arrojan una inversión acumulada de 20,93% ($ 17.260.788.928,43)

6.6.ANEXOS.

1. Flujo de inversión del proyecto actualizado
2. Curva S del proyecto.

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

PROGRAMA DE INVERSION

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO	$ 82.464.264.620,00
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	180 DIAS
FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADADA	30 DE ABRIL DE 2023


ITEM	ACTIVIDAD	VALOR TOTAL	Acumulado a 30 de junio de 2022	JULIO DE 2022	AGOSTO DE 2022	SEPTIEMBRE DE 2022	OCTUBRE DE 2022	NOVIEMBRE DE 2022	DICIEMBRE DE 2022	ENERO DE 2023	FEBRERO DE 2023	MARZO DE 2023	ABRIL DE 2023
01	OBRAS PRELIMINARES	$ 623.882.532,00	$ 197.061.267,05	$ 29.340.961,00	$ 29.340.961,00	$ 29.340.961,00	$ 29.340.961,00	$ 46.418.613,14	$ 46.418.613,14	$ 46.418.613,14	$ 46.418.613,14	$ 61.891.484,19	$ 61.891.484,19
02	MOVIMIENTOS DE TIERRA	$ 1.948.804.815,61			$ 97.440.240,78	$ 194.880.481,56	$ 97.440.240,78	$ 233.856.577,87	$ 233.856.577,87	$ 233.856.577,87	$ 233.856.577,87	$ 311.808.770,50	$ 311.808.770,50
03	PILOTAJE EN MADERA	$ 26.835.125.558,28	$ 14.369.221.205,56	$ 1.246.590.435,27	$ 1.495.908.522,33	$ 1.745.226.609,38	$ 1.745.226.609,38	$ 1.869.885.652,91	$ 1.869.885.652,91	$ 2.493.180.870,54			
04	PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA	$ 18.505.304.491,05	$ 2.595.277.372,61	$ 954.601.627,11	$ 1.272.802.169,48	$ 1.591.002.711,84	$ 1.591.002.711,84	$ 1.591.002.711,84	$ 1.591.002.711,84	$ 1.591.002.711,84	$ 1.591.002.711,84	$ 2.068.303.525,40	$ 2.068.303.525,40
05	BARANDAS EN MADERA	$ 4.647.070.333,62					$ 278.824.220,02	$ 464.707.033,36	$ 650.589.846,71	$ 650.589.846,71	$ 743.531.253,38	$ 743.531.253,38	$ 1.115.296.880,07
06	EDIFICACIONES EN MADERA	$ 7.053.059.690,30				$ 352.652.984,52	$ 705.305.969,03	$ 846.367.162,84	$ 846.367.162,84	$ 916.897.759,74	$ 916.897.759,74	$ 1.410.611.938,06	$ 1.057.958.953,55
07	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	$ 956.877.401,22			$ 47.843.870,06	$ 47.843.870,06	$ 66.981.418,09	$ 124.394.062,16	$ 124.394.062,16	$ 124.394.062,16	$ 124.394.062,16	$ 133.962.836,17	$ 162.669.158,21
08	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS	$ 209.149.887,96						$ 34.858.314,66	$ 34.858.314,66	$ 34.858.314,66	$ 34.858.314,66	$ 34.858.314,66	$ 34.858.314,66
09	PISOS Y ENCHAPES	$ 389.958.440,82						$ 64.993.073,47	$ 64.993.073,47	$ 64.993.073,47	$ 64.993.073,47	$ 64.993.073,47	$ 64.993.073,47
10	CIELOS RASOS	$ 11.098.815,78						$ 1.849.802,63	$ 1.849.802,63	$ 1.849.802,63	$ 1.849.802,63	$ 1.849.802,63	$ 1.849.802,63
11	PAVIMENTOS Y ANDENES	$ 891.018.299,60			$ 44.550.914,98	$ 44.550.914,98	$ 62.371.280,97	$ 115.832.378,95	$ 115.832.378,95	$ 115.832.378,95	$ 115.832.378,95	$ 124.742.561,94	$ 151.473.110,93
12	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	$ 98.919.370,16									$ 32.973.123,39	$ 32.973.123,39	$ 32.973.123,39
13	URBANISMO Y EXTERIORES	$ 33.366.619,00											$ 33.366.619,00
14	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI	$ 2.210.000.000,00									$ 729.300.000,00	$ 729.300.000,00	$ 751.400.000,00
15	INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 7.762.775.477,60								$ 931.533.057,31	$ 2.173.577.133,73	$ 2.328.832.643,28	$ 2.328.832.643,28
16	INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS	$ 4.290.000.000,00										$ 2.145.000.000,00	$ 2.145.000.000,00
17	INSTALACIONES VOZ Y DATOS	$ 4.290.000.000,00								$ 643.500.000,00	$ 1.072.500.000,00	$ 1.072.500.000,00	$ 1.501.500.000,00
18	PRESUPUESTO SEÑALIZACION	$ 12.312.300,00									$ 4.063.059,00	$ 4.186.182,00	$ 4.063.059,00
19	PROVISIONES												
	PMA	$ 860.762.500,00	$ 99.229.083,20	$ 22.846.002,50	$ 22.846.002,50	$ 22.846.002,50	$ 22.846.002,50	$ 22.846.002,50	$ 22.846.002,50	$ 22.846.002,50	$ 22.846.002,50	$ 289.382.698,38	$ 289.382.698,38
	PMT	$ 85.410.787,80			$ 9.490.087,53	$ 9.490.087,53	$ 9.490.087,53	$ 9.490.087,53	$ 9.490.087,53	$ 9.490.087,53	$ 9.490.087,53	$ 9.490.087,53	$ 9.490.087,53
	CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP (TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED)	$ 29.145.480,00											$ 29.145.480,00
	TOTEMS DE INFORMACION	$ 112.931.000,00									$ 37.267.230,00	$ 37.267.230,00	$ 38.396.540,00
	PROVISION PUERTAS Y VENTANAS	$ 520.000.000,00									$ 171.600.000,00	$ 171.600.000,00	$ 176.800.000,00
	SISTEMA DE RIEGO	$ 87.290.819,20									$ 43.645.409,60	$ 43.645.409,60	

INVERSION MENSUAL		$ 2.253.379.025,88	$ 3.020.222.768,66	$ 4.037.834.623,38	$ 4.608.829.501,15	$ 5.426.501.473,87	$ 5.612.384.287,21	$ 7.881.243.159,06	$ 8.170.896.593,60	$ 11.820.730.934,58	$ 12.371.453.324,18
% DE INVERSION MENSUAL		2,73%	3,66%	4,90%	5,59%	6,58%	6,81%	9,56%	9,91%	14,33%	15,00%
INVERSION ACUMULADA	$ 17.260.788.928,42	$ 19.514.167.954,30	$ 22.534.390.722,96	$ 26.572.225.346,34	$ 31.181.054.847,49	$ 36.607.556.321,36	$ 42.219.940.608,57	$ 50.101.183.767,64	$ 58.272.080.361,23	$ 70.092.811.295,82	$ 82.464.264.620,00
% DE INVERSION ACUMULADA	20,93%	23,66%	27,33%	32,22%	37,81%	44,39%	51,20%	60,76%	70,66%	85,00%	100,00%

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

PROGRAMA DE INVERSION

CONTRATO N°	**EDU-561-2021**
CONTRATANTE	**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)**
CONTRATISTA	**CONSORCIO JCO MALLORQUIN**
INTERVENTOR	**CONSORCIO UF1 MALLORQUIN**
OBJETO	**INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 82.464.264.620,00**
FECHA DE INICIO	**1 DE SEPTIEMBRE DE 2022**
FECHA DE TERMINACION INICIAL	**31 DE DICIEMBRE DE 2021**
PRORROGA N° 1	**SEIS (6) MESES**
FECHA DE TERMINACION ACORDE A PRORROGA N°1	**30 DE JUNIO DE 2022**
PRORROGA N° 2	**DIEZ (10) MESES**
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	**30 DE ABRIL DE 2023**

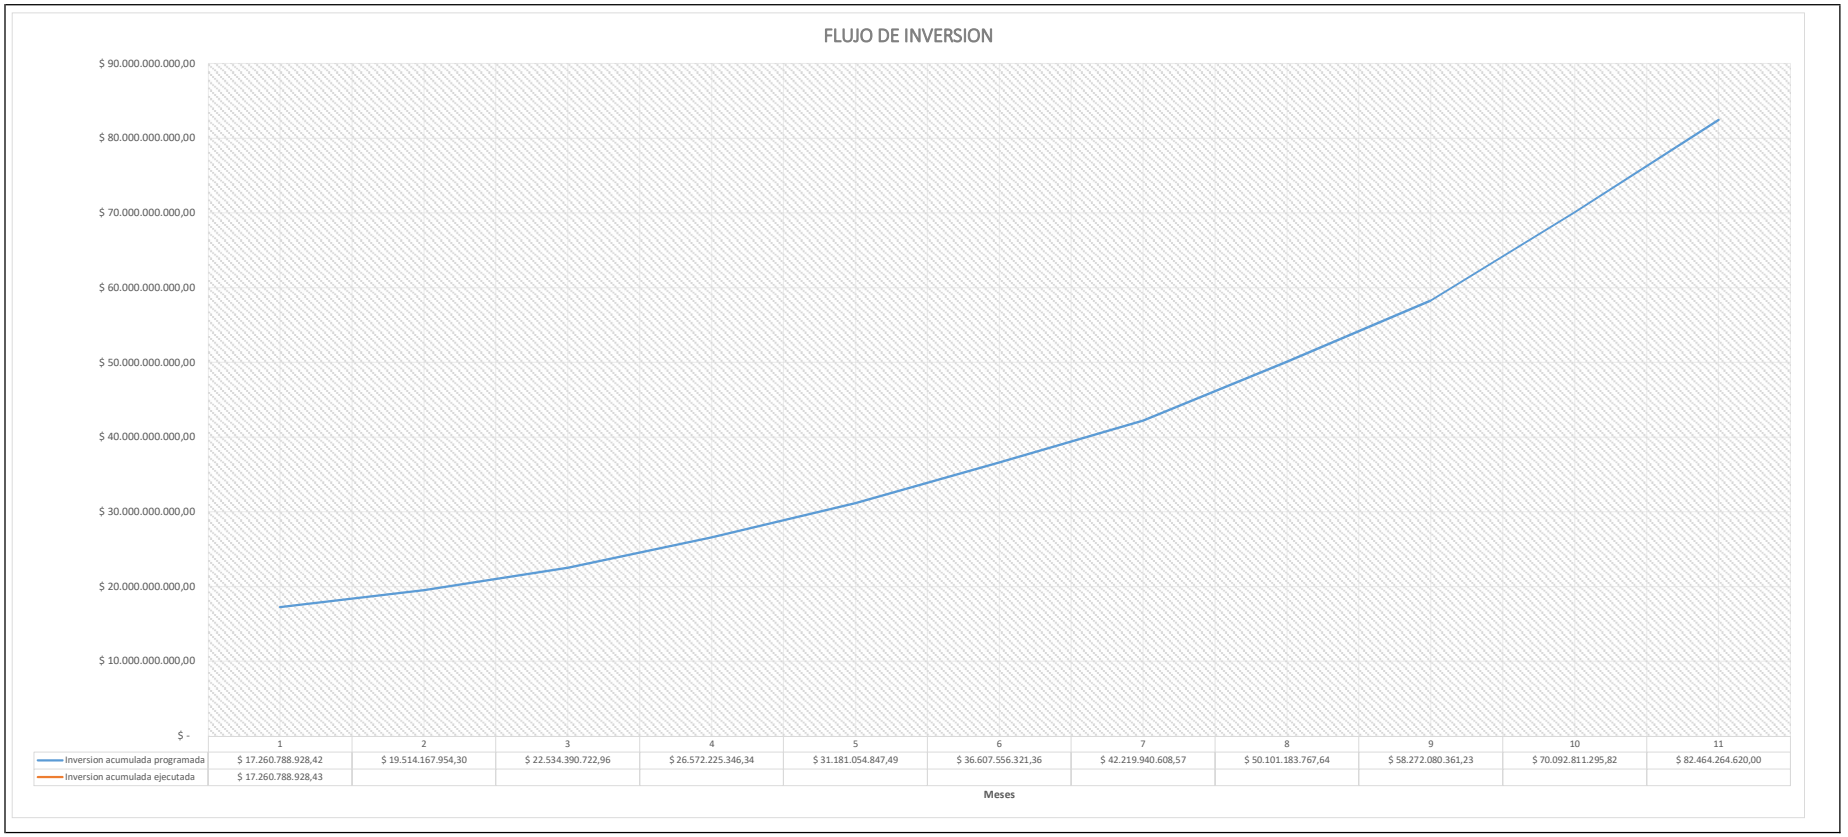

CONFORMACIÓN DE BRIGADAS Revisión Número: 01 Fecha Emisión: Septiembre de 2021	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2	F-SST-01 Fecha Revisión: Septiembre de 2021 Página 1 de 1 Aprobado por: Representante Legal

FECHA 01-06-22 HORA DE INICIO 7:30 AM HORA TERMINACION 8:30 AM.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	NOMBRE	CARGO
Isabella Monterroza	Bicosocial	Jose Alencio Sierra.	Ayudante.
Deivi Zuñiga.	Conductor	Carlos Arturo Fernandez.	Almacenista.
Melissa Ramirez	Residente Administrativa	Jesus Freyler.	Ayudante.
Jose Rodriguez	Oficial de Caseta.	Diana Daza.	Residente SST.
Cristian Osmis Ramirez	Ayudante	Carlos Pestor.	Operador.

Por medio de la cual, se establecen las siguientes personas como integrantes de la Brigada de Emergencias, declarando que conocen las responsabilidades que ello implica y se comprometen a colaborar con la prevención y atención de emergencias surgidas durante la realización de las actividades de Consorcio JCO Mallorquín

CARGO BRIGADA	NOMBRE	FIRMA
Jefe de Brigada	Jose Alencio Sierra.	
Brigadista de Evacuación	Deivi Zuñiga.	
Brigadista Contra incendios	Diana Daza.	
Brigadista de Primeros Auxilios	Isabella Monterroza	
Brigadista Ambiental	Melissa Ramirez.	

OBSERVACIONES

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

NIT: 901.501.273-2

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N° 006

CONTRATO DE OBRA Nª EDU-561-2021. INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÒN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÒN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

JUNIO DE 2022

Contenido

1. Introducción 3
2. Objetivos en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 4
3. Información Contractual 5
4. Localización del Proyecto 6
5. Actividades SISO. 7
5.1 Cronograma de actividades SST 7
5.2 Estadística Accidentalidad y Ausentismo 8
5.3 Capacitaciones realizadas. 8
5.4 Seguimiento a proveedores. 9
5.5 Afiliaciones al sistema de seguridad social: (ley 100) 9
5.6 Entrega, reposición y supervisión de elementos de protección personal y dotación 9
5.7 Inspecciones de seguridad 10
5.8 Inspecciones a instalaciones temporales: 10
5.9 Elementos básicos de atención a emergencia 10
5.10 Equipos en obra 11
4. Personal activo en obra: 11
5. Protocolo de Bioseguridad 12
6. Registros fotográficos: 12
7. Listado de anexos: 13

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

1. Introducción

Es el objetivo principal de la seguridad y salud en el trabajo, preservar, mantener y mejorar la salud de los trabajadores en su sitio de trabajo, mediante la realización de actividades de medicina preventiva, medicina del trabajo, de higiene y seguridad industrial.

En nuestro país la salud ocupacional estaba legislada desde 1979 en la ley 9a. En 1984 se emite el Decreto 614, el cual reglamenta la organización de la salud ocupacional en el país y en 1989 sale la Resolución 1016 donde se reglamenta la organización y funcionamiento de los Programas de Salud Ocupacional, posteriormente aparece la ley 1562 y pasa a ser sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en última instancia nace el decreto único reglamentario del sector trabajo 1072 de 2015 y la resolución 1111 de 2017, derogada por la resolución 0312 de 2019.

El sistema de seguridad y salud ene l trabajo consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoria y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.

2. Objetivos en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)

- Controlar los peligros y riesgos asociados con la gestión de la Unión del Consorcio JCO mallorquín, asegurando proveer lugares de trabajo libres de peligros a la salud y la seguridad,y tomar las medidas adecuadas para identificar y corregir todo tipo de peligros.

- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del SG SST

- Investigar la accidentalidad del personal, buscando promover la mejora de las condiciones de trabajo con el fin de proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores, prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo.

- Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales

- Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

3. Información Contractual

Contratante	Empresa de desarrollo urbano de barranquilla y la región Caribe S.A "EDUBARS.A."
Contratista	Consorcio JCO Mallorquín
Interventoría	CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN
Objeto del contrato	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÒN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÒN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
Contrato No.	EDU-561-2021.
Valor del contrato	$82.464.264.620
Fecha de contrato	21 de Julio del 2021
Fecha de inicio	01 de Septiembre de 2021
Plazo de ejecución inicial	Hasta el 31 de Diciembre de 2021
Prorroga N° 1	Hasta el 30 de junio de 2022
Fecha de terminación actualizada	Hasta el 30 de junio de 2022

Tabla 1. Información general del contrato de obra.

4. Localización del Proyecto

La ciénaga de mallorquín está ubicada en su totalidad en el extremo norte del distrito de Barranquilla, sobre la margen izquierda de la desembocadura del río Magdalena (Bocas de Ceniza) en el Mar Caribe, en la Costa Caribe colombiana. A continuación, una ilustración que muestra la localización del área levantada:



Ilustración 1. Ubicación del proyecto Ecoparque Ciénaga Mallorquín – UF1 Distrito Familiar.

5. Actividades SISO.

5.1 Cronograma de actividades SST

Se realiza la inducción del personal en temas de seguridad y salud en el trabajo y demás capacitaciones según el cronograma de actividades programado, donde se demuestra el grado de compromiso de la empresa en actividades de capacitación, prevención y entrenamiento en cuanto a la seguridad y Salud en el Trabajo.

En el mes de JUNIO se ejecutaron las actividades conforme al cronograma. El

siguiente informe corresponde desde el 1 de junio al 30 de junio de 2022.

ACTIVIDADES	FECHA	JUNIO			
	PERIOCIDAD	1	2	3	4
Revisión de afiliaciones y pagos de seguridad social	Al ingresar un trabajador y mensualmente las planillas de seguridad social		C	C	C
Permisos de trabajo - ATS	Según su actividad		C	C	C
Inspecciones pre-Operacionales de maquinaria	Según su actividad		C	C	C

Tabla 2. Actividades

CONSORCIO JCO MALLORQUIN

5.2 Estadística Accidentalidad y Ausentismo

Se monitorean los indicadores de accidentalidad en el proyecto en ejecución, conforme a lo establecido por la normativa legal vigente, con el fin de crear las alertas necesarias para mitigar los riesgos inherentes a las actividades que se realizan a diario en obra y de esta manera evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

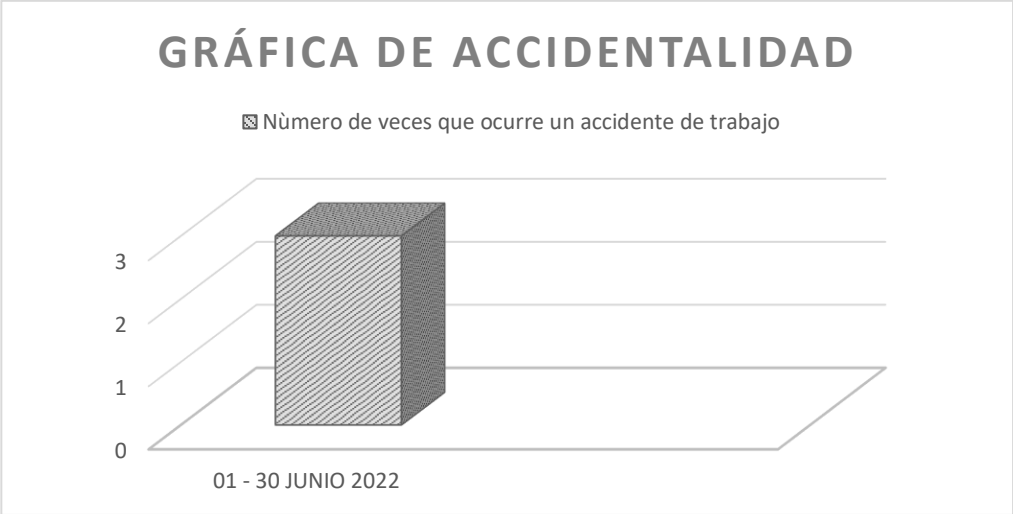


Ilustración 2. Grafica de accidentalidad.

En el periodo comprendido entre el 01 de JUNIO y 30 de JUNIO de 2022 se presentaron dos (2) accidentes laborales y un (1) incidente.

5.3 Descripción de los Accidentes e Incidentes.

Reporte No. 1:

Nombre y apellido del accidentado: Juan Carlos Bermúdez

Fecha del accidente: 01 de junio del 2022

Hora del accidente: 21:00 pm

Lugar donde ocurrió el accidente: Áreas Comunes

Persona que reporta el accidente: Juan Carlos Bermúdez

Resumen de los hechos.

Yo Juan Carlos Bermúdez con número de cédula 11444618 desde el día 26 de mayo del 2022 empecé a sentir un dolor leve en el oído derecho yo me desempeño como oficial de carpintería, el día 01 de junio empecé a sentir dolor más fuerte en la noche a las 9:00 pm me sangro el oído y me limpio el oído posterior a esto fui donde una vecina que es enfermera y me revisó el oído y me sacó un coágulo de sangre donde tenía resto de madera.

El 02 de junio a las 8:00 am me acerco a la oficina para manifestar lo sucedido.

Nombre del Residente SST: Diana Daza Becerra

Anexo 1: *Lección Aprendida*

Anexo 2: *Socialización Lección Aprendida*

Reporte No. 2:

Nombre y apellido del accidentado: Yimmis Perez de la Hoz

Fecha del accidente: 16 de junio del 2022

Hora del accidente: 9:45 am

Lugar donde ocurrió el accidente: Frente de Agua

Persona que reporta el accidente: Juan Carlos Bermúdez

Resumen de los hechos.

El día 16 de junio de 2022, el Sr. Yimmis Pérez de la Hoz siendo aproximadamente a las 9:45 am, se encontraba trasladando unos troncos de madera entre 4 personas con unos parales metálicos, había un trabajador de cada lado cuando llegan a la ciénega uno de los compañeros se resbala y suelta el tronco cayéndole en la pierna izquierda a la altura de la rodilla, e inmediatamente se le realizo los primeros auxilios y se direcciono a la Clínica Porto Azul.

Nombre del Residente SST: Diana Daza Becerra

Anexo 1: *Lección Aprendida*

Anexo 2: *Socialización Lección Aprendida*

Reporte No. 3:

Nombre y apellido del incidente: Incidente de Trabajo

Fecha del accidente: 30 de junio del 2022

Hora del accidente: 8:30 am

Lugar donde ocurrió el accidente: Frente de Tierra

Persona que reporta el accidente: José Contreras

Resumen de los hechos.

El día 30 de junio de 2022, nos encontrábamos moviendo la máquina y levantando el pilote para que hiciera profundidad porque el pilote largo no alcanza a engorrar y en una de esas maniobras se partió el polín que sostiene la máquina la cuál la hace rodar e inmediatamente la acción correctiva del cambio de polín

.

Nombre del Residente SST: Diana Daza Becerra

Anexo 1: *Lección Aprendida*

Anexo 2: *Socialización Lección Aprendida*

5.4 Capacitaciones realizadas.

Durante el mes de junio se realizaron charlas de seguridad por medio del personal SST, y trabajadores, en estas charlas se enfatizó mucho en el buen uso de los elementos de protección individual.

Anexo 2: *Soporte Charlas.*
Soporte de inducción

Fecha de capacitación	Tema de capacitación y charla	Nombre del capacitador	No. De asistentes
03 de junio de 2022	Seguridad en Campo	Diana Daza Becerra	16
03 de junio de 2022	Seguridad en Campo	Diana Daza Becerra	24
03 de junio de 2022	Seguridad en Campo	Diana Daza Becerra	24
03 de junio de 2022	Seguridad en Campo	Diana Daza Becerra	24
10 de junio de 2022	Una Correcta Higiene es tu mejor	Diana Daza Becerra	16

	protección contra el Covid-19		
10 de junio de 2022	Una Correcta Higiene es tu mejor protección contra el Covid-19	Diana Daza Becerra	16
10 de junio de 2022	Una Correcta Higiene es tu mejor protección contra el Covid-19	Diana Daza Becerra	24
10 de junio de 2022	Una Correcta Higiene es tu mejor protección contra el Covid-19	Diana Daza Becerra	24
17 de junio de 2022	Actos y Condiciones Inseguras	Diana Daza Becerra	9
17 de junio de 2022	Actos y Condiciones Inseguras	Diana Daza Becerra	15
17 de junio de 2022	Actos y Condiciones Inseguras	Diana Daza Becerra	24
17 de junio de 2022	Actos y Condiciones Inseguras	Diana Daza Becerra	24
24 de junio de 2022	Importante del uso de los Epps	Diana Daza Becerra	9
24 de junio de 2022	Importante del uso de los Epps	Diana Daza Becerra	15
24 de junio de 2022	Importante del uso de los Epps	Diana Daza Becerra	24
24 de junio de 2022	Importante del uso de los Epps	Diana Daza Becerra	24

5.5 Seguimiento a proveedores.

COSORCIO JCO MALLORQUIN en función de darle cumplimiento al alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, utiliza el ciclo PHVA para monitorear el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales de sus proveedores.

Se evidencia este requisito con las siguientes verificaciones;

- Recorridos de obra; verificación de condiciones de seguridad
- Verificación de pre operacionales a equipo.
- Revisión de la seguridad social.

5.6 Afiliaciones al sistema de seguridad social: (ley 100)

Antes de iniciar labores en la obra, se hacen las respectivas afiliaciones a la seguridad social a todo el personal.

Con el personal antiguo se verifican los pagos de las planillas de seguridad social garantizando que todos los trabajadores que pertenecen al proyecto estén vinculados al régimen de salud.

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

Anexo 3. *Seguridad Social CONSORCIO JCO MALLORQUIN Y SUBCONTRATISTAS.*

5.7 Entrega, reposición y supervisión de elementos de protección personal ydotación:

Se realiza entrega de los elementos de protección personal al personal que está en obra.

Se realiza las respectivas inspecciones de los elementos de protección personal y se verifican el estado y el uso de los trabajadores.

Anexo 4. *Entrega de dotación*

5.8 Inspecciones de seguridad:

Consorcio JCO MALLORQUIN, realizo en el mes de junio inspecciones de seguridad con el fin de identificar los peligros y condiciones existente de las maquinarias, con el fin de tomar medidas preventivas y correctivas durante la ejecución del proyecto, los respectivos formatos que se utilizaran para las respectivas inspecciones se están gestionando para proceder con el diligenciamiento de las mismas.

Dentro los procesos constructivos se realizan tareas de alto riesgo por medio de controles administrativos como ATS, pre operacionales y permisos de trabajo, se mitigan los riesgos que estos generan y se toman los controles que se determinen en estos.

Anexo 5. *Permisos de trabajo*

Anexo 5.1 *Inspecciones de equipos*

5.9 Inspecciones a instalaciones temporales:

Se realiza las adecuaciones en el área de campamento, se dotan cada oficina con los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades diarias.

En el área de campamento contamos con 3 oficinas portátiles las cuales están distribuidas de la siguiente manera.

- Oficina interventoría
- Oficina Consorcio Jco mallorquín
- Sala de juntas

5.10 Elementos básicos de atención a emergencia:

Consorcio JCO MALLORQUIN, contamos con los elementos adecuados para atender cualquier emergencia que se pueda presentar en el proyecto.

Contamos con 2 Camillas las cuales están ubicadas de la siguiente manera
1 ubicada en el frente de agua
1 ubicada en el frente de tierra

Contamos con 4 Botiquines los cuales están ubicados de la siguiente manera:

1 ubicado en la oficina
1 ubicados en el campamento
1 ubicado en el frente de agua
1 ubicado en el frente de tierra.

Contamos con 2 Extintores las cuales están ubicadas de la siguiente manera
1 ubicada en el frente de Tierra
1 ubicada en el frente de Agua

5.11 Equipos en obra

- Telehandler (1)
- Planta Eléctrica (6)
- Equipo de Oxicorte (1)
- Moto soldador (4)
- Piloteadoras o cabrias (3)
- Pulidoras ()
- Taladros (4)

- Sierra Circular (1)
- Escalera (1)

6. Personal activo en obra:

Se relaciona el personal que está activo en el periodo correspondiente al mes de JUNIO de 2022, que se encuentra en los diferentes frentes de trabajo en ejecución de actividades, y personal administrativo de CONSORCIO JCO MALLORQUIN.

ITEM	PERSONAL	CANT.
1	DIRECTOR DE OBRA	1
2	RESIDENTE ADMINISTRATIVA	1
3	INGENIERO RESIDENTE	1
4	RESIDENTE SST	1
5	ING. RESIDENTE AMBIENTAL	1
5	ALMACENISTA	1
7	CONDUCTOR	1
8	TRABAJADORA SOCIAL	1
	TOTAL	**8**

Tabla 3. Personal del Consorcio JCO mallorquín

ITEM	CONTRATISTAS	TOTAL
1	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	26
2	JAMAQ	1
3	SERVINTEGRALES	3
4	BYB PILOTAJES	25
5	DE LA CRUZ TOPOGRAFIA	5
	TOTAL	**60**

Tabla 4. Personal general en obra

Anexo 6. *Base de datos del personal en obra*


7. Protocolo de Bioseguridad:

Consorcio JCO MALLORQUIN, realizo en el mes de junio seguimiento al buen uso de los elementos de bioseguridad (Mascarillas), y correcto lavado de manos.

8. COPASST.

En este periodo se conformó el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y se realizó la reunión correspondiente con los representantes de cada una de las partes. Se anexa el acta de reunión correspondiente al periodo de junio del 2022.

9. Registros fotográficos:

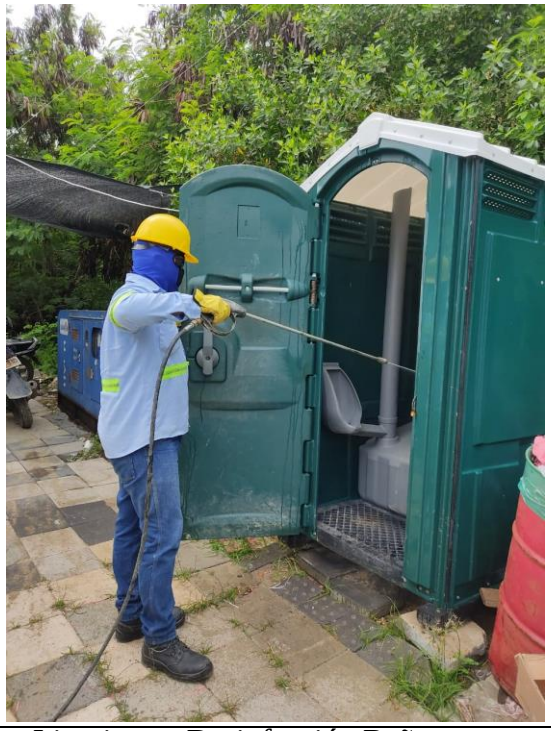	
Implementación Medidas de Bioseguridad – Desinfección de manos con alcohol	Implementación de Medidas de Bioseguridad – Lavado de Manos
	
Limpieza y Desinfección Baños y Lavamanos Portátiles	Limpieza y Desinfección Baños y Lavamanos Portátiles

	
Pausas Activas	Charlas de seguridad

10. **Listado de anexos:**

Anexo 1. *Reporte de Accidente*

Anexo 2*. Charlas****. -*** *inducción*

Anexo 3*. Seguridad social Consorcio JCO MALLORQUIN Y SUBCONTRATISTAS*

Anexo 4*. Entrega y Reposición de Epp*

Anexo 5*. Permiso de trabajo*

Anexo 5.1. *Inspecciones*

Anexo 6*. Exámenes de Ingreso*

Anexo 7*. Conformación Brigada de Emergencia*

Anexo 8*. Reunión del COPASST*

DIANA DAZA BECERRA
RESIDENTE SST
CONSORCIO JCO MALLORQUIN

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

REUNION DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

OBRA CONSORCIO JCO MALLORQUÍN.

ACTA DEL MES DE JUNIO DEL 2022.

OBJETIVO:

Realizar seguimiento a la ejecución de los programas de Seguridad y Salud En El Trabajo y seguimiento al reporte de inconformidades realizadas por los trabajadores.

Hora: 10:00 am Fecha: Junio 14 de 2022.

En las instalaciones "CAMPAMENTO" de la obra CONSORCIO JCO MALLORQUÍN a los 14 días del mes de junio se reunieron los integrantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo para tratar el siguiente orden del día:

1 LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DE ASISTENCIA.

Se llama a lista a los integrantes de COPASST:

REPRESENTANTES DEL EMPEADOR.

- *Diana Daza Becerra: Analista del Área de Seguridad y Salud en el Trabajo.*

REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES.

- *José Contreras Monterroza:(Principal)*
- *Carlos Puello Carmona: (Suplente)*

2 CONSIDERACION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

Se sometió a consideración el siguiente orden del día para su aprobación:

- *APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.*
- *REPORTE DE INCIDENTES DEL PERIODO JUNIO 2022*
- *PROPOSICIONES Y VARIOS.*
- *FIN DE REUNION.*

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. *procede a dar inicio a la reunión con la participación de los representantes del Copasst, para dar a conocer las necesidades que en estos momentos se presentan en obra.*

REPORTE DE ACCIDENTE DEL PERIODO JUNIO 2022
En este mes se presentaron dos accidentes laborales de los trabajadores Juan Carlos Bermúdez y Jimmy Pérez.

PROPOSICIONES Y VARIOS.

- *Se realiza el debido seguimiento a las actividades que se desarrollaron durante este periodo en la obra.*
- *Se realiza capacitación con el personal de la obra donde se les indica sobre los siguientes temas: seguridad en campo, una correcta higiene es tu mejor opción contra el covid-19, actos y condiciones inseguras, importante del uso de los epps e inducciones.*

COMPROMISOS:

El residente del área de seguridad industrial realizara la observación a los contratistas para que tengan en cuenta la necesidad de la dotación que requieren sus trabajadores en la obra.

FIN DE LA REUNION.

Se dio por terminada la reunión, a las 11:0 0 am para su constancia se firma.

José Contreras M.
José Contreras
Principal.

Carlos Puello
Carlos Puello
Suplente.

Diana Daza Becerra
Residente SST.

Escaneado con CamScanner
