INFORME DE ENTREGABLES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

1. DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y Apellidos	SALOMON FABIAN RINCON SIERRA				
Número del Contrato	GGC 459 DE 2022				
No. Cedula	80.539.532	De	Zipaquirá	Teléfono:	3152940828
Correo Electrónico	sfrincon@minenergia.gov.co	Fecha del Informe: 30- julio de 2022			

2. RELACIÓN DE TODOS LOS ENTREGABLES	
Entregable	Fecha programada de Entrega
Presentar dos informes (28 de febrero y 30 de julio) con las evidencias del cargue de documentos en el aplicativo AVANZAME derivados de la ejecución contractual de los contratos asignados.	Presentado en la cuenta del periodo de julio del 2022
Presentar un informe(15 de octubre) frente a las gestiones adelantadas para los contratos asignados en los cuales se evidencien los avances administrativos, técnicos y presupuestales así como las acciones adelantas y sus problemáticas de ser el caso en el marco del ejercicio de apoyo a la supervisión.	Proyectado para presentar el 15 de octubre del 2022.
Presentar un informe final, dirigido al supervisor del contrato y/o quien haga sus veces (10 de diciembre) el cual consolide cada uno de los trámites realizados respecto de los contratos asignados, identificando claramente por contrato la gestión de avance y su entrega hasta esa fecha	Proyectado para presentar el 10 de diciembre del 2022.
Un (1) informe de las actividades ejecutadas al 15 de diciembre del año en curso.	Proyectado para presentar el 15 de diciembre del 2022.

3. INFORME DE ENTREGABLES DEL PERIODO CORRESPONDIENTE
ando cumplimiento al entregable No. 1, correspondiente a la cláusula tercera del contrato GGC-459-2022, se anexa en el presente documento la gestión y avance del proceso de gestión de activos de los fondos FAZNI, FAER Y PRONE

4. APROBACIÓN
 SALOMON FABIAN RINCON SIERRA Contratista Dirección de Energía Eléctrica Revisó y Aprobó: Luis Ignacio Sánchez Castillo

Se actualizan cronogramas para subir nuevamente en la plataforma Avánzame el pasado 18 de julio del 2022:

CÓDIGO CONTRATO NEON	ETAPA	NOMBRE ACTIVIDAD	% ACTIVIDAD	FECHA INICIO ACTIVIDAD	FECHA FIN ACTIVIDAD	% AVANCE EJECUTADO
GGC-636-2020	Etapa 1	Contrato de interventoría al contrato GGC-653-2020-L09	100,00%	31/03/2021	26/06/2022	21%
GGC-659-2020	Etapa 1	Apertura de cuenta bancaria.	0,50%	28/12/2020	31/12/2020	1%
GGC-659-2020	Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	0,50%	28/12/2020	27/01/2021	1%
GGC-659-2020	Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	0,50%	31/03/2021	30/04/2021	1%
GGC-659-2020	Etapa 1	Realizar el replanteo y verificación de los usuarios beneficiarios del proyecto en el campo y tramitar las sustituciones de los mismos (si aplican), y actas de verificación de usuarios.	3,50%	27/04/2021	11/06/2021	4%
GGC-659-2020	Etapa 1	Verificar y realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	0,50%	27/04/2021	23/08/2021	1%
GGC-659-2020	Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de la existencia y suscribir las servidumbres y/o permisos de paso necesarios.	0,50%	27/04/2021	23/08/2021	1%
GGC-659-2020	Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de licencias o permisos ambientales necesarios y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de Aplicar).	0,50%	27/04/2021	23/08/2021	1%
GGC-659-2020	Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de Usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares	0,50%	27/04/2021	23/08/2021	1%
GGC-659-2020	Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	1,00%	27/04/2021	23/08/2021	1%
GGC-659-2020	Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	1,00%	11/07/2021	16/07/2021	1%
GGC-659-2020	Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	1,00%	16/07/2021	06/08/2021	1%
GGC-659-2020	Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	1,00%	06/08/2021	17/08/2021	1%
GGC-659-2020	Etapa 1	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	1,00%	17/08/2021	24/08/2021	4%
GGC-659-2020	Etapa 1	Presentacion de cronograma de obra aprobado al MINISTERIO	1,00%	24/08/2021	31/08/2021	1%

GGC-659-2020	Etapa 1	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO.	1,00%	31/08/2021	21/09/2021	1%
GGC-659-2020	Etapa 1	Suscripción del acta de Terminación de la Etapa de Previa	1,00%	21/09/2021	28/10/2021	1%
GGC-659-2020	Etapa 2	Órdenes de compra y materiales de equipos nacionales	3,00%	29/10/2021	13/11/2021	0%
GGC-659-2020	Etapa 2	Órdenes de compra y materiales de equipos importados	2,60%	29/10/2021	13/11/2021	1%
GGC-659-2020	Etapa 2	Aquisición y tranpsporte de materiales y equipos nacionales a la zona de influencia del proyecto.	2,60%	13/11/2021	13/12/2021	1%
GGC-659-2020	Etapa 2	Ensambles(equipos importados)	3,10%	13/11/2021	23/11/2021	1%
GGC-659-2020	Etapa 2	Transporte de equipos importados a puerto nacional.	3,50%	23/11/2021	02/01/2022	1%
GGC-659-2020	Etapa 2	Trámites de nacionalización de equipos importados	2,60%	02/01/2022	22/01/2022	1%
GGC-659-2020	Etapa 2	Transporte de equipos importados a puerto nacional.	2,60%	22/01/2022	21/02/2022	1%
GGC-659-2020	Etapa 2	Transporte de equipos importados a la zona del proyecto.	3,50%	21/02/2022	07/04/2022	0%
GGC-659-2020	Etapa 2	Hincado de mastiles SFV.	7,00%	13/12/2021	27/01/2022	0%
GGC-659-2020	Etapa 2	Armado de estructura	9,40%	13/12/2021	27/01/2022	0%
GGC-659-2020	Etapa 2	Instalación de gabinetes y acometidas	9,40%	07/04/2022	06/06/2022	0%
GGC-659-2020	Etapa 2	instalaciones Internas	9,40%	13/12/2021	27/01/2022	0%
GGC-659-2020	Etapa 2	Construcción, pruebas de energización, puesta en servicio y capacitación de usuarios	9,40%	07/04/2022	06/06/2022	0%
GGC-659-2020	Etapa 2	Actas de avance de instalación y acatas de recibo individuales	9,40%	07/04/2022	11/06/2022	0%
GGC-659-2020	Etapa 2	Acta de recibo y entrega de la infraestructura entre el contratista-interventoría y ministerio.	4,50%	11/06/2022	26/06/2022	0%
GGC-659-2020	Etapa 2	Acta de terminación de instalción entre el contratista-interventoría y ministerio.	3,00%	26/06/2022	24/10/2022	0%
GGC-653-2020	Etapa 1	Apertura de cuenta bancaria.	0,50%	28/12/2020	31/12/2020	1%
GGC-653-2020	Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	0,50%	28/12/2020	27/01/2021	1%
GGC-653-2020	Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	0,50%	31/03/2021	30/04/2021	1%
GGC-653-2020	Etapa 1	Realizar el replanteo y verificación de los usuarios beneficiarios del proyecto en el campo y tramitar las sustituciones de los mismos (si aplican), y actas de verificación de usuarios.	3,50%	27/04/2021	17/05/2021	4%

GGC-653-2020	Etapa 1	Verificar y realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	0,50%	27/04/2021	26/06/2021	1%
GGC-653-2020	Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de la existencia y suscribir las servidumbres y/o permisos de paso necesarios.	0,50%	27/04/2021	26/06/2021	1%
GGC-653-2020	Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de licencias o permisos ambientales necesarios y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de Aplicar).	0,50%	27/04/2021	26/06/2021	1%
GGC-653-2020	Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de Usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares	0,50%	27/04/2021	26/06/2021	1%
GGC-653-2020	Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	1,00%	27/04/2021	26/06/2021	1%
GGC-653-2020	Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	1,00%	26/06/2021	01/07/2021	1%
GGC-653-2020	Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	1,00%	01/07/2021	16/07/2021	1%
GGC-653-2020	Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	1,00%	16/07/2021	27/07/2021	1%
GGC-653-2020	Etapa 1	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	1,00%	27/07/2021	03/08/2021	1%
GGC-653-2020	Etapa 1	Presentacion de cronograma de obra aprobado al MINISTERIO	1,00%	03/08/2021	10/08/2021	1%
GGC-653-2020	Etapa 1	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO.	1,00%	10/08/2021	22/08/2021	1%
GGC-653-2020	Etapa 1	Suscripcion del acta de Terminacion de la Etapa de Previa	1,00%	22/08/2021	28/09/2021	0%
GGC-653-2020	Etapa 2	Ordenes de compra y materiales de equipos nacionales	3,00%	29/09/2021	14/10/2021	0%
GGC-653-2020	Etapa 2	Ordenes de compra y materiales de equipos importados	2,60%	29/09/2021	14/10/2021	3%
GGC-653-2020	Etapa 2	Aquisición y tranpsporte de materiales y equipos nacionales a la zona de influencia del proyecto.	2,60%	14/10/2021	13/11/2021	0%
GGC-653-2020	Etapa 2	Ensambles(equipos importados)	3,10%	14/10/2021	24/10/2021	0%
GGC-653-2020	Etapa 2	Transporte de equipos importados a puerto nacional.	3,50%	24/10/2021	03/12/2021	0%
GGC-653-2020	Etapa 2	Trámites de nacionalización de equipos importados	2,60%	03/12/2021	23/12/2021	0%
GGC-653-2020	Etapa 2	construcción y ensambles de gabinetes con equipos importados.	2,60%	23/12/2021	12/01/2022	0%

GGC-653-2020	Etapa 2	Transporte de equipos importados a la zona del proyecto.	3,50%	12/01/2022	26/02/2022	0%
GGC-653-2020	Etapa 2	Hincado de mastiles SFV.	7,00%	13/11/2021	08/12/2021	0%
GGC-653-2020	Etapa 2	Armado de estructura	9,40%	13/11/2021	08/12/2021	0%
GGC-653-2020	Etapa 2	Instalación de gabinetes y acometidas	9,40%	26/02/2022	12/04/2022	0%
GGC-653-2020	Etapa 2	instalaciones Internas	9,40%	13/11/2021	28/12/2021	0%
GGC-653-2020	Etapa 2	Construcción, pruebas de energización, puesta en servicio y capacitación de usuarios	9,40%	26/02/2022	12/04/2022	0%
GGC-653-2020	Etapa 2	Actas de avance de instalación y acatas de recibo individuales	9,40%	26/02/2022	12/04/2022	0%
GGC-653-2020	Etapa 2	Acta de recibo y entrega de la infraestructura entre el contratista-interventoría y ministerio.	4,50%	12/04/2022	27/04/2022	0%
GGC-653-2020	Etapa 2	Acta de terminación de instalción entre el contratista-interventoría y ministerio.	3,00%	27/04/2022	25/08/2022	0%
GGC-636-2020	Etapa 1	Contrato de interventoría al contrato GGC-659-2020-L09	100,00%	27/04/2022	25/08/2022	21%
GGC-738-2019	Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.(plazo 15 días a partir de la firma del contrato)	0,50%	25/11/2020	03/12/2020	1%
GGC-738-2019	Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	0,50%	25/11/2020	25/12/2020	1%
GGC-738-2019	Etapa 1	Realización de socialización y capacitación de usuarios.	0,50%	25/11/2020	24/04/2021	1%
GGC-738-2019	Etapa 1	Realizar el replanteo y verificación de los usuarios beneficiarios del proyecto en el campo y tramitar las sustituciones de los mismos (si aplican).	0,50%	25/11/2020	24/04/2021	0%
GGC-738-2019	Etapa 1	Informe del replanteo del 25% de los usuarios validados.	0,50%	25/11/2020	24/01/2021	1%
GGC-738-2019	Etapa 1	Informe del replanteo del 50% de los usuarios validados.	0,50%	24/01/2021	25/03/2021	1%
GGC-738-2019	Etapa 1	Informe del replanteo del 100% de los usuarios validados.	0,50%	25/03/2021	24/04/2021	0%
GGC-738-2019	Etapa 1	Verificar y realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	0,50%	03/02/2021	04/05/2021	1%
GGC-738-2019	Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de la existencia y suscribir las servidumbres y/o permisos de paso necesarios.	1,00%	25/11/2020	14/04/2021	1%
GGC-738-2019	Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de licencias o permisos ambientales necesarios y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de Aplicar).	1,00%	03/02/2021	04/05/2021	1%

GGC-738-2019	Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de Usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares	1,00%	03/02/2021	04/05/2021	1%
GGC-738-2019	Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	1,00%	03/02/2021	04/05/2021	1%
GGC-738-2019	Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	1,00%	25/11/2020	24/01/2021	1%
GGC-738-2019	Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	1,00%	24/01/2021	08/02/2021	1%
GGC-738-2019	Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	1,00%	08/02/2021	23/02/2021	1%
GGC-738-2019	Etapa 1	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	1,00%	23/02/2021	02/03/2021	1%
GGC-738-2019	Etapa 1	Presentación de cronograma de obra aprobado al Ministerio	1,00%	02/03/2021	16/05/2021	1%
GGC-738-2019	Etapa 1	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO.	1,00%	02/03/2021	01/04/2021	1%
GGC-738-2019	Etapa 1	Suscripción del acta de Terminación de la Etapa de Previa	1,00%	04/05/2021	22/06/2021	0%
GGC-738-2019	Etapa 2	Compra de equipos, nacionalización y recepción de equipos	13,00%	24/06/2021	21/11/2021	11%
GGC-738-2019	Etapa 2	Tramite de exención de IVA	0,50%	22/10/2021	21/12/2021	1%
GGC-738-2019	Etapa 2	Ensambles	7,00%	21/11/2021	19/02/2022	0%
GGC-738-2019	Etapa 2	Transporte	7,00%	06/12/2021	06/03/2022	2%
GGC-738-2019	Etapa 2	Instalación	47,00%	21/12/2021	09/07/2022	1%
GGC-738-2019	Etapa 2	Pruebas y puesta en servicio	2,00%	10/01/2022	01/11/2022	0%
GGC-738-2019	Etapa 2	Capacitaciones a usuarios	4,00%	21/12/2021	19/07/2022	0%
GGC-738-2019	Etapa 2	Acta de recibo de Instalación– Interventoría	4,50%	01/11/2022	16/11/2022	0%
GGC-433-L02-2020	Etapa 1	Contrato de interventoría al contrato GGC-738-2019	100,00%	25/11/2020	25/02/2023	29%
GGC-739-2019	Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	0,50%	25/11/2020	03/12/2020	1%
GGC-739-2019	Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	0,50%	25/11/2020	25/12/2020	1%
GGC-739-2019	Etapa 1	Realización de socialización y capacitación de usuarios.	0,50%	25/11/2020	04/04/2021	1%
GGC-739-2019	Etapa 1	Realizar el replanteo y verificación de los usuarios beneficiarios del proyecto en el campo y tramitar las sustituciones de los mismos (si aplican).	0,50%	25/11/2020	04/04/2021	1%
GGC-739-2019	Etapa 1	Informe del replanteo del 25% de los usuarios validados.	0,50%	25/11/2020	24/01/2021	1%

GGC-739-2019	Etapa 1	Informe del replanteo del 50% de los usuarios validados.	0,50%	24/01/2021	05/03/2021	1%
GGC-739-2019	Etapa 1	Informe del replanteo del 100% de los usuarios validados.	0,50%	05/03/2021	04/04/2021	1%
GGC-739-2019	Etapa 1	Verificar y realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	0,50%	14/01/2021	14/04/2021	1%
GGC-739-2019	Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de la existencia y suscribir las servidumbres y/o permisos de paso necesarios.	1,00%	25/11/2020	04/04/2021	1%
GGC-739-2019	Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de licencias o permisos ambientales necesarios y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de Aplicar).	1,00%	14/01/2021	14/04/2021	1%
GGC-739-2019	Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de Usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares	1,00%	14/01/2021	14/04/2021	1%
GGC-739-2019	Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	1,00%	14/01/2021	14/04/2021	1%
GGC-739-2019	Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	1,00%	25/11/2020	24/01/2021	1%
GGC-739-2019	Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	1,00%	24/01/2021	08/02/2021	1%
GGC-739-2019	Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	1,00%	08/02/2021	23/02/2021	1%
GGC-739-2019	Etapa 1	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	1,00%	23/02/2021	02/03/2021	1%
GGC-739-2019	Etapa 1	Presentación de cronograma de obra aprobado al Ministerio	1,00%	02/03/2021	16/05/2021	1%
GGC-739-2019	Etapa 1	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO.	1,00%	02/03/2021	01/04/2021	1%
GGC-739-2019	Etapa 1	Suscripción del acta de Terminación de la Etapa de Previa	1,00%	14/04/2021	24/04/2021	1%
GGC-739-2019	Etapa 2	Compra de equipos, nacionalización y recepción de equipos	13,00%	25/04/2021	23/08/2021	7%
GGC-739-2019	Etapa 2	Tramite de exención de IVA	0,50%	23/08/2021	22/10/2021	1%
GGC-739-2019	Etapa 2	Ensambles	7,00%	23/08/2021	22/09/2021	0%
GGC-739-2019	Etapa 2	Transporte	7,00%	07/09/2021	07/10/2021	0%
GGC-739-2019	Etapa 2	Instalación	47,00%	07/09/2021	05/01/2022	0%
GGC-739-2019	Etapa 2	Pruebas y puesta en servicio	2,00%	17/09/2021	10/01/2022	0%
GGC-739-2019	Etapa 2	Capacitaciones a usuarios	4,00%	07/09/2021	15/01/2022	0%

GGC-739-2019	Etapa 2	Acta de recibo de Instalación– Interventoría	4,50%	10/01/2022	24/03/2022	0%
GGC-433-L12-2020	Etapa 1	Contrato de interventoría al contrato GGC-739-2019	100,00%	25/11/2020	25/05/2022	22%
GGC-798-2019	Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.(plazo 15 días a partir de la firma del contrato)	0,50%	15/09/2020	30/09/2020	1%
GGC-798-2019	Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	0,50%	30/12/2019	14/01/2020	1%
GGC-798-2019	Etapa 1	Realización de socialización y capacitación de usuarios.	0,50%	03/11/2020	22/06/2021	1%
GGC-798-2019	Etapa 1	Realizar el replanteo y verificación de los usuarios beneficiarios del proyecto en el campo y tramitar las sustituciones de los mismos (si aplican).	0,50%	03/12/2020	22/06/2021	1%
GGC-798-2019	Etapa 1	Informe del replanteo del 25% de los usuarios validados.	0,50%	03/12/2020	02/01/2021	1%
GGC-798-2019	Etapa 1	Informe del replanteo del 50% de los usuarios validados.	0,50%	02/01/2021	18/03/2021	1%
GGC-798-2019	Etapa 1	Informe del replanteo del 100% de los usuarios validados.	0,50%	18/02/2021	22/06/2021	1%
GGC-798-2019	Etapa 1	Verificar y realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	0,50%	03/11/2020	22/06/2021	1%
GGC-798-2019	Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de la existencia y suscribir las servidumbres y/o permisos de paso necesarios.	1,00%	03/11/2020	30/06/2021	1%
GGC-798-2019	Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de licencias o permisos ambientales necesarios y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de Aplicar).	1,00%	03/11/2020	30/06/2021	1%
GGC-798-2019	Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de Usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares	1,00%	03/11/2020	22/06/2021	1%
GGC-798-2019	Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	1,00%	03/11/2020	22/06/2021	1%
GGC-798-2019	Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	1,00%	03/11/2020	08/12/2020	1%
GGC-798-2019	Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	1,00%	08/12/2020	12/01/2021	1%
GGC-798-2019	Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	1,00%	12/01/2021	16/02/2021	1%
GGC-798-2019	Etapa 1	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	1,00%	16/02/2021	23/03/2021	1%
GGC-798-2019	Etapa 1	Presentación de cronograma de obra aprobado al Ministerio	1,00%	23/03/2021	22/06/2021	1%

GGC-798-2019	Etapa 1	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO.	1,00%	23/03/2021	22/06/2021	1%
GGC-798-2019	Etapa 1	Suscripción del acta de Terminación de la Etapa de Previa	1,00%	22/06/2021	02/07/2021	1%
GGC-798-2019	Etapa 2	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (Desplegar las actividades de ejecución, se debe incluir el plazo previsto para el trámite de exención de IVA y las capacitaciones a los usuarios)	80,50%	02/07/2021	06/10/2022	0%
GGC-798-2019	Etapa 2	Acta de recibo de Instalación – Interventoría	4,50%	06/10/2022	25/10/2022	0%
GGC-433-L15-2020	Etapa 1	Contrato de interventoría al contrato GGC-798-2019	100,00%	11/03/2020	08/12/2022	15%
GGC-812-2019	Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	0,50%	27/11/2020	02/12/2020	1%
GGC-812-2019	Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	0,50%	27/11/2020	27/12/2020	1%
GGC-812-2019	Etapa 1	Realización de socialización y capacitación de usuarios.	0,50%	27/11/2020	26/04/2021	1%
GGC-812-2019	Etapa 1	Realizar el replanteo y verificación de los usuarios beneficiarios del proyecto en el campo y tramitar las sustituciones de los mismos (si aplican).	0,50%	27/11/2020	26/04/2021	1%
GGC-812-2019	Etapa 1	Informe del replanteo del 25% de los usuarios validados.	0,50%	27/11/2020	26/01/2021	1%
GGC-812-2019	Etapa 1	Informe del replanteo del 50% de los usuarios validados.	0,50%	26/01/2021	27/03/2021	1%
GGC-812-2019	Etapa 1	Informe del replanteo del 100% de los usuarios validados.	0,50%	27/03/2021	26/04/2021	1%
GGC-812-2019	Etapa 1	Verificar y realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	0,50%	05/02/2021	06/05/2021	1%
GGC-812-2019	Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de la existencia y suscribir las servidumbres y/o permisos de paso necesarios.	1,00%	27/11/2020	16/04/2021	1%
GGC-812-2019	Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de licencias o permisos ambientales necesarios y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de Aplicar).	1,00%	27/12/2020	16/05/2021	1%
GGC-812-2019	Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de Usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares	1,00%	27/12/2020	16/05/2021	1%
GGC-812-2019	Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	1,00%	27/12/2020	16/05/2021	1%

GGC-812-2019	Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	1,00%	27/11/2020	25/02/2021	1%
GGC-812-2019	Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	1,00%	25/02/2021	19/03/2021	1%
GGC-812-2019	Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	1,00%	19/03/2021	03/04/2021	1%
GGC-812-2019	Etapa 1	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	1,00%	03/04/2021	18/04/2021	1%
GGC-812-2019	Etapa 1	Presentación de cronograma de obra aprobado al Ministerio	1,00%	18/04/2021	28/04/2021	1%
GGC-812-2019	Etapa 1	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO.	1,00%	18/04/2021	18/05/2021	1%
GGC-812-2019	Etapa 1	Suscripción del acta de Terminación de la Etapa de Previa	1,00%	16/05/2021	16/07/2021	1%
GGC-812-2019	Etapa 2	Compra de equipos, nacionalización y recepción de equipos	13,00%	18/07/2021	11/09/2022	13%
GGC-812-2019	Etapa 2	Tramite de exención de IVA	0,50%	18/07/2021	15/12/2021	1%
GGC-812-2019	Etapa 2	Ensambles	7,00%	15/11/2021	19/01/2022	4%
GGC-812-2019	Etapa 2	Transporte	7,00%	15/12/2021	15/03/2022	2%
GGC-812-2019	Etapa 2	Instalación	47,00%	30/12/2021	30/03/2022	4%
GGC-812-2019	Etapa 2	Pruebas y puesta en servicio	2,00%	14/01/2022	02/08/2022	0%
GGC-812-2019	Etapa 2	Capacitaciones a usuarios	4,00%	03/02/2022	27/08/2022	0%
GGC-812-2019	Etapa 2	Acta de recibo de Instalación– Interventoría	4,50%	14/01/2022	12/08/2022	0%
GGC-433-L13-2020	Etapa 1	Contrato de interventoría al contrato GGC-812-2019	100,00%	11/09/2022	26/09/2022	39%
GGC-816-2019	Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.(plazo 15 días a partir de la firma del contrato)	0,50%	22/12/2020	30/12/2020	1%
GGC-816-2019	Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	0,50%	22/12/2020	21/01/2021	1%
GGC-816-2019	Etapa 1	Realización de socialización y capacitación de usuarios.	0,50%	30/12/2020	31/07/2021	1%
GGC-816-2019	Etapa 1	Realizar el replanteo y verificación de los usuarios beneficiarios del proyecto en el campo y tramitar las sustituciones de los mismos (si aplican).	0,50%	22/01/2021	23/08/2021	1%
GGC-816-2019	Etapa 1	Informe del replanteo del 25% de los usuarios validados.	0,50%	22/01/2021	03/04/2021	1%
GGC-816-2019	Etapa 1	Informe del replanteo del 50% de los usuarios validados.	0,50%	28/02/2021	11/05/2021	1%
GGC-816-2019	Etapa 1	Informe del replanteo del 100% de los usuarios validados.	0,50%	07/04/2021	23/08/2021	1%
GGC-816-2019	Etapa 1	Verificar y realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	0,50%	30/12/2020	23/08/2021	1%
GGC-816-2019	Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de la existencia y suscribir las	1,00%	30/12/2020	23/08/2021	1%


		servidumbres y/o permisos de paso necesarios.				
GGC-816-2019	Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de licencias o permisos ambientales necesarios y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de Aplicar).	1,00%	30/12/2020	23/08/2021	1%
GGC-816-2019	Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de Usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares	1,00%	30/12/2020	23/08/2021	1%
GGC-816-2019	Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	1,00%	30/12/2020	23/08/2021	1%
GGC-816-2019	Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	1,00%	21/01/2021	25/04/2021	1%
GGC-816-2019	Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	1,00%	22/03/2021	17/05/2021	1%
GGC-816-2019	Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	1,00%	13/04/2021	01/06/2021	1%
GGC-816-2019	Etapa 1	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	1,00%	28/04/2021	16/06/2021	1%
GGC-816-2019	Etapa 1	Presentación de cronograma de obra aprobado al Ministerio	1,00%	13/05/2021	25/07/2021	1%
GGC-816-2019	Etapa 1	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO.	1,00%	23/05/2021	22/10/2021	1%
GGC-816-2019	Etapa 1	Suscripción del acta de Terminación de la Etapa de Previa	1,00%	23/05/2021	02/12/2021	1%
GGC-816-2019	Etapa 2	Compra de equipos, nacionalización y recepción de equipos	13,00%	02/12/2021	01/04/2022	7%
GGC-816-2019	Etapa 2	Tramite de exención de IVA	0,50%	01/04/2022	05/06/2022	0%
GGC-816-2019	Etapa 2	Ensambles	7,00%	01/04/2022	31/05/2022	0%
GGC-816-2019	Etapa 2	Transporte	7,00%	16/04/2022	15/06/2022	0%
GGC-816-2019	Etapa 2	Instalación	47,00%	01/05/2022	14/08/2022	0%
GGC-816-2019	Etapa 2	Pruebas y puesta en servicio	2,00%	21/05/2022	09/09/2022	0%
GGC-816-2019	Etapa 2	Capacitaciones a usuarios	4,00%	01/05/2022	15/08/2022	0%
GGC-816-2019	Etapa 2	Acta de recibo de Instalación– Interventoría	4,50%	15/08/2022	29/08/2022	0%
GGC-433-L09-2020	Etapa 1	Contrato de interventoría al contrato GGC-816-2019	100,00%	30/12/2020	15/08/2022	22%
GGC-813-2019	Etapa 1	Suscripción de Encargo Fiduciario (Plazo 15 días a partir del contrato)	0,50%	01/10/2020	11/10/2020	1%
GGC-813-2019	Etapa 1	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad (En caso de aplicar)	0,00%			0%

GGC-813-2019	Etapa 1	Realización de Socialización y Capacitación de Usuarios	1,00%	22/12/2020	20/02/2021	1%
GGC-813-2019	Etapa 1	Realizar el Replanteo y Verificación de los Usuarios Beneficiarios del Proyecto en el Campo y Tramitar las Sustituciones de los mismos (Si aplican)	0,50%	22/12/2020	21/04/2021	1%
GGC-813-2019	Etapa 1	Informe del Replanteo del 25% de los usuarios validados	0,50%	22/12/2020	20/02/2021	1%
GGC-813-2019	Etapa 1	Informe del Replanteo del 50% de los usuarios validados	0,50%	21/02/2021	23/03/2021	1%
GGC-813-2019	Etapa 1	Informe del Replanteo del 100% de los usuarios validados	0,50%	24/03/2021	23/04/2021	1%
GGC-813-2019	Etapa 1	Verificar y realizar los tramites de consultas previas, en caso de ser necesarias	0,50%	22/12/2020	21/01/2021	1%
GGC-813-2019	Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de la existencia y suscribir las servidumbres y/o permisos de paso necesarios.	1,00%	22/12/2020	21/01/2021	1%
GGC-813-2019	Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de licencias o permisos ambientales necesarios y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de aplicar).	1,00%	22/12/2020	21/01/2021	1%
GGC-813-2019	Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o Zonas de reserva y similares.	1,00%	22/12/2020	21/01/2021	1%
GGC-813-2019	Etapa 1	Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecución no se encuentren ubicadas en zonas de alto riesgo.	1,00%	22/12/2020	21/01/2021	1%
GGC-813-2019	Etapa 1	Elaboración de Pliegos de contratación de contrato de obra/suministro	1,00%	20/02/2021	12/03/2021	1%
GGC-813-2019	Etapa 1	Publicación de Pliegos o invitación directa según corresponda	1,00%	12/03/2021	06/04/2021	1%
GGC-813-2019	Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas	1,00%	06/04/2021	01/05/2021	1%
GGC-813-2019	Etapa 1	Firma de contratos de suministro y obras, según corresponda, y suscripción de actas de inicio	1,00%	01/05/2021	31/05/2021	1%
GGC-813-2019	Etapa 1	Presentación de cronograma de obra aprobado al Ministerio	1,00%	31/05/2021	10/06/2021	1%
GGC-813-2019	Etapa 1	Suscripción del acta de terminación de la Etapa Previa	1,00%	10/06/2021	19/11/2021	1%
GGC-813-2019	Etapa 1	Ubicar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño grafico será acordado con el MINISTERIO	1,00%	21/06/2021	21/07/2021	100%
GGC-813-2019	Etapa 2	Tramite de extensión del IVA	0,50%	20/11/2021	18/02/2022	1%


GGC-813-2019	Etapa 2	Importación y Suministro de Equipos	5,00%	18/02/2022	19/05/2022	2%
GGC-813-2019	Etapa 2	Montaje y Puesta en Servicio	65,00%	19/05/2022	15/12/2022	0%
GGC-813-2019	Etapa 2	Capacitación de Usuarios	0,50%	15/12/2022	30/12/2022	0%
GGC-813-2019	Etapa 2	Acta de Recibo de Instalación - Interventoría	2,00%	30/12/2022	14/01/2023	0%
GGC-813-2019	Etapa 2	Actas de Liquidación de contratos de suministro y obra, según corresponda	2,00%	14/01/2023	13/02/2023	0%
GGC-813-2019	Etapa 2	Acta de Terminación de la instalación entre MME, INTERVENTORÍA y CONTRATISTA	5,00%	13/02/2023	15/03/2023	0%
GGC-813-2019	Etapa 2	Acta de recibo de infraestructura y entrega de inventarios entre el MME, INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA	5,00%	13/02/2023	15/03/2023	0%
GGC-429-L03-2020	Etapa 1	Contrato de interventoría al contrato GGC-813-2019	100,00%	26/10/2020	14/03/2023	18%

Remito capturas de pantalla de los contratos en ejecución de la plataforma Avánzame:


- FAZNI- GGC-738-2019

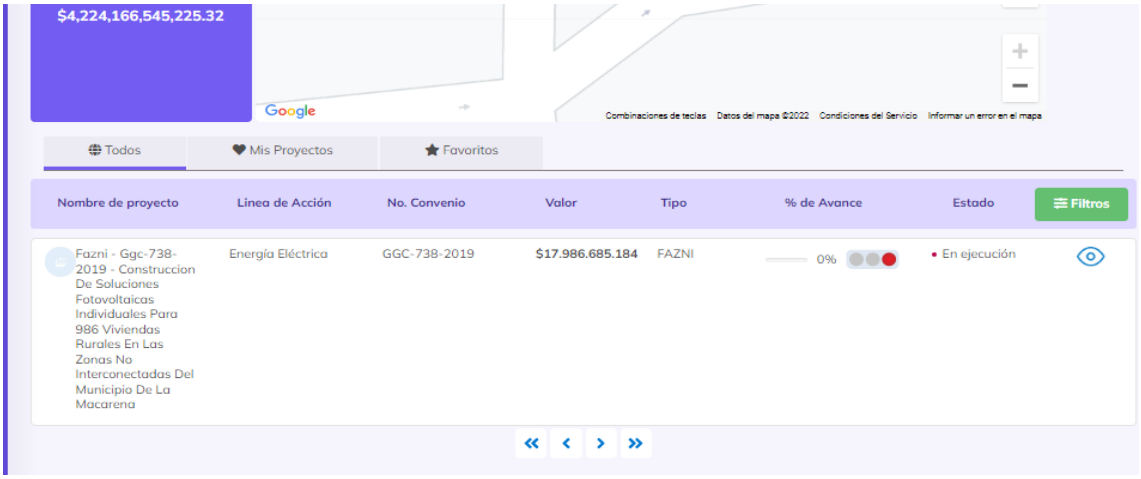


- FAZNI- GGC-816-2019

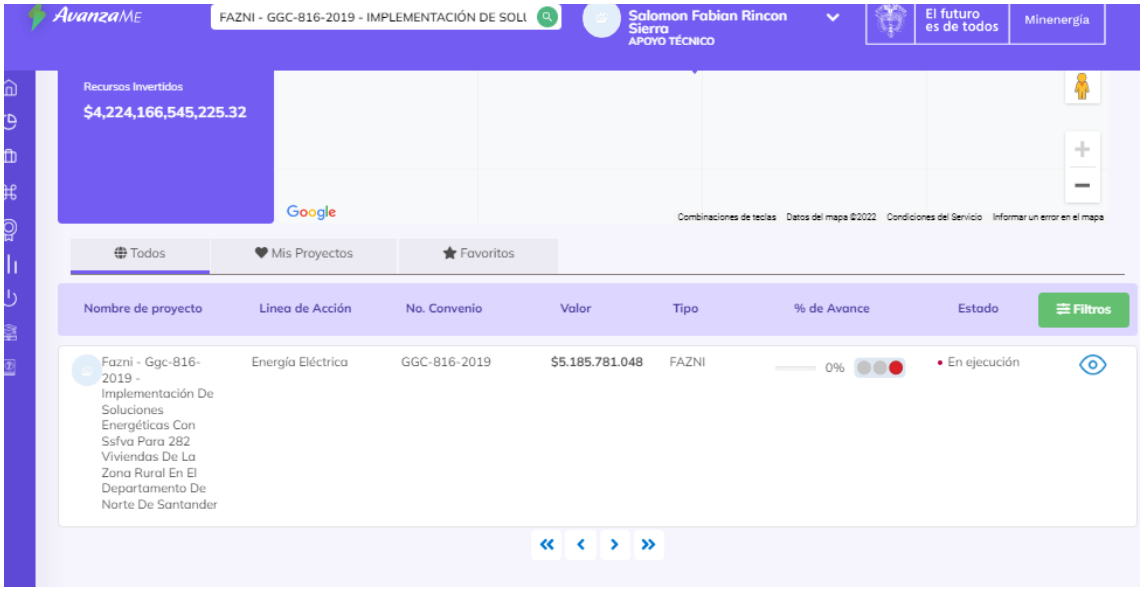


- FAZNI- GGC-739-2019

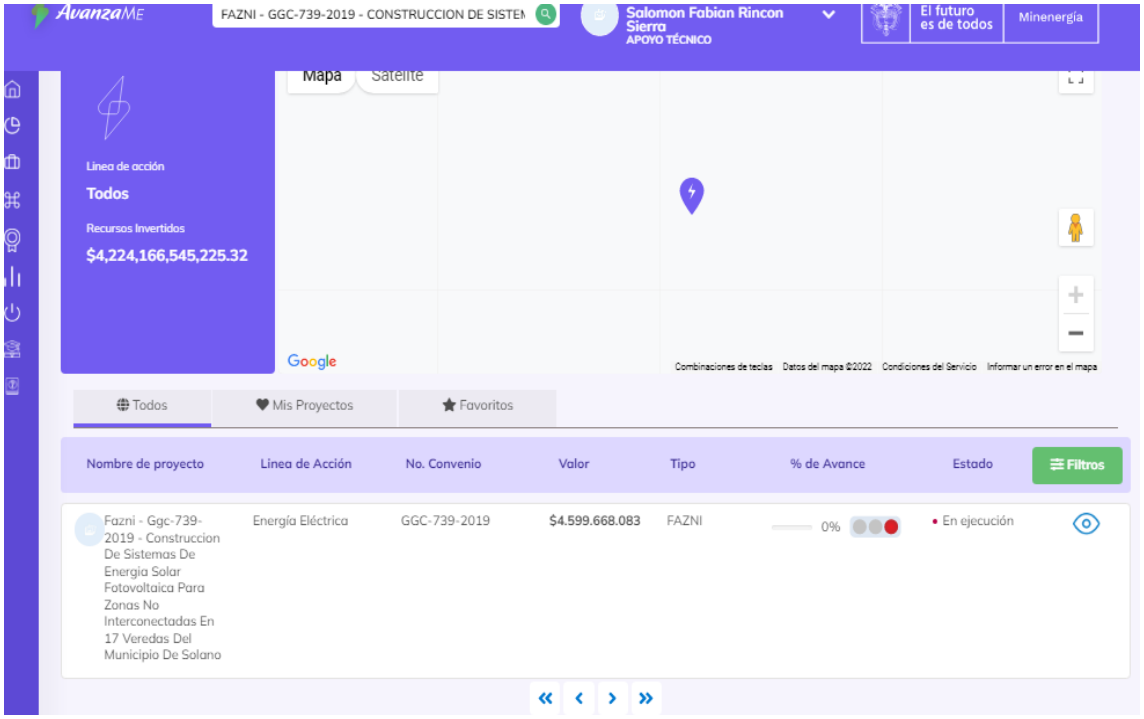


- FAZNI- GGC-812-2019

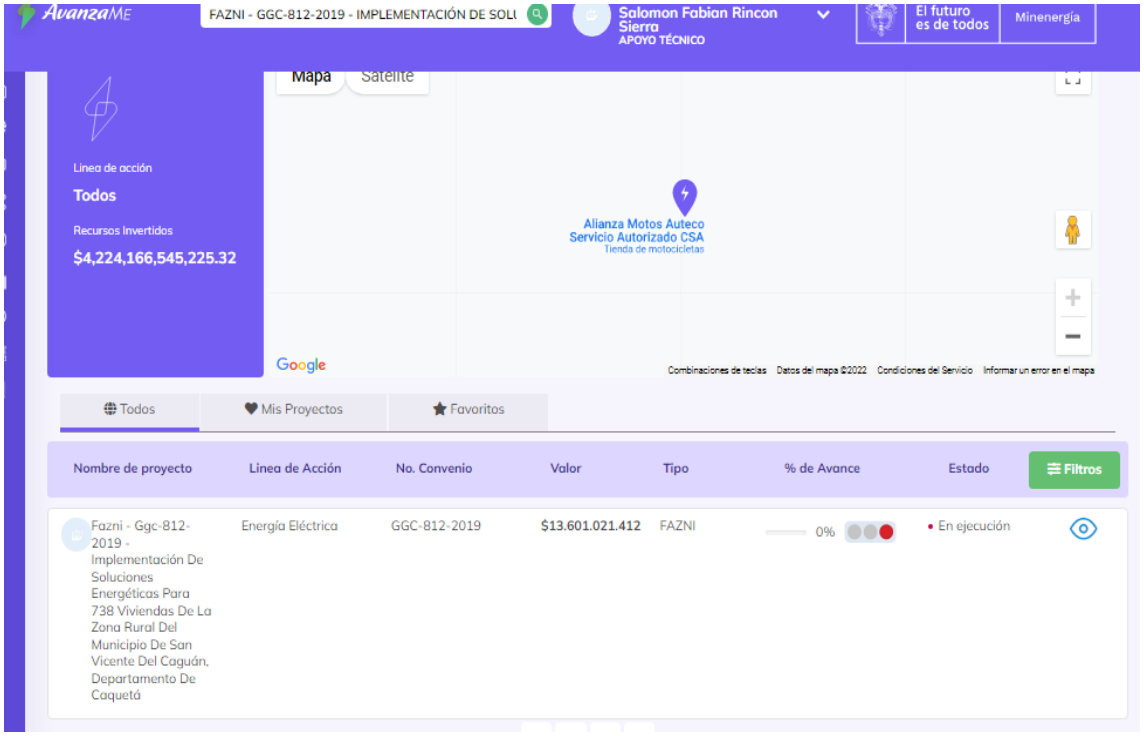


- FAZNI- GGC-798-2019

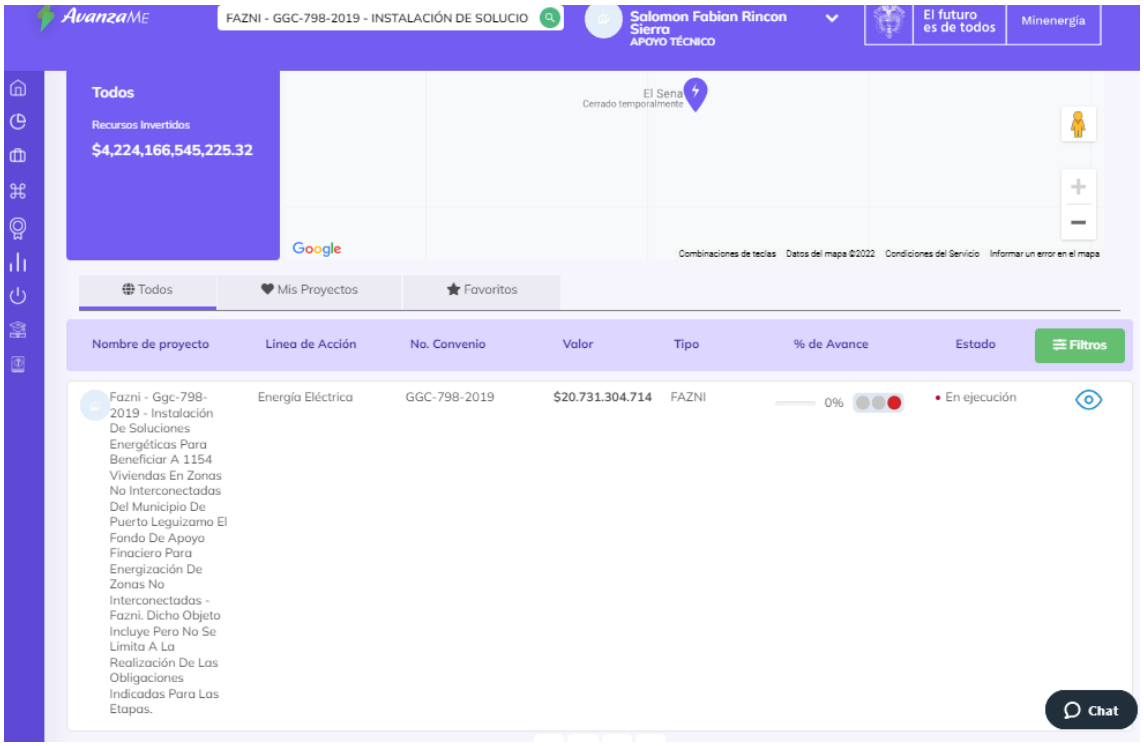

- FAZNI- GGC-813-2019

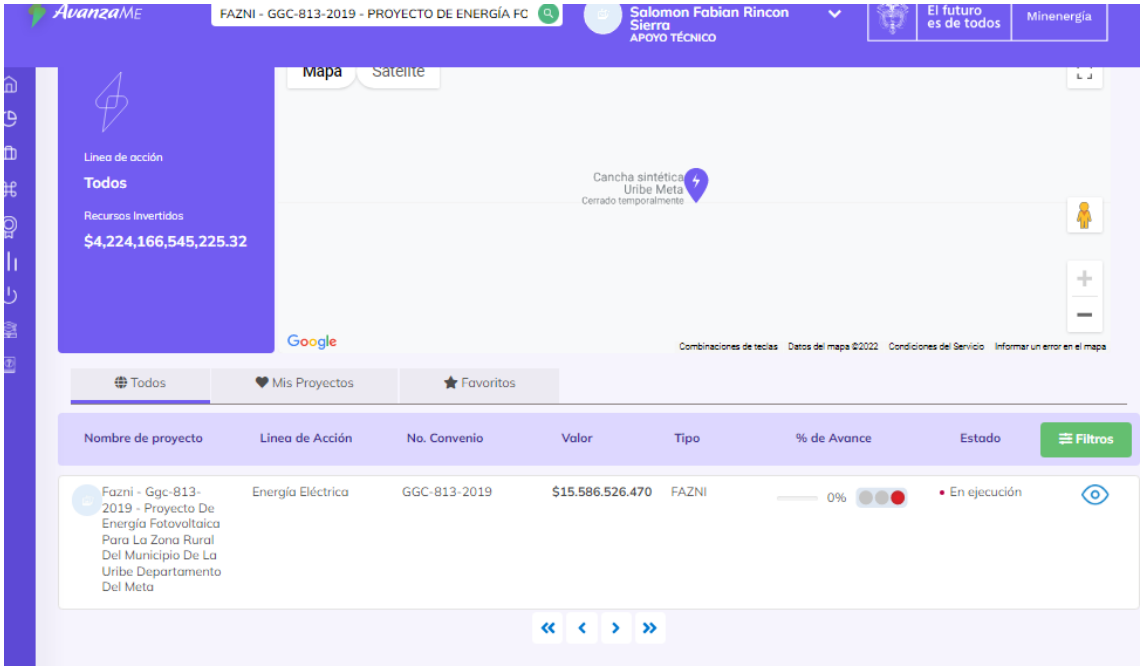

- FAZNI- GGC-653-2020

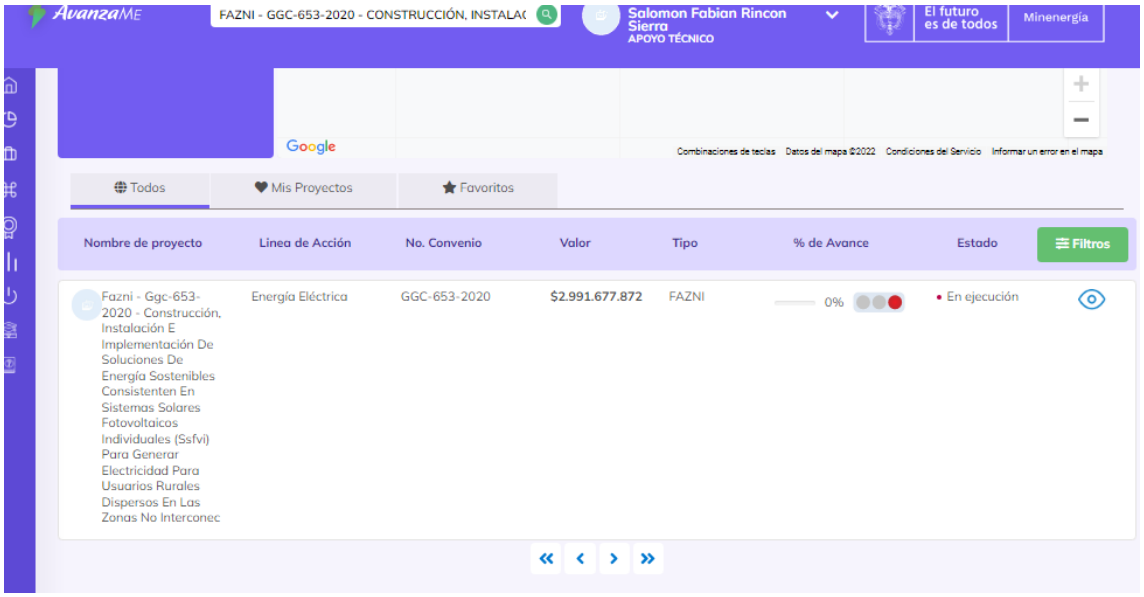

- FAZNI- GGC-659-2020

