La Jagua de Ibirico, Cesar, 05 de septiembre de 2022

Doctor
CARLOS ROBERTO BORREGO DAZA
Jefe Oficina Contratación
La Jagua de Ibirico, Cesar.

INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO N° 317 DE 2022
PERIODO UNICO
Del 25 de agosto al 03 de septiembre del 2022

OBJETIVO: Mantener informado al Municipio de La Jagua de Ibirico sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

1 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No	317 del 24 de AGOSTO del 2022		
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA		
CONTRATISTA:	HYDRORED S.A.S R/L RICARDO ANDRES MIELES MORENO		
OBJETO:	"PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES POR CAUSA DE DERRUMBES EN ZONA RURAL DE LA VEREDA SORORIA (PARTE ALTA), MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR"		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 27.939.110		
VALOR ADICION	$ 0		
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 27.939.110		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DIEZ (10) DIAS CALENDARIO		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVICION:	24 DE AGOSTO DEL 2022		
FECHA DE INICIO:	25 DE AGOSTO DEL 2022		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N.A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
ADICIONAL EN VALOR:	$	FECHA:	
PRORROGAS		FECHA:	
SUSPENSIÓN:			
FECHA DE SUSPENSIÓN:			
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:			
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:	03 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		

EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

Mediante CLAUSULA NUMERO 07 del Contrato de Obra No. 317 - 2022 de fecha 24 agosto de 2022, se me designó la supervisión, control y vigilancia del mismo objeto de este informe, me permito informar el desarrollo correspondiente al **PERIODO UNICO** en los siguientes aspectos:

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Las actividades ejecutadas por parte del contratista durante el periodo comprendido **del 25 de agosto al 03 de septiembre del 2022,** fueron las siguientes:

a) Durante la ejecución, el contratista, realizó las actividades de intervención de los puntos críticos y de alto riesgo, en los cuales se presentaba derrumbes, estrecho ancho de la vía, condiciones talud con alturas superior a 4 metros que presentaban agrietamiento, y remoción de material particulado de gran magnitud en la parte alta de la vereda Sororia del Municipio.


b) Durante la ejecución, el contratista, presto el servicio de atención a derrumbes, cumpliendo con las siguientes características.

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.
1	**DESCRIPCION DE ACTIVIDAD O SERVICIO**		
1.1	CORTE DE TALUDES PARA AMPLIACION DE VIA	M3	99,00
1.2	CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	M2	1.500,00
1.2	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTES PRODUCTO DE DERRUMBES	M3	158,90

REGISTRO FOTOGRAFICO


- **CORTE DE TALUDES PARA AMPLIACION DE VIA**




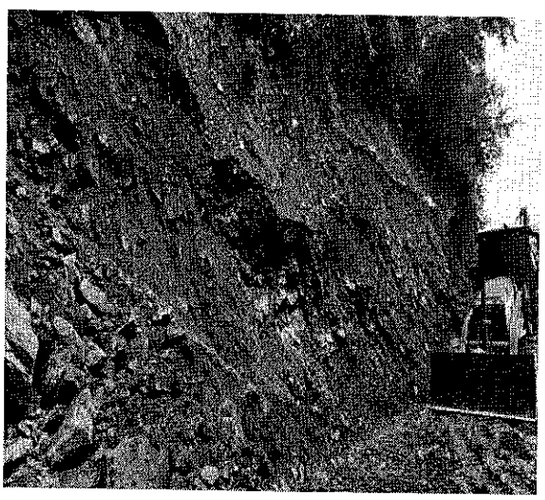


EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

EL PUEBLO PRIMERO
OVELIO JIMÉNEZ MACHADO
ALCALDE MUNICIPAL

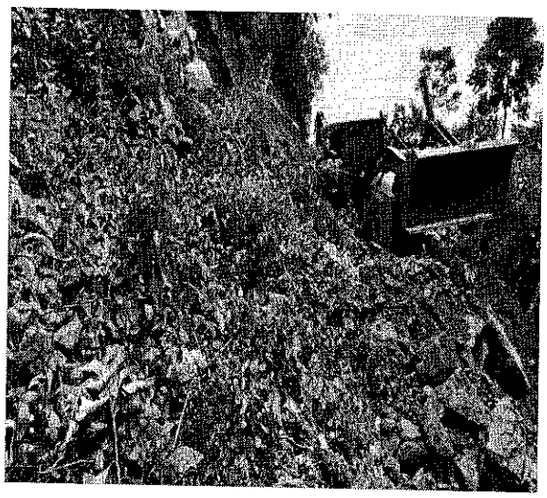

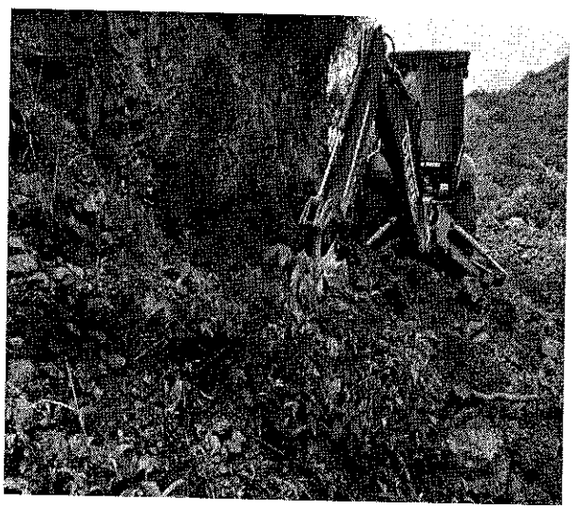

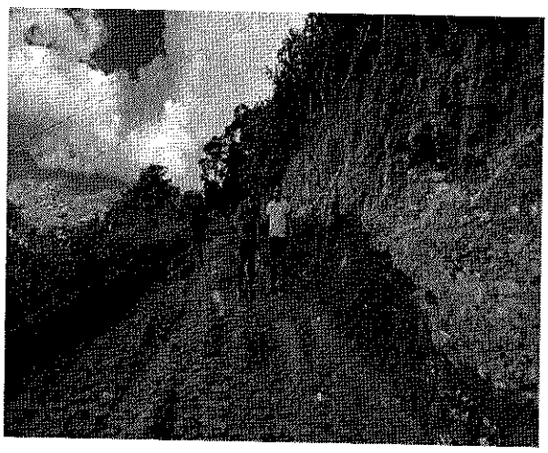



CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE





EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

EL PUEBLO PRIMERO
OVELIO JIMÉNEZ MACHADO
ALCALDE MUNICIPAL

- **RETIRO DE MATERIAL SOBRANTES PRODUCTO DE DERRUMBES**



3 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

Se verifico el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud y pensión) correspondiente al periodo laborado por el contratista:


SEGURIDAD SOCIAL DEL MES AGOSTO

IBC	$ 1.000.000
SALUD	$ 125.000
PENSIÓN	$ 160.000
RIESGOS	$ 69.600
N° DE PLANILLA	9438766320

AVANCE FINANCIERO.

CONCEPTO	VALOR	FECHA EGRESO	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 27.939.110		100%
ADICION	$		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 27.939.110		
PAGO ANTICIPADO	$		
PAGO UNICO	$ 27.939.110	PENDIENTE	100%
AMORTIZACION PAGO UNICO	0	N.A	
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 27.939.110	PENDIENTE	100%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	0	N.A.	0 %
VALOR TOTAL AMORTIZACIÒN	0	N.A	

EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldía@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

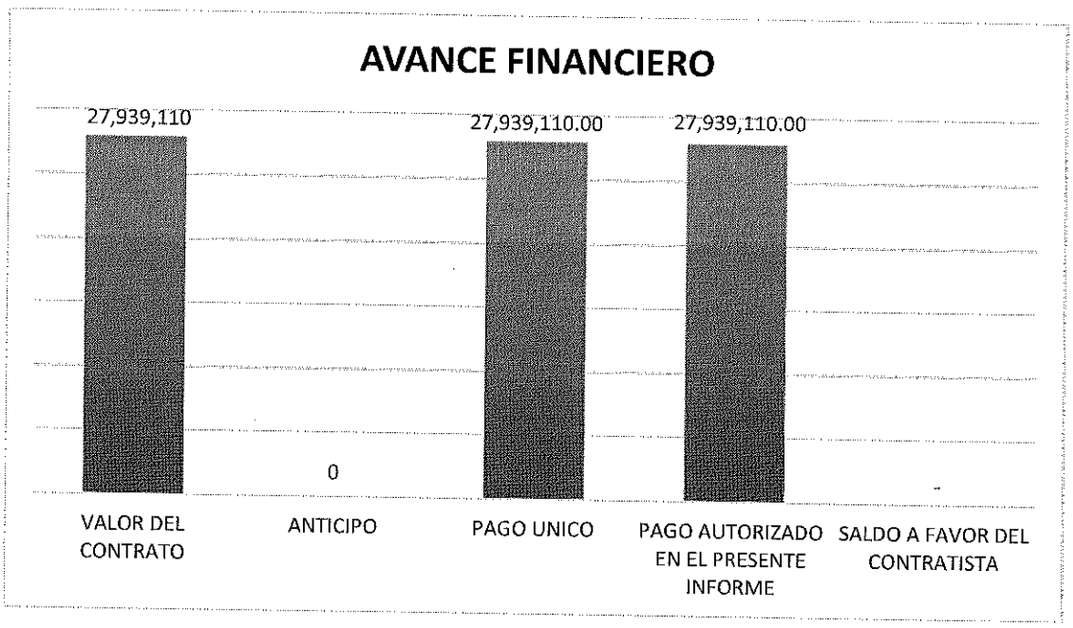



EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23

EL PUEBLO PRIMERO
OVELIO JIMÉNEZ MACHADO
ALCALDE MUNICIPAL

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo a la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que durante el **PERIODO UNICO** comprendido entre el **25 de agosto al 03 de septiembre de 2022** el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato además todas las obligaciones pactadas y cumplió con el pago del sistema de seguridad social.

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE ($ 27.939.110).**

ANEXOS:
Soportes pago de seguridad social.

ESTEBAN JAVIER REALES DIAZ
Supervisor

Proyectó: **YULEIMA AGUILAR LIMA**
Secretaria Ejecutiva

Revisó: **ESTEBAN JAVIER REALES DIAZ**
Secretario de Planeación y Desarrollo Económico

EL PUEBLO PRIMERO
Página Web: www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Correo Institucional: alcaldia@lajaguadeibirico-cesar.gov.co
Tel.: (095)5769375 - 5769024 – Fax (095)5769206
Calle 6 No. 3a – 23
