

Id	No.	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**PROGRAMACIÓN DE OBRAS DE ADECUACIONES CZ INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA**	**49,38 días**	**vie 4/03/22**	**jue 5/05/22**
2		**INICIO DEL PROYECTO**	0 días	vie 4/03/22	vie 4/03/22
3	**1**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**7 días**	**lun 18/04/22**	**mar 26/04/2**
4	1.1	Salida para luminria 110v	1 día	vie 22/04/22	lun 25/04/22
5	1.2	Suministro e instalación de luminaria tipo LED	1 día	lun 25/04/22	mar 26/04/2
6	1.3	Suministro e instalación de tablero eléctrico normal de 18 circuitos con totalizador	2 días	mar 19/04/22	jue 21/04/22
7	1.4	Suministro e instalación de tablero eléctrico regulado de 18 circuitos con totalizador	2 días	mié 20/04/22	jue 21/04/22
8	1.5	Suministro e instalación de Tubería eléctrica de 3/4" tipo EMT	3 días	lun 18/04/22	jue 21/04/22
9	1.6	Suministro e instalación de Tubería eléctrica de 1" tipo EI	3 días	lun 18/04/22	jue 21/04/22
10	1.7	Suministro e instalación de Tomacorriente Normal	2 días	jue 21/04/22	vie 22/04/22
11	1.8	Suministro e instalación de Tomacorriente Regulado	2 días	jue 21/04/22	vie 22/04/22
12	**2**	**PUERTAS EN MADERA**	**4 días**	**vie 1/04/22**	**mié 6/04/22**
13	2.1	Suministro e instalación de puertas entamboradas de madera RH modelo institucional 2.0m x 0.9m incluye cerradura	4 días	vie 1/04/22	mié 6/04/22
14	**3**	**VENTANERÍA DE ALUMINIO**	**4 días**	**vie 1/04/22**	**mié 6/04/22**
15	3.1	Suministro e instalación de ventana corrediza en aluminio y cristal incoloro de 4mm, cierre jaguar de	4 días	vie 1/04/22	mié 6/04/22
16	**4**	**AIRES ACONDICIONADOS**	**8 días**	**mar 26/04/2**	**jue 5/05/22**
17	4.1	Montaje y desmontaje de aire acondicionado Mini Split, incluye materiales.	8 días	mar 26/04/22	jue 5/05/22
18	**5**	**DIVISIONES DE OFICINA**	**15 días**	**mar 15/03/2**	**sáb 2/04/22**
19	5.1	Suministro e instalación de muro en drywall doble cara para divisiones de oficinas, incluye acabados	15 días	mar 15/03/22	sáb 2/04/22
20	**6**	**CAFÉTERÍA**	**4 días**	**mié 6/04/22**	**lun 11/04/22**
21	6.1	Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable AISI 430 calibre 22 (0.7 mm). (incluye	1 día	vie 8/04/22	sáb 9/04/22
22	6.2	Suministro e instalación de mesón en granito pulido	1 día	jue 7/04/22	vie 8/04/22
23	6.3	Suministro e instalacion de gabinetes de cocina (superior e inferior) en p.v.c incluye todos sus accesorios	1 día	sáb 9/04/22	lun 11/04/22
24	6.4	Punto sanitario 2"	1 día	mié 6/04/22	jue 7/04/22
25	6.5	Punto hidraulico 1/2"	1 día	mié 6/04/22	jue 7/04/22
26		**ÍTEMS NO PREVISTOS**	**31 días**	**lun 28/03/22**	**jue 5/05/22**
27		**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**2 días**	**lun 4/04/22**	**mié 6/04/22**
28		Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras. Incluye: accesorios, limpiador y soldaduras de diametro 2"	2 días	lun 4/04/22	mié 6/04/22
29		Suministro y colocación de tubería PVC. Presión , incluye accesorios,limpiador y soldaduras De	2 días	lun 4/04/22	mié 6/04/22
30		INSTALACIÓN DE CANALETA - CONTRATO DE FERRETERÍA	16 días	lun 28/03/22	lun 18/04/22
31		**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**9 días**	**lun 18/04/22**	**jue 28/04/22**
32		Traslado de salidas eléctricas y tuberías de refrigeración de aire acondicionado de los muros posteriores de los pisos 2, 3 y 4	4 días	mar 19/04/22	vie 22/04/22
33		Traslado de luminarias con su correspondiente salida eléctricas y todos sus elementos distancia máxima 3 metros	1 día	mar 19/04/22	mié 20/04/22
34		Suministro e instalación de Tablero Monofásico Enchufable 6 Circuitos 120V con puerta, incluye accesorios para su instalación.	3 días	mié 20/04/22	vie 22/04/22
35		Suministro e instalación de Tablero Bifasico con Puerta y Espacio para Totalizador, de 18 Circuitos, incluye accesorios para su instalación.	2 días	mié 20/04/22	jue 21/04/22
36		Suministro e instalación de Tablero Bifasico con Puerta y Espacio para Totalizador de 24 Circuitos, incluye accesorios para su instalación. Incluye conexion de circuitos existentes	1 día	vie 22/04/22	vie 22/04/22
37		Suministro e instalación de Tablero eléctrico bifásico regulado de 18 circuitos con totalizador general de 2x50 A, llave de transferencia UPS, DPS, protecciones de entrada y salida para UPS, y acometidas de entrada y salida para UPS	1 día	vie 22/04/22	lun 25/04/22

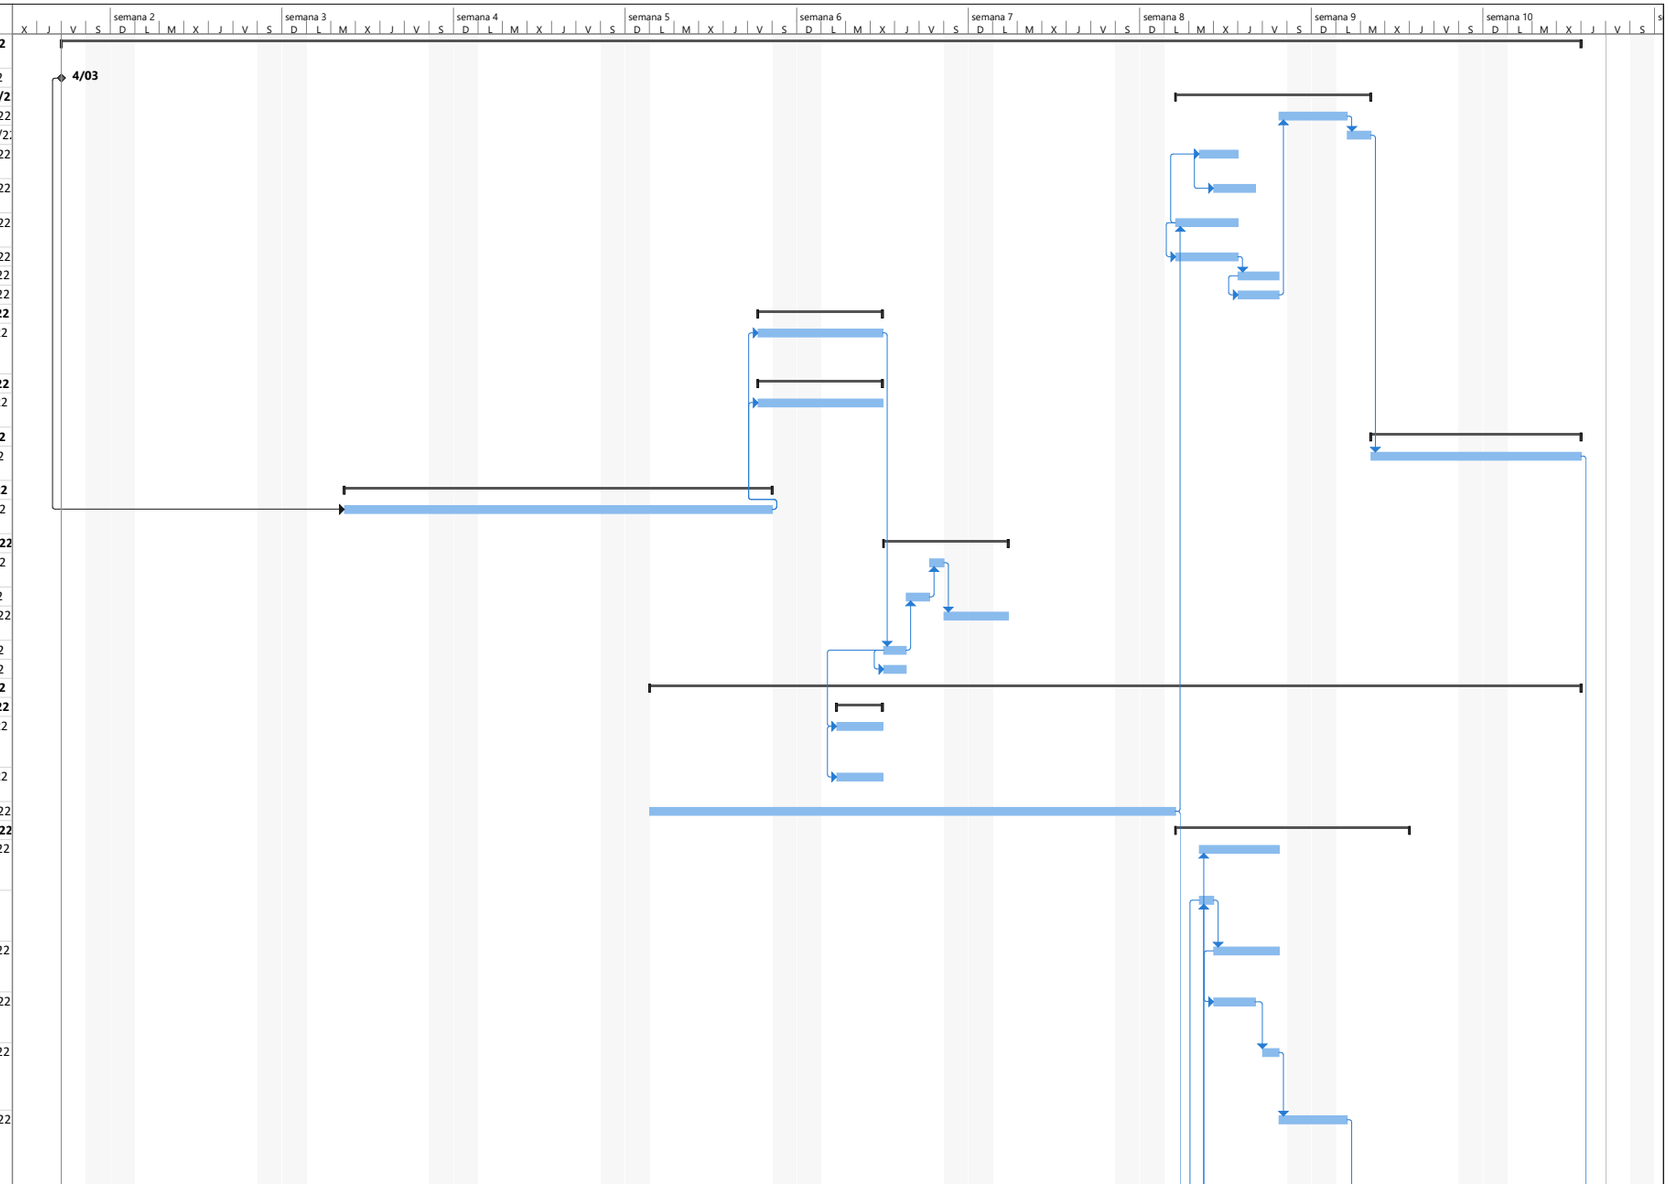

Proyecto: Ajuste_prog_ICBF
Fecha: vie 22/07/22

Tarea | Resumen | Hito inactivo | solo duración | solo el comienzo | Hito externo | Progreso manual
División | Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Informe de resumen manual | solo fin | Fecha límite
Hito | Tarea inactiva | Tarea manual | Resumen manual | Tareas externas | Progreso

Id	No.	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
38		Suministro e instalación de Breaker Easy9, 1 Polo, 20 A, 10 kA, 127 V AC, Riel DIN para tablero regulado	2 días	lun 25/04/22	mié 27/04/22
39		Suministro e instalación de Breaker totalizador 2x50 amperios	1 día	lun 25/04/22	mar 26/04/22
40		Suministro e instalación de Interruptor Monopolar de 1x20 A, Tipo Enchufable	1 día	lun 25/04/22	mar 26/04/22
41		Suministro e instalación de Interruptor Monopolar de 1x30 A, Tipo Enchufable	1 día	mar 26/04/22	mié 27/04/22
42		Suministro e instalación de Breaker Industrial Termomagnético Regulable 70 - 100A	1 día	mié 27/04/22	jue 28/04/22
43		Suministro e instalación de acometida en Cable en Cu 7 hilos libre de halogenos 2 Fases #8awg + 1Neutro #8awg + 1Tierra #10awg y tubería metálica tipo EMT de 3/4". incluye acometida en cable libre de halogenos, tuberia EMT, terminales, conectores,	1 día	lun 18/04/22	mar 19/04/22
44		Suministro e instalación de acometida en Cable en Cu 7 hilos libre de halogenos 1Fase #8awg + 1Neutro #8awg + 1Tierra #10awg y tubería metálica tipo EMT de 3/4". incluye acometida en cable libre de halogenos, tuberia EMT, terminales, conectores,	5 días	lun 18/04/22	vie 22/04/22
45		Suministro e instalación de acometida en Cable THWN 90°C libre de halogenos 2Fases #4awg + 1Neutro #4awg + 1Tierra #8awg. incluye acometida en cable libre de halogenos, instalación por tubería existente, marcacion de circuitos y demas accesorios para la i	5 días	lun 18/04/22	vie 22/04/22
46		Suministro e instalación de puesta a tierra para cuarto técnico. Incluye Varilla de 5/8 x 2,44 metros cobre, caja de inspección, tratamiento de suelo, soldadura, cable desnudo de cobre, tubería EMT de 3/4", mediciones y protocolos de pruebas.	5 días	lun 18/04/22	vie 22/04/22
47		Retiro de acometida electrica existente en cable THWN 2Fases #8awg + 1Neutro #8awg + 1Tierra	2 días	mar 19/04/22	jue 21/04/22
48		Suministro e instalación de puesta a tierra para cuarto técnico. Incluye Varilla de 5/8 x 2,44 metros cobre, caja de inspección, tratamiento de suelo, soldadura, cable desnudo de cobre, tubería EMT de 3/4", mediciones y protocolos de pruebas.	4 días	mar 19/04/22	vie 22/04/22
49		FIN DEL PROYECTO	0 días	jue 5/05/22	jue 5/05/22

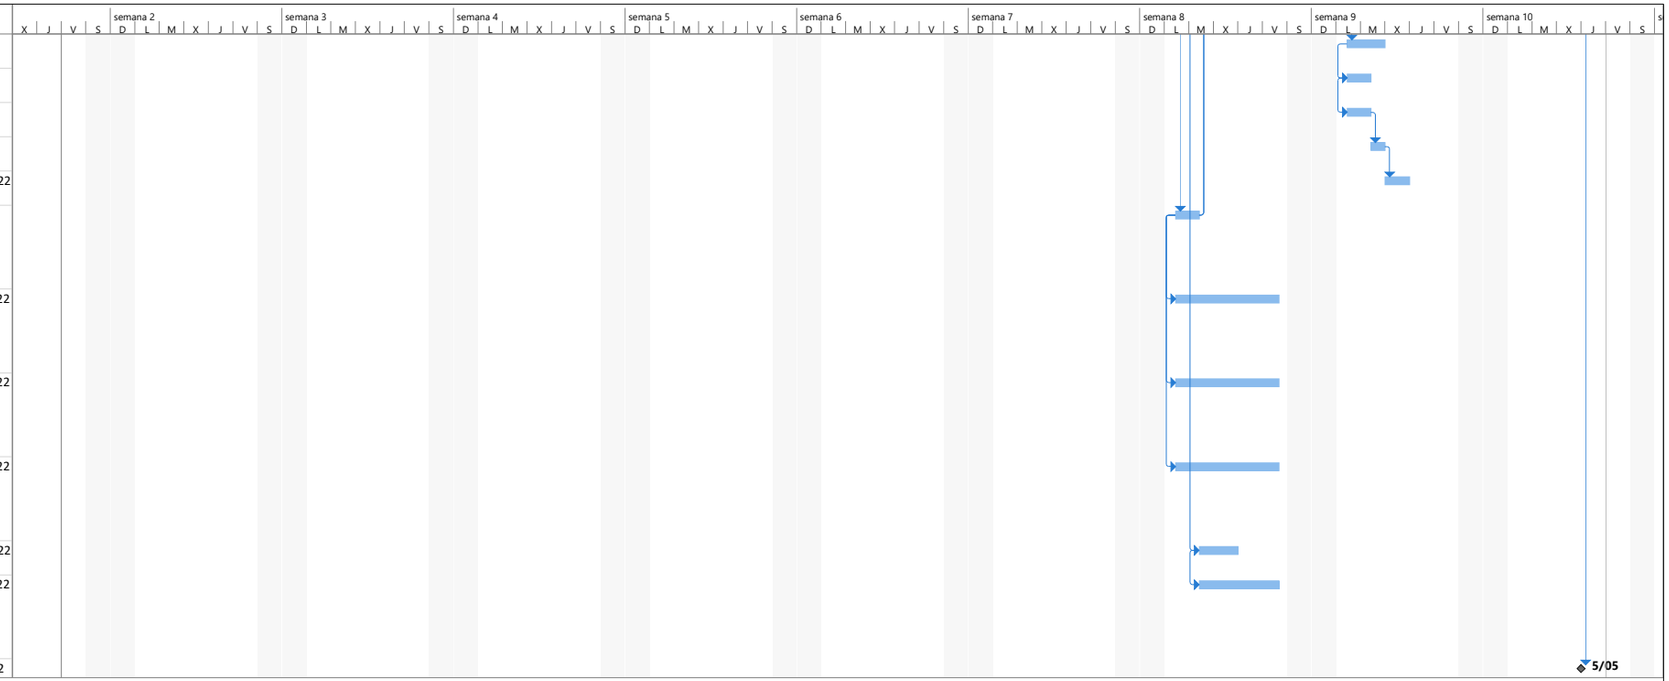

Proyecto: Ajuste_prog_ICBF
Fecha: vie 22/07/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual
