INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 05/05/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA PERIODO MES: MARZO

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 10 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 6.389.719.837

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	5/05/2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	08-05-2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	PAOLA AVILA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	13-05-2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	NYDIA CORREDOR		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 989 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 **NIT.** 901475859-6

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNANDEZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAL MHC 063

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 5.509.759.746 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CINCO MIL QUINIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: RECIBO PARCIAL DE OBRA No.10 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** MARZO DE 2022 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON
Firma
Nombre: GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON
Matricula profesional No.: 25202-099324 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON
Firma
Nombre: GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON
Matricula profesional No.: 25202-099324 CND
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: PAOLA ANDREA AVILA ARGOTA
Matricula profesional No.: 08202-384226 ATL
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNANDEZ
Matrícula Profesional No.: 25202-119224
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Mayo 05 de 2022

CONSORCIO VIAL MHC 063

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
800.215.807-2
Calle 25G N73B-90 - Piso 6
7056000

CONTRATO 989 de 2021- MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030- MODULO 1

Acta de recibo de Obra No.10 del 01 al 31 de Marzo de 2022		4,218,110,770.00
Administracion	23%	970,165,477.00
Imprevistos	5%	210,905,539.00
Utilidad	2%	84,362,215.00
IVA	19%	16,028,821.00
Gestión Predial		8,477,000.00
IVA /19%) Gestion predial	19%	1,610,630.00
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19		96,425.00
ADMINISTRACIÓN (2.5%)- PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19		2,411.00
IVA (19%) - PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	19%	**458.00**
	SUBTOTAL	**5,492,119,837.00**
	IVA	17,639,909.00
	VALOR TOTAL	**5,509,759,746.00**

Observacion:#$24-02-00;Contrato 989 de 2021;ncorredor@invias.gov.co#$

CINCO MIL QUINIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MCTE

Consorciados:

Mario Alberto Huertas Cotes Nit: 19.146.113-0

MHC Ingenieria y Construccion de obras civiles S.A.S Nit: 900.904.055-1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-05 4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA: 04/05/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No.** 10 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 5,492,119,837.00 **MES** MARZO 2022

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 989 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTU 20/12/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA $ 465,288,090,475.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 465,288,090,475.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 3 15/12/2021		Última de fecha	OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES															
1	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	72.00	$ 1,154,770.00	$ 83,143,440	72.00	$ 83,143,440		0.03	34,643.10	8.93	$ 10,312,096.10
2	5	201-13		Demolición de Estructuras	m3	4,039.00	$ 113,400.00	$ 458,022,600	4,039.00	$ 458,022,600		-	$ -	-	-
3	5	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	9,334.00	$ 4,470.00	$ 41,722,980	9,334.00	$ 41,722,980		-	$ -	-	-
4	1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	566,041.00	$ 10,000.00	$ 5,660,410,000	566,041.00	$ 5,660,410,000		22,398.00	223,980,000.00	83,333.00	$ 833,330,000.00
5	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	146,834.00	$ 12,570.00	$ 1,845,703,380	146,834.00	$ 1,845,703,380		-	$ -	-	-
6	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	14,784.00	$ 62,890.00	$ 929,765,760	14,784.00	$ 929,765,760		-	$ -	-	-
7	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	368,680.00	$ 10,000.00	$ 3,686,800,000	368,680.00	$ 3,686,800,000		-	$ -	-	-
8	1	220.1		Terraplenes	m3	734,168.00	$ 12,000.00	$ 8,810,016,000	734,168.00	$ 8,810,016,000		31,804.00	381,648,000.00	72,115.00	$ 865,380,000.00
SUBTOTAL						-		**$ 21,515,584,160**		**$ 21,515,584,160**			**605,662,643.10**	-	**$ 1,709,022,096.10**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS															
9	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	184,744.00	$ 139,000.00	$ 25,679,416,000	184,744.00	$ 25,679,416,000		-	-	524.00	$ 72,836,000.00
10	2	330-13		Base granular clase A	m3	124,370.00	$ 150,000.00	$ 18,655,500,000	124,370.00	$ 18,655,500,000		-	$ -	-	-
11	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	12,600.00	$ 179,850.00	$ 2,266,110,000	12,600.00	$ 2,266,110,000		-	$ -	-	-
Subtotal						-		**$ 46,601,026,000**		**$ 46,601,026,000**			**-**		**$ 72,836,000.00**
PAVIMENTOS ASFALTIC															
12	7	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	197,124.00	$ 2,910.00	$ 573,630,840	197,124.00	$ 573,630,840		-	-	1,786.00	$ 5,197,260.00
13	7	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	522,324.00	$ 1,840.00	$ 961,076,160	522,324.00	$ 961,076,160		6,702.00	12,331,680.00	57,854.00	$ 106,451,360.00
14	7		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	29,548.00	$ 750,000.00	$ 22,161,000,000	29,548.00	$ 22,161,000,000		987.00	740,250,000.00	7,239.40	$ 5,429,550,000.00
15	7		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	26,624.00	$ 760,000.00	$ 20,234,240,000	22,378.90	$ 17,007,964,000		-	-	-	-
16	7		450.10P.	Mezcla densa en caliente Tipo MSC-25 para bacheos	m3	5,040.00	$ 795,600.00	$ 4,009,824,000	11,039.00	$ 8,782,628,400		-	-	7,756.40	$ 6,170,991,840.00
17	7		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	14,175.00	$ 72,820.00	$ 1,032,223,500	14,175.00	$ 1,032,223,500		168.00	12,233,760.00	14,144.27	$ 1,029,985,741.40
18	7	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	22,680.00	$ 78,890.00	$ 1,789,225,200	320.00	$ 25,244,800		-	-	-	-
19	7	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	10,000.00	$ 4,340.00	$ 43,400,000	60,093.00	$ 260,803,620		-	-	59,993.00	$ 260,369,620.00
Subtotal						-		**$ 50,804,619,700**		**$ 50,804,571,320**			**764,815,440.00**		**$ 13,002,545,821.40**
PAVIMENTOS DE CONC															
20	7	500-13		Pavimento de concreto Hidraulico	m3	932.00	$ 837,200.00	$ 780,270,400	932.00	$ 780,270,400		-	$ -	-	-
Subtotal						-		**$ 780,270,400**		**$ 780,270,400**			**$ -**		-
ESTRUCTURAS Y DREN															
21	5	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	122,977.00	$ 28,000.00	$ 3,443,356,000	122,977.00	$ 3,443,356,000		-	-	-	-
22	5	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	11,429.00	$ 81,880.00	$ 935,806,520	11,429.00	$ 935,806,520		-	-	-	-
23	5	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	3,500.00	$ 25,950.00	$ 90,825,000	3,500.00	$ 90,825,000		265.00	6,876,750.00	3,475.80	$ 90,197,010.00
24	1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	34,322.00	$ 52,470.00	$ 1,800,875,340	34,322.00	$ 1,800,875,340		-	-	-	-
25	5	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	1,884.00	$ 119,000.00	$ 224,196,000	1,884.00	$ 224,196,000		-	-	-	-
26	5	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	34,991.00	$ 140,000.00	$ 4,898,740,000	34,991.00	$ 4,898,740,000		-	-	-	-
27	5		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	184.00	$ 2,289,000.00	$ 421,176,000	184.00	$ 421,176,000		-	-	-	-
28	5		621,1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	3,985.00	$ 2,300,000.00	$ 9,165,500,000	3,985.00	$ 9,165,500,000		-	-	-	-
29	6		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	5,986.00	$ 1,200,000.00	$ 7,183,200,000	5,986.00	$ 7,183,200,000		-	-	-	-
30	6		630.1.3P	Concreto clase 35 MPA, para viga cajon de puentes	m3	14,785.00	$ 1,500,000.00	$ 22,177,500,000	14,785.00	$ 22,177,500,000		-	-	-	-
31	5	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	19,118.00	$ 810,000.00	$ 15,485,580,000	19,118.00	$ 15,485,580,000		262.00	212,220,000.00	555.80	$ 450,198,000.00
32	5		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas y placas	m3	25,957.00	$ 900,000.00	$ 23,361,300,000	25,957.00	$ 23,361,300,000		-	-	-	-
33	5		630.3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	5,339.00	$ 1,200,000.00	$ 6,406,800,000	5,339.00	$ 6,406,800,000		-	-	-	-
34	5	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	27,163.00	$ 650,000.00	$ 17,655,950,000	27,163.00	$ 17,655,950,000		-	-	-	-
35	5	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	5,433.00	$ 495,350.00	$ 2,691,236,550	5,433.00	$ 2,691,236,550		15.00	7,430,250.00	62.00	$ 30,711,700.00
36	4		632.1P	Baranda Metalica	m	1,420.00	$ 548,010.00	$ 778,174,200	1,420.00	$ 778,174,200		-	-	-	-
37	5	632-13		Baranda de concreto	m	687.00	$ 214,420.00	$ 147,306,540	687.00	$ 147,306,540		-	-	-	-
38	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	11,840,561.00	$ 5,378.00	$ 63,678,537,058	11,840,561.00	$ 63,678,537,058		16,452.00	88,478,856.00	44,357.80	$ 238,556,248.40
39	4	640-13		Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg	76,562.00	$ 5,480.00	$ 419,559,760	76,562.00	$ 419,559,760		-	-	-	-
40	4	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	1,572,187.00	$ 2,230.00	$ 3,505,977,010	1,572,187.00	$ 3,505,977,010		-	-	-	-
41	5	642-13		Apoyo elastomerico de 35cm*45cm*5cm	u	156.00	$ 768,350.00	$ 119,862,600	156.00	$ 119,862,600		-	-	-	-
42	5		642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	228.00	$ 1,583,120.00	$ 360,951,360	228.00	$ 360,951,360		-	-	-	-
43	4	650-13		Fabricación de estructura metálica	kg	53,475.00	$ 11,325.00	$ 605,604,375	53,475.00	$ 605,604,375		-	-	-	-
44	4	650-13		Transporte de estructura metalica	kg	53,475.00	$ 200.00	$ 10,695,000	53,475.00	$ 10,695,000		-	-	-	-
45	4	650-13		Montaje de estructura metálica	kg	53,475.00	$ 4,286.00	$ 229,193,850	53,475.00	$ 229,193,850		-	-	-	-
46	5	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	3,722.00	$ 600,000.00	$ 2,233,200,000	3,722.00	$ 2,233,200,000		-	-	-	-
47	5	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200mm de diámetro interior	m	246.00	$ 1,264,890.00	$ 311,162,940	246.00	$ 311,162,940		-	-	-	-

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-05
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA: 04/05/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No.** 10 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 5,492,119,837.00 **MES** MARZO 2022

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 989 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTU 20/12/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA $ 465,288,090,475.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 465,288,090,475.00

48	5	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1500mm de diámetro interior	m	340.00	$ 1,834,530.00	$ 623,740,200	340.00	$ 623,740,200	-	-	-	-
49	5		663.3P	Tubería para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	42,017.00	$ 38,110.00	$ 1,601,267,870	42,017.00	$ 1,601,267,870	-	-	176.00	$ 6,707,360.00
50	5	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	3,546.00	$ 580,000.00	$ 2,056,680,000	3,546.00	$ 2,056,680,000	-	-	-	-
51	5	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	2,366.00	$ 86,540.00	$ 204,753,640	2,366.00	$ 204,753,640	-	-	-	-
52	7	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	63,200.00	$ 7,700.00	$ 486,640,000	63,200.00	$ 486,640,000	-	-	400.20	$ 3,081,540.00
53	5	673-13		Material granular drenante	m3	27,297.00	$ 130,000.00	$ 3,548,610,000	27,297.00	$ 3,548,610,000	-	-	97.00	$ 12,610,000.00
54	5	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	5,459.00	$ 170,000.00	$ 928,030,000	5,459.00	$ 928,030,000	-	-	-	-
55	5	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	1,309.00	$ 173,900.00	$ 227,635,100	1,309.00	$ 227,635,100	-	-	189.00	$ 32,867,100.00
56	5	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	2,150.00	$ 248,500.00	$ 534,275,000	2,150.00	$ 534,275,000	-	-	-	-
Subtotal						-		**$ 198,553,897,913**		**$ 198,553,897,913**	-	**315,005,856.00**		**$ 864,928,958.40**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD														
57	7	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	935,857.00	$ 1,790.00	$ 1,675,184,030	935,857.00	$ 1,675,184,030	-	-	198,606.40	$ 355,505,456.00
58	7	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	3,068.00	$ 22,070.00	$ 67,710,760	3,068.00	$ 67,710,760	-	-	3,064.20	$ 67,626,894.00
59	7	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	10,794.00	$ 59,980.00	$ 647,424,120	10,794.00	$ 647,424,120	-	-	-	-
60	7	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	53,514.00	$ 8,340.00	$ 446,306,760	53,514.00	$ 446,306,760	1,636.00	13,644,240.00	3,108.00	$ 25,920,720.00
61	4	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	2,164.00	$ 397,600.00	$ 860,406,400	2,050.00	$ 815,080,000	203.00	80,712,800.00	227.00	$ 90,255,200.00
62	4	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	2,714.00	$ 325,630.00	$ 883,759,820	2,714.00	$ 883,759,820	-	-	-	-
63	4	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	159.00	$ 504,590.00	$ 80,229,810	249.00	$ 125,642,910	-	-	141.00	$ 71,147,190.00
64	5	720-13		Poste de referencia	u	500.00	$ 254,830.00	$ 127,415,000	500.00	$ 127,415,000	-	-	-	-
65	4	730-13		Defensa metalica	m	4,000.00	$ 230,530.00	$ 922,120,000	4,000.00	$ 922,120,000	-	-	-	-
66	4	740-13		Captafaros	u	1,000.00	$ 22,030.00	$ 22,030,000	1,000.00	$ 22,030,000	-	-	-	-
Subtotal								**$ 5,732,586,700**		**$ 5,732,673,400**		**94,357,040.00**		**$ 610,455,460.00**
OBRAS SUBTERRANEAS										$ -				
67	1		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo II	m3	10,332.00	$ 221,660.00	$ 2,290,191,120		$ -	-	-	-	-
68	1		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo III	m3	16,195.00	$ 253,200.00	$ 4,100,574,000		$ -	-	-	-	-
69	1		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo IV	m3	3,360.00	$ 291,510.00	$ 979,473,600		$ -	-	-	-	-
70	1		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo V	m3	14,674.00	$ 300,000.00	$ 4,402,200,000		$ -	-	-	-	-
71	5		PT-3	Pernos Tipo A en Excavaciones Subterráneas anclados con lechada	m	2,000.00	$ 100,640.00	$ 201,280,000		$ -	-	-	-	-
72	5		PT-4	Concreto para el revestimiento del túnel	m3	2,411.00	$ 1,166,190.00	$ 2,811,684,090		$ -	-	-	-	-
73	5		PT-4	Concreto lanzando, en superficies de excavación en corte abierto: En portales de túneles, galerías y pozos.	m3	611.00	$ 970,770.00	$ 593,140,470		$ -	-	-	-	-
74	4		PT-6	Arco de acero estructural	kg	176,103.00	$ 10,648.00	$ 1,875,144,744		$ -	-	-	-	-
75	5		PT-8	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	m2	3,124.00	$ 83,100.00	$ 259,604,400		$ -	-	-	-	-
76	5		PT-9	Caja de inspección de 0,65 m x 0,65 m con altura menor a 2 m	u	71.00	$ 1,053,100.00	$ 74,770,100		$ -	-	-	-	-
77	4		PT-10	Tubería para enfilajes: Tubería metalica de 4" de diametro	m	5,341.00	$ 258,899.00	$ 1,382,779,559		$ -	-	-	-	-
Subtotal								**$ 18,970,842,083**		**$ -**		-		-
OBRAS VARIAS														
78	5	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	29,900.00	$ 34,230.00	$ 1,023,477,000	29,900.00	$ 1,023,477,000	-	-	-	-
79	5	810-13		Proteccion de taludes con tierra organica	m2	271,138.00	$ 13,000.00	$ 3,524,794,000	271,138.00	$ 3,524,794,000	-	-	-	-
Subtotal								**$ 4,548,271,000**		**$ 4,548,271,000**		**$ -**		
TRANSPORTES														
80	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	7,480,309.00	$ 1,100.00	$ 8,228,339,900	7,480,225.00	$ 8,228,247,500	991,770.00	1,090,947,000.00	2,184,912.00	$ 2,403,403,200.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-05 4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA: 04/05/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No.** 10 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 5,492,119,837.00 **MES** MARZO 2022

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 989 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTU 20/12/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA $ 465,288,090,475.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 465,288,090,475.00

Subtotal								**$ 8,228,339,900**		**$ 8,228,247,500**		**1,090,947,000.00**	-	**$ 2,403,403,200.00**
				ÍTEM NO PREVISTOS										
81	1		220.1P	Material para Terraplen	m3		$ 42,374.00	$ -	232,227.00	$ 9,840,386,898	31,804.00	1,347,662,696.00	72,299.00	$ 3,063,597,826.00
82	1	221.1		Pedraplen Compacto	m3		$ 19,910.00	$ -	34,700.00	$ 690,877,000	13,865.00	276,052,150.00	34,678.00	$ 690,438,980.00
83	1		221.1P	Material para Pedraplen	m3		$ 81,868.00	$ -	34,700.00	$ 2,840,819,600	7,897.00	646,511,596.00	34,660.00	$ 2,837,544,880.00
84	5	600.1.2.2.4		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3		$ 45,232.00	$ -	3,000.00	$ 135,696,000	-	-	339.60	$ 15,360,787.20
85	5		661.1P	Box Culvert prefabricado 1m x 1m. (Suministro e instalación)	ml		$ 1,610,012.00	$ -	1,489.00	$ 2,397,307,868	58.00	93,380,696.00	280.75	$ 452,010,869.00
86	5		7P	Bandas alertadoras, ancho 0.25m, espesor 0.02 m. (Incluye Suministro e Instalación)	ml		$ 138,738.00	$ -	5,000.00	$ 693,690,000	220.00	30,522,360.00	1,491.00	$ 206,858,358.00
87	5		8P	Bordillo traspasable. (Incluye Suministro e instalación)	u		$ 77,167.00	$ -	1,631.00	$ 125,859,377	-	-	-	-
88	5		9P	Delineador Tubular Simple (Incluye Suministro e instalación)	u		$ 77,971.00	$ -	277.00	$ 21,597,967	-	-	-	-
89	4		710.1P	Señal Vertical SI-27. Tablero Variable según leyenda proyectada (Incluye Suministro e Instalación)	u		$ 1,324,653.00	$ -	10.00	$ 13,246,530	-	-	-	-
90	7	231.1		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granular	m2		$ 10,590.00	$ -	201,773.00	$ 2,136,776,070	18,912.00	200,278,080.00	57,125.00	$ 604,953,750.00
91	5		642.5P	Cinta PVC, para junta de construcción estructuras en concreto	ml		$ 56,631.00	$ -	1,318.00	$ 74,639,658	324.00	18,348,444.00	545.30	$ 30,880,884.30
								$ -		**$ 18,970,896,968**		**2,612,756,022.00**		**$ 7,901,646,334.50**

	SUBTOTAL OBRA	**$ 355,735,437,856.00**	**$ 355,735,438,661.00**	**$ 5,483,544,001.00**	**$ 26,564,837,870.00**
*	PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 27,957,104,337.00	$ 27,957,103,532.00	$ -	$ 989,201,406.00
*	PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,200,000,000.00	$ 1,200,000,000.00	$ -	$ -
*	VALOR BASICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	$ 384,892,542,193.00	**$ 384,892,542,193.00**	**$ 5,483,544,001.00**	**$ 27,554,039,276.00**
*	VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 1,125,070,508.00	$ 1,125,070,508.00	$ 16,028,821.00	$ 80,542,576.00
*	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 386,017,612,701.00	**$ 386,017,612,701.00**	**$ 5,499,572,822.00**	**$ 27,634,581,852.00**
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 2,640,000,000.00	$ 2,640,000,000.00		$ 396,000,000.00
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 501,600,000.00	$ 501,600,000.00	$ -	$ 75,240,000.00
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 3,141,600,000.00	$ 3,141,600,000.00	$ -	**$ 471,240,000.00**
*	GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	$ 75,778,877,774.00	$ 75,778,877,774.00	$ 10,087,630.00	**$ 10,951,330.00**
	VALOR BÁSICO GESTIÓN PREDIAL			$ 8,477,000.00	$ 8,477,000.00
	IVA GESTIÓN PREDIAL			$ 1,610,630.00	$ 1,610,630.00
	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIAL			$ -	$ 806,269.00
	IVA GESTIÓN SOCIAL			$ -	$ 57,431.00
	VALOR BÁSICO GESTIÓN AMBIENTAL (incluye PAGA)			$ -	$ -
	IVA GESTIÓN AMBIENTAL (incluye PAGA)			$ -	$ -
	PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 350,000,000.00	$ 350,000,000.00	$ 99,294.00	**$ 2,398,348.00**
	PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19			$ 96,425.00	$ 2,329,058.00
	ADMINISTRACIÓN (2.5%)- PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19			$ 2,411.00	$ 58,227.00
	IVA (19%) - PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19			$ 458.00	$ 11,063.27
*	**VALOR BÁSICO TOTAL DEL CONTRATO**			**$ 5,492,119,837.00**	**$ 27,961,709,830.00**
*	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO IVA (A + B)**	**$ 465,288,090,475.00**	**$ 465,288,090,475.00**	**$ 5,509,759,746.00**	**$ 28,119,171,530.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30%
Utilidad 2%

Valor	%

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-05 4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA: 04/05/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No.** 10 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 5,492,119,837.00 **MES** MARZO 2022

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 989 DE 2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTU 20/12/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA $ 465,288,090,475.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 465,288,090,475.00

Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 5,483,544,001.00	$ 16,028,821.00	$ 5,499,572,822.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTION PREDIAL (PRE ACTA)	$ 8,477,000.00	$ 1,610,630.00	$ 10,087,630
GESTION SOCIAL (PRE ACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTION AMBIENTAL (PRE ACTA)	$ -	$ -	$ -
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 98,836.00	$ 458.00	$ 99,294
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 5,492,119,837.00**	**$ 17,639,909.00**	**$ 5,509,759,746.00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

	G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	EXPLANACIONES	$ 605,662,643	$ 1,709,022,096
SB	BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$ -	$ 72,836,000
PA	PAVIMENTOS ASFALTICOS	$ 764,815,440	$ 13,002,545,821
PC	PAVIMENTOS DE CONCRETO	$ -	$ -
OA	ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ 315,005,856	$ 864,928,958
SEÑ	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$ 94,357,040	$ 610,455,460
OS	OBRAS SUBTERRANEAS	$ -	$ -
OV	OBRAS VARIAS	$ -	$ -
T	TRANSPORTES	$ 1,090,947,000	$ 2,403,403,200
ES	ESTUDIO Y DISEÑOS	$ -	$ 396,000,000
NP	ÍTEM NO PREVISTOS	$ 2,612,756,022	$ 7,901,646,335
	TOTAL	**$ 5,483,544,001**	**$ 26,960,837,870**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1. Obras de Explanación	$ 2,875,889,085.10	$ 8,300,603,782
2. Sub-Bases y bases	$ -	$ 72,836,000
3. Transporte de materiales	$ 1,090,947,000.00	$ 2,403,403,200
4. Aceros y elementos metálicos	$ 169,191,656.00	$ 399,958,638
5. Concretos, morteros y obras varias	$ 368,778,500.00	$ 1,328,402,069
6. Concreto para superestructuras	$ -	$ -
7. Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 978,737,760.00	$ 14,059,634,181
*		
*		
TOTAL	**$ 5,483,544,001.00**	**$ 26,564,837,870.00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 5,509,759,746.00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** CINCO MIL QUINIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES Fecha: 2022.05.06 08:03:11 -05'00'

Firma:
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista - CONSORCIO VIAL MHC 063
Matrícula Profesional No.: 14502 CND

Firma:
Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor - CONSORCIO ICEACSA-TPF
Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/05/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 989-2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2022

PROYECTO: CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	R. P. No. 422021	C-2401-0600-41-0-2401008-02	20	Propios	989-2021	$ 9,910,906,523.00	$ -
		C-2401-0600-41-0-2401017-02	20	Propios	989-2021	$ 791,727,768.00	$ -
		C-2401-0600-41-0-2401023-02	20	Propios	989-2021	$ 533,075,232.00	$ -
		TOTAL				**$ 11,235,709,523.00**	
2022	R. P. No. 202422	C-2401-0600-41-0-2401008-02	13	Nación	989-2021	$ 22,599,725,502	$ 11,226,023,241
		C-2401-0600-41-0-2401017-02	13	Nación	989-2021	$ 463,254,999	$ -
		C-2401-0600-41-0-2401023-02	13	Nación	989-2021	$ 341,781,405	$ -
		TOTAL				**$ 23,404,761,905.00**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 34,640,471,428.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Obra	Junio 2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -						
1	Ajuste	Junio 2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -						
2	Obra	Julio 2021	$ 856,006,600	$ 76,640,120	$ 932,646,720	$ -	$ -	$ -	No.422021 De (24/05/2021)	$ -	$ 464,355,443,755				
2	Ajuste	Julio 2021	$ 23,621,314	$ 69,047	$ 956,337,081	$ -	$ -	$ -	No.422021 De (24/05/2021)	$ -	$ 464,331,753,394				
3	Obra	Agosto 2021	$ 1,701,826,111	$ 4,976,370	$ 2,663,139,562	$ -	$ -	$ -	No.422021 De (24/05/2021)	$ -	$ 462,624,950,913				
3	Ajuste	Agosto 2021	$ 88,354,885	$ 258,268	$ 2,751,752,715	$ -	$ -	$ -	No.422021 De (24/05/2021)	$ -	$ 462,536,337,760				
4	Obra	Septiembre 2021	$ 1,629,017,284	$ 4,762,293	$ 4,385,532,292	$ -	$ -	$ -	No.422021 De (24/05/2021)	$ -	$ 460,902,558,183				
4	Ajuste	Septiembre 2021	$ 75,998,178	$ 222,149	$ 4,461,752,619	$ -	$ -	$ -	No.422021 De (24/05/2021)	$ -	$ 460,826,337,856				
5	Obra	Octubre 2021	$ 2,486,379,830	$ 7,267,880	$ 6,955,400,329	$ -	$ -	$ -	No.422021 De (24/05/2021)	$ -	$ 458,332,690,146				
5	Ajuste	Octubre 2021	$ 124,273,332	$ 363,261	$ 7,080,036,922	$ -	$ -	$ -	No.422021 De (24/05/2021)	$ -	$ 458,208,053,553				
6	Obra	Noviembre 2021	$ 1,467,772,666	$ 4,290,412	$ 8,552,100,000	$ -	$ -	$ -	No.422021 De (24/05/2021)	$ -	$ 456,735,990,475				
6	Ajuste	Noviembre 2021	$ 102,922,830	$ 300,851	$ 8,655,323,681	$ -	$ -	$ -	No.422021 De (24/05/2021)	$ -	$ 456,632,766,794				
7	obra	Diciembre 2021	$ 2,572,751,048	$ 7,520,349	$ 11,235,595,078	$ -	$ -	$ -	No.422021 De (24/05/2021)	$ -	$ 454,052,495,397				
8	obra	Enero 2022	$ 5,379,812,813	$ 15,725,607	$ 16,631,133,498	$ -	$ -	$ -	No.422021 De (24/05/2021)	$ -	$ 448,656,956,977				
Acta No.	**Tipo de Acta**	**Mes/Año de Ejecución**	**Valor Acta sin IVA**	**Valor IVA**	**Valor Total Ejecutado Acumulado Acta**	**Anticipo Amortizado Acta**	**Valor Total Pagado Descontando Anticipo**	**Saldo Anticipo por Amortizar**	**No. de Registro y fecha**	**Saldo Registro Presupuestal**	**Saldo del Contrato**	**No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS**	**Indicar pago según reporte SIIF**		**Observaciones**
													SI	**NO**	
8	obra	Enero 2022	$ 5,379,812,813	$ 15,725,607	$ 16,631,133,498	$ -	$ -	$ -	No.202422 De (09/02/2022)	$ 17,204,301,527	$ 448,656,956,977				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/05/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 989-2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2022

PROYECTO: CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA-TPF

7	Ajuste	Diciembre 2021	$ 143,281,245	$ 418,822	$ 16,774,833,565	$ -	$ -	$ -	No.202422 De (09/02/2022)	$ 17,060,601,460	$ 448,513,256,910						
9	obra	Febrero 2022	$ 5,386,822,235	$ 15,747,248	$ 22,177,403,048	$ -	$ -	$ -	No.202422 De (09/02/2022)	$ 11,658,031,977	$ 443,110,687,427						
9	Ajuste	Febrero 2022	$ 188,520,658	$ 551,060	$ 22,366,474,766	$ -	$ -	$ -	No.202422 De (09/02/2022)	$ 11,468,960,259	$ 442,921,615,709						
8	Ajuste	Enero 2022	$ 242,228,964	$ 708,054	$ 22,609,411,784	$ -	$ -	$ -	No.202422 De (09/02/2022)	$ 11,226,023,241	$ 442,678,678,691						
10	obra	Marzo 2022	$ 5,492,119,837	$ 17,639,909	$ 28,119,171,530	$ -	$ -	$ -	No.202422 De (09/02/2022)	$ 5,716,263,495	$ 437,168,918,945						
TOTALES																	

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 26,564,837,870	$ 77,651,064	**$ 26,642,488,934**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 989,201,406	$ 2,891,512	**$ 992,092,918**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -		**$ -**
AJUSTES			**$ -**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 396,000,000	$ 75,240,000	**$ 471,240,000**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 8,477,000	$ 1,610,630	**$ 10,087,630**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 806,269	$ 57,431	**$ 863,700**
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	**$ -**
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ 2,329,058		**$ 2,329,058**
ADMINISTRACIÓN- PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ 58,227	$ 11,063	**$ 69,290**
VAALOR TOTAL	$ 27,961,709,830	$ 157,461,700	**$ 28,119,171,530**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: LUIS FRANCISCO PAEZ PAEZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-36086 CND

Firma
Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STDER

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 989 DE 2021

	%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA	X	10	MARZO 2022
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA			
		ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		PRESTACION DE SERVICIOS			
		OTRO			
		CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 202422	RUBRO No. C-2401-0600-41-0-2401008-02	RECURSO No. 13	VALOR AFECTADO	$ 5,509,759,746.00
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$
			TOTAL ACTA	$ 5,509,759,746.00

NOTAS:

Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON

GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
Matricula No. : 25202-099324

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **989-2021** Contratista **CONSORCIO VIAL MHC 063**

Objeto del Contrato: **MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1.**

Acta N° 10 Valor básico $ 5,492,119,837.00 Periodo MARZO 2022

Valor Incluido Iva $ 5,509,759,746.00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo via)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	RUTA 45A04 - 45A07	CORREDOR VIAL ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA,GIRON -PIEDECUESTA	$ 5,509,759,746.00	$ -		$ 5,509,759,746.00
2					$ -	$ -
3					$ -	$ -
4					$ -	$ -
5					$ -	$ -
6					$ -	$ -
7					$ -	$ -
8					$ -	$ -
9					$ -	$ -
10						
		TOTALES	**$ 5,509,759,746.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 5,509,759,746.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CUNDINAMARCA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	COGUA	$ 2,798,933,289.00	$ 2,789,972,294.00
	MUNICIPIO 2	FUQUENE	$ 25,362,248.00	$ 25,281,049.00
	MUNICIPIO 3	NEMOCON	$ -	$ -
	MUNICIPIO 4	SIMIJACA	$ 19,284,112.00	$ 19,222,373.00
	MUNICIPIO 5	SUSA	$ 9,136,098.00	$ 9,106,848.00
	MUNICIPIO 6	SUTATAUSA	$ 721,554,011.00	$ 719,243,902.00
	MUNICIPIO 7	TAUSA	$ 19,026,072.00	$ 18,965,158.00
	MUNICIPIO 8	UBATE	$ 37,077,426.00	$ 36,958,719.00
	MUNICIPIO 9	ZIPAQUIRA	$ 1,865,740,549.00	$ 1,859,767,241.00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 5,496,113,805.00**	**$ 5,478,517,584.00**

NIT	DEPARTAMENTO 2	BOYACA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	CHIQUINQUIRA	$ 13,645,941.00	$ 13,602,253.00
	MUNICIPIO 2		$ -	
	MUNICIPIO 3		$ -	$ -
	MUNICIPIO 4		$ -	$ -
	MUNICIPIO 5		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 13,645,941.00**	**$ 13,602,253.00**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
			$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

NOTAS:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2022.05.05 09:03:39 -05'00'

CONTRATISTA
MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante Legal

INTERVENTOR
LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante Legal (S)

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14730380161

(415)7707212489984(8020) 000001473038016 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 0 4 0 5 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MHC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 22 A 85 20 BRR POLO CLUB

42. Correo electrónico astrid.mora@mhc.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 2 2 6 6 2 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 5 1 0 2 7							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										Exportadores					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código													57. Modo			
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI X NO | 60. No. de Folios: 2 | 61. Fecha 2021 - 01 - 12 / 17 : 26: 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SANCHEZ MONTOYA LUZ ANGELA
985. Cargo Gestor III

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14730380161

(415)7707212489984(8020) **000001473038016 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 0 4 0 5 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 5 1 0 2 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 1 0 2 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 6 2 8 9 9 2	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 5 1 0 2 6	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 5 1 0 2 9		-
2	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
3	7 4	2 0 1 8 0 8 3 0	9 0 0 3 0 6 8 2 3	- 4
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14730380161

(415)7707212489984(8020) **000001473038016 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 0 4 0 5 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 1 0 2 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 1 4 6 1 1 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HUERTAS	COTES	MARIO	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 5 1 0 2 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 1 3 6 8 8 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HUERTAS	URIBE	ESTEBAN	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14730380161

(415)7707212489984(8020) **000001473038016 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 0 4 0 5 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 1 4 6 1 1 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HUERTAS	COTES	MARIO	ALBERTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 1 0 2 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 1 3 6 8 8 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HUERTAS	URIBE	ESTEBAN	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 5 1 0 2 6	2 0 1 6 0 2 1 1

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 0 1 0 5 5	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: EHU INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 6 0 2 1 1	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 5 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14730380161

(415)7707212489984(8020) **000001473038016 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 0 4 0 5 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 9 0 1 4 2 9		1 0 8 5 9 7

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CIFUENTES	LINARES	JORGE	EDUARDO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 0 1 2 3

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 0 5 3 0 4 4 3		2 1 8 4 0 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MORA	RUBIO	ASTRID	LILIANA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 6 0 8 1 6

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14733015870

(415)7707212489984(8020) 000001473301587 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 9 1 4 6 1 1 3	0	Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 1 4 6 1 1 3	1 9 7 3 0 6 2 8

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
HUERTAS	COTES	MARIO	ALBERTO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 22 A 85 20

42. Correo electrónico: astrid.mora@mhc.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 2 2 6 6 2 0	3 2 2 3 4 9 7 2 8 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	1 9 9 3 0 3 1 8	7 1 1 2	2 0 2 1 0 1 0 1	7 1 2 0	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1 0	1 3	1 4	2 2	4 1	4 2	4 8	5 2														

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 3	2 2								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	3	57. Modo	1		
		58. CPC	5 4		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 01 - 22 / 13 : 01: 47

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre HUERTAS COTES MARIO ALBERTO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 18-05-2021 11:56:02AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14733015870

(415)7707212489984(8020) 000001473301587 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 9 1 4 6 1 1 3	0	Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	63. Formas asociativas	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
65. Fondos	66. Cooperativas	67. Sociedades y organismos extranjeros
68. Sin personería jurídica	69. Otras organizaciones no clasificadas	70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	1 9 7 5 1 1 1 8	
77. No. Matrícula mercantil	6 8 3 9 4	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2	7 4	2 0 1 8 0 8 2 7	9 0 0 3 0 6 8 2 3	- 4
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14733015870

(415)7707212489984(8020) 000001473301587 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 9 1 4 6 1 1 3	0	Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento:

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 0 5 3 0 4 4 3		2 1 8 4 0 5

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MORA	RUBIO	ASTRID	LILIANA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 6 0 8 1 6

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14752339815

(415)7707212489984(8020) 000001475233981 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 8 5 9	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIAL MHC 063

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 22 A 85 20

42. Correo electrónico astrid.mora@mhc.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 2 2 6 6 2 0	3 2 2 3 4 9 7 2 8 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 1 0 4 0 6							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8																					

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☐ 60. No. de Folios: 61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo

EL TRAMITE DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14752339815

(415)7707212489984(8020) **000001475233981 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 8 5 9	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 2 1 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

EN TRAMITE
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14752339815

(415)7707212489984(8020) **000001475233981 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 8 5 9	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 2 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 1 4 6 1 1 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HUERTAS	COTES	MARIO	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 1 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 1 3 6 8 8 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HUERTAS	URIBE	ESTEBAN	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO SIN COSTO EN TRAMITE

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 4 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14752339815

(415)7707212489984(8020) 000001475233981 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 5 8 5 9	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 9 1 4 6 1 1 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HUERTAS	COTES	MARIO	ALBERTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 1 0 2 1 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 9 0 4 0 5 5	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: MHC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES S A S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 1 0 2 1 0	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO SIN COSTO
EN TRAMITE

MHC S.A.S

CONSORCIO VIAL MHC 063

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2020

Yo, **MARIO ALBERTO HUERTAS COTES**, identificado con **C.C. No. 19.146.113 de Bogotá**, en mi condición de **Representante legal** del **Consorcio Vial MHC 063, identificado con el NIT 901.475.859-6**, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales , pagadas por el consorcio durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **IVONNE FERNANDEZ BECERRA**, identificada con **C.C. No. 1.010.168.991 de Bogotá**, y con Tarjeta Profesional No. 146684-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Contador Público** del **Consorcio Vial MHC 063, identificado con el NIT 901.475.859-6**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros del Consorcio, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales , pagadas por el consorcio durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá a los (06) días del mes de Abril de 2022.

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2022.04.06 14:33:19 -05'00'

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAL MHC 063
C.C. No. 19.146.113 de Bogotá

IVONNE FERNANDEZ BECERRA
Firmado digitalmente por IVONNE FERNANDEZ BECERRA
Fecha: 2022.04.06 14:10:38 -05'00'

IVONNE FERNANDEZ BECERRA
CONTADOR PUBLICO
CONSORCIO VIAL MHC 063
C.C. No. 1.010.168.991 de Bogotá
Tarjeta Profesional No. 146684-T

Elaboro: Jorge M.

SEDE PRINCIPAL
BOGOTÁ-COLOMBIA

DIRECCIÓN
CRA. 22A No. 85-20

TELÉFONO
PBX (571) 622 6620

FAX
(571) 610 5116

presidencia@mhc.com.co

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2020

Yo, **MARIO ALBERTO HUERTAS COTES**, identificado con **C.C. No. 19.146.113 de Bogotá**, actuando en nombre propio, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales, pagadas durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **IVONNE FERNANDEZ BECERRA**, identificada con **C.C. No. 1.010.168.991 de Bogotá**, y con Tarjeta Profesional No. 146684-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Contador Público** de **MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, identificado con el C.C No. 19.146.113**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales, pagadas durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá a los (04) días del mes de Abril de 2022.

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2022.04.06 11:28:37 -05'00'

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
C.C. No. 19.146.113 de Bogotá

IVONNE FERNANDEZ BECERRA
Firmado digitalmente por IVONNE FERNANDEZ BECERRA
Fecha: 2022.04.06 08:45:12 -05'00'

IVONNE FERNANDEZ BECERRA
CONTADOR PUBLICO
C.C. No. 1.010.168.991 de Bogotá
Tarjeta Profesional No. 146684-T

SEDE PRINCIPAL
BOGOTÁ-COLOMBIA

DIRECCIÓN
CRA. 22A No. 85-20

TELÉFONO
PBX (571) 622 6620

FAX
(571) 610 5116

Elaboro: Jorge M.

icontec ISO 9001 SC 1142-1
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
mhcingenieros@mhc.com.co

Ingeniería y Construcción de Obras Civiles SAS

MHC Ingeniería y Construcción de Obras Civiles S.A.S
NIT. 900.904.055-1

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2020

Yo, **MARIO ALBERTO HUERTAS COTES**, identificado con **C.C. No. 19.146.113 de Bogotá**, en mi condición de **Representante legal** de **MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES S.A.S identificada con el NIT 900.904.055-1**, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales , pagadas por el consorcio durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **Jorge Eduardo Cifuentes Linares**, identificado con **C.C. No. 79.901.429 de Bogotá**, y con Tarjeta Profesional No. 108597-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor fiscal** de **MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES S.A.S identificada con el NIT 900.904.055-1**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros del Consorcio, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales , pagadas por el consorcio durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá a los (04) días del mes de Abril de 2022.

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2022.04.06 13:16:09 -05'00'

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 19.146.113 de Bogotá

JORGE EDUARDO CIFUENTES LINARES
Firmado digitalmente por JORGE EDUARDO CIFUENTES LINARES
Fecha: 2022.04.06 13:02:57 -05'00'

JORGE EDUARDO CIFUENTES LINARES
REVISOR FISCAL
C.C. No. 79.901.429 de Bogotá
Tarjeta Profesional No. 108597-T

Elaboro: Jorge M.

MHC S.A.S
CONSORCIO VIAL MHC 056

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2020

Yo, **MARIO ALBERTO HUERTAS COTES**, identificado con **C.C. No. 19.146.113 de Bogotá**, en mi condición de **Representante legal** del **Consorcio Vial MHC 056, identificado con el NIT 901.442.945-1**, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales , pagadas por el consorcio durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **IVONNE FERNANDEZ BECERRA**, identificada con **C.C. No. 1.010.168.991 de Bogotá**, y con Tarjeta Profesional No. 146684-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Contador Público** del **Consorcio Vial MHC 056, identificado con el NIT 901.442.945-1**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros del Consorcio, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales), aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) y el cumplimiento de las obligaciones laborales , pagadas por el consorcio durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de suscripción de este certificado. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá a los (06) días del mes de Abril de 2022.

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2022.04.06 14:32:18 -05'00'

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAL MHC 056
C.C. No. 19.146.113 de Bogotá

IVONNE FERNANDEZ BECERRA
Firmado digitalmente por IVONNE FERNANDEZ BECERRA
Fecha: 2022.04.06 14:09:47 -05'00'

IVONNE FERNANDEZ BECERRA
CONTADOR PUBLICO
CONSORCIO VIAL MHC 056
C.C. No. 1.010.168.991 de Bogotá
Tarjeta Profesional No. 146684-T

Elaboro: Jorge M.

SEDE PRINCIPAL
BOGOTÁ-COLOMBIA

DIRECCIÓN
CRA. 22A No. 85-20

TELÉFONO
PBX (571) 622 6620

FAX
(571) 610 5116

presidencia@mhc.com.co

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 10
FECHA	04/05/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 10 **DE** MARZO 2022 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 5,483,544,001.10

SEGUIMIENTO No. 10 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA; GIRÓN-PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 083

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 465,288,090,475.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 465,288,090,475.00

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 20/12/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22
EXPLANACIONES	($ 21,515,584.16)	(6.05%)	0.48%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.017%	0.057%	0.147%	0.234%	0.374%
	$21,515,584	6.05%	$1,709,022	$ P						60,544	203,002	$ 523,918	$ 831,180	$ 1,330,802
				$ E						71,421	213,053	$ 559,953	$ 1,103,359	$ 1,709,022
				% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.020%	0.060%	0.14%	0.31%	0.48%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	($ 46,601,026.00)	(13.10%)	0.02%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.038%	0.151%
	$46,601,026	13.10%	$72,836	$ P									$ 136,459	$ 536,802
				$ E									$ 72,836	$ 72,836
				% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%			0.02%	0.020%
PAVIMENTOS ASFALTICOS	($ 50,804,619.70)	(14.28%)	3.66%	% P	0.000%	0.002%	0.564%	0.958%	1.355%	1.952%	2.472%	2.496%	2.533%	2.652%
	$50,804,571	14.28%	$13,002,546	$ P		$ 8,684	2,006,050	3,406,841	$ 4,821,233	6,767,197	8,793,164	$ 8,880,008	$ 9,010,269	$ 9,436,261
				$ E		$ 424,360	2,448,328	3,748,043	$ 6,205,617	7,927,839	9,800,841	$ 10,902,071	$ 12,237,730	$ 13,002,546
				% E	0.000%	0.129%	0.604%	1.053%	1.743%	2.116%	2.516%	3.08%	3.44%	3.655%
PAVIMENTOS DE CONCRETO	($ 780,270.40)	(0.22%)	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$780,270	0.22%	$0	$ P										
				$ E										
				% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%				
ESTRUCTURA Y DRENAJES	($ 198,553,897.91)	(55.82%)	0.24%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.014%	0.039%	0.075%	0.100%	0.155%
	$198,553,898	55.82%	$864,929	$ P						48,090	137,400	$ 265,621	$ 357,420	$ 550,879
				$ E					$ 177,218	60,052	155,066	$ 263,431	$ 544,823	$ 864,929
				% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.012%	0.044%	0.07%	0.14%	0.243%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	($ 5,732,586.70)	(1.61%)	0.17%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.003%	0.073%	0.074%	0.077%	0.083%	0.086%	0.086%
	$5,732,673	1.61%	$610,455	$ P				9,262	$ 258,111	262,586	274,432	$ 295,883	305,344	$ 314,804
				$ E			11,405	42,386	$ 58,434	83,261	190,462	$ 451,879	$ 516,089	$ 610,455
				% E	0.000%	0.000%	0.003%	0.012%	0.016%	0.023%	0.054%	0.13%	0.15%	0.172%
OBRAS SUBTERRANEAS	($ 18,970,842.08)	(5.33%)	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$0	0.00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%				
OBRAS VARIAS	($ 4,548,271.00)	(1.28%)	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$4,548,271	1.28%	$0	$ P										
				$ E										
				% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%				
TRANSPORTES	($ 8,228,339.90)	(2.31%)	0.68%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.007%	0.022%	0.022%	0.022%	0.022%
	$8,228,248	2.31%	$2,403,403	$ P						23,494	77,880	$ 78,037	78,087	78,840
				$ E							94,116	$ 523,781	$ 1,312,458	$ 2,403,403
				% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.024%	0.15%	0.37%	0.676%
NO PREVISTOS	($ 0.00)	(0.00%)	2.22%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.127%	0.150%	0.228%	0.262%
	$18,970,897	5.33%	$7,901,646	$ P							453,057	$ 565,253	804,077	931,560
				$ E							27,957	$ 74,104	$ 1,402,322	$ 931,560
				% E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.203%	0.84%	1.49%	2.221%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)		100%	7.47%											
	($ 355,735,437.86)													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$355,735,439	100%	$26,564,837.87											

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.00%	0.00%	0.56%	0.40%	0.47%	0.59%	0.78%	0.19%	0.26%	0.47%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$8,684	$1,997,366	$1,469,652	$1,664,361	$2,081,847	$2,777,950	$689,377	$915,302	$1,657,127
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.56%	0.96%	1.43%	2.01%	2.79%	2.99%	3.24%	3.71%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$8,684	$2,006,050	$3,415,702	$5,080,064	$7,161,910	$9,939,861	$10,629,237	$11,544,540	$13,181,667
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.13%	0.48%	0.48%	0.78%	0.41%	0.72%	1.61%	1.81%	1.54%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$450,360	$1,700,773	$1,625,696	$2,466,380	$1,467,773	$2,572,751	$5,379,813	$5,366,148	$5,483,544
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.13%	0.61%	1.08%	1.76%	2.18%	2.90%	4.41%	5.93%	7.47%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$450,360	$2,150,733	$3,785,429	$6,274,809	$7,742,582	$10,315,333	$15,695,145	$21,061,294	$26,564,838

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 27,957,104.34 / $ 27,957,103.53	$ 558,451.78	2.00%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,200,000.00 / $ 1,200,000.00	$ -	0.00%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 1,125,070.51 / $ 1,125,070.51	$ 79,283.46	7.05%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 2,640,000.00 / $ 2,640,000.00	$ 1,293,600.00	49.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 501,600.00 / $ 501,600.00	$ 245,784.00	49.00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	$ 75,778,877.77 / $ 75,778,877.77	$ 10,951.33	0.014%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 350,000.00 / $ 350,000.00	$ 2,398.35	0.69%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 109,552,652.62	$ 2,190,468.92	2.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 109,552,651.81		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 465,288,090.48**	**$ 28,755,306.79**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 465,288,090.48**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2022.05.05 09:07:49 -05'00'

Aprueba Firma:
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante legal o apoderado del Contratista

Aprueba Firma:
Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante legal o apoderado del Interventor

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 10
		FECHA	04/05/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 10 **DE** MARZO 2022 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 5,483,544,001.10

SEGUIMIENTO No. 10 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MODULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 20/12/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 465,288,090,475.00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 465,288,090,475.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA) (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor Programado % Ejecutado	11 abr-22	12 may-22	13 jun-22	14 jul-22	15 ago-22	16 sep-22	17 oct-22	18 nov-22	19 dic-22	20 ene-23
EXPLANACIONES	$21,515,584	6.05%	0.48%	% P	0.471%	0.494%	0.510%	0.554%	0.598%	0.643%	0.687%	0.687%	0.687%	0.745%
	$21,515,584	6.05%	$1,709,022	$ P	$ 1,676,149	$ 1,757,355	$ 1,812,852	$ 1,970,348	$ 2,128,261	$ 2,286,174	$ 2,443,971	$ 2,444,387	$ 2,444,833	$ 2,649,916
				$ E										
				% E										
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$46,601,026	13.10%	0.02%	% P	0.378%	0.781%	1.064%	1.197%	1.290%	1.382%	1.474%	1.567%	1.601%	2.065%
	$46,601,026	13.10%	$72,838	$ P	$ 1,343,650	$ 2,777,650	$ 3,783,650	$ 4,259,599	$ 4,588,099	$ 4,916,599	$ 5,245,099	$ 5,573,599	$ 5,693,599	$ 7,345,488
				$ E										
				% E										
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$50,804,620	14.28%	3.66%	% P	2.697%	2.836%	2.995%	3.111%	3.214%	3.342%	3.484%	3.626%	3.898%	3.901%
	$50,804,571	14.28%	$13,002,546	$ P	$ 9,594,273	$ 10,089,700	$ 10,654,147	$ 11,067,165	$ 11,432,435	$ 11,887,889	$ 12,393,720	$ 12,900,431	$ 13,864,098	$ 13,877,744
				$ E										
				% E										
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$780,270	0.22%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.004%
	$780,270	0.22%	$0	$ P										$ 14,234
				$ E										
				% E										
ESTRUCTURA Y DRENAJES	$198,553,898	55.82%	0.24%	% P	0.217%	0.279%	0.345%	0.409%	0.473%	0.539%	0.604%	0.670%	0.682%	1.524%
	$198,553,898	55.82%	$864,929	$ P	$ 771,380	$ 991,680	$ 1,226,363	$ 1,456,273	$ 1,684,183	$ 1,916,188	$ 2,148,193	$ 2,384,928	$ 2,417,271	$ 5,402,944
				$ E										
				% E										
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$5,732,587	1.61%	0.17%	% P	0.092%	0.095%	0.106%	0.123%	0.139%	0.155%	0.172%	0.189%	0.205%	0.207%
	$5,732,673	1.61%	$610,455	$ P	$ 325,548	$ 336,640	$ 377,467	$ 435,554	$ 494,415	$ 552,866	$ 611,832	$ 670,798	$ 726,786	$ 734,615
				$ E										
				% E										
OBRAS SUBTERRANEAS	$18,970,842	5.33%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$0	0.00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E										
OBRAS VARIAS	$4,548,271	1.28%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.001%	0.002%	0.004%	0.005%	0.006%	0.015%
	$4,548,271	1.28%	$0	$ P					$ 4,162	$ 8,325	$ 12,487	$ 16,649	$ 20,812	$ 62,436
				$ E										
				% E										
TRANSPORTES	$8,228,340	$0	$0	% P	0.033%	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%	0.040%	0.077%
	$8,228,248	$0	$2,403,403	$ P	$ 117,720	$ 140,784	$ 141,342	$ 141,898	$ 142,448	$ 143,002	$ 143,555	$ 144,109	$ 144,279	$ 277,102
				$ E										
				% E										
NO PREVISTOS	$0	0.00%	2.22%	% P	0.384%	0.514%	0.655%	0.804%	0.958%	1.113%	1.268%	1.423%	1.423%	1.771%
	$18,970,897	5.33%	$7,901,646	$ P	$ 1,366,228	$ 1,829,758	$ 2,330,752	$ 2,860,811	$ 3,406,636	$ 3,961,027	$ 4,515,359	$ 4,984,161	$ 5,133,277	$ 6,361,735
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$355,735,438	100%	7%											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$355,735,439	$1	$26,564,838											

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.57%	0.77%	0.68%	0.52%	0.48%	0.90%	0.80%	0.37%	0.37%	1.55%
	VALOR (Miles de Pesos)	$2,013,406	$2,728,772	$2,403,758	$1,862,148	$1,690,857	$1,791,460	$2,122,103	$1,324,338	$1,333,258	$5,510,742
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	4.27%	5.04%	5.71%	6.24%	6.71%	7.22%	7.81%	8.19%	8.56%	10.11%
	VALOR (Miles de Pesos)	$15,195,073	$17,923,845	$20,327,602	$22,189,751	$23,880,609	$25,672,068	$27,794,172	$29,118,510	$30,451,768	$35,962,510
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 27,957,104.34 $ 27,957,103.53	$ 558,451.78	1.998%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00	$ -	0.000%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 1,125,070.51 $ 1,125,070.51	$ 79,283.46	7.047%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 2,640,000.00 $ 2,640,000.00	$ 1,293,600.00	49.000%
N/A - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 501,800.00 $ 501,800.00	$ 245,784.00	49.000%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	$ 75,778,877.77 $ 75,778,877.77	$ 10,951.33	0.014%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 350,000.00 $ 350,000.00	$ 2,398.35	0.685%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 109,552,852.62	$ 2,190,468.92	1.999%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 109,552,851.81		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 465,288,090.48**	**$ 28,755,306.79**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 465,288,090.48**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES — Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES Fecha: 2022.05.05 09:08:12 -05'00'

Aprueba Firma:
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante legal o apoderado del Contratista

Aprueba Firma:
Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante legal o apoderado del Interventor

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEP-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 de 12
FECHA	04/05/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 10 **DE** MARZO 2022 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 5,463,544,001.10

SEGUIMIENTO No. 10 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 083

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICECASA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 465,288,090,475.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 465,288,090,475.00

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 20/12/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / % Ejecutado / $ Valor Ejecutado	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	%
EXPLANACIONES	$21,515,584	6.05%	0.48%	% P	0.762%	0.775%	0.788%	0.801%	0.815%	0.829%	1.015%	1.058%	1.086%	1.095%	10%
	$21,515,584	6.05%	$1,709,022	$ P	$ 2,709,930	$ 2,756,773	$ 2,803,232	$ 2,850,534	$ 2,898,772	$ 2,947,926	$ 3,611,419	$ 3,764,931	$ 3,862,296	$ 3,894,409	9%
				$ E											8%
				% E											7%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$46,601,026	13.10%	0.02%	% P	2.236%	2.378%	2.516%	2.654%	2.791%	2.929%	3.066%	3.202%	3.338%	3.383%	6%
	$46,601,026	13.10%	$72,836	$ P	$ 7,954,777	$ 8,458,554	$ 8,950,957	$ 9,441,216	$ 9,930,218	$ 10,418,060	$ 10,904,734	$ 11,390,230	$ 11,874,537	$ 12,035,436	5%
				$ E											4%
				% E											3%
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$50,804,820	14.28%	3.66%	% P	3.903%	3.905%	3.920%	3.943%	3.966%	4.218%	4.297%	4.369%	4.440%	4.485%	2%
	$50,804,571	14.28%	$13,002,546	$ P	$ 13,884,330	$ 13,891,109	$ 13,943,382	$ 14,025,407	$ 14,107,550	$ 15,005,928	$ 15,285,391	$ 15,542,781	$ 15,795,978	$ 15,955,792	1%
				$ E											0%
				% E											-1%
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$780,270	0.22%	0.00%	% P	0.005%	0.007%	0.008%	0.009%	0.011%	0.012%	0.014%	0.015%	0.017%	0.018%	-2%
	$780,270	0.22%	$0	$ P	$ 19,324	$ 25,771	$ 28,409	$ 33,276	$ 38,392	$ 43,736	$ 49,296	$ 55,063	$ 61,026	$ 63,918	-3%
				$ E											-4%
				% E											-5%
ESTRUCTURA Y DRENAJES	$198,553,898	55.82%	0.24%	% P	1.844%	2.542%	2.877%	3.187%	3.505%	3.832%	4.171%	4.519%	4.878%	5.000%	-6%
	$198,553,898	55.82%	$864,929	$ P	$ 6,561,498	$ 9,042,461	$ 10,235,068	$ 11,337,481	$ 12,466,866	$ 13,633,331	$ 14,837,314	$ 16,077,138	$ 17,361,666	$ 17,787,727	-7%
				$ E											-8%
				% E											-9%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$5,732,587	1.61%	0.17%	% P	0.209%	0.212%	0.216%	0.220%	0.225%	0.231%	0.237%	0.244%	0.251%	0.267%	-10%
	$5,732,673	1.61%	$610,455	$ P	$ 743,972	$ 754,934	$ 769,061	$ 783,680	$ 801,092	$ 821,701	$ 843,993	$ 868,330	$ 894,656	$ 951,180	-11%
				$ E											-12%
				% E											-13%
OBRAS SUBTERRANEAS	$18,970,842	5.33%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	-14%
	$0	0.00%	$0	$ P											-15%
				$ E											-16%
				% E											-17%
OBRAS VARIAS	$4,548,271	1.28%	0.00%	% P	0.017%	0.019%	0.021%	0.023%	0.025%	0.028%	0.030%	0.032%	0.034%	0.035%	-18%
	$4,548,271	1.28%	$0	$ P	$ 61,956	$ 68,867	$ 75,881	$ 83,049	$ 90,413	$ 97,969	$ 105,708	$ 113,627	$ 121,713	$ 124,497	-19%
				$ E											-20%
				% E											-21%
TRANSPORTES	$8,228,340	$0	$0	% P	0.086%	0.092%	0.098%	0.104%	0.110%	0.117%	0.253%	0.281%	0.299%	0.304%	-22%
	$8,228,248	$0	$2,403,403	$ P	$ 306,273	$ 327,814	$ 348,825	$ 370,483	$ 392,558	$ 415,147	$ 897,841	$ 994,751	$ 1,062,911	$ 1,082,911	-23%
				$ E											-24%
				% E											-25%
NO PREVISTOS	$0	0.00%	2.22%	% P	1.640%	1.704%	1.770%	1.838%	1.907%	1.977%	2.049%	2.122%	2.197%	2.222%	-26%
	$18,970,897	5.33%	$7,901,646	$ P	$ 5,832,620	$ 6,062,646	$ 6,296,793	$ 6,536,672	$ 6,782,191	$ 7,033,102	$ 7,289,155	$ 7,550,108	$ 7,815,732	$ 7,905,636	-27%
				$ E											-28%
				% E											-29%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$355,735,438	100%	7%												0%
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$355,735,439	$1	$26,564,838												

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE GRÁFICO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0.69%**	**0.93%**	**0.58%**	**0.87%**	**0.68%**	**0.82%**	**0.96%**	**0.71%**	**0.70%**	**0.27%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$2,112,108**	**$3,312,236**	**$2,063,869**	**$2,011,072**	**$2,046,758**	**$2,908,559**	**$3,408,523**	**$2,535,756**	**$2,479,300**	**$960,100**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**10.70%**	**11.63%**	**12.21%**	**12.79%**	**13.36%**	**14.17%**	**15.13%**	**15.84%**	**16.54%**	**16.81%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$38,074,615**	**$41,386,851**	**$43,450,719**	**$45,461,792**	**$47,508,550**	**$50,417,109**	**$53,825,632**	**$56,361,388**	**$58,840,688**	**$59,800,788**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$27,957,104.34 / $27,957,103.53	$ 558,451.78	1.998%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,200,000.00 / $ 1,200,000.00	$ -	0.000%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 1,125,070.51 / $ 1,125,070.51	$ 79,283.46	7.047%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 2,640,000.00 / $ 2,640,000.00	$ 1,293,600.00	49.000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 501,600.00 / $ 501,600.00	$ 245,784.00	49.000%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	$75,778,877.77 / $75,778,877.77	$ 10,951.33	0.014%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 350,000.00 / $ 350,000.00	$ 2,398.35	0.685%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	############	$ 2,190,468.92	1.999%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	############		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$465,288,090.48**	**$ 28,755,306.79**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$465,288,090.48**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2022.05.05 09:08:28 -05'00'

Aprueba Firma:
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante legal o apoderado del Contratista

Aprueba Firma:
Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante legal o apoderado del Interventor

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera);
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
SUBGER. DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	4 de 12

FECHA: 04/05/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 10 **DE** MARZO 2022 (Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 5,483,544,001.19

SEGUIMIENTO No. 10 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"MÓDULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 083

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/05/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 465,286,090,475.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 465,286,090,475.00

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 20/12/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24
EXPLANACIONES	$21,515,584	6.05%	0.48%	% P	1.097%	1.138%	1.194%	1.224%	1.253%	1.282%	1.312%	1.342%	1.372%	1.402%
	$21,515,584	6.05%	$1,709,022	$ P	$ 3,901,003	$ 4,049,307	$ 4,247,875	$ 4,353,816	$ 4,457,060	$ 4,561,353	$ 4,667,365	$ 4,774,325	$ 4,879,975	$ 4,986,597
				$ E										
				% E										
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$46,601,026	13.10%	0.02%	% P	3.388%	3.743%	3.888%	4.022%	4.156%	4.290%	4.423%	4.556%	4.689%	4.821%
	$46,601,026	13.10%	$72,836	$ P	$ 12,052,506	$ 13,316,712	$ 13,829,505	$ 14,309,027	$ 14,785,917	$ 15,261,469	$ 15,735,725	$ 16,208,674	$ 16,680,301	$ 17,150,592
				$ E										
				% E										
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$50,804,620	14.28%	3.66%	% P	4.518%	4.627%	4.672%	4.676%	4.758%	4.803%	4.848%	4.893%	5.336%	5.452%
	$50,804,571	14.28%	$13,002,546	$ P	$ 16,073,398	$ 16,459,022	$ 16,621,047	$ 16,633,932	$ 16,934,454	$ 17,087,164	$ 17,245,927	$ 17,405,966	$ 18,983,435	$ 19,395,010
				$ E										
				% E										
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$780,270	0.22%	0.00%	% P	0.018%	0.022%	0.024%	0.026%	0.028%	0.030%	0.032%	0.035%	0.037%	0.039%
	$780,270	0.22%	$0	$ P	$ 63,297	$ 79,985	$ 87,103	$ 93,965	$ 100,964	$ 108,112	$ 115,406	$ 122,836	$ 130,403	$ 138,101
				$ E										
				% E										
ESTRUCTURA Y DRENAJES	$198,553,898	55.82%	0.24%	% P	5.407%	6.399%	6.881%	7.342%	7.811%	8.290%	8.778%	9.276%	9.783%	10.298%
	$198,553,898	55.82%	$864,929	$ P	$ 19,234,266	$ 22,764,369	$ 24,479,880	$ 26,118,314	$ 27,787,205	$ 29,490,428	$ 31,227,474	$ 32,997,669	$ 34,800,450	$ 36,635,570
				$ E										
				% E										
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$5,732,567	1.61%	0.17%	% P	0.269%	0.281%	0.295%	0.302%	0.318%	0.333%	0.348%	0.362%	0.377%	0.392%
	$5,732,673	1.61%	$610,455	$ P	$ 955,491	$ 998,175	$ 1,050,020	$ 1,075,464	$ 1,130,178	$ 1,183,890	$ 1,236,443	$ 1,288,786	$ 1,340,992	$ 1,393,078
				$ E										
				% E										
OBRAS SUBTERRANEAS	$18,970,842	5.33%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$0	0.00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E										
OBRAS VARIAS	$4,548,271	1.28%	0.00%	% P	0.035%	0.041%	0.044%	0.046%	0.049%	0.052%	0.054%	0.057%	0.059%	0.062%
	$4,548,271	1.28%	$0	$ P	$ 124,764	$ 146,924	$ 156,241	$ 165,151	$ 174,180	$ 183,346	$ 192,648	$ 202,086	$ 211,661	$ 221,372
				$ E										
				% E										
TRANSPORTES	$8,228,340	$0	$0	% P	0.297%	0.332%	0.371%	0.390%	0.408%	0.427%	0.446%	0.465%	0.485%	0.505%
	$8,228,248	$0	$2,403,403	$ P	$ 1,062,097	$ 1,180,094	$ 1,319,358	$ 1,387,290	$ 1,453,087	$ 1,519,674	$ 1,587,153	$ 1,655,504	$ 1,724,707	$ 1,794,735
				$ E										
				% E										
NO PREVISTOS	$0	0.00%	2.22%	% P	2.225%	2.428%	2.513%	2.593%	2.675%	2.757%	2.840%	2.924%	3.008%	3.094%
	$18,970,897	5.33%	$7,901,646	$ P	$ 7,915,309	$ 8,636,875	$ 8,938,172	$ 9,224,972	$ 9,514,405	$ 9,807,014	$ 10,102,836	$ 10,401,080	$ 10,702,149	$ 11,005,649
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$355,735,438	100%	7%		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$355,735,439	$1	$26,564,838											

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	% Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.45%	1.75%	0.87%	0.74%	0.83%	0.81%	0.82%	0.83%	1.24%	0.92%
	VALOR (Miles de Pesos)	$1,611,461	$6,219,227	$3,097,723	$2,632,731	$2,965,518	$2,874,980	$2,908,345	$2,946,395	$4,396,878	$3,268,478
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	17.26%	19.01%	19.88%	20.62%	21.46%	22.26%	23.08%	23.91%	25.15%	26.06%
	VALOR (Miles de Pesos)	$61,412,249	$67,631,477	$70,729,200	$73,361,931	$76,327,449	$79,202,429	$82,110,774	$85,057,169	$89,454,047	$92,720,525
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	########## / ##########	$ 558,451.78	1.998%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$1,200,000.00 / $1,200,000.00	$ -	0.000%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$1,125,070.51 / $1,125,070.51	$ 79,283.46	7.047%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$2,640,000.00 / $2,640,000.00	$ 1,293,600.00	49.000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 501,600.00 / $ 501,600.00	$ 245,784.00	49.000%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	########## / ##########	$ 10,951.33	0.014%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 350,000.00 / $ 350,000.00	$ 2,398.35	0.685%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	##########	$ 2,190,468.92	1.999%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	##########		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	##########	**$ 28,755,306.79**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	##########		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2022.05.05 09:08:43 -05'00'

Aprueba Firma:
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante legal o apoderado del Contratista

Aprueba Firma:
Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante legal o apoderado del Interventor

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera);
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEP-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	5 de 12
FECHA	04/05/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL :** CUNDINAMARCA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 10 **DE** MARZO 2022 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 5,483,544,001.10

SEGUIMIENTO No. 10 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 083

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL incluido IVA) **(A):** $ 465,288,090,475.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** (Según contrato principal) $ 465,288,090,475.00

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/12/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / % Ejecutado	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25
EXPLANACIONES	$21,515,584	6.05%	0.48%	% P	1.432%	1.463%	1.494%	1.496%	1.501%	1.508%	1.517%	1.528%	1.541%	1.556%
				$ P	$ 5,094,807	$ 5,203,718	$ 5,313,961	$ 5,323,250	$ 5,340,766	$ 5,365,896	$ 5,398,172	$ 5,437,585	$ 5,482,185	$ 5,533,055
	$21,515,584	6.05%	$1,709,022	$ E										
				% E										
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$46,601,026	13.10%	0.02%	% P	4.963%	5.084%	5.215%	5.226%	5.247%	5.276%	5.313%	5.357%	5.408%	5.466%
				$ P	$ 17,619,530	$ 18,057,100	$ 18,553,266	$ 18,591,967	$ 18,664,477	$ 18,768,938	$ 18,899,972	$ 19,057,947	$ 19,239,857	$ 19,443,561
	$46,601,026	13.10%	$72,836	$ E										
				% E										
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$50,804,620	14.28%	3.66%	% P	5.555%	5.657%	5.761%	5.770%	5.786%	5.810%	5.840%	5.876%	5.918%	5.966%
				$ P	$ 19,758,930	$ 20,120,592	$ 20,494,282	$ 20,525,211	$ 20,583,528	$ 20,667,276	$ 20,774,655	$ 20,904,055	$ 21,053,771	$ 21,222,671
	$50,804,571	14.28%	$13,002,546	$ E										
				% E										
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$780,270	0.22%	0.00%	% P	0.041%	0.043%	0.046%	0.046%	0.046%	0.047%	0.047%	0.048%	0.049%	0.050%
				$ P	$ 145,925	$ 153,872	$ 161,939	$ 162,620	$ 163,908	$ 165,763	$ 168,148	$ 171,029	$ 174,375	$ 178,154
	$780,270	0.22%	$0	$ E										
				% E										
ESTRUCTURA Y DRENAJES	$198,553,898	55.82%	0.24%	% P	10.823%	11.356%	12.123%	12.169%	12.255%	12.382%	12.541%	12.735%	12.961%	13.217%
				$ P	$ 38,501,283	$ 40,399,209	$ 43,125,408	$ 43,288,295	$ 43,596,569	$ 44,041,013	$ 44,612,997	$ 45,304,822	$ 46,108,569	$ 47,018,077
	$198,553,898	55.82%	$864,929	$ E										
				% E										
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$5,732,587	1.61%	0.17%	% P	0.406%	0.421%	0.436%	0.439%	0.443%	0.447%	0.451%	0.456%	0.460%	0.465%
				$ P	$ 1,445,801	$ 1,498,695	$ 1,550,264	$ 1,561,265	$ 1,575,864	$ 1,589,275	$ 1,603,342	$ 1,619,837	$ 1,636,305	$ 1,653,894
	$5,732,673	1.61%	$610,455	$ E										
				% E										
OBRAS SUBTERRANEAS	$18,970,842	5.33%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
				$ P										
	$0	0.00%	$0	$ E										
				% E										
OBRAS VARIAS	$4,548,271	1.28%	0.00%	% P	0.062%	0.068%	0.071%	0.091%	0.111%	0.130%	0.149%	0.167%	0.185%	0.203%
				$ P	$ 221,130	$ 241,648	$ 251,094	$ 323,726	$ 394,218	$ 462,761	$ 529,247	$ 594,752	$ 658,555	$ 721,047
	$4,548,271	1.28%	$0	$ E										
				% E										
TRANSPORTES	$8,228,340	$0	$0	% P	0.524%	0.545%	0.562%	0.563%	0.567%	0.571%	0.577%	0.584%	0.593%	0.602%
				$ P	$ 1,865,540	$ 1,937,143	$ 1,997,983	$ 2,004,066	$ 2,015,547	$ 2,032,059	$ 2,053,230	$ 2,078,765	$ 2,108,359	$ 2,141,730
	$8,228,248	$0	$2,403,403	$ E										
				% E										
NO PREVISTOS	$0	0.00%	2.22%	% P	3.180%	3.266%	3.353%	3.361%	3.374%	3.394%	3.419%	3.449%	3.484%	3.523%
				$ P	$ 11,311,382	$ 11,619,147	$ 11,928,739	$ 11,954,639	$ 12,003,386	$ 12,073,253	$ 12,162,833	$ 12,270,025	$ 12,394,028	$ 12,533,331
	$18,970,897	5.33%	$7,901,846	$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$355,735,438	100%	7%											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$355,735,439	$1	$26,564,838											

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.91%	0.92%	1.16%	0.18%	0.17%	0.23%	0.29%	0.35%	0.40%	0.45%
	VALOR (Miles de Pesos)	$3,254,504	$3,289,556	$4,114,172	$368,286	$601,050	$827,202	$1,038,000	$1,234,607	$1,418,090	$1,589,433
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	26.98%	27.90%	29.06%	29.16%	29.33%	29.56%	29.85%	30.20%	30.60%	31.05%
	VALOR (Miles de Pesos)	$95,975,029	$99,264,585	$103,378,756	$103,737,042	$104,338,093	$105,165,294	$106,203,295	$107,437,901	$108,856,991	$110,445,424
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluya IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 27,957,104.34 / $ 27,957,103.53	$ 558,451.78	1.998%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,200,000.00 / $ 1,200,000.00	$ -	0.000%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 1,125,070.51 / $ 1,125,070.51	$ 79,283.46	7.047%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O ESTUDIOS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 2,840,000.00 / $ 2,840,000.00	$ 1,293,600.00	49.000%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 501,600.00 / $ 501,600.00	$ 245,784.00	49.000%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PMA Licencia ambiental e IVA 19%)	$ 75,778,877.77 / $ 75,778,877.77	$ 10,951.33	0.014%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 350,000.00 / $ 350,000.00	$ 2,398.35	0.685%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 109,552,652.62	$ 2,190,468.92	1.999%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 109,552,651.81		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 465,288,090.48**	**$ 28,755,306.79**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 465,288,090.48**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2022.05.05 09:09:00 -05'00'

Aprueba Firma:
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante legal o apoderado del Contratista

Aprueba Firma:
Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante legal o apoderado del Interventor

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	6 de 12
FECHA	04/05/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 10 **DE** MARZO 2022 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 5,483,544,001.10

SEGUIMIENTO No. 10 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA-BARBOSA-BUCARAMANGA; GIRÓN-PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC DES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 465,288,990,475.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 465,288,990,475.00

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 20/12/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA)	((%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / % Ejecutado	51 ago-25	52 sep-25	53 oct-25	54 nov-25	55 dic-25	56 ene-26	57 feb-26	58 mar-26	59 abr-26	60 may-26	%
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos												
EXPLANACIONES	$21,515,584	6.05%	0.48%	% P	1.571%	1.588%	1.607%	1.627%	1.648%	1.705%	1.762%	1.820%	1.879%	1.938%	100%
				$ P	$ 5,589,298	$ 5,650,562	$ 5,716,537	$ 5,786,851	$ 5,861,286	$ 6,064,486	$ 6,269,310	$ 6,475,797	$ 6,683,766	$ 6,893,212	100%
	$21,515,584	6.05%	$1,709,022	$ E											100%
				% E											100%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$46,601,026	13.10%	0.02%	% P	5.529%	5.597%	5.669%	5.746%	5.827%	5.919%	6.014%	6.111%	6.211%	6.313%	100%
				$ P	$ 19,667,241	$ 19,909,178	$ 20,167,760	$ 20,441,630	$ 20,729,347	$ 21,056,541	$ 21,393,937	$ 21,740,503	$ 22,095,293	$ 22,457,442	100%
	$46,601,026	13.10%	$72,836	$ E											100%
				% E											100%
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$50,804,620	14.28%	3.66%	% P	6.018%	6.075%	6.137%	6.202%	6.271%	6.351%	6.433%	6.518%	6.606%	6.696%	100%
				$ P	$ 21,409,016	$ 21,612,087	$ 21,830,491	$ 22,063,263	$ 22,309,453	$ 22,591,305	$ 22,883,931	$ 23,186,507	$ 23,498,664	$ 23,819,480	100%
	$50,804,571	14.28%	$13,002,546	$ E											100%
				% E											100%
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$780,270	0.22%	0.00%	% P	0.051%	0.053%	0.054%	0.055%	0.057%	0.059%	0.061%	0.063%	0.065%	0.067%	100%
				$ P	$ 182,345	$ 186,917	$ 191,647	$ 197,114	$ 202,698	$ 209,106	$ 215,770	$ 222,679	$ 229,816	$ 237,196	100%
	$780,270	0.22%	$0	$ E											100%
				% E											100%
ESTRUCTURA Y DRENAJES	$198,553,898	55.82%	0.24%	% P	13.501%	13.811%	14.145%	14.503%	14.883%	15.320%	15.776%	16.249%	16.738%	18.065%	100%
				$ P	$ 48,026,884	$ 49,129,214	$ 50,319,718	$ 51,593,449	$ 52,945,829	$ 54,500,097	$ 56,120,074	$ 57,802,249	$ 59,543,354	$ 64,264,441	100%
	$198,553,898	55.82%	$864,929	$ E											100%
				% E											100%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$5,732,587	1.61%	0.17%	% P	0.470%	0.478%	0.481%	0.487%	0.493%	0.500%	0.507%	0.514%	0.521%	0.529%	100%
				$ P	$ 1,672,355	$ 1,691,643	$ 1,711,716	$ 1,732,531	$ 1,754,055	$ 1,778,274	$ 1,803,437	$ 1,828,730	$ 1,854,760	$ 1,882,899	100%
	$5,732,573	1.61%	$610,455	$ E											100%
				% E											100%
OBRAS SUBTERRANEAS	$18,970,842	5.33%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	100%
				$ P											100%
	$0	0.00%	$0	$ E											100%
				% E											100%
OBRAS VARIAS	$4,548,271	1.28%	0.00%	% P	0.220%	0.237%	0.254%	0.270%	0.286%	0.304%	0.321%	0.338%	0.355%	0.371%	100%
				$ P	$ 782,413	$ 842,756	$ 902,196	$ 960,826	$ 1,018,744	$ 1,081,148	$ 1,142,506	$ 1,202,930	$ 1,262,556	$ 1,321,410	100%
	$4,548,271	1.28%	$0	$ E											100%
				% E											100%
TRANSPORTES	$8,228,340	$0	$0	% P	0.612%	0.624%	0.638%	0.649%	0.663%	0.678%	0.695%	0.712%	0.729%	0.747%	100%
				$ P	$ 2,178,647	$ 2,218,830	$ 2,262,130	$ 2,308,283	$ 2,357,123	$ 2,412,082	$ 2,471,163	$ 2,531,379	$ 2,593,272	$ 2,657,013	100%
	$8,228,248	$0	$2,403,403	$ E											100%
				% E											100%
NO PREVISTOS	$0	0.00%	2.22%	% P	3.566%	3.613%	3.663%	3.716%	3.772%	3.836%	3.901%	3.969%	4.037%	4.107%	100%
				$ P	$ 12,686,711	$ 12,853,004	$ 13,031,121	$ 13,220,030	$ 13,418,746	$ 13,644,872	$ 13,878,057	$ 14,117,416	$ 14,362,662	$ 14,611,160	100%
	$18,970,897	5.33%	$7,901,646	$ E											100%
				% E											100%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$355,735,438	100%	7%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$355,735,439	$1	$26,564,838												

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

		51 ago-25	52 sep-25	53 oct-25	54 nov-25	55 dic-25	56 ene-26	57 feb-26	58 mar-26	59 abr-26	60 may-26
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.49%	0.53%	0.57%	0.61%	0.64%	0.77%	0.80%	0.82%	0.85%	1.69%
	VALOR (Miles de Pesos)	$1,749,541	$1,899,247	$2,039,316	$2,170,451	$2,293,303	$2,741,057	$2,839,846	$2,929,648	$3,015,992	$6,029,958
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	31.54%	32.07%	32.65%	33.26%	33.90%	34.67%	35.47%	36.29%	37.14%	38.83%
	VALOR (Miles de Pesos)	$112,194,965	$114,094,212	$116,133,527	$118,303,978	$120,597,281	$123,338,838	$126,177,684	$129,107,332	$132,123,514	$138,144,072
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES ,OBRAS COMPLEMENTARAS Y/O ADICIONALES	$ 27,957,104.34 / $ 27,957,103.53	$ 558,451.78	2.00%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,200,000.00 / $ 1,200,000.00	$ -	0.00%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 1,125,070.51 / $ 1,125,070.51	$ 79,283.46	7.05%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 2,640,000.00 / $ 2,640,000.00	$ 1,293,600.00	49.00%
N/A - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 501,600.00 / $ 501,600.00	$ 245,784.00	49.00%
GESTIÓN SOCIAL PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	$ 75,778,877.77 / $ 75,778,877.77	$ 10,951.33	0.014%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 350,000.00 / $ 350,000.00	$ 2,398.35	0.69%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 109,552,852.62	$ 2,190,468.92	2.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 109,552,851.81		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 465,288,090.48**	**$ 28,755,306.79**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 465,288,090.48**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2022.05.05 09:09:15 -05'00'

Aprueba Firma:
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante legal o apoderado del Contratista

Aprueba Firma:
Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante legal o apoderado del Interventor

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	7 de 10
FECHA	04/05/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 10 **DE** MARZO 2022 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 5.463.544.001,19

SEGUIMIENTO No. 10 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ-BARBOSA-BUCARAMANGA; GIRÓN-PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 083

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/05/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 465.288.090.475,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 465.288.090.475,00

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 20/12/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / % Ejecutado	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	%
EXPLANACIONES	$21,515,584	6.05%	0.48%	% P	1.997%	2.057%	2.117%	2.177%	2.238%	2.300%	2.361%	2.453%	2.541%	2.626%	100%
	$21,515,584	6.05%	$1,709,022	$ P	$ 7,104,251	$ 7,316,666	$ 7,530,538	$ 7,745,789	$ 7,962,379	$ 8,180,266	$ 8,399,405	$ 8,724,926	$ 9,038,685	$ 9,342,214	100%
				$ E											0%
				% E											0%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$46,601,026	13.10%	0.02%	% P	6.417%	6.522%	6.629%	6.737%	6.846%	6.956%	7.067%	7.232%	7.391%	7.545%	100%
	$46,601,026	13.10%	$72,836	$ P	$ 22,826,159	$ 23,200,714	$ 23,580,444	$ 23,964,736	$ 24,353,029	$ 24,744,810	$ 25,139,603	$ 25,726,622	$ 26,282,542	$ 26,819,612	100%
				$ E											0%
				% E											0%
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$50,804,620	14.28%	3.66%	% P	6.788%	6.883%	6.980%	7.078%	7.179%	7.281%	7.384%	7.731%	7.858%	7.984%	100%
	$50,804,571	14.28%	$13,002,546	$ P	$ 24,148,511	$ 24,485,223	$ 24,829,146	$ 25,179,845	$ 25,536,920	$ 25,900,005	$ 26,268,763	$ 27,503,265	$ 27,953,137	$ 28,401,013	100%
				$ E											0%
				% E											0%
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$780,270	0.22%	0.00%	% P	0.069%	0.071%	0.073%	0.075%	0.078%	0.080%	0.083%	0.086%	0.090%	0.093%	100%
	$780,270	0.22%	$0	$ P	$ 244,720	$ 252,461	$ 260,389	$ 268,497	$ 276,710	$ 285,102	$ 293,834	$ 306,431	$ 318,981	$ 331,020	100%
				$ E											0%
				% E											0%
ESTRUCTURA Y DRENAJES	$198,553,898	55.82%	0.24%	% P	18.505%	18.957%	19.420%	19.894%	20.379%	20.874%	21.379%	22.138%	22.873%	23.605%	100%
	$198,553,898	55.82%	$864,929	$ P	$ 65,809,670	$ 67,435,836	$ 69,083,994	$ 70,771,237	$ 72,495,975	$ 74,256,651	$ 76,051,774	$ 78,752,882	$ 81,368,872	$ 83,971,124	100%
				$ E											0%
				% E											0%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$5,732,587	1.61%	0.17%	% P	0.537%	0.548%	0.555%	0.564%	0.573%	0.583%	0.592%	0.597%	0.611%	0.636%	100%
	$5,732,673	1.61%	$610,455	$ P	$ 1,911,765	$ 1,941,969	$ 1,973,181	$ 2,005,354	$ 2,038,426	$ 2,072,361	$ 2,107,093	$ 2,159,820	$ 2,210,620	$ 2,260,913	100%
				$ E											0%
OBRAS SUBTERRANEAS	$18,970,842	5.33%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	100%
	$0	0.00%	$0	$ P											100%
				$ E											0%
				% E											0%
OBRAS VARIAS	$4,548,271	1.28%	0.00%	% P	0.388%	0.404%	0.420%	0.436%	0.452%	0.468%	0.483%	0.506%	0.529%	0.550%	100%
	$4,548,271	1.28%	$0	$ P	$ 1,379,669	$ 1,437,342	$ 1,494,538	$ 1,551,311	$ 1,607,717	$ 1,663,808	$ 1,719,630	$ 1,801,758	$ 1,880,197	$ 1,955,447	100%
				$ E											0%
				% E											0%
TRANSPORTES	$8,228,340	$0	$0	% P	0.765%	0.784%	0.803%	0.823%	0.843%	0.863%	0.883%	0.900%	0.930%	0.959%	100%
	$8,228,248	$0	$2,403,403	$ P	$ 2,722,367	$ 2,789,304	$ 2,857,837	$ 2,927,932	$ 2,998,213	$ 3,070,269	$ 3,091,122	$ 3,200,767	$ 3,307,157	$ 3,413,924	100%
				$ E											0%
NO PREVISTOS	$0	0.00%	2.22%	% P	4.178%	4.250%	4.322%	4.395%	4.467%	4.538%	5.333%	5.333%	5.333%	5.333%	100%
	$18,970,897	5.33%	$7,901,646	$ P	$ 14,863,860	$ 15,119,177	$ 15,376,154	$ 15,633,673	$ 15,890,374	$ 16,146,362	$ 18,970,897				100%
				$ E											0%
				% E											0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$355,735,438	100%	7%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$355,735,439	$1	$26,564,838												

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

		61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.81%	0.83%	0.85%	0.86%	0.87%	0.89%	1.61%	1.44%	1.18%	1.16%	41223839.95%
	VALOR (Miles de Pesos)	$2,885,899	$2,948,721	$3,007,290	$3,061,731	$3,112,931	$3,157,869	$5,724,261	$6,104,817	$4,214,296	$4,122,392	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	39.64%	40.47%	41.32%	42.18%	43.05%	43.94%	45.55%	46.99%	48.17%	49.33%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$141,024,971	$143,970,692	$146,995,982	$150,047,713	$153,159,744	$156,317,613	$162,041,874	$167,146,691	$171,360,987	$175,483,380	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 27,957,104.34 / $ 27,957,103.53	$ 558,451.78	2.00%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA	$ 1,200,000.00 / $ 1,200,000.00	$ -	0.00%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 1,125,070.51 / $ 1,125,070.51	$ 79,283.46	7.05%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 2,640,000.00 / $ 2,640,000.00	$ 1,293,600.00	49.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 501,600.00 / $ 501,600.00	$ 245,784.00	49.00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PMA, Licencia ambiental e IVA 19%)	$ 75,778,877.77 / $ 75,778,877.77	$ 10,951.33	0.014%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 350,000.00 / $ 350,000.00	$ 2,398.35	0.69%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y/OTROS CONCEPTOS (B)	$ 109,552,652.62	$ 2,190,468.92	2.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y/OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 109,552,651.81		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 465,288,090.48**	**$ 28,755,306.73**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 465,288,090.48**		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoria, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2022.05.05 09:09:30 -05'00'

Aprueba Firma:
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante legal o apoderado del Contratista

Aprueba Firma:
Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante legal o apoderado del Interventor

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	8 de 12
FECHA	04/05/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 10 **DE** MARZO 2022 (Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 5,463,544,001.10

SEGUIMIENTO No. 10
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 083

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL:	114 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	21/06/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 20/12/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):**	$ 465,288,090,475.00	VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):**	$ 465,288,090,475.00 (Según contrato principal)	

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA) (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor Programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	71 abr-27	72 may-27	73 jun-27	74 jul-27	75 ago-27	76 sep-27	77 oct-27	78 nov-27	79 dic-27	80 ene-28
EXPLANACIONES	$21,515,584	6.05%	0.48%	% P	2.709%	2.790%	2.869%	2.946%	3.022%	3.097%	3.170%	3.243%	3.315%	3.387%
	$21,515,584	6.05%	$1,709,022	$ P	$ 9,637,073	$ 9,924,275	$ 10,204,914	$ 10,479,893	$ 10,749,076	$ 11,015,810	$ 11,277,975	$ 11,536,963	$ 11,793,186	$ 11,979,208
				$ E										
				% E										
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$46,601,026	13.10%	0.02%	% P	7.694%	7.836%	7.980%	8.119%	8.254%	8.386%	8.516%	8.644%	8.770%	8.890%
	$46,601,026	13.10%	$72,836	$ P	$ 27,370,516	$ 27,886,532	$ 28,398,469	$ 28,893,654	$ 29,361,354	$ 29,832,590	$ 30,290,264	$ 30,750,155	$ 31,197,934	$ 31,619,890
				$ E										
				% E										
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$50,804,620	14.28%	3.66%	% P	8.109%	8.234%	8.360%	8.484%	8.609%	8.735%	8.860%	8.985%	9.111%	9.202%
	$50,804,571	14.28%	$13,002,546	$ P	$ 28,847,466	$ 29,292,926	$ 29,737,803	$ 30,182,361	$ 30,626,917	$ 31,071,720	$ 31,516,980	$ 31,962,881	$ 32,409,576	$ 32,736,192
				$ E										
				% E										
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$780,270	0.22%	0.00%	% P	0.096%	0.100%	0.103%	0.106%	0.109%	0.112%	0.115%	0.119%	0.122%	0.124%
	$780,270	0.22%	$0	$ P	$ 342,001	$ 354,811	$ 366,105	$ 377,441	$ 388,642	$ 399,726	$ 410,717	$ 421,622	$ 432,457	$ 440,219
				$ E										
				% E										
ESTRUCTURA Y DRENAJES	$198,553,898	55.82%	0.24%	% P	24.318%	25.021%	25.716%	26.404%	27.086%	27.762%	28.428%	29.079%	29.793%	30.285%
	$198,553,898	55.82%	$864,929	$ P	$ 86,508,743	$ 89,009,835	$ 91,481,460	$ 93,941,275	$ 96,380,967	$ 98,776,455	$ 101,184,251	$ 103,585,837	$ 105,984,496	$ 107,724,460
				$ E										
				% E										
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$5,732,587	1.61%	0.17%	% P	0.649%	0.663%	0.677%	0.694%	0.712%	0.729%	0.745%	0.774%	0.801%	0.820%
	$5,732,673	1.61%	$610,455	$ P	$ 2,310,261	$ 2,359,003	$ 2,407,139	$ 2,470,412	$ 2,532,003	$ 2,592,147	$ 2,651,844	$ 2,751,722	$ 2,846,794	$ 2,917,270
				$ E										
				% E										
OBRAS SUBTERRANEAS	$18,970,842	5.33%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$0	0.00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E										
OBRAS VARIAS	$4,548,271	1.28%	0.00%	% P	0.570%	0.590%	0.609%	0.628%	0.646%	0.664%	0.681%	0.698%	0.715%	0.727%
	$4,548,271	1.28%	$0	$ P	$ 2,027,606	$ 2,098,039	$ 2,166,079	$ 2,232,335	$ 2,297,052	$ 2,360,439	$ 2,422,677	$ 2,483,923	$ 2,544,310	$ 2,587,602
				$ E										
				% E										
TRANSPORTES	$8,228,340	$0	$0	% P	0.987%	1.015%	1.043%	1.070%	1.096%	1.123%	1.149%	1.175%	1.219%	1.238%
	$8,228,248	$0	$2,403,403	$ P	$ 3,512,321	$ 3,611,737	$ 3,709,411	$ 3,805,602	$ 3,900,510	$ 3,994,310	$ 4,087,153	$ 4,179,171	$ 4,336,474	$ 4,402,692
				$ E										
				% E										
NO PREVISTOS	$0	0.00%	2.22%	% P	5.333%	5.333%	5.333%	5.333%	5.333%	5.333%	5.333%	5.333%	5.333%	5.333%
	$18,970,897	5.33%	$7,901,646	$ P	$ 18,970,897									
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$355,735,438	100%	7%											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$355,735,439	$1	$26,564,838											

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

		71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1.14%	1.12%	1.10%	1.08%	1.06%	1.04%	1.02%	1.00%	1.00%	0.78%
	VALOR (Miles de Pesos)	$4,944,816	$3,979,689	$3,923,371	$3,896,064	$3,858,018	$3,827,135	$3,802,526	$3,826,172	$3,674,923	$2,789,806
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	50.47%	51.59%	52.69%	53.78%	54.87%	55.94%	57.01%	58.09%	59.18%	59.96%
	VALOR (Miles de Pesos)	$179,528,196	$183,507,885	$187,433,256	$191,329,319	$195,187,338	$199,014,472	$202,816,998	$206,643,170	$210,318,093	$213,107,899
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 27,957,104.34 $ 27,957,103.55	$ 558,451.78	2.00%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00	$ -	0.00%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 1,125,070.51 $ 1,125,070.51	$ 79,283.46	7.05%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 2,640,000.00 $ 2,640,000.00	$ 1,293,600.00	49.00%
N/A - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 501,600.00 $ 501,600.00	$ 245,784.00	49.00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	$ 75,778,877.77 $ 75,778,877.77	$ 10,951.33	0.014%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 350,000.00 $ 350,000.00	$ 2,398.35	0.69%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 109,552,652.62	$ 2,190,468.92	2.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 109,552,651.81		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 465,288,090.48**	**$ 28,755,306.79**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 465,288,090.48**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2022.05.05 09:09:46 -05'00'

Aprueba Firma:
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante legal o apoderado del Contratista

Aprueba Firma:
Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante legal o apoderado del Interventor

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	9 de 12
FECHA	04/05/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 10 **DE** MARZO 2022 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 5,483,544,001.19

SEGUIMIENTO No. 10 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 989 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MODULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971 - 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 465,288,090,475.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 465,288,090,475.00

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 20/12/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA) (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor Programado $ Ejecutado % Ejecutado	81 feb-28	82 mar-28	83 abr-28	84 may-28	85 jun-28	86 jul-28	87 ago-28	88 sep-28	89 oct-28	90 nov-28
EXPLANACIONES	$21,515,584 $21,515,584	6.05% 6.05%	0.48% $1,709,022	% P $ P $ E % E	3.421% $ 12,169,466	3.475% $ 12,362,949	3.542% $ 12,601,093	3.623% $ 12,886,656	3.717% $ 13,221,342	3.824% $ 13,603,745	3.934% $ 13,992,926	4.034% $ 14,349,036	4.145% $ 14,744,926	4.244% $ 15,098,022
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$48,601,026 $48,601,026	13.10% 13.10%	0.02% $72,838	% P $ P $ E % E	8.953% $ 31,848,596	9.047% $ 32,183,161	9.161% $ 32,590,694	9.298% $ 33,079,774	9.457% $ 33,643,334	9.638% $ 34,286,904	9.821% $ 34,937,777	9.988% $ 35,529,336	10.171% $ 36,182,297	10.334% $ 36,761,272
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$50,804,820 $50,804,571	14.28% 14.28%	3.66% $13,002,546	% P $ P $ E % E	9.298% $ 33,074,906	9.396% $ 33,424,726	9.517% $ 33,856,605	9.654% $ 34,379,253	9.838% $ 34,996,558	10.038% $ 35,707,722	10.243% $ 36,437,784	10.432% $ 37,111,961	10.645% $ 37,868,004	10.837% $ 38,552,316
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$780,270 $780,270	0.22% 0.22%	0.00% $0	% P $ P $ E % E	0.126% $ 448,414	0.128% $ 456,722	0.131% $ 466,002	0.135% $ 479,274	0.139% $ 492,985	0.143% $ 510,077	0.148% $ 526,868	0.152% $ 542,322	0.157% $ 559,004	0.162% $ 574,809
ESTRUCTURA Y DRENAJES	$198,553,898 $198,553,898	55.82% 55.82%	0.24% $864,929	% P $ P $ E % E	30.794% $ 109,546,571	31.320% $ 111,416,565	31.969% $ 113,726,443	32.754% $ 116,517,191	33.682% $ 119,817,204	34.751% $ 123,621,802	35.850% $ 127,531,784	36.867% $ 131,147,734	38.010% $ 135,213,531	39.044% $ 138,894,363
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$5,732,587 $5,732,673	1.61% 1.61%	0.17% $610,455	% P $ P $ E % E	0.839% $ 2,986,151	0.850% $ 3,055,380	0.862% $ 3,136,836	0.910% $ 3,237,327	0.942% $ 3,351,744	0.978% $ 3,480,731	1.015% $ 3,610,568	1.048% $ 3,726,195	1.084% $ 3,857,660	1.117% $ 3,972,812
OBRAS SUBTERRANEAS	$18,970,842 $0	5.33% 0.00%	0.00% $0	% P $ P $ E % E	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
OBRAS VARIAS	$4,548,271 $4,548,271	1.28% 1.28%	0.00% $0	% P $ P $ E % E	0.740% $ 2,632,386	0.753% $ 2,677,883	0.768% $ 2,733,552	0.787% $ 2,800,103	0.809% $ 2,878,071	0.834% $ 2,967,072	0.860% $ 3,057,580	0.883% $ 3,140,351	0.909% $ 3,232,307	0.932% $ 3,314,997
TRANSPORTES	$8,228,340 $8,228,248	$0 $0	$0 $2,403,403	% P $ P $ E % E	1.257% $ 4,470,675	1.276% $ 4,540,425	1.300% $ 4,625,969	1.329% $ 4,729,688	1.363% $ 4,849,235	1.402% $ 4,987,103	1.441% $ 5,127,272	1.478% $ 5,256,238	1.518% $ 5,399,378	1.554% $ 5,527,163
NO PREVISTOS	$0 $18,970,897	0.00% 5.33%	2.22% $7,901,646	% P $ P $ E % E	5.333% $ 18,970,897	5.333%	5.333%	5.333%	5.333%	5.333%	5.333%	5.333%	5.333%	5.333%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$355,735,438	100%	7%	% P $ P $ E % E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$355,735,439	$1	$26,564,838											

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.80%	0.83%	1.02%	1.23%	1.46%	1.66%	1.70%	1.57%	1.76%	1.59%
	VALOR (Miles de Pesos)	$2,859,155	$2,941,654	$3,621,488	$4,366,076	$5,145,090	$5,914,092	$6,057,734	$5,582,224	$6,253,180	$5,639,128
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	60.76%	61.59%	62.61%	63.83%	65.28%	66.94%	68.64%	70.21%	71.97%	73.56%
	VALOR (Miles de Pesos)	$216,147,054	$219,088,708	$222,710,195	$227,076,271	$232,221,361	$238,136,052	$244,193,786	$249,776,010	$256,029,190	$261,668,319
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluya IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 27,957,104.54 $ 27,957,103.53	$ 558,451.78	2.00%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00	$ -	0.00%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 1,125,070.51 $ 1,125,070.51	$ 79,283.46	7.05%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 2,640,000.00 $ 2,640,000.00	$ 1,293,600.00	49.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 501,600.00 $ 501,600.00	$ 245,784.00	49.00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PMA Licencia ambiental e SIA 19%)	$ 75,778,877.77 $ 75,778,877.77	$ 10,951.33	0.014%
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 350,000.00 $ 350,000.00	$ 2,398.35	0.69%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 109,552,652.62	$ 2,190,468.92	2.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 109,552,651.61		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 465,288,090.48**	**$ 28,755,306.70**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 465,288,090.48**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2022.05.05 09:10:03 -05'00'

Aprueba Firma:
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante legal o apoderado del Contratista

Aprueba Firma:
Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante legal o apoderado del Interventor

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	10 de 12
FECHA	04/05/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD E.I.P. GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 10 **DE** MARZO 2022 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 5,483,544,001.10

SEGUIMIENTO No. 10 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO: 989 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACA Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"MÓDULO 1

CONTRATIST CONSORCIO VIAL MHC 963

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/05/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) I(A): $ 465,288,090,475.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) I(C=A+B): $ 465,288,090,475.00

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 20/12/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) I(B): $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		dic-28	ene-29	feb-29	mar-29	abr-29	may-29	jun-29	jul-29	ago-29	sep-29
EXPLANACIONES	$21,515,584	6.05%	0.48%	% P	4.353%	4.594%	4.697%	4.770%	4.835%	4.899%	4.961%	5.022%	5.083%	5.143%
	$21,515,584	6.05%	$1,709,022	$ P	$ 15,465,995	$ 16,341,099	$ 16,710,088	$ 16,968,724	$ 17,201,156	$ 17,426,085	$ 17,647,307	$ 17,866,087	$ 18,081,710	$ 18,294,574
				$ E										
				% E										
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$46,601,026	13.10%	0.02%	% P	10.511%	10.898%	11.062%	11.175%	11.275%	11.372%	11.467%	11.560%	11.652%	11.742%
	$46,601,026	13.10%	$72,836	$ P	$ 37,390,249	$ 38,767,088	$ 39,350,589	$ 39,752,768	$ 40,110,709	$ 40,437,182	$ 40,747,967	$ 41,124,252	$ 41,450,200	$ 41,770,000
				$ E										
				% E										
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$50,804,620	14.28%	3.66%	% P	11.050%	11.525%	11.735%	11.887%	12.025%	12.161%	12.297%	12.433%	12.570%	12.707%
	$50,804,571	14.28%	$13,002,546	$ P	$ 39,308,099	$ 40,998,016	$ 41,746,793	$ 42,285,682	$ 42,776,739	$ 43,262,782	$ 43,745,987	$ 44,230,285	$ 44,716,029	$ 45,203,511
				$ E										
				% E										
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$780,270	0.22%	0.00%	% P	0.166%	0.177%	0.181%	0.185%	0.187%	0.190%	0.193%	0.196%	0.198%	0.201%
	$780,270	0.22%	$0	$ P	$ 591,763	$ 629,080	$ 646,251	$ 656,612	$ 666,604	$ 676,747	$ 686,468	$ 696,068	$ 705,568	$ 715,000
				$ E										
				% E										
ESTRUCTURA Y DRENAJES	$198,553,898	55.82%	0.24%	% P	49.191%	42.182%	43.328%	44.159%	44.922%	45.673%	46.425%	47.181%	47.941%	48.705%
	$198,553,898	55.82%	$864,929	$ P	$ 182,974,590	$ 150,955,218	$ 154,134,612	$ 157,089,078	$ 159,803,433	$ 162,476,120	$ 165,151,961	$ 167,859,750	$ 170,542,748	$ 173,230,045
				$ E										
				% E										
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$5,732,587	1.61%	0.17%	% P	1.152%	1.229%	1.261%	1.284%	1.305%	1.325%	1.344%	1.364%	1.383%	1.402%
	$5,732,873	1.61%	$610,455	$ P	$ 4,287,066	$ 4,370,520	$ 4,487,250	$ 4,568,543	$ 4,641,599	$ 4,712,442	$ 4,782,415	$ 4,851,748	$ 4,920,437	$ 4,988,400
				$ E										
				% E										
OBRAS SUBTERRANEAS	$18,970,842	5.33%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$0	0.00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E										
OBRAS VARIAS	$4,548,271	1.28%	0.00%	% P	0.957%	1.013%	1.037%	1.054%	1.069%	1.084%	1.099%	1.113%	1.128%	1.142%
	$4,548,271	1.28%	$0	$ P	$ 3,404,524	$ 3,603,332	$ 3,688,275	$ 3,749,012	$ 3,804,093	$ 3,856,996	$ 3,909,023	$ 3,960,644	$ 4,011,766	$ 4,062,000
				$ E										
				% E										
TRANSPORTES	$8,228,340	$0	$0	% P	1.593%	1.680%	1.718%	1.744%	1.768%	1.791%	1.813%	1.836%	1.858%	1.879%
	$8,228,248	$0	$2,403,403	$ P	$ 5,667,838	$ 5,977,449	$ 6,111,246	$ 6,205,063	$ 6,289,357	$ 6,370,896	$ 6,451,120	$ 6,530,263	$ 6,608,273	$ 6,685,000
				$ E										
				% E										
NO PREVISTOS	$0	0.00%	2.22%	% P	5.333%	5.333%	5.333%	5.333%	5.333%	5.333%	5.333%	5.333%	5.333%	5.333%
	$18,970,897	5.33%	$7,901,648	$ P	$ 18,970,897									
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$355,735,438	100%	7%											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$355,735,439	$1	$26,564,838											

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

		91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1.75%	3.32%	1.72%	1.24%	1.13%	1.11%	1.10%	1.11%	1.11%	1.11%
	VALOR (Miles de Pesos)	$8,222,492	$11,821,904	$6,123,284	$4,401,038	$4,019,819	$3,941,114	$3,929,611	$3,932,433	$3,937,815	$3,942,341
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	76.31%	79.63%	80.35%	81.59%	82.72%	83.83%	84.93%	86.04%	87.15%	88.25%
	VALOR (Miles de Pesos)	$267,895,611	$279,712,715	$285,845,999	$290,247,037	$294,266,856	$298,207,970	$302,137,581	$306,070,014	$310,007,829	$313,949,369
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 27,957,104.34 / $ 27,957,103.53	$ 558,451.78	2.00%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,200,000.00 / $ 1,200,000.00	$ -	0.00%
	$ 1,125,070.51 / $ 1,125,070.51		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 2,640,000.00 / $ 2,640,000.00	$ 1,293,600.00	49.00%
N/A - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 501,600.00 / $ 501,600.00	$ 245,784.00	49.00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	$ 75,778,877.77 / $ 75,778,877.77	$ 10,951.33	0.014%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 350,000.00 / $ 350,000.00	$ 2,398.35	0.69%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y/OTROS CONCEPTOS (B)	$ 109,552,652.62	$ 2,190,468.92	2.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y/OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 109,552,651.81		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 465,288,090.48**	**$ 28,755,306.79**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 465,288,090.48**		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2022.05.05 09:10:20 -05'00'

Aprueba Firma:
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante legal o apoderado del Contratista

Aprueba Firma:
Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante legal o apoderado del Interventor

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	11 de 12
		FECHA	04/05/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 10 **DE** MARZO 2022 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 5,483,544,001.10

SEGUIMIENTO No. 10 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 969 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 465,288,090,475.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 465,288,090,475.00

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 25/12/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		oct-29	nov-29	dic-29	ene-30	feb-30	mar-30	abr-30	may-30	jun-30	jul-30
EXPLANACIONES	$21,515,584	6.05%	0.48%	% P	5.201%	5.259%	5.315%	5.401%	5.438%	5.473%	5.509%	5.037%	5.046%	5.114%
	$21,515,584	6.05%	$1,709,022	$ P	$ 16,502,607	$ 16,706,882	$ 16,907,642	$ 19,213,647	$ 19,345,415	$ 19,471,137	$ 19,598,387	$ 21,902,780	$ 21,915,594	$ 22,035,284
				$ E										
				% E										
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$46,601,026	13.10%	0.02%	% P	11.830%	11.916%	12.000%	12.195%	12.182%	12.257%	12.326%	12.390%	12.443%	12.483%
	$46,601,026	13.10%	$72,836	$ P	$ 42,083,354	$ 42,389,478	$ 42,687,673	$ 43,040,668	$ 43,336,923	$ 43,600,730	$ 43,949,074	$ 44,076,462	$ 44,264,871	$ 44,334,916
				$ E										
				% E										
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$50,804,820	14.28%	3.66%	% P	12.844%	12.982%	13.121%	13.296%	13.439%	13.578%	13.718%	13.859%	14.000%	14.215%
	$50,804,571	14.28%	$13,002,546	$ P	$ 45,692,140	$ 46,182,518	$ 46,674,410	$ 47,310,537	$ 47,805,343	$ 48,302,781	$ 48,801,125	$ 49,300,944	$ 49,802,227	$ 50,569,553
				$ E										
				% E										
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$780,270	0.22%	0.00%	% P	0.204%	0.206%	0.209%	0.212%	0.214%	0.216%	0.216%	0.219%	0.219%	0.219%
	$780,270	0.22%	$0	$ P	$ 724,068	$ 733,034	$ 741,766	$ 752,662	$ 760,863	$ 769,182	$ 774,963	$ 780,270		
				$ E										
				% E										
ESTRUCTURA Y DRENAJES	$198,553,898	55.82%	0.24%	% P	49.473%	50.246%	52.150%	52.855%	53.490%	54.281%	55.076%	55.692%	55.723%	55.779%
	$198,553,898	55.82%	$864,929	$ P	$ 175,964,334	$ 178,743,286	$ 185,515,304	$ 188,022,526	$ 190,282,991	$ 193,095,134	$ 195,924,074	$ 198,026,622	$ 198,226,950	$ 198,424,367
				$ E										
				% E										
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$5,732,587	1.61%	0.17%	% P	1.421%	1.440%	1.458%	1.485%	1.500%	1.514%	1.528%	1.541%	1.554%	1.570%
	$5,732,673	1.61%	$610,455	$ P	$ 5,055,389	$ 5,121,850	$ 5,187,067	$ 5,281,870	$ 5,334,513	$ 5,385,697	$ 5,435,153	$ 5,482,392	$ 5,526,789	$ 5,585,239
				$ E										
				% E										
OBRAS SUBTERRANEAS	$18,970,842	5.33%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$0	0.00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E										
OBRAS VARIAS	$4,548,271	1.28%	0.00%	% P	1.156%	1.170%	1.183%	1.201%	1.214%	1.226%	1.238%	1.250%	1.261%	1.271%
	$4,548,271	1.28%	$0	$ P	$ 4,112,268	$ 4,161,556	$ 4,209,942	$ 4,271,210	$ 4,317,372	$ 4,362,242	$ 4,405,559	$ 4,446,661	$ 4,485,800	$ 4,521,015
				$ E										
				% E										
TRANSPORTES	$8,228,340	$0	$0	% P	1.900%	1.921%	1.948%	1.973%	1.982%	1.991%	2.000%	2.313%	2.313%	2.313%
	$8,228,248	$0	$2,403,403	$ P	$ 6,760,317	$ 6,833,942	$ 6,928,948	$ 7,016,948	$ 7,049,948	$ 7,082,948	$ 7,115,948	$ 8,228,248		
				$ E										
				% E										
NO PREVISTOS	$0	0.00%	2.22%	% P	5.333%	5.333%	5.333%	5.333%	5.333%	5.333%	5.333%	5.333%	5.333%	5.333%
	$18,970,897	5.33%	$7,901,646	$ P	$ 18,970,897									
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$355,735,438	100%	7%											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$355,735,439	$1	$26,564,838											

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1.11%	1.11%	2.24%	1.15%	0.93%	1.08%	1.07%	1.66%	0.29%	0.32%
	VALOR (Miles de Pesos)	$3,949,804	$3,947,590	$7,980,306	$4,077,341	$3,303,634	$3,835,493	$3,823,194	$5,918,244	$1,021,159	$1,126,886
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	89.36%	90.47%	92.72%	93.86%	94.79%	95.87%	96.94%	98.61%	99.89%	99.21%
	VALOR (Miles de Pesos)	$317,855,773	$321,843,363	$329,823,669	$333,901,010	$337,204,644	$341,040,137	$344,863,331	$350,781,575	$351,802,734	$352,929,620
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 27,957,104.34 $ 27,957,103.53	$ 558,451.78	2.00%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00	$ -	0.00%
	$ 1,125,070.51 $ 1,125,070.51		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 2,640,000.00 $ 2,640,000.00	$ 1,293,600.00	49.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 501,600.00 $ 501,600.00	$ 245,784.00	49.00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)	$ 75,778,877.77 $ 75,778,877.77	$ 10,951.33	0.014%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 350,000.00 $ 350,000.00	$ 2,398.35	0.69%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y/OTROS CONCEPTOS (B)	$ 109,552,652.62	$ 2,190,468.92	2.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y/OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 109,552,651.81		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 465,288,090.48**	**$ 28,755,306.79**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 465,288,090.48**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2022.05.05 09:10:38 -05'00'

Aprueba Firma:
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante legal o apoderado del Contratista

Aprueba Firma:
Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante legal o apoderado del Interventor

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	12 de 12
FECHA	04/05/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 10 **DE** MARZO 2022 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 10 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 5,483,544,001.10

CONTRATO No: 989 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRA -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MODULO 1.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 963

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 971- 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 465,288,090.475.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 465,288,090,475.00

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/12/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	ago-30	sep-30	oct-30	nov-30	dic-30	ene-31	feb-31	mar-31	abr-31	may-31
EXPLANACIONES	$21,515,584	6.05%	0.48%	% P	6.048%	6.048%	6.048%	6.048%	6.048%	6.048%	6.048%	6.048%	6.048%	6.048%
	$21,515,584	6.05%	$1,709,022	$ P	$ 21,515,584									
				$ E										
				% E										
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$46,601,026	13.10%	0.02%	% P	13.100%	13.100%	13.100%	13.100%	13.100%	13.100%	13.100%	13.100%	13.100%	13.100%
	$46,601,026	13.10%	$72,836	$ P	$ 46,601,026									
				$ E										
				% E										
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$50,804,620	14.28%	3.66%	% P	14.282%	14.282%	14.282%	14.282%	14.282%	14.282%	14.282%	14.282%	14.282%	14.282%
	$50,804,571	14.28%	$13,002,546	$ P	$ 50,804,571									
				$ E										
				% E										
PAVIMENTOS DE CONCRETO	$760,270	0.22%	0.00%	% P	0.219%	0.219%	0.219%	0.219%	0.219%	0.219%	0.219%	0.219%	0.219%	0.219%
	$760,270	0.22%	$0	$ P	$ 760,270									
				$ E										
				% E										
ESTRUCTURA Y DRENAJES	$198,553,898	55.82%	0.24%	% P	55.815%	55.815%	55.815%	55.815%	55.815%	55.815%	55.815%	55.815%	55.815%	55.815%
	$198,553,898	55.82%	$864,929	$ P	$ 198,553,898									
				$ E										
				% E										
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$5,732,587	1.61%	0.17%	% P	1.611%	1.611%	1.611%	1.611%	1.611%	1.611%	1.611%	1.611%	1.611%	1.611%
	$5,732,673	1.61%	$610,455	$ P	$ 5,732,673									
				$ E										
				% E										
OBRAS SUBTERRANEAS	$18,970,842	5.33%	0.00%	% P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
	$0	0.00%	$0	$ P										
				$ E										
				% E										
OBRAS VARIAS	$4,548,271	1.28%	0.00%	% P	1.279%	1.279%	1.279%	1.279%	1.279%	1.279%	1.279%	1.279%	1.279%	1.279%
	$4,548,271	1.28%	$0	$ P	$ 4,548,271									
				$ E										
				% E										
TRANSPORTES	$8,228,340	$0	$0	% P	2.313%	2.313%	2.313%	2.313%	2.313%	2.313%	2.313%	2.313%	2.313%	2.313%
	$8,228,248	$0	$2,403,403	$ P	$ 8,228,248									
				$ E										
				% E										
NO PREVISTOS	$0	0.00%	2.22%	% P	5.333%	5.333%	5.333%	5.333%	5.333%	5.333%	5.333%	5.333%	5.333%	5.333%
	$18,970,897	5.33%	$7,901,646	$ P	$ 18,970,897									
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$355,735,438	100%	7.47%											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$355,735,439	100%	$26,564,838											

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.79%												
	VALOR (Miles de Pesos)	$2,805,819												
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	100.00%												
	VALOR (Miles de Pesos)	$355,735,439												
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%												
	VALOR (Miles de Pesos)	$0												
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%												
	VALOR (Miles de Pesos)	$0												

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES , OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 27,957,104.34	$ 558,451.78	2.00%
	$ 27,957,103.53		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 1,200,000.00	$ -	0.00%
	$ 1,200,000.00		
	$ 1,125,070.51		
	$ 1,125,070.51		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 2,640,000.00	$ 1,293,600.00	49.00%
	$ 2,640,000.00		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 501,600.00	$ 245,784.00	49.00%
	$ 501,600.00		
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental+ IVA19%)	$ 75,778,877.77	$ 10,951.33	0.014%
	$ 75,778,877.77		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 350,000.00	$ 2,398.35	0.69%
	$ 350,000.00		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 109,552,652.62	$ 2,190,468.92	2.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 109,552,651.81		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 465,288,090.48**	**$ 28,755,306.79**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 465,288,090.48**		

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES — Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES Fecha: 2022.05.05 09:10:57 -05'00'

Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES

Representante legal o apoderado del Contratista

Aprueba Firma:

Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

Representante legal o apoderado del Interventor

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INVIAS	MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063	PREACTA DE OBRA	F-635

PREACTA N.° : 10

CONTRATO No : 989 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 **FECHA DE INICIO:** 21 DE JUNIO DE 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO IEACSA-TPF

VALOR DEL CONTRATO: $ 465,288,090,475.00

No. DE ORDEN	Ítem	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES						**605,662,643.00**
1	200-13	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	$ 1,154,770.00	0.03	$ 34,643.00
2	201-13	Demolición de Estructuras	m3	$ 113,400.00		$ -
3	201-13	Remoción de cercas de alambre	m	$ 4,470.00		$ -
4	210-13	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	$ 10,000.00	22,398.00	$ 223,980,000.00
5	210-13	Excavación sin clasificar de préstamos	m3	$ 12,570.00		$ -
6	210-13	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	$ 62,890.00		$ -
7	210-13	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	$ 10,000.00		$ -
8	220.1	Terraplenes	m3	$ 12,000.00	31,804.00	$ 381,648,000.00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS						**0.00**
9	320.1	Subbase Granular clase A	m3	$ 139,000.00		$ -
10	330.1	Base granular clase A	m3	$ 150,000.00		$ -
11	330.4..	Base granular para bacheo clase A	m3	$ 179,850.00		$ -
PAVIMENTOS ASFALTICOS						**764,815,440.00**
12	420-13	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	$ 2,910.00		$ -
13	421-13	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	$ 1,840.00	6,702.00	$ 12,331,680.00
14	450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	$ 750,000.00	987.00	$ 740,250,000.00
15	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	$ 760,000.00		$ -
16	450.10P	Mezcla densa en caliente Tipo MSC-25 para bacheos	m3	$ 795,600.00		$ -
17	460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	$ 72,820.00	168.00	$ 12,233,760.00
18	465-13	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	$ 78,890.00		$ -
19	466-13	Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	$ 4,340.00		$ -
PAVIMENTOS DE CONCRETO						**0.00**
20	500.1	Pavimento de concreto Hidraulico	m3	$ 837,200.00		$ -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES						**315,005,856.00**
21	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	$ 28,000.00		$ -
22	600.2.1	Excavaciones varias en roca en seco	m3	$ 81,880.00		$ -
23	600.2.3	Excavaciones varias en material comun en seco	m3	$ 25,950.00	265.00	$ 6,876,750.00
24	610.1	Rellenos para Estructuras con suelo	m3	$ 52,470.00		$ -
25	610.2	Relleno para estructuras con recebo	m3	$ 119,000.00		$ -
26	610.3	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	$ 140,000.00		$ -
27	621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	$ 2,289,000.00		$ -
28	621,1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,50 m. (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	$ 2,300,000.00		$ -
29	630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	$ 1,200,000.00		$ -
30	630.1.3P	Concreto clase 35 MPA, para viga cajon de puentes	m3	$ 1,500,000.00		$ -
31	630.3	Concreto clase 28 MPA	m3	$ 810,000.00	262.00	$ 212,220,000.00
32	630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas y placas	m3	$ 900,000.00		$ -
33	630.3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	$ 1,200,000.00		$ -
34	630.4	Concreto clase 21 MPA	m3	$ 650,000.00		$ -
35	630.6	Concreto clase 14 MPA	m3	$ 495,350.00	15.00	$ 7,430,250.00
36	632.1P	Baranda Metalica	m	$ 548,010.00		$ -
37	632.1	Baranda de concreto	m	$ 214,420.00		$ -
38	640.1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	$ 5,378.00	16,452.00	$ 88,478,856.00
39	640	Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg	$ 5,480.00		$ -
40	641.1	Acero de Preesfuerzo	Tf-m	$ 2,230.00		$ -
41	642	Apoyo elastomerico de 35cm*45cm*5cm	u	$ 768,350.00		$ -
42	642,2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	$ 1,583,120.00		$ -
43	650.2	Fabricación de estructura metálica	kg	$ 11,325.00		$ -
44	650.3	Transporte de estructura metalica	kg	$ 200.00		$ -
45	650.4	Montaje de estructura metálica	kg	$ 4,286.00		$ -
46	661.1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	$ 600,000.00		$ -
47	661.2	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200mm de diámetro interior	m	$ 1,264,890.00		$ -

INVIAS	MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063	PREACTA DE OBRA	F-635

PREACTA N.° : 10

CONTRATO No : 989 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 **FECHA DE INICIO:** 21 DE JUNIO DE 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO IEACSA-TPF

VALOR DEL CONTRATO: $ 465,288,090,475.00

No. DE ORDEN	Ítem	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
48	661.3	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1500mm de diámetro interior	m	$ 1,834,530.00		$ -
49	663.3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	$ 38,110.00		$ -
50	671.1	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	$ 580,000.00		$ -
51	672	Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	$ 86,540.00		$ -
52	673.1	Geotextil Tipo II no tejido	m2	$ 7,700.00		$ -
53	673.2	Material granular drenante	m3	$ 130,000.00		$ -
54	673.3	Material de cobertura tipo SBG	m3	$ 170,000.00		$ -
55	674	Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	$ 173,900.00		$ -
56	681.1	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	$ 248,500.00		$ -
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD						**94,357,040.00**
57	1P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	$ 1,790.00		$ -
58	2P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	$ 22,070.00	0.00	$ -
59	3P.	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	$ 59,980.00		$ -
60	4P	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	$ 8,340.00	1,636.00	$ 13,644,240.00
61	5P	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	$ 397,600.00	203.00	$ 80,712,800.00
62	6P	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	$ 325,630.00		$ -
63	5P.	Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	$ 504,590.00		$ -
64	720.1	Poste de referencia	u	$ 254,830.00		$ -
65	730.1	Defensa metalica	m	$ 230,530.00		$ -
66	740.1	Captafaros	u	$ 22,030.00		$ -
OBRAS SUBTERRANEAS						**0.00**
67	PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo II	m3	$ 221,660.00		$ -
68	PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo III	m3	$ 253,200.00		$ -
69	PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo IV	m3	$ 291,510.00		$ -
70	PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo V	m3	$ 300,000.00		$ -
71	PT-3	Pernos Tipo A en Excavaciones Subterráneas anclados con lechada	m	$ 100,640.00		$ -
72	PT-4	Concreto para el revestimiento del túnel	m3	$ 1,166,190.00		$ -
73	PT-4	Concreto lanzando, en superficies de excavación en corte abierto: En portales de túneles, galerías y pozos.	m3	$ 970,770.00		$ -
74	PT-6	Arco de acero estructural	kg	$ 10,648.00		$ -
75	PT-8	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	m2	$ 83,100.00		$ -
76	PT-9	Caja de inspección de 0,65 m x 0,65 m con altura menor a 2 m	u	$ 1,053,100.00		$ -
77	PT-10	Tuberia para enfilajes: Tuberia metalica de 4" de diametro	m	$ 258,899.00		$ -
OBRAS VARIAS						**0.00**
78	800-13	Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	$ 34,230.00		$ -
79	810-13	Proteccion de taludes con tierra organica	m2	$ 13,000.00		$ -
TRANSPORTES						**1,090,947,000.00**
80	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	$ 1,100.00	991,770.00	$ 1,090,947,000.00
NO PREVISTOS						**2,612,756,022.00**
81	220.1P	Material para Terraplen	m3	$ 42,374.00	31,804.00	$ 1,347,662,696.00
82	221	Pedraplen Compacto	m3	$ 19,910.00	13,865.00	$ 276,052,150.00
83	221.1P	Material para Pedraplen	m3	$ 81,868.00	7,897.00	$ 646,511,596.00
84	600.1.2.2.4	Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	$ 45,232.00		$ -
85	661.1P	Box Culvert prefabricado 1m x 1m. (Suministro e instalación)	ml	$ 1,610,012.00	58.00	$ 93,380,696.00
86	7P	Bandas alertadoras, ancho 0.25m, espesor 0.02 m. (Incluye Suministro e Instalación)	ml	$ 138,738.00	220.00	$ 30,522,360.00
87	8P	Bordillo traspasable. (Incluye Suministro e instalación)	u	$ 77,167.00		$ -
88	9P	Delineador Tubular Simple (Incluye Suministro e instalación)	u	$ 77,971.00		$ -
89	710.1P	Señal Vertical SI-27. Tablero Variable según leyenda proyectada (Incluye Suministro e Instalación)	u	$ 1,324,653.00		$ -
90	231	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granular	m2	$ 10,590.00	18,912.00	$ 200,278,080.00

INVIAS	MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063	PREACTA DE OBRA	F-635

PREACTA N.° : 10

CONTRATO No : 989 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA -BUCARAMANGA; GIRÓN -PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063 **FECHA DE INICIO:** 21 DE JUNIO DE 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO IEACSA-TPF

VALOR DEL CONTRATO: $ 465,288,090,475.00

No. DE ORDEN	Ítem	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
91	642.5P	Cinta PVC, para junta de construcción estructuras en concreto	ml	$ 56,631.00	324.00	$ 18,348,444.00

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	**$**	**5,483,544,001.00**
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA		
VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	**$**	**5,483,544,001.00**
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$	16,028,821.00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$**	**5,499,572,822.00**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL		
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	**$**	**-**
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA y PMA, LICENCIA AMBIENTAL e IVA 19%)	**$**	**10,087,630.00**
VALOR BÁSICO GESTIÓN PREDIAL	$	8,477,000.00
IVA GESTIÓN PREDIAL	$	1,610,630.00
VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIAL	$	-
IVA GESTIÓN SOCIAL	$	-
VALOR BÁSICO GESTIÓN AMBIENTAL (incluye PMA, PAGA y licencia ambiental)	$	-
IVA GESTIÓN AMBIENTAL (incluye PMA, PAGA y licencia ambiental)	$	-
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$	-
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$	96,425.00
ADMINISTRACIÓN (2.5%)- PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$	2,411.00
IVA (19%) -PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$	458.00
VALOR BASICO TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**5,492,119,837.00**
VALOR TOTAL	**$**	**5,509,759,746.00**

ING. ALEXIS ANDRES BLANCO CORONEL
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 08202139785ATL

JORGE ENRIQUE SANCHEZ PRADA
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 6820201827STD

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-feb-2022 a 25-mar-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
200-13	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	0,00	0,03	0,03

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	Hectaria (Ha)	FECHA	DESCRIPCIÓN
0+770	0+850	E	0,03			0,03	3/03/2022	Construccion via, separador
					SUBTOTAL	0,03		

LONGITUD PARA PAGO	0,03	
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	0,00	
LONGITUD TOTAL PARA PAGO :	0,03	Ha

ING. ALEXIS ANDRES BLANCO CORONEL
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 08202139785ATL

JUAN ROBERTO DIAZ VELANDIA
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 25202 17653CND

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ene-2022 a 25-feb-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTO** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
210-13	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	M3	0,00	22.398,00	22.398,00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
3+680				33,614				
3+690				29,50		315,570	marzo a origen	Según cartera topografica
3+700				28,94		292,195	marzo a origen	Según cartera topografica
3+710				28,70		288,180	marzo a origen	Según cartera topografica
3+720				30,26		294,780	marzo a origen	Según cartera topografica
3+730				26,42		283,395	marzo a origen	Según cartera topografica
3+740				26,06		262,415	marzo a origen	Según cartera topografica
3+750				25,50		257,790	marzo a origen	Según cartera topografica
3+760				25,39		254,410	marzo a origen	Según cartera topografica
3+770				23,27		243,270	marzo a origen	Según cartera topografica
3+780				24,28		237,745	marzo a origen	Según cartera topografica
3+790				24,85		245,645	marzo a origen	Según cartera topografica
3+800				19,64		222,430	marzo a origen	Según cartera topografica
3+810				17,63		186,325	marzo a origen	Según cartera topografica
3+820				15,03		163,270	marzo a origen	Según cartera topografica
3+830				16,70		158,660	marzo a origen	Según cartera topografica
3+840				15,55		161,255	marzo a origen	Según cartera topografica
3+850				16,28		159,155	marzo a origen	Según cartera topografica
3+860				20,43		183,590	marzo a origen	Según cartera topografica
3+870				19,96		201,975	marzo a origen	Según cartera topografica
3+880				17,99		189,760	marzo a origen	Según cartera topografica
4+370				20,19				
4+380				21,04		206,110	marzo a origen	Según cartera topografica
4+390				18,83		199,315	marzo a origen	Según cartera topografica
4+400				16,32		175,735	marzo a origen	Según cartera topografica
4+410				15,45		158,860	marzo a origen	Según cartera topografica
4+420				15,55		154,995	marzo a origen	Según cartera topografica
4+430				15,52		155,325	marzo a origen	Según cartera topografica
4+440				18,05		167,825	marzo a origen	Según cartera topografica
4+450				15,89		169,690	marzo a origen	Según cartera topografica
4+460				17,36		166,260	marzo a origen	Según cartera topografica
4+470				17,95		176,565	marzo a origen	Según cartera topografica
4+480				17,61		177,830	marzo a origen	Según cartera topografica
4+490				17,89		177,510	marzo a origen	Según cartera topografica
4+500				18,54		182,150	marzo a origen	Según cartera topografica
4+510				18,37		184,545	marzo a origen	Según cartera topografica
4+520				19,52		189,455	marzo a origen	Según cartera topografica
4+530				19,10		193,120	marzo a origen	Según cartera topografica
4+540				19,42		192,625	marzo a origen	Según cartera topografica
4+550				24,64		220,325	marzo a origen	Según cartera topografica
4+560				23,87		242,570	marzo a origen	Según cartera topografica
4+570				22,40		231,355	marzo a origen	Según cartera topografica
4+580				23,88		231,385	marzo a origen	Según cartera topografica
4+590				23,62		237,495	marzo a origen	Según cartera topografica
4+600				20,28		219,480	marzo a origen	Según cartera topografica
				24,48				
4+790				21,46		229,720	marzo a origen	Según cartera topografica
4+800				21,43		214,470	marzo a origen	Según cartera topografica
4+810				21,80		216,155	marzo a origen	Según cartera topografica
4+820				20,00		208,990	marzo a origen	Según cartera topografica
4+830				20,10		200,470	marzo a origen	Según cartera topografica
4+840				20,65		203,740	marzo a origen	Según cartera topografica
4+850				23,30		219,750	marzo a origen	Según cartera topografica
4+860				18,67		209,865	marzo a origen	Según cartera topografica
4+870				18,72		186,970	marzo a origen	Según cartera topografica

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ene-2022 a 25-feb-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTO** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
210-13	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	M3	0,00	22.398,00	22.398,00

4+880				20,43		195,765	marzo a origen	Según cartera topografica	
4+890				16,28		183,575	marzo a origen	Según cartera topografica	
				15,04					
5+040				13,67		143,505	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+050				13,48		135,740	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+060				10,41		119,445	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+070				15,76		130,850	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+080				13,60		146,805	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+090				16,32		149,565	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+100				16,66		164,860	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+110				16,71		166,830	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+120				16,03		163,685	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+130				12,04		140,355	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+140				16,61		143,245	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+150				22,60		196,005	marzo a origen	Según cartera topografica	
				21,82					
5+180				25,85		238,335	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+190				27,19		265,195	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+200				24,18		256,860	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+210				20,32		222,500	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+220				21,00		206,580	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+230				19,40		201,995	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+240				23,91		216,530	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+250				23,86		238,810	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+260				24,49		241,715	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+270				18,86		216,740	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+280				17,00		179,290	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+290				16,90		169,465	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+300				17,55		172,245	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+310				15,86		167,075	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+320				17,65		167,555	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+330				18,47		180,605	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+340				19,00		187,365	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+350				21,51		202,545	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+360				19,44		204,725	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+370				17,86		186,485	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+380				16,88		173,690	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+390				17,52		172,005	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+400				13,80		156,585	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+410				13,41		136,005	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+420				16,26		148,325	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+430				15,47		158,620	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+440				13,28		143,745	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+450				15,17		142,290	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+460				14,31		147,440	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+470				14,85		145,830	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+480				13,80		143,235	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+490				14,03		139,140	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+500				17,72		158,765	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+510				20,35		190,325	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+520				22,13		212,385	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+530				25,58		238,545	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+540				30,73		281,525	marzo a origen	Según cartera topografica	
				19,85					
5+670				23,24		215,435	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+680				22,06		226,475	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+690				22,18		221,205	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+700				21,29		217,340	marzo a origen	Según cartera topografica	

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ene-2022 a 25-feb-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTO** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
210-13	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	M3	0,00	22.398,00	22.398,00

5+710				20,81		210,455	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+720				21,85		213,255	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+730				19,58		207,105	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+740				19,83		197,045	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+750				20,62		202,265	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+760				20,31		204,660	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+770				20,97		206,415	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+780				20,98		209,755	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+790				17,97		194,770	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+800				19,22		185,980	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+810				15,75		174,850	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+820				15,92		158,340	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+830				14,42		151,685	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+840				15,21		148,125	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+850				15,85		155,275	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+860				17,06		164,510	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+870				14,58		158,195	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+880				13,38		139,815	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+890				16,78		150,785	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+900				16,84		168,075	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+910				16,35		165,950	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+920				16,60		164,780	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+930				17,03		168,160	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+940				16,54		167,845	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+950				16,30		164,190	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+960				15,31		158,050	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+970				15,27		152,895	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+980				13,40		143,305	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+990				13,68		135,390	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+000				23,13		184,040	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+010				21,98		225,505	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+020				18,33		201,520	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+030				20,01		191,700	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+040				18,05		190,305	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+050				18,54		182,955	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+060				19,85		191,935	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+070				18,58		192,130	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+080				16,90		177,420	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+090				17,87		173,865	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+100				20,09		189,785	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+110				31,33		257,065	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+120				32,67		319,985	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+130				17,18		249,265	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+140				15,03		161,050	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+150				16,43		157,270	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+160				14,61		155,170	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+170				16,33		154,695	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+180				19,32		178,235	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+190				18,29		188,030	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+200				18,20		182,445	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+210				17,29		177,450	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+220				18,86		180,755	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+230				16,06		174,575	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+240				14,83		154,415	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+250				17,44		161,350	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+260				16,97		172,035	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+270				16,24		166,030	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+280				18,49		173,670	marzo a origen	Según cartera topografica	

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ene-2022 a 25-feb-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTO** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
210-13	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	M3	0,00	22.398,00	22.398,00

6+290				21,70		200,970	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+300				23,27		224,865	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+310				19,74		215,075	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+320				21,70		207,220	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+330				18,94		203,190	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+340				19,44		191,865	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+350				18,21		188,210	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+360				15,64		169,240	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+370				15,70		156,690	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+380				16,37		160,335	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+390				13,72		150,455	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+400				14,34		140,275	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+410				18,32		163,265	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+420				17,41		178,630	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+430				19,80		186,015	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+440				19,50		196,465	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+450				23,26		213,810	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+460				29,80		265,330	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+470				26,76		282,800	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+480				21,60		241,800	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+490				15,89		187,440	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+500				16,29		160,855	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+510				16,28		162,800	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+520				15,69		159,815	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+530				15,22		154,530	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+540				14,53		148,730	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+550				14,89		147,095	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+560				14,34		146,175	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+570				14,43		143,845	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+580				15,02		147,240	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+590				15,10		150,615	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+600				13,83		144,625	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+610				14,48		141,540	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+620				13,65		140,645	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+630				13,55		135,995	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+640				12,28		129,150	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+650				15,07		136,755	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+660				15,49		152,840	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+670				15,32		154,075	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+680				16,89		161,055	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+690				18,42		176,530	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+700				19,42		189,165	marzo a origen	Según cartera topografica	
				0,00					
1+580				19,00		95,010	marzo a origen	Según cartera topografica	
1+590				13,01		160,060	marzo a origen	Según cartera topografica	
1+600				12,57		127,895	marzo a origen	Según cartera topografica	
1+610				14,25		134,070	marzo a origen	Según cartera topografica	
1+620				13,20		137,235	marzo a origen	Según cartera topografica	
1+630				9,93		115,640	marzo a origen	Según cartera topografica	
1+640				10,57		102,490	marzo a origen	Según cartera topografica	
1+650				9,83		102,015	marzo a origen	Según cartera topografica	
1+660				11,25		105,425	marzo a origen	Según cartera topografica	
1+670				7,77		95,115	marzo a origen	Según cartera topografica	
1+680				10,76		92,625	marzo a origen	Según cartera topografica	
1+690				9,39		100,715	marzo a origen	Según cartera topografica	
1+700				10,37		98,805	marzo a origen	Según cartera topografica	
1+710				9,39		98,805	marzo a origen	Según cartera topografica	
1+720				10,13		97,600	marzo a origen	Según cartera topografica	

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ene-2022 a 25-feb-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTO** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
210-13	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	M3	0,00	22.398,00	22.398,00

1+730				15,82		129,775	marzo a origen	Según cartera topografica	
1+740				13,86		148,410	marzo a origen	Según cartera topografica	
1+750				24,67		192,640	marzo a origen	Según cartera topografica	
1+760				26,82		257,420	marzo a origen	Según cartera topografica	
1+770				27,76		272,865	marzo a origen	Según cartera topografica	
1+780				16,60		221,795	marzo a origen	Según cartera topografica	
1+790				11,54		140,715	marzo a origen	Según cartera topografica	
1+800				13,26		123,995	marzo a origen	Según cartera topografica	
1+810				11,56		124,085	marzo a origen	Según cartera topografica	
1+820				10,01		107,860	marzo a origen	Según cartera topografica	
1+830				8,46		92,385	marzo a origen	Según cartera topografica	
1+840				8,97		87,190	marzo a origen	Según cartera topografica	
1+850				8,70		88,390	marzo a origen	Según cartera topografica	
1+860				8,72		87,135	marzo a origen	Según cartera topografica	
1+870				18,32		135,205	marzo a origen	Según cartera topografica	
1+880				18,04		181,800	marzo a origen	Según cartera topografica	
1+890				16,20		171,220	marzo a origen	Según cartera topografica	
1+900				13,08		146,420	marzo a origen	Según cartera topografica	
1+910				35,23		241,535	marzo a origen	Según cartera topografica	
1+920				19,34		272,820	marzo a origen	Según cartera topografica	
1+930				44,66		319,995	marzo a origen	Según cartera topografica	
1+940				35,23		399,425	marzo a origen	Según cartera topografica	
1+950				43,37		392,965	marzo a origen	Según cartera topografica	
1+960				39,75		415,570	marzo a origen	Según cartera topografica	
1+970				41,67		407,095	marzo a origen	Según cartera topografica	
1+980				39,75		407,095	marzo a origen	Según cartera topografica	
1+990				44,36		420,535	marzo a origen	Según cartera topografica	
0+110				15,93		79,645	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal de 90°	
0+120				15,07		155,010	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal de 90°	
0+130				18,89		169,790	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal de 90°	
0+140				16,52		177,035	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal de 90°	
0+150				13,91		152,175	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal de 90°	
0+160				13,18		135,465	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal de 90°	
0+170				14,67		139,250	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal de 90°	
0+180				17,55		161,080	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal de 90°	
0+190				21,66		196,020	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal de 90°	
0+200				18,13		198,945	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal de 90°	
0+210				18,23		181,795	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal de 90°	
0+220				18,73		184,805	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal de 90°	
0+230				18,44		185,885	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal de 90°	
0+240				13,78		161,130	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal de 90°	
0+250				17,46		156,215	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal de 90°	
0+260				13,53		154,940	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal de 90°	
0+270				14,13		138,275	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal de 90°	
0+280				15,86		149,930	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal de 90°	
0+290				19,59		177,250	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal de 90°	
0+300						97,960	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal de 90°	
3+644	3+675		31,00	23,00	0,80	570,400	marzo a origen		
3+930	3+960		30,00	8,40	0,50	126,000	marzo a origen		
3+990	4+030		40,00	20,00	0,70	560,000	marzo a origen		
4+230	4+270		40,00	18,00	0,60	432,000	marzo a origen		
4+350	4+370		20,00	19,60	0,60	235,200	marzo a origen		
5+610						248,965	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+620						208,330	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+630						216,385	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+640						223,380	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+650						224,885	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+660						211,130	marzo a origen	Según cartera topografica	

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ene-2022 a 25-feb-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTO** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales				M3	0,00	22.398,00	22.398,00
0+360						31,920	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal de 90°	
0+370						32,600	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal de 90°	
0+380						29,200	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal de 90°	
0+390						29,600	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal de 90°	
0+400						28,600	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal de 90°	
0+410						23,200	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal de 90°	
0+420						13,400	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal de 90°	
0+430						8,000	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal de 90°	
0+290				8,80					
0+300				7,70		82,500	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal de 90°	
0+310				7,70		77,000	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal de 90°	
0+320				7,70		77,000	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal de 90°	
0+330				7,70		77,000	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal de 90°	
0+340				7,70		77,000	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal de 90°	
0+350				7,70		77,000	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal de 90°	
3+680	3+880		200,00	26,71	0,15	801,300	Marzo	Excavacion primera capa	
4+370	4+600		230,00	25,00	0,15	862,500	Marzo	Excavacion primera capa	
4+780	4+890		110,00	24,10	0,15	397,650	Marzo	Excavacion primera capa	
4+890	5+030		140,00	19,00	0,15	399,000	Marzo	Excavacion primera capa	
5+030	5+150		120,00	27,58	0,15	496,440	Marzo	Excavacion primera capa	
5+170	5+540		370,00	23,95	0,15	1329,225	Marzo	Excavacion primera capa	
5+600	5+650		50,00	24,94	0,15	187,050	Marzo	Excavacion primera capa	
5+660	6+700		1040,00	23,30	0,15	3634,800	Marzo	Excavacion primera capa	
1+570	1+990		420,00	23,80	0,15	1499,400	Marzo	Excavacion primera capa	
0+000	0+290		290,00	17,50	0,15	761,250	Marzo	Excavacion primera capa	
3+644	3+675		31,00	27,00	0,15	125,550	Marzo	Excavacion primera capa	
3+930	3+960		30,00	21,50	0,15	96,750	Marzo	Excavacion primera capa	
3+990	4+030		40,00	19,25	0,15	115,500	Marzo	Excavacion primera capa	
4+230	4+270		40,00	18,50	0,15	111,000	Marzo	Excavacion primera capa	
4+350	4+370		20,00	18,50	0,15	55,500	Marzo	Excavacion primera capa	
0+700	1+000		80,00	33,00	0,15	396,000	Marzo	Excavacion primera capa	
1+000	1+570		570,00	24,50	0,15	2094,750	Marzo	Excavacion primera capa	
3+280	3+680		400,00	21,50	0,15	1290,000	Marzo	Excavacion primera capa	
4+100	4+230		130,00	25,50	0,15	497,250	Marzo	Excavacion primera capa	
4+600	4+780		180,00	27,50	0,15	742,500	Marzo	Excavacion primera capa	
2+000	2+300		120,00	23,00	0,15	414,000	Marzo	Excavacion primera capa	
1+730	1+770	E	6,00	3,00	0,50	9,000	3/03/2022	Fallos Marzo	
1+730	1+770	E	5,50	5,70	0,75	23,513	3/03/2022	Fallos Marzo	
1+730	1+770	E	2,40	2,00	0,70	3,360	3/03/2022	Fallos Marzo	
3+705	3+735	I	30,00	10,30	0,50	154,500	14/03/2022	Fallos Marzo	
3+960	3+960	D	20,00	7,00	0,50	70,000	17/03/2022	Fallos Marzo	
3+930	3+960	E	30,00	8,40	0,50	126,000	16/03/2022	Fallos Marzo	
4+850	4+850	E	35,00	2,90	1,00	101,500	28/02/2022	Fallos Marzo	
5+616	5+619.6	E	3,60	6,00	0,45	9,720	25/03/2022	Fallos Marzo	
						560,060	enero fallos		
						683,000	febrero fallos		
3+675	3+675		22,00	1,70	0,70	-26,180	Marzo	Obra No.28	
3+829	3+829		23,00	1,70	0,70	-27,370	Marzo	Obra No.29	
4+354	4+354		17,00	1,70	0,60	-17,340	Marzo	Obra No.32	
4+564	4+564		21,00	1,70	0,70	-24,990	Marzo	Obra No.33	
4+765	4+765		19,00	1,70	0,80	-25,840	Marzo	Obra No.35	
4+951	4+951		20,00	1,70	0,70	-23,800	Marzo	Obra No.36	
5+096	5+096		21,00	1,70	0,60	-21,420	Marzo	Obra No.37	
5+154	5+154		24,00	4,00	0,80	-76,800	Marzo	Obra No.38	
5+218	5+218		22,00	1,70	0,60	-22,440	Marzo	Obra No.39	
5+595	5+595		22,00	3,60	1,00	-79,200	Marzo	Obra No.42	
5+637	5+637		19,50	1,70	1,15	-38,123	Marzo	Obra No.43	
5+752	5+752		17,00	1,70	1,05	-30,345	Marzo	Obra No.44	

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ene-2022 a 25-feb-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTO** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales				M3	0,00	22.398,00	22.398,00
5+894	5+894		20,00	1,70	0,80	-27,200	Marzo	Obra No.45	
6+017	6+017		19,00	1,70	1,10	-35,530	Marzo	Obra No.46	
6+123	6+123		19,00	1,70	1,00	-32,300	Marzo	Obra No.47	
6+245	6+245		19,00	1,70	1,00	-32,300	Marzo	Obra No.48	
6+300	6+300		21,50	1,70	1,10	-40,205	Marzo	Obra No.49	
6+476	6+476		24,00	1,70	1,00	-40,800	Marzo	Obra No.51	
0+330	0+330		14,50	3,00	0,70	-30,450	Marzo	Obra No.52	
0+250	0+250		14,50	3,00	0,80	-34,800	Marzo	Obra No.53	
0+135	0+135		16,50	1,70	0,70	-19,635	Marzo	Obra No.54	
						-6634,000	Cobro Noviembre	Según actas de pago	
						-12672,000	Cobro Enero	Según actas de pago	
						-29129,000	Cobro Febrero	Según actas de pago	
					SUBTOTAL	**22397,96**			
						LONGITUD PARA PAGO		22397,96	
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		**0,04**	
						LONGITUD TOTAL PARA PAGO :		**22398,00**	m^3

ING. ALEXIS ANDRES BLANCO CORONEL
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 08202139785ATL

JUAN ROBERTO DIAZ VELANDIA
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 25202 17653CND

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ene-2022 a 25-feb-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220,1	Terraplenes	M3	0,00	31.804,00	31.804,00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
				24,675				
4+380				22,686		236,805	marzo a origen	Según cartera topografica
4+390				24,976		238,310	marzo a origen	Según cartera topografica
4+400				21,054		230,150	marzo a origen	Según cartera topografica
4+410				19,099		200,765	marzo a origen	Según cartera topografica
4+420				18,608		188,535	marzo a origen	Según cartera topografica
4+430				19,724		191,660	marzo a origen	Según cartera topografica
4+440				22,276		210,000	marzo a origen	Según cartera topografica
4+450				24,779		235,275	marzo a origen	Según cartera topografica
4+460				26,770		257,745	marzo a origen	Según cartera topografica
4+470				28,128		274,490	marzo a origen	Según cartera topografica
4+480				28,120		281,240	marzo a origen	Según cartera topografica
4+490				27,892		280,060	marzo a origen	Según cartera topografica
4+500				27,393		276,425	marzo a origen	Según cartera topografica
4+510				27,766		275,795	marzo a origen	Según cartera topografica
4+520				28,624		281,950	marzo a origen	Según cartera topografica
4+530				28,736		286,800	marzo a origen	Según cartera topografica
4+540				28,830		287,830	marzo a origen	Según cartera topografica
4+550				28,817		288,235	marzo a origen	Según cartera topografica
4+560				26,961		278,890	marzo a origen	Según cartera topografica
4+570				14,845		209,030	marzo a origen	Según cartera topografica
4+580				15,356		151,005	marzo a origen	Según cartera topografica
4+590				14,746		150,510	marzo a origen	Según cartera topografica
4+600				21,827		182,865	marzo a origen	Según cartera topografica
				29,707				
4+790				31,917		308,120	marzo a origen	Según cartera topografica
4+800				33,615		327,660	marzo a origen	Según cartera topografica
4+810				33,976		337,955	marzo a origen	Según cartera topografica
4+820				32,504		332,400	marzo a origen	Según cartera topografica
4+830				29,870		311,870	marzo a origen	Según cartera topografica
4+840				32,592		312,310	marzo a origen	Según cartera topografica
4+850				34,381		334,865	marzo a origen	Según cartera topografica
4+860				29,713		320,470	marzo a origen	Según cartera topografica
4+870				28,757		292,350	marzo a origen	Según cartera topografica
4+880				29,326		290,415	marzo a origen	Según cartera topografica
4+890				26,264		277,950	marzo a origen	Según cartera topografica
5+030				29,130				
5+400				32,864		309,970	marzo a origen	Según cartera topografica
5+500				35,818		343,410	marzo a origen	Según cartera topografica
5+600				34,290		350,540	marzo a origen	Según cartera topografica
5+700				40,016		371,530	marzo a origen	Según cartera topografica
5+800				39,154		395,850	marzo a origen	Según cartera topografica
5+900				40,181		396,675	marzo a origen	Según cartera topografica
5+100				39,959		400,700	marzo a origen	Según cartera topografica
5+110				38,351		391,550	marzo a origen	Según cartera topografica
5+120				38,281		383,160	marzo a origen	Según cartera topografica
5+130				13,783		260,320	marzo a origen	Según cartera topografica
5+140				18,010		158,965	marzo a origen	Según cartera topografica
5+150				18,132		180,710	marzo a origen	Según cartera topografica
5+170				16,210				
5+180				20,065		181,375	marzo a origen	Según cartera topografica
5+190				20,030		200,475	marzo a origen	Según cartera topografica
5+200				19,273		196,515	marzo a origen	Según cartera topografica
5+210				19,015		191,440	marzo a origen	Según cartera topografica
5+220				21,710		203,625	marzo a origen	Según cartera topografica
5+230				17,166		194,380	marzo a origen	Según cartera topografica

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ene-2022 a 25-feb-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220,1	Terraplenes	M3	0,00	31.804,00	31.804,00

5+240				19,442		183,040	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+250				16,263		178,525	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+260				17,527		168,950	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+270				9,782		136,545	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+280				8,122		89,520	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+290				9,138		86,300	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+300				10,276		97,070	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+310				10,477		103,765	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+320				12,723		116,000	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+330				12,400		125,615	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+340				15,499		139,495	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+350				19,838		176,685	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+360				15,334		175,860	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+370				13,811		145,725	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+380				13,597		137,040	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+390				15,075		143,360	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+400				11,354		132,145	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+410				7,235		92,945	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+420				6,679		69,570	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+430				8,148		74,135	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+440				3,705		59,265	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+450				5,226		44,655	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+460				3,183		42,045	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+470				4,992		40,875	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+480				4,660		48,260	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+490				2,883		37,715	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+500				6,569		47,260	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+510				15,920		112,445	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+520				14,585		152,525	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+530				5,534		100,595	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+540				5,719		56,265	marzo a origen	Según cartera topografica	
				43,982					
5+670				45,249		446,155	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+680				43,479		443,640	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+690				44,511		439,950	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+700				42,357		434,340	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+710				39,167		407,620	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+720				39,514		393,405	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+730				37,956		387,350	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+740				37,017		374,865	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+750				36,779		368,980	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+760				34,715		357,470	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+770				35,810		352,625	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+780				36,017		359,135	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+790				35,082		355,495	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+800				37,091		360,865	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+810				35,489		362,900	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+820				36,695		360,920	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+830				36,967		368,310	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+840				39,777		383,720	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+850				42,299		410,380	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+860				45,073		436,860	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+870				44,420		447,465	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+880				42,063		432,415	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+890				41,165		416,140	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+900				40,820		409,925	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+910				41,291		410,555	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+920				42,031		416,610	marzo a origen	Según cartera topografica	

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ene-2022 a 25-feb-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220,1	Terraplenes	M3	0,00	31.804,00	31.804,00

5+930				42,900		424,655	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+940				41,692		422,960	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+950				39,330		405,110	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+960				37,365		383,475	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+970				35,085		362,250	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+980				31,666		333,755	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+990				29,332		304,990	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+000				36,621		329,765	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+010				33,426		350,235	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+020				28,779		311,025	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+030				32,021		304,000	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+040				32,996		325,085	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+050				34,127		335,615	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+060				36,034		350,805	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+070				35,708		358,710	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+080				35,197		354,525	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+090				34,700		349,485	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+100				35,657		351,785	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+110				42,659		391,580	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+120				45,711		441,850	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+130				31,751		387,310	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+140				32,037		318,940	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+150				33,928		329,825	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+160				31,381		326,545	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+170				32,198		317,895	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+180				32,542		323,700	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+190				33,536		330,390	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+200				33,921		337,285	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+210				34,180		340,505	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+220				32,888		335,340	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+230				28,867		308,775	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+240				24,102		264,845	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+250				27,934		260,180	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+260				32,102		300,180	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+270				32,883		324,925	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+280				34,351		336,170	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+290				36,267		353,090	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+300				36,679		364,730	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+310				41,196		389,375	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+320				44,271		427,335	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+330				54,277		492,740	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+340				43,637		489,570	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+350				42,279		429,580	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+360				43,303		427,910	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+370				43,204		432,535	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+380				45,710		444,570	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+390				47,404		465,570	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+400				45,085		462,445	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+410				44,763		449,240	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+420				44,061		444,120	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+430				43,311		436,860	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+440				43,487		433,990	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+450				45,581		445,340	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+460				47,481		465,310	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+470				49,473		484,770	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+480				49,192		493,325	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+490				45,863		475,275	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+500				48,191		470,270	marzo a origen	Según cartera topografica	

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ene-2022 a 25-feb-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220,1	Terraplenes	M3	0,00	31.804,00	31.804,00

6+510				49,192		486,915	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+520				50,637		499,145	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+530				51,134		508,855	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+540				51,544		513,390	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+550				51,682		516,130	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+560				50,041		508,615	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+570				52,179		511,100	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+580				51,260		517,195	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+590				49,426		503,430	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+600				49,068		492,470	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+610				30,055		395,615	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+620				42,963		365,090	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+630				41,852		424,075	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+640				41,981		419,165	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+650				42,743		423,620	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+660				44,405		435,740	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+670				43,163		437,840	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+680				43,884		435,235	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+690				40,925		424,045	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+700				34,120		375,225	marzo a origen	Según cartera topografica	
0+110				10,681		53,405	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°	
0+120				8,017		93,490	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°	
0+130				13,522		107,695	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°	
0+140				14,440		139,810	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°	
0+150				10,600		125,200	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°	
0+160				9,964		102,820	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°	
0+170				8,488		92,260	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°	
0+180				14,036		112,620	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°	
0+190				17,219		156,275	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°	
0+200				13,470		153,445	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°	
0+210				13,470		134,700	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°	
0+220				18,284		158,770	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°	
0+230				16,490		173,870	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°	
0+240				17,220		168,550	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°	
0+250				17,461		173,405	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°	
0+260				18,699		180,800	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°	
0+270				20,147		194,230	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°	
0+280				19,474		198,105	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°	
0+290				24,370		219,220	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°	
0+300				0,000		121,850	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°	
4+470				1,973		19,520	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
4+480				2,120		20,465	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
				2,448					
4+790				2,261		23,545	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
4+800				2,258		22,595	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
4+810				2,261		22,595	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
4+820				2,264		22,625	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
4+830				2,236		22,500	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
4+840				2,195		22,155	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
4+850				2,145		21,700	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
4+860				2,071		21,080	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
4+870				2,031		20,510	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
4+880				1,995		20,130	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
4+890				1,909		19,520	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
				2,027					
5+040				2,241		21,340	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+050				2,259		22,500	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+060				2,314		22,865	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ene-2022 a 25-feb-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220,1	Terraplenes	M3	0,00	31.804,00	31.804,00

5+070				2,367		23,405	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+080				2,436		24,015	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+090				2,431		24,335	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+100				2,454		24,425	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+110				2,443		24,485	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+120				2,470		24,565	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+130				2,443		24,565	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+140				2,492		24,675	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+150				2,627		25,595	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
				2,054					
5+180				2,054		20,540	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+190				2,489		22,715	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+200				2,594		25,415	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+210				2,483		25,385	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+220				2,465		24,740	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+230				2,411		24,380	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+240				2,503		24,570	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+250				2,540		25,215	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+260				2,571		25,555	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+270				2,100		23,355	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+280				1,970		20,350	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+290				1,974		19,720	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+300				1,978		19,760	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+310				1,944		19,610	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+320				1,928		19,360	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+330				1,972		19,500	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+340				1,960		19,660	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+350				1,934		19,470	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+360				1,856		18,950	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+370				1,861		18,585	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+380				1,796		18,285	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+390				1,809		18,025	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+400				1,834		18,215	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+410				1,838		18,360	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+420				1,781		18,095	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+430				1,764		17,725	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+440				1,770		17,670	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+450				1,772		17,710	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+460				1,778		17,750	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+470				1,727		17,525	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+480				1,714		17,205	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+490				1,806		17,600	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+500				1,786		17,960	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+510				1,728		17,570	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+520				1,840		17,840	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+530				2,066		19,530	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+540				2,293		21,795	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
				2,003					
5+670				2,038		20,205	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+680				2,013		20,255	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+690				2,027		20,200	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+700				1,998		20,125	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+710				1,952		19,750	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+720				1,959		19,555	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+730				1,934		19,465	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+740				1,924		19,290	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+750				1,887		19,055	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+760				1,858		18,725	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ene-2022 a 25-feb-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220,1	Terraplenes	M3	0,00	31.804,00	31.804,00

5+770				1,875		18,665	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+780				1,879		18,770	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+790				1,879		18,790	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+800				1,895		18,870	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+810				1,931		19,130	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+820				1,958		19,445	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+830				1,951		19,545	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+840				1,993		19,720	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+850				2,031		20,120	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+860				2,065		20,480	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+870				2,054		20,595	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+880				2,018		20,360	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+890				2,012		20,150	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+900				2,005		20,085	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+910				2,041		20,230	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+920				2,053		20,470	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+930				2,053		20,530	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+940				2,044		20,485	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+950				2,010		20,270	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+960				1,984		19,970	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+970				1,951		19,675	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+980				1,927		19,390	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+990				1,893		19,100	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+000				1,855		18,740	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+100				1,811		18,330	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+200				1,833		18,220	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+300				1,863		18,480	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+400				1,889		18,760	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+500				1,907		18,980	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+600				1,833		18,700	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+700				1,954		18,935	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+800				1,959		19,565	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+900				1,959		19,590	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+100				1,911		19,350	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+110				1,812		18,615	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+120				1,812		18,120	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+130				1,869		18,405	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+140				1,911		18,900	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+150				1,932		19,215	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+160				1,932		19,320	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+170				1,903		19,175	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+180				1,848		18,755	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+190				1,879		18,635	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+200				1,916		18,975	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+210				1,919		19,175	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+220				1,886		19,025	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+230				1,889		18,875	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+240				1,819		18,540	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+250				1,859		18,390	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+260				1,896		18,775	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+270				1,946		19,210	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+280				1,939		19,425	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+290				1,900		19,195	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+300				1,861		18,805	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+310				1,965		19,130	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+320				1,963		19,640	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+330				2,360		21,615	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ene-2022 a 25-feb-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220,1	Terraplenes	M3	0,00	31.804,00	31.804,00
6+340	2,005	21,825	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+350	2,005	20,050	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+360	2,125	20,650	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+370	2,125	21,250	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+380	2,005	20,650	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+390	2,147	20,760	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+400	2,154	21,505	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+410	2,115	21,345	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+420	2,052	20,835	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+430	2,039	20,455	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+440	2,028	20,335	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+450	2,012	20,200	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+460	2,001	20,065	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+470	2,104	20,525	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+480	2,174	21,390	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+490	2,131	21,525	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+500	2,155	21,430	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+510	2,180	21,675	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+520	2,196	21,880	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+530	2,202	21,990	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+540	2,218	22,100	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+550	2,217	22,175	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+560	2,224	22,205	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+570	2,120	21,720	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+580	2,236	21,780	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+590	2,225	22,305	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+600	2,216	22,205	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+610	2,191	22,035	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
6+620	0,000	10,955	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
0+110	1,239	6,195	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello ramal 90°	
0+120	1,267	12,530	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello ramal 90°	
0+130	1,277	12,720	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello ramal 90°	
0+140	1,292	12,845	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello ramal 90°	
0+150	1,292	12,920	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello ramal 90°	
0+160	1,267	12,795	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello ramal 90°	
0+170	1,235	12,510	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello ramal 90°	
0+180	1,235	12,350	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello ramal 90°	
0+190	1,280	12,575	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello ramal 90°	
0+200	1,213	12,465	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello ramal 90°	
0+210	1,228	12,205	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello ramal 90°	
0+220	1,321	12,745	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello ramal 90°	
0+230	1,250	12,855	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello ramal 90°	
0+240	1,213	12,315	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello ramal 90°	
0+250	1,364	12,885	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello ramal 90°	
0+260	1,376	13,700	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello ramal 90°	
0+270	1,376	13,760	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello ramal 90°	
0+280	1,234	13,050	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello ramal 90°	
0+290	1,345	12,895	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello ramal 90°	
0+300	0,000	6,725	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello ramal 90°	
	5,831				
0+360	7,735	67,830	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello, ramal 90°	
0+370	6,120	69,275	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello, ramal 90°	
0+380	6,290	62,050	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello, ramal 90°	
0+390	6,290	62,900	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello, ramal 90°	
0+400	5,865	60,775	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello, ramal 90°	
0+410	3,995	49,300	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello, ramal 90°	
0+420	1,700	28,475	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello, ramal 90°	
0+430	1,700	17,000	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello, ramal 90°	

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ene-2022 a 25-feb-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220,1			Terraplenes			M3	0,00	31.804,00	31.804,00
3+644	3+675		31,000	23,000	0,300	213,900	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
3+930	3+960		30,000	8,400	0,300	75,600	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
3+990	4+030		40,000	20,000	0,300	240,000	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
4+230	4+270		40,000	18,000	0,300	216,000	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
4+350	4+370		20,000	19,600	0,300	117,600	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
4+700	4+750		50,000	19,000	0,900	855,000	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
4+750	4+780		40,000	20,000	0,300	240,000	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
4+890	5+030		140,000	18,000	1,200	3024,000	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
						-14151,000	Cobro Enero	Según actas de pago	
						-24774,000	Cobro febrero	Según actas de pago	
					SUBTOTAL	31804,06			
						LONGITUD PARA PAGO		31804,06	
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		-0,05	
						LONGITUD TOTAL PARA PAGO :		31804,00	m^3

ING. ALEXIS ANDRES BLANCO CORONEL
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 08202139785ATL

JUAN ROBERTO DIAZ VELANDIA
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 25202 17653CND

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ene-2022 a 25-feb-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1P	Material para Terraplen	M3	0,00	31.804,00	31.804,00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
4+380				22,686		236,805	marzo a origen	Según cartera topografica
4+390				24,976		238,310	marzo a origen	Según cartera topografica
4+400				21,054		230,150	marzo a origen	Según cartera topografica
4+410				19,099		200,765	marzo a origen	Según cartera topografica
4+420				18,608		188,535	marzo a origen	Según cartera topografica
4+430				19,724		191,660	marzo a origen	Según cartera topografica
4+440				22,276		210,000	marzo a origen	Según cartera topografica
4+450				24,779		235,275	marzo a origen	Según cartera topografica
4+460				26,770		257,745	marzo a origen	Según cartera topografica
4+470				28,128		274,490	marzo a origen	Según cartera topografica
4+480				28,120		281,240	marzo a origen	Según cartera topografica
4+490				27,892		280,060	marzo a origen	Según cartera topografica
4+500				27,393		276,425	marzo a origen	Según cartera topografica
4+510				27,766		275,795	marzo a origen	Según cartera topografica
4+520				28,624		281,950	marzo a origen	Según cartera topografica
4+530				28,736		286,800	marzo a origen	Según cartera topografica
4+540				28,830		287,830	marzo a origen	Según cartera topografica
4+550				28,817		288,235	marzo a origen	Según cartera topografica
4+560				26,961		278,890	marzo a origen	Según cartera topografica
4+570				14,845		209,030	marzo a origen	Según cartera topografica
4+580				15,356		151,005	marzo a origen	Según cartera topografica
4+590				14,746		150,510	marzo a origen	Según cartera topografica
4+600				21,827		182,865	marzo a origen	Según cartera topografica
				29,707				
4+790				31,917		308,120	marzo a origen	Según cartera topografica
4+800				33,615		327,660	marzo a origen	Según cartera topografica
4+810				33,976		337,955	marzo a origen	Según cartera topografica
4+820				32,504		332,400	marzo a origen	Según cartera topografica
4+830				29,870		311,870	marzo a origen	Según cartera topografica
4+840				32,592		312,310	marzo a origen	Según cartera topografica
4+850				34,381		334,865	marzo a origen	Según cartera topografica
4+860				29,713		320,470	marzo a origen	Según cartera topografica
4+870				28,757		292,350	marzo a origen	Según cartera topografica
4+880				29,326		290,415	marzo a origen	Según cartera topografica
4+890				26,264		277,950	marzo a origen	Según cartera topografica
5+030				29,130				
5+040				32,864		309,970	marzo a origen	Según cartera topografica
5+050				35,818		343,410	marzo a origen	Según cartera topografica
5+060				34,290		350,540	marzo a origen	Según cartera topografica
5+070				40,016		371,530	marzo a origen	Según cartera topografica
5+080				39,154		395,850	marzo a origen	Según cartera topografica
5+090				40,181		396,675	marzo a origen	Según cartera topografica
5+100				39,959		400,700	marzo a origen	Según cartera topografica
5+110				38,351		391,550	marzo a origen	Según cartera topografica
5+120				38,281		383,160	marzo a origen	Según cartera topografica
5+130				13,783		260,320	marzo a origen	Según cartera topografica
5+140				18,010		158,965	marzo a origen	Según cartera topografica
5+150				18,132		180,710	marzo a origen	Según cartera topografica
5+170				16,210				
5+180				20,065		181,375	marzo a origen	Según cartera topografica
5+190				20,030		200,475	marzo a origen	Según cartera topografica
5+200				19,273		196,515	marzo a origen	Según cartera topografica
5+210				19,015		191,440	marzo a origen	Según cartera topografica
5+220				21,710		203,625	marzo a origen	Según cartera topografica
5+230				17,166		194,380	marzo a origen	Según cartera topografica
5+240				19,442		183,040	marzo a origen	Según cartera topografica

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ene-2022 a 25-feb-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1P	Material para Terraplen	M3	0,00	31.804,00	31.804,00

5+250				16,263		178,525	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+260				17,527		168,950	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+270				9,782		136,545	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+280				8,122		89,520	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+290				9,138		86,300	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+300				10,276		97,070	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+310				10,477		103,765	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+320				12,723		116,000	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+330				12,400		125,615	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+340				15,499		139,495	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+350				19,838		176,685	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+360				15,334		175,860	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+370				13,811		145,725	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+380				13,597		137,040	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+390				15,075		143,360	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+400				11,354		132,145	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+410				7,235		92,945	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+420				6,679		69,570	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+430				8,148		74,135	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+440				3,705		59,265	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+450				5,226		44,655	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+460				3,183		42,045	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+470				4,992		40,875	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+480				4,660		48,260	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+490				2,883		37,715	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+500				6,569		47,260	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+510				15,920		112,445	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+520				14,585		152,525	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+530				5,534		100,595	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+540				5,719		56,265	marzo a origen	Según cartera topografica	
				43,982					
5+670				45,249		446,155	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+680				43,479		443,640	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+690				44,511		439,950	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+700				42,357		434,340	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+710				39,167		407,620	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+720				39,514		393,405	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+730				37,956		387,350	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+740				37,017		374,865	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+750				36,779		368,980	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+760				34,715		357,470	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+770				35,810		352,625	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+780				36,017		359,135	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+790				35,082		355,495	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+800				37,091		360,865	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+810				35,489		362,900	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+820				36,695		360,920	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+830				36,967		368,310	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+840				39,777		383,720	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+850				42,299		410,380	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+860				45,073		436,860	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+870				44,420		447,465	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+880				42,063		432,415	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+890				41,165		416,140	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+900				40,820		409,925	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+910				41,291		410,555	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+920				42,031		416,610	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+930				42,900		424,655	marzo a origen	Según cartera topografica	

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ene-2022 a 25-feb-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1P	Material para Terraplen	M3	0,00	31.804,00	31.804,00

5+940				41,692		422,960	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+950				39,330		405,110	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+960				37,365		383,475	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+970				35,085		362,250	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+980				31,666		333,755	marzo a origen	Según cartera topografica	
5+990				29,332		304,990	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+000				36,621		329,765	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+010				33,426		350,235	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+020				28,779		311,025	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+030				32,021		304,000	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+040				32,996		325,085	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+050				34,127		335,615	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+060				36,034		350,805	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+070				35,708		358,710	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+080				35,197		354,525	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+090				34,700		349,485	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+100				35,657		351,785	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+110				42,659		391,580	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+120				45,711		441,850	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+130				31,751		387,310	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+140				32,037		318,940	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+150				33,928		329,825	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+160				31,381		326,545	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+170				32,198		317,895	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+180				32,542		323,700	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+190				33,536		330,390	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+200				33,921		337,285	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+210				34,180		340,505	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+220				32,888		335,340	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+230				28,867		308,775	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+240				24,102		264,845	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+250				27,934		260,180	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+260				32,102		300,180	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+270				32,883		324,925	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+280				34,351		336,170	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+290				36,267		353,090	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+300				36,679		364,730	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+310				41,196		389,375	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+320				44,271		427,335	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+330				54,277		492,740	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+340				43,637		489,570	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+350				42,279		429,580	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+360				43,303		427,910	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+370				43,204		432,535	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+380				45,710		444,570	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+390				47,404		465,570	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+400				45,085		462,445	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+410				44,763		449,240	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+420				44,061		444,120	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+430				43,311		436,860	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+440				43,487		433,990	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+450				45,581		445,340	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+460				47,481		465,310	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+470				49,473		484,770	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+480				49,192		493,325	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+490				45,863		475,275	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+500				48,191		470,270	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+510				49,192		486,915	marzo a origen	Según cartera topografica	

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ene-2022 a 25-feb-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1P	Material para Terraplen	M3	0,00	31.804,00	31.804,00

6+520				50,637		499,145	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+530				51,134		508,855	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+540				51,544		513,390	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+550				51,682		516,130	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+560				50,041		508,615	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+570				52,179		511,100	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+580				51,260		517,195	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+590				49,426		503,430	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+600				49,068		492,470	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+610				30,055		395,615	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+620				42,963		365,090	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+630				41,852		424,075	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+640				41,981		419,165	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+650				42,743		423,620	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+660				44,405		435,740	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+670				43,163		437,840	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+680				43,884		435,235	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+690				40,925		424,045	marzo a origen	Según cartera topografica	
6+700				34,120		375,225	marzo a origen	Según cartera topografica	
0+110				10,681		53,405	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°	
0+120				8,017		93,490	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°	
0+130				13,522		107,695	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°	
0+140				14,440		139,810	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°	
0+150				10,600		125,200	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°	
0+160				9,964		102,820	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°	
0+170				8,488		92,260	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°	
0+180				14,036		112,620	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°	
0+190				17,219		156,275	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°	
0+200				13,470		153,445	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°	
0+210				13,470		134,700	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°	
0+220				18,284		158,770	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°	
0+230				16,490		173,870	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°	
0+240				17,220		168,550	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°	
0+250				17,461		173,405	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°	
0+260				18,699		180,800	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°	
0+270				20,147		194,230	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°	
0+280				19,474		198,105	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°	
0+290				24,370		219,220	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°	
0+300				0,000		121,850	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°	
4+470				1,973		19,520	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
4+480				2,120		20,465	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
				2,448					
4+790				2,261		23,545	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
4+800				2,258		22,595	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
4+810				2,261		22,595	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
4+820				2,264		22,625	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
4+830				2,236		22,500	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
4+840				2,195		22,155	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
4+850				2,145		21,700	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
4+860				2,071		21,080	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
4+870				2,031		20,510	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
4+880				1,995		20,130	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
4+890				1,909		19,520	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
				2,027					
5+040				2,241		21,340	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+050				2,259		22,500	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+060				2,314		22,865	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+070				2,367		23,405	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ene-2022 a 25-feb-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1P	Material para Terraplen	M3	0,00	31.804,00	31.804,00

5+080				2,436		24,015	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+090				2,431		24,335	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+100				2,454		24,425	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+110				2,443		24,485	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+120				2,470		24,565	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+130				2,443		24,565	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+140				2,492		24,675	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+150				2,627		25,595	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
				2,054					
5+180				2,054		20,540	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+190				2,489		22,715	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+200				2,594		25,415	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+210				2,483		25,385	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+220				2,465		24,740	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+230				2,411		24,380	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+240				2,503		24,570	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+250				2,540		25,215	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+260				2,571		25,555	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+270				2,100		23,355	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+280				1,970		20,350	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+290				1,974		19,720	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+300				1,978		19,760	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+310				1,944		19,610	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+320				1,928		19,360	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+330				1,972		19,500	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+340				1,960		19,660	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+350				1,934		19,470	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+360				1,856		18,950	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+370				1,861		18,585	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+380				1,796		18,285	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+390				1,809		18,025	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+400				1,834		18,215	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+410				1,838		18,360	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+420				1,781		18,095	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+430				1,764		17,725	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+440				1,770		17,670	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+450				1,772		17,710	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+460				1,778		17,750	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+470				1,727		17,525	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+480				1,714		17,205	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+490				1,806		17,600	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+500				1,786		17,960	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+510				1,728		17,570	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+520				1,840		17,840	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+530				2,066		19,530	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+540				2,293		21,795	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
				2,003					
5+670				2,038		20,205	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+680				2,013		20,255	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+690				2,027		20,200	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+700				1,998		20,125	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+710				1,952		19,750	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+720				1,959		19,555	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+730				1,934		19,465	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+740				1,924		19,290	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+750				1,887		19,055	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+760				1,858		18,725	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
5+770				1,875		18,665	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ene-2022 a 25-feb-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1P	Material para Terraplen	M3	0,00	31.804,00	31.804,00

5+780				1,879		18,770	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
5+790				1,879		18,790	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
5+800				1,895		18,870	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
5+810				1,931		19,130	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
5+820				1,958		19,445	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
5+830				1,951		19,545	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
5+840				1,993		19,720	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
5+850				2,031		20,120	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
5+860				2,065		20,480	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
5+870				2,054		20,595	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
5+880				2,018		20,360	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
5+890				2,012		20,150	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
5+900				2,005		20,085	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
5+910				2,041		20,230	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
5+920				2,053		20,470	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
5+930				2,053		20,530	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
5+940				2,044		20,485	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
5+950				2,010		20,270	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
5+960				1,984		19,970	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
5+970				1,951		19,675	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
5+980				1,927		19,390	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
5+990				1,893		19,100	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+000				1,855		18,740	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+010				1,811		18,330	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+020				1,833		18,220	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+030				1,863		18,480	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+040				1,889		18,760	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+050				1,907		18,980	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+060				1,833		18,700	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+070				1,954		18,935	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+080				1,959		19,565	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+090				1,959		19,590	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+100				1,911		19,350	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+110				1,812		18,615	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+120				1,812		18,120	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+130				1,869		18,405	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+140				1,911		18,900	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+150				1,932		19,215	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+160				1,932		19,320	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+170				1,903		19,175	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+180				1,848		18,755	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+190				1,879		18,635	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+200				1,916		18,975	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+210				1,919		19,175	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+220				1,886		19,025	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+230				1,889		18,875	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+240				1,819		18,540	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+250				1,859		18,390	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+260				1,896		18,775	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+270				1,946		19,210	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+280				1,939		19,425	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+290				1,900		19,195	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+300				1,861		18,805	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+310				1,965		19,130	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+320				1,963		19,640	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+330				2,360		21,615	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+340				2,005		21,825	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+350				2,005		20,050	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ene-2022 a 25-feb-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1P	Material para Terraplen	M3	0,00	31.804,00	31.804,00

6+360				2,125		20,650	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+370				2,125		21,250	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+380				2,005		20,650	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+390				2,147		20,760	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+400				2,154		21,505	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+410				2,115		21,345	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+420				2,052		20,835	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+430				2,039		20,455	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+440				2,028		20,335	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+450				2,012		20,200	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+460				2,001		20,065	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+470				2,104		20,525	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+480				2,174		21,390	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+490				2,131		21,525	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+500				2,155		21,430	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+510				2,180		21,675	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+520				2,196		21,880	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+530				2,202		21,990	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+540				2,218		22,100	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+550				2,217		22,175	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+560				2,224		22,205	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+570				2,120		21,720	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+580				2,236		21,780	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+590				2,225		22,305	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+600				2,216		22,205	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+610				2,191		22,035	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
6+620				0,000		10,955	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello
0+110				1,239		6,195	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello, ramal 90°
0+120				1,267		12,530	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello, ramal 90°
0+130				1,277		12,720	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello, ramal 90°
0+140				1,292		12,845	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello, ramal 90°
0+150				1,292		12,920	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello, ramal 90°
0+160				1,267		12,795	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello, ramal 90°
0+170				1,235		12,510	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello, ramal 90°
0+180				1,235		12,350	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello, ramal 90°
0+190				1,280		12,575	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello, ramal 90°
0+200				1,213		12,465	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello, ramal 90°
0+210				1,228		12,205	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello, ramal 90°
0+220				1,321		12,745	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello, ramal 90°
0+230				1,250		12,855	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello, ramal 90°
0+240				1,213		12,315	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello, ramal 90°
0+250				1,364		12,885	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello, ramal 90°
0+260				1,376		13,700	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello, ramal 90°
0+270				1,376		13,760	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello, ramal 90°
0+280				1,234		13,050	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello, ramal 90°
0+290				1,345		12,895	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello, ramal 90°
0+300				0,000		6,725	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello, ramal 90°
				5,831				
0+360				7,735		67,830	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello, ramal 90°
0+370				6,120		69,275	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello, ramal 90°
0+380				6,290		62,050	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello, ramal 90°
0+390				6,290		62,900	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello, ramal 90°
0+400				5,865		60,775	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello, ramal 90°
0+410				3,995		49,300	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello, ramal 90°
0+420				1,700		28,475	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello, ramal 90°
0+430				1,700		17,000	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello, ramal 90°
3+644	3+675		31,000	23,000	0,300	213,900	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ene-2022 a 25-feb-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
220.1P			Material para Terraplen			M3	0,00	31.804,00	31.804,00
3+930	3+960		30,000	8,400	0,300	75,600	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
3+990	4+030		40,000	20,000	0,300	240,000	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
4+230	4+270		40,000	18,000	0,300	216,000	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
4+350	4+370		20,000	19,600	0,300	117,600	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
4+700	4+750		50,000	19,000	0,900	855,000	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
4+750	4+780		40,000	20,000	0,300	240,000	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
4+890	5+030		140,000	18,000	1,200	3024,000	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello	
						-14151,000	Cobro Enero	Según actas de pago	
						-24774,000	Cobro febrero	Según actas de pago	
					SUBTOTAL	31804,06			
						LONGITUD PARA PAGO		31804,06	
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		-0,05	
						LONGITUD TOTAL PARA PAGO :		31804,00	m^3

ING. ALEXIS ANDRES BLANCO CORONEL
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 08202139785ATL

JUAN ROBERTO DIAZ VELANDIA
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 25202 17653CND

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ene-2022 a 25-feb-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
221	Pedraplén Compacto	M3	0,00	13.865,00	13.865,00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
				13,117				
3+690				12,208		126,625	marzo a origen	Según cartera topografica
3+700				12,203		122,055	marzo a origen	Según cartera topografica
3+710				12,089		121,460	marzo a origen	Según cartera topografica
3+720				11,892		119,905	marzo a origen	Según cartera topografica
3+730				11,971		119,315	marzo a origen	Según cartera topografica
3+740				11,835		119,030	marzo a origen	Según cartera topografica
3+750				11,817		118,260	marzo a origen	Según cartera topografica
3+760				11,780		117,985	marzo a origen	Según cartera topografica
3+770				11,795		117,875	marzo a origen	Según cartera topografica
3+780				11,792		117,935	marzo a origen	Según cartera topografica
3+790				11,582		116,870	marzo a origen	Según cartera topografica
3+800				11,485		115,335	marzo a origen	Según cartera topografica
3+810				11,260		113,725	marzo a origen	Según cartera topografica
3+820				11,424		113,420	marzo a origen	Según cartera topografica
3+830				11,398		114,110	marzo a origen	Según cartera topografica
3+840				11,284		113,410	marzo a origen	Según cartera topografica
3+850				11,184		112,340	marzo a origen	Según cartera topografica
3+860				11,104		111,440	marzo a origen	Según cartera topografica
3+870				11,062		110,830	marzo a origen	Según cartera topografica
3+880				10,879		109,705	marzo a origen	Según cartera topografica
				8,932				
4+380				9,099		90,155	marzo a origen	Según cartera topografica
4+390				9,095		90,970	marzo a origen	Según cartera topografica
4+400				8,965		90,300	marzo a origen	Según cartera topografica
4+410				8,898		89,315	marzo a origen	Según cartera topografica
4+420				8,858		88,780	marzo a origen	Según cartera topografica
4+430				8,724		87,910	marzo a origen	Según cartera topografica
4+440				9,001		88,625	marzo a origen	Según cartera topografica
4+450				9,437		92,190	marzo a origen	Según cartera topografica
4+460				9,658		95,475	marzo a origen	Según cartera topografica
4+470				9,871		97,645	marzo a origen	Según cartera topografica
4+480				10,600		102,355	marzo a origen	Según cartera topografica
4+490				10,914		107,570	marzo a origen	Según cartera topografica
4+500				11,232		110,730	marzo a origen	Según cartera topografica
4+510				11,757		114,945	marzo a origen	Según cartera topografica
4+520				11,865		118,110	marzo a origen	Según cartera topografica
4+530				11,825		118,450	marzo a origen	Según cartera topografica
4+540				11,752		117,885	marzo a origen	Según cartera topografica
4+550				11,590		116,710	marzo a origen	Según cartera topografica
4+560				12,152		118,710	marzo a origen	Según cartera topografica
4+570				11,505		118,285	marzo a origen	Según cartera topografica
4+580				11,525		115,150	marzo a origen	Según cartera topografica
4+590				11,544		115,345	marzo a origen	Según cartera topografica
4+600				11,610		115,770	marzo a origen	Según cartera topografica
				12,743				
4+790				11,984		123,635	marzo a origen	Según cartera topografica
4+800				11,292		116,380	marzo a origen	Según cartera topografica
4+810				12,210		117,510	marzo a origen	Según cartera topografica
4+820				11,773		119,915	marzo a origen	Según cartera topografica
4+830				11,176		114,745	marzo a origen	Según cartera topografica
4+840				12,075		116,255	marzo a origen	Según cartera topografica
4+850				10,726		114,005	marzo a origen	Según cartera topografica
4+860				10,326		105,260	marzo a origen	Según cartera topografica
4+870				10,768		105,470	marzo a origen	Según cartera topografica
4+880				9,978		103,730	marzo a origen	Según cartera topografica
4+890				10,119		100,485	marzo a origen	Según cartera topografica
				10,537				

5+040				11,241		108,890	marzo a origen	Según cartera topografica
5+050				11,303		112,720	marzo a origen	Según cartera topografica
5+060				12,311		118,070	marzo a origen	Según cartera topografica
5+070				12,098		122,045	marzo a origen	Según cartera topografica
5+080				13,258		126,780	marzo a origen	Según cartera topografica
5+090				13,819		135,385	marzo a origen	Según cartera topografica
5+100				14,282		140,505	marzo a origen	Según cartera topografica
5+110				12,964		136,230	marzo a origen	Según cartera topografica
5+120				12,677		128,205	marzo a origen	Según cartera topografica
5+130				12,850		127,635	marzo a origen	Según cartera topografica
5+140				13,224		130,370	marzo a origen	Según cartera topografica
5+150				13,531		133,775	marzo a origen	Según cartera topografica
				15,228				
5+180				18,304		167,660	marzo a origen	Según cartera topografica
5+190				18,004		181,540	marzo a origen	Según cartera topografica
5+200				17,977		179,905	marzo a origen	Según cartera topografica
5+210				13,384		156,805	marzo a origen	Según cartera topografica
5+220				12,304		128,440	marzo a origen	Según cartera topografica
5+230				12,057		121,805	marzo a origen	Según cartera topografica
5+240				12,513		122,850	marzo a origen	Según cartera topografica
5+250				13,937		132,250	marzo a origen	Según cartera topografica
5+260				12,761		133,490	marzo a origen	Según cartera topografica
5+270				11,947		123,540	marzo a origen	Según cartera topografica
5+280				8,856		104,015	marzo a origen	Según cartera topografica
5+290				9,866		93,610	marzo a origen	Según cartera topografica
5+300				10,283		100,745	marzo a origen	Según cartera topografica
5+310				9,716		99,995	marzo a origen	Según cartera topografica
5+320				9,638		96,770	marzo a origen	Según cartera topografica
5+330				9,862		97,500	marzo a origen	Según cartera topografica
5+340				9,799		98,305	marzo a origen	Según cartera topografica
5+350				9,712		97,555	marzo a origen	Según cartera topografica
5+360				9,475		95,935	marzo a origen	Según cartera topografica
5+370				9,198		93,365	marzo a origen	Según cartera topografica
5+380				8,971		90,845	marzo a origen	Según cartera topografica
5+390				9,226		90,985	marzo a origen	Según cartera topografica
5+400				10,527		98,765	marzo a origen	Según cartera topografica
5+410				13,795		121,610	marzo a origen	Según cartera topografica
5+420				13,304		135,495	marzo a origen	Según cartera topografica
5+430				12,509		129,065	marzo a origen	Según cartera topografica
5+440				12,684		125,965	marzo a origen	Según cartera topografica
5+450				11,248		119,660	marzo a origen	Según cartera topografica
5+460				10,913		110,805	marzo a origen	Según cartera topografica
5+470				11,086		109,995	marzo a origen	Según cartera topografica
5+480				9,894		104,900	marzo a origen	Según cartera topografica
5+490				12,740		113,170	marzo a origen	Según cartera topografica
5+500				11,813		122,765	marzo a origen	Según cartera topografica
5+510				12,011		119,120	marzo a origen	Según cartera topografica
5+520				15,298		136,545	marzo a origen	Según cartera topografica
5+530				18,224		167,610	marzo a origen	Según cartera topografica
5+540				17,093		176,585	marzo a origen	Según cartera topografica
				9,936				
5+670				10,189		100,625	marzo a origen	Según cartera topografica
5+680				10,066		101,275	marzo a origen	Según cartera topografica
5+690				10,132		100,990	marzo a origen	Según cartera topografica
5+700				9,994		100,630	marzo a origen	Según cartera topografica
5+710				9,739		98,665	marzo a origen	Según cartera topografica
5+720				9,822		97,805	marzo a origen	Según cartera topografica
5+730				9,702		97,620	marzo a origen	Según cartera topografica
5+740				9,639		96,705	marzo a origen	Según cartera topografica
5+750				9,472		95,555	marzo a origen	Según cartera topografica
5+760				9,283		93,775	marzo a origen	Según cartera topografica
5+770				9,369		93,260	marzo a origen	Según cartera topografica
5+780				9,393		93,810	marzo a origen	Según cartera topografica
5+790				9,428		94,105	marzo a origen	Según cartera topografica
5+800				9,478		94,530	marzo a origen	Según cartera topografica
5+810				9,677		95,775	marzo a origen	Según cartera topografica
5+820				9,788		97,325	marzo a origen	Según cartera topografica
5+830				9,754		97,710	marzo a origen	Según cartera topografica
5+840				10,009		98,815	marzo a origen	Según cartera topografica
5+850				10,154		100,815	marzo a origen	Según cartera topografica
5+860				10,326		102,400	marzo a origen	Según cartera topografica
5+870				10,286		103,060	marzo a origen	Según cartera topografica
5+880				10,087		101,865	marzo a origen	Según cartera topografica

5+890				10,059		100,730	marzo a origen	Según cartera topografica
5+900				10,095		100,770	marzo a origen	Según cartera topografica
5+910				10,203		101,490	marzo a origen	Según cartera topografica
5+920				10,261		102,320	marzo a origen	Según cartera topografica
5+930				10,313		102,870	marzo a origen	Según cartera topografica
5+940				10,222		102,675	marzo a origen	Según cartera topografica
5+950				10,048		101,350	marzo a origen	Según cartera topografica
5+960				9,919		99,835	marzo a origen	Según cartera topografica
5+970				9,753		98,360	marzo a origen	Según cartera topografica
5+980				9,635		96,940	marzo a origen	Según cartera topografica
5+990				9,463		95,490	marzo a origen	Según cartera topografica
6+000				9,649		95,560	marzo a origen	Según cartera topografica
6+100				9,056		93,525	marzo a origen	Según cartera topografica
6+200				9,165		91,105	marzo a origen	Según cartera topografica
6+300				9,324		92,445	marzo a origen	Según cartera topografica
6+400				9,444		93,840	marzo a origen	Según cartera topografica
6+500				9,926		96,850	marzo a origen	Según cartera topografica
6+600				9,929		99,275	marzo a origen	Según cartera topografica
6+700				10,163		100,460	marzo a origen	Según cartera topografica
6+800				9,757		99,600	marzo a origen	Según cartera topografica
6+900				10,257		100,070	marzo a origen	Según cartera topografica
6+100				10,136		101,965	marzo a origen	Según cartera topografica
6+110				9,054		95,950	marzo a origen	Según cartera topografica
6+120				10,207		96,305	marzo a origen	Según cartera topografica
6+130				9,382		97,945	marzo a origen	Según cartera topografica
6+140				9,648		95,150	marzo a origen	Según cartera topografica
6+150				9,662		96,550	marzo a origen	Según cartera topografica
6+160				9,457		95,595	marzo a origen	Según cartera topografica
6+170				10,083		97,700	marzo a origen	Según cartera topografica
6+180				9,240		96,615	marzo a origen	Según cartera topografica
6+190				9,393		93,165	marzo a origen	Según cartera topografica
6+200				9,581		94,870	marzo a origen	Según cartera topografica
6+210				9,617		95,990	marzo a origen	Según cartera topografica
6+220				10,001		98,090	marzo a origen	Según cartera topografica
6+230				9,828		99,145	marzo a origen	Según cartera topografica
6+240				10,006		99,170	marzo a origen	Según cartera topografica
6+250				10,676		103,410	marzo a origen	Según cartera topografica
6+260				9,339		100,075	marzo a origen	Según cartera topografica
6+270				10,877		101,080	marzo a origen	Según cartera topografica
6+280				9,983		104,300	marzo a origen	Según cartera topografica
6+290				9,499		97,410	marzo a origen	Según cartera topografica
6+300				10,237		98,680	marzo a origen	Según cartera topografica
6+310				9,613		99,250	marzo a origen	Según cartera topografica
6+320				9,812		97,125	marzo a origen	Según cartera topografica
6+330				12,555		111,835	marzo a origen	Según cartera topografica
6+340				10,022		112,885	marzo a origen	Según cartera topografica
6+350				10,656		103,390	marzo a origen	Según cartera topografica
6+360				12,143		113,995	marzo a origen	Según cartera topografica
6+370				11,601		118,720	marzo a origen	Según cartera topografica
6+380				10,743		111,720	marzo a origen	Según cartera topografica
6+390				10,702		107,225	marzo a origen	Según cartera topografica
6+400				10,468		105,850	marzo a origen	Según cartera topografica
6+410				11,441		109,545	marzo a origen	Según cartera topografica
6+420				10,085		107,630	marzo a origen	Según cartera topografica
6+430				12,636		113,605	marzo a origen	Según cartera topografica
6+440				9,930		112,830	marzo a origen	Según cartera topografica
6+450				9,969		99,495	marzo a origen	Según cartera topografica
6+460				9,170		95,695	marzo a origen	Según cartera topografica
6+470				13,107		111,385	marzo a origen	Según cartera topografica
6+480				11,956		125,315	marzo a origen	Según cartera topografica
6+490				11,720		118,380	marzo a origen	Según cartera topografica
6+500				10,292		110,060	marzo a origen	Según cartera topografica
6+510				10,657		104,745	marzo a origen	Según cartera topografica
6+520				9,995		103,260	marzo a origen	Según cartera topografica
6+530				11,680		108,375	marzo a origen	Según cartera topografica
6+540				10,409		110,445	marzo a origen	Según cartera topografica
6+550				10,757		105,830	marzo a origen	Según cartera topografica
6+560				10,619		106,880	marzo a origen	Según cartera topografica
6+570				12,267		114,430	marzo a origen	Según cartera topografica
6+580				11,321		117,940	marzo a origen	Según cartera topografica
6+590				11,174		112,475	marzo a origen	Según cartera topografica
6+600				11,570		113,720	marzo a origen	Según cartera topografica
6+610				11,614		115,920	marzo a origen	Según cartera topografica

6+620				11,614		116,140	marzo a origen	Según cartera topografica
6+630				12,030		118,220	marzo a origen	Según cartera topografica
6+640				10,974		115,020	marzo a origen	Según cartera topografica
6+650				11,221		110,975	marzo a origen	Según cartera topografica
6+660				12,113		116,670	marzo a origen	Según cartera topografica
6+670				10,904		115,085	marzo a origen	Según cartera topografica
6+680				10,951		109,275	marzo a origen	Según cartera topografica
6+690				11,921		114,360	marzo a origen	Según cartera topografica
6+700				11,923		119,220	marzo a origen	Según cartera topografica
1+910				4,980		24,900	marzo a origen	Según cartera topografica
1+920				6,612		57,960	marzo a origen	Según cartera topografica
1+930				11,887		92,495	marzo a origen	Según cartera topografica
1+940				3,890		78,885	marzo a origen	Según cartera topografica
1+950				2,789		33,395	marzo a origen	Según cartera topografica
1+960				2,713		27,510	marzo a origen	Según cartera topografica
1+970				3,356		30,345	marzo a origen	Según cartera topografica
1+980				3,841		35,985	marzo a origen	Según cartera topografica
1+990				5,523		46,820	marzo a origen	Según cartera topografica
0+110				6,579		32,895	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°
0+120				6,584		65,815	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°
0+130				9,202		78,930	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°
0+140				6,827		80,145	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°
0+150				7,622		72,245	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°
0+160				7,048		73,350	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°
0+170				7,974		75,110	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°
0+180				6,120		70,470	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°
0+190				7,281		67,005	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°
0+200				6,743		70,120	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°
0+210				6,846		67,945	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°
0+220				9,739		82,925	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°
0+230				6,776		82,575	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°
0+240				7,994		73,850	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°
0+250				8,814		84,040	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°
0+260				8,005		84,095	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°
0+270				7,587		77,960	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°
0+280				6,173		68,800	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°
0+290				7,283		67,280	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°
0+300				0,000		36,415	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°
				1,715				
0+360				2,275		19,950	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°
0+370				1,800		20,375	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°
0+380				1,850		18,250	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°
0+390				1,850		18,500	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°
0+400				1,725		17,875	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°
0+410				1,175		14,500	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°
0+420				0,500		8,375	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°
0+430				0,500		5,000	marzo a origen	Según cartera topografica, ramal 90°
3+644	3+675		31,000	23,000	0,500	356,500	marzo a origen	
3+930	3+960		30,000	8,400	0,500	126,000	marzo a origen	
3+990	4+030		40,000	20,000	0,500	400,000	marzo a origen	
4+230	4+270		40,000	18,000	0,500	360,000	marzo a origen	
4+350	4+370		20,000	19,600	0,500	196,000	marzo a origen	
				11,152				
5+610				11,144		111,480	marzo a origen	Según cartera topografica
5+620				10,398		107,710	marzo a origen	Según cartera topografica
5+630				10,029		102,135	marzo a origen	Según cartera topografica
5+640				10,257		101,430	marzo a origen	Según cartera topografica
5+650				9,922		100,895	marzo a origen	Según cartera topografica
				2,475				
3+690				2,440		24,575	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello pedraplén
3+700				2,443		24,415	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello pedraplén
3+710				2,418		24,305	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello pedraplén
3+720				2,379		23,985	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello pedraplén
3+730				2,394		23,865	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello pedraplén
3+740				2,367		23,805	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello pedraplén
3+750				2,364		23,655	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello pedraplén
3+760				2,356		23,600	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello pedraplén
3+770				2,360		23,580	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello pedraplén
3+780				2,360		23,600	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello pedraplén
3+790				2,316		23,380	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello pedraplén
3+800				2,298		23,070	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello pedraplén
3+810				2,252		22,750	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello pedraplén
3+820				2,284		22,680	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello pedraplén

3+830				2,280		22,820	marzo a origen	Según cartera topografica - Sello pedraplén
3+840				2,259		22,695	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
3+850				2,238		22,485	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
3+860				2,221		22,295	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
3+870				2,211		22,160	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
3+880				2,177		21,940	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
				1,786				
4+380				1,819		18,025	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+390				1,818		18,185	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+400				1,793		18,055	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+410				1,78		17,865	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+420				1,77		17,750	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+430				1,745		17,575	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+440				1,8		17,725	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+450				1,887		18,435	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+460				1,931		19,090	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+490				2,183		21,515	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+500				2,179		21,810	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+510				2,351		22,650	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+520				2,377		23,640	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+530				2,366		23,715	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+540				2,351		23,585	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+550				2,318		23,345	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+560				2,293		23,055	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+570				2,301		22,970	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+580				2,305		23,030	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+590				2,308		23,065	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+600				2,322		23,150	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
1+730	1+770	E	6,000	3,000	0,500	9,000	3/03/2022	Construcción via fallo. Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
1+730	1+770	E	5,500	5,700	0,750	23,513	3/03/2022	Construcción via fallo. Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
1+730	1+770	E	2,400	2,000	0,700	3,360	3/03/2022	Construcción via fallo. Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
3+705	3+735	E	30,000	10,300	0,500	154,500	14/03/2022	Construcción via fallo. Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
3+960	3+980	D	20,000	7,000	0,500	70,000	22/03/2022	Construcción via fallo. Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+850	4+850	E	35,000	2,900	1,000	101,500	28/02/2022	Construcción via fallo. Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+349	4+349	E	16,000	4,000	1,000	64,000	23/03/2022	construccion obra No.32. Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+349	4+349	E	19,000	4,000	0,800	60,800	24/03/2022	construccion obra No.32. Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+354	4+354	E	35,000	3,000	0,150	15,750	25/03/2022	construccion obra No.32. Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades

6+333	6+333	E	1,000	22,500	0,500	11,250	1/03/2022	construccion obra 50, Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
6+333	6+333	E	22,500	1,000	0,500	11,250	2/03/2022	construccion obra 50. Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
						560,060	Enero	fallos enero
						997,750	Enero	obras enero
						695,000	Feberero	fallos febrero
						468,500	Feberero	obras febrero
						-5889,000	Cobro febrero	Según actas de pago
						-9954,000	Cobro Enero	Según actas de pago
					SUBTOTAL	**13865,37**		
						LONGITUD PARA PAGO		13865,37
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		**-0,36**
						LONGITUD TOTAL PARA PAGO :		**13865,00** m^3

ING. ALEXIS ANDRES BLANCO CORONEL
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 08202139785ATL

JUAN ROBERTO DIAZ VELANDIA
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 25202 17653CND

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ene-2022 a 25-feb-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
221.1P	Material para pedraplén	M3	0,00	0,00	0,00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ARE (m²)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
				13,117				
3+690				12,208		164,613	marzo a origen	Según cartera topografica
3+700				12,203		158,672	marzo a origen	Según cartera topografica
3+710				12,089		157,898	marzo a origen	Según cartera topografica
3+720				11,892		155,877	marzo a origen	Según cartera topografica
3+730				11,971		155,110	marzo a origen	Según cartera topografica
3+740				11,835		154,739	marzo a origen	Según cartera topografica
3+750				11,817		153,738	marzo a origen	Según cartera topografica
3+760				11,780		153,381	marzo a origen	Según cartera topografica
3+770				11,795		153,238	marzo a origen	Según cartera topografica
3+780				11,792		153,316	marzo a origen	Según cartera topografica
3+790				11,582		151,931	marzo a origen	Según cartera topografica
3+800				11,485		149,936	marzo a origen	Según cartera topografica
3+810				11,260		147,843	marzo a origen	Según cartera topografica
3+820				11,424		147,446	marzo a origen	Según cartera topografica
3+830				11,398		148,343	marzo a origen	Según cartera topografica
3+840				11,284		147,433	marzo a origen	Según cartera topografica
3+850				11,184		146,042	marzo a origen	Según cartera topografica
3+860				11,104		144,872	marzo a origen	Según cartera topografica
3+870				11,062		144,079	marzo a origen	Según cartera topografica
3+880				10,879		142,617	marzo a origen	Según cartera topografica
				8,932				
4+380				9,099		117,202	marzo a origen	Según cartera topografica
4+390				9,095		118,261	marzo a origen	Según cartera topografica
4+400				8,965		117,390	marzo a origen	Según cartera topografica
4+410				8,898		116,110	marzo a origen	Según cartera topografica
4+420				8,858		115,414	marzo a origen	Según cartera topografica
4+430				8,724		114,283	marzo a origen	Según cartera topografica
4+440				9,001		115,213	marzo a origen	Según cartera topografica
4+450				9,437		119,847	marzo a origen	Según cartera topografica
4+460				9,658		124,118	marzo a origen	Según cartera topografica
4+470				9,871		126,939	marzo a origen	Según cartera topografica
4+480				10,600		133,062	marzo a origen	Según cartera topografica
4+490				10,914		139,841	marzo a origen	Según cartera topografica
4+500				11,232		143,949	marzo a origen	Según cartera topografica
4+510				11,757		149,429	marzo a origen	Según cartera topografica
4+520				11,865		153,543	marzo a origen	Según cartera topografica
4+530				11,825		153,985	marzo a origen	Según cartera topografica
4+540				11,752		153,251	marzo a origen	Según cartera topografica
4+550				11,590		151,723	marzo a origen	Según cartera topografica
4+560				12,152		154,323	marzo a origen	Según cartera topografica
4+570				11,505		153,771	marzo a origen	Según cartera topografica
4+580				11,525		149,695	marzo a origen	Según cartera topografica
4+590				11,544		149,949	marzo a origen	Según cartera topografica
4+600				11,610		150,501	marzo a origen	Según cartera topografica
				12,743				
4+790				11,984		160,726	marzo a origen	Según cartera topografica
4+800				11,292		151,294	marzo a origen	Según cartera topografica
4+810				12,210		152,763	marzo a origen	Según cartera topografica
4+820				11,773		155,890	marzo a origen	Según cartera topografica
4+830				11,176		149,169	marzo a origen	Según cartera topografica
4+840				12,075		151,132	marzo a origen	Según cartera topografica
4+850				10,726		148,207	marzo a origen	Según cartera topografica
4+860				10,326		136,838	marzo a origen	Según cartera topografica
4+870				10,768		137,111	marzo a origen	Según cartera topografica
4+880				9,978		134,849	marzo a origen	Según cartera topografica
4+890				10,119		130,631	marzo a origen	Según cartera topografica
				10,537				

5+040				11,241		141,557	marzo a origen	Según cartera topografica
5+050				11,303		146,536	marzo a origen	Según cartera topografica
5+060				12,311		153,491	marzo a origen	Según cartera topografica
5+070				12,098		158,659	marzo a origen	Según cartera topografica
5+080				13,258		164,814	marzo a origen	Según cartera topografica
5+090				13,819		176,001	marzo a origen	Según cartera topografica
5+100				14,282		182,657	marzo a origen	Según cartera topografica
5+110				12,964		177,099	marzo a origen	Según cartera topografica
5+120				12,677		166,667	marzo a origen	Según cartera topografica
5+130				12,850		165,926	marzo a origen	Según cartera topografica
5+140				13,224		169,481	marzo a origen	Según cartera topografica
5+150				13,531		173,908	marzo a origen	Según cartera topografica
				15,228				
5+180				18,304		217,958	marzo a origen	Según cartera topografica
5+190				18,004		236,002	marzo a origen	Según cartera topografica
5+200				17,977		233,877	marzo a origen	Según cartera topografica
5+210				13,384		203,847	marzo a origen	Según cartera topografica
5+220				12,304		166,972	marzo a origen	Según cartera topografica
5+230				12,057		158,347	marzo a origen	Según cartera topografica
5+240				12,513		159,705	marzo a origen	Según cartera topografica
5+250				13,937		171,925	marzo a origen	Según cartera topografica
5+260				12,761		173,537	marzo a origen	Según cartera topografica
5+270				11,947		160,602	marzo a origen	Según cartera topografica
5+280				8,856		135,220	marzo a origen	Según cartera topografica
5+290				9,866		121,693	marzo a origen	Según cartera topografica
5+300				10,283		130,969	marzo a origen	Según cartera topografica
5+310				9,716		129,994	marzo a origen	Según cartera topografica
5+320				9,638		125,801	marzo a origen	Según cartera topografica
5+330				9,862		126,750	marzo a origen	Según cartera topografica
5+340				9,799		127,797	marzo a origen	Según cartera topografica
5+350				9,712		126,822	marzo a origen	Según cartera topografica
5+360				9,475		124,716	marzo a origen	Según cartera topografica
5+370				9,198		121,375	marzo a origen	Según cartera topografica
5+380				8,971		118,099	marzo a origen	Según cartera topografica
5+390				9,226		118,281	marzo a origen	Según cartera topografica
5+400				10,527		128,395	marzo a origen	Según cartera topografica
5+410				13,795		158,093	marzo a origen	Según cartera topografica
5+420				13,304		176,144	marzo a origen	Según cartera topografica
5+430				12,509		167,785	marzo a origen	Según cartera topografica
5+440				12,684		163,755	marzo a origen	Según cartera topografica
5+450				11,248		155,558	marzo a origen	Según cartera topografica
5+460				10,913		144,047	marzo a origen	Según cartera topografica
5+470				11,086		142,994	marzo a origen	Según cartera topografica
5+480				9,894		136,370	marzo a origen	Según cartera topografica
5+490				12,740		147,121	marzo a origen	Según cartera topografica
5+500				11,813		159,595	marzo a origen	Según cartera topografica
5+510				12,011		154,856	marzo a origen	Según cartera topografica
5+520				15,298		177,509	marzo a origen	Según cartera topografica
5+530				18,224		217,893	marzo a origen	Según cartera topografica
5+540				17,093		229,561	marzo a origen	Según cartera topografica
				9,936				
5+670				10,189		130,813	marzo a origen	Según cartera topografica
5+680				10,066		131,658	marzo a origen	Según cartera topografica
5+690				10,132		131,287	marzo a origen	Según cartera topografica
5+700				9,994		130,819	marzo a origen	Según cartera topografica
5+710				9,739		128,265	marzo a origen	Según cartera topografica
5+720				9,822		127,147	marzo a origen	Según cartera topografica
5+730				9,702		126,906	marzo a origen	Según cartera topografica
5+740				9,639		125,717	marzo a origen	Según cartera topografica
5+750				9,472		124,222	marzo a origen	Según cartera topografica
5+760				9,283		121,908	marzo a origen	Según cartera topografica
5+770				9,369		121,238	marzo a origen	Según cartera topografica
5+780				9,393		121,953	marzo a origen	Según cartera topografica
5+790				9,428		122,337	marzo a origen	Según cartera topografica
5+800				9,478		122,889	marzo a origen	Según cartera topografica
5+810				9,677		124,508	marzo a origen	Según cartera topografica
5+820				9,788		126,523	marzo a origen	Según cartera topografica
5+830				9,754		127,023	marzo a origen	Según cartera topografica
5+840				10,009		128,460	marzo a origen	Según cartera topografica
5+850				10,154		131,060	marzo a origen	Según cartera topografica
5+860				10,326		133,120	marzo a origen	Según cartera topografica
5+870				10,286		133,978	marzo a origen	Según cartera topografica
5+880				10,087		132,425	marzo a origen	Según cartera topografica

5+890				10,059		130,949	marzo a origen	Según cartera topografica
5+900				10,095		131,001	marzo a origen	Según cartera topografica
5+910				10,203		131,937	marzo a origen	Según cartera topografica
5+920				10,261		133,016	marzo a origen	Según cartera topografica
5+930				10,313		133,731	marzo a origen	Según cartera topografica
5+940				10,222		133,478	marzo a origen	Según cartera topografica
5+950				10,048		131,755	marzo a origen	Según cartera topografica
5+960				9,919		129,786	marzo a origen	Según cartera topografica
5+970				9,753		127,868	marzo a origen	Según cartera topografica
5+980				9,635		126,022	marzo a origen	Según cartera topografica
5+990				9,463		124,137	marzo a origen	Según cartera topografica
6+000				9,649		124,228	marzo a origen	Según cartera topografica
6+010				9,056		121,583	marzo a origen	Según cartera topografica
6+020				9,165		118,437	marzo a origen	Según cartera topografica
6+030				9,324		120,179	marzo a origen	Según cartera topografica
6+040				9,444		121,992	marzo a origen	Según cartera topografica
6+050				9,926		125,905	marzo a origen	Según cartera topografica
6+060				9,929		129,058	marzo a origen	Según cartera topografica
6+070				10,163		130,598	marzo a origen	Según cartera topografica
6+080				9,757		129,480	marzo a origen	Según cartera topografica
6+090				10,257		130,091	marzo a origen	Según cartera topografica
6+100				10,136		132,555	marzo a origen	Según cartera topografica
6+110				9,054		124,735	marzo a origen	Según cartera topografica
6+120				10,207		125,197	marzo a origen	Según cartera topografica
6+130				9,382		127,329	marzo a origen	Según cartera topografica
6+140				9,648		123,695	marzo a origen	Según cartera topografica
6+150				9,662		125,515	marzo a origen	Según cartera topografica
6+160				9,457		124,274	marzo a origen	Según cartera topografica
6+170				10,083		127,010	marzo a origen	Según cartera topografica
6+180				9,240		125,600	marzo a origen	Según cartera topografica
6+190				9,393		121,115	marzo a origen	Según cartera topografica
6+200				9,581		123,331	marzo a origen	Según cartera topografica
6+210				9,617		124,787	marzo a origen	Según cartera topografica
6+220				10,001		127,517	marzo a origen	Según cartera topografica
6+230				9,828		128,889	marzo a origen	Según cartera topografica
6+240				10,006		128,921	marzo a origen	Según cartera topografica
6+250				10,676		134,433	marzo a origen	Según cartera topografica
6+260				9,339		130,098	marzo a origen	Según cartera topografica
6+270				10,877		131,404	marzo a origen	Según cartera topografica
6+280				9,983		135,590	marzo a origen	Según cartera topografica
6+290				9,499		126,633	marzo a origen	Según cartera topografica
6+300				10,237		128,284	marzo a origen	Según cartera topografica
6+310				9,613		129,025	marzo a origen	Según cartera topografica
6+320				9,812		126,263	marzo a origen	Según cartera topografica
6+330				12,555		145,386	marzo a origen	Según cartera topografica
6+340				10,022		146,751	marzo a origen	Según cartera topografica
6+350				10,656		134,407	marzo a origen	Según cartera topografica
6+360				12,143		148,194	marzo a origen	Según cartera topografica
6+370				11,601		154,336	marzo a origen	Según cartera topografica
6+380				10,743		145,236	marzo a origen	Según cartera topografica
6+390				10,702		139,393	marzo a origen	Según cartera topografica
6+400				10,468		137,605	marzo a origen	Según cartera topografica
6+410				11,441		142,409	marzo a origen	Según cartera topografica
6+420				10,085		139,919	marzo a origen	Según cartera topografica
6+430				12,636		147,687	marzo a origen	Según cartera topografica
6+440				9,930		146,679	marzo a origen	Según cartera topografica
6+450				9,969		129,344	marzo a origen	Según cartera topografica
6+460				9,170		124,404	marzo a origen	Según cartera topografica
6+470				13,107		144,801	marzo a origen	Según cartera topografica
6+480				11,956		162,910	marzo a origen	Según cartera topografica
6+490						153,894	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
6+500						143,078	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
6+510						136,169	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
6+520						134,238	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
6+530						140,888	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
6+540						143,579	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
6+550						137,579	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades

6+560						138,944	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
6+570						148,759	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
6+580						153,322	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
6+590						146,218	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
6+600						147,836	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
6+610						150,696	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
6+620						150,982	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
6+630						153,686	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
6+640						149,526	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
6+650						144,268	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
6+660						151,671	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
6+670						149,611	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
6+680						142,058	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
6+690						148,668	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
6+700						154,986	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
1+910						32,370	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
1+920						75,348	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
1+930						120,244	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
1+940						102,551	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
1+950						43,414	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
1+960						35,763	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
1+970						39,449	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
1+980						46,781	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
1+990						60,866	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
1+100						42,764	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
1+200						85,560	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
1+300						102,609	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
1+400						104,189	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
1+500						93,919	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
1+600						95,355	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
1+700						97,643	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
1+800						91,611	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
1+900						87,107	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
2+000						91,156	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
2+100						88,329	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
2+200						107,803	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
2+300						107,348	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
2+400						96,005	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
2+500						109,252	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
2+600						109,324	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades

2+700						101,348	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
2+800						89,440	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
2+900						87,464	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
3+000						47,340	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
0+360						25,935	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
0+370						26,488	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
0+380						23,725	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
0+390						24,050	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
0+400						23,238	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
0+410						18,850	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
0+420						10,888	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
0+430						6,500	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
3+644	3+675		31,000	23,000	0,500	463,450	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
3+930	3+960		30,000	8,400	0,500	163,800	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
3+990	4+030		40,000	20,000	0,500	520,000	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+230	4+270		40,000	18,000	0,500	468,000	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+350	4+370		20,000	19,600	0,500	254,800	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
5+610						144,924	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
5+620						140,023	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
5+630						132,776	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
5+640						131,859	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
5+650						131,164	marzo a origen	Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
3+690						31,948	marzo a origen	Sello pedraplén, Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
3+700						31,740	marzo a origen	Sello pedraplén, Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
3+710						31,597	marzo a origen	Sello pedraplén, Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
3+720						31,181	marzo a origen	Sello pedraplén, Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
3+730						31,025	marzo a origen	Sello pedraplén, Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
3+740						30,947	marzo a origen	Sello pedraplén, Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
3+750						30,752	marzo a origen	Sello pedraplén, Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
3+760						30,680	marzo a origen	Sello pedraplén, Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
3+770						30,654	marzo a origen	Sello pedraplén, Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
3+780						30,680	marzo a origen	Sello pedraplén, Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades

3+790						30,394	marzo a origen	Sello pedraplén, Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
3+800						29,991	marzo a origen	Sello pedraplén, Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
3+810						29,575	marzo a origen	Sello pedraplén, Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
3+820						29,484	marzo a origen	Sello pedraplén, Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
3+830						29,666	marzo a origen	Sello pedraplén, Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
3+840						29,504	marzo a origen	Sello pedraplén, Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
3+850						29,231	marzo a origen	Sello pedraplén, Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
3+860						28,984	marzo a origen	Sello pedraplén, Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
3+870						28,808	marzo a origen	Sello pedraplén, Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
3+880						28,522	marzo a origen	Sello pedraplén, Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+380						23,433	marzo a origen	Sello pedraplén, Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+390						23,641	marzo a origen	Sello pedraplén, Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+400						23,472	marzo a origen	Sello pedraplén, Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+410						23,225	marzo a origen	Sello pedraplén, Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+420						23,075	marzo a origen	Sello pedraplén, Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+430						22,848	marzo a origen	Sello pedraplén, Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+440						23,043	marzo a origen	Sello pedraplén, Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+450						23,966	marzo a origen	Sello pedraplén, Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+460						24,817	marzo a origen	Sello pedraplén, Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+490						27,970	marzo a origen	Sello pedraplén, Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+500						28,353	marzo a origen	Sello pedraplén, Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+510						29,445	marzo a origen	Sello pedraplén, Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+520						30,732	marzo a origen	Sello pedraplén, Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+530						30,830	marzo a origen	Sello pedraplén, Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+540						30,661	marzo a origen	Sello pedraplén, Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+550						30,349	marzo a origen	Sello pedraplén, Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+560						29,972	marzo a origen	Sello pedraplén, Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+570						29,861	marzo a origen	Sello pedraplén, Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades

4+580						29,939	marzo a origen	Sello pedraplén, Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+590						29,985	marzo a origen	Sello pedraplén, Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+600						30,095	marzo a origen	Sello pedraplén, Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
1+730	1+770	E	6,000	3,000	0,500	11,700	3/03/2022	Construcción via fallo. Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
1+730	1+770	E	5,500	5,700	0,750	30,566	3/03/2022	Construcción via fallo. Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
1+730	1+770	E	2,400	2,000	0,700	4,368	3/03/2022	Construcción via fallo. Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
3+705	3+735	E	30,000	10,300	0,500	200,850	14/03/2022	Construcción via fallo. Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
3+960	3+980	D	20,000	7,000	0,500	91,000	22/03/2022	Construcción via fallo. Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+850	4+850	E	35,000	2,900	1,000	131,950	28/02/2022	Construcción via fallo. Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+349	4+349	E	16,000	4,000	1,000	83,200	23/03/2022	construccion obra No.32. Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+349	4+349	E	19,000	4,000	0,800	79,040	24/03/2022	construccion obra No.32. Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+354	4+354	E	35,000	3,000	0,150	20,475	25/03/2022	construccion obra No.32. Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
6+333	6+333	E	1,000	22,500	0,500	14,625	1/03/2022	construccion obra 50, Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
6+333	6+333	E	22,500	1,000	0,500	14,625	2/03/2022	construccion obra 50. Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
						728,080	Enero	fallos enero
						1297,080	Enero	obras enero
						868,750	Feberero	fallos febrero
						496,730	Feberero	obras febrero
						-7361,650	Cobro febrero	Según actas de pago
						-14430,947	Cobro Enero	Según actas de pago

					SUBTOTAL	**7897,44**									
						LONGITUD PARA PAGO					7897,44				
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN					**-0,44**				
						LONGITUD TOTAL PARA PAGO :					**7897,00**	**m^3**			

ING. ALEXIS ANDRES BLANCO CORONEL
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 08202139785ATL

JUAN ROBERTO DIAZ VELANDIA
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 25202 17653CND

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ene-2022 a 25-feb-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3/Km	0,00	991.770,00	991.770,00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	MATERIAL	VOLUMEN (m3)	DISTANCIA (Km)	VOLUMEN (M3/KM)	FECHA	DESCRIPCIÓN
		E	Terraplén	1352,57	26,00	35.166,82	25/03/2022	Cantera Suiza
		E	Terraplén	14432,73	30,50	440.198,27	25/03/2022	Cantera Pinos F3
		E	Terraplén	12620,97	26,00	328.145,22	25/03/2022	Cantera Pinos F4
		E	Pedraplén	771,13	7,50	5.783,48	25/03/2022	Cantera Quinta
		E	Pedraplén	1179,88	22,20	26.193,34	25/03/2022	Cantera Resaca
		E	Pedraplén	3340,10	24,28	81.097,63	25/03/2022	Cantera Resaca
		E	Pedraplén	798,15	26,35	21.031,25	25/03/2022	Cantera Resaca
		E	Pedraplén	540,58	29,90	16.163,34	25/03/2022	Cantera Pinos
		E	Pedraplén	1118,45	30,50	34.112,73	25/03/2022	Cantera Pinos
		E	Pedraplén	149,16	26,00	3.878,16	25/03/2022	Cantera Pinos
					SUBTOTAL	**991.770,22**		

LONGITUD PARA PAGO	991770,22
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	**-0,22**
LONGITUD TOTAL PARA PAGO :	**991770,00** m3/km

ING. ALEXIS ANDRES BLANCO CORONEL
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 08202139785ATL

JUAN ROBERTO DIAZ VELANDIA
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 25202 17653CND

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45A04 **FECHA:** 26-feb-2022 a 25-mar-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
421-13	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0,00	6.702,00	6.702,00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN
62+857.55	62+869.47	I	11,92	3,19		38,02	28/02/2022	parche 209
62+919.77	62+941.17	I	21,40	3,07		65,70	28/02/2022	parhce 208
62+968.5	62+976.7	I	8,20	2,00		16,40	28/02/2022	parche 210
62+976.7	62+982.55	I	5,85	3,09		18,08	28/02/2022	parhce 210
61+885.1	61+897.65	I	12,55	3,36		42,17	28/02/2022	parhce 216
61+905.95	61+929.1	D	23,15	3,38		78,25	28/02/2022	parhce 215
61+962.7	61+969.5	D	6,80	3,54		24,07	28/02/2022	parhce 214
61+969.5	61+977.1	D	7,60	2,00		15,20	28/02/2022	parhce 214
62+94	62+128.85	D	34,85	3,40		118,49	28/02/2022	parhce 213
62+150.3	62+185.15	D	34,85	3,57		124,41	28/02/2022	parhce 212
62+271.65	62+291.1	I	19,45	2,00		38,90	28/02/2022	parhce 211
61+446.6	61+455.95	D	9,35	2,00		18,70	1/03/2022	parhce 221
61+455.95	61+503.35	D	47,40	3,59		170,17	1/03/2022	parhce 221- ontinuacion
61+503.35	61+525.55	D	22,20	2,00		44,40	1/03/2022	parhce 221 - continuacion
61+525.55	61+542.2	D	16,65	3,63		60,44	1/03/2022	parhce 221 - continuacion
61+561.5	61+566.1	D	4,60	2,00		9,20	1/03/2022	parhce 220
61+566.1	61+576.7	D	10,60	3,50		37,10	1/03/2022	parhce 220- continaucon
61+576.7	61+608.4	D	31,70	2,00		63,40	1/03/2022	parhce 2220- continuaicon
61+608.4	61+627.05	D	18,65	2,00		37,30	1/03/2022	parhce 2220-cpontinuaocn
61+694	61+715.5	D	21,50	2,00		43,00	1/03/2022	parhce 219
61+800	61+810.65	D	10,65	2,00		21,30	1/03/2022	parhce 218
61+810.65	61+820.9	D	10,25	3,57		36,59	1/03/2022	parhce 218 - continaucion
61+820.9	61+830.6	D	9,70	2,00		19,40	1/03/2022	parhce 218 continuacion
61+931.9	61+943.8	D	11,90	2,00		23,80	1/03/2022	parche 217
61+171.1	61+181	D	9,90	3,50		34,65	2/03/2022	PARHCE 223
61+413.05	61+421.93	D	8,88	2,00		17,76	2/03/2022	PARHCE 227
61+413.05	61+437.72	D	24,67	3,61		89,06	2/03/2022	PARHCE 227 CONTINAUCION
61+421.88	61+432.35	D	10,47	3,33		34,87	2/03/2022	PARHCE 222
61+432.35	61+442.85	D	10,50	2,00		21,00	2/03/2022	PARHCE 222 CONTINUACION
61+532.66	61+551.16	D	18,50	2,00		37,00	2/03/2022	PARHCE 226
61+532.66	61+535.66	D	3,00	2,00		6,00	2/03/2022	PARHCE 226 CONRINUAICON
61+532.66	61+543	D	10,34	3,64		37,64	2/03/2022	PARCHE 226 CONTINAUCION
60+457.15	60+465	D	7,85	2,00		15,70	2/03/2022	PARHCE 225
60+651.25	60+663.9	D	12,65	3,74		47,31	2/03/2022	PARHCE 224
60+665.65	60+678.15	D	12,50	2,00		25,00	2/03/2022	PARHCE 224 CONTINAUCION
58+928	58+939.1	D	11,10	3,67		40,74	3/03/2022	parhce 236
58+932.07	58+942.4	D	10,33	3,84		39,67	3/03/2022	parhce 237
58+960.7	58+970.48	D	9,78	2,20		21,52	3/03/2022	parhce 235
58+972.46	58+976.42	D	3,96	3,48		13,78	3/03/2022	parhce 234
58+980.12	58+994	D	13,88	3,59		49,83	3/03/2022	parhce 2333
60+21.1	60+37.8	D	16,70	2,00		33,40	3/03/2022	parhce 229
60+21.1	60+52.9	D	31,80	3,51		111,62	3/03/2022	parhce 229
60+69.6	60+80.22	D	10,62	2,00		21,24	3/03/2022	parhce 228
59+601	59+614	D	13,00	4,00		52,00	3/03/2022	parhce 232
59+855.4	59+872.35	D	16,95	2,00		33,90	3/03/2022	parhce 231
59+982	59+989.85	D	7,85	2,00		15,70	3/03/2022	parhce 230
58+447.5	58+479.5	D	32,00	3,83		122,56	7/03/2022	parhce 245
58+632.07	58+663.62	D	31,55	3,85		121,47	7/03/2022	parhce 237
58+874.6	58+890.5	D	15,90	3,90		62,01	7/03/2022	parhce 244
59+53.55	59+63.55	I	10,00	2,00		20,00	7/03/2022	parhce 243
59+79.85	59+88.5	I	8,65	2,00		17,30	7/03/2022	parhce 242
59+238	59+249.5	I	11,50	2,00		23,00	7/03/2022	parhce 241
59+599.5	59+605.5	I	6,00	3,80		22,80	7/03/2022	parhce 240
59+634.5	59+641	I	6,50	3,55		23,08	7/03/2022	parhce 239
59+846.7	59+859	I	12,30	2,00		24,60	7/03/2022	parche 238
57+917.7	57+939.8	D	22,10	3,49		77,13	8/03/2022	parhce 252

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45A04 **FECHA:** 26-feb-2022 a 25-mar-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
421-13	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0,00	6.702,00	6.702,00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN
57+939.8	57+950	D	10,20	2,00		20,40	8/03/2022	parhce 252
58+11.31	58+23.76	D	12,45	3,60		44,82	8/03/2022	parhce 251
58+62.26	58+68.26	D	6,00	3,60		21,60	8/03/2022	parhce 250
58+185.76	58+197.66	D	11,90	2,00		23,80	8/03/2022	parhce 249
58+223.16	58+244.22	D	21,06	2,00		42,12	8/03/2022	parhce 248
58+259.22	58+280.72	D	21,50	2,00		43,00	8/03/2022	parche 247
58+375.92	58+392.92	D	17,00	2,00		34,00	8/03/2022	parhce 246
58+414.92	58+447.5	D	32,58	3,93		128,04	8/03/2022	parhce 245
57+517.13	57+525.88	D	8,75	3,55		31,06	9/03/2022	parhce 259
57+594.38	57+626.18	D	31,80	2,00		63,60	9/03/2022	parhce 258
57+631.88	57+637.06	D	5,18	2,00		10,36	9/03/2022	parhce 257
57+661.66	57+675.46	D	13,80	3,57		49,27	9/03/2022	parche 256
57+675.46	57+699.8	D	24,34	2,00		48,68	9/03/2022	parche 256
57+745.49	57+759	D	13,51	2,00		27,02	9/03/2022	parche 255
57+942.55	57+960.37	I	17,82	3,12		55,60	9/03/2022	parche 254
57+960.37	58+7.57	I	47,20	2,00		94,40	9/03/2022	parhce 254
58+7.57	58+15.82	I	8,25	3,35		27,64	9/03/2022	parhce 254
58+333	58+354	I	21,00	3,40		71,40	9/03/2022	parhce 253
57+347.73	57+355.63	D	7,90	4,07		32,15	10/03/2022	parche 266
57+355.63	57+368.63	D	13,00	2,00		26,00	10/03/2022	Parche 266 continuacion
57+368.63	57+391.93	D	23,30	2,00		46,60	10/03/2022	Parche 266 continuacion
57+417.63	57+427.43	D	9,80	2,00		19,60	10/03/2022	Parche 265
57+427.43	57+461.73	D	34,30	4,00		137,20	10/03/2022	Parche 265 continuacion
57+464	57+468.4	D	4,40	2,00		8,80	10/03/2022	Parche 264
57+484.63	57+490.63	D	6,00	2,00		12,00	10/03/2022	Parche 263
57+493.13	57+517.13	D	21,00	2,00		42,00	10/03/2022	Parche 259
57+703.9	57+746	D	42,10	2,00		84,20	10/03/2022	Parche 262
57+908.8	57+916.8	D	8,00	2,00		16,00	10/03/2022	Parche 261
57+916.8	57+925.3	D	8,50	3,40		28,90	10/03/2022	Parche 261
57+927.8	57+941.8	D	14,00	3,55		49,70	10/03/2022	Parche 260
57+306	57+312.45	D	6,45	3,58		23,09	11/03/2022	parhce 272
57+312.45	57+325.25	D	12,80	2,00		25,60	11/03/2022	parhce 272
57+347.77	57+371.62	D	23,85	2,00		47,70	11/03/2022	parhce 266
57+425.65	57+431.45	I	5,80	3,50		20,30	11/03/2022	parhce 271
57+466.25	57+477.4	I	11,15	2,00		22,30	11/03/2022	parhce 270
57+486.22	57+497.57	I	11,35	2,00		22,70	11/03/2022	parhce 269
57+503.85	57+508	I	4,15	2,00		8,30	11/03/2022	parhce 268
57+554.5	57+560	I	5,50	2,00		11,00	11/03/2022	parhce 267
57+24.15	57+30.55	D	6,40	2,00		12,80	14/03/2022	PARCHE 282
57+32.55	57+40.5	D	7,95	2,00		15,90	14/03/2022	PARCHE 281
57+50	57+59.5	D	9,50	2,00		19,00	14/03/2022	PARCHE 280
57+84.7	57+102	D	17,30	2,00		34,60	14/03/2022	PARCHE 279
57+108	57+117	D	9,00	2,00		18,00	14/03/2022	PARCHE 278
57+117	57+129.95	D	12,95	3,65		47,27	14/03/2022	PARCHE 278
57+130.9	57+142	I	11,10	3,64		40,40	14/03/2022	PARCHE 288
57+151.5	57+157.4	I	5,90	2,00		11,80	14/03/2022	PARCHE 287
57+171.87	57+185.17	D	13,30	2,00		26,60	14/03/2022	PARCHE 277
57+177.9	57+186.2	I	8,30	2,00		16,60	14/03/2022	PARCHE 286
57+185.17	57+188.79	D	3,62	2,00		7,24	14/03/2022	PARCHE 277
57+214	57+224.05	I	10,05	2,00		20,10	14/03/2022	PARCHE 285
57+222.72	57+226	D	3,28	2,00		6,56	14/03/2022	PARCHE 276
57+285.5	57+290.5	D	5,00	2,00		10,00	14/03/2022	PARCHE 275
57+311.45	57+315	I	3,55	2,00		7,10	14/03/2022	PARCHE 284
57+336	57+349.9	I	13,90	2,00		27,80	14/03/2022	PARCHE 274
57+358.75	57+371.65	I	12,90	3,40		43,86	14/03/2022	PARCHE 273
56+998	57+14.75	D	16,75	3,63		60,80	14/03/2022	PARCHE 283

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45A04 **FECHA:** 26-feb-2022 a 25-mar-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
421-13	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0,00	6.702,00	6.702,00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN
57+38.7	57+45.5	I	6,80	2,00		13,60	15/03/2022	OARCHE 292
57+69.46	57+75	I	5,54	2,00		11,08	15/03/2022	PARCHE 291
57+103.17	57+130.9	I	27,73	2,00		55,46	15/03/2022	PARCHE 289
56+7.7	56+22.37	I	14,67	2,00		29,34	15/03/2022	PARCHE 294
56+32.97	56+38.47	I	5,50	2,00		11,00	15/03/2022	PARCHE 293
56+38.47	56+46.5	I	8,03	2,00		16,06	15/03/2022	PARCHE 293
55+649.26	55+654.26	I	5,00	2,00		10,00	15/03/2022	PARCHE 302
55+699.26	55+710.96	I	11,70	2,00		23,40	15/03/2022	PARCHE 301
55+731.96	55+741.36	I	9,40	3,13		29,42	15/03/2022	PARCHE 300
55+941.5	55+955.9	I	14,90	3,02		45,00	15/03/2022	PARCHE 295
55+955.9	55+960.7	I	4,80	2,00		9,60	15/03/2022	PARCHE 295
57+190.81	57+196.51	I	5,70	2,00		11,40	15/03/2022	PARCHE 290
57+857.81	57+862.31	I	4,50	2,00		9,00	15/03/2022	PARCHE 298
57+870.81	57+873.97	I	3,16	2,00		6,32	15/03/2022	PARCHE 297
57+879.47	57+883.65	I	4,18	2,00		8,36	15/03/2022	PARCHE 296
57+883.65	57+902.5	I	18,85	3,00		56,55	15/03/2022	PARCHE 296
55+800.56	55+808.16	I	7,60	3,07		23,33	15/03/2022	PARCHE 299
55+808.16	55+812.81	I	4,65	2,00		9,30	15/03/2022	OARCHE 299
55+449.01	55+455.01	D	6,00	2,00		12,00	16/03/2022	Parche 311
55+455.01	55+509.91	D	54,90	3,40		186,66	16/03/2022	Parche 311
55+517.41	55+527.26	D	9,00	3,43		30,87	16/03/2022	parche 310
55526,+410	55535,+260	D	8,85	3,43		30,36	16/03/2022	parche 310
55535,+260	55540,+860	D	5,60	2,00		11,20	16/03/2022	parche 310
55+580.06	55+589.66	I	9,60	3,43		32,93	16/03/2022	Parche 309
55+605.86	55+615.26	I	9,40	3,35		31,49	16/03/2022	Parche 308
55+642.86	55+649.26	I	6,40	2,00		12,80	16/03/2022	PARCHE 302
55+890.92	55+899.22	D	8,30	2,00		16,60	16/03/2022	Parche 307
55+909.72	55+915.84	D	6,12	2,00		12,24	16/03/2022	Parche 306
55+923.84	55+929.99	D	6,15	2,00		12,30	16/03/2022	Parche 305
55+940.49	55+944.84	D	4,35	3,45		15,01	16/03/2022	Parche 304
55+950.15	55+969.5	D	19,35	2,00		38,70	16/03/2022	Parche 303
57+296	57+312.3	D	16,30	3,45		56,24	17/03/2022	parhce 313
55390,+100	55406,+750	D	16,65	2,00		33,30	17/03/2022	parche 312
55+360.05	55406,+750	D	46,70	3,37		157,38	17/03/2022	parhce 312
55+406.75	55+506.75	D	100,00	3,39		339,00	17/03/2022	parhce 312
54+940	54+949	D	9,00	2,00		18,00	22/03/2022	Parche 328
54+995.9	55+0	D	4,10	2,00		8,20	22/03/2022	parche 327
55+22.3	55+27.35	D	5,05	2,00		10,10	22/03/2022	parche 326
55+104.6	55+110.7	D	6,10	2,00		12,20	22/03/2022	parche 325
55+203	55+218.45	D	15,45	2,00		30,90	22/03/2022	parche 324
55+218.45	55+223.7	D	5,25	3,80		19,95	22/03/2022	parche 324
55+242.1	55+248.2	D	6,10	2,00		12,20	22/03/2022	parche 323
55+253.2	55+272.6	D	19,40	2,00		38,80	22/03/2022	parche 322
55+282.2	55+289.75	D	6,95	3,50		24,33	22/03/2022	parche 321
55+327.85	55+334.57	D	6,72	2,00		13,44	22/03/2022	parche 320
55+368.07	55+386.8	D	18,73	2,00		37,46	22/03/2022	parche 319
55+395.8	55+403.9	D	8,10	2,00		16,20	22/03/2022	parche 318
55+431.6	55+440.3	D	8,70	2,00		17,40	22/03/2022	parche 317
55+469.84	55+479.04	D	9,20	3,44		31,65	22/03/2022	parche 316
55+479.04	55+491.26	D	12,22	2,00		24,44	22/03/2022	parche 316
55+546.26	55+552.41	D	6,15	2,00		12,30	22/03/2022	parche 315
55+593.41	55+618.56	D	25,15	2,00		50,30	22/03/2022	parche 314
55+618.56	55+625.86	D	7,50	3,63		27,23	22/03/2022	parche 314
54+985.2	54+998.4	D	13,20	3,44		45,41	23/03/2022	parche 333
55+2.8	55+10.93	D	8,13	3,45		28,05	23/03/2022	parche 334
55+18.93	55+50.48	D	31,55	3,36		106,01	23/03/2022	parche 332

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45A04 **FECHA:** 26-feb-2022 a 25-mar-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
421-13	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	0,00	6.702,00	6.702,00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	AREA (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN
55+81.78	55+86.58	D	4,80	2,20		10,56	23/03/2022	parche 331
55+205.58	55+223.1	D	17,52	2,20		38,54	23/03/2022	parche 330+
55+223.1	55+252.35	D	29,25	3,37		98,57	23/03/2022	parche 330
55+266.35	55+295.4	D	29,05	3,33		96,74	23/03/2022	parche 329
55+526.41	55+531.91	D	5,50	2,00		11,00	23/03/2022	parche 310
55+531.91	55+540.61	D	8,70	3,43		29,84	23/03/2022	parche 310
					SUBTOTAL	6702,28		
						LONGITUD PARA PAGO		6702,28
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		-0,28
						LONGITUD TOTAL PARA PAGO :		6702,00 m³

ING. ALEXIS ANDRES BLANCO CORONEL
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 08202139785ATL

MARTHA LUCIA CORTES PULIDO
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 01195-0369 CPITVC

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45A04 **FECHA:** 26-feb-2022 a 25-mar-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
450.10P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25		0,00	987,40	987,40

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
62+857.55	62+869.47	I	11,92	3,19	0,15	5,70	28/02/2022	parhce 209
62+919.77	62+941.17	I	21,40	3,07	0,15	9,85	28/02/2022	parhce 208
62+968.5	62+976.7	I	8,20	2,00	0,15	2,46	28/02/2022	parhce 210
62+976.7	62+982.55	I	5,85	3,09	0,15	2,71	28/02/2022	parhce 210
61+885.1	61+897.65	I	12,55	3,36	0,15	6,33	28/02/2022	parche 216
61+905.95	61+929.1	D	23,15	3,38	0,15	11,74	28/02/2022	parche 215
61+962.7	61+969.5	D	6,80	3,54	0,15	3,61	28/02/2022	parhce 214
61+969.5	61+977.1	D	7,60	2,00	0,15	2,28	28/02/2022	parche 214
62+94	62+128.85	D	34,85	3,40	0,15	17,77	28/02/2022	parhce 213
62+150.3	62+185.15	D	34,85	3,57	0,15	18,66	28/02/2022	parhce 212
62+271.65	62+291.1	I	19,45	2,00	0,15	5,84	28/02/2022	parhce 211
61+446.6	61+455.95	D	9,35	2,00	0,15	2,81	1/03/2022	parhce 221
61+455.95	61+503.35	D	47,40	3,59	0,15	25,52	1/03/2022	parhce 21 - continuacion
61+503.35	61+525.55	D	22,20	2,00	0,15	6,66	1/03/2022	parhce 221 - copntinuacion
61+525.55	61+542.2	D	16,65	3,63	0,15	9,07	1/03/2022	parhce 221 - continuacion
61+561.5	61+566.1	D	4,60	2,00	0,15	1,38	1/03/2022	parhce 220
61+566.1	61+576.7	D	10,60	3,50	0,15	5,57	1/03/2022	parhce 220- continuacion
61+576.7	61+608.4	D	31,70	2,00	0,15	9,51	1/03/2022	parhce 220 continuacion
61+608.4	61+627.05	D	18,65	2,00	0,15	5,60	1/03/2022	parhce 220 - continaucion
61+694	61+715.5	D	21,50	2,00	0,15	6,45	1/03/2022	parhce 219
61+800	61+810.65	D	10,65	2,00	0,15	3,20	1/03/2022	parhce 218
61+810.65	61+820.9	D	10,25	3,57	0,15	5,49	1/03/2022	parhce 218-continuacion
61+820.9	61+830.6	D	9,70	2,00	0,15	2,91	1/03/2022	parhce 218- continuacion
61+931.9	61+943.8	D	11,90	2,00	0,15	3,57	1/03/2022	parhce 217
61+171.1	61+181	D	9,90	3,50	0,15	5,20	2/03/2022	PARHCE 223
61+413.05	61+421.93	D	8,88	2,00	0,15	2,66	2/03/2022	PARHCE 227
61+413.05	61+437.72	D	24,67	3,61	0,15	13,36	2/03/2022	PARHCE 227 CONTINUACION
61+421.88	61+432.35	D	10,47	3,33	0,15	5,23	2/03/2022	PARHCE 222
61+432.35	61+442.85	D	10,50	2,00	0,15	3,15	2/03/2022	PARHCE 222 CONTINUACION
61+532.66	61+551.16	D	18,50	2,00	0,15	5,55	2/03/2022	PARCHE 226
61+532.66	61+535.66	D	3,00	2,00	0,15	0,90	2/03/2022	PARHCE 226-CONTINAUCION
61+532.66	61+543	D	10,34	3,64	0,15	5,65	2/03/2022	PARHCE 226 CONTINUACION
60+457.15	60+465	D	7,85	2,00	0,15	2,36	2/03/2022	PARHCE 225
60+651.25	60+663.9	D	12,65	3,74	0,15	7,10	2/03/2022	PARHCE 224
60+665.65	60+678.15	D	12,50	2,00	0,15	3,75	2/03/2022	PARHCE 224 CPNTINUAICON
58+928	58+939.1	D	11,10	3,67	0,15	6,11	3/03/2022	parhce 236
58+932.07	58+942.4	D	10,33	3,84	0,15	5,95	3/03/2022	parhce 237
58+960.7	58+970.48	D	9,78	2,20	0,15	3,23	3/03/2022	parhce 235
58+972.46	58+976.42	D	3,96	3,48	0,15	2,07	3/03/2022	parhce 234
58+980.12	58+994	D	13,88	3,59	0,15	7,47	3/03/2022	parhce 233
60+21.1	60+37.8	D	16,70	2,00	0,15	5,01	3/03/2022	parhce 229
60+21.1	60+52.9	D	31,80	3,51	0,15	16,74	3/03/2022	parhce 229
60+69.6	60+80.22	D	10,62	2,00	0,15	3,19	3/03/2022	parhce 228
59+601	59+614	D	13,00	4,00	0,15	7,80	3/03/2022	parhce 232
59+855.4	59+872.35	D	16,95	2,00	0,15	5,09	3/03/2022	Parche 231
59+982	59+989.85	D	7,85	2,00	0,15	2,36	3/03/2022	parhce 230
58+447.5	58+479.5	D	32,00	3,83	0,15	18,38	7/03/2022	parche 245
58+632.07	58+663.62	D	31,55	3,85	0,15	18,22	7/03/2022	parhce 237
58+874.6	58+890.5	D	15,90	3,90	0,15	9,30	7/03/2022	parche 244
59+53.55	59+63.55	I	10,00	2,00	0,15	3,00	7/03/2022	parhce 243
59+79.85	59+88.5	I	8,65	2,00	0,15	2,60	7/03/2022	parhce 242
59+238	59+249.5	I	11,50	2,00	0,15	3,45	7/03/2022	parhce 241
59+599.5	59+605.5	I	6,00	3,80	0,15	3,42	7/03/2022	parhce 240
59+634.5	59+641	I	6,50	3,55	0,15	3,46	7/03/2022	parhce 239
59+846.7	59+859	I	12,30	2,00	0,15	3,69	7/03/2022	parhce 238
57+917.7	57+939.8	D	22,10	3,49	0,15	11,57	8/03/2022	PARCHE 252

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MHC S.A.S
CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.° :** 10

RUTA: RUTA 45A04 **FECHA:** 26-feb-2022 a 25-mar-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
450.10P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25		0,00	987,40	987,40

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
57+939.8	57+950	D	10,20	2,00	0,15	3,06	8/03/2022	parhce 252
58+11.31	58+23.76	D	12,45	3,60	0,15	6,72	8/03/2022	parhce 251
58+62.26	58+68.26	D	6,00	3,60	0,15	3,24	8/03/2022	parhce 250
58+185.76	58+197.66	D	11,90	2,00	0,15	3,57	8/03/2022	parhce 249
58+223.16	58+244.22	D	21,06	2,00	0,15	6,32	8/03/2022	parhce 248
58+259.22	58+280.72	D	21,50	2,00	0,15	6,45	8/03/2022	parhce 247
58+375.92	58+392.92	D	17,00	2,00	0,15	5,10	8/03/2022	parhce 246
58+414.92	58+447.5	D	32,58	3,93	0,15	19,21	8/03/2022	parhce 245
57+517.13	57+525.88	D	8,75	3,55	0,15	4,66	9/03/2022	Parche 259
57+594.38	57+626.18	D	31,80	2,00	0,15	9,54	9/03/2022	parhce 258
57+631.88	57+637.06	D	5,18	2,00	0,15	1,55	9/03/2022	parhce 257
57+661.66	57+675.46	D	13,80	3,57	0,15	7,39	9/03/2022	parhce 256
57+675.46	57+699.8	D	24,34	2,00	0,15	7,30	9/03/2022	parhce 256
57+745.49	57+759	D	13,51	2,00	0,15	4,05	9/03/2022	parhce 255
57+942.55	57+960.37	I	17,82	3,12	0,15	8,34	9/03/2022	parhce 254
57+960.37	58+7.57	I	47,20	2,00	0,15	14,16	9/03/2022	parhce 254
58+7.57	58+15.82	I	8,25	3,35	0,15	4,15	9/03/2022	parhce 254
58+333	58+354	I	21,00	3,40	0,15	10,71	9/03/2022	parhce 253
57+347.73	57+355.63	D	7,90	4,07	0,15	4,82	10/03/2022	parche 266
57+355.63	57+368.63	D	13,00	2,00	0,15	3,90	10/03/2022	Parche 266/continuacion
57+368.63	57+391.93	D	23,30	2,00	0,15	6,99	10/03/2022	Parche 266 continuacion
57+417.63	57+427.43	D	9,80	2,00	0,15	2,94	10/03/2022	Parche 265
57+427.43	57+461.73	D	34,30	4,00	0,15	20,58	10/03/2022	Parche 265 continuacion
57+464	57+468.4	D	4,40	2,00	0,15	1,32	10/03/2022	Parche 264
57+484.63	57+490.63	D	6,00	2,00	0,15	1,80	10/03/2022	Parche 263
57+496.13	57+517.13	D	21,00	2,00	0,15	6,30	10/03/2022	Parche 259
57+703.9	57+746	D	42,10	2,00	0,15	12,63	10/03/2022	Parche 262
57+908.8	57+916.8	D	8,00	2,00	0,15	2,40	10/03/2022	Parche 261
57+916.8	57+925.3	D	8,50	3,40	0,15	4,34	10/03/2022	Parche 261
57+927.8	57+941.8	D	14,00	3,55	0,15	7,46	10/03/2022	Parche 260
57+306	57+312.45	D	6,45	3,58	0,15	3,46	11/03/2022	parche 272
57+312.45	57+325.25	D	12,80	2,00	0,15	3,84	11/03/2022	parche 272
57+347.77	57+371.62	D	23,85	2,00	0,20	9,54	11/03/2022	parhce 266
57+425.65	57+431.45	I	5,80	3,50	0,15	3,05	11/03/2022	parhce 271
57+466.25	57+477.4	I	11,15	2,00	0,15	3,35	11/03/2022	parhce 270
57+486.22	57+497.57	I	11,35	2,00	0,15	3,41	11/03/2022	parche 269
57+503.85	57+508	I	4,15	2,00	0,15	1,25	11/03/2022	parhce 268
57+554.5	57+560	I	5,50	2,00	0,15	1,65	11/03/2022	parhce 267
57+24.15	57+30.55	D	6,40	2,00	0,15	1,92	14/03/2022	PARCHE 282
57+32.55	57+40.5	D	7,95	2,00	0,15	2,39	14/03/2022	PARCHE 281
57+50	57+59.5	D	9,50	2,00	0,15	2,85	14/03/2022	PARCHE 280
57+84.7	57+102	D	17,30	2,00	0,15	5,19	14/03/2022	PARCHE 279
57+108	57+117	D	9,00	2,00	0,15	2,70	14/03/2022	PARCHE 278
57+117	57+129.95	D	12,95	3,65	0,15	7,09	14/03/2022	PARCHE 278
57+130.9	57+142	I	11,10	3,64	0,18	7,27	14/03/2022	PARCHE 288
57+151.5	57+157.4	I	5,90	2,00	0,15	1,77	14/03/2022	PARCHE 287
57+171.87	57+185.17	D	13,30	2,00	0,15	3,99	14/03/2022	PARCHE 277
57+177.9	57+186.2	I	8,30	2,00	0,15	2,49	14/03/2022	PARCHE 286
57+185.17	57+188.79	D	3,62	2,00	0,15	1,09	14/03/2022	PARCHE 277
57+214	57+224.05	I	10,05	2,00	0,15	3,02	14/03/2022	PARCHE 285
57+222.72	57+226	D	3,28	2,00	0,15	0,98	14/03/2022	PARCHE 276
57+285.5	57+290.5	D	5,00	2,00	0,15	1,50	14/03/2022	PARCHE 275
57+311.45	57+315	I	3,55	2,00	0,15	1,07	14/03/2022	PARCHE 284
57+336	57+349.9	I	13,90	2,00	0,15	4,17	14/03/2022	PARCHE 274
57+358.75	57+371.65	I	12,90	3,40	0,15	6,58	14/03/2022	PARCHE 273
56+998	57+14.75	D	16,75	3,63	0,15	9,12	14/03/2022	PARCHE 283
57+38.7	57+45.5	I	6,80	2,00	0,15	2,04	15/03/2022	PARCHE 292

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MHC S.A.S
CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.° :** 10

RUTA: RUTA 45A04 **FECHA:** 26-feb-2022 a 25-mar-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
450.10P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25		0,00	987,40	987,40

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
57+69.46	57+75	I	5,54	2,00	0,15	1,66	15/03/2022	PARCHE 291
57+103.17	57+130.9	I	27,73	2,00	0,20	11,09	15/03/2022	PARCHE 289
56+7.7	56+22.37	I	14,67	2,00	0,15	4,40	15/03/2022	PARCHE 284
56+32.97	56+38.47	I	5,50	2,00	0,15	1,65	15/03/2022	PARCHE 293
56+38.47	56+46.5	I	8,03	2,00	0,15	2,41	15/03/2022	PARCHE 293
55+649.26	55+654.26	I	5,00	2,00	0,15	1,50	15/03/2022	PARCHE 302
55+699.26	55+710.96	I	11,70	2,00	0,15	3,51	15/03/2022	PARCHE 301
55+731.96	55+741.36	I	9,40	3,13	0,15	4,41	15/03/2022	PARCHE 300
55+941.5	55+955.9	I	14,90	3,02	0,15	6,75	15/03/2022	PARCHE 295
55+955.9	55+960.7	I	4,80	2,00	0,15	1,44	15/03/2022	PARCHE 295
57+190.81	57+196.51	I	5,70	2,00	0,15	1,71	15/03/2022	PARCHE 290
57+857.81	57+862.31	I	4,50	2,00	0,15	1,35	15/03/2022	PARCHE 298
57+870.81	57+873.97	I	3,16	2,00	0,15	0,95	15/03/2022	PARCHE 297
57+879.47	57+883.65	I	4,18	2,00	0,15	1,25	15/03/2022	PARCHE 296
57+883.65	57+902.5	I	18,85	3,00	0,15	8,48	15/03/2022	PARCHE 296
55+800.56	55+808.16	I	7,60	3,07	0,15	3,50	15/03/2022	PARCHE 299
55+808.16	55+812.81	I	4,65	2,00	0,15	1,40	15/03/2022	PARCHE 299
55+449.01	55+455.01	D	6,00	2,00	0,15	1,80	16/03/2022	Parche 311
55+455.01	55+509.91	D	54,90	3,40	0,15	28,00	16/03/2022	Parche 311
55+517.41	55+527.26	D	9,00	3,43	0,15	4,63	16/03/2022	parche 310
PR 55+526,41	PR 55+535,26	D	8,85	3,43	0,08	2,43	16/03/2022	parche 310
PR 55+535,26	PR 55+540,86	D	5,60	2,00	0,08	0,90	16/03/2022	parche 310
55+580.06	55+589.66	I	9,60	3,43	0,15	4,94	16/03/2022	Parche 309
55+605.86	55+615.26	I	9,40	3,35	0,15	4,72	16/03/2022	Parche 308
55+642.86	55+649.26	I	6,40	2,00	0,15	1,92	16/03/2022	PARCHE 302
55+890.92	55+899.22	D	8,30	2,00	0,15	2,49	16/03/2022	Parche 307
55+909.72	55+915.84	D	6,12	2,00	0,15	1,84	16/03/2022	Parche 306
55+923.84	55+929.99	D	6,15	2,00	0,15	1,85	16/03/2022	Parche 305
55+940.49	55+944.84	D	4,35	3,45	0,15	2,25	16/03/2022	Parche 304
55+950.15	55+969.5	D	19,35	2,00	0,15	5,81	16/03/2022	Parche 303
57+296	57+312.3	D	16,30	3,45	0,15	8,44	17/03/2022	parhce 313
55+343.4	55+390.1	D	46,70	3,37	0,15	23,61	17/03/2022	parche 312
55+406.75	55+506.75	D	100,00	3,39	0,07	23,73	17/03/2022	parche 312
PR 55+390,10	55406,75	D	16,65	2,00	0,15	5,00	17/03/2022	parche 312
54+940	54+949	D	9,00	2,00	0,15	2,70	22/03/2022	Parche 328
54+995.9	55+0	D	4,10	2,00	0,15	1,23	22/03/2022	parche 327
55+22.3	55+27.35	D	5,05	2,00	0,15	1,52	22/03/2022	parche 326
55+104.6	55+110.7	D	6,10	2,00	0,15	1,83	22/03/2022	parche 325
55+203	55+218.45	D	15,45	2,00	0,15	4,64	22/03/2022	parche 324
55+218.45	55+223.7	D	5,25	3,80	0,15	2,99	22/03/2022	parche 324
55+242.1	55+248.2	D	6,10	2,00	0,15	1,83	22/03/2022	parche 323
55+253.2	55+272.6	D	19,40	2,00	0,15	5,82	22/03/2022	parche 322
55+282.8	55+289.75	D	6,95	3,50	0,15	3,65	22/03/2022	parche 321
55+327.85	55+334.57	D	6,72	2,00	0,15	2,02	22/03/2022	parche 320
55+368.07	55+386.8	D	18,73	2,00	0,15	5,62	22/03/2022	parche 319
55+395.8	55+403.9	D	8,10	2,00	0,27	4,37	22/03/2022	parche 318
55+431.6	55+440.3	D	8,70	2,00	0,15	2,61	22/03/2022	parche 317
55+469.84	55+479.04	D	9,20	3,44	0,15	4,75	22/03/2022	parche 316
55+479.04	55+491.26	D	12,22	2,00	0,15	3,67	22/03/2022	parche 316
55+546.26	55+552.41	D	6,15	2,00	0,15	1,85	22/03/2022	parche 315
55+593.41	55+618.56	D	25,15	2,00	0,15	7,55	22/03/2022	parche 314
55+618.56	55+625.86	D	7,50	3,63	0,15	4,08	22/03/2022	parche 314
54+985.2	54+998.4	D	13,20	3,44	0,15	6,81	23/03/2022	parche 334
55+2.8	55+10.93	D	8,13	3,45	0,15	4,21	23/03/2022	parche 333
55+18.93	55+50.48	D	31,55	3,36	0,17	18,02	23/03/2022	parche 332
55+81.78	55+86.58	D	4,80	2,20	0,17	1,80	23/03/2022	parche 331
55+205.58	55+223.1	D	17,52	2,20	0,17	6,55	23/03/2022	parche 330

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MHC S.A.S
CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45A04 **FECHA:** 26-feb-2022 a 25-mar-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
450.10P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25		0,00	987,40	987,40

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
55+223.1	55+252.35	D	29,25	3,37	0,17	16,76	23/03/2022	parche 330
55+266.35	55+295.4	D	29,05	3,33	0,17	16,45	23/03/2022	parche 329
55+526.41	55+531.91	D	5,50	2,00	0,07	0,77	23/03/2022	parche 310
55+531.91	55+540.61	D	8,70	3,43	0,07	2,09	23/03/2022	parche 310
					SUBTOTAL	987,37		
						LONGITUD PARA PAGO		987,37
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		0,03
						LONGITUD TOTAL PARA PAGO :		987,40 m^3

ING. ALEXIS ANDRES BLANCO CORONEL
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 08202139785ATL

MARTHA LUCIA CORTES PULIDO
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 01195-0369 CPITVC

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45A04 **FECHA:** 26-feb-2022 a 25-mar-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	0,00	168,20	168,20

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
62+857.55	62+869.47	I	11,92	3,19	0,15	5,70	28/02/2022	parhce 209
62+919.77	62+941.17	I	21,40	3,07	0,15	9,85	28/02/2022	parhce 208
62+968.5	62+976.7	I	8,20	2,00	0,15	2,46	28/02/2022	parhce 210
62+976.7	62+982.55	I	5,85	3,09	0,15	2,71	28/02/2022	parhce 210
61+885.1	61+897.65	I	12,55	3,36	0,15	6,33	28/02/2022	parhce 216
61+905.95	61+929.1	D	23,15	3,38	0,15	11,74	28/02/2022	parhce 215
61+962.7	61+969.5	D	6,80	3,54	0,15	3,61	28/02/2022	parche 214
61+969.5	61+977.1	D	7,60	2,00	0,15	2,28	28/02/2022	parhce 214
62+94	62+128.85	D	34,85	3,40	0,15	17,77	28/02/2022	parhce 213
62+150.3	62+185.15	D	34,85	3,57	0,15	18,66	28/02/2022	parhce 212
62+271.65	62+291.1	I	19,45	2,00	0,15	5,84	28/02/2022	parhce 211
61+446.6	61+455.95	D	9,35	2,00	0,15	2,81	1/03/2022	parhce 221
61+455.95	61+503.35	D	47,40	3,59	0,15	25,52	1/03/2022	parhce 221-+ continaucion
61+503.35	61+525.55	D	22,20	2,00	0,15	6,66	1/03/2022	parhce 221 continuacion
61+525.55	61+542.2	D	16,65	3,63	0,15	9,07	1/03/2022	parhce 221 continuacion
61+561.5	61+566.1	D	4,60	2,00	0,15	1,38	1/03/2022	parhce 220
61+566.1	61+576.7	D	10,60	3,50	0,15	5,57	1/03/2022	parhce 220 continuacion
61+576.7	61+608.4	D	31,70	2,00	0,15	9,51	1/03/2022	parhce 220 continuacion
61+608.4	61+627.05	D	18,65	2,00	0,15	5,60	1/03/2022	parhce 220 continuaicon
61+694	61+715.5	D	21,50	2,00	0,15	6,45	1/03/2022	parhce 219
61+800	61+810.65	D	10,65	2,00	0,15	3,20	1/03/2022	parhce 218
61+810.65	61+820.9	D	10,25	3,57	0,15	5,49	1/03/2022	parhce 218 continuacion
61+820.9	61+830.6	D	9,70	2,00	0,15	2,91	1/03/2022	parhce 218 continaucion, Pendiente cobro para siguiente acta a partir del presente parche, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
61+931.9	61+943.8	D	11,90	2,00	0,15	3,57	1/03/2022	parhce 217
61+413.05	61+421.93	D	8,88	2,00	0,15	2,66	2/03/2022	PARHCE 227
61+413.05	61+437.72	D	24,67	3,61	0,15	13,36	2/03/2022	PARHCE 227 CONTINAUCION
61+532.66	61+551.16	D	18,50	2,00	0,15	5,55	2/03/2022	PARCHE 226
61+532.66	61+535.66	D	3,00	2,00	0,15	0,90	2/03/2022	PARHCE 226 CONTINAUCION
61+532.66	61+543	D	10,34	3,64	0,15	5,65	2/03/2022	PARHCE 226 CONTINAUCION
60+457.15	60+465	D	7,85	2,00	0,15	2,36	2/03/2022	PARHCE 225
60+651.25	60+663.9	D	12,65	3,74	0,15	7,10	2/03/2022	PARHCE 224
61+171.1	61+181	D	9,90	3,50	0,15	5,20	2/03/2022	PARHCE 223
61+421.88	61+432.35	D	10,47	3,33	0,15	5,23	2/03/2022	PARHCE 222
61+432.35	61+442.85	D	10,50	2,00	0,15	3,15	2/03/2022	parche 222- continuacion
60+665.65	60+678.15	D	12,50	2,00	0,15	3,75	2/03/2022	parhce 224-continuacion
58+928	58+939.1	D	11,10	3,67	0,15	6,11	3/03/2022	parhce 236
58+932.07	58+942.4	D	10,33	3,84	0,15	5,95	3/03/2022	PARCHE 237
58+960.7	58+970.48	D	9,78	2,20	0,15	3,23	3/03/2022	parhce 235
58+972.46	58+976.42	D	3,96	3,48	0,15	2,07	3/03/2022	parhce 234
58+980.12	58+994	D	13,88	3,59	0,15	7,47	3/03/2022	parhce 233
60+21.1	60+37.8	D	16,70	2,00	0,15	5,01	3/03/2022	parhce 229
60+21.1	60+52.9	D	31,80	3,51	0,15	16,74	3/03/2022	parhce 229
60+69.6	60+80.22	D	10,62	2,00	0,15	3,19	3/03/2022	parhce 228
59+601	59+614	D	13,00	4,00	0,15	7,80	3/03/2022	parhce 232
59+855.4	59+872.35	D	16,95	2,00	0,15	5,09	3/03/2022	parhce 231
59+982	59+989.85	D	7,85	2,00	0,15	2,36	3/03/2022	parhce 230
58+447.5	58+479.5	D	32,00	3,83	0,15	18,38	7/03/2022	parhce 245
58+632.07	58+663.62	D	31,55	3,85	0,15	18,22	7/03/2022	parhce 237
58+874.6	58+890.5	D	15,90	3,90	0,15	9,30	7/03/2022	parhce 244
59+53.55	59+63.55	I	10,00	2,00	0,15	3,00	7/03/2022	parhce 243
59+79.85	59+88.5	I	8,65	2,00	0,15	2,60	7/03/2022	parhce 242
59+238	59+249.5	I	11,50	2,00	0,15	3,45	7/03/2022	parhce 241
59+599.5	59+605.5	I	6,00	3,80	0,15	3,42	7/03/2022	parhce 240
59+634.5	59+641	I	6,50	3,55	0,15	3,46	7/03/2022	parhce 239

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45A04 **FECHA:** 26-feb-2022 a 25-mar-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	0,00	168,20	168,20

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
59+846.7	59+859	I	12,30	2,00	0,15	3,69	7/03/2022	paarhce 238
57+917.7	57+939.8	D	22,10	3,49	0,15	11,57	8/03/2022	parhce 252
57+939.8	57+950	D	10,20	2,00	0,15	3,06	8/03/2022	parhce 252
58+11.31	58+23.76	D	12,45	3,60	0,15	6,72	8/03/2022	parhce 251
58+62.26	58+68.26	D	6,00	3,60	0,15	3,24	8/03/2022	parhce 250
58+185.76	58+197.66	D	11,90	2,00	0,15	3,57	8/03/2022	parhce 249
58+223.16	58+244.22	D	21,06	2,00	0,15	6,32	8/03/2022	parhce 248
58+259.22	58+280.72	D	21,50	2,00	0,15	6,45	8/03/2022	parhce 247
58+375.92	58+392.92	D	17,00	2,00	0,15	5,10	8/03/2022	parhce 246
58+414.92	58+447.5	D	32,58	3,93	0,15	19,21	8/03/2022	parhce 245
57+517.13	57+525.88	D	8,75	3,55	0,15	4,66	9/03/2022	parhce 259
57+594.38	57+626.18	D	31,80	2,00	0,15	9,54	9/03/2022	parhce 258
57+631.88	57+637.06	D	5,18	2,00	0,15	1,55	9/03/2022	parhce 257
57+661.66	57+675.46	D	13,80	3,57	0,15	7,39	9/03/2022	parhce 256
57+675.46	57+699.8	D	24,34	2,00	0,15	7,30	9/03/2022	parhce 256
57+745.49	57+759	D	13,51	2,00	0,15	4,05	9/03/2022	parhce 255
57+942.55	57+960.37	I	17,82	3,12	0,15	8,34	9/03/2022	parhce 254
57+960.37	58+7.57	I	47,20	2,00	0,15	14,16	9/03/2022	parhce 254
58+7.57	58+15.82	I	8,25	3,35	0,15	4,15	9/03/2022	parhce 254
58+333	58+354	I	21,00	3,40	0,15	10,71	9/03/2022	parhce 253
57+347.73	57+355.63	D	7,90	4,07	0,15	4,82	10/03/2022	parche 266
57+355.63	57+368.63	D	13,00	2,00	0,15	3,90	10/03/2022	Parche 266/continuacion
57+368.63	57+391.93	D	23,30	2,00	0,15	6,99	10/03/2022	Parche 266 continuacion
57+417.63	57+427.43	D	9,80	2,00	0,15	2,94	10/03/2022	Parche 265
57+427.43	57+461.73	D	34,30	4,00	0,15	20,58	10/03/2022	Parche 265 continuacion
57+464	57+468.4	D	4,40	2,00	0,15	1,32	10/03/2022	Parche 264
57+484.63	57+490.63	D	6,00	2,00	0,15	1,80	10/03/2022	Parche 263
57+496.13	57+517.13	D	21,00	2,00	0,15	6,30	10/03/2022	Parche 259
57+703.9	57+746	D	42,10	2,00	0,15	12,63	10/03/2022	Parche 262
57+908.8	57+916.8	D	8,00	2,00	0,15	2,40	10/03/2022	Parche 261
57+916.8	57+925.3	D	8,50	3,40	0,15	4,34	10/03/2022	Parche 261
57+927.8	57+941.8	D	14,00	3,55	0,15	7,46	10/03/2022	Parche 260
57+306	57+312.45	D	6,45	3,58	0,15	3,46	11/03/2022	parche 272
57+312.45	57+325.25	D	12,80	2,00	0,15	3,84	11/03/2022	parhce 272
57+347.77	57+371.62	D	23,85	2,00	0,20	9,54	11/03/2022	parhce 266
57+425.65	57+431.45	I	5,80	3,50	0,15	3,05	11/03/2022	PARCHE 271
57+466.25	57+477.4	I	11,15	2,00	0,15	3,35	11/03/2022	parhce 270
57+486.22	57+497.57	I	11,35	2,00	0,15	3,41	11/03/2022	parhce 269
57+503.85	57+508	I	4,15	2,00	0,15	1,25	11/03/2022	parhce 268
57+554.5	57+560	I	5,50	2,00	0,15	1,65	11/03/2022	PARCHE 267
57+24.15	57+30.55	D	6,40	2,00	0,15	1,92	14/03/2022	PARCHE 282
57+32.55	57+40.5	D	7,95	2,00	0,15	2,39	14/03/2022	PARCHE 281
57+50	57+59.5	D	9,50	2,00	0,15	2,85	14/03/2022	PARCHE 280
57+84.7	57+102	D	17,30	2,00	0,15	5,19	14/03/2022	PARCHE 279
57+108	57+117	D	9,00	2,00	0,15	2,70	14/03/2022	PARCHE 278
57+117	57+129.95	D	12,95	3,65	0,15	7,09	14/03/2022	PARCHE 278
57+130.9	57+142	D	11,10	3,64	0,18	7,27	14/03/2022	PARCHE 288
56+998	57+14.75	D	16,75	3,63	0,15	9,12	14/03/2022	PARCHE 283
57+151.5	57+157.4	I	5,90	2,00	0,15	1,77	14/03/2022	PARCHE 287
57+171.87	57+185.17	D	13,30	2,00	0,15	3,99	14/03/2022	PARCHE 277
57+177.9	57+186.2	I	8,30	2,00	0,15	2,49	14/03/2022	PARCHE 286
57+185.17	57+188.79	D	3,62	2,00	0,15	1,09	14/03/2022	PARCHE 277
57+214	57+224.05	I	10,05	2,00	0,15	3,02	14/03/2022	PARCHE 285
57+222.72	57+226	D	3,28	2,00	0,15	0,98	14/03/2022	PARCHE 276
57+285.5	57+290.5	D	5,00	2,00	0,15	1,50	14/03/2022	PARCHE 275
57+311.45	57+315	I	3,55	2,00	0,15	1,07	14/03/2022	PARCHE 284

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10
RUTA: RUTA 45A04 **FECHA:** 26-feb-2022 a 25-mar-2022
CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	0,00	168,20	168,20

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
57+336	57+349.9	I	13,90	2,00	0,15	4,17	14/03/2022	PARCHE 274
57+358.75	57+371.65	I	12,90	3,40	0,15	6,58	14/03/2022	PARCHE 273
56+7.7	56+22.37	I	14,67	2,00	0,15	4,40	15/03/2022	PARCHE 294
55+649.26	55+654.26	I	5,00	2,00	0,15	1,50	15/03/2022	PARCHE 302
55+699.26	55+710.96	I	11,70	2,00	0,15	3,51	15/03/2022	PARCHE 301
55+731.96	55+741.36	I	9,40	3,13	0,15	4,41	15/03/2022	PARCHE 300
55+941.5	55+955.9	I	14,90	3,02	0,15	6,75	15/03/2022	PARCHE 295
55+955.9	55+960.7	I	4,80	2,00	0,15	1,44	15/03/2022	PARCHE 295
57+38.7	57+45.5	I	6,80	2,00	0,15	2,04	15/03/2022	PARCHE 292
57+69.45	57+75	I	5,54	2,00	0,15	1,66	15/03/2022	PARCHE 291
57+103.17	57+130.9	I	27,73	2,00	0,20	11,09	15/03/2022	PARCHE 289
57+190.81	57+196.51	I	5,70	2,00	0,15	1,71	15/03/2022	PARCHE 290
57+857.81	57+862.31	I	4,50	2,00	0,15	1,35	15/03/2022	PARCHE 298
57+870.81	57+873.97	I	3,16	2,00	0,15	0,95	15/03/2022	PARCHE 297
57+879.47	57+883.65	I	4,18	2,00	0,15	1,25	15/03/2022	PARCHE 296
57+883.65	57+902.5	I	18,85	3,00	0,15	8,48	15/03/2022	PARCHE 296
56+32.97	56+38.47	I	5,50	2,00	0,15	1,65	15/03/2022	PARCHE 293
56+38.47	56+46.5	I	8,03	2,00	0,15	2,41	15/03/2022	PARCHE 293
55+800.56	55+808.16	I	7,60	3,07	0,15	3,50	15/03/2022	PARCHE 299
55+808.16	55+812.81	I	4,65	2,00	0,15	1,40	15/03/2022	PARCJE 299
57+347.73	57+355.63	D	7,90	4,07	0,15	4,82	16/03/2022	parche 266
57+355.63	57+368.63	D	13,00	2,00	0,15	3,90	16/03/2022	Parche 266/continuacion
57+368.63	57+391.93	D	23,30	2,00	0,15	6,99	16/03/2022	Parche 266 / continuacion
57+417.63	57+427.43	D	9,80	2,00	0,15	2,94	16/03/2022	Parche 265
57+427.43	57+461.73	D	34,30	4,00	0,15	20,58	16/03/2022	Parche 265 / continuacion
57+464	57+468.4	D	4,40	2,00	0,15	1,32	16/03/2022	Parche 264
57+484.63	57+490.63	D	6,00	2,00	0,15	1,80	16/03/2022	Parche 263
57+496.13	57+517.13	D	21,00	2,00	0,15	6,30	16/03/2022	Parche 259
57+703.9	57+746	D	42,10	2,00	0,15	12,63	16/03/2022	Parche 262
57+908.8	57+916.8	D	8,00	2,00	0,15	2,40	16/03/2022	Parche 261
57+916.8	57+925.3	D	8,50	3,40	0,15	4,34	16/03/2022	Parche 261
57+927.8	57+941.8	D	14,00	3,55	0,15	7,46	16/03/2022	Parche 260
55+449.01	55+455.01	D	6,00	2,00	0,15	1,80	16/03/2022	Parche 311
55+455.01	55+509.91	D	54,90	3,40	0,15	28,00	16/03/2022	Parche 311
55+517.41	55+527.26	D	9,00	3,43	0,15	4,63	16/03/2022	Parche 310
PR 55+526,41	PR 55+535,26	D	8,85	3,43	0,08	2,43	16/03/2022	parche 310
PR 55+535,26	PR 55+540,86	D	5,60	2,00	0,08	0,90	16/03/2022	parche 310
55+580.06	55+589.66	I	9,60	3,43	0,15	4,94	16/03/2022	Parche 309
55+605.86	55+615.26	I	9,40	3,35	0,15	4,72	16/03/2022	Parche 308
55+642.86	55+649.26	D	6,40	2,00	0,15	1,92	16/03/2022	PARCHE 302
55+890.92	55+899.22	D	8,30	2,00	0,15	2,49	16/03/2022	Parche 307
55+909.72	55+915.84	D	6,12	2,00	0,15	1,84	16/03/2022	Parche 306
55+923.84	55+929.99	D	6,15	2,00	0,15	1,85	16/03/2022	Parche 305
55+940.49	55+944.84	D	4,35	3,45	0,15	2,25	16/03/2022	Parche 304
55+950.15	55+969.5	D	19,35	2,00	0,15	5,81	16/03/2022	Parche 303
57+296	57+312	D	16,30	3,45	0,15	8,44	17/03/2022	parhce 313
55+343	55+390	D	46,70	3,37	0,15	23,61	17/03/2022	parche 312
55+407	55+507	D	100,00	3,39	0,07	23,73	17/03/2022	parche 312
55+407	55+507	D	100,00	3,39	0,11	37,29	17/03/2022	PARHCE 312
PR 55+390,10	PR 55+406,75	D	16,65	2,00	0,20	6,66	17/03/2022	parche 312
54+940	54+949	D	9,00	2,00	0,15	2,70	22/03/2022	Parche 328
54+995.9	55+0	D	4,10	2,00	0,15	1,23	22/03/2022	parche 327
55+22.3	55+27.35	D	5,05	2,00	0,15	1,52	22/03/2022	parche 326
55+104.6	55+110.7	D	6,10	2,00	0,15	1,83	22/03/2022	parche 325
55+203	55+218.45	D	15,45	2,00	0,15	4,64	22/03/2022	parche 324
55+218.45	55+223.7	D	5,25	3,80	0,15	2,99	22/03/2022	parche 324

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MHC S.A.S
CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45A04 **FECHA:** 26-feb-2022 a 25-mar-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	0,00	168,20	168,20

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
55+242.1	55+248.2	D	6,10	2,00	0,15	1,83	22/03/2022	parche 323
55+253.2	55+272.6	D	19,40	2,00	0,15	5,82	22/03/2022	parche 322
55+282.8	55+289.75	D	6,95	3,50	0,15	3,65	22/03/2022	parche 321
55+327.85	55+334.57	D	6,72	2,00	0,15	2,02	22/03/2022	parche 320
55+368.07	55+386.8	D	18,73	2,00	0,15	5,62	22/03/2022	parche 319
55+395.8	55+403.9	D	8,10	2,00	0,27	4,37	22/03/2022	parche 318
55+431.6	55+440.3	D	8,70	2,00	0,15	2,61	22/03/2022	parche 317
55+469.84	55+479.04	D	9,20	3,44	0,15	4,75	22/03/2022	parche 316
55+479.04	55+491.26	D	12,22	2,00	0,15	3,67	22/03/2022	parche 316
55+546.26	55+552.41	D	6,15	2,00	0,15	1,85	22/03/2022	parche 315
55+593.41	55+618.56	D	25,15	2,00	0,15	7,55	22/03/2022	parche 314
55+618.56	55+625.86	D	7,50	3,63	0,15	4,08	22/03/2022	parche 314
54+985.2	54+998.4	D	13,20	3,44	0,15	6,81	23/03/2022	parche 334
55+2.8	55+10.93	D	8,13	3,45	0,15	4,21	23/03/2022	parche 333
55+18.93	55+50.48	D	31,55	3,36	0,17	18,02	23/03/2022	parche 332
55+81.78	55+86.58	D	4,80	2,20	0,17	1,80	23/03/2022	parche 331
55+205.58	55+223.1	D	17,52	2,20	0,17	6,55	23/03/2022	parche 330
55+223.1	55+252.35	D	29,25	3,37	0,17	16,76	23/03/2022	parche 330
55+266.35	55+295.4	D	29,05	3,33	0,17	16,45	23/03/2022	parche 329
55+526.41	55+531.91	D	5,60	2,00	0,07	0,78	23/03/2022	parche 310
55+531.91	55+540.61	D	8,85	3,43	0,07	2,12	23/03/2022	parche 310
44+0	44+18.5	I	18,50	3,84	0,15	10,66	24/03/2022	parche 336
44+18.5	44+40.12	I	21,62	3,73	0,15	12,10	24/03/2022	parche 335
44+170	44+183.4	D	13,40	3,48	0,15	6,99	24/03/2022	parche 337
54+914	54+924.45	I	10,45	2,00	0,15	3,14	24/03/2022	parche 329
					SUBTOTAL	168,19		
						LONGITUD PARA PAGO		168,19
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		0,01
						LONGITUD TOTAL PARA PAGO :		m^3

ING. ALEXIS ANDRES BLANCO CORONEL
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 08202139785ATL

MARTHA LUCIA CORTES PULIDO
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 01195-0369 CPITVC

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-feb-2022 a 25-mar-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
630,3	Concreto clase 28 MPA	m3	0,00	262,30	262,30

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
0+203	0+203	E	7,10	0,35	0,10	0,25	17/03/2022	construcicon obra 53 los asupeiror patin modulo 1
0+203	0+203	E	7,10	0,35	0,10	0,25	17/03/2022	construcicon obra 53 los asupeiror patin modulo 1
	0+203	E	7,10	0,30	1,80	3,83	17/03/2022	construccion obra 53 modulo 1
0+203	0+203	E	7,10	0,30	1,80	3,83	17/03/2022	construccion obra 53 modulo 1
0+203	0+203	E	7,10	2,60	0,30	5,54	17/03/2022	construccion obra 53- losa superior modulo 1
0+251	0+251	E	14,25	0,35	0,10	0,50	7/03/2022	construcicon obra 53 losa inferior patin modulo 1 y2
0+251	0+251	E	14,25	0,35	0,10	0,50	7/03/2022	construcicon obra 53 losa inferior patin modulo 1 y2
0+251	0+251	E	14,25	2,60	0,30	11,12	7/03/2022	construcicon obra 53 losa inferior modulo 1 y2
0+251	0+251	E	7,15	0,35	0,10	0,25	12/03/2022	construccion obra no.53 muro patin modulo 2
0+251	0+251	E	7,15	0,35	0,10	0,25	12/03/2022	construccion obra no.53 muro patin modulo 2
0+251	0+251	E	7,15	0,30	1,80	3,86	12/03/2022	construccion obra no. 53 muro modulo 2
0+251	0+251	E	7,15	0,30	1,80	3,86	12/03/2022	construccion obra no.53 muro modulo 2
0+251	0+251	E	7,15	2,60	0,30	5,58	12/03/2022	construccion obra no.53 losa superior modulo 2
0+956	0+956	E	20,00	0,30	0,10	0,60	1/03/2022	construccion obra 4 - losa inferior patin modulo 1 y 2
0+956	0+956	E	10,00	2,60	0,30	7,80	1/03/2022	construccion obra 4 - losa inferior patin modulo 1 y 2
0+956	0+956	E	10,20	2,60	0,30	7,96	4/03/2022	construcicon obra 41 losa inferior modulo 3 y 4
0+956	0+956	E	20,40	0,35	0,10	0,71	4/03/2022	construcicon obra 41 losa inferior patines modulo 3 y 4
0+956	0+956	E	5,10	0,30	1,80	2,75	9/03/2022	construcico obra 4 muro der modulos 3
0+956	0+956	E	5,10	0,30	1,80	2,75		construcico obra 4 muro der modulos 4
0+956	0+956	E	10,00	0,30	1,80	5,40	17/03/2022	construcicon obra 4 muros modulo 1 y 2
0+956	0+956	E	10,00	0,30	1,80	5,40	17/03/2022	construcicon obra 4 muros modulo 1 y 2
3+641	3+641	E	8,00	0,30	2,80	6,72	14/03/2022	CONSTRUCCION OBRA NO.27 MODULO 1 mmuro
3+641	3+641	E	8,00	0,30	2,40	5,76	14/03/2022	CONSTRUCCION OBRA NO.27 MODULO 1 muro
3+641	3+641	E	8,00	3,60	0,30	8,64		CONSTRUCCION OBRA NO.27 MODULO 1 losa inferior
3+641	3+641	E	8,00	0,35	0,10	0,28	15/03/2022	construcicon obra 27 / losa inferior patin modulo 3
3+641	3+641	E	8,00	0,30	0,40	0,96	15/03/2022	construccion obra 27 muro faltante
3+641	3+641	E	8,00	3,60	0,30	8,64	15/03/2022	construcicon obra 27 losa infereior modulo 3
3+641	3+641	E	8,00	0,35	0,10	0,28	15/03/2022	cosntruccion obra 27 losa inferior patin modulo 3
3+641	3+641	E	8,00	0,30	2,80	6,72	16/03/2022	CONSTRUCCION OBRA nO.27 MURO IZQUIERDO MODULO 2
3+641	3+641	E	8,00	0,30	2,80	6,72	18/03/2022	construccion obra No. 27 muro modulo 2
3+641	3+641	E	8,00	3,60	0,30	8,64	18/03/2022	construccion obra No. 27 losa inferior modulo 2
3+641	3+641	E	8,00	0,30	2,80	6,72	22/03/2022	construccion obra No. 27 (muro modulo 3)
3+641	3+641	E	8,00	0,30	2,80	6,72	22/03/2022	Construccion obra No.27 (muro modulo 3)
5+154	5+154	E	8,00	0,30	2,80	6,72	2/03/2022	construccion obra 38 - muros modulo 1
5+154	5+154	E	8,00	0,30	2,80	6,72	2/03/2022	construccion obra 38 - muros modulo 1
5+154	5+154	E	8,00	0,30	2,80	6,72	9/03/2022	construccion obra 38 muros modulo 2
5+154	5+154	E	8,00	0,30	2,80	6,72	11/03/2022	construcicon obra 38 muro modulo 2
5+154	5+154	E	8,00	3,60	0,30	8,64	24/03/2022	construccion obra No.38 (losa inferior modulo 3)
5+154	5+154	E	8,00	0,35	0,10	0,28	24/03/2022	construccion obra No.38 (losa inferior modeulo 3 patin)
5+154	5+154	E	8,00	0,35	0,10	0,28	24/03/2022	construccion obra No.38 (losa inferior modeulo 3 patin)
5+154	5+154	E	8,00	3,60	0,30	8,64	25/03/2022	Construcción obra No. 38 (Losa superior modulo 1)

5+154	5+154	E	8,00	0,35	0,10	0,28	25/03/2022	Construcción obra No. 38 (Losa superior modulo 1 patín)
5+154	5+154	E	8,00	0,35	0,10	0,28	25/03/2022	Construcción obra No. 38 (Losa superior modulo 1 patín)
5+577	5+577	E	3,60	2,00	0,45	3,24	2/03/2022	construccion obra 41 losa aletas
5+577	5+577	E	6,20	2,13	0,45	5,94	2/03/2022	construccion obra 41 punta aletas
5+577	5+577	E	1,40	0,50	0,20	0,14	2/03/2022	construccion obra 41 prolongacion patin
5+577	5+577	E	2,35	1,20	0,50	1,41	2/03/2022	construccion obra 41 losa aletas
5+577	5+577	E	6,90	0,40	2,75	7,59	8/03/2022	const4rucion obra 41 aletas
5+577	5+577	E	1,40	2,50	0,50	1,75	8/03/2022	cosntrucicon obra 41 continuacion losa
5+577	5+577	E	1,40	3,80	0,40	2,13	8/03/2022	construccion obra 41 - continaucion muro
5+577	5+577	E	1,40	0,50	0,20	0,14	8/03/2022	cosntrucion obra 41 continaucion patin
5+595	5+595	E	6,00	3,60	0,30	6,48	18/03/2022	Construccion obra No.42 losa inferior modulo 3
5+595	5+595	E	6,00	0,35	0,10	0,21	18/03/2022	construccion obra no. 42 losa inf/ patin modulo 3
5+595	5+595	E	6,00	0,35	0,10	0,21	18/03/2022	construccion obra no. 42 losa inf/ patin modulo 3
5+595	5+595	E	6,25	0,30	2,80	5,25	23/03/2022	construccion obra No.42 *muro modulo 3
5+595	5+595	E	6,25	0,30	2,80	5,25	23/03/2022	construccion obra No.42 muro modulo 3
5+595	5+595	E	6,25	3,60	0,30	6,75	25/03/2022	Construcción obra No. 42 (Losa superior modulo 3)
5+595	5+595	E	6,25	0,35	0,10	0,22	25/03/2022	Construcción obra No. 42 (Losa superior modulo 3 patín)
5+595	5+595	E	6,25	0,35	0,10	0,22	25/03/2022	Construcción obra No. 42 (Losa superior modulo 3 patín)
5+595	5+595	E	-1,00	1,00	0,30	-0,30	25/03/2022	descuento ventana para caja
5+718	5+718	E	12,00	0,35	0,10	0,42	28/02/2022	construccion obra 52 losa superior patin modulo 1 y 2
5+718	5+718	E	12,00	0,30	1,80	6,48	28/02/2022	Construcicon obra 52 - muros modulo 1 y 2
5+718	5+718	E	12,00	2,60	0,30	9,36	28/02/2022	construcicon obra 52 los asuperior modulo 1 y 2
5+718	5+718	E	12,00	0,35	0,10	0,42	28/02/2022	construccion obra 52 losa superior patin modulo 1 y 2
6+333	6+333	E	5,10	0,35	0,10	0,18	5/03/2022	construcicon obra 50 losa inferior modulo 3 patines
6+333	6+333	E	5,10	0,35	0,10	0,18	5/03/2022	construcicon obra 50 losa inferior modulo 3 patines
6+333	6+333	E	5,10	0,30	2,80	4,28	10/03/2022	Construcción obra No. 50 (Muro)
6+333	6+333	E	5,10	0,30	2,80	4,28	10/03/2022	Construccion obra muro No. 50 / muro der mod 3
6+333	6+333	E	5,10	0,35	0,10	0,18	15/03/2022	construcion obra 50 patin mod 3
6+333	6+333	E	5,10	0,35	0,10	0,18	15/03/2022	construcicon obra 50 patin losa superior
6+333	6+333	E	5,10	3,60	0,30	5,51	15/03/2022	Construccion obra 50 Losa superior modulo 3
6+333	6+333	E	-2,80	1,00	0,30	-0,84	15/03/2022	volumen caja
					SUBTOTAL	**262,33**		

LONGITUD PARA PAGO	262,33	
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	**-0,03**	
LONGITUD TOTAL PARA PAGO :	**262,30**	**m^3**

ING. ALEXIS ANDRES BLANCO CORONEL
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 08202139785ATL

JUAN ROBERTO DIAZ VELANDIA
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 25202 17653CND

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-feb-2022 a 25-mar-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
630,6	Concreto clase 14 MPA	m3	0,00	15,00	15,00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
0+251	0+251	E	14,25	2,80	0,05	2,00	2/03/2022	constrccion obra 53 autohormigonera solado
0+956	0+956	E	15,50	2,90	0,05	2,25	3/03/2022	Construcicon obra 4 atohormigonera solado
0+956	0+956	E	2,15	3,40	0,05	0,37	4/03/2022	construcicon obra 4 autohormigonera - soaldo
3+641	3+641	E	3,50	4,00	0,05	0,70	12/03/2022	cosntruccion obra 27 autohormigonera solado complementario
4+349	4+349	E	17,00	1,70	0,05	1,45	8/03/2022	cosntrucicon obra 32 autohormigonera solado
4+751	4+751	E	22,50	1,50	0,05	1,69	3/03/2022	COnstrucicon obra 35 Autohormigonera / solado
5+154	5+154	E	3,80	4,00	0,05	0,76	17/03/2022	cosntruccion obra 38 autohormigonera solado modulo 3
5+577	5+577	E	5,00	3,60	0,05	0,90	26/02/2022	construccion obr a41 autohormigonera solado aletas
5+577	5+577	E	5,00	2,30	0,05	0,58	26/02/2022	construcicon obra 41 autohormigonera , solado aletas punta
5+577	5+577	E	1,40	5,00	0,05	0,35	26/02/2022	construcicon obra 41 autohormigonera , solado prolongacion muro ylosa
5+577	5+577	E	8,00	3,00	0,05	1,20	24/03/2022	construccion obra No.41 autohormigonera (solado aletas)
5+595	5+595	E	5,00	4,00	0,05	1,00	15/03/2022	construccion obra 42 autohormigonera salado madulo3
5+894	5+894	E	1,35	1,60	0,05	0,11	17/03/2022	construcicon obra 45 autohormigonera nsolado caja
6+245	6+245	E	2,00	2,60	0,05	0,26	17/03/2022	construccion obra 48 autohormigonera solado caja
6+300	6+300	E	2,00	2,60	0,05	0,26	17/03/2022	costruccion obra 49 autohormigonera solado
6+333	6+333	E	4,80	4,00	0,05	0,96	3/03/2022	costruccion obra 50 autohormigonera solado modulo 3
6+476	6+476	E	2,00	2,60	0,05	0,26	17/03/2022	construccion obra 51 autohormigonera solado caja
					SUBTOTAL	15,07		
						LONGITUD PARA PAGO		15,07
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		-0,07
						LONGITUD TOTAL PARA PAGO :		15,00 m^3

ING. ALEXIS ANDRES BLANCO CORONEL
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 08202139785ATL

JUAN ROBERTO DIAZ VELANDIA
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 25202 17653CND

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-ene-2022 a 25-feb-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
600.2.3	Excavaciones varias en material común en seco	m3	0,00	264,60	264,60

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
4+349	4+349	E	21	6,3	2	264,60	7/03/2022	construcicon obra 32
4+765	4+765	E	22,00	6,00	1,00	132,00	1/03/2022	construcción obra 33 Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
4+349	4+349	E	35,00	4,00	1,50	210,00	23/03/2022	construcción obra No.32 Pendiente cobro para siguiente acta, una vez aprobada acta modificatoria de cantidades
					SUBTOTAL	264,60		
						LONGITUD PARA PAGO		264,60
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		0,00
						LONGITUD TOTAL PARA PAGO :		264,60 m³

ING. ALEXIS ANDRES BLANCO CORONEL
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 08202139785ATL

JUAN ROBERTO DIAZ VELANDIA
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 25202 17653CND

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-feb-2022 a 25-mar-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
231	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granular	m2	0,00	18.912,00	18.912,00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m2)	FECHA	DESCRIPCIÓN
4+518	4+555	E	37,00	22,50		832,50	26/02/2022	construccion via
4+840	4+860	E	20,00	22,00		440,00	1/03/2022	construccion via
6+320	6+328	E	8,00	18,70		149,60	1/03/2022	construccion via
4+555	4+600	E	45,00	23,00		1035,00	4/03/2022	construccion via
6+390	6+450	E	60,00	11,00		660,00	4/03/2022	construccion via corona terraplen
4+290	4+345	E	55,00	18,00		990,00	5/03/2022	construccion via
6+470	6+590	E	120,00	11,10		1332,00	5/03/2022	construccion via
4+350	4+360	E	10,00	17,00		170,00	7/03/2022	construccion via
0+250	0+330	E	80,00	2,80		224,00	7/03/2022	construccion via
4+695	4+750	E	55,00	22,00		1210,00	8/03/2022	construccion via
6+370	6+470	E	100,00	5,70		570,00	8/03/2022	construccion via corona terraplen
6+470	6+590	E	120,00	6,30		756,00	10/03/2022	construccion separador
6+250	6+297	E	47,00	7,30		343,10	15/03/2022	construccion via separador
6+390	6+470	D	80,00	7,30		584,00	15/03/2022	construccion via separador
6+120	6+242	E	122,00	7,30		890,60	17/03/2022	construicon via separador
6+040	6+100	E	60,00	7,30		438,00	18/03/2022	construccion via separador
5+270	5+288	E	18,00	18,00		324,00	22/03/2022	construccion via
5+290	5+394	E	104,00	18,00		1872,00	22/03/2022	construccion vía
4+750	4+750	E	0,99	17,00		16,83	23/03/2022	construccion via
5+218	5+270	E	52,00	21,50		1118,00	23/03/2022	construccion via
4+751	4+755	E	4,00	17,00		68,00	23/03/2022	construccion via
6+014	6+040	E	26,00	7,30		189,80	24/03/2022	construccion via separador
5+893	6+012	E	119,00	7,30		868,70	24/03/2022	construccion via separador
5+394	5+430	E	36,00	18,00		648,00	24/03/2022	construccion via
3+895	4+000	E	105,00	20,50		2152,50	25/03/2022	Construcción vía
5+751	5+892	E	141,00	7,30		1029,30	25/03/2022	Construcción vía separador
					SUBTOTAL	**18911,93**		

LONGITUD PARA PAGO	18911,93		
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	**0,07**		
LONGITUD TOTAL PARA PAGO :	**18912,00**	**m2**	

ING. ALEXIS ANDRES BLANCO CORONEL
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 08202139785ATL

JUAN ROBERTO DIAZ VELANDIA
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 25202 17653CND

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-feb-2022 a 25-mar-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
642.5P	Cinta PVC, para junta de construcción estructuras en concreto	ML	0,00	323,70	323,70

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K 00+330	K 00+330	E	24,00			24,00	28/02/2022	construccion obra 52 losa superior modulo 1 y 2
0+956	0+956	E	20,00			20,00	1/03/2022	construccion obra 27 - losa modulo 1 y 2
5+577	5+577	E	8,30			8,30	2/03/2022	construccion obra 41 aletas
5+154	5+154	E	16,00			16,00		construccion obra 38 - losa inferio modulo 3
5+154	5+154	E	16,00			16,00		construccion obra 38 - muros modulo 3
5+154	5+154	E	16,00			16,00	2/03/2022	construccion obra 38 - muros modulo 2
0+956	0+956	E	20,00			20,00	4/03/2022	construcicon obra 4 muros modulo 1 y 2
6+333	6+333	E	10,00			10,00	5/03/2022	construcicon obra muros modulo 3
0+251	0+251	E	28,60			28,60	7/03/2022	construcicon obra 53 losa inferior modulo 1 y2
0+251	0+251	E	14,30			14,30	12/03/2022	Construccion obra No.53 losa superio modulo 1 y 2
0+251	0+251	E	14,30			14,30	12/03/2022	Construccion obra No.53 losa superio modulo 1 y 2
3+641	3+641	E	16,00			16,00	14/03/2022	CONSTRUCCION OBRA NO.27 MODULO 1
3+641	3+641	E	16,00			16,00	15/03/2022	cosntrucicon obra 27 muros modulo 1
3+641	3+641	E	8,00			8,00	16/03/2022	CONSTRUCCION OBRA nO.27 MURO IZQUIERDO MODULO 2
0+956	0+956	E	10,25			10,25	17/03/2022	construccion obra 4 muro modulo 3 y 4
0+250	0+250	E	14,20			14,20	17/03/2022	construcicon obra 53 los asuperior modulo 1
3+641	3+641	E	8,00			8,00	18/03/2022	construccion obra No.27 muro modulo 2
5+595	5+595	E	12,00			8,90		construccion obra no.42 modulo 1 losa superio
5+595	5+595	E	12,00			13,80		construccion obra no.42 modulo 2 losa superio
5+595	5+595	E	12,50			12,50	23/03/2022	construccion obta No,42 modulo 3
5+595	5+595	E	12,50			12,50	25/03/2022	Construcción obra No. 42 (Losa superior modulo 3)
5+154	5+154	E	16,00			16,00	25/03/2022	Construcción obra No. 38 (Losa superior modulo 1)
					SUBTOTAL	323,65		

LONGITUD PARA PAGO	323,65		
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	0,05		
LONGITUD TOTAL PARA PAGO :	323,70	ml	

ING. ALEXIS ANDRES BLANCO CORONEL
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 08202139785ATL

JUAN ROBERTO DIAZ VELANDIA
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 25202 17653CND

INVIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45A05 **FECHA:** 26-feb-2022 a 25-mar-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
4P	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	UNIDAD	0,00	1.636,00	1.636,00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	CANTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN
18+550	19+150	D	75,00			75,00	22/03/2022	Tachas (zona escolar PR19+000)
18+550	19+150	E	75,00			75,00	22/03/2022	Tachas (zona escolar PR19+000)
18+550	19+150	I	73,00			73,00	22/03/2022	Tachas (zona escolar PR19+000)
10+500	11+500	I	122,00			122,00	23/03/2022	Tachas zopna escolar PR11+000)
10+500	11+500	E	118,00			118,00	23/03/2022	Tachas zopna escolar PR11+000)
10+500	11+500	D	116,00			116,00	23/03/2022	Tachas zopna escolar PR11+000)
19+150	19+600	D	56,00			56,00	23/03/2022	Tachas (zona escolar PR19+000)
19+150	19+600	E	58,00			58,00	23/03/2022	Tachas zopna escolar PR19+000)
19+150	19+600	I	62,00			62,00	23/03/2022	Tachas zona escolar PR 19+000
22+40	22+650	I	108,00			108,00	24/03/2022	Tachas (zona escolar PR22+030)
22+40	22+650	D	106,00			106,00	24/03/2022	Tachas (zona escolar PR22+030)
22+40	22+650	E	110,00			110,00	24/03/2022	Tachas (zona escolar PR22+030)
22+650	23+200	D	67,00			67,00	24/03/2022	Tachas (CAI PR23+400 Entrada laguna Fuquene)
22+650	23+200	I	69,00			69,00	24/03/2022	Tachas (CAI PR23+400 Entrada laguna Fuquene)
22+650	23+200	E	69,00			69,00	24/03/2022	Tachas (CAI PR23+400 Entrada laguna Fuquene)
17+000	18+000	D	118,00			118,00	25/03/2022	tachas (zona escolar PR 18+100)
17+000	18+000	E	118,00			118,00	25/03/2022	tachas (zona escolar PR 18+100)
17+000	18+000	I	116,00			116,00	25/03/2022	tachas (zona escolar PR 18+100)
					SUBTOTAL	**1636,00**		
						LONGITUD PARA PAGO		1636,00
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		**0,00**
						LONGITUD TOTAL PARA PAGO :		**1636,00** Un

ING. ALEXIS ANDRES BLANCO CORONEL
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 08202139785ATL

MARTHA LUCIA CORTES PULIDO
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 01195-0369 CPITVC

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 9

RUTA: RUTA 45ACNC **FECHA:** 26-feb-2022 a 25-mar-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
6P	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	Un	0,00	63,00	63,00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	CANTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN
1+850	1+850	D	1,00			1,00	3/03/2022	SR 30 (60) (Glorieta 2) calzada derecha
2+150	2+150	D	1,00			1,00	3/03/2022	SR 30 (30) (Glorieta 2) calzada izquierda
2+180	2+180	D	1,00			1,00	3/03/2022	SR 30 (30) (Glorieta 2) calzada derecha
2+350	2+350	D	1,00			1,00	3/03/2022	SR 30 (30) (Glorieta 2) calzada izquierda
2+400	2+400	D	1,00			1,00	3/03/2022	SR 30 (60) (Glorieta 2) calzada derecha
2+400	2+400	I	1,00			1,00	3/03/2022	SR 30 (60) (Glorieta 2) calzada derecha
2+650	2+650	I	1,00			1,00	3/03/2022	SR 30 (30) (Glorieta 2) calzada derecha
2+700	2+700	D	1,00			1,00	3/03/2022	SR 30 (60) (Glorieta 2) Calzada Izquierda
2+700	2+700	I	1,00			1,00	3/03/2022	SR 30 (60) (Glorieta 2) Calzada Izquierda
1+850	1+850	D	1,00			1,00	3/03/2022	SR 30 (60) (Glorieta 2) calzada derecha
2+150	2+150	D	1,00			1,00	3/03/2022	SR 30 (60) (Glorieta 2) Calzada Izquierda
0+75	0+75	D	1,00			1,00	4/03/2022	SP 03 (GLOERIETA 1) CALZADA DERECHA
0+140	0+140	D	1,00			1,00	4/03/2022	SP 59 (GLOERIETA 1) CALZADA DERECHA
0+180	0+180	D	1,00			1,00	4/03/2022	SR 30 (30) (GLOERIETA 1) CALZADA IZQUIERDA
0+235	0+235	D	1,00			1,00	4/03/2022	SR 30 (40) (GLOERIETA 1) CALZADA IZQUIERDA
0+235	0+235	I	1,00			1,00	4/03/2022	SR 30 (40) (GLOERIETA 1) CALZADA IZQUIERDA
0+270	0+270	D	1,00			1,00	4/03/2022	SR 30 (60) (GLOERIETA 1) CALZADA DERECHA
0+270	0+270	I	1,00			1,00	4/03/2022	SR 30 (60) (GLOERIETA 1) CALZADA DERECHA
0+400	0+400	D	1,00			1,00	4/03/2022	SR 30 (60) (VARIANTE UBATE) CALZADA IZQUIERDA
0+400	0+400	I	1,00			1,00	4/03/2022	SR 30 (60) (VARIANTE UBATE) CALZADA IZQUIERDA
0+460	0+460	I	1,00			1,00	4/03/2022	SP 04 (VARIANTE UBATÉ) CALZADA IZQUIERDA
0+610	0+610	D	1,00			1,00	4/03/2022	SP 59 (VARIANTE UBATÉ) CALZADA DERECHA
0+670	0+670	I	1,00			1,00	4/03/2022	SP 59 (VARIANTE UBATÉ) CALZADA IZQUIERDA
0+830	0+830	D	1,00			1,00	4/03/2022	SE 30 (60) (VARIANTE UBATÉ) CALZADA DERECHA
0+830	0+830	I	1,00			1,00	4/03/2022	SE 30 (60) (VARIANTE UBATÉ) CALZADA DERECHA
0+950	0+950	D	1,00			1,00	4/03/2022	SP 59 (VARIANTE UBATÉ) CALZADA DERECHA
0+950	0+950	I	1,00			1,00	4/03/2022	SP 59 (VARIANTE UBATÉ) CALZADA IZQUIERDA
1+50	1+50	I	1,00			1,00	4/03/2022	SP 49 (VARIANTE UBATÉ) CALZADA IZQUIERDA
1+110	1+110	D	1,00			1,00	4/03/2022	SR 30 (60) (VARIANTE UBATÉ) CALZADA DERECHA
1+110	1+110	I	1,00			1,00	4/03/2022	SR 30 (60) (VARIANTE UBATÉ) CALZADA IZQUIERDA
1+240	1+240	D	1,00			1,00	4/03/2022	SP 59 (VARIANTE UBATÉ) CALZADA DERECHA
1+240	1+240	I	1,00			1,00	4/03/2022	SP 59 (VARIANTE UBATÉ) CALZADA IZQUIERDA
1+350	1+350	D	1,00			1,00	4/03/2022	SR 30 (60) (VARIANTE UBATÉ) CALZADA DERECHA
1+350	1+350	I	1,00			1,00	4/03/2022	SR 30 (60) (VARIANTE UBATÉ) CALZADA IZQUIERDA
1+500	1+500	D	1,00			1,00	4/03/2022	SP 59 (VARIANTE UBATÉ) CALZADA DERECHA
1+500	1+500	I	1,00			1,00	4/03/2022	SP 59 (VARIANTE UBATÉ) CALZADA IZQUIERDA
1+620	1+620	D	1,00			1,00	4/03/2022	SP 30 (60) (GLORIETA 2) CALZADA DERECHA
1+620	1+620	I	1,00			1,00	4/03/2022	SP 30 (60) (GLORIETA 2) CALZADA IZQUIERDA
1+670	2+670	D	1,00			1,00	4/03/2022	SP 49 (VARIANTE UBATÉ) CALZADA DERECHA
1+670	2+670	I	1,00			1,00	4/03/2022	SP 49 (VARIANTE UBATÉ) CALZADA IZQUIERDA
1+720	1+720	D	1,00			1,00	4/03/2022	SP 03 (VARIANTE UBATÉ) CALZADA DERECHA
1+750	1+750	D	1,00			1,00	7/03/2022	SP 20 (GLORIETA 2) CALZADA DERECHA
1+890	1+890	I	1,00			1,00	7/03/2022	SP 59 (GLORIETA 2) CALZADA IZQUIERDA
1+950	1+950	I	1,00			1,00	7/03/2022	SP 04 (GLORIETA 2) CALZADA IZQUIERDA
2+160	2+160	D	1,00			1,00	7/03/2022	SR 30 (40) (GLORIETA 2) CALZADA DERECHA
2+160	2+160	I	1,00			1,00	7/03/2022	SR 30 (40) (GLORIETA 2) CALZADA IZQUIERDA
2+200	2+200	D	1,00			1,00	7/03/2022	SP 03 (GLORIETA 2) CALZADA DERECHA
2+300	2+300	D	1,00			1,00	7/03/2022	SP 49 (GLORIETA 2) CALZADA DERECHA
2+300	2+300	I	1,00			1,00	7/03/2022	SP 49 (GLORIETA 2) CALZADA IZQUIERDA
2+420	2+420	D	1,00			1,00	7/03/2022	SR 30 (40) (GLORIETA 3) CALZADA DERECHA
2+420	2+420	I	1,00			1,00	7/03/2022	SR 30 (40) (GLORIETA 3) CALZADA IZQUIERDA
2+520	2+520	D	1,00			1,00	7/03/2022	SR 30 (40) (GLORIETA 3) CALZADA DERECHA
2+520	2+520	I	1,00			1,00	7/03/2022	SR 30 (40) (GLORIETA 3) CALZADA IZQUIERDA
2+520	2+520	I	1,00			1,00	7/03/2022	SP 04 (GLORIETA 3) CALZADA IZQUIERDA
2+930	2+930	I	1,00			1,00	7/03/2022	SP 59 (GLORIETA 3) CALZADA IZQUIERDA
0+0	0+0	D	0,00			1,00	9/03/2022	SR 02 (GLORIETA 1)

0+0	0+0	I	0,00			1,00	9/03/2022	SR 02 (GLORIETA 1)
3+0	3+0	D	0,00			1,00	9/03/2022	SR 02 (GLORIETA 3)
3+0	3+0	I	0,00			1,00	9/03/2022	SR 02 (GLORIETA 3)
0+0	0+0	I	1,00			1,00	9/03/2022	SR 02 (GLORIETA 1)
3+0	3+0	D	1,00			1,00	9/03/2022	SR 02 (GLORIETA 3)
3+0	3+0	I	1,00			1,00	9/03/2022	SR 02 (GLORIETA 3)
2+400	2+400	D	1,00			1,00	9/03/2022	SP 59 (GLORIETA 2)
					SUBTOTAL	**63,00**		
						LONGITUD PARA PAGO	63,00	
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	**0,00**	
						LONGITUD TOTAL PARA PAGO :	**63,00**	**Un**

ING. ALEXIS ANDRES BLANCO CORONEL
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 08202139785ATL

MARTHA LUCIA CORTES PULIDO
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 01195-0369 CPITVC

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10
RUTA: RUTA 45A05 **FECHA:** 26-feb-2022 a 25-mar-2022
CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
6P	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	Un	63,00	140,00	203,00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	CANTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN
48+550	48+550	I	1,00			1,00	28/02/2022	SR 30 (30) (Zona escolar Glorieta entrada a Chiquinquirá)
48+650	48+650	I	1,00			1,00	28/02/2022	SR 30 (40) (Zona escolar Glorieta entrada a Chiquinquirá)
46+850	46+850	D	1,00			1,00	28/02/2022	SR 30 (40) (Zona escolar PR 46+850)
46+920	46+920	D	1,00			1,00	28/02/2022	SR 30 (30) (Zona escolar PR 46+850)
47+100	47+100	I	1,00			1,00	28/02/2022	SR 30 (30) (Zona escolar PR 46+850)
47+150	47+150	I	1,00			1,00	28/02/2022	SR 30 (40) (Zona escolar PR 46+850)
47+250	47+250	I	1,00			1,00	28/02/2022	SR 30 (60) (Zona escolar PR 46+850)
47+400	47+400	D	1,00			1,00	28/02/2022	SR 30 (40) (Zona escolar Glorieta entrada a Chiquinquirá)
47+520	47+520	D	1,00			1,00	28/02/2022	SR 30 (60) (Zona escolar Glorieta entrada a Chiquinquirá)
47+800	47+800	I	1,00			1,00	28/02/2022	SR 30 (30) Zona escolar Glorieta entrada a Chiquinquirá- Sobre Va
47+800	47+800	I	1,00			1,00	28/02/2022	a Chiquinquirá- Sobre Variante Chia PR0+275)
47+800	47+800	I	1,00			1,00	28/02/2022	a Chiquinquirá- Sobre Variante Chia PR0+380)
32+730	32+730	I	1,00			1,00	1/03/2022	SR 30 (40) (ZONA ENTRADA NORTE Y SUR DE SUSA)
32+850	32+850	I	1,00			1,00	1/03/2022	SR 30 (60) (ZONA ENTRADA NORTE Y SUR DE SUSA)
34+810	34+810	D	1,00			1,00	1/03/2022	SR 30 (30) (Zona cruce Ingreso a Simijaca PR 35+400)
34+950	34+950	D	1,00			1,00	1/03/2022	SR 30 (40) (Zona cruce Ingreso a Simijaca PR 35+400)
36+850	36+850	D	1,00			1,00	1/03/2022	SR 30 (40) (Zona Escolar San Cayetano PR37+300)
36+900	36+900	D	1,00			1,00	1/03/2022	SR 30 (40) (Zona Escolar San Cayetano PR37+300)
37+250	37+250	I	1,00			1,00	1/03/2022	SR 30 (30) (Zona Escolar San Cayetano PR37+300)
37+800	37+800	D	1,00			1,00	1/03/2022	SR 30 (60) (Ingreso a Simijaca 38+300)
37+900	37+900	D	1,00			1,00	1/03/2022	SR 30 (60) (Ingreso a Simijaca 38+300)
37+950	37+950	D	1,00			1,00	1/03/2022	SR 30 (30) (Ingreso a Simijaca PR38+300)
35+20	35+20	D	1,00			1,00	1/03/2022	SR 30 (60) (Zona cruce ingreso a Simijaca PR 35+400)
35+850	35+850	I	1,00			1,00	1/03/2022	SR 30 (40) (Zona cruce Ingreso a Simijaca PR 35+400)
35+900	35+900	I	1,00			1,00	1/03/2022	SR 30 (40) (Zona cruce Ingreso a Simijaca PR 35+400)
41+330	41+330	D	1,00			1,00	1/03/2022	SR 30 (60) (Zona escolar Coliseo PR 41+560)
41+430	41+500	D	1,00			1,00	1/03/2022	SR 30 (40) (Zona escolar Coliseo PR 41+560)
41+500	41+500	D	1,00			1,00	1/03/2022	SR 30 (30) (Zona escolar Coliseo PR 41+560)
41+840	41+840	I	1,00			1,00	1/03/2022	SR 30 (30) (Zona escolar Coliseo PR41+560)
41+880	41+880	I	1,00			1,00	1/03/2022	SP 24 (Zona escolar Coliseo PR41+560)
41+950	41+950	I	1,00			1,00	1/03/2022	SR 30 (40) (Zona escolar Coliseo PR41+560)
38+650	38+650	D	1,00			1,00	1/03/2022	SR 30 (30) (Ingreso a Simijaca PR38+300)
38+730	38+730	D	1,00			1,00	1/03/2022	SR 30 (40) (Ingreso a Simijaca PR38+300)
38+835	38+835	D	1,00			1,00	1/03/2022	SR 30 (60) (Ingreso a Simijaca P38+300)
44+20	44+20	I	1,00			1,00	1/03/2022	SR 30 (60) (Zona escolar PR 44+300)
44+160	44+160	D	1,00			1,00	1/03/2022	SR 30 (40) (Zona escolar PR 44+300)
44+400	44+400	D	1,00			1,00	1/03/2022	SR 30 (40) (Zona escolar PR 44+300)
44+500	44+500	I	1,00			1,00	1/03/2022	SR 30 (60) (Entrada finca PR44+300)
46+720	46+720	D	1,00			1,00	1/03/2022	SR 30 (60) (Zona escolar PR 46+850)
42+280	42+280	D	1,00			1,00	1/03/2022	SR 30 (60) (Zona peatonal PR42+200)
42+380	42+380	D	1,00			1,00	1/03/2022	SR 30 (40) (Zona peatonal PR42+200)
42+870	42+870	I	1,00			1,00	1/03/2022	SR 30 (40) (Zona peatonal PR42+200)
42+970	42+970	I	1,00			1,00	1/03/2022	SR 30 (60) (Zona peatonal PR42+200)
4+80	4+80	I	1,00			1,00	2/03/2022	SR 30 (50) zona escolar PR 3
3+220	3+220	D	1,00			1,00	2/03/2022	SR 30 (50) zona escolar PR 3
3+320	3+320	D	1,00			1,00	2/03/2022	SR 30 (40) zona escolar PR 3
3+370	3+370	D	1,00			1,00	2/03/2022	SR 30 (30) zona escolar PR 3
3+800	3+800	I	1,00			1,00	2/03/2022	SR 30 (30) zona escolar PR 3
3+850	3+850	I	1,00			1,00	2/03/2022	SR 30 (40) zona escolar PR 3
2+950	2+950	D	1,00			1,00	2/03/2022	SR 30 (50) HACIA GLORIETA UBATE
2+950	2+950	I	1,00			1,00	2/03/2022	SR 30 (50) HACIA GLORIETA UBATE
10+650	10+650	D	1,00			1,00	2/03/2022	SR 30 (60) (Zona Escolar PR11+000)
10+780	10+780	D	1,00			1,00	2/03/2022	SR 30 (40) (Zona Escolar PR11+000)
10+840	10+840	D	1,00			1,00	2/03/2022	SR 30 (30) (Zona Escolar PR11+000)
11+250	11+250	I	1,00			1,00	2/03/2022	SR 30 (30) (Zona Escolar PR11+000)
11+300	11+300	D	1,00			1,00	2/03/2022	SR 30 (40) (Zona Escolar PR11+000)
11+400	11+400	D	1,00			1,00	2/03/2022	SR 30 (60) (Zona Escolar PR11+000)
17+90	17+90	D	1,00			1,00	2/03/2022	SP 30 (60) (Zona Escolar PR18+100)
17+190	17+190	D	1,00			1,00	2/03/2022	SP 30 (40) (Zona Escolar PR18+100)
17+250	17+250	D	1,00			1,00	2/03/2022	SP 30 (30) (Zona Escolar PR18+100)
17+640	17+640	I	1,00			1,00	2/03/2022	SP 30 (30) (Zona Escolar PR18+100)

17+750	17+750	I	1,00			1,00	2/03/2022	SP 30 (40) (Zona Escolar PR18+100)
17+810	17+810	I	1,00			1,00	2/03/2022	SP 30 (60) (Zona Escolar PR18+100)
18+620	18+620	D	1,00			1,00	2/03/2022	SP 30 (60) (Zona Escolar PR19+100)
18+770	18+770	D	1,00			1,00	2/03/2022	SP 30 (40) (Zona Escolar PR19+100)
18+840	18+840	D	1,00			1,00	2/03/2022	SP 30 (30) (Zona Escolar PR19+100)
1+240	1+240	I	1,00			1,00	3/03/2022	SR 30 (40) GLORIETA 3
1+400	1+400	I	1,00			1,00	3/03/2022	SR 30 (50) GLORIETA 3
1+180	1+180	E	1,00			1,00	3/03/2022	SR 30 (30) GLORIETA 3
28+100	28+100	D	1,00			1,00	3/03/2022	SR 30 (60) (Zona Escolar Llanogrande)
28+250	28+250	D	1,00			1,00	3/03/2022	SR 30 (40) (Zona Escolar Llanogrande)
28+300	28+300	D	1,00			1,00	3/03/2022	SR 30 (30) (Zona Escolar Llanogrande)
28+680	28+680	I	1,00			1,00	3/03/2022	SR 30 (30) (Zona Escolar Llanogrande)
28+750	28+750	I	1,00			1,00	3/03/2022	SR 30 (40) (Zona Escolar Llanogrande)
28+850	28+850	I	1,00			1,00	3/03/2022	SR 30 (60) (Zona Escolar Llanogrande)
25+50	25+50	D	1,00			1,00	3/03/2022	SR 30 (40) (Zona Escolar PR 25+200)
25+90	25+90	I	1,00			1,00	3/03/2022	SR 30 (60) (Zona Escolar PR 25+200)
25+440	25+440	I	1,00			1,00	3/03/2022	SR 30 (30) (Zona Escolar PR 25+200)
25+500	25+500	I	1,00			1,00	3/03/2022	SR 30 (40) (Zona Escolar PR 25+200)
24+950	24+950	D	1,00			1,00	3/03/2022	SR 30 (60) (Zona Escolar PR 25+200)
40+75	40+75	D	1,00			1,00	3/03/2022	SR 30 (50) (Paso poblado PR 39+500)
40+75	40+75	I	1,00			1,00	3/03/2022	SR 30 (50) (Paso poblado PR 39+500)
38+950	38+950	D	1,00			1,00	3/03/2022	SR 30 (50) (Paso poblado PR 39+500)
38+950	38+950	I	1,00			1,00	3/03/2022	SR 30 (50) (Paso poblado PR 39+500)
19+260	19+260	I	1,00			1,00	3/03/2022	SR 30 (30) (Zona Escolar PR 19+000)
19+310	19+310	I	1,00			1,00	3/03/2022	SR 30 (40) (Zona Escolar PR 19+000)
19+470	19+470	I	1,00			1,00	3/03/2022	SR 30 (60) (Zona Escolar PR 19+000)
1+490	1+490	I	1,00			1,00	8/03/2022	SP 20 (GLORIETA 3)
1+770	1+770	D	1,00			1,00	8/03/2022	SR 30 (50) (HACIA GLORIETA UBATÉ)
1+770	1+770	I	1,00			1,00	8/03/2022	SR 30 (50) (HACIA GLORIETA UBATÉ)
2+430	2+430	D	1,00			1,00	8/03/2022	SR 30 (50) (HACIA GLORIETA UBATÉ)
2+430	2+430	I	1,00			1,00	8/03/2022	SR 30 (50) (HACIA GLORIETA UBATÉ)
35+100	35+100	D	1,00			1,00	8/03/2022	SP 13 (CRUCE INGRESO SIMIJACA PR35+400)
35+130	35+130	D	1,00			1,00	8/03/2022	SP 25 (CRUCE INGRESO SIMIJACA PR35+400)
35+750	35+750	I	1,00			1,00	8/03/2022	SP 25 (CRUCE INGRESO SIMIJACA PR35+400)
35+800	35+800	I	1,00			1,00	8/03/2022	SP 12 (CRUCE INGRESO SIMIJACA PR35+400)
38+100	38+100	D	1,00			1,00	8/03/2022	SP 21 (CRUCE ENTRADA SIMIJACA PR38+300)
38+130	38+130	D	1,00			1,00	8/03/2022	SP 25 (CRUCE ENTRADA SIMIJACA PR38+300)
38+430	38+430	I	1,00			1,00	8/03/2022	SP 25 (CRUCE ENTRADA SIMIJACA PR38+300)
22+140	22+140	D	1,00			1,00	8/03/2022	SR 30 (30) (ZONA ESCOLAR PR22+030)
22+200	22+200	D	1,00			1,00	8/03/2022	SP 25 (ZONA ESCOLAR PR22+030)
22+240	22+240	D	1,00			1,00	8/03/2022	SP 25A (ZONA ESCOLAR PR22+030)
22+240	22+240	I	1,00			1,00	8/03/2022	SP 25A (ZONA ESCOLAR PR22+030)
22+450	22+450	I	1,00			1,00	8/03/2022	SP 25 (ZONA ESCOLAR PR22+030)
22+500	22+500	I	1,00			1,00	8/03/2022	SR 30 (30) (ZONA ESCOLAR PR22+030)
22+570	22+570	I	1,00			1,00	8/03/2022	SR 30 (40) (ZONA ESCOLAR PR22+030)
22+620	22+620	I	1,00			1,00	8/03/2022	SR 30 (60) (ZONA ESCOLAR PR22+030)
22+640	22+640	D	1,00			1,00	8/03/2022	SR 30 (40) (CAI PR23+400 ENTRADA LAUNA DE FUQUENE)
22+710	22+710	D	1,00			1,00	8/03/2022	SR 30 (30) (CAI PR23+400 ENTRADA LAUNA DE FUQUENE)
22+750	22+750	D	1,00			1,00	8/03/2022	SP 25 (CAI PR23+400 ENTRADA LAUNA DE FUQUENE)
22+950	22+950	I	1,00			1,00	8/03/2022	SP 25 (CAI PR23+400 ENTRADA LAUNA DE FUQUENE)
22+990	22+990	I	1,00			1,00	8/03/2022	SP 30 (30) (CAI PR23+400 ENTRADA LAUNA DE FUQUENE)
23+40	23+40	I	1,00			1,00	8/03/2022	SP 30 (40) (CAI PR23+400 ENTRADA LAUNA DE FUQUENE)
47+950	47+950	I	1,00			1,00	8/03/2022	SR 02 (GLORIETA ENTRADA A CHIQUINQUIRÁ)
K 47+900	K 47+900	D	1,00			1,00	8/03/2022	SR 02 (GLORIETA ENTRADA A CHIQUINQUIRÁ)
K 47+900	K 47+900	D	1,00			1,00	8/03/2022	SR 02 (GLORIETA ENTRADA A CHIQUINQUIRÁ)
42+440	42+440	D	1,00			1,00	8/03/2022	SP 25 (ZONA PEATONAL PR42+200)
42+470	42+470	D	1,00			1,00	8/03/2022	SP 11 (ZONA PEATONAL PR42+200)
42+540	42+540	D	1,00			1,00	8/03/2022	SP 25A (ZONA PEATONAL PR42+200)
42+540	42+540	I	1,00			1,00	8/03/2022	SP 25A (ZONA PEATONAL PR42+200)
42+660	42+660	D	1,00			1,00	8/03/2022	SP 25A (ZONA PEATONAL PR42+200)
42+660	42+660	I	1,00			1,00	8/03/2022	SP 25A (ZONA PEATONAL PR42+200)
42+730	42+730	I	1,00			1,00	8/03/2022	SP 25 (ZONA PEATONAL PR42+200)
2+450	2+450	D	1,00			1,00	9/03/2022	SP 13 (ZONA ESCOLAR PR 3+000)
29+760	29+760	D	1,00			1,00	9/03/2022	SR 30 (60) (ZONA ENTRADA NORTE Y SUR DE SUSA)
29+890	29+890	D	1,00			1,00	9/03/2022	SR 30 (40) (ZONA ENTRADA NORTE Y SUR DE SUSA)
29+950	29+950	D	1,00			1,00	9/03/2022	SR 30 (30) (ZONA ENTRADA NORTE Y SUR DE SUSA)
12+420	12+420	D	1,00			1,00	9/03/2022	SR 30 (40) (ZONA URBANA CAPELLANÍA)
12+470	12+470	D	1,00			1,00	9/03/2022	SP 50 (PUENTE PEATONAL CAPELLANÍA)
12+625	12+625	D	1,00			1,00	9/03/2022	SR 32 (PUENTE PEATONAL CAPELLANÍA)
12+650	12+650	I	1,00			1,00	9/03/2022	SR 32 (PUENTE PEATONAL CAPELLANÍA)
12+720	12+720	I	1,00			1,00	9/03/2022	SP 50 (PUENTE PEATONAL CAPELLANÍA)
22+950	22+950	I	1,00			1,00	9/03/2022	SP 25A (CAI PR23+400 ENTRADA LAGUNA FUQUENE)
22+990	22+990	I	1,00			1,00	9/03/2022	SP 25A (CAI PR23+400 ENTRADA LAGUNA FUQUENE)
23+140	23+140	I	1,00			1,00	9/03/2022	SR 30 (60) (ENTRADA LAGUNA FUQUENE)
33+30	33+30	D	1,00			1,00	10/03/2022	SR 30 (ZONA ESCOLAR LA GLORIETA PR33+500)
33+340	33+340	I	1,00			1,00	10/03/2022	SR 30 (ZONA ESCOLAR LA GLORIETA PR33+500)
33+390	33+390	I	1,00			1,00	10/03/2022	SR 30 (ZONA ESCOLAR LA GLORIETA PR33+500)
32+980	32+980	D	1,00			1,00	10/03/2022	SR 30 (ZONA ESCOLAR LA GLORIETA PR33+500)

30+350	30+350	I	1,00			1,00	10/03/2022	SR 18 (ZONA ESCOLAR TISQUESUSA Y ZONA HOSPITAL SUSA)	
					SUBTOTAL	140,00			
						LONGITUD PARA PAGO		140,00	
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		0,00	
						LONGITUD TOTAL PARA PAGO :		140,00	Un

ING. ALEXIS ANDRES BLANCO CORONEL
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 08202139785ATL

MARTHA LUCIA CORTES PULIDO
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 01195-0369 CPITVC

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.° :** 10

RUTA: RUTA 45A05 **FECHA:** 26-feb-2022 a 25-mar-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
7P	Bandas alertadoras, ancho 0.25m, espesor 0.02 m. (Incluye Suministro e Instalación)	ML	0,00	220,00	220,00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	LONGITUD (m)	FECHA	DESCRIPCIÓN
48+700	48+700	I	3,82			3,82	9/03/2022	Bandas alertadoras 3 grupos, primer grupo 1, segundo grupo 2, tercer grupo 2, Glorieta entrada a chiquinquira- sobre variante chiquinquira Pr0+080 PR0+130 - tercera
48+700	48+700	I	3,91			3,91	9/03/2022	Bandas alertadoras 3 grupos, primer grupo 1, segundo grupo 2, tercer grupo 2, Glorieta entrada a chiquinquira- sobre variante chiquinquira Pr0+080 PR0+130 - Primera
48+700	48+700	I	3,81			3,81	9/03/2022	Bandas alertadoras 3 grupos, primer grupo 1, segundo grupo 2, tercer grupo 2, Glorieta entrada a chiquinquira- sobre variante chiquinquira Pr0+080 PR0+130 - segunda
48+700	48+700	I	4,07			4,07	9/03/2022	Bandas alertadoras 3 grupos, primer grupo 1, segundo grupo 2, tercer grupo 2, Glorieta entrada a chiquinquira- sobre variante chiquinquira Pr0+080 PR0+130 - cuasrta
48+700	48+700	I	4,18			4,18	9/03/2022	Bandas alertadoras 3 grupos, primer grupo 1, segundo grupo 2, tercer grupo 2, Glorieta entrada a chiquinquira- sobre variante chiquinquira Pr0+080 PR0+130 - quinta
41+461	41+700	E	7,40			7,40	10/03/2022	Bandas alertadoras 3 grupos (primer grupo 1, segundo grupo 2, tercer grupo 2) (zona escolar coliseo PR41+560) (quinta)
41+461	41+700	E	7,42			7,42	10/03/2022	Bandas alertadoras 3 grupos (primer grupo 1, segundo grupo 2, tercer grupo 2) (zona escolar coliseo PR41+560) (primera)
41+461	41+700	E	7,37			7,37	10/03/2022	Bandas alertadoras 3 grupos (primer grupo 1, segundo grupo 2, tercer grupo 2) (zona escolar coliseo PR41+560) (cuarta)
41+461	41+700	E	7,48			7,48	10/03/2022	Bandas alertadoras 3 grupos (primer grupo 1, segundo grupo 2, tercer grupo 2) (zona escolar coliseo PR41+560) (segunda)
41+461	41+700	E	7,44			7,44	10/03/2022	Bandas alertadoras 3 grupos (primer grupo 1, segundo grupo 2, tercer grupo 2) (zona escolar coliseo PR41+560) (tercera)
41+480	41+510	E	7,40			7,40	10/03/2022	Bandas alertadoras 3 grupos (primer grupo 1, segundo grupo 2, tercer grupo 2) (zona escolar coliseo PR41+560) (cuarta)
41+480	41+510	E	7,85			7,85	10/03/2022	Bandas alertadoras 3 grupos (primer grupo 1, segundo grupo 2, tercer grupo 2) (zona escolar coliseo PR41+560) (primera)
41+480	41+510	E	7,36			7,36	10/03/2022	Bandas alertadoras 3 grupos (primer grupo 1, segundo grupo 2, tercer grupo 2) (zona escolar coliseo PR41+560) (quinta)
41+480	41+510	E	7,47			7,47	10/03/2022	Bandas alertadoras 3 grupos (primer grupo 1, segundo grupo 2, tercer grupo 2) (zona escolar coliseo PR41+560) (segunda)
41+480	41+510	E	7,57			7,57	10/03/2022	Bandas alertadoras 3 grupos (primer grupo 1, segundo grupo 2, tercer grupo 2) (zona escolar coliseo PR41+560) (tercero)
K 33+140	K 33+200	E	8,17			8,17	16/03/2022	Bandas alertadoras 3 grupos (primer grupo 1, segundo grupo 2, tercer grupo 2) (Zona Escolar Tisquesusa) (primera)
K 33+140	K 33+200	E	9,40			9,40	16/03/2022	Bandas alertadoras 3 grupos (primer grupo 1, segundo grupo 2, tercer grupo 2)(Zona Escolar Tisquesusa) (segunda)
K 33+140	K 33+200	E	9,54			9,54	16/03/2022	Bandas alertadoras 3 grupos (primer grupo 1, segundo grupo 2, tercer grupo 2)(Zona Escolar Tisquesusa) (tercera)
K 33+140	K 33+200	E	10,20			10,20	16/03/2022	Bandas alertadoras 3 grupos (primer grupo 1, segundo grupo 2, tercer grupo 2) (Zona Escolar Tisquesusa) (cuarta)
K 33+140	K 33+200	E	10,33			10,33	16/03/2022	Bandas alertadoras 3 grupos (primer grupo 1, segundo grupo 2, tercer grupo 2) (Zona Escolar Tisquesusa) (quinta)
K 33+300	K 33+360	E	7,75			7,75	16/03/2022	Bandas alertadoras 3 grupos (primer grupo 1, segundo grupo 2, tercer grupo 2) (Zona Escolar Tisquesusa) (primera)
K 33+300	K 33+360	E	7,91			7,91	16/03/2022	Bandas alertadoras 3 grupos (primer grupo 1, segundo grupo 2, tercer grupo 2) (Zona Escolar Tisquesusa) (segunda)

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.° :** 10

RUTA: RUTA 45A05 **FECHA:** 26-feb-2022 a 25-mar-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
7P	Bandas alertadoras, ancho 0.25m, espesor 0.02 m. (Incluye Suministro e Instalación)	ML	0,00	220,00	220,00

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	LONGITUD (m)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K 33+300	K 33+360	E	7,86			7,86	16/03/2022	Bandas alertadoras 3 grupos (primer grupo 1, segundo grupo 2, tercer grupo 2) (Zona Escolar Tisquesusa) (tercera)
K 33+300	K 33+360	E	9,00			9,00	16/03/2022	Bandas alertadoras 3 grupos (primer grupo 1, segundo grupo 2, tercer grupo 2) (Zona Escolar Tisquesusa) (cuarta)
K 33+300	K 33+360	E	9,10			9,10	16/03/2022	Bandas alertadoras 3 grupos (primer grupo 1, segundo grupo 2, tercer grupo 2) (Zona Escolar Tisquesusa) (quinta)
K 31+560	K 31+610	E	7,55			7,55	18/03/2022	Bandas alertadoras 3 grupos (primer grupo 1, segundo grupo 2, tercer grupo 2) (Zona entrada norte y sur de Susa) (primera)
K 31+560	K 31+610	E	7,38			7,38	18/03/2022	Bandas alertadoras 3 grupos (primer grupo 1, segundo grupo 2, tercer grupo 2)(Zona entrada norte y sur de Susa) (segunda)
K 31+560	K 31+610	E	7,38			7,38	18/03/2022	Bandas alertadoras 3 grupos (primer grupo 1, segundo grupo 2, tercer grupo 2)(Zona entrada norte y sur de Susa) (tercera)
K 31+560	K 31+610	E	7,19			7,19	18/03/2022	Bandas alertadoras 3 grupos (primer grupo 1, segundo grupo 2, tercer grupo 2) (Zona entrada norte y sur de Susa) (cuarta)
K 31+560	K 31+610	E	7,17			7,17	18/03/2022	Bandas alertadoras 3 grupos (primer grupo 1, segundo grupo 2, tercer grupo 2) (Zona entrada norte y sur de Susa) (quinta)
					SUBTOTAL	220,48		
						LONGITUD PARA PAGO		220,48
						APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		-0,48
						LONGITUD TOTAL PARA PAGO :		220,00 ml

ING. ALEXIS ANDRES BLANCO CORONEL
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 08202139785ATL

MARTHA LUCIA CORTES PULIDO
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 01195-0369 CPITVC

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-feb-2022 a 25-mar-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
661.1P	Box Culvert prefabricado 1m x 1m. (Suministro e instalación)	ml	0,00	57,50	57,50

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	FECHA	DESCRIPCIÓN
4+555	4+555	E	18,75			18,75	26/02/2022	construccion obra No.33 tramo 1
4+765	4+765	E	22,50			22,50	5/03/2022	construccion obra 35
4+349	4+349	E	16,25			16,25	9/03/2022	construccion obra 32 tramo1
					SUBTOTAL	57,50		

LONGITUD PARA PAGO	57,50
APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN	0,00
LONGITUD TOTAL PARA PAGO :	57,50 ml

ING. ALEXIS ANDRES BLANCO CORONEL
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 08202139785ATL

JUAN ROBERTO DIAZ VELANDIA
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 25202 17653CND

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-feb-2022 a 25-mar-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTO** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
640,1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	KG	0,00	16.451,60	16.451,60

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	DIAMETRO (m)	LONGITUD (m)	CANTIDAD (m)	PESO Kg/m	PESO (Kg)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K 00+245	K 00+245		4	2,80	72	1,00	201,60	2/03/2022	Obra No: 53 losa inferior modulo 1 y 2
K 00+245	K 00+245		4	2,80	72	1,00	201,60	2/03/2022	Obra No: 53 losa inferior modulo 1 y 2
K 00+245	K 00+245		4	2,80	145	1,00	406,00	2/03/2022	Obra No: 53 losa inferior modulo 1 y 2
K 00+245	K 00+245		4	2,80	114	1,00	319,20	2/03/2022	Obra No: 53 losa inferior modulo 1 y 2
K 00+245	K 00+245		3	14,62	30	0,56	245,62	2/03/2022	Obra No: 53 losa inferior modulo 1 y 2
K 00+245	K 00+245		4	1,35	144	1,00	194,40	2/03/2022	Obra No: 53 losa inferior modulo 1 y 2
K 00+245	K 00+245		6	1,00	10	2,24	22,40	2/03/2022	Obra No: 53 losa inferior modulo 1 y 2
K 00+245	K 00+245		3	7,21	44	0,56	177,65	12/03/2022	Obra No: 53 Muros modulo 2
K 00+245	K 00+245		4	1,35	72	1,00	97,20	12/03/2022	Obra No: 53 Muros modulo 2
K 00+245	K 00+245		6	1,00	10	2,24	22,40	12/03/2022	Obra No: 53 Muros modulo 2
K 00+245	K 00+245		3	14,62	30	0,56	245,62	15/03/2022	Obra No: 53 Losa superior modulo 1 y 2
K 00+245	K 00+245		4	2,80	72	1,00	201,60	15/03/2022	Obra No: 53 Losa superior modulo 1 y 2
K 00+245	K 00+245		4	2,80	72	1,00	201,60	15/03/2022	Obra No: 53 Losa superior modulo 1 y 2
K 00+245	K 00+245		3	7,21	44	0,56	177,65	17/03/2022	Obra No: 53 Muros modulo 1
K 00+245	K 00+245		4	1,35	72	1,00	97,20	17/03/2022	Obra No: 53 Muros modulo 1
K 00+245	K 00+245		6	1,00	10	2,24	22,40	17/03/2022	Obra No: 53 Muros modulo 1
K 00+330	K 00+330		3	6,12	44	0,56	150,80	28/02/2022	Obra No: 52 placa superior modulo 1
K 00+330	K 00+330		4	2,80	60	1,00	168,00	28/02/2022	Obra No: 52 placa superior modulo 1
K 00+330	K 00+330		6	1,00	9	2,24	20,16	28/02/2022	Obra No: 52 placa superior modulo 1
K 00+330	K 00+330		4	1,35	60	1,00	81,00	28/02/2022	Obra No: 52 placa superior modulo 1
K 00+330	K 00+330		4	1,35	60	1,00	81,00	28/02/2022	Obra No: 52 placa superior modulo 2
K 00+330	K 00+330		3	6,12	44	0,56	150,80	28/02/2022	Obra No: 52 placa superior modulo 2
K 00+330	K 00+330		4	2,80	60	1,00	168,00	28/02/2022	Obra No: 52 placa superior modulo 2
K 00+330	K 00+330		6	1,00	9	2,24	20,16	28/02/2022	Obra No: 52 placa superior modulo 2
K 00+950	K 00+950		4	2,80	51	1,00	142,80	4/03/2022	Obra No: 4 losa inferior modulo 1 y 2
K 00+950	K 00+950		4	2,80	51	1,00	142,80	4/03/2022	Obra No: 4 losa inferior modulo 1 y 2
K 00+950	K 00+950		4	2,80	103	1,00	288,40	4/03/2022	Obra No: 4 losa inferior modulo 1 y 2
K 00+950	K 00+950		4	2,80	81	1,00	226,80	4/03/2022	Obra No: 4 losa inferior modulo 1 y 2
K 00+950	K 00+950		3	10,42	30	0,56	175,06	4/03/2022	Obra No: 4 losa inferior modulo 1 y 2
K 00+950	K 00+950		4	1,35	101	1,00	136,35	4/03/2022	Obra No: 4 losa inferior modulo 1 y 2
K 00+950	K 00+950		6	1,00	5	2,24	11,20	4/03/2022	Obra No: 4 losa inferior modulo 1 y 2
K 00+950	K 00+950		4	2,80	51	1,00	142,80	4/03/2022	Obra No: 4 losa inferior modulo 3 Y 4
K 00+950	K 00+950		4	2,80	51	1,00	142,80	4/03/2022	Obra No: 4 losa inferior modulo 3 Y 4
K 00+950	K 00+950		4	2,80	103	1,00	288,40	4/03/2022	Obra No: 4 losa inferior modulo 3 Y 4
K 00+950	K 00+950		4	2,80	81	1,00	226,80	4/03/2022	Obra No: 4 losa inferior modulo 3 Y 4
K 00+950	K 00+950		3	10,42	30	0,56	175,06	4/03/2022	Obra No: 4 losa inferior modulo 3 Y 4
K 00+950	K 00+950		4	1,35	101	1,00	136,35	4/03/2022	Obra No: 4 losa inferior modulo 3 Y 4
K 00+950	K 00+950		6	1,00	5	2,24	11,20	4/03/2022	Obra No: 4 losa inferior modulo 3 Y 4
K 00+950	K 00+950		3	7,06	44	0,56	173,96	9/03/2022	Obra No: 4 muros modulo 1
K 00+950	K 00+950		4	1,35	70	1,00	94,50	9/03/2022	Obra No: 4 muros modulo 1
K 00+950	K 00+950		6	10,00	1	2,24	22,40	9/03/2022	Obra No: 4 muros modulo 1
K 00+950	K 00+950		3	3,06	44	0,56	75,40	9/03/2022	Obra No: 4 muros modulo 2
K 00+950	K 00+950		4	1,35	30	1,00	40,50	9/03/2022	Obra No: 4 muros modulo 2
K 00+950	K 00+950		6	10,00	1	2,24	22,40	9/03/2022	Obra No: 4 muros modulo 2
K 00+950	K 00+950		3	5,06	22	0,56	62,34	17/03/2022	Obra No: 4 muro der modulo 3
K 00+950	K 00+950		4	1,35	25	1,00	33,75	17/03/2022	Obra No: 4 muro der modulo 3
K 00+950	K 00+950		6	10,00	1	2,24	22,40	17/03/2022	Obra No: 4 muro der modulo 3
K 00+950	K 00+950		3	5,06	22	0,56	62,34	17/03/2022	Obra No: 4 muro der modulo 4
K 00+950	K 00+950		4	1,35	25	1,00	33,75	17/03/2022	Obra No: 4 muro der modulo 4
K 00+950	K 00+950		6	10,00	1	2,24	22,40	17/03/2022	Obra No: 4 muro der modulo 4
K 03+641	K 03+641		3	8,06	30	0,56	135,41	9/03/2022	Obra No: 27 Muros lateral der modulo 1
K 03+641	K 03+641		4	1,35	40	1,00	54,00	9/03/2022	Obra No: 27 Muros lateral der modulo 1
K 03+641	K 03+641		6	1,00	6	2,24	13,44	9/03/2022	Obra No: 27 Muros lateral der modulo 1
K 03+641	K 03+641		3	8,06	30	0,56	135,41	9/03/2022	Obra No: 27 Muros lateral izq modulo 2
K 03+641	K 03+641		4	1,35	40	1,00	54,00	9/03/2022	Obra No: 27 Muros lateral izq modulo 2
K 03+641	K 03+641		6	1,00	6	2,24	13,44	9/03/2022	Obra No: 27 Muros lateral izq modulo 2
K 03+641	K 03+641		4	3,80	40	1,00	152,00	15/03/2022	Obra No: 27 Losa inferior modulo 3
K 03+641	K 03+641		4	3,80	40	1,00	152,00	15/03/2022	Obra No: 27 Losa inferior modulo 3
K 03+641	K 03+641		4	3,80	160	1,00	608,00	15/03/2022	Obra No: 27 Losa inferior modulo 3
K 03+641	K 03+641		4	3,80	64	1,00	243,20	15/03/2022	Obra No: 27 Losa inferior modulo 3
K 03+641	K 03+641		3	8,06	40	0,56	180,54	15/03/2022	Obra No: 27 Losa inferior modulo 3
K 03+641	K 03+641		4	1,35	80	1,00	108,00	15/03/2022	Obra No: 27 Losa inferior modulo 3
K 03+641	K 03+641		6	1,00	16	2,24	35,84	15/03/2022	Obra No: 27 Losa inferior modulo 3
K 03+641	K 03+641		3	8,06	30	0,56	135,41	15/03/2022	Obra No: 27 Muros lateral der modulo 2
K 03+641	K 03+641		4	1,35	40	1,00	54,00	15/03/2022	Obra No: 27 Muros lateral der modulo 2

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-feb-2022 a 25-mar-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTO** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
640,1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	KG	0,00	16.451,60	16.451,60

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	DIAMETRO (m)	LONGITUD (m)	CANTIDAD (m)	PESO Kg/m	PESO (Kg)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K 03+641	K 03+641		6	1,00	6	2,24	13,44	15/03/2022	Obra No: 27 Muros lateral der modulo 2
K 03+641	K 03+641		3	8,06	30	0,56	135,41	18/03/2022	Obra No: 27 Muros lateral izq modulo 1
K 03+641	K 03+641		4	1,35	40	1,00	54,00	18/03/2022	Obra No: 27 Muros lateral izq modulo 1
K 03+641	K 03+641		6	1,00	6	2,24	13,44	18/03/2022	Obra No: 27 Muros lateral izq modulo 1
K 03+641	K 03+641		3	8,06	60	0,56	270,82	22/03/2022	Obra No: 27 Muros laterales modulo 3
K 03+641	K 03+641		4	1,35	80	1,00	108,00	22/03/2022	Obra No: 27 Muros laterales modulo 3
K 03+641	K 03+641		6	1,00	12	2,24	26,88	22/03/2022	Obra No: 27 Muros laterales modulo 3
K 05+577	K 05+577		5	3,15	32	1,55	155,99	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	0,63	2	1,55	1,95	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	0,71	2	1,55	2,21	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	0,80	2	1,55	2,48	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	0,89	2	1,55	2,75	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	0,97	2	1,55	3,02	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	1,06	2	1,55	3,28	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	1,15	2	1,55	3,55	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	1,23	2	1,55	3,82	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	1,32	2	1,55	4,09	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	1,40	2	1,55	4,35	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	1,49	2	1,55	4,62	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	1,58	2	1,55	4,89	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	1,66	2	1,55	5,16	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	1,75	2	1,55	5,42	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	1,84	2	1,55	5,69	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	1,92	2	1,55	5,96	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	2,01	2	1,55	6,23	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	2,09	2	1,55	6,49	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	2,18	2	1,55	6,76	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	2,27	2	1,55	7,03	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	2,35	2	1,55	7,30	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	2,44	2	1,55	7,56	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	2,53	2	1,55	7,83	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	2,61	2	1,55	8,10	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	2,70	2	1,55	8,37	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	2,79	2	1,55	8,63	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	2,87	2	1,55	8,90	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	2,96	2	1,55	9,17	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	3,04	2	1,55	9,44	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	3,13	2	1,55	9,70	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	3,22	2	1,55	9,97	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	3,30	2	1,55	10,24	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	3,39	2	1,55	10,51	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	3,48	2	1,55	10,77	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	3,25	2	1,55	10,08	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	3,51	2	1,55	10,87	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	3,76	2	1,55	11,67	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	4,02	2	1,55	12,46	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	4,28	2	1,55	13,26	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	4,53	2	1,55	14,05	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	4,79	2	1,55	14,85	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	5,05	2	1,55	15,64	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	5,30	2	1,55	16,44	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	5,56	2	1,55	17,23	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	5,82	2	1,55	18,03	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	6,07	2	1,55	18,82	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	6,33	2	1,55	19,62	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	6,58	2	1,55	20,41	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	6,84	2	1,55	21,21	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	7,10	2	1,55	22,00	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	7,35	2	1,55	22,80	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	7,61	2	1,55	23,59	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	7,87	2	1,55	24,39	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	8,12	2	1,55	25,18	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	9,08	2	1,55	28,14	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	9,09	2	1,55	28,19	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	5,18	12	1,55	96,26	2/03/2022	Obra No: 41 aleta

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-feb-2022 a 25-mar-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTO** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
640,1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	KG	0,00	16.451,60	16.451,60

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	DIAMETRO (m)	LONGITUD (m)	CANTIDAD (m)	PESO Kg/m	PESO (Kg)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K 05+577	K 05+577		5	1,83	2	1,55	5,66	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	1,92	2	1,55	5,97	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	2,02	2	1,55	6,28	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	2,12	2	1,55	6,58	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	2,22	2	1,55	6,89	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	2,32	2	1,55	7,20	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	2,42	2	1,55	7,51	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	2,52	2	1,55	7,82	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	2,62	2	1,55	8,13	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	2,72	2	1,55	8,44	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	2,82	2	1,55	8,75	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	2,92	2	1,55	9,06	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	3,02	2	1,55	9,37	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	3,12	2	1,55	9,68	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	3,22	2	1,55	9,99	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	3,32	2	1,55	10,29	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	3,42	2	1,55	10,60	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	3,52	2	1,55	10,91	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	3,62	2	1,55	11,22	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	3,72	2	1,55	11,53	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	3,82	2	1,55	11,84	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	3,92	2	1,55	12,15	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	4,02	2	1,55	12,46	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	4,12	2	1,55	12,77	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	4,22	2	1,55	13,08	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	4,32	2	1,55	13,39	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	4,42	2	1,55	13,70	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	4,52	2	1,55	14,00	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	4,62	2	1,55	14,31	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	4,72	2	1,55	14,62	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	4,82	2	1,55	14,93	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	4,92	2	1,55	15,24	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	5,02	2	1,55	15,55	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	6,20	20	1,55	192,05	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	1,32	2	1,55	4,09	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	1,54	2	1,55	4,77	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	1,76	2	1,55	5,45	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	1,98	2	1,55	6,14	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	2,20	2	1,55	6,82	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	2,42	2	1,55	7,50	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	2,64	2	1,55	8,18	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	2,86	2	1,55	8,86	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	3,08	2	1,55	9,54	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	3,30	2	1,55	10,23	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	3,52	2	1,55	10,91	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	3,74	2	1,55	11,59	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	3,96	2	1,55	12,27	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	4,18	2	1,55	12,95	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	4,40	2	1,55	13,63	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	4,62	2	1,55	14,31	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	4,84	2	1,55	15,00	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	5,06	2	1,55	15,68	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	5,28	2	1,55	16,36	2/03/2022	Obra No: 41 aleta

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-feb-2022 a 25-mar-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTO** CONSORCIO ICEACSA-TPF

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
640,1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	KG	0,00	16.451,60	16.451,60

KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	DIAMETRO (m)	LONGITUD (m)	CANTIDAD (m)	PESO Kg/m	PESO (Kg)	FECHA	DESCRIPCIÓN
K 05+577	K 05+577		5	5,50	2	1,55	17,04	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	5,72	2	1,55	17,72	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		5	5,94	2	1,55	18,40	2/03/2022	Obra No: 41 aleta
K 05+577	K 05+577		4	5,20	17	1,00	88,40	2/03/2022	Obra No: 41 Empalme muro
K 05+577	K 05+577		3	1,40	38	0,56	29,79	2/03/2022	Obra No: 41 Empalme muro
K 05+577	K 05+577		4	1,92	7	1,00	13,44	2/03/2022	Obra No: 41 Empalme muro
K 05+595	K 05+595		4	3,45	51	1,00	175,95	25/03/2022	Obra No: 42 lado izquier muro, modulo 3
K 05+595	K 05+595		4	3,45	21	1,00	72,45	25/03/2022	Obra No: 42 lado izquier muro, modulo 3
K 05+595	K 05+595		3	5,30	30	0,56	89,04	25/03/2022	Obra No: 42 lado izquier muro, modulo 3
K 05+595	K 05+595		4	3,45	65	1,00	224,25	25/03/2022	Obra No: 42 lado derecho muro, modulo 3
K 05+595	K 05+595		4	3,45	26	1,00	89,70	25/03/2022	Obra No: 42 lado derecho muro, modulo 3
K 05+595	K 05+595		3	6,50	30	0,56	109,20	25/03/2022	Obra No: 42 lado derecho muro, modulo 3
K 05+595	K 05+595		4	3,80	146	1,00	554,80	25/03/2022	Obra No: 42 losa superior e inferior, modulo 3
K 05+595	K 05+595		3	6,50	4	0,56	14,56	25/03/2022	Obra No: 42 losa superior e inferior, modulo 3
K 05+595	K 05+595		3	6,45	4	0,56	14,45	25/03/2022	Obra No: 42 losa superior e inferior, modulo 3
K 05+595	K 05+595		3	6,39	4	0,56	14,31	25/03/2022	Obra No: 42 losa superior e inferior, modulo 3
K 05+595	K 05+595		3	6,34	4	0,56	14,20	25/03/2022	Obra No: 42 losa superior e inferior, modulo 3
K 05+595	K 05+595		3	6,28	4	0,56	14,07	25/03/2022	Obra No: 42 losa superior e inferior, modulo 3
K 05+595	K 05+595		3	6,23	4	0,56	13,96	25/03/2022	Obra No: 42 losa superior e inferior, modulo 3
K 05+595	K 05+595		3	6,17	4	0,56	13,82	25/03/2022	Obra No: 42 losa superior e inferior, modulo 3
K 05+595	K 05+595		3	6,06	4	0,56	13,57	25/03/2022	Obra No: 42 losa superior e inferior, modulo 3
K 05+595	K 05+595		3	6,00	4	0,56	13,44	25/03/2022	Obra No: 42 losa superior e inferior, modulo 3
K 05+595	K 05+595		3	5,95	4	0,56	13,33	25/03/2022	Obra No: 42 losa superior e inferior, modulo 3
K 05+595	K 05+595		3	5,90	4	0,56	13,22	25/03/2022	Obra No: 42 losa superior e inferior, modulo 3
K 05+595	K 05+595		3	5,84	4	0,56	13,08	25/03/2022	Obra No: 42 losa superior e inferior, modulo 3
K 05+595	K 05+595		3	5,79	4	0,56	12,97	25/03/2022	Obra No: 42 losa superior e inferior, modulo 3
K 05+595	K 05+595		3	5,73	4	0,56	12,84	25/03/2022	Obra No: 42 losa superior e inferior, modulo 3
K 05+595	K 05+595		3	5,68	4	0,56	12,72	25/03/2022	Obra No: 42 losa superior e inferior, modulo 3
K 05+595	K 05+595		3	5,62	4	0,56	12,59	25/03/2022	Obra No: 42 losa superior e inferior, modulo 3
K 05+595	K 05+595		3	5,57	4	0,56	12,48	25/03/2022	Obra No: 42 losa superior e inferior, modulo 3
K 05+595	K 05+595		3	5,51	4	0,56	12,34	25/03/2022	Obra No: 42 losa superior e inferior, modulo 3
K 05+595	K 05+595		3	5,40	4	0,56	12,10	25/03/2022	Obra No: 42 losa superior e inferior, modulo 3
K 05+595	K 05+595		4	1,35	125	1,00	168,75	25/03/2022	Obra No: 42 losa superior e inferior, modulo 3
K 06+330	K 06+330		4	3,80	25	1,00	95,00	5/03/2022	Obra No: 50 losa inferior modulo 3
K 06+330	K 06+330		4	3,80	25	1,00	95,00	5/03/2022	Obra No: 50 losa inferior modulo 3
K 06+330	K 06+330		4	3,80	100	1,00	380,00	5/03/2022	Obra No: 50 losa inferior modulo 3
K 06+330	K 06+330		4	3,80	40	1,00	152,00	5/03/2022	Obra No: 50 losa inferior modulo 3
K 06+330	K 06+330		3	5,06	40	0,56	113,34	5/03/2022	Obra No: 50 losa inferior modulo 3
K 06+330	K 06+330		4	1,35	50	1,00	67,50	5/03/2022	Obra No: 50 losa inferior modulo 3
K 06+330	K 06+330		3	5,16	60	0,56	173,38	10/03/2022	Obra No: 50 Muros modulo 3
K 06+330	K 06+330		4	1,35	52	1,00	70,20	10/03/2022	Obra No: 50 Muros modulo 3
5+154	5+154		3	8,06	60	0,56	270,82	2/03/2022	Obra No: 38 Muros laterales modulo 1
5+154	5+154		4	1,35	80	1,00	108,00	2/03/2022	Obra No: 38 Muros laterales modulo 1
5+154	5+154		6	1,00	22	2,24	49,28	2/03/2022	Obra No: 38 Muros laterales modulo 1
5+154	5+154		3	8,06	60	0,56	270,82	9/03/2022	Obra No: 38 Muros laterales modulo 2
5+154	5+154		4	1,35	80	1,00	108,00	9/03/2022	Obra No: 38 Muros laterales modulo 2
5+154	5+154		6	1,00	6	2,24	13,44	9/03/2022	Obra No: 38 Muros laterales modulo 2
5+154	5+154		3	8,06	30	0,56	135,41	11/03/2022	Obra No: 38 Muro izq modulo 3
5+154	5+154		4	1,35	40	1,00	54,00	11/03/2022	Obra No: 38 Muro izq modulo 3

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | MHC S.A.S CONSORCIO VIAL MHC 063

F-635 A

CONTRATO DE OBRA: 989 DE 2021 **PREACTA N.º :** 10

RUTA: RUTA 45ACND **FECHA:** 26-feb-2022 a 25-mar-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO VIAL MHC 063


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 971 DE 2021 **INTERVENTO** CONSORCIO ICEACSA-TPF


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
640,1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	KG	0,00	16.451,60	16.451,60


KM INICIAL	KM FINAL	CARRIL	DIAMETRO (m)	LONGITUD (m)	CANTIDAD (m)	PESO Kg/m	PESO (Kg)	FECHA	DESCRIPCIÓN
5+154	5+154		6	1,00	6	2,24	13,44	11/03/2022	Obra No: 38 Muro izq modulo 3
5+154	5+154		4	3,80	40	1,00	152,00	24/03/2022	Obra No: 38 Losa inferior modulo 3
5+154	5+154		4	3,80	40	1,00	152,00	24/03/2022	Obra No: 38 Losa inferior modulo 3
5+154	5+154		4	3,80	160	1,00	608,00	24/03/2022	Obra No: 38 Losa inferior modulo 3
5+154	5+154		4	3,80	64	1,00	243,20	24/03/2022	Obra No: 38 Losa inferior modulo 3
5+154	5+154		3	8,06	40	0,56	180,54	24/03/2022	Obra No: 38 Losa inferior modulo 3
5+154	5+154		4	1,35	80	1,00	108,00	24/03/2022	Obra No: 38 Losa inferior modulo 3
5+154	5+154		6	1,00	8	2,24	17,92	24/03/2022	Obra No: 38 Losa inferior modulo 3
							16451,59		
							LONGITUD PARA PAGO		16451,59
							APROXIMACIÓN S/ ESPECIFICACIÓN		**0,01**
							LONGITUD TOTAL PARA PAGO :		**16451,60** Kg


ING. ALEXIS ANDRES BLANCO CORONEL
ING. RESIDENTE DE OBRA
Matricula No: 08202139785ATL


JUAN ROBERTO DIAZ VELANDIA
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA
Matrícula No. 25202 17653CND

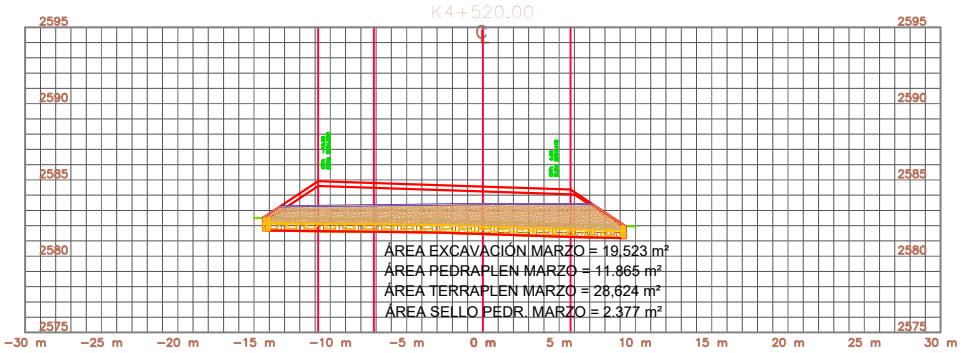

K4+520.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 19.523 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11.865 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 28.624 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.377 m²

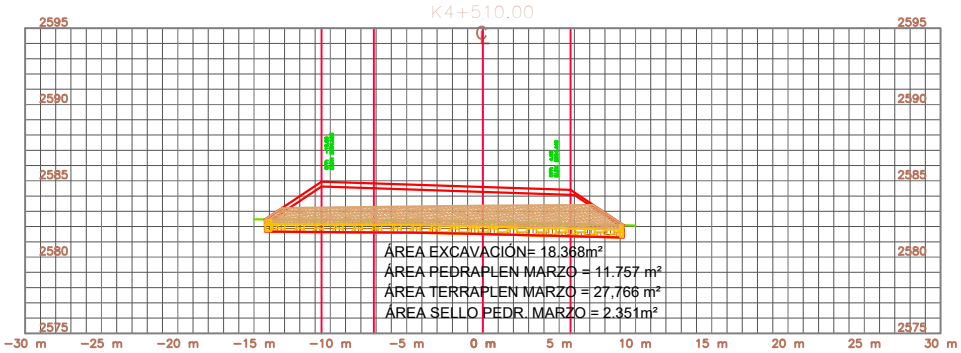

K4+510.00
ÁREA EXCAVACIÓN= 18.368m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11.757 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 27.766 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.351m²

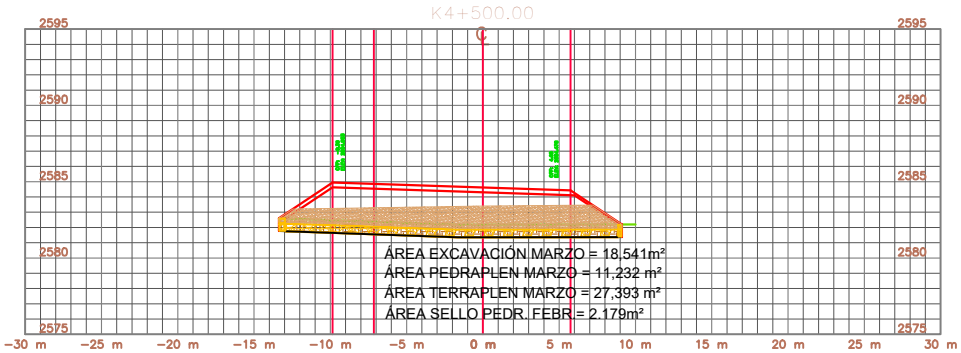

K4+500.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 18.541m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11.232 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 27.393 m²
ÁREA SELLO PEDR. FEBR = 2.179m²

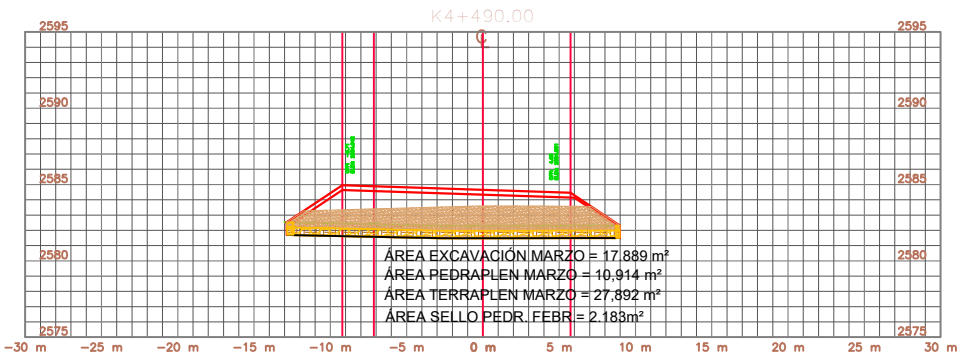

K4+490.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 17.889 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10.914 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 27.892 m²
ÁREA SELLO PEDR. FEBR = 2.183m²

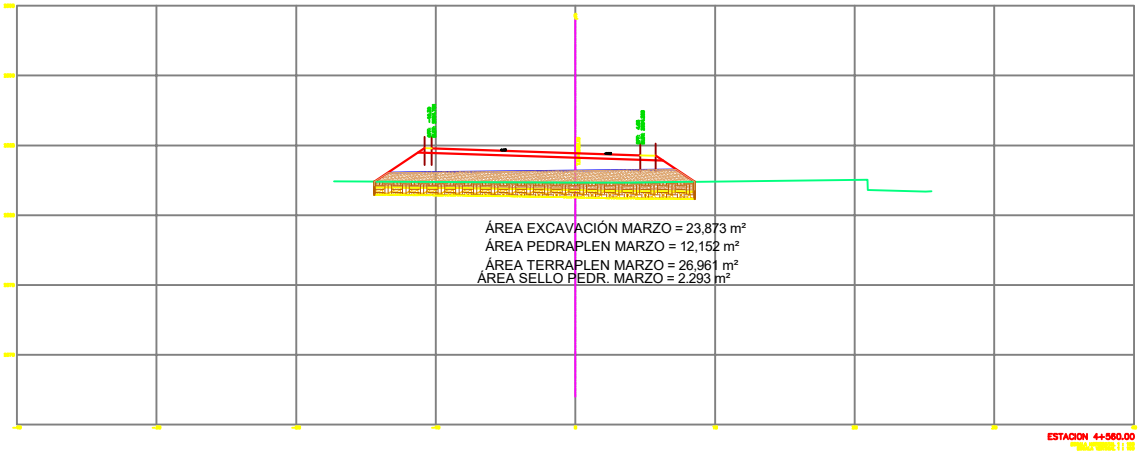

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 23,873 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 12,152 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 26,961 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.293 m²
ESTACION 4+560.00

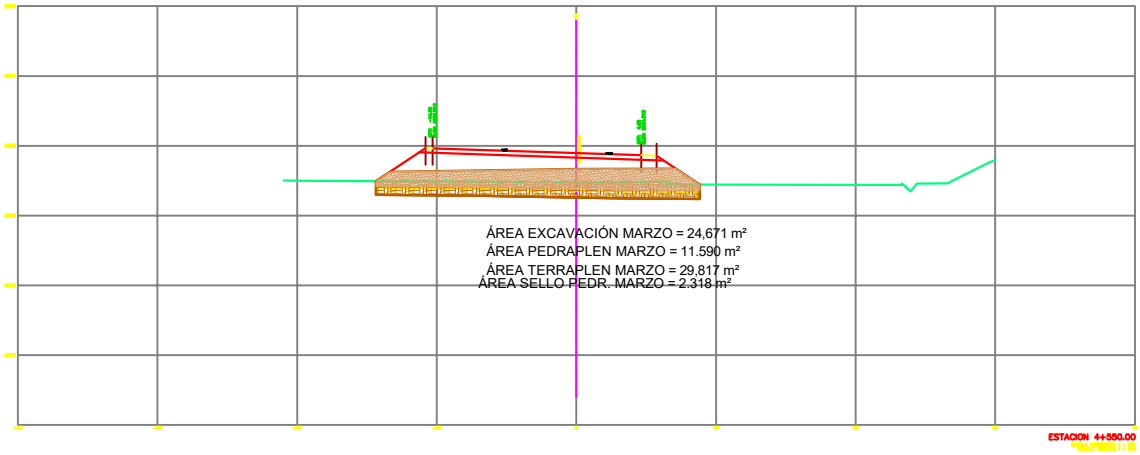

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 24,671 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11.590 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 29,817 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.318 m²
ESTACION 4+550.00

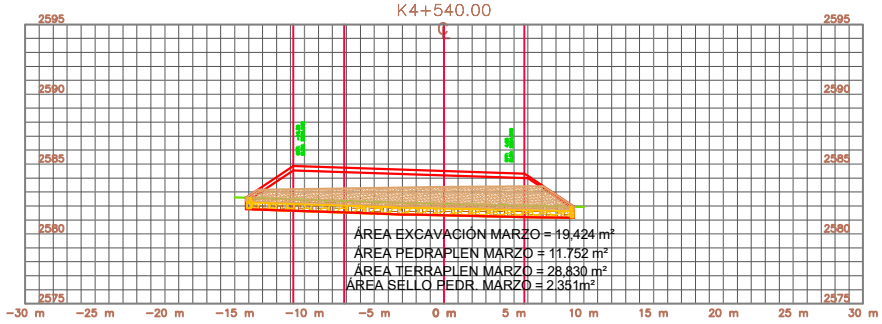

K4+540.00
2595
2590
2585
2580
2575
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 19,424 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11.752 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 28,830 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.351m²
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m

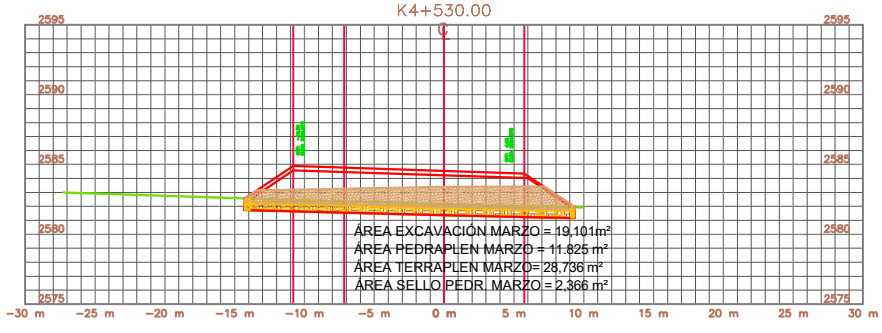

K4+530.00
2595
2590
2585
2580
2575
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 19,101m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11.825 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO= 28,736 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.366 m²
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m

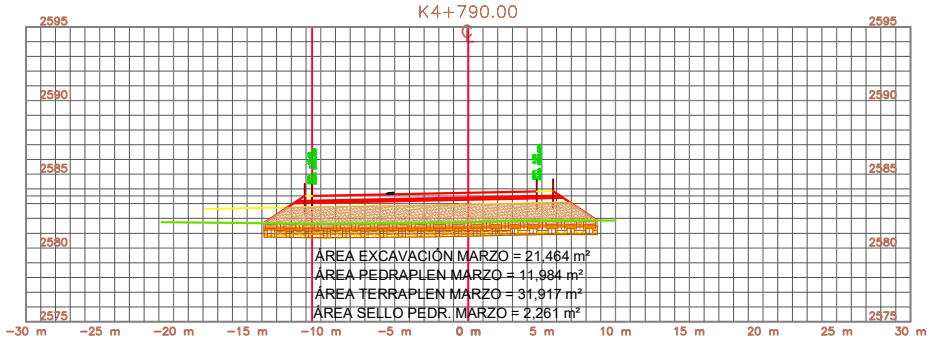

K4+790.00
2595
2590
2585
2580
2575
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 21.464 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11.984 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 31.917 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.261 m²
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m

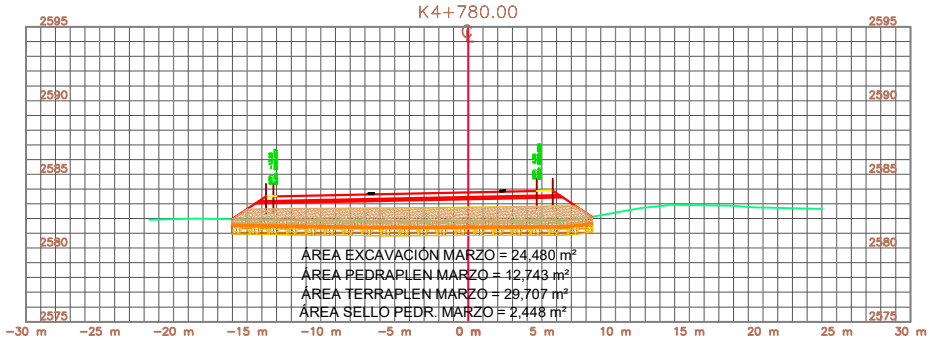

K4+780.00
2595
2590
2585
2580
2575
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 24.480 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 12.743 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 29.707 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.448 m²
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m

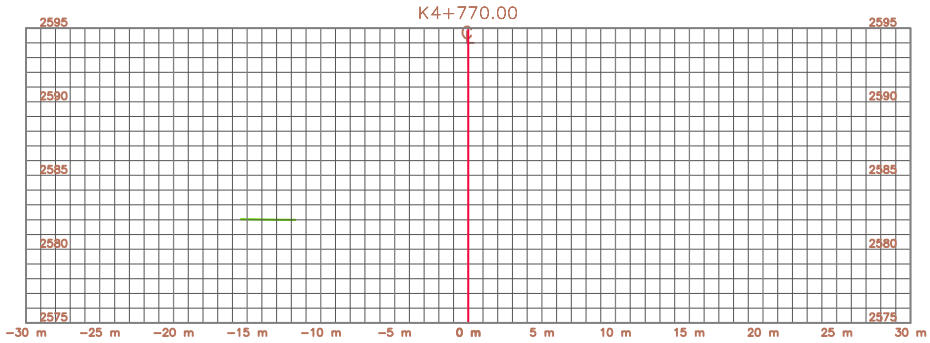

K4+770.00
2595
2590
2585
2580
2575
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m



K4+760.00
2595
2590
2585
2580
2575
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m

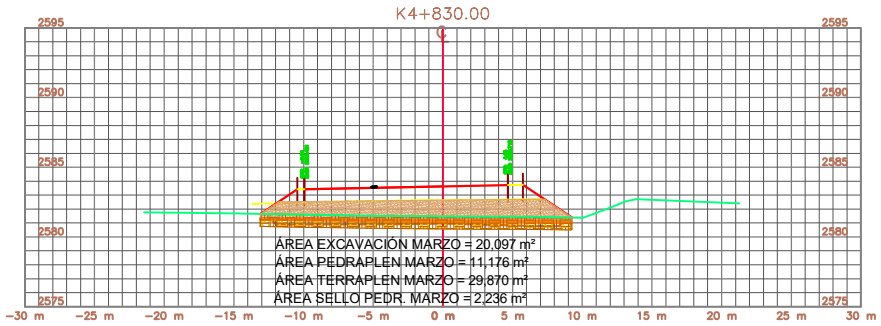

K4+830.00
2595
2590
2585
2580
2575
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 20,097 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11,176 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 29,870 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,236 m²

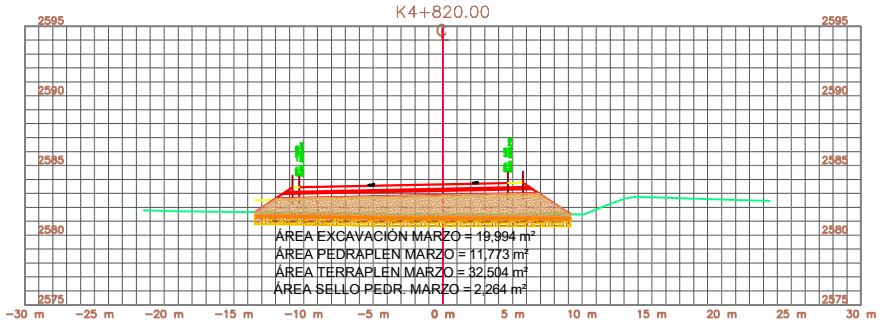

K4+820.00
2595
2590
2585
2580
2575
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 19,994 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11,773 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 32,504 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,264 m²

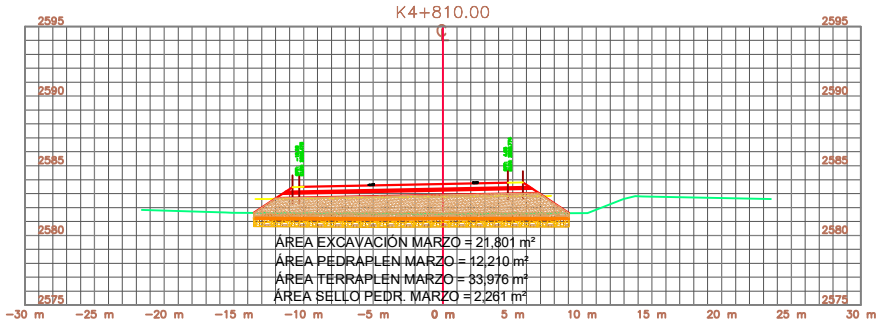

K4+810.00
2595
2590
2585
2580
2575
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 21,801 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 12,210 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 33,976 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,261 m²

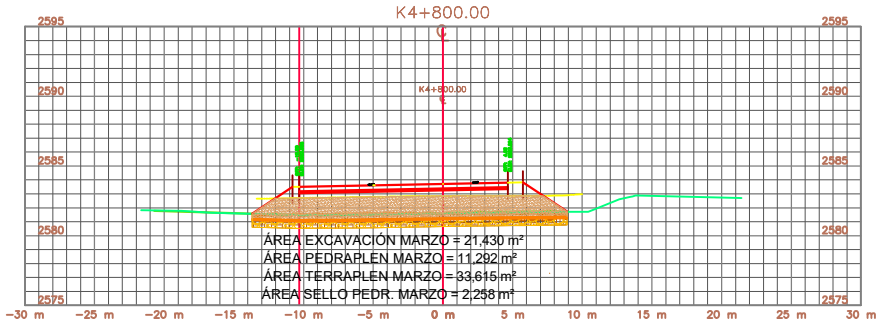

K4+800.00
2595
2590
2585
2580
2575
K4+800.00
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 21,430 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11,282 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 33,615 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,258 m²

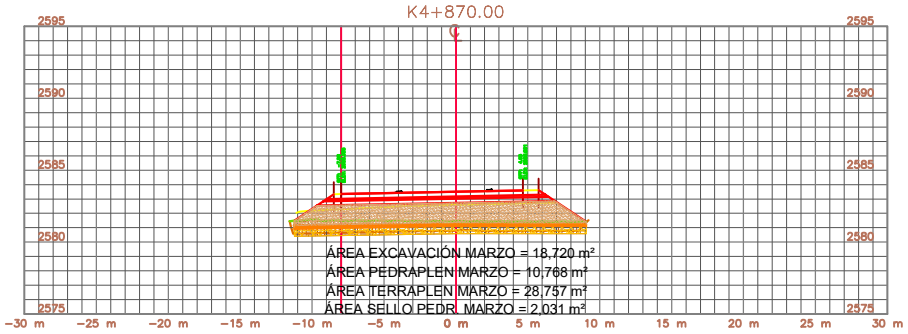

K4+870.00
2595
2590
2585
2580
2575
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 18,720 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10,768 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 28,757 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,031 m²

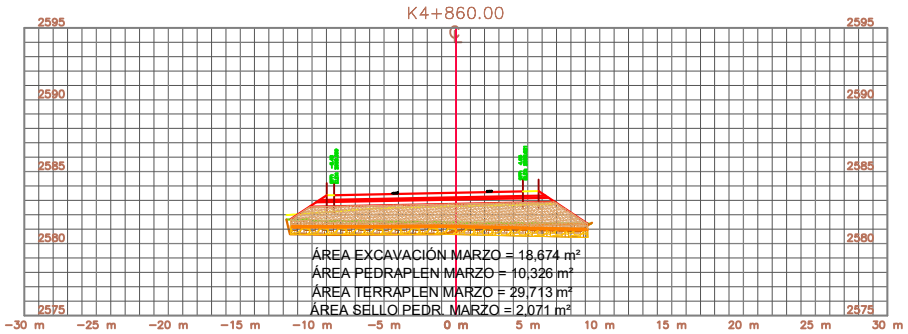
K4+860.00
2595
2590
2585
2580
2575
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 18,674 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10,326 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 29,713 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,071 m²

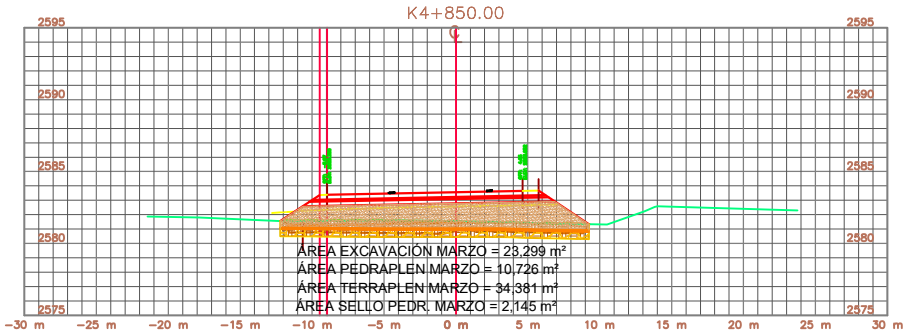

K4+850.00
2595
2590
2585
2580
2575
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 23,299 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10,726 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 34,381 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,145 m²

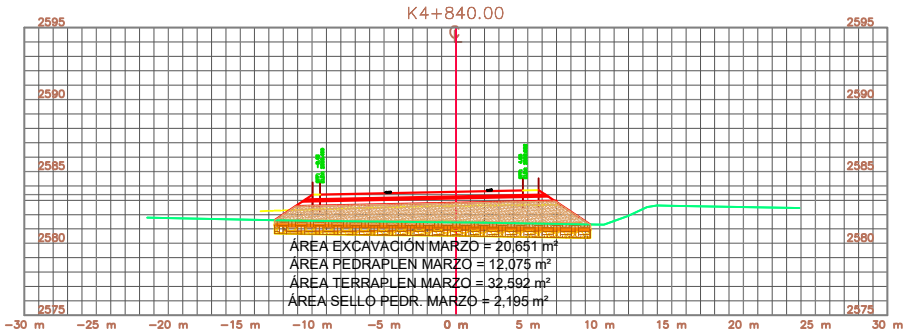
K4+840.00
2595
2590
2585
2580
2575
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 20,651 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 12,075 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 32,592 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,195 m²

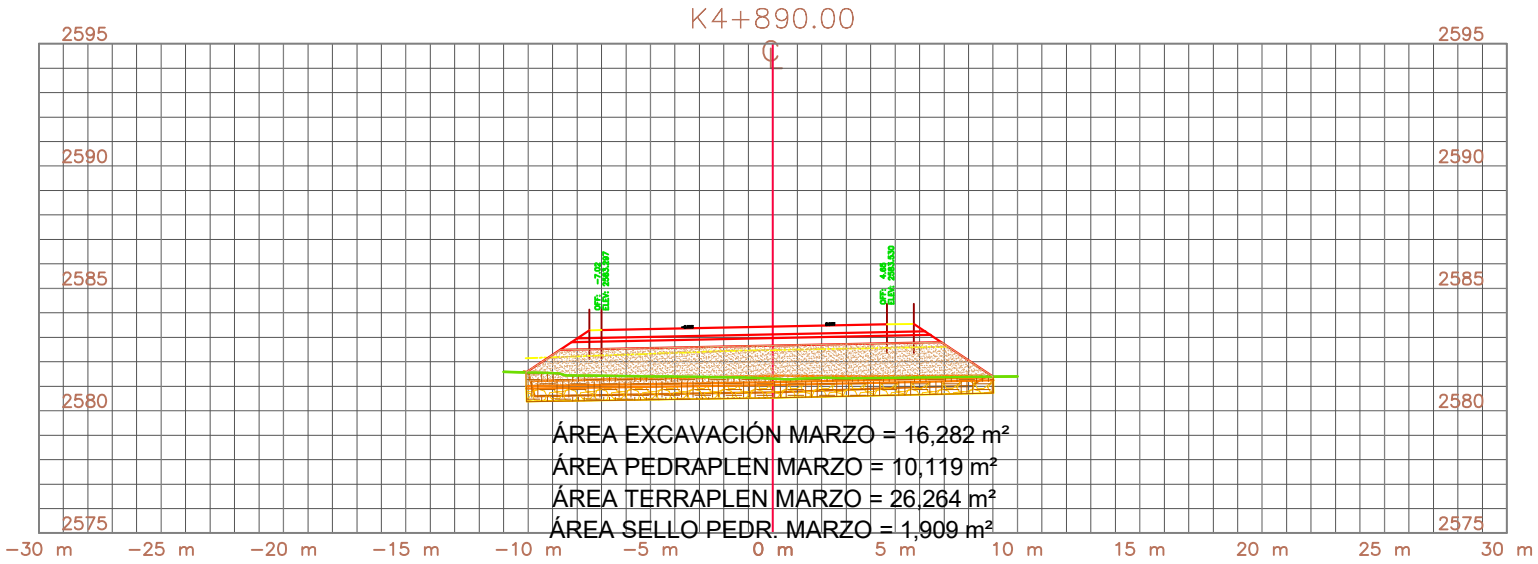

K4+890.00
2595
2590
2585
2580
2575
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 16,282 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10,119 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 26,264 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,909 m²

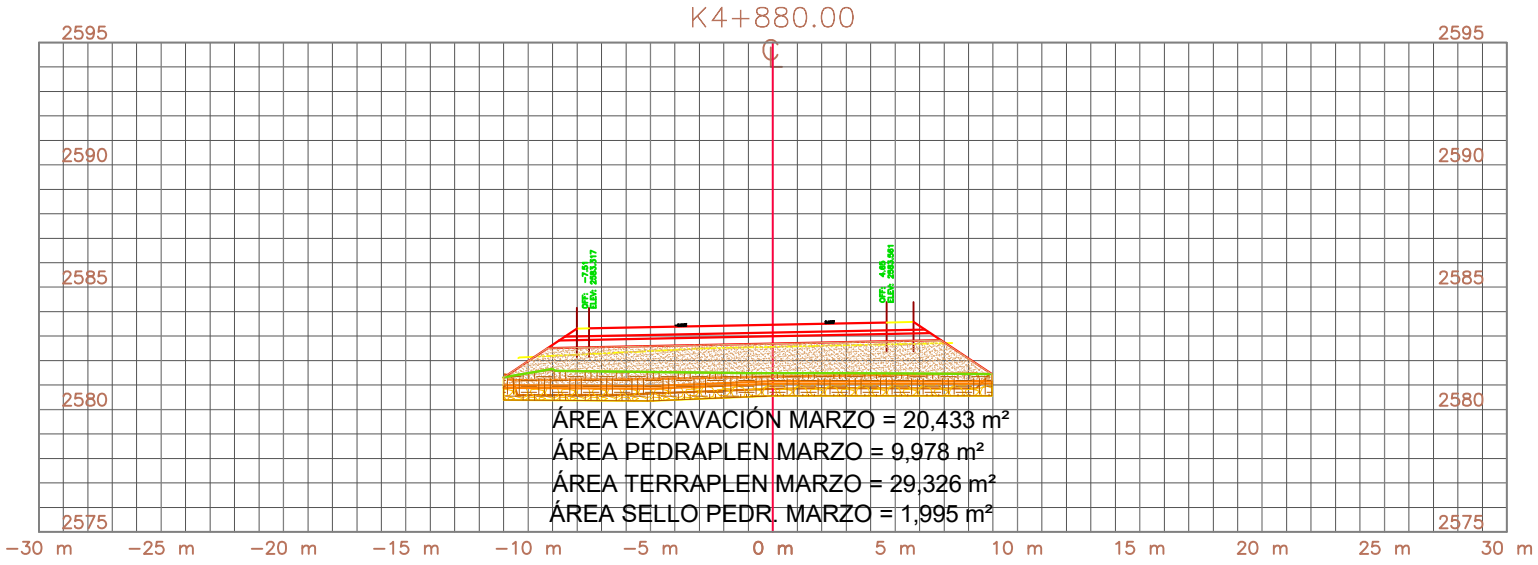
K4+880.00
2595
2590
2585
2580
2575
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 20,433 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9,978 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 29,326 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,995 m²


K5+060.00

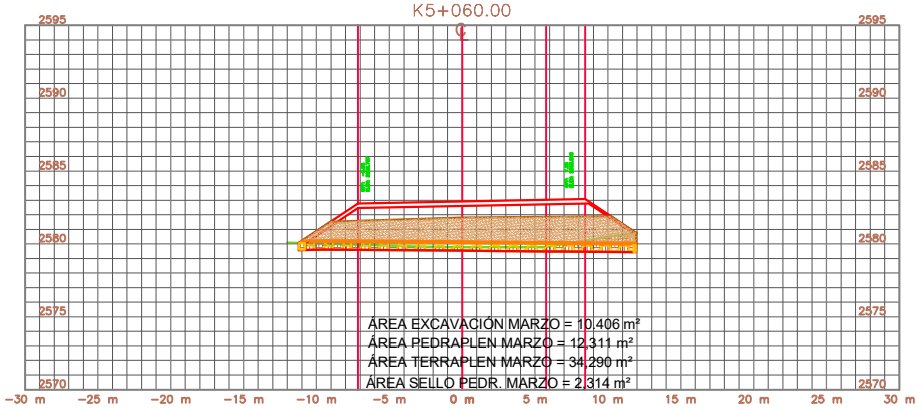


K5+050.00

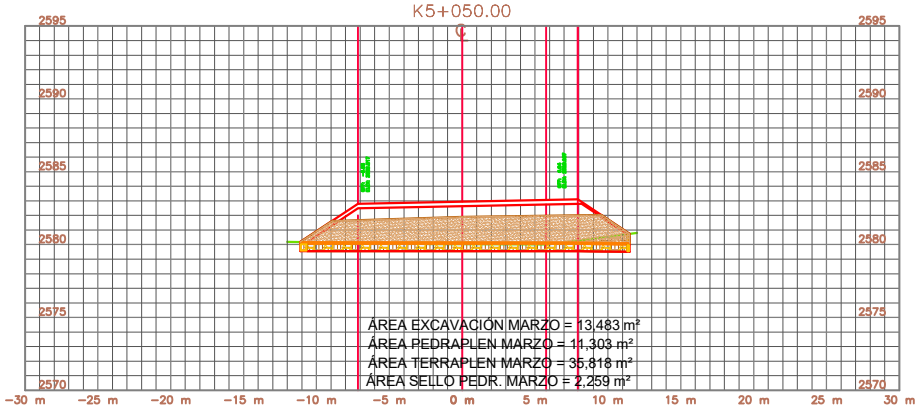


K5+040.00

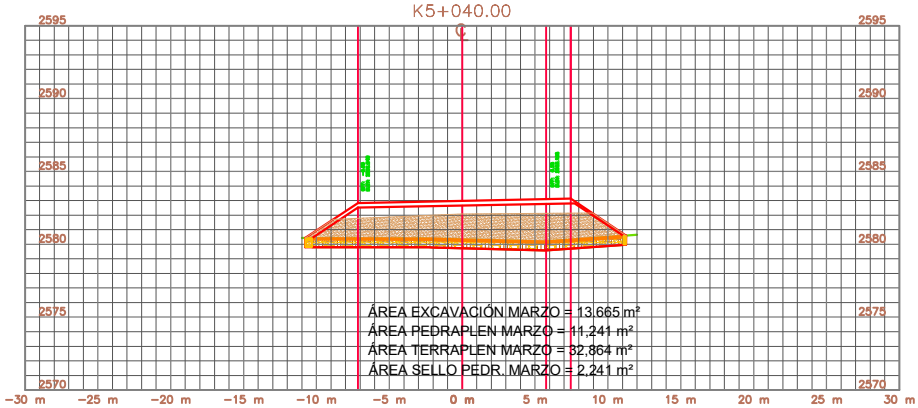


K5+030.00

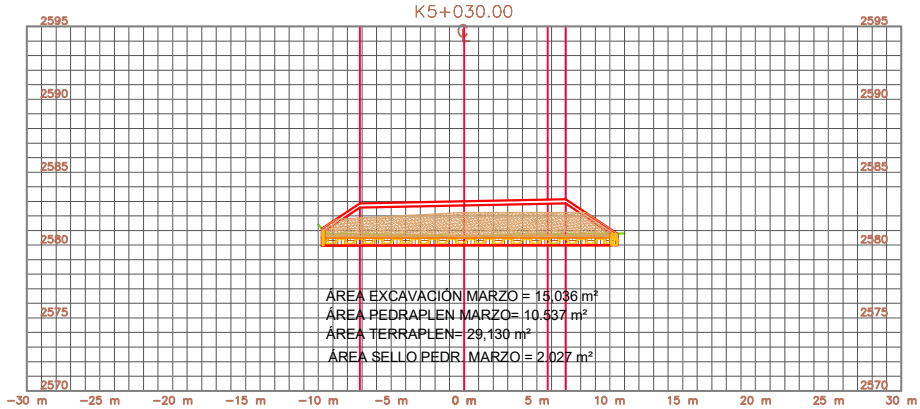


K5+100.00

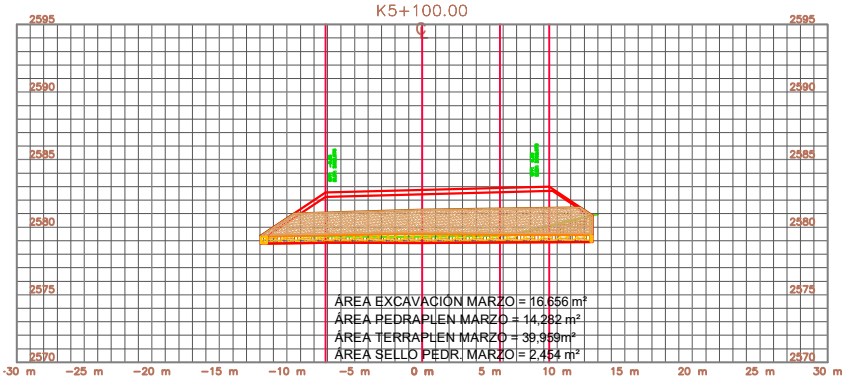


K5+090.00

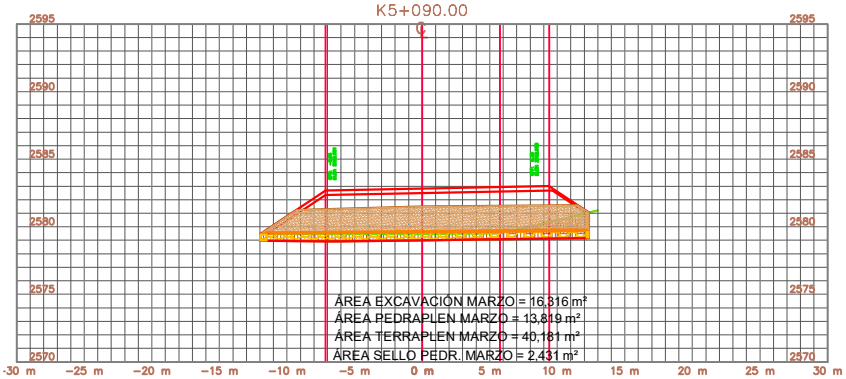


K5+080.00

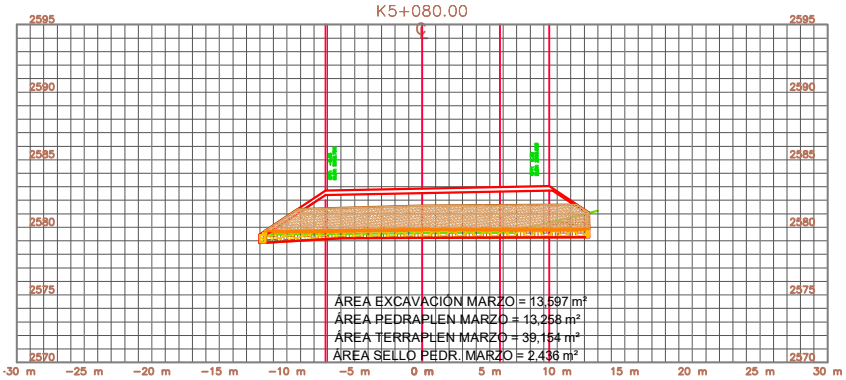


K5+070.00

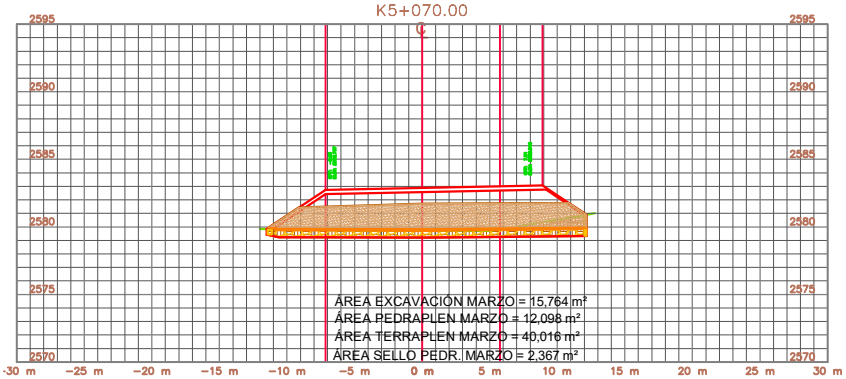


K5+150.00

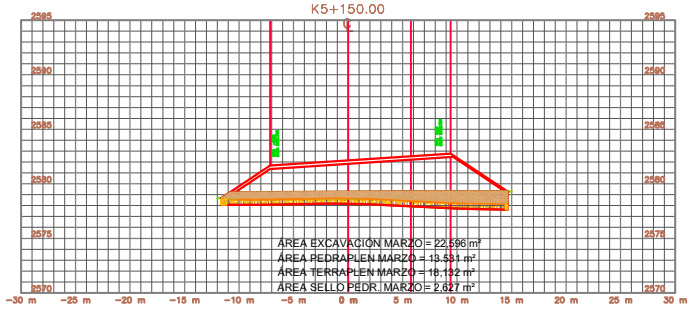


K5+140.00

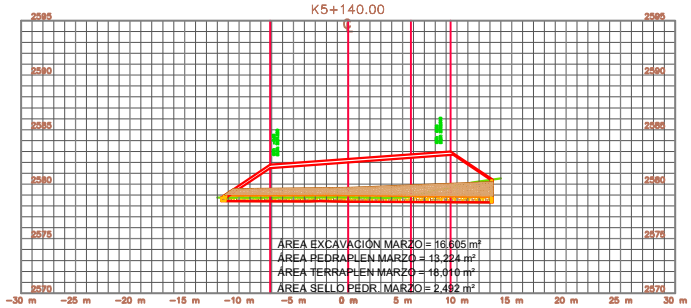


K5+130.00

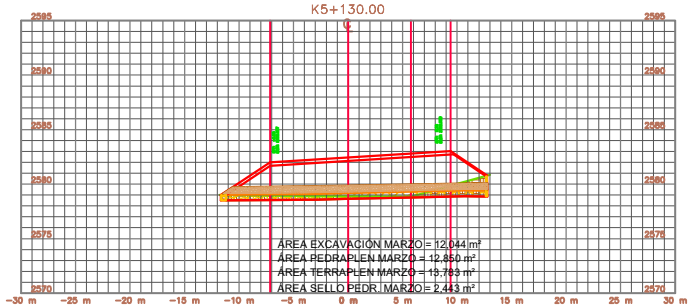



K5+120.00

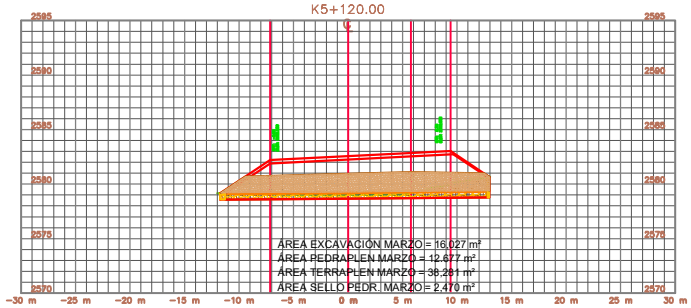



K5+110.00

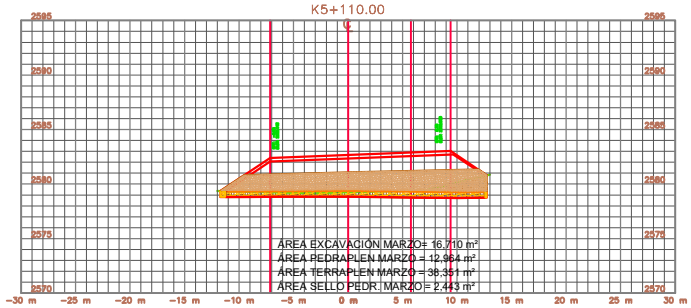


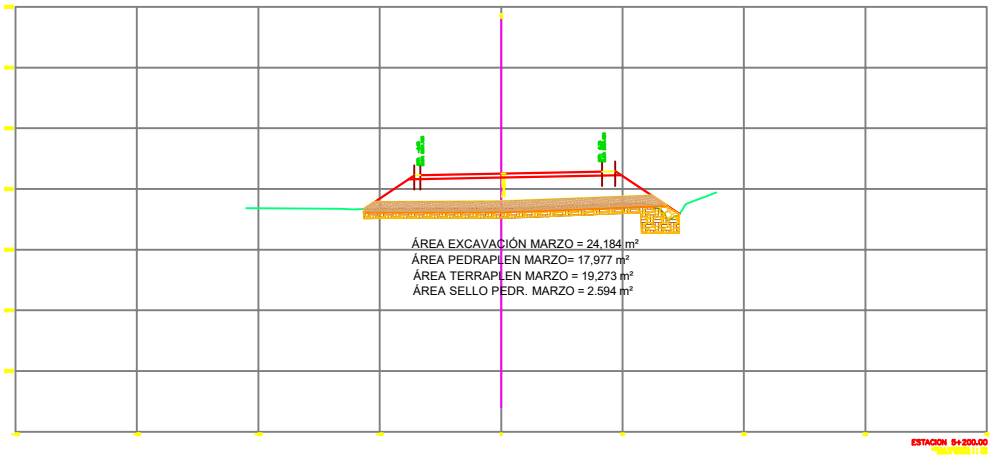

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 24,184 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 17,977 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 19,273 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.594 m²
ESTACION 5+200.00

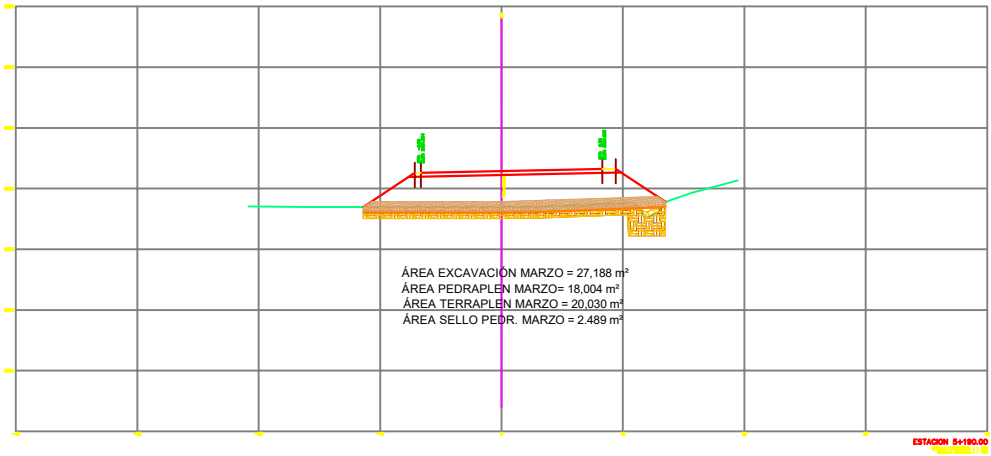

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 27,188 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 18,004 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 20,030 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.489 m²
ESTACION 5+190.00

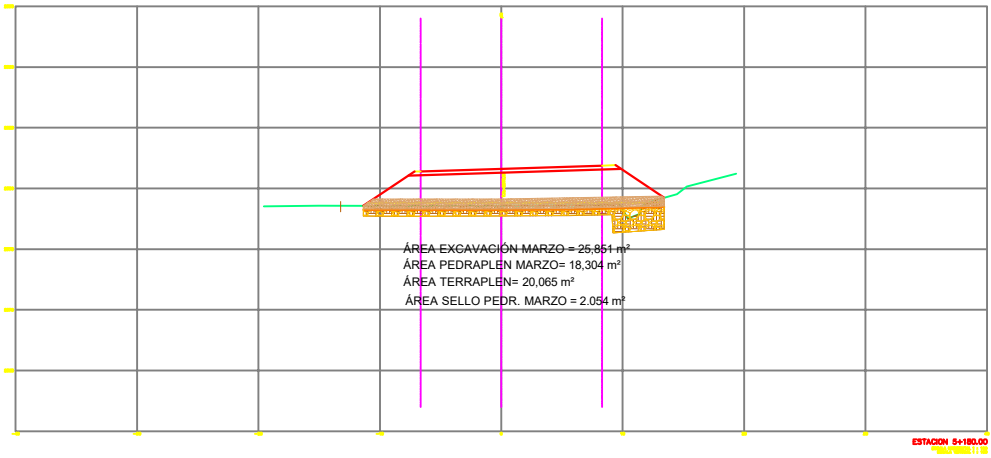

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 25,851 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 18,304 m²
ÁREA TERRAPLEN= 20,065 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.054 m²
ESTACION 5+180.00

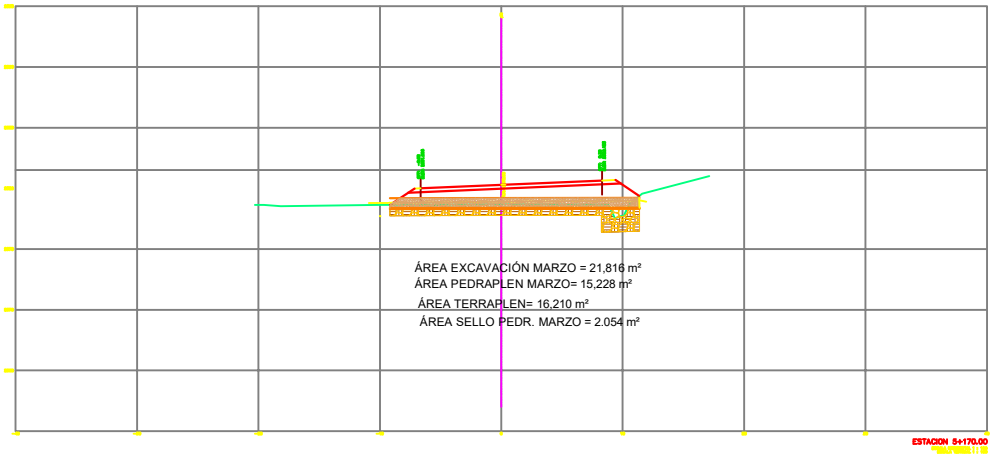

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 21,816 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 15,228 m²
ÁREA TERRAPLEN= 16,210 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.054 m²
ESTACION 5+170.00

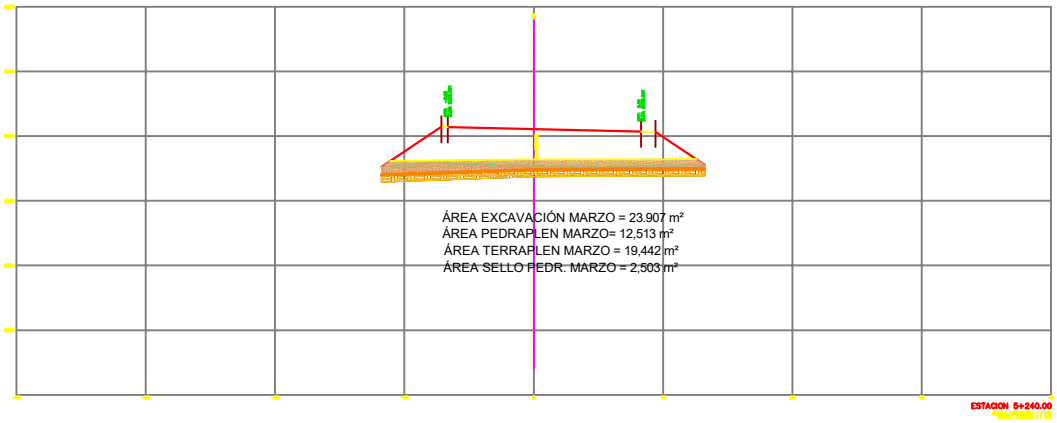

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 23,907 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 12,513 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 19,442 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,503 m²
ESTACION 5+240.00

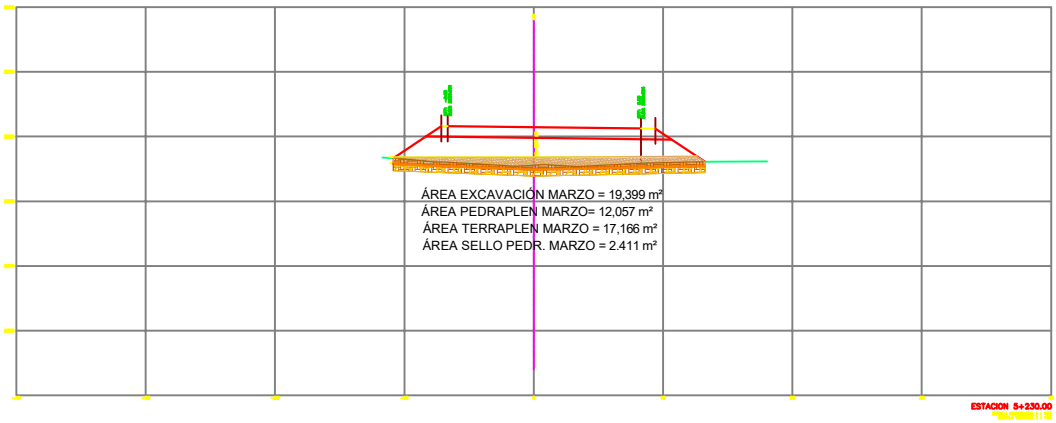

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 19,399 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 12,057 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 17,166 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.411 m²
ESTACION 5+230.00

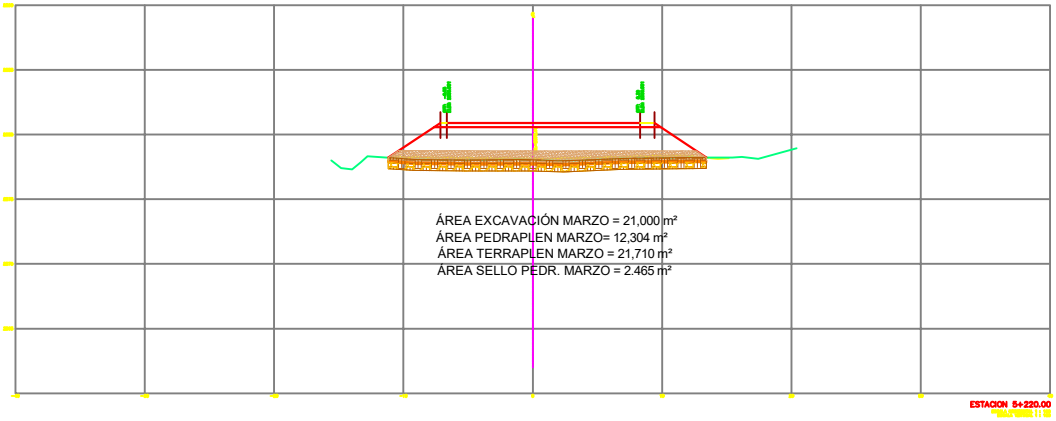

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 21,000 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 12,304 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 21,710 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.465 m²
ESTACION 5+220.00

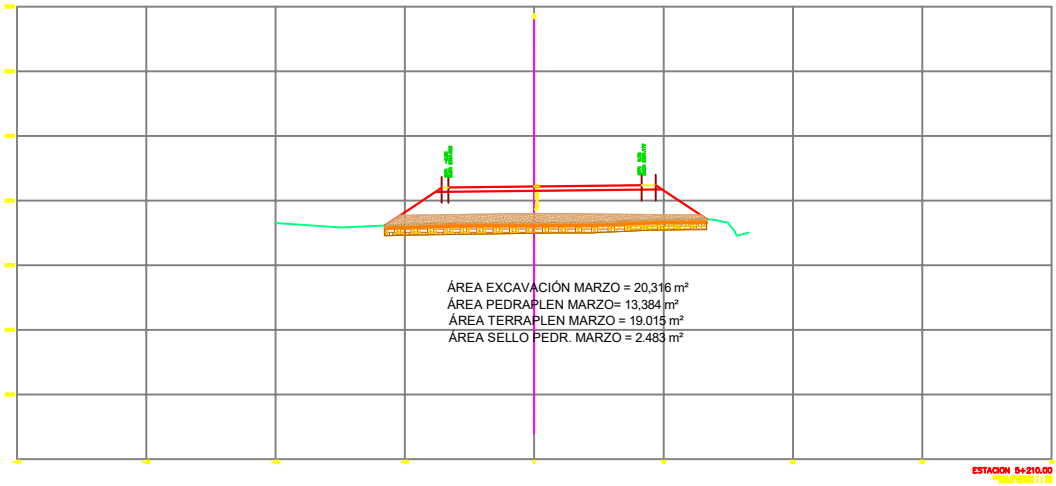

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 20,316 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 13,384 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 19,015 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.483 m²
ESTACION 5+210.00

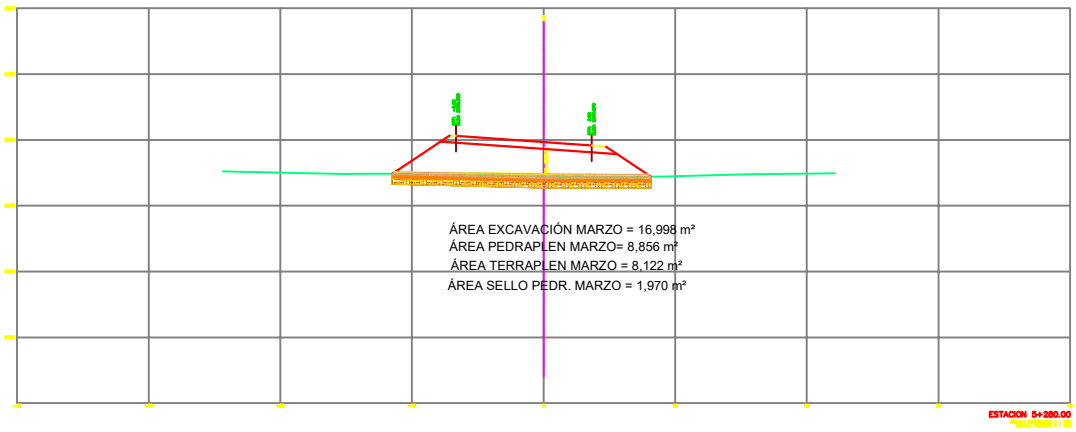
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 16,998 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 8,856 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 8,122 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,970 m²
ESTACION 5+280.00

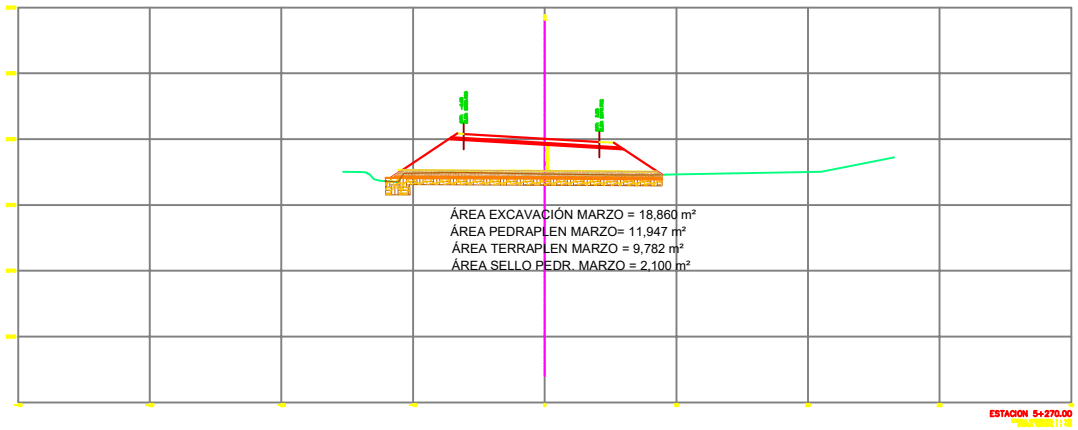
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 18,860 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 11,947 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 9,782 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,100 m²
ESTACION 5+270.00

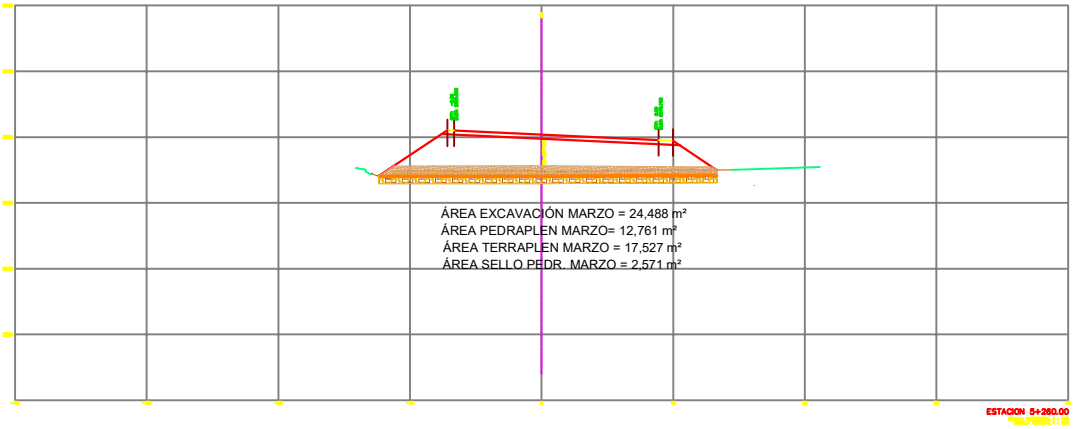

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 24,488 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 12,761 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 17,527 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,571 m²
ESTACION 5+260.00

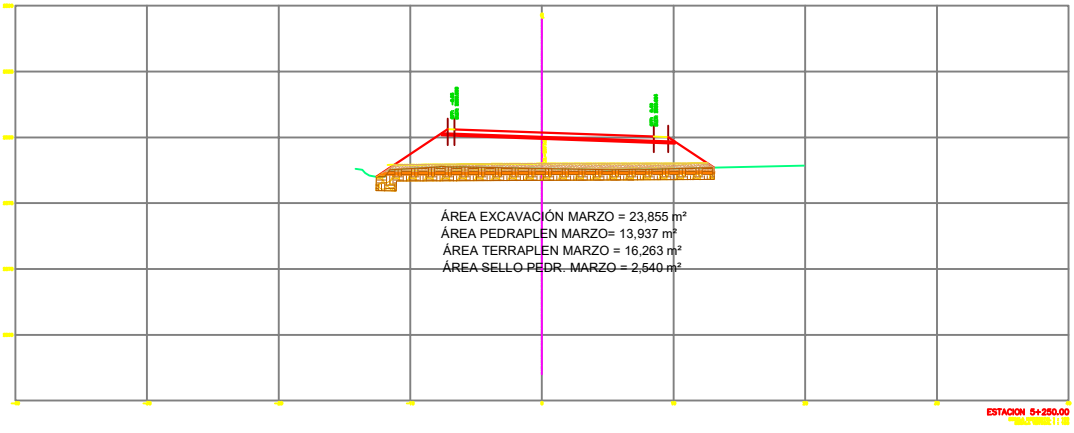
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 23,855 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 13,937 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 16,263 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,540 m²
ESTACION 5+250.00

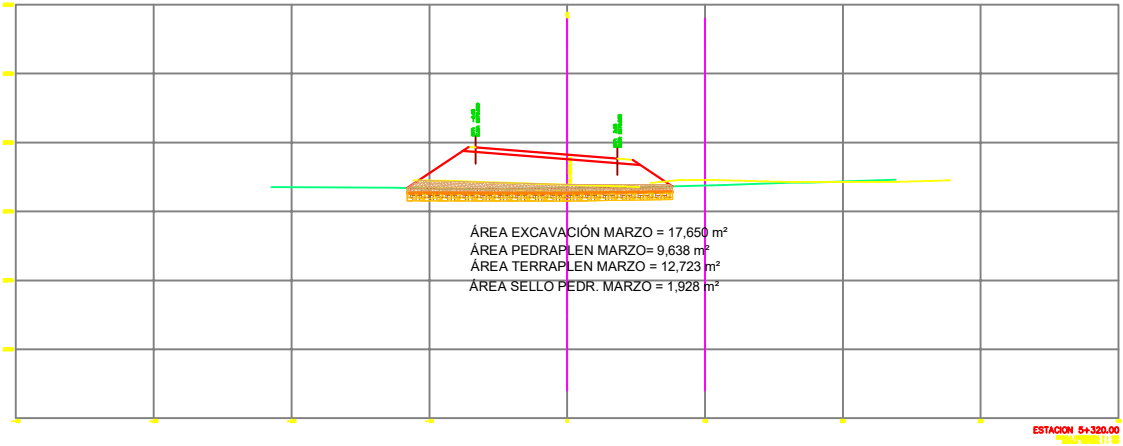


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 17,650 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,638 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 12,723 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,928 m²

ESTACION 5+320.00

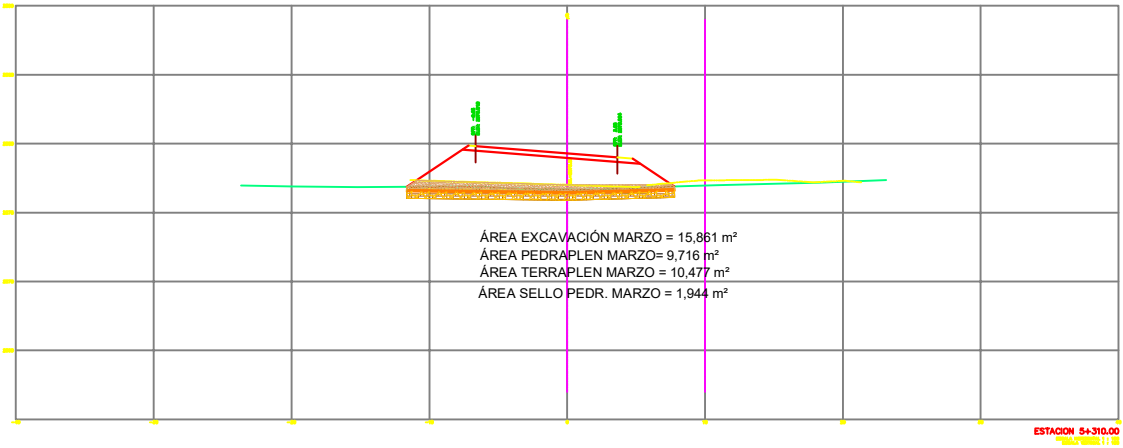


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 15,861 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,716 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 10,477 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,944 m²

ESTACION 5+310.00

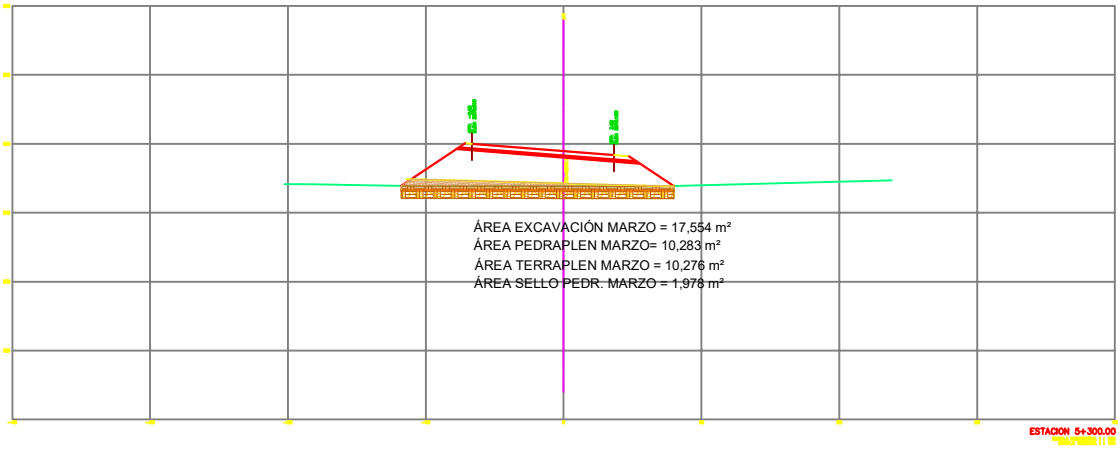


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 17,554 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 10,283 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 10,276 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,978 m²

ESTACION 5+300.00

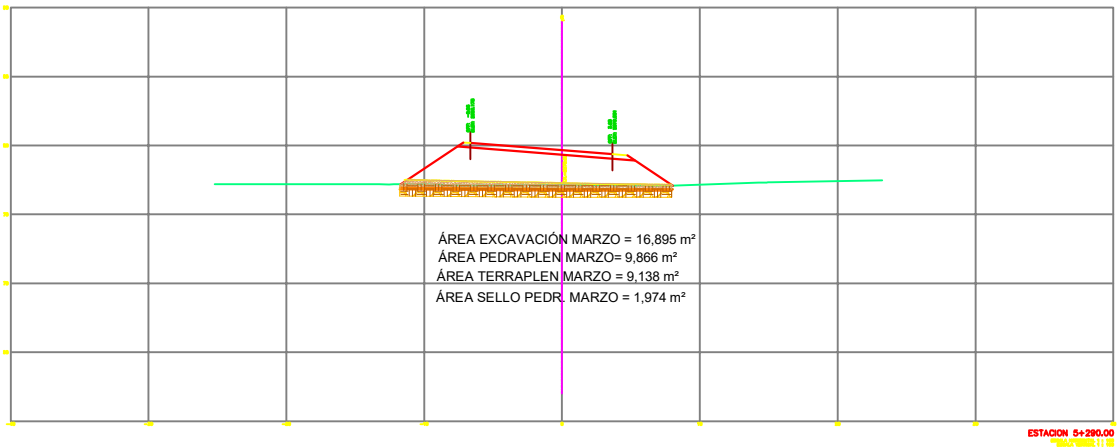


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 16,895 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,866 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 9,138 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,974 m²

ESTACION 5+290.00

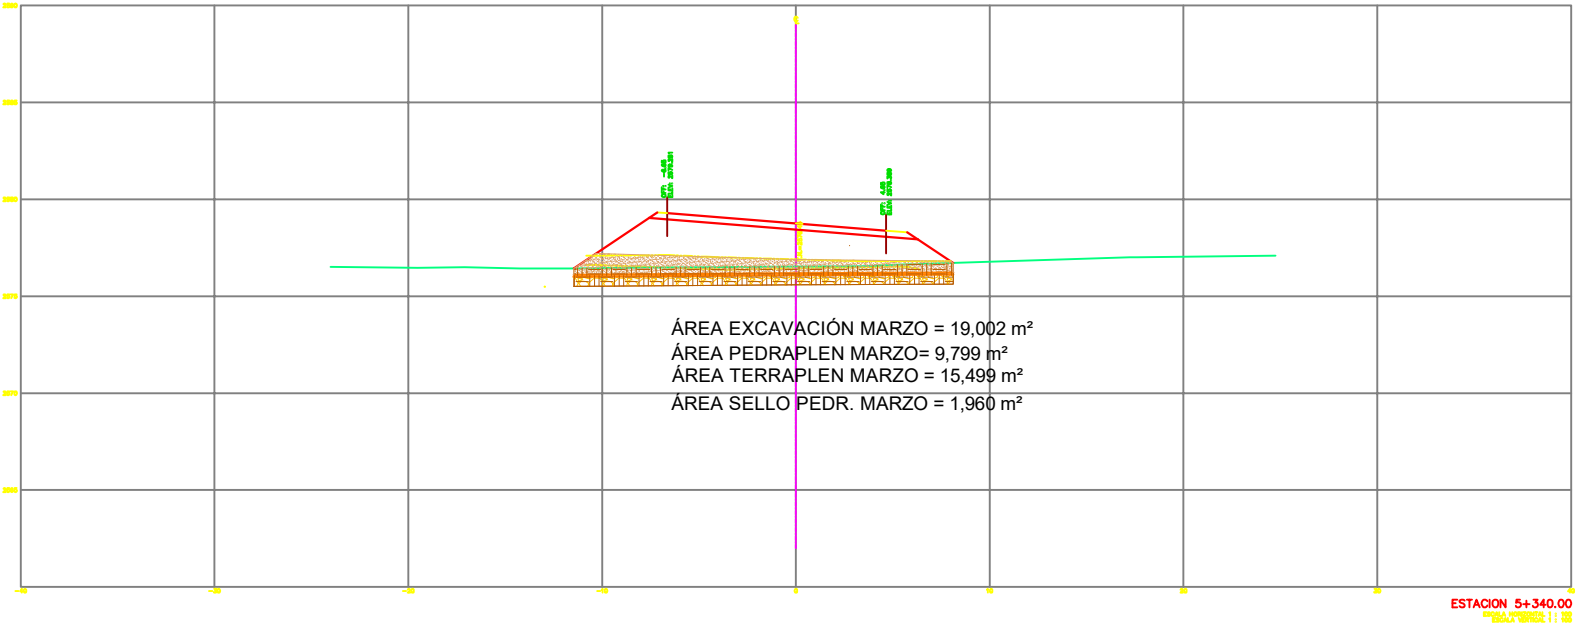


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 19,002 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,799 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 15,499 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,960 m²


ESTACION 5+340.00

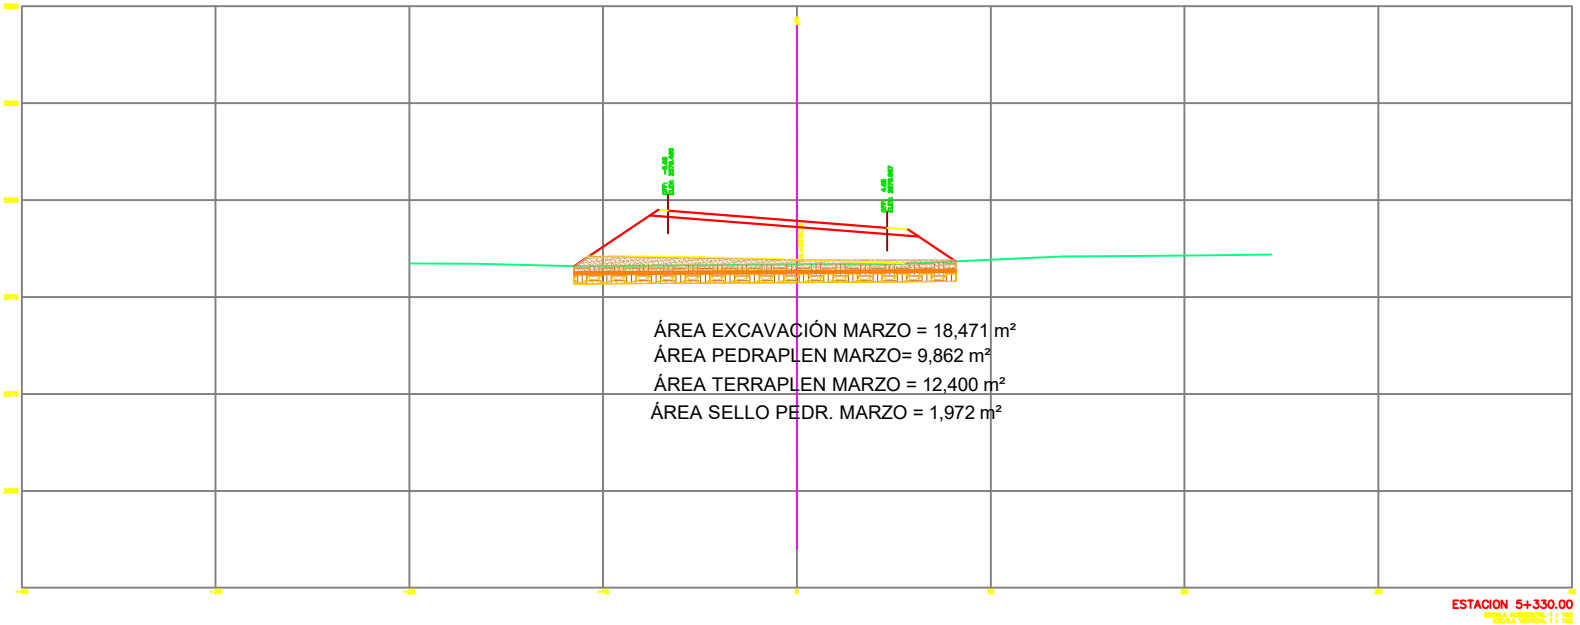



ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 18,471 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,862 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 12,400 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,972 m²


ESTACION 5+330.00

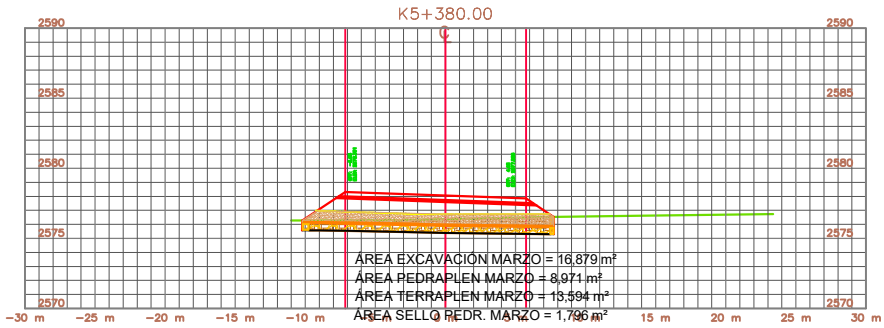

K5+380.00
2590
2585
2580
2575
2570
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 16,879 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 8,971 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 13,594 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,796 m²

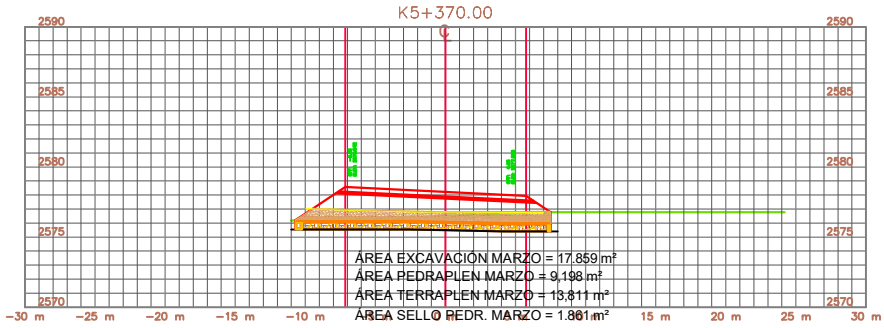

K5+370.00
2590
2585
2580
2575
2570
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 17,859 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9,198 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 13,811 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,861 m²

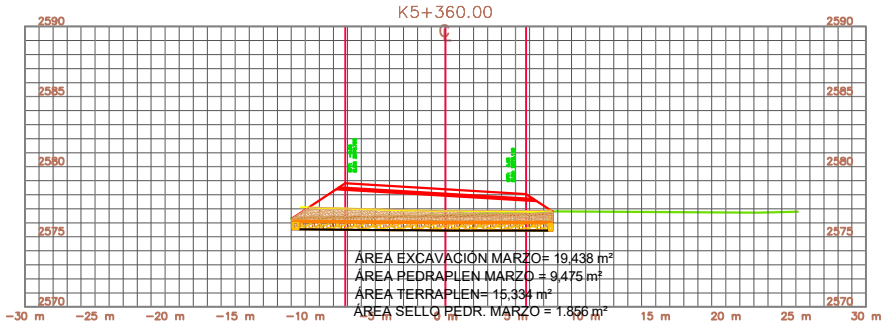

K5+360.00
2590
2585
2580
2575
2570
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO= 19,438 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9,475 m²
ÁREA TERRAPLEN= 15,334 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,856 m²

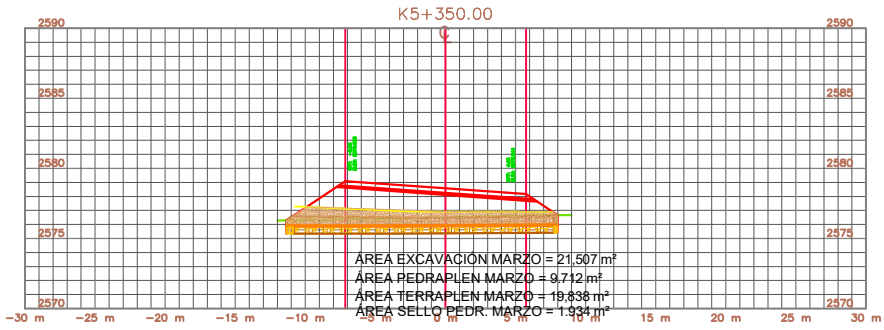

K5+350.00
2590
2585
2580
2575
2570
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 21,507 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9,712 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 19,838 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,934 m²

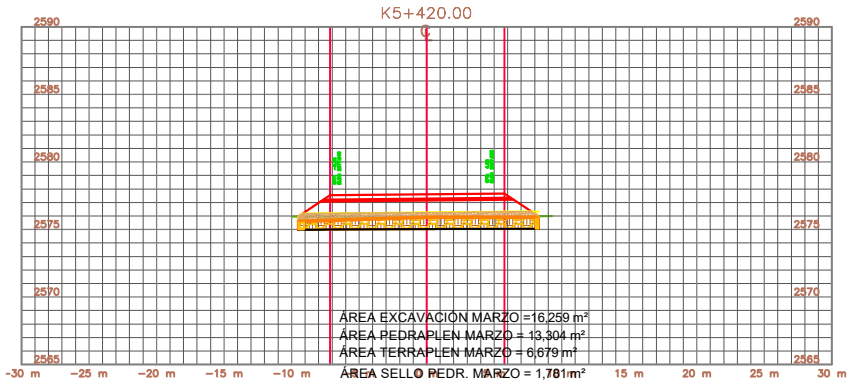

K5+420.00
2590
2585
2580
2575
2570
2565
-30 m
-25 m
-20 m
-15 m
-10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
AREA EXCAVACIÓN MARZO =16,259 m²
AREA PEDRAPLEN MARZO = 13,304 m²
AREA TERRAPLEN MARZO = 6,679 m²
AREA SELLO PEDR. MARZO = 1,781 m²

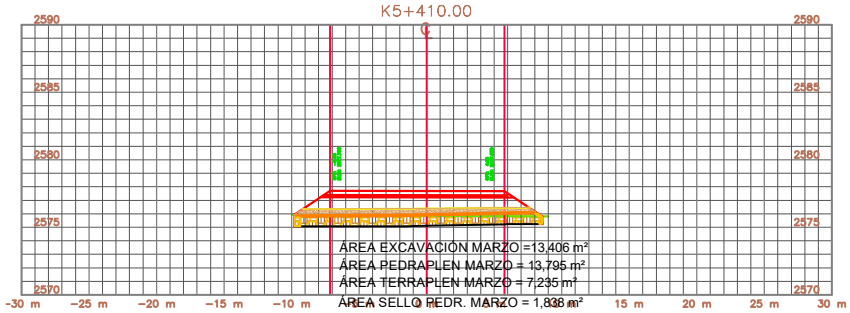

K5+410.00
2590
2585
2580
2575
2570
-30 m
-25 m
-20 m
-15 m
-10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
AREA EXCAVACIÓN MARZO =13,406 m²
AREA PEDRAPLEN MARZO = 13,795 m²
AREA TERRAPLEN MARZO = 7,235 m²
AREA SELLO PEDR. MARZO = 1,838 m²

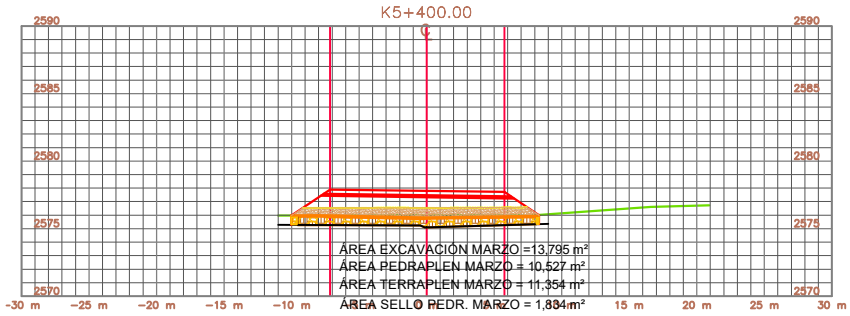

K5+400.00
2590
2585
2580
2575
2570
-30 m
-25 m
-20 m
-15 m
-10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
AREA EXCAVACIÓN MARZO =13,795 m²
AREA PEDRAPLEN MARZO = 10,527 m²
AREA TERRAPLEN MARZO = 11,354 m²
AREA SELLO PEDR. MARZO = 1,834 m²

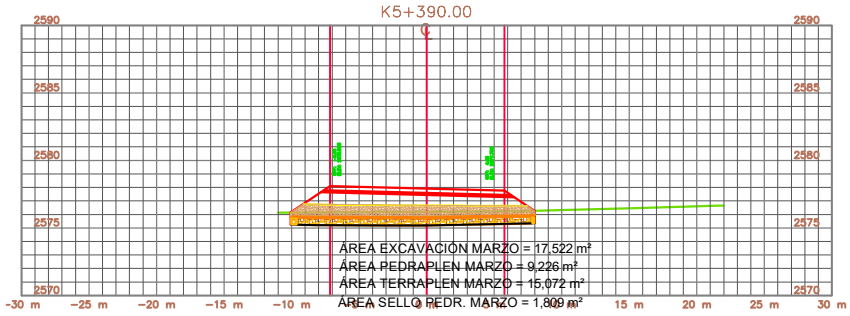

K5+390.00
2590
2585
2580
2575
2570
-30 m
-25 m
-20 m
-15 m
-10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
AREA EXCAVACIÓN MARZO = 17,522 m²
AREA PEDRAPLEN MARZO = 9,226 m²
AREA TERRAPLEN MARZO = 15,072 m²
AREA SELLO PEDR. MARZO = 1,809 m²

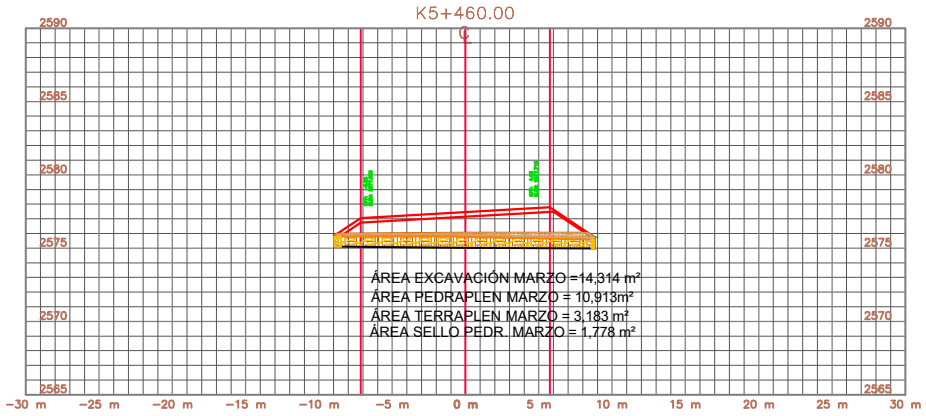

K5+460.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO =14,314 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10,913m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 3,183 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,778 m²

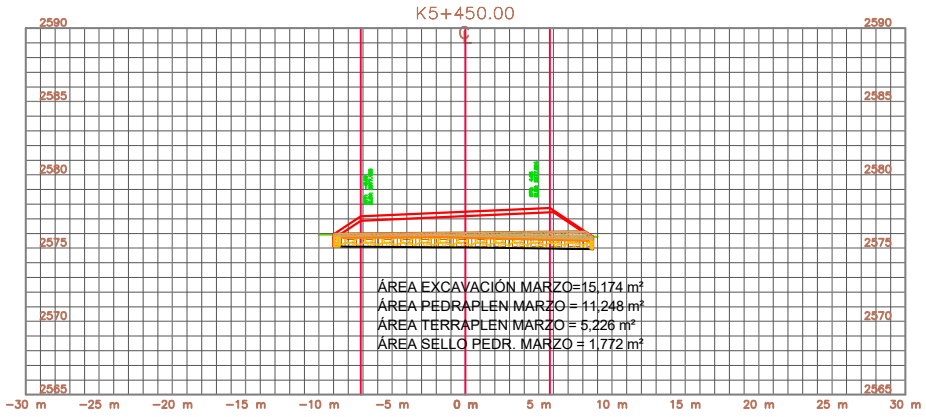

K5+450.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO=15,174 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11,248 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 5,226 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,772 m²

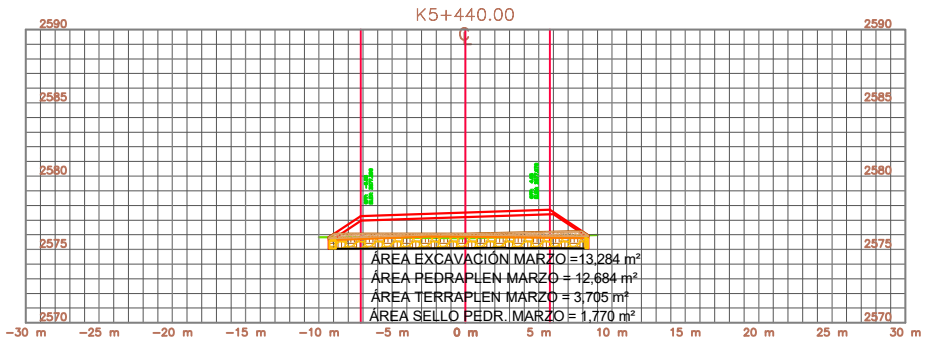

K5+440.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO =13,284 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 12,684 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 3,705 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,770 m²

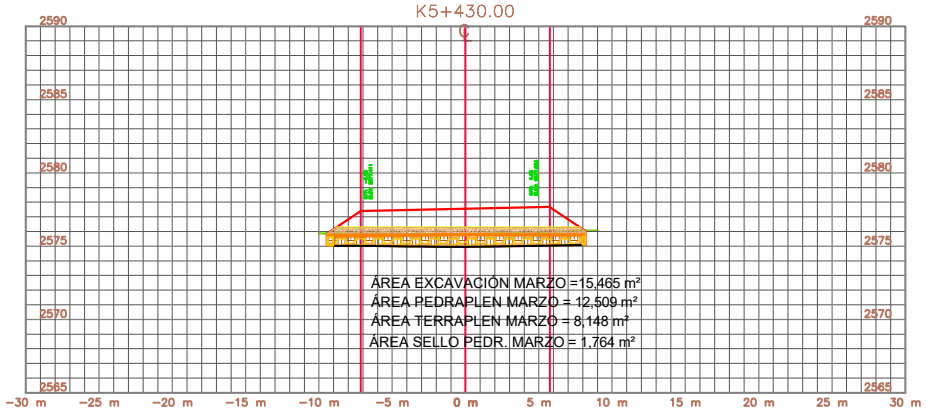

K5+430.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO =15,465 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 12,509 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 8,148 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,764 m²

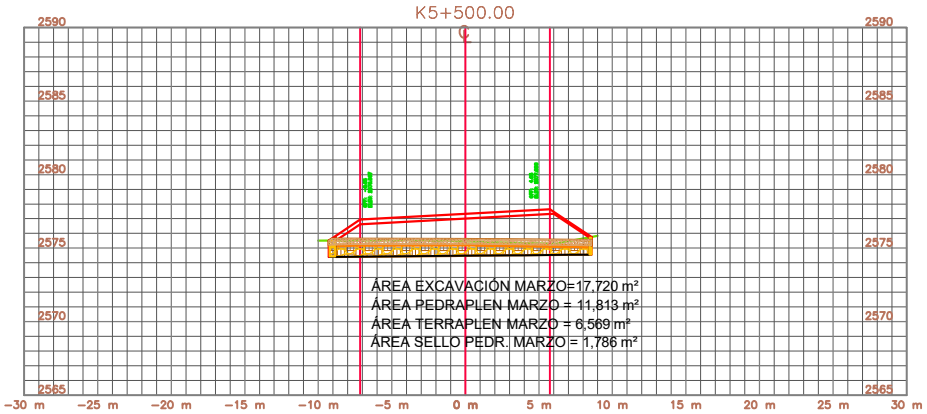

K5+500.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO=17,720 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11,813 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 6,569 m³
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,786 m²

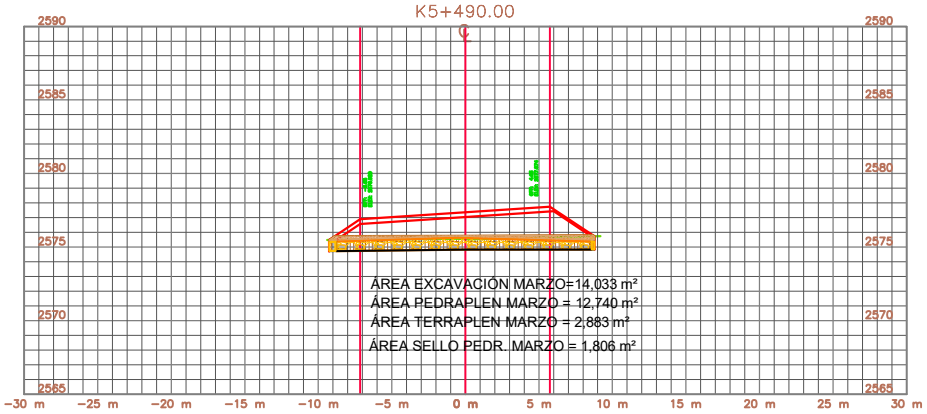

K5+490.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO=14,033 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 12,740 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 2,883 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,806 m²

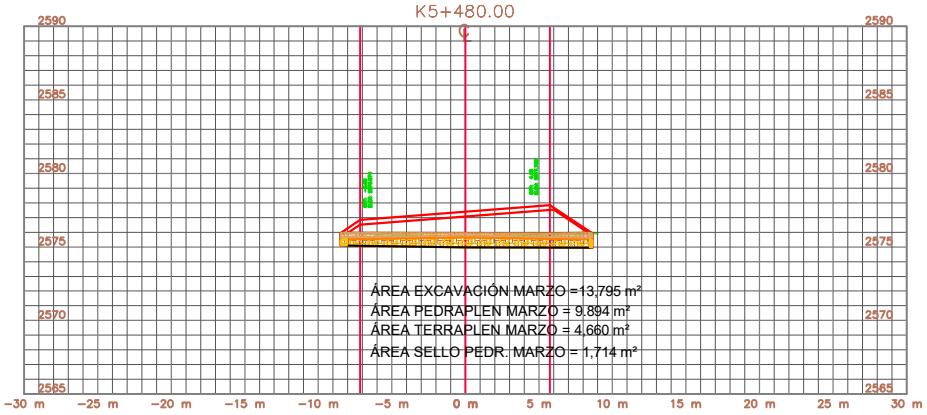

K5+480.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO =13,795 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9,894 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 4,660 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,714 m²

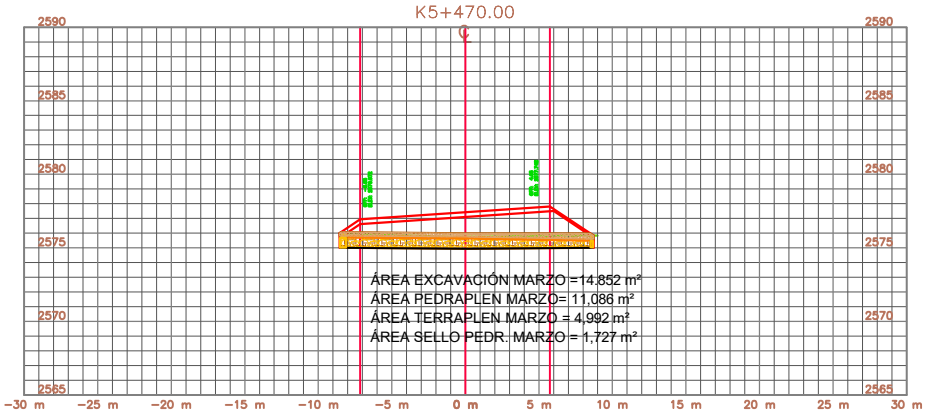

K5+470.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO =14,852 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 11,086 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 4,992 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,727 m²

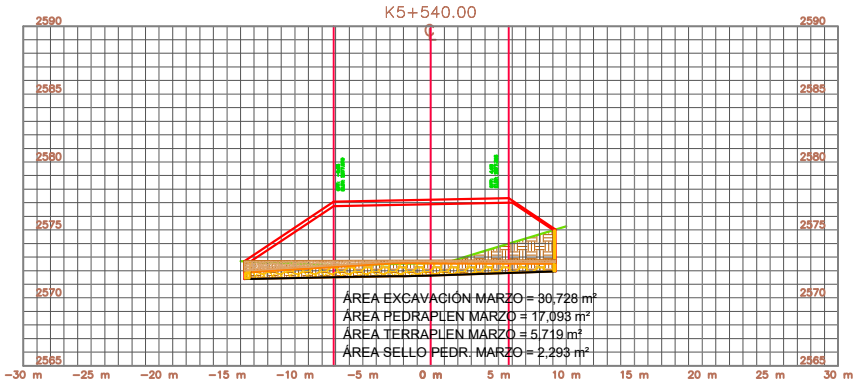

K5+540.00
2590
2585
2580
2575
2570
2565
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 30,728 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 17,093 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 5,719 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,293 m²

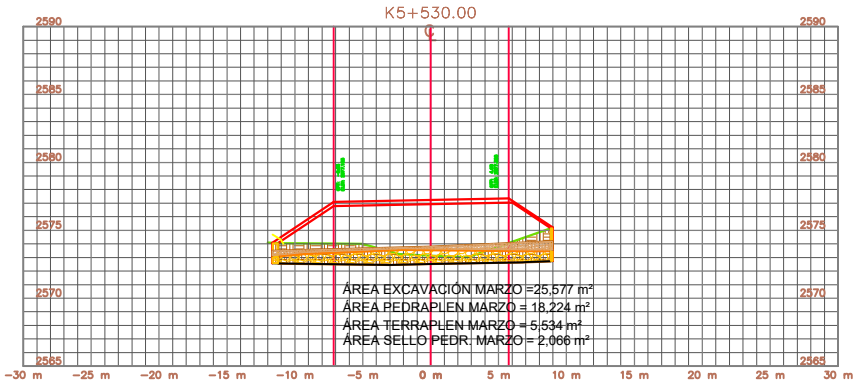

K5+530.00
2590
2585
2580
2575
2570
2565
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO =25,577 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 18,224 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 5,534 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,066 m²

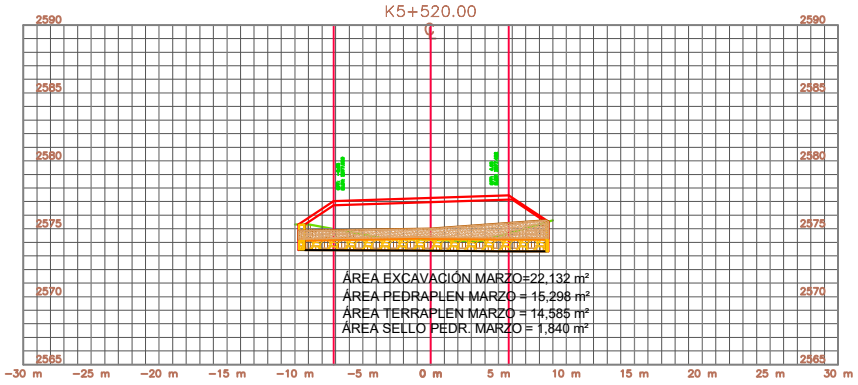

K5+520.00
2590
2585
2580
2575
2570
2565
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO=22,132 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 15,298 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 14,585 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,840 m²

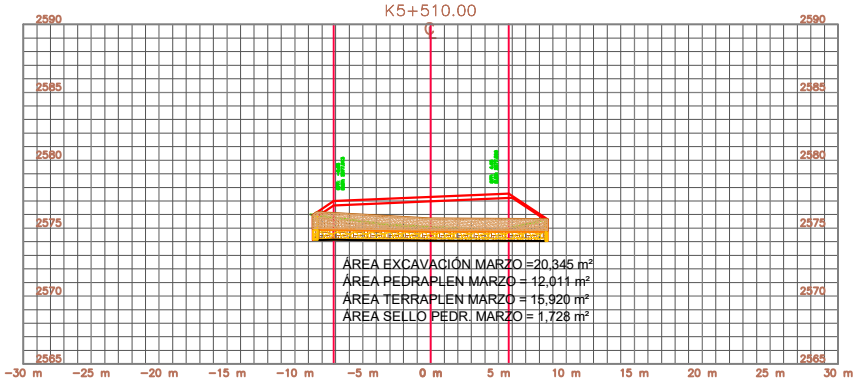

K5+510.00
2590
2585
2580
2575
2570
2565
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO =20,345 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 12,011 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 15,920 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,728 m²

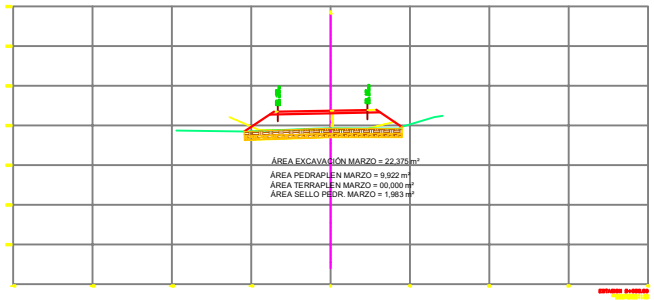

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 22,375 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9,922 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 00,000 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,983 m²

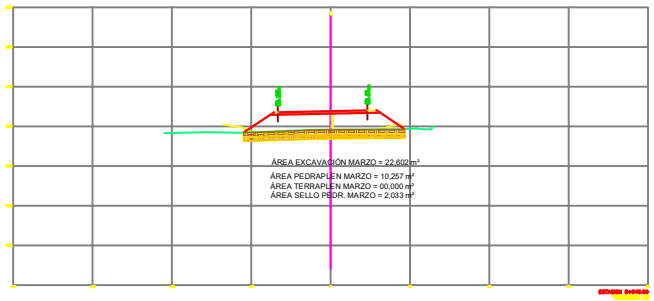
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 22,602 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10,257 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 00,000 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,033 m²

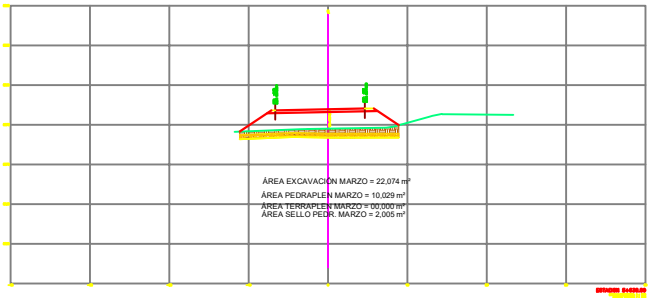

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 22,074 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10,029 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 00,000 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,005 m²

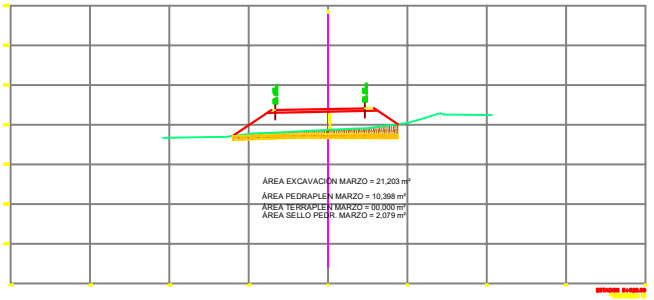
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 21,203 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10,398 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 00,000 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,079 m²

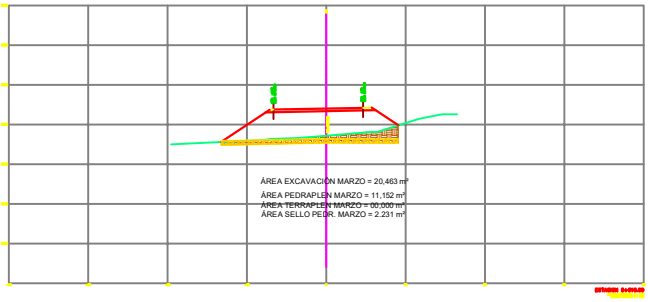
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 20,463 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11,152 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 00,000 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.231 m²

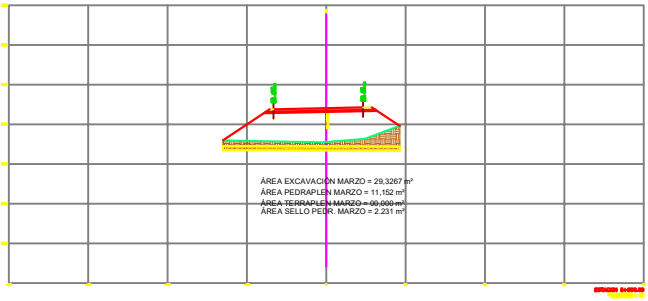

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 29,3267 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11,152 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 00,000 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.231 m²

K5+690.00

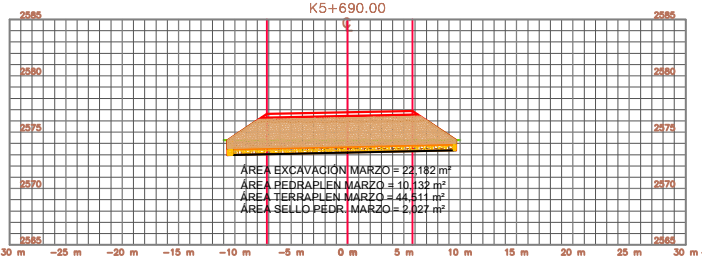


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 22.182 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10.132 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 44.511 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.027 m²

K5+730.00

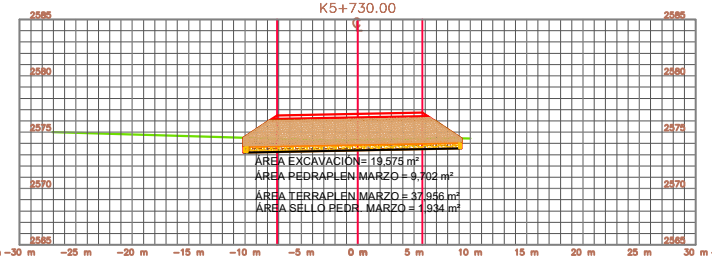


ÁREA EXCAVACIÓN = 19.575 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.702 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 37.956 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.934 m²

K5+770.00

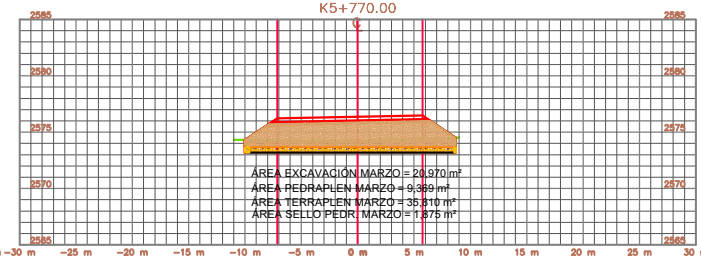


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 20.970 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.369 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 35.810 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.875 m²

K5+680.00

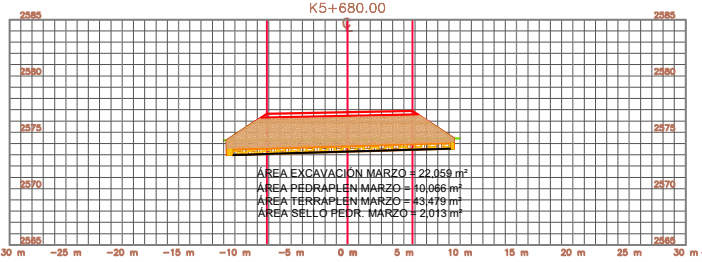


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 22.059 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10.066 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 43.479 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.013 m²

K5+720.00

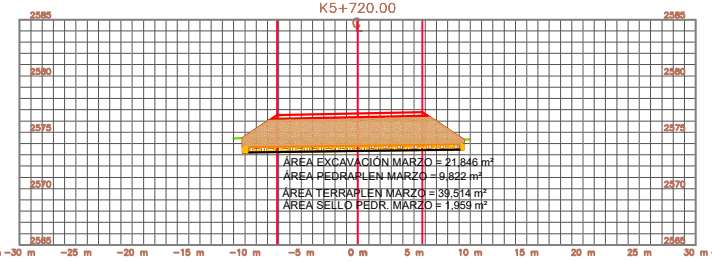


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 21.846 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.822 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 39.514 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.959 m²

K5+760.00

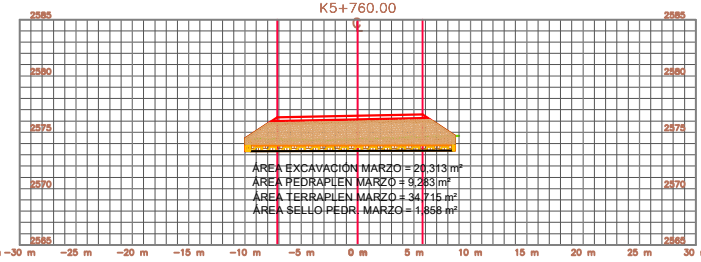


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 20.313 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.283 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 34.715 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.858 m²

K5+670.00

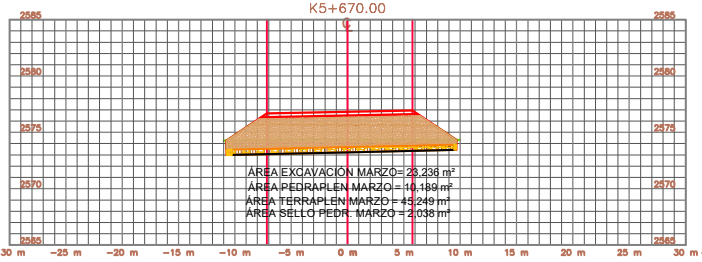


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO= 23.236 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10.189 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 45.249 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.038 m²

K5+710.00

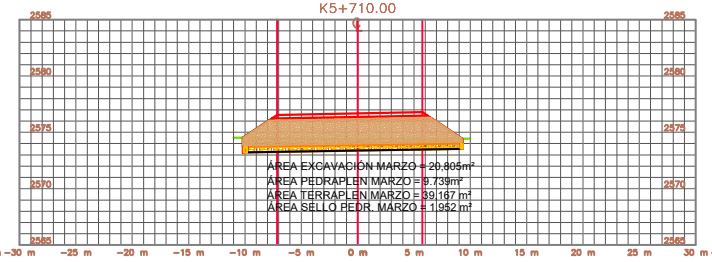


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 20.805m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.739m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 39.167 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.952 m²

K5+750.00

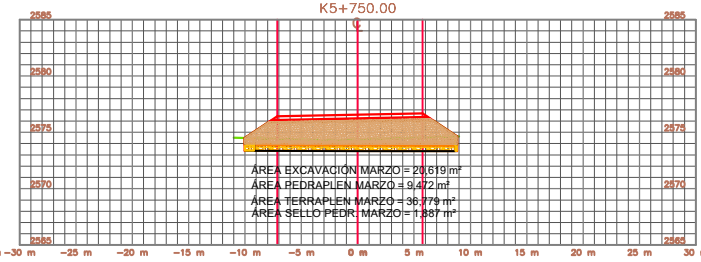


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 20.619 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.472 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 36.779 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.887 m²

K5+660.00

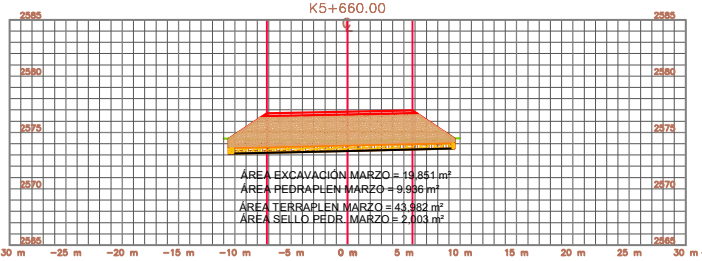


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 19.851 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.936 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 43.982 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.003 m²

K5+700.00

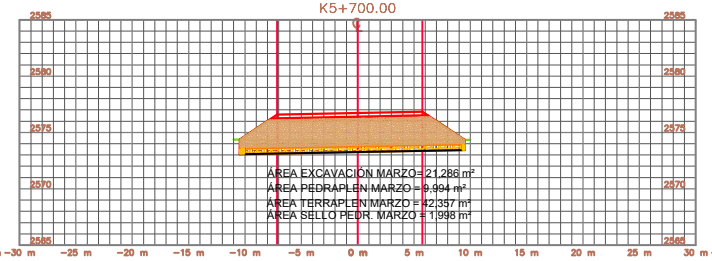


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO= 21.286 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.994 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 42.357 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.998 m²

K5+740.00

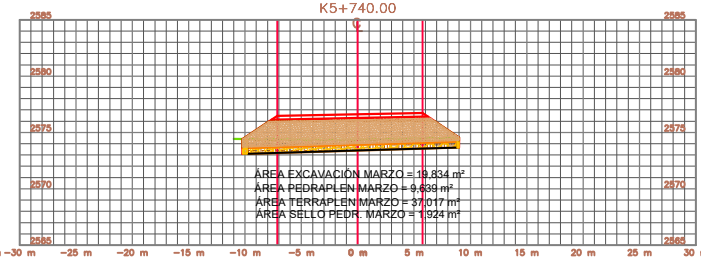


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 19.834 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.639 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 37.017 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.924 m²

K5+690.00

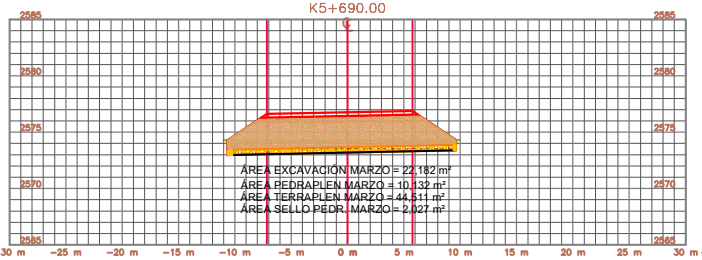


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 22.182 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10.132 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 44.511 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.027 m²

K5+730.00

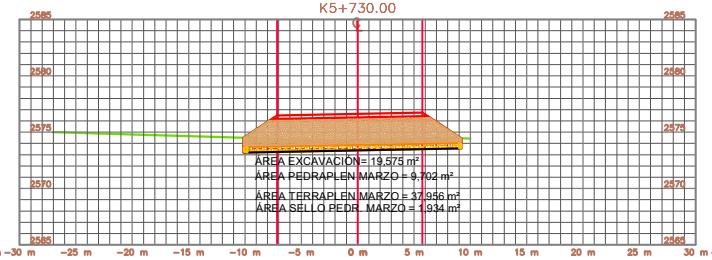


ÁREA EXCAVACIÓN = 19.575 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.702 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 37.956 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.934 m²

K5+770.00

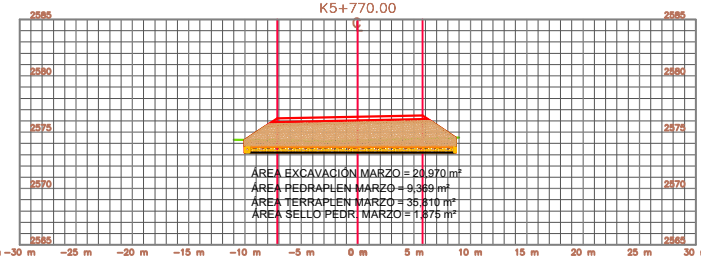


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 20.970 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.369 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 35.810 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.875 m²

K5+680.00

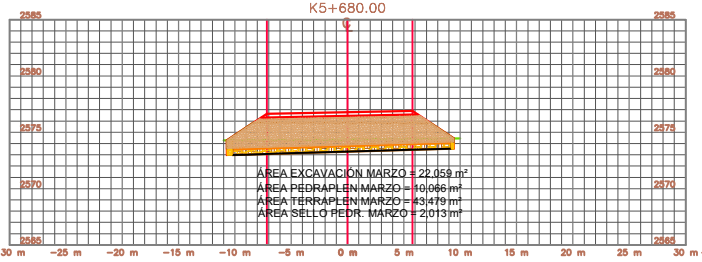


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 22.059 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10.066 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 43.479 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.013 m²

K5+720.00

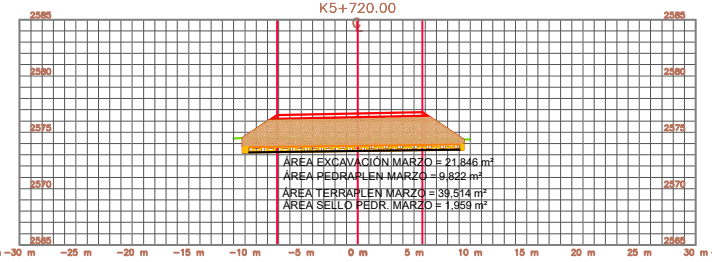


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 21.846 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.822 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 39.514 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.959 m²

K5+760.00

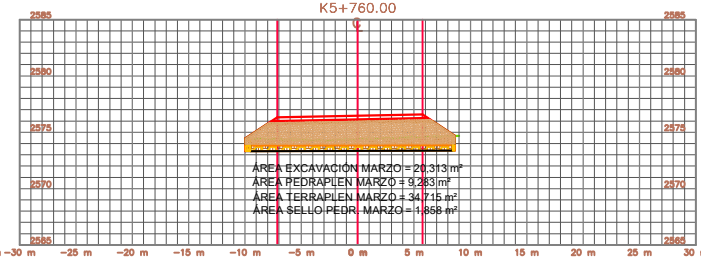


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 20.313 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.283 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 34.715 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.858 m²

K5+670.00

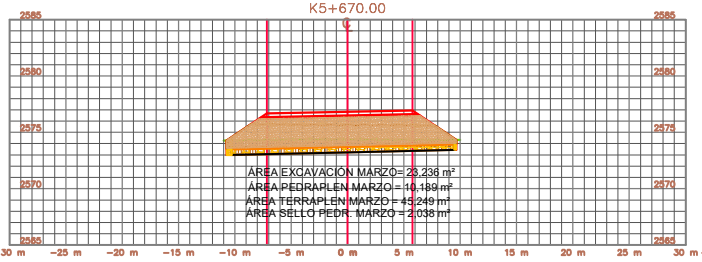


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO= 23.236 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10.189 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 45.249 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.038 m²

K5+710.00

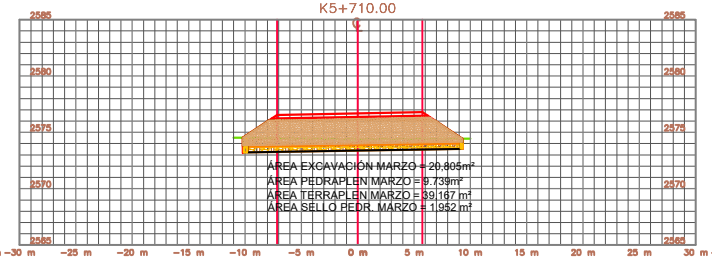


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 20.805m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.739m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 39.167 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.952 m²

K5+750.00

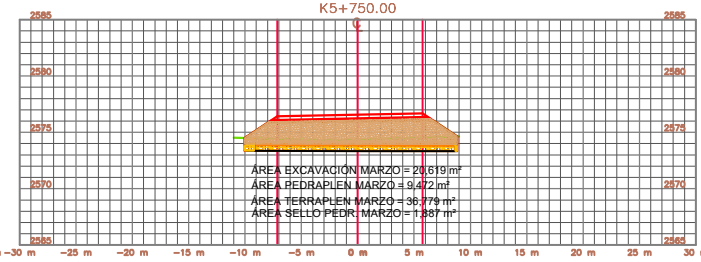


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 20.619 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.472 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 36.779 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.887 m²

K5+660.00

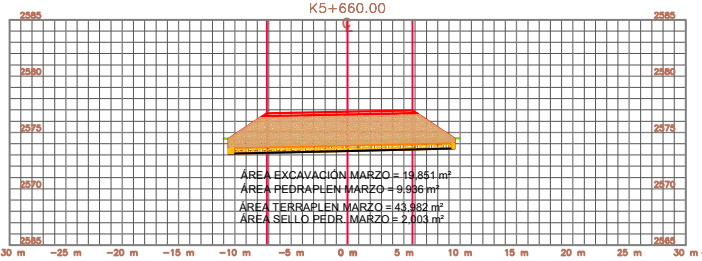


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 19.851 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.936 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 43.982 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.003 m²

K5+700.00

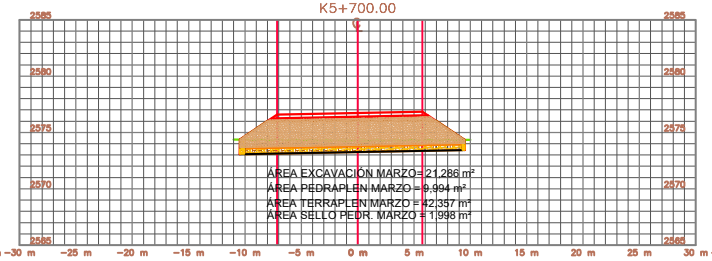



ÁREA EXCAVACIÓN MARZO= 21.286 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.994 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 42.357 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.998 m²


K5+740.00

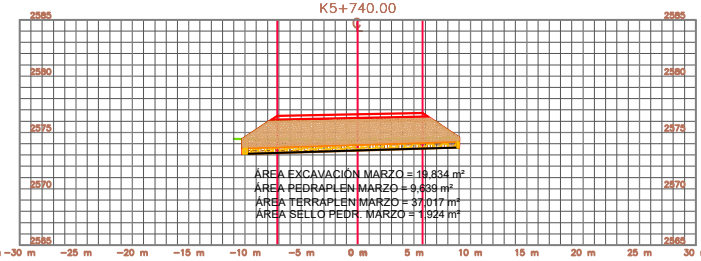



ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 19.834 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.639 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 37.017 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.924 m²

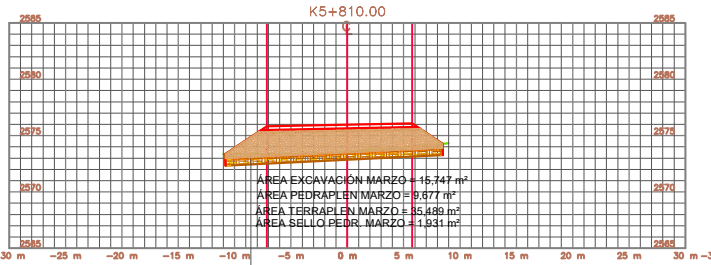

K5+810.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 15,747 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9,677 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 35,489 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,931 m²

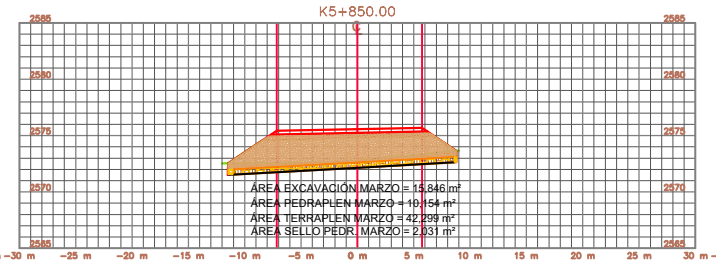

K5+850.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 15,846 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10,154 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 42,299 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,031 m²

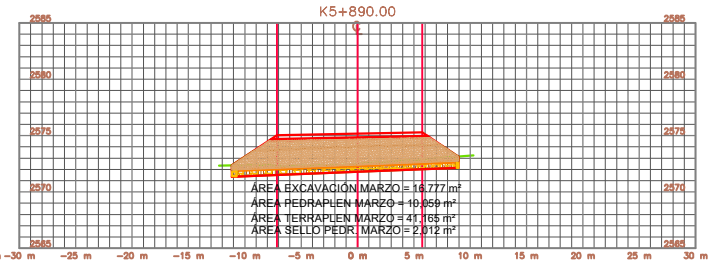

K5+890.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 16,777 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10,059 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 41,165 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,012 m²

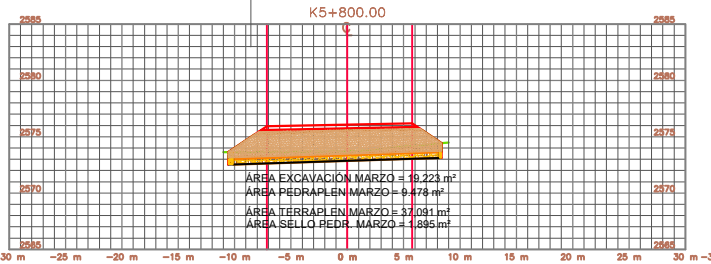

K5+800.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 19,223 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9,478 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 37,091 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,895 m²

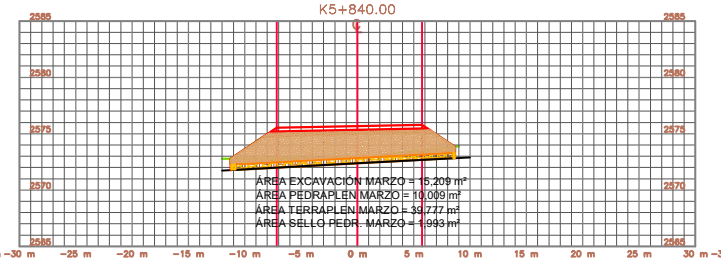

K5+840.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 15,209 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10,009 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 39,777 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,993 m²

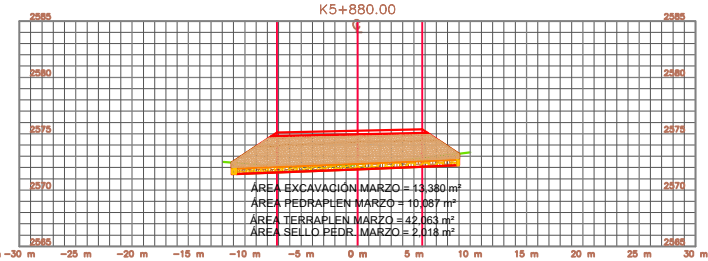

K5+880.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 13,380 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10,087 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 42,063 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,018 m²

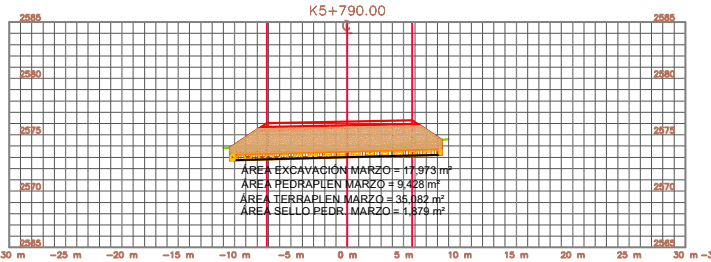

K5+790.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 17,973 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9,428 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 35,082 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,879 m²

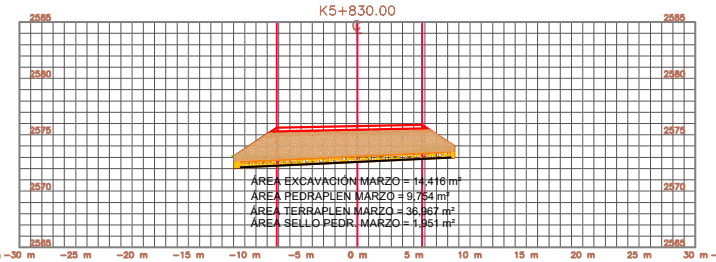
K5+830.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 14,416 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9,754 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 36,967 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,951 m²

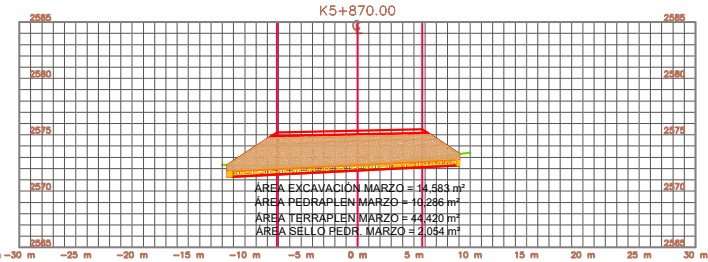

K5+870.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 14,583 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10,266 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 44,420 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,054 m²

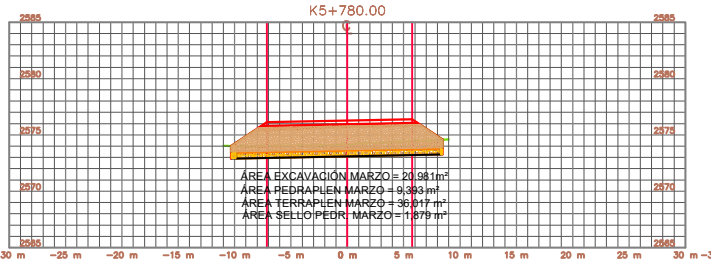
K5+780.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 20,981 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9,393 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 36,017 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,879 m²

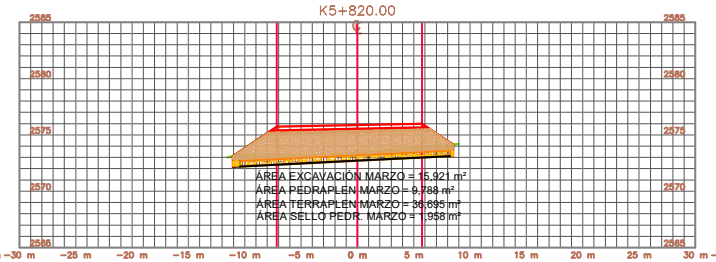
K5+820.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 15,921 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9,788 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 36,695 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,958 m²

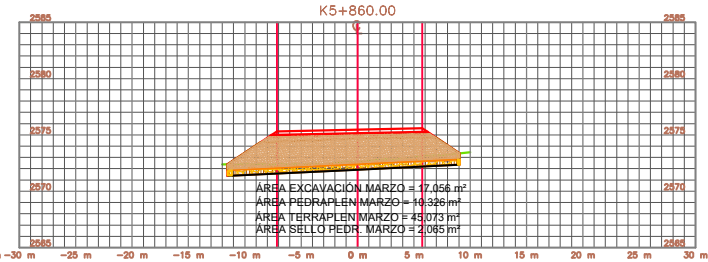

K5+860.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 17,056 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10,326 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 45,073 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,065 m²

K5+930.00

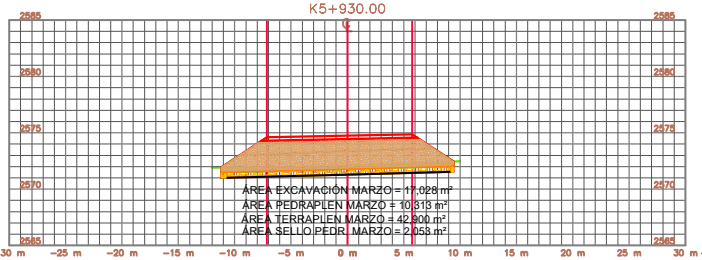


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 17.028 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10.313 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 42.900 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.053 m²

K5+970.00

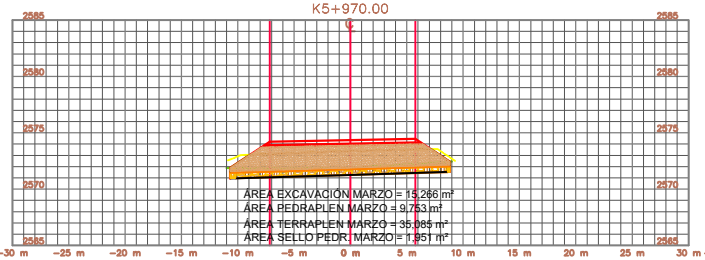


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 15.266 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.753 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 35.085 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.951 m²

K6+010.00

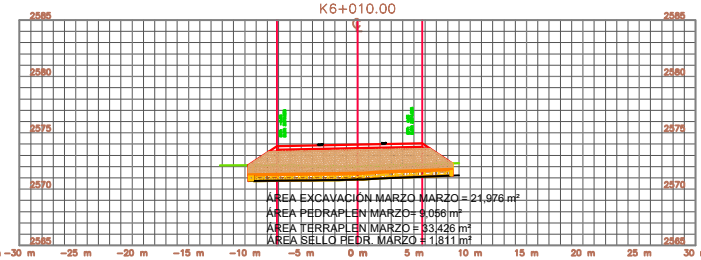


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 21.976 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9.056 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 33.426 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.811 m²

K5+920.00

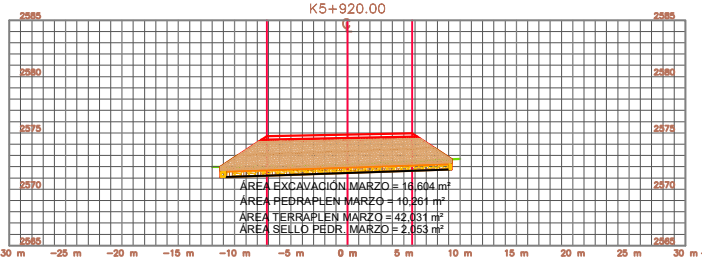


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 16.604 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10.261 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 42.031 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.053 m²

K5+960.00

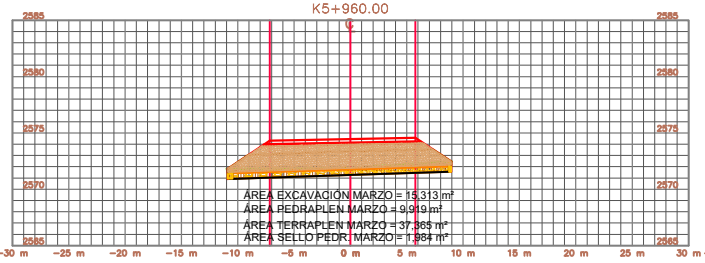


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 15.313 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.919 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 37.365 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.984 m²

K6+000.00

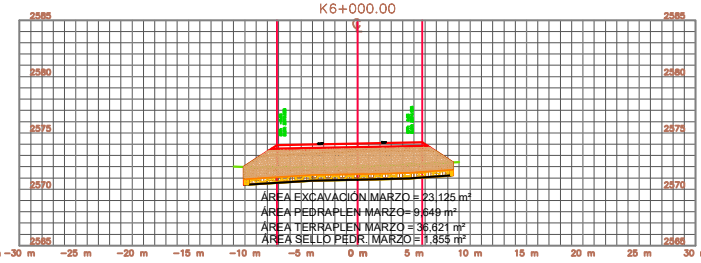


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 23.125 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9.649 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 36.621 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.855 m²

K5+910.00

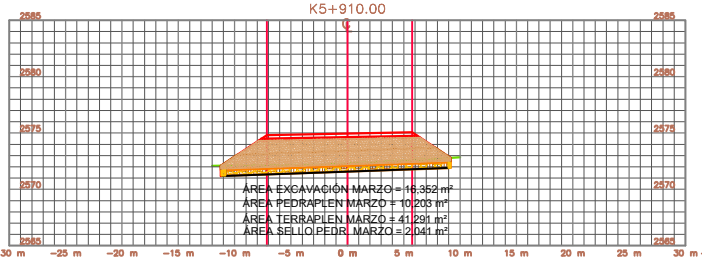


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 16.352 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10.203 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 41.291 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.041 m²

K5+950.00

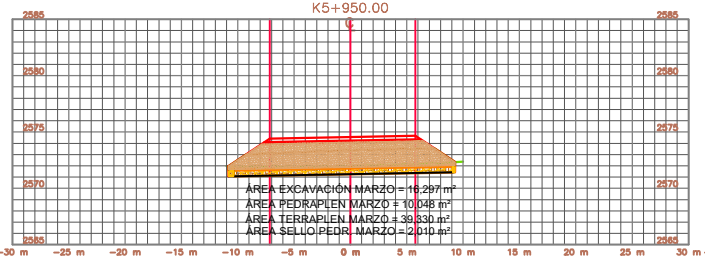


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 16.297 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10.048 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 39.330 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.010 m²

K5+990.00

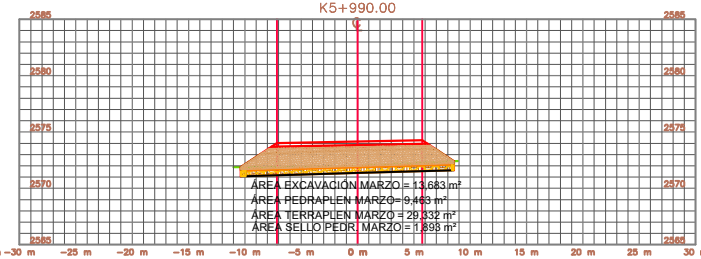


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 13.683 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9.463 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 29.332 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.893 m²

K5+900.00

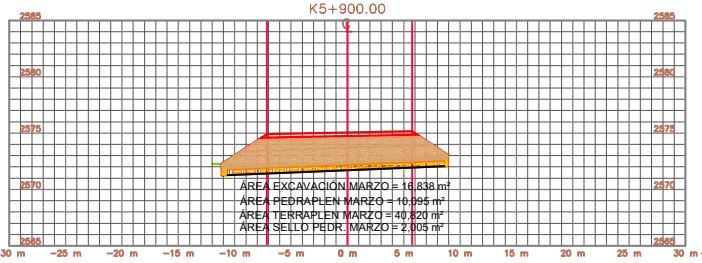


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 16.838 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10.395 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 40.820 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.005 m²

K5+940.00

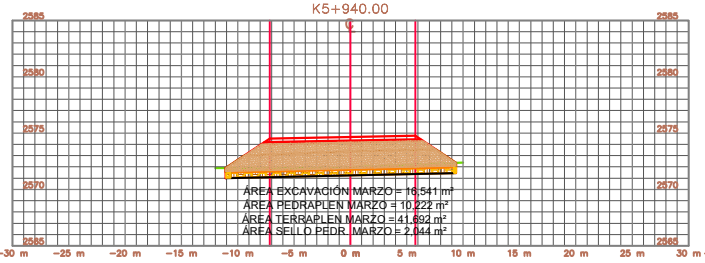


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 16.541 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10.222 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 41.692 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.044 m²

K5+980.00

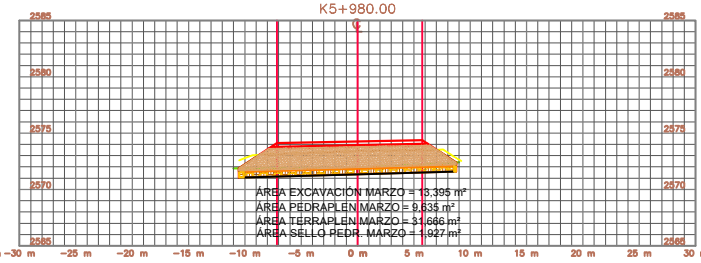

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 13.395 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.635 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 31.666 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.927 m²


K6+050.00

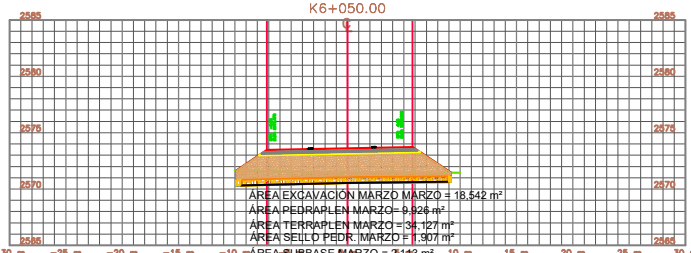

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 18,542 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,926 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 34,127 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,907 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²

ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+090.00

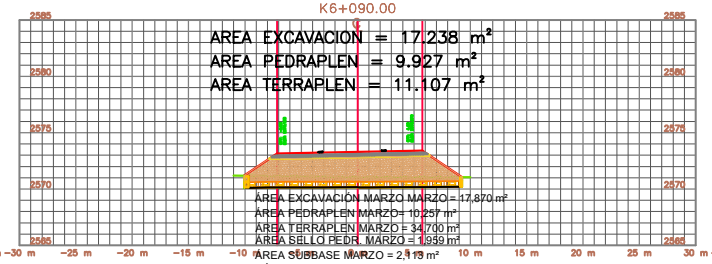


AREA EXCAVACION = 17.238 m²
AREA PEDRAPLEN = 9.927 m²
AREA TERRAPLEN = 11.107 m²

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 17,870 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 10,257 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 34,700 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,959 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²

ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²


K6+130.00

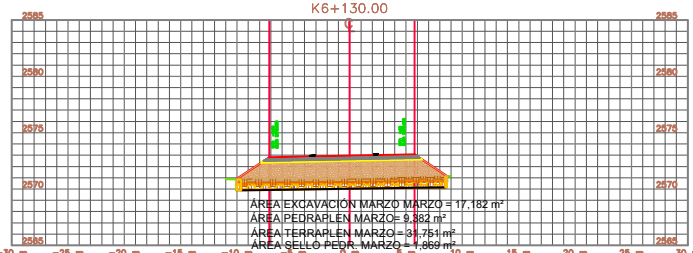

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 17,182 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,382 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 31,751 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,869 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²

ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²


K6+040.00



ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 18,049 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,444 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 32,996 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,889 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²

ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²


K6+080.00



ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 16,903 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,757 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 35,197 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,959 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²

ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²


K6+120.00

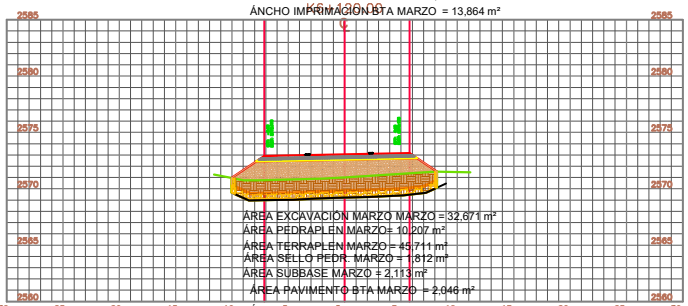

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 32,671 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 10,207 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 45,711 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,812 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²

ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²


K6+030.00



ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 20,012 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,324 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 32,021 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,863 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²

ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²


K6+070.00



ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 18,581 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 10,163 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 35,708 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,833 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²

ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²


K6+110.00

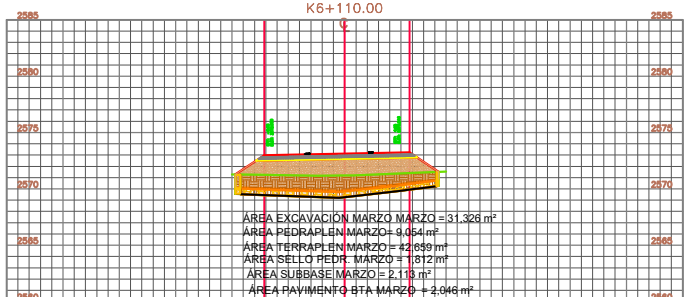

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 31,326 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,054 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 42,659 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,812 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²

ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²


K6+020.00

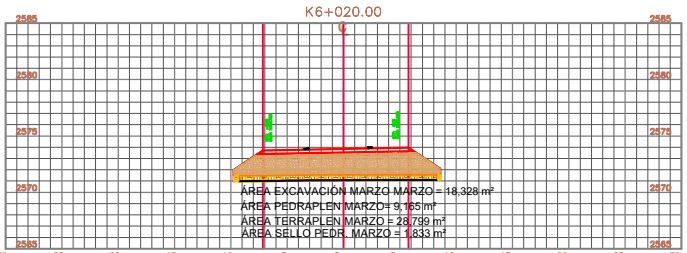

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 18,328 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,165 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 28,799 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,833 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²

ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²


K6+060.00

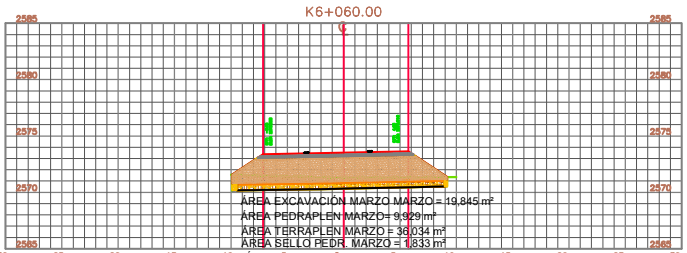

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 19,845 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,929 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 36,034 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,833 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²

ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²


K6+100.00

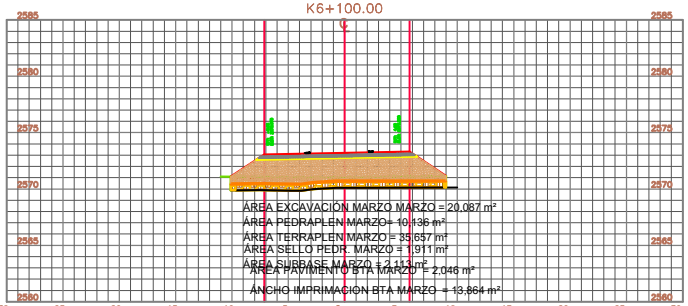

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 20,087 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 10,136 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 35,657 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,911 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²


ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+170.00

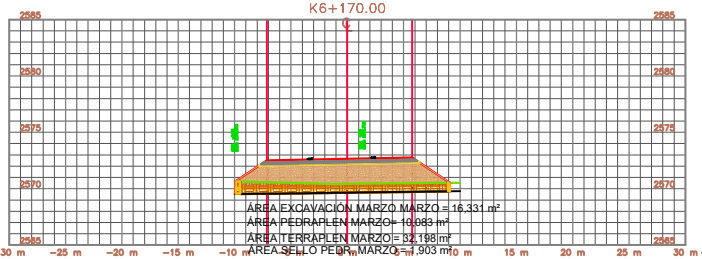


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 16,331 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 10,083 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 32,198 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,903 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+160.00

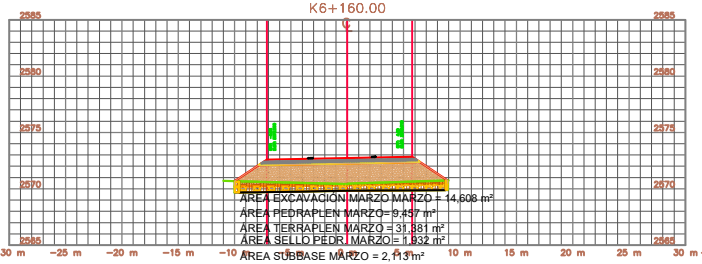


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 14,608 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,457 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 31,881 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,932 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+150.00

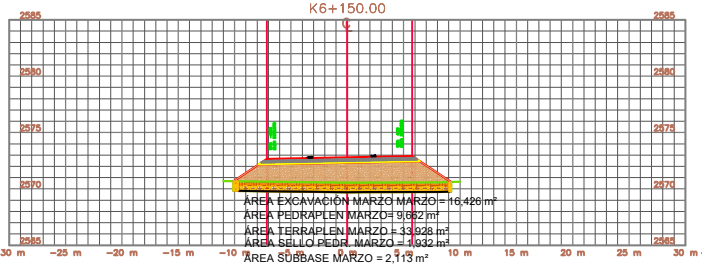


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 16,426 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,662 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 33,928 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,932 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+140.00

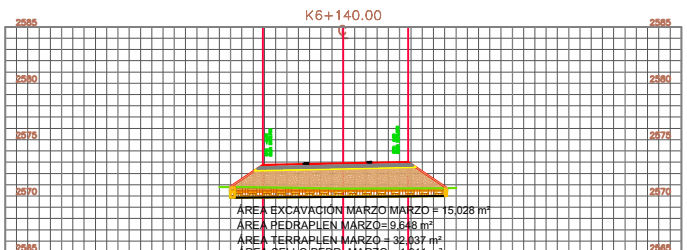


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 15,028 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,648 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 32,937 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,911 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+210.00

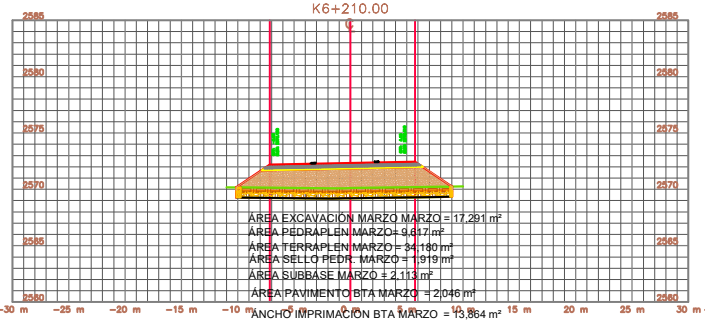


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 17,291 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,617 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 34,180 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,919 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+200.00

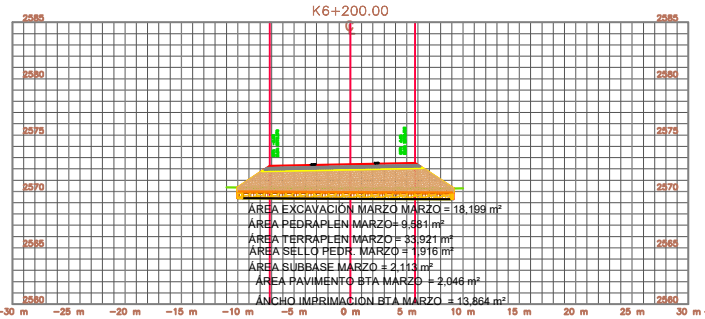


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 18,199 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,681 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 33,921 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,916 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+190.00

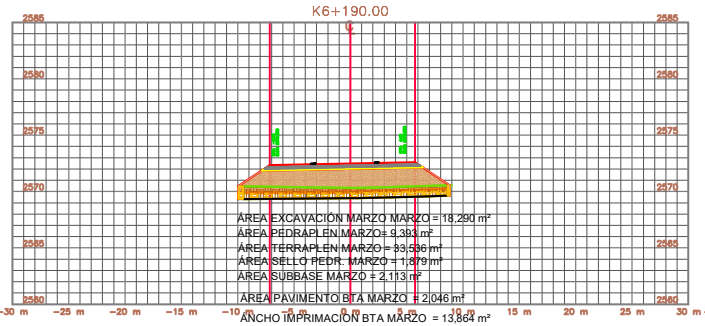


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 18,290 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,393 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 33,536 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,879 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+180.00

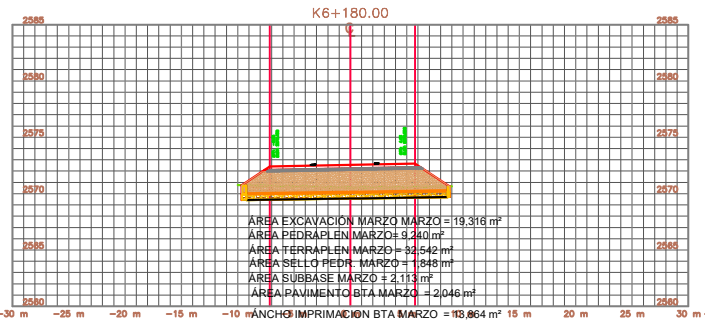


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 19,316 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,240 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 32,542 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,848 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+250.00

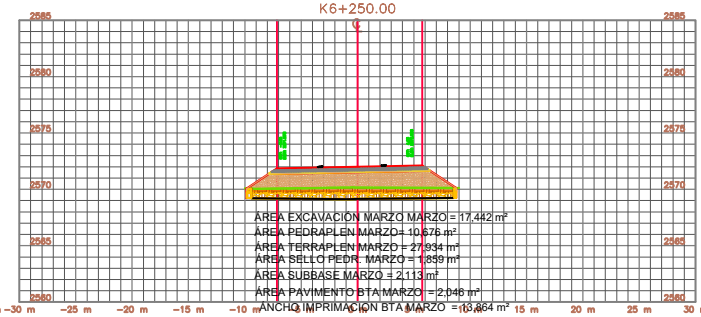


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 17,442 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 10,676 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 27,934 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,859 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+240.00

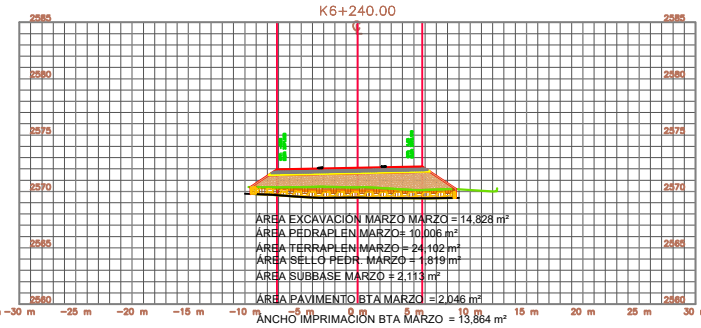


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 14,828 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 10,006 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 24,102 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,819 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+230.00

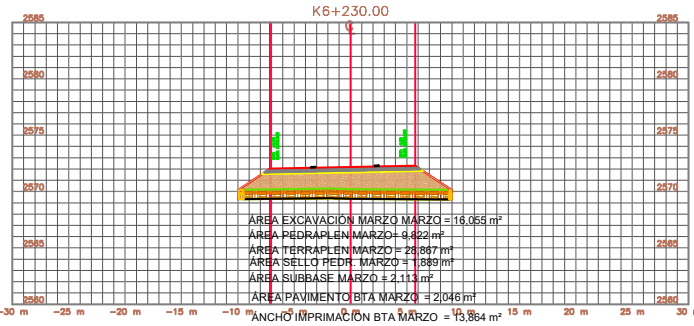


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 16,055 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,822 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 28,867 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,889 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+220.00

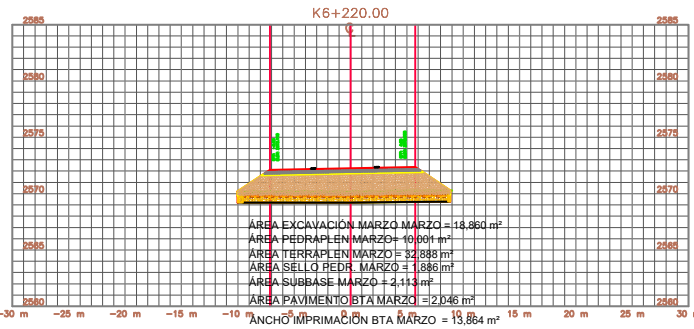


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 18,860 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 10,001 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 32,888 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,886 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+290.00

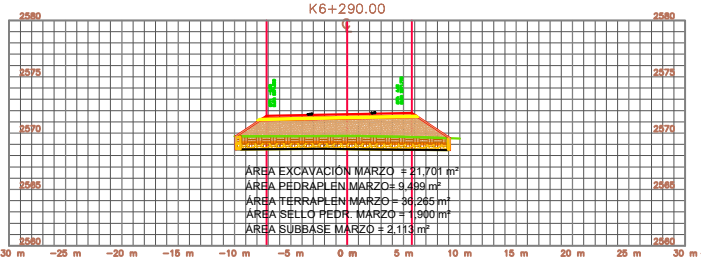


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 21,701 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,499 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 36,265 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,900 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²

K6+330.00

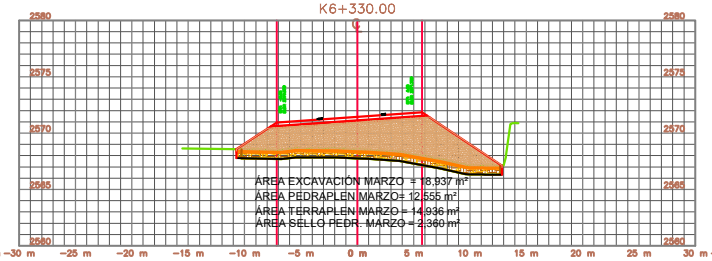


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 18,937 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 12,555 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 14,936 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,360 m²

K6+370.00

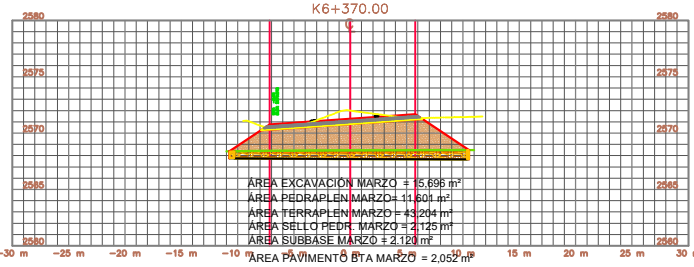


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 15,696 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 11,601 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 43,204 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,125 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,052 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,906 m²

K6+280.00

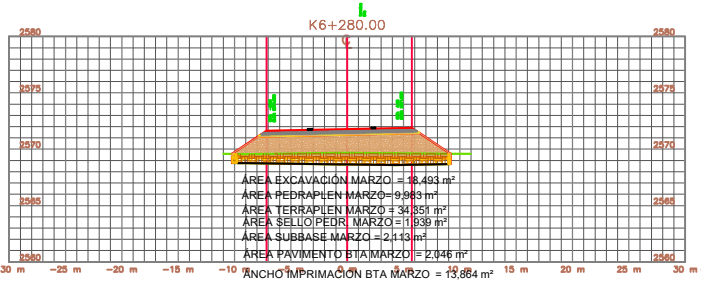


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 18,493 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,983 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 34,351 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,939 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+320.00

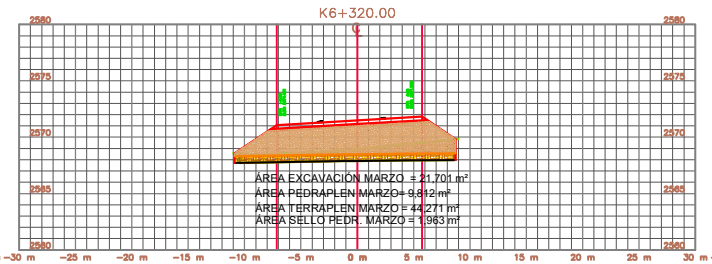


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 21,701 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,812 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 44,271 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,963 m²

K6+360.00

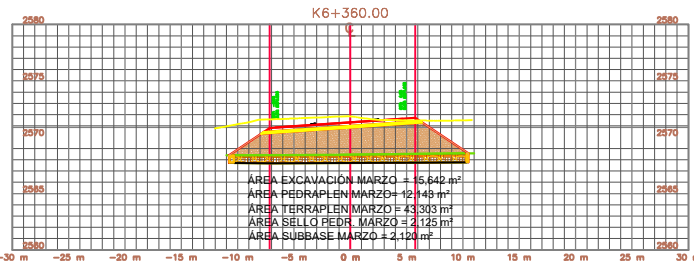


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 15,642 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 12,143 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 43,303 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,125 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²

K6+270.00

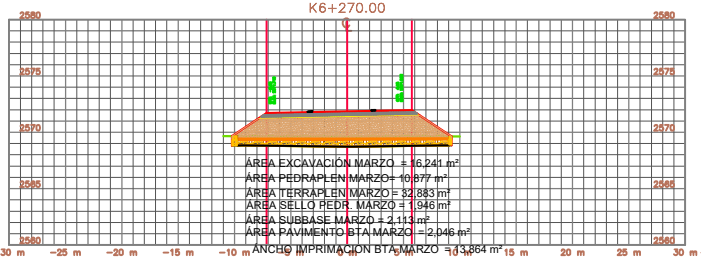


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 16,241 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 10,877 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 32,883 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,946 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+310.00

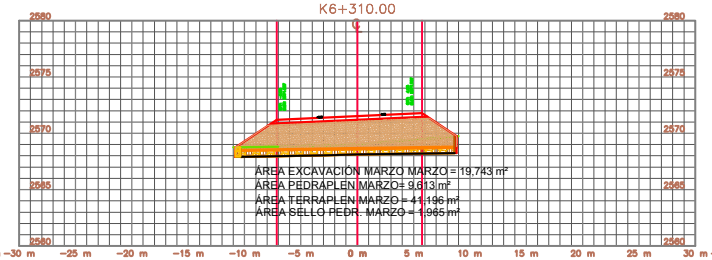


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 19,743 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,613 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 41,196 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,965 m²

K6+350.00




ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 18,206 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 10,856 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 42,279 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,005 m²

K6+260.00

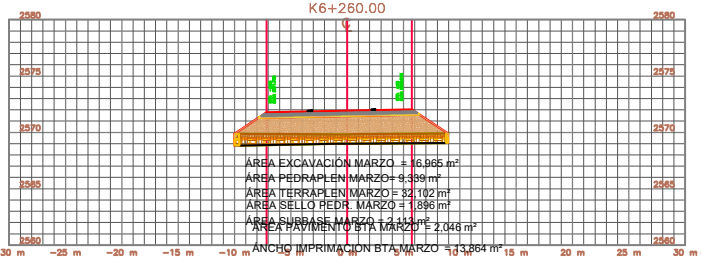


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 16,965 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,339 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 32,102 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,896 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+300.00

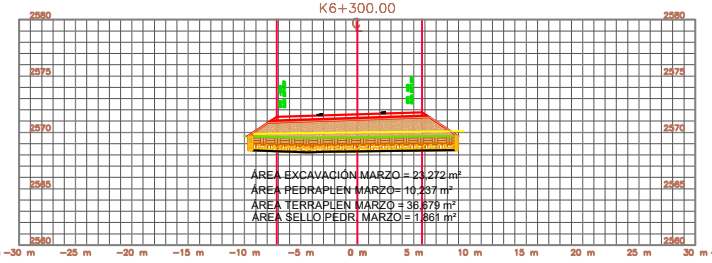


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 23,272 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 10,237 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 36,679 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,861 m²

K6+340.00

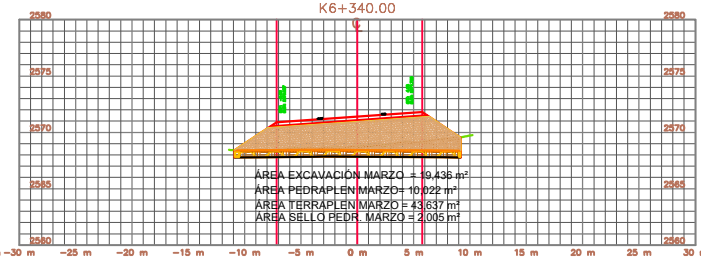


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 19,436 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 10,022 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 43,637 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,005 m²

K6+410.00

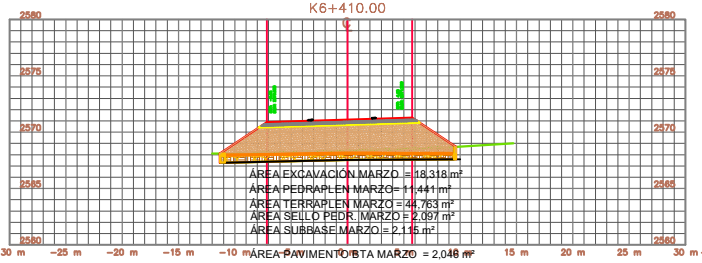


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 18,318 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 11,441 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 44,763 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,097 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,115 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+450.00

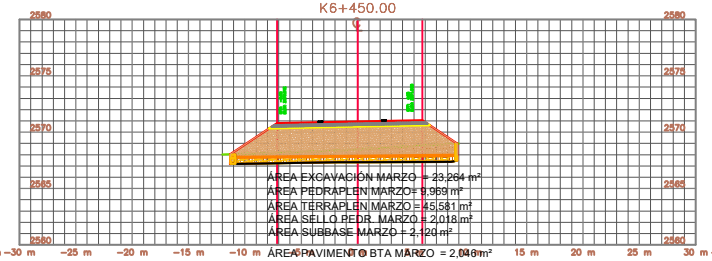


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 23,264 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,969 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 45,581 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,018 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+490.00

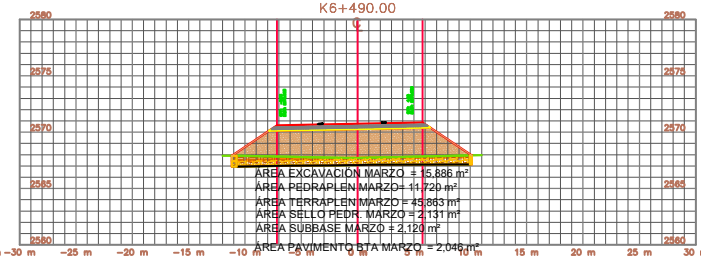


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 15,886 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 11,720 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 45,863 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,131 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+400.00

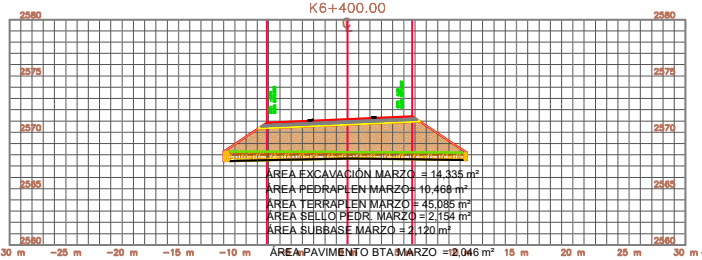


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 14,335 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 10,468 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 45,085 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,154 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+440.00

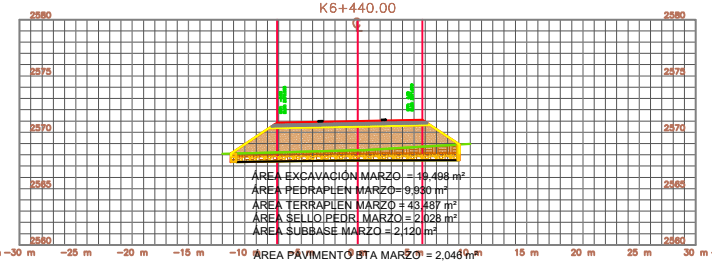


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 19,498 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,930 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 43,487 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,028 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+480.00

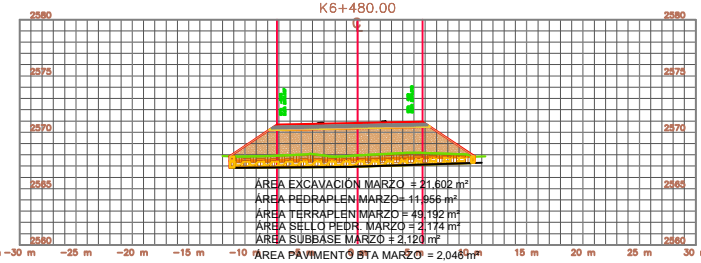


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 21,602 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 11,958 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 49,192 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,174 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+390.00

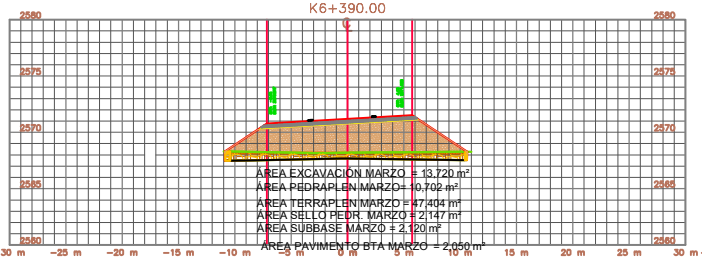


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 13,720 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 10,702 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 47,404 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,147 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,050 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,891 m²

K6+430.00

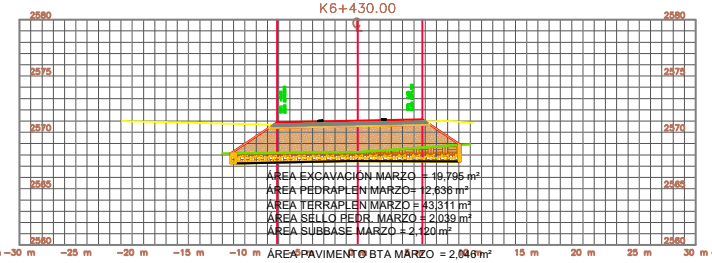


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 19,795 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 12,838 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 43,311 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,039 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+470.00

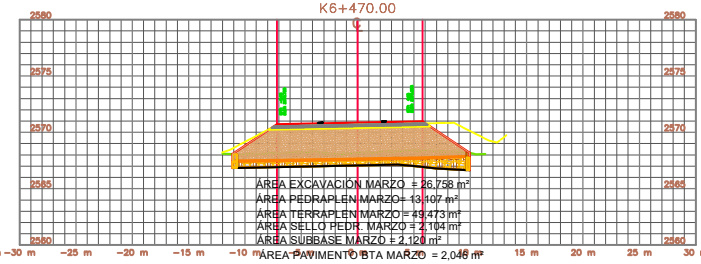


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 26,758 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 13,107 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 49,473 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,104 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+380.00

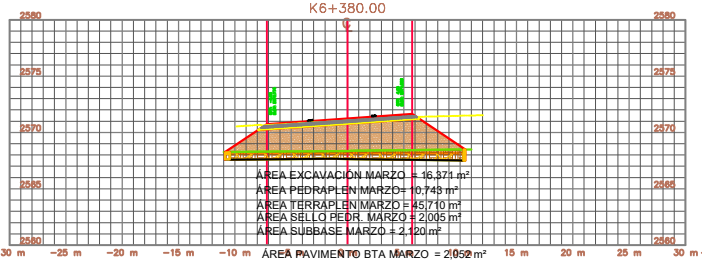


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 16,371 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 10,743 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 45,710 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,005 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,052 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,906 m²

K6+420.00

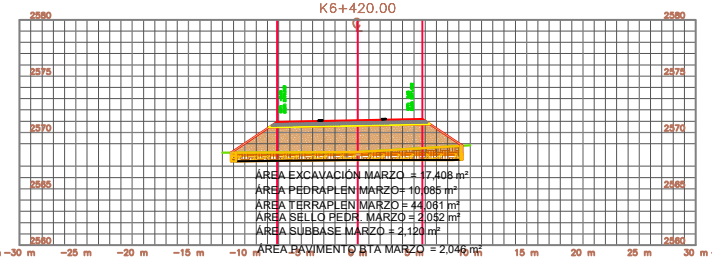


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 17,408 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 10,085 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 44,061 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,052 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+460.00

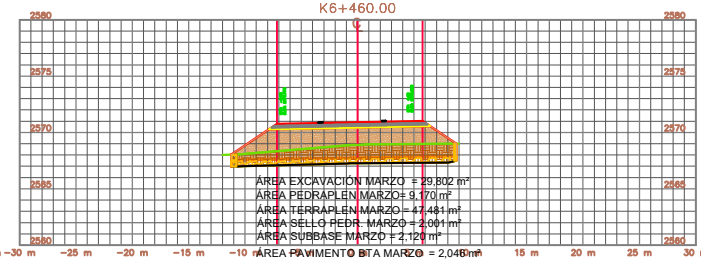


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 29,802 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,170 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 47,481 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,001 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+530.00

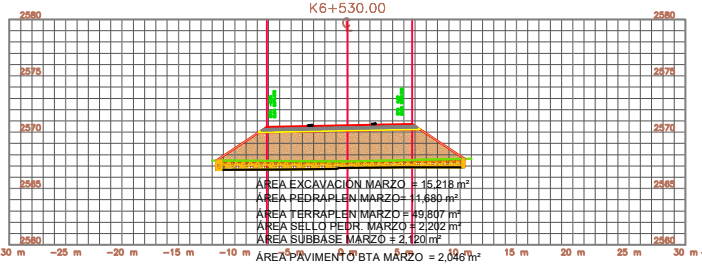


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 15,218 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 1,680 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 49,807 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,202 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+570.00

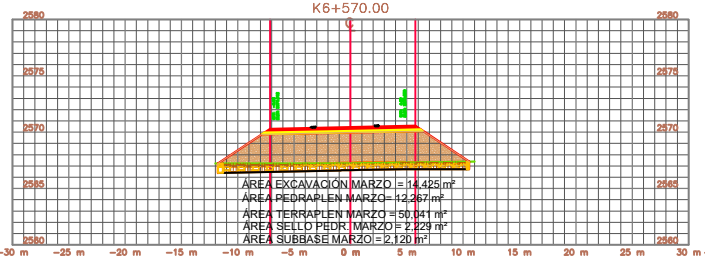


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 14,425 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 12,267 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 50,041 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,229 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²

K6+610.00

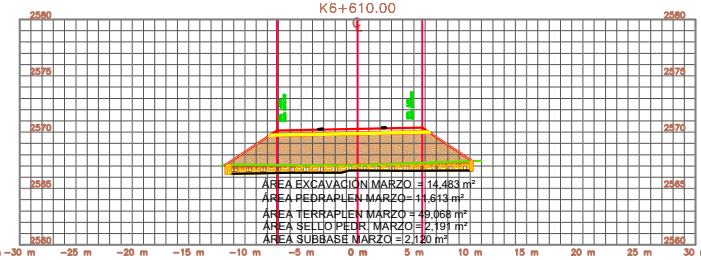


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 14,483 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 11,613 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 49,068 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,191 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²

K6+520.00

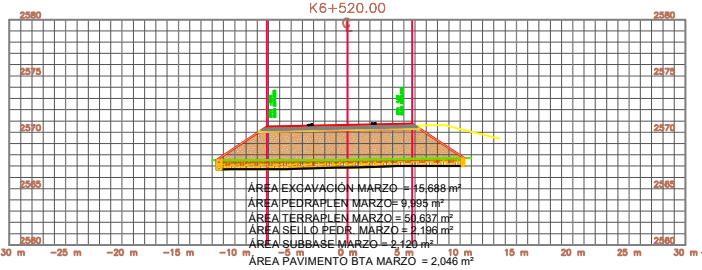


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 15,688 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,995 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 50,637 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,196 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+560.00

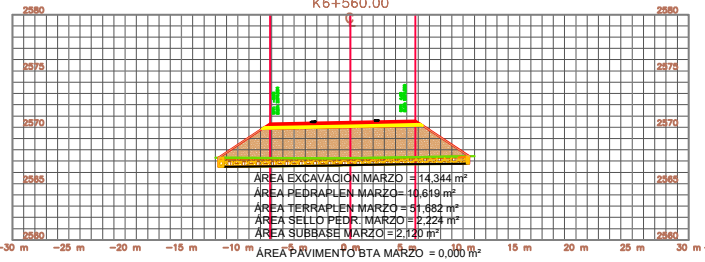


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 14,344 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 10,619 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 51,682 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,224 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 0,000 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+600.00

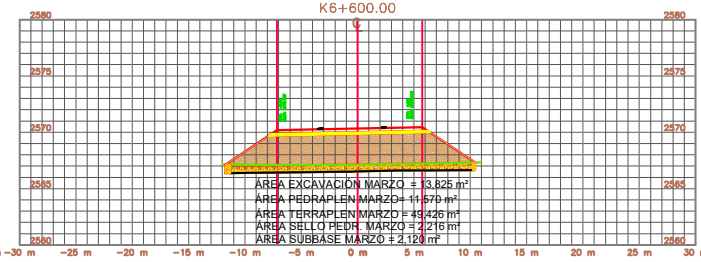


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 13,825 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 11,570 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 49,426 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,216 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²

K6+510.00

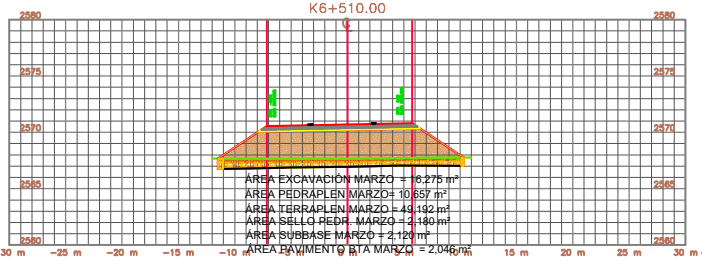


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 16,275 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 10,657 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 49,192 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,180 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+550.00

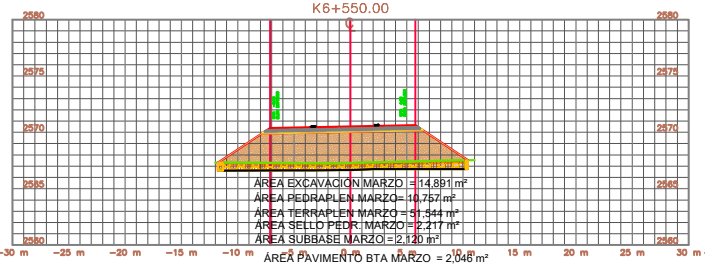


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 14,891 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 10,757 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 51,544 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,217 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+590.00

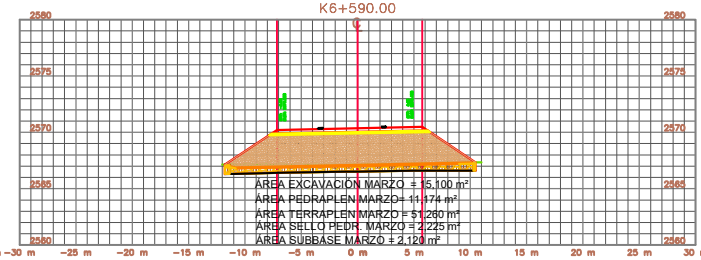


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 15,100 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 11,174 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 51,260 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,225 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²

K6+500.00

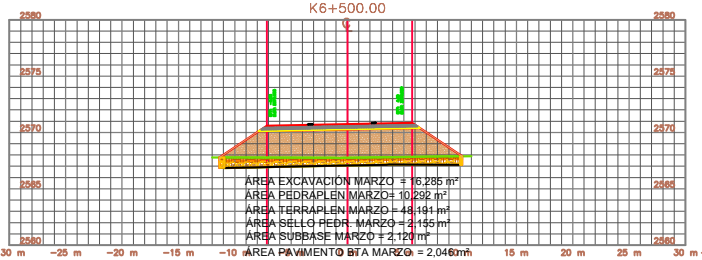


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 16,285 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 10,292 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 48,191 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,155 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+540.00

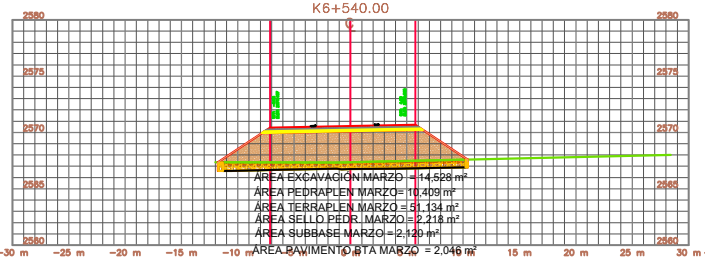


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 14,528 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 10,409 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 51,134 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,218 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+580.00

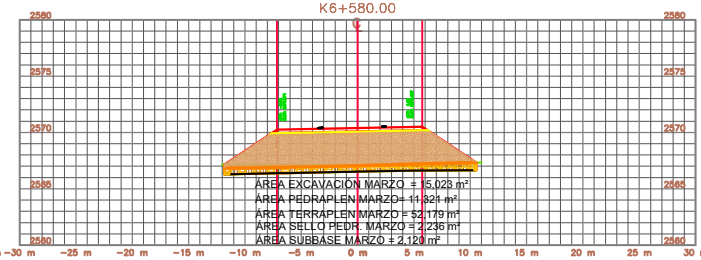


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 15,023 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 11,321 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 52,179 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,236 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²


K6+650.00

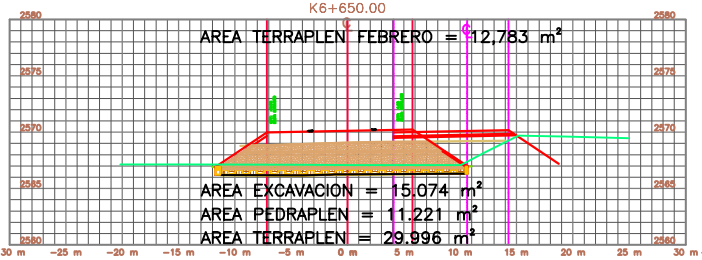


K6+690.00

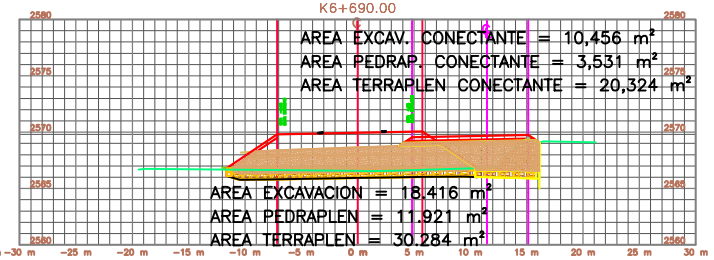


K6+640.00

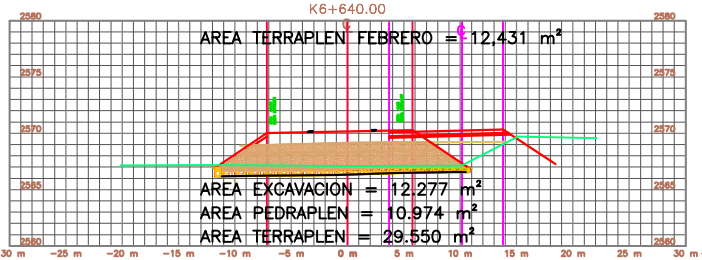


K6+680.00

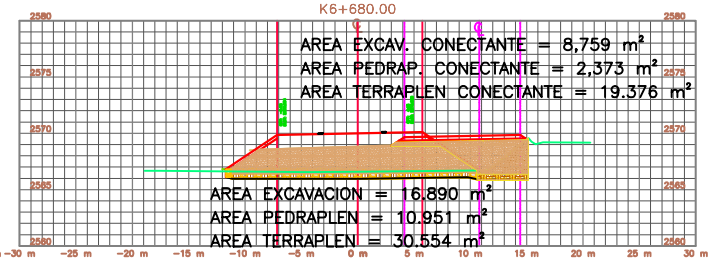


K6+630.00

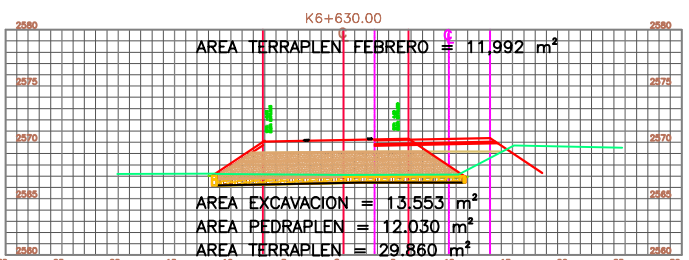


K6+670.00

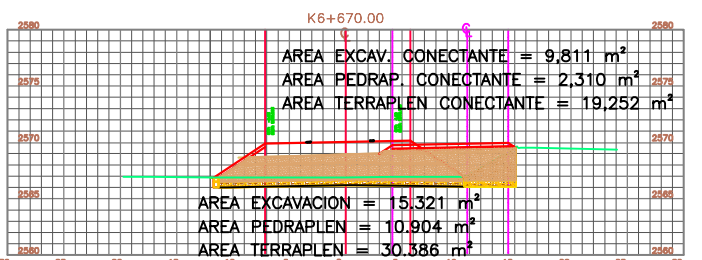


K6+620.00

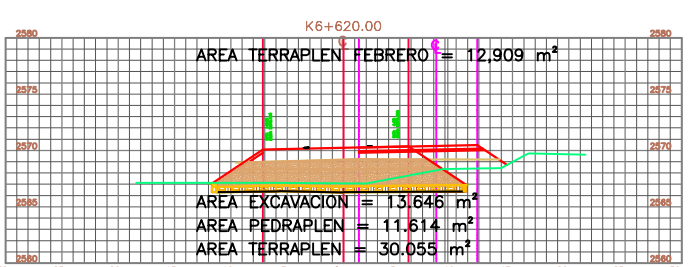


K6+660.00

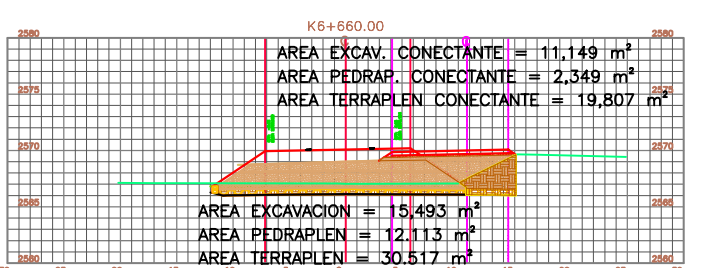


K6+700.00

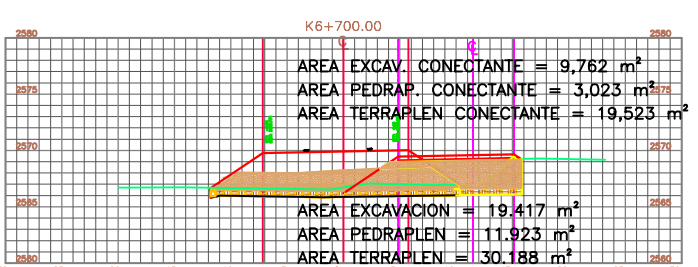


K0+290.00

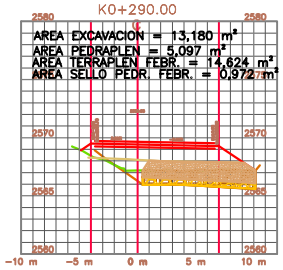


K0+240.00

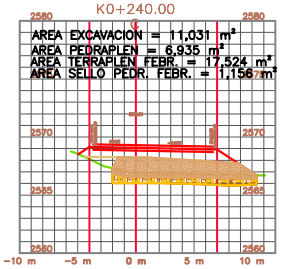


K0+280.00

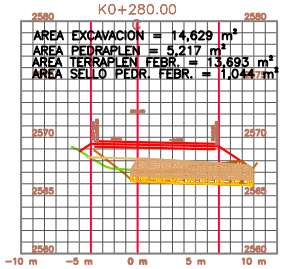


K0+230.00

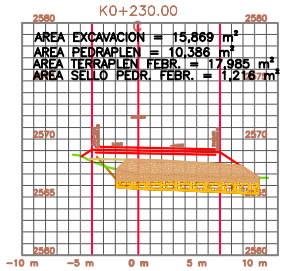


K0+270.00

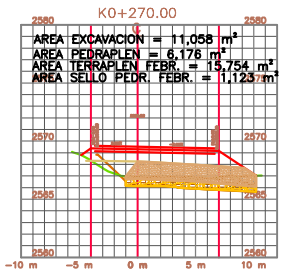


K0+220.00

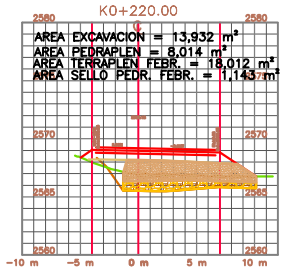


K0+260.00

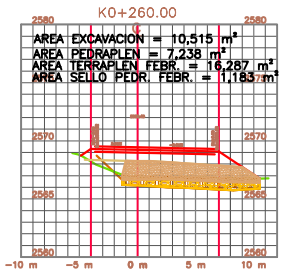


K0+210.00

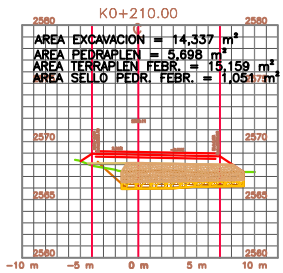


K0+250.00

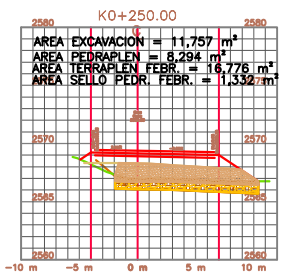


K0+150.00

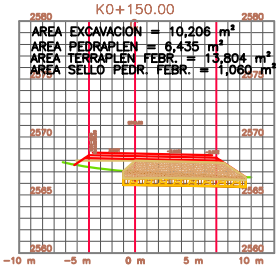


K0+200.00

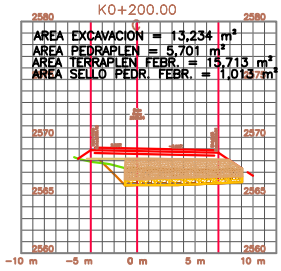


K0+140.00

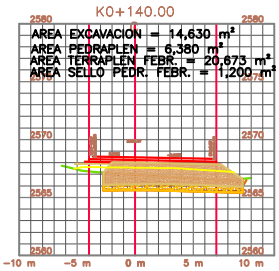


K0+190.00

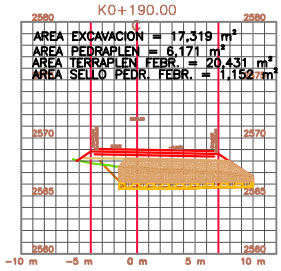


K0+130.00

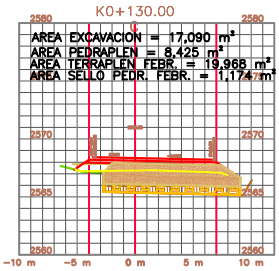


K0+180.00

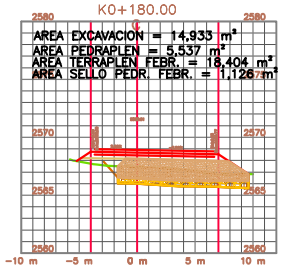


K0+120.00

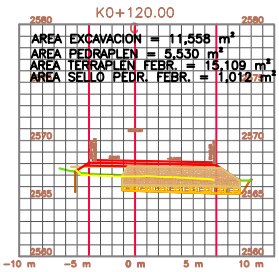


K0+170.00

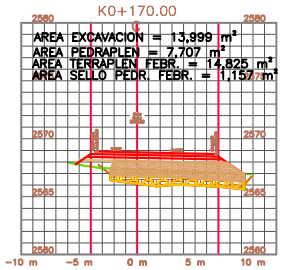



K0+110.00

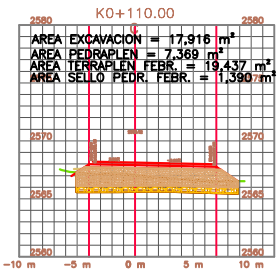



K0+160.00

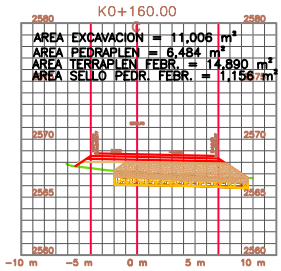


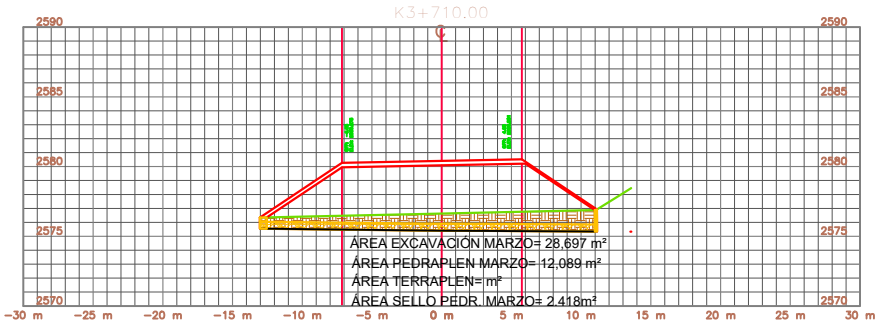

K3+710.00
2590
2585
2580
2575
2570
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO= 28,697 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 12,089 m²
ÁREA TERRAPLEN= m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO= 2.418m²

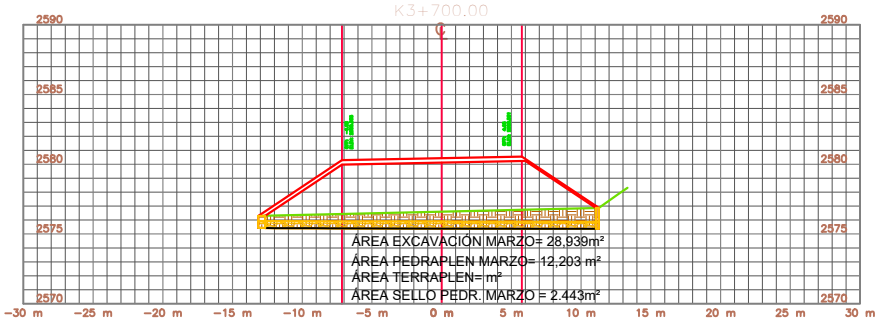

K3+700.00
2590
2585
2580
2575
2570
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO= 28,939m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 12,203 m²
ÁREA TERRAPLEN= m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.443m²

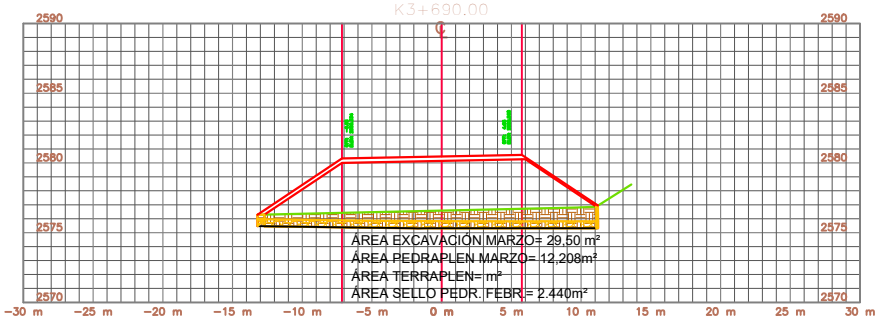

K3+690.00
2590
2585
2580
2575
2570
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO= 29,50 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 12,208m²
ÁREA TERRAPLEN= m²
ÁREA SELLO PEDR. FEBR.= 2.440m²

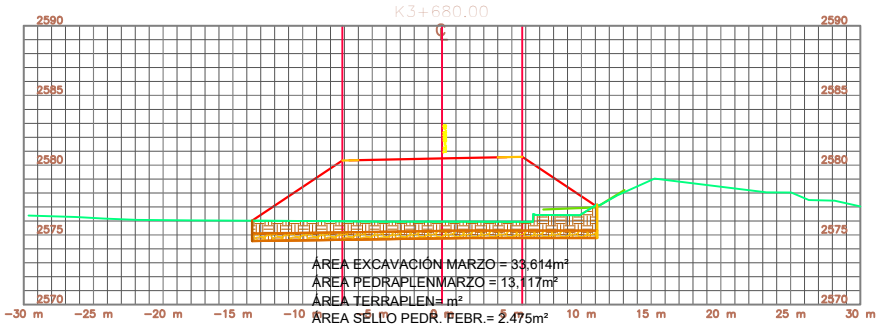

K3+680.00
2590
2585
2580
2575
2570
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 33,614m²
ÁREA PEDRAPLENMARZO = 13,117m²
ÁREA TERRAPLEN= m²
ÁREA SELLO PEDR. FEBR.= 2.475m²

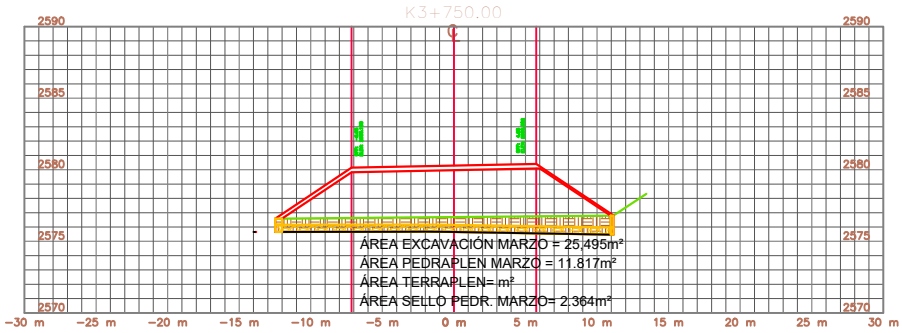

K3+750.00
2590
2585
2580
2575
2570
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 25.495m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11.817m²
ÁREA TERRAPLEN= m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO= 2.364m²

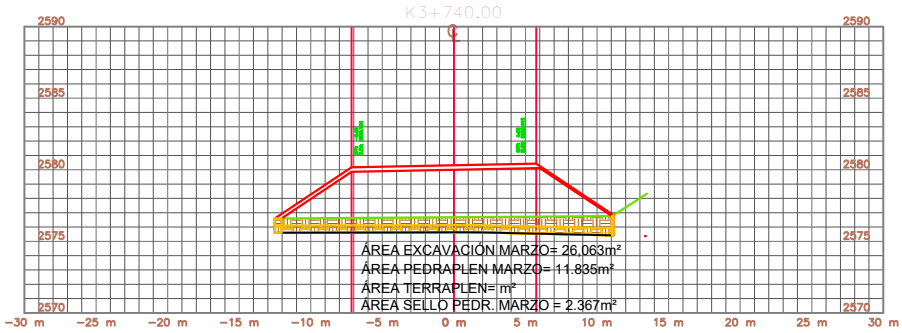

K3+740.00
2590
2585
2580
2575
2570
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO= 26.063m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 11.835m²
ÁREA TERRAPLEN= m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.367m²

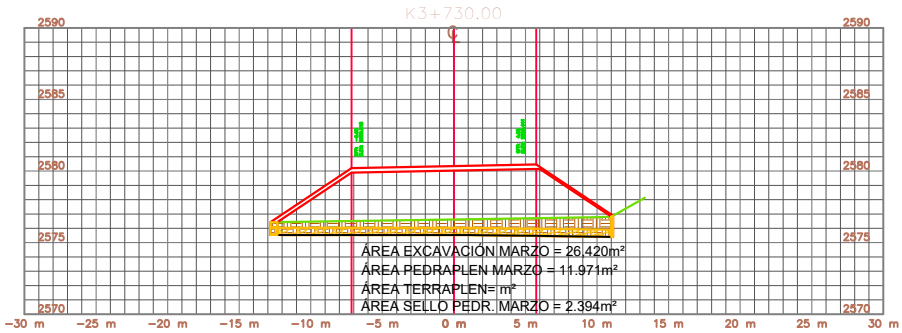

K3+730.00
2590
2585
2580
2575
2570
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 26.420m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11.971m²
ÁREA TERRAPLEN= m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.394m²

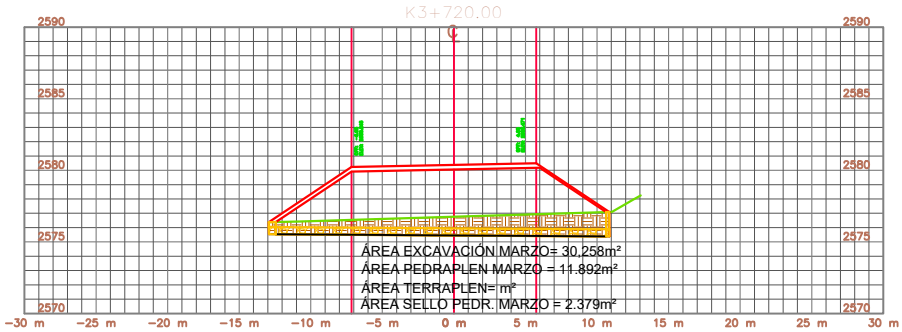

K3+720.00
2590
2585
2580
2575
2570
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO= 30.258m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11.892m²
ÁREA TERRAPLEN= m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.379m²

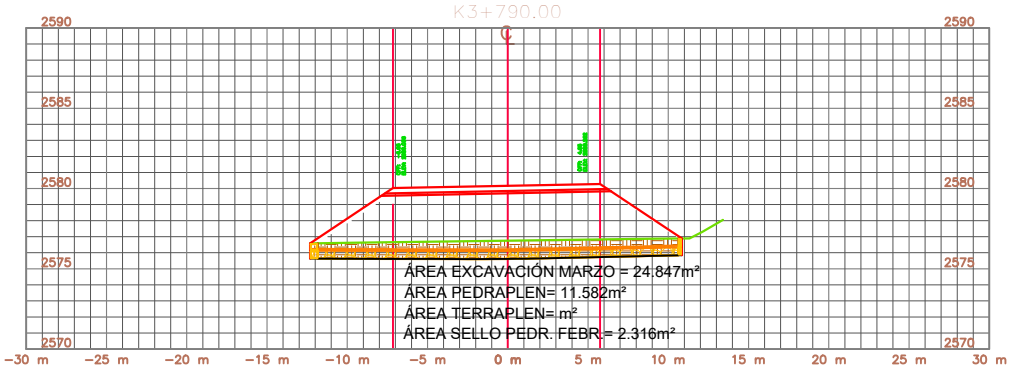

K3+790.00
2590
2585
2580
2575
2570
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 24.847m²
ÁREA PEDRAPLEN= 11.582m²
ÁREA TERRAPLEN= m²
ÁREA SELLO PEDR. FEBR.= 2.316m²

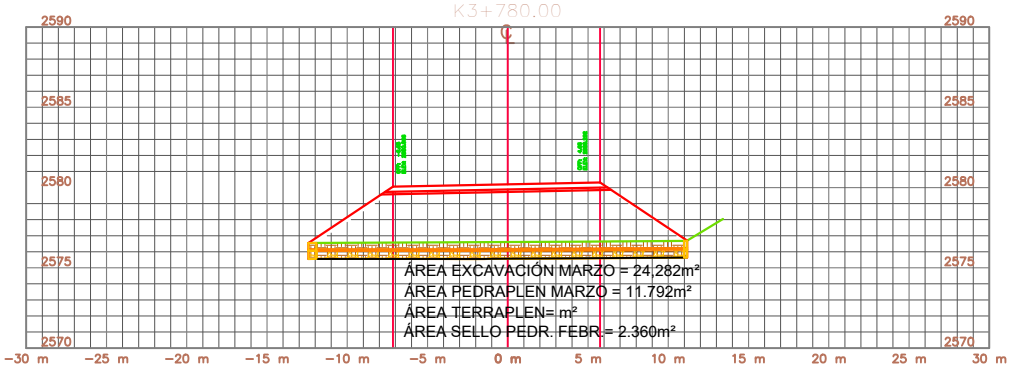

K3+780.00
2590
2585
2580
2575
2570
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 24.282m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11.792m²
ÁREA TERRAPLEN= m²
ÁREA SELLO PEDR. FEBR.= 2.360m²

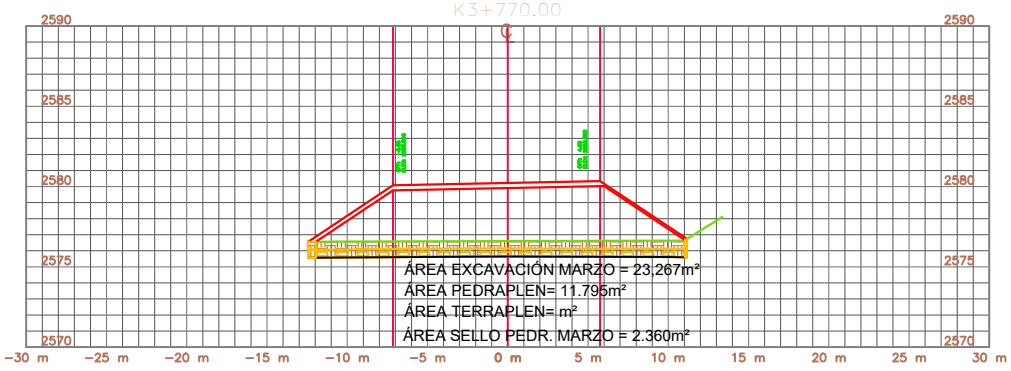

K3+770.00
2590
2585
2580
2575
2570
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 23.267m²
ÁREA PEDRAPLEN= 11.795m²
ÁREA TERRAPLEN= m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.360m²

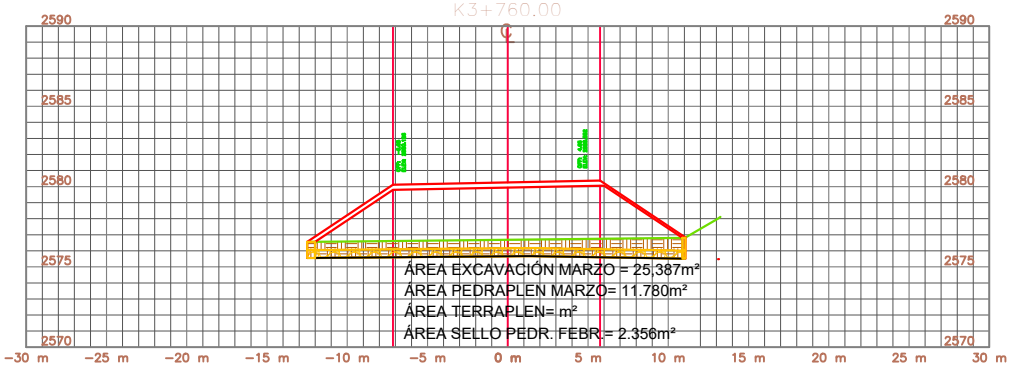

K3+760.00
2590
2585
2580
2575
2570
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 25.387m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 11.780m²
ÁREA TERRAPLEN= m²
ÁREA SELLO PEDR. FEBR.= 2.356m²

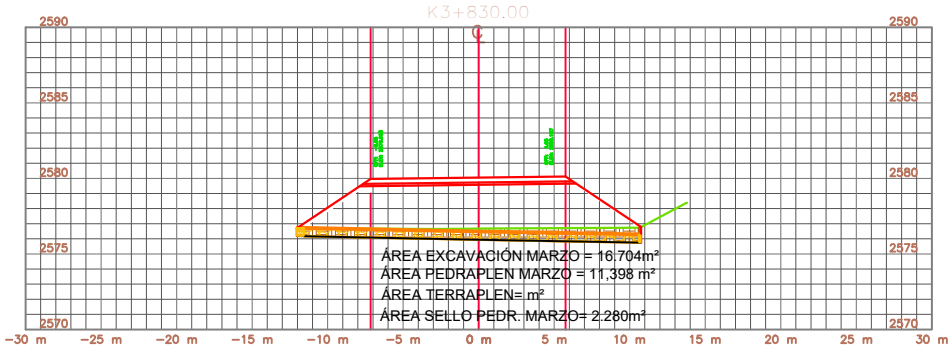

K3+830.00
2590
2585
2580
2575
2570
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 16.704m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11.398 m²
ÁREA TERRAPLEN= m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO= 2.280m²

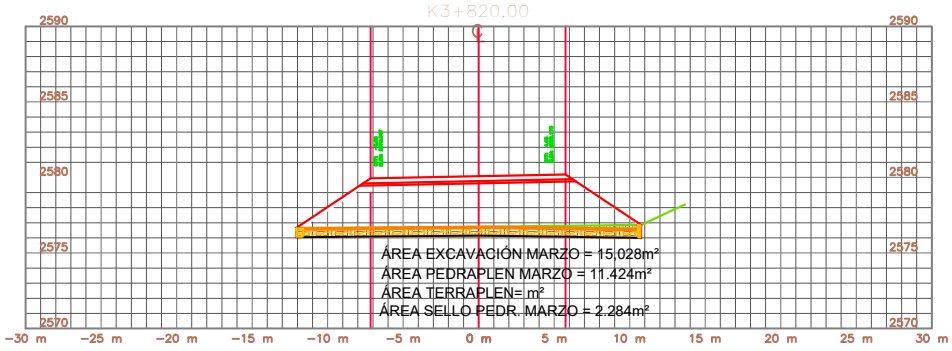

K3+820.00
2590
2585
2580
2575
2570
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 15.028m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11.424m²
ÁREA TERRAPLEN= m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.284m²

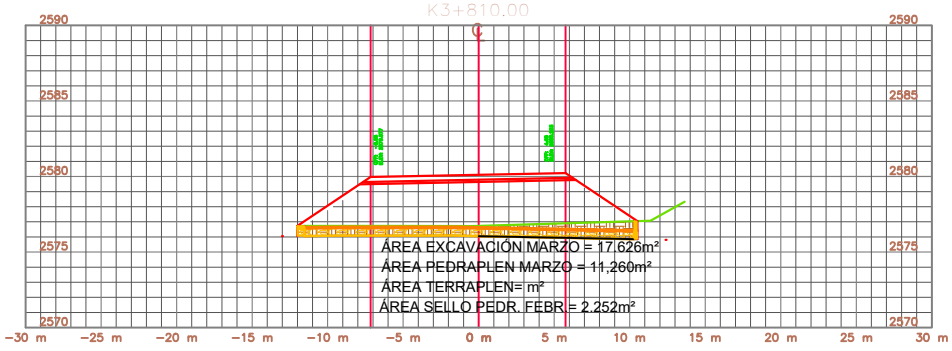

K3+810.00
2590
2585
2580
2575
2570
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 17.626m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11.260m²
ÁREA TERRAPLEN= m²
ÁREA SELLO PEDR. FEBR.= 2.252m²

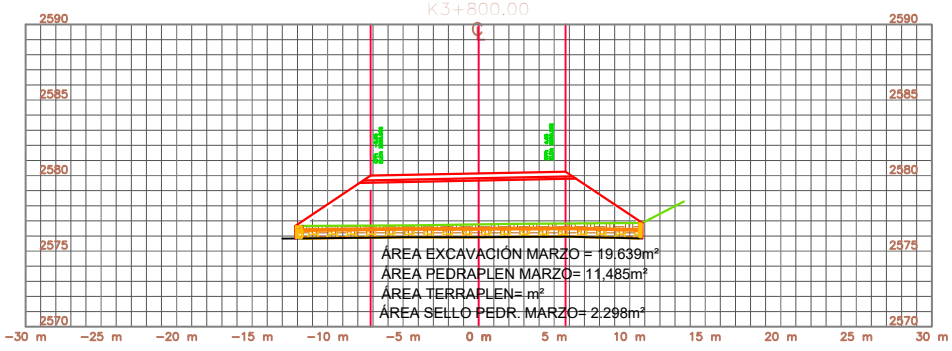

K3+800.00
2590
2585
2580
2575
2570
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 19.639m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 11.485m²
ÁREA TERRAPLEN= m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO= 2.298m²

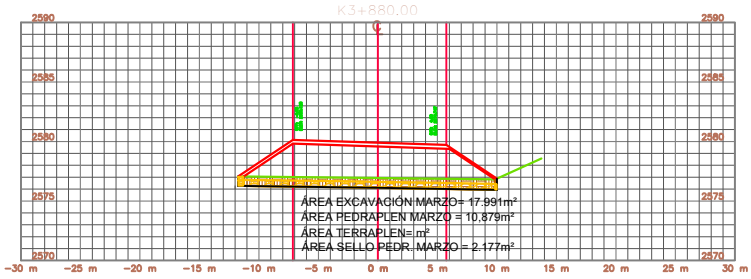

K3+880.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO= 17.991m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10.879m²
ÁREA TERRAPLEN= m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.177m²

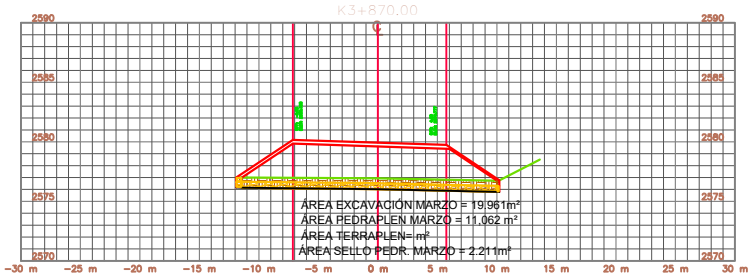

K3+870.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 19.961m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11.062 m²
ÁREA TERRAPLEN= m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.211m²

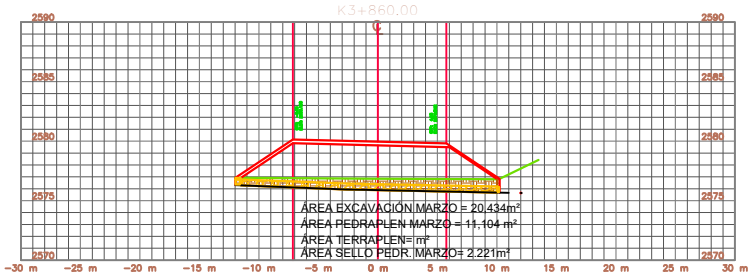

K3+860.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 20.434m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11.104 m²
ÁREA TERRAPLEN= m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO= 2.221m²

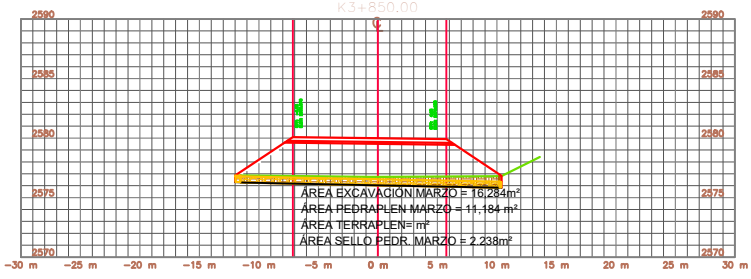

K3+850.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 16.284m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11.184 m²
ÁREA TERRAPLEN= m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.238m²

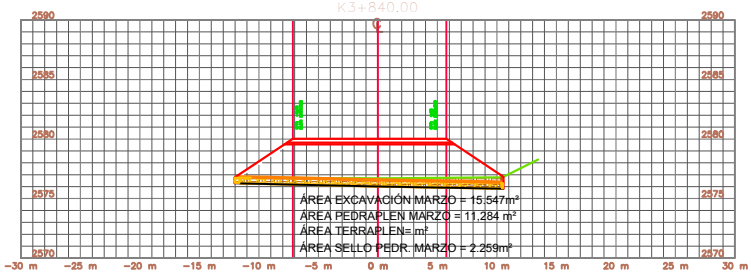

K3+840.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 15.547m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11.284 m²
ÁREA TERRAPLEN= m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.259m²

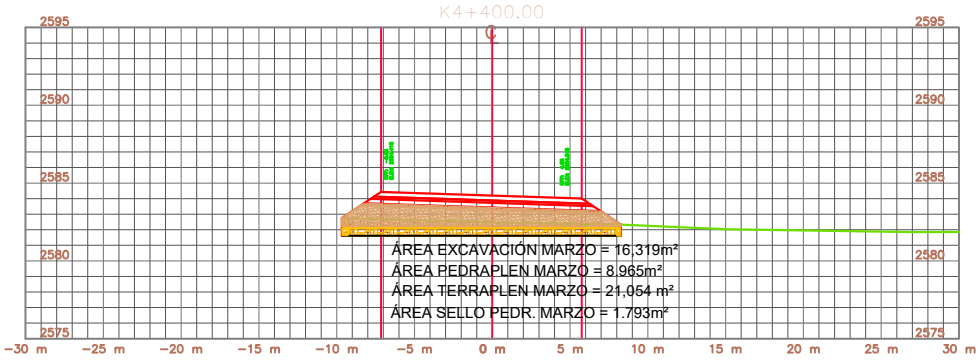

K4+400.00
2595
2590
2585
2580
2575
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 16,319m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 8,965m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 21,054 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.793m²

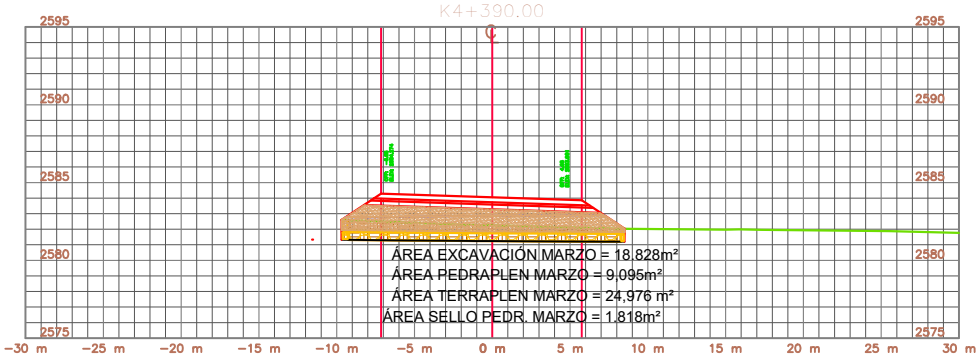

K4+390.00
2595
2590
2585
2580
2575
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 18,828m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9,095m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 24,976 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,818m²

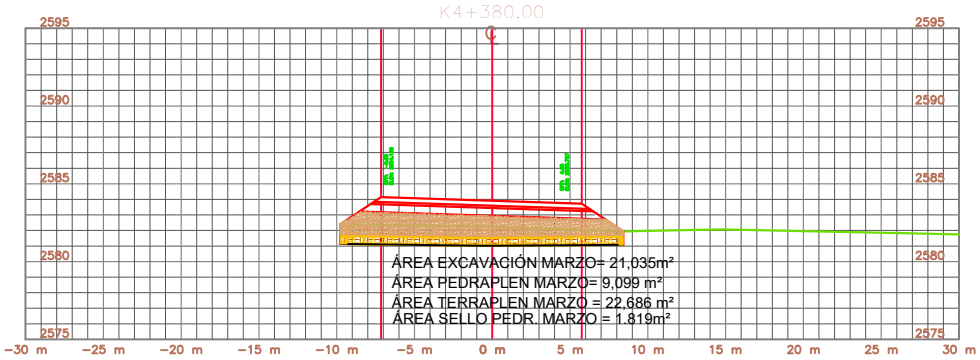

K4+380.00
2595
2590
2585
2580
2575
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO= 21,035m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,099 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 22,686 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.819m²

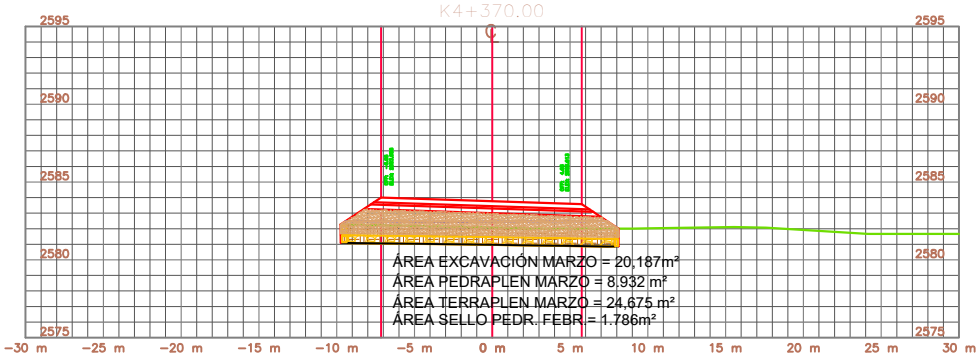

K4+370.00
2595
2590
2585
2580
2575
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 20,187m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 8,932 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 24,675 m²
ÁREA SELLO PEDR. FEBR. = 1.786m²

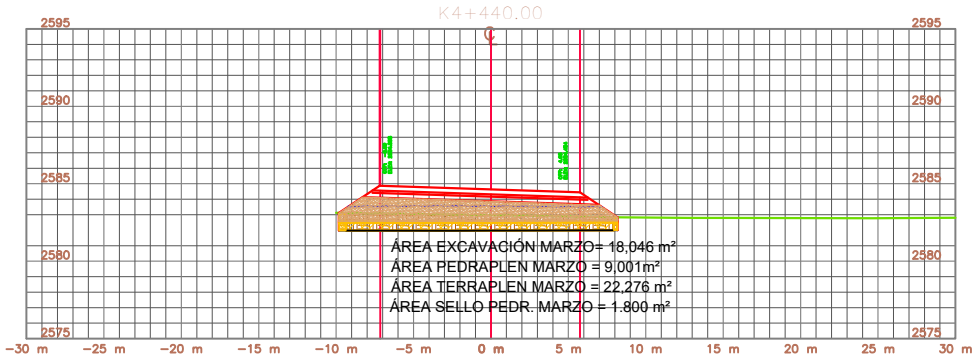

K4+440.00
2595
2590
2585
2580
2575
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO= 18,046 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9,001m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 22,276 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,800 m²

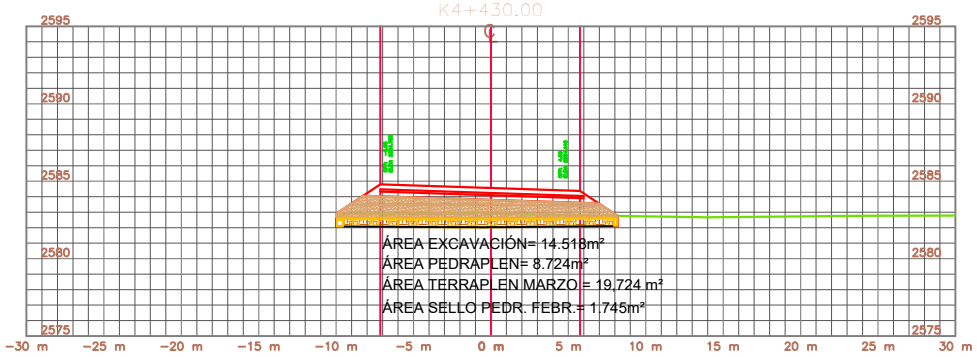

K4+430.00
2595
2590
2585
2580
2575
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN= 14.518m²
ÁREA PEDRAPLEN= 8.724m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 19,724 m²
ÁREA SELLO PEDR. FEBR.= 1,745m²

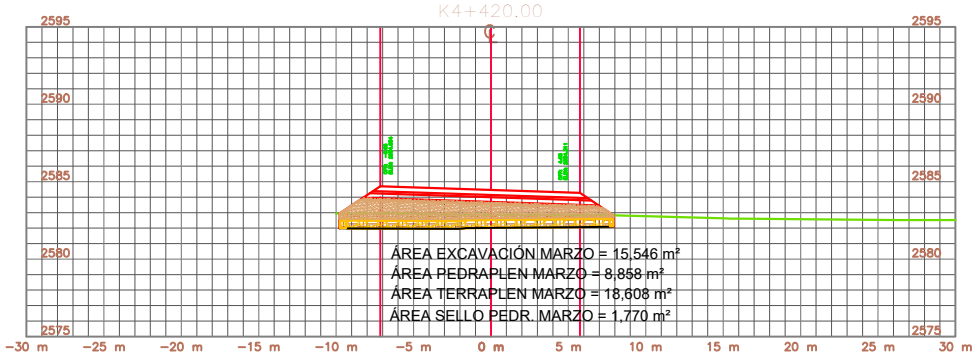

K4+420.00
2595
2590
2585
2580
2575
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 15,546 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 8,858 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 18,608 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,770 m²

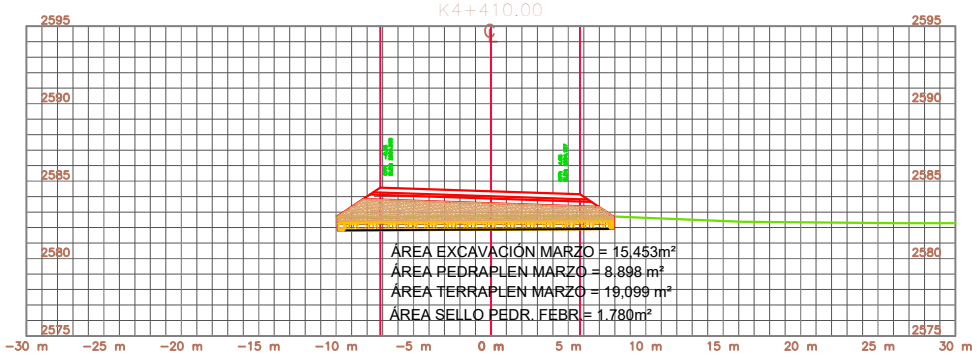

K4+410.00
2595
2590
2585
2580
2575
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 15,453m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 8,898 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 19,099 m²
ÁREA SELLO PEDR. FEBR.= 1,780m²

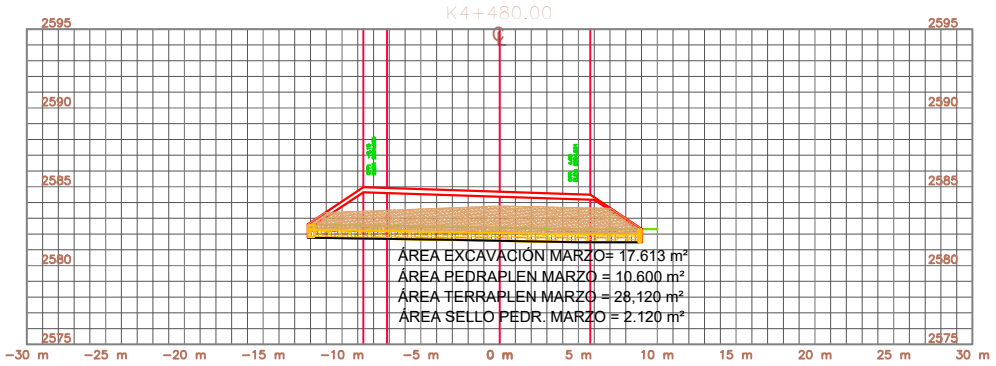

K4+480.00
2595
2590
2585
2580
2575
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO= 17.613 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10.600 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 28,120 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.120 m²

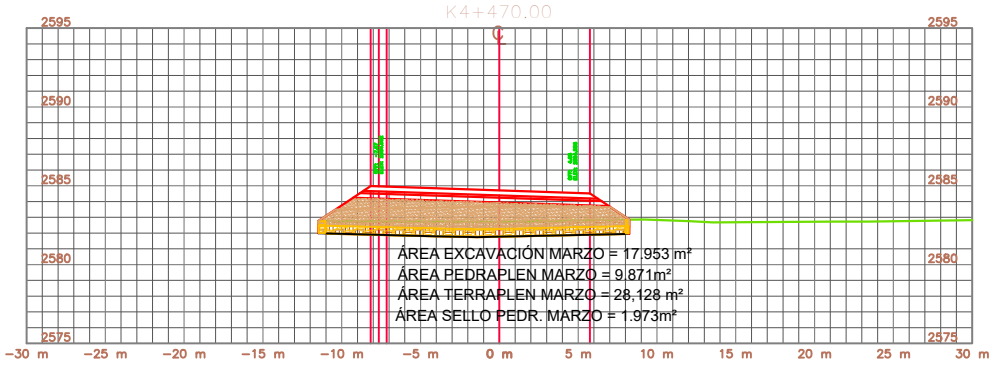

K4+470.00
2595
2590
2585
2580
2575
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 17.953 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.871m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 28,128 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.973m²

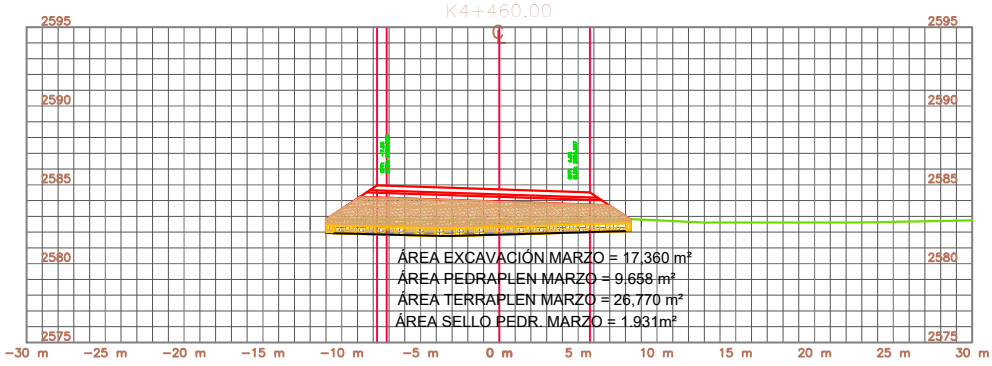

K4+460.00
2595
2590
2585
2580
2575
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 17.360 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.658 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 26,770 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.931m²

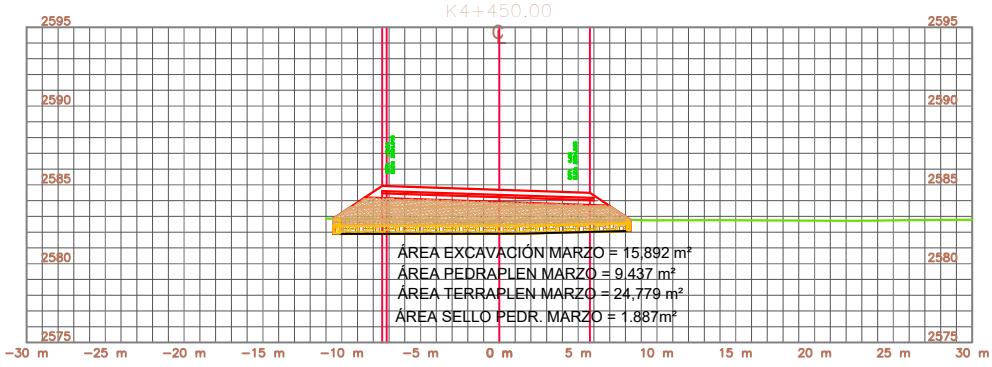

K4+450.00
2595
2590
2585
2580
2575
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 15.892 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.437 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 24,779 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.887m²

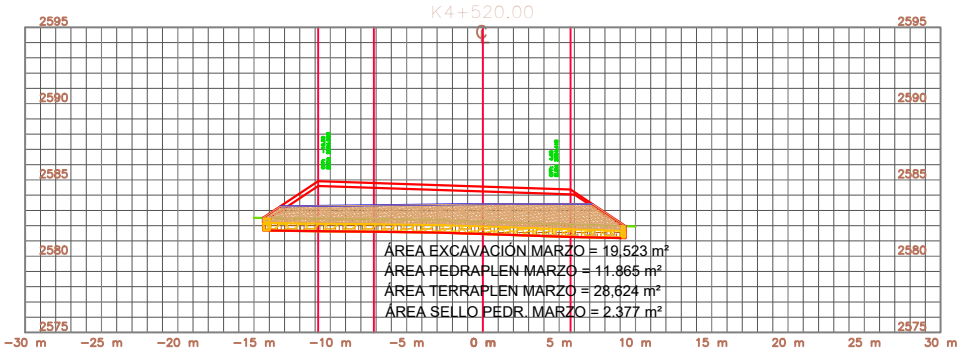

K4+520.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 19.523 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11.865 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 28.624 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.377 m²

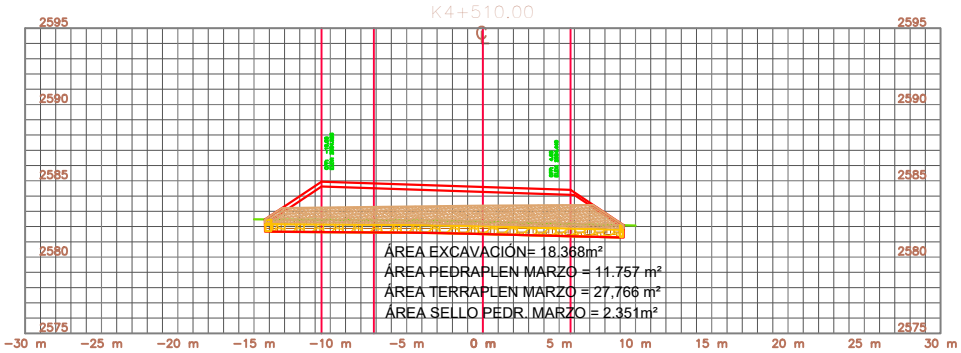

K4+510.00
ÁREA EXCAVACIÓN= 18.368m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11.757 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 27.766 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.351m²

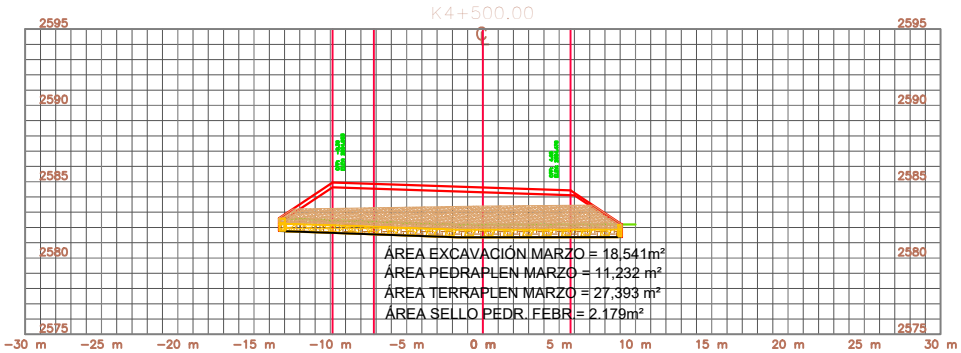

K4+500.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 18.541m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11.232 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 27.393 m²
ÁREA SELLO PEDR. FEBR = 2.179m²

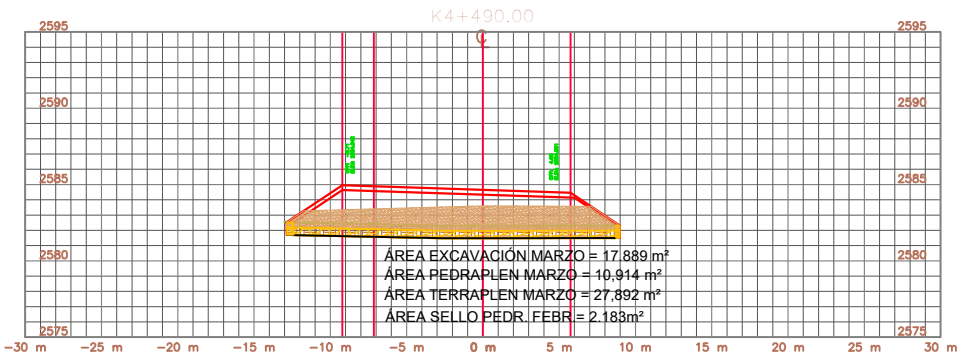

K4+490.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 17.889 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10.914 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 27.892 m²
ÁREA SELLO PEDR. FEBR = 2.183m²

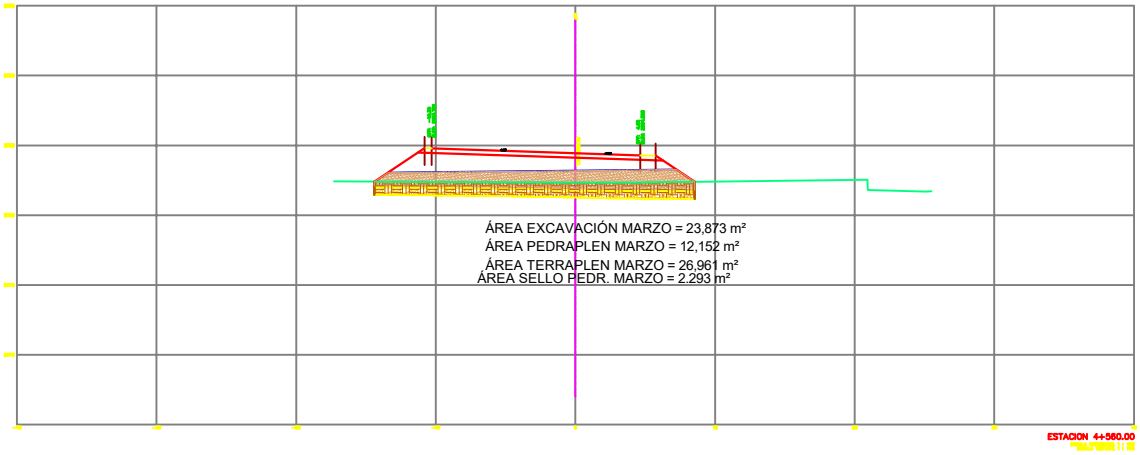

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 23,873 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 12,152 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 26,961 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.293 m²
ESTACION 4+560.00

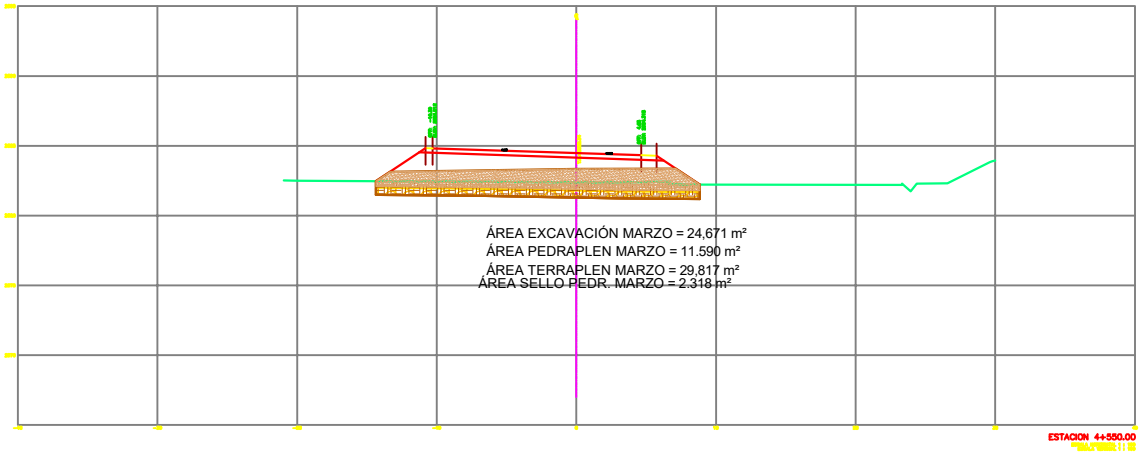

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 24,671 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11.590 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 29,817 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.318 m²
ESTACION 4+550.00

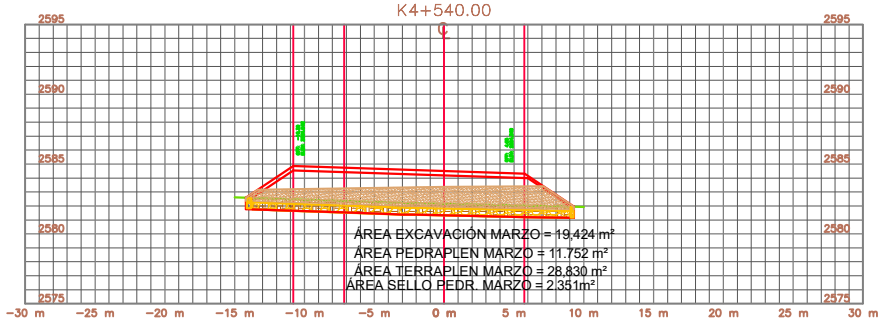

K4+540.00
2595
2590
2585
2580
2575
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 19,424 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11.752 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 28,830 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.351m²
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m

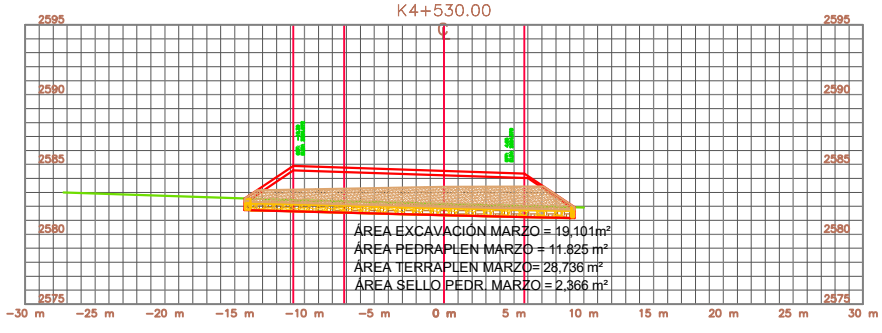

K4+530.00
2595
2590
2585
2580
2575
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 19,101m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11.825 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO= 28,736 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.366 m²
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m

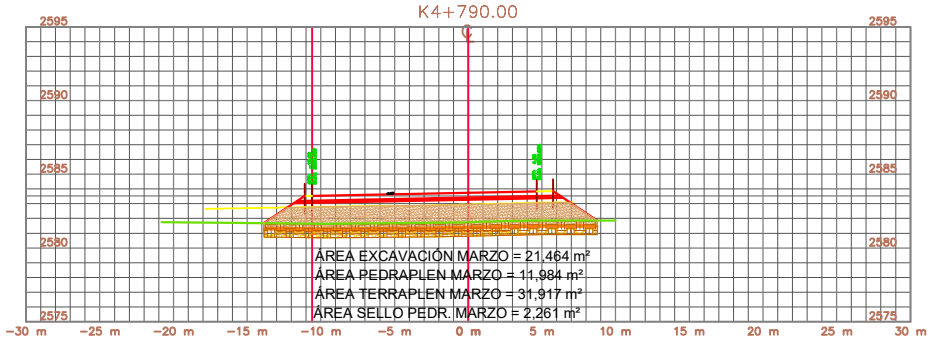

K4+790.00
2595
2590
2585
2580
2575
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 21.464 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11.984 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 31.917 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.261 m²
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m

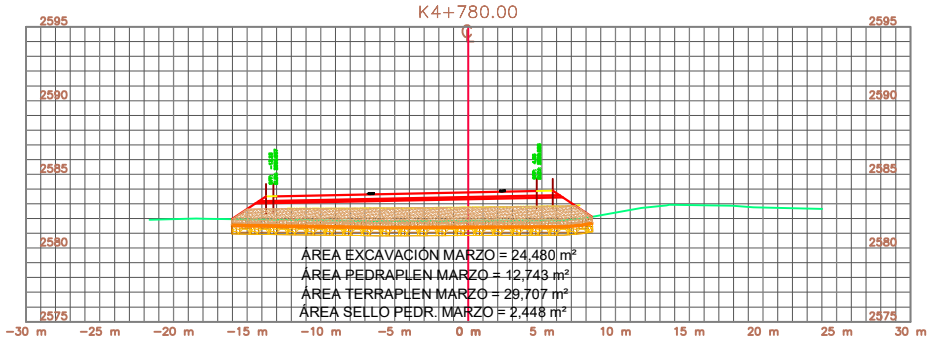

K4+780.00
2595
2590
2585
2580
2575
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 24.480 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 12.743 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 29.707 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.448 m²
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m

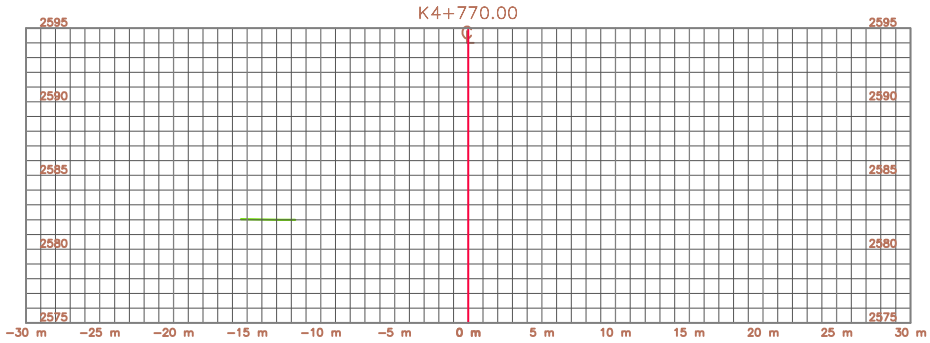

K4+770.00
2595
2590
2585
2580
2575
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m

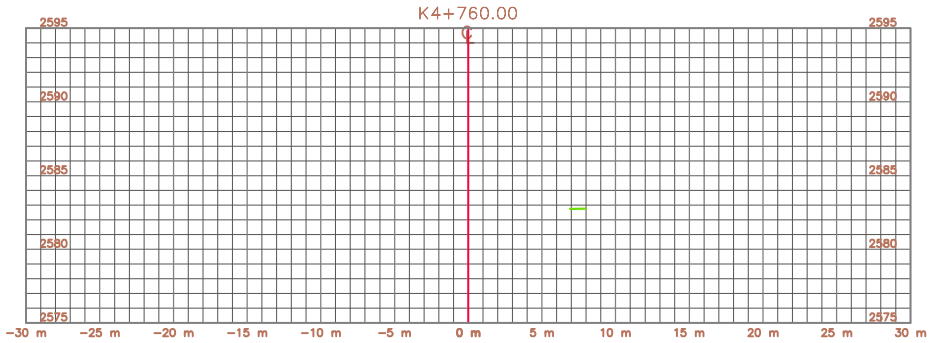

K4+760.00
2595
2590
2585
2580
2575
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m

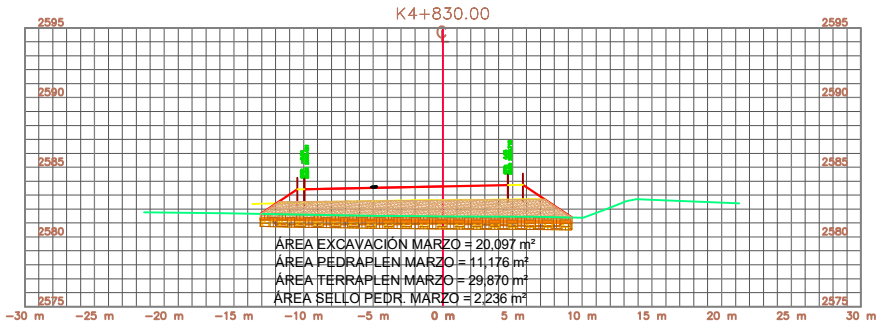

K4+830.00
2595
2590
2585
2580
2575
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 20,097 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11,176 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 29,870 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,236 m²

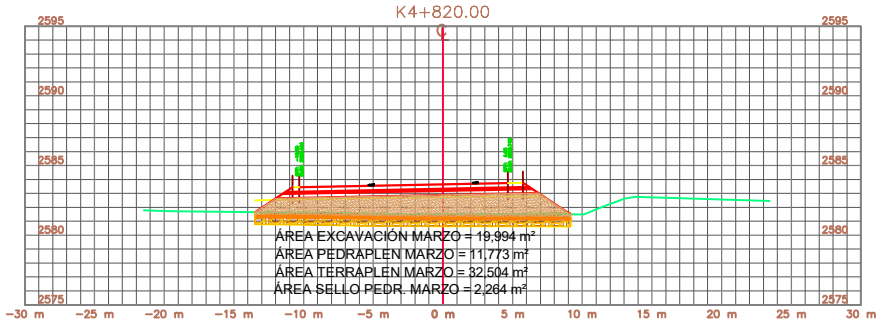

K4+820.00
2595
2590
2585
2580
2575
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 19,994 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11,773 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 32,504 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,264 m²

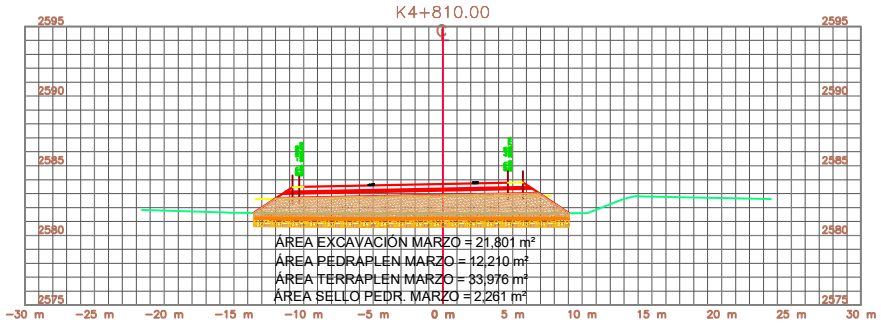

K4+810.00
2595
2590
2585
2580
2575
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 21,801 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 12,210 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 33,976 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,261 m²

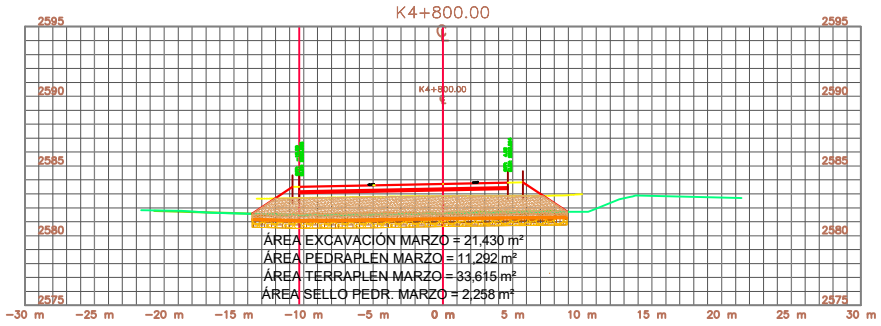

K4+800.00
2595
2590
2585
2580
2575
K4+800.00
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 21,430 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11,282 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 33,615 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,258 m²

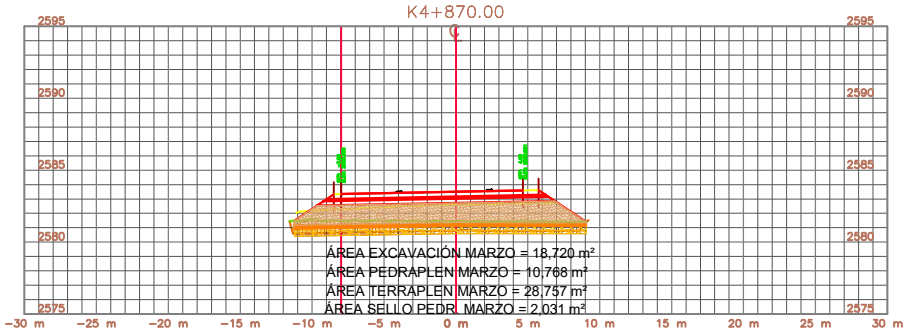

K4+870.00
2595
2590
2585
2580
2575
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 18,720 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10,768 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 28,757 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,031 m²

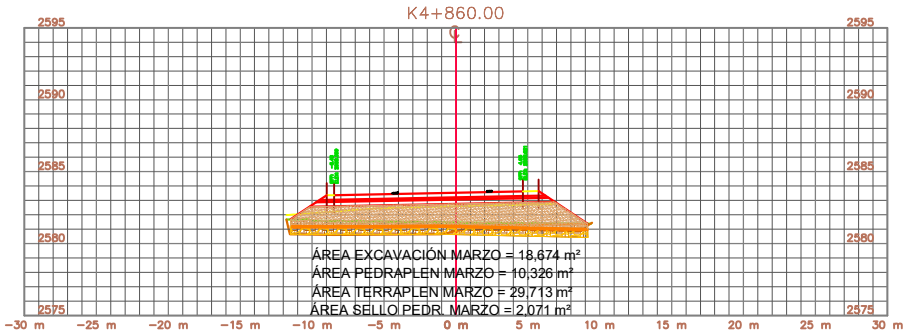
K4+860.00
2595
2590
2585
2580
2575
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 18,674 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10,326 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 29,713 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,071 m²

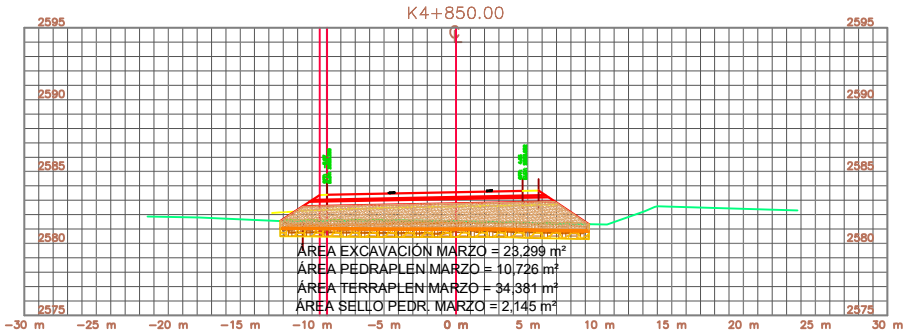

K4+850.00
2595
2590
2585
2580
2575
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 23,299 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10,726 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 34,381 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,145 m²

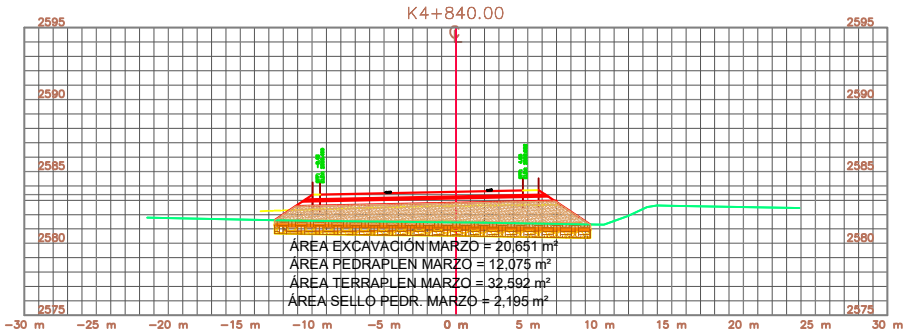
K4+840.00
2595
2590
2585
2580
2575
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 20,651 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 12,075 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 32,592 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,195 m²

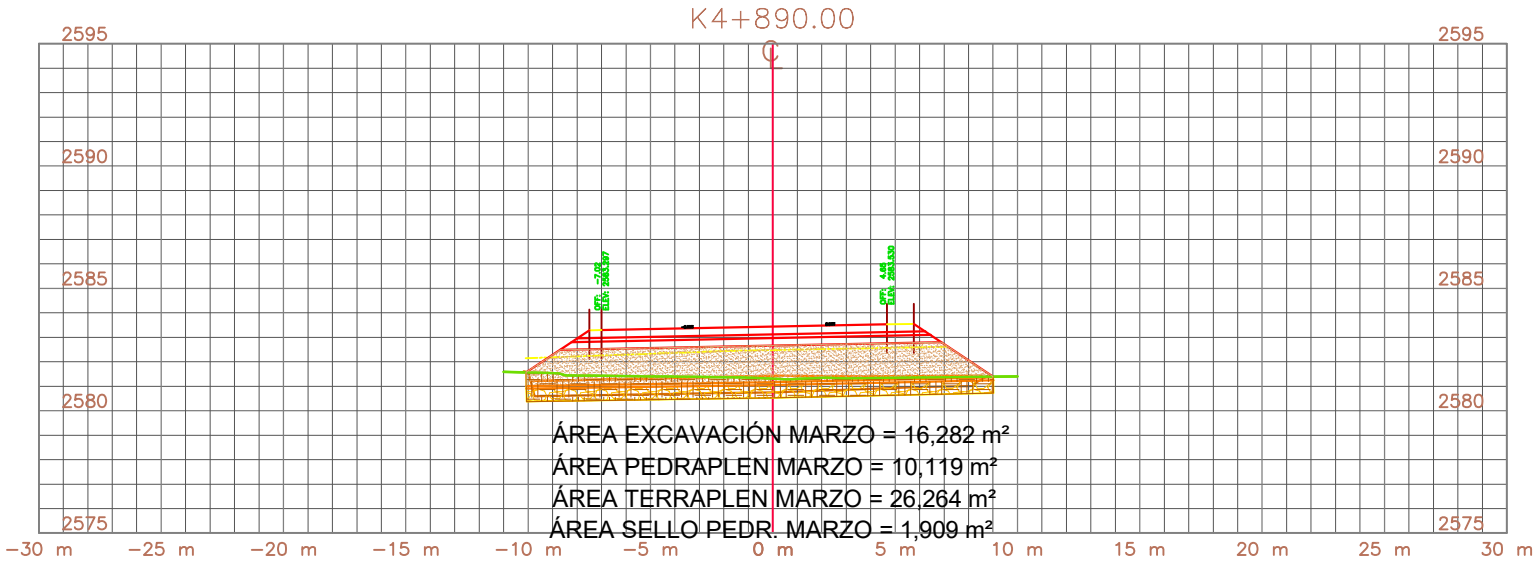

K4+890.00
2595
2590
2585
2580
2575
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 16,282 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10,119 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 26,264 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,909 m²

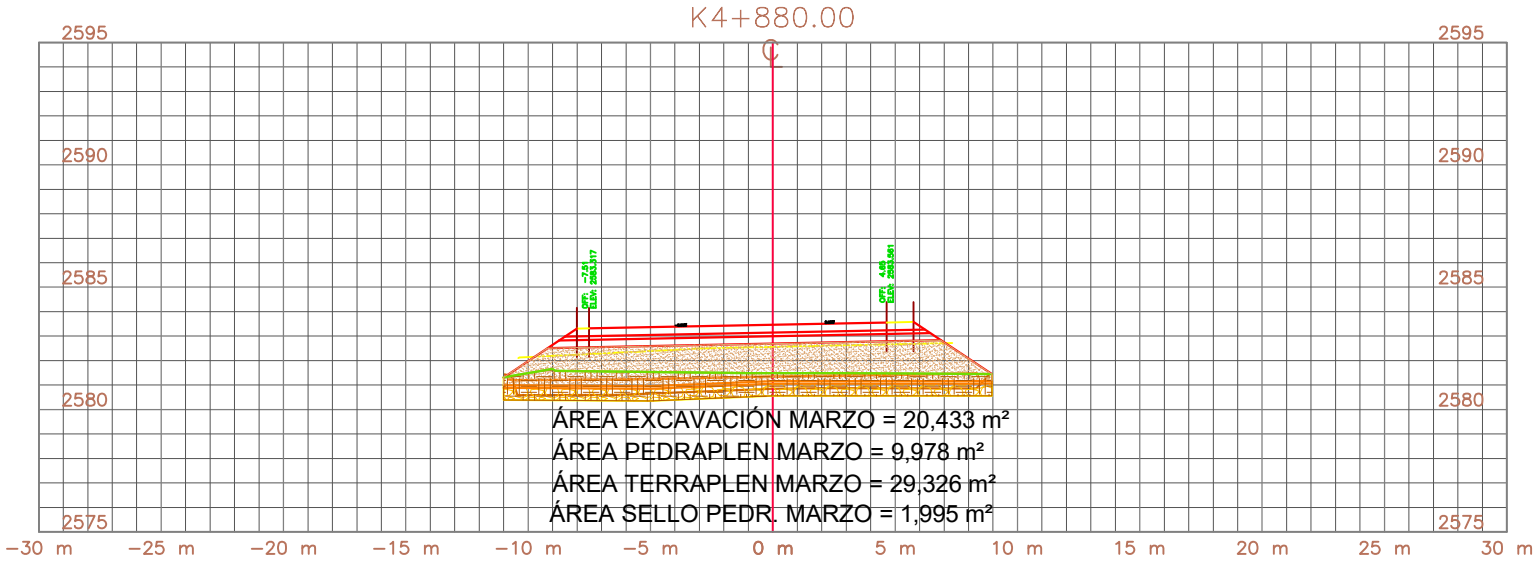
K4+880.00
2595
2590
2585
2580
2575
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 20,433 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9,978 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 29,326 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,995 m²


K5+060.00

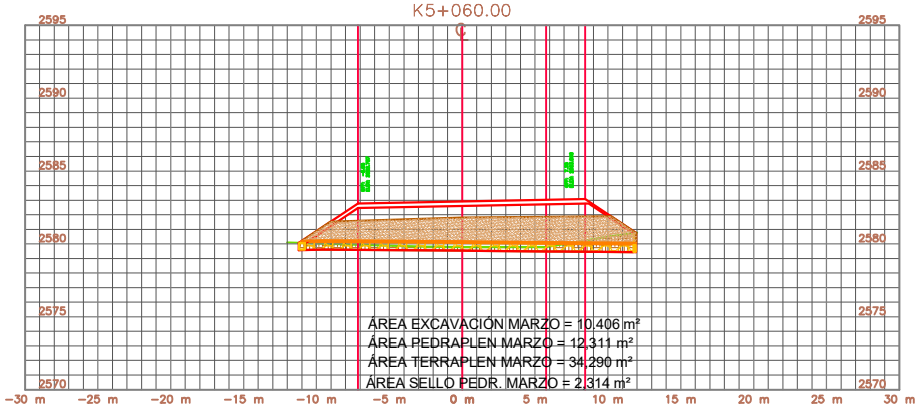


K5+050.00

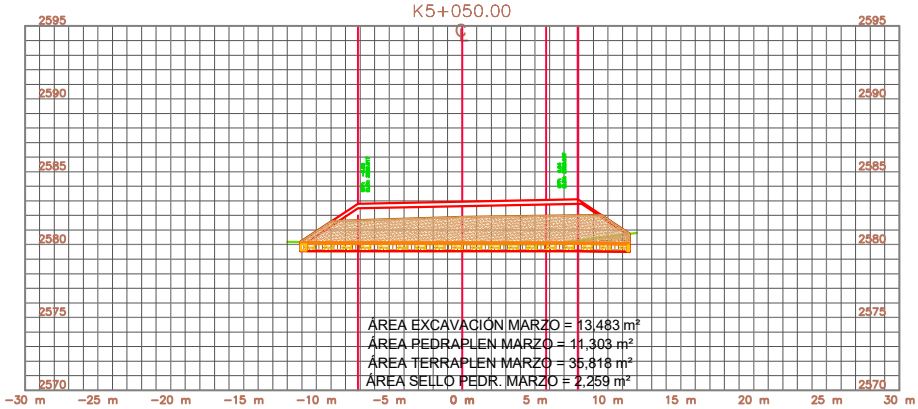


K5+040.00

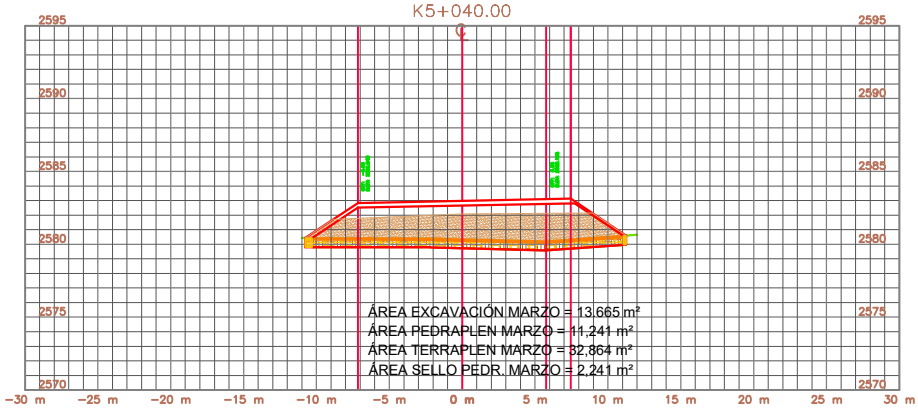


K5+030.00

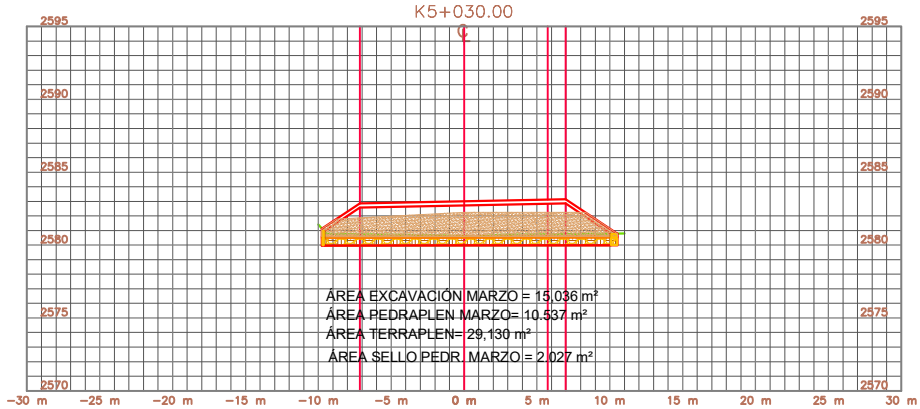


K5+100.00

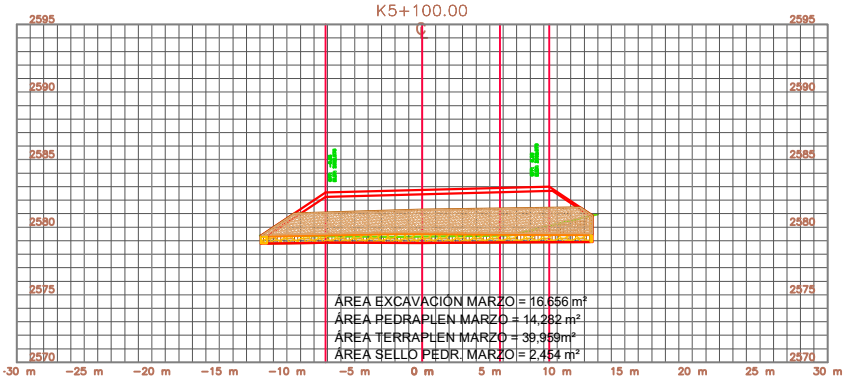


K5+090.00

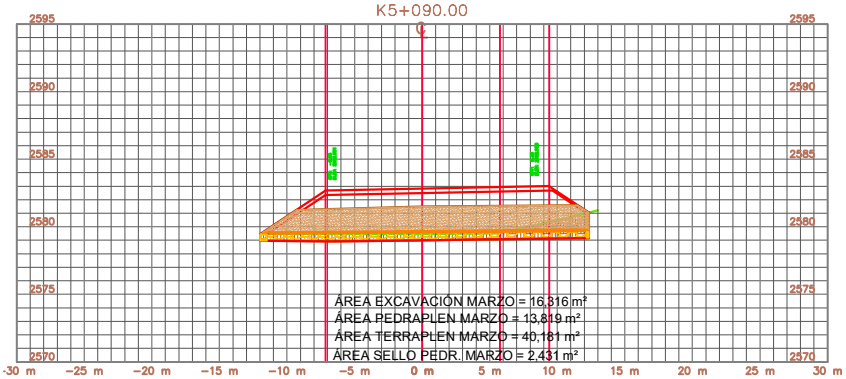


K5+080.00

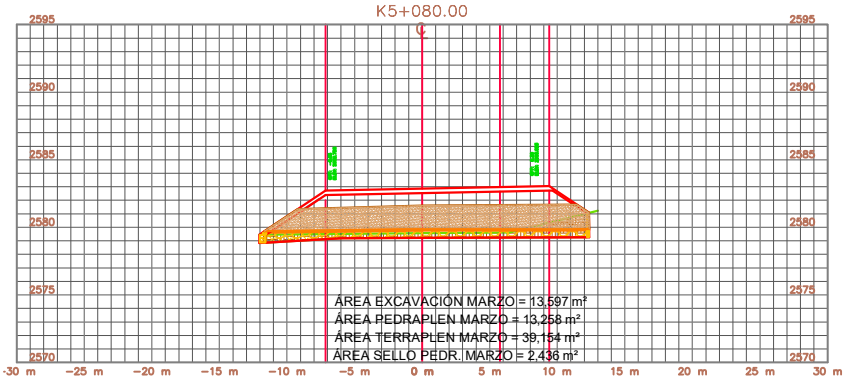


K5+070.00

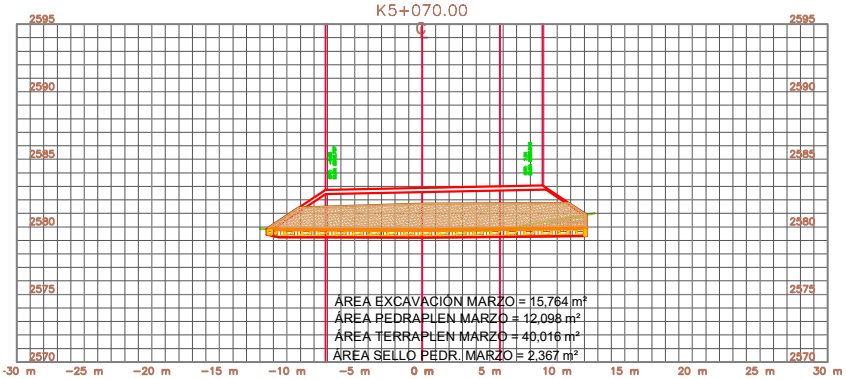


K5+150.00

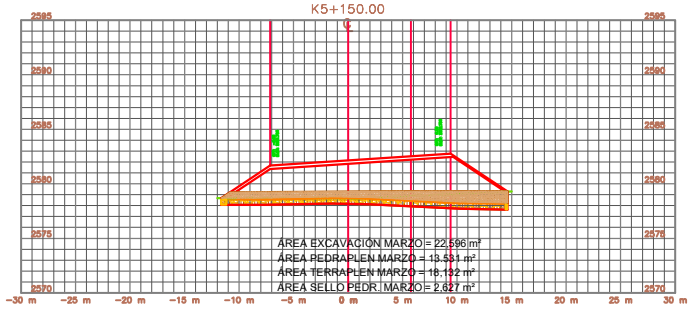


K5+140.00

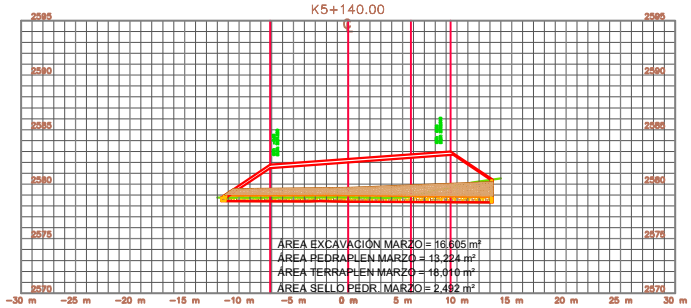


K5+130.00

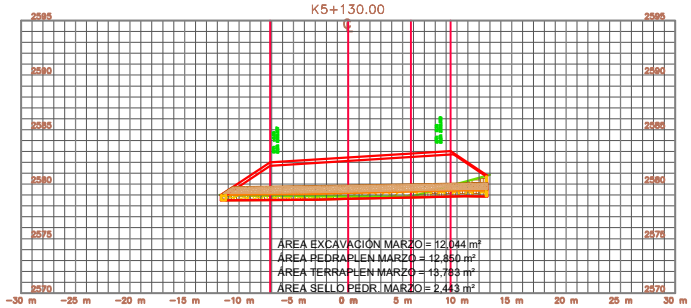



K5+120.00

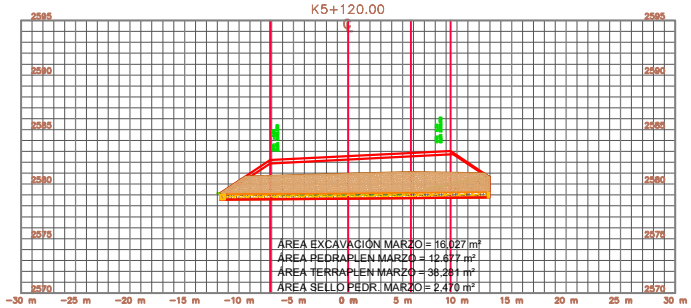



K5+110.00

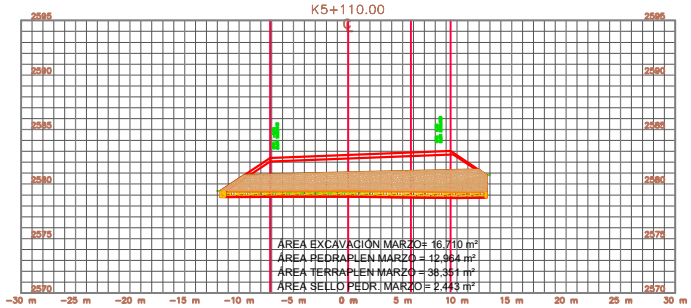


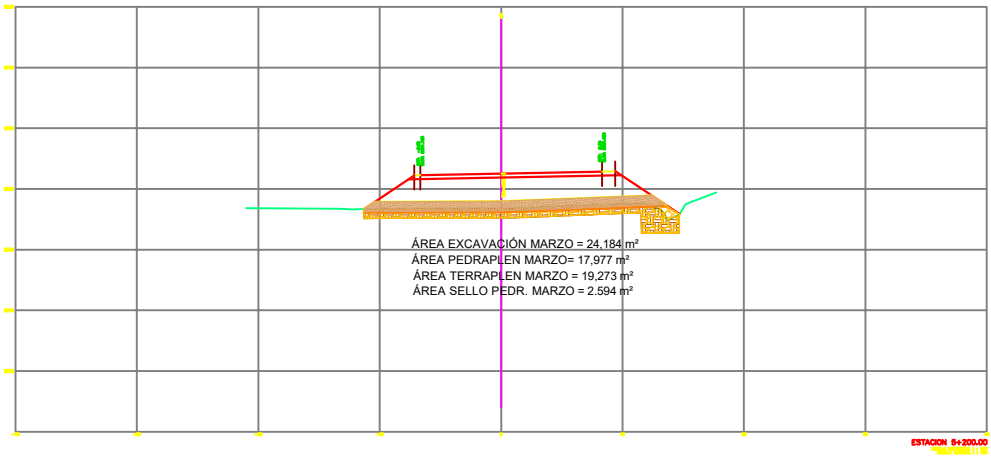

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 24,184 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 17,977 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 19,273 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.594 m²
ESTACION 5+200.00

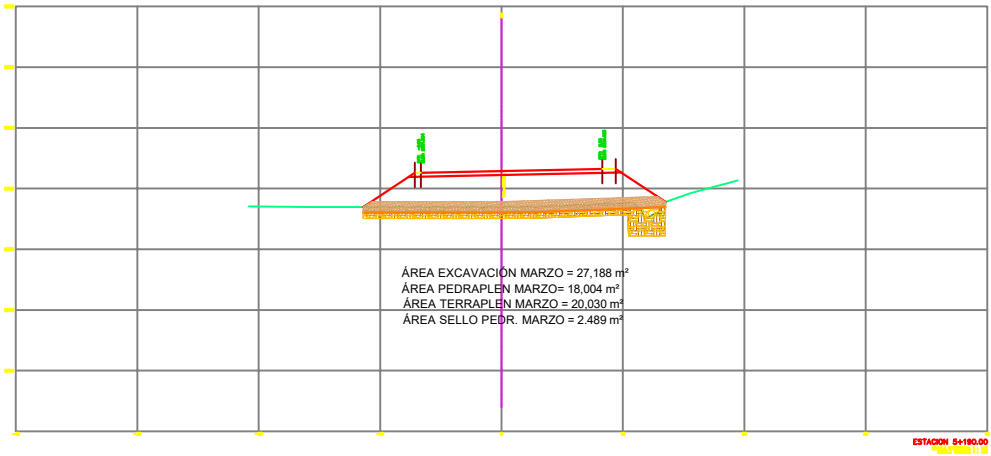

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 27,188 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 18,004 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 20,030 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.489 m²
ESTACION 5+190.00

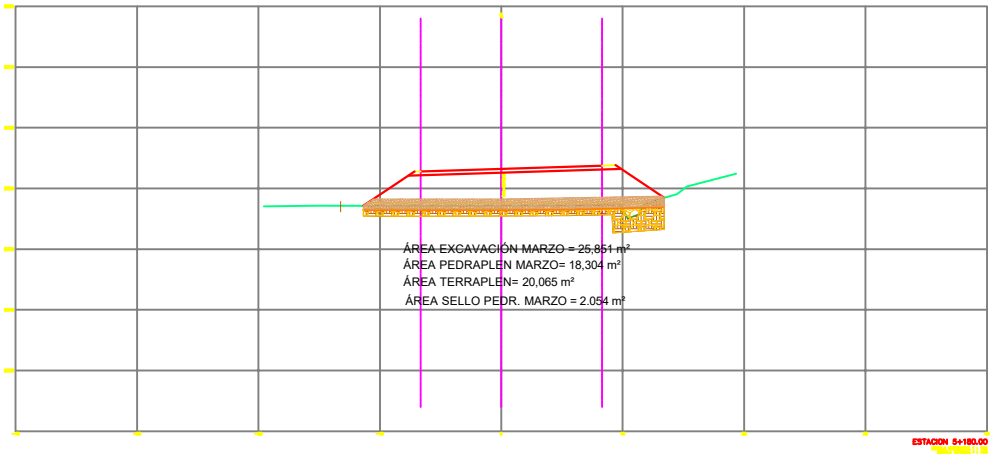

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 25,851 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 18,304 m²
ÁREA TERRAPLEN= 20,065 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.054 m²
ESTACION 5+180.00

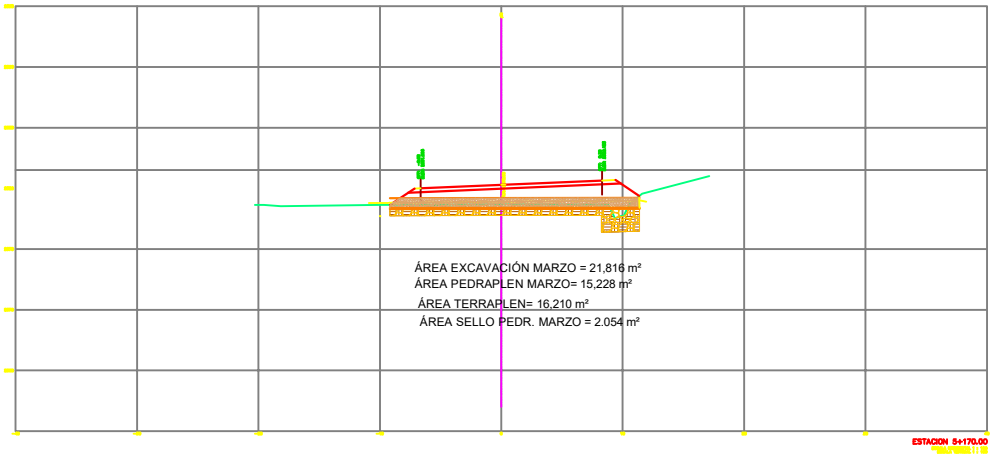

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 21,816 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 15,228 m²
ÁREA TERRAPLEN= 16,210 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.054 m²
ESTACION 5+170.00

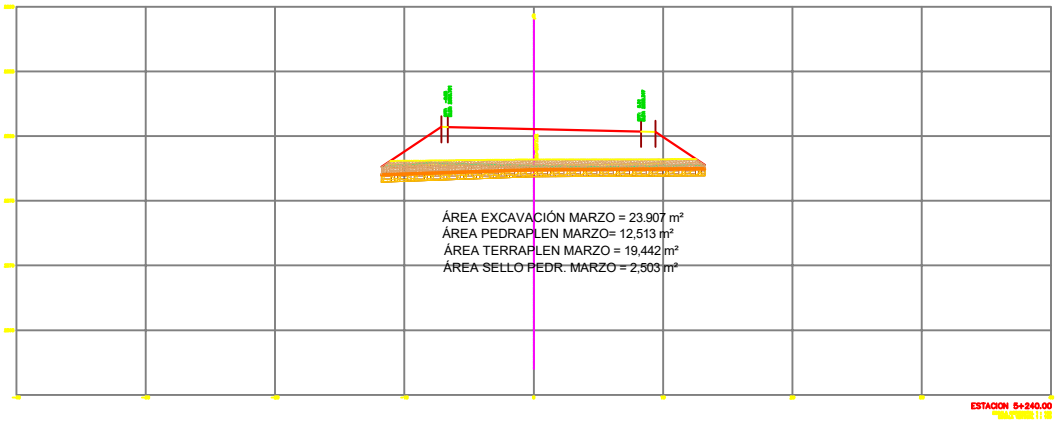

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 23,907 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 12,513 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 19,442 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,503 m²
ESTACION 5+240.00

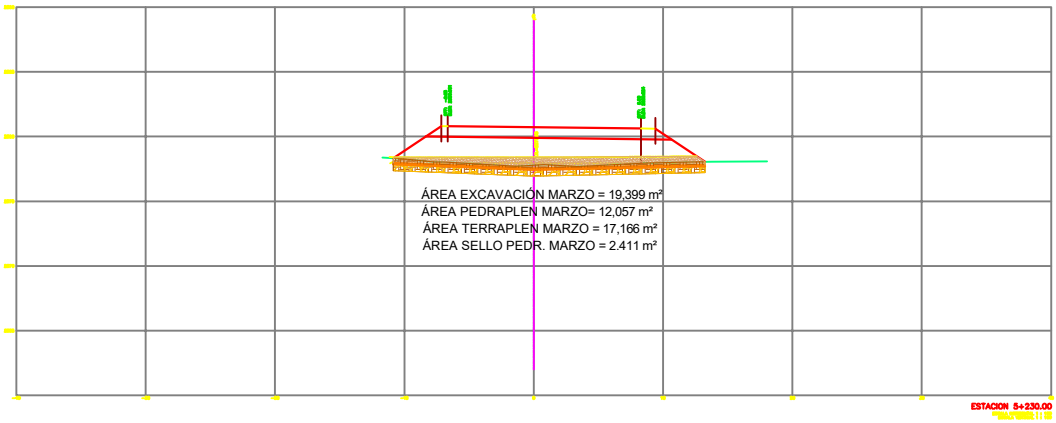

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 19,399 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 12,057 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 17,166 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.411 m²
ESTACION 5+230.00

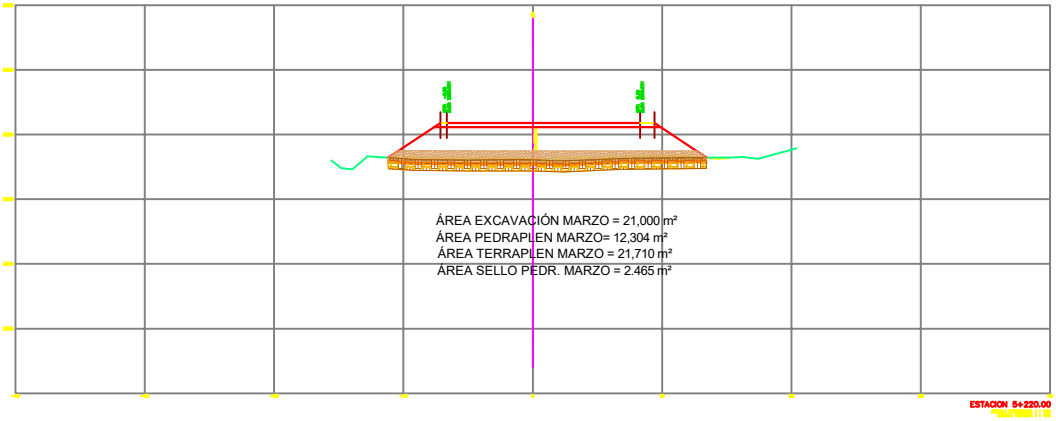

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 21,000 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 12,304 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 21,710 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.465 m²
ESTACION 5+220.00

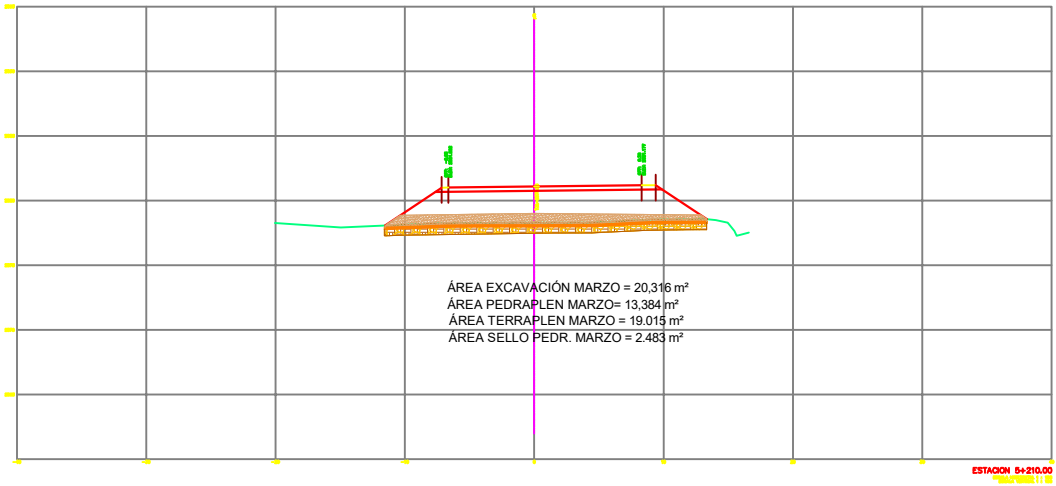

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 20,316 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 13,384 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 19,015 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.483 m²
ESTACION 5+210.00

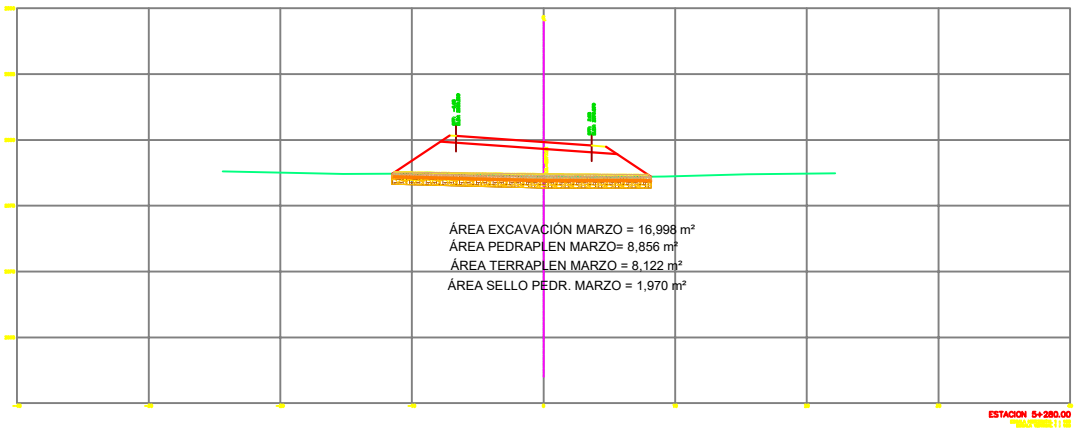
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 16,998 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 8,856 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 8,122 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,970 m²
ESTACION 5+280.00

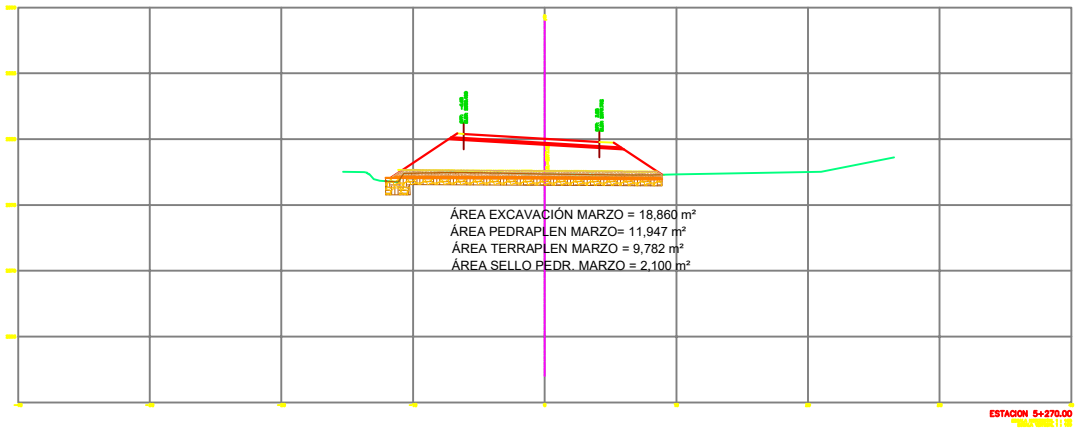
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 18,860 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 11,947 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 9,782 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,100 m²
ESTACION 5+270.00

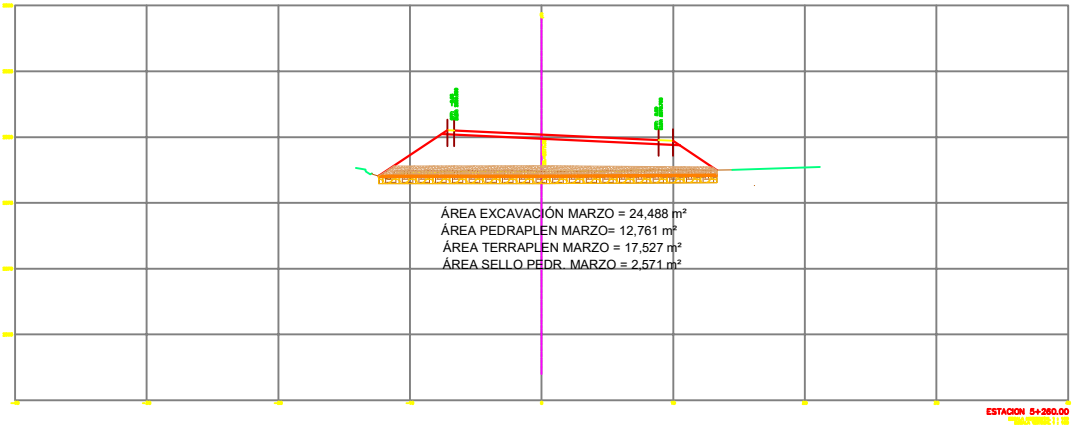

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 24,488 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 12,761 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 17,527 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,571 m²
ESTACION 5+260.00

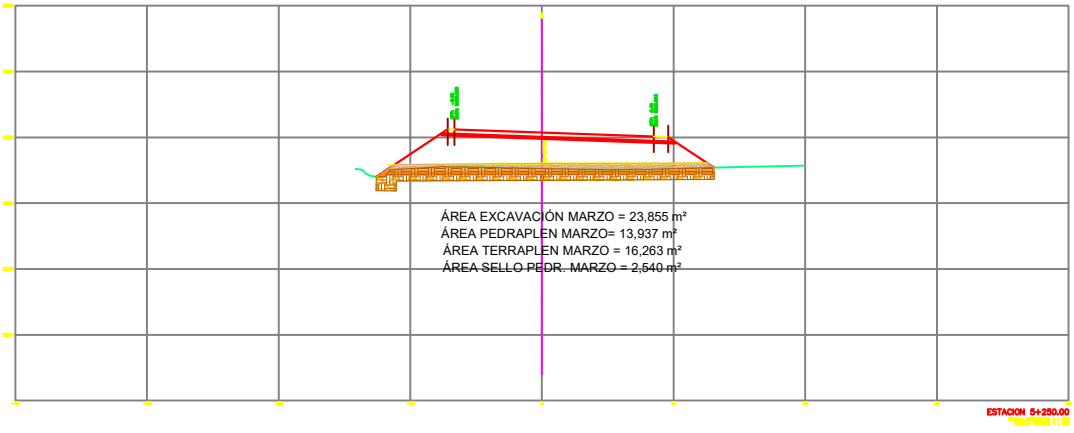
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 23,855 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 13,937 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 16,263 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,540 m²
ESTACION 5+250.00

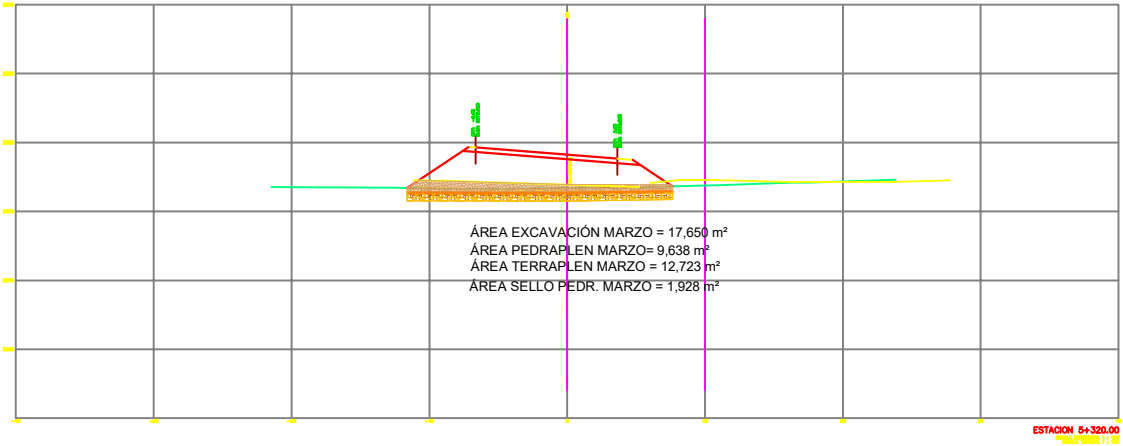


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 17,650 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,638 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 12,723 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,928 m²

ESTACION 5+320.00

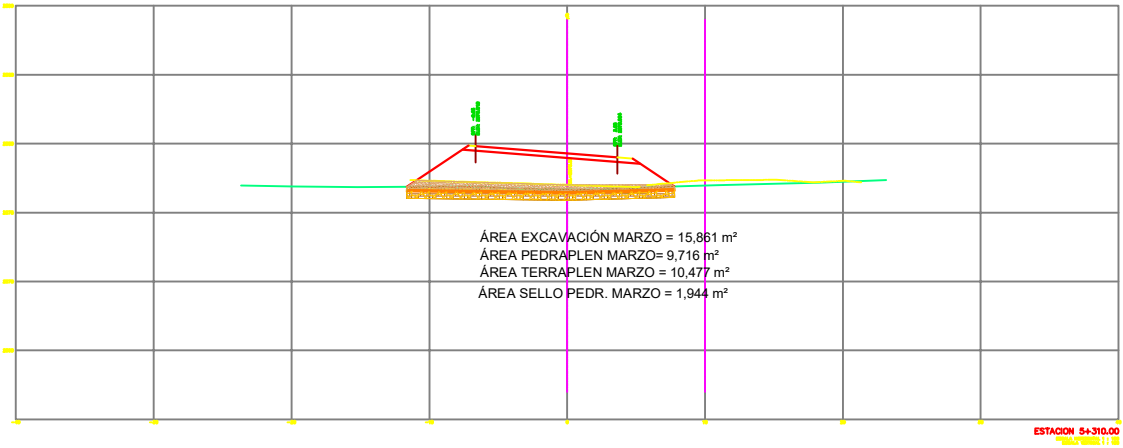


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 15,861 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,716 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 10,477 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,944 m²

ESTACION 5+310.00

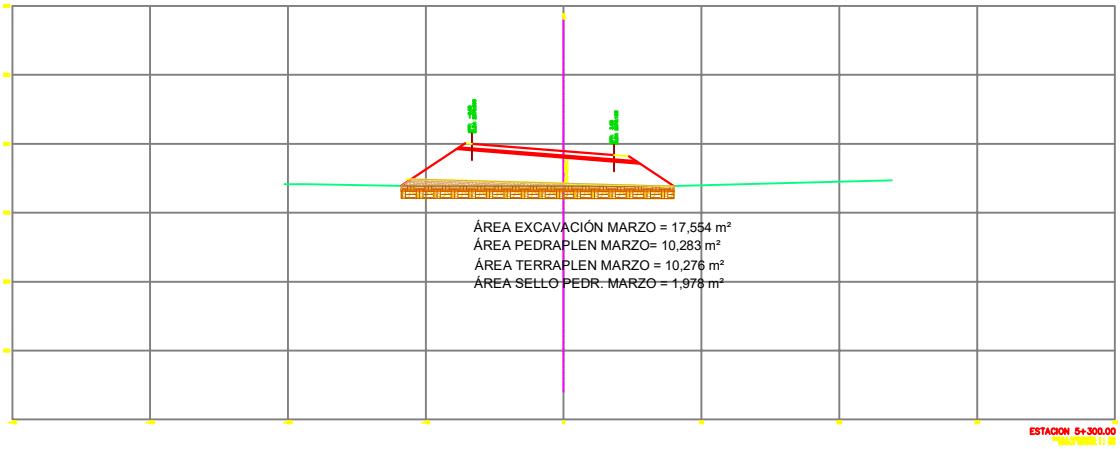


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 17,554 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 10,283 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 10,276 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,978 m²

ESTACION 5+300.00

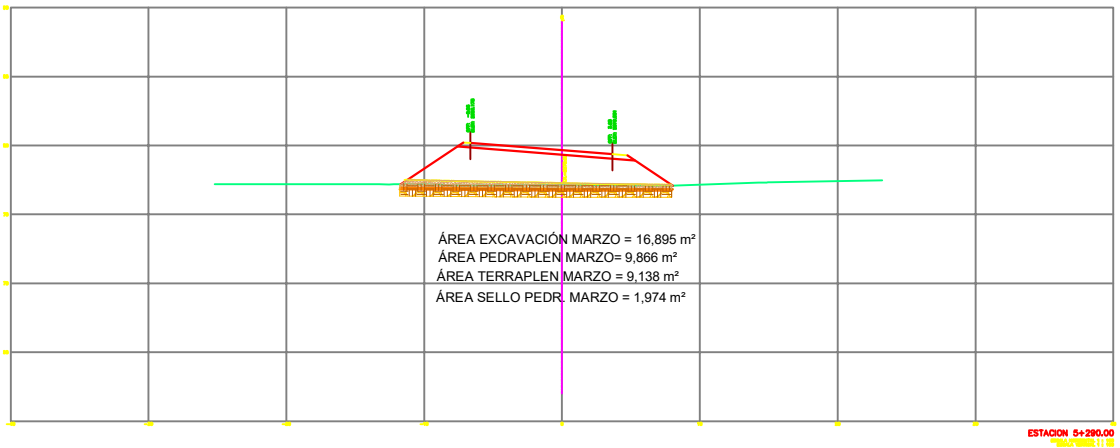


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 16,895 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,866 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 9,138 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,974 m²

ESTACION 5+290.00

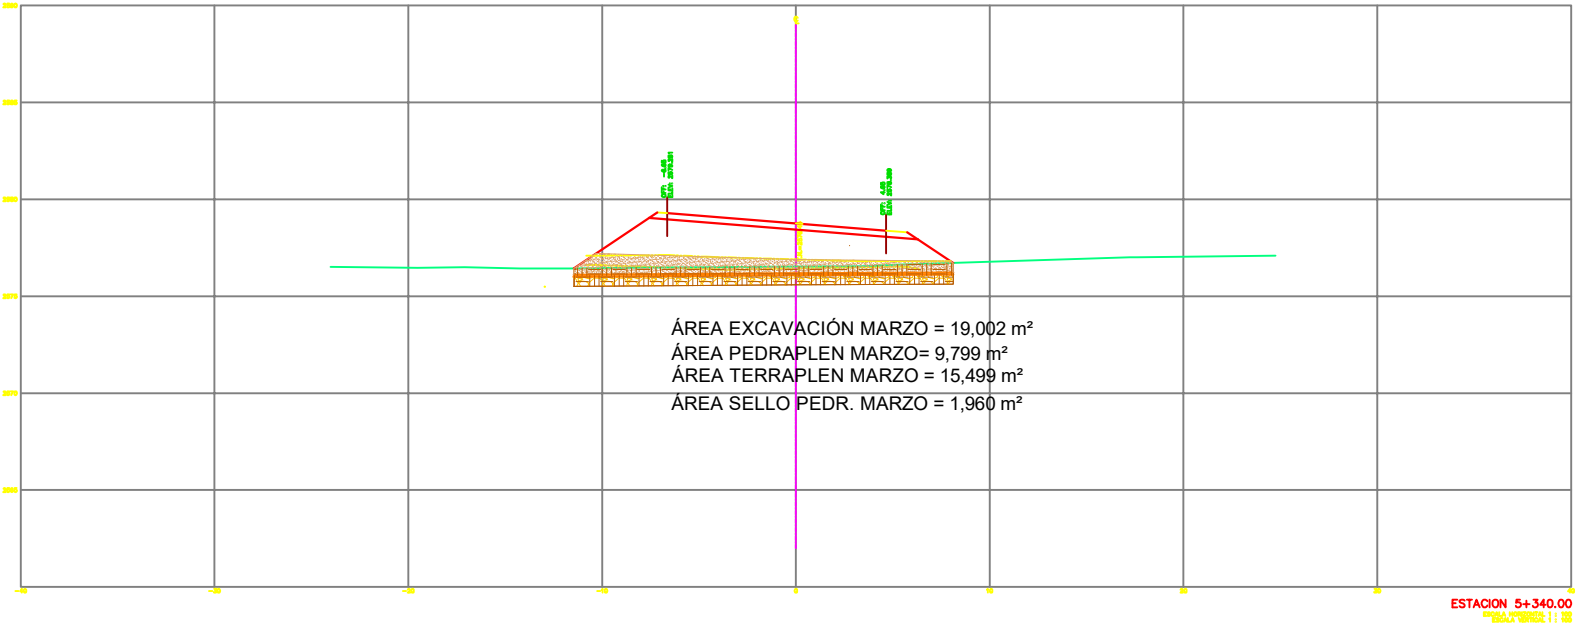


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 19,002 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,799 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 15,499 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,960 m²


ESTACION 5+340.00

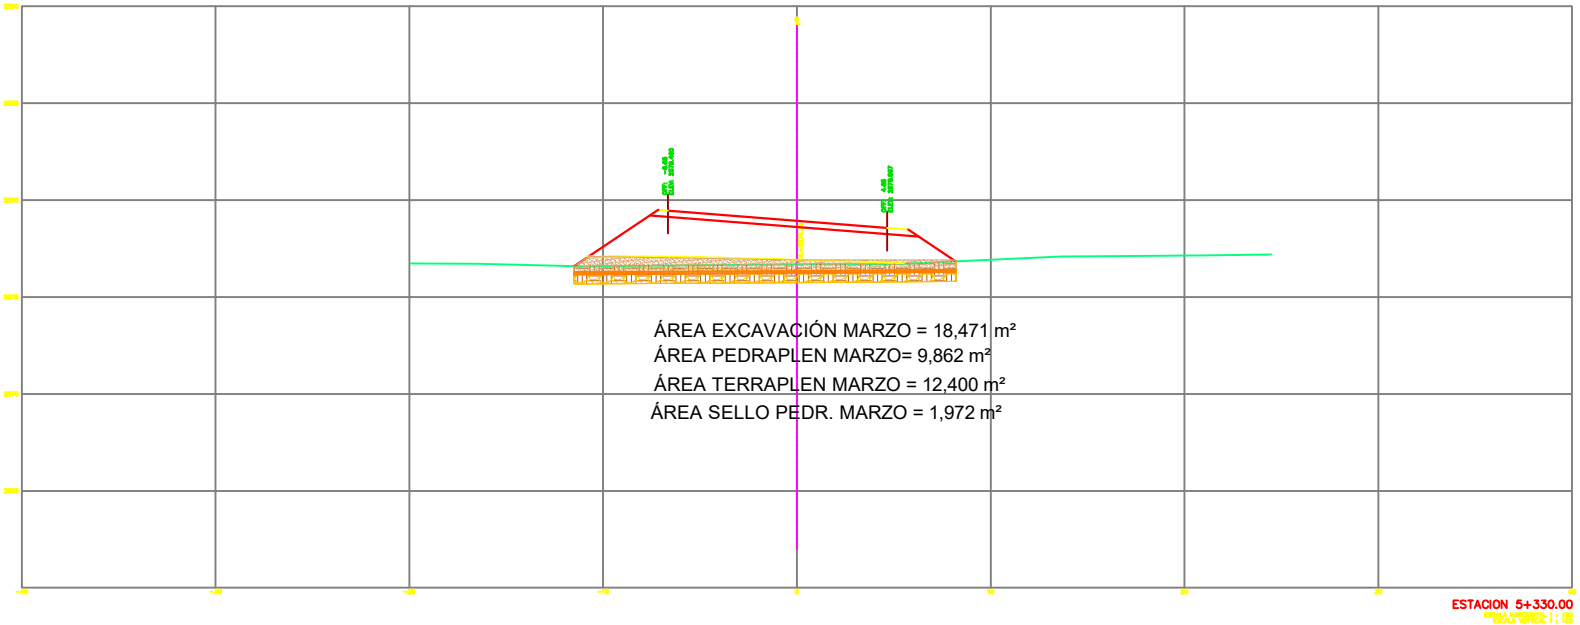



ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 18,471 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,862 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 12,400 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,972 m²


ESTACION 5+330.00

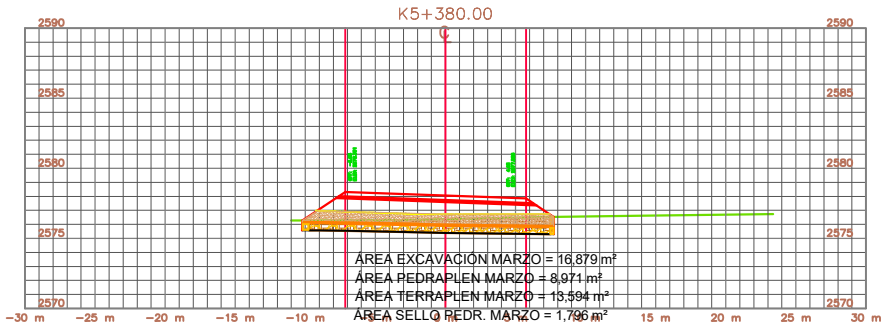

K5+380.00
2590
2585
2580
2575
2570
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 16,879 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 8,971 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 13,594 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,796 m²

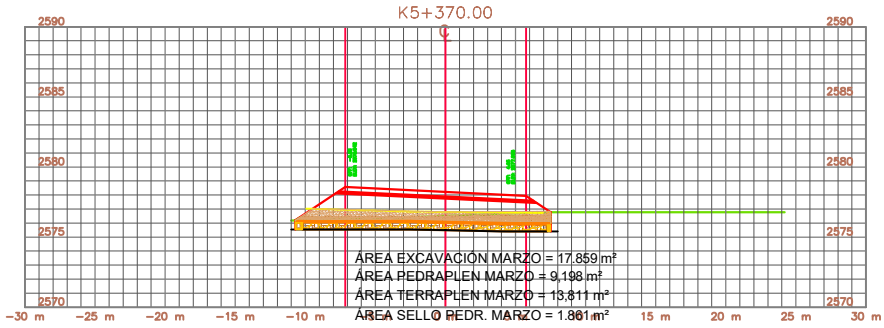

K5+370.00
2590
2585
2580
2575
2570
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 17,859 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9,198 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 13,811 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,861 m²

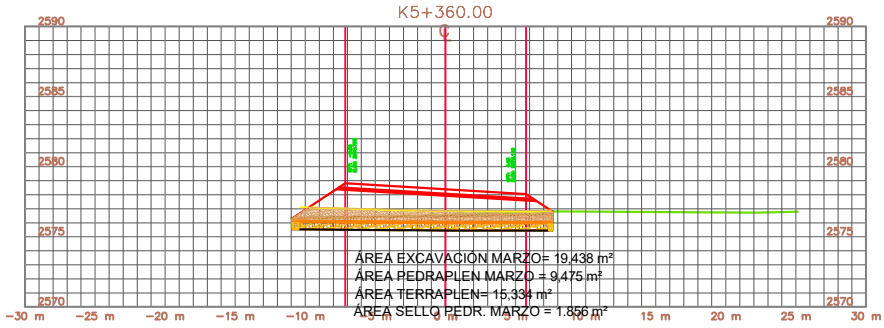

K5+360.00
2590
2585
2580
2575
2570
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO= 19,438 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9,475 m²
ÁREA TERRAPLEN= 15,334 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,856 m²

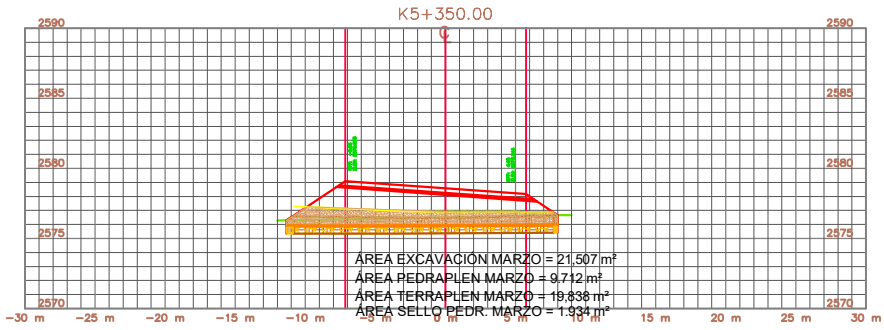

K5+350.00
2590
2585
2580
2575
2570
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 21,507 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9,712 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 19,838 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,934 m²

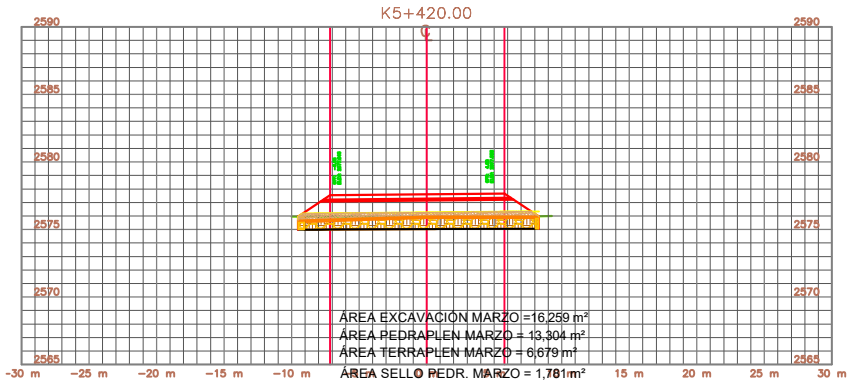

K5+420.00
2590
2585
2580
2575
2570
2565
-30 m
-25 m
-20 m
-15 m
-10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
AREA EXCAVACIÓN MARZO =16,259 m²
AREA PEDRAPLEN MARZO = 13,304 m²
AREA TERRAPLEN MARZO = 6,679 m²
AREA SELLO PEDR. MARZO = 1,781 m²

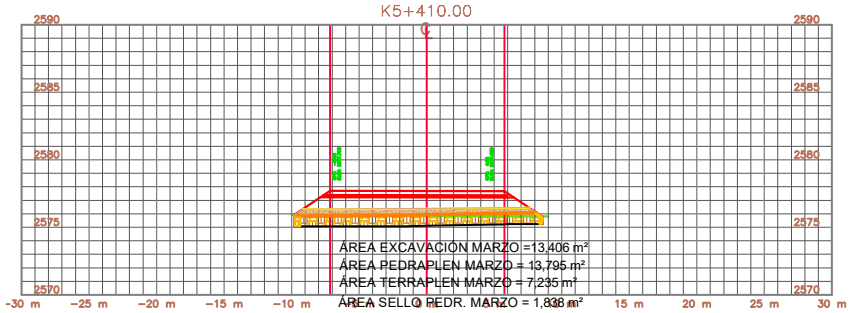

K5+410.00
2590
2585
2580
2575
2570
-30 m
-25 m
-20 m
-15 m
-10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
AREA EXCAVACIÓN MARZO =13,406 m²
AREA PEDRAPLEN MARZO = 13,795 m²
AREA TERRAPLEN MARZO = 7,235 m²
AREA SELLO PEDR. MARZO = 1,838 m²

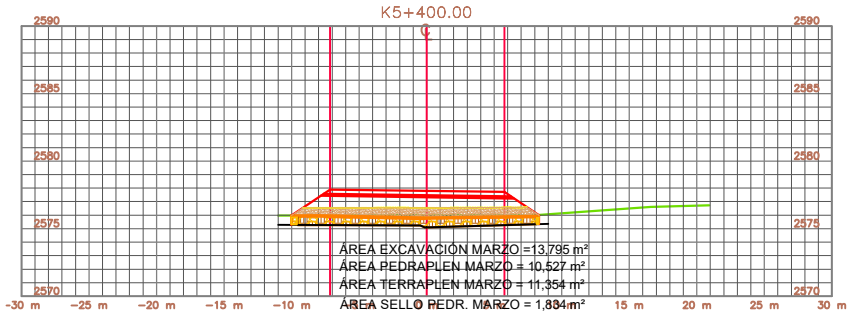

K5+400.00
2590
2585
2580
2575
2570
-30 m
-25 m
-20 m
-15 m
-10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
AREA EXCAVACIÓN MARZO =13,795 m²
AREA PEDRAPLEN MARZO = 10,527 m²
AREA TERRAPLEN MARZO = 11,354 m²
AREA SELLO PEDR. MARZO = 1,834 m²

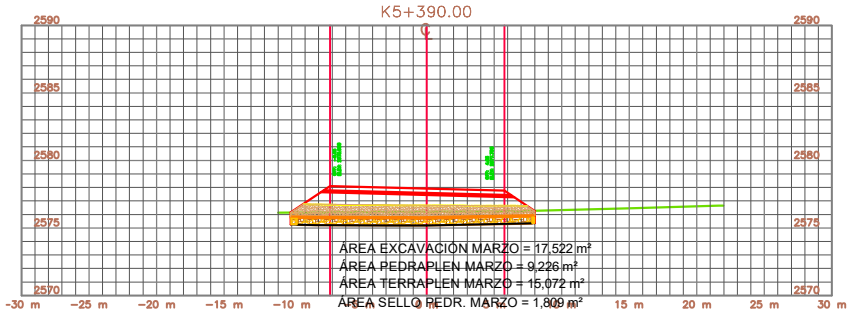

K5+390.00
2590
2585
2580
2575
2570
-30 m
-25 m
-20 m
-15 m
-10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
AREA EXCAVACIÓN MARZO = 17,522 m²
AREA PEDRAPLEN MARZO = 9,226 m²
AREA TERRAPLEN MARZO = 15,072 m²
AREA SELLO PEDR. MARZO = 1,809 m²

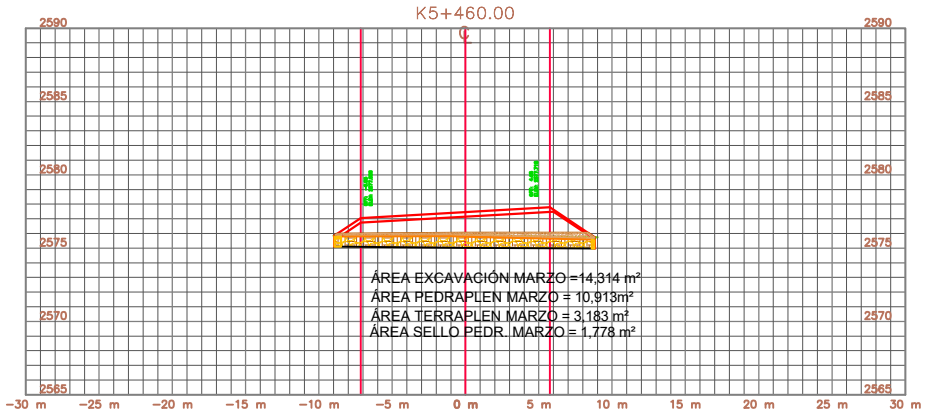

K5+460.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO =14,314 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10,913m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 3,183 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,778 m²

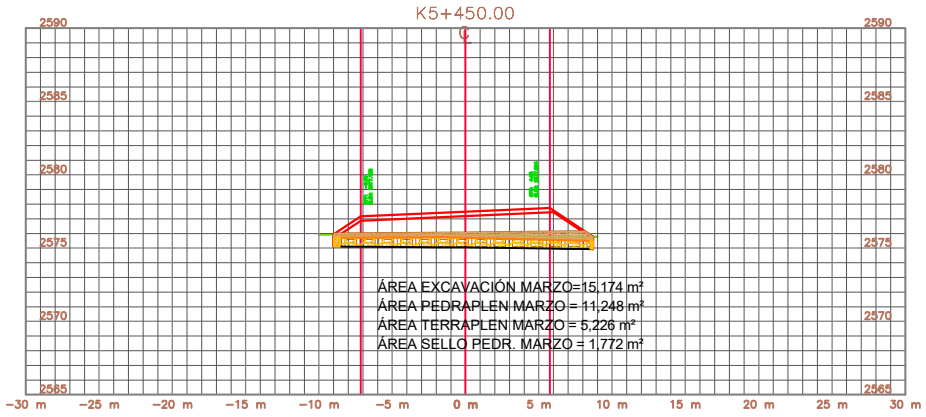

K5+450.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO=15,174 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11,248 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 5,226 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,772 m²

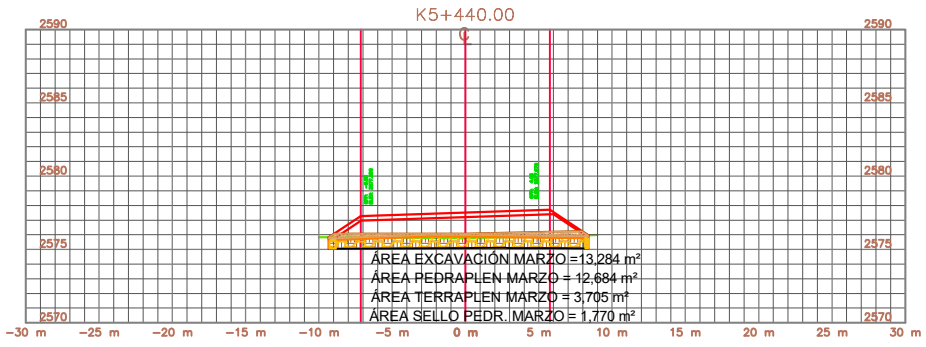

K5+440.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO =13,284 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 12,684 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 3,705 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,770 m²

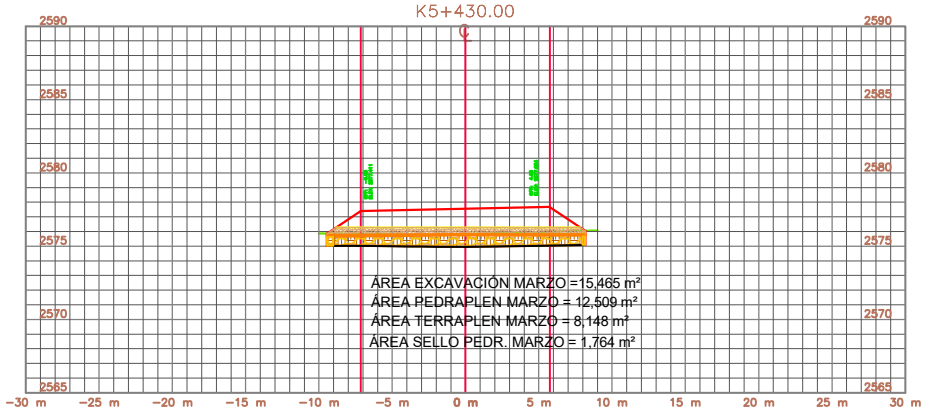

K5+430.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO =15,465 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 12,509 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 8,148 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,764 m²

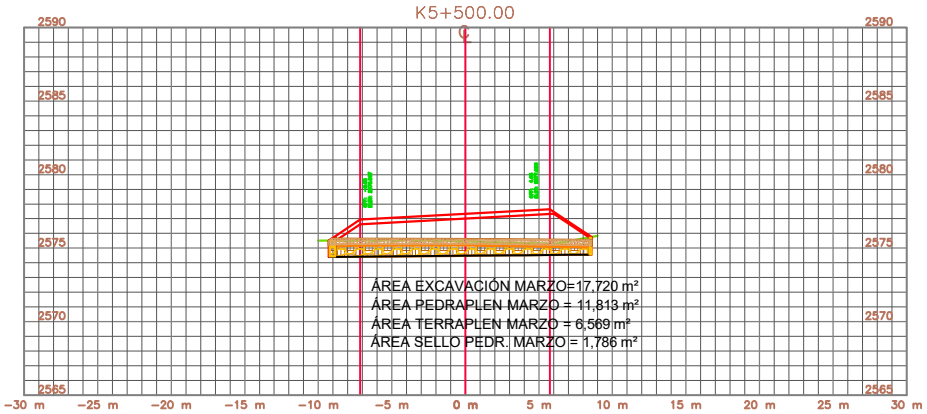

K5+500.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO=17,720 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11,813 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 6,569 m³
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,786 m²

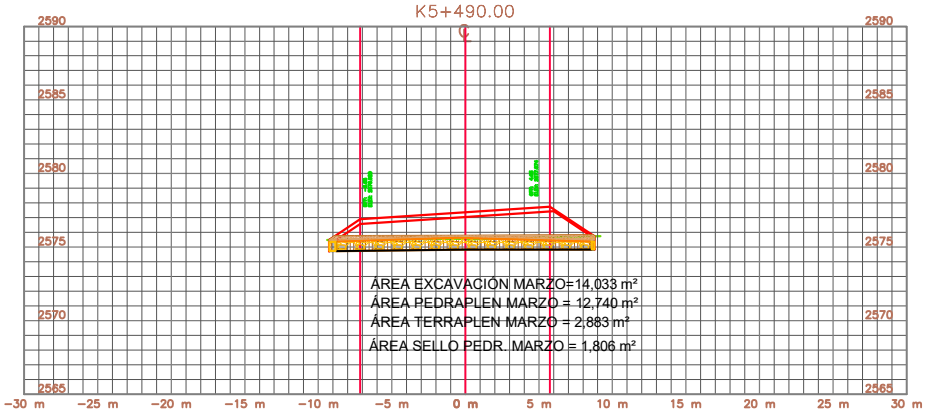

K5+490.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO=14,033 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 12,740 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 2,883 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,806 m²

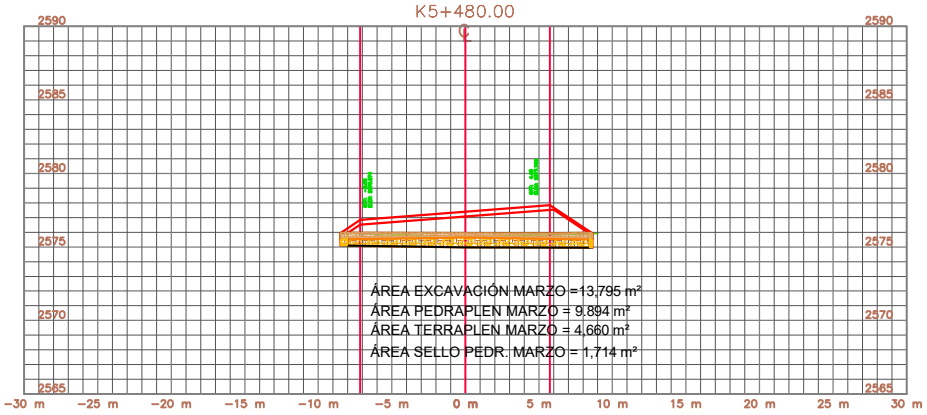

K5+480.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO =13,795 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9,894 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 4,660 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,714 m²

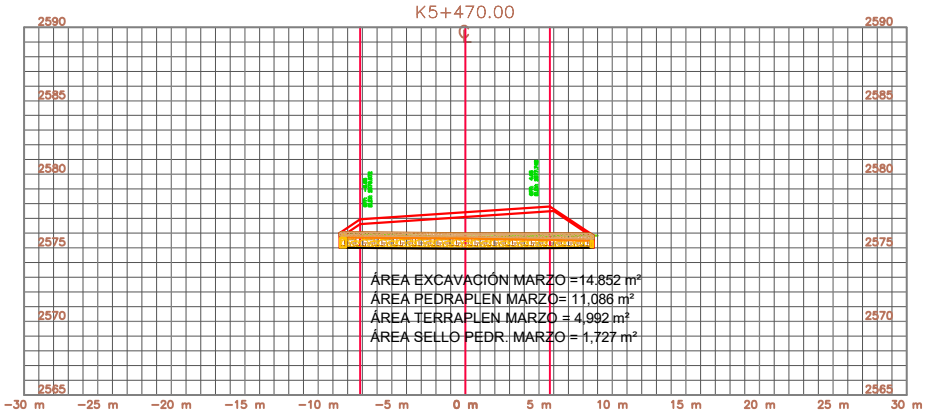

K5+470.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO =14,852 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 11,086 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 4,992 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,727 m²

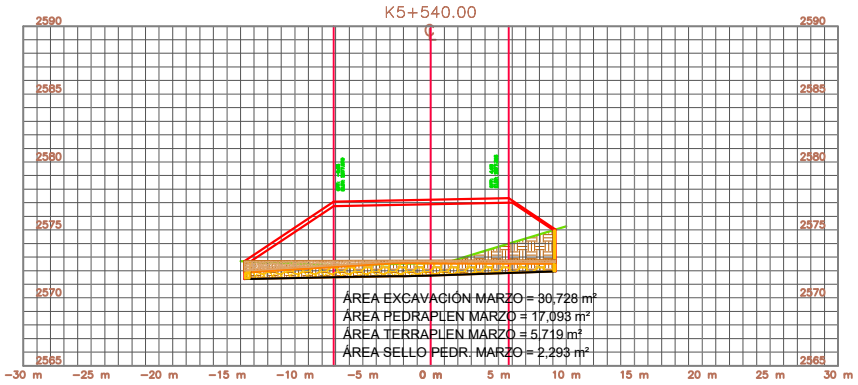

K5+540.00
2590
2585
2580
2575
2570
2565
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 30,728 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 17,093 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 5,719 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,293 m²

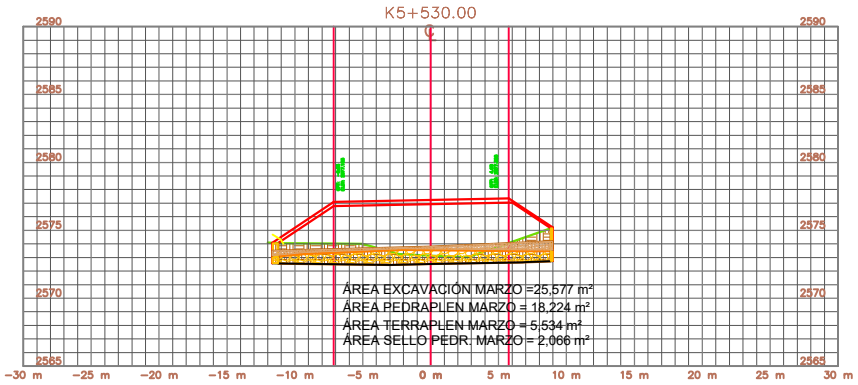

K5+530.00
2590
2585
2580
2575
2570
2565
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO =25,577 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 18,224 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 5,534 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,066 m²

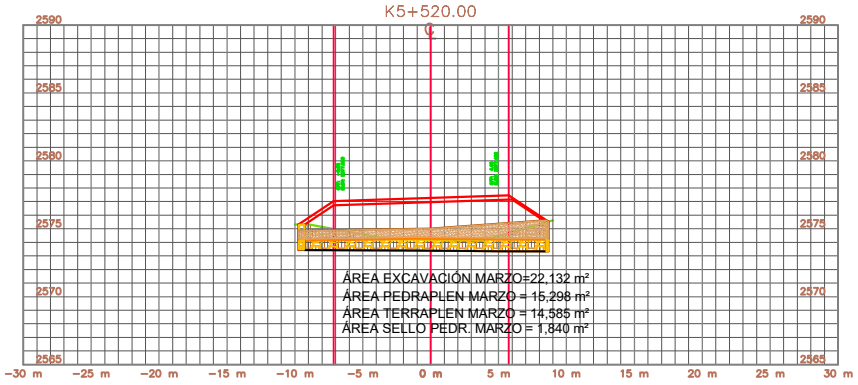

K5+520.00
2590
2585
2580
2575
2570
2565
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO=22,132 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 15,298 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 14,585 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,840 m²

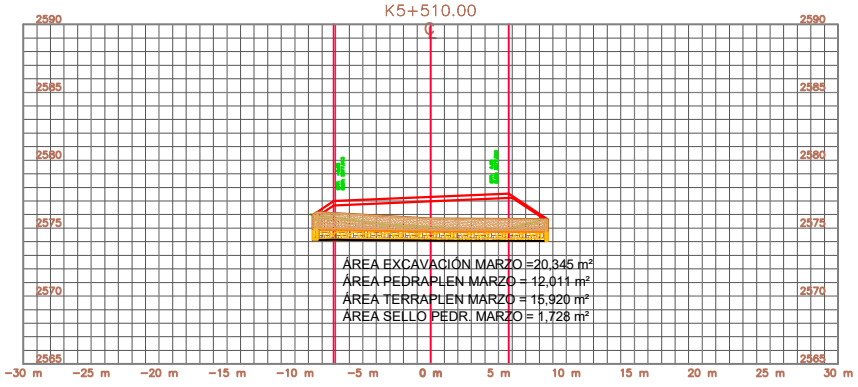

K5+510.00
2590
2585
2580
2575
2570
2565
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO =20,345 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 12,011 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 15,920 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,728 m²

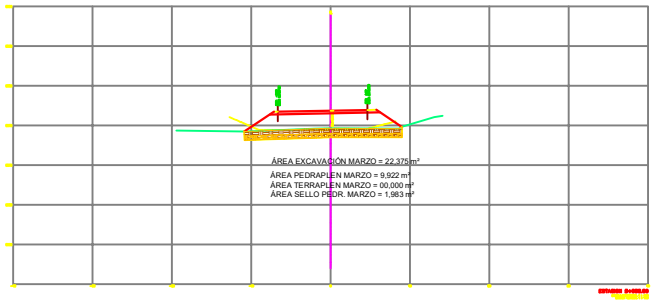

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 22,375 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9,922 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 00,000 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,983 m²

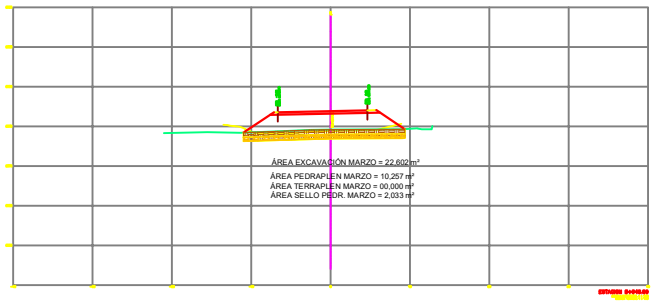
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 22,602 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10,257 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 00,000 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,033 m²

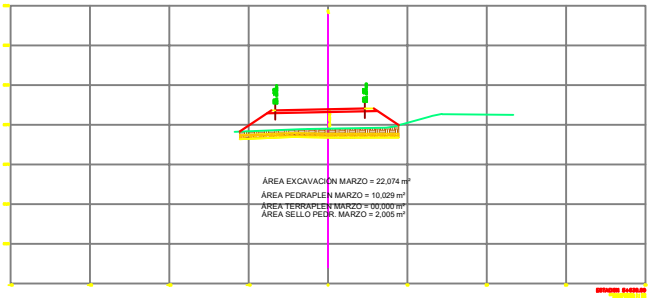

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 22,074 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10,029 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 00,000 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,005 m²

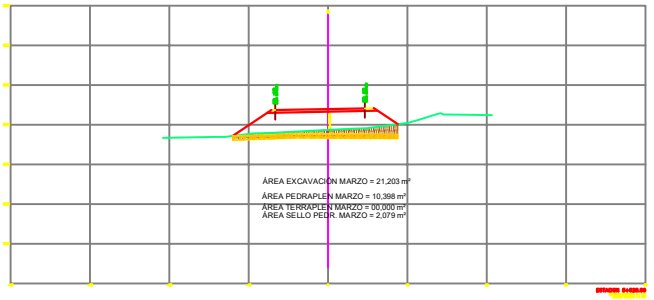
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 21,203 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10,398 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 00,000 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,079 m²

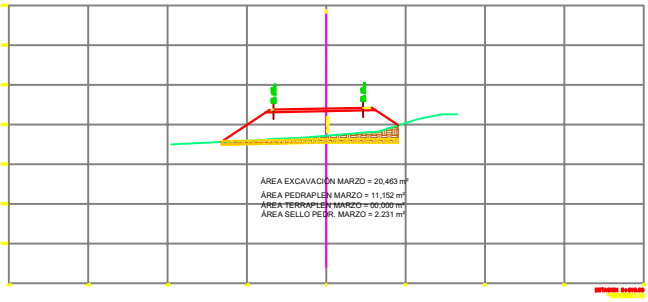
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 20,463 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11,152 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 00,000 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.231 m²

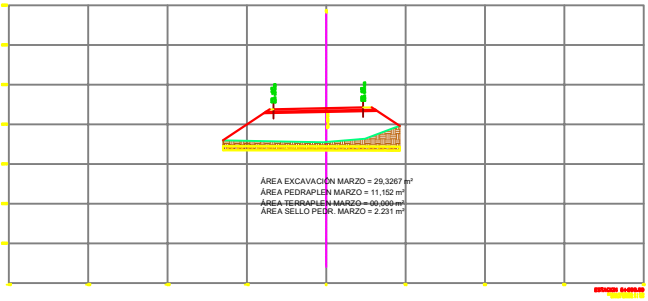

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 29,3267 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11,152 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 00,000 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.231 m²

K5+690.00

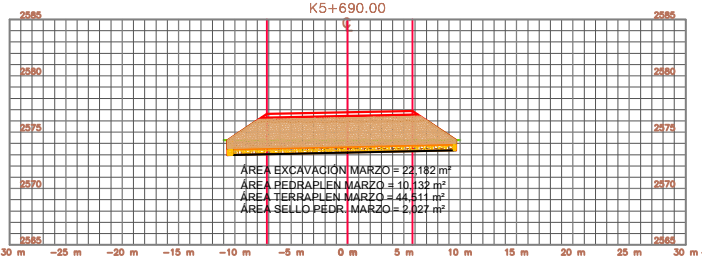


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 22.182 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10.132 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 44.511 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.027 m²

K5+730.00

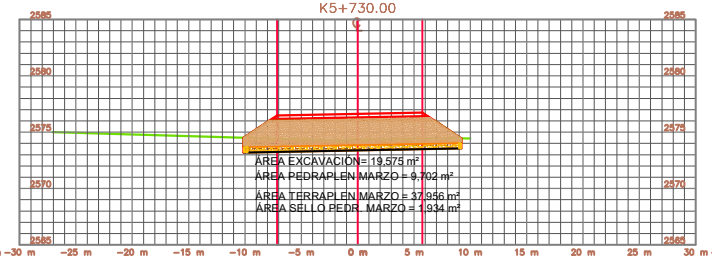


ÁREA EXCAVACIÓN = 19.575 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.702 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 37.956 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.934 m²

K5+770.00

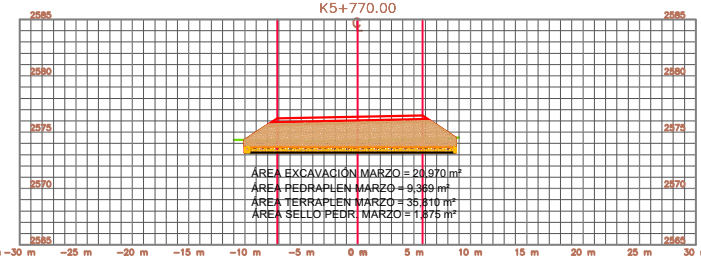


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 20.970 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.369 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 35.810 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.875 m²

K5+680.00

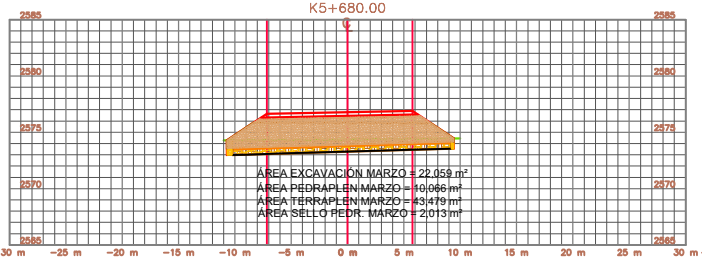


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 22.059 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10.066 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 43.479 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.013 m²

K5+720.00

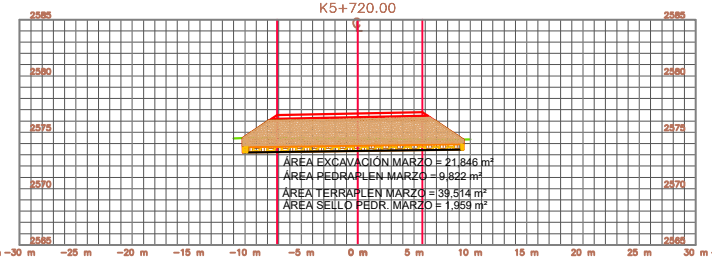


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 21.846 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.822 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 39.514 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.959 m²

K5+760.00

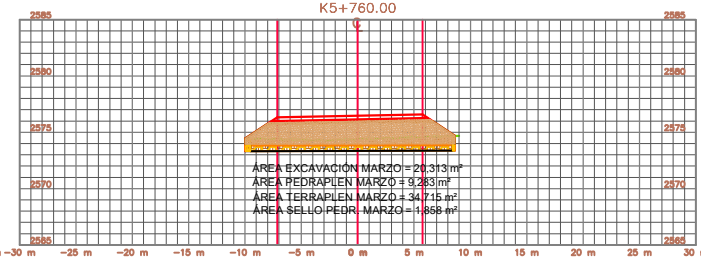


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 20.313 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.283 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 34.715 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.858 m²

K5+670.00

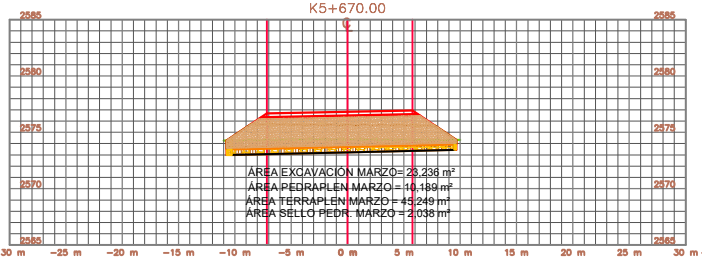


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO= 23.236 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10.189 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 45.249 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.038 m²

K5+710.00

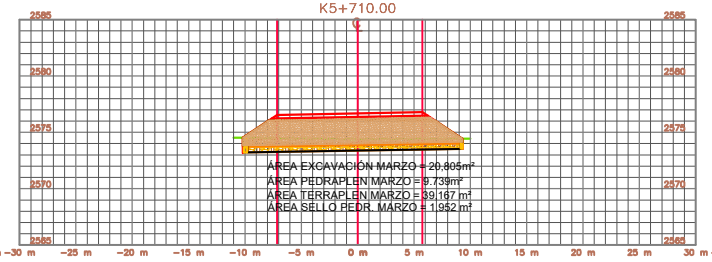


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 20.805m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.739m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 39.167 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.952 m²

K5+750.00

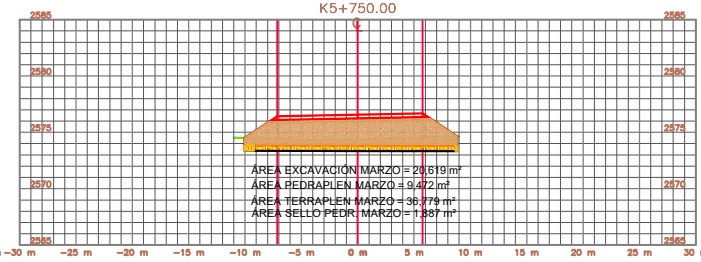


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 20.619 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.472 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 36.779 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.887 m²

K5+660.00

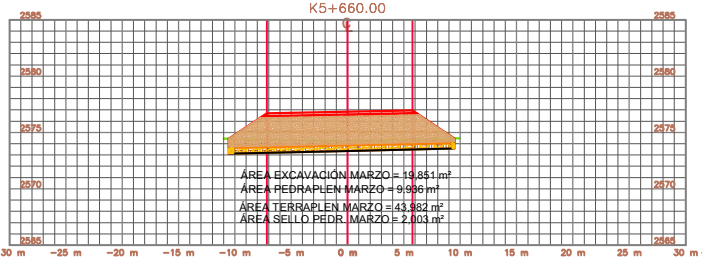


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 19.851 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.936 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 43.982 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.003 m²

K5+700.00

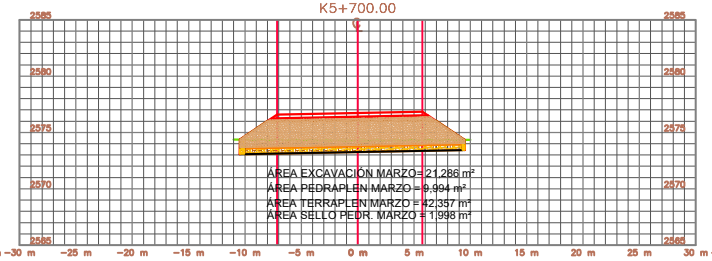


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO= 21.286 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.994 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 42.357 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.998 m²

K5+740.00

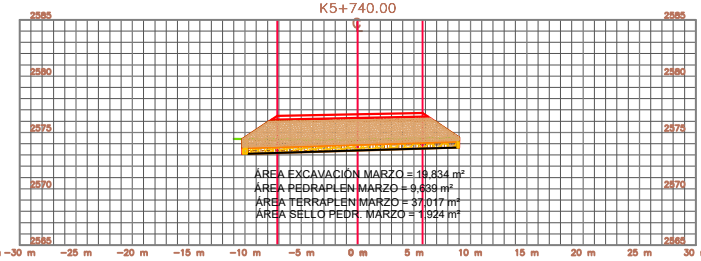


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 19.834 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.639 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 37.017 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.924 m²

K5+690.00

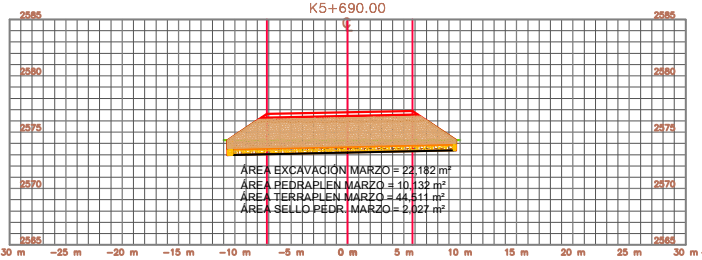


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 22.182 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10.132 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 44.511 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.027 m²

K5+730.00

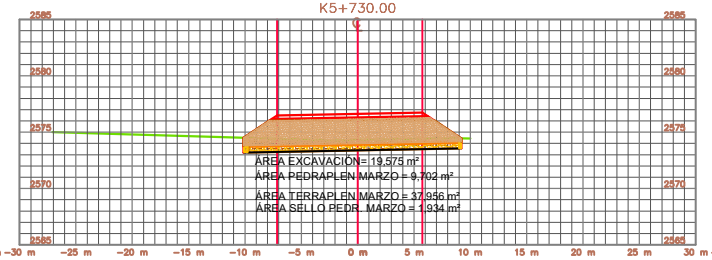


ÁREA EXCAVACIÓN = 19.575 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.702 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 37.956 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.934 m²

K5+770.00

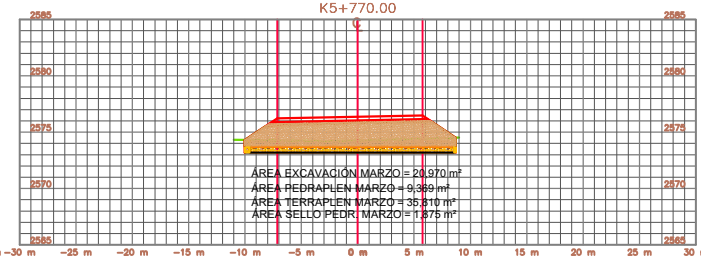


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 20.970 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.369 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 35.810 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.875 m²

K5+680.00

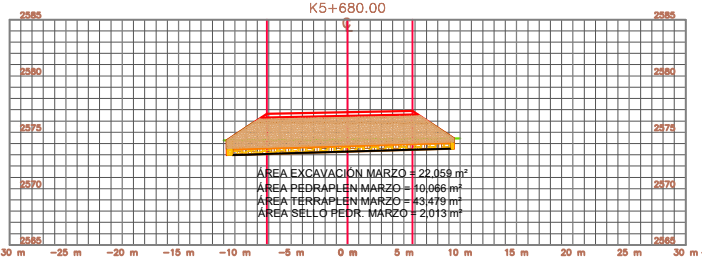


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 22.059 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10.066 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 43.479 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.013 m²

K5+720.00

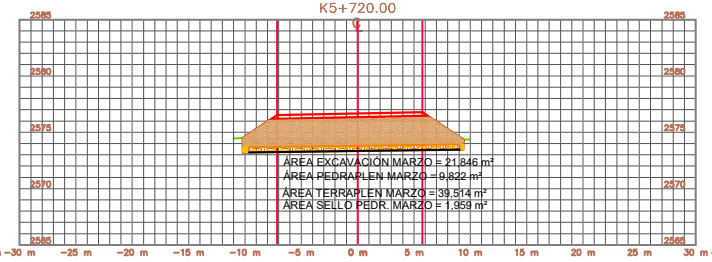


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 21.846 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.822 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 39.514 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.959 m²

K5+760.00

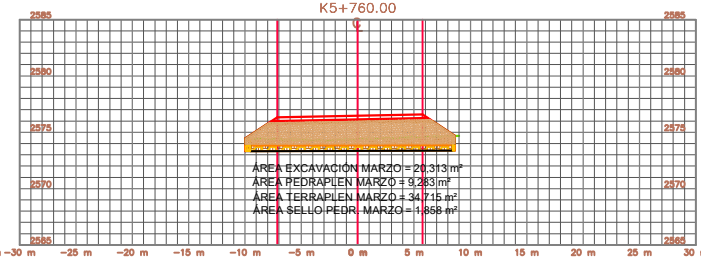


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 20.313 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.283 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 34.715 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.858 m²

K5+670.00

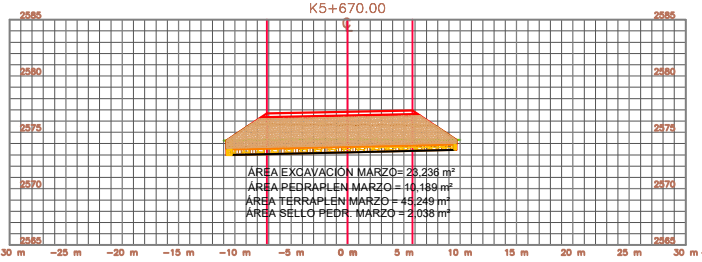


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO= 23.236 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10.189 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 45.249 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.038 m²

K5+710.00

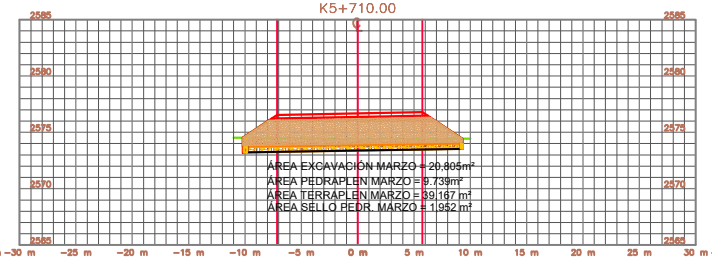


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 20.805m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.739m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 39.167 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.952 m²

K5+750.00

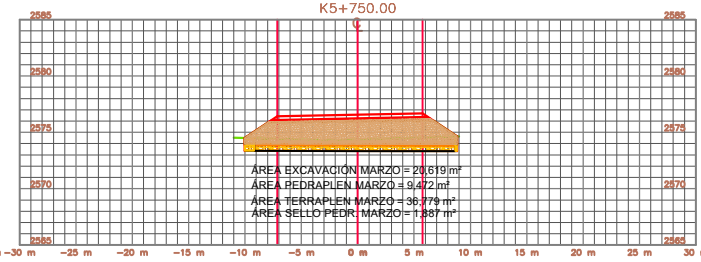


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 20.619 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.472 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 36.779 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.887 m²

K5+660.00

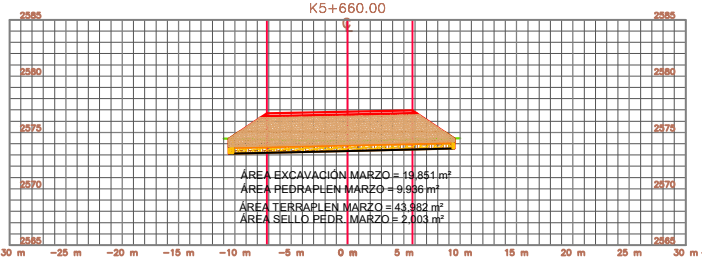


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 19.851 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.936 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 43.982 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.003 m²

K5+700.00

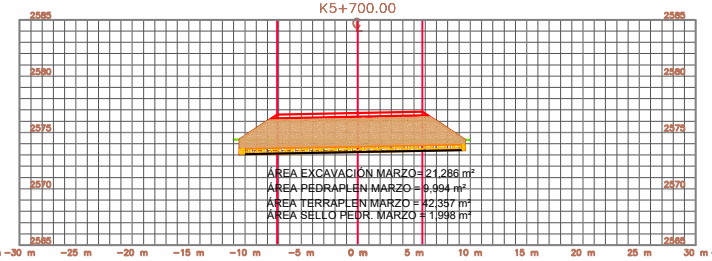



ÁREA EXCAVACIÓN MARZO= 21.286 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.994 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 42.357 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.998 m²


K5+740.00

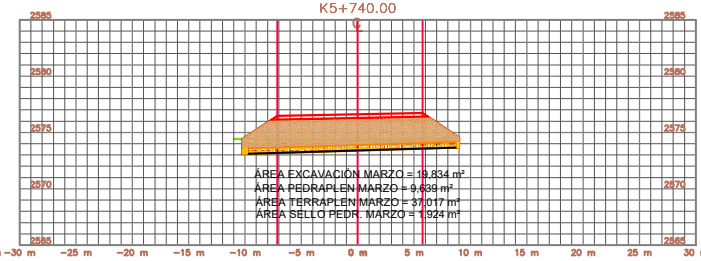



ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 19.834 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.639 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 37.017 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.924 m²

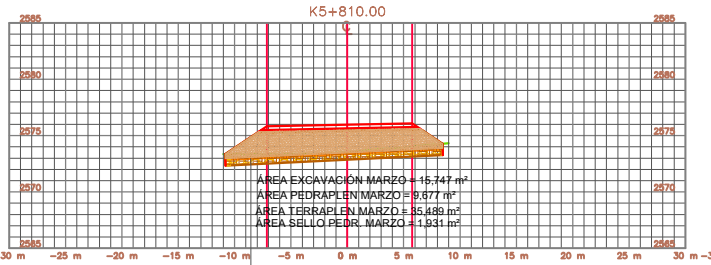

K5+810.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 15,747 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9,677 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 35,489 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,931 m²

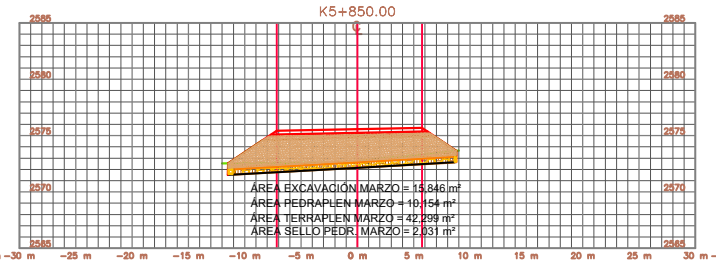

K5+850.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 15,846 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10,154 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 42,299 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,031 m²

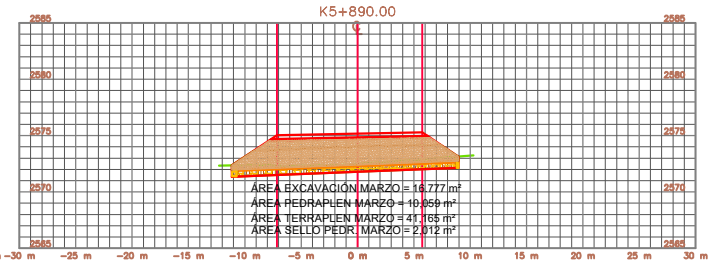

K5+890.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 16,777 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10,059 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 41,165 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,012 m²

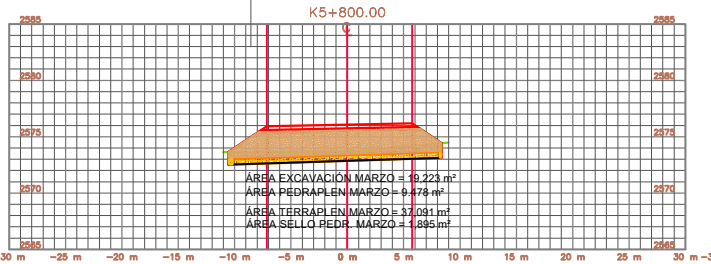

K5+800.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 19,223 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9,478 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 37,091 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,895 m²

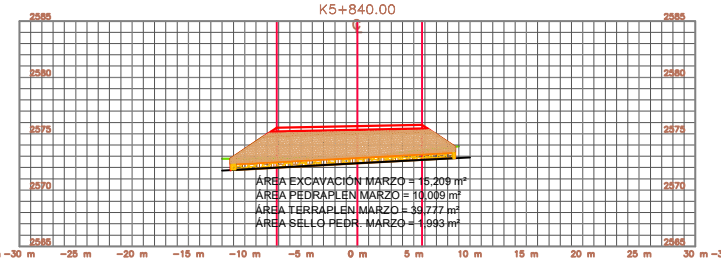

K5+840.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 15,209 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10,009 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 39,777 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,993 m²

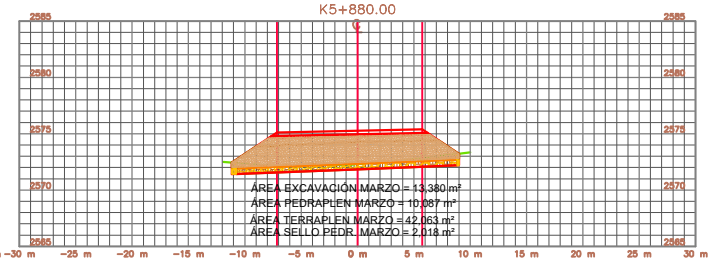

K5+880.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 13,380 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10,087 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 42,063 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,018 m²

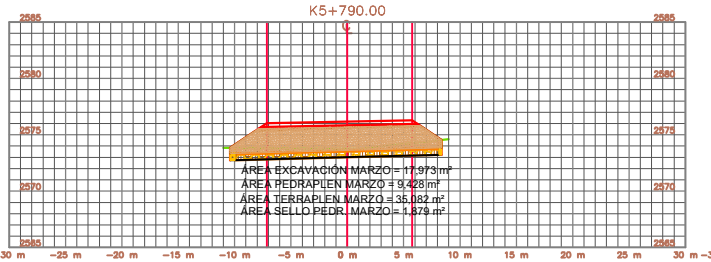

K5+790.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 17,973 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9,428 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 35,082 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,879 m²

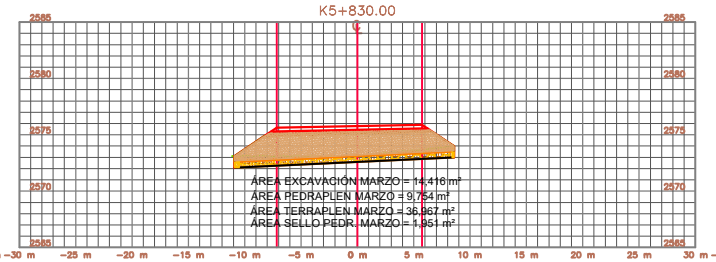
K5+830.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 14,416 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9,754 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 36,967 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,951 m²

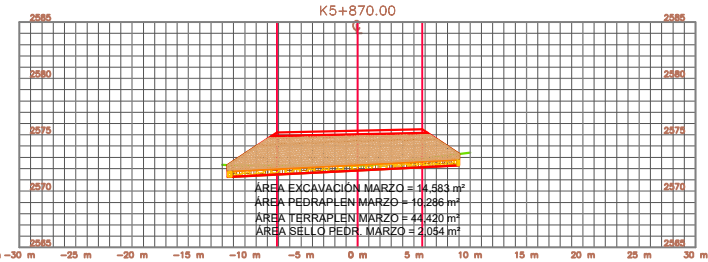

K5+870.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 14,583 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10,266 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 44,420 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,054 m²

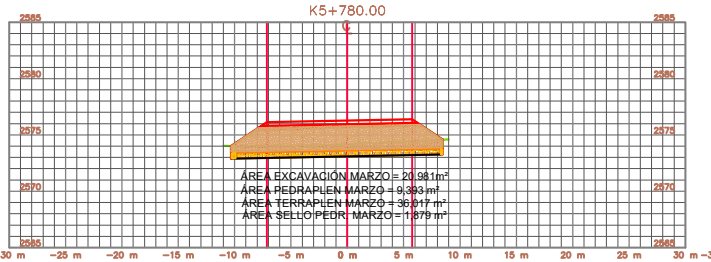
K5+780.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 20,981 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9,393 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 36,017 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,879 m²

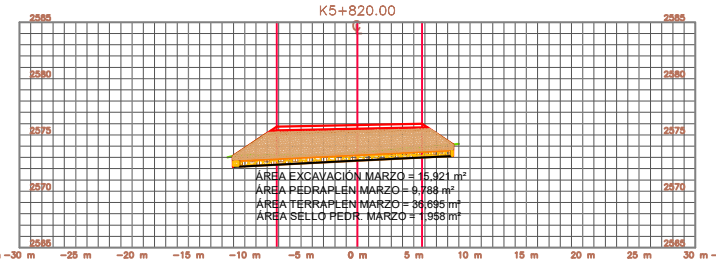
K5+820.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 15,921 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9,788 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 36,695 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,958 m²

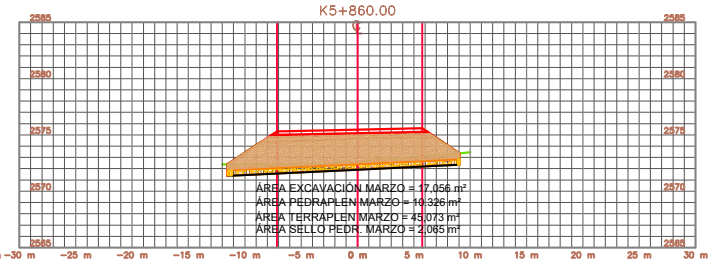

K5+860.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 17,056 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10,326 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 45,073 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,065 m²

K5+930.00

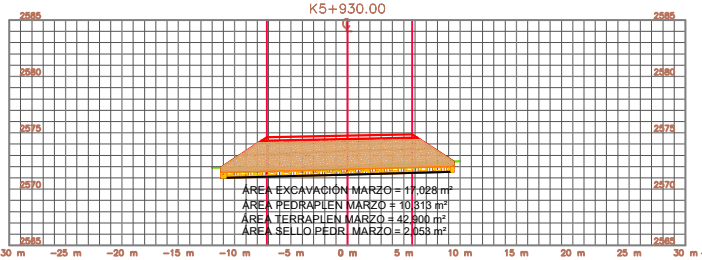


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 17.028 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10.313 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 42.900 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.053 m²

K5+970.00

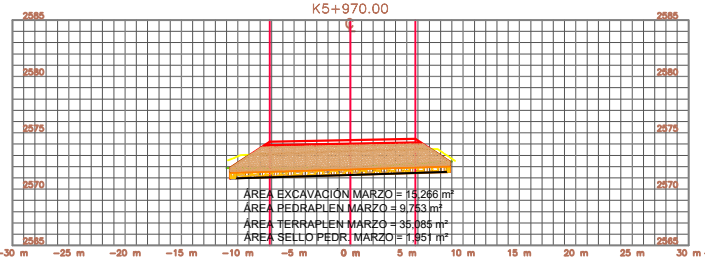


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 15.266 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.753 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 35.085 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.951 m²

K6+010.00

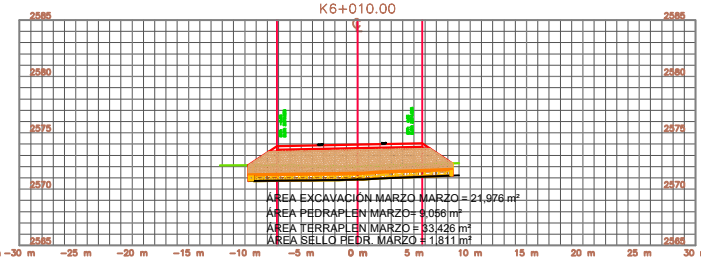


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 21.976 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9.056 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 33.426 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.811 m²

K5+920.00

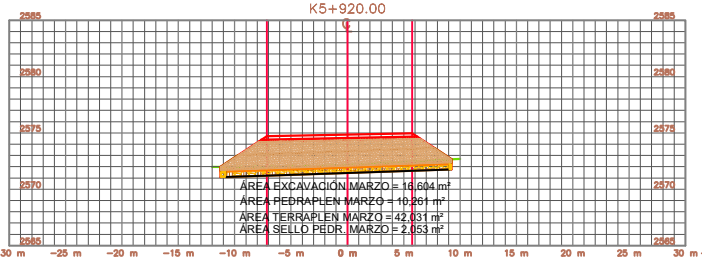


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 16.604 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10.261 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 42.031 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.053 m²

K5+960.00

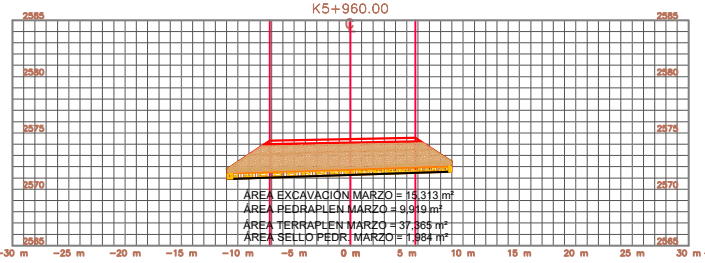


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 15.313 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.919 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 37.365 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.984 m²

K6+000.00

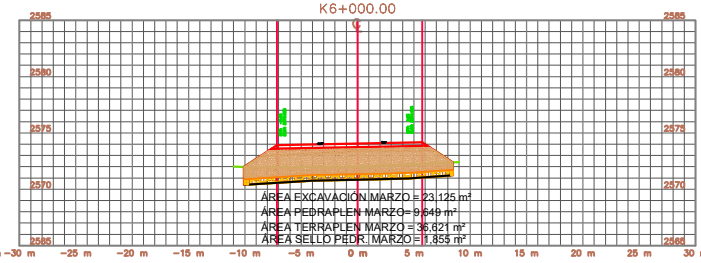


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 23.125 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9.649 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 36.621 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.855 m²

K5+910.00

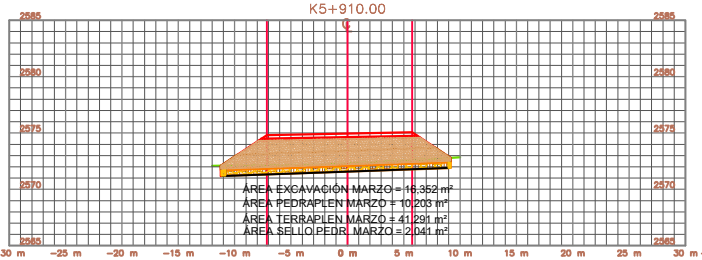


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 16.352 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10.203 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 41.291 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.041 m²

K5+950.00

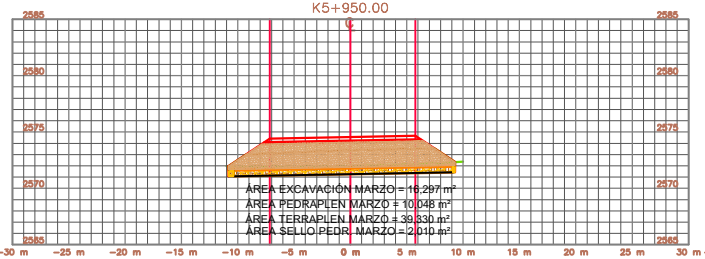


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 16.297 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10.048 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 39.330 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.010 m²

K5+990.00

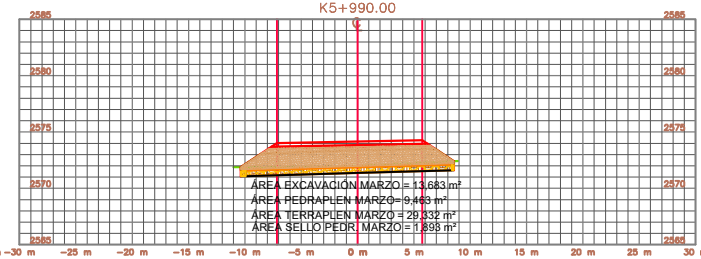


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 13.683 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9.463 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 29.332 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.893 m²

K5+900.00

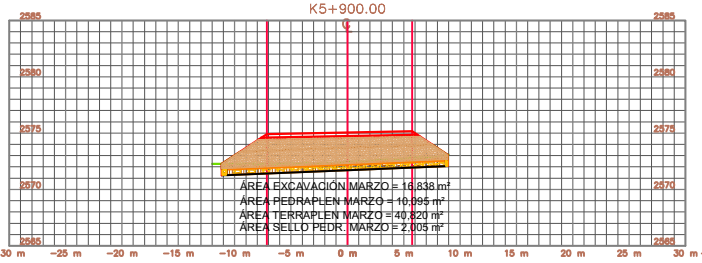


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 16.838 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10.395 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 40.820 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.005 m²

K5+940.00

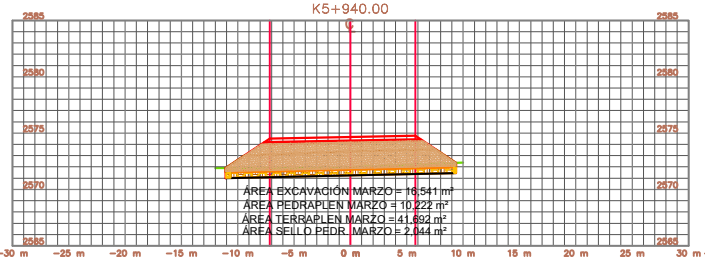


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 16.541 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10.222 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 41.692 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.044 m²

K5+980.00

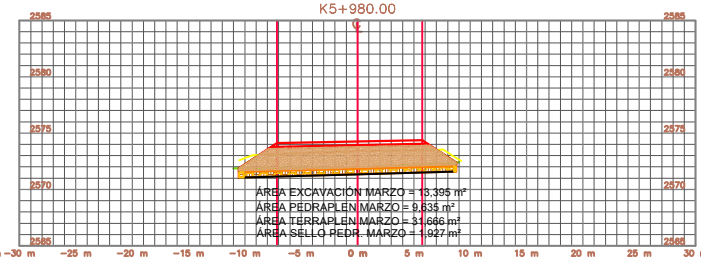

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 13.395 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.635 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 31.666 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.927 m²


K6+050.00

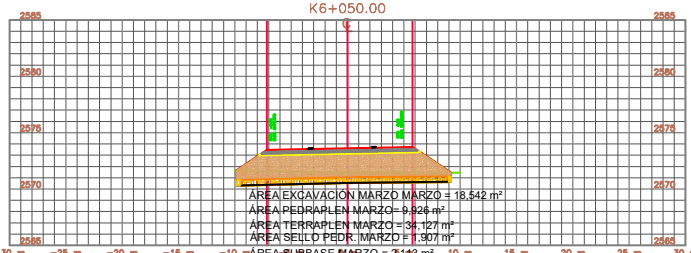

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 18,542 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,926 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 34,127 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,907 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²

ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+090.00

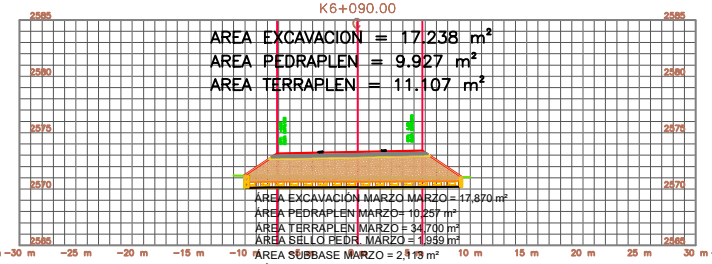


AREA EXCAVACION = 17.238 m²
AREA PEDRAPLEN = 9.927 m²
AREA TERRAPLEN = 11.107 m²

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 17,870 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 10,257 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 34,700 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,959 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²

ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²


K6+130.00

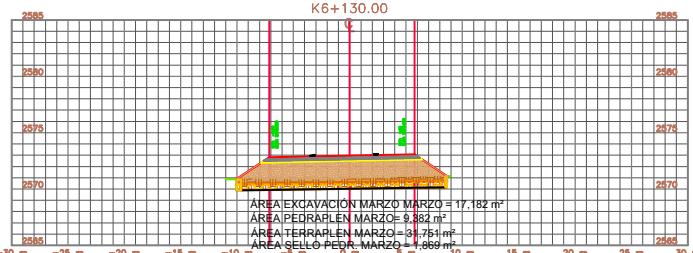

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 17,182 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,382 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 31,751 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,869 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²

ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²


K6+040.00



ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 18,049 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,444 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 32,996 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,889 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²

ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²


K6+080.00



ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 16,903 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,757 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 35,197 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,959 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²

ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²


K6+120.00

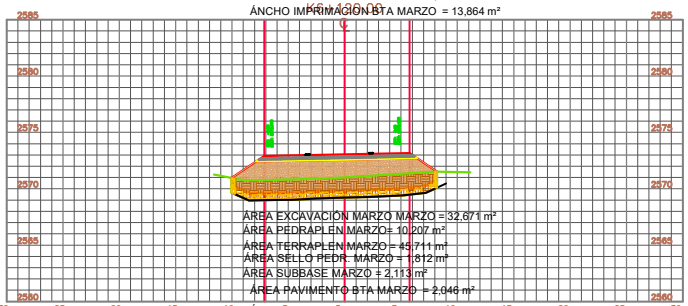

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 32,671 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 10,207 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 45,711 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,812 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²

ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²


K6+030.00



ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 20,012 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,324 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 32,021 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,863 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²

ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²


K6+070.00



ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 18,581 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 10,163 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 35,708 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,833 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²

ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²


K6+110.00

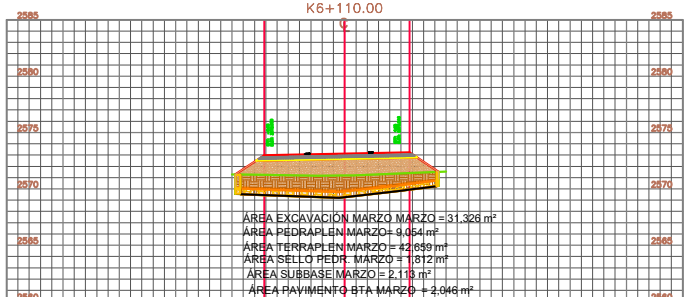

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 31,326 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,054 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 42,659 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,812 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²

ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²


K6+020.00

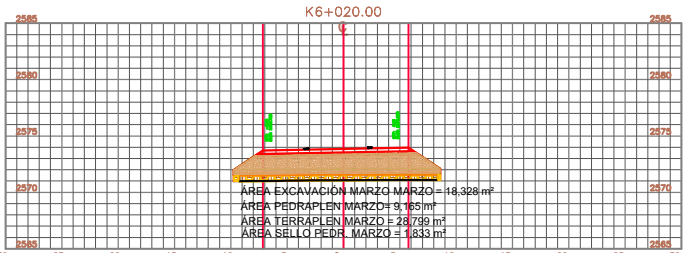

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 18,328 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,165 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 28,799 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,833 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²

ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²


K6+060.00

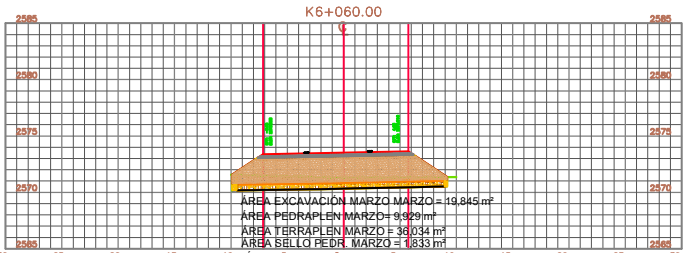

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 19,845 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,929 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 36,034 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,833 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²

ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²


K6+100.00

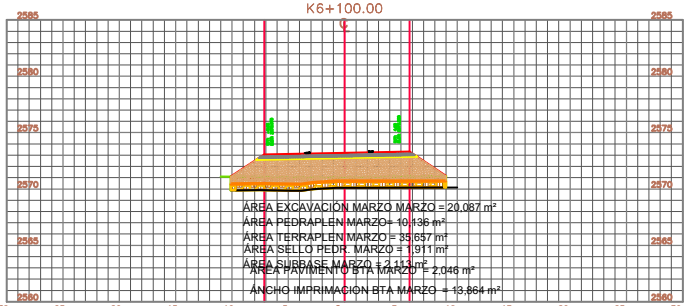

ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 20,087 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 10,136 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 35,657 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,911 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²


ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+170.00

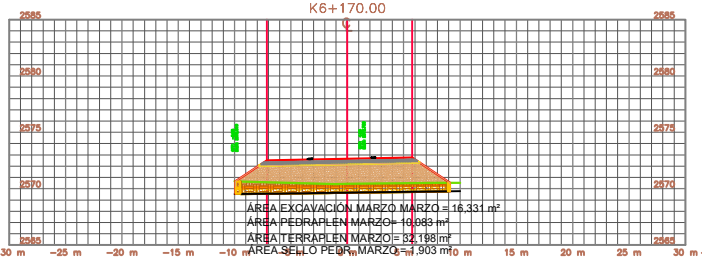


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 16,331 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 10,083 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 32,198 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,903 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+160.00

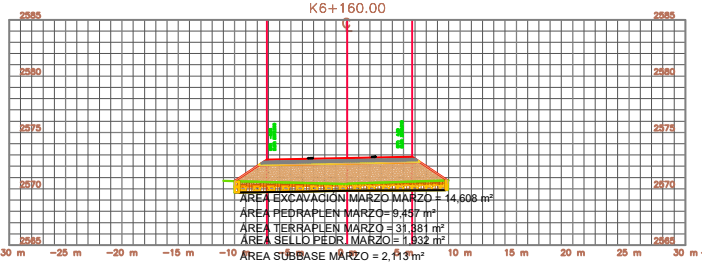


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 14,608 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,457 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 31,881 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,932 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+150.00

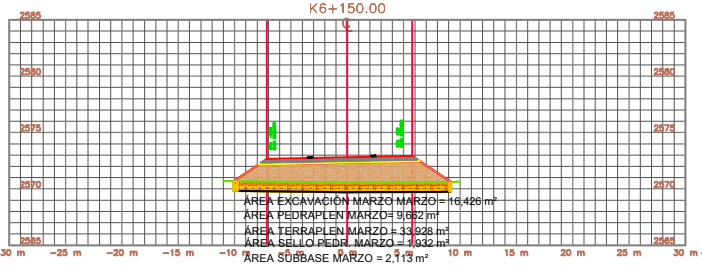


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 16,426 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,662 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 33,928 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,932 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+140.00

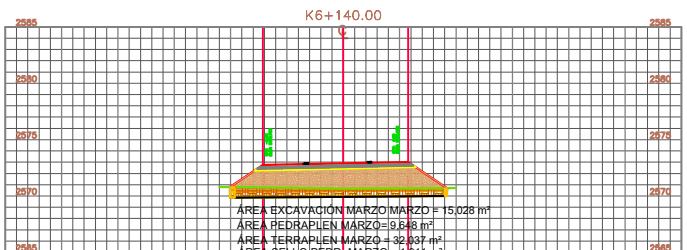


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 15,028 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,648 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 32,937 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,911 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+210.00

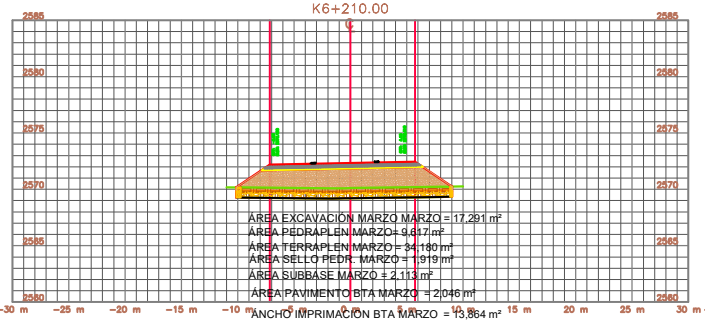


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 17,291 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,617 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 34,180 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,919 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+200.00

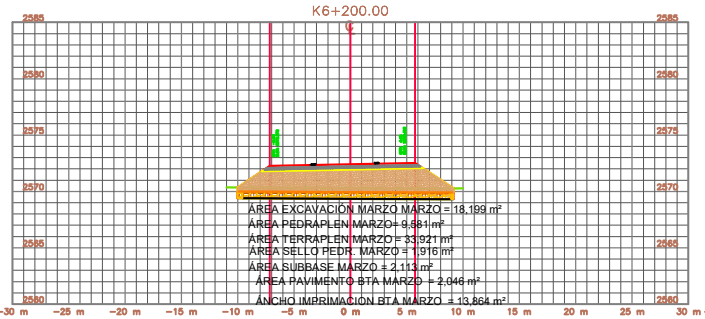


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 18,199 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,681 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 33,921 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,916 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+190.00

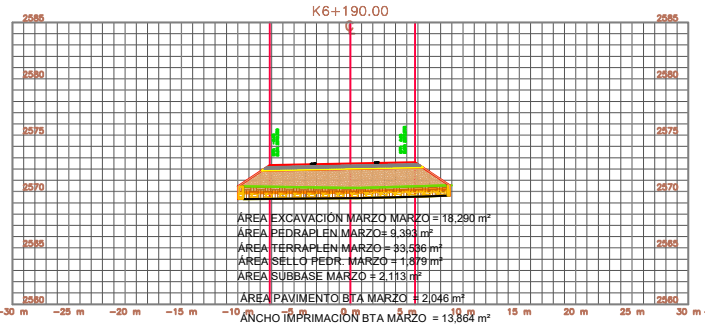


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 18,290 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,393 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 33,536 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,879 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+180.00

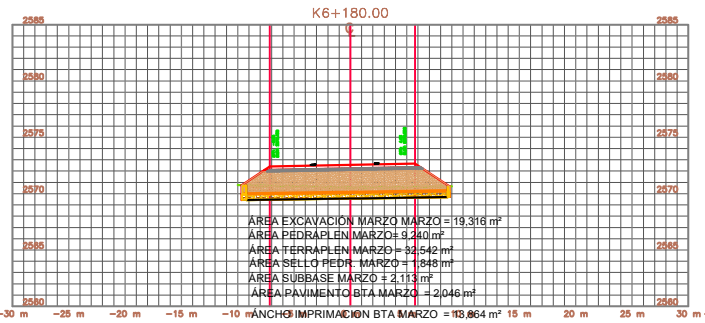


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 19,316 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,240 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 32,542 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,848 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+250.00

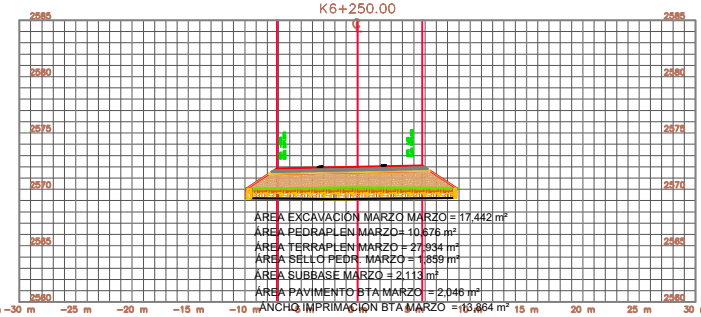


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 17,442 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 10,676 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 27,934 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,859 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+240.00

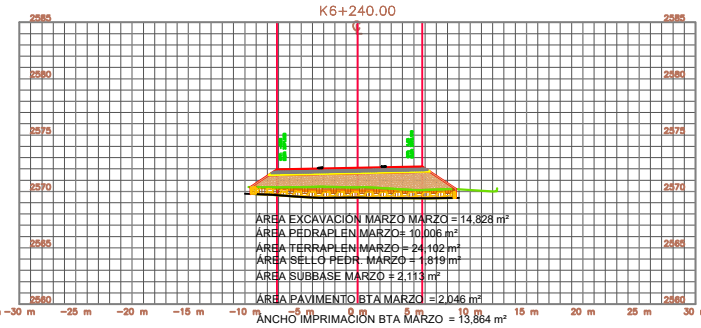


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 14,828 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 10,006 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 24,102 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,819 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+230.00

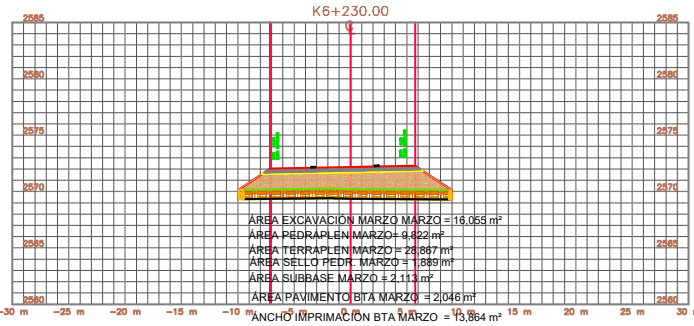


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 16,055 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,822 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 28,867 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,889 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+220.00

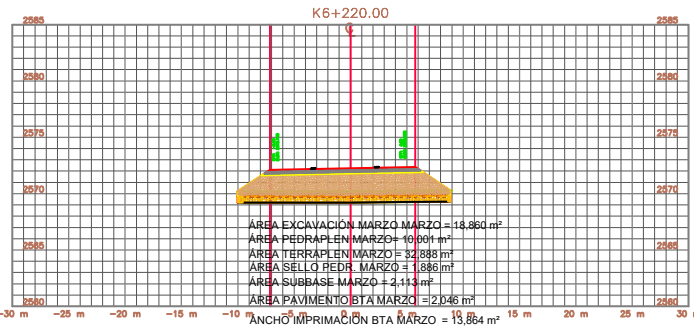


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 18,860 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 10,001 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 32,888 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,886 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+290.00

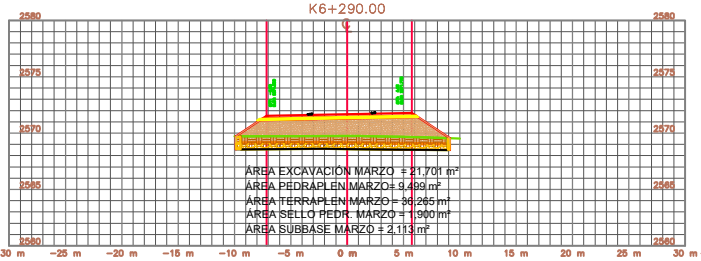


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 21,701 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,499 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 36,265 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,900 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²

K6+330.00

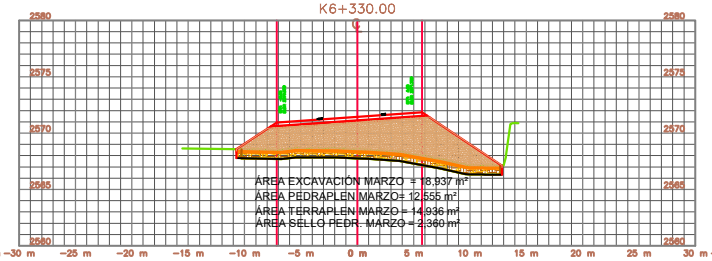


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 18,937 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 12,555 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 14,936 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,360 m²

K6+370.00

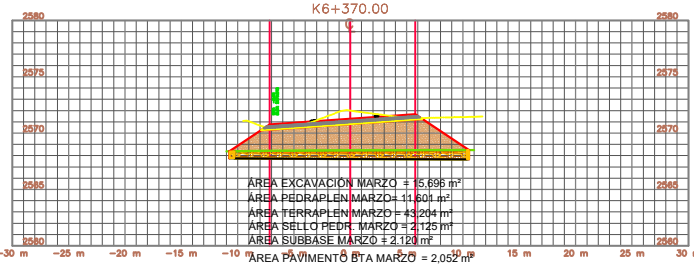


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 15,696 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 11,601 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 43,204 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,125 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,052 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,906 m²

K6+280.00

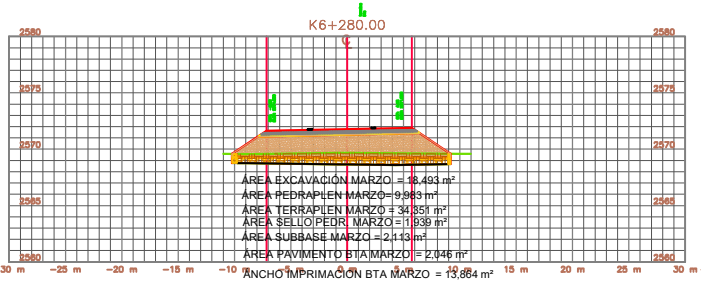


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 18,493 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,983 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 34,351 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,939 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+320.00

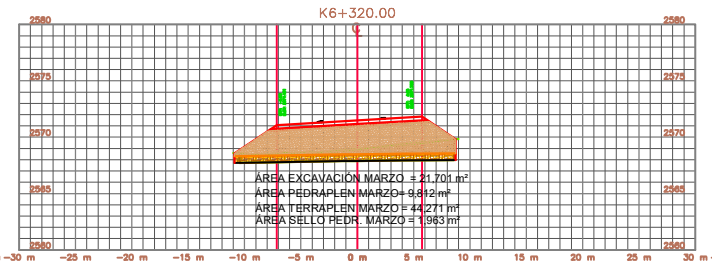


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 21,701 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,812 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 44,271 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,963 m²

K6+360.00

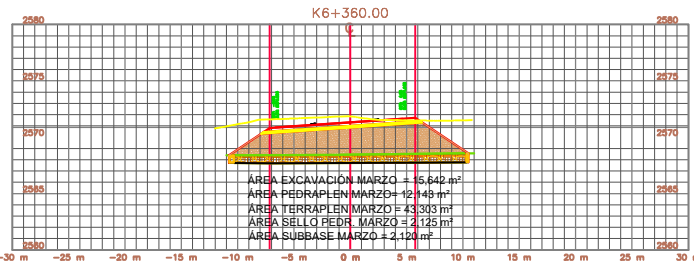


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 15,642 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 12,143 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 43,303 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,125 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²

K6+270.00

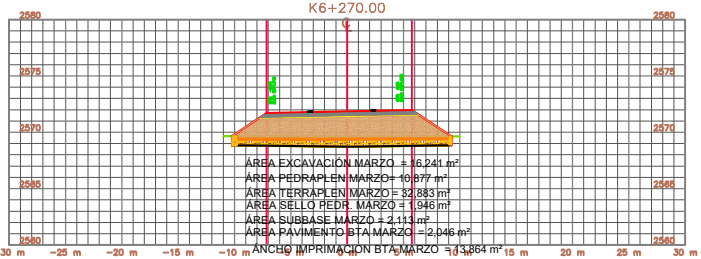


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 16,241 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 10,877 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 32,883 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,946 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+310.00

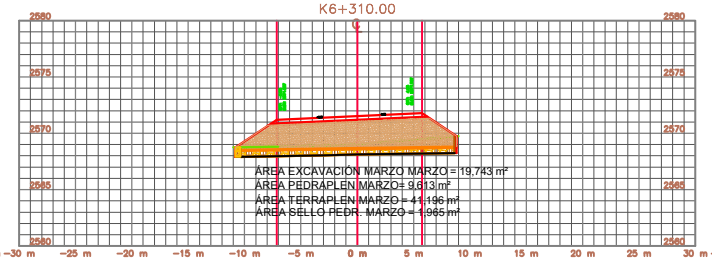


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO MARZO = 19,743 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,613 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 41,196 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,965 m²

K6+350.00




ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 18,206 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 10,856 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 42,279 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,005 m²

K6+260.00

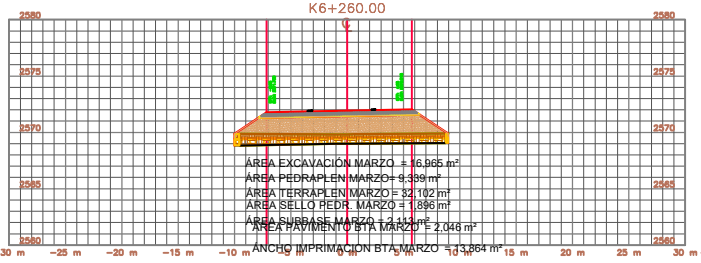


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 16,965 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,339 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 32,102 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,896 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,113 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+300.00

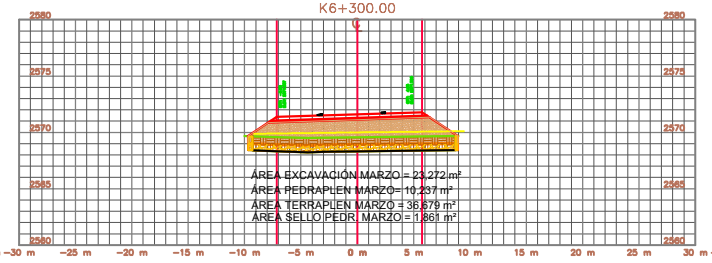


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 23,272 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 10,237 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 36,679 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,861 m²

K6+340.00

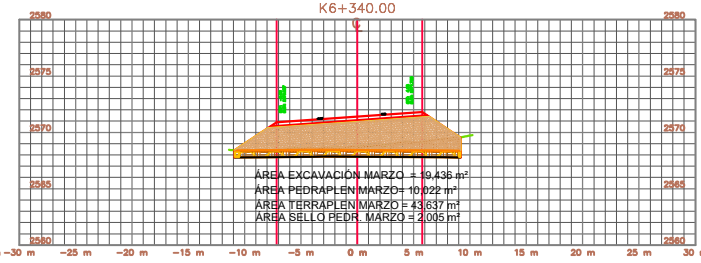


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 19,436 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 10,022 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 43,637 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,005 m²

K6+410.00

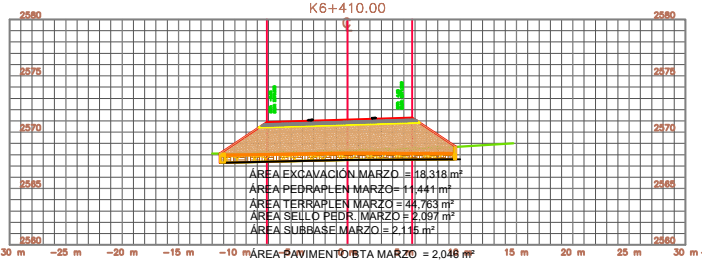


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 18,318 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 11,441 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 44,763 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,097 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,115 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+450.00

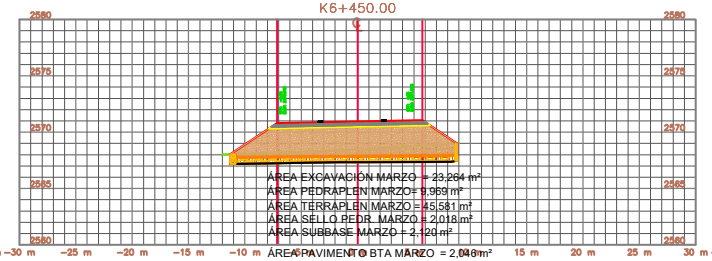


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 23,264 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,969 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 45,581 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,018 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+490.00

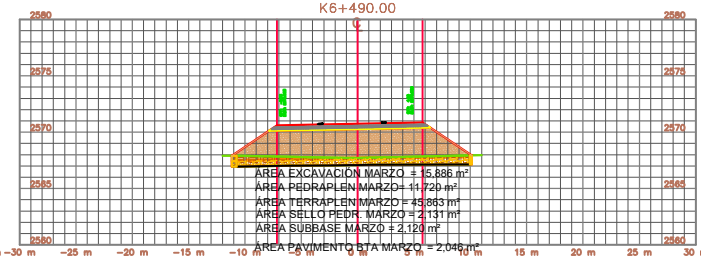


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 15,886 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 11,720 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 45,863 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,131 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+400.00

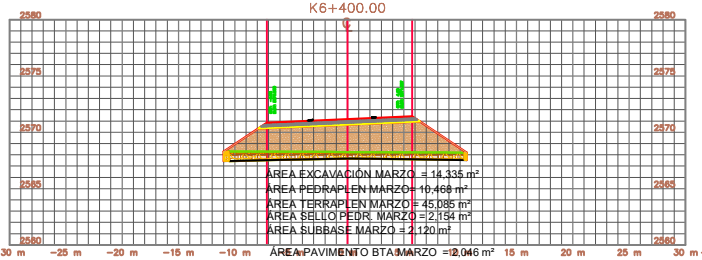


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 14,335 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 10,468 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 45,085 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,154 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+440.00

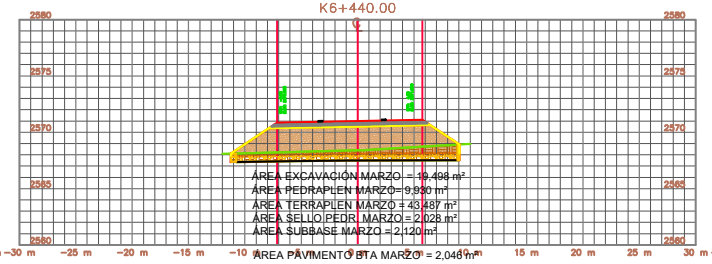


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 19,498 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,930 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 43,487 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,028 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+480.00

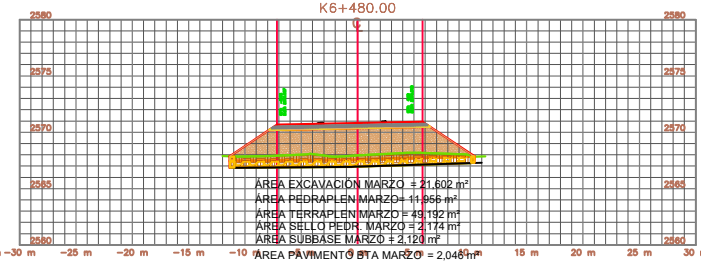


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 21,602 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 11,958 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 49,192 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,174 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+390.00

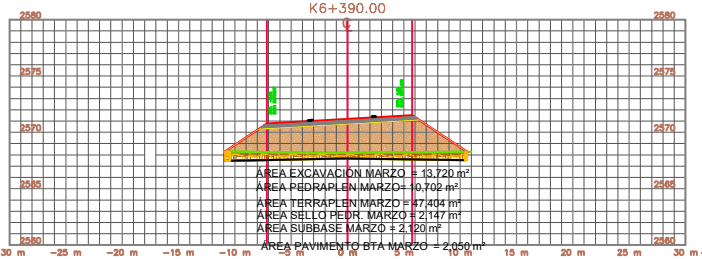


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 13,720 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 10,702 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 47,404 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,147 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,050 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,891 m²

K6+430.00

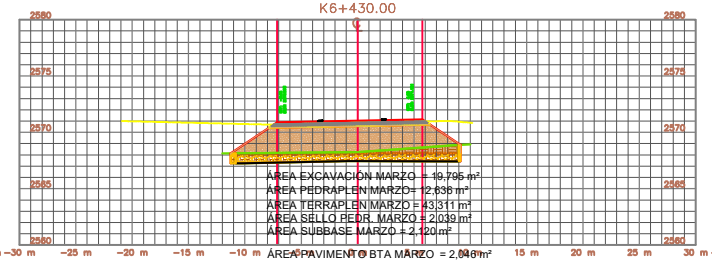


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 19,795 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 12,838 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 43,311 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,039 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+470.00

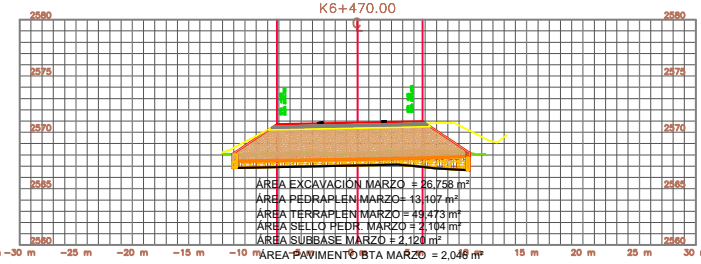


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 26,758 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 13,107 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 49,473 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,104 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+380.00

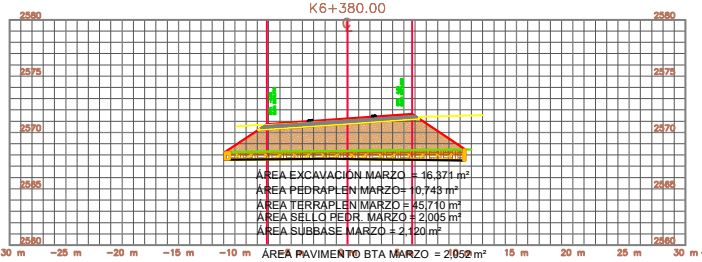


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 16,371 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 10,743 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 45,710 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,005 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,052 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,906 m²

K6+420.00

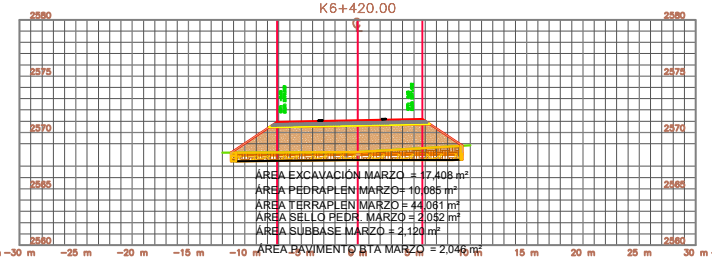


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 17,408 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 10,085 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 44,061 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,052 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+460.00

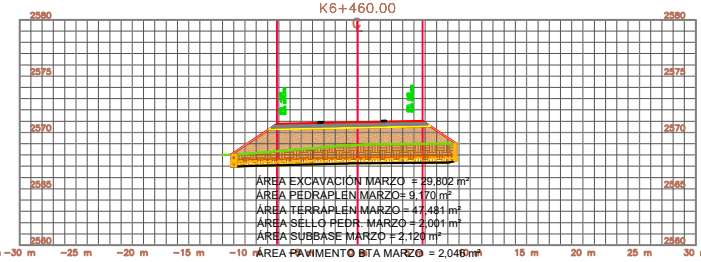


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 29,802 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,170 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 47,481 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,001 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+530.00

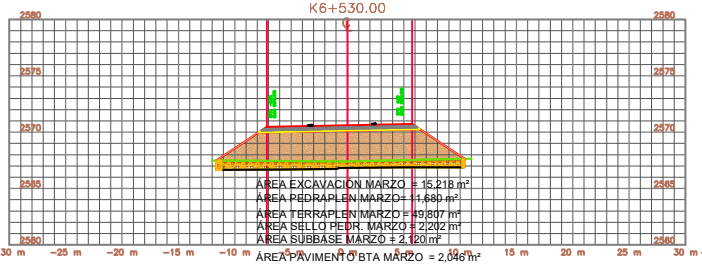


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 15,218 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 1,680 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 49,807 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,202 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+570.00

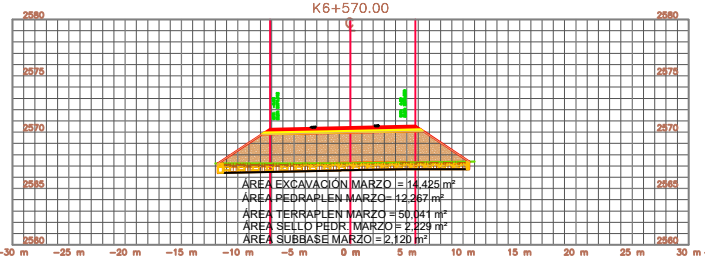


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 14,425 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 12,267 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 50,041 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,229 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²

K6+610.00

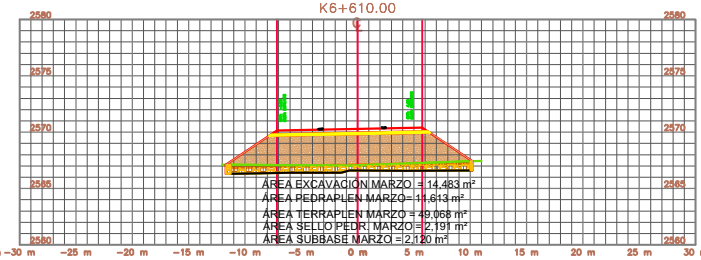


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 14,483 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 11,613 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 49,068 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,191 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²

K6+520.00

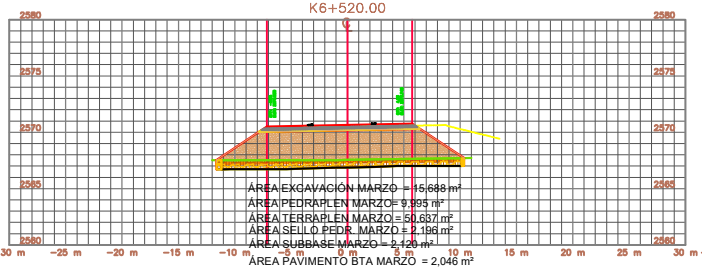


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 15,688 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,995 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 50,637 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,196 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+560.00

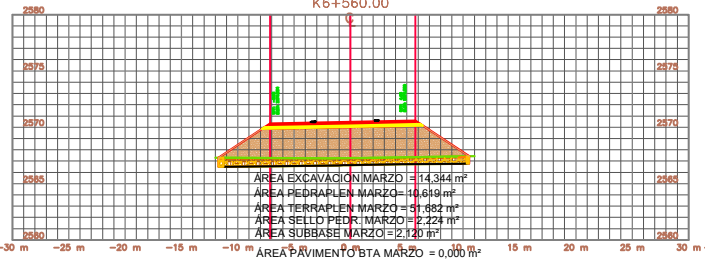


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 14,344 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 10,619 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 51,682 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,224 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 0,000 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+600.00

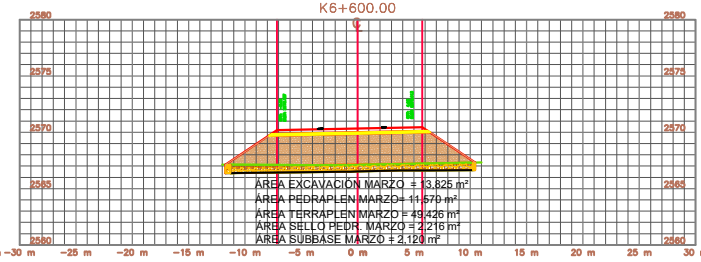


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 13,825 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 11,570 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 49,426 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,216 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²

K6+510.00

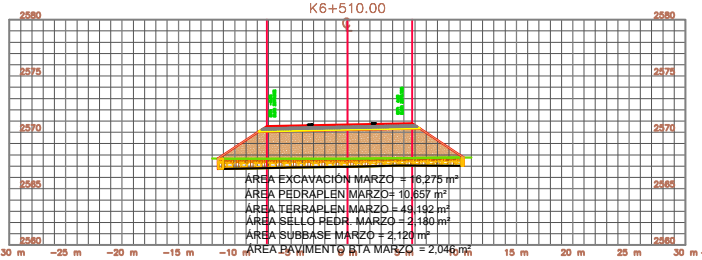


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 16,275 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 10,657 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 49,192 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,180 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+550.00

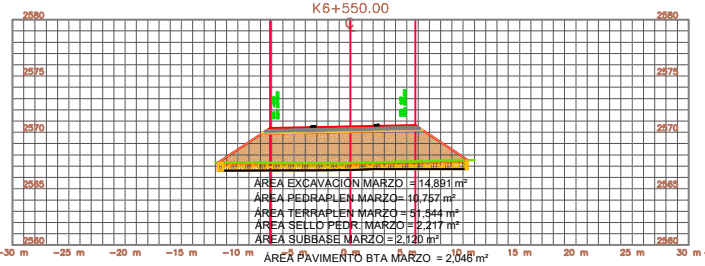


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 14,891 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 10,757 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 51,544 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,217 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+590.00

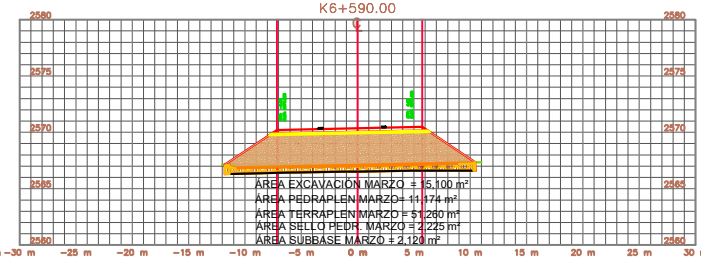


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 15,100 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 11,174 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 51,260 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,225 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²

K6+500.00

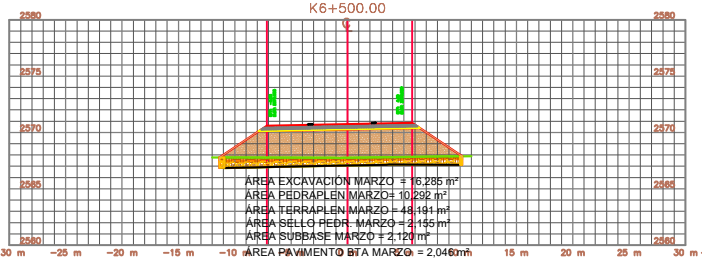


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 16,285 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 10,292 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 48,191 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,155 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+540.00

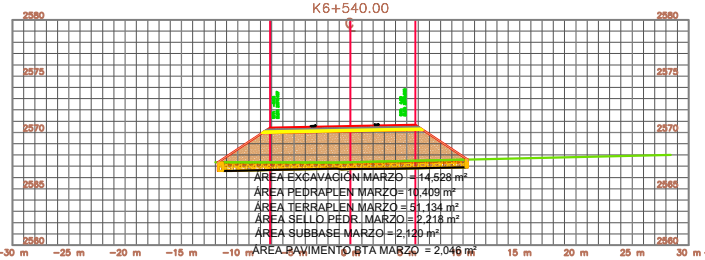


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 14,528 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 10,409 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 51,134 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,218 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²
ÁREA PAVIMENTO BTA MARZO = 2,046 m²
ÁNCHO IMPRIMACION BTA MARZO = 13,864 m²

K6+580.00

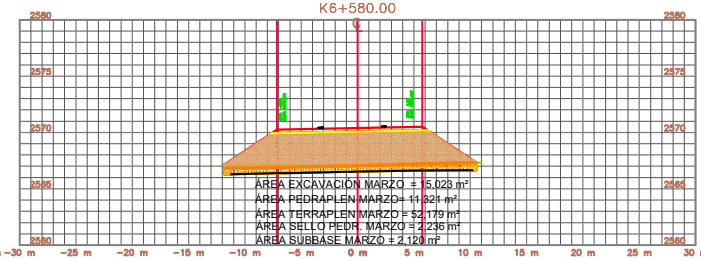


ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 15,023 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 11,321 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 52,179 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2,236 m²
ÁREA SUBBASE MARZO = 2,120 m²


K6+650.00

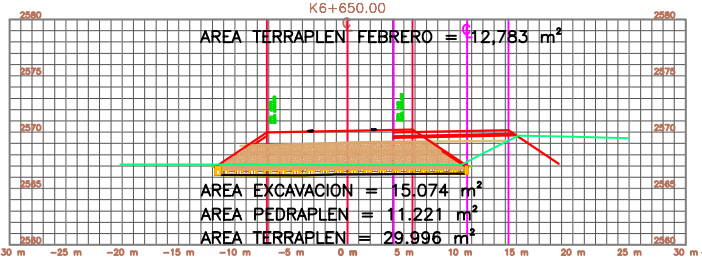


K6+690.00

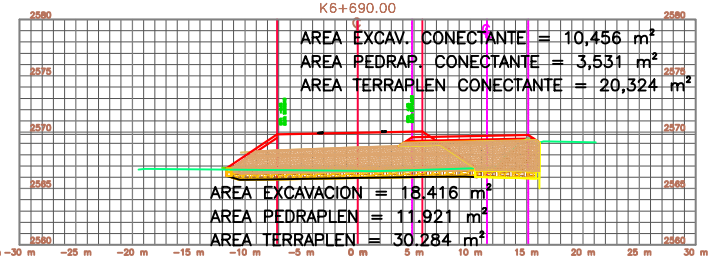


K6+640.00

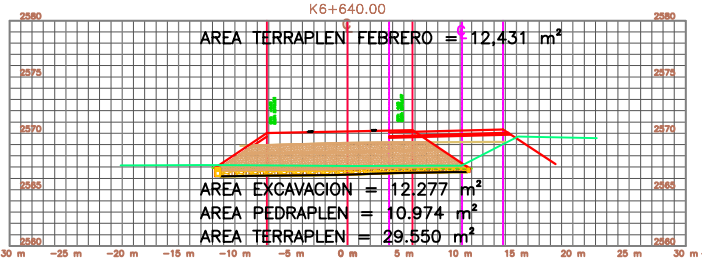


K6+680.00

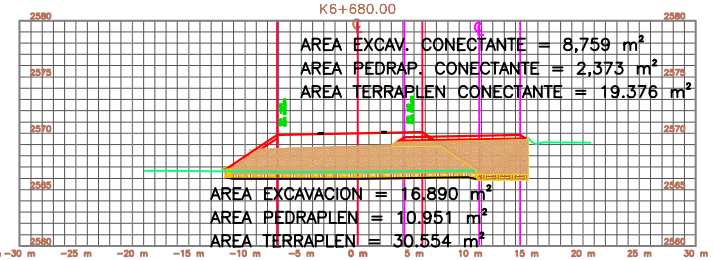


K6+630.00

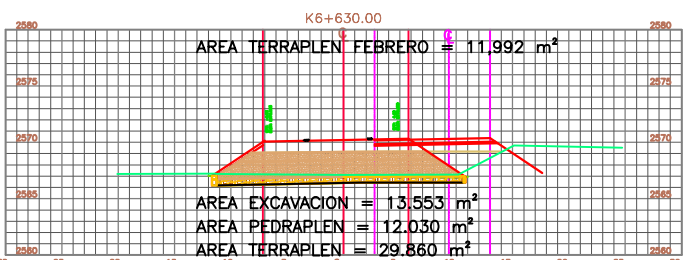


K6+670.00

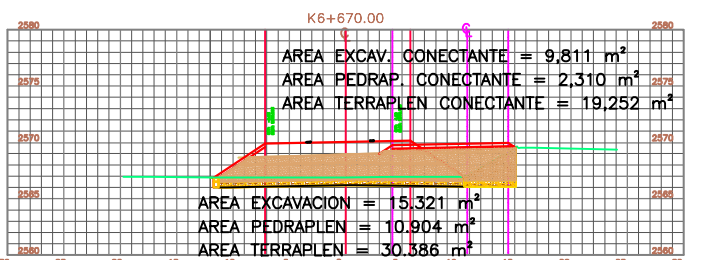


K6+620.00

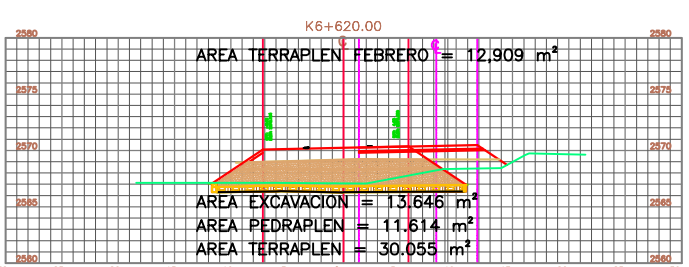


K6+660.00

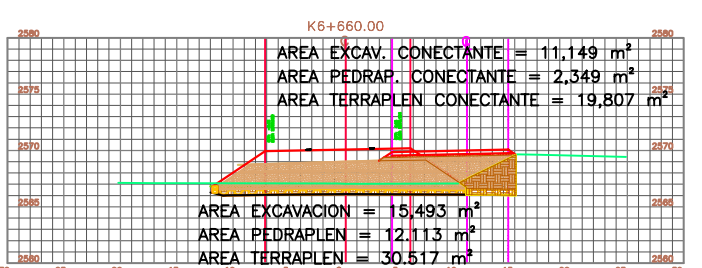



K6+700.00

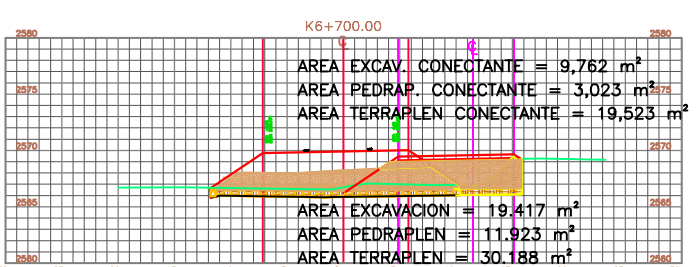



SECCIONES OH27
















SECCIONES OH28



















SECCIONES OH29



















SECCIONES OH36
















SECCIONES OH37



















SECCIONES OH38
















SECCIONES OH39






















SECCIONES OH52



















SECCIONES OH53















SECCIONES OH54












K0+290.00

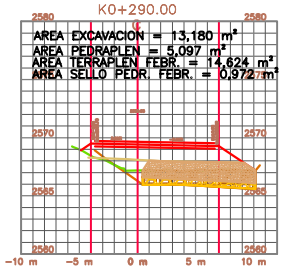


K0+240.00

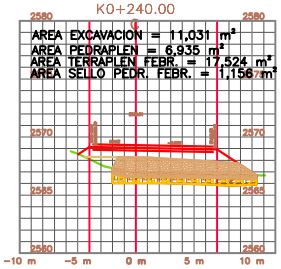


K0+280.00

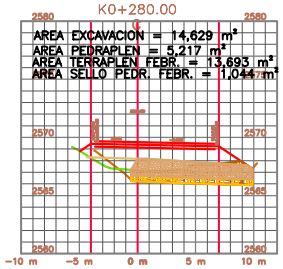


K0+230.00

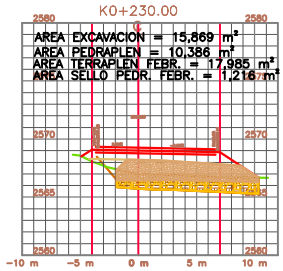


K0+270.00

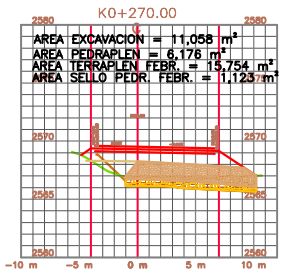


K0+220.00

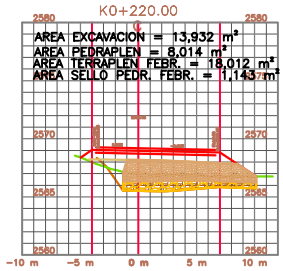


K0+260.00

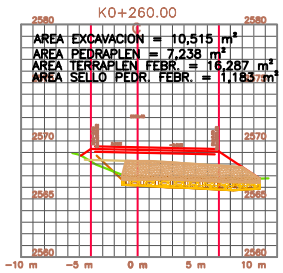


K0+210.00

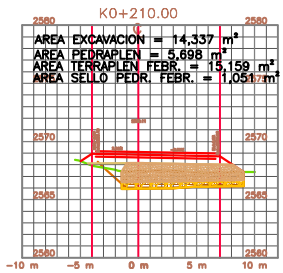


K0+250.00

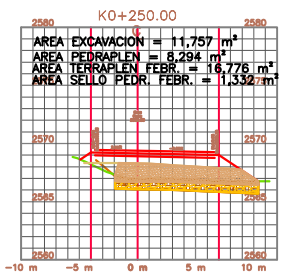


K0+150.00

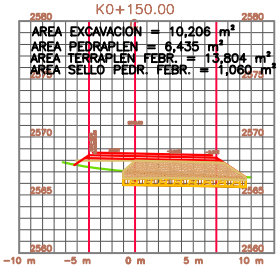


K0+200.00

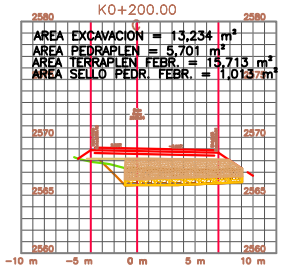


K0+140.00

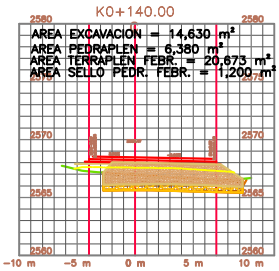


K0+190.00

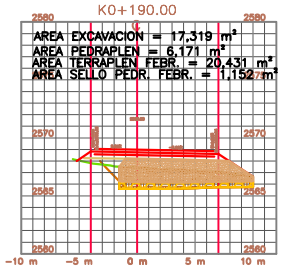


K0+130.00

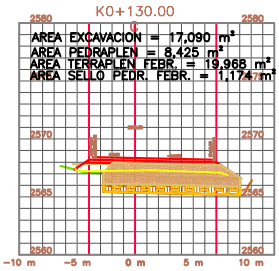


K0+180.00

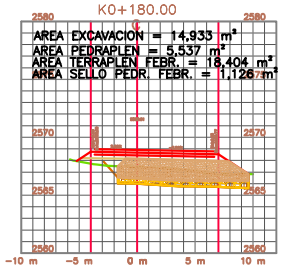


K0+120.00

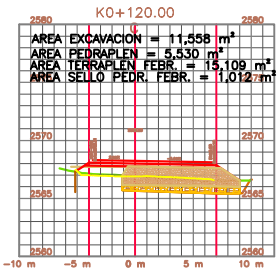


K0+170.00

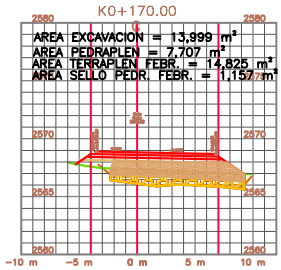



K0+110.00

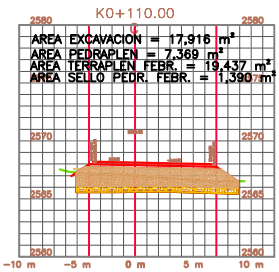



K0+160.00

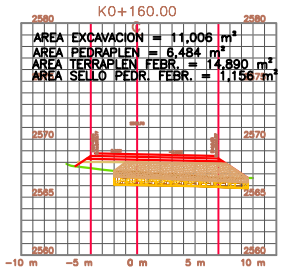


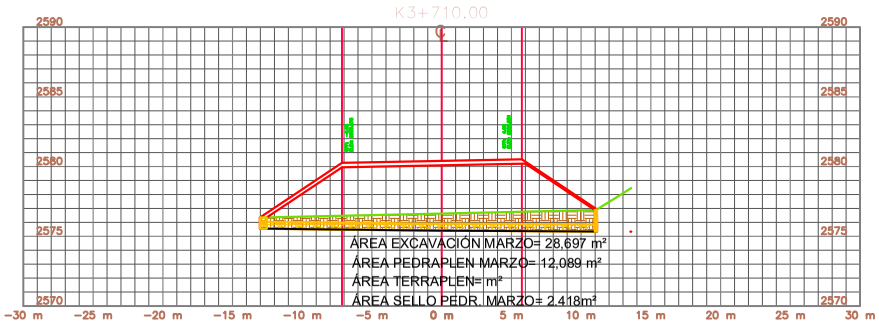

K3+710.00
2590
2585
2580
2575
2570
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO= 28,697 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 12,089 m²
ÁREA TERRAPLEN= m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO= 2.418m²

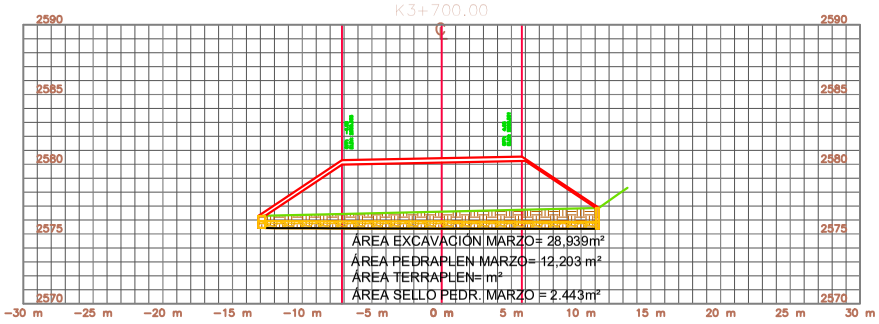

K3+700.00
2590
2585
2580
2575
2570
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO= 28,939m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 12,203 m²
ÁREA TERRAPLEN= m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.443m²

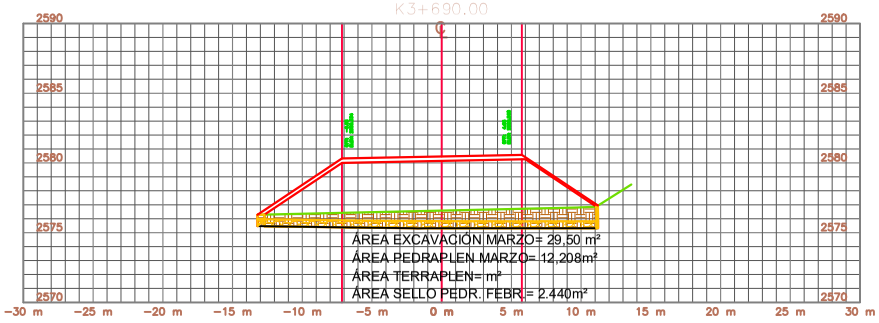

K3+690.00
2590
2585
2580
2575
2570
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO= 29,50 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 12,208m²
ÁREA TERRAPLEN= m²
ÁREA SELLO PEDR. FEBR.= 2.440m²

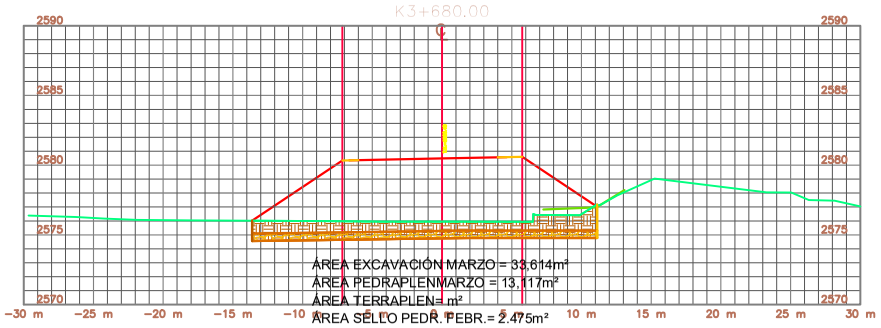

K3+680.00
2590
2585
2580
2575
2570
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 33,614m²
ÁREA PEDRAPLENMARZO = 13,117m²
ÁREA TERRAPLEN= m²
ÁREA SELLO PEDR. FEBR.= 2.475m²

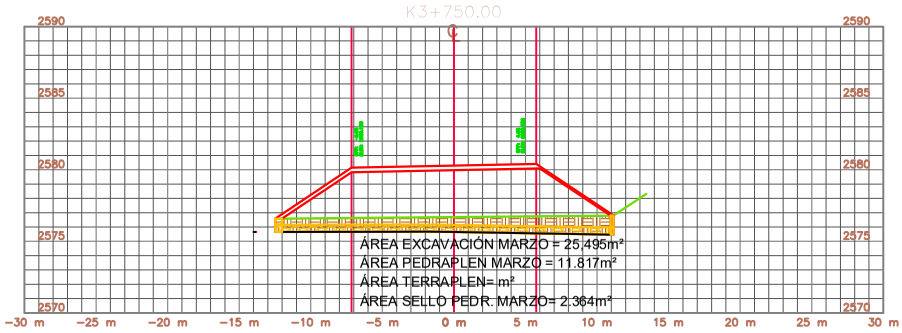

K3+750.00
2590
2585
2580
2575
2570
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 25.495m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11.817m²
ÁREA TERRAPLEN= m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO= 2.364m²

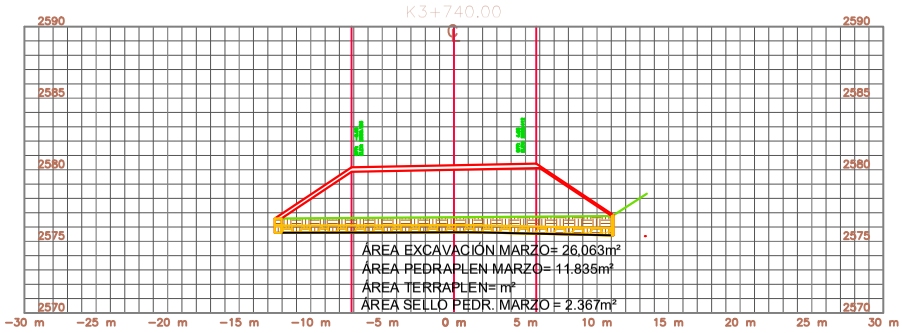

K3+740.00
2590
2585
2580
2575
2570
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO= 26.063m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 11.835m²
ÁREA TERRAPLEN= m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.367m²

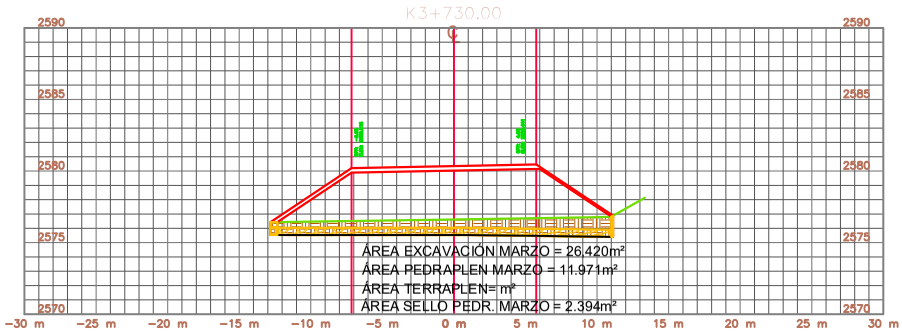

K3+730.00
2590
2585
2580
2575
2570
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 26.420m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11.971m²
ÁREA TERRAPLEN= m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.394m²

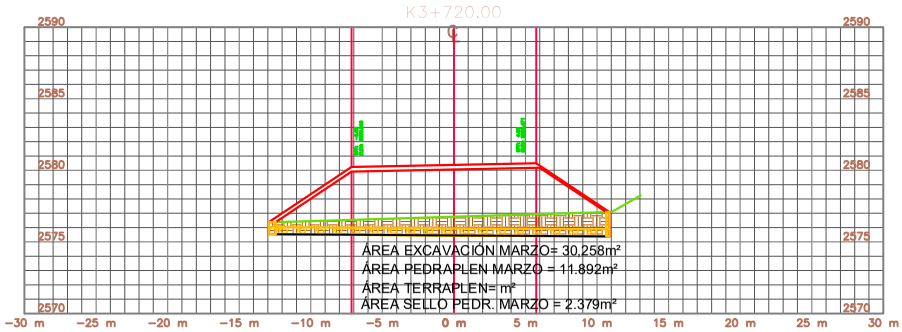

K3+720.00
2590
2585
2580
2575
2570
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO= 30.258m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11.892m²
ÁREA TERRAPLEN= m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.379m²

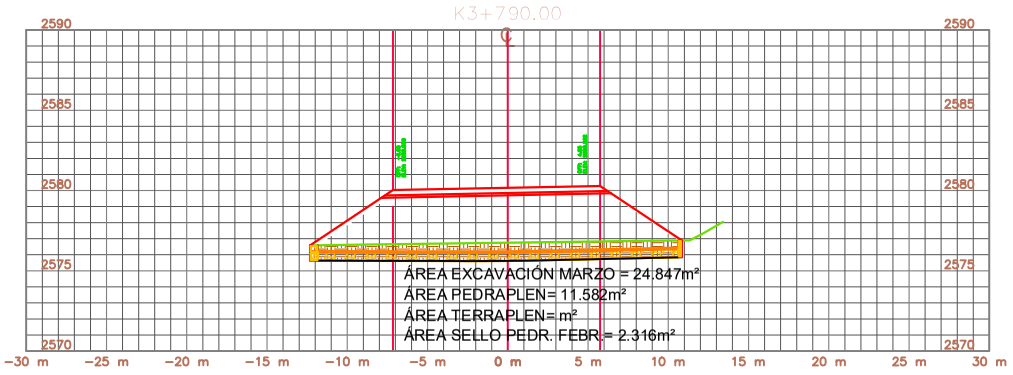

K3+790.00
2590
2585
2580
2575
2570
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 24.847m²
ÁREA PEDRAPLEN= 11.582m²
ÁREA TERRAPLEN= m²
ÁREA SELLO PEDR. FEBR.= 2.316m²

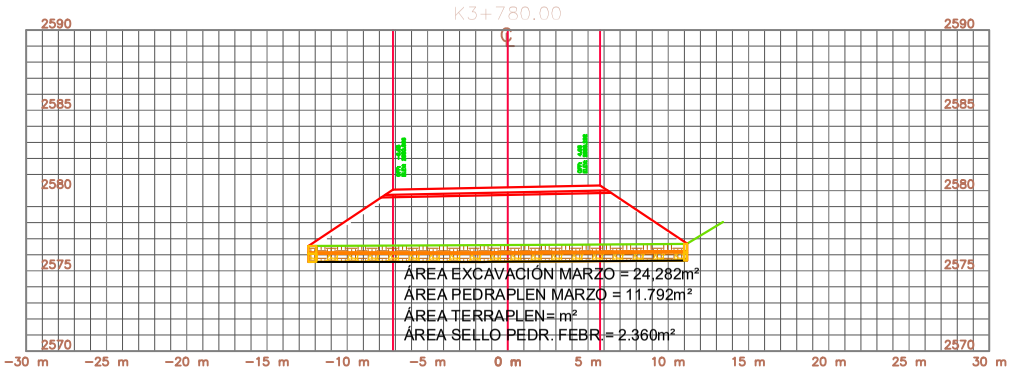

K3+780.00
2590
2585
2580
2575
2570
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 24.282m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11.792m²
ÁREA TERRAPLEN= m²
ÁREA SELLO PEDR. FEBR.= 2.360m²

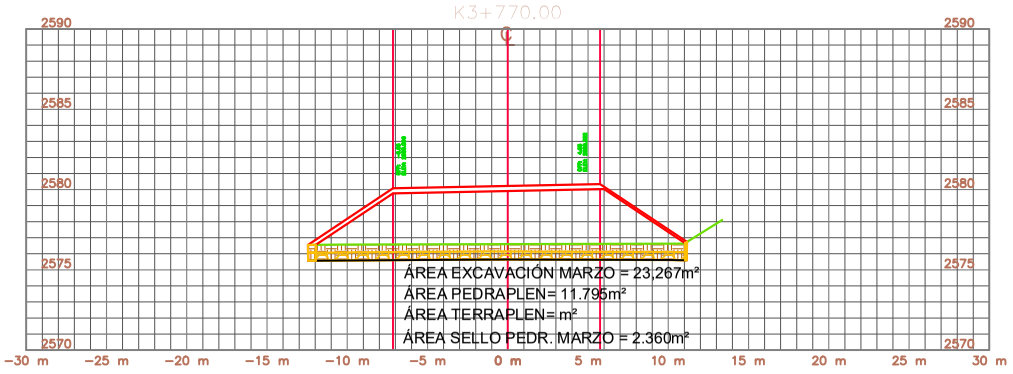

K3+770.00
2590
2585
2580
2575
2570
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 23.267m²
ÁREA PEDRAPLEN= 11.795m²
ÁREA TERRAPLEN= m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.360m²

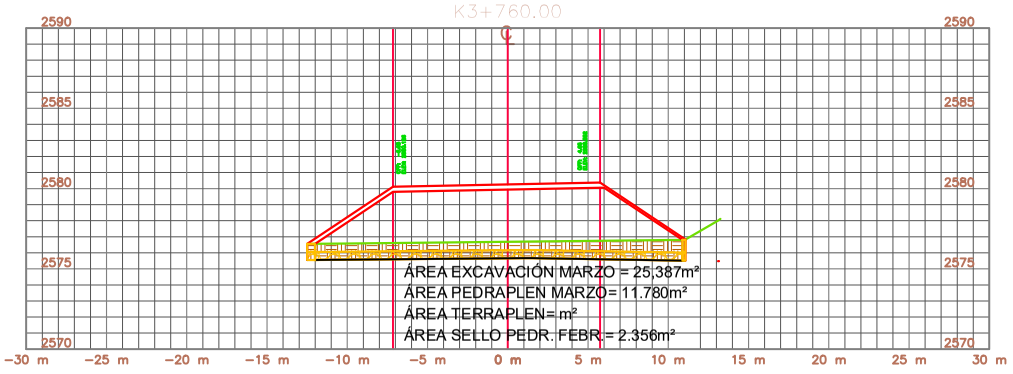

K3+760.00
2590
2585
2580
2575
2570
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 25,387m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 11.780m²
ÁREA TERRAPLEN= m²
ÁREA SELLO PEDR. FEBR.= 2.356m²

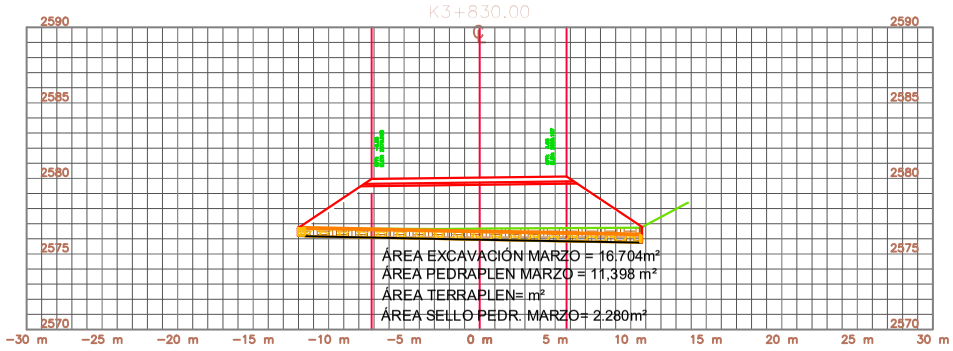

K3+830.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 16.704m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11.398 m²
ÁREA TERRAPLEN= m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO= 2.280m²

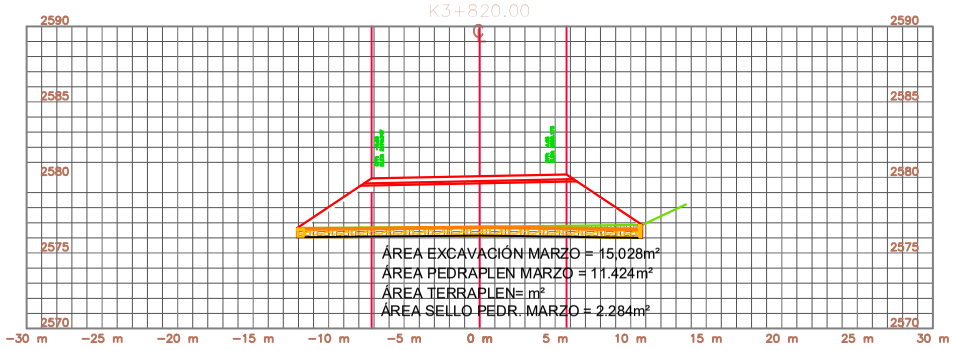

K3+820.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 15.028m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11.424m²
ÁREA TERRAPLEN= m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.284m²

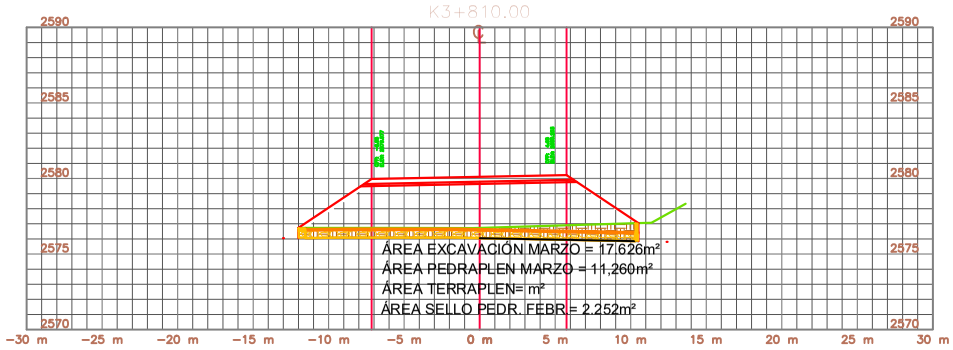

K3+810.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 17.626m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11.260m²
ÁREA TERRAPLEN= m²
ÁREA SELLO PEDR. FEBR = 2.252m²

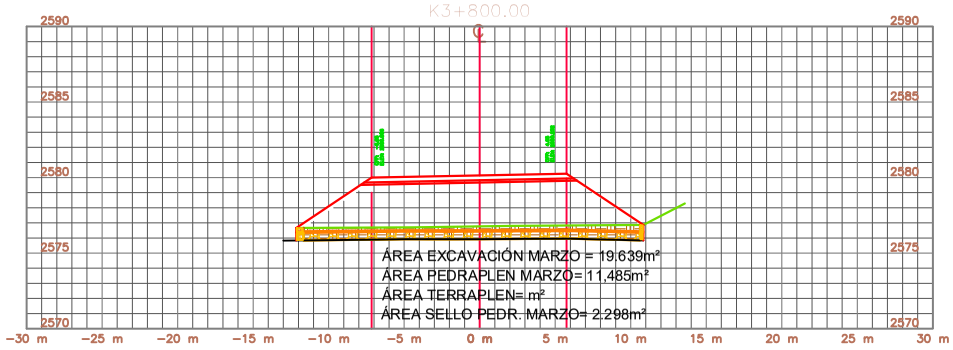

K3+800.00
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 19.639m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 11.485m²
ÁREA TERRAPLEN= m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO= 2.298m²

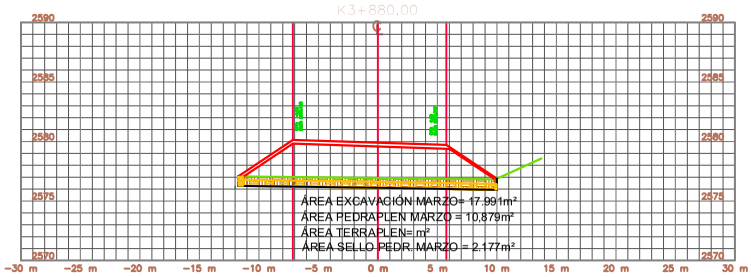

K3+880.00
2590
2585
2580
2575
2570
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO= 17.991m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10,879m²
ÁREA TERRAPLEN= m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.177m²

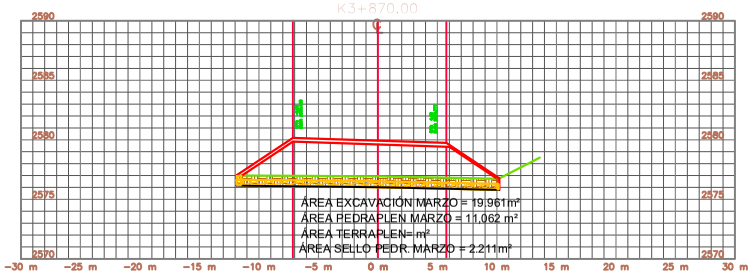

K3+870.00
2590
2585
2580
2575
2570
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 19.961m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11.062 m²
ÁREA TERRAPLEN= m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.211m²

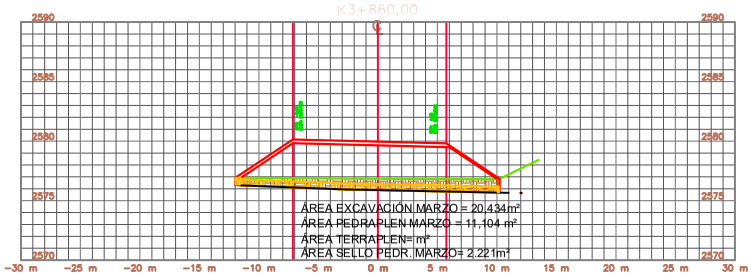

K3+860.00
2590
2585
2580
2575
2570
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 20.434m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11.104 m²
ÁREA TERRAPLEN= m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO= 2.221m²

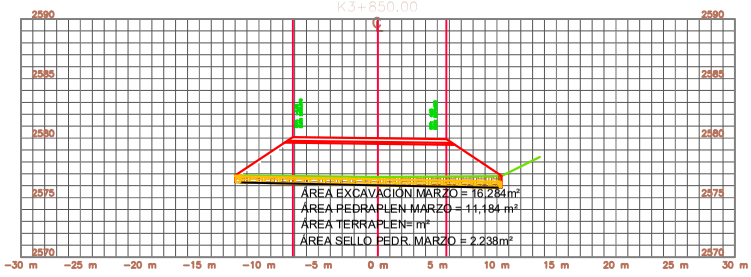

K3+850.00
2590
2585
2580
2575
2570
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 16.284m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11.184 m²
ÁREA TERRAPLEN= m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.238m²

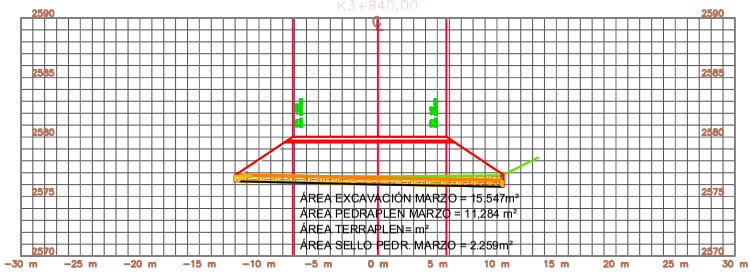

K3+840.00
2590
2585
2580
2575
2570
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 15.547m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 11.284 m²
ÁREA TERRAPLEN= m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.259m²

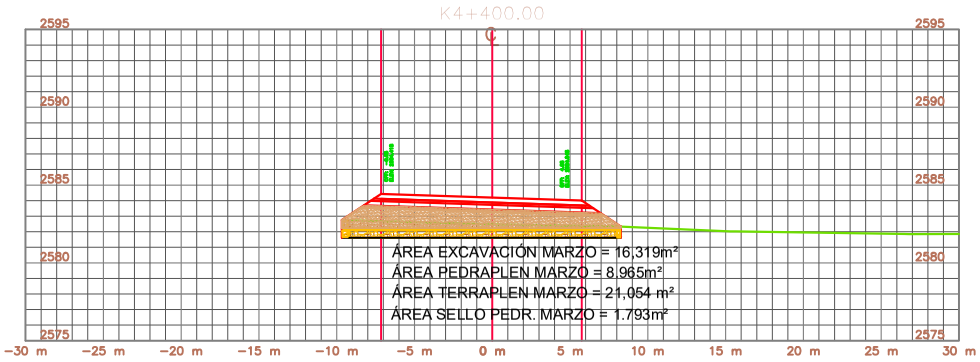

K4+400.00
2595
2590
2585
2580
2575
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 16,319m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 8,965m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 21,054 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.793m²

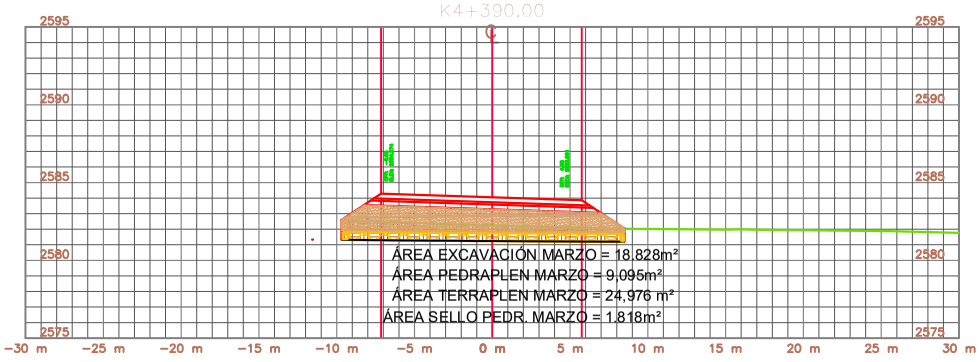

K4+390.00
2595
2590
2585
2580
2575
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 18,828m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9,095m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 24,976 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,818m²

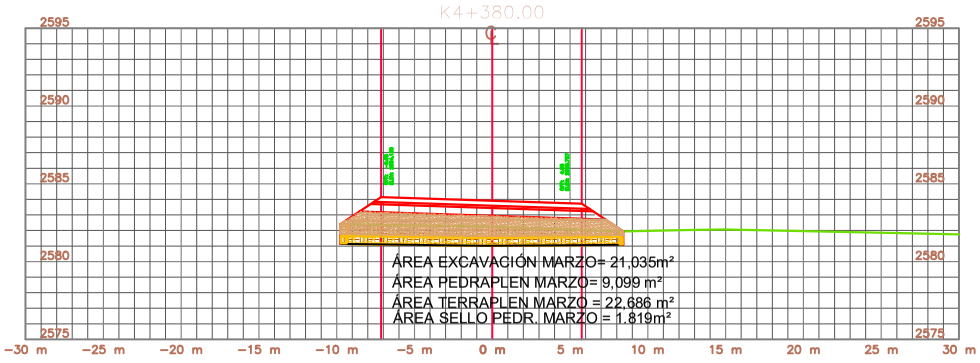

K4+380.00
2595
2590
2585
2580
2575
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO= 21,035m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO= 9,099 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 22,686 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,819m²

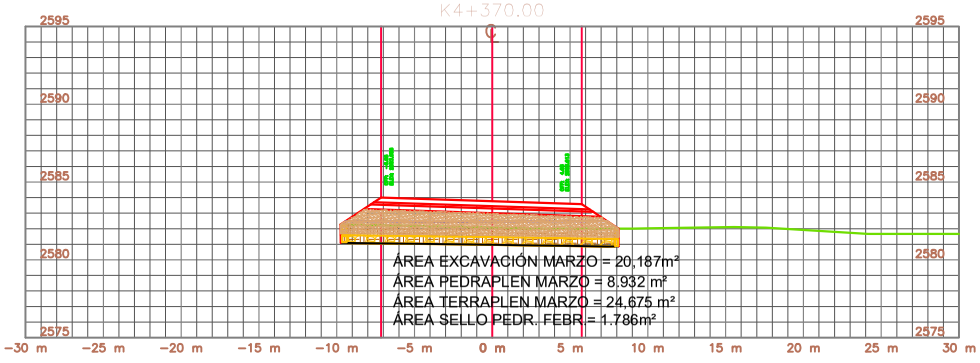

K4+370.00
2595
2590
2585
2580
2575
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 20,187m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 8,932 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 24,675 m²
ÁREA SELLO PEDR. FEBR = 1.786m²

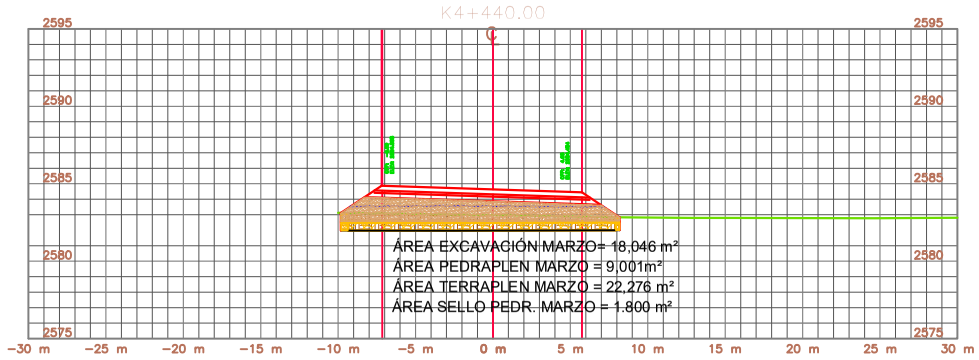

K4+440.00
2595
2590
2585
2580
2575
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO= 18,046 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9,001m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 22,276 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,800 m²
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m

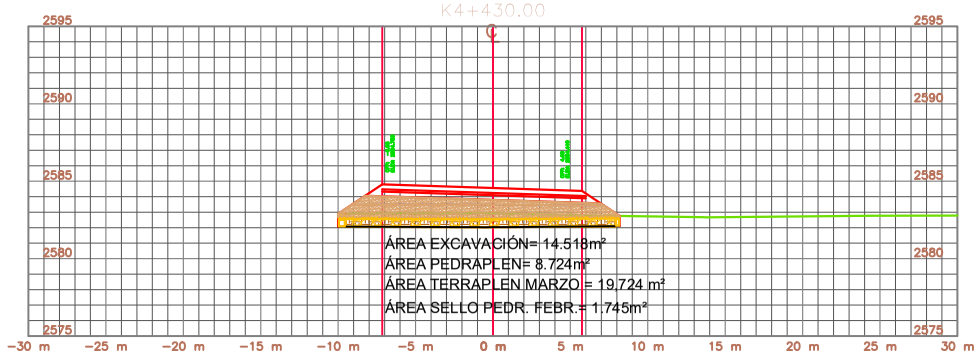

K4+430.00
2595
2590
2585
2580
2575
ÁREA EXCAVACIÓN= 14,518m²
ÁREA PEDRAPLEN= 8,724m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 19,724 m²
ÁREA SELLO PEDR. FEBR.= 1,745m²
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m

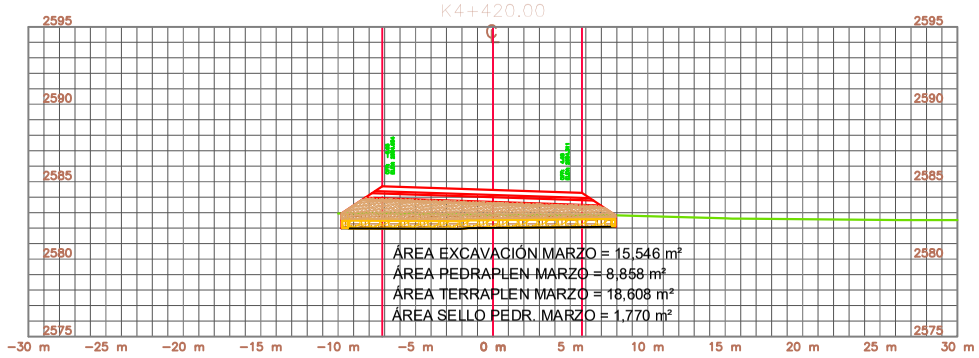

K4+420.00
2595
2590
2585
2580
2575
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 15,546 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 8,858 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 18,608 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1,770 m²
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m

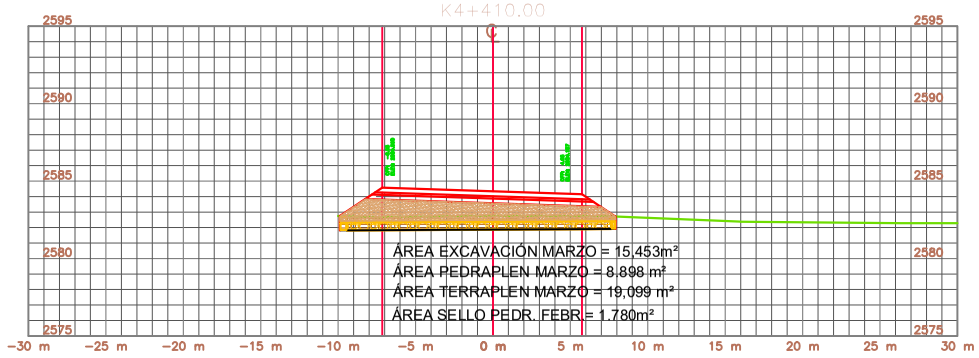
K4+410.00
2595
2590
2585
2580
2575
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 15,453m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 8,898 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 19,099 m²
ÁREA SELLO PEDR. FEBR.= 1,780m²
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m

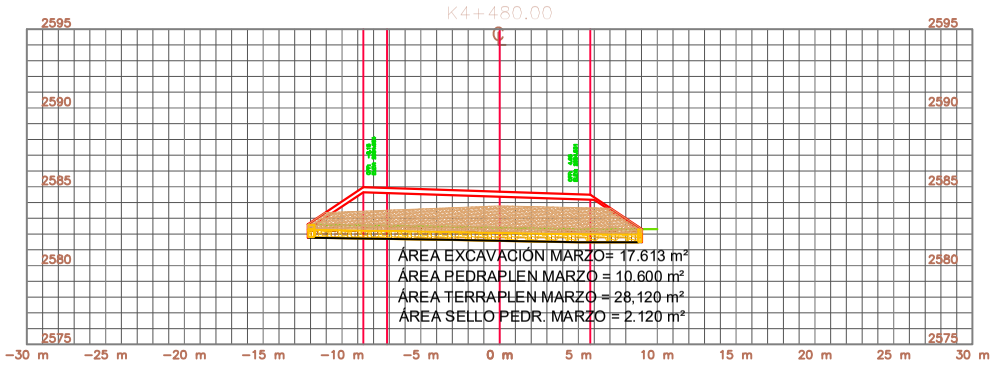
K4+480.00
2595
2590
2585
2580
2575
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO= 17.613 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 10.600 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 28.120 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 2.120 m²

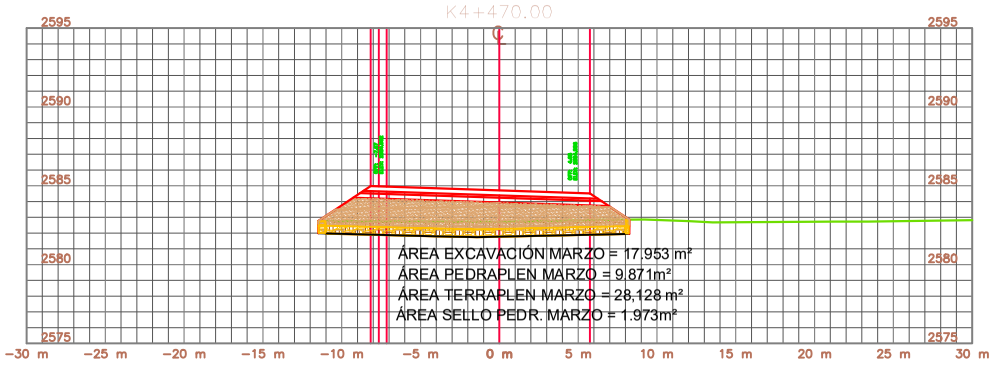
K4+470.00
2595
2590
2585
2580
2575
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 17.953 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.871m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 28.128 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.973m²

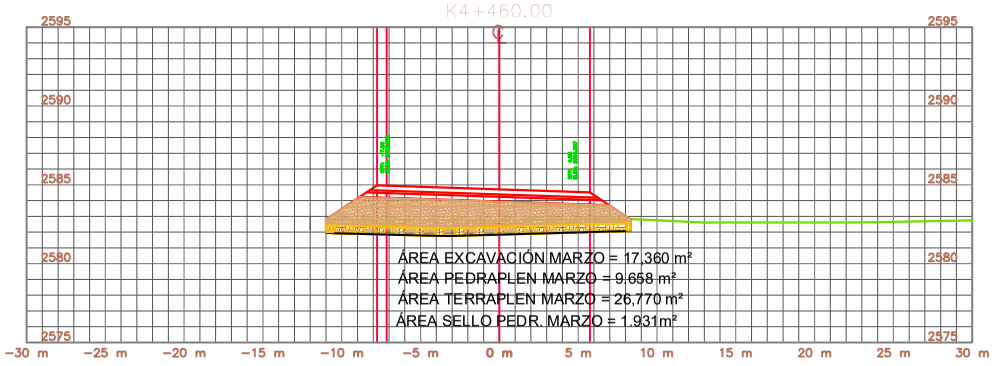
K4+460.00
2595
2590
2585
2580
2575
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 17.360 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.658 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 26.770 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.931m²

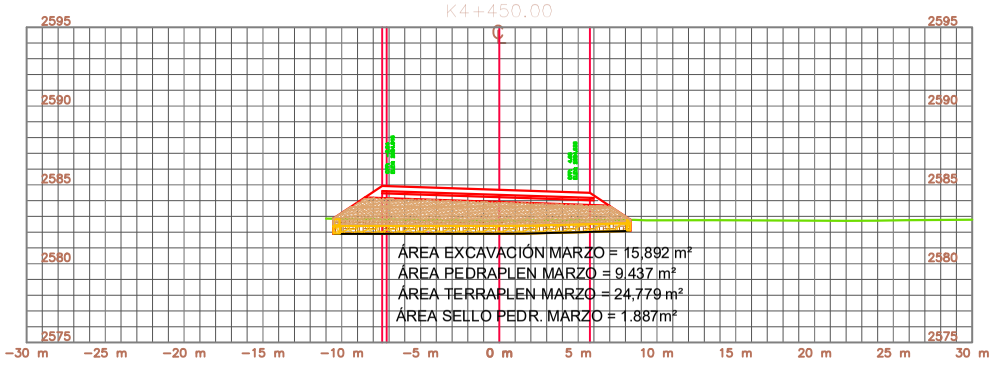
K4+450.00
2595
2590
2585
2580
2575
−30 m
−25 m
−20 m
−15 m
−10 m
−5 m
0 m
5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
ÁREA EXCAVACIÓN MARZO = 15.892 m²
ÁREA PEDRAPLEN MARZO = 9.437 m²
ÁREA TERRAPLEN MARZO = 24.779 m²
ÁREA SELLO PEDR. MARZO = 1.887m²

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

TIPO DE DOCUMENTO		**PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No.** **(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)**	**10**		FECHA	**31 MARZO 2022** (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA	**Dirección Técnica y de Estructuración**	**OBJETO DEL CONTRATO**	**MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1**	**No. CONTRATO DE OBRA / AÑO**	**989 de 2021**
DIRECCIÓN TERRITORIAL	**Dirección Territorial Cundinamarca**				**No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO**	**971 de 2021**

2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. 1			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA 3 SEPTIEMBRE 2021											
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	E E M	T E M	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECUC. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	

3. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. 2			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA 1 ENERO 2000											
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	E E M	T E M	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$	-	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO	$	-
B	VALOR BÁSICO PRE-ACTA	$	-	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$	-
C	VALOR IVA MENSUAL	$	-	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL	$	-
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL	$	-	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL	$	-
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$	-	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$	-
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	$	-	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)		

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

N/A

6. FIRMAS

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Fecha: 2022.04.06 14:05:24 -05'00'

Firma
Nombre: **Mario Alberto Huertas Cotes**
Representante Legal Contratista
Matrícula Profesional No.: 14502 CND
☑ **Apoderado** ☐

Firma
Nombre: **Luz Amparo Sánchez Porras**
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No.: 151743705 - I

Firma
Nombre: **Luis Antonio Rueda Rueda**
Representante Legal Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-16905 STND
☐ **Apoderado** ☑

Firma
Nombre: **Danna Soler Ruiz**
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: 271911023 - 1

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

Fracción Cliente

Uptc
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Estampilla - UPTC

NIT: 891.800.330-1

Para captura manual digite el Nro de Referencia

REFERENCIA
7083202
FECHA DE EXPEDICIÓN
06/04/2022
FECHA DE VENCIMIENTO
31/12/2022

Pagar en:
Banco de Bogotá

NOMBRE DEL PAGADOR / CLIENTE	NIT O C.C.	CORREO ELECTRÓNICO
CONSORCIO VIAL MHC 063	901475859	yeir.garzon@mhc.com.co

CONCEPTO	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	$ 159,000.00	$ 159,000.00
SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS.	TOTAL	$ 159,000.00

Banco de Bogota 081 Siete de Agosto
B0008102 ****1729 Horario Normal
CC******1240 07/04/22 09:45 T 160
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y CEO 2048
FAUS 000007083202
Valor Efectivo:159,000.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor ND:0.00
Valor Total:159,000.00
2121 21641RecaudoWebService1

Observaciones:

1. Favor verificar que el valor registrado sea igual al entregado por usted.
2. La impresion de los formatos de recaudo debe hacerse en papel Bond 75 gr/m2 (Papel para Fotocopiado)
3. No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX, la impresión debe realizarse con impresora laser de alta resolución

Escaneado con CamScanner

SS 15909

Bogotá D. C., 23 de marzo de 2022

Ingeniero
LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Director de interventoría
CONSORCIO ICEACSA
Carrera 13A # 86A-40 Oficina 402
6180526 / 6180519
consorcio.iceacsatpf2021@gmail.com
Bogotá

Asunto: Respuesta a Entrada No. 26963 con Fecha 18/03/2022

Respetado Ingeniero Luis Antonio.

Una vez revisada la preacta predial No. 10, correspondiente a las actividades desarrolladas en el mes de marzo de 2022, en el marco del contrato de obra 989 de 2021, por un valor a pagar por la gestión predial de ($10.087.630) diez millones ochenta y siete mil seis cientos treinta pesos, con los soportes respectivos, revisados y aprobados por la interventoría, se emite el visto bueno de no objeción, a fin de continuar con su respectivo trámite.

Respecto a lo anterior, se precisa que los vistos de conformidad o de no objeción, que generan tanto el Subdirector de Sostenibilidad, así como los diferentes gestores prediales, no constituyen aprobación sino la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apéndice predial y manual de interventoría, en el entendido de que la aprobación es competencia del interventor.

Gracias por su atención.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
Fecha: 2022.03.25 14:54:54 -05'00'

JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
Subdirector De Sostenibilidad

Proyecto: CARMEN STIBEL DUARTE

Reviso: OMAR CAMELO OSORIO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30 (Día) 3 (Mes) 2022 (Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TÉCNICA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CUNDINAMARCA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 10
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO X (Indicar con una X) **Resolución N°** 2029-2009 (Indicar N° de Resolución día, mes y año) **NO LICENCIADO (PMA o PAGA)** X

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC 063

OBJETO MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PEDRIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ, BARBOSA, BUCARAMANGA, GIRÓN, PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA , MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 1.

N° CONTRATO 989 de 2021 **FECHA DE INICIO** 21 de junio de 2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 20 de diciembre de 2030

Valor Inicial Contrato Obra	$	465.288.090.475,00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	465.288.090.475,00

AIU %:	30%
U %:	2%

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	75.778.877.774,00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental	$	-
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$	-
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	-

Nota: El valor registrado hace parte de la Gestion Social, Predial y Ambiental del contrato

INTERVENTORIA CONSORCIO ICEACSA - TPF

OBJETO INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ -BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1

N° CONTRATO 971 de 2021 **FECHA DE INICIO** 21 de junio de 2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 20 de diciembre de 2030

Valor Inicial Contrato Interventoría	$	33.499.857.438,00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	-

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

								CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° ____ Fecha _____									EJECUTADO EN EL MES								ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR			
CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR					CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO			IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALORTOTAL ($)	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN				VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO						
									0		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00			0,00	$ 0,00												
									0		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	0		$ 0,00			0,00		$ 0,00											
									0		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00	0,00			$ 0,00										
											SUBTOTAL	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	0	$ 0,00										

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0,00
VALOR BASICO GESTION	$ 0,00
VALOR TOTAL BASICO PRE-ACTA	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL:	$ 0,00

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

MARIO ALBERTO HUERTAS COTES — Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO HUERTAS COTES. Fecha: 2022.04.05 16:47:56 -05'00'


Firma
Nombre: MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matricula No. : 14502 CND

Firma
Nombre: LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA
Representante Legal o Apoderado
Interventoria
Matricula No. : 68202-16905 STDER

Vo. Bo. Firma
Nombre : JAIME MAXIMINO GONZALEZ AGUILAR
Profesional Ambiental
Contratista de Obra
Matricula No. : 68238120308STD

Vo. Bo. Firma
Nombre : JUAN CARLOS CORTES MAHECHA
Profesional Ambiental
Interventoria
Matricula No. : 2523829579CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor

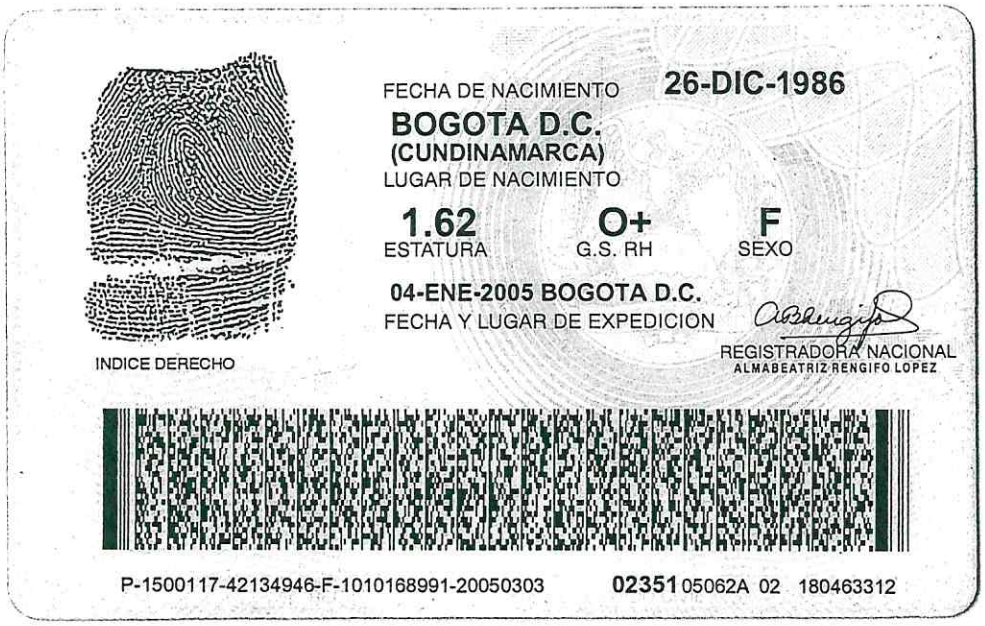

FECHA DE NACIMIENTO **26-DIC-1986**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

04-ENE-2005 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

P-1500117-42134946-F-1010168991-20050303 **02351** 05062A 02 180463312



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.010.168.991**

FERNANDEZ BECERRA
APELLIDOS

IVONNE
NOMBRES

Ivonne Fernandez B
FIRMA

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

146684-T



IVONNE
FERNANDEZ BECERRA
C.C. 1010168901

RESOLUCION INSCRIPCION 50 FECHA 11/02/2010
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

PRESIDENTE Leonardo Sánchez G.

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 157282

71142

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

985C828A466B2692

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **IVONNE FERNANDEZ BECERRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1010168991 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 146684-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Mayo de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.901.429**

CIFUENTES LINARES

APELLIDOS

JORGE EDUARDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-MAR-1978**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO


08-ABR-1996 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00130570-M-0079901429-20081122 0006659602A 1 1520045039

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

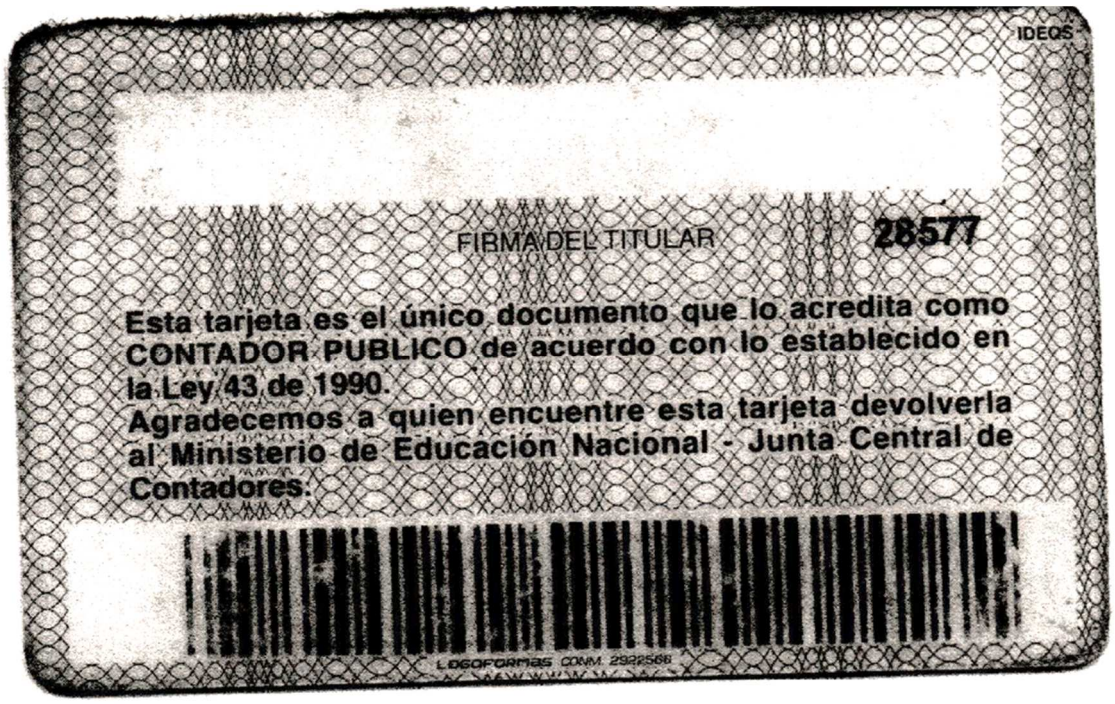

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR

28577

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS COMM. 2922568



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

108597-T

JORGE EDUARDO
CIFUENTES LINARES
C.C. 79901429
RESOLUCION INSCRIPCION 03 FECHA 2005/02/03
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 118246

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4BEDFFC7359D2BFB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE EDUARDO CIFUENTES LINARES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79901429 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 108597-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Mayo de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Banco de Occidente

CERTIFICACIÓN

Mediante la presente certificamos que **CONSORCIO VIAL MHC 063** identificado con Nit 901.475.859-6 es cuenta habiente del Banco de Occidente desde el 22 de abril de 2021 con cuenta corriente No. 235-84664-9 la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación del **CONSORCIO VIAL MHC 063** es ser un "Cliente Activo del BANCO de OCCIDENTE".

Expedimos esta certificación hoy 23 de abril de 2021 a **CONSORCIO VIAL MHC 063**

Cordialmente,

VIVIANA LUCIA MONICA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	6/03/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 989 DE 2021

CONTRATISTA: MARIO HUERTAS COTES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO DE 2022

PROYECTO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ-BARBOSA-BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"MÓDULO 1.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ICEACSA TPF

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COLSUBSIDIO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
																																					Base de Cotización (IBC)	Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ACEVEDO JOHN LENIS	11444784	AYUDANTE CONTROLADOR DE TRANSITO	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	LR	D	D	X	X	X	X	R					MHC	$ 400,000	$ 99,600	V	SALUD TOTAL EPS	1045147656	$ 57,300	PROTECCION (ING +	1045147656	$ 228,900	$ 67,600	$ 0.00	$ 0.00	RETIRO 26/03/2022
2	AGUIAR MORERA NELSON	1075652420	AYUDANTE GENERAL DE OBRA	$ 1,000,000	X	X	X	R																												MHC	$ 400,000	$ 20,000	V	SALUD TOTAL EPS	1045147656	$ 11,500	PROTECCION (ING +	1045147656	$ 45,900	$ 13,400	$ 0.00	$ 0.00	RETIRO 4/03/2022
3	AHUMADA ANZOLA BRAYAN DANIEL	1193586114	AYUDANTE GENERAL DE OBRA	$ 1,000,000			INC	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 68,400	V	EPS SURA	1045147656	$ 39,300	COLPENSIONES	1045147656	$ 157,200	$ 39,300	$ 0.00	$ 0.00	INGRESO 03/03/2022
4	ALARCON PEÑA ANDRES FELIPE	1076667721	AYUDANTE FINISHER	$ 1,200,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	LR	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	MHC	$ 480,000	$ 106,800	V	NUEVA EPS	1045147656	$ 64,100	PROTECCION (ING +	1045147656	$ 256,000	$ 63,000	$ 0.00	$ 0.00	LICENCIA REMUNIEDAD 19/03/2022
5	ALARCON RUIZ HECTOR	1048821056	CONDUCTOR CAMIONETA NISSAN SPR-256	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	MHC	$ 520,000	$ 162,800	V	SALUD TOTAL EPS	1045147656	$ 93,600	PORVENIR	1045147656	$ 374,200	$ 93,600	$ 0.00	$ 0.00	
6	ALDANA RAMIREZ FIDEL ANDRES	14010620	CONDUCTOR MICROBUS 5 TSM -434	$ 1,400,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	MHC	$ 560,000	$ 100,300	V	NUEVA EPS	1045147656	$ 92,300	PORVENIR	1045147656	$ 368,900	$ 92,300	$ 0.00	$ 0.00	
7	ALONSO CRUZ NURY PAOLA	1023025530	ASISTENTE SOCIAL	$ 1,500,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	MHC	$ 600,000	$ 104,400	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 60,000	PORVENIR	1045147656	$ 240,000	$ 60,000	$ 0.00	$ 0.00	
8	ALVARADO ARIAS EDIER	1192896428	AYUDANTE GENERAL DE OBRA	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 100,800	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 58,000	PORVENIR	1045147656	$ 231,700	$ 58,000	$ 0.00	$ 0.00	
9	ALVARADO BEJARANO YEFERSON	1006866846	AYUDANTE TOPOGRAFIA	$ 1,000,000							INC	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 57,400	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 33,000	PORVENIR	1045147656	$ 131,900	$ 33,000	$ 0.00	$ 0.00	INGRESO 08/03/2022
10	ALVAREZ CEDIEL MICHAEL SEBASTIAN	1007565462	AYUDANTE TOPOGRAFIA	$ 1,000,000							INC	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 54,900	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 31,600	PROTECCION (ING +	1045147656	$ 126,100	$ 31,600	$ 0.00	$ 0.00	INGRESO 08/03/2022
11	ALVAREZ GARZON DANIEL SANTIAGO	1003526270	AYUDANTE GENERAL DE OBRA	$ 1,000,000	X	X	X	R																												MHC	$ 400,000	$ 11,900	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 6,900	PORVENIR	1045147656	$ 35,500	$ 7,800	$ 0.00	$ 0.00	RETIRO 4/03/2022
12	ALVAREZ VIVAS DIEGO MAURICIO	94482582	OPERADOR BULLDOZER CAT D6N 23	$ 2,500,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	MHC	$ 1,000,000	$ 242,000	V	NUEVA EPS	1045147656	$ 139,100	COLFONDOS	1045147656	$ 556,300	$ 139,100	$ 0.00	$ 0.00	
13	AMADO GONZALEZ ALEXANDER	80110542	AYUDANTE CONTROLADOR DE TRANSITO	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	LR	D	D	X	X	LR	R							MHC	$ 400,000	$ 63,900	V	NUEVA EPS	1045147656	$ 39,100	COLPENSIONES	1045147656	$ 197,700	$ 48,800	$ 0.00	$ 0.00	LICENCIA REMUNIEDAD 19/03/2022-25/03/2022 Y RETIRO 26/03/2022
14	ANDRADE LONDOÑO NINE YOHANNA	53131280	INSPECTOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	$ 3,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	LR	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	MHC	$ 1,200,000	$ 336,100	V	SALUD TOTAL EPS	1045147656	$ 199,700	PORVENIR	1045147656	$ 798,400	$ 197,200	$ 0.00	$ 0.00	LICENCIA REMUNIEDAD 19/03/2022
15	ANTOLINEZ MATTA AILEEN YURANI	1070945437	RESIDENTE SOCIAL PREDIAL	$ 4,500,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	MHC	$ 1,800,000	$ 313,200	V	EPS SANITAS	1045147656	$ 180,000	PORVENIR	1045147656	$ 720,000	$ 180,000	$ 0.00	$ 0.00	
16	ARDILA DUCUARA GABRIEL FERNANDO	91016163	TOPOGRAFO INSPECTOR	$ 2,800,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	MHC	$ 1,120,000	$ 198,000	V	NUEVA EPS	1045147656	$ 113,800	COLPENSIONES	1045147656	$ 455,000	$ 113,800	$ 0.00	$ 0.00	
17	AREVALO CASTILLO ISMAEL	11345802	AYUDANTE GENERAL DE OBRA	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 89,600	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 51,500	COLPENSIONES	1045147656	$ 205,900	$ 51,500	$ 0.00	$ 0.00	
18	ARIZA TELLEZ JAIME IRIOL	1097665832	CADENERO SEGUNDO	$ 1,800,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	INA	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	MHC	$ 720,000	$ 135,200	V	COMPENSAR EPS	1045147656	$ 77,700	PORVENIR	1045147656	$ 326,000	$ 77,700	$ 0.00	$ 0.00	INASISTENCIA 19/03/2022
19	ARROYO MEDINA VICTOR MANUEL	1068657255	OPERADOR FRESADORA ROADTEC RX600	$ 2,600,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	LR	D	D	X	X	X	X	X	D	INC	INC	X	X	MHC	$ 1,040,000	$ 217,000	V	NUEVA EPS	1045147656	$ 132,900	PORVENIR	1045147656	$ 531,100	$ 128,200	$ 0.00	$ 0.00	LICENCIA REMUNIEDAD 19/03/2022 - INCAPACIDAD MIGRAÑA, NO ESPECIFICADA 27
20	BALLEN CENDALES LUIS ALBERTO	1075685009	AYUDANTE GENERAL DE OBRA	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 72,900	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 41,900	PORVENIR	1045147656	$ 167,600	$ 41,900	$ 0.00	$ 0.00	
21	BALLEN RAMOS JORGE ALEJANDRO	1075683124	AYUDANTE CONTROLADOR DE TRANSITO	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 76,800	V	EPS SURA	1045147656	$ 44,200	PORVENIR	1045147656	$ 176,600	$ 44,200	$ 0.00	$ 0.00	
22	BALLESTAS PUELLO FRANCISCO JAVIER	1192756534	OPERADOR MOTO NEWHOLLAND RG170B 17	$ 3,200,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	MHC	$ 1,280,000	$ 320,700	V	EPS SURA	1045147656	$ 184,300	PORVENIR	1045147656	$ 737,100	$ 184,300	$ 0.00	$ 0.00	
23	BARRANTES LARA SERGIO YOVANNY	1073605711	CONDUCTOR 2.TROQ. DINA 83 SOA-803	$ 1,700,000													INC	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 680,000	$ 75,600	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 43,500	PORVENIR	1045147656	$ 173,700	$ 43,500	$ 0.00	$ 0.00	INGRESO 14/03/2022
24	BASABE MEDINA MARCO TULIO	14325995	AYUDANTE IRRIGADOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 92,900	V	NUEVA EPS	1045147656	$ 53,400	PORVENIR	1045147656	$ 213,400	$ 53,400	$ 0.00	$ 0.00	
25	BELTRAN AMORTEGUI NOE	5996924	AYUDANTE CONTROLADOR DE TRANSITO	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 107,100	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 61,600	PORVENIR	1045147656	$ 246,200	$ 61,600	$ 0.00	$ 0.00	
26	BELTRAN PATIÑO LUIS EMILIO	3234911	OPERADOR RETRO EXC. VOLVO EC360 15	$ 3,500,000	X	TR																													MHC	$ 1,400,000	$ 256,300	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 147,300	COLPENSIONES	1045147656	$ 589,200	$ 147,300	$ 0.00	$ 0.00	RETIRO 02/03/2022
27	BELTRAN RINCON MICHAEL ALEXIS	1023904054	TORNILLERO EXTENDEDORA ASFALTO	$ 1,600,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	MHC	$ 640,000	$ 141,500	V	SALUD TOTAL EPS	1045147656	$ 81,300	PORVENIR	1045147656	$ 325,100	$ 81,300	$ 0.00	$ 0.00	
28	BERMUDEZ AGAPE MIGUEL ANTONIO	80495388	OPERADOR DUMPER VOLVO 27 A25D	$ 2,500,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	MHC	$ 1,000,000	$ 246,700	V	NUEVA EPS	1045147656	$ 141,800	COLPENSIONES	1045147656	$ 567,100	$ 141,800	$ 0.00	$ 0.00	

29	BERMUDEZ ALAPE JOHAN CAMILO	80658165	OPERADOR DUMPER VOLVO 36 A25E	$ 2,300,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 920,000	$ 231,700	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 133,200	PORVENIR	1045147656	$ 532,500	$ 133,200	$ 0.00	$ 0.00		
30	BERMUDEZ PARRA JUAN CARLOS	1065620635	OPERADOR BULLDOZER CAT D6H 22	$ 2,200,000				INC	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 880,000	$ 133,200	V	SALUD TOTAL EPS	1045147656	$ 76,600	COLFONDOS	1045147656	$ 306,200	$ 76,600	$ 0.00	$ 0.00	INGRESO 04/03/2022	
31	BLANCO CORONEL ALEXIS ANDRES	72284595	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	$ 5,500,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	LR	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 2,200,000	$ 370,100	V	EPS SURA	1045147656	$ 220,100	PORVENIR	1045147656	$ 880,100	$ 220,100	$ 0.00	$ 0.00	LICENICA REMUNERADA 19/03/2022	
32	BOHORQUEZ CASTAÑEDA ALVARO	79065570	TORNILLERO EXTENDEDORA ASFALTO	$ 1,600,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 640,000	$ 140,900	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 81,000	PORVENIR	1045147656	$ 323,800	$ 81,000	$ 0.00	$ 0.00		
33	BOHORQUEZ ROJAS NELSON DARIO	74281791	RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	$ 5,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 2,000,000	$ 348,000	V	COMPENSAR EPS	1045147656	$ 200,000	COLFONDOS	1045147656	$ 800,000	$ 200,000	$ 0.00	$ 0.00		
34	BUITRAGO VERA CARLOS JAVIER	1098626096	OPERADOR TALADRO PERFORADOR BERETTA T46 1	$ 2,200,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 880,000	$ 219,700	V	NUEVA EPS	1045147656	$ 126,300	PORVENIR	1045147656	$ 505,000	$ 126,300	$ 0.00	$ 0.00		
35	BUITRAGO VERA WILSON ENRIQUE	91520549	OPERADOR CILINDRO HAMM 3307 10	$ 2,300,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 920,000	$ 218,000	V	SALUD TOTAL EPS	1045147656	$ 125,300	COLPENSIONES	1045147656	$ 501,100	$ 125,300	$ 0.00	$ 0.00		
36	BUSTOS AHUMADA EDWIN FABIAN	1075675001	AYUDANTE ORDEN ASEO Y LIMPIEZA	$ 1,000,000														INC	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 44,100	V	COMPENSAR EPS	1045147656	$ 25,400	PORVENIR	1045147656	$ 101,400	$ 25,400	$ 0.00	$ 0.00	INGRESO 14/03/2022	
37	BUSTOS BUSTOS NIXON FELILPE	1070305835	CONDUCTOR CAMIONETA NISSAN RZG-126	$ 1,300,000																													INC	X	X	MHC	$ 520,000	$ 6,100	V	SALUD TOTAL EPS	1045147656	$ 3,500	COLFONDOS	1045147656	$ 13,900	$ 3,500	$ 0.00	$ 0.00	INGRESO 29/03/2022	
38	CABREJO SAENZ DIEGO ANDRES	1003826788	AYUDANTE CONTROLADOR DE TRANSITO	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	INC	INC	INC	INC	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 95,400	V	NUEVA EPS	1045147656	$ 58,900	PORVENIR	1045147656	$ 235,300	$ 54,800	$ 0.00	$ 0.00	INCAPACIDAD DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN	
39	CADENA QUINTERO PAOLA ANDREA	1075684019	ASISTENTE SOCIAL	$ 1,500,000																INC	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 600,000	$ 52,200	V	EPS SANITAS	1045147656	$ 30,000	PORVENIR	1045147656	$ 120,000	$ 30,000	$ 0.00	$ 0.00	INGRESO 16/03/2022	
40	CAICEDO MINA YONOVER	76216360	OPERADOR FINISHER DYNAPAC SD2500 N. 5	$ 2,500,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	LR	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 1,000,000	$ 210,800	V	COMPENSAR EPS	1045147656	$ 125,300	PORVENIR	1045147656	$ 501,000	$ 124,600	$ 0.00	$ 0.00	LICENICA REMUNERADA 19/03/2022	
41	CALDERON BERNAL JESUS ORLANDO	11428038	OPERADOR CARGADOR JCB 437ZX 65	$ 3,300,000	X	LR	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 1,320,000	$ 322,800	V	NUEVA EPS	1045147656	$ 190,900	NINGUNA AFP	1045147656	$ 0	$ 189,900	$ 0.00	$ 0.00	LICENICA REMUNERADA 02/03/2022	
42	CAMACHO FLOREZ YEFERSSON ESNEIDER	1075681816	AYUDANTE FINISHER	$ 1,200,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	LR	D	D	X	X	X	X	X	D	X	D	D	D	MHC	$ 480,000	$ 107,900	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 69,200	PROTECCION (ING +	1045147656	$ 276,800	$ 66,800	$ 0.00	$ 0.00	LICENICA REMUNERADA 19/03/2022	
43	CAÑON CABALLERO LUIS ANTONIO	79170740	OPERADOR BULLDOZER CAT D6N 26	$ 2,200,000														INC	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 880,000	$ 97,000	V	NUEVA EPS	1045147656	$ 55,800	PORVENIR	1045147656	$ 223,000	$ 55,800	$ 0.00	$ 0.00	INGRESO 14/03/2022	
44	CAÑON MARROQUIN LUIS EDUARDO	79186183	CONDUCTOR SENCILLA DINA 09 SKH-804	$ 1,700,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 680,000	$ 164,200	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 94,400	PROTECCION (ING +	1045147656	$ 377,400	$ 94,400	$ 0.00	$ 0.00		
45	CARDENAS CARDENAS DAVID	11447698	OFICIAL DE OBRA	$ 1,500,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 600,000	$ 144,400	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 83,000	COLPENSIONES	1045147656	$ 339,900	$ 83,000	$ 0.00	$ 0.00		
46	CARDENAS GUEPENDO MILLER	1032432251	OPERADOR RETRO EXC. KOBELCO SK 210 3	$ 3,000,000	X	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 1,200,000	$ 262,600	V	EPS SANITAS	1045147656	$ 150,900	PORVENIR	1045147656	$ 603,500	$ 150,900	$ 0.00	$ 0.00	TRASLADO ENTRE OBRAS DEL 02/03/2022 AL 22/03/2022	
47	CARDENAS URIAN JOHN JAIRO	1002365693	AYUDANTE FINISHER	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	LR	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	TR	TR	MHC	$ 520,000	$ 115,700	V	NUEVA EPS	1045147656	$ 68,800	PORVENIR	1045147656	$ 275,100	$ 68,300	$ 0.00	$ 0.00	LICENCIA REMUNERADA 19/03/2022 Y TRASLADO ENTRE OBRAS 30 Y 31/03/2022	
48	CARDOZO IBARRA CAMILO ANDRES	1106892051	INSPECTOR DE OBRA	$ 2,500,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	LR	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 1,000,000	$ 261,400	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 150,300	PROTECCION (ING +	1045147656	$ 600,900	$ 150,300	$ 0.00	$ 0.00		
49	CASTAÑEDA CARRILLO JOHN HUMBERTO	1075657078	CONDUCTOR 2.TROQ. DINA 82 SOA-802	$ 1,700,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 680,000	$ 90,200	V	EPS SURA	1045147656	$ 82,900	PORVENIR	1045147656	$ 331,500	$ 82,900	$ 0.00	$ 0.00		
50	CASTAÑEDA GOMEZ JOSE ARNULFO	80546238	AYUDANTE TOPOGRAFIA	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 92,900	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 53,400	COLFONDOS	1045147656	$ 213,400	$ 53,400	$ 0.00	$ 0.00		
51	CASTIBLANCO PEÑA SANDRA VIVIANA	1026292216	PROFESIONAL SOCIAL ACTAS DE VECINDAD	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 800,000	$ 139,200	V	EPS SANITAS	1045147656	$ 80,000	COLFONDOS	1045147656	$ 320,000	$ 80,000	$ 0.00	$ 0.00		
52	CASTILLO CASTILLO JORGE ENRIQUE	80544823	OFICIAL DE OBRA	$ 1,500,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 600,000	$ 145,900	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 83,900	PORVENIR	1045147656	$ 335,300	$ 83,900	$ 0.00	$ 0.00		
53	CASTILLO GOMEZ SERGIO ALEXANDER	1098610928	ESPECIALISTA DISEÑO GEOMETRICO	$ 5,500,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 2,200,000	$ 382,800	V	EPS SURA	1045147656	$ 220,000	PORVENIR	1045147656	$ 880,000	$ 220,000	$ 0.00	$ 0.00		
54	CASTRO ANGEL CARLOS ALBERTO	11439559	CONDUCTOR MULA DINA 47 SKH-023	$ 3,500,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	LR	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 1,400,000	$ 224,300	IV	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 212,700	COLPENSIONES	1045147656	$ 850,300	$ 211,000	$ 0.00	$ 0.00	LICENICA REMUNERADA 19/03/2022	
55	CEBALLOS RIVERA BRAYAN STIVEN	1193210340	AYUDANTE CONTROLADOR DE TRANSITO	$ 1,000,000	X	X	X	R																												MHC	$ 400,000	$ 30,700	V	NUEVA EPS	1045147656	$ 17,700	PORVENIR	1045147656	$ 70,500	$ 18,700	$ 0.00	$ 0.00	RETIRO 04/03/2022	
56	CERVERA ACOSTA JULIO CESAR	93355503	COORDINADOR DE TOPOGRAFIA	$ 4,200,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 1,680,000	$ 292,400	V	EPS SURA	1045147656	$ 168,000	PORVENIR	1045147656	$ 672,000	$ 168,000	$ 0.00	$ 0.00		
57	CESPEDES CHICA JOHN EDUARDO	1078367073	OPERADOR BULDOZER JD 850	$ 2,800,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	LNR	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 1,120,000	$ 216,200	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 124,300	PROTECCION (ING +	1045147656	$ 511,000	$ 124,300	$ 0.00	$ 0.00	LICENCIA NO REMUNERADA 19/03/2022	
58	CHAMORRO ATENCIA BERSELAIS	1149441062	OPERADOR CILINDRO CAT CS-533E 35	$ 1,600,000	X	INC	INC	INC	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 640,000	$ 153,400	V	NUEVA EPS	1045147656	$ 91,100	PORVENIR	1045147656	$ 364,000	$ 88,200	$ 0.00	$ 0.00	INCAPACIDAD AT DEL 02 AL 04/03/2022 OTROS TRAUMATISMOS DE LA CABEZA,	
59	CHAPARRO SANABRIA HENDERSON	13514289	CONDUCTOR 2.TROQ. INTER.114 SMP-554	$ 2,200,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	LR	D	D	D	D	D	D	D	D	D	X	X	X	MHC	$ 880,000	$ 117,100	IV	NUEVA EPS	1045147656	$ 140,800	PORVENIR	1045147656	$ 562,600	$ 128,300	$ 0.00	$ 0.00	LICENCIA REMUNIEDAD 19/03/2022	

60	CHAVES ANGARITA DIEGO ALEXANDER	1007341923	AYUDANTE CONTROLADOR DE TRANSITO	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	LNR	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 109,200	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 62,800	PORVENIR	1045147656	$ 256,600	$ 62,800	$ 0.00	$ 0.00	LICENCIA NO REMUNERADA 19/03/2022	
61	CHAVES GARCIA CARLOS ENRIQUE	1105785905	AYUDANTE ORDEN ASEO Y LIMPIEZA	$ 1,000,000	INC	INC	INC	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 86,500	V	NUEVA EPS	1045147656	$ 52,500	PORVENIR	1045147656	$ 209,600	$ 49,800	$ 0.00	$ 0.00	INCAPACIDAD DEL 01 AL 03/03/2022 DORSALGIA	
62	CHUNZA ROMERO JORGE ARMANDO	1073532958	CADENERO PRIMERO INSPECTOR	$ 1,800,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 720,000	$ 170,400	V	EPS SANITAS	1045147656	$ 97,900	PROTECCION (ING +	1045147656	$ 391,500	$ 97,900	$ 0.00	$ 0.00		
63	CIFUENTES CIFUENTES FREDY	11443231	OPERADOR RETRO EXC. VOLVO EC360 19	$ 3,600,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 1,440,000	$ 360,000	V	EPS SANITAS	1045147656	$ 206,900	COLPENSIONES	1045147656	$ 827,400	$ 206,900	$ 0.00	$ 0.00		
64	COCA ORTEGON YEISSON ARLEY	1007409735	AYUDANTE GENERAL DE OBRA	$ 1,000,000								INC	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 55,200	V	EPS SANITAS	1045147656	$ 31,800	PORVENIR	1045147656	$ 126,900	$ 31,800	$ 0.00	$ 0.00	INGRESO 08/03/2022	
65	CONEJO MARIN MELQUECIDE	79167728	OPERADOR DUMPER VOLVO 30 A25E	$ 2,300,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 920,000	$ 230,800	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 132,700	COLPENSIONES	1045147656	$ 530,600	$ 132,700	$ 0.00	$ 0.00		
66	CONTRERAS ALVAREZ JOSE ALFREDO	13392180	GUITARRERO	$ 1,600,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	LR	D	D	X	X	X	X	X	D	X	D	D	D	MHC	$ 640,000	$ 137,000	V	EPS SANITAS	1045147656	$ 89,800	COLPENSIONES	1045147656	$ 358,800	$ 85,300	$ 0.00	$ 0.00	LICENCIA REMUNIEDAD 19/03/2022	
67	CONTRERAS LONDOÑO GLENDY CORAYMA	1090489370	RESIDENTE CONTROL DE OBRA	$ 3,500,000														INC	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 1,400,000	$ 154,300	V	EPS SANITAS	1045147656	$ 88,700	PORVENIR	1045147656	$ 354,700	$ 88,700	$ 0.00	$ 0.00	INGRESO 14/03/2022	
68	CONTRERAS VANEGAS JEISSON NICOLAS	1007341906	AYUDANTE GENERAL DE OBRA	$ 1,000,000	X	X	INC	INC	INC	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 96,200	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 58,000	PORVENIR	1045147656	$ 231,800	$ 55,300	$ 0.00	$ 0.00	INCAPACIDAD DEL 03 AL 05/03/2022 CEFALEA	
69	CONTRERAS VANEGAS RAFAEL RICARDO	1075672646	AYUDANTE CONTROLADOR DE TRANSITO	$ 1,000,000	X	X	INC	INC	INC	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 103,000	V	EPS-S CONVIDA	1045147656	$ 61,900	PORVENIR	1045147656	$ 247,400	$ 59,200	$ 0.00	$ 0.00	INCAPACIDAD DEL 05 AL 05/03/2022 LUXACION DE DIENTE	
70	CORREA NARVAEZ SEBASTIAN ABELARDO	15028352	OPERADOR DUMPER BELL B30 47	$ 2,500,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 1,000,000	$ 250,000	V	SALUD TOTAL EPS	1045147656	$ 143,700	PORVENIR	1045147656	$ 574,600	$ 143,700	$ 0.00	$ 0.00		
71	CORTES CAMACHO VICTOR RAUL	9498998	AYUDANTE GENERAL DE OBRA	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 97,500	V	COMPENSAR EPS	1045147656	$ 56,100	PORVENIR	1045147656	$ 224,100	$ 56,100	$ 0.00	$ 0.00		
72	CUADROS ALMEIDA JHON JAIRO	91510564	OPERADOR CARGADOR HYUNDAI HL740 60	$ 2,200,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	LNR	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 880,000	$ 202,100	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 116,200	PORVENIR	1045147656	$ 475,800	$ 116,200	$ 0.00	$ 0.00	LICENCIA NO REMUNERADA 22/03/2022	
73	DELRIO CAÑON JULIAN ANDRES	13993947	TOPOGRAFO INSPECTOR	$ 3,600,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	LR	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 1,440,000	$ 355,000	V	EPS SANITAS	1045147656	$ 212,500	PORVENIR	1045147656	$ 849,900	$ 208,800	$ 0.00	$ 0.00	LICENCIA REMUNIEDAD 19/03/2022	
74	DIAZ CABALLERO CRISTIAN ANDRES	1024585186	AYUDANTE FINISHER	$ 1,200,000	X	X	X	X	X	D	X	TR	TR	TR	TR	X	D	X	X	X	X	X	LR	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 480,000	$ 111,800	V	EPS SURA	1045147656	$ 64,300	PORVENIR	1045147656	$ 257,000	$ 64,300	$ 0.00	$ 0.00	TRASLADO ENTRE OBRAS DEL 08 AL 11/03/2022 - LICENCIA NO REMUNERADA 19/03/2022	
75	DIAZ CALDAS MILTON GERARDO	80148758	OPERADOR MINICARGADOR JCB 73	$ 1,600,000	X	X	X	X	LR	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	LR	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 640,000	$ 141,100	V	SALUD TOTAL EPS	1045147656	$ 84,200	PROTECCION (ING +	1045147656	$ 336,500	$ 83,300	$ 0.00	$ 0.00	LICENCIA REMUNERADA 05/03/2022-LICENCIA NO REMUNERADA 19/03/2022	
76	DIAZ PALACIO JORGE LUIS	1095818839	CADENERO PRIMERO INSPECTOR	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	D	LR	LR	LR	LR	LR	LR	LR	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 800,000	$ 152,700	V	SALUD TOTAL EPS	1045147656	$ 107,700	PORVENIR	1045147656	$ 430,400	$ 106,500	$ 0.00	$ 0.00	LICENCIA REMUNERADA 07 AL 13/03/2022	
77	ESPITIA RINCON RONALD ANCIZAR	80544530	CADENERO SEGUNDO	$ 1,200,000	X	INC	INC	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 480,000	$ 99,100	V	EPS-S CONVIDA	1045147656	$ 58,300	PROTECCION (ING +	1045147656	$ 242,700	$ 56,900	$ 0.00	$ 0.00	INCAPACIDAD DEL 02 AL 3/03/2022 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE	
78	FAJARDO CASTELLANOS CRISTIAN DAVID	1077085173	CONDUCTOR MICROBUS 5 TSM -434	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 520,000	$ 76,000	IV	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 69,900	PORVENIR	1045147656	$ 279,600	$ 69,900	$ 0.00	$ 0.00		
79	FIQUITIVA DELGADO CRISTIAN CAMILO	1070969001	AYUDANTE FINISHER	$ 1,200,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 480,000	$ 106,100	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 61,000	PORVENIR	1045147656	$ 243,800	$ 61,000	$ 0.00	$ 0.00		
80	FLOREZ SALGADO MICHELL DIRLAY	1075689674	ASISTENTE SOCIAL	$ 1,500,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 600,000	$ 104,400	V	NUEVA EPS	1045147656	$ 60,000	PORVENIR	1045147656	$ 240,000	$ 60,000	$ 0.00	$ 0.00		
81	FORERO HERNANDEZ JUNIOR FABIAN	1003671793	AYUDANTE CONTROLADOR DE TRANSITO	$ 1,000,000								INC	X	X	X	X	D	X	X	R																MHC	$ 400,000	$ 29,500	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 17,000	PORVENIR	1045147656	$ 67,700	$ 17,500	$ 0.00	$ 0.00	INGRESO 08/03/2022 - RETIRO 16/03/2022	
82	FORERO MENDEZ BRAYAN CAMILO	1007380183	AYUDANTE CONTROLADOR DE TRANSITO	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 112,200	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 64,500	PORVENIR	1045147656	$ 257,900	$ 64,500	$ 0.00	$ 0.00		
83	GALINDO CASTILLO SERGIO ANDRES	1075673962	AYUDANTE CONTROLADOR DE TRANSITO	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 105,500	V	NUEVA EPS	1045147656	$ 60,600	PORVENIR	1045147656	$ 246,500	$ 60,600	$ 0.00	$ 0.00		
84	GALVEZ VERGARA YOMARA	1054988888	RESIDENTE TECNICO PREDIAL	$ 3,500,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	LR	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 1,400,000	$ 235,500	V	EPS SURA	1045147656	$ 140,100	PORVENIR	1045147656	$ 560,100	$ 140,100	$ 0.00	$ 0.00	LICENCIA REMUNIEDAD 19/03/2022	
85	GARCIA CRISTANCHO CARLOS ADRIAN	1075662151	AYUDANTE GENERAL DE OBRA	$ 1,000,000	R																															MHC	$ 400,000	$ 10,700	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 6,200	PORVENIR	1045147656	$ 24,500	$ 11,300	$ 0.00	$ 0.00	RETIRO 01/03/2022	
86	GARCIA MARTINEZ ARMANDO	11520902	AYUDANTE GENERAL DE OBRA	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 59,100	V	COMPENSAR EPS	1045147656	$ 42,400	COLPENSIONES	1045147656	$ 169,300	$ 42,000	$ 0.00	$ 0.00		
87	GARZON ALFONSO WILSON RAMIRO	80378246	OPERADOR AUTOHORMIGONERO DIECI 11	$ 2,100,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	TR													MHC	$ 840,000	$ 216,400	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 124,400	COLPENSIONES	1045147656	$ 497,400	$ 124,400	$ 0.00	$ 0.00	TRASLADO ENTRE OBRAS DESDE EL 19/03/2022	
88	GARZON SUAREZ EUCLIDES	2989077	OPERADOR CILINDRO DYNAPACK 250 23	$ 1,600,000																INC	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 640,000	$ 70,600	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 40,600	PORVENIR	1045147656	$ 162,200	$ 40,600	$ 0.00	$ 0.00	INGRESO 17/03/2022	
89	GIL CHIMA EDER ANTONIO	1069984670	AYUDANTE CONTROLADOR DE TRANSITO	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 109,500	V	ASOCIACION MUTUAL SER	1045147656	$ 63,000	PORVENIR	1045147656	$ 251,700	$ 63,000	$ 0.00	$ 0.00		
90	GOMEZ DELGADO JOHN ANGEL	3103557	AYUDANTE CONTROLADOR DE TRANSITO	$ 1,000,000														INC	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 44,900	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 25,800	PORVENIR	1045147656	$ 103,000	$ 25,800	$ 0.00	$ 0.00	INGRESO 14/03/2022	
91	GOMEZ HENAO JHON GEIMAR	4414259	OPERADOR BULLDOZER CAT D6N 24	$ 3,200,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 1,280,000	$ 320,000	V	SALUD TOTAL EPS	1045147656	$ 183,900	PORVENIR	1045147656	$ 735,500	$ 183,900	$ 0.00	$ 0.00		
92	GOMEZ MORA EDWIN EDUARDO	80018032	OPERADOR FINISHER DYNAPAC SD2500C N. 8	$ 3,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 1,200,000	$ 268,900	V	NUEVA EPS	1045147656	$ 154,500	COLPENSIONES	1045147656	$ 618,000	$ 154,500	$ 0.00	$ 0.00		
93	GOMEZ PELAYO SEBASTIAN ORLANDO	1075687690	AYUDANTE GENERAL DE OBRA	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 96,400	V	SALUD TOTAL EPS	1045147656	$ 55,400	PORVENIR	1045147656	$ 221,600	$ 55,400	$ 0.00	$ 0.00		
94	GOMEZ PINILLA WILSON GIOVANNY	1068952762	AYUDANTE GENERAL DE OBRA	$ 1,000,000														INC	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 39,500	V	EPS SURA	1045147656	$ 22,700	PORVENIR	1045147656	$ 90,700	$ 20,500	$ 0.00	$ 0.00	INGRESO 14/03/2022	
95	GONZALEZ AGUILAR JAIME MAXIMINO	91110198	RESIDENTE AMBIENTAL	$ 5,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 2,000,000	$ 348,000	V	EPS SANITAS	1045147656	$ 200,000	COLPENSIONES	1045147656	$ 800,000	$ 200,000	$ 0.00	$ 0.00		
96	GONZALEZ JIMENEZ SERGIO FABIAN	1007421156	AYUDANTE GENERAL DE OBRA	$ 1,000,000								INC	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	LNR	X	X	MHC	$ 400,000	$ 52,900	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 30,400	PORVENIR	1045147656	$ 125,700	$ 30,400	$ 0.00	$ 0.00	INGRESO 08/03/2022 - LICENCIA 29/03/2022	

97	GONZALEZ VARGAS JOSE	1104700791	AUXILIAR LABORATORIO	$ 1,600,000	X	INC	INC	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 640,000	$ 145,100	V	COMPENSAR EPS	1045147656	$ 84,900	PORVENIR	1045147656	$ 339,100	$ 83,400	$ 0.00	$ 0.00	INCAPACIDAD AT DEL 02 AL 03/03/2022 HERIDA DE LA CABEZA	
98	GUAQUETA VEGA ERIK ARVEY	80027557	OPERADOR RETRO EXC. VOLVO EC360 13	$ 2,200,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	INC	INC	INC	INC	INC	INC	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 880,000	$ 187,800	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 118,300	PROTECCION (ING +	1045147656	$ 473,000	$ 107,900	$ 0.00	$ 0.00	INCAPACIDAD DEL 10 AL 15/03/2022 COVID VIRUS AISLAMIENTO	
99	GUAYACAN LOPEZ HERNEY	3251310	OPERADOR CILINDRO CAT PS-180 22	$ 1,900,000	X	X	X	X	X	D	X	X	TR	TR	TR	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 760,000	$ 183,400	V	NUEVA EPS	1045147656	$ 105,400	COLPENSIONES	1045147656	$ 421,500	$ 105,400	$ 0.00	$ 0.00	TRASLADO ENTRE OBRAS DEL 09 AL 11/03/2022	
100	GUERRERO RODRIGUEZ JAIRO	4144268	OPERADOR RETRO EXC. VOLVO EC460 12	$ 4,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 1,600,000	$ 384,600	V	ALIANSALUD	1045147656	$ 221,100	COLPENSIONES	1045147656	$ 884,100	$ 221,100	$ 0.00	$ 0.00		
101	GUEVARA OLARTE JAIRO ANDRES	1070611037	AYUDANTE GENERAL DE OBRA	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	INA	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 100,300	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 57,700	PORVENIR	1045147656	$ 239,300	$ 57,700	$ 0.00	$ 0.00	INASISTENCIA 19/03/2022	
102	GUTIERREZ CAMELO ERIKA LUCIA	20362761	ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA	$ 13,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 5,200,000	$ 47,600	V	COMPENSAR EPS	1045147656	$ 1,137,500	COLPENSIONES	1045147656	$ 1,456,000	$ 364,000	$ 182,000	$ 273,000		
103	GUTIERREZ DELGADO JONATHAN ANDRES	80902816	AYUDANTE CONTROLADOR DE TRANSITO	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	LR	D	D	X	X	X	X	R						MHC	$ 400,000	$ 104,700	V	NUEVA EPS	1045147656	$ 61,700	PROTECCION (ING +	1045147656	$ 246,500	$ 72,100	$ 0.00	$ 0.00	LICENCIA REMUNIEDAD 19/03/2022 - RETIRO 26/03/2022	
104	GUTIERREZ FAJARDO YESID ARBEY	80775218	ASISTENTE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS OBRA	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 800,000	$ 139,200	V	COMPENSAR EPS	1045147656	$ 80,000	PROTECCION (ING +	1045147656	$ 320,000	$ 80,000	$ 0.00	$ 0.00		
105	GUTIERREZ MAHECHA DAVINSON	1077972031	OPERADOR LANZADORA DE CONCRETO	$ 2,100,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	D	D	D	D	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 840,000	$ 198,000	V	EPS SANITAS	1045147656	$ 122,000	PORVENIR	1045147656	$ 487,800	$ 122,200	$ 0.00	$ 0.00		
106	HERNANDEZ ARGOTE MONICA TATIANA	1022404846	ARQUEOLOGO	$ 3,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 1,200,000	$ 215,400	V	COMPENSAR EPS	1045147656	$ 123,800	COLFONDOS	1045147656	$ 495,000	$ 123,800	$ 0.00	$ 0.00		
107	HERNANDEZ GUZMAN GIOVANNI ANDRES	1069432781	CADENERO SEGUNDO	$ 1,400,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 560,000	$ 163,300	V	SALUD TOTAL EPS	1045147656	$ 93,800	PORVENIR	1045147656	$ 382,000	$ 93,800	$ 0.00	$ 0.00		
108	HERNANDEZ MUÑOZ JOHN VLADIMIR	1102358201	OPERADOR GRUA DIECI 2 (38.16)	$ 3,100,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 1,240,000	$ 266,200	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 153,000	COLPENSIONES	1045147656	$ 611,800	$ 153,000	$ 0.00	$ 0.00		
109	HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DAVID	1075681689	AYUDANTE TOPOGRAFIA	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 77,300	V	COMPENSAR EPS	1045147656	$ 44,500	PORVENIR	1045147656	$ 186,600	$ 44,500	$ 0.00	$ 0.00		
110	HERNANDEZ TOVIO MANUEL DAVID	1070018525	PROFESIONAL TECNICO ACTAS DE VECINDAD	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	LR	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 800,000	$ 134,600	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 80,100	PORVENIR	1045147656	$ 320,100	$ 80,100	$ 0.00	$ 0.00	LICENCIA REMUNERADA 25/03/2022	
111	HERNANDEZ VERGARA HERNANDO	93456965	OPERADOR CILINDRO CAT CS-533E 35	$ 1,600,000														INC	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 640,000	$ 70,600	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 40,600	COLPENSIONES	1045147656	$ 162,200	$ 40,600	$ 0.00	$ 0.00	INGRESO 14/03/2022	
112	HERRERA TOVAR JEFFERSON ALEJANDRO	1030536614	RESIDENTE AVALUADOR PREDIAL	$ 5,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 2,000,000	$ 348,000	V	EPS SURA	1045147656	$ 200,000	PROTECCION (ING +	1045147656	$ 800,000	$ 200,000	$ 0.00	$ 0.00		
113	JARA USPIAN WILLIAM	16889956	GUITARRERO	$ 1,600,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	D	D	D	MHC	$ 640,000	$ 137,500	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 85,300	PORVENIR	1045147656	$ 340,600	$ 83,400	$ 0.00	$ 0.00		
114	JIMENEZ CARDENAS FREDY GIOVANNY	80547486	CONDUCTOR CAMIONETA NISSAN RZG-126	$ 1,600,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	LNR	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 640,000	$ 123,200	IV	COMPENSAR EPS	1045147656	$ 113,300	PORVENIR	1045147656	$ 461,000	$ 113,300	$ 0.00	$ 0.00	LICENCIA NO REMUNERADA 19/03/2022	
115	JIMENEZ MENDEZ JOSE LUIS	80135602	CONDUCTOR 2.TROQ. DINA 87 SKH-570	$ 1,700,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 680,000	$ 157,700	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 90,600	PROTECCION (ING +	1045147656	$ 362,400	$ 90,600	$ 0.00	$ 0.00		
116	JIMENEZ ORTEGA ARCENIO GILBERTO	1069478421	OPERADOR DUMPER VOLVO 40 A30E	$ 2,300,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 920,000	$ 225,500	V	EPS SANITAS	1045147656	$ 129,600	PROTECCION (ING +	1045147656	$ 518,300	$ 129,600	$ 0.00	$ 0.00		
117	LATORRE AMORTEGUI ANA MARIA	52156314	AUXILIAR LOGISTICO DE OBRA	$ 3,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 1,200,000	$ 15,700	I	EPS SANITAS	1045147656	$ 120,000	COLPENSIONES	1045147656	$ 480,000	$ 120,000	$ 0.00	$ 0.00		
118	MANJARREZ TRIANA DIEGO ALEJANDRO	1007534795	TORNILLERO EXTENDEDORA ASFALTO	$ 1,600,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	LR	D	D	X	X	X	X	X	D	X	D	D	D	MHC	$ 640,000	$ 136,900	V	COMPENSAR EPS	1045147656	$ 89,700	PORVENIR	1045147656	$ 358,100	$ 85,200	$ 0.00	$ 0.00	LICENCIA REMUNIEDAD 19/03/2022	
119	MARQUEZ SUAREZ JAIME ALFONSO	74321724	INSPECTOR DE OBRA	$ 3,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 1,200,000	$ 311,300	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 178,900	COLFONDOS	1045147656	$ 715,500	$ 178,900	$ 0.00	$ 0.00		
120	MARTINEZ LEON ANGEL EDISON	1016054283	ANALISTA TECNICO DE TOPOGRAFIA	$ 2,600,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	MHC	$ 1,040,000	$ 54,300	V	EPS SURA	1045147656	$ 79,800	PROTECCION (ING +	1045147656	$ 319,000	$ 31,200	$ 0.00	$ 0.00	INCAPACIDAD DEL 10 AL 25 FRACTURA DEL HUESO ESCAFOIDES [NAVICULAR] DE	
121	MEDINA RODRIGUEZ ISRAEL	3057201	AYUDANTE CONTROLADOR DE TRANSITO	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	LR	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 98,200	V	EPS-S CONVIDA	1045147656	$ 58,900	COLFONDOS	1045147656	$ 235,000	$ 57,900	$ 0.00	$ 0.00	LICENCIA REMUNIEDAD 19/03/2022	
122	MEDINA MIGUEL ANGEL	1005543158	OPERADOR CILINDRO DYNAPACK 2200 31	$ 1,900,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	LR	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 760,000	$ 185,700	V	SALUD TOTAL EPS	1045147656	$ 110,500	PORVENIR	1045147656	$ 441,600	$ 109,400	$ 0.00	$ 0.00	LICENCIA REMUNIEDAD 19/03/2022	
123	MEDRANO BELTRAN WILLIAM CRISTIAN	3837933	RESIDENTE TECNICO PREDIAL	$ 4,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 1,600,000	$ 278,400	V	EPS SANITAS	1045147656	$ 160,000	COLPENSIONES	1045147656	$ 640,000	$ 160,000	$ 0.00	$ 0.00		
124	MELO MORALES PEDRO MIGUEL	4188849	OPERADOR FINISHER VOGELE 1803 1	$ 2,500,000	X	X	X	X	X	D	TR																									MHC	$ 1,000,000	$ 185,100	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 106,400	PORVENIR	1045147656	$ 425,500	$ 106,400	$ 0.00	$ 0.00	TRASLADO ENTRE OBRAS 07/03/2022	
125	MENDOZA CARDENAS AURA LUCERO	52839239	INSPECTOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	$ 3,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 1,200,000	$ 344,100	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 197,800	COLPENSIONES	1045147656	$ 791,000	$ 197,800	$ 0.00	$ 0.00		
126	MEZA MARQUEZ MARIO LUIS	1031126868	OPERADOR MINIEXCAVADORA KOBELCO 33	$ 1,900,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	MHC	$ 760,000	$ 165,200	V	COMPENSAR EPS	1045147656	$ 95,000	PORVENIR	1045147656	$ 379,700	$ 95,000	$ 0.00	$ 0.00	TRASLADO ENTRE OBRAS DEL 02/03/2022 AL 31/03/2022	
127	MOLINA NIÑO NESTOR JULIAN	1069100660	AYUDANTE TOPOGRAFIA	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	INC	INC	INC	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 77,000	V	COMPENSAR EPS	1045147656	$ 47,000	PORVENIR	1045147656	$ 187,600	$ 44,300	$ 0.00	$ 0.00	INCAPACIDAD DEL 10 AL 12/03/2022 TRASTORNO DE LOS TEJIDOS BLANDOS, NO	
128	MONTES QUINTERO GONZALO	11382319	OPERADOR MOTO CAT 14G 33	$ 3,800,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X		D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 1,520,000	$ 378,900	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 217,800	COLPENSIONES	1045147656	$ 870,900	$ 217,800	$ 0.00	$ 0.00		
129	MORA MORA WILLIAM JOHAN	1070958972	OPERADOR TRIT./CLAS. ASTEC JCI GT165	$ 2,300,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 920,000	$ 140,400	IV	NUEVA EPS	1045147656	$ 129,100	PORVENIR	1045147656	$ 516,400	$ 129,100	$ 0.00	$ 0.00		
130	MORALES VARGAS YESID	11444420	OPERADOR CARGADOR KAWASAKI 90Z6 N.62	$ 2,900,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 1,160,000	$ 283,300	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 162,800	COLPENSIONES	1045147656	$ 651,100	$ 162,800	$ 0.00	$ 0.00		
131	MORANTES ALVARADO GUSTAVO	1070706537	OPERADOR FRESADORA CAT PR 450C 32	$ 2,700,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	LR	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	TR	TR	MHC	$ 1,080,000	$ 250,400	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 150,200	PORVENIR	1045147656	$ 600,700	$ 147,500	$ 0.00	$ 0.00	LICENCIA REMUNIEDAD 19/03/2022	
132	MORENO RICO LUIS ALFONSO	80279301	MAESTRO DE OBRA	$ 1,800,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 720,000	$ 173,700	V	NUEVA EPS	1045147656	$ 99,900	PROTECCION (ING +	1045147656	$ 399,300	$ 99,900	$ 0.00	$ 0.00		
133	MUÑOZ BLANCO JOHN ALEXANDER	80545156	AYUDANTE ORDEN ASEO Y LIMPIEZA	$ 1,000,000	INC	INC	INC	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 82,400	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 50,100	COLFONDOS	1045147656	$ 200,100	$ 47,400	$ 0.00	$ 0.00	INCAPACIDAD DEL 01 AL 03/03/2022 NAUSEA Y VOMITO	
134	MUÑOZ BOLAÑOS CRISTIAN CAMILO	1070923126	AYUDANTE GENERAL DE OBRA	$ 1,000,000								INC	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 58,800	V	EPS-S CONVIDA	1045147656	$ 33,800	COLPENSIONES	1045147656	$ 135,200	$ 33,800	$ 0.00	$ 0.00	INGRESO 08/03/2022	
135	MUÑOZ HENDE HECTOR JAVIER	80256668	AYUDANTE DE MAQUINARIA	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 87,300	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 50,200	COLFONDOS	1045147656	$ 200,700	$ 50,200	$ 0.00	$ 0.00		
136	MUÑOZ FABIOLA	52615785	AYUDANTE CONTROLADOR DE TRANSITO	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	LR	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 110,800	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 65,800	PORVENIR	1045147656	$ 262,900	$ 65,100	$ 0.00	$ 0.00	LICENCIA REMUNIEDAD 19/03/2022	
137	MURCIA PARRA ANDRES FELIPE	1000180330	AYUDANTE TOPOGRAFIA	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	LR	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 73,500	V	EPS SURA	1045147656	$ 43,700	PROTECCION (ING +	1045147656	$ 174,400	$ 43,700	$ 0.00	$ 0.00	LICENCIA REMUNERADA	
138	NOBLES GONZALEZ WILDER	13567141	TORNILLERO EXTENDEDORA ASFALTO	$ 1,600,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	LR	D	D	X	X	X	X	X	D	X	D	D	D	MHC	$ 640,000	$ 138,000	V	SALUD TOTAL EPS	1045147656	$ 90,000	PORVENIR	1045147656	$ 359,300	$ 85,800	$ 0.00	$ 0.00	LICENCIA REMUNIEDAD 19/03/2022	

139	NOCUA CASTIBLANCO IVAN DANILO	1074187060	AYUDANTE FINISHER	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 88,800	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 51,100	COLFONDOS	1045147656	$ 204,100	$ 51,100	$ 0.00	$ 0.00	
140	NOCUA QUIROGA NELSON IGNACIO	1076647515	CONDUCTOR MICROBUS 3 TSM -279	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 520,000	$ 97,600	V	COMPENSAR EPS	1045147656	$ 89,800	PORVENIR	1045147656	$ 358,900	$ 89,800	$ 0.00	$ 0.00	
141	NOVA SANCHEZ JULLY ALEXANDRA	1010247027	ASISTENTE SOCIAL	$ 1,500,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 600,000	$ 104,400	V	NUEVA EPS	1045147656	$ 60,000	PORVENIR	1045147656	$ 240,000	$ 60,000	$ 0.00	$ 0.00	
142	ORTEGON PEÑA GIOVANNI ANDRES	16075376	GUITARRERO	$ 1,600,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	LR	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 640,000	$ 158,300	V	NUEVA EPS	1045147656	$ 94,300	PROTECCION (ING +	1045147656	$ 376,700	$ 93,200	$ 0.00	$ 0.00	LICENCIA REMUNIEDAD 19/03/2022
143	ORTIZ ORTIZ LIBARDO ANGEL	11411101	AYUDANTE CONTROLADOR DE TRANSITO	$ 1,000,000	RET																															MHC	$ 400,000	$ 25,600	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 14,700	PORVENIR	1045147656	$ 58,700	$ 24,800	$ 0.00	$ 0.00	
144	ORTIZ RODRIGUEZ KEVIN MATEO	1076736089	AYUDANTE CONTROLADOR DE TRANSITO	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 108,100	V	EPS SANITAS	1045147656	$ 62,100	PORVENIR	1045147656	$ 248,400	$ 62,100	$ 0.00	$ 0.00	
145	OVIEDO OROZCO SERGIO ANDRES	1192897853	OPERADOR IRRIGADOR MANUAL	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	LR	D	D	X	X	X	X	LR	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 85,700	V	COMPENSAR EPS	1045147656	$ 51,400	PORVENIR	1045147656	$ 205,200	$ 50,700	$ 0.00	$ 0.00	LICENCIA REMUNIEDAD 19/03/2022
146	PAEREZ QUINTANA JULIAN ANDRES	1106741828	OPERADOR MINICARGADOR CAT. 42	$ 1,900,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	INC	INC	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	_NI	X	MHC	$ 760,000	$ 170,600	V	NUEVA EPS	1045147656	$ 99,800	PORVENIR	1045147656	$ 410,500	$ 98,100	$ 0.00	$ 0.00	INCAPACIDAD DEL 16 AL 17/03/2022 LUMBAGO NO ESPECIFICADO - LICENCIA NO
147	PAEZ PAEZ LUIS FRANCISCO	14242290	INGENIERO DIRECTOR DE PROYECTO	$ 20,500,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 8,200,000	$ 998,800	V	EPS SANITAS	1045147656	$ 1,793,800	COLPENSIONES	1045147656	$ 2,296,000	$ 574,000	$ 287,000	$ 430,500	
148	PALMAR VARGAS LUIS ALEJANDRO	3184637	OPERADOR DUMPER BELL B30 48	$ 2,600,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 1,040,000	$ 235,900	V	NUEVA EPS	1045147656	$ 135,600	COLPENSIONES	1045147656	$ 542,100	$ 135,600	$ 0.00	$ 0.00	
149	PALOMINO PEREZ ZAIRA CAROLINA	65829520	ASISTENTE TALENTO HUMANO OBRA	$ 2,500,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	R														MHC	$ 1,000,000	$ 7,900	I	EPS SANITAS	1045147656	$ 60,000	PORVENIR	1045147656	$ 240,000	$ 94,600	$ 0.00	$ 0.00	RETIRO 18/03/2022
150	PANTOJA YAMA JHULIANA KATERINE	1072664523	RESIDENTE CONTROL DE OBRA	$ 4,500,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	R													MHC	$ 1,800,000	$ 208,800	V	COMPENSAR EPS	1045147656	$ 120,000	PORVENIR	1045147656	$ 480,000	$ 188,800	$ 0.00	$ 0.00	RETIRO 19/03/2022
151	PARRA JAIMES BYRON ALFONSO	1102382293	AUXILIAR DE INGENIERIA	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	INC	INC	INC	X	D	LR	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 66,000	V	SALUD TOTAL EPS	1045147656	$ 42,000	PORVENIR	1045147656	$ 167,600	$ 39,300	$ 0.00	$ 0.00	INCAPACIDAD DEL 09 AL 11/03/2022 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE
152	PATIÑO MARULANDA JESUS ANTONIO	2988498	OPERADOR CILINDRO DYNAPACK CC424 HF 34	$ 2,300,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 920,000	$ 213,800	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 122,900	COLPENSIONES	1045147656	$ 491,500	$ 122,900	$ 0.00	$ 0.00	
153	PEDRAZA PEÑA EDGAR ALONSO	1075662006	AYUDANTE CONTROLADOR DE TRANSITO	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 88,700	V	NUEVA EPS	1045147656	$ 51,000	PROTECCION (ING +	1045147656	$ 203,900	$ 51,000	$ 0.00	$ 0.00	
154	PENAGOS ORDUY YSAID	80541596	CONDUCTOR 2.TROQ. DINA 86 ZKG-021	$ 1,700,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 680,000	$ 158,300	V	COMPENSAR EPS	1045147656	$ 91,000	COLPENSIONES	1045147656	$ 363,800	$ 91,000	$ 0.00	$ 0.00	
155	PEÑA SALAZAR MARIO ANDRES	1007788654	AYUDANTE CONTROLADOR DE TRANSITO	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	INC	INC	INC	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 89,000	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 53,900	PORVENIR	1045147656	$ 230,400	$ 51,200	$ 0.00	$ 0.00	INCAPACIDAD DEL 23 AL 25/03/2022 MORDEDURA O ATAQUE DE PERRO: CALLES Y
156	PEÑA VILLAMIL MARIA DEL PILAR	1075670604	INSPECTOR AMBIENTAL	$ 2,500,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 1,000,000	$ 107,200	V	COMPENSAR EPS	1045147656	$ 88,700	COLPENSIONES	1045147656	$ 354,700	$ 61,600	$ 0.00	$ 0.00	
157	PEREZ CENTENO DIONEL	1104133338	AYUDANTE TOPOGRAFIA	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 103,900	V	EPS-S COOSALUD	1045147656	$ 59,700	PORVENIR	1045147656	$ 238,700	$ 59,700	$ 0.00	$ 0.00	
158	PEREZ CONTRERAS HORACIO	91489996	OPERADOR FRESADORA CAT PR-450C 33	$ 2,600,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 1,040,000	$ 258,100	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 148,400	PORVENIR	1045147656	$ 593,300	$ 148,400	$ 0.00	$ 0.00	
159	PEREZ RAMIREZ JOSUE	1064119445	AYUDANTE ORDEN ASEO Y LIMPIEZA	$ 1,000,000		INC	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 74,600	V	NUEVA EPS	1045147656	$ 42,900	PORVENIR	1045147656	$ 171,400	$ 42,900	$ 0.00	$ 0.00	INGRESO 02/03/2022
160	PINILLA PEÑA EDUAR YAMITH	1075687408	AYUDANTE ORDEN ASEO Y LIMPIEZA	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	INA	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 76,200	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 43,800	PORVENIR	1045147656	$ 183,300	$ 43,800	$ 0.00	$ 0.00	INASISTENCIA 22/03/2022
161	PINZON CARDENAS CARLOS HERNANDO	1073380781	AYUDANTE CONTROLADOR DE TRANSITO	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 109,500	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 62,900	PORVENIR	1045147656	$ 251,600	$ 62,900	$ 0.00	$ 0.00	
162	PIÑERES SILVA EDUARDO	93456669	OPERADOR CILINDRO DYNAPACK 3500 29	$ 2,300,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 920,000	$ 241,200	V	NUEVA EPS	1045147656	$ 138,600	PORVENIR	1045147656	$ 554,300	$ 138,600	$ 0.00	$ 0.00	
163	PISCO BOLAÑOS BRANDON ALEXANDER	1023919720	ARQUEOLOGO	$ 3,500,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 1,400,000	$ 246,200	V	EPS SURA	1045147656	$ 141,500	PORVENIR	1045147656	$ 565,900	$ 141,500	$ 0.00	$ 0.00	
164	PLAZAS HERNANDEZ ANGIE MARCELA	1075684845	AYUDANTE SERVICIOS GENERALES OBRA	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	LR	LR	LR	X	X	D	X	X	X	X	LR	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 4,600	I	NUEVA EMPRESA	1045147656	$ 40,100	PORVENIR	1045147656	$ 160,100	$ 40,100	$ 0.00	$ 0.00	LICENCIA REMUNERADA 08 AL 10/03/2022 Y 18/03/2022
165	PRIETO CRUZ DIANA CAROLINA	1003838274	AUXILIAR DE DIGITACION	$ 1,200,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 480,000	$ 84,400	V	EPS SANITAS	1045147656	$ 48,500	PROTECCION (ING +	1045147656	$ 194,000	$ 48,500	$ 0.00	$ 0.00	
166	QUINTERO CARDENAS YARI EMMANUEL	1071329990	CONDUCTOR 2.TROQ. DINA 87 SKH-570	$ 1,700,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 680,000	$ 142,400	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 81,900	PORVENIR	1045147656	$ 327,300	$ 81,900	$ 0.00	$ 0.00	
167	QUINTERO CARDONA EDILSON DE JESUS	1128625855	CADENERO PRIMERO INSPECTOR	$ 1,800,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	_NI	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 720,000	$ 160,300	V	NUEVA EPS	1045147656	$ 92,100	PORVENIR	1045147656	$ 376,700	$ 92,100	$ 0.00	$ 0.00	LICENCIA NO REMUNERADA 22/03/2022
168	RAMIREZ GUTIERREZ JUAN FELIPE	1045248031	OPERADOR AUTOHORMIGONERO PICCINI 17	$ 2,100,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 840,000	$ 197,400	V	NUEVA EPS	1045147656	$ 113,500	COLFONDOS	1045147656	$ 453,700	$ 113,500	$ 0.00	$ 0.00	
169	RAMIREZ LOPERA ANA CATALINA	53906302	PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL	$ 5,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 2,000,000	$ 348,000	V	COMPENSAR EPS	1045147656	$ 200,000	COLPENSIONES	1045147656	$ 800,000	$ 200,000	$ 0.00	$ 0.00	
170	RAMIREZ MEDINA EDGAR ORLANDO	79006194	CONDUCTOR CAMIONETA NISSAN SPR-257	$ 1,700,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	INC	INC	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 680,000	$ 81,800	IV	NUEVA EPS	1045147656	$ 76,800	PORVENIR	1045147656	$ 306,800	$ 75,200	$ 0.00	$ 0.00	INCAPACIDAD DEL 14 Y 15/03/2022 SINDROME DEL COLON IRRITABLE CON
171	RAMIREZ OCHOA CARLOS FERNANDO	1075664068	CADENERO PRIMERO INSPECTOR	$ 1,500,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 600,000	$ 199,300	V	EPS SURA	1045147656	$ 114,600	PORVENIR	1045147656	$ 458,100	$ 114,600	$ 0.00	$ 0.00	
172	RAMIREZ JOHN FREDY	1072744032	CONDUCTOR 2.TROQ. DINA 84 SOA-804	$ 1,700,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	LR	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 680,000	$ 203,700	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 120,400	PORVENIR	1045147656	$ 481,200	$ 119,400	$ 0.00	$ 0.00	LICENCIA REMUNIEDAD 19/03/2022
173	RESTREPO CALDERA EDILBERTO DEJESUS	17856250	OPERADOR BULLDOZER KOMATSU D155A	$ 3,000,000	X	X	X	X	X	D	X	TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR	X	D	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 1,200,000	$ 281,700	V	EPS-S CAJACOPI	1045147656	$ 161,900	COLPENSIONES	1045147656	$ 647,500	$ 161,900	$ 0.00	$ 0.00	TRASLADO ENTRE OBRAS DEL 08 AL 14/03/2022 -
174	RHENALS CASTELLANO REMBERTO ENRIQUE	78714569	AYUDANTE CONTROLADOR DE TRANSITO	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	INC	INC	INC	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 103,500	V	SALUD TOTAL EPS	1045147656	$ 62,200	PROTECCION (ING +	1045147656	$ 248,600	$ 59,500	$ 0.00	$ 0.00	INCAPACIDAD DEL 10 AL 12/03/2022 TRASTORNO ATROFICO DE LA PIEL, NO
175	RIAÑOS GUZMAN FREDY GIOVANI	80758274	AYUDANTE TOPOGRAFIA	$ 1,000,000								INC	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 55,600	V	SALUD TOTAL EPS	1045147656	$ 32,000	PORVENIR	1045147656	$ 127,700	$ 32,000	$ 0.00	$ 0.00	INGRESO 08/03/2022
176	RINCON BACHILLER JHON ALEXANDER	1074187616	OPERADOR FRESADORA WIRTGEN W1000 FK	$ 2,500,000	X	X	X	X	X	D	TR																									MHC	$ 1,000,000	$ 181,300	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 104,200	PORVENIR	1045147656	$ 416,700	$ 104,200	$ 0.00	$ 0.00	TRASLADO ENTRE OBRAS 07/03/2022
177	RINCON BACHILLER JUAN CARLOS	1070951879	OPERADOR RETRO EXC. KOBELCO SK 350 5	$ 3,400,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	INC	INC	INC	INC	INC	INC	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 1,360,000	$ 284,500	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 180,900	COLFONDOS	1045147656	$ 723,600	$ 163,500	$ 0.00	$ 0.00	INCAPACIDAD DEL 17 AL 22/03/2022 ESTERILIZACION
178	RINCON BARBOSA RAUL	79635906	OPERADOR RETRO EXC. KOBELCO SK 350 4	$ 3,800,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 1,520,000	$ 381,300	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 219,200	COLPENSIONES	1045147656	$ 876,600	$ 219,200	$ 0.00	$ 0.00	
179	RINCON ROMERO HENRY	1075684646	AYUDANTE TOPOGRAFIA	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	INA	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 77,300	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 44,500	COLFONDOS	1045147656	$ 185,800	$ 44,500	$ 0.00	$ 0.00	INASISTENCIA 19/03/2022
180	RIOS MENDEZ FEIBER SAIT	1069468419	OPERADOR DUMPER VOLVO 24 A25C	$ 2,300,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 920,000	$ 225,200	V	NUEVA EPS	1045147656	$ 129,400	COLFONDOS	1045147656	$ 517,500	$ 129,400	$ 0.00	$ 0.00	
181	RIOS EDGAR JOAQUIN	11346058	RESIDENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA	$ 4,500,000	INC	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 1,800,000	$ 313,200	V	EPS SANITAS	1045147656	$ 180,000	COLPENSIONES	1045147656	$ 720,000	$ 180,000	$ 0.00	$ 0.00	INGRESO 01/03/2022
182	RIOS ALFONSO JOHAN NICOLAS	1007861118	AUXILIAR DE DIGITACION	$ 1,200,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	INC	INC	INC	INC	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 480,000	$ 77,400	V	EPS SANITAS	1045147656	$ 48,600	COLPENSIONES	1045147656	$ 193,900	$ 44,500	$ 0.00	$ 0.00	INCAPACIDAD DEL 21 AL 24/03/2022 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE
183	ROBAYO BARRERA JULIO ENRIQUE	11344254	TOPOGRAFO INSPECTOR	$ 2,800,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 1,120,000	$ 194,900	V	SALUD TOTAL EPS	1045147656	$ 112,000	PORVENIR	1045147656	$ 448,000	$ 112,000	$ 0.00	$ 0.00	
184	RODRIGUEZ MATABANCHOY MARIO FERNANDO	5228280	INSPECTOR DE OBRA	$ 3,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 1,200,000	$ 302,800	V	COMPENSAR EPS	1045147656	$ 174,000	PROTECCION (ING +	1045147656	$ 696,000	$ 174,000	$ 0.00	$ 0.00	
185	RODRIGUEZ PEDRAZA MARTIN ALONSO	1075681614	AYUDANTE GENERAL DE OBRA	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	MHC	$ 400,000	$ 33,100	V	EPS-S CONVIDA	1045147656	$ 36,500	COLFONDOS	1045147656	$ 145,500	$ 19,100	$ 0.00	$ 0.00	INCAPACIDAD DEL 14 AL 18/03/2022 CONTUSION DE LA RODILLA Y DEL 18 AL 22 OTRAS

186	RODRIGUEZ RESTREPO OSCAR HERNANDO	86004336	OPERADOR RETRO CARG. 428D 66	$ 1,800,000	INC	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	TR	MHC	$ 720,000	$ 121,200	V	EPS SURA	1045147656	$ 69,600	COLPENSIONES	1045147656	$ 285,600	$ 69,600	$ 0.00	$ 0.00	INGRESO 01/03/2022 - TRASLADO ENTRE OBRAS 31/03/2022	
187	RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDGAR FERNANDO	11275487	ALMACENISTA DE ABASTECIMIENTO	$ 1,500,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 600,000	$ 105,500	V	SALUD TOTAL EPS	1045147656	$ 60,700	PROTECCION (ING +	1045147656	$ 242,500	$ 60,700	$ 0.00	$ 0.00		
188	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ARTURO	11347058	CONDUCTOR 2.TROQ. DINA 88 SHK-571	$ 1,700,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	LR	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 680,000	$ 163,000	V	COMPENSAR EPS	1045147656	$ 96,000	PORVENIR	1045147656	$ 383,700	$ 96,000	$ 0.00	$ 0.00	LICENCIA REMUNIEDAD 19/03/2022	
189	RODRIGUEZ SANDOVAL HUGO ERNESTO	1075653623	AYUDANTE GENERAL DE OBRA	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 73,300	V	EPS SURA	1045147656	$ 42,100	PROTECCION (ING +	1045147656	$ 168,400	$ 42,100	$ 0.00	$ 0.00		
190	RODRIGUEZ SILVA WILLIAM ALFONSO	1075687210	AYUDANTE GENERAL DE OBRA	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 77,600	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 44,600	PORVENIR	1045147656	$ 178,200	$ 44,600	$ 0.00	$ 0.00		
191	RODRIGUEZ VELANDIA JOHAN FRANZUA	1075654495	CONDUCTOR CAMIONETA NISSAN SPR-256	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 520,000	$ 125,100	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 71,900	PORVENIR	1045147656	$ 287,600	$ 71,900	$ 0.00	$ 0.00		
192	ROJAS ALFONSO HECTOR JAVIER	1079034635	AYUDANTE CONTROLADOR DE TRANSITO	$ 1,000,000														INC	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 45,200	V	EPS-S CONVIDA	1045147656	$ 26,000	PROTECCION (ING +	1045147656	$ 103,900	$ 26,000	$ 0.00	$ 0.00	INGRESO 14/03/2022	
193	ROJAS CORTES LAURA MARIA	1075677784	ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA	$ 1,300,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 520,000	$ 6,600	I	COMPENSAR EPS	1045147656	$ 52,100	COLPENSIONES	1045147656	$ 208,100	$ 52,100	$ 0.00	$ 0.00		
194	ROJAS HINCAPIE JOHNNY ALEXANDER	16161903	CADENERO PRIMERO INSPECTOR	$ 2,100,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 840,000	$ 189,100	V	NUEVA EPS	1045147656	$ 108,700	COLPENSIONES	1045147656	$ 434,800	$ 108,700	$ 0.00	$ 0.00		
195	ROJAS MADRIGAL ARBEY DEJESUS	75145329	TORNILLERO EXTENDEDORA ASFALTO	$ 1,600,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	LR	D	D	X	X	X	X	X	D	X	D	D	D	MHC	$ 640,000	$ 147,100	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 95,400	COLFONDOS	1045147656	$ 381,400	$ 91,100	$ 0.00	$ 0.00	LICENCIA REMUNIEDAD 19/03/2022	
196	ROJAS GILBERTO	4144059	OPERADOR CILINDRO HAMM 3307 11	$ 2,200,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 880,000	$ 187,300	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 107,700	COLPENSIONES	1045147656	$ 430,500	$ 107,700	$ 0.00	$ 0.00		
197	ROJAS ROLON JAIRO WILSON	1093906490	OPERADOR TALADRO DRACK DRILL FUR. 2	$ 2,300,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	TR															MHC	$ 920,000	$ 187,100	V	SALUD TOTAL EPS	1045147656	$ 107,600	PROTECCION (ING +	1045147656	$ 430,100	$ 107,600	$ 0.00	$ 0.00	TRASLADO ENTRE OBRAS DESDE EL 1703/2022	
198	ROMERO GONZALEZ ANDREA YINETH	1075688014	INGENIERO AUXILIAR	$ 1,500,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	LR	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 600,000	$ 101,000	V	COMPENSAR EPS	1045147656	$ 60,000	PORVENIR	1045147656	$ 240,000	$ 60,000	$ 0.00	$ 0.00	LICENCIA 12/03/2022	
199	ROMERO GONZALEZ GABRIEL ESTEBAN	1007228134	AYUDANTE GENERAL DE OBRA	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 90,300	V	EPS-S CONVIDA	1045147656	$ 51,900	PORVENIR	1045147656	$ 207,600	$ 51,900	$ 0.00	$ 0.00		
200	ROZO OLAYA OSCAR ESNEYDER	1075662982	AYUDANTE TOPOGRAFIA	$ 1,000,000		INC	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 74,200	V	EPS-S CONVIDA	1045147656	$ 42,700	PORVENIR	1045147656	$ 170,600	$ 42,700	$ 0.00	$ 0.00	INGRESO 02/03/2022	
201	ROZO SALDARRIAGA HEIDI MAGALI	20577421	ASISTENTE TALENTO HUMANO OBRA	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	R																					MHC	$ 800,000	$ 51,100	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 29,400	PROTECCION (ING +	1045147656	$ 117,400	$ 45,100	$ 0.00	$ 0.00	RETIRO 11/03/2022	
202	RUIZ CORREA DEVISON ERNESTO	1073327376	GUITARRERO	$ 1,600,000	X	X	X	X	X	D	X	TR	TR	TR	TR	LR	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 640,000	$ 133,900	V	NUEVA EPS	1045147656	$ 82,200	PORVENIR	1045147656	$ 328,400	$ 81,300	$ 0.00	$ 0.00	TRASLADO ENTRE OBRAS DEL 08 AL 11/03/2022 - LICENCIA REMUNERADA 12/03/2022	
203	SAENZ MALAGON ERMINSON	74242544	OPERADOR CILINDRO HAMM 3520	$ 2,300,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 920,000	$ 240,800	V	EPS SANITAS	1045147656	$ 138,400	PORVENIR	1045147656	$ 553,600	$ 138,400	$ 0.00	$ 0.00		
204	SAIZ DIAZ SANTIAGO ESTEBAN	1193516329	AYUDANTE FINISHER	$ 1,200,000	X	X	X	X	X	D	X	TR	TR	TR	TR	X	D	X	X	X	X	X	LR	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 480,000	$ 111,800	V	EPS SANITAS	1045147656	$ 64,300	PROTECCION (ING +	1045147656	$ 257,000	$ 64,300	$ 0.00	$ 0.00	TRASLADO ENTRE OBRAS DEL 08 AL 11/03/2022 - LICENCIA REMUNERADA 19/03/2022	
205	SALAMANCA GOMEZ HEIDY JOHANNA	1073608173	AYUDANTE CONTROLADOR DE TRANSITO	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 110,800	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 63,700	PORVENIR	1045147656	$ 254,600	$ 63,700	$ 0.00	$ 0.00		
206	SALAZAR REYES MILTON DAVID	1020828349	AYUDANTE FINISHER	$ 1,200,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	LR	D	D	X	X	X	X	X	D	X	D	D	D	MHC	$ 480,000	$ 114,500	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 73,000	PORVENIR	1045147656	$ 291,700	$ 70,600	$ 0.00	$ 0.00	LICENCIA REMUNERADA 19/03/2022	
207	SALGADO CASTRO EDGAR GONZALO	3210400	OPERADOR MINICARGADOR JCB 74	$ 1,600,000	X	X	X	X	TR																											MHC	$ 640,000	$ 142,500	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 81,900	COLPENSIONES	1045147656	$ 327,500	$ 81,900	$ 0.00	$ 0.00	TRASLADO ENTRE OBRAS DESDE EL 05/03/2022	
208	MILENA SALGUERO VARGAS	1072747306	AYUDANTE CONTROLADOR DE TRANSITO	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	INC	INC	R																						MHC	$ 400,000	$ 42,200	V	EPS SANITAS	1045147656	$ 25,700	PORVENIR	1045147656	$ 102,400	$ 32,800	$ 0.00	$ 0.00	INCAPACIDAD DEL 08 AL 09/03/2022 OTROS SINDROMES DE CEFALEA ESPECIFICADOS -	
209	SANCHEZ CARLOS LEONEL	74357313	CONDUCTOR 2.TROQ. DINA 90 SKH-632	$ 1,700,000														INC	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 680,000	$ 75,600	V	EPS SANITAS	1045147656	$ 43,500	PROTECCION (ING +	1045147656	$ 173,700	$ 43,500	$ 0.00	$ 0.00	INGRESO 14/03/2022	
210	SANCHEZ HERNANDEZ HERMES YAMID	11444770	INSPECTOR CANTERA	$ 3,800,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 1,520,000	$ 365,900	V	COMPENSAR EPS	1045147656	$ 210,300	COLPENSIONES	1045147656	$ 841,100	$ 210,300	$ 0.00	$ 0.00		
211	SANCHEZ PORRAS LUZ AMPARO	37754784	PROFESIONAL SOCIAL	$ 5,000,000	X	X	X	X	INC	INC	INC	X	X	X	X	X	D	X	X	INC	INC	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 2,000,000	$ 301,700	V	NUEVA EPS	1045147656	$ 191,300	PORVENIR	1045147656	$ 764,600	$ 173,400	$ 0.00	$ 0.00	INCAPACIDAD DEL 05 AL 08/03/2022 LUMBAGO NO ESPECIFICADO - INCAPACIDAD	
212	SANCHEZ ROJAS JHON EIDER	7317410	TOPOGRAFO INSPECTOR	$ 2,800,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	LNR	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 1,120,000	$ 214,200	V	SALUD TOTAL EPS	1045147656	$ 123,100	PORVENIR	1045147656	$ 504,100	$ 123,100	$ 0.00	$ 0.00	LICENCIA NO REMUNERADA 19/03/2022	
213	SANDOVAL DALEMAN MANUEL JOSE	11383816	INGENIERO DIRECTOR DE OBRA	$ 13,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 5,200,000	$ 633,400	V	COMPENSAR EPS	1045147656	$ 1,137,500	COLPENSIONES	1045147656	$ 1,456,000	$ 364,000	$ 182,000	$ 273,000.00		
214	SIERRA GALEANO BLANCA INES	23500541	AYUDANTE CONTROLADOR DE TRANSITO	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	LR	D	D	X	X	X	X	R						MHC	$ 400,000	$ 106,500	V	NUEVA EPS	1045147656	$ 63,300	COLPENSIONES	1045147656	$ 253,200	$ 74,000	$ 0.00	$ 0.00	LICENCIA REMUNERADA 19/03/2022 - RETIRO 26/03/2022	
215	SILVA MARTINEZ DIEGO OLIVERIO	80543333	CONDUCTOR CAMION NISSAN 2 SPM-273	$ 1,700,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	LR	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 680,000	$ 200,700	V	SALUD TOTAL EPS	1045147656	$ 119,200	PROTECCION (ING +	1045147656	$ 476,300	$ 117,700	$ 0.00	$ 0.00	LICENCIA REMUNERADA 19/03/2022	
216	SILVA SOSA EDILBERTO	80407479	OPERADOR TORNADOZER CAT 834B 12	$ 4,500,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 1,800,000	$ 450,900	V	NUEVA EPS	1045147656	$ 259,200	COLPENSIONES	1045147656	$ 1,036,600	$ 259,200	$ 0.00	$ 0.00		
217	SUAREZ HERNANDEZ BRANYONY	1053807757	OPERADOR AUTOHORMIGONERO DIECI 12	$ 2,100,000																	TR	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 840,000	$ 146,100	V	ASMET SALUD	1045147656	$ 93,000	PROTECCION (ING +	1045147656	$ 371,600	$ 92,400	$ 0.00	$ 0.00	TRASLADO ENTRE OBRAS DEL 01 AL 17/03/2022	
218	SUAREZ EDILSON	1075661539	CONDUCTOR SENCILLA DINA 03 SQA-693	$ 1,700,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	LR	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 680,000	$ 174,200	V	EPS SURA	1045147656	$ 103,900	PROTECCION (ING +	1045147656	$ 415,600	$ 102,400	$ 0.00	$ 0.00	LICENCIA REMUNERADA 19/03/2022	
219	TOLE ALDANA NEIDY YANETH	52491792	ASISTENTE DE NOTARIADO Y REGISTRO	$ 3,200,000	INC	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 1,280,000	$ 222,800	V	SALUD TOTAL EPS	1045147656	$ 128,000	PORVENIR	1045147656	$ 512,000	$ 128,000	$ 0.00	$ 0.00	INGRESO 01/03/2022	
220	TRIANA ANGEL FABIO NELSON	11448488	OPERADOR TORNADOZER MICH 1	$ 4,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 1,600,000	$ 412,100	V	SALUD TOTAL EPS	1045147656	$ 236,900	PORVENIR	1045147656	$ 947,400	$ 236,900	$ 0.00	$ 0.00		

221	TRIANA ANGEL JAIRO HERNAN	11445172	OPERADOR RETRO EXC. HYUNDAI R520LC 22	$ 4,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 1,600,000	$ 377,600	V	EPS SANITAS	1045147656	$ 217,100	COLPENSIONES	1045147656	$ 868,100	$ 217,100	$ 0.00	$ 0.00	
222	URETA VANEGAS JOSE JACINTO	79726581	TORNILLERO EXTENDEDORA ASFALTO	$ 1,600,000	X	X	X	X	X	D	X	TR	TR	TR	TR	X	D	X	X	X	X	X	LR	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 640,000	$ 134,500	V	NUEVA EPS	1045147656	$ 81,000	PROTECCION (ING +	1045147656	$ 323,900	$ 79,500	$ 0.00	$ 0.00	TRASLADO ENTRE OBRAS DEL 08 AL 11/03/2022 - LICENCIA REMUNERADA 19/03/2022
223	URIBE GARCIA CAROLINA	1100951482	RESIDENTE DE CONTROL Y CALIDAD DE MATERIALES	$ 4,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 1,600,000	$ 278,400	V	EPS SANITAS	1045147656	$ 160,000	COLPENSIONES	1045147656	$ 640,000	$ 160,000	$ 0.00	$ 0.00	
224	URREGO MENDEZ HECTOR ANDRES	1070955259	AUXILIAR DE LABORATORIO MHC	$ 1,900,000							TR	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 760,000	$ 146,600	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 84,300	PORVENIR	1045147656	$ 337,000	$ 84,300	$ 0.00	$ 0.00	TRASLADO ENTRE OBRAS DEL 01 AL 07/03/2022
225	VARGAS RINCON YULY JACKELINE	1075656385	RESIDENTE SOCIAL	$ 3,500,000																INC	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	LR	X	X	X	MHC	$ 1,400,000	$ 113,700	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 70,100	PORVENIR	1045147656	$ 280,100	$ 70,100	$ 0.00	$ 0.00	INGRESO 16/03/2022
226	VARGAS RIOS BRAYAN FELIPE	1075682755	AYUDANTE VIGILANCIA	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 72,900	V	EPS SANITAS	1045147656	$ 41,900	PORVENIR	1045147656	$ 167,600	$ 41,900	$ 0.00	$ 0.00	
227	VARON RAFAEL	14270208	OPERADOR CILINDRO CAT PS-150C 22	$ 2,200,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	LR	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 880,000	$ 199,700	V	NUEVA EPS	1045147656	$ 119,500	COLPENSIONES	1045147656	$ 477,600	$ 117,800	$ 0.00	$ 0.00	LICENCIA REMUNERADA 19/03/2022
228	VASQUEZ RODRIGUEZ NEYLA YISSETH	1105786307	ASISTENTE PREDIAL	$ 2,300,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 920,000	$ 160,100	V	EPS SANITAS	1045147656	$ 92,000	COLPENSIONES	1045147656	$ 368,000	$ 92,000	$ 0.00	$ 0.00	
229	VEGA CORREDOR BRAYAN STEEP	1003660870	AYUDANTE CONTROLADOR DE TRANSITO	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	LR	D	D	X	X	X	X	R						MHC	$ 400,000	$ 94,200	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 54,200	PORVENIR	1045147656	$ 216,600	$ 66,000	$ 0.00	$ 0.00	LICENCIA REMUNERADA 19/03/2022 - RETIRO 26/03/2022
230	VELANDIA CRISTANCHO WILLIAM FERNANDO	80546819	OFICIAL DE OBRA	$ 1,000,000	X	X	X	INC	INC	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	INC	INC	INC	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 400,000	$ 222,100	V	FAMISANAR EPS	1045147656	$ 131,800	PROTECCION (ING +	1045147656	$ 199,000	$ 42,300	$ 0.00	$ 0.00	INCAPACIDAD DEL 04 AL 05/03/2022 MIGRAÑA, NO ESPECIFICADA - INCAPACIDAD
231	ZAMORA SUAREZ ANGIE CAROLINA	1233899380	AUXILIAR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	$ 1,700,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 680,000	$ 148,600	V	NUEVA EPS	1045147656	$ 85,400	PORVENIR	1045147656	$ 341,500	$ 85,400	$ 0.00	$ 0.00	NINGUNA
232	OREJARENA RODRIGUEZ SILVIA JULIANA	1098675736	ESPECIALISTA AMBIENTAL	$ 4,000,000										ING	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 1,600,000	$ 306,300	V	EPS SANITAS	1045147656	$ 176,000	COLPENSIONES	1045147656	$ 704,000	$ 176,000	$ 0.00	$ 0.00	INGRESO 10/03/2022
233	HENRY AUGUSTO TARAZONA MONTERO	79285675	DIRECTOR SOCIOAMBIENTAL Y TRANSITO	$ 14,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MHC	$ 5,600,000	$ 974,400	V	COMPENSAR EPS	1045147656	$ 1,750,000	COLPENSIONES	1045147656	$ 2,240,000	$ 560,000	$ 280,000	$ 420,000	NINGUNA
234	LUIS JAVIER CARRILLO PUERTO	11433692	ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA	$ 13,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	HYMAC INGENIERÍA S.A.S	$ 520,000	$ 125,300	V	COMPENSAR EPS	57150046	$ 250,000	PORVENIR	57150046	$ 320,000	$ 40,000	$ 0.00	$ 0.00	NINGUNA
235	JENNY LORENA NIÑO SANA	1118561197	COORDINADORA DE DISEÑO	$ 3,550,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	GEOTECNIA ANDINA	$ 568,000	$ 18,600	I	SANITAS	900388310	$ 142,000	PORVENIR	900388310	$ 568,000	$ 142,000	$ 0.00	$ 0.00	MARZO
236	NEYID MAURICIO JASBON CARVAJAL	9146647	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	$ 6,065,108	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	PEDELTA COLOMBIA SAS	$ 6,065,108	$ 422,200	V	NUEVA EPS	57181188	$ 242,700	COLPENSIONES	57181188	$ 1,031,300	$ 242,700	$ 0.00	$ 0.00	CONTINUA EN EL PROYECTO
237	OSCAR MAURICIO BAUTISTA RODRÍGUEZ	1069304896	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	NS	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	NS	D	NS	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	TRANSPORTES CATALAN SAS	$ 1,000,000	$ 69,600	V	FAMISANAR	7833162014	$ 40,000	PORVENIR	7833162014	$ 160,000	$ 40,000	$ 0.00	$ 0.00	NO PRESTO SERVICIOS EN ZIBU LOS DIAS 5, 19 Y 21 DE MARZO
238	EDUARD ANDRES CAICEDO BONILLA	1069098959	CONDUCTOR	$ 1,000,000	NS	X	X	NS	X	D	X	X	X	X	X	X	D	NS	X	X	X	X	NS	D	NS	X	X	X	X	X	D	X	X	X	NS	TRANSPORTES CATALAN SAS	$ 1,000,000	$ 69,600	V	FAMISANAR	7833162014	$ 40,000	COLFONDOS	7833162014	$ 160,000	$ 40,000	$ 0.00	$ 0.00	NO PRESTO SERVICIOS EN ZIBU LOS DIAS 1, 4, 14, 19, 21 Y 31 DE MARZO
239	JHON EDISON CASTILLO TRIVIÑO	1076658424	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	NS	D	X	X	X	X	X	NS	D	NS	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	TRANSPORTES CATALAN SAS	$ 1,000,000	$ 69,600	V	FAMISANAR	7833162014	$ 40,000	PORVENIR	7833162014	$ 160,000	$ 40,000	$ 0.00	$ 0.00	NO PRESTO SERVICIOS EN ZIBU LOS DIAS 12, 19 Y 21 DE MARZO
240	EYNER AUGUSTO CASTIBLANCO CARDENAS	74357343	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	NS	X	X	NS	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	NS	NS	NS	D	NS	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	TRANSPORTES CATALAN SAS	$ 1,000,000	$ 69,600	V	SURA	7833162014	$ 40,000	COLPENSIONES	7833162014	$ 160,000	$ 40,000	$ 0.00	$ 0.00	NO PRESTO SERVICIOS EN ZIBU LOS DIAS 2, 5, 17, 18, 19 Y 21 DE MARZO
241	JHOELL OBANDO MUÑOZ	1069098871	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	NS	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	NS	D	NS	NS	X	X	X	X	D	X	X	X	X	TRANSPORTES CATALAN SAS	$ 1,000,000	$ 69,600	V	FAMISANAR	7833162014	$ 40,000	PROTECCION	7833162014	$ 160,000	$ 40,000	$ 0.00	$ 0.00	NO PRESTO SERVICIOS EN ZIBU LOS DIAS 5, 19, 21, 22 DE MARZO
242	JORGE LEONARDO PACHÓN ALVARADO	3196570	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	NS	X	X	NS	D	NS	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	TRANSPORTES CATALAN SAS	$ 1,000,000	$ 69,600	V	SANITAS	7833162014	$ 40,000	PORVENIR	7833162014	$ 160,000	$ 40,000	$ 0.00	$ 0.00	NO PRESTO SERVICIOS EN ZIBU LOS DIAS 16, 19 21 DE MARZO
243	MIGUEL ANTONIO PRADA MURCIA	3195943	CONDUCTOR	$ 1,000,000	V	V	V	X	V	D	V	V	X	X	V	V	D	V	V	V	V	V	V	D	NS	NS	NS	NS	X	X	D	X	X	X	X	TRANSPORTES CATALAN SAS	$ 1,000,000	$ 34,800	V	NUEVA EPS	7833162014	$ 40,100	COLPENSIONES	7833162014	$ 160,100	$ 40,100	$ 0.00	$ 0.00	VACACIONES DEL 1 AL 19 DE MARZO. LABORÓ LOS DIAS 4,10,11 Y DEL 22 EN ADELANTE
244	SANDRO FABIAN RODRIGUEZ GOMEZ	79167821	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	NS	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	NS	D	NS	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	TRANSPORTES CATALAN SAS	$ 1,000,000	$ 69,600	V	COMPENSAR EPS	7833162014	$ 40,000	PROTECCION	7833162014	$ 160,000	$ 40,000	$ 0.00	$ 0.00	NO PRESTO SERVICIOS EN ZIBU LOS DIAS 5, 19, 21 DE MARZO
245	EDILBERTO TORRES FAJARDO	11335734	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	NS	D	X	X	X	NS	X	X	D	X	X	X	X	X	NS	D	NS	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	TRANSPORTES CATALAN SAS	$ 1,000,000	$ 69,600	V	FAMISANAR	7833162014	$ 40,000	PORVENIR	7833162014	$ 160,000	$ 40,000	$ 0.00	$ 0.00	NO PRESTO SERVICIOS EN ZIBU LOS DIAS 5, 10, 19, 21 DE MARZO
246	EDILBERTO VELASQUEZ ALVARADO	80547997	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	NS	X	X	X	D	X	X	NS	X	X	X	D	X	X	X	X	X	NS	D	NS	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	TRANSPORTES CATALAN SAS	$ 1,000,000	$ 69,600	V	SURA	7833162014	$ 40,100	COLPENSIONES	7833162014	$ 160,000	$ 40,000	$ 0.00	$ 0.00	NO PRESTO SERVICIOS EN ZIBU LOS DIAS2, 9, 19, 21 DE MARZO
247	ABELLA LEAL HAROL DANIEL	1,016,049,364	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	SERMAR INGENIEROS SAS	$ 400,000	$ 69,600	V	NUEVA E.P.S.	57249446	$ 40,000	PORVENIR	57249446	$ 160,000	$ 40,000	$ 0.00	$ 0.00	
248	ACEVEDO GUEVARA JHORMAN MOISES	963678209071 993	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	SERMAR INGENIEROS SAS	$ 400,000	$ 69,600	V	SALUD TOTAL	57249446	$ 40,000	PROTECCION (ING+PROTECCION)	57249446	$ 160,000	$ 40,000	$ 0.00	$ 0.00	
249	ALVARES PATIÑO GABRIEL SANTIAGO	1,193,118,703	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	TRA	X	X	X	X	D	X	X	X	X	SERMAR INGENIEROS SAS	$ 400,000	$ 69,600	V	NUEVA E.P.S.	57249446	$ 40,000	PROTECCION (ING+PROTECCION)	57249446	$ 160,000	$ 40,000	$ 0.00	$ 0.00	TRANSALDO EL 22 DE MARZO
250	BUSTAMANTE NARVAES WILLINGTON	1,108,828,916	MAESTRO	$ 1,500,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	SERMAR INGENIEROS SAS	$ 600,000	$ 104,000	V	NUEVA E.P.S.	57249446	$ 60,000	PORVENIR	57249446	$ 240,000	$ 60,000	$ 0.00	$ 0.00	
251	CARDOZO CRISTANCHO NELSON EDUARDO	1,098,769,971	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	TRA	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	SERMAR INGENIEROS SAS	$ 400,000	$ 62,700	V	SALUD TOTAL	57249446	$ 40,000	PORVENIR	57249446	$ 160,000	$ 40,000	$ 0.00	$ 0.00	TRANSLADO DE 12 MARZO
252	CORTES TOQUICA FREDY NORBERTO	1076220443	OFICCIAL	$ 1,150,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	SERMAR INGENIEROS SAS	$ 460,000	$ 80,100	V	NUEVA E.P.S.	57249446	$ 46,000	COLFONDOS	57249446	$ 184,000	$ 46,000	$ 0.00	$ 0.00	
253	CORTEZ TOQUICA JOSE LIBARDO	3,239,248	MAESTRO	$ 1,700,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	TRA	X	X	X	X	D	X	X	X	X	SERMAR INGENIEROS SAS	$ 680,000	$ 118,400	V	FAMISANAR	57249446	$ 68,000	COLFONDOS	57249446	$ 272,000	$ 68,000	$ 0.00	$ 0.00	TRANSLADO EL 22 DE MARZO
254	COTE GARCIA JHON ESNEIDER	1,098,726,762	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	TRA	X	X	X	X	D	X	X	X	X	SERMAR INGENIEROS SAS	$ 400,000	$ 62,700	V	SALUD TOTAL	57249446	$ 40,000	PORVENIR	57249446	$ 160,000	$ 40,000	$ 0.00	$ 0.00	TRANSLADO EL 22 DE MARZO
255	JIMENEZ PIRAJAN EDWAR YOBAN	1055228977	CONDUCTOR	$ 1,250,000	X	X	X	TRA	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	SERMAR INGENIEROS SAS	$ 500,000	$ 87,000	V	NUEVA E.P.S.	57249446	$ 50,000	PORVENIR	57249446	$ 200,000	$ 50,000	$ 0.00	$ 0.00	TRANSLADADO EL 04 DE MARZO
256	GONZALEZ RODRIGUEZ OMER DAVIS	1,038,385,554	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	TRANSLA	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	SERMAR INGENIEROS SAS	$ 400,004	$ 65,000	V	COOSALUD	57249446	$ 37,400	PROTECCION (ING+PROTECCION)	57249446	$ 160,001	$ 37,400	$ 0.00	$ 0.00	SE TRANSLADO EL 10 DE MARZO
257	MELO LINARES FRANCY LINDAY	1,111,200,339	COORDINADOR SST	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	SERMAR INGENIEROS SAS	$ 800,000	$ 139,200	V	NUEVA E.P.S.	57249446	$ 80,000	PORVENIR	57249446	$ 320,000	$ 80,000	$ 0.00	$ 0.00	
258	PEREZ BAÑOS JOSE MANUEL	1,051,659,630	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	SERMAR INGENIEROS SAS	$ 400,000	$ 62,700	V	FAMISANAR	57249446	$ 40,000	PORVENIR	57249446	$ 160,000	$ 40,000	$ 0.00	$ 0.00	
259	PEREZ PADILLA JEAN CARLOS	1,003,158,795	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,000,001	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	SERMAR INGENIEROS SAS	$ 400,004	$ 65,000	V	EPS SANITAS	57249446	$ 37,400	PORVENIR	57249446	$ 160,001	$ 37,400	$ 0.00	$ 0.00	
260	RIAÑOS GUZMAN FREDY GIOVANY	80,759,874	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,000,000	X	X	X	REN	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	SERMAR INGENIEROS SAS	$ 400,000	$ 62,700	V	SALUD TOTAL	57249446	$ 40,000	PORVENIR	57249446	$ 160,000	$ 40,000	$ 0.00	$ 0.00	RENUNCIA EL 04 DE MARZO

261	WILMER ERNESTO RUIZ ALFONSO RUIZ	1,094,164,819	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	SERMAR INGENIEROS SAS	$ 400,000	$ 62,700	V	NUEVA E.P.S.	57249446	$ 40,000	PROTECCION (ING+PROTECCION)	57249446	$ 160,000	$ 40,000	$ 0.00	$ 0.00	
262	CARLOS ALBERTO PEÑA VARGAS	1033684346	OPERARIO	$ 1,350,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	VYS COMERCIAL SAS	$ 1,870,333	$ 130,200	V	COMPENSAR EPS	1044256411	$ 74,900	PORVENIR	1044256411	$ 299,300	$ 74,900	$ 0.00	$ 0.00	
263	WILMER JOGAN VARGAS BELTRAN	1073516639	OPERARIO	$ 1,200,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	VYS COMERCIAL SAS	$ 1,448,000	$ 100,800	V	FAMISANAR	1044256411	$ 58,000	PORVENIR	1044256411	$ 231,700	$ 58,000	$ 0.00	$ 0.00	
264	PABLO ANTONIO CAICEDO RIAÑO	79566921	OPERARIO	$ 1,280,500	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	VYS COMERCIAL SAS	$ 1,545,137	$ 107,600	V	FAMISANAR	1044256411	$ 61,900	COLFONDOS	1044256411	$ 247,300	$ 61,900	$ 0.00	$ 0.00	
265	JUAN SEBASTIÁN SALAS SÁNCHEZ	1014303283	OPERARIO	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	VYS COMERCIAL SAS	$ 1,206,667	$ 84,000	V	FAMISANAR	1044256411	$ 48,300	PORVENIR	1044256411	$ 193,100	$ 48,300	$ 0.00	$ 0.00	
266	MARIO ALEXANDER DUQUE ARANGUREN	79743772	AYUDANTE	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	VYS COMERCIAL SAS	$ 1,000,000	$ 69,600	V	CONVIDA	1044256411	$ 40,000	COLFONDOS	1044256411	$ 160,000	$ 40,000	$ 0.00	$ 0.00	
267	JULIAN ALEJANDRO AVILA AVILA	1071840695	AYUDANTE	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	VYS COMERCIAL SAS	$ 1,000,000	$ 69,600	V	CONVIDA	1044256411	$ 40,000	PORVENIR	1044256411	$ 160,000	$ 40,000	$ 0.00	$ 0.00	
268	YUDY LIZETH RICO GRANADOS	1030621877	COORDINADORA SST	$ 1,450,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	VYS COMERCIAL SAS	$ 1,810,603	$ 126,100	V	COMPENSAR EPS	1044256411	$ 72,500	COLPENSIONES	1044256411	$ 289,700	$ 72,500	$ 0.00	$ 0.00	
269	JUAN DIEGO PINILLA GUZMÁN	1076669147	AYUDANTE	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	VYS COMERCIAL SAS	$ 1,000,000	$ 69,600	V	COMPENSAR EPS	1044256411	$ 40,000	PORVENIR	1044256411	$ 160,000	$ 40,000	$ 0.00	$ 0.00	
270	ABRAHAM AVILA AVILA	79125337	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	N	D	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	GEMMA RODRIGUEZ SAS	$ 1,000,000	$ 69,600	V	COMPENSAR EPS	57464667	$ 40,000	Proteccion	57464667	$ 160,000	$ 30,000	$ 0.00	$ 0.00	
271	CESAR HUMBERTO TRIVIÑO BALLEN *	3029215	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	N	D	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	CESAR HUMBERTO TRIVIÑO BALLEN	$ 1,100,000	$ 47,900	V	COMPENSAR EPS	9432132350	$ 137,500	Colfondos	9432132350	$ 176,000	$ 0	$ 0.00	$ 0.00	
272	FREDY FABIAN RINCON REYES	80550513	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	N	D	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	GEMMA RODRIGUEZ SAS	$ 1,000,000	$ 69,600	V	COMPENSAR EPS	57464667	$ 40,000	Porvenir	57464667	$ 160,000	$ 30,000	$ 0.00	$ 0.00	
273	HERMES HERNANDO GOMEZ RIAÑO	1032356519	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	N	D	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	GEMMA RODRIGUEZ SAS	$ 1,000,000	$ 69,600	V	COMPENSAR EPS	57464667	$ 40,000	Colpensiones	57464667	$ 160,000	$ 30,000	$ 0.00	$ 0.00	
274	JOEL DE JESUS GRAJALES GRAJALES	1109291118	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	N	D	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	GEMMA RODRIGUEZ SAS	$ 1,000,000	$ 69,600	V	COMPENSAR EPS	57464667	$ 40,000	Colfondos	57464667	$ 160,000	$ 30,000	$ 0.00	$ 0.00	
275	JOHAN SNEIDER RIOS RODRIGUEZ	1070307579	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	N	D	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	MULTISERVICIOS A&C SAS	$ 1,000,000	$ 43,500	V	SALUD TOTAL EPS	7829681503	$ 40,000	Porvenir	7829681503	$ 160,000	$ 0	$ 0.00	$ 0.00	
276	JORGE EMILIO OSPINA GARZON	2986205	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	N	D	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES MAC LTDA	$ 1,093,546	$ 76,200	V	COMPENSAR EPS	56279552	$ 43,800	Colfondos	56279552	$ 175,000	$ 43,800	$ 0.00	$ 0.00	
277	JOSE YOBANI CARDENAS CHITIVA	80811371	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	N	D	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	TRANSPORTES SALAMANCA Y VEGA SAS	$ 1,000,000	$ 43,500	V	COMPENSAR EPS	57210323	$ 40,000	Colpensiones	57210323	$ 160,000	$ 40,000	$ 0.00	$ 0.00	
278	WILMER ALEJANDRO MORA PINZON *	1073534355	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	N	D	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	WILMER ALEJANDRO MORA PINZON	$ 1,100,000	$ 47,900	V	Famisanar	9430815494	$ 137,500	Porvenir	9430815494	$ 176,000	$ 0	$ 0.00	$ 0.00	
279	YERSON LIBARDO ORTEGON BALLESTEROS	79058090	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	N	D	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	GEMMA RODRIGUEZ SAS	$ 1,000,000	$ 69,600	V	Famisanar	57464667	$ 40,000	Colpensiones	57464667	$ 160,000	$ 30,000	$ 0.00	$ 0.00	
280	ANGULO PARRA MAURICIO	91015216	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RET									ASESORIAS Y TRANSPORTES S.A.S	$ 920,000	$ 40,100	IV	NUEVA EPS	9431820020	$ 36,800	COLFONDOS	9431820020	$ 147,200	$ 41,500	$ 0.00	$ 0.00	RETIRO EL 23 DE MARZO
281	BARON RANGEL EDUARD ARLED	1069434966	CONDUCTOR	$ 1,000,000	RET																															ASESORIAS Y TRANSPORTES S.A.S	$ 40,001	$ 1,800	IV	FAMISANAR	9431820020	$ 1,700	PORVENIR	9431820020	$ 6,500	$ 4,200	$ 0.00	$ 0.00	
282	BONILLA MARTINEZ JEISSON MANUEL	1123531659	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RAS													ASESORIAS Y TRANSPORTES S.A.S	$ 1,085,000	$ 75,600	IV	MEDIMAS EPS	9431820020	$ 43,400	PORVENIR	9431820020	$ 173,600	$ 43,400	$ 0.00	$ 0.00	TRASLADO
283	ESCOBAR MORALES HAROLD ANDRES	1014251132	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RET									ASESORIAS Y TRANSPORTES S.A.S	$ 920,000	$ 40,100	IV	SANITAS	9431820020	$ 36,800	PORVENIR	9431820020	$ 147,200	$ 38,800	$ 0.00	$ 0.00	RETIRO EL 23 DE MARZO
284	LARROTA SABOYA JUAN CARLOS	11200739	SUPERVISOR	$ 1,500,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RAS		ASESORIAS Y TRANSPORTES S.A.S	$ 1,600,000	$ 111,400	IV	EPS SURA	9431820020	$ 64,000	COLPENSIONES	9431820020	$ 256,000	$ 64,000	$ 0.00	$ 0.00	TRASLADO
285	PARRA GONZALEZ BRAYAN AUGUSTO	1005485639	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RET									ASESORIAS Y TRANSPORTES S.A.S	$ 920,000	$ 40,100	IV	NUEVA EPS	9431820020	$ 36,800	PORVENIR	9431820020	$ 147,200	$ 41,900	$ 0.00	$ 0.00	RETIRO EL 23 DE MARZO
286	PARRA ATUESTA JORGE ELIECER	13526425	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RET									ASESORIAS Y TRANSPORTES S.A.S	$ 920,000	$ 40,100	IV	NUEVA EPS	9431820020	$ 36,800	PROTECCION	9431820020	$ 147,200	$ 41,500	$ 0.00	$ 0.00	RETIRO EL 23 DE MARZO
287	PEREZ ALVAREZ ANDRES CAMILO	1014278559	CONDUCTOR	$ 1,000,000	RET																															ASESORIAS Y TRANSPORTES S.A.S	$ 40,001	$ 1,800	IV	COMPENSAR EPS	9431820020	$ 1,700	PORVENIR	9431820020	$ 6,500	$ 4,200	$ 0.00	$ 0.00	RETIRO EL 1 DE MARZO
288	PEREZ CASTIBLANCO DIEGO ANDRES	1233900550	CONDUCTOR	$ 1,000,000	RET																															ASESORIAS Y TRANSPORTES S.A.S	$ 40,001	$ 1,800	IV	NUEVA EPS	9431820020	$ 1,700	COLPENSIONES	9431820020	$ 6,500	$ 4,200	$ 0.00	$ 0.00	RETIRO EL 1 DE MARZO
289	RODRIGUEZ VARGAS JUAN PABLO	1032366813	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	RET																												ASESORIAS Y TRANSPORTES S.A.S	$ 200,000	$ 8,700	IV	SALUD TOTAL EPS	9431820020	$ 8,000	PORVENIR	9431820020	$ 32,000	$ 14,100	$ 0.00	$ 0.00	RETIRO EL 4 DE MARZO
290	TORRES AMADO JHON EDINSON	1096618143	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RET									ASESORIAS Y TRANSPORTES S.A.S	$ 920,000	$ 40,100	IV	COOSALUD	9431820020	$ 36,800	PORVENIR	9431820020	$ 147,200	$ 41,500	$ 0.00	$ 0.00	RETIRO EL 23 DE MARZO

291	ANDRES DAVID PAVA ZAMBRANO	1,066,864,109	AYUDANTE PRACTICO	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	VGR INGENIERIA SAS	$ 400,000	$ 76,000	V	NUEVA EPS	9432646244	$ 43,700	PROTECCION	9432646244	$ 174,700	$ 43,700	$ 0.00	$ 0.00	NINGUNA
292	CLAUDIA XIMENA ROJAS HENAO	1,019,024,360	SUPERVISOR DE OBRA	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	VGR INGENIERIA SAS	$ 500,000	$ 76,000	V	NUEVA EPS	9432646244	$ 43,700	PORVENIR	9432646244	$ 174,700	$ 43,700	$ 0.00	$ 0.00	NINGUNA
293	DANIEL ROJAS HENAO	1,007,386,165	INSPECTOR DE OBRA	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	VGR INGENIERIA SAS	$ 500,000	$ 76,000	V	NUEVA EPS	9432646244	$ 43,700	PORVENIR	9432646244	$ 174,700	$ 43,700	$ 0.00	$ 0.00	NINGUNA
294	ELIECER SAA MARTINEZ	1,120,565,324	COORDINADOR SST	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	VGR INGENIERIA SAS	$ 466,667	$ 76,000	V	CAJACOPI	9432646244	$ 43,700	PORVENIR	9432646244	$ 174,700	$ 43,700	$ 0.00	$ 0.00	NINGUNA
295	ELVIS NEL SALAZAR NORIEGA	7,811,007	MAESTRO	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	VGR INGENIERIA SAS	$ 266,667	$ 76,000	V	NUEVA EPS	9432646244	$ 43,700	PORVENIR	9432646244	$ 174,700	$ 43,700	$ 0.00	$ 0.00	NINGUNA
296	GUSTAVO ADOLFO ROJAS HENAO	1,077,861,892	COORDINADOR LOGISTICO	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	VGR INGENIERIA SAS	$ 500,000	$ 76,000	V	FAMISANAR	9432646244	$ 43,700	PORVENIR	9432646244	$ 174,700	$ 43,700	$ 0.00	$ 0.00	NINGUNA
297	HENRY ALBERTO RAMOS MANGA	12,630,948	OFICIAL	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	VGR INGENIERIA SAS	$ 266,667	$ 76,000	V	SALUD TOTAL EPS	9432646244	$ 43,700	PROTECCION	9432646244	$ 174,700	$ 43,700	$ 0.00	$ 0.00	NINGUNA
298	IVAN RAFAEL CUETO FERREIRA	1,010,061,467	OFICIAL	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	VGR INGENIERIA SAS	$ 266,667	$ 76,000	V	NUEVA EPS	9432646244	$ 43,700	PORVENIR	9432646244	$ 174,700	$ 43,700	$ 0.00	$ 0.00	NINGUNA
299	JAIME ANDRES BORNACELLY SANDOVAL	1,143,268,811	MAESTRO	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	VGR INGENIERIA SAS	$ 500,000	$ 76,000	V	NUEVA EPS	9432646244	$ 43,700	PROTECCION	9432646244	$ 174,700	$ 43,700	$ 0.00	$ 0.00	NINGUNA
300	JORGE ANDRES MARTINEZ QUIROZ	1,085,041,350	OFICIAL	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	VGR INGENIERIA SAS	$ 466,667	$ 76,000	V	MUTUALSER	9432646244	$ 43,700	PROTECCION	9432646244	$ 174,700	$ 43,700	$ 0.00	$ 0.00	NINGUNA
301	JOSE DANIEL QUINTANA MORENO	1,000,306,240	OFICIAL	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	VGR INGENIERIA SAS	$ 266,667	$ 76,000	V	SALUD TOTAL EPS	9432646244	$ 43,700	PORVENIR	9432646244	$ 174,700	$ 43,700	$ 0.00	$ 0.00	NINGUNA
302	LUIS MIGUEL GUIZA QUIROGA	1,098,760,116	INGENIERO RESIDENTE	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	VGR INGENIERIA SAS	$ 266,667	$ 76,000	V	SANITAS	9432646244	$ 43,700	PORVENIR	9432646244	$ 174,700	$ 43,700	$ 0.00	$ 0.00	NINGUNA
303	MANUEL ANTONIO OCHOA SOLERA	1,002,999,407	OFICIAL	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	VGR INGENIERIA SAS	$ 266,667	$ 76,000	V	NUEVA EPS	9432646244	$ 43,700	PROTECCION	9432646244	$ 174,700	$ 43,700	$ 0.00	$ 0.00	NINGUNA
304	MIYER STIVEN GUEVARA RODRIGUEZ	1,006,531,672	AYUDANTE PRACTICO	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	VGR INGENIERIA SAS	$ 500,000	$ 76,000	V	CAPRESOCA	9432646244	$ 43,700	PROTECCION	9432646244	$ 174,700	$ 43,700	$ 0.00	$ 0.00	NINGUNA
305	OSCAR DAVID GUERRA CARMONA	1,066,513,939	OFICIAL	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	VGR INGENIERIA SAS	$ 400,000	$ 76,000	V	NUEVA EPS	9432646244	$ 43,700	PROTECCION	9432646244	$ 174,700	$ 43,700	$ 0.00	$ 0.00	NINGUNA
306	JORGE IVAN MENA PALACIOS	11,814,835	AYUDANTE PRACTICO	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	ING	X	X	X	D	X	X	X	X	VGR INGENIERIA SAS	$ 400,000	$ 76,000	V	SALUD TOTAL EPS	9432646244	$ 43,700	PORVENIR	9432646244	$ 174,700	$ 43,700	$ 0.00	$ 0.00	23 DE MARZO INGRESO
307	YEISON JOSE MONTILLA	840,157,520,011,989	OFICIAL	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	ING	VGR INGENIERIA SAS	$ 400,000	$ 76,000	V	NUEVA EPS	9432646244	$ 43,700	PORVENIR	9432646244	$ 174,700	$ 43,700	$ 0.00	$ 0.00	NINGUNA
308	BUITRAGO JOSÉ *	79157889	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	D	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	BUITRAGO JOSÉ	$ 1,000,000	$ 69,600	V	SURA	53943289	$ 125,000	COLPENSIONES	53943289	$ 160,000	$ 0	$ 0.00	$ 0.00	
309	BUITRAGO MANUEL *	1015424891	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	D	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	BUITRAGO MANUEL	$ 1,000,000	$ 69,600	V	SURA	54021791	$ 125,000	PORVENIR	54021791	$ 160,000	$ 0	$ 0.00	$ 0.00	
310	CABANILLA LUIS *	1003487715	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	D	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	CABANILLA LUIS	$ 1,000,000	$ 69,600	V	SALUD TOTAL EPS	9429993997	$ 125,000	PORVENIR	9429993997	$ 160,000	$ 0	$ 0.00	$ 0.00	
311	CASTIBLANCO NELSON	1022331222	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	D	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES DYG SAS	$ 1,000,000	$ 69,600	V	SALUD TOTAL EPS	9430847619	$ 40,000	PROTECCION	9430847619	$ 160,000	$ 40,000	$ 0.00	$ 0.00	
312	CHAVEZ VICTOR *	1019018652	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	D	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	CHAVEZ VICTOR	$ 1,000,000	$ 43,500	IV	MEDIMAS EPS	8865364178	$ 125,000	COLPATRIA	8865364178	$ 160,000	$ 0	$ 0.00	$ 0.00	
313	DELGADO GREGORIO *	80736969	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	D	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	DELGADO GREGORIO	$ 1,000,000	$ 69,600	V	SURA	5374158258	$ 125,000	PORVENIR	5374158258	$ 160,000	$ 0	$ 0.00	$ 0.00	
314	GARCIA JUAN CARLOS	79941099	CONDUCTOR	$ 2,456,892	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	D	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	ARCO CONSTRUCTORES SAS	$ 2,456,892	$ 171,000	V	SANITAS	56549385	$ 98,300	COLPENSIONES	56549385	$ 393,200	$ 98,300	$ 0.00	$ 0.00	
315	LOPEZ FERNANDO	80417405	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	D	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES DYG SAS	$ 1,000,000	$ 69,600	V	SALUD TOTAL EPS	9430847619	$ 40,000	PORVENIR	9430847619	$ 160,000	$ 40,000	$ 0.00	$ 0.00	
316	LOPEZ GUSTAVO *	79149248	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	D	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	GUSTAVO LOPEZ	$ 1,000,000	$ 69,600	V	SURA	54267654	$ 125,000	PROTECCION	54267654	$ 160,000	$ 0	$ 0.00	$ 0.00	
317	LOPEZ JORGE	1020757942	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	D	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	SERSA PROYECTOS SAS	$ 1,000,000	$ 69,600	V	FAMISANAR	56948460	$ 40,000	PROTECCION	56948460	$ 160,000	$ 40,000	$ 0.00	$ 0.00	
318	LOPEZ JULIAN	1020747692	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	D	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES DYG SAS	$ 1,000,000	$ 69,600	V	SALUD TOTAL EPS	9430847619	$ 40,000	PORVENIR	9430847619	$ 160,000	$ 40,000	$ 0.00	$ 0.00	
319	MORALES DAN JOUBERT	1020738795	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	D	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	AMT MATERIALES SAS	$ 1,000,000	$ 69,600	V	SALUD TOTAL EPS	CERTIFICADO DE AFILIACION	$ 40,000	PORVENIR	CERTIFICADO DE AFILIACION	$ 160,000	$ 40,000	$ 0.00	$ 0.00	
320	MONTAÑO JOSE	1020773398	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	D	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES CIVILES SUMINISTROS Y TRANSPORTES LAMD	$ 1,000,000	$ 69,600	V	SURA	9431242920	$ 40,000	PROTECCION	9431242920	$ 160,000	$ 40,000	$ 0.00	$ 0.00	
321	MONTAÑO VICTOR	19429852	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	D	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES CIVILES SUMINISTROS Y	$ 1,000,000	$ 69,600	V	SANITAS	56385910	$ 40,000	COLPENSIONES	56385910	$ 160,000	$ 40,000	$ 0.00	$ 0.00	
322	NIÑO DIEGO	79315926	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	D	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	SERSA PROYECTOS SAS	$ 1,000,000	$ 69,600	V	COMPENSAR EPS	56948460	$ 40,000	PROTECCION	56948460	$ 160,000	$ 40,000	$ 0.00	$ 0.00	
323	NAVARRETE WILLIAM	1020839216	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	D	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES HUMANAS SAS	$ 1,000,000	$ 69,600	V	FAMISANAR	1042952989	$ 63,000	COLPENSIONES	1042952989	$ 160,000	$ 0	$ 0.00	$ 0.00	
324	PATIÑO IGNACIO	79939530	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	D	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	CONSTRUCCIONES DYG SAS	$ 1,000,000			SANITAS			COLPENSIONES						CERTIFICADOS DE AFILIACIONES
325	PEREZ CESAR *	79982603	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	D	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	PEREZ CESAR	$ 1,000,000	$ 43,500	IV	SANITAS	8937644159	$ 125,000	PORVENIR	8937644159	$ 160,000	$ 0	$ 0.00	$ 0.00	
326	PULIDO JULIO *	80872508	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	D	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	PULIDO JULIO	$ 1,000,000	$ 43,500	IV	COMPENSAR EPS	9429508858	$ 125,000	COLPENSIONES	9429508858	$ 160,000	$ 125,000	$ 0.00	$ 0.00	
327	QUINTERO CESAR	1032424643	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	D	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	TRANSPORTE Y SUMINISTRO C O SAS	$ 1,000,000	$ 69,600	V	SANITAS	1043299810	$ 40,000	COLPENSIONES	1043299810	$ 160,000	$ 40,000	$ 0.00	$ 0.00	

328	URREGO ANDRES	1020786031	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	D	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	INGENIERIA Y CONSTRUCCION JB SAS	$ 1,000,000	$ 69,600	V	SANITAS	1043190107	$ 40,000	PROTECCION	1043190107	$ 160,000	$ 40,000	$ 0.00	$ 0.00	
329	VEGA YILMER	1032429325	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	D	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	TRANSPORTES Y SUMINISTROS GOMEZ TORRES	$ 1,000,000	$ 43,500	IV	FAMISANAR	9430789714	$ 40,000	PORVENIR	9430789714	$ 160,000	$ 40,000	$ 0.00	$ 0.00	
330	JORGE ANDRES DAZA	79126250	GERENTE GENERAL	$ 1,000,000								X	X	X	X			X		X																PAVIMCONC GJ S.A.S	$ 1,000,000	$ 69,600	v	FAMISANAR	5162847212	$ 40,000	PORVENIR	5162847212	$ 160,000	$ 30,000	$ 0.00	$ 0.00	
331	YUDIER ARIZA	1117963744	OPERARIO	$ 1,000,000								X	X	X	X			X		X																PAVIMCONC GJ S.A.S	$ 1,000,000	$ 69,600	v	NUEVA EPS	5162765917	$ 40,000	PORVENIR	5162765917	$ 160,000	$ 30,000	$ 0.00	$ 0.00	
332	LAURA VILLAMIL	1070022992	INSPECTORA SST	$ 1,000,000								X	X	X	X			X		X																PAVIMCONC GJ S.A.S	$ 1,000,000	$ 55,700	v	FAMISANAR	5162847387	$ 32,000	PROTECCION	5162847387	$ 128,000	$ 24,000	$ 0.00	$ 0.00	
333	JUAN NICOLAS DAZA	1016035515	OPERARIO	$ 1,000,000								X	X	X	X			X		X																PAVIMCONC GJ S.A.S	$ 1,000,000	$ 55,700	v	COMPENSAR EPS	5162847239	$ 32,000	PORVENIR	5162847239	$ 128,000	$ 24,000	$ 0.00	$ 0.00	
334	VARON CASTILLO JERONIMO	CC 3056353	VIGILANTE	$ 1,268,291																														X		SEGUIRIDAD ARMY VIG LTDA	$ 1,268,291	$ 88,300	V	EPS SURA	1045100838	$ 50,800	PORVENIR	1045100838	$ 203,000	$ 50,800	$ 0.00	$ 0.00	
335	GUEVARA BAQUERO NILSON	CC 6031783	SUPERVISOR	$ 1,340,030																														X		SEGUIRIDAD ARMY VIG LTDA	$ 1,340,030	$ 93,300	V	FAMISANAR EPS	1045100838	$ 53,700	PORVENIR	1045100838	$ 214,500	$ 53,700	$ 0.00	$ 0.00	
336	GUZMAN OLAYA MANUEL FERNANDO	CC 11346324	VIGILANTE	$ 1,268,291																														X		SEGUIRIDAD ARMY VIG LTDA	$ 1,268,291	$ 88,300	V	FAMISANAR EPS	1045100838	$ 50,800	COLPENSIONES	1045100838	$ 203,000	$ 50,800	$ 0.00	$ 0.00	
337	ARAQUE PEREZ ARNULFO	CC 74270603	VIGILANTE	$ 1,268,291																														X		SEGUIRIDAD ARMY VIG LTDA	$ 1,268,291	$ 88,300	V	NUEVA EPS	1045100838	$ 50,800	PROTECCION	1045100838	$ 203,000	$ 50,800	$ 0.00	$ 0.00	
338	MESA SAENZ JESUS ANTONIO	CC 79163295	VIGILANTE	$ 1,268,291																														X		SEGUIRIDAD ARMY VIG LTDA	$ 1,268,291	$ 88,300	V	NUEVA EPS	1045100838	$ 50,800	COLPENSIONES	1045100838	$ 203,000	$ 50,800	$ 0.00	$ 0.00	
339	GUAYAZAN LATORRE LUIS ENRIQUE	CC 79168016	VIGILANTE	$ 42,277	X																															SEGUIRIDAD ARMY VIG LTDA	$ 42,277	$ 3,000	V	NUEVA EPS	1045100838	$ 1,700	COLFONDOS	1045100838	$ 6,800	$ 1,700	$ 0.00	$ 0.00	RETIRADO
340	SANTANA RODRIGUEZ WILLIAM	CC 79168072	VIGILANTE	$ 169,106				X																												SEGUIRIDAD ARMY VIG LTDA	$ 169,106	$ 11,800	V	NUEVA EPS	1045100838	$ 6,800	PORVENIR	1045100838	$ 27,100	$ 6,800	$ 0.00	$ 0.00	RETIRADO
341	CASTIBLANCO VALBUENA ANGEL BASILIO	CC 79169745	VIGILANTE	$ 1,141,462																											X					SEGUIRIDAD ARMY VIG LTDA	$ 1,141,462	$ 79,500	V	FAMISANAR EPS	1045100838	$ 45,700	PORVENIR	1045100838	$ 182,700	$ 45,700	$ 0.00	$ 0.00	RETIRADO
342	GOMEZ MURCIA JUAN CARLOS	CC 79170170	VIGILANTE	$ 1,141,462																											X					SEGUIRIDAD ARMY VIG LTDA	$ 1,141,462	$ 79,500	V	COMPENSAR EPS	1045100838	$ 45,700	COLFONDOS	1045100838	$ 182,700	$ 45,700	$ 0.00	$ 0.00	RETIRADO
343	LOTE RODRIGUEZ NELSON ENRIQUE	CC 79171559	VIGILANTE	$ 465,040											X																					SEGUIRIDAD ARMY VIG LTDA	$ 465,040	$ 32,400	V	NUEVA EPS	1045100838	$ 18,700	COLPENSIONES	1045100838	$ 74,500	$ 18,700	$ 0.00	$ 0.00	RETIRADO
344	RODRIGUEZ CANO NESTOR ANTONIO	CC 79265293	VIGILANTE	$ 380,487									X																							SEGUIRIDAD ARMY VIG LTDA	$ 380,487	$ 26,500	V	FAMISANAR EPS	1045100838	$ 15,300	COLPENSIONES	1045100838	$ 60,900	$ 15,300	$ 0.00	$ 0.00	RETIRADO
345	CAMARGO CASTELLANOS CESAR AUGUSTO	CC 91275624	VIGILANTE	$ 1,268,291																														X		SEGUIRIDAD ARMY VIG LTDA	$ 1,268,291	$ 88,300	V	EPS SANITAS	1045100838	$ 50,800	PORVENIR	1045100838	$ 203,000	$ 50,800	$ 0.00	$ 0.00	
346	SANTANA SANTANA ELVIS	CC 1003879383	VIGILANTE	$ 42,277	X																															SEGUIRIDAD ARMY VIG LTDA	$ 42,277	$ 3,000	V	NUEVA EPS	1045100838	$ 1,700	PROTECCION	1045100838	$ 6,800	$ 1,700	$ 0.00	$ 0.00	RETIRADO
347	ROJAS ROBAYO JEFERSON ALEXANDER	CC 1007441296	VIGILANTE	$ 333,334										X																						SEGUIRIDAD ARMY VIG LTDA	$ 333,334	$ 23,300	V	NUEVA EPS	1045100838	$ 13,400	PORVENIR	1045100838	$ 53,400	$ 3,000	$ 0.00	$ 0.00	RETIRADO
348	NIÑO CAÑON GIOVANNY ALEXANDER	CC 1007696300	VIGILANTE	$ 126,829			X																													SEGUIRIDAD ARMY VIG LTDA	$ 126,829	$ 8,900	V	NUEVA EPS	1045100838	$ 5,100	PORVENIR	1045100838	$ 20,300	$ 5,100	$ 0.00	$ 0.00	RETIRADO
349	BOLIVAR GARZON OSCAR FABIAN	CC 1069434559	VIGILANTE	$ 1,268,291																														X		SEGUIRIDAD ARMY VIG LTDA	$ 1,268,291	$ 88,300	V	NUEVA EPS	1045100838	$ 50,800	PORVENIR	1045100838	$ 203,000	$ 50,800	$ 0.00	$ 0.00	
350	ACOSTA PUERTAS EDWIN FERNEY	CC 1073605971	VIGILANTE	$ 1,268,291																														X		SEGUIRIDAD ARMY VIG LTDA	$ 1,268,291	$ 88,300	V	FAMISANAR EPS	1045100838	$ 50,800	PORVENIR	1045100838	$ 203,000	$ 50,800	$ 0.00	$ 0.00	
351	MORENO SANCHEZ JOHN EDISON	CC 1075626447	VIGILANTE	$ 1,268,291																														X		SEGUIRIDAD ARMY VIG LTDA	$ 1,268,291	$ 88,300	V	SALUD TOTAL EPS	1045100838	$ 50,800	PORVENIR	1045100838	$ 203,000	$ 50,800	$ 0.00	$ 0.00	
352	GARCIA GUZMAN EDUARD GIOVANNY	CC 1075662027	VIGILANTE	$ 1,268,291																														X		SEGUIRIDAD ARMY VIG LTDA	$ 1,268,291	$ 88,300	V	EPS SURA	1045100838	$ 50,800	PORVENIR	1045100838	$ 203,000	$ 50,800	$ 0.00	$ 0.00	
353	CRUZ AREVALO LUIS FERNANDO	CC 1075671042	VIGILANTE	$ 1,183,739																												X				SEGUIRIDAD ARMY VIG LTDA	$ 1,183,739	$ 82,400	V	NUEVA EPS	1045100838	$ 47,400	PORVENIR	1045100838	$ 189,400	$ 47,400	$ 0.00	$ 0.00	
354	OLAYA ORTIZ JEISSON RICARDO	CC 1075674229	VIGILANTE	$ 1,268,291																														X		SEGUIRIDAD ARMY VIG LTDA	$ 1,268,291	$ 88,300	V	FAMISANAR EPS	1045100838	$ 50,800	COLPENSIONES	1045100838	$ 203,000	$ 50,800	$ 0.00	$ 0.00	

355	CAÑON CAÑON EDGAR	CC 1076651902	VIGILANTE	$ 211,382					X																											SEGUIRIDAD ARMY VIG LTDA	$ 211,382	$ 14,800	V	NUEVA EPS	1045100838	$ 8,500	PORVENIR	1045100838	$ 33,900	$ 8,500	$ 0,00	$ 0,00	RETIRADO
356	CASTRO ROBERTO CRISTIAN CAMILO	CC 1076662055	VIGILANTE	$ 676,423															X																SEGUIRIDAD ARMY VIG LTDA	$ 676,423	$ 47,100	V	NUEVA EPS	1045100838	$ 27,100	PROTECCION	1045100838	$ 108,300	$ 27,100	$ 0,00	$ 0,00	RETIRADO
357	CAÑON CAÑON EDILSON	CC 1076662698	VIGILANTE	$ 42,277	X																															SEGUIRIDAD ARMY VIG LTDA	$ 42,277	$ 3,000	V	NUEVA EPS	1045100838	$ 1,700	PORVENIR	1045100838	$ 6,800	$ 1,700	$ 0,00	$ 0,00	RETIRADO
358	GUZMAN GUZMAN MILTON JAVIER	CC 1076669035	VIGILANTE	$ 422,764										X																						SEGUIRIDAD ARMY VIG LTDA	$ 422,764	$ 29,500	V	NUEVA EPS	1045100838	$ 17,000	PORVENIR	1045100838	$ 67,700	$ 17,000	$ 0,00	$ 0,00	RETIRADO
359	KEVIN NICOLAS DIAZ CASTRO	1012450362	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X																											TRANSCARGA AMAYA SAS	$ 1,000,000	$ 69,600	V	EPS SANITAS	1044282491	$ 40,000	PORVENIR	1045038474	$ 160,000	$ 40,000	$ 0,00	$ 0,00	
360	PEDRO ANDRES AMAYA CASTRO	1056553942	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X																					TRANSCARGA AMAYA SAS	$ 1,000,000	$ 69,600	V	SALUD TOTAL EPS	1044282491	$ 40,000	COLFONDOS	1045038474	$ 160,000	$ 40,000	$ 0,00	$ 0,00	
361	JOSE ABRAHAM PEDRAZA CELY	1057184232	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X														TRANSCARGA AMAYA SAS	$ 1,000,000	$ 69,600	V	FAMISANAR	1044282491	$ 40,000	COLFONDOS	1045038474	$ 160,000	$ 40,000	$ 0,00	$ 0,00	
362	JOSE ALEJANDRO GARZON VARGAS	1069900419	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X		X																									TRANSCARGA AMAYA SAS	$ 1,000,000	$ 43,500	V	NUEVA EPS	1044282491	$ 40,000	PROTECCION	1045038474	$ 160,000	$ 40,000	$ 0,00	$ 0,00	
363	WILIAN JOHAN HERNANDEZ ROJAS	79926499	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X															TRANSCARGA AMAYA SAS	$ 1,000,000	$ 69,600	V	EPS SANITAS	1044282491	$ 40,000	PORVENIR	1045038474	$ 160,000	$ 40,000	$ 0,00	$ 0,00	
364	RICARDO ARIAS CARRASCO	80921572	CONDUCTOR	$ 1,000,000	X	X	X	X	X		X	X	X	X																						TRANSCARGA AMAYA SAS	$ 1,000,000	$ 69,600	V	FAMISANAR	1044282491	$ 40,000	PORVENIR	1045038474	$ 160,000	$ 40,000	$ 0,00	$ 0,00	
365	MAURICIO RUIZ	93417451	MAESTRO	$ 1,000,000															INC	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	DINAMICA INGENIERIA Y EQUIPOS LTDA	$ 766,667	$ 53,400	V	MEDIMAS EPS	7829370877	$ 30,700	COLFONDOS	7829370877	$ 122,700	$ 30,700	$ 0,00	$ 0,00	INGRESO 15 DE MARZO
366	OSWALDO RODRIGUEZ	12738566	AYUDANTE	$ 1,000,000															INC	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	DINAMICA INGENIERIA Y EQUIPOS LTDA	$ 533,334	$ 37,200	V	SANITAS	7830329120	$ 21,400	COLPENSIONES	7830329120	$ 85,400	$ 21,400	$ 0,00	$ 0,00	INGRESO 15 DE MARZO
367	SINDY YESENIA BLANDON MARTINEZ	1095920062	INSP SST	$ 1,000,000															INC	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	DINAMICA INGENIERIA Y EQUIPOS LTDA	$ 733,334	$ 51,100	V	NUEVA E.P.S.	7829370877	$ 29,400	PORVENIR	7829370877	$ 117,400	$ 29,400	$ 0,00	$ 0,00	INGRESO 15 DE MARZO
368	LOPEZ CARLOS ARTURO	1113597851	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 933,334										ING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DCM INGENIEROS	$ 933,334	$ 933,334	V	SALUD TOTAL EPS	AFILIACION	$ 37,400	PROTECCION	AFILIACION	$ 149,400	$ 37,400	$ 0,00	$ 0,00	INGRESO 10 DE MARZO DE 2022
369	LOPEZ JUAN ESTEBAN	1007697236	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 933,334										ING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DCM INGENIEROS	$ 933,334	$ 933,334	V	COOSALUD	AFILIACION	$ 37,400	PROTECCION	AFILIACION	$ 149,400	$ 37,400	$ 0,00	$ 0,00	INGRESO 10 DE MARZO DE 2022
370	EDUARD MORALES SANCHEZ	1019079991	AUXILIAR DE PERFORACION	$ 933,334										ING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DCM INGENIEROS	$ 933,334	$ 933,334	V	NUEVA EPS	57643993	$ 37,400	PORVENIR	57643993	$ 149,400	$ 37,400	$ 0,00	$ 0,00	INGRESO 10 DE MARZO DE 2022
371	TORRES MORALES FERNEY	1050170311	PERFORADOR	$ 933,334										ING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DCM INGENIEROS	$ 933,334	$ 933,334	V	NUEVA EPS	57643993	$ 37,400	COLFONDOS	57643993	$ 149,400	$ 37,400	$ 0,00	$ 0,00	INGRESO 10 DE MARZO DE 2022
372	PAEZ HERNANDEZ FABIAN ALEXANDER	79592928	SUPERVISOR	$ 1,000,000										ING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DCM INGENIEROS	$ 1,000,000	$ 1,000,000	V	NUEVA EPS	57643993	$ 40,000	COLPENSIONES	57643993	$ 160,000	$ 40,000	$ 0,00	$ 0,00	INGRESO 10 DE MARZO DE 2022
373	SUAREZ JENNY CAROLINA	1076659414	SST	$ 1,000,000										ING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		DCM INGENIEROS	$ 1,000,000	$ 1,000,000	V	SANITAS	AFILIACION	$ 40,000	COLPENSIONES	AFILIACION	$ 160,000	$ 40,000	$ 0,00	$ 0,00	INGRESO 10 DE MARZO DE 2022

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ____________________ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato, Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Asi mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma ________________

Nombre: Luis Francisco Paez Paez

Director de Obra

Matricula Profesional No.: 25202-36086

Firma ________________

Nombre: Luis Antonio Rueda

Director de Interventoría

Matricula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

MHC S.A.S
CONSORCIO VIAL MHC 063

Fecha de corte: 01 a 31 de Marzo -2022

Documentos de referencia:
Circular externa No.003-2020
Complemento a la Circular externa No.003-2020

mar-22	Numero de dias:	31	Numero de personas:	208	PRESUPUESTO INVIAS			
	#	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD MAXIMA INVIAS POR PERSONA	CANTIDAD TOTAL INSUMO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
DENTRO DE ESPECIFICACION INVIAS	1	Alcohol antiseptico al 70%	Litro	Litros por dia por persona	0,006	0	$ 7.768	$ -
	2	Gel antibacterial	Litro	Litros por dia por pesona	0,003	12,34	$ 7.814	$ 96.425,00
	3	Jabon liquido antibacterial	Litro	Litros por dia por pesona	0,005	0	$ 3.624	$ -
	4	Hipoclorito de uso domestico	Litro	Litros por cada litro de solucion a 2500 ppm, para lavado rutinario	0,05	0	$ 2.274	$ -
	5	Tapabocas reutilizable en tela	Unidad	Unidades por mes por persona	4	0	$ 1.000	$ -
	6	Guantes de nitrilo	Par	Dos Pares por semana por persona	4	0	$ 598	$ -
	8	Bomba de espalda	Unidad	Por cada obra	0	0	$ 124.900	$ -
								$ 96.425

Administración (2.5%)	$ 2.411,00
IVA 19%	$ 458,00
TOTAL CON IVA	$ 99.294,00

Elaboró: Nelson Bohorquez

ProFesional SST - MHC

Aprobado: Vanesa Valbuena

Profesional SST Interventoria

Simple

Informe Detallado por Empleado

RAZON SOCIAL	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES		
NIT EMPRESA	CC 19146113	**DIRECCION**	Carrera 22a No. 85-20
TIPO APORTANTE	2	**TELEFONO**	6226620
TIPO PERSONA	N	**FORMA PRESENTACION**	U
CIUDAD	BOGOTA	**DEPARTAMENTO**	BOGOTA D.C.

Número Planilla	Fecha pago	Periodos	
1045147656	2022-04-05	202203	202204

DATOS AFILIADO					Novedades																		Pension			salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Documento	Apellidos y Nombres		Cotizante	Subtipo	Ing	Ret	Tde	Tae	Vsp	corr	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irp	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Nombre AFP	IBC	Cotizacion	Nombre EPS	IBC	Cotizacion	Nombre ARP	IBC	Cotizacion	Nombre CCF	IBC	Cotizacion CCF	Cotizacion Sena	Cotizacion ICBF	Cotizacion ESAP	Cotizacion Min EDU	TOTAL
1075672646	CONTRERAS	RAFAEL	1	0									X					0	2	2	2	2	PORVENIR	66.667	10.700	EPS-S CONVIDA	66.667	2.700	ARL SURA	66.667	0	COLSUBSIDIO	66.667	0	0	0	0	0	$13.400
7317410	SANCHEZ	JHON	1	0							X							0	29	29	29	29	PORVENIR	3.077.087	492.400	SALUD TOTAL EPS	3.077.087	123.100	ARL SURA	3.077.087	214.200	COLSUBSIDIO	3.077.087	123.100	0	0	0	0	$952.800
65829520	PALOMINO	ZAIRA	1	0		X												0	18	18	18	18	PORVENIR	1.500.000	240.000	EPS SANITAS	1.500.000	60.000	ARL SURA	1.500.000	7.900	COLSUBSIDIO	2.364.583	94.600	0	0	0	0	$402.500
1007421156	GONZALEZ	SERGIO	1	0								X						0	1	1	1	1	PORVENIR	33.334	4.100	FAMISANAR EPS	33.334	0	ARL SURA	33.334	0	COLSUBSIDIO	33.334	0	0	0	0	0	$4.100
80110542	AMADO	ALEXANDER	1	0											X			0	1	1	1	1	COLPENSIONES	57.818	9.300	NUEVA EPS	57.818	2.400	ARL SURA	57.818	0	COLSUBSIDIO	33.333	1.400	0	0	0	0	$13.100
1105786307	VASQUEZ	NEYLA	1	0														0	30	30	30	30	COLPENSIONES	2.300.000	368.000	EPS SANITAS	2.300.000	92.000	ARL SURA	2.300.000	160.100	COLSUBSIDIO	2.300.000	92.000	0	0	0	0	$712.100
86004336	RODRIGUEZ	OSCAR	1	0	X													0	29	29	29	29	COLPENSIONES	1.740.000	278.400	EPS SURA	1.740.000	69.600	ARL SURA	1.740.000	121.200	COLSUBSIDIO	1.740.000	69.600	0	0	0	0	$538.800
1104133338	PEREZ	DIONEL	1	0							X							0	30	30	30	30	PORVENIR	1.491.682	238.700	EPS-S COOSALUD	1.491.682	59.700	ARL SURA	1.491.682	103.900	COLSUBSIDIO	1.491.682	59.700	0	0	0	0	$462.000
80256668	MUÑOZ	HECTOR	1	0							X							0	30	30	30	30	COLFONDOS	1.254.181	200.700	FAMISANAR EPS	1.254.181	50.200	ARL SURA	1.254.181	87.300	COLSUBSIDIO	1.254.181	50.200	0	0	0	0	$388.400
13567141	NOBLES	WILDER	1	0											X			0	1	1	1	1	PORVENIR	87.637	14.100	SALUD TOTAL EPS	87.637	3.600	ARL SURA	87.637	0	COLSUBSIDIO	53.333	2.200	0	0	0	0	$19.900
1075687210	RODRIGUEZ	WILLIAM	1	0							X							0	30	30	30	30	PORVENIR	1.113.545	178.200	FAMISANAR EPS	1.113.545	44.600	ARL SURA	1.113.545	77.600	COLSUBSIDIO	1.113.545	44.600	0	0	0	0	$345.000
1073327376	RUIZ	DEVISON	1	0							X							0	28	28	28	28	PORVENIR	1.923.345	307.800	NUEVA EPS	1.923.345	77.000	ARL SURA	1.923.345	133.900	COLSUBSIDIO	1.923.345	77.000	0	0	0	0	$595.700
1075661539	SUAREZ	EDILSON	1	0											X			0	1	1	1	1	PROTECCION (ING +	94.622	15.200	EPS SURA	94.622	3.800	ARL SURA	94.622	0	COLSUBSIDIO	56.667	2.300	0	0	0	0	$21.300
1075670604	PEÑA	MARIA	1	0							X							0	18	18	18	18	COLPENSIONES	1.539.063	246.300	COMPENSAR EPS	1.539.063	61.600	ARL SURA	1.539.063	107.200	COLSUBSIDIO	1.539.063	61.600	0	0	0	0	$476.700
1075657078	CASTAÑEDA	JOHN	1	0							X							0	30	30	30	30	PORVENIR	2.071.865	331.500	EPS SURA	2.071.865	82.900	ARL SURA	2.071.865	90.200	COLSUBSIDIO	2.071.865	82.900	0	0	0	0	$587.500
79006194	RAMIREZ	EDGAR	1	0			X				X							0	29	29	29	29	PORVENIR	1.878.845	300.700	NUEVA EPS	1.878.845	75.200	ARL SURA	1.878.845	81.800	COLSUBSIDIO	1.878.845	75.200	0	0	0	0	$532.900
13392180	CONTRERAS	JOSE	1	0											X			0	2	2	2	2	COLPENSIONES	182.292	29.200	EPS SANITAS	182.292	7.300	ARL SURA	182.292	0	COLSUBSIDIO	106.667	4.300	0	0	0	0	$40.800
16889956	JARA	WILLIAM	1	0							X							0	28	28	28	28	PORVENIR	1.975.017	316.100	FAMISANAR EPS	1.975.017	79.100	ARL SURA	1.975.017	137.500	COLSUBSIDIO	1.975.017	79.100	0	0	0	0	$611.800
1097665832	ARIZA	JAIME	1	0			X				X							0	28	28	28	28	PORVENIR	1.942.500	310.800	COMPENSAR EPS	1.942.500	77.700	ARL SURA	1.942.500	135.200	COLSUBSIDIO	1.942.500	77.700	0	0	0	0	$601.400
11347058	RODRIGUEZ	JOSE	1	0							X							0	29	29	29	29	PORVENIR	2.341.014	374.600	COMPENSAR EPS	2.341.014	93.700	ARL SURA	2.341.014	163.000	COLSUBSIDIO	2.341.014	93.700	0	0	0	0	$725.000
1075682755	VARGAS	BRAYAN	1	0							X							0	30	30	30	30	PORVENIR	1.046.877	167.600	EPS SANITAS	1.046.877	41.900	ARL SURA	1.046.877	72.900	COLSUBSIDIO	1.046.877	41.900	0	0	0	0	$324.300

Simple

Informe Detallado por Empleado

RAZON SOCIAL	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES		
NIT EMPRESA	CC 19146113	**DIRECCION**	Carrera 22a No. 85-20
TIPO APORTANTE	2	**TELEFONO**	6226620
TIPO PERSONA	N	**FORMA PRESENTACION**	U
CIUDAD	BOGOTA	**DEPARTAMENTO**	BOGOTA D.C.

Número Planilla	Fecha pago	Periodos	
1045147656	2022-04-05	202203	202204

DATOS AFILIADO					Novedades																	Pension			salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Documento	Apellidos y Nombres		Cotizante	Subtipo	Ing	Ret	Tde	Tae	Vsp	corr	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irp	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Nombre AFP	IBC	Cotizacion	Nombre EPS	IBC	Cotizacion	Nombre ARP	IBC	Cotizacion	Nombre CCF	IBC	Cotizacion CCF	Cotizacion Sena	Cotizacion ICBF	Cotizacion ESAP	Cotizacion Min EDU	TOTAL
1070958972	MORA	WILLIAM	1	0							X							0	30	30	30	30	PORVENIR	3.227.171	516.400	NUEVA EPS	3.227.171	129.100	ARL SURA	3.227.171	140.400	COLSUBSIDIO	3.227.171	129.100	0	0	0	0	$915.000
1075662006	PEDRAZA	EDGAR	1	0							X							0	30	30	30	30	PROTECCION (ING +	1.273.977	203.900	NUEVA EPS	1.273.977	51.000	ARL SURA	1.273.977	88.700	COLSUBSIDIO	1.273.977	51.000	0	0	0	0	$394.600
1077972031	GUTIERREZ	DAVINSON	1	0											X			0	3	3	3	3	PORVENIR	204.375	32.700	EPS SANITAS	204.375	8.200	ARL SURA	204.375	0	COMFAMILIARES DE CALDAS	210.000	8.400	0	0	0	0	$49.300
1075684646	RINCON	HENRY	1	0								X						0	2	2	2	2	COLFONDOS	66.667	8.100	FAMISANAR EPS	66.667	0	ARL SURA	66.667	0	COLSUBSIDIO	66.667	0	0	0	0	0	$8.100
1048821056	ALARCON	HECTOR	1	0			X				X							0	30	30	30	30	PORVENIR	2.338.680	374.200	SALUD TOTAL EPS	2.338.680	93.600	ARL SURA	2.338.680	162.800	COLSUBSIDIO	2.338.680	93.600	0	0	0	0	$724.200
1023904054	BELTRAN	MICHAEL	1	0							X							0	30	30	30	30	PORVENIR	2.031.683	325.100	SALUD TOTAL EPS	2.031.683	81.300	ARL SURA	2.031.683	141.500	COLSUBSIDIO	2.031.683	81.300	0	0	0	0	$629.200
13514289	CHAPARRO	HENDERSON	1	0											X			0	1	1	1	1	PORVENIR	108.232	17.400	NUEVA EPS	108.232	4.400	ARL SURA	108.232	0	COLSUBSIDIO	73.333	3.000	0	0	0	0	$24.800
79726581	URETA	JOSE	1	0											X			0	1	1	1	1	PROTECCION (ING +	92.180	14.800	NUEVA EPS	92.180	3.700	ARL SURA	92.180	0	COLSUBSIDIO	53.333	2.200	0	0	0	0	$20.700
1030536614	HERRERA	JEFFERSON	1	0														0	30	30	30	30	PROTECCION (ING +	5.000.000	800.000	EPS SURA	5.000.000	200.000	ARL SURA	5.000.000	348.000	COLSUBSIDIO	5.000.000	200.000	0	0	0	0	$1.548.000
1072747306	SALGUERO	MILENA	1	0									X					0	1	1	1	1	PORVENIR	33.334	5.400	EPS SANITAS	33.334	1.400	ARL SURA	33.334	0	COLSUBSIDIO	33.334	0	0	0	0	0	$6.800
11520902	GARCIA	ARMANDO	1	0							X							0	24	24	24	24	COLPENSIONES	848.962	135.900	COMPENSAR EPS	848.962	34.000	ARL SURA	848.962	59.100	COLSUBSIDIO	848.962	34.000	0	0	0	0	$263.000
91110198	GONZALEZ	JAIME	1	0														0	30	30	30	30	COLPENSIONES	5.000.000	800.000	EPS SANITAS	5.000.000	200.000	ARL SURA	5.000.000	348.000	COLSUBSIDIO	5.000.000	200.000	0	0	0	0	$1.548.000
76216360	CAICEDO	YONOVER	1	0											X			0	1	1	1	1	PORVENIR	102.031	16.400	COMPENSAR EPS	102.031	4.100	ARL SURA	102.031	0	COLSUBSIDIO	83.333	3.400	0	0	0	0	$23.900
52156314	LATORRE	ANA	1	0					X									0	30	30	30	30	COLPENSIONES	3.000.000	480.000	EPS SANITAS	3.000.000	120.000	ARL SURA	3.000.000	15.700	COLSUBSIDIO	3.000.000	120.000	0	0	0	0	$735.700
80775218	GUTIERREZ	YESID	1	0														0	30	30	30	30	PROTECCION (ING +	2.000.000	320.000	COMPENSAR EPS	2.000.000	80.000	ARL SURA	2.000.000	139.200	COLSUBSIDIO	2.000.000	80.000	0	0	0	0	$619.200
1075688014	ROMERO	ANDREA	1	0														0	29	29	29	29	PORVENIR	1.450.000	232.000	COMPENSAR EPS	1.450.000	58.000	ARL SURA	1.450.000	101.000	COLSUBSIDIO	1.450.000	58.000	0	0	0	0	$449.000
11444770	SANCHEZ	HERMES	1	0							X							0	30	30	30	30	COLPENSIONES	5.256.651	841.100	COMPENSAR EPS	5.256.651	210.300	ARL SURA	5.256.651	365.900	COLSUBSIDIO	5.256.651	210.300	0	0	0	0	$1.627.600
1003660870	VEGA	BRAYAN	1	0		X					X							0	26	26	26	26	PORVENIR	1.353.135	216.600	FAMISANAR EPS	1.353.135	54.200	ARL SURA	1.353.135	94.200	COLSUBSIDIO	1.648.967	66.000	0	0	0	0	$431.000
11444420	MORALES	YESID	1	0							X							0	30	30	30	30	COLPENSIONES	4.069.046	651.100	FAMISANAR EPS	4.069.046	162.800	ARL SURA	4.069.046	283.300	COLSUBSIDIO	4.069.046	162.800	0	0	0	0	$1.260.000
1020828349	SALAZAR	MILTON	1	0											X			0	1	1	1	1	PORVENIR	59.500	9.600	FAMISANAR EPS	59.500	2.400	ARL SURA	59.500	0	COLSUBSIDIO	40.000	1.600	0	0	0	0	$13.600
1024585186	DIAZ	CRISTIAN	1	0							X							0	30	30	30	30	PORVENIR	1.606.250	257.000	EPS SURA	1.606.250	64.300	ARL SURA	1.606.250	111.800	COLSUBSIDIO	1.606.250	64.300	0	0	0	0	$497.400

Simple

Informe Detallado por Empleado

RAZON SOCIAL	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES		
NIT EMPRESA	CC 19146113	**DIRECCION**	Carrera 22a No. 85-20
TIPO APORTANTE	2	**TELEFONO**	6226620
TIPO PERSONA	N	**FORMA PRESENTACION**	U
CIUDAD	BOGOTA	**DEPARTAMENTO**	BOGOTA D.C.

Número Planilla	Fecha pago	Periodos	
1045147656	2022-04-05	202203	202204

DATOS AFILIADO					Novedades																	Pension			salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Documento	Apellidos y Nombres		Cotizante	Subtipo	Ing	Ret	Tde	Tae	Vsp	corr	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irp	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Nombre AFP	IBC	Cotizacion	Nombre EPS	IBC	Cotizacion	Nombre ARP	IBC	Cotizacion	Nombre CCF	IBC	Cotizacion CCF	Cotizacion Sena	Cotizacion ICBF	Cotizacion ESAP	Cotizacion Min EDU	TOTAL
80758274	RIAÑOS	FREDY	1	0	X						X							0	23	23	23	23	PORVENIR	797.920	127.700	SALUD TOTAL EPS	797.920	32.000	ARL SURA	797.920	55.600	COLSUBSIDIO	797.920	32.000	0	0	0	0	$247.300
80110542	AMADO	ALEXANDER	1	0		X					X							0	18	18	18	18	COLPENSIONES	916.680	146.700	NUEVA EPS	916.680	36.700	ARL SURA	916.680	63.900	COLSUBSIDIO	1.183.346	47.400	0	0	0	0	$294.700
1075687408	PINILLA	EDUAR	1	0								X						0	2	2	2	2	PORVENIR	66.667	8.100	FAMISANAR EPS	66.667	0	ARL SURA	66.667	0	COLSUBSIDIO	66.667	0	0	0	0	0	$8.100
1007341923	CHAVES	DIEGO	1	0								X						0	1	1	1	1	PORVENIR	45.069	5.500	FAMISANAR EPS	45.069	0	ARL SURA	45.069	0	COLSUBSIDIO	45.069	0	0	0	0	0	$5.500
1005543158	MEDINA	MIGUEL	1	0							X							0	29	29	29	29	PORVENIR	2.667.937	426.900	SALUD TOTAL EPS	2.667.937	106.800	ARL SURA	2.667.937	185.700	COLSUBSIDIO	2.667.937	106.800	0	0	0	0	$826.200
1106892051	CARDOZO	CAMILO	1	0							X							0	30	30	30	30	PROTECCION (ING +	3.755.231	600.900	FAMISANAR EPS	3.755.231	150.300	ARL SURA	3.755.231	261.400	COLSUBSIDIO	3.755.231	150.300	0	0	0	0	$1.162.900
1193586114	AHUMADA	BRAYAN	1	0	X						X							0	28	28	28	28	COLPENSIONES	982.295	157.200	EPS SURA	982.295	39.300	ARL SURA	982.295	68.400	COLSUBSIDIO	982.295	39.300	0	0	0	0	$304.200
1095818839	DIAZ	JORGE	1	0							X							0	23	23	23	23	PORVENIR	2.193.744	351.000	SALUD TOTAL EPS	2.193.744	87.800	ARL SURA	2.193.744	152.700	COMFAMILIARES DE CALDAS	2.193.744	87.800	0	0	0	0	$679.300
1075664068	RAMIREZ	CARLOS	1	0					X		X							0	30	30	30	30	PORVENIR	2.862.501	458.100	EPS SURA	2.862.501	114.600	ARL SURA	2.862.501	199.300	COLSUBSIDIO	2.862.501	114.600	0	0	0	0	$886.600
1069100660	MOLINA	NESTOR	1	0							X							0	28	28	28	28	PORVENIR	1.105.219	176.900	COMPENSAR EPS	1.105.219	44.300	ARL SURA	1.105.219	77.000	COLSUBSIDIO	1.105.219	44.300	0	0	0	0	$342.500
16161903	ROJAS	JOHNNY	1	0							X							0	30	30	30	30	COLPENSIONES	2.716.876	434.800	NUEVA EPS	2.716.876	108.700	ARL SURA	2.716.876	189.100	COMFAMILIARES DE CALDAS	2.716.876	108.700	0	0	0	0	$841.300
13993947	DEL RIO	JULIAN	1	0							X							0	29	29	29	29	PORVENIR	5.100.000	816.000	EPS SANITAS	5.100.000	204.000	ARL SURA	5.100.000	355.000	COLSUBSIDIO	5.100.000	204.000	0	0	0	0	$1.579.000
1105785905	CHAVES	CARLOS	1	0							X							0	28	28	28	28	PORVENIR	1.242.723	198.900	NUEVA EPS	1.242.723	49.800	ARL SURA	1.242.723	86.500	COLSUBSIDIO	1.242.723	49.800	0	0	0	0	$385.000
16889956	JARA	WILLIAM	1	0											X			0	2	2	2	2	PORVENIR	152.800	24.500	FAMISANAR EPS	152.800	6.200	ARL SURA	152.800	0	COLSUBSIDIO	106.667	4.300	0	0	0	0	$35.000
1068657255	ARROYO	VICTOR	1	0											X			0	1	1	1	1	PORVENIR	143.282	23.000	NUEVA EPS	143.282	5.800	ARL SURA	143.282	0	COMFAMILIAR DEL	86.667	3.500	0	0	0	0	$32.300
11447698	CARDENAS	DAVID	1	0								X						0	1	1	1	1	COLPENSIONES	66.875	8.100	FAMISANAR EPS	66.875	0	ARL SURA	66.875	0	COLSUBSIDIO	66.875	0	0	0	0	0	$8.100
1007788654	PEÑA	MARIO	1	0								X						0	2	2	2	2	PORVENIR	125.029	15.100	FAMISANAR EPS	125.029	0	ARL SURA	125.029	0	COLSUBSIDIO	125.029	0	0	0	0	0	$15.100
1075662151	GARCIA	CARLOS	1	0		X					X							0	1	1	1	1	PORVENIR	153.117	24.500	FAMISANAR EPS	153.117	6.200	ARL SURA	153.117	10.700	COLSUBSIDIO	282.284	11.300	0	0	0	0	$52.700
3103557	GOMEZ	JOHN	1	0	X						X							0	17	17	17	17	PORVENIR	643.750	103.000	FAMISANAR EPS	643.750	25.800	ARL SURA	643.750	44.900	COLSUBSIDIO	643.750	25.800	0	0	0	0	$199.500
79635906	RINCON	RAUL	1	0							X							0	30	30	30	30	COLPENSIONES	5.478.315	876.600	FAMISANAR EPS	5.478.315	219.200	ARL SURA	5.478.315	381.300	COLSUBSIDIO	5.478.315	219.200	0	0	0	0	$1.696.300
16075376	ORTEGON	GIOVANNI	1	0							X							0	29	29	29	29	PROTECCION (ING +	2.273.351	363.800	NUEVA EPS	2.273.351	91.000	ARL SURA	2.273.351	158.300	COMFAMILIARES DE CALDAS	2.273.351	91.000	0	0	0	0	$704.100

Simple

Informe Detallado por Empleado

RAZON SOCIAL	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES		
NIT EMPRESA	CC 19146113	**DIRECCION**	Carrera 22a No. 85-20
TIPO APORTANTE	2	**TELEFONO**	6226620
TIPO PERSONA	N	**FORMA PRESENTACION**	U
CIUDAD	BOGOTA	**DEPARTAMENTO**	BOGOTA D.C.

Número Planilla	Fecha pago	Periodos	
1045147656	2022-04-05	202203	202204

DATOS AFILIADO					Novedades																		Pension			salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Documento	Apellidos y Nombres		Cotizante	Subtipo	Ing	Ret	Tde	Tae	Vsp	corr	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irp	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Nombre AFP	IBC	Cotizacion	Nombre EPS	IBC	Cotizacion	Nombre ARP	IBC	Cotizacion	Nombre CCF	IBC	Cotizacion CCF	Cotizacion Sena	Cotizacion ICBF	Cotizacion ESAP	Cotizacion Min EDU	TOTAL
11344254	ROBAYO	JULIO	1	0							X							0	30	30	30	30	PORVENIR	2.800.000	448.000	SALUD TOTAL EPS	2.800.000	112.000	ARL SURA	2.800.000	194.900	COLSUBSIDIO	2.800.000	112.000	0	0	0	0	$866.900
80902816	GUTIERREZ	JONATHAN	1	0											X			0	1	1	1	1	PROTECCION (ING +	36.021	5.800	NUEVA EPS	36.021	1.500	ARL SURA	36.021	0	COLSUBSIDIO	33.333	1.400	0	0	0	0	$8.700
1093906490	ROJAS	JAIRO	1	0							X							0	30	30	30	30	PROTECCION (ING +	2.688.125	430.100	SALUD TOTAL EPS	2.688.125	107.600	ARL SURA	2.688.125	187.100	COMFAMILIARES DE CALDAS	2.688.125	107.600	0	0	0	0	$832.400
1075672646	CONTRERAS	RAFAEL	1	0							X							0	28	28	28	28	PORVENIR	1.479.182	236.700	EPS-S CONVIDA	1.479.182	59.200	ARL SURA	1.479.182	103.000	COLSUBSIDIO	1.479.182	59.200	0	0	0	0	$458.100
1070706537	MORANTES	GUSTAVO	1	0							X							0	29	29	29	29	PORVENIR	3.597.188	575.600	FAMISANAR EPS	3.597.188	143.900	ARL SURA	3.597.188	250.400	COLSUBSIDIO	3.597.188	143.900	0	0	0	0	$1.113.800
80544530	ESPITIA	RONALD	1	0									X					0	1	1	1	1	PROTECCION (ING +	33.334	5.400	EPS-S CONVIDA	33.334	1.400	ARL SURA	33.334	0	COLSUBSIDIO	33.334	0	0	0	0	0	$6.800
1070305835	BUSTOS	NIXON	1	0	X						X							0	2	2	2	2	COLFONDOS	86.667	13.900	SALUD TOTAL EPS	86.667	3.500	ARL SURA	86.667	6.100	COMFENALCO ANTIOQUIA	86.667	3.500	0	0	0	0	$27.000
80378246	GARZON	WILSON	1	0							X							0	30	30	30	30	COLPENSIONES	3.108.438	497.400	FAMISANAR EPS	3.108.438	124.400	ARL SURA	3.108.438	216.400	COLSUBSIDIO	3.108.438	124.400	0	0	0	0	$962.600
2988498	PATIÑO	JESUS	1	0							X							0	30	30	30	30	COLPENSIONES	3.071.442	491.500	FAMISANAR EPS	3.071.442	122.900	ARL SURA	3.071.442	213.800	COLSUBSIDIO	3.071.442	122.900	0	0	0	0	$951.100
11428038	CALDERON	JESUS	1	1											X			0	0	1	1	1	NINGUNA AFP	0	0	NUEVA EPS	134.635	5.400	ARL SURA	134.635	0	COLSUBSIDIO	110.000	4.400	0	0	0	0	$9.800
1026292216	CASTIBLANCO	SANDRA	1	0														0	30	30	30	30	COLFONDOS	2.000.000	320.000	EPS SANITAS	2.000.000	80.000	ARL SURA	2.000.000	139.200	COLSUBSIDIO	2.000.000	80.000	0	0	0	0	$619.200
1075656385	VARGAS	YULY	1	0											X			0	1	1	1	1	PORVENIR	116.667	18.700	FAMISANAR EPS	116.667	4.700	ARL SURA	116.667	0	COLSUBSIDIO	116.667	4.700	0	0	0	0	$28.100
3210400	SALGADO	EDGAR	1	0							X							0	30	30	30	30	COLPENSIONES	2.046.676	327.500	FAMISANAR EPS	2.046.676	81.900	ARL SURA	2.046.676	142.500	COLSUBSIDIO	2.046.676	81.900	0	0	0	0	$633.800
1075683124	BALLEN	JORGE	1	0							X							0	30	30	30	30	PORVENIR	1.103.128	176.600	EPS SURA	1.103.128	44.200	ARL SURA	1.103.128	76.800	COLSUBSIDIO	1.103.128	44.200	0	0	0	0	$341.800
1064119445	PEREZ	JOSUE	1	0	X						X							0	29	29	29	29	PORVENIR	1.070.842	171.400	NUEVA EPS	1.070.842	42.900	ARL SURA	1.070.842	74.600	COLSUBSIDIO	1.070.842	42.900	0	0	0	0	$331.800
1003526270	ALVAREZ	DANIEL	1	0		X					X							0	2	2	2	2	PORVENIR	170.826	27.400	FAMISANAR EPS	170.826	6.900	ARL SURA	170.826	11.900	COLSUBSIDIO	194.436	7.800	0	0	0	0	$54.000
2989077	GARZON	EUCLIDES	1	0	X						X							0	17	17	17	17	PORVENIR	1.013.332	162.200	FAMISANAR EPS	1.013.332	40.600	ARL SURA	1.013.332	70.600	COLSUBSIDIO	1.013.332	40.600	0	0	0	0	$314.000
79006194	RAMIREZ	EDGAR	1	0									X					0	1	1	1	1	PORVENIR	37.774	6.100	NUEVA EPS	37.774	1.600	ARL SURA	37.774	0	COLSUBSIDIO	37.774	0	0	0	0	0	$7.700
1053807757	SUAREZ	BRANYONY	1	0							X							0	27	27	27	27	PROTECCION (ING +	2.097.813	335.700	ASMET SALUD	2.097.813	84.000	ARL SURA	2.097.813	146.100	COMFAMILIARES DE CALDAS	2.097.813	84.000	0	0	0	0	$649.800
11275487	RODRIGUEZ	EDGAR	1	0							X							0	30	30	30	30	PROTECCION (ING +	1.515.625	242.500	SALUD TOTAL EPS	1.515.625	60.700	ARL SURA	1.515.625	105.500	COLSUBSIDIO	1.515.625	60.700	0	0	0	0	$469.400
14325995	BASABE	MARCO	1	0							X							0	30	30	30	30	PORVENIR	1.333.347	213.400	NUEVA EPS	1.333.347	53.400	ARL SURA	1.333.347	92.900	COLSUBSIDIO	1.333.347	53.400	0	0	0	0	$413.100

Simple

Informe Detallado por Empleado

RAZON SOCIAL	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES		
NIT EMPRESA	CC 19146113	**DIRECCION**	Carrera 22a No. 85-20
TIPO APORTANTE	2	**TELEFONO**	6226620
TIPO PERSONA	N	**FORMA PRESENTACION**	U
CIUDAD	BOGOTA	**DEPARTAMENTO**	BOGOTA D.C.

Número Planilla	Fecha pago	Periodos	
1045147656	2022-04-05	202203	202204

DATOS AFILIADO					Novedades																		Pension			salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Documento	Apellidos y Nombres		Cotizante	Subtipo	Ing	Ret	Tde	Tae	Vsp	corr	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irp	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Nombre AFP	IBC	Cotizacion	Nombre EPS	IBC	Cotizacion	Nombre ARP	IBC	Cotizacion	Nombre CCF	IBC	Cotizacion CCF	Cotizacion Sena	Cotizacion ICBF	Cotizacion ESAP	Cotizacion Min EDU	TOTAL
11520902	GARCIA	ARMANDO	1	0											X			0	6	6	6	6	COLPENSIONES	208.332	33.400	COMPENSAR EPS	208.332	8.400	ARL SURA	208.332	0	COLSUBSIDIO	200.000	8.000	0	0	0	0	$49.800
1095818839	DIAZ	JORGE	1	0											X			0	7	7	7	7	PORVENIR	495.831	79.400	SALUD TOTAL EPS	495.831	19.900	ARL SURA	495.831	0	COMFAMILIARES DE CALDAS	466.667	18.700	0	0	0	0	$118.000
1076647515	NOCUA	NELSON	1	0							X							0	30	30	30	30	PORVENIR	2.242.532	358.900	COMPENSAR EPS	2.242.532	89.800	ARL SURA	2.242.532	97.600	COLSUBSIDIO	2.242.532	89.800	0	0	0	0	$636.100
75145329	ROJAS	ARBEY	1	0											X			0	1	1	1	1	COLFONDOS	89.735	14.400	FAMISANAR EPS	89.735	3.600	ARL SURA	89.735	0	COLSUBSIDIO	53.333	2.200	0	0	0	0	$20.200
11445172	TRIANA	JAIRO	1	0							X							0	30	30	30	30	COLPENSIONES	5.425.018	868.100	EPS SANITAS	5.425.018	217.100	ARL SURA	5.425.018	377.600	COLSUBSIDIO	5.425.018	217.100	0	0	0	0	$1.679.900
1005543158	MEDINA	MIGUEL	1	0											X			0	1	1	1	1	PORVENIR	91.504	14.700	SALUD TOTAL EPS	91.504	3.700	ARL SURA	91.504	0	COLSUBSIDIO	63.333	2.600	0	0	0	0	$21.000
1023919720	PISCO	BRANDON	1	0							X							0	30	30	30	30	PORVENIR	3.536.458	565.900	EPS SURA	3.536.458	141.500	ARL SURA	3.536.458	246.200	COLSUBSIDIO	3.536.458	141.500	0	0	0	0	$1.095.100
1098626096	BUITRAGO	CARLOS	1	0							X							0	30	30	30	30	PORVENIR	3.155.645	505.000	NUEVA EPS	3.155.645	126.300	ARL SURA	3.155.645	219.700	COMFAMILIARES DE CALDAS	3.155.645	126.300	0	0	0	0	$977.300
1097665832	ARIZA	JAIME	1	0								X						0	2	2	2	2	PORVENIR	126.250	15.200	COMPENSAR EPS	126.250	0	ARL SURA	126.250	0	COLSUBSIDIO	126.250	0	0	0	0	0	$15.200
86004336	RODRIGUEZ	OSCAR	1	0								X						0	1	1	1	1	COLPENSIONES	60.000	7.200	EPS SURA	60.000	0	ARL SURA	60.000	0	COLSUBSIDIO	60.000	0	0	0	0	0	$7.200
1192896428	ALVARADO	EDIER	1	0							X							0	30	30	30	30	PORVENIR	1.447.936	231.700	FAMISANAR EPS	1.447.936	58.000	ARL SURA	1.447.936	100.800	COLSUBSIDIO	1.447.936	58.000	0	0	0	0	$448.500
80495388	BERMUDEZ	MIGUEL	1	0							X							0	30	30	30	30	COLPENSIONES	3.544.292	567.100	NUEVA EPS	3.544.292	141.800	ARL SURA	3.544.292	246.700	COLSUBSIDIO	3.544.292	141.800	0	0	0	0	$1.097.400
74281791	BOHORQUEZ	NELSON	1	0														0	30	30	30	30	COLFONDOS	5.000.000	800.000	COMPENSAR EPS	5.000.000	200.000	ARL SURA	5.000.000	348.000	COLSUBSIDIO	5.000.000	200.000	0	0	0	0	$1.548.000
1192897853	OVIEDO	SERGIO	1	0							X							0	28	28	28	28	PORVENIR	1.230.225	196.900	COMPENSAR EPS	1.230.225	49.300	ARL SURA	1.230.225	85.700	COLSUBSIDIO	1.230.225	49.300	0	0	0	0	$381.200
1075687408	PINILLA	EDUAR	1	0							X							0	28	28	28	28	PORVENIR	1.094.794	175.200	FAMISANAR EPS	1.094.794	43.800	ARL SURA	1.094.794	76.200	COLSUBSIDIO	1.094.794	43.800	0	0	0	0	$339.000
1016054283	MARTINEZ	ANGEL	1	0									X					0	15	15	15	15	PROTECCION (ING +	866.580	138.700	EPS SURA	866.580	34.700	ARL SURA	866.580	0	COLSUBSIDIO	866.580	0	0	0	0	0	$173.400
1106741828	PAEREZ	JULIAN	1	0							X							0	28	28	28	28	PORVENIR	2.450.225	392.100	NUEVA EPS	2.450.225	98.100	ARL SURA	2.450.225	170.600	COLSUBSIDIO	2.450.225	98.100	0	0	0	0	$758.900
93355503	CERVERA	JULIO	1	0														0	30	30	30	30	PORVENIR	4.200.000	672.000	EPS SURA	4.200.000	168.000	ARL SURA	4.200.000	292.400	COLSUBSIDIO	4.200.000	168.000	0	0	0	0	$1.300.400
4144268	GUERRERO	JAIRO	1	0			X				X							0	30	30	30	30	COLPENSIONES	5.525.019	884.100	ALIANSALUD	5.525.019	221.100	ARL SURA	5.525.019	384.600	COLSUBSIDIO	5.525.019	221.100	0	0	0	0	$1.710.900
1032432251	CARDENAS	MILLER	1	0							X							0	30	30	30	30	PORVENIR	3.771.875	603.500	EPS SANITAS	3.771.875	150.900	ARL SURA	3.771.875	262.600	COLSUBSIDIO	3.771.875	150.900	0	0	0	0	$1.167.900
53131280	ANDRADE	NINE	1	0											X			0	1	1	1	1	PORVENIR	161.875	25.900	SALUD TOTAL EPS	161.875	6.500	ARL SURA	161.875	0	COLSUBSIDIO	100.000	4.000	0	0	0	0	$36.400

Simple

Informe Detallado por Empleado

RAZON SOCIAL	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES		
NIT EMPRESA	CC 19146113	**DIRECCION**	Carrera 22a No. 85-20
TIPO APORTANTE	2	**TELEFONO**	6226620
TIPO PERSONA	N	**FORMA PRESENTACION**	U
CIUDAD	BOGOTA	**DEPARTAMENTO**	BOGOTA D.C.

Número Planilla	Fecha pago	Periodos	
1045147656	2022-04-05	202203	202204

DATOS AFILIADO					Novedades																	Pension			salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Documento	Apellidos y Nombres		Cotizante	Subtipo	Ing	Ret	Tde	Tae	Vsp	corr	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irp	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Nombre AFP	IBC	Cotizacion	Nombre EPS	IBC	Cotizacion	Nombre ARP	IBC	Cotizacion	Nombre CCF	IBC	Cotizacion CCF	Cotizacion Sena	Cotizacion ICBF	Cotizacion ESAP	Cotizacion Min EDU	TOTAL
1076736089	ORTIZ	KEVIN	1	0							X							0	30	30	30	30	PORVENIR	1.552.107	248.400	EPS SANITAS	1.552.107	62.100	ARL SURA	1.552.107	108.100	COLSUBSIDIO	1.552.107	62.100	0	0	0	0	$480.700
37754784	SANCHEZ	LUZ	1	0			X											0	26	26	26	26	PORVENIR	4.333.334	693.400	NUEVA EPS	4.333.334	173.400	ARL SURA	4.333.334	301.700	COLSUBSIDIO	4.333.334	173.400	0	0	0	0	$1.341.900
1070955259	URREGO	HECTOR	1	0							X							0	30	30	30	30	PORVENIR	2.105.840	337.000	FAMISANAR EPS	2.105.840	84.300	ARL SURA	2.105.840	146.600	COLSUBSIDIO	2.105.840	84.300	0	0	0	0	$652.200
1003826788	CABREJO	DIEGO	1	0							X							0	27	27	27	27	PORVENIR	1.369.812	219.200	NUEVA EPS	1.369.812	54.800	ARL SURA	1.369.812	95.400	COLSUBSIDIO	1.369.812	54.800	0	0	0	0	$424.200
78714569	RHENALS	REMBERTO	1	0							X							0	28	28	28	28	PROTECCION (ING +	1.486.480	237.900	SALUD TOTAL EPS	1.486.480	59.500	ARL SURA	1.486.480	103.500	COLSUBSIDIO	1.486.480	59.500	0	0	0	0	$460.400
1075670604	PEÑA	MARIA	1	0									X					0	12	12	12	12	COLPENSIONES	677.016	108.400	COMPENSAR EPS	677.016	27.100	ARL SURA	677.016	0	COLSUBSIDIO	677.016	0	0	0	0	0	$135.500
14270208	VARON	RAFAEL	1	0							X							0	29	29	29	29	COLPENSIONES	2.869.188	459.100	NUEVA EPS	2.869.188	114.800	ARL SURA	2.869.188	199.700	COLSUBSIDIO	2.869.188	114.800	0	0	0	0	$888.400
1074187616	RINCON	JHON	1	0							X							0	30	30	30	30	PORVENIR	2.604.167	416.700	FAMISANAR EPS	2.604.167	104.200	ARL SURA	2.604.167	181.300	COLSUBSIDIO	2.604.167	104.200	0	0	0	0	$806.400
1022404846	HERNANDEZ	MONICA	1	0							X							0	30	30	30	30	COLFONDOS	3.093.750	495.000	COMPENSAR EPS	3.093.750	123.800	ARL SURA	3.093.750	215.400	COLSUBSIDIO	3.093.750	123.800	0	0	0	0	$958.000
1075681816	CAMACHO	YEFERSSON	1	0											X			0	2	2	2	2	PROTECCION (ING +	119.916	19.200	FAMISANAR EPS	119.916	4.800	ARL SURA	119.916	0	COLSUBSIDIO	80.000	3.200	0	0	0	0	$27.200
11444784	ACEVEDO	JOHN	1	0		X					X							0	26	26	26	26	PROTECCION (ING +	1.430.207	228.900	SALUD TOTAL EPS	1.430.207	57.300	ARL SURA	1.430.207	99.600	COLSUBSIDIO	1.689.929	67.600	0	0	0	0	$453.400
15028352	CORREA	SEBASTIAN	1	0							X							0	30	30	30	30	PORVENIR	3.591.166	574.600	SALUD TOTAL EPS	3.591.166	143.700	ARL SURA	3.591.166	250.000	COLSUBSIDIO	3.591.166	143.700	0	0	0	0	$1.112.000
1069432781	HERNANDEZ	GIOVANNI	1	0								X						0	1	1	1	1	PORVENIR	56.365	6.800	SALUD TOTAL EPS	56.365	0	ARL SURA	56.365	0	COLSUBSIDIO	56.365	0	0	0	0	0	$6.800
1010247027	NOVA	JULLY	1	0														0	30	30	30	30	PORVENIR	1.500.000	240.000	NUEVA EPS	1.500.000	60.000	ARL SURA	1.500.000	104.400	COLSUBSIDIO	1.500.000	60.000	0	0	0	0	$464.400
91520549	BUITRAGO	WILSON	1	0							X							0	30	30	30	30	COLPENSIONES	3.131.335	501.100	SALUD TOTAL EPS	3.131.335	125.300	ARL SURA	3.131.335	218.000	COLSUBSIDIO	3.131.335	125.300	0	0	0	0	$969.700
1079034635	ROJAS	HECTOR	1	0	X						X							0	17	17	17	17	PROTECCION (ING +	648.958	103.900	EPS-S CONVIDA	648.958	26.000	ARL SURA	648.958	45.200	COLSUBSIDIO	648.958	26.000	0	0	0	0	$201.100
1007565462	ALVAREZ	MICHAEL	1	0	X						X							0	23	23	23	23	PROTECCION (ING +	787.502	126.100	FAMISANAR EPS	787.502	31.600	ARL SURA	787.502	54.900	COLSUBSIDIO	787.502	31.600	0	0	0	0	$244.200
1128625855	QUINTERO	EDILSON	1	0								X						0	1	1	1	1	PORVENIR	69.062	8.300	NUEVA EPS	69.062	0	ARL SURA	69.062	0	COLSUBSIDIO	69.062	0	0	0	0	0	$8.300
1020828349	SALAZAR	MILTON	1	0							X							0	27	27	27	27	PORVENIR	1.643.750	263.000	FAMISANAR EPS	1.643.750	65.800	ARL SURA	1.643.750	114.500	COLSUBSIDIO	1.643.750	65.800	0	0	0	0	$509.100
1078367073	CESPEDES	JOHN	1	0							X							0	29	29	29	29	PROTECCION (ING +	3.106.257	497.100	FAMISANAR EPS	3.106.257	124.300	ARL SURA	3.106.257	216.200	COLSUBSIDIO	3.106.257	124.300	0	0	0	0	$961.900
1075685009	BALLEN	LUIS	1	0							X							0	30	30	30	30	PORVENIR	1.046.878	167.600	FAMISANAR EPS	1.046.878	41.900	ARL SURA	1.046.878	72.900	COLSUBSIDIO	1.046.878	41.900	0	0	0	0	$324.300

Simple

Informe Detallado por Empleado

RAZON SOCIAL	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES		
NIT EMPRESA	CC 19146113	**DIRECCION**	Carrera 22a No. 85-20
TIPO APORTANTE	2	**TELEFONO**	6226620
TIPO PERSONA	N	**FORMA PRESENTACION**	U
CIUDAD	BOGOTA	**DEPARTAMENTO**	BOGOTA D.C.

Número Planilla	Fecha pago	Periodos	
1045147656	2022-04-05	202203	202204

DATOS AFILIADO					Novedades																		Pension			salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Documento	Apellidos y Nombres		Cotizante	Subtipo	Ing	Ret	Tde	Tae	Vsp	corr	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irp	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Nombre AFP	IBC	Cotizacion	Nombre EPS	IBC	Cotizacion	Nombre ARP	IBC	Cotizacion	Nombre CCF	IBC	Cotizacion CCF	Cotizacion Sena	Cotizacion ICBF	Cotizacion ESAP	Cotizacion Min EDU	TOTAL
1100951482	URIBE	CAROLINA	1	0							X							0	30	30	30	30	COLPENSIONES	4.000.000	640.000	EPS SANITAS	4.000.000	160.000	ARL SURA	4.000.000	278.400	COLSUBSIDIO	4.000.000	160.000	0	0	0	0	$1.238.400
1102358201	HERNANDEZ	JOHN	1	0							X							0	30	30	30	30	COLPENSIONES	3.823.350	611.800	FAMISANAR EPS	3.823.350	153.000	ARL SURA	3.823.350	266.200	COMFAMILIARES DE CALDAS	3.823.350	153.000	0	0	0	0	$1.184.000
1007534795	MANJARREZ	DIEGO	1	0											X			0	1	1	1	1	PORVENIR	90.278	14.500	COMPENSAR EPS	90.278	3.700	ARL SURA	90.278	0	COLSUBSIDIO	53.333	2.200	0	0	0	0	$20.400
1072664523	PANTOJA	JHULIANA	1	0		X					X							0	19	19	19	19	PORVENIR	3.000.000	480.000	COMPENSAR EPS	3.000.000	120.000	ARL SURA	3.000.000	208.800	COLSUBSIDIO	4.718.755	188.800	0	0	0	0	$997.600
7317410	SANCHEZ	JHON	1	0								X						0	1	1	1	1	PORVENIR	96.736	11.700	SALUD TOTAL EPS	96.736	0	ARL SURA	96.736	0	COLSUBSIDIO	96.736	0	0	0	0	0	$11.700
79186183	CANON	LUIS	1	0							X							0	30	30	30	30	PROTECCION (ING +	2.358.732	377.400	FAMISANAR EPS	2.358.732	94.400	ARL SURA	2.358.732	164.200	COLSUBSIDIO	2.358.732	94.400	0	0	0	0	$730.400
1192756534	BALLESTAS	FRANCISCO	1	0							X							0	30	30	30	30	PORVENIR	4.606.648	737.100	EPS SURA	4.606.648	184.300	ARL SURA	4.606.648	320.700	COMFAMILIARDEL	4.606.648	184.300	0	0	0	0	$1.426.400
80545156	MUÑOZ	JOHN	1	0							X							0	28	28	28	28	COLFONDOS	1.183.343	189.400	FAMISANAR EPS	1.183.343	47.400	ARL SURA	1.183.343	82.400	COLSUBSIDIO	1.183.343	47.400	0	0	0	0	$366.600
80148758	DIAZ	MILTON	1	0											X			0	1	1	1	1	PROTECCION (ING +	75.725	12.200	SALUD TOTAL EPS	75.725	3.100	ARL SURA	75.725	0	COLSUBSIDIO	53.333	2.200	0	0	0	0	$17.500
1075675001	BUSTOS	EDWIN	1	0	X						X							0	17	17	17	17	PORVENIR	633.332	101.400	COMPENSAR EPS	633.332	25.400	ARL SURA	633.332	44.100	COLSUBSIDIO	633.332	25.400	0	0	0	0	$196.300
1192897853	OVIEDO	SERGIO	1	0											X			0	1	1	1	1	PORVENIR	51.306	8.300	COMPENSAR EPS	51.306	2.100	ARL SURA	51.306	0	COLSUBSIDIO	33.333	1.400	0	0	0	0	$11.800
1076667721	ALARCON	ANDRES	1	0							X							0	29	29	29	29	PROTECCION (ING +	1.533.750	245.400	NUEVA EPS	1.533.750	61.400	ARL SURA	1.533.750	106.800	COLSUBSIDIO	1.533.750	61.400	0	0	0	0	$475.000
74357313	SANCHEZ	LEONEL	1	0	X						X							0	17	17	17	17	PROTECCION (ING +	1.085.520	173.700	EPS SANITAS	1.085.520	43.500	ARL SURA	1.085.520	75.600	COLSUBSIDIO	1.085.520	43.500	0	0	0	0	$336.300
1071329990	QUINTERO	YARI	1	0							X							0	30	30	30	30	PORVENIR	2.045.303	327.300	FAMISANAR EPS	2.045.303	81.900	ARL SURA	2.045.303	142.400	COLSUBSIDIO	2.045.303	81.900	0	0	0	0	$633.500
1075684845	PLAZAS	ANGIE	1	0														0	26	26	26	26	PORVENIR	866.667	138.700	NUEVA EMPRESA	866.667	34.700	ARL SURA	866.667	4.600	COLSUBSIDIO	866.667	34.700	0	0	0	0	$212.700
1078367073	CESPEDES	JOHN	1	0								X						0	1	1	1	1	PROTECCION (ING +	115.208	13.900	FAMISANAR EPS	115.208	0	ARL SURA	115.208	0	COLSUBSIDIO	115.208	0	0	0	0	0	$13.900
94482582	ALVAREZ	DIEGO	1	0							X							0	30	30	30	30	COLFONDOS	3.476.581	556.300	NUEVA EPS	3.476.581	139.100	ARL SURA	3.476.581	242.000	COLSUBSIDIO	3.476.581	139.100	0	0	0	0	$1.076.500
13392180	CONTRERAS	JOSE	1	0											X			0	1	1	1	1	COLPENSIONES	91.146	14.600	EPS SANITAS	91.146	3.700	ARL SURA	91.146	0	COLSUBSIDIO	53.333	2.200	0	0	0	0	$20.500
11411101	ORTIZ	LIBARDO	1	0		X					X							0	1	1	1	1	PORVENIR	366.653	58.700	FAMISANAR EPS	366.653	14.700	ARL SURA	366.653	25.600	COLSUBSIDIO	619.430	24.800	0	0	0	0	$123.800
1102382293	PARRA	BYRON	1	0											X			0	1	1	1	1	PORVENIR	33.334	5.400	SALUD TOTAL EPS	33.334	1.400	ARL SURA	33.334	0	COLSUBSIDIO	33.334	1.400	0	0	0	0	$8.200
4414259	GOMEZ	JHON	1	0			X				X							0	30	30	30	30	PORVENIR	4.596.648	735.500	SALUD TOTAL EPS	4.596.648	183.900	ARL SURA	4.596.648	320.000	COMFAMILIARES DE CALDAS	4.596.648	183.900	0	0	0	0	$1.423.300

Simple

Informe Detallado por Empleado

RAZON SOCIAL	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES		
NIT EMPRESA	CC 19146113	**DIRECCION**	Carrera 22a No. 85-20
TIPO APORTANTE	2	**TELEFONO**	6226620
TIPO PERSONA	N	**FORMA PRESENTACION**	U
CIUDAD	BOGOTA	**DEPARTAMENTO**	BOGOTA D.C.

Número Planilla	Fecha pago	Periodos	
1045147656	2022-04-05	202203	202204

DATOS AFILIADO					Novedades																		Pension			salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Documento	Apellidos y Nombres		Cotizante	Subtipo	Ing	Ret	Tde	Tae	Vsp	corr	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irp	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Nombre AFP	IBC	Cotizacion	Nombre EPS	IBC	Cotizacion	Nombre ARP	IBC	Cotizacion	Nombre CCF	IBC	Cotizacion CCF	Cotizacion Sena	Cotizacion ICBF	Cotizacion ESAP	Cotizacion Min EDU	TOTAL
1070018525	HERNANDEZ	MANUEL	1	0											X			0	1	1	1	1	PORVENIR	66.667	10.700	FAMISANAR EPS	66.667	2.700	ARL SURA	66.667	0	COLSUBSIDIO	66.667	2.700	0	0	0	0	$16.100
11383816	SANDOVAL	MANUEL	1	0														0	30	30	30	30	COLPENSIONES	9.100.000	1.456.000	COMPENSAR EPS	9.100.000	1.137.500	ARL SURA	9.100.000	633.400	COLSUBSIDIO	9.100.000	364.000	182.000	273.000	0	0	$4.045.900
1074187060	NOCUA	IVAN	1	0							X							0	30	30	30	30	COLFONDOS	1.275.017	204.100	FAMISANAR EPS	1.275.017	51.100	ARL SURA	1.275.017	88.800	COLSUBSIDIO	1.275.017	51.100	0	0	0	0	$395.100
1065620635	BERMUDEZ	JUAN	1	0	X						X							0	24	24	24	24	COLFONDOS	1.913.547	306.200	SALUD TOTAL EPS	1.913.547	76.600	ARL SURA	1.913.547	133.200	COLSUBSIDIO	1.913.547	76.600	0	0	0	0	$592.600
1007341923	CHAVES	DIEGO	1	0							X							0	29	29	29	29	PORVENIR	1.568.775	251.100	FAMISANAR EPS	1.568.775	62.800	ARL SURA	1.568.775	109.200	COLSUBSIDIO	1.568.775	62.800	0	0	0	0	$485.900
1070923126	MUÑOZ	CRISTIAN	1	0	X						X							0	23	23	23	23	COLPENSIONES	844.798	135.200	EPS-S CONVIDA	844.798	33.800	ARL SURA	844.798	58.800	COLSUBSIDIO	844.798	33.800	0	0	0	0	$261.600
1098675736	OREJARENA	SILVIA	1	0	X													0	22	22	22	22	COLPENSIONES	4.400.000	704.000	EPS SANITAS	4.400.000	176.000	ARL SURA	4.400.000	306.300	COLSUBSIDIO	4.400.000	176.000	0	0	0	0	$1.362.300
1072747306	SALGUERO	MILENA	1	0		X					X							0	9	9	9	9	PORVENIR	606.241	97.000	EPS SANITAS	606.241	24.300	ARL SURA	606.241	42.200	COLSUBSIDIO	818.741	32.800	0	0	0	0	$196.300
93456669	PIÑERES	EDUARDO	1	0							X							0	30	30	30	30	PORVENIR	3.464.354	554.300	NUEVA EPS	3.464.354	138.600	ARL SURA	3.464.354	241.200	COLSUBSIDIO	3.464.354	138.600	0	0	0	0	$1.072.700
1075687690	GOMEZ	SEBASTIAN	1	0							X							0	30	30	30	30	PORVENIR	1.384.390	221.600	SALUD TOTAL EPS	1.384.390	55.400	ARL SURA	1.384.390	96.400	COLSUBSIDIO	1.384.390	55.400	0	0	0	0	$428.800
1075684845	PLAZAS	ANGIE	1	0											X			0	1	1	1	1	PORVENIR	33.334	5.400	NUEVA EMPRESA	33.334	1.400	ARL SURA	33.334	0	COLSUBSIDIO	33.334	1.400	0	0	0	0	$8.200
1000180330	MURCIA	ANDRES	1	0											X			0	1	1	1	1	PROTECCION (ING +	34.041	5.500	EPS SURA	34.041	1.400	ARL SURA	34.041	0	COLSUBSIDIO	33.333	1.400	0	0	0	0	$8.300
1020828349	SALAZAR	MILTON	1	0											X			0	2	2	2	2	PORVENIR	119.000	19.100	FAMISANAR EPS	119.000	4.800	ARL SURA	119.000	0	COLSUBSIDIO	80.000	3.200	0	0	0	0	$27.100
1007788654	PEÑA	MARIO	1	0							X							0	26	26	26	26	PORVENIR	1.278.138	204.600	FAMISANAR EPS	1.278.138	51.200	ARL SURA	1.278.138	89.000	COLSUBSIDIO	1.278.138	51.200	0	0	0	0	$396.000
4144059	ROJAS	GILBERTO	1	0							X							0	30	30	30	30	COLPENSIONES	2.690.435	430.500	FAMISANAR EPS	2.690.435	107.700	ARL SURA	2.690.435	187.300	COLSUBSIDIO	2.690.435	107.700	0	0	0	0	$833.200
80544823	CASTILLO	JORGE	1	0							X							0	30	30	30	30	PORVENIR	2.095.314	335.300	FAMISANAR EPS	2.095.314	83.900	ARL SURA	2.095.314	145.900	COLSUBSIDIO	2.095.314	83.900	0	0	0	0	$649.000
1104700791	GONZALEZ	JOSE	1	0									X					0	1	1	1	1	PORVENIR	35.552	5.700	COMPENSAR EPS	35.552	1.500	ARL SURA	35.552	0	COLSUBSIDIO	35.552	0	0	0	0	0	$7.200
74321724	MARQUEZ	JAIME	1	0							X							0	30	30	30	30	COLFONDOS	4.471.875	715.500	FAMISANAR EPS	4.471.875	178.900	ARL SURA	4.471.875	311.300	COLSUBSIDIO	4.471.875	178.900	0	0	0	0	$1.384.600
1075673962	GALINDO	SERGIO	1	0								X						0	1	1	1	1	PORVENIR	33.334	4.100	NUEVA EPS	33.334	0	ARL SURA	33.334	0	COLSUBSIDIO	33.334	0	0	0	0	0	$4.100
1075681614	RODRIGUEZ	MARTIN	1	0							X							0	13	13	13	13	COLFONDOS	475.003	76.100	EPS-S CONVIDA	475.003	19.100	ARL SURA	475.003	33.100	COLSUBSIDIO	475.003	19.100	0	0	0	0	$147.400
5996924	BELTRAN	NOE	1	0							X							0	30	30	30	30	PORVENIR	1.538.562	246.200	FAMISANAR EPS	1.538.562	61.600	ARL SURA	1.538.562	107.100	COLSUBSIDIO	1.538.562	61.600	0	0	0	0	$476.500

Simple

Informe Detallado por Empleado

RAZON SOCIAL	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES		
NIT EMPRESA	CC 19146113	**DIRECCION**	Carrera 22a No. 85-20
TIPO APORTANTE	2	**TELEFONO**	6226620
TIPO PERSONA	N	**FORMA PRESENTACION**	U
CIUDAD	BOGOTA	**DEPARTAMENTO**	BOGOTA D.C.

Número Planilla	Fecha pago	Periodos	
1045147656	2022-04-05	202203	202204

DATOS AFILIADO					Novedades																	Pension			salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Documento	Apellidos y Nombres		Cotizante	Subtipo	Ing	Ret	Tde	Tae	Vsp	corr	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irp	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Nombre AFP	IBC	Cotizacion	Nombre EPS	IBC	Cotizacion	Nombre ARP	IBC	Cotizacion	Nombre CCF	IBC	Cotizacion CCF	Cotizacion Sena	Cotizacion ICBF	Cotizacion ESAP	Cotizacion Min EDU	TOTAL
1076667721	ALARCON	ANDRES	1	0											X			0	1	1	1	1	PROTECCION (ING +	65.934	10.600	NUEVA EPS	65.934	2.700	ARL SURA	65.934	0	COLSUBSIDIO	40.000	1.600	0	0	0	0	$14.900
3057201	MEDINA	ISRAEL	1	0											X			0	1	1	1	1	COLFONDOS	57.976	9.300	EPS-S CONVIDA	57.976	2.400	ARL SURA	57.976	0	COLSUBSIDIO	33.333	1.400	0	0	0	0	$13.100
1075662982	ROZO	OSCAR	1	0	X						X							0	29	29	29	29	PORVENIR	1.065.633	170.600	EPS-S CONVIDA	1.065.633	42.700	ARL SURA	1.065.633	74.200	COLSUBSIDIO	1.065.633	42.700	0	0	0	0	$330.200
1090489370	CONTRERAS	GLENDY	1	0	X						X							0	17	17	17	17	PORVENIR	2.216.666	354.700	EPS SANITAS	2.216.666	88.700	ARL SURA	2.216.666	154.300	COLSUBSIDIO	2.216.666	88.700	0	0	0	0	$686.400
3057201	MEDINA	ISRAEL	1	0							X							0	29	29	29	29	COLFONDOS	1.410.440	225.700	EPS-S CONVIDA	1.410.440	56.500	ARL SURA	1.410.440	98.200	COLSUBSIDIO	1.410.440	56.500	0	0	0	0	$436.900
1075681816	CAMACHO	YEFERSSON	1	0							X							0	27	27	27	27	PROTECCION (ING +	1.550.000	248.000	FAMISANAR EPS	1.550.000	62.000	ARL SURA	1.550.000	107.900	COLSUBSIDIO	1.550.000	62.000	0	0	0	0	$479.900
1075681689	HERNANDEZ	JUAN	1	0							X							0	28	28	28	28	PORVENIR	1.110.424	177.700	COMPENSAR EPS	1.110.424	44.500	ARL SURA	1.110.424	77.300	COLSUBSIDIO	1.110.424	44.500	0	0	0	0	$344.000
1075689674	FLOREZ	MICHELL	1	0														0	30	30	30	30	PORVENIR	1.500.000	240.000	NUEVA EPS	1.500.000	60.000	ARL SURA	1.500.000	104.400	COLSUBSIDIO	1.500.000	60.000	0	0	0	0	$464.400
1073327376	RUIZ	DEVISON	1	0											X			0	2	2	2	2	PORVENIR	128.738	20.600	NUEVA EPS	128.738	5.200	ARL SURA	128.738	0	COLSUBSIDIO	106.667	4.300	0	0	0	0	$30.100
1002365693	CARDENAS	JOHN	1	0							X							0	29	29	29	29	PORVENIR	1.661.583	265.900	NUEVA EPS	1.661.583	66.500	ARL SURA	1.661.583	115.700	COLSUBSIDIO	1.661.583	66.500	0	0	0	0	$514.600
11382319	MONTES	GONZALO	1	0							X							0	30	30	30	30	COLPENSIONES	5.442.690	870.900	FAMISANAR EPS	5.442.690	217.800	ARL SURA	5.442.690	378.900	COLSUBSIDIO	5.442.690	217.800	0	0	0	0	$1.685.400
1016054283	MARTINEZ	ANGEL	1	0														0	9	9	9	9	PROTECCION (ING +	780.000	124.800	EPS SURA	780.000	31.200	ARL SURA	780.000	54.300	COLSUBSIDIO	780.000	31.200	0	0	0	0	$241.500
1073532958	CHUNZA	JORGE	1	0							X							0	30	30	30	30	PROTECCION (ING +	2.446.875	391.500	EPS SANITAS	2.446.875	97.900	ARL SURA	2.446.875	170.400	COLSUBSIDIO	2.446.875	97.900	0	0	0	0	$757.700
1007534795	MANJARREZ	DIEGO	1	0											X			0	2	2	2	2	PORVENIR	180.556	28.900	COMPENSAR EPS	180.556	7.300	ARL SURA	180.556	0	COLSUBSIDIO	106.667	4.300	0	0	0	0	$40.500
78714569	RHENALS	REMBERTO	1	0									X					0	2	2	2	2	PROTECCION (ING +	66.667	10.700	SALUD TOTAL EPS	66.667	2.700	ARL SURA	66.667	0	COLSUBSIDIO	66.667	0	0	0	0	0	$13.400
4188849	MELO	PEDRO	1	0							X							0	30	30	30	30	PORVENIR	2.658.859	425.500	FAMISANAR EPS	2.658.859	106.400	ARL SURA	2.658.859	185.100	COLSUBSIDIO	2.658.859	106.400	0	0	0	0	$823.400
53131280	ANDRADE	NINE	1	0							X							0	29	29	29	29	PORVENIR	4.828.125	772.500	SALUD TOTAL EPS	4.828.125	193.200	ARL SURA	4.828.125	336.100	COLSUBSIDIO	4.828.125	193.200	0	0	0	0	$1.495.000
3184637	PALMAR	LUIS	1	0							X							0	30	30	30	30	COLPENSIONES	3.388.112	542.100	NUEVA EPS	3.388.112	135.600	ARL SURA	3.388.112	235.900	COLSUBSIDIO	3.388.112	135.600	0	0	0	0	$1.049.200
80546238	CASTAÑEDA	JOSE	1	0							X							0	30	30	30	30	COLFONDOS	1.333.346	213.400	FAMISANAR EPS	1.333.346	53.400	ARL SURA	1.333.346	92.900	COLSUBSIDIO	1.333.346	53.400	0	0	0	0	$413.100
37754784	SANCHEZ	LUZ	1	0									X					0	1	1	1	1	PORVENIR	111.100	17.800	NUEVA EPS	111.100	4.500	ARL SURA	111.100	0	COLSUBSIDIO	111.100	0	0	0	0	0	$22.300
17856250	RESTREPO	EDILBERTO	1	0							X							0	30	30	30	30	COLPENSIONES	4.046.875	647.500	EPS-S CAJACOPI	4.046.875	161.900	ARL SURA	4.046.875	281.700	COLSUBSIDIO	4.046.875	161.900	0	0	0	0	$1.253.000

Simple

Informe Detallado por Empleado

RAZON SOCIAL	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES		
NIT EMPRESA	CC 19146113	**DIRECCION**	Carrera 22a No. 85-20
TIPO APORTANTE	2	**TELEFONO**	6226620
TIPO PERSONA	N	**FORMA PRESENTACION**	U
CIUDAD	BOGOTA	**DEPARTAMENTO**	BOGOTA D.C.

Número Planilla	Fecha pago	Periodos	
1045147656	2022-04-05	202203	202204

DATOS AFILIADO					Novedades																		Pension			salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Documento	Apellidos y Nombres		Cotizante	Subtipo	Ing	Ret	Tde	Tae	Vsp	corr	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irp	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Nombre AFP	IBC	Cotizacion	Nombre EPS	IBC	Cotizacion	Nombre ARP	IBC	Cotizacion	Nombre CCF	IBC	Cotizacion CCF	Cotizacion Sena	Cotizacion ICBF	Cotizacion ESAP	Cotizacion Min EDU	TOTAL
80110542	AMADO	ALEXANDER	1	0								X						0	6	6	6	6	COLPENSIONES	346.909	41.700	NUEVA EPS	346.909	0	ARL SURA	346.909	0	COLSUBSIDIO	346.909	0	0	0	0	0	$41.700
79285675	TARAZONA	HENRY	1	0														0	30	30	30	30	COLPENSIONES	14.000.000	2.240.000	COMPENSAR EPS	14.000.000	1.750.000	ARL SURA	14.000.000	974.400	COLSUBSIDIO	14.000.000	560.000	280.000	420.000	0	0	$6.224.400
1193210340	CEBALLOS	BRAYAN	1	0		X					X							0	4	4	4	4	PORVENIR	440.605	70.500	NUEVA EPS	440.605	17.700	ARL SURA	440.605	30.700	COLSUBSIDIO	466.995	18.700	0	0	0	0	$137.600
80658165	BERMUDEZ	JOHAN	1	0							X							0	30	30	30	30	PORVENIR	3.327.793	532.500	FAMISANAR EPS	3.327.793	133.200	ARL SURA	3.327.793	231.700	COLSUBSIDIO	3.327.793	133.200	0	0	0	0	$1.030.600
1075656385	VARGAS	YULY	1	0	X													0	14	14	14	14	PORVENIR	1.633.334	261.400	FAMISANAR EPS	1.633.334	65.400	ARL SURA	1.633.334	113.700	COLSUBSIDIO	1.633.334	65.400	0	0	0	0	$505.900
3251310	GUAYACAN	HERNEY	1	0							X							0	30	30	30	30	COLPENSIONES	2.634.286	421.500	NUEVA EPS	2.634.286	105.400	ARL SURA	2.634.286	183.400	COLSUBSIDIO	2.634.286	105.400	0	0	0	0	$815.700
80541596	PENAGOS	YSAID	1	0							X							0	30	30	30	30	COLPENSIONES	2.273.731	363.800	COMPENSAR EPS	2.273.731	91.000	ARL SURA	2.273.731	158.300	COLSUBSIDIO	2.273.731	91.000	0	0	0	0	$704.100
80545156	MUÑOZ	JOHN	1	0									X					0	2	2	2	2	COLFONDOS	66.667	10.700	FAMISANAR EPS	66.667	2.700	ARL SURA	66.667	0	COLSUBSIDIO	66.667	0	0	0	0	0	$13.400
1002365693	CARDENAS	JOHN	1	0											X			0	1	1	1	1	PORVENIR	57.453	9.200	NUEVA EPS	57.453	2.300	ARL SURA	57.453	0	COLSUBSIDIO	43.333	1.800	0	0	0	0	$13.300
1233899380	ZAMORA	ANGIE	1	0							X							0	30	30	30	30	PORVENIR	2.133.843	341.500	NUEVA EPS	2.133.843	85.400	ARL SURA	2.133.843	148.600	COLSUBSIDIO	2.133.843	85.400	0	0	0	0	$660.900
93456965	HERNANDEZ	HERNANDO	1	0	X						X							0	17	17	17	17	COLPENSIONES	1.013.332	162.200	FAMISANAR EPS	1.013.332	40.600	ARL SURA	1.013.332	70.600	COLSUBSIDIO	1.013.332	40.600	0	0	0	0	$314.000
1075684019	CADENA	PAOLA	1	0	X													0	15	15	15	15	PORVENIR	750.000	120.000	EPS SANITAS	750.000	30.000	ARL SURA	750.000	52.200	COLSUBSIDIO	750.000	30.000	0	0	0	0	$232.200
80544530	ESPITIA	RONALD	1	0							X							0	27	27	27	27	PROTECCION (ING +	1.422.500	227.600	EPS-S CONVIDA	1.422.500	56.900	ARL SURA	1.422.500	99.100	COLSUBSIDIO	1.422.500	56.900	0	0	0	0	$440.500
1006866846	ALVARADO	YEFERSON	1	0	X						X							0	23	23	23	23	PORVENIR	823.963	131.900	FAMISANAR EPS	823.963	33.000	ARL SURA	823.963	57.400	COLSUBSIDIO	823.963	33.000	0	0	0	0	$255.300
5228280	RODRIGUEZ	MARIO	1	0							X							0	30	30	30	30	PROTECCION (ING +	4.350.000	696.000	COMPENSAR EPS	4.350.000	174.000	ARL SURA	4.350.000	302.800	COLSUBSIDIO	4.350.000	174.000	0	0	0	0	$1.346.800
1070706537	MORANTES	GUSTAVO	1	0											X			0	1	1	1	1	PORVENIR	156.635	25.100	FAMISANAR EPS	156.635	6.300	ARL SURA	156.635	0	COLSUBSIDIO	90.000	3.600	0	0	0	0	$35.000
23500541	SIERRA	BLANCA	1	0		X					X							0	25	25	25	25	COLPENSIONES	1.529.597	244.800	NUEVA EPS	1.529.597	61.200	ARL SURA	1.529.597	106.500	COLSUBSIDIO	1.814.319	72.600	0	0	0	0	$485.100
74242544	SAENZ	ERMINSON	1	0							X							0	30	30	30	30	PORVENIR	3.459.563	553.600	EPS SANITAS	3.459.563	138.400	ARL SURA	3.459.563	240.800	COLSUBSIDIO	3.459.563	138.400	0	0	0	0	$1.071.200
1007534795	MANJARREZ	DIEGO	1	0							X							0	27	27	27	27	PORVENIR	1.966.684	314.700	COMPENSAR EPS	1.966.684	78.700	ARL SURA	1.966.684	136.900	COLSUBSIDIO	1.966.684	78.700	0	0	0	0	$609.000
1149441062	CHAMORRO	BERSELAIS	1	0									X					0	2	2	2	2	PORVENIR	71.104	11.400	NUEVA EPS	71.104	2.900	ARL SURA	71.104	0	COMFAMILIAR DEL	71.104	0	0	0	0	0	$14.300
1105785905	CHAVES	CARLOS	1	0									X					0	2	2	2	2	PORVENIR	66.667	10.700	NUEVA EPS	66.667	2.700	ARL SURA	66.667	0	COLSUBSIDIO	66.667	0	0	0	0	0	$13.400

Simple

Informe Detallado por Empleado

RAZON SOCIAL	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES		
NIT EMPRESA	CC 19146113	**DIRECCION**	Carrera 22a No. 85-20
TIPO APORTANTE	2	**TELEFONO**	6226620
TIPO PERSONA	N	**FORMA PRESENTACION**	U
CIUDAD	BOGOTA	**DEPARTAMENTO**	BOGOTA D.C.

Número Planilla	Fecha pago	Periodos	
1045147656	2022-04-05	202203	202204

DATOS AFILIADO					Novedades																		Pension			salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Documento	Apellidos y Nombres		Cotizante	Subtipo	Ing	Ret	Tde	Tae	Vsp	corr	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irp	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Nombre AFP	IBC	Cotizacion	Nombre EPS	IBC	Cotizacion	Nombre ARP	IBC	Cotizacion	Nombre CCF	IBC	Cotizacion CCF	Cotizacion Sena	Cotizacion ICBF	Cotizacion ESAP	Cotizacion Min EDU	TOTAL
80546819	VELANDIA	WILLIAM	1	0								X						0	1	1	1	1	PROTECCION (ING +	38.507	4.700	FAMISANAR EPS	38.507	0	ARL SURA	38.507	0	COLSUBSIDIO	38.507	0	0	0	0	0	$4.700
11428038	CALDERON	JESUS	1	1							X							0	0	29	29	29	NINGUNA AFP	0	0	NUEVA EPS	4.637.188	185.500	ARL SURA	4.637.188	322.800	COLSUBSIDIO	4.637.188	185.500	0	0	0	0	$693.800
9498998	CORTES	VICTOR	1	0			X				X							0	30	30	30	30	PORVENIR	1.400.020	224.100	COMPENSAR EPS	1.400.020	56.100	ARL SURA	1.400.020	97.500	COLSUBSIDIO	1.400.020	56.100	0	0	0	0	$433.800
80546819	VELANDIA	WILLIAM	1	0									X					0	1	1	1	1	PROTECCION (ING +	33.334	5.400	FAMISANAR EPS	33.334	1.400	ARL SURA	33.334	0	COLSUBSIDIO	33.334	0	0	0	0	0	$6.800
14242290	PAEZ	LUIS	1	0														0	30	30	30	30	COLPENSIONES	14.350.000	2.296.000	EPS SANITAS	14.350.000	1.793.800	ARL SURA	14.350.000	998.800	COLSUBSIDIO	14.350.000	574.000	287.000	430.500	0	0	$6.380.100
80544530	ESPITIA	RONALD	1	0								X						0	2	2	2	2	PROTECCION (ING +	80.833	9.700	EPS-S CONVIDA	80.833	0	ARL SURA	80.833	0	COLSUBSIDIO	80.833	0	0	0	0	0	$9.700
80018032	GOMEZ	EDWIN	1	0							X							0	30	30	30	30	COLPENSIONES	3.862.500	618.000	NUEVA EPS	3.862.500	154.500	ARL SURA	3.862.500	268.900	COLSUBSIDIO	3.862.500	154.500	0	0	0	0	$1.195.900
80543333	SILVA	DIEGO	1	0							X							0	29	29	29	29	PROTECCION (ING +	2.882.880	461.300	SALUD TOTAL EPS	2.882.880	115.400	ARL SURA	2.882.880	200.700	COLSUBSIDIO	2.882.880	115.400	0	0	0	0	$892.800
1070951879	RINCON	JUAN	1	0									X					0	5	5	5	5	COLFONDOS	434.401	69.600	FAMISANAR EPS	434.401	17.400	ARL SURA	434.401	0	COLSUBSIDIO	434.401	0	0	0	0	0	$87.000
1102382293	PARRA	BYRON	1	0							X							0	27	27	27	27	PORVENIR	946.875	151.500	SALUD TOTAL EPS	946.875	37.900	ARL SURA	946.875	66.000	COLSUBSIDIO	946.875	37.900	0	0	0	0	$293.300
52491792	TOLE	NEIDY	1	0	X													0	30	30	30	30	PORVENIR	3.200.000	512.000	SALUD TOTAL EPS	3.200.000	128.000	ARL SURA	3.200.000	222.800	COLSUBSIDIO	3.200.000	128.000	0	0	0	0	$990.800
80902816	GUTIERREZ	JONATHAN	1	0		X					X							0	25	25	25	25	PROTECCION (ING +	1.504.188	240.700	NUEVA EPS	1.504.188	60.200	ARL SURA	1.504.188	104.700	COLSUBSIDIO	1.765.300	70.700	0	0	0	0	$476.300
1007861118	RIOS	JOHAN	1	0							X							0	27	27	27	27	COLPENSIONES	1.111.250	177.800	EPS SANITAS	1.111.250	44.500	ARL SURA	1.111.250	77.400	COLSUBSIDIO	1.111.250	44.500	0	0	0	0	$344.200
80546819	VELANDIA	WILLIAM	1	0								X						0	2	2	2	2	PROTECCION (ING +	77.014	9.300	FAMISANAR EPS	77.014	0	ARL SURA	77.014	0	COLSUBSIDIO	77.014	0	0	0	0	0	$9.300
1003838274	PRIETO	DIANA	1	0							X							0	30	30	30	30	PROTECCION (ING +	1.212.500	194.000	EPS SANITAS	1.212.500	48.500	ARL SURA	1.212.500	84.400	COLSUBSIDIO	1.212.500	48.500	0	0	0	0	$375.400
80279301	MORENO	LUIS	1	0							X							0	30	30	30	30	PROTECCION (ING +	2.495.625	399.300	NUEVA EPS	2.495.625	99.900	ARL SURA	2.495.625	173.700	COMFAMILIARES DE CALDAS	2.495.625	99.900	0	0	0	0	$772.800
1073608173	SALAMANCA	HEIDY	1	0							X							0	30	30	30	30	PORVENIR	1.590.651	254.600	FAMISANAR EPS	1.590.651	63.700	ARL SURA	1.590.651	110.800	COLSUBSIDIO	1.590.651	63.700	0	0	0	0	$492.800
1075653623	RODRIGUEZ	HUGO	1	0							X							0	30	30	30	30	PROTECCION (ING +	1.052.087	168.400	EPS SURA	1.052.087	42.100	ARL SURA	1.052.087	73.300	COLSUBSIDIO	1.052.087	42.100	0	0	0	0	$325.900
1193516329	SAIZ	SANTIAGO	1	0							X							0	30	30	30	30	PROTECCION (ING +	1.606.250	257.000	EPS SANITAS	1.606.250	64.300	ARL SURA	1.606.250	111.800	COLSUBSIDIO	1.606.250	64.300	0	0	0	0	$497.400
1070969001	FIQUITIVA	CRISTIAN	1	0							X							0	30	30	30	30	PORVENIR	1.523.750	243.800	FAMISANAR EPS	1.523.750	61.000	ARL SURA	1.523.750	106.100	COLSUBSIDIO	1.523.750	61.000	0	0	0	0	$471.900
1068657255	ARROYO	VICTOR	1	0							X							0	28	28	28	28	PORVENIR	3.117.273	498.800	NUEVA EPS	3.117.273	124.700	ARL SURA	3.117.273	217.000	COMFAMILIAR DEL	3.117.273	124.700	0	0	0	0	$965.200

Simple

Informe Detallado por Empleado

RAZON SOCIAL	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES		
NIT EMPRESA	CC 19146113	**DIRECCION**	Carrera 22a No. 85-20
TIPO APORTANTE	2	**TELEFONO**	6226620
TIPO PERSONA	N	**FORMA PRESENTACION**	U
CIUDAD	BOGOTA	**DEPARTAMENTO**	BOGOTA D.C.

Número Planilla	Fecha pago	Periodos	
1045147656	2022-04-05	202203	202204

DATOS AFILIADO					Novedades																	Pension			salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Documento	Apellidos y Nombres		Cotizante	Subtipo	Ing	Ret	Tde	Tae	Vsp	corr	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irp	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Nombre AFP	IBC	Cotizacion	Nombre EPS	IBC	Cotizacion	Nombre ARP	IBC	Cotizacion	Nombre CCF	IBC	Cotizacion CCF	Cotizacion Sena	Cotizacion ICBF	Cotizacion ESAP	Cotizacion Min EDU	TOTAL
1007228134	ROMERO	GABRIEL	1	0							X							0	30	30	30	30	PORVENIR	1.296.889	207.600	EPS-S CONVIDA	1.296.889	51.900	ARL SURA	1.296.889	90.300	COLSUBSIDIO	1.296.889	51.900	0	0	0	0	$401.700
1069984670	GIL	EDER	1	0							X							0	30	30	30	30	PORVENIR	1.572.941	251.700	ASOCIACION MUTUAL SER	1.572.941	63.000	ARL SURA	1.572.941	109.500	COLSUBSIDIO	1.572.941	63.000	0	0	0	0	$487.200
1003526270	ALVAREZ	DANIEL	1	0								X						0	2	2	2	2	PORVENIR	66.667	8.100	FAMISANAR EPS	66.667	0	ARL SURA	66.667	0	COLSUBSIDIO	66.667	0	0	0	0	0	$8.100
1070018525	HERNANDEZ	MANUEL	1	0														0	29	29	29	29	PORVENIR	1.933.334	309.400	FAMISANAR EPS	1.933.334	77.400	ARL SURA	1.933.334	134.600	COLSUBSIDIO	1.933.334	77.400	0	0	0	0	$598.800
1069478421	JIMENEZ	ARCENIO	1	0							X							0	30	30	30	30	PROTECCION (ING +	3.239.149	518.300	EPS SANITAS	3.239.149	129.600	ARL SURA	3.239.149	225.500	COLSUBSIDIO	3.239.149	129.600	0	0	0	0	$1.003.000
75145329	ROJAS	ARBEY	1	0							X							0	27	27	27	27	COLFONDOS	2.113.349	338.200	FAMISANAR EPS	2.113.349	84.600	ARL SURA	2.113.349	147.100	COLSUBSIDIO	2.113.349	84.600	0	0	0	0	$654.500
1075684845	PLAZAS	ANGIE	1	0											X			0	3	3	3	3	PORVENIR	100.000	16.000	NUEVA EMPRESA	100.000	4.000	ARL SURA	100.000	0	COLSUBSIDIO	100.000	4.000	0	0	0	0	$24.000
1053807757	SUAREZ	BRANYONY	1	0											X			0	3	3	3	3	PROTECCION (ING +	224.220	35.900	ASMET SALUD	224.220	9.000	ARL SURA	224.220	0	COMFAMILIARES DE CALDAS	210.000	8.400	0	0	0	0	$53.300
1003671793	FORERO	JUNIOR	1	0	X	X					X							0	9	9	9	9	PORVENIR	422.912	67.700	FAMISANAR EPS	422.912	17.000	ARL SURA	422.912	29.500	COLSUBSIDIO	435.412	17.500	0	0	0	0	$131.700
1075677784	ROJAS	LAURA	1	0														0	29	29	29	29	COLPENSIONES	1.256.667	201.100	COMPENSAR EPS	1.256.667	50.300	ARL SURA	1.256.667	6.600	COLSUBSIDIO	1.256.667	50.300	0	0	0	0	$308.300
80546819	VELANDIA	WILLIAM	1	0									X					0	2	2	2	2	PROTECCION (ING +	66.667	10.700	FAMISANAR EPS	66.667	2.700	ARL SURA	66.667	0	COLSUBSIDIO	66.667	0	0	0	0	0	$13.400
1070951879	RINCON	JUAN	1	0							X							0	25	25	25	25	COLFONDOS	4.087.099	654.000	FAMISANAR EPS	4.087.099	163.500	ARL SURA	4.087.099	284.500	COLSUBSIDIO	4.087.099	163.500	0	0	0	0	$1.265.500
1075652420	AGUIAR	NELSON	1	0		X					X							0	4	4	4	4	PROTECCION (ING +	286.449	45.900	SALUD TOTAL EPS	286.449	11.500	ARL SURA	286.449	20.000	COLSUBSIDIO	333.672	13.400	0	0	0	0	$90.800
14010620	ALDANA	FIDEL	1	0							X							0	30	30	30	30	PORVENIR	2.305.597	368.900	NUEVA EPS	2.305.597	92.300	ARL SURA	2.305.597	100.300	COLSUBSIDIO	2.305.597	92.300	0	0	0	0	$653.800
1070945437	ANTOLINEZ	AILEEN	1	0														0	30	30	30	30	PORVENIR	4.500.000	720.000	EPS SANITAS	4.500.000	180.000	ARL SURA	4.500.000	313.200	COLSUBSIDIO	4.500.000	180.000	0	0	0	0	$1.393.200
79065570	BOHORQUEZ	ALVARO	1	0							X							0	30	30	30	30	PORVENIR	2.023.351	323.800	FAMISANAR EPS	2.023.351	81.000	ARL SURA	2.023.351	140.900	COLSUBSIDIO	2.023.351	81.000	0	0	0	0	$626.700
1007380183	FORERO	BRAYAN	1	0							X							0	30	30	30	30	PORVENIR	1.611.459	257.900	FAMISANAR EPS	1.611.459	64.500	ARL SURA	1.611.459	112.200	COLSUBSIDIO	1.611.459	64.500	0	0	0	0	$499.100
13567141	NOBLES	WILDER	1	0							X							0	27	27	27	27	PORVENIR	1.981.683	317.100	SALUD TOTAL EPS	1.981.683	79.300	ARL SURA	1.981.683	138.000	COLSUBSIDIO	1.981.683	79.300	0	0	0	0	$613.700
1007861118	RIOS	JOHAN	1	0									X					0	3	3	3	3	COLPENSIONES	100.001	16.100	EPS SANITAS	100.001	4.100	ARL SURA	100.001	0	COLSUBSIDIO	100.001	0	0	0	0	0	$20.200
72284595	BLANCO	ALEXIS	1	0											X			0	1	1	1	1	PORVENIR	183.333	29.400	EPS SURA	183.333	7.400	ARL SURA	183.333	0	COLSUBSIDIO	183.333	7.400	0	0	0	0	$44.200
13514289	CHAPARRO	HENDERSON	1	0											X			0	6	6	6	6	PORVENIR	649.392	104.000	NUEVA EPS	649.392	26.000	ARL SURA	649.392	0	COLSUBSIDIO	440.000	17.600	0	0	0	0	$147.600

Simple

Informe Detallado por Empleado

RAZON SOCIAL	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES		
NIT EMPRESA	CC 19146113	**DIRECCION**	Carrera 22a No. 85-20
TIPO APORTANTE	2	**TELEFONO**	6226620
TIPO PERSONA	N	**FORMA PRESENTACION**	U
CIUDAD	BOGOTA	**DEPARTAMENTO**	BOGOTA D.C.

Número Planilla	Fecha pago	Periodos	
1045147656	2022-04-05	202203	202204

DATOS AFILIADO					Novedades																		Pension			salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Documento	Apellidos y Nombres		Cotizante	Subtipo	Ing	Ret	Tde	Tae	Vsp	corr	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irp	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Nombre AFP	IBC	Cotizacion	Nombre EPS	IBC	Cotizacion	Nombre ARP	IBC	Cotizacion	Nombre CCF	IBC	Cotizacion CCF	Cotizacion Sena	Cotizacion ICBF	Cotizacion ESAP	Cotizacion Min EDU	TOTAL
1069432781	HERNANDEZ	GIOVANNI	1	0							X							0	29	29	29	29	PORVENIR	2.344.980	375.200	SALUD TOTAL EPS	2.344.980	93.800	ARL SURA	2.344.980	163.300	COLSUBSIDIO	2.344.980	93.800	0	0	0	0	$726.100
1102382293	PARRA	BYRON	1	0									X					0	2	2	2	2	PORVENIR	66.667	10.700	SALUD TOTAL EPS	66.667	2.700	ARL SURA	66.667	0	COLSUBSIDIO	66.667	0	0	0	0	0	$13.400
53906302	RAMIREZ	ANA	1	0														0	30	30	30	30	COLPENSIONES	5.000.000	800.000	COMPENSAR EPS	5.000.000	200.000	ARL SURA	5.000.000	348.000	COLSUBSIDIO	5.000.000	200.000	0	0	0	0	$1.548.000
1075688014	ROMERO	ANDREA	1	0											X			0	1	1	1	1	PORVENIR	50.000	8.000	COMPENSAR EPS	50.000	2.000	ARL SURA	50.000	0	COLSUBSIDIO	50.000	2.000	0	0	0	0	$12.000
20577421	ROZO	HEIDI	1	0		X												0	11	11	11	11	PROTECCION (ING +	733.334	117.400	FAMISANAR EPS	733.334	29.400	ARL SURA	733.334	51.100	COLSUBSIDIO	1.125.001	45.100	0	0	0	0	$243.000
1069468419	RIOS	FEIBER	1	0							X							0	30	30	30	30	COLFONDOS	3.234.357	517.500	NUEVA EPS	3.234.357	129.400	ARL SURA	3.234.357	225.200	COMFAMILIAR DEL	3.234.357	129.400	0	0	0	0	$1.001.500
1007341906	CONTRERAS	JEISSON	1	0									X					0	2	2	2	2	PORVENIR	66.667	10.700	FAMISANAR EPS	66.667	2.700	ARL SURA	66.667	0	COLSUBSIDIO	66.667	0	0	0	0	0	$13.400
1003826788	CABREJO	DIEGO	1	0									X					0	3	3	3	3	PORVENIR	100.001	16.100	NUEVA EPS	100.001	4.100	ARL SURA	100.001	0	COLSUBSIDIO	100.001	0	0	0	0	0	$20.200
1075681816	CAMACHO	YEFERSSON	1	0											X			0	1	1	1	1	PROTECCION (ING +	59.958	9.600	FAMISANAR EPS	59.958	2.400	ARL SURA	59.958	0	COLSUBSIDIO	40.000	1.600	0	0	0	0	$13.600
1128625855	QUINTERO	EDILSON	1	0							X							0	29	29	29	29	PORVENIR	2.302.500	368.400	NUEVA EPS	2.302.500	92.100	ARL SURA	2.302.500	160.300	COLSUBSIDIO	2.302.500	92.100	0	0	0	0	$712.900
11346058	RIOS	EDGAR	1	0	X													0	30	30	30	30	COLPENSIONES	4.500.000	720.000	EPS SANITAS	4.500.000	180.000	ARL SURA	4.500.000	313.200	COLSUBSIDIO	4.500.000	180.000	0	0	0	0	$1.393.200
79170740	CAÑON	LUIS	1	0	X						X							0	17	17	17	17	PORVENIR	1.393.332	223.000	NUEVA EPS	1.393.332	55.800	ARL SURA	1.393.332	97.000	COLSUBSIDIO	1.393.332	55.800	0	0	0	0	$431.600
1068952762	GOMEZ	WILSON	1	0	X						X							0	17	17	17	17	PORVENIR	566.667	90.700	EPS SURA	566.667	22.700	ARL SURA	566.667	39.500	COLSUBSIDIO	510.418	20.500	0	0	0	0	$173.400
1068657255	ARROYO	VICTOR	1	0									X					0	1	1	1	1	PORVENIR	57.772	9.300	NUEVA EPS	57.772	2.400	ARL SURA	57.772	0	COMFAMILIAR DEL	57.772	0	0	0	0	0	$11.700
91016163	ARDILA	GABRIEL	1	0							X							0	30	30	30	30	COLPENSIONES	2.843.750	455.000	NUEVA EPS	2.843.750	113.800	ARL SURA	2.843.750	198.000	COLSUBSIDIO	2.843.750	113.800	0	0	0	0	$880.600
3837933	MEDRANO	WILLIAM	1	0														0	30	30	30	30	COLPENSIONES	4.000.000	640.000	EPS SANITAS	4.000.000	160.000	ARL SURA	4.000.000	278.400	COLSUBSIDIO	4.000.000	160.000	0	0	0	0	$1.238.400
1069100660	MOLINA	NESTOR	1	0									X					0	2	2	2	2	PORVENIR	66.667	10.700	COMPENSAR EPS	66.667	2.700	ARL SURA	66.667	0	COLSUBSIDIO	66.667	0	0	0	0	0	$13.400
80407479	SILVA	EDILBERTO	1	0							X							0	30	30	30	30	COLPENSIONES	6.478.126	1.036.600	NUEVA EPS	6.478.126	259.200	ARL SURA	6.478.126	450.900	COLSUBSIDIO	6.478.126	259.200	0	0	0	0	$2.005.900
1000180330	MURCIA	ANDRES	1	0							X							0	29	29	29	29	PROTECCION (ING +	1.055.215	168.900	EPS SURA	1.055.215	42.300	ARL SURA	1.055.215	73.500	COLSUBSIDIO	1.055.215	42.300	0	0	0	0	$327.000
1073605711	BARRANTES	SERGIO	1	0	X						X							0	17	17	17	17	PORVENIR	1.085.520	173.700	FAMISANAR EPS	1.085.520	43.500	ARL SURA	1.085.520	75.600	COLSUBSIDIO	1.085.520	43.500	0	0	0	0	$336.300
1072744032	RAMIREZ	JOHN	1	0							X							0	29	29	29	29	PORVENIR	2.925.382	468.100	FAMISANAR EPS	2.925.382	117.100	ARL SURA	2.925.382	203.700	COLSUBSIDIO	2.925.382	117.100	0	0	0	0	$906.000

Simple

Informe Detallado por Empleado

RAZON SOCIAL	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES		
NIT EMPRESA	CC 19146113	**DIRECCION**	Carrera 22a No. 85-20
TIPO APORTANTE	2	**TELEFONO**	6226620
TIPO PERSONA	N	**FORMA PRESENTACION**	U
CIUDAD	BOGOTA	**DEPARTAMENTO**	BOGOTA D.C.

Número Planilla	Fecha pago	Periodos	
1045147656	2022-04-05	202203	202204

DATOS AFILIADO					Novedades																	Pension			salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Documento	Apellidos y Nombres		Cotizante	Subtipo	Ing	Ret	Tde	Tae	Vsp	corr	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irp	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Nombre AFP	IBC	Cotizacion	Nombre EPS	IBC	Cotizacion	Nombre ARP	IBC	Cotizacion	Nombre CCF	IBC	Cotizacion CCF	Cotizacion Sena	Cotizacion ICBF	Cotizacion ESAP	Cotizacion Min EDU	TOTAL
1106741828	PAEREZ	JULIAN	1	0								X						0	1	1	1	1	PORVENIR	96.334	11.600	NUEVA EPS	96.334	0	ARL SURA	96.334	0	COLSUBSIDIO	96.334	0	0	0	0	0	$11.600
80543333	SILVA	DIEGO	1	0											X			0	1	1	1	1	PROTECCION (ING +	93.736	15.000	SALUD TOTAL EPS	93.736	3.800	ARL SURA	93.736	0	COLSUBSIDIO	56.667	2.300	0	0	0	0	$21.100
11443231	CIFUENTES	FREDY	1	0							X							0	30	30	30	30	COLPENSIONES	5.171.250	827.400	EPS SANITAS	5.171.250	206.900	ARL SURA	5.171.250	360.000	COLSUBSIDIO	5.171.250	206.900	0	0	0	0	$1.601.200
13514289	CHAPARRO	HENDERSON	1	0							X							0	23	23	23	23	PORVENIR	2.690.438	430.500	NUEVA EPS	2.690.438	107.700	ARL SURA	2.690.438	117.100	COLSUBSIDIO	2.690.438	107.700	0	0	0	0	$763.000
1070611037	GUEVARA	JAIRO	1	0								X						0	2	2	2	2	PORVENIR	72.222	8.700	FAMISANAR EPS	72.222	0	ARL SURA	72.222	0	COLSUBSIDIO	72.222	0	0	0	0	0	$8.700
1075661539	SUAREZ	EDILSON	1	0							X							0	29	29	29	29	PROTECCION (ING +	2.502.169	400.400	EPS SURA	2.502.169	100.100	ARL SURA	2.502.169	174.200	COLSUBSIDIO	2.502.169	100.100	0	0	0	0	$774.800
11345802	AREVALO	ISMAEL	1	0							X							0	30	30	30	30	COLPENSIONES	1.286.471	205.900	FAMISANAR EPS	1.286.471	51.500	ARL SURA	1.286.471	89.600	COLSUBSIDIO	1.286.471	51.500	0	0	0	0	$398.500
1149441062	CHAMORRO	BERSELAIS	1	0							X							0	28	28	28	28	PORVENIR	2.203.353	352.600	NUEVA EPS	2.203.353	88.200	ARL SURA	2.203.353	153.400	COMFAMILIAR DEL	2.203.353	88.200	0	0	0	0	$682.400
79726581	URETA	JOSE	1	0							X							0	29	29	29	29	PROTECCION (ING +	1.931.684	309.100	NUEVA EPS	1.931.684	77.300	ARL SURA	1.931.684	134.500	COLSUBSIDIO	1.931.684	77.300	0	0	0	0	$598.200
1054988888	GALVEZ	YOMARA	1	0														0	29	29	29	29	PORVENIR	3.383.334	541.400	EPS SURA	3.383.334	135.400	ARL SURA	3.383.334	235.500	COLSUBSIDIO	3.383.334	135.400	0	0	0	0	$1.047.700
13567141	NOBLES	WILDER	1	0											X			0	2	2	2	2	PORVENIR	175.274	28.100	SALUD TOTAL EPS	175.274	7.100	ARL SURA	175.274	0	COLSUBSIDIO	106.667	4.300	0	0	0	0	$39.500
11448488	TRIANA	FABIO	1	0							X							0	30	30	30	30	PORVENIR	5.920.853	947.400	SALUD TOTAL EPS	5.920.853	236.900	ARL SURA	5.920.853	412.100	COLSUBSIDIO	5.920.853	236.900	0	0	0	0	$1.833.300
1007341906	CONTRERAS	JEISSON	1	0							X							0	28	28	28	28	PORVENIR	1.381.264	221.100	FAMISANAR EPS	1.381.264	55.300	ARL SURA	1.381.264	96.200	COLSUBSIDIO	1.381.264	55.300	0	0	0	0	$427.900
1077085173	FAJARDO	CRISTIAN	1	0							X							0	30	30	30	30	PORVENIR	1.746.884	279.600	FAMISANAR EPS	1.746.884	69.900	ARL SURA	1.746.884	76.000	COLSUBSIDIO	1.746.884	69.900	0	0	0	0	$495.400
37754784	SANCHEZ	LUZ	1	0									X					0	3	3	3	3	PORVENIR	333.300	53.400	NUEVA EPS	333.300	13.400	ARL SURA	333.300	0	COLSUBSIDIO	333.300	0	0	0	0	0	$66.800
1007409735	COCA	YEISSON	1	0	X						X							0	23	23	23	23	PORVENIR	792.711	126.900	EPS SANITAS	792.711	31.800	ARL SURA	792.711	55.200	COLSUBSIDIO	792.711	31.800	0	0	0	0	$245.700
1075681614	RODRIGUEZ	MARTIN	1	0									X					0	9	9	9	9	COLFONDOS	300.000	48.000	EPS-S CONVIDA	300.000	12.000	ARL SURA	300.000	0	COLSUBSIDIO	300.000	0	0	0	0	0	$60.000
80547486	JIMENEZ	FREDY	1	0							X							0	29	29	29	29	PORVENIR	2.830.034	452.900	COMPENSAR EPS	2.830.034	113.300	ARL SURA	2.830.034	123.200	COLSUBSIDIO	2.830.034	113.300	0	0	0	0	$802.700
1007788654	PEÑA	MARIO	1	0									X					0	2	2	2	2	PORVENIR	66.667	10.700	FAMISANAR EPS	66.667	2.700	ARL SURA	66.667	0	COLSUBSIDIO	66.667	0	0	0	0	0	$13.400
79167728	CONEJO	MELQUECIDE	1	0							X							0	30	30	30	30	COLPENSIONES	3.315.816	530.600	FAMISANAR EPS	3.315.816	132.700	ARL SURA	3.315.816	230.800	COLSUBSIDIO	3.315.816	132.700	0	0	0	0	$1.026.800
1016054283	MARTINEZ	ANGEL	1	0									X					0	6	6	6	6	PROTECCION (ING +	346.632	55.500	EPS SURA	346.632	13.900	ARL SURA	346.632	0	COLSUBSIDIO	346.632	0	0	0	0	0	$69.400

Simple

Informe Detallado por Empleado

RAZON SOCIAL	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES		
NIT EMPRESA	CC 19146113	**DIRECCION**	Carrera 22a No. 85-20
TIPO APORTANTE	2	**TELEFONO**	6226620
TIPO PERSONA	N	**FORMA PRESENTACION**	U
CIUDAD	BOGOTA	**DEPARTAMENTO**	BOGOTA D.C.

Número Planilla	Fecha pago	Periodos	
1045147656	2022-04-05	202203	202204

DATOS AFILIADO					Novedades																		Pension			salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Documento	Apellidos y Nombres		Cotizante	Subtipo	Ing	Ret	Tde	Tae	Vsp	corr	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irp	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Nombre AFP	IBC	Cotizacion	Nombre EPS	IBC	Cotizacion	Nombre ARP	IBC	Cotizacion	Nombre CCF	IBC	Cotizacion CCF	Cotizacion Sena	Cotizacion ICBF	Cotizacion ESAP	Cotizacion Min EDU	TOTAL
1075681689	HERNANDEZ	JUAN	1	0								X						0	2	2	2	2	PORVENIR	73.611	8.900	COMPENSAR EPS	73.611	0	ARL SURA	73.611	0	COLSUBSIDIO	73.611	0	0	0	0	0	$8.900
11447698	CARDENAS	DAVID	1	0							X							0	29	29	29	29	COLPENSIONES	2.073.438	331.800	FAMISANAR EPS	2.073.438	83.000	ARL SURA	2.073.438	144.400	COLSUBSIDIO	2.073.438	83.000	0	0	0	0	$642.200
1007421156	GONZALEZ	SERGIO	1	0	X						X							0	22	22	22	22	PORVENIR	759.378	121.600	FAMISANAR EPS	759.378	30.400	ARL SURA	759.378	52.900	COLSUBSIDIO	759.378	30.400	0	0	0	0	$235.300
23500541	SIERRA	BLANCA	1	0											X			0	1	1	1	1	COLPENSIONES	51.895	8.400	NUEVA EPS	51.895	2.100	ARL SURA	51.895	0	COLSUBSIDIO	33.333	1.400	0	0	0	0	$11.900
11439559	CASTRO	CARLOS	1	0											X			0	1	1	1	1	COLPENSIONES	158.594	25.400	FAMISANAR EPS	158.594	6.400	ARL SURA	158.594	0	COLSUBSIDIO	116.667	4.700	0	0	0	0	$36.500
1054988888	GALVEZ	YOMARA	1	0											X			0	1	1	1	1	PORVENIR	116.667	18.700	EPS SURA	116.667	4.700	ARL SURA	116.667	0	COLSUBSIDIO	116.667	4.700	0	0	0	0	$28.100
1075654495	RODRIGUEZ	JOHAN	1	0							X							0	30	30	30	30	PORVENIR	1.797.007	287.600	FAMISANAR EPS	1.797.007	71.900	ARL SURA	1.797.007	125.100	COLSUBSIDIO	1.797.007	71.900	0	0	0	0	$556.500
11439559	CASTRO	CARLOS	1	0							X							0	29	29	29	29	COLPENSIONES	5.155.186	824.900	FAMISANAR EPS	5.155.186	206.300	ARL SURA	5.155.186	224.300	COLSUBSIDIO	5.155.186	206.300	0	0	0	0	$1.461.800
52615785	MUÑOZ	FABIOLA	1	0							X							0	29	29	29	29	PORVENIR	1.591.690	254.700	FAMISANAR EPS	1.591.690	63.700	ARL SURA	1.591.690	110.800	COLSUBSIDIO	1.591.690	63.700	0	0	0	0	$492.900
11347058	RODRIGUEZ	JOSE	1	0											X			0	1	1	1	1	PORVENIR	56.667	9.100	COMPENSAR EPS	56.667	2.300	ARL SURA	56.667	0	COLSUBSIDIO	56.667	2.300	0	0	0	0	$13.700
1075677784	ROJAS	LAURA	1	0											X			0	1	1	1	1	COLPENSIONES	43.333	7.000	COMPENSAR EPS	43.333	1.800	ARL SURA	43.333	0	COLSUBSIDIO	43.333	1.800	0	0	0	0	$10.600
75145329	ROJAS	ARBEY	1	0											X			0	2	2	2	2	COLFONDOS	179.470	28.800	FAMISANAR EPS	179.470	7.200	ARL SURA	179.470	0	COLSUBSIDIO	106.667	4.300	0	0	0	0	$40.300
80135602	JIMENEZ	JOSE	1	0							X							0	30	30	30	30	PROTECCION (ING +	2.264.877	362.400	FAMISANAR EPS	2.264.877	90.600	ARL SURA	2.264.877	157.700	COLSUBSIDIO	2.264.877	90.600	0	0	0	0	$701.300
52615785	MUÑOZ	FABIOLA	1	0											X			0	1	1	1	1	PORVENIR	51.104	8.200	FAMISANAR EPS	51.104	2.100	ARL SURA	51.104	0	COLSUBSIDIO	33.333	1.400	0	0	0	0	$11.700
72284595	BLANCO	ALEXIS	1	0														0	29	29	29	29	PORVENIR	5.316.667	850.700	EPS SURA	5.316.667	212.700	ARL SURA	5.316.667	370.100	COLSUBSIDIO	5.316.667	212.700	0	0	0	0	$1.646.200
1070611037	GUEVARA	JAIRO	1	0							X							0	28	28	28	28	PORVENIR	1.440.650	230.600	FAMISANAR EPS	1.440.650	57.700	ARL SURA	1.440.650	100.300	COLSUBSIDIO	1.440.650	57.700	0	0	0	0	$446.300
1106741828	PAEREZ	JULIAN	1	0									X					0	1	1	1	1	PORVENIR	42.218	6.800	NUEVA EPS	42.218	1.700	ARL SURA	42.218	0	COLSUBSIDIO	42.218	0	0	0	0	0	$8.500
20362761	GUTIERREZ	ERIKA	1	0														0	30	30	30	30	COLPENSIONES	9.100.000	1.456.000	COMPENSAR EPS	9.100.000	1.137.500	ARL SURA	9.100.000	47.600	COLSUBSIDIO	9.100.000	364.000	182.000	273.000	0	0	$3.460.100
76216360	CAICEDO	YONOVER	1	0							X							0	29	29	29	29	PORVENIR	3.028.664	484.600	COMPENSAR EPS	3.028.664	121.200	ARL SURA	3.028.664	210.800	COLSUBSIDIO	3.028.664	121.200	0	0	0	0	$937.800
1077972031	GUTIERREZ	DAVINSON	1	0							X							0	27	27	27	27	PORVENIR	2.843.751	455.100	EPS SANITAS	2.843.751	113.800	ARL SURA	2.843.751	198.000	COMFAMILIARES DE CALDAS	2.843.751	113.800	0	0	0	0	$880.700
1075684646	RINCON	HENRY	1	0							X							0	28	28	28	28	COLFONDOS	1.110.420	177.700	FAMISANAR EPS	1.110.420	44.500	ARL SURA	1.110.420	77.300	COLSUBSIDIO	1.110.420	44.500	0	0	0	0	$344.000

Simple

Informe Detallado por Empleado

RAZON SOCIAL	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES		
NIT EMPRESA	CC 19146113	**DIRECCION**	Carrera 22a No. 85-20
TIPO APORTANTE	2	**TELEFONO**	6226620
TIPO PERSONA	N	**FORMA PRESENTACION**	U
CIUDAD	BOGOTA	**DEPARTAMENTO**	BOGOTA D.C.

Número Planilla	Fecha pago	Periodos	
1045147656	2022-04-05	202203	202204

DATOS AFILIADO					Novedades																		Pension			salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Documento	Apellidos y Nombres		Cotizante	Subtipo	Ing	Ret	Tde	Tae	Vsp	corr	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irp	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Nombre AFP	IBC	Cotizacion	Nombre EPS	IBC	Cotizacion	Nombre ARP	IBC	Cotizacion	Nombre CCF	IBC	Cotizacion CCF	Cotizacion Sena	Cotizacion ICBF	Cotizacion ESAP	Cotizacion Min EDU	TOTAL
16075376	ORTEGON	GIOVANNI	1	0											X			0	1	1	1	1	PROTECCION (ING +	80.516	12.900	NUEVA EPS	80.516	3.300	ARL SURA	80.516	0	COMFAMILIARES DE CALDAS	53.333	2.200	0	0	0	0	$18.400
1045248031	RAMIREZ	JUAN	1	0							X							0	30	30	30	30	COLFONDOS	2.835.001	453.700	NUEVA EPS	2.835.001	113.500	ARL SURA	2.835.001	197.400	COMFENALCO ANTIOQUIA	2.835.001	113.500	0	0	0	0	$878.100
1023025530	ALONSO	NURY	1	0														0	30	30	30	30	PORVENIR	1.500.000	240.000	FAMISANAR EPS	1.500.000	60.000	ARL SURA	1.500.000	104.400	COLSUBSIDIO	1.500.000	60.000	0	0	0	0	$464.400
13392180	CONTRERAS	JOSE	1	0							X							0	27	27	27	27	COLPENSIONES	1.968.348	315.000	EPS SANITAS	1.968.348	78.800	ARL SURA	1.968.348	137.000	COLSUBSIDIO	1.968.348	78.800	0	0	0	0	$609.600
1075673962	GALINDO	SERGIO	1	0							X							0	29	29	29	29	PORVENIR	1.514.608	242.400	NUEVA EPS	1.514.608	60.600	ARL SURA	1.514.608	105.500	COLSUBSIDIO	1.514.608	60.600	0	0	0	0	$469.100
91489996	PEREZ	HORACIO	1	0							X							0	30	30	30	30	PORVENIR	3.707.685	593.300	FAMISANAR EPS	3.707.685	148.400	ARL SURA	3.707.685	258.100	COLSUBSIDIO	3.707.685	148.400	0	0	0	0	$1.148.200
91510564	CUADROS	JHON	1	0							X							0	29	29	29	29	PORVENIR	2.903.556	464.600	FAMISANAR EPS	2.903.556	116.200	ARL SURA	2.903.556	202.100	COLSUBSIDIO	2.903.556	116.200	0	0	0	0	$899.100
80027557	GUAQUETA	ERIK	1	0							X							0	25	25	25	25	PROTECCION (ING +	2.697.307	431.600	FAMISANAR EPS	2.697.307	107.900	ARL SURA	2.697.307	187.800	COLSUBSIDIO	2.697.307	107.900	0	0	0	0	$835.200
3234911	BELTRAN	LUIS	1	0							X							0	30	30	30	30	COLPENSIONES	3.682.288	589.200	FAMISANAR EPS	3.682.288	147.300	ARL SURA	3.682.288	256.300	COLSUBSIDIO	3.682.288	147.300	0	0	0	0	$1.140.100
91510564	CUADROS	JHON	1	0								X						0	1	1	1	1	PORVENIR	92.812	11.200	FAMISANAR EPS	92.812	0	ARL SURA	92.812	0	COLSUBSIDIO	92.812	0	0	0	0	0	$11.200
1075681614	RODRIGUEZ	MARTIN	1	0									X					0	4	4	4	4	COLFONDOS	133.334	21.400	EPS-S CONVIDA	133.334	5.400	ARL SURA	133.334	0	COLSUBSIDIO	133.334	0	0	0	0	0	$26.800
80148758	DIAZ	MILTON	1	0							X							0	28	28	28	28	PROTECCION (ING +	2.026.683	324.300	SALUD TOTAL EPS	2.026.683	81.100	ARL SURA	2.026.683	141.100	COLSUBSIDIO	2.026.683	81.100	0	0	0	0	$627.600
80547486	JIMENEZ	FREDY	1	0								X						0	1	1	1	1	PORVENIR	67.389	8.100	COMPENSAR EPS	67.389	0	ARL SURA	67.389	0	COLSUBSIDIO	67.389	0	0	0	0	0	$8.100
80027557	GUAQUETA	ERIK	1	0									X					0	5	5	5	5	PROTECCION (ING +	258.742	41.400	FAMISANAR EPS	258.742	10.400	ARL SURA	258.742	0	COLSUBSIDIO	258.742	0	0	0	0	0	$51.800
1072744032	RAMIREZ	JOHN	1	0											X			0	1	1	1	1	PORVENIR	81.517	13.100	FAMISANAR EPS	81.517	3.300	ARL SURA	81.517	0	COLSUBSIDIO	56.667	2.300	0	0	0	0	$18.700
1031126868	MEZA	MARIO	1	0							X							0	30	30	30	30	PORVENIR	2.373.029	379.700	COMPENSAR EPS	2.373.029	95.000	ARL SURA	2.373.029	165.200	COLSUBSIDIO	2.373.029	95.000	0	0	0	0	$734.900
1073380781	PINZON	CARLOS	1	0							X							0	30	30	30	30	PORVENIR	1.571.899	251.600	FAMISANAR EPS	1.571.899	62.900	ARL SURA	1.571.899	109.500	COLSUBSIDIO	1.571.899	62.900	0	0	0	0	$486.900
52839239	MENDOZA	AURA	1	0							X							0	30	30	30	30	COLPENSIONES	4.943.750	791.000	FAMISANAR EPS	4.943.750	197.800	ARL SURA	4.943.750	344.100	COLSUBSIDIO	4.943.750	197.800	0	0	0	0	$1.530.700
1104700791	GONZALEZ	JOSE	1	0			X				X							0	29	29	29	29	PORVENIR	2.083.349	333.400	COMPENSAR EPS	2.083.349	83.400	ARL SURA	2.083.349	145.100	COLSUBSIDIO	2.083.349	83.400	0	0	0	0	$645.300
80546819	VELANDIA	WILLIAM	1	0							X							0	24	24	24	24	PROTECCION (ING +	1.055.217	168.900	FAMISANAR EPS	1.055.217	42.300	ARL SURA	1.055.217	73.500	COLSUBSIDIO	1.055.217	42.300	0	0	0	0	$327.000
14270208	VARON	RAFAEL	1	0											X			0	1	1	1	1	COLPENSIONES	115.194	18.500	NUEVA EPS	115.194	4.700	ARL SURA	115.194	0	COLSUBSIDIO	73.333	3.000	0	0	0	0	$26.200

Simple

Informe Detallado por Empleado

RAZON SOCIAL	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES		
NIT EMPRESA	CC 19146113	**DIRECCION**	Carrera 22a No. 85-20
TIPO APORTANTE	2	**TELEFONO**	6226620
TIPO PERSONA	N	**FORMA PRESENTACION**	U
CIUDAD	BOGOTA	**DEPARTAMENTO**	BOGOTA D.C.

Número Planilla	Fecha pago	Periodos	
1045147656	2022-04-05	202203	202204

DATOS AFILIADO				Novedades																	Pension			salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Documento	Apellidos y Nombres		Cotizante	Subtipo	Ing	Ret	Tde	Tae	Vsp	corr	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irp	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Nombre AFP	IBC	Cotizacion	Nombre EPS	IBC	Cotizacion	Nombre ARP	IBC	Cotizacion	Nombre CCF	IBC	Cotizacion CCF	Cotizacion Sena	Cotizacion ICBF	Cotizacion ESAP	Cotizacion Min EDU	TOTAL
1098610928	CASTILLO	SERGIO	1	0														0	30	30	30	30	PORVENIR	5.500.000	880.000	EPS SURA	5.500.000	220.000	ARL SURA	5.500.000	382.800	COLSUBSIDIO	5.500.000	220.000	0	0	0	0	$1.702.800
13993947	DEL RIO	JULIAN	1	0											X			0	1	1	1	1	PORVENIR	211.838	33.900	EPS SANITAS	211.838	8.500	ARL SURA	211.838	0	COLSUBSIDIO	120.000	4.800	0	0	0	0	$47.200

PAGADO

RESUMEN DE PAGO

ADMINISTRADORA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	TOTAL LIQUIDADO
AFP 6					
PROTECCION (ING + PROTECCION)	230201	800229739	0	331	$109.415.300
COLFONDOS	231001	800227940	6	181	$68.260.600
PORVENIR	230301	800224808	8	761	$251.410.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	373	$218.045.700
NINGUNA AFP	NIN-AF	000000000		6	$0
OLD MUTUAL SKANDIA	230901	800253055	2	3	$5.440.100
ARP 1					
ARL SURA	14-11	890903790	5	1655	$224.530.500
CCF 6					
COMFENALCO VALLE	CCF56	890303093	5	2	$597.600
COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	CCF07	890101994	9	170	$13.826.900
COLSUBSIDIO	CCF22	860007336	1	1321	$135.337.100
CAJAMAG	CCF33	891780093	3	1	$60.000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890900842	6	80	$5.103.300
COMFAMILIARES DE CALDAS	CCF11	890806490	5	81	$9.328.800
EPS 18					
EPS-S CAJACOPI	CCFC55	890102044	1	16	$964.000
RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	EPSC34	900298372	9	20	$957.800
ASOCIACION MUTUAL SER	ESSC07	806008394	7	19	$1.073.600
ALIANSALUD	EPS001	830113831	0	20	$6.958.700
ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	EPS040	900604350	0	20	$1.194.500
EPS SANITAS	EPS005	800251440	6	254	$53.867.800
FAMISANAR EPS	EPS017	830003564	7	347	$35.755.100
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	10	$710.400
EPS SURA	EPS010	800088702	2	124	$16.750.000
EPS-S MUTUAL SER	EPS048	806008394	7	2	$83.300
ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	$93.000
SALUD TOTAL EPS	EPS002	800130907	4	296	$24.739.800
NUEVA EPS	EPS037	900156264	2	293	$29.765.900
EPS-S CONVIDA	EPSC22	899999107	9	14	$808.000
TOTAL				6401	$1.215.077.900

PAGADO

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	EPS041	900156264	2	14	$714.200
ECOOPSOS	ESSC91	901093846	0	1	$59.700
COMPENSAR EPS	EPS008	860066942	7	203	$28.731.700
ADRES (MIN001) antes FOSYGA	MIN001	901037916	1	1	$1.875.000
ESA	1				
ESAP	PAESAP	899999054	7	1655	$0
ICB	1				
ICBF	PAICBF	899999239	2	1655	$14.419.400
MIN	1				
MINISTERIO DE EDUCACION	PAMIED	899999001	7	1655	$0
SEN	1				
SENA	PASENA	899999034	1	1655	$9.612.900
TOTAL				6839	$55.412.900

PAGADO

FECHA: 31/03/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	CUNDINAMARCA
3. AÑO	**2022** MES 1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: RUTA DE LOS COMUNEROS	TRAMO:	1
6. CONTRATO DE OBRA No:	989 DE 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL MHC 063	NIT	
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO ICEACSA TPF	NIT	900797235-9
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	971 DE 2021		

11. PLAZO INICIAL:	21/06/2021	12. FECHA DE INICIO:	21/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	-
14. PLAZO ACUMULADO:	20/12/2030	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	-	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	-
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 69.304.992.541,00	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO	$ 465.288.090.475,00
21. VR. ANTICIPO:	$ 0,00
22. VR. ADICIÓN No:	$ 0,00
23. VR. ADICIÓN No:	$ 0,00
24. VR. TOTAL ADICIONES:	$ 0,00
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	**$ 465.288.090.475,00**

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE	3	$ 1.394.000,00	$ 4.182.000,00
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	0	$ 2.788.000,00	$ -
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO	0	$ 1.045.000,00	$ -
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)	0	$ 348.500,00	$ -
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES	0	$ 1.074.000,00	$ -
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO,	0	$ 805.500,00	$ -
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)	0	$ 268.500,00	$ -
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)	3	$ 754.000,00	$ 2.262.000,00
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN	0	$ 377.000,00	$ -
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS	0	$ 377.000,00	$ -
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS	0	$ 320.000,00	$ -
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)	0	$ 217.000,00	$ -
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO	1	$ 1.340.000,00	$ 1.340.000,00
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.	0	$ 2.680.000,00	$ -
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV	0	$ 860.000,00	$ -
	41. AVALUOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV	0	$ 640.000,00	$ -
	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV	0		$ -
	43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV	0		$ -
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	1	$ 346.500,00	$ 346.500,00
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA	0	$ 231.000,00	$ -
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA	1	$ 346.500,00	$ 346.500,00
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA	0	$ 231.000,00	$ -
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ 115.500,00	$ -
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS	0	$ 462.000,00	$ -
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ 231.000,00	$ -
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL	0	$ 231.000,00	$ -
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)	0	$ 321.000,00	$ -
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	$ 321.000,00	$ -
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	$ 107.000,00	$ -
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA	0	$ 749.000,00	$ -
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE	0	$ 642.000,00	$ -
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIUA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	0	$ 150.000,00	$ -
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	0	$ 300.000,00	$ -
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA	0	$ 150.000,00	$ -
	60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ 150.000,00	$ -
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN	0	$ 640.000,00	$ -
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61		9		$ 8.477.000,00
IVA		19%		$ 1.610.630,00
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL		**9**		**$ 10.087.630,00**

FECHA: 31/03/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	CUNDINAMARCA
3. AÑO **2022**	MES 1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: RUTA DE LOS COMUNEROS	TRAMO:	1
6. CONTRATO DE OBRA No:	989 DE 2021		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL MHC 063	NIT	
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO ICEACSA TPF	NIT	900797235-9
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	971 DE 2021		

11. PLAZO INICIAL:	21/06/2021	12. FECHA DE INICIO:	21/06/2021	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	-
14. PLAZO ACUMULADO:	20/12/2030	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	-	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	-
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ 69.304.992.541,00	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	**TRADENTE** (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA	**NUM DOC TRADENTE**	**MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ**	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	**No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS**	**VALOR AVALÚO TERRENO**	**PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO**	**VALOR TOTAL AVALÚO**	**VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)**	**OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO**

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**$ 0,00**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$ 0,00
64. OTROS	$ 0,00
65. IVA	$ 0,00
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	$ 0,38

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$ 8.477.000,00
68. IVA PRESENTE PREACTA	$ 1.610.630,00
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$ 10.087.630,00**
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	**$ 10.087.630,00**

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	
72. GESTIÓN PREDIAL	
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	
74. OTROS	
75. IVA	
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	
77. SALDO POR EJECUTAR	

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL INTERVENTOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	MARIO ALBERTO HUERTAS COTES		NOMBRES Y APELLIDOS	LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA	
C.C. __ C.E. __	NUMERO	19146113	C.C. X C.E. __	NUMERO	91200647
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	25000-14502	MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	68202-16905 STD
Representante Legal [x]	Apoderado [ ]		Representante Legal [ ]	Apoderado [X]	

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-9	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 de 4	

FECHA: 31/03/2022
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS
DIRECCIÓN TERRITORAL: Cundinamarca

PRE ACTA PREDIAL No: 10
PERIODO - MES: 1 de Marzo de 2022 al 31 de Marzo de 2022
FECHA ELABORACION: 31-mar-22

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 989 de 2021
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MHC - 063
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): Zipaquirá - Ubaté 45A04 K28+200 - 67+113
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 971 - 2021

PLAZO ACUMULADO:
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:
VALOR ADICIÓN No:
VALOR TOTAL ADICIONES:

2. DESCRIPCIÓN

No. Predio	Propietario	Ficha	Correcc Ficha	Estudio Título	Ajuste Estudio de Títulos	Avalúo	Oferta	Oficio de Inscripción	Gestión Predios						Gestión Mejoras		
									Entrega Anticipada	Promesa	Pago No. 1	Escrituración	Pago N° 2	IGAC	Entrega mejoratario	Compraventa Mejoras	Pago Mejoras
005-I-T1-MCRC	APRECUZ ASOCIACION PRO RECREACION Y CULTURA DE ZIPAQUIRA	10		10					10								
010-D-T1-MCRC	AVE COLOMBIANA LTDA	10		10													
013-I-T1-MCRC	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA	10		10		10	10										
TOTAL		**3**	**0**	**3**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**								

Preacta gestión y adquisición No 1	0	0	0	0	0	0	0	0									
Preacta gestión y adquisición No 2	0	0	0	0	0	0	0	0									
Preacta gestión y adquisición No 3	0	0	0	0	0	0	0	0									
Preacta gestión y adquisición No 4	0	0	0	0	0	0	0	0									
Preacta gestión y adquisición No 5	0	0	0	0	0	0	0	0									
Preacta gestión y adquisición No 6	0	0	0	0	0	0	0	0									
Preacta gestión y adquisición No 7	0	0	0	0	0	0	0	0									
Preacta gestión y adquisición No 8	0	0	0	0	0	0	0	0									
Preacta gestión y adquisición No 9	0	0	0	0	0	0	0	0									
Preacta gestión y adquisición No 10	3	0	3	0	1	1	0	1									
Preacta gestión y adquisición No 11																	
Preacta gestión y adquisición No 12																	
Preacta gestión y adquisición No 13																	
Preacta gestión y adquisición No 14																	
Preacta gestión y adquisición No 15																	
TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA	**3**	**0**	**3**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**									

Firma
Nombre ALEJANDRO HERRERA TOVAR
Residente Predial - MHC
Matrícula Profesional No: 25222-34419 CND.

Firma
Nombre: Alfonso Rozo González
Profesional Predial Interventoría
Matrícula No: 25335183241 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

FECHA: 31/03/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **Cundinamarca**

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 1		
CONTRATO DE OBRA No	989 de 2021	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No**	**971 - 2021**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL MHC - 063	**NOMBRE INTERVENTORIA**	CONSORCIO ICEACSA TPF
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)	Zipaquirá - Ubaté 45A04 K28+200 - 67+113		

2. DESCRIPCIÓN

PREDIO	Cedula Ciudadanía	Propietario	Abs. Inicial	Abs. Final	Avalúo
013-I-T1-MCRC	8000878216	CLUB DEL COMERCIO DE ZIPAQUIRA	K2+781,26	K2+839,27	$ 1.400.959.564,22

Firma

Nombre ALEJANDRO HERRERA TOVAR
Residente Predial - MHC
Matrícula Profesional No: 25222-34419 CND.

Firma

Nombre: Alfonso Rozo González
Profesional Predial Interventoría
Matrícula No: 25335183241 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.
