	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/02/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PUENTE ARIMENA - EL VIENTO

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 35 (Numeración consecutiva) del 18/02/2022 al 24/02/2022 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ORLANDO ORTIZ GOMEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. ANDRÉS RICARDO TOVAR MANZANARES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACIFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURIPE-PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030", MÓDULO 4.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
SE TIENE CONTEMPLADO CONSTRUIR 34.0 KM DE VIA Y MANTENER LA TRANSITABILIDAD DE LOS 59.9 KM DESDE PUENTE ARIMENA - EL VIENTO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
SE TIENE CONTEMPLADO CONSTRUIR INICIALMENTE EN LONGITUD DE 34.0 KM DE VIA, SE CONSTRUIRÁ TERRAPLEN CON MATERIAL DE PRESTAMO ESTABILIZADO CON CAL SOBRE EL CUAL SE INSTALARÁ BASE GRANULAR Y CARPETA ASFALTICA CON 3,5 DE ANCHO DE CARRIL Y UN METRO DE BERMA.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA
INTEGRANTES: PAVIMENTOS EL DORADO SAS 30%; SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES 70%

CONTRATO No.	974 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 205.918.749.263,00
FECHA DE INICIO:	28 DE JUNIO DE 2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE AGOSTO DE 2030	VALOR ACUMULADO:	**$ 205.918.749.263,00**
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE AGOSTO DE 2030		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC
INTEGRANTES: INTECSA - INARSA Sucursal Colombia 40%; CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICAS S.A.S. 30%; CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 30%

CONTRATO No.	1065 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 30.499.980.246,00
FECHA DE INICIO:	28 DE JUNIO DE 2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE AGOSTO DE 2030	VALOR ACUMULADO:	**$ 30.499.980.246,00**
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE AGOSTO DE 2030	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 3.682.749.263	$ 10.644.000.000	$ 21.288.000.000	$ 12.772.800.000	$ 12.772.800.000	$ 27.674.400.000	$ 27.674.400.000	$ 29.803.200.000	$ 29.803.200.000	$ 29.803.200.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 3.682.749.263	$ 3.721.855.170								
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 6.922.144.830	$ 21.288.000.000	$ 12.772.800.000	$ 12.772.800.000	$ 27.674.400.000	$ 27.674.400.000	$ 29.803.200.000	$ 29.803.200.000	$ 29.803.200.000
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.524.980.246	$ 1.525.000.000	$ 3.050.000.000	$ 1.830.000.000	$ 1.830.000.000	$ 3.965.000.000	$ 3.965.000.000	$ 4.270.000.000	$ 4.270.000.000	$ 4.270.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.524.980.246	$ 170.184.893								
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.354.815.107	$ 3.050.000.000	$ 1.830.000.000	$ 1.830.000.000	$ 3.965.000.000	$ 3.965.000.000	$ 4.270.000.000	$ 4.270.000.000	$ 4.270.000.000

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 182.451.868.100	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 5.164.578.505	2,831%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 7.041.994.433	4,058%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 2.240.025.928	1,228%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 362.610.000	0,199%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 5.164.578.505	2,831%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 7.404.604.433	4,058%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 200.996.175	0,110%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 764.414.890	0,419%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI X NO
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ENERO DE 2022
VALOR FACTURA: $ 1.935.037.533,00
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: no se ha aprobado la reprogramación propuesta

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.980.853.659,00	6,495%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.067.776.413,00	3,501%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 42.883.766,75	0,141%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 62.308.527,93	0,204%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI X NO
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 1/02/2022
PERIODO FACTURADO: ENERO DE 2022
VALOR FACTURA: $ 170.184.893,00
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS (OBRA)	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,088
Acumulado:	0,144

ANTICIPOS (INTERVENTORÍA)	
Otorgado $	$ 640.748.002,00
Amortizado $	$ 41.337.913,00
Saldo $	$ 599.410.089,00

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 2,831% — Avance o Atraso Físico % 143%
Meta Física Ejecutada % 4,058%

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100%			Prog	100			100	10000,0%
					Ejec	71			71	7100,0%
* KM Mantenidos	KM	60			Prog	60			60	100,0%
					Ejec	34			34	56,7%
* KM Pavimentados	KM	34			Prog	34			34	100,0%
					Ejec					
* Alcantarillas	Unidad	88			Prog	88			88	100,0%
					Ejec					

(Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada)

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PUENTE ARIMENA - EL VIENTO — TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadoras sobre orugas de mínimo 120 HP	2	6
Moto niveladoras de mínimo 120 HP	2	2
Compactadores vibratorios de mínimo 8 toneladas cada uno	2	3
Compactadores	2	
Volquetas	10	17
Retrocargador sobre llantas		2
Bulldozer		2
Carrotanque		2
Cargador		1
Dumper		1
Planta o central de fabricación de mezclas de concreto hidráulico o Asfáltico con capacidad mínima de 50 Toneladas/hora, según la estructura de pavimento de cada frente de obra. En proceso de montaje.	1	1
Trituradora con capacidad mínima de 50 Toneladas/hora. En ajuste final.	1	1
Terminadora de Asfalto o equipo completo de extendido, vibrado, compactado, texturizado y curado de losas de concreto hidráulico, según la estructura de pavimento de cada frente de obra	1	-
Total	21	38

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: RIO OCOA - VILLAVICENCIO FKG-091 — DISPONIBLE: PERMISO MINERO: SI X NO; LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO
UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO; LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES: Los permisos ambientales continua pendiente la entrega de la información completa y actualizada.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

	SI	NO	N/A
ZONAS DE DEPOSITO		X	
LICENCIA AMBIENTAL:		X	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:		X	
CONCESION DE AGUAS:		X	
OCUPACIÓN DE CAUCES:		X	
VERTIMIENTOS:		X	
EMISIONES:		X	
OTROS (Especificar cual)		X	

OBSERVACIONES: Estos permisos ambientales todavía sigue pendiente por entregar por parte del CSDV, no hay modificación sobre el estado de los permisos

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: El CSDV remitió 10 capítulos, los cuales fueron revisados por la Interventoría, generando el comunicado TR1-ICC-369-22, mediante el cual se informa que el documento está incompleto y no cumple con todo lo solicitado por el INVIAS para este tipo de documento, se han realizado mesas de trabajo con contratista para determinar los ajustes y correcciones al DOCUMENTO PAGA VER. 01

OBSERVACIONES: Se continua con el proceso sancionatorio por el presunto incumplimiento de la entrega del documento PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	151	11
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	91	11
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	60	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	46	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 162

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: NINGUNA
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: LOTE - 10 PUENTE ARIMENA

OBSERVACIONES: La Interventoría remitió observaciones al documento PAGA
Recepción de PQRS N°32
Seguimiento al trámite PQRS N°31
Capacitación Manual de Interventoría

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N.A.
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: N.A.
PREDIOS ADQUIRIDOS: N.A.

OBSERVACIONES: El 14 de febrero, se llevó a cabo una reunión conjunta con el gestor técnico del proyecto, donde se le solicito la aclaración e interpretación jurídica, con respecto al ancho del derecho de vía que se estableció en las resoluciones de adjudicación por el decreto 2770 de 1953 y la ley 1228 del 2008, como conclusión de esta solicitud el jurídico predial de la Entidad manifestó durante la reunión del 16 de febrero ,que el acho de la vía paro los predios adjudicados con el decreto 2770 es de 30 mts y los adjudicados con la ley 1228 el acho de la vía es de 60 mts , tal como lo establece la Agencia Nacional de Tierras.
El Contratita se comprometió en realizar un inventario donde identificará en terreno, cuantos y cuales predios fueron adjudicados con cada resolución y así poder determinar con que volumen de material se cuenta para la elaboración de los terraplenes.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Durante la presente semana se revisó el comunicado 2022-SDV-CENV-0032 mediante el cual, el Consorcio SD Vichada presentó solicitud de definición de las gestiones ambientales, sociales, prediales, y de Sostenibilidad. Al respecto, mediante mensaje correo electrónico, se remitió a la Dirección de la Interventoría la respuesta al numeral 7 de la citada comunicación, en el cual, se indica que: "de manera perentoria, vuelve a reiterarse al CSDV, la entrega del Plan de Inversión de Sostenibilidad, como primera medida (lógicamente, este documento deberá ser coherente con el Plan de Trabajo y Cronograma de ejecución de Sostenibilidad, el cual, a la fecha, tampoco cuenta con aprobación por parte de la Interventoría), para la revisión por parte de esta Interventoría."

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SOCIAL: 1.Se recibe PQRS N° 32 (Fiscal JAC Carimagua) y se da traslado al CSDV para su respectiva atención
2.Se solicita al CSDV remitir los compromisos del acta de comité social de fecha 24/01/2022
3.Se solicitó las respuestas a la comunidad y acta de reunión extraordinaria de fecha 2/02/2022
4.Revisión Manual de Interventoría y formatos
5.Elaboración de informe semanal y mensual
6.Traslado SST para respectivo trámite de acuerdo con manifestación ciudadana
7.Se solicitó al CSDV remitir el acta de vecindad y compromiso del acopio ubicado en el predio PR5+000 (MD)
8.Se remite al CSDV nuevos formatos para respectiva firma (PIS y Preacta) para respectiva entrega del informe mensual

AMBIENTAL: Viernes 18 de febrero de 2022
Se actualiza la información ambiental
Se verifica y ajusta los nuevos formatos ambientales solicitados por el INVIAS
Se elabora y remite varios comunicados al contratista sobre el estado ambiental del proyecto
El contratista continua con los incumplimientos al no entregar la información tanto de los permisos ambientales como de los proveedores y/o gestores ambientales, contrario a lo establecido contractualmente, lo cual impide el normal desarrollo de las funciones de la interventoría, por tanto, cualquier incumplimiento generado por estas acciones, serán imputables al CSDV y se libera de total responsabilidad al INVIAS y a la Interventoría frente a eta situación
Sábado 19 de febrero de 2022
Se actualiza la información ambiental
Se verifica y ajusta los nuevos formatos ambientales solicitados por el INVIAS
Se elabora y remite varios comunicados al contratista sobre el estado ambiental del proyecto
Lunes 21 de febrero de 2022
Elaboración de varios comunicados dirigidos al contratista para solicitar el cumplimiento de las actividades del componente Ambiental, estableciendo los plazos contractuales teniendo en cuenta que las solicitudes han sido efectuadas en reiteradas oportunidades
El contratista sigue sin dar cumplimiento a la formulación, implementación y desarrollo del componente ambiental, tanto en la parte documental como en obra
El contratista no informa sobre el estado de los permisos ambientales, consecución de gestores y/o proveedores para el componente ambiental, situación que está generando presuntos incumplimientos del CSDV
Martes 22 de febrero de 2022
Participación en el Taller Programas Posconsumo y Estrategias de Entrega de Residuos Peligrosos de la SDA
Participación en la socialización del nuevo Manual de Interventoría del INVIAS, 2022
Inicio de la revisión y elaboración de nuevos formatos para la elaboración del Informe Mensual Ambiental
Miércoles 23 de febrero de 2022
Elaboración de comunicados para el contratista, en revisión a documentos remitidos
Inicio de la revisión y elaboración de nuevos formatos para la elaboración del Informe Mensual Ambiental
Jueves 24 de febrero de 2022
Elaboración de comunicados para el contratista, en revisión a documentos remitidos
Inicio de la revisión y elaboración de nuevos formatos para la elaboración del Informe Mensual Ambiental

PREDIAL: Envío de la comunicación TR1-ICC-366-22 a INVIAS, alcance respuesta a su oficio SS 72696 del 27 de diciembre de 2021, Envío de la comunicación TR1-ICC-367-22 al Consorcio SDVICHADA, respuesta a la comunicación 2022-CSDV-EXT-008(CR-TR1-270-22)-Radicación Diagnóstico Predial Puente Arimena.
envío de la comunicación TR1-ICC-368-22 al Consorcio SDVICHADA, solicitud diligenciamiento de los formatos INVIAS, seguimiento de la gestión predial.

TÉCNICA: Viernes: Se realiza la ampliación del canal K3+090 - K3+200 MD, construcción del canal MI desde el K2+300 - K2+320, se instaló 4ta capa de terraplén MI desde el K3+360 - K3+450, se instala corona de terraplén MD del K2+048 - K2+260.
Sábado: Se instaló 2da capa de terraplén MI del k3+450 - K3+690, se instaló corona de terraplén del K1+840 - K1+940 MD, se realizó la ampliación del canal MD del K2+980 - K3+040, construcción del canal MI desde el K2+320 -K2+460. Se vienen atendiendo los sitios críticos del sector los Mangos conforme a las indicaciones del INVIAS.
Domingo: Se hizo ampliación del canal MD del K2+900 - K2+980 y construcción del canal MI desde el K2+400 - K2+500, se instala la 2da capa de terraplén MI DEL k3+690 - K3+860 Y la corona de terraplén MD del K2+020 - K2+260.
Lunes: Se procedió a instalar corona de terraplén MD desde el K2+310 - K2+560 y K2+660 - K2+980. Se realiza la ampliación del canal MD del K 2+740 - K2+880 y construcción del canal MI del K2+515 - K2+650. Se atienden el sector los Mangos mediante instalación de material de préstamo y geotextil.
Martes: Se realiza la debida construcción del canal MI desde el K2+650 - K2+780, ampliación del canal MD del K2+600 - K2+740, se procedió a instalar la 4ta capa de terraplén MI del canal K1+840 - K1+900, instalación de la corona de terraplén MI K2+010 -K2+210, 4ta capa de terraplén MD del K2+560 - K2+660.
Miércoles: Se realiza la ampliación del canal MD K2+430 - K2+600, nivelación de la corona de terraplén para instalación de base granular, Se instaló corona de terraplén MD del K3+170 - K3+300, MI del K2+210 -K2+260 Y K2+420 -K2+600, atención de los sitios críticos del sector los Mangos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	25/03/2022 (Día/ Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PUENTE ARIMENA - EL VIENTO

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS A DIRECCIÓN TERRITORIAL: META SEMANA No: 36 (Numeración consecutiva) del 18/09/2022 al 24/09/2022 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JOBLANDO ORTIZ GOMEZ GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. ANDRÉS RICARDO TOVAR MANZANARES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACIFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURIPE-PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2021", MODULO 4

ALCANCE FISICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
SE TIENE CONTEMPLADO CONSTRUIR 34.0 KM DE VIA Y MANTENER LA TRANSITABILIDAD DE LOS 59.9 KM DESDE PUENTE ARIMENA - EL VIENTO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
SE TIENE CONTEMPLADO CONSTRUIR INICIALMENTE EN LONGITUD DE 34.0 KM DE VIA, SE CONSTRUIRÁ TERRAPLEN CON MATERIAL DE PRESTAMO ESTABILIZADO CON CAL SOBRE EL CUAL SE INSTALARÁ BASE GRANULAR Y CARPETA ASFALTICA CON 3,5 DE ANCHO DE CARRIL Y UN METRO DE BERMA.

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	**CONSORCIO SD VICHADA**			INTERVENTOR:	**CONSORCIO CORREDORES ICC**		
INTEGRANTES:	PAVIMENTOS EL DORADO SAS 30% SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES 70%			INTEGRANTES:	INTERCSA - AGUASO Sucursal Colombia 40% CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICAS S.A.S. 30% CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 30%		
CONTRATO No.	019 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 405.916.245,00	CONTRATO No.	0095 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 30.499.980,246.00
FECHA DE INICIO:	01 DE JUNIO DE 2021	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	20 DE ENERO DE 2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE AGOSTO DE 2021	VALOR ACUMULADO:	$ 405.916.245,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE AGOSTO DE 2021	VALOR ACUMULADO:	$ 30.499.980,246.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE AGOSTO DE 2021		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE AGOSTO DE 2021	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

VI. PORCENTAJES PROGRAMADO - AVANCE FINANCIERO

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con la adecuación de la cilanta de asfalto.
Se continuará con la estabilización con cal en espesor de 25 cm y anches de acuerdo con la necesidad del terraplén, los cuales deben tener aprobación de la Interventoría, asi proceder a instalar la base granular
Participación en tres diferentes comités técnicos, ambiental, sostenibilidad, social, predial, operativo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

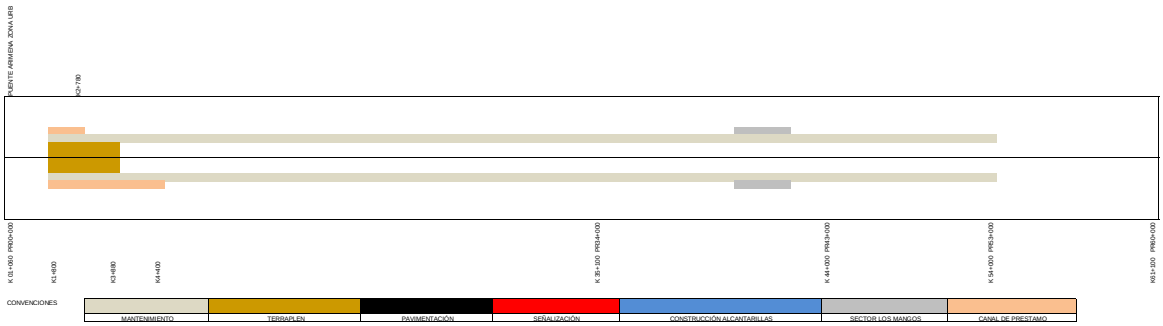

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Inspección visual en el terraplén instalado

Revisión de la tubería en concreto para alcantarillas

Instalación de terraplén en el K3+150 y uso de Fresadora

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Seguimiento y control actividades de mantenimiento en sitios críticos de Los Mangos y mayores Hacer los requerimientos necesarios para la entrega de manera cumplida de todos los requisitos que debe cumplir el contratista, y dar prioridad a las actividades de construcción. Seguimiento y control a los trabajos de conformación y de estabilización de subrasante y terraplén de la vía. Seguimiento a las labores de planeación previa para liberar tramos y poder dar aval a la ejecución de las actividades de obra	FIRMA NOMBRE: EFRAIN DE JESUS PINEDA BUELVAS Matrícula Profesional No.: 05202- 37791 ANT.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
