	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 12/08/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PUENTE ARIMENA - EL VIENTO

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 59 (Numeración consecutiva) del 5/08/2022 al 11/08/2022 Último Informe Semanal SI ■

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ORLANDO ORTIZ GOMEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. ANDRÉS RICARDO TOVAR MANZANARES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACIFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURIPE-PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 4.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
SE TIENE CONTEMPLADO CONSTRUIR 34.0 KM DE VIA Y MANTENER LA TRANSITABILIDAD DE LOS 59.9 KM DESDE PUENTE ARIMENA - EL VIENTO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
SE TIENE CONTEMPLADO CONSTRUIR INICIALMENTE EN LONGITUD DE 34.0 KM DE VIA, SE CONSTRUIRÁ TERRAPLEN CON MATERIAL DE PRESTAMO ESTABILIZADO CON CAL SOBRE EL CUAL SE INSTALARÁ BASE GRANULAR Y CARPETA ASFALTICA CON 3,5 DE ANCHO DE CARRIL Y UN METRO DE BERMA.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA
INTEGRANTES:
PAVIMENTOS EL DORADO SAS 30%
SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES 70%

CONTRATO No.	974 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 205.918.749.263,00
FECHA DE INICIO:	28 DE JUNIO DE 2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE AGOSTO DE 2030	VALOR ACUMULADO:	**$ 205.918.749.263,00**
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE AGOSTO DE 2030		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC
INTEGRANTES:
INTECSA - INARSA Sucursal Colombia 40%
CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICAS S.A.S. 30%
CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 30%

CONTRATO No.	1065 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 30.499.980.246,00
FECHA DE INICIO:	28 DE JUNIO DE 2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE AGOSTO DE 2030	VALOR ACUMULADO:	**$ 30.499.980.246,00**
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE AGOSTO DE 2030	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 3.682.749.263	$ 20.644.000.000	$ 21.288.000.000	$ 12.772.800.000	$ 12.772.800.000	$ 27.674.400.000	$ 27.674.400.000	$ 29.803.200.000	$ 29.803.200.000	$ 19.803.200.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 3.682.749.263	$ 15.368.376.221								
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 5.275.623.779	$ 21.288.000.000	$ 12.772.800.000	$ 12.772.800.000	$ 27.674.400.000	$ 27.674.400.000	$ 29.803.200.000	$ 29.803.200.000	$ 19.803.200.000
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.524.980.246	$ 1.525.000.000	$ 3.050.000.000	$ 1.830.000.000	$ 1.830.000.000	$ 3.965.000.000	$ 3.965.000.000	$ 4.270.000.000	$ 4.270.000.000	$ 4.270.000.000
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.524.980.246	$ 402.028.202								
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 1.122.971.798	$ 3.050.000.000	$ 1.830.000.000	$ 1.830.000.000	$ 3.965.000.000	$ 3.965.000.000	$ 4.270.000.000	$ 4.270.000.000	$ 4.270.000.000

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 182.451.868.100	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 13.774.759.791	7,550%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 18.688.515.484	10,243%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 4.913.755.693	2,693%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 362.610.000	0,199%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 14.137.369.791	7,749%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 19.051.125.484	10,442%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 4.913.755.693	2,693%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 324.818.201	0,178%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 40.841.202	0,022%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: JULIO DE 2022
VALOR FACTURA: $ 472.231.556,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite): Se está a la espera de la definición de solicitud de redistribución de vigencias.
Observaciones: El seguimiento se está realizando con la reprogramación vigente (No. 3).

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.794.179.518,51	9,161%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.927.008.448,00	6,318%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 62.415.674,73	0,205%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 47.477.321,75	0,156%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 5/07/2022
PERIODO FACTURADO: JUNIO DE 2022
VALOR FACTURA: $ 192.652.787,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C

En el mes:	0,408
Acumulado:	0,101

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 640.748.002,00
Amortizado $	$ 91.969.958,00
Saldo $	$ 548.778.044,00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 7,550% — Avance o Atraso Físico % 138%
Meta Física Ejecutada % 10,442%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%	100%			Prog	100%			100%	100,0%
					Ejec	71%			71%	71,0%
* KM Mantenidos	KM	60			Prog	60			60	100,0%
					Ejec	34			34	56,7%
* KM Pavimentados	KM	34			Prog	34			34	100,0%
					Ejec	0,45			0,45	1,3%
* Alcantarillas	Unidad	88			Prog	88			88	100,0%
					Ejec	4			4	4,5%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PUENTE ARIMENA - EL VIENTO (4010)
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadoras sobre orugas de mínimo 120 HP	2	2
Moto niveladoras de mínimo 120 HP	2	2
Compactadores vibratorios de mínimo 8 toneladas cada uno	2	2
Compactadores	2	
Volquetas	10	3
Retrocargador sobre llantas		2
Bulldozer		2
Carrotanque		1
Cargador		1
Dumper		
Planta o central de fabricación de mezclas de concreto hidráulico o Asfáltico con capacidad mínima de 50 Toneladas/hora, según la estructura de pavimento de cada frente de obra. En proceso de montaje.	1	1*
Trituradora con capacidad mínima de 50 Toneladas/hora. En ajuste final.	1	1
Terminadora de Asfalto o equipo completo de extendido, vibrado, compactado, texturizado y curado de losas de concreto hidráulico, según la estructura de pavimento de cada frente de obra	1	1
Total	21	17

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.
* En proceso de Montaje y pruebas.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	RIO OCOA - VILLAVICENCIO	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	FKG-091	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES. No se tienen observaciones por el momento.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES El estado de los permisos ambientales, gestión que el contratista realiza es el siguiente, a la fecha de hoy:
1. Concesión de aguas superficiales: el contratista manifiesta que realizaron la consulta ante la entidad ambiental por el estado de otorgamiento de este permiso, y desde la entidad manifiestan que esta en el proceso de establecer que tipo de compensación aplicaría para este acto administrativo. Se espera que para los próximos días la entidad se pronuncie.
2. Permiso de emisiones atmosféricas: el contratista manifiesta que en el momento de la emisión del auto de inicio del proceso de gestión del permiso de emisiones atmosféricas para la planta de asfalto y triturado, este ultimo proceso no fue incluido dentro del documento, causando un error en el mismo. Así mismo, el contratista manifiesta que se ha contactado de manera telefónica con los profesionales de la entidad, para agilizar la corrección del auto de inicio, y estos manifiestan que posiblemente la próxima semana estarán dando una respuesta a esta solicitud.
3. Permiso de vertimientos y concesión de aguas subterráneas: La entidad ambiental CORMACARENA, solicito información adicional al contratista mediante comunicado, y este el día 15 de junio de 2022 entrego respuesta a la información solicitada, para la gestión de dichos permisos, los cuales se están tramitando conjuntamente, y se espera respuesta por parte de CORMACARENA.
4. Permiso de aprovechamiento forestal (K10+000 al K30+000): el contratista manifiesta que ha terminado el proceso de inventario forestal en el sector antes mencionado, y la recopilación de la información la esta realizando el consultor contratado para este proceso. Esta interventoría se encuentra a la espera de la entrega de dicha información para su posterior revisión.
Esta interventoría, a través del comunicado TR1-ICC-495-22 del 12 de julio de 2022, solicita al contratista el estado actual de la gestión de los permisos ambientales necesarios para el proyecto, a su vez, tener soportes para validar estas gestiones, tanto de parte del contratista, como de parte de la autoridad ambiental CORMACARENA.
PARA ESTE PERIODO, DEBIDO A LA DISMINUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO, PRESENTADAS EN ESTE PERIODO, NO SE REALIZO NINGUN AVANCE EN LA GESTION DE LOS PERMISOS AMBIENTALES POR PARTE DEL CONTRATISTA, QUEDANDO SIN RESPUESTA EL ULTIMO COMUNICADO ENVIADO AL CONTRATISTA (TR1-ICC-495-22 del 12 de julio de 2022). AUN SIGUE SIN RESPUESTA POR PARTE DEL CONTRATISTA DE ESTE COMUNICADO ENVIADO PARA LA FECHA DEL 12 DE JULIO DE 2022.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: A la fecha, la interventoría realiza la supervisión y verificación de las obligaciones determinadas en el documento PAGA, el cual fue aprobado en su versión 4, generando así visitas a obra para seguimiento de cada ficha de manejo, y el reporte de los informes mensuales, a partir de la fecha de aprobación de este documento, serán tenidos en cuenta los indicadores de cada ficha, para revisión y aprobación de esta interventoría. Esta supervisión se realiza mediante visitas de campo a obra y comités con el profesional ambiental del contratista. El INVIAS, a través del comunicado SS41956 del 22 de julio de 2022, realiza una serie de observaciones a la entrega del documento PAGA aprobado por esta interventoría, la cual se están dando la atención requerida y la entrega de la respuesta en los

OBSERVACIONES: No se tienen observaciones

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	38	28
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	38	24
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	4

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 66

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: LOTE - 10 PUENTE ARIMENA

OBSERVACIONES: teniendo en cuenta que las actividades de obran han tenido una disminución significativa y que la obra en el momento cuenta con poco personal laborando las actividades sociales se han visto perjudicadas, en esta semana solo se realizaron actividades de atención a la comunidad. El 10 de agosto la interventoría participa de la reunión convocada por la comunidad de Carimagua y Puente Arimena , en esta dieron a conocer algunas inconformidades en el manejo que el contratista ha dado a algunas situaciones con el personal que labora y la comunidad y dejaron claro la " no aceptación" de la profesional social del contratista en la reunión ni en las demás que exige el contrato. Situación que entra en revisión .

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N.A.
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N.A.
AVALÚOS APROBADOS:	N.A.
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N.A.

OBSERVACIONES: No se tienen observaciones

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Se coordinó con la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS, comite para el miércoles 17 de agosto, para revisar aspectos de Sostenibilidad Social, y la aplicación del formato de inclusión social.
Además, se remitió proyección de comunicación a la Dirección de la Interventoría, para dar respuesta al comunicado SS-41956. Componente de Sostenibilidad.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

SOCIAL: *Se supervisa la Atención al usuario realizada por el contratista en la oficina de Servicio de atención al Usuario ubicado en Puente Arimena del 04 de Agosto al 10 de Agosto de 2022.

*Se realiza revisión y supervisión a la atención ciudadana por parte del señor William Mendez Landaeta quien solicita via telfónica la adecuación de acceso a predios ubicado en el PR 1+850 margen derecho. 05 de Agosto de 2022

*Se realiza revisión y supervisión de la atención ciudadana recibida por el contratista por parte de la señora Flor Jimenéz quien solicita via mediante comunicado escrito la cancelación de $148.000 por concepto de unipapeleria entregada al señor Zaldaña operador de maquina retirado de la obra (se informa al área administrativa y se explica la señora Flor que la empresa no se hace responsable de los créditos por parte de los establecimientos econ micos de la zona no obstante buscará la forma de que la persona realice la cancelación del dinero. 07 de agosto de 2022

*Se realiza revisión y supervisión de la verificación que hace el contratista a la PQR presentada por la señora angelica Mogollón frente a la solicitud de hacer una zanja dentro del predio para evacuar las aguas lluvias, se realizará visita con el parea técnica de Interventoría y contratista para determonar la actividad a seguir. 9 de Agosto de 2022

*Se verifica el cierre de la solicitud ciudadana por parte del señor Jairo Barajas Sabogal a quien se le cancelan 48.8 galones de gasolina adeudados por el Consorcio SD Vichada. ($635,000) Seiscientos treinta y conco mil pesos M/cte. 8 de Agosto de 2022

*Se asiste a comite social el dia 5 de agosto de 2022.

*Se asiste a la reunión convocada por la comunidad en la vereda de Carimagua el 10 de agosto de 2022.

*Se asiste a la reunión convocada por la comunidad de Puerto Arimena el 10 de agosto de 2022.

PREDIAL: - Se realiza reunión mesa técnica (05/08/2022) entre interventoría y consorcio SD vichada (tramo1) que tuvo como fin dar seguimiento y control a observaciones indicadas para el documento de diagnóstico predial y lineamientos respectivos para su avance respectivo.

AMBIENTAL: En la semana del 4 al 10 de agosto, se realizaron inspecciones a obra rutinarias, para la verificacion del cumplimiento de las obligaciones descritas en el documento PAGA, debido a la disminucion de las actividades de obra del contratista.

TECNICA:
* Se verifica el estado de la señalización del corredor y se verifica el estado de la vía para garantizar su transitabilidad
* Se realiza reconformacion en sitios críticos atendidos K30+490 y K30+630
* Se realiza instalación de material crudo de rio atendiendo sitio critico K14+100
* Se realiza conformación en algunos sitios criticos para garantizar transitabilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 12/08/2022 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PUENTE ARIMENA - EL VIENTO

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 59 (Numeración consecutiva) del 5/08/2022 al 11/08/2022 Último Informe Semanal SI ■

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ORLANDO ORTIZ GOMEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. ANDRÉS RICARDO TOVAR MANZANARES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACIFICO – ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA-VIENTO-SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA-VIENTO; JURIPE-PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DEL META Y VICHADA, MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 4.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
SE TIENE CONTEMPLADO CONSTRUIR 34.0 KM DE VIA Y MANTENER LA TRANSITABILIDAD DE LOS 59.9 KM DESDE PUENTE ARIMENA - EL VIENTO

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
SE TIENE CONTEMPLADO CONSTRUIR INICIALMENTE EN LONGITUD DE 34.0 KM DE VIA, SE CONSTRUIRÁ TERRAPLEN CON MATERIAL DE PRESTAMO ESTABILIZADO CON CAL SOBRE EL CUAL SE INSTALARÁ BASE GRANULAR Y CARPETA ASFALTICA CON 3,5 DE ANCHO DE CARRIL Y UN METRO DE BERMA.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: **CONSORCIO SD VICHADA**
INTEGRANTES:
PAVIMENTOS EL DORADO SAS 30%
SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES 70%

CONTRATO No.	974 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 205.918.749.263,00
FECHA DE INICIO:	28 DE JUNIO DE 2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE AGOSTO DE 2030	VALOR ACUMULADO:	**$ 205.918.749.263,00**
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE AGOSTO DE 2030		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: **CONSORCIO CORREDORES ICC**
INTEGRANTES:
INTECSA - INARSA Sucursal Colombia 40%
CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICAS S.A.S. 30%
CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC 30%

CONTRATO No.	1065 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 30.499.980.246,00
FECHA DE INICIO:	28 DE JUNIO DE 2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE AGOSTO DE 2030	VALOR ACUMULADO:	**$ 30.499.980.246,00**
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE AGOSTO DE 2030	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

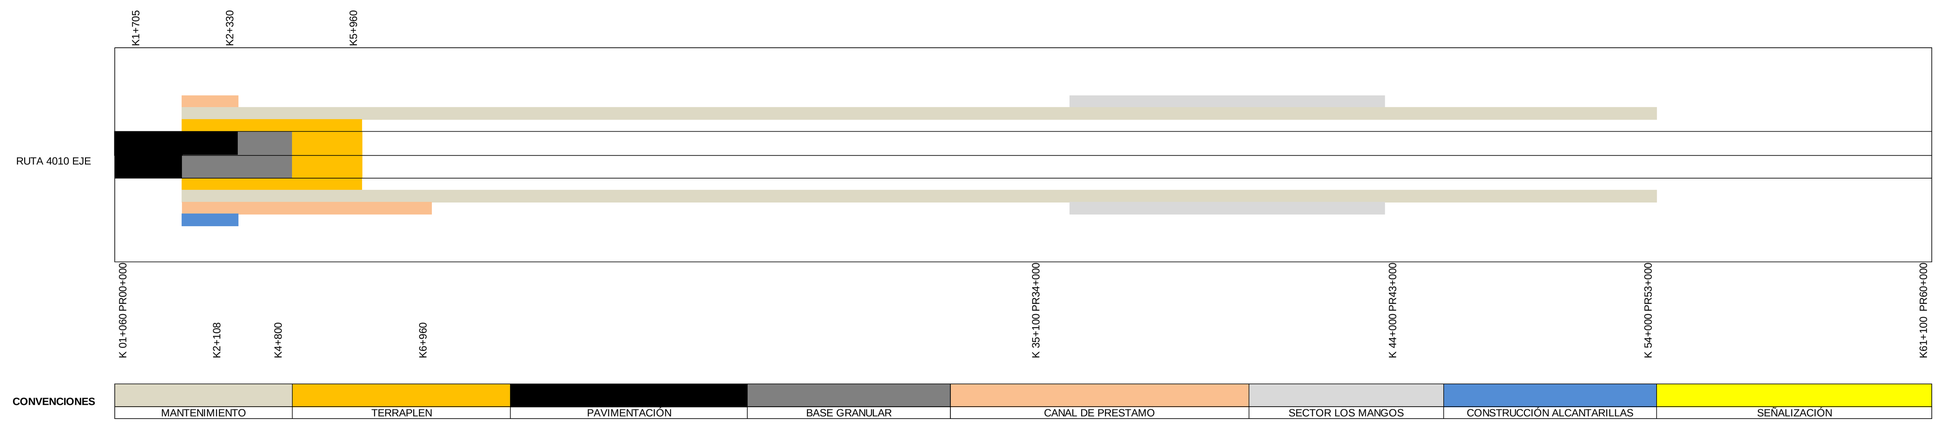

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Atención sitios crticitos

Atención sitios crticitos

Atención sitios crticitos

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Hacer los requerimientos y seguimiento para la entrega oportuna de los requisitos que debe cumplir el contratista, y dar prioridad a las actividades de construcción.

Seguimiento y control a las actividades de mantenimiento y atención de sitios críticos del sector de Carimagua y Puerto Machete.

Verificar cumplimiento de medidas ambientales en obra y seguimiento a la gestión de permisos ambientales.

Realizar labores de verificación de todos los aspectos inherentes a comunicación con la comunidad y sus lideres para atender sus peticiones y reclamos.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: EFRAIN DE JESUS PINEDA BUELVAS
Matrícula Profesional No.: 05202- 37791 ANT.
