INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 9/8/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PUENTE JURIEPE - PUERTO CARREÑO

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 27 del 9/2/2022 al 9/8/2022 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ■

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ORLANDO ORTIZ GOMEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. ANDRÉS RICARDO TOVAR MANZANARES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA SECTOR PUERTO GAITÁN - PUENTE ARIMENA - VIENTO - SANTA CECILIA - JURIEPE - PUERTO CARREÑO (PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" Y VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0". MÓDULO 1.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PARA EL TRAMO JURIEPE PUERTO CARREÑO SE TIENE CONTEMPLADO CONSTRUIR 26 KM DE VIA Y MANTENER LA TRANSITABILIDAD DE LOS 97 KM DESDE PUERTO CARREÑO HASTA PUENTE JURIEPE.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO (JURIEPE PUERTO CARREÑO)
SE TIENE CONTEMPLADO CONSTRUIR INICIALMENTE EN UNA LONGITUD DE 20 KM DE VIA, SE CONSTRUIRÁ TERRAPLÉN CON MATERIAL DE PRESTAMO O RIPIO DE LA ZONA, BASE Y CARPETA ASFÁLTICA CON 3,65 DE ANCHO DE CARRIL Y UN METRO DE BERMA. SE ESTÁ EN LA ETAPA DE REVISION DE DISEÑOS PARA DEFINIR LAS CARACTERÍSTICA S DEFINITIVAS

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: **CONSORCIO GPS INFRAESTRUCTURA**

INTEGRANTES:

PROCOPAL SA	33%
GISAICO SA	33%
SP INGENIEROS	34%

CONTRATO No.	2254 DE 2021	VALOR INICIAL TRAMO 5:	$ 233,526,917,828.00
FECHA DE INICIO:	4 DE MARZO DE 2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE JULIO DE 2030	VALOR ACUMULADO:	**$ 233,526,917,828.00**
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE JULIO DE 2030		$ -
		VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 454,775,921,790.00
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: **CONSORCIO CORREDORES ICC**

INTEGRANTES:

INTECSA - INARSA Sucursal Colombia	40%
CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICAS S.A.S.	30%
CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC	30%

CONTRATO No.	1065 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 30,499,980,246.00
FECHA DE INICIO:	28 DE JUNIO DE 2021	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31 DE AGOSTO DE 2030	VALOR ACUMULADO:	**$ 30,499,980,246.00**
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE AGOSTO DE 2030	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	SUMAS
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 2,568,917,828	$ 25,662,000,000	$ 15,397,200,000	$ 15,397,200,000	$ 33,360,600,000	$ 33,360,600,000	$ 35,926,800,000	$ 35,926,800,000	$ 35,926,800,000	$ 233,526,917,828
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 505,403,714									
	SALDO DE VIGENCIA		$ 2,063,514,114	$ 25,662,000,000	$ 15,397,200,000	$ 15,397,200,000	$ 33,360,600,000	$ 33,360,600,000		$ 35,926,800,000	$ 35,926,800,000	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,524,980,246	$ 1,525,000,000	$ 3,050,000,000	$ 1,830,000,000	$ 1,830,000,000	$ 3,965,000,000	$ 3,965,000,000	$ 4,270,000,000	$ 4,270,000,000	$ 4,270,000,000	$ 30,499,980,246
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1,524,980,246	$ 645,582,270									
	SALDO DE VIGENCIA	$ -	$ 879,417,730	$ 3,050,000,000	$ 1,830,000,000	$ 1,830,000,000	$ 3,965,000,000	$ 3,965,000,000	$ 4,270,000,000	$ 4,270,000,000	$ 4,270,000,000	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 187,940,045,533	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 228,430,862	0.122%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 505,403,714	0.269%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 276,972,852	0.147%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 228,430,862	0.122%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 505,403,714	0.269%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 276,972,852	0.147%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9,723,165	0.005%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 36,164,778	0.019%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: AGOSTO 2022
VALOR FACTURA: $ 95,767,800.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Al corte, el constructor no ha presentado factura, se encuentra en trámite de revisión y aprobación por parte del INVIAS.
El valor de inversión de obra ejecutado acumulado registrado, incluye la actividad de conformación de calzada existente sin adición de material y la jornada tapa hueco, a corte del día 7 de septiembre de 2022.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 3,016,122,753.84	9.889%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,170,562,516.00	7.117%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 62,415,674.73	0.205%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 47,477,321.75	0.156%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 8/5/2022
PERIODO FACTURADO: JULIO DE 2022
VALOR FACTURA: $ 243,554,068.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C

En el mes:	2.543
Acumulado:	4.295

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 640,748,002.00
Amortizado $	$ 105,683,877.00
Saldo $	$ 535,064,125.00

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0.122% — Avance o Atraso Físico % 221%
Meta Física Ejecutada % 0.269%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base							Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad			Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	%			100%			Prog					
							Ejec					
* KM Mantenidos	KM			62			Prog					
							Ejec	60.1			60.082	96.9%
KM Pavimentados	KM			20			Prog					
							Ejec					
* Alcantarillas	Unidad						Prog					
							Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadoras sobre orugas de mínimo 120 HP	2	
Moto niveladoras de mínimo 120 HP	2	1
Compactadores vibratorios de mínimo 8 toneladas cada uno	2	1
Compactadores neumáticos min 8 ton (operando)	2	
Volquetas	10	1
Retrocargador sobre llantas		1
Bulldozer		
Carrotanque		1
Cargador		
Dumper		
Planta o central de fabricación de mezclas de concreto hidráulico o Asfáltico con capacidad mínima de 50 Toneladas/hora, según la estructura de pavimento de cada frente de obra. En proceso de montaje.	1	
Trituradora con capacidad mínima de 50 Toneladas/hora. En ajuste final.	1	
Terminadora de Asfalto o equipo completo de extendido, vibrado, compactado, texturizado y curado de losas de concreto hidráulico,	1	
Total	21	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: PUERTO CARREÑO (K96+140) AL K00+000 PUENTE JURIEPE)
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: El 9 de junio de 2022 el contratista de obra informa a la interventoría que tiene radicado ante la Agencia Nacional Minera "ANM" el trámite para la obtención del permiso de explotación de material para terraplenes, para las fuentes FINCA NÁPOLES Y FINCA EL ARRENDAJO mediante radicado ANM 506043. Se está a la espera que la ANM emita algún comunicado del proceso de revisión.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	X	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES:
1. Se realiza capacitación ambiental al personal operativo tema, Manejo de sustancias de hidrocarburos y cuidado y protección de la fauna
2. Se registra control consumo del tanqueo de agua del carro tanque para riego de vía.
3. Se continua con el pesaje y registro de generación de residuos sólidos, dispuestos con la empresa de servicios públicos EMPCA en la oficina ubicada en el barrio La Florida.
4. Se continúa con los ajustes al documento PAGA.
5. En la construcción del campamento se avanza con la construcción de los acopios y de las redes sanitarias de aguas residuales domésticas.
6. Se realizó comunicado al contratista con observaciones a la entrega del informe mensual correspondiente al mes de agosto de 2022.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: El contratista se encuentra atendiendo las observaciones realizadas al documento PAGA.

OBSERVACIONES: Por medio del comunicado 15-2246-346-185-2022 del 25 de julio de 2022, el contratista realiza la entrega del documento PAGA en su versión 1, el cual esta interventoría realizara la revisión de cada uno de sus componentes, para verificar su cumplimiento, de acuerdo a la Guía de Manejo Ambiental para proyectos de infraestructura del INVIAS. Mediante el comunicado TR5-ICC-069-22 del 12 de agosto de 2022, la interventoría realiza la revisión del documento, emitiendo una serie de observaciones, las cuales el contratista debe atender con prontitud. A fecha de hoy, las observaciones al documento PAGA, aún no ha sido entregado a esta interventoría, a la cual, de manera oficial será remitido

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	49	31
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	42	23
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	7	8
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	28	9

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 80

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 3
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Calle 22#22-10 Barrio La Florida

OBSERVACIONES:
1.Se realiza supervisión y verificación de la atención en la oficina Servicio de Atención al Usuario- SAU realizada por e contratista; se evidencia cumplimiento y atención oportuna a la comunidad.
2. Se realizará verificación a la capacitación en Liderazgo realizada al personal del Consorcio GPS.
3. Inducción al personal vinculado en obra
4. la interventoría realiza verificación a la actividad que realizó el contratista donde hizo presentación del área social y la oficina de Servicio de Atención al usuario al presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Libertad, la cual está en la zona de influencia directa., con el fin de programar próximas reuniones de interés general.
5. La interventoría en cumplimiento de los compromisos contractuales realiza los informes semanales y demás que exija los compromisos contractuales.

Se aclara que la información que refiere la interventoría referente a los empleos directos generados corresponde

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N.A.
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N.A.
AVALÚOS APROBADOS:	N.A.
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N.A.

OBSERVACIONES:
A la fecha contratista no indica predios objeto de gestión predial debido a las condiciones jurídico-catastrales de los predios en campo.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Participación en la convocatoria del Invias (05/09/22) para socializar la Res. 245/22, sobre el Reglamento y regulación de nuevas tecnologías para la infraestructura de Transporte.
Revisión y observaciones al Plan de Sostenibilidad y documentos relacionados, según comunicado 15-2246-346-263-2022.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se continúa con la construcción de campamento.
La topografía se encuentra realizando el levantamiento de los 12 K iniciales comprendidos entre el K66+903 al K54+896, materializando los 3 kilómetros iniciales del K66+900 al K63+900, que son los primeros 3 km de diseño que se deben entregar según pliegos.
En la semana, el rendimiento de ejecución en la actividad de conformación de calzada existente sin adición de material ha mejorado, sin embargo, se continúa viendo afectado por las lluvias que se presentan en la región. A la fecha se ha realizado el mantenimiento a 60,082 km, en la presente semana se intervino del K60+400 al K65+000 para una intervención semanal de 4,6 Km.
Se realiza el comité N°19 de fecha 6 de septiembre de 2022. Se solicita la entrega de resultados de ensayos de laboratorio del K54+896 al K653+000; se pregunta en que avance se encuentran los trámites de permisos y licencia ambiental; se informa el avance de la revisión y/o modificación de estudios y diseños.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuamos con el seguimiento de la ejecución de la conformación de calzada existente sin adición de material, desde el K65+000 hacia mayores.
Seguimiento al desarrollo y entrega de los diseños entregados por el consorcio GPS , a cargo de nuestros especialistas.
Se continuará con la realización de inspecciones correspondientes a la construcción del campamento y señalización vial.
Realizar comité de obra N°20 el día martes 13 de septiembre de 2022.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: 9/8/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PUENTE JURIEPE - PUERTO CARREÑO

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

SEMANA No.: 27 del 9/2/2022 al 9/8/2022 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ■

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ORLANDO ORTIZ GOMEZ


GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. ANDRÉS RICARDO TOVAR MANZANARES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUÍA SECTOR PUERTO GAITÁN - PUENTE ARIMENA - VIENTO - SANTA CECILIA - JURIEPE - PUERTO CARREÑO (PUENTE ARIMENA - VIENTO; JURIEPE – PUERTO CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" Y VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0". MÓDULO 1.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
PARA EL TRAMO JURIEPE PUERTO CARREÑO SE TIENE CONTEMPLADO CONSTRUIR 26 KM DE VIA Y MANTENER LA TRANSITABILIDAD DE LOS 97 KM DESDE PUERTO CARREÑO HASTA PUENTE JURIEPE.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO (JURIEPE PUERTO CARREÑO)
SE TIENE CONTEMPLADO CONSTRUIR INICIALMENTE EN UNA LONGITUD DE 20 KM DE VIA, SE CONSTRUIRÁ TERRAPLÉN CON MATERIAL DE PRESTAMO O RIPIO DE LA ZONA, BASE Y CARPETA ASFÁLTICA CON 3,65 DE ANCHO DE CARRIL Y UN METRO DE BERMA. SE ESTÁ EN LA ETAPA DE REVISION DE DISEÑOS PARA DEFINIR LAS CARACTERÍSTICA S DEFINITIVAS

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

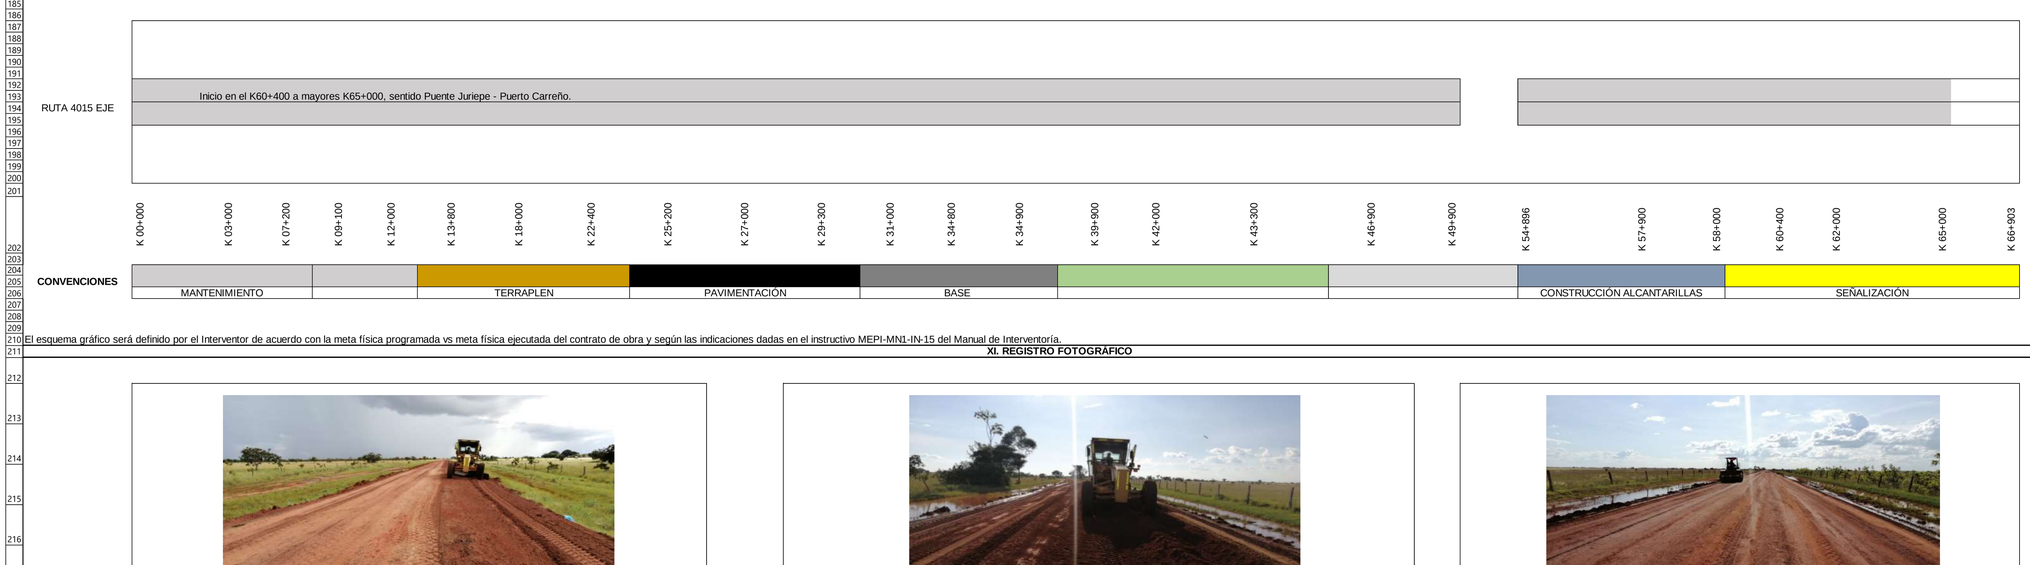

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1. PROCESO DE RECUPERACIÓN DE MATERIAL

FOTO 2. PROCESO DE CONFORMACIÓN

FOTO 3. PROCESO DE COMPACTACIÓN

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Revisión y/o aprobación de Estudios y Diseños entregados por el contratista de obra.
Seguimiento de los trabajos de conformación que se adelantan hacia menores sentido Puerto Carreño - caño Juriepe.
Seguimiento a labores previstas en la programación en general.
Seguimiento a la entrega de documentos y requerimientos pendientes, en las áreas ambiental (PAGA y permisos), social, técnica.
Elaboración de los informes correspondientes del manual de interventoría para el Invias.
Seguimiento a las pruebas de laboratorio, proctor y densidades que se estarán realizando la próxima semana.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: EFRAÍN DE JESÚS PINEDA BUELVAS
Matrícula Profesional No.: 05202- 37791 ANT.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
