| CONTRATISTA: CONSORCIO DSC. | OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" | INTERVENTOR |
|---|---|---|

**PREACTA DE OBRA NÚMERO:09**

| PERIODO PRE-ACTA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| | 01/febrero/2022 | 28/febrero/2022 |

| No. DE ORDEN | DESCRIPCIÓN ÍTEM | CANTIDAD EJECUTADA | UND. |
|---|---|---|---|
| 2 | Demolición de Estructuras | 12.30 | m3 |

| ABSCISAS | DIMENSIONES | | | | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INICIO | LONGITUD (m) | ANCHO (m) | ALTURA (m) | ESPESOR (m) | ÁREA TUBO (m2) | MURO 1 (m) | MURO 2 (m) | ÁREA (m2) | CANTIDAD (und) | VOLUMEN (m3) | |
| PR40+300 | | 1.30 | 1.20 | 0.20 | | | | | 2.00 | 0.62 | Aletas de descole |
| | 1.20 | 2.10 | | 0.20 | | | | | | 0.50 | Piso descole |
| | | 1.40 | 0.30 | 0.20 | | | | | | 0.08 | Guardarueda descole |
| | 8.00 | 1.40 | 1.40 | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | 7.68 | Paredes box - Paredes internas son de 1.0x1.00 |
| | | | | 0.20 | | 1.00 | 1.40 | | | 0.28 | Caja de encole muro lateral |
| | | | | 0.20 | | 1.00 | 1.00 | | 2.00 | 0.40 | Caja de encole paredes laterales |
| | | 1.20 | 0.30 | 0.20 | | | | | | 0.07 | Guardarueda encole |
| PR41+500 | | 0.97 | 1.30 | 0.20 | | | | | 2.00 | 0.50 | Aletas de descole |
| | | 1.90 | 1.30 | 0.20 | 0.50 | | | | | 0.39 | Cabazal descole - Tubería 24'' |
| | | 1.90 | 0.20 | 0.20 | | | | | | 0.08 | Guardarueda descole |
| PR41+330 | | 1.90 | 1.15 | 0.20 | | | | | 2.00 | 0.44 | Aletas de descole |
| | 1.30 | 2.50 | | 0.20 | | | | | | 0.65 | Piso descole |
| | | 1.40 | 1.15 | 0.20 | 0.95 | | | | | 0.13 | Cabazal descole |
| | | 1.40 | 0.20 | 0.20 | | | | | | 0.06 | Guardarueda descole |
| | | | | 0.20 | | 1.00 | 1.02 | | 2.00 | 0.41 | Caja de encole muro lateral |
| PR42+675 | 1.90 | 1.40 | 1.50 | 0.20 | | 1.50 | 1.00 | 1.50 | | 0.00 | Caja de encole |
| | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | TOTAL | | | | | | 12.30 | |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO.**



PR40+430



PR41+500



PR41+330

| | | |
|---|---|---|
| FIRMA | | |
| NOMBRE | EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA | OSCAR ALVARADO DIAZ |
| CARGO | DIRECTOR DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA |
| ENTIDAD | CONSORCIO DSC | CONSORCIO ECOVISIÓN 190 |

| CONTRATISTA: CONSORCIO DSC. | OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" | INTERVENTOR |
|---|---|---|

**PREACTA DE OBRA NÚMERO:09**

| PERIODO PRE-ACTA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| | 01/febrero/2022 | 28/febrero/2022 |

| No. DE ORDEN | DESCRIPCIÓN ÍTEM | CANTIDAD EJECUTADA | UND. |
|---|---|---|---|
| 3 | Remoción de alcantarillas | 13.00 | ml |

| ALCANTARILLAS | DIMENSIONES | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSCISA | CANTIDAD | LARGO (m) | LARGO (m) | ALTO (m) | LONGITUD (m) | |
| PR41+500 | 5.00 | | | | 5.00 | |
| PR41+330 | 8.00 | | | | 8.00 | |
| | | | | | 0.00 | |
| | | | | | 00 | |
| | | | | | 00 | |
| | | | | TOTAL | 13.00 | |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO.**



PR41+500



PR41+330

| FIRMA | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA | OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ |
| CARGO | DIRECTOR DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA |
| ENTIDAD | CONSORCIO DSC | CONSORCIO ECOVISIÓN 190 |

| CONTRATISTA: CONSORCIO DSC. | OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" | INTERVENTOR |
|---|---|---|

**PREACTA DE OBRA NÚMERO:09**

| PERIODO PRE-ACTA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| | 01/febrero/2022 | 28/febrero/2022 |

| No. DE ORDEN | DESCRIPCIÓN ÍTEM | CANTIDAD EJECUTADA | UND. |
|---|---|---|---|
| 5 | Excavación sin clasificar de préstamos | 128.00 | m3 |

| ABSCISAS | | DIMENSIONES | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INICIO | FIN | LONGITUD (m) | AREA ABSCISA INICIO (m2) | AREA ABSCISA FIN (m2) | AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2) | CANTIDAD (m3) | |
| PR42+140 | PR42+130 | 10.00 | 1.007 | 1.007 | 1.01 | 10.065 | CANTIDADES VERIFICADAS POR TOPOGRAFIA DEL CONSORCIO E INTERVENTORÍA |
| PR42+130 | PR42+120 | 10.00 | 1.007 | 1.007 | 1.01 | 10.065 | |
| | | | | | | | |
| PR42+010 | PR42+000 | 10.00 | 0.684 | 0.666 | 0.68 | 6.750 | |
| PR42+000 | PR41+990 | 10.00 | 0.666 | 0.612 | 0.64 | 6.390 | |
| PR41+990 | PR41+980 | 10.00 | 0.612 | 0.576 | 0.59 | 5.940 | |
| PR41+980 | PR41+970 | 10.00 | 0.576 | 0.546 | 0.56 | 5.610 | |
| PR41+970 | PR41+960 | 10.00 | 0.546 | 0.588 | 0.57 | 5.670 | |
| PR41+960 | PR41+950 | 10.00 | 0.588 | 0.588 | 0.59 | 5.880 | |
| PR41+950 | PR41+940 | 10.00 | 0.588 | 0.504 | 0.55 | 5.460 | |
| PR41+940 | PR41+930 | 10.00 | 0.504 | 0.504 | 0.50 | 5.040 | |
| PR41+930 | PR41+920 | 10.00 | 0.504 | 0.504 | 0.50 | 5.040 | |
| PR41+920 | PR41+910 | 10.00 | 0.504 | 0.504 | 0.50 | 5.040 | |
| | | 0.00 | | | | | |
| PR41+830 | PR41+820 | 10.00 | 0.479 | 0.479 | 0.48 | 4.785 | |
| PR41+820 | PR41+810 | 10.00 | 0.479 | 0.423 | 0.45 | 4.508 | |
| PR41+810 | PR41+800 | 10.00 | 0.423 | 0.396 | 0.41 | 4.095 | |
| PR41+800 | PR41+790 | 10.00 | 0.396 | 0.375 | 0.39 | 3.855 | |
| PR41+790 | PR41+780 | 10.00 | 0.375 | 0.315 | 0.35 | 3.450 | |
| PR41+780 | PR41+770 | 10.00 | 0.315 | 0.315 | 0.32 | 3.150 | |
| | | | | | | | |
| PR41+220 | PR41+210 | 10.00 | 0.252 | 0.252 | 0.25 | 2.520 | |
| PR41+210 | PR41+200 | 10.00 | 0.252 | 0.360 | 0.31 | 3.060 | |
| PR41+200 | PR41+190 | 10.00 | 0.360 | 0.495 | 0.43 | 4.275 | |
| PR41+190 | PR41+180 | 10.00 | 0.495 | 0.279 | 0.39 | 3.870 | |
| PR41+180 | PR41+170 | 10.00 | 0.279 | 0.456 | 0.37 | 3.675 | |
| PR41+170 | PR41+160 | 10.00 | 0.456 | 0.525 | 0.49 | 4.905 | |
| PR41+160 | PR41+150 | 10.00 | 0.525 | 0.450 | 0.49 | 4.875 | |
| | | | | | TOTAL | 128.00 | |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO.**



PR41+950



PR41+790

| CONTRATISTA: CONSORCIO DSC. | OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" | INTERVENTOR |
|---|---|---|

**PREACTA DE OBRA NÚMERO:09**

| PERIODO PRE-ACTA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| | 01/febrero/2022 | 28/febrero/2022 |

| No. DE ORDEN | DESCRIPCIÓN ÍTEM | CANTIDAD EJECUTADA | UND. |
|---|---|---|---|
| 5 | Excavación sin clasificar de préstamos | 128.00 | m3 |

| ABSCISAS | | DIMENSIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INICIO | FIN | LONGITUD (m) | AREA ABSCISA INICIO (m2) | AREA ABSCISA FIN (m2) | AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2) | CANTIDAD (m3) | OBSERVACIONES |



PR41+160



PR41+180

| FIRMA | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | EDWIN XAVIER BUSTOS IBARRA | OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ |
| CARGO | DIRECTOR DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA |
| ENTIDAD | CONSORCIO DSC | CONSORCIO ECOVISIÓN 190 |

| CONTRATISTA: CONSORCIO DSC. | OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" | INTERVENTOR |
|---|---|---|

**PREACTA DE OBRA NÚMERO:09**

| PERIODO PRE-ACTA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| | 01/febrero/2022 | 28/febrero/2022 |

| No. DE ORDEN | DESCRIPCIÓN ÍTEM | CANTIDAD EJECUTADA | UND. |
|---|---|---|---|
| 6 | Excavaciones en material común de la Explanación y Canales | 299.00 | m3 |

| ABSCISAS | | | DIMENSIONES | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INICIO | FIN | LONGITUD (m) | AREA ABSCISA INICIO (m2) | AREA ABSCISA FIN (m2) | AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2) | CANTIDAD (m3) | |
| PR42+140 | PR42+130 | 10.00 | 2.349 | 2.349 | 2.35 | 23.49 | |
| PR42+130 | PR42+120 | 10.00 | 2.349 | 2.349 | 2.35 | 23.49 | |
| | | | | | | | |
| PR42+010 | PR42+000 | 10.00 | 1.596 | 1.554 | 1.58 | 15.75 | |
| PR42+000 | PR41+990 | 10.00 | 1.554 | 1.428 | 1.49 | 14.91 | |
| PR41+990 | PR41+980 | 10.00 | 1.428 | 1.344 | 1.39 | 13.86 | |
| PR41+980 | PR41+970 | 10.00 | 1.344 | 1.274 | 1.31 | 13.09 | |
| PR41+970 | PR41+960 | 10.00 | 1.274 | 1.372 | 1.32 | 13.23 | |
| PR41+960 | PR41+950 | 10.00 | 1.372 | 1.372 | 1.37 | 13.72 | |
| PR41+950 | PR41+940 | 10.00 | 1.372 | 1.176 | 1.27 | 12.74 | |
| PR41+940 | PR41+930 | 10.00 | 1.176 | 1.176 | 1.18 | 11.76 | |
| PR41+930 | PR41+920 | 10.00 | 1.176 | 1.176 | 1.18 | 11.76 | |
| PR41+920 | PR41+910 | 10.00 | 1.176 | 1.176 | 1.18 | 11.76 | |
| | | | | | | | |
| PR41+830 | PR41+820 | 10.00 | 1.117 | 1.117 | 1.12 | 11.17 | |
| PR41+820 | PR41+810 | 10.00 | 1.117 | 0.987 | 1.05 | 10.52 | |
| PR41+810 | PR41+800 | 10.00 | 0.987 | 0.924 | 0.96 | 9.56 | |
| PR41+800 | PR41+790 | 10.00 | 0.924 | 0.875 | 0.90 | 9.00 | |
| PR41+790 | PR41+780 | 10.00 | 0.875 | 0.735 | 0.81 | 8.05 | |
| PR41+780 | PR41+770 | 10.00 | 0.735 | 0.735 | 0.74 | 7.35 | |
| | | | | | | 0.00 | |
| PR41+220 | PR41+210 | 10.00 | 0.588 | 0.588 | 0.59 | 5.88 | |
| PR41+210 | PR41+200 | 10.00 | 0.588 | 0.840 | 0.71 | 7.14 | |
| PR41+200 | PR41+190 | 10.00 | 0.840 | 1.155 | 1.00 | 9.98 | |
| PR41+190 | PR41+180 | 10.00 | 1.155 | 0.651 | 0.90 | 9.03 | |
| PR41+180 | PR41+170 | 10.00 | 0.651 | 1.064 | 0.86 | 8.58 | |
| PR41+170 | PR41+160 | 10.00 | 1.064 | 1.225 | 1.14 | 11.45 | |
| PR41+160 | PR41+150 | 10.00 | 1.225 | 1.050 | 1.14 | 11.38 | |
| | | | | | TOTAL | 299.00 | |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO.**



PR41+830



PR41+810



PR41+930

| | | |
|---|---|---|
| FIRMA | | |
| NOMBRE | EDWIN JAVIER BUITÓS IBARRA | OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ |
| CARGO | DIRECTOR DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA |
| ENTIDAD | CONSORCIO DSC | CONSORCIO ECOVISIÓN 190 |

| CONTRATISTA: CONSORCIO DSC. | OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" | INTERVENTOR |
|---|---|---|

**PREACTA DE OBRA NÚMERO:09**

| PERIODO PRE-ACTA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| | 01/febrero/2022 | 28/febrero/2022 |

| No. DE ORDEN | DESCRIPCIÓN ÍTEM | CANTIDAD EJECUTADA | UND. |
|---|---|---|---|
| 12 | Subbase Granular clase A (No incluye Transporte) | 2,589.00 | m3 |

| ABSCISAS | | DIMENSIONES | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INICIO | FIN | LONGITUD (m) | AREA ABSCISA INICIO (m2) | AREA ABSCISA FIN (m2) | AREA PROMEDIO TERRAPLEN (m2) | VOLUMEN (m3) | |
| PR45+000 | PR44+990 | 10.00 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 25.94 | Según cartera topográfica entregada por el profesional topográfico Camilo Sánchez. |
| PR44+990 | PR44+980 | 10.00 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 25.94 | |
| PR44+980 | PR44+970 | 10.00 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 25.93 | |
| PR44+970 | PR44+960 | 10.00 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 25.93 | |
| PR44+960 | PR44+950 | 10.00 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 25.93 | |
| PR44+950 | PR44+940 | 10.00 | 2.59 | 2.69 | 2.64 | 26.41 | |
| PR44+940 | PR44+930 | 10.00 | 2.69 | 2.95 | 2.82 | 28.17 | |
| PR44+930 | PR44+920 | 10.00 | 2.95 | 3.24 | 3.09 | 30.92 | |
| PR44+920 | PR44+910 | 10.00 | 3.24 | 3.42 | 3.33 | 33.27 | |
| PR44+910 | PR44+900 | 10.00 | 3.42 | 3.43 | 3.43 | 34.25 | |
| PR44+900 | PR44+890 | 10.00 | 3.43 | 3.42 | 3.43 | 34.27 | |
| PR44+890 | PR44+880 | 10.00 | 3.42 | 3.43 | 3.43 | 34.27 | |
| PR44+880 | PR44+870 | 10.00 | 3.43 | 3.42 | 3.43 | 34.27 | |
| PR44+870 | PR44+860 | 10.00 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 34.20 | |
| PR44+860 | PR44+850 | 10.00 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 34.20 | |
| PR44+850 | PR44+840 | 10.00 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 34.20 | |
| PR44+840 | PR44+830 | 10.00 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 34.20 | |
| PR44+830 | PR44+820 | 10.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 33.32 | |
| PR44+820 | PR44+810 | 10.00 | 3.25 | 3.02 | 3.13 | 31.34 | |
| PR44+810 | PR44+800 | 10.00 | 3.02 | 2.80 | 2.91 | 29.10 | |
| PR44+800 | PR44+790 | 10.00 | 2.80 | 2.59 | 2.70 | 26.96 | |
| PR44+790 | PR44+780 | 10.00 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 25.94 | |
| PR44+780 | PR44+770 | 10.00 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 25.94 | |
| PR44+770 | PR44+760 | 10.00 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 25.94 | |
| PR44+760 | PR44+750 | 10.00 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 25.94 | |
| PR44+750 | PR44+740 | 10.00 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 25.94 | |
| PR44+740 | PR44+730 | 10.00 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 25.94 | |
| PR44+730 | PR44+720 | 10.00 | 2.59 | 2.73 | 2.66 | 26.60 | |
| PR44+720 | PR44+710 | 10.00 | 2.73 | 3.02 | 2.88 | 28.75 | |
| PR44+710 | PR44+700 | 10.00 | 3.02 | 3.23 | 3.13 | 31.29 | |
| | | | | | | **885.29** | |
| PR43+850 | PR43+840 | 10.00 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 25.94 | |
| PR43+840 | PR43+830 | 10.00 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 25.94 | |
| PR43+830 | PR43+820 | 10.00 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 25.94 | |
| PR43+820 | PR43+810 | 10.00 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 25.94 | |
| PR43+810 | PR43+800 | 10.00 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 25.93 | |
| PR43+800 | PR43+790 | 10.00 | 2.59 | 2.61 | 2.60 | 26.00 | |
| PR43+790 | PR43+780 | 10.00 | 2.61 | 2.72 | 2.66 | 26.64 | |
| PR43+780 | PR43+770 | 10.00 | 2.72 | 2.86 | 2.79 | 27.90 | |
| PR43+770 | PR43+760 | 10.00 | 2.86 | 2.94 | 2.90 | 29.00 | |
| PR43+760 | PR43+750 | 10.00 | 2.94 | 2.93 | 2.94 | 29.38 | |
| PR43+750 | PR43+740 | 10.00 | 2.93 | 2.89 | 2.91 | 29.15 | |

| CONTRATISTA: CONSORCIO DSC. | OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" | INTERVENTOR |
|---|---|---|

**PREACTA DE OBRA NÚMERO:09**

| PERIODO PRE-ACTA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| | 01/febrero/2022 | 28/febrero/2022 |

| No. DE ORDEN | DESCRIPCIÓN ÍTEM | CANTIDAD EJECUTADA | UND. |
|---|---|---|---|
| 12 | Subbase Granular clase A (No incluye Transporte) | 2,589.00 | m3 |

| ABSCISAS | | DIMENSIONES | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INICIO | FIN | LONGITUD (m) | AREA ABSCISA INICIO (m2) | AREA ABSCISA FIN (m2) | AREA PROMEDIO TERRAPLEN (m2) | VOLUMEN (m3) | |
| PR43+740 | PR43+730 | 10.00 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 28.95 | |
| PR43+730 | PR43+720 | 10.00 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 28.95 | |
| PR43+720 | PR43+710 | 10.00 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 28.95 | |
| PR43+710 | PR43+700 | 10.00 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 28.95 | |
| PR43+700 | PR43+690 | 10.00 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 28.95 | |
| PR43+690 | PR43+680 | 10.00 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 28.95 | |
| PR43+680 | PR43+670 | 10.00 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 28.95 | |
| PR43+670 | PR43+660 | 10.00 | 2.89 | 2.91 | 2.90 | 29.03 | |
| PR43+660 | PR43+650 | 10.00 | 2.91 | 2.97 | 2.94 | 29.42 | |
| PR43+650 | PR43+640 | 10.00 | 2.97 | 2.90 | 2.94 | 29.38 | |
| PR43+640 | PR43+630 | 10.00 | 2.90 | 2.75 | 2.83 | 28.26 | |
| PR43+630 | PR43+620 | 10.00 | 2.75 | 2.63 | 2.69 | 26.87 | |
| PR43+620 | PR43+610 | 10.00 | 2.63 | 2.59 | 2.61 | 26.09 | |
| PR43+610 | PR43+600 | 10.00 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 25.94 | |
| PR43+600 | PR43+590 | 10.00 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 25.94 | |
| PR43+590 | PR43+580 | 10.00 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 25.94 | |
| PR43+580 | PR43+570 | 10.00 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 25.94 | |
| PR43+570 | PR43+560 | 10.00 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 25.94 | |
| PR43+560 | PR43+550 | 10.00 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 25.94 | |
| PR43+550 | PR43+540 | 10.00 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 25.94 | |
| PR43+540 | PR43+530 | 10.00 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 25.94 | |
| PR43+530 | PR43+520 | 10.00 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 25.94 | |
| PR43+520 | PR43+510 | 10.00 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 25.94 | |
| PR43+510 | PR43+500 | 10.00 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 25.94 | |
| PR43+500 | PR43+490 | 10.00 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 25.94 | |
| PR43+490 | PR43+480 | 10.00 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 25.94 | |
| PR43+480 | PR43+470 | 10.00 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 25.94 | |
| PR43+470 | PR43+460 | 10.00 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 25.94 | |
| PR43+460 | PR43+450 | 10.00 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 25.94 | |
| PR43+450 | PR43+440 | 10.00 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 25.94 | |
| PR43+440 | PR43+430 | 10.00 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 25.94 | |
| PR43+430 | PR43+420 | 10.00 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 25.94 | |
| PR43+420 | PR43+410 | 10.00 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 25.94 | |
| PR43+410 | PR43+400 | 10.00 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 25.94 | |
| PR43+400 | PR43+390 | 10.00 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 25.94 | |
| PR43+390 | PR43+380 | 10.00 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 25.94 | |
| PR43+380 | PR43+370 | 10.00 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 25.94 | |
| PR43+370 | PR43+360 | 10.00 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 25.94 | |
| PR43+360 | PR43+350 | 10.00 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 25.94 | |
| PR43+350 | PR43+340 | 10.00 | 2.59 | 2.63 | 2.61 | 26.14 | |
| PR43+340 | PR43+330 | 10.00 | 2.63 | 2.70 | 2.66 | 26.64 | |
| PR43+330 | PR43+320 | 10.00 | 2.70 | 2.76 | 2.73 | 27.26 | |
| PR43+320 | PR43+310 | 10.00 | 2.76 | 2.80 | 2.78 | 27.77 | |
| PR43+310 | PR43+300 | 10.00 | 2.80 | 2.79 | 2.80 | 27.96 | |
| PR43+300 | PR43+290 | 10.00 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 27.94 | |
| PR43+290 | PR43+280 | 10.00 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 27.95 | |
| PR43+280 | PR43+270 | 10.00 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 27.95 | |
| PR43+270 | PR43+260 | 10.00 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 27.95 | |
| PR43+260 | PR43+250 | 10.00 | 2.79 | 2.82 | 2.81 | 28.09 | |
| PR43+250 | PR43+240 | 10.00 | 2.82 | 2.89 | 2.85 | 28.54 | |
| PR43+240 | PR43+230 | 10.00 | 2.89 | 2.83 | 2.86 | 28.58 | |
| PR43+230 | PR43+220 | 10.00 | 2.83 | 2.70 | 2.76 | 27.63 | |
| | | | | | | 1704.16 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 2,589.00 | |

| CONTRATISTA: CONSORCIO DSC. | OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" | INTERVENTOR |
|---|---|---|

**PREACTA DE OBRA NÚMERO:09**

| PERIODO PRE-ACTA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| | 01/febrero/2022 | 28/febrero/2022 |

| No. DE ORDEN | DESCRIPCIÓN ÍTEM | CANTIDAD EJECUTADA | UND. |
|---|---|---|---|
| 12 | Subbase Granular clase A (No incluye Transporte) | 2,589.00 | m3 |

| ABSCISAS | | DIMENSIONES | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INICIO | FIN | LONGITUD (m) | AREA ABSCISA INICIO (m2) | AREA ABSCISA FIN (m2) | AREA PROMEDIO TERRAPLEN (m2) | VOLUMEN (m3) | |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO.**



PR43+550



PR43+850



PR44+890



PR44+700

| FIRMA | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA | OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ |
| CARGO | DIRECTOR DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA |
| ENTIDAD | CONSORCIO DSC | CONSORCIO ECOVISIÓN 190 |

| CONTRATISTA: CONSORCIO DSC. | CONTRATO 976-2021<br>OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" | INTERVENTOR |
|---|---|---|

**CARTERAS TOPOGRAFICAS**

| PERIODO PRE-ACTA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| | 01/febrero/2022 | 28/febrero/2022 |

| No. DE ORDEN | DESCRIPCIÓN ÍTEM | CANTIDAD EJECUTADA | UND. |
|---|---|---|---|
| 13 | Base granular clase A (No incluye Transporte) | 1,396.00 | m3 |

| ABSCISAS | | DIMENSIONES | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INICIO | FIN | LONGITUD (m) | AREA ABSCISA INICIO (m2) | AREA ABSCISA FIN (m2) | AREA PROMEDIO (m2) | CANTIDAD (m3) | |
| PR44+350 | PR44+340 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | Carteras topográficas entregadas por el profesional del área Camilo Sánchez y revisadas previamente con el topografo de interventoría |
| PR44+340 | PR44+330 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR44+330 | PR44+320 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR44+320 | PR44+310 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR44+310 | PR44+300 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR44+300 | PR44+290 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR44+290 | PR44+280 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR44+280 | PR44+270 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR44+270 | PR44+260 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR44+260 | PR44+250 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR44+250 | PR44+240 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR44+240 | PR44+230 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR44+230 | PR44+220 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR44+220 | PR44+210 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR44+210 | PR44+200 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR44+200 | PR44+190 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR44+190 | PR44+180 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR44+180 | PR44+170 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR44+170 | PR44+160 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR44+160 | PR44+150 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR44+150 | PR44+140 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.87 | |
| PR44+140 | PR44+130 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.87 | |
| PR44+130 | PR44+120 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR44+120 | PR44+110 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR44+110 | PR44+100 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR44+100 | PR44+090 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR44+090 | PR44+080 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR44+080 | PR44+070 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR44+070 | PR44+060 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR44+060 | PR44+050 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR44+050 | PR44+040 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR44+040 | PR44+030 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR44+030 | PR44+020 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR44+020 | PR44+010 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR44+010 | PR44+000 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR44+000 | PR43+990 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR43+990 | PR43+980 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR43+980 | PR43+970 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR43+970 | PR43+960 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR43+960 | PR43+950 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR43+950 | PR43+940 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR43+940 | PR43+930 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR43+930 | PR43+920 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR43+920 | PR43+910 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR43+910 | PR43+900 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR43+900 | PR43+890 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR43+890 | PR43+880 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR43+880 | PR43+870 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR43+870 | PR43+860 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR43+860 | PR43+850 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR43+850 | PR43+840 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR43+840 | PR43+830 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR43+830 | PR43+820 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR43+820 | PR43+810 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR43+810 | PR43+800 | 10.00 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 18.88 | |
| PR43+800 | PR43+790 | 10.00 | 1.89 | 1.90 | 1.89 | 18.93 | |
| PR43+790 | PR43+780 | 10.00 | 1.90 | 1.99 | 1.94 | 19.44 | |
| PR43+780 | PR43+770 | 10.00 | 1.99 | 2.10 | 2.05 | 20.46 | |
| PR43+770 | PR43+760 | 10.00 | 2.10 | 2.17 | 2.13 | 21.33 | |
| PR43+760 | PR43+750 | 10.00 | 2.17 | 2.16 | 2.16 | 21.63 | |
| PR43+750 | PR43+740 | 10.00 | 2.16 | 2.13 | 2.14 | 21.44 | |
| PR43+740 | PR43+730 | 10.00 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 21.28 | |
| PR43+730 | PR43+720 | 10.00 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 21.28 | |

| CONTRATISTA: CONSORCIO DSC. | CONTRATO 976-2021<br>OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" | INTERVENTOR |
|---|---|---|

**CARTERAS TOPOGRAFICAS**

| PERIODO PRE-ACTA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| | 01/febrero/2022 | 28/febrero/2022 |

| No. DE ORDEN | DESCRIPCIÓN ÍTEM | CANTIDAD EJECUTADA | UND. |
|---|---|---|---|
| 13 | Base granular clase A (No incluye Transporte) | 1,396.00 | m3 |

| ABSCISAS | | DIMENSIONES | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INICIO | FIN | LONGITUD (m) | AREA ABSCISA INICIO (m2) | AREA ABSCISA FIN (m2) | AREA PROMEDIO (m2) | CANTIDAD (m3) | |
| PR43+720 | PR43+710 | 10.00 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 21.28 | |
| PR43+710 | PR43+700 | 10.00 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 21.28 | |
| PR43+700 | PR43+690 | 10.00 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 21.28 | |
| PR43+690 | PR43+680 | 10.00 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 21.28 | |
| PR43+680 | PR43+670 | 10.00 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 21.28 | |
| PR43+670 | PR43+660 | 10.00 | 2.13 | 2.14 | 2.14 | 21.36 | |
| PR43+660 | PR43+650 | 10.00 | 2.14 | 2.19 | 2.17 | 21.67 | |
| PR43+650 | PR43+640 | 10.00 | 2.19 | 2.14 | 2.16 | 21.63 | |
| PR43+640 | PR43+630 | 10.00 | 2.14 | 2.01 | 2.07 | 20.74 | |
| | | | | | TOTAL VOLUMEN (m3) | 1,396.00 | |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO.**



PR43+680



PR44+340



PR43+550



PR43+650

| FIRMA | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA | OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ |
| CARGO | DIRECTOR DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA |
| ENTIDAD | CONSORCIO DSC | ECOVISIÓN 190 |

| CONTRATISTA: CONSORCIO DSC. | OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" | INTERVENTOR |
|---|---|---|

**PREACTA DE OBRA NÚMERO:09**

| PERIODO PRE-ACTA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| | 01/febrero/2022 | 28/febrero/2022 |

| No. DE ORDEN | DESCRIPCIÓN ÍTEM | CANTIDAD EJECUTADA | UND. |
|---|---|---|---|
| 14 | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 | 10,138.00 | m2 |

| ABSCISAS | | DIMENSIONES | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INICIO | FIN | LONGITUD INTERVENIDA | AREA ABSCISA INICIO (m2) | AREA ABSCISA FIN (m2) | AREA PROMEDIO (m2) | VOLUMEN (m2) | |
| PR44+340 | PR44+330 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR44+330 | PR44+320 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR44+320 | PR44+310 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR44+310 | PR44+300 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR44+300 | PR44+290 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR44+290 | PR44+280 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR44+280 | PR44+270 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR44+270 | PR44+260 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR44+260 | PR44+250 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR44+250 | PR44+240 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR44+240 | PR44+230 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR44+230 | PR44+220 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR44+220 | PR44+210 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR44+210 | PR44+200 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR44+200 | PR44+190 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR44+190 | PR44+180 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR44+180 | PR44+170 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR44+170 | PR44+160 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR44+160 | PR44+150 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR44+150 | PR44+140 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR44+140 | PR44+130 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR44+130 | PR44+120 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR44+120 | PR44+110 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR44+110 | PR44+100 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR44+100 | PR44+090 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR44+090 | PR44+080 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR44+080 | PR44+070 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR44+070 | PR44+060 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR44+060 | PR44+050 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR44+050 | PR44+040 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR44+040 | PR44+030 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR44+030 | PR44+020 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR44+020 | PR44+010 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR44+010 | PR44+000 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR44+000 | PR43+990 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+990 | PR43+980 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+980 | PR43+970 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+970 | PR43+960 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+960 | PR43+950 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+950 | PR43+940 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+940 | PR43+930 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+930 | PR43+920 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+920 | PR43+910 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+910 | PR43+900 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+900 | PR43+890 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+890 | PR43+880 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+880 | PR43+870 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+870 | PR43+860 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+860 | PR43+850 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+850 | PR43+840 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+840 | PR43+830 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | Carteras topográficas entregadas por el profesional del área Camilo Sánchez y revisadas previamente con el topografo de interventoría |
| PR43+830 | PR43+820 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+820 | PR43+810 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+810 | PR43+800 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+800 | PR43+790 | 10.00 | 9.40 | 10.45 | 9.93 | 99.25 | |
| PR43+790 | PR43+780 | 10.00 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 104.50 | |
| PR43+780 | PR43+770 | 10.00 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 104.50 | |
| PR43+770 | PR43+760 | 10.00 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 104.50 | |
| PR43+760 | PR43+750 | 10.00 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 104.50 | |
| PR43+750 | PR43+740 | 10.00 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 104.50 | |
| PR43+740 | PR43+730 | 10.00 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 104.50 | |
| PR43+730 | PR43+720 | 10.00 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 104.50 | |
| PR43+720 | PR43+710 | 10.00 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 104.50 | |
| PR43+710 | PR43+700 | 10.00 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 104.50 | |
| PR43+700 | PR43+690 | 10.00 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 104.50 | |
| PR43+690 | PR43+680 | 10.00 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 104.50 | |
| PR43+680 | PR43+670 | 10.00 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 104.50 | |
| PR43+670 | PR43+660 | 10.00 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 104.50 | |
| PR43+660 | PR43+650 | 10.00 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 104.50 | |
| PR43+650 | PR43+640 | 10.00 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 104.50 | |
| PR43+640 | PR43+630 | 10.00 | 10.45 | 10.00 | 10.23 | 102.25 | |
| PR43+630 | PR43+620 | 10.00 | 10.00 | 9.40 | 9.70 | 97.00 | |
| PR43+620 | PR43+610 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+610 | PR43+600 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+600 | PR43+590 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+590 | PR43+580 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+580 | PR43+570 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+570 | PR43+560 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+560 | PR43+550 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+550 | PR43+540 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+540 | PR43+530 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+530 | PR43+520 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+520 | PR43+510 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+510 | PR43+500 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+500 | PR43+490 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+490 | PR43+480 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+480 | PR43+470 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+470 | PR43+460 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+460 | PR43+450 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+450 | PR43+440 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+440 | PR43+430 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+430 | PR43+420 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+420 | PR43+410 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+410 | PR43+400 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+400 | PR43+390 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+390 | PR43+380 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |

| CONTRATISTA: CONSORCIO DSC. | OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" | INTERVENTOR |
|---|---|---|

**PREACTA DE OBRA NÚMERO:09**

| PERIODO PRE-ACTA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| | 01/febrero/2022 | 28/febrero/2022 |

| No. DE ORDEN | DESCRIPCIÓN ÍTEM | CANTIDAD EJECUTADA | UND. |
|---|---|---|---|
| 14 | Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 | 10,138.00 | m2 |

| ABSCISAS | | DIMENSIONES | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INICIO | FIN | LONGITUD INTERVENIDA | AREA ABSCISA INICIO (m2) | AREA ABSCISA FIN (m2) | AREA PROMEDIO (m2) | VOLUMEN (m2) | |
| PR43+380 | PR43+370 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+370 | PR43+360 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+360 | PR43+350 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+350 | PR43+340 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+340 | PR43+330 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+330 | PR43+320 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+320 | PR43+310 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+310 | PR43+300 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+300 | PR43+290 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| PR43+290 | PR43+280 | 10.00 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 94.00 | |
| | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL | 10,138.00 | |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO.**



PR44+010



PR43+670



PR44+350



PR43+900



PR43+730

| FIRMA | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA | OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ |
| CARGO | DIRECTOR DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA |
| ENTIDAD | CONSORCIO DSC | CONSORCIO ECOVISIÓN 190 |

| CONTRATISTA: CONSORCIO DSC. | OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" | INTERVENTOR |
|---|---|---|

**PREACTA DE OBRA NÚMERO:09**

| PERIODO PRE-ACTA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| | 01/febrero/2022 | 28/febrero/2022 |

| No. DE ORDEN | DESCRIPCIÓN ÍTEM | CANTIDAD EJECUTADA | UND. |
|---|---|---|---|
| 16 | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte) | 454.00 | m3 |

| ABSCISAS | | DIMENSIONES | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INICIO | FIN | LONGITUD INTERVENIDA | AREA ABSCISA INICIO (m2) | AREA ABSCISA FIN (m2) | AREA PROMEDIO (m2) | VOLUMEN ($m^3$) | |
| PR44+340 | PR44+330 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | Carteras topográficas entregadas por el profesional del área Camilo Sánchez y revisadas previamente con el topografo de interventoría |
| PR44+330 | PR44+320 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR44+320 | PR44+310 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR44+310 | PR44+300 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR44+300 | PR44+290 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR44+290 | PR44+280 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR44+280 | PR44+270 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR44+270 | PR44+260 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR44+260 | PR44+250 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR44+250 | PR44+240 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR44+240 | PR44+230 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR44+230 | PR44+220 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR44+220 | PR44+210 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR44+210 | PR44+200 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR44+200 | PR44+190 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR44+190 | PR44+180 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR44+180 | PR44+170 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR44+170 | PR44+160 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR44+160 | PR44+150 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR44+150 | PR44+140 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR44+140 | PR44+130 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR44+130 | PR44+120 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR44+120 | PR44+110 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR44+110 | PR44+100 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR44+100 | PR44+090 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR44+090 | PR44+080 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR44+080 | PR44+070 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR44+070 | PR44+060 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR44+060 | PR44+050 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR44+050 | PR44+040 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR44+040 | PR44+030 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR44+030 | PR44+020 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR44+020 | PR44+010 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR44+010 | PR44+000 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR44+000 | PR43+990 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR43+990 | PR43+980 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR43+980 | PR43+970 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR43+970 | PR43+960 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR43+960 | PR43+950 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR43+950 | PR43+940 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR43+940 | PR43+930 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR43+930 | PR43+920 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR43+920 | PR43+910 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR43+910 | PR43+900 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR43+900 | PR43+890 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR43+890 | PR43+880 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR43+880 | PR43+870 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR43+870 | PR43+860 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR43+860 | PR43+850 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR43+850 | PR43+840 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR43+840 | PR43+830 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR43+830 | PR43+820 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR43+820 | PR43+810 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATISTA: CONSORCIO DSC. | OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" | INTERVENTOR |

**PREACTA DE OBRA NÚMERO:09**

| PERIODO PRE-ACTA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| | 01/febrero/2022 | 28/febrero/2022 |

| No. DE ORDEN | DESCRIPCIÓN ÍTEM | CANTIDAD EJECUTADA | UND. |
|---|---|---|---|
| 16 | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte) | 454.00 | m3 |

| ABSCISAS | | DIMENSIONES | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INICIO | FIN | LONGITUD INTERVENIDA | AREA ABSCISA INICIO (m2) | AREA ABSCISA FIN (m2) | AREA PROMEDIO (m2) | VOLUMEN ($m^3$) | |
| PR43+810 | PR43+800 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | Carteras topográficas entregadas por el profesional del área Camilo Sánchez y revisadas previamente con el topografo de interventoría |
| PR43+800 | PR43+790 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.175 | |
| PR43+790 | PR43+780 | 10.00 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 4.405 | |
| PR43+780 | PR43+770 | 10.00 | 0.45 | 0.48 | 0.47 | 4.682 | |
| PR43+770 | PR43+760 | 10.00 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 4.844 | |
| PR43+760 | PR43+750 | 10.00 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 4.831 | |
| PR43+750 | PR43+740 | 10.00 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 4.750 | |
| PR43+740 | PR43+730 | 10.00 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 4.750 | |
| PR43+730 | PR43+720 | 10.00 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 4.750 | |
| PR43+720 | PR43+710 | 10.00 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 4.750 | |
| PR43+710 | PR43+700 | 10.00 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 4.750 | |
| PR43+700 | PR43+690 | 10.00 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 4.750 | |
| PR43+690 | PR43+680 | 10.00 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 4.750 | |
| PR43+680 | PR43+670 | 10.00 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 4.750 | |
| PR43+670 | PR43+660 | 10.00 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 4.790 | |
| PR43+660 | PR43+650 | 10.00 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 4.902 | |
| PR43+650 | PR43+640 | 10.00 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 4.769 | |
| PR43+640 | PR43+630 | 10.00 | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 4.460 | |
| PR43+630 | PR43+620 | 10.00 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 4.214 | |
| PR43+620 | PR43+610 | 10.00 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 4.235 | |
| PR43+610 | PR43+600 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR43+600 | PR43+590 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR43+590 | PR43+580 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR43+580 | PR43+570 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR43+570 | PR43+560 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR43+560 | PR43+550 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR43+550 | PR43+540 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR43+540 | PR43+530 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR43+530 | PR43+520 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR43+520 | PR43+510 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR43+510 | PR43+500 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR43+500 | PR43+490 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR43+490 | PR43+480 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR43+480 | PR43+470 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR43+470 | PR43+460 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR43+460 | PR43+450 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR43+450 | PR43+440 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR43+440 | PR43+430 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR43+430 | PR43+420 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR43+420 | PR43+410 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR43+410 | PR43+400 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR43+400 | PR43+390 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR43+390 | PR43+380 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR43+380 | PR43+370 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR43+370 | PR43+360 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR43+360 | PR43+350 | 10.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 4.176 | |
| PR43+350 | PR43+340 | 10.00 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 4.243 | |
| PR43+340 | PR43+330 | 10.00 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 4.372 | |
| PR43+330 | PR43+320 | 10.00 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 4.495 | |
| PR43+320 | PR43+310 | 10.00 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 4.597 | |
| PR43+310 | PR43+300 | 10.00 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 4.634 | |
| PR43+300 | PR43+290 | 10.00 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 4.630 | |
| PR43+290 | PR43+280 | 10.00 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 4.630 | |
| | | | | | TOTAL | 454.000 | |

| CONTRATISTA: CONSORCIO DSC. | OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" | INTERVENTOR |
|---|---|---|

**PREACTA DE OBRA NÚMERO:09**

| PERIODO PRE-ACTA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| | 01/febrero/2022 | 28/febrero/2022 |

| No. DE ORDEN | DESCRIPCIÓN ÍTEM | CANTIDAD EJECUTADA | UND. |
|---|---|---|---|
| 16 | Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte) | 454.00 | m3 |

| ABSCISAS | | DIMENSIONES | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INICIO | FIN | LONGITUD INTERVENIDA | AREA ABSCISA INICIO (m2) | AREA ABSCISA FIN (m2) | AREA PROMEDIO (m2) | VOLUMEN ($m^3$) | |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO.**



PR44+250



PR44+280



PR43+790



PR44+080

| FIRMA | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA | OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ |
| CARGO | DIRECTOR DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA |
| ENTIDAD | CONSORCIO DSC | CONSORCIO ECOVISIÓN 190 |

| CONTRATISTA: CONSORCIO DSC. | OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" | INTERVENTOR |
|---|---|---|

**PREACTA DE OBRA NÚMERO:09**

| PERIODO PRE-ACTA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| | 01/febrero/2022 | 28/febrero/2022 |

| No. DE ORDEN | DESCRIPCIÓN ÍTEM | CANTIDAD EJECUTADA | UND. |
|---|---|---|---|
| 18 | Excavaciones varias sin clasificar | 43.20 | m3 |

| ALCANTARILLAS | DIMENSIONES | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| ABSCISA | LONGITUD (m) | ANCHO (m) | ALTO (m) | VOLUMEN (m3) | |
| PR41+500 | 6.00 | 2.00 | 1.20 | 14.40 | DESCOLE |
| PR44+370 | 6.00 | 2.00 | 1.20 | 14.40 | DESCOLE |
| PR44+570 | 6.00 | 2.00 | 1.20 | 14.40 | DESCOLE |
| | | | | 00 | |
| | | | | 00 | |
| | | | | 00 | |
| | | | | 00 | |
| | | | | 00 | |
| | | | | 00 | |
| | | | | 00 | |
| | | | | 00 | |
| | | | | 00 | |
| | | | | 00 | |
| | | | | 00 | |
| | | | TOTAL | 43.20 | |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO.**



PR41+500



PR44+370 - Se realizo la excavación previo a la construcción de la alcantarilla



PR44+570 - Se realizo la excavación con excavadora previo a la construcción de la alcantarilla

| FIRMA | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | EDWIN JAVIER BOSTOS IBARRA | OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ |
| CARGO | DIRECTOR DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA |
| ENTIDAD | CONSORCIO DSC | CONSORCIO ECOVISIÓN 190 |

| CONTRATISTA: CONSORCIO DSC. | OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" | INTERVENTOR |
|---|---|---|

**PREACTA DE OBRA NÚMERO:09**

| PERIODO PRE-ACTA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| | 01/febrero/2022 | 28/febrero/2022 |

| No. DE ORDEN | DESCRIPCIÓN ÍTEM | CANTIDAD EJECUTADA | UND. |
|---|---|---|---|
| 21 | Rellenos para Estructuras con suelo | 5.90 | m3 |

| ALCANTARILLAS | DIMENSIONES | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| ABSCISA | LONGITUD (m) | ANCHO (m) | ALTO (m) | VOLUMEN (m3) | |
| PR41+550 | 4.00 | 0.45 | 1.10 | 1.98 | DESCOLE |
| PR44+370 | 4.00 | 0.45 | 1.10 | 1.98 | DESCOLE |
| PR44+565 | 4.00 | 0.45 | 1.10 | 1.98 | DESCOLE |
| | | | | 0.00 | |
| | | | | 0.00 | |
| | | | | 00 | |
| | | | | 00 | |
| | | | | 00 | |
| | | | | 00 | |
| | | | | 00 | |
| | | | | 00 | |
| | | | | 00 | |
| | | | | 00 | |
| | | | TOTAL | 5.90 | |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO.**



PR41+550 - Se evidencia avance de relleno con un porcentaje de ejecución del 75% en



PR44+370

| FIRMA | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA | OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ |
| CARGO | DIRECTOR DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA |
| ENTIDAD | CONSORCIO DSC | CONSORCIO ECOVISIÓN 190 |

| CONTRATISTA: CONSORCIO DSC. | OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" | INTERVENTOR |
|---|---|---|

**PREACTA DE OBRA NÚMERO:09**

| PERIODO PRE-ACTA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| | 01/febrero/2022 | 28/febrero/2022 |

| No. DE ORDEN | DESCRIPCIÓN ÍTEM | CANTIDAD EJECUTADA | UND. |
|---|---|---|---|
| 24 | Concreto clase 21 MPA | 22.80 | m3 |

| ALCANTARILLAS | DIMENSIONES | | | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSCISA | ALTO (m) | ANCHO (m) | LARGO (m) | ESPESOR (m) | RADIO TUBERÍA | VOLUMEN DE TUBERÍA | ANCHO (m) | VOLUMEN (m3) | |
| PR44+580 | 1.10 | 1.60 | 10.50 | | 0.55 | 9.98 | | 8.500 | Atraque para tubería de 36 |
| | | 1.60 | 10.50 | 0.15 | | | | 2.500 | Placa sobre tubería |
| PR44+370 | 1.10 | 1.60 | 10.50 | | 0.55 | 9.98 | | 8.500 | Atraque para tubería de 36 |
| | | 1.60 | 10.50 | 0.15 | | | | 2.500 | Placa sobre tubería |
| PR42+685 | 0.33 | 0.25 | 2.75 | | | | | 0.200 | Atraque para tubería descole |
| PR42+530 | 0.33 | 0.25 | 1.75 | | | | | 0.100 | Atraque para tubería encole |
| PR41+500 | 0.33 | 0.25 | 5.75 | | | | | 0.500 | Atraque para tubería descole |
| | | | | | | | | 0.000 | |
| | | | | TOTAL | | | | 22.80 | |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO.**



PR44+565



PR44+370



PR42+685



PR42+685



PR44+580



PR44+530



PR41+500

| FIRMA | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | EDWIN JAVIER BURGOS IBARRA | OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ |
| CARGO | DIRECTOR DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA |
| ENTIDAD | CONSORCIO DSC | CONSORCIO ECOVISIÓN 190 |

| CONTRATISTA: CONSORCIO DSC. | OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" | INTERVENTOR |
|---|---|---|

**PREACTA DE OBRA NÚMERO:09**

| PERIODO PRE-ACTA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| | 01/febrero/2022 | 28/febrero/2022 |

| No. DE ORDEN | DESCRIPCIÓN ÍTEM | CANTIDAD EJECUTADA | UND. |
|---|---|---|---|
| 25 | Concreto clase 14 MPA | 6.00 | m3 |

| ALCANTARILLAS | DIMENSIONES | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSCISA | ALTO (m) | ANCHO (m) | LARGO (m) | ESPESOR (m) | VOLUMEN (m3) | |
| PR44+370 | | 1.60 | 11.00 | 0.100 | 1.8 | Solado tubería |
| | | 1.28 | 3.58 | 0.050 | 0.2 | Solado descole |
| PK00+885 | | 1.60 | 11.00 | 0.090 | 1.6 | Solado tubería |
| | | 1.28 | 3.58 | 0.050 | 0.2 | Solado descole |
| PK02+775 | | 1.28 | 3.53 | 0.050 | 0.2 | Solado descole |
| PR42+530 | | 1.90 | 1.50 | 0.040 | 0.1 | Solado encole |
| PR41+950 | | 1.60 | 5.75 | 0.100 | 0.9 | Solado tubería |
| PR41+500 | | 1.60 | 6.00 | 0.100 | 1.0 | Solado tubería |
| | | | | TOTAL | 6.00 | |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO.**



PR41+950



PR41+500



PR44+370

| FIRMA | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA | OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ |
| CARGO | DIRECTOR DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA |
| ENTIDAD | CONSORCIO DSC | CONSORCIO ECOVISIÓN 190 |

| CONTRATISTA: CONSORCIO DSC. | OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" | INTERVENTOR |
|---|---|---|

**PREACTA DE OBRA NÚMERO:09**

| PERIODO PRE-ACTA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| | 01/febrero/2022 | 28/febrero/2022 |

| No. DE ORDEN | DESCRIPCIÓN ÍTEM | CANTIDAD EJECUTADA | UND. |
|---|---|---|---|
| 26 | Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. | 3,102.00 | kg |

| ALCANTARILLAS | DIMENSIONES | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSCISA | DIÁMETRO | LONGITUD (m) | CANTIDAD | PESO KG | PESO (kg) | |
| PR44+570 | 1/2" | 10.5 | 8 | 0.996 | 83.70 | PARRILLA SOBRE TUBERIA |
| | 1/2" | 53 | 1.5 | 0.996 | 79.20 | |
| | TOTAL DE ACERO PARA PLACA | | | | 162.90 | |
| PR44+370 | 1/2" | 10.5 | 8 | 0.996 | 83.70 | PARRILLA SOBRE TUBERIA |
| | 1/2" | 53 | 1.5 | 0.996 | 79.20 | |
| | TOTAL DE ACERO PARA PLACA | | | | 162.90 | |
| PR44+010 | 5/8" | 5.55 | 9.00 | 1.560 | 77.90 | ACERO MURO EXTERIOR Y ZARPA INFERIOR DESCOLE |
| | 5/8" | 5.76 | 9.00 | 1.560 | 80.90 | |
| | 5/8" | 5.59 | 6.00 | 1.560 | 52.30 | |
| | 5/8" | 2.65 | 5.00 | 1.560 | 20.70 | |
| | 5/8" | 1.82 | 5.00 | 1.560 | 14.20 | |
| | 5/8" | 1.75 | 10.00 | 1.560 | 27.30 | |
| | 1/2" | 6.06 | 10.00 | 0.996 | 60.40 | |
| | 1/2" | 2.55 | 8.00 | 0.996 | 20.30 | |
| | 1/2" | 2.65 | 4.00 | 0.996 | 10.60 | |
| | 1/2" | 2.30 | 2.00 | 0.996 | 4.60 | |
| | TOTAL PESO (Kg) ACERO | | | | 369.20 | |
| | 1/2" | 3.56 | 18.00 | 0.996 | 63.80 | ACERO MURO INTERIOR Y ZARPA SUPERIOR DESCOLE |
| | 1/2" | 2.55 | 8.00 | 0.996 | 20.30 | |
| | 1/2" | 3.15 | 9.00 | 0.996 | 28.20 | |
| | 1/2" | 2.65 | 4.00 | 0.996 | 10.60 | |
| | 1/2" | 2.59 | 5.00 | 0.996 | 12.90 | |
| | 1/2" | 4.01 | 6.00 | 0.996 | 24.00 | |
| | 1/2" | 2.30 | 2.00 | 0.996 | 4.60 | |
| | 1/2" | 2.25 | 18.00 | 0.996 | 40.30 | |
| | 1/2" | 3.84 | 8.00 | 0.996 | 30.60 | |
| | 1/2" | 2.32 | 5.00 | 0.996 | 11.60 | |
| | 1/2" | 1.85 | 10.00 | 0.996 | 18.40 | |
| | 1/2" | 2.32 | 6.00 | 0.996 | 13.90 | |
| | TOTAL PESO (Kg) ACERO | | | | 279.20 | |
| | 1/2" | 0.85 | 21.00 | 0.996 | 17.80 | REFUERZO DENTELLON DESCOLE |
| | 1/2" | 4.70 | 4.00 | 0.996 | 18.70 | |
| | TOTAL PESO (Kg) ACERO | | | | 36.50 | |
| | 1/2" | 1.00 | 4.00 | 0.996 | 4.00 | REFUERZO TUBERIA |
| | 1/2" | 0.70 | 8.00 | 0.996 | 5.60 | |
| | TOTAL PESO (Kg) ACERO | | | | 9.60 | |
| PR43+770 | 1/2" | 3.57 | 22.00 | 0.996 | 78.20 | CAJA DE ENCOLE |
| | 1/2" | 5.05 | 5.00 | 0.996 | 25.10 | |
| | 1/2" | 1.75 | 31.00 | 0.996 | 54.00 | |
| | 1/2" | 2.15 | 30.00 | 0.996 | 64.20 | |
| | 1/2" | 8.39 | 4.00 | 0.996 | 33.40 | |
| | 1/2" | 5.22 | 4.00 | 0.996 | 20.80 | |
| | 1/2" | 5.32 | 2.00 | 0.996 | 10.60 | |
| | 1/2" | 3.87 | 4.00 | 0.996 | 15.40 | |
| | 1/2" | 6.80 | 10.00 | 0.996 | 67.70 | |
| | 1/2" | 8.49 | 7.00 | 0.996 | 59.20 | |
| | 1/2" | 2.45 | 14.00 | 0.996 | 34.20 | |
| | TOTAL PESO (Kg) ACERO CAJA ENCOLE | | | | 462.80 | |
| | 1/2" | 4.54 | 9 | 0.996 | 40.70 | ACERO MURO EXTERIOR Y ZARPA INFERIOR DESCOLE |
| | 1/2" | 5.19 | 9 | 0.996 | 46.50 | |
| | 1/2" | 5.9 | 10 | 0.996 | 58.80 | |
| | 1/2" | 2.4 | 12 | 0.996 | 28.70 | |
| | 1/2" | 5.15 | 4 | 0.996 | 20.50 | |
| | 1/2" | 2.4 | 6 | 0.996 | 14.30 | |
| | 1/2" | 2.6 | 2 | 0.996 | 5.20 | |
| | 1/2" | 1.85 | 6 | 0.996 | 11.10 | |
| | 1/2" | 1.7 | 10 | 0.996 | 16.90 | |
| | TOTAL PESO (Kg) ACERO | | | | 242.70 | |
| | 1/2" | 3.04 | 18 | 0.996 | 54.50 | ACERO MURO INTERIOR Y ZARPA SUPERIOR DESCOLE |
| | 1/2" | 3.15 | 9 | 0.996 | 28.20 | |
| | 1/2" | 2.4 | 12 | 0.996 | 28.70 | |
| | 1/2" | 2.4 | 6 | 0.996 | 14.30 | |
| | 1/2" | 3.7 | 4 | 0.996 | 14.70 | |
| | 1/2" | 2.3 | 2 | 0.996 | 4.60 | |
| | 1/2" | 2.25 | 18 | 0.996 | 40.30 | |
| | 1/2" | 3.88 | 8 | 0.996 | 30.90 | |
| | 1/2" | 2.33 | 6 | 0.996 | 13.90 | |
| | 1/2" | 1.85 | 10 | 0.996 | 18.40 | |
| | 1/2" | 2.33 | 4 | 0.996 | 9.30 | |
| | TOTAL PESO (Kg) ACERO | | | | 257.80 | |
| | 1/2" | 0.85 | 20 | 0.996 | 16.90 | REFUERZO DENTELLON |
| | 1/2" | 4.73 | 4 | 0.996 | 18.80 | |
| | TOTAL PESO (Kg) ACERO DENTELLON | | | | 35.70 | |
| | 1/2" | 1 | 4 | 0.996 | 4.00 | REFUERZO TUBERIA |
| | 1/2" | 0.7 | 8 | 0.996 | 5.60 | |
| | TOTAL PESO (Kg) REFUERZO TUBERIA | | | | 9.60 | |

| CONTRATISTA: CONSORCIO DSC. | OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" | INTERVENTOR |
|---|---|---|

**PREACTA DE OBRA NÚMERO:09**

| PERIODO PRE-ACTA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| | 01/febrero/2022 | 28/febrero/2022 |

| No. DE ORDEN | DESCRIPCIÓN ÍTEM | CANTIDAD EJECUTADA | UND. |
|---|---|---|---|
| 26 | Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. | 3,102.00 | kg |

| ALCANTARILLAS | DIMENSIONES | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSCISA | DIÁMETRO | LONGITUD (m) | CANTIDAD | PESO KG | PESO (kg) | |
| PR44+570 | 1/2" | 10.5 | 8 | 0.996 | 83.70 | PARRILLA SOBRE TUBERIA |
| | 1/2" | 53 | 1.5 | 0.996 | 79.20 | |
| PR43+605 | 1/2" | 3.75 | 7 | 0.996 | 26.10 | ACERO MURO EXTERIOR Y ZARPA INFERIOR DESCOLE |
| | 1/2" | 3.76 | 11 | 0.996 | 41.20 | |
| | 1/2" | 5.95 | 4 | 0.996 | 23.70 | |
| | 1/2" | 2.12 | 4 | 0.996 | 8.40 | |
| | 1/2" | 3.97 | 5 | 0.996 | 19.80 | |
| | 1/2" | 1.1 | 5 | 0.996 | 5.50 | |
| | 1/2" | 2.3 | 2 | 0.996 | 4.60 | |
| | 1/2" | 1.88 | 5 | 0.996 | 9.40 | |
| | 1/2" | 1.7 | 10 | 0.996 | 16.90 | |
| | 1/2" | 2.71 | 4 | 0.996 | 10.80 | |
| | | | | TOTAL PESO (Kg) ACERO | 166.40 | |
| | 1/2" | 2.09 | 18 | 0.996 | 37.50 | ACERO MURO INTERIOR Y ZARPA SUPERIOR DESCOLE |
| | 1/2" | 2.12 | 4 | 0.996 | 8.40 | |
| | 1/2" | 3.2 | 3 | 0.996 | 9.60 | |
| | 1/2" | 2.71 | 4 | 0.996 | 10.80 | |
| | 1/2" | 1.1 | 5 | 0.996 | 5.50 | |
| | 1/2" | 2.3 | 2 | 0.996 | 4.60 | |
| | 1/2" | 2.6 | 2 | 0.996 | 5.20 | |
| | 1/2" | 3.84 | 8 | 0.996 | 30.60 | |
| | 1/2" | 1.85 | 10 | 0.996 | 18.40 | |
| | 1/2" | 2.33 | 5 | 0.996 | 11.60 | |
| | 1/2" | 1.85 | 2 | 0.996 | 3.70 | |
| | 1/2" | 2.33 | 5 | 0.996 | 11.60 | |
| | | | | TOTAL PESO (Kg) ACERO | 157.50 | |
| | 1/2" | 0.85 | 20 | 0.996 | 16.90 | REFUERZO DENTELLON |
| | 1/2" | 4.73 | 4 | 0.996 | 18.80 | |
| | | | | TOTAL PESO (Kg) ACERO DENTELLO | 35.70 | |
| | 1/2" | 1 | 4 | 0.996 | 4.00 | REFUERZO TUBERIA |
| | 1/2" | 0.7 | 8 | 0.996 | 5.60 | |
| | | | | TOTAL PESO (Kg) REFUERZO TUBERIA | 9.60 | |
| | 1/2" | 2.15 | 23 | 0.996 | 49.30 | CAJA DE ENCOLE |
| | 1/2" | 5.05 | 5 | 0.996 | 25.10 | |
| | 1/2" | 1.75 | 24 | 0.996 | 41.80 | |
| | 1/2" | 2.15 | 17 | 0.996 | 36.40 | |
| | 1/2" | 3.80 | 4.00 | 0.996 | 15.10 | |
| | 1/2" | 2.45 | 4.00 | 0.996 | 9.80 | |
| | 1/2" | 1.30 | 14.00 | 0.996 | 18.10 | |
| | 1/2" | 6.80 | 3.00 | 0.996 | 20.30 | |
| | 1/2" | 5.65 | 7.00 | 0.996 | 39.40 | |
| | 1/2" | 3.60 | 2.00 | 0.996 | 7.20 | |
| | 1/2" | 3.05 | 4.00 | 0.996 | 12.20 | |
| | | | | TOTAL PESO (Kg) ACERO | 274.70 | |
| PR43+470 | 1/2" | 4.25 | 18 | 0.996 | 76.20 | ACERO MURO EXTERIOR Y ZARPA INFERIOR DESCOLE |
| | 1/2" | 5.90 | 5.00 | 0.996 | 29.40 | |
| | 1/2" | 2.55 | 10.00 | 0.996 | 25.40 | |
| | 1/2" | 4.28 | 4.00 | 0.996 | 17.10 | |
| | 1/2" | 1.70 | 6.00 | 0.996 | 10.20 | |
| | 1/2" | 2.30 | 2.00 | 0.996 | 4.60 | |
| | 1/2" | 1.75 | 5.00 | 0.996 | 8.70 | |
| | 1/2" | 1.70 | 10.00 | 0.996 | 16.90 | |
| | | | | TOTAL PESO (Kg) ACERO | 188.50 | |
| | 1/2" | 3.08 | 18.00 | 0.996 | 55.20 | ACERO MURO INTERIOR Y ZARPA SUPERIOR DESCOLE |
| | 1/2" | 3.23 | 4.00 | 0.996 | 12.90 | |
| | 1/2" | 2.50 | 10.00 | 0.996 | 24.90 | |
| | 1/2" | 1.30 | 6.00 | 0.996 | 7.80 | |
| | 1/2" | 2.90 | 4.00 | 0.996 | 11.60 | |
| | 1/2" | 2.30 | 2.00 | 0.996 | 4.60 | |
| | 1/2" | 2.20 | 8.00 | 0.996 | 17.50 | |
| | 1/2" | 3.89 | 8.00 | 0.996 | 31.00 | |
| | 1/2" | 1.85 | 10.00 | 0.996 | 18.40 | |
| | 1/2" | 2.33 | 6.00 | 0.996 | 13.90 | |
| | 1/2" | 2.33 | 4.00 | 0.996 | 9.30 | |
| | | | | TOTAL PESO (Kg) ACERO | 207.10 | |
| | 1/2" | 0.85 | 20.00 | 0.996 | 16.90 | REFUERZO DENTELLON |
| | 1/2" | 4.20 | 4.00 | 0.996 | 16.70 | |
| | | | | TOTAL PESO (Kg) REFUERZO DENTELLON | 33.60 | |
| | 1/2" | 1.00 | 4.00 | 0.996 | 4.00 | REFUERZO TUBERIA |
| | 1/2" | 0.70 | 8.00 | 0.996 | 5.60 | |
| | | | | TOTAL PESO (Kg) TUBERIA | 9.60 | |
| | | | | | | |
| | | | TOTAL | | 3102.00 | |

| CONTRATISTA: CONSORCIO DSC. | OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" | INTERVENTOR |
|---|---|---|

**PREACTA DE OBRA NÚMERO:09**

| PERIODO PRE-ACTA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| | 01/febrero/2022 | 28/febrero/2022 |

| No. DE ORDEN | DESCRIPCIÓN ÍTEM | CANTIDAD EJECUTADA | UND. |
|---|---|---|---|
| 26 | Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. | 3,102.00 | kg |

| ALCANTARILLAS | DIMENSIONES | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSCISA | DIÁMETRO | LONGITUD (m) | CANTIDAD | PESO KG | PESO (kg) | |
| PR44+570 | 1/2" | 10.5 | 8 | 0.996 | 83.70 | PARRILLA SOBRE TUBERIA |
| | 1/2" | 53 | 1.5 | 0.996 | 79.20 | |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO.**



PR43+470 DESCOLE



PR44+010 ENCOLE



PR44+010 DESCOLE



PR44+570



PR43+770

| FIRMA | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA | OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ |
| CARGO | DIRECTOR DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA |
| ENTIDAD | CONSORCIO DSC | CONSORCIO ECOVISIÓN 190 |

| CONTRATISTA: CONSORCIO DSC. | OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" | INTERVENTOR |
|---|---|---|

**PREACTA DE OBRA NÚMERO:09**

| PERIODO PRE-ACTA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| | 01/febrero/2022 | 28/febrero/2022 |

| No. DE ORDEN | DESCRIPCIÓN ÍTEM | CANTIDAD EJECUTADA | UND. |
|---|---|---|---|
| 27 | Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior | 33.00 | ml |

| ALCANTARILLAS | DIMENSIONES | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSCISA | CANTIDAD | LARGO (m) | LARGO (m) | ALTO (m) | LONGITUD (m) | |
| PR44+420 | 11.00 | | | | 11 | Descole |
| PR44+565 | 11.00 | | | | 11 | Descole |
| PR42+700 | 3.00 | | | | 3.00 | Descole |
| PR42+520 | 2.00 | | | | 2.00 | Encole |
| PR41+500 | 6.00 | | | | 6.00 | Encole |
| | | | | | 00 | |
| | | | | | 00 | |
| | | | | | 00 | |
| | | | | | 00 | |
| | | | | | 00 | |
| | | | | | 00 | |
| | | | | | 00 | |
| | | | | TOTAL | 33.00 | |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO.**



PR42+520



PR41+500



PR42+700

| | | |
|---|---|---|
| FIRMA | | |
| NOMBRE | EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA | OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ |
| CARGO | DIRECTOR DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA |
| ENTIDAD | CONSORCIO DSC | CONSORCIO ECOVISIÓN 190 |

| CONTRATISTA: CONSORCIO DSC. | OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" | INTERVENTOR |
|---|---|---|

**PREACTA DE OBRA NÚMERO:08**

| PERIODO PRE-ACTA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| | 01/febrero/2022 | 28/febrero/2022 |

| No. DE ORDEN | DESCRIPCIÓN ÍTEM | CANTIDAD EJECUTADA | UND. |
|---|---|---|---|
| 39 | Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m) | 819.84 | m3-km |

| ABSCISAS | | DIMENSIONES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INICIO | FIN | LONGITUD TRANSPORTE | AREA (m2) | ALTO (m) | VOLUMEN DESCAPOTE ($m^3$) | VOLUMEN EXCAVACIONES ($m^3$) | VOLUMEN ($m^3$-Km) | OBSERVACIONES |
| PR42+140 | PR40+220 | 1.92 | | | | 427.00 | 819.84 | Vo. Excavaciones |
| | | | | | | | 00 | |
| | | | | | | | 00 | |
| | | | | | | | 00 | |
| | | | | | | | 00 | |
| | | | | | | | 00 | |
| | | | | | | | 00 | |
| | | | | | | | 00 | |
| | | | | | | | 00 | |
| | | | | | | | 00 | |
| | | | | | | | 00 | |
| | | | | | | TOTAL | 819.84 | |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO.**



PR41+250



PR41+350



PR42+150



PR42+400

| FIRMA | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA | OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ |
| CARGO | DIRECTOR DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA |
| ENTIDAD | CONSORCIO DSC | CONSORCIO ECOVISIÓN 190 |

| CONTRATISTA: CONSORCIO DSC. | OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" | INTERVENTOR |
|---|---|---|

**PREACTA DE OBRA NÚMERO: 08**

| PERIODO PRE-ACTA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| | 01/febrero/2022 | 28/febrero/2022 |

| No. DE ORDEN | DESCRIPCIÓN ÍTEM | CANTIDAD EJECUTADA | UND. |
|---|---|---|---|
| 40 | Transporte de materiales de sub-base y base granular, compactos | 924,300.00 | m3-km |

| ABSCISAS | | | | DIMENSIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INICIO | LONGITUD AL PR45+450 (Km) | COLOCACION | | LONGITUD EN OBRA | LONGITUD TRANSPORTE | VOLUMEN MATERIALES ($m^3$) | VOLUMEN ($m^3$-Km) | OBSERVACIONES |
| UBICACIÓN | DISTANCIA | INICIO | FIN | LO | 218,5 KM + LO | | | |
| Granada<br>Coordenandas<br>Lat. 3.4827924N<br>Long. -73.7164277W | | PR44+990 | PR44+700 | 0.90 | 236.895 | 885.29 | 209,720.42 | |
| | 236.00 | K43+840 | K43+220 | 2.54 | 238.540 | 1,704.16 | 406,510.45 | SUB BASE GRANULAR |
| Fuente de Oro<br>Coordenandas<br>Lat. 3.425163N<br>Long. -73.636824W | 218.50 | K44+350 | K43+630 | 2.18 | 220.680 | 1,396.00 | 308,069.28 | BASE GRANULAR |
| | | | | | | TOTAL | 924,300.00 | |


**REGISTRO FOTOGRÁFICO.**



PR44+700 Sub-base granular





PR43+810 Sub-base granular

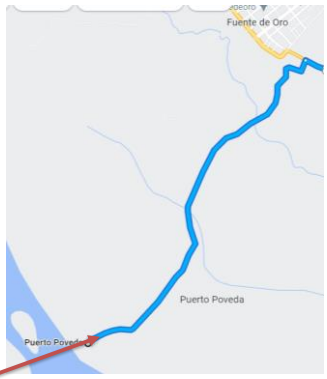




PR43+710 Base granular

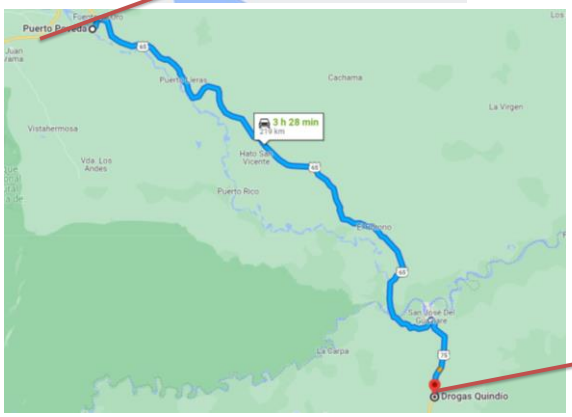

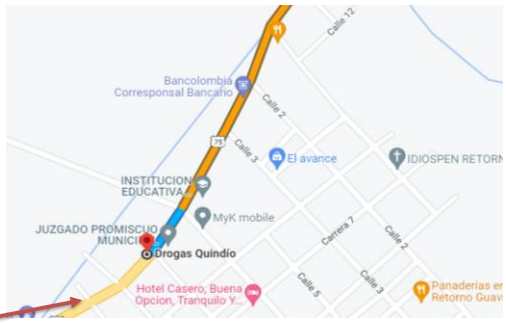
FUENTE DE MATERIALES DE BASE Y SUBBASE MAS CERCANOS RIO ARIARI TRITURADOS DEL ARIARI A 218,5 KM DE Pr45+450

| FIRMA | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | EDWIN XAVIER BUSTOS IBARRA | OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ |
| CARGO | DIRECTOR DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA |
| ENTIDAD | CONSORCIO DSC | CONSORCIO ECOVISIÓN 190 |

| CONTRATISTA: CONSORCIO DSC. | OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" | INTERVENTOR |
|---|---|---|

**PREACTA DE OBRA NÚMERO:09**

| PERIODO PRE-ACTA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| | 01/febrero/2022 | 28/febrero/2022 |

| No. DE ORDEN | DESCRIPCIÓN ÍTEM | CANTIDAD EJECUTADA | UND. |
|---|---|---|---|
| 41 | Transporte de mezcla asfáltica, compactos | 94,901.00 | m3-km |

| ABSCISAS | | | DIMENSIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INICIO | COLOCACION | | LONGITUD EN OBRA | LONGITUD AL PR45+450 | MEZCLA ASFALTICA | | | OBSERVACIONES |
| | INICIO | FIN | LO | 218,5 KM + LO | PORCENTAJE ASFALTO (%) | VOLUMEN MATERIALES ($m^3$) | VOLUMEN ($m^3$-Km) | |
| Fuente de Oro coordenandas (3.425163, -73.636824) | K44+340 | K43+280 | 2.70 | 221.20 | 5.5% | 429.03 | 94,901.44 | Vo. MEZCLA ASFÁLTICA |
| | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL | 94,901.00 | |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO.**



PR44+250




PR44+280



PR43+770



PR43+970

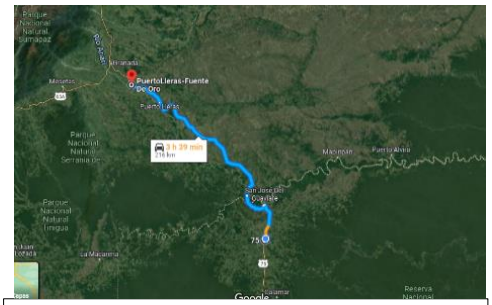


RECORRIDO MEZCLA ASFÁLTICA 216KM DESDE LA PLANTA HASTA EL PR43+250

| FIRMA | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | EDWIN JAVIER BOTOS IBARRA | OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ |
| CARGO | DIRECTOR DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA |
| ENTIDAD | CONSORCIO DSC | CONSORCIO ECOVISIÓN 190 |

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio ECOVISIÓN-190

**PREACTA DE OBRA NÚMERO: 08**

| PERIODO PRE-ACTA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| | 01/febrero/2022 | 28/febrero/2022 |

| No. DE ORDEN | DESCRIPCIÓN ÍTEM | CANTIDAD EJECUTADA | UND. |
|---|---|---|---|
| NP-2 | Suministro de Cal Viva | 313,545.60 | KG |

| ACTIVIDADES CAL | | | | | | | DIMENSIONES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INICIO | FIN | LONGITUD | AREA ABSCISA INICIO (m2) | AREA ABSCISA FIN (m2) | AREA PROMEDIO TERRAPLEN (m2) | VOLUMEN (m3) | DENSIDAD SUELO ESTABILIZADO | ESTABILIZACIÓN | SUMINISTRO CAL (kg) | OBSERVACIONES |
| PR42+310.00 | PR42+300.00 | 10.00 | 1.48 | 4.66 | 3.07 | 30.65 | 1560 | 2.00% | 956.28 | |
| PR42+300.00 | PR42+290.00 | 10.00 | 4.66 | 7.53 | 6.09 | 60.90 | 1560 | 2.00% | 1900.08 | |
| PR42+290.00 | PR42+280.00 | 10.00 | 7.53 | 9.22 | 8.37 | 83.70 | 1560 | 2.00% | 2611.44 | |
| PR42+280.00 | PR42+270.00 | 10.00 | 9.22 | 9.23 | 9.22 | 92.20 | 1560 | 2.00% | 2876.64 | |
| PR42+270.00 | PR42+260.00 | 10.00 | 9.23 | 7.63 | 8.43 | 84.25 | 1560 | 2.00% | 2628.60 | |
| PR42+260.00 | PR42+250.00 | 10.00 | 7.63 | 4.53 | 6.08 | 60.75 | 1560 | 2.00% | 1895.40 | |
| PR42+250.00 | PR42+240.00 | 10.00 | 4.53 | 0.76 | 2.64 | 26.40 | 1560 | 2.00% | 823.68 | |
| PR42+240.00 | PR42+230.00 | 10.00 | 0.76 | 2.83 | 1.79 | 17.90 | 1560 | 2.00% | 558.48 | |
| | | | | | | | | | **14250.60** | |
| PR42+070.00 | PR42+060.00 | 10.00 | 2.83 | 10.42 | 6.62 | 66.20 | 1560 | 2.00% | 2065.44 | |
| PR42+060.00 | PR42+050.00 | 10.00 | 10.42 | 20.68 | 15.55 | 155.45 | 1560 | 2.00% | 4850.04 | |
| PR42+050.00 | PR42+040.00 | 10.00 | 20.68 | 28.19 | 24.43 | 244.30 | 1560 | 2.00% | 7622.16 | |
| PR42+040.00 | PR42+030.00 | 10.00 | 28.19 | 57.05 | 42.62 | 426.15 | 1560 | 2.00% | 13295.88 | |
| PR42+030.00 | PR42+020.00 | 10.00 | 57.05 | 54.06 | 55.55 | 555.50 | 1560 | 2.00% | 17331.60 | |
| PR42+020.00 | PR42+010.00 | 10.00 | 54.06 | 31.26 | 42.66 | 426.55 | 1560 | 2.00% | 13308.36 | |
| PR42+010.00 | PR42+000.00 | 10.00 | 31.26 | 22.46 | 26.86 | 268.55 | 1560 | 2.00% | 8378.76 | |
| PR42+000.00 | PR41+990.00 | 10.00 | 22.46 | 19.20 | 20.83 | 208.25 | 1560 | 2.00% | 6497.40 | |
| PR41+990.00 | PR41+980.00 | 10.00 | 19.20 | 14.33 | 16.76 | 167.60 | 1560 | 2.00% | 5229.12 | |
| PR41+980.00 | PR41+970.00 | 10.00 | 14.33 | 9.75 | 12.04 | 120.35 | 1560 | 2.00% | 3754.92 | |
| PR41+970.00 | PR41+960.00 | 10.00 | 9.75 | 5.45 | 7.60 | 75.95 | 1560 | 2.00% | 2369.64 | |
| PR41+960.00 | PR41+950.00 | 10.00 | 5.45 | 1.76 | 3.60 | 36.00 | 1560 | 2.00% | 1123.20 | |
| PR41+950.00 | PR41+940.00 | 10.00 | 1.76 | 1.37 | 1.56 | 15.60 | 1560 | 2.00% | 486.72 | |
| | | | | | | | | | **85826.52** | |
| PR41+750.00 | PR41+740.00 | 10.00 | 1.37 | 5.21 | 3.29 | 32.85 | 1560 | 2.00% | 1024.92 | |
| PR41+740.00 | PR41+730.00 | 10.00 | 5.21 | 9.21 | 7.21 | 72.05 | 1560 | 2.00% | 2247.96 | |
| PR41+730.00 | PR41+720.00 | 10.00 | 9.21 | 12.42 | 10.81 | 108.10 | 1560 | 2.00% | 3372.72 | |
| PR41+720.00 | PR41+710.00 | 10.00 | 12.42 | 14.94 | 13.68 | 136.75 | 1560 | 2.00% | 4266.60 | |
| PR41+710.00 | PR41+700.00 | 10.00 | 14.94 | 15.54 | 15.24 | 152.35 | 1560 | 2.00% | 4753.32 | |
| PR41+700.00 | PR41+690.00 | 10.00 | 15.54 | 13.47 | 14.50 | 145.00 | 1560 | 2.00% | 4524.00 | |
| PR41+690.00 | PR41+680.00 | 10.00 | 13.47 | 10.91 | 12.19 | 121.85 | 1560 | 2.00% | 3801.72 | |
| PR41+680.00 | PR41+670.00 | 10.00 | 10.91 | 9.10 | 10.00 | 100.00 | 1560 | 2.00% | 3120.00 | |
| PR41+670.00 | PR41+660.00 | 10.00 | 9.10 | 6.34 | 7.72 | 77.15 | 1560 | 2.00% | 2407.08 | |
| PR41+660.00 | PR41+650.00 | 10.00 | 6.34 | 3.37 | 4.85 | 48.50 | 1560 | 2.00% | 1513.20 | |
| PR41+650.00 | PR41+640.00 | 10.00 | 3.37 | 0.27 | 1.82 | 18.15 | 1560 | 2.00% | 566.28 | |
| PR41+640.00 | PR41+630.00 | 10.00 | 0.27 | 1.15 | 0.71 | 7.05 | 1560 | 2.00% | 219.96 | |
| | | | | | | | | | **31817.76** | |
| PR41+170.00 | PR41+160.00 | 10.00 | 1.15 | 1.70 | 1.42 | 14.20 | 1560 | 2.00% | 443.04 | |
| PR41+160.00 | PR41+150.00 | 10.00 | 1.70 | 0.90 | 1.30 | 12.95 | 1560 | 2.00% | 404.04 | |
| PR41+150.00 | PR41+140.00 | 10.00 | 0.90 | 0.10 | 0.50 | 4.95 | 1560 | 2.00% | 154.44 | |
| | | | | | | | | | **1001.52** | |
| | | | | | | | | **TOTAL ESTABILIZADO AL 2%** | **132896.40** | |
| PR42+320.00 | PR42+310.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR42+310.00 | PR42+300.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR42+300.00 | PR42+290.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR42+290.00 | PR42+280.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR42+280.00 | PR42+270.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR42+270.00 | PR42+260.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR42+260.00 | PR42+250.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR42+250.00 | PR42+240.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR42+240.00 | PR42+230.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR42+230.00 | PR42+220.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR42+220.00 | PR42+210.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR42+210.00 | PR42+200.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR42+200.00 | PR42+190.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR42+190.00 | PR42+180.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR42+180.00 | PR42+170.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR42+170.00 | PR42+160.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR42+160.00 | PR42+150.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR42+150.00 | PR42+140.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR42+140.00 | PR42+130.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR42+130.00 | PR42+120.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR42+120.00 | PR42+110.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR42+110.00 | PR42+100.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR42+100.00 | PR42+090.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR42+090.00 | PR42+080.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR42+080.00 | PR42+070.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR42+070.00 | PR42+060.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR42+060.00 | PR42+050.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR42+050.00 | PR42+040.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR42+040.00 | PR42+030.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR42+030.00 | PR42+020.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR42+020.00 | PR42+010.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR42+010.00 | PR42+000.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR42+000.00 | PR41+990.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| | | | | | | | | | 00.00 | |
| PR41+990.00 | PR41+980.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+980.00 | PR41+970.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+970.00 | PR41+960.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | Carteras topográfica entregada por el profesional Camilo Sánchez |
| PR41+960.00 | PR41+950.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+950.00 | PR41+940.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+940.00 | PR41+930.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+930.00 | PR41+920.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+920.00 | PR41+910.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+910.00 | PR41+900.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+900.00 | PR41+890.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+890.00 | PR41+880.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+880.00 | PR41+870.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+870.00 | PR41+860.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+860.00 | PR41+850.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+850.00 | PR41+840.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+840.00 | PR41+830.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+830.00 | PR41+820.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+820.00 | PR41+810.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+810.00 | PR41+800.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+800.00 | PR41+790.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio ECOVISIÓN-190

**PREACTA DE OBRA NÚMERO: 08**

| PERIODO PRE-ACTA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| | 01/febrero/2022 | 28/febrero/2022 |

| No. DE ORDEN | DESCRIPCIÓN ÍTEM | CANTIDAD EJECUTADA | UND. |
|---|---|---|---|
| NP-2 | Suministro de Cal Viva | 313,545.60 | KG |

| ACTIVIDADES CAL | | | | | | | DIMENSIONES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INICIO | FIN | LONGITUD | AREA ABSCISA INICIO (m2) | AREA ABSCISA FIN (m2) | AREA PROMEDIO TERRAPLEN (m2) | VOLUMEN (m3) | DENSIDAD SUELO ESTABILIZADO | ESTABILIZACIÓN | SUMINISTRO CAL (kg) | OBSERVACIONES |
| PR41+790.00 | PR41+780.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+780.00 | PR41+770.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+770.00 | PR41+760.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+760.00 | PR41+750.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+750.00 | PR41+740.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+740.00 | PR41+730.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+730.00 | PR41+720.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+720.00 | PR41+710.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+710.00 | PR41+700.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+700.00 | PR41+690.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+690.00 | PR41+680.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+680.00 | PR41+670.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+670.00 | PR41+660.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+660.00 | PR41+650.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+650.00 | PR41+640.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+640.00 | PR41+630.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+630.00 | PR41+620.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+620.00 | PR41+610.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+610.00 | PR41+600.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+600.00 | PR41+590.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+590.00 | PR41+580.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+580.00 | PR41+570.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+570.00 | PR41+560.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+560.00 | PR41+550.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+550.00 | PR41+540.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+540.00 | PR41+530.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+530.00 | PR41+520.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+520.00 | PR41+510.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+510.00 | PR41+500.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+500.00 | PR41+490.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+490.00 | PR41+480.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+480.00 | PR41+470.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+470.00 | PR41+460.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+460.00 | PR41+450.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+450.00 | PR41+440.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+440.00 | PR41+430.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+430.00 | PR41+420.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+420.00 | PR41+410.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+410.00 | PR41+400.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+400.00 | PR41+390.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+390.00 | PR41+380.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+380.00 | PR41+370.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+370.00 | PR41+360.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+360.00 | PR41+350.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+350.00 | PR41+340.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+340.00 | PR41+330.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+330.00 | PR41+320.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+320.00 | PR41+310.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+310.00 | PR41+300.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+300.00 | PR41+290.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+290.00 | PR41+280.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+280.00 | PR41+270.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+270.00 | PR41+260.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+260.00 | PR41+250.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+250.00 | PR41+240.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+240.00 | PR41+230.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+230.00 | PR41+220.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+220.00 | PR41+210.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+210.00 | PR41+200.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+200.00 | PR41+190.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+190.00 | PR41+180.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+180.00 | PR41+170.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+170.00 | PR41+160.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| PR41+160.00 | PR41+150.00 | 10.00 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 26.75 | 1560 | 3.70% | 1544.01 | |
| | | | | | | | | TOTAL ESTABILIZADO AL 3.7% | 180649 | |
| | | | | | | | | TOTAL | 313,545.60 | |

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Consorcio ECOVISIÓN-190

**PREACTA DE OBRA NÚMERO: 08**

| PERIODO PRE-ACTA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| | 01/febrero/2022 | 28/febrero/2022 |

| No. DE ORDEN | DESCRIPCIÓN ÍTEM | CANTIDAD EJECUTADA | UND. |
|---|---|---|---|
| NP-2 | Suministro de Cal Viva | 313,545.60 | KG |

| ACTIVIDADES CAL | | | | | | | DIMENSIONES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INICIO | FIN | LONGITUD | AREA ABSCISA INICIO (m2) | AREA ABSCISA FIN (m2) | AREA PROMEDIO TERRAPLEN (m2) | VOLUMEN (m3) | DENSIDAD SUELO ESTABILIZADO | ESTABILIZACIÓN | SUMINISTRO CAL (kg) | OBSERVACIONES |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO.**



PR



PR41+180



PR41+670



PR41+420



PR41+680



PR41+680

| | | |
|---|---|---|
| FIRMA | | |
| NOMBRE | EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA | OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ |
| CARGO | DIRECTOR DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA |
| ENTIDAD | CONSORCIO DSC | CONSORCIO ECOVISIÓN 190 |

| CONTRATISTA: CONSORCIO DSC. | CONTRATO 976-2021<br>OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" | INTERVENTOR |
|---|---|---|

**PREACTA DE OBRA NÚMERO: 08**

| PERIODO PRE-ACTA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| | 01/febrero/2022 | 28/febrero/2022 |

| No. DE ORDEN | DESCRIPCIÓN ÍTEM | CANTIDAD EJECUTADA | UND. |
|---|---|---|---|
| NP-3 | Mejoramiento de la Subrasante con Cal Viva, no incluye suministro de Cal ni transporte. (Con material de prestamo). | 7,390.00 | m3 |

| ABSCISAS | | DIMENSIONES | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INICIO | FIN | LONGITUD (m) | AREA ABSCISA INICIO (m2) | AREA ABSCISA FIN (m2) | AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2) | CANTIDAD (m3) | |
| PR42+320 | PR42+310 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | 3.70% |
| PR42+310 | PR42+300 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR42+300 | PR42+290 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR42+290 | PR42+280 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR42+280 | PR42+270 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR42+270 | PR42+260 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR42+260 | PR42+250 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR42+250 | PR42+240 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR42+240 | PR42+230 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR42+230 | PR42+220 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR42+220 | PR42+210 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR42+210 | PR42+200 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR42+200 | PR42+190 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR42+190 | PR42+180 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR42+180 | PR42+170 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR42+170 | PR42+160 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR42+160 | PR42+150 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR42+150 | PR42+140 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR42+140 | PR42+130 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR42+130 | PR42+120 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR42+120 | PR42+110 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR42+110 | PR42+100 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR42+100 | PR42+090 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR42+090 | PR42+080 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR42+080 | PR42+070 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR42+070 | PR42+060 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR42+060 | PR42+050 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR42+050 | PR42+040 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR42+040 | PR42+030 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR42+030 | PR42+020 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR42+020 | PR42+010 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR42+010 | PR42+000 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR42+000 | PR41+990 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+990 | PR41+980 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+980 | PR41+970 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+970 | PR41+960 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+960 | PR41+950 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+950 | PR41+940 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+940 | PR41+930 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+930 | PR41+920 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+920 | PR41+910 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+910 | PR41+900 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+900 | PR41+890 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+890 | PR41+880 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+880 | PR41+870 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+870 | PR41+860 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+860 | PR41+850 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+850 | PR41+840 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+840 | PR41+830 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+830 | PR41+820 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+820 | PR41+810 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+810 | PR41+800 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+800 | PR41+790 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+790 | PR41+780 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+780 | PR41+770 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+770 | PR41+760 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |

| CONTRATISTA: CONSORCIO DSC. | CONTRATO 976-2021<br>OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" | INTERVENTOR |
|---|---|---|

**PREACTA DE OBRA NÚMERO: 08**

| PERIODO PRE-ACTA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| | 01/febrero/2022 | 28/febrero/2022 |

| No. DE ORDEN | DESCRIPCIÓN ÍTEM | CANTIDAD EJECUTADA | UND. |
|---|---|---|---|
| NP-3 | Mejoramiento de la Subrasante con Cal Viva, no incluye suministro de Cal ni transporte. (Con material de prestamo). | 7,390.00 | m3 |

| ABSCISAS | | DIMENSIONES | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INICIO | FIN | LONGITUD (m) | AREA ABSCISA INICIO (m2) | AREA ABSCISA FIN (m2) | AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2) | CANTIDAD (m3) | |
| PR41+760 | PR41+750 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+750 | PR41+740 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+740 | PR41+730 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+730 | PR41+720 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+720 | PR41+710 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+710 | PR41+700 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+700 | PR41+690 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+690 | PR41+680 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+680 | PR41+670 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+670 | PR41+660 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+660 | PR41+650 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+650 | PR41+640 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+640 | PR41+630 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+630 | PR41+620 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+620 | PR41+610 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+610 | PR41+600 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+600 | PR41+590 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+590 | PR41+580 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+580 | PR41+570 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+570 | PR41+560 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+560 | PR41+550 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+550 | PR41+540 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+540 | PR41+530 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+530 | PR41+520 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+520 | PR41+510 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+510 | PR41+500 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+500 | PR41+490 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+490 | PR41+480 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+480 | PR41+470 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+470 | PR41+460 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+460 | PR41+450 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+450 | PR41+440 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+440 | PR41+430 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+430 | PR41+420 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+420 | PR41+410 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+410 | PR41+400 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+400 | PR41+390 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+390 | PR41+380 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+380 | PR41+370 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+370 | PR41+360 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+360 | PR41+350 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+350 | PR41+340 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+340 | PR41+330 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+330 | PR41+320 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+320 | PR41+310 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+310 | PR41+300 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+300 | PR41+290 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+290 | PR41+280 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+280 | PR41+270 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+270 | PR41+260 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+260 | PR41+250 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+250 | PR41+240 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+240 | PR41+230 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+230 | PR41+220 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+220 | PR41+210 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |

| CONTRATISTA: CONSORCIO DSC. | CONTRATO 976-2021<br>OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" | INTERVENTOR |
|---|---|---|

**PREACTA DE OBRA NÚMERO: 08**

| PERIODO PRE-ACTA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| | 01/febrero/2022 | 28/febrero/2022 |

| No. DE ORDEN | DESCRIPCIÓN ÍTEM | CANTIDAD EJECUTADA | UND. |
|---|---|---|---|
| NP-3 | Mejoramiento de la Subrasante con Cal Viva, no incluye suministro de Cal ni transporte. (Con material de prestamo). | 7,390.00 | m3 |

| ABSCISAS | | DIMENSIONES | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INICIO | FIN | LONGITUD (m) | AREA ABSCISA INICIO (m2) | AREA ABSCISA FIN (m2) | AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2) | CANTIDAD (m3) | |
| PR41+210 | PR41+200 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+200 | PR41+190 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+190 | PR41+180 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+180 | PR41+170 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+170 | PR41+160 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| PR41+160 | PR41+150 | 10.00 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 26.63 | |
| | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | | 0.00 | |
| | | | | | SUMA TOTAL ESTABILIZADO AL 3.7% | 3,115.00 | |



PR42+290



PR42+210



PR41+720



PR41+630

| FIRMA | | FIRMA | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA | NOMBRE | OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ |
| CARGO | DIRECTOR DE OBRA | CARGO | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA |
| ENTIDAD | CONSORCIO DSC | ENTIDAD | CONSORCIO ECOVISIÓN 190 |

| CONTRATISTA: CONSORCIO DSC. | CONTRATO 976-2021<br>OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" | INTERVENTOR |
|---|---|---|

**PREACTA DE OBRA NÚMERO: 08**

| PERIODO PRE-ACTA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| | 01/febrero/2022 | 28/febrero/2022 |

| No. DE ORDEN | DESCRIPCIÓN ÍTEM | CANTIDAD EJECUTADA | UND. |
|---|---|---|---|
| NP-3 | Mejoramiento de la Subrasante con Cal Viva, no incluye suministro de Cal ni transporte. (Con material de préstamo). | 7,390.00 | m3 |

| ABSCISAS | | DIMENSIONES | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INICIO | FIN | LONGITUD (m) | AREA ABSCISA INICIO (m2) | AREA ABSCISA FIN (m2) | AREA PROMEDIO TERRAPLEN (m2) | CANTIDAD (m3) | |
| PR42+310 | PR42+300 | 10.00 | 1.48 | 4.66 | 3.07 | 30.65 | Según carteras topográficas entregadas por el profesional Camilo Sánchez |
| PR42+300 | PR42+290 | 10.00 | 4.66 | 7.53 | 6.09 | 60.90 | |
| PR42+290 | PR42+280 | 10.00 | 7.53 | 9.22 | 8.37 | 83.70 | |
| PR42+280 | PR42+270 | 10.00 | 9.22 | 9.23 | 9.22 | 92.20 | |
| PR42+270 | PR42+260 | 10.00 | 9.23 | 7.63 | 8.43 | 84.25 | |
| PR42+260 | PR42+250 | 10.00 | 7.63 | 4.53 | 6.08 | 60.75 | |
| PR42+250 | PR42+240 | 10.00 | 4.53 | 0.76 | 2.64 | 26.40 | |
| PR42+240 | PR42+230 | 10.00 | 0.76 | 2.83 | 1.79 | 17.90 | |
| PR42+070 | PR42+060 | 10.00 | 2.83 | 10.42 | 6.62 | 66.20 | |
| PR42+060 | PR42+050 | 10.00 | 10.42 | 20.68 | 15.55 | 155.45 | |
| PR42+050 | PR42+040 | 10.00 | 20.68 | 28.19 | 24.43 | 244.30 | |
| PR42+040 | PR42+030 | 10.00 | 28.19 | 57.05 | 42.62 | 426.15 | |
| PR42+030 | PR42+020 | 10.00 | 57.05 | 54.06 | 55.55 | 555.50 | |
| PR42+020 | PR42+010 | 10.00 | 54.06 | 31.26 | 42.66 | 426.55 | |
| PR42+010 | PR42+000 | 10.00 | 31.26 | 22.46 | 26.86 | 268.55 | |
| PR42+000 | PR41+990 | 10.00 | 22.46 | 19.20 | 20.83 | 208.25 | |
| PR41+990 | PR41+980 | 10.00 | 19.20 | 14.33 | 16.76 | 167.60 | |
| PR41+980 | PR41+970 | 10.00 | 14.33 | 9.75 | 12.04 | 120.35 | |
| PR41+970 | PR41+960 | 10.00 | 9.75 | 5.45 | 7.60 | 75.95 | |
| PR41+960 | PR41+950 | 10.00 | 5.45 | 1.76 | 3.60 | 36.00 | |
| PR41+950 | PR41+940 | 10.00 | 1.76 | 1.37 | 1.56 | 15.60 | |
| PR41+750 | PR41+740 | 10.00 | 1.37 | 5.21 | 3.29 | 32.85 | |
| PR41+740 | PR41+730 | 10.00 | 5.21 | 9.21 | 7.21 | 72.05 | |
| PR41+730 | PR41+720 | 10.00 | 9.21 | 12.42 | 10.81 | 108.10 | |
| PR41+720 | PR41+710 | 10.00 | 12.42 | 14.94 | 13.68 | 136.75 | |
| PR41+710 | PR41+700 | 10.00 | 14.94 | 15.54 | 15.24 | 152.35 | |
| PR41+700 | PR41+690 | 10.00 | 15.54 | 13.47 | 14.50 | 145.00 | |
| PR41+690 | PR41+680 | 10.00 | 13.47 | 10.91 | 12.19 | 121.85 | |
| PR41+680 | PR41+670 | 10.00 | 10.91 | 9.10 | 10.00 | 100.00 | |
| PR41+670 | PR41+660 | 10.00 | 9.10 | 6.34 | 7.72 | 77.15 | |
| PR41+660 | PR41+650 | 10.00 | 6.34 | 3.37 | 4.85 | 48.50 | |
| PR41+650 | PR41+640 | 10.00 | 3.37 | 0.27 | 1.82 | 18.15 | |
| PR41+640 | PR41+630 | 10.00 | 0.27 | 1.15 | 0.71 | 7.05 | |
| PR41+170 | PR41+160 | 10.00 | 1.15 | 1.70 | 1.42 | 14.20 | |
| PR41+160 | PR41+150 | 10.00 | 1.70 | 0.90 | 1.30 | 12.95 | |
| PR41+150 | PR41+140 | 10.00 | 0.90 | 0.10 | 0.50 | 4.95 | |
| | | | | | SUMA TOTAL ESTABILIZADO AL 2.0% | 4,275.00 | |
| | | | | | VOLUMEN TOTAL | 7,390.00 | |

| CONTRATISTA: CONSORCIO DSC. | CONTRATO 976-2021<br>OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" | INTERVENTOR |
|---|---|---|

**PREACTA DE OBRA NÚMERO: 08**

| PERIODO PRE-ACTA | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| | 01/febrero/2022 | 28/febrero/2022 |

| No. DE ORDEN | DESCRIPCIÓN ÍTEM | CANTIDAD EJECUTADA | UND. |
|---|---|---|---|
| NP-3 | Mejoramiento de la Subrasante con Cal Viva, no incluye suministro de Cal ni transporte. (Con material de préstamo). | 7,390.00 | m3 |

| ABSCISAS | | DIMENSIONES | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INICIO | FIN | LONGITUD (m) | AREA ABSCISA INICIO (m2) | AREA ABSCISA FIN (m2) | AREA PROMEDIO TERRAPLEN (m2) | CANTIDAD (m3) | |



PR42+330



PR41+370



PR41+270



PR42+230

| FIRMA | | FIRMA | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA | NOMBRE | OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ |
| CARGO | DIRECTOR DE OBRA | CARGO | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA |
| ENTIDAD | CONSORCIO DSC | ENTIDAD | CONSORCIO ECOVISIÓN 190 |
