CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA NÚMERO:12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM		CANTIDAD EJECUTADA	UND.
1	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas		0.40	Ha

ABSCISAS		DIMENSIONES						OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	COSTADO	CANTIDAD (Ha)	VOLUMEN (m3)	
PR37+190	PR36+870	320.00	2.00	0.20	DERECHO	0.064	128.00	
PR37+190	PR36+750	440.00	1.80	0.20	IZQUIERDO	0.079	158.40	
PR36+870	PR36+350	520.00	3.00	0.20	DERECHO	0.156	312.00	
PR36+650	PR36+350	300.00	2.00	0.20	IZQUIERDO	0.060	120.00	
					TOTAL Ha		0.40	
					TOTAL M3		718.40	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.



PR37+190



PR36+870





PR36+750





PR36+650

FIRMA		
NOMBRE	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA	OSCAR ALVARADO DIAZ
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
2	Demolición de Estructuras	82.90	m3

ABSCISAS	DIMENSIONES										
INICIO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	ESPESOR (m)	ÁREA TUBO (m2)	MURO 1 (m)	MURO 2 (m)	ÁREA (m2)	CANTIDAD (und)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
	5.00	1.50	1.10		0.55					3.50	Atraque tubería
PR40+040	5.00	1.50	0.20							1.50	Placa sobre tuberia
	5.00	1.50	1.10		0.95					3.50	Atraque tubería
PR39+850	5.00	1.50	0.20							1.50	Placa sobre tuberia
	1.10	2.50		0.25						0.69	Zarpa descole
		2.10	1.55	0.20					2.00	1.30	Aletas de descole
		1.50	1.84	0.20	0.95					0.36	Cabezal descole
		1.50	0.25	0.20						0.08	Guardarueda descole
	9.50	1.50	1.30		0.95					9.50	Atraque tubería
	1.16		1.60							1.86	Caja de encole
		1.90	0.25	0.20						0.10	Guardarueda de encole
		1.90	1.40	0.25						0.67	Piso de caja del encole
PR37+270	9.50	1.50	0.20							2.85	Placa sobre tuberia
	1.40	2.60		0.25						0.91	Zarpa descole
		1.40	2.60	0.20					1.00	0.73	Aletas de descole
		1.10	2.10	0.20					1.00	0.46	Aletas de descole
		1.10	1.70	0.20	0.95					0.18	Cabezal descole
		1.10	0.20	0.20						0.04	Guardarueda descole
	11.50	1.50	0.37		0.30					2.93	Atraque tubería a 1/3 de tubo
	1.16		1.70							1.97	Caja de encole
		1.90	0.20	0.20						0.08	Guardarueda de encole
PR37+430		1.90	1.40	0.25						0.67	Piso de caja del encole
	1.57	1.00	1.04	0.30						0.40	Zarpa descole
		1.50	0.80	0.20					2.00	0.48	Aletas de descole
		1.40	0.30	0.20						0.08	Guardarueda descole
	10.00	1.40	1.40			1.00	1.00	1.00		9.60	Paredes box - Paredes internas son de 1.0x1.00
	1.20		1.40							1.68	Caja de encole
		1.90	0.20	0.20						0.08	Guardarueda de encole
		1.90	1.40	0.25						0.67	Piso de caja del encole
PR37+150		1.90	0.30	0.20						0.11	Guardarueda encole
PR39+745	4.00	1.50	1.25			1.00	1.00	1.00		3.50	Paredes box - Paredes internas son de 1.0x1.00
		1.70	0.85	0.20					2.00	0.58	Aletas de descole
PR39+510	5.00	1.50	1.10		0.95					3.50	Atraque tubería
	2.85	1.40	0.20							0.80	Zarpa descole
		1.30	1.50	0.20	0.95					0.20	Cabezal descole
		1.70	0.85	0.20					2.00	0.58	Aletas de descole
		1.40	0.20	0.20						0.06	Guardarueda descole
		1.30	1.50	0.20	0.95					0.20	Cabezal encole
		1.70	0.85	0.20					2.00	0.58	Aletas de encole
		2.85	1.40	0.20						0.80	Piso de caja del encole
	10.00	1.50	1.10		0.95					7.00	Atraque tubería
PR39+850	10.00	1.50	0.20							3.00	Placa sobre tuberia
	3.00	1.50	0.20							0.90	Zarpa descole
		1.30	1.50	0.20	0.95					0.20	Cabezal descole
		1.90	0.85	0.20					2.00	0.65	Aletas de descole
		1.40	0.20	0.20						0.06	Guardarueda encole
		1.50	1.10	0.20						0.33	Cabezal encole
		1.90	0.85	0.20					2.00	0.65	Aletas de encole
		3.00	1.50	0.20						0.90	Zarpa de caja del encole
	10.00	1.50	1.10		0.95					7.00	Atraque tubería

PR40+030	10.00	1.50	0.20							3.00	Placa sobre tuberia
									TOTAL	**82.90**	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

DEMOLICIÓN DE ALCANTARILLA DEL PR37+430







DEMOLICIÓN DE ALCANTARILLA DEL PR37+270







DEMOLICIÓN DE BOX CULVERT DE PR37+150








ALCANTARILLA PR39+510





BOX CULVERT PR39+745



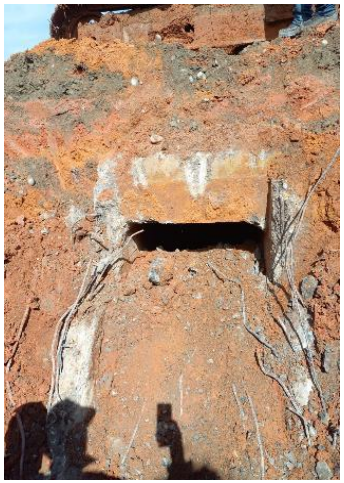

BOX CULVERT PR40+040



FIRMA		
NOMBRE	**EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA**	**OSCAR ALVARADO DIAZ**
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
3	Remoción de alcantarillas	32.00	ml

ALCANTARILLAS	DIMENSIONES					OBSERVACIONES
ABSCISA	CANTIDAD	LARGO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	LONGITUD (m)	
PR37+270	10.00				10.00	
PR37+430	12.00				12.00	
PR39+850	5.00				5.00	
PR40+040	5.00				5.00	
				TOTAL	32.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

REMOCIÓN DE ALCANTARILLA PR37+430







REMOCIÓN DE ALCANTARILLA PR37+270



REMOCIÓN DE ALCANTARILLA PR39+850



FIRMA		
NOMBRE	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
5	Excavación sin clasificar de préstamos	1,138.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR38+050.00	PR38+040.00	10.00	1.25	1.25	1.25	12.50	
PR38+040.00	PR38+030.00	10.00	1.25	1.25	1.25	12.50	
PR38+030.00	PR38+020.00	10.00	1.25	1.25	1.25	12.50	
PR38+020.00	PR38+010.00	10.00	1.25	1.25	1.25	12.50	
PR38+010.00	PR38+000.00	10.00	1.25	1.94	1.60	15.96	
PR38+000.00	PR37+990.00	10.00	1.94	1.57	1.76	17.57	
PR37+990.00	PR37+980.00	10.00	1.57	1.63	1.60	16.01	
PR37+980.00	PR37+970.00	10.00	1.63	1.62	1.62	16.23	
PR37+970.00	PR37+960.00	10.00	1.62	1.49	1.55	15.51	
PR37+960.00	PR37+950.00	10.00	1.49	1.87	1.68	16.76	
PR37+950.00	PR37+940.00	10.00	1.87	1.50	1.68	16.82	
PR37+940.00	PR37+930.00	10.00	1.50	1.66	1.58	15.78	
PR37+930.00	PR37+920.00	10.00	1.66	1.25	1.45	14.54	
PR37+800.00	PR37+790.00	10.00	0.20	0.73	0.46	4.64	
PR37+790.00	PR37+780.00	10.00	0.73	1.05	0.89	8.88	
PR37+780.00	PR37+770.00	10.00	1.05	2.17	1.61	16.10	
PR37+770.00	PR37+760.00	10.00	2.17	1.30	1.74	17.36	
PR37+760.00	PR37+750.00	10.00	1.30	1.15	1.23	12.26	
PR37+750.00	PR37+740.00	10.00	1.15	1.85	1.50	15.03	
PR37+740.00	PR37+730.00	10.00	1.85	0.61	1.23	12.33	
PR37+730.00	PR37+720.00	10.00	0.61	0.72	0.66	6.65	
PR37+720.00	PR37+710.00	10.00	0.72	0.54	0.63	6.30	
PR37+710.00	PR37+700.00	10.00	0.54	0.53	0.54	5.37	
PR37+700.00	PR37+690.00	10.00	0.53	0.51	0.52	5.21	
PR37+690.00	PR37+680.00	10.00	0.51	0.00	0.26	2.55	
PR37+470.00	PR37+460.00	10.00	0.31	0.70	0.50	5.04	
PR37+460.00	PR37+450.00	10.00	0.70	1.08	0.89	8.90	
PR37+450.00	PR37+440.00	10.00	1.08	2.65	1.86	18.62	
PR37+440.00	PR37+430.00	10.00	2.65	2.68	2.66	26.61	
PR37+430.00	PR37+420.00	10.00	2.68	1.66	2.17	21.69	
PR37+420.00	PR37+410.00	10.00	1.66	2.11	1.89	18.86	
PR37+410.00	PR37+400.00	10.00	2.11	0.76	1.44	14.36	
PR37+400.00	PR37+390.00	10.00	0.76	0.29	0.53	5.25	
PR37+390.00	PR37+380.00	10.00	0.29	0.19	0.24	2.39	
PR37+380.00	PR37+370.00	10.00	0.19	0.16	0.17	1.74	
PR37+370.00	PR37+360.00	10.00	0.16	0.14	0.15	1.49	
PR37+360.00	PR37+350.00	10.00	0.14	0.23	0.18	1.83	
PR37+350.00	PR37+340.00	10.00	0.23	0.40	0.31	3.12	
PR37+340.00	PR37+330.00	10.00	0.40	0.37	0.38	3.84	
PR37+330.00	PR37+320.00	10.00	0.37	1.25	0.81	8.12	
PR37+320.00	PR37+310.00	10.00	1.25	0.58	0.92	9.15	
PR37+310.00	PR37+300.00	10.00	0.58	0.32	0.45	4.49	
PR37+300.00	PR37+290.00	10.00	0.32	0.44	0.38	3.77	
PR37+290.00	PR37+280.00	10.00	0.44	1.20	0.82	8.19	Vo. Correspondientes a cajeos
PR37+280.00	PR37+270.00	10.00	1.20	2.12	1.66	16.62	
PR37+270.00	PR37+260.00	10.00	2.12	1.41	1.76	17.64	
PR37+260.00	PR37+250.00	10.00	1.41	1.01	1.21	12.06	
PR37+250.00	PR37+240.00	10.00	1.01	0.60	0.80	8.03	
PR37+240.00	PR37+230.00	10.00	0.60	0.23	0.42	4.17	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
5	Excavación sin clasificar de préstamos	1,138.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR37+230.00	PR37+220.00	10.00	0.23	0.09	0.16	1.61	
PR37+220.00	PR37+210.00	10.00	0.09	0.04	0.06	0.65	
PR37+210.00	PR37+200.00	10.00	0.04	0.03	0.04	0.38	
PR37+200.00	PR37+190.00	10.00	0.03	0.35	0.19	1.92	
PR37+190.00	PR37+180.00	10.00	0.35	0.78	0.56	5.64	
PR37+180.00	PR37+170.00	10.00	0.78	0.35	0.56	5.64	
PR37+170.00	PR37+160.00	10.00	0.35	0.44	0.40	3.96	
PR37+160.00	PR37+150.00	10.00	0.44	1.55	1.00	9.98	
PR37+150.00	PR37+140.00	10.00	1.55	2.30	1.92	19.25	
PR37+140.00	PR37+130.00	10.00	2.30	2.07	2.18	21.84	
PR37+130.00	PR37+120.00	10.00	2.07	1.88	1.98	19.79	
PR37+120.00	PR37+110.00	10.00	1.88	1.74	1.81	18.11	
PR37+110.00	PR37+100.00	10.00	1.74	1.25	1.49	14.94	
PR37+100.00	PR37+090.00	10.00	1.25	1.10	1.18	11.78	
PR37+090.00	PR37+080.00	10.00	1.10	1.16	1.13	11.34	
PR37+080.00	PR37+070.00	10.00	1.16	1.37	1.26	12.65	
PR37+070.00	PR37+060.00	10.00	1.37	3.25	2.31	23.07	
PR37+060.00	PR37+050.00	10.00	3.25	3.61	3.43	34.28	
PR37+050.00	PR37+040.00	10.00	3.61	4.11	3.86	38.60	
PR37+040.00	PR37+030.00	10.00	4.11	4.68	4.40	43.98	
PR37+030.00	PR37+020.00	10.00	4.68	5.04	4.86	48.60	
PR37+020.00	PR37+010.00	10.00	5.04	4.94	4.99	49.86	
PR37+010.00	PR37+000.00	10.00	4.94	4.93	4.93	49.32	
PR37+000.00	PR36+990.00	10.00	3.37	2.88	3.12	31.25	
PR36+990.00	PR36+980.00	10.00	2.88	2.67	2.78	27.75	
PR36+980.00	PR36+970.00	10.00	2.67	2.22	2.44	24.44	
PR36+970.00	PR36+960.00	10.00	2.22	1.82	2.02	20.16	
PR36+960.00	PR36+950.00	10.00	1.82	1.12	1.47	14.66	
PR36+950.00	PR36+940.00	10.00	1.12	0.65	0.88	8.81	
PR36+940.00	PR36+930.00	10.00	0.65	0.31	0.48	4.76	
PR36+930.00	PR36+920.00	10.00	0.31	0.11	0.21	2.07	
PR36+920.00	PR36+910.00	10.00	0.11	0.01	0.06	0.59	
PR36+910.00	PR36+900.00	10.00	0.01	0.00	0.00	0.05	
PR36+820.00	PR36+810.00	10.00	0.02	0.20	0.11	1.10	
PR36+810.00	PR36+800.00	10.00	0.20	0.31	0.25	2.54	
PR36+800.00	PR36+790.00	10.00	0.31	0.37	0.34	3.42	
PR36+790.00	PR36+780.00	10.00	0.37	0.44	0.41	4.08	
PR36+780.00	PR36+770.00	10.00	0.44	0.33	0.39	3.86	
PR36+770.00	PR36+760.00	10.00	0.33	0.34	0.33	3.33	
PR36+760.00	PR36+750.00	10.00	0.34	0.47	0.41	4.07	
					TOTAL	1,138.00	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
5	Excavación sin clasificar de préstamos	1,138.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO.



PR37+040



PR37+150



PR37+000



PR38+050

FIRMA		
NOMBRE	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
6	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	2,654.00	m3

ABSCISAS			DIMENSIONES				
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR38+050.00	PR38+040.00	10.00	2.91	2.91	2.91	29.10	
PR38+040.00	PR38+030.00	10.00	2.91	2.91	2.91	29.10	
PR38+030.00	PR38+020.00	10.00	2.91	2.91	2.91	29.10	
PR38+020.00	PR38+010.00	10.00	2.91	2.91	2.91	29.10	
PR38+010.00	PR38+000.00	10.00	2.91	4.53	3.72	37.20	
PR38+000.00	PR37+990.00	10.00	4.53	3.67	4.10	40.99	
PR37+990.00	PR37+980.00	10.00	3.67	3.80	3.73	37.35	
PR37+980.00	PR37+970.00	10.00	3.80	3.77	3.79	37.87	
PR37+970.00	PR37+960.00	10.00	3.77	3.47	3.62	36.19	
PR37+960.00	PR37+950.00	10.00	3.47	4.35	3.91	39.10	
PR37+950.00	PR37+940.00	10.00	4.35	3.49	3.92	39.24	
PR37+940.00	PR37+930.00	10.00	3.49	3.87	3.68	36.82	
PR37+930.00	PR37+920.00	10.00	3.87	2.91	3.39	33.92	
						0.00	
PR37+800.00	PR37+790.00	10.00	0.46	1.70	1.08	10.82	
PR37+790.00	PR37+780.00	10.00	1.70	2.44	2.07	20.72	
PR37+780.00	PR37+770.00	10.00	2.44	5.07	3.76	37.56	
PR37+770.00	PR37+760.00	10.00	5.07	3.03	4.05	40.50	
PR37+760.00	PR37+750.00	10.00	3.03	2.69	2.86	28.60	
PR37+750.00	PR37+740.00	10.00	2.69	4.33	3.51	35.07	
PR37+740.00	PR37+730.00	10.00	4.33	1.43	2.88	28.77	
PR37+730.00	PR37+720.00	10.00	1.43	1.67	1.55	15.51	
PR37+720.00	PR37+710.00	10.00	1.67	1.27	1.47	14.70	
PR37+710.00	PR37+700.00	10.00	1.27	1.24	1.25	12.53	
PR37+700.00	PR37+690.00	10.00	1.24	1.19	1.21	12.15	
PR37+690.00	PR37+680.00	10.00	1.19	0.00	0.60	5.95	
						0.00	
PR37+470.00	PR37+460.00	10.00	0.71	1.64	1.18	11.76	
PR37+460.00	PR37+450.00	10.00	1.64	2.51	2.08	20.76	
PR37+450.00	PR37+440.00	10.00	2.51	6.17	4.34	43.44	
PR37+440.00	PR37+430.00	10.00	6.17	6.24	6.21	62.09	
PR37+430.00	PR37+420.00	10.00	6.24	3.88	5.06	50.61	
PR37+420.00	PR37+410.00	10.00	3.88	4.92	4.40	44.00	
PR37+410.00	PR37+400.00	10.00	4.92	1.78	3.35	33.50	
PR37+400.00	PR37+390.00	10.00	1.78	0.67	1.23	12.25	
PR37+390.00	PR37+380.00	10.00	0.67	0.44	0.56	5.57	
PR37+380.00	PR37+370.00	10.00	0.44	0.37	0.41	4.06	
PR37+370.00	PR37+360.00	10.00	0.37	0.32	0.35	3.47	
PR37+360.00	PR37+350.00	10.00	0.32	0.53	0.43	4.27	
PR37+350.00	PR37+340.00	10.00	0.53	0.92	0.73	7.28	
PR37+340.00	PR37+330.00	10.00	0.92	0.87	0.90	8.96	
PR37+330.00	PR37+320.00	10.00	0.87	2.92	1.89	18.94	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
6	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	2,654.00	m3

ABSCISAS			DIMENSIONES				
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR37+320.00	PR37+310.00	10.00	2.92	1.35	2.14	21.35	
PR37+310.00	PR37+300.00	10.00	1.35	0.74	1.05	10.47	
PR37+300.00	PR37+290.00	10.00	0.74	1.02	0.88	8.79	
PR37+290.00	PR37+280.00	10.00	1.02	2.81	1.91	19.11	Vo. Correspondientes a cajeos
PR37+280.00	PR37+270.00	10.00	2.81	4.95	3.88	38.78	
PR37+270.00	PR37+260.00	10.00	4.95	3.28	4.12	41.16	
PR37+260.00	PR37+250.00	10.00	3.28	2.35	2.81	28.14	
PR37+250.00	PR37+240.00	10.00	2.35	1.40	1.87	18.73	
PR37+240.00	PR37+230.00	10.00	1.40	0.55	0.97	9.73	
PR37+230.00	PR37+220.00	10.00	0.55	0.20	0.37	3.75	
PR37+220.00	PR37+210.00	10.00	0.20	0.10	0.15	1.51	
PR37+210.00	PR37+200.00	10.00	0.10	0.08	0.09	0.88	
PR37+200.00	PR37+190.00	10.00	0.08	0.82	0.45	4.48	
PR37+190.00	PR37+180.00	10.00	0.82	1.81	1.32	13.16	
PR37+180.00	PR37+170.00	10.00	1.81	0.82	1.32	13.16	
PR37+170.00	PR37+160.00	10.00	0.82	1.03	0.92	9.24	
PR37+160.00	PR37+150.00	10.00	1.03	3.63	2.33	23.28	
PR37+150.00	PR37+140.00	10.00	3.63	5.36	4.49	44.91	
PR37+140.00	PR37+130.00	10.00	5.36	4.84	5.10	50.96	
PR37+130.00	PR37+120.00	10.00	4.84	4.40	4.62	46.17	
PR37+120.00	PR37+110.00	10.00	4.40	4.05	4.22	42.25	
PR37+110.00	PR37+100.00	10.00	4.05	2.92	3.49	34.86	
PR37+100.00	PR37+090.00	10.00	2.92	2.58	2.75	27.48	
PR37+090.00	PR37+080.00	10.00	2.58	2.72	2.65	26.46	
PR37+080.00	PR37+070.00	10.00	2.72	3.19	2.95	29.51	
PR37+070.00	PR37+060.00	10.00	3.19	7.58	5.38	53.83	
PR37+060.00	PR37+050.00	10.00	7.58	8.41	8.00	79.98	
PR37+050.00	PR37+040.00	10.00	8.41	9.60	9.01	90.06	
PR37+040.00	PR37+030.00	10.00	9.60	10.93	10.26	102.62	
PR37+030.00	PR37+020.00	10.00	10.93	11.75	11.34	113.40	
PR37+020.00	PR37+010.00	10.00	11.75	11.52	11.63	116.34	
PR37+010.00	PR37+000.00	10.00	11.52	11.50	11.51	115.08	
PR37+000.00	PR36+990.00	10.00	7.86	6.72	7.29	72.91	
PR36+990.00	PR36+980.00	10.00	6.72	6.23	6.48	64.75	
PR36+980.00	PR36+970.00	10.00	6.23	5.17	5.70	57.02	
PR36+970.00	PR36+960.00	10.00	5.17	4.24	4.70	47.04	
PR36+960.00	PR36+950.00	10.00	4.24	2.60	3.42	34.20	
PR36+950.00	PR36+940.00	10.00	2.60	1.51	2.05	20.55	
PR36+940.00	PR36+930.00	10.00	1.51	0.71	1.11	11.10	
PR36+930.00	PR36+920.00	10.00	0.71	0.25	0.48	4.83	
PR36+920.00	PR36+910.00	10.00	0.25	0.02	0.14	1.37	
PR36+910.00	PR36+900.00	10.00	0.02	0.00	0.01	0.11	
PR36+820.00	PR36+810.00	10.00	0.06	0.46	0.26	2.56	
PR36+810.00	PR36+800.00	10.00	0.46	0.73	0.59	5.92	
PR36+800.00	PR36+790.00	10.00	0.73	0.87	0.80	7.98	
PR36+790.00	PR36+780.00	10.00	0.87	1.04	0.95	9.52	
PR36+780.00	PR36+770.00	10.00	1.04	0.76	0.90	9.00	
PR36+770.00	PR36+760.00	10.00	0.76	0.79	0.78	7.77	
PR36+760.00	PR36+750.00	10.00	0.79	1.11	0.95	9.49	
					TOTAL	2,654.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.



PR38+050



PR37+150

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
6	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	2,654.00	m3

ABSCISAS			DIMENSIONES				
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES



PR37+800



PR37+430



PR37+990

FIRMA		
NOMBRE	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
12	Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)	8,768.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO TERRAPLEN (m2)	VOLUMEN (m3)	
PR40+400	PR40+390	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR40+390	PR40+380	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR40+380	PR40+370	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR40+370	PR40+360	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR40+360	PR40+350	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR40+350	PR40+340	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR40+340	PR40+330	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR40+330	PR40+320	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR40+320	PR40+310	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR40+310	PR40+300	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR40+300	PR40+290	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR40+290	PR40+280	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR40+280	PR40+270	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR40+270	PR40+260	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR40+260	PR40+250	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR40+250	PR40+240	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR40+240	PR40+230	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR40+230	PR40+220	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR40+220	PR40+210	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR40+210	PR40+200	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR40+200	PR40+190	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR40+190	PR40+180	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR40+180	PR40+170	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR40+170	PR40+160	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR40+160	PR40+150	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR40+150	PR40+140	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR40+140	PR40+130	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR40+130	PR40+120	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	Aún está el fallo - **EL FALLO SE ARREGLO**
PR40+120	PR40+110	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR40+110	PR40+100	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR40+100	PR40+090	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR40+090	PR40+080	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR40+080	PR40+070	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR40+070	PR40+060	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR40+060	PR40+050	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR40+050	PR40+040	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR40+040	PR40+030	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	ventana - **NO HAY VENTANA**
PR40+030	PR40+020	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR40+020	PR40+010	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR40+010	PR40+000	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR40+000	PR39+990	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+990	PR39+980	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+980	PR39+970	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+970	PR39+960	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+960	PR39+950	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+950	PR39+940	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+940	PR39+930	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+930	PR39+920	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+920	PR39+910	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+910	PR39+900	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+900	PR39+890	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+890	PR39+880	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+880	PR39+870	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+870	PR39+860	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+860	PR39+850	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+850	PR39+840	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+840	PR39+830	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
12	Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)	8,768.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO TERRAPLEN (m2)	VOLUMEN (m3)	
						1478.44	
PR39+690	PR39+680	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+680	PR39+670	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+670	PR39+660	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+660	PR39+650	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+650	PR39+640	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+640	PR39+630	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+630	PR39+620	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+620	PR39+610	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+610	PR39+600	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+600	PR39+590	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+590	PR39+580	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+580	PR39+570	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+570	PR39+560	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+560	PR39+550	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+550	PR39+540	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+540	PR39+530	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+530	PR39+520	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
						440.94	
PR39+500	PR39+490	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+490	PR39+480	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+480	PR39+470	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+470	PR39+460	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+460	PR39+450	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+450	PR39+440	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+440	PR39+430	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+430	PR39+420	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+420	PR39+410	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+410	PR39+400	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+400	PR39+390	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+390	PR39+380	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+380	PR39+370	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+370	PR39+360	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+360	PR39+350	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+350	PR39+340	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+340	PR39+330	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+330	PR39+320	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+320	PR39+310	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+310	PR39+300	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+300	PR39+290	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+290	PR39+280	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+280	PR39+270	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+270	PR39+260	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+260	PR39+250	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+250	PR39+240	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+240	PR39+230	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+230	PR39+220	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+220	PR39+210	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+210	PR39+200	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+200	PR39+190	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+190	PR39+180	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+180	PR39+170	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+170	PR39+160	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+160	PR39+150	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+150	PR39+140	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+140	PR39+130	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+130	PR39+120	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+120	PR39+110	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+110	PR39+100	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+100	PR39+090	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+090	PR39+080	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+080	PR39+070	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+070	PR39+060	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+060	PR39+050	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+050	PR39+040	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
12	Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)	8,768.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO TERRAPLEN (m2)	VOLUMEN (m3)	
PR39+040	PR39+030	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+030	PR39+020	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+020	PR39+010	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+010	PR39+000	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+000	PR38+990	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+990	PR38+980	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+980	PR38+970	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+970	PR38+960	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+960	PR38+950	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+950	PR38+940	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+940	PR38+930	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+930	PR38+920	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+920	PR38+910	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+910	PR38+900	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+900	PR38+890	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+890	PR38+880	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+880	PR38+870	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+870	PR38+860	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+860	PR38+850	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+850	PR38+840	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+840	PR38+830	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+830	PR38+820	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+820	PR38+810	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+810	PR38+800	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+800	PR38+790	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+790	PR38+780	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
						1867.50	
PR38+750	PR38+740	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+740	PR38+730	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+730	PR38+720	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+720	PR38+710	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+710	PR38+700	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+700	PR38+690	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+690	PR38+680	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+680	PR38+670	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+670	PR38+660	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+660	PR38+650	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+650	PR38+640	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+640	PR38+630	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+630	PR38+620	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+620	PR38+610	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+610	PR38+600	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+600	PR38+590	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+590	PR38+580	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+580	PR38+570	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+570	PR38+560	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+560	PR38+550	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+550	PR38+540	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+540	PR38+530	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+530	PR38+520	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+520	PR38+510	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+510	PR38+500	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+500	PR38+490	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+490	PR38+480	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+480	PR38+470	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+470	PR38+460	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+460	PR38+450	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+450	PR38+440	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+440	PR38+430	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+430	PR38+420	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+420	PR38+410	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+410	PR38+400	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+400	PR38+390	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+390	PR38+380	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+380	PR38+370	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
12	Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)	8,768.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO TERRAPLEN (m2)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
PR38+370	PR38+360	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+360	PR38+350	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+350	PR38+340	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+340	PR38+330	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+330	PR38+320	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+320	PR38+310	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+310	PR38+300	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+300	PR38+290	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+290	PR38+280	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+280	PR38+270	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+270	PR38+260	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+260	PR38+250	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
						1296.88	
					TOTAL VOLUMEN SUBBASE GRANULAR (M3)	**5,083.75**	
SUBBASE GRANULAR CLASE A							
PR45+130	PR45+120	10.00	1.39	1.39	1.39	13.94	
PR45+120	PR45+110	10.00	1.39	1.39	1.39	13.94	mejoramiento via existente
PR45+110	PR45+100	10.00	1.39	1.39	1.39	13.94	
						41.81	
PR43+150	PR43+140	10.00	2.29	2.29	2.29	22.88	
PR43+140	PR43+130	10.00	2.29	2.29	2.29	22.88	material utilizado para mejoramiento de acceso a terraplen
PR43+130	PR43+120	10.00	2.29	2.29	2.29	22.88	
						68.64	
PR44+640	PR44+630	10.00	3.03	5.96	4.50	44.95	volumen correspondiente a mejoramiento de sub rasante
PR44+630	PR44+620	10.00	5.96	6.16	6.06	60.60	
						105.55	
PR42+140.00	PR42+130.00	10.00	2.48	2.48	2.48	24.80	
PR42+130.00	PR42+120.00	10.00	2.48	2.48	2.48	24.80	
PR42+120.00	PR42+110.00	10.00	2.48	2.48	2.48	24.80	
PR42+110.00	PR42+100.00	10.00	2.48	2.48	2.48	24.80	
PR42+100.00	PR42+090.00	10.00	2.48	2.48	2.48	24.80	mejoramiento de subrasante calzada completa
PR42+090.00	PR42+080.00	10.00	2.48	2.48	2.48	24.80	
PR42+080.00	PR42+070.00	10.00	2.48	2.48	2.48	24.80	
PR42+070.00	PR42+060.00	10.00	2.48	2.48	2.48	24.80	
PR42+060.00	PR42+050.00	10.00	2.48	2.48	2.48	24.80	
						223.20	
PR41+950.00	PR41+940.00	10.00	1.75	1.75	1.75	17.50	
PR41+940.00	PR41+930.00	10.00	1.75	1.75	1.75	17.50	material utilizado para proteger subrasante
PR41+930.00	PR41+920.00	10.00	1.75	1.75	1.75	17.50	
PR41+920.00	PR41+910.00	10.00	1.75	1.75	1.75	17.50	
						70.00	
PR40+320	PR40+310	10.00	10.32	10.32	10.32	103.16	
PR40+310	PR40+300	10.00	10.32	10.32	10.32	103.16	
PR40+300	PR40+290	10.00	10.32	10.32	10.32	103.16	mejoramiento de subrasante en calzada completa (banco de arena)
PR40+290	PR40+280	10.00	10.32	10.32	10.32	103.16	
PR40+280	PR40+270	10.00	10.32	10.32	10.32	103.16	
PR40+270	PR40+260	10.00	10.32	10.32	10.32	103.16	
						618.96	
PR40+430	PR40+420	10.00	1.40	1.40	1.40	14.00	
PR40+420	PR40+410	10.00	1.40	1.40	1.40	14.00	Mejoramiento muro de contención
PR40+410	PR40+400	10.00	1.40	1.40	1.40	14.00	
						42.00	
PR40+150	PR40+140	10.00	3.98	2.52	3.25	32.52	
PR40+140	PR40+130	10.00	2.52	2.47	2.50	24.98	
PR40+130	PR40+120	10.00	2.47	3.56	3.02	30.18	
PR40+120	PR40+110	10.00	3.56	4.60	4.08	40.84	cajeo para mejoramiento de subrasante
PR40+110	PR40+100	10.00	4.60	4.14	4.37	43.70	
PR40+100	PR40+090	10.00	4.14	3.98	4.06	40.58	
PR40+090	PR40+080	10.00	3.98	2.26	3.12	31.22	
						244.02	
PR40+030	PR40+020	10.00	1.40	1.40	1.40	14.00	Material usado para fallo en alcantarilla
PR40+020	PR40+010	10.00	1.40	1.40	1.40	14.00	
						28.00	
PR38+570	PR38+560	10.00	2.25	2.25	2.25	22.50	mejoramiento de subrasante
PR38+560	PR38+550	10.00	2.25	4.50	3.38	33.75	
PR38+550	PR38+540	10.00	4.50	4.50	4.50	45.00	
PR38+540	PR38+530	10.00	4.50	4.50	4.50	45.00	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
12	Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)	8,768.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO TERRAPLEN (m2)	VOLUMEN (m3)	
PR38+530	PR38+520	10.00	4.50	4.50	4.50	45.00	
PR38+520	PR38+510	10.00	4.50	4.50	4.50	45.00	
PR38+510	PR38+500	10.00	4.50	4.50	4.50	45.00	
PR38+500	PR38+490	10.00	4.50	3.65	4.08	40.75	
PR38+490	PR38+480	10.00	3.65	3.65	3.65	36.50	
						358.50	
PR38+340	PR38+330	10.00	4.00	4.00	4.00	40.00	
PR38+330	PR38+320	10.00	4.00	4.00	4.00	40.00	
PR38+320	PR38+310	10.00	4.00	4.00	4.00	40.00	
PR38+310	PR38+300	10.00	4.00	4.00	4.00	40.00	
PR38+300	PR38+290	10.00	4.00	4.00	4.00	40.00	
PR38+290	PR38+280	10.00	4.00	4.00	4.00	40.00	
PR38+280	PR38+270	10.00	4.00	4.00	4.00	40.00	
PR38+270	PR38+260	10.00	4.00	4.00	4.00	40.00	
PR38+260	PR38+250	10.00	4.00	4.00	4.00	40.00	
						360.00	
PR38+100	PR38+090	10.00	4.27	4.27	4.27	42.70	
PR38+090	PR38+080	10.00	4.27	4.27	4.27	42.70	
PR38+080	PR38+070	10.00	4.27	4.27	4.27	42.70	
PR38+070	PR38+060	10.00	4.27	4.27	4.27	42.70	
PR38+060	PR38+050	10.00	4.27	4.16	4.22	42.15	
PR38+050	PR38+040	10.00	4.16	4.16	4.16	41.60	
PR38+040	PR38+030	10.00	4.16	4.16	4.16	41.60	
PR38+030	PR38+020	10.00	4.16	4.16	4.16	41.60	
PR38+020	PR38+010	10.00	4.16	4.16	4.16	41.60	
PR38+010	PR38+000	10.00	4.16	4.16	4.16	41.60	
PR38+000	PR37+990	10.00	4.16	4.16	4.16	41.60	
PR37+990	PR37+980	10.00	4.16	4.16	4.16	41.60	
PR37+980	PR37+970	10.00	4.16	4.16	4.16	41.60	
PR37+970	PR37+960	10.00	4.16	4.16	4.16	41.60	Excavación caja para mejoramiento lado derecho
PR37+960	PR37+950	10.00	4.16	4.16	4.16	41.60	
PR37+950	PR37+940	10.00	4.16	4.16	4.16	41.60	
PR37+940	PR37+930	10.00	4.16	4.16	4.16	41.60	
PR37+930	PR37+920	10.00	4.16	4.16	4.16	41.60	
						753.75	
PR37+450	PR37+440	10.00	7.28	7.28	7.28	72.80	
PR37+440	PR37+430	10.00	7.28	7.28	7.28	72.80	
PR37+430	PR37+420	10.00	7.28	7.28	7.28	72.80	
PR37+420	PR37+410	10.00	7.28	7.28	7.28	72.80	
						291.20	
PR37+060	PR37+050	10.00	5.20	5.20	5.20	52.00	
PR37+050	PR37+040	10.00	5.20	5.20	5.20	52.00	
PR37+040	PR37+030	10.00	5.20	5.20	5.20	52.00	
PR37+030	PR37+020	10.00	5.20	5.20	5.20	52.00	FALLO EN CARRIL COMPLETO
PR37+020	PR37+010	10.00	5.20	5.20	5.20	52.00	
PR37+010	PR37+000	10.00	5.20	2.96	4.08	40.80	
PR37+000	PR36+990	10.00	2.96	2.96	2.96	29.60	
PR36+990	PR36+980	10.00	2.96	2.96	2.96	29.60	
PR36+980	PR36+970	10.00	2.96	2.96	2.96	29.60	
PR36+970	PR36+960	10.00	2.96	2.96	2.96	29.60	
PR36+960	PR36+950	10.00	2.96	2.96	2.96	29.60	
PR36+950	PR36+940	10.00	2.96	2.96	2.96	29.60	
						478.40	
					TOTAL VOLUMEN SUBBASE GRANULAR CLASE A (M3)	3,684.03	
					TOTAL VOLUMEN (M3)	8,768.00	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
12	Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)	8,768.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO TERRAPLEN (m2)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

SUBBBASE GRANULAR PR40+000 al PR39+870









CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
12	Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)	8,768.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO TERRAPLEN (m2)	VOLUMEN (m3)	

SUBBBASE GRANULAR PR39+800 al PR39+650






SUBBBASE GRANULAR PR39+270 al PR39+020




CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
12	Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)	8,768.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO TERRAPLEN (m2)	VOLUMEN (m3)	

SUBBBASE GRANULAR PR39+020 al PR38+910





APROXIMACIÓN DE SUBBASE GRANULAR AL PR38+750





PR37+060





CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
12	Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)	8,768.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO TERRAPLEN (m2)	VOLUMEN (m3)	

PR37+430



PR37+040





CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
12	Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)	8,768.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO TERRAPLEN (m2)	VOLUMEN (m3)	

PR37+990





PR38+430



PR40+150



FIRMA		
NOMBRE	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.

CONTRATO 976-2021
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
13	Base granular clase A (No incluye Transporte)	2,243.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR40+400	PR40+390	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR40+390	PR40+380	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR40+380	PR40+370	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR40+370	PR40+360	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR40+360	PR40+350	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR40+350	PR40+340	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR40+340	PR40+330	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR40+330	PR40+320	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR40+320	PR40+310	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR40+310	PR40+300	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR40+300	PR40+290	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR40+290	PR40+280	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR40+280	PR40+270	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR40+270	PR40+260	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR40+260	PR40+250	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR40+250	PR40+240	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR40+240	PR40+230	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR40+230	PR40+220	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR40+220	PR40+210	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR40+210	PR40+200	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR40+200	PR40+190	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR40+190	PR40+180	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR40+180	PR40+170	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR40+170	PR40+160	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR40+160	PR40+150	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR40+150	PR40+140	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
						507.00	
PR39+690	PR39+680	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+680	PR39+670	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+670	PR39+660	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+660	PR39+650	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+650	PR39+640	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+640	PR39+630	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+630	PR39+620	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+620	PR39+610	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+610	PR39+600	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+600	PR39+590	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+590	PR39+580	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+580	PR39+570	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+570	PR39+560	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+560	PR39+550	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+550	PR39+540	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+540	PR39+530	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+530	PR39+520	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
						331.50	
PR39+500	PR39+490	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+490	PR39+480	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+480	PR39+470	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+470	PR39+460	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+460	PR39+450	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+450	PR39+440	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+440	PR39+430	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+430	PR39+420	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+420	PR39+410	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+410	PR39+400	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+400	PR39+390	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+390	PR39+380	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+380	PR39+370	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+370	PR39+360	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+360	PR39+350	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+350	PR39+340	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+340	PR39+330	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+330	PR39+320	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+320	PR39+310	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+310	PR39+300	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+300	PR39+290	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.

CONTRATO 976-2021
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
13	Base granular clase A (No incluye Transporte)	2,243.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR39+290	PR39+280	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+280	PR39+270	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+270	PR39+260	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+260	PR39+250	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+250	PR39+240	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+240	PR39+230	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+230	PR39+220	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+220	PR39+210	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+210	PR39+200	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+200	PR39+190	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+190	PR39+180	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+180	PR39+170	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+170	PR39+160	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+160	PR39+150	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+150	PR39+140	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+140	PR39+130	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+130	PR39+120	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+120	PR39+110	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+110	PR39+100	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+100	PR39+090	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+090	PR39+080	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+080	PR39+070	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+070	PR39+060	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+060	PR39+050	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+050	PR39+040	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+040	PR39+030	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+030	PR39+020	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+020	PR39+010	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+010	PR39+000	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+000	PR38+990	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+990	PR38+980	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+980	PR38+970	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+970	PR38+960	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+960	PR38+950	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+950	PR38+940	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+940	PR38+930	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+930	PR38+920	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+920	PR38+910	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+910	PR38+900	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+900	PR38+890	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+890	PR38+880	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+880	PR38+870	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+870	PR38+860	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+860	PR38+850	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+850	PR38+840	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+840	PR38+830	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+830	PR38+820	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+820	PR38+810	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+810	PR38+800	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+800	PR38+790	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+790	PR38+780	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
						1404.00	
					TOTAL VOLUMEN (M3)	2,243.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

BASE GRANULAR DEL PR39+500





CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
13	Base granular clase A (No incluye Transporte)	2,243.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	





BASE GRANULAR DEL PR38+950 AL PR38+810









FIRMA		
NOMBRE	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
14	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	3,312.00	m2

ABSCISAS		DIMENSIONES			OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD INTERVENIDA	AREA ABSCISA FIN (m2)	ÁREA (m2)	
PR40+830	PR40+820	10.00	9.20	92.00	
PR40+820	PR40+810	10.00	9.20	92.00	
PR40+810	PR40+800	10.00	9.20	92.00	
PR40+800	PR40+790	10.00	9.20	92.00	
PR40+790	PR40+780	10.00	9.20	92.00	
PR40+780	PR40+770	10.00	9.20	92.00	
PR40+770	PR40+760	10.00	9.20	92.00	
PR40+760	PR40+750	10.00	9.20	92.00	
PR40+750	PR40+740	10.00	9.20	92.00	
PR40+740	PR40+730	10.00	9.20	92.00	
PR40+730	PR40+720	10.00	9.20	92.00	
PR40+720	PR40+710	10.00	9.20	92.00	
PR40+710	PR40+700	10.00	9.20	92.00	
PR40+700	PR40+690	10.00	9.20	92.00	
PR40+690	PR40+680	10.00	9.20	92.00	
PR40+680	PR40+670	10.00	9.20	92.00	
PR40+670	PR40+660	10.00	9.20	92.00	
PR40+660	PR40+650	10.00	9.20	92.00	
PR40+650	PR40+640	10.00	9.20	92.00	
PR40+640	PR40+630	10.00	9.20	92.00	
PR40+630	PR40+620	10.00	9.20	92.00	
PR40+620	PR40+610	10.00	9.20	92.00	
PR40+610	PR40+600	10.00	9.20	92.00	
PR40+600	PR40+590	10.00	9.20	92.00	
PR40+590	PR40+580	10.00	9.20	92.00	
PR40+580	PR40+570	10.00	9.20	92.00	
PR40+570	PR40+560	10.00	9.20	92.00	
PR40+560	PR40+550	10.00	9.20	92.00	
PR40+550	PR40+540	10.00	9.20	92.00	
PR40+540	PR40+530	10.00	9.20	92.00	
PR40+530	PR40+520	10.00	9.20	92.00	
PR40+520	PR40+510	10.00	9.20	92.00	
PR40+510	PR40+500	10.00	9.20	92.00	
PR40+500	PR40+490	10.00	9.20	92.00	
PR40+490	PR40+480	10.00	9.20	92.00	
PR40+480	PR40+470	10.00	9.20	92.00	
			TOTAL	3,312.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

IMPRIMACIÓN DEL TRAMO DEL PR40+830





FIRMA		
NOMBRE	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
15	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	14,393.20	m2

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD INTERVENIDA	ANCHO DE ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	ÁREA (m2)	OBSERVACIONES
PR45+000	PR44+990	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+990	PR44+980	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+980	PR44+970	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+970	PR44+960	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+960	PR44+950	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+950	PR44+940	10.00	8.30	8.68	8.49	84.90	
PR44+940	PR44+930	10.00	8.68	9.71	9.20	91.95	
PR44+930	PR44+920	10.00	9.71	10.87	10.29	102.90	
PR44+920	PR44+910	10.00	10.87	11.60	11.24	112.35	
PR44+910	PR44+900	10.00	11.60	11.60	11.60	116.00	
PR44+900	PR44+890	10.00	11.60	11.60	11.60	116.00	
PR44+890	PR44+880	10.00	11.60	11.60	11.60	116.00	
PR44+880	PR44+870	10.00	11.60	11.60	11.60	116.00	
PR44+870	PR44+860	10.00	11.60	11.60	11.60	116.00	
PR44+860	PR44+850	10.00	11.60	11.60	11.60	116.00	
PR44+850	PR44+840	10.00	11.60	11.60	11.60	116.00	
PR44+840	PR44+830	10.00	11.60	11.60	11.60	116.00	
PR44+830	PR44+820	10.00	11.60	10.90	11.25	112.50	
PR44+820	PR44+810	10.00	10.90	10.02	10.46	104.60	
PR44+810	PR44+800	10.00	10.02	9.12	9.57	95.70	
PR44+800	PR44+790	10.00	9.12	8.30	8.71	87.10	
PR44+790	PR44+780	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+780	PR44+770	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+770	PR44+760	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+760	PR44+750	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+750	PR44+740	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+740	PR44+730	10.00	8.30	8.88	8.59	85.90	
PR44+730	PR44+720	10.00	8.88	10.02	9.45	94.50	
PR44+720	PR44+710	10.00	10.02	10.71	10.37	103.65	
PR44+710	PR44+700	10.00	10.71	10.96	10.84	108.35	
PR44+700	PR44+690	10.00	10.96	10.96	10.96	109.60	
PR44+690	PR44+680	10.00	10.96	10.96	10.96	109.60	
PR44+680	PR44+670	10.00	10.96	10.96	10.96	109.60	
PR44+670	PR44+660	10.00	10.96	10.96	10.96	109.60	
PR44+660	PR44+650	10.00	10.96	10.96	10.96	109.60	
PR44+650	PR44+640	10.00	10.96	10.96	10.96	109.60	
PR44+640	PR44+630	10.00	10.96	10.96	10.96	109.60	
PR44+630	PR44+620	10.00	10.96	10.86	10.91	109.10	
PR44+620	PR44+610	10.00	10.86	9.94	10.40	104.00	
PR44+610	PR44+600	10.00	9.94	8.73	9.34	93.35	
PR44+600	PR44+590	10.00	8.73	8.30	8.52	85.15	
PR44+590	PR44+580	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+580	PR44+570	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+570	PR44+560	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+560	PR44+550	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+550	PR44+540	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+540	PR44+530	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+530	PR44+520	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+520	PR44+510	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+510	PR44+500	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+340	PR44+330	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+330	PR44+320	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+320	PR44+310	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+310	PR44+300	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+300	PR44+290	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+290	PR44+280	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+280	PR44+270	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+270	PR44+260	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+260	PR44+250	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+250	PR44+240	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+240	PR44+230	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+230	PR44+220	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+220	PR44+210	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+210	PR44+200	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+200	PR44+190	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+190	PR44+180	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+180	PR44+170	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+170	PR44+160	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+160	PR44+150	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+150	PR44+140	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+140	PR44+130	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+130	PR44+120	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+120	PR44+110	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+110	PR44+100	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+100	PR44+090	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+090	PR44+080	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+080	PR44+070	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+070	PR44+060	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+060	PR44+050	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+050	PR44+040	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+040	PR44+030	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+030	PR44+020	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+020	PR44+010	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR44+010	PR44+000	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
15	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	14,393.20	m2

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD INTERVENIDA	ANCHO DE ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	ÁREA (m2)	
PR44+000	PR43+990	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+990	PR43+980	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+980	PR43+970	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+970	PR43+960	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+960	PR43+950	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+050	PR43+040	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+040	PR43+030	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+030	PR43+020	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+020	PR43+010	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+010	PR43+000	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR43+000	PR42+990	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+990	PR42+980	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+980	PR42+970	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+970	PR42+960	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+960	PR42+950	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+950	PR42+940	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+940	PR42+930	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+930	PR42+920	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+920	PR42+910	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+910	PR42+900	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+900	PR42+890	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+890	PR42+880	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+880	PR42+870	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+870	PR42+860	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+860	PR42+850	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+850	PR42+840	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+840	PR42+830	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+830	PR42+820	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+820	PR42+810	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+810	PR42+800	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+800	PR42+790	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+790	PR42+780	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+780	PR42+770	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+770	PR42+760	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+760	PR42+750	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+750	PR42+740	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+740	PR42+730	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+730	PR42+720	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+720	PR42+710	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+710	PR42+700	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+700	PR42+690	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+690	PR42+680	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+680	PR42+670	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+670	PR42+660	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+660	PR42+650	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+650	PR42+640	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+640	PR42+630	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+630	PR42+620	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+620	PR42+610	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+610	PR42+600	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+600	PR42+590	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+590	PR42+580	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+580	PR42+570	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+570	PR42+560	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+560	PR42+550	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+550	PR42+540	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+540	PR42+530	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+530	PR42+520	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+520	PR42+510	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+510	PR42+500	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+500	PR42+490	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+490	PR42+480	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+480	PR42+470	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+470	PR42+460	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+460	PR42+450	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+450	PR42+440	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+440	PR42+430	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+430	PR42+420	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+420	PR42+410	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+410	PR42+400	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+400	PR42+390	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+390	PR42+380	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+380	PR42+370	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+370	PR42+360	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+360	PR42+350	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+350	PR42+340	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+340	PR42+330	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+330	PR42+320	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+320	PR42+310	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+310	PR42+300	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
PR42+300	PR42+290	10.00	8.30	8.30	8.30	83.00	
					TOTAL	14,393.20	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

RIEGO DE LIGA DEL PR45+000







CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
15	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	14,393.20	m2

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD INTERVENIDA	ANCHO DE ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	ÁREA (m2)	OBSERVACIONES

RIEGO DE LIGA DEL PR43+050





RIEGO DE LIGA DEL PR42+600





RIEGO DE LIGA DEL PR43+050





FIRMA		
NOMBRE	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

d	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
16	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)	1,117.90	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD INTERVENIDA	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	VOLUMEN (m^3)	
PR40+830	PR40+820	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+820	PR40+810	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+810	PR40+800	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+800	PR40+790	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+790	PR40+780	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+780	PR40+770	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+770	PR40+760	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+760	PR40+750	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+750	PR40+740	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+740	PR40+730	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+730	PR40+720	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+720	PR40+710	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+710	PR40+700	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+700	PR40+690	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+690	PR40+680	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+680	PR40+670	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+670	PR40+660	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+660	PR40+650	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+650	PR40+640	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	ASFALTO EN PRIMERA CAPA
PR40+640	PR40+630	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+630	PR40+620	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+620	PR40+610	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+610	PR40+600	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+600	PR40+590	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+590	PR40+580	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+580	PR40+570	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+570	PR40+560	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+560	PR40+550	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+550	PR40+540	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+540	PR40+530	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+530	PR40+520	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+520	PR40+510	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+510	PR40+500	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+500	PR40+490	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+490	PR40+480	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+480	PR40+470	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
						180.36	
PR45+000	PR44+990	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR44+990	PR44+980	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR44+980	PR44+970	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR44+970	PR44+960	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR44+960	PR44+950	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR44+950	PR44+940	10.00	0.50	0.55	0.52	5.24	
PR44+940	PR44+930	10.00	0.55	0.67	0.61	6.09	
PR44+930	PR44+920	10.00	0.67	0.81	0.74	7.40	
PR44+920	PR44+910	10.00	0.81	0.90	0.85	8.53	
PR44+910	PR44+900	10.00	0.90	0.90	0.90	8.97	
PR44+900	PR44+890	10.00	0.90	0.90	0.90	8.97	
PR44+890	PR44+880	10.00	0.90	0.90	0.90	8.97	
PR44+880	PR44+870	10.00	0.90	0.90	0.90	8.97	
PR44+870	PR44+860	10.00	0.90	0.90	0.90	8.97	
PR44+860	PR44+850	10.00	0.90	0.90	0.90	8.97	
PR44+850	PR44+840	10.00	0.90	0.90	0.90	8.97	
PR44+840	PR44+830	10.00	0.90	0.90	0.90	8.97	
PR44+830	PR44+820	10.00	0.90	0.82	0.86	8.59	
PR44+820	PR44+810	10.00	0.82	0.71	0.76	7.64	
PR44+810	PR44+800	10.00	0.71	0.60	0.65	6.54	
PR44+800	PR44+790	10.00	0.60	0.50	0.55	5.50	
PR44+790	PR44+780	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR44+780	PR44+770	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR44+770	PR44+760	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR44+760	PR44+750	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR44+750	PR44+740	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	ASFALTO EN SEGUNDA CAPA
PR44+740	PR44+730	10.00	0.50	0.57	0.54	5.36	
PR44+730	PR44+720	10.00	0.57	0.71	0.64	6.39	
PR44+720	PR44+710	10.00	0.71	0.79	0.75	7.49	
PR44+710	PR44+700	10.00	0.79	0.82	0.81	8.05	
PR44+700	PR44+690	10.00	0.82	0.82	0.82	8.20	
PR44+690	PR44+680	10.00	0.82	0.82	0.82	8.20	
PR44+680	PR44+670	10.00	0.82	0.82	0.82	8.20	
PR44+670	PR44+660	10.00	0.82	0.82	0.82	8.20	
PR44+660	PR44+650	10.00	0.82	0.82	0.82	8.20	
PR44+650	PR44+640	10.00	0.82	0.82	0.82	8.20	
PR44+640	PR44+630	10.00	0.82	0.82	0.82	8.20	
PR44+630	PR44+620	10.00	0.82	0.81	0.81	8.14	
PR44+620	PR44+610	10.00	0.81	0.70	0.75	7.53	
PR44+610	PR44+600	10.00	0.70	0.55	0.63	6.25	
PR44+600	PR44+590	10.00	0.55	0.50	0.53	5.27	
PR44+590	PR44+580	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR44+580	PR44+570	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR44+570	PR44+560	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR44+560	PR44+550	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR44+550	PR44+540	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR44+540	PR44+530	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR44+530	PR44+520	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR44+520	PR44+510	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR44+510	PR44+500	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
						334.36	
PR44+340	PR44+330	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR44+330	PR44+320	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR44+320	PR44+310	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR44+310	PR44+300	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR44+300	PR44+290	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR44+290	PR44+280	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR44+280	PR44+270	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR44+270	PR44+260	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR44+260	PR44+250	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR44+250	PR44+240	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR44+240	PR44+230	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR44+230	PR44+220	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR44+220	PR44+210	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR44+210	PR44+200	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR44+200	PR44+190	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR44+190	PR44+180	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR44+180	PR44+170	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	

d	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
16	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)	1,117.90	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD INTERVENIDA	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	VOLUMEN (m^3)	
PR44+170	PR44+160	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR44+160	PR44+150	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR44+150	PR44+140	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	ASFALTO EN SEGUNDA CAPA CON ESPESOR DE 0.07M
PR44+140	PR44+130	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR44+130	PR44+120	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR44+120	PR44+110	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR44+110	PR44+100	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR44+100	PR44+090	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR44+090	PR44+080	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR44+080	PR44+070	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR44+070	PR44+060	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR44+060	PR44+050	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR44+050	PR44+040	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR44+040	PR44+030	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR44+030	PR44+020	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR44+020	PR44+010	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR44+010	PR44+000	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR44+000	PR43+990	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR43+990	PR43+980	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR43+980	PR43+970	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR43+970	PR43+960	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR43+960	PR43+950	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
						227.37	
PR43+050	PR43+040	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR43+040	PR43+030	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR43+030	PR43+020	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR43+020	PR43+010	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR43+010	PR43+000	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR43+000	PR42+990	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+990	PR42+980	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+980	PR42+970	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+970	PR42+960	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+960	PR42+950	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+950	PR42+940	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+940	PR42+930	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+930	PR42+920	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+920	PR42+910	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+910	PR42+900	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+900	PR42+890	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+890	PR42+880	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+880	PR42+870	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+870	PR42+860	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+860	PR42+850	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+850	PR42+840	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+840	PR42+830	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+830	PR42+820	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+820	PR42+810	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+810	PR42+800	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+800	PR42+790	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+790	PR42+780	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+780	PR42+770	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+770	PR42+760	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+760	PR42+750	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+750	PR42+740	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+740	PR42+730	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+730	PR42+720	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+720	PR42+710	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+710	PR42+700	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+700	PR42+690	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+690	PR42+680	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+680	PR42+670	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	**ASFALTO EN SEGUNDA CAPA**
PR42+670	PR42+660	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+660	PR42+650	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+650	PR42+640	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+640	PR42+630	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+630	PR42+620	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+620	PR42+610	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+610	PR42+600	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+600	PR42+590	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+590	PR42+580	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+580	PR42+570	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+570	PR42+560	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+560	PR42+550	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+550	PR42+540	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+540	PR42+530	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+530	PR42+520	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+520	PR42+510	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+510	PR42+500	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+500	PR42+490	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+490	PR42+480	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+480	PR42+470	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+470	PR42+460	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+460	PR42+450	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+450	PR42+440	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+440	PR42+430	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+430	PR42+420	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+420	PR42+410	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+410	PR42+400	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+400	PR42+390	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+390	PR42+380	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+380	PR42+370	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+370	PR42+360	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+360	PR42+350	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+350	PR42+340	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+340	PR42+330	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+330	PR42+320	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+320	PR42+310	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR42+310	PR42+300	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
						375.75	

TOTAL M3 DE ASFALTO EN PRIMERA CAPA	**180.40**
TOTAL M3 DE ASFALTO EN SEGUNDA CAPA	**937.50**
TOTAL	**1117.90**

d	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	Consorcio ECOVISIÓN-190 INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
16	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)	1,117.90	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD INTERVENIDA	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	VOLUMEN (m^3)	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

ASFALTO EN PRIMERA CAPA DEL PR40+830








ASFALTO EN SEGUNDA CAPA PR45+000




ASFALTO EN SEGUNDA CAPA PR43+050



d	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
16	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)	1,117.90	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD INTERVENIDA	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	VOLUMEN (m^3)	

ASFALTO EN SEGUNDA CAPA PR42+600







ASFALTO EN SEGUNDA CAPA PR43+050





FIRMA		
NOMBRE	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
18	Excavaciones varias sin clasificar	55.00	m3

ALCANTARILLAS	DIMENSIONES				OBSERVACIONES
ABSCISA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	VOLUMEN (m3)	
PR40+040	6.00	2	1.5	18.00	ENCOLE
PR39+840	6.00	2	1.8	21.60	DESCOLE
PR39+510	5.00	2	1.5	15.00	DESCOLE
			TOTAL	55.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.



EXCAVACIÓN PR39+840



EXCAVACIÓN PR39+510



EXCAVACIÓN PR40+040

FIRMA		
NOMBRE	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
21	Rellenos para Estructuras con suelo	7.20	m3

ALCANTARILLAS	DIMENSIONES				OBSERVACIONES
ABSCISA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	VOLUMEN (m3)	
PR39+510	5.00	0.80	1.80	7.20	MEJORAMIENTO
			TOTAL	7.20	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

RELLENO PR39+840









FIRMA		
NOMBRE	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA NÚMERO:12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
23	Concreto clase 28 MPA	28.60	m3

ALCANTARILLAS	DIMENSIONES						OBSERVACIONES
ABSCISA	ALTO (m)	ANCHO (m)	LARGO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN DE TUBO (m3)	VOLUMEN (m3)	
PR40+430 PASO FAUNA	3.70		13.10	0.35	0.95	16.30	Concreto pantalla de muro menos área de dos tubos
PR40+040		2.30	4.76	0.30		3.28	Vástago del muro
		2.20	4.76	1.53	0.30	1.60	Zarpa descole
		4.76	0.25	0.30		0.36	Dentellón descole
		1.60	10.00	0.15		2.40	Parrilla de tubería
PR39+850		2.20	4.71	1.58	0.30	1.64	Piso de descole
	2.40	2.10	2.10	0.25		2.36	Aletas descole
		1.70	0.42	0.25		0.18	Muros de confinamiento
		4.71	0.30	0.25		0.35	Dentellón descole
		2.70	1.97	0.25	0.24	0.14	Cabezal descole
				TOTAL		28.60	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.









MURO DEL PR40+430





ALCANTARILLA DEL PR40+030









PR39+850 DESCOLE

FIRMA		
NOMBRE	**EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA**	**OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ**
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
24	Concreto clase 21 MPA	10.90	m3

ALCANTARILLAS	DIMENSIONES								OBSERVACIONES
ABSCISA	ALTO (m)	ANCHO (m)	LARGO (m)	ESPESOR (m)	RADIO TUBERÍA	VOLUMEN DE TUBERÍA	ANCHO (m)	VOLUMEN (m3)	
PR41+510	1.60	5.00	0.37		0.300			1.55	Atraque para tubería
	1.60	5.75	1.10		0.550			4.66	Atraque para tubería
PR39+850	1.60	5.75	1.10		0.550			4.66	Atraque para tubería
							TOTAL	10.90	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

PR40+040 ENCOFRADO PARA ATRAQUE DE TUBERÍA





PR39+850 ATRAQUE DE TUBERÍA





FIRMA		
NOMBRE	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
25	Concreto clase 14 MPA	2.60	m3

ALCANTARILLAS	DIMENSIONES					OBSERVACIONES
ABSCISA	ALTO (m)	ANCHO (m)	LARGO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	
PR40+040		1.60	4.00	0.100	0.64	Solado tubería
PR39+850		1.60	6.00	0.100	0.96	Solado tubería
PR39+510		1.70	4.00	0.100	0.68	Solado tubería
	3.15	1.10	1.58	0.050	0.27	Solado aletas descole
				TOTAL	2.60	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

SOLADO DE PR39+510





SOLADO DE PR40+040





SOLADO DE PR39+865



SOLADO DE PR39+865



FIRMA		
NOMBRE	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
26	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	1,446.30	kg

ALCANTARILLAS	DIMENSIONES					OBSERVACIONES
ABSCISA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	PESO KG	PESO (kg)	
	1/2"	4.50	8.00	0.996	35.86	ACERO PARRILLA
	1/2"	1.50	23.00	0.996	34.36	
	1/2"	2.60	6.00	0.996	15.54	ACERO DE CABEZOTE Y ALETAS DE DESCOLE
	1/2"	2.10	4.00	0.996	8.37	
	1/2"	2.50	6.00	0.996	14.94	
	1/2"	2.10	4.00	0.996	8.37	
	1/2"	6.54	5.00	0.996	32.57	
	1/2"	2.60	10.00	0.996	25.90	
	1/2"	5.99	4.00	0.996	23.86	
	1/2"	2.30	8.00	0.996	18.33	
	1/2"	3.08	8.00	0.996	24.54	
	1/2"	2.12	1.00	0.996	2.11	PARRILLA SUPERIOR DE DESCOLE
	1/2"	1.93	1.00	0.996	1.92	
	1/2"	1.76	1.00	0.996	1.75	
	1/2"	1.57	1.00	0.996	1.56	
	1/2"	1.39	1.00	0.996	1.38	
	1/2"	1.17	1.00	0.996	1.17	
	1/2"	2.13	1.00	0.996	2.12	
	1/2"	1.89	1.00	0.996	1.88	
	1/2"	1.71	1.00	0.996	1.70	
	1/2"	1.46	1.00	0.996	1.45	
	1/2"	1.26	1.00	0.996	1.25	
	1/2"	1.06	1.00	0.996	1.06	
	1/2"	2.15	1.00	0.996	2.14	PARTE CENTRAL DE LA PARRILLA SUPERIOR DESCOLE
	1/2"	2.08	1.00	0.996	2.07	
	1/2"	2.18	1.00	0.996	2.17	
	1/2"	2.22	4.00	0.996	8.84	
	1/2"	2.10	1.00	0.996	2.09	
	1/2"	2.16	1.00	0.996	2.15	
	1/2"	0.85	4.00	0.996	3.39	REFUERZO DENTELLÓN DESCOLE
	1/2"	4.50	23.00	0.996	103.09	
	1/2"	1.97	2.00	0.996	3.92	PARRILLA INFERIOR DE DESCOLE
	1/2"	1.76	2.00	0.996	3.51	
	1/2"	1.56	1.00	0.996	1.55	
	1/2"	1.28	2.00	0.996	2.55	
	1/2"	0.91	1.00	0.996	0.91	
	1/2"	1.61	1.00	0.996	1.60	
	1/2"	1.02	1.00	0.996	1.02	
PR40+040	1/2"	1.42	1.00	0.996	1.41	
	1/2"	4.10	4.00	0.996	16.33	PARRILLA INFERIOR ZONA DE TUBO
	1/2"	1.45	2.00	0.996	2.89	
	1/2"	1.53	2.00	0.996	3.05	
	1/2"	1.57	4.00	0.996	6.25	

	1/2"	1.98	8.00	0.996	15.78	CABEZOTE DE DESCOLE
	1/2"	1.98	8.00	0.996	15.78	
	1/2"	2.00	4.00	0.996	7.97	
	1/2"	6.62	1.00	0.996	6.59	ACERO MURO DE ALETAS DE DESCOLE
	1/2"	2.50	2.00	0.996	4.98	
	1/2"	6.86	1.00	0.996	6.83	
	1/2"	2.48	2.00	0.996	4.94	
	1/2"	7.09	1.00	0.996	7.06	
	1/2"	2.46	2.00	0.996	4.90	
	1/2"	7.31	1.00	0.996	7.28	
	1/2"	2.43	2.00	0.996	4.84	
	1/2"	7.55	1.00	0.996	7.52	
	1/2"	2.41	2.00	0.996	4.80	
	1/2"	7.79	1.00	0.996	7.76	
	1/2"	2.39	2.00	0.996	4.76	
	1/2"	8.04	1.00	0.996	8.01	
	1/2"	2.37	2.00	0.996	4.72	
	1/2"	8.28	1.00	0.996	8.25	
	1/2"	2.35	2.00	0.996	4.68	
	1/2"	8.51	1.00	0.996	8.48	
	1/2"	2.33	2.00	0.996	4.64	
	1/2"	8.76	1.00	0.996	8.72	
	1/2"	2.31	2.00	0.996	4.60	
	1/2"	2.42	1.00	0.996	2.41	
	1/2"	2.70	1.00	0.996	2.69	
	1/2"	2.97	1.00	0.996	2.96	
	1/2"	3.25	1.00	0.996	3.24	
	1/2"	3.53	1.00	0.996	3.52	
	1/2"	3.81	1.00	0.996	3.79	
	1/2"	4.10	1.00	0.996	4.08	
	1/2"	4.38	1.00	0.996	4.36	
	1/2"	4.65	1.00	0.996	4.63	
	1/2"	4.94	1.00	0.996	4.92	
				TOTAL DE ACERO DE ALCANTARILLA KG	**633.41**	
PR39+850	1/2"	4.70	4.00	0.996	18.72	GUARDARUEDA DESCOLE
	1/2"	9.60	9.00	0.996	86.05	ALETAS Y PISO DESCOLE (VERTICAL)
	1/2"	2.77	1.00	0.996	2.76	
	1/2"	3.05	1.00	0.996	3.04	
	1/2"	3.33	1.00	0.996	3.32	
	1/2"	3.61	1.00	0.996	3.60	
	1/2"	3.89	1.00	0.996	3.87	
	1/2"	4.17	1.00	0.996	4.15	
	1/2"	4.45	1.00	0.996	4.43	
	1/2"	4.73	1.00	0.996	4.71	
	1/2"	5.00	1.00	0.996	4.98	
	1/2"	2.05	2.00	0.996	4.08	
	1/2"	1.85	2.00	0.996	3.69	
	1/2"	1.63	2.00	0.996	3.25	
	1/2"	1.44	2.00	0.996	2.87	
	1/2"	1.24	2.00	0.996	2.47	
	1/2"	1.10	2.00	0.996	2.19	
	1/2"	2.20	2.00	0.996	4.38	
	1/2"	1.90	2.00	0.996	3.78	
	1/2"	1.78	2.00	0.996	3.55	
	1/2"	1.59	2.00	0.996	3.17	
	1/2"	1.39	2.00	0.996	2.77	
	1/2"	1.25	2.00	0.996	2.49	
	1/2"	2.15	28.00	0.996	59.96	
	1/2"	1.66	5.00	0.996	8.27	
	1/2"	2.11	5.00	0.996	10.51	
	1/2"	6.02	6.00	0.996	35.98	
	1/2"	3.00	6.00	0.996	17.93	

	1/2"	2.25	11.00	0.996	24.65	ALETAS Y PISO ACERO INTERIOR INCLUYE ACERO DE BASTONES Y GANCHOS
	1/2"	2.55	20.00	0.996	50.80	
	1/2"	3.24	4.00	0.996	12.91	
	1/2"	2.94	4.00	0.996	11.71	
	1/2"	2.88	4.00	0.996	11.47	
	1/2"	2.82	2.00	0.996	5.62	
	1/2"	2.79	4.00	0.996	11.12	
	1/2"	2.73	4.00	0.996	10.88	
	1/2"	0.85	20.00	0.996	16.93	
	1/2"	4.55	4.00	0.996	18.13	
	1/2"	1.75	10.00	0.996	17.43	
				TOTAL ALCANTARILLA KG	**502.62**	
PR43+135	1/2"	6.02	8	0.996	47.97	ACERO MURO EXTERIOR Y ZARPA INFERIOR ENCOLE
	1/2"	1.92	9	0.996	17.21	
	1/2"	5.40	3	0.996	16.14	
	1/2"	3.78	4	0.996	15.06	
	1/2"	0.85	4	0.996	3.39	
	1/2"	1.80	2	0.996	3.59	
	1/2"	1.90	11	0.996	20.82	
	1/2"	1.70	12	0.996	20.32	
	1/2"	2.50	9	0.996	22.41	
	1/2"	1.86	16	0.996	29.64	ACERO MURO INTERIOR Y ZARPA SUPERIOR ENCOLE
	1/2"	3.15	2	0.996	6.27	
	1/2"	0.85	4	0.996	3.39	
	1/2"	2.30	2	0.996	4.58	
	1/2"	2.45	7	0.996	17.08	
	1/2"	1.85	8	0.996	14.74	
	1/2"	2.92	7	0.996	20.36	
	1/2"	1.88	7	0.996	13.11	
	1/2"	0.85	14	0.996	11.85	REFUERZO DENTELLON
	1/2"	3.20	4	0.996	12.75	
	1/2"	1.00	4	0.996	3.98	REFUERZO TUBERIA
	1/2"	0.70	8	0.996	5.58	
				TOTAL ACERO MURO KG	**310.24**	
				TOTAL	**1,446.30**	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

AMARRE DE ACERO DESCOLE PR40+040





AMARRE DE ACERO DESCOLE PR39+850





ACERO DEL MURO EN ALCANTARILLA DEL PR43+135 - PR43+123



FIRMA		
NOMBRE	**EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA**	**OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ**
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
27	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	16.00	ml

ALCANTARILLAS	DIMENSIONES					OBSERVACIONES
ABSCISA	CANTIDAD	LARGO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	LONGITUD (ml)	
PR41+510	5.00				5.00	Tubería encole
PR40+040	5.00				5.00	Tubería instalada
PR39+850	6.00				6.00	Tubería instalada
				TOTAL	16.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

PR38+850





PR40+040



FIRMA		
NOMBRE	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
39	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	2,465.00	m3-km

ABSCISAS		DIMENSIONES						
INICIO	FIN	LONGITUD TRANSPORTE	AREA (m2)	ALTO (m)	VOLUMEN DESCAPOTE (m^3)	VOLUMEN EXCAVACIONES (m^3)	VOLUMEN (m^3-Km)	OBSERVACIONES
PR38+050	PR36+750	0.65				3,792.00	2,464.80	Vo. Excavaciones
							00	
							00	
							00	
							00	
						TOTAL	2,465.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.



PR37+040




PR37+150



PR38+030



PR38+030

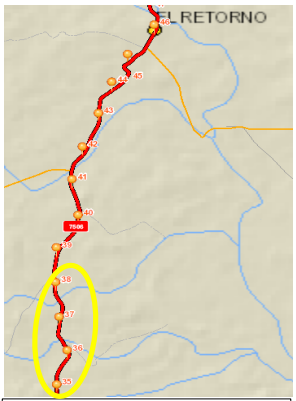

Recorrido transporte de materiales de excavación y llenos

FIRMA		
NOMBRE	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
40	Transporte de materiales de sub-base y base granular, compactos	2,631,488.00	m3-km

ABSCISAS				DIMENSIONES				
INICIO	LONGITUD AL PR45+450 (Km)	COLOCACION		LONGITUD EN OBRA	LONGITUD TRANSPORTE	VOLUMEN MATERIALES (m^3)	VOLUMEN (m^3-Km)	OBSERVACIONES
UBICACION	DISTANCIA	INICIO	FIN	LO	218,5 KM + LO			
Granada Coordenandas Lat. 3.4827924N Long. -73.7164277W	236.00	PR40+400	PR39+830	5.91	241.905	1,478.44	357,641.42	SUBBASEGRANULAR
	236.00	PR39+690	PR39+520	6.02	242.015	440.94	106,713.49	
	236.00	PR39+500	PR38+780	7.03	243.030	1,867.50	453,858.53	
	236.00	PR38+750	PR38+250	7.45	243.450	1,296.88	315,724.22	
Fuente de Oro Coordenandas Lat. 3.425163N Long. -73.636824W	218.50	PR40+400	PR40+140	5.44	223.940	507.00	113,537.58	BASE GRANULAR
	218.50	PR39+690	PR39+520	6.02	224.515	331.50	74,426.72	
	218.50	PR39+500	PR38+780	7.03	225.530	1,404.00	316,644.12	
					TOTAL TRANSPORTE DE SUBBASE Y BASE GRANULAR		1,738,546.00	
Transporte desde Granada	236.00	PR45+130	PR45+100	0.37	236.365	41.81	9,881.95	TRANSPORTE DE SUBBASE GRANULAR CLASE A
	236.00	PR43+150	PR43+120	2.35	238.345	68.64	16,360.00	
	236.00	PR44+640	PR44+620	0.84	236.840	105.55	24,998.46	
	236.00	PR42+140	PR42+050	3.45	239.445	223.20	53,444.12	
	236.00	PR41+950	PR41+910	3.56	239.560	70.00	16,769.20	
	236.00	PR40+320	PR40+260	5.22	241.220	618.96	149,305.53	
	236.00	PR40+430	PR40+400	5.07	241.065	42.00	10,124.73	
	236.00	PR40+150	PR40+080	5.41	241.405	244.02	58,907.65	
	236.00	PR40+030	PR40+010	5.45	241.450	28.00	6,760.60	
	236.00	PR38+570	PR38+480	7.02	243.015	358.50	87,120.88	
	236.00	PR38+340	PR38+250	7.25	243.245	360.00	87,568.20	
	236.00	PR38+100	PR37+920	7.62	243.620	753.75	183,628.58	
	236.00	PR37+450	PR37+410	8.06	244.060	291.20	71,070.27	
	236.00	PR37+060	PR36+940	8.57	244.570	478.40	117,002.29	
					TOTAL TRANSPORTE DE SUBBASE GRANULAR CLASE A		892,942.00	
					TOTAL		2,631,488.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

TRANSPORTE DE BASE GRANULAR








TRANSPORTE DE SUBBASE GRANULAR CLASE A








FUENTE DE MATERIALES DE SUBBASE MAS CERCANOS RIO ARIARI TRITURADOS DEL ARIARI A 218.5 KM DE PR45+450









FUENTE DE MATERIALES DE BASE MAS CERCANOS RIO ARIARI MINERALES DEL LLANO A 236 KM DE PR45+450

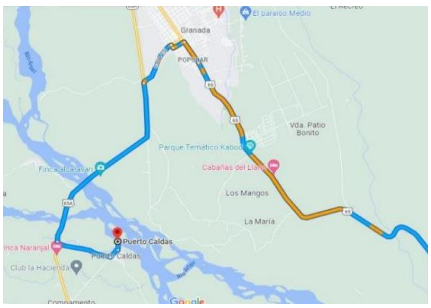

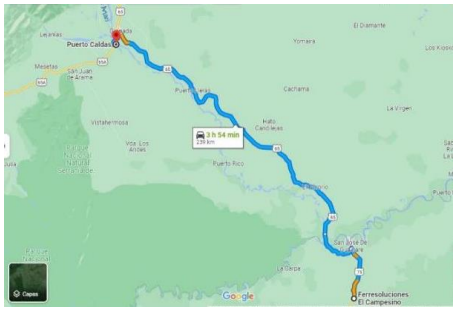

FUENTE DE MATERIALES SUBBASE GRANULAR CLASE A 236 KM DE PR45+450

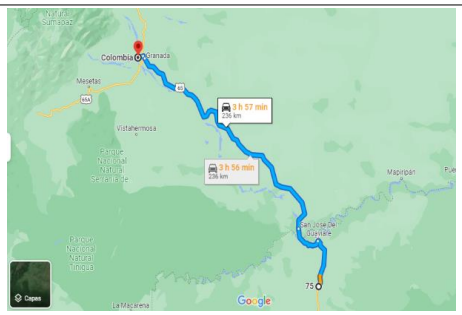

FIRMA		
NOMBRE	**EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA**	**OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ**
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
41	Transporte de mezcla asfáltica, compactos	233,689.00	m3-km

ABSCISAS			DIMENSIONES						OBSERVACIONES
INICIO	COLOCACION		LONGITUD EN OBRA	LONGITUD AL PR45+450	MEZCLA ASFALTICA				
	INICIO	FIN	LO	218,5 KM + LO	PORCENTAJE ASFALTO (%)	VOLUMEN MATERIALES (m^3)	VOLUMEN DE AGREGADOS (m3)	VOLUMEN (m^3-Km)	
Fuente de Oro coordenandas (3.425163, -73.636824)	PR40+830	PR40+470	5.16	223.66	5.5%	180.36	170.44	38120.66	
	PR45+000	PR44+500	1.20	219.70	5.5%	334.36	315.97	69418.65	Vo. MEZCLA ASFÁLTICA
	PR44+340	PR43+950	1.70	220.20	5.5%	227.37	214.86	47312.12	
	PR43+050	PR42+300	3.53	222.03	5.5%	375.75	355.08	78837.47	
							TOTAL	233,689.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA DEL PR40+830





TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN SEGUNDA CAPA PR45+000




TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN SEGUNDA CAPA PR43+050





TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN SEGUNDA CAPA PR42+600






TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN SEGUNDA CAPA PR43+050







TRANSPORTE DE ASFALTO DESDE FUENTE DE ORO

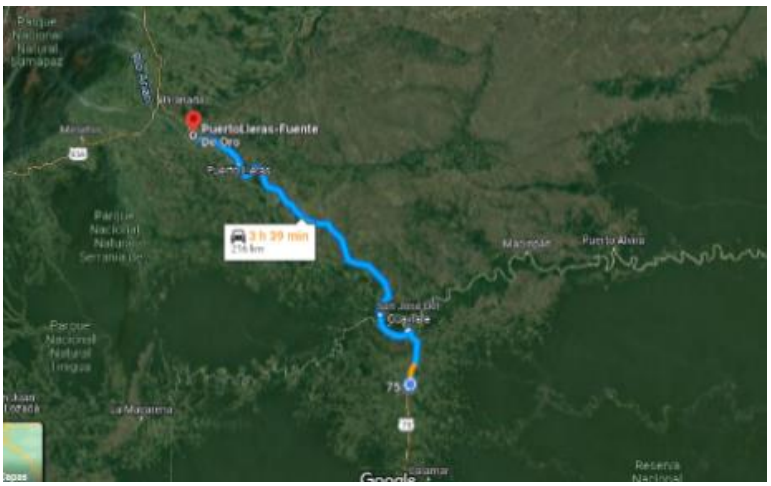

RECORRIDO AGREGADOS PÉTREOS PARA MEZCLA ASFÁLTICA

FIRMA		
NOMBRE	**EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA**	**OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ**
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE - ACTA	DESDE	HASTA
	01/05/2022	31/05/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD
NP-2	Suministro de Cal Viva	147,000.00	KG

FECHA	PK INSTALADOS	CALZADA		%	NÚMERO DE BULTOS	OBSERVACIONES
		IZQUIERDA	DERECHA			
01/05/2022	PR37+200 - PR37+290		X	3.70%	12	Estabilización subrasante
					TOTAL CAL DEL 1 DE MAYO	**12**
02/05/2022						No se reporta bultos de cal
					TOTAL CAL DEL 2 DE MAYO	**0**
03/05/2022	PR36+950 - PR36+910		X	2.00%	1	Mejoramiento de hombro
	PR36+950 - PR36+880	X		2.00%	1	Mejoramiento de hombro
	PR36+880 PR36+850	X		2.00%	1	Mejoramiento de hombro
					TOTAL CAL DEL 3 DE MAYO	**3**
04/05/2022	PR36+900 - PR36880	X		2.00%	1	Mejoramiento de hombro
	PR36+880 - PR36+860	X		2.00%	1	Mejoramiento de hombro - Capa lleno
	PR36+860 - PR36+880	X		2.00%	1	Mejoramiento de hombro - Capa lleno
	PR37+530- PR37+940		X	2.00%	2	Mejoramiento de hombro - Capa lleno
	PR37+410 - PR37+290	X		3.70%	10	Estabilización subrasante
					TOTAL CAL DEL 4 DE MAYO	**15**
05/05/2022	PR37+480 - PR37+410	X		3.70%	6	Estabilización subrasante
	PR38+200 - PR38+170		X	2.00%	1	Estabilización primera capa
	PR36+880 - PR36+840	X		2.00%	1	Mejoramiento de hombro - Tercera capa
	PR36+900 - PR36+880	X		2.00%	1	Mejoramiento de hombro - Tercera capa
					TOTAL CAL DEL 5 DE MAYO	**9**
06/05/2022	PK08+230 - PK08+290		X	2.00%	2	Mejoramiento de hombro
					TOTAL CAL DEL 6 DE MAYO	**2**
07/05/2022	PR38+250 - PR38+150		X	3.70%	9	Estabilización subrasante
	PR37+290 - PR37+090		X	3.70%	17	Estabilización subrasante
					TOTAL CAL DEL 7 DE MAYO	**26**
08/05/2022	PR36+910 -PR36+840	X		2.00%	3	Estabilización lleno - Primera capa
					TOTAL CAL DEL 8 DE MAYO	**3**
09/05/2022	PR37+090 - PR37+010		X	3.70%	7	Estabilización subrasante
	PR38+090 - PR38+010		X	3.70%	7	Estabilización subrasante
	PR38+210- PR38+150	X		2.00%	3	Estabilización primera capa
					TOTAL CAL DEL 9 DE MAYO	**17**
10/05/2022	PR37+010 - PR36+640		X	3.70%	6	Estabilización de subrasante

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE - ACTA	DESDE	HASTA
	01/05/2022	31/05/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM					CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD
NP-2	Suministro de Cal Viva					147,000.00	KG
10/05/2022	PR38+250 - PR38+140	X		3.70%	10	Estabilización de subrasante	
					TOTAL CAL DEL 10 DE MAYO	16	
11/05/2022	PR37+290 - PR37+150	X		3.70%	12	Estabilización subrasante	
	PR36+850 - PR36+820		X	2.00%	1	Lleno de hombro	
					TOTAL CAL DEL 11 DE MAYO	13	
12/05/2022	PR37+150 - PR37+030	X		3.70%	10	Estabilización de subrasante	
	PR37+530 - PR37+500	X		2.00%	1	Estabilización	
					TOTAL CAL DEL 12 DE MAYO	11	
13/05/2022	PR38+130 - PR37+990	X		3.70%	12	Estabilización de subrasante	
	PR38+130 - PR38+090		X	3.70%	3	Estabilización de subrasante	
	PR37+690 - PR37+610	X		2.00%	2	Mejoramiento de hombro	
					TOTAL CAL DEL 13 DE MAYO	17	
14/05/2022	PR38+010 - PR37+970	X		3.70%	3	Estabilización de subrasante	
					TOTAL CAL DEL 14 DE MAYO	3	
					TOTAL CAL DEL MES	147000	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CAL DEL 1 DE MAYO DEL 2022 PR37+200 - PR37+290



CAL DEL 3 DE MAYO DEL 2022 PR36+950 PR36+910 - PR36+950 PR36+880 - PR36+880 PR36+850



CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	**CONTRATO 976-2021** **OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"**	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE - ACTA	DESDE	HASTA
	01/05/2022	31/05/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD
NP-2	Suministro de Cal Viva	147,000.00	KG

CAL DEL 4 DE MAYO DEL 2022 MEJORAMIENTO DE HOMBRO EN CALZADA DERECHA E IZQUIERDA PR36+900 - PR36880 Y ESTABILIZACIÓN PR37+410 - PR37+290









CAL DEL 5 DE MAYO DEL 2022 ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE Y MEJORAMIENTO DE HOMBRO PR37+480 PR37+410 -





CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE - ACTA	DESDE	HASTA
	01/05/2022	31/05/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD
NP-2	Suministro de Cal Viva	147,000.00	KG



CAL DEL 7 DE MAYO DEL 2022 PR38+250 - PR38+150 Y PR37+290 - PR37+090





CAL DEL 8 DE MAYO DEL 2022 ESTABILIZACIÓN LLENO EN PRIMERA CAPA PR36+910 -PR36+840



FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-3	Mejoramiento de la Subrasante con Cal Viva, no incluye suministro de Cal ni transporte. (Con material de prestamo).	2,304.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR38+010.00	PR38+000.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR38+000.00	PR37+990.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+990.00	PR37+980.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+980.00	PR37+970.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+480.00	PR37+470.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+470.00	PR37+460.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+460.00	PR37+450.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+450.00	PR37+440.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+440.00	PR37+430.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+430.00	PR37+420.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+420.00	PR37+410.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+410.00	PR37+400.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+400.00	PR37+390.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+390.00	PR37+380.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+380.00	PR37+370.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+370.00	PR37+360.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+360.00	PR37+350.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+350.00	PR37+340.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+340.00	PR37+330.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+330.00	PR37+320.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+320.00	PR37+310.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+310.00	PR37+300.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+300.00	PR37+290.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+290.00	PR37+280.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+280.00	PR37+270.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+270.00	PR37+260.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+260.00	PR37+250.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+250.00	PR37+240.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+240.00	PR37+230.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+230.00	PR37+220.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+220.00	PR37+210.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+210.00	PR37+200.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+200.00	PR37+190.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+190.00	PR37+180.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+180.00	PR37+170.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+170.00	PR37+160.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	ESTABILIZACIÓN AL 3.7%
PR37+160.00	PR37+150.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+150.00	PR37+140.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+140.00	PR37+130.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+130.00	PR37+120.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+120.00	PR37+110.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+110.00	PR37+100.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+100.00	PR37+090.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+090.00	PR37+080.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+080.00	PR37+070.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+070.00	PR37+060.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-3	Mejoramiento de la Subrasante con Cal Viva, no incluye suministro de Cal ni transporte. (Con material de prestamo).	2,304.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR37+060.00	PR37+050.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+050.00	PR37+040.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+040.00	PR37+030.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+030.00	PR37+020.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+020.00	PR37+010.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+010.00	PR37+000.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR37+000.00	PR36+990.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR36+990.00	PR36+980.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR36+980.00	PR36+970.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR36+970.00	PR36+960.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR36+960.00	PR36+950.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR36+950.00	PR36+940.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR36+940.00	PR36+930.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR36+930.00	PR36+920.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR36+920.00	PR36+910.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR36+910.00	PR36+900.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR36+900.00	PR36+890.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR36+890.00	PR36+880.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR36+880.00	PR36+870.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR36+870.00	PR36+860.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR36+860.00	PR36+850.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR36+850.00	PR36+840.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR36+840.00	PR36+830.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
PR36+830.00	PR36+820.00	10.00	2.66	2.66	2.66	26.63	
					TOTAL ESTABILIZADO AL 3.7%	1863.75	
PR37+690.00	PR37+680.00	10.00	0.65	0.65	0.65	6.50	
PR37+680.00	PR37+670.00	10.00	0.65	0.65	0.65	6.50	
PR37+670.00	PR37+660.00	10.00	0.65	0.65	0.65	6.50	
PR37+660.00	PR37+650.00	10.00	0.65	0.65	0.65	6.50	
PR37+650.00	PR37+640.00	10.00	0.65	0.65	0.65	6.50	
PR37+640.00	PR37+630.00	10.00	0.65	0.65	0.65	6.50	
PR37+630.00	PR37+620.00	10.00	0.65	0.65	0.65	6.50	
PR37+620.00	PR37+610.00	10.00	0.65	0.65	0.65	6.50	
PR37+240.00	PR37+230.00	10.00	1.12	1.12	1.12	11.20	
PR37+230.00	PR37+220.00	10.00	1.12	1.35	1.24	12.35	
PR37+220.00	PR37+210.00	10.00	1.35	1.35	1.35	13.50	
PR37+210.00	PR37+200.00	10.00	1.35	1.40	1.38	13.75	
PR37+200.00	PR37+190.00	10.00	1.40	1.40	1.40	14.00	
PR36+950.00	PR36+940.00	10.00	0.75	0.75	0.75	7.50	
PR36+940.00	PR36+930.00	10.00	0.75	0.75	0.75	7.50	
PR36+930.00	PR36+920.00	10.00	0.75	0.75	0.75	7.50	
PR36+920.00	PR36+910.00	10.00	0.75	1.04	0.89	8.94	
PR36+910.00	PR36+900.00	10.00	1.04	1.56	1.30	12.98	
PR36+900.00	PR36+890.00	10.00	1.56	6.03	3.79	37.94	
PR36+890.00	PR36+880.00	10.00	6.03	6.58	6.31	63.05	
PR36+880.00	PR36+870.00	10.00	6.58	8.67	7.63	76.25	
PR36+870.00	PR36+860.00	10.00	8.67	4.93	6.80	68.00	
PR36+860.00	PR36+850.00	10.00	4.93	0.95	2.94	29.38	
PR36+850.00	PR36+840.00	10.00	0.95	0.00	0.47	4.73	
					TOTAL ESTABILIZADO AL 2.00%	440.55	
					TOTAL	2,304.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-3	Mejoramiento de la Subrasante con Cal Viva, no incluye suministro de Cal ni transporte. (Con material de prestamo).	2,304.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES

ESTABILIZACIÓN PR37+200 - PR37+290 CALZADA DERECHA



MEJORAMIENTO DE HOMBEO PR36+950 PR36+910 - PR36+950 PR36+880 - PR36+880 PR36+850 CALZADA DERECHA E IZQUIERDA



CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-3	Mejoramiento de la Subrasante con Cal Viva, no incluye suministro de Cal ni transporte. (Con material de prestamo).	2,304.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	

MEJORAMIENTO DE HOMBRO EN CALZADA DERECHA E IZQUIERDA PR36+900 - PR36880 Y ESTABILIZACIÓN PR37+410 - PR37+290









ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE Y MEJORAMIENTO DE HOMBRO PR37+480 PR37+410 -





CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-3	Mejoramiento de la Subrasante con Cal Viva, no incluye suministro de Cal ni transporte. (Con material de prestamo).	2,304.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE EN PR38+250 - PR38+150 Y PR37+290 - PR37+090





ESTABILIZACIÓN LLENO EN PRIMERA CAPA PR36+910 -PR36+840



FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA	NOMBRE	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 12

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/mayo/2022	31/mayo/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-6	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos entre 100 metros y 1000 metros de distancia.	4,510.00	m3-E

ACTIVIDADES	DIMENSIONES			OBSERVACIONES
TRANSPORTE DE	VOLUMEN DESCAPOTE (m^3)	VOLUMEN EXCAVACIONES (m^3)	VOLUMEN (m^3-E)	
Descapote	718.40	1.00	718.40	
Excavaciones	3,792.00	1.00	3,792.00	
		TOTAL	4,510.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.



PR38+030



PR38+050



PR38+070



PR38+250



Recorrido de excavaciones



Recorrido transporte de materiales provenientes de

FIRMA		
NOMBRE	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190
