enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de	1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO											
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES											
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A											
REGISTRO No.	INC 023	FECHA	2022	8	22	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	IROLDO TORRES SAMPAYO		
DIRECCIÓN	CL 13 5A -49		
TELÉFONO	311375 1031	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	13.5	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir segun tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda, cuenta con terraza de acabado en concreto y pintura en muros en regular estado. La puerta principal e s de madera y la ventana es de vidrio. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en concreto con presencia de algunas grietas y pintura en muro s con desgaste.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma Irroldo Torres
Nombre: IROLDO TORRES SAMPAYO
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 73.316.674

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :	2220576							Hoja	1	de	1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	INC 036	FECHA	2022	8	22	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	ELSY ESTRADA LEGUIA		
DIRECCIÓN	CL 13 4A-7		
TELÉFONO	3215816711	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	13.0	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	N	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

L a fachada frontal de la vivienda cuenta con andén de acabado en arena y muros sin pañetar en mal estado. La puerta principal es de madera. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en arena y muros con pañete parcial en mal estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre: ELSY ESTRDA LEGUIA
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 22.554.755

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :	2220576							Hoja	1	de	1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	161	FECHA	2022	8	18	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ		
DIRECCIÓN	CL 10 KR 7 - 24		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	12.13	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	N	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS			
RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION -Describir segun tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con andén de acabado en concreto con prresencia de grietas y muros con pintura en mal estado con presencia de múltiples grietas. La puerta principal y la ventana son de madera. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en concreto e n regular estado y muros con pintura en mal estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO





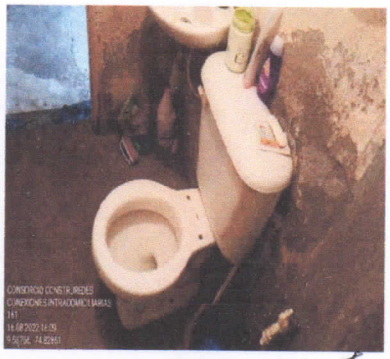

Firma MANUEL R
Nombre: MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1.849.454.237

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	INC 024	FECHA	2022	8	22	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

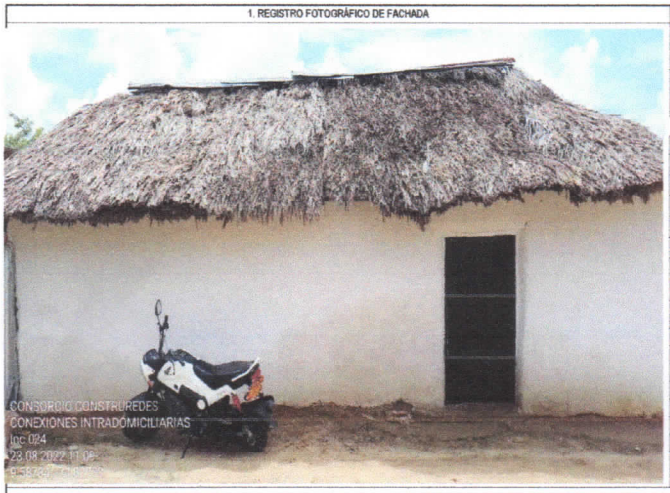

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	ARGENIDA RIVERA CRUZATE		
DIRECCIÓN	CR 6 CL 9-2		
TELÉFONO	3244824726	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	9.5	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir segun tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda, cuenta con andén de acabado en arena y muros con pintura en regular estado. La puerta principal es de madera. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de psio en arena y muros con pintura en regular estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre: ARGENIDA RIVERA CRUZATE
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 22.854.180

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	INC 049	FECHA	2022	8	22	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	ROSA DE AVILA PADILLA		
DIRECCIÓN	CL 12 7-50		
TELÉFONO	3145030830	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	10.0	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir segun tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con terraza de acabado en concreto y muros con pintura en regular estado. La puerta principal es de metal con rejas de hierro y las ventanas son corredizas de vidro con protectores de hierro. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en concreto y pintura en muros en regular estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma

Nombre: ROSA DE AVILA PADILLA
PROPIETARIO DEL PREDIO

C.C. / NIT 26.840.974

Firma

Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma

Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio solo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	INC 027	FECHA	2022	8	18	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	ROSA ESCOBAR FERNANDEZ		
DIRECCIÓN	CR 4A 8 - 20		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	12.0	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con andén de acabado en arena y muros con pañete y pintura parcial en mal estado. La puerta principal es de madera con reja de hierro y la ventana es corrediza de vidrio. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en arena y muros de bahareque sin pañetar.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre: ROSA ESCOBAR FERNANDEZ
C.C. / NIT 22.854.436

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	INC 032	FECHA	2022	8	22	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

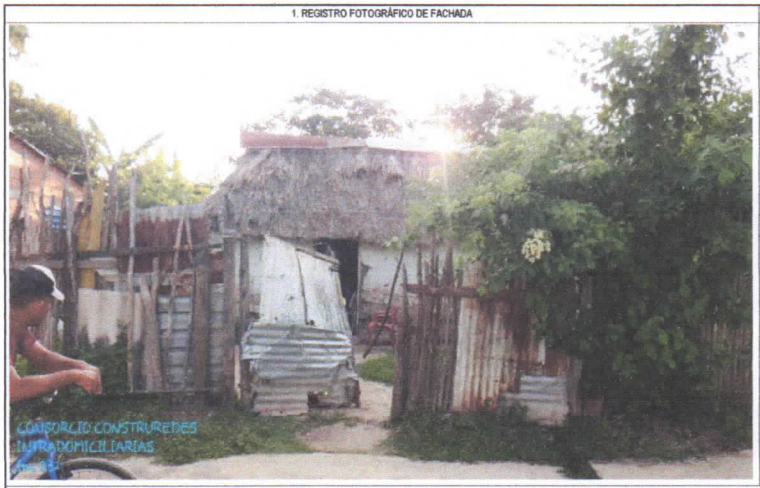

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	RAFAEL VILLAMIZAR ROSALES		
DIRECCIÓN	CR 4 8 - 31		
TELÉFONO	3135843161	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	13.0	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS


RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO ¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con andén de acabado en arena y muros de bahareque con pintura parcial enmal estado. La puerta principal es de madera. Al int erior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en arena y muros de bahareque sin pañetar en mal estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre: RAFAEL VILLAMIZAR ROSALES
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 3.831.845

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	037	FECHA	2022	5	12	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	TERESA RIVERA CRUZATE.		
DIRECCIÓN	CR. 6 CL 9-2		
TELÉFONO	3002316099	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	7.0	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO ¿CUÁL?	


OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada de la vivienda cuenta con terraza de acabado en concreto y pintura en muros en regular estado. La puerta principal es de metal con rejas de hierro y las ventanas son corredizas de vidrio. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en concreto y muros sin pañete.

4. ANEXO FOTOGRAFICO



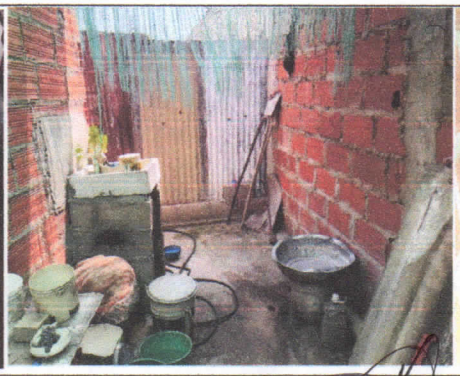

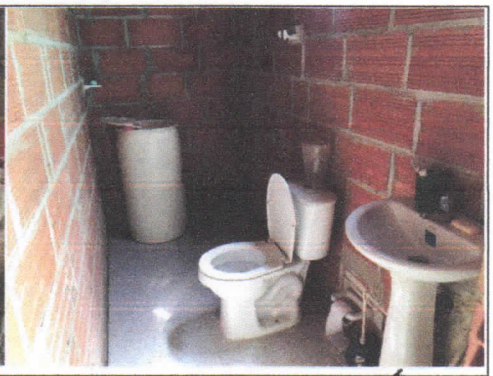

Firma
Nombre: TERESA RIVERA CRUZATE.
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 22.853.365

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	INC 038	FECHA	2022	8	18	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

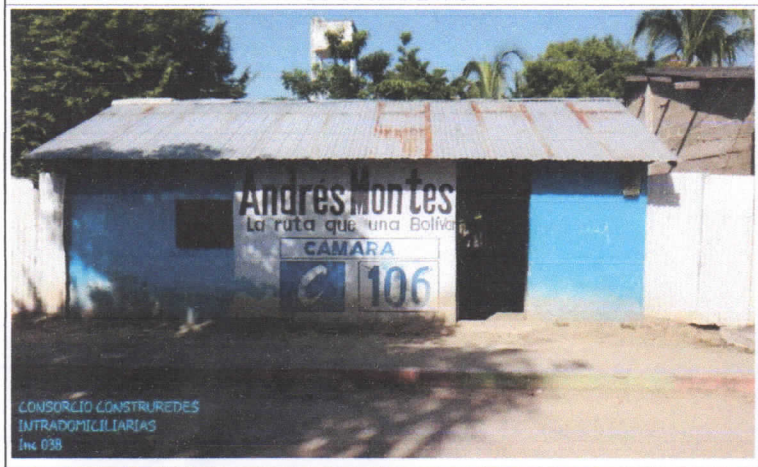

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	MARTIN LOZANO RIVERA		
DIRECCIÓN	CR 4A 11 - 76		
TELÉFONO	3024194186	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	9.0	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con andén de acabado en concreto y arena y ointura en muros en regular estado. La puerta principal es d e madera. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en concreto y pintura en muros en regular estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre: MARTIN LOZANO RIVERA
C.C. / NIT 12.537.129

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	INC 039	FECHA	2022	8	18	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	ELIANI FLOREZ MENDOZA		
DIRECCIÓN	CR 8 12 - 36		
TELÉFONO	3244856529	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	9.0	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	N	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con terraza de acabado en concreto rústico y pintura en muros en mal estado. La puerta principal y las ventanas son de madera. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en concreto y pintura en muros en regular estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma: Eliani Florez Mendoza
Nombre: ELIANI FLOREZ MENDOZA
C.C. / NIT 22.856.909

Firma:
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma:
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORIA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	200	FECHA	2022	8	22	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

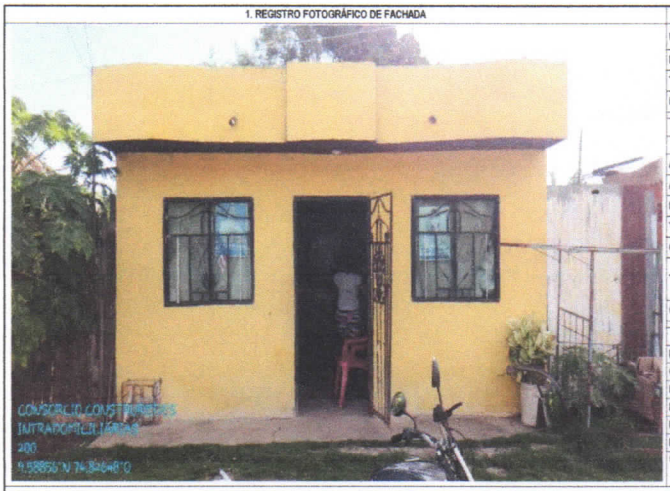

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	NELFIS TORRES PEREZ		
DIRECCIÓN	CL 11 5A - 3		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	4.85	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	N	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS


RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir segun tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con terraza de acabado en concreto con presencia de grietas y pintura en muros en regular estado con presencia de grietas . La puerta principal es de metal con rejas de hierro y ventanas de vidrio con protectores de hierro. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en concreto y muros con pañete sin pintura con presencia de múltiples grietas.

4. ANEXO FOTOGRAFICO

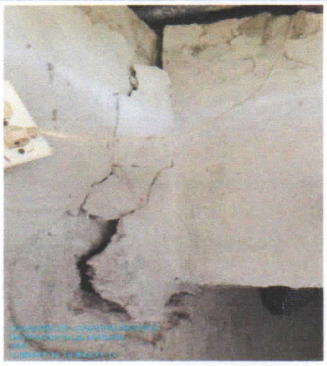





Firma
Nombre: NELFIS TORRES PEREZ
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 22.856.790

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	INC 040	FECHA	2022	8	22	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

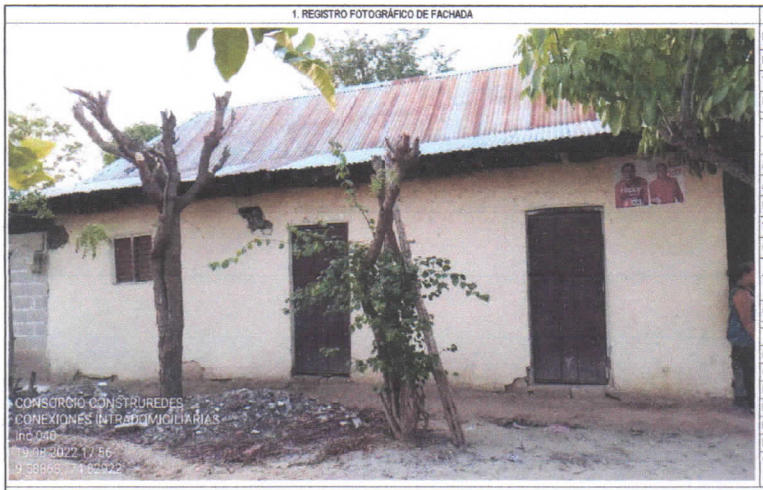

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	FIDEL ALVAREZ MARTINEZ		
DIRECCIÓN	CL 12 KR 8 - 6		
TELÉFONO	3114315654	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	12.0	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con andén en arena en mal estado y pintura en muros en mal estado. La puerta principal y la ventana es mader. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en concreto con múltiples grietas y muros en su mayoria cuentan con pañete y pintura en regular es tado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre: FIDEL ALVAREZ MARTINEZ
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 3.831.827

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	INC 041	FECHA	2022	8	22	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	DUBERLIS TORRES ANAYA		
DIRECCIÓN	CL 11 4 -6		
TELÉFONO	3005794572	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	14.0	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir segun tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con rejas de madera, terraza de acabado en baldosa y pintura en muros en regular estado. La pue rta principal es de metal con rejas de hierro y ventanas de vidrio con protectores de hierro. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en bal dosa y pintura en muros en regular estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma DUBERLIS TORRES
Nombre: DUBERLIS TORRES ANAYA
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 22.856.866

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORIA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio solo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :	2220576							Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO									
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES									
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A									
REGISTRO No.	201	FECHA	2022	7	28	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	YULISSA PEREZ ROMERO		
DIRECCIÓN	CL 11 4A - 4		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	11,50	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO ¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con andén de acabado en concreto en mal estado y pintura en muros en mal estado. La puerta principal y la ventana es de madera. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en concreto y pintura en muros en regular estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma: Yulissa Perez Romero
Nombre: YULISSA PEREZ ROMERO
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1.049.454.950

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	INC 046	FECHA	2022	8	22	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	NULIS HENAO CAUSADO		
DIRECCIÓN	CL 13 KR 6A-5		
TELÉFONO	3023678979	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	10.4	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir segun tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con terraza de acabado en arena y pintura en muros en regular estado. La puerta principal es de metal y las ventanas son de vidriocon protectores de hierro. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en concreto rústico y muros con pintura en regular estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO





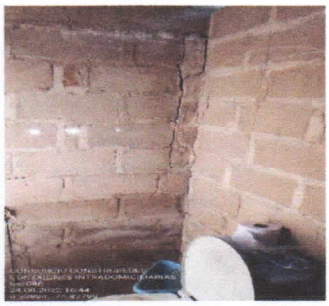

Firma Nulis Henao
Nombre: NULIS HENAO BARBOZA
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 22.856.863

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	INC 050	FECHA	2022	8	22	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

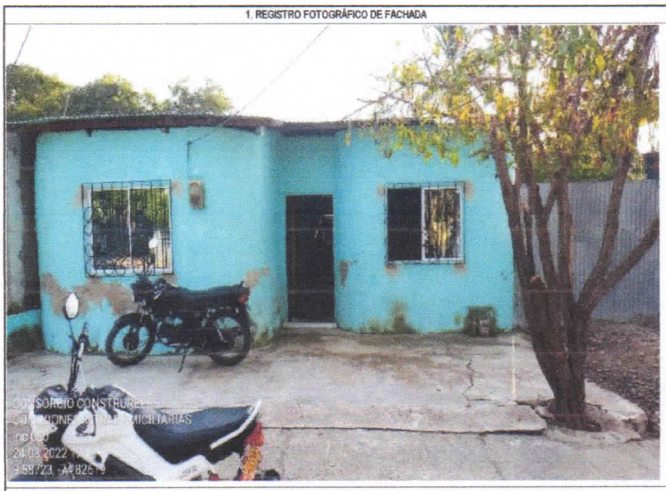

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	ANGELA MARTINEZ FLOREZ		
DIRECCIÓN	KR 4A CLN 8 - 47		
TELÉFONO	3227622976	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	13.0	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir segun tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con terraza de acabado en concreto y pintura en muros en mal estado. La puerta principal es de madera y las ventanas son corredizas de vidrio con protectores de hierro. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en concreto y pintura en muros en regular estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre: ANGELA MARTINEZ FLOREZ
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 22.053.964

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORIA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	INC 051	FECHA	2022	8	18	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	LILIA TERAN ROMERO		
DIRECCIÓN	KR 4A CL 6 -29		
TELÉFONO	3008993126	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)		ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS


RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?


OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir segun tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con terraza de acabado en concreto con presencia de múltiples grietas y pintura en muros en regular estado. La puerta principal es de metal y las ventanas son de madera con vidrio con protectores de hierro. Al interior de la vivienda cuenta con acabado de piso en concreto con presencia de múltiples grietas y pintura en muros en regular estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO

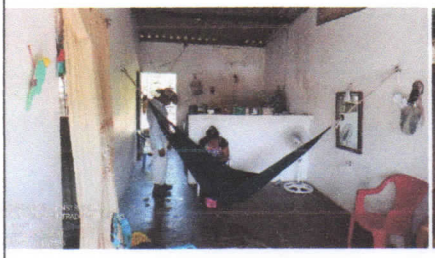

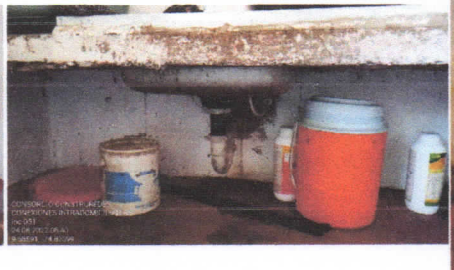

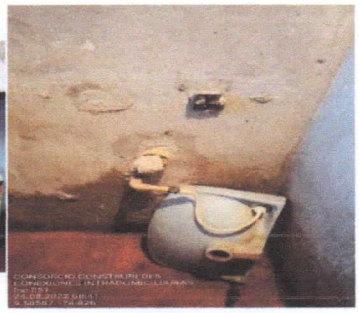

Firma Lilia TeRan
Nombre: LILIA TERAN ROMERO
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 22.855.017

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	INC 062	FECHA	2022	8	22	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	TULIA OCHOA CRUZATE		
DIRECCIÓN	CR 7A 11-61		
TELÉFONO	3116514304	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	11.5	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir segun tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con terraza de acabado en baldosa y pintura en muros en regular estado. La puerta principal es de madera con reja de hierro y las ventanas son de madera y vidrio con protectores de hierro. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en bald osa y pintura en muros en regular estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma Tulia ochoa c
Nombre: TULIA OCHOA CRUZATE
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 22.654.199

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORIA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	INC 065	FECHA	2022	8	22	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	EULOGIO VILLAMIZAR SANES		
DIRECCIÓN	CR 8 11 - 32		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	9.0	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION -Describir segun tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con andén de acabado en arena y muros de bahareque con pintura parcial en mal estado. La puerta principal es de lámina de zinc. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en arena y muros de bahareque sin pañetar en mal estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre: EULOGIO VILLAMIZAR SANES
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 3.831.698

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:			CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO								
CONTRATISTA:			CONSORCIO CONSTRUREDES								
INTERVENTOR:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A								
REGISTRO No.	O75	FECHA	2022	7	28	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

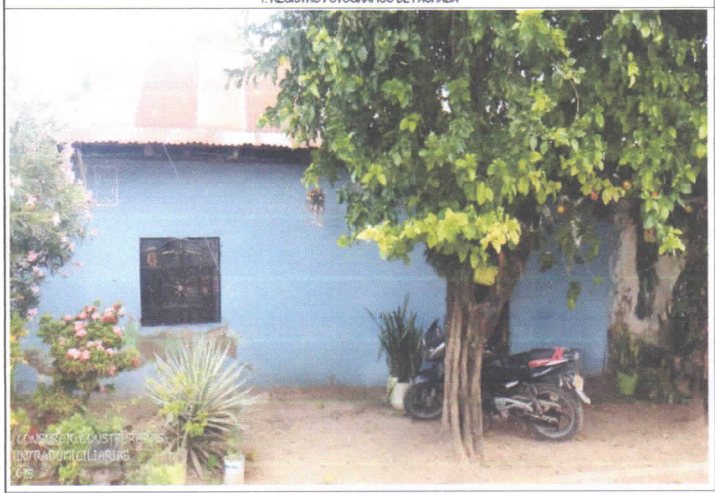

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	JULIO MEDINA ARIAS		
DIRECCIÓN	CR 8 CL 8 - 21		
TELÉFONO	3008767577	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	11,25	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		


CLASIFICACIÓN DE PREDIOS			
RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO ¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con andén de acabado en t ierra y pintura en muros en regular estado. La puerta principal es de madera y las ventanas son de vidrio con protectores de hierro. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en concreto y adoquín, pintura en m uros en mal estado con presencia de algunas grietas.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre: JULIO MEDINA ARIAS
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 73,316,758

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:			CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO								
CONTRATISTA:			CONSORCIO CONSTRUREDES								
INTERVENTOR:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A								
REGISTRO No.	105	FECHA	2022	7	28	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	YADIRA ZUÑIGA DE MORANTE		
DIRECCIÓN	CL 8 CR 5A - 35		
TELÉFONO	3003209835	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	20,30	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO ¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION :<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con terraza de acabado en baldosa y pintura en muros en buen estado. La puerta principal y l as ventanas son de madera con protectores de hierro. Al interior de la vivienda cuenta con acabado de piso en baldosa y pintura en muros en buen estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre: YADIRA ZUÑIGA DE MORANTE
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 22,853,989

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	178	FECHA	2022	7	28	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	LUIS ALBERTO VALETH HERNANDEZ		
DIRECCIÓN	CL 8 CR 4 - 41		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	9.9	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION -Describir segun tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 -

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con terraza de acabado en baldosa y rejas, pintura en muros en regular estado. La puerta principal es de madera y las ventanas son corredizas de vidrio con protectores de hierro. Al interior de la vivienda cuenta con acabado de piso en baldosa y pintur a en muros en regular estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre: LUIS VALETH HERNANDEZ
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1.049.452.015

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	202	FECHA	2022	7	28	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

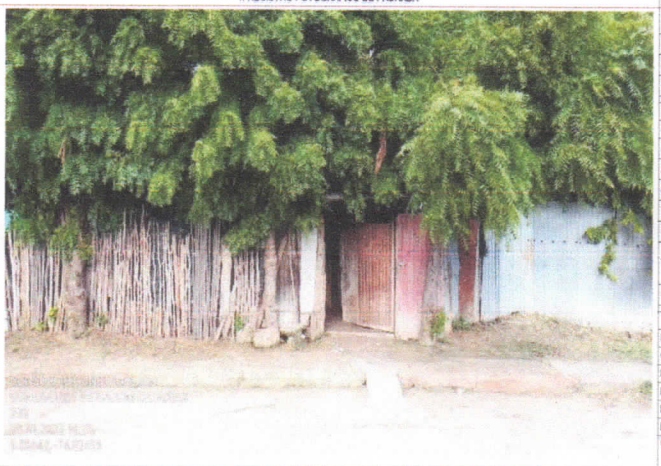

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	ANTONIO HENAO ESCOBAR		
DIRECCIÓN			
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	14.5	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir segun tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con andén de acabado en concreto y arena. La puerta de acceso es de zinc en regular estado. Al interior de la vivienda cuenta con acabado de piso en arena y muros sin pañete.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma Antonio Henao
Nombre: ANTONIO HENAO ESCOBAR
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 73.315.178

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	208	FECHA	2022	8	18	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

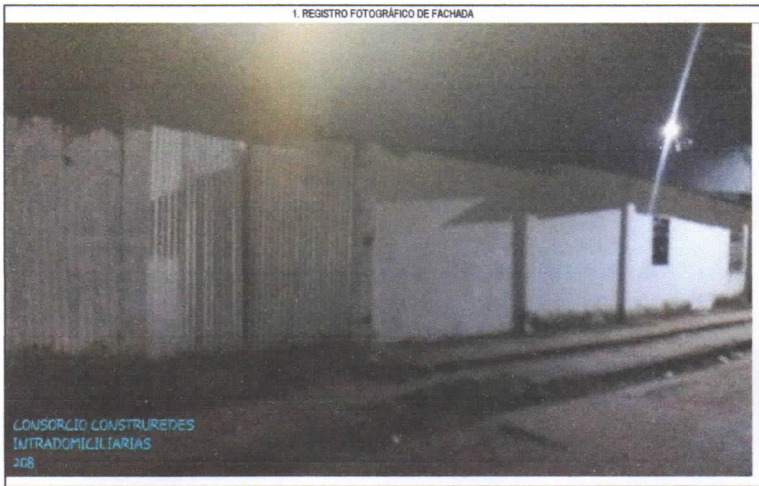

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	DAIBER BANDA RIVERA		
DIRECCIÓN	CR 8 7 - 6		
TELÉFONO	3013491343	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	10.6	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	N	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con acabado de andén de acabado en concreto y pintura en muros en regular estado. La puerta principal e s de metal con rejas de hierro y las ventanas son corredizas de vidrios con protectores de hierro. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en baldo sa y pintura en muros en regular estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre: DAIBER BANDA RIVERA
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 73.316.074

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :	2220576								Hoja	1	de	1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO											
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES											
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A											
REGISTRO No.	065	FECHA	2022	7	28	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA			

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

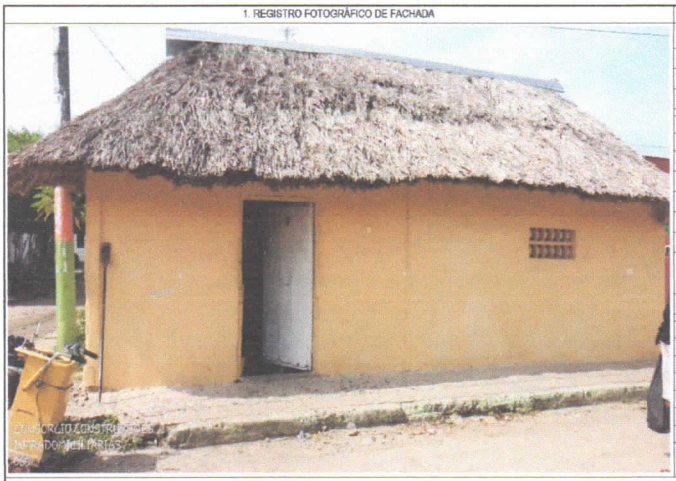

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	RANGEL MONTES OCHOA		
DIRECCIÓN	CL 10 7 - 1		
TELÉFONO	3012630200	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	10,10	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS		
	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS					
RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION:<Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, murca, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda, cuenta con andén en concreto en mal estado y pintura en muros en regular estado. La puerta principal es de madera en regular estado. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en concreto y pintura en muros en regular estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma Rangel montes
Nombre: RANGEL MONTES OCHOA
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 73.315.021

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	066	FECHA	2022	8	18	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

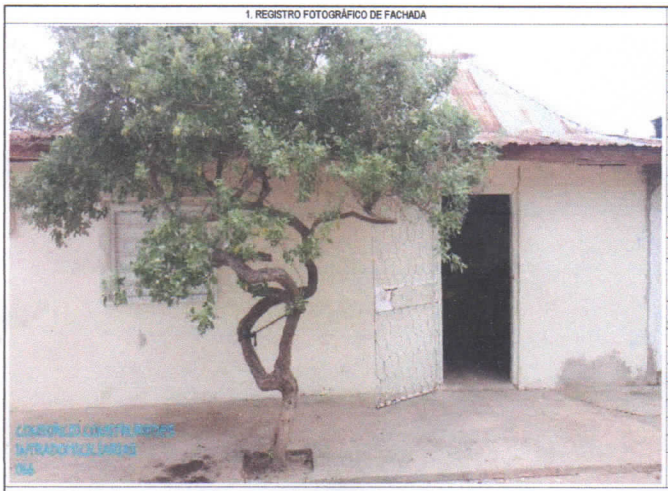

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	PEDRO VERGARA VEGA		
DIRECCIÓN	CL 10 7 - 35		
TELÉFONO	3017869640	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	10.4	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO ¿CUÁL?	


OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con terraza de acabado en concreto y pintura en muros en regular estado. La puerta principal es de madera con rejas de hierro y ventanas de madera con protectores de hierro. Al interior de la vivienda cuenta con acabado de piso en concreto y pintura en muros en regular estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO



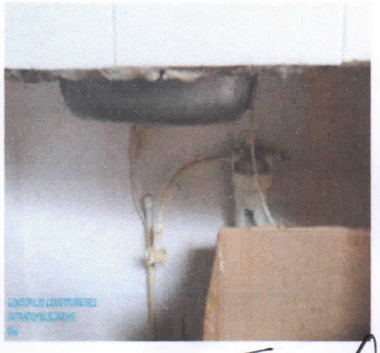



Firma
Nombre: PEDRO VERGARA VEGA
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 3.831.416

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :	2220576							Hoja	1	de	1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	077	FECHA	2022	7	16	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

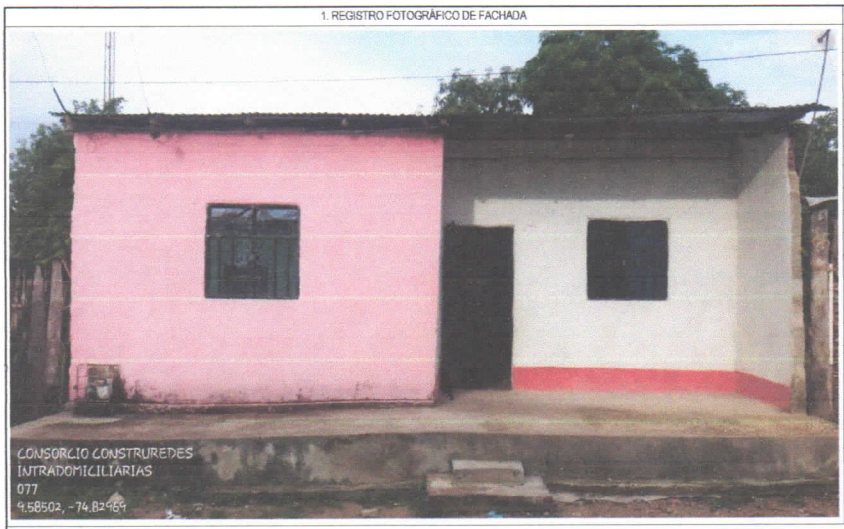

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	IRLENA GONZALEZ TERAN		
DIRECCIÓN	KR 8 CL 7 - 20		
TELÉFONO	3003079960	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	7,65	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	


OBSERVACIONES - DESCRIPCION: <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con acabado de piso en concreto y pintura en muros en regular estado. La puerta principal es de metal y las ventanas son de vidrio con protectores de hierro. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en arena y muros sin pañete.

4. ANEXO FOTOGRAFICO



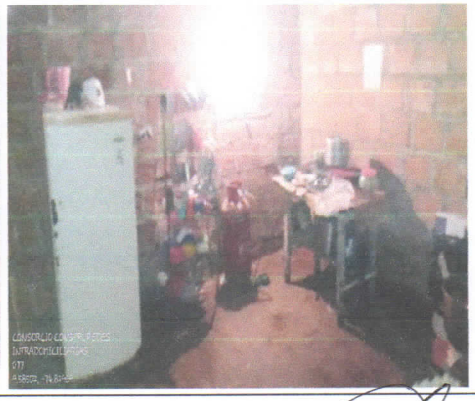

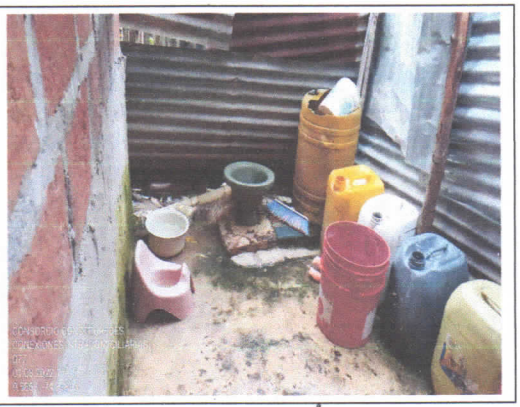

Firma
Nombre: IRLENA GONZALEZ TERAN
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 57,445,250

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	080	FECHA	2022	7	28	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

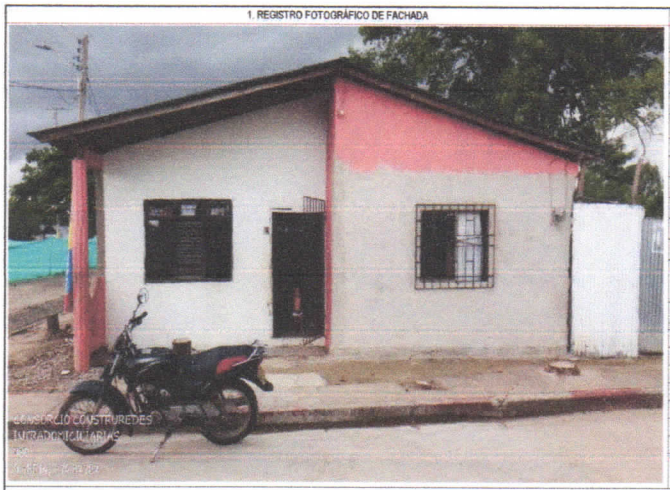

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	AUDITH SANCHEZ PIÑA		
DIRECCIÓN	CL 11 6 - 36		
TELÉFONO	3122467550	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	18.3	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION -Describir segun tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 -

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con terraza de acabado en concreto en regular estado y pintura en muros en mal estado. La p uerta principal es de madera y las ventanas son de madera con protectores de hierro. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en concreto y muros en su mayoria con pintura con desgaste por uso.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma Audith Sánchez Piña
Nombre: AUDITH SANCHEZ PIÑA
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 22.855.984

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio solo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :	2220576								Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	083	FECHA	2022	7	28	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	LUZ MARY PEREZ MARTINEZ		
DIRECCIÓN	CL 12 CR 6		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	4.8	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir segun tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con andén de acabado en arena y pintura en muros en mal estado. La puerta principal es de madera. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en arena y muros con pintura parcial en mal estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre: LUZ MARY PEREZ MARTINEZ
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 22.855.982

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	108	FECHA	2022	7	28	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	IVAN BAÑOS CARDONA		
DIRECCIÓN	CL 7 K 7 - 32		
TELÉFONO	3004599951	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	12,00	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir segun tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con terraza de acabado en baldosa y pintura en muros en buen estado. La puerta principa l es de madera con reja de hierro y las ventanas son de vidrio. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en baldosa y pintura en muros en buen estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre: IVAN BAÑOS CARDONA
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 73.206.883

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	116	FECHA	2022	7	28	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO .

PROPIETARIO	EMMA MORENO REINA		
DIRECCIÓN	KR 4 CL 6 - 1		
TELÉFONO	3135875311	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	8.9	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION -Describir segun tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 -

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con andén de acabado en concreto y pintura en muros en regular estado. La puerta principal es de madera. Al interior de la vivienda cuenta con acabado de piso en concreto con presencia de grietas y pintura en muros en mal estado con presencia de gr ietas.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre: EMMA MORENO REINA
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 39.616.741

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	117	FECHA	2022	8	18	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	ARTURO VILLAFAÑE HERRERA		
DIRECCIÓN	CL 7 3 - 51		
TELÉFONO	3114141335	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	9.4	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS				
RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir segun tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda, cuenta con andén en arena y pintura en muros en regular estado. La puerta principal es de metal con rejas de hierro y ventanas de vidrio corredizas con protectores de hierro. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en concreto y pintura en muros en regular estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma x Arturo Villafañe

Nombre: ARTURO VILLAFAÑE HERRERA
PROPIETARIO DEL PREDIO

C.C. / NIT 5.124.620

Firma

Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma

Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576						Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO										
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES										
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A										
REGISTRO No.	141	FECHA	2022	7	16	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	ANA VASQUEZ GUERRERO		
DIRECCIÓN	CL 9 4A - 69		
TELÉFONO	3043935658	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	12,84	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

OBSERVACIONES - DESCRIPCION <Describir según tipologías definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003.>

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con terraza de acabado en baldosa y pintura en muros en regular estado. La puerta principal es de metal y las ventanas son corredizas de vidrio con protectores de hierro. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en baldosa y pintura en muros en re gular estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma ANA VOSQUEZ
Nombre: ANA VASQUEZ GUERRERO
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 22,854,689

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoria, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.


Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

enterritorio	ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO:	F-GG-04
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

CONTRATO No. :			2220576					Hoja	1	de 1
OBJETO:	CHEQUEO,VALIDACION DE PROTOTIPOS,DIAGNOSTICOS,CONCERTACION,INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION PARA EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO									
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES									
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A									
REGISTRO No.	191	FECHA	2022	7	28	ELABORÓ	ING. RONAL BLANCO ARROYO	REVISÓ	RONAL JAVIER ARRIETA	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

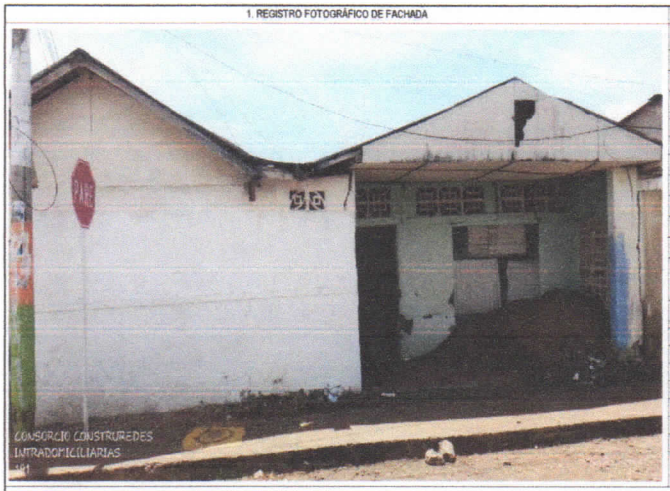

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	JORGE PALOMINO MARRUGO		
DIRECCIÓN	CALLE 10 KR 7 - 28		
TELÉFONO	3007293711	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	12.8	ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	S	
ALCANTARILLADO	N	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	S	
TELEVISIÓN - CABLE	S	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

OBSERVACIONES - DESCRIPCION -Describir segun tipologias definidas en el Acuerdo No. 105 de 2003 >

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas, otros)

La fachada frontal de la vivienda cuenta con terraza de acabado en concreto en mal estado y muros con pintura en mal estado con presencia de múltiples grietas. La puerta principal es de madera y las ventanas están cubiertas con láminas de zinc. Al interior de la vivienda, cuenta con acabado de piso en concreto con presencia de múltiples grietas y muros en su mayoria sin pintura, en mal estado.

4. ANEXO FOTOGRAFICO







Firma
Nombre: JORGE PALOMINO MARRUGO
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1.193.567.190

Firma
Nombre: RONAL BLANCO ARROYO
REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma
Nombre: RONALD JAVIER ARRIETA
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría, Propietario

Nota: Ver aviso de privacidad para la recolección de datos personales al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

AVANCE DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PROYECTO

SEMANA 15 DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DEL 2022

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 1.771.707.945,99

Semáforo

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 625.511.364,50	35,31%	$ 465.955.429,45	26,30%	-$ 159.555.935,05	-9,01%
Durante el Periodo	$ 127.355.175,68	7,19%	$ 95.813.355,01	5,41%	-$ 31.541.820,67	-1,78%
Acumulado a la Fecha	**$ 752.866.540,18**	**42,49%**	**$ 561.768.784,46**	**31,71%**	**-$ 191.097.755,72**	**-10,79%**

Desviación en días: 16 Días

SEMANA 16 DEL 08 AL 14 DE AGOSTO DEL 2022

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 1.771.707.945,99

Semáforo

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 752.866.540,18	42,49%	$ 561.808.589,67	31,71%	-$ 191.057.950,51	-10,78%
Durante el Periodo	$ 127.355.175,68	7,19%	$ 55.790.979,19	3,15%	-$ 71.564.196,49	-4,04%
Acumulado a la Fecha	**$ 880.221.715,86**	**49,68%**	**$ 617.599.568,86**	**34,86%**	**-$ 262.622.147,00**	**-14,82%**

Desviación en días: 22 Días

SEMANA 17 DEL 15 AL 21 DE AGOSTO DEL 2022

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 1.771.707.945,99

Semáforo

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 880.221.715,86	49,68%	$ 617.617.389,97	34,86%	-$ 262.604.325,89	-14,82%
Durante el Periodo	$ 131.335.024,92	7,41%	$ 141.765.289,12	8,00%	$ 10.430.264,20	0,59%
Acumulado a la Fecha	**$ 1.011.556.740,78**	**57,10%**	**$ 759.382.679,09**	**42,86%**	**-$ 252.174.061,69**	**-14,23%**

Desviación en días: 21 Días

SEMANA 18 DEL 22 AL 28 DE AGOSTO DEL 2022

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 1.771.707.945,99

Semáforo

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 1.011.556.740,78	57,10%	$ 759.354.025,65	42,86%	-$ 252.202.715,13	-14,24%
Durante el Periodo	$ 155.214.120,36	8,76%	$ 156.918.242,57	8,86%	$ 1.704.122,21	0,10%
Acumulado a la Fecha	**$ 1.166.770.861,14**	**65,86%**	**$ 916.272.268,22**	**51,72%**	**-$ 250.498.592,92**	**-14,14%**


Desviación en días: 21 Días

MEMORIAS DE CALCULO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES

CODIGO INMUEBLE	MANZANA CATASTRAL CATASTRO MUNICIPAL	BARRIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CEDULA DE CIUDADANIA	DIRECCION	COORDENADAS	
						LATITUD	LONGITUD
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100	100	100
101	101	101	101	101	101	101	101
102	102	102	102	102	102	102	102
103	103	103	103	103	103	103	103
104	104	104	104	104	104	104	104
105	105	105	105	105	105	105	105
106	106	106	106	106	106	106	106
107	107	107	107	107	107	107	107
108	108	108	108	108	108	108	108
109	109	109	109	109	109	109	109
110	110	110	110	110	110	110	110
111	111	111	111	111	111	111	111
112	112	112	112	112	112	112	112
113	113	113	113	113	113	113	113
114	114	114	114	114	114	114	114
115	115	115	115	115	115	115	115
116	116	116	116	116	116	116	116
117	117	117	117	117	117	117	117
118	118	118	118	118	118	118	118
119	119	119	119	119	119	119	119
120	120	120	120	120	120	120	120
121	121	121	121	121	121	121	121
122	122	122	122	122	122	122	122
123	123	123	123	123	123	123	123
124	124	124	124	124	124	124	124
125	125	125	125	125	125	125	125
126	126	126	126	126	126	126	126
127	127	127	127	127	127	127	127
128	128	128	128	128	128	128	128
129	129	129	129	129	129	129	129
130	130	130	130	130	130	130	130
131	131	131	131	131	131	131	131
132	132	132	132	132	132	132	132
133	133	133	133	133	133	133	133
134	134	134	134	134	134	134	134
135	135	135	135	135	135	135	135
136	136	136	136	136	136	136	136
137	137	137	137	137	137	137	137
138	138	138	138	138	138	138	138
139	139	139	139	139	139	139	139
140	140	140	140	140	140	140	140
141	141	141	141	141	141	141	141
142	142	142	142	142	142	142	142
143	143	143	143	143	143	143	143
144	144	144	144	144	144	144	144
145	145	145	145	145	145	145	145
146	146	146	146	146	146	146	146
147	147	147	147	147	147	147	147
148	148	148	148	148	148	148	148
149	149	149	149	149	149	149	149
150	150	150	150	150	150	150	150
151	151	151	151	151	151	151	151
152	152	152	152	152	152	152	152
153	153	153	153	153	153	153	153
154	154	154	154	154	154	154	154
155	155	155	155	155	155	155	155
156	156	156	156	156	156	156	156
157	157	157	157	157	157	157	157
158	158	158	158	158	158	158	158
159	159	159	159	159	159	159	159
160	160	160	160	160	160	160	160
161	161	161	161	161	161	161	161
162	162	162	162	162	162	162	162
163	163	163	163	163	163	163	163
164	164	164	164	164	164	164	164
165	165	165	165	165	165	165	165
166	166	166	166	166	166	166	166
167	167	167	167	167	167	167	167
168	168	168	168	168	168	168	168
169	169	169	169	169	169	169	169
170	170	170	170	170	170	170	170
171	171	171	171	171	171	171	171
172	172	172	172	172	172	172	172
173	173	173	173	173	173	173	173
174	174	174	174	174	174	174	174
175	175	175	175	175	175	175	175
176	176	176	176	176	176	176	176
177	177	177	177	177	177	177	177
178	178	178	178	178	178	178	178
179	179	179	179	179	179	179	179
180	180	180	180	180	180	180	180
181	181	181	181	181	181	181	181
182	182	182	182	182	182	182	182
183	183	183	183	183	183	183	183
184	184	184	184	184	184	184	184
185	185	185	185	185	185	185	185
186	186	186	186	186	186	186	186
187	187	187	187	187	187	187	187
188	188	188	188	188	188	188	188
189	189	189	189	189	189	189	189
190	190	190	190	190	190	190	190
191	191	191	191	191	191	191	191
192	192	192	192	192	192	192	192
193	193	193	193	193	193	193	193
194	194	194	194	194	194	194	194
195	195	195	195	195	195	195	195
196	196	196

| CODIGO COMARCA | COMARCA | MUNICIPIO | DISTRITO | CODIGO INE | NOMBRE VIA | CRUCE A | DIRECCION | COORDENADAS | | Fecha de creación de la ficha | Nombre de la persona que rellena la ficha | Nombre de la persona que rellena la ficha | Nombre de la persona que rellena

| | | |

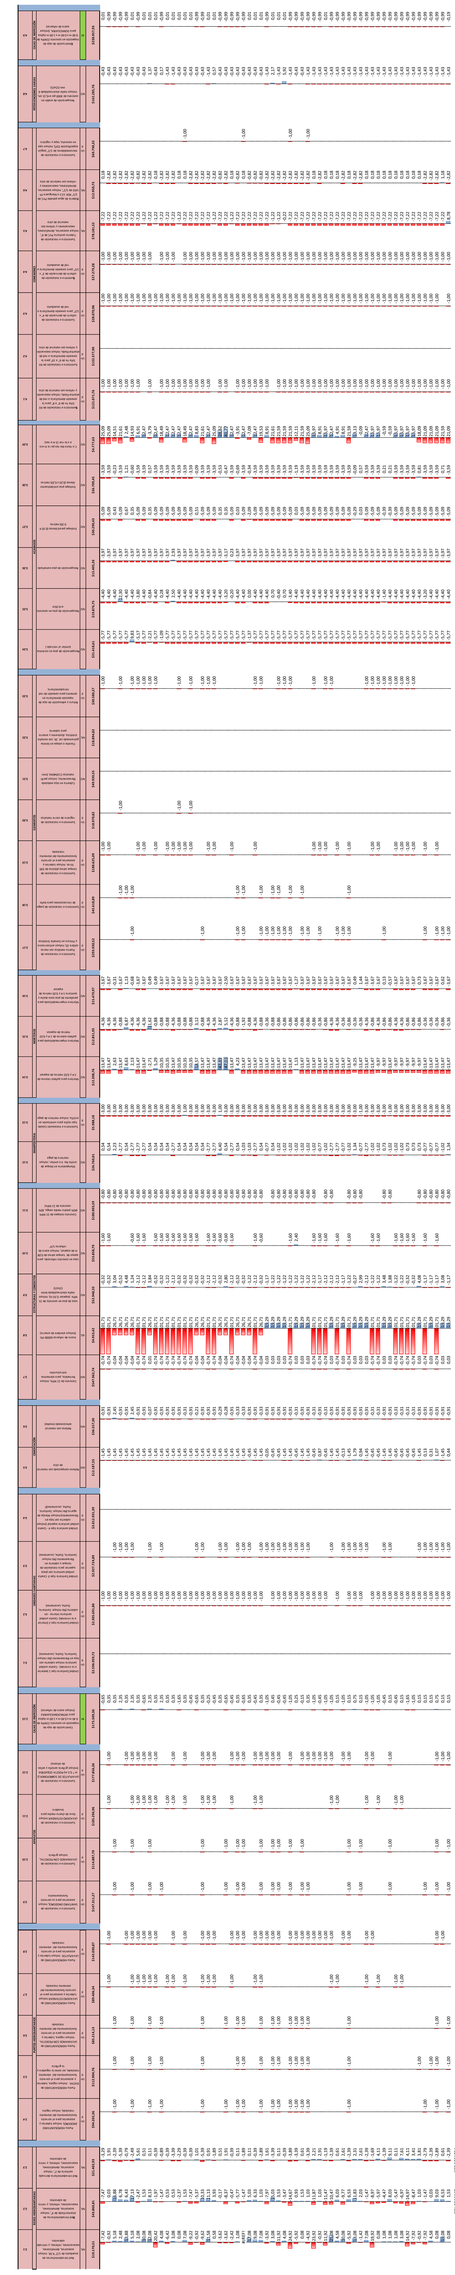

POTENCIALES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE CONVERSIONES INTRAGUBERNAMENTALES

| 1. IDENTIFICACIÓN VACANTE/TA | | |

| | | |

RELACIÓN DE PLANOS DEL PROYECTO

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**RELACIÓN DE PLANOS**	CÓDIGO	**F-GG-20**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-12**


CONTRATO No. :	2220576
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.
SUPERVISOR:	KAROLL YULIETH JAVELA

No.	Plano #	Versión	Fecha	Contenido	Remplaza Plano #	Nueva Versión	Aprobado por	Observaciones
1	EST-01	1	3-may-22	ESPECIFICACIONES TECNICAS				CORESPONDEN A CASETA T3
2	EST-02	1	3-may-22	PLANTA ESTRUCTTURAL DESPIECE DE COLUMNAS DESPIECE DE VIGAS CORTES Y DETALLES				CORESPONDEN A CASETA T3
3	EST-01	1	9-may-22	ESPECIFICACIONES TECNICAS				CORESPONDEN A CASETA T1
4	EST-02	1	12-may-22	PLANTA ESTRUCTTURAL DESPIECE DE COLUMNAS DESPIECE DE VIGAS CORTES Y DETALLES				CORESPONDEN A CASETA T1
5	EST-01	1	12-may-22	ESPECIFICACIONES TECNICAS				CORESPONDEN A CASETA T2
6	EST-02	1	12-may-22	PLANTA ESTRUCTTURAL DESPIECE DE COLUMNAS DESPIECE DE VIGAS CORTES Y DETALLES				CORESPONDEN A CASETA T2
7	EST-01	1	12-may-22	ESPECIFICACIONES TECNICAS				CORESPONDEN A CASETA T4
8	EST-02	1	12-may-22	PLANTA ESTRUCTTURAL DESPIECE DE COLUMNAS DESPIECE DE VIGAS CORTES Y DETALLES				CORESPONDEN A CASETA T4
9	EST-01	1	23-may-22	ESPECIFICACIONES TECNICAS				CORRESPONDEN A TANQUE
10	EST-02	1	23-may-22	PLANTA ESTRUCTTURAL DESPIECE DE COLUMNAS DESPIECE DE VIGAS CORTES Y DETALLES				CORRESPONDEN A TANQUE
11	EST-	1	1-jul-22	PLANTA DE CIMIENTOS, PLANTAS DE VIGAS DE CUBIERTA, DETALLES DE VIGAS DE CIMIENTO Y DE CUBIERTA, CORTE ESTRUCTURAL,PLANTILLA LOSA MACIZA Y MACHONES DE CASETAS T1,T2,T3,T4 Y TANQUE				CORRESPONDE A CASTEAS T1,T2,T3,T4 Y TANQUE


Para constancia de lo anterior, se firma en ___CORDOBA____ a los ____31_ días del mes ____AGOSTO___ del ____2022___.

ENTREGA	**RECIBE**
Firma ING. JOSÉ ALEXANDER ROMERO CETINA T.P. 25202-177284 CND	Firma
NOMBRE: ALEXANDER ROMERO	**NOMBRE Jose Stalin Castaño**
Fecha: 31/07/2022	Fecha: 31/07/2022


Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

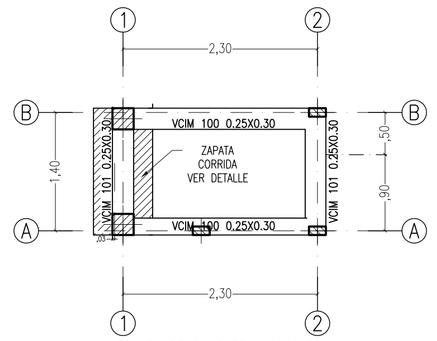


PLANTA DE CIMIENTO CASETA T3
ESC 1:25

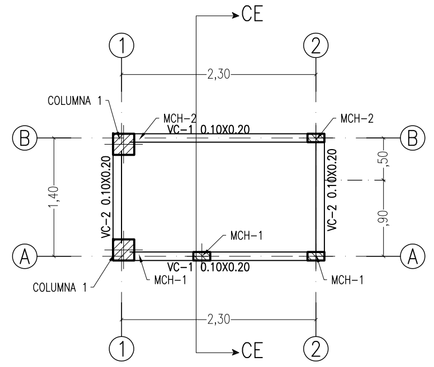


PLANTA ESTRUCTURAL DE CUBIERTA CASETA T3
ESC 1:25




PLANTA ESTRUCTURAL DE Llosa DE TANQUE ELEVADO CASETA T3
ESC 1:25

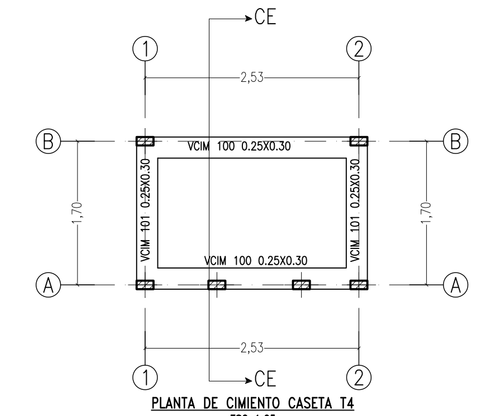


PLANTA DE CIMIENTO CASETA T4
ESC 1:25

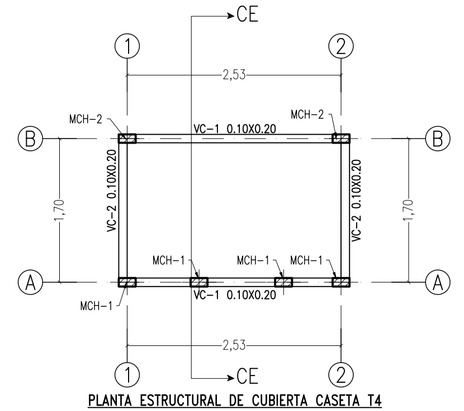



PLANTA ESTRUCTURAL DE CUBIERTA CASETA T4
ESC 1:25






DETALLES DE VIGAS CIMIENTO CASETA T3
ESC 1:50







DETALLES DE VIGAS CORONAS CASETA T3
ESC 1:50

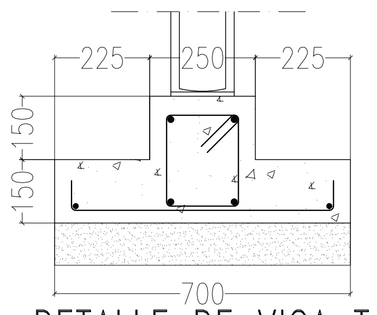


DETALLE DE VIGA T
ESC 1:10





DETALLE DE VIGAS DE TANQUE CASETA T3
ESC 1:50






DETALLES DE VIGAS CIMIENTO CASETA T4
ESC 1:50







DETALLES DE VIGAS CORONAS CASETA T4
ESC 1:50

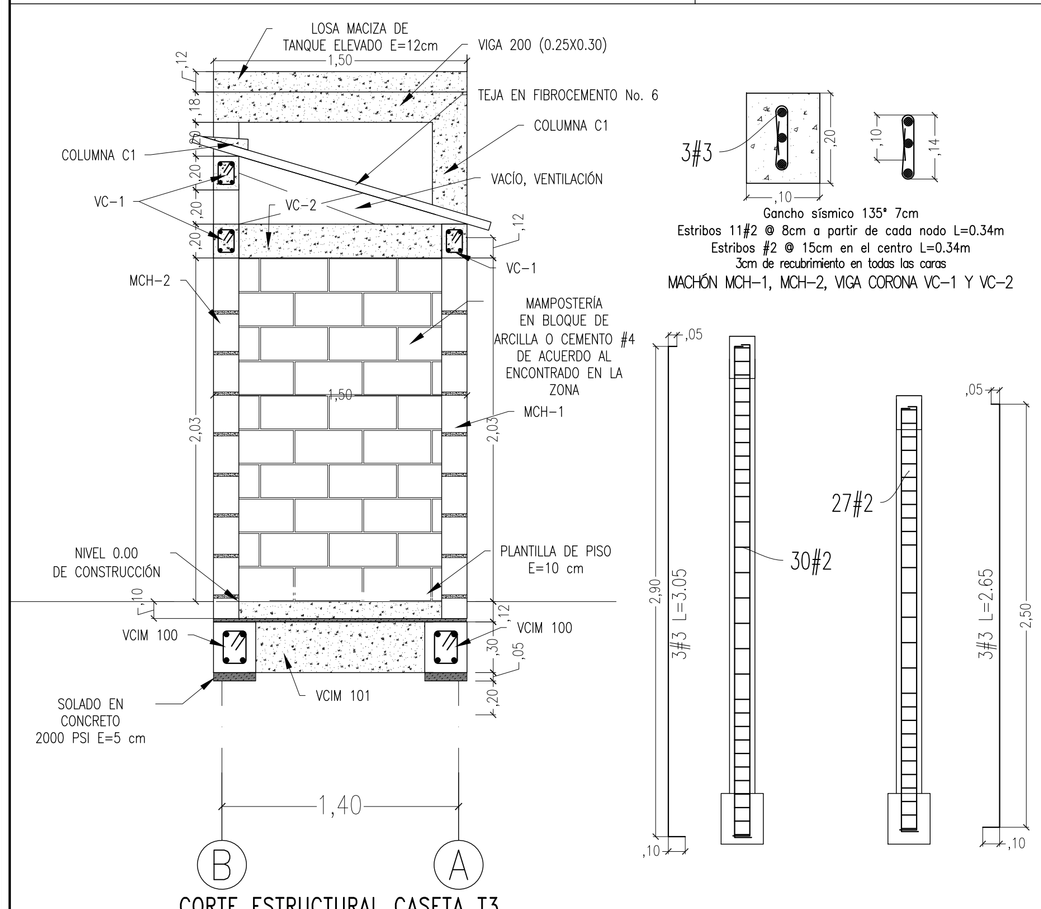


CORTE ESTRUCTURAL CASETA T3
ESC 1:25

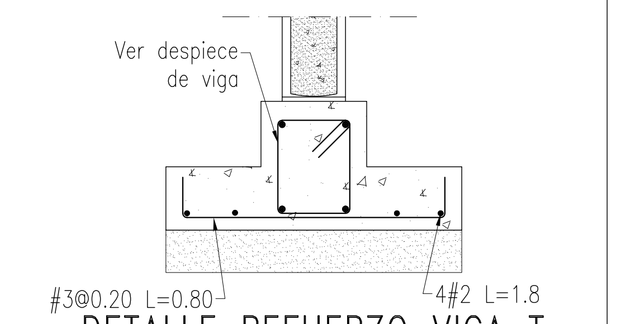


DETALLE REFUERZO VIGA T
ESC 1:10

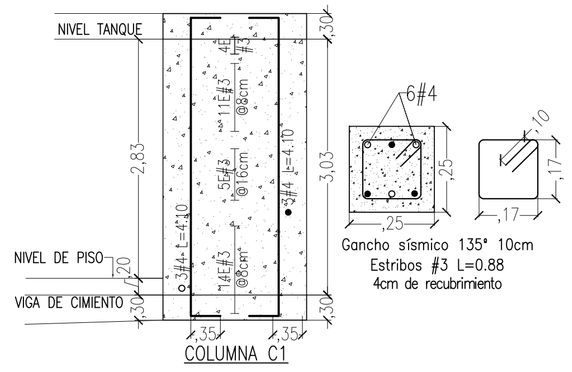


DESPIECE COLUMNAS CASETA T3
ESC VERTICAL: 1:50

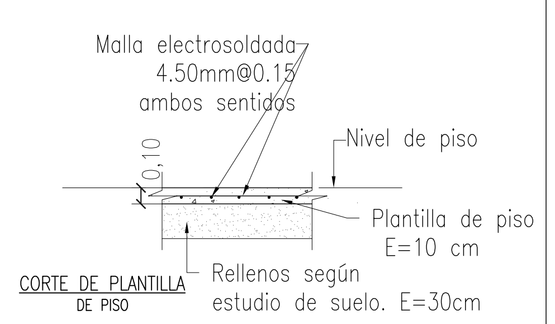




CORTE TRANSVERSAL DE LOSA MACIZA DE TANQUE ELEVADO CASETA T3 E=12cm

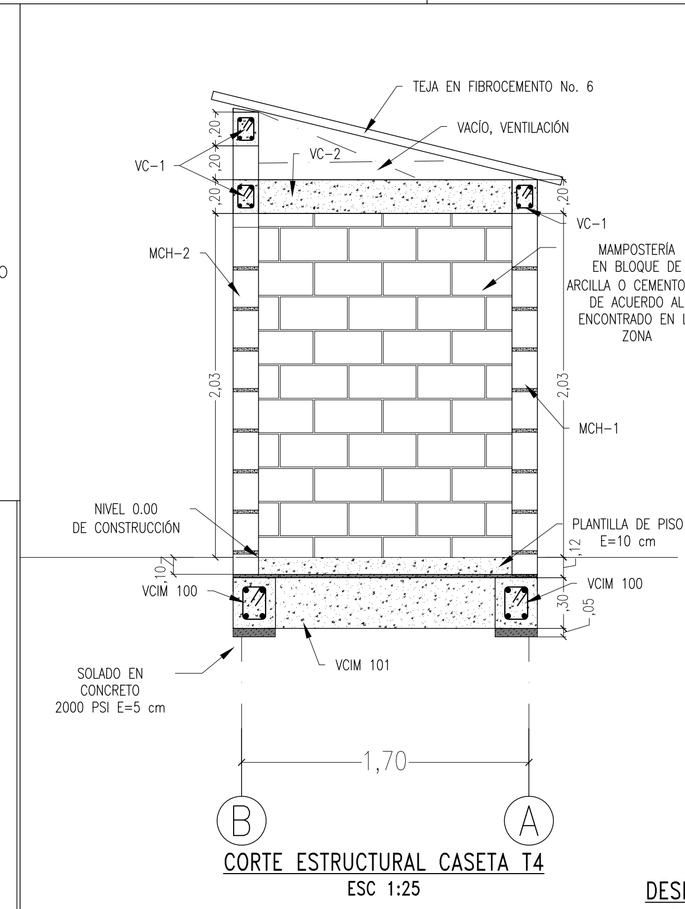


CORTE ESTRUCTURAL CASETA T4
ESC 1:25

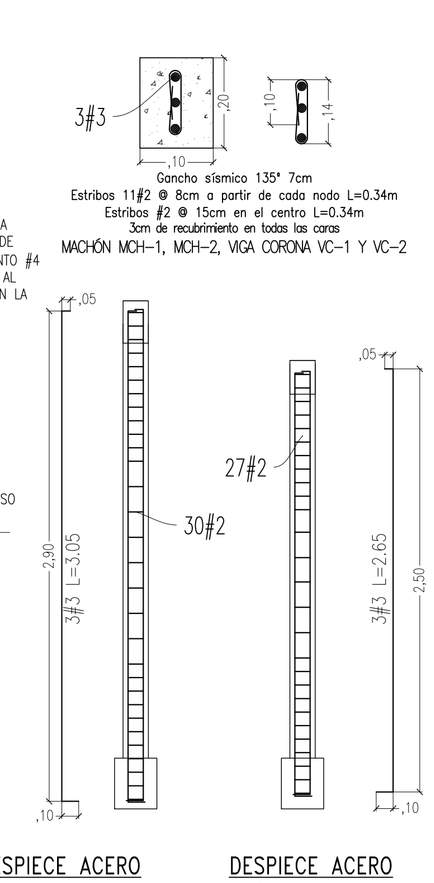

DESPIECE ACERO MACHÓN 2 CASETA T4
ESC 1:25

DESPIECE ACERO MACHÓN 1 CASETA T4
ESC 1:25

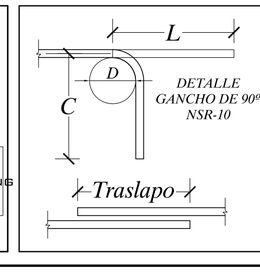

DETALLE GANCHO DE 90° NSR-10

DIMENSIONES DE LOS GANCHOS ESTANDAR Y LONGITUDES DE TRASLAPOS PARA CADA BARRA					
Barra #	Ø Pulg	L(cm)	D(cm)	C(cm)	Traslapo(m)
3	3/8	-	-	-	0,40
4	1/2	25	3,8	20	0,60
5	5/8	30	4,8	25	0,70
6	3/4	35	5,7	30	0,85
7	7/8	40	6,7	35	1,25
8	1	45	8,0	40	1,40

ESPECIFICACIONES GENERALES
-Zona de amenaza sísmica: Intermedia (Aa=0.10; Av=0.15)
-Capacidad de disipación de energía: D.M.O., -Grupo de uso: I,
-Tipo de suelo:D, -Carga de acabados: 1.4KN/m².
-Mortero de pega: Tipo S. 1:3,
-Mortero de relleno: Tipo grueso 1:3
-fy :420MPa Ø > #2 y cumplir con NTC 2289 (ASTM A706)
-Concreto f'c= 21.0 MPa. y cumplir NSR-10.
-Carga viva de diseño: 1.8 KN/m².,
-Mamposteria fcu=5Mpa.
- No se puede embeber ductos, tuberías o camisas de cualquier material en las vigas y/o columnas.

NOTA: El primer estribo de cada viga debe ser colocado a una distancia no mayor a 5cm medidos desde la cara de la columna.
El tamaño máximo de los agregados debe definirse según el diseño de mezcla

Cantidad ┐ ┌ Diametro en octavos
1#4 L=3.0
└ Longitud en metros

RECUBRIMIENTO		REFUERZO	AGREGADO MAXIMO	
Cimentación:	7.5 cm	#2 fy = 240MPa	Zapatas:	3/4"
Columnas:	4.0 cm	#3 a #9 fy = 420MPa	Columnas:	1/2"
Vigas:	4.0 cm		Losas y escalera:	1/2"
Losa:	3.0 cm			

PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS MUNICIPIO DE CÓRDOBA-BOLÍVAR

CONTIENE:
PLANTA DE CIMIENTOS, PLANTA DE VIGAS DE CUBIERTA, DETALLES DE VIGAS CIMIENTO Y DE CUBIERTA, CORTE ESTRUCTURAL, PLANTILLA, LOSA MACIZA Y MACHONES. DE CASETAS T1, T2, T3, T4 Y TANQUE

ESCALA: INDICADAS
PLANO Nº: 2/2

DISEÑO ESTRUCTURAL:
LOGO DE ESTRUCTURAL.PNG
LOGO JOSE ALEXANDER.PNG

DIRECCION:
BARRIO SAN MARTÍN MUNICIPIO DE CÓRDOBA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

FECHA:
JUNIO DE 2022

PETICIONARIO:
CONSORCIO CONSTRUREDES

EQUIPO DE TRABAJO:

ARCHIVO MAGNÉTICO:
EST. CASETAS CORDOBA.dwg

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA – BOLIVAR
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE CORDOBA BOLIVAR, BARRIO SAN MARTÍN
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES
CONTRATO DE OBRA No.:	2220576
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	2220587
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2022

FOTOGRAFÍA (1)



Descripción.
Se realiza construcción de caseta tipo 2, se puede apreciar desencofrado de columnetas y levante de muro a altura de viga dintel, relleno en suelo con material seleccionado, para posterior fundida de plantilla.

FOTOGRAFÍA (2)



Descripción.
Caseta tipo 3 en estado de acabados, se aprecia instalación de tanque elevado.

FOTOGRAFÍA (3)



Descripción.
Se evidencia instalación de sanitario, lavamanos con pedestal, cerámica en piso y accesorios de pared en vivienda con intervención de adecuación.

FOTOGRAFÍA (4)



Descripción.
Se realiza construcción de Caseta tipo 3, con pañete interno y externos en muros; con aplicación de pintura, cubierta, columnas y losa de tanque, faltante cerámica en piso y pared e instalación de aparatos sanitarios e incrustaciones en pared.

FOTOGRAFÍA (5)



Descripción.
Se observa columna y losa de tanque e instalación de tanque elevado, en vivienda con intervención de adecuación.

FOTOGRAFÍA (6)



Descripción.
Se observa construcción de muros, columnas y losa de tanque, columnetas y pañete terminado en parte interna y externa de muros, así mismo suelo relleno y compactado con material seleccionado para posterior fundición de plantilla.

FOTOGRAFÍA (7)



Descripción.
Se observa intervención en caseta tipo 3, con pañete y aplicación de pintura en muros externos, instalación de cubierta y tanque elevado, enchape en cerámica en piso y pared de acuerdo a los diseños.

FOTOGRAFÍA (8)



Descripción.
Se aprecia construcción de Caseta tipo 3, con levante de muros, cubierta, columnas y losa para tanque, así mismo se observa pañete en muro exterior de caseta.

FOTOGRAFÍA (9)



Descripción.
Se observa construcción de soporte e instalación de lavadero estándar con aplicación de pintura en vivienda con intervención de adecuación.

FOTOGRAFÍA (10)



Descripción.
Se realiza construcción de columna y losa para tanque elevado, además se realiza levante de muros de soporte para lavadero estándar, en vivienda con intervención de adecuación.

FOTOGRAFÍA (11)



Descripción.
Se realiza labores de pañete en muros externos de la caseta tipo 3, se observa construcción de columnas y losa de tanque, excavaciones para puesta de tubería sanitaria.

FOTOGRAFÍA (12)



Descripción.
Se evidencia terminación e instalación de lavaplatos con accesorios, además con aplicación de pintura, en vivienda con intervención de caseta tipo 3.

VIDEOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

SE ADJUNTAN EN CARPETA DIGITAL

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS ENSAYOS DE MATERIALES Y DEMÁS PRUEBAS

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS**	CÓDIGO:	**F-GG-23**
		VERSIÓN:	**1**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-19**

FECHA DE PRESENTACIÓN:	(31/08/2022)	**INFORME MENSUAL DEL**	**(01/08/2022)**	**AL**	**(31/08/2022)**
CONTRATO No. :	2220587				
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES				
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A				
SUPERVISOR:	ENTERRITORIO				

MEDIANTE EL PRESENTE FORMATO, EL INTERVENTOR CERTIFICA QUE LOS ÍTEMS DE PROYECTO QUE SE PAGARÁN, CUMPLEN EN TODOS LOS CASOS CON TODAS LAS NORMAS TÉCNICAS APLICABLES Y CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1595 DE 2015 LOS QUE LE MODIFIQUEN O SUSTITUYAN

1. Si para el producto (bien o servicio), proceso o procedimiento se exigen requisitos por un Reglamento Técnico, decreto o ley (página web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo), obligatoriamente se declarará la conformidad y será entregable verificado previa presentación del certificado de conformidad de producto, sello de calidad o ensayos en laboratorio acreditado.

2. Si el producto (bien o servicios) proceso o procedimiento no está regido por un Reglamento técnico obligatorio, decreto o ley pero el contrato en su texto, en una especificación, el diseño, los planos u otro documento o requisito contractual cualquiera que sea se indica el cumplimiento de una norma (NTC, internacional, nacional o sectorial) o requisito particular o general, para declarar conforme ese bien o servicio y declararse entregable verificado, debe contar obligatoriamente con ensayo o cumplimiento de protocolo donde conste la conformidad con el requisito exigido.

1. LABORATORIOS ACREDITADOS Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

La Interventoría de Contrato CERTIFICA que la totalidad de los resultados de conformidad que se relacionan en este informe y anexan (anexo digital), se obtuvieron: en laboratorios acreditados cuando el bien o servicio está especificado y/o normado por un Reglamento Técnico Obligatorio, ley o decreto; cuando el proceso, procedimiento, bien o servicio no esta regido por un Reglamento técnico obligatorio, ley o decreto pero el Contrato lo exige, la conformidad de calidad se declaró mediante ensayo realizado con equipos de medición calibrados o verificación de cumplimiento de protocolo, bajo el control y seguimiento de un profesional capacitado e idóneo quien suscribe el registro del ensayo o protocolo en particular (anexo digital); en este último caso, se incluye en este formato la acreditación del laboratorio (anexo digital) si así lo exige el Contrato o acuerdo entre las partes. A continuación se relacionan los laboratorios acreditados y no acreditados donde se realizaron los ensayos y certificados de calibración de equipos utilizados (anexo digital).

1. 1. LABORATORIOS ACREDITADOS -EXIGIDO CUANDO EL BIEN O SERVICIO SE RIGE POR REGLAMENTO TÉCNICO OBLIGATORIO, LEY O DECRETO

Laboratorio		Certificado de Acreditación	Vigencia de la acreditación		Ensayos realizados en este laboratorio
Código (1)	**Nombre**		**Desde**	**Hasta**	
N/A	N/A PARA EL PRESENTE INFORME	N/A	N/A	N/A	N/A
	Adicione las filas necesarias				

(1) Para efectos de trazabilidad y control, asignar a cada laboratorio un código LAC (Laboratorio Acreditado) seguido de un número consecutivo, sin repetir y sin anular desde el inicio del proyecto hasta el final.

1.1.1. EQUIPOS - Certificados de calibración

Laboratorio (3)	Serial equipo (2)	Descripción del equipo	Número de Certificado de Calibración	Vigencia certificado de calibración	
				Desde	**Hasta**
Laboratorio Hernán Ramos Villamil S.A.S	2124	CAZUELA CASAGRANDE	NA-24532-001 R0	3/12/2021	
Laboratorio Hernán Ramos Villamil S.A.S	N/A	MANOMETRO HUMEDÓMETRO	NA-23741-001 R0	16/07/2021	
Hernán Ramos Villamil S.A.S	B-001/LCD/2-X	MAQUINA DE ENSAYO A COMPRESION (MARCO CILINDROS)	F1305	30/03/2022	
Laboratorio Hernán Ramos Villamil S.A.S	N/A	MAQUINA DE ENSAYO A COMPRESION (CILINDROS)	F1304	30/03/2022	

(2) Para efectos de trazabilidad y control, relacionar el serial del equipo calibrado, sin repetir desde el inicio del proyecto hasta el final.
(3) Indique en esta casilla, el código del laboratorio donde se encuentra el equipo cuyo certificado de calibración se está informando.

2. ENSAYOS, SELLOS DE CALIDAD, CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD O REGISTRO DE ENSAYO EN LABORATORIO Y/O PROTOCOLOS APLICADOS

Los resultados de ensayos realizados y que se pagan parcial o totalmente en este periodo o períodos posteriores, son los que a continuación se relacionan.

Con el fin de tener trazabilidad de los ensayos, estos se numeran con dos dígitos XX-YY donde XX es el número del periodo del mes de ejecución del Proyecto y YY es el número en estricto orden cronológico del ensayo o certificado; para el primer informe el número de orden XX será 01, para el segundo informe 02 y así sucesivamente.

2.1. ENSAYOS REALIZADOS y/o PROTOCOLOS APLICADOS EN ESTE PERÍODO

No. de Orden			Ensayo			Resultado del Ensayo
XX	YY	Fecha ensayo o aplicac. protocolo	Norma, protocolo o requisito técnico aplicable (exigido)	Nombre de la norma, protocolo o requisito	Código de Laboratorio donde se realizó el ensayo	Observaciones (la observación no pude condicionar la conformidad)
04	01	11/08/2022	I.N.V.E 410 NTC-673-1513	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDRO DE CONCRETO	FC-19 VERSIÓN 2	LOS ELEMENTOS SOMETIDOS AL ENSAYO A COMPRESIÓN, COMO LO FUERON LA COLUMNA, LOSA DE TANQUE Y VIGA PRESENTAN UN 70% DE RESISTENCIA A LOS 7 DIAS DE TOMADA LA MUESTRA
04	02	25/08/2020	I.N.V.E 410 NTC-673-1513	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDRO DE CONCRETO	FC-19 VERSIÓN 2	LOS ELEMENTOS SOMETIDOS AL ENSAYO A COMPRESIÓN, COMO LO FUERON LA COLUMNA, LOSA DE TANQUE Y VIGA PRESENTAN MAS DEL 100% DE RESISTENCIA A LOS 28 DIAS DE TOMADA LA MUESTRA

2.2. CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO Y SELLOS DE CALIDAD RECIBIDOS EN ESTE PERIODO

No. de orden		No. Certificado o sello de calidad	Vigencia del Certificado o del sello de calidad		Certificador (entidad acreditada para expedir certificado)	Este sello de calidad o certificado de conformidad ampara los siguientes entregables del contrato
XX	YY		Desde	Hasta		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A PARA EL PRESENTE INFORME

CONTROL DE CONFORMIDAD DE CALIDAD POR ÍTEMS DE CONTRATO OBJETO DE PAGO

A continuación se relacionan los ítems de contrato que el Interventor avala para pago en este período, para lo cual se requiere como condición previa que la Interventoría los haya declarado entregables verificados mediante certificados de conformidad de producto y/o sellos de calidad recibidos y/o los ensayos que recibió de un laboratorio acreditatado.

A continuación se resumen los requisitos y trazabilidad de conformidad de los ítems que cumplen calidad para pago en el presente período

Ítems de contrato que se incluirán en el acta y/o factura y/o cuenta del presente período		Normas técnicas (ley, decreto, resolución, reglamento) exigidas a cada ítem en particular		La conformidad con la norma se demuestra mediante	documento (certificado, ensayo, sello) que evidencia objetivamente el cumplimiento (5) (6)
# del ítem según contrato	Descripción del ítem	Numero de norma (4)	Descripción de la norma, reglamento, ley, decreto, resolución u otro exigible		
N/A	N/A PARA EL PRESENTE INFORME	N/A	N/A PARA EL PRESENTE INFORME		N/A

(4) Si un ítem está sujeto a mas de una norma o protocolo, utilice tantas filas como sean necesarias e indique una sola norma o protocolo por fila.
(5) El número de orden puede ser de ensayo, protocolo o certificado obtenido en este período o periodos anteriores.
(6) El Interventor llevará control de las cantidades, baches o volúmenes de productos, procesos o procedimientos que certifica que cumplen calidad, de manera que garantice la trazabilidad de calidad para cada entregable evitando que se aplique un certificado vencido, o se aplique un ensayo excediendo su alcance en frecuencia, cantidad o tiempo. El Supervisor ENTerritorio exigirá esta trazabilidad en cualquier momento.

TRAZABILIDAD: Para efectos de trazabilidad, el Interventor anexa a este formato un archivo digital que contiene una carpeta denominada "Control inspección y ensayo Periodo XXX) con la información del período. Esta carpeta contiene tantas subcarpetas como subcapítulos contiene este formato y en cada una de esas subcarpetas se están incluyendo la totalidad de documentos que soportan lo certificado. El Interventor declara que no ha aceptado ningún laboratorio acreditado, calibración de equipo o ensayo del cual no dispone de trazabilidad que anexa a este informe. No se aceptan excepciones ni entregas de trazabilidad posteriores a la radicación de este formato. Este formato incluye como ítems verificados para pago únicamente aquellos que cumplen todos los requisitos establecidos.

Firma
ING.MARCY CORREA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA (no se acepta firma "por" o "en nombre de")

Firma
ING. DUARTE JOSE PINEDO DURANGO
DIRECTOR DE OBRA (no se acepta firma "por" o "en nombre de")

ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
INGENIERIA CIVIL- ESTUDIOS DE SUELO.

OFICINA Y LABORATORIO
Calle 12 No. 24B – 17 Barrio La Palma
Telef. y Fax 095-282 58 08 - SINCELEJO

Sincelejo, 1 de julio de 2022
Señores
ENTerritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
Ref. Certificación para realización de ensayos de geotecnia

Cordial saludo,

Yo, **HERNAN RAMOS VILLAMIL**, identificado con la cedula de ciudadanía número 9.053.862 de Cartagena y la Matricula profesional 494 de S.I.A.B. que me acredita como ingeniero civil, en calidad de representante legal de la empresa **HERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S. Nit. 900.565.151-3**, laboratorio con más de 50 años de experiencia en el campo de la geotecnia, certifico que seremos los encargados de realizar todos los ensayos pertinentes que garanticen el control y el aseguramiento de la calidad de la obra *"ejecución de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el Municipio de Córdoba, Departamento de Bolívar"* la cual está a cargo de la firma **Consorcio Construredes Nit 901.568.676-5**.

Firma Electrónica
ID Firma: 67c37f62-3496-469f-b5c0-733a2abbe22b

HERNAN RAMOS VILLAMIL
C.C. 9.053.862 de Cartagena.
T.P. 494 S.I.A.B.
Representante Legal

CONSORCIO CONSTRUREDES

Cra 24 No. 15 - 17 Centro

Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com

Teléfono: 311 4143542

«CIUDAD_PROPONENTE»

El consorcio Construredes Se hace responsables de todos los ensayos emitidos por la empresa **Hernán Ramos Villamil S.A.S Nit 901.565.151-3**, laboratorio con más de 50 años de experiencia en el campo de la geotecnia y los cuales poseen la calibración de los equipos, cuyo proveedor si está acreditado para realizar las calibraciones correspondientes y es un respaldo a nuestro trabajo. Estarán encargados de realizar los ensayos pertinentes que garanticen el control y aseguramiento de la calidad de la obra “ejecución de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de cordoba, departamento de bolívar”

REPRESENTANTE LEGAL

ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
INGENIERIA CIVIL- ESTUDIOS DE SUELO.

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
I.N.V. E-410

FC - 19

VERSIÓN 02

Fecha
31/05/2013


CLIENTE CONSORCIO CONSTRUREDES
OBRA INTERDOMICILIARIOS MUNICIPIO DE CORDOBA DPTO DE BOLIVAR
LOCALIZACION DEPARTAMENTO DE CORDOBA -BOLIVAR
FECHA 25/08/2022

NORMAS

I.N.V.E.-410
NTC-673-1513

IDENT.	ELEMENTO	FECHA FUNDICIÓN	FECHA ROTURA	EDAD MUESTRA (Días)	RESISTENCIA REQUERIDA (PSI)	ASENT. PULG	CARGA (KN)	TIPO DE FALLA (1-6)	RESISTENCIA A LA FECHA (PSI)	% DE RESISTENCIA DESARROLLADO
	COLUMNAS	28/07/2022	25/08/2022	28	3.000		180,3	5	3180,6	106,0%
	VIGA	28/07/2022	25/08/2022	28	3.000		170,3	5	3175,2	105,8%
	PLACA	28/07/2022	25/08/2022	28	3.000		183,3	5	3240,2	108,0%

TIPOS DE FALLA



FORMA DE PROBETAS		Area (cm2)
CILINDRICA NORMAL 4"	10,20	81,75
CILINDRICA NORMAL 6"	15,24	176,115

OBSERVACIONES:

ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
NIT N° 900.565.151-3
INGENIERIA CIVIL - ESTUDIOS DE SUELO.

DIR. TÉCNICO

LABORATORISTA

ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
INGENIERIA CIVIL- ESTUDIOS DE SUELO.

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO
I.N.V. E-410

FC - 19

VERSIÓN 02

Fecha
31/05/2013


CLIENTE CONSORCIO CONSTRUREDES
OBRA INTERDOMICILIARIOS MUNICIPIO DE CORDOBA DPTO DE BOLIVAR
LOCALIZACION DEPARTAMENTO DE CORDOBA -BOLIVAR
FECHA 11/08/2022

NORMAS

I.N.V.E.-410
NTC-673-1513

IDENT.	ELEMENTO	FECHA FUNDICIÓN	FECHA ROTURA	EDAD MUESTRA (Días)	RESISTENCIA REQUERIDA (PSI)	ASENT. PULG	CARGA (KN)	TIPO DE FALLA (1-6)	RESISTENCIA A LA FECHA (PSI)	% DE RESISTENCIA DESARROLLADO
	COLUMNAS	04/08/2022	11/08/2022	7	3.000		132,1	5	2135,5	71,1%
	VIGA	04/08/2022	11/08/2022	7	3.000		133,5	5	2244,3	74,8%
	PLACA	04/08/2022	11/08/2022	7	3.000		128,5	5	2196,9	73,2%

TIPOS DE FALLA



FORMA DE PROBETAS		Area (cm2)
CILINDRICA NORMAL 4"	10,20	81,75
CILINDRICA NORMAL 6"	15,24	176,115

OBSERVACIONES:

ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
NIT N° 900.565.151-3
INGENIERIA CIVIL - ESTUDIOS DE SUELO.

DIR. TÉCNICO

LABORATORISTA

Certificado de Calibración - Laboratorio de Longitud

NA-24532-001 R0

Calibration Certificate - Dimensional Metrology Laboratory

Equipo *Instrument*	CAZUELA CASAGRANDE
Fabricante *Manufacturer*	PINZUAR
Modelo *Model*	PS-11
Número de Serie *Serial Number*	2124
Identificación Interna *Internal Identification*	No presenta
Intervalo de Medición *Measurement Range*	Ver tabla de resultados
Solicitante *Customer*	HERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
Dirección *Address*	Calle 12 No24 B - 17
Ciudad *City*	Sincelejo - Sucre
Fecha de Calibración *Date of Calibration*	2021 – 12 – 03
Fecha de Emisión *Date of Issue*	2021 – 12 – 13
Número de páginas del certificado, incluyendo anexos *Number of pages of the certificate and documents attached*	02

Los resultados emitidos en este certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. Dichos resultados solo coresponden al item que se relaciona en esta página. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos y/o de la información suministrada por el solicitante.

Este certificado de calibración documenta y asegura la trazabilidad a patrones nacionales e internacionales, que reproducen las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

El usuario es responsable de la calibración de los intrumentos en apropiados intervalos de tiempo.

The results issued in this certificate relates to the time and conditions under which the measurements. These results correspond to the item that relates on page number one. The laboratory, which will not be liable for any damages that may arise from the improper use of the instruments and/or the information provided by the customer.

This calibration certificate documents and ensures the traceability to national and internationals standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI).

The user is responsable for recalibrating the measuring instruments at appropriate time intervals.

Sin la aprobación del Laboratorio de Metrología Pinzuar. no se puede resproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad, ya que proporciona la seguridad que las partes del certificado no se sacan de contexto. Los certificados de calibración sin firma no son válidos.

Without the approval of the Pinzuar Metrology Laboratory, the report can not be reproduced, except when it is reproduced in its entirety, since it provides the security that the parts of the certificate are not taken out of context. Unsigned calibration certificates are not valid.

Firmas Autorizadas

Authorized signatureS

Ing. Sergio Iván Martínez
Director Laboratorio de Metrología

Tecg. Jaiver Arnulfo López
Metrólogo Laboratorio de Metrología


DATOS TÉCNICOS

Método Empleado	Comparación Directa
Instrumentos de Referencia	Pie de Rey
Certificado No.	L-21980-001 de Pinzuar
Documento de Referencia	INVIAS E – 125/13 Numeral 5

TABLA DE RESULTADOS

Cazuela

Letra*	Especificación	Valor Medido
	mm	mm
A	54 ± 0.5	54,03
B	2 ± 0.1	2,08
C	27 ± 0.5	27,36
K	50 ±2	51,33
L	150 ± 2	151,24
M	125 ± 2	126,05
U	47 ± 1	46,95
P	28	27,33
R	24	23,95
T	45	45,04

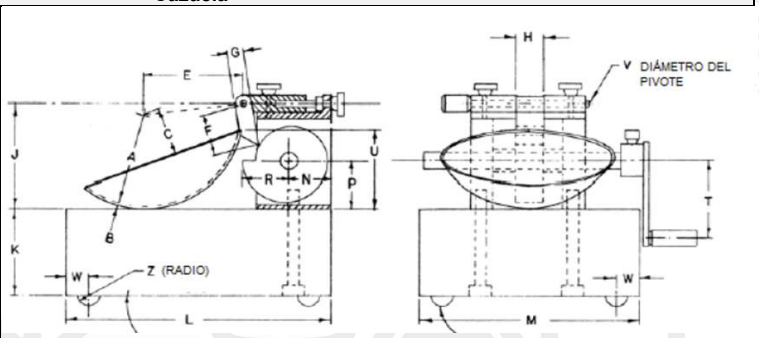

CONDICIONES AMBIENTALES

La verificación se llevó a cabo en en las instalaciones del Laboratorio de Metrología Pinzuar., las condiciones ambientales durante la ejecución fueron las siguientes:

Temperatura Máxima:	19,8 °C	**Humedad Máxima:**	56 %
Temperatura Mínima:	19,5 °C	**Humedad Mínima:**	53 %

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre expandida de la medición reportada (Tablas de resultados), se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura k y la probabilidad de cobertura aproximadamente al 95 %. Basados en el documento: JCGM 100:2008. GUM 1995 with minor corrections. Evaluation of measurement data Guide to the expression of uncertainty in measurement. First Edition. September 2008.
* La incertidumbre máxima encontrada en la medición de dimensiones es 12 µm para un factor de cobertura k=2.

OBSERVACIONES

1. Se usa la coma como separador decimal.
2. Se adjunta la estampilla de calibracón.

NA-24532-001

Fin de Certificado

ROSSEMBERG
LABORATORY EQUIPMENT
CEL.:(057)3016256345 - 3157815444
www.rossemberg.com.co

Laboratorio de Metrología

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1304**
Number

Número de páginas incluyendo anexos
Number of pages and documents attached 3

Objeto: Máquina de ensayo a compresion (Cilindros)
Object

Fabricante: N/P
Manufacturer

Modelo: N/P
Model

Número de identificación: N/P
Identificación number

Rango de mediciòn: 100,0 kN …….. 1200,0 kN
Range of measurement

Usuario final del certificado: Hernan ramos villamil SAS
Certificate end user

Dirección del usuario: Calle 12 # 24b - 170 Barrio las palmas Sincelejo (Sucre)
User´s address

Lugar de calibración: Laboratorio
Calibration site

Fecha de calibración: miércoles, 30 de marzo de 2022
Calibración date

Este certificado documenta la trazabilidad a los patrones nacionales o internacionales, los cuales representan las unidades de medida en concordancia con el sistema internacional de unidades (SI). Este certificado de calibración no podrá ser reproducido total ni parcialmente sin autorización escrita de Sistemas de Ensayo y Calibración RYR. Los resultados, consignados en este certificado se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. RYR SAS, no se responsabiliza por los perjuicios que pueden derivarse del uso inadecuado de los objetos calibrados o de este certificado. Este certificado no tiene valides sin las firmas y el sello de RYR SAS.

This certificate declares the traceability to the National Standards, which represent the units of measurament that are in agreement with the International System Units (SI). This certificate of calibration could not be reproduced partially without written authorization of the RYR SAS. The sesult of this certificate is for the object of calibration, at the conditions in which the measurements were made. The RYR SAS does not take responsibility from the inadequate use of the calibrated objects or this certificate. The calibration certificate is not valid without the signatures and the seal of the RYR SAS


Fecha de emisión: viernes, 20 de agosto de 2021
Date of issue

Número: **F 1304**
Number

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)
AUTORIZED SIGNATURE (S)



Leonard González M.
Realizado por:
Performed by



Rossemberg Indaburo M
Verificado por:
reviewed by

ROSSEMBERG
LABORATORY EQUIPMENT
CEL.:(057)3016256345 - 3157815444
www.rossemberg.com.co

Laboratorio de Metrología

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1304**
Number

Fecha de calibración: miércoles, 30 de marzo de 2022

Método de calibración
Calibration method
Fuerza indicada constante, Norma Tecnica Colombiana NTC 7500-1/2002-09-18

Condiciones ambientales
Environmental conditions

Temperatura Ambiente	Inicial/*Initial*	32,0	°C
	Final/*End*	33,0	°C

Resultados
Results

	Limite inferior de la escala del instrumento de medición	20,0 kN
	Resolución **(r)**	0,1 kN
Dirección de la carga: Compresión	Resolución relativa de la máquina de ensayo **(a)** %	al 10% = 0,08
Indicación de la máquina: Digital		al 20% = 0,04

CARGA (%)	Indicación del Instrumento Patrón (F) en kN					PROMEDIO L1,L2 Y L3	Indicación del instrumento a calibrar **(Fi)**	Errores encontrados %					Incertidumbre Expandida	k
	L1	Girar Celda 120° L2	Girar Celda 120° L3	L4	Reversibilidad Fó F' L2 Descendente			Resolución relativa **(a)**	Reversibilidad **(v)**	Repetibilidad **(b)**	Exactitud **(q)**	Accesorios		
8	100,00	100,40	100,30			100,23	100,0	0,10		0,40	-0,23		5,7,E-01	2,00
17	200,00	200,00	200,20			200,07	200,0	0,05		0,10	-0,03		3,7,E-01	1,96
25	300,00	300,00	301,00			300,33	300,0	0,03		0,33	-0,11		3,7,E-01	1,96
33	401,00	401,00	400,00			400,67	400,0	0,03		0,25	-0,17		3,7,E-01	1,96
42	501,00	501,00	500,00			500,67	500,0	0,02		0,20	-0,13		3,7,E-01	1,96
50	600,00	601,00	601,00			600,67	600,0	0,02		0,17	-0,11		3,7,E-01	1,96
58	700,00	702,00	702,00			701,33	700,0	0,01		0,29	-0,19		3,7,E-01	1,96
67	800,00	801,00	801,00			800,67	800,0	0,01		0,12	-0,08		3,7,E-01	1,96
83	1001,00	1002,00	1004,00			1002,33	1000,0	0,01		0,30	-0,23		3,7,E-01	1,96
100	1201,00	1205,30	1203,00			1203,10	1200,0	0,01		0,36	-0,26		3,7,E-01	1,96

0,033	0,40	0,30	0,20		Indicación Residual de la maquina de ensayo sin carga **(F_{i0})**:


	Cero F_0	Reversibilidad (v)	Repetibilidad (b)	Exactitud (q)	Accesorios
Máximos errores encontrados (%)	0,033	No se determino	0,4	-0,23	No se determino
Máximos errores permitido para clase : 1	± 0,1	± 1,5	1,0	± 1,0	1,50
Norma Tecnica Colombiana NTC 7500-1/2002-09-18, Numeral:	6.4.5	6.4.8	6.5.2	6.5.1	6.4.6

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1305**
Number

Fecha de calibración miércoles, 30 de marzo de 2022

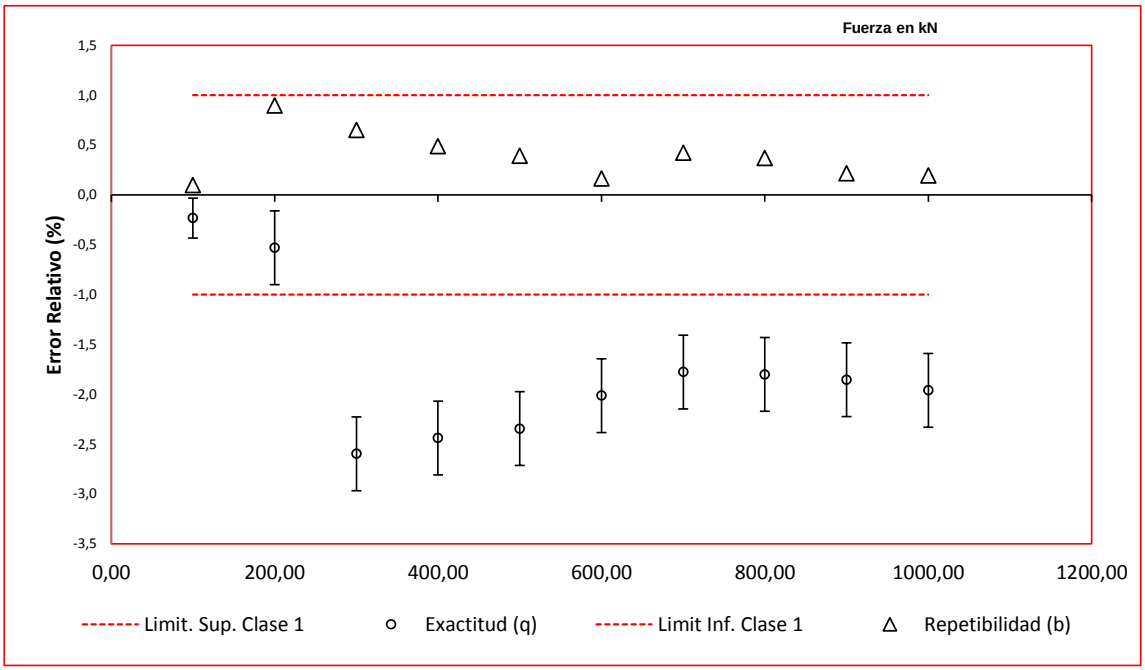

DE ACUERDO A LOS ERRORES RELATIVOS MAXIMOS PRESENTADOS Y SEGUN LAS PRESCRIPCIONES DE LA NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 7500-1, LA MAQUINA DE ENSAYO CALIBRADA SE CLASIFICA COMO:

Clase 1 DEL 10% AL 100% DE SU CAPACIDAD MAXIMA

TRAZABILIDAD :

EL LABORATORIO DE METROLOGÍA DE RYR SAS , ASEGURA EL MANTENIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD

Equipos utilizados en la calibraciòn

Equipo	*Fabricante*	*Modelo*	*Serie*	*Capacidad*	*Cert. No*	*Fecha Cal.*	*Entidad Cert.*
Celda de carga	AEP	KAL2000KN	901080	1000 kN	MF-172-18	2018/01/11	SIMIM
Celda de carga	AEP	KAL300KN	903408	300 kN	MF-174-18	2018/01/13	SIMIM

OBSERVACIONES :

1. La máquina de ensayos deberá ser calibrada inmediatamente despues de cualquier reparación ya que la sustitución de elementos del sistema mecánico o eléctrico afectan la operación del sistema de medida.
2. Si la máquina de ensayos es reubicada, se deberá repetir la calibración. Igualmente, cuando exista razón de duda con respecto a la exactitud de la carga, independientemente del tiempo transcurrido desde la última calibración,
3. Los datos emitidos en el presente certificado, se ajustan al momento y condiciones dadas en la calibración RYR SAS. no se hace responsable por daños ocasionados al equipo debido al uso inadecuado.

ROSSEMBERG
LABORATORY EQUIPMENT
CEL.:(057)3016256345 - 3157815444
www.rossemberg.com.co

Laboratorio de Metrología

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1305**
Number

Página /Pages 1 de 3

Número de páginas incluyendo anexos 3
Number of pages and documents attached

Objeto: Máquina de ensayo a compresion (Marco Cilindros)
Object

Fabricante: Alfa
Manufacturer

Modelo: B-001/LCD/2-X
Model

Número de identificación: 170225/33
Identificación number

Rango de mediciòn: 100,0 kN …….. 1000,0 kN
Range of measurement

Usuario final del certificado: Hernan ramos villamil SAS
Certificate end user

Dirección del usuario: Calle 12 # 24b -17 Barrio las palmas Sincelejo (Sucre)
User´s address

Lugar de calibración: Laboratorio
Calibration site

Fecha de calibración: miércoles, 30 de marzo de 2022
Calibración date

Este certificado documenta la trazabilidad a los patrones nacionales o internacionales, los cuales representan las unidades de medida en concordancia con el sistema internacional de unidades (SI). Este certificado de calibración no podrá ser reproducido total ni parcialmente sin autorización escrita de Sistemas de Ensayo y Calibración RYR. Los resultados, consignados en este certificado se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. RYR SAS, no se responsabiliza por los perjuicios que pueden derivarse del uso inadecuado de los objetos calibrados o de este certificado. Este certificado no tiene valides sin las firmas y el sello de RYR SAS.

This certificate declares the traceability to the National Standards, which represent the units of measurament that are in agreement with the International System Units (SI). This certificate of calibration could not be reproduced partially without written authorization of the RYR SAS. The sesult of this certificate is for the object of calibration, at the conditions in which the measurements were made. The RYR SAS does not take responsibility from the inadequate use of the calibrated objects or this certificate. The calibration certificate is not valid without the signatures and the seal of the RYR SAS


Fecha de emisión: miércoles, 06 de abril de 2022
Date of issue

Número: **F 1305**
Number

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)
AUTORIZED SIGNATURE (S)



Leonard González M.
Realizado por:
Performed by



Rossemberg Indaburo M.
Verificado por:
reviewed by

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1305**
Number

Fecha de calibración: miércoles, 30 de marzo de 2022

Método de calibración
Calibration method

Fuerza indicada constante, Norma Tecnica Colombiana NTC 7500-1/2002-09-18

Condiciones ambientales
Environmental conditions

Temperatura Ambiente — Inicial/*Initial* 20,2 °C; Final/*End* 21,0 °C

Resultados

Results

	Limite inferior de la escala del instrumento de medición	20,0 kN
	Resolución **(r)**	0,1 kN
Dirección de la carga: Compresión	Resolución relativa de la máquina de ensayo **(a)** %	al 10% = 0,10
Indicación de la máquina: Digital		al 20% = 0,05

CARGA (%)	Indicación del Instrumento Patrón (F) en kN					PROMEDIO L1,L2 Y L3	Indicación del instrumento a calibrar **(Fi)**	Errores encontrados %					Incertidumbre Expandida	k
	L1	Girar Celda 120° L2	Girar Celda 120° L3	L4	Reversibilidad Fó F' L2 Descendente			Resolución relativa **(a)**	Reversibilidad **(v)**	Repetibilidad **(b)**	Exactitud **(q)**	Accesorios		
10	100,20	100,30	100,20			100,23	100,0	0,10		0,10	-0,23		2,0,E-01	2,00
20	201,00	202,00	200,20			201,07	200,0	0,05		0,90	-0,53		3,7,E-01	1,96
30	309,00	308,00	307,00			308,00	300,0	0,03		0,65	-2,60		3,7,E-01	1,96
40	410,00	411,00	409,00			410,00	400,0	0,03		0,49	-2,44		3,7,E-01	1,96
50	512,00	511,00	513,00			512,00	500,0	0,02		0,39	-2,34		3,7,E-01	1,96
60	612,00	613,00	612,00			612,33	600,0	0,02		0,16	-2,01		3,7,E-01	1,96
70	714,00	713,00	711,00			712,67	700,0	0,01		0,42	-1,78		3,7,E-01	1,96
80	816,00	813,00	815,00			814,67	800,0	0,01		0,37	-1,80		3,7,E-01	1,96
90	916,00	918,00	917,00			917,00	900,0	0,01		0,22	-1,85		3,7,E-01	1,96
100	1020,00	1019,00	1021,00			1020,00	1000,0	0,01		0,20	-1,96		3,7,E-01	1,96

0,040	0,40	0,30	0,20		Indicación Residual de la maquina de ensayo sin carga **(F_{i0})**:


	Cero F_0	**Reversibilidad (v)**	**Repetibilidad (b)**	**Exactitud (q)**	**Accesorios**
Máximos errores encontrados (%)	0,040	No se determino	0,9	-2,60	No se determino
Máximos errores permitido para clase : 1	± 0,1	± 1,5	1,0	± 1,0	1,50
Norma Tecnica Colombiana NTC 7500-1/2002-09-18, Numeral:	6.4.5	6.4.8	6.5.2	6.5.1	6.4.6

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1305** *Number*

Fecha de calibración miércoles, 30 de marzo de 2022

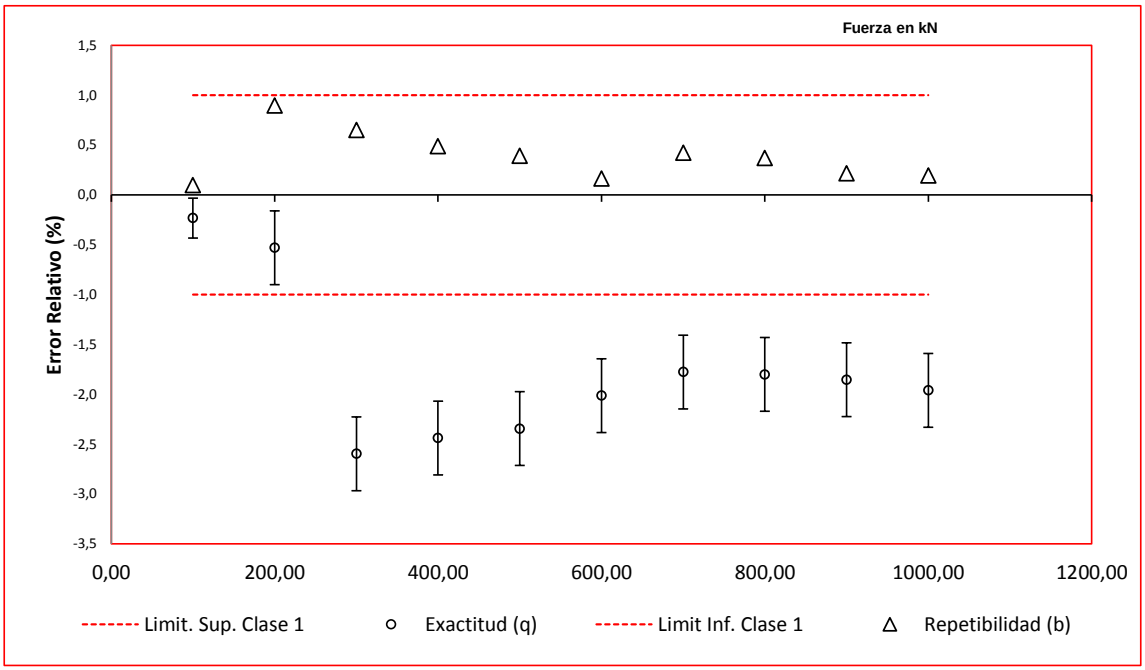

DE ACUERDO A LOS ERRORES RELATIVOS MAXIMOS PRESENTADOS Y SEGUN LAS PRESCRIPCIONES DE LA NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 7500-1, LA MAQUINA DE ENSAYO CALIBRADA SE CLASIFICA COMO:

Clase 1 DEL 10% AL 100% DE SU CAPACIDAD MAXIMA

TRAZABILIDAD :

EL LABORATORIO DE METROLOGÍA DE RYR SAS , ASEGURA EL MANTENIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD

Equipos utilizados en la calibraciòn

Equipo	*Fabricante*	*Modelo*	*Serie*	*Capacidad*	*Cert. No*	*Fecha Cal.*	*Entidad Cert.*
Celda de carga	AEP	KAL2000KN	901080	1000 kN	MF-172-18	2018/01/11	SIMIM
Celda de carga	AEP	KAL300KN	903408	300 kN	MF-174-18	2018/01/13	SIMIM

OBSERVACIONES :

1. La máquina de ensayos deberá ser calibrada inmediatamente despues de cualquier reparación ya que la sustitución de elementos del sistema mecánico o eléctrico afectan la operación del sistema de medida.
2. Si la máquina de ensayos es reubicada, se deberá repetir la calibración. Igualmente, cuando exista razón de duda con respecto a la exactitud de la carga, independientemente del tiempo transcurrido desde la última calibración,
3. Los datos emitidos en el presente certificado, se ajustan al momento y condiciones dadas en la calibración RYR SAS. no se hace responsable por daños ocasionados al equipo debido al uso inadecuado.

PINZUAR
LABORATORIO DE METROLOGÍA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN – LABORATORIO PRESIÓN

NA-23741-001 R0

CALIBRATION CERTIFICATE – LABORATORY OF PRESSURE

INSTRUMENTO *Instrument*	*MANÓMETRO HUMEDÓMETRO*
INTERVALO DE MEDIDA *Measurement range*	*0 %HR - 20 %HR*
FABRICANTE *Manufaturer*	*RYR*
MODELO *Model*	*DI*
SERIE *Identification number*	*No Presenta*
CODIGO INTERNO *Internal Code*	*23741-001*
SOLICITANTE *Customer*	*HERNAN RAMOS VILLAMIL SAS*
DIRECCIÓN *Address*	*Calle 12 No. 24 B - 17*
CIUDAD *City*	*Sincelejo - Sucre*
FECHA DE CALIBRACIÓN *Date of calibration*	2021 - 07 - 14
FECHA DE EXPEDICIÓN *Date of Issue*	2021 - 07 - 16

NÚMERO DE PÁGINAS DEL CERTIFICADO INCLUYENDO ANEXOS ***3***
Number of pages of this certificate and documents attached

Firmas que autorizan el certificado
Signatures authorizing the certificate

Ing. Sergio Martínez
Director Laboratorio de Metrología

Tecg. Francisco Durán Romero
Metrólogo Laboratorio de Metrología

DETALLES DE LA CALIBRACIÓN

MÉTODO DE CALIBRACIÓN Comparación directa. **Documento de Referencia** DKD R 6 - 1 del 2014

FACTOR DE CONVERSIÓN 1 psi = 6,89476 kPa Nota: Factor de conversión tomado del NIST Special Publication 811 2008 Edition

DATOS DE LA CALIBRACIÓN

INTERVALO A CALIBRAR 0 %HR - 20 %HR **DIVISIÓN DE ESCALA** 0,2 %HR **RESOLUCIÓN** 0,1 %HR

	Indicación del IBC	indicaciones del instrumento patrón	
		M1 - asc	M2 - desc
%	% HR	psi	psi
0	0,00	0,000	0,000
20	4,00	6,166	5,972
40	8,00	12,136	11,988
60	12,00	17,966	17,689
80	16,00	23,934	23,899
100	20,00	29,988	29,988

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN

Indicación del IBC		Promedio Patrón	Desviación	Histeresis	Incertidumbre Expandida
%	psi	psi	psi	psi	psi
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
4,00	6,00	6,07	-0,07	0,19	0,25
8,00	12,00	12,06	-0,06	0,15	0,21
12,00	18,00	17,83	0,17	0,28	0,34
16,00	24,00	23,92	0,08	0,04	0,13
20,00	30,00	29,99	0,01	0,00	0,12

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

La desviación máxima encontrada durante la calibración entre el instrumento sometido a prueba y el patrón es:

0,172 psi

La desviación máxima encontrada, respecto al valor máximo de la escala en porcentaje es:

% Desviación = 0,6

INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN

La incertidumbre expandida de la medición esta dada en la tabla de resultados de la página No. 2, para cada punto de calibración. La incertidumbre de medición fue calculada utilizando un factor de cobertura k = 2 para un nivel de confianza aproximado del 95,45% para una distribución "t-student" y fue estimada con el documento: JCGM 100:2008. GUM 1995 with minor corrections. Evaluation of measurement data Guide to the expression of uncertainty in measurement. First Edition. September 2008.

CONDICIONES AMBIENTALES

Max. Temp.	*20,3 °C*	***Min. Temp.***	*19,6 °C*
Max. Hum. (%)	*55 HR*	***Min. Hum. (%)***	*53 HR*

TRAZABILIDAD

El Laboratorio de Metrología de Pinzuar Ltda. asegura el mantenimiento de la trazabilidad de los patrones de trabajo utilizados en las mediciones.

PATRÓN UTILIZADO	Manómetro Digital		
CERT.DE CALIBRACIÓN	7337 de Flexilatina S.A.S.	**CLASE DE EXACTITUD**	0,050%
INTERVALO DE MEDIDA	30 psi	**SERIE**	3227038

OBSERVACIONES .

1. Se realizó una inspección general del instrumento encontrándose en buen estado de funcionamiento
2. Los Certificados de calibración sin las firmas no tienen validez .
3. El usuario es responsable de la recalibración de los instrumentos de medición.
4. Los resultados contenidos parcialmente en este informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos.
5. Se adjunta estampilla de calibración adherida al instrumento No. **NA-23741-001**

Fin de Certificado

CALIBRACIÓN Y CONTROL DE EQUIPOS DEL PROYECTO

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**CONTROL DE EQUIPOS**	CÓDIGO	**F-GG-22**
		VERSIÓN	**01**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA	**2020-10-19**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL **1 AGOSTO 20222** **Y EL** **31 DE AGOSTO 2022** **FECHA INICIO** **1-jun**

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES **CONTRATO No.** 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A **CONTRATO No.** 2220587

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
MEZCLADORA			X		CORDOBA - BOLIVAR	MEZCLA DE CONCRETO	En buen estado
RANA			X		CORDOBA - BOLIVAR	COMPACTAR TERRENO DEBAÑOS	En buen estado
MOTO CARRO			X		CORDOBA - BOLIVAR	TRANSPORTE DE MATERIALES	En buen estado

Marcy A. Correa C

Firma:

Nombre: Ing. Marcy Correa

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Certificado de Calibración - Laboratorio de Longitud

NA-24532-001 R0

Calibration Certificate - Dimensional Metrology Laboratory

Equipo *Instrument*	CAZUELA CASAGRANDE
Fabricante *Manufacturer*	PINZUAR
Modelo *Model*	PS-11
Número de Serie *Serial Number*	2124
Identificación Interna *Internal Identification*	No presenta
Intervalo de Medición *Measurement Range*	Ver tabla de resultados
Solicitante *Customer*	HERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
Dirección *Address*	Calle 12 No24 B - 17
Ciudad *City*	Sincelejo - Sucre
Fecha de Calibración *Date of Calibration*	2021 – 12 – 03
Fecha de Emisión *Date of Issue*	2021 – 12 – 13
Número de páginas del certificado, incluyendo anexos *Number of pages of the certificate and documents attached*	02

Los resultados emitidos en este certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. Dichos resultados solo coresponden al item que se relaciona en esta página. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos y/o de la información suministrada por el solicitante.

Este certificado de calibración documenta y asegura la trazabilidad a patrones nacionales e internacionales, que reproducen las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

El usuario es responsable de la calibración de los intrumentos en apropiados intervalos de tiempo.

The results issued in this certificate relates to the time and conditions under which the measurements. These results correspond to the item that relates on page number one. The laboratory, which will not be liable for any damages that may arise from the improper use of the instruments and/or the information provided by the customer.

This calibration certificate documents and ensures the traceability to national and internationals standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI).

The user is responsable for recalibrating the measuring instruments at appropriate time intervals.

Sin la aprobación del Laboratorio de Metrología Pinzuar. no se puede resproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad, ya que proporciona la seguridad que las partes del certificado no se sacan de contexto. Los certificados de calibración sin firma no son válidos.

Without the approval of the Pinzuar Metrology Laboratory, the report can not be reproduced, except when it is reproduced in its entirety, since it provides the security that the parts of the certificate are not taken out of context. Unsigned calibration certificates are not valid.

Firmas Autorizadas

Authorized signatureS

Ing. Sergio Iván Martínez
Director Laboratorio de Metrología

Tecg. Jaiver Arnulfo López
Metrólogo Laboratorio de Metrología


DATOS TÉCNICOS

Método Empleado	Comparación Directa
Instrumentos de Referencia	Pie de Rey
Certificado No.	L-21980-001 de Pinzuar
Documento de Referencia	INVIAS E – 125/13 Numeral 5

TABLA DE RESULTADOS

Cazuela

Letra*	Especificación	Valor Medido
	mm	mm
A	54 ± 0.5	54,03
B	2 ± 0.1	2,08
C	27 ± 0.5	27,36
K	50 ±2	51,33
L	150 ± 2	151,24
M	125 ± 2	126,05
U	47 ± 1	46,95
P	28	27,33
R	24	23,95
T	45	45,04

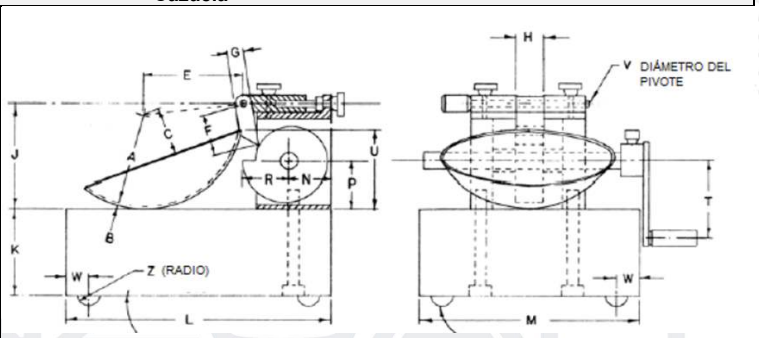

CONDICIONES AMBIENTALES

La verificación se llevó a cabo en en las instalaciones del Laboratorio de Metrología Pinzuar., las condiciones ambientales durante la ejecución fueron las siguientes:

Temperatura Máxima:	19,8 °C	**Humedad Máxima:**	56 %
Temperatura Mínima:	19,5 °C	**Humedad Mínima:**	53 %

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre expandida de la medición reportada (Tablas de resultados), se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura k y la probabilidad de cobertura aproximadamente al 95 %. Basados en el documento: JCGM 100:2008. GUM 1995 with minor corrections. Evaluation of measurement data Guide to the expression of uncertainty in measurement. First Edition. September 2008.
* La incertidumbre máxima encontrada en la medición de dimensiones es 12 µm para un factor de cobertura k=2.

OBSERVACIONES

1. Se usa la coma como separador decimal.
2. Se adjunta la estampilla de calibracón.

NA-24532-001

Fin de Certificado

ROSSEMBERG
LABORATORY EQUIPMENT
CEL.:(057)3016256345 - 3157815444
www.rossemberg.com.co

Laboratorio de Metrología

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1304**
Number

Número de páginas incluyendo anexos
Number of pages and documents attached 3

Objeto: Máquina de ensayo a compresion (Cilindros)
Object

Fabricante: N/P
Manufacturer

Modelo: N/P
Model

Número de identificación: N/P
Identificación number

Rango de mediciòn: 100,0 kN …….. 1200,0 kN
Range of measurement

Usuario final del certificado: Hernan ramos villamil SAS
Certificate end user

Dirección del usuario: Calle 12 # 24b - 170 Barrio las palmas Sincelejo (Sucre)
User´s address

Lugar de calibración: Laboratorio
Calibration site

Fecha de calibración: miércoles, 30 de marzo de 2022
Calibración date

Este certificado documenta la trazabilidad a los patrones nacionales o internacionales, los cuales representan las unidades de medida en concordancia con el sistema internacional de unidades (SI). Este certificado de calibración no podrá ser reproducido total ni parcialmente sin autorización escrita de Sistemas de Ensayo y Calibración RYR. Los resultados, consignados en este certificado se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. RYR SAS, no se responsabiliza por los perjuicios que pueden derivarse del uso inadecuado de los objetos calibrados o de este certificado. Este certificado no tiene valides sin las firmas y el sello de RYR SAS.

This certificate declares the traceability to the National Standards, which represent the units of measurament that are in agreement with the International System Units (SI). This certificate of calibration could not be reproduced partially without written authorization of the RYR SAS. The sesult of this certificate is for the object of calibration, at the conditions in which the measurements were made. The RYR SAS does not take responsibility from the inadequate use of the calibrated objects or this certificate. The calibration certificate is not valid without the signatures and the seal of the RYR SAS


Fecha de emisión: viernes, 20 de agosto de 2021
Date of issue

Número: **F 1304**
Number

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)
AUTORIZED SIGNATURE (S)



Leonard González M.
Realizado por:
Performed by



Rossemberg Indaburo M
Verificado por:
reviewed by

ROSSEMBERG
LABORATORY EQUIPMENT
CEL.:(057)3016256345 - 3157815444
www.rossemberg.com.co

Laboratorio de Metrología

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1304**
Number

Fecha de calibración: miércoles, 30 de marzo de 2022

Método de calibración
Calibration method
Fuerza indicada constante, Norma Tecnica Colombiana NTC 7500-1/2002-09-18

Condiciones ambientales
Environmental conditions

Temperatura Ambiente	Inicial/*Initial*	32,0	°C
	Final/*End*	33,0	°C

Resultados
Results

	Limite inferior de la escala del instrumento de medición	20,0 kN
	Resolución **(r)**	0,1 kN
Dirección de la carga: Compresión	Resolución relativa de la máquina de ensayo **(a)** %	al 10% = 0,08
Indicación de la máquina: Digital		al 20% = 0,04

CARGA (%)	Indicación del Instrumento Patrón (F) en kN					PROMEDIO L1,L2 Y L3	Indicación del instrumento a calibrar **(Fi)**	Errores encontrados %					Incertidumbre Expandida	k
	L1	Girar Celda 120° L2	Girar Celda 120° L3	L4	Reversibilidad Fó F' L2 Descendente			Resolución relativa **(a)**	Reversibilidad **(v)**	Repetibilidad **(b)**	Exactitud **(q)**	Accesorios		
8	100,00	100,40	100,30			100,23	100,0	0,10		0,40	-0,23		5,7,E-01	2,00
17	200,00	200,00	200,20			200,07	200,0	0,05		0,10	-0,03		3,7,E-01	1,96
25	300,00	300,00	301,00			300,33	300,0	0,03		0,33	-0,11		3,7,E-01	1,96
33	401,00	401,00	400,00			400,67	400,0	0,03		0,25	-0,17		3,7,E-01	1,96
42	501,00	501,00	500,00			500,67	500,0	0,02		0,20	-0,13		3,7,E-01	1,96
50	600,00	601,00	601,00			600,67	600,0	0,02		0,17	-0,11		3,7,E-01	1,96
58	700,00	702,00	702,00			701,33	700,0	0,01		0,29	-0,19		3,7,E-01	1,96
67	800,00	801,00	801,00			800,67	800,0	0,01		0,12	-0,08		3,7,E-01	1,96
83	1001,00	1002,00	1004,00			1002,33	1000,0	0,01		0,30	-0,23		3,7,E-01	1,96
100	1201,00	1205,30	1203,00			1203,10	1200,0	0,01		0,36	-0,26		3,7,E-01	1,96

0,033	0,40	0,30	0,20		Indicación Residual de la maquina de ensayo sin carga **(F_{i0})**:


	Cero F_0	Reversibilidad (v)	Repetibilidad (b)	Exactitud (q)	Accesorios
Máximos errores encontrados (%)	0,033	No se determino	0,4	-0,23	No se determino
Máximos errores permitido para clase : 1	± 0,1	± 1,5	1,0	± 1,0	1,50
Norma Tecnica Colombiana NTC 7500-1/2002-09-18, Numeral:	6.4.5	6.4.8	6.5.2	6.5.1	6.4.6

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1305**
Number

Fecha de calibración miércoles, 30 de marzo de 2022

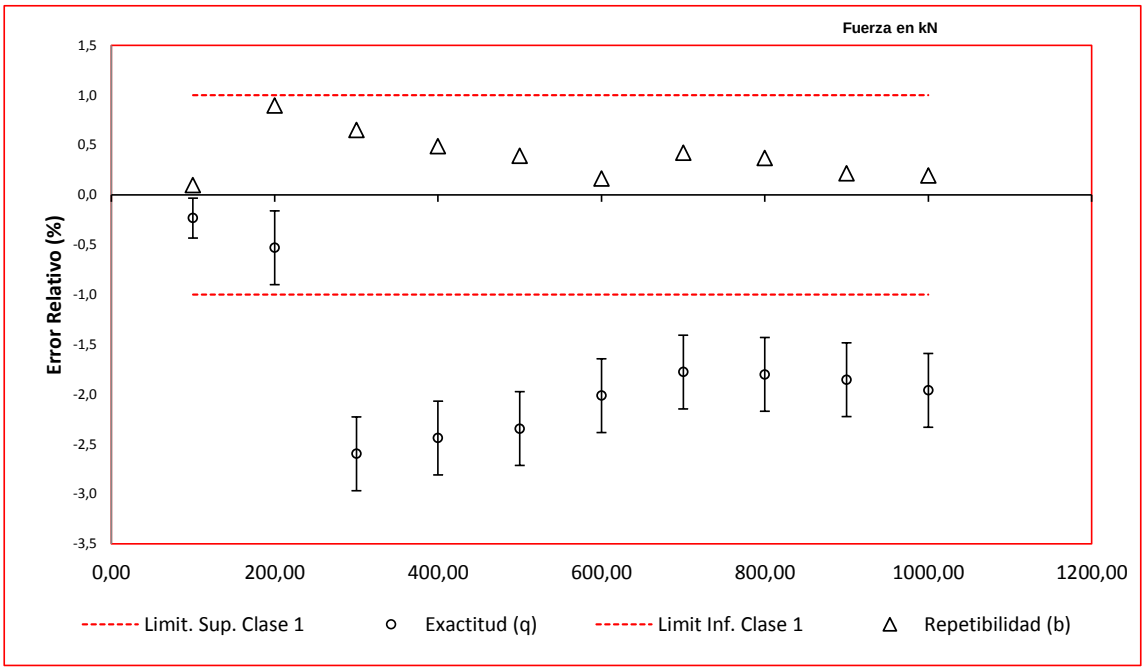

DE ACUERDO A LOS ERRORES RELATIVOS MAXIMOS PRESENTADOS Y SEGUN LAS PRESCRIPCIONES DE LA NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 7500-1, LA MAQUINA DE ENSAYO CALIBRADA SE CLASIFICA COMO:

Clase 1 DEL 10% AL 100% DE SU CAPACIDAD MAXIMA

TRAZABILIDAD :

EL LABORATORIO DE METROLOGÍA DE RYR SAS , ASEGURA EL MANTENIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD

Equipos utilizados en la calibraciòn

Equipo	*Fabricante*	*Modelo*	*Serie*	*Capacidad*	*Cert. No*	*Fecha Cal.*	*Entidad Cert.*
Celda de carga	AEP	KAL2000KN	901080	1000 kN	MF-172-18	2018/01/11	SIMIM
Celda de carga	AEP	KAL300KN	903408	300 kN	MF-174-18	2018/01/13	SIMIM

OBSERVACIONES :

1. La máquina de ensayos deberá ser calibrada inmediatamente despues de cualquier reparación ya que la sustitución de elementos del sistema mecánico o eléctrico afectan la operación del sistema de medida.
2. Si la máquina de ensayos es reubicada, se deberá repetir la calibración. Igualmente, cuando exista razón de duda con respecto a la exactitud de la carga, independientemente del tiempo transcurrido desde la última calibración,
3. Los datos emitidos en el presente certificado, se ajustan al momento y condiciones dadas en la calibración RYR SAS. no se hace responsable por daños ocasionados al equipo debido al uso inadecuado.

ROSSEMBERG
LABORATORY EQUIPMENT
CEL.:(057)3016256345 - 3157815444
www.rossemberg.com.co

Laboratorio de Metrología

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1305**
Number

Página /Pages 1 de 3

Número de páginas incluyendo anexos 3
Number of pages and documents attached

Objeto: Máquina de ensayo a compresion (Marco Cilindros)
Object

Fabricante: Alfa
Manufacturer

Modelo: B-001/LCD/2-X
Model

Número de identificación: 170225/33
Identificación number

Rango de mediciòn: 100,0 kN …….. 1000,0 kN
Range of measurement

Usuario final del certificado: Hernan ramos villamil SAS
Certificate end user

Dirección del usuario: Calle 12 # 24b -17 Barrio las palmas Sincelejo (Sucre)
User´s address

Lugar de calibración: Laboratorio
Calibration site

Fecha de calibración: miércoles, 30 de marzo de 2022
Calibración date

Este certificado documenta la trazabilidad a los patrones nacionales o internacionales, los cuales representan las unidades de medida en concordancia con el sistema internacional de unidades (SI). Este certificado de calibración no podrá ser reproducido total ni parcialmente sin autorización escrita de Sistemas de Ensayo y Calibración RYR. Los resultados, consignados en este certificado se refieren únicamente al objeto sometido a calibración, al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. RYR SAS, no se responsabiliza por los perjuicios que pueden derivarse del uso inadecuado de los objetos calibrados o de este certificado. Este certificado no tiene valides sin las firmas y el sello de RYR SAS.

This certificate declares the traceability to the National Standards, which represent the units of measurament that are in agreement with the International System Units (SI). This certificate of calibration could not be reproduced partially without written authorization of the RYR SAS. The sesult of this certificate is for the object of calibration, at the conditions in which the measurements were made. The RYR SAS does not take responsibility from the inadequate use of the calibrated objects or this certificate. The calibration certificate is not valid without the signatures and the seal of the RYR SAS


Fecha de emisión: miércoles, 06 de abril de 2022
Date of issue

Número: **F 1305**
Number

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)
AUTORIZED SIGNATURE (S)



Leonard González M.
Realizado por:
Performed by



Rossemberg Indaburo M.
Verificado por:
reviewed by

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1305**
Number

Fecha de calibración: miércoles, 30 de marzo de 2022

Método de calibración
Calibration method

Fuerza indicada constante, Norma Tecnica Colombiana NTC 7500-1/2002-09-18

Condiciones ambientales
Environmental conditions

Temperatura Ambiente — Inicial/*Initial* 20,2 °C; Final/*End* 21,0 °C

Resultados

Results

	Limite inferior de la escala del instrumento de medición	20,0 kN
	Resolución **(r)**	0,1 kN
Dirección de la carga: Compresión	Resolución relativa de la máquina de ensayo **(a)** %	al 10% = 0,10
Indicación de la máquina: Digital		al 20% = 0,05

CARGA (%)	Indicación del Instrumento Patrón (F) en kN					PROMEDIO L1,L2 Y L3	Indicación del instrumento a calibrar **(Fi)**	Errores encontrados %					Incertidumbre Expandida	k
	L1	Girar Celda 120° L2	Girar Celda 120° L3	L4	Reversibilidad Fó F' L2 Descendente			Resolución relativa **(a)**	Reversibilidad **(v)**	Repetibilidad **(b)**	Exactitud **(q)**	Accesorios		
10	100,20	100,30	100,20			100,23	100,0	0,10		0,10	-0,23		2,0,E-01	2,00
20	201,00	202,00	200,20			201,07	200,0	0,05		0,90	-0,53		3,7,E-01	1,96
30	309,00	308,00	307,00			308,00	300,0	0,03		0,65	-2,60		3,7,E-01	1,96
40	410,00	411,00	409,00			410,00	400,0	0,03		0,49	-2,44		3,7,E-01	1,96
50	512,00	511,00	513,00			512,00	500,0	0,02		0,39	-2,34		3,7,E-01	1,96
60	612,00	613,00	612,00			612,33	600,0	0,02		0,16	-2,01		3,7,E-01	1,96
70	714,00	713,00	711,00			712,67	700,0	0,01		0,42	-1,78		3,7,E-01	1,96
80	816,00	813,00	815,00			814,67	800,0	0,01		0,37	-1,80		3,7,E-01	1,96
90	916,00	918,00	917,00			917,00	900,0	0,01		0,22	-1,85		3,7,E-01	1,96
100	1020,00	1019,00	1021,00			1020,00	1000,0	0,01		0,20	-1,96		3,7,E-01	1,96

0,040	0,40	0,30	0,20		Indicación Residual de la maquina de ensayo sin carga **(F_{i0})**:


	Cero F_0	**Reversibilidad (v)**	**Repetibilidad (b)**	**Exactitud (q)**	**Accesorios**
Máximos errores encontrados (%)	0,040	No se determino	0,9	-2,60	No se determino
Máximos errores permitido para clase : 1	± 0,1	± 1,5	1,0	± 1,0	1,50
Norma Tecnica Colombiana NTC 7500-1/2002-09-18, Numeral:	6.4.5	6.4.8	6.5.2	6.5.1	6.4.6

Certificado de Calibración

Calibration Certificate

Número: **F 1305** *Number*

Fecha de calibración miércoles, 30 de marzo de 2022

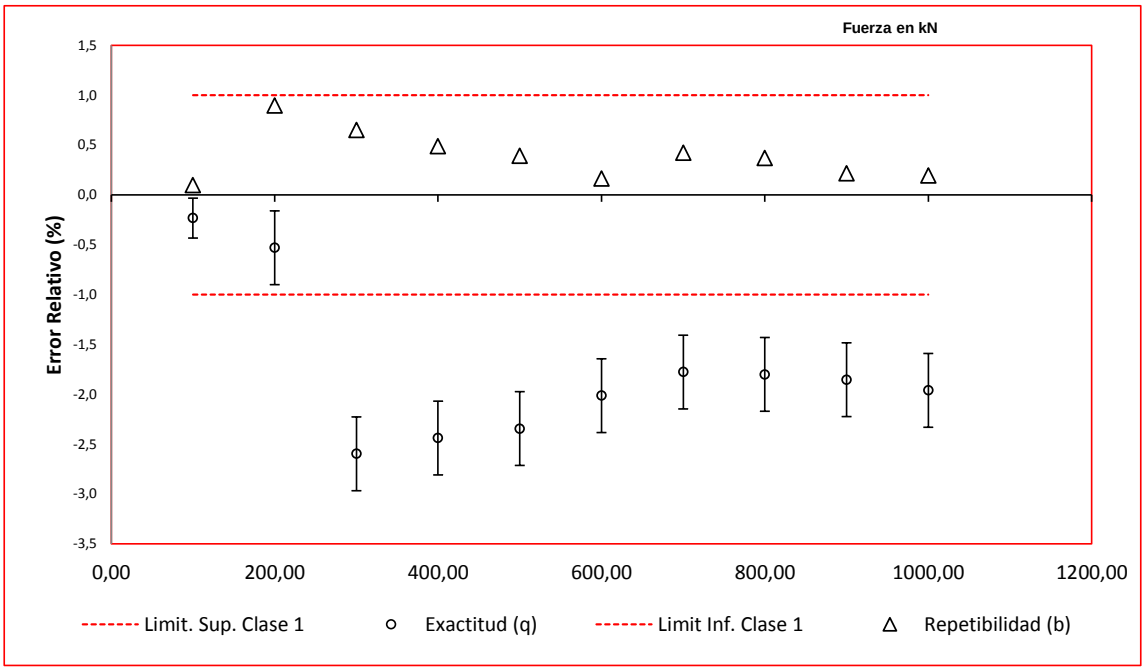

DE ACUERDO A LOS ERRORES RELATIVOS MAXIMOS PRESENTADOS Y SEGUN LAS PRESCRIPCIONES DE LA NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 7500-1, LA MAQUINA DE ENSAYO CALIBRADA SE CLASIFICA COMO:

Clase 1 DEL 10% AL 100% DE SU CAPACIDAD MAXIMA

TRAZABILIDAD :

EL LABORATORIO DE METROLOGÍA DE RYR SAS , ASEGURA EL MANTENIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD

Equipos utilizados en la calibraciòn

Equipo	*Fabricante*	*Modelo*	*Serie*	*Capacidad*	*Cert. No*	*Fecha Cal.*	*Entidad Cert.*
Celda de carga	AEP	KAL2000KN	901080	1000 kN	MF-172-18	2018/01/11	SIMIM
Celda de carga	AEP	KAL300KN	903408	300 kN	MF-174-18	2018/01/13	SIMIM

OBSERVACIONES :

1. La máquina de ensayos deberá ser calibrada inmediatamente despues de cualquier reparación ya que la sustitución de elementos del sistema mecánico o eléctrico afectan la operación del sistema de medida.
2. Si la máquina de ensayos es reubicada, se deberá repetir la calibración. Igualmente, cuando exista razón de duda con respecto a la exactitud de la carga, independientemente del tiempo transcurrido desde la última calibración,
3. Los datos emitidos en el presente certificado, se ajustan al momento y condiciones dadas en la calibración RYR SAS. no se hace responsable por daños ocasionados al equipo debido al uso inadecuado.

PINZUAR
LABORATORIO DE METROLOGÍA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN – LABORATORIO PRESIÓN

NA-23741-001 R0

CALIBRATION CERTIFICATE – LABORATORY OF PRESSURE

INSTRUMENTO *Instrument*	*MANÓMETRO HUMEDÓMETRO*
INTERVALO DE MEDIDA *Measurement range*	*0 %HR - 20 %HR*
FABRICANTE *Manufaturer*	*RYR*
MODELO *Model*	*DI*
SERIE *Identification number*	*No Presenta*
CODIGO INTERNO *Internal Code*	*23741-001*
SOLICITANTE *Customer*	*HERNAN RAMOS VILLAMIL SAS*
DIRECCIÓN *Address*	*Calle 12 No. 24 B - 17*
CIUDAD *City*	*Sincelejo - Sucre*
FECHA DE CALIBRACIÓN *Date of calibration*	2021 - 07 - 14
FECHA DE EXPEDICIÓN *Date of Issue*	2021 - 07 - 16

NÚMERO DE PÁGINAS DEL CERTIFICADO INCLUYENDO ANEXOS ***3***
Number of pages of this certificate and documents attached

Firmas que autorizan el certificado
Signatures authorizing the certificate

Ing. Sergio Martínez
Director Laboratorio de Metrología

Tecg. Francisco Durán Romero
Metrólogo Laboratorio de Metrología

DETALLES DE LA CALIBRACIÓN

MÉTODO DE CALIBRACIÓN Comparación directa. **Documento de Referencia** DKD R 6 - 1 del 2014

FACTOR DE CONVERSIÓN 1 psi = 6,89476 kPa Nota: Factor de conversión tomado del NIST Special Publication 811 2008 Edition

DATOS DE LA CALIBRACIÓN

INTERVALO A CALIBRAR 0 %HR - 20 %HR **DIVISIÓN DE ESCALA** 0,2 %HR **RESOLUCIÓN** 0,1 %HR

	Indicación del IBC	indicaciones del instrumento patrón	
		M1 - asc	M2 - desc
%	% HR	psi	psi
0	0,00	0,000	0,000
20	4,00	6,166	5,972
40	8,00	12,136	11,988
60	12,00	17,966	17,689
80	16,00	23,934	23,899
100	20,00	29,988	29,988

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN

Indicación del IBC		Promedio Patrón	Desviación	Histeresis	Incertidumbre Expandida
%	psi	psi	psi	psi	psi
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
4,00	6,00	6,07	-0,07	0,19	0,25
8,00	12,00	12,06	-0,06	0,15	0,21
12,00	18,00	17,83	0,17	0,28	0,34
16,00	24,00	23,92	0,08	0,04	0,13
20,00	30,00	29,99	0,01	0,00	0,12

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

La desviación máxima encontrada durante la calibración entre el instrumento sometido a prueba y el patrón es:

0,172 psi

La desviación máxima encontrada, respecto al valor máximo de la escala en porcentaje es:

% Desviación = 0,6

INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN

La incertidumbre expandida de la medición esta dada en la tabla de resultados de la página No. 2, para cada punto de calibración. La incertidumbre de medición fue calculada utilizando un factor de cobertura k = 2 para un nivel de confianza aproximado del 95,45% para una distribución "t-student" y fue estimada con el documento: JCGM 100:2008. GUM 1995 with minor corrections. Evaluation of measurement data Guide to the expression of uncertainty in measurement. First Edition. September 2008.

CONDICIONES AMBIENTALES

Max. Temp.	*20,3 °C*	***Min. Temp.***	*19,6 °C*
Max. Hum. (%)	*55 HR*	***Min. Hum. (%)***	*53 HR*

TRAZABILIDAD

El Laboratorio de Metrología de Pinzuar Ltda. asegura el mantenimiento de la trazabilidad de los patrones de trabajo utilizados en las mediciones.

PATRÓN UTILIZADO	Manómetro Digital		
CERT.DE CALIBRACIÓN	7337 de Flexilatina S.A.S.	**CLASE DE EXACTITUD**	0,050%
INTERVALO DE MEDIDA	30 psi	**SERIE**	3227038

OBSERVACIONES .

1. Se realizó una inspección general del instrumento encontrándose en buen estado de funcionamiento
2. Los Certificados de calibración sin las firmas no tienen validez .
3. El usuario es responsable de la recalibración de los instrumentos de medición.
4. Los resultados contenidos parcialmente en este informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos.
5. Se adjunta estampilla de calibración adherida al instrumento No. **NA-23741-001**

Fin de Certificado

ERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S.
INGENIERIA CIVIL- ESTUDIOS DE SUELO.

OFICINA Y LABORATORIO
Calle 12 No. 24B – 17 Barrio La Palma
Telef. y Fax 095-282 58 08 - SINCELEJO

Sincelejo, 1 de julio de 2022
Señores
ENTerritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
Ref. Certificación para realización de ensayos de geotecnia

Cordial saludo,

Yo, **HERNAN RAMOS VILLAMIL**, identificado con la cedula de ciudadanía número 9.053.862 de Cartagena y la Matricula profesional 494 de S.I.A.B. que me acredita como ingeniero civil, en calidad de representante legal de la empresa **HERNAN RAMOS VILLAMIL S.A.S. Nit. 900.565.151-3**, laboratorio con más de 50 años de experiencia en el campo de la geotecnia, certifico que seremos los encargados de realizar todos los ensayos pertinentes que garanticen el control y el aseguramiento de la calidad de la obra *"ejecución de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el Municipio de Córdoba, Departamento de Bolívar"* la cual está a cargo de la firma **Consorcio Construredes Nit 901.568.676-5**.

Firma Electrónica
ID Firma: 67c37f62-3496-469f-b5c0-733a2abbe22b

HERNAN RAMOS VILLAMIL
C.C. 9.053.862 de Cartagena.
T.P. 494 S.I.A.B.
Representante Legal

CONSORCIO CONSTRUREDES

Cra 24 No. 15 - 17 Centro

Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com

Teléfono: 311 4143542

«CIUDAD_PROPONENTE»

El consorcio Construredes Se hace responsables de todos los ensayos emitidos por la empresa **Hernán Ramos Villamil S.A.S Nit 901.565.151-3**, laboratorio con más de 50 años de experiencia en el campo de la geotecnia y los cuales poseen la calibración de los equipos, cuyo proveedor si está acreditado para realizar las calibraciones correspondientes y es un respaldo a nuestro trabajo. Estarán encargados de realizar los ensayos pertinentes que garanticen el control y aseguramiento de la calidad de la obra “ejecución de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de cordoba, departamento de bolívar”

REPRESENTANTE LEGAL

FOTOCOPIA DE LA BITACORA O LIBRO DE OBRA DE TODA LA EJECUCION DEL PROYECTO

OLUNES 01 AGOSTO 2022

PERSONAL EN OBRA

- Ing. Residente
- SISO
- 10 Maestros
- Ing. Diagnostico
- Trabajadora social
- 18 ayudantes

PERSONAL INTERVENTORIA

- Arq. Residente
- Trabajadora Social.
- Ing. Inspectora.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realizo fundicion de columnatas.
- Se realizo excavacion para tuberia sanitaria
- Se realizo fundicion de columna para tanques.
- Se realizo levante de muro.
- instalacion de ceramica e instalacion de aparatos sanitarios
- Se realizo excavacion para cajas de inspeccion.

Estado del tiempo: Mayormente soleado.

RONALD ARRIETA
R. INTERVENTORIA

RONAL BLANCO
R. OBRA.

MARTES 02 AGOSTO 2022

CLIMA: MAYORMENTE SOLEADO.

PERSONAL EN OBRA

- ING. RESIDENTE
- SISO
- 14 MAESTROS - 16 AYUDANTES
- ING. DIAGNOSTICOS
- TRABAJADORA SOCIAL

PERSONAL INTERVENTORIA.

-
- ARQ. RESIDENTE.
- ING. INSTECTOR
- TRABAJADORA SOCIAL.

SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE LEVANTAMIENTO DE PLANOS PARA PRESUPUESTOS Y DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS PARA DIAGNOSTICOS.

SE SIGUE ADELANTANDO EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS ADECUACIONES, CASETAS TIPO 2, CASETAS TIPO 3 Y CASETAS TIPO 4, LOS CUALES SE ENCUENTRAN REALIZANDO LABORES DE:

- EXCANACION.
- VIGAS DE CIMIENTO
- LEVANTE DE MUROS
- FUNDICION DE COLUNAS
- FUNDICION DE COLUMNETAS
- FUNDICION DE VIGA SUPERIOR.
- FUNDICION PLACA PARA TANQUE
- INSTALACION DE ENCHAPES PISO Y PARED.
- INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS.

RONALD ARRIETA
R. INTERVENTORIA.

MIERCOLES 03-AGO-22

PERSONAL OBRA

- ING. RESIDENTE
- ING. DIAGNOSTICOS
- SISO
- TRABAJADORA SOCIAL
- 14 MAESTROS - 14 AYUDANTES.

PERSONAL INTERVENTORIA

- ARQ. RESIDENTE.
- ING. INSPECTOR
- PROFESIONAL SOCIAL

EN LA ACTIVIDAD 2 SE CONTINUA CON EL PROCESO DE DIAGNOSTICOS CON EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS, LEVANTAMIENTOS ARQUITECTONICOS Y PRESUPUESTOS.
EN LA ACTIVIDAD 3 SE CONTINUA CON LA EJECUCION DE LAS INTERVENCIONES EN LOS PROCESOS DE EXCAVACION, FUNDICION DE VIGAS DE CIMENTACION, LEVANTES DE MAMPOSTERIA, FUNDICIÓN DE COLUMNAS Y COLUMNETAS, FUNDICION DE PLACAS PARA TANQUES, INSTALACION DE CUBIERTAS, PAÑETES, INSTALACION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES, CONSTRUCION DE SOPORTES PARA LAVAPLATOS Y LAVADEROS E INSTALACION DE LOS MISMOS.

- ESTADO DEL TIEMPO: MAYORMENTE SOLEADO.

ARQ. RONALD ARRIETA.
R. INTERVENTORIA.

Ronal Blanco
R. OBRA.

JUEVES 04 - AGO - 22

PERSONAL OBRA.

- ING. RESIDENTE.
- ING. DIAGNOSTICOS
- SISO
- TRABAJADORA SOCIAL
- 14 MAESTROS - 16 AYUDANTES.

PERSONAL INTERVENTORIA.

- ARQ. RESIDENTE.
- ING. INSPECTOR
- TRABAJADORA SOCIAL.

EN LA ACTIVIDAD 3 se continua con la ejecucion de las intervenciones en las viviendas para la construccion de la Caseta Tipo 2, Tipo 3, y adecuaciones. Las actividades desarrolladas son: excavacion, armado de acero para refuerzo de cimentacion, columnas y columnetas caseta Tipo 3. y Columna, vigas y losa en tanque elevados. De igual manera, instalaciones de cubiertas, pañete, Construccion de soporte para lavaplatos y lavadero estandas e instalaciones de los mismos.
- Se realiza comite de obra Nº 13.

Ronald Arneta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. Obra

Viernes, 05 Agosto /2022

Personal en Obra

- Ing. Residente
- Ing. Diagnostico
- SISO
- Trabajadora social
- 16 Maestros - 18 Ayudantes

Personal Interventoría:

- ~~Arq~~. Residente
- Ing Inspector
- Profesional Social

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continua desarrollando la actividad 2 de Diagnostico con el diligenciamiento de los Formatos, levantamiento de planos arquitectonicos y presupuestos.

De igual forma se continua con las actividades de excavación, armado de acero, levante de muros, Fundición de elementos estructurales en caseta de baño y tanque elevado. con el personal en campo, haciendo el uso correcto de los EPP.

- Por medio electronico, correo, Constructores envía informe PDF con anexos PGIO MES JUNIO, de acuerdo a la solicitud Profesional Social Yira Lemus.
- Ing residente interventoria envia mediante correo OFICIO TEC-048-22 Solicitud respuesta a oficios de disponibilidad de redes a

Ronal Arreta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. de obra.

Sábado 06 de Agosto / 2022

→ Personal Obra
- Ing. residente
- Ing Diagnóstico
- Profesional SISO
- Trabajadora Social
- 16 Maestros - 18 Ayudantes

- Personal Interventoría
- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Trabajadora social

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continúa con el desarrollo de la actividad 3, con la ejecución de las actividades en campo en viviendas intervenidas de acuerdo a la necesidad, siendo adecuación, Casita Tipo 2, Casita Tipo 3 y Tipo 4.
Se realiza:
- Armado de acero para vigas de cimentación y columnas, viga aerea y losa de tanque.
- Levante de muro y pañete
- Instalación de equipo sanitario, incrustaciones en pared e instalación de puerta
- Construcción de lavadero y lavamanos de soporte

Estado del clima: Soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoría

Ronald Blanco
R. de Obra

Lunes 08 de Agosto /2022

→ PERSONAL OBRA
- Ing. Residente
- Ing Diagnostico
- Trabajadora Soual
- SISO
- 18 Maestros
- 20 Ayudantes

→ PERSONAL INTERVENTORIA
- Arq. Residente
- Ing. Inspector
- Trabajadora Social

— ACTIVIDADES REALIZADAS —

Se realiza el desarrollo y continuación de la actividad 2 con el diligenciamiento de los Formularios para diagnóstico se realiza el levantamiento arquitectonico.
Se continua desarrollo de la ejecución de actividad 3, dentro de los wales: fundición de cimentación, levantamento de muro, encofrado de columnas y losa tanque.
Instalación de equipo sanitarios, instalacion de puntas, tanque elevado, lavamanos con pedestal y lavaplatos de soporte, de igual forma se construye el soporte para el lavadero estandar.

- De parte de la trabajadora social, del Interventoría se envia mediante vía electronica oficio TEC-049-22 "Remisión de Solicitud de inclusión"

Estado clima: Soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoría

Ronald Blanco
R. Obra.

Martes 09 Agosto /2022

→ PERSONAL OBRA
- Ing residente
- Ing. Diagnostico
- Trabajadora social
- SISO
- 20 Maestros
- 22 Ayudantes

→ PERSONAL INTERVENTORIA
- Arq Residente
- Ing. Inspector
- Trabajador Social

→ ACTIVIDADES REALIZADAS
Se avanza el proceso constructivo de la actividad 3, con las actividades de intervención en viviendas de acuerdo a la necesidad según sea el caso, adecuación, Casita Tipo 2, Tipo 3 y Tipo 4. Se adelantan labores como cimentación, mampostería, fundición de columnas y columnetas. pañete, instalación de tubería hidrosanitaria, instalación de equipo sanitario, cubierta, puerta metalica, instalación de tanque elevado.

- Se recibe correspondencia de parte de Interventoria con observaciones al Informe semanal, resaltando que a la fecha deberian estar 86 viviendas terminadas, siendo el caso de 60 terminadas actualmente.

Estado del clima: lluvias leves

Ronald Ameta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. Obra

Miercoles, 10 Agosto / 2022

= PERSONAL OBRA
- Ing. Residente
- SISO
- Ing. Diagnostico
- Profesional Social
- 20 Maestros
- 22 Ayudantes

= PERSONAL INTERVENTORIA
- Ing. Inspector
- Arq. Residente
- Trabajadora Social

= ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continua la ejecución de la Actividad 3, se estan realizando las siguientes labores:
- Excavacion para redes hidrosanitaria, cimentacion
- Fundición de placas, cimentación, columnas y placa de tanque
- Instalación de aparatos sanitarios
- Instalación de ceramicas en piso y pared
- Cubierta
- Instalacion de tanque elevado

→ Se realiza Comite de obra N°14, a la fecha de corte se han terminado 60 viviendas, 25 en ejecución se recomienda a contratista aumentar el personal y número de cuadilla para alcanzar la reprogramación
→ Se establecen compromiso de terminación de diagnosticos por parte de Contratista

Ronald Arrieta
Residente Interventoria

Ronald Blanco
Residente Obra

Jueves 11 Agosto /2022

-PERSONAL EN OBRA-
- Ing residente
- SISO
- Ing. Diagnostico
- Profesional social
- 20 Maestros - 22 Ayudantes

=PERSONAL INTERVENTORIA
- Arq. residente
- Ing. Inspector
- Trabajador social

-Actividades realizadas-

Se continua desarrollando la Actividad 2, con el diligenciamiento de los Formularios, recibo de soportes Levantamiento Arquitectonico para proyección de diseño hidrosanitarios

Por otra parte, se realiza verificación al desarrollo de la actividad 3, en la que se estan ejecutando la construcción de las adecuaciones, instalación de ceramica, aparatos sanitarios; Construcción de Casita tipo 2 y tipo 3, con la fundida de viga de cimentación, armado de acero, levante de muro instalación de lavamanos y lavaplatos, instalacion de cubierta, encofrado de columna y placa para tanque

→ Se recibe mediante correo electronico respuesta de Oficio de solicitud de disponibilidad de redes, notificando que el listado de viviendas cuentan con conexion red acueducto y alcantarillado. También, solicitan tubería y materiales para conexión domiciliaria. Serán suministrados al contratista los materiales pedidos para vivienda CBB.

Ronald Arrieta
Residente Interventoria

Ronald Blanco
Residente Obra.

Viernes 12 Agosto /2022

= PERSONAL OBRA
- Ing residente
- Ing Diagnostico
- SISO
- Trabajadora social
- 22 Maestros — 24 Ayudantes

= PERSONAL INTERVENTORIA
- Arq Residente
- Ing Inspector
- Trabajador Social

= ACTIVIDADES REALIZADAS
- Se continua con el desarollo de Actividad 3:
  - Armado de acero
  - Aplicación de pañete
  - Instalación de aparatos sanitarios
  - Armado de encofrados para viga dintel, columnas y losa tanque
  - Fundicion de elementos estructurales

4 En la actividad 2, se continua con el diligenciamiento de los formularios de diagnostico, levantamiento arquitectonicos y presupuestos.

4 Se recibe correo electronico de Gerencia Interventoria relacionado planilla de seguridad social

Clima: Soleado

Ronald Arrieta
Residente Interventoria

Ronald Blanco
Residente Obra

Sábado 13/Agosto - 2022

- PERSONAL OBRA
- Ing Residente
- SISO
- Trabajador social
- Ing Diagnóstico
- 22 Maestros
- 24 Ayudantes

- PERSONAL INTERVENTORIA
- Arq Residente
- Ing. Inspector
- Trabajador social

- ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se continua con el desarrollo de la Actividad 2, con el diligenciamiento de los formularios, levantamiento arquitectonico y presupuesto.

- Se continua con la actividad 3, con la intervención de adecuaciones, construcción de caseta Tipo 2, y Tipo 3.
  - Excavación de cimentación
  - Excavación para puesta de tubería hidrosanitaria
  - Levante de muro
  - Pañete interno y externo en muros
  - Instalación de cubierta
  - Fundición de columnas, columnetas y losa de tanque
  - Instalación de sanitario, lavamanos con pedestal
  - Instalación de lavaplatos
  - Instalación de lavadero.

Clima: Soleado

Ronald Arrieta
Residente Interventoría

Ronald Blanco
R. Obra

Lunes, 15 Agosto /2022

- PERSONAL OBRA
- Ing residente
- Ing Diagnostico
- Trabajador Social
- SISO
- 24 Maestros 24 Ayudantes

- PERSONAL INTERVENTORIA
- Ing Inspector
- Arq. residente
- Trabajador Social

- ACTIVIDADES REALIZADAS

- Continua el desarrollo de las actividades de intervencion en viviendas beneficiadas, de acuerdo a la ACTIVIDAD 3. Las labores realizadas fueron: Fundición de columnas y columnetas, encofrado de columna para tanque, encofrado de losa de tanque, construcción de muro para soporte de lavadero y lavaplatos, se realiza instalación de cerámica en piso y pared, excavación y construcción de caja de registro

- En la ejecución de la ACTIVIDAD 2, el personal encargado continua con el diligenciamiento de los formularios de diagnosticos, el levantamiento arquitectonico y registro fotografico correspondiente.

Clima: Muy soleado

Ronald Arrieta
Resid. Interventoria

Ronald Blanco
R. Obra

Martes 16 Agosto / 2022

- PERSONAL OBRA
- Ing. Residente
- Ing. Diagnostico
- Trabajador social
- SISO
- 24 Maestro - 24 Ayudante

- PERSONAL INTERVENTORIA
- Arq. residente
- Trabajador social
- Ing Inspector

- ACTIVIDADES REALIZADAS -

- Se realizan trabajos de excavación de la viga cimentación para la caseta tipo 3
- Se realiza levante de muros
- Construcción de soporte para lavadero
- Retiro de ceramica en mal estado para posterior instalación de ceramica en piso y pared en cuendas con intervención de adecuación
- Encofrado de columna y losa de tanque
- Instalación de tubería hidrosanitaria
- Instalación de incrustaciones en pared
- Instalación de aparatos sanitarios.

Se continua desarrollando la Actividad 2. con el diligenciamiento de Formatos diagnostico, recibo de soportes, levantamiento arquitectonica y proyección de redes hidrosanitarias (trazado)

Clima: Soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. Obra

Miercoles 17 Agosto 2022

- PERSONAL OBRA
  - Ing residente
  - Ing Diagnostico
  - SISO
  - Trabajado. Social
  - 24 Maestro
  - 24 Ayudantes
- PERSONAL INTERVENTORIA
  - Ing Inspector
  - Arq residente
  - Trabajador social

= ACTIVIDADES REALIZADAS -

- Se continua con el diligenciamiento de formatos de diagnostico, trazado y levantamiento arquitectonico, recepción de soportes y registro fotografico.

- En la actividad 3: Se realiza el armado de acero de refuerzo para viga dintel, encofrado de columnetas y vigas, se realiza pañete en muros, instalación de equipo sanitarios, instalación de accesorios, instalación de tubería de 4" sanitario, instalación de puertas, instalación de tubería 1/2" y 2".

↳ Observacion: Se recibe del prestador COOSEPCOR LTDA mediante correo electrónico, respuesta a 32 favorable 8 no favorable para Solicitud de inclusión, se remite a profesional social Interventoría.

- Se emite mediante oficio TEC-052-22 Solicitud de accion frente atraso de Interventoría a Constructor.

Clima: Soleado ↳ Se envia de gerencia Interventoria acta de comite F-66-09-V1

Ronald Arrieta
R. Interventoría

Ronald Blanco
R. Obra

Jueves 18 Agosto /2022

- PERSONAL OBRA
- Ing residente
- Ing diagnostico
- Trabajador social
- SISO
- 24 Maestros — 28 Ayudantes
- PERSONAL INTERVENTORIA
- Ing inspector
- Arq residente
- Trabajador social

- ACTIVIDADES REALIZADAS
- Se continua la actividad 3: excavación y construcción de cajas de inspección, levante de muro, instalación de puertas, pañete en muros internos y externos, instalación de equipo sanitario, armado de acero de refuerzo para columnas y losa de tanque.

- Se recepciona en Interventoria por parte de Construredes soportes solicitados por Directora de Interventoría.

- Se envia a Secretario de planeación de Alcaldía Municipal en oficio TEC-053-22 remisión de Solicitud para 20 inclusiones.

- El arq. residente de Interventoría envia a INTemitorio con copia a Directora de Int., reporte de obra con Personal de mano de obra a corte 18 Agosto/2022 y Relación de herramientas Consorcio construredes.

Clima: Soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoría

Ronald Blanco
R. Obra.

Viernes 19 Agosto /2022

- PERSONAL OBRA
- Ing residente
- Ing Diagnostico
- SISO
- Profesional Social
- 24 Maestros - 28 Ayudantes
- PERSONAL INTERVENTORIA
- Arq residente
- Ing inspector
- Trabajadora social

=ACTIVIDADES REALIZADAS-

- Se realiza excavación de vigas de cimentación
- Se realizo armado de acero para columnas, Losa de tanque, viga dintel
- Se realizó levante de muros y pañete
- Se realizó Fundición de zapata y pedestal
- Se realizo excavación para tubería, Caja de inspección
- Se realizó Fundición de caja de inspección.

↳ Se recibe de Gerencia Interventoría "Resolución Vigente por la cual se establecen los lineamientos para implementación del PCI, y se solicita a Interventoría compartirla y socializarla con contratista, con evidencias

↳ Se recibe mediante correo electrónico de Consorcio Construredes Diagnostico para revisión y aprobación de intruntoria con oficio CCR_CORDOBA_2220576_2022_081.

Estado del clima: Soleado

Ronald Arnulfo
R. Interventoria

Ronald B Vanco
R. de obra

Sábado 20 Agosto / 2022

- PERSONAL OBRA
- Ing residente
- Ing Diagnostico
- SISO
- Trabajadora social
- 24 Maestros - 28 Ayudantes
- PERSONAL INTERVENTORIA
- Arq. residente
- Ing Inspector
- Trabajadora social

- ACTIVIDADES REALIZADAS -

- Se realiza levantamiento de muros para caseta tipo 3.
- Se realiza fundición de zapatas y pedestales
- Se realiza fundición de losa de tanque con su viga.
- Se realizó pañete en baño en caseta tipo 3.
- Se realiza encoframento de columnas
- Se realizó armado de dado de refuerzo para viga dintel.
- Se realiza instalación de cerámica en pared y piso en adecuación.

El residente de Interventoría envía Acta de comité de aprobación de diagnosticos Nº 15 con folio F-GC-09 V1 ACTA DE APROBACIÓN NO 15.

Estado de clima: Soleado.

Ronald Ameta
R. Interventoría

Ronald Blanco
R de obra

Lunes 22 Agosto / 2022

- PERSONAL OBRA
- Ing residente
- Ing Diagnostico
- SISO
- Trabajadora social
- 24 Maestro - 28 Ayudante
- PERSONAL INTERVENTORIA
- Arq residente
- Ing inspector
- Trabajadora Social

-ACTIVIDADES REALIZADAS-

- Se continua con la Actividad 2, con el diligenciamiento de formulario de diagnostico, levantamiento arquitectonico, trazado de redes hidrosanitarias, registro fotografico.
- Se continua con la Actividad 3, con las intervenciones en viviendas con adecuación, construcción de caseta tipo 2 y tipo 3, y cada una de las actividades que de ello se derivan.

↳ Se recibe por correo electronico respuesta al Oficio TEC-050-22 por parte de Consorcio Construredes con oficios CCR-CORDOBA_2220576_2022-082 y Plan de acción-Cordoba (1).

↳ De Directora de Interventoría, se envia a Consorcio Construredes la petición de memorias a items cobrados en el corte, con oficio 2022.08.19 Acta parcial de Obra N.1 Córdoba.

↳ Se recibe de Construredes "Certificado Usuarios Inclusion TEC 053-22.

↳ Se remite a Interventoria F-66-09 V3 Acta de aprobación de diagnosticos N°16 (cual 10 diagnosticos)

Ronald Arieta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. Obra

Martes 23 Agosto /2022

- PERSONAL OBRA
  - Ing residente
  - Ing Diagnostico
  - Siso
  - Trabajador Social
  - 24 Maestros -28 Ayudantes
- PERSONAL INTERVENTORIA
  - Ing Inspector
  - Arq. residente
  - Profesional social

- ACTIVIDADES REALIZADAS
  - Se continua con la actividad 3 en la ejecución de intervenciones en procesos de excavación, fundición de vigas de cimentación, levante de mampostería, fundición de columnas y columnetas, Fundición losa de tanque, instalación de cerámica en piso y pared, instalación de aparatos sanitarios.

↳ Se recibe de Gerencia oficio 2022-07-14-Observaciones recorrido de campo Córdoba para dar respuesta a subsanación y registro fotografico de atención a las observaciones.

↳ Remiten Enteritorio adjuntos Informe Semanal Nº 17 y ANEXOS.

Clima: Soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. Obra

Miercoles 24 Agosto 2022

- PERSONAL OBRA
  - Ing residente
  - Ing. Diagnostico
  - SISO
  - Trabajador social
  - 24 Maestros - 28 Ayudantes
- PERSONAL INTERVENTORIA
  - Arq. residente
  - Ing. Inspector
  - Trabajador social

- ACTIVIDADES REALIZADAS -

- Se continua con el diligenciamiento de Formulario de diagnostico, Levantamiento arquitectonico, recepción de soportes y registro fotograficos.

- Se realiza excavación de caja de inspección
- Levante en mampostaria en canta tipo 3
- Encofrado de columnas y columnetas
- Instalación de aparatos sanitar
- Fundición de columna y losa tanque
- Fundición de viga de cimentación, zapatas y pedestales.

↳ Se recibe de Coordinadora HSE Revisión Informe Mensual 3
↳ Se envia de Interventoria a Consorcio Constructor Código F-66-09-V1 Acta de Reunión Nº 14 - 10 de AGOSTO.
↳ Se ~~envia~~ recibe en correo GER03-E REMISION OBSERVACIONES INFORME MENSUAL NO2 Contratista, se constata subsanación de las observaciones realizadas.
↳ Se recibe presentacion Comite Nº 16 (Corte 21 Agosto)
Clima: Soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. obra

Jueves 25 Agosto / 2022

- PERSONAL OBRA
- Ing residente
- Ing Diagnostico
- SISO
- Trabajador social
- 24 Maestros - 28 Ayudantes
- PERSONAL INTERVENTORIA
- Arq. residente
- Ing Inspector
- Trabajador social

- ACTIVIDADES REALIZADAS -

- Se realiza excavación de la viga cimentación en Caseta tipo 3.
- Se realiza levante de muros
- Construcción de soportes para lavaderos y lavaplatos
- Encofrado de columnas y losa de tanque.
- Instalación de aparatos sanitarios
- Instalación de tubería hidrosanitaria.
- Se realiza instalación de cerámica en piso y pared
- Construcción de caja de inspección
- Pañete en muros de caseta.
- Fundición de viga dintel.

↳ En la actividad 2, Se continua con el diligenciamiento de formato de diagnostico, Levantamiento arquitectonico registro fotografico y presupuesto.

Estado del clima: Soleado

Ronald Arrieta
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. Obra

Viern 26 Agosto / 2022

= PERSONAL OBRA

- Ing residente
- Siso
- Ing Diagnostico
- Trabajadora social
- 24 Maestros - 28 Ayudantes

= PERSONAL INTERVENTORIA

- Arq. Residente
- Ing. inspector
- Trabajador Social

= ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se continua con el desarrollo de la actividad 2, con el diligenciamiento de formularios de diagnostico, levantamiento arquitectonico, trazado de redes hidrosanitarias, recepción de soportes y registro fotografico
- Por su parte, de manera simultanea se desarolla la ejecución de la actividad 3, con las labores realizadas en las viviendas intervenidas con adecuación, caseta Tipo 2 y Tipo 3. Se desarollan: excavaciones, levante de muros, encofrado de elementos estructurales, fundición de columnas, losa de tanque, instalación de equipos sanitarios e incrustaciones en pared.

↳ Se remite mediante correo electronico de Prof. social Interventoría oficio TEC-057-22 REMISION SOLICITUDES DE INCLUSION (con 76 solicitudes) a las partes para su debido tramite.

Clima: Se presentaron lluvias torrenciales en las horas de la mañana

Ronald Arrieta
R. Interventoría

Ronald Blanco
R - obra

Sábado 27 Agosto / 2022

- PERSONAL OBRA
- Ing residente
- Ing Diagnostico
- SISO
- Trabajador Social
- 24 Maestros - 28 Ayudantes
- PERSONAL INTERVENTORIA
- Arq. residente
- Ing Inspector
- Trabajador social

- ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realiza instalación de ceramica en piso y pared del baño
- Se realiza el levantamiento de muro
- Se realiza pañete
- Se realiza excavación de cimentación de caseta,
- Se realiza fundición de viga dintel
- Instalación de aparatos sanitarios.

↳ Se continua con el desarrollo de la actividad 2, con el diligenciamiento de Formulario de diagnostico, levantamiento arquitectonico, presupuesto.

↳ Se recpuona mediante correo electronico de Consorcio Construredes oficio CCR_CORDOBA-22205 76-2022-088 para revisión y aprobación de Interventoría de 14 Diagnostico.

Clima: Se presenta lluvias, resto de la jornada Soleado

Ronald Amete
R. Interventoría

Ronald Blanco
R. Obra

Lunes 29 Agosto /2022

= PERSONAL OBRA
- Ing residente
- Ing Diagnostico
- SISO
- Trabajadora social
- 24 Maestro - 28 Ayudantes

= PERSONAL INTERVENTORIA
- Arq. residente
- Ing Inspector
- Trabajador social

-ACTIVIDADES REALIZADAS

↳ Se realiza recorrido para vinpcación de trabajos ejecutados en la ACTIVIDAD 3, se realiza levante de muro, pañete, instalación de aparatos sanitarios, encofrado y fundición de viga dintel, desencofrado de columna de tanque elevado, excavación de caja de inspección, instalación de tubería hidrosanitaria.

↳ Se realiza el acompañamiento de interventoría en el diligenciamiento de formularios para diagnostico, levantamiento arquitectonico y presupuesto.

⇒ Observación (Interventoría)
- Se reciben resultados de los ensayos a compresión en cilindros, por parte del profesional SISO, estos corresponden a los realizados en el mes de AGOSTO.
- Se recibe oficio F-66-09 VJ Acta de aprobación de diagnosticos N° 17 con ajustes por parte ENTerritorio

Estado del clima: Soleado

Ronald Arrieta
R Interventoria

Ronald Blanco
R. Obra

Martes 30 Agosto / 2022

= PERSONAL OBRA
- Ing residente
- Ing Diagnostico
- Trabajadora social
- SISO
- 24 Maestros - 28 Ayudantes

= PERSONAL INTERVENTORIA
- Arq. residente
- Ing Inspector
- Trabajadora social

=ACTIVIDADES REALIZADAS=

• Se continua con el desarrollo de la actividad 2, con el diligenciamiento de los formatos de diagnosticos, levantamiento arquitectonico, presupuesto.

• Con respecto al desarrollo de la Actividad 3, se continua con la ejecución en viviendas intervenidas con adecuación. Casita Tipo 2 y Tipo 3, dentro de las actividades:
- Se realizaron excavaciones de caja de inspecion
- Levante de muro
- Instalación de cerámica en pared y piso
- Construcción de soporte para lavadero y lavaplatos
- Se realizó pañete en muros internos y externos de casita
- Se realizo armado de acero de refuerzo para columna y losa de tanque.

Clima: Se presentan lluvias torrenciales en las horas de la mañana.

Ronald Arnedo
R. Interventoría

Ronald Blanco
R. Obra

Miercoles 31 Agosto /2022

- PERSONAL OBRA
  - Ing residente
  - Ing Diagnostico
  - SISO
  - Trabajadora social
  - 24 Maestros - 28 Ayudantes
- PERSONAL INTERVENTORIA
  - Ing Inspector
  - Arq. residente
  - Trabajadora social

- ACTIVIDADES REALIZADAS

• Durante toda la jornada se realizaron el diligenciamiento de los formularios de los diagnosticos, se hizo recepción de documentación requerida además de ello el levantamiento arquitectonico y trazado de redes hidrosanitarias.

- Se continuó con la ejecución de la actividad 3, donde se desarollaron entre otras, las siguientes:
  - Fundición de cimentación (zapatas, pedestales) para columna de tanque
  - Se realizo Fundición de viga dintel
  - Levante de muro
  - Armado de acero de ref para elementos estructurales columnas, columnetas, viga cimentación, viga dintel.
  - Encofrado de columnas en casita Tipo 3.
  - Instalación de equipos sanitarios
  - Colocación ceramica en zona de piso y pared.

Estado del clima: Soleado

Ronald Amaya
R. Interventoria

Ronald Blanco
R. Obra

RELACIÓN DEL PERSONAL EMPLEADO

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	CONTROL DE PERSONAL	CÓDIGO:	F-GG-10
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/08/2020 Y EL 31/08/2022 PLAZO: 5 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES — CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. — CONTRATO No. 2220587

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVACIONES
NOMBRE Y CARGO																																
DUARTE PINEDO - DIRECTOR DE OBRA	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	
RONALD BLANCO - RESIDENTE DE OBRA	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	Resaltados en rojo lo dias Domingo
RAFAEL CASTILLO - RESIDENTE SST	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	
NORELIS ANAYA - TRABAJADORA SOCIAL	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	
OSWALDO GARZON - PROFESIONAL DIAGNOSTICO	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	
SINDY ESCOBAR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	
PERSONAL CONTRATISTA	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**0**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**0**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**0**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**0**	**5**	**5**	**5**	**TOTAL PERIODO** 135

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE*	SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA		**0**	**0,00%**	
De la región		0	0,00%	
RODOLFO JOSE TORRES ANAYA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	27	20,00%	
YOVANNI CHAMORRO FLOREZ	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	27	20,00%	
JULIO SANCHEZ BLANCO	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	27	20,00%	
ERIS ALFONSO HERNANDEZ ESCOBAR	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	27	20,00%	
CRISTIAN GARIZA FLOREZ	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	27	20,00%	
CARLOS JOSE ESCOBAR PIÑA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	27	20,00%	
HEIDER MANUEL PINEDA HENAO	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	27	20,00%	
JESUS MANUEL VALETH ANDRADE	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	27	20,00%	
De fuera de la región	N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A	0	0,00%	
WALBERTO GUETTE PACHECO	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	27	20,00%	
ROBERTO ENRIQUE BRITO APIAYU	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	27	20,00%	
CRISTIAN JOSE ESCOBAR PIÑA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	27	20,00%	
RAFAEL MARTINEZ GONZALEZ	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	27	20,00%	
RAFAEL ISIDRO PACHECO HORTA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	27	20,00%	
LUIS EDUARDO MEDINA FONTALVO	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	27	20,00%	
CRISTIAN JOSE PACHECO PEREA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	27	20,00%	
HERIBERTO VALENCIA PEREZ	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	27	20,00%	
		0	0,00%	
MANO OBRA CALIFICADA		**0**	**0,00%**	
De la región		0	0,00%	
DONAIRO ALFONSO ESCOBAR ROMERO	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	27	20,00%	
YULDOR VERGARA TOREES MAESTRO	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	27	20,00%	
YEISON ESCOBAR VERGARA MAESTRO	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	27	20,00%	
JESUS ESCOBAR VERGARA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	27	20,00%	
		0	0,00%	
		0	0,00%	
		0	0,00%	
De fuera de la región	N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A	0	0,00%	
GENKY ALVAREZ PADILLA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	27	20,00%	
ALEXI CORDOBA CUESTA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	27	20,00%	
JHON JEIDER SANCHEZ PADILLA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	27	20,00%	
MAICOL RIOS ARANGO	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	27	20,00%	
CRISTIAN PACHECO HORTA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	27	20,00%	
LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	27	20,00%	
PEDRO PABLO GOMEZ DOMINGUEZ	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	27	20,00%	

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**CONTROL DE PERSONAL**	CÓDIGO:	**F-GG-10**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/08/2020 Y EL 31/08/2022 PLAZO: 5 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES — CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. — CONTRATO No. 2220587

| | | |

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**CONTROL DE PERSONAL**	CÓDIGO:	**F-GG-10**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/08/2022 Y EL 31/08/2022 PLAZO: 5 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES — CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. — CONTRATO No. 2220587

PERSONAL INTERVENTORIA

FECHA	MES: 01 JULIO AL 31 DE JULIO 2022																														OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
NOMBRE Y CARGO																																
MARCY CORREA - DIRECTOR INTERVENTORIA	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	Resaltados en rojo lo dias Domingo
RONALD ARIETA - RESIDENTE INTERVENTORIA	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	
MARIELIS OCHOA- INSPECTORA DE INTERVENTORIA																													1	1	1	
FERNANDA GRIJALBA - PROFESIONAL SOCIAL	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	
YIRA LEMUS - PROFESIONAL HSEQ	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	
LEYDIS HERRERA - AUXILIAR SOCIAL	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	
JOSE CASTAÑO - ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	
CRISTINA PAEZ - PROFESIONAL HSEQ	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	
GREGORIO MARÍN - ESPECIALSITA HIDROSANITARIO	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	
CARLOS FORERO - PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	
PERSONAL INTERVENTORIA	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**0**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**0**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**0**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**0**	**10**	**10**	**10**	**TOTAL PERIODO** **246**

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

Firma: Marcy A. Correa C

Nombre: Ing. Marcy Correa

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

INFORMES SEMANALES PRESENTADOS Y APROBADOS DEL PROYECTO

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

ADMON

Bogotá D.C, 22 de agosto de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-089-22

Señores:
Ingeniera
Karol Yulieth Javela
Supervisora
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio
Calle 26 # 13-19 Piso 20
Bogotá. Colombia

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: REMISIÓN INFORMES SEMANALES 15.

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales remitimos informe semanal 15 correspondiente al periodo del 01 de agosto del 2022 al 07 de agosto del 2022, para fines pertinentes.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 22/08/2022
HORA: 9:10:22 a. m.
20224300311632

FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA
Anexo: 75 folios
Proyectó: Jineth Marcela Gordillo – Residente Admón.
Reviso: Ing. Marcy Correa – Directora de Interventoría

INFORME SEMANAL 15

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 15	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 015

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **1/08/2022** al **7/08/2022** Fecha **7/08/2022**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO PROYECTO	
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** BOLÍVAR **MUNICIPIO** CÓRDOBA
GERENCIA A CARGO	ENTERRITORIO
SUPERVISOR	KAROL YULIETH JAVELA PEREZ
ESTADO DEL PROYECTO	EN EJECUCIÓN ACTIVIDAD 1, 2 Y 3

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2220576
Contratista	CONSORCIO CONSTRUREDES
Valor inicial	$ 1.771.707.945,99
Valor actual	$ 1.771.707.945,99
Variación del valor	$ -
Fecha de Inicio	26/04/2022
Plazo inicial (Días)	150 Días
Plazo actual (Días)	150 Días — 5 MESES - 150 DÍAS
Variación en plazo	Días
Fecha Contractual de terminación	26/09/2022
Tiempo Transcurrido (días)	103 — 68,67%
Días remanentes del Contrato	50,00 — 33,33%
Acumulado a última acta pagada	
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ 429.432.131,57

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.	2220587
Interventor	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS.
Valor inicial	$ 202.479.313,00
Valor actual	$ 202.479.313,00
Variación del valor	$ -
Fecha de Inicio	26/04/2022
Plazo inicial	150 Días
Plazo actual	150 Días — 5 MESES - 150 DÍAS
Variación en plazo	Días
Fecha Contractual de terminación	26/09/2022
Ejecución del Contrato	103 — 68,67%
Días remanentes del Contrato	50,00 — 33,33%
Acumulado a última acta pagada	$ 32.396.690,09
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ 32.396.690,09

3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 1.771.707.945,99

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 625.511.364,50	35,31%	$ 465.955.429,45	26,30%	-$ 159.555.935,05	-9,01%
Durante el Periodo	$ 127.355.175,68	7,19%	$ 95.813.355,01	5,41%	-$ 31.541.820,67	-1,78%
Acumulado a la Fecha	**$ 752.866.540,18**	**42,49%**	**$ 561.768.784,46**	**31,71%**	**-$ 191.097.755,72**	**-10,79%**


Semáforo


Desviación en días: 16 Días


Observaciones al desempeño del proyecto

De acuerdo a la reprogramación de obra el programado nos indica un 42,49% frente a un ejecutado del 31,71% indicándonos un atraso de 10,79%
De acuerdo a la reprogramación de obra se debería tener un total de 217 diagnósticos aprobados a la fecha, durante la semana del presente informe se aprobaron 10 diagnósticos, completando 170 avalados, lo cual nos indica un atraso de 47 diagnósticos.
En cuanto a la actividad 3 el contratista de acuerdo a la reprogramación de obra debería tener 81 viviendas terminadas al 100%, sin embargo, a la fecha se han intervenido 85 viviendas, de las cuales se han ejecutado 60 terminadas y se adelantan labores constructivas en 25 más, el contratista cuenta con 14 frentes de trabajo.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

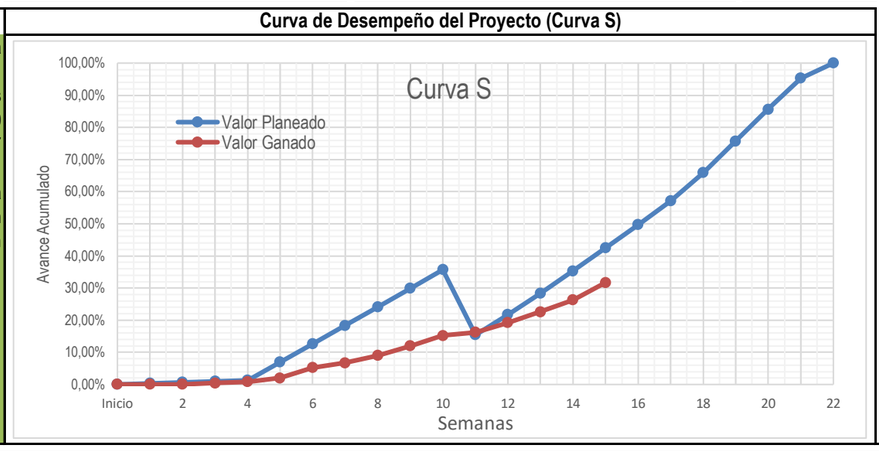

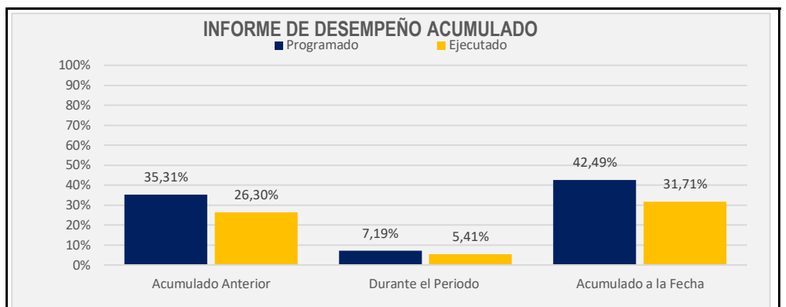

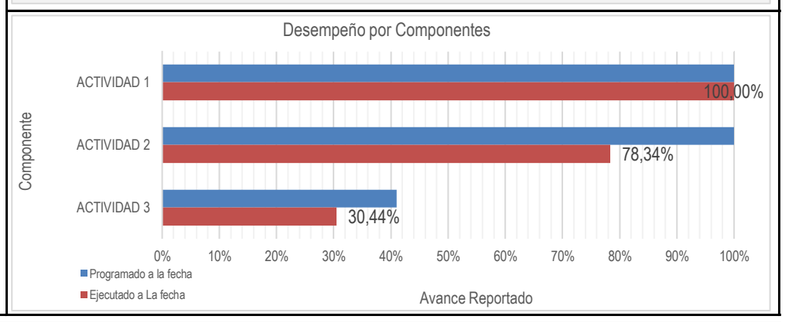


CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

A la fecha del presente informe no se han presntado cambios en la LINEA BASE.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	35,31%	26,30%	-9,01%	
Durante el Periodo	7,19%	5,41%	-1,78%	
Acumulado a la Fecha	**42,49%**	**31,71%**	**-10,79%**	

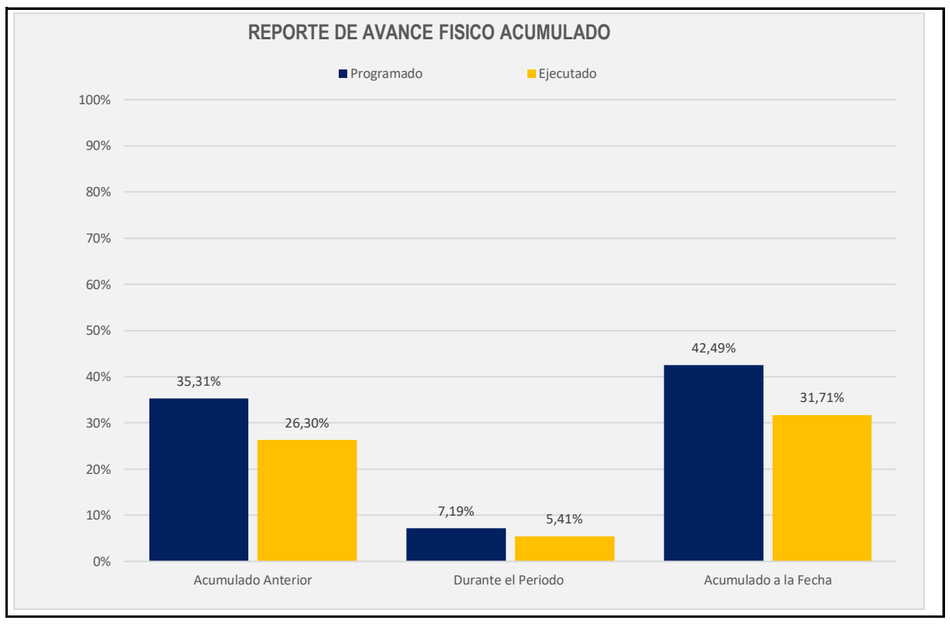


AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 1.771.707.945,99	$ 1.771.707.945,99	$ -	$ 345.450.914,11		$ 345.450.914,11

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
		0,00%			0,00%		









AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
$ 202.479.313,00	$ 202.479.313,00	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
2	$ 32.396.690,09	16,00%	2	$ 32.396.690,09	16,00%	$ 16.198.345,04	$ 16.198.346,04







INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 015

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **1/08/2022** al **7/08/2022** Fecha **7/08/2022**

OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDAD No. 1
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: Actividad No. 1, la aprobación de la actividad N° 1 se hizo comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-037-22 del 3 de junio de 2022. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
ACTIVIDAD No. 2
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 78,34%
Comentario: La Actividad No. 2, De acuerdo a la reprogramación de obra este ítems debería estas con la totalidad de los diagnósticos terminados, durante la semana del presente informe se hicieron 10 aprobaciones de diagnósticos, completando 170, lo cual nos indica un atraso del 21,66% según la reprogramación de obra, equivalentes a 47 diagnósticos pendientes, el contratista debe incrementar los esfuerzos y alcanzar las metas trazadas en la reprogramación de obra, que a la fecha de corte del presente informe debería ser de 217 viviendas aprobadas.
ACTIVIDAD No. 3
PROGRAMADO 41,01% vs 30,44% EJECUTADO
Comentario: La Actividad No. 3 nos indica un atraso de 10,57%, de acuerdo a la reprogramación de obra debería tener 81 viviendas terminadas, sin embargo, ha intervenido 85 viviendas de las cuales solo 60 están terminadas y se adelantan trabajos constructivos en otras 25 más, el contratista cuenta con 14 cuadrillas de trabajo.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

En el ítem ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10. El contratista subsanó los diseños de las casetas y el diseño de la estructura para el tanque elevado, también realizó entrega del informe técnico especialista estructural el cual fue aprobado por la interventoría con lo cual esta actividad queda en un 100% de su ejecución. Sin embargo, el Contratista posteriormente solicitó un cambio de especificaciones en algunos ítems, uno de ellos el ladrillo de arcilla por bloque de Concreto, razón por la cual se hace necesario ajustar el diseño estructural con dicho cambio. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
El ítem ACTIVIDAD 2: DIAGNOSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. Esta actividad avanza con el diligenciamiento de los diagnósticos de los cuales ya se sometieron a comité de aprobación 170 diagnósticos, los cuales fueron avalados por la interventoría, la próxima semana el contratista debe presentar la totalidad de los diagnósticos pendientes para completar la meta de los 217, ya que conforme a la reprogramación la etapa de diagnósticos finalizaba en la semana 14.
En el ítem ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS. ACTA DE ENTREGA Y RECIBOS DE LAS OBRAS
A la fecha y de acuerdo la reprogramación de obra el contratista debería tener 81 viviendas terminadas, sin embargo, se han intervenido 85 viviendas, de las cuales solo 60 están terminadas indicándonos un atraso de 21, estás intervenciones avanzan en su proceso constructivo. A esto se suma que para la siguiente semana se debería tener terminadas 97 viviendas, es decir, el contratista debe redoblar esfuerzos e incrementar frentes de trabajo para reducir el atraso, tal como se solicitó en el pasado comité de seguimiento.
En las casetas tipo 3 y otras intervenciones se ha avanzado en actividades como: cimentación, mampostería, fundición de columnas y columnetas, pañetes, instalación de tubería hidrosanitaria, instalación de aparatos sanitarios, instalación de tejas para cubierta, instalación de puertas metálicas, instalación de tanque elevado de 500 Lts, de igual forma se adelantan labores en intervenciones correspondientes a adecuaciones, construcción de estructura para el tanque elevado, cambio de pañete, instalación de enchape de pared y pisos y cambio de equipos sanitarios, para estas actividades el contratista cuenta con 14 frentes de trabajo


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Para la próxima semana correspondiente al periodo del 08 al 14 de agosto 2022 y de acuerdo la reprogramación de obra la actividad 2, que corresponde al ítem de diagnósticos se tiene programado que el contratista presente 47 diagnósticos más, para completar 217 diagnósticos, esta actividad debió estar al 100% a corte del 31 de julio 2022.
El contratista en la actividad 3 debe continuar con la ejecución de obra completando la intervención de 97 viviendas 100% de acuerdo a la reprogramación de obra.

6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTIÓN SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0

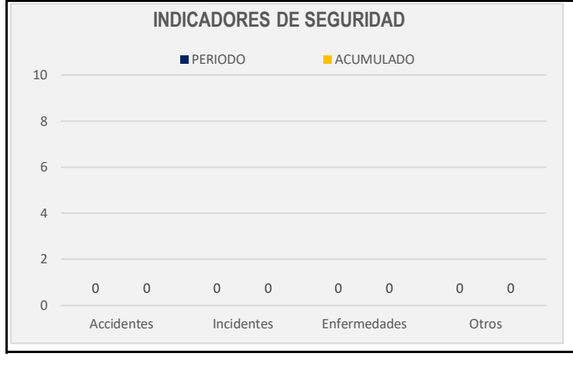

Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	20	0	20	74,1%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	7	0	7	25,9%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál?	0	0	0	0,0%
	Total	**27**	**0**	**27**	**100,00%**



OBSERVACIONES

En el presente periodo NO se presentaron lluvias, predomino el tiempo seco.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 015

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **1/08/2022** al **7/08/2022** Fecha **7/08/2022**

GESTIÓN SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
	3/08/2022	CASA DE LA CULTURA	7	1. La profesional social de la E.S.E Municipal se encargará del abordaje del subtema: higiene al interior de la vivienda. 2. La Secretaria de Salud junto al técnico de Saneamiento Básico e Higiene de la E.S.E Municipal se encargarán del abordaje de los subtemas: manejo adecuado de residuos sólidos y manejo adecuado de aguas residuales. 3. El Gerente General de la entidad prestadora de los servicios de Acueducto y Alcantarillado se encargará del abordaje del subtema: almacenamiento manipulación y uso adecuado del agua potable. Además, abordará los conceptos de cultura de pago tarifa y consumo. 4. Por su parte, el contratista de obra e interventoría se encargarán del abordaje de diferentes temáticas como: almacenamiento manipulación y uso adecuado del agua potable, mantenimiento básico de los equipos hidrosanitarios, manejo adecuado de los equipos de agua, recomendaciones para el cuidado de los equipos de agua y consejos para el buen uso de la del alcantarillado sanitario.	CONTRATISTA	3/08/2022

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
INCLUSION 107	Edith Marina Rivera Escobar	1/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 108	Ormedo De Jesus Medina	2/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 109	Eleida Del Socorro Casseres Alvarez	3/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 110	Erica Porto Cardona	4/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 111	Georgina Cantillo De Valeth	4/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 112	Wilman Valeth Cantillo	4/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 113	Orlando Escobar Henao	4/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 114	Maria Del Carmen Guerra Gomez	4/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 115	Linda Leonor Manjarrez Atencio	4/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA

7. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA









CASETA TIPO 3, SE APRECIA AVANCE EN EL PAÑETE DE MAMPOSTERIA, FUNDICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS.










ADECUACIONES DE UNIDADES SANITARIAS, SE APRECIA INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, LAVAPLATOS Y LAVADEROS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 015

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **1/08/2022** al **7/08/2022** Fecha **7/08/2022**



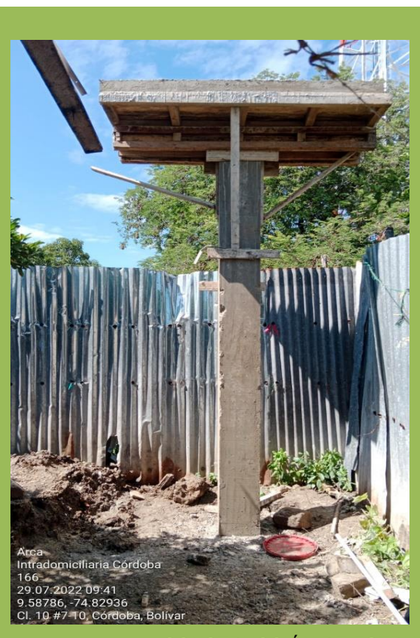





CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO-

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-045-22 mediante el cual se solicitó presentar los resultados correspondientes a las muestras de concretos tomadas en el periodo de los meses de junio y julio a los elementos estructurales de las intervenciones como lo son las vigas de cimentación, columnas y placas para tanques elevados.
La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-046-22 con el asunto SOLICITUD TOMAR ACCIONES FRENTE AL ATRASO DE OBRA, mediante el cual se solicitó reporte de la evaluación que realizó el día jueves 28 de Julio 2022 luego del recorrido de obra, en atención a la solicitud realizada en el comité de obra No. 12, con el fin de conocer las acciones a tomar para mitigar el atraso de frente a la reprogramación de obra.
A la fecha nos refleja el PROGRAMADO en un 42,49% vs un ejecutado del 31,71% indicándonos un atraso del 10,79%
Cabe mencionar que para el corte del 07 de agosto se debe tener un total de 81 intervenciones al 100%.
Por lo tanto, se requiere al contratista agilizar el proceso constructivo e incrementar el número de cuadrillas para mitigar el atraso presentado y alcanzar las metas propuestas de acuerdo a la reprogramación.
La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-047-22 con el asunto RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_074 mediante el cual realizamos entrega de aval para 10 diagnósticos presentados en comité de aprobación No. 013 los cuales se relacionan con los siguientes códigos: B-C-SM-MZ55-VE-048, B-C-SM-MZ66-VE-065, B-C-SM-MZ75-VE-070, B-C-SM-MZ76-VE-075, B-C-SM-MZ68-VE-077, B-C-SM-MZ47-VE-105, B-C-SM-MZ31-VE-141, B-C-SM-MZ33-VE-193, B-C-SM-MZ31-VE-199 y B-C-SM-MZ31-VE-201.
La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-048-22 mediante al cual se solicita a la empresa Coosepcor Ltda. Respuesta a los oficios emitidos por la interventoría TEC-023-22, TEC-034-22 y TEC-041-22 mediante los cuales se solicitó que se indicara por parte de ustedes si las viviendas relacionadas en los anexos cuentan con la disponibilidad de red de acueducto y red de alcantarillado y para las intervenciones que necesiten conexión de instalación domiciliaria otorgar el permiso o autorización para el procedimiento de conexión a la red principal teniendo en cuenta los acuerdos con respecto a la demolición del pavimento y reparación del mismo.

Marcy A. Correa C		Karol Javela	
Firma		**Firma**	
Nombre	Marcy Correa castaño	Nombre	Karol Yulieth Javela Pérez
	Directora de la interventoría	Supervisor	Supervisor ENTerritorio

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría

Enviar Informe para validación

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

			No. De solicitudes	DIRIGIDO A		ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA		FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-013	2-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	**11**	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	2-jun-22	SI	SI	13-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-019	9-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	22	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	9-jun-22	SI	SI	14-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-026	16-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	18	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	14-jun-22	SI	SI	11-jul-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-032	28-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	13	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	28-jun-22	SI	SI	11-jul-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-039	8-jul-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	29	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	8-jul-22	SI	SI	13-jul-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-043	26-jul-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	10	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	26-jul-22	NO	NO	

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

[illegible]		ASUNTO	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA	FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-025	15-jun-22	SOLICITUD ESPECIFICACIÓN TECNICA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	15-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

		UNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA	FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-021	13-jun-22	SOLICITUD RESPUESTA AL CONCEPTO EMITIDO POR COOSEPCOR MEDIANTE ACTA DE REUNION DE OBRA	1	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	13-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta
ARCA-INT/FDA276-TEC-029	21-jun-22	OBRA REQUERIA EN LA VIA PUBLICA PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE LAS VIVIENDAS 001, 085, 088, 163	4	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	21-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

			No. De solicitudes	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA	FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-015	2-jun-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	24	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	2-jun-22	SI	3-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-023	15-jun-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	27	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	15-jun-22	**NO**	
ARCA-INT/FDA276-TEC-034	2-jul-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	29	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	2-jul-22	**NO**	
ARCA-INT/FDA276-TEC-041	13-jul-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	47	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	13-jul-22	**NO**	
ARCA-INT/FDA276-TEC-048	5-ago-22	SOLICITUD RESPUESTA A OFICIOS TEC-023-22, TEC-034-22 y TEC-041-22 DE DISPONIBILIDAD DE REDES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	N/A	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	5-ago-22	NO	

INFORME PCI

Fecha de Corte	7/08/2022	PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS																										
Priorización		MATRIZ BASE						INCLUSIONES												TOTALES								
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No.2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Solicitudes de Inclusion	Atendida de la ESP	Atendida por la Alcaldia	Pendientes por atender ESP	Pendientes por atender Alcaldia	Respuesta positiva	Respuesta negativa	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Visitadas	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Recibidas a satisfaccion	Viviendas En ejecución.	Viviendas Programadas actividad No.3
Cordoba Bolivar	San Martin	217	0	206	10	170	1	114	93	93	21	50	64	0	0	0	0	0	217	206	10	170	1	85	60	0	25	0
	TOTAL	**217**	**0**	**206**	**10**	**170**	**1**	**114**	**93**	**93**	**21**	**50**	**64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**217**	**206**	**10**	**170**	**1**	**85**	**60**	**0**	**25**	**0**

INFORME ESTADO DE COVID-19

	INFORME ESTADO DE COVID - 19	CÓDIGO:	F-GG-10
enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/08/2022 Y EL 7/08/2022 PLAZO: 5 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES — CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. — CONTRATO No. 2220587

PERSONAL DEL CONTRATISTA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	OBSERVACIONES
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
DUARTE PINEDO - DIRECTOR DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD BLANCO - RESIDENTE DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RAFAEL CASTILLO - RESIDENTE SST	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
NORELIS ANAYA - TRABAJADORA SOCIAL	**ASTRAZENIKA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
OSWALDO GARZÓN - PROFESIONAL DIAGNOSTICO	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
SINDY ESCOBAR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**SINOVAC**		F	NO	NO	NO	SI	SI	

PERSONAL INTERVENTORIA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	**OBSERVACIONES**
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
MARCY CORREA - DIRECTOR INTERVENTORIA	**PFIZER**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD ARIETA - RESIDENTE INTERVENTORIA	**PFIZER**	**MODERNA**	M	NO	NO	NO	SI	SI	
DIAMYS SANCHEZ PORTILLO - INSPECTORA DE INTERVENTORIA	**PFIZER**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
FERNANDA GRIJALBA - PROFESIONAL SOCIAL	**MODERNA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
YIRA LEMUS - PROFESIONAL HSEQ	**AZTRAZENECA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
LEYDIS HERRERA - AUXILIAR SOCIAL	**JONSSON**	**JONSSON**	F	NO	NO	NO	SI	SI	

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Firma: Marcy A. Correa C

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

REPORTE Y EJECUCIÒN DE VIVIENDAS SEMANALES

Ejecución de Actividad en Viviendas al Programa Conexiones Intradomiciliarias con corte a 07/08/2022

BARRIO	ACTA	No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización	Número de días Máximo permitido según tipo de intervención	Número de Dias de la Intervencion por parte del Contratista	Dias de cumplimiento o incumplimiento según tipo de intervención (-) atraso y (+) avance	¿SE ENCUENTRA RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR INTERVENTORÍA?	
															SI (X)	NO (X)
SM	1	1	B-C-SM-MZ29-VE-001		Adecuacion	$7.967.801,13	$0,00			0/01/1900	5/01/1900	0	5	-5		x
SM	1	2	B-C-SM-MZ32-VE-002	100%	Caseta T3	$8.126.190,79	$8.126.190,79	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	8	16	-8		x
SM	1	3	B-C-SM-MZ32-VE-003	100%	Caseta T3	$7.914.431,13	$7.914.431,13	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	20/06/2022	8	16	-8		x
SM	1	4	B-C-SM-MZ18-VE-004	100%	Adecuacion	$7.636.382,30	$7.636.382,30	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	5	B-C-SM-MZ22-VE-005	100%	Adecuacion	$7.148.052,07	$7.148.052,07	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	12/06/2022	5	8	-3		x
SM	1	6	B-C-SM-MZ34-VE-006	100%	Adecuacion	$7.826.891,21	$7.826.891,21	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	7	B-C-SM-MZ22-VE-007	100%	Adecuacion	$7.415.092,49	$7.415.092,49	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	14/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	8	B-C-SM-MZ22-VE-009	100%	Caseta T3	$7.908.010,60	$7.908.010,60	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	16/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	9	B-C-SM-MZ21-VE-010	100%	Caseta T3	$8.928.931,81	$8.928.931,81	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	10	B-C-SM-MZ22-VE-011	100%	Adecuacion	$8.088.174,13	$8.088.174,13	8/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	21/06/2022	5	13	-8		x
SM	1	11	B-C-SM-MZ34-VE-012	100%	Caseta T3	$9.305.276,37	$9.305.276,37	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	12	B-C-SM-MZ21-VE-013	100%	Adecuacion	$5.457.782,54	$5.457.782,54	2/06/2022	TERMINADA	7/06/2022	11/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	13	B-C-SM-MZ21-VE-014	100%	Caseta T3	$8.614.149,98	$8.614.149,98	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	18/06/2022	8	14	-6		x
SM	1	14	B-C-SM-MZ21-VE-015	100%	Caseta T3	$8.265.079,43	$8.265.079,43	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	15	B-C-SM-MZ21-VE-016	100%	Caseta T3	$9.299.320,83	$9.299.320,83	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	8	14	-6		x
SM	1	16	B-C-SM-MZ38-VE-017	100%	Caseta T3	$8.532.396,85	$8.532.396,85	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		x
SM	2	17	B-C-SM-MZ24-VE-018	100%	Caseta T3	$8.502.042,22	$8.502.042,22	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	18	B-C-SM-MZ24-VE-019	100%	Adecuacion	$6.921.383,30	$6.921.383,30	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	19	B-C-SM-MZ24-VE-020	100%	Adecuacion	$4.593.449,33	$4.593.449,33	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	5	13	-8		x
SM	2	20	B-C-SM-MZ85-VE-021	100%	Caseta T3	$8.614.688,02	$8.614.688,02	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	22/06/2022	8	17	-9		x
SM	2	21	B-C-SM-MZ85-VE-022	100%	Caseta T3	$8.896.124,14	$8.896.124,14	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	22	B-C-SM-MZ85-VE-023	100%	Adecuacion	$8.133.478,61	$8.133.478,61	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	23	B-C-SM-MZ29-VE-024	100%	Adecuacion	$7.072.986,22	$7.072.986,22	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	2	24	B-C-SM-MZ31-VE-025	100%	Caseta T3	$8.637.204,11	$8.637.204,11	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	25	B-C-SM-MZ31-VE-026	100%	Adecuacion	$5.113.367,92	$5.113.367,92	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	19/06/2022	5	14	-9		x
SM	1	26	B-C-SM-MZ31-VE-027	100%	Adecuacion	$4.365.339,96	$4.365.339,96	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	14/06/2022	5	9	-4		x
SM	2	27	B-C-SM-MZ31-VE-028	100%	Adecuacion	$7.668.943,15	$7.668.943,15	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	13/06/2022	5	8	-3		x
SM	2	28	B-C-SM-MZ31-VE-029	100%	Caseta T3	$8.468.136,75	$8.468.136,75	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	29	B-C-SM-MZ31-VE-030	100%	Adecuacion	$4.637.820,16	$4.637.820,16	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	30	B-C-SM-MZ31-VE-031	100%	Caseta T2	$8.119.008,44	$8.119.008,44	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	31	B-C-SM-MZ56-VE-038	100%	Adecuacion	$8.227.630,94	$8.227.630,94	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	32	B-C-SM-MZ56-VE-039	100%	Adecuacion	$1.443.687,77	$1.443.687,77	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	33	B-C-SM-MZ46-VE-040	100%	Adecuacion	$6.628.376,66	$6.628.376,66	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	34	B-C-SM-MZ45-VE-041	100%	Adecuacion	$4.845.221,48	$4.845.221,48	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	35	B-C-SM-MZ21-VE-042	100%	Adecuacion	$4.634.812,47	$4.634.812,47	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	36	B-C-SM-MZ31-VE-043	100%	Caseta T3	$6.939.713,07	$6.939.713,07	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x

SM	3	37	B-C-SM-MZ145-VE-044	100%	Caseta T3	$7.980.826,25	$7.980.826,25	9/06/2022	**TERMINADA**	**17/06/2022**	23/06/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	3	38	B-C-SM-MZ55-VE-046	100%	Caseta T3	$7.344.533,10	$7.344.533,10	9/06/2022	**TERMINADA**	**17/06/2022**	23/06/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	3	39	B-C-SM-MZ55-VE-047	100%	Caseta T2	$7.890.285,26	$7.890.285,26	9/06/2022	**TERMINADA**	**17/06/2022**	23/06/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	3	40	B-C-SM-MZ145-VE-053	100%	Caseta T3	$8.262.443,76	$8.262.443,76	9/06/2022	**TERMINADA**	**17/06/2022**	23/06/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	3	41	B-C-SM-MZ91-VE-054	100%	Caseta T2	$8.230.167,20	$8.230.167,20	9/06/2022	**TERMINADA**	**17/06/2022**	23/06/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	3	42	B-C-SM-MZ56-VE-055	100%	Adecuacion	$3.160.157,78	$3.160.157,78	14/06/2022	**TERMINADA**	**19/06/2022**	25/06/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	6	43	B-C-SM-MZ55-VE-056	100%	Adecuacion	$8.215.661,11	$8.215.661,11	14/06/2022	**TERMINADA**	**19/06/2022**	25/06/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	4	44	B-C-SM-M55-VE-061	100%	Adecuacion	$7.040.722,29	$7.040.722,29	14/06/2022	**TERMINADA**	**19/06/2022**	25/06/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	4	45	B-C-SM-MZ56-VE-062	100%	Caseta T2	$8.362.124,52	$8.362.124,52	14/06/2022	**TERMINADA**	**22/06/2022**	28/06/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	4	46	B-C-SM-MZ66-VE-067	100%	Caseta T3	$7.306.146,52	$7.306.146,52	14/06/2022	**TERMINADA**	**22/06/2022**	28/06/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	4	47	B-C-SM-MZ66-VE-068	100%	Caseta T3	$7.971.707,31	$7.971.707,31	14/06/2022	**TERMINADA**	**22/06/2022**	28/06/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	4	48	B-C-SM-MZ75-VE-071	100%	Adecuacion	$7.170.024,86	$7.170.024,86	14/06/2022	**TERMINADA**	**19/06/2022**	25/06/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	4	49	B-C-SM-MZ75-VE-072	100%	Caseta T3	$8.040.278,46	$8.040.278,46	14/06/2022	**TERMINADA**	**22/06/2022**	28/06/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	4	50	B-C-SM-MZ75-VE-073	100%	Caseta T3	$8.332.036,11	$8.332.036,11	14/06/2022	**TERMINADA**	**22/06/2022**	28/06/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	5	51	B-C-SM-MZ75-VE-074	100%	Caseta T3	$7.656.034,05	$7.656.034,05	21/06/2022	**TERMINADA**	**29/06/2022**	5/07/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	4	52	B-C-SM-MZ89-VE-084	100%	Caseta T3	$8.247.304,21	$8.247.304,21	21/06/2022	**TERMINADA**	**29/06/2022**	5/07/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	5	53	B-C-SM-MZ69-VE-087	100%	Adecuacion	$7.074.492,71	$7.074.492,71	21/06/2022	**TERMINADA**	**26/06/2022**	2/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	54	B-C-SM-MZ69-VE-O88	85%	Adecuacion	$7.465.862,82	$6.345.983,40	21/06/2022	**EN EJECUCION**	**26/06/2022**	2/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	6	55	B-C-SM-MZ77-VE-O94	100%	Adecuacion	$3.585.305,08	$3.585.305,08	21/06/2022	**TERMINADA**	**26/06/2022**	2/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	10	56	B-C-SM-MZ68-VE-097	75%	Caseta T3	$8.172.428,90	$6.129.321,68	21/06/2022	**EN EJECUCION**	**29/06/2022**	5/07/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	57	B-C-SM-MZ59-VE-099	100%	Adecuacion	$6.098.594,42	$6.098.594,42	21/06/2022	**TERMINADA**	**26/06/2022**	2/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	58	B-C-SM-MZ84-VE-166	100%	Adecuacion	$6.744.749,39	$6.744.749,39	22/06/2022	**TERMINADA**	**27/06/2022**	3/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	10	59	B-C-SM-MZ84-VE-175	100%	Adecuacion	$6.901.938,50	$6.901.938,50	23/06/2022	**TERMINADA**	**28/06/2022**	4/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	8	60	B-C-SM-MZ55-VE-060	65%	Caseta T4	$9.444.985,92	$6.139.240,85	24/06/2022	**EN EJECUCION**	**2/07/2022**	8/07/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	4	61	B-C-SM-MZ66-VE-069	100%	Adecuacion	$6.509.744,54	$6.509.744,54	25/06/2022	**TERMINADA**	**30/06/2022**	6/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	3	62	B-C-SM-MZ30-VE-032	100%	Adecuacion	$7.557.018,99	$7.557.018,99	26/06/2022	**TERMINADA**	**1/07/2022**	7/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	3	63	B-C-SM-MZ44-VE-034	100%	Adecuacion	$5.519.347,12	$5.519.347,12	27/06/2022	**TERMINADA**	**2/07/2022**	8/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	3	64	B-C-SM-MZ44-VE-035	45%	Adecuacion	$8.137.626,09	$3.661.931,74	28/06/2022	**EN EJECUCION**	**3/07/2022**	9/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	6	65	B-C-SM-MZ69-VE-085	45%	Adecuacion	$6.566.494,56	$2.954.922,55	29/06/2022	**EN EJECUCION**	**4/07/2022**	10/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	6	66	B-C-SM-MZ58-VE-100	70%	Caseta T2	$7.970.674,94	$5.579.472,46	30/07/2022	**EN EJECUCION**	**7/08/2022**	13/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	67	B-C-SM-MZ47-VE-104	90%	Adecuacion	$8.247.586,36	$7.422.827,72	30/07/2022	**EN EJECUCION**	**4/08/2022**	10/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	10	68	B-C-SM-MZ58-VE-107	80%	Adecuacion	$7.990.185,62	$6.392.148,50	30/07/2022	**EN EJECUCION**	**4/08/2022**	10/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	7	69	B-C-SM-MZ58-VE-110	45%	Adecuacion	$6.954.066,54	$3.129.329,94	30/07/2022	**EN EJECUCION**	**4/08/2022**	10/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	7	70	B-C-SM-MZ47-VE-111	45%	Caseta t3	$8.318.089,49	$3.743.140,27	3/08/2022	**EN EJECUCION**	**11/08/2022**	17/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	71	B-C-SM-MZ47-VE-112	45%	Adecuacion	$6.827.279,63	$3.072.275,83	3/08/2022	**EN EJECUCION**	**8/08/2022**	14/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	8	72	B-C-SM-MZ47-VE-113	45%	Adecuacion	$5.043.864,80	$2.269.739,16	3/08/2022	**EN EJECUCION**	**8/08/2022**	14/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	7	73	B-C-SM-MZ47-VE-114	45%	Caseta t3	$7.850.343,91	$3.532.654,76	3/08/2022	**EN EJECUCION**	**11/08/2022**	17/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	8	74	B-C-SM-MZ47-VE-115	45%	Caseta t3	$8.322.147,74	$3.744.966,48	3/08/2022	**EN EJECUCION**	**11/08/2022**	17/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	11	75	B-C-SM-MZ21-VE-118	45%	Caseta t3	$8.148.709,57	$3.666.919,31	3/08/2022	**EN EJECUCION**	**11/08/2022**	17/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	9	76	B-C-SM-MZ30-VE-121	45%	Caseta t3	$7.765.616,43	$3.494.527,39	3/08/2022	**EN EJECUCION**	**11/08/2022**	17/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	77	B-C-SM-MZ59-VE-102	60%	Caseta T2	$8.805.748,18	$5.283.448,91	3/08/2022	**EN EJECUCION**	**11/08/2022**	17/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**

SM	6	78	B-C-SM-MZ58-VE-101	100%	Adecuacion	$5.300.910,78	$5.300.910,78	3/08/2022	**TERMINADA**	**8/08/2022**	14/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	8	79	B-C-SM-MZ30-VE-122	45%	Caseta t3	$8.106.560,85	$3.647.952,38	5/08/2022	**EN EJECUCION**	**13/08/2022**	19/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	80	B-C-SM-MZ30-VE-124	45%	Caseta t3	$7.850.343,91	$3.532.654,76	5/08/2022	**EN EJECUCION**	**13/08/2022**	19/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	9	81	B-C-SM-MZ87-VE-125	45%	Caseta t3	$8.100.577,85	$3.645.260,03	5/08/2022	**EN EJECUCION**	**13/08/2022**	19/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	9	82	B-C-SM-MZ87-VE-126	25%	Caseta t3	$8.057.934,94	$2.014.483,74	6/08/2022	**EN EJECUCION**	**14/08/2022**	20/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	9	83	B-C-SM-MZ30-VE-127	25%	Caseta t3	$7.998.497,33	$1.999.624,33	6/08/2022	**EN EJECUCION**	**14/08/2022**	20/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	9	84	B-C-SM-MZ31-VE-142	25%	Adecuacion	$7.456.473,74	$1.864.118,44	6/08/2022	**EN EJECUCION**	**11/08/2022**	17/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	9	85	B-C-SM-MZ87-VE-128	20%	Adecuacion	$7.523.102,18	$1.504.620,44	6/08/2022	**EN EJECUCION**	**11/08/2022**	17/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	6	86	B-C-SM-MZ87-VE-129	20%	Caseta t3	$8.132.932,39	$1.626.586,48	6/08/2022	**EN EJECUCION**	**14/08/2022**	20/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM																

CUADRO DE PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PROGRAMAS Y EJECUTADAS

PROGRAMACIÓN

Fechas de Corte		Actividad 1		Actividad 2			Actividad 3			Actividad 4		Total	
		$	5.140.026,35	$		39.313.349,11	$		1.727.254.570,53	$	-	$	1.771.707.945,99
										$	-	$	-
		$	5.140.026,35	$		39.313.349,11	$		1.727.254.570,53	$	-	$	1.771.707.945,99
	Semana 0	0,00%	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		$ -	**0,00%**	**$ -**
1/05/2022	**Semana 1**	100,00%	$ 5.140.026,35	5,07%	11	$ 1.992.842,58	0,00%	0	$ -		$ -	**0,40%**	**$ 7.132.868,93**
8/05/2022	**Semana 2**	100,00%	$ 5.140.026,35	10,14%	22	$ 3.985.685,16	0,00%	0	$ -		$ -	**0,52%**	**$ 9.125.711,51**
15/05/2022	**Semana 3**	100,00%	$ 5.140.026,35	15,21%	33	$ 5.978.527,74	0,00%	0	$ -		$ -	**0,63%**	**$ 11.118.554,09**
22/05/2022	**Semana 4**	100,00%	$ 5.140.026,35	20,28%	44	$ 7.971.370,33	0,92%	2	$ 15.919.396,96		$ -	**1,64%**	**$ 29.030.793,64**
29/05/2022	**Semana 5**	100,00%	$ 5.140.026,35	25,35%	55	$ 9.964.212,91	1,84%	4	$ 31.838.793,93		$ -	**2,65%**	**$ 46.943.033,18**
5/06/2022	**Semana 6**	100,00%	$ 5.140.026,35	30,41%	66	$ 11.957.055,49	2,30%	5	$ 39.798.492,41		$ -	**3,21%**	**$ 56.895.574,25**
12/06/2022	**Semana 7**	100,00%	$ 5.140.026,35	35,48%	77	$ 13.949.898,07	2,76%	6	$ 47.758.190,89		$ -	**3,77%**	**$ 66.848.115,31**
19/06/2022	**Semana 8**	100,00%	$ 5.140.026,35	40,09%	87	$ 15.761.573,15	4,15%	9	$ 71.637.286,34		$ -	**5,22%**	**$ 92.538.885,83**
26/06/2022	**Semana 9**	100,00%	$ 5.140.026,35	44,70%	97	$ 17.573.248,22	5,07%	11	$ 87.556.683,30		$ -	**6,22%**	**$ 110.269.957,87**
3/07/2022	**Semana 10**	100,00%	$ 5.140.026,35	58,53%	127	$ 23.008.273,44	11,06%	24	$ 191.032.763,56		$ -	**12,37%**	**$ 219.181.063,35**
10/07/2022	**Semana 11**	100,00%	$ 5.140.026,35	72,35%	157	$ 28.443.298,66	17,05%	37	$ 294.508.843,82		$ -	**18,52%**	**$ 328.092.168,84**
17/07/2022	**Semana 12**	100,00%	$ 5.140.026,35	86,18%	187	$ 33.878.323,89	23,04%	50	$ 397.984.924,09		$ -	**24,67%**	**$ 437.003.274,32**
24/07/2022	**Semana 13**	100,00%	$ 5.140.026,35	92,00%	200	$ 36.168.281,18	27,65%	60	$ 477.581.908,90		$ -	**29,29%**	**$ 518.890.216,43**
31/07/2022	**Semana 14**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	**32,26%**	**70**	**$ 557.178.893,72**		$ -	**33,96%**	**$ 601.632.269,18**
7/08/2022	**Semana 15**	**100,00%**	**$ 5.140.026,35**	**100,00%**	**217**	**$ 39.313.349,11**	**37,33%**	**81**	**$ 644.735.577,02**		$ -	**38,90%**	**$ 689.188.952,48**
14/08/2022	**Semana 16**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	44,70%	97	$ 772.090.752,73		$ -	**46,09%**	**$ 816.544.128,19**
21/08/2022	**Semana 17**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	52,07%	113	$ 899.445.928,43		$ -	**53,28%**	**$ 943.899.303,89**
28/08/2022	**Semana 18**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	59,91%	130	$ 1.034.760.802,62		$ -	**60,91%**	**$ 1.079.214.178,08**
4/09/2022	**Semana 19**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	70,05%	152	$ 1.209.874.169,22		$ -	**70,80%**	**$ 1.254.327.544,68**
11/09/2022	**Semana 20**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	80,18%	174	$ 1.384.987.535,82		$ -	**80,68%**	**$ 1.429.440.911,28**
18/09/2022	**Semana 21**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	90,32%	196	$ 1.560.100.902,41		$ -	**90,57%**	**$ 1.604.554.277,87**
26/09/2022	**Semana 22**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	100,00%	217	$ 1.727.254.570,53		$ -	**100,00%**	**$ 1.771.707.945,99**

EJECUTADO													
Fechas de Corte		Actividad 1		Actividad 2			Actividad 3			Actividad 4		Total	
		$ 5.140.026,35		$ 39.313.349,11			$ 1.727.254.570,53			$ -		$ 1.771.707.945,99	
										$ -		$ -	
		$ 5.140.026,35		$ 39.313.349,11			$ 1.727.254.570,53			$ -		$ 1.771.707.945,99	
	Semana 0	0,00%	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		$ -	**0,00%**	**$ -**
1/05/2022	**Semana 1**	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,15%**	**$ 2.570.013,18**
8/05/2022	**Semana 2**	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,15%**	**$ 2.570.013,18**
15/05/2022	**Semana 3**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
22/05/2022	**Semana 4**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
29/05/2022	**Semana 5**	100,00%	$ 5.140.026,35	11,06%	24	$ 4.348.020,18	1,38%	3	$ 22.883.102,57		$ -	**1,83%**	**$ 32.371.149,10**
5/06/2022	**Semana 6**	100,00%	$ 5.140.026,35	13,82%	30	$ 5.435.025,22	2,76%	6	$ 45.766.205,14		$ -	**3,18%**	**$ 56.341.256,71**
12/06/2022	**Semana 7**	100,00%	$ 5.140.026,35	19,35%	42	$ 7.609.035,31	4,61%	10	$ 76.277.008,56		$ -	**5,02%**	**$ 89.026.070,22**
19/06/2022	**Semana 8**	100,00%	$ 5.140.026,35	23,50%	51	$ 9.239.542,88	6,45%	14	$ 106.787.811,98		$ -	**6,84%**	**$ 121.167.381,21**
26/06/2022	**Semana 9**	100,00%	$ 5.140.026,35	32,72%	71	$ 12.862.893,03	8,29%	18	$ 137.298.615,41		$ -	**8,77%**	**$ 155.301.534,78**
3/07/2022	**Semana 10**	100,00%	$ 5.140.026,35	43,32%	94	$ 17.029.745,70	10,14%	22	$ 167.809.418,83		$ -	**10,72%**	**$ 189.979.190,88**
10/07/2022	**Semana 11**	100,00%	$ 5.140.026,35	53,00%	115	$ 20.834.263,35	11,98%	26	$ 198.320.222,25		$ -	**12,66%**	**$ 224.294.511,96**
17/07/2022	**Semana 12**	100,00%	$ 5.140.026,35	64,98%	141	$ 25.544.618,55	13,82%	30	$ 228.831.025,68		$ -	**14,65%**	**$ 259.515.670,57**
24/07/2022	**Semana 13**	100,00%	$ 5.140.026,35	64,98%	141	$ 25.544.618,55	20,74%	45	$ 343.246.538,51		$ -	**21,11%**	**$ 373.931.183,41**
31/07/2022	**Semana 14**	**100,00%**	**$ 5.140.026,35**	73,73%	160	$ 28.986.801,19	22,12%	48	$ 366.129.641,08		$ -	**22,59%**	**$ 400.256.468,62**
7/08/2022	**Semana 15**	**100,00%**	**$ 5.140.026,35**	**78,34%**	**170**	**$ 30.798.476,26**	**27,65%**	**60**	**$ 457.662.051,35**		$ -	**27,86%**	**$ 493.600.553,96**
14/08/2022	**Semana 16**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
21/08/2022	**Semana 17**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
28/08/2022	**Semana 18**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
4/09/2022	**Semana 19**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
11/09/2022	**Semana 20**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
18/09/2022	**Semana 21**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ 1.727.254.570,53		$ -	**100,00%**	**$ 1.771.707.945,99**
26/09/2022	**Semana 22**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0					

PERSONAL DE OBRA

REPORTE DE PERSONAL DE MANO DE OBRA			
No. DE LA CUADRILLA	**No. DE MAETROS**	**No. DE AYUDANTES U OFICIALES**	**No. INTERVENCIONES A CARGO**
1	1	1	2
2	1	1	2
3	1	1	2
4	1	1	2
5	1	1	2
6	1	1	2
7	1	1	2
8	1	1	2
9	1	1	2
10	1	1	2
11	1	1	1
12	1	1	1
13	1	1	1
14	1	1	1
15	1	1	1
TOTAL	**15**	**15**	**25**

REPROGRAMACIÓN

REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

Id	Nombre de tarea	Unidad	Ca	Dura	Comienzo	Fin	Costo	% PROGRAMADO
1	**CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR**			**132 días**	**mar 26/04/22**	**lun 26/09/22**	**$ 1.771.707.945,99**	**47%**
2	**ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACION DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10.**			**14 días**	**mar 26/04/22**	**mié 11/05/22**	**$ 5.140.026,35**	**100%**
3	CHEQUEO Y VALIDACION DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE NSR-10.	GL	1	14 días	mar 26/04/22	mié 11/05/22	$ 5.140.026,35	100%
4	**ACTIVIDAD 2: DIAGNOSTICO, VALIDACION PRELIMINAR, CONCERTACION DE LA INTERVENCION Y PLANEACION DE LA INTERVENCION**			**83 días**	**mar 26/04/22**	**sáb 30/07/22**	**$ 39.313.349,11**	**100%**
5	DIAGNOSTICOS SEMANA 1	UND	1	7 día	mar 26/04/22	mar 3/05/22	$ 1.992.842,58	100%
6	DIAGNOSTICOS SEMANA 2	UND	1	7 día	mié 4/05/22	mié 11/05/22	$ 1.992.842,58	100%
7	DIAGNOSTICOS SEMANA 3	UND	1	7 día	jue 12/05/22	jue 19/05/22	$ 1.992.842,58	100%

21 23

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

Id	Nombre de tarea	Unidad	Ca	Dura	Comienzo	Fin	Costo	% PROGRAMADO
8	DIAGNOSTICOS SEMANA 4	UND	11	6 día	vie 20/05/22	jue 26/05/22	$ 1.992.842,58	100%
9	DIAGNOSTICOS SEMANA 5	UND	11	6 día	vie 27/05/22	jue 2/06/22	$ 1.992.842,58	100%
10	DIAGNOSTICOS SEMANA 6	UND	11	6 día	vie 3/06/22	jue 9/06/22	$ 1.992.842,58	100%
11	DIAGNOSTICOS SEMANA 7	UND	11	6 día	vie 10/06/22	jue 16/06/22	$ 1.992.842,58	100%
12	DIAGNOSTICOS SEMANA 8	UND	10	6 día	vie 17/06/22	jue 23/06/22	$ 1.811.675,08	100%
13	DIAGNOSTICOS SEMANA 9	UND	10	6 día	vie 24/06/22	jue 30/06/22	$ 1.811.675,08	100%
14	DIAGNOSTICOS SEMANA 10	UND	30	6 día	vie 1/07/22	jue 7/07/22	$ 5.435.025,22	100%
15	DIAGNOSTICOS SEMANA 11	UND	30	6 día	vie 8/07/22	jue 14/07/22	$ 5.435.025,22	100%
16	DIAGNOSTICOS SEMANA 12	UND	30	7 día	vie 15/07/22	vie 22/07/22	$ 5.435.025,22	100%
17	DIAGNOSTICOS SEMANA 13	UND	30	7 día	sáb 23/07/22	sáb 30/07/22	$ 5.435.025,23	100%
18	**ACTIVIDAD 3: EJECUCION DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS. ACTA DE ENTREGA Y RECIBOS DE LAS OBRAS**			**106 días**	**jue 26/05/22**	**lun 26/09/22**	**$ 1.727.254.570,53**	**41%**
19	**MES 1 (11 VIVIENDAS)**			**30 d**	**jue 26/05/22**	**mié 29/06/2**	**$ 87.556.683,28**	**100%**
20	INTERVENCION N°1	UND	1	6 día	jue 26/05/22	mié 1/06/22	$ 7.959.698,48	100%
21	INTERVENCION N°2	UND	1	6 día	jue 26/05/22	mié 1/06/22	$ 7.959.698,48	100%
22	INTERVENCION N°3	UND	1	6 día	jue 2/06/22	mié 8/06/22	$ 7.959.698,48	100%

21 23

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

Id	Nombre de tarea	Unidad	Ca	Dura	Comienzo	Fin	Costo	% PROGRAMADO
23	INTERVENCION N°4	UND	1	6 día	jue 2/06/22	mié 8/06/22	$ 7.959.698,48	100%
24	INTERVENCION N°5	UND	1	6 día	jue 9/06/22	mié 15/06/22	$ 7.959.698,48	100%
25	INTERVENCION N°6	UND	1	6 día	jue 9/06/22	mié 15/06/22	$ 7.959.698,48	100%
26	INTERVENCION N°7	UND	1	6 día	jue 16/06/22	mié 22/06/22	$ 7.959.698,48	100%
27	INTERVENCION N°8	UND	1	6 día	jue 16/06/22	mié 22/06/22	$ 7.959.698,48	100%
28	INTERVENCION N°9	UND	1	6 día	jue 16/06/22	mié 22/06/22	$ 7.959.698,48	100%
29	INTERVENCION N°10	UND	1	6 día	jue 23/06/22	mié 29/06/22	$ 7.959.698,48	100%
30	INTERVENCION N°11	UND	1	6 día	jue 23/06/22	mié 29/06/22	$ 7.959.698,48	100%
31	ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (1 - 1	UND	11	1 día	mié 29/06/22	mié 29/06/22	$ 0,00	100%
32	**MES 2 (54 VIVIENDAS)**			**24 d**	**jue 30/06/22**	**mié 27/07/22**	**$ 429.823.717,92**	**100%**
33	INTERVENCION N°12	UND	1	6 día	jue 30/06/22	mié 6/07/22	$ 7.959.698,48	100%
34	INTERVENCION N°13	UND	1	6 día	jue 30/06/22	mié 6/07/22	$ 7.959.698,48	100%
35	INTERVENCION N°14	UND	1	6 día	jue 30/06/22	mié 6/07/22	$ 7.959.698,48	100%
36	INTERVENCION N°15	UND	1	6 día	jue 30/06/22	mié 6/07/22	$ 7.959.698,48	100%
37	INTERVENCION N°16	UND	1	6 día	jue 30/06/22	mié 6/07/22	$ 7.959.698,48	100%
38	INTERVENCION N°17	UND	1	6 día	jue 30/06/22	mié 6/07/22	$ 7.959.698,48	100%

21 23

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

Id	Nombre de tarea	Unidad	Ca	Dura	Comienzo	Fin	Costo	% PROGRAMADO
39	INTERVENCION N°18	UND	1	6 día	jue 30/06/22	mié 6/07/22	$ 7.959.698,48	100%
40	INTERVENCION N°19	UND	1	6 día	jue 30/06/22	mié 6/07/22	$ 7.959.698,48	100%
41	INTERVENCION N°20	UND	1	6 día	jue 30/06/22	mié 6/07/22	$ 7.959.698,48	100%
42	INTERVENCION N°21	UND	1	6 día	jue 30/06/22	mié 6/07/22	$ 7.959.698,48	100%
43	INTERVENCION N°22	UND	1	6 día	jue 30/06/22	mié 6/07/22	$ 7.959.698,48	100%
44	INTERVENCION N°23	UND	1	6 día	jue 30/06/22	mié 6/07/22	$ 7.959.698,48	100%
45	INTERVENCION N°24	UND	1	6 día	jue 30/06/22	mié 6/07/22	$ 7.959.698,48	100%
46	ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (12 -	UND	13	1 día	mié 6/07/22	mié 6/07/22	$ 0,00	100%
47	INTERVENCION N°25	UND	1	6 día	jue 7/07/22	mié 13/07/22	$ 7.959.698,48	100%
48	INTERVENCION N°26	UND	1	6 día	jue 7/07/22	mié 13/07/22	$ 7.959.698,48	100%
49	INTERVENCION N°27	UND	1	6 día	jue 7/07/22	mié 13/07/22	$ 7.959.698,48	100%
50	INTERVENCION N°28	UND	1	6 día	jue 7/07/22	mié 13/07/22	$ 7.959.698,48	100%
51	INTERVENCION N°29	UND	1	6 día	jue 7/07/22	mié 13/07/22	$ 7.959.698,48	100%
52	INTERVENCION N°30	UND	1	6 día	jue 7/07/22	mié 13/07/22	$ 7.959.698,48	100%
53	INTERVENCION N°31	UND	1	6 día	jue 7/07/22	mié 13/07/22	$ 7.959.698,48	100%
54	INTERVENCION N°32	UND	1	6 día	jue 7/07/22	mié 13/07/22	$ 7.959.698,48	100%

21 23

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22



REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

Id	Nombre de tarea	Unidad	Ca	Dura	Comienzo	Fin	Costo	% PROGRAMADO
55	INTERVENCION N°33	UND	1	6 día	jue 7/07/22	mié 13/07/22	$ 7.959.698,48	100%
56	INTERVENCION N°34	UND	1	6 día	jue 7/07/22	mié 13/07/22	$ 7.959.698,48	100%
57	INTERVENCION N°35	UND	1	6 día	jue 7/07/22	mié 13/07/22	$ 7.959.698,48	100%
58	INTERVENCION N°36	UND	1	6 día	jue 7/07/22	mié 13/07/22	$ 7.959.698,48	100%
59	INTERVENCION N°37	UND	1	6 día	jue 7/07/22	mié 13/07/22	$ 7.959.698,48	100%
60	ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (25 -	UND	13	1 día	mié 13/07/22	mié 13/07/22	$ 0,00	100%
61	INTERVENCION N°38	UND	1	6 día	jue 14/07/22	mié 20/07/22	$ 7.959.698,48	100%
62	INTERVENCION N°39	UND	1	6 día	jue 14/07/22	mié 20/07/22	$ 7.959.698,48	100%
63	INTERVENCION N°40	UND	1	6 día	jue 14/07/22	mié 20/07/22	$ 7.959.698,48	100%
64	INTERVENCION N°41	UND	1	6 día	jue 14/07/22	mié 20/07/22	$ 7.959.698,48	100%
65	INTERVENCION N°42	UND	1	6 día	jue 14/07/22	mié 20/07/22	$ 7.959.698,48	100%
66	INTERVENCION N°43	UND	1	6 día	jue 14/07/22	mié 20/07/22	$ 7.959.698,48	100%
67	INTERVENCION N°44	UND	1	6 día	jue 14/07/22	mié 20/07/22	$ 7.959.698,48	100%
68	INTERVENCION N°45	UND	1	6 día	jue 14/07/22	mié 20/07/22	$ 7.959.698,48	100%
69	INTERVENCION N°46	UND	1	6 día	jue 14/07/22	mié 20/07/22	$ 7.959.698,48	100%
70	INTERVENCION N°47	UND	1	6 día	jue 14/07/22	mié 20/07/22	$ 7.959.698,48	100%

21 23

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

Id	Nombre de tarea	Unidad	Ca	Dura	Comienzo	Fin	Costo	% PROGRAMADO
71	INTERVENCION N°48	UND	1	6 día	jue 14/07/22	mié 20/07/22	$ 7.959.698,48	100%
72	INTERVENCION N°49	UND	1	6 día	jue 14/07/22	mié 20/07/22	$ 7.959.698,48	100%
73	INTERVENCION N°50	UND	1	6 día	jue 14/07/22	mié 20/07/22	$ 7.959.698,48	100%
74	INTERVENCION N°51	UND	1	6 día	jue 14/07/22	mié 20/07/22	$ 7.959.698,48	100%
75	ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (38 -	UND	14	1 día	mié 20/07/22	mié 20/07/22	$ 0,00	100%
76	INTERVENCION N°52	UND	1	6 día	jue 21/07/22	mié 27/07/22	$ 7.959.698,48	100%
77	INTERVENCION N°53	UND	1	6 día	jue 21/07/22	mié 27/07/22	$ 7.959.698,48	100%
78	INTERVENCION N°54	UND	1	6 día	jue 21/07/22	mié 27/07/22	$ 7.959.698,48	100%
79	INTERVENCION N°55	UND	1	6 día	jue 21/07/22	mié 27/07/22	$ 7.959.698,48	100%
80	INTERVENCION N°56	UND	1	6 día	jue 21/07/22	mié 27/07/22	$ 7.959.698,48	100%
81	INTERVENCION N°57	UND	1	6 día	jue 21/07/22	mié 27/07/22	$ 7.959.698,48	100%
82	INTERVENCION N°58	UND	1	6 día	jue 21/07/22	mié 27/07/22	$ 7.959.698,48	100%
83	INTERVENCION N°59	UND	1	6 día	jue 21/07/22	mié 27/07/22	$ 7.959.698,48	100%
84	INTERVENCION N°60	UND	1	6 día	jue 21/07/22	mié 27/07/22	$ 7.959.698,48	100%
85	INTERVENCION N°61	UND	1	6 día	jue 21/07/22	mié 27/07/22	$ 7.959.698,48	100%
86	INTERVENCION N°62	UND	1	6 día	jue 21/07/22	mié 27/07/22	$ 7.959.698,48	100%

21 23

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

Id	Nombre de tarea	Unidad	Ca	Dura	Comienzo	Fin	Costo	% PROGRAMADO
87	INTERVENCION N°63	UND	1	6 día	jue 21/07/22	mié 27/07/22	$ 7.959.698,48	100%
88	INTERVENCION N°64	UND	1	6 día	jue 21/07/22	mié 27/07/22	$ 7.959.698,48	100%
89	INTERVENCION N°65	UND	1	6 día	jue 21/07/22	mié 27/07/22	$ 7.959.698,48	100%
90	ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (52 -	UND	14	1 día	mié 27/07/22	mié 27/07/22	$ 0,00	100%
91	**MES 3 (65 VIVIENDAS)**			**24 d**	**jue 28/07/22**	**mié 24/08/22**	**$ 517.380.401,20**	**37%**
92	INTERVENCION N°66	UND	1	6 día	jue 28/07/22	mié 3/08/22	$ 7.959.698,48	100%
93	INTERVENCION N°67	UND	1	6 día	jue 28/07/22	mié 3/08/22	$ 7.959.698,48	100%
94	INTERVENCION N°68	UND	1	6 día	jue 28/07/22	mié 3/08/22	$ 7.959.698,48	100%
95	INTERVENCION N°69	UND	1	6 día	jue 28/07/22	mié 3/08/22	$ 7.959.698,48	100%
96	INTERVENCION N°70	UND	1	6 día	jue 28/07/22	mié 3/08/22	$ 7.959.698,48	100%
97	INTERVENCION N°71	UND	1	6 día	jue 28/07/22	mié 3/08/22	$ 7.959.698,48	100%
98	INTERVENCION N°72	UND	1	6 día	jue 28/07/22	mié 3/08/22	$ 7.959.698,48	100%
99	INTERVENCION N°73	UND	1	6 día	jue 28/07/22	mié 3/08/22	$ 7.959.698,48	100%
100	INTERVENCION N°74	UND	1	6 día	jue 28/07/22	mié 3/08/22	$ 7.959.698,48	100%
101	INTERVENCION N°75	UND	1	6 día	jue 28/07/22	mié 3/08/22	$ 7.959.698,48	100%
102	INTERVENCION N°76	UND	1	6 día	jue 28/07/22	mié 3/08/22	$ 7.959.698,48	100%

21 23

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

Id	Nombre de tarea	Unidad	Ca	Dura	Comienzo	Fin	Costo	% PROGRAMADO
103	INTERVENCION N°77	UND	1	6 día	jue 28/07/22	mié 3/08/22	$ 7.959.698,48	100%
104	INTERVENCION N°78	UND	1	6 día	jue 28/07/22	mié 3/08/22	$ 7.959.698,48	100%
105	INTERVENCION N°79	UND	1	6 día	jue 28/07/22	mié 3/08/22	$ 7.959.698,48	100%
106	INTERVENCION N°80	UND	1	6 día	jue 28/07/22	mié 3/08/22	$ 7.959.698,48	100%
107	INTERVENCION N°81	UND	1	6 día	jue 28/07/22	mié 3/08/22	$ 7.959.698,48	100%
108	ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (66 -	UND	16	1 día	mié 3/08/22	mié 3/08/22	$ 0,00	100%
109	INTERVENCION N°82	UND	1	6 día	jue 4/08/22	mié 10/08/22	$ 7.959.698,48	50%
110	INTERVENCION N°83	UND	1	6 día	jue 4/08/22	mié 10/08/22	$ 7.959.698,48	50%
111	INTERVENCION N°84	UND	1	6 día	jue 4/08/22	mié 10/08/22	$ 7.959.698,48	50%
112	INTERVENCION N°85	UND	1	6 día	jue 4/08/22	mié 10/08/22	$ 7.959.698,48	50%
113	INTERVENCION N°86	UND	1	6 día	jue 4/08/22	mié 10/08/22	$ 7.959.698,48	50%
114	INTERVENCION N°87	UND	1	6 día	jue 4/08/22	mié 10/08/22	$ 7.959.698,48	50%
115	INTERVENCION N°88	UND	1	6 día	jue 4/08/22	mié 10/08/22	$ 7.959.698,48	50%
116	INTERVENCION N°89	UND	1	6 día	jue 4/08/22	mié 10/08/22	$ 7.959.698,48	50%
117	INTERVENCION N°90	UND	1	6 día	jue 4/08/22	mié 10/08/22	$ 7.959.698,48	50%
118	INTERVENCION N°91	UND	1	6 día	jue 4/08/22	mié 10/08/22	$ 7.959.698,48	50%

21 23

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22



REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

Id	Nombre de tarea	Unidad	Ca	Dura	Comienzo	Fin	Costo	% PROGRAMADO
119	INTERVENCION N°92	UND	1	6 día	jue 4/08/22	mié 10/08/22	$ 7.959.698,48	50%
120	INTERVENCION N°93	UND	1	6 día	jue 4/08/22	mié 10/08/22	$ 7.959.698,48	50%
121	INTERVENCION N°94	UND	1	6 día	jue 4/08/22	mié 10/08/22	$ 7.959.698,48	50%
122	INTERVENCION N°95	UND	1	6 día	jue 4/08/22	mié 10/08/22	$ 7.959.698,48	50%
123	INTERVENCION N°96	UND	1	6 día	jue 4/08/22	mié 10/08/22	$ 7.959.698,48	50%
124	INTERVENCION N°97	UND	1	6 día	jue 4/08/22	mié 10/08/22	$ 7.959.698,48	50%
125	ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (82 -	UND	16	1 día	mié 10/08/22	mié 10/08/22	$ 0,00	0%
126	INTERVENCION N°98	UND	1	6 día	jue 11/08/22	mié 17/08/22	$ 7.959.698,48	0%
127	INTERVENCION N°99	UND	1	6 día	jue 11/08/22	mié 17/08/22	$ 7.959.698,48	0%
128	INTERVENCION N°100	UND	1	6 día	jue 11/08/22	mié 17/08/22	$ 7.959.698,48	0%
129	INTERVENCION N°101	UND	1	6 día	jue 11/08/22	mié 17/08/22	$ 7.959.698,48	0%
130	INTERVENCION N°102	UND	1	6 día	jue 11/08/22	mié 17/08/22	$ 7.959.698,48	0%
131	INTERVENCION N°103	UND	1	6 día	jue 11/08/22	mié 17/08/22	$ 7.959.698,48	0%
132	INTERVENCION N°104	UND	1	6 día	jue 11/08/22	mié 17/08/22	$ 7.959.698,48	0%
133	INTERVENCION N°105	UND	1	6 día	jue 11/08/22	mié 17/08/22	$ 7.959.698,48	0%
134	INTERVENCION N°106	UND	1	6 día	jue 11/08/22	mié 17/08/22	$ 7.959.698,48	0%

21 23

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

Id	Nombre de tarea	Unidad	Ca	Dura	Comienzo	Fin	Costo	% PROGRAMADO
135	INTERVENCION N°107	UND	1	6 día	jue 11/08/22	mié 17/08/22	$ 7.959.698,48	0%
136	INTERVENCION N°108	UND	1	6 día	jue 11/08/22	mié 17/08/22	$ 7.959.698,48	0%
137	INTERVENCION N°109	UND	1	6 día	jue 11/08/22	mié 17/08/22	$ 7.959.698,48	0%
138	INTERVENCION N°110	UND	1	6 día	jue 11/08/22	mié 17/08/22	$ 7.959.698,48	0%
139	INTERVENCION N°111	UND	1	6 día	jue 11/08/22	mié 17/08/22	$ 7.959.698,48	0%
140	INTERVENCION N°112	UND	1	6 día	jue 11/08/22	mié 17/08/22	$ 7.959.698,48	0%
141	INTERVENCION N°113	UND	1	6 día	jue 11/08/22	mié 17/08/22	$ 7.959.698,48	0%
142	ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (98 - 113)	UND	16	1 día	mié 17/08/22	mié 17/08/22	$ 0,00	0%
143	INTERVENCION N°114	UND	1	6 día	jue 18/08/22	mié 24/08/22	$ 7.959.698,48	0%
144	INTERVENCION N°115	UND	1	6 día	jue 18/08/22	mié 24/08/22	$ 7.959.698,48	0%
145	INTERVENCION N°116	UND	1	6 día	jue 18/08/22	mié 24/08/22	$ 7.959.698,48	0%
146	INTERVENCION N°117	UND	1	6 día	jue 18/08/22	mié 24/08/22	$ 7.959.698,48	0%
147	INTERVENCION N°118	UND	1	6 día	jue 18/08/22	mié 24/08/22	$ 7.959.698,48	0%
148	INTERVENCION N°119	UND	1	6 día	jue 18/08/22	mié 24/08/22	$ 7.959.698,48	0%
149	INTERVENCION N°120	UND	1	6 día	jue 18/08/22	mié 24/08/22	$ 7.959.698,48	0%

21 23

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

Id	Nombre de tarea	Unidad	Ca	Dura	Comienzo	Fin	Costo	% PROGRAMADO
150	INTERVENCION N°121	UND	1	6 día	jue 18/08/22	mié 24/08/22	$ 7.959.698,48	0%
151	INTERVENCION N°122	UND	1	6 día	jue 18/08/22	mié 24/08/22	$ 7.959.698,48	0%
152	INTERVENCION N°123	UND	1	6 día	jue 18/08/22	mié 24/08/22	$ 7.959.698,48	0%
153	INTERVENCION N°124	UND	1	6 día	jue 18/08/22	mié 24/08/22	$ 7.959.698,48	0%
154	INTERVENCION N°125	UND	1	6 día	jue 18/08/22	mié 24/08/22	$ 7.959.698,48	0%
155	INTERVENCION N°126	UND	1	6 día	jue 18/08/22	mié 24/08/22	$ 7.959.698,48	0%
156	INTERVENCION N°127	UND	1	6 día	jue 18/08/22	mié 24/08/22	$ 7.959.698,48	0%
157	INTERVENCION N°128	UND	1	6 día	jue 18/08/22	mié 24/08/22	$ 7.959.698,48	0%
158	INTERVENCION N°129	UND	1	6 día	jue 18/08/22	mié 24/08/22	$ 7.959.698,48	0%
159	INTERVENCION N°130	UND	1	6 día	jue 18/08/22	mié 24/08/22	$ 7.959.698,48	0%
160	ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (114 - 130)	UND	1	71 día	mié 24/08/22	mié 24/08/22	$ 0,00	0%
161	**MES 4 (87 VIVIENDAS)**			**28 d**	**jue 25/08/22**	**lun 26/09/22**	**$ 692.493.768,13**	**0%**
162	INTERVENCION N°131	UND	1	6 día	jue 25/08/22	mié 31/08/22	$ 7.959.698,48	0%
163	INTERVENCION N°132	UND	1	6 día	jue 25/08/22	mié 31/08/22	$ 7.959.698,48	0%
164	INTERVENCION N°133	UND	1	6 día	jue 25/08/22	mié 31/08/22	$ 7.959.698,48	0%

21 23

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

Id	Nombre de tarea	Unidad	Ca	Dura	Comienzo	Fin	Costo	% PROGRAMADO
165	INTERVENCION N°134	UND	1	6 día	jue 25/08/22	mié 31/08/22	$ 7.959.698,48	0%
166	INTERVENCION N°135	UND	1	6 día	jue 25/08/22	mié 31/08/22	$ 7.959.698,48	0%
167	INTERVENCION N°136	UND	1	6 día	jue 25/08/22	mié 31/08/22	$ 7.959.698,48	0%
168	INTERVENCION N°137	UND	1	6 día	jue 25/08/22	mié 31/08/22	$ 7.959.698,48	0%
169	INTERVENCION N°138	UND	1	6 día	jue 25/08/22	mié 31/08/22	$ 7.959.698,48	0%
170	INTERVENCION N°139	UND	1	6 día	jue 25/08/22	mié 31/08/22	$ 7.959.698,48	0%
171	INTERVENCION N°140	UND	1	6 día	jue 25/08/22	mié 31/08/22	$ 7.959.698,48	0%
172	INTERVENCION N°141	UND	1	6 día	jue 25/08/22	mié 31/08/22	$ 7.959.698,48	0%
173	INTERVENCION N°142	UND	1	6 día	jue 25/08/22	mié 31/08/22	$ 7.959.698,48	0%
174	INTERVENCION N°143	UND	1	6 día	jue 25/08/22	mié 31/08/22	$ 7.959.698,48	0%
175	INTERVENCION N°144	UND	1	6 día	jue 25/08/22	mié 31/08/22	$ 7.959.698,48	0%
176	INTERVENCION N°145	UND	1	6 día	jue 25/08/22	mié 31/08/22	$ 7.959.698,48	0%
177	INTERVENCION N°146	UND	1	6 día	jue 25/08/22	mié 31/08/22	$ 7.959.698,48	0%
178	INTERVENCION N°147	UND	1	6 día	jue 25/08/22	mié 31/08/22	$ 7.959.698,48	0%
179	INTERVENCION N°148	UND	1	6 día	jue 25/08/22	mié 31/08/22	$ 7.959.698,48	0%
180	INTERVENCION N°149	UND	1	6 día	jue 25/08/22	mié 31/08/22	$ 7.959.698,48	0%

21 23

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

Id	Nombre de tarea	Unidad	Ca	Dura	Comienzo	Fin	Costo	% PROGRAMADO
181	INTERVENCION N°150	UND	1	6 día	jue 25/08/22	mié 31/08/22	$ 7.959.698,48	0%
182	INTERVENCION N°151	UND	1	6 día	jue 25/08/22	mié 31/08/22	$ 7.959.698,48	0%
183	INTERVENCION N°152	UND	1	6 día	jue 25/08/22	mié 31/08/22	$ 7.959.698,48	0%
184	ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (131 - 152)	UND	22	1 día	mié 31/08/22	mié 31/08/22	$ 0,00	0%
185	INTERVENCION N°153	UND	1	6 día	jue 1/09/22	mié 7/09/22	$ 7.959.698,48	0%
186	INTERVENCION N°154	UND	1	6 día	jue 1/09/22	mié 7/09/22	$ 7.959.698,48	0%
187	INTERVENCION N°155	UND	1	6 día	jue 1/09/22	mié 7/09/22	$ 7.959.698,48	0%
188	INTERVENCION N°156	UND	1	6 día	jue 1/09/22	mié 7/09/22	$ 7.959.698,48	0%
189	INTERVENCION N°157	UND	1	6 día	jue 1/09/22	mié 7/09/22	$ 7.959.698,48	0%
190	INTERVENCION N°158	UND	1	6 día	jue 1/09/22	mié 7/09/22	$ 7.959.698,48	0%
191	INTERVENCION N°159	UND	1	6 día	jue 1/09/22	mié 7/09/22	$ 7.959.698,48	0%
192	INTERVENCION N°160	UND	1	6 día	jue 1/09/22	mié 7/09/22	$ 7.959.698,48	0%
193	INTERVENCION N°161	UND	1	6 día	jue 1/09/22	mié 7/09/22	$ 7.959.698,48	0%
194	INTERVENCION N°162	UND	1	6 día	jue 1/09/22	mié 7/09/22	$ 7.959.698,48	0%
195	INTERVENCION N°163	UND	1	6 día	jue 1/09/22	mié 7/09/22	$ 7.959.698,48	0%

21 23

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

Id	Nombre de tarea	Unidad	Ca	Dura	Comienzo	Fin	Costo	% PROGRAMADO
196	INTERVENCION N°164	UND	1	6 día	jue 1/09/22	mié 7/09/22	$ 7.959.698,48	0%
197	INTERVENCION N°165	UND	1	6 día	jue 1/09/22	mié 7/09/22	$ 7.959.698,48	0%
198	INTERVENCION N°166	UND	1	6 día	jue 1/09/22	mié 7/09/22	$ 7.959.698,48	0%
199	INTERVENCION N°167	UND	1	6 día	jue 1/09/22	mié 7/09/22	$ 7.959.698,48	0%
200	INTERVENCION N°168	UND	1	6 día	jue 1/09/22	mié 7/09/22	$ 7.959.698,48	0%
201	INTERVENCION N°169	UND	1	6 día	jue 1/09/22	mié 7/09/22	$ 7.959.698,48	0%
202	INTERVENCION N°170	UND	1	6 día	jue 1/09/22	mié 7/09/22	$ 7.959.698,48	0%
203	INTERVENCION N°171	UND	1	6 día	jue 1/09/22	mié 7/09/22	$ 7.959.698,48	0%
204	INTERVENCION N°172	UND	1	6 día	jue 1/09/22	mié 7/09/22	$ 7.959.698,48	0%
205	INTERVENCION N°173	UND	1	6 día	jue 1/09/22	mié 7/09/22	$ 7.959.698,48	0%
206	INTERVENCION N°174	UND	1	6 día	jue 1/09/22	mié 7/09/22	$ 7.959.698,48	0%
207	ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (153 - 174)	UND	22	1 día	mié 7/09/22	mié 7/09/22	$ 0,00	0%
208	INTERVENCION N°175	UND	1	6 día	jue 8/09/22	mié 14/09/22	$ 7.959.698,48	0%
209	INTERVENCION N°176	UND	1	6 día	jue 8/09/22	mié 14/09/22	$ 7.959.698,48	0%
210	INTERVENCION N°177	UND	1	6 día	jue 8/09/22	mié 14/09/22	$ 7.959.698,48	0%

21 23

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

Id	Nombre de tarea	Unidad	Ca	Dura	Comienzo	Fin	Costo	% PROGRAMADO
211	INTERVENCION N°178	UND	1	6 día	jue 8/09/22	mié 14/09/22	$ 7.959.698,48	0%
212	INTERVENCION N°179	UND	1	6 día	jue 8/09/22	mié 14/09/22	$ 7.959.698,48	0%
213	INTERVENCION N°180	UND	1	6 día	jue 8/09/22	mié 14/09/22	$ 7.959.698,48	0%
214	INTERVENCION N°181	UND	1	6 día	jue 8/09/22	mié 14/09/22	$ 7.959.698,49	0%
215	INTERVENCION N°182	UND	1	6 día	jue 8/09/22	mié 14/09/22	$ 7.959.698,49	0%
216	INTERVENCION N°183	UND	1	6 día	jue 8/09/22	mié 14/09/22	$ 7.959.698,49	0%
217	INTERVENCION N°184	UND	1	6 día	jue 8/09/22	mié 14/09/22	$ 7.959.698,49	0%
218	INTERVENCION N°185	UND	1	6 día	jue 8/09/22	mié 14/09/22	$ 7.959.698,49	0%
219	INTERVENCION N°186	UND	1	6 día	jue 8/09/22	mié 14/09/22	$ 7.959.698,49	0%
220	INTERVENCION N°187	UND	1	6 día	jue 8/09/22	mié 14/09/22	$ 7.959.698,49	0%
221	INTERVENCION N°188	UND	1	6 día	jue 8/09/22	mié 14/09/22	$ 7.959.698,49	0%
222	INTERVENCION N°189	UND	1	6 día	jue 8/09/22	mié 14/09/22	$ 7.959.698,49	0%
223	INTERVENCION N°190	UND	1	6 día	jue 8/09/22	mié 14/09/22	$ 7.959.698,49	0%
224	INTERVENCION N°191	UND	1	6 día	jue 8/09/22	mié 14/09/22	$ 7.959.698,49	0%
225	INTERVENCION N°192	UND	1	6 día	jue 8/09/22	mié 14/09/22	$ 7.959.698,49	0%
226	INTERVENCION N°193	UND	1	6 día	jue 8/09/22	mié 14/09/22	$ 7.959.698,49	0%

21 23

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

Id	Nombre de tarea	Unidad	Ca	Dura	Comienzo	Fin	Costo	% PROGRAMADO
227	INTERVENCION N°194	UND	1	6 día	jue 8/09/22	mié 14/09/22	$ 7.959.698,49	0%
228	INTERVENCION N°195	UND	1	6 día	jue 8/09/22	mié 14/09/22	$ 7.959.698,49	0%
229	INTERVENCION N°196	UND	1	6 día	jue 8/09/22	mié 14/09/22	$ 7.959.698,49	0%
230	ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (175 - 196)	UND	22	1 día	mié 14/09/22	mié 14/09/22	$ 0,00	0%
231	INTERVENCION N°197	UND	1	6 día	jue 15/09/22	mié 21/09/22	$ 7.959.698,49	0%
232	INTERVENCION N°198	UND	1	6 día	jue 15/09/22	mié 21/09/22	$ 7.959.698,49	0%
233	INTERVENCION N°199	UND	1	6 día	jue 15/09/22	mié 21/09/22	$ 7.959.698,49	0%
234	INTERVENCION N°200	UND	1	6 día	jue 15/09/22	mié 21/09/22	$ 7.959.698,49	0%
235	INTERVENCION N°201	UND	1	6 día	jue 15/09/22	mié 21/09/22	$ 7.959.698,49	0%
236	INTERVENCION N°202	UND	1	6 día	jue 15/09/22	mié 21/09/22	$ 7.959.698,49	0%
237	INTERVENCION N°203	UND	1	6 día	jue 15/09/22	mié 21/09/22	$ 7.959.698,49	0%
238	INTERVENCION N°204	UND	1	6 día	jue 15/09/22	mié 21/09/22	$ 7.959.698,49	0%
239	INTERVENCION N°205	UND	1	6 día	jue 15/09/22	mié 21/09/22	$ 7.959.698,49	0%
240	INTERVENCION N°206	UND	1	6 día	jue 15/09/22	mié 21/09/22	$ 7.959.698,49	0%
241	INTERVENCION N°207	UND	1	6 día	jue 15/09/22	mié 21/09/22	$ 7.959.698,49	0%

21 23

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

Id	Nombre de tarea	Unidad	Ca	Dura	Comienzo	Fin	Costo	% PROGRAMADO	21 23
242	INTERVENCION N°208	UND	1	6 día	jue 15/09/22	mié 21/09/22	$ 7.959.698,49	0%	
243	INTERVENCION N°209	UND	1	6 día	jue 15/09/22	mié 21/09/22	$ 7.959.698,49	0%	
244	INTERVENCION N°210	UND	1	6 día	jue 15/09/22	mié 21/09/22	$ 7.959.698,49	0%	
245	INTERVENCION N°211	UND	1	6 día	jue 15/09/22	mié 21/09/22	$ 7.959.698,49	0%	
246	INTERVENCION N°212	UND	1	6 día	jue 15/09/22	mié 21/09/22	$ 7.959.698,49	0%	
247	INTERVENCION N°213	UND	1	6 día	jue 15/09/22	mié 21/09/22	$ 7.959.698,49	0%	
248	INTERVENCION N°214	UND	1	6 día	jue 15/09/22	mié 21/09/22	$ 7.959.698,49	0%	
249	INTERVENCION N°215	UND	1	6 día	jue 15/09/22	mié 21/09/22	$ 7.959.698,49	0%	
250	INTERVENCION N°216	UND	1	6 día	jue 15/09/22	mié 21/09/22	$ 7.959.698,49	0%	
251	INTERVENCION N°217	UND	1	6 día	jue 15/09/22	mié 21/09/22	$ 7.959.698,49	0%	
252	ENTREGA A INTERVENTORIA VIVIENDAS INTERVENIDAS (197 - 217)	UND	21	4 días	jue 22/09/22	lun 26/09/22	$ 0,00	0%	
253	**ACTIVIDAD 4: PLAN DE GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES1, 2 Y 3.**			**132 días**	**mar 26/04/22**	**lun 26/09/22**	**$ 0,00**	**67%**	

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

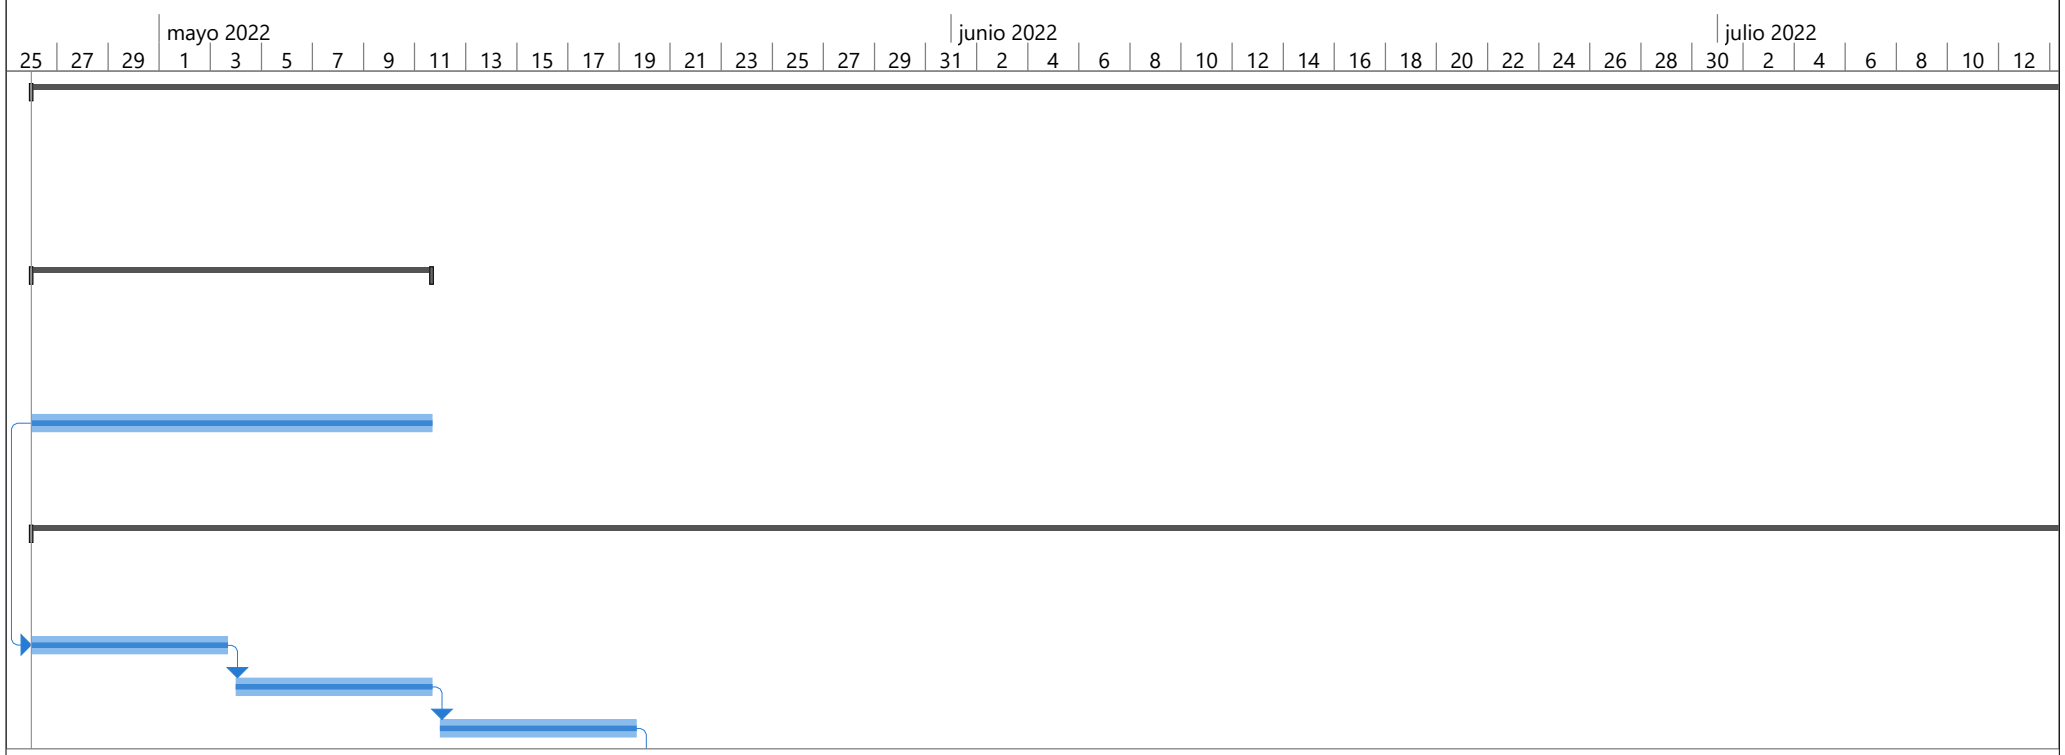

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

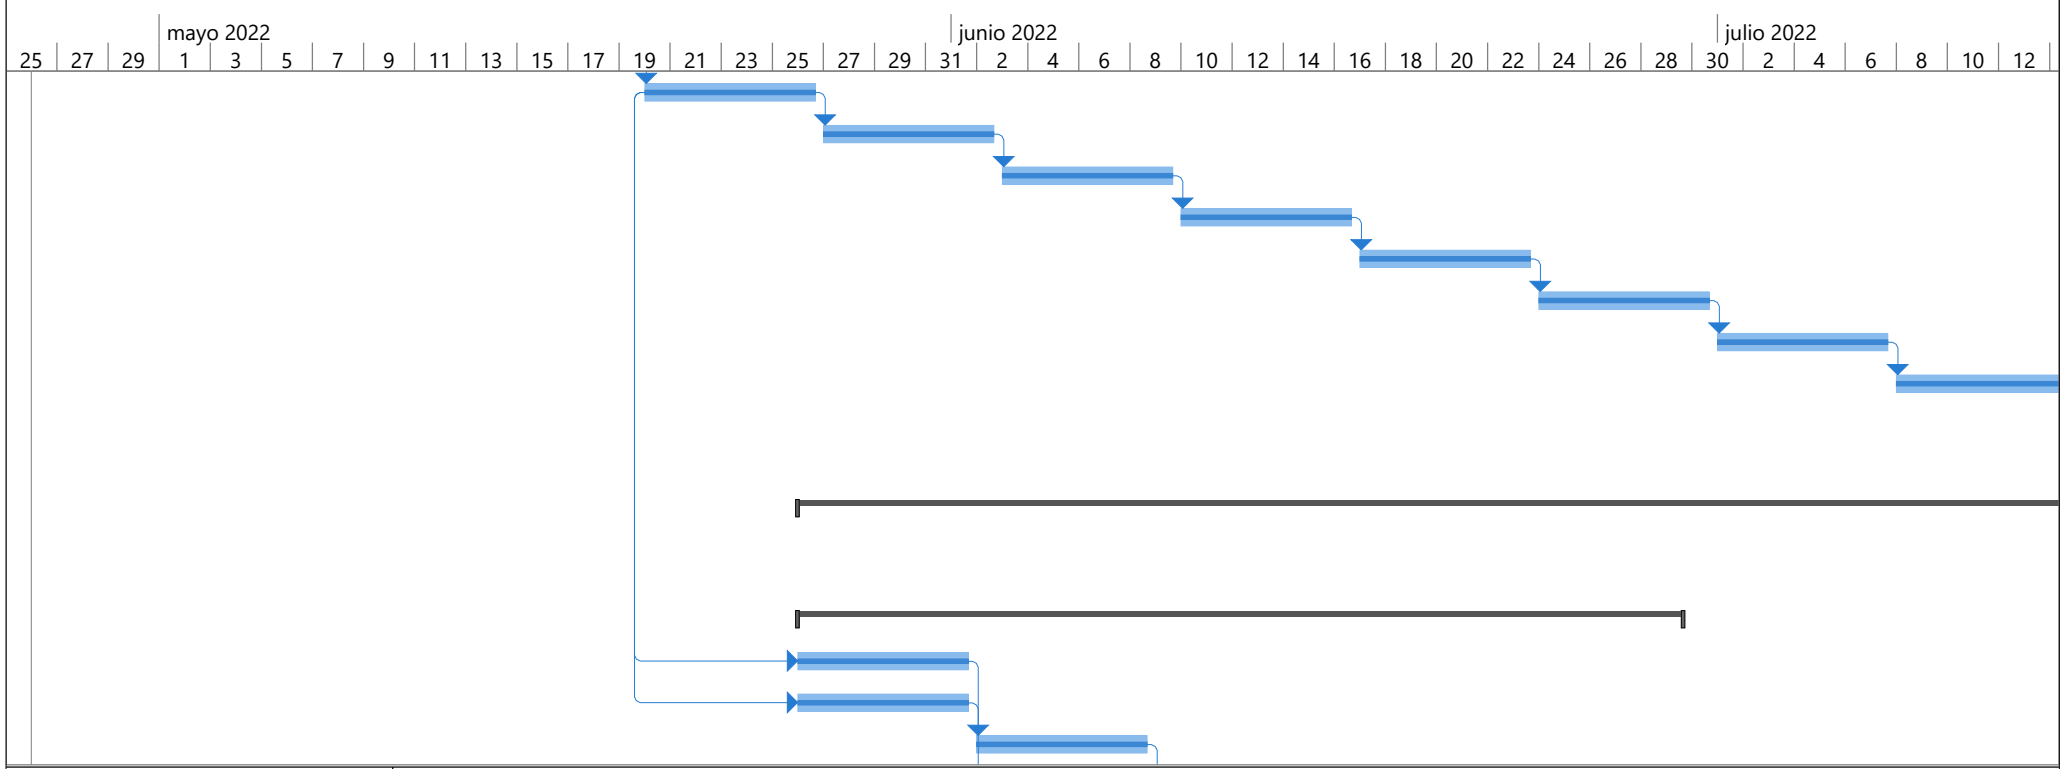

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

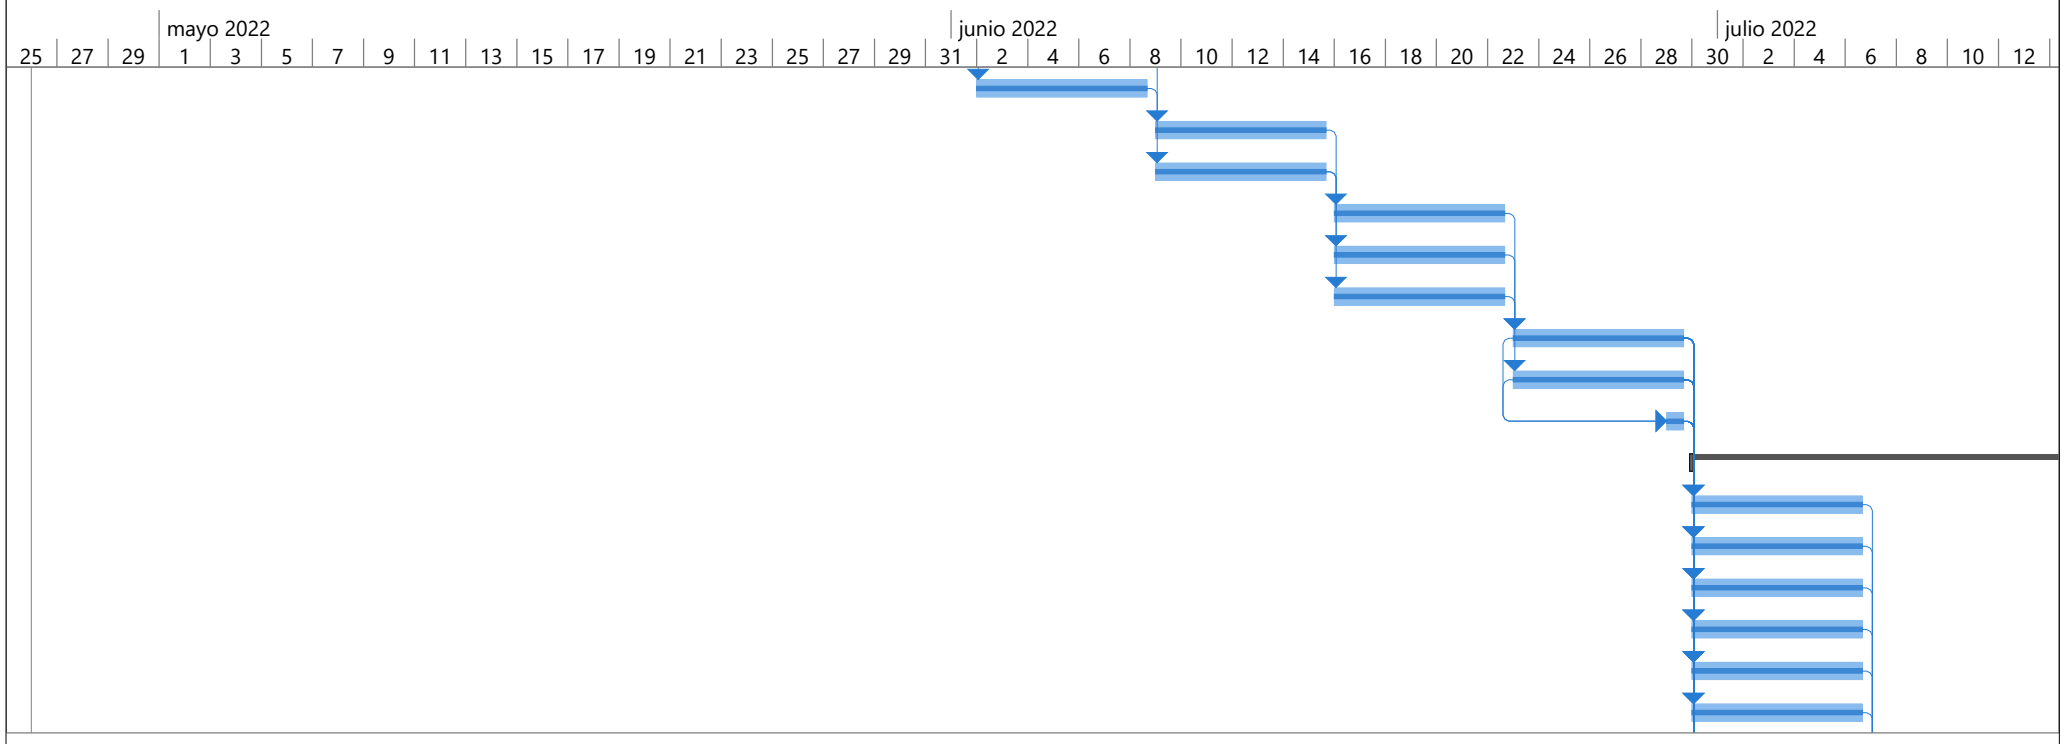

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

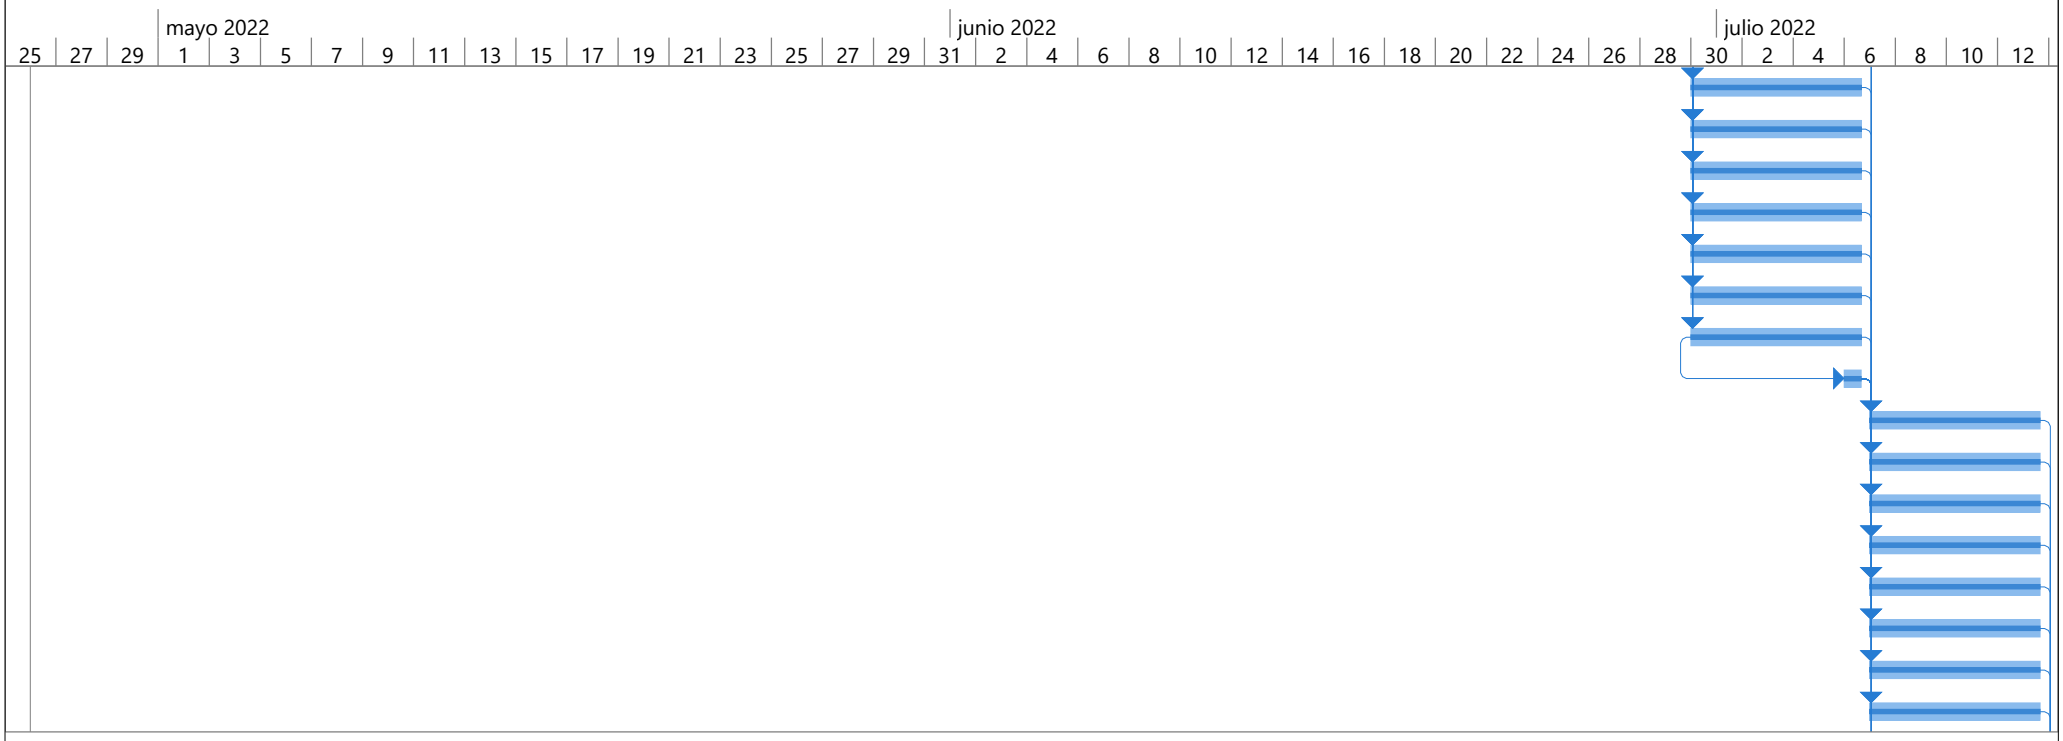

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

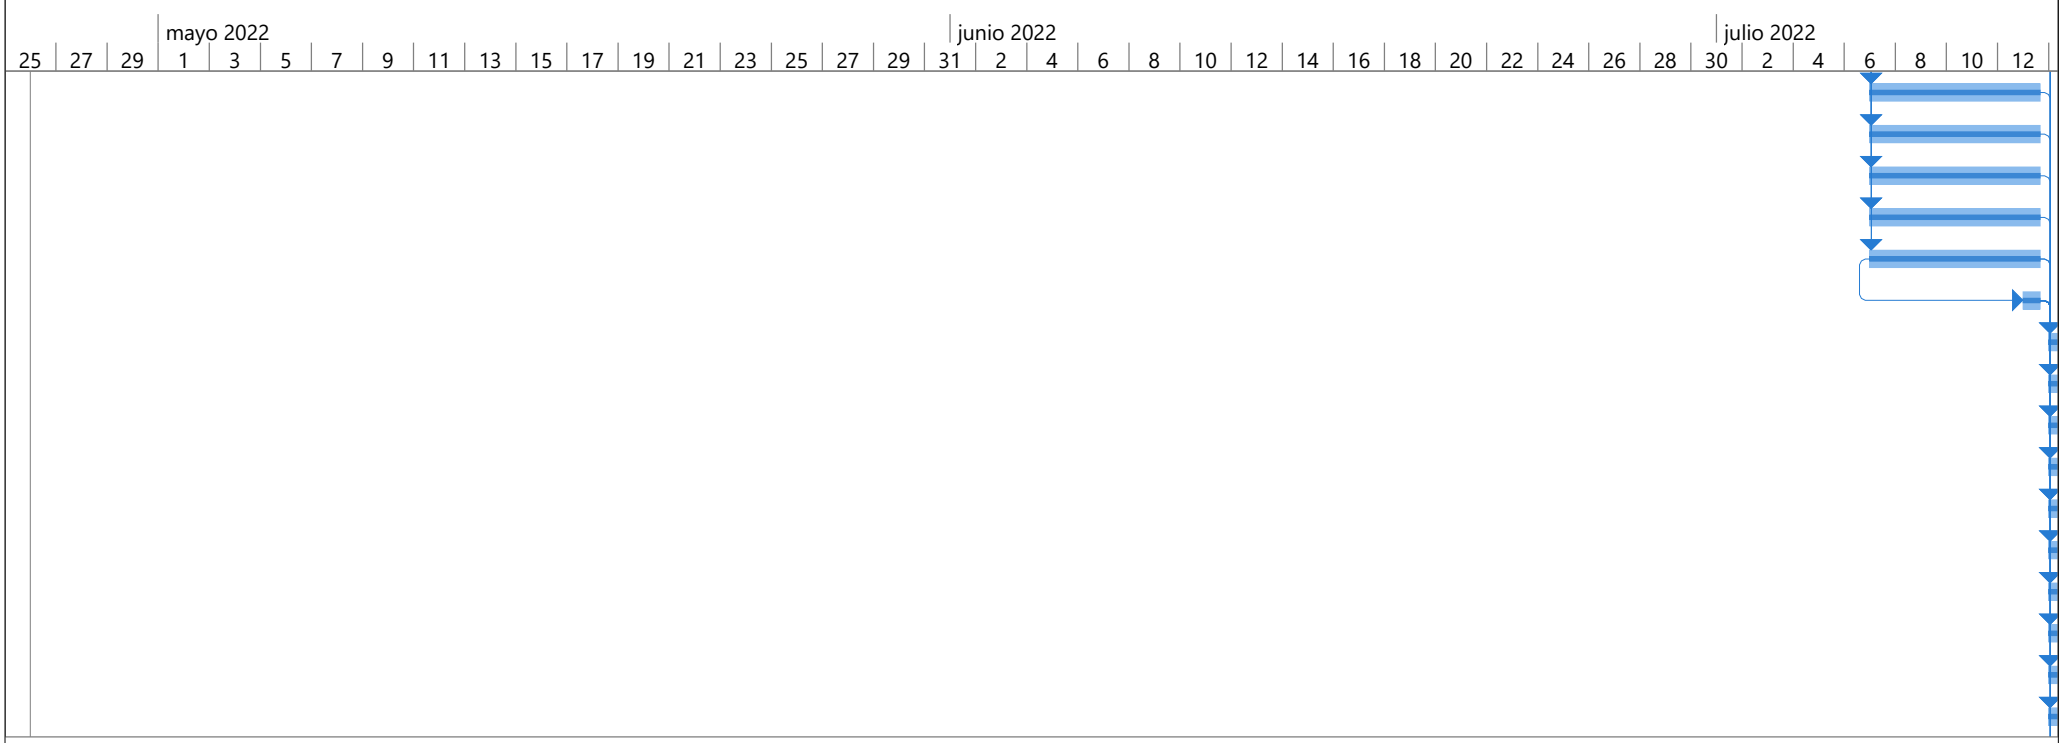

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

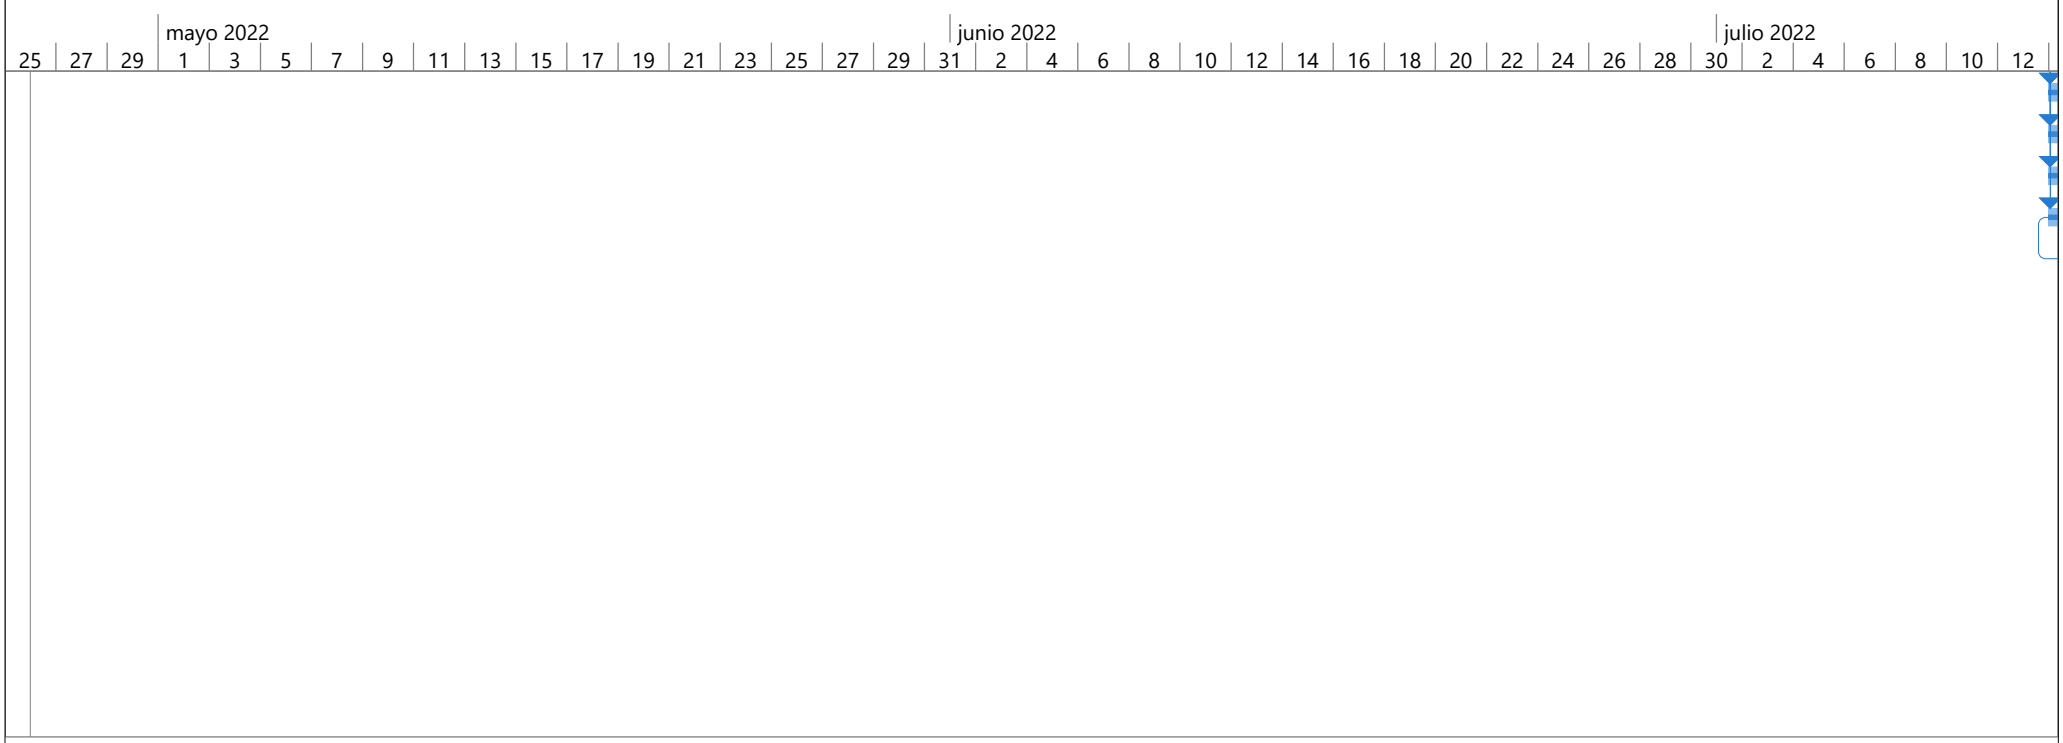

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

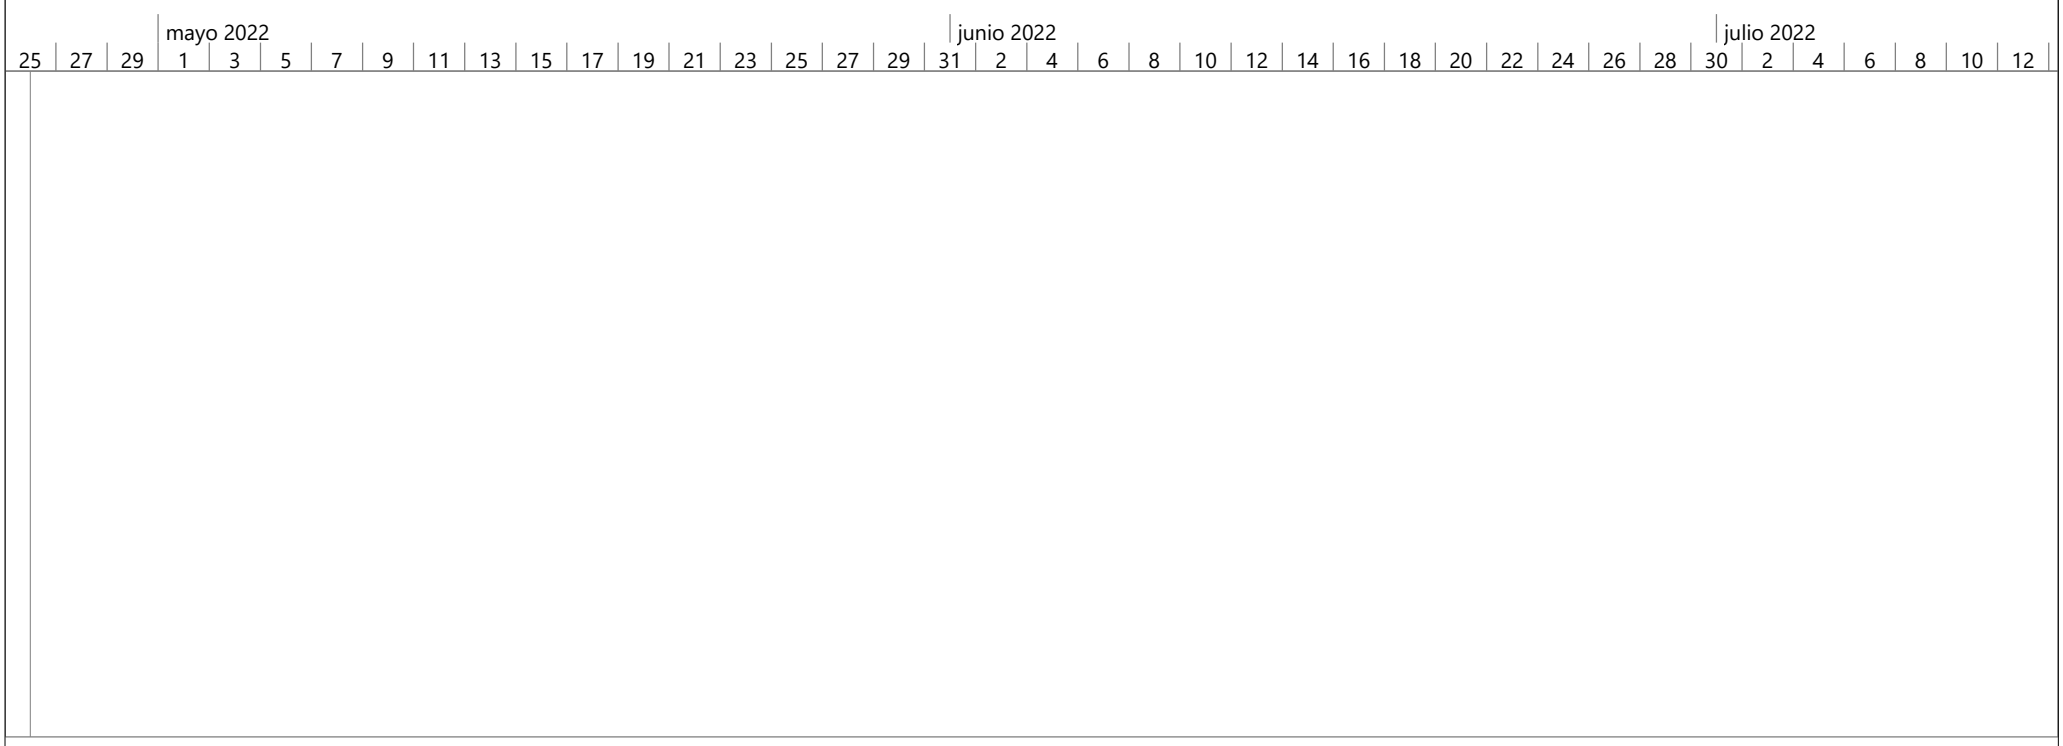

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

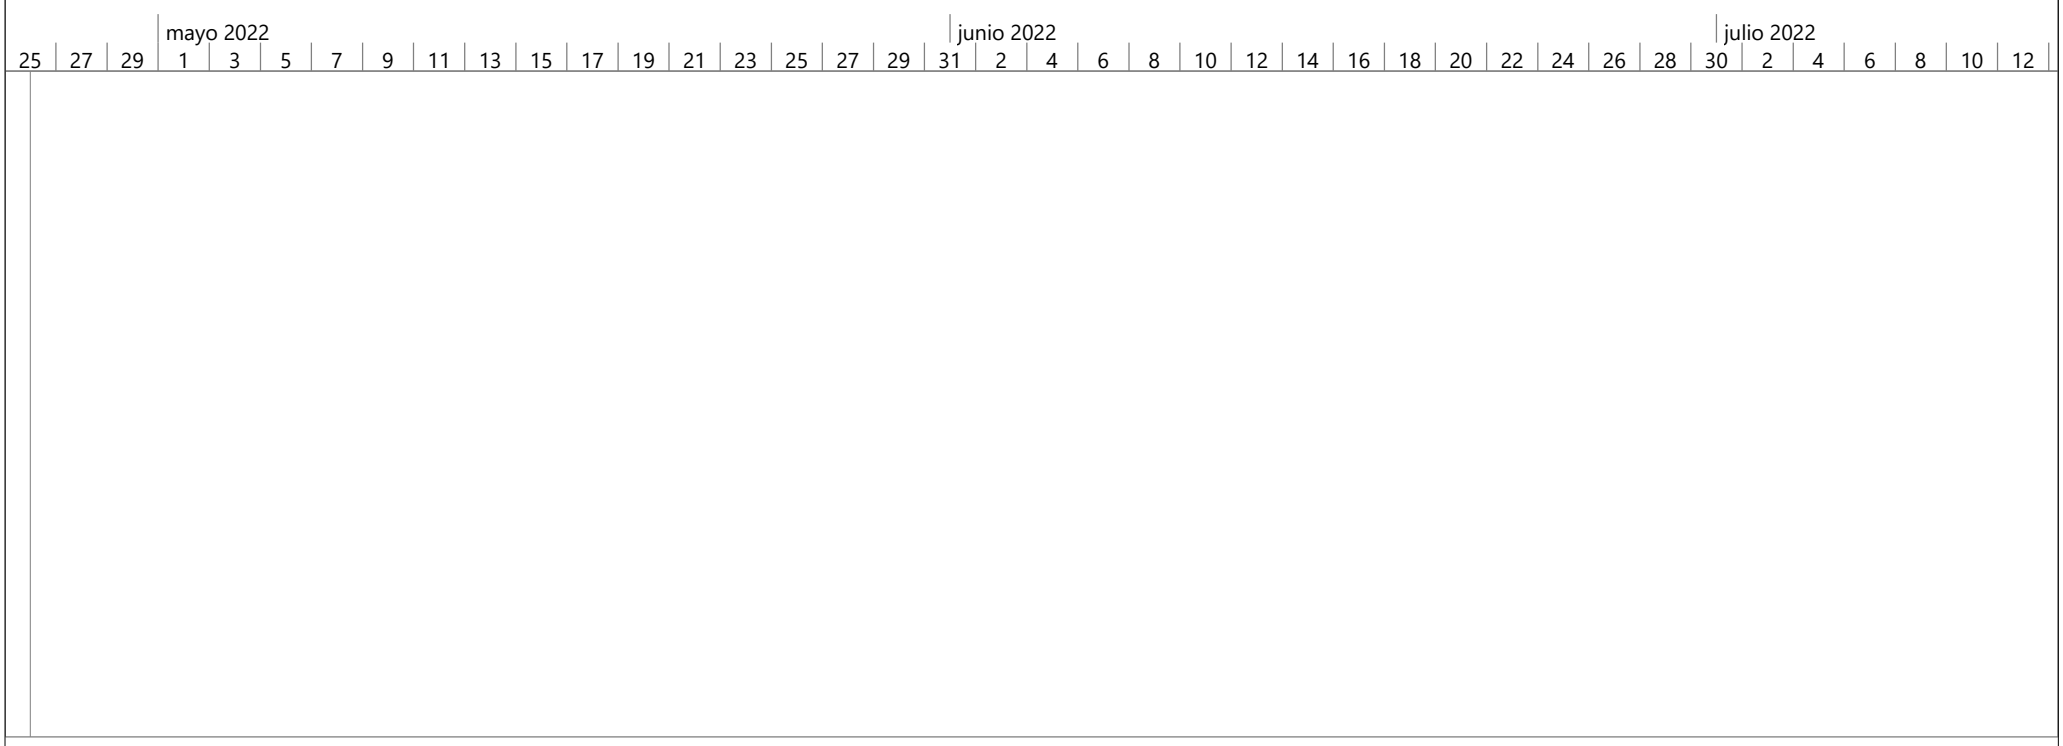

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

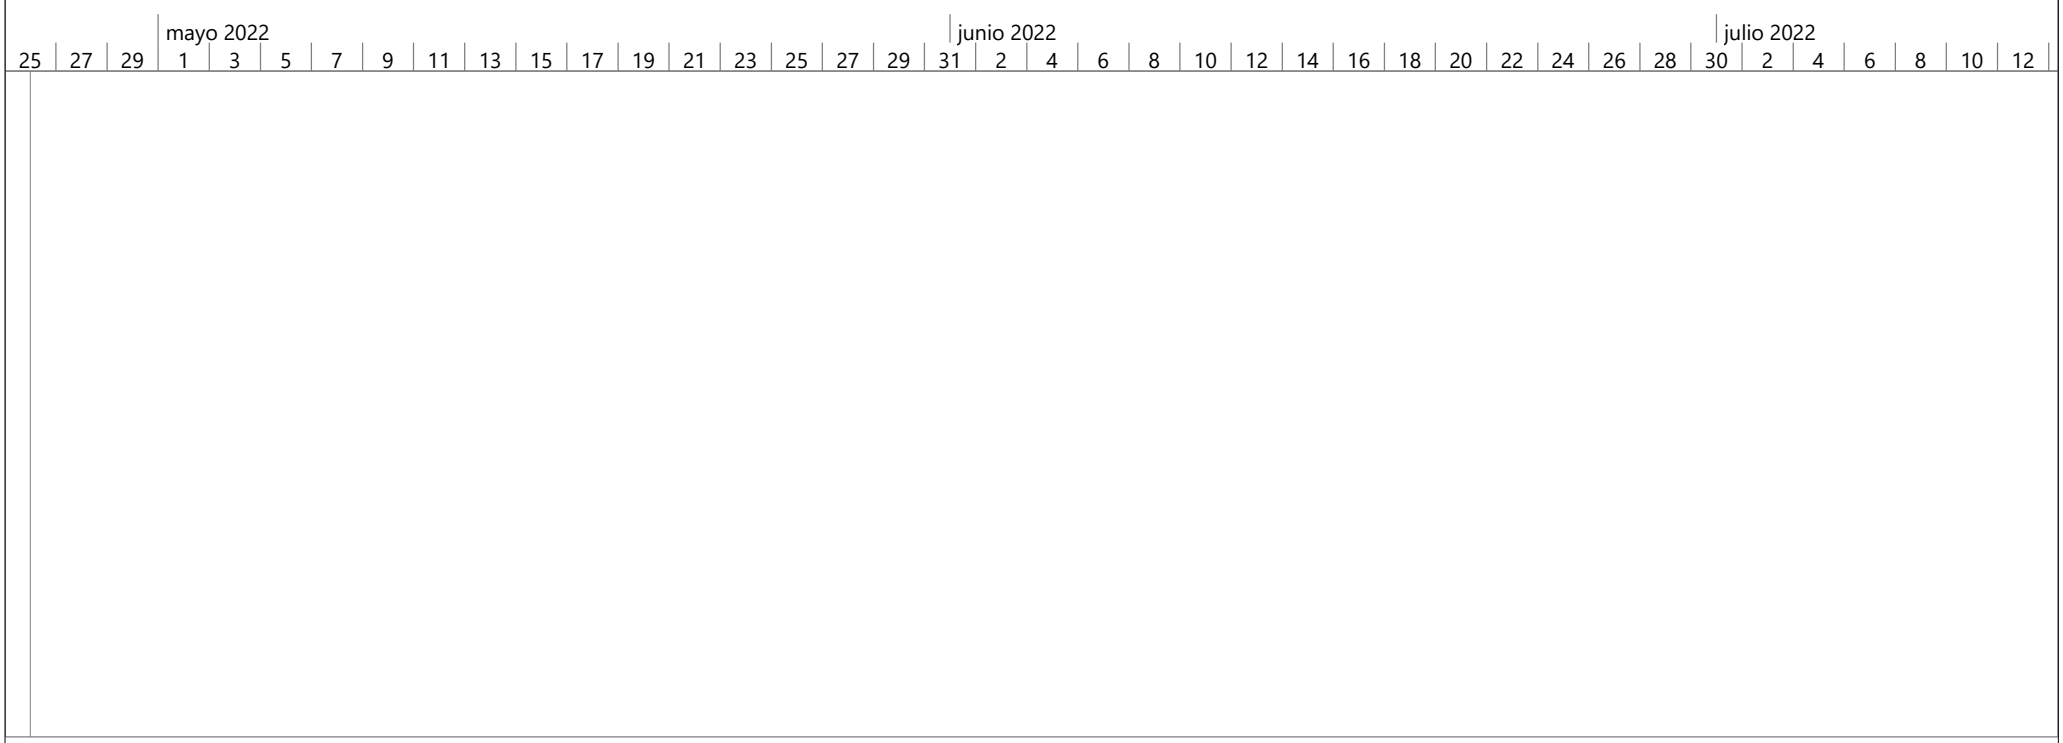

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

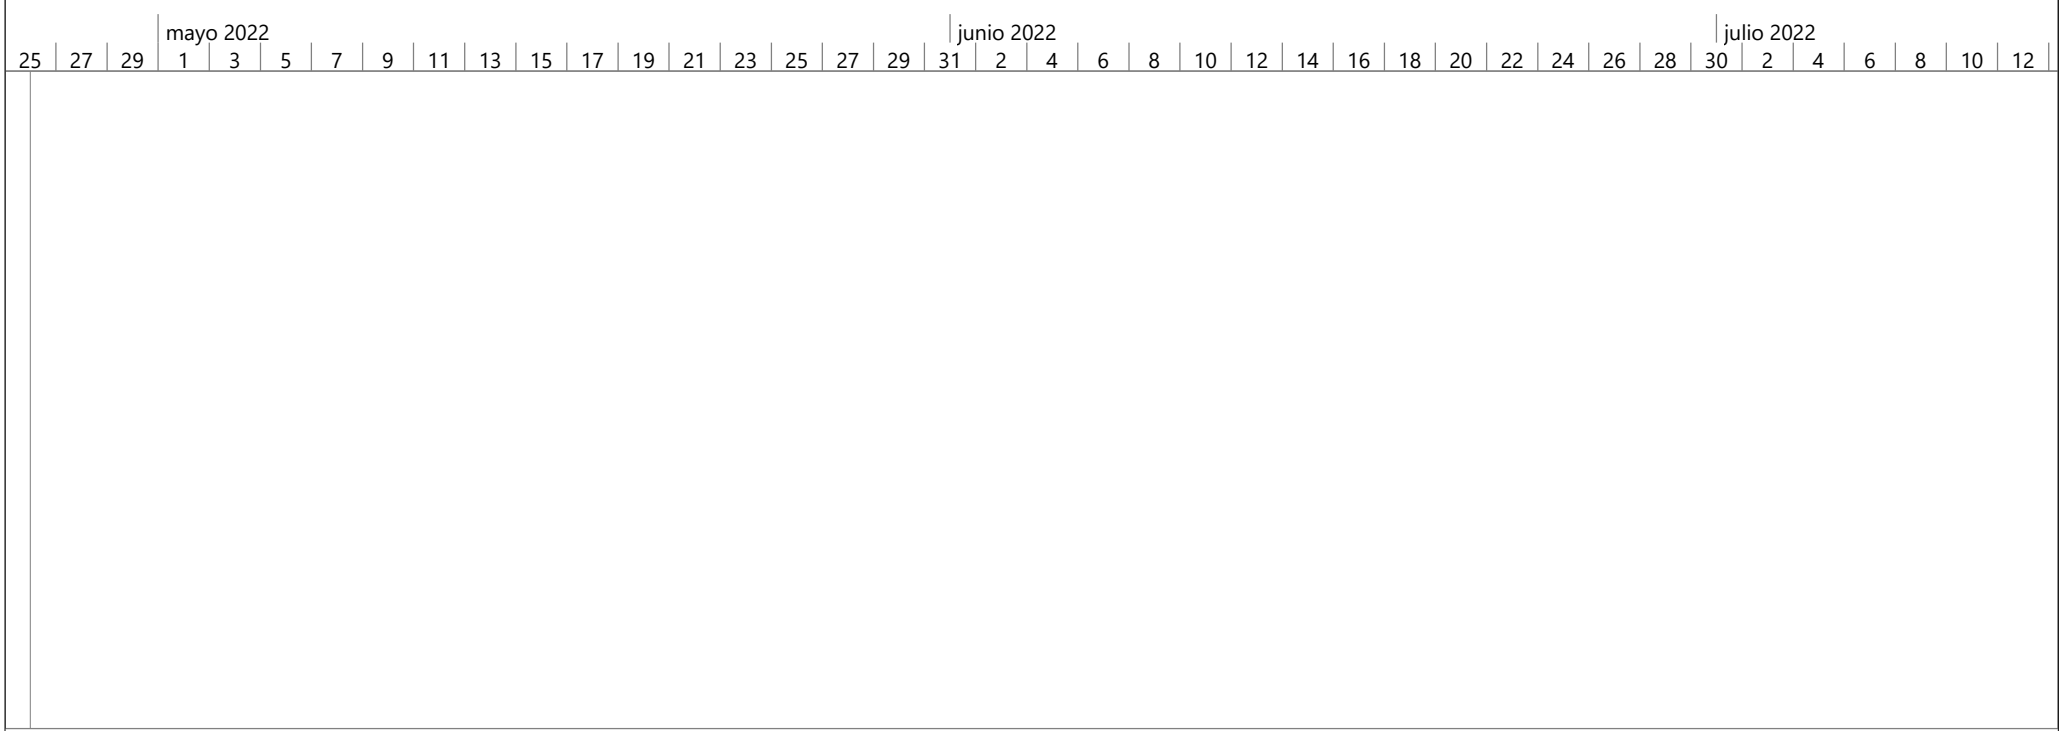

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

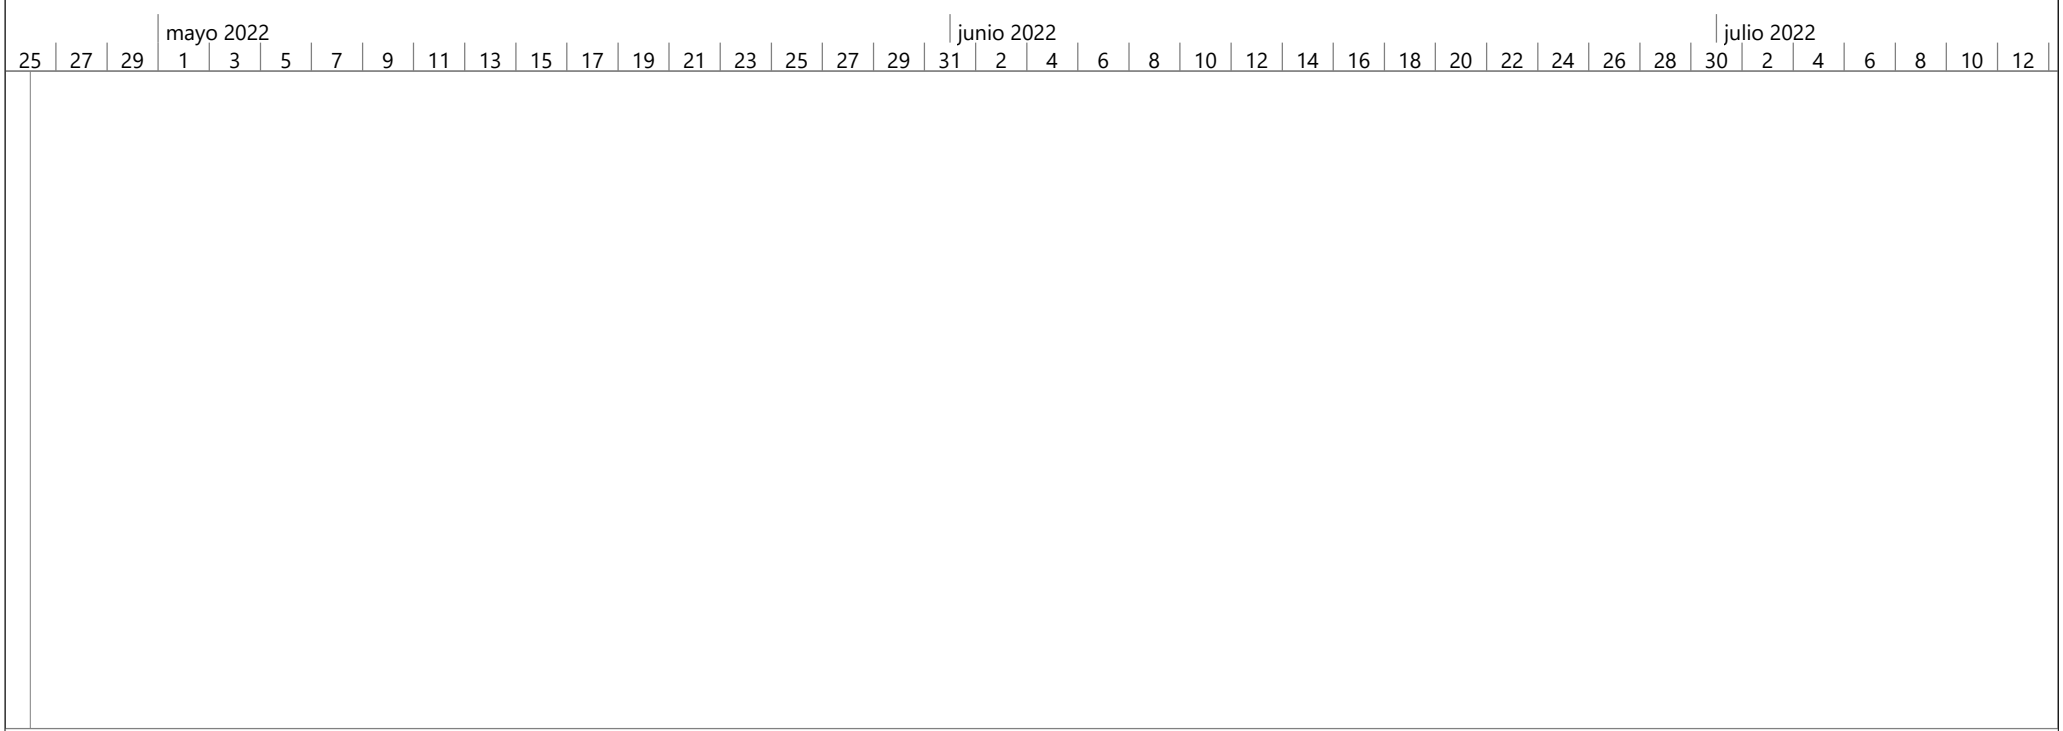

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

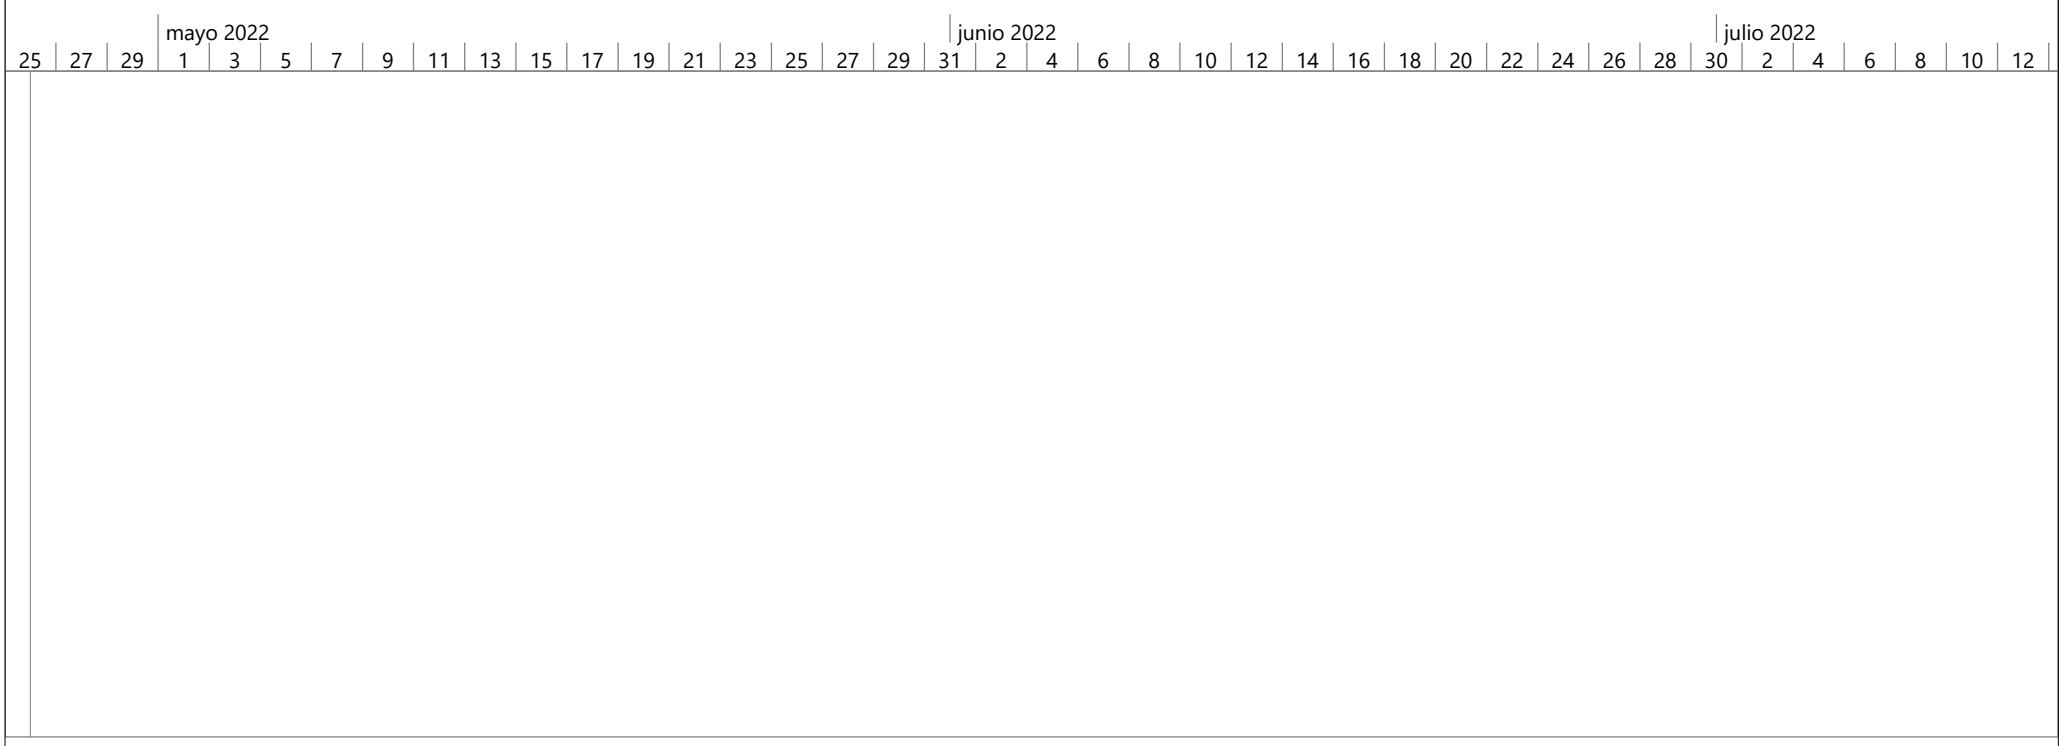

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

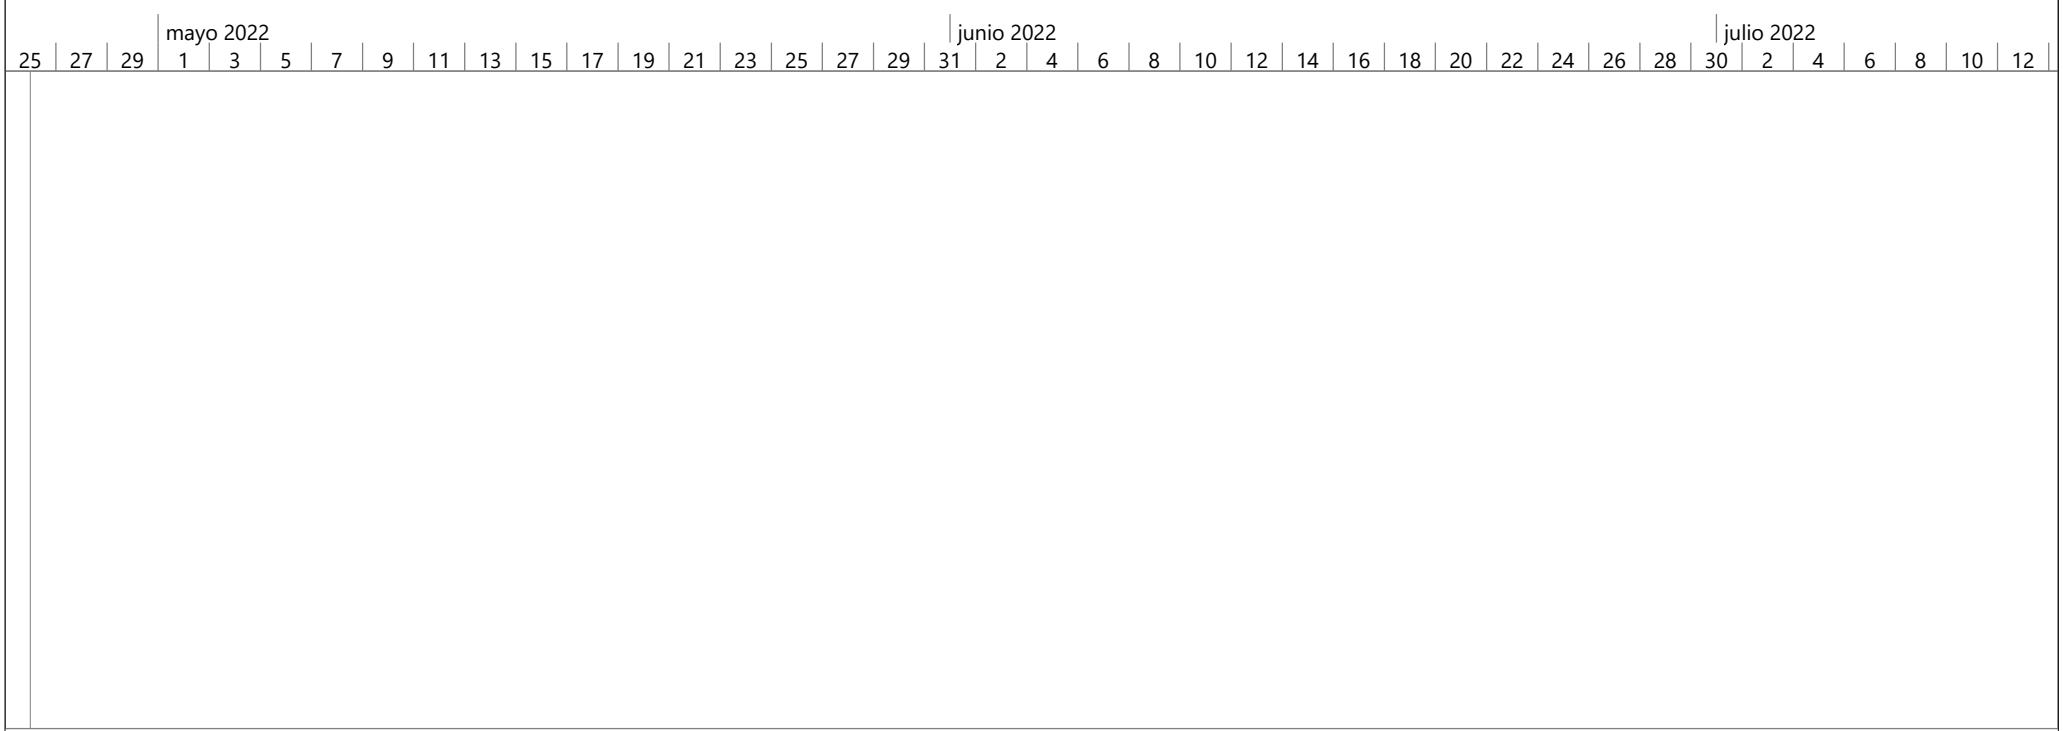

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

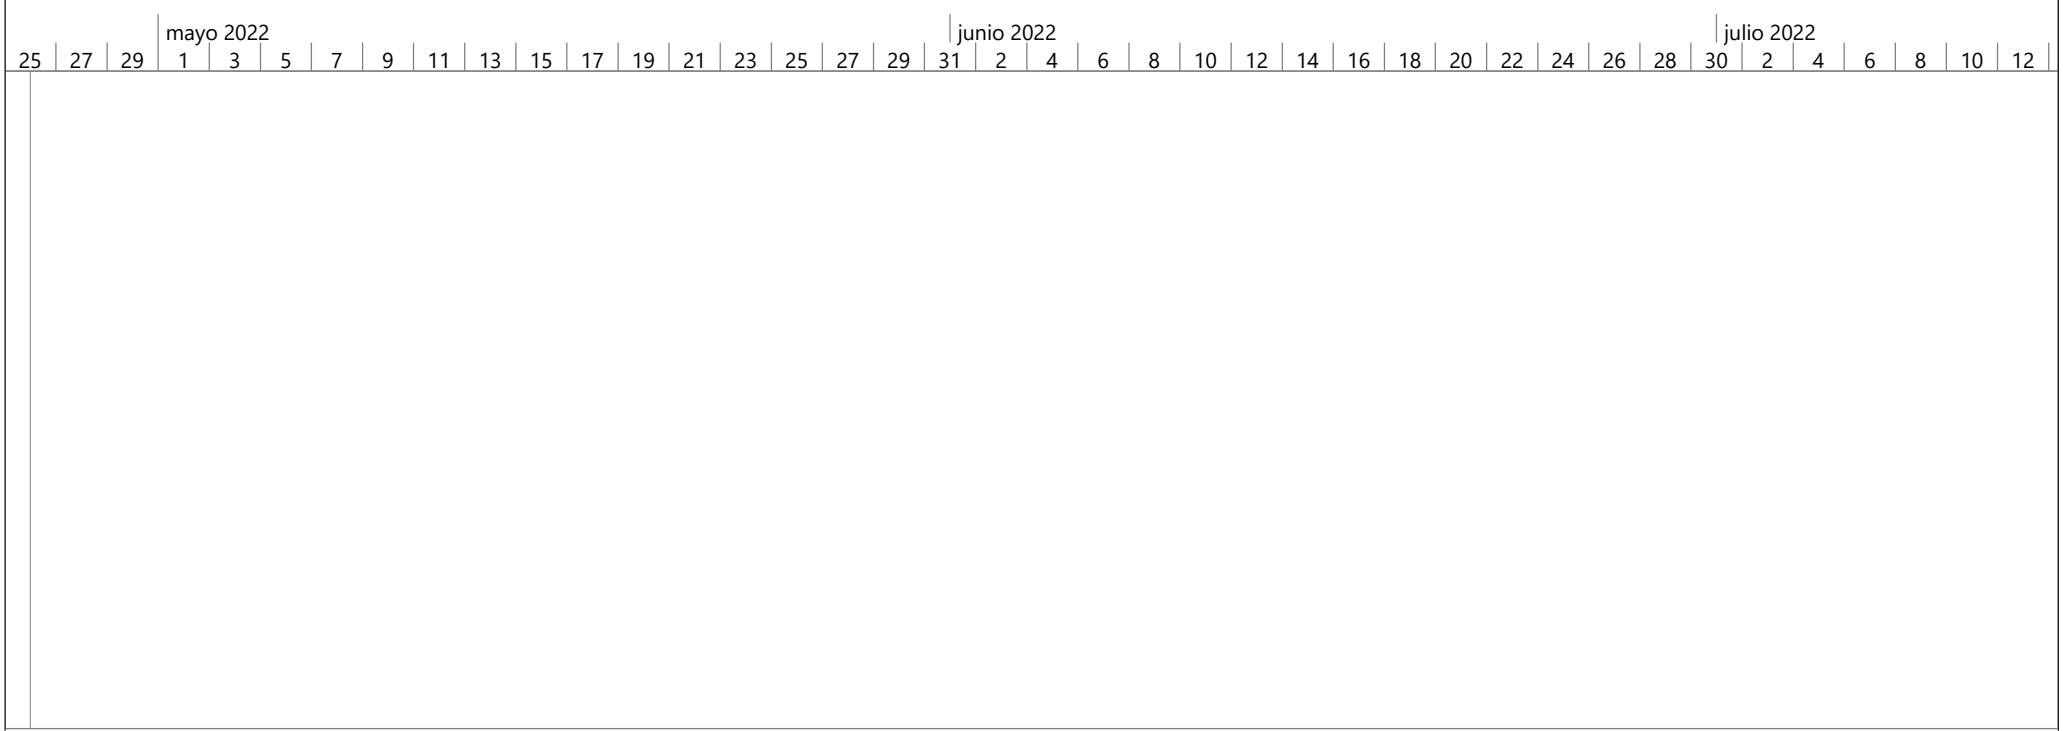

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

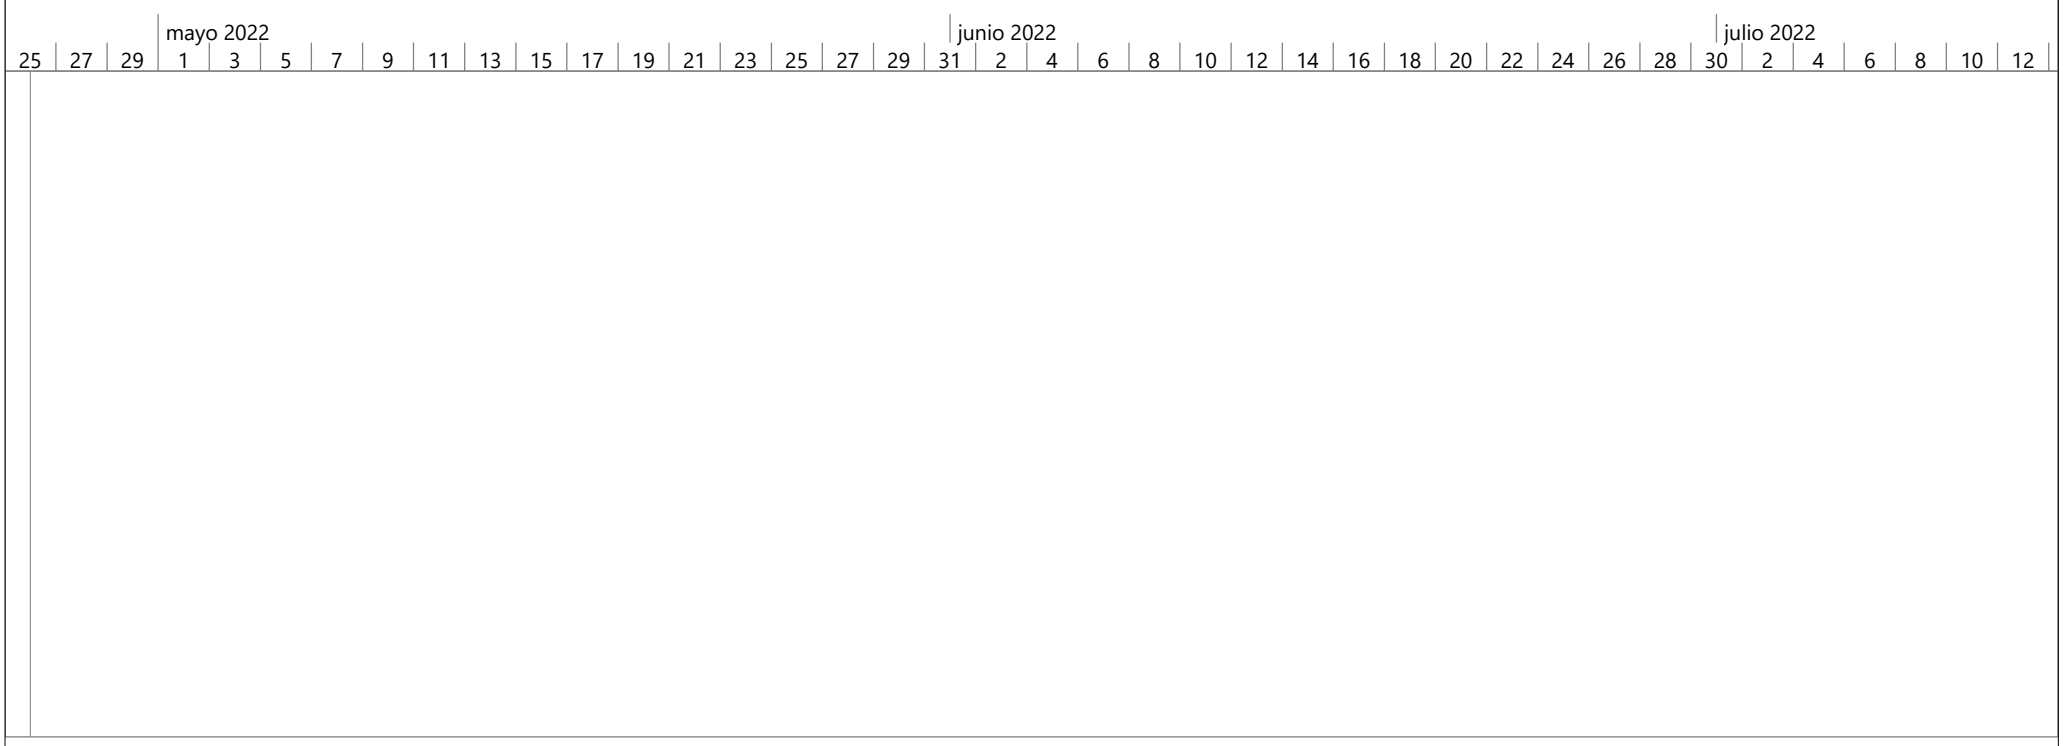

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

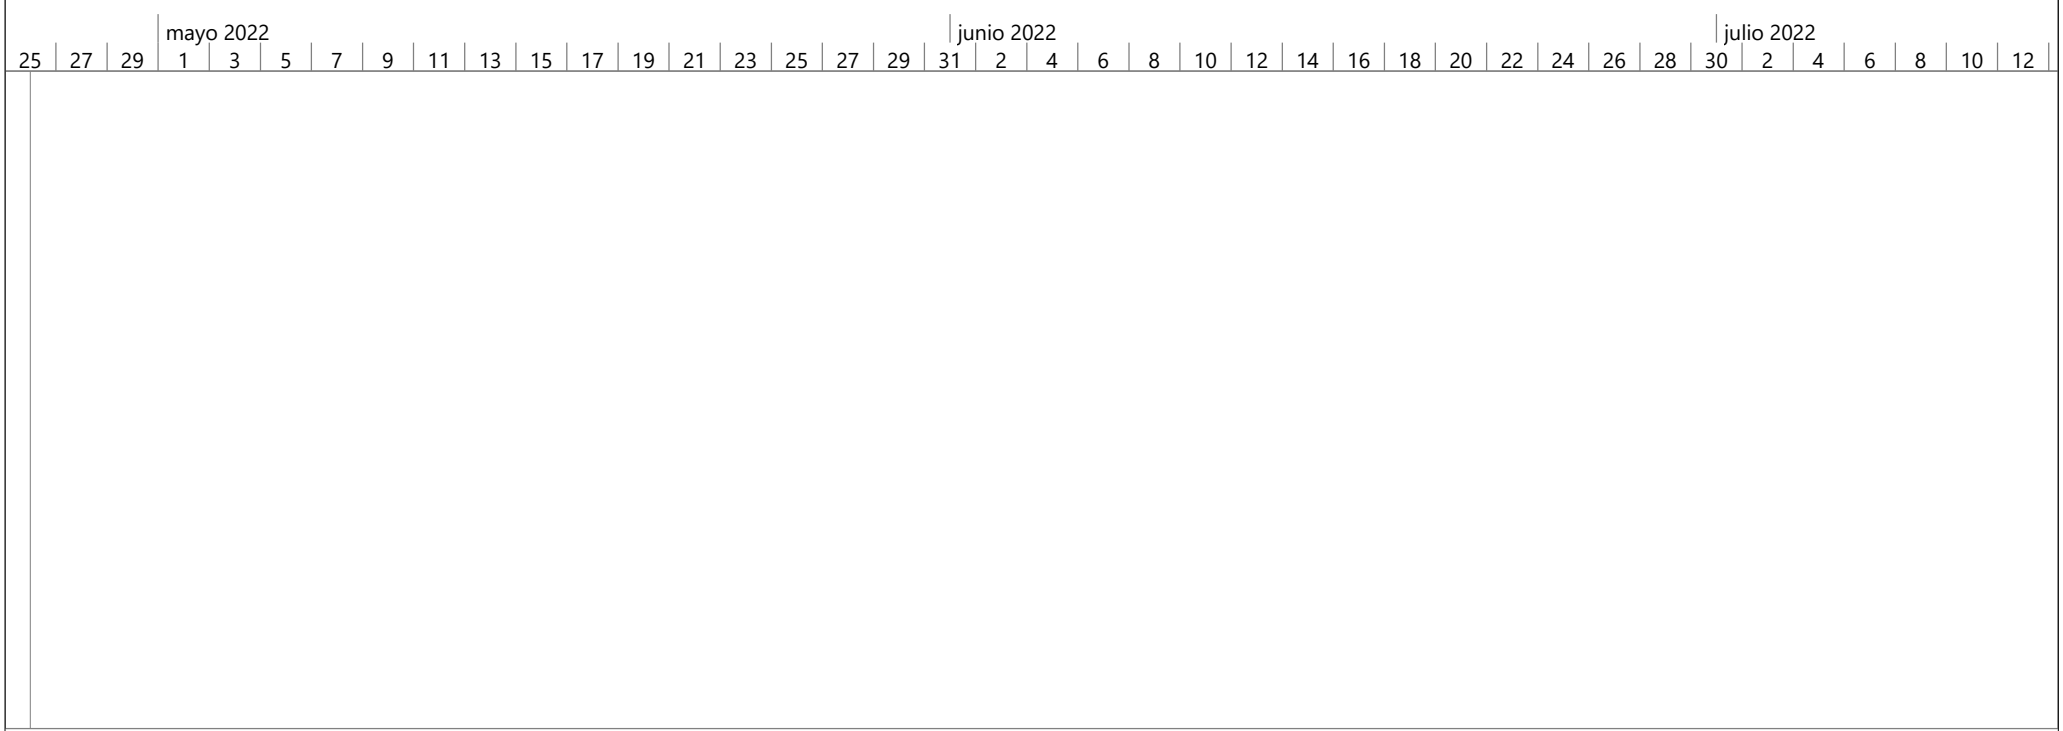

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

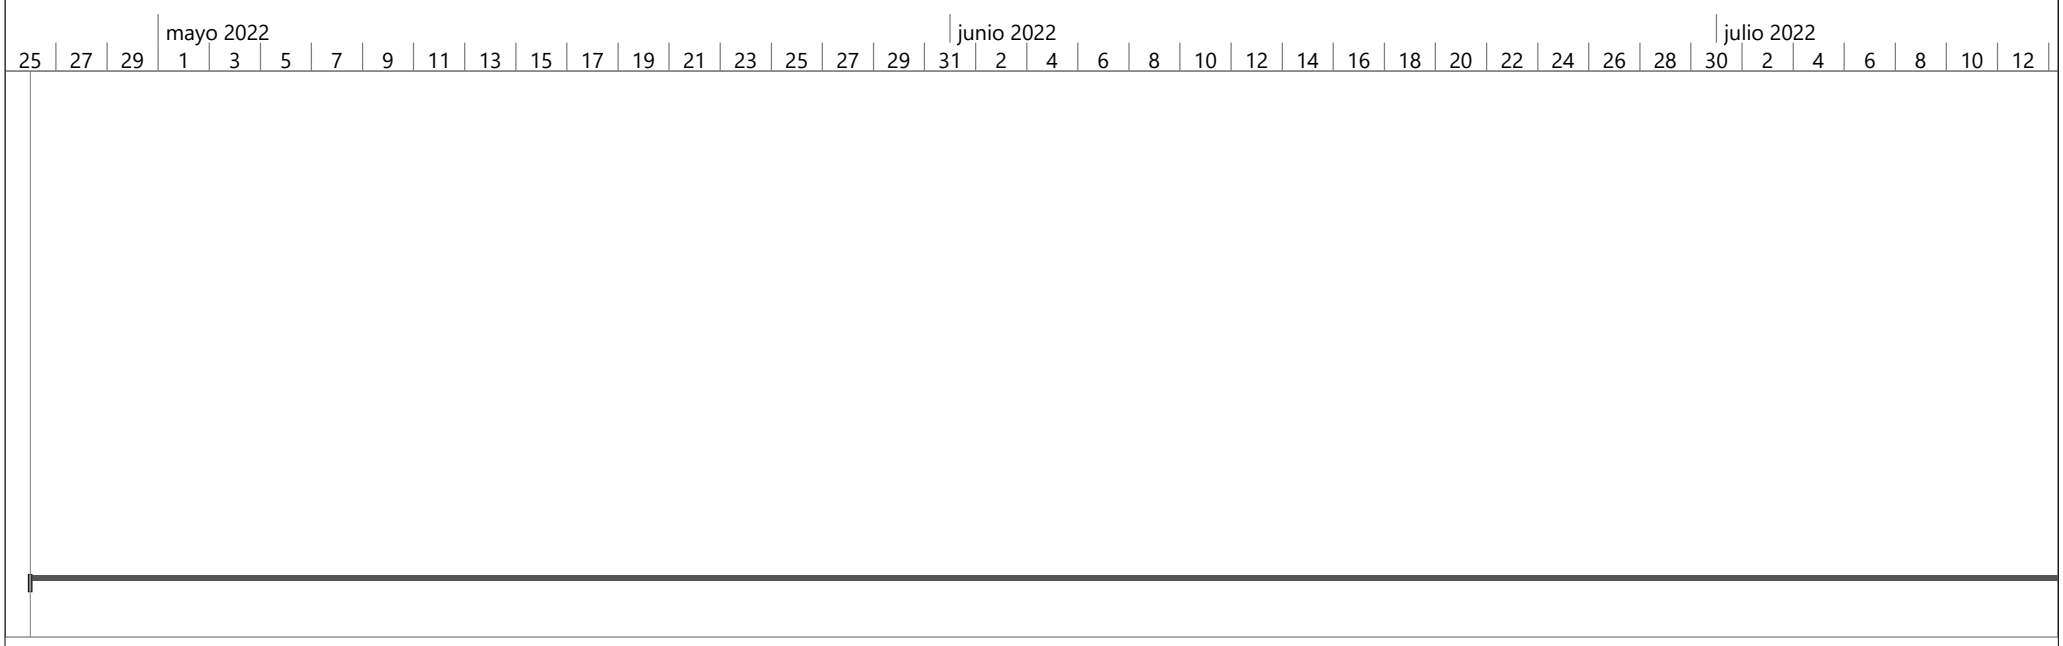

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

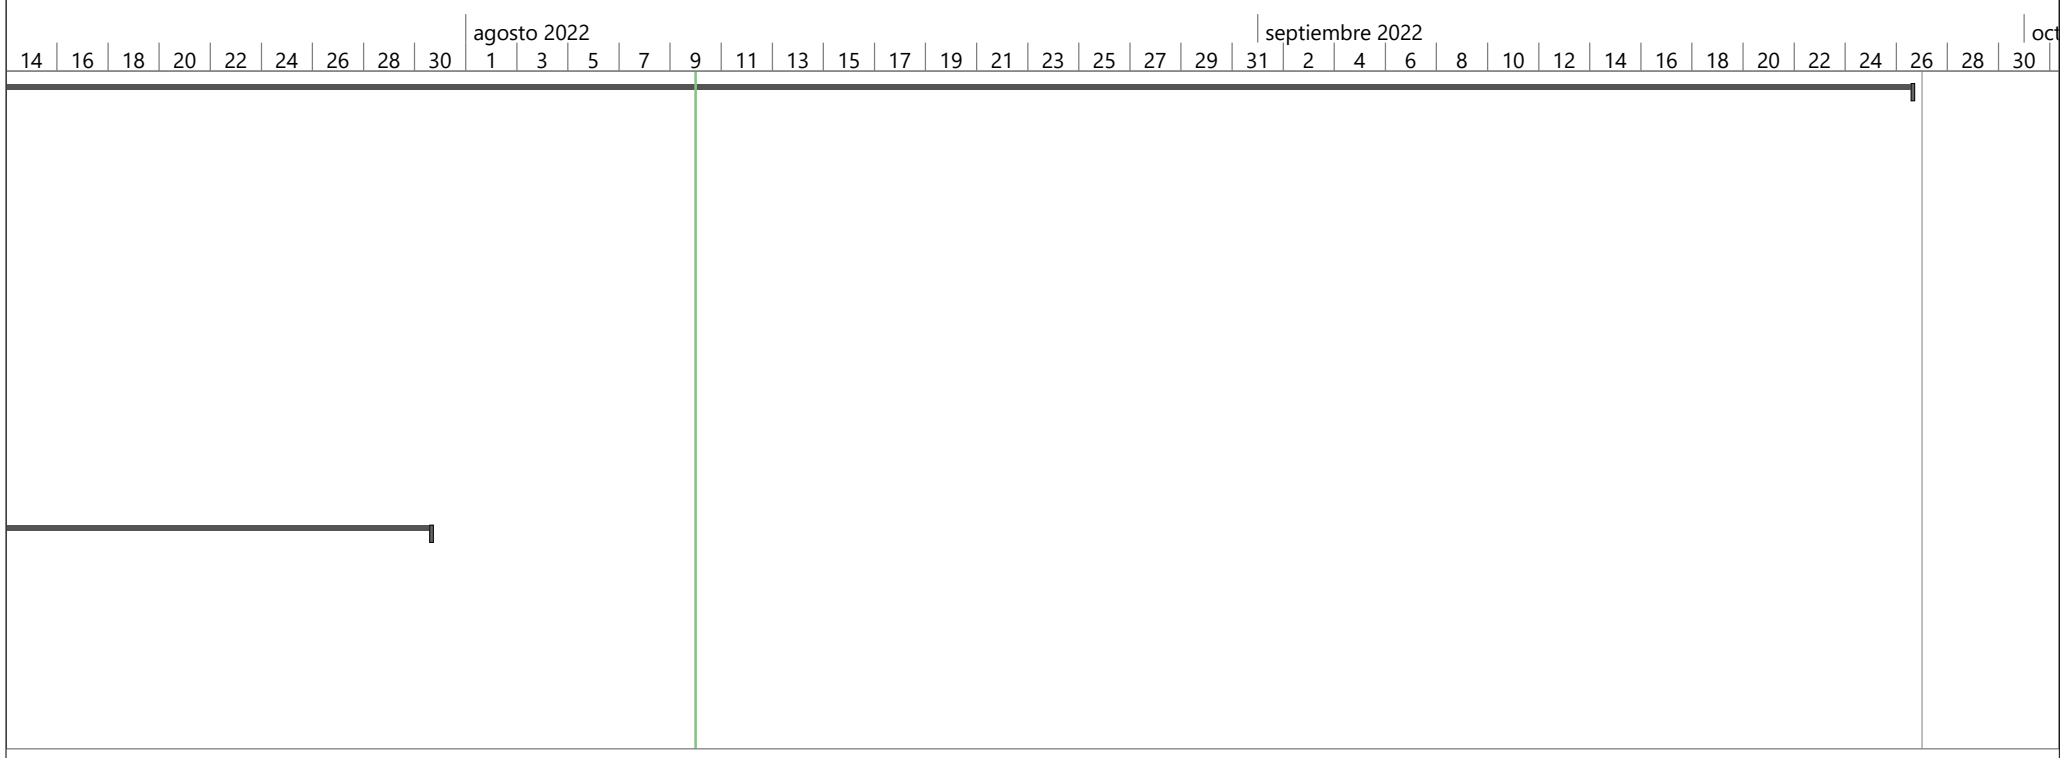

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

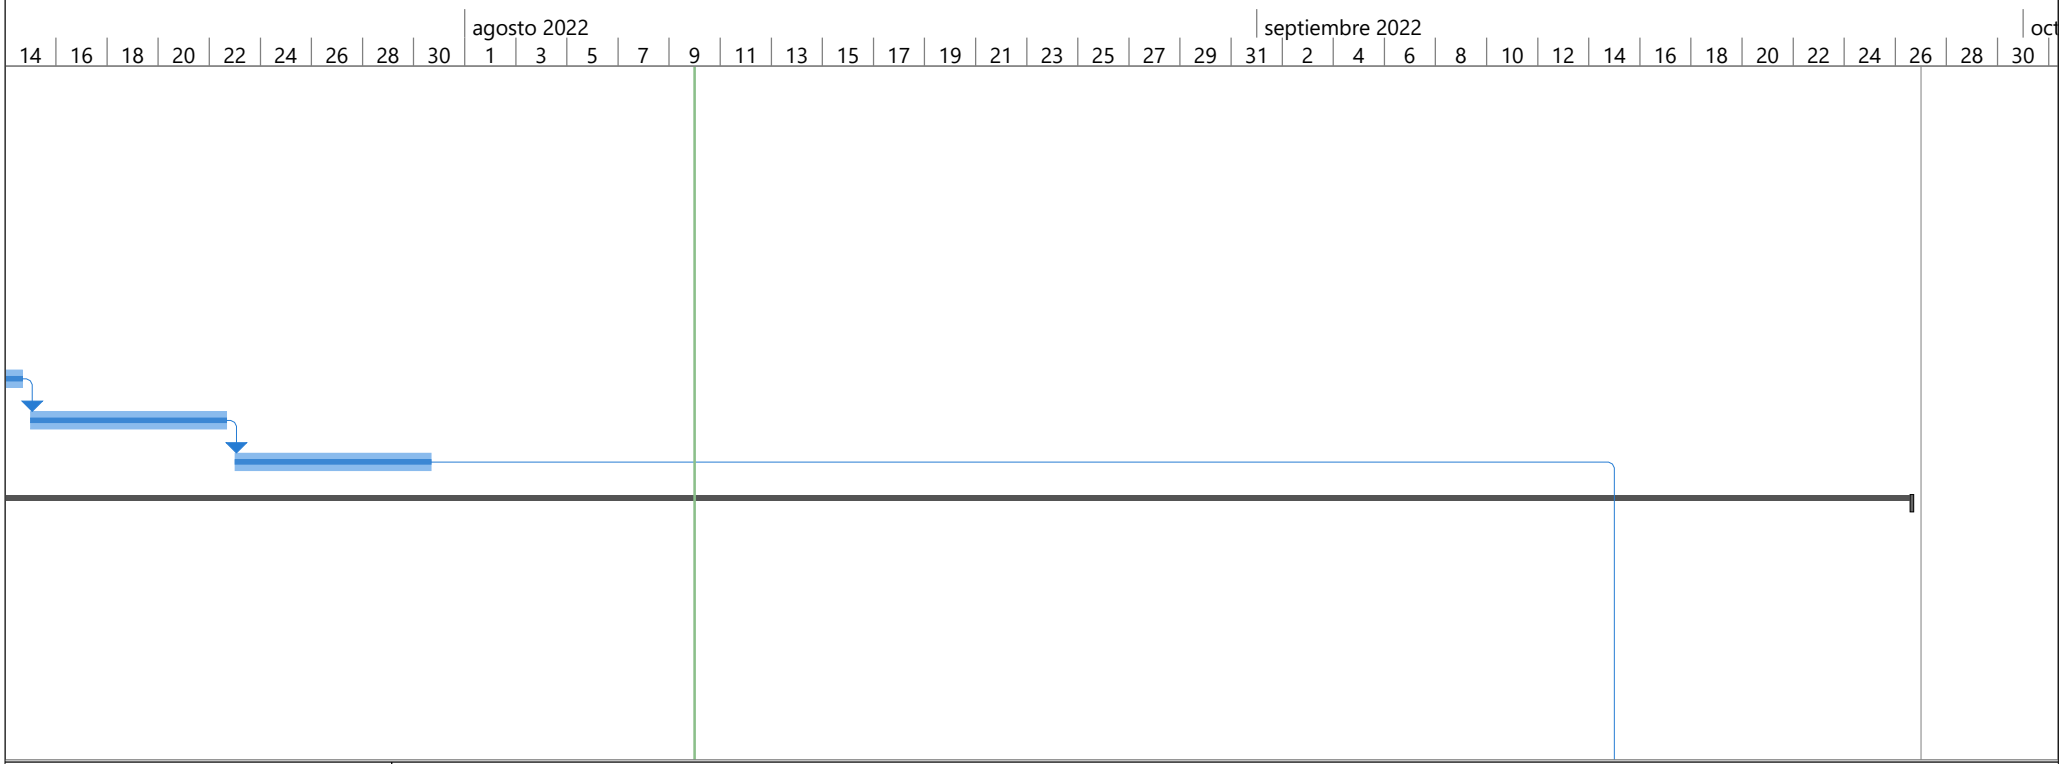

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

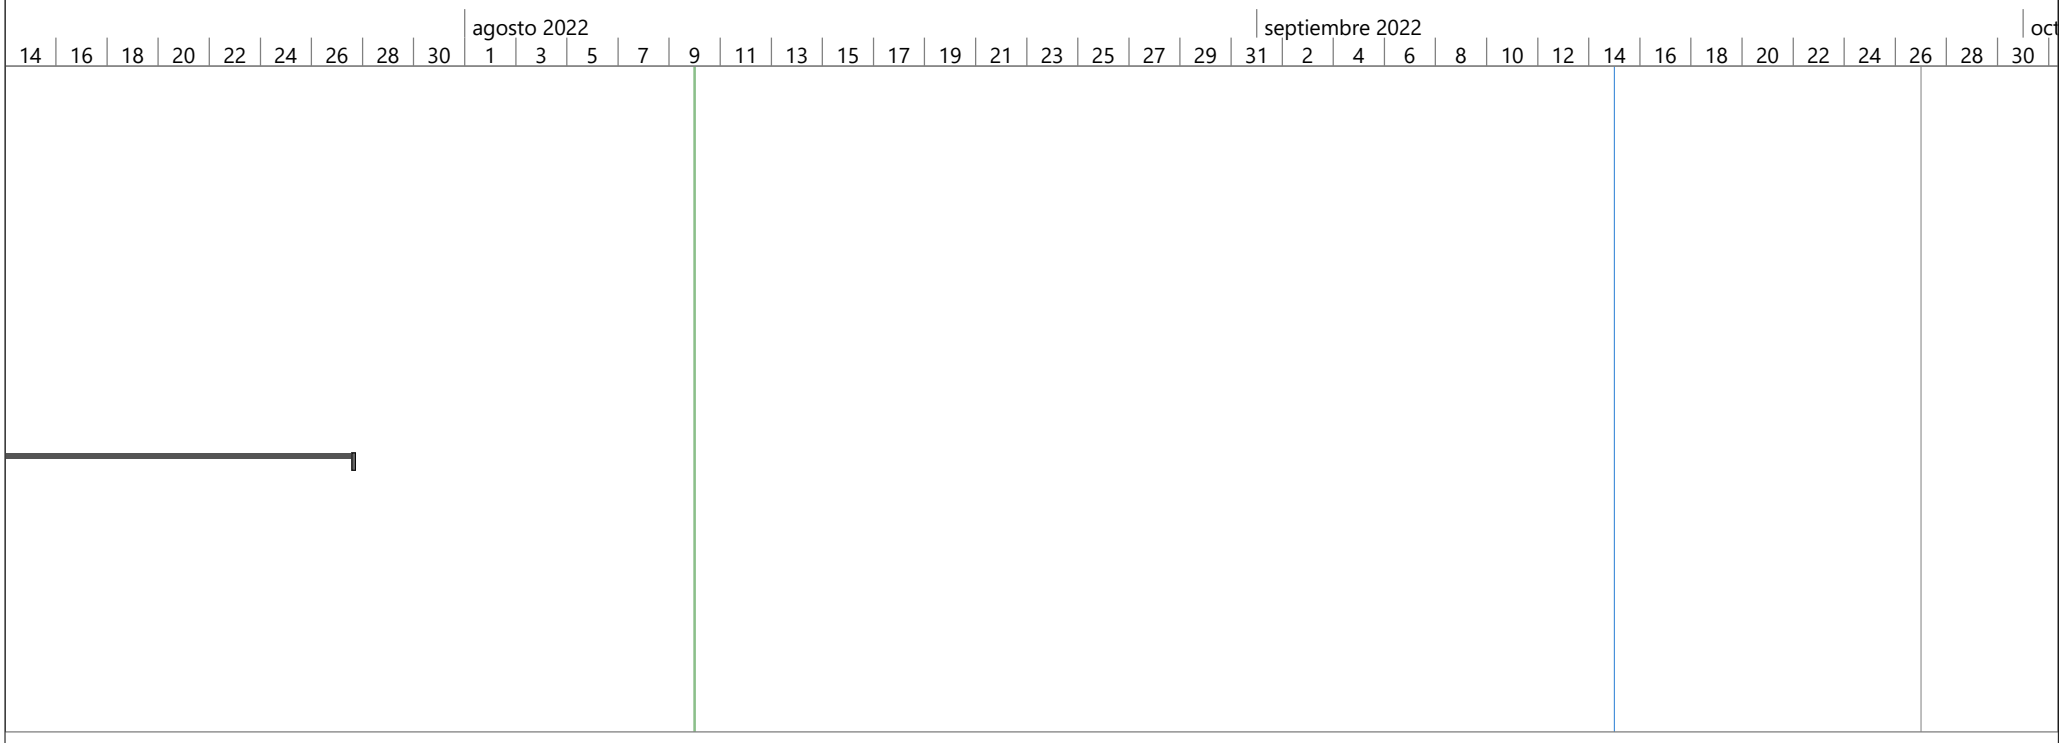

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

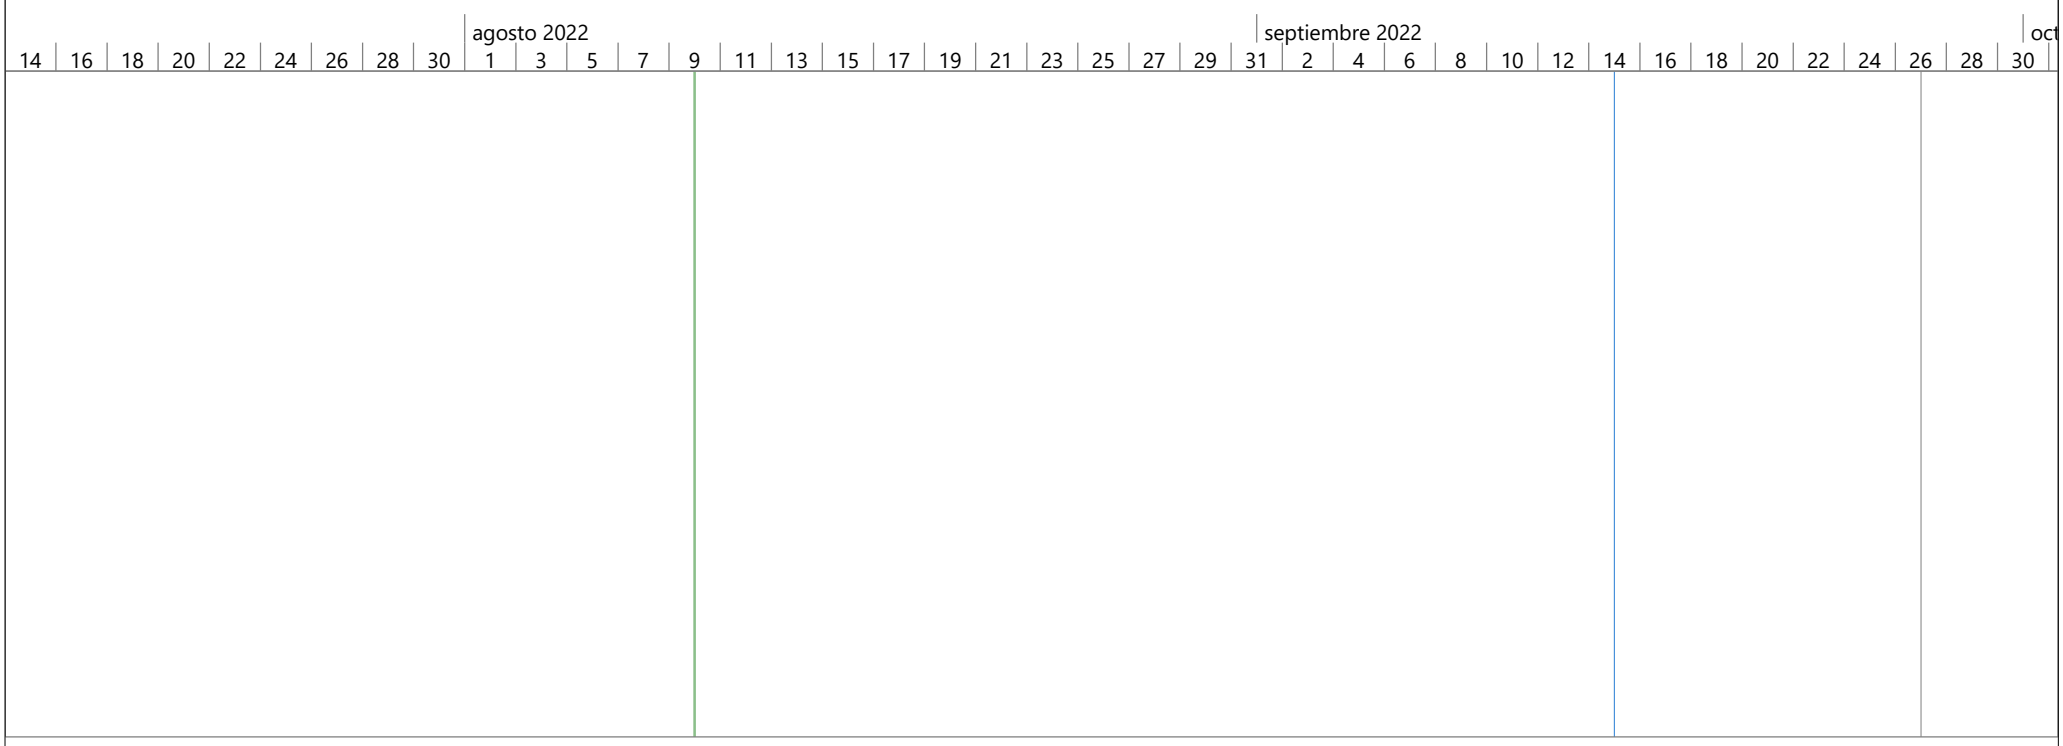

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

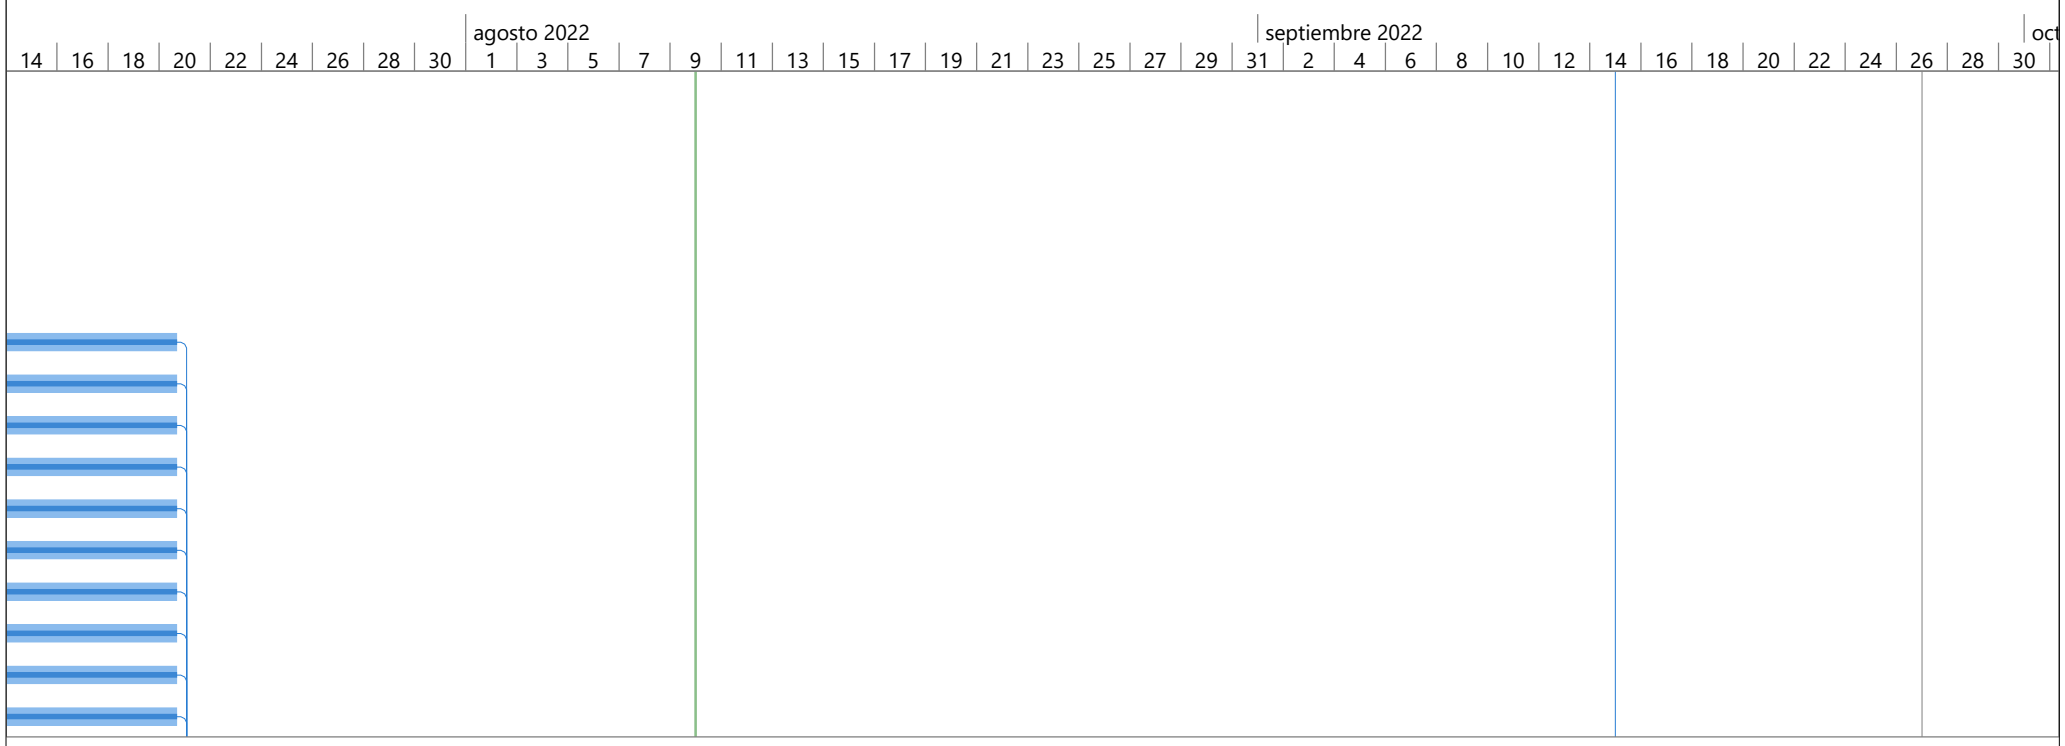

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

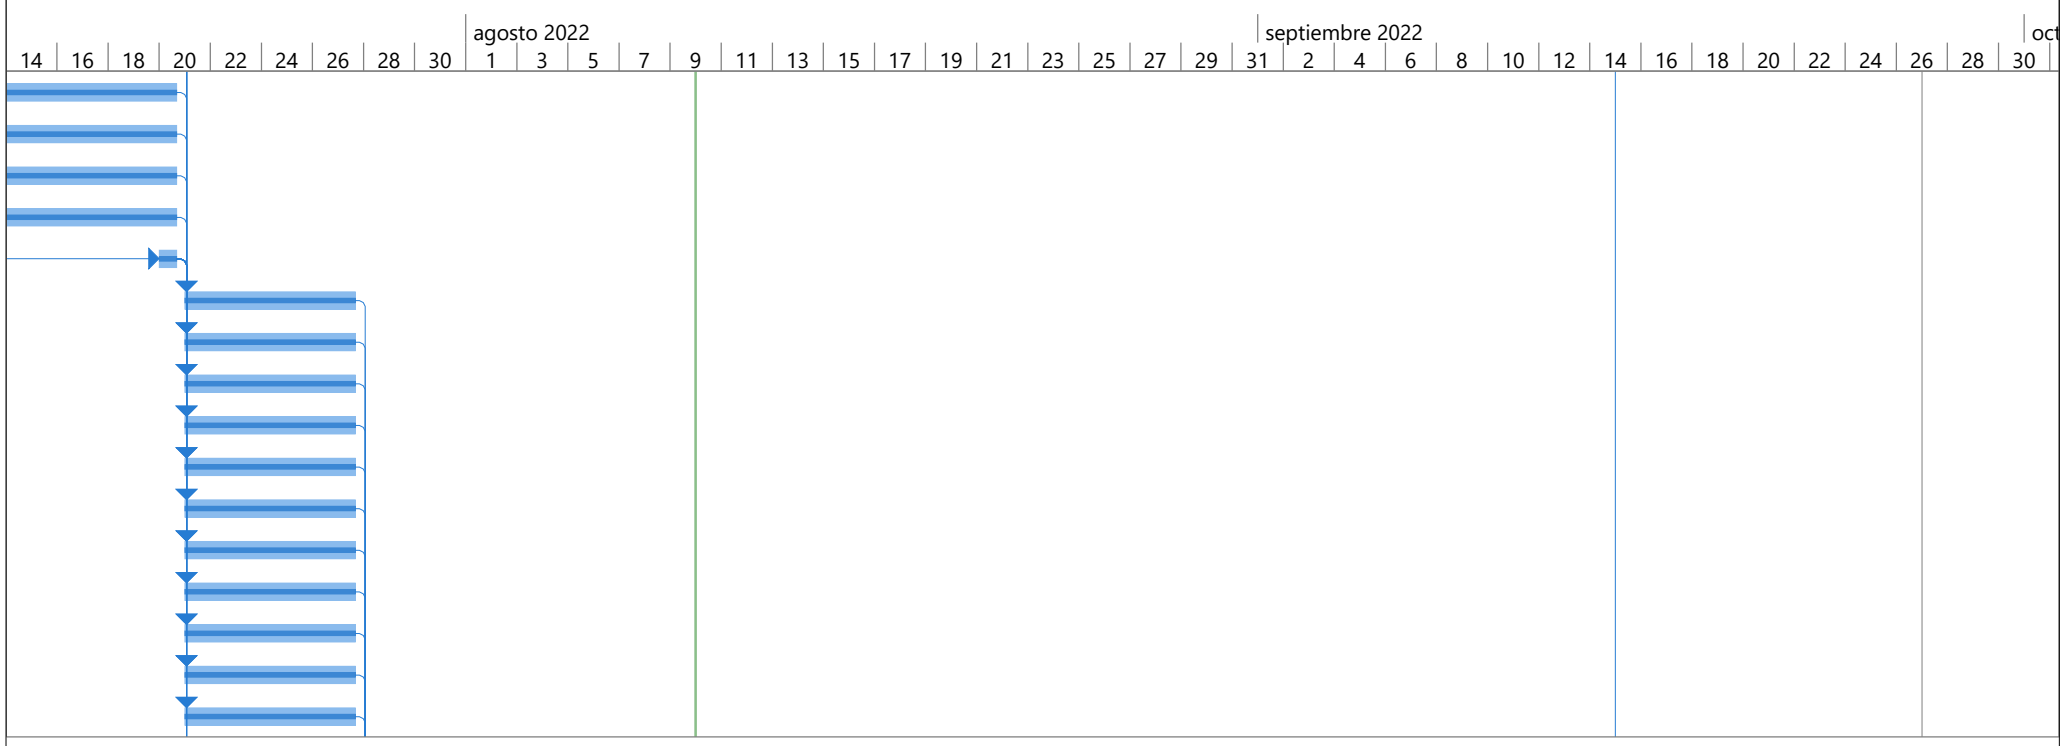

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

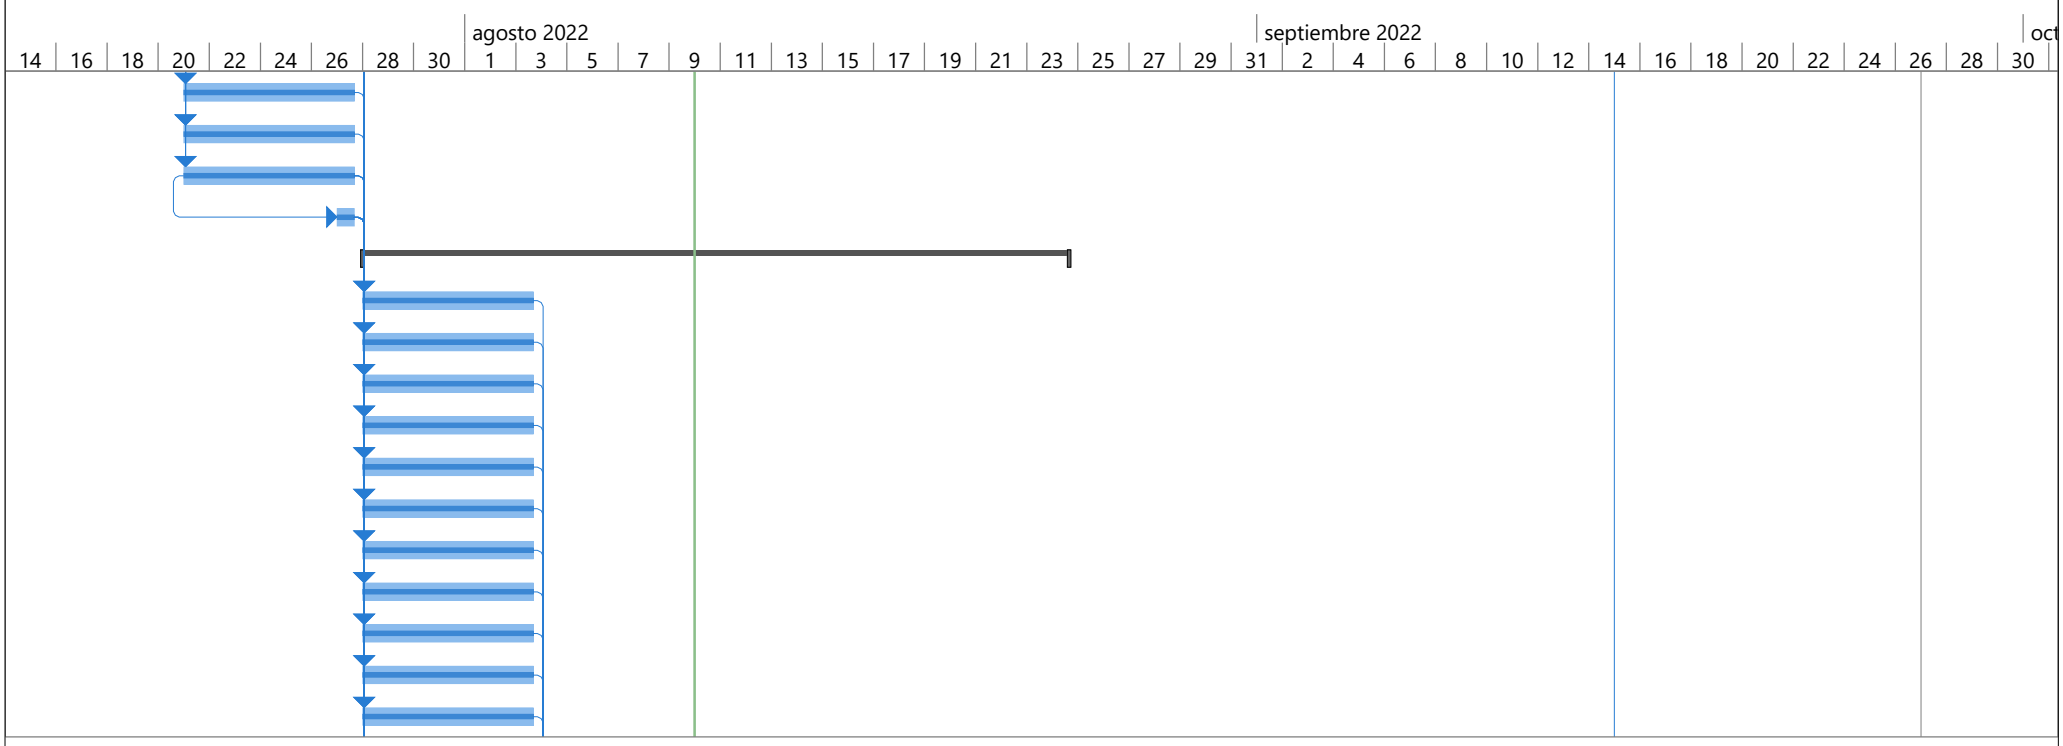

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

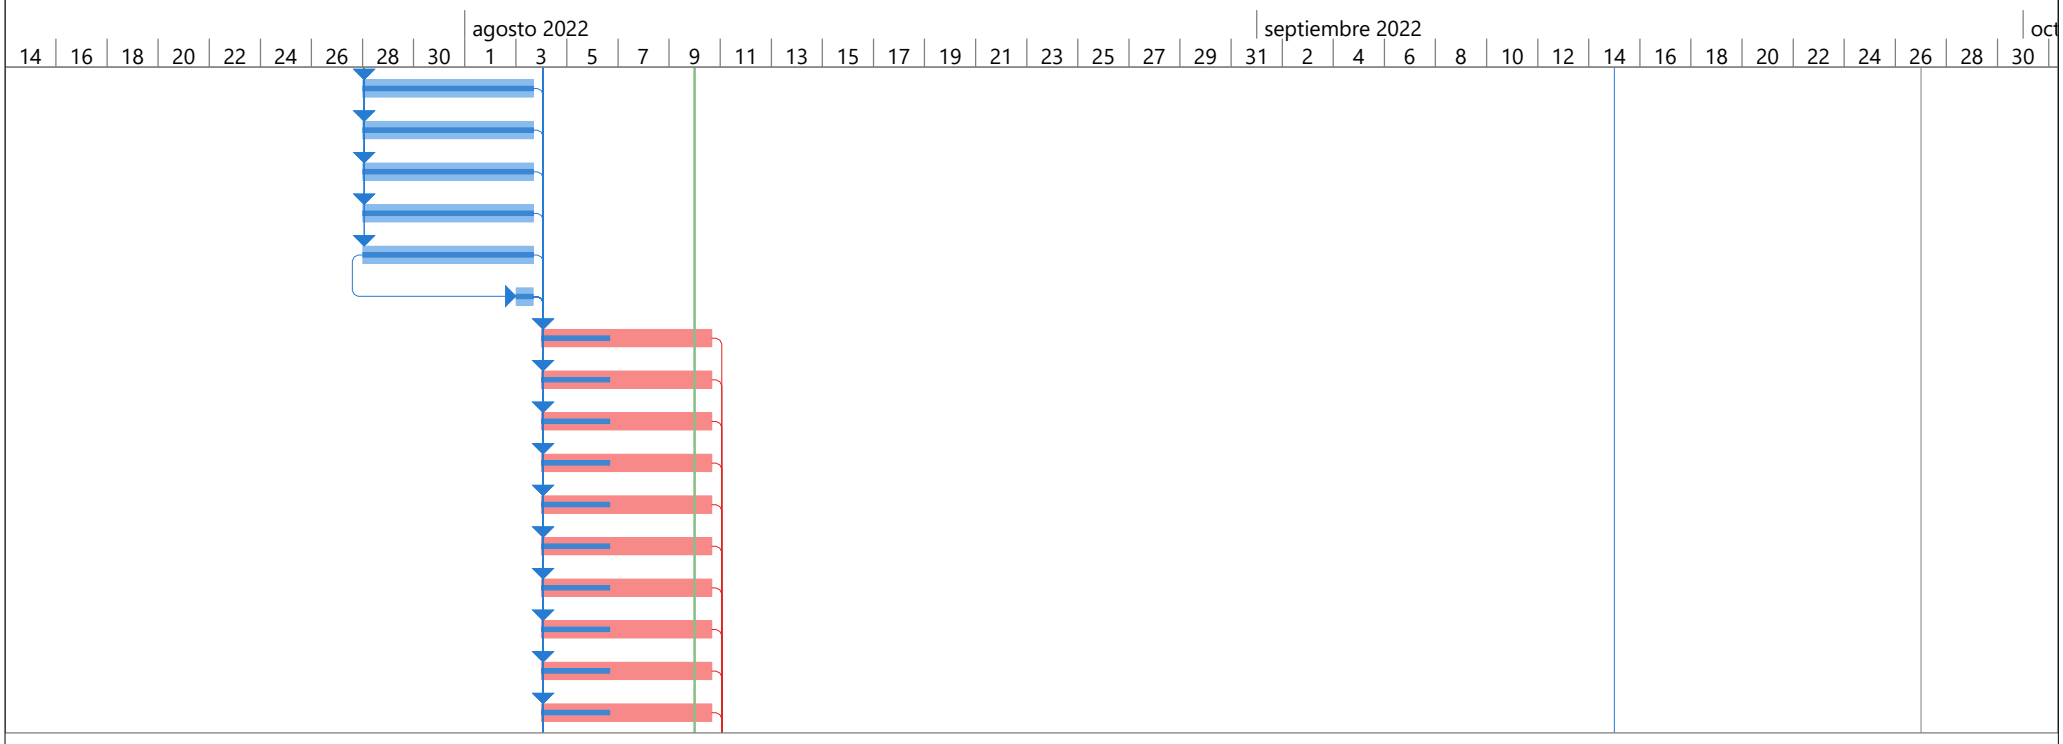

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

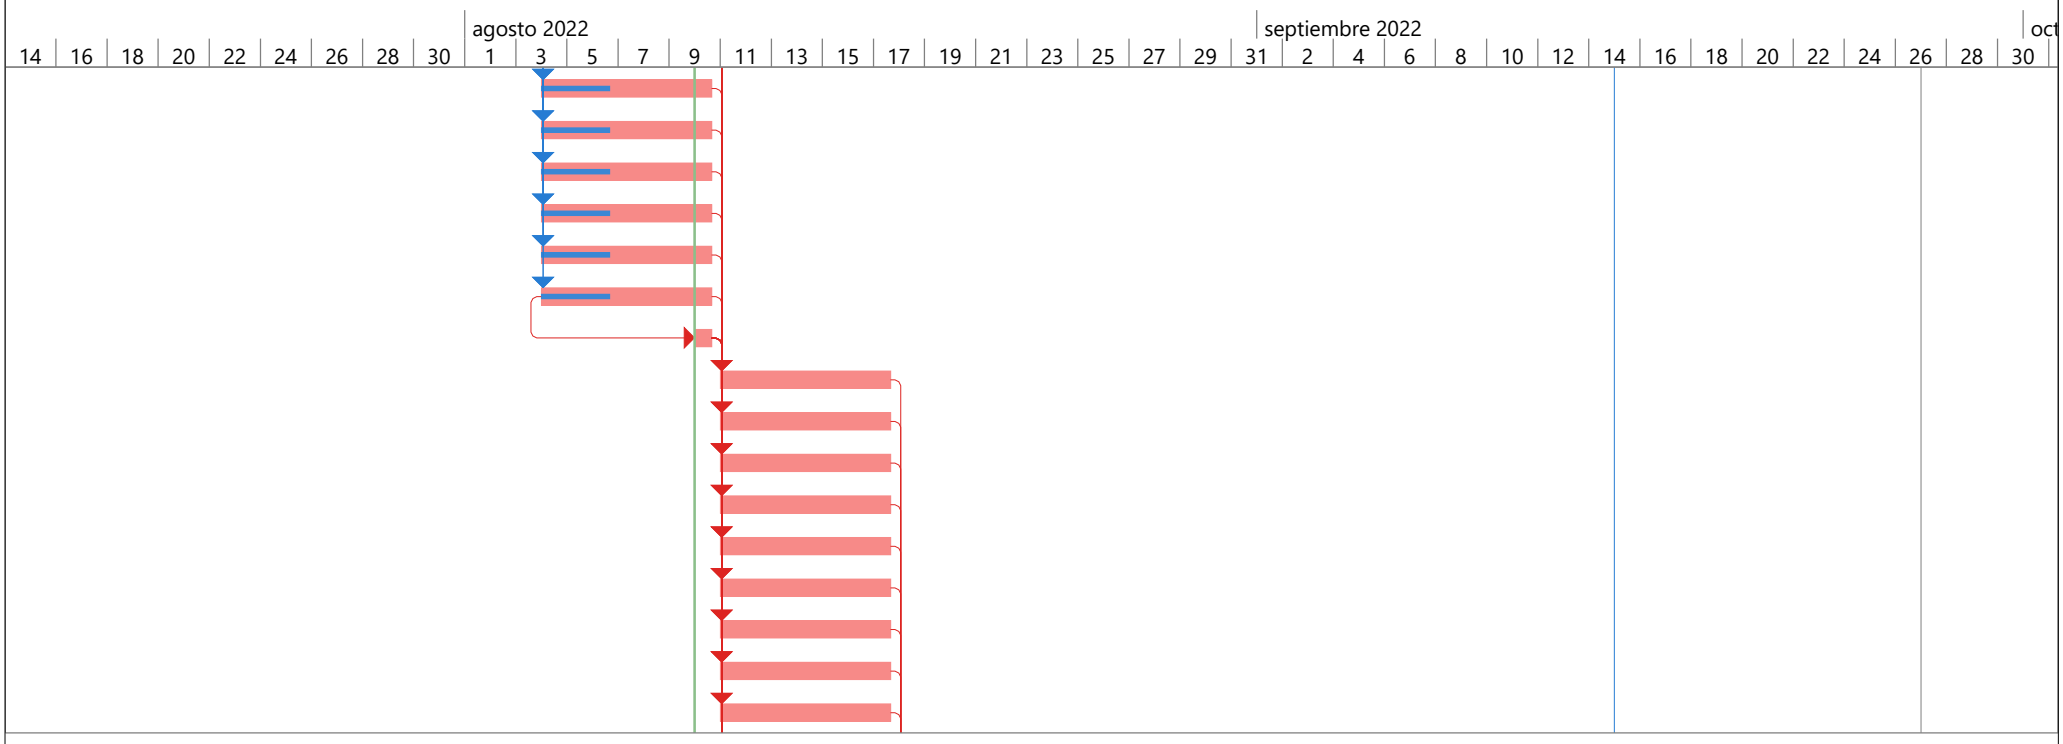

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

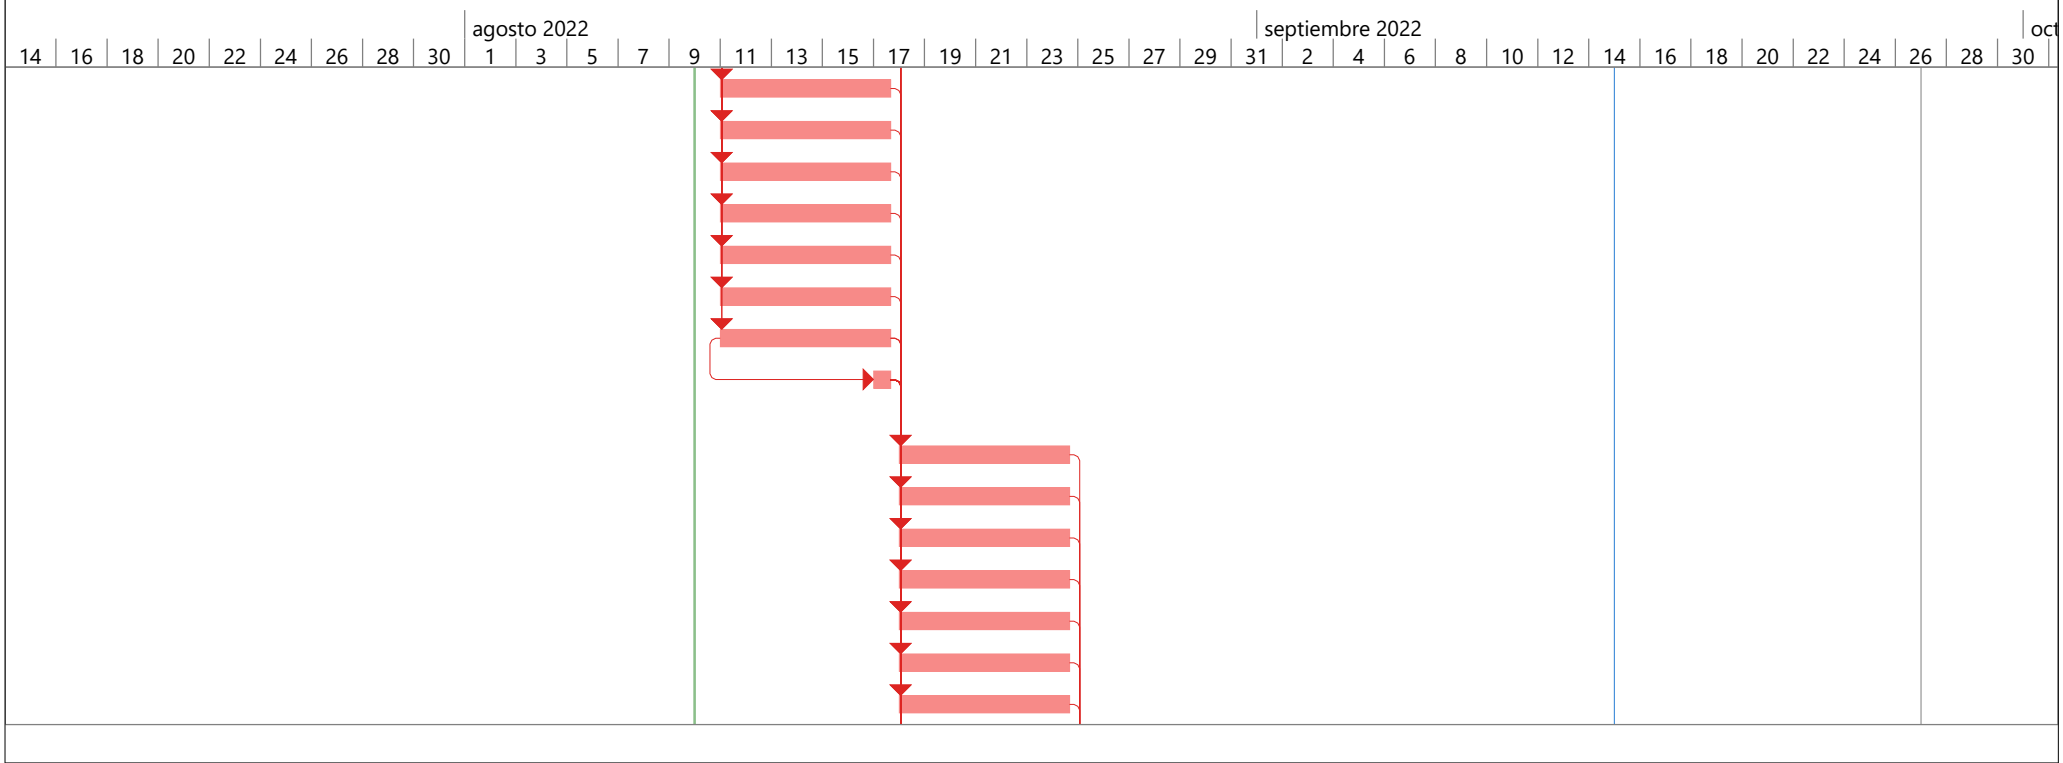

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

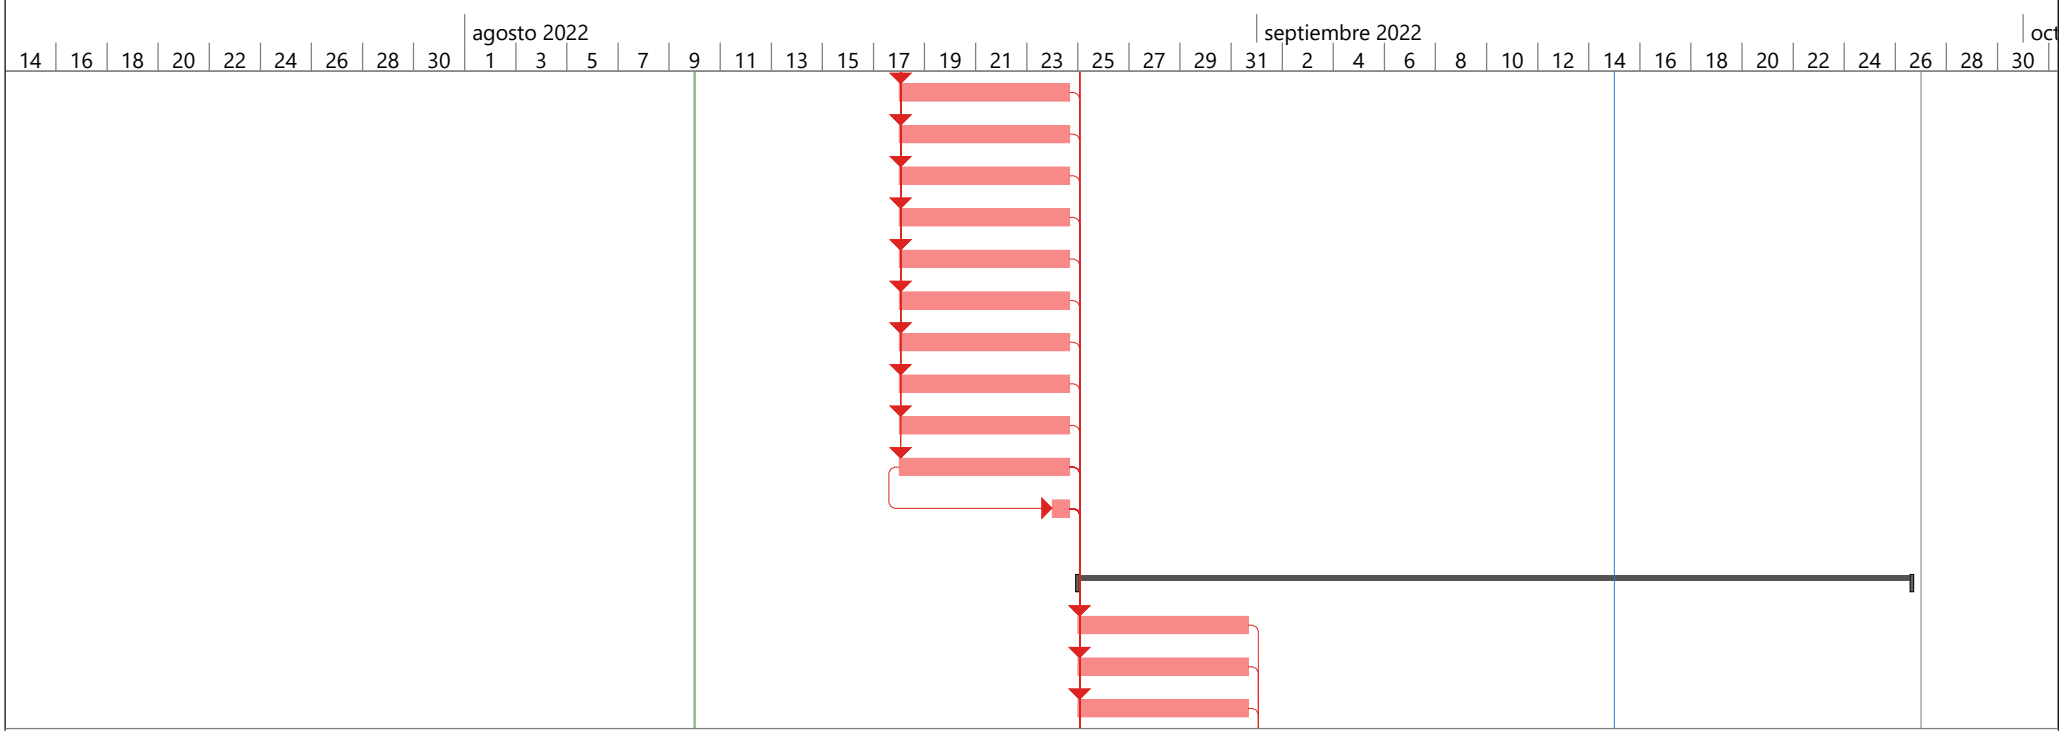

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

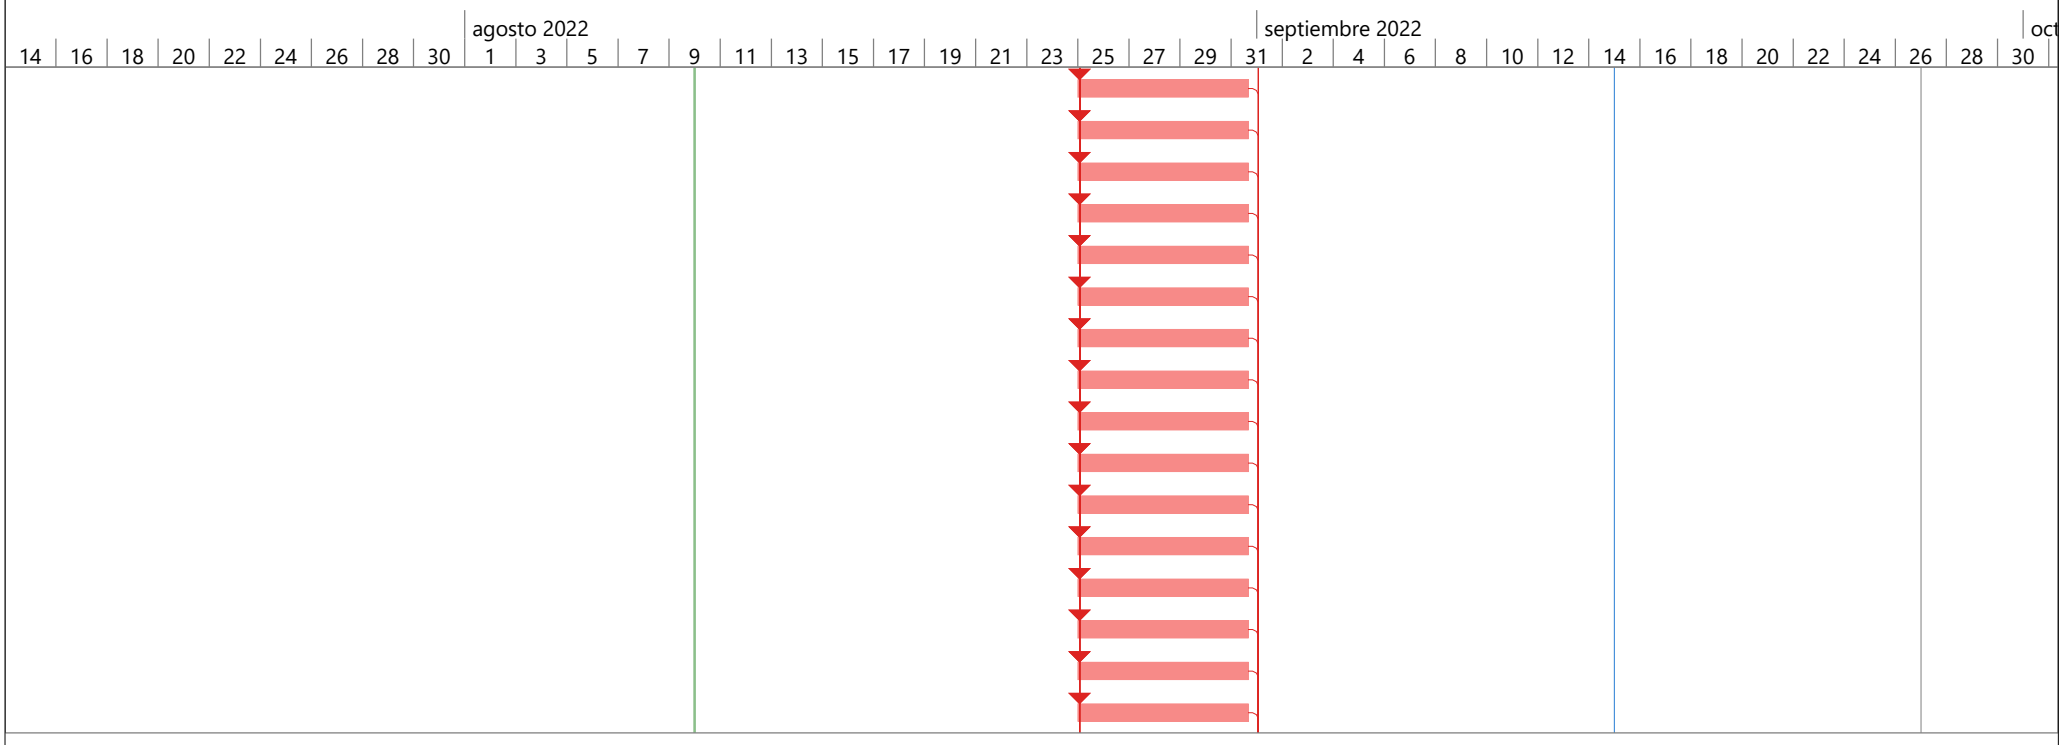

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

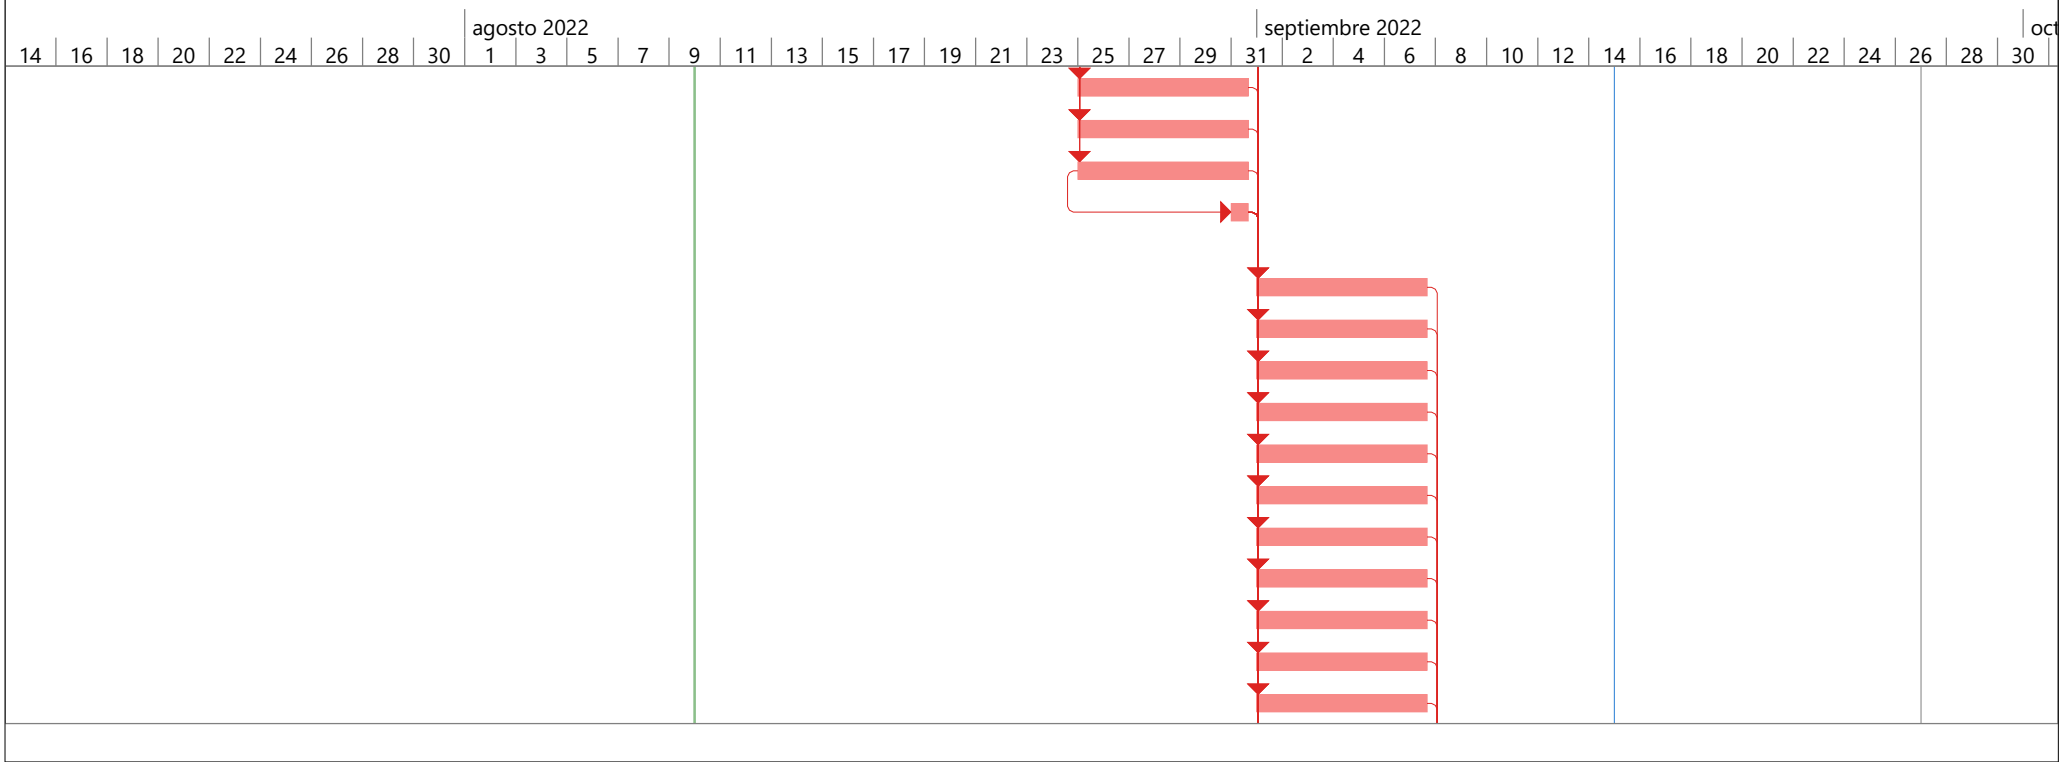

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

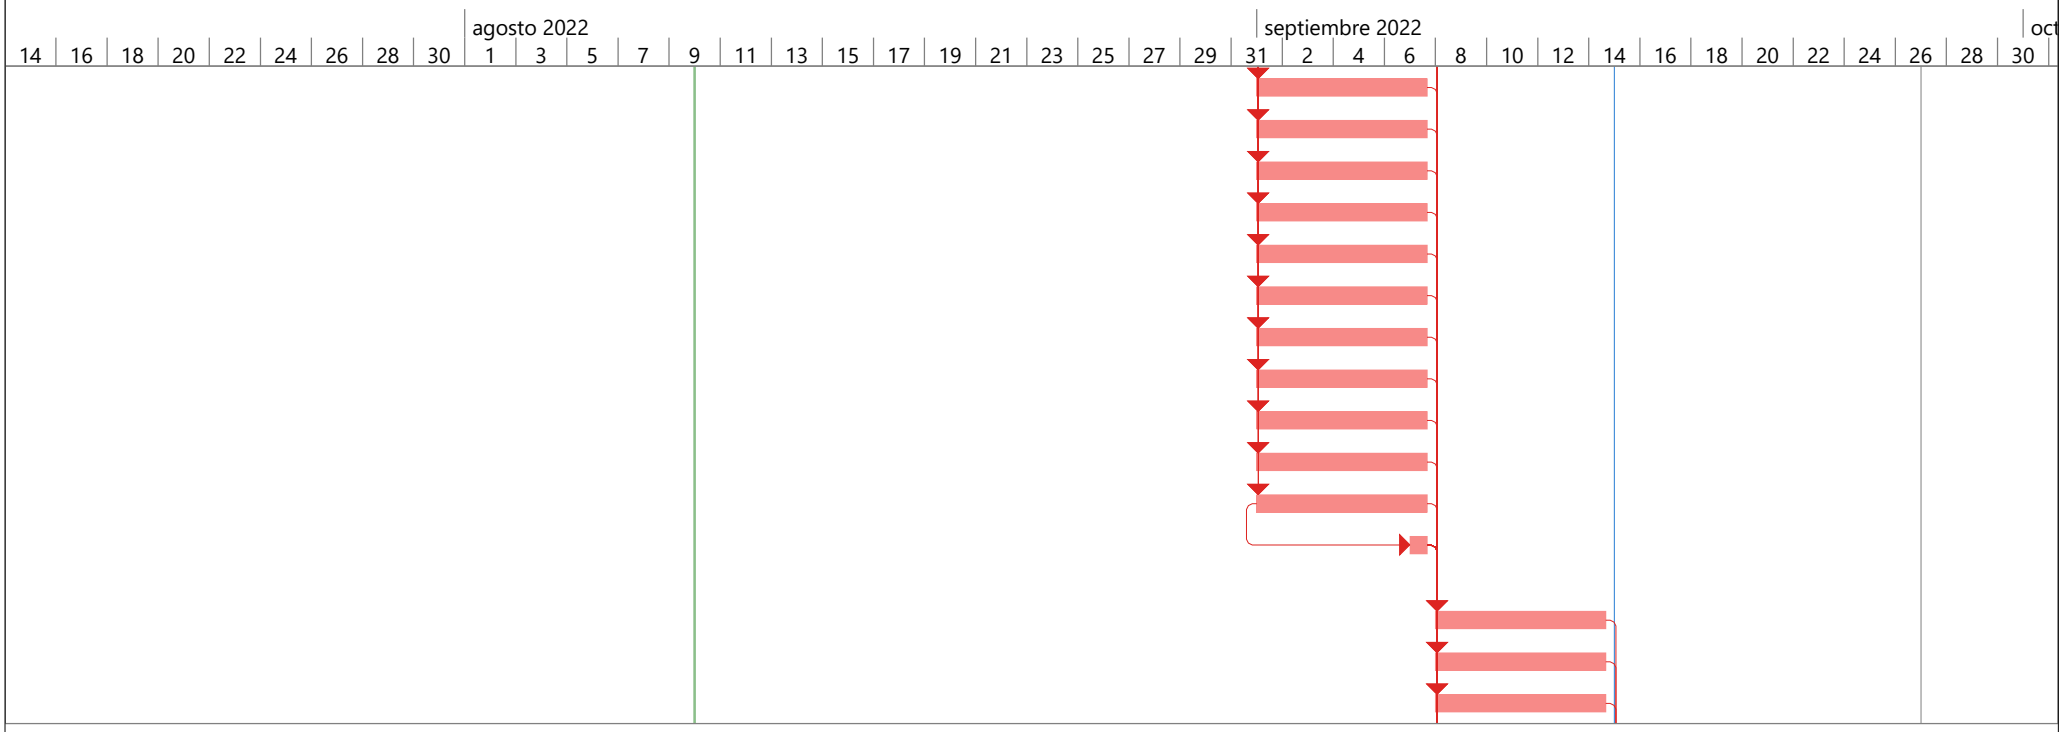

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

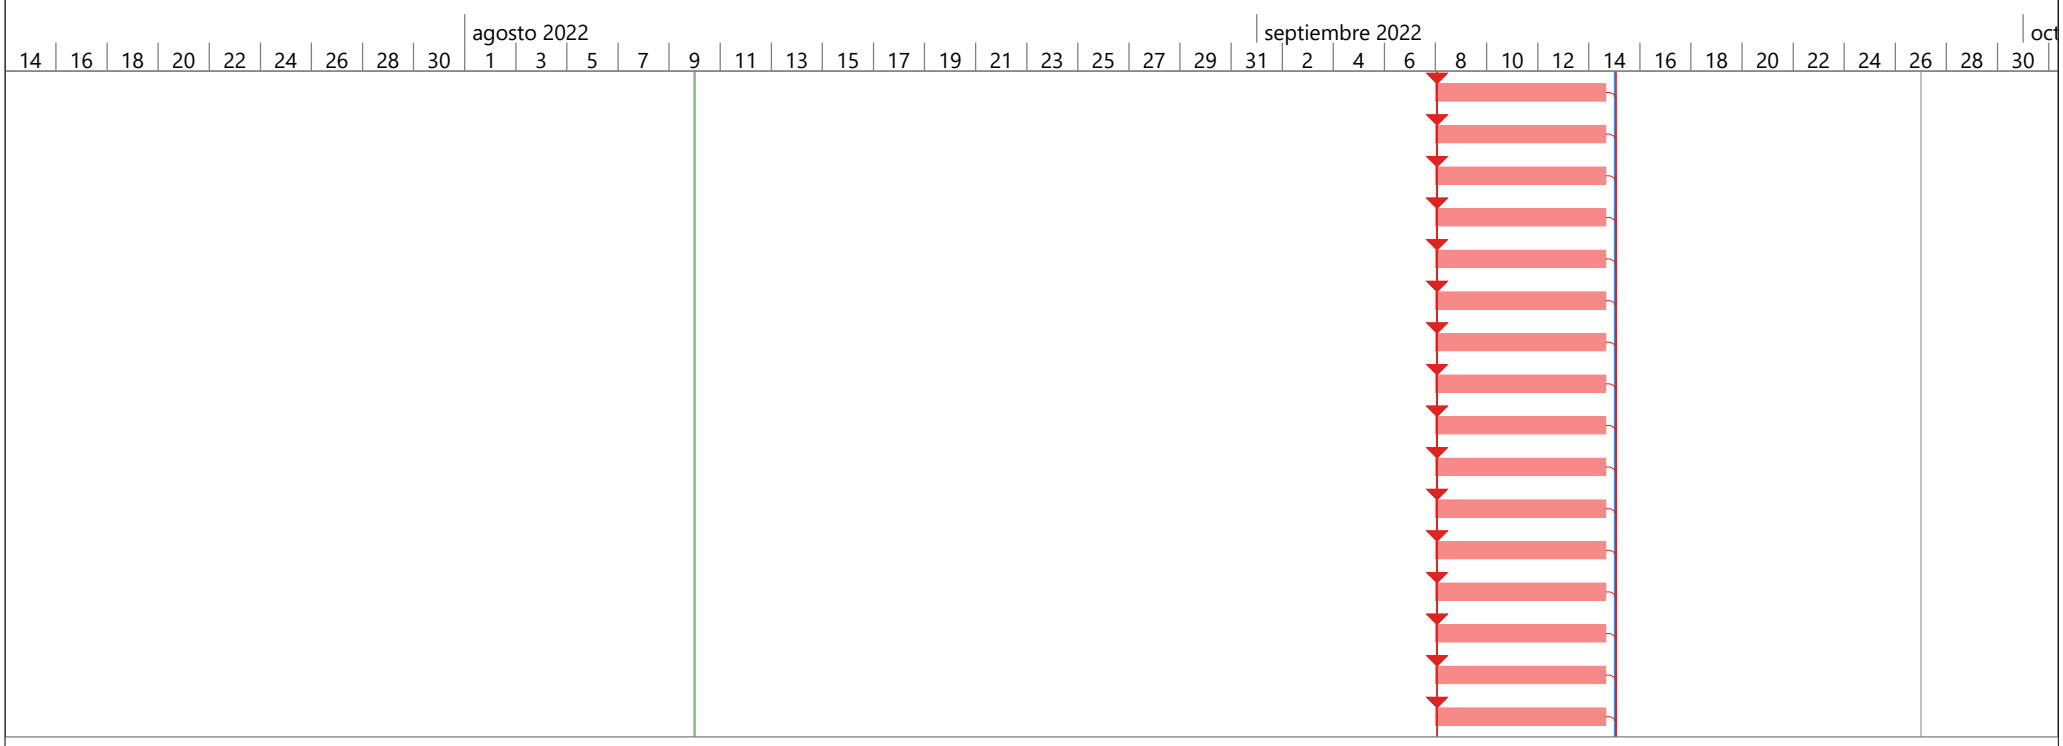

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

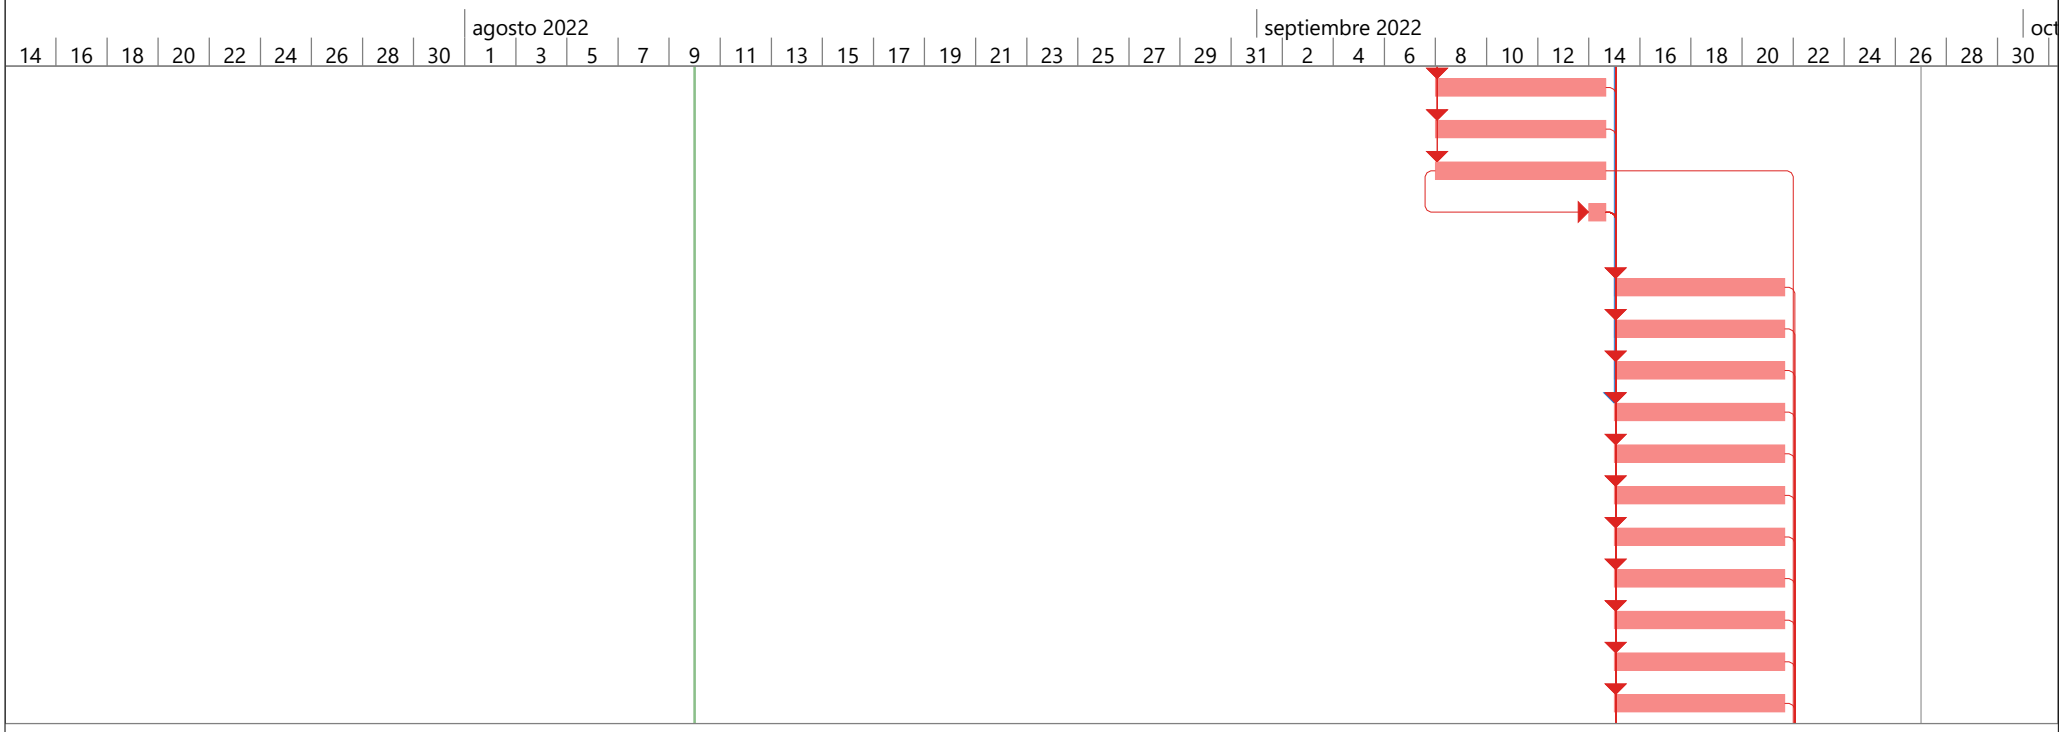

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

REPROGRAMACION CONTRATO DE OBRA No. 2220576 DE 2022 - CONSORCIO CONSTRUREDES

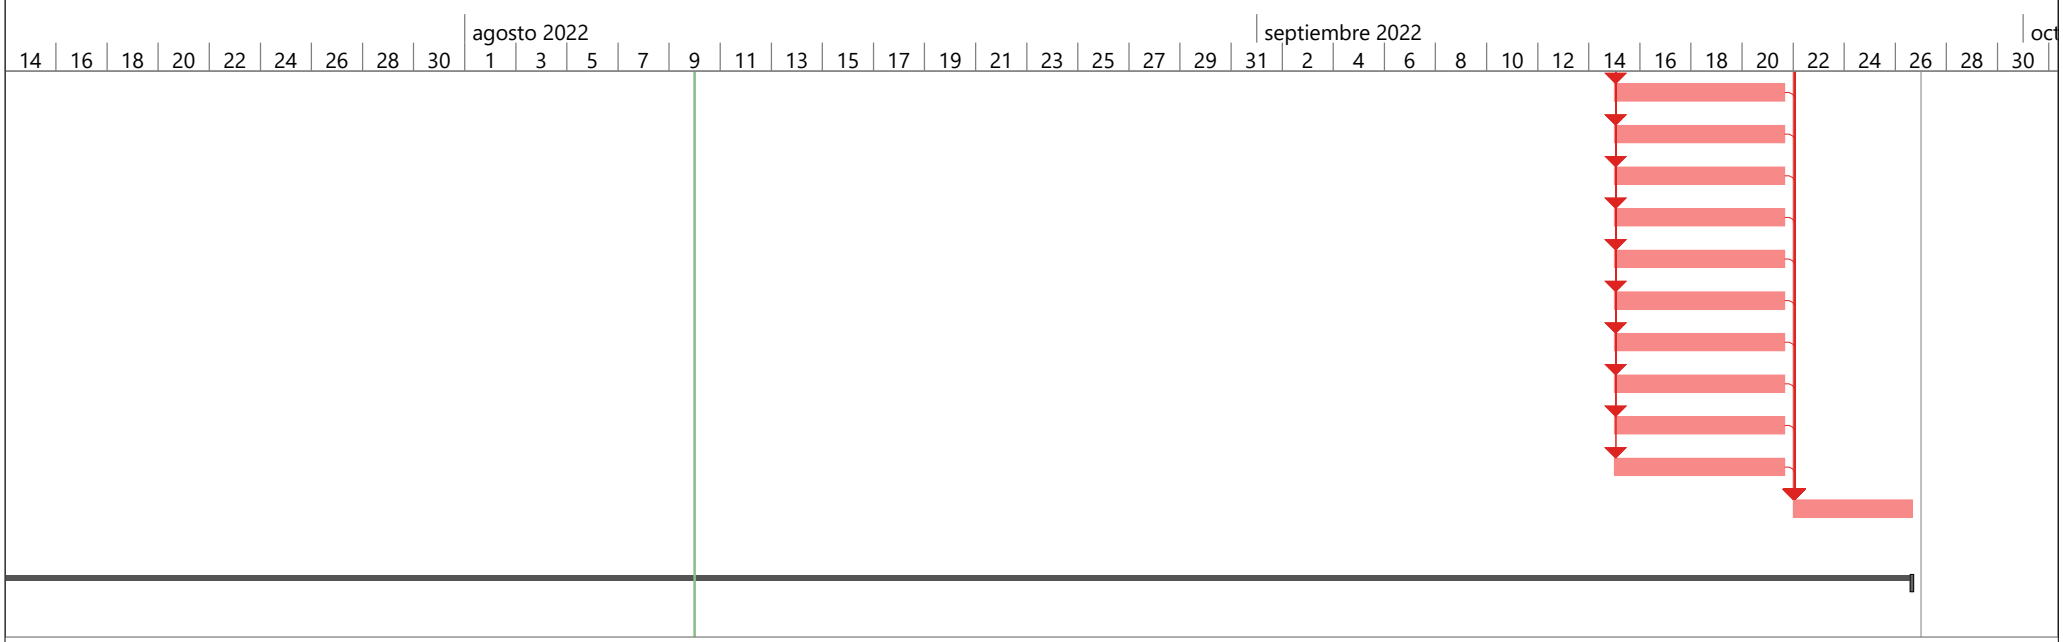

Proyecto: Programacion Cordo
Fecha: mié 10/08/22

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

ADMON

Bogotá D.C, 22 de agosto de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-090-22

Señores:
Ingeniera
Karol Yulieth Javela
Supervisora
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio
Calle 26 # 13-19 Piso 20
Bogotá. Colombia

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: REMISIÓN INFORMES SEMANALES 16.

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales remitimos informe semanal 16 correspondiente al periodo del 08 de agosto del 2022 al 14 de agosto del 2022, para fines pertinentes.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 22/08/2022
HORA: 10:26:49 a. m.
20224300312042

FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA
Anexo: 24 folios
Proyectó: Jineth Marcela Gordillo – Residente Admón.
Reviso: Ing. Marcy Correa – Directora de Interventoría

INFORME SEMANAL 16

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 16	CÓDIGO:	F-GG-06
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 016

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **8/08/2022** al **14/08/2022** | Fecha **14/08/2022**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO PROYECTO	
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** BOLIVAR — **MUNICIPIO** CORDOBA
GERENCIA A CARGO	ENTERRITORIO
SUPERVISOR	KAROL YULIETH JAVELA PEREZ
ESTADO DEL PROYECTO	EN EJECUCION ACTIVIDAD 2 Y 3

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2220576		
Contratista	CONSORCIO CONSTRUREDES		
Valor inicial	$ 1.771.707.945,99		
Valor actual	$ 1.771.707.945,99		
Variación del valor	$ -		
Fecha de Inicio	26/04/2022		
Plazo inicial (Días)	150 Días		
Plazo actual (Días)	150 Días	5 MESES - 150 DIAS	
Variación en plazo	Días		
Fecha Contractual de terminación	26/09/2022		
Tiempo Transcurrido (días)	110	73,33%	
Días remanentes del Contrato	43,00	28,67%	
Acumulado a última acta pagada			
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ 476.424.039,52		

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.	2220587		
Interventor	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS.		
Valor inicial	$ 202.479.313,00		
Valor actual	$ 202.479.313,00		
Variación del valor	$ -		
Fecha de Inicio	26/04/2022		
Plazo inicial	150 Días		
Plazo actual	150 Días	5 MESES - 150 DIAS	
Variación en plazo	Días		
Fecha Contractual de terminación	26/09/2022		
Ejecución del Contrato	110	73,33%	
Días remanentes del Contrato	43,00	28,67%	
Acumulado a última acta pagada	$ 32.396.690,09		
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ 32.396.690,09		

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPENO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 1.771.707.945,99

Semáforo

Desviación en días: 22 Días

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 752.866.540,18	42,49%	$ 561.808.589,67	31,71%	-$ 191.057.950,51	-10,78%
Durante el Periodo	$ 127.355.175,68	7,19%	$ 55.790.979,19	3,15%	-$ 71.564.196,49	-4,04%
Acumulado a la Fecha	**$ 880.221.715,86**	**49,68%**	**$ 617.599.568,86**	**34,86%**	**-$ 262.622.147,00**	**-14,82%**




Observaciones al desempeño del proyecto:


De acuerdo a la reprogramación de obra el programado nos indica un 49,68% frente a un ejecutado del 34,86% indicándonos un atraso de 14,83%

De acuerdo a la reprogramación de obra se debería tener un total de 217 diagnósticos aprobados a la fecha, durante la semana del presente informe se aprobaron 09 diagnósticos, completando 179 avalados, lo cual nos indica un atraso de 38 diagnósticos.

En cuanto a la actividad 3 el contratista de acuerdo a la reprogramación de obra debería tener 97 viviendas terminadas al 100%, sin embargo, a la fecha se han intervenido 94 viviendas, de las cuales se han ejecutado 66 terminadas y se adelantan labores constructivas en 28 más, el contratista cuenta con 15 frentes de trabajo.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

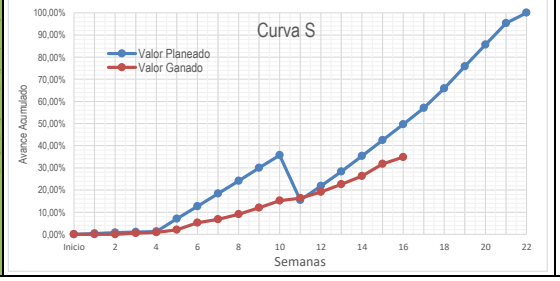




CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

A la fecha del presente informe no se han presntado cambios en la LINEA BASE.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	42,49%	31,71%	-10,78%	
Durante el Periodo	7,19%	3,15%	-4,04%	
Acumulado a la Fecha	**49,68%**	**34,86%**	**-14,82%**	

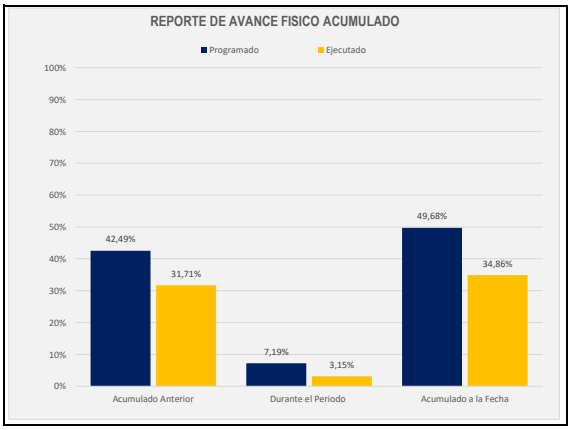

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 1.771.707.945,99	$ 1.771.707.945,99	$ -	$ 345.450.914,11		$ 345.450.914,11

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
		0,00%			0,00%		








AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 202.479.313,00	$ 202.479.313,00	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
2	$ 32.396.690,09	16,00%	2	$ 32.396.690,09	16,00%	$ 16.198.345,04	$ 16.198.346,04







INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 016

Entidad Contratante: ENTERRITORIO | Semana del 8/08/2022 al 14/08/2022 | Fecha 14/08/2022

OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDAD No. 1
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: Actividad No. 1, la aprobación de la actividad N° 1 se hizo comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-037-22 del 3 de junio de 2022. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
ACTIVIDAD No. 2
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 82,49%
Comentario: La Actividad No. 2, De acuerdo a la reprogramación de obra este ítems debería estas con la totalidad de los diagnósticos terminados, durante la semana del presente informe se hicieron 09 aprobaciones de diagnósticos, completando 179, lo cual nos indica un atraso del 17,51% según la reprogramación de obra, equivalentes a 38 diagnósticos pendientes, el contratista debe incrementar los esfuerzos y alcanzar las metas trazadas en la reprogramación de obra, que a la fecha de corte del presente informe debería ser de 217 viviendas aprobadas.
ACTIVIDAD No. 3
PROGRAMADO 41,01% vs 30,44% EJECUTADO
Comentario: La Actividad No. 3 nos indica un atraso de 14,81%, de acuerdo a la reprogramación de obra debería tener 97 viviendas terminadas, sin embargo, ha intervenido 94 viviendas de las cuales solo 66 están terminadas y se adelantan trabajos constructivos en otras 28 más, el contratista cuenta con 16 cuadrillas de trabajo.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

En el ítem ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10. El contratista subsanó los diseños de las casetas y el diseño de la estructura para el tanque elevado, también realizó entrega del informe técnico especialista estructural el cual fue aprobado por la interventoría con lo cual esta actividad queda en un 100% de su ejecución. Sin embargo, el Contratista posteriormente solicitó un cambio de especificaciones en algunos ítems, uno de ellos el ladrillo de arcilla por bloque de Concreto, razón por la cual se hace necesario ajustar el diseño estructural con dicho cambio. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
El ítem ACTIVIDAD 2: DIAGNOSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. Esta actividad avanza con el diligenciamiento de los diagnósticos de los cuales ya se sometieron a comité de aprobación 179 diagnósticos, los cuales fueron avalados por la interventoría, la próxima semana el contratista debe presentar la totalidad de los diagnósticos pendientes para completar la meta de los 217, ya que conforme a la reprogramación la etapa de diagnósticos finalizaba en la semana 14.
En el ítem ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS. ACTA DE ENTREGA Y RECIBOS DE LAS OBRAS
A la fecha y de acuerdo la reprogramación de obra el contratista debería tener 97 viviendas terminadas, sin embargo, se han intervenido 94 viviendas, de las cuales solo 66 están terminadas indicándonos un atraso de 31, estás intervenciones avanzan en su proceso constructivo. A esto se suma que para la siguiente semana se debería tener terminadas 113 viviendas, es decir, el contratista debe redoblar esfuerzos e incrementar frentes de trabajo para reducir el atraso, tal como se solicitó en el pasado comité de seguimiento.
En las casetas tipo 3 y otras intervenciones se ha avanzado en actividades como: cimentación, mampostería, fundición de columnas y columnetas, pañetes, instalación de tubería hidrosanitaria, instalación de aparatos sanitarios, instalación de tejas para cubierta, instalación de puertas metálicas, instalación de tanque elevado de 500 Lts, de igual forma se adelantan labores en intervenciones correspondientes a adecuaciones, construcción de estructura para el tanque elevado, cambio de pañete, instalación de enchape de pared y pisos y cambio de equipos sanitarios, para estas actividades el contratista cuenta con 16 frentes de trabajo

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Para la próxima semana correspondiente al periodo del 15 al 21 de agosto 2022 y de acuerdo la reprogramación de obra la actividad 2, que corresponde al ítem de diagnósticos se tiene programado que el contratista presente 38 diagnósticos más, para completar 217 diagnósticos, esta actividad debió estar al 100% a corte del 31 de julio 2022.
El contratista en la actividad 3 debe continuar con la ejecución de obra completando la intervención de 113 viviendas 100% de acuerdo a la reprogramación de obra.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTIÓN SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	20	0	20	74,1%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	7	0	7	25,9%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál?	0	0	0	0,0%
	Total	27	0	27	100,00%



OBSERVACIONES

En el presente periodo NO se presentaron lluvias, predomino el tiempo seco.

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
	10/08/2022	CASA DE LA CULTURA	36,00	1. Jornadas sectorizadas de capacitación en educación sanitaria. 2. Programación de refuerzo, visitas casa a casa e instalación de acrílico.	1. Contratista de obra e interventoría, con apoyo del municipio. 2. Contratista de obra e interventoría.	1. 16-08-2022 2. 18-08-2022
	10/08/2022	CASA DE LA CULTURA	6,00	1. Recorrido de obra con el comité veedor. Punto de encuentro Calle 8 Carrera 3 Barrio San Martín.	Contratista de obra e interventoría.	11/08/2022
	11/08/2022	BARRIO SAN MARTIN	14,00	No se dejaron compromisos	N/A	

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
INCLUSION 116	Carlota Isabel Cantillo De Pineda	8/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 117	Maria Isabel Puertas Bohorquez	10/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 118	Hector Rafael Ortega Ochoa	10/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 119	Victoria Rosa Palomino Escobar	11/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 120	Desireth Paola Torres Escobar	11/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 121	Sonia Torres	12/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 122	Lucia Mendez Torres	12/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 123	Vicenta Palomino Marrugo	12/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 124	Saturnino Alvarez Martinez	12/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 125	Carlos Arturo Campo Peña	12/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 126	Darlys Meza Caballero	16/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 127	Pedro Fonseca Romero	16/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA

7. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 016

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **8/08/2022** al **14/08/2022** Fecha **14/08/2022**

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA









CASETA TIPO 3, SE APRECIA AVANCE EN EL PAÑETE DE MAMPOSTERIA, FUNDICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS.









ADECUACIONES DE UNIDADES SANITARIAS, SE APRECIA INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, LAVAPLATOS Y LAVADEROS









CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO-

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 016

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **8/08/2022** al **14/08/2022** Fecha **14/08/2022**

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-048-22 mediante al cual se solicita a la empresa Coosepcor Ltda. Respuesta a los oficios emitidos por la interventoría TEC-023-22, TEC-034-22 y TEC-041-22 mediante los cuales se solicitó que se indicara por parte de ustedes si las viviendas relacionadas en los anexos cuentan con la disponibilidad de red de acueducto y red de alcantarillado y para las intervenciones que necesiten conexión de instalación domiciliaria otorgar el permiso o autorización para el procedimiento de conexión a la red principal teniendo en cuenta los acuerdos con respecto a la demolición del pavimento y reparación del mismo.
La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-049-22 mediante al cual se remite para su debido tramite Once (11) solicitudes de inclusión teniendo en cuenta el PROTOCOLO PARA LA INCLUSION DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS AL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.
La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-050-22 con el asunto SOLICITUD TOMAR ACCIONES FRENTE AL ATRASO DE OBRA mediante al cual solicitamos tomar acciones inmediatas que permitan reducir el porcentaje de atraso presentado de acuerdo a la reprogramación de obra
A la fecha del ultimo corte 07 de agosto nos refleja el PROGRAMADO en un 42,49% vs un ejecutado del 31,37% indicándonos un atraso del 10,79%
En el siguiente cuadro se determina cuantas viviendas se deben terminar por semana para cumplir con las 157 intervenciones pendientes dentro de la fecha del contrato.
La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-051-22 con el asunto RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_077 mediante el cual realizamos entrega de aval para 09 diagnósticos presentados en comité de aprobación No. 014 con los siguientes codicos:
B-C-SM-MZ45-VE-037, B-C-SM-MZ67-VE-078, B-C-SM-MZ89-VE-080, B-C-SM-MZ89-VE-083, B-C-SM-MZ68-VE-108, B-C-SM-MZ34-VE-116, B-C-SM-MZ58-VE-178, B-C-SM-MZ56-VE-191 y B-C-SM-MZ18-VE-202

Marcy A. Correa C		Karol Javela	
Firma		**Firma**	
Nombre	Marcy Correa castaño	Nombre	Karol Yulieth Javela Pérez
	Directora de la interventoría	Supervisor	Supervisor ENTerritorio

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría

Enviar Informe para validación

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A		ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA		FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-013	2-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	**11**	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	2-jun-22	SI	SI	13-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-019	9-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	22	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	9-jun-22	SI	SI	14-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-026	16-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	18	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	14-jun-22	SI	SI	11-jul-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-032	28-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	13	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	28-jun-22	SI	SI	11-jul-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-039	8-jul-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	29	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	8-jul-22	SI	SI	13-jul-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-043	26-jul-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	10	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	26-jul-22	SI	NO	27-jul-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-049	8-ago-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	11	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	27-jul-22	SI	NO	12-ago-22

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022	FECHA	ASUNTO	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA	FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-025	15-jun-22	SOLICITUD ESPECIFICACIÓN TECNICA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	15-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA	FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-021	13-jun-22	SOLICITUD RESPUESTA AL CONCEPTO EMITIDO POR COOSEPCOR MEDIANTE ACTA DE REUNION DE OBRA	1	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	13-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta
ARCA-INT/FDA276-TEC-029	21-jun-22	OBRA REQUERIA EN LA VIA PUBLICA PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE LAS VIVIENDAS 001, 085, 088, 163	4	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	21-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA	FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-015	2-jun-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	24	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	2-jun-22	SI	3-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-023	15-jun-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	27	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	15-jun-22	SI	9-ago-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-034	2-jul-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	29	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	2-jul-22	SI	9-ago-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-041	13-jul-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	47	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	13-jul-22	SI	9-ago-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-048	5-ago-22	SOLICITUD RESPUESTA A OFICIOS TEC-023-22, TEC-034-22 y TEC-041-22 DE DISPONIBILIDAD DE REDES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	N/A	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	5-ago-22	SI	9/08/2022 se entreagaron los certificados sin oficio

INFORME PCI

Fecha de Corte	14/08/2022	PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS																										
Priorización		MATRIZ BASE						INCLUSIONES												TOTALES								
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No.2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Solicitudes de Inclusion	Atendida de la ESP	Atendida por la Alcaldia	Pendientes por atender ESP	Pendientes por atender Alcaldia	Respuesta positiva	Respuesta negativa	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Visitadas	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Recibidas a satisfaccion	Viviendas En ejecución.	Viviendas Programadas actividad No.3
Cordoba Bolivar	San Martin	217	0	206	10	179	1	126	114	103	0	50	64	0	0	0	0	0	217	206	10	179	1	94	66	0	28	0
	TOTAL	**217**	**0**	**206**	**10**	**179**	**1**	**126**	**114**	**103**	**0**	**50**	**64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**217**	**206**	**10**	**179**	**1**	**94**	**66**	**0**	**28**	**0**

Valor comprometido Actividad 1	**$**	**5.140.026,35**
Valor comprometido actividad 2	**$**	**32.428.982,50**
Valor comprometido actividad 3	**$**	**1.257.565.055,34**
Valor ejecutado actividad 3	**$**	**580.030.560,01**

Fecha de Corte	14/08/2022	PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS																										
Priorización		MATRIZ BASE						INCLUSIONES												TOTALES								
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No.2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Solicitudes de Inclusion	Atendida de la ESP	Atendida por la Alcaldia	Pendientes por atender ESP	Pendientes por atender Alcaldia	Respuesta positiva	Respuesta negativa	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Visitadas	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Recibidas a satisfaccion	Viviendas En ejecución.	Viviendas Programadas actividad No.3
Cordoba Bolivar	San Martin	217	0	206	10	179	1	126	114	103	0	50	64	0	0	0	0	0	217	206	10	179	1	94	66	0	28	0
	TOTAL	**217**	**0**	**206**	**10**	**179**	**1**	**126**	**114**	**103**	**0**	**50**	**64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**217**	**206**	**10**	**179**	**1**	**94**	**66**	**0**	**28**	**0**

Valor comprometido Actividad 1	**$**	**5.140.026,35**
Valor comprometido actividad 2	**$**	**32.428.982,50**
Valor comprometido actividad 3	**$**	**1.257.565.055,34**
Valor ejecutado actividad 3	**$**	**580.030.560,01**

INFORME ESTADO DE COVID-19

enterritorio	**INFORME ESTADO DE COVID - 19**	CÓDIGO:	**F-GG-10**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 8/08/2022 Y EL 14/08/2022 PLAZO: 5 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. CONTRATO No. 2220587

PERSONAL DEL CONTRATISTA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	OBSERVACIONES
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
DUARTE PINEDO - DIRECTOR DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD BLANCO - RESIDENTE DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RAFAEL CASTILLO - RESIDENTE SST	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
NORELIS ANAYA - TRABAJADORA SOCIAL	**ASTRAZENIKA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
OSWALDO GARZÓN - PROFESIONAL DIAGNOSTICO	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
SINDY ESCOBAR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**SINOVAC**		F	NO	NO	NO	SI	SI	

PERSONAL INTERVENTORIA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	**OBSERVACIONES**
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
MARCY CORREA - DIRECTOR INTERVENTORIA	**PFIZER**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD ARIETA - RESIDENTE INTERVENTORIA	**PFIZER**	**MODERNA**	M	NO	NO	NO	SI	SI	
DIAMYS SANCHEZ PORTILLO - INSPECTORA DE INTERVENTORIA	**PFIZER**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
FERNANDA GRIJALBA - PROFESIONAL SOCIAL	**MODERNA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
YIRA LEMUS - PROFESIONAL HSEQ	**AZTRAZENECA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
LEYDIS HERRERA - AUXILIAR SOCIAL	**JONSSON**	**JONSSON**	F	NO	NO	NO	SI	SI	

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Firma: Marcy A. Correa C

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

REPORTE Y EJECUCIÒN DE VIVIENDAS SEMANALES

Ejecución de Actividad en Viviendas al Programa Conexiones Intradomiciliarias con corte a 14/08/2022

BARRIO	ACTA	No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización	Número de días Máximo permitido según tipo de intervención	Número de Dias de la Intervencion por parte del Contratista	Dias de cumplimiento o incumplimiento según tipo de intervención (-) atraso y (+) avance	¿SE ENCUENTRA RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR INTERVENTORÍA?	
															SI (X)	NO (X)
SM	1	1	B-C-SM-MZ29-VE-001		Adecuacion	$7.967.801,13	$0,00			0/01/1900	5/01/1900	0	5	-5		x
SM	1	2	B-C-SM-MZ32-VE-002	100%	Caseta T3	$8.126.190,79	$8.126.190,79	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	8	16	-8		x
SM	1	3	B-C-SM-MZ32-VE-003	100%	Caseta T3	$7.914.431,13	$7.914.431,13	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	20/06/2022	8	16	-8		x
SM	1	4	B-C-SM-MZ18-VE-004	100%	Adecuacion	$7.636.382,30	$7.636.382,30	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	5	B-C-SM-MZ22-VE-005	100%	Adecuacion	$7.148.052,07	$7.148.052,07	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	12/06/2022	5	8	-3		x
SM	1	6	B-C-SM-MZ34-VE-006	100%	Adecuacion	$7.826.891,21	$7.826.891,21	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	7	B-C-SM-MZ22-VE-007	100%	Adecuacion	$7.415.092,49	$7.415.092,49	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	14/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	8	B-C-SM-MZ22-VE-009	100%	Caseta T3	$7.908.010,60	$7.908.010,60	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	16/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	9	B-C-SM-MZ21-VE-010	100%	Caseta T3	$8.928.931,81	$8.928.931,81	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	10	B-C-SM-MZ22-VE-011	100%	Adecuacion	$8.088.174,13	$8.088.174,13	8/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	21/06/2022	5	13	-8		x
SM	1	11	B-C-SM-MZ34-VE-012	100%	Caseta T3	$9.305.276,37	$9.305.276,37	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	12	B-C-SM-MZ21-VE-013	100%	Adecuacion	$5.457.782,54	$5.457.782,54	2/06/2022	TERMINADA	7/06/2022	11/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	13	B-C-SM-MZ21-VE-014	100%	Caseta T3	$8.614.149,98	$8.614.149,98	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	18/06/2022	8	14	-6		x
SM	1	14	B-C-SM-MZ21-VE-015	100%	Caseta T3	$8.265.079,43	$8.265.079,43	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	15	B-C-SM-MZ21-VE-016	100%	Caseta T3	$9.299.320,83	$9.299.320,83	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	8	14	-6		x
SM	1	16	B-C-SM-MZ38-VE-017	100%	Caseta T3	$8.532.396,85	$8.532.396,85	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		x
SM	2	17	B-C-SM-MZ24-VE-018	100%	Caseta T3	$8.502.042,22	$8.502.042,22	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	18	B-C-SM-MZ24-VE-019	100%	Adecuacion	$6.921.383,30	$6.921.383,30	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	19	B-C-SM-MZ24-VE-020	100%	Adecuacion	$4.593.449,33	$4.593.449,33	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	5	13	-8		x
SM	2	20	B-C-SM-MZ85-VE-021	100%	Caseta T3	$8.614.688,02	$8.614.688,02	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	22/06/2022	8	17	-9		x
SM	2	21	B-C-SM-MZ85-VE-022	100%	Caseta T3	$8.896.124,14	$8.896.124,14	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	22	B-C-SM-MZ85-VE-023	100%	Adecuacion	$8.133.478,61	$8.133.478,61	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	23	B-C-SM-MZ29-VE-024	100%	Adecuacion	$7.072.986,22	$7.072.986,22	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	2	24	B-C-SM-MZ31-VE-025	100%	Caseta T3	$8.637.204,11	$8.637.204,11	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	25	B-C-SM-MZ31-VE-026	100%	Adecuacion	$5.113.367,92	$5.113.367,92	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	19/06/2022	5	14	-9		x
SM	1	26	B-C-SM-MZ31-VE-027	100%	Adecuacion	$4.365.339,96	$4.365.339,96	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	14/06/2022	5	9	-4		x
SM	2	27	B-C-SM-MZ31-VE-028	100%	Adecuacion	$7.668.943,15	$7.668.943,15	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	13/06/2022	5	8	-3		x
SM	2	28	B-C-SM-MZ31-VE-029	100%	Caseta T3	$8.468.136,75	$8.468.136,75	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	29	B-C-SM-MZ31-VE-030	100%	Adecuacion	$4.637.820,16	$4.637.820,16	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	30	B-C-SM-MZ31-VE-031	100%	Caseta T2	$8.119.008,44	$8.119.008,44	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	31	B-C-SM-MZ56-VE-038	100%	Adecuacion	$8.227.630,94	$8.227.630,94	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	32	B-C-SM-MZ56-VE-039	100%	Adecuacion	$1.443.687,77	$1.443.687,77	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	33	B-C-SM-MZ46-VE-040	100%	Adecuacion	$6.628.376,66	$6.628.376,66	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	34	B-C-SM-MZ45-VE-041	100%	Adecuacion	$4.845.221,48	$4.845.221,48	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	35	B-C-SM-MZ21-VE-042	100%	Adecuacion	$4.634.812,47	$4.634.812,47	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	36	B-C-SM-MZ31-VE-043	100%	Caseta T3	$6.939.713,07	$6.939.713,07	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	37	B-C-SM-MZ145-VE-044	100%	Caseta T3	$7.980.826,25	$7.980.826,25	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	38	B-C-SM-MZ55-VE-046	100%	Caseta T3	$7.344.533,10	$7.344.533,10	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	39	B-C-SM-MZ55-VE-047	100%	Caseta T2	$7.890.285,26	$7.890.285,26	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	40	B-C-SM-MZ145-VE-053	100%	Caseta T3	$8.262.443,76	$8.262.443,76	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	41	B-C-SM-MZ91-VE-054	100%	Caseta T2	$8.230.167,20	$8.230.167,20	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x

SM	3	42	B-C-SM-MZ56-VE-055	100%	Adecuacion	$3.160.157,78	$3.160.157,78	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		X
SM	6	43	B-C-SM-MZ55-VE-056	100%	Adecuacion	$8.215.661,11	$8.215.661,11	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		X
SM	4	44	B-C-SM-M55-VE-061	100%	Adecuacion	$7.040.722,29	$7.040.722,29	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		X
SM	4	45	B-C-SM-MZ56-VE-062	100%	Caseta T2	$8.362.124,52	$8.362.124,52	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		X
SM	4	46	B-C-SM-MZ66-VE-067	100%	Caseta T3	$7.306.146,52	$7.306.146,52	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		X
SM	4	47	B-C-SM-MZ66-VE-068	100%	Caseta T3	$7.971.707,31	$7.971.707,31	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		X
SM	4	48	B-C-SM-MZ75-VE-071	100%	Adecuacion	$7.170.024,86	$7.170.024,86	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		X
SM	4	49	B-C-SM-MZ75-VE-072	100%	Caseta T3	$8.040.278,46	$8.040.278,46	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		X
SM	4	50	B-C-SM-MZ75-VE-073	100%	Caseta T3	$8.332.036,11	$8.332.036,11	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		X
SM	5	51	B-C-SM-MZ75-VE-074	100%	Caseta T3	$7.656.034,05	$7.656.034,05	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		X
SM	4	52	B-C-SM-MZ89-VE-084	100%	Caseta T3	$8.247.304,21	$8.247.304,21	21/06/2022	TERMINADA	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		X
SM	5	53	B-C-SM-MZ69-VE-087	100%	Adecuacion	$7.074.492,71	$7.074.492,71	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		X
SM	5	54	B-C-SM-MZ69-VE-O88	100%	Adecuacion	$7.465.862,82	$7.465.862,82	21/06/2022	EN EJECUCION	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		X
SM	6	55	B-C-SM-MZ77-VE-O94	100%	Adecuacion	$3.585.305,08	$3.585.305,08	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		X
SM	10	56	B-C-SM-MZ68-VE-097	100%	Caseta T3	$8.172.428,90	$8.172.428,90	21/06/2022	EN EJECUCION	29/06/2022	5/07/2022	8	14	-6		X
SM	7	57	B-C-SM-MZ59-VE-099	100%	Adecuacion	$6.098.594,42	$6.098.594,42	21/06/2022	TERMINADA	26/06/2022	2/07/2022	5	11	-6		X
SM	5	58	B-C-SM-MZ84-VE-166	100%	Adecuacion	$6.744.749,39	$6.744.749,39	22/06/2022	TERMINADA	27/06/2022	3/07/2022	5	11	-6		X
SM	10	59	B-C-SM-MZ84-VE-175	100%	Adecuacion	$6.901.938,50	$6.901.938,50	23/06/2022	TERMINADA	28/06/2022	4/07/2022	5	11	-6		X
SM	8	60	B-C-SM-MZ55-VE-060	70%	Caseta T4	$9.444.985,92	$6.611.490,14	24/06/2022	EN EJECUCION	2/07/2022	8/07/2022	8	14	-6		X
SM	4	61	B-C-SM-MZ66-VE-069	100%	Adecuacion	$6.509.744,54	$6.509.744,54	25/06/2022	TERMINADA	30/06/2022	6/07/2022	5	11	-6		X
SM	3	62	B-C-SM-MZ30-VE-032	100%	Adecuacion	$7.557.018,99	$7.557.018,99	26/06/2022	TERMINADA	1/07/2022	7/07/2022	5	11	-6		X
SM	3	63	B-C-SM-MZ44-VE-034	100%	Adecuacion	$5.519.347,12	$5.519.347,12	27/06/2022	TERMINADA	2/07/2022	8/07/2022	5	11	-6		X
SM	3	64	B-C-SM-MZ44-VE-035	45%	Adecuacion	$8.137.626,09	$3.661.931,74	28/06/2022	EN EJECUCION	3/07/2022	9/07/2022	5	11	-6		X
SM	6	65	B-C-SM-MZ69-VE-085	100%	Adecuacion	$6.566.494,56	$6.566.494,56	29/06/2022	EN EJECUCION	4/07/2022	10/07/2022	5	11	-6		X
SM	6	66	B-C-SM-MZ58-VE-100	80%	Caseta T2	$7.970.674,94	$6.376.539,95	30/07/2022	EN EJECUCION	7/08/2022	13/08/2022	8	14	-6		X
SM	7	67	B-C-SM-MZ47-VE-104	100%	Adecuacion	$8.247.586,36	$8.247.586,36	30/07/2022	EN EJECUCION	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		X
SM	10	68	B-C-SM-MZ58-VE-107	100%	Adecuacion	$7.990.185,62	$7.990.185,62	30/07/2022	EN EJECUCION	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		X
SM	7	69	B-C-SM-MZ58-VE-110	50%	Adecuacion	$6.954.066,54	$3.477.033,27	30/07/2022	EN EJECUCION	4/08/2022	10/08/2022	5	11	-6		X
SM	7	70	B-C-SM-MZ47-VE-111	60%	Caseta t3	$8.318.089,49	$4.990.853,69	3/08/2022	EN EJECUCION	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		X
SM	7	71	B-C-SM-MZ47-VE-112	80%	Adecuacion	$6.827.279,63	$5.461.823,70	3/08/2022	EN EJECUCION	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		X
SM	8	72	B-C-SM-MZ47-VE-113	65%	Adecuacion	$5.043.864,80	$3.278.512,12	3/08/2022	EN EJECUCION	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		X
SM	7	73	B-C-SM-MZ47-VE-114	70%	Caseta t3	$7.850.343,91	$5.495.240,74	3/08/2022	EN EJECUCION	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		X
SM	8	74	B-C-SM-MZ47-VE-115	45%	Caseta t3	$8.322.147,74	$3.744.966,48	3/08/2022	EN EJECUCION	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		X
SM	11	75	B-C-SM-MZ21-VE-118	45%	Caseta t3	$8.148.709,57	$3.666.919,31	3/08/2022	EN EJECUCION	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		X
SM	9	76	B-C-SM-MZ30-VE-121	45%	Caseta t3	$7.765.616,43	$3.494.527,39	3/08/2022	EN EJECUCION	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		X
SM	7	77	B-C-SM-MZ59-VE-102	60%	Caseta T2	$8.805.748,18	$5.283.448,91	3/08/2022	EN EJECUCION	11/08/2022	17/08/2022	8	14	-6		X
SM	6	78	B-C-SM-MZ58-VE-101	100%	Adecuacion	$5.300.910,78	$5.300.910,78	3/08/2022	TERMINADA	8/08/2022	14/08/2022	5	11	-6		X
SM	8	79	B-C-SM-MZ30-VE-122	45%	Caseta t3	$8.106.560,85	$3.647.952,38	5/08/2022	EN EJECUCION	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		X
SM	7	80	B-C-SM-MZ30-VE-124	45%	Caseta t3	$7.850.343,91	$3.532.654,76	5/08/2022	EN EJECUCION	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		X
SM	9	81	B-C-SM-MZ87-VE-125	45%	Caseta t3	$8.100.577,85	$3.645.260,03	5/08/2022	EN EJECUCION	13/08/2022	19/08/2022	8	14	-6		X
SM	9	82	B-C-SM-MZ87-VE-126	35%	Caseta t3	$8.057.934,94	$2.820.277,23	6/08/2022	EN EJECUCION	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		X
SM	9	83	B-C-SM-MZ30-VE-127	35%	Caseta t3	$7.998.497,33	$2.799.474,07	6/08/2022	EN EJECUCION	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		X
SM	9	84	B-C-SM-MZ31-VE-142	60%	Adecuacion	$7.456.473,74	$4.473.884,24	6/08/2022	EN EJECUCION	11/08/2022	17/08/2022	5	11	-6		X
SM	9	85	B-C-SM-MZ87-VE-128	35%	Adecuacion	$7.523.102,18	$2.633.085,76	6/08/2022	EN EJECUCION	11/08/2022	17/08/2022	5	11	-6		X
SM	6	86	B-C-SM-MZ87-VE-129	35%	Caseta t3	$8.132.932,39	$2.846.526,34	6/08/2022	EN EJECUCION	14/08/2022	20/08/2022	8	14	-6		X
SM	5	87	B-C-SM-MZ66-VE-131	35%	Caseta t3	$8.139.325,77	$2.848.764,02	11/08/2022	EN EJECUCION	19/08/2022	25/08/2022	8	14	-6		X

SM	11	88	B-C-SM-MZ67-VE-133	35%	Adecuacion	$6.390.026,30	$2.236.509,21	11/08/2022	**EN EJECUCION**	**16/08/2022**	22/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	10	89	B-C-SM-MZ66-VE-134	35%	Adecuacion	$8.426.367,54	$2.949.228,64	11/08/2022	**EN EJECUCION**	**16/08/2022**	22/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	6	90	B-C-SM-MZ56-VE-135	35%	Adecuacion	$7.522.231,25	$2.632.780,94	11/08/2022	**EN EJECUCION**	**16/08/2022**	22/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	91	B-C-SM-MZ56-VE-136	35%	Adecuacion	$7.922.709,35	$2.772.948,27	11/08/2022	**EN EJECUCION**	**16/08/2022**	22/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	92	B-C-SM-MZ56-VE-138	35%	Adecuacion	$7.984.245,73	$2.794.486,01	11/08/2022	**EN EJECUCION**	**16/08/2022**	22/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	93	B-C-SM-MZ56-VE-139	35%	Caseta t3	$7.415.285,53	$2.595.349,94	11/08/2022	**EN EJECUCION**	**19/08/2022**	25/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	5	94	B-C-SM-MZ56-VE-140	35%	Caseta t3	$8.097.289,18	$2.834.051,21	11/08/2022	**EN EJECUCION**	**19/08/2022**	25/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	95	B-C-SM-MZ47-VE-103	100%	Adecuacion	$8.549.349,69	$8.549.349,69	9/08/2022	**EN EJECUCION**	**14/08/2022**	20/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM		96														
SM		97														
SM																

CUADRO DE PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PROGRAMAS Y EJECUTADAS

PROGRAMADA

Fechas de Corte		Actividad 1		Actividad 2			Actividad 3			Actividad 4		Total	
		$	5.140.026,35	$		39.313.349,11	$		1.727.254.570,53	$	-	$	1.771.707.945,99
										$	-	$	-
		$	5.140.026,35	$		39.313.349,11	$		1.727.254.570,53	$	-	$	1.771.707.945,99
	Semana 0	0,00%	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		$ -	**0,00%**	**$ -**
1/05/2022	**Semana 1**	100,00%	$ 5.140.026,35	5,07%	11	$ 1.992.842,58	0,00%	0	$ -		$ -	**0,40%**	**$ 7.132.868,93**
8/05/2022	**Semana 2**	100,00%	$ 5.140.026,35	10,14%	22	$ 3.985.685,16	0,00%	0	$ -		$ -	**0,52%**	**$ 9.125.711,51**
15/05/2022	**Semana 3**	100,00%	$ 5.140.026,35	15,21%	33	$ 5.978.527,74	0,00%	0	$ -		$ -	**0,63%**	**$ 11.118.554,09**
22/05/2022	**Semana 4**	100,00%	$ 5.140.026,35	20,28%	44	$ 7.971.370,33	0,92%	2	$ 15.919.396,96		$ -	**1,64%**	**$ 29.030.793,64**
29/05/2022	**Semana 5**	100,00%	$ 5.140.026,35	25,35%	55	$ 9.964.212,91	1,84%	4	$ 31.838.793,93		$ -	**2,65%**	**$ 46.943.033,18**
5/06/2022	**Semana 6**	100,00%	$ 5.140.026,35	30,41%	66	$ 11.957.055,49	2,30%	5	$ 39.798.492,41		$ -	**3,21%**	**$ 56.895.574,25**
12/06/2022	**Semana 7**	100,00%	$ 5.140.026,35	35,48%	77	$ 13.949.898,07	2,76%	6	$ 47.758.190,89		$ -	**3,77%**	**$ 66.848.115,31**
19/06/2022	**Semana 8**	100,00%	$ 5.140.026,35	40,09%	87	$ 15.761.573,15	4,15%	9	$ 71.637.286,34		$ -	**5,22%**	**$ 92.538.885,83**
26/06/2022	**Semana 9**	100,00%	$ 5.140.026,35	44,70%	97	$ 17.573.248,22	5,07%	11	$ 87.556.683,30		$ -	**6,22%**	**$ 110.269.957,87**
3/07/2022	**Semana 10**	100,00%	$ 5.140.026,35	58,53%	127	$ 23.008.273,44	11,06%	24	$ 191.032.763,56		$ -	**12,37%**	**$ 219.181.063,35**
10/07/2022	**Semana 11**	100,00%	$ 5.140.026,35	72,35%	157	$ 28.443.298,66	17,05%	37	$ 294.508.843,82		$ -	**18,52%**	**$ 328.092.168,84**
17/07/2022	**Semana 12**	100,00%	$ 5.140.026,35	86,18%	187	$ 33.878.323,89	23,04%	50	$ 397.984.924,09		$ -	**24,67%**	**$ 437.003.274,32**
24/07/2022	**Semana 13**	100,00%	$ 5.140.026,35	92,00%	200	$ 36.168.281,18	27,65%	60	$ 477.581.908,90		$ -	**29,29%**	**$ 518.890.216,43**
31/07/2022	**Semana 14**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	**32,26%**	**70**	$ 557.178.893,72		$ -	**33,96%**	**$ 601.632.269,18**
7/08/2022	**Semana 15**	100,00%	$ 5.140.026,35	**100,00%**	**217**	$ 39.313.349,11	**37,33%**	81	$ 644.735.577,02		$ -	**38,90%**	**$ 689.188.952,48**
14/08/2022	**Semana 16**	**100,00%**	**$ 5.140.026,35**	**100,00%**	**217**	**$ 39.313.349,11**	**44,70%**	**97**	**$ 772.090.752,73**		$ -	**46,09%**	**$ 816.544.128,19**
21/08/2022	**Semana 17**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	52,07%	113	$ 899.445.928,43		$ -	**53,28%**	**$ 943.899.303,89**
28/08/2022	**Semana 18**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	59,91%	130	$ 1.034.760.802,62		$ -	**60,91%**	**$ 1.079.214.178,08**
4/09/2022	**Semana 19**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	70,05%	152	$ 1.209.874.169,22		$ -	**70,80%**	**$ 1.254.327.544,68**
11/09/2022	**Semana 20**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	80,18%	174	$ 1.384.987.535,82		$ -	**80,68%**	**$ 1.429.440.911,28**
18/09/2022	**Semana 21**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	90,32%	196	$ 1.560.100.902,41		$ -	**90,57%**	**$ 1.604.554.277,87**
26/09/2022	**Semana 22**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	100,00%	217	$ 1.727.254.570,53		$ -	**100,00%**	**$ 1.771.707.945,99**

EJECUTADO

Fechas de Corte		Actividad 1		Actividad 2			Actividad 3			Actividad 4		Total	
		$	5.140.026,35	$		39.313.349,11	$		1.727.254.570,53	$	-	$	1.771.707.945,99
										$	-	$	-
		$	5.140.026,35	$		39.313.349,11	$		1.727.254.570,53	$	-	$	1.771.707.945,99
	Semana 0	0,00%	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		$ -	**0,00%**	**$ -**
1/05/2022	**Semana 1**	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,15%**	**$ 2.570.013,18**
8/05/2022	**Semana 2**	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,15%**	**$ 2.570.013,18**
15/05/2022	**Semana 3**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
22/05/2022	**Semana 4**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
29/05/2022	**Semana 5**	100,00%	$ 5.140.026,35	11,06%	24	$ 4.348.020,18	1,38%	3	$ 22.883.102,57		$ -	**1,83%**	**$ 32.371.149,10**
5/06/2022	**Semana 6**	100,00%	$ 5.140.026,35	13,82%	30	$ 5.435.025,22	2,76%	6	$ 45.766.205,14		$ -	**3,18%**	**$ 56.341.256,71**
12/06/2022	**Semana 7**	100,00%	$ 5.140.026,35	19,35%	42	$ 7.609.035,31	4,61%	10	$ 76.277.008,56		$ -	**5,02%**	**$ 89.026.070,22**
19/06/2022	**Semana 8**	100,00%	$ 5.140.026,35	23,50%	51	$ 9.239.542,88	6,45%	14	$ 106.787.811,98		$ -	**6,84%**	**$ 121.167.381,21**
26/06/2022	**Semana 9**	100,00%	$ 5.140.026,35	32,72%	71	$ 12.862.893,03	8,29%	18	$ 137.298.615,41		$ -	**8,77%**	**$ 155.301.534,78**
3/07/2022	**Semana 10**	100,00%	$ 5.140.026,35	43,32%	94	$ 17.029.745,70	10,14%	22	$ 167.809.418,83		$ -	**10,72%**	**$ 189.979.190,88**
10/07/2022	**Semana 11**	100,00%	$ 5.140.026,35	53,00%	115	$ 20.834.263,35	11,98%	26	$ 198.320.222,25		$ -	**12,66%**	**$ 224.294.511,96**
17/07/2022	**Semana 12**	100,00%	$ 5.140.026,35	64,98%	141	$ 25.544.618,55	13,82%	30	$ 228.831.025,68		$ -	**14,65%**	**$ 259.515.670,57**
24/07/2022	**Semana 13**	100,00%	$ 5.140.026,35	64,98%	141	$ 25.544.618,55	20,74%	45	$ 343.246.538,51		$ -	**21,11%**	**$ 373.931.183,41**
31/07/2022	**Semana 14**	100,00%	$ 5.140.026,35	73,73%	160	$ 28.986.801,19	22,12%	48	$ 366.129.641,08		$ -	**22,59%**	**$ 400.256.468,62**
7/08/2022	**Semana 15**	100,00%	$ 5.140.026,35	78,34%	170	$ 30.798.476,26	27,65%	60	$ 457.662.051,35		$ -	**27,86%**	**$ 493.600.553,96**
14/08/2022	**Semana 16**	**100,00%**	**$ 5.140.026,35**	**82,49%**	**179**	**$ 32.428.983,83**	**30,41%**	**66**	**$ 503.428.256,49**		$ -	**30,54%**	**$ 540.997.266,67**
21/08/2022	**Semana 17**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
28/08/2022	**Semana 18**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
4/09/2022	**Semana 19**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
11/09/2022	**Semana 20**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
18/09/2022	**Semana 21**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ 1.727.254.570,53		$ -	**100,00%**	**$ 1.771.707.945,99**
						$ -							

PERSONAL DE OBRA

REPORTE DE PERSONAL DE MANO DE OBRA - 14-08-22			
No. DE LA CUADRILLA	**No. DE MAETROS**	**No. DE AYUDANTES U OFICIALES**	**No. INTERVENCIONES A CARGO**
1	1	1	2
2	1	1	2
3	1	1	2
4	1	1	2
5	1	1	2
6	1	1	2
7	1	1	2
8	1	1	2
9	1	1	2
10	1	1	2
11	1	1	2
12	1	1	2
13	1	1	1
14	1	1	1
15	1	1	1
16	1	1	1
TOTAL	**16**	**16**	**28**

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

ADMON

Bogotá D.C, 24 de agosto de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-094-22

Señores:
Ingeniera
Karol Yulieth Javela
Supervisora
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio
Calle 26 # 13-19 Piso 20
Bogotá. Colombia

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: REMISIÓN INFORMES SEMANALES 17.

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales remitimos informe semanal 17 correspondiente al periodo del 15 de agosto del 2022 al 21 de agosto del 2022, para fines pertinentes.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 24/08/2022
HORA: 11:19:19 a. m.
20224300317392

FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA
Anexo: 21 folios
Proyectó: Jineth Marcela Gordillo – Residente Admón.
Reviso: Ing. Marcy Correa – Directora de Interventoría

INFORME SEMANAL 17

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 17	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 017

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **15/08/2022** al **21/08/2022** | Fecha **21/08/2022**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO PROYECTO	
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** BOLIVAR — **MUNICIPIO** CORDOBA
GERENCIA A CARGO	ENTERRITORIO
SUPERVISOR	KAROL YULIETH JAVELA PEREZ
ESTADO DEL PROYECTO	EN EJECUCION ACTIVIDAD 2 Y 3

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2220576
Contratista	CONSORCIO CONSTRUREDES
Valor inicial	$ 1.771.707.945,99
Valor actual	$ 1.771.707.945,99
Variación del valor	$ -
Fecha de Inicio	26/04/2022
Plazo inicial (Días)	150 Días
Plazo actual (Días)	150 Días — 5 MESES - 150 DIAS
Variación en plazo	Días
Fecha Contractual de terminación	26/09/2022
Tiempo Transcurrido (días)	117 — 78,00%
Días remanentes del Contrato	36,00 — 24,00%
Acumulado a última acta pagada	
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ 585.124.754,07

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.	2220587
Interventor	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS.
Valor inicial	$ 202.479.313,00
Valor actual	$ 202.479.313,00
Variación del valor	$ -
Fecha de Inicio	26/04/2022
Plazo inicial	150 Días
Plazo actual	150 Días — 5 MESES - 150 DIAS
Variación en plazo	Días
Fecha Contractual de terminación	26/09/2022
Ejecución del Contrato	117 — 78,00%
Días remanentes del Contrato	36,00 — 24,00%
Acumulado a última acta pagada	$ 32.396.690,09
Estimado ejecutado por llevar a acta	

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 1.771.707.945,99

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 880.221.715,86	49,68%	$ 617.617.389,97	34,86%	-$ 262.604.325,89	-14,82%
Durante el Periodo	$ 131.335.024,92	7,41%	$ 141.765.289,12	8,00%	$ 10.430.264,20	0,59%
Acumulado a la Fecha	**$ 1.011.556.740,78**	**57,10%**	**$ 759.382.679,09**	**42,86%**	**-$ 252.174.061,69**	**-14,23%**

Semáforo

Desviación en días: 21 Días




Observaciones al desempeño del proyecto:


De acuerdo a la reprogramación de obra el programado nos indica un 57,10% frente a un ejecutado del 42,86% indicándonos un atraso de 14,23%

De acuerdo a la reprogramación de obra se debería tener un total de 217 diagnósticos aprobados a la fecha, durante la semana del presente informe se aprobaron 14 diagnósticos, completando 203 avalados, lo cual nos indica un atraso de 14 diagnósticos.

En cuanto a la actividad 3 el contratista de acuerdo a la reprogramación de obra debería tener 113 viviendas terminadas al 100%, y a la fecha se han intervenido 116 viviendas, de las cuales se han terminado 80 y se adelantan labores constructivas en 36 más, el contratista cuenta con 22 frentes de trabajo.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

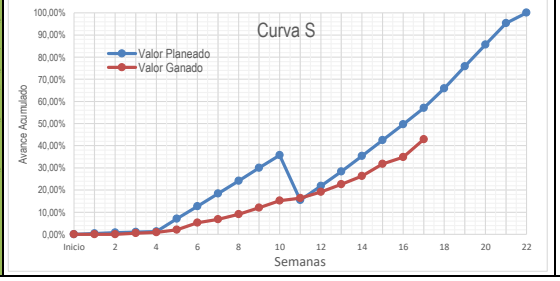




CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE

A la fecha del presente informe no se han presntado cambios en la LINEA BASE.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	49,68%	34,86%	-14,82%	
Durante el Periodo	7,41%	8,00%	0,59%	
Acumulado a la Fecha	**57,10%**	**42,86%**	**-14,23%**	

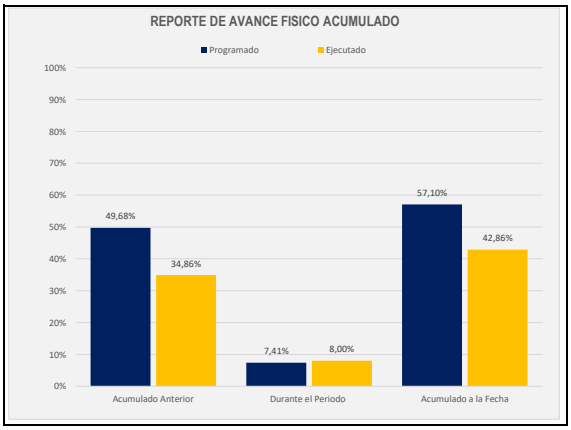

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 1.771.707.945,99	$ 1.771.707.945,99	$ -	$ 345.450.914,11		$ 345.450.914,11

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
		0,00%			0,00%		








AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 202.479.313,00	$ 202.479.313,00	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
3	$ 32.396.690,09	16,00%	2	$ 32.396.690,09	16,00%	13/07/2022	$ 16.198.346,04







INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 017

Entidad Contratante: ENTERRITORIO | Semana del 15/08/2022 al 21/08/2022 | Fecha 21/08/2022

OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDAD No. 1
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: Actividad No. 1, la aprobación de la actividad N° 1 se hizo comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-037-22 del 3 de junio de 2022. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
ACTIVIDAD No. 2
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 93,55%
Comentario: La Actividad No. 2, De acuerdo a la reprogramación de obra este ítems debería estas con la totalidad de los diagnósticos terminados, durante la semana del presente informe se hicieron 14 aprobaciones de diagnósticos, completando 203, lo cual nos indica un atraso del 6,45% según la reprogramación de obra, equivalentes a 14 diagnósticos pendientes, el contratista debe incrementar los esfuerzos y alcanzar las metas trazadas en la reprogramación de obra, que a la fecha de corte del presente informe debería ser de 217 viviendas aprobadas.
ACTIVIDAD No. 3
PROGRAMADO 55,99% vs 41,54% EJECUTADO
Comentario: La Actividad No. 3 nos indica un atraso de 14,45%, de acuerdo a la reprogramación de obra debería tener 113 viviendas terminadas, sin embargo, ha intervenido 116 viviendas de las cuales solo 80 están terminadas y se adelantan trabajos constructivos en otras 36 más, el contratista cuenta con 22 cuadrillas de trabajo.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

En el ítem ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10. El contratista subsanó los diseños de las casetas y el diseño de la estructura para el tanque elevado, también realizó entrega del informe técnico especialista estructural el cual fue aprobado por la interventoría con lo cual esta actividad queda en un 100% de su ejecución. Sin embargo, el Contratista posteriormente solicitó un cambio de especificaciones en algunos ítems, uno de ellos el ladrillo de arcilla por bloque de Concreto, razón por la cual se hace necesario ajustar el diseño estructural con dicho cambio. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
El ítem ACTIVIDAD 2: DIAGNOSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. Esta actividad avanza con el diligenciamiento de los diagnósticos de los cuales ya se sometieron a comité de aprobación 203 diagnósticos, los cuales fueron avalados por la interventoría, la próxima semana el contratista debe presentar la totalidad de los 14 diagnósticos pendientes para completar la meta de los 217, ya que conforme a la reprogramación la etapa de diagnósticos finalizaba en la semana 14.
En el ítem ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS. ACTA DE ENTREGA Y RECIBOS DE LAS OBRAS
A la fecha y de acuerdo la reprogramación de obra el contratista debería tener 113 viviendas terminadas, y se han intervenido 116 viviendas, de las cuales solo 80 están terminadas indicándonos un atraso de 36, estás intervenciones avanzan en su proceso constructivo. A esto se suma que para la siguiente semana se debería tener terminadas 130 viviendas, es decir, el contratista debe redoblar esfuerzos e incrementar frentes de trabajo para reducir el atraso, tal como se solicitó en el pasado comité de seguimiento.
En las casetas tipo 3 y otras intervenciones se ha avanzado en actividades como: cimentación, mampostería, fundición de columnas y columnetas, pañetes, instalación de tubería hidrosanitaria, instalación de aparatos sanitarios, instalación de tejas para cubierta, instalación de puertas metálicas, instalación de tanque elevado de 500 Lts, de igual forma se adelantan labores en intervenciones correspondientes a adecuaciones, construcción de estructura para el tanque elevado, cambio de pañete, instalación de enchape de pared y pisos y cambio de equipos sanitarios, para estas actividades el contratista cuenta con 22 frentes de trabajo


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Para la próxima semana correspondiente al periodo del 22 al 28 de agosto 2022 y de acuerdo la reprogramación de obra la actividad 2, que corresponde al ítem de diagnósticos se tiene programado que el contratista presente 14 diagnósticos más, para completar 217 diagnósticos, esta actividad debió estar al 100% a corte del 31 de julio 2022.
El contratista en la actividad 3 debe continuar con la ejecución de obra completando la intervención de 130 viviendas 100% de acuerdo a la reprogramación de obra.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTIÓN SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	20	0	20	74,1%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	7	0	7	25,9%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál?	0	0	0	0,0%
	Total	27	0	27	100,00%



OBSERVACIONES

En el presente periodo no se presentaron lluvias.

GESTIÓN SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
	18/08/2022	BARRIO SAN MARTIN	15,00	Corregir las falencias en las intervenciones con el fin de realizar las respectivas entregas.	CONTRATISTA	
	18/08/2022	CASA DE LA CULTURA	40,00	dirigir al beneficiario al PAC en caso de requerir el acompañamiento del personal tecnico y social.	CONTRATISTA	

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
INCLUSION 128	EDELMA ESTHER SANCHEZ BARRAZA	16/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 129	ZAIDA SALAZAR ORTIZ	16/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 130	JUAN JOSE TERAN OCHOA	16/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 131	YARIMA ROSA VERGARA ACUÑA	16/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 132	ESCILDA ELENA OCHOA FLOREZ	16/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 133	EDITH TARCILA VERGARA CARDENAS	16/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 134	YARLEDISVILLARREAL LANDERO	16/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 135	NELSY BELTRAN RODRIGUEZ	16/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 136	ORLANDO TEHERAN HERNANDEZ	16/08/2022	PETICION	CONTRATISTA
INCLUSION 137	HADLEY ARTEAGA PALOMINO	19/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 1378	HUMBERTO SIERRA TAPIA	19/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA

7. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 017

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **15/08/2022** al **21/08/2022** Fecha **21/08/2022**

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA









CASETA TIPO 3, SE APRECIA AVANCE EN EL PAÑETE DE MAMPOSTERIA, FUNDICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS.








ADECUACIONES DE UNIDADES SANITARIAS, SE APRECIA INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, LAVAPLATOS Y LAVADEROS









CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO-

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 017

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **15/08/2022** al **21/08/2022** Fecha **21/08/2022**

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-049-22 mediante al cual se remite para su debido tramite Once (11) solicitudes de inclusión teniendo en cuenta el PROTOCOLO PARA LA INCLUSION DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS AL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.
La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-050-22 con el asunto SOLICITUD TOMAR ACCIONES FRENTE AL ATRASO DE OBRA mediante al cual solicitamos tomar acciones inmediatas que permitan reducir el porcentaje de atraso presentado de acuerdo a la reprogramación de obra
La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-051-22 con el asunto RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_077 mediante el cual realizamos entrega de aval para 09 diagnósticos presentados en comité de aprobación No. 014 con los siguientes codicos:
B-C-SM-MZ45-VE-037, B-C-SM-MZ67-VE-078, B-C-SM-MZ89-VE-080, B-C-SM-MZ89-VE-083, B-C-SM-MZ68-VE-108, B-C-SM-MZ34-VE-116, B-C-SM-MZ58-VE-178, B-C-SM-MZ56-VE-191 y B-C-SM-MZ18-VE-202
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-052-22 con el asunto REITERACIÓN DE SOLICITUD PARA TOMAR ACCIONES FRENTE AL ATRASO DE OBRA medienta el cual solicitamos tomar acciones inmediatas que permitan reducir el porcentaje de atraso presentado de acuerdo a la reprogramación de obra, a la fecha del presente comunicado se tiene una cifra de 80 intervenciones terminadas y 36 en ejecución.
Sin embargo, con corte de informe semanal del 21 de agosto nos indicá un atraso del 14,23%. Lo que significa una pequeña disminución del atraso con respecto al corte anterior que fue de 14,82%
La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-053-22 con el asunto SOLICITUDES DE INCLUSION mediante el cual se remite para su debido tramite Veinte (20) solicitudes de inclusión teniendo en cuenta el PROTOCOLO PARA LA INCLUSION DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS AL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-054-22 con el asunto RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_081 mediante el cual realizamos entrega de aval para 14 diagnósticos presentados en comité de aprobación No. 015.

Marcy A. Correa C		Karol Javela	
Firma		**Firma**	
Nombre	Marcy Correa castaño	Nombre	Karol Yulieth Javela Pérez
	Directora de la interventoría	Supervisor	Supervisor ENTerritorio

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría

Enviar Informe para validación

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A		ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA		FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-013	2-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	**11**	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	2-jun-22	SI	SI	13-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-019	9-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	22	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	9-jun-22	SI	SI	14-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-026	16-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	18	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	16-jun-22	SI	SI	11-jul-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-032	28-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	13	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	28-jun-22	SI	SI	11-jul-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-039	8-jul-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	29	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	8-jul-22	SI	SI	13-jul-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-043	26-jul-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	10	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	26-jul-22	SI	NO	27-jul-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-049	8-ago-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	11	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	8-ago-22	SI	NO	12-ago-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-053	18-ago-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	20	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE	18-ago-22	NO	NO	

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA						
CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022	**FECHA**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO A**	**ENTIDAD**	**FECHA DE RADICADO**	**RESPUESTA RECIBIDA**	**FECHA DE RESPUESTA**
ARCA-INT/FDA276-TEC-025	15-jun-22	SOLICITUD ESPECIFICACIÓN TECNICA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	15-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA	FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-021	13-jun-22	SOLICITUD RESPUESTA AL CONCEPTO EMITIDO POR COOSEPCOR MEDIANTE ACTA DE REUNION DE OBRA	1	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	13-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta
ARCA-INT/FDA276-TEC-029	21-jun-22	OBRA REQUERIA EN LA VIA PUBLICA PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE LAS VIVIENDAS 001, 085, 088, 163	4	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	21-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA	FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-015	2-jun-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	24	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	2-jun-22	SI	3-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-023	15-jun-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	27	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	15-jun-22	SI	9-ago-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-034	2-jul-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	29	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	2-jul-22	SI	9-ago-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-041	13-jul-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	47	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	13-jul-22	SI	9-ago-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-048	5-ago-22	SOLICITUD RESPUESTA A OFICIOS TEC-023-22, TEC-034-22 y TEC-041-22 DE DISPONIBILIDAD DE REDES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	N/A	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	5-ago-22	SI	9/08/2022 se entreagaron los certificados sin oficio

INFORME PCI

Fecha de Corte	21/08/2022	PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS																											
Priorización		MATRIZ BASE						INCLUSIONES													TOTALES								
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No.2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Solicitudes de Inclusion	Atendida de la ESP	Atendida por la Alcaldia	Pendientes por atender ESP	Pendientes por atender Alcaldia	Respuesta positiva	Respuesta negativa	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Visitadas	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Recibidas a satisfaccion	Viviendas En ejecución.	Viviendas Programadas actividad No.3
Cordoba Bolivar	San Martin	217	0	206	10	203	1	136	134	114	0	20	94	19	20	0	10	0	217	206	10	213	1	116	80	0	36	0
	TOTAL	**217**	**0**	**206**	**10**	**203**	**1**	**136**	**134**	**114**	**0**	**20**	**94**	**19**	**20**	**0**	**10**	**0**	**217**	**206**	**10**	**213**	**1**	**116**	**80**	**0**	**36**	**0**

INFORME ESTADO DE COVID-19

enterritorio	**INFORME ESTADO DE COVID - 19**	CÓDIGO:	**F-GG-10**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15/08/2022 Y EL 21/08/2022 PLAZO: 5 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. CONTRATO No. 2220587

PERSONAL DEL CONTRATISTA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	OBSERVACIONES
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
DUARTE PINEDO - DIRECTOR DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD BLANCO - RESIDENTE DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RAFAEL CASTILLO - RESIDENTE SST	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
NORELIS ANAYA - TRABAJADORA SOCIAL	**ASTRAZENIKA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
OSWALDO GARZÓN - PROFESIONAL DIAGNOSTICO	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
SINDY ESCOBAR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**SINOVAC**		F	NO	NO	NO	SI	SI	

PERSONAL INTERVENTORIA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	**OBSERVACIONES**
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
MARCY CORREA - DIRECTOR INTERVENTORIA	**PFIZER**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD ARIETA - RESIDENTE INTERVENTORIA	**PFIZER**	**MODERNA**	M	NO	NO	NO	SI	SI	
FERNANDA GRIJALBA - PROFESIONAL SOCIAL	**MODERNA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
YIRA LEMUS - PROFESIONAL HSEQ	**AZTRAZENECA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
LEYDIS HERRERA - AUXILIAR SOCIAL	**JONSSON**	**JONSSON**	F	NO	NO	NO	SI	SI	

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Marcy A. Correa C

Firma:

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

REPORTE Y EJECUCIÒN DE VIVIENDAS SEMANALES

Ejecución de Actividad en Viviendas al Programa Conexiones Intradomiciliarias con corte a 21/08/2022

BARRIO	ACTA	No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización	Número de días Máximo permitido según tipo de intervención	Número de Dias de la Intervencion por parte del Contratista	Dias de cumplimiento o incumplimiento según tipo de intervención (-) atraso y (+) avance	¿SE ENCUENTRA RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR INTERVENTORÍA?	
															SI (X)	NO (X)
SM	1	1	B-C-SM-MZ29-VE-001	0%	Adecuacion	$7.967.801,13	$0,00			0/01/1900	5/01/1900	0	5	-5		x
SM	1	2	B-C-SM-MZ32-VE-002	100%	Caseta T3	$8.126.190,79	$8.126.190,79	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	8	16	-8		x
SM	1	3	B-C-SM-MZ32-VE-003	100%	Caseta T3	$7.914.431,13	$7.914.431,13	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	20/06/2022	8	16	-8		x
SM	1	4	B-C-SM-MZ18-VE-004	100%	Adecuacion	$7.636.382,30	$7.636.382,30	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	5	B-C-SM-MZ22-VE-005	100%	Adecuacion	$7.148.052,07	$7.148.052,07	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	12/06/2022	5	8	-3		x
SM	1	6	B-C-SM-MZ34-VE-006	100%	Adecuacion	$7.826.891,21	$7.826.891,21	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	7	B-C-SM-MZ22-VE-007	100%	Adecuacion	$7.415.092,49	$7.415.092,49	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	14/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	8	B-C-SM-MZ22-VE-009	100%	Caseta T3	$7.908.010,60	$7.908.010,60	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	16/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	9	B-C-SM-MZ21-VE-010	100%	Caseta T3	$8.928.931,81	$8.928.931,81	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	10	B-C-SM-MZ22-VE-011	100%	Adecuacion	$8.088.174,13	$8.088.174,13	8/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	21/06/2022	5	13	-8		x
SM	1	11	B-C-SM-MZ34-VE-012	100%	Caseta T3	$9.305.276,37	$9.305.276,37	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	12	B-C-SM-MZ21-VE-013	100%	Adecuacion	$5.457.782,54	$5.457.782,54	2/06/2022	TERMINADA	7/06/2022	11/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	13	B-C-SM-MZ21-VE-014	100%	Caseta T3	$8.614.149,98	$8.614.149,98	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	18/06/2022	8	14	-6		x
SM	1	14	B-C-SM-MZ21-VE-015	100%	Caseta T3	$8.265.079,43	$8.265.079,43	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	15	B-C-SM-MZ21-VE-016	100%	Caseta T3	$9.299.320,83	$9.299.320,83	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	8	14	-6		x
SM	1	16	B-C-SM-MZ38-VE-017	100%	Caseta T3	$8.532.396,85	$8.532.396,85	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		x
SM	2	17	B-C-SM-MZ24-VE-018	100%	Caseta T3	$8.502.042,22	$8.502.042,22	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	18	B-C-SM-MZ24-VE-019	100%	Adecuacion	$6.921.383,30	$6.921.383,30	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	19	B-C-SM-MZ24-VE-020	100%	Adecuacion	$4.593.449,33	$4.593.449,33	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	5	13	-8		x
SM	2	20	B-C-SM-MZ85-VE-021	100%	Caseta T3	$8.614.688,02	$8.614.688,02	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	22/06/2022	8	17	-9		x
SM	2	21	B-C-SM-MZ85-VE-022	100%	Caseta T3	$8.896.124,14	$8.896.124,14	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	22	B-C-SM-MZ85-VE-023	100%	Adecuacion	$8.133.478,61	$8.133.478,61	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	23	B-C-SM-MZ29-VE-024	100%	Adecuacion	$7.072.986,22	$7.072.986,22	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	2	24	B-C-SM-MZ31-VE-025	100%	Caseta T3	$8.637.204,11	$8.637.204,11	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	25	B-C-SM-MZ31-VE-026	100%	Adecuacion	$5.113.367,92	$5.113.367,92	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	19/06/2022	5	14	-9		x
SM	1	26	B-C-SM-MZ31-VE-027	100%	Adecuacion	$4.365.339,96	$4.365.339,96	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	14/06/2022	5	9	-4		x
SM	2	27	B-C-SM-MZ31-VE-028	100%	Adecuacion	$7.668.943,15	$7.668.943,15	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	13/06/2022	5	8	-3		x
SM	2	28	B-C-SM-MZ31-VE-029	100%	Caseta T3	$8.468.136,75	$8.468.136,75	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	29	B-C-SM-MZ31-VE-030	100%	Adecuacion	$4.637.820,16	$4.637.820,16	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	30	B-C-SM-MZ31-VE-031	100%	Caseta T2	$8.119.008,44	$8.119.008,44	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	31	B-C-SM-MZ56-VE-038	100%	Adecuacion	$8.227.630,94	$8.227.630,94	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	32	B-C-SM-MZ56-VE-039	100%	Adecuacion	$1.443.687,77	$1.443.687,77	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	33	B-C-SM-MZ46-VE-040	100%	Adecuacion	$6.628.376,66	$6.628.376,66	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	34	B-C-SM-MZ45-VE-041	100%	Adecuacion	$4.845.221,48	$4.845.221,48	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	35	B-C-SM-MZ21-VE-042	100%	Adecuacion	$4.634.812,47	$4.634.812,47	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	36	B-C-SM-MZ31-VE-043	100%	Caseta T3	$6.939.713,07	$6.939.713,07	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	37	B-C-SM-MZ145-VE-044	100%	Caseta T3	$7.980.826,25	$7.980.826,25	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	38	B-C-SM-MZ55-VE-046	100%	Caseta T3	$7.344.533,10	$7.344.533,10	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	39	B-C-SM-MZ55-VE-047	100%	Caseta T2	$7.890.285,26	$7.890.285,26	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	40	B-C-SM-MZ145-VE-053	100%	Caseta T3	$8.262.443,76	$8.262.443,76	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	41	B-C-SM-MZ91-VE-054	100%	Caseta T2	$8.230.167,20	$8.230.167,20	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	42	B-C-SM-MZ56-VE-055	100%	Adecuacion	$3.160.157,78	$3.160.157,78	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	6	43	B-C-SM-MZ55-VE-056	100%	Adecuacion	$8.215.661,11	$8.215.661,11	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	44	B-C-SM-M55-VE-061	100%	Adecuacion	$7.040.722,29	$7.040.722,29	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x
SM	4	45	B-C-SM-MZ56-VE-062	100%	Caseta T2	$8.362.124,52	$8.362.124,52	14/06/2022	TERMINADA	22/06/2022	28/06/2022	8	14	-6		x

SM	4	46	B-C-SM-MZ66-VE-067	100%	Caseta T3	$7.306.146,52	$7.306.146,52	14/06/2022	**TERMINADA**	**22/06/2022**	28/06/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	4	47	B-C-SM-MZ66-VE-068	100%	Caseta T3	$7.971.707,31	$7.971.707,31	14/06/2022	**TERMINADA**	**22/06/2022**	28/06/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	4	48	B-C-SM-MZ75-VE-071	100%	Adecuacion	$7.170.024,86	$7.170.024,86	14/06/2022	**TERMINADA**	**19/06/2022**	25/06/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	4	49	B-C-SM-MZ75-VE-072	100%	Caseta T3	$8.040.278,46	$8.040.278,46	14/06/2022	**TERMINADA**	**22/06/2022**	28/06/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	4	50	B-C-SM-MZ75-VE-073	100%	Caseta T3	$8.332.036,11	$8.332.036,11	14/06/2022	**TERMINADA**	**22/06/2022**	28/06/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	5	51	B-C-SM-MZ75-VE-074	100%	Caseta T3	$7.656.034,05	$7.656.034,05	21/06/2022	**TERMINADA**	**29/06/2022**	5/07/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	4	52	B-C-SM-MZ89-VE-084	100%	Caseta T3	$8.247.304,21	$8.247.304,21	21/06/2022	**TERMINADA**	**29/06/2022**	5/07/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	5	53	B-C-SM-MZ69-VE-087	100%	Adecuacion	$7.074.492,71	$7.074.492,71	21/06/2022	**TERMINADA**	**26/06/2022**	2/07/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	5	54	B-C-SM-MZ69-VE-O88	100%	Adecuacion	$7.465.862,82	$7.465.862,82	21/06/2022	**TERMINADA**	**26/06/2022**	2/07/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	6	55	B-C-SM-MZ77-VE-O94	100%	Adecuacion	$3.585.305,08	$3.585.305,08	21/06/2022	**TERMINADA**	**26/06/2022**	2/07/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	10	56	B-C-SM-MZ68-VE-097	100%	Caseta T3	$8.172.428,90	$8.172.428,90	21/06/2022	**TERMINADA**	**29/06/2022**	5/07/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	7	57	B-C-SM-MZ59-VE-099	100%	Adecuacion	$6.098.594,42	$6.098.594,42	21/06/2022	**TERMINADA**	**26/06/2022**	2/07/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	5	58	B-C-SM-MZ84-VE-166	100%	Adecuacion	$6.744.749,39	$6.744.749,39	22/06/2022	**TERMINADA**	**27/06/2022**	3/07/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	10	59	B-C-SM-MZ84-VE-175	100%	Adecuacion	$6.901.938,50	$6.901.938,50	23/06/2022	**TERMINADA**	**28/06/2022**	4/07/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	8	60	B-C-SM-MZ55-VE-060	100%	Caseta T4	$9.444.985,92	$9.444.985,92	24/06/2022	**TERMINADA**	**2/07/2022**	8/07/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	4	61	B-C-SM-MZ66-VE-069	100%	Adecuacion	$6.509.744,54	$6.509.744,54	25/06/2022	**TERMINADA**	**30/06/2022**	6/07/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	3	62	B-C-SM-MZ30-VE-032	100%	Adecuacion	$7.557.018,99	$7.557.018,99	26/06/2022	**TERMINADA**	**1/07/2022**	7/07/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	3	63	B-C-SM-MZ44-VE-034	100%	Adecuacion	$5.519.347,12	$5.519.347,12	27/06/2022	**TERMINADA**	**2/07/2022**	8/07/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	3	64	B-C-SM-MZ44-VE-035	45%	Adecuacion	$8.137.626,09	$3.661.931,74	28/06/2022	**EN EJECUCION**	**3/07/2022**	9/07/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	6	65	B-C-SM-MZ69-VE-085	100%	Adecuacion	$6.566.494,56	$6.566.494,56	29/06/2022	**TERMINADA**	**4/07/2022**	10/07/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	6	66	B-C-SM-MZ58-VE-100	100%	Caseta T2	$7.970.674,94	$7.970.674,94	30/07/2022	**TERMINADA**	**7/08/2022**	13/08/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	7	67	B-C-SM-MZ47-VE-104	100%	Adecuacion	$8.247.586,36	$8.247.586,36	30/07/2022	**TERMINADA**	**4/08/2022**	10/08/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	10	68	B-C-SM-MZ58-VE-107	100%	Adecuacion	$7.990.185,62	$7.990.185,62	30/07/2022	**TERMINADA**	**4/08/2022**	10/08/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	7	69	B-C-SM-MZ58-VE-110	100%	Adecuacion	$6.954.066,54	$6.954.066,54	30/07/2022	**TERMINADA**	**4/08/2022**	10/08/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	7	70	B-C-SM-MZ47-VE-111	100%	Caseta t3	$8.318.089,49	$8.318.089,49	3/08/2022	**TERMINADA**	**11/08/2022**	17/08/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	7	71	B-C-SM-MZ47-VE-112	100%	Adecuacion	$6.827.279,63	$6.827.279,63	3/08/2022	**TERMINADA**	**8/08/2022**	14/08/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	8	72	B-C-SM-MZ47-VE-113	100%	Adecuacion	$5.043.864,80	$5.043.864,80	3/08/2022	**TERMINADA**	**8/08/2022**	14/08/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	7	73	B-C-SM-MZ47-VE-114	100%	Caseta t3	$7.850.343,91	$7.850.343,91	3/08/2022	**TERMINADA**	**11/08/2022**	17/08/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	8	74	B-C-SM-MZ47-VE-115	85%	Caseta t3	$8.322.147,74	$7.073.825,58	3/08/2022	**EN EJECUCION**	**11/08/2022**	17/08/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	11	75	B-C-SM-MZ21-VE-118	70%	Caseta t3	$8.148.709,57	$5.704.096,70	3/08/2022	**EN EJECUCION**	**11/08/2022**	17/08/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	9	76	B-C-SM-MZ30-VE-121	100%	Caseta t3	$7.765.616,43	$7.765.616,43	3/08/2022	**TERMINADA**	**11/08/2022**	17/08/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	7	77	B-C-SM-MZ59-VE-102	100%	Caseta T2	$8.805.748,18	$8.805.748,18	3/08/2022	**TERMINADA**	**11/08/2022**	17/08/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	6	78	B-C-SM-MZ58-VE-101	100%	Adecuacion	$5.300.910,78	$5.300.910,78	3/08/2022	**TERMINADA**	**8/08/2022**	14/08/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	8	79	B-C-SM-MZ30-VE-122	100%	Caseta t3	$8.106.560,85	$8.106.560,85	5/08/2022	**TERMINADA**	**13/08/2022**	19/08/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	7	80	B-C-SM-MZ30-VE-124	80%	Caseta t3	$7.850.343,91	$6.280.275,13	5/08/2022	**EN EJECUCION**	**13/08/2022**	19/08/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	9	81	B-C-SM-MZ87-VE-125	100%	Caseta t3	$8.100.577,85	$8.100.577,85	5/08/2022	**TERMINADA**	**13/08/2022**	19/08/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	9	82	B-C-SM-MZ87-VE-126	100%	Caseta t3	$8.057.934,94	$8.057.934,94	6/08/2022	**TERMINADA**	**14/08/2022**	20/08/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	9	83	B-C-SM-MZ30-VE-127	100%	Caseta t3	$7.998.497,33	$7.998.497,33	6/08/2022	**TERMINADA**	**14/08/2022**	20/08/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	9	84	B-C-SM-MZ31-VE-142	100%	Adecuacion	$7.456.473,74	$7.456.473,74	6/08/2022	**TERMINADA**	**11/08/2022**	17/08/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	9	85	B-C-SM-MZ87-VE-128	75%	Adecuacion	$7.523.102,18	$5.642.326,64	6/08/2022	**EN EJECUCION**	**11/08/2022**	17/08/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	6	86	B-C-SM-MZ87-VE-129	35%	Caseta t3	$8.132.932,39	$2.846.526,34	6/08/2022	**EN EJECUCION**	**14/08/2022**	20/08/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	5	87	B-C-SM-MZ66-VE-131	35%	Caseta t3	$8.139.325,77	$2.848.764,02	11/08/2022	**EN EJECUCION**	**19/08/2022**	25/08/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	11	88	B-C-SM-MZ67-VE-133	45%	Adecuacion	$6.390.026,30	$2.875.511,84	11/08/2022	**EN EJECUCION**	**16/08/2022**	22/08/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	10	89	B-C-SM-MZ66-VE-134	45%	Adecuacion	$8.426.367,54	$3.791.865,39	11/08/2022	**EN EJECUCION**	**16/08/2022**	22/08/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	6	90	B-C-SM-MZ56-VE-135	45%	Adecuacion	$7.522.231,25	$3.385.004,06	11/08/2022	**EN EJECUCION**	**16/08/2022**	22/08/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	5	91	B-C-SM-MZ56-VE-136	45%	Adecuacion	$7.922.709,35	$3.565.219,21	11/08/2022	**EN EJECUCION**	**16/08/2022**	22/08/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	5	92	B-C-SM-MZ56-VE-138	45%	Adecuacion	$7.984.245,73	$3.592.910,58	11/08/2022	**EN EJECUCION**	**16/08/2022**	22/08/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	5	93	B-C-SM-MZ56-VE-139	45%	Caseta t3	$7.415.285,53	$3.336.878,49	11/08/2022	**EN EJECUCION**	**19/08/2022**	25/08/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	5	94	B-C-SM-MZ56-VE-140	45%	Caseta t3	$8.097.289,18	$3.643.780,13	11/08/2022	**EN EJECUCION**	**19/08/2022**	25/08/2022	8	**14**	**-6**		**x**

SM	7	95	B-C-SM-MZ47-VE-103	100%	Adecuacion	$8.549.349,69	$8.549.349,69	9/08/2022	**TERMINADA**	**14/08/2022**	20/08/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	12	96	B-C-SM-MZ69-VE-086	50%	Caseta t3	$8.441.178,67	$4.220.589,34	15/08/2022	**EN EJECUCION**	**23/08/2022**	29/08/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	7	97	B-C-SM-MZ32-VE-143	50%	Caseta t3	$8.877.043,95	$4.438.521,98	15/08/2022	**EN EJECUCION**	**23/08/2022**	29/08/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	6	98	B-C-SM-MZ87-VE-145	20%	Caseta t3	$8.314.813,05	$1.662.962,61	18/08/2022	**EN EJECUCION**	**26/08/2022**	1/09/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	6	99	B-C-SM-MZ87-VE-146	15%	Adecuacion	$7.503.681,08	$1.125.552,16	19/08/2022	**EN EJECUCION**	**24/08/2022**	30/08/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	6	100	B-C-SM-MZ87-VE-147	20%	Caseta t3	$8.285.180,86	$1.657.036,17	20/08/2022	**EN EJECUCION**	**28/08/2022**	3/09/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	6	101	B-C-SM-MZ87-VE-148	20%	Caseta t3	$8.170.302,32	$1.634.060,46	21/08/2022	**EN EJECUCION**	**29/08/2022**	4/09/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	5	102	B-C-SM-MZ89-VE-149	20%	Caseta t3	$8.178.886,20	$1.635.777,24	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	5	103	B-C-SM-MZ89-VE-150	25%	Caseta t3	$8.339.015,83	$2.084.753,96	23/08/2022	**EN EJECUCION**	**31/08/2022**	6/09/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	8	104	B-C-SM-MZ89-VE-151	20%	Adecuacion	$7.760.503,36	$1.552.100,67	24/08/2022	**EN EJECUCION**	**29/08/2022**	4/09/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	5	105	B-C-SM-MZ56-VE-152	20%	Caseta t2	$8.292.567,48	$1.658.513,50	25/08/2022	**EN EJECUCION**	**2/09/2022**	8/09/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	7	106	B-C-SM-MZ76-VE-153	20%	Adecuacion	$6.803.533,70	$1.360.706,74	26/08/2022	**EN EJECUCION**	**31/08/2022**	6/09/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	9	107	B-C-SM-MZ075-VE-154	20%	Adecuacion	$7.419.892,36	$1.483.978,47	27/08/2022	**EN EJECUCION**	**1/09/2022**	7/09/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	7	108	B-C-SM-MZ75-VE-155	20%	Adecuacion	$7.958.081,38	$1.591.616,28	28/08/2022	**EN EJECUCION**	**2/09/2022**	8/09/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	5	109	B-C-SM-MZ75-VE-156	20%	Adecuacion	$8.011.976,60	$1.602.395,32	29/08/2022	**EN EJECUCION**	**3/09/2022**	9/09/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	11	110	B-C-SM-MZ145-VE-157	20%	Adecuacion	$9.653.914,02	$1.930.782,80	30/08/2022	**EN EJECUCION**	**4/09/2022**	10/09/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	5	111	B-C-SM-MZ75-VE-158	20%	Adecuacion	$6.846.229,60	$1.369.245,92	31/08/2022	**EN EJECUCION**	**5/09/2022**	11/09/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	11	112	B-C-SM-MZ-VE145-160	20%	Adecuacion	$9.325.691,25	$1.865.138,25	1/09/2022	**EN EJECUCION**	**6/09/2022**	12/09/2022	5	**11**	**-6**		**x**
SM	11	113	B-C-SM-MZ-VE145-162	20%	Adecuacion	$7.000.723,74	$1.400.144,75	2/09/2022	**EN EJECUCION**	**2/09/2022**	8/09/2022		**6**	**-6**		**x**
SM	5	114	B-C-SM-MZ84-VE-165	20%	Caseta t3	$8.259.418,86	$1.651.883,77	3/09/2022	**EN EJECUCION**	**11/09/2022**	17/09/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	6	115	B-C-SM-MZ91-VE-167	20%	Adecuacion	$7.334.345,73	$1.466.869,15	4/09/2022	**EN EJECUCION**	**4/09/2022**	10/09/2022		**6**	**-6**		**x**
SM	9	121	B-C-SM-MZ77-VE-179	20%	Caseta t3	$8.930.810,61	$1.786.162,12	10/09/2022	**EN EJECUCION**	**18/09/2022**	24/09/2022	8	**14**	**-6**		**x**
SM	9	122	B-C-SM-MZ87-VE-180	20%	Caseta t3	$8.116.195,29	$1.623.239,06	11/09/2022	**EN EJECUCION**	**19/09/2022**	25/09/2022	8	**14**	**-6**		**x**

CUADRO DE PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PROGRAMAS Y EJECUTADAS

Fechas de Corte		Actividad 1		Actividad 2			Actividad 3			Actividad 4		Total	
			$ 5.140.026,35			$ 39.313.349,11			$ 1.727.254.570,53		$ -		$ 1.771.707.945,99
											$ -		$ -
			$ 5.140.026,35			$ 39.313.349,11			$ 1.727.254.570,53		$ -		$ 1.771.707.945,99
	Semana 0	0,00%	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		$ -	**0,00%**	**$ -**
1/05/2022	**Semana 1**	100,00%	$ 5.140.026,35	5,07%	11	$ 1.992.842,58	0,00%	0	$ -		$ -	**0,40%**	**$ 7.132.868,93**
8/05/2022	**Semana 2**	100,00%	$ 5.140.026,35	10,14%	22	$ 3.985.685,16	0,00%	0	$ -		$ -	**0,52%**	**$ 9.125.711,51**
15/05/2022	**Semana 3**	100,00%	$ 5.140.026,35	15,21%	33	$ 5.978.527,74	0,00%	0	$ -		$ -	**0,63%**	**$ 11.118.554,09**
22/05/2022	**Semana 4**	100,00%	$ 5.140.026,35	20,28%	44	$ 7.971.370,33	0,92%	2	$ 15.919.396,96		$ -	**1,64%**	**$ 29.030.793,64**
29/05/2022	**Semana 5**	100,00%	$ 5.140.026,35	25,35%	55	$ 9.964.212,91	1,84%	4	$ 31.838.793,93		$ -	**2,65%**	**$ 46.943.033,18**
5/06/2022	**Semana 6**	100,00%	$ 5.140.026,35	30,41%	66	$ 11.957.055,49	2,30%	5	$ 39.798.492,41		$ -	**3,21%**	**$ 56.895.574,25**
12/06/2022	**Semana 7**	100,00%	$ 5.140.026,35	35,48%	77	$ 13.949.898,07	2,76%	6	$ 47.758.190,89		$ -	**3,77%**	**$ 66.848.115,31**
19/06/2022	**Semana 8**	100,00%	$ 5.140.026,35	40,09%	87	$ 15.761.573,15	4,15%	9	$ 71.637.286,34		$ -	**5,22%**	**$ 92.538.885,83**
26/06/2022	**Semana 9**	100,00%	$ 5.140.026,35	44,70%	97	$ 17.573.248,22	5,07%	11	$ 87.556.683,30		$ -	**6,22%**	**$ 110.269.957,87**
3/07/2022	**Semana 10**	100,00%	$ 5.140.026,35	58,53%	127	$ 23.008.273,44	11,06%	24	$ 191.032.763,56		$ -	**12,37%**	**$ 219.181.063,35**
10/07/2022	**Semana 11**	100,00%	$ 5.140.026,35	72,35%	157	$ 28.443.298,66	17,05%	37	$ 294.508.843,82		$ -	**18,52%**	**$ 328.092.168,84**
17/07/2022	**Semana 12**	100,00%	$ 5.140.026,35	86,18%	187	$ 33.878.323,89	23,04%	50	$ 397.984.924,09		$ -	**24,67%**	**$ 437.003.274,32**
24/07/2022	**Semana 13**	100,00%	$ 5.140.026,35	92,00%	200	$ 36.168.281,18	27,65%	60	$ 477.581.908,90		$ -	**29,29%**	**$ 518.890.216,43**
31/07/2022	**Semana 14**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	**32,26%**	**70**	$ 557.178.893,72		$ -	**33,96%**	**$ 601.632.269,18**
7/08/2022	**Semana 15**	100,00%	$ 5.140.026,35	**100,00%**	**217**	$ 39.313.349,11	**37,33%**	81	$ 644.735.577,02		$ -	**38,90%**	**$ 689.188.952,48**
14/08/2022	Semana 16	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	44,70%	97	$ 772.090.752,73		$ -	**46,09%**	**$ 816.544.128,19**
21/08/2022	**Semana 17**	**100,00%**	**$ 5.140.026,35**	**100,00%**	**217**	**$ 39.313.349,11**	**52,07%**	**113**	**$ 899.445.928,43**		$ -	**53,28%**	**$ 943.899.303,89**
28/08/2022	**Semana 18**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	59,91%	130	$ 1.034.760.802,62		$ -	**60,91%**	**$ 1.079.214.178,08**
4/09/2022	**Semana 19**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	70,05%	152	$ 1.209.874.169,22		$ -	**70,80%**	**$ 1.254.327.544,68**
11/09/2022	**Semana 20**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	80,18%	174	$ 1.384.987.535,82		$ -	**80,68%**	**$ 1.429.440.911,28**
18/09/2022	**Semana 21**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	90,32%	196	$ 1.560.100.902,41		$ -	**90,57%**	**$ 1.604.554.277,87**
26/09/2022	**Semana 22**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	100,00%	217	$ 1.727.254.570,53		$ -	**100,00%**	**$ 1.771.707.945,99**

Fechas de Corte		Actividad 1		Actividad 2			Actividad 3			Actividad 4		Total	
		$	5.140.026,35	$		39.313.349,11	$		1.727.254.570,53	$	-	$	1.771.707.945,99
										$	-	$	-
		$	5.140.026,35	$		39.313.349,11	$		1.727.254.570,53	$	-	$	1.771.707.945,99
	Semana 0	0,00%	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		$ -	**0,00%**	**$ -**
1/05/2022	**Semana 1**	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,15%**	**$ 2.570.013,18**
8/05/2022	**Semana 2**	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,15%**	**$ 2.570.013,18**
15/05/2022	**Semana 3**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
22/05/2022	**Semana 4**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
29/05/2022	**Semana 5**	100,00%	$ 5.140.026,35	11,06%	24	$ 4.348.020,18	1,38%	3	$ 22.883.102,57		$ -	**1,83%**	**$ 32.371.149,10**
5/06/2022	**Semana 6**	100,00%	$ 5.140.026,35	13,82%	30	$ 5.435.025,22	2,76%	6	$ 45.766.205,14		$ -	**3,18%**	**$ 56.341.256,71**
12/06/2022	**Semana 7**	100,00%	$ 5.140.026,35	19,35%	42	$ 7.609.035,31	4,61%	10	$ 76.277.008,56		$ -	**5,02%**	**$ 89.026.070,22**
19/06/2022	**Semana 8**	100,00%	$ 5.140.026,35	23,50%	51	$ 9.239.542,88	6,45%	14	$ 106.787.811,98		$ -	**6,84%**	**$ 121.167.381,21**
26/06/2022	**Semana 9**	100,00%	$ 5.140.026,35	32,72%	71	$ 12.862.893,03	8,29%	18	$ 137.298.615,41		$ -	**8,77%**	**$ 155.301.534,78**
3/07/2022	**Semana 10**	100,00%	$ 5.140.026,35	43,32%	94	$ 17.029.745,70	10,14%	22	$ 167.809.418,83		$ -	**10,72%**	**$ 189.979.190,88**
10/07/2022	**Semana 11**	100,00%	$ 5.140.026,35	53,00%	115	$ 20.834.263,35	11,98%	26	$ 198.320.222,25		$ -	**12,66%**	**$ 224.294.511,96**
17/07/2022	**Semana 12**	100,00%	$ 5.140.026,35	64,98%	141	$ 25.544.618,55	13,82%	30	$ 228.831.025,68		$ -	**14,65%**	**$ 259.515.670,57**
24/07/2022	**Semana 13**	100,00%	$ 5.140.026,35	64,98%	141	$ 25.544.618,55	20,74%	45	$ 343.246.538,51		$ -	**21,11%**	**$ 373.931.183,41**
31/07/2022	**Semana 14**	100,00%	$ 5.140.026,35	73,73%	160	$ 28.986.801,19	22,12%	48	$ 366.129.641,08		$ -	**22,59%**	**$ 400.256.468,62**
7/08/2022	**Semana 15**	100,00%	$ 5.140.026,35	78,34%	170	$ 30.798.476,26	27,65%	60	$ 457.662.051,35		$ -	**27,86%**	**$ 493.600.553,96**
14/08/2022	Semana 16	100,00%	$ 5.140.026,35	82,49%	179	$ 32.428.983,83	30,41%	66	$ 503.428.256,49		$ -	**30,54%**	**$ 540.997.266,67**
21/08/2022	**Semana 17**	**100,00%**	**$ 5.140.026,35**	**93,55%**	**203**	**$ 36.777.004,01**	**36,87%**	**80**	**$ 610.216.068,47**		$ -	**36,81%**	**$ 652.133.098,83**
28/08/2022	**Semana 18**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
4/09/2022	**Semana 19**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
11/09/2022	**Semana 20**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
18/09/2022	**Semana 21**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ 1.727.254.570,53		$ -	**100,00%**	**$ 1.771.707.945,99**
26/09/2022	**Semana 22**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0					

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 18	CÓDIGO:	F-GG-06
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 018

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **22/08/2022** al **28/08/2022** | Fecha **28/08/2022**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO PROYECTO	
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** BOLIVAR — **MUNICIPIO** CORDOBA
GERENCIA A CARGO	ENTERRITORIO
SUPERVISOR	ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITAN
ESTADO DEL PROYECTO	EN EJECUCIÓN ACTIVIDAD 2 Y 3

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.			2220576
Contratista			CONSORCIO CONSTRUREDES
Valor inicial	$		1.771.707.945,99
Valor actual	$		1.771.707.945,99
Variación del valor	$		-
Fecha de Inicio			26/04/2022
Plazo inicial (Días)			150 Días
Plazo actual (Días)	150 Días		5 MESES - 150 DÍAS
Variación en plazo			Días
Fecha Contractual de terminación			26/09/2022
Tiempo Transcurrido (días)	124		82,67%
Días remanentes del Contrato	29,00		19,33%
Acumulado a última acta pagada			
Estimado ejecutado por llevar a acta			$ 671.723.377,43

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.			2220587
Interventor			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS.
Valor inicial	$		202.479.313,00
Valor actual	$		202.479.313,00
Variación del valor	$		-
Fecha de Inicio			26/04/2022
Plazo inicial			150 Días
Plazo actual	150 Días		5 MESES - 150 DÍAS
Variación en plazo			Días
Fecha Contractual de terminación			26/09/2022
Ejecución del Contrato	124		82,67%
Días remanentes del Contrato	29,00		19,33%
Acumulado a última acta pagada	$		32.396.690,09
Estimado ejecutado por llevar a acta			

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 1.771.707.945,99

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 1.011.556.740,78	57,10%	$ 759.354.025,65	42,86%	-$ 252.202.715,13	-14,24%
Durante el Periodo	$ 155.214.120,36	8,76%	$ 156.918.242,57	8,86%	$ 1.704.122,21	0,10%
Acumulado a la Fecha	**$ 1.166.770.861,14**	**65,86%**	**$ 916.272.268,22**	**51,72%**	**-$ 250.498.592,92**	**-14,14%**

Semáforo


Desviación en días: 21 Días




Observaciones al desempeño del proyecto

De acuerdo a la reprogramación de obra el programado nos indica un 65,86% frente a un ejecutado del 51,72% indicándonos un atraso de 14,14%
De acuerdo a la reprogramación de obra se debería tener un total de 217 diagnósticos aprobados a la fecha, durante la semana del presente informe se aprobaron 14 diagnósticos, completando 217 avalados, lo cual nos indica que se aprobó la cifra inicialmente comtemplada en el contrato.
En cuanto a la actividad 3 el contratista de acuerdo a la reprogramación de obra debería tener 130 viviendas terminadas al 100%, y a la fecha se han intervenido 133 viviendas, de las cuales se han terminado 91 y se adelantan labores constructivas en 42 más, el contratista cuenta con 24 frentes de trabajo.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

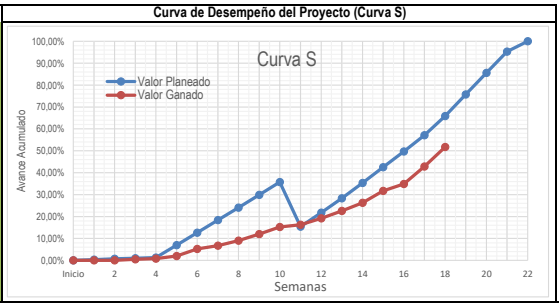




CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

A la fecha del presente informe no se han presntado cambios en la LINEA BASE.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	57,10%	42,86%	-14,24%	
Durante el Periodo	8,76%	8,86%	0,10%	
Acumulado a la Fecha	**65,86%**	**51,72%**	**-14,14%**	

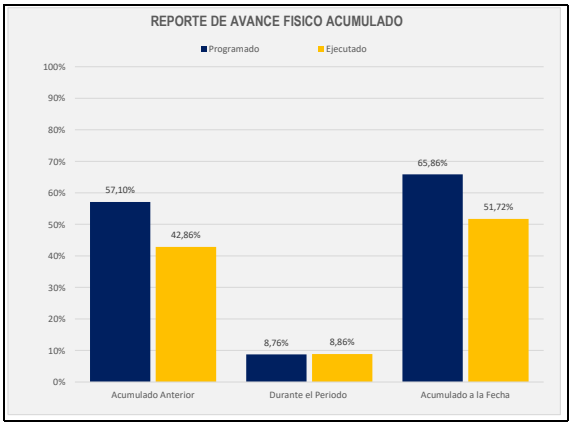


AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 1.771.707.945,99	$ 1.771.707.945,99	$ -	$ 345.450.914,11		$ 345.450.914,11

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
1	$ 379.134.821,64	21,40%	1		0,00%		








AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 202.479.313,00	$ 202.479.313,00	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
3	$ 32.396.690,09	16,00%	2	$ 32.396.690,09	16,00%	13/07/2022	$ 16.198.346,04







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 018

Entidad Contratante: ENTERRITORIO | Semana del 22/08/2022 al 28/08/2022 | Fecha 28/08/2022

ACTIVIDAD No. 1
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: Actividad No. 1, la aprobación de la actividad N° 1 se hizo comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-037-22 del 3 de junio de 2022. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
ACTIVIDAD No. 2
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: La Actividad No. 2, De acuerdo a la reprogramación de obra este ítems debería estas con la totalidad de los diagnósticos terminados, durante la semana del presente informe se hicieron 14 aprobaciones de diagnósticos, completando 217, lo cual nos indica que se aprobó la cifra inicialmente comtemplada en el contrato.
ACTIVIDAD No. 3
PROGRAMADO 65,86% vs 51,72% EJECUTADO
Comentario: La Actividad No. 3 nos indica un atraso de 14,14%, de acuerdo a la reprogramación de obra debería tener 130 viviendas terminadas, sin embargo, ha intervenido 133 viviendas de las cuales solo 91 están terminadas y se adelantan trabajos constructivos en otras 42 más, el contratista cuenta con 24 cuadrillas de trabajo.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

En el ítem ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10. El contratista subsanó los diseños de las casetas y el diseño de la estructura para el tanque elevado, también realizó entrega del informe técnico especialista estructural el cual fue aprobado por la interventoría con lo cual esta actividad queda en un 100% de su ejecución. Sin embargo, el Contratista posteriormente solicitó un cambio de especificaciones en algunos ítems, uno de ellos el ladrillo de arcilla por bloque de Concreto, razón por la cual se hace necesario ajustar el diseño estructural con dicho cambio. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
El ítem ACTIVIDAD 2: DIAGNOSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. Esta actividad se completó en un 100%, el contratista hizo entrega de los diagnósticos pendientes para completar la meta de los 217 establecidos contractualmente, sin embargo se siguen elaborando más diagnósticos hasta ajustar la ejecución del 100% el valor contractual de la actividad N° 3.
En el ítem ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS. ACTA DE ENTREGA Y RECIBOS DE LAS OBRAS
A la fecha y de acuerdo la reprogramación de obra el contratista debería tener 130 viviendas terminadas, y se han intervenido 133 viviendas, de las cuales solo 91 están terminadas indicándonos un atraso de 39. El contratista tiene en ejecución 42 viviendas y se continúa incrementando el personal de obra con el fin de seguir disminuyendo los atraso registrados.
En las casetas tipo 3 y otras intervenciones se ha avanzado en actividades como: cimentación, mampostería, fundición de columnas y columnetas, pañetes, instalación de tubería hidrosanitaria, instalación de aparatos sanitarios, instalación de tejas para cubierta, instalación de puertas metálicas, instalación de tanque elevado de 500 Lts, de igual forma se adelantan labores en intervenciones correspondientes a adecuaciones, construcción de estructura para el tanque elevado, cambio de pañete, instalación de enchape de pared y pisos y cambio de equipos sanitarios, para estas actividades el contratista cuenta con 22 frentes de trabajo


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Para la próxima semana correspondiente al periodo del 29 de agosto y el 04 de septiembre de 2022 y teniendo en cuenta que ya se completaron los 217 diagnosticos inicialmente contemplados en el contrato de obra el contratista debe segir presentado los diagnosticos de las incluciones para aprobacion hasta que se agote la totalidad del monto presupuestal del contrato.
El contratista en la actividad 3 debe continuar con la ejecución de obra completando la intervención de 152 viviendas 100% de acuerdo a la reprogramación de obra.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTIÓN SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0

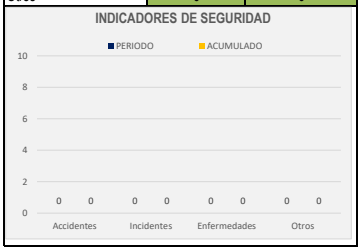

Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	20	7	27	100,0%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0	0,0%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál?	0	0	0	0,0%
	Total	**20**	**7**	**27**	**100,00%**


HORAS PERDIDAS SEMANALES
Acumulado Anterior
Semana Actual
Acumulado
Horas Perdidas
50
25
0
20
7
27
0 0 0 0 0 0 0

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 018

Entidad Contratante: ENTERRITORIO | Semana del 22/08/2022 al 28/08/2022 | Fecha 28/08/2022

GESTIÓN SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
	N/A			N/A		
	N/A			N/A		

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
INCLUSION 139	CANDELARIA VELASQUEZ	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 140	LEIDIS NOVOA OSUNA	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 141	ILSE MARTINEZ DE AVILA	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 142	ANA MARIA ROMERA	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 143	DENIS MEDINA DE PEREZ	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 144	EDITH RIVERA ESCOBAR	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 145	ANTONIO CANTILLO	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 146	JESUS OCHOA OCHOA	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 147	DILIA ELENA FERNANDEZ ANAYA	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 148	DENIS GONZALEZ MARTINEZ	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 149	YULEIDIS BARRIOS HERRERA	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 150	RUMALDA PATERNINA ORTEGA	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 151	DINA MARGARITA MEDINA MEDINA	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 152	LUCILA ROSA GONZALEZ MARTINEZ	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 153	MONICA PTRICIA CACERES MEZA	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 154	LUZMARI FERNANDEZ ANAYA	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 155	NESLI MARTINEZ ATENCIO	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 156	YOLEMIS VILLAMIZAR RODRIGUEZ	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 157	IDA ILDA RODRIGUEZ PIÑA	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 158	LORENZO MIGUEL PIÑA AHUMADA	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 159	IVAN BALLESTAS BARRIOS	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 160	YANETH ARIA BECERRA	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 161	CANDELARIA BARRIOS ROMERO	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 162	ROSA BARRIOS ROMERO	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 163	YEIDIS RODRIGUEZ	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 164	GERMAN FLOREZ	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 165	NUR MARIA RODRIGUEZ	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 166	YENIS DIAZ AGUILAR	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 167	JONNY ORTEGA BENAVIDES	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 168	EVA RODRIGUEZ PORTO	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 169	DOMINGO PEREZ	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 170	ENGERIS MEJIA ORTEGA	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 171	WILMAR RUENES	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 172	ELIZABETH LOPEZ PIÑA	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 173	YEISON ALVAREZ HENAO	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 174	OLFA MARINA OCHOA	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 175	HORACIO MANCERA	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 176	CARLOS EDUARDO MARTINEZ	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 177	VITALIA ESTHER NAVARRO	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 178	ADELA DEL PILAR CARDONA	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 179	GLADIS POLO VERGARA	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 180	ANA CANTILLO LOPEZ	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 181	ZUNILDA TOBIAS	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 182	EMETERIO BECERRA	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 183	ABEL VILLARREAL PINTO	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 184	ROBINSON TARRA DIAZ	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 185	SIGRIS GALVAN TORRES	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 186	LUIS DAZA HERNANDEZ	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 187	RUBEN DARIO ALVIS	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 188	MARIA PEREZ JIMENEZ	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 189	GEORGINA CALVO	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 190	DIGNA LUZ BARRIOS	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 191	ERASMO RODRIGUEZ	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 192	ROSA ACOSTA CANTILLO	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 193	NELFIS OSPINO BAENA	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 194	LESBIA MANUELA RAMIREZ	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 195	SIXTA MEDINA ROMERO	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 196	ENALDO MEDINA TORRES	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 197	MARIA EUGENIA GUISADO	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 198	DENIS ESTELA ESCOBAR	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 199	EDILMA ROSA VERGARA	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 200	ALVARO JOSE CASERES SIERRA	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 201	PEDRO MANUEL RIVERA PUERTA	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 202	ELIZABETH LOPEZ PIÑA	20/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 203	JAIR POLO PADILLA	24/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 204	ELIZABETH VILLAFAÑE	24/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 205	EDWIN ESCOBAR	24/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 206	DAISY OCHOA YEPEZ	24/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 207	LEONARDO FONSECA	24/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 208	WILHEM PORTO ALVIS	24/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 209	WOLMEN MEDINA	24/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 210	JOAQUIN RIVERA	24/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 211	ESTHER VANEGA ORTEGA	24/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 212	KEIVIS MEJIA BELTRAN	24/08/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA

7. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 018

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **22/08/2022** al **28/08/2022** Fecha **28/08/2022**

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA









CASETA TIPO 3, SE APRECIA AVANCE EN EL PAÑETE DE MAMPOSTERIA, FUNDICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS.









INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 018

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **22/08/2022** al **28/08/2022** Fecha **28/08/2022**

ADECUACIONES DE UNIDADES SANITARIAS, SE APRECIA INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, LAVAPLATOS Y LAVADEROS









CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO-

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 18**	CÓDIGO:	**F-GG-06**
		VERSIÓN:	**1**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA No. 018

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **22/08/2022** al **28/08/2022** Fecha **28/08/2022**

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-049-22 mediante al cual se remite para su debido tramite Once (11) solicitudes de inclusión teniendo en cuenta el PROTOCOLO PARA LA INCLUSION DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS AL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.
La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-050-22 con el asunto SOLICITUD TOMAR ACCIONES FRENTE AL ATRASO DE OBRA mediante al cual solicitamos tomar acciones inmediatas que permitan reducir el porcentaje de atraso presentado de acuerdo a la reprogramación de obra
La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-051-22 con el asunto RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_077 mediante el cual realizamos entrega de aval para 09 diagnósticos presentados en comité de aprobación No. 014 con los siguientes codicos:
B-C-SM-MZ45-VE-037, B-C-SM-MZ67-VE-078, B-C-SM-MZ89-VE-080, B-C-SM-MZ89-VE-083, B-C-SM-MZ68-VE-108, B-C-SM-MZ34-VE-116, B-C-SM-MZ58-VE-178, B-C-SM-MZ56-VE-191 y B-C-SM-MZ18-VE-202
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-052-22 con el asunto REITERACIÓN DE SOLICITUD PARA TOMAR ACCIONES FRENTE AL ATRASO DE OBRA medienta el cual solicitamos tomar acciones inmediatas que permitan reducir el porcentaje de atraso presentado de acuerdo a la reprogramación de obra, a la fecha del presente comunicado se tiene una cifra de 80 intervenciones terminadas y 36 en ejecución.
Sin embargo, con corte de informe semanal del 28 de agosto nos indicá un atraso del 14,14%. Lo que significa una pequeña disminución del atraso con respecto al corte anterior que fue de 14,23%. Esta es la tercera semana en que se evidencian una disminución leve en el atraso del proyecto.
La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-053-22 con el asunto SOLICITUDES DE INCLUSION mediante el cual se remite para su debido tramite Veinte (20) solicitudes de inclusión teniendo en cuenta el PROTOCOLO PARA LA INCLUSION DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS AL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.
La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-054-22 con el asunto RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_081 mediante el cual realizamos entrega de aval para 14 diagnósticos presentados en comité de aprobación No. 015.

Marcy A. Correa C		Erika Marcela Gutiérrez Gaitán	
Firma		**Firma**	
Nombre	Marcy Correa castaño	Nombre	Erika Marcela Gutiérrez Gaitán
	Directora de la interventoría	Supervisor	Supervisor ENTerritorio

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría

Enviar Informe para validación

COMPONENTE HSE DEL PROYECTO

EL SUSCRITO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA DE ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A., CERTIFICA;

Que durante el periodo comprendido del 1 al 31 de agosto del 2022, ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A con NIT: 800173768-1, evidencia que el contratista CONSORCIO CONSTRUREDES de acuerdo con las obligaciones del contrato 2220576 con objeto "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓ DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.)., da el cumplimiento normatividad ambiental, se evidencia la implementación del Plan de Manejo Ambiental diseñado para el proyecto, evidenciando la implementación de los programas mediante las fichas de manejo ambiental.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., al primer día (1) días del mes de septiembre de 2022.

Marcy Alejandra Correa Castaño
Director de Interventoría
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.

Formato
Control De Licencias Ambientales
IN-FO-53 V:3

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

OBRA: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓ DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

PERMISO	LOCALIZACIÓN	MATERIAL	NO LICENCIA / PERMISO	AUTORIDAD AMBIENTAL	VIGENCIA / LICENCIA / PERMISO
Cantera Triturados y Agregados del Caribe S.A.S Licencia Ambiental	Bosconia Cesar	Por medio de la cual se otorga a A& G Constructores S.A.S. con identificación tributaria N° 900193651-7 Licencia Ambiental Global, para la explotación de un yacimineto de materiales de construcción, en jurisdicción del Municipio de Bosconia Cesar, en desarrollo del contrato de conseción minera KHE -08121 del 24 de noviembre del 2009.	Resolución 743 del 2018	CORPOCESAR	30 años

YIRA LEMUS GÓMEZ. ESP. AMBIENTAL
Diligencia

Formato
Informe HSE Interventoría No 04
IN-FO-12, V-1

PROYECTO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓ DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	PERIODO			1 al 30 de agosto de 2022		
		CUMPLIMIENTO					
ITEM	ASPECTOS PARA DESTACAR EN LA GESTIÓN MENSUAL (CONTRATISTA)	CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO CUMPLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	ASPECTOS A MEJORAR
IMPLEMENTACIÓN DEL SG SST	El contratista cuenta con Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo, el cual fue avalado mediante el informe técnico de especialista HSE # 4 emitido el 25 de abril del 2022, en el transcurso del periodo se evidencia la afiliaciones del personal que esta realizando el diagnóstico de las viviendas. Se implementó el PAPSO, actualmente se encuentra en un porcentaje de cumplimiento del 100%. Se continúa con la implementación de las medidas de bioseguridad: toma de temperatura, encuesta de auto condiciones, limpieza y desinfección de puestos de trabajo y oficinas con hipoclorito diluido y alcohol. El personal del contratista cuenta con los EPP requeridos y los utiliza de manera correcta. Se tienen publicadas las políticas y normas de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo. Se cuenta con elementos para atención de emergencias y la brigada de emergencias. Plan de trabajo anual 60%. Programa de capacitaciones ejecutado en un 100% Programa de inspecciones ejecutado en un 100%. Implementación del PAPSO en un 100%.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Continuar con la implementación de la interventoria
AFILIACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	El CONSORCIO CONSTRUREDES en el periodo reportado continua presentando los soporte de pago de seguridad social de 32 personas y/ o afiliaciones del personal administrativo y operativo que trabajo, se realizo la afiliación del personal operativo como independiente en total fueron 23, estas son revisadas y avaladas por el profesional PGIO del contratista, actualmente se cuenta con 32 personas en obra son verificados por la interventoria donde se evidencia que se realizaron las afiliaciones correspondientes en caso de no presentarse la información pertinente se restringe el ingreso a obra del personal que no cuente con afiliaciones o pagos vigentes por parte de interventoria.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Hacer la entrega de la información completa para el ingreso del personal de acuerdo a los lineamientos establecidos por la interventoría.
DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	En recorridos diarios realizados por Interventoría, se evidencia la entrega y reposición de los EPP, uso de dotación, en el periodo se mantiene la entrega de tapabocas como medida preventiva para el peligro biológico presente por COVID -19 , se exige el uso adecuado, se reitera al contratista realizar inspección diaria, verificando las condiciones de la dotación y ponte de la misma de acuerdo al manual de imagen de Enterritorio.		X		80%	Profesional PGIO del Contratista	Hacer la entrega de Elementos de protección personal y la dotación al personal de obra y asegurar el uso por parte del contratista.
PLAN DE EMERGENCIAS, EQUIPOS DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y SEÑALIZACION	En el periodo se realiza ubicación de señalización preventiva, de obligatoriedad y de salvamento, se establecen salidas de emergencias, de acuerdo a la dinámica y avance de la obra ,así mismo se mantienen punto de encuentro, puntos con elementos de atención a emergencias con camilla, botiquín, extintor , ubicado en el campamento de obra, se tiene realizo la conformación de la brigada para atención de emergencias, en el periodo no se presentaron emergencias.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	En el momento que se encuentre el personal de obra se debe realizar la conformación de la brigada de emergencia.
PLAN DE TRABAJO ANUAL, CAPACITACIONES Y CHARLAS	El contratista inicia con la realización de charlas diarias por parte del profesional PGIO. Interventoría realiza la revisión y seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo establecido en el SG-SST, se evidencia el cumplimiento del 60 % , se recomienda al contratista realizar todas las actividades planeadas.		X		80%	Profesional PGIO del Contratista	Hacer entrega de los soportes del informe, y realizar todas actividades planificadas.
CONFORMACION Y REUNIONES DE COMITÉ COPASST Y CONVIVENCIA	El CONSORCIO CONSTRUREDES en el periodo reportado, realizo reunión del Copasst el 18 de agosto del 2022, así mismo se evidencia acta de reunión de comité de convivencia laboral el 18 de agosto del 2022, así mismo se realiza la primera reunión en cada uno de los comités.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Hacer la reuniones mensuales y trimestrales de cada uno de los comités.
PAZ Y SALVOS TRABAJADORES	El CONSORCIO CONSTRUREDES tiene pendiente la entrega de los paz y salvos del personal retirado del proyecto,			X	0%	Profesional PGIO del Contratista	En el momento de salida de personal realizar la entrega de paz y salvo
PERMISOS DE TRABAJO (ALTURA, CALIENTE, ESPACIO CONFINADO)	De acuerdo al avance de obra el contratista continua realizando tareas de alto riesgo en trabajo en alturas (TSA) , por lo cual implementa los formatos requeridos de acuerdo a los procedimientos establecidos para dichas actividades como (permisos, inspecciones preoperacionales y análisis de trabajo seguro (ATS) de la diferente maquinaria, equipos y herramientas electromecánicas) estos formados y avalados por profesional de apoyo PGIO del contratista, interventoría sugiere realizar seguimiento a las medidas preventivas establecidas en los ATS realizados para las actividades	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Realizar el diligenciamiento de los permisos de acuerdo a las actividades de alto de riesgo ejecutadas(Trabajo en Altura)
ASPECTOS AMBIENTALES (AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE)	• La Interventoría evidencia que el contratista ha implementado las medidas de manejo ambiental establecidas en el contrato se debe reforzar las mejoras en los acopios de material, en cuanto a señalización señalizados y demarcados, se solicita el constante orden y aseo en espacios exteriores, por lo que el contratista toma las medidas necesarias y realiza las respectivas jornadas, el área de la ZMPA se encuentra organizada y aseada. • Se cuenta con la documentación de los materiales como insumos, equipos, maquinaria, volquetas, entre otros. Se solicito al contratista hacer refuerzo en el acopio, en el manejo de suelo reforzar las hojas de seguridad y las etiquetas. • En este periodo ingresó material granular a obra. Los certificados y permisos ambientales de los proveedores de estos materiales fueron presentados Licencia Ambiental de la Resolución 743 del 2018 se evidencia que Triturados y Agregados del Caribe S.A.S, esta avalado para explotación y comercialización de material pétreo. Se solicita al contratista realizar el requerimiento al proveedor la actualización del titulo minero KHE-08121 ya que se tenia vigente hasta el 31 de Julio del 2022. • La obra cuenta con un punto ecológico el cual fue adecuado con la nueva normatividad en colores, dichos puntos están señalizados y demarcados, de tal manera que los trabajadores identifiquen donde deben realizar el depósito de los residuos. Solamente fue necesario realizar el retiro de residuos sólidos ordinarios de obra. • La Interventoría sugiere mantener y mejorar los puntos de acopio de los materiales granulares que se encuentran en obra, en cuanto señalización , demarcación y protección. • La Interventoría solicita de manera permanente el orden y aseo dentro del proyecto, se insistió en la generación de una brigada de orden y aseo para mantener los espacios organizados.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Darle cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental diseñado para el proyecto.
PLAN DE GESTION DE RESIDUOS DE DEMOLICION Y CONSTRUCCION	Para este periodo solo se generaron Residuos de Construcción y Demolición, el material es reutilizado como relleno en las mismas excavaciones realizadas, es importante aclarar que la excavación es mínima.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Se debe realizar clasificación en los frentes de trabajo.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADOS EN OBRA	El CONSORCIO CONSTRUREDES en el periodo reportado, se evidencia un vehículo, el uso de herramientas menores (pulidoras) que se encuentran en obra cuentan con la documentación reglamentaria y aprobación de la interventoría. A la fecha de corte de este periodo informado se cuenta con la autorización de acceso para -1 volquetas.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Realizar todas las inspecciones realizadas en el proyecto
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DENTRO DE LA OBRA	Actualmente el Contratista cuenta con un punto ecológico en obra y con un recipiente rojo adicional destinado solo a la disposición de los residuos generados por la implementación del PAPSO en obra. Se entregaron los residuos ordinarios generados en obra al recolector autorizado del municipio.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Se debe realizar clasificación en los frentes de trabajo.
MANEJO DE CAMPAMENTO (SERVICIOS SANITARIOS)	El proyecto de obra cuenta con el respectivo campamento, el mismo se encuentra señalizado, se tiene 1 unidad sanitaria para el servicio del personal femenino y masculino, se cuenta con área de almacén y punto de atención al ciudadano.	X			100%	Profesional PGIO del Contratista	Verificar el uso de baño de los trabajadores en los frentes de trabajo.
OTROS CUALES	En recorridos diarios realizados por interventoría se evidencia la presencia de condiciones inseguras y la ocurrencia actos inseguros por parte de los trabajadores, los cuales son direccionados al profesional SST del contratista para que sean subsanados de manera inmediata, mejorando así las condiciones y controlando los peligros presente durante la ejecución de la actividades, a los cuales el contratista realiza la gestión necesaria para atender las solicitudes realizadas. En el periodo no se presentaron casos positivos para covid-19.						

	ASPECTOS PARA DESTACAR (INTERVENTORÍA)
SEGUIMIENTO A NIVEL CUMPLIMIENTO FRENTE A NORMATIVA EN SST (Evaluación Inicial, Certificado de 50 horas, Licencia en Seguridad y salud en el Trabajo, Designación de Responsable, Matriz de peligros, Plan de formación anual, Plan de trabajo anual, Diagnostico de Condiciones, estadísticas de Incidentes, Status de cumplimiento del decreto 1072 del 2015 y Resolución 312 del 2019)	Interventoría cuenta con la documentación del SGSST para la implementación en obra , Certificado de 50 horas, Licencia en Seguridad y salud en el Trabajo, Designación de Responsable, Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos . Actualmente se cuenta con 12 profesionales asesores de interventoría quienes apoyan el proceso desde sus áreas , todos cuentan con pagos de parafiscales con los periodos vigentes a la EPS, ARL, AFP ,(CCF , a todos los profesionales se les han realizado los exámenes médicos de ingreso, conocen las políticas, procedimientos y protocolos establecidos en el SG-SST a si mismo el PAPSO establecido por la empresa y el aprobado para la obra ,se realizan capacitaciones mensuales a través de boletines informativos . Durante este periodo no se presentaron accidentes laborales , para este periodo no se presentó ausentismo por enfermedad general, el personal se encuentra capacitado de acuerdo los peligros asociados y presentes durante la ejecución de sus actividades.
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA (Señalización de obra, Manejo de aguas superficiales, Manejo y disposición de escombros, Transporte de materiales y escombros, Manejo de maquinaria y equipo, Almacenamiento y manejo de materiales de construcción, Manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas de emisiones atmosféricas, Control de plagas. Licencias, permisos y bitácoras, Manejo de campamentos transitorios, Control de plagas)	Para este periodo la interventoría cuenta con un campamento, el mismo está debidamente señalizado, Se fomenta el orden y aseo y desinfección en cada puesto de trabajo de manera periódica. Se utiliza de manera responsable los recursos de energía, agua y papelería. Se cuenta con cartelera informativa. se realizan capacitaciones mensuales a través de boletines informativos.
	La Interventoría verifica y controla todos los aspectos mediante inspecciones diarias, verificación documental de los informes mensuales, RCD, maquinaria y equipos, documentación de licencias y certificados generados para el proyecto, las apreciaciones generadas se transmiten al contratista mediante informes técnicos, oficios, notas en bitácora y correos electrónicos.

INDICADORES RESULTADO SST

CONSTANTE K 200

PERIODO	No TOTAL DE PERSONAL MENSUAL		No TOTAL DE HORAS MENSUALES				TOTAL HORAS TRABAJADAS		INCIDENTES LABORALES		No DIAS DE INCAPACIDAD CAUSADAS		No ACCIDENTES		No ACCIDENTES MORTALES		No. DÍAS PERDIDOS POR ACCIDENTES LABORALES		DIAS CARGADOS POLITO MADRE		ENFERMEDAD LABORAL	
	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	DIRV HORA DIURNA	DIRV HORA NOCT	CONTRA HORA DIURNA	CONTRA HORA NOC	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA
MAYO	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	0	0	0	0	n	n	n	n	n	n
JUNIO	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	0	0	0	0	n	n	n	n	n	n
JULIO	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	0	0	0	0	n	n	n	n	n	n
AGOSTO	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	0	0	0	0	n	n	n	n	n	n
SEPTIEMBRE																						
OCTUBRE																						

PERIODO	SEVERIDAD DE LOS ACCIDENTES LABORALES		FRECUENCIA DE LOS ACCIDENTES LABORALES		FRECUENCIA DE LOS INCIDENTES LABORALES		MORTALIDAD DE LOS ACCIDENTES LABORALES		PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL		INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL		AUSENTISMO LABORAL		AUSENTISMO DOMÍN		INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES		OBSERVACION INDICADORES INTERVENTORIA	OBSERVACION INDICADORES CONTRATISTA
	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CONTRATISTA		
MAYO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En el periodo no se presentaron accidentes de trabajo ,el Incidentes laborales.	En el periodo no se presentaron accidentes de trabajo ,el Incidentes laborales.
JUNIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
JULIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
AGOSTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
SEPTIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
OCTUBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		

INDICADORES ESTRUCTURA Y PROCESO DE INTERVENTORÍA SST

PERIODO	POLITICA SG SST				PERSONAL/COMITÉ COPASST				CUMPLIMIENTO DE PLAN DE TRABAJO ANUAL				PRESENTACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES			
	No de trabajadores que conocen la Política	No. Total de Trabajadores	RESULTADO	ANALISIS	No de veces de reunión mensuales	No total de veces al mes	RESULTADO	ANALISIS	Actividades Ejecutadas y PTA	No. Actividades Programadas.	RESULTADO	ANALISIS	No de accidentes y/o Incidentes reportados	No accidentes y/o Incidentes reportados	RESULTADO	ANALISIS
MAYO	0	0	100%	Todo el personal cuenta con una inducción y tiene conocimiento de la política	1	1	100%	Se realiza la reunión de COPASST del mes.	1	1	100%	Se realizan las actividades previstas para el mes	0	0	0%	No se han reportado accidentes de trabajo para el periodo
JUNIO	0	0	100%	Todo el personal cuenta con una inducción y tiene conocimiento de la política	1	1	100%	Se realiza la reunión de COPASST del mes.	1	1	100%	Se realizan las actividades previstas para el mes	0	0	0%	No se han reportado accidentes de trabajo para el periodo
JULIO	0	0	100%	Todo el personal cuenta con una inducción y tiene conocimiento de la política	1	1	100%	Se realiza la reunión de COPASST del mes.	1	1	100%	Se realizan las actividades previstas para el mes	0	0	0%	No se han reportado accidentes de trabajo para el periodo
AGOSTO	0	0	100%	Todo el personal cuenta con una inducción y tiene conocimiento de la política	1	1	100%	Se realiza la reunión de COPASST del mes.	1	1	100%	Se realizan las actividades previstas para el mes	0	0	0%	No se han reportado accidentes de trabajo para el periodo
SEPTIEMBRE	0		0%													
OCTUBRE	0		0%													

REPORTE DE ACCIDENTES Y/O INCIDENTES DE TRABAJO

FECHA	INCIDENTE	ACCIDENTE	CEDULA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	CARGO	DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE O ACCIDENTE	PARTE DEL CUERPO AFECTADA	DÍAS DE INCAPACIDAD

Formato
Informe HSE Interventoría No 04
IN-FO-11 V-1

PROYECTO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓ DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	PERIODO	1 al 30 de agosto de 2022
N/A	N/A	N/A	

CAPACITACIONES Y CHARLAS

FECHA DE CAPACITACIÓN	TEMÁS DE LA CAPACITACIÓN Y/O CHARLA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA
agosto-22	Elementos de protección Personal	X	
agosto-22	Consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas	X	

CONTROL AMBIENTAL

PERIODO	RELACION DE MATERIAL DE PETREO			DISPOSICION RESIDUOS SOLIDOS				RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN				ACCIDENTE E INCIDENTE AMBIENTAL				OBSERVACIONES DE AMBIENTALES
	Tipo de material	Cantidad	Cantera	RECICLABLES (papel, plástico, vidrio, aluminio)	ORDINARIO	PELIGROSOS	OTROS	ESCOMBROS	EXCAVACION	RECICLABLE	RECICLABLE	FECHA	LUGAR	DESCRIPCIÓN	PLAN DE ACCIÓN	
MAYO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
JUNIO	ARENA DE RIO	35	Licencia Ambiental de la Resolución 743 del 2018 se evidencia que Triturados y Agregados del Caribe S.A.S	0	0	0	0	0	0	32	Reutilización de material de excavación en relleno .	N/A	N/A	N/A	N/A	
	GRAVA	35														
JULIO	ARENA DE RIO	35	Licencia Ambiental de la Resolución 743 del 2018 se evidencia que Triturados y Agregados del Caribe S.A.S	0	0	0	0	0	0	65	Reutilización de material de excavación en relleno .	N/A	N/A	N/A	N/A	
	GRAVA	30														
AGOSTO	ARENA DE RIO	119	Licencia Ambiental de la Resolución 743 del 2018 se evidencia que Triturados y Agregados del Caribe S.A.S	0	0	0	0	0	0	27	Reutilización de material de excavación en relleno .	N/A	N/A	N/A	N/A	
	GRAVA	70														
SEPTIEMBRE																
OCTUBRE																

Para el periodo no se presentaron accidentes de emergencia, , se ingreso material granular, y no se realizo retiro de material RCD, pero se realizo reutilización en el proyecto.

FOTOGRAFÍA





FOTOGRAFÍA







FOTOGRAFÍA





OBSERVACIÓN Y/O CONCLUSIÓN: **En este período se evidencio que dentro de los requerimientos hechos al contratista se ha cumplido en un 77,8 % con los aspectos de Seguridad Industrial, Salud en el trabajo, Medio ambiente, se debe hacer la entrega de toda la documentación completa del personal que ingresa al proyecto, se evidencia la falta del buen uso de los elementos de protección personal y dotación establecida en el proyecto, por lo tanto la Interventoría genera un llamado de atención al contratista para que le de cumplimiento a estos requerimientos, en los aspectos que hasta la fecha están pendiente se realizará un estricto control para que en este proyecto se minimicen los factores de riesgo de accidentes, se le solicita al contratista una gestión permanente, se realizó con el contratista mesas de trabajo donde se debe realizar comités de seguimiento para mejorar en los aspectos donde se cuenta con falencias de acuerdo a la recomendaciones dadas. La interventoría verifica y controla todos estos aspectos mediante inspecciones diarias, verificación documental de los planes generados para el proyecto y la normatividad vigente en cuanto seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente.**

V.	VERIFICACIÓN	APROBACIÓN
INSPECTOR Y/O RESIDENTE	COORDINADOR DE GESTIÓN HSEQ PROYECTO	DIRECTOR

PLANILLA CONTRATISTA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901568676	5	CONSORCIO CONSTRUREDES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 24 15 17 BARRIO CENTRO	SAN MARCOS-SUCRE	2953041	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-08	1608645937	9438812157	E	2022/08/18	2022/08/18	BANCOLOMBIA	0	$6,130,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	10774359	ALVAREZ PADILLA GENKY SAIMER	231001	30	$1,000,000	$160,000	CCFC55	30	$1,000,000	$40,000	CCF41	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
2	CC	1093752620	ANAYA PEREZ NORELIS DEL CARMEN	25-14	30	$2,000,000	$320,000	ESSC07	30	$2,000,000	$80,000	CCF41	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
3	CC	1102815039	BLANCO ARROYO RONAL ANDRES	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF41	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
4	CC	1066181984	CASTILLO LOBO RAFAEL FRANCISCO	230301	30	$1,800,000	$288,000	ESSC07	30	$1,800,000	$72,000	CCF41	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
5	CC	1049453183	ESCOBAR VERGARA SINDY PAOLA	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS048	30	$1,500,000	$60,000	CCF41	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
6	CC	1049452239	ESCOBAR VERGARA YEISON JOSE	231001	30	$1,000,000	$160,000	ESSC07	30	$1,000,000	$40,000	CCF41	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
7	CC	1118528862	GARZON RIOS OSWALDO	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF41	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
8	CC	85474042	GUTIERREZ URIBE CARLOS ALBERTO	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF41	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
9	CC	1049453497	PINEDA HENAO HEIDER MANUEL	230301	30	$1,000,000	$160,000	CCFC55	30	$1,000,000	$40,000	CCF41	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
10	CC	1069464406	PINEDO DURANGO DUARTE JOSE	230301	30	$3,000,000	$480,000	ESSC07	30	$3,000,000	$120,000	CCF41	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
11	CC	1049453345	VALETH ANDRADE JESUS MANUEL	230301	30	$1,000,000	$160,000	ESSC07	30	$1,000,000	$40,000	CCF41	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
Total	**Afiliados(11)**					**$19,800,000**	**$3,168,000**			**$19,800,000**	**$792,000**			**$19,800,000**	**$792,000**			**$19,800,000**	**$1,378,100**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$3,168,000	$0	$0	$3,168,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$720,000	$0	$0	$720,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,128,000	$0	$0	$2,128,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,378,100	$0	$0	$1,378,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$1,378,100	$0	$0	$1,378,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$792,000	$0	$0	$792,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	11	$792,000	$0	$0	$792,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				11	$792,000	$0	$0	$792,000
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	$80,000	$0	$0	$80,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$60,000	$0	$0	$60,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	$352,000	$0	$0	$352,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$200,000	$0	$0	$200,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$100,000	$0	$0	$100,000
TOTAL				11	$6,130,100	$0	$0	$6,130,100

2022/08/24 11:01 AM
