INFORME DE SUPERVISIÓN No 05 Y FINAL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
No 126 DEL 28 DE ENERO DE 2022
CELEBRADO ENTRE EL IMER Y JUAN CAMILO ARBOLEDA MEJÍA

FECHA DE ELABORACIÓN	Julio 12 DE 2022

INFORME No: SUPERVISIÓN X INTERVENTORÍA ☐	No.5	DE SEGUIMIENTO	☐	FINAL	X
		PARA PAGO			
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01 de junio de 2022	Hasta:	30 de junio de 2022	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO:

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION No 126 DE ENERO 28 DE 2022	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28 DE ENERO DE 2022	
FECHA ACTA DE INICIO:			28 DE ENERO DE 2022	
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALESY DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA ADELANTADOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN –IMER				
CONTRATISTA / ASOCIADO	JUAN CAMILO ARBOLEDA MEJÍA			
NIT O CÉDULA	1.128.264.840			
VALOR INICIAL	$30.800.000	TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L		
APORTE IMER	$30.800.000	TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L		
APORTE EN DINERO CONTRATISTA / ASOCIADO	N/A	N/A		
APORTE EN ESPECIE CONTRATISTA / ASOCIADO	N/A	N/A		
PLAZO INICIAL	CINCO (5) MESES Y CINCO (5) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 DE JUNIO DE 2022			
ADICIÓN	N°	VALOR ADICIÓN	% DE ADICIÓN	
PRÓRROGA	N°	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	

HISTÓRICO DE SUSPENSIONES	N°	FECHA INICIO	FECHA REANUDACIÓN
REINICIO	N°	FECHA REINICIO	
CDP	No 130	FECHA DEL CDP	26-01-2022
REGISTRO PRESUPUESTAL	No 129	FECHA DEL CRP	26-01-2022
SUPERVISOR/CARGO	JESUS OCTAVIO HENAO AGUDELO		
INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:	N/A	
	NÚMERO CONTRATO:	N/A	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA		98.06%	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA		98.06%	

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

Se ha cumplido hasta la fecha tanto con el objeto contractual, así como con las obligaciones del mismo, en un 98.06% de ejecución física, del contrato.

2.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

HALLAZGOS:

COMPONENTE TÉCNICO

Mediante la realización de la supervisión del contrato de Prestación de Servicios No 126 enero 28 de 2022, se realizaron las siguientes acciones, para velar por el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Obligaciones generales.	Honorarios a cobrar e IBC $	Periodo de cotización	Valor del pago $	Numero de planilla
Se verificó que el contratista realizó sus aportes al Sistema de seguridad en salud	Honorarios: $6.000.000 IBC: $2.400.000	Junio	$732.600	9439802352
El contratista presentó el informe de actividades	Fecha de presentación del informe	Periodo de ejecución del informe	Fecha de revisión del informe	N° de informe de actividades

considerando lo siguiente:	Julio 08 de 2022	01 de junio al 30 de junio de 2022	Julio 12 de 2022	5
Marque la opción según lo requiera SI el informe de actividades recibió observaciones por parte del supervisor:	SI		NO	X
¿Cuáles?				
Marque la opción según lo requiera SI se realizaron indicaciones al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones:	SI		NO	X
¿Cuáles?				

El instituto o el supervisor generó espacios de reuniones	Fecha	Tema	Modalidad (Presencial/Virtual)
			N/A


ACCIONES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

- En el periodo comprendido entre el 01 de junio y el 30 de junio de 2022, se realizó el seguimiento en cada una de las obligaciones específicas del contrato, donde se corroboro la PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALESY DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCTURA ADELANTADOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN –IMER.
- El contratista cumplió con la entrega del Informe de actividades, Cuenta de Cobro y planilla-soporte de pago de la seguridad social.
- A la fecha de elaboración de este informe se evidencia que el contratista ha cumplido de manera satisfactoria con el objeto contractual, presentando una ejecución del 98.06%.
- Todos los requerimientos e información solicitada al contratista con respecto a la revisión y seguimiento de los procesos de infraestructura adelantados por el instituto fueron atendidos de manera oportuna.
- El contratista revisó 53 Ítems del presupuesto y Análisis de Precios Unitarios (APUS) de la propuesta enviada por la EDESO para la construcción del escenario deportivo Villa Camila.

- El contratista revisó 67 Ítems del presupuesto y Análisis de Precios Unitarios (APUS) de la propuesta enviada por la EDESO para la construcción del escenario deportivo Chachafruto.
- El contratista revisó 44 Ítems del presupuesto y Análisis de Precios Unitarios (APUS) de la propuesta enviada por la EDESO para la construcción de la cubierta en el escenario deportivo Cuatro Esquinas.
- El contratista revisó 52 Ítems del presupuesto y Análisis de Precios Unitarios (APUS) de la propuesta enviada por la EDESO para la construcción de la cubierta en el escenario deportivo Libertadores.
- El contratista revisó 79 Ítems del presupuesto y Análisis de Precios Unitarios (APUS) de la propuesta enviada por la EDESO para la construcción del escenario deportivo Linda Granja.
- El contratista asistió a reunión con técnicos de la EDESO en el marco de la revisión de los presupuestos mencionados.
- El contratista realizó ajustes a la proyección de acta de terminación/recibo del Contrato Interadministrativo 007 del 2021 suscrito con la EDESO.
- El contratista realizó coordinación en el mantenimiento y limpieza a sistema de drenaje del escenario Abreo.
- El contratista realizó visita al escenario de ABREO donde se determinan algunas posibles causas de la afectación frente al muro, al parecer todas causas externas, se toman algunas medidas en campo.
- El contratista asistió a reunión con Gerente EDESO y Gerente IMER donde se acordó la ruta para liquidación de Contrato Interadministrativo 007 de 2020 y sus respectivos contratos de obra e interventoría.
- El contratista envía informe de gestión que contiene un informe detallado de las actividades desarrolladas mes a mes durante la ejecución del contrato. Así mismo se anexa formato de paz y salvo debidamente diligenciado.

EVIDENCIAS

PRESUPUESTOS REVISADOS POR EL CONTRATISTA

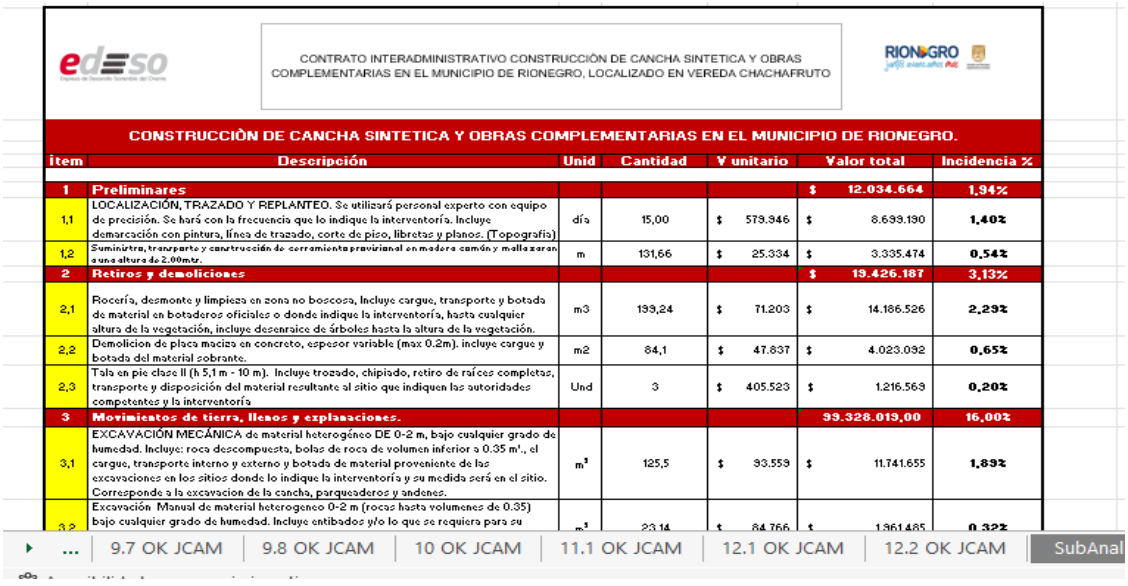

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, LOCALIZADO EN VEREDA CHACHAFRUTO

CONSTRUCCIÒN DE CANCHA SINTETICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Item	Descripción	Unid	Cantidad	V unitario	Valor total	Incidencia %
1	**Preliminares**				$ 12.034.664	1,94%
1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos. (Topografía)	día	15,00	$ 579.946	$ 8.699.190	1,40%
1,2	Suministro, transporte y construcción de cerramiento provisional en madera comón y malla zaran a una altura de 2.00mts.	m	131,66	$ 25.334	$ 3.335.474	0,54%
2	**Retiros y demoliciones**				$ 19.426.187	3,13%
2,1	Rocería, desmonte y limpieza en zona no boscosa, Incluye cargue, transporte y botada de material en botaderos oficiales o donde indique la interventoría, hasta cualquier altura de la vegetación, incluye desenraice de árboles hasta la altura de la vegetación.	m3	199,24	$ 71.203	$ 14.186.526	2,29%
2,2	Demolicion de placa maciza en concreto, espesor variable (max 0.2m). incluye cargue y botada del material sobrante.	m2	84,1	$ 47.837	$ 4.023.032	0,65%
2,3	Tala en pie clase II (h 5,1 m - 10 m). Incluye trozado, chipiado, retiro de raíces completas, transporte y disposición del material resultante al sitio que indiquen las autoridades competentes y la interventoría	Und	3	$ 405.523	$ 1.216.569	0,20%
3	**Movimientos de tierra, llenos y explanaciones.**				99.328.019,00	16,00%
3,1	EXCAVACIÓN MECÁNICA de material heterogéneo DE 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo y botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. Corresponde a la excavacion de la cancha, parqueaderos y andenes.	m³	125,5	$ 93.559	$ 11.741.655	1,89%
3,2	Excavación Manual de material heterogeneo 0-2 m (rocas hasta volumenes de 0.35) bajo cualquier grado de humedad. Incluye entibados y/o lo que se requiera para su	m³	23,14	$ 64.766	$ 1.361.485	0,22%

... | 9.7 OK JCAM | 9.8 OK JCAM | 10 OK JCAM | 11.1 OK JCAM | 12.1 OK JCAM | 12.2 OK JCAM | SubAnal

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONSTRUCCIÒN DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA CANCHA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, LOCALIZADO EN 4 ESQUINAS

CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	V unitario	Valor total	Incidencia %
1	**Preliminares**				$ 8.218.857	0,95%
1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos. (Topografia)	día	10,00	$ 579.946	$ 5.799.460	0,67%
1,2	Suministro, transporte y construcción de cerramiento provisional en madera común y malla zaran a una altura de 2.00mts.	m	95,5	$ 25.334	$ 2.419.397	0,28%
2	**Movimiento de tierras**				$ 17.923.821	2,07%
2,1	EXCAVACIÓN DE PILAS Y PILOTES DE 0.0 – 2.0m de profundidad en material heterogéneo con cualquier grado de humedad, diámetro hasta 1.40m. Incluye anillos en concreto de 17.5MPa, bombeo (de requerirse) transportes verticales y horizontales, formaleta anillos, cargue y botada de material sobrante. No incluye: excavación en roca, piedras que no quepan en tarro.	m	20,00	$ 329.929	$ 6.598.580	0,76%
	EXCAVACIÓN DE PILAS Y PILOTES DE 2.0 – 4.0m de profundidad en material heterogéneo con cualquier grado de humedad, diámetro hasta 1.40m. Incluye anillos en					


... | 4.18 | 4.19 | 4.20 | 4.21 | 4.22 | 4.23 | 4.24 | 4.25 OK JCAM | 4.26 OK JCAM | 5.1 OK JCAM | S

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONSTRUCCIÒN DE CBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA CANCHA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, LOCALIZADO EN LIBERTADORES

CONSTRUCCIÒN DE CANCHA SINTETICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	V unitario	Valor total	Incidencia %
1	**Preliminares**				$ 13.251.102	1,24%
1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos. (Topografia)	día	18,00	$ 579.946	$ 10.439.028	0,98%
1,2	Suministro, transporte y construcción de cerramiento provisional en madera común y malla zaran a una altura de 2.00mts.	m	111	$ 25.334	$ 2.812.074	0,26%
2	**Movimiento de tierras**				$ 18.534.863	1,73%
2,1	EXCAVACIÓN DE PILAS Y PILOTES DE 0.0 - 2.0m de profundidad en material heterogéneo con cualquier grado de humedad, diámetro hasta 1.40m. Incluye anillos en concreto de 17.5MPa, bombeo (de requerirse) transportes verticales y horizontales, formaleta anillos, cargue y botada de material sobrante. No incluye: excavación en roca, piedras que no quepan en tarro.	m	20,00	$ 329.565,01	$ 6.591.300	0,62%
2,2	EXCAVACIÓN DE PILAS Y PILOTES DE 2.0 - 4.0m de profundidad en material heterogéneo con cualquier grado de humedad, diámetro hasta 1.40m. Incluye anillos en concreto de 17.5MPa, bombeo (de requerirse) transportes verticales y horizontales, formaleta anillos, cargue y botada de material sobrante. No incluye: excavación en roca, piedras que no quepan en tarro.	m	20,00	$ 345.524,53	$ 6.910.491	0,65%
2,3	EXCAVACIÓN DE PILAS DE 4.0 - 6.0m de profundidad en material heterogéneo con cualquier grado de humedad, diámetro hasta 1.40m. Incluye anillos en concreto de 17.5MPa, bombeo (de requerirse) transportes verticales y	m	10,50	########	$ 4.030.625	0,38%

... | 5.2 OK JCAM | 5.3 OK JCAM | 5.4 OK JCAM | 5.5 OK JCAM | 5.6 OK JCAM

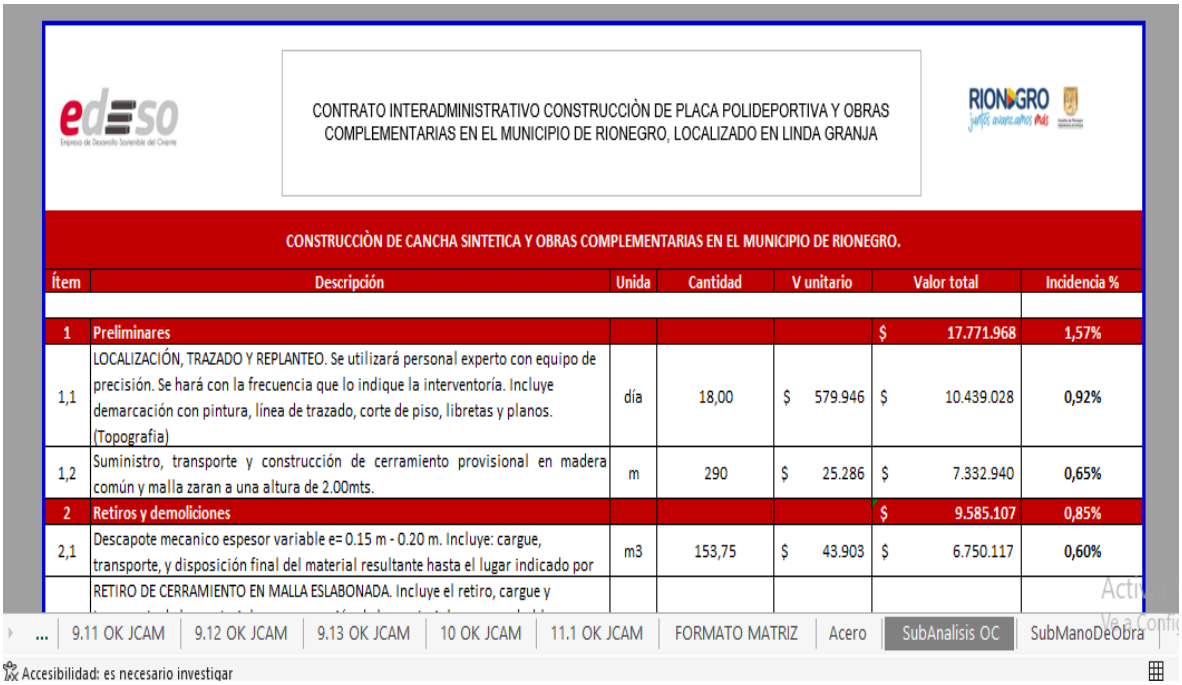


CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONSTRUCCIÒN DE PLACA POLIDEPORTIVA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, LOCALIZADO EN LINDA GRANJA

CONSTRUCCIÒN DE CANCHA SINTETICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Ítem	Descripción	Unida	Cantidad	V unitario	Valor total	Incidencia %
1	**Preliminares**				$ 17.771.968	1,57%
1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos. (Topografia)	día	18,00	$ 579.946	$ 10.439.028	0,92%
1,2	Suministro, transporte y construcción de cerramiento provisional en madera común y malla zaran a una altura de 2.00mts.	m	290	$ 25.286	$ 7.332.940	0,65%
2	**Retiros y demoliciones**				$ 9.585.107	0,85%
2,1	Descapote mecanico espesor variable e= 0.15 m - 0.20 m. Incluye: cargue, transporte, y disposición final del material resultante hasta el lugar indicado por	m3	153,75	$ 43.903	$ 6.750.117	0,60%
	RETIRO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA. Incluye el retiro, cargue y					

... | 9.11 OK JCAM | 9.12 OK JCAM | 9.13 OK JCAM | 10 OK JCAM | 11.1 OK JCAM | FORMATO MATRIZ | Acero | SubAnalisis OC | SubManoDeObra

Accesibilidad: es necesario investigar

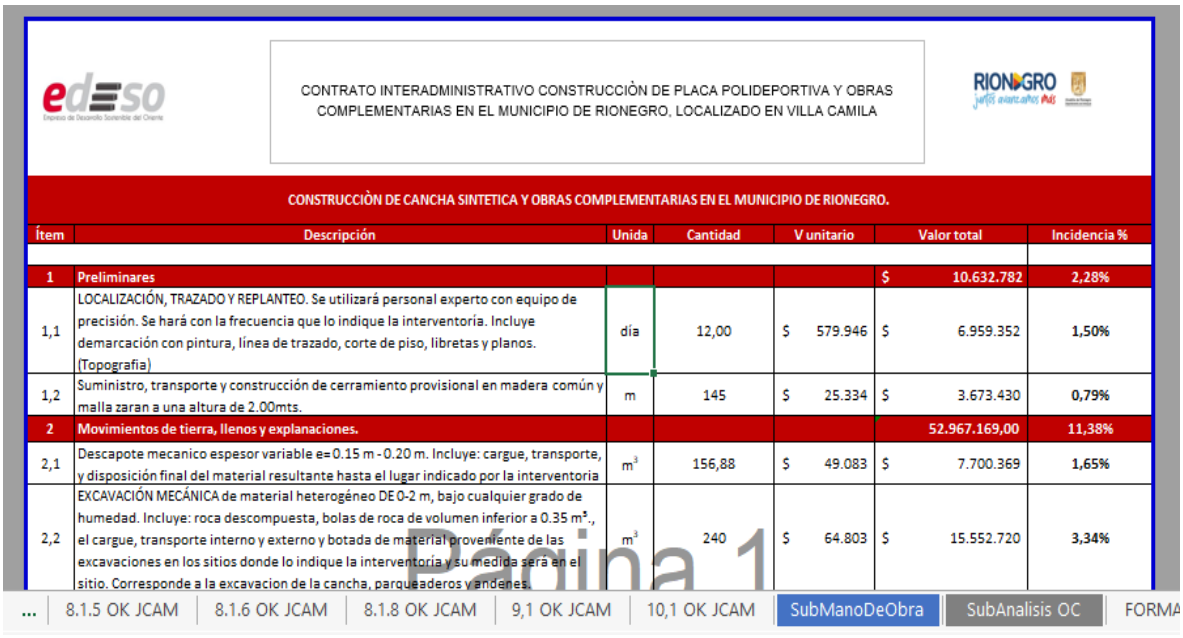

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONSTRUCCIÒN DE PLACA POLIDEPORTIVA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, LOCALIZADO EN VILLA CAMILA

CONSTRUCCIÒN DE CANCHA SINTETICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Ítem	Descripción	Unida	Cantidad	V unitario	Valor total	Incidencia %
1	**Preliminares**				$ 10.632.782	2,28%
1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos. (Topografia)	día	12,00	$ 579.946	$ 6.959.352	1,50%
1,2	Suministro, transporte y construcción de cerramiento provisional en madera común y malla zaran a una altura de 2.00mts.	m	145	$ 25.334	$ 3.673.430	0,79%
2	**Movimientos de tierra, llenos y explanaciones.**				52.967.169,00	11,38%
2,1	Descapote mecanico espesor variable e= 0.15 m - 0.20 m. Incluye: cargue, transporte, y disposición final del material resultante hasta el lugar indicado por la interventoria	m^3	156,88	$ 49.083	$ 7.700.369	1,65%
2,2	EXCAVACIÓN MECÁNICA de material heterogéneo DE 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m^3., el cargue, transporte interno y externo y botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. Corresponde a la excavacion de la cancha, parqueaderos y andenes.	m^3	240	$ 64.803	$ 15.552.720	3,34%

... | 8.1.5 OK JCAM | 8.1.6 OK JCAM | 8.1.8 OK JCAM | 9,1 OK JCAM | 10,1 OK JCAM | SubManoDeObra | SubAnalisis OC | FORMA

AJUSTE ACTA DE TERMINACIÓN REALIZADA POR EL CONTRATISTA

ACTA DE PAGO	CUENTA DE COBRO/FACTURA	DETALLE	VALOR	VALOR TOTAL COBRADO	VALOR TOTAL PAGADO
ANTICIPO	CUENTA DE COB	RECURSOS PARA A	$ 556.933.128	$ 586.137.698	$ 586.137.698
	FACTURA NC 138	HONORARIOS	$ 29.204.569		
1	CUENTA DE COB	RECURSOS PARA A	$ 32.156.180	$ 94.737.400	$ 94.737.400
	FACTURA NC 181	HONORARIOS	$ 62.581.220		
2	CUENTA DE COB	RECURSOS PARA A	$ 211.630.596	$ 232.491.003	$ 232.491.003
	FACTURA NC 190	HONORARIOS	$ 20.860.407		
3	CUENTA DE COB	RECURSOS PARA A	$ 209.139.593	$ 317.230.041	$ 317.230.041
	CUENTA DE COB	RECURSOS PARA A	$ 87.230.041		
	FACTURA NC 201	HONORARIOS	$ 20.860.407		
4	CUENTA DE COB	RECURSOS PARA A	$ 32.156.180	$ 53.016.587	$ 53.016.587
	FACTURA NC 224	HONORARIOS	$ 20.860.407		
5	CUENTA DE COB	RECURSOS PARA A	$ 377.397.082	$ 398.257.489	$ 320.860.407
	FACTURA FE 234	HONORARIOS	$ 20.860.407		
6	CUENTA DE COB	RECURSOS PARA A	$ 166.656.948	$ 170.328.048	$ 170.328.048
	FACTURA FE 261	HONORARIOS	$ 3.671.100		
7	CUENTA DE COB	RECURSOS PARA A	$ 33.465.180	$ 37.136.280	$ 110.862.262
	FACTURA FE 281	HONORARIOS	$ 3.671.100		
8	CUENTA COBRO	RECURSOS PARA A	$ 552.616.279	$ 555.294.889	$ 552.616.279
	FACTURA FE 296	HONORARIOS	$ 2.678.610		
VALOR PAGADO				$ 2.444.629.435	$ 2.438.279.725
VALOR EJECUTADO				$ 2.551.286.748	
PENDIENTE POR COBRAR/PAGAR				$ 106.657.313	$ 113.007.023
VALOR NO EJECUTADO				$ 416.079	
RECURSOS OPTIMIZADOS				$ 2.474.763	


APOYO COORDINACIÓN MANTENIMIENTOS DRENAJES ABREO REALIZADO POR EL CONTRATISTA







REUNIÓN CON GERENCIA

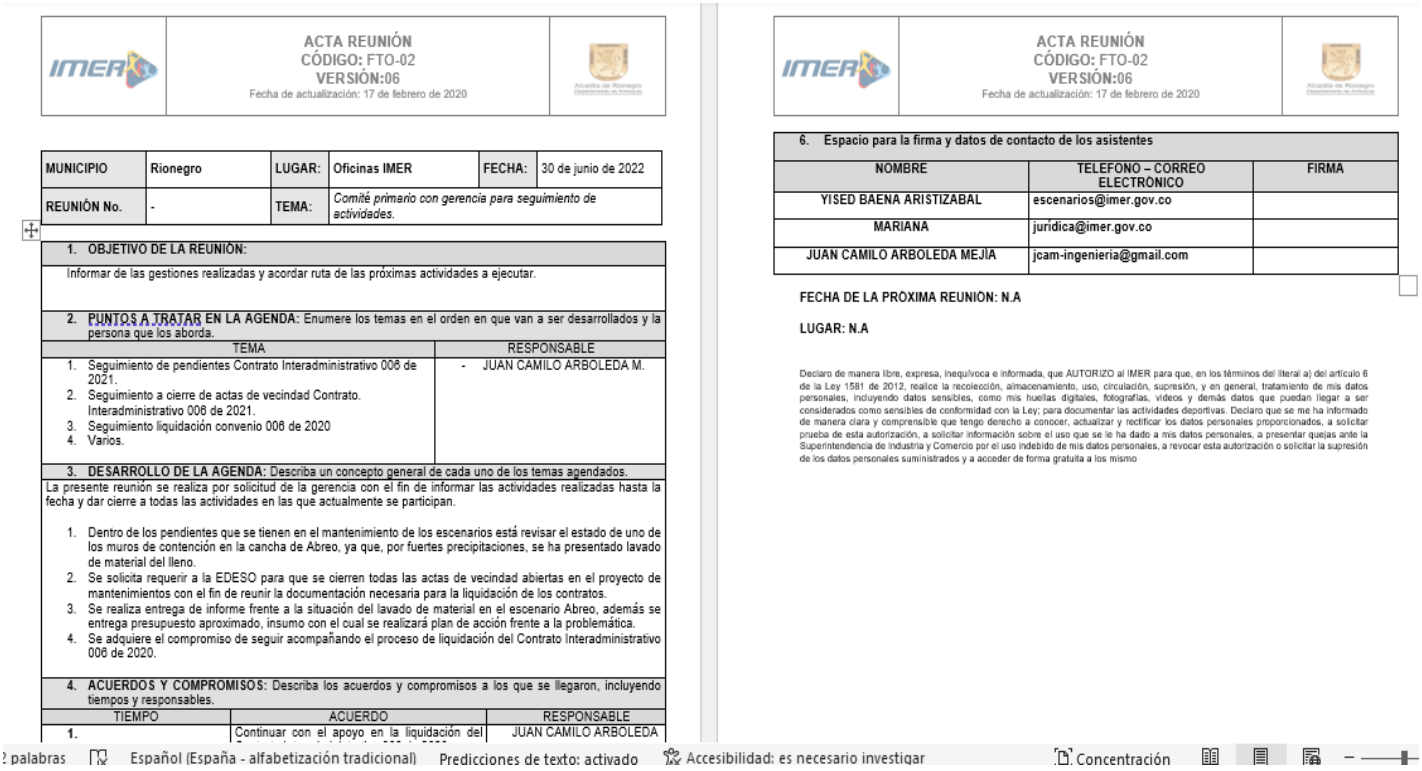

ACTA REUNIÓN
CÓDIGO: FTO-02
VERSIÓN:06
Fecha de actualización: 17 de febrero de 2020

MUNICIPIO	Rionegro	LUGAR:	Oficinas IMER	FECHA:	30 de junio de 2022
REUNIÓN No.	-	TEMA:	*Comité primario con gerencia para seguimiento de actividades.*		

1. OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Informar de las gestiones realizadas y acordar ruta de las próximas actividades a ejecutar.

2. PUNTOS A TRATAR EN LA AGENDA: Enumere los temas en el orden en que van a ser desarrollados y la persona que los aborda.

TEMA	RESPONSABLE
1. Seguimiento de pendientes Contrato Interadministrativo 006 de 2021. 2. Seguimiento a cierre de actas de vecindad Contrato. Interadministrativo 006 de 2021. 3. Seguimiento liquidación convenio 006 de 2020 4. Varios.	- JUAN CAMILO ARBOLEDA M.

3. DESARROLLO DE LA AGENDA: Describa un concepto general de cada uno de los temas agendados.

La presente reunión se realiza por solicitud de la gerencia con el fin de informar las actividades realizadas hasta la fecha y dar cierre a todas las actividades en las que actualmente se participan.

1. Dentro de los pendientes que se tienen en el mantenimiento de los escenarios está revisar el estado de uno de los muros de contención en la cancha de Abreo, ya que, por fuertes precipitaciones, se ha presentado lavado de material del lleno.
2. Se solicita requerir a la EDESO para que se cierren todas las actas de vecindad abiertas en el proyecto de mantenimientos con el fin de reunir la documentación necesaria para la liquidación de los contratos.
3. Se realiza entrega de informe frente a la situación del lavado de material en el escenario Abreo, además se entrega presupuesto aproximado, insumo con el cual se realizará plan de acción frente a la problemática.
4. Se adquiere el compromiso de seguir acompañando el proceso de liquidación del Contrato Interadministrativo 006 de 2020.

4. ACUERDOS Y COMPROMISOS: Describa los acuerdos y compromisos a los que se llegaron, incluyendo tiempos y responsables.

TIEMPO	ACUERDO	RESPONSABLE
1.	Continuar con el apoyo en la liquidación del	JUAN CAMILO ARBOLEDA

ACTA REUNIÓN
CÓDIGO: FTO-02
VERSIÓN:06
Fecha de actualización: 17 de febrero de 2020

6. Espacio para la firma y datos de contacto de los asistentes

NOMBRE	TELEFONO – CORREO ELECTRONICO	FIRMA
YISED BAENA ARISTIZABAL	escenarios@imer.gov.co	
MARIANA	juridica@imer.gov.co	
JUAN CAMILO ARBOLEDA MEJÍA	jcam-ingenieria@gmail.com	

FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN: N.A

LUGAR: N.A

Declaro de manera libre, expresa, inequívoca e informada, que AUTORIZO al IMER para que, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, realice la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, y en general, tratamiento de mis datos personales, incluyendo datos sensibles, como mis huellas digitales, fotografías, videos y demás datos que puedan llegar a ser considerados como sensibles de conformidad con la Ley; para documentar las actividades deportivas. Declaro que se me ha informado de manera clara y comprensible que tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar los datos personales proporcionados, a solicitar prueba de esta autorización, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a mis datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de mis datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismo

palabras | Español (España - alfabetización tradicional) | Predicciones de texto: activado | Accesibilidad: es necesario investigar | Concentración

2.2 SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Ejecución presupuestal

Dados por alcanzado los objetivos y las metas proyectadas a la fecha de la presentación del informe, se da evidencia de la ejecución del 98.06% del presupuesto total aportado por el IMER para el cumplimiento de los objetivos, y se da por ejecutado para este periodo de seguimiento el 20,64% equivalente a la suma de: SEIS MILLONES DE PESOS M/L ($6.000.000)

COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO	
1. Valor Contrato	$31.000.000
2. Valor Acta (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista o Conveniente). ACTA DE PAGO 05	$6.000.000
3. Valor Ejecución del Contrato a la fecha del Informe con las Facturas de Este Pago (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista más el anticipo si lo hubo).	$30.400.000
5. Pagos pendientes	$600.000

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO: Conforme a la Cláusula Quinta del Contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión No 126 de 2022.

El Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y Recreación – IMER pagará al contratista sus honorarios de manera mensual dentro de los 10 primeros días de cada mes, por valor de SEIS MILLONES DE PESOS M/L ($6.000.000), previa presentación de informe de actividades y aprobación de la supervisión; el pago se realizará de conformidad con la planificación financiera que tiene la tesorería del instituto IMER.

NOTA: cuando el periodo a cobrar sea inferior a un mes, el pago se realizará de manera proporcional a las tareas efectivamente ejecutadas.

Para efectos de aprobación de pago, se deberá acreditar al supervisor del contrato, el pago de aportes a seguridad social, ARL en los términos señalados para el efecto en la normatividad vigente en la materia, presentación del informe mensual de actividades y presentación de factura o cuenta de cobro.

NUMERO DE PAGO	NUMERO DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	PAGO PARCIAL	PAGO	ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACION PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	SALDO
1	CUENTA DE COBRO #001	X				2022-00279 18-03-2022	$6.400.000	N/A	$24.600.000
2	CUENTA DE COBRO #002	X				607 (06/05/2022)	$6.000.000	N/A	$18.600.000
3	CUENTA DE COBRO #003	X				871 (10/06/2022)	$6.000.000	N/A	$12.600.000
4	CUENTA DE COBRO #004						$6.000.000	N/A	$6.600.000
5	CUENTA DE COBRO #005						$6.000.000	N/A	$600.000

4. NOTA: Teniendo en cuenta que el plazo contractual terminó el 30 de junio de 2022, se solicita al área contable del Instituto liberar el valor no ejecutado, esto es, la suma de SEISCIENTOS MIL PESOS M/L ($600.000)
5.
6. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y e igualmente por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad y uso adecuado de los desechos (para los contratos y convenios que aplique) de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nacional 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017.

7. ANOTACIONES ADICIONALES:

Realizar las anotaciones y/o recomendaciones realizadas a que dé lugar con respecto al desarrollo de las actividades por parte del contratista.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	Problemas o hallazgos identificados que afectan la ejecución del contrato	Causas	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1	N/A	N/A	N/A
RECOMENDACIONES			
1	N/A		

8. ANEXOS

1- Informe de actividades 05
2- Cuenta de Cobro N.º 05
3- Planilla de seguridad social
4- Acta de pago 05

Para constancia, se firma la presente acta:



JESUS OCTAVIO HENAO AGUDELO
Profesional Universitario
Supervisor
