REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS N[redacted]

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/05/2028
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/07/2022	31/07/2022

FECHA PRESENTE ACTA

16/08/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 16 de Agosto de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de **A CONSTRUIR S.A.**, Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO**, supervisores del contrato y **ESTHER MENDOZA PEINADO**, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

		CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL				CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 007		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
1,00	CAPITULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 308.285.984,20		$ 396.930.981,02		$ 396.724.091,92		$ -		$ 396.724.091,92		$ 206.889,10	99,95%	0,05%
1,10	Localizacion y replanteo con equipo	m2	7.366,00	$ 3.883,00	28.602.178,00	14.383,50	55.851.130,50	14.383,50	55.851.130,50			14.383,50	55.851.130,50	-	-	100,00%	
1,20	Cerramiento en lona verde H=2.00m	ml	480,00	$ 17.539,00	8.418.720,00	480,00	8.418.720,00	468,29	8.213.250,62			468,29	8.213.250,62	11,72	205.469,39	97,56%	2,44%
1,30	Descapote a maquina espesor 20cm	m2	11.974,93	$ 6.880,00	82.387.518,40	-	-	-	-			-	-	-	-		
1,40	Acometida provisional agua 50ml	und.	1,00	$ 950.000,00	950.000,00	1,00	950.000,00	1,00	950.000,00			1,00	950.000,00	-	-	100,00%	
1,50	Acometida provisional electrica 100ml	und.	1,00	$ 5.800.000,00	5.800.000,00	1,00	5.800.000,00	1,00	5.800.000,00			1,00	5.800.000,00	-	-	100,00%	
1,60	Acometida provisional telefonos	und.	1,00	$ 950.000,00	950.000,00	1,00	950.000,00	1,00	950.000,00			1,00	950.000,00	-	-	100,00%	
1,70	Demoliciones	m3	1.276,15	$ 141.972,00	181.177.567,80	2.288,91	324.961.130,52	2.288,90	324.959.710,80			2.288,90	324.959.710,80	0,01	1.419,72	100,00%	0,00%
2,00	CAPITULO 2. EXCAVACIONES Y RELLENO				$ 843.241.884,50		$ 425.316.642,86		$ 406.968.404,90		$ -		$ 406.968.404,90		$ 18.348.237,96	95,69%	4,31%
2,10	Excavacion mecanica a nivel bajo placa de subpresion, con retiro hasta 10 km	m3	48.516,40	$ 16.355,00	793.485.722,00	22.963,04	375.560.480,36	22.617,40	369.907.538,16		-	22.617,40	369.907.538,16	345,64	5.652.942,20	98,49%	1,51%
2,20	Excavacion manual para zapatas	m3	825,00	$ 18.246,00	15.052.950,00	825,00	15.052.950,00	752,98	13.738.879,47		-	752,98	13.738.879,47	72,02	1.314.070,53	91,27%	8,73%
2,30	Cargue y retiro de sobrantes hasta 10 km	m3	1.072,50	$ 15.069,00	16.161.502,50	1.072,50	16.161.502,50	598,03	9.011.766,13		-	598,03	9.011.766,13	474,47	7.149.736,37	55,76%	44,24%
2,40	Rellenos con material seleccionado de sitio	m3	990,00	$ 18.729,00	18.541.710,00	990,00	18.541.710,00	764,07	14.310.221,14		-	764,07	14.310.221,14	225,93	4.231.488,86	77,18%	22,82%
3,00	CIMENTACION				$ 4.746.920.679,00	$ -	$ 855.203.826,62		$ 851.203.828,62		$ -		$ 851.203.828,62		$ 3.799.777,40	99,56%	0,44%
3,10	Concreto pobre e =5cm	m2	7.683,00	$ 24.563,00	188.717.529,00	2.935,73	72.110.421,96	2.854,76	70.121.371,63		-	2.854,76	70.121.371,63	80,98	1.989.050,33	97,24%	2,76%
3,20	ZAPATAS EN CONCRETO DE 4000 SPI		-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
3,2,1	Concreto de 4000 psi para Zapatas	m3	330,00	$ 899.509,00	296.837.970,00	475,11	427.368.250,86	473,46	425.881.531,14		-	473,46	425.881.531,14	1,65	1.486.719,72	99,65%	0,35%
3,2,2	Acero de refuerzo fy 60.000psi	kg	16.500,00	$ 5.905,00	97.432.500,00	60.207,44	355.524.933,20	60.152,57	355.200.925,85		-	60.152,57	355.200.925,85	54,87	324.007,35	99,91%	0,09%
3,30	LOSA ALIGERADA DE CIMENTACIÓN E=80CM		-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
3,3,1	Concreto 4000Psi para losa aligerada	m3	3.007,00	$ 857.676,00	2.579.031.732,00	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
3,3,2	Aligeramiento en casetón de lona	m2	5.420,00	$ 32.402,00	175.618.840,00	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
3,3,3	Acero de refuerzo fy 60.000psi	kg	181.000,00	$ 5.905,00	1.068.805.000,00	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
3,3,4	Malla electrosoldada 15x15cm 7.0x6.5mm	kg	58.612,00	$ 5.809,00	340.477.108,00	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
3,40	ACTIVIDADES ADICIONALES PARA CIMENTACION		-		-	-	$ 4.052.725.996,05	-	$ 3.603.396.926,48		$ -	-	$ 3.603.396.926,48	-	$ 449.329.069,57	88,91%	11,09%
NP 01	Concreto pobre e=15cm	m2	-	$ 73.407,00	-	532,59	39.096.017,65	532,59	39.095.834,13		-	532,59	39.095.834,13	0,00	183,52	100,00%	0,00%
NP 02	Acero de refuerzo fy 60.000psi	kg	-	$ 5.905,00	-	184.338,69	1.088.519.976,26	179.634,92	1.060.744.202,60		-	179.634,92	1.060.744.202,60	4.703,77	27.775.773,66	97,45%	2,55%
NP 03	Concreto 4000Psi Losa de cimentación	m3	-	$ 857.676,00	-	1.142,94	980.275.638,14	1.031,63	884.804.291,88		-	1.031,63	884.804.291,88	111,31	95.471.346,26	90,26%	9,74%
NP 04	Concreto 4000Psi viga de cimentación	m3	-	$ 991.354,24	-	1.669,87	1.655.435.734,91	1.632,87	1.618.752.597,87		-	1.632,87	1.618.752.597,87	37,00	36.683.137,04	97,78%	2,22%
NP 05	Malla electrosoldada	kg	-	$ 5.809,00	-	49.819,01	289.398.629,09	-	-		-	-	-	49.819,01	289.398.629,09		100,00%
4,00	COLUMNAS Y PANTALLAS DE CONCRETO				$ 4.323.952.325,00	$ -	$ 3.901.064.417,20		$ 1.802.271.669,62		$ -		$ 1.802.271.669,62		$ 2.098.792.747,58	46,20%	53,80%
4,10	COLUMNAS DE CONCRETO Y MUROS CORTINA		-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
4,1,1	Concreto 4000psi	m3	1.467,00	$ 1.155.437,00	1.695.026.079,00	1.584,58	1.830.887.156,52	533,52	616.442.971,06		-	533,52	616.442.971,06	1.051,07	1.214.444.185,47	33,87%	66,33%
4,1,2	Acero de refuerzo fy 60.000psi	kg	366.745,00	$ 5.905,00	2.165.629.225,00	278.220,08	1.642.889.558,70	128.458,24	758.545.907,20		-	128.458,24	758.545.907,20	149.761,84	884.343.651,50	46,17%	53,83%
4,20	MURO DE CONTENCIÓN		-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
4,2,1	Concreto 4000psi	m3	333,00	$ 1.155.437,00	384.760.521,00	241,78	279.363.868,73	241,78	279.358.958,13		-	241,78	279.358.958,13	0,00	4.910,61	100,00%	0,00%
4,2,2	Acero de refuerzo fy 60.000psi	kg	13.300,00	$ 5.905,00	78.536.500,00	15.796,21	93.276.620,05	15.796,21	93.276.620,05		-	15.796,21	93.276.620,05	-	-	100,00%	
4,30	ACTIVIDADES ADICIONALES		-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
NP 06	SUELO CEMENTO PERIMETRAL	M3	-	$ 178.995,13	-	305,30	54.647.213,19	305,30	54.647.213,19		-	305,30	54.647.213,19	-	-	100,00%	
5,00	PLACAS DE SOTANO				$ 3.225.228.312,00		$ 3.225.228.312,00		$ 2.916.952.187,51		$ -		$ 2.916.952.187,51		$ 308.276.124,49	90,44%	9,56%
5,1,1	Concreto 4000Psi para losa aligerada E=60cm	m3	1.759,00	$ 1.028.440,00	1.809.025.960,00	1.759,00	1.809.025.960,00	1.616,20	1.662.164.728,00		-	1.616,20	1.662.164.728,00	142,80	146.861.232,00	91,88%	8,12%
5,1,2	Aligeramiento en casetón de icopor removible	m2	5.660,00	$ 67.402,00	381.495.320,00	5.660,00	381.495.320,00	5.637,28	379.963.946,56		-	5.637,28	379.963.946,56	22,72	1.531.373,44	99,60%	0,40%
5,1,3	Acero de refuerzo fy 60.000psi	kg	140.467,00	$ 5.905,00	829.457.635,00	140.467,00	829.457.635,00	113.607,32	670.851.224,60		-	113.607,32	670.851.224,60	26.859,68	158.606.410,40	80,88%	19,12%
5,1,4	Malla electrosoldada 15x15 8mm	kg	35.333,00	$ 5.809,00	205.249.397,00	35.333,00	205.249.397,00	35.113,15	203.972.288,35		-	35.113,15	203.972.288,35	219,85	1.277.108,65	99,38%	0,62%
6,00	PLACAS DE ENTREPISO				$ 2.096.971.497,46	$ -	$ 2.096.971.497,46		$ -		$ -		$ -		$ 2.096.971.497,46		100,00%
6,10	TP - 1 SISTEMA LAMINA COLABORANTE		-		-	-	-		-		-		-	-	-		
6,1,1	Concreto para losa maciza E=15cm	m3	521,37	$ 1.028.440,00	536.197.762,80	521,37	536.197.762,80		-		-		-	521,37	536.197.762,80		100,00%
6,1,2	Mallas Electrosoldada fy 60.000psi M-188	kg	18.146,00	$ 5.809,00	105.410.114,00	18.146,00	105.410.114,00		-		-		-	18.146,00	105.410.114,00		100,00%
6,1,3	Metaldeck 3" calibre 22	m2	4.697,00	$ 58.842,00	276.380.874,00	4.697,00	276.380.874,00		-		-		-	4.697,00	276.380.874,00		100,00%
6,20	TP - 2 Y 2A SISTEMA LAMINA COLABORANTE		-		-	-	-		-		-		-	-	-		
6,2,1	Concreto para losa maciza E=15cm	m3	394,61	$ 1.028.440,00	405.832.708,40	394,61	405.832.708,40		-		-		-	394,61	405.832.708,40		100,00%
6,2,2	Mallas Electrosoldada fy 60.000psi M-188	kg	13.504,00	$ 5.809,00	78.444.736,00	13.504,00	78.444.736,00		-		-		-	13.504,00	78.444.736,00		100,00%
6,2,3	Metaldeck 3" calibre 22	m2	3.555,00	$ 58.842,00	209.183.310,00	3.555,00	209.183.310,00		-		-		-	3.555,00	209.183.310,00		100,00%
6,30	TP - 3 SISTEMA LAMINA COLABORANTE		705,00	-	-	705,00	-		-		-		-	705,00	-		
6,3,1	Concreto para losa maciza E=15cm	m3	78,26	$ 1.028.440,00	80.485.714,40	78,26	80.485.714,40		-		-		-	78,26	80.485.714,40		100,00%
6,3,2	Mallas Electrosoldada fy 60.000psi M-188	kg	2.954,00	$ 5.809,00	17.159.786,00	2.954,00	17.159.786,00		-		-		-	2.954,00	17.159.786,00		100,00%
6,3,3	Metaldeck 3" calibre 22	m2	705,00	$ 58.842,00	41.483.610,00	705,00	41.483.610,00		-		-		-	705,00	41.483.610,00		100,00%
6,40	TP - 4 SISTEMA LAMINA COLABORANTE		-		-	-	-		-		-		-	-	-		
6,7,1	Concreto para losa maciza E=15cm	m3	266,73	$ 1.028.440,00	274.315.801,20	266,73	274.315.801,20		-		-		-	266,73	274.315.801,20		100,00%
6,7,2	Mallas Electrosoldada fy 60.000psi M-188	kg	9.706,00	$ 5.809,00	56.382.154,00	9.706,00	56.382.154,00		-		-		-	9.706,00	56.382.154,00		100,00%
6,7,3	Metaldeck 3" calibre 22	m2	266,73	$ 58.842,00	15.694.926,66	266,73	15.694.926,66		-		-		-	266,73	15.694.926,66		100,00%
7,00	ESTRUCTURA METALICA				$ 34.824.798.005,34	$ -	$ 34.722.190.108,14		$ 4.816.309.445,41		$ 3.421.407.081,72		$ 8.237.716.527,13		$ 26.484.473.581,01	23,72%	76,28%
7,10	Estructura metálica (inc. Placinas, pernos y demás)	kg	2.736.124,00	$ 12.108,00	33.128.989.392,00	2.727.649,61	33.026.381.494,80	397.779,11	4.816.309.445,41	282.574,09	3.421.407.081,72	680.353,20	8.237.716.527,13	2.047.296,41	24.788.664.967,67	24,94%	75,06%
7,20	Pintura intumescente	m2	13.680,62	$ 123.957,00	1.695.808.613,34	13.680,62	1.695.808.613,34	-	-	-	-	-	-	13.680,62	1.695.808.613,34		100,00%
9,00	DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS				$ 437.474.737,70	$ -	$ 1.131.441.864,45		$ 779.466.809,16		$ -		$ 779.466.809,16		$ 351.975.055,30	68,89%	31,11%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS N[redacted]7

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/05/2028
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/07/2022	31/07/2022

FECHA PRESENTE ACTA

16/08/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 16 de Agosto de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de **A CONSTRUIR S.A.**, Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO**, supervisores del contrato y **ESTHER MENDOZA PEINADO**, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

						CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL				CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 007		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.		VR. UNITARIO		VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
9,10	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCION**		-				-	-	-				-				-	-	-		
9,1,1	CAJA DE INSPECCIÓN	und	11,00	$	715.121,00		7.866.331,00	11,00	7.866.331,00				-				-	11,00	7.866.331,00		100,00%
9,1,2	TUBERIA PERFORADA PARA DRENAJE 4"	ml	527,91	$	147.160,00		77.687.235,60	-	-				-				-	-	-		
9,1,3	TUBERIA PERFORADA PARA DRENAJE 8"	ml	81,29	$	195.705,00		15.908.859,45	992,20	194.176.501,00			992,19	194.176.543,95			992,19	194.176.543,95	0,01	1.957,05	100,00%	0,00%
9,1,4	CONEXIÓN A RED SANITARIA 12"	und	1,00	$	1.331.346,00		1.331.346,00	1,00	1.331.346,00			-	-			-	-	1,00	1.331.346,00		100,00%
9,1,5	CONEXIÓN A RED SANITARIA 10"	und	1,00	$	1.207.553,00		1.207.553,00	1,00	1.207.553,00			-	-			-	-	1,00	1.207.553,00		100,00%
9,1,6	**ACTIVIDADES ADICIONALES**		-				-	-	-			-	-			-	-	-	-		
NP 07	RELLENO CON SUBBASE	M3	-	$	92.037,22		-	1.112,90	102.426.222,14			1.111,53	102.302.131,15			1.111,53	102.302.131,15	1,37	126.090,99	99,88%	0,12%
NP 08	PEDRAPLEN	M3	-	$	133.476,32		-	3.040,40	405.821.536,80			3.040,40	405.821.403,33			3.040,40	405.821.403,33	0,00	133,48	100,00%	0,00%
NP 09	FILTRO PERIMETRAL MURO DE CONTENCION	ML	-	$	142.289,84		-	435,91	62.025.564,86			379,91	54.057.333,73			379,91	54.057.333,73	56,00	7.968.231,13	87,15%	12,85%
NP 10	CAJAS DE INTERSECCION DE TUBERIA DE 8" PERFORADA	UNID	-	$	340.450,89		-	37,00	12.596.683,00			37,00	12.596.683,00			37,00	12.596.683,00	-	-	100,00%	
NP 11	TUBERIA SANITARIA DE 8"	ML	-	$	175.211,90		-	60,00	10.512.714,00			60,00	10.512.714,00			60,00	10.512.714,00	-	-	100,00%	
9,20	**BAJANTES AGUAS LLUVIAS Y AGUAS NEGRAS**		-				-	-	-			-	-			-	-	-	-		
9,2,1	BAJANTE AGUAS NEGRAS PVC-S 4"	ml	8,18	$	56.270,00		460.288,60	8,18	460.288,60			-	-			-	-	8,18	460.288,60		100,00%
9,2,2	BAJANTE AGUAS NEGRAS PVC-S 6"	ml	49,99	$	114.129,00		5.705.308,71	49,99	5.705.308,71			-	-			-	-	49,99	5.705.308,71		100,00%
9,2,3	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC-S 4"	ml	570,52	$	50.261,00		28.674.905,72	570,52	28.674.905,72			-	-			-	-	570,52	28.674.905,72		100,00%
9,2,4	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC-S 6"	ml	120,38	$	122.801,00		14.782.784,38	120,38	14.782.784,38			-	-			-	-	120,38	14.782.784,38		100,00%
9,30	**SALIDAS SANITARIAS**		-				-	-	-			-	-			-	-	-	-		
9,3,1	PUNTO DESAGUE PVC 2"	und	87,00	$	59.600,00		5.185.200,00	87,00	5.185.200,00			-	-			-	-	87,00	5.185.200,00		100,00%
9,3,2	PUNTO DESAGUE PVC 3"	und	7,00	$	84.478,00		591.346,00	7,00	591.346,00			-	-			-	-	7,00	591.346,00		100,00%
9,3,3	PUNTO DESAGUE PVC 4"	und	48,00	$	111.607,00		5.357.136,00	48,00	5.357.136,00			-	-			-	-	48,00	5.357.136,00		100,00%
9,3,4	VALVULA DE ADMISION DE AIRE	und	98,00	$	325.811,00		31.929.478,00	98,00	31.929.478,00			-	-			-	-	98,00	31.929.478,00		100,00%
9,40	**RED SANITARIA, VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS INTERNA**		-				-	-	-			-	-			-	-	-	-		
9,4,1	TUBERIA PVC-S 4" VENTILACION	ml	76,04	$	58.918,00		4.480.124,72	76,04	4.480.124,72			-	-			-	-	76,04	4.480.124,72		100,00%
9,4,2	TUBERIA PVC-S 3"	ml	25,89	$	68.055,00		1.761.943,95	25,89	1.761.943,95			-	-			-	-	25,89	1.761.943,95		100,00%
9,4,3	TUBERIA PVC-S 1 1/2"	ml	560,81	$	23.686,00		13.272.129,46	560,81	13.272.129,46			-	-			-	-	560,81	13.272.129,46		100,00%
9,4,4	TUBERIA PVC-S 2"	ml	174,87	$	41.055,00		7.179.287,85	174,87	7.179.287,85			-	-			-	-	174,87	7.179.287,85		100,00%
9,4,5	TUBERIA PVC-S 4"	ml	1.237,83	$	60.210,00		74.529.744,30	1.237,83	74.529.744,30			-	-			-	-	1.237,83	74.529.744,30		100,00%
9,4,6	TUBERIA PVC-S 6"	ml	714,24	$	99.472,00		71.046.881,28	714,24	71.046.881,28			-	-			-	-	714,24	71.046.881,28		100,00%
9,4,7	TRAGANTE AGUAS LLUVIAS 6X4" METALICO	und	28,00	$	86.183,00		2.413.124,00	28,00	2.413.124,00			-	-			-	-	28,00	2.413.124,00		100,00%
9,50	**SUMIDEROS, REJILLAS Y TRAMPAS DE GRASAS**		-				-	-	-			-	-			-	-	-	-		
9,5,1	REJILLA Aluminio 4 x 2"	und	35,00		33.463,00		1.171.205,00	35,00	1.171.205,00			-	-			-	-	35,00	1.171.205,00		100,00%
9,5,2	CARCAMO CONCRETO 3.000 PSI	ml	11,08		269.946,00		2.991.001,68	11,08	2.991.001,68			-	-			-	-	11,08	2.991.001,68		100,00%
9,5,3	TRAMPA DE GRASAS	und	2,00		2.860.272,00		5.720.544,00	2,00	5.720.544,00			-	-			-	-	2,00	5.720.544,00		100,00%
9,5,4	GRUPO DE BOMBEO PARA AGUAS NEGRAS	und	1,00		24.962.197,00		24.962.197,00	1,00	24.962.197,00			-	-			-	-	1,00	24.962.197,00		100,00%
9,5,5	GRUPO DE BOMBEO PARA AGUAS DE NIVEL FREATICO	und	1,00		31.258.782,00		31.258.782,00	1,00	31.258.782,00			-	-			-	-	1,00	31.258.782,00		100,00%
10,00	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**	**und**				$	**351.591.545,93**	$ -	$ **351.591.545,93**			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ **351.591.545,93**		**100,00%**
10,10	**INSTALACIÓN HIDRAULICA**		-				-	-	-			-	-			-	-	-	-		
10,1,1	CONEXIÓN A RED HIDRAULICA PVC-P 3"	und	1,00		442.813,00		442.813,00	1,00	442.813,00			-	-			-	-	1,00	442.813,00		100,00%
10,1,2	CONEXIÓN A RED HIDRAULICA PVC-P 4"	und	2,00		490.043,00		980.086,00	2,00	980.086,00			-	-			-	-	2,00	980.086,00		100,00%
10,1,3	VALVULA BOLA 3"	und	5,00		774.277,00		3.871.385,00	5,00	3.871.385,00			-	-			-	-	5,00	3.871.385,00		100,00%
10,1,4	VALVULA BOLA 4"	und	6,00		1.277.325,00		7.663.950,00	6,00	7.663.950,00			-	-			-	-	6,00	7.663.950,00		100,00%
10,1,5	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 3"	und	4,00		1.156.876,00		4.627.504,00	4,00	4.627.504,00			-	-			-	-	4,00	4.627.504,00		100,00%
10,1,6	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 1 1/2"	und	5,00		620.368,00		3.101.840,00	5,00	3.101.840,00			-	-			-	-	5,00	3.101.840,00		100,00%
10,1,7	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 1"	und	6,00		330.195,00		1.981.170,00	6,00	1.981.170,00			-	-			-	-	6,00	1.981.170,00		100,00%
10,1,8	VALVULA CHECK 3"	und	9,00		1.267.609,00		11.408.481,00	9,00	11.408.481,00			-	-			-	-	9,00	11.408.481,00		100,00%
10,1,9	VALVULA CHECK 1"	und	3,00		149.999,00		449.997,00	3,00	449.997,00			-	-			-	-	3,00	449.997,00		100,00%
10,1,10	GRUPO DE PRESION PARA AGUA POTABLE 180GPM, 62 m.c.a.	und	1,00		58.758.659,00		58.758.659,00	1,00	58.758.659,00			-	-			-	-	1,00	58.758.659,00		100,00%
10,1,11	CONEXIÓN A TANQUE EN 1 1/2", INCLUYE FLOTADORA 1.1/2"	und	1,00		1.395.089,00		1.395.089,00	1,00	1.395.089,00			-	-			-	-	1,00	1.395.089,00		100,00%
10,1,12	CONJUNTO DE VACIADO DE DEPOSITOS DE AGUA	und	1,00		4.479.116,00		4.479.116,00	1,00	4.479.116,00			-	-			-	-	1,00	4.479.116,00		100,00%
10,1,13	TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2"	ml	154,23		15.354,00		2.368.047,42	154,23	2.368.047,42			-	-			-	-	154,23	2.368.047,42		100,00%
10,1,14	TUBERIA PVC-P RDE 21 1"	ml	579,36		20.397,00		11.817.205,92	579,36	11.817.205,92			-	-			-	-	579,36	11.817.205,92		100,00%
10,1,15	TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/2"	ml	284,47		44.177,00		12.567.031,19	284,47	12.567.031,19			-	-			-	-	284,47	12.567.031,19		100,00%
10,1,16	TUBERIA PVC-P RDE 21 2"	ml	128,27		60.305,00		7.735.322,35	128,27	7.735.322,35			-	-			-	-	128,27	7.735.322,35		100,00%
10,1,17	TUBERIA PVC-P RDE 21 2 1/2"	ml	37,00		79.803,00		2.952.711,00	37,00	2.952.711,00			-	-			-	-	37,00	2.952.711,00		100,00%
10,1,18	TUBERIA PVC-P RDE 21 3"	ml	18,27		94.415,00		1.724.962,05	18,27	1.724.962,05			-	-			-	-	18,27	1.724.962,05		100,00%
10,1,19	TUBERIA PVC-P RDE 21 4"	ml	282,00		155.336,00		43.804.752,00	282,00	43.804.752,00			-	-			-	-	282,00	43.804.752,00		100,00%
10,1,20	REGISTRO Red White o Similar 1/2"	und	3,00		96.180,00		288.540,00	3,00	288.540,00			-	-			-	-	3,00	288.540,00		100,00%
10,1,21	REGISTRO Red White o Similar 1"	und	10,00		134.580,00		1.345.800,00	10,00	1.345.800,00			-	-			-	-	10,00	1.345.800,00		100,00%
10,1,22	REGISTRO Red White o Similar 1 1/2"	und	16,00		230.889,00		3.694.224,00	16,00	3.694.224,00			-	-			-	-	16,00	3.694.224,00		100,00%
10,1,23	REGISTRO Red White o Similar 2"	und	2,00		371.276,00		742.552,00	2,00	742.552,00			-	-			-	-	2,00	742.552,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS N[redacted]7

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/05/2028
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/07/2022	31/07/2022

FECHA PRESENTE ACTA

16/08/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 16 de Agosto de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 007		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
10,1,24	PUNTO AGUA FRIA 1/2"	und	61,00	31.274,00	1.907.714,00	61,00	1.907.714,00		-				-	61,00	1.907.714,00		100,00%
10,1,25	PUNTO AGUA FRIA 1"	und	58,00	39.994,00	2.319.652,00	58,00	2.319.652,00		-				-	58,00	2.319.652,00		100,00%
10,1,28	TRAMITE ANTE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA ACCEDER AL SERVICIO DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES DEL PROYECTO	und	1,00	15.225.145,00	15.225.145,00	1,00	15.225.145,00		-				-	1,00	15.225.145,00		100,00%
10,30	MEDIDORES, ACOMETIDAS Y CONEXIONES		-		-		-		-				-	-	-		
10,3,1	MEDIDOR AGUA 2"	und	1,00	4.048.311,00	4.048.311,00	1,00	4.048.311,00		-				-	1,00	4.048.311,00		100,00%
10,3,2	MEDIDOR AGUA 1 1/2"	und	1,00	549.566,00	549.566,00	1,00	549.566,00		-				-	1,00	549.566,00		100,00%
10,3,3	MEDIDOR AGUA 1"	und	3,00	434.770,00	1.304.310,00	3,00	1.304.310,00		-				-	3,00	1.304.310,00		100,00%
10,40	SANITARIOS		-		-		-		-				-	-	-		
10,4,1	SANITARIO CON FLUXOMETRO	und	37,00	1.720.715,00	63.666.455,00	37,00	63.666.455,00		-				-	37,00	63.666.455,00		100,00%
10,4,2	SANITARIO PARA DISCAPACITADO ELONGADO. INCLUYE BARRAS DE SEGURIDAD EN U	und	11,00	2.250.963,00	24.760.593,00	11,00	24.760.593,00		-				-	11,00	24.760.593,00		100,00%
10,50	ORINALES		-		-		-		-				-	-	-		
10,5,1	ORINAL CON FLUXOMETRO	und	10,00	1.604.826,00	16.048.260,00	10,00	16.048.260,00		-				-	10,00	16.048.260,00		100,00%
10,60	LAVAMANOS		-		-		-		-				-	-	-		
10,6,1	LAVAMANOS SOBREPONER	und	36,00	312.260,00	11.241.360,00	36,00	11.241.360,00		-				-	36,00	11.241.360,00		100,00%
10,6,2	LAVAMANOS DE COLGAR FREE	und	11,00	530.787,00	5.838.657,00	11,00	5.838.657,00		-				-	11,00	5.838.657,00		100,00%
10,70	GRIFERIA		-		-		-		-				-	-	-		
10,10,1	GRIFERIA LAVAMANOS TIPO PUSH ANTIVANDALICA	und	47,00	277.965,00	13.064.355,00	47,00	13.064.355,00		-				-	47,00	13.064.355,00		100,00%
10,10,2	LAVADERO PREFABRICADO DE 80x60x50cm EN ACRILICO	und	4,00	538.692,00	2.154.768,00	4,00	2.154.768,00		-				-	4,00	2.154.768,00		100,00%
10,10,3	GRIFERIA DUCHA BALANCE DE PRESIÓN	und	7,00	180.166,00	1.261.162,00	7,00	1.261.162,00		-				-	7,00	1.261.162,00		100,00%
11,00	RED DE GAS	und			$ 19.014.790,80	$ -	$ 19.014.790,80		$ -		$ -		$ -		$ 19.014.790,80		100,00%
11,10	RED DE GAS		-		-	-	-		-				-	-	-		
11,1,1	ACOMETIDA DE GAS	und	1,00	1.460.077,00	1.460.077,00	1,00	1.460.077,00		-				-	1,00	1.460.077,00		100,00%
11,1,2	TUBERÍA 3/4" PE 80 RDE 11 PARA INSTALACIÓN COMÚN DE GAS	ml	26,98	17.220,00	464.595,60	26,98	464.595,60		-				-	26,98	464.595,60		100,00%
11,1,3	CONTADOR PARA GAS DE MEMBRANA	und	2,00	1.345.355,00	2.690.710,00	2,00	2.690.710,00		-				-	2,00	2.690.710,00		100,00%
11,1,4	RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 3/4"	und	276,55	23.844,00	6.538.748,20	276,55	6.538.748,20		-				-	276,55	6.538.748,20		100,00%
11,1,5	VALVULA TIPO BOLA	und	2,00	53.656,00	107.312,00	2,00	107.312,00		-				-	2,00	107.312,00		100,00%
11,1,6	ESTACIÓN REGULADORA DE PRESIÓN	und	2,00	3.471.116,00	6.942.232,00	2,00	6.942.232,00		-				-	2,00	6.942.232,00		100,00%
11,1,7	TRAMITE ANTE LA EMPRESA SUMINISTRADORA DE GAS PARA ACCEDER AL SERVICIO, PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, ETC.	und	1,00	811.116,00	811.116,00	1,00	811.116,00		-				-	1,00	811.116,00		100,00%
12,00	PROTECCION CONTRA INCENDIOS	und			$ 1.221.084.605,79	$ -	$ 1.221.084.605,79		$ -		$ -		$ -		$ 1.221.084.605,79		100,00%
12,20	EXTINCIÓN		-		-	-	-		-				-	-	-		
12,1,1	GRUPO DE PRESIÓN CONTRA INCENDIOS S/NFPA20	und	1,00	546.543.324,00	546.543.324,00	1,00	546.543.324,00		-				-	1,00	546.543.324,00		100,00%
12,1,2	CONEXION SIAMESA PARA BOMBEROS CUERPO 4"	und	3,00	3.129.806,00	9.389.418,00	3,00	9.389.418,00		-				-	3,00	9.389.418,00		100,00%
12,1,3	MANOMETRO DE 0 A 200 PSI	und	8,00	57.963,00	463.704,00	8,00	463.704,00		-				-	8,00	463.704,00		100,00%
12,1,4	MEDIDOR DE CAUDAL	und	1,00	5.193.087,00	5.193.087,00	1,00	5.193.087,00		-				-	1,00	5.193.087,00		100,00%
12,1,5	TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN CON COSTURA SCH10 COLMENA 6" INCLUYE SOPORTERIA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION	ml	438,21	254.693,00	111.609.019,53	438,21	111.609.019,53		-				-	438,21	111.609.019,53		100,00%
12,1,6	TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN CON COSTURA SCH10 COLMENA 4" INCLUYE SOPORTERIA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION	ml	9,58	210.559,00	2.017.155,22	9,58	2.017.155,22		-				-	9,58	2.017.155,22		100,00%
12,1,7	TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN CON COSTURA SCH10 COLMENA 3"	ml	127,68	126.096,00	16.099.937,28	127,68	16.099.937,28		-				-	127,68	16.099.937,28		100,00%
12,1,8	TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN CON COSTURA SCH10 COLMENA 2 1/2" INCLUYE SOPORTERIA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION	ml	338,85	101.588,00	34.423.093,80	338,85	34.423.093,80		-				-	338,85	34.423.093,80		100,00%
12,1,9	TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN CON COSTURA SCH10 COLMENA 1 1/2" INCLUYE SOPORTERIA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION	ml	1.887,18	59.267,00	111.885.240,66	1.887,18	111.885.240,66		-				-	1.887,18	111.885.240,66		100,00%
12,1,10	TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN CON COSTURA SCH10 COLMENA 1" INCLUYE SOPORTERIA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION	ml	1.227,05	50.206,00	61.605.272,30	1.227,05	61.605.272,30		-				-	1.227,05	61.605.272,30		100,00%
12,1,11	VÁLVULA MARIPOSA 1 1/2" TIPO TTV	und	4,00	479.799,00	1.919.196,00	4,00	1.919.196,00		-				-	4,00	1.919.196,00		100,00%
12,1,12	VÁLVULA MARIPOSA 6" CON REDUCTOR Y VOLANTE TIPO TTV	und	5,00	1.889.087,00	9.445.435,00	5,00	9.445.435,00		-				-	5,00	9.445.435,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS N[redacted]7

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/05/2028
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/07/2022	31/07/2022

FECHA PRESENTE ACTA

16/08/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 16 de Agosto de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de **A CONSTRUIR S.A.**, Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **ANDRES ALMARALES MELO** y **LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO**, supervisores del contrato y **ESTHER MENDOZA PEINADO**, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

			CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL			CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 007		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
12,1,13	VÁLVULA MARIPOSA 8" CON REDUCTOR Y VOLANTE TIPO TTV	und	1,00	3.066.984,00	3.066.984,00	1,00	3.066.984,00		-				-	1,00	3.066.984,00		100,00%
12,1,14	VÁLVULA SUPERVISADA OS&Y 6"	und	1,00	2.160.640,00	2.160.640,00	1,00	2.160.640,00		-				-	1,00	2.160.640,00		100,00%
12,1,15	VÁLVULA SUPERVISADA OS&Y 8"	und	1,00	3.154.160,00	3.154.160,00	1,00	3.154.160,00		-				-	1,00	3.154.160,00		100,00%
12,1,16	BRIDA 4"	und	4,00	237.022,00	948.088,00	4,00	948.088,00		-				-	4,00	948.088,00		100,00%
12,1,17	BRIDA 6"	und	12,00	355.533,00	4.266.396,00	12,00	4.266.396,00		-				-	12,00	4.266.396,00		100,00%
12,1,18	BRIDA 8"	und	6,00	544.730,00	3.268.380,00	6,00	3.268.380,00		-				-	6,00	3.268.380,00		100,00%
12,1,19	PLATINA ANTIVORTICE O VORTEX DE 8" - EQUIPO CONTRAINCENDIOS	und	1,00	1.881.015,00	1.881.015,00	1,00	1.881.015,00		-				-	1,00	1.881.015,00		100,00%
12,1,20	VÁLVULA CHECK 1 1/2"	und	1,00	693.923,00	693.923,00	1,00	693.923,00		-				-	1,00	693.923,00		100,00%
12,1,21	VÁLVULA SEGURIDAD 1 1/2"	und	2,00	618.134,00	1.236.268,00	2,00	1.236.268,00		-				-	2,00	1.236.268,00		100,00%
12,1,22	ROCIADOR COLGANTE INCLUYE ESCUDO	und	511,00	92.683,00	47.361.013,00	511,00	47.361.013,00		-				-	511,00	47.361.013,00		100,00%
12,1,23	ROCIADOR MONTANTE	und	558,00	78.153,00	43.609.374,00	558,00	43.609.374,00		-				-	558,00	43.609.374,00		100,00%
12,1,24	CONEXION PARA ROCIADORES	und	1.069,00	40.806,00	43.621.614,00	1.069,00	43.621.614,00		-				-	1.069,00	43.621.614,00		100,00%
12,1,25	PUESTO DE CONTROL DE 6"	und	4,00	6.524.185,00	26.096.740,00	4,00	26.096.740,00		-				-	4,00	26.096.740,00		100,00%
12,1,26	PUESTO DE CONTROL DE 3"	und	11,00	2.352.982,00	25.882.802,00	11,00	25.882.802,00		-				-	11,00	25.882.802,00		100,00%
12,1,27	PUNTO DE PRUEBA/LIMPIEZA 1". ORIFICIO 1/2".	und	11,00	933.975,00	10.273.725,00	11,00	10.273.725,00		-				-	11,00	10.273.725,00		100,00%
12,1,28	HIDRANTE CHICAGO 4" EXTREMO LISO	und	2,00	6.034.112,00	12.068.224,00	2,00	12.068.224,00		-				-	2,00	12.068.224,00		100,00%
12,30	GABINETES CONTRAINCENDIO Y EXTINTORES		-		-	-	-		-				-	-	-		
12,2,1	GABINETE CONTRAINCENDIO CLASE III	und	16,00	1.920.241,00	30.723.856,00	16,00	30.723.856,00		-				-	16,00	30.723.856,00		100,00%
12,2,2	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO ABC	und	109,00	272.327,00	29.683.643,00	109,00	29.683.643,00		-				-	109,00	29.683.643,00		100,00%
12,2,3	EXTINTOR DE CO2	und	7,00	648.782,00	4.541.474,00	7,00	4.541.474,00		-				-	7,00	4.541.474,00		100,00%
12,2,4	CONEXION PARA BOMBEROS 2 1/2", EN ESCALERAS	und	13,00	1.227.108,00	15.952.404,00	13,00	15.952.404,00		-				-	13,00	15.952.404,00		100,00%
13,00	**SISTEMAS DE COMUNICACIONES**				**$ 2.930.192.260,00**	**$ -**	**$ 2.930.192.260,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 2.930.192.260,00**		**100,00%**
13,10	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS**		-		-	-	-		-				-	-	-		
13,1,1	Suministro e instalación de Panel de detección de incendios direccionable, capaz de soportar mínimo 4 lazos y 4 circuitos de notificación. Certificación UL 864 9 edición. Debe permitir secuencia de alarma positiva. Incluye marcación y ficho de identificación, todas las tarjetas, conectores, cables y todos los elementos necesarios para conectar 4 lazos, 5 anunciadores remotos y conexión en red. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	1,00	13.658.899,00	13.658.899,00	1,00	13.658.899,00		-				-	1,00	13.658.899,00		100,00%
13,1,2	Suministro e instalación de anunciador remoto de detección de incendios, con pantalla LCD. Certificación UL Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	4,00	7.414.267,00	29.657.068,00	4,00	29.657.068,00		-				-	4,00	29.657.068,00		100,00%
13,1,3	Suministro e instalación de fuente de alimentación auxiliar de 6A. Certificada UL. Mínimo 4 circuitos de notificación. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	5,00	3.790.867,00	18.954.335,00	5,00	18.954.335,00		-				-	5,00	18.954.335,00		100,00%
13,1,4	Suministro e instalación de Batería 12V 18 Ah, recargable. Certificación UL. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	12,00	363.228,00	4.358.736,00	12,00	4.358.736,00		-				-	12,00	4.358.736,00		100,00%
13,1,5	Suministro e instalación de estrobo multicandela con sirena electrónica, intensidad seleccionable, montura pared, color rojo. Fuego en español. Certificación UL. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	19,00	527.569,00	10.023.811,00	19,00	10.023.811,00		-				-	19,00	10.023.811,00		100,00%
13,1,6	Suministro e instalación de Estrobo multicandela con sirena electrónica, intensidad seleccionable, montura de techo, color rojo. Fuego en español Certificación UL. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	139,00	540.894,00	75.184.266,00	139,00	75.184.266,00		-				-	139,00	75.184.266,00		100,00%
13,1,7	Suministro e instalación de multisensor de humo y temperatura (doble tecnología), incluye base. Certificación UL. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	6,00	523.127,00	3.138.762,00	6,00	3.138.762,00		-				-	6,00	3.138.762,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS N[redacted]7

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NUMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/07/2022	31/07/2022

FECHA PRESENTE ACTA

16/08/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	Nº POLIZA		VR. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	5.940.883.448,00	12/07/2021	11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023	11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	8.940.883.448,00	12/07/2021	11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 16 de Agosto de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de **A CONSTRUIR S.A.**, Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO**, supervisores del contrato y **ESTHER MENDOZA PEINADO**, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

		CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL				CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 007		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
13,1,8	Suministro e instalación de sensor de humo fotoeléctrico, incluye base. Certificación UL. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	247,00	412.086,00	101.785.242,00	247,00	101.785.242,00		-				-	247,00	101.785.242,00		100,00%
13,1,9	Suministro e instalación de sensor de temperatura fija e incremental, incluye base. Certificación UL. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	61,00	438.736,00	26.762.896,00	61,00	26.762.896,00		-				-	61,00	26.762.896,00		100,00%
13,1,10	Suministro e instalación de sensor de humo de haz proyectado, controlador y reflector.Certificación UL. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	2,00	4.808.334,00	9.616.668,00	2,00	9.616.668,00		-				-	2,00	9.616.668,00		100,00%
13,1,11	Suministro e instalación de sensor de humo direccionable para ducto de aire, incluye ducto de muestreo e indicador LED remoto.Certificación UL. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	4,00	1.175.063,00	4.700.252,00	4,00	4.700.252,00		-				-	4,00	4.700.252,00		100,00%
13,1,12	Suministro e instalación de estación manual, incluye Stopper. Certificación UL. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	50,00	817.304,00	40.865.200,00	50,00	40.865.200,00		-				-	50,00	40.865.200,00		100,00%
13,1,13	Suministro e instalación de modulo de entrada, monitoreo o supervisión simple para conexión a un contacto normalmente abierto. Certificación UL. Incluye caja, tapa protectora y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	78,00	576.427,00	44.961.306,00	78,00	44.961.306,00		-				-	78,00	44.961.306,00		100,00%
13,1,14	Suministro e instalación de modulo de entrada de señal para conexión de señales de telefonia y notificación. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	10,00	576.427,00	5.764.270,00	10,00	5.764.270,00		-				-	10,00	5.764.270,00		100,00%
13,1,15	Suministro e instalación de modulo salida de control de señales externas. Contiene un relevo clase C. Certificación UL. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	36,00	483.152,00	17.393.472,00	36,00	17.393.472,00		-				-	36,00	17.393.472,00		100,00%
13,1,16	Suministro e instalación de Cable FPLR 2x16. Certificación UL	ml	1.525,00	4.683,00	7.141.575,00	1.525,00	7.141.575,00		-				-	1.525,00	7.141.575,00		100,00%
13,1,17	Suministro e instalación de Cable FPLR 2x18. Certificación UL	ml	7.930,00	3.619,00	28.698.670,00	7.930,00	28.698.670,00		-				-	7.930,00	28.698.670,00		100,00%
13,1,18	Suministro e instalación de tubería EMT 3/4", incluye uniones, codos, terminales, cajas aluminio 2400 tipo rawelt con tapa, chazos, abrazaderas dobles, tornillos y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	ml	3.332,00	22.733,00	75.746.356,00	3.332,00	75.746.356,00		-				-	3.332,00	75.746.356,00		100,00%
13,2,0	SISTEMA DE CCTV		-		-	-	-		-				-	-	-		
13,2,1	Suministro e instalación de grabador de video en red de 128 canales rackeable, doble salida GB NIC, fuente de alimentación redundante, soporte de camaras multimarca por protocolo ONVIF, incluye arreglo de discos duros especiales para CCTV de mínimo 120TB, salida por VGA y HDMI 4K. Capacidad de grabación mínimo de 12 MPX.	un	2,00	17.903.802,00	35.807.604,00	2,00	35.807.604,00		-				-	2,00	35.807.604,00		100,00%
13,2,2	Suministro e instalación de Switch para cctv de 24 Puertos PoE, 802.3af, 802.3at, 802.3az, mínimo 2 puertos SFP de 1000Mbps. Incluye los transceptores con conectores LC	un	10,00	3.164.809,00	31.648.090,00	10,00	31.648.090,00		-				-	10,00	31.648.090,00		100,00%
13,2,3	Suministro e instalación de Cámara IP tipo domo, de resolución mínima 1920X1080P 30FPS, lente varifocal 2.8-12mm, sensor 1/2.8", sistema de compresion H.265 o superior, función día/noche con rango IR de mínimo 30m. Grado de proteccion IP67 IK10, alimentación por PoE. Incluye soporte, caja de conexión adapador u otro elemento que sea necesario para su correcta instalación.	un	126,00	874.018,00	110.126.268,00	126,00	110.126.268,00		-				-	126,00	110.126.268,00		100,00%
13,2,4	Suministro e instalación de Cámara IP tipo bala, de resolucion mínima 1920X1080P 30FPS, lente varifocal 2.8-12mm o superior, sensor 1/2.8", sistema de compresion H.265 o superior, función día/noche con rango IR de mínimo 50m. Grado de protección IP67, alimentación por PoE. Incluye soporte, caja de conexión adapador u otro elemento que sea necesario para su correcta instalación.	un	65,00	1.100.542,00	71.535.230,00	65,00	71.535.230,00		-				-	65,00	71.535.230,00		100,00%
13,2,5	Suministro e instalación de Cámara IP PTZ de mínimo 30X ópticos, de resolución mínima 1920X1080P 30FPS, sistema de compresión H.265 o superior, funci÷on día/noche con rango IR o laser de de m÷inimo 150m .Grado de proteccion IP67. Incluye soporte, caja de conexión adapador u otro elemento que sea necesario para su correcta instalación.	un	3,00	3.164.923,00	9.494.769,00	3,00	9.494.769,00		-				-	3,00	9.494.769,00		100,00%
13,2,6	Suministro e instalación de Cámara IP Fish Eye de 360 grados, de resolución mínima 1920X1080P 30FPS, sistema de compresión H.265 o superior, función día/noche con rango IR de mínimo 10m .Grado de protección IP66, IK10. Incluye soporte, caja de conexión adapador u otro elemento que sea necesario para su correcta instalación.	un	2,00	1.238.233,00	2.476.466,00	2,00	2.476.466,00		-				-	2,00	2.476.466,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS N[redacted]7

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115408-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/07/2022	31/07/2022

FECHA PRESENTE ACTA

16/08/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	Nº POLIZA		VR. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 16 de Agosto de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

			CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL			CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 007		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
13,2,7	Suministro e instalación de Cámara IP tipo domo, de resolución mínima 1920X1080P 30FPS, lente fijo especial para ascensores, sistema de compresión H.265 o superior, función día/noche con rango IR de mínimo 15m. Grado de protección IP67 IK10, alimentación por PoE. Incluye soporte, caja de conexión adepador u otro elemento qus sea necesario para su correcta instalación	un	6,00	918.434,00	5.510.604,00	6,00	5.510.604,00	-	-			-	-	6,00	5.510.604,00		100,00%
13,2,8	Suministro e instalación de teclado o joystick, basado en redes IP, soporta multiples permisos de usuario, interoperabilidad con NVR y cámaras	un	1,00	1.267.548,00	1.267.548,00	1,00	1.267.548,00	-	-			-	-	1,00	1.267.548,00		100,00%
13,2,9	Suministro e instalación de decodificador de video con mínimo 12 interfases HDMI e salida, 2 interfaces HDMI de entrada y 2 interfases DVI de entrada, capacidad de decodificación de mínimo 12MPX, capaz de decodificar H.265 o superior, H.264 y MPEG. Incluye todos loe elementos necesarios para su correctainstelación.	un	1,00	17.001.653,00	17.001.653,00	1,00	17.001.653,00	-	-			-	-	1,00	17.001.653,00		100,00%
13,2,10	Suministro e instalación de unidad de visualización de empalme para videowall, de 55" o superior, tecnología LCD o LED, resolución 1920X1080 o superior, para interior, soporta trabajo 24/7, mínimo una interfaz de conexión HDMI, 1 VGA y 1 DVI. incluye coporte de pared y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	8,00	10.594.160,00	84.753.280,00	8,00	84.753.280,00	-	-			-	-	8,00	84.753.280,00		100,00%
13,2,11	Suministro e instalación de estación de trabajo para control de monitoreo, capaz de correr el software según los requerimientos mínimos del software cliente instalado. Se debe entregar instalado, funcional e interconectado con el sistema de vigilancia. Incluye licencia de windows 10 pro	un	3,00	4.740.960,00	14.222.880,00	3,00	14.222.880,00	-	-			-	-	3,00	14.222.880,00		100,00%
13,2,12	Suministro, transporte e instalación de cable UTP Categoría 6A de cuatro pares, cumple normas EIA/TIA568. Incluye plug RJ-45, certificación y resultados en medio impreso y magnético. Marcación y ficho de identificación según norma EIA/TIA606 y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	14.350,00	4.865,00	69.812.750,00	14.350,00	69.812.750,00	-	-			-	-	14.350,00	69.812.750,00		100,00%
13,2,13	Suministro e instalación de tubería EMT 3/4", incluye uniones, codos, terminales, cajas 2400 con tapa, chazos, abrazaderas dobles, tornillos y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje. (Reflejado en la canalización de la red de datos)	ml	100,00	22.733,00	2.273.300,00	100,00	2.273.300,00	-	-			-	-	100,00	2.273.300,00		100,00%
13,36	SISTEMA DE INSTRUSIÓN		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
13,3,1	Suministro e instalación de panel central de intrusión 8-246 zonas, 8 particiones, incluye gabinete con llave, 1 Transformador Plug-In rated 16.5VAC, 40 VA y Backup Battery.	un	1,00	3.169.529,00	3.169.529,00	1,00	3.169.529,00	-	-			-	-	1,00	3.169.529,00		100,00%
13,3,2	Suministro e instalación de Teclado de control LCD.	un	4,00	1.136.917,00	4.547.668,00	4,00	4.547.668,00	-	-			-	-	4,00	4.547.668,00		100,00%
13,3,3	Suministro e instalación de magnético liviano N.A para circuitos N.C gap 25mm. Para aplicaciones en puertas comerciales o acero detección superior.	un	135,00	172.730,00	23.318.550,00	135,00	23.318.550,00	-	-			-	-	135,00	23.318.550,00		100,00%
13,3,4	Suministro, transporte e instalación de cable UTP Categoría 6A de cuatro pares, cumple normas EIA/TIA568. Incluye plug RJ-45, certificación y resultados en medio impreso y magnético. Marcación y ficho de identificación según norma EIA/TIA606 y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	250,00	4.865,00	1.216.250,00	250,00	1.216.250,00	-	-			-	-	250,00	1.216.250,00		100,00%
13,3,5	Suministro e instalación de Cable 2x18AWG apantallado.	ml	3.460,00	3.712,00	12.843.520,00	3.460,00	12.843.520,00	-	-			-	-	3.460,00	12.843.520,00		100,00%
13,3,6	Suministro e instalación de tubería EMT 3/4", incluye uniones, codos, terminales, cajas 2400 con tapa, chazos, abrazaderas dobles, tornillos y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje. (El resto se encuentra reflejado en la canalziacion de incendios y de datos)	ml	95,00	22.733,00	2.159.635,00	95,00	2.159.635,00	-	-			-	-	95,00	2.159.635,00		100,00%
13,40	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
13,4,1	Suministro e instalación de panel control de acceso Ethernet para mínimo 4 puertas, puerto comunicación 10/100 Bate-T, puerto comunicación RS-23 y/o, RS485, mínimo 12 entradas, selección de piso aplicación elevador, mínimo 4 salidas y 4 entradas para lectora, Incluye gabinete, baterías, fuente de poder y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	14,00	7.340.239,00	102.763.346,00	14,00	102.763.346,00	-	-			-	-	14,00	102.763.346,00		100,00%
13,4,2	Suministro e instalación de electroimán 800 lb con antirremanente o cerradura electrónica, incluye soporte ZL, Soporte U Y/O todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	70,00	465.386,00	32.577.020,00	70,00	32.577.020,00	-	-			-	-	70,00	32.577.020,00		100,00%
13,4,3	Suministro e instalación de brazo hidráulico, visagra hidraulica o cualquier otro componente que garantice el cierre automatico de la puerta. Incluye todos los elementros necesarios para su correcta instalación.	un	70,00	268.692,00	18.808.440,00	70,00	18.808.440,00	-	-			-	-	70,00	18.808.440,00		100,00%
13,4,4	Suministro e instalación de lectora de proximidad RFID 125KHz, y/o MIFARE 13.56MHz y/o HID iClass 13.56MMHZ, adicionalmente cuenta con lector de huella dactilar, grado de protección IP65	un	92,00	820.052,00	75.444.784,00	92,00	75.444.784,00	-	-			-	-	92,00	75.444.784,00		100,00%
13,4,5	Suministro instalación Consola Dispensadora de tarjetas Uso Interior. Mueble en Coil Roll, incluye: pantalla a color, chip de voz, computador embebido. Incluye obra, configuración y puesta en marcha del equipo	Un	1,00	10.047.636,00	10.047.636,00	1,00	10.047.636,00	-	-			-	-	1,00	10.047.636,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS N[redacted]7

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.617.688.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/05/2028
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/07/2022	31/07/2022

FECHA PRESENTE ACTA

16/08/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 16 de Agosto de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 007		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
13,4,6	Suministro e instalación Consola recolectora de tarjetas Uso Interior. Mueble en Coil Roll, incluye: pantalla a color, chip de voz, computador embebido. Incluye obra, configuración y puesta en marcha del equipo	Un	1,00	10.047.636,00	10.047.636,00	1,00	10.047.636,00		-				-	1,00	10.047.636,00		100,00%
13,4,7	Suministro transporte e instalación talanquera vehicular derecha/izquierda de 5m, de alto tráfico, con apertura rápida en menos de 5 segundos, barrera con mástil, bandas reflectantes, cordón luminoso, luz intermitente, fotocelda, soporte para fotocelda, columna para fotocelda, apoyo fijo para talanquera, bobina para detección de campo vehicular, obra civil y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	2,00	5.257.896,00	10.515.792,00	2,00	10.515.792,00		-				-	2,00	10.515.792,00		100,00%
13,4,8	Suministro e instalación de punto de pago automatico, debe soportar billetes y monedas colombianas, permitir configuración de tarifas diferenciales por dia u horario, ingreso sin cobro a ciertas tarjetas o placas. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	un	3,00	29.337.060,00	88.011.180,00	3,00	88.011.180,00		-				-	3,00	88.011.180,00		100,00%
13,4,9	Suministro e instalación de punto de pago manual, debe soportar billetes y monedas colombianas, permitir configuración de tarifas diferenciales por dia u horario, ingreso sin cobro a ciertas tarjetas o placas. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	un	4,00	11.261.550,00	45.046.200,00	4,00	45.046.200,00		-				-	4,00	45.046.200,00		100,00%
13,4,10	Suministro e instalación de cable UTP Categoria 6A de cuatro pares, cumple normas EIA/TIA568. Incluye plug RJ-45, certificación y resultados en medio impreso y magnético, marcación y ficho de identificación según norma EIA/TIA606 y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	2.760,00	4.865,00	13.427.400,00	2.760,00	13.427.400,00		-				-	2.760,00	13.427.400,00		100,00%
13,4,11	Suministro e instalación de Cable 2x16AWG apantallado.	ml	2.100,00	3.713,00	7.797.300,00	2.100,00	7.797.300,00		-				-	2.100,00	7.797.300,00		100,00%
13,4,12	Suministro e instalación de tuberia EMT 3/4", incluye uniones, codos, terminales, cajas 2400 con tapa, chazos, abrazaderas dobles, tornillos y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	ml	1.391,00	22.733,00	31.621.603,00	1.391,00	31.621.603,00		-				-	1.391,00	31.621.603,00		100,00%
13,50	SISTEMA RED DE DATOS		-		-	-	-		-				-	-	-		
13,5,1	Suministro e instalación de Rack cerrado de 42 unidades, en lámina cold rolled calibre 16. Incluye, bandeja portacable de 15x3 cm con peldaños, multitoma de 6 salidas 1800 vatios como mínimo, pernos expansivos de fijación, y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	un	9,00	4.398.582,00	39.587.238,00	9,00	39.587.238,00		-				-	9,00	39.587.238,00		100,00%
13,5,2	Suministro e instalación de bandeja portacables para rack. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	9,00	77.454,00	697.086,00	9,00	697.086,00		-				-	9,00	697.086,00		100,00%
13,5,3	Suministro e instalación de organizador horizontal de cables 40x40 para instalar en Rack. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	40,00	143.028,00	5.721.120,00	40,00	5.721.120,00		-				-	40,00	5.721.120,00		100,00%
13,5,4	Suministro e instalación de Switch Core de mínimo 24 puertos SFP 100/1000Mbps, 2 puertos 10 Gigabit de Uplink. Incluye los transceptores con conectores LC y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye la marcación de los puertos en el switch según TIA606	un	2,00	17.992.800,00	35.985.600,00	2,00	35.985.600,00		-				-	2,00	35.985.600,00		100,00%
13,5,5	Suministro e instalación de switch Ethernet, 10/100/1000 Mbps de 24 puertos, capa 3, con 2 puertos a 1000 Mbps + 2 slot SFP a 10000 Mbps para fibra. Incluye la marcación de los puertos en el switch según TIA606. Incluye los transceptores con conectores LC	un	5,00	4.345.689,00	21.728.445,00	5,00	21.728.445,00		-				-	5,00	21.728.445,00		100,00%
13,5,6	Suministro e instalación de Cable de Fibra Óptica de 6 hilos, Interior, Tight Buffer, No Conductiva (Dieléctrica), Plenum, Multimodo OM3 50/125 optimizada, debe cumplir con estándares ISO/IEC 11801:2002 OM3, ANSI/TIA/EIA-568-C.3, ANSI/TIA-598-C, ANSI/TIA-492 AAAC, Telcordia GR-409-CORE. Incluye módulos, elementos asociados,conectores, marcación con placa en acrílico o térmica según norma TIA606, ducto pvc, curvas, adaptadores terminal, pega pvc, obra civil y demás elementos necesarios para su correcta instalación	ml	980,00	84.766,00	83.070.680,00	980,00	83.070.680,00		-				-	980,00	83.070.680,00		100,00%
13,5,7	Suministro e instalación Panel de Conexión de Fibra para Rack de 19in, Bandeja Fija, Acepta mínimo 72 Fibras, 1 UR. Incluye de Placa acopladora de Fibra Optica Quick-Pack, Con 6 Conectores LC Duplex (12 Fibras), Para Fibra Multimodo, Placa adaptadora ciega, elementos asociados,conectores, marcación con placa en acrílico o térmica según norma TIA606, y demás elementos necesarios para su correcta instalación	un	9,00	2.159.136,00	19.432.224,00	9,00	19.432.224,00		-				-	9,00	19.432.224,00		100,00%
13,5,8	Suministro e instalación de salida doble de voz y datos RJ 45 cat 6A, aplicable a normas TIA 568, cumpla standares industriales y estén en el listado UL y además sean marca reconocida en el mercado. incluye el toma de voz y datos, caja 4x4 con tapa suplemento, faceplates, módulos, elementos asociados, marcación con placa en acrílico o térmica segun norma TIA606, ducto pvc, curvas, adaptadores terminal, pega pvc, obra civil y demás elementos necesarios para su correcta instalación.(Salida promedio 3 metros)	un	80,00	257.040,00	20.563.200,00	80,00	20.563.200,00		-				-	80,00	20.563.200,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS N[redacted]7

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/07/2022	31/07/2022

FECHA PRESENTE ACTA

16/08/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	Nº POLIZA		VR. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el da 16 de Agosto de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de **A CONSTRUIR S.A.**, Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **ANDRES ALMARALES MELO** y **LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO**, supervisores del contrato y **ESTHER MENDOZA PEINADO**, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 007		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
13,5,9	Suministro e instalación de salida sencilla de datos RJ 45 Categoría 6A, aplicable a normas TIA 568, cumpla estandares industriales y estén en el listado UL y además sean marca reconocida en el mercado. Incluye: toma de voz o datos, caja metálica 12x5cm con tapa troquel, faceplate, módulo, elementos asociados, marcación con placa en acrilico o térmica segun norma TIA 606, ducto EMT, curvas, uniones, adaptadores, grapas y demás elementos necesarios para su correcta instalación.(Salida promedio 3 metros). No incluye cable	un	284,00	226.195,00	64.239.380,00	284,00	64.239.380,00	-	-		-	-	-	284,00	64.239.380,00		100,00%
13,5,10	Suministro, transporte e instalación de Patch panel preensamblado en fábrica con capacidad para 24 puertos UTP, RJ-45, categoría 6A, incluye elementos de fijación y marcación de los puertos de los puertos según norma TIA 606. Incluye patch cord cable flexible 4 pares con conectores RJ-45 en ambos extremos, cat 6A del tamaño indicado para interconetcarlo correctamente; preensamblado en fábrica. Incluye marcación en ambos extremos y color según la norma TIA 606	un	27,00	1.118.638,00	30.203.226,00	27,00	30.203.226,00	-	-		-	-	-	27,00	30.203.226,00		100,00%
13,5,11	Suministro e instalación de patch cord cable flexible 4 pares con conectores RJ-45 en ambos extremos, cat 6A de 90 cm; preensamblado en fábrica. Incluye marcación en ambos extremos y color según la norma TIA 606	ml	468,00	82.701,00	38.704.068,00	468,00	38.704.068,00	-	-		-	-	-	468,00	38.704.068,00		100,00%
13,5,12	Suministro e instalación de Jumper de Fibra Óptica Multimodo 50/125 OM3 XGLO, LC-LC Duplex, del tamaño adecuado para conexión de switches en cuartos de comunicaciones. Incluye marcación en ambos extremos y color según la norma TIA 606	un	23,00	97.332,00	2.238.636,00	23,00	2.238.636,00	-	-		-	-	-	23,00	2.238.636,00		100,00%
13,5,13	Suministro e instalación de switch Ethernet, 10/100/1000 Mbps de 24 puertos, con 2 puertos a 1000 Mbps + 2 slot SFP a 10000 Mbps para fibra. Incluye la marcación de los puertos en el switch según TIA606. Incluye los transceptores con conectores LC	un	12,00	3.431.769,00	41.181.228,00	12,00	41.181.228,00	-	-		-	-	-	12,00	41.181.228,00		100,00%
13,5,14	Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A de cuatro pares, cumple normas EIA/TIA568. Incluye plug RJ-45, certificación y resultados en medio impreso y magnético, marcación y ficha de identificación según norma EIA/TIA606 y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	12.880,00	4.865,00	62.661.200,00	12.880,00	62.661.200,00	-	-		-	-	-	12.880,00	62.661.200,00		100,00%
13,5,15	Suministro e instalación de tubería EMT 3/4", incluye uniones, codos, terminales, cajas 2400 con tapa, chazos, abrazaderas dobles, tornillos y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	ml	1.782,00	22.733,00	40.510.206,00	1.782,00	40.510.206,00	-	-		-	-	-	1.782,00	40.510.206,00		100,00%
13,5,16	Suministro e instalación piso falso antiestático, de gran resistencia y tratado contra el fuego, incluye pedestal de alumno con una altura ente 20 y 50 cms y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	m2	72,00	746.855,00	53.773.560,00	72,00	53.773.560,00	-	-		-	-	-	72,00	53.773.560,00		100,00%
13,5,17	Suministro e instalación de Rack cerrado de 12 unidades, en lámina cold rolled calibre 16. Incluye, bandeja portacable de 15x3 cm con peldaños, multitoma de 8 salidas 1800 vatios como mínimo, pernos expansivos de fijación, y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	Un	2,00	897.500,00	1.795.000,00	2,00	1.795.000,00	-	-		-	-	-	2,00	1.795.000,00		100,00%
13,5,18	Suministro e instalación de tubería EMT 1 1/2", incluye uniones, codos, terminales, cajas 2400 con tapa, chazos, abrazaderas dobles, tornillos y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	ml	235,00	58.900,00	13.841.500,00	235,00	13.841.500,00	-	-		-	-	-	235,00	13.841.500,00		100,00%
13,5,19	Suministro e instalación de bandeja portacables tipo escalera, de 300mm X 80mm, incluye curvas de 90 grados, uniones en T, uniones lineales, soportes, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	1.630,00	207.220,00	337.768.600,00	1.630,00	337.768.600,00	-	-		-	-	-	1.630,00	337.768.600,00		100,00%
13,60	SISTEMA DE RED INALAMBRICA WIFI		-		-	-	-		-		-		-	-	-		
13,6,1	Suministro e instalación punto de acceso WiFi empresarial, para interior y/o exterior, compatible con el estandar 802.11AC wave 2 de doble banda, alcance máximo de 120m o superior, cuenta con mínimo 2 puertos Ethernet 10/100/1000 Mbps, cuenta con la capacidad de radiar en las frecuencias de 2.5GHz y 5GHz, la alimentación debe ser PoE, compatible con 802.3at incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	57,00	1.544.707,00	88.048.299,00	57,00	88.048.299,00	-	-		-	-	-	57,00	88.048.299,00		100,00%
13,6,2	Suministro e instalación de switch Ethernet, 10/100/1000 Mbps de 24 puertos PoE 802.3af - 802.3at, 802.3bt PoE++, con 2 puertos a 1000 Mbps + 2 slot SFP a 10000 Mbps, para fibra. Incluya la marcación de los puertos en el switch según TIA606. incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Incluye los transceptores con conectores LC	un	5,00	4.320.099,00	21.600.495,00	5,00	21.600.495,00	-	-		-	-	-	5,00	21.600.495,00		100,00%
13,6,3	Suministro e instalación de controladora Wi-FI y gateway de seguridad con mínimo 2 puertos SFP a 10Gbps, mínimo 8 puertos LAN 10/100/1000. Incluya la marcación de los puertos en el switch según TIA606. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	1,00	2.854.172,00	2.854.172,00	1,00	2.854.172,00	-	-		-	-	-	1,00	2.854.172,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS N[redacted]7

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/07/2022	31/07/2022

FECHA PRESENTE ACTA

16/08/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	Nº POLIZA		VR. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 16 de Agosto de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 007		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
13,6,4	Suministro e instalación de cable UTP categoría 6A de cuatro pares, cumple normas EIA/TIA568. Incluye plug RJ-45, certificación y resultados en medio impreso y magnético, marcación y ficho de identificación según norma EIA/TIA606 y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	3.990,00	4.865,00	19.411.350,00	3.990,00	19.411.350,00		-				-	3.990,00	19.411.350,00		100,00%
13,6,5	Suministro e instalación de tubería EMT 3/4", incluye uniones, codos, terminales, cajas 2400 con tapa, chazos, abrazaderas dobles, tornillos y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje. (Reflejado en canalizacion de red de datos)	ml	100,00	22.733,00	2.273.300,00	100,00	2.273.300,00		-				-	100,00	2.273.300,00		100,00%
13,70	SISTEMA SONIDO AMBIENTAL Y AUDIO EVACUACUACION		-		-	-	-		-				-	-	-		
13,7,1	Suministro e instalación de controlador de audio de mínimo 8 entradas y 4 salidas, certificado EN para audioevacuacion, supervisión interna y monitoreo de señales debe permitir grabar almenos 50 minutos de mensajes internos y permitir dar prioridad a señales de emergencia con respecto al resto de entradas de audio y tener interconexión con estaciones de llamado para voceo. Incluye fuente de alimentación, marcación, ficho de identificación y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	un	1,00	9.888.431,00	9.888.431,00	1,00	9.888.431,00		-				-	1,00	9.888.431,00		100,00%
13,7,2	Suministro e instalación matriz de audio DSP mínimo 8 zonas, certificado EN safety, debe permitir manipulación desde PC, dispositivo movil, tablets y/o teclado de control. Incluye marcación, ficho de identificación y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	un	1,00	6.720.053,00	6.720.053,00	1,00	6.720.053,00		-				-	1,00	6.720.053,00		100,00%
13,7,3	Suministro e instalación de amplificador DSP de mínimo 4 canales de 220W, salidas de 100V/70V/8ohms y 4ohms. Debe ser compatible con la matriz.Incluye marcación, ficho de identificación y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	un	5,00	8.738.537,00	43.692.685,00	5,00	43.692.685,00		-				-	5,00	43.692.685,00		100,00%
13,7,4	Suministro e instalación estación de llamado compatible con la matriz de 7.02, debe permitir programación de grabación de zonas. Incluye marcación, ficho de identificación y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	un	4,00	2.688.021,00	10.752.084,00	4,00	10.752.084,00		-				-	4,00	10.752.084,00		100,00%
13,7,5	Suministro e instalación teclado de gestion de volumen y fuente de audio compatible con la matriz de 7.02, debe permitir programación de grabación de zonas. Incluye marcación, ficho de identificación y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	un	4,00	1.253.664,00	5.014.656,00	4,00	5.014.656,00		-				-	4,00	5.014.656,00		100,00%
13,7,6	Suministro e instalación amplificador profesional DSP para sonido en vivo de mínimo dos salidas de 1800w, debe permitir procesamiento profesional de altavoces con tecnologia FIR drive, y supervisión y control a traves de display LC ubicado en la aparte delantera. Incluye marcación, ficho de identificación y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	un	3,00	7.726.828,00	23.180.484,00	3,00	23.180.484,00		-				-	3,00	23.180.484,00		100,00%
13,7,7	Suministro e instalación modulo de arreglo lineal para aplicaciones de sonido, debe contener mínimo dos arreglos en cada modulo, dos woofers de 8" de baja distorsion, cuetro diafragmas de titanio con driver HF de 1,25", sensibilidad e mínimo 104 decibeles, manejo de energía de mínimo 350w continuos, 1400w pico . Incluye marcación, ficho de identificación y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	un	8,00	16.912.820,00	135.302.560,00	8,00	135.302.560,00		-				-	8,00	135.302.560,00		100,00%
13,7,8	Suministro e instalación modulo de subwoofer de arreglo lineal para aplicaciones de sonido, debe contener mínimo dos subwoofers de 15" para baja distroción y alto SPL con una sensibilidad de 100db, manejo de energía de 1000w continuos y 4000w pico y un SPL máximo de 130 dB. Incluye marcación, ficho de identificación y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	un	4,00	18.472.333,00	73.889.332,00	4,00	73.889.332,00		-				-	4,00	73.889.332,00		100,00%
13,7,9	Suministro e instalación de altavoz modular de 24 Vatios para ontaje en techo, para reproducción de música ambiental y vos, certificado UL 2043, UL 1424 y EN54-24 para audio evacuación, debe contener transformador de derivación de alimentación de 70/100V con funcionamiento a máxima potencia, a potencia media, a un cuarto de potencia o a un octavo de potencia. Incluye soporte para montaje en escenarios, marcación y ficho de identificación y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	un	109,00	604.558,00	65.896.822,00	109,00	65.896.822,00		-				-	109,00	65.896.822,00		100,00%
13,7,10	Suministro e instalación de cable de cobre 2X16AWG especialmente diseñado para sonido, de alta pureza y sin oxigeno para un amplio rango de frecuencia, baja pérdida de señal y mayor énfasis en el extremo bajo para una reproducción de audio fuerte, clara y audaz. Incluye conectores, marcación, ficho de identificación y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	3.270,00	7.745,00	25.326.150,00	3.270,00	25.326.150,00		-				-	3.270,00	25.326.150,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS N[redacted]7

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2498104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4817	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/05/2028
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/07/2022	31/07/2022

FECHA PRESENTE ACTA

16/08/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 16 de Agosto de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : **IVAN JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de **A CONSTRUIR S.A.**, Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO**, supervisores del contrato y **ESTHER MENDOZA PEINADO**, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

		CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL				CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 007		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
13.7.11	Suministro e instalación de catie de cobre 2X10AWG especialmente diseñado para sonido, de alta pureza y sin oxigeno para un amplio rango de frecuencia, baja pérdida de señal y mayor énfasis en el extremo bajo para una reproducción de audio fuerte, clara y audaz. Incluye conectores, marcación, ficho de identificación y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	360,00	10.224,00	3.680.640,00	360,00	3.680.640,00		-				-	360,00	3.680.640,00		100,00%
13.7.12	Suministro e instalación de Tuberia EMT 3/4", incluye uniones, codos, terminales, cajas 2400 con tapa, chazos, abrazaderas dobles, tornillos y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje	un	495,00	22.733,00	11.252.835,00	495,00	11.252.835,00		-				-	495,00	11.252.835,00		100,00%
14,00	**SISTEMA HVAC - HEATING - VENTILATION - AIR CONDITIONING**				**$ 2.062.962.119,00**	**$ -**	**$ 2.062.962.119,00**		**$ -**				**$ -**		**$ 2.062.962.119,00**		**100,00%**
14,10	EQUIPOS	-			-	-	-		-				-	-	-		
14,1,1	UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 520.000 BTU, 220 V, 3 PH, R-410A	Und	1,00	48.585.856,00	48.585.856,00	1,00	48.585.856,00		-				-	1,00	48.585.856,00		100,00%
14,1,2	UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 440.000 BTU, 220 V, 3 PH, R-410A	Und	1,00	43.930.354,00	43.930.354,00	1,00	43.930.354,00		-				-	1,00	43.930.354,00		100,00%
14,1,3	UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 540.000 BTU, 220 V, 3 PH, R-410A	Und	1,00	56.147.075,00	56.147.075,00	1,00	56.147.075,00		-				-	1,00	56.147.075,00		100,00%
14,1,4	UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 320.000 BTU, 220 V, 3 PH, R-410A	Und	1,00	34.656.288,00	34.656.288,00	1,00	34.656.288,00		-				-	1,00	34.656.288,00		100,00%
14,1,5	UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 140.000 BTU, 220 V, 3 PH, R-410A	Und	1,00	16.405.677,00	16.405.677,00	1,00	16.405.677,00		-				-	1,00	16.405.677,00		100,00%
14,1,6	UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE CIRCULAR DE 12.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	2,00	2.095.407,00	4.190.814,00	2,00	4.190.814,00		-				-	2,00	4.190.814,00		100,00%
14,1,7	UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE CIRCULAR DE 18.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	1,00	2.189.577,00	2.189.577,00	1,00	2.189.577,00		-				-	1,00	2.189.577,00		100,00%
14,1,8	UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE CIRCULAR DE 24.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	2,00	2.167.062,00	4.334.124,00	2,00	4.334.124,00		-				-	2,00	4.334.124,00		100,00%
14,1,9	UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE CIRCULAR DE 30.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	1,00	2.317.049,00	2.317.049,00	1,00	2.317.049,00		-				-	1,00	2.317.049,00		100,00%
14,1,10	UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE CIRCULAR DE 36.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	5,00	2.440.250,00	12.201.250,00	5,00	12.201.250,00		-				-	5,00	12.201.250,00		100,00%
14,1,11	UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE CIRCULAR DE 48.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	19,00	2.664.151,00	50.618.869,00	19,00	50.618.869,00		-				-	19,00	50.618.869,00		100,00%
14,1,12	UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE 1 VIA DE 7.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	1,00	1.208.706,00	1.208.706,00	1,00	1.208.706,00		-				-	1,00	1.208.706,00		100,00%
14,1,13	UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE 1 VIA DE 9.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	5,00	1.252.005,00	6.260.025,00	5,00	6.260.025,00		-				-	5,00	6.260.025,00		100,00%
14,1,14	UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE 1 VIA DE 12.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	1,00	1.330.472,00	1.330.472,00	1,00	1.330.472,00		-				-	1,00	1.330.472,00		100,00%
14,1,15	UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE 1 VIA DE 18.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	1,00	1.720.765,00	1.720.765,00	1,00	1.720.765,00		-				-	1,00	1.720.765,00		100,00%
14,1,16	UNIDAD EVAPORADORA TIPO PARED DE 12.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	8,00	928.070,00	7.424.560,00	8,00	7.424.560,00		-				-	8,00	7.424.560,00		100,00%
14,1,17	UNIDAD EVAPORADORA TIPO PARED DE 18.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	2,00	1.098.680,00	2.197.360,00	2,00	2.197.360,00		-				-	2,00	2.197.360,00		100,00%
14,1,18	UNIDAD FANCOIL OCULTA DEDICADA DE AIRE EXTERIOR DE 48.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	8,00	3.719.540,00	29.756.320,00	8,00	29.756.320,00		-				-	8,00	29.756.320,00		100,00%
14,1,19	CONTROL CENTRALIZADO PANTALLA TÁCTIL / 128 UNIDADES INTERIORES / 10 HORARIOS DE PROGRAMACIÓN	Und	1,00	2.078.892,00	2.078.892,00	1,00	2.078.892,00		-				-	1,00	2.078.892,00		100,00%
14,1,20	CONTROL REMOTO ALAMBRADO TÁCTIL / SENSOR DETEMPERATURA INTEGRADO Y RECEPTOR DE SEÑAL INALAMBRICA	Und	8,00	264.631,00	2.117.048,00	8,00	2.117.048,00		-				-	8,00	2.117.048,00		100,00%
14,1,21	CONTROL REMOTO INALAMBRICO PARA CASSETTE CIRCULAR	Und	5,00	102.595,00	512.975,00	5,00	512.975,00		-				-	5,00	512.975,00		100,00%
14,1,22	CONTROL REMOTO INALAMBRICO PARA CASSETTE 1 VIA	Und	8,00	76.704,00	613.632,00	8,00	613.632,00		-				-	8,00	613.632,00		100,00%
14,1,23	ENFRIADOR DE AGUA CONDENSADO POR AIRE DE 40 TR, 208/230 V, 3 PH, COMPRESORES INVERTER	Und	1,00	81.070.000,00	81.070.000,00	1,00	81.070.000,00		-				-	1,00	81.070.000,00		100,00%
14,1,24	ENFRIADOR DE AGUA CONDENSADO POR AIRE DE 60 TR, 208/230 V, 3 PH, COMPRESORES INVERTER	Und	1,00	114.950.000,00	114.950.000,00	1,00	114.950.000,00		-				-	1,00	114.950.000,00		100,00%
14,1,25	BOMBA DE AGUA FRIA DE 223 GPM, CABEZA 90 FT	Und	2,00	11.495.000,00	22.990.000,00	2,00	22.990.000,00		-				-	2,00	22.990.000,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS N[redacted]7

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/05/2028
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/07/2022	31/07/2022

FECHA PRESENTE ACTA

16/08/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el da 16 de Agosto de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de **A CONSTRUIR S.A.**, Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO**, supervisores del contrato y **ESTHER MENDOZA PEINADO**, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

			CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL			CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 007		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
14,1,26	UNIDAD MANEJADORA AGUA HELADA DE 6.800 CFM, 202.400 BTU, 208/230 V, 3 PH	Und	3,00	30.250.000,00	90.750.000,00	3,00	90.750.000,00		-				-	3,00	90.750.000,00		100,00%
14,1,27	UNIDAD MANEJADORA (DEDICADA DE AIRE EXTERIOR) AGUA HELADA DE 6.400 CFM, 378.323 BTU, 208/230 V, 3 PH	Und	1,00	173.030.000,00	173.030.000,00	1,00	173.030.000,00		-				-	1,00	173.030.000,00		100,00%
14,1,28	UNIDAD MANEJADORA AGUA HELADA DE 4000 CFM, 109.000 BTU, 208/230 V, 3 PH	Und	1,00	18.150.000,00	18.150.000,00	1,00	18.150.000,00		-				-	1,00	18.150.000,00		100,00%
14,1,29	EXTRACTOR AXIAL TUBULAR DE 14.400 CFM, 208/230 V, 3 PH	Und	3,00	9.202.050,00	27.606.150,00	3,00	27.606.150,00		-				-	3,00	27.606.150,00		100,00%
14,1,30	VENTILADOR JET FAN BAJO PERFIL DE 5.497 CFM, 208/230 V, 3 PH	Und	10,00	9.365.400,00	93.654.000,00	10,00	93.654.000,00		-				-	10,00	93.654.000,00		100,00%
14,1,31	EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO DE 640 CFM, 120 V, 1 PH	Und	1,00	2.123.550,00	2.123.550,00	1,00	2.123.550,00		-				-	1,00	2.123.550,00		100,00%
14,1,32	EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO DE 800 CFM, 120 V, 1 PH	Und	1,00	2.668.050,00	2.668.050,00	1,00	2.668.050,00		-				-	1,00	2.668.050,00		100,00%
14,1,33	EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO DE 580 CFM, 120 V, 1 PH	Und	1,00	1.306.800,00	1.306.800,00	1,00	1.306.800,00		-				-	1,00	1.306.800,00		100,00%
14,1,34	EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO DE 400 CFM, 120 V, 1 PH	Und	1,00	1.306.800,00	1.306.800,00	1,00	1.306.800,00		-				-	1,00	1.306.800,00		100,00%
14,1,35	EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO DE 320 CFM, 120 V, 1 PH	Und	1,00	1.306.800,00	1.306.800,00	1,00	1.306.800,00		-				-	1,00	1.306.800,00		100,00%
14,1,36	EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO DE 720 CFM, 120 V, 1 PH	Und	1,00	2.668.050,00	2.668.050,00	1,00	2.668.050,00		-				-	1,00	2.668.050,00		100,00%
14,1,37	EXTRACTOR DE BAÑO TIPO PLAFON DE 80 CFM, 120 V 1 PH	Und	1,00	108.900,00	108.900,00	1,00	108.900,00		-				-	1,00	108.900,00		100,00%
14,1,38	EXTRACTOR TIPO HONGO DE TEJADO DE 6800 CFM, 208/230 V, 3 PH	Und	2,00	6.043.950,00	12.087.900,00	2,00	12.087.900,00		-				-	2,00	12.087.900,00		100,00%
14,1,39	VENTILADOR DE SUMINISTRO TIPO PENTHOUSE DE 6.400 CFM, 208/230 V, 3 PH	Und	2,00	6.261.750,00	12.523.500,00	2,00	12.523.500,00		-				-	2,00	12.523.500,00		100,00%
14,20	**CONDUCTOS**		-		-	-	-		-				-	-	-		
14,2,1	DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA TDF, INCLUYE (LAMINA, CLIPS, ESQUINEROS, TORNILLO DE CARRIAJE, SOPORTERIA, MANO DE OBRA FABRICACION E INSTALACION)	Kg	12.856,20	22.738,00	292.324.275,60	12.856,20	292.324.275,60		-				-	12.856,20	292.324.275,60		100,00%
14,2,2	AISLAMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO DUCT WRAP, INCLUYE (AISLAMIENTO, CINTA FOIL, PEGANTE, SOPORTERIA, MANO DE OBRA FABRICACION E INSTALACION)	m²	898,43	52.384,00	47.063.357,12	898,43	47.063.357,12		-				-	898,43	47.063.357,12		100,00%
14,2,3	DUCTO EN FIBRA DEVIDRIO DUCTO GLASS NETO, INCLUYE (LAMINA DE FIBRA, PEGANTE, MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m²	92,48	121.236,00	11.211.905,28	92,48	11.211.905,28		-				-	92,48	11.211.905,28		100,00%
14,2,4	DUCTO FLEXIBLE DE 14" DE DIAMETRO, INCLUYE (DUCTO FLEXIBLE, CINTA FOIL, PEGANTE MANO DE OBRA FABRICACION E INSTALACION)	m	85,00	48.235,00	4.099.975,00	85,00	4.099.975,00		-				-	85,00	4.099.975,00		100,00%
14,2,5	ACOPLE FLEXIBLE A EQUIPOS CON LONA	und	44,00	79.672,00	3.505.568,00	44,00	3.505.568,00		-				-	44,00	3.505.568,00		100,00%
14,30	**TUBERIA DE REFRIGERACION**		-		-	-	-		-				-	-	-		
14,3,1	TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4", INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	151,00	36.735,00	5.546.985,00	151,00	5.546.985,00		-				-	151,00	5.546.985,00		100,00%
14,3,2	TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 3/8" TIPO L, INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	326,00	42.035,00	13.703.410,00	326,00	13.703.410,00		-				-	326,00	13.703.410,00		100,00%
14,3,3	TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 1/2" TIPO L, INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	289,00	48.985,00	14.156.665,00	289,00	14.156.665,00		-				-	289,00	14.156.665,00		100,00%
14,3,4	TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 5/8", INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	367,00	54.685,00	20.069.395,00	367,00	20.069.395,00		-				-	367,00	20.069.395,00		100,00%
14,3,5	TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 7/8" TIPO L, INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	395,00	68.150,00	26.919.250,00	395,00	26.919.250,00		-				-	395,00	26.919.250,00		100,00%
14,3,6	TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 1 1/8" TIPO K, INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	98,00	106.130,00	10.400.740,00	98,00	10.400.740,00		-				-	98,00	10.400.740,00		100,00%
14,3,7	TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 1 3/8" TIPO K, INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	85,00	122.445,00	10.407.825,00	85,00	10.407.825,00		-				-	85,00	10.407.825,00		100,00%
14,3,8	TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 1 5/8" TIPO K, INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	211,00	146.081,00	30.823.091,00	211,00	30.823.091,00		-				-	211,00	30.823.091,00		100,00%
14,3,9	TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 2 1/8" TIPO K, INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	59,00	221.961,00	13.095.699,00	59,00	13.095.699,00		-				-	59,00	13.095.699,00		100,00%
14,3,10	TERMOSTATO DIGITAL 1 ETAPA PRO 2000	Und	5,00	234.000,00	1.170.000,00	5,00	1.170.000,00		-				-	5,00	1.170.000,00		100,00%
14,3,11	GAS REFRIGERANTE R-410A	Lb	410,00	24.960,00	10.233.600,00	410,00	10.233.600,00		-				-	410,00	10.233.600,00		100,00%
14,3,12	GASES DE SOLDADURA INCLUYE (GASES OXIACETILENICOS Y NITROGENO)	unb	1,00	3.840.000,00	3.840.000,00	1,00	3.840.000,00		-				-	1,00	3.840.000,00		100,00%
14,40	**ACCESORIOS TIPO Y-BRACH Y CONTROLES**		-		-	-	-						-	-	-		

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS N[illegible]7

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/07/2022	31/07/2022

FECHA PRESENTE ACTA

16/08/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				VIGENCIA	
AMPAROS	N° POLIZA		VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021 A	11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021 A	11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021 A	11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023 A	11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.940.883.448,00	12/07/2021 A	11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 16 de Agosto de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 007		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
14,4,1	Y-JOINT UNIDAD EXTERIOR PARA CAPACIDADES MAYORES A 456KBTU	m	2,00	635.954,00	1.271.908,00	2,00	1.271.908,00		-				-	2,00	1.271.908,00		100,00%
14,4,2	Y-JOINT UNIDAD EXTERIOR PARA CAPACIDADES MENORES A 456KBTU	m	3,00	510.916,00	1.532.748,00	3,00	1.532.748,00		-				-	3,00	1.532.748,00		100,00%
14,4,3	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES MAYORES A 461KBTU	m	3,00	954.552,00	2.863.656,00	3,00	2.863.656,00		-				-	3,00	2.863.656,00		100,00%
14,4,4	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 51KBTU - 136KBTU	m	22,00	322.608,00	7.097.376,00	22,00	7.097.376,00		-				-	22,00	7.097.376,00		100,00%
14,4,5	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 336KBTU - 461KBTU	m	3,00	655.620,00	1.966.860,00	3,00	1.966.860,00		-				-	3,00	1.966.860,00		100,00%
14,4,6	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES MENORES A 51KBTU	m	8,00	211.492,00	1.691.936,00	8,00	1.691.936,00		-				-	8,00	1.691.936,00		100,00%
14,4,7	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 240KBTU - 336KBTU	m	4,00	588.234,00	2.352.936,00	4,00	2.352.936,00		-				-	4,00	2.352.936,00		100,00%
14,4,8	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 154KBTU - 240KBTU	m	6,00	460.826,00	2.764.956,00	6,00	2.764.956,00		-				-	6,00	2.764.956,00		100,00%
14,4,9	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 136KBTU - 154KBTU	m	5,00	393.287,00	1.966.435,00	5,00	1.966.435,00		-				-	5,00	1.966.435,00		100,00%
14,50	TUBERIA DE PVC		-		-	-	-		-				-	-	-		
14,5,1	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 1",INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, TEE, ADAPTADOR MACHO Y HEMBRA, UNION UNIVERSAL, SOLDADURA, LIMPIADOR, CAÑUELA PREFORMADA, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	1,00	176.031,00	176.031,00	1,00	176.031,00		-				-	1,00	176.031,00		100,00%
14,5,2	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 2",INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, TEE, ADAPTADOR MACHO Y HEMBRA, UNION UNIVERSAL, SOLDADURA, LIMPIADOR, CAÑUELA PREFORMADA, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	55,00	428.768,00	23.582.240,00	55,00	23.582.240,00		-				-	55,00	23.582.240,00		100,00%
14,5,3	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 2 1/2",INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, TEE, ADAPTADOR MACHO Y HEMBRA, UNION UNIVERSAL, SOLDADURA, LIMPIADOR, CAÑUELA PREFORMADA, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	12,00	494.384,00	5.932.608,00	12,00	5.932.608,00		-				-	12,00	5.932.608,00		100,00%
14,5,4	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 3",INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, TEE, ADAPTADOR MACHO Y HEMBRA, UNION UNIVERSAL, SOLDADURA, LIMPIADOR, CAÑUELA PREFORMADA, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	20,00	583.391,00	11.667.820,00	20,00	11.667.820,00		-				-	20,00	11.667.820,00		100,00%
14,5,5	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 4",INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, TEE, ADAPTADOR MACHO Y HEMBRA, UNION UNIVERSAL, SOLDADURA, LIMPIADOR, CAÑUELA PREFORMADA, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	170,00	550.816,00	93.638.720,00	170,00	93.638.720,00		-				-	170,00	93.638.720,00		100,00%
14,60	VALVULAS DE CORTE		-		-	-	-		-				-	-	-		
14,6,1	VALVULA DE CORTE DE 2", INCLUYE (VALVULA, ADAPTADOR MACHO, SOLDADURA, LIMPIADOR Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	Und	12,00	219.886,00	2.638.632,00	12,00	2.638.632,00		-				-	12,00	2.638.632,00		100,00%
14,6,2	VALVULA MARIPOSA DE 3", INCLUYE (VALVULA, ADAPTADOR MACHO, SOLDADURA, LIMPIADOR Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	Und	4,00	576.892,00	2.307.568,00	4,00	2.307.568,00		-				-	4,00	2.307.568,00		100,00%
14,6,3	VALVULA MARIPOSA DE 4", INCLUYE (VALVULA, ADAPTADOR MACHO, SOLDADURA, LIMPIADOR Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	Und	6,00	581.728,00	3.490.368,00	6,00	3.490.368,00		-				-	6,00	3.490.368,00		100,00%
14,70	VALVULAS DE GLOBO		-		-	-	-		-				-	-	-		
14,7,1	VALVULA GLOBO DE 2", INCLUYE (VALVULA, ADAPTADOR MACHO, SOLDADURA, LIMPIADOR Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	Und	12,00	416.856,00	5.002.272,00	12,00	5.002.272,00		-				-	12,00	5.002.272,00		100,00%
14,7,2	VALVULA GLOBO DE 3", INCLUYE (VALVULA, ADAPTADOR MACHO, SOLDADURA, LIMPIADOR Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	Und	2,00	1.302.292,00	2.604.584,00	2,00	2.604.584,00		-				-	2,00	2.604.584,00		100,00%
14,80	VALVULAS TRES VIAS		-		-	-	-		-				-	-	-		
14,8,1	VALVULA TRES VIAS DE 1 1/2", INCLUYE (VALVULA, ADAMPATADOR MACHO, SOLDADURA, LIMPIADOR Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	Und	6,00	1.847.656,00	11.085.936,00	6,00	11.085.936,00		-				-	6,00	11.085.936,00		100,00%
14,90	ACCESORIOS PARA EQUIPOS AGUA HEALDA		-		-	-	-		-				-	-	-		
14,9,1	TANQUE DE EXPASION CERRADO	Und	1,00	6.303.648,00	6.303.648,00	1,00	6.303.648,00		-				-	1,00	6.303.648,00		100,00%
14,9,2	CODO DIFUSOR DE SUCCION DE 4"	Und	2,00	2.715.648,00	5.431.296,00	2,00	5.431.296,00		-				-	2,00	5.431.296,00		100,00%
14,9,3	DES - AIREADOR	Und	1,00	5.118.048,00	5.118.048,00	1,00	5.118.048,00		-				-	1,00	5.118.048,00		100,00%
14,9,4	VORTEX	Und	1,00	1.171.248,00	1.171.248,00	1,00	1.171.248,00		-				-	1,00	1.171.248,00		100,00%
14,9,5	CONEXIONES ANTI-VIBRATORIAS	Und	2,00	469.428,00	938.856,00	2,00	938.856,00		-				-	2,00	938.856,00		100,00%
14,9,6	FILTRO EN Y	Und	2,00	2.712.528,00	5.425.056,00	2,00	5.425.056,00		-				-	2,00	5.425.056,00		100,00%
14,9,7	MANOMETRO DE CARATULA	Und	4,00	491.090,00	1.964.360,00	4,00	1.964.360,00		-				-	4,00	1.964.360,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No. 007

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4617	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4617	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4617	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/05/2028
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4617	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/07/2022	31/07/2022

FECHA PRESENTE ACTA

16/08/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 16 de Agosto de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de **A CONSTRUIR S.A.**, Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **ANDRES ALMARALES MELO** y **LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO**, supervisores del contrato y **ESTHER MENDOZA PEINADO**, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

		CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL				CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 007		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
14,9,6	TERMOMETRO DE COLUMNA	Und	4,00	648.973,00	2.595.892,00	4,00	2.595.892,00		-		-		-	4,00	2.595.892,00		100,00%
14,10	**TABLEROS ELECTRICOS DE POTENCIA**		-		-		-		-		-		-	-	-		
14,10,1	TABLERO ELECTRICO TE-01	Und	1,00	6.669.000,00	6.669.000,00	1,00	6.669.000,00		-		-		-	1,00	6.669.000,00		100,00%
14,10,2	TABLERO ELECTRICO TE-02	Und	1,00	6.669.000,00	6.669.000,00	1,00	6.669.000,00		-		-		-	1,00	6.669.000,00		100,00%
14,10,3	TABLERO ELECTRICO TE-03	Und	1,00	9.789.000,00	9.789.000,00	1,00	9.789.000,00		-		-		-	1,00	9.789.000,00		100,00%
14,10,4	VARIADOR DE VELOCIDAD DE 11.6 KW	Und	1,00	7.137.000,00	7.137.000,00	1,00	7.137.000,00		-		-		-	1,00	7.137.000,00		100,00%
14,10,5	VARIADOR DE VELOCIDAD DE 7.5 KW	Und	1,00	3.393.000,00	3.393.000,00	1,00	3.393.000,00		-		-		-	1,00	3.393.000,00		100,00%
14,10,6	VARIADOR DE VELOCIDAD DE 2 KW	Und	1,00	2.925.000,00	2.925.000,00	1,00	2.925.000,00		-		-		-	1,00	2.925.000,00		100,00%
14,11	**SISTEMA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL**		-		-	-	-		-		-		-	-	-		
14,11,1	AUTOMATIZACION Y CONTROL	Und	1,00	135.408.000,00	135.408.000,00	1,00	135.408.000,00		-		-		-	1,00	135.408.000,00		100,00%
14,12	**DIFUSORES**		-		-	-	-		-		-		-	-	-		
14,12,1	DIFUSOR DE SUMINITRO 4 VIAS DE 20"X20"	Und	8,00	279.084,00	2.232.672,00	8,00	2.232.672,00		-		-		-	8,00	2.232.672,00		100,00%
14,12,2	DIFUSOR DE SUMINISTRO 3 CONOS Ø14 C.D.	Und	36,00	469.404,00	16.898.544,00	36,00	16.898.544,00		-		-		-	36,00	16.898.544,00		100,00%
14,15	**REJILLAS DE SUMINISTRO**		-		-	-	-		-		-		-	-	-		
14,15,1	REJILLA DE SUMINISTRO LINEAL DE 90"X8"	Und	8,00	341.848,00	2.734.784,00	8,00	2.734.784,00		-		-		-	8,00	2.734.784,00		100,00%
14,16	REJILLAS DE RETORNO O EXTRACCION		-		-	-	-		-		-		-	-	-		
14,16,1	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 8"X4" C.D.	Und	44,00	52.884,00	2.326.896,00	44,00	2.326.896,00		-		-		-	44,00	2.326.896,00		100,00%
14,16,2	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 54"X8" C.D.	Und	15,00	336.804,00	5.052.060,00	15,00	5.052.060,00		-		-		-	15,00	5.052.060,00		100,00%
14,16,3	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 32"X18" C.D.	Und	18,00	335.244,00	6.034.392,00	18,00	6.034.392,00		-		-		-	18,00	6.034.392,00		100,00%
14,17	**REJILLAS TIPO LOUVER**		-		-	-	-		-		-		-	-	-		
14,17,1	REJILLA TIPO LOUVER DE 18"X8" C.D.	Und	2,00	124.644,00	249.288,00	2,00	249.288,00		-		-		-	2,00	249.288,00		100,00%
14,17,2	REJILLA TIPO LOUVER DE 24"X8" C.D.	Und	1,00	168.324,00	168.324,00	1,00	168.324,00		-		-		-	1,00	168.324,00		100,00%
14,17,3	REJILLA TIPO LOUVER DE 28"X8" C.D.	Und	1,00	193.284,00	193.284,00	1,00	193.284,00		-		-		-	1,00	193.284,00		100,00%
14,17,4	REJILLA TIPO LOUVER DE 36"X8" C.D.	Und	1,00	235.404,00	235.404,00	1,00	235.404,00		-		-		-	1,00	235.404,00		100,00%
14,17,5	REJILLA TIPO LOUVER DE 50"X14" C.D.	Und	8,00	444.444,00	3.555.552,00	8,00	3.555.552,00		-		-		-	8,00	3.555.552,00		100,00%
14,17,6	REJILLA TIPO LOUVER DE 6"X4" C.D.	Und	1,00	57.564,00	57.564,00	1,00	57.564,00		-		-		-	1,00	57.564,00		100,00%
14,17,7	REJILLA TIPO LOUVER DE 32"X8" C.D.	Und	1,00	212.004,00	212.004,00	1,00	212.004,00		-		-		-	1,00	212.004,00		100,00%
14,18	**DAMPERS**		-		-	-	-		-		-		-	-	-		
14,18,1	DAMPER MANUAL UNA ALETA DE 20"X16"	Und	4,00	258.196,00	1.032.784,00	4,00	1.032.784,00		-		-		-	4,00	1.032.784,00		100,00%
14,18,2	DAMPER MANUAL UNA ALETA DE 16"X14"	Und	4,00	211.100,00	844.400,00	4,00	844.400,00		-		-		-	4,00	844.400,00		100,00%
14,19	**TRANSPORTE DE MATERIALES , UBICACIÓN DE EQUIPOS, INGENIERIA Y ARRANQUE**		-		-	-	-		-		-		-	-	-		
14,19,1	BASES Y SOPORTES PARA EQUIPOS	undB	1,00	6.895.200,00	6.895.200,00	1,00	6.895.200,00		-		-		-	1,00	6.895.200,00		100,00%
14,19,2	MANO DE OBRA INSTALACION DE EQUIPOS	undB	1,00	27.572.220,00	27.572.220,00	1,00	27.572.220,00		-		-		-	1,00	27.572.220,00		100,00%
14,19,3	IZAJE Y UBICACIÓN DE EQUIPOS	undB	1,00	8.736.000,00	8.736.000,00	1,00	8.736.000,00		-		-		-	1,00	8.736.000,00		100,00%
14,19,4	ARRANQUE DEL SISTEMA	undB	1,00	27.823.224,00	27.823.224,00	1,00	27.823.224,00		-		-		-	1,00	27.823.224,00		100,00%
14,19,5	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS	undB	1,00	26.379.600,00	26.379.600,00	1,00	26.379.600,00		-		-		-	1,00	26.379.600,00		100,00%
14,19,6	INGENIERIA Y SUPERVISION	undB	1,00	29.484.000,00	29.484.000,00	1,00	29.484.000,00		-		-		-	1,00	29.484.000,00		100,00%
15,00	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 2.594.231.573,00**	**$ -**	**$ 2.594.231.573,00**		**$ 2.603.097,90**		**$ -**		**$ 2.603.097,90**		**$ 2.591.628.475,10**	**0,10%**	**99,90%**
15,10	**OBRAS CIVILES EN VIA PÚBLICA (CANTIDADES APROXIMADAS, ESTAN AJUSTARÁN CON LA APROBACION DEL PROYECTO POR PARTE DE ELECTRICARIBE (AFINIA))**		-		-	-	-		-		-		-	-	-		
15,1,1	Caja de paso en piso duro, para energia Norma Electricaribe Afinia	un	2,00	3.275.380,00	6.550.760,00	2,00	6.550.760,00		-		-		-	2,00	6.550.760,00		100,00%
15,20	**ACOMETIDA PRIMARIA CANALIZADA (CANTIDADES APROXIMADAS, ESTAN AJUSTARÁN CON LA APROBACION DEL PROYECTO POR PARTE DE ELECTRICARIBE (AFINIA))**		-		-	-	-		-		-		-	-	-		
15,2,1	Tubería PVC canalizada de 4(6" desde la caja de paso exterior hasta la caja de paso metalica interior, incluye terminales campana, cinta peligro y demas accesorios para su correcta instalacion.	ml	80,00	152.600,00	12.208.000,00	80,00	12.208.000,00		-		-		-	80,00	12.208.000,00		100,00%
15,2,2	Caja de paso metalica 100x100, norma para cambio nivel, incluye acrilico peligro alta tension, tornillos para sello y demas accesorios para su correcta instalación.	un	1,00	836.600,00	836.600,00	1,00	836.600,00		-		-		-	1,00	836.600,00		100,00%
15,2,3	Caja de paso metalica 100x100, norma para cambio de tuberia PVC a tuberia IMC, incluye acrilico peligro alta tensión, tornillos para sello y demas accesorios para su correcta instalación.	un	2,00	660.400,00	1.320.800,00	2,00	1.320.800,00		-		-		-	2,00	1.320.800,00		100,00%
15,2,4	Tuberia IMC 6" expuesta desde la caja de paso metalica hasta el equipo de medida, incluye curvas, uniones, soportes y demas accesorios para su correcta instalacion.	ml	20,00	534.800,00	10.696.000,00	20,00	10.696.000,00		-		-		-	20,00	10.696.000,00		100,00%
15,2,5	Acometida en 3x4/0 Al-XLPE-15 kV desde punto de conexión asignado por operador de red a subestación (Medida aproximada)	ml	150,00	134.149,00	20.122.350,00	150,00	20.122.350,00		-		-		-	150,00	20.122.350,00		100,00%
15,2,6	Estructura de subterranización/aforamiento (Incluye cajas primarias/cortacircuitos, seccionamiento, crucetas, herrajes, poste de concreto 12m 1050 Kgf)	Un	1,00	3.332.000,00	3.332.000,00	1,00	3.332.000,00		-		-		-	1,00	3.332.000,00		100,00%
15,2,7	Terminales premoldeados uso exterior-15kV (Juego completo de conos) incluye conectores, accesorios y elementos para su correcta instalacion hasta las pruebas finales.	jgo	2,00	637.873,00	1.275.746,00	2,00	1.275.746,00		-		-		-	2,00	1.275.746,00		100,00%
15,30	**SUBESTACIÓN INTERIOR DE MEDIA TENSIÓN**		-		-	-	-		-		-		-	-	-		
15,3,1	Cable Cu No. 2/0 AWG desnudo	ml	40,00	22.810,00	904.400,00	40,00	904.400,00		-		-	37,99	858.953,90	2,01	45.446,10	94,98%	5,02%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No. 007

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/07/2022	31/07/2022

FECHA PRESENTE ACTA

16/08/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	Nº POLIZA		VR. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023	11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 16 de Agosto de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de **A CONSTRUIR S.A.**, Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO**, supervisores del contrato y **ESTHER MENDOZA PEINADO**, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

			CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL			CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 007		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
15.3.2	Soldadura exotérmica 150 ó 200g (cable-cable en T)	un	16,00	78.900,00	1.262.400,00	16,00	1.262.400,00	11,00	867.900,00		-	11,00	867.900,00	5,00	394.500,00	68,75%	31,25%
15.3.3	Borna terminal estañada 2/0	un	16,00	9.832,00	157.312,00	16,00	157.312,00	-	-		-	-	-	16,00	157.312,00		100,00%
15.3.4	Caja de inspección 30x30	un	4,00	214.600,00	858.400,00	4,00	858.400,00	-	-		-	-	-	4,00	858.400,00		100,00%
15.3.5	Electrodo de Cu para puesta a tierra de 5/8"x2,4m	un	9,00	127.200,00	1.144.800,00	9,00	1.144.800,00	4,00	508.800,00		-	4,00	508.800,00	5,00	636.000,00	44,44%	55,56%
15,3,6	Suministro, montaje, instalación y puesta en servicio de: CELDA MEDIDA SF6 según diagrama Unifilar (Incluye Medidor electrónico, multitarifa, multirango, (3) transformadores de corriente 40:5A, (3) PTs de 13200/√3:120V/√3 y demás accesorios)	un	1,00	22.562.102,00	22.562.102,00	1,00	22.562.102,00		-		-		-	1,00	22.562.102,00		100,00%
15,3,7	Suministro, montaje, instalación y puesta en servicio de: Celda de protección en SF6 /incluye fusibles HH 63 A) según diagrama Unifilar	un	1,00	27.000.000,00	27.000.000,00	1,00	27.000.000,00		-		-		-	1,00	27.000.000,00		100,00%
15,3,8	Suministro, montaje, instalación y puesta en servicio de: Seccionador de 17.5 kV-630A bajo carga, cuchilla de puesta a tierra	un	2,00	9.080.875,00	18.161.750,00	2,00	18.161.750,00		-		-		-	2,00	18.161.750,00		100,00%
15,3,9	Suministro, montaje, instalación y puesta en servicio de: Gabinete metálico para encerrar el transformador de acuerdo con normativas Electricaribe y RETIE.	un	1,00	11.748.400,00	11.748.400,00	1,00	11.748.400,00		-		-		-	1,00	11.748.400,00		100,00%
15,3,10	Suministro, montaje, instalación y puesta en servicio de: Transformador tipo seco de 800 kVA, 13,800 a 208/120, Clase F, ahorrador de energia, con termocuplas por debanado y termometro. Incluye DPS, extractor, chequeo y transporte y puesta en sitio	un	1,00	61.130.000,00	61.130.000,00	1,00	61.130.000,00		-		-		-	1,00	61.130.000,00		100,00%
15,3,11	Riel Transformador	un	1,00	290.000,00	290.000,00	1,00	290.000,00		-		-		-	1,00	290.000,00		100,00%
15,3,12	Marquillado y pintura	un	1,00	4.265.300,00	4.265.300,00	1,00	4.265.300,00		-		-		-	1,00	4.265.300,00		100,00%
15,3,13	Puesta tierra de cuarto S/E, puertas y elementos metalicos	un	1,00	2.450.000,00	2.450.000,00	1,00	2.450.000,00		-		-		-	1,00	2.450.000,00		100,00%
15,3,14	Suministro, montaje, instalación y puesta en servicio de: Interconexiones primarias entre Celda de medida - TRF 1 (barras de cobre forradas en funda termoencogible)	un	1,00	5.897.787,00	5.897.787,00	1,00	5.897.787,00		-		-		-	1,00	5.897.787,00		100,00%
15,3,15	Suministro, montaje, instalación y puesta en servicio de: Interconexiones primarias entre transformador de 800 kVA y Tablero general Distribucion 10,8 m (Bus de barras trifasico para 3000 A + neutro y tierra, tramo recto, incluye accesorios, curvas y soportes)	un	1,00	29.698.710,00	29.698.710,00	1,00	29.698.710,00		-		-		-	1,00	29.698.710,00		100,00%
15,3,16	Conductor de puesta a tierra para aterrizaje de blindobarra, en cable Cu No. 2. Incluye elementos de conexión	ml	12,00	12.500,00	150.000,00	12,00	150.000,00	-	-		-	-	-	12,00	150.000,00		100,00%
15,40	TABLEROS GENERALES DE BAJA TENSIÓN		-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
15,4,1	Tablero General de Distribucion de BT 208 V, para alojar los siguientes equipos, incluye barraje (interruptores de caja moldeada 25kA). Fabricar según D.U.	un	1,00	107.764.682,00	107.764.682,00	1,00	107.764.682,00	-	-		-	-	-	1,00	107.764.682,00		100,00%
15,4,2	Celda de BT 208 V , para alojar los siguientes equipos, incluye barraje. (interruptores de caja moldeada 25kA) según Diagrama Unifilar	un	1,00	21.196.686,00	21.196.686,00	1,00	21.196.686,00	-	-		-	-	-	1,00	21.196.686,00		100,00%
15,4,3	Celda de BT 208 V, para alojar los siguientes equipos, incluye barraje, Según Diagrama Unifilar	un	1,00	19.613.483,00	19.613.483,00	1,00	19.613.483,00	-	-		-	-	-	1,00	19.613.483,00		100,00%
15,50	SALIDAS ELECTRICAS		-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
	SOTANO 1		-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
15.5.1	Salida para iluminación en tubería EMT. Luminaria Hermetica Led 2x18 (No incluida)	un	154,00	162.500,00	25.025.000,00	154,00	25.025.000,00	-	-		-	-	-	154,00	25.025.000,00		100,00%
15.5.2	Salida para iluminación, que incluye: tubería PVC, accesorios, cajas, tapa lisa, cable LSHF, prensacable, conector de resorte y encauchetado (3x16) de la caja a la luminaria. Luminaria Bala LED 18W.	un	23,00	57.087,00	1.313.001,00	23,00	1.313.001,00	-	-		-	-	-	23,00	1.313.001,00		100,00%
15.5.3	Salida para iluminación de emergencia en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, cable LSHF, conectores de resorte, tramo de encauchetado 3x16, Juego de conectores macho y hembra para desconexion rapida certificada (borneras de conexion). Luminaria Lotus 13W LED.	un	45,00	108.964,00	4.903.380,00	45,00	4.903.380,00	-	-		-	-	-	45,00	4.903.380,00		100,00%
15.5.4	Salida para control iluminacion, incluye basicamente 2 cables de control No 16 THHN a instalar en las tuberias de las salidas de iluminacion anteriores con sus respectivos empalmes y derivaciones	un	222,00	36.794,00	8.168.268,00	222,00	8.168.268,00	-	-		-	-	-	222,00	8.168.268,00		100,00%
15.5.5	Salida para sensor de presencia en tubería EMT de 1/2", caja metálica, cable LSHF, incluye accesorios, tornillos, tapa flux (No incluye sensor) en circulaciones	un	8,00	98.580,00	788.640,00	8,00	788.640,00	-	-		-	-	-	8,00	788.640,00		100,00%
15.5.6	Suministro e instalacion de Sensor de movimiento 360° Techo 6mts de Radio OSC15-IOW con Unidad de Control Sugerido	un	8,00	128.689,00	1.029.512,00	8,00	1.029.512,00	-	-		-	-	-	8,00	1.029.512,00		100,00%
15.5.7	Salida eléctrica para toma corriente 120 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tubería EMT, accesorios, fijación, cajas, tapa troquelada, cable LSH, empalme y aparato.	un	31,00	114.760,00	3.557.560,00	31,00	3.557.560,00	-	-		-	-	-	31,00	3.557.560,00		100,00%
15.5.8	Salida eléctrica, para toma corriente 120 V con polo a tierra, 15 A, en canalizacion superficial, que incluye: tapa troquelada, cable LSHF, empalme y aparato. No incluye la canalizacion.	un	10,00	528.949,00	5.289.490,00	10,00	5.289.490,00	-	-		-	-	-	10,00	5.289.490,00		100,00%
15.5.9	Salida eléctrica, para toma corriente 120 V con polo a tierra aislada, 15 A, en canalizacion superficial, que incluye: tapa troquelada, cable LSHF, empalme y aparato. No incluye la canalizacion.	un	2,00	68.564,00	137.128,00	2,00	137.128,00	-	-		-	-	-	2,00	137.128,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS N[illegible]07

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NUMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2489104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4817	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/05/2028
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/07/2022	31/07/2022

FECHA PRESENTE ACTA

16/08/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el da 16 de Agosto de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 007		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
15,5,10	Salida eléctrica para toma corriente, 220 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tubería EMT, accesorios, fijación, cajas, tapa troquelada, cable LSHF, empalme y aparato.	un	1,00	67.387,00	67.387,00	1,00	67.387,00	-	-			-	-	1,00	67.387,00		100,00%
15,5,11	Salida para suiche sencillo en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, tapa lisa, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	ml	13,00	120.887,00	1.571.531,00	13,00	1.571.531,00	-	-			-	-	13,00	1.571.531,00		100,00%
15,60	INSTALACION CON SUMINISTRO DE LUMINARIAS		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
	EN SOTANO 1		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15,6,1	Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. LED 2x18W Hermética	un	154,00	246.762,00	38.001.348,00	154,00	38.001.348,00	-	-			-	-	154,00	38.001.348,00		100,00%
15,6,2	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado Luminaria EM2 6XLEDS.	un	45,00	199.840,00	8.992.800,00	45,00	8.992.800,00	-	-			-	-	45,00	8.992.800,00		100,00%
15,6,3	Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Aplique	un	5,00	41.972,00	209.860,00	5,00	209.860,00	-	-			-	-	5,00	209.860,00		100,00%
15,6,4	Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Lotus 18W LED.	un	23,00	145.812,00	3.353.676,00	23,00	3.353.676,00	-	-			-	-	23,00	3.353.676,00		100,00%
15,70	SALIDAS ELECTRICAS		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
	EN NIVEL 1 PISO 1		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15,7,1	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, cable LSHF, conectores de resorte. Bala Lotus 1x13W. (No incluida).	un	42,00	101.889,00	4.279.338,00	42,00	4.279.338,00	-	-			-	-	42,00	4.279.338,00		100,00%
15,7,2	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, cable LSHF, conectores de resorte. Pandora LED 18W. (No incluida).	un	22,00	117.909,00	2.593.998,00	22,00	2.593.998,00	-	-			-	-	22,00	2.593.998,00		100,00%
15,7,3	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, cable LSHF, conectores de resorte. LED 60x60 38W. (No incluida).	un	13,00	117.897,00	1.532.661,00	13,00	1.532.661,00	-	-			-	-	13,00	1.532.661,00		100,00%
15,7,4	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, cable LSHF, conectores de resorte. Cubik LED 12ROS 108W 6.0m. (No incluida).	un	85,00	106.009,00	9.010.765,00	85,00	9.010.765,00	-	-			-	-	85,00	9.010.765,00		100,00%
15,7,5	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, cable LSHF, conectores de resorte. Cubik LED 6ROS 54W 3.6m. (No incluida).	un	12,00	106.009,00	1.272.108,00	12,00	1.272.108,00	-	-			-	-	12,00	1.272.108,00		100,00%
15,7,6	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, cable LSHF, conectores de resorte. Piso LED 7W (No incluida)	un	43,00	101.003,00	4.343.129,00	43,00	4.343.129,00	-	-			-	-	43,00	4.343.129,00		100,00%
15,7,8	Salida para iluminación de emergencia en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, toma corriente, cable LSHF, conectores de resorte. Luminaria EM2 6XLEDS.(No incluida).	un	38,00	120.659,00	4.585.042,00	38,00	4.585.042,00	-	-			-	-	38,00	4.585.042,00		100,00%
15,7,9	Salida para iluminación, que incluye: tubería PVC, accesorios, cajas, tapa lisa, cable LSHF, prensacable, conector de resorte y encauchetado (3x16) de la caja a la luminaria. Luminaria AP1 plafon en muro (No incluida).	un	2,00	65.772,00	131.544,00	2,00	131.544,00	-	-			-	-	2,00	131.544,00		100,00%
15,7,10	Salida para iluminación, que incluye: tubería PVC, accesorios, cajas, tapa lisa, alambre, prensacable, conector de resorte y encauchetado (3x16) de la caja a la luminaria. Luminaria Riel estudio de grabacion (No incluida).	un	50,00	79.439,00	3.971.950,00	50,00	3.971.950,00	-	-			-	-	50,00	3.971.950,00		100,00%
15,7,11	Salida para iluminación, que incluye: tubería PVC, accesorios, cajas, tapa lisa, alambre, prensacable, conector de resorte y encauchetado (3x16) de la caja a la luminaria. Luminaria Riel Galeria de arte (No incluida).	un	30,00	79.438,00	2.383.140,00	30,00	2.383.140,00	-	-			-	-	30,00	2.383.140,00		100,00%
15,7,12	Salida para iluminación, que incluye: tubería PVC, accesorios, caja 4"x4", tapa lisa, alambre, prensacable, conector de resorte y encauchetado (3x16) de la caja a la luminaria. Luminaria AP1 aplique de pared (No incluida).	un	80,00	65.772,00	5.261.760,00	80,00	5.261.760,00	-	-			-	-	80,00	5.261.760,00		100,00%
15,7,13	Salida para sensor de presencia en tubería EMT de 1/2", caja metálica de 10x10cm cm doble fondo, cable LSHF, incluye accesorios, tornillos, tapa flux (No incluye sensor) en Escaleras	un	9,00	98.580,00	887.220,00	9,00	887.220,00	-	-			-	-	9,00	887.220,00		100,00%
15,7,14	Suministro e instalacion de Sensor de movimiento 360° Techo 6mts de Radio OSC15-I0W con Unidad de Control Sugerido	un	6,00	128.690,00	772.140,00	6,00	772.140,00	-	-			-	-	6,00	772.140,00		100,00%
15,7,15	Salida para control iluminacion, incluye basicamente 2 cables No 16 THHN a instalar en las tuberias de las salidas de iluminacion anteriores con sus respectivos empalmes y derivaciones	un	432,00	25.044,00	10.819.008,00	432,00	10.819.008,00	-	-			-	-	432,00	10.819.008,00		100,00%
15,7,16	Salida eléctrica para toma corriente 120 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tubería EMT, accesorios, fijación, cajas metalica, tapa troquelada, cable LSHF, empalme y aparato.	un	13,00	118.597,00	1.541.761,00	13,00	1.541.761,00	-	-			-	-	13,00	1.541.761,00		100,00%
15,7,17	Salida eléctrica empotrada para toma corriente GFCI 120 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	2,00	156.405,00	312.810,00	2,00	312.810,00	-	-			-	-	2,00	312.810,00		100,00%
15,7,18	Salida eléctrica empotrada para toma corriente 120 V con polo a tierra aislado 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	5,00	117.420,00	587.100,00	5,00	587.100,00	-	-			-	-	5,00	587.100,00		100,00%
15,7,19	Salida eléctrica de piso, para toma corriente polo a tierra aislada, 15 A, que incluye caja especial, tubería EMT, cable LSHF, conector de resorte y aparatos.	un	5,00	1.398.120,00	6.990.600,00	5,00	6.990.600,00	-	-			-	-	5,00	6.990.600,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS N[redacted]7

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				VIGENCIA	
AMPAROS	N° POLIZA		VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/07/2022	31/07/2022

FECHA PRESENTE ACTA

16/08/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 16 de Agosto de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : **IVAN JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de **A CONSTRUIR S.A.**, Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **ANDRES ALMARALES MELO** y **LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO**, supervisores del contrato y **ESTHER MENDOZA PEINADO**, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

		CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL				CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 007		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
15,7,20	Salida eléctrica de piso, para (1) toma corriente 120 V con polo a tierra aislado, (1) toma corriente polo a tierra aislada, 15 A, que incluye: caja especial, tuberia EMT, cable LSHF, conector de resorte y aparatos.	un	8,00	562.109,00	4.496.872,00	8,00	4.496.872,00	-	-			-	-	8,00	4.496.872,00		100,00%
15,7,21	Salida eléctrica para sensor, de puertas, que incluye: tuberia EMT, accesorios, fijación, cajas, cable LSHF. (No incluye sensor)	un	10,00	117.173,00	1.171.730,00	10,00	1.171.730,00	-	-			-	-	10,00	1.171.730,00		100,00%
15,7,22	Salida para suiche sencillo en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	5,00	117.173,00	585.865,00	5,00	585.865,00	-	-			-	-	5,00	585.865,00		100,00%
15,7,23	Salida para suiche doble en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable HF, conector de resorte y aparato.	un	5,00	135.757,00	678.785,00	5,00	678.785,00	-	-			-	-	5,00	678.785,00		100,00%
15,7,24	Salida para suiche triple en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable HF, conector de resorte y aparato.	un	4,00	141.066,00	564.264,00	4,00	564.264,00	-	-			-	-	4,00	564.264,00		100,00%
15,80	INSTALACION CON SUMINISTRO DE LUMINARIAS		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
	EN NIVEL 1 PISO 1		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15,8,1	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Bala Lotus 1x13W.	un	42,00	145.812,00	6.124.104,00	42,00	6.124.104,00	-	-			-	-	42,00	6.124.104,00		100,00%
15,8,2	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Pandora LED 18W.	un	22,00	174.603,00	3.841.266,00	22,00	3.841.266,00	-	-			-	-	22,00	3.841.266,00		100,00%
15,8,3	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. 60x60 LED 38W.	un	13,00	246.762,00	3.207.906,00	13,00	3.207.906,00	-	-			-	-	13,00	3.207.906,00		100,00%
15,8,4	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Cubik LED 12ROS 108W 6.0m.	un	85,00	879.429,00	74.751.465,00	85,00	74.751.465,00	-	-			-	-	85,00	74.751.465,00		100,00%
15,8,5	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Cubik LED 6ROS 54W 3,6m.	un	12,00	564.988,00	6.779.856,00	12,00	6.779.856,00	-	-			-	-	12,00	6.779.856,00		100,00%
15,8,6	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Piso LED Exterior.	un	43,00	36.839,00	1.584.077,00	43,00	1.584.077,00	-	-			-	-	43,00	1.584.077,00		100,00%
15,8,8	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado.Luminaria EM2 6XLEDS.	un	38,00	199.840,00	7.593.920,00	38,00	7.593.920,00	-	-			-	-	38,00	7.593.920,00		100,00%
15,8,9	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Luminaria AP1 plafon en muro.	un	2,00	41.972,00	83.944,00	2,00	83.944,00	-	-			-	-	2,00	83.944,00		100,00%
15,8,10	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Luminaria AP1 aplique de pared.	un	50,00	41.972,00	2.098.600,00	50,00	2.098.600,00	-	-			-	-	50,00	2.098.600,00		100,00%
15,90	SALIDAS ELECTRICAS		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
	EN NIVEL 2 PISO 2		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15,9,1	Salida para iluminación en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica cms, cable LSHF, conectores de resorte. Bala Lotus 1x13W. (No incluida).	un	195,00	101.889,00	19.868.355,00	195,00	19.868.355,00	-	-			-	-	195,00	19.868.355,00		100,00%
15,9,2	Salida para iluminación en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. Pandora LED 18W. (No incluida).	un	16,00	117.909,00	1.886.544,00	16,00	1.886.544,00	-	-			-	-	16,00	1.886.544,00		100,00%
15,9,3	Salida para iluminación en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. Pandora LED 6W. (No incluida).	un	38,00	117.897,00	4.480.086,00	38,00	4.480.086,00	-	-			-	-	38,00	4.480.086,00		100,00%
15,9,4	Salida para iluminación en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. Cubik LED 12ROS 108W 6.0m. (No incluida).	un	60,00	106.009,00	6.360.540,00	60,00	6.360.540,00	-	-			-	-	60,00	6.360.540,00		100,00%
15,9,5	Salida para iluminación en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. Cubik LED 6ROS 54W 3,6m. (No incluida).	un	80,00	106.009,00	8.480.720,00	80,00	8.480.720,00	-	-			-	-	80,00	8.480.720,00		100,00%
15,9,6	Salida para iluminación en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica,cable LSHF, conectores de resorte. Gyro LED GU10 7W 40D 4000K (No incluida).	un	20,00	101.003,00	2.020.060,00	20,00	2.020.060,00	-	-			-	-	20,00	2.020.060,00		100,00%
15,9,7	Salida para iluminación en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, caja 12x12x5 cms, cable LSHF, conectores de resorte. Cubik LED 8ROS 72W 4,8m. (No incluida).	un	15,00	106.008,00	1.590.120,00	15,00	1.590.120,00	-	-			-	-	15,00	1.590.120,00		100,00%
15,9,8	Salida para iluminación de emergencia en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, toma corriente, cable LSHF, conectores de resorte. Luminaria EM2 6XLEDS.(No incluida)	un	71,00	120.659,00	8.566.789,00	71,00	8.566.789,00	-	-			-	-	71,00	8.566.789,00		100,00%
15,9,9	Salida para iluminación, que incluye: tuberia PVC, accesorios, caja 4"x4", tapa lisa, cable LSHF, prensacable, conector de resorte y encauchetado (3x16) de la caja a la luminaria. Luminaria AP1 plafon en muro.	un	8,00	67.896,00	543.168,00	8,00	543.168,00	-	-			-	-	8,00	543.168,00		100,00%
15,9,10	Salida para sensor de presencia en tuberia EMT de 1/2", caja metálica, cable LSHF, incluye accesorios, tornillos, tapa flux (No incluye sensor) en circulaciones	un	18,00	98.579,00	1.774.422,00	18,00	1.774.422,00	-	-			-	-	18,00	1.774.422,00		100,00%
15,9,11	Suministro e instalacion de Sensor de movimiento 360° Techo 6mts de Radio OSC15-IOW con Unidad de Control Sugerido	un	18,00	128.690,00	2.316.420,00	18,00	2.316.420,00	-	-			-	-	18,00	2.316.420,00		100,00%
15,9,12	Salida para control iluminacion, incluye basicamente 2 cables No 16 THHN a instalar en las tuberias de las salidas de iluminacion anteriores con sus respectivos empalmes y derivaciones	un	521,00	25.044,00	13.047.924,00	521,00	13.047.924,00	-	-			-	-	521,00	13.047.924,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS N[illegible]7

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				VIGENCIA	
AMPAROS	Nº POLIZA		VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021 A	11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021 A	11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021 A	11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023 A	11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.940.883.448,00	12/07/2021 A	11/05/2023

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/07/2022	31/07/2022

FECHA PRESENTE ACTA

16/08/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 16 de Agosto de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra. JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora. ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

	CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 007		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
15,9,13	Salida eléctrica para toma corriente 120 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tubería EMT, accesorios, fijación, cajas, tapa troquelada, cable LSHF, empalme y aparato.	un	63,00	118.597,00	7.471.611,00	63,00	7.471.611,00	-	-			-	-	63,00	7.471.611,00		100,00%
15,9,14	Salida eléctrica empotrada para toma corriente GFCI 120 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento,cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	3,00	156.405,00	469.215,00	3,00	469.215,00	-	-			-	-	3,00	469.215,00		100,00%
15,9,15	Salida eléctrica empotrada para toma corriente 120 V con polo a tierra aislado 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	49,00	117.420,00	5.753.580,00	49,00	5.753.580,00	-	-			-	-	49,00	5.753.580,00		100,00%
15,9,18	Salida eléctrica para toma corriente trifilar 220 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, empalme y aparato.	un	12,00	124.722,00	1.496.664,00	12,00	1.496.664,00	-	-			-	-	12,00	1.496.664,00		100,00%
15,9,19	Salida eléctrica para toma corriente trifilar 220 V con polo a tierra, 15 A, cafeteria y tienda, que incluya: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, empalme y aparato.	un	12,00	124.722,00	1.496.664,00	12,00	1.496.664,00	-	-			-	-	12,00	1.496.664,00		100,00%
15,9,20	Salida para suiche sencillo en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	12,00	117.173,00	1.406.076,00	12,00	1.406.076,00	-	-			-	-	12,00	1.406.076,00		100,00%
15,9,21	Salida para suiche doble en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	1,00	135.757,00	135.757,00	1,00	135.757,00	-	-			-	-	1,00	135.757,00		100,00%
15,9,22	Salida para suiche triple en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	4,00	141.066,00	564.264,00	4,00	564.264,00	-	-			-	-	4,00	564.264,00		100,00%
15,10	INSTALACIÓN CON SUMINISTRO DE LUMINARIAS		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
	EN NIVEL 2 PISO 2		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15,10,1	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Bala Lotus 1x13W.	un	195,00	145.812,00	28.433.340,00	195,00	28.433.340,00	-	-			-	-	195,00	28.433.340,00		100,00%
15,10,2	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Pandora LED 18W.	un	16,00	174.603,00	2.793.648,00	16,00	2.793.648,00	-	-			-	-	16,00	2.793.648,00		100,00%
15,10,3	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Pandora LED 8W.	un	38,00	246.762,00	9.376.956,00	38,00	9.376.956,00	-	-			-	-	38,00	9.376.956,00		100,00%
15,10,4	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Cubik LED 12ROS 108W 6.0m	un	60,00	879.429,00	52.765.740,00	60,00	52.765.740,00	-	-			-	-	60,00	52.765.740,00		100,00%
15,10,5	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Cubik LED 6ROS 54W 3,6m.	un	80,00	564.988,00	45.199.040,00	80,00	45.199.040,00	-	-			-	-	80,00	45.199.040,00		100,00%
15,10,6	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Gyro LED GU10 7W 40D 4000K	un	20,00	36.839,00	736.780,00	20,00	736.780,00	-	-			-	-	20,00	736.780,00		100,00%
15,10,7	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Cubik LED 8ROS 72W 4,8m.	un	15,00	669.452,00	10.041.780,00	15,00	10.041.780,00	-	-			-	-	15,00	10.041.780,00		100,00%
15,10,8	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado.Luminaria EM2 6XLEDS.	un	71,00	199.840,00	14.188.640,00	71,00	14.188.640,00	-	-			-	-	71,00	14.188.640,00		100,00%
15,10,9	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Luminaria AP1 plafon en muro.	un	8,00	41.972,00	335.776,00	8,00	335.776,00	-	-			-	-	8,00	335.776,00		100,00%
15,11	SALIDAS ELECTRICAS		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
	EN NIVEL 3 PISO 3		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15,11,1	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica oms, cable LSHF, conectores de resorte. Bala Lotus 1x13W. (No incluida).	un	69,00	135.825,00	9.371.925,00	69,00	9.371.925,00	-	-			-	-	69,00	9.371.925,00		100,00%
15,11,2	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. Pandora LED 18W. (No incluida).	un	12,00	135.825,00	1.629.900,00	12,00	1.629.900,00	-	-			-	-	12,00	1.629.900,00		100,00%
15,11,3	Salida para iluminación, que incluye: tubería PVC, accesorios, caja metalica, tapa lisa, alambre, prensacable, conector de resorte y encauchetado (3x16) de la caja a la luminaria. Luminaria AP1 plafon en muro (No incluida).	un	12,00	90.300,00	1.083.600,00	12,00	1.083.600,00	-	-			-	-	12,00	1.083.600,00		100,00%
15,11,4	Salida para iluminación de emergencia en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, toma corriente, cable LSHF, conectores de resorte. Luminaria EM2 6XLEDS (No incluida).	un	26,00	154.783,00	4.024.358,00	26,00	4.024.358,00	-	-			-	-	26,00	4.024.358,00		100,00%
15,11,5	Salida para sensor de presencia en tubería EMT de 1/2", caja metálica, cable LSHF, incluye accesorios, tornillos, tapa flux (No incluye sensor) en circulaciones	un	8,00	135.825,00	1.086.600,00	8,00	1.086.600,00	-	-			-	-	8,00	1.086.600,00		100,00%
15,11,6	Suministro e instalacion de Sensor de movimiento 360° Techo 6mts de Radio OSC15-I0W con Unidad de Control Sugerido.	un	8,00	90.300,00	722.400,00	8,00	722.400,00	-	-			-	-	8,00	722.400,00		100,00%
15,11,8	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Cubik LED 12ROS 108W 6.0m. (No incluida)	un	11,00	135.825,00	1.494.075,00	11,00	1.494.075,00	-	-			-	-	11,00	1.494.075,00		100,00%
15,11,9	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. DESC-SOBR 4ROS 54W . (No incluida).	un	4,00	135.825,00	543.300,00	4,00	543.300,00	-	-			-	-	4,00	543.300,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No. 007

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2489104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901483970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE 1/07/2022 — HASTA 31/07/2022

FECHA PRESENTE ACTA

16/08/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				VIGENCIA	
AMPAROS	Nº POLIZA		VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 16 de Agosto de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de **A CONSTRUIR S.A.**, Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**; firma Interventora, **ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO**, supervisores del contrato y **ESTHER MENDOZA PEINADO**, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

			CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL			CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 007		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
15,11,10	Salida para iluminacion a 6 metros, en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF , conectores de resorte, tramo de encauchetado 3x16, Juego de conectores macho y hembra para desconexion rapida certificada (borneras de conexion). Luminaria AP3 LED 48W.	un	12,00	151.343,00	1.816.116,00	12,00	1.816.116,00	-	-			-	-	12,00	1.816.116,00		100,00%
15,11,11	Salida para control iluminacion, incluye basicamente 2 cables No 16 THHN a instalar en las tuberias de las salidas de iluminacion anteriores con sus respectivos empalmes y derivaciones	un	162,00	31.948,00	5.175.576,00	162,00	5.175.576,00	-	-			-	-	162,00	5.175.576,00		100,00%
15,11,12	Salida eléctrica para toma corriente 120 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tubería EMT, accesorios, fijación, caja metalica, tapa troquelada, cable LSHF, empalme y aparato	un	5,00	152.719,00	763.595,00	5,00	763.595,00	-	-			-	-	5,00	763.595,00		100,00%
15,11,13	Salida eléctrica empotrada para toma corriente 120 V con polo a tierra aislado 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	20,00	151.543,00	3.030.860,00	20,00	3.030.860,00	-	-			-	-	20,00	3.030.860,00		100,00%
15,11,14	Salida eléctrica empotrada en piso para toma corriente 120 V con polo a tierra aislado 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	3,00	414.130,00	1.242.390,00	3,00	1.242.390,00	-	-			-	-	3,00	1.242.390,00		100,00%
15,11,15	Salida eléctrica empotrada en piso para toma corriente 120 V con polo a tierra 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	3,00	408.917,00	1.226.751,00	3,00	1.226.751,00	-	-			-	-	3,00	1.226.751,00		100,00%
15,11,16	Salida eléctrica tipo intemperie empotrada para toma corriente GFCI 120 V con polo a tierra a 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	4,00	173.796,00	695.184,00	4,00	695.184,00	-	-			-	-	4,00	695.184,00		100,00%
15,11,17	Salida eléctrica empotrada para toma corriente trifilar 220 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, empalme y aparato.	un	5,00	158.845,00	794.225,00	5,00	794.225,00	-	-			-	-	5,00	794.225,00		100,00%
15,11,18	Salida eléctrica para video beam, para (1) toma corriente 120 V con polo a tierra, (2) toma corriente polo a tierra aislada, 15 A, que incluye: caja especial, tubería EMT,cable LSHF, conector de resorte y aparatos.	un	4,00	1.833.886,00	7.335.544,00	4,00	7.335.544,00	-	-			-	-	4,00	7.335.544,00		100,00%
15,11,19	Salida para suiche sencillo en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	31,00	155.132,00	4.809.092,00	31,00	4.809.092,00	-	-			-	-	31,00	4.809.092,00		100,00%
15,11,20	Salida para suiche doble en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	1,00	135.757,00	135.757,00	1,00	135.757,00	-	-			-	-	1,00	135.757,00		100,00%
15,11,21	Salida eléctrica empotrada, para tarima y puerta levadiza de teatro, que incluye: tubería 1.1/2 PVC, accesorios, fijación, caja metalica, No incluye cableado y aparato.	un	4,00	205.853,00	823.412,00	4,00	823.412,00	-	-			-	-	4,00	823.412,00		100,00%
15,11,22	Suministro e instalación de luminaria tipo Bala, Ref: Start track spot small 14W 3k ra90 nb black	un	8,00	341.067,00	2.728.536,00	8,00	2.728.536,00	-	-			-	-	8,00	2.728.536,00		100,00%
15,11,23	Suministro e instalación de luminaria tipo Bala, Ref: Rana led r 600 ho 4k louv+pri ssc w gen2	un	156,00	333.333,00	51.999.948,00	156,00	51.999.948,00	-	-			-	-	156,00	51.999.948,00		100,00%
15,11,24	Suministro e instalación de luminaria tipo Bala, Ref: LYTEFRAM Recessed 2x70 W HI-PAR 111 24°	un	48,00	291.667,00	14.000.016,00	48,00	14.000.016,00	-	-			-	-	48,00	14.000.016,00		100,00%
15,12	**INSTALACIÓN CON SUMINISTRO DE LUMINARIAS**		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
	EN NIVEL 3 PISO 3		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15,12,1	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Bala Lotus 1x13W.	un	69,00	181.624,00	12.532.056,00	69,00	12.532.056,00	-	-			-	-	69,00	12.532.056,00		100,00%
15,12,2	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Bala Lotus 1x13W.	un	12,00	145.812,00	1.749.744,00	12,00	1.749.744,00	-	-			-	-	12,00	1.749.744,00		100,00%
15,12,3	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Luminaria AP1 plafon en muro.	un	12,00	41.972,00	503.664,00	12,00	503.664,00	-	-			-	-	12,00	503.664,00		100,00%
15,12,4	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Luminaria EM2 6XLEDS.	un	26,00	199.840,00	5.195.840,00	26,00	5.195.840,00	-	-			-	-	26,00	5.195.840,00		100,00%
15,12,5	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. TLLED - 40Z 7W	un	8,00	199.840,00	1.598.720,00	8,00	1.598.720,00	-	-			-	-	8,00	1.598.720,00		100,00%
15,12,7	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado libre de halógenos. Pandora LED 28W.	un	85,00	174.603,00	14.841.255,00	85,00	14.841.255,00	-	-			-	-	85,00	14.841.255,00		100,00%
15,12,8	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. DESC-SOBR 4ROS 108W.	un	11,00	246.762,00	2.714.382,00	11,00	2.714.382,00	-	-			-	-	11,00	2.714.382,00		100,00%
15,12,9	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. DESC-SOBR 4ROS 36W	un	4,00	566.735,00	2.266.940,00	4,00	2.266.940,00	-	-			-	-	4,00	2.266.940,00		100,00%
15,12,10	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Luminaria AP3 LED 48W.	un	12,00	205.459,00	2.465.508,00	12,00	2.465.508,00	-	-			-	-	12,00	2.465.508,00		100,00%
15,13	**SALIDAS ELECTRICAS**		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
	EN NIVEL 4 PISO 4		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15,13,1	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica oms, cable LSHF, conectores de resorte. Bala Lotus 1x13W. (No incluida).	un	13,00	135.825,00	1.765.725,00	13,00	1.765.725,00	-	-			-	-	13,00	1.765.725,00		100,00%
15,13,2	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. Pandora LED 18W. (No incluida).	un	8,00	135.825,00	1.086.600,00	8,00	1.086.600,00	-	-			-	-	8,00	1.086.600,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No. 007

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND	4817	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/05/2028
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/07/2022	31/07/2022

FECHA PRESENTE ACTA

16/08/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 16 de Agosto de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

	CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 007		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
15.13.3	Salida para iluminación en tubería EMT. Luminaria Led 1x28 Hermetica (No incluida)	un	6,00	90.300,00	541.800,00	6,00	541.800,00	-	-			-	-	6,00	541.800,00		100,00%
15.13.4	Salida para iluminación de emergencia en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, toma corriente, cable LSHF, conectores de resorte. Luminaria EM2 6XLEDS (No incluida)	un	12,00	154.783,00	1.857.396,00	12,00	1.857.396,00	-	-			-	-	12,00	1.857.396,00		100,00%
15.13.5	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. Panel LED 60x06 38W (No incluida).	un	2,00	135.825,00	271.650,00	2,00	271.650,00	-	-			-	-	2,00	271.650,00		100,00%
15.13.6	Salida para sensor de presencia en tubería EMT de 1/2", caja metálica, cable LSHF, incluye accesorios, tornillos, tapa flux (No incluye sensor) en circulaciones	un	8,00	98.579,00	788.632,00	8,00	788.632,00	-	-			-	-	8,00	788.632,00		100,00%
15.13.7	Suministro e instalacion de Sensor de movimiento 360° Techo 6mts de Radio OSC15-I0W con Unidad de Control Superido	un	8,00	128.690,00	1.029.520,00	8,00	1.029.520,00	-	-			-	-	8,00	1.029.520,00		100,00%
15.13.8	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, cable LSHF, conectores de resorte. Cubik LED 12ROS 108W 6.0m. (No incluida).	un	25,00	135.825,00	3.395.625,00	25,00	3.395.625,00	-	-			-	-	25,00	3.395.625,00		100,00%
15.13.9	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. DESC-SOBR 4ROS 54W . (No incluida)	un	34,00	135.825,00	4.618.050,00	34,00	4.618.050,00	-	-			-	-	34,00	4.618.050,00		100,00%
15.13.10	Salida para iluminacion a 6 mstros, en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF , conectores de resorte, tramo de encauchetado 3x16, Juego de conectores macho y hembra para desconexion rapida certificada (borneras de conexion). Luminaria AP3 LED 48W.	un	25,00	151.343,00	3.783.575,00	25,00	3.783.575,00	-	-			-	-	25,00	3.783.575,00		100,00%
15.13.11	Salida para control iluminacion, incluye basicamente 2 cables No 16 THHN a instalar en las tuberias de las salidas de iluminacion anteriores con sus respectivos empalmes y derivaciones	un	141,00	31.948,00	4.504.668,00	141,00	4.504.668,00	-	-			-	-	141,00	4.504.668,00		100,00%
15.13.12	Salida eléctrica para toma corriente 120 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tubería EMT, accesorios, fijación, caja metalica, tapa troquelada, cable LSHF, empalme y aparato	un	38,00	152.719,00	5.803.322,00	38,00	5.803.322,00	-	-			-	-	38,00	5.803.322,00		100,00%
15.13.13	Salida eléctrica para toma corriente 120 V con polo a tierra aislado 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, alambre THHN, conector de resorte y aparato	un	28,00	151.343,00	4.237.604,00	28,00	4.237.604,00	-	-			-	-	28,00	4.237.604,00		100,00%
15.13.14	Salida eléctrica en techo Centro de Eventos para toma corriente 120 V con polo a tierra aislado 15 A, que incluye: tubería EMT, accesorios, fijación, caja metálica con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	18,00	414.130,00	7.454.340,00	18,00	7.454.340,00	-	-			-	-	18,00	7.454.340,00		100,00%
15.13.15	Salida eléctrica empotrada en piso para toma corriente 120 V con polo a tierra 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	30,00	408.917,00	12.267.510,00	30,00	12.267.510,00	-	-			-	-	30,00	12.267.510,00		100,00%
15.13.16	Salida eléctrica tipo intemperie empotrada para toma corriente GFCI 120 V con polo a tierra a 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	45,00	173.796,00	7.820.820,00	45,00	7.820.820,00	-	-			-	-	45,00	7.820.820,00		100,00%
15.13.17	Salida eléctrica en techo Centro de Eventos para toma corriente trifilar 220 V con polo a tierra, 20 A, que incluye: tubería EMT, accesorios, fijación, caja Metalica, cable LSHF, empalme y aparato.	un	5,00	158.845,00	794.225,00	5,00	794.225,00	-	-			-	-	5,00	794.225,00		100,00%
15.13.18	Salida eléctrica para video beam, para (1) toma corriente 120 V con polo a tierra, (2) toma corriente polo a tierra aislada, 15 A, que incluye: caja especial, tubería EMT, cable LSHF, conector de resorte y aparatos.	un	4,00	1.833.886,00	7.335.544,00	4,00	7.335.544,00	-	-			-	-	4,00	7.335.544,00		100,00%
15.13.19	Salida para suiche sencillo en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	17,00	155.132,00	2.637.244,00	17,00	2.637.244,00	-	-			-	-	17,00	2.637.244,00		100,00%
15.13.20	Salida para suiche doble en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	2,00	135.757,00	271.514,00	2,00	271.514,00	-	-			-	-	2,00	271.514,00		100,00%
15.13.21	Salida para suiche conmutable sencillo en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	4,00	205.853,00	823.412,00	4,00	823.412,00	-	-			-	-	4,00	823.412,00		100,00%
15,14	INSTALACION CON SUMINISTRO DE LUMINARIAS		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
	EN NIVEL 4 PISO 4		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.14.1	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Bala Lotus 1x13W.	un	13,00	181.624,00	2.361.112,00	13,00	2.361.112,00	-	-			-	-	13,00	2.361.112,00		100,00%
15.14.2	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Pandora LED 16W.	un	8,00	145.812,00	1.166.496,00	8,00	1.166.496,00	-	-			-	-	8,00	1.166.496,00		100,00%
15.14.3	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. 1x28 Hermetica LED.	un	6,00	41.972,00	251.832,00	6,00	251.832,00	-	-			-	-	6,00	251.832,00		100,00%
15.14.4	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Luminaria EM2 6XLEDS.	un	12,00	199.840,00	2.398.080,00	12,00	2.398.080,00	-	-			-	-	12,00	2.398.080,00		100,00%
15.14.5	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Panel LED 60x60W	un	2,00	199.840,00	399.680,00	2,00	399.680,00	-	-			-	-	2,00	399.680,00		100,00%
15.14.7	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. DESC-SOBR 4ROS 36W .	un	34,00	566.735,00	19.268.990,00	34,00	19.268.990,00	-	-			-	-	34,00	19.268.990,00		100,00%
15.14.8	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Luminaria AP3 LED 48W.	un	25,00	205.459,00	5.136.475,00	25,00	5.136.475,00	-	-			-	-	25,00	5.136.475,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS N[redacted]07

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/05/2028
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/07/2022	31/07/2022

FECHA PRESENTE ACTA

16/08/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 16 de Agosto de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de **A CONSTRUIR S.A.**, Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **ANDRES ALMARALES MELO** y **LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO**, supervisores del contrato y **ESTHER MENDOZA PEINADO**, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

		CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL				CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 007		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
15,15	SALIDAS ELECTRICAS		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
	EN NIVEL 5 PISO 5		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.15.1	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica cms, cable LSHF, conectores de resorte. Bala Lotus 1x13W. (No incluida).	un	76,00	135.825,00	10.322.700,00	76,00	10.322.700,00	-	-			-	-	76,00	10.322.700,00		100,00%
15.15.2	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. Pandora LED 18W. (No incluida).	un	8,00	135.825,00	1.086.600,00	8,00	1.086.600,00	-	-			-	-	8,00	1.086.600,00		100,00%
15.15.3	Salida para iluminación en tubería EMT. Luminaria Led 1x28 Hermetica (No incluida)	un	7,00	90.300,00	632.100,00	7,00	632.100,00	-	-			-	-	7,00	632.100,00		100,00%
15.15.4	Salida para iluminación de emergencia en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, toma corriente, cable LSHF, conectores de resorte. Luminaria EM2 6XLED5 (No incluida).	un	19,00	154.783,00	2.940.877,00	19,00	2.940.877,00	-	-			-	-	19,00	2.940.877,00		100,00%
15.15.5	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. Aplique LED 18W (No incluida).	un	5,00	135.825,00	679.125,00	5,00	679.125,00	-	-			-	-	5,00	679.125,00		100,00%
15.15.6	Salida para sensor de presencia en tubería EMT de 1/2", caja metálica, cable LSHF, incluye accesorios, tornillos, tapa flux (No incluye sensor) en circulaciones	un	5,00	98.579,00	492.895,00	5,00	492.895,00	-	-			-	-	5,00	492.895,00		100,00%
15.15.7	Suministro e instalacion de Sensor de movimiento 360° Techo 6mts de Radio OSC15-I0W con Unidad de Control Sugerido	un	5,00	128.690,00	643.450,00	5,00	643.450,00	-	-			-	-	5,00	643.450,00		100,00%
15.15.8	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. Tipo Poste Tabaco LED 54W . (No incluida).	un	8,00	135.825,00	1.086.600,00	8,00	1.086.600,00	-	-			-	-	8,00	1.086.600,00		100,00%
15.15.9	Salida para control iluminacion, incluye basicamente 2 cables No 16 THHN a instalar en las tuberias de las salidas de iluminacion anteriores con sus respectivos empalmes y derivaciones	un	133,00	31.948,00	4.249.084,00	133,00	4.249.084,00	-	-			-	-	133,00	4.249.084,00		100,00%
15.15.10	Salida eléctrica para toma corriente 120 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tubería EMT, accesorios, fijación, caja metalica, tapa troquelada, cable LSHF, empalme y aparato.	un	12,00	152.719,00	1.832.628,00	12,00	1.832.628,00	-	-			-	-	12,00	1.832.628,00		100,00%
15.15.11	Salida eléctrica tipo intemperie empotrada para toma corriente GFCI 120 V con polo a tierra a 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	5,00	173.796,00	868.980,00	5,00	868.980,00	-	-			-	-	5,00	868.980,00		100,00%
15.15.12	Salida para suiche sencillo en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	10,00	155.132,00	1.551.320,00	10,00	1.551.320,00	-	-			-	-	10,00	1.551.320,00		100,00%
15.15.13	Salida para suiche doble en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	2,00	135.757,00	271.514,00	2,00	271.514,00	-	-			-	-	2,00	271.514,00		100,00%
15.15.14	Salida para suiche triple en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	4,00	205.853,00	823.412,00	4,00	823.412,00	-	-			-	-	4,00	823.412,00		100,00%
15,16	INSTALACION CON SUMINISTRO DE LUMINARIAS		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
	EN NIVEL 5 PISO 5		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.16.1	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Bala Lotus 1x13W.	un	76,00	181.624,00	13.803.424,00	76,00	13.803.424,00	-	-			-	-	76,00	13.803.424,00		100,00%
15.16.2	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Pandora LED 18W.	un	8,00	145.812,00	1.166.496,00	8,00	1.166.496,00	-	-			-	-	8,00	1.166.496,00		100,00%
15.16.3	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. 1x28 Hermetica LED	un	7,00	41.972,00	293.804,00	7,00	293.804,00	-	-			-	-	7,00	293.804,00		100,00%
15.16.4	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Luminaria EM2 6XLED5.	un	19,00	199.840,00	3.796.960,00	19,00	3.796.960,00	-	-			-	-	19,00	3.796.960,00		100,00%
15.16.5	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Aplique LED	un	5,00	199.840,00	999.200,00	5,00	999.200,00	-	-			-	-	5,00	999.200,00		100,00%
15.16.6	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Tipo Poste Tabaco LED 54W	un	8,00	147.292,00	1.178.336,00	8,00	1.178.336,00	-	-			-	-	8,00	1.178.336,00		100,00%
15,17	CONEXIÓN DE EQUIPOS ESPECIALES HIDRÁULICOS		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
	SALIDAS DE FUERZA, INCLUYENDO; TUBERIAS EMT CON ACCESORIOS Y ANCLAJES, CABLES, ACOPLES FLEXIBLES, CONECTORES, ETC, DESDE EL TABLERO HASTA LA BOMBAS SEGÚN PLANOS		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.17.1	- Bomba Equipo de Presion Agua Potable, en cable 3xNo.1/0(F)+1xNo.1/0(N)+1xNo.8(T) AWG Cu	ML	95,00	307.494,00	29.211.930,00	95,00	29.211.930,00	-	-			-	-	95,00	29.211.930,00		100,00%
15.17.2	- Bomba Equipo Red Contra Incendio, en cable 3x(3xNo.4/0(F)+1xNo.4/0(N))+1xNo.1/0(T) AWG Cu	ML	100,00	832.485,00	83.248.500,00	100,00	83.248.500,00	-	-			-	-	100,00	83.248.500,00		100,00%
15.17.3	- Bomba Equipo pozo Eyector aguas freaticas, en cable 3xNo.2(F)+1xNo.2(N)+1xNo.8(T) AWG Cu	ML	130,00	156.078,00	20.290.140,00	130,00	20.290.140,00	-	-			-	-	130,00	20.290.140,00		100,00%
15.17.4	- Bomba Equipo pozo Eyector aguas negras, en cable 3xNo.6(F)+1xNo.6(N)+1xNo.10(T) AWG Cu	ML	120,00	109.666,00	13.159.920,00	120,00	13.159.920,00	-	-			-	-	120,00	13.159.920,00		100,00%
15,18	CONEXIÓN DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS [redacted]07

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/07/2022	31/07/2022

FECHA PRESENTE ACTA

16/08/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	Nº POLIZA		VR. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 16 de Agosto de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

			CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL			CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 007		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
	SALIDA COMPLETA PARA UNIDADES VENTILADORAS, MANEJADORAS, EVAPORADORAS. INCLUYE TUBERIA EMT CON AACCESORIOS Y ANCLAJES, ACOPLES FLEXIBLES, CONECTORES DESDE EL TABLERO HASTA EL EQUIPO SEGUN PLANOS.		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
	SOTANO 2		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.18.1	- Unidad ventiladora # 13, en cable # 12	un	1,00	186.241,00	186.241,00	1,00	186.241,00	-	-			-	-	1,00	186.241,00		100,00%
15.18.2	- Unidad ventiladora # 14, en cable 12	un	1,00	432.489,00	432.489,00	1,00	432.489,00	-	-			-	-	1,00	432.489,00		100,00%
15.18.3	- Unidad ventiladora # 15, en cable # 12	un	1,00	307.494,00	307.494,00	1,00	307.494,00	-	-			-	-	1,00	307.494,00		100,00%
15.18.4	- Unidad jet fan #1, en cable 12.	un	9,00	261.553,00	2.353.977,00	9,00	2.353.977,00	-	-			-	-	9,00	2.353.977,00		100,00%
	Sotano 1		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.18.5	- Unidad ventiladora # 10-11, en cable # 12	un	2,00	112.178,00	224.356,00	2,00	224.356,00	-	-			-	-	2,00	224.356,00		100,00%
15.18.6	- Unidad jet fan #1, en cable 12.	un	9,00	261.553,00	2.353.977,00	9,00	2.353.977,00	-	-			-	-	9,00	2.353.977,00		100,00%
	Nivel 1		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.18.7	- Unidad FCC 360, en cable # 12	un	7,00	349.092,00	2.443.644,00	7,00	2.443.644,00	-	-			-	-	7,00	2.443.644,00		100,00%
15.18.8	- Unidad ventiladora # 201, en cable # 12	un	1,00	92.678,00	92.678,00	1,00	92.678,00	-	-			-	-	1,00	92.678,00		100,00%
	NIVEL 2		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.18.9	- Unidad FCC 360, en cable # 12	un	15,00	349.092,00	5.236.380,00	15,00	5.236.380,00	-	-			-	-	15,00	5.236.380,00		100,00%
15.18.10	- Unidad aire exterior UDA, en cable # 10	un	8,00	456.735,00	3.653.880,00	8,00	3.653.880,00	-	-			-	-	8,00	3.653.880,00		100,00%
	NIVEL 3		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.18.11	- UMA # 1, en cable # 8	un	1,00	78.986,00	78.986,00	1,00	78.986,00	-	-			-	-	1,00	78.986,00		100,00%
15.18.12	- UMA # 2, en cable # 8	un	1,00	78.986,00	78.986,00	1,00	78.986,00	-	-			-	-	1,00	78.986,00		100,00%
15.18.13	- UMA # 3, en cable # 8	un	1,00	81.896,00	81.896,00	1,00	81.896,00	-	-			-	-	1,00	81.896,00		100,00%
15.18.14	- UMA # 3, en cable # 8	un	1,00	530.674,00	530.674,00	1,00	530.674,00	-	-			-	-	1,00	530.674,00		100,00%
15.18.15	- Unidad fecol pared en cable # 12	un	10,00	530.674,00	5.306.740,00	10,00	5.306.740,00	-	-			-	-	10,00	5.306.740,00		100,00%
	NIVEL 4		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.18.16	- Unidad fancoil cassette 1 via FCV en cable # 12	un	8,00	92.678,00	741.424,00	8,00	741.424,00	-	-			-	-	8,00	741.424,00		100,00%
15.18.17	- Unidad fancoil cassette 360, FCC 360, en cable # 12	un	5,00	349.092,00	1.745.460,00	5,00	1.745.460,00	-	-			-	-	5,00	1.745.460,00		100,00%
	NIVEL 5		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.18.18	- Unidad fancoil cassette 360, FCC 360, en cable # 12	un	3,00	349.092,00	1.047.276,00	3,00	1.047.276,00	-	-			-	-	3,00	1.047.276,00		100,00%
	CUBIERTA		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.18.19	- Unidad condensadora UCA # 301, en cable # 6	un	10,00	92.678,00	926.780,00	10,00	926.780,00	-	-			-	-	10,00	926.780,00		100,00%
15.18.20	- Bomba agua fria BAF en cable # 10	un	2,00	92.678,00	185.356,00	2,00	185.356,00	-	-			-	-	2,00	185.356,00		100,00%
15.18.21	- Extractor tipo hongo EXT, en cable # 8	un	2,00	102.571,00	205.142,00	2,00	205.142,00	-	-			-	-	2,00	205.142,00		100,00%
15.18.22	- Unidad Chiller, en cable # 250	un	2,00	552.297,00	1.104.594,00	2,00	1.104.594,00	-	-			-	-	2,00	1.104.594,00		100,00%
15,19	ALIMENTADORES		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.19.1	Alimentador en cable 3x8, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. T. TD_ILUM SOTANO 1	ml	58,00	38.150,00	2.212.700,00	58,00	2.212.700,00	-	-			-	-	58,00	2.212.700,00		100,00%
15.19.2	Alimentador en cable 3x8, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. T. TD_TOMAS SOTANO 1	ml	55,00	33.558,00	1.845.690,00	55,00	1.845.690,00	-	-			-	-	55,00	1.845.690,00		100,00%
15.19.3	Alimentador en cable 3x2, 1x2, 1x4 AWG, por tuberia EMT 2" , incluye elementos de fijacion. TD_AA S1	ml	15,00	49.648,00	744.720,00	15,00	744.720,00	-	-			-	-	15,00	744.720,00		100,00%
15.19.4	Alimentador en cable 3x6, 1x6, 1x8 AWG, por tuberia EMT 1 1/4" , incluye elementos de fijacion. TD_ILUM P1	ml	82,00	38.150,00	3.128.300,00	82,00	3.128.300,00	-	-			-	-	82,00	3.128.300,00		100,00%
15.19.5	Alimentador en cable 3x8, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. TD_TOMAS P1	ml	83,00	38.150,00	3.166.450,00	83,00	3.166.450,00	-	-			-	-	83,00	3.166.450,00		100,00%
15.19.6	Alimentador en cable 3x8, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. TD_AA P1	ml	105,00	38.150,00	4.005.750,00	105,00	4.005.750,00	-	-			-	-	105,00	4.005.750,00		100,00%
15.19.7	Alimentador en cable 3x4, 1x4, 1x6 AWG, por tuberia EMT 1 1/4" , incluye elementos de fijacion. TD_ILUM P2	ml	20,00	38.150,00	763.000,00	20,00	763.000,00	-	-			-	-	20,00	763.000,00		100,00%
15.19.8	Alimentador en cable 3x8, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. TD_TOMAS P2	ml	67,00	38.150,00	2.556.050,00	67,00	2.556.050,00	-	-			-	-	67,00	2.556.050,00		100,00%
15.19.9	Alimentador en cable 3x2, 1x2, 1x8 AWG, por tuberia EMT 2" , incluye elementos de fijacion. TD_TOMAS CE	ml	69,00	38.150,00	2.632.350,00	69,00	2.632.350,00	-	-			-	-	69,00	2.632.350,00		100,00%
15.19.10	Alimentador en cable 3x10, 1x10, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. TD_ILUM CE	ml	71,00	38.150,00	2.708.650,00	71,00	2.708.650,00	-	-			-	-	71,00	2.708.650,00		100,00%
15.19.11	Alimentador en cable 3x8, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. TD_AA P2	ml	55,00	38.150,00	2.098.250,00	55,00	2.098.250,00	-	-			-	-	55,00	2.098.250,00		100,00%
15.19.12	Alimentador en cable 3x8, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. TD_P3	ml	55,00	38.150,00	2.098.250,00	55,00	2.098.250,00	-	-			-	-	55,00	2.098.250,00		100,00%
15.19.13	Alimentador en cable 3x1/0, 1x1/0, 1x6 AWG, por tuberia EMT 2" , incluye elementos de fijacion. TD_AA P3	ml	25,00	126.509,00	3.162.725,00	25,00	3.162.725,00	-	-			-	-	25,00	3.162.725,00		100,00%
15.19.14	Alimentador en cable 3x8, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. TD_P4	ml	85,00	25.911,00	2.202.435,00	85,00	2.202.435,00	-	-			-	-	85,00	2.202.435,00		100,00%
15.19.15	Alimentador en cable 3x8, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. TD_AA P4	ml	44,00	33.559,00	1.476.596,00	44,00	1.476.596,00	-	-			-	-	44,00	1.476.596,00		100,00%
15.19.16	Alimentador en cable 3x8, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. TD_P5	ml	50,00	33.559,00	1.677.950,00	50,00	1.677.950,00	-	-			-	-	50,00	1.677.950,00		100,00%
15.19.17	Alimentador en cable 3x40, 1x40, 1x2 AWG, por tuberia EMT 3" , incluye elementos de fijacion. TD_AA CHILLER	ml	54,00	230.423,00	12.442.842,00	54,00	12.442.842,00	-	-			-	-	54,00	12.442.842,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS [redacted]07

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/05/2028
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/07/2022	31/07/2022

FECHA PRESENTE ACTA

16/08/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el da 16 de Agosto de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de **A CONSTRUIR S.A.**, Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **ANDRES ALMARALES MELO** y **LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO**, supervisores del contrato y **ESTHER MENDOZA PEINADO**, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

			CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL			CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 007		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
15.19.18	Alimentador en cable 3x250, 1x250, 1x4 AWG, por tuberia EMT 3" , incluye elementos de fijacion. TD_AA CUBIERTA	ml	35,00	256.129,00	8.964.515,00	35,00	8.964.515,00	-	-			-	-	35,00	8.964.515,00		100,00%
15.19.19	Alimentador en cable 3x8, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. TD_LOCAL BANCARIO	ml	35,00	38.150,00	1.335.250,00	35,00	1.335.250,00	-	-			-	-	35,00	1.335.250,00		100,00%
15.19.20	Alimentador en cable 3x8, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. TD_CAFE	ml	35,00	38.150,00	1.335.250,00	35,00	1.335.250,00	-	-			-	-	35,00	1.335.250,00		100,00%
15.19.21	Alimentador en cable 3x8, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. TD_ESC EL 1	ml	35,00	38.150,00	1.335.250,00	35,00	1.335.250,00	-	-			-	-	35,00	1.335.250,00		100,00%
15.19.22	Alimentador en cable 3x8, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. TD_ESC EL 2	ml	35,00	38.150,00	1.335.250,00	35,00	1.335.250,00	-	-			-	-	35,00	1.335.250,00		100,00%
15.19.23	Alimentador en cable 3x8, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. TD_ESC EL 3	ml	35,00	38.150,00	1.335.250,00	35,00	1.335.250,00	-	-			-	-	35,00	1.335.250,00		100,00%
15.19.24	Alimentador en cable 3x4, 1x4, 1x6 AWG, por tuberia EMT 2", incluye elementos de fijacion. TD_N Ascensor 1	ml	23,00	69.362,00	1.595.326,00	23,00	1.595.326,00	-	-			-	-	23,00	1.595.326,00		100,00%
15.19.25	Alimentador en cable 3x4, 1x4, 1x6 AWG, por tuberia EMT 2", incluye elementos de fijacion. TD_N Ascensor 2	ml	58,00	69.362,00	4.022.996,00	58,00	4.022.996,00	-	-			-	-	58,00	4.022.996,00		100,00%
15.19.26	Alimentador en cable 3x4, 1x4, 1x6 AWG, por tuberia EMT 2", incluye elementos de fijacion. TD_N Ascensor 3	ml	40,00	69.362,00	2.774.480,00	40,00	2.774.480,00	-	-			-	-	40,00	2.774.480,00		100,00%
15.19.27	Alimentador en cable 3x4, 1x4, 1x6 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. TD_N Ascensor montacargas	ml	42,00	38.150,00	1.602.300,00	42,00	1.602.300,00	-	-			-	-	42,00	1.602.300,00		100,00%
15.19.28	Alimentador en cable 3x4, 1x4, 1x6 AWG, por tuberia EMT 2", incluye elementos de fijacion. TD_N Ascensor 4	ml	99,00	38.150,00	3.776.850,00	99,00	3.776.850,00	-	-			-	-	99,00	3.776.850,00		100,00%
15.19.29	Alimentador en cable 3x4, 1x4, 1x6 AWG, por tuberia EMT 2", incluye elementos de fijacion. TD_N Ascensor 5	ml	108,00	38.150,00	4.120.200,00	108,00	4.120.200,00	-	-			-	-	108,00	4.120.200,00		100,00%
15.19.30	Alimentador en cable 3x8, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. TD_N Bomba Jockey	ml	96,00	38.150,00	3.662.400,00	96,00	3.662.400,00	-	-			-	-	96,00	3.662.400,00		100,00%
15.19.31	Alimentador en cable 3x250, 1x250, 1x1/0 Al, por tuberia EMT 3". Incluye elementos de fijación. UPS	ml	23,00	75.716,00	1.741.468,00	23,00	1.741.468,00	-	-			-	-	23,00	1.741.468,00		100,00%
15.19.32	Alimentador en cable 3x8, 1x6, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. Tablero Regulado 1	ml	50,00	32.791,00	1.639.550,00	50,00	1.639.550,00	-	-			-	-	50,00	1.639.550,00		100,00%
15.19.33	Alimentador en cable 3x8, 1x6, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. Tablero Regulado 2	ml	6,00	32.791,00	196.746,00	6,00	196.746,00	-	-			-	-	6,00	196.746,00		100,00%
15.19.34	Alimentador en cable 3x8, 1x6, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. Tablero Regulado 3	ml	25,00	32.791,00	819.775,00	25,00	819.775,00	-	-			-	-	25,00	819.775,00		100,00%
15.19.35	Alimentador en cable 3x8, 1x6, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. Tablero Regulado 4	ml	55,00	32.791,00	1.803.505,00	55,00	1.803.505,00	-	-			-	-	55,00	1.803.505,00		100,00%
15.19.36	Alimentador en cable 3x8, 1x6, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. Tablero Regulado 5	ml	33,00	32.791,00	1.082.103,00	33,00	1.082.103,00	-	-			-	-	33,00	1.082.103,00		100,00%
15.19.37	Alimentador en cable 3x8, 1x6, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. Tablero Regulado 6	ml	43,00	32.791,00	1.410.013,00	43,00	1.410.013,00	-	-			-	-	43,00	1.410.013,00		100,00%
15.19.38	Interconexion con la planta de emergencia en 3x(3x500, 1x500, 1x250), Cu embebida en placa. A BCI	ml	95,00	267.687,00	25.430.265,00	95,00	25.430.265,00	-	-			-	-	95,00	25.430.265,00		100,00%
15.19.39	Interconexion con la planta de emergencia y transferencia en Electrobarra 3000 A	ml	18,00	29.698.710,00	534.576.780,00	18,00	534.576.780,00	-	-			-	-	18,00	534.576.780,00		100,00%
15.19.40	Cable de cobre desnudo, # 2 AWG, para puesta a tierra equipos, incluye grapas	ml	210,00	10.060,00	2.112.600,00	210,00	2.112.600,00	-	-			-	-	210,00	2.112.600,00		100,00%
15.20	TABLEROS E INTERRUPTORES		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.20.1	Tablero eléctrico de distribución de 30 circuitos trifásico para interruptores enchufables, con espacio para totalizador, 5 hilos (barras de neutro y tierra independientes), con puerta y chapa.	un	2,00	449.686,00	899.372,00	2,00	899.372,00	-	-			-	-	2,00	899.372,00		100,00%
15.20.2	Tablero eléctrico de distribución de 24 circuitos trifásico para interruptores enchufables, con espacio para totalizador, 5 hilos (barras de neutro y tierra independientes), con puerta y chapa.	un	9,00	342.639,00	3.083.751,00	9,00	3.083.751,00	-	-			-	-	9,00	3.083.751,00		100,00%
15.20.3	Tablero eléctrico de distribución de 12 circuitos trifásico para interruptores enchufables, con espacio para totalizador, 5 hilos (barras de neutro y tierra independientes), con puerta y chapa.	un	9,00	243.890,00	2.195.010,00	9,00	2.195.010,00	-	-			-	-	9,00	2.195.010,00		100,00%
15.20.4	Tablero eléctrico de distribución de 18 circuitos trifásico para interruptores enchufables, con espacio para totalizador, 5 hilos (barras de neutro y tierra independientes), con puerta y chapa.	un	8,00	283.594,00	2.268.752,00	8,00	2.268.752,00	-	-			-	-	8,00	2.268.752,00		100,00%
15.20.5	Cajilla para control de iluminacion en todas las zonas con teleruptores	un	9,00	342.638,00	3.083.742,00	9,00	3.083.742,00	-	-			-	-	9,00	3.083.742,00		100,00%
15.20.6	ML de 10 puestos, para A/A en terraza - 5P, tipo intemperie, para interruptor industrial, trifasico, barras de 500 A, con puerta y chapa.	un	2,00	2.793.490,00	5.586.980,00	2,00	5.586.980,00	-	-			-	-	2,00	5.586.980,00		100,00%
15.20.7	ML de 10 puestos ,para A/A en sotano, para interruptor industrial, trifásico, barras de 225 A, con puerta y chapa.	un	1,00	2.558.590,00	2.558.590,00	1,00	2.558.590,00	-	-			-	-	1,00	2.558.590,00		100,00%
15.20.8	ML de 8 puestos para AA en sotano, para interruptor industrial, trifásico, barras de 225 A, con puerta y chapa.	un	1,00	2.369.921,00	2.369.921,00	1,00	2.369.921,00	-	-			-	-	1,00	2.369.921,00		100,00%
15.20.9	SISTEMA UPS DE 50 KVA	un	1,00	83.300.000,00	83.300.000,00	1,00	83.300.000,00	-	-			-	-	1,00	83.300.000,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No. 007

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/05/2028
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/07/2022	31/07/2022

FECHA PRESENTE ACTA

16/08/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el da 16 de Agosto de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

	CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 007		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
15.20.10	Cofre o tablero para ubicar protecciones de entrada y salida de UPS	un	1,00	567.895,00	567.895,00	1,00	567.895,00	-	-			-	-	1,00	567.895,00		100,00%
15.20.11	Bypass de mantenimiento manual externo para la UPS, con todos sus accesorios.	un	1,00	1.350.876,00	1.350.876,00	1,00	1.350.876,00	-	-			-	-	1,00	1.350.876,00		100,00%
15.20.12	Interruptores tipo industrial de 3x40A, como mínimo 25KA a 240V, con unidades térmico ajustable de disparo	un	10,00	179.900,00	1.799.000,00	10,00	1.799.000,00	-	-			-	-	10,00	1.799.000,00		100,00%
15.20.13	Interruptores tipo industrial de 3x150A, como mínimo de 25KA a 240V, con unidades térmico ajustable de disparo.	un	1,00	564.480,00	564.480,00	1,00	564.480,00	-	-			-	-	1,00	564.480,00		100,00%
15.20.14	Interruptor automático (breaker) enchufable 1x20 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	400,00	12.617,00	5.046.800,00	400,00	5.046.800,00	-	-			-	-	400,00	5.046.800,00		100,00%
15.20.15	Interruptor automático (breaker) enchufable 2x20 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	2,00	18.023,00	36.046,00	2,00	36.046,00	-	-			-	-	2,00	36.046,00		100,00%
15.20.16	Interruptor automático (breaker) enchufable 2x40 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	2,00	16.949,00	33.898,00	2,00	33.898,00	-	-			-	-	2,00	33.898,00		100,00%
15.20.17	Interruptor automático (breaker) enchufable 3x30 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	7,00	41.155,00	288.085,00	7,00	288.085,00	-	-			-	-	7,00	288.085,00		100,00%
15.20.18	Interruptor automático (breaker) enchufable 3x40 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	1,00	41.155,00	41.155,00	1,00	41.155,00	-	-			-	-	1,00	41.155,00		100,00%
15.20.19	Interruptor automático (breaker) enchufable 3x60 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	1,00	56.670,00	56.670,00	1,00	56.670,00	-	-			-	-	1,00	56.670,00		100,00%
15.20.20	Interruptor automático (breaker) industrial 3x20 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	1,00	129.991,00	129.991,00	1,00	129.991,00	-	-			-	-	1,00	129.991,00		100,00%
15.20.21	Interruptor automático (breaker) industrial 3x30 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	12,00	129.919,00	1.559.028,00	12,00	1.559.028,00	-	-			-	-	12,00	1.559.028,00		100,00%
15.20.22	Interruptor automático (breaker) industrial 3x40 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	6,00	129.919,00	779.514,00	6,00	779.514,00	-	-			-	-	6,00	779.514,00		100,00%
15.20.23	Interruptor automático (breaker) industrial 3x60 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	3,00	152.742,00	458.226,00	3,00	458.226,00	-	-			-	-	3,00	458.226,00		100,00%
15.20.24	Interruptor automático (breaker) industrial 3x80 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	3,00	189.093,00	567.279,00	3,00	567.279,00	-	-			-	-	3,00	567.279,00		100,00%
15.20.25	Interruptor automático (breaker) industrial 3x100 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	1,00	189.093,00	189.093,00	1,00	189.093,00	-	-			-	-	1,00	189.093,00		100,00%
15.20.26	Interruptor automático (breaker) industrial 3x400 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	3,00	1.740.000,00	5.220.000,00	3,00	5.220.000,00	-	-			-	-	3,00	5.220.000,00		100,00%
15,21	BANDEJAS PORTACABLE Y CANALIZACIONES SUPERFICIALES		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE:		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.21.1	Bandeja portacables tipo malla de 5.4x150 mm, incluye accesorios y elementos de fijación.	ml	71,00	91.570,00	6.501.470,00	71,00	6.501.470,00	-	-			-	-	71,00	6.501.470,00		100,00%
15.21.2	Bandeja portacables tipo malla 300 mm, incluye accesorios y elementos de fijación.	ml	30,00	54.872,00	1.646.160,00	30,00	1.646.160,00	-	-			-	-	30,00	1.646.160,00		100,00%
15.21.3	Canalización superficial metálica 12x5 cm con división, incluye accesorios y elementos de fijación.	ml	272,00	36.287,00	9.870.064,00	272,00	9.870.064,00	-	-			-	-	272,00	9.870.064,00		100,00%
15,22	APANTALLAMIENTO		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.22.1	Punta Franklin 150 cms en acero inox	un	9,00	79.040,00	711.360,00	9,00	711.360,00	-	-			-	-	9,00	711.360,00		100,00%
15.22.2	Alambron 8 mm	ml	564,00	8.713,00	4.914.132,00	564,00	4.914.132,00	-	-			-	-	564,00	4.914.132,00		100,00%
15.22.3	Cable de Aluminio 2/0 AWG THHN instalado, para anillos, bajante e interconexiones.	ml	24,00	8.713,00	209.112,00	24,00	209.112,00	-	-			-	-	24,00	209.112,00		100,00%
15.22.4	Cable de Cobre 2/0 AWG AWG desnudo, desde la caja de conexión hasta la malla de tierra	ml	104,00	14.564,00	1.514.656,00	104,00	1.514.656,00	-	-			-	-	104,00	1.514.656,00		100,00%
15.22.5	Tubería PVC de 1", incluye accesorios prefabricados y soldadura PVC.	ml	468,00	7.782,00	3.641.976,00	468,00	3.641.976,00	-	-			-	-	468,00	3.641.976,00		100,00%
15.22.6	Varilla copperweld 5/8"x2,4 mts	un	8,00	38.889,00	311.112,00	8,00	311.112,00	4,00	155.556,00		-	4,00	155.556,00	4,00	155.556,00	50,00%	50,00%
15.22.7	Conector de compresión en aluminio Al-Al. Incluye la instalación y encintada	un	14,00	8.216,00	115.024,00	14,00	115.024,00	-	-		-	-	-	14,00	115.024,00		100,00%
15.22.8	Conector bimetálico tipo H1010 para empalme Al-Cu. Incluye la instalación y encintada	un	71,00	25.709,00	1.825.339,00	71,00	1.825.339,00	-	-		-	-	-	71,00	1.825.339,00		100,00%
15.22.9	Soldadura exotermica	un	21,00	26.486,00	556.206,00	21,00	556.206,00	8,00	211.888,00		-	8,00	211.888,00	13,00	344.318,00	38,10%	61,90%
15.22.10	Caja de inspección 30x30 cm en concreto	un	5,00	241.600,00	1.208.000,00	5,00	1.208.000,00	-	-		-	-	-	5,00	1.208.000,00		100,00%
15.22.11	Caja metálica de 15x15 cm aprox. Para empalme entre el cable Al 2/0 bajante y el cable Cu 2/0 de tierra.	un	37,00	31.705,00	1.173.085,00	37,00	1.173.085,00	-	-		-	-	-	37,00	1.173.085,00		100,00%
15,23	OTROS TRABAJOS		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
	SUMINISTRO DE HORAS HOMBRE, INCLUYENDO HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y DIRECCIÓN, PARA TODOS LOS RETIROS DE LA INSTALACIÓN SOBRANTE Y OTRAS OBRAS NO CONTEMPLADAS EN LOS ANTERIORES PUNTOS.		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.23.1	- Hora oficial	un	40,00	13.453,00	538.120,00	40,00	538.120,00	-	-			-	-	40,00	538.120,00		100,00%
15.23.2	- Hora ayudante	un	40,00	9.600,00	384.000,00	40,00	384.000,00	-	-			-	-	40,00	384.000,00		100,00%
15,24	INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES REDES EXTERNAS CABLEADO ESTRUCTURADO		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS N° 007

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NUMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/05/2028
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/07/2022	31/07/2022

FECHA PRESENTE ACTA

16/08/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el día 16 de Agosto de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : **IVAN JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de **A CONSTRUIR S.A.**, Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO**, supervisores del contrato y **ESTHER MENDOZA PEINADO**, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

			CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL			CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 007		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
15.24.1	Suministro e instalación de herraje para cámara de entrada 60X80 cm de telecomunicaciones subterranea; incluye: Ducteria PVC 4x2" Pesada tipo DB desde red de alimentación hasta Caja de Paso en muro y accesorios para la instalacion. (Prom - m x 12)	un	1,00	258.963,00	258.963,00	1,00	258.963,00	-	-			-	-	1,00	258.963,00		100,00%
15,25	INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES NIVEL SOTANO		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.25.1	Suministro e instalación salida para toma voz y datos en tuberia EMT de 1", caja 12x12 cm. Incluye tuberia EMT desde Rack, accesorios, soldadura EMT, guia en alambre 16 galvanizado y tapa floux. No incluye Aparatos. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	1,00	45.401,00	45.401,00	1,00	45.401,00	-	-			-	-	1,00	45.401,00		100,00%
15.25.2	Suministro e instalación salida para toma datos sencilla en tuberia EMT de 1", caja 12x12 cm. Incluye tuberia EMT desde Rack, accesorios, soldadura EMT, guia en alambre 16 galvanizado y tapa floux. No incluye Aparatos. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	1,00	45.401,00	45.401,00	1,00	45.401,00	-	-			-	-	1,00	45.401,00		100,00%
15,26	INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES NIVEL -1		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.26.1	Suministro e instalación salida para toma voz y datos en piso con tuberia PVC de 1", caja 4x4" doble fondo. Incluye tuberia PVC desde bandeja portacable, accesorios, soldadura PVC, guia en alambre 16 galvanizado y tapa floux. No incluye Aparatos. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	4,00	66.589,00	266.356,00	4,00	266.356,00	-	-			-	-	4,00	266.356,00		100,00%
15.26.2	Suministro e instalación salida para toma voz y datos en tuberia PVC de 1", caja 4x4" doble fondo. Incluye tuberia PVC desde bandeja portacable, accesorios, soldadura PVC, guia en alambre 16 galvanizado y tapa floux. No incluye Aparatos. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	74,00	45.401,00	3.359.674,00	74,00	3.359.674,00	-	-			-	-	74,00	3.359.674,00		100,00%
15.26.3	Suministro e instalación salida para toma datos sencilla en tuberia PVC de 1", caja 4x4" doble fondo. Incluye tuberia PVC desde bandeja portacable, accesorios, soldadura PVC, guia en alambre 16 galvanizado y tapa floux. No incluye Aparatos. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	7,00	45.401,00	317.807,00	7,00	317.807,00	-	-			-	-	7,00	317.807,00		100,00%
15.26.4	Suministro e instalación salida para Access Point sencilla en tuberia PVC de 3/4", caja 4x4". Incluye tuberia PVC desde bandeja portacable, accesorios, soldadura PVC, guia en alambre 16 galvanizado y tapa floux. No incluye Aparatos. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	3,00	84.596,00	253.788,00	3,00	253.788,00	-	-			-	-	3,00	253.788,00		100,00%
15.26.5	Suministro e instalación salida para Caja de Telecomunicaciones 20x20 cm con tuberia PVC de 3/4", caja 4x4". Incluye tuberia PVC desde buitrón en punto fijo, accesorios, soldadura PVC, guia en alambre 16 galvanizado y tapa floux. No incluye Aparatos.	un	3,00	74.142,00	222.426,00	3,00	222.426,00	-	-			-	-	3,00	222.426,00		100,00%
15.26.6	Suministro e instalación de Bandeja Metálica porta cable 30x5cm, incluye: anclaje y accesorios hasta buitrón cuarto técnico de telecomunicaciones	ml	96,00	89.175,00	8.560.800,00	96,00	8.560.800,00	-	-			-	-	96,00	8.560.800,00		100,00%
15.26.7	Suministro e instalación salida para TV con tuberia PVC de 3/4", caja 4x4". Incluye tuberia PVC desde buitrón en punto fijo, accesorios, soldadura PVC, guia en alambre 16 galvanizado y tapa floux. No incluye Aparatos. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	1,00	45.401,00	45.401,00	1,00	45.401,00	-	-			-	-	1,00	45.401,00		100,00%
15,27	INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES NIVEL 0		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.27.1	Suministro e instalación salida para toma voz y datos en piso con tuberia PVC de 1", caja 4x4" doble fondo. Incluye tuberia PVC desde bandeja portacable, accesorios, soldadura PVC, guia en alambre 16 galvanizado y tapa floux. No incluye Aparatos. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	1,00	39.810,00	39.810,00	1,00	39.810,00	-	-			-	-	1,00	39.810,00		100,00%
15.27.2	Suministro e instalación salida para toma voz y datos en tuberia PVC de 1", caja 4x4" doble fondo. Incluye tuberia PVC desde bandeja portacable, accesorios, soldadura PVC, guia en alambre 16 galvanizado y tapa floux. No incluye Aparatos. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	6,00	45.401,00	272.406,00	6,00	272.406,00	-	-			-	-	6,00	272.406,00		100,00%
15.27.3	Suministro e instalación salida para toma datos sencilla en tuberia PVC de 1", caja 4x4" doble fondo. Incluye tuberia PVC desde bandeja portacable, accesorios, soldadura PVC, guia en alambre 16 galvanizado y tapa floux. No incluye Aparatos. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	18,00	45.401,00	817.218,00	18,00	817.218,00	-	-			-	-	18,00	817.218,00		100,00%
15.27.4	Suministro e instalación salida para Access Point sencilla en tuberia PVC de 3/4", caja 4x4". Incluye tuberia PVC desde bandeja portacable, accesorios, soldadura PVC, guia en alambre 16 galvanizado y tapa floux. No incluye Aparatos. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	2,00	84.596,00	169.192,00	2,00	169.192,00	-	-			-	-	2,00	169.192,00		100,00%
15.27.5	Suministro e instalación salida para TV con tuberia PVC de 3/4", caja 4x4". Incluye tuberia PVC desde buitrón en punto fijo, accesorios, soldadura PVC, guia en alambre 16 galvanizado y tapa floux. No incluye Aparatos. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	15,00	45.401,00	681.015,00	15,00	681.015,00	-	-			-	-	15,00	681.015,00		100,00%
15,28	INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES NIVEL +1		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No. 007

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/07/2022	31/07/2022

FECHA PRESENTE ACTA

16/08/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.					VIGENCIA	
AMPAROS	Nº POLIZA		VR. ASEGURADO		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00		12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.940.883.448,00		12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.645.300.685,00		12/07/2021	A 11/05/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00		11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.940.883.448,00		12/07/2021	A 11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el da 16 de Agosto de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : **IVAN JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de **A CONSTRUIR S.A.**, Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO**, supervisores del contrato y **ESTHER MENDOZA PEINADO**, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

			CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL			CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 007		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
15.28.1	Suministro e instalación salida para toma voz y datos en tuberia PVC de 1", caja 4x4" doble fondo. Incluye tuberia PVC desde bandeja portacable, accesorios, soldadura PVC, guia en alambre 16 galvanizado y tapa floux. No incluye Aparatos. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	7,00	45.401,00	317.807,00	7,00	317.807,00	-	-			-	-	7,00	317.807,00		100,00%
15.28.2	Suministro e instalación salida para Access Point sencilla en tuberia PVC de 3/4", caja 4x4". Incluye tuberia PVC desde bandeja portacable, accesorios, soldadura PVC, guia en alambre 16 galvanizado y tapa floux. No incluye Aparatos. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	1,00	84.596,00	84.596,00	1,00	84.596,00	-	-			-	-	1,00	84.596,00		100,00%
15,29	INFRAESTRUCTURA VERTICAL TELECOMUNICACIONES		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.29.1	Suministro e instalación de Bandeja Metálica porta cable 60x8 cm, entre sotano 1 y Piso 4. Incluye: anclaje y accesorios.	ml	12,00	18.963,00	227.556,00	12,00	227.556,00	-	-			-	-	12,00	227.556,00		100,00%
15.29.2	troquel para salida voz y datos en canaleta 12x5 de presion	un	20,00	3.027,00	60.540,00	20,00	60.540,00	-	-			-	-	20,00	60.540,00		100,00%
15.29.3	Marcacion de gabinetes de seguridad, sensores, detectores, tuberias y demas elementos que conforman el sistema con cinta en Impresión Termínica	un	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1,00	1.500.000,00	-	-			-	-	1,00	1.500.000,00		100,00%
15.29.4	Documentacion " Diagramas de Conexión, Planos de Rutas" de toda la instalacion.	un	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1,00	2.500.000,00	-	-			-	-	1,00	2.500.000,00		100,00%
15.30	INFRAESTRUCTURA DETECCION DE INCENDIOS. TODOS LOS NIVELES		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.30.1	Suministro de salida para sensor de temperatura en cielo en tuberia EMT de 3/4", caja 4x4". Incluye tuberia EMT entre sensores; accesorios, soldadura, guia en alambre 16 galvanizado, caja y tapa metálica según detalles de plano. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	40,00	54.873,00	2.194.920,00	40,00	2.194.920,00	-	-			-	-	40,00	2.194.920,00		100,00%
15.30.2	Suministro de salida para sensor de humo foto electrico en cielo en tuberia EMT de 3/4", caja 4x4". Incluye tuberia EMT entre sensores; accesorios, soldadura, guia en alambre 16 galvanizado, caja y tapa metálica según detalles de plano. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	115,00	77.785,00	8.945.275,00	115,00	8.945.275,00	-	-			-	-	115,00	8.945.275,00		100,00%
15.30.3	Suministro de salida para sensor opto-térmico en cielo en tuberia EMT de 3/4", caja 4x4". Incluye tuberia EMT entre sensores; accesorios, soldadura, guia en alambre 16 galvanizado, caja y tapa metálica según detalles de plano. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	12,00	54.873,00	658.476,00	12,00	658.476,00	-	-			-	-	12,00	658.476,00		100,00%
15.30.4	Suministro de salida para estación manual en muro con tuberia EMT de 3/4", caja 4x4". Incluye tuberia EMT entre sensores; accesorios, soldadura, guia en alambre 16 galvanizado, caja y tapa metálica según detalles de plano. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	16,00	54.873,00	877.968,00	16,00	877.968,00	-	-			-	-	16,00	877.968,00		100,00%
15.30.5	Suministro de salida para sirena estroboscopica en muro con tuberia EMT de 3/4", caja 4x4". Incluye tuberia EMT entre sensores; accesorios, soldadura, guia en alambre 16 galvanizado, caja y tapa metálica según detalles de plano. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	15,00	54.873,00	823.095,00	15,00	823.095,00	-	-			-	-	15,00	823.095,00		100,00%
15.30.6	Suministro de salida para módulo direccionable en muro con tuberia EMT de 3/4", caja 4x4". Incluye tuberia EMT entre sensores; accesorios, soldadura, guia en alambre 16 galvanizado, caja y tapa metálica según detalles de plano. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	4,00	54.873,00	219.492,00	4,00	219.492,00	-	-			-	-	4,00	219.492,00		100,00%
15.30.7	Suministro de salida para receptor beam en muro con tuberia EMT de 3/4", caja 4x4". Incluye tuberia EMT entre sensores; accesorios, soldadura, guia en alambre 16 galvanizado, caja y tapa metálica según detalles de plano. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	4,00	78.873,00	315.492,00	4,00	315.492,00	-	-			-	-	4,00	315.492,00		100,00%
15.30.8	Suministro de salida para transmisor beam en muro con tuberia EMT de 3/4", caja 4x4". Incluye tuberia EMT entre sensores; accesorios, soldadura, guia en alambre 16 galvanizado, caja y tapa metálica según detalles de plano.	un	4,00	97.873,00	391.492,00	4,00	391.492,00	-	-			-	-	4,00	391.492,00		100,00%
15,31	INFRAESTRUCTURA SONIDO. NIVEL SOTANO		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.31.1	Suministro e instalación salida para Sonido en Muro en tuberia EMT de 3/4", caja 4x4". Incluye tuberia PVC desde cuarto de comunicaciones, accesorios, soldadura EMT, guia en alambre 16 galvanizado, caja y tapa lisa. No incluye cableado ni aparatos(Canalización solamente y cableado por aparte)	un	4,00	77.785,00	311.140,00	4,00	311.140,00	-	-			-	-	4,00	311.140,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS N[illegible]07

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NUMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/07/2022	31/07/2022

FECHA PRESENTE ACTA

16/08/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				VIGENCIA	
AMPAROS	Nº POLIZA		VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 16 de Agosto de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de **A CONSTRUIR S.A.**, Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO**, supervisores del contrato y **ESTHER MENDOZA PEINADO**, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 007		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
15,32	INFRAESTRUCTURA SONIDO Y VIDEO. NIVEL PISO -1		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.32.1	Suministro e instalación salida para Sonido en Cielo en tuberia PVC de 3/4", caja 4x4". Incluye tuberia PVC desde la bandeja portacable; accesorios, soldadura PVC, guia en alambre 16 galvanizado, caja y tapa lisa. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	21,00	54.873,00	1.152.333,00	21,00	1.152.333,00	-	-			-	-	21,00	1.152.333,00		100,00%
15.32.2	Suministro e instalación salida para Sonido en muro en tuberia PVC de 3/4", caja 4x4". Incluye tuberia PVC desde la bandeja portacable; accesorios, soldadura PVC, guia en alambre 16 galvanizado, caja y tapa lisa. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	2,00	51.578,00	103.156,00	2,00	103.156,00	-	-			-	-	2,00	103.156,00		100,00%
15.32.3	Suministro e instalación salida para Caja de Video en muro con tuberia PVC de 3/4", caja 4x4" doble fondo. Incluye tuberia PVC desde la bandeja portacable; accesorios, soldadura PVC, guia en alambre 16 galvanizado, caja y tapa floux. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	4,00	54.873,00	219.492,00	4,00	219.492,00	-	-			-	-	4,00	219.492,00		100,00%
15.32.4	Suministro e instalación salida para proyector en muro con tuberia PVC de 3/4", caja 4x4". Incluye tuberia PVC desde la bandeja portacable; accesorios, soldadura PVC, guia en alambre 16 galvanizado, caja y tapa lisa.	un	4,00	54.873,00	219.492,00	4,00	219.492,00	-	-			-	-	4,00	219.492,00		100,00%
15.32.5	Suministro e instalación salida para placa multimedia en tuberia PVC de 3/4", caja 4x4" doble fondo. Incluye tuberia PVC desde bandeja portacable, accesorios, soldadura PVC, guia en alambre 16 galvanizado y tapa lisa. No incluye Aparatos.	un	25,00	54.873,00	1.371.825,00	25,00	1.371.825,00	-	-			-	-	25,00	1.371.825,00		100,00%
15.32.6	Suministro e instalación salida para control de aire en cielo en tuberia PVC de 3/4", caja 4x4" doble fondo. Incluye tuberia PVC desde bandeja portacable, accesorios, soldadura PVC, guia en alambre 16 galvanizado y tapa lisa. No incluye Aparatos.	un	2,00	89.541,00	179.082,00	2,00	179.082,00	-	-			-	-	2,00	179.082,00		100,00%
15,33	INFRAESTRUCTURA SONIDO Y VIDEO. NIVEL PISO 0		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.33.1	Suministro e instalación salida para Sonido en Cielo en tuberia PVC de 3/4", caja 4x4". Incluye tuberia PVC desde la bandeja portacable; accesorios, soldadura PVC, guia en alambre 16 galvanizado, caja y tapa lisa.	un	13,00	54.873,00	713.349,00	13,00	713.349,00	-	-			-	-	13,00	713.349,00		100,00%
15.33.2	Suministro e instalación salida para Sonido en Muro en tuberia PVC de 3/4", caja 4x4". Incluye tuberia PVC desde la bandeja portacable; accesorios, soldadura PVC, guia en alambre 16 galvanizado, caja y tapa lisa.	un	2,00	51.578,00	103.156,00	2,00	103.156,00	-	-			-	-	2,00	103.156,00		100,00%
15.33.3	Suministro e instalación salida para Caja de Video en muro con tuberia PVC de 3/4", caja 4x4" doble fondo. Incluye tuberia PVC desde la bandeja portacable, accesorios, soldadura PVC, guia en alambre 16 galvanizado, caja y tapa floux.	un	4,00	54.873,00	219.492,00	4,00	219.492,00	-	-			-	-	4,00	219.492,00		100,00%
15.33.4	Suministro e instalación salida para microfono en muro con tuberia PVC de 3/4", caja 4x4" doble fondo. Incluye tuberia PVC desde la bandeja portacable; accesorios, soldadura PVC, guia en alambre 16 galvanizado, caja y tapa lisa.	un	4,00	65.874,00	263.496,00	4,00	263.496,00	-	-			-	-	4,00	263.496,00		100,00%
15,34	INFRAESTRUCTURA SONIDO Y VIDEO. NIVEL PISO +1		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.34.1	Suministro e instalación salida para Sonido en Cielo en tuberia PVC de 3/4", caja 4x4". Incluye tuberia PVC desde la bandeja portacable; accesorios, soldadura PVC, guia en alambre 16 galvanizado, caja y tapa lisa.	un	16,00	54.873,00	877.968,00	16,00	877.968,00	-	-			-	-	16,00	877.968,00		100,00%
15,35	INFRAESTRUCTURA CONTROLES DE ACCESO TODOS LOS NIVELES		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.35.1	Salidas para lectoras en tuberia EMT de 3/4" con sus uniones, curvas y cajas. No incluye cableado ni aparatos (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	38,00	89.873,00	3.415.174,00	38,00	3.415.174,00	-	-			-	-	38,00	3.415.174,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS N[redacted]7

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/07/2022	31/07/2022

FECHA PRESENTE ACTA

16/08/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				VIGENCIA	
AMPAROS	N° POLIZA		VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 16 de Agosto de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de **A CONSTRUIR S.A.**, Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **ANDRES ALMARALES MELO** y **LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO**, supervisores del contrato y **ESTHER MENDOZA PEINADO**, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

	CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 007		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
15.35.2	Suministro de salida para pulsador de salida en pared en tuberia EMT de 3/4", caja 4x4". Incluye tubería EMT desde la bandeja portacable; accesorios, soldadura, guia en alambre 16 galvanizado, caja y tapa lisa. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	20,00	112.584,00	2.251.680,00	20,00	2.251.680,00	-	-			-	-	20,00	2.251.680,00		100,00%
15.35.3	Suministro e instalación salida para Electroiman en dintel de la puerta con tuberia EMT de 3/4", caja 4x4" doble fondo. Incluye tuberia EMT desde la bandeja portacable; accesorios, soldadura, guia en alambre 16 galvanizado, caja y tapa floux. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	27,00	112.584,00	3.039.768,00	27,00	3.039.768,00	-	-			-	-	27,00	3.039.768,00		100,00%
15.35.4	Suministro de salida para Pulsador de liberación general en pared en tuberia PVC de 3/4", caja 4x4". Incluye tuberia PVC desde panel; accesorios, soldadura PVC, guia en alambre 16 galvanizado, caja y tapa lisa. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	2,00	54.873,00	109.746,00	2,00	109.746,00	-	-			-	-	2,00	109.746,00		100,00%
15.35.5	Suministro de salida para gabinete control acceso, incluye toma Regulada	un	11,00	175.830,00	1.934.130,00	11,00	1.934.130,00	-	-			-	-	11,00	1.934.130,00		100,00%
15,36	**INFRAESTRUCTURA CCTV TODOS LOS NIVELES**		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.36.1	Suministro de salida para cámara tipo domo en tuberia EMT de 3/4", caja 4x4" incluye tuberia EMT desde la bandeja portacable; accesorios, soldadura EMT, guia en alambre 16 galvanizado, caja y tapa lisa. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	24,00	89.873,00	2.156.952,00	24,00	2.156.952,00	-	-			-	-	24,00	2.156.952,00		100,00%
15.36.2	Suministro de salida para cámara tipo bala en tuberia EMT de 3/4", caja 4x4". Incluye tuberia EMT desde la bandeja portacable; accesorios, soldadura EMT, guia en alambre 16 galvanizado, caja y tapa lisa. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	8,00	89.873,00	718.984,00	8,00	718.984,00	-	-			-	-	8,00	718.984,00		100,00%
15.36.3	Suministro e instalacion de tuberia EMT 3/4 con sus respectivos accesorios como uniones, curvas, grapas, marcacion etc. Esta tuberia es la adicional a la incluida en las salidas anteriores	ML	400,00	15.496,00	6.198.400,00	400,00	6.198.400,00	-	-			-	-	400,00	6.198.400,00		100,00%
15,37	**INFRAESTRUCTURA EQUIPOS ELECTROMECANICOS**		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.37.1	Suministro e instalacion de tuberia EMT 3/4 con sus respectivos accesorios como uniones, curvas, grapas, marcacion etc.	ML	500,00	15.496,00	7.748.000,00	500,00	7.748.000,00	-	-			-	-	500,00	7.748.000,00		100,00%
15,38	**OTROS VARIOS**		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.38.3	Planta Electrica 600kVA efectivos Valledupar	un	1,00	248.500.000,00	248.500.000,00	1,00	248.500.000,00	-	-			-	-	1,00	248.500.000,00		100,00%
15.38.4	Transformador Baja-Baja Tipo Seco 225kVA, 208V/460V	un	2,00	25.000.000,00	50.000.000,00	2,00	50.000.000,00	-	-			-	-	2,00	50.000.000,00		100,00%
16,00	**ARQUITECTÓNICOS**				$ 38.912.168.484,21	$ -	$ 38.912.168.484,21		$ 392.542.152,80		$ -		$ 392.542.152,80		$ 38.519.626.331,41	1,01%	98,99%
16,10	**CUBIERTAS**		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
16.1.1	CUBERTA TIPO 1 (P7) PISO FLOTADO DE MADERA	m2	1.163,71	477.479,00	555.647.087,09	1.163,71	555.647.087,09	-	-			-	-	1.163,71	555.647.087,09		100,00%
16.1.2	CUBERTA TIPO 2 (P10) MULCH DE CORTEZA VEGETAL	m2	2.945,65	277.785,00	818.257.385,25	2.945,65	818.257.385,25	-	-			-	-	2.945,65	818.257.385,25		100,00%
16.1.3	CUBIERTA TIPO 3 (P11) VEGETACIÓN + SUSTRATO PARA VEGETACIÓN	m2	958,20	345.885,00	331.427.007,00	958,20	331.427.007,00	-	-			-	-	958,20	331.427.007,00		100,00%
16,20	**MAMPOSTERIA**		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
16.2.1	MURO BLOQUE nº5 DE ARCILLA 33X11,5X23 CM, E=11,5CM	M2	673,00	85.471,00	57.521.983,00	673,00	57.521.983,00	-	-			-	-	673,00	57.521.983,00		100,00%
16.2.2	MURO DRYWALL CON LÁMINA DE FIBROCEMENTO de 8mm 105/900 (8+90+8)	M2	4.343,00	106.524,00	462.633.732,00	4.343,00	462.633.732,00	-	-			-	-	4.343,00	462.633.732,00		100,00%
16.2.3	MURO DOBLE DRYWALL CON LÁMINA DE FIBROCEMENTO de 8mm 204/900 (8+90+8+90+8)	M2	2.055,00	244.994,00	503.462.670,00	2.055,00	503.462.670,00	-	-			-	-	2.055,00	503.462.670,00		100,00%
16.2.4	MURO BLOQUE DE CONCRETO ESTRUCTURAL RF 40X20X20 CM, E=20CM	M2	983,00	141.249,00	138.847.767,00	983,00	138.847.767,00	-	-			-	-	983,00	138.847.767,00		100,00%
16.2.5	TRASDOS DRYWALL 72,7/600 (12,7+60)	m2	445,54	53.746,00	23.945.992,84	445,54	23.945.992,84	-	-			-	-	445,54	23.945.992,84		100,00%
16.2.6	TRASDOS DRYWALL RH 72,7/600 (12,7+60)	m2	129,82	61.313,00	7.959.653,66	129,82	7.959.653,66	-	-			-	-	129,82	7.959.653,66		100,00%
16.2.7	MURO DRYWALL CON AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA 85,4/600 (12,7+60LR+12,7)	m2	266,41	159.929,00	42.606.684,89	266,41	42.606.684,89	-	-			-	-	266,41	42.606.684,89		100,00%
16.2.8	TRASDOS SALA DE GRABACIÓN 84,4/400 (60LR+12,7+LBM+12,7) CON LAMINA BETUN MODIFICADO	m2	567,50	185.277,00	105.144.697,50	567,50	105.144.697,50	-	-			-	-	567,50	105.144.697,50		100,00%
16.2.9	MURO SALA EVENTOS 216,7/400 (8+90LR+12,7+90LR+8+8)	m2	790,58	337.009,00	266.432.575,22	790,58	266.432.575,22	-	-			-	-	790,58	266.432.575,22		100,00%
16,30	**ENVOLVENTE Y CIERRES COMPUESTOS DE FACHADA**		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
16.3.1	C12 ENVOLVENTE EDIFICIO MEDIANTE MALLA METALICA METALSCREEN HUNTER DOUGLAS	M2	9.500,00	930.000,00	8.835.000.000,00	9.500,00	8.835.000.000,00	-	-			-	-	9.500,00	8.835.000.000,00		100,00%
16.3.2	F1/BLOQUE CONCRETO 40X30X20 + PAÑETE HIDROFUGO + PINTURA INTUMESCENTE	M2	1.141,75	351.399,00	401.209.808,25	1.141,75	401.209.808,25	-	-			-	-	1.141,75	401.209.808,25		100,00%
16.3.3	F2/BLOQUE CONCRETO 40X30X20+PAÑETE HIDROFUGO+PINTURA INTUMESCENTE+TRASDOS DRYWALL RH 72,7/600 (12,7+60)	M2	41,09	412.712,00	16.958.336,08	41,09	16.958.336,08	-	-			-	-	41,09	16.958.336,08		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No. 007

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2489104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/05/2028
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/07/2022	31/07/2022

FECHA PRESENTE ACTA

16/08/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el da 16 de Agosto de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de **A CONSTRUIR S.A.**, Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO**, supervisores del contrato y **ESTHER MENDOZA PEINADO**, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

		CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL				CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 007		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
16.6.1	C1 / TECHO EN MALLA METÁLICA HUNTER DOUGLAS METALSCREEN	M2	5.500,00	910.000,00	5.005.000.000,00	5.500,00	5.005.000.000,00	-	-			-	-	5.500,00	5.005.000.000,00		100,00%
16.6.2	C3 / CIELO SUSPENDIDO PANEL ACUSTICO MDF RANURADO TIPO D+002 DECUSTIK O SIMILAR	M2	32,01	587.786,00	18.815.029,86	32,01	18.815.029,86	-	-			-	-	32,01	18.815.029,86		100,00%
16.6.3	C5 / PINTURA VINILTEX RAL SEGUN PLANOS (C1+C5+C7+C9+C10+C11+C15)	M2	10.339,05	33.732,00	348.756.834,60	10.339,05	348.756.834,60	-	-			-	-	10.339,05	348.756.834,60		100,00%
16.6.4	C6 / PANELES DE ALUZINC DE HUNTER DOUGLAS TIPO 84R DE 150X25X0.6MM Y PASO 100MM + PINTURA POLIESTER	M2	543,53	200.066,00	108.741.872,98	543,53	108.741.872,98	-	-			-	-	543,53	108.741.872,98		100,00%
16.6.5	C7 / CIELO RASO SUSPENDIDO DOBLE DRYWALL CON AISLAMIENTO Y CUELGUES DE MUELLE (C7+C8)	M2	60,41	132.331,00	7.994.115,71	60,41	7.994.115,71	-	-			-	-	60,41	7.994.115,71		100,00%
16.6.6	C8 / CIELO SUSPENDIDO FONOABSORVENTE TIPO LAMITHEC 60X60	M2	33,42	253.891,00	8.485.037,22	33,42	8.485.037,22	-	-			-	-	33,42	8.485.037,22		100,00%
16.6.7	C9 / CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL RH	M2	416,41	62.996,00	26.232.164,36	416,41	26.232.164,36	-	-			-	-	416,41	26.232.164,36		100,00%
16.6.8	C10 / PAÑETE HIDROFUGO	M2	199,86	32.073,00	6.410.109,78	199,86	6.410.109,78	-	-			-	-	199,86	6.410.109,78		100,00%
16.6.9	C11 / CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL RESISTENTE AL FUEGO	M2	995,44	62.996,00	62.708.738,24	995,44	62.708.738,24	-	-			-	-	995,44	62.708.738,24		100,00%
16.6.10	C13 / PINTURA VINILTEX ANTIHUMEDAD	M2	8.286,27	31.295,00	259.318.819,65	8.286,27	259.318.819,65	-	-			-	-	8.286,27	259.318.819,65		100,00%
16.6.11	C15 / LOSA DE CONCRETO SOBRE PLACA NERVADA DE ACERO GALV. + CIELO RASO DRYWALL 15.9+2LR	M2	42,60	265.275,00	11.300.715,00	42,60	11.300.715,00	-	-			-	-	42,60	11.300.715,00		100,00%
16.6.12	C4 / CIELO RASO ACÚSTICO LMD-L 601 DE LINEAR GRID DE LINDNER	M2	933,60	688.132,00	642.440.035,20	933,60	642.440.035,20	-	-			-	-	933,60	642.440.035,20		100,00%
16.70	VARIOS		-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
16.7.1	CORTINA ALUMINIO ANODIZADO KRISKADECOR, ARAHUACA	M2	478,35	849.055,00	406.145.459,25	478,35	406.145.459,25	-	-			-	-	478,35	406.145.459,25		100,00%
16.7.2	CORTINA DE MALLA METALICA HUNTER DOUGLAS METALSCREEN	M2	450,00	917.951,00	413.077.950,00	450,00	413.077.950,00	-	-			-	-	450,00	413.077.950,00		100,00%
16.80	PUERTAS DE MADERA		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
16.8.1	Puerta de madera tipo PM1.1C/PM1.1Cs, de 1 hoja batiente,DE 1020 MM DE ANCHURA X 2100 MM DE ALTURA y 36 mm de espesor	UD	4,00	701.191,00	2.804.764,00	4,00	2.804.764,00	-	-			-	-	4,00	2.804.764,00		100,00%
16.8.2	Puerta de madera tipo PM1.1D/PM1.1Ds, de 1 hoja batiente, DE 1040 MM DE ANCHURA X 2100 MM DE ALTURA y 36 mm de espesor	UD	6,00	697.424,00	4.184.544,00	6,00	4.184.544,00	-	-			-	-	6,00	4.184.544,00		100,00%
16.8.3	Puerta de madera tipo TIPO PM1.2F/PM1.2Fs, de una hoja batiente, DE 1020 MM DE ANCHURA X 2600 MM DE ALTURA y 72 mm de espesor	UD	6,00	1.169.138,00	7.014.828,00	6,00	7.014.828,00	-	-			-	-	6,00	7.014.828,00		100,00%
16.8.4	Puerta de madera tipo PM1.3D/PM1.3Ds, de una hoja batiente,DE 840 MM DE ANCHURA X 2500 MM DE ALTURA y 36 mm de espesor	UD	9,00	734.806,00	6.613.254,00	9,00	6.613.254,00	-	-			-	-	9,00	6.613.254,00		100,00%
16.8.5	Puerta de madera tipo PM1.4F/PM1.4Fs, de una hoja batiente, DE 700 MM DE ANCHURA X 2100 MM DE ALTURA y 72 mm de espesor	UD	8,00	1.073.349,00	8.586.792,00	8,00	8.586.792,00	-	-			-	-	8,00	8.586.792,00		100,00%
16.8.6	Puerta de madera tipo PM1.5D, de una hoja batiente de 920X2100MM y tablero superior DE 920X1630 mm y 36 mm de espesor	UD	1,00	833.835,00	833.835,00	1,00	833.835,00	-	-			-	-	1,00	833.835,00		100,00%
16.8.7	Puerta corrediza de madera tipo PMC1.11Y/PMC1.11Ys, DE 1100mm de anchura x 2500 MM de altura y 36 mm de espesor	UD	19,00	954.492,00	18.135.348,00	19,00	18.135.348,00	-	-			-	-	19,00	18.135.348,00		100,00%
16.8.8	Puerta corrediza de madera tipo PMC1.6R/PMC1.6Rs, de 1050mm de anchura x 2500 MM de altura y 36 mm de espesor	UD	14,00	999.170,00	13.988.380,00	14,00	13.988.380,00	-	-			-	-	14,00	13.988.380,00		100,00%
16.8.9	Puerta corrediza de madera tipo PMC1.9Ps, de 2550 mm de anchura x 2540 MM de altura y 36 mm de espesor	UD	1,00	2.593.042,00	2.593.042,00	1,00	2.593.042,00	-	-			-	-	1,00	2.593.042,00		100,00%
16.8.10	Puerta corrediza de madera tipo PMC1.10P, de 2550 mm de anchura x 3730 MM de altura y 36 mm de espesor	UD	1,00	3.048.720,00	3.048.720,00	1,00	3.048.720,00	-	-			-	-	1,00	3.048.720,00		100,00%
16.8.11	Puerta de madera tipo PM1.17C, de 1 hoja batiente,DE 1020 MM DE ANCHURA X 2600 MM DE ALTURA y 36 mm de espesor	UD	1,00	822.878,00	822.878,00	1,00	822.878,00	-	-			-	-	1,00	822.878,00		100,00%
16.8.12	Puerta doble de madera tipo PM2.12G, de 2 hojas batientes, DE 2500 MM DE ANCHURA X 2800 MM DE ALTURA y 36 mm de espesor	UD	2,00	2.360.262,00	4.720.524,00	2,00	4.720.524,00	-	-			-	-	2,00	4.720.524,00		100,00%
16.8.13	Puerta doble de madera tipo PM2.11H, de 2 hojas batientes, DE 2200 MM DE ANCHURA X 2800 MM DE ALTURA y 72 mm de espesor	UD	6,00	3.634.019,00	21.804.114,00	6,00	21.804.114,00	-	-			-	-	6,00	21.804.114,00		100,00%
16.8.14	Puerta doble de madera tipo PM2.10K, de 2 hojas batientes, DE 2500 MM DE ANCHURA X 2800 MM DE ALTURA y 36 mm de espesor	UD	2,00	2.214.463,00	4.428.926,00	2,00	4.428.926,00	-	-			-	-	2,00	4.428.926,00		100,00%
16.8.15	Puerta de madera tipo PM1.13J/PM1.13Js, de 1 hoja batiente,DE 1020 MM DE ANCHURA X 2700 MM DE ALTURA y 36 mm de espesor	UD	16,00	1.299.521,00	20.792.336,00	16,00	20.792.336,00	-	-			-	-	16,00	20.792.336,00		100,00%
16.8.16	Puerta de madera tipo PM1.15L, de 1 hoja batiente,DE 1020 MM DE ANCHURA X 2100 MM DE ALTURA y 36 mm de espesor	UD	5,00	691.355,00	3.456.775,00	5,00	3.456.775,00	-	-			-	-	5,00	3.456.775,00		100,00%
16.8.17	Puerta plegable de paneles de madera tipo PM1.16, de 3750 mm de anchura x 2500 MM de altura y 36 mm de espesor	UD	4,00	3.166.781,00	12.667.124,00	4,00	12.667.124,00	-	-			-	-	4,00	12.667.124,00		100,00%
16.8.18	Puerta doble de madera, de gran tamaño, tipo PM2.14X_A y PM2.14X_B, de 2 hojas batientes, DE 1520 MM DE ANCHURA X 8950 MM DE ALTURA y 18 mm de espesor total	UD	4,00	14.046.751,00	56.187.004,00	4,00	56.187.004,00	-	-			-	-	4,00	56.187.004,00		100,00%
16.8.19	Conjunto de madera tipo CM1, de hojas batientes y fijo, DE 3605 MM DE ANCHURA X 3730 MM DE ALTURA y 18 mm de espesor	UD	1,00	3.514.338,00	3.514.338,00	1,00	3.514.338,00	-	-			-	-	1,00	3.514.338,00		100,00%
16.8.20	Conjunto de madera tipo CM2, de hojas batientes y fijo, DE 18735 MM DE ANCHURA X 3730 MM DE ALTURA y 18 mm de espesor	UD	1,00	17.496.671,00	17.496.671,00	1,00	17.496.671,00	-	-			-	-	1,00	17.496.671,00		100,00%
16.8.21	Conjunto de madera tipo CM3, de hojas batientes y fijos, DE 19401 MM DE ANCHURA X 1190 MM DE ALTURA máxima y 18mm de espesor	UD	1,00	4.364.716,00	4.364.716,00	1,00	4.364.716,00	-	-			-	-	1,00	4.364.716,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No. 007

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/07/2022	31/07/2022

FECHA PRESENTE ACTA

16/08/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				VIGENCIA	
AMPAROS	N° POLIZA		VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 16 de Agosto de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de **A CONSTRUIR S.A.**, Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **ANDRES ALMARALES MELO** y **LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO**, supervisores del contrato y **ESTHER MENDOZA PEINADO**, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 007		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
16.10	HERRERIA Y METALISTERIA		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
16.10.1	BARANDA TIPO H1	ML	668,71	331.399,00	221.609.825,29	668,71	221.609.825,29	-	-			-	-	668,71	221.609.825,29		100,00%
16.10.2	BARANDA TIPO H2	ML	30,40	840.286,00	25.544.694,40	30,40	25.544.694,40	-	-			-	-	30,40	25.544.694,40		100,00%
16.10.3	BARANDA TIPO H3	ML	276,10	1.418.482,00	391.642.880,20	276,10	391.642.880,20	-	-			-	-	276,10	391.642.880,20		100,00%
16.10.4	BARANDA TIPO H4	ML	156,14	2.314.151,00	361.331.537,14	156,14	361.331.537,14	-	-			-	-	156,14	361.331.537,14		100,00%
16.10.5	BARANDA TIPO H4B	ML	32,16	2.126.193,00	68.378.366,88	32,16	68.378.366,88	-	-			-	-	32,16	68.378.366,88		100,00%
16.10.6	BARANDA TIPO H5	ML	102,23	1.671.468,00	170.874.173,64	102,23	170.874.173,64	-	-			-	-	102,23	170.874.173,64		100,00%
16.10.7	BARANDA TIPO H5B	ML	44,92	341.708,00	15.349.523,36	44,92	15.349.523,36	-	-			-	-	44,92	15.349.523,36		100,00%
16.10.8	LAMINA GALVANIZADA LACADA PERFORADA TIPO H6	M2	81,94	783.000,00	62.520.220,00	81,94	62.520.220,00	-	-			-	-	81,94	62.520.220,00		100,00%
16.10.9	PASARELA TIPO H8	M2	63,53	932.874,00	59.265.485,22	63,53	59.265.485,22	-	-			-	-	63,53	59.265.485,22		100,00%
16.10.10	BARANDA TIPO H9	ML	47,12	409.745,00	19.307.184,40	47,12	19.307.184,40	-	-			-	-	47,12	19.307.184,40		100,00%
16.10.11	BARANDA TIPO H10	ML	114,99	957.260,00	110.075.327,40	114,99	110.075.327,40	-	-			-	-	114,99	110.075.327,40		100,00%
16.10.12	PASARELA TIPO H11	ML	225,25	1.513.284,00	340.867.221,00	225,25	340.867.221,00	-	-			-	-	225,25	340.867.221,00		100,00%
16.10.13	SOPORTE MALLA CAMUFLAJE TIPO A	UD	20,00	371.845,00	7.436.900,00	20,00	7.436.900,00	-	-			-	-	20,00	7.436.900,00		100,00%
16.10.14	SOPORTE MALLA CAMUFLAJE TIPO B	UD	20,00	357.276,00	7.145.520,00	20,00	7.145.520,00	-	-			-	-	20,00	7.145.520,00		100,00%
16.10.15	SOPORTE MALLA CAMUFLAJE TIPO C	UD	43,00	558.660,00	24.022.380,00	43,00	24.022.380,00	-	-			-	-	43,00	24.022.380,00		100,00%
16.10.16	SOPORTE MALLA CAMUFLAJE TIPO D	UD	7,00	346.251,00	2.423.757,00	7,00	2.423.757,00	-	-			-	-	7,00	2.423.757,00		100,00%
16.10.17	CASETON TIPO H12	UD	1,00	11.705.793,00	11.705.793,00	1,00	11.705.793,00	-	-			-	-	1,00	11.705.793,00		100,00%
16.10.18	CASETON TIPO H13	UD	1,00	12.942.806,00	12.942.806,00	1,00	12.942.806,00	-	-			-	-	1,00	12.942.806,00		100,00%
16.10.19	CASETON TIPO H14	UD	1,00	6.956.570,00	6.956.570,00	1,00	6.956.570,00	-	-			-	-	1,00	6.956.570,00		100,00%
16.10.20	CASETON TIPO H15	UD	1,00	6.534.894,00	6.534.894,00	1,00	6.534.894,00	-	-			-	-	1,00	6.534.894,00		100,00%
16.10.21	ESCALERA DE GATO	ML	62,92	4.103.483,00	258.191.150,36	62,92	258.191.150,36	-	-			-	-	62,92	258.191.150,36		100,00%
16.10.22	ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO H17	M2	3,33	4.794.357,00	15.965.208,81	3,33	15.965.208,81	-	-			-	-	3,33	15.965.208,81		100,00%
16,11	VIDRIO		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
16.11.1	PUERTA DE VIDRIO DOBLE EN FACHADA SISTEMA SPIDER	UD	2,00	3.990.410,00	7.980.820,00	2,00	7.980.820,00	-	-			-	-	2,00	7.980.820,00		100,00%
16.11.2	CIERRE DE VIDRIO INTERIOR FLOTANTE DE P1* SISTEMA SPIDER	M2	96,87	1.006.724,00	97.521.353,88	96,87	97.521.353,88	-	-			-	-	96,87	97.521.353,88		100,00%
16.11.3	CIERRE DE VIDRIO INTERIOR SISTEMA PIE DE AMIGO ACERO INOXIDABLE	M2	68,27	755.181,00	51.556.206,87	68,27	51.556.206,87	-	-			-	-	68,27	51.556.206,87		100,00%
16.11.4	PUERTA DE VIDRIO DOBLE EN CIERRE DE VIDRIO SISTEMA PIE DE AMIGO	UD	3,00	4.923.147,00	14.769.441,00	3,00	14.769.441,00	-	-			-	-	3,00	14.769.441,00		100,00%
16.11.5	PUERTA DE VIDRIO SIMPLE EN CIERRE DE VIDRIO SISTEMA PIE DE AMIGO 2.60X0.90M	UD	3,00	3.123.314,00	9.369.942,00	3,00	9.369.942,00	-	-			-	-	3,00	9.369.942,00		100,00%
16.11.6	PUERTA DE VIDRIO SIMPLE EN CIERRE DE VIDRIO SISTEMA PIE DE AMIGO 2.10X0.90M	UD	1,00	2.917.191,00	2.917.191,00	1,00	2.917.191,00	-	-			-	-	1,00	2.917.191,00		100,00%
16.11.7	PUERTA CORREDERA AUTOMATICA	UD	2,00	29.831.050,00	59.662.100,00	2,00	59.662.100,00	-	-			-	-	2,00	59.662.100,00		100,00%
16.11.8	VENTANA V4	M2	4,80	978.225,00	4.695.480,00	4,80	4.695.480,00	-	-			-	-	4,80	4.695.480,00		100,00%
16.11.9	VENTANA V6 y V6B	M2	4,50	1.127.691,00	5.074.609,50	4,50	5.074.609,50	-	-			-	-	4,50	5.074.609,50		100,00%
16.12	TRANSPORTE VERTICAL		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
16.12.1	ASCENSOR 1 y 2. Principal	ud	2,00	243.914.560,00	487.829.120,00	2,00	487.829.120,00	-	-			-	-	2,00	487.829.120,00		100,00%
16.12.2	ASCENSOR 3 y 4. Principal	ud	2,00	212.094.560,00	424.189.120,00	2,00	424.189.120,00	-	-			-	-	2,00	424.189.120,00		100,00%
16.12.3	ASCENSOR 5	ud	1,00	207.099.560,00	207.099.560,00	1,00	207.099.560,00	-	-			-	-	1,00	207.099.560,00		100,00%
16.12.4	MONTACARGAS	ud	1,00	468.399.560,00	468.399.560,00	1,00	468.399.560,00	-	-			-	-	1,00	468.399.560,00		100,00%
16.12.5	ESCALERA MECANICA	ud	3,00	354.666.227,00	1.063.998.681,00	3,00	1.063.998.681,00	-	-			-	-	3,00	1.063.998.681,00		100,00%
16,13	MOBILIARIO		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
16.13.1	SILLA APILABLE	UD	840,00	608.564,00	511.193.760,00	840,00	511.193.760,00	-	-			-	-	840,00	511.193.760,00		100,00%
16.13.2	CARRO PARA SILLA	UD	21,00	1.273.564,00	26.744.844,00	21,00	26.744.844,00	-	-			-	-	21,00	26.744.844,00		100,00%
16.13.3	GRADERIAS TELESCOPICAS / RETRACTILES	UD	1,00	457.146.700,00	457.146.700,00	1,00	457.146.700,00	-	-			-	-	1,00	457.146.700,00		100,00%
16,14	EQUIPAMIENTO		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
16.14.1	CABINA SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE	M2	69,40	955.271,00	66.295.807,40	69,40	66.295.807,40	-	-			-	-	69,40	66.295.807,40		100,00%
16.14.2	ESPEJOS EN BAÑOS	M2	57,78	267.922,00	15.480.533,16	57,78	15.480.533,16	-	-			-	-	57,78	15.480.533,16		100,00%
16.14.3	ENCIMERA-MESON EN BAÑOS FONDO 60 CM EN CUARZO	ML	33,16	616.188,00	20.432.794,08	33,16	20.432.794,08	-	-			-	-	33,16	20.432.794,08		100,00%
16.14.4	ENCIMERA-MESON EN BAÑOS FONDO 51 CM EN CUARZO	ML	2,64	560.265,00	1.479.099,60	2,64	1.479.099,60	-	-			-	-	2,64	1.479.099,60		100,00%
16.14.5	BARRA FIJA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE	UD	12,00	140.225,00	1.682.700,00	12,00	1.682.700,00	-	-			-	-	12,00	1.682.700,00		100,00%
16.14.6	BARRA ABATIBLE DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE	UD	10,00	650.225,00	6.502.250,00	10,00	6.502.250,00	-	-			-	-	10,00	6.502.250,00		100,00%
16.14.7	ESPEJO DISCAPACITADOS INCLINADO, MARCO ACERO INOXIDABLE	UD	12,00	356.254,00	4.275.048,00	12,00	4.275.048,00	-	-			-	-	12,00	4.275.048,00		100,00%
16.14.8	SILLA BAÑO PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE	UD	2,00	1.124.195,00	2.248.390,00	2,00	2.248.390,00	-	-			-	-	2,00	2.248.390,00		100,00%
16.14.9	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO EN ACERO INOXIDABLE	UD	47,00	180.225,00	8.470.575,00	47,00	8.470.575,00	-	-			-	-	47,00	8.470.575,00		100,00%
16.14.10	DISPENSADOR DE JABON EN ENCIMERA-MESÓN EN ACERO INOXIDABLE	UD	35,00	250.225,00	8.757.875,00	35,00	8.757.875,00	-	-			-	-	35,00	8.757.875,00		100,00%
16.14.11	DISPENSADOR DE JABON EN PARED EN ACERO INOXIDABLE	UD	12,00	270.225,00	3.242.700,00	12,00	3.242.700,00	-	-			-	-	12,00	3.242.700,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 007

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/07/2022	31/07/2022

FECHA PRESENTE ACTA

16/08/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				VIGENCIA	
AMPAROS	N° POLIZA		VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 16 de Agosto de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de **A CONSTRUIR S.A.**, Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **ANDRES ALMARALES MELO** y **LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO**, supervisores del contrato y **ESTHER MENDOZA PEINADO**, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

			CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL			CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 007		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
16.14.12	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA EN ACERO INOXIDABLE	UD	33,00	370.225,00	12.217.425,00	33,00	12.217.425,00	-	-			-	-	33,00	12.217.425,00		100,00%
16.14.13	RECIPIENTE DE DESECHOS	UD	33,00	432.283,00	14.265.339,00	33,00	14.265.339,00	-	-			-	-	33,00	14.265.339,00		100,00%
16,15	URBANIZACION		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
16.15.1	SUBBASE GRANULAR COMPACTADA	M3	1.042,39	94.477,00	98.481.880,03	1.042,39	98.481.880,03	-	-			-	-	1.042,39	98.481.880,03		100,00%
16.15.2	BASE GRANULAR B-200	M3	1.547,17	86.677,00	134.104.054,09	1.547,17	134.104.054,09	-	-			-	-	1.547,17	134.104.054,09		100,00%
16.15.3	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFÁLTICO	M2	4.925,06	105.218,00	518.204.963,08	4.925,06	518.204.963,08	-	-			-	-	4.925,06	518.204.963,08		100,00%
16.15.4	LOSA 3000 PSI REFORZADO CON MALLA 7MM 15X15 M-262	m2	1.203,89	122.231,00	147.152.678,59	1.203,89	147.152.678,59	-	-			-	-	1.203,89	147.152.678,59		100,00%
16.15.5	CONCRETO PARA CIMENTACION LUMINARIAS	m3	1,87	683.981,00	1.279.044,47	1,87	1.279.044,47	-	-			-	-	1,87	1.279.044,47		100,00%
16.15.6	GEOTEXTIL NT 1600	m2	11.200,00	7.682,00	86.038.400,00	11.200,00	86.038.400,00	10.149,94	77.971.839,08		-	10.149,94	77.971.839,08	1.050,06	8.066.560,92	90,62%	9,38%
16.15.7	POLIETILENO (impermeabilizacion de piso)	m2	10.530,47	5.382,00	56.674.989,54	10.530,47	56.674.989,54	4.916,90	26.462.755,80		-	4.916,90	26.462.755,80	5.613,57	30.212.233,74	46,69%	53,31%
16.15.8	ANDEN DE CONCRETO REFORZADO ESCOBEADO	m2	1.121,89	90.743,00	101.803.664,27	1.121,89	101.803.664,27	-	-		-	-	-	1.121,89	101.803.664,27		100,00%
16.15.9	BOLARDO LUMINOSO	UD	42,00	1.190.714,00	50.009.988,00	42,00	50.009.988,00	-	-		-	-	-	42,00	50.009.988,00		100,00%
16.15.10	PINTADO DE LINEAS Y FLECHAS CALLE	m2	257,00	36.382,00	9.350.174,00	257,00	9.350.174,00	-	-		-	-	-	257,00	9.350.174,00		100,00%
16.15.11	ADOQUIN EN HUELLAS 8X15X15cm	m2	37,44	96.562,00	3.615.281,28	37,44	3.615.281,28	-	-		-	-	-	37,44	3.615.281,28		100,00%
16.15.12	ADOQUIN EN CONTRAHUELLAS 6x10x15cm	m2	19,89	85.312,00	1.696.855,68	19,89	1.696.855,68	-	-		-	-	-	19,89	1.696.855,68		100,00%
16.15.13	ARENA ESPACIO PUBLICO	M2	1.656,60	116.005,00	192.173.883,00	1.656,60	192.173.883,00	-	-		-	-	-	1.656,60	192.173.883,00		100,00%
16.15.14	LISTONES DE CONCRETO 14,5 X 4,5 X 120 CM PREFABRICADO EN SITIO	m2	3.227,00	82.288,00	265.543.376,00	3.227,00	265.543.376,00	-	-		-	-	-	3.227,00	265.543.376,00		100,00%
16.15.15	CIERRE DE TUBOS DE ACERO GALVANIZADO LACADO DE 2"	m2	77,60	434.294,00	33.701.214,40	77,60	33.701.214,40	-	-		-	-	-	77,60	33.701.214,40		100,00%
16.15.16	BORDILLO PARA ALCORQUE TIPO A	m	30,00	90.160,00	2.704.800,00	30,00	2.704.800,00	-	-		-	-	-	30,00	2.704.800,00		100,00%
16.15.17	BORDILLO PARA ALCORQUE TIPO B	m	61,60	116.807,00	7.195.311,20	61,60	7.195.311,20	-	-		-	-	-	61,60	7.195.311,20		100,00%
16.15.18	BORDILLO BARRERA RECTANGULAR	m	1.232,73	83.283,00	102.665.452,59	1.232,73	102.665.452,59	-	-		-	-	-	1.232,73	102.665.452,59		100,00%
16.15.19	BORDILLO BARRERA RECTO	m	288,10	75.255,00	21.680.965,50	288,10	21.680.965,50	-	-		-	-	-	288,10	21.680.965,50		100,00%
16.15.20	EMPRADIZACION (inc capa de 20cm de tierra negra)	m2	5.820,00	48.600,00	282.852.000,00	5.820,00	282.852.000,00	-	-		-	-	-	5.820,00	282.852.000,00		100,00%
16.15.21	CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA E=10cm	M2	47,26	47.361,00	2.239.226,06	47,26	2.239.226,06	-	-		-	-	-	47,26	2.239.226,06		100,00%
16.15.22	AISLAMIENTO DE EPS	m2	2.000,00	66.132,00	132.264.000,00	2.000,00	132.264.000,00	-	-		-	-	-	2.000,00	132.264.000,00		100,00%
16.15.23	MURO BLOQUE DE CONCRETO ESTRUCTURAL RF 40X20X20 CM, E=20CM	M2	163,35	164.711,00	26.905.541,85	163,35	26.905.541,85	-	-		-	-	-	163,35	26.905.541,85		100,00%
16.15.24	ARBOL MANGIFERA	UD	130,00	342.958,00	44.584.540,00	130,00	44.584.540,00	-	-		-	-	-	130,00	44.584.540,00		100,00%
16.15.25	LOSA CONCRETO CALZADA	M2	3.009,23	193.085,00	581.037.174,55	3.009,23	581.037.174,55	-	-		-	-	-	3.009,23	581.037.174,55		100,00%
16.15.26	MORTERO IMPERMEABILIZADO CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE MANTO ASFÁLTICO CON FOIL DE ALUMINIO	M2	3.173,00	149.190,00	473.379.870,00	3.173,00	473.379.870,00	-	-		-	-	-	3.173,00	473.379.870,00		100,00%
16.15.27	ADOQUIN FRANJA PODOTÁCTIL SOBRE BASE DE ARENA	ML	450,20	66.136,00	29.774.427,20	450,20	29.774.427,20	-	-		-	-	-	450,20	29.774.427,20		100,00%
16.15.28	FILTROS Y DRENAJES PARA OBRAS DE URBANISMOS	ML	973,00	52.135,00	50.727.355,00	973,00	50.727.355,00	-	-		-	-	-	973,00	50.727.355,00		100,00%
16,16	MOBILIARIO DE URBANIZACION		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
16.16.1	MODULO DE PUESTO DE VENTA EN ACERPO INOXIDABLE	ud	15,00	18.908.683,00	283.630.245,00	15,00	283.630.245,00	-	-			-	-	15,00	283.630.245,00		100,00%
16.16.2	BANCO TIPO ESCOFET TWIG O SIMILAR	UD	27,00	6.841.071,00	184.708.917,00	27,00	184.708.917,00	-	-			-	-	27,00	184.708.917,00		100,00%
16.16.3	BINOCULARES V1C	UD	4,00	14.041.071,00	56.164.284,00	4,00	56.164.284,00	-	-			-	-	4,00	56.164.284,00		100,00%
17,00	**CONTROL DE ACCESO**				**$ 606.257.400,00**	**$ -**	**$ 606.257.400,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 606.257.400,00**		**100,00%**
17.1	AENP2000: Dispensador de tiquetes de papel con QR, Incluye sistema para usuarios mensuales, pantalla grafica de 7", mensajes de voz, logo entrada retroluminado. Control con PC industrial de alto rendimiento.	und	2,00	20.468.000,00	40.936.000,00	2,00	40.936.000,00	-	-		-	-	-	2,00	40.936.000,00		100,00%
17.2	AEXP2000: Verificador de salida tiquetes de papel con QR Incluye sistema para usuarios mensuales, pantalla grafica de 7", mensajes de voz, logo salida retroluminado. Control con PC industrial de alto rendimiento	und	2,00	18.623.500,00	37.247.000,00	2,00	37.247.000,00	-	-		-	-	-	2,00	37.247.000,00		100,00%
17.3	Barrera de control de acceso para alto trafico con brazo de 3 metros. Con sensor óptico en inductivo incluido INCLEYE UNIDADES DE SEGURUDAD DE RESPALDO	und	4,00	8.211.000,00	32.844.000,00	4,00	32.844.000,00	-	-		-	-	-	4,00	32.844.000,00		100,00%
17.4	Sistema de reconocimiento de placas para carriles de entrada	und	4,00	5.890.500,00	23.562.000,00	4,00	23.562.000,00	-	-		-	-	-	4,00	23.562.000,00		100,00%
17.5	PC Industrial Fanless Disco de estado solido 256GB, RAM 8GB Bajo consumo con licencia Windows 8 profesional	und	1,00	3.748.500,00	3.748.500,00	1,00	3.748.500,00	-	-		-	-	-	1,00	3.748.500,00		100,00%
17.6	Licencia de uso software SOFTPARK (Uso en dos equipos modelo cliente-servidor)	und	1,00	2.879.800,00	2.879.800,00	1,00	2.879.800,00	-	-		-	-	-	1,00	2.879.800,00		100,00%
17.7	Lector para tarjeta inteligente Mifare® Codificación tarjetas mensuales	und	1,00	487.900,00	487.900,00	1,00	487.900,00	-	-		-	-	-	1,00	487.900,00		100,00%
17.8	UPS de protección PC TRIPP LITE 550 VA	und	1,00	452.200,00	452.200,00	1,00	452.200,00	-	-		-	-	-	1,00	452.200,00		100,00%
17.9	Sistema de guiado por medio de video para estacionamiento según planos y cupos, 1 Displays externo, 4 Displays internos de direccionamiento.	und	1,00	464.100.000,00	464.100.000,00	1,00	464.100.000,00	-	-		-	-	-	1,00	464.100.000,00		100,00%
	SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 99.504.376.203,93**		**$ 99.504.376.203,93**		**$ 15.968.438.614,31**		**$ 3.421.407.081,72**		**$ 19.389.845.696,03**		**$ 80.114.530.507,90**	**19,49%**	**80,51%**
18.1	**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PAGA)**	UD	1,00	244.836.361,00	244.836.361,00	1,00	244.836.361,00		[illegible]		[illegible]	0,47	115.792.801,07	0,53	129.043.559,93	47,29%	52,71%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS [redacted]7

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				VIGENCIA	
AMPAROS	N° POLIZA		VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/07/2022	31/07/2022

FECHA PRESENTE ACTA

16/08/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 16 de Agosto de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de **A CONSTRUIR S.A.**, Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **ANDRES ALMARALES MELO** y **LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO**, supervisores del contrato y **ESTHER MENDOZA PEINADO**, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 007 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 007		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
18.2	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	UD	1,00	255.487.000,00	255.487.000,00	1,00	255.487.000,00	0,44	113.543.834,48			0,44	113.543.834,48	0,56	141.943.165,52	44,44%	55,56%
18.3	PLAN DE MANEO DE TRÁNSITO (PMT)	UD	1,00	240.132.394,00	240.132.394,00	1,00	240.132.394,00	-	-			-	-	1,00	240.132.394,00		100,00%
18.4	MUSEOGRÁFICO		1,00	5.873.295.717,80	5.873.295.717,80	1,00	5.873.295.717,80	-	-			-	-	1,00	5.873.295.717,80		100,00%
18.5	MOBILIARIO		1,00	560.770.816,20	560.770.816,20	1,00	560.770.816,20	-	-			-	-	1,00	560.770.816,20		100,00%
18.6	EQUIPOS ESPECIALES PARA ESCENARIO Y TELONERIA		1,00	2.270.279.850,00	2.270.279.850,00	1,00	2.270.279.850,00	-	-			-	-	1,00	2.270.279.850,00		100,00%
18.7	TRAMITES ANTE OPERADORES DE SERVICIOS		1,00	17.177.745,00	17.177.745,00	1,00	17.177.745,00	-	-			-	-	1,00	17.177.745,00		100,00%
	SUB TOTAL OTROS COSTOS				9.461.979.884,00	-	9.461.979.884,00		$ 229.336.636		$ -		$ 229.336.636	-	$ 9.232.643.248	2,42%	97,58%
	VALOR COSTOS DIRECTOS CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO				$ 99.504.376.203,93	$	99.504.376.203,93	$	15.968.438.614,31	$	3.421.407.091,72	$	19.389.845.696,03	$	80.114.530.507,90		
VALOR COSTOS ADMMINISTRATIVOS A.I.U 30%	ADMINISTRACION(21%)				$ 20.895.919.003	A.I.U 30%	$ 21.890.962.764,86	A.I.U 30%	$ 3.353.372.109,01	A.I.U 30%	$ 718.495.487	A.I.U 30%	$ 4.071.867.596	A.I.U 30%	$ 16.824.051.407	PORCENTAJES	
	IMPREVISTOS(4%)				$ 3.980.175.048		$ 4.975.218.810,20		$ 638.737.544,57		$ 136.856.283		$ 775.593.828		$ 3.204.581.220	EJECUTADO DEL CONTRATO	POR EJECUTAR DEL CONTRATO
	UTILIDAD(5%)				$ 4.975.218.810		$ 2.985.131.286,12		$ 798.421.930,72		$ 171.070.354		$ 969.492.285		$ 4.005.726.525		
	TOTAL AIU				$ 29.851.312.861		$ 29.851.312.861,18		$ 4.790.531.584,29		$ 1.026.422.125		$ 5.816.953.709		$ 24.034.359.152	19,49%	80,51%
	VALOR COSTO DE CONSTRUUCCIÓN DEL PROYECTO				$ 129.355.689.065,11	$	129.355.689.065	$	20.758.970.198,60	$	4.447.829.206,24	$	25.206.799.404,84	$	104.148.889.660,27		
	VALOR COSTO TOTAL DE CONSTRUUCCIÓN DEL PROYECTO				$ 138.817.668.949,11	$	138.817.668.949	$	20.988.306.834,16	$	4.447.829.206,24	$	25.436.136.040,39	$	113.381.532.908,72		

RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR BRUTO
VALOR DEL CONTRATO	$ 138.817.668.949,11
ANTICIPO ENTREGADO	N/A

DESCRIPCIÓN	VALOR BRUTO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO	% FACTURADO
ACTA PARCIAL DE OBRAS No 1	$ 989.095.946,99	$ -	$ 989.095.946,99	0,71%
ACTA PARCIAL DE OBRAS No 2	$ 1.084.213.519,92	$ -	$ 1.084.213.519,92	0,78%
ACTA PARCIAL DE OBRAS No 3	$ 6.749.214.394,91	$ -	$ 6.749.214.394,91	4,86%
ACTA PARCIAL DE OBRAS No 4	$ 1.664.472.075,32	$ -	$ 1.664.472.075,32	1,20%
ACTA PARCIAL DE OBRAS No 5	$ 9.409.019.956,18	$ -	$ 9.409.019.956,18	6,78%
ACTA PARCIAL DE OBRAS No 6	$ 1.092.290.940,84			0,79%
PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRAS No 7	$ 4.447.829.206,24		$ 4.447.829.206,24	3,20%
ACUMULADO TOTAL	$ 25.436.136.040,39	$ -	$ 25.436.136.040,39	18,32%
SALDOS POR FACTURAR	$ 113.381.532.908,72	$ -	$ 113.381.532.908,7	81,68%

VALOR A PAGAR EN LETRAS PRESENTE ACTA:

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES, OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRAS PLASMADAS EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL No 7, SON PRODUCTO DE LAS MEDICIONES DE CAMPO, VERIFICADAS EN CONJUNTO ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORIA, POR CONSIGUIENTE LAS CANTIDADES SON RESPONSABILIDAD DE AMBAS PARTES

Vo Bo

Nombre: LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO
Supervisor del contrato
Gobernación del Cesar

Vo Bo

Nombre: ANDRES ALMARALES MELO
Supervisor del contrato
Gobernación del Cesar

Nombre: IVAN JIMENEZ AGUIRRE
Representante Legal
A CONSTRUIR S.A.
Contratista

Nombre: JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS
Representante Legal
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR
Interventoria

Nombre: ESTHER MENDOZA PEINADO
Secretaria de Infraestructura
Gobernación del Cesar

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 07

PERIODO DE EVALUACIÓN

Del 1 al 31 de julio de 2022

OBJETO DELCONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115405-0		CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007

CAPÍTULO	7	ITEM	7.1	Estructura metálica (Incluye platina, pernos y demás)	TOTAL

















ELEMENTO	CANTIDADES REQUERIDA	CANTIDADES FABRICADA	CANTIDADES EN OBRA	PESO (Kg)		Kg
Platinas ventanas						2229,20
Plantillas COL N+0.50						881,32
COL2-1	10	5	5	3.903,80		19519,01
VS-1	54	48	47	443,57		20847,89
VS-4	25	16	6	371,44		2228,66
VS-5	46	46	46	371,44		17086,39
VS-6	6	6	6	371,44		2228,66
VS-7	13	12	12	2054,45		24653,42
VS-8	19	19	7	429,82		3008,73
VS-9	7	7	7	371,44		2600,10
VS-10	4	4	4	371,44		1485,77
VS-13	2	2	2	2112,83		4225,66
VIGA-1	1	1	1	14251,59		14251,59
VIGA-2	1	1	1	14242,55		14242,55
VIGA-3	1	1	1	8845,59		8845,59
VIGA-4	1	1	1	8836,55		8836,55
VIGA-5	1	1	1	16078,69		16078,69
VIGA-6	1	1	1	16375,27		16375,27
VIGA-7	1	1	1	15112,48		15112,48
VIGA-8	1	1	1	15339,46		15339,46
VIGA-9	10	10	10	6004,05		60040,55
VIGA-10	2	2	2	4512,69		9025,39
VIGA-11	1	1	1	13756,89		13756,89
VIGA-12	1	1	1	13460,37		13460,37
VIGA-13	1	1	1	12208,33		12208,33
VIGA-14	1	1	1	11981,35		11981,35
VIGA-15	1	1	1	11776,68		11776,68
VIGA-16	1	1	1	11819,12		11819,12
VIGA-17	1	1	1	11295,66		11295,66
VIGA-18	1	1	1	11420,86		11420,86
VIGA-19	1	1	1	11861,54		11861,54
VIGA-20	1	1	1	11799,60		11799,60
VIGA-21	1	1	1	18974,48		18974,48
VIGA-22	1	1	1	18912,54		18912,54
VIGA-23	1	1	1	12299,35		12299,35
VIGA-24	1	1	1	11885,28		11885,28
VIGA-25	1	1	1	8397,86		8397,86
VIGA-26	1	1	1	8293,53		8293,53
VIGA-27	1	1	1	11524,80		11524,80
VIGA-28	1	1	1	11771,26		11771,26
VIGA-29	1	1	1	13257,08		13257,08
VIGA-30	1	1	1	13545,92		13545,92
VIGA-31	1	1	1	8050,89		8050,89
VIGA-32	1	1	1	7946,56		7946,56
VIGA-33	1	1	1	11773,87		11773,87
VIGA-34	1	1	1	11524,80		11524,80
VIGA-35	3	3	3	3085,69		9257,06
VIGA-36	3	3	3	3085,69		9257,06
VIGA-37	1	1	1	3085,69		3085,69
VIGA-38	1	1	1	3085,69		3085,69
VIGA-39	1	1	1	3122,48		3122,48
VIGA-40	1	1	1	3122,48		3122,48
VIGA-41	1	1	1	3122,48		3122,48
VIGA-42	1	1	1	3122,48		3122,48
VIGA-43	1	1	1	3159,27		3159,27
VIGA-44	1	1	1	3159,27		3159,27
VIGA-51	1	1	1	7133,78		7133,78
VIGA-52	1	1	1	7154,52		7154,52
VIGA-53	1	1	1	7154,52		7154,52
VIGA-54	1	1	1	7302,99		7302,99
VIGA-63	1	1	1	6019,90		6019,90
VIGA-64	1	1	1	6018,05		6018,05
VIGA-69	1	1	1	9176,40		9176,40
VIGA-70	1	1	1	9165,71		9165,71
VIGA-71	1	1	1	4494,91		4494,91
VIGA-72	1	1	1	4556,87		4556,87





SUBTOTAL	680353,20
CANTIDAD ACTA Parcial No 1	
CANTIDAD ACTA Parcial No 2	
CANTIDAD ACTA Parcial No 3	
CANTIDAD ACTA Parcial No 4	
CANTIDAD ACTA Parcial No 5	397.779,11
CANTIDAD ACTA Parcial No 6	
CANTIDAD ACTA Parcial No 7	282.574,09
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	680.353,20
CANTIDAD CONTRACTUAL	2.727.649,61
PENDIENTE POR PAGAR	2.047.296,41
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	282.574,09

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 07


PERIODO DE EVALUACIÓN

Del 1 al 31 de julio de 2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007

CAPÍTULO	7	ITEM	7.1	Estructura metálica (Incluye platina, pernos y demás)	TOTAL

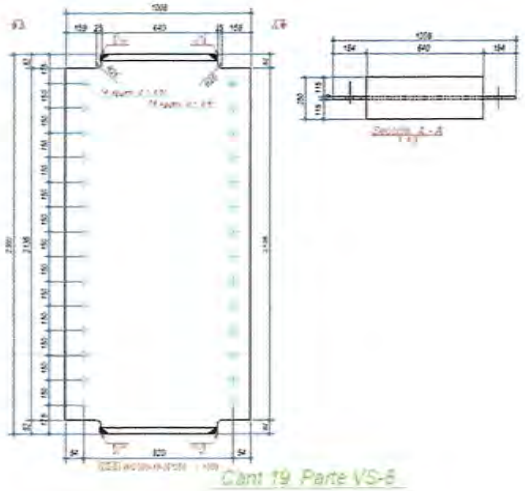

REFERENCIA:
Plano de taller M3 (VIGAS SUELTAS VS-8 AL VS-13 REV.3)

ELEMENTO	DIMENSIONES Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	DENSIDAD (kg/m3)	CANTD POR ELEMENTO	PESO UNIT (kg)	CANTD	PESO (kg)
VS-8								
Alma	2224	1008	19	7850	1	334,36	7	2.340,54
Patín	250	640	38	7850	2	47,73	7	668,19
								-
								-
								-
							SUBTOTAL	3.008,73
							SUBTOTAL	3.008,73

Nombre: PABLO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 07

PERIODO DE EVALUACIÓN

Del 1 al 31 de julio de 2022

OBJETO DEL CNTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A. — NIT 890115406-0 — CONTRATO No. 2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR — NIT 901493970-2 — CONTRATO No. 2021050007

CAPÍTULO	7	ITEM	7.1	Estructura metálica (Incluye platina, pernos y demás)	TOTAL

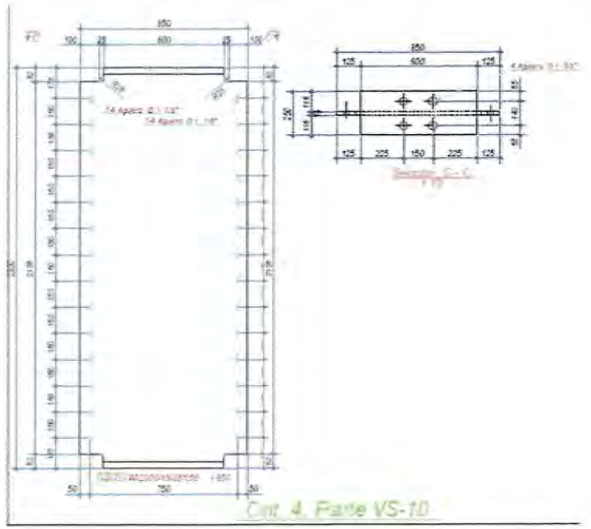

REFERENCIA:
Plano de taller M3 (VIGAS SUELTAS VS-8 AL VS-13 REV.3)

ELEMENTO	DIMENSIONES Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	DENSIDAD (kg/m3)	CANTD POR ELEMENTO	PESO UNIT (kg)	CANTD	PESO (kg)
VS-10								
Alma	2224	850	19	7850	1	281,95	4	1127,81
Patín	250	600	38	7850	2	44,75	4	357,96
								-
								-
								-
							SUBTOTAL	1.485,77
							SUBTOTAL	1.485,77

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 07


PERIODO DE EVALUACIÓN

Del 1 al 31 de julio de 2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007

CAPÍTULO	7	ITEM	7.1	Estructura metálica (Incluye platina, pernos y demás)

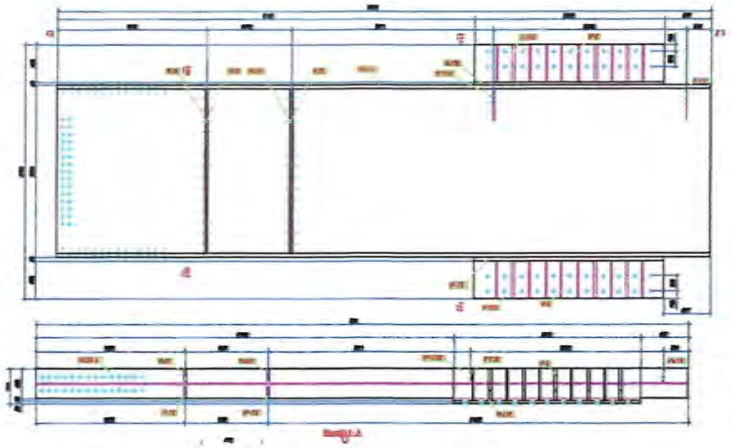

REFERENCIAS:
Plano de taller M7 (VIGA-3 REV. 01)
Viga correspondiente al nodo 34

ELEMENTO	DIMENSIONES Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	DENSIDAD (kg/m3)	CANTD POR ELEMENTO	PESO UNIT (kg)	CANTD	PESO (kg)
VIGA-3								
P-6	500	425	25	7850	20	41.70	1	834.06
P-70	2198	189	32	7850	4	104.35	1	417.42
P-118	400	120	12	7850	2	4.52	1	9.04
P-178	2300	500	50	7850	2	451.38	1	902.75
P-179	2300	475	50	7850	2	428.81	1	857.61
VCA2-1								
Alma	8000	2200	22	7850	1	3039.52	1	3039.52
Patín	8000	400	50	7850	2	1256.00	1	2512.00
Perno 1 1/4"	900	31.25		7850	22	5.42	2	238.43
Arandelas 1 1/4"	4	31.25		7850	22	0.07	2	3.08
Tuercas 1 1/4"	25	31.25		7850	44	0.36	2	31.68
Valor cobrado acta 5								
								-
								-
								-
						SUBTOTAL		8.845.59
						Valor cobrado acta 5		-646.79
						SUBTOTAL		8.198.80

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 07


PERIODO DE EVALUACIÓN

Del 1 al 31 de julio de 2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002	
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007	

CAPÍTULO	7	ITEM	7.1	Estructura metálica (Incluye platina, pernos y demás)	TOTAL

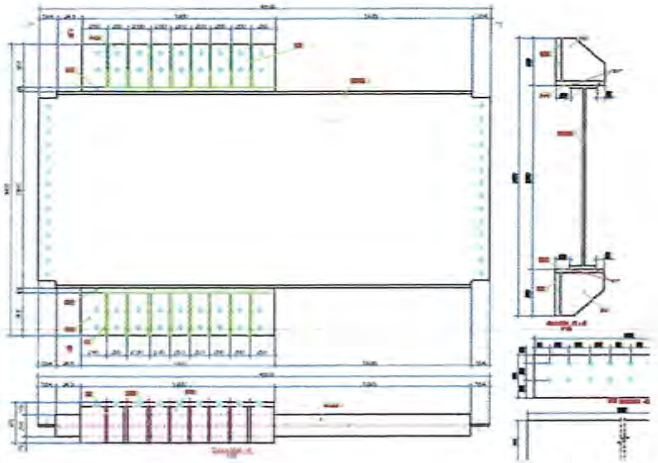

REFERENCIAS:
Plano de taller M14 (VIGA-10 REV. 01)
Vigas correspondientes al nodo 34

ELEMENTO	DIMENSIONES Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	DENSIDAD (kg/m3)	CANTD POR ELEMENTO	PESO UNIT (kg)	CANTD	PESO (kg)
VIGA-10								
P-6	500	425	25	7850	16	41,70	2	1334,50
P-12	1900	500	50	7850	2	372,88	2	1491,50
P-13	1900	475	50	7850	2	354,23	2	1416,93
VCA1-1								
Alma	4508	2224	19	7850	1	1495,35	2	2990,69
Patín	4508	250	38	7850	2	336,18	2	1344,74
Perno 1 1/4"	900	31,25		7850	18	5,42	4	390,15
Arandelas 1 1/4"	4	31,25		7850	18	0,07	4	5,04
Tuercas 1 1/4"	25	31,25		7850	36	0,36	4	51,84
								-
								-
							SUBTOTAL	9.025,39
							SUBTOTAL	9.025,39

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 07


PERIODO DE EVALUACIÓN

Del 1 al 31 de julio de 2022

OBJETO DEL CNTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOI	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007

CAPÍTULO	7	ITEM	7.1	Estructura metálica (Incluye platina, pernos y demás)	TOTAL

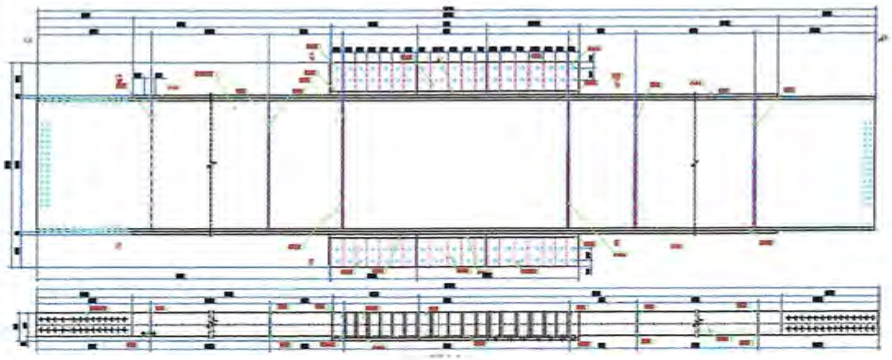

REFERENCIAS:
Plano de taller M27 (VIGA-22 REV. 01)
Viga correspondiente al nodo 35

ELEMENTO	DIMENSIONES Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	DENSIDAD (kg/m3)	CANTD POR ELEMENTO	PESO UNIT (kg)	CANTD	PESO (kg)
VIGA-22								
P-8	500	425	25	7850	38	41,70	1	1.584,72
P-28	2198	189	19	7850	4	61,96	1	247,84
P-70	2198	189	32	7850	6	104,35	1	626,12
P-100	2198	189	19	7850	2	61,96	1	123,92
P-114	1175	475	50	7850	2	219,06	1	438,13
P-130	1175	500	50	7850	2	230,59	1	461,19
P-131	1238	475	50	7850	4	230,81	1	923,24
P-166	1238	500	50	7850	4	242,96	1	971,83
PLB-3	10850	400	50	7850	1	1.703,45	1	1.703,45
PLB-4	10850	400	50	7850	1	1.703,45	1	1.703,45
VCA2-11								
Alma	13700	2200	22	7850	1	5.205,18	1	5.205,18
Patín	13700	400	50	7850	2	2.150,90	1	4.301,80
Perno 1 1/4"	900	31,25		7850	12	5,42	2	130,05
Arandelas 1 1/4"	4	31,25		7850	12	0,07	2	1,68
Tuercas 1 1/4"	25	31,25		7850	24	0,36	2	17,28
Perno 1 1/2"	900	37,50		7850	14	7,15	4	400,51
Arandelas 1 1/2"	4	37,50		7850	14	0,10	4	5,60
Tuercas 1 1/2"	25	37,50		7850	28	0,59	4	66,55
							SUBTOTAL	18.912,54
							SUBTOTAL	18.912,54

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 07

PERIODO DE EVALUACIÓN

Del 1 al 31 de julio de 2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007

CAPÍTULO	7	ITEM	7.1	Estructura metálica (Incluye platina, pernos y demás)	TOTAL



REFERENCIAS:
Plano de taller M28 (VIGA-23 REV. 01)
Viga correspondiente al nodo 33

ELEMENTO	DIMENSIONES Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	DENSIDAD (kg/m3)	CANTD POR ELEMENTO	PESO UNIT (kg)	CANTD	PESO (kg)
VIGA-23								
P-6	500	425	25	7850	38	41,70	1	1.584,72
P-70	2198	189	32	7850	1	104,35	1	104,35
P-100	2198	189	19	7850	1	61,96	1	61,96
P-137	2198	189	19	7850	3	61,96	1	185,88
P-173	2197	189	19	7850	3	61,93	1	185,80
P-174	2760	475	50	7850	2	514,57	1	1.029,14
P-175	2760	500	50	7850	2	541,65	1	1.083,30
P-176	670	475	50	7850	4	124,91	1	499,65
P-177	670	500	50	7850	4	131,49	1	525,95
VCA2-13								
Alma	9350	2200	22	7850	1	3.552,44	1	3.552,44
Patín	9350	400	50	7850	2	1.467,95	1	2.935,90
Perno 1 1/4"	900	31,25		7850	28	5,42	2	303,45
Arandelas 1 1/4"	4	31,25		7850	28	0,07	2	3,92
Tuercas 1 1/4"	25	31,25		7850	56	0,36	2	40,32
Perno 1 1/2"	900	37,50		7850	6	7,15	4	171,65
Arandelas 1 1/2"	4	37,50		7850	6	0,10	4	2,40
Tuercas 1 1/2"	25	37,50		7850	12	0,59	4	26,52
							SUBTOTAL	12.299,35
							SUBTOTAL	12.299,35

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 07


PERIODO DE EVALUACIÓN

Del 1 al 31 de julio de 2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007

CAPÍTULO	7	ITEM	7.1	Estructura metálica (Incluye platina, pernos y demás)	TOTAL

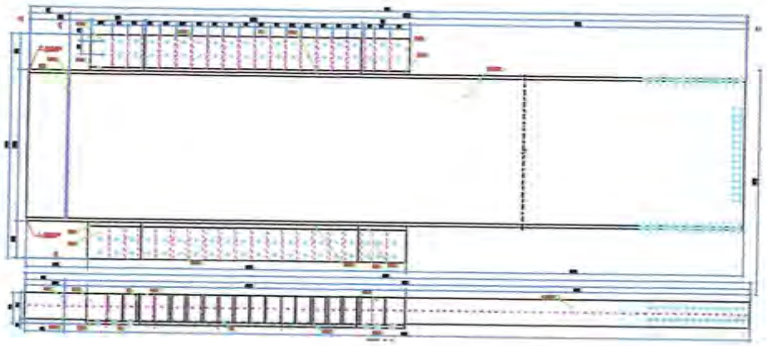

REFERENCIAS:
Plano de taller M29 (VIGA-24 REV. 01)
Viga correspondiente al nodo 33

ELEMENTO	DIMENSIONES Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	DENSIDAD (kg/m3)	CANTD POR ELEMENTO	PESO UNIT (kg)	CANTD	PESO (kg)
VIGA-24								
P-6	500	425	25	7850	38	41,70	1	1.584,72
P-26	2198	189	19	7850	1	61,96	1	61,96
P-100	2198	189	19	7850	1	61,96	1	61,96
P-174	2760	475	50	7850	2	514,57	1	1.029,14
P-175	2760	500	50	7850	2	541,65	1	1.083,30
P-176	670	475	50	7850	4	124,91	1	499,65
P-177	670	500	50	7850	4	131,49	1	525,95
VCA2-13								
Alma	9350	2200	22	7850	1	3.552,44	1	3.552,44
Patín	9350	400	50	7850	2	1.467,95	1	2.935,90
Perno 1 1/4"	900	31,25		7850	28	5,42	2	303,45
Arandelas 1 1/4"	4	31,25		7850	28	0,07	2	3,92
Tuercas 1 1/4"	25	31,25		7850	56	0,36	2	40,32
Perno 1 1/2"	900	37,50		7850	6	7,15	4	171,65
Arandelas 1 1/2"	4	37,50		7850	6	0,10	4	2,40
Tuercas 1 1/2"	25	37,50		7850	12	0,59	4	28,52
							SUBTOTAL	11.885,28
							SUBTOTAL	11.885,28

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 07

PERIODO DE EVALUACIÓN

Del 1 al 31 de julio de 2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007

CAPÍTULO	7	ITEM	7.1	Estructura metálica (Incluye platina, pernos y demás)	TOTAL



REFERENCIAS:
Plano de taller M30 (VIGA-25 REV. 01)
Viga correspondiente al nodo 33

ELEMENTO	DIMENSIONES Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	DENSIDAD (kg/m3)	CANTD POR ELEMENTO	PESO UNIT (kg)	CANTD	PESO (kg)
VIGA-25								
P-6	500	425	25	7850	20	41,70	1	834,06
P-18	2199	299	12	7850	1	61,94	1	61,94
P-70	2198	189	32	7850	4	104,35	1	417,42
P-100	2198	189	19	7850	2	61,96	1	123,92
P-128	2300	475	50	7850	2	428,81	1	857,61
P-178	2300	500	50	7850	2	451,38	1	902,75
VCA2-14								
Alma	7100	2200	22	7850	1	2.697,57	1	2.697,57
Patin	7100	400	50	7850	2	1.114,70	1	2.229,40
Perno 1 1/4"	900	31,25		7850	22	5,42	2	238,43
Arandelas 1 1/4"	4	31,25		7850	22	0,07	2	3,08
Tuercas 1 1/4"	25	31,25		7850	44	0,36	2	31,68
								-
								-
							SUBTOTAL	8.397,86

							SUBTOTAL	8.397,86

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 07

PERIODO DE EVALUACIÓN

Del 1 al 31 de julio de 2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007

CAPÍTULO	7	ITEM	7.1	Estructura metálica (Incluye platina, pernos y demás)	TOTAL



REFERENCIAS:
Plano de taller M31 (VIGA-26 REV. 01)
Viga correspondiente al nodo 33

ELEMENTO	DIMENSIONES Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	DENSIDAD (kg/m3)	CANTD POR ELEMENTO	PESO UNIT (kg)	CANTD	PESO (kg)
VIGA-26								
P-6	500	425	25	7850	20	41,70	1	834,06
P-28	2198	189	19	7850	1	61,96	1	61,96
P-70	2198	189	32	7850	3	104,35	1	313,06
P-100	2198	189	19	7850	2	61,96	1	123,92
P-128	2300	475	50	7850	2	428,81	1	857,61
P-178	2300	500	50	7850	2	451,38	1	902,75
VCA2-14								
Alma	7100	2200	22	7850	1	2.697,57	1	2.697,57
Patin	7100	400	50	7850	2	1.114,70	1	2.229,40
Perno 1 1/4"	900	31,25		7850	22	5,42	2	238,43
Arandelas 1 1/4"	4	31,25		7850	22	0,07	2	3,08
Tuercas 1 1/4"	25	31,25		7850	44	0,36	2	31,68
								-
								-
							SUBTOTAL	8.293,53
							SUBTOTAL	8.293,53

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 07

PERIODO DE EVALUACIÓN

Del 1 al 31 de julio de 2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR						
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002	
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007	
CAPÍTULO	7	ITEM	7.1	Estructura metálica (Incluye platina, pernos y demás)			TOTAL

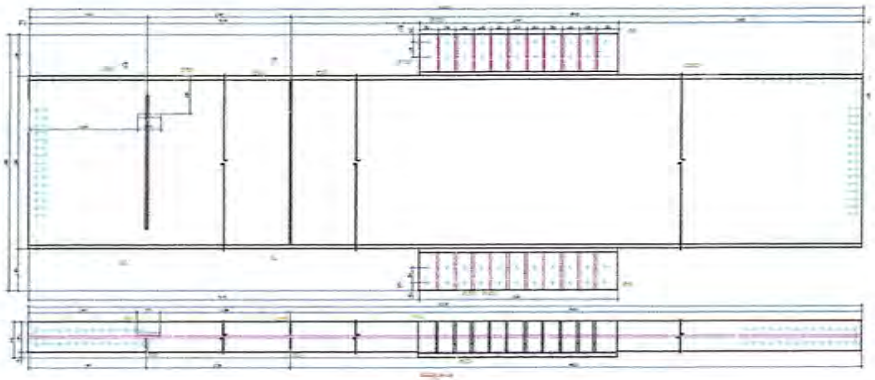

REFERENCIAS:
Plano de taller M32 (VIGA-27 REV. 01)
Viga correspondiente al nodo 36

ELEMENTO	DIMENSIONES Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	DENSIDAD (kg/m3)	CANTD POR ELEMENTO	PESO UNIT (kg)	CANTD	PESO (kg)
VIGA-27								
AN-1	270	50	6	7850	2	0,66	1	1,32
P-6	500	425	25	7850	20	41,70	1	834,06
P-28	2198	189	19	7850	2	61,96	1	123,92
P-78	1776	189	25	7850	1	65,87	1	65,87
P-128	2300	475	50	7850	2	428,61	1	857,61
P-178	2300	500	50	7850	2	451,38	1	902,75
VCA2-9								
Alma	12200	2200	22	7850	1	4.635,27	1	4.635,27
Patin	12200	400	50	7850	2	1.915,40	1	3.830,80
Perno 1 1/4"	900	31,25		7850	22	5,42	2	238,43
Arandelas 1 1/4"	4	31,25		7850	22	0,07	2	3,08
Tuercas 1 1/4"	25	31,25		7850	44	0,36	2	31,68
								-
								-
							SUBTOTAL	11.524,80
							SUBTOTAL	11.524,80

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 07

PERIODO DE EVALUACIÓN

Del 1 al 31 de julio de 2022

OBJETO DEL CNTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR						
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002	
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007	
CAPÍTULO	7	ITEM	7.1	Estructura metálica (Incluye platina, pernos y demás)			TOTAL



REFERENCIAS:
Plano de taller M33 (VIGA-28 REV. 01)
Viga correspondiente al nodo 36

ELEMENTO	DIMENSIONES Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	DENSIDAD (kg/m3)	CANTD POR ELEMENTO	PESO UNIT (kg)	CANTD	PESO (kg)
VIGA-28								
P-6	500	425	25	7850	20	41,70	1	834,06
P-28	2198	189	19	7850	1	61,96	1	61,96
P-78	1776	189	25	7850	1	65,87	1	65,87
P-100	2198	189	19	7850	1	61,96	1	61,96
P-128	2300	475	50	7850	2	428,81	1	857,61
P-137	2198	189	19	7850	2	61,96	1	123,92
P-173	2197	189	19	7850	2	61,93	1	123,86
P-178	2300	500	50	7850	2	451,38	1	902,75
VCA2-9								
Alma	12200	2200	22	7850	1	4.635,27	1	4.635,27
Patín	12200	400	50	7850	2	1.915,40	1	3.830,80
Perno 1 1/4"	900	31,25		7850	22	5,42	2	238,43
Arandelas 1 1/4"	4	31,25		7850	22	0,07	2	3,08
Tuercas 1 1/4"	25	31,25		7850	44	0,36	2	31,68
								-
							SUBTOTAL	11.771,26

							SUBTOTAL	11.771,26

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 07


PERIODO DE EVALUACIÓN

Del 1 al 31 de julio de 2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007

CAPÍTULO	7	ITEM	7.1	Estructura metálica (incluye platina, pernos y demás)	TOTAL

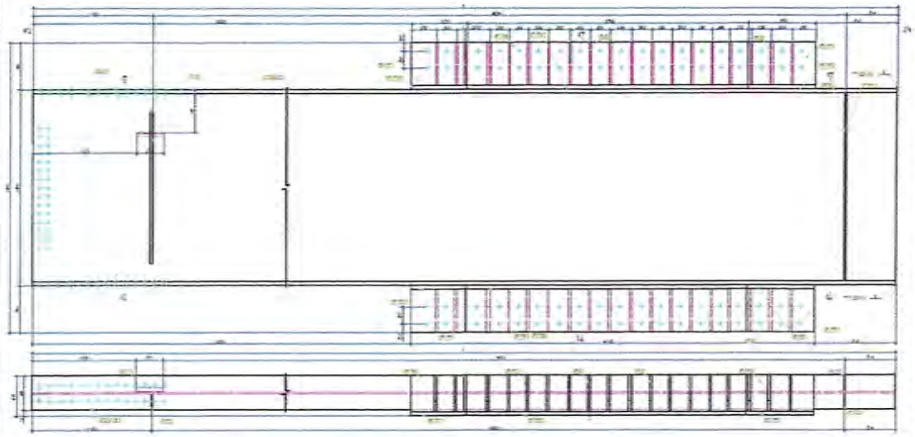

REFERENCIAS:
Plano de taller M34 (VIGA-29 REV. 01)
Viga correspondiente al nodo 33

ELEMENTO	DIMENSIONES Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	DENSIDAD (kg/m3)	CANTD POR ELEMENTO	PESO UNIT (kg)	CANTD	PESO (kg)
VIGA-29								
AN-1	270	50	6	7850	2	0,66	1	1,32
P-6	500	425	25	7850	38	41,70	1	1.584,72
P-28	2198	189	19	7850	1	61,96	1	61,96
P-78	1776	189	25	7850	1	65,87	1	65,87
P-100	2198	189	19	7850	1	61,96	1	61,96
P-174	2760	475	50	7850	2	514,57	1	1.029,14
P-175	2760	500	50	7850	2	541,65	1	1.083,30
P-176	670	475	50	7850	4	124,91	1	499,65
P-177	670	500	50	7850	4	131,49	1	525,95
VCA2-15								
Alma	11230	2200	22	7850	1	4.266,73	1	4.266,73
Patín	11230	400	50	7850	2	1.763,11	1	3.526,22
Perno 1 1/4"	900	31,25		7850	28	5,42	2	303,45
Arandelas 1 1/4"	4	31,25		7850	28	0,07	2	3,92
Tuercas 1 1/4"	25	31,25		7850	56	0,36	2	40,32
Perno 1 1/2"	900	37,50		7850	6	7,15	4	171,65
Arandelas 1 1/2"	4	37,50		7850	6	0,10	4	2,40
Tuercas 1 1/2"	25	37,50		7850	12	0,59	4	28,52
								-
							SUBTOTAL	13.257,08

		SUBTOTAL	13.257,08

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 07

PERIODO DE EVALUACIÓN

Del 1 al 31 de julio de 2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007

CAPÍTULO	7	ITEM	7.1

Estructura metálica (Incluye platina, pernos y demás)



REFERENCIAS:
Plano de taller M35 (VIGA-30 REV. 01)
Viga correspondiente al nodo 33

ELEMENTO	DIMENSIONES Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	DENSIDAD (kg/m3)	CANTD POR ELEMENTO	PESO UNIT (kg)	TOTAL CANTD	TOTAL PESO (kg)
VIGA-30								
P-6	500	425	25	7850	38	41,70	1	1.584,72
P-9	2199	299	12	7850	3	61,94	1	185,81
P-70	2198	189	32	7850	1	104,35	1	104,35
P-78	1776	189	25	7850	1	65,87	1	65,87
P-137	2198	189	19	7850	2	61,96	1	123,92
P-174	2760	475	50	7850	2	514,57	1	1.029,14
P-175	2760	500	50	7850	2	541,65	1	1.083,30
P-176	670	475	50	7850	4	124,91	1	499,65
P-177	670	500	50	7850	4	131,49	1	525,95
VCA2-15								
Alma	11230	2200	22	7850	1	4.266,73	1	4.266,73
Patín	11230	400	50	7850	2	1.763,11	1	3.526,22
Perno 1 1/4"	900	31,25		7850	28	5,42	2	303,45
Arandelas 1 1/4"	4	31,25		7850	28	0,07	2	3,92
Tuercas 1 1/4"	25	31,25		7850	56	0,36	2	40,32
Perno 1 1/2"	900	37,50		7850	6	7,15	4	171,65
Arandelas 1 1/2"	4	37,50		7850	6	0,10	4	2,40
Tuercas 1 1/2"	25	37,50		7850	12	0,59	4	28,52
								-
							SUBTOTAL	13.545,92

		SUBTOTAL	13.545,92

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 07


PERIODO DE EVALUACIÓN

Del 1 al 31 de julio de 2022

OBJETO DEL CORATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007

CAPÍTULO	7	ITEM	7.1	Estructura metálica (Incluye platina, pernos y demás)	TOTAL

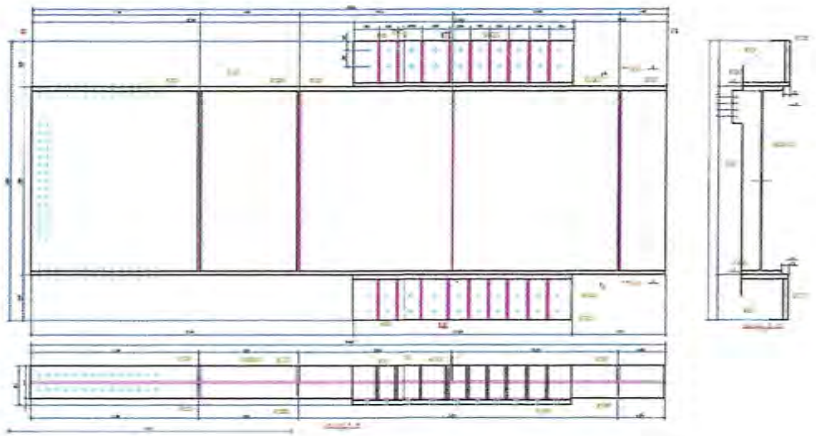

REFERENCIAS:
Plano de taller M36 (VIGA-31 REV. 01)
Viga correspondiente al nodo 33

ELEMENTO	DIMENSIONES Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	DENSIDAD (kg/m3)	CANTD POR ELEMENTO	PESO UNIT (kg)	CANTD	PESO (kg)
VIGA-31								
P-6	500	425	25	7850	20	41,70	1	834,06
P-9	2199	299	12	7850	1	61,94	1	61,94
P-70	2198	189	32	7850	4	104,35	1	417,42
P-100	2198	189	19	7850	2	61,96	1	123,92
P-128	2300	475	50	7850	2	428,81	1	857,61
P-178	2300	500	50	7850	2	451,38	1	902,75
VCA2-16								
Alma	6600	2200	22	7850	1	2.507,60	1	2.507,60
Patín	6600	400	50	7850	2	1.036,20	1	2.072,40
Perno 1 1/4"	900	31,25		7850	22	5,42	2	238,43
Arandelas 1 1/4"	4	31,25		7850	22	0,07	2	3,08
Tuercas 1 1/4"	25	31,25		7850	44	0,36	2	31,68
								-
							SUBTOTAL	8.050,89

			SUBTOTAL	8.050,89

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 07


PERIODO DE EVALUACIÓN

Del 1 al 31 de julio de 2022

OBJETO DEL CONRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0	CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2	CONTRATO No.	2021050007

CAPÍTULO	7	ITEM	7.1	Estructura metálica (Incluye platina, pernos y demás)	TOTAL

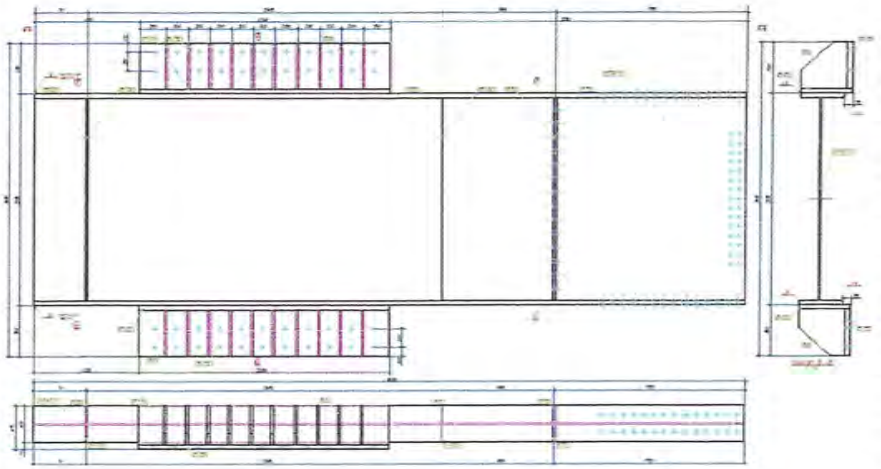

REFERENCIAS:
Plano de taller M37 (VIGA-32 REV. 01)
Viga correspondiente al nodo 33

ELEMENTO	DIMENSIONES Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	DENSIDAD (kg/m3)	CANTD POR ELEMENTO	PESO UNIT (kg)	CANTD	PESO (kg)
VIGA-32								
P-6	500	425	25	7850	20	41,70	1	834,06
P-28	2198	189	19	7850	1	61,96	1	61,96
P-70	2198	189	32	7850	3	104,35	1	313,06
P-100	2198	189	19	7850	2	61,96	1	123,92
P-128	2300	475	50	7850	2	428,81	1	857,61
P-178	2300	500	50	7850	2	451,38	1	902,75
VCA2-16								
Alma	6600	2200	22	7850	1	2.507,60	1	2.507,60
Patín	6600	400	50	7850	2	1.036,20	1	2.072,40
Perno 1 1/4"	900	31,25		7850	22	5,42	2	238,43
Arandelas 1 1/4"	4	31,25		7850	22	0,07	2	3,08
Tuercas 1 1/4"	25	31,25		7850	44	0,36	2	31,68
								-
						SUBTOTAL		7.946,56
						SUBTOTAL		7.946,56

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 07


PERIODO DE EVALUACIÓN

Del 1 al 31 de julio de 2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007

CAPÍTULO	7	ITEM	7.1	Estructura metálica (Incluye platina, pernos y demás)	TOTAL

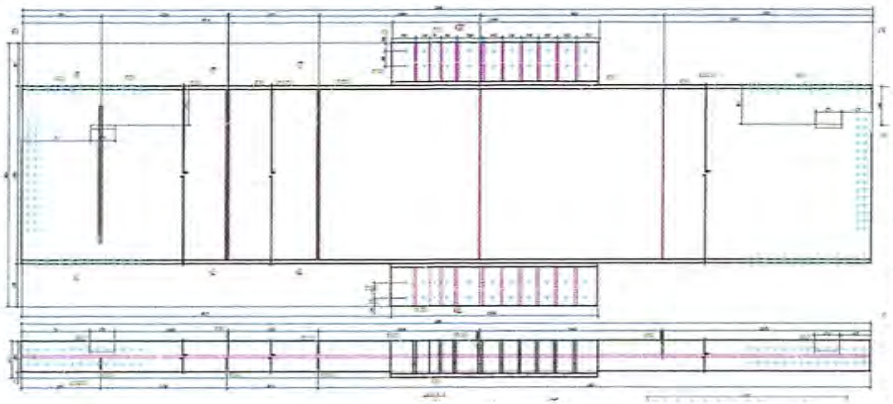

REFERENCIAS:
Plano de taller M38 (VIGA-33 REV. 01)
Viga correspondiente al nodo 36

ELEMENTO	DIMENSIONES Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	DENSIDAD (kg/m3)	CANTD POR ELEMENTO	PESO UNIT (kg)	CANTD	PESO (kg)
VIGA-33								
AN-1	270	50	6	7850	4	0,66	1	2,65
P-6	500	425	25	7850	20	41,70	1	834,06
P-9	2199	299	12	7850	3	61,94	1	185,81
P-28	2198	189	19	7850	1	61,96	1	61,96
P-78	1776	189	25	7850	1	65,87	1	65,87
P-128	2300	475	50	7850	2	428,81	1	857,61
P-137	2198	189	19	7850	1	61,96	1	61,96
P-173	2197	189	19	7850	1	61,93	1	61,93
P-178	2300	500	50	7850	2	451,38	1	902,75
VCA2-9								
Alma	12200	2200	22	7850	1	4.635,27	1	4.635,27
Patin	12200	400	50	7850	2	1.915,40	1	3.830,80
Perno 1 1/4"	900	31,25		7850	22	5,42	2	238,43
Arandelas 1 1/4"	4	31,25		7850	22	0,07	2	3,08
Tuercas 1 1/4"	25	31,25		7850	44	0,36	2	31,68
								-
							SUBTOTAL	11.773,87

	SUBTOTAL 11.773,87

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 07


PERIODO DE EVALUACIÓN

Del 1 al 31 de julio de 2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007

CAPÍTULO	7	ITEM	7.1	Estructura metálica (incluye platina, pernos y demás)	TOTAL

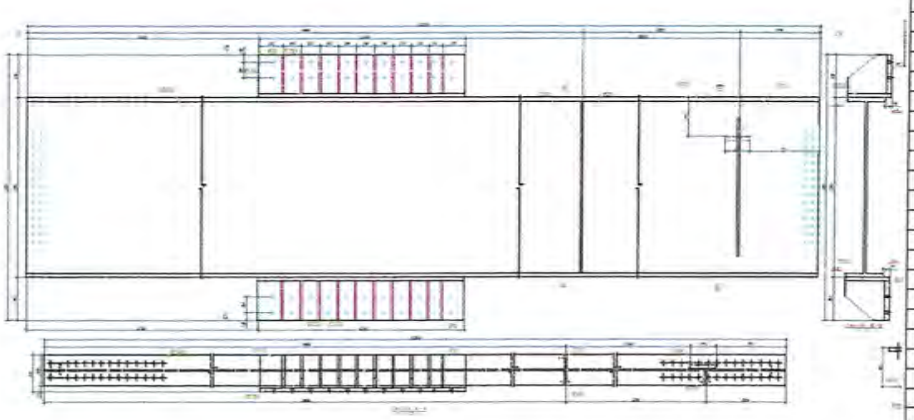

REFERENCIAS:
Plano de taller M39 (VIGA-34 REV. 01)
Viga correspondiente al nodo 36

ELEMENTO	DIMENSIONES Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	DENSIDAD (kg/m3)	CANTD POR ELEMENTO	PESO UNIT (kg)	CANTD	PESO (kg)
VIGA-34								
AN-1	270	50	6	7850	2	0,66	1	1,32
P-6	500	425	25	7850	20	41,70	1	834,06
P-28	2198	189	19	7850	2	61,96	1	123,92
P-78	1776	189	25	7850	1	65,87	1	65,87
P-128	2300	475	50	7850	2	428,61	1	857,61
P-178	2300	500	50	7850	2	451,38	1	902,75
VCA2-9								
Alma	12200	2200	22	7850	1	4.635,27	1	4.635,27
Patín	12200	400	50	7850	2	1.915,40	1	3.830,80
Perno 1 1/4"	900	31,25		7850	22	5,42	2	238,43
Arandelas 1 1/4"	4	31,25		7850	22	0,07	2	3,08
Tuercas 1 1/4"	25	31,25		7850	44	0,36	2	31,68
								-
							SUBTOTAL	11.524,80
							SUBTOTAL	11.524,80

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 07

PERIODO DE EVALUACIÓN

Del 1 al 31 de julio de 2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR						
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002	
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007	
CAPÍTULO	7	ITEM	7.1	Estructura metálica (Incluye platina, pernos y demás)			TOTAL

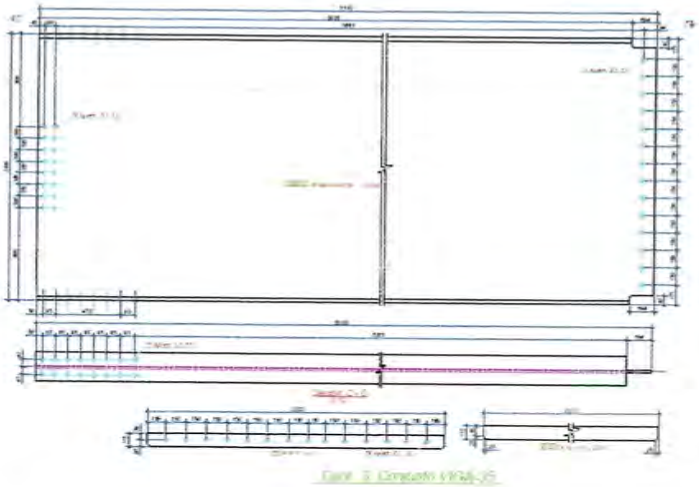

Corte 3 Corte en VIGA-35

REFERENCIAS:
Plano de taller M41 (VIGAS 35 Y 36 REV. 01)

ELEMENTO	DIMENSIONES Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	DENSIDAD (kg/m3)	CANTD POR ELEMENTO	PESO UNIT (kg)	CANTD	PESO (kg)
VIGA-35								
P-2	2222	115	19	7850	2	38,11	3	228,67
P-63	2222	115	19	7850	2	38,11	3	228,67
VCA1-2								
Alma	6100	2224	19	7850	1	2.023,43	3	6.070,29
Patín	6100	250	38	7850	2	454,91	3	2.729,45
							SUBTOTAL	-
							SUBTOTAL	9.257,08
							SUBTOTAL	9.257,08

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 07

PERIODO DE EVALUACIÓN

Del 1 al 31 de julio de 2022

OBJETO DEL CINTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR						
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002	
INTERVENTOI	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007	
CAPÍTULO	7	ITEM	7.1	Estructura metálica (Incluye platina, pernos y demás)			TOTAL

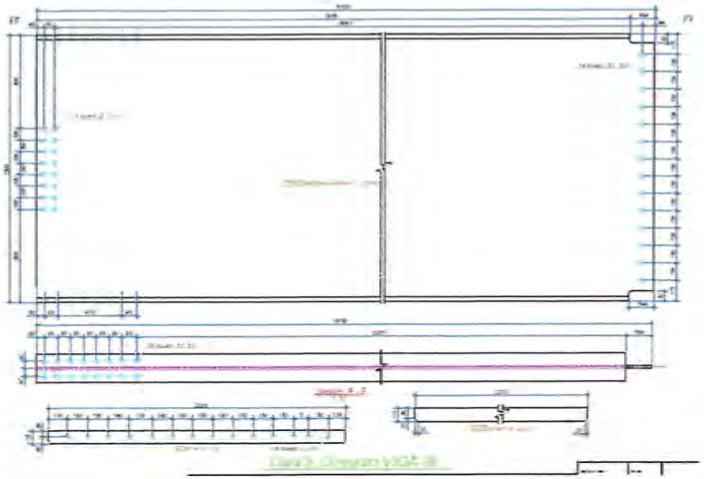

REFERENCIAS:
Plano de taller M41 (VIGAS 35 Y 36 REV. 01)

ELEMENTO	DIMENSIONES Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	DENSIDAD (kg/m3)	CANTD POR ELEMENTO	PESO UNIT (kg)	CANTD	PESO (kg)
VIGA-36								
P-2	2222	115	19	7850	2	38,11	3	228,67
P-63	2222	115	19	7850	2	38,11	3	228,67
VCA1-2								
Alma	6100	2224	19	7850	1	2.023,43	3	6.070,29
Patin	6100	250	38	7850	2	454,91	3	2.729,45
							SUBTOTAL	9.257,08
							SUBTOTAL	9.257,08

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 07

PERIODO DE EVALUACIÓN

Del 1 al 31 de julio de 2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR						
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002	
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007	
CAPÍTULO	7	ITEM	7.1	Estructura metálica (Incluye platina, pernos y demás)			TOTAL

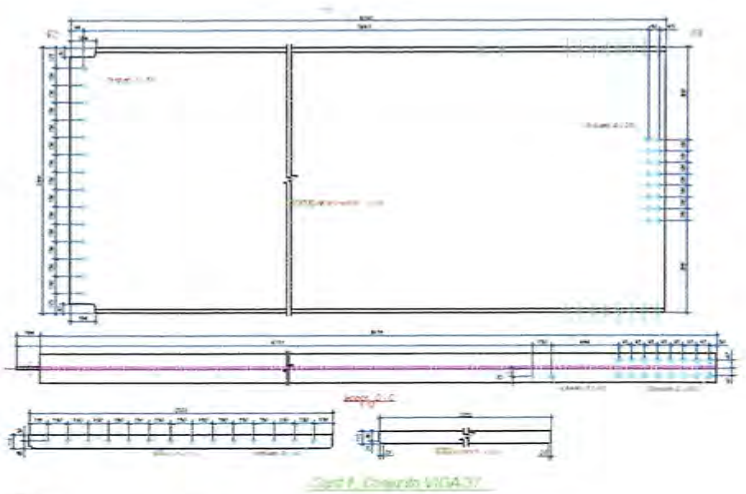

REFERENCIAS:
Plano de taller M42 (VIGAS 37 Y 38 REV. 01)

ELEMENTO	DIMENSIONES Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	DENSIDAD (kg/m3)	CANTD POR ELEMENTO	PESO UNIT (kg)	CANTD	PESO (kg)
VIGA-37								
P-2	2222	115	19	7850	2	38,11	1	76,22
P-63	2222	115	19	7850	2	38,11	1	76,22
VCA1-4								
Alma	6100	2224	19	7850	1	2.023,43	1	2.023,43
Patín	6100	250	38	7850	2	454,91	1	909,82
							SUBTOTAL	3.085,69
							SUBTOTAL	3.085,69

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 07


PERIODO DE EVALUACIÓN

Del 1 al 31 de julio de 2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007

CAPÍTULO	7	ITEM	7.1	Estructura metálica (incluye platina, pernos y demás)	TOTAL

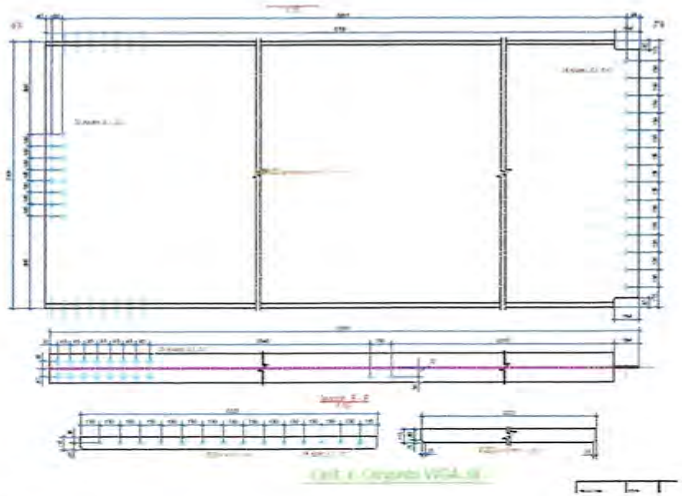

REFERENCIAS:
Plano de taller M42 (VIGAS 37 Y 38 REV. 01)

ELEMENTO	DIMENSIONES Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	DENSIDAD (kg/m3)	CANTD POR ELEMENTO	PESO UNIT (kg)	CANTD	PESO (kg)
VIGA-38								
P-2	2222	115	19	7850	2	38,11	1	76,22
P-63	2222	115	19	7850	2	38,11	1	76,22
VCA1-5								
Alma	6100	2224	19	7850	1	2.023,43	1	2.023,43
Patín	6100	250	38	7850	2	454,91	1	909,82
						SUBTOTAL		-
						SUBTOTAL		3.085,69
						SUBTOTAL		3.085,69

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 07

PERIODO DE EVALUACIÓN

Del 1 al 31 de julio de 2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR						
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002	
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007	
CAPÍTULO	7	ITEM	7.1	Estructura metálica (Incluye platina, pernos y demás)			TOTAL



REFERENCIAS:
Plano de taller M43 (VIGAS 39 Y 40 REV. 01)

ELEMENTO	DIMENSIONES Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	DENSIDAD (kg/m3)	CANTD POR ELEMENTO	PESO UNIT (kg)	CANTD	PESO (kg)
VIGA-39								
P-2	2222	115	19	7850	3	38,11	1	114,34
P-155	2222	226	19	7850	1	74,90	1	74,90
VCA1-2								
Alma	6100	2224	19	7850	1	2.023,43	1	2.023,43
Patín	6100	250	38	7850	2	454,91	1	909,82
							SUBTOTAL	-
							SUBTOTAL	3.122,48
							SUBTOTAL	3.122,48

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 07

PERIODO DE EVALUACIÓN

Del 1 al 31 de julio de 2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR						
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002	
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007	
CAPÍTULO	7	ITEM	7.1	Estructura metálica (Incluye platina, pernos y demás)			TOTAL



REFERENCIAS:
Plano de taller M43 (VIGAS 39 Y 40 REV. 01)

ELEMENTO	DIMENSIONES Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	DENSIDAD (kg/m3)	CANTD POR ELEMENTO	PESO UNIT (kg)	CANTD	PESO (kg)
VIGA-40								
P-2	2222	115	19	7850	3	38,11	1	114,34
P-155	2222	226	19	7850	1	74,90	1	74,90
VCA1-2								
Alma	6100	2224	19	7850	1	2.023,43	1	2.023,43
Patín	6100	250	38	7850	2	454,91	1	909,82
							SUBTOTAL	-
							SUBTOTAL	3.122,48

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 07


PERIODO DE EVALUACIÓN

Del 1 al 31 de julio de 2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007

CAPÍTULO	7	ITEM	7.1	Estructura metálica (Incluye platina, pernos y demás)	TOTAL

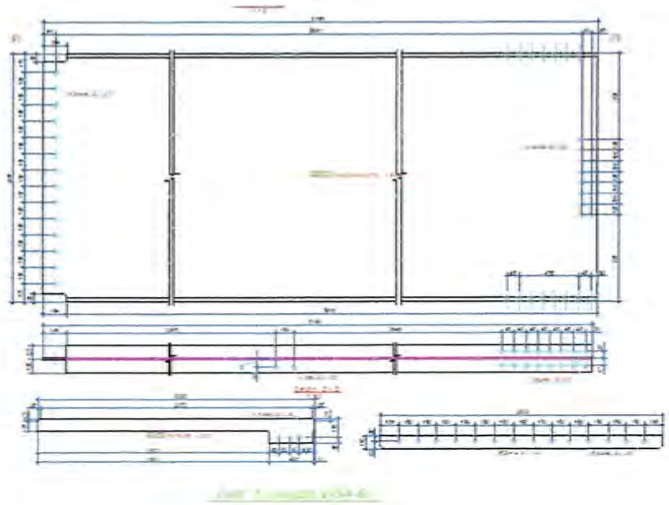

REFERENCIAS:
Plano de taller M44 (VIGAS 41 Y 42 REV. 01)

ELEMENTO	DIMENSIONES Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	DENSIDAD (kg/m3)	CANTD POR ELEMENTO	PESO UNIT (kg)	CANTD	PESO (kg)
VIGA-41								
P-2	2222	115	19	7850	3	38,11	1	114,34
P-155	2222	226	19	7850	1	74,90	1	74,90
VCA1-2								
Alma	6100	2224	19	7850	1	2.023,43	1	2.023,43
Patín	6100	250	38	7850	2	454,91	1	909,82
							SUBTOTAL	-
							SUBTOTAL	3.122,48
							SUBTOTAL	3.122,48

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 07

PERIODO DE EVALUACIÓN

Del 1 al 31 de julio de 2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR						
CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002	
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007	
CAPÍTULO	7	ITEM	7.1	Estructura metálica (Incluye platina, pernos y demás)			TOTAL



REFERENCIAS:
Plano de taller M44 (VIGAS 41 Y 42 REV. 01)

ELEMENTO	DIMENSIONES Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	DENSIDAD (kg/m3)	CANTD POR ELEMENTO	PESO UNIT (kg)	CANTD	PESO (kg)
VIGA-42								
P-2	2222	115	19	7850	3	38,11	1	114,34
P-155	2222	226	19	7850	1	74,90	1	74,90
VCA1-2								
Alma	6100	2224	19	7850	1	2.023,43	1	2.023,43
Patin	6100	250	38	7850	2	454,91	1	909,82
							SUBTOTAL	3.122,48
							SUBTOTAL	3.122,48

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 07


PERIODO DE EVALUACIÓN

Del 1 al 31 de julio de 2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007

CAPÍTULO	7	ITEM	7.1	Estructura metálica (Incluye platina, pernos y demás)	TOTAL

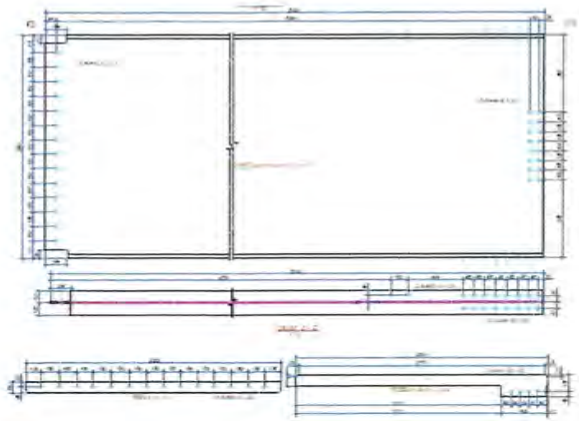

REFERENCIAS:
Plano de taller M45 (VIGAS 43 Y 44 REV. 01)

ELEMENTO	DIMENSIONES Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	DENSIDAD (kg/m3)	CANTD POR ELEMENTO	PESO UNIT (kg)	CANTD	PESO (kg)
VIGA-43								
P-2	2222	115	19	7850	2	38,11	1	76,22
P-155	2222	226	19	7850	2	74,90	1	149,80
VCA1-2								
Alma	6100	2224	19	7850	1	2023,43	1	2023,43
Patin	6100	250	38	7850	2	454,91	1	909,82
						SUBTOTAL		-
						SUBTOTAL		3.159,27
						SUBTOTAL		3.159,27

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 07


PERIODO DE EVALUACIÓN

Del 1 al 31 de julio de 2022

OBJETO DEL CNTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007

CAPÍTULO	7	ITEM	7.1	Estructura metálica (Incluye platina, pernos y demás)	TOTAL

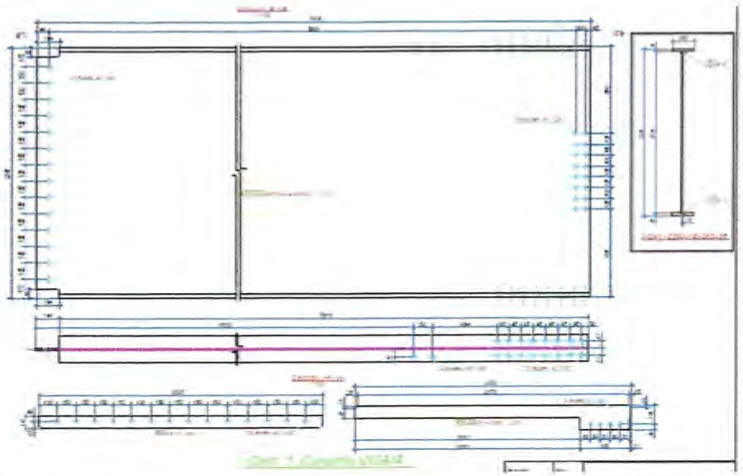

REFERENCIAS:
Plano de taller M45 (VIGAS 43 Y 44 REV. 01)

ELEMENTO	DIMENSIONES Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	DENSIDAD (kg/m3)	CANTD POR ELEMENTO	PESO UNIT (kg)	CANTD	PESO (kg)
VIGA-44								
P-2	2222	115	19	7850	2	38,11	1	76,22
P-155	2222	226	19	7850	2	74,90	1	149,80
VCA1-2								
Alma	6100	2224	19	7850	1	2.023,43	1	2.023,43
Patín	6100	250	38	7850	2	454,91	1	909,82
							SUBTOTAL	3.159,27
							SUBTOTAL	3.159,27

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 07


PERIODO DE EVALUACIÓN

Del 1 al 31 de julio de 2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002	
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007	

CAPÍTULO	7	ITEM	7.1	Estructura metálica (Incluye platina, pernos y demás)	TOTAL

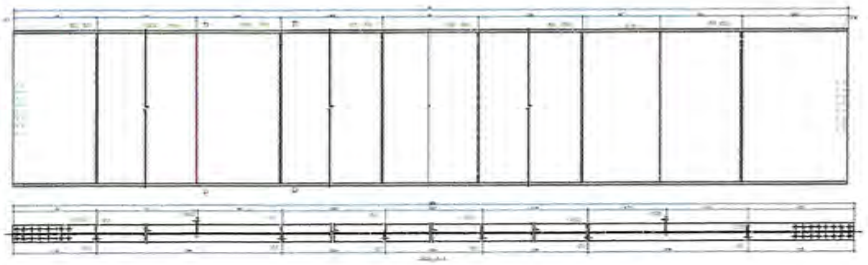

REFERENCIAS:
Plano de taller M51 (VIGA 51 REV. 01)

ELEMENTO	DIMENSIONES Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	DENSIDAD (kg/m3)	CANTD POR ELEMENTO	PESO UNIT (kg)	CANTD	PESO (kg)
VIGA-51								
P-2	2222	115	19	7850	6	38,11	1	228,67
P-3	2222	115	9	7850	3	18,05	1	54,16
p-63	2222	115	19	7850	3	38,11	1	114,34
P-155	2222	226	19	7850	2	74,90	1	149,80
VCA1-9								
Alma	13698	2224	19	7850	1	4.543,76	1	4.543,76
Patín	13698	250	38	7850	2	1.021,53	1	2.043,06
							SUBTOTAL	-
							SUBTOTAL	7.133,78

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 07


PERIODO DE EVALUACIÓN

Del 1 al 31 de julio de 2022

OBJETO DEL CNTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTI	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTO!	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007

CAPÍTULO	7	ITEM	7.1	Estructura metálica (Incluye platina, pernos y demás)	TOTAL

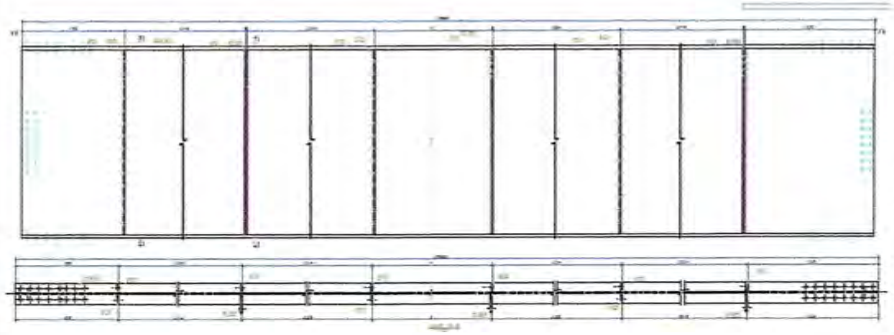

REFERENCIAS:
Plano de taller M52 (VIGA 52 REV. 01)

ELEMENTO	DIMENSIONES Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	DENSIDAD (kg/m3)	CANTD POR ELEMENTO	PESO UNIT (kg)	CANTD	PESO (kg)
VIGA-52								
P-2	2222	115	19	7850	9	38,11	1	343,01
P-155	2222	226	19	7850	3	74,90	1	224,70
VCA1-9								
Alma	13698	2224	19	7850	1	4.543,76	1	4.543,76
Patin	13698	250	38	7850	2	1.021,53	1	2.043,06
							SUBTOTAL	7.154,52
							SUBTOTAL	7.154,52

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACH
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 07


PERIODO DE EVALUACIÓN

Del 1 al 31 de julio de 2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002	
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007	

CAPÍTULO	7	ITEM	7.1	Estructura metálica (Incluye platina, pernos y demás)	TOTAL

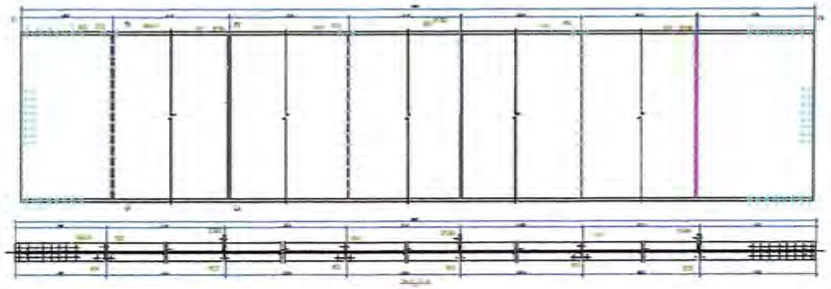

REFERENCIAS:
Plano de taller M53 (VIGA 53 REV. 01)

ELEMENTO	DIMENSIONES Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	DENSIDAD (kg/m3)	CANTD POR ELEMENTO	PESO UNIT (kg)	CANTD	PESO (kg)
VIGA-53								
P-2	2222	115	19	7850	9	38,11	1	343,01
P-155	2222	226	19	7850	3	74,90	1	224,70
VCA1-7								
Alma	13698	2224	19	7850	1	4.543,76	1	4.543,76
Patin	13698	250	38	7850	2	1.021,53	1	2.043,06
							SUBTOTAL	-
							SUBTOTAL	7.154,52

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 07


PERIODO DE EVALUACIÓN

Del 1 al 31 de julio de 2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007

CAPÍTULO	7	ITEM	7.1	Estructura metálica (incluye platina, pernos y demás)	TOTAL

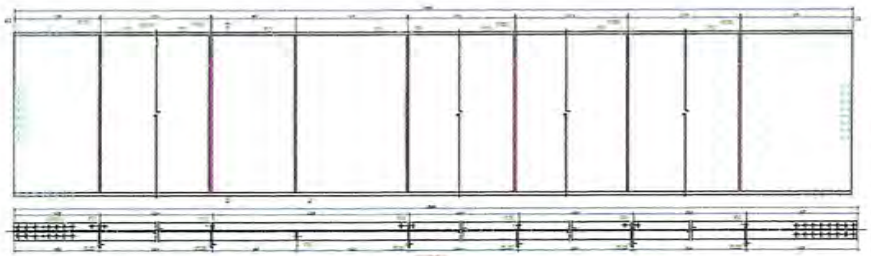

REFERENCIAS:
Plano de taller M54 (VIGA 54 REV. 01)

ELEMENTO	DIMENSIONES Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	DENSIDAD (kg/m3)	CANTD POR ELEMENTO	PESO UNIT (kg)	CANTD	PESO (kg)
VIGA-54								
P-2	2222	115	19	7850	5	38,11	1	190,56
P-5	2222	115	19	7850	1	38,11	1	38,11
P-79	2222	115	19	7850	1	38,11	1	38,11
P-155	2222	226	19	7850	6	74,90	1	449,39
VCA1-8								
Alma	13698	2224	19	7850	1	4.543,76	1	4.543,76
Patín	13698	250	38	7850	2	1.021,53	1	2.043,06
							SUBTOTAL	-
							SUBTOTAL	7.302,99

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 07


PERIODO DE EVALUACIÓN

Del 1 al 31 de julio de 2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002	
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007	

CAPÍTULO	7	ITEM	7.1	Estructura metálica (Incluye platina, pernos y demás)	TOTAL

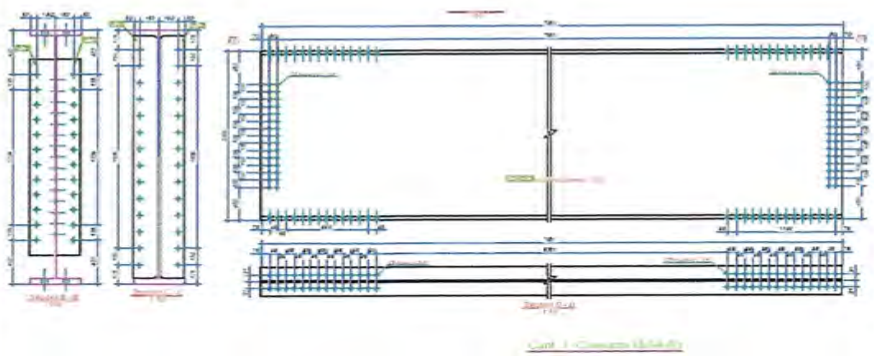

REFERENCIAS:
Plano de taller M63 (VIGA 63 REV. 01)

ELEMENTO	DIMENSIONES Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	DENSIDAD (kg/m3)	CANTD POR ELEMENTO	PESO UNIT (kg)	CANTD	PESO (kg)
VIGA-63								
P-28	2198	189	19	7850	3	61,96	1	185,88
P-78	1776	189	25	7850	3	65,87	1	197,62
P-184	2199	299	19	7850	1	98,07	1	98,07
VCA2-23								
Alma	7981	2200	22	7850	1	3.032,30	1	3.032,30
Patín	7981	400	50	7850	2	1.253,02	1	2.506,03
							SUBTOTAL	-
							SUBTOTAL	6.019,90
							SUBTOTAL	6.019,90

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 07


PERIODO DE EVALUACIÓN

Del 1 al 31 de julio de 2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002	
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007	

CAPÍTULO	7	ITEM	7.1	Estructura metálica (Incluye platina, pernos y demás)	TOTAL



REFERENCIAS:
Plano de taller M64 (VIGA 64 REV. 01)

ELEMENTO	DIMENSIONES Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	DENSIDAD (kg/m3)	CANTD POR ELEMENTO	PESO UNIT (kg)	CANTD	PESO (kg)
VIGA-64								
P-28	2198	189	19	7850	2	61,96	1	123,92
P-78	1776	189	25	7850	2	65,87	1	131,75
P-99	1776	189	19	7850	2	50,06	1	100,13
P-137	2198	189	19	7850	2	61,96	1	123,92
VCA2-23								
Alma	7981	2200	22	7850	1	3.032,30	1	3.032,30
Patín	7981	400	50	7850	2	1.253,02	1	2.506,03
							SUBTOTAL	-
							SUBTOTAL	6.018,05
							SUBTOTAL	6.018,05

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 07


PERIODO DE EVALUACIÓN

Del 1 al 31 de julio de 2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007

CAPÍTULO	7	ITEM	7.1	Estructura metálica (Incluye platina, pernos y demás)	TOTAL

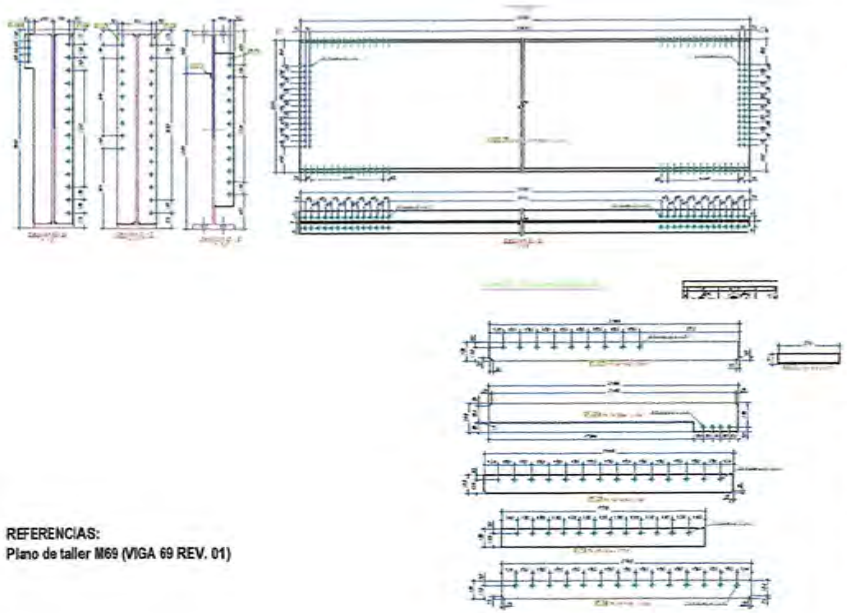

REFERENCIAS:
Plano de taller M69 (VIGA 69 REV. 01)

ELEMENTO	DIMENSIONES Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	DENSIDAD (kg/m3)	CANTD POR ELEMENTO	PESO UNIT (kg)	CANTD	PESO (kg)
VIGA-69								
AN-1	270	50	6	7850	2	0,66	1	1,32
P-28	2198	189	19	7850	2	61,96	1	123,92
P-29	2198	189	25	7850	2	81,53	1	163,05
P-78	1776	189	25	7850	1	65,87	1	65,87
P-137	2198	189	19	7850	1	61,96	1	61,96
P-184	2199	299	19	7850	3	98,07	1	294,20
VCA2-27								
Alma	12200	2200	22	7850	1	4.635,27	1	4.635,27
Patín	12200	400	50	7850	2	1.915,40	1	3.830,80
								-
							SUBTOTAL	9.176,40
							SUBTOTAL	9.176,40

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 07


PERIODO DE EVALUACIÓN


Del 1 al 31 de julio de 2022

OBJETO DEL CONRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007

CAPÍTULO	7	ITEM	7.1	Estructura metálica (Incluye platina, pernos y demás)	TOTAL

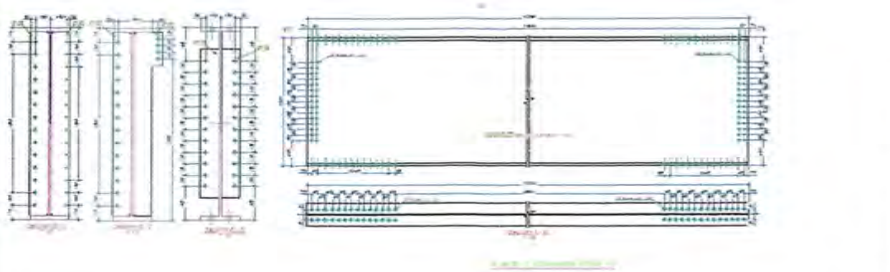



REFERENCIAS:
Plano de taller M70 (VIGA 70 REV. 01)

ELEMENTO	DIMENSIONES Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	DENSIDAD (kg/m3)	CANTD POR ELEMENTO	PESO UNIT (kg)	CANTD	PESO (kg)
VIGA-70								
P-28	2198	189	19	7850	6	61,96	1	371,76
P-57	2199	299	19	7850	2	98,07	1	196,13
P-78	1776	189	25	7850	2	65,87	1	131,75
VCA2-27								
Alma	12200	2200	22	7850	1	4.635,27	1	4.635,27
Patín	12200	400	50	7850	2	1.915,40	1	3.830,80
							SUBTOTAL	9.165,71
							SUBTOTAL	9.165,71

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 07


PERIODO DE EVALUACIÓN

Del 1 al 31 de julio de 2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007

CAPÍTULO	7	ITEM	7.1	Estructura metálica (Incluye platina, pernos y demás)	TOTAL

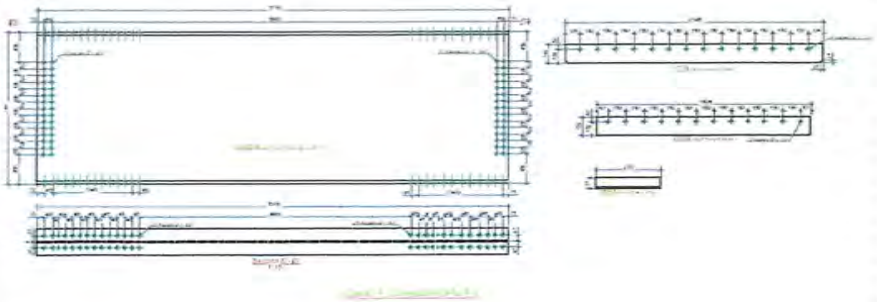

REFERENCIAS:
Plano de taller M71 (VIGA 71 REV. 01)

ELEMENTO	DIMENSIONES Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	DENSIDAD (kg/m3)	CANTD POR ELEMENTO	PESO UNIT (kg)	CANTD	PESO (kg)
VIGA-71								
AN-1	270	50	6	7850	2	0,66	2	2,65
P-28	2198	189	19	7850	2	61,96	1	123,92
P-168	1824	189	25	7850	2	67,65	1	135,31
VCA2-28								
Alma	6100	2200	22	7850	1	2.317,63	1	2.317,63
Patín	6100	400	50	7850	2	957,70	1	1.915,40
							SUBTOTAL	4.494,91
							SUBTOTAL	4.494,91

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEL ACTA PARCIAL DE OBRAS No 07

PERIODO DE EVALUACIÓN

Del 1 al 31 de julio de 2022

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MÚSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	A CONSTRUIR S.A.	NIT	890115406-0		CONTRATO No.	2021040002
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	NIT	901493970-2		CONTRATO No.	2021050007

CAPÍTULO	7	ITEM	7.1	Estructura metálica (Incluye platina, pernos y demás)	TOTAL



REFERENCIAS:
Plano de taller M72 (VIGA 72 REV. 01)

ELEMENTO	DIMENSIONES Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	DENSIDAD (kg/m3)	CANTD POR ELEMENTO	PESO UNIT (kg)	CANTD	PESO (kg)
VIGA-72								
AN-1	270	50	6	7850	2	0,66	2	2,65
P-28	2198	189	19	7850	1	61,96	1	61,96
P-100	2198	189	19	7850	1	61,96	1	61,96
P-137	2198	189	19	7850	1	61,96	1	61,96
P-168	1824	189	25	7850	2	67,65	1	135,31
VCA2-28								
Alma	6100	2200	22	7850	1	2.317,63	1	2.317,63
Patín	6100	400	50	7850	2	957,70	1	1.915,40
						SUBTOTAL		4.556,87
						SUBTOTAL		4.556,87

Nombre: FABIO LOPEZ POSADA
RESIDENTE DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: VANESA MORENO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR
