

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 De 03 septiembre 2022

LAPSO del 03 de agosto al 03 septiembre 2022

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	062-ARC-CBNL02-2022
CONTRATISTA	:	FABIO GARZÓN DAZA
OBJETO DEL CONTRATO	:	ESTUDIOS, DISEÑOS, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, A TODO COSTO, DE MÓDULO CONTAINER TIPO ALOJAMIENTO CON BAÑO Y EL SISTEMA MODULAR DE ALOJAMIENTOS PARA EL MUELLE DE LA ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS, SU EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO A PRECIOS UNITARIOS Y FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	09 JUNIO DE 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	10 OCTUBRE DE 2022
VALOR INICIAL	:	SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($642.409.304,85) M/CTE incluido AIU e IVA y demás erogaciones pertinentes.
ADICIÓN (S)	:	CIENTO CINCUENTA MILLONES M/CTE ($150.000.000,00) M/CTE
VALOR TOTAL CONTRATO	:	SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO CON OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($792.409.304,85) M/CTE incluido AIU e IVA y demás erogaciones pertinentes.
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	
SUPERVISOR INICIAL	:	TKESP MENDEZ QUINTERO JHOAN SEBASTIAN
SUPERVISOR FINAL	:	TKEIN MORENO ALVAREZ JULIAN ALFONSO

En la ciudad de Bahía Málaga Valle del cauca, a los tres (03) días del mes de Septiembre de dos mil veintidós (2022), en calidad de Supervisor del CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA No. 062-ARC-CBNL02-2022 suscrito con la empresa FABIO GARZON DAZA NIT. 19.336.660, representada legalmente por FABIO GARZÓN DAZA y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1] , artículos 4º, 5º, 11º, 12º , 26º, 50º, 51º, 52º, 53º [2] , 56º, Ley 1474 de 2011 [3] , entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 [4] , la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 [5] y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 [6] , modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".*

[2] *Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.*

[3] *Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".*

[4] *Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

[5] *Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.*

marzo de 2018, numeral 2.4 "*EJECUCIÓN*", en el presente informe deja constancia de los obras desarrolladas, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

ESTUDIOS, DISEÑOS, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, A TODO COSTO, DE MÓDULO CONTAINER TIPO ALOJAMIENTO CON BAÑO Y EL SISTEMA MODULAR DE ALOJAMIENTOS PARA EL MUELLE DE LA ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS, SU EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO A PRECIOS UNITARIOS Y FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y numero del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
ADICIÓN	N/A	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONOMICO Y ADICIÓN DEL VALOR	SI	$150.000.000

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO CON OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($792.409.304,85) M/CTE incluido AIU e IVA y demás erogaciones pertinentes.	SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO CON OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($792.409.304,85) M/CTE incluido AIU e IVA y demás erogaciones pertinentes.	SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO CON OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($792.409.304,85) M/CTE incluido AIU e IVA y demás erogaciones pertinentes.	N/A	N/A	SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO CON OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($792.409.304,85) M/CTE incluido AIU e IVA y demás erogaciones pertinentes.

[6] *Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.*

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No. NV-100012387 DE FECHA 02/06/2022** **SEGUROS MUNDIAL** **06/06/2022**

AMPAROS	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)	**N/A**	**SI**	**N/A**	**N/A**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**SI**	**N/A**	**31/05/2022**	**N/A**
PRESTACIONES SOCIALES	**SI**	**N/A**	**31/05/2022**	**N/A**
CALIDAD DEL SERVICIO	**SI**	**N/A**	**31/05/2022**	**N/A**
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	**SI**	**N/A**	**31/05/2022**	**N/A**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	**SI**	**N/A**	**10/10/2022**	**N/A**

GARANTIA TECNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	**VIGENCIA**	**VALOR** (Indicar tipo de moneda)	**OBLIGACIÓN**		**ORDEN DE PAGO**		**VALOR TOTAL** (Indicar tipo de moneda)	**VALOR PENDIENTE POR CANCELAR**	**% EJECUCION CONTRACTUAL**
			No.	**FECHA**	**No.**	**FECHA**			
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
N/A	**N/A**
CESIONES DEL CONTRATO	**DESCRIPCIÓN**
N/A	**N/A**

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	**VALOR CDP**	**VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN**	**AUTORIZACION MIN HACIENDA**	**AUTORIZACION DEPLAN**	**No. Y FECHA**	**VALOR CRP**	**VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN** (Si aplica, de lo contrario obviar)
ESTUDIOS, DISEÑOS, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, A TODO COSTO, DE MÓDULO CONTAINER TIPO ALOJAMIENTO CON BAÑO Y EL SISTEMA MODULAR DE	2022	5322 DEL 07 ENERO DEL 2022	$820.000.000,00	N/A	N/A	N/A	44022 DEL 31 MAYO DEL 2022	$792.409.304,85	N/A

ALOJAMIENTOS PARA EL MUELLE DE LA ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS, SU EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO A PRECIOS UNITARIOS Y FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE									
ESTUDIOS, DISEÑOS, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, A TODO COSTO, DE MÓDULO CONTAINER TIPO ALOJAMIENTO CON BAÑO Y EL SISTEMA MODULAR DE ALOJAMIENTOS PARA EL MUELLE DE LA ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS, SU EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO A PRECIOS UNITARIOS Y FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	2022	5322 DEL 07 ENERO DEL 2022	$670.000.000,00	N/A	N/A	N/A	44022 DEL 31 MAYO DEL 2022	$150.000.000,00	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	**No. Y FECHA**	**VALOR**	**OBSERVACIONES / JUSTIFICACION**
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

NO APLICA

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

A la fecha los proyectos se encuentran aún en la fase de aprobación de diseños, siendo Cerro Mutis la mas desarrollada en aspectos de movilización de material y puesta en sitio, con un porcentaje de avance de 40%,

9.1 CONSTRUCCION ALOJAMIENTOS PARA EL MUELLE DE LA ESTACION DE GUARDACOSTAS BAHIA SOLANO.

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	% Avance	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda
1	ETAPA I: ESTUDIOS Y DISEÑOS		
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO		
1.1.1	Levantamiento topográfico del sitio de incidencia. Incluye puntos de acometidas	100	$ 1.734.600
1.1.2	Exploración geotécnica-sondeos con profundidades de 3- 6m. Incluye: ensayos de laboratorio-estudio de suelos acuerdo especificaciones técnicas y recomendaciones del título H de la nsr-10. Incluye cálculo del nivel de capa freática-tensión admisible del terreno.	100	$ 4.410.000
1.2	DISEÑOS		
1.2.1	Diseño arquitectónico, para 04 modulares (2.5 x 8.0 x 2.99) dispuestos en dos niveles con sistema constructivo royal building system (RBS) de acuerdo a bosquejo arquitectónico de referencia, para las siguientes necesidades: primer nivel 01 modulo 2.5 x 8.0 x 2.99 comedor (para 20 pax)- 01 baño- 01 cocina; 01 modulo 2.5 x 8.0 x 2.99 alojamiento infantes (para 06 pax) con 01 baño-01 lavandería; segundo nivel 01 modulo 2.5 x 8.0 x 2.99 alojamiento suboficiales (para 08 pax) con 01 baño ; 01 modulo 2.5 x 8.0 x 2.99 alojamiento oficiales (para 06 pax) con 01 baño- 01 oficina. Incluye plantas, cortes, fachadas, urbanismo y demás detalles necesarios para la construcción del mismo.	100	$ 6.370.000
1.2.2	Diseño estructural y de cimentación para 04 modulares (2.5 x 8.0 x 2.99) dispuestos en dos niveles con sistema constructivo royal building system (RBS) de acuerdo al reglamento colombiano de construcción sismo resistente (nsr-10) y normatividad vigente. Incluye plano refuerzo de muros y dinteles, esquema de muros, esquema de marcos, esquema de contramarcos y esquineros, esquema de tapas en muros y vigas, esquema de cubierta, plano de anclaje de techo y segundo nivel, detalles constructivos.	75	$ 11.270.000
1.2.3	Diseño general sistema redes hidráulicas para 04 modulares (2.5 x 8.0 x 2.99) dispuestos en dos niveles con sistema constructivo royal building system (RBS), redes externas e internas. (04 sanitarios-03duchas-04 lavamanos-01 lavaplatos-01 lavadero-02 lavadora)	75	$ 4.410.000
1.2.4	Diseño general sistema redes sanitarias, para 04 modulares (2.5 x 8.0 x 2.99) dispuestos en dos niveles con sistema constructivo royal building system (RBS), redes externas e internas. (04 sanitarios-03 duchas-04 lavamanos-01 lavaplatos-01 lavadero-02 lavadora,05 sifones de piso).	75	$ 4.410.000
1.2.5	Diseño general sistema red contra incendio, para 04 modulares (2.5 x 8.0 x 2.99) dispuestos en dos niveles con sistema constructivo royal building system (RBS), redes externas e internas.	0	$ 3.185.000
1.2.6	Diseño sistema eléctrico, voz & datos. Para 04 modulares (2.5 x	75	$ 4.410.000

	8.0 x 2.99) dispuestos en dos niveles con sistema constructivo royal building system (RBS). Incluye acometida, red eléctrica interna y externa.		
1.3	GESTIÓN AMBIENTAL		
1.3.1	Plan de manejo ambiental para la ejecución y disposición final de los residuos generados en obra.	50	$ 2.450.000
2	ETAPA II: CONSTRUCCIÓN SISTEMA MODULAR CON ROYAL BUILDING SYSTEM (RBS).		
2.1	PRELIMINARES		
2.1.1	Este ítem hace referencia al desmonte y chatarrización de contenedores con dimensiones 6.06x 2.43x 2.6 m C/U-ubicados en dos niveles existentes en la zona a realizar la construcción de los modulares. Incluye escaleras de acceso a los contenedores (6m de largo x 1.3 ancho) y demás elementos que deban ser retiradas para realizar el proyecto nuevo	50	$ 13.086.784
2.1.2	Demolición 08 dados de concreto existentes (33.5 cm de alto x 76 cm de ancho x 49 cm). Incluye disposición final de los residuos.	100	$ 1.645.428
2.1.3	Suministro e instalación cimentación acuerdo a diseño ítem 1.2.2. Incluye formaleta en madera, concreto, acero de refuerzo, figurado, cortes, replanteo de muros y nivelación, pases para tubería embebida. Transporte, mano de obra, materiales y demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem.	20	$ 23.972.270
2.2	SUMINISTRO E INSTALCION SISTEMA MODULAR (RBS)		
2.2.1	Suministró e instalación sistema modular para solución habitacional acuerdo a diseño ítem 1.2.1 para los cuatro modulares con sistema constructivo royal building system (rbs). Incluye estructura metálica, paneles en pvc, acero de refuerzo, concreto, conectores en encuentros en muros, modulación de vanos para puertas y ventanas, soldadura, cortes, anclaje a cimentación, flim de protección. (de acuerdo a diseños estructurales de acuerdo -nrs-10 norma sismo resistente de Colombia 2010.	20	$ 221.406.040
2.3	PISOS		
2.3.1	Suministro e instalación de piso acuerdo a diseño ítem 1.2.1 para los cuatro modulares, incluye cerámica para piso y pared de los baños, piso cocina y lavandería, guarda escoba, pega, biselada, win de remate en plástico y emboquillada, placa entre piso, anclajes a muros, remates, piso sector comedor- alojamientos en vinilo pvc con apariencia de madera- antideslizante, transporte, mano de obra, materiales y demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem.	20	$ 34.715.176
2.4	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
2.4.1	Suministro e instalación de red eléctrica acuerdo a diseño ítem 1.2.5 para los cuatro modulares, incluye acometida, red eléctrica interna, tomacorrientes, luminarias, interruptores, tablero de distribución, canalizaciones cajas de paso, conexión a tablero principal o transformador, transporte, mano de obra, materiales y demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem.	20	$ 24.235.233
2.5	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS		
2.5.1	Suministro e instalación de red hidráulica y sanitaria acuerdo a diseño ítem 1.2.3. Para los cuatro modulares, incluye acometida, 01 lavadero, 04 sanitarios, 03 duchas, 01 lavaplatos con mesón de empotrar en acero inoxidable con estufa de 4 puestos, acoples, pega, biselada, accesorios pvc sanitarios, accesorios de pvc, llave de corte, rejillas de piso en acero inoxidable, canalizaciones cajas de paso, transporte, mano de obra, materiales y demás elementos	20	$ 17.387.011

	necesarios para la correcta ejecución del ítem.		
2.6	INSTALACIONES RED CONTRA INCENDIO		
2.6.1	Suministro e instalación de red contra incendio acuerdo a diseño ítem 1.2.3. Para los cuatro modulares, incluye acometida, soportes, canalizaciones, cajas de paso, transporte, mano de obra, materiales y demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem.	0	$ 11.793.045
2.7	VENTANAS Y PUERTAS		
2.7.1	Suministro e instalación de ventanas, puertas y rejillas de ventilación acuerdo a diseño ítem 1.2.1 para los cuatro modulares, incluye vidrios, modulación de vanos para puertas, ventanas y rejillas, soldadura, cortes, anclaje, transporte, mano de obra, materiales y demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem	0	$ 26.054.405
2.8	CUBIERTA		
2.8.1	Suministro e instalación de cubierta acuerdo a diseño ítem 1.2.4. Para los dos modulares superiores, incluye teja, tornillería, sellado de juntas e impermeabilización de los puntos de anclaje, soldadura, perforaciones, corte de pulidora ajustes de perfilería en estructura que soporta la cubierta, canal pvc perimetral y bajantes color blanco, caballete para teja, transporte, mano de obra, materiales y demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem.	25	$ 41.602.282
2.9	ESTRUCTURA METÁLICA EXTERIOR		
2.9.1	Suministro e instalación de escaleras metálica acuerdo a diseño ítem 1.2.1. Para los cuatro modulares, incluye soldadura, cortes, barandas metálicas para escalera, peldaños, transporte, mano de obra, materiales y demás elementos necesarios para la correcta ejecución del ítem.	25	$ 14.526.042
	MATERIAL MOBILIARIO PARA ALOJAMIENTOS MUELLE EGBAS BAHIA SOLANO		
1	aire acondicionado tipo mini split con capacidad de enfriamiento de 12.000 btu, de 110v, tecnología de enfriamiento convencional, refrigerante r410a, control remoto, purificador de aire, temporizador, función turbo, reinicio automático, función de memoria, tablero digital y kit de instalación que incluye: tubería de cobre, cinta vinilo anti condensación, aislamiento térmico flexible de espuma para el control de la condensación, manguera de drenaje y carga básica de refrigerante	25	$ 21.364.104,00
2	secadora eléctrica carga superior a 44 lbs, color blanco, filtro para pelusas, sistema de secado eléctrico, alto 70 - 100 cm, frecuencia 60 hz, voltaje 220v, capacidad de secado 28 kg, niveles de temperatura de secado 5 tecnología auto dry, tipo de energía para secado eléctrico, tipo de panel manual, niveles de secado 14, ancho 109 cm, alarma de fin de ciclo sí, garantía de fábrica 12 meses, función antiarrugas sí, temporizador sí, indicador filtro de motas sí, material de la puerta acero, luz interior sí, material del tambor porcelanizado color cromado	0	$ 4.733.350,00
3	lavadora frontal 22kg, dimensión alto 68,6x98,4x79,6 cm, frecuencia 60 hz, voltaje 110 - 127 v, tecnología lavado adaptativo alta eficiencia, tipo de energía para secado eléctrico, tipo de panel digital, tipo de carga frontal, con sistema de centrifugado material de la tina acero inoxidable y polietileno, color cromado.	0	$ 4.952.806,00
4	nevecón tipo europeo black 628 lts. dimensiones 95 × 76 × 170 cm. peso 118,5 kg. capacidad neta 543lts. luz interior led, bandejas en	0	$ 6.912.428,00

	vidrio templado, tecnología no frost con dispensador. refrigerante r600a		
5	minibar 99l, tecnología frost, material de las bandejas en vidrio templado. dimensiones ancho 53,5 cm alto 83,4 cm fondo 48,5 cm. cuenta con iluminación incandescente en su interior, termostato mecánico para mejorar la temperatura, compresor con gar r600.	0	$ 1.328.048,00
6	horno microondas 0,7pc, 20 lts, 120v, 700w dimensiones (ancho x alto x fondo) 45.5 x 26,2 x 31,5 cm. 10 niveles de cocción con 22 programas	0	$ 632.220,00
7	cafetera 6 tazas, capacidad del tanque 0,66l 110v. sistema antigoteo con acabados en acero inoxidable, porta filtro renovable	0	$ 217.465,00
8	camarote institucional, estructura metálica de tubo redondo 2 pulgadas calibre 18, cubierta en pintura electrostática termo-fijada. dimensiones alto 172 cm, ancho 100cm, fondo 190cm. soldadura mig y acoples plásticos, escalera fija en el piecero con tendido de tablas en madera cepillada.	0	$ 1.269.886,00
9	colchón semi-ortopédico resortado para cama sencilla de 100 x 190 ms. soporta peso de 85 - 100 klg. material espuma de alta densidad 26d tela: superior acolchada importada jacquard, forrado con filtro y protectores de colchón medidas 100 cm ancho x 190 cm largo x 26 cm alto colchón semiortopédico para mayor confort. hipoalergénico con tecnología antiácaros. protector semi-impermeable que protege al colchón contra agentes externos y retrasa el paso de líquidos, se ajusta perfectamente al colchón. medidas 100 cm ancho x 190 cm largo x 30 cm grosor. espumas alta densidad color hueso o marfil no blanco, estructuración del colchón espumado, escala suavidad/firmeza: medio; certificado de calidad y garantía x tres años en estructura, resorte y relleno.	0	$ 770.293,00
10	locker de seguridad para 06 fusiles y 06 pistolas. medidas alto 180 cm, ancho 100 cm, fondo 40 cm, elaborado en acero inoxidable calibre ½, con pintura electroestática color gris, pasador en acero 1045, cerradura de seguridad croix, bisagras en acero 1045, incluye sistema anti palanca.	0	$ 1.213.392,00
11	armario individual en madera con puerta abatibles, bolillo para colgar ropa, entrepaño maletero, dos cajones uno de ellos con chapa de seguridad. 40 cm ancho x 200 cm alto x 49.8 cm fondo. fabricado en madera aglomerada (mdp) y cubierta en melánico	0	$ 777.961,00
12	escritorio con superficie de trabajo en madera bordes en caucho, con archivador metálico de 3 gavetas, con chapa, patas metálicas, medidas 120 cm largo x 60 cm de ancho x 73 cm de alto	0	$ 831.769,00
13	silla ergonómica con soporte lumbar optimo fijo, ruedas en nylon certificación ansi bifma 100,000 ciclos de rodamiento. base en nylon de 5 aspas. mecanismo basculante, mecanismo de tensión ajustable, brazos fijos en nylon, asiento acolchado en tela mesh de alta resistencia para oficina	0	$ 805.327,00
14	mesa de noche en madera madecor termo-laminado de 15ms. dimensiones: alto: 60 cm ancho: 42 cm fondo: 33 cm. 01 cajón y 01 gaveta	0	$ 253.289,00
15	comedor 6 puestos. incluye 1 mesa, 6 sillas. mesa de vidrio medidas 78x78x160 cm con estructura en metal. sillas con estructura en metal, cojinería en cuero sintético, ancho 40 cm, alto 88 cm	0	$ 1.586.766,00
16	juego de comedor en rattan diseño natural de 6 puestos. la estructura y cubierta de la mesa fabricadas rattan sintético nacional de alta densidad y su estructura de aluminio inoxidable de gran	0	$ 9.123.238,00

	calidad y su forma rectangular, acabado pintado color café, muy resistente para uso tanto interior como exterior, incluye vidrio espesor de 10 pulgadas para la mesa medidas de la mesa: 76 (alto) (ancho/diámetro 206.5) x 230 (profundidad) cm. sillas fabricadas en rattan sintético nacional de alta densidad sus patas de aluminio inoxidable de gran calidad, medida de la silla 90 (alto) x 46 (alto del asiento) x 50 (ancho) x 62 (profundidad) x 60(profundidad diagonal) cm. y cojines de gran comodidad y resistencia fabricados en dralón, todos ellos desenfundadles con cremallera y lavables en lavador. fácil de limpiar, no necesita mantenimiento, ligero y fácil de mover para poder adaptarse a cualquier entorno. color del mueble café, color de los cojines: beige, material de los cojines dralón: -fibra sintética acrílica 100 % teñida y con protección teflón -resistencia a la abrasión 22.000 ciclos -no destiñe -resistencia a: luz solar, agua marina, manchas, hongos y lavados. -fácil mantenimiento: admite planchado, limpieza con agua y jabón suave. -anti rayos uva clase 7 -peso 190gr/m² -cojines de asiento de 10 cm de grosor. incluye 01 mesa forma rectangular y 06 sillas fabricada en rattan color café, vidrio transparente espesor 10 pulgadas y 06 cojines fabricados en dralón		
17	sofá grande en rattan para interiores o exteriores de tres (03) plazas y/o puestos. en color natural con cojín en color marrón incluidos. sofá de alta calidad fabricado de aluminio inoxidable de gran calidad y rattán sintético plano de doble trenzado. estructura y uniones fabricadas de aluminio reforzado de gran grosor para obtener unos muebles resistentes y con alta durabilidad. las patas terminan con protección de aluminio y con tacos de goma de gran calidad y grosor, para evitar rallar los suelos delicados y reducir el ruido producido con el movimiento. características: tamaño: 80x2.17x93 cm color: natural material: estructura de aluminio y rattán sintético capacidad: 3 plazas protección uv: si. tornillería: tornillería y anclajes vistos de acero inoxidable con gran resistencia a la oxidación. cojines: cojín incluido de gran comodidad y resistencia en color marrón, asiento desenfundable para que puedas lavarlo con facilidad. protección uv que aporta una elevada protección sobre los efectos nocivos de los rayos uv y también ayuda a evitar la decoloración. cojines realizados con tela de gran gramaje, con unos materiales fuertes y duraderos, 100 % teñida y con protección teflón -resistencia a la abrasión 22.000 ciclos -no destiñe -resistencia a: luz solar, agua marina, manchas, hongos y lavados. -fácil mantenimiento: admite planchado, limpieza con agua y jabón suave. -anti rayos uva clase 7 -peso 190gr/m² -cojines de asiento de 10 cm de grosor y respaldos rellenos adaptable al cuerpo para una mayor suavidad y adaptabilidad a las medidas del sofá: largo entre 2'17 y 2'40 metros de largo	0	$ 3.643.964,00
18	juego de sabanas para cama sencilla color blanco: incluye sábana ajustable, sábana plana y dos fundas. medida sábana ajustable tipo de tela 50% algodón, 50% poliéster, medidas: funda para almohada 65 cm x 35 cm, sabana con ajuste en caucho medida sábana ajustable 100x190x23cm, medida	0	$ 145.721,00
19	almohada poliéster blanco con cubierta anti-fluidos y antialérgica con forros en poliéster y la capa exterior con recubrimiento blanco, con forros diferentes para el poliéster y la capa exterior, lo cual permita lavar el forro exterior de la almohada, así mismo con cierre para poder sacar el relleno de 20 x 26 pulgadas (50,80 x 66 cm)	0	$72.246,00

9.2 CONTENEDOR MODULAR HABITACIONAL CON DOTACIÓN CERRO MUTIS:

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda
1	ELEMENTOS		
1.1	Suministro de un contenedor TIPO SEA LAND van o para transporte marítimo de 20 pies tiene medidas estándar 2.352m x 2.393m x 5.898m (ancho x alto x largo). Incluye muro perimetral del contenedor en base a plancha plegada de acero de 2,5 mm de espesor, unidas mediante soldadura MIG, piso en planchas de terciado de 32 mm fijadas mediante pernos auto roscantes. La cubierta debe ser con pendiente hacia cara posterior de la unidad. Se debe tener en cuenta que el contenedor debe ser transportado por partes y posteriorme armado en sitio.	50	$35.431.041,3
1.2	Suministró y aplicación de esquema de pintura anticorrosivo en PRIMER Z8 BLER o de mejores especificas tanto interna como externa del contenedor. Incluye limpieza y lijado de la superficie metálica del contenedor.	50	$494.711,54
1.3	Suministró y aplicación de impermeabilización e imunizado del piso en madera del contenedor especialmente contra humedad para evitar la putrefacción, usando pintura o impermeabilizante para madera (Merulex® I.F.A, sika o equivalente) que garantice la durabilidad de esta contra humedad, plagas y hongos como mínimo 10 años. Este debe estar perfectamente nivelado. La impermeabilización deberá ser aplicada por las dos caras del piso, interior y exterior.	50	$4.794.833,56
1.4	Suministró y aplicación de esquema de pintura en color azul marino Aroflex – acabado externo homogéneo a tres manos.	50	$3.543.053,64
1.5	Suministro e instalación de láminas de tipo de Fibrocemento de espesor de 17mm; resistente a golpes e impactos, impermeable, incombustible; placa Compuesta por una mezcla homogénea de cemento, cuarzo y fibras de celulosa, no contiene asbestos. Dimensionalmente estable, inalterable. Incluye todos sus accesorios de acabado de cintas y masillas, perfilería en lámina galvanizada apta para placas de hasta 56.52k. El área a recubrir es el techo y todas las paredes exceptuando el área de las puertas y ventanas.	50	$3.385.857,75
	Suministro e instalación de láminas de poliuretano de alta densidad (antiflama), en las caras internas del mismo, con un espesor Mínimo de 5 cm, para garantizar un adecuado aislamiento térmico y acústico. Incluye cielo raso y muros internos.	50	$2.184.149
1.7	Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 color blanco aplicación de 3 manos de pintura. El espesor mínimo será de 3 mils entre las tres manos de pintura. Acabó interno en muros y cielo raso.	50	$3.662.104,05

1.8	Suministro e instalación de piso de caucho tráfico comercial alto tipo konker o equivalente como acabado interno, de cuadros de espesor mínimo 4 mm. Incluye aplicación de un aislante y/o elemento de empalme entre el piso y el acabado para asegurar estabilidad y evitar dilataciones o levantamientos por los cambios de temperatura.	25	$4.767.756,18
1.9	Suministro e instalación de guarda escobas deberá ser de caucho o PVC, del mismo color del Piso, como acabado interno.	25	$992.178
1.10	Suministro e instalación de division zona baño de largo 1,435 dispuesta en dos muros en láminas de tipo de Fibrocemento de espesor de 17mm; resistente a golpes e impactos, impermeable, incombustible. Dimensionalmente estable, inalterable. Incluye todos sus accesorios de acabado de cintas y masillas, perfilería en lámina galvanizada apta para placas de hasta 56.52k.Acabado vinilo tipo 1 color blanco aplicación de 3 manos de pintura.	25	$654.991,65
1.11	Suministro e instalación de láminas de poliuretano de alta densidad (antiflama) para zona baño, en las caras internas del mismo, con un espesor Mínimo de 5 cm, para garantizar un adecuado aislamiento térmico y acústico.	25	$372.822,54
1.12	Dados en concreto de 210 kg/cm2 incluye acero de refuerzo en malla en ambos sentidos de ½" separaciones 25 cm, doble malla, armado 04 varillas ½ con flejes ¾ cada 20 cm. Cada dado de sección 60 x 60 cm, y largo 1.5 m de altura promedio. Acuerdo nivelación del terreno. Incluye formaleta en madera,excavacion. Profundidad de cimentación 1.20m.Rerito de material sobrante	50	$1.973.696
1.13	Suministro e instalacion de Ducha/cabina antivandálica con tres puntos de soporte en piso y tres vigas traseras de amarre para brindar, mayor resistencia, se entrega con puerta en aluminio crudo con pasador horizontal con mango en goma anclado con remaches.	20	$754.246
1.14	Suministro e instalacion de accesorios para ducha en tubería galvanizada con sus respectivos acoples y uniones entre si instalada internamente.	10	$650.719
1.15	Suministro e instalación de sanitario Espesor mínimo de loza: 6 mm • Tolerancia dimensional: ± 3% • Instalación: 305 mm• Altura del Sello: 55 mm• Diámetro de la Trampa: 47.6 mm • Diámetro de la Trampa: 47.6 mm• Superficie de agua: 190 x 156 mm. Incluye pega, emboquillado, accesorios, tuberías de conexión y desagüe, garantizando su optima instalación.	0	$479.347
1.16	Suministro e instalación de lavamanos con su respectivo pedestal, altura 75 cm, ancho 40 cm, Largo 51 cm, color blanco, entregado con sus respectivos accesorios.	0	$278.447
1.17	Suministro e instalación de Interruptor sencillo Voltaje (V) 127-250 para el control de encendido de bombillas, todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE.Incluye punto electrico, cable numero 12, terminales y accesorios.	0	$317.520

1.18	Suministro e instalación Tubería EMT de 1/2 con sus respectivos acoples, terminales embebida en los muros y canalización.	0	$1.247.584
1.19	Suministro e instalación de puerta para acceso principal con chapa pico de loro con manija, medidas 2 mt x 1 mt en acero color blanco, estilo apertura hacia exterior, grosor de la puerta de acuerdo a muro después tener acabo en láminas de tipo de Fibrocemento. Incluye corte en lamina de contenedor, soldadura , vanos para adecuacion de puerta y demás elementos para su correcta instalación.	0	$2.450.000
1.20	Suministro e instalación de puerta para acceso camarotes con chapa pico de loro con manija, medidas 2 mt x 1 mt en acero color blanco, grosor de la puerta de acuerdo a muro después tener acabo en láminas de tipo de Fibrocemento. Incluye corte en lamina de contenedor, soldadura , vanos para adecuacion de puerta y demás elementos para su correcta instalación.	0	$2.842.000
1.21	Suministro e instalación de puerta para acceso baño con chapa pico de loro con manija, medidas 2 mt x 1 mt en acero color blanco, grosor de la puerta de acuerdo a muro después tener acabo en láminas de tipo de Fibrocemento. Incluye corte en lamina de contenedor, soldadura , vanos para adecuacion de puerta y demás elementos para su correcta instalación.	0	$1.421.000
1.22	Suministro e instalación de escalera de ingreso con lámina de alfajor a contenedor, se apoyará en el borde de la puerta de acceso del contenedor. Incluye una mano de pintura anticorrosiva y dos manos de pintura esmalte de alta calidad, con acabado resistente a intemperie	50	$552.926
1.23	Suministro e instalación de Ventana en PVC con dos alas, un ala fija y un ala corrediza de 1 mt x 1 mt, Ventana altavista con perfil en PVC multicameral para mayor aislamiento térmico. Marcos sellados por termofusión, para mayor hermeticidad y minimizar filtraciones de agua. Incluye el corte de la lamina en el contenedor para su correcta instalación, vanos para la correcta instalacion.	50	$1.101.872
1.24	Instalación BlackOut color blanco, dimensiones de 1.00 x 1.50 mts. Incluye instalación y accesorios.	25	$274.400
1.25	Suministro e instalación de Rejilla tipo persiana en aluminio pintado al horno color blanco de 70 cm x 35 cm con sus canaletas horizontales remachadas y rematadas con silicona en las cuatro caras laterales.Incluye corte a lamina de contenedor ,soldadura y vanos de adecuacion de rejillas.	25	$235.692
1.26	Suministro e instalación de tablero de breaker tablero de electricidad, anticorrosivo, trifásico con puerta, resistente, 6 circuitos completamente instalada.	25	$382.425
1.27	Suministro e instalación de Breaker automático para montaje en riel din termomagnético curva de disparo tipo C, puede ser usado como interruptor principal o aislar alimentación de una instalación	25	$144.052
1.28	Suministro e instalación Panel LED 24W, 10Pulgadas, 6500K Color Luz Fría, Multivoltaje, Borde Blanco, Cuadrado Sobreponer.Incluye accesorios de fijación, conectores de resorte y derivación en cable rencauchutado para alimentación de luminaria.	25	$287.484

1.29	Suministro e instalación de punto electrico de toma corriente 110 V para zona interior.Incluye tomas dobles de 110 v, polo aislado, maquillada con una plaqueta plastica contramarcada (bajo o alto relieve) o metalico.	25	$241.770
	Suministro e instalacion de red interna en cable3X(No. 12) desde el tablero principal, aire acondicionado, luminarias, toma corrientes e interreptores.	25	$450.398
1.30	Instalación de Aire acondicionado de 12,000 BTU TIPO inverter completamente instalado con sus respectivas bases metálicas en ángulo con diagonal para soporte, unidas entre sí con soldadura MIG.Incluye puntos electricos y drenajes.	25	$2.706.838
1.31	Suministro e instalación Canal de recolección de aguas lluvia superiores a lo largo de todos los laterales de la cubierta con empalme en dados metálicos superiores.	25	$1.858.593
1.32	Suministro e instalación de Bajantes de agua lluvia internos (no se observan) a través de columnas metálicas. Incluye hasta conexión a tanque de almacenamiento. Longitud mínima de 15 ml	25	$3.687.992
1.33	Suministro e instalación PLUG de sobreponer exterior hermético de 4 hilos de 32 A macho/hembra.	25	$241.570
1.34	Desarme por piezas para traslado marítimo del contenedor. Incluye transporte hasta el punto de embarque en Buenaventura, acomodación y embalaje del material a las unidades de la Armada Nacional. Los elementos deberán estar correctamente embalados de tal forma que tengan dimensiones que permitan el movimiento del material en el medio de transporte más desfavorable.Incluye personal el cual debe hacer el ambarque , la acomodacion.	50	$2.742.746
1.35	Arme por piezas en destino del contenedor posterior a traslado. Incluye retiro de embalaje y demas elementos para la correcta ejecuccion de esta actividad.Disposicion final de residuos de sobrantes.Incluye personal el cual debe hacer el armado y la acomodacion.	0	$3.394.446
1.36	Transporte hasta el punto de embarque del material en Buenaventura para el desarrollo del proyecto, acomodación y embalaje del material a las unidades de la Armada Nacional. Los elementos deberán estar correctamente embalados de tal forma que tengan dimensiones que permitan el movimiento del material en el medio de transporte más desfavorable.	75	$3.668.728
3	ADECUACIONES DE OBRA CIVIL PARA FUNCIONALIDAD DEL MODULO HABITACIONAL.		
3.1	Instalación Tanque negro de 1,000 Lt de capacidad de almacenamiento con. su respectiva tapa y puntos para ingreso y salida de agua.Incluye excavacion,accesorios, registros y tuberías de conexión y desagüe.	50	$4.899.373
3.2	Instalación Bomba HIDROFLO D 0,5 HP, compuesta de hierro y metal con caudal de 40 Lt por minuto, consumo 5,5 Amperios, diámetro de descarga, potencia 0,5 HP de corriente monofásica, equipo de presión de alto rendimiento y trabajo continuo de 110 V. Incluye correcta instalación redes eléctricas con caja eléctrica e hidraulicas.	50	$4.604.746

3.3	Suministro e instalacion de conexión de tubería hidráulica, entre los bajantes del contenedor internos y el tanque, a su vez, entregando el retorno de agua hacia el sanitario para su reutilización. Entregado todo enterrado en tierra.Incluye las actividades de excavación, suministro e instalación de tubería hidraulica.	50	$7.236.989
3.4	Instalacion sistema de tratamiento de aguas residuales Ajover o similar, incluye tanque séptico TS, tanque anaerobio TA, caja de recolección y distribución caja de inspección y campo de infiltración. Incluye las actividades de excavación, suministro e instalación de tubería sanitaria, suministro e instalación de elementos del sistema sanitario.	50	$1.526.843
4	CONEXIÓN ELÉCTRICA A PLANTA SUMINITRO ELECTRICA:		
4.1	Suministro e instalacion Cableado encauchetado de 3 líneas #8	20	$674.010
4.2	Suministro e instalacion tubería metálica para guiar el cableado desde la planta hasta la unidad modular.Incluye excavacion,relleno y recuperacion de areas afectadas.	20	$234.710
4.3	Suministro e instalacion planta eléctrica trifásica de minimo 5Kva con tablero de control que cumpla la capacidad para la unidad de vivienda.	20	$3.815.532

10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

10.1 INFORMACIÓN GENERAL DE AVANCE DE OBRA:

SEMANA	FECHA	ACTIVIDAD EN OBRA	ACTIVIDADES DE GESTION
1	3/08/2022	SE REALIZA MUESTREO MATERIAL ALTERADO PARA ESTUDIO GEOTECNICO A 0,5 - 1,0 - 2,0 - 3,0 METROS	SE INICIA GESTION DE MOVILIZACION DE BDA, PARA MOVIMIENTO DE MATERIAL A SOLANO
	4/08/2022	SIN ACTIVIDAD QUE REPORTAR	SE SOLICITA A LA BASE NAVAL ARC MALAGA (N3) VIA SEÑAL INTEGRO DE MATERIAL EN CRONOGRAMA OPERACIONAL DE BDA
	5/08/2022	SIN ACTIVIDAD QUE REPORTAR	SE VERIFICAN ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CONTRATO PARA UNIDAD HABITACIPONAL DE SOLANO.
	6/08/2022	SIN ACTIVIDAD QUE REPORTAR	SE VERIFICA ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MOVILIARIOS CONTRATADOS.
	7/08/2022	**FIN DE SEMANA**	

2	8/08/2022	SIN ACTIVIDAD QUE REPORTAR	SE REALIZA REVISION DE MOBILIARIOS CONTRATADOS EN EL CECOP II, PUESTO NOVEDAD DE ADQUISICION
	9/08/2022	SIN ACTIVIDAD QUE REPORTAR	SE AJUSTAN CANTIDADES DE MOBILIARIOS PUESTO NECESIDAD Y ADICION SOBRANTE DE CDP
	10/08/2022	SIN ACTIVIDAD QUE REPORTAR	SE APRUEVA MOVIMIENTO DE UNIDAD TIPO BDA PARA EL APOYO DE TRANSPORTE DE MATERIAL - BAHIA SOLANO
	11/08/2022	SIN ACTIVIDAD QUE REPORTAR	SE REVISA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE CONTRUCCION CERRO MUTIS Y BAHIA SOLANO; SE DAN OBSERVACIONES Y CORRECCIONES TECNICAS, SEGÚN OBLIGACIONES CONTRACTUALES
	12/08/2022	PERSONAL REALIZA INSPECCION A LAS 03 CAJAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	SE EVALUAN LOS RESULTADOS DEL ESTUDIOS GEOTECNICO; NO SE ENCUENTRA NIVEL FREATICO Y SE AVALA LA CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO PARA LA NECESIDAD HABITACIONAL.
	13/08/2022	SIN ACTIVIDAD QUE REPORTAR	SE PREPARA MODIFICACION PARA INTEGRAR CAMBIO DE MOBILIARIO Y PRESUPUESTO A EJECUTAR CONTRATO No. 062-ARC-CBNL02-2022.
	14/08/2022	**FIN DE SEMANA**	
3	15/08/2022	SIN ACTIVIDAD QUE REPORTAR	SEGUIMIENTO ALA CONSTRUCCION DE MODULARES SBS ASSEMBLA.
	16/08/2022	SIN ACTIVIDAD QUE REPORTAR	SEGUIMIENTO ALA CONSTRUCCION DE MODULARES SBS ASSEMBLA.
	17/08/2022	SIN ACTIVIDAD QUE REPORTAR	SE ENVIA EL PRIMER OFICIO DE INCUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES AL CONTRATISTA N°20220014770018701
	18/08/2022	SIN ACTIVIDAD QUE REPORTAR	SEGUIMIENTO ALA CONSTRUCCION DE MODULARES SBS ASSEMBLA.
	19/08/2022	SIN ACTIVIDAD QUE REPORTAR	SE PREPARA LA LOGISTICA PARA LA RECEPCION Y EMBARQUE DE 21TON DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN EL MUELLE PUERTA ROJA.
	20/08/2022	SIN ACTIVIDAD QUE REPORTAR	SIN ACTIVIDAD QUE REPORTAR

	21/08/2022	**FIN DE SEMANA**	
4	22/08/2022	SIN ACTIVIDAD QUE REPORTAR	SE PREPARA MODIFICACION PARA INTEGRAR CAMBIO DE MOBILIARIO Y PRESUPUESTO A EJECUTAR CONTRATO No. 062-ARC-CBNL02-2022.
	23/08/2022	SIN ACTIVIDAD QUE REPORTAR	SE REMITE MODIFICACION PARA CORRECCIONES ALA BASE NAVAL ARC BAHIA MALAGA (CBNL02).
	24/08/2022	SIN ACTIVIDAD QUE REPORTAR	SE GESTIONA RECEPCION DE MATERIAL EN BUENAVENTURA PREVIO EMBARQUE
	25/08/2022	SIN ACTIVIDAD QUE REPORTAR	SE REALIZA PRIMER EMBARQUE DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (21TON).
	26/08/2022	SE INICIA PLANEACION DE RECEPCION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y DESEMBARQUE DE CONTENEDOR CERRO MUTOIS.	SE SOLICITA A LA AERO NAVAL APOYO PARA EL TRANSPOTE DE MATERIAL A CERRO MUTIS (9,64TON)
	27/08/2022	SIN ACTIVIDAD QUE REPORTAR	SIN ACTIVIDAD QUE REPORTAR
	28/08/2022	**FIN DE SEMANA**	
5	29/08/2022	SE INICIA PLANEACION DE RECEPCION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y DESEMBARQUE DE CONTENEDOR CERRO MUTOIS.	*SE ENVIA SEGUNDO OFICIO DE INCUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES AL CONTRATISTA N° 20220014770466973 *SE ENVIAN OBSERVACIONES DE LOS PLANOS IDRAULICOS, ESTRUCTURALES, SANITARIOS.
	30/08/2022	SIN ACTIVIDAD QUE REPORTAR	SE REMITE PARA APOYO TECNICO A CBNL02 EL PLANO ELECTRICO, VOZ Y DATOS PUESTO QUE GRUPA NO CUENTA CON UN PROFECIONAL IDONEO PARA LA REVICION Y APROBACION DEL MISMO.
	31/08/2022	SE DESEMBARCA Y ALMACENA MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA POSTERIOR TRASLADO AEREO.	SE VERIFICA ACTA DE EJECUCION N°2, PARA INICIA PROCESO DE PAGO.
	1/09/2022	ACOMODACION DE MATERIAL EN CONTENEDOR DE ALMACENAMIENTO	SE GESTIONA LA LOGISTICA DE LA NECESIDAD DE CARGA DEL APOYO AEREO, CON LA AERONAVAL Y N3-BNL02.
	2/09/2022	LOGISTICA DE MATERIAL	SE INICIA PROCESO DE PAGO PAC AGOSTO
	3/09/2022	SIN ACTIVIDAD QUE REPORTAR	SIN ACTIVIDAD QUE REPORTAR
	4/09/2022	**FIN DE SEMANA**	

10.2 **NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO:**

Ala fecha 02 de septiembre se presenta un retraso de aprobación de planos de treinta y dos (32) días según cronograma de actividades, debido a la falta de puntualidad del proveedor o contratista en la entrega de los mismos; Aun así, se han adelantado gestiones logísticas para programar movimientos de unidad tipo BDA e iniciar del transporte de material de construcción, con el fin de mitigar el retraso y poder efectuar el proyecto en los plazos establecidos.

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista FABIO GARZÓN DAZA frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el articulo 99 "*Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud*.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que se encuentra al día en el pago de sus aportes.

En tratandose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el ____de 20___, suscrito por el ____ (Representante Legal/Contador/Revisor Fiscal)_____ en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a fecha _____de 20_____, así como en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.


Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra, evidenciándose que existe materialización de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

13.1 **Lunes 03 de agosto hasta el día 03 de septiembre de 2022:**
ETAPA II CONSTRUCCION SISTEMAS MODULARES:

 Recolección de muestras alteradas para estudio geotécnico.	 Se toman muestras a 0.5 - 01 - 02 - 03 M
 Replanteo de obra in situ.	 Personal realiza inspección a 03 cajas del sistema de alcantarillado comprobando condición, viabilidad de conexión y capacidad de acople ala nueva necesidad
 Conteiner cerro mutis en estado de puntalacion y diseño.	 Cargue de 22.9 Ton de material de construccion en BDA Bahia Colombia.

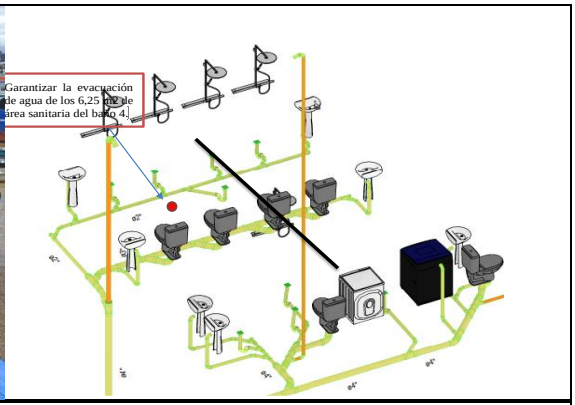	
Descargue de MATERIAL de construcción en muelle de Bahía Solano	Revisión, observación y formulación de corrección de diseños estructurales, sanitarios, hidráulicos y eléctricos por profesional idóneo.
	
Replanteo de proyecto Cerro Mutis	Gestión de apoyo Aero naval para 9.64 Ton de material con destino Cerro Mutis, esperando confirmación.


14 RELACIONAR INFORME FINAL:

N/A

15 REPORTE FINAL:

N/A

Atentamente,



TKEIN MORENO ALVAREZ JULIAN ALFOSNO
C.C. 1.049.652.151 de Tunja
Estación Guardacostas Primaria de Buenaventura
3209466735
Julian.moreno.a@armada.mil.co
